INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

ICCU
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 219 DE 2025

CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA No. 138 DE 2025

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

INFORME MENSUAL No. 14

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2026

CONSORCIO INTERVENCIÓN A.C.

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

BOGOTÁ D.C., 01 DE JUNIO DE 2026

TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción 8
2. Descripción del proyecto 11
   2.1 Localización 11
   2.2 Estado inicial de la vía 11
3 Información Contrato de Obra 12
   3.1 Información general contrato de obra 12
   3.2 Actividades ejecutadas en el mes 13
   3.2.1 Actividades ejecutadas en el mes componente técnico 13
   3.2.2 Actividades Fase II Caracterización de Materiales y Propuesta de Intervenciones 13
   3.2.3 Actividades Fase III Construcción 15
   3.2.3.1 Topografía 34
   3.2.4 Actividades ejecutadas en el mes componente ambiental 36
   3.2.4.1 cumplimiento del plan de adaptación a la guía ambiental (paga). 36
   3.2.5 Actividades ejecutadas en el mes componente social 39
   3.2.5.1 Programa de Atención a la Comunidad: 39
   3.2.5.2 Programa de información y divulgación 43
   3.2.6 Actividades ejecutadas en el mes componente SST 45
4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra 49
   4.1 Estado General del Tiempo 51
   4.2 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra 52
   4.2.1 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría 60
   4.3 Seguimiento al Factor de Calidad de Obra (Plan de Gerencia) 65
   4.3.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo 69
   4.3.2 Seguimiento Programa de Obra 70
5 Información contrato de interventoría 72
   5.1 Información general del contrato de interventoría 72

5.2 Informe semanal 74
5.3 Descripción de las actividades realizadas por el Interventor 74
5.4 Informe del Programa Anual de Caja – PAC 76
6 Reportes ejecución mensual contrato de interventoría 77
6.1 Equipo y vehículos Contrato de Interventoría 77
6.2 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría 77
6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría 79
6.4 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría 80
6.5 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría 81
6.5.1 Seguimiento al Factor de Calidad Contrato de Interventoría 81
6.6 Otros Documentos seguimiento mensual 81
6.6.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo 81
6.7 Actas de Comité de Obra 82
7 Conclusiones y recomendaciones 82
7.1 Conclusiones y recomendaciones área ambiental 86
7.2 Conclusiones y recomendaciones área social 86
7.3 Conclusiones y recomendaciones área SST 87
8 Anexos 88
8.1 Carpeta componente técnico 88
8.2 Carpeta componente social 88
8.3 Carpeta componente SST 88
8.4 Carpeta componente ambiental 88
8.5 Informe de buen manejo del anticipo de obra 88
8.6 Informe mensual de obra en observación 88
8.7 Informe de buen manejo del anticipo de Interventoría 88
9 Registro fotográfico del avance de las obras. 88
9.1 Correspondencia 101
9.2 Bitácora de obra 101

9.3 Certificación componente ambiental y social.....102

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Aprobaciones entregables fase 1 y 2 14
Tabla 2. Actividades de estabilización de rasante municipio de Ubalá tramo de prueba. 15
Tabla 3. Alcantarillas intervenidas dentro del periodo del 21 de julio al 10 de octubre, suspensión de actividades. 17
Tabla 4.Registro fotográfico Ubalá 18
Tabla 5. Avance de obra por vereda, estabilización de rasante municipio de Junín provincia Guavio. 19
Tabla 6. Relación de alcantarillas ejecutadas y porcentaje de avance. 20
Tabla 8. Alcantarillas construidas en el municipio de gama. 20
Tabla 8. Definición de sectores homogéneos tramo El Rosario – La Caja – Chatasuga – La Llanada – Ferralarada – Barro Negro – Granadillo – Chivate – Resguardo Bajo..... 21
Tabla 9. Registro fotográfico actividades tratamiento superficial simple - municipio de Choachí..... 22
Tabla 10. Avance tratamiento superficial simple municipio de Choachí provincia Oriente 26
Tabla 11. Definición de sectores homogéneos tramo Fomeque Cáqueza..... 27
Tabla 12. Registro fotográfico actividades mejoramiento de rasante con cemento municipio de Fomeque. 27
Tabla 13. Avance mejoramiento de rasante tramo municipio de Fomeque provincia Oriente 31
Tabla 14. Definición de sectores homogéneos tramo Siecha – Caldera – Potrero Grande. 32
Tabla 15. Avance mejoramiento de rasante tramo municipio de Chipaque provincia Oriente 33
Tabla 16. Definición de sectores homogéneos tramo Vereda San Rafael - Vereda Altocharco - Sector alto de la Virgen - Vereda La Unión..... 33
Tabla 17. Avance mejoramiento de rasante tramo Municipio de Sibaté de la PROVINCIA DE SOACHA..... 33
Tabla 18. Registro fotográfico actividades topografía Guavio. 35
Tabla 19. Registro fotográfico actividades topografía Oriente. 36
Tabla 20. Cuadro de capacitaciones 37
Tabla 21. Manejo de residuos peligrosos 38

Tabla 22. Gestión de RCD 39
Tabla 23 PQRSD del mes de mayo. 40
Tabla 26. Puntos SAU 41
Tabla 25. Recorridos internos – mayo 2026 42
Tabla 26. Recorridos con la comunidad – mayo 2026 42
Tabla 27. Acciones de información – reuniones participativas 43
Tabla 28. Estado de los volantes y folletos– abril 2026 43
Tabla 29. Actas de vecindad aprobadas- marzo del 2026 45
Tabla 39. Informes semanales de contratista – mayo 2026 45
Tabla 31. Distribución de maquinaria del lote 1 a la fecha del mes de abril del 2026. 47
Tabla 42.mesas de trabajo realizadas en el mes de mayo 2026 48
Tabla 33. tabla de control presupuesto ejecutado semanal del contratista 50
Tabla 45. Resumen precipitaciones mensual del mes de mayo 2026 51
Tabla 35. Avance físico del contrato 71
Tabla 36. Avance financiero de acuerdo con los capítulos de ejecución 71
Tabla 37. Avance de actividades de obra por fases 72
Tabla 38. Personal de la interventoría, periodo mes de febrero 77
Tabla 39. Personal de interventoría-personales especialistas 78
Tabla 40. Retiro de personal de interventoría 79
Tabla 41. Valor acumulado de actividades ejecutadas por parte de la interventoría ... 80
Tabla 53. Estado actual del anticipo de Interventoría CTO ICCU-219-2025 81

INDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. % Compactación. 58
Ilustración 2. Resultados ensayos de Interventoría 61
Ilustración 3. Resultados ensayos de Interventoría 64
Ilustración 4. Control inversión del anticipo de obra a corte del 31 de mayo del 2026 70

RESUMEN MENSUAL DEL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

El Informe Mensual de Interventoría No. 14, correspondiente al mes de mayo de 2026, presenta un balance detallado de las actividades ejecutadas por el contratista en el marco de la supervisión técnica, administrativa, financiera y documental del contrato de obra ICCU-138-2025. En relación con la Fase I correspondiente al diagnóstico y

caracterización vial alcanzó un avance del 100 % al 12 de diciembre de 2025, de igual forma la Fase II correspondiente a la caracterización de materiales y propuesta de intervenciones alcanzó un avance del 100% al 24 de abril de 2026.

Durante el mes de mayo, en el marco de la Fase III correspondiente a la intervención de las vías objeto del proyecto, las actividades de obra se concentraron en el municipio de Ubalá, provincia del Guavio. En este sector se ejecutaron trabajos de mejoramiento de rasante en una longitud aproximada de 2.6 km, así como la construcción de dos alcantarillas. Se prevé dar continuidad y culminar estas actividades durante el próximo mes. Por otra parte, en los municipios de Gama y Junín la ejecución de actividades de estabilización finalizo en meses anteriores, a la fecha se encuentra pendiente el inicio de las actividades correspondientes a la instalación de tratamiento superficial simple (TSS), programadas para el mes de junio.

En la provincia de Oriente se finalizaron las actividades de estabilización de la rasante en el municipio de Choachí, con una intervención total según levantamiento topográfico final de 11.655,69 ml y un volumen total de 9.570,91 m³ de material estabilizado. Adicionalmente se iniciaron las actividades de tratamiento superficial simple, con una intervención para el mes de mayo de 6.216,00 ml y un área aproximada de 24.864,00 m², con un acumulado de 10.263,51 ml. Por otra parte, se continua con actividades de estabilización de rasante en el municipio de Fomeque, con una intervención para el mes mayo de 1.360 ml y un volumen aproximado de 1.394,00 m³ de material estabilizado. Así mismo en el municipio de Chipaque se finalizaron actividades de estabilización de rasante, con una intervención total según levantamiento topográfico final de 2.418,40 ml y un volumen total aproximado de 1.764,09 m³ de material estabilizado

En la provincia de Soacha se finalizaron las actividades de estabilización de la rasante en el municipio de Sibaté, con una intervención de 3.783,24 ml y un volumen total aproximado de 2.890,26 m³ de material estabilizado. De igual forma se finalizaron

actividades de recubrimiento superficial con una intervención aproximada de 17.276,79 m^2.

De este modo, la Fase III la cual corresponde a las actividades de obra, se viene ejecutando en las provincias del Guavio y Oriente, concentrándose en el mejoramiento de rasante para este mes en los municipios de Ubalá y Fomeque; resultando así en una ejecución acumulada del 46.01%, y del 3,38% durante el periodo, y un retraso del 13,42%. Se registra un avance físico de 38.034,33 ml de capa estabilizada con proes plus más cemento. Finalmente, el informe describe los aspectos generales del contrato ICCU-219-2025 de interventoría, destacando el alcance de las labores ejecutadas y el seguimiento a los compromisos establecidos.

En el componente financiero, la ejecución acumulada alcanzó la suma de $15.798.613.795,89 y de $1.161.765.599,72 durante el periodo. La interventoría mantuvo un seguimiento integral a los aspectos técnicos, financieros, de calidad, sociales, ambientales y de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos contractuales y la mitigación de riesgos en la ejecución.

A corte del presente informe se mantienen 3 municipios con ejecución simultanea de actividades de instalación de tratamiento superficial simple TSS (Choachí, Oriente), estabilización de rasante (Ubalá, Guavio) y (Fomeque, Oriente); por lo que la Interventoría ha conminado al contratista contar con 5 tramos de intervención, los 2 faltantes con intervenciones posibles con construcción de alcantarillas en el municipio de Chipaque y Fosca para dar cumplimiento al anexo técnico del contrato.

Se radico en la entidad el modificatorio N° 2 al contrato de Obra ICCU-138 del 2025, en el cual se incluyen las actividades no previstas del TTS y Berma Cunetas en concreto reforzado, viabilizadas por Interventoría. La modificación presentada no implica adición presupuestal, de tal forma, que se balancearon las cantidades contractuales para

compensar los ítems no previstos y garantizar la ejecución máxima de los tramos priorizados con base en los resultados de la fase de caracterización.

1. Introducción

Dentro de este marco, el Departamento de Cundinamarca, a través del Instituto de caminos y construcciones de Cundinamarca (ICCU), en el LOTE 1, firmó el Contrato No. ICCU-138-2025 con el CONSORCIO SOFAN C-031 para desarrollar el proyecto cuyo objetivo es la **"Intervención de las vías que conforman el Programa de Caminos Vecinales, Caminos para Quedarse, en las Provincias de Medina, Guavio, Oriente y Soacha, en el Departamento de Cundinamarca"**. Este proyecto no solo busca mejorar la infraestructura vial, sino también crear un impacto positivo en las comunidades a través de la creación de empleos, la optimización del acceso a servicios básicos, y el impulso al desarrollo local.

Así mismo, dando aplicación al artículo 32 de la ley 80 de 1993 realizó el Contrato No. ICCU-219-2025 con el CONSORCIO INTERVENCIÓN A.C. cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

La supervisora de los contratos de obra e interventoría para el LOTE 1 es **Laura Daniela Nieto Gutiérrez**, quien conto con el apoyo inicialmente de **Dairon Andrés Solano Duran** desde el 9 de abril hasta **30 de mayo**, luego de **Adriana Martín** en apoyo del 30 de mayo hasta el **19 de junio** posterior a la fecha quedo a cargo la Arquitecta **Luz Angela Sanabria** quien estuvo en la supervisión de las actividades de este mes hasta el **22 de julio del 2025**, actualmente como supervisor asignado se encuentra **Adriana Martín** quien reemplazó al Ingeniero **Juan Sebastián Sánchez Estrada** durante la última semana del mes de octubre del 2025, actualmente se cuenta con la supervisión

del ingeniero **Juan Sebastián Sánchez** y de **Adriana Martin** a la fechas de este informe.

Se reporta la continuidad de las actividades de la **Fase III – Intervención de las vías**, con un **41,26%** de avance en esta FASE; especialmente se realizan actividades en la Provincia del Guavio (Ubalá) y en la Provincia de Oriente (municipio de Choachí, Fomeque).

En la provincia del Guavio, las actividades correspondientes a la Fase III del proyecto presentan diferentes niveles de avance según el municipio intervenido. En el municipio de Ubalá, las labores iniciaron el 30 de abril de 2026 y, a la fecha de corte del presente informe, se ha ejecutado la estabilización de rasante en aproximadamente 2,7 km de un total proyectado de 7,4 km, así como la construcción de dos (2) de las cinco (5) alcantarillas contempladas.

Por su parte, en el municipio de Gama se culminaron las actividades de estabilización de rasante y construcción de obras de drenaje, alcanzando una intervención de aproximadamente 3,0 km de vía y la construcción de cuatro (4) alcantarillas. Estas actividades finalizaron el 28 de febrero de 2026, quedando pendiente la ejecución de las obras de cunetas y la aplicación del recubrimiento superficial programado para la etapa siguiente.

En el municipio de Junín se finalizaron las actividades de estabilización de rasante en una longitud aproximada de 9,2 km, así como la construcción de cinco (5) alcantarillas. Actualmente, se encuentra pendiente el inicio de las actividades correspondientes a la instalación del Tratamiento Superficial Simple (TSS), con las cuales se dará continuidad a la fase de mejoramiento vial prevista para este sector.

En la provincia de Oriente se finalizaron las actividades de estabilización de la rasante en el municipio de Choachí, con una intervención total según levantamiento topográfico

final de 11.655,69 ml y un volumen total de 9.570,91 m³ de material estabilizado. Adicionalmente se iniciaron las actividades de tratamiento superficial simple, con una intervención para el mes de mayo de 6.216,00 ml y un área aproximada de 24.864,00 m², con un acumulado de 10.263,51 ml. Por otra parte, se continua con actividades de estabilización de rasante en el municipio de Fomeque, con una intervención para el mes mayo de 1.360 ml y un volumen aproximado de 1.394,00 m³ de material estabilizado. Así mismo en el municipio de Chipaque se finalizaron actividades de estabilización de rasante, con una intervención total según levantamiento topográfico final de 2.418,40 ml y un volumen total aproximado de 1.764,09 m³ de material estabilizado

En la provincia de Soacha se finalizaron las actividades de estabilización de la rasante en el municipio de Sibaté, con una intervención de 3.783,24 ml y un volumen total aproximado de 2.890,26 m³ de material estabilizado. De igual forma se finalizaron actividades de recubrimiento superficial con una intervención aproximada de 17.276,79 m^2.

Se mantuvo la ejecución de los componentes social, ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), en cumplimiento de la normativa vigente. La Interventoría continuó con su gestión en los ámbitos técnico, administrativo y contractual, velando por el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la adecuada ejecución del proyecto. A la fecha de corte, el contrato presenta un **atraso del 13,42%** respecto al cronograma establecido con la reprogramación con línea base 4 entregada por el contratista de obra y aprobada por la interventoría el día 19 de diciembre del 2025.

Teniendo en cuenta lo anterior, se requirió y apremio al contratista la entrega de plan de contingencia inmediato que permita subsanar el desfase de la reprogramación de actividades de obra. Ver oficio 766-815 Requerimiento técnico, administrativo, financiero y legal por retraso acumulado del10,88% en la ejecución del contrato de obra ICCU-138-2025.

Por otra parte, esta Interventoría recomienda a la entidad la consideración de alternativas a la construcción de cunetas en concreto para los tramos estabilizados con el fin de preservar la estabilización realizada desde el inicio de actividades en octubre del 2026. Asimismo, se remitió y se solicitó al contratista tomar las medidas de conformación temporal de cunetas, así como la intervención oportuna con el TTS para mitigar el desgaste, lavado y erosión de la capa estabilizada.

En este sentido, la interventoría ha sido persistente y ha requerido al contratista para las acciones pertinentes que permitan la mitigación de la afectación de lluvias y cumplimiento de la secuencia de actividades de obra aprobadas por Interventoría donde se evidencia la intervención oportuna del TTS una vez que termine la capa estabilizada. Por otro lado, se ha invitado y manifestado a la entidad la consideración de obras longitudinales de naturaleza industrial que permitan el drenaje y conducción de escorrentías superficiales.

2. Descripción del proyecto

2.1 Localización

El Proyecto para la intervención de vías se localiza en las Provincias del oriente de Cundinamarca: **Medina, Guavio, Oriente y Soacha**, toda la información en referente a la localización de cada provincia se encuentra dentro del anexo del componente técnico, actas de localización.

2.2 Estado inicial de la vía

Todo el registro fotográfico referente al estado inicial de la vía ya se encuentra referenciado dentro del contenido de los informes mensuales N°1, 2, 3, y 4 correspondientes a los meses de abril, mayo, junio, y julio concerniente a todos los tramos existentes del proyecto, este registro fotográfico se hace con el fin de contar con evidencia del antes y el después de la intervención del contrato de obra.

3 Información Contrato de Obra

3.1 Información general contrato de obra

Durante el presente periodo de este informe, no se presentaron modificaciones del contrato de obra ICCU 138 del 2025 hasta el 31 de agosto del 2026.

Apertura del proceso de contratación	**No.:** ICCU-LP-031 de 2024.
Resolución de adjudicación del contrato	**No.:** 1053 de 2024
CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal) y Fecha	DIS-2025000077 de miércoles, 22 de enero de 2025 y DIS-2025000080 de miércoles, 22 de enero de 2025.
RP (Registro Presupuestal) y Fecha:	RES-2025000367 de lunes, 17 de febrero de 2025 y RES-2025000368 de lunes, 17 de febrero de 2025.
Contrato ICCU No.:	138 DE 2025.
Fecha de suscripción del contrato:	27 de enero de 2025.
Objeto del contrato:	Intervención de las vías que conforman el programa de caminos vecinales, caminos para quedarse, en las provincias de Medina, Guavio, Oriente y Soacha, en el departamento de Cundinamarca.
Contratista:	CONSORCIO SOFAN C-031, NIT. 901.906.842 – 2 SOFAN INGENIERIA S.A.S identificada con NIT 800.012.888 – 7 constituida mediante Escritura Pública No. 1769 del 31 de julio de 1987 de la Notaria 1a. De Montería. inscrito en la Cámara de Comercio el 11 de agosto de 1987, con el No. 3560 del Libro IX, representada legalmente por ANDRES GABRIEL SOFAN SANCHEZ mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 79.553.192 de Bogotá D.C, todo lo cual consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal de la Cámara de Comercio de Montería, con una participación del noventa por ciento (90%). ANDRES GABRIEL SOFAN SANCHEZ mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 79.553.192 de Bogotá D.C, quien obra en nombre propio con una participación del diez por ciento (10%).
Valor inicial:	$ 35.350.235.228,00

Adiciones:	NINGUNA.
Valor acumulado del contrato:	$35.350.235.228,00
Modificaciones:	Modificatorio 1: la modificación de la cláusula 7 de contrato de Obra N° ICCU-138 de 2025 (Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. DIS-2025000418 del 10 de julio de 2025)
Aclaraciones:	NINGUNA
Suspensiones:	NINGUNA
Cesiones de participación contractual:	NINGUNA
Plazo:	Once (11) meses y quince (15) días o hasta el 31 de diciembre de 2025, lo que primero ocurra.
Prorroga 1:	8 meses hasta el 31 de agosto del 2026
Plazo total	19 meses y quince días
Fecha de terminación inicial del contrato:	31 de diciembre de 2025.
Fecha de terminación actual del contrato	31 de agosto del 2026

Fuente: elaboración propia

3.2 Actividades ejecutadas en el mes

3.2.1 Actividades ejecutadas en el mes componente técnico

- ✓ **Actividades Fase I Geoposicionamiento, Topografía y Caracterización de materiales.**

Durante el período se realizan actividades de seguimiento a los replanteos previo a la intervención de la capa estabilizada, así como la revisión de la topografía final de los tramos intervenidos, como Sibaté.

3.2.2 Actividades Fase II Caracterización de Materiales y Propuesta de Intervenciones

Se realizo el seguimiento, control, vigilancia y cumplimiento de las formulas de trabajos de capa estabilizada y recubrimiento superficial aprobado para cada corredor, de

acuerdo a los conceptos de los especialistas de geotécnica y pavimentos, como se enlista a continuación.

Tabla 1. Aprobaciones entregables fase 1 y 2

Municipio	Fase 1	Entrega	Fase 2	Entrega
1.1. Tramo 1 - Gama	https://drive.google.com/drive/folders/1ZwNoGQ3bdObvgywHTKsbPkpuPFJFjjWd?usp=drive_link	766-307.1	https://drive.google.com/drive/folders/1KLxJXQOq7Y92TZsp49omj3xkZnHnjIqX?usp=drive_link	766-598
1.2. Tramo 2 - Junin	https://drive.google.com/drive/folders/1_wGtLCJqPs_jzgP3Gg6JV-UKtLgvICD3?usp=drive_link	766-309.1	https://drive.google.com/drive/folders/1fLyLo5hSs9FTfZ6wAGMp7aFrM1cwJHwE?usp=drive_link	
1.3. Tramo 3 - Ubalá	https://drive.google.com/drive/folders/1-gr840SHIVFiw0xCHfd77TheWnSxwA4_?usp=drive_link	766-216.1	https://drive.google.com/drive/folders/1TifQ0ZGekfbs3SBzrozh2Q69vBOvMLEW?usp=drive_link	
1.4. Tramo 4 - Medina	https://drive.google.com/drive/folders/1McVQMZNB_aTlWaohGrghseRM369NWBSY?usp=drive_link	766-498.2	https://drive.google.com/drive/folders/1k8T5MwKNpQY4a9rvw_4Xr9yAsduvKQYc?usp=sharing	766-777
1.5. Tramo 5 - Paratebueno	https://drive.google.com/drive/folders/1liDKjqQfjcjh-B4MpHQqdVKCadPe9Qzy?usp=drive_link	766-498.1	https://drive.google.com/drive/folders/1EJwVpCZvYlsB0unrHkdM8p_5OSr1que2?usp=drive_link	
1.6. Tramo 6 - Choachí	https://drive.google.com/drive/folders/10WYMdPGftPFSCsLhpMd82SaYfWWJ1rKH?usp=drive_link	766-420.1	https://drive.google.com/drive/folders/1VCVtbAAzomewjkH06zxSSuA7bdCAOpkf?usp=drive_link	766-605
1.7. Tramo 7 - Fosca	https://drive.google.com/drive/folders/1PFEEK3hj-jGhRXA2ksqHrOqJxSAAs94x?usp=drive_link	766-307.2	https://drive.google.com/drive/folders/1Z71kBuRUOw_u9ggGch3eEKM5Y7Rt1cJ?usp=drive_link	
1.8. Tramo 8 - Fomeque	https://drive.google.com/drive/folders/1uzlMZJvB7EHQ2S-YCeSBaR-uWNAhW7VB?usp=drive_link	766-381.1	https://drive.google.com/drive/folders/1qNx-n7FQ7d9R2eeJV0baoWxwN73UilOn?usp=drive_link	

1.9. Tramo 9 - Quetame	https://drive.google.com/drive/folders/195ueDia4vZtd2qgyGE46t7CuxlnbY4_8?usp=drive_link	766-381.2	https://drive.google.com/drive/folders/1G5kejQQGLP10VrNARQXnf32BKlEhgmDE?usp=drive_link	
1.11. Tramo 11-Chipaque	https://drive.google.com/drive/folders/1z7illeJAnjfLrzPDLS2AlgWsMX1-DnNF?usp=drive_link	766-330.1	https://drive.google.com/drive/folders/1ySlQ5_Ayfz-1R00Lq_bQvD1DBYEwlxjO?usp=drive_link	
1.10. Tramo 10 -Sibaté	https://drive.google.com/drive/folders/1EqbUZ8K8UH_mhsvcdjQQjS1xWhTfbHiO?usp=drive_link	766-343.1	https://drive.google.com/drive/folders/1Ec9tiI0ZYWuzTlgHBifhD5piFQzD0A2J?usp=drive_link	766-599

Fuente: elaboración propia, interventoría


3.2.3 Actividades Fase III Construcción

- **Provincia del Guavio**

- **Tramo Casa Rosada – Laguna Azul, ubicado en el municipio de Ubalá**.

Durante el mes de mayo se continuaron ejecutando las actividades de estabilización de la rasante, las cuales incluyeron la escarificación del material existente, instalación de cemento, adición del aditivo PROES, homogenización, conformación mediante cereo y compactación de la rasante, ejecutando a la fecha un total de 2.695 ml, equivalente aproximadamente a 2.237 m³ de material estabilizado; a continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades desarrolladas.

Tabla 2. Actividades de estabilización de rasante municipio de Ubalá tramo de prueba.

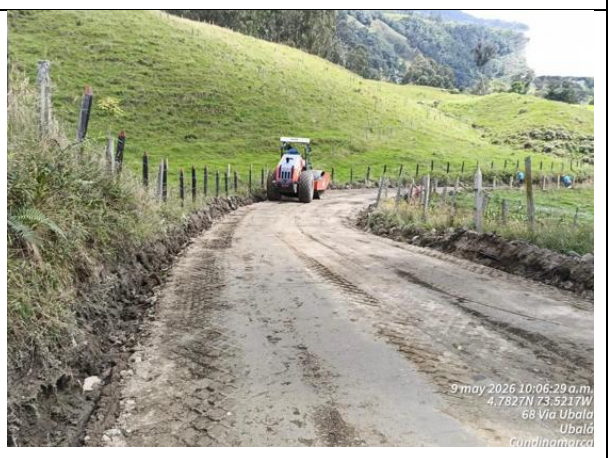	
Escarificación de rasante	Instalación de cemento
	
Homogenización	Instalación de aditivo PROES
	
Cereo	Compactación

Fuente: registro fotográfico interventoría

Se establece cuadro resumen de las alcantarillas que a la fecha el contratista ha ejecutado hasta la fecha:

Tabla 3. Alcantarillas intervenidas dentro del periodo del 21 de julio al 10 de octubre, suspensión de actividades.

No	PR	ESTADO ACTUAL	OBSERVACIONES
Alcantarillas ejecutadas en el 2025			
1	PR5+900	Ejecutada 95%	Falta Relleno Estructural
2	PR0+407	Ejecutada 95%	Falta Demolición Y Reconstrucción Muro Descole
3	PR6+800	Ejecutada 100%	Alcantarilla Funcional Terminada
4	PR7+775	Ejecutada 95%	Falta Excavación De Descole
5	PR13+800	Ejecutada 95%	Falta Realizar Relleno Estructural
6	PR14+000	Ejecutada 95%	Falta Realizar Relleno Estructural
Alcantarillas ejecutadas en el 2026			
7	PR1+240	Ejecutada 85%	Falta relleno estructural poceta y muro desencofre
8	PR1+760	Ejecutada 30%	Falta construcción de encole y descole amarre acero

Fuente: elaboración propia

En la alcantarilla ubicada en el PR 1+240, las actividades fueron suspendidas temporalmente debido a las condiciones climáticas adversas presentadas durante el período, específicamente por las fuertes precipitaciones que afectaron la zona de intervención. No obstante, los trabajos fueron reanudados durante la última semana del mes, ejecutándose actividades correspondientes a la construcción de la poceta, instalación de formaleta y fundida de concreto con resistencia de 3.000 psi.

Por otra parte, en la alcantarilla localizada en el PR 1+770, y atendiendo una solicitud presentada por la comunidad, se determinó reubicar la alcantarilla inicialmente programada para el PR 1+500 hacia esta nueva ubicación. Esta decisión se adoptó luego de que, durante las labores de limpieza e inspección de la estructura existente, se

evidenciaran fallas estructurales que comprometían su funcionalidad y estabilidad. En consecuencia, se priorizó su reposición mediante la construcción de una nueva alcantarilla. En este frente de trabajo se ejecutaron actividades de excavación, construcción de solado, instalación de tubería y conformación de atraques. El detalle de las actividades ejecutadas se presentan en el registro fotográfico que se relaciona a continuación.

Tabla 4.Registro fotográfico Ubalá

	
Excavaciones	Instalación solado
	
Instalación de tubería	Instalación de señalización

Fuente: elaboración propia

- **Tramo Sueva – San Francisco – el Valle - Junín municipio de Junín**

Durante el periodo del 1 al 31 de mayo del 2026 el contratista no ejecuto actividades se Encuentra a la espera de continuar con la instalación del tratamiento superficial simple. Las actividades de estabilización de rasante finalizaron el día 20 de marzo del 2026, se realizó una revisión profunda de los tramos estabilizados ajustando el valor de 9268 ml a un valor de 9261 ml de estabilización equivalentes a un total de 8860 m3 ejecutados de acuerdo con los ítems del contrato arrojando la siguiente tabla. No se realizaron actividades durante el periodo, ni tampoco se intervienen conformaciones de cuneta en material existente para el mantenimiento de los drenajes temporales.

Tabla 5. Avance de obra por vereda, estabilización de rasante municipio de Junín provincia Guavio.

VEREDA	LONGITUD POR EJECUTAR	TRAMO	LONGITUD EJECUTADA	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL
SAN FRANCISCO	4,7	TRAMO 1	131	PR0+000	PR0+131
		TRAMO 2	760	PR0+940	PR1+700
		TRAMO 3	1320	PR1+880	PR3+200
		TRAMO 4	610	PR3+540	PR4+150
		TRAMO 5	2080	PR4+400	PR6+480
VALLE DE JESUS	3,75	TRAMO 1	1050	PR7+550	PR8+600
		TRAMO 2	1271	PR10+130	PR11+640
		TRAMO3	1287	PR11+640	PR12+927
ALEMANIA	1,2	TRAMO 1	752	PR12+933	PR13+700
		TOTAL	9261		

Fuente: elaboración propia interventoría.

La construcción alcantarillas en el municipio de Junín se ejecutó desde el 26 de febrero hasta el día 9 de abril, a continuación, se muestra tabla resumen.

Tabla 6. Relación de alcantarillas ejecutadas y porcentaje de avance.

Alcantarilla	Avance	Observaciones
Alcantarilla 1 PR 1+620	100%	Completada
Alcantarilla 2 PR 7+550	100%	Falta ajuste de cerca
Alcantarilla 3 PR 12+780	100%	Completada
Alcantarilla 4 PR 13+780	100%	Completada
Alcantarilla 5 PR 14+800	100%	Completada

Fuente: elaboración interventoría

- **Clemente – Palenque - Río Rucio, Municipio de Gama**

A la fecha, la alcantarilla ubicada en el PR 4+200 presenta observaciones y se encuentra pendiente de la construcción de un par de pie de amigos en la zona de descole del muro. No se realizaron actividades durante el periodo, ni tampoco se intervienen conformaciones de cuneta en material existente para el mantenimiento de los drenajes temporales.

Tabla 7. Alcantarillas construidas en el municipio de gama.

No	**PR**	**ESTADO ACTUAL**	**OBSERVACIONES**
1	PR2+900	Ejecutada 100%	Completada
2	PR3+980	Ejecutada 100%	completada
3	PR4+100	Ejecutada 100%	Completada
4	PR3+200	Ejecutada 100%	Falta construcción de pie de amigo muro de descole

Fuente: elaboración propia interventoría

B. Provincia de Oriente

- **Tramo El Rosario – La Caja – Chatasuga – La Llanada – Ferralarada – Barro Negro – Granadillo – Chivate – Resguardo Bajo, municipio de Choachí.**

Para el periodo del presente informe se finalizaron las actividades correspondientes a la estabilización del afirmado de la rasante de la vía con espesor de 18 cm y 22 cm, utilizando cemento portland tipo 1 al 3% y aditivo marca PROES en segmentos viales definidos previamente en recorridos conjuntos realizados entre representantes de la Alcaldía, la Supervisión del ICCU, el Contratista de obra y la Interventoría y la Supervisión.

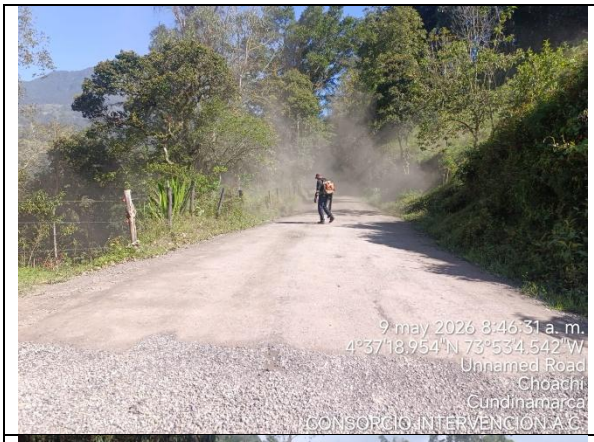
Aunque los anchos y espesores de los tramos homogéneos de intervención presentan variaciones, estos deben ajustarse a las condiciones topográficas del terreno y a las tablas de espesores establecidas en el informe de caracterización aprobado por la interventoría sectores homogéneos tramo **El Rosario – La Caja – Chatasuga – La Llanada – Ferralarada – Barro Negro – Granadillo – Chivate – Resguardo Bajo.**

Tabla 8. Definición de sectores homogéneos tramo El Rosario – La Caja – Chatasuga – La Llanada – Ferralarada – Barro Negro – Granadillo – Chivate – Resguardo Bajo.

Sector	Abscisa	CBR subrasante (%)	Espesor de la Capa de Mejoramiento (cm)
1	K0+000 – K3+445	4.52	18
2	K3+445 – K9+120	2.97	22
3	K9+120 – K14+535	2.99	22
4	K14+535 – K21+000	2.89	22

Fuente: Informe caracterización V10, municipio de Choachí.

Tabla 9. Registro fotográfico actividades tratamiento superficial simple - municipio de Choachí

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">Retiro de material granular sobre la vía</td>
</tr>
</table>


9 may 2026 9:29:12 a. m.
4°37'19.002"N 73°53'4.632"W
Unnamed Road
La Caja
Choachí
Cundinamarca
CONSORCIO INTERVENCIÓN A.C.


20 may 2026 15:23:39
4°34'32"N 73°54'24"W
Unnamed Road
Choachí
Cundinamarca
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC


20 may 2026 3:23:46 p.m.
4°34'31.866"N 73°54'23.946"W
Unnamed Road
Choachí
Cundinamarca
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC


22 may 2026 2:07:59 p. m.
4°33'53.67"N 73°54'19.044"W
Unnamed Road
Choachí
Cundinamarca
CONSORCIO INTERVENCIÓN A.C.


22 may 2026 3:54:45 p. m.
4°33'41.814"N 73°54'10.98"W
Choachí
Cundinamarca
CONSORCIO INTERVENCIÓN A.C.


25 may 2026 13:28:34
4°33'35"N 73°54'12"W
Choachí
Cundinamarca
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC









Tratamiento superficial simple







Sellado de tratamiento

Fuente: elaboración propia

Las actividades de estabilización se finalizaron previamente con una intervención total de **11.655,69 ml** y un volumen total aproximado de **9.570,91 m³** distribuidos en las veredas de **Resguardo Norte, Resguardo Parte Baja, La Caja, Chatasuga, La Llanada, Maza, Ferralarada** y **Barronegro**. Durante el mes de mayo continuo la actividad del tratamiento superficial simple con una intervención para el mes de abril de **6.216,00 ml** y un área aproximada de **24.864,04 m²** distribuidos en las veredas de **Resguardo Norte, Resguardo Parte Baja, La Caja, Chatasuga, La Llanada, Maza y Ferralarada**. Frente a lo anterior se aprecia en la siguiente tabla la discriminación de los tramos a intervenir, según los programado y ejecutado, conforme al alcance del proyecto.

Tabla 10. Avance tratamiento superficial simple municipio de Choachí provincia Oriente

FASE III AVANCE DE OBRA - MUNICIPIO DE CHOACHI						
VEREDA	TRAMO	REAL EN CAMPO		LONGITUD EJECUT (m)	TSS (m)	AVANCE %
		ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL			
LA CAJA	TRAMO 1	K01+597,71	K03+878,37	2280,66	2010,66	88%
CHATASUGA	TRAMO 1	K04+860,00	K06+220,00	1314,18	1314,18	100%
	TRAMO 2	K06+340,00	K07+841,05	1501,05	1501,05	100%
LA LLANADA	TRAMO 1	K08+520,00	K09+570,00	1050,00	1050,00	100%
	TRAMO 2	K10+390,00	K10+570,00	180,00	180,00	100%
MAZA	TRAMO 1	K10+570,00	K11+018,00	448,00	448,00	100%
	TRAMO 2	K11+480,00	K12+090,00	610,00	610,00	100%
FERRALARADA	TRAMO UNICO	K12+100,00	K13+170,00	1070,00	1070,00	100%
BARRONEGRO	TRAMO 1	K13+170,00	K14+320,00	1150,00	0,00	0%
RESGUARDO PARTE BAJA	TRAMO 1	K18+990,34	K19+563,79	573,45	573,45	100%
	TRAMO 2	K19+563,79	K20+882,25	1144,76	1144,76	100%
RESGUARDO NORTE	TRAMO UNICO	K21+075,85	K21+409,51	333,66	333,66	100%

Fuente: elaboración propia

- **Tramo Fomeque Cáqueza, municipio de Fomeque.**

Durante el mes de mayo se continua con la ejecución de actividades correspondientes a la estabilización del afirmado de la rasante de la vía a una profundidad de 25 cm, utilizando cemento portland tipo 1 al 3% y aditivo marca PROES en segmentos viales definidos durante recorridos conjuntos realizados entre representantes de la Alcaldía, la Supervisión del ICCU, el Contratista de obra y la Interventoría y la Supervisión, además en el recorrido se determinó la construcción de obras de drenaje tipo alcantarilla, con el objetivo de garantizar el adecuado manejo y control de las aguas lluvias sobre la vía.

Aunque los anchos y espesores de los tramos homogéneos de intervención presentan variaciones, estos deben ajustarse a las condiciones topográficas del terreno y a las

tablas de espesores establecidas en el informe de caracterización aprobado por la interventoría sectores homogéneos tramo **Fomeque Cáqueza.**

Tabla 11. Definición de sectores homogéneos tramo Fomeque Cáqueza.

Sector	Abscisa	CBR subrasante (%)	Espesor de la Capa de Mejoramiento (cm)
1	K0+000 – K1+400	2.61	25,00
2	K1+400 – K5+000	2.61	25,00
3	K5+000 – K8+550	2.61	25,00
4	K8+550 – K10+000	2.61	25,00
5	K10+000 – K13+600	2.61	25,00
6	K13+600 – K19+000	2.61	25,00

Fuente: Informe caracterización V2, municipio de Fomeque.

Tabla 12. Registro fotográfico actividades mejoramiento de rasante con cemento municipio de Fomeque.





Escarificación





Retiro de sobre tamaños









Instalación de cemento









Homogeneización de afirmado con cemento









Instalación de aditivo + agua


15 may 2026 11:38:25 a.m.
4°26'33.18"N 73°52'10.2"W
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC


15 may 2026 12:34:08 p.m.
4°26'30.972"N 73°52'9.534"W
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC


15 may 2026 1:06:55 p.m.
4°26'35.934"N 73°52'10.578"W
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC


15 may 2026 1:01:34 p.m.
4°26'35.322"N 73°52'10.626"W
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

Céreo


15 may 2026 1:15:43 p.m.
4°26'34.242"N 73°52'9.906"W
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC


25 may 2026 2:55:23 p.m.
4°26'7.404"N 73°52'1.26"W
Vía Bogotá - Villavicencio
Cáqueza
Cundinamaroa
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC



Compactación

Fuente: elaboración propia

Durante el mes de mayo se intervinieron aproximadamente **1.360,00 ml**, desde el **PR05+450,0** hasta el **PR08+650,0**, distribuidos en la vereda **Margarita** y **La Pastora**, con un espesor de **25 cm** y un ancho promedio de **4,3 m**. En resumen, en el **municipio de Fomeque** se presenta un avance de obra del **47,32%**, lo que equivale a un total de **4.020,00 ml**. Esta información se basa en la socialización realizada frente a la reducción de longitud a intervenir en los diferentes tramos hecha durante el mes de mayo. Frente a lo anterior se aprecia en la siguiente tabla la discriminación de los tramos a intervenir, según los programado y ejecutado, conforme al alcance del proyecto.

Tabla 13. Avance mejoramiento de rasante tramo municipio de Fomeque provincia Oriente

FASE III AVANCE DE OBRA - MUNICIPIO DE FOMEQUE							
VEREDA	**TRAMO**	**ABSCISA INICIAL**	**ABSCISA FINAL**	**LONGITUD A INTERV (m)**	**LONGITUD EJECUT (m)**	**ESPESOR (cm)**	**AVANCE %**
LADERA	TRAMO 1	K01+800,00	K03+500,00	1700	1700	25	100%
MARGARITA	TRAMO 2	K04+880,00	K05+660,00	780	780	25	100%
LA PASTORA	TRAMO 3	K05+980,00	K06+660,00	680	680	25	100%
	TRAMO 4	K08+040,00	K08+880,00	840	470	25	56%
	TRAMO 5	K09+480,00	K10+280,00	800	0	25	0%

SAN LORENZO	TRAMO 6	K10+740,00	K11+135,35	395,35	0	25	0%
	TRAMO 7	K12+240,00	K12+590,00	350	0	25	0%
POTRERO GRANDE	TRAMO 8	K13+160,00	K13+520,00	360	0	25	0%
	TRAMO 9	K14+450,00	K15+570,00	1120	0	25	0%
PONTA	TRAMO 10	K16+250,00	K17+410,00	1160	0	25	0%
	TRAMO 11	K18+170,00	K18+480,00	310	0	25	0%

Fuente: elaboración propia

- **Tramo Siecha – Caldera – Potrero Grande, municipio de Chipaque.**

Para el periodo del presente informe se finalizaron las actividades correspondientes a la estabilización del afirmado de la rasante de la vía a una profundidad de 20 cm y 22 cm, utilizando cemento portland tipo 1 al 3% y aditivo marca PROES en segmentos viales definidos previamente en recorridos conjuntos realizados entre representantes de la Alcaldía, la Supervisión del ICCU, el Contratista de obra y la Interventoría y la Supervisión.

Aunque los anchos y espesores de los tramos homogéneos de intervención presentan variaciones, estos deben ajustarse a las condiciones topográficas del terreno y a las tablas de espesores establecidas en el informe de caracterización aprobado por la interventoría sectores homogéneos tramo **Siecha – Caldera – Potrero Grande.**

Tabla 14. Definición de sectores homogéneos tramo Siecha – Caldera – Potrero Grande.

Sector	Abscisa	CBR subrasante (%)	Espesor de la Capa de Mejoramiento (cm)
1	K0+000 – K1+082	3.64	20
2	K1+082 – K2+935	2.95	22
3	K2+935 – K5+340	3.56	20

Fuente: Informe caracterización V2, municipio de Chipaque.

Se está a la espera de la entrega del cronograma de actividades pendientes para el municipio de Chipaque, frente a las actividades ejecutadas se intervinieron **2.418,40 ml** y un volumen total aproximado de **1.764,09 m³** de material estabilizado, desde el

PR00+200,0 hasta el **PR04+479,21** distribuidos en la vereda **Siecha, Caldera** y **Potrero Grande.**, con un espesor entre **20 cm** y **22 cm** y un ancho promedio de **4,1 m**. Frente a lo anterior se aprecia en la siguiente tabla la discriminación de los tramos a intervenir, según los programado y ejecutado, conforme al alcance del proyecto.

Tabla 15. Avance mejoramiento de rasante tramo municipio de Chipaque provincia Oriente

FASE III AVANCE DE OBRA - MUNICIPIO DE CHIPAQUE						
VEREDA	TRAMO	REAL EN CAMPO		LONGITUD EJECUT (m)	TSS (m)	AVANCE %
		ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL			
CALDERA	TRAMO 1	K00+200,00	K01+248,65	1014,41	0,00	0%
CALDERA	TRAMO 1	K01+680,00	K02+680,98	1000,98	0,00	0%
SIECHA	TRAMO 2	K04+076,20	K04+479,21	403,01	0,00	0%

Fuente: elaboración propia

C. Provincia de Soacha

No se realizaron actividades durante el periodo, ni tampoco se intervienen conformaciones de cuneta en material existente para el mantenimiento de los drenajes temporales.

Tabla 16. Definición de sectores homogéneos tramo Vereda San Rafael - Vereda Altocharco - Sector alto de la Virgen - Vereda La Unión.

Sector	Abscisa	CBR a partir del LWD MR (%)	Espesor de la Capa de Mejoramiento (cm
1	K3+540 - K4+150	8.17	15
2	K4+150 - K5+620	4.06 - 6.93	20
3	K5+620 - K7+330	10.00	15

Fuente: informe caracterización V10, municipio de Sibaté.

Tabla 17. Avance mejoramiento de rasante tramo Municipio de Sibaté de la PROVINCIA DE SOACHA.

FASE III AVANCE DE OBRA - MUNICIPIO DE SIBATÉ						
Vereda	**Tramo**	**Abscisa inicial**	**Abscisa final**	**Longitud a interv (m)**	**Longitud TSS (m)**	**Avance %**
Altocharco	Tramo 1	Pr03+540	Pr04+150	610	610	100%
San Rafael	Tramo 2	Pr04+150	Pr05+620	1470	1470	100%
San Rafael	Tramo 3	Pr0+5+620	Pr07+330	1710	1710	100%

Fuente: elaboración propia

3.2.3.1 Topografía


- Provincia del Guavio

Durante el mes de mayo de 2026 se registraron los siguientes avances en las actividades topográficas en el municipio de Ubalá (Casa Rosada – Laguna Azul): PR4+3000 al PR6+980 y del PR8+400 al PR9+900, llegando a 6071 metros en replanteo (veredas San Luis y Santa María). La Interventoría hace un chequeo del cereo en el tramo comprendido entre las abscisas PR5+260 al PR5+840 evidenciando inconsistencias entre bombeos y peraltes necesarios para el manejo de aguas. Con base a lo anterior, se emitió el oficio 766-857 donde se insta al Contratista a mejorar las actividades de cereo ejecutados y pendientes por ejecutar.

En el municipio de Junín se mantiene el replanteo 9503 m, pero aún sin inicio del levantamiento topográfico final.

En Gama no hay actividades de topografía, quedando el levantamiento topográfico en 1600 metros (PR0+000 – PR1+600; 53 % del tramo, como los meses anteriores).

Tabla 18. Registro fotográfico actividades topografía Guavio.

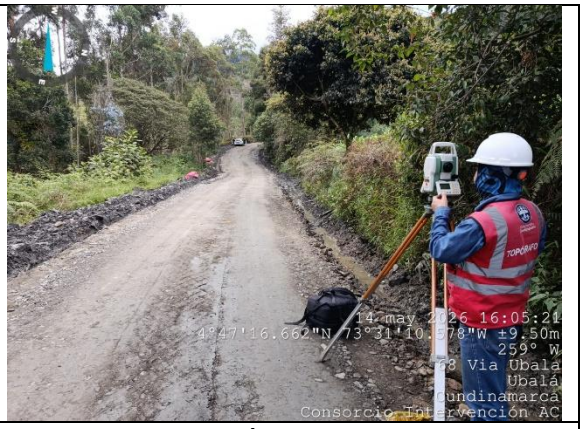	
Chequeo con nivelación cereo tramo PR5+260 al PR5+840 y revisión replanteo PR6+980 a mayores	

- Provincia de Oriente

En la Provincia de Oriente, durante el mes de mayo de 2026, en el municipio de Choachí se rectifica el levantamiento topográfico a la longitud de 11642.15 metros (longitud de intervención de rasante).

En el municipio de Fómeque se avanza en replanteo desde PR8+040 a PR9+040, PR9+480 a PR10+280, PR10+740 a PR11+135, PR12+240 a PR12+590 con un acumulado de 6225 metros. Luego de la intervención de mejoramiento en estos tramos, el Contratista continúa levantamiento topográfico final del PR5+500 a PR5+860, PR5+980 a PR6+660; llegando a 2660 metros.

En el municipio de Chipaque, similar al municipio de Fómeque, las actividades de replanteo se mantienen hasta la abscisa PR5+080 con 2900 metros y el levantamiento topográfico final hasta la abscisa PR2+680 con de 2000 metros.

Tabla 19. Registro fotográfico actividades topografía Oriente.

	
Levantamiento topográfico Fómeque	

- Provincia de Soacha

Para la topografía final de Sibaté, el Contratista hace una segunda entrega de los productos de capas geográficas mediante comunicado SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-735 el cual la Interventoría hace su respectiva revisión y remite mediante comunicado 766-806 respuesta con más observaciones, las cuales a terminar el mes el Contratista no ha subsanado.

3.2.4 Actividades ejecutadas en el mes componente ambiental

3.2.4.1 cumplimiento del plan de adaptación a la guía ambiental (paga).

Durante el periodo de reporte, las actividades ejecutadas corresponden al desarrollo de los programas de dicho documento para cada una de las provincias. A continuación, se evidencian las actividades desde el componente ambiental para las provincias del Guavio y Oriente.

- Capacitaciones.

A continuación, se presentan las capacitaciones correspondientes al **mes de mayo del 2026**, dando cumplimiento a los lineamientos y programas establecidos en el PAGA de cada una de las provincias intervenidas.

Tabla 20. Cuadro de capacitaciones

PROVINCIA	MUNICIPIO	TEMA DE CAPACITACIÓN	FECHA	ASISTENTES
GUAVIO	**Junín**	Manejo de Materiales de Construcción	15 de mayo 2026.	15
		Manejo Integral de residuos sólidos (Plan de gestión de residuos RCD, Plan de Gestión de Residuos Sólidos).	20 de mayo 2026.	14
		Prevención, control y atención a emergencias.	26 de mayo 2026.	15
ORIENTE	**Choachí**	Manejo de Materiales de Construcción	06 de mayo 2026.	16
		Manejo Integral de residuos Sólidos.	14 de mayo 2026.	16
		Prevención, control y atención a emergencias.	27 de mayo 2026	15

Fuente: Interventoría.

- **Gestión e instalación señalización respectiva en sitios requeridos.**

Durante el mes reportado, se implementó el Plan de Manejo de Tráfico (PMT) conforme al diseño típico aprobado por la Interventoría, con el objetivo de garantizar condiciones seguras de circulación para peatones, vehículos y personal de obra durante las actividades de intervención vial. Cada una de las provincias cuentan con la siguiente señalización:

- Tipo de señales:

2 señales SIO-01 (trabajos en la vía).

2 señales SR-30 (Velocidad máxima 30 KPH)

4 señales SP0-01 (Obra en la Vía a 100 mts)

1 señal SP-31 (reducción de calzada).

- **Gestión y manejo de los residuos generados.**

Se realiza separación de los residuos regenerados el desarrollo de las actividades diarias, para ello, se implementa el código de colores y la separación en la fuente, para el periodo no se cuentan con puntos de depósitos plásticas, pero se realiza la adecuada separación de los residuos

Para cada una de las provincias se tienen instalados 2 puntos ecológicos distribuidos en los diferentes tramos de intervención.

- Manejo de residuos peligrosos:

Durante el periodo de reporte se generaron los siguientes residuos peligrosos en cada una de las provincias:

Tabla 21. Manejo de residuos peligrosos

PROVINCIA	MUNICIPIO	TIPO DE RESIDUO	CANTIDAD (Unidades)	Kg
Guavio	Ubalá	Bolsas de cemento	2400	480
Oriente	Fómeque		2400	480

Fuente: Interventoría.

- **Maquinaria y equipos proyecto:**

Se mantienen las acciones de mantenimiento rutinario y preventivo, Verificación y seguimiento de las condiciones técnico-mecánicas de los vehículos.

Se presentan las certificaciones técnico mecánica y de gases de los vehículos trabajando en obra. La gestión de la ficha se aborda desde el área SST.

- **Gestión de los RDC pétreos, de material sobrante o RCD´s aprovechables.**

Durante el periodo se reporta la generaron de material de excavación en las actividades realizadas de estabilización de rasante en cada uno de los municipios intervenidos, en la siguiente tabla se evidencia las cantidades de RCD generados en el periodo.

Tabla 22. Gestión de RCD

PROVINCIA	MUNICIPIO	Tipo de RCD	Cantidad (m3)
Guavio	Ubalá	Pétreos	150,5
		Finos no Expansivos	1354,5
Oriente	Fomeque y Chipaque	Pétreos	223,7
		Finos no Expansivos	2014,16

Fuente: Interventoría.

3.2.5 Actividades ejecutadas en el mes componente social

En cumplimiento del contrato de interventoría No. 219 de 2025, correspondiente al contrato de obra No. 138 de 2025, se presenta el balance gerencial de las actividades adelantadas en el componente social durante el mes de mayo del 2026. Este reporte resume las acciones en las provincias de Guavio, Medina, Soacha y Oriente, destacando los avances en los programas establecidos en el Plan de Gestión social, con el objetivo de dar cumplimiento con el fortalecimiento de la participación ciudadana, la transparencia y la articulación institucional.

De acuerdo con lo anterior se relacionan los avances del componente social en cada uno de los programas aplicables al proyecto:

3.2.5.1 Programa de Atención a la Comunidad:

En este programa se relacionan las actividades relacionadas con solicitudes ciudadanas y el uso de canales de comunicación, garantizando la comunicación entre la comunidad, el Contratista, la interventoría y la Entidad.

- **Atención de PQRSD:**

A corte del mes de mayo del 2026, a continuación, se presenta el estado de las PQRSD recibidas por el Contratista a través de los canales oficiales habilitados para la atención a la comunidad:

Tabla 23 PQRSD del mes de mayo.

PQRSD a corte del mes de mayo de 2026								
No.	**Provincia**	**Municipio**	**Peticionario**	**Recepción**	**Envío a revisión**	**Envío a revisión**	**Fecha de cierre**	**Fecha de respuesta**
5	Oriente	Choachí	Vianey Amórtegui (Integrante JAC Maza)	05/03/2026	23/03/2026	25/03/2025	25/03/2025	26/03/2025
6	Guavio	Ubalá	Secretaría Municipal de Planeación	05/03/2026	17/01/2026	25/03/2025	25/03/2025	26/03/2025
7	Oriente	Choachí	Julio Rivera	27/03/2026	16/04/2026	N/A	18/04/2026	22/04/2026
8	Oriente	Choachí	Aura Amorteguí	27/03/2026	06/04/2026	N/A	18/04/2026	08/04/2026
9	N. A	N. A	Stephany Laiton	07/04/2026	13/04/2026		23/04/2026	14/04/2026
10	Oriente	Choachí	Blanca Sánchez	25/05/2026	Pendiente	Pendiente	17/06/2026	Pendiente

Fuente: elaboración propia

Para mayor detalle ver el Informe social No. 14.

- **Puntos SAU:**

Los Puntos SAU (Sistema de atención al Usuario) corresponden a oficinas físicas que tienen el objetivo de ser un espacio para brindar atención a la ciudadanía, estas se determinaron para instalación de una (1) por provincia y tendrán horario de atención un (1) día a la semana, por lo tanto, a continuación, se relacionan las oficinas de atención presencial que se encontraron activas durante el mes de mayo del 2026:

Tabla 24. Puntos SAU

PUNTOS SAU ACTIVOS – MAYO 2026			
Provincia	**Municipio de Ubicación**	**Dirección**	**Horario de atención**
Guavio	Ubalá	Kr 3 # 03 21	Viernes, 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Oriente	Choachí	Calle 3 # 03 - 02	Miércoles, 8:00 a.m. a 4:00 p.m
Soacha	Sibaté	Salón Comunal Vereda Alto Charco	Lunes, 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Fuente: elaboración propia

Este sistema de atención se complementa con los siguientes canales virtuales activos y disponibles para la comunidad en general:

WhatsApp y teléfono: 320 2451798

Correo electrónico: social138@sofaningenieria.com

Para mayor detalle ver el Informe social No. 14.

- **Recorridos de Obra**

Se usan como una estrategia para mejorar el alcance en la atención a la comunidad, haciendo presencia al área de influencia directa del proyecto, adicionalmente, se realizar recorridos con la comunidad de acuerdo con lo requerido por el área técnica o la misma comunidad, administraciones municipales, entes y /o entidades municipales:

Recorridos internos: Recorridos que se realizan para brindar atención en campo a la comunidad.

Tabla 25. Recorridos internos – mayo 2026

Recorridos internos – mayo 2026			
Provincia	**Municipio**	**Fecha**	**Actividad**
Guavio	Junín	06-05-2026	Atención a la comunidad
		13-05-2026	Atención a la comunidad
		20-05-2026	Atención a la comunidad
		27-05-2026	Atención a la comunidad
	Ubalá	N. A	N. A
	Gama	06-05-2026	Atención a la comunidad
		13-05-2026	Atención a la comunidad
		20-05-2026	Atención a la comunidad
		27-05-2026	Atención a la comunidad
Oriente	Choachí	08-05-2026	Atención a la comunidad
		12-05-2026	Atención a la comunidad
		19-05-2026	Atención a la comunidad
		25-05-2026	Recorrido obra ICCU
	Fómeque	05-05-2026	Atención a la comunidad
		12-05-2026	Atención a la comunidad
		22-05-2026	Atención a la comunidad
	Chipaque	11-05-2026	Atención a la comunidad
		12-05-2026	Atención a la comunidad
Soacha	Sibaté	04-05-2026	Atención a la comunidad
		11-05-2026	Atención a la comunidad
		19-05-2026	Atención a la comunidad
		25-05-2026	Atención a la comunidad

Fuente: elaboración propia

Recorridos con la comunidad:

Tabla 26. Recorridos con la comunidad – mayo 2026

Recorridos comunidad – mayo 2026				
No.	**Provincia**	**Municipio**	**Fecha**	**Actividad**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Fuente: elaboración propia

Para mayor detalle ver el Informe social No. 14.

3.2.5.2 Programa de información y divulgación

El Programa de Información y Divulgación tiene como propósito garantizar una comunicación clara, oportuna y transparente entre el proyecto, las comunidades y las autoridades locales. A través de reuniones de socialización, elaboración y distribución de piezas comunicativas, cartas personalizadas, instalación de vallas y el uso de medios alternativos

- **Acciones de información:**

Este ítem hace referencia a la gestión, logística, desarrollo y elaboración de soportes de las reuniones participativas con la comunidad:

Tabla 27. Acciones de información – reuniones participativas

Reuniones participativas – mayo 2026				
No de la reunión.	**Tipo**	**Provincia**	**Municipio**	**Fecha**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Fuente: elaboración propia

Para mayor detalle ver el Informe social No. 14.

- **Acciones de divulgación:**

Elaboración y distribución de piezas de divulgación

En este ítem se relacionan los volantes y folletos diseñados y difundidos para informar a la comunidad:

Tabla 28. Estado de los volantes y folletos– abril 2026

Estado de los volantes– mayo 2026					
No.	**Tipo**	**Provincia**	**Municipio**	**Objetivo**	**Medios de difusión**
38	Volante	Guavio	Ubalá	Comité de participación No. 13 – municipio de Ubalá	Grupo de WhatsApp

Estado de los volantes– mayo 2026					
No.	**Tipo**	**Provincia**	**Municipio**	**Objetivo**	**Medios de difusión**
37	Volante	Oriente	Fómeque	Invitación al comité de participación No. 12 – municipio de Fómeque	Grupo de WhatsApp
41	Volante	Guavio	Junin	Invitación al comité de participación No. 14 – municipio de Junín	Grupo de WhatsApp
42	Volante	Guavio	Gama	Invitación al comité de participación No. 15 – municipio de Junín	Grupo de WhatsApp
43	Volante	Oriente	Chipaque	Invitación al comité de participación No. 16 – municipio de Chipaque	Grupo de WhatsApp
44	Volante	Soacha	Sibaté	Invitación al comité de participación No. 17 – municipio de Sibaté	Grupo de WhatsApp

Fuente: elaboración propia.

Para mayor detalle ver el Informe social No. 14. Programa de manejo de infraestructura de predios y servicios públicos

En este programa se reportan las actividades relacionadas con el acompañamiento social a las actividades técnicas. Para el periodo reportado se realizaron actividades en el municipio de Fómeque y Chipaque – provincia del Oriente, relacionadas con el levantamiento de las actas de vecindad de inicio y remisión a los propietarios de los documentos respectivos

- **Actas de vecindad de inicio:**

A corte del presente informe, se relaciona el estado del levantamiento de actas de vecindad:

Tabla 29. Actas de vecindad aprobadas- marzo del 2026

***A*ctas de vecindad aprobadas- mayo del 2026**				
Provincia	**Municipio**	**Previstas**	**Aprobadas**	**Faltantes**
Guavio	Ubalá	39	39	0
	Junín	40	39	0
	Gama	31	31	0
Oriente	Choachí	59	59	0
	Fómeque	62	50	12
Soacha	Sibaté	15	15	0
Total		247	228	19

Fuente: elaboración propia

Para mayor detalle ver el Informe social No. 14.

- **Informes semanales del Contratista – mayo 2026:**

A continuación, se relacionan los informes semanales reportados por el contratista durante el mes de mayo:

Tabla 30. Informes semanales de contratista – mayo 2026

Informes semanales del Contratista – mayo 2026		
No.	**Fecha de envío**	**Periodo reportado**
45	05 de mayo	25 de abril al 1 de mayo del 2026
46	11 de mayo	02 al 12 de mayo del 2026
47	19 de mayo	09 al 15 de mayo del 2026
48	25 de mayo	16 al 22 de mayo del 2026

Fuente: elaboración propia

3.2.6 Actividades ejecutadas en el mes componente SST

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de mayo de 2026, se ejecutaron actividades de estabilización de rasante y obras hidráulicas correspondientes a las: Fases I y II, ubicadas en la provincia del Oriente Choachí y Chipaque y en la provincia del Guavio – Ubalá.

En estos frentes de trabajo se desarrollaron actividades propias de la inspección del área de seguridad y salud en el trabajo evidenciando:

- Verificación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT):

En donde se evidencia que en el municipio de Ubalá falta según plano de PMT un (1) controlador vial, se realiza la solicitud en una mesa de trabajo el día 28 de mayo de 2026 y queda el compromiso para respuesta de esta observación el 1 de junio del 2026.

En el municipio de Choachí se emite oficio por falta de implementación de PMT en la actividad del Tratamiento Superficial simple TSS.

- Verificación del pago de seguridad social SS:

De acuerdo con la cantidad de trabajadores, se solicita la planilla de pago de seguridad social, verificando el cubrimiento de las respectivas entidades como son ARL, EPS, CCF, AFP y que esté de acuerdo con el nivel de riesgo establecido para esa actividad, se verifica también la seguridad social de subcontratistas en la obra.

- Accidentes de trabajo:

El día 22 de mayo del 2026 ocurre un accidente laboral en la provincia de Oriente municipio de Fomeque, esta investigación y demás anexos se debe entregar con el informe mensual del mes de mayo.

- Inspecciones preoperacionales de vehículos y maquinaria, herramientas:

Seguimiento a la realización de preoperacionales de manera diaria y correcto diligenciamiento de estas. Para la provincia de Oriente en el municipio de Choachí en una visita realizada por la interventoría se evidencia que una de la maquinaria utilizada en la actividad de estabilización no tiene el pito de reversa, se realiza el debido oficio para que se subsane esa novedad. En campo se evidencia esta maquinaria en los frentes de obra.

Tabla 31. Distribución de maquinaria del lote 1 a la fecha del mes de abril del 2026.

MAQUINA	FRENTE DE OBRA
Retroexcavadora New Holand B95B	Ubalá
Vibro compactador HAMM	
Motoniveladora Caterpillar 87V10029	
Tractor Deutz-Fahr 6180	
Volqueta WER185	
Carro tanque INB498	
Retroexcavadora JCB 3CX	Fomeque
Motoniveladora Deere 670	
Recicladora Caterpillar RR250	
Vibro compactador Bitelli	
Minicargador Nex Holland L223	
Volqueta INB 498	
FAE – Deutz Fahr	
Minicargador CAT	

Fuente: elaboración interventoría, informe SST.

- Inspecciones de camillas, botiquines, extintores y kit de derrames:

Verificación de manera mensual de camilla, botiquín y se realiza la inspección de fechas de vencimiento de los insumos, la maquinaria debe tener asignado el extintor y estar en buenas condiciones. El kit de derrames debe estar en obra, cerca de la maquinaria para utilización en caso fortuito.

- Recolección de bolsas de cemento:

Esta recolección se realiza de manera diaria si se realiza actividades de estabilización o fundición de alcantarillas, deben recolectarse en su respectiva bolsa de color rojo y garantizar el traslado hasta el punto de acopio, y los demás residuos en su respectivo color de bolsa y correcta disposición.

- Entrega de dotación y reposición de elementos de protección personal (EPP):

Se evidencia la entrega de dotación para el personal nuevo y la reposición de elementos de protección personal para personal que lo necesite según su desgaste o daño.

- Actividades de orden y aseo:

Se inspecciona los frentes de trabajo al terminar la jornada laboral o al inicio. Se debe dejar los lugares de trabajo sin ningún obstáculo que genere un acto o condición insegura, para los trabajadores o para terceros.

Se solicita en el área de la bodega realizar orden y aseo, este se notifica de manera verbal y también en oficio solicitando un programa de orden y aseo que sea funcional y se cumpla. Se acompaña de solicitud por la parte ambiental.

- Mesa de trabajo con el contratista:

Se realiza el día 28 de mayo del 2026 y se socializa las recomendaciones con cada uno de los ítems que se encontraron en el informe gerencial para su mejora.

Se repasan los compromisos pendientes del comité de seguimiento de parte del contratista e interventoría para su cumplimiento.

Tabla 32.mesas de trabajo realizadas en el mes de mayo 2026

COMPROMISOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1. Contratación de controlador vial Ubalá	01-06-2026
2. Enviar planillas de S.S. **Sofan NIT 88** y subcontratista **Urbanuz.**	28-05-2026
3. Reunión presencial profesionales SST – Sofan e interventoría	29-05-2026
4. Crear grupo de WhatsApp con profesionales contratista e interventoría	28-05-2026
5. Entrega de investigación de accidente de trabajo con el informe del mes de mayo.	05-06-2026
6. Entrega de ATS de la actividad de TSS – Jennifer Rincon	02-06-2026
7. Solicitud de instalación de pito de reversa de maquinaria en campo	05-06-2026
8. Verificación de la información enviada de informes gerenciales.	Mes a mes

Fuente: elaboración propia, interventoría, componente SST

- Señalización y delimitación de excavaciones:

En el frente de obra de Junin se realiza inspección de las obras hidráulicas ya que están asociadas al control de condiciones y actos inseguros, por la ausencia o deficiencia en la demarcación y señalización de las áreas intervenidas. Se solicita que se realice la respectiva señalización al termino de cada jornada laboral dejando con evidencia el registro fotográfico.

La adecuada instalación de señalización preventiva, delimitación perimetral y elementos de protección colectiva constituye una medida fundamental de control para la prevención de caídas a distinto nivel, atrapamientos o incidentes derivados del tránsito no controlado en zonas de excavación.

- Revisión y aprobación de documentación:

se realiza la revisión de los informes semanales y mensuales enviados de los frentes de obra de Chipaque y Ubalá, para su respectiva aprobación o subsanación, así como la elaboración de los respectivos oficios administrativos.

- Inspección actividades de construcción:

Supervisión en las actividades como el cargue y descargue de cemento, uso correcto de los elementos de protección personal, manejo de cargas en el traslado de campamento.

4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

Para el informe mensual el contratista reporta el valor ejecutado mensual de MIL CIENTO SESENTA Y UN MILLONES SETESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON SETENTA Y DOS CENTAVOS **($1.161.765.599,72)** lo cual corresponde a las actividades de la fase III del proyecto durante el período comprendido

entre el 1 y el 31 de MAYO de 2026. Por lo tanto, se tiene un acumulado ejecutado de **QUINCE MIL SETESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL SETESCIENTOS MOVENTA PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 15.798.613.794,89)** hasta la fecha.

Tabla 33. tabla de control presupuesto ejecutado semanal del contratista

PROGRAMACION						EJECUCION				INDICADORES		
		TOTALES				TOTALES				VARIACION	IEP	IEC
No.	Fecha	SEMANA	ACUMULADO	CPTP(Millones)	% PROG.	SEMANA	ACUMULADO	CPTR (Millones)	% EJEC	% EJEC - % PROG.	CPTR/CPTP	CPTR/CRTR
semana 1	16/04/2025	$ 16.874.004,30	$ 16.874.004,30	$ 16,87	0,05%	$ 43.661.486,00	$ 43.661.486,00	$ 43,66	0,12%	0,08%	2,59	1,05
semana 2	25/04/2025	$ 71.111.875,23	$ 87.985.879,53	$ 87,99	0,25%	$ 61.611.208,17	$ 105.272.694,17	$ 105,27	0,30%	0,05%	1,20	1,05
semana 3	2/05/2025	$ 55.744.478,47	$ 143.730.357,99	$ 143,73	0,41%	$ 63.074.310,74	$ 168.347.004,91	$ 168,35	0,48%	0,07%	1,17	1,05
semana 4	9/05/2025	$ 157.338.037,49	$ 301.068.395,48	$ 301,07	0,85%	$ 296.404.548,09	$ 464.751.553,00	$ 464,75	1,31%	0,50%	1,54	
semana 5	16/05/2025	$ 199.494.927,25	$ 500.563.322,73	$ 500,56	1,42%	$ 258.847.011,65	$ 723.598.564,65	$ 723,60	2,05%	0,69%	1,45	
semana 6	23/05/2025	$ 166.745.415,42	$ 667.308.738,15	$ 667,31	1,89%	$ 125.990.876,85	$ 849.589.441,50	$ 849,59	2,40%	0,59%	1,27	
semana 7	30/05/2025	$ 180.716.896,91	$ 848.025.635,07	$ 848,03	2,40%	$ 132.744.400,84	$ 982.333.842,34	$ 982,33	2,78%	0,46%	1,16	
semana 8	6/06/2025	$ 281.338.648,42	$ 1.129.364.283,49	$ 1.129,36	3,19%	$ 41.478.569,23	$ 1.023.812.411,57	$ 1.023,81	2,90%	-0,21%	0,91	
semana 9	13/06/2025	$ 260.487.774,16	$ 1.389.852.057,64	$ 1.389,85	3,93%	$ 98.562.080,84	$ 1.122.374.492,41	$ 1.122,37	3,18%	-0,76%	0,81	
semana 10	20/06/2025	$ 332.536.623,38	$ 1.722.388.681,03	$ 1.722,39	4,87%	$ 56.953.759,79	$ 1.179.328.252,20	$ 1.179,33	3,34%	-1,54%	0,68	
semana 11	27/06/2025	$ 373.544.117,98	$ 2.095.932.799,00	$ 2.095,93	5,93%	$ 67.837.316,00	$ 1.247.165.568,20	$ 1.247,17	3,53%	-2,40%	0,60	
semana 12	4/07/2025	$ 371.397.703,56	$ 2.467.330.502,55	$ 2.467,33	6,98%	$ 70.586.372,53	$ 1.317.751.941,00	$ 1.317,75	3,73%	-3,25%	0,53	
semana 13	11/07/2025	$ 344.598.744,22	$ 2.811.929.246,76	$ 2.811,93	7,95%	$ 47.542.714,44	$ 1.365.294.655,17	$ 1.365,29	3,86%	-4,09%	0,49	
semana 14	18/07/2025	$ 759.387.682,03	$ 3.571.316.928,80	$ 3.571,32	10,10%	$ 79.717.426,83	$ 1.445.012.082,00	$ 1.445,01	4,09%	-6,01%	0,40	
semana 15	25/07/2025	$ 822.872.298,22	$ 4.394.189.227,03	$ 4.394,19	12,43%	$ 48.635.647,25	$ 1.493.647.729,25	$ 1.493,65	4,23%	-8,21%	0,34	
semana 16	1/08/2025	$ 906.147.843,12	$ 5.300.337.070,15	$ 5.300,34	14,99%	$ 33.661.131,13	$ 1.527.308.860,37	$ 1.527,31	4,32%	-10,67%	0,29	
semana 17	8/08/2025	$ 972.953.608,32	$ 6.273.290.678,49	$ 6.273,29	17,75%	$ 64.246.379,65	$ 1.591.555.240,02	$ 1.591,56	4,50%	-13,24%	0,25	
semana 18	15/08/2025	$ 800.147.227,63	$ 7.073.437.906,11	$ 7.073,44	20,01%	$ 83.876.846,14	$ 1.675.432.086,16	$ 1.675,43	4,74%	-15,27%	0,24	
semana 19	22/08/2025	$ 1.073.638.193,85	$ 8.147.076.099,96	$ 8.147,08	23,05%	$ 36.751.440,51	$ 1.712.183.526,67	$ 1.712,18	4,84%	-18,20%	0,21	
semana 20	29/08/2025	$ 982.196.191,80	$ 9.129.272.291,75	$ 9.129,27	25,83%	$ 186.400.993,55	$ 1.898.584.520,23	$ 1.898,58	5,37%	-20,45%	0,21	
semana 21	5/09/2025	$ 773.270.563,77	$ 9.902.542.855,52	$ 9.902,54	28,01%	$ 217.151.381,08	$ 2.115.735.901,31	$ 2.115,74	5,99%	-22,03%	0,21	
semana 22	12/09/2025	$ 897.933.564,08	$ 10.800.476.419,58	$ 10.800,48	30,55%	$ 68.010.756,69	$ 2.183.746.658,00	$ 2.183,75	6,18%	-24,38%	0,20	
semana 23	19/09/2025	$ 788.401.131,34	$ 11.588.877.550,92	$ 11.588,88	32,78%	$ 113.514.921,41	$ 2.297.261.579,41	$ 2.297,26	6,50%	-26,28%	0,20	
semana 24	26/09/2025	$ 937.875.310,87	$ 12.526.752.861,81	$ 12.526,75	35,44%	$ 18.968.806,68	$ 2.312.239.722,77	$ 2.312,24	6,54%	-28,90%	0,18	
semana 25	3/10/2025	$ 1.317.898.987,44	$ 13.844.651.849,24	$ 13.844,65	39,16%	$ 61.512.509,36	$ 2.377.742.895,45	$ 2.377,74	6,73%	-32,44%	0,17	
semana 26	10/10/2025	$ 1.403.736.117,44	$ 15.248.387.966,66	$ 15.248,39	43,14%	$ 197.820.608,50	$ 2.575.563.503,95	$ 2.575,56	7,29%	-35,85%	0,17	
semana 27	17/10/2025	$ 920.647.732,67	$ 16.169.035.699,34	$ 16.169,04	45,74%	$ 294.380.229,06	$ 2.869.943.733,01	$ 2.869,94	8,12%	-37,62%	0,18	
semana 28	24/10/2025	$ 1.097.811.581,30	$ 17.266.847.280,66	$ 17.266,85	48,85%	$ 148.436.361,71	$ 3.018.380.094,71	$ 3.018,38	8,54%	-40,31%	0,17	
semana 29	31/10/2025	$ 1.151.330.177,87	$ 18.418.177.458,52	$ 18.418,18	52,10%	$ 312.378.422,28	$ 3.330.758.517,00	$ 3.330,76	9,42%	-42,68%	0,18	
semana 30	7/11/2025	$ 1.136.926.999,56	$ 19.555.104.458,09	$ 19.555,10	55,32%	$ 161.428.539,06	$ 3.492.187.056,06	$ 3.492,19	9,88%	-45,44%	0,18	
semana 31	14/11/2025	$ 988.441.084,52	$ 4.798.839.913,25	$ 4.798,84	13,58%	$ 363.269.475,94	$ 3.855.456.531,99	$ 3.855,46	10,91%	-2,67%	0,80	
semana 32	21/11/2025	$ 867.199.990,19	$ 5.666.039.903,44	$ 5.666,04	16,03%	$ 198.054.852,15	$ 4.053.511.384,14	$ 4.053,51	11,47%	-4,56%	0,72	
semana 33	28/11/2025	$ 960.834.740,83	$ 6.626.874.644,27	$ 6.626,87	18,75%	$ 160.435.559,80	$ 4.213.946.943,94	$ 4.213,95	11,92%	-6,83%	0,64	
semana 34	5/12/2025	$ 1.354.839.595,00	$ 7.981.714.239,27	$ 7.981,71	22,58%	$ 196.380.381,53	$ 4.410.327.325,47	$ 4.410,33	12,48%	-10,10%	0,55	
semana 35	12/12/2025	$ 2.122.882.445,39	$ 10.104.596.684,66	$ 10.104,60	28,58%	$ 150.331.648,46	$ 4.560.658.973,93	$ 4.560,66	12,90%	-15,68%	0,45	
semana 36	19/12/2025	$ 467.871.246,67	$ 4.968.281.366,16	$ 4.968,28	14,47%	$ 475.115.138,19	$ 5.035.774.112,11	$ 5.035,77	14,25%	0,19%	1,01	
semana 37	26/12/2025	$ 389.892.705,54	$ 5.358.174.071,70	$ 5.358,17	15,61%	$ 248.027.166,16	$ 5.283.801.278,28	$ 5.283,80	14,95%	-0,21%	0,99	
semana 38	2/01/2026	$ 393.104.531,54	$ 5.751.278.603,24	$ 5.751,28	16,75%	$ 58.561.180,37	$ 5.342.362.458,65	$ 5.342,36	15,11%	-1,16%	0,93	
semana 39	9/01/2026	$ 493.943.587,85	$ 6.245.222.191,09	$ 6.245,22	18,19%	$ 104.098.298,39	$ 5.446.460.757,04	$ 5.446,46	15,41%	-2,26%	0,87	
semana 40	16/01/2026	$ 547.800.508,82	$ 6.793.022.699,91	$ 6.793,02	19,22%	$ 190.943.672,95	$ 5.637.404.429,99	$ 5.637,40	15,95%	-3,27%	0,83	
semana 41	23/01/2026	$ 405.594.408,33	$ 6.211.850.197,66	$ 6.211,85	18,09%	$ 826.396.098,69	$ 6.463.800.528,68	$ 6.463,80	18,29%	0,71%	1,04	
semana 42	30/01/2026	$ 344.401.728,11	$ 6.556.251.925,77	$ 6.556,25	19,10%	$ 458.162.737,90	$ 6.921.963.266,58	$ 6.921,96	20,16%	1,07%	1,06	
semana 43	6/02/2026	$ 474.130.732,50	$ 7.030.382.658,27	$ 7.030,38	20,48%	$ 361.834.379,82	$ 7.283.797.646,40	$ 7.283,80	21,21%	0,74%	1,04	
semana 44	13/02/2026	$ 686.150.079,99	$ 7.716.532.738,25	$ 7.716,53	22,47%	$ 1.764.711.868,97	$ 9.048.509.515,36	$ 9.048,51	26,35%	3,88%	1,17	
semana 45	20/02/2026	$ 700.298.198,82	$ 8.416.830.937,09	$ 8.416,83	24,51%	$ 729.030.913,62	$ 9.777.540.428,99	$ 9.777,54	28,48%	3,96%	1,16	
semana 46	27/02/2026	$ 776.060.093,90	$ 9.192.891.030,99	$ 9.192,89	26,77%	$ 366.279.692,78	$ 10.143.820.121,77	$ 10.143,82	29,54%	2,77%	1,10	
semana 47	6/03/2026	$ 917.756.973,24	$ 10.110.648.004,23	$ 10.110,65	29,45%	$ 261.695.020,84	$ 10.405.515.142,60	$ 10.405,52	30,31%	0,86%	1,03	
semana 48	13/03/2026	$ 1.247.639.912,05	$ 11.358.287.916,30	$ 11.358,29	33,08%	$ 822.329.518,64	$ 11.227.844.661,24	$ 11.227,84	32,70%	-0,38%	0,99	
semana 49	20/03/2026	$ 1.089.604.138,94	$ 12.447.892.055,25	$ 12.447,89	36,25%	$ 526.472.172,22	$ 11.754.316.833,47	$ 11.754,32	34,23%	-2,02%	0,94	
semana 50	27/03/2026	$ 847.512.441,46	$ 13.295.404.496,72	$ 13.295,40	38,72%	$ 375.627.514,90	$ 12.129.944.348,36	$ 12.129,94	35,33%	-3,39%	0,91	
semana 51	3/04/2026	$ 758.018.898,59	$ 14.053.423.395,32	$ 14.053,42	40,93%	$ 185.289.221,29	$ 12.315.233.569,65	$ 12.315,23	35,87%	-5,06%	0,88	
semana 52	10/04/2026	$ 763.908.187,41	$ 14.817.331.582,74	$ 14.817,33	43,16%	$ 376.181.559,84	$ 12.691.415.129,49	$ 12.691,42	36,96%	-6,19%	0,86	
semana 53	17/04/2026	$ 880.118.735,43	$ 15.697.450.318,18	$ 15.697,45	45,72%	$ 496.989.861,04	$ 13.188.404.990,53	$ 13.188,40	38,41%	-7,31%	0,84	
semana 54	24/04/2026	$ 752.933.318,19	$ 16.450.383.636,39	$ 16.450,38	47,91%	$ 564.132.763,50	$ 13.752.537.754,03	$ 13.752,54	40,05%	-7,86%	0,84	
semana 55	1/05/2026	$ 899.268.040,34	$ 17.349.651.676,74	$ 17.349,65	50,53%	$ 884.310.441,15	$ 14.636.848.195,18	$ 14.636,85	42,63%	-7,90%	0,84	
semana 56	8/05/2026	$ 738.656.079,74	$ 18.088.307.756,49	$ 18.088,31	52,68%	$ 151.903.032,40	$ 14.788.751.227,58	$ 14.788,75	43,07%	-9,61%	0,82	
semana 57	15/05/2026	$ 811.327.875,83	$ 18.899.635.632,33	$ 18.899,64	55,05%	$ 376.627.537,58	$ 15.165.378.764,99	$ 15.165,38	44,17%	-10,88%	0,80	
semana 58	22/05/2026	$ 695.963.704,22	$ 19.595.599.336,54	$ 19.595,60	57,07%	$ 404.168.825,40	$ 15.569.547.590,39	$ 15.569,55	45,35%	-11,73%	0,79	
semana 59	29/05/2026	$ 810.051.057,57	$ 20.405.650.394,11	$ 20.405,65	59,43%	$ 229.066.204,34	$ 15.798.613.794,73	$ 15.798,61	46,01%	-13,42%	0,77	
semana 60	5/06/2026	$ 857.638.301,26	$ 21.263.288.695,36	$ 21.263,29	61,93%							
semana 61	12/06/2026	$ 739.623.673,17	$ 22.002.912.368,53	$ 22.002,91	64,08%							
semana 62	19/06/2026	$ 751.481.626,35	$ 22.754.393.994,87	$ 22.754,39	66,27%							
semana 63	26/06/2026	$ 887.404.474,96	$ 23.641.798.469,80	$ 23.641,80	68,86%							
semana 64	3/07/2026	$ 803.764.506,74	$ 24.445.562.976,52	$ 24.445,56	71,20%							
semana 65	10/07/2026	$ 1.059.870.212,67	$ 25.505.433.189,21	$ 25.505,43	74,28%							
semana 66	17/07/2026	$ 1.118.756.825,00	$ 26.624.190.014,19	$ 26.624,19	77,54%							
semana 67	24/07/2026	$ 825.806.355,30	$ 27.449.996.369,48	$ 27.450,00	79,95%							
semana 68	31/07/2026	$ 1.008.055.947,11	$ 28.458.052.316,58	$ 28.458,05	82,88%							
semana 69	7/08/2026	$ 1.241.073.220,40	$ 29.699.125.536,97	$ 29.699,13	86,50%							
semana 70	14/08/2026	$ 1.252.746.998,26	$ 30.951.872.535,22	$ 30.951,87	90,15%							
semana 71	21/08/2026	$ 1.233.880.381,06	$ 32.185.752.916,27	$ 32.185,75	93,74%							
semana 72	28/08/2026	$ 1.576.237.423,49	$ 33.761.990.339,70	$ 33.761,99	98,33%							
semana 73	4/09/2026	$ 572.855.008,30	$ 34.334.845.348,00	$ 34.334,85	100,00%							
			$ 35.350.235.228,00	$ 35.350,24	100,00%							

Fuente: informe semanal 59

4.1 Estado General del Tiempo

La interventoría reporta el certificado de comportamiento de los días del mes conforme aparece en la base de datos de IDEAM, el cual cuenta con registro diario del estado general del tiempo de las estaciones pluviométricas que se encuentran activas cercanas a cada municipio de cada una de las provincias donde se ejecutan actividades. Esta información permite llevar un control detallado de las condiciones climáticas donde el contratista viene desarrollando actividades, de igual manera el contratista también lleva registro de novedad de lluvias mediante bitácora de obra, este registro es comparado con los reportes de información Hidrometeorológica de DHIME del IDEAM de los cuales la interventoría toma como referencia para verificar la información entregada por el contratista de obra.

A continuación, se detallan el valor de la precipitación mensual de cada provincia:

Tabla 34. Resumen precipitaciones mensual del mes de mayo 2026

Provincia	Precipitación (mm)
Guavio	466,5
Medina	224.1
Soacha	52,6
Oriente	159,3

Fuente: elaboración propia

De acuerdo con los últimos datos tomados en el mes de mayo es evidente el aumento de las lluvias en cada una de las provincias pertenecientes al lote 1, De igual manera se anexan los registros pluviométricos por cada provincia en su municipio más representativo, ver en la carpeta componente técnico n°1.11 reportes IDEAN CLIMA.

Durante el mes de mayo de 2026, los frentes de obra localizados en los municipios de Ubalá y Choachí presentaron afectaciones en su programación y rendimiento debido a las condiciones climáticas adversas registradas en la región. La ocurrencia de

precipitaciones frecuentes y de alta intensidad limitó el desarrollo normal de las actividades constructivas, generando retrasos en la ejecución del tratamiento superficial en el municipio de Ubalá y en las labores de instalación del Tratamiento Superficial Simple (TSS) en el municipio de Choachí. Esta situación obedeció al incremento de la humedad superficial de la vía, la saturación de los materiales y las restricciones operativas derivadas de las condiciones de seguridad y calidad requeridas para la ejecución de dichas actividades. De acuerdo con los boletines meteorológicos emitidos por el IDEAM, durante mayo se mantuvo activa la primera temporada de lluvias del año, registrándose un aumento significativo de las precipitaciones en la región Andina, incluyendo el departamento de Cundinamarca, especialmente en las provincias de Oriente y Guavio, donde históricamente se presentan algunos de los mayores acumulados de lluvia del departamento durante este periodo. Estas condiciones incidieron directamente en el normal avance de las obras, afectando los rendimientos programados y obligando a la reprogramación parcial de actividades para garantizar la calidad técnica de los trabajos ejecutados.

Dado este contexto climatológico se recomienda nuevamente a la entidad, la consideración de la alternativa constructiva industrial de obras de drenaje longitudinal con el fin de dar cumplimiento a la secuencia constructiva y garantizar la conducción de la escorrentía superficial.

4.2 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

Entre el **01 y el 31 de mayo de 2026**, la interventoría realizó seguimiento al cumplimiento del Plan de Aseguramiento de la Calidad, verificando que se esté implementando las acciones para el cumplimiento de los componentes implicados durante la ejecución de actividades del mes, a continuación se realiza un resumen de los resultados obtenidos de igual manera todos los resultados representados en este capítulo se encuentran dentro de la carpeta del componente técnico anexo 1.9 resultados de laboratorio.

CONCRETOS

- **Resultados resistencia a la compresión, alcantarillas, municipio de Junin.**

A la fecha de elaboración del presente informe se cuenta con los resultados obtenidos por el laboratorio de la interventoría y contratista de las 4 alcantarillas ejecutadas en el municipio de Junin. De acuerdo con la revisión realizada de los resultados del contratista y comprobada con los resultados obtenidos por interventoría todas las muestras cumplieron con la resistencia equivalente a 3000 PSI para estructuras de drenaje como lo solicitan las especificaciones NSR-10.

- **Resultados resistencia a la compresión, alcantarillas, municipio de Gama.**

A la fecha del presente informe, el contratista de obra realizó la entrega del archivo ajustado conforme a la solicitud efectuada, teniendo en cuenta que la versión inicialmente presentada no incluía la identificación ni el nombre de los elementos correspondientes a cada registro.

De acuerdo con la información suministrada por el contratista, se anexaron los resultados de resistencia correspondientes a las cuatro (4) alcantarillas ejecutadas en este municipio. Una vez revisados los resultados entregados, se evidencia que estos cumplen con los valores de resistencia requeridos, considerando la edad de falla de las muestras y la resistencia especificada para cada elemento evaluado.


Los resultados tanto de interventoría como de contratista se anexan al presente informe en la carpeta **Anexo 1.9 – Resultados de laboratorio**, dentro del componente técnico.

DENSIDADES

- **Densidades rasantes estabilizada con cemento más aditivo Proes municipio de Junín.**

Dando seguimiento a las actividades que viene desarrollando el contratista de obra en relación a la estabilización de 9,2 km de vía en el municipio de Junín y dando seguimiento a las condiciones en que el terreno queda estabilizado el contratista de obra ha venido realizado una serie de ensayos de laboratorio en campo con densímetro nuclear a fin de determinar la densidad del material y el porcentaje(%) de compactación de la estructura de la capa final del tramo antes de su ejecución y después, teniendo en cuenta lo anterior se tiene un avance del 100% del tramo ejecutado lo que equivale a un longitud intervenida de 9261 ml. Se espera seguir realizado actividades de laboratorio en campo a fin de terminar de consolidar la información esto teniendo en cuenta que ya se cumple con los 28 días de curado del suelo cemento.


gráfico 1. Densidades municipio de Junín del PR0+000 al PR4+500

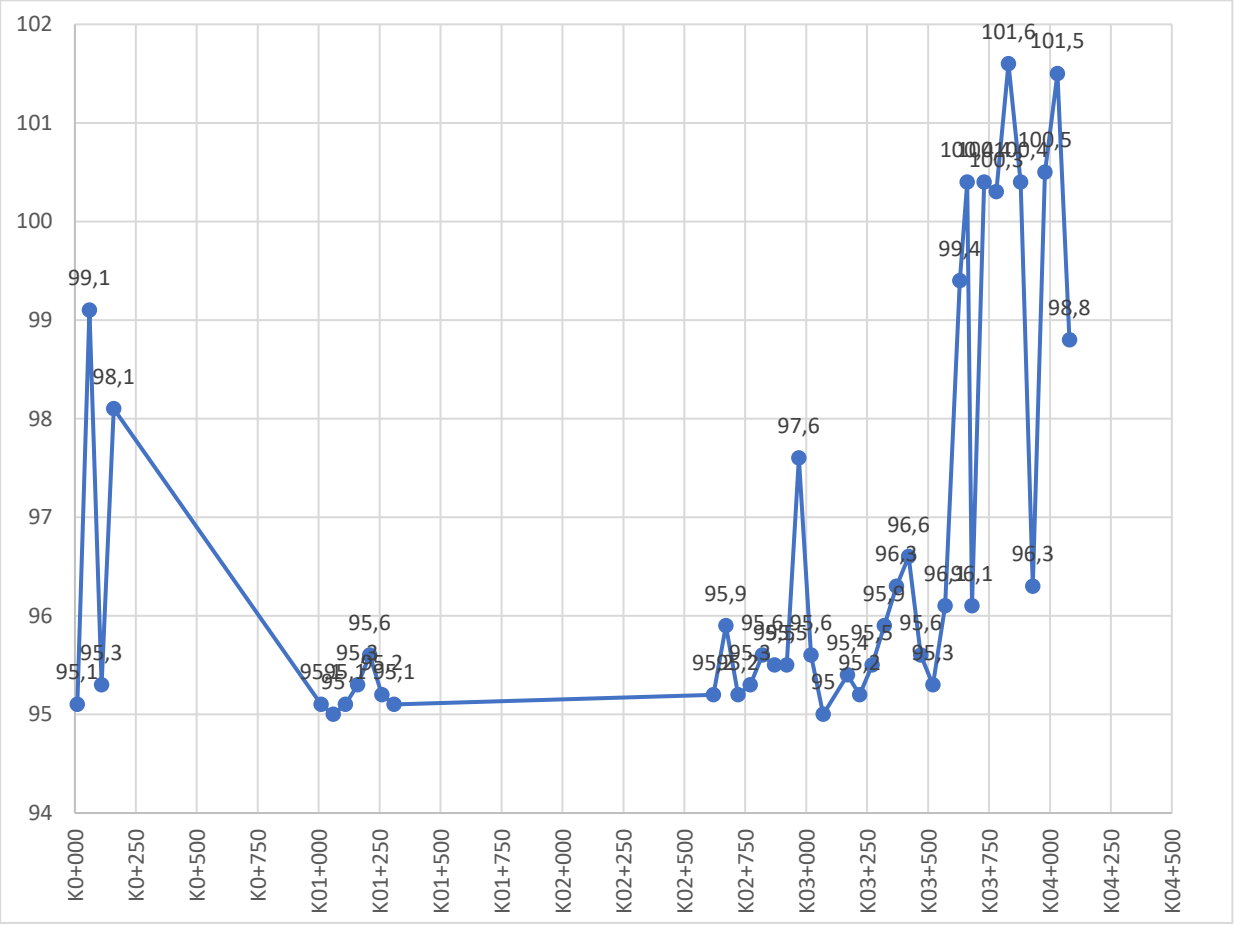

Fuente: elaboración propia, interventoría, recopilación de densidades municipio de Junin

En el primer grafico analizamos que las densidades cumplen en su totalidad con el porcentaje de compactación requerido para aprobación de la capa estabilizada.

gráfico 2. Densidades municipio de Junin del PR 4+500 al PR13+700

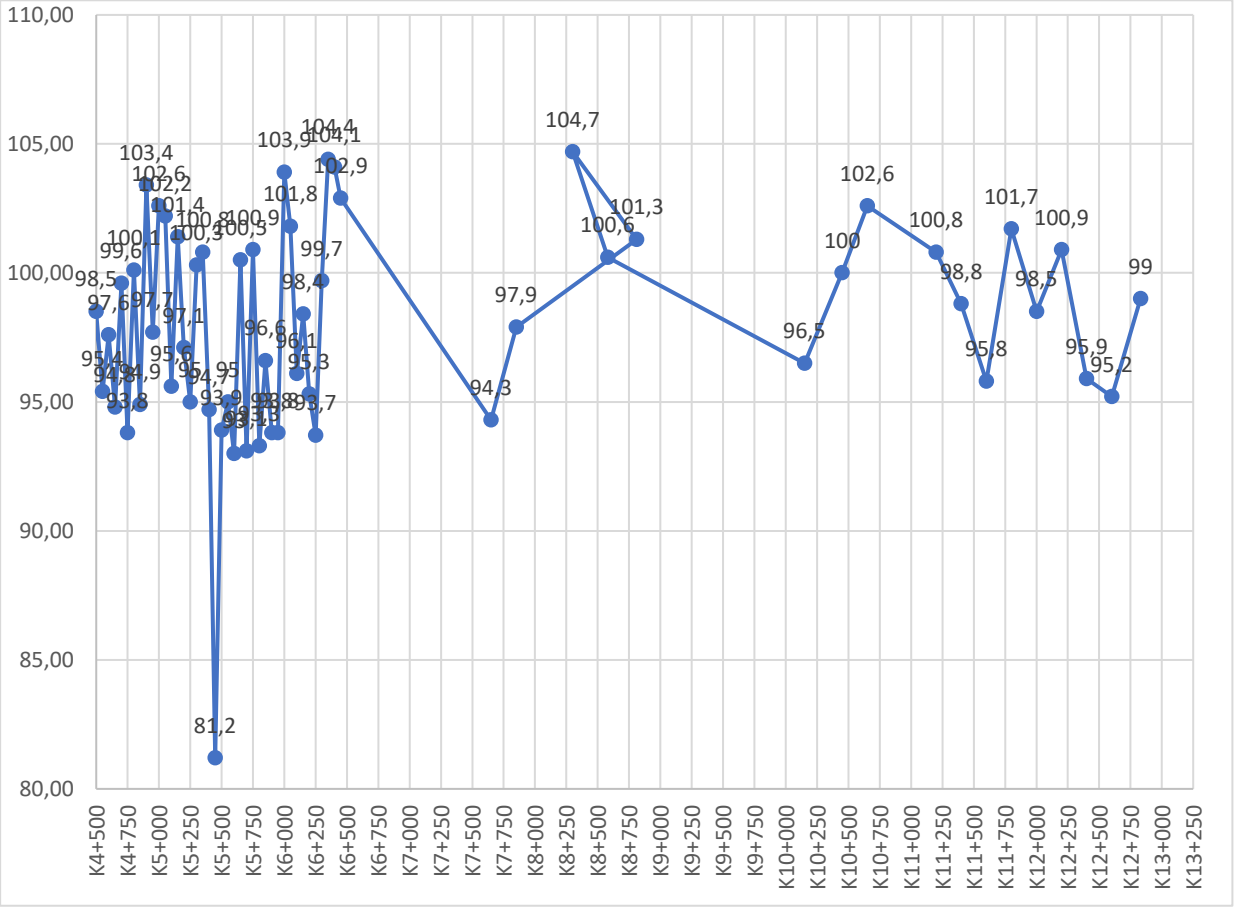

Fuente: elaboración propia, interventoría, recopilación de densidades municipio de Junin

Mientras que en la segunda grafica se percibe un sector entre el PR4+500 al PR6+200 los cuales no alcanzan la resistencia suficiente estando muy cerca del valor de aprobación, estas densidades serán tomadas de nuevo por el equipo de interventoría a fin de verificar nuevamente la resistencia de la capa transcurridos alrededor de 56 días de estabilización de estos tramos.

Se encuentra el caso especial del sector ubicado entre los PR5+400 al PR5+600 donde se tendrá mayor prioridad por parte de interventoría y se realiza el respectivo análisis del tramo una vez se cuente con la información.


- **Resultados ensayos a la rasante estabilizada con cemento más aditivo Proes municipio de Choachí.**

Durante el período correspondiente al mes del presente informe, se llevaron a cabo actividades de seguimiento y control a las obras de tratamiento superficial simple en las diferentes veredas de Choachí. Por parte del Contratista de obra se finalizó la toma de densidades in situ, ejecutadas conforme a la norma INVIAS 164-13 y las mediciones con equipo de deflectómetria de impacto ligero (LWD), realizados de acuerdo con la norma INVIAS E 826-22, las cuales se encuentran pendientes por remitir los resultados. Adicionalmente se encuentra pendiente la toma de la medida del coeficiente de resistencia al deslizamiento usando el péndulo británico conforme a la norma INVIAS 792-13. De igual forma se adjuntan los certificados de materiales en el Anexo 1. Componente técnico / 1.9 Resultados de laboratorios.

- **Resultados ensayos a la rasante estabilizada con cemento más aditivo Proes municipio de Fomeque.**

Durante el período correspondiente al mes del presente informe, se llevaron a cabo actividades de seguimiento y control a las obras de estabilización de rasante en las diferentes veredas intervenidas en el municipio de Fomeque. Como parte del control de calidad, por parte del Contratista de obra se realizaron ensayos de laboratorio en campo, consistentes en pruebas de densidad in situ, ejecutadas conforme a la norma INVIAS 164-13. Estos ensayos se aplicaron entre los PR01+800 a PR06+650 tramos intervenidos durante el mes de marzo, abril y mayo, adicionalmente ensayos de deflectómetria de impacto ligero con equipo LWD, realizados de acuerdo con la norma INVIAS E 826-22, esto con el fin de evaluar las condiciones de compactación y la capacidad estructural de la capa estabilizada, cuyos resultados se presentan y analizan en el presente informe.

Ilustración 1. % Compactación.

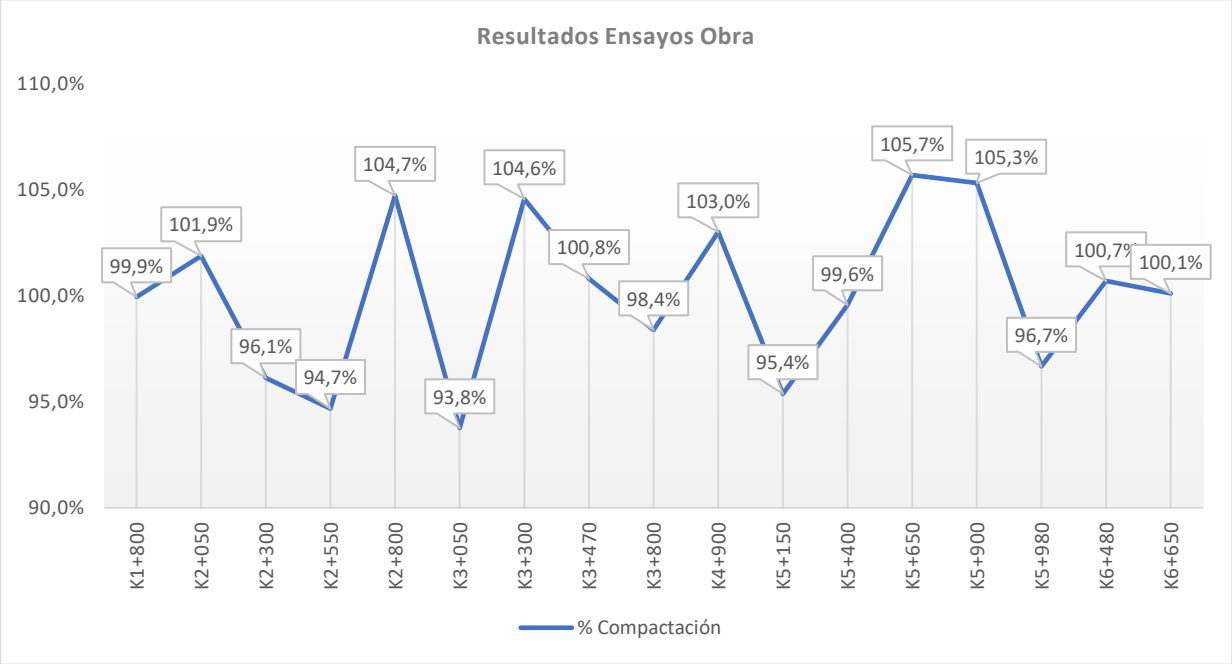

Fuente: Elaboración propia, Interventoría.

Del análisis de los resultados obtenidos en los ensayos de densidad, se evidencia que se tiene un promedio del 100,1% de compactación, frente a esto se concluye que los valores registrados cumplen con los parámetros y criterios establecidos en las especificaciones técnicas del proyecto y en la normativa aplicable. En consecuencia, las capas estabilizadas presentan condiciones satisfactorias de compactación y comportamiento estructural, evidenciando el cumplimiento de los estándares de calidad requeridos para las actividades de mejoramiento de vías terciarias. Frente a los resultados obtenidos del deflectómetria de impacto ligero con equipo LWD, se adjuntan los resultados en el Anexo 1. Componente técnico / 1.9 Resultados de laboratorios, debido al volumen de los resultados de laboratorio, su representación gráfica dentro del cuerpo del informe dificulta la adecuada visualización e interpretación. Por lo tanto, se presentan de manera detallada en la sección de Anexos. De igual forma frente al análisis de los resultados obtenidos en los ensayos de LWD, se evidencio que en los puntos

iniciales se tomaron ensayos previos a la estabilización y posterior a esta, obteniendo valores superiores a los iniciales, frente a esto se concluye que los valores registrados cumplen con los parámetros y criterios establecidos en las especificaciones técnicas del proyecto y en la normativa aplicable. En consecuencia, las capas estabilizadas presentan condiciones satisfactorias de compactación y comportamiento estructural, evidenciando el cumplimiento de los estándares de calidad requeridos para las actividades de mejoramiento de vías terciarias.

- **Resultados ensayos a la rasante estabilizada con cemento más aditivo Proes municipio de Chipaque.**

Durante el período correspondiente al mes del presente informe, se llevaron a cabo actividades de seguimiento y control a las obras de estabilización de rasante en las diferentes veredas de Chipaque. Por parte del Contratista de obra se tomaron densidades in situ y mediciones con equipo de deflectómetria de impacto ligero (LWD) de la totalidad de los tramos intervenidos, dichos resultados se encuentran pendientes por remitir, esto con el fin de evaluar las condiciones de compactación y la capacidad estructural de la capa estabilizada.

- **Resultados ensayos a la rasante estabilizada con cemento más aditivo Proes municipio de Sibaté.**

Durante el período correspondiente al mes del presente informe, no se llevaron a cabo actividades en las diferentes veredas de Sibaté. Por parte del Contratista de obra se encuentran pendientes la toma de la medida del coeficiente de resistencia al deslizamiento usando el péndulo británico conforme a la norma INVIAS 792-13. Adicionalmente se adjuntan los certificados de materiales en el Anexo 1. Componente técnico / 1.9 Resultados de laboratorios.


4.2.1 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría

- **Resultados ensayos Interventoría municipio de Choachí.**

Durante el período correspondiente al mes del presente informe, se llevaron a cabo actividades de seguimiento y control a las obras de tratamiento superficial simple en las diferentes veredas de Choachí. Como parte del control de calidad, por parte de la Interventoría se tomaron la totalidad de ensayos de laboratorio en campo, desde el PR01+597,71 al PR21+409,51, se realizó la toma de densidad y peso unitario del suelo en el terreno por el método del cono y arena in situ, ejecutadas conforme a la norma INVIAS 161-13. Por parte de la Interventoría se tomaron ensayos en las veredas **La Caja, Chatasuga, La Llanada, Maza, Ferralarada, Barronegro, Resguardo Bajo** y **Resguardo Norte**. Estos ensayos se aplicaron con el fin de evaluar las condiciones de compactación y la capacidad estructural de la capa estabilizada, cuyos resultados se presentaron y analizan en informes previos.

De acuerdo con las densidades tomadas por Interventoría se tienen los siguientes resultados los cuales se exponen en la siguiente gráfica:

Ilustración 2. Resultados ensayos de Interventoría

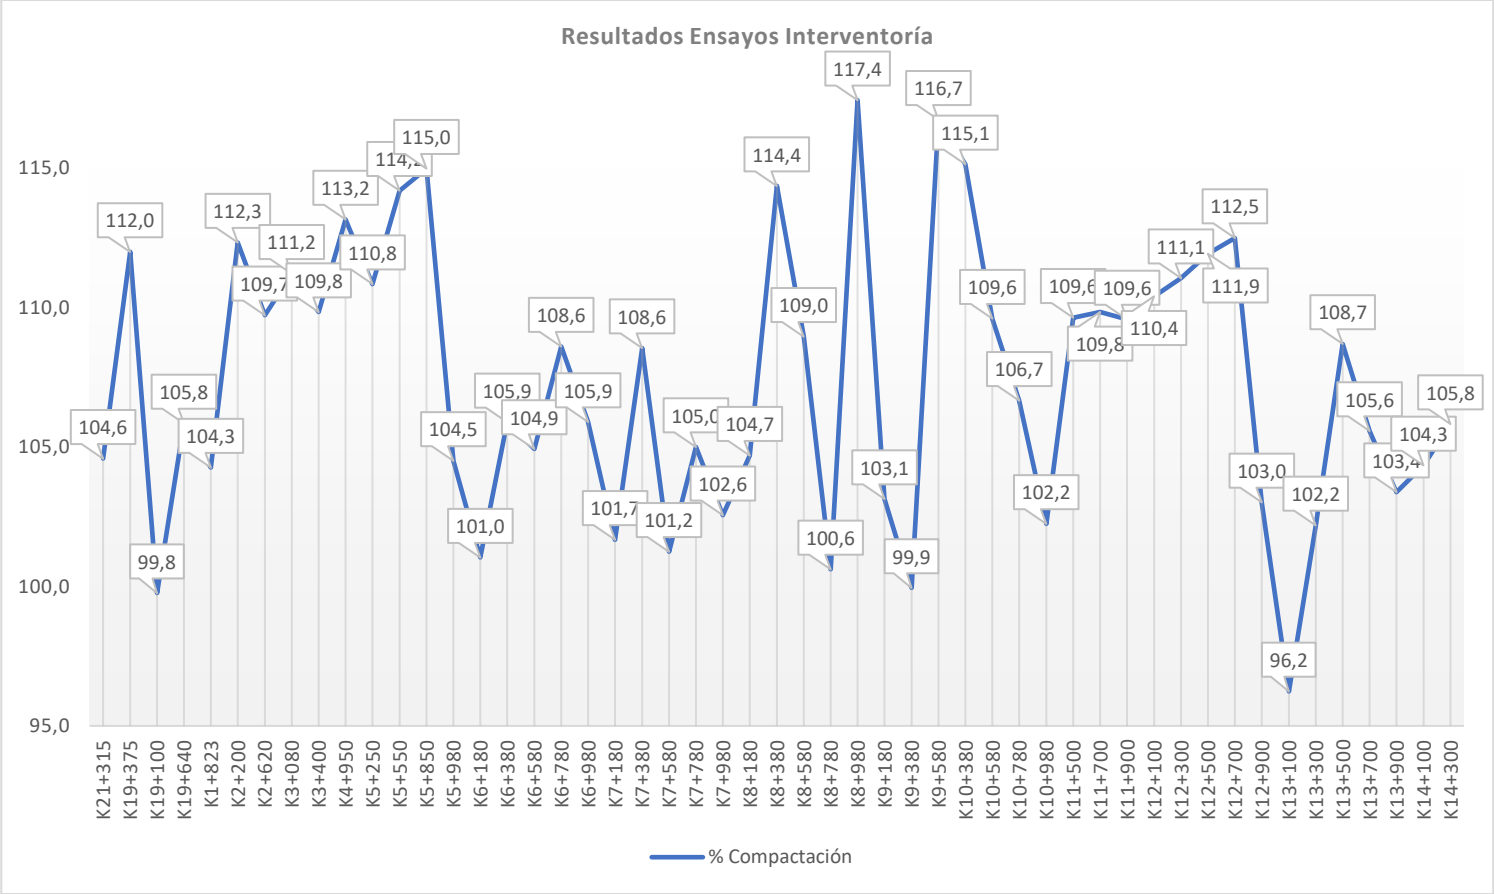

Fuente: elaboración propia

Del análisis de los resultados obtenidos en los ensayos de densidad, se logró evidenciar que se tiene un promedio del 107,4% de compactación, frente a esto se concluye que los valores registrados cumplen con los parámetros y criterios establecidos en las especificaciones técnicas del proyecto y en la normativa aplicable. En consecuencia, las capas estabilizadas presentan condiciones satisfactorias de compactación y comportamiento estructural, evidenciando el cumplimiento de los estándares de calidad requeridos para las actividades de mejoramiento de vías terciarias. De igual forma se adjunta en su totalidad los resultados en el Anexo 1. Componente técnico / 1.9 Resultados de laboratorios.

- **Resultados ensayos Interventoría municipio de Fomeque.**

Durante el período correspondiente al mes del presente informe, se llevaron a cabo actividades de seguimiento y control a las obras de estabilización de rasante en las diferentes veredas intervenidas en el municipio de Fomeque. Como parte del control de calidad, por parte de la Interventoría se realizaron ensayos de laboratorio en campo, consistentes en la toma de densidad y peso unitario del suelo en el terreno por el método del cono y arena in situ, ejecutadas conforme a la norma INVIAS 161-13. Estos ensayos se aplicaron en los diferentes tramos intervenidos con el fin de evaluar las condiciones de compactación y la capacidad estructural de la capa estabilizada, para el corte del presente mes los ensayos tomados se encuentran en revisión por parte de los especialistas de geotecnia y pavimento.

- **Resultados ensayos Interventoría municipio de Chipaque.**

Durante el período correspondiente al mes del presente informe, se llevaron a cabo actividades de seguimiento y control a las obras de estabilización de rasante en las diferentes veredas intervenidas en el municipio de Chipaque. Como parte del control de calidad, por parte de la Interventoría se realizaron ensayos de laboratorio en campo, consistentes en la toma de densidad y peso unitario del suelo en el terreno por el método del cono y arena in situ, ejecutadas conforme a la norma INVIAS 161-13. Estos ensayos se aplicaron en los diferentes tramos intervenidos con el fin de evaluar las condiciones de compactación y la capacidad estructural de la capa estabilizada, cuyos resultados se están analizando por parte de los especialistas de pavimento y geotecnia.

- **Resultados ensayos Interventoría municipio de Sibaté.**

Durante el período correspondiente al mes del presente informe, no se llevaron a cabo actividades en las diferentes veredas de Sibaté. Por parte del Contratista de obra se encuentran pendientes la toma de la medida del coeficiente de resistencia al deslizamiento usando el péndulo británico conforme a la norma INVIAS 792-13. Se está a la espera de la toma de los ensayos pendientes para realizar el análisis por parte de la Interventoría.

- **Resultados ensayos Interventoría municipio de Junín.**
- **CONCRETOS**


Con base en la información suministrada por el laboratorio de la Interventoría GETECNA, se realizó el análisis de los resultados de laboratorio correspondientes a las cinco (5) alcantarillas ejecutadas en el municipio. Del análisis se concluye lo siguiente:

- Las muestras ensayadas para la determinación de la resistencia a la compresión de los cilindros de concretos asociados a zarpas, muros y pocetas de las alcantarillas no alcanzan, en algunos casos, el 95 % de la resistencia especificada para un concreto de 3.000 psi, según los resultados obtenidos por el laboratorio de la Interventoría. No obstante, al efectuar la comparación con los resultados reportados por el laboratorio del contratista, se evidencia que dichas muestras sí cumplen con la resistencia requerida. En consecuencia, las estructuras se consideran aprobadas, teniendo en cuenta que los ensayos del contratista corresponden a resistencias obtenidas después del periodo reglamentario de curado de 28 días del concreto.
- Para el resto de las muestras evaluadas, tanto los resultados del laboratorio de la Interventoría como los del contratista evidencian el cumplimiento de la resistencia especificada para las alcantarillas ubicadas en el tramo intervenido.

DENSIDADES

La interventoría ha realizado un seguimiento de las densidades mediante el método de cono y arena, después de la intervención realizado por el contratista de obra desde el PR0+000 hasta el PR 3+800 realizando una revisión de los trabajos ejecutados que cumplan con los 28 días de curado del cemento para la estabilización de la rasante, los cuales se encuentran en revisión por parte de los especialistas de pavimento y geotecnia. De acuerdo con las densidades tomadas por interventoría se tienen los siguientes resultados consolidados:

Ilustración 3. Resultados ensayos de Interventoría

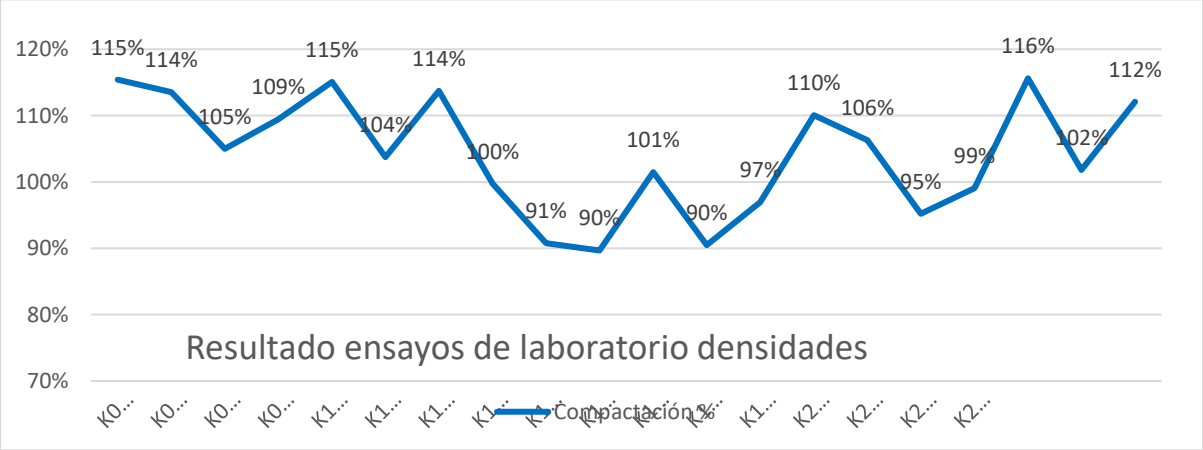

Fuente: elaboración propia

A la fecha no se ha podido concluir con los resultados de laboratorio relacionados con el tema de densidades por parte de interventoría debido a que durante todo el mes se presentaron lluvias lo que no permitió la toma de los resultados faltantes desde el PR4+000 al PR 13+700, tanto para el municipio de gama como para el municipio de Junín.

4.3 Seguimiento al Factor de Calidad de Obra (Plan de Gerencia)

La Interventoría realizó durante el periodo del presente informe el seguimiento al plan de gerencia del contratista, y teniendo en cuenta las líneas base del cronograma, presupuesto y alcance; se realizaron las siguientes actuaciones administrativas:

- Se determina un retraso total del -7,9%, lo cual constituye un incumplimiento de los hitos de programación. Esta desviación tiene su origen en el desfase acumulado de 247 días en la Fase 2 (Laboratorios y caracterización, retrasos y jornadas perdidas por fallas mecánicas, operación y logística del contratista de obra y condiciones climáticas adversas). Como consecuencia técnica directa, existe un vacío de validación que impide la aprobación de actividades críticas. Por ejemplo, en el municipio de Junín, la falta de entrega oportuna de resultados de laboratorio ha bloqueado la recepción técnica de obras de concreto. Ante esta situación, la interventoría ha emitido el oficio 766-758, exigiendo la presentación inmediata de un Plan de Contingencia.
- Se reporta un manejo deficiente de aguas superficiales, este es el principal riesgo de deterioro prematuro para la estructura estabilizada. Se requiere una gestión inmediata sobre los siguientes puntos: Gama: Gestión eficiente con 4 alcantarillas nuevas construidas y la limpieza de 9 estructuras. Ubalá: Estado de alerta. Se reportan 3 alcantarillas en observación y una omisión crítica en el PR 1+240, donde no se ha ejecutado la actividad de encole.
- Se registra el incumplimiento en la entrega del Manual de Mantenimiento de tramos intervenidos (V0), documento vital para la sostenibilidad de la inversión. A pesar de los hitos logrados en Sibaté y Choachí, el proyecto se encuentra en un estado de vulnerabilidad técnica y administrativa por el retraso del -7,9% y la proximidad del 31 de agosto de 2026. Se solicitan las siguientes Acciones Obligatorias:

  - Plan de Contingencia: Radicación y ejecución inmediata de la estrategia para recuperar los 40,30 días de desfase.
  - Manejo Financiero: Subsanación urgente del informe de buen manejo del anticipo de obra de diciembre 2025, enero 2026 y febrero 2026.
  - Corrección Técnica tramos intervenidos: Subsanación de surcos y huellas en la capa estabilizada antes de aplicar el TSS para garantizar la seguridad vial y la adherencia.
  - Laboratorios Junín: Entrega inmediata de resultados de densidades y LWD del tramo PR 4+080 al PR 8+600, cuyo periodo de 28 días ya ha expirado.
  - Realización obligatoria de pruebas de péndulo en Sibaté y Choachí para certificar el coeficiente de fricción del TSS.
  - Manual de Mantenimiento: Entrega definitiva de la versión V0 del manual para la entrega de tramos

- Se remitió al contratista el oficio 766-799 Compromisos pendientes tramos Gama y Junín, provincia del Guavio, del 11 de mayo del 2026, donde se insta al consorcio Sofán C-031 la corrección de cercas en el municipio de Junín y retiro de material en el municipio de Gama. Por otro lado, se radico el comunicado 766-802 Irregularidades en actividades de estabilización de rasante y maquinaria municipio de Ubalá, provincia de Guavio; por deficiencias en el procedimiento de aplicación del aditivo químico no tradicional sobre la mezcla de solo-cemento en los tramos intervenidos en el municipio de Ubalá. Se radicaron al contratista de obra observaciones a los insumos topográficos recibidos del tramo intervenido en el municipio de Sibaté, tras la segunda revisión de Interventoría. Ver oficio 766-806 RESPUESTA SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-735 Entrega de insumos topográficos – Tramo K3+540 a k7+323.23 (Sibaté) – Segunda revisión
- Se radicó al contratista de obra el apremio de incumplimiento N° 1 al contratista de obra por la no entrega de informes mensuales y de inversión del anticipo a

tiempo. Ver oficio 766-798 Apremio de Incumplimiento N°1 y llamado de atención por la NO entrega de informes mensuales de obra, de inversión del anticipo y reportes semanales de ejecución. Se radico al contratista el oficio 766-803 con observaciones al registro fotográfico de los corredores intervenidos, ver oficio Respuesta y revisión N° 2 Registro fotográfico-SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-734. Se emitió la aprobación del informe mensual de marzo tras la revisión número 3. Ver comunicado 766-800 Revisión No 3 y aprobación del INFORME MENSUAL MES DE MARZO 2026 V3- RTA SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-731

- Se reiteró al contratista de obra la necesidad de cumplir con la remisión del plan de contingencia para la recuperación del desfase actual del cronograma de actividades, así como tambien él envió del manual de mantenimiento de los tramos intervenidos, el cual ha sido postergado de manera reiterada, razón por la cual se hizo llamado de atención al respecto. Por otro lado, se recordó al contratista que debe ajustar el balance de PMT y PAGA de acuerdo con las mesas técnicas realizadas en conjunto con interventoría.
- Se radicó a la entidad el modificatorio del contrato de obra ICCU-138-2025 con el cual se incluyen las actividades no previstas TTS y Berma cuenta en concreto, mediante el comunicado 766-807 Radicación de Solicitud de Modificatorio N° 2 al Contrato de Obra ICCU-138-2025 y 766-817 Alcance al oficio 766-807 – Sustento técnico, administrativo, financiero y legal de la Solicitud de Modificatorio N° 2 al Contrato de Obra ICCU-138-2025. Se realizó la revisión N° 1 del informe mensual de obra del mes de abril, ver oficio 766-809 Revisión N° 1 INFORME MENSUAL MES DE ABRIL 2026 V1- RTA SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-741. Se realizó la viabilidad del ajuste de los tramos de intervención del municipio de Fómeque, considerando la reducción del alcance según los balances presupuestos de intervención actualizaos con cierre de cunetas en concreto. Ver oficio 766-814

Respuesta al oficio SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-746 Radicado de tramos por intervenir después de ajustarse al presupuesto balanceado – Fomeque.

- Se dio respuesta a la documentación requerida por interventoría para el cumplimiento de estándares de ARL. Ver oficio 766-819 Respuesta al oficio N.º SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-757, Estándares mínimos por ARL y Ministerio de Trabajo del SG-SST. Se hizo el requerimiento formal al contratista de obra por insuficiente personal en obra, ver oficio 766-820 Requerimiento por insuficiencia de personal y ausencia de implementación del PMT. Se realizaron observaciones de seguridad en obra en el tramo de Fómeque, ver oficio. 766-821 Observaciones de seguridad y supervisión en punto de obra – Fómeque. Se dio respuesta al contratista de obra por actividades de limpiezas observadas en el municipio de Ubalá, ver oficio 766-825 RESPUESTA OFICIO SOFAN-FOR-CO-03-755.
- Se realizó la viabilidad de los tramos de intervención ajustados al cierre presupuestal de TTS y cunetas en el municipio de Fómeque, ver oficio 766-814 Respuesta al oficio SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-746 Radicado de tramos por intervenir después de ajustarse al presupuesto balanceado – Fomeque. Se realizó requerimiento técnico, administrativo y financiero al contratista por el desfase actual de la reprogramación de obras, conminándolo a presentar de manera urgente el plan de contingencia y de acción para recuperar el desfase de la línea base N4 del cronograma, así como tambien ar cumplimiento a la implementación de 5 frentes de obra en simultaneo según el anexo técnico. Ver oficio 766-815 Requerimiento técnico, administrativo, financiero y legal por retraso acumulado del10,88% en la ejecución del contrato de obra ICCU-138-2025. Se dio respuesta al contratista para la validación de informe ejecutivo de aprobación de productos de fases i y ii donde se relaciona el consolidado de aprobaciones por municipio, ver oficio 766-837 Respuesta al comunicado SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-761 —

Radicación del informe resumen de la Fase II del Contrato de Obra ICCU-138 de 2025

- Se realizó alcance al oficio de radicación del modificatorio N° 2 al contrato de obra ICCU 138 2025 para dar mayor contexto a la inclusión de los ítems NP de Tratamiento superficial y berma cuneta en concreto, desde la Fase de caracterización del contrato, y aprobaciones de fórmulas de trabajo y recomendaciones técnicas y constructivas aprobadas en los informes de caracterización geotécnica. Ver oficio 766-817 Alcance al oficio 766-807 – Sustento técnico, administrativo, financiero y legal de la Solicitud de Modificatorio N° 2 al Contrato de Obra ICCU-138-2025. Se dio cierre a la solicitud de cotización de cunetas prefabricadas en concreto, ver oficio 766-833 Acuse de recibo comunicado SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-743 y cierre del trámite de APUS de cuneta prefabricada. Se realizó alcance de carácter informativo a la entidad para la corrección de dato de precios y longitud en la solicitud del contratista de obra, ver oficio 766-839 Alcance informativo a la Solicitud de Modificatorio N° 2 al Contrato de Obra ICCU-138-2025 (oficios 766-807 y 766-817)

4.3.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo

La Interventoría realizó seguimiento al Plan de Inversión del Anticipo presentado por el Contratista de Obra CONSORCIO SOFAN C-031, por un total acumulado aprobado y tramitado por interventoría de $10.105.667.370,00 del anticipo de obra del contrato ICCU-138-2025, conforme al plan de inversión del anticipo de obra V4 aprobado mediante el comunicado *766- 664 Revisión y aprobación – Plan de Inversión Anticipo V4 – Respuesta al comunicado SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-622* del 05 de marzo del 2026.

Se remitieron observaciones a los informes de seguimiento de anticipo de los meses de diciembre del 2025, mediante el comunicado *766-827 Observaciones Informe de*

seguimiento anticipo No. 6 – diciembre v2. Respuesta oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-742, del 28 de mayo de 2026, enero del 2026, mediante comunicado *766-828 Obs Informe seguimiento anticipo 7 v2 - Rta SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-744*, del 28 de mayo de 2026, febrero del 2026, mediante comunicado *766-829 Obs Informe Buen Manejo del Anticipo No. 8 v2 - Rta SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-745*, del 28 de mayo de 2026 y marzo del 2026, mediante comunicado *766-830 Obs Informe Buen Manejo del Anticipo No. 9 - Rta SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-748*, del 28 de mayo de 2026.

De acuerdo con el seguimiento al plan de inversión del anticipo de obra, se tiene el siguiente estado:

Ilustración 4. Control inversión del anticipo de obra a corte del 31 de mayo del 2026

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO V4	DESEMBOLSO GIRO N° 10	SALDO APROBADO RESTANTE DESPUÉS DE GIRO N°10
1	COSTO DE MANO DE OBRA (PERSONAL DIRECTO E INDIRECTO)	$ 2.652.935.144,79	$ 198.401.019,79	$ -
2	INSUMOS Y MATERIALES	$ 4.642.015.015,21	$ 389.167.009,00	$ 10.832.991,00
3	COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	$ 2.571.481.979,00		$ -
4	REPUESTOS PARA MAQUINARA Y EQUIPOS	$ 126.017.708,00		$ -
5	TRANSPORTE DE MATERIALES	$ 124.050.514,00		$ -
6	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	$ (488.570.207,00)		$ -
TOTAL		$ 10.116.500.361,00	$ 587.568.028,79	$ 10.832.991,00

Fuente: elaboración propia

Así las cosas, se ha invertido a la fecha un 99,89% del anticipo de obra, manteniendo los rubros del plan de inversión de acuerdo con la versión 4 del plan de inversión del anticipo de obra aprobado.

4.3.2 Seguimiento Programa de Obra

En el Informe Semanal No.59 correspondiente al período semanal del 1 al 31 de mayo del 2026, se registró el control de programación así:

Tabla 35. Avance físico del contrato

AVANCE FISICO DEL CONTRATO			
	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	57,07%	45,35%	-11,36%
Durante el periodo	2,36%	0,67%	-1,69%
Acumulado Actual	59,43%	46,01%	-13,42%

Fuente: informe semanal No.59

Se registró un porcentaje de ejecución acumulado del 46.01% de acuerdo con la reprogramación de actividades de la prórroga N°1 hasta el 31 de agosto del 2026. Es decir, un porcentaje de avance del 3,37% durante el mes de mayo. Esto se traduce en un porcentaje de atraso del -13,42%, no obstante, por parte de esta interventoría se emitió comunicado frente a los frecuentes daños de la maquinaria y de igual forma para que el contratista a garantice los 5 frentes de ejecución simultaneas en aras de mantener la línea base del cronograma en los siguientes periodos, así y cumplir con el anexo técnico.

En cuanto al avance físico de la capa estabilizada, se tiene un avance de 38.034,33 ml, ejecutados en las provincias de Oriente, Soacha y Guavio, esto es la sumatoria de haber completado satisfactoriamente la ejecución de estabilización de rasante en los municipios de Choachí, Chipaque, Sibaté, Junín y Gama, y los adelantos en los Fomeque y Ubalá.

A continuación, se presenta el avance presupuestal del contrato de obra ICCU-138-2025:

Tabla 36. Avance financiero de acuerdo con los capítulos de ejecución

No.	Indicadores	Valores (+AIU)	Porcentaje valor total del contrato	Diferencia (+) adelanto (-) atraso
1	Valor acumulado programado	$ 20.405.650.394,00	**57,72%**	**-13,03%**

2	Valor acumulado ejecutado	$ 15.798.613.795,00	**44,69%**	

Fuente: Elaboración propia, interventoría

Se reporta un retraso del -13,03% en el avance financiero con respecto a la reprogramación de actividades de la prórroga N° 1 al contrato de obra.

Tabla 37. Avance de actividades de obra por fases

EDT	Descripción de la actividad	Avance de obra (% ejecutada inversión acumulada)		
		Por capitulo		Diferencia (+) adelanto (-) atraso
		Programado	Ejecutado	
0	**Redistribución de actividades**	**57,72%**	**44,69%**	**-13,03%**
A	Fase 1 – Caracterización	100,00%	100,00%	0%
B	Fase 2 – Laboratorios	100,00%	100,00%	0%
C	Fase 3 – Obra	59,43%	46,01%	-13,42%

Fuente: elaboración propia, interventoría

5 Información contrato de interventoría

5.1 Información general del contrato de interventoría

Durante el presente periodo de este informe, no se presentaron modificaciones del contrato ICCU-219-2025.

Número del proceso de selección	ICCU-CM-050 de 2024.
Resolución de adjudicación del contrato No.:	099 de 2025.
No. CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal) y Fecha:	DIS- 2025000090 de lunes, 27 de enero de 2025.
No RP (Registro Presupuestal) y Fecha	RES- 000425 de lunes, 10 de marzo de 2025.
Número del contrato ICCU:	219 DE 2025.
Fecha de suscripción del contrato:	30 de marzo de 2025.

Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
Contratista:	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC, NIT. 901.915.404 – 8, representado legalmente por **SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA** y conformado por: • ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. BIC., con NIT.:901.915.404-8, con una participación del noventa por ciento (50%). • CANJI DISEÑOS E INTERVENTORÍAS S.A.S., con NIT.:901.324.813-0, con una participación del noventa por ciento (50%).
Valor inicial:	$3.865.474.620,00 TRESMIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE.
Adiciones:	NINGUNA.
Modificaciones:	MODIFICATORIO NO 1 EN CUAL SE ACLARA QUE EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES LA NO DIS-2025000420 Y AL ACLARATORIO NO 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO ICC-219 DE 2025
Aclaraciones:	NINGUNA.
Suspensiones:	NINGUNA.
Cesiones de participación contractual:	NINGUNA.
Plazo:	Once (11) meses y quince (15) días o hasta el 31 de diciembre de 2025, lo que primero ocurra.
Prorroga 1:	8 meses hasta el 31 de agosto del 2026
Fecha de inicio:	9 de abril de 2025.
Fecha de terminación contractual:	31 de diciembre de 2025.

Fecha de terminación actualizada prorroga 1	31 de agosto del 2026

Fuente: elaboración propia

5.2 Informe semanal

Durante el periodo mensual de mayo la Interventoría envió al ICCU los Informes Semanales **No.56, No.57, No.58 y No.59** correspondientes a las semanas dentro de este período, cabe resaltar que todos los informes presentados a continuación fueron también presentados en formato Excel y contienen cada uno de los componentes de obra del contrato técnico, social, ambiental y salud y seguridad y un registro fotográfico detallado de cada una de las actividades realizadas cada semana, mediante el formato MS-GP-FR-034 INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA. Estos son anexados en un paquete formato Excel y en PDF de la carpeta de componente técnico. Ver anexo 1.2 Informes semanales, dentro de la carpeta 1. Componente técnico de los anexos del informe mensual del mes de abril.

5.3 Descripción de las actividades realizadas por el Interventor

Durante este período la Interventoría realizaron las siguientes actividades:

- Se presentaron los informes **semanales No.56, No.57, No.58** y **No.59** en las condiciones establecidas para la correcta ejecución de la interventoría.
- Se reiteró al contratista la obligación de cumplir con las fechas establecidas para la entrega de informes, con el fin de que la interventoría pudiera gestionar oportunamente el informe de gerencia ante la supervisión ICCU. No obstante, el contratista de obra incumplió la entrega del informe correspondiente a abril de 2026, en consecuencia, mediante **oficio No. 766-798**, la interventoría notificó el Incumplimiento N°1 y llamado de atención por la NO entrega de informes mensuales de obra, de inversión del anticipo y reportes, el 11 de mayo a fin de que no se presenten atrasos en la presentación de los documentos contractuales del contratista de obra.

- Se asiste de manera presencial y/o virtual a las **reuniones programadas** dentro del desarrollo del contrato de interventoría, las cuales se realizaron 4 reuniones de comité de obra los días 06, 13, 20 y 28 de mayo del 2026, de manera semanal los **miércoles o jueves**, con el fin de efectuar seguimiento técnico, administrativo, financiero, social, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo al proyecto.
- Se radicó el modificatorio de obra N° 2 al contrato de obra ICCU-138-2025, mediante el cual se incluyeron las actividades no previstas, Tratamiento Superficial Simple y Berma Cuneta en concreto.
- En relación a la inclusión del ítems NP7-CUNETA-BERMA DE CONCRETO 3000 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR e=0,12m ancho=1 m, 0,80 m y 0,6 m (incluye formaleta y retiro de material) obedece al reemplazo del ítems contractual 4.7 CUNETA EN GEOMEMBRANA DE POLIETILENO HDPE 0.75MM, que estructuralmente presenta limitaciones frente a las condiciones reales de servicio, toda vez que no ofrecen la resistencia suficiente ante el punzonamiento, arrastre y además son de fácil remoción y retiro, y en los sectores donde funcionan como berma debido a las condiciones geométricas no es apta para soportar cargas provenientes del paso del tránsito en los corredores. Luego de la evaluación técnica, económica y presupuestal de las alternativas presentadas por el contratista a saber, manto en concreto, cunetas en material estabilizado, supercompuesto tricapa y cunetas en concreto reforzado de 3000 PSI y cunetas en elementos prefabricados en concreto; la interventoría avalo técnicamente y aprobó los APUS de los Ítems NP7 para las provincias por ser los que representan mayor duración y resistencia estructural, y facilita el mantenimiento mecánico en los corredores intervenidos.
- A partir de las consideraciones técnicas y jurídicas expuestas anteriormente, se relaciona el vínculo con el aspecto económico del contrato de obra ICCU-138-2025:
    - Conceptos de inversión:

- - Ítems no previstos NP6 y NP7 relacionados anteriormente, las cuales son necesarios para garantizar los resultados de los productos de caracterización de la fase del contrato de obra ICCU-138-2025.
- Cuantificación:
- -La presente modificación no implica la adición presupuestal. Así las cosas, los ítems a incluir suman una inversión de $12.774.754.777,42 del presupuesto contractual, los cuales se balancean con los ítems contractuales del presupuesto inicial, incluyendo el ajuste de las cantidades de intervención el 11 corredores viabilizados y radicados a la entidad mediante el comunicado 766-768 Notificación-Viabilidad de escenarios para las cuatro provincias del Lote 1- RTA FOR-CO-03-720 y 725 entrega de Balances actualizados; el cual se presentó en el capítulo anterior de actividades a desarrollar

- Se instó al contratista a subsanar el plan de contingencia presentado para recuperar el retraso de reprogramación de actividades, y dar cumplimiento al anexo técnico, que exige la ejecución simultanea de 5 corredores del lote 1. Si bien es cierto, que se está tramitando la modificación del contrato por la inclusión de Ítems no previstos, es responsabilidad exclusiva del contratista cumplir con el anexo técnico y con la línea del cronograma vigente. Ver oficio 766-815 Requerimiento técnico, administrativo, financiero y legal por retraso acumulado del10,88% en la ejecución del contrato de obra ICCU-138-2025.

5.4 Informe del Programa Anual de Caja – PAC

Se reporta una ejecución de TRESCIENTOS NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y OCHO PEZO cm/cte. ($ 309.236.199,48) de acuerdo con lo que se tenía establecido de acuerdo con el Programa Anualizado de Caja remitido con la justificación de la prórroga N° 1 al contrato de Interventoría ICCU-219-2025. (PAC) presentado por la Interventoría, en el cual para

el mes de MAYO se tenía establecido ejecutar $ 309.236.199,48 sin tener en cuenta el veinte por ciento (20%) por amortización del anticipo. Ver Anexo 1.8 dentro de la carpeta 1. Componente técnico

6 Reportes ejecución mensual contrato de interventoría

6.1 Equipo y vehículos Contrato de Interventoría

A la fecha de este informe se mantiene la misma cantidad de vehículos y equipos utilizados para las actividades que debe ejecutar la interventoría para este periodo, sin embargo, se realizó cambio de camioneta de la interventoría, toda la documentación relacionada con la camioneta de placas LZN651 se anexara en la carpeta indicada al final de este párrafo, de igual manera con los programas y aplicativos necesarios para los informes de interventoría. Ver en carpeta componente SST, anexo 11, informe.

6.2 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría

A continuación, se presenta la información correspondiente a las contrataciones directas y de subcontratistas realizadas por parte del Consorcio Intervención AC.

Tabla 38. Personal de la interventoría, periodo mes de febrero

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEDICACIÓN
Cristian Moreno Arias	Director de Obra	100%
Roberto Carlos López	Director de Obra	100%
Byron Aguirre Díaz	Ingeniero Residente Técnico	100%
Anderson Sierra	Ingeniero Residente Técnico	100%
Cristian Liñán	Profesional Ingeniero Apoyo	100%
Cristian Camilo Silva	Residente Social	100%
Lady Johanna Jiménez	Residente Salud y Seguridad	100%
Catherine Castellanos	Especialista Ambiental	100%
Helbert Casallas	Topógrafo	100%

Natalia Chasoy	Topógrafo	100%
Nelson Ávila	Cadenero 1	100%
Cristian Mancipe	Cadenero 2	100%
Esteban Barrera	Cadenero 3	100%
Marcela Aguilar	Cadenero 4	100%
Tania Jiménez	Cadenero 5	100%
Diana Casallas	Secretaria	100%
Natalia Rodríguez	Especialista Ambiental 1	100%
Erica Mendoza V	Profesional Siso 2	100%
Manuel Mueses	Profesional Siso 2	100%
Mirna González	Topógrafo 3	100%
Robinson Hernández	Topógrafo 4	100%
Yuly Emma Cristancho	Profesional Gestor Social 2	100%
Wendy Delgado	Profesional Gestor Social 4	100%
Ana María Houghton	Profesional Gestor Social 5	100%
Laurenth Melissa Copete	Cadenero 2	100%
Ana María Correa	Cadenero 4	100%

Fuente: personal de interventoría informe componente SST

Tabla 39. Personal de interventoría-personales especialistas

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEDICACIÓN
Angela Salazar Herrera	Geotecnia	40%
Luis Felipe Morales	Geotecnia	40%
Oscar Javier Caballero Chaves	Geotecnia	40%
Daniel Vargas Rozo	Pavimentos	50%
Neymar Castaño Peláez	Pavimentos	50%
Néstor Bahos Canencio	Pavimentos	50%

Fuente: personal de interventoría informe componente SST

De acuerdo con las actividades de este periodo la Interventoría presenta la Seguridad Social que se encuentra en el Anexo 2.

10. RETIRO DE PERSONAL INTERVENTORÍA:

Para el periodo evaluado, se presentaron dos retiros por parte de la interventoría.

Tabla 40. Retiro de personal de interventoría

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEDICACIÓN
Laura Peñuela	Residente Social	100%
Juan Camilo Cruz	Inspector Vial	100%

Fuente: personal de interventoría informe componente SST

De acuerdo con las actividades de este periodo la Interventoría presenta la seguridad social que se encuentra en el anexo 2, carpeta componente SST.

9 de la carpeta de la interventoría. Para este período no hubo retiro de personal por parte de la Interventoría de Obra. También se anexa Formato MS-GC-FR-013 herramienta de base revisión cálculo de seguridad social que se encuentra en la carpeta Anexo 3 cálculo del IBC vinculado.

6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

De acuerdo con la propuesta económica de la Interventoría de Obra el CONSORCIO INTERVENCIÓN AC para el LOTE 1 El ICCU la contrató por un valor de **tres mil ochocientos sesenta y cinco millones cuatrocientos setenta y cuatro mil seiscientos veinte pesos ($3.865.474.620)**, para el presente Informe Mensual se reporta una ejecución de TRESCIENTOS NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y OCHO PEZO cm/cte. (309.236.199,48) de las actividades correspondientes a las Fases II y III que se desarrollaron durante el período del **primero (01) al treinta (30) de mayo de 2026.** A continuación, se refleja el registro acumulado del total ejecutado por la interventoría.

Tabla 41. Valor acumulado de actividades ejecutadas por parte de la interventoría

No.	MES	VALOR
1	Abril	$ 70.693.378,00
2	Mayo	$ 113.748.530,00
3	Junio	$ 117.933.760,00
4	Julio	$ 123.536.875,00
5	Agosto	$ 151.180.575,00
6	Septiembre	$ 185.919.650,00
7	Octubre	$ 188.396.087,60
8	Noviembre	$ 213.782.310,00
9	Diciembre	$ 224.729.754,27
10	ene-26	$ 213.782.310,00
11	feb-26	$ 213.782.310,00
12	mar-26	$ 306.658.152,24
13	abr-26	$ 309.236.199,48
14	may-26	$ 309.236.199,48
	VALOR ACUMULADO	**$ 2.742.616.091,07**

Fuente: elaboración propia

Este valor acumulado correspondería SETENTA PUNTO NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (70,95%) de los recursos destinados para el contrato de interventoría.

6.4 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

A partir del acta de inicio firmada el **09 de abril de 2025**, se firmó acta de inicio del contrato de obra, a la fecha no se ha generado ninguna suspensión del contrato de obra. Dado el modificatorio N° 1 se actualizaron las pólizas del acta de inicio al anexo 3 de la póliza de responsabilidad civil extracontractual y póliza de cumplimiento de esta manera se anexa la actualización mencionada anteriormente. Se realizó la prórroga 1 al contrato de interventoría ICCU-219-2025, por lo que se actualizaron las pólizas de este, y se encuentran dentro de los anexos.

Ver anexo 1.3 Actas aprobación de pólizas

6.5 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría

6.5.1 Seguimiento al Factor de Calidad Contrato de Interventoría

Se realizo verificación de la documentación de los vehículos y conductores de la maquinaria que se reportó en el mes por parte de la interventoría, dentro de la documentación se verifico estado de tarjeta de propiedad del vehículo SOAT, tecno mecánica, licencias de conducción de los conductores del contratista de obra.

Adicionalmente se han realizado los ensayos correspondientes a las intervenciones de actividades de la fase 3, que se anexan en la carpeta de laboratorios.

Ver numeral 4.2.1

6.6 Otros Documentos seguimiento mensual

6.6.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo

La Interventoría presentó El Plan de Inversión del anticipo mensualizado y fue actualizado para aprobación del ICCU mediante el oficio 766-818 alcance- Solicitud de aprobación de actualización del Plan de Inversión del Anticipo de Interventoría. Se presenta el informe de buen manejo del anticipo de Interventoría de mayo 2026.

Tabla 42. Estado actual del anticipo de Interventoría CTO ICCU-219-2025

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%	MAYO 2026	EGRESO ACUMULADO 31 de mayo 2026	% INVERTIDO	SALDO A CORTE DEL 31 de mayo 2026
1	HONORARIOS Y NÓMINA	$ 305.672.048,35	39,54%		$ 132.984.030,35	17,20%	$ 172.688.018,00
2	ALQUILER Y/O COMPRA DE VEHICULOS	$ 351.840.180,00	45,51%		$ 351.840.180,00	45,51%	$ -
3	EQUIPOS DE MEDICIÓN, ENSAYO DE LABORATORIO Y TOPOGRAFIA	$ 52.568.160,00	6,80%		$ 52.568.160,00	6,80%	$ -
4	DOTACIÓN OFICINA, ARRENDAMIENTOS, INSUMOS Y SUMINISTROS	$ 26.874.617,65	3,48%		$ 26.874.617,65	3,48%	$ -
5	DEDUCCIONES IMPUESTO TIMBRE	$ 32.482.980,00	4,20%		$ 32.482.980,00		
6	RETIRO ADICIONAL POR ERROR DE TESORERIA-PTE DEVOLUCIÓN				$ 55.625.433,00		
7	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				$ 33.970,37		
8	DEVOLUCIÓN RENDIMIENTOS				$ 29.703,00		
9	IMPUESTOS Y COMISIONES BANCARIAS	$ 3.656.938,00			$ 3.767.427,95		
10	PENDIENTE DEVOLUCIÓN RENDIMIENTO						$ 4.267,37
11	SALDO A FAVOR DE INTERVENTORIA						$ 938.141,20
12	DEVOLUCION RETIROS NO AUTORIZADOS				$ 55.723.443,00		
	TOTAL	**$ 773.094.924,00**	**100%**		**$ 600.415.118,58**	**72,99%**	**$ 173.630.426,57**

Fuente: elaboración propia

Ver Anexo 1.13 Informe de buen manejo del anticipo de Interventoría

6.7 Actas de Comité de Obra

Durante el periodo comprendido entre el **1 al 31 de mayo** se realizaron tres actas en campo, y se cumplió con las cuatro reuniones de seguimiento entre contratista, interventoría y la supervisión del ICCU a fin de revisar el avance de obra que se vienen ejecutando, estas fueron diligenciadas en el formato ES-MC-FR-06_ACTA DE REUNION. Ver anexo

- Acta de comité de obra fecha: 06/05/2026
- Acta de comité de obra fecha: 13/05/2026
- Acta de comité de obra fecha: 20/05/2026
- Acta de comité de obra fecha: 28/05/2026

Tanto las actas de comité de obra como las actas de reunión se encuentran en trámite de ser firmadas por los asistentes.

7 Conclusiones y recomendaciones

- ✓ Durante el mes de mayo de 2026, la interventoría mantuvo el seguimiento integral a los componentes técnico, administrativo, financiero, legal, social, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo del contrato de obra ICCU-138-2025, en cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría ICCU-219-2025.
- ✓ En relación con el avance de las fases del contrato de obra, se reporta que la Fase I – Diagnóstico y Caracterización Vial cuenta con aprobación del 100% de los 11 municipios del Lote 1, finalizada el 12 de diciembre de 2025. De igual forma, la Fase II – Caracterización de Materiales y Propuesta de Intervenciones alcanzó el 100% de aprobación, finalizada el 24 de abril de 2026, y radicada ante la entidad mediante el comunicado 766-777 del 30 de abril de 2026. La Fase III – Intervención de las vías registra una ejecución acumulada del 46,01% y un avance durante el periodo del

1,60%, con un atraso del 13,42% respecto a la reprogramación de actividades con línea base N°4 aprobada el 19 de diciembre de 2025. Lo que establece un posible incumplimiento debido al retraso presentado.

- ✓ En el componente financiero, la ejecución acumulada del contrato de obra alcanzó la suma de $15.798.613.795 y la ejecución durante el periodo fue de $1.161.765.599,72, lo que representa un avance financiero acumulado del 44,69% frente al valor total del contrato, con un desfase del -13,42% respecto a lo programado.
- ✓ En materia administrativa y gerencial, la interventoría realizó la aprobación de los informes mensuales de los meses de marzo de 2026, y remitió observaciones al informe del mes de abril de 2026, cuya subsanación fue entrega y finalmente aprobada mediante oficio 766-847 con aprobación parcial teniendo en cuenta que faltaba subsanar algunas observaciones del componente ambiental.
- ✓ Durante el periodo evaluado, se adelantó el trámite correspondiente al Modificatorio N° 2 del Contrato de Obra, presentado por el contratista, como resultado de la necesidad técnica de incorporar dos (2) ítems no previstos inicialmente dentro del alcance contractual. Dichos ítems corresponden a: NP7 – Cuneta-Berma de concreto de 3.000 psi fundida en sitio, espesor e = 0,12 m y anchos de 1,00 m, 0,80 m y 0,60 m, propuesto en sustitución del ítem contractual 4.7 Cuneta en geomembrana de polietileno HDPE de 0,75 mm; y NP6 – Tratamiento Superficial Simple (TSS), planteado en reemplazo del ítem contractual Tratamiento Superficial Doble con emulsión CRR-2. Para el desarrollo y sustentación del trámite, la Interventoría emitió el oficio N° 766-792, mediante el cual se impartieron las instrucciones, lineamientos y requisitos para la presentación formal de la solicitud de modificación contractual, en atención al comunicado SOFAN-FOR CO-03-ICCU031-729 remitido por el contratista. Lo anterior con el fin de garantizar la adecuada justificación técnica,

económica y contractual de los cambios propuestos, así como su respectiva evaluación y aprobación conforme a las disposiciones establecidas en el contrato.

- ✓ La interventoría reitera que la definición oportuna de las obras de drenaje longitudinal resulta determinante para garantizar la estabilidad y calidad de los corredores que ya cuentan con la capa estabilizada, los cuales podrían verse afectados por la ausencia de cunetas, especialmente ante las condiciones climáticas propias de la temporada invernal que se presenta en el periodo actual. Ante esta situación, se conminó al contratista mediante comunicación formal a la implementación del tratamiento superficial simple (TSS) en los tramos que ya cuentan con capa estabilizada, como medida de mitigación frente a los eventos climáticos.
- ✓ se reitera la necesidad de que el contratista de obra dé cumplimiento estricto a los plazos contractuales establecidos para la presentación de los informes mensuales de obra, los informes de inversión y buen manejo del anticipo, así como de los reportes semanales de ejecución y demás entregables requeridos. El cumplimiento oportuno de estas obligaciones resulta fundamental para garantizar el adecuado seguimiento técnico, administrativo, financiero y contractual del proyecto, así como para evitar afectaciones en la gestión y trámite de la información por parte de la Interventoría ante la Supervisión del ICCU. En este sentido, mediante oficio N° 766-798 "Apremio de Incumplimiento N 1 y llamado de atención por la no entrega de informes mensuales de obra, de inversión del anticipo y reportes semanales de ejecución", la Interventoría efectuó el respectivo requerimiento formal al contratista, instándolo a implementar las acciones necesarias que permitan mejorar la oportunidad, calidad y cumplimiento en la entrega de la documentación contractual exigida.
- ✓ Se reitera la obligación del contratista de garantizar el pago oportuno y completo de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de todo el personal vinculado al proyecto, incluidos empleados directos, proveedores y subcontratistas, en

cumplimiento de la normatividad laboral vigente y de las obligaciones contractuales adquiridas. Durante la revisión documental correspondiente al mes de marzo se evidenciaron inconsistencias en los soportes y oportunidades de pago de algunos aportes, situación que motivó la formulación de observaciones y llamados de atención por parte de la Interventoría. En consecuencia, se recomienda fortalecer los mecanismos internos de control y seguimiento administrativo, con el fin de asegurar el cumplimiento permanente de estas obligaciones, mitigar riesgos legales y contractuales, y garantizar la adecuada ejecución del contrato conforme a los requisitos establecidos por la entidad contratante.

- ✓ Se recomienda al contratista de obra implementar las medidas necesarias para mantener los cinco (5) frentes de ejecución simultánea requeridos, de conformidad con el anexo técnico del contrato, con el propósito de recuperar el desfase del cronograma de obra y dar cumplimiento a la fecha de terminación del contrato.
- ✓ En relación con las afectaciones operativas registradas por los eventos de precipitaciones durante el periodo evaluado, la Interventoría recomienda a la entidad considerar la instalación de una solución industrial para el manejo longitudinal de escorrentías de manera complementaria a la construcción de las bermas cunetas en concreto reforzado. Esta alternativa constructiva permite proteger las áreas intervenidas frente al impacto hidrológico y garantiza la estabilidad de la inversión ejecutada en los tramos viales. Se requiere al contratista asumir su responsabilidad técnica mediante la ejecución inmediata de acciones temporales de limpieza y conformación de cunetas en el material actual del terreno. Estas intervenciones provisionales son de estricto cumplimiento para permitir la conducción continua de la escorrentía superficial y prevenir la saturación de las capas de rodadura tratadas. Asimismo, resulta imperativa la instalación oportuna del Tratamiento Superficial Simple una vez finalice la estabilización y el periodo de curado de la capa intervenida. La demora en la aplicación de este tratamiento expone la estructura a deterioros

prematuros, por lo cual la programación de la actividad debe ejecutarse de forma secuencial y sin interrupciones para asegurar la integridad de la obra

7.1 Conclusiones y recomendaciones área ambiental

- ✓ Durante el mes de mayo de 2026 se evidenció un avance significativo en el desarrollo de las actividades correspondientes a la Fase III del proyecto en la Provincia del Guavio y Oriente. Se dio continuidad a los frentes de trabajo en los municipios de Ubalá y Fómeque.
- ✓ No se presentaron incidentes ni accidentes ambientales y no fueron requeridos permisos adicionales ni trámites ante autoridades ambientales, dado que las actividades ejecutadas no generaron impactos que lo exigieran. Asimismo, se mantuvo el cumplimiento del 100% de los compromisos adquiridos.
- ✓ Durante el periodo se da cumplimiento al cronograma de capacitaciones establecido en cada una de las Provincias según el PAGA aprobado por la entidad.
- ✓ Se recomienda que el contratista realice recorridos previos al inicio de actividades constructivas para definir los tramites de permisos menores que se requieran en la zona de intervención.
- ✓ Se recomienda al contratista que el manejo de RCD generados en obra debe ser consultado con la supervisión y la interventoría para definir el destino de estos, ya que, no se puede entregar a terceros el 100% de estos RCD Fino no expansivos generados, pétreos y otros.

7.2 Conclusiones y recomendaciones área social

- ✓ Se evidencia un seguimiento continuo y estructurado por parte de la interventoría al componente social, con avances en la implementación del Plan de Gestión Social y en los canales de atención a la comunidad.
- ✓ Se evidencia que algunas de las piezas informativas o presentaciones para las reuniones, no son remitidas a interventoría con el tiempo suficiente para la revisión

y concepto, por lo tanto, se solicita al contratista la remisión oportuna de documentos y demás material de revisión.

- ✓ Los mecanismos de atención (Punto SAU, buzones y medios digitales) han permitido mantener comunicación activa con la comunidad y atender solicitudes de manera oportuna.
- ✓ Se identifican retrasos en la planeación y ejecución de actividades sociales, incluyendo incumplimientos en programaciones.
- ✓ Existen inconformidades comunitarias en algunos sectores frente a decisiones técnicas del proyecto, lo que evidencia la necesidad de fortalecer los procesos de socialización y claridad en la información.
- ✓ Se presentan oportunidades de mejora en la gestión documental, debido a retrasos, inconsistencias y falta de completitud en los soportes entregados por el contratista.
- ✓ El comité de participación comunitaria para el municipio de Chipaque, no se contó con asistencia de la comunidad, por lo tanto, tuvo que ser reprogramado.
- ✓ Para los comités de participación comunitaria llevados a cabo, se presentaron diferentes dudas respecto a los recortes de los tramos, cuyo alcance debió ser recortado debido a la construcción de las canales en concreto.

7.3 Conclusiones y recomendaciones área SST

- ✓ Durante el periodo del mes de mayo se presentó un accidente de trabajo, el cual fue atendido por parte del contratista y reportado según procedimientos establecidos por el área de seguridad y salud en el trabajo. La respectiva investigación será adjuntada para el informe mensual del mes correspondiente.
- ✓ Se realizo las correspondientes inspecciones preoperacionales de la maquinaria utilizados en el proyecto, evidenciando su importancia como medida de control para identificar oportunamente condiciones inseguras, fallas mecánicas o aspectos que puedan afectar la seguridad de los trabajadores y continuidad de las actividades.

- ✓ Las visitas y las mesas de trabajo por parte de interventoría se realizan con el propósito de verificar condiciones de seguridad y salud en el trabajo, el cumplimiento de los procedimientos establecidos y el avance de las actividades ejecutadas por el contratista.
- ✓ Las actividades de gestión de seguridad y salud en el trabajo desarrolladas durante el periodo permiten reducir la exposición de los trabajadores a riesgos que se pueden minimizar, verificar la forma en que realizan las actividades diarias y evitar posibles incidentes y accidentes laborales.
- ✓ Se hace indispensable la socialización de análisis de trabajo seguro para las distintas actividades realizadas por el contratista, con ello se evidencia la participación y claridad de los riesgos a los cuales se encuentran expuestos los trabajadores.

8 Anexos

8.1 Carpeta componente técnico

8.2 Carpeta componente social

8.3 Carpeta componente SST

8.4 Carpeta componente ambiental

8.5 Informe de buen manejo del anticipo de obra

8.6 Informe mensual de obra en observación

8.7 Informe de buen manejo del anticipo de Interventoría


9 Registro fotográfico del avance de las obras.

Registro fotográfico componente técnico otras actividades realizadas
Municipio de Ubalá provincia de Guavio



Fuente: elaboración propia, interventoría

Registro fotográfico componente técnico otras actividades realizadas
Municipio de Choachí provincia de Oriente

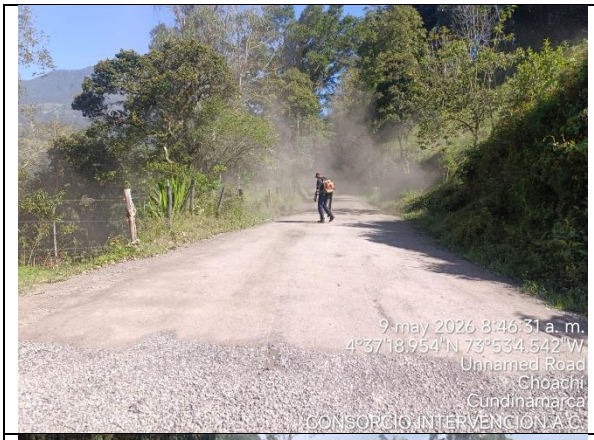











Retiro de material granular sobre la vía


9 may 2026 9:29:12 a. m.
4°37'19.002"N 73°53'4.632"W
Unnamed Road
La Caja
Choachí
Cundinamarca
CONSORCIO INTERVENCIÓN A.C.


20 may 2026 15:23:39
4°34'32"N 73°54'24"W
Unnamed Road
Choachí
Cundinamarca
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC


20 may 2026 3:23:46 p.m.
4°34'31.866"N 73°54'23.946"W
Unnamed Road
Choachí
Cundinamarca
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC


22 may 2026 2:07:59 p. m.
4°33'53.67"N 73°54'19.044"W
Unnamed Road
Choachí
Cundinamarca
CONSORCIO INTERVENCIÓN A.C.


22 may 2026 3:54:45 p. m.
4°33'41.814"N 73°54'10.98"W
Choachí
Cundinamarca
CONSORCIO INTERVENCIÓN A.C.


25 may 2026 13:28:34
4°33'35"N 73°54'12"W
Choachí
Cundinamarca
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC









Tratamiento superficial simple













Sellado de tratamiento

Fuente: elaboración propia

Registro fotográfico componente técnico otras actividades realizadas

Municipio de Fomeque provincia de Oriente





Escarificación





Retiro de sobre tamaños









Instalación de cemento









Homogeneización de afirmado con cemento









Instalación de aditivo + agua










Céreo





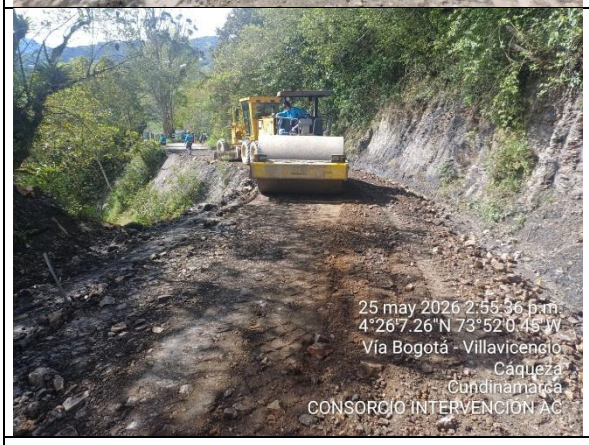



Compactación

Fuente: elaboración propia

Registro fotográfico componente social	
Provincia de guavio	
	
Oficina de componente social contratista	Buzones satelitales
Provincia oriente	

	
Buzones satelitales	Reuniones con la comunidad

Fuente: elaboración propia, interventoría

Registro fotográfico componente ambiental	
Provincia oriente	
	
	27 may 2026 11:05:24 a.m. 4°25'31.236"N 73°52'43.776"W Unnamed Road Fómeque Cundinamarca CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
Recolección de bolsas de cemento	
	
4 may 2026 3:44:19 p.m. 315° NW Número de índice: 263	15 may 2026 8:00:51 a.m. CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

Capacitaciones	Punto ecológico
Provincia Guavio	
	
Señalización PMT	Punto ecológico
	
recolección de bolsas de cemento	Capacitaciones

Fuente: elaboración propia, interventoría

Registro fotográfico componente SST	
	
Cumplimiento PMT	Charlas de seguridad
	
Recoleccion de residuos	Preoperacional de maqunarias
	
Pausas activas	Acopio en campamento

Registro fotográfico componente SST	
	
Acopio de quimicos aditivos	Fik de emergencias y punto ecologico

Fuente: elaboración propia, interventoría

9.1 Correspondencia

Se presenta documento del Control de Correspondencia Recibida y enviada por la Interventoría durante el mes de abril de 2026, en el cual se detallan las comunicaciones recibidas y las respectivas respuestas emitidas, atendiendo a su prioridad, pertinencia y oportunidad, conforme a los procedimientos establecidos, este cuadro de relación de correspondencia se encuentra anexado dentro de la carpeta el componente técnico, carpeta 1.12 correspondencia.

9.2 Bitácora de obra

Este documento refleja las principales actividades ejecutadas, novedades técnicas, observaciones relevantes, instrucciones impartidas y hechos relevantes ocurridos durante el periodo del **1 al 31 de mayo del 2026**, constituyéndose en una herramienta fundamental para la trazabilidad y verificación del avance físico y administrativo del proyecto. En la siguiente carpeta se presentan las bitácoras de las provincias de Guavio, Oriente, Medina y Soacha en donde se vienen realizando actividades de obra a la fecha. Ver anexo 1.7 Bitácora de obra

9.3 Certificación componente ambiental y social

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

CALLE 107A NO.8-22
USAQUÉN
TEL: +57(1) 3003053
CEL: +57(1) 3013369740
BOGOTA D.C., COLOMBIA

CERTIFICACIÓN DE AUSENCIA DE SANCIONES, MULTAS O INCUMPLIMIENTOS COMPONENTES AMBIENTAL Y/O SOCIAL

El Consorcio Intervención AC, en cumplimiento de sus obligaciones legales y contractuales, se permite CERTIFICAR que:

A corte del mes de Mayo del 2026, el Consorcio SOFAN C-031 no se encuentra sancionado ni tiene procesos de incumplimiento o multas en curso relacionados con el Contrato ICCU No. 138 del 2025, en lo que respecta a asuntos ambientales y/o sociales.

Dada a los doce (12) días del mes de junio de dos mil veintiséis (2026).

Atentamente,

Wendy Delgado
Profesional social de Interventoria.

Catherine Castellanos
Especialista Ambiental Interventoria.

Roberto Carlos Lopéz
Director de la Interventoria de Obra.

Firma:

ROBERTO LÓPEZ

Firmado digitalmente por ROBERTO LÓPEZ
Fecha: 2026.06.19 13:23:34 -05'00'

Roberto Carlos López Julio

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

Director de Interventoría Fase III

Anexo: Carpeta con 4 componentes y sus anexos
Preparó: Equipo de trabajo Consorcio Intervención AC
Revisó: Roberto C. López J.
Aprobó: Roberto C. López J.
