
| Id | Modo de tarea | EDT | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Sucesoras | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | **1** | **IDU-1528-2025-CONSTRUCCION_PUENTE_LOS_ANDES-CLB-2026062** | **242.5 días** | **jue 12/03/26** | **dom 21/02/27** | | | **$ 3,341,344,560.00** |
| 2 | | *1.1* | *Firma del Acta de Inicio* | *0 días* | *jue 12/03/26* | *jue 12/03/26* | | *107;117;130;* | *$ 0.00* |
| 3 | | **1.2** | **Construcción Puente los Andes IDU 1528 DE 2025** | **242.5 días** | **jue 12/03/26** | **dom 21/02/27** | | | **$ 3,341,344,560.00** |
| 4 | | **1.2.1** | **Preconstrucción** | **90 días** | **jue 12/03/26** | **mar 21/07/26** | | | **$ 419,417,105.00** |
| 5 | | **1.2.1.1** | **Documentación principal requerida** | **42 días** | **lun 16/03/26** | **vie 15/05/26** | | | **$ 25,670,012.00** |
| 6 | | *1.2.1.1.1* | *Presentación Hojas de vida del personal mínimo requerido para preconstrucción* | *0 días* | *lun 16/03/26* | *lun 16/03/26* | *2CC+3 días* | *147* | *$ 0.00* |
| 7 | | *1.2.1.1.2* | *Presentación del Cronograma general del proyecto* | *0 días* | *mar 17/03/26* | *mar 17/03/26* | *2CC+4 días* | *8FC+3 días* | *$ 0.00* |
| 8 | | *1.2.1.1.3* | *Aprobación del Cronograma general del proyecto por interventoría* | *1 día* | *sáb 21/03/26* | *mar 24/03/26* | *7FC+3 días* | *9* | *$ 25,670,012.00* |
| 9 | | *1.2.1.1.15* | *Entrega al IDU del producto aprobado por parte de interventoría* | *0 días* | *mar 24/03/26* | *mar 24/03/26* | *8* | *147* | *$ 0.00* |
| 10 | | *1.2.1.1.4* | *Presentación del Desglose del AIU* | *0 días* | *lun 16/03/26* | *lun 16/03/26* | *2CC+3 días* | *11FC+2 días* | *$ 0.00* |
| 11 | | ***1.2.1.1.5*** | ***Aprobación del Desglose del AIU por interventoría*** | ***0 días*** | ***mié 18/03/26*** | ***mié 18/03/26*** | ***10FC+2 días*** | ***12*** | ***$ 0.00*** |
| 12 | | *1.2.1.1.12* | *Entrega al IDU del producto aprobado por parte de interventoría* | *0 días* | *mié 18/03/26* | *mié 18/03/26* | *11* | *147* | *$ 0.00* |
| 13 | | *1.2.1.1.6* | *Presentación del PAC (Plan Anual de Caja)* | *0 días* | *lun 16/03/26* | *lun 16/03/26* | *2CC+3 días* | *14FC+3 días* | *$ 0.00* |
| 14 | | ***1.2.1.1.7*** | ***Aprobación del PAC (Plan Anual de Caja) por interventoría*** | ***0 días*** | ***jue 19/03/26*** | ***jue 19/03/26*** | ***13FC+3 días*** | ***15*** | ***$ 0.00*** |
| 15 | | *1.2.1.1.13* | *Entrega al IDU del producto aprobado por parte de interventoría* | *0 días* | *jue 19/03/26* | *jue 19/03/26* | *14* | *147* | *$ 0.00* |
| 16 | | *1.2.1.1.8* | *Visita de Obra inicial* | *0 días* | *mar 24/03/26* | *mar 24/03/26* | *2CC+8 días* | *147* | *$ 0.00* |
| 17 | | *1.2.1.1.9* | *Presentación del Plan de Calidad* | *0 días* | *mar 24/03/26* | *mar 24/03/26* | *2CC+8 días* | *19FC+3 días* | *$ 0.00* |
| 18 | | *1.2.1.1.10* | *Presentación del PIE (Plan de Inspección y Ensayos)* | *0 días* | *mar 12/05/26* | *mar 12/05/26* | *2CC+42 días* | *19FC+3 días* | *$ 0.00* |
| 19 | | ***1.2.1.1.11*** | ***Aprobación del Plan de Calidad y PIE (Plan de Inspección y Ensayos) por interventoría*** | ***0 días*** | ***vie 15/05/26*** | ***vie 15/05/26*** | ***17FC+3 días;18FC+3 días*** | ***20*** | ***$ 0.00*** |
| 20 | | *1.2.1.1.14* | *Entrega al IDU del producto aprobado por parte de interventoría* | *0 días* | *vie 15/05/26* | *vie 15/05/26* | *19* | *147* | *$ 0.00* |
| 21 | | **1.2.1.2** | **Estudios y Diseños de Detalle** | **90 días** | **jue 12/03/26** | **mar 21/07/26** | | | **$ 157,288,719.00** |
| 22 | | **1.2.1.2.1** | **Componente de Hidrología (Principal)** | **63 días** | **jue 12/03/26** | **jue 11/06/26** | | | **$ 50,056,524.00** |
| 23 | | 1.2.1.2.1.1 | Recopilación de información del diseño desarrollado por el IDU (Solicitud al Centro de Documentación IDU) | 3 días | jue 12/03/26 | lun 16/03/26 | 2 | 24 | $ 1,668,551.00 |
| 24 | | 1.2.1.2.1.2 | Análisis de la información recopilada | 2 días | lun 16/03/26 | mié 18/03/26 | 23 | 25 | $ 1,668,551.00 |
| 25 | | 1.2.1.2.1.3 | Elaboración del entregable No. 001 - Informe de Análisis y Diagnóstico de la información de diseño recopilada y generación de recomendaciones y observaciones iniciales | 3 días | mié 18/03/26 | mar 24/03/26 | 24 | 26 | $ 10,011,304.00 |
| 26 | | *1.2.1.2.1.4* | *Revisión de la Primera entrega (Informe Análisis de diagnóstico) por parte de interventoría* | *8 días* | *mar 24/03/26* | *lun 6/04/26* | *25* | *27* | *$ 0.00* |
| 27 | | *1.2.1.2.1.5* | *Ajuste y atención de comentarios realizados por interventoría, por parte del contratista* | *5 días* | *lun 6/04/26* | *lun 13/04/26* | *26* | *29;34;28* | *$ 3,337,102.00* |
| 28 | | *1.2.1.2.1.14* | *Entrega al IDU del producto aprobado por parte de interventoría* | *0 días* | *lun 13/04/26* | *lun 13/04/26* | *27* | *147* | *$ 0.00* |
| 29 | | *1.2.1.2.1.6* | Producto No. 002- Informe de Detalle No. 001 ( Análisis detallado de variables hidrologicas del río Mugroso - Histórico de lluvias, reportes IDEAM, modelación HECRAS, proyección de la socavación y analisis de posibles obras complementarias) | *20 días* | *lun 13/04/26* | *lun 11/05/26* | *27* | *30FC+11 días* | $ 13,348,406.00 |
| 30 | | *1.2.1.2.1.7* | *Segunda entrega - Informe de Diseño de detalle No. 001* | *0 días* | *mar 26/05/26* | *mar 26/05/26* | *29FC+11 días* | *31;35* | *$ 0.00* |
| 31 | | *1.2.1.2.1.8* | *Revisión de la Segunda entrega (Informe de detalle No. 001) por parte de interventoría* | *7 días* | *mar 26/05/26* | *jue 4/06/26* | *30* | *32* | *$ 0.00* |
| 32 | | *1.2.1.2.1.9* | *Ajuste y atención de comentarios realizados por interventoría, por parte del contratista* | *4 días* | *jue 4/06/26* | *jue 11/06/26* | *31* | *37CC-1 día;33* | *$ 3,337,102.00* |
| 33 | | *1.2.1.2.1.16* | *Entrega al IDU del producto aprobado por parte de interventoría* | *0 días* | *jue 11/06/26* | *jue 11/06/26* | *32* | *147* | *$ 0.00* |
| 34 | | 1.2.1.2.1.10 | Producto No. 003- Informe de Detale No. 002 ( Análisis hidrologico para diseño de obras especiales de protección en condiciones de obra nueva) | 16 días | lun 13/04/26 | mar 5/05/26 | 27 | 35 | $ 13,348,406.00 |
| 35 | | *1.2.1.2.1.11* | *Tercera entrega - Informe de Diseño de detalle No. 002* | *0 días* | *mar 26/05/26* | *mar 26/05/26* | *30;34* | *36* | *$ 0.00* |
| 36 | | *1.2.1.2.1.12* | *Revisión de la Tercera entrega (Informe de diseños de detalle No. 002) por parte de interventoría* | *6 días* | *mar 26/05/26* | *mié 3/06/26* | *35* | *37* | *$ 0.00* |
| 37 | | *1.2.1.2.1.13* | *Ajuste y atención de comentarios realizados por interventoría, por parte del contratista* | *5 días* | *mié 3/06/26* | *jue 11/06/26* | *32CC-1 día;36* | *103;38* | *$ 3,337,102.00* |
| 38 | | *1.2.1.2.1.17* | *Entrega al IDU del producto aprobado por parte de interventoría* | *0 días* | *jue 11/06/26* | *jue 11/06/26* | *37* | *147* | *$ 0.00* |
| 39 | | **1.2.1.2.2** | **Componente de Geotecnia (Principal)** | **63 días** | **jue 12/03/26** | **jue 11/06/26** | | | **$ 44,717,162.00** |
| 40 | | 1.2.1.2.2.1 | Recopilación de información del diseño desarrollado por el IDU (Solicitud al Centro de Documentación IDU) | 3 días | jue 12/03/26 | lun 16/03/26 | 2 | 41 | $ 1,668,551.00 |
| 41 | | 1.2.1.2.2.2 | Análisis de la información recopilada | 2 días | lun 16/03/26 | mié 18/03/26 | 40 | 42 | $ 1,668,551.00 |
| 42 | | 1.2.1.2.2.3 | Elaboración del entregable No. 001 - Informe de Análisis y Diagnóstico de la información de diseño recopilada y generación de recomendaciones y observaciones iniciales | 3 días | mié 18/03/26 | mar 24/03/26 | 41 | 43 | $ 10,011,304.00 |
| 43 | | *1.2.1.2.2.4* | *Revisión de la Primera entrega (Informe Análisis de diagnóstico) por parte de interventoría* | *8 días* | *mar 24/03/26* | *lun 6/04/26* | *42* | *44* | *$ 0.00* |
| 44 | | *1.2.1.2.2.5* | *Ajuste y atención de comentarios realizados por interventoría, por parte del contratista* | *5 días* | *lun 6/04/26* | *lun 13/04/26* | *43* | *46;51;45* | *$ 3,337,102.00* |
| 45 | | *1.2.1.2.2.14* | *Entrega al IDU del producto aprobado por parte de interventoría* | *0 días* | *lun 13/04/26* | *lun 13/04/26* | *44* | *147* | *$ 0.00* |
| 46 | | *1.2.1.2.2.6* | Producto No. 002- Informe de Detalle No. 001 ( Análisis geotecnico para ajuste de diseño de cimentación) | *20 días* | *lun 13/04/26* | *lun 11/05/26* | *44* | *47FC+11 días* | $ 13,348,406.00 |
| 47 | | *1.2.1.2.2.7* | *Segunda entrega - Informe de Diseño de detalle No. 001* | *0 días* | *mar 26/05/26* | *mar 26/05/26* | *46FC+11 días* | *48;52* | *$ 0.00* |
| 48 | | *1.2.1.2.2.8* | *Revisión de la Segunda entrega (Informe de diseños de detalle No. 001) por parte de interventoría* | *7 días* | *mar 26/05/26* | *jue 4/06/26* | *47* | *49* | *$ 0.00* |
| 49 | | *1.2.1.2.2.9* | *Ajuste y atención de comentarios realizados por interventoría, por parte del contratista* | *4 días* | *jue 4/06/26* | *jue 11/06/26* | *48* | *54CC-1 día;50* | *$ 3,337,102.00* |
| 50 | | *1.2.1.2.2.15* | *Entrega al IDU del producto aprobado por parte de interventoría* | *0 días* | *jue 11/06/26* | *jue 11/06/26* | *49* | *147* | *$ 0.00* |
| 51 | | 1.2.1.2.2.10 | Producto No. 003- Informe de Detale No. 002 ( Análisis geotecnico para diseño de obras especiales de protección) | 16 días | lun 13/04/26 | mar 5/05/26 | 44 | 52 | $ 8,009,044.00 |
| 52 | | *1.2.1.2.2.11* | *Tercera entrega - Informe de Diseño de detalle No. 002* | *0 días* | *mar 26/05/26* | *mar 26/05/26* | *47;51* | *53* | *$ 0.00* |
| 53 | | *1.2.1.2.2.12* | *Revisión de la Tercera entrega (Informe de diseños de detalle No. 002) por parte de interventoría* | *6 días* | *mar 26/05/26* | *mié 3/06/26* | *52* | *54* | *$ 0.00* |
| 54 | | *1.2.1.2.2.13* | *Ajuste y atención de comentarios realizados por interventoría, por parte del contratista* | *5 días* | *mié 3/06/26* | *jue 11/06/26* | *53;49CC-1 día* | *103;55* | *$ 3,337,102.00* |
| 55 | | *1.2.1.2.2.16* | *Entrega al IDU del producto aprobado por parte de interventoría* | *0 días* | *jue 11/06/26* | *jue 11/06/26* | *54* | *147* | *$ 0.00* |
| 56 | | **1.2.1.2.3** | **Componente de Estructuras (Principal)** | **90 días** | **jue 12/03/26** | **mar 21/07/26** | | | **$ 45,829,529.00** |
| 57 | | 1.2.1.2.3.1 | Recopilación de información del diseño desarrollado por el IDU (Solicitud al Centro de Documentación IDU) | 3 días | jue 12/03/26 | lun 16/03/26 | 2 | 58 | $ 1,668,551.00 |
| 58 | | 1.2.1.2.3.2 | Análisis de la información recopilada | 2 días | lun 16/03/26 | mié 18/03/26 | 57 | 59;63 | $ 1,668,551.00 |
| 59 | | 1.2.1.2.3.3 | Elaboración del entregable No. 001 - Informe de Análisis y Diagnóstico de la información de diseño recopilada y generación de recomendaciones y observaciones iniciales | 3 días | mié 18/03/26 | mar 24/03/26 | 58 | 60 | $ 8,009,043.00 |
| 60 | | *1.2.1.2.3.4* | *Revisión de la Primera entrega (Informe Análisis de diagnóstico) por parte de interventoría* | *8 días* | *mar 24/03/26* | *lun 6/04/26* | *59* | *61* | *$ 0.00* |

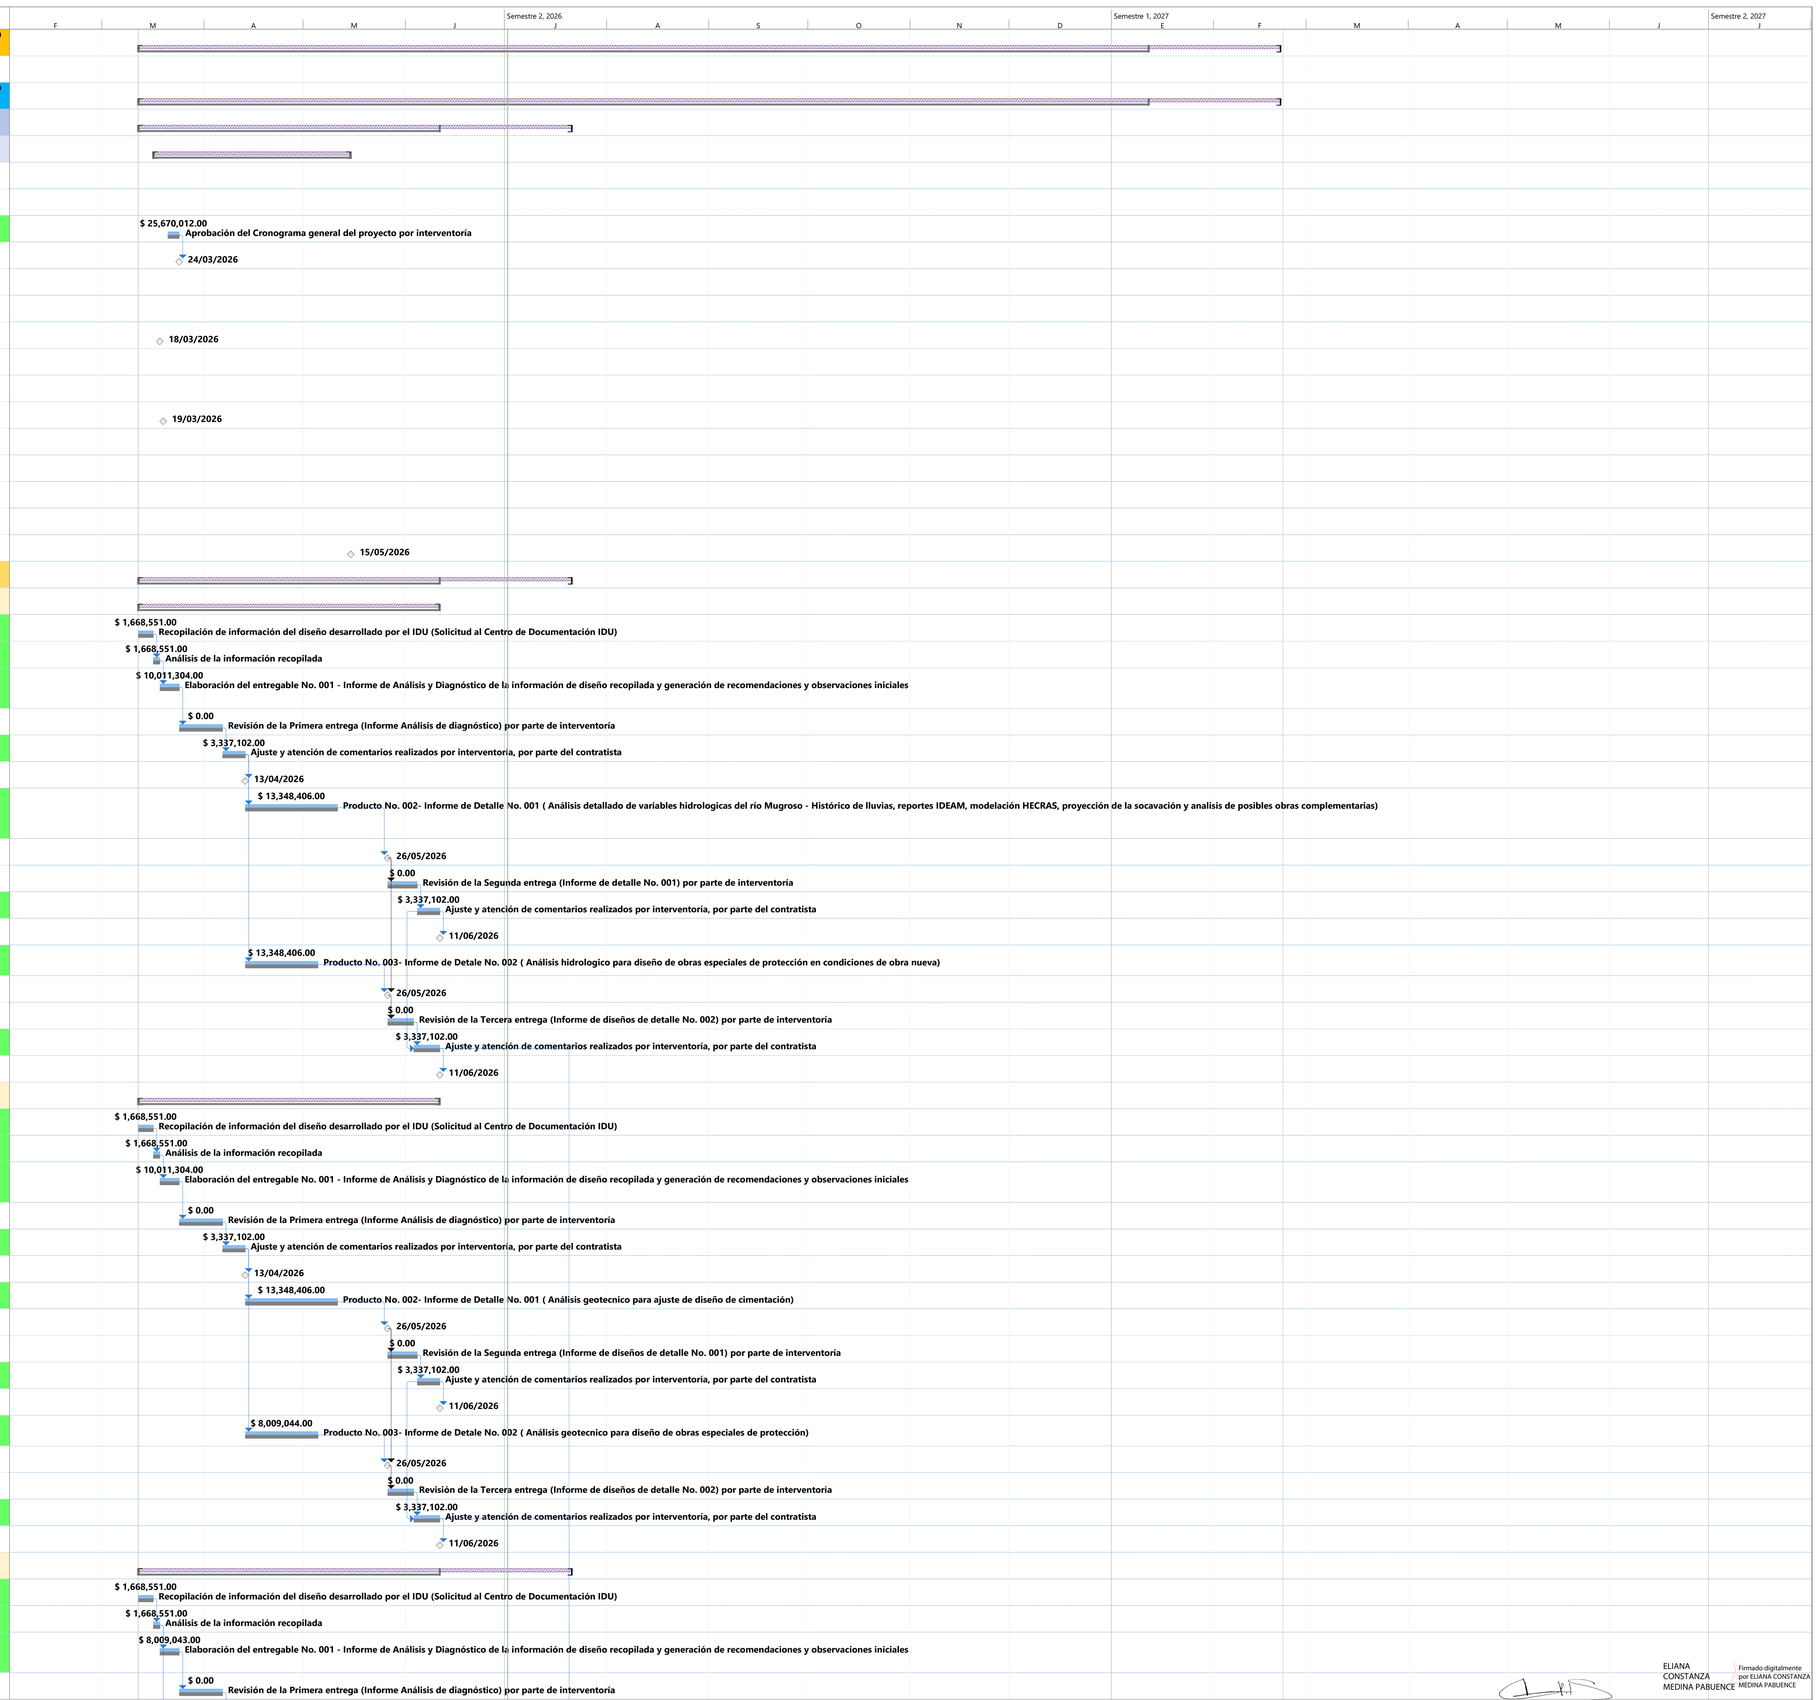


Proyecto: CRONOGRAMA GEN
Fecha: jue 2/07/26


Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Hito de línea base · Progreso
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Línea base · Resumen de línea base · Progreso manual

ELIANA CONSTANZA MEDINA PABUENCE
Firmado digitalmente por ELIANA CONSTANZA MEDINA PABUENCE

Ing. Nelson Rafael Paba Solano
Representante Legal
TCONSTRUYE INGENIERÍA SAS
Contratista de Obra

Ing. Eliana Medina Pabuence
Representante Legal (S)
CONSORCIO ESTRUCTURAL GP
Contratista de Interventoría

| Id | Modo de tarea | EDT | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Sucesoras | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | | *1.2.1.2.3.5* | *Ajuste y atención de comentarios realizados por interventoría, por parte del contratista* | *5 días* | *lun 6/04/26* | *lun 13/04/26* | *60* | *70CC+5 días;62* | *$ 3,337,102.00* |
| 62 | | ***1.2.1.2.3.16*** | ***Entrega al IDU del producto aprobado por parte de interventoría*** | ***0 días*** | ***lun 13/04/26*** | ***lun 13/04/26*** | ***61*** | ***147*** | ***$ 0.00*** |
| 63 | | *1.2.1.2.3.6* | Producto No. 002- Informe de Diseño de Detalle No. 001 ( Diseño de vigas y tablero) | *36 días* | *mié 18/03/26* | *lun 11/05/26* | *58* | *64;68CC* | $ 13,348,406.00 |
| 64 | | **1.2.1.2.3.7** | **Segunda entrega - Informe de Diseño de detalle No. 001** | **0 días** | **lun 11/05/26** | **lun 11/05/26** | **63** | **65** | **$ 0.00** |
| 65 | | *1.2.1.2.3.8* | *Revisión de la Segunda entrega (Informe de diseños de detalle No. 001) por parte de interventoría* | *7 días* | *lun 11/05/26* | *jue 21/05/26* | *64* | *66* | *$ 0.00* |
| 66 | | *1.2.1.2.3.9* | *Ajuste y atención de comentarios realizados por interventoría, por parte del contratista* | *4 días* | *jue 21/05/26* | *mar 26/05/26* | *65* | *71;67* | *$ 3,337,102.00* |
| 67 | | ***1.2.1.2.3.17*** | ***Entrega al IDU del producto aprobado por parte de interventoría*** | ***0 días*** | ***mar 26/05/26*** | ***mar 26/05/26*** | ***66*** | ***147*** | ***$ 0.00*** |
| 68 | | 1.2.1.2.3.10 | Producto No. 003 - Informe de Diseño de Detalle No. 002 (Elementos de protección vehicular y peatonales, apoyos, neoprenos, juntas) | 36 días | mié 18/03/26 | lun 11/05/26 | 63CC | 69CC;71 | $ 4,449,469.00 |
| 69 | | 1.2.1.2.3.11 | Producto No. 004 - Informe de Diseño de Detalle No. 003 (Estribos) | 36 días | mié 18/03/26 | lun 11/05/26 | 68CC | 71 | $ 5,561,836.00 |
| 70 | | 1.2.1.2.3.12 | Producto No. 005 - Informe de Diseño de Detalle No. 004 (Cimentación - Caissons, y obras especiales de protección por erosión y socavación) | 58 días | lun 13/04/26 | lun 6/07/26 | 61CC+5 días | 71 | $ 3,337,102.00 |
| 71 | | 1.2.1.2.3.13 | Tercera entrega - Informe de Diseño de detalle No. 002 a 004 | 1 día | lun 6/07/26 | mar 7/07/26 | 66;68;69;70 | 72 | $ 0.00 |
| 72 | | *1.2.1.2.3.14* | *Revisión de la Tercera entrega (Informe de diseños de detalle No. 002 a 004) por parte de interventoría* | *5 días* | *mar 7/07/26* | *mar 14/07/26* | *71* | *73* | *$ 0.00* |
| 73 | | *1.2.1.2.3.15* | *Ajuste y atención de comentarios realizados por interventoría, por parte del contratista* | *5 días* | *mar 14/07/26* | *mar 21/07/26* | *72* | *103;74* | *$ 1,112,367.00* |
| 74 | | ***1.2.1.2.3.18*** | ***Entrega al IDU del producto aprobado por parte de interventoría*** | ***0 días*** | ***mar 21/07/26*** | ***mar 21/07/26*** | ***73*** | ***147*** | ***$ 0.00*** |
| 75 | | **1.2.1.2.4** | **Componente de Pavimentos (Secundario)** | **53 días** | **jue 12/03/26** | **mié 27/05/26** | | | **$ 1,668,551.00** |
| 76 | | 1.2.1.2.4.1 | Recopilación de información del diseño desarrollado por el IDU (Solicitud al Centro de Documentación IDU) | 3 días | jue 12/03/26 | lun 16/03/26 | 2 | 77 | $ 166,855.00 |
| 77 | | 1.2.1.2.4.2 | Análisis de la información recopilada | 2 días | lun 16/03/26 | mié 18/03/26 | 76 | 78 | $ 166,855.00 |
| 78 | | 1.2.1.2.4.3 | Elaboración del entregable No. 001 - Informe de Análisis y Diagnóstico de la información de diseño recopilada y generación de recomendaciones y observaciones iniciales | 35 días | mié 18/03/26 | vie 8/05/26 | 77 | 79 | $ 1,167,986.00 |
| 79 | | *1.2.1.2.4.4* | *Revisión de la Primera entrega (Informe Análisis de diagnóstico) por parte de interventoría* | *8 días* | *vie 8/05/26* | *jue 21/05/26* | *78* | *80* | *$ 0.00* |
| 80 | | *1.2.1.2.4.5* | *Ajuste y atención de comentarios realizados por interventoría, por parte del contratista* | *5 días* | *jue 21/05/26* | *mié 27/05/26* | *79* | *103;81* | *$ 166,855.00* |
| 81 | | ***1.2.1.2.4.6*** | ***Entrega al IDU del producto aprobado por parte de interventoría*** | ***0 días*** | ***mié 27/05/26*** | ***mié 27/05/26*** | ***80*** | ***147*** | ***$ 0.00*** |
| 82 | | **1.2.1.2.5** | **Componente de Diseño geométrico (Secundario)** | **79 días** | **jue 12/03/26** | **lun 6/07/26** | | | **$ 1,668,551.00** |
| 83 | | 1.2.1.2.5.1 | Recopilación de información del diseño desarrollado por el IDU (Solicitud al Centro de Documentación IDU) | 3 días | jue 12/03/26 | lun 16/03/26 | 2 | 84 | $ 166,855.00 |
| 84 | | 1.2.1.2.5.2 | Análisis de la información recopilada | 2 días | lun 16/03/26 | mié 18/03/26 | 83 | 85 | $ 166,855.00 |
| 85 | | 1.2.1.2.5.3 | Elaboración del entregable No. 001 - Informe de Análisis y Diagnóstico de la información de diseño recopilada y generación de recomendaciones y observaciones iniciales | 35 días | mié 18/03/26 | vie 8/05/26 | 84 | 86 | $ 1,167,986.00 |
| 86 | | *1.2.1.2.5.4* | *Revisión de la Primera entrega (Informe Análisis de diagnóstico) por parte de interventoría* | *33 días* | *vie 8/05/26* | *jue 25/06/26* | *85* | *87* | *$ 0.00* |
| 87 | | *1.2.1.2.5.5* | *Ajuste y atención de comentarios realizados por interventoría, por parte del contratista* | *6 días* | *vie 26/06/26* | *lun 6/07/26* | *86* | *103;88* | *$ 166,855.00* |
| 88 | | ***1.2.1.2.5.6*** | ***Entrega al IDU del producto aprobado por parte de interventoría*** | ***0 días*** | ***lun 6/07/26*** | ***lun 6/07/26*** | ***87*** | ***147*** | ***$ 0.00*** |
| 89 | | **1.2.1.2.6** | **Componente de Redes Secas y Redes Húmedas (Secundario)** | **53 días** | **jue 12/03/26** | **mié 27/05/26** | | | **$ 1,668,551.00** |
| 90 | | 1.2.1.2.6.1 | Recopilación de información del diseño desarrollado por el IDU (Solicitud al Centro de Documentación IDU) | 3 días | jue 12/03/26 | lun 16/03/26 | 2 | 91 | $ 166,855.00 |
| 91 | | 1.2.1.2.6.2 | Análisis de la información recopilada | 2 días | lun 16/03/26 | mié 18/03/26 | 90 | 92 | $ 166,855.00 |
| 92 | | 1.2.1.2.6.3 | Elaboración del entregable No. 001 - Informe de Análisis y Diagnóstico de la información de diseño recopilada y generación de recomendaciones y observaciones iniciales | 35 días | mié 18/03/26 | vie 8/05/26 | 91 | 93 | $ 1,167,986.00 |
| 93 | | *1.2.1.2.6.4* | *Revisión de la Primera entrega (Informe Análisis de diagnóstico) por parte de interventoría* | *8 días* | *vie 8/05/26* | *jue 21/05/26* | *92* | *94* | *$ 0.00* |
| 94 | | *1.2.1.2.6.5* | *Ajuste y atención de comentarios realizados por interventoría, por parte del contratista* | *5 días* | *jue 21/05/26* | *mié 27/05/26* | *93* | *103;95* | *$ 166,855.00* |
| 95 | | ***1.2.1.2.6.6*** | ***Entrega al IDU del producto aprobado por parte de interventoría*** | ***0 días*** | ***mié 27/05/26*** | ***mié 27/05/26*** | ***94*** | ***147*** | ***$ 0.00*** |
| 96 | | **1.2.1.2.7** | **Componente de Diseños de señalización y demarcación vial (Secundario)** | **79 días** | **jue 12/03/26** | **lun 6/07/26** | | | **$ 3,337,101.00** |
| 97 | | 1.2.1.2.7.1 | Recopilación de información del diseño desarrollado por el IDU (Solicitud al Centro de Documentación IDU) | 3 días | jue 12/03/26 | lun 16/03/26 | 2 | 98 | $ 333,710.00 |
| 98 | | 1.2.1.2.7.2 | Análisis de la información recopilada | 2 días | lun 16/03/26 | mié 18/03/26 | 97 | 99 | $ 333,710.00 |
| 99 | | 1.2.1.2.7.3 | Elaboración del entregable No. 001 - Informe de Análisis y Diagnóstico de la información de diseño recopilada y generación de recomendaciones y observaciones iniciales | 35 días | mié 18/03/26 | vie 8/05/26 | 98 | 100 | $ 2,335,971.00 |
| 100 | | *1.2.1.2.7.4* | *Revisión de la Primera entrega (Informe Análisis de diagnóstico) por parte de interventoría* | *8 días* | *vie 8/05/26* | *jue 21/05/26* | *99* | *101* | *$ 0.00* |
| 101 | | *1.2.1.2.7.5* | *Ajuste y atención de comentarios realizados por interventoría, por parte del contratista* | *31 días* | *jue 21/05/26* | *lun 6/07/26* | *100* | *103;102* | *$ 333,710.00* |
| 102 | | *1.2.1.2.7.6* | *Entrega al IDU del producto aprobado por parte de interventoría* | *0 días* | *lun 6/07/26* | *lun 6/07/26* | *101* | *147* | *$ 0.00* |
| 103 | | ***1.2.1.2.8*** | ***Aprobación de Estudios y diseños de detalle y obras complementarias definitivo por parte de interventoría*** | ***0 días*** | ***mar 21/07/26*** | ***mar 21/07/26*** | ***73;54;37;87;94;*** | ***104;148*** | ***$ 8,342,750.00*** |
| 104 | | *1.2.1.2.9* | *Entrega al IDU del producto aprobado por parte de interventoría* | *0 días* | *mar 21/07/26* | *mar 21/07/26* | *103* | *147* | *$ 0.00* |
| 105 | | **1.2.1.3** | **Gestión Ambiental, SST, Forestal, Fauna Silvestre, MEV** | **63 días** | **jue 12/03/26** | **jue 11/06/26** | | | **$ 64,336,604.00** |
| 106 | | *1.2.1.3.1* | *Gestión Ambiental, SST, Forestal, Fauna Silvestre, MEV* | *63 días* | *jue 12/03/26* | *jue 11/06/26* | *2* | *147* | *$ 41,818,792.60* |
| 107 | | 1.2.1.3.2 | Elaboración MAO (Manejo Ambiental y SST del proyecto) | 41 días | jue 12/03/26 | lun 11/05/26 | 2 | 108 | $ 22,517,811.40 |
| 108 | | *1.2.1.3.3* | *Entrega del PMA/RCD (Plan de Manejo Ambiental - RCD)* | *0 días* | *lun 11/05/26* | *lun 11/05/26* | *107* | *109* | $ 0.00 |
| 109 | | *1.2.1.3.4* | *Entrega Plan de Manejo Fauna Silvestre* | *0 días* | *lun 11/05/26* | *lun 11/05/26* | *108* | *110* | $ 0.00 |
| 110 | | *1.2.1.3.5* | *Presentación propuesta de diseño sostenible e innovación ambiental* | *0 días* | *lun 11/05/26* | *lun 11/05/26* | *109* | *111* | $ 0.00 |
| 111 | | *1.2.1.3.6* | *Revisión por parte de interventoría de los productos de los componentes Ambiental, SST, Forestal, Fauna Silvestre y MEV* | *5 días* | *lun 11/05/26* | *mar 19/05/26* | *110* | *112FC+5 días* | $ 0.00 |
| 112 | | *1.2.1.3.7* | *Entrega de documentos con Corrección y atención de observaciones emitidas por interventoría a los productos de los componentes Ambiental, SST, Forestal, Fauna Silvestre y MEV* | *0 días* | *lun 25/05/26* | *lun 25/05/26* | *111FC+5 días* | *113FC+1 día* | $ 0.00 |
| 113 | | ***1.2.1.3.8*** | ***Aprobación de los productos de los componentes Ambiental, SST, Forestal, Fauna Silvestre y MEV*** | ***1 día*** | ***mar 26/05/26*** | ***mié 27/05/26*** | ***112FC+1 día*** | ***147;114*** | $ 0.00 |
| 114 | | *1.2.1.3.9* | *Entrega al IDU del producto aprobado por parte de interventoría* | *0 días* | *mié 27/05/26* | *mié 27/05/26* | *113* | *147* | *$ 0.00* |
| 115 | | **1.2.1.4** | **Gestión Social (Plan de Dialogo ciudadano y comunicación estratégica)** | **86 días** | **jue 12/03/26** | **mié 15/07/26** | | | **$ 85,065,809.00** |
| 116 | | *1.2.1.4.1* | *Gestión Social (Plan de Dialogo ciudadano y comunicación estratégica)* | *63 días* | *jue 12/03/26* | *jue 11/06/26* | *2* | *147* | *$ 51,039,485.40* |
| 117 | | 1.2.1.4.2 | Elaboración del Plan de Dialogo ciudadano y comunicación estratégica | 13 días | jue 12/03/26 | mar 31/03/26 | 2 | 118FC+3 días | $ 17,013,161.80 |
| 118 | | *1.2.1.4.3* | *Revisión y aprobación por parte de interventoría del Plan de Dialogo ciudadano y comunicación estratégica* | *0 días* | *lun 6/04/26* | *lun 6/04/26* | *117FC+3 días* | *119FC+4 días* | $ 0.00 |
| 119 | | *1.2.1.4.4* | *Presentación del documento de caracterización del área de influencia social* | *0 días* | *vie 10/04/26* | *vie 10/04/26* | *118FC+4 días* | *120FC+3 días;121CC* | $ 0.00 |

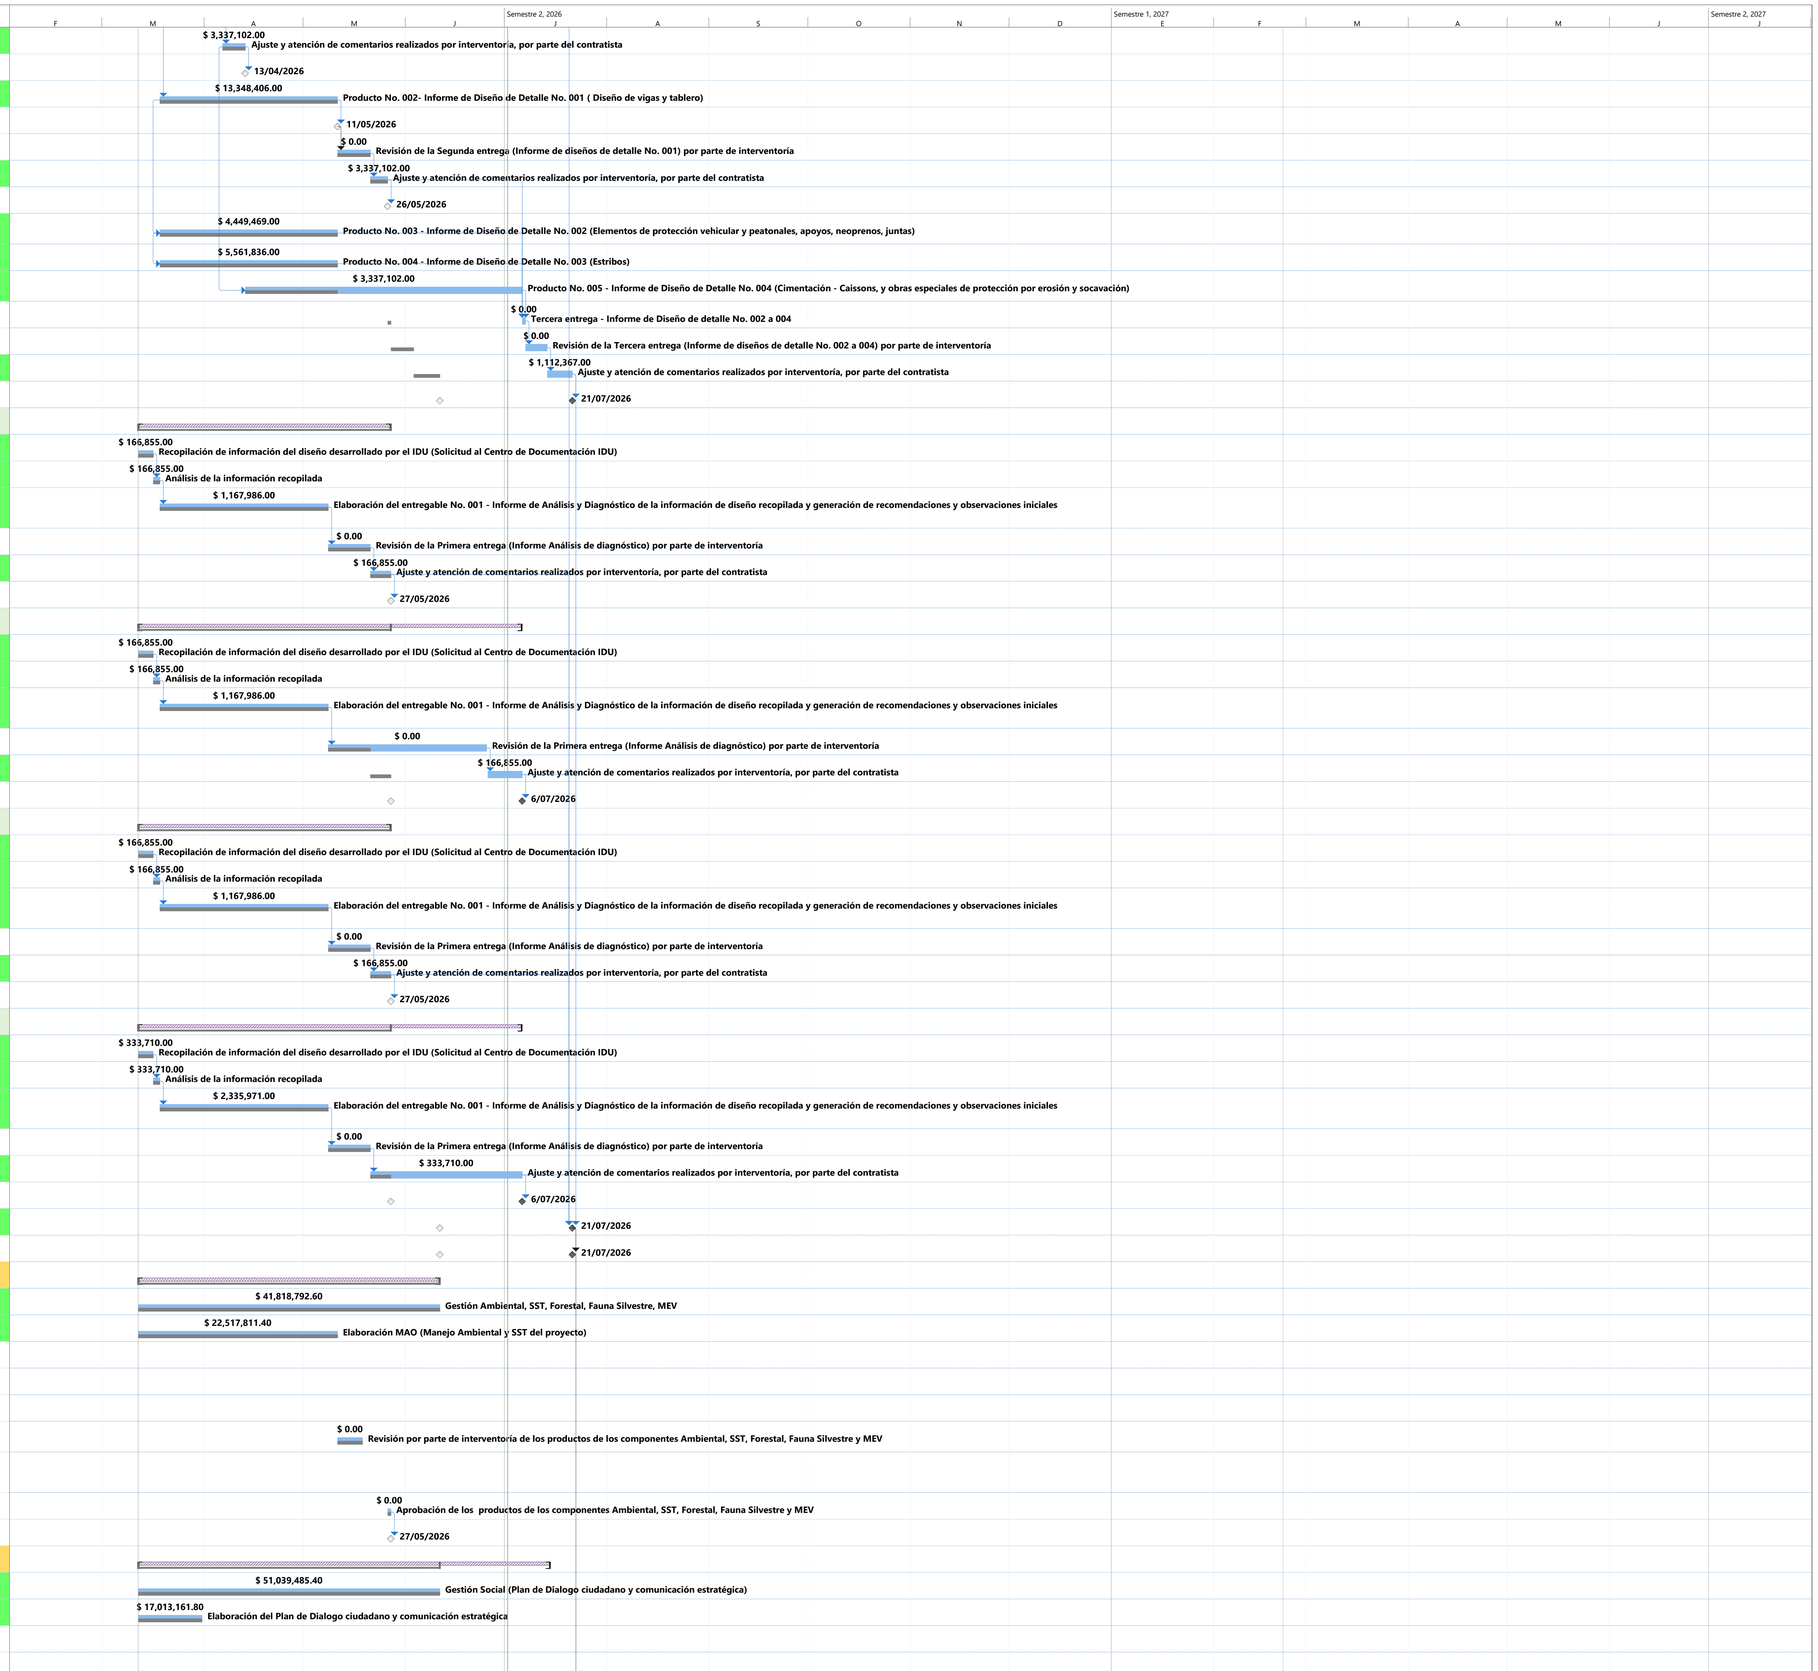


Proyecto: CRONOGRAMA GEN
Fecha: jue 2/07/26


Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Hito de línea base · Progreso
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Línea base · Resumen de línea base · Progreso manual

ELIANA CONSTANZA MEDINA PABUENCE — Firmado digitalmente por ELIANA CONSTANZA MEDINA PABUENCE

Ing. Nelson Rafael Paba Solano
Representante Legal
TCONSTRUYE INGENIERÍA SAS
Contratista de Obra

Ing. Eliana Medina Pabuence
Representante Legal (S)
CONSORCIO ESTRUCTURAL GP
Contratista de Interventoría

| Id | Modo de tarea | EDT | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Sucesoras | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | | *1.2.1.4.5* | *Revisión y aprobación por parte de interventoría del documento de caracterización del área de influencia social* | *0 días* | *mié 15/04/26* | *mié 15/04/26* | *119FC+3 días* | *147* | $ 0.00 |
| 121 | | *1.2.1.4.6* | *Presentación del Mapa de Actores* | *0 días* | *vie 10/04/26* | *vie 10/04/26* | *119CC* | *122FC+3 días;123CC* | $ 0.00 |
| 122 | | *1.2.1.4.7* | *Revisión y aprobación por parte de interventoría del Mapa de Actores* | *0 días* | *mié 15/04/26* | *mié 15/04/26* | *121FC+3 días* | *147* | $ 0.00 |
| 123 | | *1.2.1.4.8* | *Presentación de la Metodolodía para el levantamiento de actas de vecindad* | *0 días* | *vie 10/04/26* | *vie 10/04/26* | *121CC* | *124FC+3 días* | $ 0.00 |
| 124 | | *1.2.1.4.9* | *Revisión y aprobación por parte de interventoría de la metodología para el levantamiento de actas de vecindad* | *0 días* | *mié 15/04/26* | *mié 15/04/26* | *123FC+3 días* | *125CC+1 día* | $ 0.00 |
| 125 | | *1.2.1.4.10* | *Presentación informe Final de preconstrucción* | *55 días* | *jue 16/04/26* | *lun 6/07/26* | *124CC+1 día* | *126FC+6 días* | $ 17,013,161.80 |
| 126 | | *1.2.1.4.11* | *Aprobación de los productos del componente DC&CE* | *1 día* | *mar 14/07/26* | *mié 15/07/26* | *125FC+6 días* | *147;127* | $ 0.00 |
| 127 | | *1.2.1.4.12* | *Entrega al IDU del producto aprobado por parte de interventoría* | *0 días* | *mié 15/07/26* | *mié 15/07/26* | *126* | *147* | *$ 0.00* |
| 128 | | **1.2.1.5** | **Plan de Manejo de Tránsito y Señalización (PMT)** | **88 días** | **jue 12/03/26** | **vie 17/07/26** | | | **$ 13,314,574.00** |
| 129 | | *1.2.1.5.1* | *Gestión PMT - Plan de Manejo de Tránsito* | *32 días* | *jue 12/03/26* | *lun 27/04/26* | *2* | *147* | *$ 9,320,201.80* |
| 130 | | 1.2.1.5.2 | Elaboración y radicación del PMTG - Plan de Manejo de Tránsito General de obra del contrato | 36 días | jue 12/03/26 | lun 4/05/26 | 2 | 131FC+6 días | $ 2,662,914.80 |
| 131 | | *1.2.1.5.3* | *Revisión por parte de interventoría del Plan de Manejo de Tránsito General (PMTG) del proyecto* | *0 días* | *mar 12/05/26* | *mar 12/05/26* | *130FC+6 días* | *132* | *$ 0.00* |
| 132 | | *1.2.1.5.4* | Correción a observaciones realizadas por interventoría al PMTG - Plan de Manejo de Tránsito General de obra del contrato | *2 días* | *mar 12/05/26* | *jue 14/05/26* | *131* | *133FC+30 días* | *$ 1,331,457.40* |
| 133 | | *1.2.1.5.5* | *Aprobación por parte de interventoría del PMTG del proyecto* | *0 días* | *sáb 27/06/26* | *sáb 27/06/26* | *132FC+30 días* | *135FC+3 días;161FC+1 día;134* | *$ 0.00* |
| 134 | | *1.2.1.5.8* | *Entrega al IDU del producto aprobado por parte de interventoría* | *0 días* | *sáb 27/06/26* | *sáb 27/06/26* | *133* | *147* | *$ 0.00* |
| 135 | | *1.2.1.5.6* | *Radicación del PMTG a la Secretaría Distrital de Movilidad SDM* | *0 días* | *jue 2/07/26* | *jue 2/07/26* | *133FC+3 días* | *136FC+10 días* | *$ 0.00* |
| 136 | | *1.2.1.5.7* | *Aprobación del PMT general de obra por parte de la SDM* | *1 día* | *jue 16/07/26* | *vie 17/07/26* | *135FC+10 días* | *147* | *$ 0.00* |
| 137 | | **1.2.1.6** | **Plan de Trabajo BIM** | **88 días** | **jue 12/03/26** | **vie 17/07/26** | | | **$ 9,566,357.00** |
| 138 | | 1.2.1.6.1 | Elaboración del PEB - Plan de Ejecución BIM | 11 días | jue 12/03/26 | vie 27/03/26 | 2 | 139FC+5 días | $ 5,339,362.00 |
| 139 | | *1.2.1.6.2* | *Revisión por parte de interventoría del PEB - Plan de Ejecución BIM* | *0 días* | *lun 6/04/26* | *lun 6/04/26* | *138FC+5 días* | *140* | *$ 0.00* |
| 140 | | *1.2.1.6.3* | Correción a observaciones realizadas por interventoría al PEB - Plan de Ejecución BIM | *25 días* | lun 6/04/26 | lun 11/05/26 | *139* | *141FC+2 días* | $ 2,002,261.00 |
| 141 | | *1.2.1.6.4* | *Aprobación por parte de interventoría del PEB - Plan de Ejecución BIM* | *0 días* | *mié 13/05/26* | *mié 13/05/26* | *140FC+2 días* | *147;143FC+1 día;142* | $ 0.00 |
| 142 | | *1.2.1.6.6* | *Entrega al IDU del producto aprobado por parte de interventoría* | *0 días* | *mié 13/05/26* | *mié 13/05/26* | *141* | *147* | *$ 0.00* |
| 143 | | 1.2.1.6.5 | Elaboración y ejecución de modelado BIM (Todas las especialidades necesarias para la coordinación BIM) | 44 días | jue 14/05/26 | vie 17/07/26 | 141FC+1 día | 147;144 | $ 2,224,734.00 |
| 144 | | *1.2.1.6.7* | *Entrega al IDU del producto aprobado por parte de interventoría* | *0 días* | *vie 17/07/26* | *vie 17/07/26* | *143* | *147* | *$ 0.00* |
| 145 | | 1.2.1.7 | Suscripción del Acta de Cambio de Etapa (Preconstrucción a Construcción) | 0 días | mar 21/07/26 | mar 21/07/26 | 148CC | 164;146 | *$ 51,340,024.00* |
| 146 | | *1.2.1.11* | *Entrego al IDU del producto aprobado por parte de interventoría* | *0 días* | *mar 21/07/26* | *mar 21/07/26* | *145* | *147* | *$ 0.00* |
| 147 | | *1.2.1.8* | *Fin de Etapa de Preconstrucción* | *0 días* | *mar 21/07/26* | *mar 21/07/26* | *113;120;122;12:164;150FC+1 días* | *;$ 0.00* | |
| 148 | | *1.2.1.12* | *Cierre y aprobación de los productos finales por parte de las ESP (Si Aplica)* | *0 días* | *mar 21/07/26* | *mar 21/07/26* | *103* | *147;145CC* | *$ 12,835,006.00* |
| 149 | | **1.2.4** | **Informe Final de Preconstrucción** | **46 días** | **vie 17/07/26** | **lun 21/09/26** | | | **$ 0.00** |
| 150 | | *1.2.4.11* | *Entrega del Informe Final de preconstrucción por parte del contratista de obra (Componente técnico y especialidades)* | *0 días* | *jue 6/08/26* | *jue 6/08/26* | *147FC+12 días* | *151CC;153* | *$ 0.00* |
| 151 | | *1.2.4.12* | *Entrega del Informe Final de preconstrucción por parte del contratista de obra (Componentes SSTMA, MEV, Forestal, Fauna)* | *0 días* | *jue 6/08/26* | *jue 6/08/26* | *150CC* | *152CC;153* | *$ 0.00* |
| 152 | | *1.2.4.13* | *Entrega del Informe Final de preconstrucción por parte del contratista de obra (Componente Diálogo Ciudadano y comunicación estratégica)* | *0 días* | *jue 6/08/26* | *jue 6/08/26* | *151CC* | *153* | *$ 0.00* |
| 153 | | *1.2.4.14* | *Entrega de observaciones por parte de interventoría* | *5 días* | *jue 6/08/26* | *vie 14/08/26* | *152;150;151* | *154FC+3 días* | *$ 0.00* |
| 154 | | *1.2.4.15* | *Entrega de informes corregidos por parte del contratista* | *0 días* | *mié 19/08/26* | *mié 19/08/26* | *153FC+3 días* | *155* | *$ 0.00* |
| 155 | | *1.2.4.16* | *Aprobación y envío de informes por parte de interventoría a la supervisión* | *1 día* | *mié 19/08/26* | *jue 20/08/26* | *154* | *156* | *$ 0.00* |
| 156 | | *1.2.4.17* | *Revisión de informes finales por parte de la supervisión* | *10 días* | *jue 20/08/26* | *jue 3/09/26* | *155* | *157FC+3 días* | *$ 0.00* |
| 157 | | *1.2.4.18* | *Entrega de informes corregidos por parte del contratista* | *0 días* | *lun 7/09/26* | *lun 7/09/26* | *156FC+3 días* | *158* | *$ 0.00* |
| 158 | | *1.2.4.19* | *Aprobación final del IDU a informe final de preconstrucción* | *10 días* | *mar 8/09/26* | *lun 21/09/26* | *157* | | *$ 0.00* |
| 159 | | **1.2.4.10** | **Actividades Preliminares (hitos a tener listos, previo al inicio de la etapa de obra)** | **0 días** | **vie 17/07/26** | **vie 17/07/26** | | | **$ 0.00** |
| 160 | | *1.2.4.10.1* | *Terminación de la Localización, implantación, replanteo y demás actividades de Topografía* | *0 días* | *vie 17/07/26* | *vie 17/07/26* | *2CC+88 días* | *164* | *$ 0.00* |
| 161 | | *1.2.4.10.2* | *Terminación de la instalación de cerramientos provisionales y señalización temporal de obra* | *0 días* | *vie 17/07/26* | *vie 17/07/26* | *133FC+14 días* | *162CC* | *$ 0.00* |
| 162 | | *1.2.4.10.3* | *Terminación de la Construcción e implementación de campamento temporal de obra* | *0 días* | *vie 17/07/26* | *vie 17/07/26* | *161CC* | *164FC+3 días* | *$ 0.00* |
| 163 | | **1.2.2** | **Construcción** | **151.5 días** | **mié 22/07/26** | **dom 21/02/27** | | | **$ 2,921,927,455.00** |
| 164 | | *1.2.2.1* | *Inicio de Etapa de Construcción* | *0 días* | *mié 22/07/26* | *mié 22/07/26* | *162FC+3 días;145;147;16* | *165CC;175CC* | *$ 0.00* |
| 165 | | 1.2.2.2 | Actividades de Rocería (Poda de Retamo Espinoso) | 10 días | mié 22/07/26 | mié 5/08/26 | 164CC | 166 | $ 61,512,766.00 |
| 166 | | 1.2.2.3 | Ejecución Capítulo de Preliminares | 25 días | mié 5/08/26 | mié 9/09/26 | 165 | 167 | $ 160,755,104.00 |
| 167 | | 1.2.2.4 | Ejecución de Capítulo de Estructuras | 70 días | jue 10/09/26 | jue 17/12/26 | 166 | 168CC;169;17 días | $ 355,134,699.00 |
| 168 | | 1.2.2.5 | Ejecución de Capítulo de Actividades de Acero | 70 días | jue 10/09/26 | jue 17/12/26 | 167CC | 169 | $ 355,467,694.00 |
| 169 | | 1.2.2.6 | Ejecución de Capítulo de Pavimentos | 15 días | jue 17/12/26 | vie 8/01/27 | 167;168 | 170CC;171 | $ 263,412,846.00 |
| 170 | | 1.2.2.7 | Ejecución de Capítulo de Esp. Público / Urbanismo | 15 días | jue 17/12/26 | vie 8/01/27 | 169CC | 171 | $ 27,812,276.00 |
| 171 | | 1.2.2.8 | Ejecución de Capítulo de Señalización | 8.5 días | vie 8/01/27 | jue 21/01/27 | 169;170 | 172FC-30 días;180 | $ 6,689,664.00 |
| 172 | | 1.2.2.9 | Ejecución de Actividades de Plantación (Cucharo) | 29 días | mié 9/12/26 | mié 20/01/27 | 171FC-30 días | 174CC+14 días | $ 137,150,500.00 |
| 173 | | 1.2.2.10 | Costos Estimados para el componente de ensayos de laboratorio en la fase de ejecución (Incluye Fondo de cambio de vigencia e IVA) | 85.5 días | lun 21/09/26 | jue 21/01/27 | 167CC+8 días | 179 | $ 61,216,354.00 |
| 174 | | 1.2.2.11 | Valor Fondo Especial de compensaciones, evaluación y seguimiento de a autoridad ambiental (Incluye Fondo de cambio de vigencia e IVA) | 15 días | mar 29/12/26 | mié 20/01/27 | 172CC+14 días | 178CC | $ 14,902,473.00 |
| 175 | | 1.2.2.12 | Ejecución del Componente de Dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica durante etapa de obra | 128.5 días | mié 22/07/26 | jue 21/01/27 | 164CC | 176CC | $ 411,784,271.00 |
| 176 | | 1.2.2.13 | Ejecución del Componente Ambiental, SST, Avifauna, Forestal, MEV durante etapa de obra | 128.5 días | mié 22/07/26 | jue 21/01/27 | 175CC | 177CC | $ 215,578,053.00 |
| 177 | | 1.2.2.14 | Ejecución del Componente PMT (Plan de Manejo de Tránsito) durante etapa de obra | 128.5 días | mié 22/07/26 | jue 21/01/27 | 176CC | 179 | $ 85,700,822.00 |
| 178 | | 1.2.2.15 | Valor Para pagos asociados al fondo de compensaciones | 15 días | mar 29/12/26 | mié 20/01/27 | 174CC | 179 | $ 764,809,933.00 |
| 179 | | *1.2.2.16* | *Fin etapa de construcción* | *0 días* | *jue 21/01/27* | *jue 21/01/27* | *173;177;178* | *180* | *$ 0.00* |
| 180 | | *1.2.2.17* | *Inicio actividades para el Recibo final de Obra* | *0 días* | *jue 21/01/27* | *jue 21/01/27* | *171;179* | *181* | *$ 0.00* |
| 181 | | *1.2.2.18* | *Ejecución mes de Recibo de Obra* | *23 días* | *jue 21/01/27* | *dom 21/02/27* | *180* | *182* | *$ 0.00* |

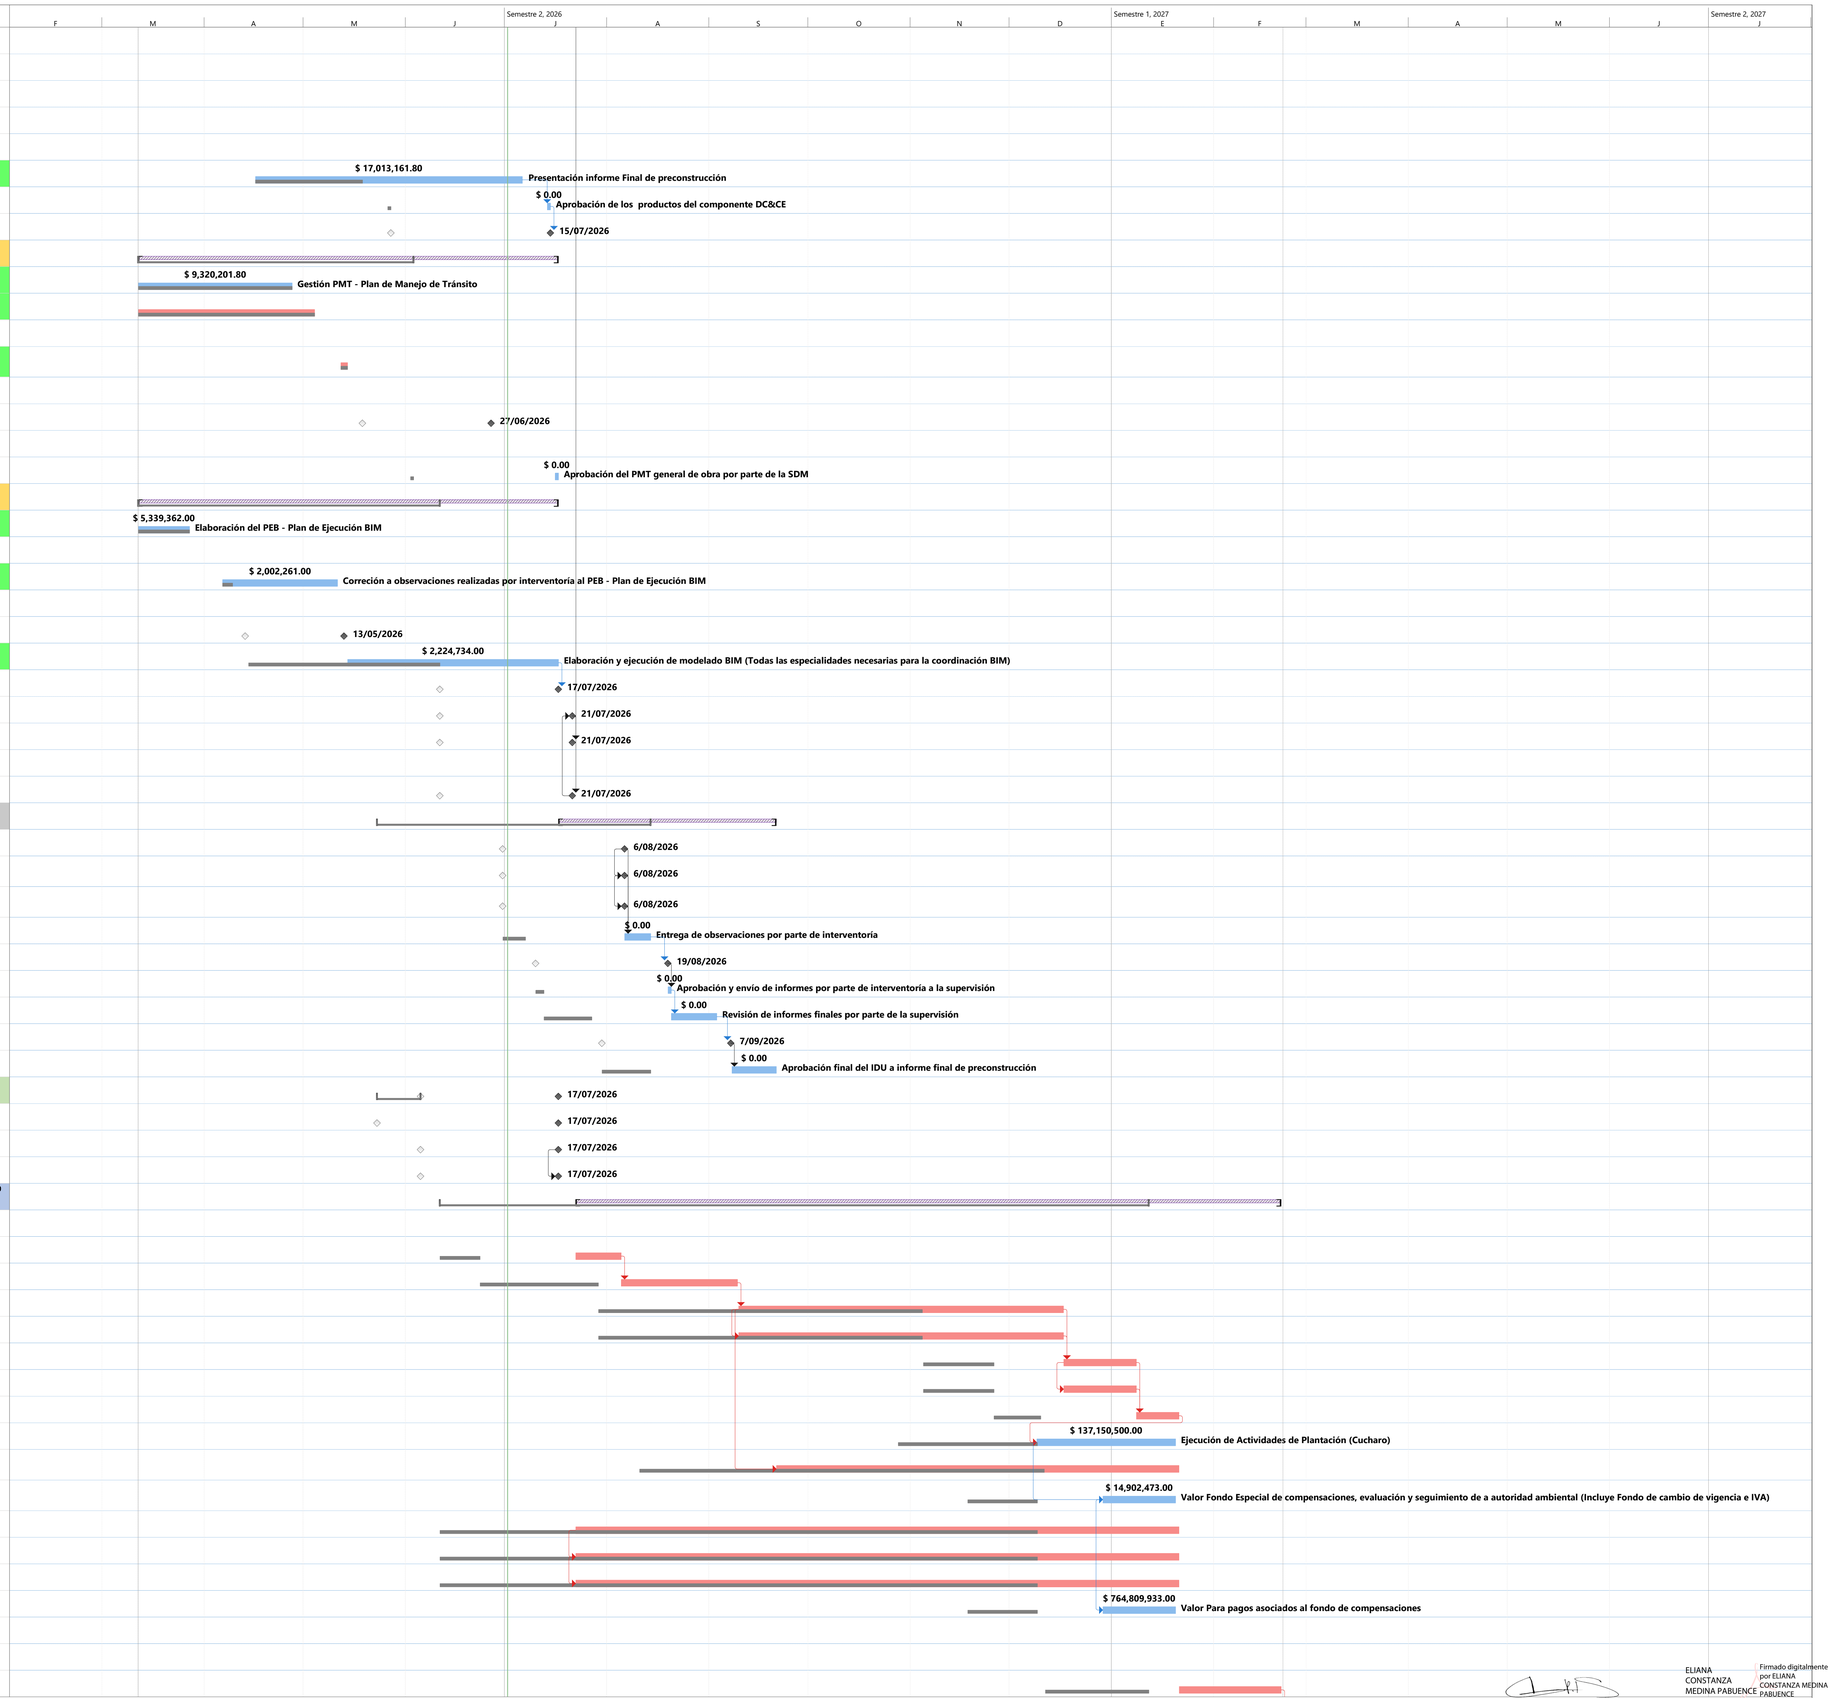


Proyecto: CRONOGRAMA GEN
Fecha: jue 2/07/26


Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Línea base · Hito de línea base · Resumen de línea base · Progreso · Progreso manual

ELIANA CONSTANZA MEDINA PABUENCE
Firmado digitalmente por ELIANA CONSTANZA MEDINA PABUENCE

Ing. Nelson Rafael Paba Solano
Representante Legal
TCONSTRUYE INGENIERÍA SAS
Contratista de Obra

Ing. Eliana Medina Pabuence
Representante Legal (S)
CONSORCIO ESTRUCTURAL GP
Contratista de Interventoría

| Id | | Modo de tarea | EDT | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Sucesoras | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | | | *1.2.2.19* | *Fin Etapa de construcción* | *0 días* | *dom 21/02/27* | *dom 21/02/27* | *181* | *183* | *$ 0.00* |
| 183 | | | *1.2.3* | *Finalización del Contrato* | *0 días* | *dom 21/02/27* | *dom 21/02/27* | *182* | | *$ 0.00* |




Ing. Nelson Rafael Paba Solano
Representante Legal
TCONSTRUYE INGENIERÍA SAS
Contratista de Obra

ELIANA CONSTANZA MEDINA PABUENCE

Firmado digitalmente por ELIANA CONSTANZA MEDINA PABUENCE

Ing. Eliana Medina Pabuence
Representante Legal (S)
CONSORCIO ESTRUCTURAL GP
Contratista de Interventoría
