1006

25 Febrero 2026 al 11 Mayo 2026

Durante este periodo, no se realizaron actividades correspondientes a la construcción de Placa huella ni la instalación de alcantarillas. lo anterior debido a que, durante este lapso, se desarrollaron las labores preliminares de implantación de puntos mediante levantamiento topográfico, actividad necesaria para el replanteo y localización de las obras proyectadas. Dichas labores fueron ejecutadas en su totalidad durante el periodo reportado, dejando las condiciones necesarias para el inicio de las actividades constructivas

Ing. Res Obra. Ing Res Interventoria.

12 Mayo 2026

Clima = Soleado

Personal de obra = 1 Maestro de obra. 2 ayudantes

- Se realizo la excavación de una longitud aproximada de 5 m y un ancho de 1.8 m para la instalación de la tubería de la alcantarilla, adicionalmente se realizo el descole y encole.
- se ejecuto Solado de limpieza de 10 cm de espesor como base para la instalación de tubería de 36"
- Se instalo la tubería de 36" incluyendo la colocación del atraque de concreto correspondiente
- se efectuo el relleno de la excavación con recebo sobre la tubería y alrededor del atraque, garantizando su estabilidad

Ing. Res. Obra Ing Res. Interventoria.

Powered by CamScanner

1007

13 Mayo 2026

Clima: Soleado
Personal de obra: 1 Maestro de obra, 2 ayudantes, Ing Residente obra.

- Se realizo la limpieza del area destinada al encole y descole de la alcantarilla Ubicada en el K1+936.7.
- Se ejecuto el solado de limpieza y la nivelación del terreno como Preparación Para Aletas y Poceta.

Ing Residente Obra Ing Res. Interventoria

14 Mayo 2026

Clima = Soleado
Personal de obra: 1 Maestro de obra, 2 ayudantes, Ing Residente obra.

- Se ejecuto el Figurado y amarre del acero de refuerzo en varillas de 1/2" y 3/8" Para la alcantarilla Ubicada en el K1+936.7.

Ing Residen Obra. Ing Res Interventoria

Powered by CamScanner

0008

15 Mayo 2026

Clima = Soleado

Personal de obra = 1 Maestro de obra, 2 ayudante, Ing Residente obra.

- Se realizo Vaciado de concreto de 21 MPa en Piso de aletas y poceta. de la alcantarilla ubicada en el Km 936.7

Ing Residente obra Ing Residente Interventoria

19 Mayo 2026

Clima = Soleado

Personal de obra = 1 Maestro de obra, 2 ayudantes, Ing Residente obra.

- Se realizo Vaciado de Concreto en 21 MPa de aletas de alcantarilla ubicada en el Km 936.7.

Ing Res. Obra Ing Res. Interventoria

20 Mayo 2026.

Clima = Soleado

Personal de obra = 1 Maestro de obra, 2 ayudantes, Ing Residente obra.

- Se realizo instalación de formaleta para poceta de alcantarilla. Ubicada en el Km 936.7.

- se realizo Vaciado de concreto de 21 MPa. en poceta de alcantarilla. Ubicada en el Km 936.7

Ing Residente Obra Ing Residente Interventoria.

Powered by CamScanner

L009

21 Mayo 2026

Clima = Soleado

Personal de obra: 1 maestro de obra, 2 ayudantes, 1 ing. residente obra.

-Se realizo excavacion de una longitud aproximada de 5m y un ancho de 1,8m para la instalacion de tuberia
- Se ejecuto un solado de limpieza de 10 cm de espesor como base para la instalacion de la tuberia de 36"
- se instalo tubaria de 36" incluyendo la colocacion del dado de concreto.
- Se realizo el relleno de la excavación con recebo sobre la tuberia y alrededor del atraque

Ing Res. Obra Ing Res Interventoria.

22 Mayo 2026

Clima = Soleado

Personal de obra: 1 Maestro de obra, 2 ayudantes, 1 ing residente obra

-Se realizo limpieza y retiro del material de excavacion para liberar el area destinada al encole y descole de la alcantarilla.

Ing Res. Obra Ing Res Interventoria.

Powered by CamScanner

1010

25 Mayo 2026

Clima: soleado

Personal de obra: 1 maestro de obra, 2 ayudantes, Ing Residente obra

- Se realizaron solados de limpieza en poceta y aletas para instalacion de acero.

Ing Res. Obra | Ing Res. Interventoria

26 Mayo 2026

Clima: Soleado

Personal de obra: 1 Maestro de obra, 2 ayudantes, Ing Res. Obra.

- Se realizo amarre y figurado de acero de 1/2" y de 3/8" para poceta y aletas. Con un espaciamiento de 22 cm.

Ing Res. Obra | Ing Res Interventoria

27 Mayo 2026

Clima: Soleado

Personal de obra: Maestro de obra, 2 ayudantes, Ing Res. obra.

- Se realizo amarre y figurado de acero de 1/2" y 3/8" para poceta
- Se realizo vaciado de concreto de 21 MPa en piso de poceta de alcantarilla en el K1537.7

Ing. Res. Obra | Ing Res. Interventoria

Powered by CamScanner

28 Mayo 2026

Clima = Soleado

Personal de obra = Maestro de obra, 3 ayudantes, Ing Res. obra.

-Se realizo instalación de formaleta de madera para poceta de alcantarilla ubicada en el KI+537.7

Ing Res. Obra Ing Res. Interventoria

24 Mayo 2026

Clima = soleado

Personal de obra = Maestro de obra, 3 ajudantes, Ing Res. Obra

-se realizo vaciado de concreto de 21 MPa en poceta de alcantarilla ubicada en el KI+537.7.

Ing Res. Obra Ing Res. Interventoria.

01 Junio 2026

Clima = Soleado

Personal de obra = Maestro de obra, 3 ajudantes, Ing Res. Obra.

-Se realizo instalación de formaleta para aletas de alcantar ubicada en el KI+537.7.

Ing Residente obra Ing Residente Interventoria

Powered by CamScanner

1012

02 Junio 2026

Clima = Soleado

Personal de obra = Maestro de obra, 3 ayudantes, Ing residente obra

- Se realizo Vaciado de Concreto de 21 Mpa en aletas de alcantarilla ubicada en el Km537.7.

Ing Res obra Ing Res Interventoria.

03 Junio 2026

Clima = Soleado

Personal de obra = Maestro de obra, 3 ayudantes, Ing residente obra.

- Se realizo retiro de Formaleta de aletas y Pocela
- Se realizo acopio de Material Granular en la siguiente alcantarilla.

Ing Residente obra Ing residente Interventoria.

04 Junio 2026

Clima = Soleado

Personal de obra = Maestro de obra, 3 ayudantes, Ing residente obra.

- Se realizo limpieza de alcantarilla. Km537.7.
- Se realizo traslado de equipos a la alcantarilla siguiente

Ing Residente Obra Ing residente Interventoria.

Powered by CamScanner

1013

05 Junio 2026

Clima: Soleado

Personal de obra: Maestro obra, 3 ayudantes, Ing Residente obra.

-Se realizo acopio de Material para siguiente alcantarilla.

Ing Residente Obra Ing Residente Interventoria.

09 Junio 2026

Clima: Lluvioso

-No hay actividad en Obra.

Ing Res. Obra Ing res. Interventoria.

10 Junio 2026

Clima: Soleado

Personal de Obra: Maestro de Obra, 3 ayudantes, Ing Residente obra

-Se realizo la excavación de una longitud aproximada de 5 m y un ancho 1.8 para la instalacion de la tuberia.
-se ejecuto un solado de limpieza de 10 cm de espesor como base para la instalacion de la tuberia.
-Se instalo la tuberia de 36" incluyendo la colocacion del atraque de concreto.
-Se realizo relleno de la excavación con recebo sobre la tuberia y alrededor del atraque.

Powered by CamScanner

1014.

Ing Residente obra Ing Residente Interventoria

11 Junio 2026

Clima = Soleado

Personal de obra: Maestro de obra, 3 ayudantes, Ing residente obra.

-Se realizo limpieza del area destinada al encole y descole de la alcantarilla ubicada en el Km 441.66
-se realizo solado de limpieza de 10 cm de espesor como base para la instalacion de acero.

Ing Residente obra Ing Residente Interventoria

12 Junio 2026

Clima = Soleado

Personal de obra: Maestro de obra 3 ayudantes, Ing Residente obra.

-Se realizo amasse y Figurado de acero de 3/8" y 1/2" para encole de alcantarilla.
-Se realizo vaciado de concreto de 21 Mpa en piso de encole de alcantarilla en el Km 441.66

Ing Res. Obra Ing Res. Interventoria.

Powered by CamScanner

1015

15 Junio 2026

Clima: Soleado

Personal de obra: Maestro de obra, 3 ayudantes, Ing. Residente obra.

- Se realizo instalacion de formaleta para encole de alcantarilla ubicada en el KI+441.66

- Se realizo vaciado de concreto de 21mpa en poceta de encole.

Ing residente obra | Ing residente Interventoria.

16 Junio 2026

Personal de Obra: Maestro de obra, 3 ayudantes, Ing Residente obra

- Se realizo instalación de formaleta para aletas de descole de alcantarilla ubicada en el KI+441.66
- Se realizo vaciado de concreto de 21 MPa. en aletas de descole de alcantarilla ubicada en el KI+441.66

Ing. Res. obra | Ing. Res. Interventoria

17 Junio 2026

Clima: Soleado

Personal de Obra: Maestro de obra, 3 ayudantes, Ing residente obra.

- Se realizo retiro de formaleta de aletas y Poceta.
- Se realizo acopio de material en el KI+441

Ing Residente Obra | Ing Residente Interventoria

Powered by CamScanner

1016

18 Junio 2026

Clima = Soleado

Personal de obra: maestro de obra, 3 ayudantes, Ing Res. de la obra.

- Se realizo la excavación de una longitud de 6m. x un ancho de 1.8m para la instalación de la tubería del Km 250
- Se ejecuto solado de limpieza de 10 cm de espesor.
- Se instalo tubería de 36" incluyendo colocacion del atraque en concreto
- Se ejecuto el relleno de la excavacion con recebo sobre la tubería y atraque.

Ing Residente obra Ing Residente Interventoria

19 Junio 2026

Clima = Soleado

Personal de obra: Maestro de obra, 3 ayudantes, Ing Residente obra.

- Se realizo limpieza del area destinada al encole y descole de alcantarilla ubicada en el Km 250.
- Se realizo Solado de limpieza en encole y descole.

Ing Res. de la obra Ing. Res. Interventoria

Powered by CamScanner

1017

22 Junio 2026

Clima = Soleado

Personal de obra: Maestro de obra, 3 ayudantes, Ing. Residente obra

-Se realizo Amarre y figurado de acero para Piso y muros de encole de alcantarilla en el Km 2+250

Ing Residente Obra Ing Residente Interventoria.

23 Junio 2026

Clima = Soleado

Personal de obra: Maestro de obra, 3 ayudantes, Ing residente obra.

-Se realizo vaciado de concreto de 21 MPa en Piso de Poceta de encole de la alcantarilla ubicada en el Km 2+280

Ing Residente obra Ing Residente. Interventoria

24 Junio 2026.

Clima = Soleado

Personal obra: Maestro de obra, 3 ayudantes, Ing residente obra.

-Se realizo instalacion de formaleta y vaciado de concreto de 21 MPa en Poceta de alcantarilla en el Km 2+250

Ing Res. Obra Ing Res Interventoria.

Powered by CamScanner

1018

25 Junio 2026

Clima = Soleado

Personal obra: Maestro obra, 3 ayudantes, Ing residente obra

- Se realizo instalación de formaleta y vaciado de concreto de 21 Mpa en aletas de alcantarilla ubicada en el Km 2+5 0

Ing Residente Obra Ing Residente Interventoria

26 Junio 2026

Clima = soleado

Personal de obra: Maestro de obra, 3 ayudantes, Ing residente obra.

- Se realizo excavación de una longitud de 5m y un ancho de 1.8 m para la instalacion de la tubelia. del Km 3+16.5
- Se escotovó solado de limpieza de 10 cm de espesor como base para la instalacion de la tubería de 36".
- Se instalo tubería de 36"
- Se realizo relleno de la excavacion con recebo sobre la tubería y en el atraque

Ing residente obra Ing. Res. Interventoria

Powered by CamScanner

1019

29 Junio 2026

Clima: Soleado

Personal obra: Maestro obra, 3 ayudantes, Ing residente obra.

-Se realizo limpieza del area de encole y descole de la excavacion

-Se realizo vaciado de concreto de tercera para solados de limpieza para encole y descole.

Ing Residente Obra Ing Res. Interventoria

30 Junio 2026

Clima: Soleado

Personal Obra: Maestro de obra, 3 ayudantes, Ing residente obra.

-Se realizo vaciado de concreto de 21 Mpa. Para Piso de encole y descole de alcantarilla ubicada en el K1+346.5

-Se realizo amarre y figurado de acero de 1/2 y 3/8" para encole y descole de alcantarilla.

Ing Res. Obra Ing Res. Interventoria

01 Julio 2026

Clima: Soleado

Personal de obra: Maestro, 3 ayudantes, Ing residente Obra

-se realizo vaciado de concreto de 21 MPa en Poceta.

Powered by CamScanner

1020

- Se realizo armada y figurado de acero para aletas

Ing Residente Obra — Ing Residente Interventoria

02 Julio 2026

Clima = Soleado

Personal de obra = 1 Maestro, 3 ayudantes, Ing Residente obra.

- se realizo instalación de Formaleta para aletas de alcantarilla en el KI+346.5.

Ing Residente Obra — Ing residente Interventoria.

03 Julio 2026.

Clima = Soleado

Personal de obra = 1 Maestro, 3 ayudantes, Ing residente obra

- Se realizo vaciado de concreto de 21 Mpa en aletas de alcantarilla.

Ing. Residente obra — Ing residente Interventoria

Powered by CamScanner

1021

06 Julio 2026

Clima = Soleado

Personal Obra = 1 Maestro, 3 ayudantes, Ing Residente Obra

- Se realizo retiro de formaleta y limpieza de Poceta y aletas.

Ing Residente Obra . Ing Residente Interventoria

07 Julio 2026.

Clima = Soleado

- No hay actividad en Obra.

Ing Residente Obra. Ing Residente Interventoria.

08 Julio 2026

Clima = Soleado

- Se realizo limpieza de via y acceso para entrada de volquetas.

Ing Residente Obra Ing Residente Interventoria

Powered by CamScanner

1022

09 Julio 2026

Clima - soleado

- se realizo Conformacion de via con recebo Para acceso de volquetas

Ing residente Obra Ing residente Interventoria

10 Julio 2026

Clima = soleado

- se realizo Conformacion de via con recebo y Material granular Para mejoramiento de acceso de volquetas

Ing Res. Obra Ing. Res Interventoria.

Powered by CamScanner

1023

CONTRATO DE OBRA 001 DE 2026

UNIÓN TEMPORAL PROINGENIERIA RIOBLANCO 2025

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA PAVIMENTACION CON PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE EN VARIOS PUNTOS CRITICOS DISPERSOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE RIO BLANCO TOLIMA.

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25 DE FEBRERO DEL 2026

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTER TERCIARIAS RIOBLANCO 2026

Powered by CamScanner

1024

25 de Febrero 2026 al 20 de abril 2026

Durante este Periodo rebitado no se realizaron actividades Correspondientes a la Construccion de Placa huella ni a la instalacion de alcantarillas, debido a la realizacion Previa de la implantación de Puntos, Mediante levantamiento topografico, actividad que se desarrollo en su totalidad en este lapso.

Sara Marsalve Vergara
Ing Residente Obra

Ing Residente Interventoria.

21 Abril 2026

Clima= Soleado

Personal de Obra: Maestro de Obra, estudiantes, Ing. Residente de Obra.

- Se realizó excavacion de alcantarilla Para instalación de tubería en el tramo de altagracia
- Se realizo Solado de limpieza y nivelacion del terreno Para instalacion de tubería.
- Se realizo instalacion de tubería de 36" Con su respectivo relleno con material granular.

Sara Marsalve Vergara
Ing Residente Obra

Ing Residente Interventoria

Powered by CamScanner

1025

22 Abril 2026

Clima: Soleado

Personal de obra: Maestro de obra, 1 Ayudante, Ing Residente de Obra

- Se realizo limpieza de estacio para el excole y descole de la alcantarilla ubicada en el tramo de Allagracia
- Se realizo retiro de material sobrante de la excavacion.

Sosa Gonsalve Yerson
Ing. Residente obra

Ing. Residente Interventoria

23 Abril 2026

Clima = Nuboso

Personal de obra: Maestro de obra, 2 ayudantes, Ing Residente obra

- Se realizo Armado y Figurado de acero para Poceta de la alcantarilla del tramo Allagracia
- Se realizo acolio de subbase en la vereda las delicias
- Se realizo el armado de las formaletas en madera para la construccion de la alcantarilla

Sosa Gonsalve Yerson
Ing Residente obra

Si
Ing Residente Interventoria

Powered by CamScanner

24 Abril 2026 /026

Clima: Soleado

Personal de obra: Maestro de obra, 2 ayudantes, Ing Res. de obra.

- Se realizo la conformacion de la subbase granular Tipo E mediante su extendido y compactación en el tramo de las delicias desde el KM 14+385 al KM 14+461.17.

Sasa Rosales Vera
Ing Residente Obra

Ing Residente Interventoria

25 Abril 2026

Clima: Soleado.

Personal de obra: Maestro de obra, Ayudante, Ing Residente Obra.

- Se realizo compactacion del Material de subbase, asi, garantizando las condiciones adecuadas para la estructura en el tramo de las delicias.

Sasa Rosales Vera
Ing Residente Obra

Ing Residente Interventoria

Powered by CamScanner

27 Abril 2026

Clima = lluvioso

Personal de obra: 1 Maestro de obra, 3 ayudantes, Ing Residente Obra

- Se realizo Corte y figurado de acero para huellas y vigas de la Placa huella ubicada en el tramo de las delicias.
- Se realizo instalación de Formaleta Para poceta de alcantarilla en la vereda Altagracia.

Sara Rosalba Vertiz
Ing Residente Obra

Ing. Residente Interventoria.

28 Abril 2026

Clima: Soleado

Personal de obra: 1 Maestro de obra, 5 ayudantes, Ing Residente Obra

- Se realizo Corte Figurado y Amarre de acero de 1/2" y 3/8" Para aletas de alcantarilla del tramo de Altagracia
- Se realizo Abaciado de concreto de 3000 PSI Para Piso de poceta del encole de la alcantarilla.
- Se realizo Amarre y figurado de acero para cunetas de Placa huella del tramo de las delicias.

Sara Rosalba Vertiz
Ing Residente Obra

Ing Residente Interventoria.

Powered by CamScanner

1028

29 Abril 2026

Clima: Soleado

Personal de Obra: 1 Maestro de Obra, 5 ayudantes, Ing Residente Obra.

- Se realizó Vaciado de Concreto de 21 MPa en la Poceta de la alcantarilla del tramo Altascacia.
- Se realizó Amarre y Figurado de acero de vigas de las Delicias

Sara Monsalve Verján
Ing Residente Obra

Ing Residente Interventoria

30 Abril 2026.

Clima = Soleado

Personal de obra = 1 Maestro de Obra, 5 ayudantes, Ing Residente Obra.

- Se realizo Anarrado y figurado de acero para Huella en el tramo las Delicias adenas de Conformación de Cunetas.
- Se realizo consolidación de Cunetas con Bentin.

Sara Monsalve Verján
Ing. Residente obra.

Ing Residente Interventoria

Powered by CamScanner

1029

01 Mayo 2026

Clima: soleado

Personal de obra: 1 Maestro de obra, 6 Ayudantes, Ing. Residente obra.

-Se realizo instalacion de formaleta para huella derecha, izquierda y centro. en el tramo las delicias

-Se realizo vaciado de concreto de 21 MPa en huella derecha izquierda y centro. en un total de 9 m³ en el tramo las delicias

-Se realizo instalacion de acero longitudinal y transversal en las huellas en varilla de 3/8" cada 20 cm.

Sara Rosalve Vergara
Ing Residente Obra

Ing Residente Interventoria.

02 - Mayo - 2026

Clima: soleado.

Personal de obra: 1 maestro de obra, 6 ayudantes, Ing Residente obra

-Se realizo vaciado de concreto de 21 mpa en huella derecha, izquierda y centro en un total de 18 m³.

-Se instalo acero longitudinal y transversal en las huellas con varilla de 3/8" cada 20 cm

- Se realizo vaciado de concreto ciclopeo con 60% de concreto y 40% de piedra.

Sara Rosalve Vergara
Ing. Residente Obra

Ing Residente Interventoria

Powered by CamScanner

1030

04 Mayo 2026.

Clima: Soleado

Personal de obra: 1 Maestro de Obra, 6 ayudantes, Ing. Residente obra.

- Se realizo instalacion de formaleta para 14 modulos de huella centro, derecha e izquierda.
- Se realizo vaciado de concreto de 21 mpa con su respectivo acero longitudinal y transversal cada 20cm en huella derecha y izquierda en un total de 12 ml en el tramo las delicias.

Sasa Ronsalve Vergán
Ing Residente Obra

Ing. Residente Interventoria.

05 Mayo 2026

Clima: Soleado

Personal de obra: 1 Maestro de obra, 6 ayudantes, 1 Ing Residente obra.

- Se realizo vaciado de concreto de 21 mpa con su respectivo acero longitudinal y transversal cada 20 cm en huella derecha y izquierda en un total de 18 ml en el tramo las delicias
- Se realizo vaciado de concreto ciclopeo con una relacion de 60% concreto y 40% piedra en el tramo las delicias

Sasa Ronsalve Vergán
Ing. Residente obra.

Ing Residente Interventoria

Powered by CamScanner

1031

06 Mayo 2026

Clima: Lluvioso

Personal Obra: 1 Maestro Obra, 6 ayudantes, 1 Residente obra

Las delicias

-Se realizo instalación de formaleta para cunetas de margen derecha y izquierda en total de 15ml

-Se realizo conformación del terreno en un total de 20 ml con material de sublase granular tipo C

* Alhagracia

-Se realizo retiro de formaleta de muros de Boca de Encole y instalación de acero de aletas de alcantarilla

Sara Rosalba Verján
Ing. Residente Obra

Ing. Residente Interventoria

07 Mayo 2026

Clima: Soleado

Personal de obra: 1 maestro de Obra, 6 ayudantes, 1 residente obra

Las delicias

-Se realizo vaciado de Concreto de 21 Mpa en un total de 15 ml con su respectivo acero longitudinal y transversal en 3/8" en huella derecha y izquierda

Ing Residente Obra

Ing Residente Interventoria

Powered by CamScanner

1032

08 Mayo 2026

Clima = Soleado

Personal de Obra = 1 Maestro de Obra, 6 ayudantes, 1 ing residente Obra.

Las delicias.

-Se realizo repalnteo y Conformacion Pasoal bateo. la Cual es constuida en concreto de 21mpa, acero HY y espaciamiento de 20cm.

Altagracia

-se realizo instalación de formaleta para aletas de alcantarilla ubicada en el K11+485

Ing. Residente Obra

Ing. Residente Obra

09 Mayo 2026

Clima = Soleado

Personal de obra = 1 maestro de obra, 6 ayudantes, 1 ing Residente obra

Delicias

-se realizo Vaciado de Concreto de 21mpa en cunetas margen derecha y izquierda en un total de 35 ml.

Powered by CamScanner

1033

Altagracia

-Se realizo Vaciado de concreto de 21 M3 en aletas de alcantarilla Ubicada en KM 7+485.

Ing. Residente Obra : Ing Residente Interventoria

(19) Mayo 2026

Clima = Soleado

Personal de Obra= 2 Maestros de obra, 10 ayudantes, Ing Residente obra

Delicias

-Se realizo Vaciado de Concreto en cunetas en un total de 15 M1 en Cuneta Margen derecha y izquierda

-se realizo replante o de Sobreancho de cunetas. / Con Acero de 3/8" cada 20cm.

Quebradon.

-Se realizo excavación para instalación de tubería en un total de 5 M de longitud. y 1m de ancho.

se realizo instalación de tubería de 36"

Ing Residente Obra Ing Residente Interventoria

Powered by CamScanner

1034

12 Mayo 2026

Clima: Soleado

Personal de obra: 2 Maestros de Obra, 10 ayudantes, Ing. residente obra.

Delicias

- Se realizo Figurado y Armado de acero para vigas y cuetas.

Quebrada

- Se realizo figurado y Armado de acero Para Poceta en acero de 1/2" y 3/8" Para alcantarilla ubicada en el K6+200.

Ing Residente obra

Ing Residente Interventoria

13 Mayo 2026

Clima: Soleado

Personal de obra: 2 Maestro de obra, 10 ayudantes, Ing. residente obra.

Delicias.

- Se realizo vaciado de Concreto en cuetas y Sobreancho en un total de 120 ml. margen derecha y izquierda.
- Se realizo instalacion de acero para batea.

Powered by CamScanner

1035

Quebradon

-se realizo vaciado de concreto en Piso de aletas el cual tiene acero de 1/2" verticalmente y 3/8" horizontalmente
-se realizo instalacion de formaleta para boceta de Alcantarilla Ubicada en el KG+200

Ing Residente obra Ing Residente Interventoria

14 Mayo 2026

Clima: Soleado

Personal Obra: 2 Maestro de obra, 10 ayudantes, Ing residente Obra

Delicias

-se realizo vaciado de concreto de zampeado en aletas de 4 m de longitud y 4.1 de ancho
-se realizo vaciado de Concreto de 21 MPa en aletas Margen derecha izquierda en un total de 30 m3

Quebradon

-se realizo arreglo de acceso de boceta y de aletas de Alcantarilla ubicada en el KG+200

Ing. Residente Obra Ing Residente interventoria

Powered by CamScanner

1036

15 Mayo 2026.

Clima = Soleado

Personal de Obra: 1 Maestro de obra, 11 ayudantes, Ing residente Obra.

Delicias.

-Se realizo vaciado de concreto de 21 MPa con su respectivo acero de 3/8" en Rampa de acceso, a la Placa huella.

Quebradon.

-Se realizo vaciado de concreto de 21 MPa en Poceta de alcantarilla ubicada en el K6+200

-Se realizo vaciado de Concreto de 21 MPa en aletas.

Ing Residente Obra / Ing Residente Interventoria.

18 Mayo 2026

Clima = Soleado

Personal de Obra = 1 Maestro de Obra, 4 ayudantes, Ing residente obra

Quebradon

-Se realizo instalacion de tuberias pasa alcantarilla ubicada en el K6+285.

-Se realizo retiro de Formaleta de aletas y Poceta de Alcantarilla ubicada en el K6+200

Ing Residente Obra

Ing Residente Interventoria

Powered by CamScanner

1037

19 Mayo 2026

Clima = Soleado

Personal de obra: 2 Maestros de obra, 10 ayudantes, 1 ing residente obra.

Delicias

-Se realizo instalación de Acero para bordillo en un total de 120 ml en varilla #3.
-se realizo instalación de Formaleta para bordillo en un total de 20 ml.

Quebradon

-se realizo instalación de acero de 3/8" @ 1/2" en Poceta de alcantarilla ubicada en K6+285
-se realizo instalacion de Formaleta Para Poceta de Alcantarilla ubicada en el K6+285

Ing Residente Obra Ing Residente Interventoria.

20 Mayo 2026.

Clima = Soleado

Personal de Obra = 2 Maestros de obra, 10 ayudantes, 1 ing residente obra

Delicias

-se realizo vaciado de concreto de 21 MPa en 14 ml de bordillo.

Powered by CamScanner

1038

Quebradon

- Se realizo vaciado de concreto de 21 mpa en Poceta de alcantarilla ubicada en el KG+285.
- Se realizo vaciado de concreto de 21 mpa en piso de aletas de alcantarilla. Con su respectivo acero.

Ing Residente obra Ing Residente Interventoria

21 Mayo 2026.

Personal de obra = 2 maestro de obra, 10 ayudantes, Ing residente obra.
Clima = Soleado

Delicias

- Se realizo vaciado de Concreto de 21 Mpa de bordillo en un total de 30 ml.
- Se realizo instalacion de Formaletas de bordillos en 30 ml.

Quebradon

- Se realizo vaciado de Concreto en aletas de alcantarilla ubicada en el KG+285
- Se realizo retiro de Formaleta de Poceta de alcantarilla.

Ing Residente Obra Ing Residente Interventoria

Powered by CamScanner

1039

22 Mayo 2026

Clima: Soleado

Personal obra: 2 Maestro de obra, 10 ayudantes, 1 ing residente obra.

Obras.

-se realizo vaciado de Concreto de 21 kg/cm² en bordillos en un total de 20 ml.

Quebrada

-se realizo retiro de formaleta y traslado de herramientas a través de [illegible]

Ing Residente Obra [illegible] Ing Residente Fiscalizadora

25 Mayo 2026

Clima Soleado.

Personal de Obra: 2 Maestro de obra, 10 ayudantes, 1 ing residente obra

Delicias

-se realizo vaciado de concreto de 21 kg/cm² en bordillos en un total de 20 ml.

Powered by CamScanner

(Q) Poblenik 4

- Se realizo acopio de Material para instalacion de tuberia para alcantarillas.

26 Mayo 2026

Clima: Soleado

Personal de obra: 2 Maestros de Obra, 1o ayudantes, 1ng residente obra.

Oficios

- Se realizo vaciado de concreto de 21 Mpa, en bordillos

Altagracia

- Se realizo Conformación de la rasante, y instalación de material granular en cunetas.

Ing Residente Obra Ing residente interventoria.

27 Mayo 2026

Clima: Soleado

Personal de Obra: 2 Maestro de obra, 1o ayudantes, 1ng residente obra.

Oficios

- Vaciado de Concreto de 21 Mpa en bordillos en un total de 30ml
- limpieza de Obra.

MKB

Powered by CamScanner

1041

Altagracia

-Se realizo Conformacion de subbase en un total de 1.0ml Con un espesor de .15cm
-Se realizo Compactacion de material subbase tipo C Con Benitin.

Ing Residente Obra Ing residente Interventoria

28 Mayo 2026.

Clima= Soleado

Personal de Obra: 2 Maestros de obra, 10 ayudantes, 1 ing residente obra.

Altagracia

-Se realizo anclaje y figurado de acero de huella, Contra, y vigas

-Se realizo excavacion para instalacion de tuberia para alcantarilla
-Se realizo instalacion de tuberia de 36"
-Se realizo relleno Con recebo
-Se realizo solado de limpieza de .10cm y ataque de tuberia de 20cm.

Ing Residente Obra Ing residente Interventoria.

Powered by CamScanner

1042

29 Mayo 2026

Clima = Soleado

Personal de obra: 2 maestros de obra, 2 ayudantes, 1 Ing residente obra.

Delicias

-se realizo vaciado de concreto de 21 MPa en bordillos.

Porvenir 4

-se realizo vaciado de concreto de 21 MPa en piso de boeta de alcantarilla con su respectivo acero de 3/8" N°3 y 1/2" N°4

Allagueria

-se realizo conformación de material de subbase tipo C. con motoniveladora.

Ing Residente Obra

Ing Residente Ingeniería.

01 Junio 2026

Clima = Soleado

Personal de obra = 2 maestros de obra, 2 ayudantes, Ing Residente obra.

Delicias

-se realizo vaciado de concreto de 21 MPa en bordillos.

Porvenir

-se realizo instalación de formaleta y vaciado de concreto de 21 MPa en boeta de alcantarilla.

Powered by CamScanner

1043

Altagracia

-Se realizo compactacion de subbase granular tipo C instalada en un espesor de 15cm.

Ing Residente obra Ing. Residente Altagracia.

02 Junio 2026.

Clima = soleado

Personal de obra = 2 maestros de obra 10 ayudantes, Ing. residente obra.

Altagracia

-se realizo instalación de formaleta para losa izquierda derecha y centro. En un total de 730 ml.

Poseur 4.

-Se realizo vaciado de Solado de limpieza en concreto de 3000 psi.

-Se realizo armado y figurado de acero para aletas de alcantarilla.

Ing Residente Obra Ing. Residente Altagracia

Powered by CamScanner

1044

03 Junio 2026.

Clima: soleado

Personal de Obra: 2 Maestros de Obra, 10 ayudantes, Ing residente

Altagracia.

-Se realizo vaciado de Concreto 21 Mpa de huella margen derecha, izquierda, y centro en 21 m.

Poyente 4

-se realizo instalación de formaleta, Pusa aletas y vaciado de Concreto de 21 Mpa de las mismas.

Ing Residente Obra — Ing. Residente Interventoria

04 Junio 2026

Clima = Lluvioso

Personal de obra = 2 maestros de obra, 10 ayudantes, Ing residente.

Altagracia.

-se realizo analisis de acero por fuertes lluvias en la zona

Ing Residente Obra — Ing. Residente Interventoria

Powered by CamScanner

1045

05 Junio 2026

Clima = lluvioso

Personal en obra = 2 Maestros, 10 ayudantes, Ing. Residente obra.

Altagracia.

Se realizo Vaciado de Concreto de 21 Mpa en huella derecha, izquierda y centro en un total de 9 ml

Poblenou

Se realizo retiro de formaleta de aletas de alcantarilla Ubicada en el KM+286.6

Ing. Residente Obra

Ing. Residente Interventoria

08 Junio 2026

Clima = lluvioso

Personal en obra = 2 maestros, 10 ayudantes, Ing residente obra

Altagracia

Se realizo vaciado de Concreto de 21Mpa en Cunetas y vigas de 30 ml en margen derecha y izquierda.

Ing. Residente Obra

Ing. Residente Interventoria

Powered by CamScanner

1046

09 Junio 2026

Clima: Soleado
Personal en obra: 2 maestros, 10 ayudantes, Ing residente o bra

Allagracia

-Se realizo vaciado de concreto de 21 mts de huella margen derecha, izquierda y centro en un total de 15 ml.

Polvenir

-se realizo excavacion para instalacion de tuberia, para esto se realizo un Solado de 10cm de espesor y seguido a esto la instalacion de tuberia de 36".
-Se realizo ataque de 30cm a la tuberia.
-Se realizo sellado con recebo en los laterales y en la parte superior de la tuberia.

Ing residente obra Ing. Residente Interventoria.

10 Junio 2026

Clima=Soleado
Personal de Obra= 2 maestros, 10 ayudantes, Ing residente obra.

Allagracia.
-Se realizo retiro de formaleta y instalación de formaleta para Cuneta y vigas.
-Se realizo instalacion de acero para huella y Cuneta.

Powered by CamScanner

1047

Pavens 4

-Se realizo vaciado de Concreto de zapata Para losa de 10 cm de Peralta y aletas.

Ing Residente Obra

Ing Residente Interventoria

11 Junio 2016

Clima=Soleado

Personal de Obra: 2 Maestros de obra, 10 Ayudantes, Ingeniero residente Altagracia.

-Se realizo vaciado de concreto de zapata 15 M de ancho derecha, izquierda, y centro.

-Se realizo figurado de acero de 3/8" Para vigas riostras

Pavens 4

-Se realizo armado y figurado de acero Para Peralta de alcantarilla ubicada en el KM 1+200.

Ing Residente Obra

Ing. Residente Interventoria

1048

12 Junio 2026

Clima= Soleado

Personal de obra: 2 Maestros de obra, 10 Ayudantes, 1 Ing. Res. Obra

Altagracia

-se realizo vaciado de Concreto de 21 Mpa en cunetas y vigas con su respectivo acero de 3/8" con separación de 20cm en un total de 15 ml. Margen derecha y izquierda.

Paveria 4

-se realizo instalación de Formaleta de Poceta de alcantarilla luego de amarrar y figuras acero de 3/8" y 1/2"

-se realizo vaciado de Concreto de 21 Mpa en Poceta de alcantarilla ubicada en el Km 200.

Ing. Res. Obra

Ing. Res. Interventoria

15 Junio 2026

Clima= Soleado

Personal de obra= 2 Maestros de obra, 10 Ayudantes Ingres. Obra.

Altagracia

-se realizo Retiro y instalacion de Formaleta para nella derecha, izquierda y centro.

-se realizo acopio de Material granular.

Powered by CamScanner

1069

Pavimento 4.
-se realizo Amarre y Figurado de acero de Aletas de Alcantarilla ubicada en el Km 1+200
-se realizo instalacion de Formaleta. Para aletas de Alcantarilla

Ing. Res. Obra Ing. Res. Interventoria

16 - Junio - 26

Clima = Soleado

Personal de obra = 2 Maestros de obra, 10 Ayudantes, Ing. Res. obra.

Alfajiaca

-se realizo Amarre y Figurado de acero 3/8" Para linea Margen derecha y izquierda en 10 ml.

Pavimento 4.

-se realizo vaciado de Concreto de 21 Mpa en Aletas de alcantarilla ubicada en el Km 1+200.

Sara Morsalve Versin

Ing. Res. Obra Ing. Res. Interventoria

Powered by CamScanner

1050

17 Junio 2026

Clima = lluvioso

Personal de Obra: 2 maestros de obra, 10 Ayudantes, Ing Res. Obra

Altagracia.

-Se realizo vaciado de concreto de 21 Mpa en huella derecha, izquierda, y centro.

Porvenir 3

- Se realizo excavacion de 5 m de longitud y 1m de Ancho Para instalación de tubería de alcantarilla.
- Se realizo Solado de 10 cm para tubería de 36".
- se instalo la respectiva tubería de 36" y se coloco el Atraque Correspondiente.
- Se relleno con recebo encima del tubo y el atraque.

Ing Res. Obra | Ing. Res. | Interventoria

18 Junio 2026

Clima = Soleado

Personal de obra: 2 maestros de obra, 10 Ayudantes. Ing Res Obra.

Altagracia:

-se realizo retiro de Formaleta de huella y instalacion de Formaleta para cuneta y vigas riostras.

Powered by CamScanner

1051

Poniente.
-Se realizo Solado de limpieza Para aletas y Poceta de alcantarilla ubicada en el Km 1058.34.
-Se realizo figurado y colocado de acero de 3/8" y 1/2" Para poceta y aletas de alcantarilla

Ing. Res. Obra — Ing. Res. Interventoria.

19 Junio 2020

Cima: Soleado
Personal de ocurrencias de obra: 06 ayudantes, Ing. Res. Obra

Allagracia:
-Se realizo vaciado de Concreto de 3000 psi en aletas y Vigas riostras.

Poniente 3
-Se realizo instalacion de acero de Poceta y aletas de alcantarilla
-Se realizo vaciado de concreto de 3000 psi en piso de Poceta y aletas.

Ing Res. Obra — Ing res. Interventoria

Powered by CamScanner

1052

22 Junio 2026

Clima: Soleado

Personal de Obra: 2 Maestros de obra, 10 Ayudantes, 1 ing Res Obra.

Altagracia

-Se realizo instalacion de Formaleta de bordillo y acero longitudinal de bordillo

-Se realizo instalación de Formaleta para Rampa de acceso con su respectivo de acero de 3/8" cada 20cm.

Proyecto 3

-se realizo vaciado de concreto de 21 Mpa en poceta de alcantarilla.

-Se realizo instalación de Formaleta en aletas. para alcantarilla

Ing. Res. Obra

Ing Res. Interventoria

23 Junio 2026

Clima = Soleado

Personal de obra: 2 Maestros de obra, 10 Ayudantes Ing Res. Obra

Altagracia.

-se realizo vaciado de Concreto de 21 MPa en bordillo de Margen izquierda y derecha.

Proyecto 3

-Se realizo vaciado de concreto de 21 MPa en aletas. de alcantarilla ubicada en el K2+058.34.

Ing Res. Obra

Ing. Res. Interventoria.

Powered by CamScanner

1053

24 Junio 2026

Clima=Soleado

Personal de obra: 6 Maestros de obra, 10 Ayudantes, Ing. Res obra.

Altagracia

-Se realizo vaciado de concreto de 21 MPa en bordillos Margen derecha y izquierda

-Se realizo replanteo de disipados para alcantarilla Ubicada en el KM 48

Porvenir 3

-se realizo instalación de tubería de 36" con su respectiva Solado y de limpieta de 10cm alrededor de tubería de 20cm por cada lado, adicionalmente se instalo recebo para el relleno

Ing Res. Obra Ingo Res. Interventoria

25 Junio 2026

Clima=Soleado

Personal de obra: 2 Maestros de obra, 10 Ayudantes, Ing. Res. Obra

Altagracia

-Se realizo vaciado de concreto de 21 MPa en bordillo

-Se realizo instalacion de cunetas de disipadores

Porvenir 3

-Se realizo vaciado de concreto de 14 MPa en solado de limpieza en encole y descole.

Ing Res Obra Ing Res Interventoria.

Powered by CamScanner

1054

26 Junio 2026

Clima: Soleado

Personal de obra= 2 Maestros de obra, 10 Ayudantes, Ing. Res. Obra.

Altagracia.

- Se realizo armado y figurado de acero para dispadores de alcantarilla con Acero de 3/8".

Poste # 3

-se realizo figurado y armado de acero de 3/8" y 1/2" para aletas y poceta.

-se realizo instalacion de Formaleta para Poceta.

-Se realizo vaciado de Concreto de 21 Mpa en Piso de Poceta y aletas.

Ing Res. Obra Ing. Res Interventoria.

29 Junio 2026

Clima: Soleado

Personal de Obra: 2 Maestros de obra, 10 ayudantes; Ing. Res obra

Altagracia

-se realizo retiro de Formaleta de disipador y bordillos.

-se realizo limpieza de placa huella

Poste # 3.

-se realizo vaciado de Concreto de 21 Mpa en aletas y Poceta de alcantarilla.

Powered by CamScanner

1055

26 Junio 2026

Clima = Soleado

Personal de Obra = 2 Maestros de obra, 10 Ayudantes, Ing. Res. Obra.

Altagracia.

- Se realizo armado y Figurado de acero para disipador de alcantarilla con Acero de 3/8"

Poste nº 3

- Se realizo figurado y armado de acero de 3/8" y 1/2" para aletas y poceta.
- Se realizo instalacion de Formaleta para poceta.
- Se realizo vaciado de Concreto de 21 MPa en piso de poceta y aletas.

Ing Res. Obra. Ing. Res Interventoria.

29 Junio 2026

Clima = Soleado

Personal de Obra = 2 Maestros de obra, 10 ayudantes, Ing. Res Obra

Altagracia:

- Se realizo retiro de Formaleta de disipador y bordillos.
- Se realizo limpieza de placa huella.

Poste nº 3.

- Se realizo vaciado de Concreto de 21 MPa en aletas y poceta de alcantarilla.

MCB

Powered by CamScanner

1056

Quebradon

-Se realizo relleno de Material o capa orgánica de la rasante. Con excavacion.

-Se realizo instalacion de sub base en un total de 20ml con su respectiva compactacion

Ing Res Obra Ing Res Interventoria

30 Junio 2026

Clima: soleado

Personal de obra: 2 maestros de obra 10 ayudantes, Ing res obra.

Aqueni 3

-Se realizo instalación de tubería de 36" en la cual se realizo excavacion de 2 m de Profundidad, 5m de longitud y 1.8 de ancho, se instalo el respectivo solado de 10cm y atraque de 20 cm.

Quebradon

-se realizo compactacion de sub base granular tipo C instalada

-se realizo instalacion de 30 ml de sub base granular tipo C y su respectiva compactacion

Ing Res. Obra Ing Res Interventoria.

Powered by CamScanner

1057

01 Julio 2026

Clima: Soleado

Personal de obra: 2 maestros, 10 ayudantes de obra.

Proveniz 3

- Se realizo limpieza de material de excavacion de poceta y aletas de alcantarilla.
- Se realizaron solados de limpieza de 10 cm en aletas y poceta.

Quebradon.

- Se realizo Amarre y Figurado de acero de 3/8" Para cuneta y Huella.

Ing. Ibes. Obra Ing. Ibes. Interventoria.

02 Julio 2026.

Clima: Soleado

Personal de obra: 2 maestros, 10 ayudantes, Ing. Ibes. Obra.

Proveniz 3

- se realizo amarre y figurado de acero para poceta de alcantarilla
- se realizo instalacion de Formaleta para poceta de alcantarilla.

Powered by CamScanner

1058

Quebradon

-Se realizo amarre y figurado de acero de 3/8" para huella, contra. y viga riostra.

Ing. Residente obra — Ing residente Interventoria.

03 Julio 2026

Clima = Soleado

Personal de obra: 2 maestros, 10 ayudantes, 1 ing residente obra.

Polvorin 3.

-Se realizo vaciado de concreto de 21 Mpa en Placa de alcantarilla

-Se realizo amarre y figurado de acero para aletas.

-Se realizo vaciado de concreto de 21 Mpa para piso de aletas.

Quebradon.

-Se realizo instalacion de formaleta para huella derecha, izquierda y centro.

Ing Res. Obra — Ing Res. Interventoria

Powered by CamScanner

1059

06 Julio 2026

Clima: soleado

Personal de obra: 2 ayudantes, 2 Maestros de obra, Ing Residente

Polvenis 3

-se realizo vaciado de Concreto de 21 Mpa en aletas de alcantarilla.

Quebrada

-Se realizo vaciado de concreto de 21 Mpa en 15 ml de Placa huella

-se instalo el acero correspondiente para huella de 3/8"

Ing. Res. Obra Ing. Res. Interventoria.

07 Julio 2026

Clima= Soleado

Personal de obra= 2 Maestros, 10 ayudantes, Ing Residente.

Polvenis 3

-se realizo retiro de formaleta de alcantarillas

-se realizo limpieza de alcantarilla.

NKB

Powered by CamScanner

1060

Quebradon

-se realizo instalación de acero de 3/8" para cuneta y bordillo.
-se realizo vaciado de concreto de 21 Mpa en cunetas en 15 m margen derecha y izquierda

Ing Res. Obra Ing Res. Interventoria

08 Julio 2026

Clima: Soleado

Personal Obra: 2 Maestros, 10 ayudantes, Ing Residente obra.

quebradon
-se realizo instalación de Formaleta para huella margen derecha, izquierda.
-se realizo vaciado de Concreto de 21Mpa en 3m total de zonl de huella derecha, izquierda, centro.

Ing Residente Obra Ing Residente Obra

Powered by CamScanner

1061

09 Julio 2026

Clima: Soleado

Personal obra: 1 Maestro, 1 oficial, 5 ayudantes, Ing residente

Quebradon

-Se realizo instalación de acero de 3/8" para huella Cuneta y bordillo.

-Se realizo vaciado de concreto de 21 Mpa para Cuneta margen derecha y izquierda en un total de 20 ml.

Ing Residente obra

Ing Residente Interventoria

10 Julio 2026

Clima = Soleado

Personal obra = 1 Maestro, 1 oficial, 5 ayudantes, Ing Residente obra

Quebradon

- Se realizo vaciado de Concreto 21 Mpa de 10 ml de huella Centro, derecha, izquierda.

-Se realizo vaciado de Concreto de 21 Mpa de cuneta de 10 ml.

Ing residente obra

Ing residente Interventoria

Powered by CamScanner

CONTRATO DE OBRA No.001 DEL 12 DE FEBRERO 2026

MUNICIPIO DE RIOBLANCO	"MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN CON PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE EN VARIOS PUNTOS CRÍTICOS DISPERSOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO, TOLIMA".	

BALANCE DE OBRA No 1

CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL RIOBLANCO - TOLIMA NIT. 890702040-7	**VALOR DEL CONTRATO:**	$ 16,013,896,392.00	**Fecha Presente Acta:**
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROINGENIERIA RIOBLANCO 2025 NIT: 902.031.674-9	**SUPERVISOR CONTRATO DE OBRA:**	SUBSECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	
INTERVENTOR: CONSORCIO INTER TERCIARIAS RIOBLANCO 2026 NIT: 902.044.775-0	**SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	**17 DE JUNIO DE 2026**
PLAZO INICIAL: OCHO (08) MESES	**ACTA DE INICIO:**	25 de febrero de 2026	

En las instalaciones de la Secretaría de Planeación e Infraestructura del Municipio de Rioblanco - Tolima, a los diesciete (17) días del mes de junio de 2026, se reunieron el Ingeniero Gustavo Alberto Rodriguez Chavarro representante legal de la **UNION TEMPORAL PROINGENIERIA RIOBLANCO 2025** en calidad de contratista, El ingeniero Mario Alejandro Alvarado Guzman representante legal del **CONSORCIO INTER TERCIARIAS RIOBLANCO 2026** en calidad de interventor, la Arquitecta Lina Maritza Bocanegra Quintero en calidad de supervisor del contrato de interventoria y el ingeniero Ivan Mauricio Penagos Andrade en calidad de supervisor del contrato de obra; con el fin de suscribir la presente **BALANCE DE OBRA No 01**, del contrato de Obra de la referencia.

				CONDICIONES CONTRACTUALES		MAYORES Y MENORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 01	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL
	NUCLEO 1. QUEBRADON Y GAITAN								
	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA EN TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 900 MM								
1.1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	10.40	$ 227,954.00	$ 2,370,722.00	4.89	$ 1,115,362.00	15.29	$ 3,486,084.00
1.2	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	308.23	$ 36,315.00	$ 11,193,371.00	-	$ -	308.23	$ 11,193,371.00
1.3	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	M3	164.55	$ 752,998.00	$ 123,908,794.00	-	$ -	164.55	$ 123,908,794.00
1.4	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA MEZCLADO EN SITIO	M3	97.80	$ 1,515,988.00	$ 148,260,463.00	-	$ -	97.80	$ 148,260,463.00
1.5	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA MEZCLADO EN SITIO	M3	11.66	$ 1,227,792.00	$ 14,321,472.00	0.56	$ 690,123.00	12.23	$ 15,011,596.00
1.6	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA.	KG	7,525.70	$ 12,615.00	$ 94,936,706.00	- 143.12	-$ 1,805,485.00	7,382.58	$ 93,131,220.00
1.7	TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO 21 MPA DE 900 MM DE DIÁMETRO INTERIOR	M	78.00	$ 1,468,551.00	$ 114,546,978.00	-	$ -	78.00	$ 114,546,978.00
				SUBTOTAL - ALCANTARILLAS	$ 509,538,506.00		$ -		$ 509,538,506.00
	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO								
2.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	40.42	$ 36,315.00	$ 1,467,792.00	389.58	$ 14,147,658.00	430.00	$ 15,615,450.00
2.2	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	891.41	$ 471,529.00	$ 420,326,845.00	-	$ -	891.41	$ 420,326,845.00
2.3	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA MEZCLADO EN SITIO	M3	707.87	$ 1,515,988.00	$ 1,073,123,386.00	-	$ -	707.87	$ 1,073,123,386.00
2.4	CONCRETO CICLÓPEO (CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (D) 60% CONCRETO - 40% AGREGADO CICLÓPEO)	M3	299.08	$ 977,598.00	$ 292,382,552.00	-	$ -	299.08	$ 292,382,552.00
2.5	MATERIAL EN AFIRMADO PARA MEJORAMIENTO, RENIVELACIÓN Y LLENOS DE SUBRASANTE	M3	974.84	$ 702,477.00	$ 684,802,679.00	- 20.14	-$ 14,147,658.00	954.70	$ 670,655,021.00
2.6	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA.	KG	32,179.57	$ 12,615.00	$ 405,945,230.00	-	$ -	32,179.57	$ 405,945,230.00
2.7	CORTE Y SELLO PARA JUNTAS	M	6,646.28	$ 19,949.00	$ 132,586,640.00	-	$ -	6,646.28	$ 132,586,640.00
2.8	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE PRÉSTAMOS	M3	551.73	$ 21,173.00	$ 11,681,779.00	-	$ -	551.73	$ 11,681,779.00
2.9	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 DIMENSIONES (75 x 75) CM CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV	U	43.00	$ 850,189.00	$ 36,558,127.00	-	$ -	43.00	$ 36,558,127.00
				SUBTOTAL - PLACA HUELLA	$ 3,058,875,030.00		$ -		$ 3,058,875,030.00
				SUB TOTAL OBRAS - NUCLEO 1. QUEBRADON Y GAITAN	**$ 3,568,413,536.00**		**$ -**		**$ 3,568,413,536.00**
	NUCLEO 2. LA URIBE, MARACAIBO Y LA LINDOSA								
	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA EN TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 900 MM								
1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	545.33	$ 52,695.00	$ 28,736,160.00	-	$ -	545.33	$ 28,736,160.00
1.2	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	M3	291.13	$ 821,459.00	$ 239,154,569.00	-	$ -	291.13	$ 239,154,569.00
1.3	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA MEZCLADO EN SITIO	M3	173.03	$ 1,584,450.00	$ 274,152,752.00	-	$ -	173.03	$ 274,152,752.00
1.4	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA MEZCLADO EN SITIO	M3	20.64	$ 1,305,207.00	$ 26,935,606.00	-	$ -	20.64	$ 26,935,606.00
1.5	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA.	KG	13,314.70	$ 12,644.00	$ 168,351,067.00	-	$ -	13,314.70	$ 168,351,067.00
1.6	TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO 21 MPA DE 900 MM DE DIÁMETRO INTERIOR	M	138.00	$ 1,501,581.00	$ 207,218,178.00	-	$ -	138.00	$ 207,218,178.00
				SUBTOTAL - ALCANTARILLAS	$ 944,548,332.00		$ -		$ 944,548,332.00
	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO								
2.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	76.52	$ 52,695.00	$ 4,032,274.00	873.48	$ 46,027,976.00	950.00	$ 50,060,250.00
2.2	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	1,696.97	$ 505,297.00	$ 857,475,113.00	-	$ -	1,696.97	$ 857,475,113.00
2.3	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA MEZCLADO EN SITIO	M3	1,337.36	$ 1,584,450.00	$ 2,118,980,020.00	-	$ -	1,337.36	$ 2,118,980,020.00
2.4	CONCRETO CICLÓPEO (CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (D) 60% CONCRETO - 40% AGREGADO CICLÓPEO)	M3	569.59	$ 1,045,112.00	$ 595,284,048.00	-	$ -	569.59	$ 595,284,048.00
2.5	MATERIAL EN AFIRMADO PARA MEJORAMIENTO, RENIVELACIÓN Y LLENOS DE SUBRASANTE	M3	1,938.99	$ 768,305.00	$ 1,489,731,870.00	- 59.91	-$ 46,027,976.00	1,879.08	$ 1,443,703,894.00
2.6	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA.	KG	61,048.88	$ 12,644.00	$ 771,902,098.00	-	$ -	61,048.88	$ 771,902,098.00
2.7	CORTE Y SELLO PARA JUNTAS	M	12,657.53	$ 19,949.00	$ 252,505,026.00	-	$ -	12,657.53	$ 252,505,026.00
2.8	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE PRÉSTAMOS	M3	970.56	$ 37,554.00	$ 36,448,410.00	-	$ -	970.56	$ 36,448,410.00

1062

CONTRATO DE OBRA No.001 DEL 12 DE FEBRERO 2026

MUNICIPIO DE RIOBLANCO

"MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN CON PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE EN VARIOS PUNTOS CRÍTICOS DISPERSOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO, TOLIMA".

BALANCE DE OBRA No 1

CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL RIOBLANCO - TOLIMA NIT. 890702040-7	**VALOR DEL CONTRATO:**	$ 16,013,896,392.00	**Fecha Presente Acta:**
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROINGENIERIA RIOBLANCO 2025 NIT: 902.031.674-9	**SUPERVISOR CONTRATO DE OBRA:**	SUBSECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	
INTERVENTOR: CONSORCIO INTER TERCIARIAS RIOBLANCO 2026 NIT: 902.044.775-0	**SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	**17 DE JUNIO DE 2026**
PLAZO INICIAL: OCHO (08) MESES	**ACTA DE INICIO:**	25 de febrero de 2026	

En las instalaciones de la Secretaria de Planeación e Infraestructura del Municipio de Rioblanco - Tolima, a los diesciete (17) dias del mes de junio de 2026, se reunieron el Ingeniero Gustavo Alberto Rodriguez Chavarro representante legal de la **UNION TEMPORAL PROINGENIERIA RIOBLANCO 2025** en calidad de contratista, El ingeniero Mario Alejandro Alvarado Guzman representante legal del **CONSORCIO INTER TERCIARIAS RIOBLANCO 2026** en calidad de interventor, la Arquitecta Lina Maritza Bocanegra Quintero en calidad de supervisor del contrato de interventoria y el ingeniero Ivan Mauricio Penagos Andrade en calidad de supervisor del contrato de obra; con el fin de suscribir la presente **BALANCE DE OBRA No 01**, del contrato de Obra de la referencia.

		CONDICIONES CONTRACTUALES					MAYORES Y MENORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 01	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT.**	**VR. UNIT**	**VR.TOTAL**		**CANT.**	**VR.TOTAL**	**CANT.**	**VR.TOTAL**
2.9	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 DIMENSIONES (75 x 75) CM CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV	U	63.00	$ 851,948.00	$ 53,672,724.00		-	$ -	63.00	$ 53,672,724.00
				SUBTOTAL - PLACA HUELLA	$ 6,180,031,583.00			$ -		$ 6,180,031,583.00
				SUB TOTAL OBRAS - NUCLEO 2. LA URIBE, MARACAIBO Y LA LINDOSA	**$ 7,124,579,915.00**			**$ -**		**$ 7,124,579,915.00**
	NUCLEO 3. MESA DE PALMICHAL									
	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA EN TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 900 MM									
1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	118.55	$ 53,274.00	$ 6,315,632.00		-	$ -	118.55	$ 6,315,632.00
1.2	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	M3	63.29	$ 792,303.00	$ 50,144,841.00		-	$ -	63.29	$ 50,144,841.00
1.3	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA MEZCLADO EN SITIO	M3	37.61	$ 1,555,294.00	$ 58,501,734.00		-	$ -	37.61	$ 58,501,734.00
1.4	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA MEZCLADO EN SITIO	M3	4.49	$ 1,272,238.00	$ 5,707,657.00		-	$ -	4.49	$ 5,707,657.00
1.5	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA.	KG	2,894.50	$ 12,632.00	$ 36,563,324.00		-	$ -	2,894.50	$ 36,563,324.00
1.6	TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO 21 MPA DE 900 MM DE DIÁMETRO INTERIOR	M	30.00	$ 1,487,514.00	$ 44,625,420.00		-	$ -	30.00	$ 44,625,420.00
				SUBTOTAL - ALCANTARILLAS	$ 201,858,608.00			$ -		$ 201,858,608.00
	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO									
2.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	13.07	$ 53,274.00	$ 696,522.00		-	$ -	13.07	$ 696,522.00
2.2	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	289.67	$ 490,916.00	$ 142,204,865.00		-	$ -	289.67	$ 142,204,865.00
2.3	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA MEZCLADO EN SITIO	M3	228.58	$ 1,555,294.00	$ 355,512,080.00		-	$ -	228.58	$ 355,512,080.00
2.4	CONCRETO CICLÓPEO (CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (D) 60% CONCRETO - 40% AGREGADO CICLÓPEO)	M3	97.22	$ 1,016,360.00	$ 98,812,511.00		-	$ -	97.22	$ 98,812,511.00
2.5	MATERIAL EN AFIRMADO PARA MEJORAMIENTO, RENIVELACIÓN Y LLENOS DE SUBRASANTE	M3	238.47	$ 740,271.00	$ 176,532,425.00		-	$ -	238.47	$ 176,532,425.00
2.6	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA.	KG	10,427.12	$ 12,632.00	$ 131,715,394.00		-	$ -	10,427.12	$ 131,715,394.00
2.7	CORTE Y SELLO PARA JUNTAS	M	2,160.49	$ 19,949.00	$ 43,099,575.00		-	$ -	2,160.49	$ 43,099,575.00
2.8	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE PRÉSTAMOS	M3	236.52	$ 38,133.00	$ 9,019,217.00		-	$ -	236.52	$ 9,019,217.00
2.9	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 DIMENSIONES (75 x 75) CM CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV	U	12.00	$ 851,199.00	$ 10,214,388.00		-	$ -	12.00	$ 10,214,388.00
				SUBTOTAL - PLACA HUELLA	$ 967,806,977.00		-	$ -		$ 967,806,977.00
				SUB TOTAL OBRAS - NUCLEO 3. MESA DE PALMICHAL	**$ 1,169,665,585.00**			**$ -**		**$ 1,169,665,585.00**
	NUCLEO 4. LA ITALIA Y LA JUNTAS									
	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA EN TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 900 MM									
1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	142.26	34,356.00	$ 4,887,484.00		-	$ -	142.26	$ 4,887,484.00
1.2	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	M3	75.95	861,833.00	$ 65,454,472.00		-	$ -	75.95	$ 65,454,472.00
1.3	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA MEZCLADO EN SITIO	M3	45.14	1,624,824.00	$ 73,340,491.00		-	$ -	45.14	$ 73,340,491.00
1.4	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA MEZCLADO EN SITIO	M3	5.38	1,350,860.00	$ 7,272,456.00		-	$ -	5.38	$ 7,272,456.00
1.5	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA.	KG	3,473.40	12,661.00	$ 43,976,717.00		-	$ -	3,473.40	$ 43,976,717.00
1.6	TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO 21 MPA DE 900 MM DE DIÁMETRO INTERIOR	M	36.00	1,521,059.00	$ 54,758,124.00		-	$ -	36.00	$ 54,758,124.00
				SUBTOTAL - ALCANTARILLAS	$ 249,689,744.00			$ -		$ 249,689,744.00
	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO									
2.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	17.69	$ 34,356.00	$ 607,586.00		-	$ -	17.69	$ 607,586.00
2.2	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	388.91	$ 525,211.00	$ 204,261,123.00		-	$ -	388.91	$ 204,261,123.00
2.3	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA MEZCLADO EN SITIO	M3	310.07	$ 1,624,824.00	$ 503,801,541.00		-	$ -	310.07	$ 503,801,541.00
2.4	CONCRETO CICLÓPEO (CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (D) 60% CONCRETO - 40% AGREGADO CICLÓPEO)	M3	130.46	$ 1,084,927.00	$ 141,538,058.00		-	$ -	130.46	$ 141,538,058.00
2.5	MATERIAL EN AFIRMADO PARA MEJORAMIENTO, RENIVELACIÓN Y LLENOS DE SUBRASANTE	M3	135.34	$ 807,126.00	$ 109,236,433.00		-	$ -	135.34	$ 109,236,433.00
2.6	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA.	KG	14,064.99	$ 12,661.00	$ 178,076,775.00		-	$ -	14,064.99	$ 178,076,775.00

CONTRATO DE OBRA No.001 DEL 12 DE FEBRERO 2026

MUNICIPIO DE RIOBLANCO	"MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN CON PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE EN VARIOS PUNTOS CRÍTICOS DISPERSOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO, TOLIMA".	

BALANCE DE OBRA No 1

CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL RIOBLANCO - TOLIMA NIT. 890702040-7	**VALOR DEL CONTRATO:**	$ 16,013,896,392.00	**Fecha Presente Acta:**
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROINGENIERIA RIOBLANCO 2025 NIT: 902.031.674-9	**SUPERVISOR CONTRATO DE OBRA:**	SUBSECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	
INTERVENTOR: CONSORCIO INTER TERCIARIAS RIOBLANCO 2026 NIT: 902.044.775-0	**SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	**17 DE JUNIO DE 2026**
PLAZO INICIAL: OCHO (08) MESES	**ACTA DE INICIO:**	25 de febrero de 2026	

En las instalaciones de la Secretaria de Planeación e Infraestructura del Municipio de Rioblanco - Tolima, a los diesciete (17) dias del mes de junio de 2026, se reunieron el Ingeniero Gustavo Alberto Rodriguez Chavarro representante legal de la **UNION TEMPORAL PROINGENIERIA RIOBLANCO 2025** en calidad de contratista, El ingeniero Mario Alejandro Alvarado Guzman representante legal del **CONSORCIO INTER TERCIARIAS RIOBLANCO 2026** en calidad de interventor, la Arquitecta Lina Maritza Bocanegra Quintero en calidad de supervisor del contrato de interventoria y el ingeniero Ivan Mauricio Penagos Andrade en calidad de supervisor del contrato de obra; con el fin de suscribir la presente **BALANCE DE OBRA No 01**, del contrato de Obra de la referencia.

CONDICIONES CONTRACTUALES						MAYORES Y MENORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 01	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL
2.7	CORTE Y SELLO PARA JUNTAS	M	2,899.08	$ 19,949.00	$ 57,833,747.00	-	$ -	2,899.08	$ 57,833,747.00
2.8	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE PRÉSTAMOS	M3	259.64	$ 19,215.00	$ 4,988,983.00	-	$ -	259.64	$ 4,988,983.00
2.9	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 DIMENSIONES (75 x 75) CM CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV	U	20.00	$ 852,985.00	$ 17,059,700.00	-	$ -	20.00	$ 17,059,700.00
				SUBTOTAL - PLACA HUELLA	$ 1,217,403,946.00		$ -		$ 1,217,403,946.00
				SUB TOTAL OBRAS - NUCLEO 4. LA ITALIA Y LA JUNTAS	**$ 1,467,093,690.00**		**$ -**		**$ 1,467,093,690.00**
NUCLEO 5. CHELE Y BUENAVISTA									
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA EN TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 900 MM									
1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	189.68	$ 43,259.00	$ 8,205,366.00	-	$ -	189.68	$ 8,205,366.00
1.2	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	M3	101.26	$ 713,692.00	$ 72,271,284.00	-	$ -	101.26	$ 72,271,284.00
1.3	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA MEZCLADO EN SITIO	M3	60.18	$ 1,476,683.00	$ 88,871,702.00	-	$ -	60.18	$ 88,871,702.00
1.4	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA MEZCLADO EN SITIO	M3	7.18	$ 1,183,347.00	$ 8,494,183.00	-	$ -	7.18	$ 8,494,183.00
1.5	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA.	KG	4,631.20	$ 12,599.00	$ 58,348,489.00	-	$ -	4,631.20	$ 58,348,489.00
1.6	TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO 21 MPA DE 900 MM DE DIÁMETRO INTERIOR	M	48.00	$ 1,449,588.00	$ 69,580,224.00	-	$ -	48.00	$ 69,580,224.00
				SUBTOTAL - ALCANTARILLAS	$ 305,771,248.00		$ -		$ 305,771,248.00
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO									
2.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	33.48	$ 43,259.00	$ 1,448,153.00	-	$ -	33.48	$ 1,448,153.00
2.2	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	744.22	$ 452,142.00	$ 336,491,989.00	-	$ -	744.22	$ 336,491,989.00
2.3	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA MEZCLADO EN SITIO	M3	584.52	$ 1,476,683.00	$ 863,148,788.00	-	$ -	584.52	$ 863,148,788.00
2.4	CONCRETO CICLÓPEO (CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (D) 60% CONCRETO - 40% AGREGADO CICLÓPEO)	M3	249.84	$ 938,837.00	$ 234,560,050.00	-	$ -	249.84	$ 234,560,050.00
2.5	MATERIAL EN AFIRMADO PARA MEJORAMIENTO, RENIVELACIÓN Y LLENOS DE SUBRASANTE	M3	345.35	$ 664,683.00	$ 229,548,274.00	-	$ -	345.35	$ 229,548,274.00
2.6	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA.	KG	26,732.24	$ 12,599.00	$ 336,799,491.00	-	$ -	26,732.24	$ 336,799,491.00
2.7	CORTE Y SELLO PARA JUNTAS	M	5,552.02	$ 19,949.00	$ 110,757,327.00	-	$ -	5,552.02	$ 110,757,327.00
2.8	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE PRÉSTAMOS	M3	914.37	$ 28,117.00	$ 25,709,341.00	-	$ -	914.37	$ 25,709,341.00
2.9	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 DIMENSIONES (75 x 75) CM CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV	U	30.00	$ 849,179.00	$ 25,475,370.00	-	$ -	30.00	$ 25,475,370.00
				SUBTOTAL - PLACA HUELLA	$ 2,163,938,783.00		$ -		$ 2,163,938,783.00
				SUB TOTAL OBRAS - NUCLEO 5. CHELE Y BUENAVISTA	**$ 2,469,710,031.00**		**$ -**		**$ 2,469,710,031.00**
				SUBTOTAL DE OBRAS	$ 15,799,462,757.00		$ -		$ 15,799,462,757.00
				PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL (PAGA)	**$ 56,400,000.00**		**$ -**		**$ 56,400,000.00**
				PLAN DE MANEJO TRANSITO (PMT)	**$ 158,033,635.00**		**$ -**		**$ 158,033,635.00**
				VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA	**$ 16,013,896,392.00**		**$ -**		**$ 16,013,896,392.00**

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 16,013,896,392.00	
VALOR PRESENTE **BALANCE No 1**		$ 16,013,896,392.00
VALOR A ADICIONAR		$ -
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$16,013,896,392.00**	**$ 16,013,896,392.00**

No siendo otro el objeto de la presente **BALANCE No 1**, se firma una vez leida y aprobada en cada una de sus partes por los que en ella intervinieron. A los diesciete (17) dias del mes de junio de 2026.

GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ CHAVARRO
R.L UNION TEMPORAL PROINGENIERIA RIOBLANCO 2025
CONTRATISTA

MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMAN
R.L CONSORCIO INTER TERCIARIAS RIOBLANCO 2026
INTERVENTOR

1064

CONTRATO DE OBRA No.001 DEL 12 DE FEBRERO 2026

MUNICIPIO DE RIOBLANCO

"MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN CON PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE EN VARIOS PUNTOS CRÍTICOS DISPERSOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO, TOLIMA".

ACTA PARCIAL 01

CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL RIOBLANCO - TOLIMA NIT. 890702040-7	**VALOR DEL CONTRATO:**	$ 16,013,896,392.00	**Fecha Presente Acta:**
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROINGENIERIA RIOBLANCO 2025 NIT: 902.031.674-9	**SUPERVISOR CONTRATO DE OBRA:**	SUBSECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	
INTERVENTOR: CONSORCIO INTER TERCIARIAS RIOBLANCO 2026 NIT: 902.044.775-0	**SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	**10 DE JULIO DE 2026**
PLAZO INICIAL: OCHO (08) MESES	**ACTA DE INICIO:**	25 de febrero de 2026	

En las instalaciones de la Secretaría de Planeación e Infraestructura del Municipio de Rioblanco - Tolima, a los diez (10) dias del mes de julio de 2026, se reunieron el Ingeniero Gustavo Alberto Rodriguez Chavarro representante legal de la **UNION TEMPORAL PROINGENIERIA RIOBLANCO 2025** en calidad de contratista, El ingeniero Mario Alejandro Alvarado Guzman representante legal del **CONSORCIO INTER TERCIARIAS RIOBLANCO 2026** en calidad de interventor, la Arquitecta Lina Maritza Bocanegra Quintero en calidad de supervisor del contrato de interventoria y el ingeniero Ivan Mauricio Penagos Andrade en calidad de supervisor del contrato de obra; con el fin de suscribir la presente **ACTA PARCIAL 01**, del contrato de Obra de la referencia.

	CONDICIONES BALANCE No 1					CANT EJECUTADAS PRESENTE ACTA		CANTIDADES POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL
	NUCLEO 1. QUEBRADON Y GAITAN								
	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA EN TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 900 MM								
1.1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	15.29	$ 227,954.00	$ 3,486,084.00	15.29	$ 3,486,084.00	0.00	$ -
1.2	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	308.23	$ 36,315.00	$ 11,193,371.00	273.42	$ 9,929,330.00	34.81	$ 1,264,041.00
1.3	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	M3	164.55	$ 752,998.00	$ 123,908,794.00	105.81	$ 79,673,210.00	58.75	$ 44,235,584.00
1.4	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA MEZCLADO EN SITIO	M3	97.80	$ 1,515,988.00	$ 148,260,463.00	51.88	$ 78,644,012.00	45.92	$ 69,616,450.00
1.5	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA MEZCLADO EN SITIO	M3	12.23	$ 1,227,792.00	$ 15,011,596.00	12.23	$ 15,011,596.00	-	$ -
1.6	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA.	KG	7,382.58	$ 12,615.00	$ 93,131,220.00	3,301.96	$ 41,654,173.00	4,080.62	$ 51,477,047.00
1.7	TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO 21 MPA DE 900 MM DE DIÁMETRO INTERIOR	M	78.00	$ 1,468,551.00	$ 114,546,978.00	41.00	$ 60,210,591.00	37.00	$ 54,336,387.00
				SUBTOTAL - ALCANTARILLAS	$ 509,538,506.00		$ 288,608,996.00		$ 220,929,509.00
	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO								
2.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	430.00	$ 36,315.00	$ 15,615,450.00	194.50	$ 7,063,117.00	235.50	$ 8,552,333.00
2.2	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	891.41	$ 471,529.00	$ 420,326,845.00	107.34	$ 50,614,754.00	784.07	$ 369,712,091.00
2.3	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA MEZCLADO EN SITIO	M3	707.87	$ 1,515,988.00	$ 1,073,123,386.00	92.89	$ 140,822,892.00	614.98	$ 932,300,494.00
2.4	CONCRETO CICLÓPEO (CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (D) 60% CONCRETO - 40% AGREGADO CICLÓPEO)	M3	299.08	$ 977,598.00	$ 292,382,552.00	27.16	$ 26,547,651.00	271.93	$ 265,834,900.00
2.5	MATERIAL EN AFIRMADO PARA MEJORAMIENTO, RENIVELACIÓN Y LLENOS DE SUBRASANTE	M3	954.70	$ 702,477.00	$ 670,655,021.00	114.35	$ 80,328,245.00	840.35	$ 590,326,776.00
2.6	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA.	KG	32,179.57	$ 12,615.00	$ 405,945,230.00	4,392.20	$ 55,407,626.00	27,787.36	$ 350,537,604.00
2.7	CORTE Y SELLO PARA JUNTAS	M	6,646.28	$ 19,949.00	$ 132,586,640.00	-	$ -	6,646.28	$ 132,586,640.00
2.8	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE PRÉSTAMOS	M3	551.73	$ 21,173.00	$ 11,681,779.00	-	$ -	551.73	$ 11,681,779.00
2.9	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 DIMENSIONES (75 x 75) CM CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV	U	43.00	$ 850,189.00	$ 36,558,127.00	-	$ -	43.00	$ 36,558,127.00
				SUBTOTAL - PLACA HUELLA	$ 3,058,875,030.00		$ 360,784,285.00		$ 2,698,090,744.00
				SUB TOTAL OBRAS - NUCLEO 1. QUEBRADON Y GAITAN	**$ 3,568,413,536.00**		**$ 649,393,281.00**		**$ 2,919,020,253.00**
	NUCLEO 2. LA URIBE, MARACAIBO Y LA LINDOSA								
	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA EN TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 900 MM								
1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	545.33	$ 52,695.00	$ 28,736,160.00	171.82	$ 9,054,223.00	373.51	$ 19,681,937.00
1.2	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	M3	291.13	$ 821,459.00	$ 239,154,569.00	62.61	$ 51,433,744.00	228.52	$ 187,720,825.00
1.3	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA MEZCLADO EN SITIO	M3	173.03	$ 1,584,450.00	$ 274,152,752.00	25.82	$ 40,906,469.00	147.21	$ 233,246,284.00
1.4	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA MEZCLADO EN SITIO	M3	20.64	$ 1,305,207.00	$ 26,935,606.00	7.74	$ 10,105,578.00	12.89	$ 16,830,028.00
1.5	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA.	KG	13,314.70	$ 12,644.00	$ 168,351,067.00	2,130.38	$ 26,936,550.00	11,184.32	$ 141,414,517.00
1.6	TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO 21 MPA DE 900 MM DE DIÁMETRO INTERIOR	M	138.00	$ 1,501,581.00	$ 207,218,178.00	26.00	$ 39,041,106.00	112.00	$ 168,177,072.00
				SUBTOTAL - ALCANTARILLAS	$ 944,548,332.00		$ 177,477,670.00		$ 767,070,663.00
	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO								
2.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	950.00	$ 52,695.00	$ 50,060,250.00	869.83	$ 45,835,692.00	80.17	$ 4,224,558.00
2.2	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	1,696.97	$ 505,297.00	$ 857,475,113.00	115.50	$ 58,361,804.00	1,581.47	$ 799,113,310.00
2.3	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA MEZCLADO EN SITIO	M3	1,337.36	$ 1,584,450.00	$ 2,118,980,020.00	93.00	$ 147,355,434.00	1,244.36	$ 1,971,624,586.00
2.4	CONCRETO CICLÓPEO (CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (D) 60% CONCRETO - 40% AGREGADO CICLÓPEO)	M3	569.59	$ 1,045,112.00	$ 595,284,048.00	35.74	$ 37,354,393.00	533.85	$ 557,929,655.00
2.5	MATERIAL EN AFIRMADO PARA MEJORAMIENTO, RENIVELACIÓN Y LLENOS DE SUBRASANTE	M3	1,879.08	$ 768,305.00	$ 1,443,703,894.00	327.28	$ 251,450,860.00	1,551.80	$ 1,192,253,034.00
2.6	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA.	KG	61,048.88	$ 12,644.00	$ 771,902,098.00	4,375.68	$ 55,326,138.00	56,673.20	$ 716,575,960.00
2.7	CORTE Y SELLO PARA JUNTAS	M	12,657.53	$ 19,949.00	$ 252,505,026.00	-	$ -	12,657.53	$ 252,505,026.00
2.8	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE PRÉSTAMOS	M3	970.56	$ 37,554.00	$ 36,448,410.00	-	$ -	970.56	$ 36,448,410.00
2.9	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 DIMENSIONES (75 x 75) CM CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV	U	63.00	$ 851,948.00	$ 53,672,724.00	-	$ -	63.00	$ 53,672,724.00
				SUBTOTAL - PLACA HUELLA	$ 6,180,031,583.00		$ 595,684,321.00		$ 5,584,347,263.00
				SUB TOTAL OBRAS - NUCLEO 2. LA URIBE, MARACAIBO Y LA LINDOSA	**$ 7,124,579,915.00**		**$ 773,161,991.00**		**$ 6,351,417,926.00**

1665

CONTRATO DE OBRA No.001 DEL 12 DE FEBRERO 2026

MUNICIPIO DE RIOBLANCO

"MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN CON PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE EN VARIOS PUNTOS CRÍTICOS DISPERSOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO, TOLIMA".

ACTA PARCIAL 01

CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL RIOBLANCO - TOLIMA NIT. 890702040-7	**VALOR DEL CONTRATO:**	$ 16,013,896,392.00	**Fecha Presente Acta:**
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROINGENIERIA RIOBLANCO 2025 NIT: 902.031.674-9	**SUPERVISOR CONTRATO DE OBRA:**	SUBSECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	
INTERVENTOR: CONSORCIO INTER TERCIARIAS RIOBLANCO 2026 NIT: 902.044.775-0	**SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	**10 DE JULIO DE 2026**
PLAZO INICIAL: OCHO (08) MESES	**ACTA DE INICIO:**	25 de febrero de 2026	

En las instalaciones de la Secretaría de Planeación e Infraestructura del Municipio de Rioblanco - Tolima, a los diez (10) días del mes de julio de 2026, se reunieron el Ingeniero Gustavo Alberto Rodríguez Chavarro representante legal de la **UNION TEMPORAL PROINGENIERIA RIOBLANCO 2025** en calidad de contratista, El ingeniero Mario Alejandro Alvarado Guzman representante legal del **CONSORCIO INTER TERCIARIAS RIOBLANCO 2026** en calidad de interventor, la Arquitecta Lina Maritza Bocanegra Quintero en calidad de supervisor del contrato de interventoria y el ingeniero Ivan Mauricio Penagos Andrade en calidad de supervisor del contrato de obra; con el fin de suscribir la presente **ACTA PARCIAL 01**, del contrato de Obra de la referencia.

CONDICIONES BALANCE No 1						CANT EJECUTADAS PRESENTE ACTA		CANTIDADES POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL
NUCLEO 3. MESA DE PALMICHAL									
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA EN TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 900 MM									
1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	118.55	$ 53,274.00	$ 6,315,632.00	-	$ -	118.55	$ 6,315,632.00
1.2	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	M3	63.29	$ 792,303.00	$ 50,144,841.00	-	$ -	63.29	$ 50,144,841.00
1.3	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA MEZCLADO EN SITIO	M3	37.61	$ 1,555,294.00	$ 58,501,734.00	-	$ -	37.61	$ 58,501,734.00
1.4	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA MEZCLADO EN SITIO	M3	4.49	$ 1,272,238.00	$ 5,707,657.00	-	$ -	4.49	$ 5,707,657.00
1.5	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA.	KG	2,894.50	$ 12,632.00	$ 36,563,324.00	-	$ -	2,894.50	$ 36,563,324.00
1.6	TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO 21 MPA DE 900 MM DE DIÁMETRO INTERIOR	M	30.00	$ 1,487,514.00	$ 44,625,420.00	-	$ -	30.00	$ 44,625,420.00
				SUBTOTAL - ALCANTARILLAS	$ 201,858,608.00		$ -		$ 201,858,608.00
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO									
2.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	13.07	$ 53,274.00	$ 696,522.00	-	$ -	13.07	$ 696,522.00
2.2	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	289.67	$ 490,916.00	$ 142,204,865.00	-	$ -	289.67	$ 142,204,865.00
2.3	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA MEZCLADO EN SITIO	M3	228.58	$ 1,555,294.00	$ 355,512,080.00	-	$ -	228.58	$ 355,512,080.00
2.4	CONCRETO CICLÓPEO (CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (D) 60% CONCRETO - 40% AGREGADO CICLÓPEO)	M3	97.22	$ 1,016,360.00	$ 98,812,511.00	-	$ -	97.22	$ 98,812,511.00
2.5	MATERIAL EN AFIRMADO PARA MEJORAMIENTO, RENIVELACIÓN Y LLENOS DE SUBRASANTE	M3	238.47	$ 740,271.00	$ 176,532,425.00	-	$ -	238.47	$ 176,532,425.00
2.6	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA.	KG	10,427.12	$ 12,632.00	$ 131,715,394.00	-	$ -	10,427.12	$ 131,715,394.00
2.7	CORTE Y SELLO PARA JUNTAS	M	2,160.49	$ 19,949.00	$ 43,099,575.00	-	$ -	2,160.49	$ 43,099,575.00
2.8	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE PRÉSTAMOS	M3	236.52	$ 38,133.00	$ 9,019,217.00	-	$ -	236.52	$ 9,019,217.00
2.9	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 DIMENSIONES (75 x 75) CM CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV	U	12.00	$ 851,199.00	$ 10,214,388.00	-	$ -	12.00	$ 10,214,388.00
				SUBTOTAL - PLACA HUELLA	$ 967,806,977.00	-	$ -		$ 967,806,977.00
				SUB TOTAL OBRAS - NUCLEO 3. MESA DE PALMICHAL	**$ 1,169,665,585.00**		$ -		**$ 1,169,665,585.00**
NUCLEO 4. LA ITALIA Y LA JUNTAS									
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA EN TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 900 MM									
1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	142.26	34,356.00	$ 4,887,484.00	-	$ -	142.26	$ 4,887,484.00
1.2	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	M3	75.95	861,833.00	$ 65,454,472.00	-	$ -	75.95	$ 65,454,472.00
1.3	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA MEZCLADO EN SITIO	M3	45.14	1,624,824.00	$ 73,340,491.00	-	$ -	45.14	$ 73,340,491.00
1.4	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA MEZCLADO EN SITIO	M3	5.38	1,350,860.00	$ 7,272,456.00	-	$ -	5.38	$ 7,272,456.00
1.5	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA.	KG	3,473.40	12,661.00	$ 43,976,717.00	-	$ -	3,473.40	$ 43,976,717.00
1.6	TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO 21 MPA DE 900 MM DE DIÁMETRO INTERIOR	M	36.00	1,521,059.00	$ 54,758,124.00	-	$ -	36.00	$ 54,758,124.00
				SUBTOTAL - ALCANTARILLAS	$ 249,689,744.00		$ -		$ 249,689,744.00
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO									
2.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	17.69	34,356.00	$ 607,586.00	-	$ -	17.69	$ 607,586.00
2.2	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	388.91	525,211.00	$ 204,261,123.00	-	$ -	388.91	$ 204,261,123.00
2.3	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA MEZCLADO EN SITIO	M3	310.07	1,624,824.00	$ 503,801,541.00	-	$ -	310.07	$ 503,801,541.00
2.4	CONCRETO CICLÓPEO (CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (D) 60% CONCRETO - 40% AGREGADO CICLÓPEO)	M3	130.46	1,084,927.00	$ 141,538,058.00	-	$ -	130.46	$ 141,538,058.00
2.5	MATERIAL EN AFIRMADO PARA MEJORAMIENTO, RENIVELACIÓN Y LLENOS DE SUBRASANTE	M3	135.34	807,126.00	$ 109,236,433.00	-	$ -	135.34	$ 109,236,433.00
2.6	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA.	KG	14,064.99	12,661.00	$ 178,076,775.00	-	$ -	14,064.99	$ 178,076,775.00
2.7	CORTE Y SELLO PARA JUNTAS	M	2,899.08	19,949.00	$ 57,833,747.00	-	$ -	2,899.08	$ 57,833,747.00
2.8	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE PRÉSTAMOS	M3	259.64	19,215.00	$ 4,988,983.00	-	$ -	259.64	$ 4,988,983.00
2.9	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 DIMENSIONES (75 x 75) CM CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV	U	20.00	852,985.00	$ 17,059,700.00	-	$ -	20.00	$ 17,059,700.00
				SUBTOTAL - PLACA HUELLA	$ 1,217,403,946.00		$ -		$ 1,217,403,946.00
				SUB TOTAL OBRAS - NUCLEO 4. LA ITALIA Y LA JUNTAS	**$ 1,467,093,690.00**		$ -		**$ 1,467,093,690.00**

CONTRATO DE OBRA No.001 DEL 12 DE FEBRERO 2026

MUNICIPIO DE RIOBLANCO

"MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN CON PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE EN VARIOS PUNTOS CRÍTICOS DISPERSOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO, TOLIMA".

ACTA PARCIAL 01

CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL RIOBLANCO - TOLIMA NIT. 890702040-7	**VALOR DEL CONTRATO:**	$ 16,013,896,392.00	**Fecha Presente Acta:**
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROINGENIERIA RIOBLANCO 2025 NIT: 902.031.674-9	**SUPERVISOR CONTRATO DE OBRA:**	SUBSECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	
INTERVENTOR: CONSORCIO INTER TERCIARIAS RIOBLANCO 2026 NIT: 902.044.775-0	**SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	**10 DE JULIO DE 2026**
PLAZO INICIAL: OCHO (08) MESES	**ACTA DE INICIO:**	25 de febrero de 2026	

En las instalaciones de la Secretaría de Planeación e Infraestructura del Municipio de Rioblanco - Tolima, a los diez (10) dias del mes de julio de 2026, se reunieron el Ingeniero Gustavo Alberto Rodriguez Chavarro representante legal de la **UNION TEMPORAL PROINGENIERIA RIOBLANCO 2025** en calidad de contratista, El ingeniero Mario Alejandro Alvarado Guzman representante legal del **CONSORCIO INTER TERCIARIAS RIOBLANCO 2026** en calidad de interventor, la Arquitecta Lina Maritza Bocanegra Quintero en calidad de supervisor del contrato de interventoria y el ingeniero Ivan Mauricio Penagos Andrade en calidad de supervisor del contrato de obra; con el fin de suscribir la presente **ACTA PARCIAL 01**, del contrato de Obra de la referencia.

CONDICIONES BALANCE No 1						CANT EJECUTADAS PRESENTE ACTA		CANTIDADES POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL
	NUCLEO 5. CHELE Y BUENAVISTA								
	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA EN TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 900 MM								
1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	189.68	$ 43,259.00	$ 8,205,366.00	116.62	$ 5,044,867.00	73.06	$ 3,160,499.00
1.2	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	M3	101.26	$ 713,692.00	$ 72,271,284.00	45.26	$ 32,299,331.00	56.01	$ 39,971,953.00
1.3	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA MEZCLADO EN SITIO	M3	60.18	$ 1,476,683.00	$ 88,871,702.00	18.00	$ 26,581,784.00	42.18	$ 62,289,918.00
1.4	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA MEZCLADO EN SITIO	M3	7.18	$ 1,183,347.00	$ 8,494,183.00	6.34	$ 7,507,319.00	0.83	$ 986,864.00
1.5	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA.	KG	4,631.20	$ 12,599.00	$ 58,348,489.00	1,523.57	$ 19,195,439.00	3,107.63	$ 39,153,050.00
1.6	TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO 21 MPA DE 900 MM DE DIÁMETRO INTERIOR	M	48.00	$ 1,449,588.00	$ 69,580,224.00	22.00	$ 31,890,936.00	26.00	$ 37,689,288.00
				SUBTOTAL - ALCANTARILLAS	$ 305,771,248.00		$ 122,519,676.00		$ 183,251,572.00
	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO								
2.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	33.48	$ 43,259.00	$ 1,448,153.00	-	$ -	33.48	$ 1,448,153.00
2.2	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	744.22	$ 452,142.00	$ 336,491,989.00	-	$ -	744.22	$ 336,491,989.00
2.3	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA MEZCLADO EN SITIO	M3	584.52	$ 1,476,683.00	$ 863,148,788.00	-	$ -	584.52	$ 863,148,788.00
2.4	CONCRETO CICLÓPEO (CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (D) 60% CONCRETO - 40% AGREGADO CICLÓPEO)	M3	249.84	$ 938,837.00	$ 234,560,050.00	-	$ -	249.84	$ 234,560,050.00
2.5	MATERIAL EN AFIRMADO PARA MEJORAMIENTO, RENIVELACIÓN Y LLENOS DE SUBRASANTE	M3	345.35	$ 664,683.00	$ 229,548,274.00	-	$ -	345.35	$ 229,548,274.00
2.6	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA.	KG	26,732.24	$ 12,599.00	$ 336,799,491.00	-	$ -	26,732.24	$ 336,799,491.00
2.7	CORTE Y SELLO PARA JUNTAS	M	5,552.02	$ 19,949.00	$ 110,757,327.00	-	$ -	5,552.02	$ 110,757,327.00
2.8	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE PRÉSTAMOS	M3	914.37	$ 28,117.00	$ 25,709,341.00	-	$ -	914.37	$ 25,709,341.00
2.9	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 DIMENSIONES (75 x 75) CM CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV	U	30.00	$ 849,179.00	$ 25,475,370.00	-	$ -	30.00	$ 25,475,370.00
				SUBTOTAL - PLACA HUELLA	$ 2,163,938,783.00		$ -		$ 2,163,938,783.00
				SUB TOTAL OBRAS - NUCLEO 5. CHELE Y BUENAVISTA	**$ 2,469,710,031.00**		**$ 122,519,676.00**		**$ 2,347,190,355.00**
				SUBTOTAL DE OBRAS	$ 15,799,462,757.00		$ 1,545,074,948.00		$ 14,254,387,809.00
				PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL (PAGA)	**$ 56,400,000.00**		$ -		**$ 56,400,000.00**
				PLAN DE MANEJO TRANSITO (PMT)	**$ 158,033,635.00**		$ -		**$ 158,033,635.00**
				VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA	**$ 16,013,896,392.00**		**$ 1,545,074,948.00**		**$ 14,468,821,444.00**

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 16,013,896,392.00	
VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL 1		$ 1,545,074,948.00
VALOR POR EJECUTAR		$ 14,468,821,444.00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$16,013,896,392.00**	**$ 16,013,896,392.00**

PORCENTAJE DE EJECUCION	
VALOR EJECTUADO A LA FECHA	**$ 1,545,074,948.00**
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA	**9.65%**

BALANCE DEL PAGO ANTICIPADO		
VALOR DEL ANTICIPO	$ 6,405,558,556.80	$ -
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA		$ 618,029,979.20
SALDO POR AMORTIZAR		$ 5,787,528,577.60
VALOR FINAL DEL PAGO ANTICIPADO	**$6,405,558,556.80**	**$ 6,405,558,556.80**
SALDO NETO A GIRAR PRESENTE ACTA:		**$ 927,044,968.80**

SON: NOVECIENTOS VEINTISIETE MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS MCTE

No siendo otro el objeto de la presente **ACTA PARCIAL No 1**, se firma una vez leída y aprobada en cada una de sus partes por los que en ella intervinieron. A los diez (10) días del mes de julio de 2026.

GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ CHAVARRO
R.L UNION TEMPORAL PROINGENIERIA RIOBLANCO 2025
CONTRATISTA

MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMAN
R.L. CONSORCIO INTER TERCIARIAS RIOBLANCO 2026
INTERVENTOR

1067

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN CON PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE EN VARIOS PUNTOS CRÍTICOS DISPERSOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO, TOLIMA	ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA DE RIOBLANCO TOLIMA
FECHA: 10/07/2026		CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROINGENIERIA RIOBLANCO 2025
LOCALZIACIÓN: RIOBLANCO TOLIMA		INTERVENTORIA: CONSORCIO INTER TERCIARIAS RIOBLANCO 2026

Capítulo	1 CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA EN TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 900 MM		
Ítem	1,1 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	UNIDAD	M3

Área/lugar/elemento		Longitud (m)	ancho (m)	Altura(m)	VACIOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
PARCIAL No.1									
ALTAGRACIA	MUROS / POCETA	5,20	0,20	1,60	0,06	1,61	1,00	M3	1,61
ALTAGRACIA	PLACA / POCETA	1,50	1,50	0,20		0,45	1,00	M3	0,45
ALTAGRACIA	MUROS / ALETAS	1,10	0,20	1,50		0,33	2,00	M3	0,66
ALTAGRACIA	MURO / CABEZOTE	1,12	0,20	1,80	0,06	0,35	1,00	M3	0,35
ALTAGRACIA	PLACA / DESCOLE	1,20	1,70	0,20		0,41	1,00	M3	0,41
ALTAGRACIA	TUBERIA EXISTENTE	5,00			0,09	0,43	1,00	M3	0,43
QUEBRADON	MUROS / POCETA	5,25	0,20	1,60	0,06	1,62	1,00	M3	1,62
QUEBRADON	PLACA / POCETA	1,55	1,50	0,20		0,47	1,00	M3	0,47
QUEBRADON	MUROS / ALETAS	1,15	0,20	1,45		0,33	2,00	M3	0,67
QUEBRADON	MURO / CABEZOTE	1,10	0,20	1,60	0,06	0,30	1,00	M3	0,30
QUEBRADON	PLACA / DESCOLE	1,20	1,90	0,20		0,46	1,00	M3	0,46
QUEBRADON	TUBERIA EXISTENTE	5,00			0,09	0,43	1,00	M3	0,43
PORVENIR 4	MUROS / POCETA	4,80	0,20	1,55	0,06	1,43	1,00	M3	1,43
PORVENIR 4	PLACA / POCETA	1,40	1,40	0,20		0,39	1,00	M3	0,39
PORVENIR 4	MUROS / ALETAS	1,13	0,20	1,47		0,33	2,00	M3	0,66
PORVENIR 4	MURO / CABEZOTE	1,10	0,20	1,65	0,06	0,31	1,00	M3	0,31
PORVENIR 4	PLACA / DESCOLE	1,20	1,85	0,20		0,44	1,00	M3	0,44
PORVENIR 4	TUBERIA EXISTENTE	5,00			0,09	0,43	1,00	M3	0,43
PORVENIR 3	MUROS / POCETA	4,80	0,20	1,60	0,06	1,48	1,00	M3	1,48
PORVENIR 3	PLACA / POCETA	1,40	1,40	0,20		0,39	1,00	M3	0,39
PORVENIR 3	MUROS / ALETAS	1,20	0,20	1,47		0,35	2,00	M3	0,71
PORVENIR 3	MURO / CABEZOTE	1,20	0,20	1,76	0,06	0,37	1,00	M3	0,37
PORVENIR 3	PLACA / DESCOLE	1,15	1,76	0,20		0,40	1,00	M3	0,40
PORVENIR 3	TUBERIA EXISTENTE	5,00			0,09	0,43	1,00	M3	0,43
							TOTAL CANTIDAD EJECUTADA	M3	15,29
							TOTAL CANTIDADES PAGADAS ACTAS ANTERIORES	M3	-
							TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA		15,29

REGISTRO FOTOGRAFICO





Observaciones

GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ CHAVARRO
UNION TEMPORAL PROINGENIERIA RIOBLANCO 2025

MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMAN
R.L CONSORCIO INTER TERCIARIAS RIOBLANCO 2026

1068

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN CON PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE EN VARIOS PUNTOS CRÍTICOS DISPERSOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO, TOLIMA	ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA DE RIOBLANCO TOLIMA
FECHA: 10/07/2026		CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROINGENIERIA RIOBLANCO 2025
LOCALIZACIÓN: RIOBLANCO TOLIMA		INTERVENTORIA: CONSORCIO INTER TERCIARIAS RIOBLANCO 2026

Capítulo	1 CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA EN TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 900 MM		
Ítem	1,2 EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	UNIDAD	M3

Área/lugar/elemento	Longitud (m)	ancho (m)	Altura(m)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
PARCIAL No.1							
TRAMO ALTAGRACIA / TUBERIA	5,00	1,80	2,00	18,00	1,00	M3	18,00
TRAMO ALTAGRACIA / ALETAS	1,60	2,92	2,30	10,73	1,00	M3	10,73
TRAMO ALTAGRACIA / POCETA	1,60	1,60	2,30	5,89	1,00	M3	5,89
TRAMO ALTAGRACIA / DEMOLICION				(3,90)	1,00	M3	(3,90)
TRAMO ALTAGRACIA / DENTELLON	3,13	0,20	0,20	0,13	1,00	M3	0,13
TRAMO QUEBRADON A1 / TUBERIA	5,00	1,80	2,00	18,00	1,00	M3	18,00
TRAMO QUEBRADON A1 / ALETAS	1,60	3,21	2,00	10,27	1,00	M3	10,27
TRAMO QUEBRADON A1 / POCETA	1,80	1,80	2,00	6,48	1,00	M3	6,48
TRAMO QUEBRADON A1 / DEMOLICION				(3,94)	1,00	M3	(3,94)
TRAMO QUEBRADON A1 / DENTELLON	3,62	0,20	0,20	0,14	1,00	M3	0,14
TRAMO QUEBRADON A2 / TUBERIA	5,00	1,80	2,00	18,00	1,00	M3	18,00
TRAMO QUEBRADON A2 / ALETAS	1,60	3,25	2,20	11,44	1,00	M3	11,44
TRAMO QUEBRADON A2/ POCETA	1,82	1,80	2,00	6,55	1,00	M3	6,55
TRAMO QUEBRADON A2/ DENTELLON	3,70	0,20	0,20	0,15	1,00	M3	0,15
TRAMO PORVENIR 4 A1/ TUBERIA	6,00	1,80	2,00	21,60	1,00	M3	21,60
TRAMO PORVENIR 4 A1/ ALETAS	1,60	3,25	2,20	11,44	1,00	M3	11,44
TRAMO PORVENIR 4 A1/ POCETA	1,80	1,80	2,00	6,48	1,00	M3	6,48
TRAMO PORVENIR 4 A1/ DENTELLON	3,70	0,20	0,20	0,15	1,00	M3	0,15
TRAMO PORVENIR 4 A2/ TUBERIA	5,00	1,80	2,00	18,00	1,00	M3	18,00
TRAMO PORVENIR 4 A2/ ALETAS	1,60	3,05	2,20	10,74	1,00	M3	10,74
TRAMO PORVENIR 4 A2/ POCETA	1,80	1,80	2,00	6,48	1,00	M3	6,48
TRAMO PORVENIR 4 A2/ DEMOLICION				(3,67)	1,00	M3	(3,67)
TRAMO PORVENIR 4 A2/ DENTELLON	3,30	0,20	0,20	0,13	1,00	M3	0,13

REGISTRO FOTOGRAFICO





TRAMO PORVENIR 3 A1/TUBERIA	5,00	1,80	2,00	18,00	1,00	M3	18,00
TRAMO PORVENIR 3 A1/ALETA	1,60	3,33	2,20	11,70	1,00	M3	11,70
TRAMO PORVENIR 3 A1/POCETA	1,80	1,80	2,00	6,48	1,00	M3	6,48
TRAMO PORVENIR 3 A1/DENTELLON	3,85	0,20	0,20	0,15	1,00	M3	0,15
TRAMO PORVENIR 3 A2/TUBERIA	5,00	1,80	2,00	18,00	1,00	M3	18,00
TRAMO PORVENIR 3 A2/ALETA	1,60	3,00	2,20	10,56	1,00	M3	10,56
TRAMO PORVENIR 3 A2/POCETA	1,80	1,80	2,00	6,48	1,00	M3	6,48
TRAMO PORVENIR 3 A2/DENTELLON	3,20	0,20	0,20	0,13	1,00	M3	0,13
TRAMO PORVENIR 3 A3/TUBERIA	5,00	1,80	2,00	18,00	1,00	M3	18,00
TRAMO PORVENIR 3 A3/ALETA	1,60	3,20	2,30	11,78	1,00	M3	11,78
TRAMO PORVENIR 3 A3/POCETA	1,80	1,80	2,00	6,48	1,00	M3	6,48
TRAMO PORVENIR 3 A3/DEMOLICION				(3,78)	1,00	M3	(3,78)
TRAMO PORVENIR 3 A3/DENTELLON	4,00	0,20	0,20	0,16	1,00	M3	0,16
				TOTAL CANTIDAD EJECUTADA		M3	273,42
				TOTAL CANTIDADES PAGADAS ACTAS ANTERIORES		M3	-
				TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA			273,42



Observaciones

GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ CHAVARRO
UNION TEMPORAL PROINGENIERIA RIOBLANCO 2025

MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMAN
R.L CONSORCIO INTER TERCIARIAS RIOBLANCO 2026

1024

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN CON PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE EN VARIOS PUNTOS CRÍTICOS DISPERSOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO, TOLIMA	ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA DE RIOBLANCO TOLIMA
FECHA: 10/07/2026		CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROINGENIERIA RIOBLANCO 2025
LOCALZIACIÓN: RIOBLANCO TOLIMA		INTERVENTORIA: CONSORCIO INTER TERCIARIAS RIOBLANCO 2026

Capítulo	1 CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA EN TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 900 MM		
Ítem	1,3 RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	UNIDAD	M3

Área/lugar/elemento	Longitud (m)	ancho (m)	Altura(m)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
PARCIAL No.1							
TRAMO ALTAGRACIA / TUBERIA / CENTRO	5,00	1,80	0,90	8,10	1,00	M3	8,10
TRAMO ALTAGRACIA / TUBERIA / SUPERIOR	5,00	1,80	0,85	7,65	1,00	M3	7,65
TRAMO ALTAGRACIA / POCETA / EXTERIOR	6,00	0,10	2,30	1,38	1,00	M3	1,38
TRAMO ALTAGRACIA / ALETA / EXTERIOR	1,80	0,10	2,00	0,36	2,00	M3	0,72
TRAMO ALTAGRACIA / VOL TUBERIA				(4,75)	1,00	M3	(4,75)
TRAMO QUEBRADON A1/ TUBERIA / CENTRO	5,00	1,80	0,90	8,10	1,00	M3	8,10
TRAMO QUEBRADON A1/ TUBERIA / SUPERIOR	5,00	1,80	0,85	7,65	1,00	M3	7,65
TRAMO QUEBRADON A1/ POCETA / EXTERIOR	6,80	0,10	2,00	1,36	1,00	M3	1,36
TRAMO QUEBRADON A1/ ALETA EXTERIOR	1,60	0,10	1,90	0,30	2,00	M3	0,61
TRAMO QUEBRADON A1 / VOL TUBERIA				(4,75)	1,00	M3	(4,75)
TRAMO QUEBRADON A2/ TUBERIA / CENTRO	5,00	1,80	0,90	8,10	1,00	M3	8,10
TRAMO QUEBRADON A2/ TUBERIA / SUPERIOR	5,00	1,80	0,85	7,65	1,00	M3	7,65
TRAMO QUEBRADON A2/ POCETA / EXTERIOR	6,84	0,10	2,00	1,37	1,00	M3	1,37
TRAMO QUEBRADON A2/ ALETA EXTERIOR	1,60	0,10	1,70	0,27	2,00	M3	0,54
TRAMO QUEBRADON A2 / VOL TUBERIA				(4,75)	1,00	M3	(4,75)
TRAMO PORVENIR 4 A1/ TUBERIA / CENTRO	6,00	1,80	0,90	9,72	1,00	M3	9,72
TRAMO PORVENIR 4 A1/ TUBERIA / SUPERIOR	6,00	1,80	0,85	9,18	1,00	M3	9,18
TRAMO PORVENIR 4 A1/ POCETA / EXTERIOR	6,80	0,10	2,00	1,36	1,00	M3	1,36
TRAMO PORVENIR 4 A1/ ALETA EXTERIOR	1,60	0,10	1,70	0,27	2,00	M3	0,54
TRAMO PORVENIR 4 A1/ TUBERIA / VOL TUBERIA				(5,70)	1,00	M3	(5,70)
TRAMO PORVENIR 4 A2/ TUBERIA / CENTRO	5,00	1,80	0,90	8,10	1,00	M3	8,10
TRAMO PORVENIR 4 A2/ TUBERIA / SUPERIOR	5,00	1,80	0,85	7,65	1,00	M3	7,65
TRAMO PORVENIR 4 A2/ POCETA / EXTERIOR	6,80	0,10	2,00	1,36	1,00	M3	1,36
TRAMO PORVENIR 4 A2/ ALETA EXTERIOR	1,60	0,10	1,80	0,29	2,00	M3	0,58
TRAMO PORVENIR 4 A2/ TUBERIA / VOL TUBERIA				(4,75)	1,00	M3	(4,75)
TRAMO PORVENIR 3 A1/TUBERIA/ CENTRO	5,00	1,80	0,90	8,10	1,00	M3	8,10
TRAMO PORVENIR 3 A1/TUBERIA/ SUPERIO	5,00	1,80	0,85	7,65	1,00	M3	7,65
TRAMO PORVENIR 3 A1/POCETA/EXTERIOR	6,80	0,10	2,00	1,36	1,00	M3	1,36
TRAMO PORVENIR 3 A1/ALETA/EXTERIOR	1,60	0,10	1,70	0,27	2,00	M3	0,54
TRAMO PORVENIR 3 A1/TUBERIA/ VOL TUBERIA				(4,75)	1,00	M3	(4,75)
TRAMO PORVENIR 3 A2/TUBERIA/ CENTRO	5,00	1,80	0,90	8,10	1,00	M3	8,10
TRAMO PORVENIR 3 A2/TUBERIA/ SUPERIO	5,00	1,80	0,85	7,65	1,00	M3	7,65
TRAMO PORVENIR 3 A2/POCETA/EXTERIOR	6,80	0,10	2,00	1,36	1,00	M3	1,36
TRAMO PORVENIR 3 A2/ALETA/EXTERIOR	1,60	0,10	1,73	0,28	2,00	M3	0,55
TRAMO PORVENIR 3 A2/TUBERIA/ VOL TUBERIA				(4,75)	1,00	M3	(4,75)
TRAMO PORVENIR 3 A3/TUBERIA/ CENTRO	5,00	1,80	0,90	8,10	1,00	M3	8,10
TRAMO PORVENIR 3 A3/TUBERIA/ SUPERIO	5,00	1,80	0,85	7,65	1,00	M3	7,65
TRAMO PORVENIR 3 A3/POCETA/EXTERIOR	6,80	0,10	2,00	1,36	1,00	M3	1,36
TRAMO PORVENIR 3 A3/ALETA/EXTERIOR	1,60	0,10	1,95	0,31	2,00	M3	0,62
TRAMO PORVENIR 3 A3/TUBERIA/ VOL TUBERIA				(4,75)	1,00	M3	(4,75)
				TOTAL CANTIDAD EJECUTADA		M3	105,81
				TOTAL CANTIDADES PAGADAS ACTAS ANTERIORES		M3	-
				TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA			105,81

REGISTRO FOTOGRAFICO





Observaciones


GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ CHAVARRO
UNION TEMPORAL PROINGENIERIA RIOBLANCO 2025

MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMAN
R.L CONSORCIO INTER TERCIARIAS RIOBLANCO 2026

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN CON PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE EN VARIOS PUNTOS CRÍTICOS DISPERSOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO, TOLIMA	ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA DE RIOBLANCO TOLIMA
FECHA: 10/07/2026		CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROINGENIERIA RIOBLANCO 2025
LOCALZIACIÓN: RIOBLANCO TOLIMA		INTERVENTORIA: CONSORCIO INTER TERCIARIAS RIOBLANCO 2026

Capítulo	1 CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA EN TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 900 MM									
Ítem	1,4 CONCRETO RESISTENCIA 21MPA MEZCLADO EN SITIO							UNIDAD	M3	

Área/lugar/elemento	Longitud (m)	ancho (m)	Altura(m)	V. PARCIAL	VACIOS	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
PARCIAL No.1									
TRAMO ALTAGRACIA / CABEZOTE DESCOLE	1,53	0,20	1,94	0,59	0,19	1,00	M3	0,40	
TRAMO ALTAGRACIA / DESCOLE ALETA 1	1,82	0,20	1,82	0,66		1,00	M3	0,66	
TRAMO ALTAGRACIA / DESCOLE ALETA 2	1,80	0,20	2,00	0,72		1,00	M3	0,72	
TRAMO ALTAGRACIA / POCETA	4,80	0,20	1,80	1,73	0,19	1,00	M3	1,54	
TRAMO ALTAGRACIA / POCETA PLACA	1,40	1,40	0,20	0,39		1,00	M3	0,39	
TRAMO ALTAGRACIA / DESCOLE PLACA	2,72	1,80	0,20	0,98		1,00	M3	0,98	
TRAMO ALTAGRACIA / DESCOLE DENTELLOM	3,53	0,20	0,20	0,14		1,00	M3	0,14	
TRAMO ALTAGRACIA / GR DESCOLE	1,53	0,20	0,40	0,12		1,00	M3	0,12	
TRAMO ALTAGRACIA / GR POCETA	1,42	0,20	0,25	0,07		1,00	M3	0,07	
TRAMO QUEBRADON A1 / CABEZOTE DESCOLE	1,60	0,20	2,00	0,64	0,19	1,00	M3	0,45	
TRAMO QUEBRADON A1 / DESCOLE ALETA 1	1,60	0,20	1,90	0,61		1,00	M3	0,61	
TRAMO QUEBRADON A1 / DESCOLE ALETA 2	1,60	0,20	1,90	0,61		1,00	M3	0,61	
TRAMO QUEBRADON A1 / POCETA	5,60	0,20	1,80	2,02	0,19	1,00	M3	1,83	
TRAMO QUEBRADON A1 / POCETA PLACA	1,60	1,60	0,20	0,51		1,00	M3	0,51	
TRAMO QUEBRADON A1 / DESCOLE PLACA	3,01	1,57	0,20	0,95		1,00	M3	0,95	
TRAMO QUEBRADON A1 / DESCOLE DENTELLON	4,02	0,20	0,20	0,16		1,00	M3	0,16	
TRAMO QUEBRADON A1 / GR DESCOLE	1,60	0,20	0,20	0,06		1,00	M3	0,06	
TRAMO QUEBRADON A1 / GR POCETA	1,60	0,20	0,20	0,06		1,00	M3	0,06	
TRAMO QUEBRADON A2 / CABEZOTE DESCOLE	1,60	0,20	2,00	0,64	0,19	1,00	M3	0,45	
TRAMO QUEBRADON A2 / DESCOLE ALETA 1	1,60	0,20	1,70	0,54		1,00	M3	0,54	
TRAMO QUEBRADON A2 / DESCOLE ALETA 2	1,60	0,20	1,70	0,54		1,00	M3	0,54	
TRAMO QUEBRADON A2 / POCETA	5,68	0,20	1,80	2,04	0,19	1,00	M3	1,85	
TRAMO QUEBRADON A2 / POCETA PLACA	1,62	1,62	0,20	0,52		1,00	M3	0,52	
TRAMO QUEBRADON A2 / DESCOLE PLACA	3,05	1,42	0,20	0,87		1,00	M3	0,87	
TRAMO QUEBRADON A2 / DESCOLE DENTELLON	4,10	0,20	0,20	0,16		1,00	M3	0,16	
TRAMO QUEBRADON A2 / GR DESCOLE	1,60	0,20	0,20	0,06		1,00	M3	0,06	
TRAMO QUEBRADON A2 / GR POCETA	1,60	0,20	0,20	0,06		1,00	M3	0,06	
TRAMO PORVENIR 4 A1 / CABEZOTE DESCOLE	1,60	0,20	1,80	0,58	0,19	1,00	M3	0,39	
TRAMO PORVENIR 4 A1 / DESCOLE ALETA 1	1,60	1,70	0,20	0,54		1,00	M3	0,54	
TRAMO PORVENIR 4 A1 / DESCOLE ALETA 2	1,60	1,70	0,20	0,54		1,00	M3	0,54	
TRAMO PORVENIR 4 A1 / POCETA	5,60	0,20	1,80	2,02	0,19	1,00	M3	1,83	
TRAMO PORVENIR 4 A1 / POCETA PLACA	1,60	1,60	0,20	0,51		1,00	M3	0,51	
TRAMO PORVENIR 4 A1 / DESCOLE PLACA	3,05	1,43	0,20	0,87		1,00	M3	0,87	
TRAMO PORVENIR 4 A1 / DESCOLE DENTELLON	4,10	0,20	0,20	0,16		1,00	M3	0,16	
TRAMO PORVENIR 4 A1 / GR DESCOLE	1,60	0,20	0,20	0,06		1,00	M3	0,06	
TRAMO PORVENIR 4 A1 / GR POCETA	1,60	0,20	0,20	0,06		1,00	M3	0,06	
TRAMO PORVENIR 4 A2 / CABEZOTE DESCOLE	1,60	0,20	2,00	0,64	0,19	1,00	M3	0,45	
TRAMO PORVENIR 4 A2 / DESCOLE ALETA 1	1,60	0,20	1,80	0,58		1,00	M3	0,58	
TRAMO PORVENIR 4 A2 / DESCOLE ALETA 2	1,60	0,20	1,80	0,58		1,00	M3	0,58	
TRAMO PORVENIR 4 A2 / POCETA	5,60	0,20	1,80	2,02	0,19	1,00	M3	1,83	
TRAMO PORVENIR 4 A2 / POCETA PLACA	1,60	1,60	0,20	0,51		1,00	M3	0,51	
TRAMO PORVENIR 4 A2 / DESCOLE PLACA	2,85	1,56	0,20	0,89		1,00	M3	0,89	

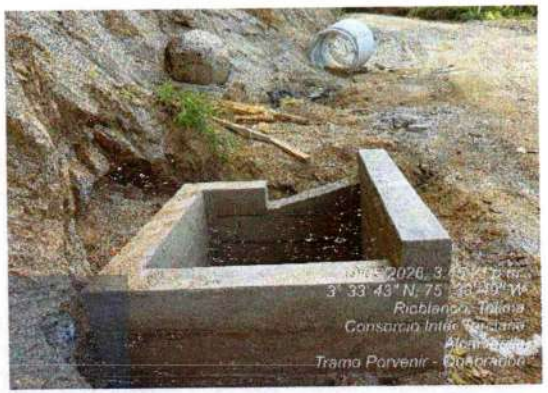



TRAMO PORVENIR 4 A2 / DESCOLE DENTELLON	3,70	0,20	0,20	0,15		1,00	M3	0,15
TRAMO PORVENIR 4 A2 / GR DESCOLE	1,60	0,20	0,20	0,06		1,00	M3	0,06
TRAMO PORVENIR 4 A2 / GR POCETA	1,60	0,20	0,20	0,06		1,00	M3	0,06
TRAMO PORVENIR 3 A1 / CABEZOTE DESCOLE	1,60	0,20	1,80	0,58	0,19	1,00	M3	0,39
TRAMO PORVENIR 3 A1 / DESCOLE ALETA 1	1,60	0,20	1,70	0,54		1,00	M3	0,54
TRAMO PORVENIR 3 A1 / DESCOLE ALETA 2	1,60	0,20	1,70	0,54		1,00	M3	0,54
TRAMO PORVENIR 3 A1 / POCETA	5,60	0,20	1,80	2,02	0,19	1,00	M3	1,83
TRAMO PORVENIR 3 A1 / POCETA PLACA	1,60	1,60	0,20	0,51		1,00	M3	0,51
TRAMO PORVENIR 3 A1 / DESCOLE PLACA	3,13	1,43	0,20	0,89		1,00	M3	0,89
TRAMO PORVENIR 3 A1 / DESCOLE DENTELLON	4,25	0,20	0,20	0,17		1,00	M3	0,17
TRAMO PORVENIR 3 A1 / GR DESCOLE	1,60	0,20	0,20	0,06		1,00	M3	0,06
TRAMO PORVENIR 3 A1 / GR POCETA	1,60	0,20	0,20	0,06		1,00	M3	0,06
TRAMO PORVENIR 3 A2 / CABEZOTE DESCOLE	1,60	0,20	1,80	0,58	0,19	1,00	M3	0,39
TRAMO PORVENIR 3 A2 / DESCOLE ALETA 1	1,58	0,20	1,73	0,55		1,00	M3	0,55
TRAMO PORVENIR 3 A2 / DESCOLE ALETA 2	1,60	0,20	1,73	0,55		1,00	M3	0,55
TRAMO PORVENIR 3 A2 / POCETA	5,60	0,20	1,80	2,02	0,19	1,00	M3	1,83
TRAMO PORVENIR 3 A2 / POCETA PLACA	1,60	1,60	0,20	0,51		1,00	M3	0,51
TRAMO PORVENIR 3 A2 / DESCOLE PLACA	2,80	1,60	0,20	0,90		1,00	M3	0,90
TRAMO PORVENIR 3 A2 / DESCOLE DENTELLON	3,60	0,20	0,20	0,14		1,00	M3	0,14
TRAMO PORVENIR 3 A2 / GR DESCOLE	1,60	0,20	0,20	0,06		1,00	M3	0,06
TRAMO PORVENIR 3 A2 / GR POCETA	1,60	0,20	0,20	0,06		1,00	M3	0,06
TRAMO PORVENIR 3 A3 / CABEZOTE DESCOLE	1,60	0,20	2,10	0,67	0,19	1,00	M3	0,48
TRAMO PORVENIR 3 A3 / DESCOLE ALETA 1	16,00	0,20	1,95	6,24		1,00	M3	6,24
TRAMO PORVENIR 3 A3 / DESCOLE ALETA 2	16,00	0,20	1,95	6,24		1,00	M3	6,24
TRAMO PORVENIR 3 A3 / POCETA	5,60	0,20	1,80	2,02	0,19	1,00	M3	1,83
TRAMO PORVENIR 3 A3 / POCETA PLACA	1,60	1,60	0,20	0,51		1,00	M3	0,51
TRAMO PORVENIR 3 A3 / DESCOLE PLACA	3,00	1,45	0,20	0,87		1,00	M3	0,87
TRAMO PORVENIR 3 A3 / DESCOLE DENTELLON	4,00	0,20	0,20	0,16		1,00	M3	0,16
TRAMO PORVENIR 3 A3 / GR DESCOLE	1,60	0,20	0,20	0,06		1,00	M3	0,06
TRAMO PORVENIR 3 A3 / GR POCETA	1,60	0,20	0,20	0,06		1,00	M3	0,06
					TOTAL CANTIDAD EJECUTADA		M3	51,88
					TOTAL CANTIDADES PAGADAS ACTAS ANTERIORES		M3	-
					TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA			51,88





Observaciones

GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ CHAVARRO
UNION TEMPORAL PROINGENIERIA RIOBLANCO 2025

MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMAN
R.L CONSORCIO INTER TERCIARIAS RIOBLANCO 2026

1078

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN CON PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE EN VARIOS PUNTOS CRÍTICOS DISPERSOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO, TOLIMA	ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA DE RIOBLANCO TOLIMA
FECHA: 10/07/2026		CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROINGENIERIA RIOBLANCO 2025
LOCALZIACIÓN: RIOBLANCO TOLIMA		INTERVENTORIA: CONSORCIO INTER TERCIARIAS RIOBLANCO 2026

Capítulo	1 CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA EN TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 900 MM								
Ítem	1,5 CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA MEZCLADO EN SITIO						UNIDAD	M3	

Área/lugar/elemento		Longitud (m)	ancho (m)	Altura(m)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
PARCIAL No.1								
TRAMO ALTAGRACIA	TUBERIA	5,00	1,80	0,05	0,45	1,00	M3	0,45
TRAMO ALTAGRACIA	POCETA / PLACA	1,40	1,40	0,05	0,10	1,00	M3	0,10
TRAMO ALTAGRACIA	DESCOLE / PLACA	2,72	1,80	0,05	0,24	1,00	M3	0,24
TRAMO ALTAGRACIA	ATRAQUE TUBERIA	5,00	0,70	0,20	0,70	1,00	M3	0,70
TRAMO QUEBRADON A1	TUBERIA	5,00	1,80	0,05	0,45	1,00	M3	0,45
TRAMO QUEBRADON A1	POCETA / PLACA	1,60	1,60	0,05	0,13	1,00	M3	0,13
TRAMO QUEBRADON A1	DESCOLE / PLACA	3,01	1,57	0,05	0,24	1,00	M3	0,24
TRAMO QUEBRADON A1	ATRAQUE TUBERIA	5,00	0,70	0,20	0,70	1,00	M3	0,70
TRAMO QUEBRADON A2	TUBERIA	5,00	1,80	0,05	0,45	1,00	M3	0,45
TRAMO QUEBRADON A2	POCETA / PLACA	1,60	1,60	0,05	0,13	1,00	M3	0,13
TRAMO QUEBRADON A2	DESCOLE / PLACA	3,05	1,42	0,05	0,22	1,00	M3	0,22
TRAMO QUEBRADON A2	ATRAQUE TUBERIA	5,00	0,70	0,20	0,70	1,00	M3	0,70
TRAMO PORVENIR 4 A1	TUBERIA	6,00	1,80	0,05	0,54	1,00	M3	0,54
TRAMO PORVENIR 4 A1	POCETA / PLACA	1,60	1,60	0,05	0,13	1,00	M3	0,13
TRAMO PORVENIR 4 A1	DESCOLE / PLACA	3,05	1,43	0,05	0,22	1,00	M3	0,22
TRAMO PORVENIR 4 A1	ATRAQUE TUBERIA	6,00	0,70	0,20	0,84	1,00	M3	0,84
TRAMO PORVENIR 4 A2	TUBERIA	5,00	1,80	0,05	0,45	1,00	M3	0,45
TRAMO PORVENIR 4 A2	POCETA / PLACA	1,60	1,60	0,05	0,13	1,00	M3	0,13
TRAMO PORVENIR 4 A2	DESCOLE / PLACA	2,85	1,56	0,05	0,22	1,00	M3	0,22
TRAMO PORVENIR 4 A2	ATRAQUE TUBERIA	5,00	0,70	0,20	0,70	1,00	M3	0,70
TRAMO PORVENIR 3 A1	TUBERIA	5,00	1,80	0,05	0,45	1,00	M3	0,45


REGISTRO FOTOGRAFICO





1024

TRAMO PORVENIR 3 A1	POCETA / PLACA	1,60	1,60	0,05	0,13	1,00	M3	0,13
TRAMO PORVENIR 3 A1	DESCOLE / PLACA	3,13	1,43	0,05	0,22	1,00	M3	0,22
TRAMO PORVENIR 3 A1	ATRAQUE TUBERIA	5,00	0,70	0,20	0,70	1,00	M3	0,70
TRAMO PORVENIR 3 A2	TUBERIA	5,00	1,80	0,05	0,45	1,00	M3	0,45
TRAMO PORVENIR 3 A2	POCETA / PLACA	1,60	1,60	0,05	0,13	1,00	M3	0,13
TRAMO PORVENIR 3 A2	DESCOLE / PLACA	2,80	1,60	0,05	0,22	1,00	M3	0,22
TRAMO PORVENIR 3 A2	ATRAQUE TUBERIA	5,00	0,70	0,20	0,70	1,00	M3	0,70
TRAMO PORVENIR 3 A3	TUBERIA	5,00	1,80	0,05	0,45	1,00	M3	0,45
TRAMO PORVENIR 3 A3	POCETA / PLACA	1,60	1,60	0,05	0,13	1,00	M3	0,13
TRAMO PORVENIR 3 A3	DESCOLE / PLACA	3,00	1,45	0,05	0,22	1,00	M3	0,22
TRAMO PORVENIR 3 A3	ATRAQUE TUBERIA	5,00	0,70	0,20	0,70	1,00	M3	0,70
						TOTAL CANTIDAD EJECUTADA	M3	12,23
						TOTAL CANTIDADES PAGADAS ACTAS ANTERIORES	M3	-
						TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA		12,23

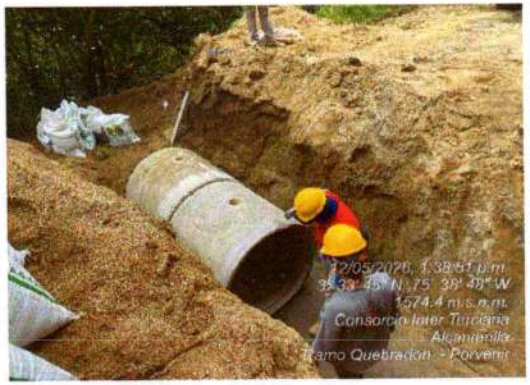

Observaciones

GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ CHAVARRO
UNION TEMPORAL PROINGENIERIA RIOBLANCO 2025

MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMAN
R.L CONSORCIO INTER TERCIARIAS RIOBLANCO 2026

9101

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN CON PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE EN VARIOS PUNTOS CRÍTICOS DISPERSOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO, TOLIMA	ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA DE RIOBLANCO TOLIMA
FECHA: 10/07/2026		CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROINGENIERIA RIOBLANCO 2025
LOCALZIACIÓN: RIOBLANCO TOLIMA		INTERVENTORIA: CONSORCIO INTER TERCIARIAS RIOBLANCO 2026

Capítulo	1 CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA EN TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 900 MM		
Ítem	1,1 ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA.	UNIDAD	KG

Área/lugar/elemento				Total (Kg)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
PARCIAL No.1								
TRAMO ALTAGRACIA	ALC / ENCOLE			153,17	153,17	1,00	KG	153,17
TRAMO ALTAGRACIA	ALC / DESCOLE			263,09	263,09	1,00	KG	263,09
TRAMO QUEBRADON	ALC 01 / ENCOLE			181,19	181,19	1,00	KG	181,19
TRAMO QUEBRADON	ALC 01 / DESCOLE			248,93	248,93	1,00	KG	248,93
TRAMO QUEBRADON	ALC 02 / ENCOLE			178,70	178,70	1,00	KG	178,70
TRAMO QUEBRADON	ALC 02 / DESCOLE			224,10	224,10	1,00	KG	224,10
TRAMO PORVENIR 4	ALC 01 / ENCOLE			178,70	178,70	1,00	KG	178,70
TRAMO PORVENIR 4	ALC 01 / DESCOLE			224,40	224,40	1,00	KG	224,40
TRAMO PORVENIR 4	ALC 02 / ENCOLE			178,70	178,70	1,00	KG	178,70
TRAMO PORVENIR 4	ALC 02 / DESCOLE			236,11	236,11	1,00	KG	236,11
TRAMO PORVENIR 3	ALC 01 / ENCOLE			178,70	178,70	1,00	KG	178,70
TRAMO PORVENIR 3	ALC 01 / DESCOLE			223,41	223,41	1,00	KG	223,41
TRAMO PORVENIR 3	ALC 02 / ENCOLE			179,45	179,45	1,00	KG	179,45
TRAMO PORVENIR 3	ALC 02 / DESCOLE			232,99	232,99	1,00	KG	232,99
TRAMO PORVENIR 3	ALC 03 / ENCOLE			178,70	178,70	1,00	KG	178,70
TRAMO PORVENIR 3	ALC 03 / DESCOLE			241,59	241,59	1,00	KG	241,59
						TOTAL CANTIDAD EJECUTADA	KG	3.301,96
						TOTAL CANTIDADES PAGADAS ACTAS ANTERIORES	KG	-
							TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA	3301,96

REGISTRO FOTOGRAFICO





Observaciones

GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ CHAVARRO
UNION TEMPORAL PROINGENIERIA RIOBLANCO 2025

MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMAN
R.L CONSORCIO INTER TERCIARIAS RIOBLANCO 2026

1026

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN CON PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE EN VARIOS PUNTOS CRÍTICOS DISPERSOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO, TOLIMA	ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA DE RIOBLANCO TOLIMA
FECHA: 10/07/2026		CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROINGENIERIA RIOBLANCO 2025
LOCALZIACIÓN: RIOBLANCO TOLIMA		INTERVENTORIA: CONSORCIO INTER TERCIARIAS RIOBLANCO 2026

Capítulo	1 CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA EN TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 900 MM		
Ítem	1,7 TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO 21 MPA DE 900 MM DE DIÁMETRO INTERIOR	UNIDAD	M

Área/lugar/elemento		Longitud (m)	ancho (m)	Altura(m)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
PARCIAL No.1								
TRAMO ALTAGRACIA	ALCANTARILLA	5,00			5,00	1,00	M	5,00
TRAMO QUEBRADON	ALCANTARILLA 1	5,00			5,00	1,00	M	5,00
TRAMO QUEBRADON	ALCANTARILLA 2	5,00			5,00	1,00	M	5,00
TRAMO PORVENIR 4	ALCANTARILLA 1	6,00			6,00	1,00	M	6,00
TRAMO PORVENIR 4	ALCANTARILLA 2	5,00			5,00	1,00	M	5,00
TRAMO PORVENIR 3	ALCANTARILLA 1	5,00			5,00	1,00	M	5,00
TRAMO PORVENIR 3	ALCANTARILLA 2	5,00			5,00	1,00	M	5,00
TRAMO PORVENIR 3	ALCANTARILLA 3	5,00			5,00	1,00	M	5,00
					TOTAL CANTIDAD EJECUTADA		M	41,00
					TOTAL CANTIDADES PAGADAS ACTAS ANTERIORES		M	-
						TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA		41,00

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones

GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ CHAVARRO
UNION TEMPORAL PROINGENIERIA RIOBLANCO 2025

MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMAN
R.L CONSORCIO INTER TERCIARIAS RIOBLANCO 2026

1074

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN CON PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE EN VARIOS PUNTOS CRÍTICOS DISPERSOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO, TOLIMA	ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA DE RIOBLANCO TOLIMA
FECHA: 10/07/2026		CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROINGENIERIA RIOBLANCO 2025
LOCALZIACIÓN: RIOBLANCO TOLIMA		INTERVENTORIA: CONSORCIO INTER TERCIARIAS RIOBLANCO 2026

Capítulo	2 CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO			
Ítem	2,1 EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	UNIDAD	M3	

Área/lugar/elemento		Longitud (m)	ancho (m)	Area (m2)	Altura(m)	Volumen (m3)	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
PARCIAL No.1									
TRAMO DELICIAS	AMPLIACION ANCHO VIA K0+028.14 AL K0+043.24 / TALUD	15,10	0,50	7,55	1,30	9,82	1,00	M3	9,82
TRAMO DELICIAS	AMPLIACION ANCHO VIA K0+076.74 AL K0+076.59 / TALUD	15,00	0,40	6,00	0,80	4,80	1,00	M3	4,80
TRAMO DELICIAS	VIGA RIOSTRA T1	4,20	0,20	0,84	0,10	0,08	5,00	M3	0,42
TRAMO DELICIAS	VIGA RIOSTRA T2	4,20	0,20	0,84	0,10	0,08	6,00	M3	0,50
TRAMO DELICIAS	VIGA RIOSTRA T3	4,53	0,20	0,91	0,10	0,09	5,00	M3	0,45
TRAMO DELICIAS	VIGA RIOSTRA T4	4,17	0,20	0,83	0,10	0,08	10,00	M3	0,83
CAJEO DE VIA				Area (m2)	Volumen Seccion (m3)	Volumen Acumulado (m3)			
TRAMO DELICIAS	0+000.00			1,27	-	-		M3	
TRAMO DELICIAS	0+005.00			1,16	6,07	6,07		M3	6,07
TRAMO DELICIAS	0+010.00			1,02	5,45	11,51		M3	5,45
TRAMO DELICIAS	0+015.00			1,01	5,08	16,59		M3	5,08
TRAMO DELICIAS	0+020.00			0,86	4,68	21,27		M3	4,68
TRAMO DELICIAS	0+025.00			0,88	4,35	25,62		M3	4,35
TRAMO DELICIAS	0+030.00			0,91	4,48	30,10		M3	4,48
TRAMO DELICIAS	0+035.00			1,09	5,01	35,11		M3	5,01
TRAMO DELICIAS	0+040.00			1,12	5,53	40,64		M3	5,53
TRAMO DELICIAS	0+045.00			1,04	5,41	46,06		M3	5,41
TRAMO DELICIAS	0+050.00			1,17	5,53	51,59		M3	5,53
TRAMO DELICIAS	0+055.00			1,16	5,83	57,42		M3	5,83
TRAMO DELICIAS	0+060.00			1,21	5,92	63,34		M3	5,92
TRAMO DELICIAS	0+065.00			1,26	6,18	69,51		M3	6,18
TRAMO DELICIAS	0+070.00			1,17	6,07	75,58		M3	6,07
TRAMO DELICIAS	0+075.00			0,87	5,09	80,67		M3	5,09
TRAMO DELICIAS	0+075.36			0,24	0,20	80,87		M3	0,20

REGISTRO FOTOGRAFICO





2391

TRAMO ALTAGRACIA	CONFORMACION CUNETA DER K0+071.5 AL K0+035	35,00	0,70		0,20	4,90	1,00	M3	4,90
TRAMO ALTAGRACIA	VIGA RIOSTRA	5,00	0,20		0,10	0,10	29,00	M3	2,90
CAJEO DE VIA				Area (m2)	Volumen Seccion (m3)	Volumen Acumulado (m3)			
TRAMO ALTAGRACIA	0+000.00			0	0	0			-
TRAMO ALTAGRACIA	0+005.00			2,01	5,03	5,03		M3	5,03
TRAMO ALTAGRACIA	0+010.00			2,09	10,25	15,28		M3	10,25
TRAMO ALTAGRACIA	0+015.00			2	10,23	25,51		M3	10,23
TRAMO ALTAGRACIA	0+020.00			1,8	9,51	35,01		M3	9,51
TRAMO ALTAGRACIA	0+025.00			1,65	8,61	43,62		M3	8,61
TRAMO ALTAGRACIA	0+030.00			1,68	8,32	51,94		M3	8,32
TRAMO ALTAGRACIA	0+035.00			1,66	8,35	60,29		M3	8,35
TRAMO ALTAGRACIA	0+040.00			1,62	8,19	68,48		M3	8,19
TRAMO ALTAGRACIA	0+045.00			1,52	7,84	76,32		M3	7,84
TRAMO ALTAGRACIA	0+050.00			1,47	7,47	83,79		M3	7,47
TRAMO ALTAGRACIA	0+053.56			1,44	5,19	88,98		M3	5,19
							TOTAL CANTIDAD EJECUTADA	M3	194,50
							TOTAL CANTIDADES PAGADAS ACTAS ANTERIORES	M3	-
							TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA		194,50



Observaciones

GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ CHAVARRO
UNION TEMPORAL PROINGENIERIA RIOBLANCO 2025

MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMAN
R.L CONSORCIO INTER TERCIARIAS RIOBLANCO 2026

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN CON PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE EN VARIOS PUNTOS CRÍTICOS DISPERSOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO, TOLIMA	ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA DE RIOBLANCO TOLIMA
FECHA: 10/07/2026		CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROINGENIERIA RIOBLANCO 2025
LOCALZIACIÓN: RIOBLANCO TOLIMA		INTERVENTORIA: CONSORCIO INTER TERCIARIAS RIOBLANCO 2026

Capitulo	2 CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO							
Ítem	2,2 SUBBASE GRANULAR CLASE C					UNIDAD	M3	

Área/lugar/elemento		Longitud (m)	ancho (m)	Altura(m)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
PARCIAL No.1								
TRAMO DELICIAS	K0+000 AL K0+012.74	12,74	4,20	0,15	8,03	1,00	M3	8,03
TRAMO DELICIAS	K0+012.74 AL K0+016.94	4,20	4,10	0,15	2,58	1,00	M3	2,58
TRAMO DELICIAS	K0+016.94 AL K0+028.14	11,20	4,20	0,15	7,06	1,00	M3	7,06
TRAMO DELICIAS	K+0+028.14 AL K0+043.24	15,10	4,53	0,15	10,27	1,00	M3	10,27
TRAMO DELICIAS	K0+043.24 AL K0+076.74	33,50	4,17	0,15	20,94	1,00	M3	20,94
TRAMO DELICIAS	RAMPA ENTRADA	1,60	4,20	0,15	1,01	1,00	M3	1,01
TRAMO DELICIAS	RAMPA SALIDA	1,50	4,14	0,15	0,93	1,00	M3	0,93
TRAMO ALTAGRACIA	K0+000 AL K0+071.5	71,50	5,00	0,15	53,63	1,00	M3	53,63
TRAMO ALTAGRACIA	RAMPA ENTRADA	1,70	6,35	0,15	1,62	1,00	M3	1,62
TRAMO ALTAGRACIA	RAMPA SALIDA	1,50	5,70	0,15	1,28	1,00	M3	1,28
						TOTAL CANTIDAD EJECUTADA	M3	107,34
						TOTAL CANTIDADES PAGADAS ACTAS ANTERIORES	M3	-
							TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA	107,34

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones

GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ CHAVARRO
UNION TEMPORAL PROINGENIERIA RIOBLANCO 2025

MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMAN
R.L CONSORCIO INTER TERCIARIAS RIOBLANCO 2026

1080

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN CON PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE EN VARIOS PUNTOS CRÍTICOS DISPERSOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO, TOLIMA	ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA DE RIOBLANCO TOLIMA
FECHA: 10/07/2026		CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROINGENIERIA RIOBLANCO 2025
LOCALZIACIÓN: RIOBLANCO TOLIMA		INTERVENTORIA: CONSORCIO INTER TERCIARIAS RIOBLANCO 2026

Capítulo	2 CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO						
Ítem	2,3 CONCRETO RESISTENCIA 21MPA MEZCLADO EN SITIO				UNIDAD	M3	

Área/lugar/elemento		Longitud (m)	ancho (m)	Altura(m)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
PARCIAL No.1									
TRAMO DELICIAS	K0+000 AL K0+012.74 / CH + CUNETA	11,74	2,90	0,15	5,11	1,00	M3	5,11	
TRAMO DELICIAS	K0+000 AL K0+012.74/ VR	4,20	0,20	0,25	0,21	5,00	M3	1,05	
TRAMO DELICIAS	K0+000 AL K0+012.74/ BORDILLO	12,74	0,15	0,30	0,57	2,00	M3	1,15	
TRAMO DELICIAS	K0+012.74 AL K0+016.94 / BATEA	4,20	4,10	0,15	2,58	1,00	M3	2,58	
TRAMO DELICIAS	K0+016.94 AL K0+028.14 / CH+CUNETA	10,00	2,90	0,15	4,35	1,00	M3	4,35	
TRAMO DELICIAS	K0+016.94 AL K0+028.14 / VR	4,20	0,20	0,25	0,21	6,00	M3	1,26	
TRAMO DELICIAS	K0+016.94 AL K0+028.14 / BORDILLO	11,20	0,15	0,30	0,50	2,00	M3	1,01	
TRAMO DELICIAS	K+0+028.14 AL K0+043.24 / CH+ CUNETA IZQ	14,10	2,35	0,15	4,97	1,00	M3	4,97	
TRAMO DELICIAS	K+0+028.14 AL K0+043.24 / CUNETA DER	14,10	1,13	0,15	2,39	1,00	M3	2,39	
TRAMO DELICIAS	K+0+028.14 AL K0+043.24 / VR	4,53	0,20	0,25	0,23	5,00	M3	1,13	
TRAMO DELICIAS	K+0+028.14 AL K0+043.24 / BORDILLO	15,10	0,15	0,30	0,68	2,00	M3	1,36	
TRAMO DELICIAS	K0+043.24 AL K0+076.74 / CH + CUNETA	31,50	2,97	0,15	14,03	1,00	M3	14,03	
TRAMO DELICIAS	K0+043.24 AL K0+076.74 / VR	4,17	0,20	0,25	0,21	10,00	M3	2,08	
TRAMO DELICIAS	K0+043.24 AL K0+076.74 / BORDILLO	33,50	0,15	0,30	1,51	2,00	M3	3,02	
TRAMO DELICIAS	RAMPA ENTRADA	1,60	4,20	0,15	1,01	1,00	M3	1,01	
TRAMO DELICIAS	RAMPA SALIDA	1,50	4,14	0,15	0,93	1,00	M3	0,93	
TRAMO ALTAGRACIA	K0+000 AL K0+071.5 / CH + CUNETA	65,70	2,90	0,15	28,58	1,00	M3	28,58	
TRAMO ALTAGRACIA	K0+000 AL K0+071.5 / VR	5,00	0,20	0,25	0,25	29,00	M3	7,25	
TRAMO ALTAGRACIA	K0+000 AL K0+071.5 / BORDILLO PH + RAMPA	74,80	0,15	0,30	3,37	2,00	M3	6,73	
TRAMO ALTAGRACIA	RAMPA ENTRADA	1,50	5,70	0,15	1,28	1,00	M3	1,28	
TRAMO ALTAGRACIA	RAMPA SALIDA	1,70	6,35	0,15	1,62	1,00	M3	1,62	
						TOTAL CANTIDAD EJECUTADA	M3	92,89	
						TOTAL CANTIDADES PAGADAS ACTAS ANTERIORES	M3	-	
							TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA	92,89	





Observaciones

GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ CHAVARRO
UNION TEMPORAL PROINGENIERIA RIOBLANCO 2025

MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMAN
R.L CONSORCIO INTER TERCIARIAS RIOBLANCO 2026

1081

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN CON PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE EN VARIOS PUNTOS CRÍTICOS DISPERSOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO, TOLIMA	ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA DE RIOBLANCO TOLIMA
FECHA: 10/07/2026		CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROINGENIERIA RIOBLANCO 2025
LOCALZIACIÓN: RIOBLANCO TOLIMA		INTERVENTORIA: CONSORCIO INTER TERCIARIAS RIOBLANCO 2026

Capítulo	2 CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO			
Ítem	2,4 CONCRETO CICLÓPEO (CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (D) 60% CONCRETO - 40% AGREGADO CICLÓPEO)	UNIDAD	M3	

Área/lugar/elemento		Longitud (m)	ancho (m)	Altura(m)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
PARCIAL No.1									
TRAMO DELICIAS	K0+000 AL K0+012.74	11,74	1,00	0,15	1,76	1,00	M3	1,76	
TRAMO DELICIAS	K0+016.94 AL K0+028.14	10,00	1,00	0,15	1,50	1,00	M3	1,50	
TRAMO DELICIAS	K+0+028.14 AL K0+043.24	14,10	0,90	0,15	1,90	1,00	M3	1,90	
TRAMO DELICIAS	K0+043.24 AL K0+076.74	31,50	0,90	0,15	4,25	1,00	M3	4,25	
TRAMO ALTAGRACIA	K0+000 AL K0+071.5	65,70	1,80	0,15	17,74	1,00	M3	17,74	
					-	1,00	M3	-	
					-		M3	-	
TOTAL CANTIDAD EJECUTADA							M3	27,16	
TOTAL CANTIDADES PAGADAS ACTAS ANTERIORES							M3	-	
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA								27,16	



Observaciones

GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ CHAVARRO
UNION TEMPORAL PROINGENIERIA RIOBLANCO 2025

MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMAN
R.L CONSORCIO INTER TERCIARIAS RIOBLANCO 2026

280

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN CON PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE EN VARIOS PUNTOS CRÍTICOS DISPERSOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO, TOLIMA	ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA DE RIOBLANCO TOLIMA
FECHA: 10/07/2026		CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROINGENIERIA RIOBLANCO 2025
LOCALZIACIÓN: RIOBLANCO TOLIMA		INTERVENTORIA: CONSORCIO INTER TERCIARIAS RIOBLANCO 2026

Capítulo	2 CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO			
Ítem	2,5 MATERIAL EN AFIRMADO PARA MEJORAMIENTO, RENIVELACIÓN Y LLENOS DE SUBRASANTE	UNIDAD	M3	

Área/lugar/elemento		Longitud (m)	ancho (m)	Area (m2)	Altura(m)	Volumen (m3)	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
PARCIAL No.1									
TRAMO ALTAGRACIA	K0+000 AL K0+071.5 / CUNETA IZQ	71,50	1,00	71,50	0,30	21,45	1,00	M3	21,45
MEJORAMIENTO Y NIVELACION				Area (m2)	Volumen Seccion (m3)	Volumen Acumulado (m3)			
TRAMO ALTAGRACIA	0+000.00			0	0	0		M3	-
TRAMO ALTAGRACIA	0+005.00			1,33	3,31	3,31		M3	3,31
TRAMO ALTAGRACIA	0+010.00			1,34	6,68	9,99		M3	6,68
TRAMO ALTAGRACIA	0+015.00			1,25	6,48	16,48		M3	6,48
TRAMO ALTAGRACIA	0+020.00			1,04	5,72	22,19		M3	5,72
TRAMO ALTAGRACIA	0+025.00			0,9	4,85	27,05		M3	4,85
TRAMO ALTAGRACIA	0+030.00			0,95	4,63	31,67		M3	4,63
TRAMO ALTAGRACIA	0+035.00			0,93	4,71	36,38		M3	4,71
TRAMO ALTAGRACIA	0+040.00			0,89	4,57	40,96		M3	4,57
TRAMO ALTAGRACIA	0+045.00			0,79	4,21	45,16		M3	4,21
TRAMO ALTAGRACIA	0+050.00			0,7	3,71	48,88		M3	3,71
TRAMO ALTAGRACIA	0+053.56			0,64	2,38	51,26		M3	2,38
MEJORAMIENTO Y NIVELACION				Area (m2)	Volumen Seccion (m3)	Volumen Acumulado (m3)			
TRAMO DELICIAS	0+000.00			0,7	0	0		M3	-
TRAMO DELICIAS	0+005.00			0,59	3,21	3,21		M3	3,21
TRAMO DELICIAS	0+010.00			0,44	2,55	5,76		M3	2,55
TRAMO DELICIAS	0+015.00			0,72	2,89	8,65		M3	2,89
TRAMO DELICIAS	0+020.00			0,4	2,8	11,46		M3	2,80
TRAMO DELICIAS	0+025.00			0,35	1,87	13,32		M3	1,87

REGISTRO FOTOGRAFICO





2801

TRAMO DELICIAS	0+030.00			0,35	1,75	15,08		M3	1,75
TRAMO DELICIAS	0+035.00			0,53	2,21	17,29		M3	2,21
TRAMO DELICIAS	0+040.00			0,54	2,69	19,98		M3	2,69
TRAMO DELICIAS	0+045.00			0,48	2,57	22,55		M3	2,57
TRAMO DELICIAS	0+050.00			0,62	2,75	25,3		M3	2,75
TRAMO DELICIAS	0+055.00			0,66	3,19	28,49		M3	3,19
TRAMO DELICIAS	0+060.00			0,65	3,27	31,77		M3	3,27
TRAMO DELICIAS	0+065.00			0,69	3,36	35,12		M3	3,36
TRAMO DELICIAS	0+070.00			0,52	3,03	38,16		M3	3,03
TRAMO DELICIAS	0+075.00			0,79	3,28	41,44		M3	3,28
TRAMO DELICIAS	0+075.36			0,49	0,23	41,67		M3	0,23
							TOTAL CANTIDAD EJECUTADA	M3	114,35
							TOTAL CANTIDADES PAGADAS ACTAS ANTERIORES	M3	-
							TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA		114,35



Observaciones

GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ CHAVARRO
UNION TEMPORAL PROINGENIERIA RIOBLANCO 2025

MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMAN
R.L CONSORCIO INTER TERCIARIAS RIOBLANCO 2026

1801

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN CON PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE EN VARIOS PUNTOS CRÍTICOS DISPERSOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO, TOLIMA	ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA DE RIOBLANCO TOLIMA
FECHA: 10/07/2026		CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROINGENIERIA RIOBLANCO 2025
LOCALZIACIÓN: RIOBLANCO TOLIMA		INTERVENTORIA: CONSORCIO INTER TERCIARIAS RIOBLANCO 2026

Capitulo	2 CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO									
Ítem	2,6 ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA.						UNIDAD	KG		


Área/lugar/elemento		Longitud Tramo (m)	Longitud Varilla	Cantidad	Peso x Kg/M	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
PARCIAL No.1										
TRAMO DELICIAS	K0+000 AL K0+012.74 / TRAV	12,74	0,80	63,00	0,56	28,22	2,00	KG	56,45	
TRAMO DELICIAS	K0+016.94 AL K0+028.14 / TRAV	11,20	0,80	55,00	0,56	24,64	2,00	KG	49,28	
TRAMO DELICIAS	K+0+028.14 AL K0+043.24 / TRAV	15,10	0,80	75,00	0,56	33,60	2,00	KG	67,20	
TRAMO DELICIAS	K0+043.24 AL K0+076.74 / TRAV	33,50	0,80	167,00	0,56	74,82	2,00	KG	149,63	
TRAMO DELICIAS	K0+000 AL K0+012.74 / LONG	12,74	12,74	5,00	0,56	35,67	2,00	KG	71,34	
TRAMO DELICIAS	K0+016.94 AL K0+076.74 / LONG	59,80	59,80	5,00	0,56	167,44	2,00	KG	334,88	
TRAMO DELICIAS	K0+000 AL K0+012.74 / TRAV / CUNETA	12,74	0,90	64,00	0,56	32,26	2,00	KG	64,51	
TRAMO DELICIAS	K0+000 AL K0+012.74 / LONG / CUNETA + BORDILLO	12,74	12,74	5,00	0,56	35,67	2,00	KG	71,34	
TRAMO DELICIAS	K0+016.94 AL K0+028.14 / TRAV / CUNETA	11,20	0,90	56,00	0,56	28,22	2,00	KG	56,45	
TRAMO DELICIAS	K0+016.94 AL K0+028.14 / LONG / CUNETA + BORDILLO	11,20	11,20	5,00	0,56	31,36	2,00	KG	62,72	
TRAMO DELICIAS	K+0+028.14 AL K0+043.24 / TRAV / CUNETA + BORD IZQ	15,10	0,90	76,00	0,56	38,30	1,00	KG	38,30	
TRAMO DELICIAS	K+0+028.14 AL K0+043.24 / TRAV / CUNETA + BORD DER	15,10	1,33	76,00	0,56	56,60	1,00	KG	56,60	
TRAMO DELICIAS	K+0+028.14 AL K0+043.24 / LONG / CUNETA + BORD IZQ	15,10	15,10	5,00	0,56	42,28	1,00	KG	42,28	
TRAMO DELICIAS	K+0+028.14 AL K0+043.24 / LONG / CUNETA + BORD DER	15,10	15,10	6,00	0,56	50,74	1,00	KG	50,74	
TRAMO DELICIAS	K0+043.24 AL K0+076.74 / TRAV / CUNETA + BORD	33,50	0,90	168,00	0,56	84,67	2,00	KG	169,34	
TRAMO DELICIAS	K0+043.24 AL K0+076.74 / LONG / CUNETA + BORD	33,50	33,50	5,00	0,56	93,80	2,00	KG	187,60	
TRAMO DELICIAS	K0+000 AL K0+012.74 / LONG /VR		4,20	4,00	0,56	9,41	5,00	KG	47,04	
TRAMO DELICIAS	K0+000 AL K0+012.74 / FLEJE /VR		0,82	16,00	0,56	7,35	5,00	KG	36,74	
TRAMO DELICIAS	K0+016.94 AL K0+028.14 / LONG /VR		4,20	4,00	0,56	9,41	6,00	KG	56,45	
TRAMO DELICIAS	K0+016.94 AL K0+028.14 / FLEJE /VR		0,82	16,00	0,56	7,35	6,00	KG	44,08	





1085

TRAMO DELICIAS	K+0+028.14 AL K0+043.24 / LONG / VR		4,53	4,00	0,56	10,15	5,00	KG	50,76
TRAMO DELICIAS	K+0+028.14 AL K0+043.24 / FLEJE / VR		0,82	18,00	0,56	8,27	5,00	KG	41,33
TRAMO DELICIAS	K0+043.24 AL K0+076.74 / LONG / VR		4,17	4,00	0,56	9,34	10,00	KG	93,36
TRAMO DELICIAS	K0+043.24 AL K0+076.74 / FLEJE / VR		0,82	16,00	0,56	7,35	10,00	KG	73,47
TRAMO DELICIAS	RAMPA ENTRADA / LONG		1,50	21,00	0,56	17,64	1,00	KG	17,64
TRAMO DELICIAS	RAMPA ENTRADA / TRAN		4,10	9,00	0,56	20,66	1,00	KG	20,66
TRAMO DELICIAS	RAMPA SALIDA / LONG		1,40	20,00	0,56	15,68	1,00	KG	15,68
TRAMO DELICIAS	RAMPA SALIDA / TRANS		4,04	8,00	0,56	18,10	1,00	KG	18,10
TRAMO DELICIAS	BATEA / LONG		4,00	21,00	0,99	83,50	1,00	KG	83,50
TRAMO DELICIAS	BATEA / TRANS		4,10	21,00	0,99	85,58	1,00	KG	85,58
TRAMO ALTAGRACIA	K0+000 AL K0+071.5 / LONG / CH	71,50	71,50	5,00	0,56	200,20	2,00	KG	400,40
TRAMO ALTAGRACIA	K0+000 AL K0+071.5 / TRAN / CH	71,50	0,80	358,00	0,56	160,38	2,00	KG	320,77
TRAMO ALTAGRACIA	K0+000 AL K0+071.5 / LONG / CUNETA + BORDILLO	71,50	71,50	5,00	0,56	200,20	2,00	KG	400,40
TRAMO ALTAGRACIA	K0+000 AL K0+071.5 / TRASN / CUNETA + BORDILLO	71,50	0,90	358,00	0,56	180,43	2,00	KG	360,86
TRAMO ALTAGRACIA	K0+000 AL K0+071.5 / LONG / RIOSTRA	5,00	5,00	4,00	0,56	11,20	29,00	KG	324,80
TRAMO ALTAGRACIA	K0+000 AL K0+071.5 / FLEJE / RIOSTRA	5,00	0,82	20,00	0,56	9,18	29,00	KG	266,34
TRAMO ALTAGRACIA	RAMPA ENTRADA / LONG		1,40	30,00	0,56	23,52	1,00	KG	23,52
TRAMO ALTAGRACIA	RAMPA ENTRADA / TRAN		5,90	7,00	0,56	23,13	1,00	KG	23,13
TRAMO ALTAGRACIA	RAMPA SALIDA / LONG		1,60	33,00	0,56	29,57	1,00	KG	29,57
TRAMO ALTAGRACIA	RAMPA SALIDA / TRANS		6,55	8,00	0,56	29,34	1,00	KG	29,34
							TOTAL CANTIDAD EJECUTADA	KG	4.392,20
							TOTAL CANTIDADES PAGADAS ACTAS ANTERIORES	KG	-
							TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA		4392,20

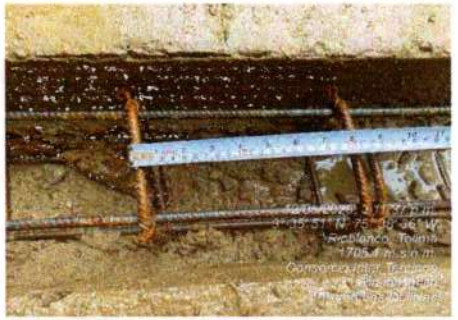



Observaciones

GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ CHAVARRO
UNION TEMPORAL PROINGENIERIA RIOBLANCO 2025

MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMAN
R.L CONSORCIO INTER TERCIARIAS RIOBLANCO 2026

1086

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN CON PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE EN VARIOS PUNTOS CRÍTICOS DISPERSOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO, TOLIMA	ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA DE RIOBLANCO TOLIMA
FECHA: 10/07/2026		CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROINGENIERIA RIOBLANCO 2025
LOCALZIACIÓN: RIOBLANCO TOLIMA		INTERVENTORIA: CONSORCIO INTER TERCIARIAS RIOBLANCO 2026

Capítulo	1 CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA EN TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 900 MM		
Ítem	1,1 EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	UNIDAD	M3

Área/lugar/elemento		Longitud (m)	ancho (m)	Altura(m)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
PARCIAL No.1								
LA GALLERA A1	TUBERIA	5,00	1,80	2,14	19,26	1,00	M3	19,26
LA GALLERA A1	ALETAS	1,50	3,00	2,14	9,63	1,00	M3	9,63
LA GALLERA A1	POCETA	1,70	1,70	2,10	6,07	1,00	M3	6,07
LA GALLERA A1	DENTELLON	4,00	0,20	0,20	0,16	1,00	M3	0,16
LA GALLERA A2	TUBERIA	5,00	1,80	2,00	18,00	1,00	M3	18,00
LA GALLERA A2	ALETAS	1,50	2,90	2,00	8,70	1,00	M3	8,70
LA GALLERA A2	POCETA	1,70	1,70	2,00	5,78	1,00	M3	5,78
LA GALLERA A2	DENTELLON	3,85	0,20	0,20	0,15	1,00	M3	0,15
CASTILLO A1	TUBERIA	5,00	1,80	2,00	18,00	1,00	M3	18,00
CASTILLO A1	ALETAS	1,25	3,30	2,00	8,25	1,00	M3	8,25
CASTILLO A1	POCETA	1,60	1,60	2,00	5,12	1,00	M3	5,12
CASTILLO A1	DENTELLON	4,40	0,20	0,20	0,18	1,00	M3	0,18
CASTILLO A2	TUBERIA	5,00	1,80	1,74	15,66	1,00	M3	15,66
CASTILLO A2	ALETAS	1,50	3,15	1,74	8,22	1,00	M3	8,22
CASTILLO A2	POCETA	1,60	1,60	1,65	4,22	1,00	M3	4,22
CASTILLO A2	DENTELLON	4,10	0,20	0,20	0,16	1,00	M3	0,16
URIBE	TUBERIA	6,00	1,80	2,16	23,33	1,00	M3	23,33
URIBE	ALETAS	1,75	3,35	2,16	12,64	1,00	M3	12,64
URIBE	POCETA	1,97	2,01	2,05	8,12	1,00	M3	8,12
URIBE	DENTELLON	4,13	0,20	0,20	0,17	1,00	M3	0,17
					-	1,00	M3	-
					-	1,00	M3	-
					TOTAL CANTIDAD EJECUTADA		M3	171,82
					TOTAL CANTIDADES PAGADAS ACTAS ANTERIORES		M3	-
							TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA	171,82

REGISTRO FOTOGRAFICO





Observaciones

GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ CHAVARRO
UNION TEMPORAL PROINGENIERIA RIOBLANCO 2025

MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMAN
R.L CONSORCIO INTER TERCIARIAS RIOBLANCO 2026

1087

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN CON PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE EN VARIOS PUNTOS CRÍTICOS DISPERSOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO, TOLIMA	ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA DE RIOBLANCO TOLIMA
FECHA: 10/07/2026		CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROINGENIERIA RIOBLANCO 2025
LOCALZIACIÓN: RIOBLANCO TOLIMA		INTERVENTORIA: CONSORCIO INTER TERCIARIAS RIOBLANCO 2026

Capítulo	1 CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA EN TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 900 MM		
Ítem	1,2 RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	UNIDAD	M3

Área/lugar/elemento		Longitud (m)	ancho (m)	Altura(m)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
PARCIAL No.1								
LA GALLERA A1	CENTRO	5,00	1,80	0,90	8,10	1,00	M3	8,10
LA GALLERA A1	SUPERIOR	5,00	1,80	0,60	5,40	1,00	M3	5,40
LA GALLERA A1	POCETA / EXTERIOR	6,40	0,10	2,10	1,34	1,00	M3	1,34
LA GALLERA A1	ALETAS / EXTERIOR	1,70	0,10	1,49	0,25	2,00	M3	0,51
LA GALLERA A1	VOL TUBERIA				(4,75)	1,00	M3	(4,75)
LA GALLERA A2	CENTRO	5,00	1,80	0,90	8,10	1,00	M3	8,10
LA GALLERA A2	SUPERIOR	5,00	1,80	0,70	6,30	1,00	M3	6,30
LA GALLERA A2	POCETA / EXTERIOR	6,40	0,10	2,00	1,28	1,00	M3	1,28
LA GALLERA A2	ALETAS / EXTERIOR	1,75	0,10	1,63	0,29	2,00	M3	0,57
LA GALLERA A2	VOL TUBERIA				(4,75)	1,00	M3	(4,75)
CASTILLO A1	CENTRO	5,00	1,80	0,90	8,10	1,00	M3	8,10
CASTILLO A1	SUPERIOR	5,00	1,80	0,98	8,82	1,00	M3	8,82
CASTILLO A1	POCETA / EXTERIOR	6,00	0,10	2,00	1,20	1,00	M3	1,20
CASTILLO A1	ALETAS / EXTERIOR	1,80	0,10	1,84	0,33	2,00	M3	0,66
CASTILLO A1	VOL TUBERIA				(4,75)	1,00	M3	(4,75)
CASTILLO A2	CENTRO	5,00	1,80	0,90	8,10	1,00	M3	8,10
CASTILLO A2	SUPERIOR	5,00	1,80	0,64	5,76	1,00	M3	5,76
CASTILLO A2	POCETA / EXTERIOR	6,00	0,10	1,65	0,99	1,00	M3	0,99
CASTILLO A2	ALETAS / EXTERIOR	1,80	0,10	1,67	0,30	2,00	M3	0,60
CASTILLO A2	VOL TUBERIA				(4,75)	1,00	M3	(4,75)
URIBE	CENTRO	6,00	1,80	0,90	9,72	1,00	M3	9,72
URIBE	SUPERIOR	5,00	1,80	1,06	9,54	1,00	M3	9,54
URIBE	POCETA / EXTERIOR	7,56	0,10	2,05	1,55	1,00	M3	1,55
URIBE	ALETAS / EXTERIOR	1,80	0,10	1,88	0,34	2,00	M3	0,68
URIBE	VOL TUBERIA				(5,70)	1,00	M3	(5,70)
					TOTAL CANTIDAD EJECUTADA		M3	62,61
					TOTAL CANTIDADES PAGADAS ACTAS ANTERIORES		M3	-
					TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA			62,61

REGISTRO FOTOGRAFICO





Observaciones

GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ CHAVARRO
UNION TEMPORAL PROINGENIERIA RIOBLANCO 2025

MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMAN
R.L CONSORCIO INTER TERCIARIAS RIOBLANCO 2026

1982

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN CON PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE EN VARIOS PUNTOS CRÍTICOS DISPERSOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO, TOLIMA	ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA DE RIOBLANCO TOLIMA
FECHA: 10/07/2026		CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROINGENIERIA RIOBLANCO 2025
LOCALZIACIÓN: RIOBLANCO TOLIMA		INTERVENTORIA: CONSORCIO INTER TERCIARIAS RIOBLANCO 2026

Capítulo	1 CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA EN TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 900 MM			
Ítem	1,3 CONCRETO RESISTENCIA 21MPA MEZCLADO EN SITIO	UNIDAD	M3	

Área/lugar/elemento		Longitud (m)	ancho (m)	Altura(m)	V. PARCIAL	VACIOS	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
PARCIAL No.1									
LA GALLERA A1	CABEZOTE DESCOLE	1,20	0,20	1,63	0,39	0,19	1,00	M3	0,20
LA GALLERA A1	DESCOLE ALETA 1	1,70	0,20	1,49	0,50		1,00	M3	0,50
LA GALLERA A1	DESCOLE ALETA 2	1,70	0,20	1,49	0,50		1,00	M3	0,50
LA GALLERA A1	POCETA	5,20	0,20	1,90	1,98	0,19	1,00	M3	1,79
LA GALLERA A1	POCETA PLACA	1,50	1,50	0,20	0,45		1,00	M3	0,45
LA GALLERA A1	DESCOLE PLACA	2,80	1,70	0,20	0,95		1,00	M3	0,95
LA GALLERA A1	DESCOLE DENTELLON	4,00	0,20	0,20	0,16		1,00	M3	0,16
LA GALLERA A1	GR DESCOLE	1,20	0,20	0,31	0,07		1,00	M3	0,07
LA GALLERA A1	GR POCETA	1,50	0,20	0,20	0,06		1,00	M3	0,06
LA GALLERA A2	CABEZOTE DESCOLE	1,15	0,20	1,80	0,41	0,19	1,00	M3	0,22
LA GALLERA A2	DESCOLE ALETA 1	1,75	0,20	1,63	0,57		1,00	M3	0,57
LA GALLERA A2	DESCOLE ALETA 2	1,75	0,20	1,63	0,57		1,00	M3	0,57
LA GALLERA A2	POCETA	5,20	0,20	1,90	1,98	0,19	1,00	M3	1,79
LA GALLERA A2	POCETA PLACA	1,50	1,50	0,20	0,45		1,00	M3	0,45
LA GALLERA A2	DESCOLE PLACA	2,70	1,70	0,20	0,92		1,00	M3	0,92
LA GALLERA A2	DESCOLE DENTELLON	3,85	0,20	0,20	0,15		1,00	M3	0,15
LA GALLERA A2	GR DESCOLE	1,15	0,20	0,20	0,05		1,00	M3	0,05
LA GALLERA A2	GR POCETA	1,50	0,20	0,20	0,06		1,00	M3	0,06
CASTILLO A1	CABEZOTE DESCOLE	1,40	0,20	2,08	0,58	0,19	1,00	M3	0,39
CASTILLO A1	DESCOLE ALETA 1	1,80	0,20	1,84	0,66		1,00	M3	0,66
CASTILLO A1	DESCOLE ALETA 2	1,80	0,20	1,84	0,66		1,00	M3	0,66
CASTILLO A1	POCETA	4,80	0,20	2,00	1,92	0,19	1,00	M3	1,73
CASTILLO A1	POCETA PLACA	1,40	1,40	0,20	0,39		1,00	M3	0,39
CASTILLO A1	DESCOLE PLACA	3,10	1,45	0,20	0,90		1,00	M3	0,90
CASTILLO A1	DESCOLE DENTELLON	4,40	0,20	0,20	0,18		1,00	M3	0,18
CASTILLO A1	GR DESCOLE	1,40	0,20	0,30	0,08		1,00	M3	0,08

REGISTRO FOTOGRAFICO





CASTILLO A1	GR POCETA	1,40	0,20	0,30	0,08		1,00	M3	0,08
CASTILLO A2	CABEZOTE DESCOLE	1,40	0,20	1,74	0,49	0,19	1,00	M3	0,30
CASTILLO A2	DESCOLE ALETA 1	1,80	0,20	1,67	0,60		1,00	M3	0,60
CASTILLO A2	DESCOLE ALETA 2	1,80	0,20	1,67	0,60		1,00	M3	0,60
CASTILLO A2	POCETA	4,88	0,20	1,65	1,61	0,19	1,00	M3	1,42
CASTILLO A2	POCETA PLACA	1,40	1,44	0,20	0,40		1,00	M3	0,40
CASTILLO A2	DESCOLE PLACA	2,95	1,70	0,20	1,00		1,00	M3	1,00
CASTILLO A2	DESCOLE DENTELLON	4,10	0,20	0,20	0,16		1,00	M3	0,16
CASTILLO A2	GR DESCOLE	1,40	0,20	0,30	0,08		1,00	M3	0,08
CASTILLO A2	GR POCETA	1,40	0,20	0,30	0,08		1,00	M3	0,08
URIBE	CABEZOTE DESCOLE	1,79	0,20	2,16	0,77	0,19	1,00	M3	0,58
URIBE	DESCOLE ALETA 1	1,80	0,20	1,88	0,68		1,00	M3	0,68
URIBE	DESCOLE ALETA 2	1,80	0,20	1,88	0,68		1,00	M3	0,68
URIBE	POCETA	6,36	0,20	2,05	2,61	0,19	1,00	M3	2,42
URIBE	POCETA PLACA	1,77	1,81	0,20	0,64		1,00	M3	0,64
URIBE	DESCOLE PLACA	3,16	1,95	0,20	1,23		1,00	M3	1,23
URIBE	DESCOLE DENTELLON	4,13	0,20	0,20	0,17		1,00	M3	0,17
URIBE	GR DESCOLE	1,79	0,20	0,30	0,11		1,00	M3	0,11
URIBE	GR POCETA	1,81	0,20	0,30	0,11		1,00	M3	0,11
					-		1,00	M3	-
							TOTAL CANTIDAD EJECUTADA	M3	25,82
							TOTAL CANTIDADES PAGADAS ACTAS ANTERIORES	M3	-
							TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA		25,82



Observaciones

GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ CHAVARRO
UNION TEMPORAL PROINGENIERIA RIOBLANCO 2025

MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMAN
R.L CONSORCIO INTER TERCIARIAS RIOBLANCO 2026

1000

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN CON PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE EN VARIOS PUNTOS CRÍTICOS DISPERSOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO, TOLIMA	ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA DE RIOBLANCO TOLIMA
FECHA: 10/07/2026		CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROINGENIERIA RIOBLANCO 2025
LOCALZIACIÓN: RIOBLANCO TOLIMA		INTERVENTORIA: CONSORCIO INTER TERCIARIAS RIOBLANCO 2026

Capitulo	1 CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA EN TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 900 MM			
Ítem	1,4 CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA MEZCLADO EN SITIO	UNIDAD	M3	

Área/lugar/elemento		Longitud (m)	ancho (m)	Altura(m)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
PARCIAL No.1								
LA GALLERA A1	TUBERIA	5,00	1,80	0,05	0,45	1,00	M3	0,45
LA GALLERA A1	POCETA / PLACA	1,50	1,50	0,05	0,11	1,00	M3	0,11
LA GALLERA A1	DESCOLE / PLACA	2,85	1,70	0,05	0,24	1,00	M3	0,24
LA GALLERA A1	ATRAQUE TUBERIA	5,00	0,70	0,20	0,70	1,00	M3	0,70
LA GALLERA A2	TUBERIA	5,00	1,80	0,05	0,45	1,00	M3	0,45
LA GALLERA A2	POCETA / PLACA	1,50	1,50	0,05	0,11	1,00	M3	0,11
LA GALLERA A2	DESCOLE / PLACA	2,88	1,70	0,05	0,24	1,00	M3	0,24
LA GALLERA A2	ATRAQUE TUBERIA	5,00	0,70	0,20	0,70	1,00	M3	0,70
CASTILLO A1	TUBERIA	5,00	1,80	0,05	0,45	1,00	M3	0,45
CASTILLO A1	POCETA / PLACA	1,40	1,40	0,05	0,10	1,00	M3	0,10
CASTILLO A1	DESCOLE / PLACA	3,10	1,47	0,05	0,23	1,00	M3	0,23
CASTILLO A1	ATRAQUE TUBERIA	5,00	0,70	0,20	0,70	1,00	M3	0,70
CASTILLO A2	TUBERIA	5,00	1,80	0,05	0,45	1,00	M3	0,45
CASTILLO A2	POCETA / PLACA	1,40	1,44	0,05	0,10	1,00	M3	0,10
CASTILLO A2	DESCOLE / PLACA	2,95	1,70	0,05	0,25	1,00	M3	0,25
CASTILLO A2	ATRAQUE TUBERIA	5,00	0,70	0,20	0,70	1,00	M3	0,70
URIBE	TUBERIA	6,00	1,80	0,05	0,54	1,00	M3	0,54
URIBE	POCETA / PLACA	1,77	1,81	0,05	0,16	1,00	M3	0,16
URIBE	DESCOLE / PLACA	3,16	1,35	0,05	0,21	1,00	M3	0,21
URIBE	ATRAQUE TUBERIA	6,00	0,70	0,20	0,84	1,00	M3	0,84
						TOTAL CANTIDAD EJECUTADA	M3	7,74
						TOTAL CANTIDADES PAGADAS ACTAS ANTERIORES	M3	-
						TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA		7,74

REGISTRO FOTOGRAFICO





Observaciones

GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ CHAVARRO
UNION TEMPORAL PROINGENIERIA RIOBLANCO 2025

MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMAN
R.L CONSORCIO INTER TERCIARIAS RIOBLANCO 2026

1094

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN CON PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE EN VARIOS PUNTOS CRÍTICOS DISPERSOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO, TOLIMA	ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA DE RIOBLANCO TOLIMA
FECHA: 10/07/2026		CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROINGENIERIA RIOBLANCO 2025
LOCALZIACIÓN: RIOBLANCO TOLIMA		INTERVENTORIA: CONSORCIO INTER TERCIARIAS RIOBLANCO 2026

Capítulo	1 CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA EN TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 900 MM			
Ítem	1,5 ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA.	UNIDAD	KG	

Área/lugar/elemento				Total (Kg)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
PARCIAL No.1								
GALLERA A1	ALC 01 / ENCOLE			158,13	158,13	1,00	KG	158,13
GALLERA A1	ALC 01 / DESCOLE			227,87	227,87	1,00	KG	227,87
GALLERA A2	ALC 02 / ENCOLE			169,88	169,88	1,00	KG	169,88
GALLERA A2	ALC 02 / DESCOLE			237,96	237,96	1,00	KG	237,96
CASTILLO A1	ALC 01 / ENCOLE			160,16	160,16	1,00	KG	160,16
CASTILLO A1	ALC 01 / DESCOLE			248,12	248,12	1,00	KG	248,12
CASTILLO A2	ALC 02 / ENCOLE			146,02	146,02	1,00	KG	146,02
CASTILLO A2	ALC 02 / DESCOLE			261,58	261,58	1,00	KG	261,58
URIBE	ALC 01 / ENCOLE			220,92	220,92	1,00	KG	220,92
URIBE	ALC 01 / DESCOLE			299,75	299,75	1,00	KG	299,75
					-	1,00	KG	-
						TOTAL CANTIDAD EJECUTADA	KG	2.130,38
						TOTAL CANTIDADES PAGADAS ACTAS ANTERIORES	KG	-
						TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA		2130,38

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones

GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ CHAVARRO
UNION TEMPORAL PROINGENIERIA RIOBLANCO 2025

MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMAN
R.L CONSORCIO INTER TERCIARIAS RIOBLANCO 2026

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN CON PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE EN VARIOS PUNTOS CRÍTICOS DISPERSOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO, TOLIMA	ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA DE RIOBLANCO TOLIMA
FECHA: 10/07/2026		CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROINGENIERIA RIOBLANCO 2025
LOCALZIACIÓN: RIOBLANCO TOLIMA		INTERVENTORIA: CONSORCIO INTER TERCIARIAS RIOBLANCO 2026

Capítulo	1 CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA EN TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 900 MM								
Ítem	1,6 TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO 21 MPA DE 900 MM DE DIÁMETRO INTERIOR					UNIDAD	M		

Área/lugar/elemento		Longitud (m)	ancho (m)	Altura(m)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
PARCIAL No.1									
TRAMO GALLERA	ALCANTARILLA 1	5,00			5,00	1,00	M	5,00	
TRAMO GALLERA	ALCANTARILLA 2	5,00			5,00	1,00	M	5,00	
TRAMO CASTILLO	ALCANTARILLA 1	5,00			5,00	1,00	M	5,00	
TRAMO CASTILLO	ALCANTARILLA 2	5,00			5,00	1,00	M	5,00	
TRAMO URIBE	ALCANTARILLA 1	6,00			6,00	1,00	M	6,00	
TOTAL CANTIDAD EJECUTADA							M	26,00	
TOTAL CANTIDADES PAGADAS ACTAS ANTERIORES							M	-	
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA								26,00	



Observaciones

GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ CHAVARRO
UNION TEMPORAL PROINGENIERIA RIOBLANCO 2025

MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMAN
R.L CONSORCIO INTER TERCIARIAS RIOBLANCO 2026

1093

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN CON PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE EN VARIOS PUNTOS CRÍTICOS DISPERSOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO, TOLIMA	ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA DE RIOBLANCO TOLIMA
FECHA: 10/07/2026		CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROINGENIERIA RIOBLANCO 2025
LOCALZIACIÓN: RIOBLANCO TOLIMA		INTERVENTORIA: CONSORCIO INTER TERCIARIAS RIOBLANCO 2026

Capítulo	2 CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO		
Ítem	2,1 EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	UNIDAD	M3

Área/lugar/elemento		Longitud (m)	ancho (m)	Area (m2)	Altura(m)	Volumen (m3)	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
PARCIAL No.1									
TRAMO GALLERA	AMPLIACION DE VIA K0+135 AL K0+226	91,00	1,20	109,20	0,70	76,44	1,00	M3	76,44
TRAMO GALLERA	VIGA RIOSTRA	5,00	0,20	1,00	0,10	0,10	30,00	M3	3,00
CAJEO DE VIA				Area (m2)	Volumen Seccion (m3)	Volumen Acumulado (m3)			
TRAMO GALLERA	0+000.00			1,42	0	0		M3	-
TRAMO GALLERA	0+005.00			1,41	7,07	7,07		M3	7,07
TRAMO GALLERA	0+010.00			1,43	7,1	14,17		M3	7,10
TRAMO GALLERA	0+015.00			1,45	7,21	21,39		M3	7,21
TRAMO GALLERA	0+020.00			1,4	7,13	28,52		M3	7,13
TRAMO GALLERA	0+025.00			1,38	6,96	35,48		M3	6,96
TRAMO GALLERA	0+030.00			1,36	6,86	42,33		M3	6,86
TRAMO GALLERA	0+035.00			1,39	6,87	49,21		M3	6,87
TRAMO GALLERA	0+040.00			1,43	7,04	56,25		M3	7,04
TRAMO GALLERA	0+045.00			1,47	7,24	63,49		M3	7,24
TRAMO GALLERA	0+050.00			1,47	7,35	70,84		M3	7,35
TRAMO GALLERA	0+055.00			1,47	7,36	78,2		M3	7,36
TRAMO GALLERA	0+060.00			1,47	7,34	85,54		M3	7,34
TRAMO GALLERA	0+065.00			1,46	7,31	92,85		M3	7,31
TRAMO GALLERA	0+070.00			1,42	7,19	100,04		M3	7,19
TRAMO GALLERA	0+075.00			1,35	6,92	106,96		M3	6,92
TRAMO GALLERA	0+080.00			1,27	6,56	113,52		M3	6,56
TRAMO GALLERA	0+085.00			1,44	6,79	120,31		M3	6,79
TRAMO GALLERA	0+090.00			1,45	7,24	127,55		M3	7,24
TRAMO GALLERA	0+095.00			1,45	7,25	134,8		M3	7,25
TRAMO GALLERA	0+100.00			1,45	7,24	142,03		M3	7,24
TRAMO GALLERA	0+105.00			1,45	7,23	149,26		M3	7,23
TRAMO GALLERA	0+110.00			1,45	7,23	156,49		M3	7,23
TRAMO GALLERA	0+115.00			1,45	7,23	163,72		M3	7,23
TRAMO GALLERA	0+120.00			1,45	7,23	170,95		M3	7,23
TRAMO GALLERA	0+125.00			1,45	7,24	178,19		M3	7,24
TRAMO GALLERA	0+130.00			1,46	7,28	185,47		M3	7,28
TRAMO GALLERA	0+135.00			1,47	7,32	192,79		M3	7,32
TRAMO GALLERA	0+140.00			1,45	7,29	200,08		M3	7,29
TRAMO GALLERA	0+145.00			1,43	7,19	207,26		M3	7,19
TRAMO GALLERA	0+150.00			1,42	7,13	214,39		M3	7,13
TRAMO GALLERA	0+155.00			1,43	7,13	221,52		M3	7,13
TRAMO GALLERA	0+160.00			1,43	7,16	228,68		M3	7,16
TRAMO GALLERA	0+165.00			1,44	7,18	235,86		M3	7,18

REGISTRO FOTOGRAFICO





100

TRAMO GALLERA	0+170.00			1,44	7,19	243,05		M3	7,19
TRAMO GALLERA	0+175.00			1,46	7,24	250,29		M3	7,24
TRAMO GALLERA	0+180.00			1,41	7,17	257,46		M3	7,17
TRAMO GALLERA	0+185.00			1,55	7,41	264,87		M3	7,41
TRAMO GALLERA	0+190.00			1,47	7,57	272,44		M3	7,57
TRAMO GALLERA	0+195.00			1,46	7,33	279,77		M3	7,33
TRAMO GALLERA	0+200.00			1,45	7,26	287,03		M3	7,26
TRAMO GALLERA	0+205.00			1,47	7,29	294,33		M3	7,29
TRAMO GALLERA	0+210.00			1,51	7,45	301,78		M3	7,45
TRAMO GALLERA	0+215.00			1,51	7,55	309,33		M3	7,55
TRAMO GALLERA	0+220.00			1,44	7,38	316,71		M3	7,38
TRAMO GALLERA	0+225.00			1,49	7,32	324,03		M3	7,32
TRAMO GALLERA	0+225.75			1,5	1,12	325,15		M3	1,12
TRAMO CASTILLO	AMPLIACION DE VIA K0+189 AL K0+240	60,00	1,80	108,00	1,20	129,60	1,00	M3	129,60
TRAMO CASTILLO	VIGA RIOSTRA	5,00	0,20	1,00	0,10	0,10	22,00	M3	2,20
CAJEO DE VIA				Area (m2)	Volumen Seccion (m3)	Volumen Acumulado (m3)			
TRAMO CASTILLO	0+000.00			-	-	-		M3	-
TRAMO CASTILLO	0+005.00			1,13	2,83	2,83		M3	2,83
TRAMO CASTILLO	0+010.00			1,18	5,77	8,60		M3	5,77
TRAMO CASTILLO	0+015.00			1,31	6,21	14,81		M3	6,21
TRAMO CASTILLO	0+020.00			1,61	7,30	22,11		M3	7,30
TRAMO CASTILLO	0+025.00			1,46	7,67	29,79		M3	7,67
TRAMO CASTILLO	0+030.00			1,46	7,29	37,07		M3	7,29
TRAMO CASTILLO	0+035.00			1,51	7,41	44,49		M3	7,41
TRAMO CASTILLO	0+040.00			1,33	7,09	51,58		M3	7,09
TRAMO CASTILLO	0+045.00			1,17	6,24	57,81		M3	6,24
TRAMO CASTILLO	0+050.00			1,43	6,49	64,31		M3	6,49
TRAMO CASTILLO	0+055.00			1,63	7,65	71,96		M3	7,65
TRAMO CASTILLO	0+060.00			1,49	7,79	79,75		M3	7,79
TRAMO CASTILLO	0+065.00			1,43	7,28	87,03		M3	7,28
TRAMO CASTILLO	0+070.00			1,38	7,01	94,04		M3	7,01
TRAMO CASTILLO	0+075.00			1,33	6,76	100,80		M3	6,76
TRAMO CASTILLO	0+080.00			1,33	6,64	107,44		M3	6,64
TRAMO CASTILLO	0+085.00			1,31	6,58	114,02		M3	6,58
TRAMO CASTILLO	0+090.00			1,45	6,89	120,92		M3	6,89
TRAMO CASTILLO	0+095.00			1,55	7,50	128,42		M3	7,50
TRAMO CASTILLO	0+100.00			1,62	7,93	136,35		M3	7,93
TRAMO CASTILLO	0+105.00			1,52	7,85	144,20		M3	7,85
TRAMO CASTILLO	0+110.00			1,60	7,80	152,00		M3	7,80
TRAMO CASTILLO	0+115.00			1,60	8,00	160,00		M3	8,00
TRAMO CASTILLO	0+120.00			1,48	7,70	167,70		M3	7,70
TRAMO CASTILLO	0+125.00			1,41	7,24	174,94		M3	7,24
TRAMO CASTILLO	0+130.00			1,39	7,01	181,95		M3	7,01
TRAMO CASTILLO	0+135.00			1,37	6,90	188,85		M3	6,90
TRAMO CASTILLO	0+140.00			1,39	6,90	195,74		M3	6,90
TRAMO CASTILLO	0+145.00			1,28	6,66	202,41		M3	6,66
TRAMO CASTILLO	0+150.00			1,12	6,00	208,41		M3	6,00
TRAMO CASTILLO	0+155.00			1,02	5,36	213,77		M3	5,36
TRAMO CASTILLO	0+160.00			1,48	6,25	220,02		M3	6,25





9001

TRAMO CASTILLO	0+165.00			1,28	6,89	226,91		M3	6,89
TRAMO CASTILLO	0+170.00			1,21	6,23	233,14		M3	6,23
TRAMO CASTILLO	0+175.00			1,11	5,82	238,96		M3	5,82
TRAMO CASTILLO	0+180.00			1,25	5,90	244,86		M3	5,90
TRAMO CASTILLO	0+185.00			1,37	6,54	251,40		M3	6,54
TRAMO CASTILLO	0+190.00			1,48	7,13	258,53		M3	7,13
TRAMO CASTILLO	0+195.00			1,60	7,70	266,23		M3	7,70
TRAMO CASTILLO	0+200.00			1,74	8,35	274,58		M3	8,35
TRAMO CASTILLO	0+205.00			1,74	8,69	283,27		M3	8,69
TRAMO CASTILLO	0+210.00			1,52	8,14	291,42		M3	8,14
TRAMO CASTILLO	0+215.00			1,17	6,71	298,12		M3	6,71
TRAMO CASTILLO	0+220.00			1,16	5,83	303,95		M3	5,83
TRAMO CASTILLO	0+225.00			1,30	6,15	310,10		M3	6,15
TRAMO CASTILLO	0+230.00			1,23	6,32	316,42		M3	6,32
TRAMO CASTILLO	0+235.00			1,32	6,39	322,82		M3	6,39
TRAMO CASTILLO	0+240.00			1,32	6,61	329,43		M3	6,61
TRAMO CASTILLO	0+244.10			0,65	4,04	333,47		M3	4,04
							TOTAL CANTIDAD EJECUTADA	M3	869,83
							TOTAL CANTIDADES PAGADAS ACTAS ANTERIORES	M3	-
							TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA		869,83

Observaciones

GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ CHAVARRO
UNION TEMPORAL PROINGENIERIA RIOBLANCO 2025

MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMAN
R.L CONSORCIO INTER TERCIARIAS RIOBLANCO 2026

1096

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN CON PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE EN VARIOS PUNTOS CRÍTICOS DISPERSOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO, TOLIMA	ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA DE RIOBLANCO TOLIMA
FECHA: 10/07/2026		CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROINGENIERIA RIOBLANCO 2025
LOCALZIACIÓN: RIOBLANCO TOLIMA		INTERVENTORIA: CONSORCIO INTER TERCIARIAS RIOBLANCO 2026

Capítulo	2 CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO			
Ítem	2,2 SUBBASE GRANULAR CLASE C	UNIDAD	M3	

Área/lugar/elemento		Longitud (m)	ancho (m)	Altura(m)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
PARCIAL No.1								
TRAMO GALLERA	K0+135 AL K0+226	91,00	5,00	0,15	68,25	1,00	M3	68,25
TRAMO CASTILLO	K0+179 AL K0+249	70,00	4,50	0,15	47,25	1,00	M3	47,25
					-			-
					-			-
					-			-
					-			-
					-			-
					-			-
TOTAL CANTIDAD EJECUTADA							M3	115,50
TOTAL CANTIDADES PAGADAS ACTAS ANTERIORES							M3	-
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA								115,50

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones

GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ CHAVARRO
UNION TEMPORAL PROINGENIERIA RIOBLANCO 2025

MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMAN
R.L CONSORCIO INTER TERCIARIAS RIOBLANCO 2026

1004

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN CON PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE EN VARIOS PUNTOS CRÍTICOS DISPERSOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO, TOLIMA	ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA DE RIOBLANCO TOLIMA
FECHA: 10/07/2026		CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROINGENIERIA RIOBLANCO 2025
LOCALZIACIÓN: RIOBLANCO TOLIMA		INTERVENTORIA: CONSORCIO INTER TERCIARIAS RIOBLANCO 2026

Capitulo	2 CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO				
Ítem	2,3 CONCRETO RESISTENCIA 21MPA MEZCLADO EN SITIO		UNIDAD	M3	

Área/lugar/elemento		Longitud (m)	ancho (m)	Altura(m)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
PARCIAL No.1									
TRAMO GALLERA	K0+135 AL K0+226 / CH + CUNETA	85,00	2,90	0,15	36,98	1,00	M3	36,98	
TRAMO GALLERA	K0+135 AL K0+226 / VR	5,00	0,20	0,25	0,25	30,00	M3	7,50	
TRAMO GALLERA	K0+135 AL K0+226 / BORDILLO PH	91,00	0,15	0,30	4,10	2,00	M3	8,19	
TRAMO CASTILLO	K0+179 AL K0+249 / CH + CUNETA	65,60	2,90	0,15	28,54	1,00	M3	28,54	
TRAMO CASTILLO	K0+179 AL K0+249 / VR	5,00	0,20	0,25	0,25	22,00	M3	5,50	
TRAMO CASTILLO	K0+179 AL K0+249 / BORDILLO PH	70,00	0,15	0,30	3,15	2,00	M3	6,30	
						TOTAL CANTIDAD EJECUTADA	M3	93,00	
						TOTAL CANTIDADES PAGADAS ACTAS ANTERIORES	M3	-	
						TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA		93,00	



Observaciones

GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ CHAVARRO
UNION TEMPORAL PROINGENIERIA RIOBLANCO 2025

MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMAN
R.L CONSORCIO INTER TERCIARIAS RIOBLANCO 2026

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN CON PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE EN VARIOS PUNTOS CRÍTICOS DISPERSOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO, TOLIMA	ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA DE RIOBLANCO TOLIMA
FECHA: 10/07/2026		CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROINGENIERIA RIOBLANCO 2025
LOCALZIACIÓN: RIOBLANCO TOLIMA		INTERVENTORIA: CONSORCIO INTER TERCIARIAS RIOBLANCO 2026

Capítulo	2 CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO			
Ítem	2,4 CONCRETO CICLÓPEO (CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (D) 60% CONCRETO - 40% AGREGADO CICLÓPEO)	UNIDAD	M3	

Área/lugar/elemento		Longitud (m)	ancho (m)	Altura(m)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
PARCIAL No.1									
TRAMO GALLERA	K0+135 AL K0+226	85,00	1,80	0,15	22,95	1,00	M3	22,95	
TRAMO CASTILLO	K0+179 AL K0+249	65,60	1,30	0,15	12,79	1,00	M3	12,79	
					-		M3	-	
TOTAL CANTIDAD EJECUTADA							M3	35,74	
TOTAL CANTIDADES PAGADAS ACTAS ANTERIORES							M3	-	
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA								35,74	



Observaciones

GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ CHAVARRO
UNION TEMPORAL PROINGENIERIA RIOBLANCO 2025

MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMAN
R.L CONSORCIO INTER TERCIARIAS RIOBLANCO 2026

1099


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN CON PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE EN VARIOS PUNTOS CRÍTICOS DISPERSOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO, TOLIMA	ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA DE RIOBLANCO TOLIMA
FECHA: 10/07/2026		CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROINGENIERIA RIOBLANCO 2025
LOCALZIACIÓN: RIOBLANCO TOLIMA		INTERVENTORIA: CONSORCIO INTER TERCIARIAS RIOBLANCO 2026

Capítulo	2 CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO			
Ítem	2,5 MATERIAL EN AFIRMADO PARA MEJORAMIENTO, RENIVELACIÓN Y LLENOS DE SUBRASANTE	UNIDAD	M3	

Área/lugar/elemento		Longitud (m)	ancho (m)	Area (m2)	Altura(m)	Volumen (m3)	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
PARCIAL No.1									
CAJEO DE VIA				Area (m2)	Volumen Seccion (m3)	Volumen Acumulado (m3)			
TRAMO GALLERA	0+000.00			0,74	0	0		M3	-
TRAMO GALLERA	0+005.00			0,74	3,69	3,69		M3	3,69
TRAMO GALLERA	0+010.00			0,74	3,7	7,39		M3	3,70
TRAMO GALLERA	0+015.00			0,75	3,72	11,11		M3	3,72
TRAMO GALLERA	0+020.00			0,72	3,66	14,77		M3	3,66
TRAMO GALLERA	0+025.00			0,72	3,59	18,37		M3	3,59
TRAMO GALLERA	0+030.00			0,71	3,57	21,93		M3	3,57
TRAMO GALLERA	0+035.00			0,71	3,56	25,49		M3	3,56
TRAMO GALLERA	0+040.00			0,72	3,59	29,08		M3	3,59
TRAMO GALLERA	0+045.00			0,74	3,65	32,73		M3	3,65
TRAMO GALLERA	0+050.00			0,75	3,71	36,44		M3	3,71
TRAMO GALLERA	0+055.00			0,75	3,74	40,18		M3	3,74
TRAMO GALLERA	0+060.00			0,75	3,75	43,93		M3	3,75
TRAMO GALLERA	0+065.00			0,75	3,75	47,68		M3	3,75
TRAMO GALLERA	0+070.00			0,73	3,7	51,38		M3	3,70
TRAMO GALLERA	0+075.00			0,7	3,59	54,97		M3	3,59
TRAMO GALLERA	0+080.00			0,52	3,06	58,03		M3	3,06
TRAMO GALLERA	0+085.00			0,73	3,13	61,16		M3	3,13
TRAMO GALLERA	0+090.00			0,75	3,7	64,87		M3	3,70
TRAMO GALLERA	0+095.00			0,75	3,75	68,62		M3	3,75
TRAMO GALLERA	0+100.00			0,75	3,75	72,37		M3	3,75
TRAMO GALLERA	0+105.00			0,75	3,75	76,12		M3	3,75
TRAMO GALLERA	0+110.00			0,75	3,75	79,87		M3	3,75
TRAMO GALLERA	0+115.00			0,75	3,75	83,62		M3	3,75
TRAMO GALLERA	0+120.00			0,75	3,75	87,36		M3	3,75
TRAMO GALLERA	0+125.00			0,75	3,74	91,1		M3	3,74
TRAMO GALLERA	0+130.00			0,75	3,73	94,84		M3	3,73
TRAMO GALLERA	0+135.00			0,75	3,73	98,56		M3	3,73
TRAMO GALLERA	0+140.00			0,74	3,72	102,28		M3	3,72
TRAMO GALLERA	0+145.00			0,74	3,71	105,99		M3	3,71

REGISTRO FOTOGRAFICO




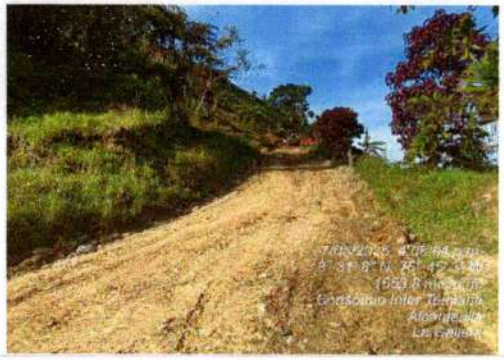



0011


TRAMO GALLERA	0+150.00			0,75	3,72	109,71		M3	3,72
TRAMO GALLERA	0+155.00			0,75	3,73	113,44		M3	3,73
TRAMO GALLERA	0+160.00			0,75	3,74	117,18		M3	3,74
TRAMO GALLERA	0+165.00			0,75	3,74	120,92		M3	3,74
TRAMO GALLERA	0+170.00			0,75	3,74	124,66		M3	3,74
TRAMO GALLERA	0+175.00			0,75	3,73	128,39		M3	3,73
TRAMO GALLERA	0+180.00			0,8	3,87	132,26		M3	3,87
TRAMO GALLERA	0+185.00			0,83	4,08	136,34		M3	4,08
TRAMO GALLERA	0+190.00			0,75	3,95	140,29		M3	3,95
TRAMO GALLERA	0+195.00			0,74	3,72	144,01		M3	3,72
TRAMO GALLERA	0+200.00			0,74	3,71	147,72		M3	3,71
TRAMO GALLERA	0+205.00			0,74	3,71	151,42		M3	3,71
TRAMO GALLERA	0+210.00			0,75	3,73	155,15		M3	3,73
TRAMO GALLERA	0+215.00			0,75	3,73	158,88		M3	3,73
TRAMO GALLERA	0+220.00			0,73	3,69	162,57		M3	3,69
TRAMO GALLERA	0+225.00			0,74	3,67	166,23		M3	3,67
TRAMO GALLERA	0+225.75			0,74	0,56	166,79		M3	0,56
CAJEO DE VIA				Area (m2)	Volumen Seccion (m3)	Volumen Acumulado (m3)			
TRAMO CASTILLO	0+000.00			0,34	0	0		M3	-
TRAMO CASTILLO	0+005.00			0,68	2,53	2,53		M3	2,53
TRAMO CASTILLO	0+010.00			0,65	3,32	5,85		M3	3,32
TRAMO CASTILLO	0+015.00			0,65	3,27	9,12		M3	3,27
TRAMO CASTILLO	0+020.00			0,67	3,32	12,44		M3	3,32
TRAMO CASTILLO	0+025.00			0,65	3,31	15,75		M3	3,31
TRAMO CASTILLO	0+030.00			0,66	3,28	19,03		M3	3,28
TRAMO CASTILLO	0+035.00			0,65	3,28	22,31		M3	3,28
TRAMO CASTILLO	0+040.00			0,64	3,24	25,54		M3	3,24
TRAMO CASTILLO	0+045.00			0,63	3,17	28,71		M3	3,17
TRAMO CASTILLO	0+050.00			0,64	3,17	31,89		M3	3,17
TRAMO CASTILLO	0+055.00			0,67	3,27	35,16		M3	3,27
TRAMO CASTILLO	0+060.00			0,68	3,35	38,51		M3	3,35
TRAMO CASTILLO	0+065.00			0,67	3,37	41,89		M3	3,37
TRAMO CASTILLO	0+070.00			0,67	3,35	45,24		M3	3,35
TRAMO CASTILLO	0+075.00			0,66	3,31	48,55		M3	3,31
TRAMO CASTILLO	0+080.00			0,66	3,29	51,83		M3	3,29
TRAMO CASTILLO	0+085.00			0,66	3,3	55,13		M3	3,30
TRAMO CASTILLO	0+090.00			0,67	3,32	58,45		M3	3,32
TRAMO CASTILLO	0+095.00			0,67	3,34	61,78		M3	3,34

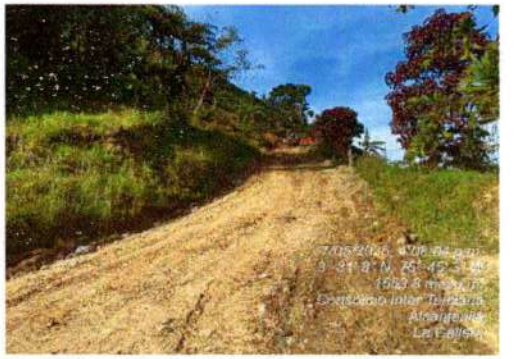



107

TRAMO CASTILLO	0+100.00			0,67	3,34	65,13		M3	3,34
TRAMO CASTILLO	0+105.00			0,67	3,34	68,47		M3	3,34
TRAMO CASTILLO	0+110.00			0,67	3,34	71,81		M3	3,34
TRAMO CASTILLO	0+115.00			0,67	3,36	75,17		M3	3,36
TRAMO CASTILLO	0+120.00			0,67	3,36	78,53		M3	3,36
TRAMO CASTILLO	0+125.00			0,66	3,31	81,84		M3	3,31
TRAMO CASTILLO	0+130.00			0,64	3,24	85,08		M3	3,24
TRAMO CASTILLO	0+135.00			0,65	3,22	88,3		M3	3,22
TRAMO CASTILLO	0+140.00			0,67	3,31	91,61		M3	3,31
TRAMO CASTILLO	0+145.00			0,67	3,37	94,98		M3	3,37
TRAMO CASTILLO	0+150.00			0,68	3,37	98,35		M3	3,37
TRAMO CASTILLO	0+155.00			0,68	3,38	101,73		M3	3,38
TRAMO CASTILLO	0+160.00			0,67	3,37	105,1		M3	3,37
TRAMO CASTILLO	0+165.00			0,67	3,35	108,46		M3	3,35
TRAMO CASTILLO	0+170.00			0,66	3,31	111,77		M3	3,31
TRAMO CASTILLO	0+175.00			0,65	3,27	115,04		M3	3,27
TRAMO CASTILLO	0+180.00			0,66	3,28	118,32		M3	3,28
TRAMO CASTILLO	0+185.00			0,67	3,33	121,65		M3	3,33
TRAMO CASTILLO	0+190.00			0,68	3,37	125,02		M3	3,37
TRAMO CASTILLO	0+195.00			0,67	3,37	128,39		M3	3,37
TRAMO CASTILLO	0+200.00			0,67	3,37	131,77		M3	3,37
TRAMO CASTILLO	0+205.00			0,67	3,37	135,14		M3	3,37
TRAMO CASTILLO	0+210.00			0,67	3,37	138,52		M3	3,37
TRAMO CASTILLO	0+215.00			0,67	3,37	141,89		M3	3,37
TRAMO CASTILLO	0+220.00			0,65	3,31	145,2		M3	3,31
TRAMO CASTILLO	0+225.00			0,66	3,27	148,47		M3	3,27
TRAMO CASTILLO	0+230.00			0,66	3,29	151,76		M3	3,29
TRAMO CASTILLO	0+235.00			0,67	3,33	155,09		M3	3,33
TRAMO CASTILLO	0+240.00			0,66	3,34	158,43		M3	3,34
TRAMO CASTILLO	0+244.10			0,34	2,07	160,49		M3	2,07
							TOTAL CANTIDAD EJECUTADA	M3	327,28
							TOTAL CANTIDADES PAGADAS ACTAS ANTERIORES	M3	-
								TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA	327,28

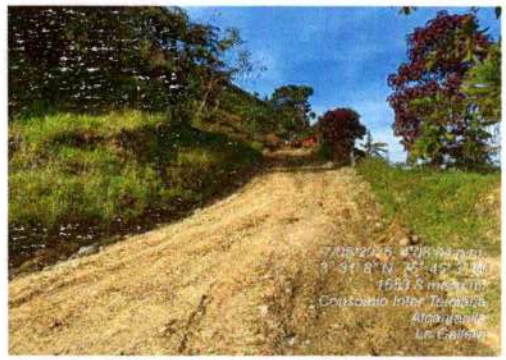



Observaciones

GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ CHAVARRO
UNION TEMPORAL PROINGENIERIA RIOBLANCO 2025

MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMAN
R.L CONSORCIO INTER TERCIARIAS RIOBLANCO 2026

1102

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN CON PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE EN VARIOS PUNTOS CRÍTICOS DISPERSOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO, TOLIMA	ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA DE RIOBLANCO TOLIMA
FECHA: 10/07/2026		CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROINGENIERIA RIOBLANCO 2025
LOCALZIACIÓN: RIOBLANCO TOLIMA		INTERVENTORIA: CONSORCIO INTER TERCIARIAS RIOBLANCO 2026

Capitulo	2 CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO									
Ítem	2,6 ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA.						UNIDAD	KG		

Área/lugar/elemento		Longitud Tramo (m)	Longitud Varilla	Cantidad	Peso x Kg/M	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
PARCIAL No.1									
TRAMO GALLERA	K0+135 AL K0+226 / LONG / CH	91,00	91,00	5,00	0,56	254,80	2,00	KG	509,60
TRAMO GALLERA	K0+135 AL K0+226 / TRAN / CH	91,00	0,80	455,00	0,56	203,84	2,00	KG	407,68
TRAMO GALLERA	K0+135 AL K0+226 / LONG / CUNETA + BORDILLO	91,00	91,00	5,00	0,56	254,80	2,00	KG	509,60
TRAMO GALLERA	K0+135 AL K0+226 / TRASN / CUNETA + BORDILLO	91,00	0,90	455,00	0,56	229,32	2,00	KG	458,64
TRAMO GALLERA	K0+135 AL K0+226 / LONG / RIOSTRA	5,00	5,00	4,00	0,56	11,20	30,00	KG	336,00
TRAMO GALLERA	K0+135 AL K0+226 / FLEJE / RIOSTRA	5,00	0,82	20,00	0,56	9,18	30,00	KG	275,52
TRAMO CASTILLO	K0+179 AL K0+249 / LONG / CH	70,00	70,00	5,00	0,56	196,00	2,00	KG	392,00
TRAMO CASTILLO	K0+179 AL K0+249 / TRAN / CH	70,00	0,80	350,00	0,56	156,80	2,00	KG	313,60
TRAMO CASTILLO	K0+179 AL K0+249 / LONG / CUNETA + BORDILLO	70,00	70,00	5,00	0,56	196,00	2,00	KG	392,00
TRAMO CASTILLO	K0+179 AL K0+249 / TRASN / CUNETA + BORDILLO	70,00	0,90	350,00	0,56	176,40	2,00	KG	352,80
TRAMO CASTILLO	K0+179 AL K0+249 / LONG / RIOSTRA	4,50	5,00	4,00	0,56	11,20	22,00	KG	246,40
TRAMO CASTILLO	K0+179 AL K0+249 / FLEJE / RIOSTRA	4,50	0,82	18,00	0,56	8,27	22,00	KG	181,84
							TOTAL CANTIDAD EJECUTADA	KG	4.375,68
							TOTAL CANTIDADES PAGADAS ACTAS ANTERIORES	KG	-
							TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA		4375,68

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones

GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ CHAVARRO
UNION TEMPORAL PROINGENIERIA RIOBLANCO 2025

MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMAN
R.L CONSORCIO INTER TERCIARIAS RIOBLANCO 2026

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN CON PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE EN VARIOS PUNTOS CRÍTICOS DISPERSOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO, TOLIMA	ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA DE RIOBLANCO TOLIMA
FECHA: 10/07/2026		CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROINGENIERIA RIOBLANCO 2025
LOCALZIACIÓN: RIOBLANCO TOLIMA		INTERVENTORIA: CONSORCIO INTER TERCIARIAS RIOBLANCO 2026

Capítulo	1 CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA EN TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 900 MM		
Ítem	1,1 EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	UNIDAD	M3

Área/lugar/elemento		Longitud (m)	ancho (m)	Altura(m)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
PARCIAL No.1								
CHELE A1	TUBERIA	5,00	1,80	1,80	16,20	1,00	M3	16,20
CHELE A1	ALETAS	1,50	2,79	1,80	7,52	1,00	M3	7,52
CHELE A1	POCETA	1,80	1,80	1,80	5,83	1,00	M3	5,83
CHELE A1	DENTELLON	3,54	0,20	0,20	0,14	1,00	M3	0,14
CHELE A2	TUBERIA	7,00	1,80	1,70	21,42	1,00	M3	21,42
CHELE A2	ALETAS	1,70	2,50	1,70	7,23	1,00	M3	7,23
CHELE A2	POCETA	1,80	1,86	1,70	5,69	1,00	M3	5,69
CHELE A2	DENTELLON	3,10	0,20	0,20	0,12	1,00	M3	0,12
CHELE A3	TUBERIA	5,00	1,80	1,60	14,40	1,00	M3	14,40
CHELE A3	ALETAS	1,52	2,62	1,60	6,36	1,00	M3	6,36
CHELE A3	POCETA	1,85	1,80	1,60	5,33	1,00	M3	5,33
CHELE A3	DENTELLON	3,23	0,20	0,20	0,13	1,00	M3	0,13
CHELE A4	TUBERIA	5,00	1,80	1,65	14,85	1,00	M3	14,85
CHELE A4	ALETAS	1,30	2,64	1,65	5,65	1,00	M3	5,65
CHELE A4	POCETA	1,84	1,85	1,65	5,62	1,00	M3	5,62
CHELE A4	DENTELLON	3,27	0,20	0,20	0,13	1,00	M3	0,13
					-	1,00	M3	-
					-	1,00	M3	-
					TOTAL CANTIDAD EJECUTADA		M3	116,62
					TOTAL CANTIDADES PAGADAS ACTAS ANTERIORES		M3	-
					TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA			116,62

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones

GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ CHAVARRO
UNION TEMPORAL PROINGENIERIA RIOBLANCO 2025

MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMAN
R.L CONSORCIO INTER TERCIARIAS RIOBLANCO 2026

104

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN CON PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE EN VARIOS PUNTOS CRÍTICOS DISPERSOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO, TOLIMA	ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA DE RIOBLANCO TOLIMA
FECHA: 10/07/2026		CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROINGENIERIA RIOBLANCO 2025
LOCALZIACIÓN: RIOBLANCO TOLIMA		INTERVENTORIA: CONSORCIO INTER TERCIARIAS RIOBLANCO 2026

Capítulo	1 CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA EN TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 900 MM		
Ítem	1,2 RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	UNIDAD	M3

Área/lugar/elemento		Longitud (m)	ancho (m)	Altura(m)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
PARCIAL No.1								
CHELE A1	CENTRO	5,00	1,80	0,90	8,10	1,00	M3	8,10
CHELE A1	SUPERIOR	5,00	1,80	0,60	5,40	1,00	M3	5,40
CHELE A1	POCETA / EXTERIOR	6,80	0,10	1,80	1,22	1,00	M3	1,22
CHELE A1	ALETAS / EXTERIOR	1,60	0,10	1,60	0,26	2,00	M3	0,51
CHELE A1	VOL TUBERIA				(4,75)	1,00	M3	(4,75)
CHELE A2	CENTRO	7,00	1,80	0,90	11,34	1,00	M3	11,34
CHELE A2	SUPERIOR	7,00	1,80	0,60	7,56	1,00	M3	7,56
CHELE A2	POCETA / EXTERIOR	6,92	0,10	1,70	1,18	1,00	M3	1,18
CHELE A2	ALETAS / EXTERIOR	1,73	0,10	1,58	0,27	2,00	M3	0,55
CHELE A2	VOL TUBERIA				(6,65)	1,00	M3	(6,65)
CHELE A3	CENTRO	5,00	1,80	0,90	8,10	1,00	M3	8,10
CHELE A3	SUPERIOR	5,00	1,80	0,60	5,40	1,00	M3	5,40
CHELE A3	POCETA / EXTERIOR	6,86	0,10	1,60	1,10	1,00	M3	1,10
CHELE A3	ALETAS / EXTERIOR	1,60	0,10	1,62	0,26	2,00	M3	0,52
CHELE A3	VOL TUBERIA				(4,75)	1,00	M3	(4,75)
CHELE A4	CENTRO	5,00	1,80	0,90	8,10	1,00	M3	8,10
CHELE A4	SUPERIOR	5,00	1,80	0,60	5,40	1,00	M3	5,40
CHELE A4	POCETA / EXTERIOR	6,98	0,10	1,65	1,15	1,00	M3	1,15
CHELE A4	ALETAS / EXTERIOR	1,70	0,10	1,58	0,27	2,00	M3	0,54
CHELE A4	VOL TUBERIA				(4,75)	1,00	M3	(4,75)
						TOTAL CANTIDAD EJECUTADA	M3	45,26
						TOTAL CANTIDADES PAGADAS ACTAS ANTERIORES	M3	-
						TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA		45,26

REGISTRO FOTOGRAFICO





Observaciones

GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ CHAVARRO
UNION TEMPORAL PROINGENIERIA RIOBLANCO 2025

MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMAN
R.L CONSORCIO INTER TERCIARIAS RIOBLANCO 2026


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN CON PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE EN VARIOS PUNTOS CRÍTICOS DISPERSOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO, TOLIMA	ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA DE RIOBLANCO TOLIMA
FECHA: 10/07/2026		CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROINGENIERIA RIOBLANCO 2025
LOCALZIACIÓN: RIOBLANCO TOLIMA		INTERVENTORIA: CONSORCIO INTER TERCIARIAS RIOBLANCO 2026

Capítulo	1 CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA EN TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 900 MM							
Ítem	1,3 CONCRETO RESISTENCIA 21MPA MEZCLADO EN SITIO					UNIDAD	M3	

Área/lugar/elemento		Longitud (m)	ancho (m)	Altura(m)	V. PARCIAL	VACIOS	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
PARCIAL No.1									
CHELE A1	CABEZOTE DESCOLE	1,20	0,20	1,70	0,41	0,19	1,00	M3	0,22
CHELE A1	DESCOLE ALETA 1	1,60	0,20	1,60	0,51		1,00	M3	0,51
CHELE A1	DESCOLE ALETA 2	1,60	0,20	1,60	0,51		1,00	M3	0,51
CHELE A1	POCETA	5,60	0,20	1,80	2,02	0,19	1,00	M3	1,83
CHELE A1	POCETA PLACA	1,60	1,60	0,20	0,51		1,00	M3	0,51
CHELE A1	DESCOLE PLACA	2,59	1,50	0,20	0,78		1,00	M3	0,78
CHELE A1	DESCOLE DENTELLON	3,54	0,20	0,20	0,14		1,00	M3	0,14
CHELE A1	GR DESCOLE	1,66	0,20	0,20	0,07		1,00	M3	0,07
CHELE A1	GR POCETA	1,66	0,20	0,20	0,07		1,00	M3	0,07
CHELE A2	CABEZOTE DESCOLE	1,20	0,20	1,65	0,40	0,19	1,00	M3	0,21
CHELE A2	DESCOLE ALETA 1	1,73	0,20	1,58	0,54		1,00	M3	0,54
CHELE A2	DESCOLE ALETA 2	1,73	0,20	1,58	0,54		1,00	M3	0,54
CHELE A2	POCETA	5,72	0,20	1,65	1,89	0,19	1,00	M3	1,70
CHELE A2	POCETA PLACA	1,66	1,60	0,20	0,53		1,00	M3	0,53
CHELE A2	DESCOLE PLACA	2,35	1,70	0,20	0,80		1,00	M3	0,80
CHELE A2	DESCOLE DENTELLON	3,10	0,20	0,20	0,12		1,00	M3	0,12
CHELE A2	GR DESCOLE	1,65	0,20	0,20	0,07		1,00	M3	0,07
CHELE A2	GR POCETA	1,65	0,20	0,20	0,07		1,00	M3	0,07
CHELE A3	CABEZOTE DESCOLE	1,20	0,20	1,70	0,41	0,19	1,00	M3	0,22
CHELE A3	DESCOLE ALETA 1	1,60	0,20	1,62	0,52		1,00	M3	0,52
CHELE A3	DESCOLE ALETA 2	1,60	0,20	1,62	0,52		1,00	M3	0,52
CHELE A3	POCETA	5,70	0,20	1,60	1,82	0,19	1,00	M3	1,63

REGISTRO FOTOGRAFICO



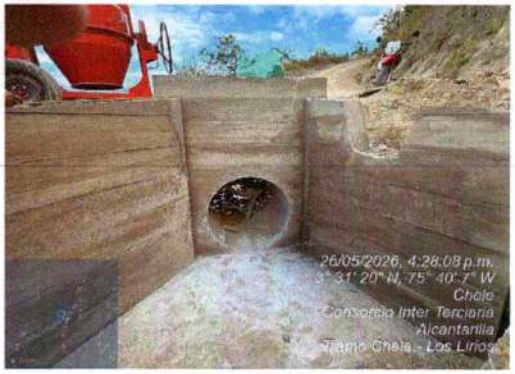

106

CHELE A3	POCETA PLACA	1,60	1,65	0,20	0,53		1,00	M3	0,53
CHELE A3	DESCOLE PLACA	2,42	1,52	0,20	0,73		1,00	M3	0,73
CHELE A3	DESCOLE DENTELLON	3,23	0,20	0,20	0,13		1,00	M3	0,13
CHELE A3	GR DESCOLE	1,66	0,20	0,20	0,07		1,00	M3	0,07
CHELE A3	GR POCETA	1,66	0,20	0,20	0,07		1,00	M3	0,07
CHELE A4	CABEZOTE DESCOLE	1,20	0,20	1,66	0,40	0,19	1,00	M3	0,21
CHELE A4	DESCOLE ALETA 1	1,70	0,20	1,58	0,54		1,00	M3	0,54
CHELE A4	DESCOLE ALETA 2	1,58	0,20	1,58	0,50		1,00	M3	0,50
CHELE A4	POCETA	5,78	0,20	1,60	1,85	0,19	1,00	M3	1,66
CHELE A4	POCETA PLACA	1,64	1,65	0,20	0,54		1,00	M3	0,54
CHELE A4	DESCOLE PLACA	2,24	1,50	0,20	0,67		1,00	M3	0,67
CHELE A4	DESCOLE DENTELLON	3,27	0,20	0,20	0,13		1,00	M3	0,13
CHELE A4	GR DESCOLE	1,65	0,20	0,20	0,07		1,00	M3	0,07
CHELE A4	GR POCETA	1,65	0,20	0,20	0,07		1,00	M3	0,07
					-		1,00	M3	-
							TOTAL CANTIDAD EJECUTADA	M3	18,00
							TOTAL CANTIDADES PAGADAS ACTAS ANTERIORES	M3	-
							TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA		18,00



Observaciones

GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ CHAVARRO
UNION TEMPORAL PROINGENIERIA RIOBLANCO 2025

MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMAN
R.L CONSORCIO INTER TERCIARIAS RIOBLANCO 2026

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN CON PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE EN VARIOS PUNTOS CRÍTICOS DISPERSOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO, TOLIMA	ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA DE RIOBLANCO TOLIMA
FECHA: 10/07/2026		CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROINGENIERIA RIOBLANCO 2025
LOCALZIACIÓN: RIOBLANCO TOLIMA		INTERVENTORIA: CONSORCIO INTER TERCIARIAS RIOBLANCO 2026

Capítulo	1 CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA EN TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 900 MM			
Ítem	1,4 CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA MEZCLADO EN SITIO	UNIDAD	M3	

Área/lugar/elemento		Longitud (m)	ancho (m)	Altura(m)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
PARCIAL No.1								
CHELE A1	TUBERIA	5,00	1,80	0,05	0,45	1,00	M3	0,45
CHELE A1	POCETA / PLACA	1,60	1,60	0,05	0,13	1,00	M3	0,13
CHELE A1	DESCOLE / PLACA	2,54	1,50	0,05	0,19	1,00	M3	0,19
CHELE A1	ATRAQUE TUBERIA	5,00	0,70	0,20	0,70	1,00	M3	0,70
CHELE A2	TUBERIA	7,00	1,80	0,05	0,63	1,00	M3	0,63
CHELE A2	POCETA / PLACA	1,60	1,66	0,05	0,13	1,00	M3	0,13
CHELE A2	DESCOLE / PLACA	2,35	1,70	0,05	0,20	1,00	M3	0,20
CHELE A2	ATRAQUE TUBERIA	7,00	0,70	0,20	0,98	1,00	M3	0,98
CHELE A3	TUBERIA	5,00	1,80	0,05	0,45	1,00	M3	0,45
CHELE A3	POCETA / PLACA	1,65	1,60	0,05	0,13	1,00	M3	0,13
CHELE A3	DESCOLE / PLACA	2,42	1,52	0,05	0,18	1,00	M3	0,18
CHELE A3	ATRAQUE TUBERIA	5,00	0,70	0,20	0,70	1,00	M3	0,70
CHELE A4	TUBERIA	5,00	1,80	0,05	0,45	1,00	M3	0,45
CHELE A4	POCETA / PLACA	1,64	1,65	0,05	0,14	1,00	M3	0,14
CHELE A4	DESCOLE / PLACA	2,44	1,50	0,05	0,18	1,00	M3	0,18
CHELE A4	ATRAQUE TUBERIA	5,00	0,70	0,20	0,70	1,00	M3	0,70
						TOTAL CANTIDAD EJECUTADA	M3	6,34
						TOTAL CANTIDADES PAGADAS ACTAS ANTERIORES	M3	-
						TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA		6,34

REGISTRO FOTOGRAFICO





Observaciones

GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ CHAVARRO
UNION TEMPORAL PROINGENIERIA RIOBLANCO 2025

MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMAN
R.L CONSORCIO INTER TERCIARIAS RIOBLANCO 2026

1108

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN CON PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE EN VARIOS PUNTOS CRÍTICOS DISPERSOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO, TOLIMA	ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA DE RIOBLANCO TOLIMA
FECHA: 10/07/2026		CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROINGENIERIA RIOBLANCO 2025
LOCALZIACIÓN: RIOBLANCO TOLIMA		INTERVENTORIA: CONSORCIO INTER TERCIARIAS RIOBLANCO 2026

Capítulo	1 CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA EN TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 900 MM			
Ítem	1,5 ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA.	UNIDAD	KG	

Área/lugar/elemento				Total (Kg)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
PARCIAL No.1								
CHELE A1	ALC 01 / ENCOLE			178,70	178,70	1,00	KG	178,70
CHELE A1	ALC 01 / DESCOLE			205,25	205,25	1,00	KG	205,25
CHELE A2	ALC 02 / ENCOLE			172,74	172,74	1,00	KG	172,74
CHELE A2	ALC 02 / DESCOLE			218,04	218,04	1,00	KG	218,04
CHELE A3	ALC 03 / ENCOLE			174,04	174,04	1,00	KG	174,04
CHELE A3	ALC 03 / DESCOLE			200,44	200,44	1,00	KG	200,44
CHELE A4	ALC 04 / ENCOLE			176,89	176,89	1,00	KG	176,89
CHELE A4	ALC 04 / DESCOLE			197,47	197,47	1,00	KG	197,47
					TOTAL CANTIDAD EJECUTADA		KG	1.523,57
					TOTAL CANTIDADES PAGADAS ACTAS ANTERIORES		KG	-
							TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA	1523,57

REGISTRO FOTOGRAFICO





Observaciones

GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ CHAVARRO
UNION TEMPORAL PROINGENIERIA RIOBLANCO 2025

MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMAN
R.L CONSORCIO INTER TERCIARIAS RIOBLANCO 2026

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN CON PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE EN VARIOS PUNTOS CRÍTICOS DISPERSOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO, TOLIMA	ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA DE RIOBLANCO TOLIMA
FECHA: 10/07/2026		CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROINGENIERIA RIOBLANCO 2025
LOCALZIACIÓN: RIOBLANCO TOLIMA		INTERVENTORIA: CONSORCIO INTER TERCIARIAS RIOBLANCO 2026

Capítulo	1 CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA EN TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 900 MM								
Ítem	1,6 TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO 21 MPA DE 900 MM DE DIÁMETRO INTERIOR					UNIDAD	M		

Área/lugar/elemento		Longitud (m)	ancho (m)	Altura(m)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
PARCIAL No.1								
TRAMO CHELE	ALCANTARILLA 1	5,00			5,00	1,00	M	5,00
TRAMO CHELE	ALCANTARILLA 2	7,00			7,00	1,00	M	7,00
TRAMO CHELE	ALCANTARILLA 3	5,00			5,00	1,00	M	5,00
TRAMO CHELE	ALCANTARILLA 4	5,00			5,00	1,00	M	5,00
					-	1,00	M	-
TOTAL CANTIDAD EJECUTADA							M	22,00
TOTAL CANTIDADES PAGADAS ACTAS ANTERIORES							M	-
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA								22,00

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones

GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ CHAVARRO
UNION TEMPORAL PROINGENIERIA RIOBLANCO 2025

MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMAN
R.L CONSORCIO INTER TERCIARIAS RIOBLANCO 2026

1111

Volume Report

Client:
Client
Client Company
Address 1
Date: 7/07/2026 12:10:17 p. m.

Prepared by:
Preparer
Your Company Name
123 Main Street

Aignment: EJE VIA
Sample Line Group: SAMPLEADO
Start Sta: 0+000.00
End Sta: 0+075.36

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Reusable Volume (Cu.M.)	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)	Cum. Reusable Vol. (Cu.M.)	Cum. Fill Vol. (Cu.M.)	Cum. Net Vol. (Cu.M.)
0+000.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+005.00	0.59	3.21	3.21	0.00	0.00	3.21	0.00	0.00	3.21
0+010.00	0.44	2.55	2.55	0.00	0.00	5.76	0.00	0.00	5.76
0+015.00	0.72	2.89	2.89	0.00	0.00	8.65	0.00	0.00	8.65
0+020.00	0.40	2.80	2.80	0.00	0.00	11.46	0.00	0.00	11.46
0+025.00	0.35	1.87	1.87	0.00	0.00	13.32	0.00	0.00	13.32
0+030.00	0.35	1.75	1.75	0.00	0.00	15.08	0.00	0.00	15.08
0+035.00	0.53	2.21	2.21	0.00	0.00	17.29	0.00	0.00	17.29
0+040.00	0.54	2.69	2.69	0.00	0.00	19.98	0.00	0.00	19.98
0+045.00	0.48	2.57	2.57	0.00	0.00	22.55	0.00	0.00	22.55
0+050.00	0.62	2.75	2.75	0.00	0.00	25.30	0.00	0.00	25.30
0+055.00	0.66	3.19	3.19	0.00	0.00	28.49	0.00	0.00	28.49
0+060.00	0.65	3.27	3.27	0.00	0.00	31.77	0.00	0.00	31.77
0+065.00	0.69	3.36	3.36	0.00	0.00	35.12	0.00	0.00	35.12
0+070.00	0.52	3.03	3.03	0.00	0.00	38.16	0.00	0.00	38.16
0+075.00	0.79	3.28	3.28	0.00	0.00	41.44	0.00	0.00	41.44
0+075.36	0.49	0.23	0.23	0.00	0.00	41.67	0.00	0.00	41.67

1112

Volume Report

Client:
Client
Client Company
Address 1
Date: 7/07/2026 12:10:17 p. m.

Prepared by:
Preparer
Your Company Name
123 Main Street

Aignment: EJE VIA
Sample Line Group: SAMPLEADO
Start Sta: 0+000.00
End Sta: 0+075.36

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Reusable Volume (Cu.M.)	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)	Cum. Reusable Vol. (Cu.M.)	Cum. Fill Vol. (Cu.M.)	Cum. Net Vol. (Cu.M.)
0+000.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+005.00	0.59	3.21	3.21	0.00	0.00	3.21	0.00	0.00	3.21
0+010.00	0.44	2.55	2.55	0.00	0.00	5.76	0.00	0.00	5.76
0+015.00	0.72	2.89	2.89	0.00	0.00	8.65	0.00	0.00	8.65
0+020.00	0.40	2.80	2.80	0.00	0.00	11.46	0.00	0.00	11.46
0+025.00	0.35	1.87	1.87	0.00	0.00	13.32	0.00	0.00	13.32
0+030.00	0.35	1.75	1.75	0.00	0.00	15.08	0.00	0.00	15.08
0+035.00	0.53	2.21	2.21	0.00	0.00	17.29	0.00	0.00	17.29
0+040.00	0.54	2.69	2.69	0.00	0.00	19.98	0.00	0.00	19.98
0+045.00	0.48	2.57	2.57	0.00	0.00	22.55	0.00	0.00	22.55
0+050.00	0.62	2.75	2.75	0.00	0.00	25.30	0.00	0.00	25.30
0+055.00	0.66	3.19	3.19	0.00	0.00	28.49	0.00	0.00	28.49
0+060.00	0.65	3.27	3.27	0.00	0.00	31.77	0.00	0.00	31.77
0+065.00	0.69	3.36	3.36	0.00	0.00	35.12	0.00	0.00	35.12
0+070.00	0.52	3.03	3.03	0.00	0.00	38.16	0.00	0.00	38.16
0+075.00	0.79	3.28	3.28	0.00	0.00	41.44	0.00	0.00	41.44
0+075.36	0.49	0.23	0.23	0.00	0.00	41.67	0.00	0.00	41.67

1113

Volume Report

Client:
Client
Client Company
Address 1
Date: 7/07/2026 11:53:04 a. m.

Prepared by:
Preparer
Your Company Name
123 Main Street

Aignment: EJE VIA
Sample Line Group: SAMPLEADO
Start Sta: 0+000.00
End Sta: 0+075.36

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Reusable Volume (Cu.M.)	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)	Cum. Reusable Vol. (Cu.M.)	Cum. Fill Vol. (Cu.M.)	Cum. Net Vol. (Cu.M.)
0+000.00	0.00	0.00	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+005.00	0.00	0.00	0.00	1.16	6.07	0.00	6.07	6.07	-6.07
0+010.00	0.00	0.00	0.00	1.02	5.45	0.00	11.51	11.51	-11.51
0+015.00	0.00	0.00	0.00	1.01	5.08	0.00	16.59	16.59	-16.59
0+020.00	0.00	0.00	0.00	0.86	4.68	0.00	21.27	21.27	-21.27
0+025.00	0.00	0.00	0.00	0.88	4.35	0.00	25.62	25.62	-25.62
0+030.00	0.00	0.00	0.00	0.91	4.48	0.00	30.10	30.10	-30.10
0+035.00	0.00	0.00	0.00	1.09	5.01	0.00	35.11	35.11	-35.11
0+040.00	0.00	0.00	0.00	1.12	5.53	0.00	40.64	40.64	-40.64
0+045.00	0.00	0.00	0.00	1.04	5.41	0.00	46.06	46.06	-46.06
0+050.00	0.00	0.00	0.00	1.17	5.53	0.00	51.59	51.59	-51.59
0+055.00	0.00	0.00	0.00	1.16	5.83	0.00	57.42	57.42	-57.42
0+060.00	0.00	0.00	0.00	1.21	5.92	0.00	63.34	63.34	-63.34
0+065.00	0.00	0.00	0.00	1.26	6.18	0.00	69.51	69.51	-69.51
0+070.00	0.00	0.00	0.00	1.17	6.07	0.00	75.58	75.58	-75.58
0+075.00	0.00	0.00	0.00	0.87	5.09	0.00	80.67	80.67	-80.67
0+075.36	0.00	0.00	0.00	0.24	0.20	0.00	80.87	80.87	-80.87

1114

Volume Report

Client:
Client
Client Company
Address 1
Date: 7/07/2026 12:21:55 p. m.

Prepared by:
Preparer
Your Company Name
123 Main Street

Aignment: EJE VIA
Sample Line Group: SAMPLEADO
Start Sta: 0+000.00
End Sta: 0+075.36

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Reusable Volume (Cu.M.)	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)	Cum. Reusable Vol. (Cu.M.)	Cum. Fill Vol. (Cu.M.)	Cum. Net Vol. (Cu.M.)
0+000.00	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+005.00	0.59	3.02	3.02	0.00	0.00	3.02	0.00	0.00	3.02
0+010.00	0.58	2.93	2.93	0.00	0.00	5.95	0.00	0.00	5.95
0+015.00	0.37	2.37	2.37	0.00	0.00	8.32	0.00	0.00	8.32
0+020.00	0.48	2.11	2.11	0.00	0.00	10.43	0.00	0.00	10.43
0+025.00	0.55	2.57	2.57	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	13.00
0+030.00	0.56	2.78	2.78	0.00	0.00	15.78	0.00	0.00	15.78
0+035.00	0.58	2.85	2.85	0.00	0.00	18.63	0.00	0.00	18.63
0+040.00	0.58	2.90	2.90	0.00	0.00	21.53	0.00	0.00	21.53
0+045.00	0.58	2.89	2.89	0.00	0.00	24.42	0.00	0.00	24.42
0+050.00	0.56	2.85	2.85	0.00	0.00	27.28	0.00	0.00	27.28
0+055.00	0.54	2.77	2.77	0.00	0.00	30.04	0.00	0.00	30.04
0+060.00	0.57	2.77	2.77	0.00	0.00	32.82	0.00	0.00	32.82
0+065.00	0.59	2.88	2.88	0.00	0.00	35.70	0.00	0.00	35.70
0+070.00	0.28	2.18	2.18	0.00	0.00	37.87	0.00	0.00	37.87
0+075.00	0.20	1.22	1.22	0.00	0.00	39.10	0.00	0.00	39.10
0+075.36	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	39.14	0.00	0.00	39.14

Volume Report

Client:
Client
Client Company
Address 1
Date: 2/07/2026 2:06:18 p. m.

Prepared by:
Preparer
Your Company Name
123 Main Street

Aignment: EJE VIA
Sample Line Group: SAMPLEADO
Start Sta: 0+000.00
End Sta: 0+053.56

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Reusable Volume (Cu.M.)	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)	Cum. Reusable Vol. (Cu.M.)	Cum. Fill Vol. (Cu.M.)	Cum. Net Vol. (Cu.M.)
0+000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+005.00	1.33	3.31	3.31	0.00	0.00	3.31	0.00	0.00	3.31
0+010.00	1.34	6.68	6.68	0.00	0.00	9.99	0.00	0.00	9.99
0+015.00	1.25	6.48	6.48	0.00	0.00	16.48	0.00	0.00	16.48
0+020.00	1.04	5.72	5.72	0.00	0.00	22.19	0.00	0.00	22.19
0+025.00	0.90	4.85	4.85	0.00	0.00	27.05	0.00	0.00	27.05
0+030.00	0.95	4.63	4.63	0.00	0.00	31.67	0.00	0.00	31.67
0+035.00	0.93	4.71	4.71	0.00	0.00	36.38	0.00	0.00	36.38
0+040.00	0.89	4.57	4.57	0.00	0.00	40.96	0.00	0.00	40.96
0+045.00	0.79	4.21	4.21	0.00	0.00	45.16	0.00	0.00	45.16
0+050.00	0.70	3.71	3.71	0.00	0.00	48.88	0.00	0.00	48.88
0+053.56	0.64	2.38	2.38	0.00	0.00	51.26	0.00	0.00	51.26

1176

Volume Report

Client:
Client
Client Company
Address 1
Date: 2/07/2026 2:07:41 p. m.

Prepared by:
Preparer
Your Company Name
123 Main Street

Aignment: EJE VIA
Sample Line Group: SAMPLEADO
Start Sta: 0+000.00
End Sta: 0+053.56

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Reusable Volume (Cu.M.)	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)	Cum. Reusable Vol. (Cu.M.)	Cum. Fill Vol. (Cu.M.)	Cum. Net Vol. (Cu.M.)
0+000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+005.00	2.01	5.03	5.03	0.00	0.00	5.03	0.00	0.00	5.03
0+010.00	2.09	10.25	10.25	0.00	0.00	15.28	0.00	0.00	15.28
0+015.00	2.00	10.23	10.23	0.00	0.00	25.51	0.00	0.00	25.51
0+020.00	1.80	9.51	9.51	0.00	0.00	35.01	0.00	0.00	35.01
0+025.00	1.65	8.61	8.61	0.00	0.00	43.62	0.00	0.00	43.62
0+030.00	1.68	8.32	8.32	0.00	0.00	51.94	0.00	0.00	51.94
0+035.00	1.66	8.35	8.35	0.00	0.00	60.29	0.00	0.00	60.29
0+040.00	1.62	8.19	8.19	0.00	0.00	68.48	0.00	0.00	68.48
0+045.00	1.52	7.84	7.84	0.00	0.00	76.32	0.00	0.00	76.32
0+050.00	1.47	7.47	7.47	0.00	0.00	83.79	0.00	0.00	83.79
0+053.56	1.44	5.19	5.19	0.00	0.00	88.98	0.00	0.00	88.98

1.117

Volume Report

Client:
Client
Client Company
Address 1
Date: 2/07/2026 2:05:12 p. m.

Prepared by:
Preparer
Your Company Name
123 Main Street

Aignment: EJE VIA
Sample Line Group: SAMPLEADO
Start Sta: 0+000.00
End Sta: 0+053.56

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Reusable Volume (Cu.M.)	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)	Cum. Reusable Vol. (Cu.M.)	Cum. Fill Vol. (Cu.M.)	Cum. Net Vol. (Cu.M.)
0+000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+005.00	0.75	1.88	1.88	0.00	0.00	1.88	0.00	0.00	1.88
0+010.00	0.74	3.74	3.74	0.00	0.00	5.62	0.00	0.00	5.62
0+015.00	0.76	3.75	3.75	0.00	0.00	9.37	0.00	0.00	9.37
0+020.00	0.76	3.79	3.79	0.00	0.00	13.16	0.00	0.00	13.16
0+025.00	0.74	3.76	3.76	0.00	0.00	16.91	0.00	0.00	16.91
0+030.00	0.74	3.71	3.71	0.00	0.00	20.63	0.00	0.00	20.63
0+035.00	0.74	3.70	3.70	0.00	0.00	24.33	0.00	0.00	24.33
0+040.00	0.74	3.69	3.69	0.00	0.00	28.02	0.00	0.00	28.02
0+045.00	0.72	3.65	3.65	0.00	0.00	31.67	0.00	0.00	31.67
0+050.00	0.67	3.49	3.49	0.00	0.00	35.16	0.00	0.00	35.16
0+053.56	0.64	2.32	2.32	0.00	0.00	37.48	0.00	0.00	37.48

Volume Report

Client:
Client
Client Company
Address 1
Date: 8/07/2026 11:39:07 p. m.

Prepared by:
Preparer
Your Company Name
123 Main Street

Aignment: PERFIL VIA
Sample Line Group: SAMPLEADO
Start Sta: 0+000.00
End Sta: 0+244.10

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Reusable Volume (Cu.M.)	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)	Cum. Reusable Vol. (Cu.M.)	Cum. Fill Vol. (Cu.M.)	Cum. Net Vol. (Cu.M.)
0+000.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+005.00	0.68	2.53	2.53	0.00	0.00	2.53	0.00	0.00	2.53
0+010.00	0.65	3.32	3.32	0.00	0.00	5.85	0.00	0.00	5.85
0+015.00	0.65	3.27	3.27	0.00	0.00	9.12	0.00	0.00	9.12
0+020.00	0.67	3.32	3.32	0.00	0.00	12.44	0.00	0.00	12.44
0+025.00	0.65	3.31	3.31	0.00	0.00	15.75	0.00	0.00	15.75
0+030.00	0.66	3.28	3.28	0.00	0.00	19.03	0.00	0.00	19.03
0+035.00	0.65	3.28	3.28	0.00	0.00	22.31	0.00	0.00	22.31
0+040.00	0.64	3.24	3.24	0.00	0.00	25.54	0.00	0.00	25.54
0+045.00	0.63	3.17	3.17	0.00	0.00	28.71	0.00	0.00	28.71
0+050.00	0.64	3.17	3.17	0.00	0.00	31.89	0.00	0.00	31.89
0+055.00	0.67	3.27	3.27	0.00	0.00	35.16	0.00	0.00	35.16
0+060.00	0.68	3.35	3.35	0.00	0.00	38.51	0.00	0.00	38.51
0+065.00	0.67	3.37	3.37	0.00	0.00	41.89	0.00	0.00	41.89
0+070.00	0.67	3.35	3.35	0.00	0.00	45.24	0.00	0.00	45.24
0+075.00	0.66	3.31	3.31	0.00	0.00	48.55	0.00	0.00	48.55
0+080.00	0.66	3.29	3.29	0.00	0.00	51.83	0.00	0.00	51.83
0+085.00	0.66	3.30	3.30	0.00	0.00	55.13	0.00	0.00	55.13
0+090.00	0.67	3.32	3.32	0.00	0.00	58.45	0.00	0.00	58.45
0+095.00	0.67	3.34	3.34	0.00	0.00	61.78	0.00	0.00	61.78
0+100.00	0.67	3.34	3.34	0.00	0.00	65.13	0.00	0.00	65.13
0+105.00	0.67	3.34	3.34	0.00	0.00	68.47	0.00	0.00	68.47
0+110.00	0.67	3.34	3.34	0.00	0.00	71.81	0.00	0.00	71.81
0+115.00	0.67	3.36	3.36	0.00	0.00	75.17	0.00	0.00	75.17
0+120.00	0.67	3.36	3.36	0.00	0.00	78.53	0.00	0.00	78.53
0+125.00	0.66	3.31	3.31	0.00	0.00	81.84	0.00	0.00	81.84
0+130.00	0.64	3.24	3.24	0.00	0.00	85.08	0.00	0.00	85.08
0+135.00	0.65	3.22	3.22	0.00	0.00	88.30	0.00	0.00	88.30
0+140.00	0.67	3.31	3.31	0.00	0.00	91.61	0.00	0.00	91.61
0+145.00	0.67	3.37	3.37	0.00	0.00	94.98	0.00	0.00	94.98
0+150.00	0.68	3.37	3.37	0.00	0.00	98.35	0.00	0.00	98.35
0+155.00	0.68	3.38	3.38	0.00	0.00	101.73	0.00	0.00	101.73
0+160.00	0.67	3.37	3.37	0.00	0.00	105.10	0.00	0.00	105.10
0+165.00	0.67	3.35	3.35	0.00	0.00	108.46	0.00	0.00	108.46
0+170.00	0.66	3.31	3.31	0.00	0.00	111.77	0.00	0.00	111.77
0+175.00	0.65	3.27	3.27	0.00	0.00	115.04	0.00	0.00	115.04
0+180.00	0.66	3.28	3.28	0.00	0.00	118.32	0.00	0.00	118.32
0+185.00	0.67	3.33	3.33	0.00	0.00	121.65	0.00	0.00	121.65
0+190.00	0.68	3.37	3.37	0.00	0.00	125.02	0.00	0.00	125.02
0+195.00	0.67	3.37	3.37	0.00	0.00	128.39	0.00	0.00	128.39
0+200.00	0.67	3.37	3.37	0.00	0.00	131.77	0.00	0.00	131.77
0+205.00	0.67	3.37	3.37	0.00	0.00	135.14	0.00	0.00	135.14
0+210.00	0.67	3.37	3.37	0.00	0.00	138.52	0.00	0.00	138.52
0+215.00	0.67	3.37	3.37	0.00	0.00	141.89	0.00	0.00	141.89
0+220.00	0.65	3.31	3.31	0.00	0.00	145.20	0.00	0.00	145.20

0+225.00	0.66	3.27	3.27	0.00	0.00	148.47	0.00	0.00	148.47
0+230.00	0.66	3.29	3.29	0.00	0.00	151.76	0.00	0.00	151.76
0+235.00	0.67	3.33	3.33	0.00	0.00	155.09	0.00	0.00	155.09
0+240.00	0.66	3.34	3.34	0.00	0.00	158.43	0.00	0.00	158.43
0+244.10	0.34	2.07	2.07	0.00	0.00	160.49	0.00	0.00	160.49

1179

Volume Report

Client:
Client
Client Company
Address 1
Date: 8/07/2026 11:13:56 p. m.

Prepared by:
Preparer
Your Company Name
123 Main Street

Aignment: PERFIL VIA
Sample Line Group: SAMPLEADO
Start Sta: 0+000.00
End Sta: 0+244.10

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Reusable Volume (Cu.M.)	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)	Cum. Reusable Vol. (Cu.M.)	Cum. Fill Vol. (Cu.M.)	Cum. Net Vol. (Cu.M.)
0+000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+005.00	1.13	2.83	2.83	0.00	0.00	2.83	0.00	0.00	2.83
0+010.00	1.18	5.77	5.77	0.00	0.00	8.60	0.00	0.00	8.60
0+015.00	1.31	6.21	6.21	0.00	0.00	14.81	0.00	0.00	14.81
0+020.00	1.61	7.30	7.30	0.00	0.00	22.11	0.00	0.00	22.11
0+025.00	1.46	7.67	7.67	0.00	0.00	29.79	0.00	0.00	29.79
0+030.00	1.46	7.29	7.29	0.00	0.00	37.07	0.00	0.00	37.07
0+035.00	1.51	7.41	7.41	0.00	0.00	44.49	0.00	0.00	44.49
0+040.00	1.33	7.09	7.09	0.00	0.00	51.58	0.00	0.00	51.58
0+045.00	1.17	6.24	6.24	0.00	0.00	57.81	0.00	0.00	57.81
0+050.00	1.43	6.49	6.49	0.00	0.00	64.31	0.00	0.00	64.31
0+055.00	1.63	7.65	7.65	0.00	0.00	71.96	0.00	0.00	71.96
0+060.00	1.49	7.79	7.79	0.00	0.00	79.75	0.00	0.00	79.75
0+065.00	1.43	7.28	7.28	0.00	0.00	87.03	0.00	0.00	87.03
0+070.00	1.38	7.01	7.01	0.00	0.00	94.04	0.00	0.00	94.04
0+075.00	1.33	6.76	6.76	0.00	0.00	100.80	0.00	0.00	100.80
0+080.00	1.33	6.64	6.64	0.00	0.00	107.44	0.00	0.00	107.44
0+085.00	1.31	6.58	6.58	0.00	0.00	114.02	0.00	0.00	114.02
0+090.00	1.45	6.89	6.89	0.00	0.00	120.92	0.00	0.00	120.92
0+095.00	1.55	7.50	7.50	0.00	0.00	128.42	0.00	0.00	128.42
0+100.00	1.62	7.93	7.93	0.00	0.00	136.35	0.00	0.00	136.35
0+105.00	1.52	7.85	7.85	0.00	0.00	144.20	0.00	0.00	144.20
0+110.00	1.60	7.80	7.80	0.00	0.00	152.00	0.00	0.00	152.00
0+115.00	1.60	8.00	8.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	160.00
0+120.00	1.48	7.70	7.70	0.00	0.00	167.70	0.00	0.00	167.70
0+125.00	1.41	7.24	7.24	0.00	0.00	174.94	0.00	0.00	174.94
0+130.00	1.39	7.01	7.01	0.00	0.00	181.95	0.00	0.00	181.95
0+135.00	1.37	6.90	6.90	0.00	0.00	188.85	0.00	0.00	188.85
0+140.00	1.39	6.90	6.90	0.00	0.00	195.74	0.00	0.00	195.74
0+145.00	1.28	6.66	6.66	0.00	0.00	202.41	0.00	0.00	202.41
0+150.00	1.12	6.00	6.00	0.00	0.00	208.41	0.00	0.00	208.41
0+155.00	1.02	5.36	5.36	0.00	0.00	213.77	0.00	0.00	213.77
0+160.00	1.48	6.25	6.25	0.00	0.00	220.02	0.00	0.00	220.02
0+165.00	1.28	6.89	6.89	0.00	0.00	226.91	0.00	0.00	226.91
0+170.00	1.21	6.23	6.23	0.00	0.00	233.14	0.00	0.00	233.14
0+175.00	1.11	5.82	5.82	0.00	0.00	238.96	0.00	0.00	238.96
0+180.00	1.25	5.90	5.90	0.00	0.00	244.86	0.00	0.00	244.86
0+185.00	1.37	6.54	6.54	0.00	0.00	251.40	0.00	0.00	251.40
0+190.00	1.48	7.13	7.13	0.00	0.00	258.53	0.00	0.00	258.53
0+195.00	1.60	7.70	7.70	0.00	0.00	266.23	0.00	0.00	266.23
0+200.00	1.74	8.35	8.35	0.00	0.00	274.58	0.00	0.00	274.58
0+205.00	1.74	8.69	8.69	0.00	0.00	283.27	0.00	0.00	283.27
0+210.00	1.52	8.14	8.14	0.00	0.00	291.42	0.00	0.00	291.42
0+215.00	1.17	6.71	6.71	0.00	0.00	298.12	0.00	0.00	298.12
0+220.00	1.16	5.83	5.83	0.00	0.00	303.95	0.00	0.00	303.95

0+225.00	1.30	6.15	6.15	0.00	0.00	310.10	0.00	0.00	310.10
0+230.00	1.23	6.32	6.32	0.00	0.00	316.42	0.00	0.00	316.42
0+235.00	1.32	6.39	6.39	0.00	0.00	322.82	0.00	0.00	322.82
0+240.00	1.32	6.61	6.61	0.00	0.00	329.43	0.00	0.00	329.43
0+244.10	0.65	4.04	4.04	0.00	0.00	333.47	0.00	0.00	333.47

1120

Volume Report

Client:
Client
Client Company
Address 1
Date: 9/07/2026 12:05:22 a. m.

Prepared by:
Preparer
Your Company Name
123 Main Street

Aignment: PERFIL VIA
Sample Line Group: SAMPLEADO
Start Sta: 0+000.00
End Sta: 0+244.10

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Reusable Volume (Cu.M.)	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)	Cum. Reusable Vol. (Cu.M.)	Cum. Fill Vol. (Cu.M.)	Cum. Net Vol. (Cu.M.)
0+000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+005.00	0.00	0.00	0.00	0.46	1.14	0.00	1.14	1.14	-1.14
0+010.00	0.00	0.00	0.00	0.52	2.45	0.00	3.59	3.59	-3.59
0+015.00	0.00	0.00	0.00	0.65	2.94	0.00	6.53	6.53	-6.53
0+020.00	0.00	0.00	0.00	0.94	3.98	0.00	10.52	10.52	-10.52
0+025.00	0.00	0.00	0.00	0.81	4.36	0.00	14.88	14.88	-14.88
0+030.00	0.00	0.00	0.00	0.80	4.01	0.00	18.89	18.89	-18.89
0+035.00	0.00	0.00	0.00	0.85	4.13	0.00	23.02	23.02	-23.02
0+040.00	0.00	0.00	0.00	0.69	3.85	0.00	26.88	26.88	-26.88
0+045.00	0.00	0.00	0.00	0.54	3.06	0.00	29.94	29.94	-29.94
0+050.00	0.00	0.00	0.00	0.79	3.32	0.00	33.26	33.26	-33.26
0+055.00	0.00	0.00	0.00	0.96	4.38	0.00	37.64	37.64	-37.64
0+060.00	0.00	0.00	0.00	0.81	4.43	0.00	42.07	42.07	-42.07
0+065.00	0.00	0.00	0.00	0.75	3.91	0.00	45.98	45.98	-45.98
0+070.00	0.00	0.00	0.00	0.71	3.66	0.00	49.64	49.64	-49.64
0+075.00	0.00	0.00	0.00	0.67	3.45	0.00	53.09	53.09	-53.09
0+080.00	0.00	0.00	0.00	0.67	3.35	0.00	56.44	56.44	-56.44
0+085.00	0.00	0.00	0.00	0.65	3.29	0.00	59.73	59.73	-59.73
0+090.00	0.00	0.00	0.00	0.78	3.58	0.00	63.31	63.31	-63.31
0+095.00	0.00	0.00	0.00	0.88	4.16	0.00	67.47	67.47	-67.47
0+100.00	0.00	0.00	0.00	0.95	4.58	0.00	72.06	72.06	-72.06
0+105.00	0.00	0.00	0.00	0.85	4.51	0.00	76.57	76.57	-76.57
0+110.00	0.00	0.00	0.00	0.93	4.46	0.00	81.03	81.03	-81.03
0+115.00	0.00	0.00	0.00	0.92	4.64	0.00	85.67	85.67	-85.67
0+120.00	0.00	0.00	0.00	0.81	4.34	0.00	90.01	90.01	-90.01
0+125.00	0.00	0.00	0.00	0.76	3.92	0.00	93.93	93.93	-93.93
0+130.00	0.00	0.00	0.00	0.75	3.77	0.00	97.71	97.71	-97.71
0+135.00	0.00	0.00	0.00	0.72	3.68	0.00	101.39	101.39	-101.39
0+140.00	0.00	0.00	0.00	0.71	3.59	0.00	104.97	104.97	-104.97
0+145.00	0.00	0.00	0.00	0.60	3.28	0.00	108.26	108.26	-108.26
0+150.00	0.00	0.00	0.00	0.45	2.62	0.00	110.88	110.88	-110.88
0+155.00	0.00	0.00	0.00	0.35	1.99	0.00	112.87	112.87	-112.87
0+160.00	0.00	0.00	0.00	0.80	2.88	0.00	115.75	115.75	-115.75
0+165.00	0.00	0.00	0.00	0.59	3.50	0.00	119.24	119.24	-119.24
0+170.00	0.00	0.00	0.00	0.53	2.81	0.00	122.05	122.05	-122.05
0+175.00	0.00	0.00	0.00	0.47	2.49	0.00	124.54	124.54	-124.54
0+180.00	0.00	0.00	0.00	0.58	2.62	0.00	127.16	127.16	-127.16
0+185.00	0.00	0.00	0.00	0.70	3.21	0.00	130.37	130.37	-130.37
0+190.00	0.00	0.00	0.00	0.80	3.76	0.00	134.13	134.13	-134.13
0+195.00	0.00	0.00	0.00	0.93	4.33	0.00	138.46	138.46	-138.46
0+200.00	0.00	0.00	0.00	1.06	4.97	0.00	143.43	143.43	-143.43
0+205.00	0.00	0.00	0.00	1.07	5.32	0.00	148.75	148.75	-148.75
0+210.00	0.00	0.00	0.00	0.84	4.77	0.00	153.52	153.52	-153.52
0+215.00	0.00	0.00	0.00	0.50	3.34	0.00	156.86	156.86	-156.86
0+220.00	0.00	0.00	0.00	0.51	2.52	0.00	159.38	159.38	-159.38

0+225.00	0.00	0.00	0.00	0.64	2.88	0.00	162.26	162.26	-162.26
0+230.00	0.00	0.00	0.00	0.57	3.03	0.00	165.29	165.29	-165.29
0+235.00	0.00	0.00	0.00	0.65	3.06	0.00	168.35	168.35	-168.35
0+240.00	0.00	0.00	0.00	0.66	3.28	0.00	171.63	171.63	-171.63
0+244.10	0.00	0.00	0.00	0.31	1.99	0.00	173.62	173.62	-173.62

1121

Volume Report

Client:
Client
Client Company
Address 1
Date: 8/07/2026 2:14:26 p. m.

Prepared by:
Preparer
Your Company Name
123 Main Street

Aignment: ALINEAMIENTO
Sample Line Group: SAMPLEADO
Start Sta: 0+000.00
End Sta: 0+225.75

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Reusable Volume (Cu.M.)	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)	Cum. Reusable Vol. (Cu.M.)	Cum. Fill Vol. (Cu.M.)	Cum. Net Vol. (Cu.M.)
0+000.00	0.00	0.00	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+005.00	0.00	0.00	0.00	0.74	3.69	0.00	3.69	3.69	-3.69
0+010.00	0.00	0.00	0.00	0.74	3.70	0.00	7.39	7.39	-7.39
0+015.00	0.00	0.00	0.00	0.75	3.72	0.00	11.11	11.11	-11.11
0+020.00	0.00	0.00	0.00	0.72	3.66	0.00	14.77	14.77	-14.77
0+025.00	0.00	0.00	0.00	0.72	3.59	0.00	18.37	18.37	-18.37
0+030.00	0.00	0.00	0.00	0.71	3.57	0.00	21.93	21.93	-21.93
0+035.00	0.00	0.00	0.00	0.71	3.56	0.00	25.49	25.49	-25.49
0+040.00	0.00	0.00	0.00	0.72	3.59	0.00	29.08	29.08	-29.08
0+045.00	0.00	0.00	0.00	0.74	3.65	0.00	32.73	32.73	-32.73
0+050.00	0.00	0.00	0.00	0.75	3.71	0.00	36.44	36.44	-36.44
0+055.00	0.00	0.00	0.00	0.75	3.74	0.00	40.18	40.18	-40.18
0+060.00	0.00	0.00	0.00	0.75	3.75	0.00	43.93	43.93	-43.93
0+065.00	0.00	0.00	0.00	0.75	3.75	0.00	47.68	47.68	-47.68
0+070.00	0.00	0.00	0.00	0.73	3.70	0.00	51.38	51.38	-51.38
0+075.00	0.00	0.00	0.00	0.70	3.59	0.00	54.97	54.97	-54.97
0+080.00	0.00	0.00	0.00	0.52	3.06	0.00	58.03	58.03	-58.03
0+085.00	0.00	0.00	0.00	0.73	3.13	0.00	61.16	61.16	-61.16
0+090.00	0.00	0.00	0.00	0.75	3.70	0.00	64.87	64.87	-64.87
0+095.00	0.00	0.00	0.00	0.75	3.75	0.00	68.62	68.62	-68.62
0+100.00	0.00	0.00	0.00	0.75	3.75	0.00	72.37	72.37	-72.37
0+105.00	0.00	0.00	0.00	0.75	3.75	0.00	76.12	76.12	-76.12
0+110.00	0.00	0.00	0.00	0.75	3.75	0.00	79.87	79.87	-79.87
0+115.00	0.00	0.00	0.00	0.75	3.75	0.00	83.62	83.62	-83.62
0+120.00	0.00	0.00	0.00	0.75	3.75	0.00	87.36	87.36	-87.36
0+125.00	0.00	0.00	0.00	0.75	3.74	0.00	91.10	91.10	-91.10
0+130.00	0.00	0.00	0.00	0.75	3.73	0.00	94.84	94.84	-94.84
0+135.00	0.00	0.00	0.00	0.75	3.73	0.00	98.56	98.56	-98.56
0+140.00	0.00	0.00	0.00	0.74	3.72	0.00	102.28	102.28	-102.28
0+145.00	0.00	0.00	0.00	0.74	3.71	0.00	105.99	105.99	-105.99
0+150.00	0.00	0.00	0.00	0.75	3.72	0.00	109.71	109.71	-109.71
0+155.00	0.00	0.00	0.00	0.75	3.73	0.00	113.44	113.44	-113.44
0+160.00	0.00	0.00	0.00	0.75	3.74	0.00	117.18	117.18	-117.18
0+165.00	0.00	0.00	0.00	0.75	3.74	0.00	120.92	120.92	-120.92
0+170.00	0.00	0.00	0.00	0.75	3.74	0.00	124.66	124.66	-124.66
0+175.00	0.00	0.00	0.00	0.75	3.73	0.00	128.39	128.39	-128.39
0+180.00	0.00	0.00	0.00	0.80	3.87	0.00	132.26	132.26	-132.26
0+185.00	0.00	0.00	0.00	0.83	4.08	0.00	136.34	136.34	-136.34
0+190.00	0.00	0.00	0.00	0.75	3.95	0.00	140.29	140.29	-140.29
0+195.00	0.00	0.00	0.00	0.74	3.72	0.00	144.01	144.01	-144.01
0+200.00	0.00	0.00	0.00	0.74	3.71	0.00	147.72	147.72	-147.72
0+205.00	0.00	0.00	0.00	0.74	3.71	0.00	151.42	151.42	-151.42
0+210.00	0.00	0.00	0.00	0.75	3.73	0.00	155.15	155.15	-155.15
0+215.00	0.00	0.00	0.00	0.75	3.73	0.00	158.88	158.88	-158.88
0+220.00	0.00	0.00	0.00	0.73	3.69	0.00	162.57	162.57	-162.57

0+225.00	0.00	0.00	0.00	0.74	3.67	0.00	166.23	166.23	-166.23
0+225.75	0.00	0.00	0.00	0.74	0.56	0.00	166.79	166.79	-166.79

1422

Volume Report

Client:
Client
Client Company
Address 1
Date: 8/07/2026 1:18:20 p. m.

Prepared by:
Preparer
Your Company Name
123 Main Street

Aignment: ALINEAMIENTO
Sample Line Group: SAMPLEADO
Start Sta: 0+000.00
End Sta: 0+225.75

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Reusable Volume (Cu.M.)	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)	Cum. Reusable Vol. (Cu.M.)	Cum. Fill Vol. (Cu.M.)	Cum. Net Vol. (Cu.M.)
0+000.00	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+005.00	1.41	7.07	7.07	0.00	0.00	7.07	0.00	0.00	7.07
0+010.00	1.43	7.10	7.10	0.00	0.00	14.17	0.00	0.00	14.17
0+015.00	1.45	7.21	7.21	0.00	0.00	21.39	0.00	0.00	21.39
0+020.00	1.40	7.13	7.13	0.00	0.00	28.52	0.00	0.00	28.52
0+025.00	1.38	6.96	6.96	0.00	0.00	35.48	0.00	0.00	35.48
0+030.00	1.36	6.86	6.86	0.00	0.00	42.33	0.00	0.00	42.33
0+035.00	1.39	6.87	6.87	0.00	0.00	49.21	0.00	0.00	49.21
0+040.00	1.43	7.04	7.04	0.00	0.00	56.25	0.00	0.00	56.25
0+045.00	1.47	7.24	7.24	0.00	0.00	63.49	0.00	0.00	63.49
0+050.00	1.47	7.35	7.35	0.00	0.00	70.84	0.00	0.00	70.84
0+055.00	1.47	7.36	7.36	0.00	0.00	78.20	0.00	0.00	78.20
0+060.00	1.47	7.34	7.34	0.00	0.00	85.54	0.00	0.00	85.54
0+065.00	1.46	7.31	7.31	0.00	0.00	92.85	0.00	0.00	92.85
0+070.00	1.42	7.19	7.19	0.00	0.00	100.04	0.00	0.00	100.04
0+075.00	1.35	6.92	6.92	0.00	0.00	106.96	0.00	0.00	106.96
0+080.00	1.27	6.56	6.56	0.00	0.00	113.52	0.00	0.00	113.52
0+085.00	1.44	6.79	6.79	0.00	0.00	120.31	0.00	0.00	120.31
0+090.00	1.45	7.24	7.24	0.00	0.00	127.55	0.00	0.00	127.55
0+095.00	1.45	7.25	7.25	0.00	0.00	134.80	0.00	0.00	134.80
0+100.00	1.45	7.24	7.24	0.00	0.00	142.03	0.00	0.00	142.03
0+105.00	1.45	7.23	7.23	0.00	0.00	149.26	0.00	0.00	149.26
0+110.00	1.45	7.23	7.23	0.00	0.00	156.49	0.00	0.00	156.49
0+115.00	1.45	7.23	7.23	0.00	0.00	163.72	0.00	0.00	163.72
0+120.00	1.45	7.23	7.23	0.00	0.00	170.95	0.00	0.00	170.95
0+125.00	1.45	7.24	7.24	0.00	0.00	178.19	0.00	0.00	178.19
0+130.00	1.46	7.28	7.28	0.00	0.00	185.47	0.00	0.00	185.47
0+135.00	1.47	7.32	7.32	0.00	0.00	192.79	0.00	0.00	192.79
0+140.00	1.45	7.29	7.29	0.00	0.00	200.08	0.00	0.00	200.08
0+145.00	1.43	7.19	7.19	0.00	0.00	207.26	0.00	0.00	207.26
0+150.00	1.42	7.13	7.13	0.00	0.00	214.39	0.00	0.00	214.39
0+155.00	1.43	7.13	7.13	0.00	0.00	221.52	0.00	0.00	221.52
0+160.00	1.43	7.16	7.16	0.00	0.00	228.68	0.00	0.00	228.68
0+165.00	1.44	7.18	7.18	0.00	0.00	235.86	0.00	0.00	235.86
0+170.00	1.44	7.19	7.19	0.00	0.00	243.05	0.00	0.00	243.05
0+175.00	1.46	7.24	7.24	0.00	0.00	250.29	0.00	0.00	250.29
0+180.00	1.41	7.17	7.17	0.00	0.00	257.46	0.00	0.00	257.46
0+185.00	1.55	7.41	7.41	0.00	0.00	264.87	0.00	0.00	264.87
0+190.00	1.47	7.57	7.57	0.00	0.00	272.44	0.00	0.00	272.44
0+195.00	1.46	7.33	7.33	0.00	0.00	279.77	0.00	0.00	279.77
0+200.00	1.45	7.26	7.26	0.00	0.00	287.03	0.00	0.00	287.03
0+205.00	1.47	7.29	7.29	0.00	0.00	294.33	0.00	0.00	294.33
0+210.00	1.51	7.45	7.45	0.00	0.00	301.78	0.00	0.00	301.78
0+215.00	1.51	7.55	7.55	0.00	0.00	309.33	0.00	0.00	309.33
0+220.00	1.44	7.38	7.38	0.00	0.00	316.71	0.00	0.00	316.71

0+225.00	1.49	7.32	7.32	0.00	0.00	324.03	0.00	0.00	324.03
0+225.75	1.50	1.12	1.12	0.00	0.00	325.15	0.00	0.00	325.15

1123

Volume Report

Client:
Client
Client Company
Address 1
Date: 8/07/2026 2:20:23 p. m.

Prepared by:
Preparer
Your Company Name
123 Main Street

Aignment: ALINEAMIENTO
Sample Line Group: SAMPLEADO
Start Sta: 0+000.00
End Sta: 0+225.75

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Reusable Volume (Cu.M.)	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)	Cum. Reusable Vol. (Cu.M.)	Cum. Fill Vol. (Cu.M.)	Cum. Net Vol. (Cu.M.)
0+000.00	0.00	0.00	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+005.00	0.00	0.00	0.00	0.67	3.39	0.00	3.39	3.39	-3.39
0+010.00	0.00	0.00	0.00	0.70	3.42	0.00	6.81	6.81	-6.81
0+015.00	0.00	0.00	0.00	0.71	3.52	0.00	10.33	10.33	-10.33
0+020.00	0.00	0.00	0.00	0.68	3.48	0.00	13.81	13.81	-13.81
0+025.00	0.00	0.00	0.00	0.67	3.37	0.00	17.18	17.18	-17.18
0+030.00	0.00	0.00	0.00	0.65	3.29	0.00	20.47	20.47	-20.47
0+035.00	0.00	0.00	0.00	0.68	3.31	0.00	23.79	23.79	-23.79
0+040.00	0.00	0.00	0.00	0.71	3.46	0.00	27.24	27.24	-27.24
0+045.00	0.00	0.00	0.00	0.73	3.58	0.00	30.83	30.83	-30.83
0+050.00	0.00	0.00	0.00	0.73	3.64	0.00	34.46	34.46	-34.46
0+055.00	0.00	0.00	0.00	0.72	3.62	0.00	38.08	38.08	-38.08
0+060.00	0.00	0.00	0.00	0.72	3.59	0.00	41.68	41.68	-41.68
0+065.00	0.00	0.00	0.00	0.71	3.56	0.00	45.24	45.24	-45.24
0+070.00	0.00	0.00	0.00	0.69	3.49	0.00	48.73	48.73	-48.73
0+075.00	0.00	0.00	0.00	0.65	3.34	0.00	52.06	52.06	-52.06
0+080.00	0.00	0.00	0.00	1.06	4.28	0.00	56.35	56.35	-56.35
0+085.00	0.00	0.00	0.00	0.71	4.44	0.00	60.79	60.79	-60.79
0+090.00	0.00	0.00	0.00	0.70	3.53	0.00	64.32	64.32	-64.32
0+095.00	0.00	0.00	0.00	0.70	3.50	0.00	67.82	67.82	-67.82
0+100.00	0.00	0.00	0.00	0.70	3.49	0.00	71.30	71.30	-71.30
0+105.00	0.00	0.00	0.00	0.70	3.48	0.00	74.78	74.78	-74.78
0+110.00	0.00	0.00	0.00	0.70	3.48	0.00	78.26	78.26	-78.26
0+115.00	0.00	0.00	0.00	0.70	3.48	0.00	81.75	81.75	-81.75
0+120.00	0.00	0.00	0.00	0.70	3.48	0.00	85.23	85.23	-85.23
0+125.00	0.00	0.00	0.00	0.70	3.50	0.00	88.73	88.73	-88.73
0+130.00	0.00	0.00	0.00	0.71	3.54	0.00	92.27	92.27	-92.27
0+135.00	0.00	0.00	0.00	0.72	3.59	0.00	95.86	95.86	-95.86
0+140.00	0.00	0.00	0.00	0.70	3.57	0.00	99.43	99.43	-99.43
0+145.00	0.00	0.00	0.00	0.69	3.48	0.00	102.91	102.91	-102.91
0+150.00	0.00	0.00	0.00	0.68	3.41	0.00	106.32	106.32	-106.32
0+155.00	0.00	0.00	0.00	0.68	3.40	0.00	109.72	109.72	-109.72
0+160.00	0.00	0.00	0.00	0.69	3.42	0.00	113.13	113.13	-113.13
0+165.00	0.00	0.00	0.00	0.69	3.44	0.00	116.57	116.57	-116.57
0+170.00	0.00	0.00	0.00	0.69	3.46	0.00	120.03	120.03	-120.03
0+175.00	0.00	0.00	0.00	0.71	3.50	0.00	123.54	123.54	-123.54
0+180.00	0.00	0.00	0.00	0.61	3.31	0.00	126.84	126.84	-126.84
0+185.00	0.00	0.00	0.00	0.70	3.30	0.00	130.14	130.14	-130.14
0+190.00	0.00	0.00	0.00	0.73	3.58	0.00	133.72	133.72	-133.72
0+195.00	0.00	0.00	0.00	0.71	3.61	0.00	137.32	137.32	-137.32
0+200.00	0.00	0.00	0.00	0.71	3.55	0.00	140.88	140.88	-140.88
0+205.00	0.00	0.00	0.00	0.73	3.59	0.00	144.46	144.46	-144.46
0+210.00	0.00	0.00	0.00	0.76	3.73	0.00	148.19	148.19	-148.19
0+215.00	0.00	0.00	0.00	0.76	3.82	0.00	152.01	152.01	-152.01
0+220.00	0.00	0.00	0.00	0.71	3.69	0.00	155.70	155.70	-155.70

0+225.00	0.00	0.00	0.00	0.75	3.66	0.00	159.36	159.36	-159.36
0+225.75	0.00	0.00	0.00	0.76	0.57	0.00	159.93	159.93	-159.93

INFORME DE SUPERVISIÓN ACTA PARCIAL No.01 CONTRATO DE OBRA 001 DE 2026 DEL 12 DE FEBRERO DE 2026 - LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA LP-007-2025

CONTRATO No:	001 DE 2026 DEL 12 DE FEBRERO DE 2026 - LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA LP-007-2025
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE RIOBLANCO TOLIMA
NIT:	890702040-7
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR:	IVAN MAURICIO PENAGOS ANDRADE
CARGO DEL SUPERVISOR:	SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
OBJETO:	"MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN CON PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE EN VARIOS PUNTOS CRÍTICOS DISPERSOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO, TOLIMA."
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL PROINGENIERIA RIO BLANCO 2025
NIT.	902.031.674-9
REPRESENTANTE LEGAL:	GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ CHAVARRO
CEDULA:	93.128.151 de Espinal Tolima
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER TERCIARIAS RIOBLANCO 2026
NIT:	902.044.775-0
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMAN
CEDULA:	1.110.510.653 de Ibagué
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	DIECISÉIS MIL TRECE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($16.013.896.392,00) M/CTE
PLAZO INICIAL:	El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de OCHO (08) MESES, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución, es decir, contado a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.
FECHA DE INICIO:	25 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	10 DE JULIO DE 2026

1. INTRODUCCIÓN.

El presente informe del **ACTA PARCIAL No.01**, contiene la ejecución física y financiera del **CONTRATO DE OBRA 001 DE 2026 DEL 12 DE FEBRERO DE 2026**, la cual tiene por objeto **"MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN CON PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE EN VARIOS PUNTOS CRÍTICOS DISPERSOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO, TOLIMA"**,

desarrollado en la zona rural del Municipio de Rioblanco - Tolima. Este informe corresponde al periodo del 25 DE FEBRERO DE 2026 al 10 DE JULIO DE 2026.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO.

LOCALIZACIÓN:

El proyecto se localiza en la zona rural del municipio de Rioblanco, departamento del Tolima, sobre corredores viales terciarios distribuidos en veredas como Quebradón, Porvenir, Altagracia, La Uribe, Mesa Palmichal, La Italia y Chele, entre otras, contemplando la intervención de 5,34 kilómetros mediante la construcción de placa huella y 55 alcantarillas en puntos críticos identificados en la consultoría previa.



Fuente 1: Wikipedia, Google Earth.

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO:

ANTECEDENTES:

- Que el día doce (12) de febrero de 2026 se suscribió el CONTRATO 001 DE 2026 entre el MUNICIPIO DE RIOBLANCO y UNION TEMPORAL PROINGENIERIA RIO BLANCO 2025.
- Que el día veinticinco (25) de febrero de 2026 se suscribió el ACTA DE INICIO, previa verificación y cumplimiento de los requisitos de ejecución y legalización del contrato, así como la acreditación del pago de seguridad social integral y aportes parafiscales, cuando a ello hubiere lugar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FINANCIERAS DE LA PRESENTE ACTA.

ANEXO: ACTA PARCIAL No.01.

3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:

Para el presente proceso se utilizó el **CONTRATO DE OBRA 001 DE 2026 DEL 12 DE FEBRERO DE 2026**, derivado de la **Licitación de Obra Pública LP-007-2025,** de acuerdo con lo establecido en la ley de contratación estatal.

INFORMACIÓN FINANCIERA:

Estado financiero y económico del contrato.

BALANCE DEL CONTRATO		
Valor inicial del Contrato	$16.013.896.392,00	
Valor del pago anticipado (40%)		$6.405.558.556,80
Valor presente Acta Parcial No.01 menos amortización		$927.044.968,80
Saldo por ejecutar		$8.681.292.866,40
Porcentaje de ejecución ACUMULADO		9,65%
SUMAS IGUALES	**$16.013.896.392,00**	**$16.013.896.392,00**

BALANCE DEL PAGO ANTICIPADO			**BALANCE DEL CONTRATO**		
Valor del pago anticipado	$6.405.558.556,80	40.00%	Valor inicial del Contrato	$16.013.896.392,00	
Valor amortizado presente Acta	$618.029.979,20		Valor del pago anticipado		$6.405.558.556,80

LP 007-2025


Saldo por amortizar	$5.787.528.577,60		Valor presente Acta Parcial No.01 menos amortización		$927.044.968,80
			Saldo por ejecutar		$8.681.292.866,40
SUMAS IGUALES	**$6.405.558.556,80**	**$6.405.558.556,80**	**SUMAS IGUALES**	**$16.013.896.392,00**	**$16.013.896.392,00**

4. ANEXOS.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:

Se anexa el respectivo registro fotográfico de las actividades realizadas por parte del contratista.

1.1 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS

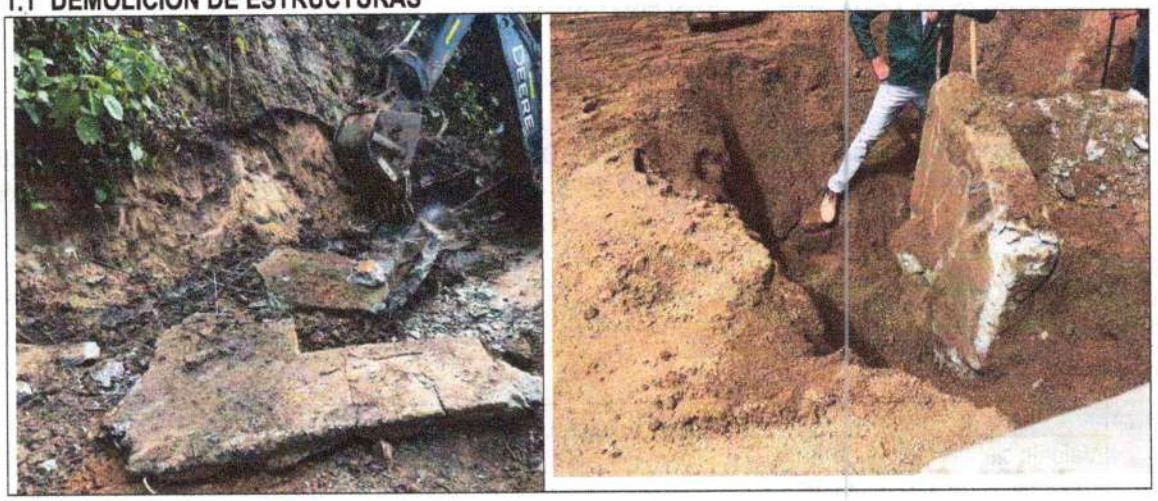

1.2 EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR



1.3 RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO



1.4 CONCRETO RESISTENCIA 21MPA MEZCLADO EN SITIO



1.5 CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA MEZCLADO EN SITIO



1.6 ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA




1.7 TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO 21 MPA DE 900 MM DE DIÁMETRO INTERIOR



2.1 EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR



2.2 SUBBASE GRANULAR CLASE C

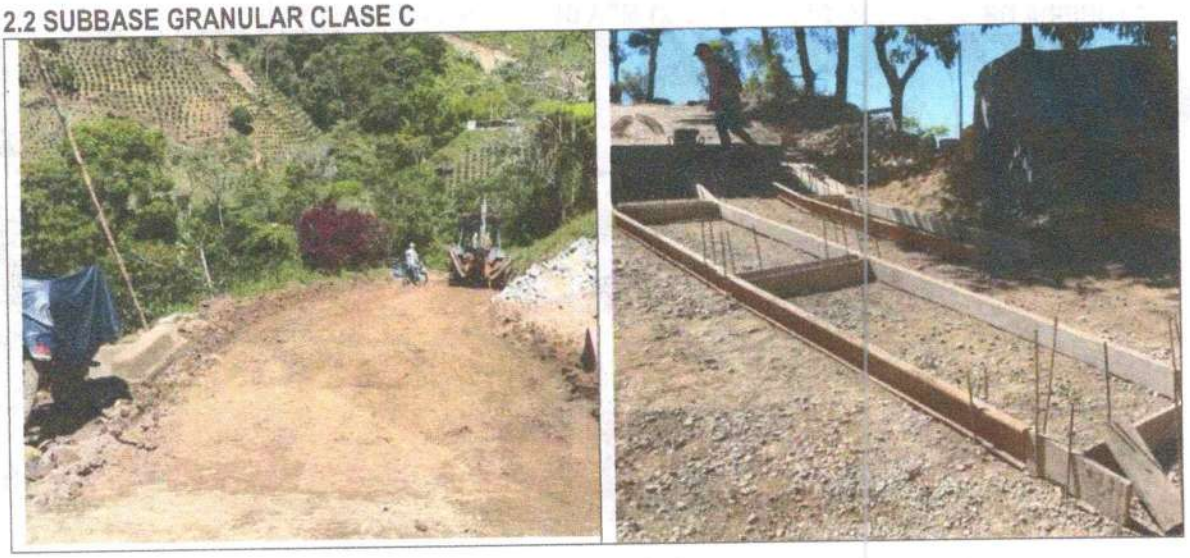

2.3 CONCRETO RESISTENCIA 21MPA MEZCLADO EN SITIO



2.4 CONCRETO CICLÓPEO (CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (D) 60% CONCRETO - 40% AGREGADO CICLÓPEO)



2.5 MATERIAL EN AFIRMADO PARA MEJORAMIENTO, RENIVELACIÓN Y LLENOS DE SUBRASANTE



2.6 ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA





Cómo se observa en las imágenes, las actividades se han ejecutaron con éxito, cumpliendo lo especificado en el contrato de contrato de obra 001 DE 2026 DEL 12 DE FEBRERO DE 2026.

Iván Mauricio Penagos A

ING. IVAN MAURICIO PENAGOS ANDRADE
Subsecretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor del Contrato de Obra

PROCESO	NOMBRE	CARGO	FECHA	FIRMA
Proyecto y Elaboro	IVAN MAURICIO PENAGOS ANDRADE	SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA	10/07/2026	

ACTA PARCIAL N.01 AL CONTRATO DE OBRA No. 001 DE 2026 DEL 12 DE FEBRERO DE 2026 - LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA LP-007-2025

CONTRATO No:	001 DE 2026 DEL 12 DE FEBRERO DE 2026 - LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA LP-007-2025
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE RIOBLANCO TOLIMA
NIT:	890702040-7
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR:	IVAN MAURICIO PENAGOS ANDRADE
CARGO DEL SUPERVISOR:	SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
OBJETO:	"MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN CON PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE EN VARIOS PUNTOS CRÍTICOS DISPERSOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO, TOLIMA."
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL PROINGENIERIA RIO BLANCO 2025
NIT.	902.031.674-9
REPRESENTANTE LEGAL:	GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ CHAVARRO
CEDULA:	93.128.151 de Espinal Tolima
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER TERCIARIAS RIOBLANCO 2026
NIT:	902.044.775-0
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMAN
CEDULA:	1.110.510.653 de Ibagué
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	DIECISÉIS MIL TRECE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($16.013.896.392,00) M/CTE
PLAZO INICIAL:	El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de OCHO (08) MESES, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución, es decir, contado a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.
FECHA DE INICIO:	25 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	10 DE JULIO DE 2026

En las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Rioblanco, a los diez (10) días del mes de julio de 2026, se reunieron la **UNION TEMPORAL PROINGENIERIA RIO BLANCO 2025** con Nit No. 902.031.674-9, representado legalmente por **GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ CHAVARRO**, identificado con cédula de ciudadanía No. **93.128.151** de Espinal Tolima, en calidad de CONTRATISTA; y el **CONSORCIO INTER TERCIARIAS RIOBLANCO 2026** con Nit. **902.044.775-0**, representado legalmente por **MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMAN**, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.110.510.653** de Ibagué, en calidad de

INTERVENTOR, con el fin de suscribir la presente **ACTA PARCIAL N.01** del Contrato de obra **001 DE 2026 DEL 12 DE FEBRERO DE 2026**, en los siguientes términos:

En calidad de interventor certifico que las actividades realizadas por la **UNION TEMPORAL PROINGENIERIA RIO BLANCO 2025** en el marco del contrato de obra **001 DE 2026 DEL 12 DE FEBRERO DE 2026**, cuyo objeto contractual "**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN CON PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE EN VARIOS PUNTOS CRÍTICOS DISPERSOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO, TOLIMA**", se ejecutaron conforme a lo establecido en el contrato y sus anexos, que hacen parte integral del mismo. Por esta razón, se procede a autorizar el pago del **ACTA PARCIAL N.01** por un valor ejecutado de **MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($1.545.074.948,00 M/CTE)**, del cual se amortiza el 40% equivalente a **SEISCIENTOS DIECIOCHO MILLONES VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE ($618.029.979,20 M/CTE)** por concepto del pago anticipado, resultando un SALDO NETO A GIRAR de **NOVECIENTOS VEINTISIETE MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE ($927.044.968,80 M/CTE).**

BALANCE FINANCIERO.

Estado financiero y económico del contrato.

BALANCE DEL CONTRATO		
Valor inicial del Contrato	$16.013.896.392,00	
Valor del pago anticipado (40%)		$6.405.558.556,80
Valor presente Acta Parcial No.01 menos amortización		$927.044.968,80
Saldo por ejecutar		$8.681.292.866,40
Porcentaje de ejecución ACUMULADO		9,65%
SUMAS IGUALES	**$16.013.896.392,00**	**$16.013.896.392,00**

BALANCE DEL PAGO ANTICIPADO			**BALANCE DEL CONTRATO**		
Valor del pago anticipado	$6.405.558.556,80	40.00%	Valor inicial del Contrato	$16.013.896.392,00	
Valor amortizado presente Acta	$618.029.979,20		Valor del pago anticipado		$6.405.558.556,80
Saldo por amortizar	$5.787.528.577,60		Valor presente Acta Parcial No.01 menos amortización		$927.044.968,80
			Saldo por ejecutar		$8.681.292.866,40
SUMAS IGUALES	**$6.405.558.556,80**	**$6.405.558.556,80**	**SUMAS IGUALES**	**$16.013.896.392,00**	**$16.013.896.392,00**

El contratista se encuentra al día en el pago de seguridad social, para lo cual anexan planillas y certificado del contador.

BALANCE TÉCNICO.

De acuerdo con los informes de ejecución de obra del CONTRATISTA y el objeto contractual, el contratista cumplió con las siguientes obligaciones:

Realizó la ejecución del avance de obra referente a **"MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN CON PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE EN VARIOS PUNTOS CRÍTICOS DISPERSOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO, TOLIMA"** correspondiente al **CONTRATO DE OBRA 001 DE 2026 DEL 12 DE FEBRERO DE 2026**, conforme a las cantidades, precios, condiciones y requisitos consignados en la propuesta escogida, la cual se anexa a este contrato y hace parte integral del mismo.

También se deja constancia del cumplimiento de los deberes del contratista de la siguiente manera:

a. Atendió todos los requerimientos del Municipio respecto al servicio contratado.
b. Actuó con eficacia y responsabilidad en la ejecución de las actividades objeto del contrato y conexas al mismo.
c. Rindió oportunamente los informes sobre la ejecución y el estado del contrato según lo solicitado por el Municipio por conducto del supervisor y acató las instrucciones e indicaciones que le impartieron.
d. Deja constancia que no sufrió presiones o amenazas de ningún tipo.
e. Se recibe la documentación para el acta parcial con sus respectivos anexos avalada contratista de interventoría.

Se deja constancia del cumplimiento de los deberes del Municipio de la siguiente manera:

a. El Municipio controló la calidad de los servicios contratados y el cumplimiento de los requisitos y condiciones acordadas.

La entidad pagará al contratista, a título de pago anticipado, un valor equivalente al 40% del valor básico del contrato, y el Cincuenta y Cinco por ciento (55%) restante del valor del contrato de acuerdo con los avances de obra en igual porcentaje del valor del cobro efectuado por el contratista de obra, y un pago final equivalente al Cinco por ciento (5%) del valor del contrato que se pagará al momento de la suscripción del acta de recibo final y de liquidación y el lleno de requisitos exigidos por la entidad; los pagos se efectuarán de conformidad con los requerimientos hechos por el supervisor del contrato cuyo objeto es **"MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN CON PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE EN VARIOS PUNTOS CRÍTICOS DISPERSOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO, TOLIMA".** Para los pagos que el Municipio de Rioblanco haga al contratista, se verificará previamente el cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. La obtención de certificación de cumplimiento de las entregas por parte del supervisor. 2. La constancia de pago de los aportes a seguridad social (salud, pensión, riesgos profesionales), y de las obligaciones parafiscales (SENA, ICBF, Caja de Compensación Familiar). 3. La radicación de la factura o cuenta

de cobro, con todos los anexos anteriores. El Municipio de Rioblanco solo adquiere obligaciones con el proponente favorecido en el presente proceso de selección y bajo ningún motivo o circunstancia efectuará pagos a terceros.

Que, a la fecha de la presente, considero procedente en calidad de interventor del **CONTRATO DE OBRA 001 DE 2026 DEL 12 DE FEBRERO DE 2026,** autorizar el pago del **ACTA PARCIAL N.01** por un valor ejecutado de **MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($1.545.074.948,00 M/CTE)**, del cual se amortiza **SEISCIENTOS DIECIOCHO MILLONES VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE ($618.029.979,20 M/CTE)**correspondiente al 40% del pago anticipado, resultando un saldo neto a girar de **NOVECIENTOS VEINTISIETE MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE ($927.044.968,80 M/CTE).**, al **UNION TEMPORAL PROINGENIERIA RIO BLANCO 2025** con Nit No. **902.031.674-9**, representado legalmente por **GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ CHAVARRO**, identificado con cédula de ciudadanía No. **93.128.151** de Espinal Tolima, en calidad de **CONTRATISTA**.

La presente acta se suscribe a los diez (10) días del mes de julio de 2026.

POR LA INTERVENTORÍA	CONTRATISTA
MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMAN	GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ CHAVARRO
R.L. CONSORCIO INTER TERCIARIAS RIOBLANCO 2026	R/Legal UNION TEMPORAL PROINGENIERIA RIO BLANCO 2025

PROCESO	NOMBRE	CARGO	FECHA	FIRMA
Proyecto y Elaboro	IVAN MAURICIO PENAGOS ANDRADE	SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA	10/07/2026	

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DE RIOBLANCO TOLIMA

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO No.01

AL CONTRATO DE OBRA No. 001 DE 2026 DEL 12 DE FEBRERO DE 2026 LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA LP-007-2025

CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO Y UNION TEMPORAL PROINGENIERIA RIO BLANCO 2025 con NIT. 902.031.674-9, Representante legal GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ CHAVARRO, identificado con cédula de ciudadanía No. 93.128.151 de Espinal Tolima, Cuyo Objeto es: **"MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN CON PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE EN VARIOS PUNTOS CRÍTICOS DISPERSOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO, TOLIMA."**

MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMAN
R.L. CONSORCIO INTER TERCIARIAS RIOBLANCO 2026

GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ CHAVARRO
R.L UNION TEMPORAL PROINGENIERIA RIO BLANCO 2025

RIOBLANCO, 10 DE JULIO DE 2026

1. INTRODUCCIÓN.

La Administración Municipal de Rioblanco, Tolima, en cumplimiento de los principios consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política y demás normas concordantes, orienta su gestión al servicio de la comunidad, garantizando la efectividad de los derechos y el cumplimiento de los fines esenciales del Estado. El artículo 2 de la Constitución Política de Colombia establece que: "*Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares*".

En concordancia, el artículo 311 de la Constitución Política de Colombia dispone: *"Al Municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la constitución y las leyes".* Así mismo, el artículo 365 establece: *"Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y que es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional".*

En desarrollo de estos mandatos, la Ley 136 de 1994 asigna a los municipios la competencia de construir y mantener la red vial urbana y rural y procurar la solución de las necesidades básicas insatisfechas. A su vez, el artículo 3 de la Ley 80 de 1993 *"Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública*", establece que la contratación estatal debe orientarse al cumplimiento de los fines estatales y a la eficiente prestación de los servicios públicos.

En el marco del Plan de Desarrollo Municipal "JUNTOS LOS HAREMOS REALIDAD 2024-2027", programa "Vía terciaria mejorada", se priorizó el mejoramiento de la conectividad rural como estrategia para fortalecer el desarrollo socioeconómico y la competitividad del municipio.

Para tal efecto, el Municipio adelantó el proceso de concurso de méritos abierto No. CMA 001-2024, contrato de consultoría No. CMA 001 de 2024, cuyo objeto fue "CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS CON LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN DIFERENTES PUNTOS CRITICOS DISPERSOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO TOLIMA", ejecutado por el CONSORCIO DISEÑOS RIOBLANCO identificado con Nit. 901.817.344-4.

De acuerdo con los resultados técnicos obtenidos, se evidenció el grave deterioro de la red vial terciaria rural, caracterizada por vías en afirmado sin pavimentar, afectadas por lluvias intensas, erosión, deslizamientos y mantenimiento insuficiente, lo que genera dificultades de movilidad,

incremento en los tiempos de desplazamiento, mayores costos de transporte, afectación a la comercialización de productos agrícolas, limitaciones en el acceso a servicios de salud y educación, y aumento del riesgo de accidentes.

Como solución técnica viable y prioritaria, se determinó el mejoramiento mediante pavimentación con placa huella y la construcción de obras de drenaje (alcantarillas), alternativa que garantiza estabilidad estructural, adecuada evacuación de aguas lluvias, mayor durabilidad, sostenibilidad y reducción del impacto ambiental, contribuyendo significativamente a la conectividad y al desarrollo rural.

Para la financiación del proyecto, la Administración Municipal postuló la iniciativa ante la OCAD PAZ, mecanismo del Sistema General de Regalías creado para viabilizar y aprobar proyectos con cargo a la asignación para la paz. Conforme a la Ley 2056 de 2020, el Sistema General de Regalías tiene como objeto *"determinar la distribución, objetivos, fines, administración, ejecución, control, el uso eficiente y la destinación de los ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables precisando las condiciones de participación de sus beneficiarios. Este conjunto de ingresos, asignaciones, órganos, procedimientos y regulaciones constituye el Sistema General de Regalías".*

El proyecto fue aprobado en sesión número 83 del OCAD Paz, determinándose su contribución al (punto "1. Reforma Rural Integral"; pilar "1.2. Infraestructura Y Adecuación De Tierras"; estrategia "2.2.1. Infraestructura vial") del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, alineándose igualmente con la Política Transversal de Paz y Postconflicto en el SUIFP-SGR, el Plan Nacional de Desarrollo "(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida", el plan de desarrollo departamental "Con seguridad en el territorio 2024-2027" y el Plan de Desarrollo Municipal "Juntos lo haremos realidad 2024-2027".

En atención a las anteriores consideraciones, la administración municipal encuentra justificada la necesidad de realizar un proceso de selección cuyo objeto será el **"MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN CON PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE EN VARIOS PUNTOS CRÍTICOS DISPERSOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO, TOLIMA"** que permita dar cumplimiento a las funciones legales atribuidas al municipio como mecanismo para su desarrollo, así como dar lugar a la ejecución de los programas y proyectos que se encuentran a cargo de la entidad de conformidad con las características, cantidades y especificaciones técnicas, las condiciones y obligaciones establecidas en el presente estudio previo y demás documentos que integran el actual proceso de selección.

ANTECEDENTES.

- Que el día doce (12) de febrero de 2026 se suscribió el CONTRATO 001 DE 2026 entre el MUNICIPIO DE RIOBLANCO y UNION TEMPORAL PROINGENIERIA RIO BLANCO 2025.
- Que el día veinticinco (25) de febrero de 2026 se suscribió el ACTA DE INICIO, previa verificación y cumplimiento de los requisitos de ejecución y legalización del contrato, así como la acreditación del pago de seguridad social integral y aportes parafiscales, cuando a ello hubiere lugar.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL.


CONTRATO No:	001 DE 2026 DEL 12 DE FEBRERO DE 2026 - LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA LP-007-2025
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE RIOBLANCO TOLIMA
NIT:	890702040-7
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR:	IVAN MAURICIO PENAGOS ANDRADE
CARGO DEL SUPERVISOR:	SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
OBJETO:	"MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN CON PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE EN VARIOS PUNTOS CRÍTICOS DISPERSOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO, TOLIMA."
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL PROINGENIERIA RIO BLANCO 2025
NIT.	902.031.674-9
REPRESENTANTE LEGAL:	GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ CHAVARRO
CEDULA:	93.128.151 de Espinal Tolima
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER TERCIARIAS RIOBLANCO 2026
NIT:	902.044.775-0
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMAN
CEDULA:	1.110.510.653 de Ibagué
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	DIECISÉIS MIL TRECE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($16.013.896.392,00) M/CTE
PLAZO INICIAL:	El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de OCHO (08) MESES, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución, es decir, contado a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.
FECHA DE INICIO:	25 DE FEBRERO DE 2026

FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	10 DE JULIO DE 2026

2. LOCALIZACIÓN.

El proyecto se localiza en la zona rural del municipio de Rioblanco, departamento del Tolima, sobre corredores viales terciarios distribuidos en veredas como Quebradón, Porvenir, Altagracia, La Uribe, Mesa Palmichal, La Italia y Chele, entre otras, contemplando la intervención de 5,34 kilómetros mediante la construcción de placa huella y 55 alcantarillas en puntos críticos identificados en la consultoría previa.



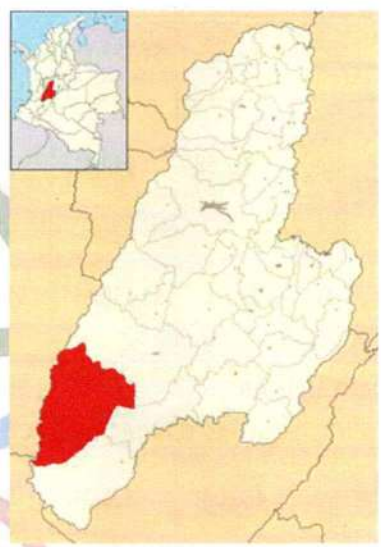

3. ACTIVIDADES REALIZADAS.

Se llevó a cabo la ejecución parcial de las actividades referentes a: MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN CON PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE EN VARIOS PUNTOS CRÍTICOS DISPERSOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO, TOLIMA.

CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FINANCIERAS DE LA PRESENTE ACTA (ACTA PARCIAL No.01)

		PRESUPUESTO CONTRACTUAL				ACTA PARCIAL 1	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR
NUCLEO 1. QUEBRADON Y GAITAN							
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA EN TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 900 MM							
1.1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	15.29	$227.954	$3.486.084	15.29	$3.486.084
1.2	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	308.23	$36.315	$11.193.371	273.42	$9.929.330
1.3	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	M3	164.55	$752.998	$123.908.794	105.81	$79.673.210
1.4	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA MEZCLADO EN SITIO	M3	97.80	$1.515.988	$148.260.463	51.88	$78.644.012
1.5	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA MEZCLADO EN SITIO	M3	12.23	$1.227.792	$15.011.596	12.23	$15.011.596
1.6	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA.	KG	7,382.58	$12.615	$93.131.220	3,301.96	$41.654.173
1.7	TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO 21 MPA DE 900 MM DE DIÁMETRO INTERIOR	M	78.00	$1.468.551	$114.546.978	41.00	$60.210.591
SUBTOTAL - ALCANTARILLAS					**$509.538.506**		**$288.608.996**
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO							
2.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	430.00	$36.315	$15.615.450	194.50	$7.063.117

2.2	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	891.41	$471.529	$420.326.845	107.34	$50.614.754
2.3	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA MEZCLADO EN SITIO	M3	707.87	$1.515.988	$1.073.123.386	92.89	$140.822.892
2.4	CONCRETO CICLÓPEO (CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (D) 60% CONCRETO - 40% AGREGADO CICLÓPEO)	M3	299.08	$977.598	$292.382.552	27.16	$26.547.651
2.5	MATERIAL EN AFIRMADO PARA MEJORAMIENTO, RENIVELACIÓN Y LLENOS DE SUBRASANTE	M3	954.70	$702.477	$670.655.021	114.35	$80.328.245
2.6	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA.	KG	32,179.57	$12.615	$405.945.230	4,392.20	$55.407.626
2.7	CORTE Y SELLO PARA JUNTAS	M	6,646.28	$19.949	$132.586.640	0.00	$0
2.8	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE PRÉSTAMOS	M3	551.73	$21.173	$11.681.779	0.00	$0
2.9	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 DIMENSIONES (75 x 75) CM CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV	U	43.00	$850.189	$36.558.127	0.00	$0
SUBTOTAL - PLACA HUELLA					**$3.058.875.030**		**$360.784.285**
SUB TOTAL OBRAS - NUCLEO 1. QUEBRADON Y GAITAN					**$3.568.413.536**		**$649.393.281**
NUCLEO 2. LA URIBE, MARACAIBO Y LA LINDOSA							
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA EN TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 900 MM							
1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	545.33	$52.695	$28.736.160	171.82	$9.054.223
1.2	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	M3	291.13	$821.459	$239.154.569	62.61	$51.433.744
1.3	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA MEZCLADO EN SITIO	M3	173.03	$1.584.450	$274.152.752	25.82	$40.906.469

1.4	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA MEZCLADO EN SITIO	M3	20.64	$1.305.207	$26.935.606	7.74	$10.105.578
1.5	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA.	KG	13,314.70	$12.644	$168.351.067	2,130.38	$26.936.550
1.6	TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO 21 MPA DE 900 MM DE DIÁMETRO INTERIOR	M	138.00	$1.501.581	$207.218.178	26.00	$39.041.106
SUBTOTAL - ALCANTARILLAS					**$944.548.332**		**$177.477.670**
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO							
2.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	950.00	$52.695	$50.060.250	869.83	$45.835.692
2.2	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	1,696.97	$505.297	$857.475.113	115.50	$58.361.804
2.3	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA MEZCLADO EN SITIO	M3	1,337.36	$1.584.450	$2.118.980.020	93.00	$147.355.434
2.4	CONCRETO CICLÓPEO (CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (D) 60% CONCRETO - 40% AGREGADO CICLÓPEO)	M3	569.59	$1.045.112	$595.284.048	35.74	$37.354.393
2.5	MATERIAL EN AFIRMADO PARA MEJORAMIENTO, RENIVELACIÓN Y LLENOS DE SUBRASANTE	M3	1,879.08	$768.305	$1.443.703.894	327.28	$251.450.860
2.6	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA.	KG	61,048.88	$12.644	$771.902.098	4,375.68	$55.326.138
2.7	CORTE Y SELLO PARA JUNTAS	M	12,657.53	$19.949	$252.505.026	0.00	$0

2.8	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE PRÉSTAMOS	M3	970.56	$37.554	$36.448.410	0.00	$0
2.9	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 DIMENSIONES (75 x 75) CM CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV	U	63.00	$851.948	$53.672.724	0.00	$0
SUBTOTAL - PLACA HUELLA					**$6.180.031.583**		**$595.684.321**
SUB TOTAL OBRAS - NUCLEO 2. LA URIBE, MARACAIBO Y LA LINDOSA					**$7.124.579.915**		**$773.161.991**
NUCLEO 3. MESA DE PALMICHAL							
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA EN TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 900 MM							
1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	118.55	$53.274	$6.315.632	0.00	$0
1.2	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	M3	63.29	$792.303	$50.144.841	0.00	$0
1.3	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA MEZCLADO EN SITIO	M3	37.61	$1.555.294	$58.501.734	0.00	$0
1.4	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA MEZCLADO EN SITIO	M3	4.49	$1.272.238	$5.707.657	0.00	$0
1.5	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA.	KG	2,894.50	$12.632	$36.563.324	0.00	$0
1.6	TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO 21 MPA DE 900 MM DE DIÁMETRO INTERIOR	M	30.00	$1.487.514	$44.625.420	0.00	$0
SUBTOTAL - ALCANTARILLAS					**$201.858.608**		**$0**
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO							
2.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	13.07	$53.274	$696.522	0.00	$0

2.2	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	289.67	$490.916	$142.204.865	0.00	$0
2.3	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA MEZCLADO EN SITIO	M3	228.58	$1.555.294	$355.512.080	0.00	$0
2.4	CONCRETO CICLÓPEO (CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (D) 60% CONCRETO - 40% AGREGADO CICLÓPEO)	M3	97.22	$1.016.360	$98.812.511	0.00	$0
2.5	MATERIAL EN AFIRMADO PARA MEJORAMIENTO, RENIVELACIÓN Y LLENOS DE SUBRASANTE	M3	238.47	$740.271	$176.532.425	0.00	$0
2.6	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA.	KG	10,427.12	$12.632	$131.715.394	0.00	$0
2.7	CORTE Y SELLO PARA JUNTAS	M	2,160.49	$19.949	$43.099.575	0.00	$0
2.8	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE PRÉSTAMOS	M3	236.52	$38.133	$9.019.217	0.00	$0
2.9	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 DIMENSIONES (75 x 75) CM CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV	U	12.00	$851.199	$10.214.388	0.00	$0
	SUBTOTAL - PLACA HUELLA				**$967.806.977**		**$0**
	SUB TOTAL OBRAS - NUCLEO 3. MESA DE PALMICHAL				**$1.169.665.585**		**$0**
	NUCLEO 4. LA ITALIA Y LA JUNTAS						
	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA EN TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 900 MM						
1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	142.26	$34.356	$4.887.484	0.00	$0

1.2	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	M3	75.95	$861.833	$65.454.472	0.00	$0
1.3	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA MEZCLADO EN SITIO	M3	45.14	$1.624.824	$73.340.491	0.00	$0
1.4	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA MEZCLADO EN SITIO	M3	5.38	$1.350.860	$7.272.456	0.00	$0
1.5	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA.	KG	3,473.40	$12.661	$43.976.717	0.00	$0
1.6	TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO 21 MPA DE 900 MM DE DIÁMETRO INTERIOR	M	36.00	$1.521.059	$54.758.124	0.00	$0
SUBTOTAL - ALCANTARILLAS					**$249.689.744**		**$0**
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO							
2.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	17.68	$34.356	$607.586	0.00	$0
2.2	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	388.91	$525.211	$204.261.123	0.00	$0
2.3	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA MEZCLADO EN SITIO	M3	310.07	$1.624.824	$503.801.541	0.00	$0
2.4	CONCRETO CICLÓPEO (CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (D) 60% CONCRETO - 40% AGREGADO CICLÓPEO)	M3	130.46	$1.084.927	$141.538.058	0.00	$0
2.5	MATERIAL EN AFIRMADO PARA MEJORAMIENTO, RENIVELACIÓN Y LLENOS DE SUBRASANTE	M3	135.34	$807.126	$109.236.433	0.00	$0

2.6	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA.	KG	14,064.99	$12.661	$178.076.775	0.00	$0
2.7	CORTE Y SELLO PARA JUNTAS	M	2,899.08	$19.949	$57.833.747	0.00	$0
2.8	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE PRÉSTAMOS	M3	259.64	$19.215	$4.988.983	0.00	$0
2.9	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 DIMENSIONES (75 x 75) CM CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV	U	20.00	$852.985	$17.059.700	0.00	$0
SUBTOTAL - PLACA HUELLA					**$1.217.403.946**		**$0**
SUB TOTAL OBRAS - NUCLEO 4. LA ITALIA Y LA JUNTAS					**$1.467.093.690**		**$0**
NUCLEO 5. CHELE Y BUENAVISTA							
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA EN TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 900 MM							
1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	189.68	$43.259	$8.205.366	116.62	$5.044.867
1.2	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	M3	101.26	$713.692	$72.271.284	45.26	$32.299.331
1.3	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA MEZCLADO EN SITIO	M3	60.18	$1.476.683	$88.871.702	18.00	$26.581.784
1.4	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA MEZCLADO EN SITIO	M3	7.18	$1.183.347	$8.494.183	6.34	$7.507.319
1.5	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA.	KG	4,631.20	$12.599	$58.348.489	1,523.57	$19.195.439

1.6	TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO 21 MPA DE 900 MM DE DIÁMETRO INTERIOR	M	48.00	$1.449.588	$69.580.224	22.00	$31.890.936
SUBTOTAL - ALCANTARILLAS					**$305.771.248**		**$122.519.676**
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO							
2.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	33.48	$43.259	$1.448.153	0.00	$0
2.2	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	744.22	$452.142	$336.491.989	0.00	$0
2.3	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA MEZCLADO EN SITIO	M3	584.52	$1.476.683	$863.148.788	0.00	$0
2.4	CONCRETO CICLÓPEO (CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (D) 60% CONCRETO - 40% AGREGADO CICLÓPEO)	M3	249.84	$938.837	$234.560.050	0.00	$0
2.5	MATERIAL EN AFIRMADO PARA MEJORAMIENTO, RENIVELACIÓN Y LLENOS DE SUBRASANTE	M3	345.35	$664.683	$229.548.274	0.00	$0
2.6	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA.	KG	26,732.24	$12.599	$336.799.491	0.00	$0
2.7	CORTE Y SELLO PARA JUNTAS	M	5,552.02	$19.949	$110.757.327	0.00	$0
2.8	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE PRÉSTAMOS	M3	914.37	$28.117	$25.709.341	0.00	$0
2.9	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 DIMENSIONES (75 x 75) CM CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV	U	30.00	$849.179	$25.475.370	0.00	$0
SUBTOTAL - PLACA HUELLA					**$2.163.938.783**		**$0**
SUB TOTAL OBRAS - NUCLEO 5. CHELE Y BUENAVISTA					**$2.469.710.031**		**$122.519.676**
SUBTOTAL DE OBRAS					**$15.799.462.757**		**$1.545.074.948**

PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL (PAGA)	$56.400.000		$0
PLAN DE MANEJO TRANSITO (PMT)	$158.033.635		$0
VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA	$16.013.896.392		$1.545.074.948

ESTADO FINANCIERO Y ECONÓMICO DEL CONTRATO:

Estado financiero y económico del contrato.

INFORMACIÓN FINANCIERA:

Estado financiero y económico del contrato.

BALANCE DEL CONTRATO		
Valor inicial del Contrato	$16.013.896.392,00	
Valor del pago anticipado (40%)		$6.405.558.556,80
Valor presente Acta Parcial No.01 menos amortización		$927.044.968,80
Saldo por ejecutar		$8.681.292.866,40
Porcentaje de ejecución ACUMULADO		9,65%
SUMAS IGUALES	**$16.013.896.392,00**	**$16.013.896.392,00**

BALANCE DEL PAGO ANTICIPADO			BALANCE DEL CONTRATO		
Valor del pago anticipado	$6.405.558.556,80	40.00%	Valor inicial del Contrato	$16.013.896.392,00	
Valor amortizado presente Acta	$618.029.979,20		Valor del pago anticipado		$6.405.558.556,80
Saldo por amortizar	$5.787.528.577,60		Valor presente Acta Parcial No.01 menos amortización		$927.044.968,80
			Saldo por ejecutar		$8.681.292.866,40
SUMAS IGUALES	**$6.405.558.556,80**	**$6.405.558.556,80**	**SUMAS IGUALES**	**$16.013.896.392,00**	**$16.013.896.392,00**

El contratista se encuentra al día en el pago de seguridad social, para lo cual anexa planillas y certificado del contador.

CERTIFICAMOS QUE EL CONTRATISTA EN MENCIÓN:

De conformidad al objeto y obligaciones contratadas, las actividades correspondientes a la presente **Acta Parcial No.01** fueron realizadas y recibidas por la Alcaldía Municipal de Rioblanco - Tolima a entera satisfacción.

Durante el plazo de ejecución del contrato, el contratista acreditó el pago de sus obligaciones frente a los sistemas de Seguridad Social, de conformidad con el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003 y demás normas complementarias.

Por lo anterior, se autoriza realizar el pago correspondiente al ACTA PARCIAL No.01 por un valor ejecutado de **MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($1.545.074.948,00 M/CTE)**, del cual se amortiza el 40% del pago anticipado equivalente a **SEISCIENTOS DIECIOCHO MILLONES VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE ($618.029.979,20 M/CTE)**, resultando un SALDO NETO A GIRAR de **NOVECIENTOS VEINTISIETE MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE ($927.044.968,80 M/CTE),**

Para constancia se firma la presente certificación, a los diez (10) días del mes de julio de 2026.

POR LA INTERVENTORÍA	CONTRATISTA
MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMAN R.L. CONSORCIO INTER TERCIARIAS RIOBLANCO 2026	GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ CHAVARRO R/Legal UNION TEMPORAL PROINGENIERIA RIO BLANCO 2025

PROCESO	NOMBRE	CARGO	FECHA	FIRMA
Proyecto y Elaboro	IVAN MAURICIO PENAGOS ANDRADE	SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA	10/07/2026	
