

Id	Modo de tarea	Nivel de esqu	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		1	**MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA EXISTENTE LA PEÑA- PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**	**289 días**	**mié 1/10/25**	**lun 31/08/26**
2		2	**Firma acta de inicio**	**289 días**	**mié 1/10/25**	**lun 31/08/26**
3		3	**ACTIVIDADES INICIALES**	**176 días**	**mié 1/10/25**	**lun 27/04/26**
4		4	VISITA DE CAMPO	15 días	mié 1/10/25	sáb 18/10/25
5		4	SUSPENCIÓN N°1	25 días	vie 14/11/25	lun 15/12/25
6		4	REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	40 días	lun 15/12/25	sáb 31/01/26
7		4	ENTREGA INFORME A INTERVENTORIA REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	30 días	vie 26/12/25	sáb 31/01/26
8		4	SOCIALIZACION PROYECTO	1 día	sáb 31/01/26	lun 2/02/26
9		4	LOCALIZACION Y REPLANTEO	60 días	lun 16/02/26	lun 27/04/26
10		3	**CAPITULO 1. ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**111 días**	**lun 23/02/26**	**mar 30/06/26**
11		4	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	70 días	lun 23/02/26	vie 15/05/26
12		4	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	100 días	vie 6/03/26	mar 30/06/26
13		4	ROCERÍA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	20 días	mar 5/05/26	mié 27/05/26
14		3	**CAPITULO 2. EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES**	**100 días**	**vie 6/03/26**	**mar 30/06/26**
15		4	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	100 días	vie 6/03/26	mar 30/06/26
16		3	**CAPITULO 3. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**	**154 días**	**lun 9/03/26**	**lun 31/08/26**
17		4	FRESADO CONCRETO ASFÁLTICO (E=5-12 cm)	1 día	lun 30/03/26	mar 31/03/26
18		4	SUBBASE GRANULAR	90 días	lun 9/03/26	sáb 20/06/26
19		4	AFIRMADO	90 días	lun 9/03/26	lun 22/06/26
20		4	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	90 días	lun 9/03/26	sáb 20/06/26
21		4	BASE GRANULAR	65 días	mié 15/04/26	jue 25/06/26
22		4	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	12 días	sáb 25/07/26	vie 7/08/26
23		4	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	29 días	mié 29/07/26	lun 31/08/26
24		3	**CAPITULO 4. OBRAS DE ARTE Y ESTRUCTURAS DE CONTENCION**	**118 días**	**vie 17/04/26**	**jue 27/08/26**
25		4	TUBERÍA DRENAJE PVC 110 FILTROS	40 días	vie 24/04/26	lun 8/06/26
26		4	CONCRETO CLASE D, f'c =4000 psi (bases) // cartilla: D f'c = 3000 psi (bases)	30 días	vie 17/04/26	jue 21/05/26
27		4	CONCRETO CLASE D, f'c =4000 psi (elevaciones) // cartilla: D f'c = 3000 psi (elevaciones)	30 días	mar 28/04/26	lun 1/06/26
28		4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (plac	1 día	vie 15/05/26	sáb 16/05/26
29		4	PILOTE EN CONCRETO DE 4000 PSI, DIÁMETRO 1.5M. CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS) // cartilla: 3000 PSI	1 día	vie 15/05/26	sáb 16/05/26
30		4	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 3000 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR // Castilla 2500 psi	24 días	vie 31/07/26	jue 27/08/26
31		4	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	24 días	vie 31/07/26	jue 27/08/26
32		4	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	45 días	vie 24/04/26	sáb 13/06/26
33		4	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	45 días	vie 24/04/26	sáb 13/06/26
34		4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	45 días	vie 24/04/26	sáb 13/06/26

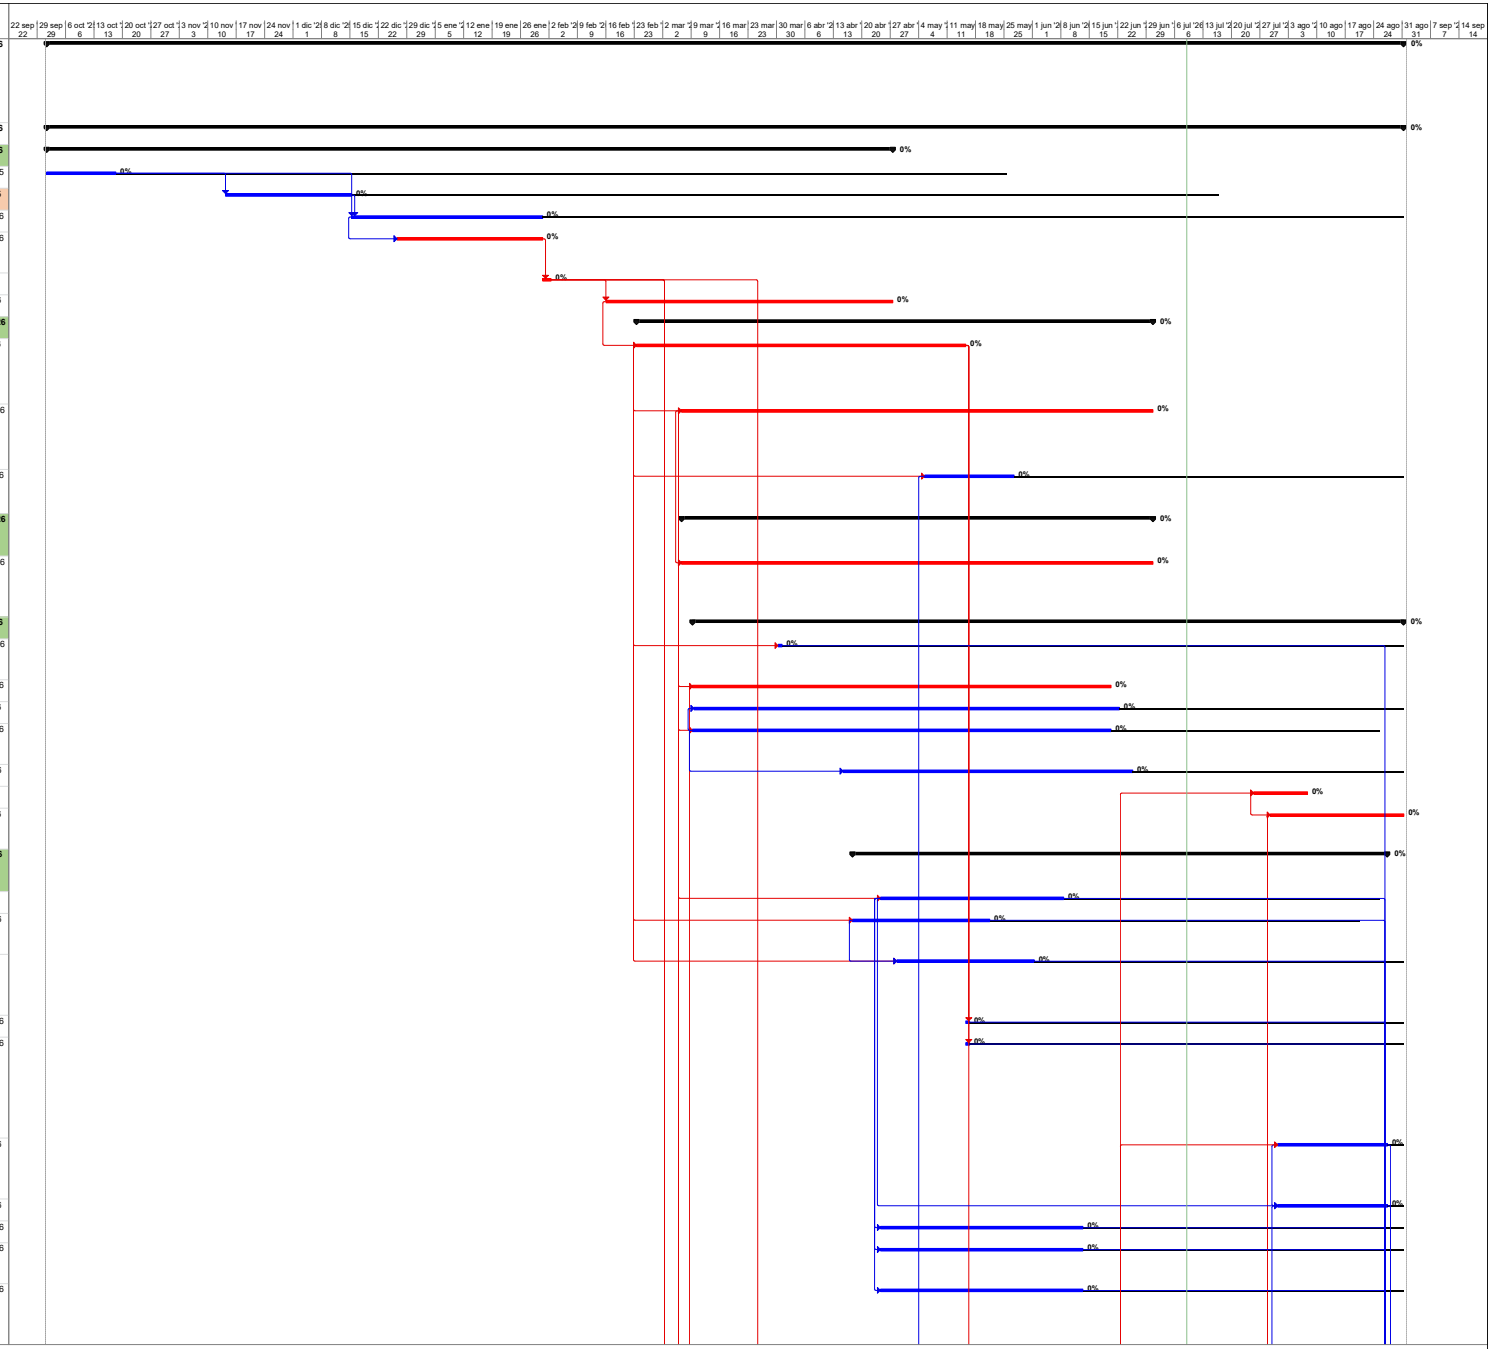

Proyecto: msproj11
Fecha: jue 9/07/26

Tarea
Progreso de tarea
División
Margen de demora
Hito
Hito de línea base
Resumen
Resumen del proyecto
Agrupar por síntesis
Tarea resumida
Tarea crítica resumida
Hito resumido
Resumen de línea base
Línea base resumida
Hito de línea base resumida
Progreso resumido
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Fecha límite
Línea base
Tarea crítica
Progreso de tarea crítica

Id	Modo de tarea	Nivel de esqu	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
35		4	DREN EN TUBERÍA PVC SANITARIA, D=4" (PUENTES)	1 día	vie 31/07/26	sáb 1/08/26
36		4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA	1 día	vie 15/05/26	sáb 16/05/26
37		4	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	55 días	vie 24/04/26	jue 25/06/26
38		4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 PSI (BASES)	40 días	vie 24/04/26	lun 8/06/26
39		4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 PSI (ELEVACIONES)	40 días	vie 24/04/26	lun 8/06/26
40		**3**	**CAPITULO 5. SEÑALIZACIÓN**	**23 días**	**sáb 1/08/26**	**jue 27/08/26**
41		4	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	15 días	jue 6/08/26	sáb 22/08/26
42		4	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	15 días	sáb 1/08/26	mar 18/08/26
43		4	TOPE DE DEFENSA METÁLICA	10 días	jue 6/08/26	lun 17/08/26
44		4	SECCIÓN FINAL DEFENSA METÁLICA	10 días	jue 6/08/26	lun 17/08/26
45		4	DEFENSA METÁLICA	10 días	jue 6/08/26	lun 17/08/26
46		4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES	10 días	jue 6/08/26	lun 17/08/26
47		4	SEÑAL VERTICAL GRUPO I 0.60x0.60M POSTE 3.5M	18 días	jue 6/08/26	mié 26/08/26
48		4	SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO I 0.75X0.75M, POSTE 3.5M	18 días	vie 7/08/26	jue 27/08/26
49		**3**	**CAPITULO 6. MANTENIMIENTO VIAL**	**20 días**	**mar 5/05/26**	**mié 27/05/26**
50		4	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	20 días	mar 5/05/26	mié 27/05/26
51		**3**	**ITEMS NO PREVISTOS**	**98 días**	**lun 20/04/26**	**jue 6/08/26**
52		4	BASE ESTABILIZADA CON EMULSION ASFALTICA TIPO BEE-1	40 días	mar 23/06/26	jue 6/08/26
53		4	GAVION MALLA PVC	40 días	lun 20/04/26	mié 3/06/26
54		**3**	**COSTOS INDIRECTOS**	**105 días**	**lun 2/03/26**	**mar 30/06/26**
55		4	AIU 37%	85 días	mié 25/03/26	mar 30/06/26
56		4	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	105 días	lun 2/03/26	mar 30/06/26
57		4	PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL	105 días	lun 2/03/26	mar 30/06/26
58		1	Fin de obra	0 días	jue 27/08/26	jue 27/08/26

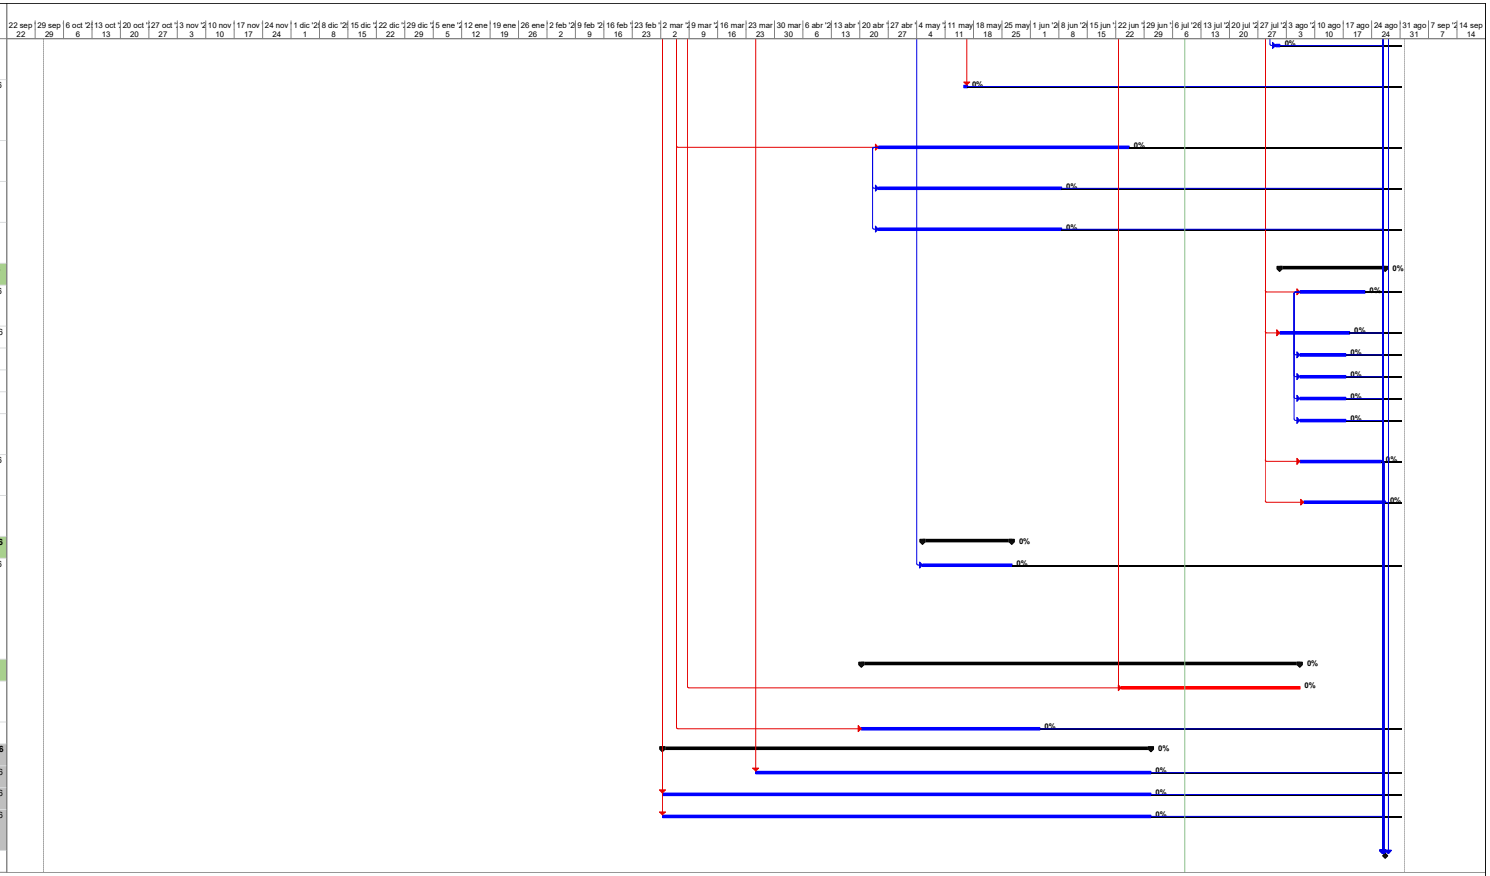

Proyecto: msproj11
Fecha: jue 9/07/26

Tarea
Progreso de tarea
División
Margen de demora
Hito
Hito de línea base
Resumen
Resumen del proyecto
Agrupar por síntesis
Tarea resumida
Tarea crítica resumida
Hito resumido
Resumen de línea base
Línea base resumida
Hito de línea base resumida
Progreso resumido
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Fecha límite
Línea base
Tarea crítica
Progreso de tarea crítica
