

Id	Modo de Tarea	ITEM	Nombre de tarea	UNIDAD	CANTIDAD	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1			CONTRATO 031 DE 2025			$ 6.079.846.263,81	402 días	jue 26/06/25	sie 18/09/26	
2			INICIO			$ 0,00	0 días	jue 26/06/25	jue 26/06/25	
3			FASE II			$ 6.079.846.263,81	385 días	mar 4/11/25	sie 28/05/26	
4		01	PRELIMINARES 0			$ 289.723.085,85	196 días	mar 4/11/25	jue 11/06/26	
5		01.01	DEMOLICIONES Y RETIROS 0			$ 60.188.524,06	183 días	mar 4/11/25	jue 28/05/26	
6		01.01.02	DEMOLICION Y RETIRO DE MUROS QUE HACEN PARTE DEL AREA CONSTRUIDA EXISTENTE, NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, LAS CUALES SERÁN REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE MANERA MANUAL Y MECÁNICA DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES EN LOS PLANOS O CONC	m2	875,07	$ 41.708.387,29	50 días	jue 1/01/26	jue 26/02/26	601FC-66 días
7		01.01.05	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE PLACA DE ENTREPISO QUE HACEN PARTE DEL AREA CONSTRUIDA EXISTENTE, NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, LAS CUALES SERÁN REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE MANERA MANUAL Y MECÁNICA DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES EN LOS	m2	4,78	$ 808.789,86	70 días	jue 1/01/26	vie 20/03/26	601FC-66 días
8		01.01.06	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE PLACA DE CONTRAPISO QUE HACEN PARTE DEL AREA CONSTRUIDA EXISTENTE, NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, LAS CUALES SERÁN REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE MANERA MANUAL Y MECÁNICA DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES EN LOS	m2	56,44	$ 5.947.813,93	70 días	jue 1/01/26	vie 20/03/26	601FC-66 días
9		01.01.09	DEMOLICION Y RETIRO DE CERRAMIENTO EXISTENTE QUE HACEN PARTE DEL AREA CONSTRUIDA EXISTENTE, NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, LAS CUALES SERÁN REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE MANERA MANUAL Y MECÁNICA DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES EN L	m	4,30	$ 272.151,42	65 días	mar 4/11/25	lue 15/01/26	2FC+117 días
10		01.01.10	DEMOLICION Y RETIRO DE ANDEN EXISTENTE , NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, LAS CUALES SERÁN REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE MANERA MANUAL Y MECÁNICA DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES EN LOS PLANOS O CONCERTADAS CON EL INTERVENTOR - (INCLU	m2	172,42	$ 11.451.381,56	65 días	lun 16/03/26	lue 28/05/26	601
11		01.02	DESMONTES 0			$ 212.510.209,81	183 días	mar 4/11/25	jue 28/05/26	
12		01.02.01	DESMONTE DE PUERTAS EN MADERA, CRISTAL Y/O METALICAS - DIM=VARIABLES	M2	169,41	$ 5.766.844,66	65 días	mar 4/11/25	lue 15/01/26	2FC+117 días
13		01.02.02	DESMONTE DE VENTANAS INTERNAS Y EXTERNAS DIM=VARIABLES	M2	217,13	$ 7.454.282,62	65 días	mar 4/11/25	lue 15/01/26	2FC+117 días
14		01.02.04	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y/O LAVAMANOSINCLUYE SELLO DE PUNTO EXISTENTE	und	28,00	$ 1.124.889,48	65 días	mar 4/11/25	lue 15/01/26	2FC+117 días
15		01.02.05	Desmonte instalaciones sanitarias pvc Ø 2",3",4" ,con retiro y disposicion final	M	145,72	$ 1.516.364,50	65 días	mar 4/11/25	lue 15/01/26	2FC+117 días
16		01.02.06	Desmonte instalaciones hidraulicas pvc Ø 1/2",3/4",1", 1 1/2" con retiro y disposicion final	M	87,14	$ 586.602,29	65 días	mar 4/11/25	lue 15/01/26	2FC+117 días
17		01.02.07	Desmonte de registros y valvulas hidraulicas internas Ø 1/2" a 2"	und	12,00	$ 225.862,22	65 días	mar 4/11/25	lue 15/01/26	2FC+117 días
18		01.02.08	DEMOLICION DE ACABADO DE PISO 0	m2	1100,04	$ 71.921.608,56	65 días	mar 4/11/25	lue 15/01/26	2FC+117 días
19		01.02.09	Desmantelamiento y disposicion final de red de baja tension	m	862,37	$ 11.317.809,81	65 días	mar 4/11/25	lue 15/01/26	2FC+117 días
20		01.02.10	DESMONTE DE TEJA DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE REMATES Y ESTRUCTURA DE SOPORTE	m2	293,92	$ 39.599.221,51	65 días	lun 16/03/26	lue 28/05/26	601
21		01.02.11	DESMONTE DE MARQUESINA EXISTENTE	m2	146,00	$ 19.269.962,85	65 días	lun 16/03/26	lue 28/05/26	601
22		01.02.12	DESMONTE DE BARANDAS METALICAS EXISTENTE	m	92,66	$ 7.213.437,80	65 días	mar 4/11/25	lue 15/01/26	2FC+117 días
23		01.02.13	DESMONTE DE MESON DE ATENCION HASTA 8=0.60MTS EXISTENTES	m	22,88	$ 1.494.499,97	65 días	mar 4/11/25	lue 15/01/26	2FC+117 días
24		01.02.14	DESMONTE DE MUEBLES FIJOS EXISTENTES INCLUYE MOBILIARIO	M2	107,38	$ 12.380.602,92	65 días	mar 4/11/25	lue 15/01/26	2FC+117 días
25		01.02.15	DESMONTE DE EQUIPOS MECANICOS/HIDRAULICOS/ELECTRICOS	und	31,00	$ 5.073.632,00	65 días	mar 4/11/25	lue 15/01/26	2FC+117 días
26		01.02.17	DESMONTE DE CIELO RASO 0	m2	281,47	$ 15.103.755,70	65 días	mar 4/11/25	lue 15/01/26	2FC+117 días
27		01.02.18	DESMONTE DE REJAS DE CARCELES O CALABOZOS 0	und	2,00	$ 263.233,10	65 días	mar 4/11/25	lue 15/01/26	2FC+117 días
28		01.02.20	DESMONTE APARATOS ELECTRICOS: Incluye aparatos, luminarias, canaletas, tomacorrientes, interruptores. incluye retiro y disposicion final	und	696,00	$ 10.802.073,05	65 días	mar 4/11/25	lue 15/01/26	2FC+117 días
29		01.02.21	Desmonte tableros electricos, incluye retiro y disposicion final	und	12,00	$ 1.395.526,77	65 días	mar 4/11/25	lue 15/01/26	2FC+117 días
30		01.04	TRABAJOS PRELIMINARES 0			$ 14.202.880,34	70 días	lun 16/03/26	mar 2/06/26	
31		01.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLA INFORMACIÓN LICENCIA (INCLUYE LOS MATERIALES Y ACCESORIOS COMPLETOS PARA SU INSTALACION)	und	1,00	$ 687.427,23	3 días	lun 16/03/26	jue 19/03/26	601
32		01.04.03	SUMINISTRO Y EJECUCION DE LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO PARA UBICACIÓN Y MARCADO EN EL TERRENO DE CONSTRUCCIÓN LOS EJES PRINCIPALES, PARALELOS Y PERPENDICULARES SEÑALADOS EN EL PLANO DEL PROYECTO, ASÍ COMO LOS LINDEROS DEL MISMO.	m2	1037,78	$ 13.515.453,11	10 días	vie 22/05/26	mar 2/06/26	28FC-5 días;6FC-5 días;7FC-5 días;8FC-5 días;9FC-5 días;10FC-5 días;12FC-5 días;13FC-5
33		01.07	CERRAMIENTO 0			$ 2.821.471,64	13 días	jue 28/05/26	jue 11/06/26	
34		01.07.05	SUMINISTRO Y EJECUCION DE CERRAMIENTO DE OBRA EN LONA VERDE (COLUMNAS EN MADERA) H=2,10 MTS, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	m2	98,00	$ 2.821.471,64	13 días	jue 28/05/26	jue 11/06/26	32FC-5 días
35		02	CIMENTACIÓN 0			$ 12.455.611,52	38 días	vie 5/06/26	sáb 18/07/26	
36		02.01	MOVIMIENTOS DE TIERRA CIMENTACIÓN 0			$ 1.204.557,50	10 días	vie 5/06/26	mié 17/06/26	
37		02.01.06	SUMINISTRO Y EJECUCION DE EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN- INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	m3	7,94	$ 1.204.557,50	10 días	vie 5/06/26	mié 17/06/26	34FC-5 días
38		02.06	LOSAS DE CIMENTACION 0			$ 6.329.434,27	15 días	mié 1/07/26	sáb 18/07/26	
39		02.06.11	SUMINISTRO Y EJECUCION DE PLACA CONTRAPISO CONCRETO E=30CM EN CONCRETO DE 3000 PSI NO INCLUYE ACERO	m2	17,50	$ 6.329.434,27	15 días	mié 1/07/26	sáb 18/07/26	43FC-3 días;44FC-3 días
40		02.07	SUMINISTROS CONCRETOS Y OTROS (ACTIVIDADADES DIFERENTES A ELEMENTOS ESTRUCTURALES) 0			$ 480.729,65	7 días	mié 17/06/26	jue 25/06/26	
41		02.07.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO 1.500PSI (CONCRETO DE LIMPIEZA) SEGÚN PROCESO CONSTRUCTIVO Y/O DISEÑO ESTRUCTURAL	m3	0,69	$ 480.729,65	7 días	mié 17/06/26	jue 25/06/26	37
42		02.09	ACERO DE REFUERZO 0			$ 4.440.890,10	12 días	lun 22/06/26	sáb 4/07/26	
43		02.09.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO 60.000 PSI/420 MPA INCLUYE ALAMBRE NEGRO DE AMARRE	kg	297,13	$ 2.953.094,46	12 días	lun 22/06/26	sáb 4/07/26	41FC-3 días
44		02.09.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA ESTANDAR INCLUYE ALAMBRE NEGRO DE AMARRE	kg	148,20	$ 1.487.795,64	12 días	lun 22/06/26	sáb 4/07/26	41FC-3 días
45		03	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS			$ 20.571.892,80	102 días	jue 28/05/26	vie 18/09/26	
46		03.01	EXCAVACIONES			$ 4.834.917,81	26 días	jue 28/05/26	jue 25/06/26	
47		03.01.01	SUMINISTRO Y EJECUCION DE EXCAVACION MANUAL PARA REDES DE TUBERIAS SEGÚN PLANOS HIDROSANITARIOS-INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	m3	31,87	$ 4.834.917,81	26 días	jue 28/05/26	jue 25/06/26	32FC-5 días
48		03.02	RELLENOS Y REEMPLAZOS			$ 1.900.729,37	10 días	vie 26/06/26	mar 7/07/26	

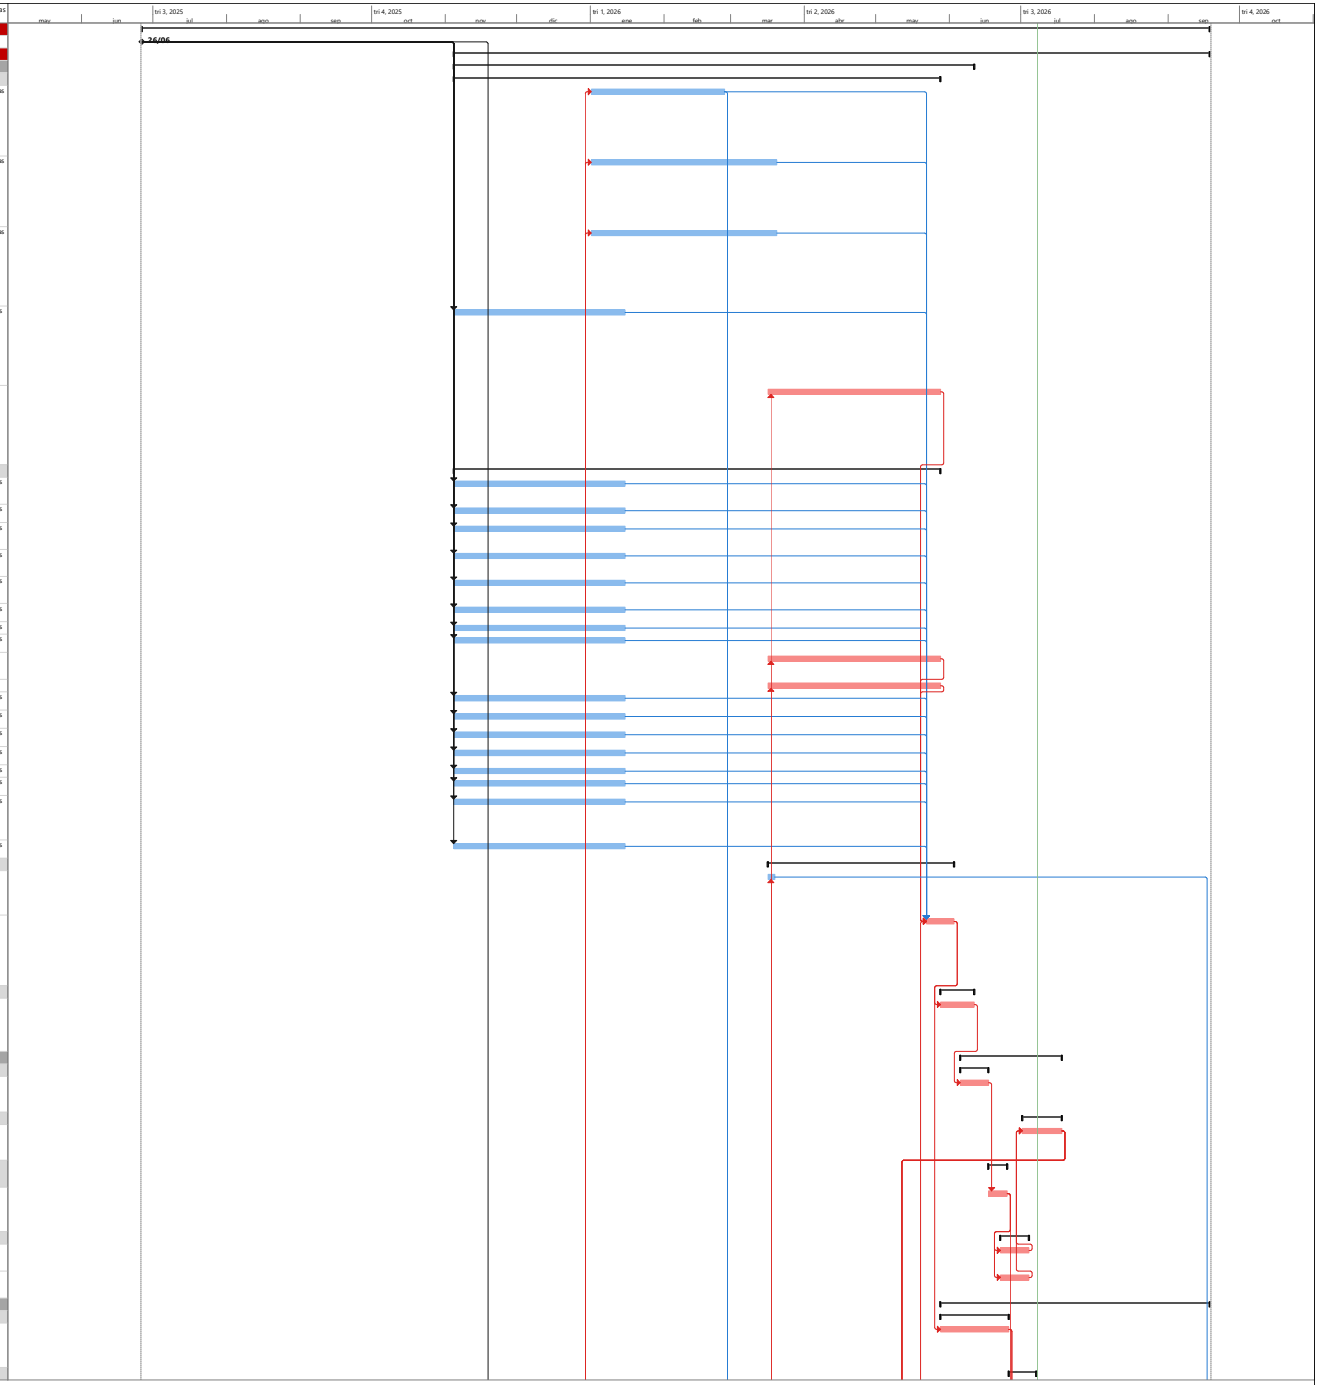


Id	Modo de Tarea	ITEM	Nombre de tarea	UNIDAD	CANTIDAD	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
49		03.02.02	SUMINISTRO Y EJECUCION DE RELLENO EN MATERIAL GRANULAR (ARENA)	m3	4,82	$ 1.900.729,37	10 días	vie 26/06/26	mar 7/07/26	47
50		**03.03**	**RETIROS**			**$ 3.794.276,66**	**10 días**	**vie 26/06/26**	**mar 7/07/26**	
51		03.03.01	SUMINISTRO Y EJECUCION DE RETIRO MATERIAL DE EXCAVACION	m3	27,50	$ 3.794.276,66	10 días	vie 26/06/26	mar 7/07/26	47
52		**03.04**	**CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA**			**$ 4.274.940,24**	**10 días**	**mar 7/07/26**	**sáb 18/07/26**	
53		03.04.11	SUMINISTRO Y EJECUCION DE CAJAS DE INSPECCIÓN AGUAS RESIDUALES (0.60X0.60)M 0	und	3,00	$ 2.564.964,14	10 días	mar 7/07/26	sáb 18/07/26	49,51
54		03.04.14	SUMINISTRO Y EJECUCION DE CAJAS DE INSPECCIÓN AGUAS LLUVIAS (0.60X0.60)M	und	2,00	$ 1.709.976,10	10 días	mar 7/07/26	sáb 18/07/26	49,51
55		**03.08**	**CAÑUELAS, CANALETAS, CARCAMOS Y CUNETAS**			**$ 4.896.164,19**	**5 días**	**lun 14/09/26**	**vie 18/09/26**	
56		03.08.04	SUMINISTRO Y EJECUCION DE CÁRCAMO CON REJILLA B=0,10m x H=0,15m	m	6,50	$ 4.896.164,19	5 días	lun 14/09/26	vie 18/09/26	602FF
57		**03.10**	**OBRAS PARA CONEXIONES ACOMETIDAS Y DOMICILIARIAS**			**$ 870.864,53**	**5 días**	**lun 14/09/26**	**vie 18/09/26**	
58		03.10.05	SUMINISTRO Y EJECUCION DE CONEXIÓN A RED ACOMETIDA	und	1,00	$ 870.864,53	5 días	lun 14/09/26	vie 18/09/26	602FF
59		**04**	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METALICAS Y MADERA 0**			**$ 244.347.419,68**	**51 días**	**jue 21/05/26**	**vie 17/07/26**	
60		**04.01**	**PRELIMINARES DE ESTRUCTURA 0**			**$ 4.256.196,53**	**30 días**	**vie 22/05/26**	**jue 25/06/26**	
61		04.01.01	SUMINISTRO Y EJECUCION DE REPLANTEO DE ESTRUCTURA 0	m2	411,41	$ 4.256.196,53	30 días	vie 22/05/26	jue 25/06/26	32CC
62		**04.05**	**LOSAS ALIGERADAS EN CONCRETO 0**			**$ 17.476.279,34**	**15 días**	**mié 1/07/26**	**vie 17/07/26**	
63		04.05.01	SUMINISTRO Y EJECUCION DE LOSA ALIGERADA SIN TORTA INFERIOR A LA VISTA 4000PSI TORTA E=12CM INCLUYE VIGAS DESCOLGADAS H=0.75M Y H=0.5M - CONSTRUIDOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS INDICADOS EN EL ESTUDIO DE SUELOS Y	m2	25,00	$ 15.063.904,47	15 días	mié 1/07/26	vie 17/07/26	68FC-5 días
64		04.05.02	SUMINISTRO Y EJECUCION DE SOBREANCHO EN CONCRETO EN PLACA EXISTENTE TIPO_1 4000PSI E=40CM - CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS INDICADOS EN EL ESTUDIO DE SUELOS Y EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES - (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS, ACCESORI	m2	3,40	$ 2.412.374,87	15 días	mié 1/07/26	vie 17/07/26	68FC-5 días
65		**04.08**	**FOSOS EN CONCRETO 0**			**$ 5.216.037,08**	**10 días**	**jue 2/07/26**	**mar 14/07/26**	
66		04.08.01	SUMINISTRO Y EJECUCION DE FOSO ASCENSOR EN CONCRETO TIPO_01 CONCRETO 4000 PSI PUBLICOS Y PRIVADOS - CONSTRUIDOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS INDICADOS EN EL ESTUDIO DE SUELOS Y EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES - (INCLU	m3	3,70	$ 5.216.037,08	10 días	jue 2/07/26	mar 14/07/26	68FC-3 días
67		**04.10**	**ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURA 0**			**$ 19.007.818,64**	**10 días**	**jue 25/06/26**	**lun 6/07/26**	
68		04.10.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO 60.000 PSI/420 MPA INCLUYE ALAMBRE NEGRO DE AMARRE	kg	1912,50	$ 19.007.818,64	10 días	jue 25/06/26	lun 6/07/26	41FC-3 días;61
69		**04.17**	**CUBIERTA METALICA 0**			**$ 101.173.802,76**	**35 días**	**jue 21/05/26**	**mar 30/06/26**	
70		04.17.01	SUMINISTRO Y EJECUCION ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA INCLUYE CONEXIONES, SOLDADURA Y TODO ELEMENTO REQUERIDO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	kg	3445,75	$ 101.173.802,76	35 días	jue 21/05/26	mar 30/06/26	63FC-5.1 días;64FC-5.1 días;66FC-5.1 días
71		**04.19**	**OTROS ELEMENTOS METALICOS 0**			**$ 97.217.285,33**	**10 días**	**lun 6/07/26**	**vie 17/07/26**	
72		04.19.01	SUMINISTRO Y EJECUCION DE FOSO ASCENSOR METALICO TIPO_01 INCLUYE CONEXIONES, SOLDADURA Y TODO ELEMENTO REQUERIDO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	kg	3.311,00	$ 97.217.285,33	10 días	lun 6/07/26	vie 17/07/26	63FC-10 días;64FC-10 días;66FC-10 días
73		**05**	**MAMPOSTERIA, DIVISIONES, ENCHAPES Y REMATES 0**			**$ 116.074.872,47**	**101 días**	**lun 6/04/26**	**lun 27/07/26**	
74		**05.08**	**MAMPOSTERIA EN BLOQUE ARCILLA 0**			**$ 22.637.207,06**	**30 días**	**jue 14/05/26**	**mié 17/06/26**	
75		05.08.01	SUMINISTRO Y EJECUCION DE MURO BLOQUE ARCILLA X M2 N° 4 - PERFORACION VERTICAL 0,33X0,115X0,23M DE ARCILLA INCLUYE PEGA DE 1 CM EN MORTERO 1:3, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECION Y FUNCIONAMIENTO.	m2	262,18	$ 22.511.965,57	30 días	jue 14/05/26	mié 17/06/26	39FC-58 días;53FC-58 días;54FC-58 días;70FC-58 días;72FC-58 días
76		05.08.02	SUMINISTRO Y EJECUCION DE MURO BLOQUE ARCILLA X ML N° 4 - PERFORACION VERTICAL 0,33X0,115X0,23M DE ARCILLA INCLUYE PEGA DE 1 CM EN MORTERO 1:3, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECION Y FUNCIONAMIENTO.	m	2,31	$ 125.241,49	30 días	jue 14/05/26	mié 17/06/26	75CC
77		**05.10**	**OTRAS ACTIVIDADES EN MAMPOSTERIA 0**			**$ 2.930.232,69**	**51 días**	**lun 6/04/26**	**mar 2/06/26**	
78		05.10.01	SUMINISTRO Y EJECUCION DE REGATAS Y REMATES EN MUROS 0	m	177,50	$ 2.930.232,69	51 días	lun 6/04/26	mar 2/06/26	75FC-65 días;76FC-65
79		**05.11**	**MUROS EN DRY WALL Y FIBROCEMENTO 0**			**$ 51.828.008,38**	**53 días**	**vie 29/05/26**	**lun 27/07/26**	
80		05.11.01	SUMINISTRO Y EJECUCION DE MUROS EN DRY WALL UNA CARA TIPO_01X M2 MASILLADO SIN ACABADO	m2	168,90	$ 21.362.103,61	53 días	vie 29/05/26	lun 27/07/26	89FC+25 días
81		05.11.02	SUMINISTRO Y EJECUCION DE MUROS EN DRY WALL UNA CARA TIPO_01X ML MASILLADO SIN ACABADO	m	323,67	$ 30.465.904,77	53 días	vie 29/05/26	lun 27/07/26	89FC+25 días
82		**05.12**	**ACEROS Y REFUERZOS EN CONCRETO PARA MAMPOSTERIAS 0**			**$ 29.077.770,78**	**30 días**	**jue 14/05/26**	**mié 17/06/26**	
83		05.12.01	SUMINISTRO Y EJECUCION DE COLUMINETAS EN CONCRETO 3000 PSI - (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	m	245,44	$ 19.869.283,83	30 días	jue 14/05/26	mié 17/06/26	39FC-58 días;53FC-58 días;54FC-58 días;70FC-58 días;72FC-58 días
84		05.12.01	SUMINISTRO Y EJECUCION DE COLUMINETAS EN CONCRETO 3000 PSI - (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	m	113,75	$ 9.208.486,95	30 días	jue 14/05/26	mié 17/06/26	39FC-58 días;53FC-58 días;54FC-58 días;70FC-58 días;72FC-58 días
85		**05.13**	**ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA MAMPOSTERIAS 0**			**$ 9.601.653,56**	**30 días**	**jue 14/05/26**	**mié 17/06/26**	
86		05.13.02	SUMINISTRO Y EJECUCION DE ANCLAJES EPOXICO 1/2" - (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	und	342,00	$ 9.601.653,56	30 días	jue 14/05/26	mié 17/06/26	39FC-58 días;53FC-58 días;54FC-58 días;70FC-58 días;72FC-58
87		**06**	**PAÑETES**			**$ 51.241.838,77**	**70 días**	**mar 14/04/26**	**mié 1/07/26**	
88		**06.01**	**PAÑETES INTERIORES**			**$ 35.960.054,74**	**60 días**	**mar 14/04/26**	**sáb 20/06/26**	
89		06.01.01	SUMINISTRO Y EJECUCION DE PAÑETE INTERIOR USO MUROS X M2 MORTERO 1:4 E: 0,015 M (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES, MATERIALES, EQUIPOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	m2	44,23	$ 1.652.660,21	15 días	mar 14/04/26	jue 30/04/26	98FC-50 días;99FC-50 días;103FC-50 días;101FC-50 días;102FC-50 días;103FC-50 días;104FC-50
90		06.01.02	SUMINISTRO Y EJECUCION DE PAÑETE INTERIOR USO MUROS X ML MORTERO 1:4 E: 0,015 M (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES, MATERIALES, EQUIPOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	m	166,70	$ 4.434.686,23	60 días	mar 14/04/26	sáb 20/06/26	89CC
91		06.01.03	SUMINISTRO Y EJECUCION DE PAÑETE INTERIOR IMPERMEABILIZADO MUROS X M2 MORTERO 1:4 E: 0,015 M (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES, MATERIALES, EQUIPOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	m2	463,52	$ 22.756.623,33	60 días	mar 14/04/26	sáb 20/06/26	89CC
92		06.01.04	SUMINISTRO Y EJECUCION DE PAÑETE INTERIOR IMPERMEABILIZADO MUROS X ML MORTERO 1:4 E: 0,015 M (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES, MATERIALES, EQUIPOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	m	204,40	$ 7.116.084,97	60 días	mar 14/04/26	sáb 20/06/26	89CC

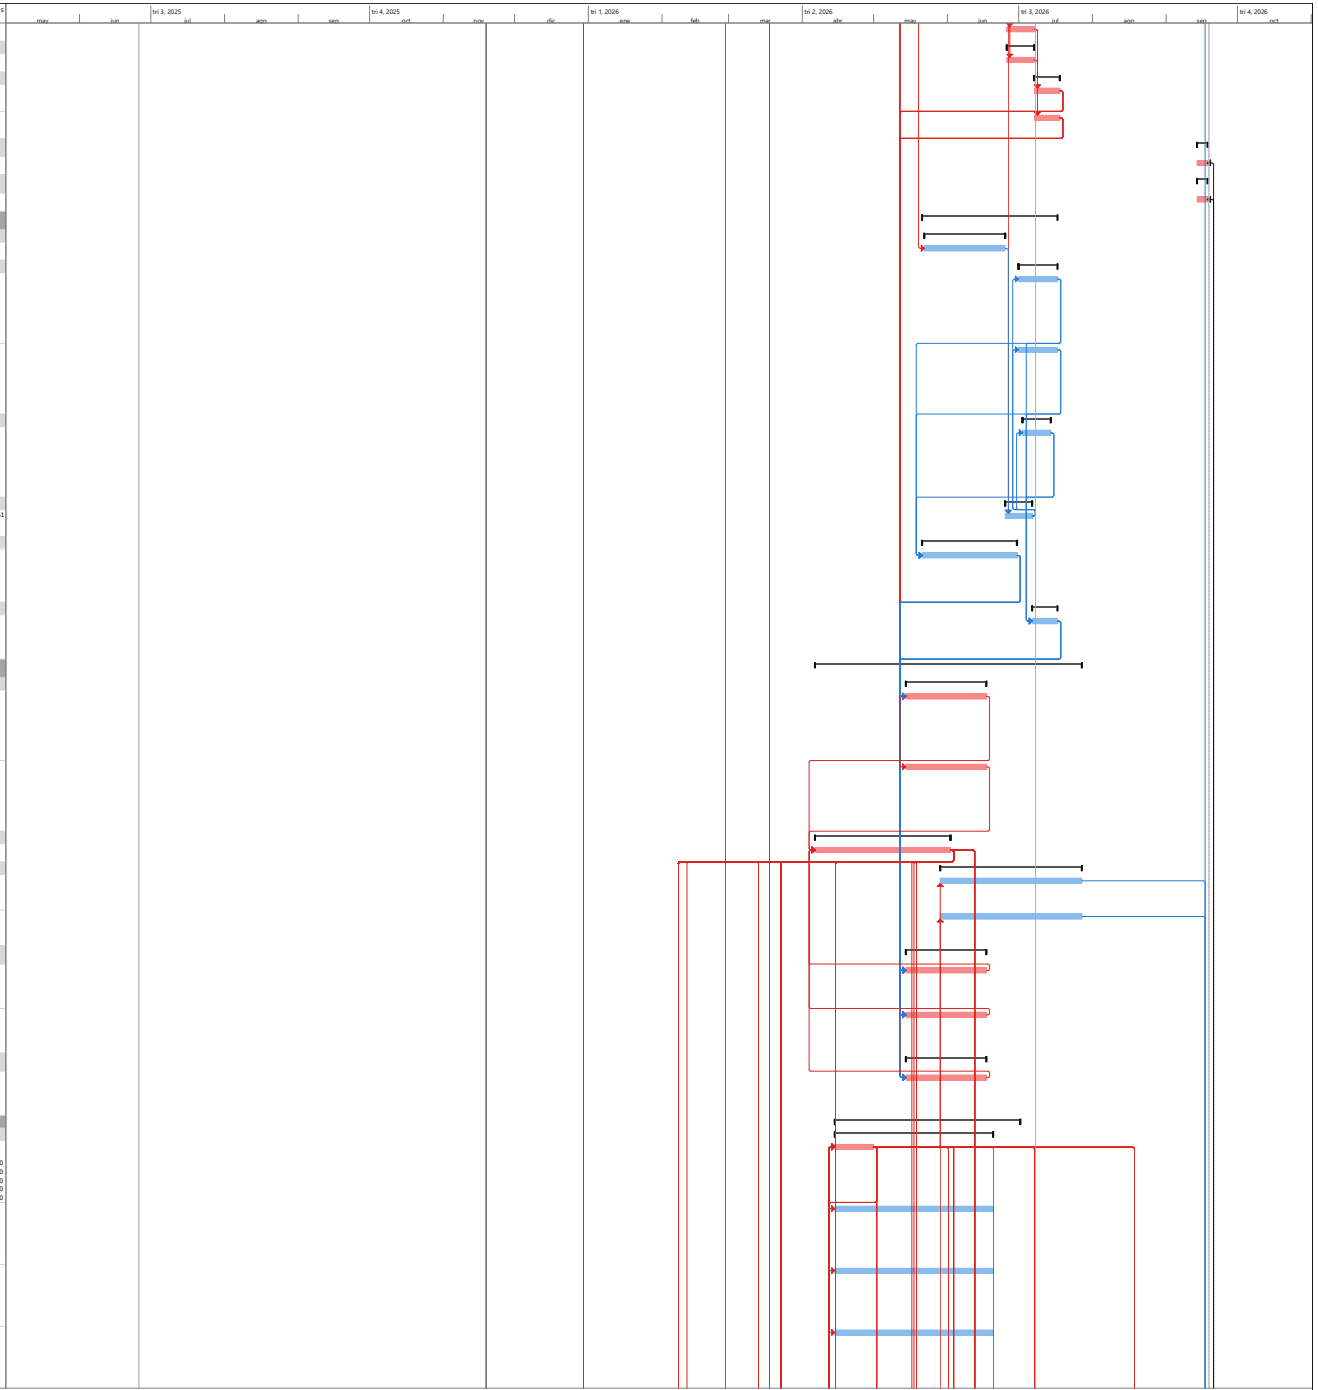


Proyecto: PROGRAMACION YO
Fecha: mié 8/07/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso

Id	Modo de Tarea	ITEM	Nombre de tarea	UNIDAD	CANTIDAD	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
93		**06.02**	**PAÑETES EXTERIORES**			**$ 15.281.784,03**	**30 días**	**vie 29/05/26**	**mié 1/07/26**	
94		06.02.01	SUMINISTRO Y EJECUCION DE PAÑETE EXTERIOR USO MUROS X M2	m2	374,95	$ 12.321.228,76	30 días	vie 29/05/26	mié 1/07/26	98FC-33 días;99FC-33
95		06.02.02	SUMINISTRO Y EJECUCION DE PAÑETE EXTERIOR USO MUROS X ML	m	117,50	$ 2.960.555,27	30 días	vie 29/05/26	mié 1/07/26	94CC
96		**08**	**INSTALACION HIDROSANITARIA, INCENDIO Y DE GAS 0**			**$ 170.418.464,45**	**198 días**	**mar 10/02/26**	**vie 18/09/26**	
97		**08.01**	**ACOMETIDA O RED DE LLENADO DE TANQUES 0**			**$ 2.966.585,86**	**107 días**	**mar 10/02/26**	**mar 9/06/26**	
98		08.01.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P 3/4"	m	26,04	$ 550.114,54	107 días	mar 10/02/26	mar 9/06/26	78FC-100 días
99		08.01.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PVC-P 3/4"	und	11,00	$ 103.083,26	107 días	mar 10/02/26	mar 9/06/26	78FC-100 días
100		08.01.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR TOTALIZADOR 3/4"	und	1,00	$ 1.228.091,24	107 días	mar 10/02/26	mar 9/06/26	78FC-100 días
101		08.01.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO BOLA 3/4" 0	und	5,00	$ 359.785,07	107 días	mar 10/02/26	mar 9/06/26	78FC-100 días
102		08.01.39	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLOTADOR MECANICO 3/4" 0	und	1,00	$ 326.347,54	107 días	mar 10/02/26	mar 9/06/26	78FC-100 días
103		08.01.47	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIÓN DRESSER 3/4" 0	und	2,00	$ 112.269,16	107 días	mar 10/02/26	mar 9/06/26	78FC-100 días
104		08.01.63	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE HIDRO 3/4" 0	und	1,00	$ 134.571,13	107 días	mar 10/02/26	mar 9/06/26	78FC-100 días
105		08.01.73	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE PASAMUROS ACERO INOXIDABLE CON RUANA. 3/4" 0	und	1,00	$ 82.018,00	107 días	mar 10/02/26	mar 9/06/26	78FC-100 días
106		08.01.83	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE TIPO PERA 3/4" 0	und	4,00	$ 70.305,92	107 días	mar 10/02/26	mar 9/06/26	78FC-100 días
107		**08.02**	**CONEXIONES CUARTO DE BOMBAS AGUA POTABLE 0**			**$ 29.359.369,85**	**125 días**	**mar 10/02/26**	**mar 30/06/26**	
108		08.02.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SCH 80 3" 0	m	2,44	$ 523.701,48	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
109		08.02.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SCH 80 2.1/2" 0	m	3,37	$ 584.512,37	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
110		08.02.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SCH 80 2" 0	m	5,04	$ 519.915,84	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
111		08.02.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 1" RDE 21 0	m	7,95	$ 383.963,99	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
112		08.02.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PVC SCH 80 3" PVC SCH 80	und	6,00	$ 906.121,73	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
113		08.02.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PVC SCH 80 2.1/2" PVC SCH 80	und	6,00	$ 787.258,50	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
114		08.02.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PVC SCH 80. 2" PVC SCH 80	und	16,00	$ 1.634.198,28	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
115		08.02.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PVC - P 1" PVC - P	und	6,00	$ 253.323,69	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
116		08.02.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE HIDRO 2.1/2" 0	und	1,00	$ 944.378,70	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
117		08.02.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE HIDRO 2" 0	und	1,00	$ 840.470,53	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
118		08.02.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PIE Y CANASTILLA EN HIERRO FUNDIDO ROSCA NPT O SIMILAR 3" 0	und	2,00	$ 2.103.384,00	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
119		08.02.39	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO CORTINA 3" CUERPO EN BRONCE ROSCA NPT 0	und	2,00	$ 3.810.858,36	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
120		08.02.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO CORTINA 2.1/2" CUERPO EN BRONCE ROSCA NPT 0	und	5,00	$ 6.909.488,36	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
121		08.02.41	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO CORTINA 2" CUERPO EN BRONCE ROSCA NPT 0	und	1,00	$ 310.186,65	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
122		08.02.44	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO CORTINA 1" CUERPO EN BRONCE ROSCA NPT 0	und	2,00	$ 610.610,89	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
123		08.02.47	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION FLEXIBLE BORRACHA 3" 0	und	2,00	$ 903.571,10	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
124		08.02.48	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION FLEXIBLE BORRACHA 2.1/2" 0	und	2,00	$ 701.592,14	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
125		08.02.61	SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE ALIVIO 2" 0	und	1,00	$ 2.094.275,32	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
126		08.02.79	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPA CONCENTRICA EN ACERO INKOXDABLE DE UNIÓNSOLDADA - TIPO 2 3"x2"	und	2,00	$ 367.296,70	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
127		08.02.82	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPA EXCENTRICA EN ACERO INOXIDABLE DE UNIÓNSOLDADA ASMT-A351 - TIPO 1 2.1/2"x2"	und	2,00	$ 367.296,70	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
128		08.02.88	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE PASAMUROS ACERO INOXIDABLE CON RUANA. 3" 0	und	2,00	$ 1.948.456,68	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
129		08.02.90	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE PASAMUROS ACERO INOXIDABLE CON RUANA. 2" 0	und	1,00	$ 515.532,14	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
130		08.02.93	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE PASAMUROS ACERO INOXIDABLE CON RUANA. 1" 0	und	1,00	$ 447.033,03	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
131		08.02.105	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE TIPO PERA 2.1/2" 0	und	10,00	$ 479.614,76	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
132		08.02.106	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE TIPO PERA 2" 0	und	8,00	$ 287.411,10	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
133		08.02.109	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE TIPO PERA 1" 0	und	4,00	$ 124.916,81	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
134		**08.05**	**RED SUMINISTRO AGUA POTABLE 0**			**$ 17.298.556,14**	**125 días**	**mar 10/02/26**	**mar 30/06/26**	
135		08.05.04	SUMINISTRO E INSTALAKACION DE TUBERIA PVC-P RDE=21 2 1/2" 0	m	18,00	$ 1.884.778,30	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
136		08.05.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P RDE=21 2" 0	m	6,00	$ 323.287,30	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
137		08.05.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P RDE=21 1.1/2" 0	m	75,22	$ 2.778.952,14	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
138		08.05.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P RDE=21 1" 0	m	171,40	$ 2.995.624,46	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
139		08.05.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P RDE=11 3/4" 0	m	16,94	$ 342.392,15	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
140		08.05.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P RDE=9 1/2" 0	m	16,80	$ 253.904,34	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
141		08.05.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PVC-P 2 1/2" 0	und	12,00	$ 870.495,19	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
142		08.05.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PVC-P 2" 0	und	9,00	$ 301.551,56	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
143		08.05.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PVC-P 1.1/2" 0	und	77,00	$ 1.671.769,32	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
144		08.05.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PVC-P 1" 0	und	157,00	$ 1.743.431,64	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
145		08.05.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PVC-P 3/4" 0	und	9,00	$ 80.321,86	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
146		08.05.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PVC-P 1/2" 0	und	15,00	$ 101.478,50	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
147		08.05.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO TIPO PESADO 1.1/2" 0	und	7,00	$ 1.648.113,53	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
148		08.05.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO TIPO PESADO 1/2" 0	und	9,00	$ 513.897,78	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
149		08.05.41	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE TIPO PERA 1" 0	und	75,00	$ 1.671.297,03	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
150		08.05.47	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERAS 2.1/2" 0	und	7,00	$ 117.261,04	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
151		**08.08**	**RED GENERAL DE AGUAS RESIDUALES 0**			**$ 19.541.541,16**	**125 días**	**mar 10/02/26**	**mar 30/06/26**	
152		08.08.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 160MM 0	m	9,40	$ 880.215,92	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
153		08.08.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO PVC ALCANTARILLADO 160MM 0	und	1,00	$ 224.721,05	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
154		08.08.34	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-S 4" 0	m	85,22	$ 5.927.313,84	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
155		08.08.35	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-S 3" 0	m	14,64	$ 729.380,12	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
156		08.08.36	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-S 2" 0	m	18,25	$ 721.017,90	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
157		08.08.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-L 2" 0	m	38,69	$ 1.367.038,66	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
158		08.08.42	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PVC-S 4" 0	und	133,00	$ 6.265.227,61	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
159		08.08.43	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PVC-S 3" 0	und	14,00	$ 344.747,64	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días

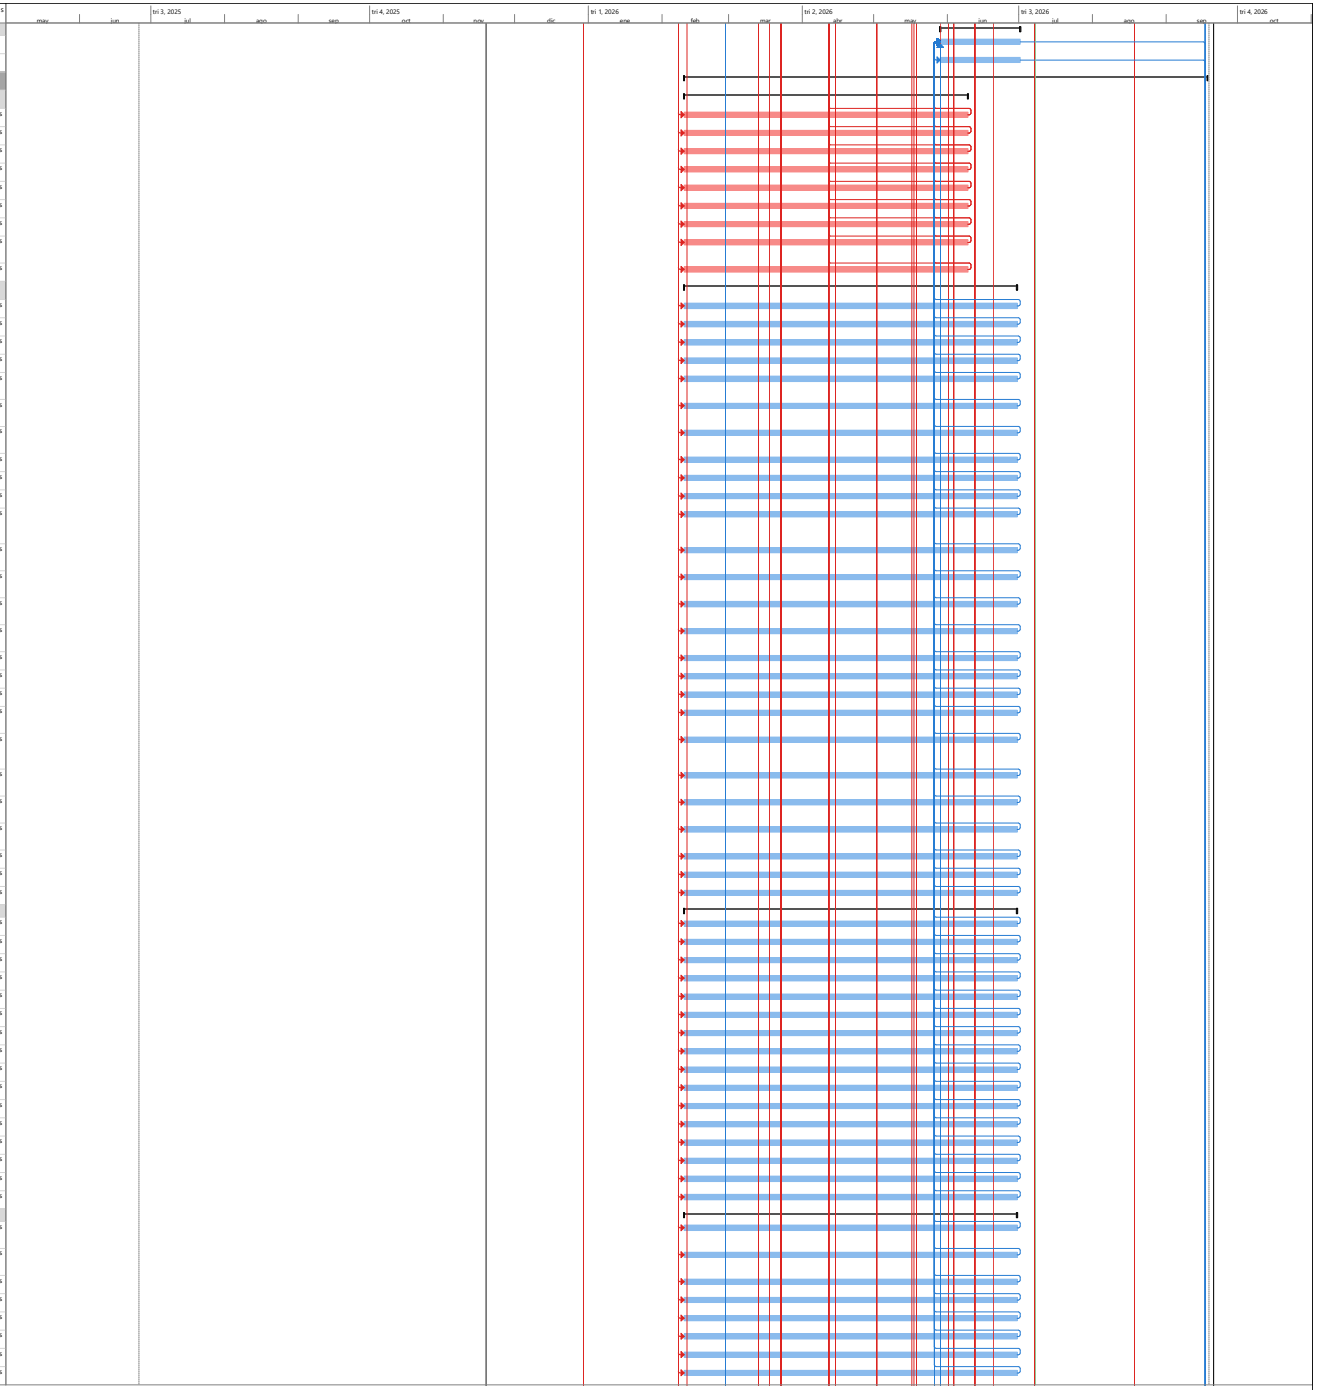


Id	Modo de Tarea	ITEM	Nombre de tarea	UNIDAD	CANTIDAD	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
160		08.08.44	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PVC-S 2" 0	und	139,00	$ 2.383.027,37	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
161		08.08.52	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE TIPO PERA 4" 0	und	6,00	$ 273.368,45	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
162		08.08.54	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE TIPO PERA 2" 0	und	6,00	$ 215.558,32	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
163		08.08.56	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERAS 4" 0	und	13,00	$ 209.924,28	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
164		**08.10**	**RED GENERAL DE AGUAS LLUVIAS 0**			**$ 17.793.195,12**	**125 días**	**mar 10/02/26**	**mar 30/06/26**	
165		08.10.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 160MM 0	m	31,80	$ 2.977.751,73	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
166		08.10.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO PVC ALCANTARILLADO 160MM 0	und	15,00	$ 3.370.815,78	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
167		08.10.34	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-S DIAM= 4" 0	m	100,05	$ 6.958.786,08	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
168		08.10.35	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-S DIAM= 3" 0	m	3,80	$ 189.319,98	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
169		08.10.38	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PVC-S DIAM= 4" 0	und	63,00	$ 2.967.739,39	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
170		08.10.39	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PVC-S DIAM= 3" 0	und	20,00	$ 492.496,63	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
171		08.10.44	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAGANTE 4" 0	und	15,00	$ 836.285,53	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
172		**08.12**	**PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA 0**			**$ 6.140.883,47**	**125 días**	**mar 10/02/26**	**mar 30/06/26**	
173		08.12.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO A.F LAVAMANOS 1/2" 0	und	17,00	$ 2.130.564,62	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
174		08.12.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO A.F DUCHA 1/2" 0	und	1,00	$ 125.327,33	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
175		08.12.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO A.F LAVAPLATOS 1/2" 0	und	4,00	$ 501.309,32	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
176		08.12.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO A.F ORINAL 3/4" 0	und	3,00	$ 408.960,09	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
177		08.12.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO A.F SANITARIO DE TANQUE 1/2" 0	und	4,00	$ 503.481,61	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
178		08.12.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO A.F SANITARIO 1 1/2" 0	und	10,00	$ 1.841.888,49	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
179		08.12.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO A.F LLAVE MANGUERA 1/2" 0	und	2,00	$ 251.740,80	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
180		08.12.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO A.F POCETA DE ASEO 1/2" 0	und	3,00	$ 377.611,21	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
181		**08.15**	**SALIDAS SANITARIAS 0**			**$ 10.133.001,69**	**125 días**	**mar 10/02/26**	**mar 30/06/26**	
182		08.15.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA SANITARIO 4" 0	und	14,00	$ 3.680.521,13	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
183		08.15.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA LAVAMANOS 2" 0	und	11,00	$ 1.650.634,56	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
184		08.15.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DUCHA 2" 0	und	1,00	$ 150.057,69	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
185		08.15.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA LAVAPLATOS 2" 0	und	4,00	$ 600.230,75	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
186		08.15.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA POCETA ASEO 2" 0	und	3,00	$ 450.173,06	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
187		08.15.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ORINAL 2" 0	und	3,00	$ 450.173,06	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
188		08.15.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA SIFON 2" 0	und	21,00	$ 3.151.211,44	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
189		**08.18**	**SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO 0**			**$ 37.067.809,70**	**125 días**	**mar 10/02/26**	**mar 30/06/26**	
190		08.18.27	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO NEGRO SCHD40 4" 0	m	35,00	$ 12.349.973,93	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
191		08.18.33	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO NEGRO SCHD40 1" 0	m	2,00	$ 143.831,67	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
192		08.18.49	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS ACERO RANURADOS 4" 0	und	8,00	$ 1.645.924,51	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
193		08.18.51	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS ACERO RANURADOS 2.1/2" 0	und	2,00	$ 122.399,63	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
194		08.18.55	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS ACERO ROSCADO 1" 0	und	1,00	$ 27.530,65	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
195		08.18.88	SUMINISTRO E INSTALACION DE COUPLING 4" 0	und	16,00	$ 1.013.850,71	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
196		08.18.90	SUMINISTRO E INSTALACION DE COUPLING 2 1/2" 0	und	2,00	$ 103.986,67	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
197		08.18.98	SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA EXPULSORA DE AIRE 1" 0	und	1,00	$ 639.911,03	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
198		08.18.101	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CORTE 1" 0	und	1,00	$ 123.188,50	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
199		08.18.104	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIAMESA 4" X 2.1/2" X 2.1/2" CON CHEQUE INTEGRADO 0	und	1,00	$ 3.265.139,41	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
200		08.18.105	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA PARA BOMBEROS 2.1/2" 0	und	2,00	$ 3.038.890,81	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
201		08.18.110	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA PARA TUBERIA 0	m	35,00	$ 768.948,49	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
202		08.18.111	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTOR MULTIPROPOSITO ABC 10 LB 0	und	13,00	$ 1.620.304,90	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
203		08.18.112	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTOR A BASE DE CO2 10 LB 0	und	2,00	$ 1.051.737,04	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
204		08.18.113	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTOR K DE 10 LB 0	und	3,00	$ 1.388.817,33	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
205		08.18.143	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE SISMO RESISTENTE 4 VIAS 0	und	3,00	$ 3.673.950,22	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
206		08.18.150	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERAS UL/FM 4" 0	und	19,00	$ 6.089.424,20	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
207		**08.22**	**PRUEBAS DEL SISTEMA 0**			**$ 30.117.521,46**	**10 días**	**mar 8/09/26**	**vie 18/09/26**	
208		08.22.01	SUMINISTRO Y EJECUCION DE PRUEBA DE HERMÉTICIDAD PARA LAS REDES DE PRESIÓN 0	und	18,00	$ 12.132.411,90	10 días	mar 8/09/26	vie 18/09/26	602FF
209		08.22.02	SUMINISTRO Y EJECUCION DE PRUEBA DE HERMETICIDAD PARA LAS REDES A GRAVEDAD 0	und	15,00	$ 4.071.822,38	10 días	mar 8/09/26	vie 18/09/26	602FF
210		08.22.04	SUMINISTRO Y EJECUCION DE PRUEBA PARA LAS REDES RCI 0	und	1,00	$ 159.630,94	10 días	mar 8/09/26	vie 18/09/26	602FF
211		08.22.06	SUMINISTRO Y EJECUCION DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES 0	und	1,00	$ 1.613.347,92	10 días	mar 8/09/26	vie 18/09/26	602FF
212		08.22.07	SUMINISTRO Y EJECUCION DE DESINFECCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 0	gb	1,00	$ 1.076.590,94	10 días	mar 8/09/26	vie 18/09/26	602FF
213		08.22.08	PUESTA EN MARCHA, OPERACIÓN, ARRANQUE Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMAS HIDRO NEUMÁTICOS INCLUYE INGENIERÍA, TRÁMITES DE CONEXIÓN ANTE OPERADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONSUMIBLES, MANUALES Y DEMÁS INSUMOS NECESARIOS PARA SUS CORRECTO FUNCIONAMIENTO, INCLUY	und	1,00	$ 11.063.717,38	10 días	mar 8/09/26	vie 18/09/26	602FF
214		**09**	**INSTALACION INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ,DATOS, SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS, CCTV 0**			**$ 878.393.282,44**	**198 días**	**mar 10/02/26**	**vie 18/09/26**	
215		**09.01**	**DE TUBERIAS ELÉCTRICAS PVC CONDUIT 0**			**$ 32.788.613,48**	**125 días**	**mar 10/02/26**	**mar 30/06/26**	
216		09.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CONDUIT Diam= 3" 0	m	10,00	$ 584.677,28	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
217		09.01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CONDUIT Diam= 1.1/2" 0	m	11,80	$ 564.244,65	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
218		09.01.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CONDUIT Diam= 1" 0	m	30,80	$ 1.015.685,83	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
219		09.01.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CONDUIT Diam= 3/4" 0	m	930,25	$ 30.624.005,72	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
220		**09.02**	**DE TUBERIAS ELÉCTRICAS EMT 0**			**$ 34.030.397,54**	**125 días**	**mar 10/02/26**	**mar 30/06/26**	
221		09.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT Diam= 1.1/2" 0	m	30,00	$ 2.217.508,87	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
222		09.02.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT Diam= 1" 0	m	30,00	$ 1.701.063,03	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
223		09.02.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT Diam= 3/4" 0	m	1018,00	$ 30.111.825,64	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
224		**09.04**	**DE BANDEJAS PORTACABLES Y CANALETAS 0**			**$ 31.676.844,03**	**125 días**	**mar 10/02/26**	**mar 30/06/26**	
225		09.04.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA 300X200 mm 0	m	110,25	$ 12.567.794,62	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
226		09.04.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLE TIPO DUCTO CERRADO 300X100 mm 0	m	110,00	$ 19.109.049,41	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
227		**09.05**	**DE CAJAS ELECTRICAS 0**			**$ 5.087.602,14**	**125 días**	**mar 10/02/26**	**mar 30/06/26**	

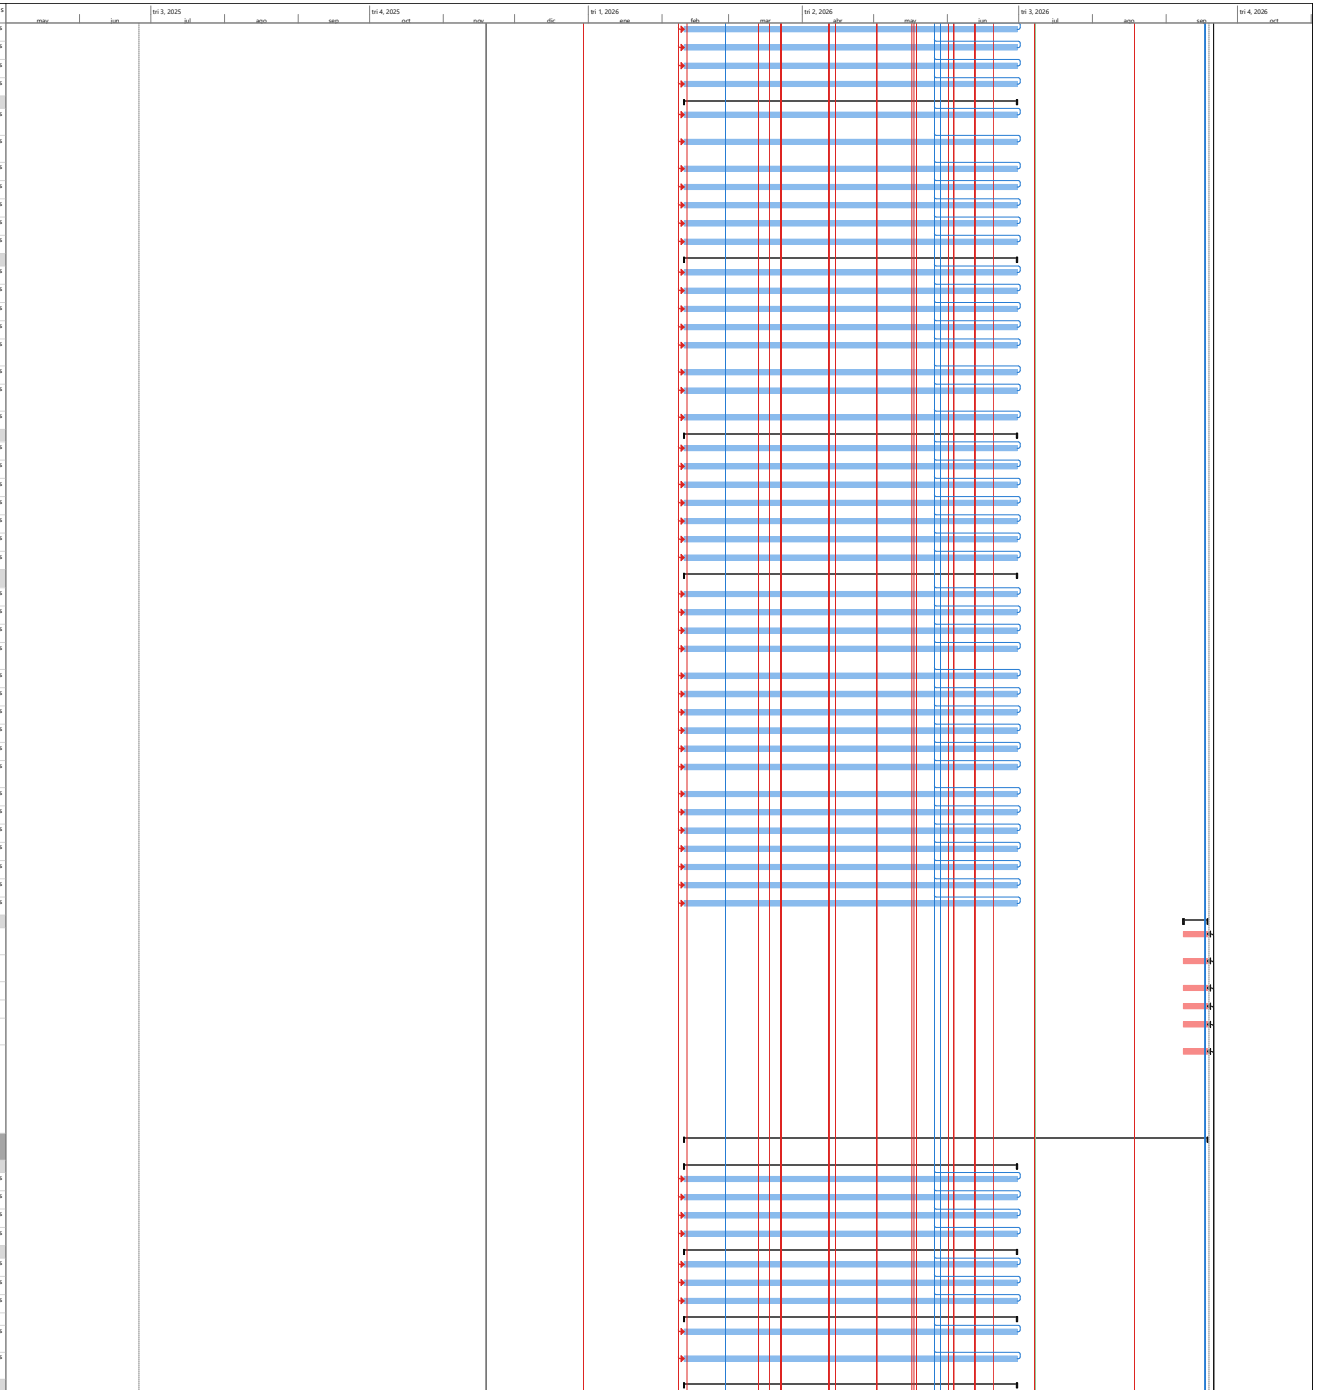

Proyecto: PROGRAMACION YO
Fecha: mié 8/07/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso


Id	Modo de Tarea	ITEM	Nombre de tarea	UNIDAD	CANTIDAD	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
228		09.05.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA RAWELT 4X4 0	und	20,00	$ 901.679,35	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
229		09.05.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA GALVANIZADA 5800 0	und	97,00	$ 618.154,69	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
230		09.05.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA GALVANIZADA 2400 0	und	154,00	$ 1.274.512,30	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
231		09.05.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA GALVANIZADA OCTAGONAL 0	und	250,00	$ 2.293.255,80	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
232		**09.06**	**DE CABLES ELECTRICOS Y VARILLAS DE PUESTA A TIERRA CON ACCESORIOS 0**			**$ 297.497.023,61**	**125 días**	**mar 10/02/26**	**mar 30/06/26**	
233		09.06.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CU AISLADO LSZH NO 12 0	m	13329,27	$ 70.106.099,32	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
234		09.06.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CU AISLADO LSZH NO 6 0	m	400,50	$ 8.034.108,98	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
235		09.06.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CU AISLADO LSZH NO 4 0	m	320,40	$ 10.509.282,51	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
236		09.06.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CU AISLADO LSZH NO 2 0	m	170,00	$ 8.007.091,80	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
237		09.06.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CU AISLADO LSZH NO 1/0 0	m	120,00	$ 10.170.010,37	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
238		09.06.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CU AISLADO LSZH NO 250 0	m	640,00	$ 103.717.139,26	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
239		09.06.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CU DESNUDO NO 4 0	m	200,25	$ 5.476.161,66	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
240		09.06.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CU DESNUDO NO 2/0 0	m	35,50	$ 3.314.123,33	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
241		09.06.51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CATEGORIA 6A FUTP DE 500 MH2 0	m	6088,00	$ 63.084.579,25	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
242		09.06.78	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA COOPER WELL 2,4 MTS 0	und	8,00	$ 3.411.314,52	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
243		09.06.81	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 18AWG FPLR/2 CONDUCTORES, LISTADO UL	und	1545,00	$ 11.667.112,61	125 días	mar 10/02/26	mar 30/06/26	78FC-100 días
244		**09.07**	**DE TABLEROS ELECTRICOS 0**			**$ 52.260.644,81**	**20 días**	**vie 12/06/26**	**sáb 4/07/26**	
245		09.07.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELECTRICO TRIFASICO 36 CTOS CON ESPACIO DE TOTALIZADOR 0	und	2,00	$ 2.497.082,74	20 días	vie 12/06/26	sáb 4/07/26	78FC+10 días
246		09.07.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELECTRICO TRIFASICO 42 CTOS CON ESPACIO DE TOTALIZADOR 0	und	1,00	$ 1.304.470,05	20 días	vie 12/06/26	sáb 4/07/26	78FC+10 días
247		09.07.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELECTRICO TRIFASICO TGA TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION	und	1,00	$ 14.900.255,83	20 días	vie 12/06/26	sáb 4/07/26	78FC+10 días
248		09.07.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELECTRICO TRIFASICO T-BOMBAS 0	und	1,00	$ 9.465.888,18	20 días	vie 12/06/26	sáb 4/07/26	78FC+10 días
249		09.07.15	SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA DE 150KVA. INCLUYE COFRE METÁLICO EN LÁMINA COLD ROLED EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, CONTACTORES, ENCLAVAMIENTO, BARRAJES, TARJETAS, RELÉS, TEMPORIZADORES, BREAKERS, SELECTORES, LÁMPARAS PILOTO Y DEMÁS ELEM	und	1,00	$ 24.092.948,01	20 días	vie 12/06/26	sáb 4/07/26	78FC+10 días
250		**09.08**	**DE BREAKERS ELECTRICOS0**			**$ 9.714.331,95**	**20 días**	**vie 12/06/26**	**sáb 4/07/26**	
251		09.08.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEBREAKER 1X20A0	und	101,00	$ 2.915.511,84	20 días	vie 12/06/26	sáb 4/07/26	78FC+10 días
252		09.08.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEBREAKER 2X20A0	und	8,00	$ 684.744,05	20 días	vie 12/06/26	sáb 4/07/26	78FC+10 días
253		09.08.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEBREAKER 2X30A0	und	3,00	$ 320.967,02	20 días	vie 12/06/26	sáb 4/07/26	78FC+10 días
254		09.08.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOTALIZADOR 3X60A 0	und	5,00	$ 1.948.006,27	20 días	vie 12/06/26	sáb 4/07/26	78FC+10 días
255		09.08.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOTALIZADOR 3X70 0	und	5,00	$ 1.985.229,85	20 días	vie 12/06/26	sáb 4/07/26	78FC+10 días
256		09.08.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOTALIZADOR 3X150A 0	und	1,00	$ 1.108.965,48	20 días	vie 12/06/26	sáb 4/07/26	78FC+10 días
257		09.08.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOTALIZADOR 3X250A 0	und	1,00	$ 750.907,44	20 días	vie 12/06/26	sáb 4/07/26	78FC+10 días
258		**09.09**	**DE TOMAS ELECTRICAS, INTERRUPTORES Y SENSORES 0**			**$ 36.719.223,22**	**65 días**	**vie 17/04/26**	**mar 30/06/26**	
259		09.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE TOMA MONOFASICA SYS NORMAL 0	und	211,00	$ 15.768.632,78	65 días	vie 17/04/26	mar 30/06/26	78FC-40 días
260		09.09.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE TOMA GFCI MONOFASICA 0	und	28,00	$ 3.418.469,68	65 días	vie 17/04/26	mar 30/06/26	78FC-40 días
261		09.09.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE TOMA REGULADA 0	und	100,00	$ 10.819.869,13	65 días	vie 17/04/26	mar 30/06/26	78FC-40 días
262		09.09.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE SENSOR DE MOVIMIENTO TIPO 1 0	und	26,00	$ 2.975.142,93	65 días	vie 17/04/26	mar 30/06/26	78FC-40 días
263		09.09.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO 0	und	43,00	$ 3.737.108,70	65 días	vie 17/04/26	mar 30/06/26	78FC-40 días
264		**09.10**	**DE SALIDA DE ILUMINACIÓN 0**			**$ 25.800.233,20**	**65 días**	**vie 17/04/26**	**mar 30/06/26**	
265		09.10.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA INTERIOR TIPO 1 PANEL REDONDO INCRUSTAR 18W	und	14,00	$ 1.110.507,19	65 días	vie 17/04/26	mar 30/06/26	78FC-40 días
266		09.10.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA INTERIOR TIPO 2 LUMINARIA LED HERMÉTICA 2X18W	und	10,00	$ 793.798,53	65 días	vie 17/04/26	mar 30/06/26	78FC-40 días
267		09.10.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA INTERIOR TIPO 3 LUMINARIA LINEAL INCRUSTAR 120CM 40W	und	119,00	$ 9.466.723,38	65 días	vie 17/04/26	mar 30/06/26	78FC-40 días
268		09.10.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA INTERIOR TIPO 4 LUMINARIA BALA MOON 8W	und	99,00	$ 7.887.016,31	65 días	vie 17/04/26	mar 30/06/26	78FC-40 días
269		09.10.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA INTERIOR TIPO 5 LUMINARIA CON BATERIA DE EMERGENCIA	und	80,00	$ 6.382.509,24	65 días	vie 17/04/26	mar 30/06/26	78FC-40 días
270		09.10.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA INTERIOR TIPO 6 REFLECTOR 50W	und	2,00	$ 159.678,55	65 días	vie 17/04/26	mar 30/06/26	78FC-40 días
271		**09.11**	**DE VOZ Y DATOS 0**			**$ 171.907.007,82**	**65 días**	**vie 17/04/26**	**mar 30/06/26**	
272		09.11.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK TIPO 1 ABIERTO 42 UR	und	1,00	$ 6.833.400,39	65 días	vie 17/04/26	mar 30/06/26	78FC-40 días
273		09.11.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK TIPO 2 TIPO GABINETE 10 UR	und	3,00	$ 38.913.122,62	65 días	vie 17/04/26	mar 30/06/26	78FC-40 días
274		09.11.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACK CAT. 6A 0	und	151,00	$ 9.105.924,23	65 días	vie 17/04/26	mar 30/06/26	78FC-40 días
275		09.11.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACE PLATE TIPO 1 SENCILLO	und	151,00	$ 6.108.703,25	65 días	vie 17/04/26	mar 30/06/26	78FC-40 días
276		09.11.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORE DE 2 MTS 0	und	151,00	$ 6.108.703,25	65 días	vie 17/04/26	mar 30/06/26	78FC-40 días
277		09.11.34	SWITCHES DE ACCESO DE 48 PUERTOS CAT 6A CON 2 PUERTOS DE FIBRA DE 10 GBPS PARA UTILIZAR COMO UPLINKS A LOS SWITCHES DE CORE PUERTOS 10/100/1000 LAYER 2 (DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TECNICA, PLANO DE VOZ Y DATOS) incluye todos los elementos necesarios par	und	3,00	$ 47.575.958,18	65 días	vie 17/04/26	mar 30/06/26	78FC-40 días
278		09.11.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCHES DE POE DE 24 PUERTOS CAT 6A 0	und	2,00	$ 21.005.088,08	65 días	vie 17/04/26	mar 30/06/26	78FC-40 días
279		09.11.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PACH PANEL DE 24 PUERTOS 0	und	7,00	$ 4.708.998,74	65 días	vie 17/04/26	mar 30/06/26	78FC-40 días
280		09.11.61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE HDMI 10 METRO 0	m	1,00	$ 258.228,07	65 días	vie 17/04/26	mar 30/06/26	78FC-40 días
281		09.11.62	ACCESS POINT GESTIONADOS DE MANERA CENTRALIZADA	und	11,00	$ 19.595.644,32	65 días	vie 17/04/26	mar 30/06/26	78FC-40 días
282		09.11.63	Patch Core de fibra	und	8,00	$ 1.984.646,88	65 días	vie 17/04/26	mar 30/06/26	78FC-40 días
283		09.11.64	Bandeja de fibra	und	1,00	$ 608.297,04	65 días	vie 17/04/26	mar 30/06/26	78FC-40 días
284		09.11.66	Canaleta metalica 12x5 con división y tapa, incluye elementos de fijación	und	50,00	$ 6.703.783,83	65 días	vie 17/04/26	mar 30/06/26	78FC-40 días
285		09.11.67	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR HORIZONTAL DE 1RU 0	und	6,00	$ 710.237,54	65 días	vie 17/04/26	mar 30/06/26	78FC-40 días
286		09.13.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAJE EQUIPOTENCIAL DE TIERRAS 0	und	1,00	$ 1.686.271,40	65 días	vie 17/04/26	mar 30/06/26	78FC-40 días
287		**09.14**	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS 0**			**$ 53.423.191,66**	**40 días**	**jue 21/05/26**	**sáb 4/07/26**	
288		09.14.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE INCENDIOS	und	1,00	$ 15.537.724,32	40 días	jue 21/05/26	sáb 4/07/26	78FC-10 días
289		09.14.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE OPTICO 0	und	65,00	$ 21.178.880,07	40 días	jue 21/05/26	sáb 4/07/26	78FC-10 días
290		09.14.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL 0	und	10,00	$ 9.829.432,28	40 días	jue 21/05/26	sáb 4/07/26	78FC-10 días

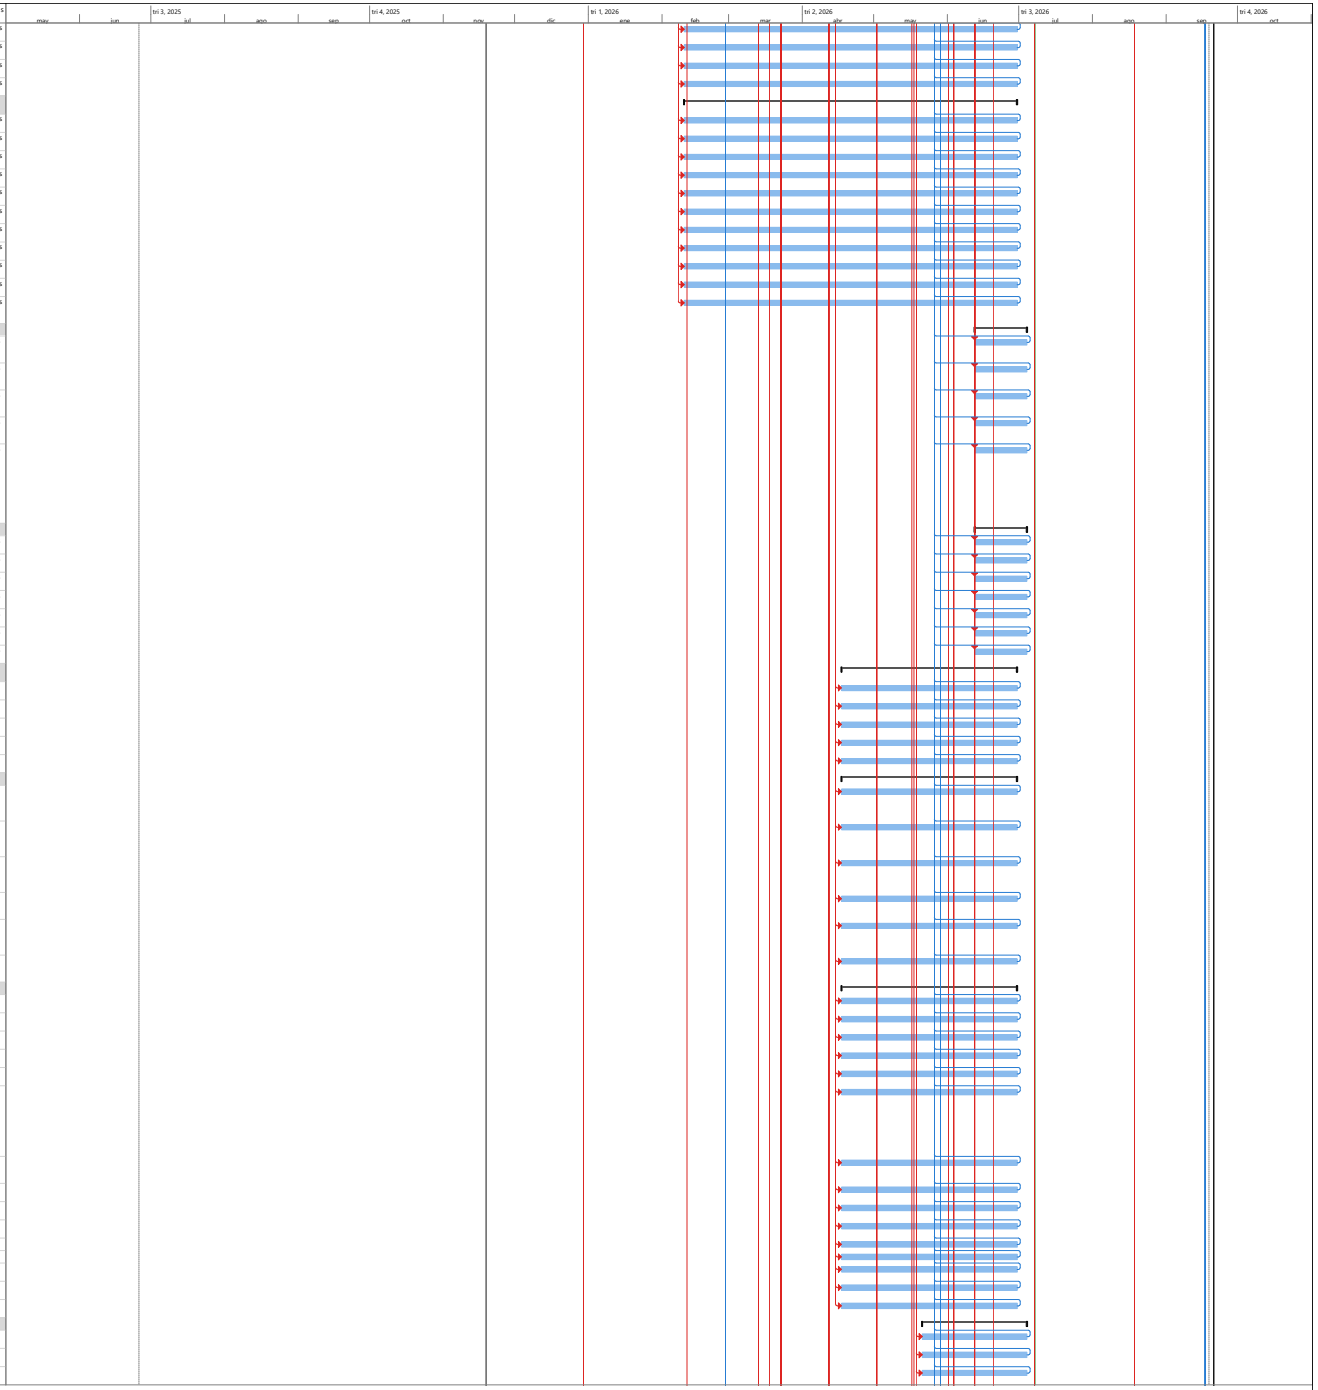


Proyecto: PROGRAMACION YO
Fecha: mié 8/07/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso


Id	Modo de Tarea	ITEM	Nombre de tarea	UNIDAD	CANTIDAD	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
291		09.14.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DESIRENAD	und	10,00	$ 6.877.154,99	40 días	jue 21/05/26	sáb 4/07/26	78FC-10 días
292		**09.15**	**CCTV0**			**$ 58.975.072,59**	**20 días**	**vie 12/06/26**	**sáb 4/07/26**	
293		09.15.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DENVR0	und	1,00	$ 18.398.910,97	20 días	vie 12/06/26	sáb 4/07/26	78FC+10 días
294		09.15.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMARA INTERIOR TIPO 1 MINI DOMO	und	19,00	$ 37.923.411,59	20 días	vie 12/06/26	sáb 4/07/26	78FC+10 días
295		09.15.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTO DE MONITOREO CCTV TIPO 1 INCLUYE UN PUESTO DE TRABAJO CON MONITOR	und	1,00	$ 2.652.750,03	20 días	vie 12/06/26	sáb 4/07/26	78FC+10 días
296		**09.16**	**CONTROL DE ACCESOS 0**			**$ 9.869.109,98**	**125 días**	**sáb 14/02/26**	**vie 3/07/26**	
297		09.16.02	Tablero regulado tipo industrial de 30kva incluye bypass con llave selectora protecciones y distribucion para 26 circuitos	und	1,00	$ 9.869.109,98	125 días	sáb 14/02/26	vie 3/07/26	78FC-100 días
298		**09.18**	**CERTIFICACIONES 0**			**$ 58.643.986,41**	**5 días**	**lun 14/09/26**	**vie 18/09/26**	
299		09.18.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERTIFICACIÓN PUNTOS LOGICOS DE VOZ T DATOS 0	und	151,00	$ 5.246.691,30	5 días	lun 14/09/26	vie 18/09/26	602FF
300		09.18.04	CERTIFICACION RETIE	UND	1,00	$ 12.869.000,00	5 días	lun 14/09/26	vie 18/09/26	602FF
301		09.18.05	CERTIFICACION RETILAB	UND	1,00	$ 12.869.000,00	5 días	lun 14/09/26	vie 18/09/26	602FF
302		09.18.06	PUESTA EN MARCHA, ARRANQUE Y PUESTA EN SERVICIO DEFINITIVO DE SISTEMA ELÉCTRICOS GENERALES, SISTEMAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS DE DETECCIÓN DE INCENDIOS, SISTEMAS CCTV, EQUIPOS ASCENSOR, PLANTA ELÉCTRICA INCLUYE INGENIERÍA, TRÁMITES DE CONEXIÓN A	UND	1,00	$ 27.659.295,11	5 días	lun 14/09/26	vie 18/09/26	602FF
303		**10**	**INSTALACIONES MECANICAS DE AIRE ACONDICIONADO**			**$ 753.913.682,18**	**159 días**	**mié 25/03/26**	**vie 18/09/26**	
304		**10.06**	**DE EQUIPOS MECÁNICOS, unidades condensadoras de refrigerante variable Cooling Only**			**$ 162.491.540,37**	**30 días**	**vie 1/05/26**	**mié 3/06/26**	
305		10.06.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA VRF CO >180 - <=200 MBH UNIDAD CONDENSADORA VRF C.O. R410A, CAPACIDAD DE 192 MBH, 208/3/60. (Incluye: Bases antivibratorias, transporte, puesta en sitio, accesorios de instalacion, mano de obra y pruebas)	und	1,00	$ 49.995.582,41	30 días	vie 1/05/26	mié 3/06/26	89
306		10.06.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA VRF CO >200 - <=220 MBH UNIDAD CONDENSADORA VRF C.O. R410A, CAPACIDAD DE 216 MBH, 208/3/60. (Incluye: Bases antivibratorias, transporte, puesta en sitio, accesorios de instalacion, mano de obra y pruebas)	und	1,00	$ 51.829.152,38	30 días	vie 1/05/26	mié 3/06/26	89
307		10.06.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA VRF CO >260 - <=280 MBH UNIDAD CONDENSADORA VRF C.O. R410A, CAPACIDAD DE 264 MBH, 208/3/60. (Incluye: Bases antivibratorias, transporte, puesta en sitio, accesorios de instalacion, mano de obra y pruebas)	und	1,00	$ 60.666.805,58	30 días	vie 1/05/26	mié 3/06/26	89
308		**10.14**	**DE EQUIPOS MECÁNICOS, Unidades evaporadoras VRF tipo Cassette 4 vias**			**$ 178.873.902,21**	**90 días**	**vie 1/05/26**	**lun 10/08/26**	
309		10.14.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD EVAPORADORA VRF- CST 4V >7.000 - <= 9.000 BTUH SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD EVAPORADORA VRF - CST 4V 9.000 BTUH (Incluye: Termostato de muro, panel decorativo, soporteria antivibratoria, accesorios de instalacion	und	1,00	$ 4.334.705,16	30 días	vie 1/05/26	mié 3/06/26	89
310		10.14.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD EVAPORADORA VRF- CST 4V >15.000 - <=18.000 BTUH SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD EVAPORADORA VRF - CST 4V 18.000 BTUH (Incluye: Termostato de muro, panel decorativo, soporteria antivibratoria, accesorios de instalaci	und	12,00	$ 64.824.148,90	30 días	mar 7/07/26	lun 10/08/26	89FC+60 días
311		10.14.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD EVAPORADORA VRF - CST 4V >21.000 - <= 24.000 BTUH SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD EVAPORADORA VRF - CST 4V 24.000 BTUH (Incluye: Termostato de muro, panel decorativo, soporteria antivibratoria, accesorios de instalac	und	2,00	$ 11.689.180,38	30 días	mar 7/07/26	lun 10/08/26	89FC+60 días
312		10.14.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD EVAPORADORA VRF - CST 4V >24.000 - <=28.000 BTUH SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD EVAPORADORA VRF - CST 4V 28.000 BTUH (Incluye: Termostato de muro, panel decorativo, soporteria antivibratoria, accesorios de instalaci	und	6,00	$ 37.551.183,49	30 días	mar 7/07/26	lun 10/08/26	89FC+60 días
313		10.14.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD EVAPORADORA VRF - CST 4V >30.000 - <=36.000 BTUH SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD EVAPORADORA VRF - CST 4V 36.000 BTUH (Incluye: Termostato de muro, panel decorativo, soporteria antivibratoria, accesorios de instalaci	und	7,00	$ 44.891.890,15	30 días	mar 7/07/26	lun 10/08/26	89FC+60 días
314		10.14.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD EVAPORADORA VRF - CST 4V >42.000 - <=48.000 BTUH SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD EVAPORADORA VRF - CST 4V 48.000 BTUH (Incluye: Termostato de muro, panel decorativo, soporteria antivibratoria, accesorios de instalaci	und	2,00	$ 15.582.794,13	30 días	mar 7/07/26	lun 10/08/26	89FC+60 días
315		**10.21**	**DE EQUIPOS MECÁNICOS, unidades minisplit independientes tipo FanCoil Desnudo**			**$ 23.546.205,97**	**30 días**	**mar 7/07/26**	**lun 10/08/26**	
316		10.21.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINISPLIT INVERTER INDEPENDIENTES FC >24.000 - <=36.000 BTUH SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD SPLIT CON EVAPORADORA TIPO FANCOIL DESNUDO, 28.000 BTUH (Incluye: Unidad interior y exterior, tuberia de cobre, soporetia antivibra	und	2,00	$ 23.546.205,97	30 días	mar 7/07/26	lun 10/08/26	89FC+60 días
317		**10.25**	**DE EQUIPOS MECÁNICOS, Ventiladores tipo centrífugos.**			**$ 13.861.597,55**	**30 días**	**mar 7/07/26**	**lun 10/08/26**	
318		10.25.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR CENTRIFUGO - TIPO 1 SUMISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR HONGO DE DESCARGA VERTICAL - VE-01 (Incluye: Tranporte, bases antivibratorias, ubicacion en sitio, puesta en marcha y pruebas)	und	1,00	$ 13.861.597,55	30 días	mar 7/07/26	lun 10/08/26	89FC+60 días
319		**10.32**	**DE EQUIPOS MECÁNICOS, Ventiladores tipo individual.**			**$ 6.319.303,15**	**30 días**	**mar 7/07/26**	**lun 10/08/26**	
320		10.32.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR individual - TIPO 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR INDIVIDUAL TIPO AXIAL - VAX-01 (Incluye: Tranporte, instalacion, accesorios, pruebas)	und	3,00	$ 3.655.137,03	30 días	mar 7/07/26	lun 10/08/26	89FC+60 días
321		10.32.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR individual - TIPO 2 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR INDIVIDUAL TIPO CENTRIFUGO - CFP-02 (Incluye: Tranporte, instalacion, accesorios, pruebas)	und	2,00	$ 2.664.166,12	30 días	mar 7/07/26	lun 10/08/26	89FC+60 días
322		**10.36**	**MATERIALES, Materiales para la fabricación de ductos rectangulares**			**$ 7.031.641,98**	**80 días**	**mié 25/03/26**	**mar 23/06/26**	
323		10.36.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA GALVANIZA CALIBRE 24	m2	40,58	$ 7.031.641,98	80 días	mié 25/03/26	mar 23/06/26	78FC-61 días

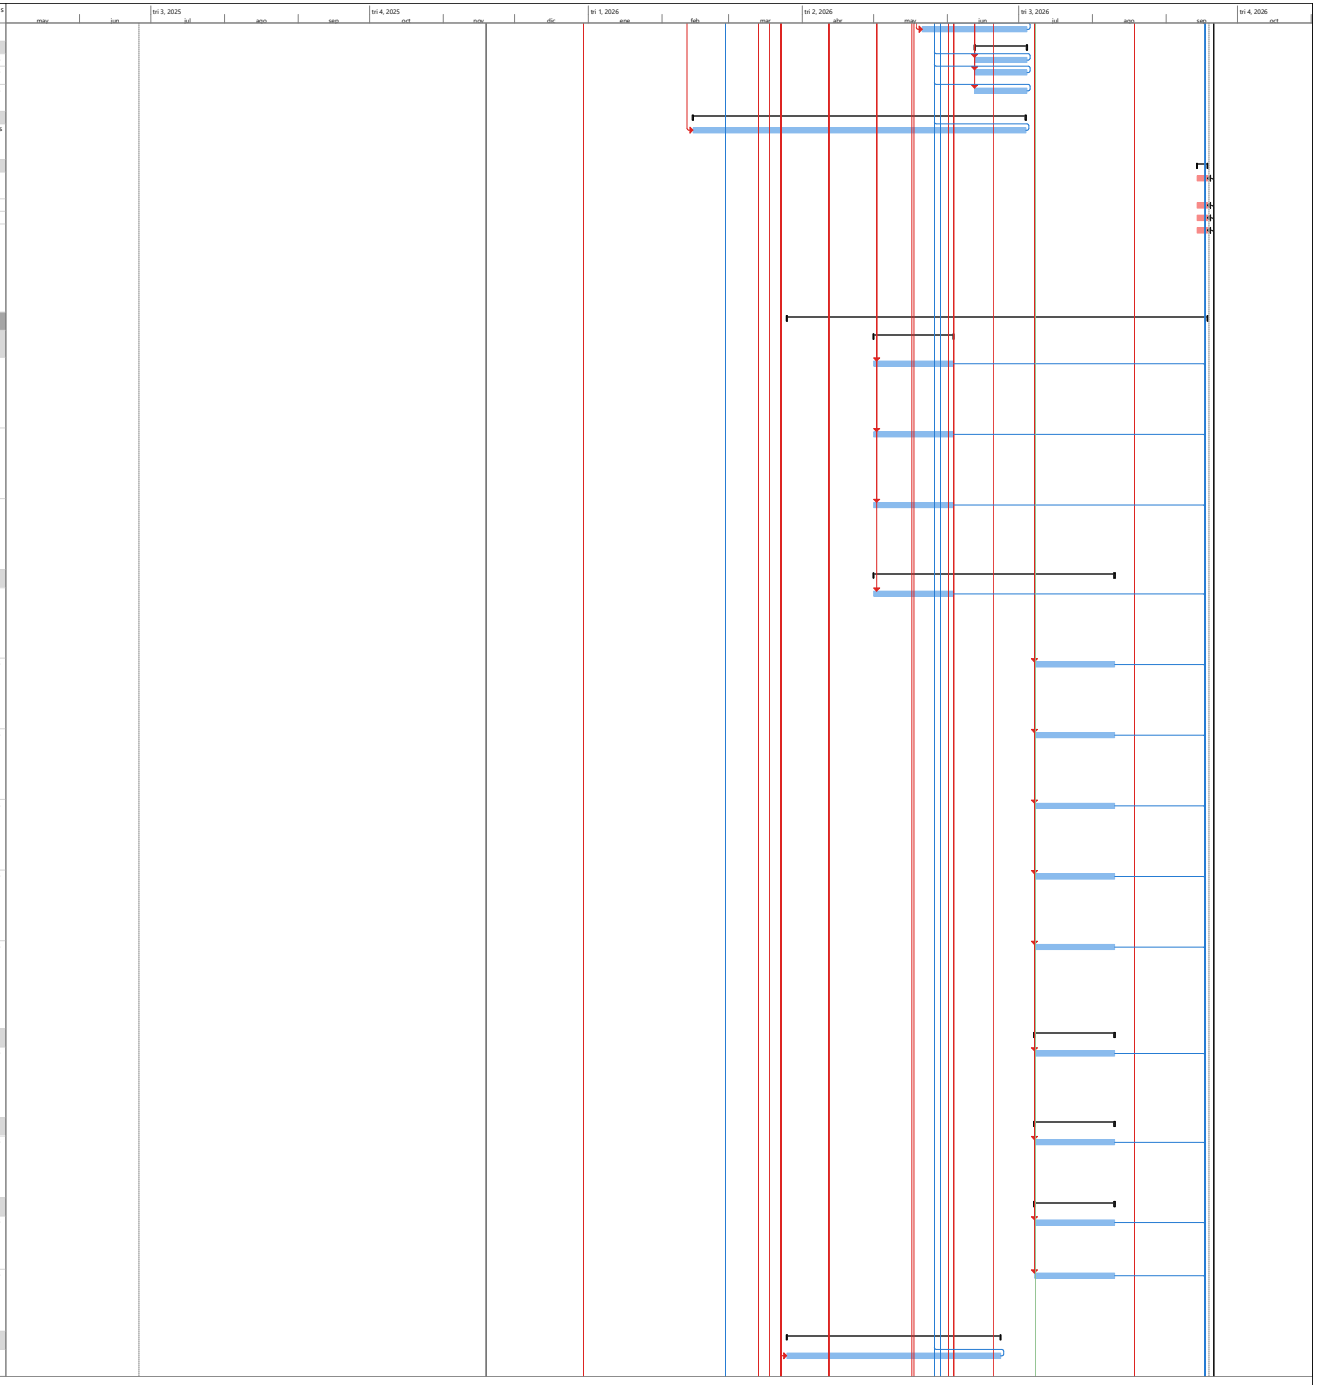

Id	Modo de Tarea	ITEM	Nombre de tarea	UNIDAD	CANTIDAD	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
324		**10.37**	**MATERIALES, Materiales para la fabricación de ductos circulares**			**$ 8.223.289,48**	**80 días**	**mié 25/03/26**	**mar 23/06/26**	
325		10.37.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Ducto circular (Lamina Galvanizada Cal 16)	m2	45,86	$ 6.924.019,93	80 días	mié 25/03/26	mar 23/06/26	78FC-61 días
326		10.37.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Ducto circular uniones (Lamina Galvanizada Cal 16)	m2	8,03	$ 1.299.269,55	80 días	mié 25/03/26	mar 23/06/26	78FC-61 días
327		**10.40**	**ACCESORIOS SISTEMA DE DUCTOS, Dampers de balanceo**			**$ 2.313.184,73**	**80 días**	**mié 25/03/26**	**mar 23/06/26**	
328		10.40.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DAMPERS DE BALANCEO	und	6,00	$ 2.313.184,73	80 días	mié 25/03/26	mar 23/06/26	78FC-61 días
329		**10.43**	**DIFUSORES Y REJILLAS, Difusores 3 vías**			**$ 1.137.858,96**	**80 días**	**mié 25/03/26**	**mar 23/06/26**	
330		10.43.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR 3 VIAS CON DAMPER OB DS3V - TAMAÑO 1 15 X 15 PULGADAS	und	2,00	$ 1.137.858,96	80 días	mié 25/03/26	mar 23/06/26	78FC-61 días
331		**10.50**	**DIFUSORES Y REJILLAS, Rejillas de extracción aleta fija**			**$ 3.604.919,62**	**80 días**	**mié 25/03/26**	**mar 23/06/26**	
332		10.50.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE EXT SIN DAMPER REAF - TAMAÑO 1 6 X 6 PULGADAS	und	17,00	$ 3.604.919,62	80 días	mié 25/03/26	mar 23/06/26	78FC-61 días
333		**10.52**	**DIFUSORES Y REJILLAS, Rejillas de retorno aleta fija**			**$ 1.254.287,38**	**80 días**	**mié 25/03/26**	**mar 23/06/26**	
334		10.52.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RET SIN DAMPER RRAF - TAMAÑO 1 16 X 16 PULGADAS	und	2,00	$ 1.254.287,38	80 días	mié 25/03/26	mar 23/06/26	78FC-61 días
335		**10.54**	**DIFUSORES Y REJILLAS, Rejillas tipo louver**			**$ 7.019.783,41**	**80 días**	**mié 25/03/26**	**mar 23/06/26**	
336		10.54.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA TIPO LOUVER RTLV - TAMAÑO 1 6 X 6 PULGADAS	und	33,00	$ 7.019.783,41	80 días	mié 25/03/26	mar 23/06/26	78FC-61 días
337		**10.55**	**TUBERIA DE REFRIGERACION, Tubería de refrigerante Rígida**			**$ 83.803.858,16**	**80 días**	**mié 25/03/26**	**mar 23/06/26**	
338		10.55.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO L (Ambos tubos aislados independientemente) 1/4"	m	68,38	$ 6.995.682,65	80 días	mié 25/03/26	mar 23/06/26	78FC-61 días
339		10.55.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO L (Ambos tubos aislados independientemente) 3/8"	m	135,24	$ 12.369.396,18	80 días	mié 25/03/26	mar 23/06/26	78FC-61 días
340		10.55.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO L (Ambos tubos aislados independientemente) 1/2"	m	76,25	$ 8.509.693,81	80 días	mié 25/03/26	mar 23/06/26	78FC-61 días
341		10.55.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO L (Ambos tubos aislados independientemente) 5/8"	m	215,06	$ 28.345.278,81	80 días	mié 25/03/26	mar 23/06/26	78FC-61 días
342		10.55.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO L (Ambos tubos aislados independientemente) 3/4"	m	28,51	$ 4.181.504,48	80 días	mié 25/03/26	mar 23/06/26	78FC-61 días
343		10.55.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO L (Ambos tubos aislados independientemente) 7/8"	m	18,50	$ 3.338.308,68	80 días	mié 25/03/26	mar 23/06/26	78FC-61 días
344		10.55.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO L (Ambos tubos aislados independientemente) 1 1/8"	m	86,60	$ 17.345.941,07	80 días	mié 25/03/26	mar 23/06/26	78FC-61 días
345		10.55.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO L (Ambos tubos aislados independientemente) 1 3/8"	m	10,90	$ 2.718.052,48	80 días	mié 25/03/26	mar 23/06/26	78FC-61 días
346		**10.57**	**TUBERIA DE REFRIGERACION, Accesorios derivadores de cobre aislados (BRANCH).**			**$ 31.102.941,97**	**80 días**	**mié 25/03/26**	**mar 23/06/26**	
347		10.57.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO DERIVADORES DE COBRE AISLADOS (BRANCH) 0	und	54,00	$ 31.102.941,97	80 días	mié 25/03/26	mar 23/06/26	78FC-61 días
348		**10.58**	**TUBERIA DE REFRIGERACION, Adicionales**			**$ 4.902.522,76**	**80 días**	**mié 25/03/26**	**mar 23/06/26**	
349		10.58.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Cantidad de refrigerante adicional R410A	kg	40,00	$ 4.902.522,76	80 días	mié 25/03/26	mar 23/06/26	78FC-61 días
350		**10.59**	**SISTEMA ELÉCTRICO, Tableros eléctricos**			**$ 10.587.251,66**	**80 días**	**mié 25/03/26**	**mar 23/06/26**	
351		10.59.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLEROS ELECTRICOS TAE-01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO TAE-01 (Incluye: Tablero para interiores con proteccion a la corrosion, soporteria, protecciones electricas, accesorios, instalacion y pruebas)	und	1,00	$ 6.059.331,33	80 días	mié 25/03/26	mar 23/06/26	78FC-61 días
352		10.59.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLEROS ELECTRICOS TAE-02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO TAE-02 (Incluye: Tablero para interiores con proteccion a la corrosion, soporteria, protecciones electricas, accesorios, instalacion y pruebas)	und	1,00	$ 4.527.920,33	80 días	mié 25/03/26	mar 23/06/26	78FC-61 días
353		**10.61**	**SISTEMA DE CONTROL, tableros de control**			**$ 9.422.605,87**	**80 días**	**mié 25/03/26**	**mar 23/06/26**	
354		10.61.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Tablero de control TC-01	und	1,00	$ 9.422.605,87	80 días	mié 25/03/26	mar 23/06/26	78FC-61 días
355		**10.62**	**SISTEMA DE CONTROL, controladores**			**$ 42.080.478,22**	**80 días**	**mié 25/03/26**	**mar 23/06/26**	
356		10.62.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Control central VRF <=64 UI 0	und	1,00	$ 27.243.617,66	80 días	mié 25/03/26	mar 23/06/26	78FC-61 días
357		10.62.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Control Controlador de campo SUPERVISOR TIPO 1 0	und	1,00	$ 14.836.860,56	80 días	mié 25/03/26	mar 23/06/26	78FC-61 días
358		**10.63**	**SISTEMA DE CONTROL, Sensores - actuadores**			**$ 46.987.209,15**	**80 días**	**mié 25/03/26**	**mar 23/06/26**	
359		10.63.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Termostatos VRF independientes por área 0	und	30,00	$ 45.271.533,38	80 días	mié 25/03/26	mar 23/06/26	78FC-61 días
360		10.63.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Rele contactor	und	1,00	$ 940.584,91	80 días	mié 25/03/26	mar 23/06/26	78FC-61 días
361		10.63.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Dona de corriente	und	1,00	$ 775.090,86	80 días	mié 25/03/26	mar 23/06/26	78FC-61 días
362		**10.64**	**SISTEMA DE CONTROL, Otras actividades**			**$ 109.349.299,58**	**159 días**	**mié 25/03/26**	**vie 18/09/26**	
363		10.64.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Transformador tableros de control 0	und	1,00	$ 589.935,55	80 días	mié 25/03/26	mar 23/06/26	78FC-61 días
364		10.64.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Cableado de control SENSORES (Incluye canalización y5Oporteria). (Incluye canalización y5Oporteria).	m	450,00	$ 32.019.873,66	80 días	mié 25/03/26	mar 23/06/26	78FC-61 días
365		10.64.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Cableado de control COMUNICACION (Incluye canalización y5Oporteria). (Incluye canalización y5Oporteria).	m	750,00	$ 60.143.914,95	80 días	mié 25/03/26	mar 23/06/26	78FC-61 días
366		10.64.06	PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN, ARRANQUE Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMAS HIDRO NEUMÁTICOS INCLUYE INGENIERÍA, TRÁMITES DE CONEXIÓN ANTE OPERADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONSUMIBLES, MANUALES Y DEMÁS INSUMOS NECESARIOS PARA SUS CORRECTO FUNCIONAMIENTO, INCLU	und	1,00	$ 16.595.575,42	10 días	mar 8/09/26	vie 18/09/26	602FF
367		**11**	**SOBREPISOS Y ACABADOS INTERIORES**			**$ 51.153.319,84**	**72 días**	**lun 16/03/26**	**mié 3/06/26**	
368		**11.02**	**ALISTADOS DE PISOS**			**$ 48.365.961,18**	**20 días**	**lun 16/03/26**	**mar 7/04/26**	
369		11.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALISTADO LLANA MADERA MORTERO 1:3 E=0,04M	m2	1037,78	$ 38.617.869,78	20 días	lun 16/03/26	mar 7/04/26	78FC-70 días
370		11.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALISTADO IMPERMEABILIZADO INTEGRAL E=0,04M	m2	97,55	$ 6.800.595,51	20 días	lun 16/03/26	mar 7/04/26	78FC-70 días
371		11.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALISTADO PASO ESCALERAS 0	m	81,60	$ 2.278.109,50	20 días	lun 16/03/26	mar 7/04/26	78FC-70 días
372		11.02.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALISTADO, PENDIENTADO E IMPERMEABILIZADO PARA CUBIERTAS	m2	7,96	$ 669.386,39	20 días	lun 16/03/26	mar 7/04/26	78FC-70 días
373		**11.03**	**POYOS, BORDILLOS Y CARCAMOS FUNDIDOS**			**$ 2.787.358,66**	**14 días**	**mar 19/05/26**	**mié 3/06/26**	

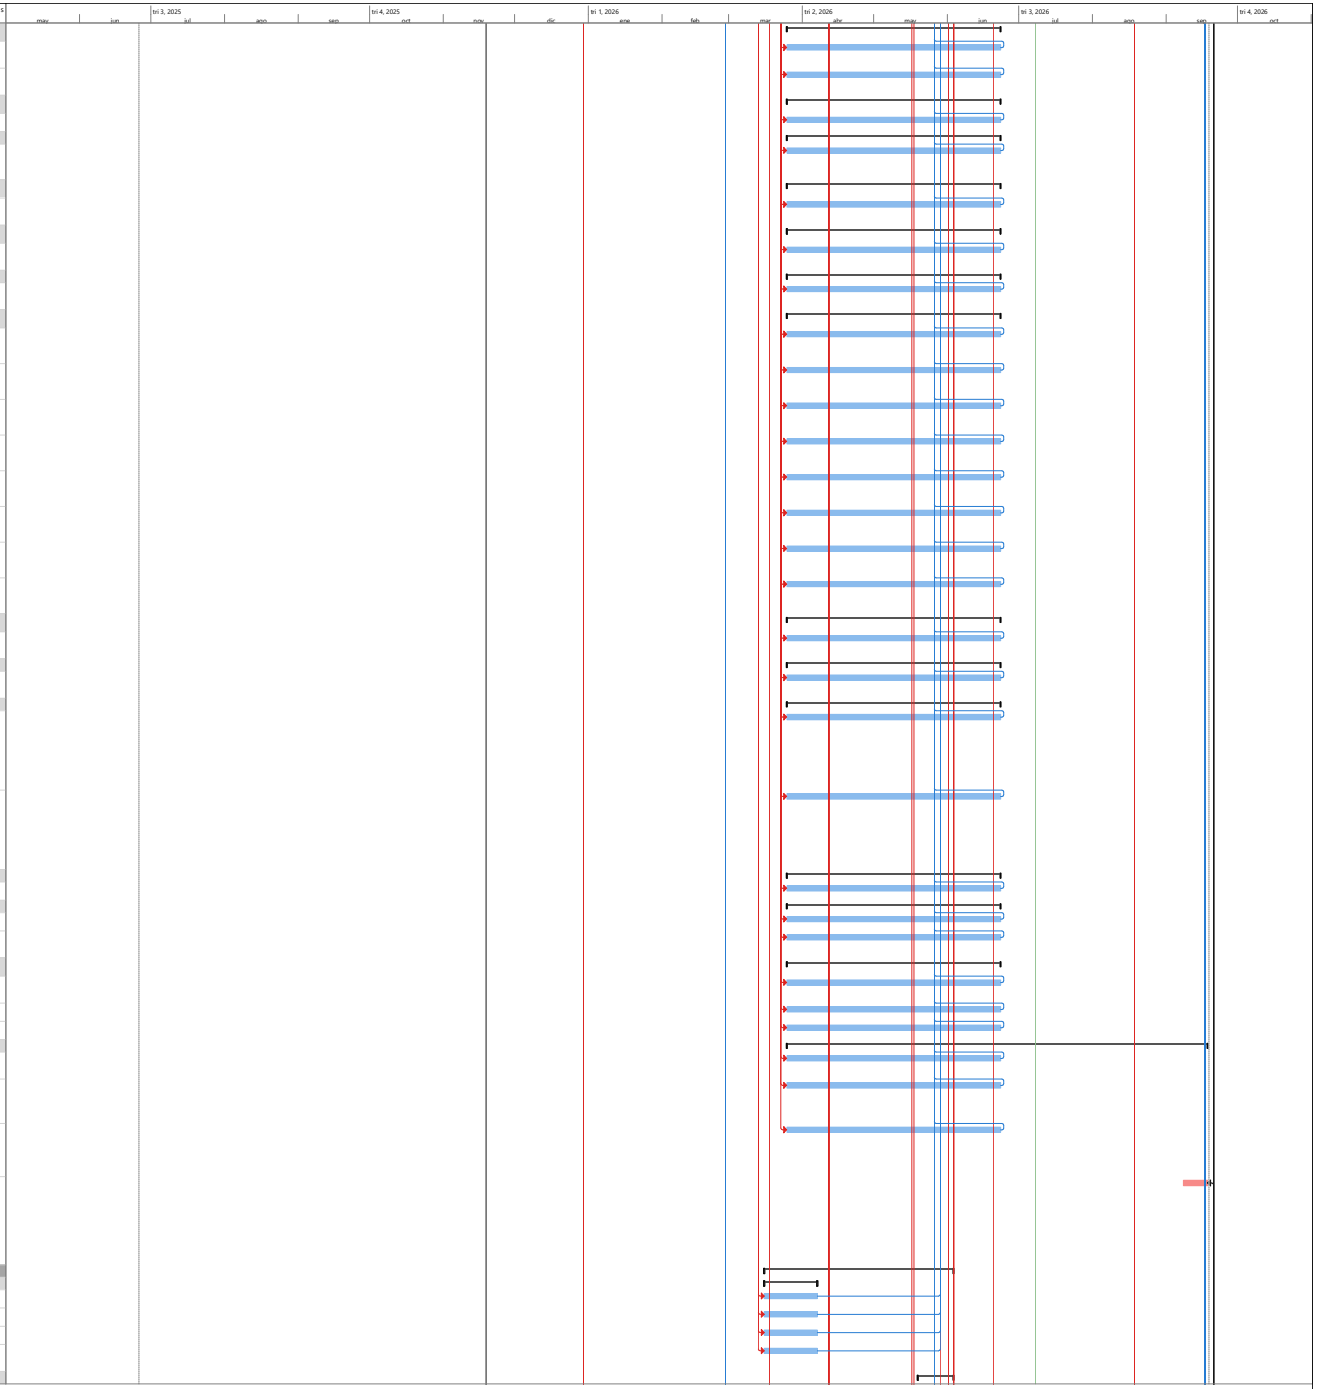


Id	Modo de Tarea	ITEM	Nombre de tarea	UNIDAD	CANTIDAD	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
374		11.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POYO EN CONCRETO EN CONCRETO 2500 PSI PARA MUEBLES FIJOS H=0,15	m	40,78	$ 2.787.358,66	14 días	mar 19/05/26	mié 3/06/26	78FC-12 días
375		**12**	**ACABADOS DE PISOS**			**$ 316.237.554,33**	**92 días**	**mar 14/04/26**	**sáb 25/07/26**	
376		**12.02**	**PISOS Y GUARDAESCOBAS EN PORCELANATO**			**$ 20.093.817,33**	**92 días**	**mar 14/04/26**	**sáb 25/07/26**	
377		12.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN PORCELANATO TEMPO 0,60 X 0,60 M COLOR GRIS OSCURO, SIMILAR O EQUIVALENTE - INCLUYE LOS ACCESORIOS, ELEMENTOS HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	m2	101,55	$ 20.093.817,33	92 días	mar 14/04/26	sáb 25/07/26	89FC-15 días
378		**12.03**	**PISOS EN CONCRETO**			**$ 711.259,33**	**30 días**	**mié 20/05/26**	**mar 23/06/26**	
379		12.03.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CONCRETO ESMALTADO PARA ASEOS Y CUARTOS TÉCNICOS E=10CM	m2	4,00	$ 711.259,33	30 días	mié 20/05/26	mar 23/06/26	78FC-11 días
380		**12.05**	**PISOS EN GRANITO**			**$ 286.371.204,75**	**92 días**	**mar 14/04/26**	**sáb 25/07/26**	
381		12.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN GRANITO BALDOSA TERRAZO BH MAZZ 30X30-1- INCLUYE LOS ACCESORIOS, ELEMENTOS HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	m2	1037,78	$ 161.965.076,67	90 días	mar 14/04/26	jue 23/07/26	89FC-15 días
382		12.05.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZOCALO BH MAZZ - 30CM X 7CM, H=10CM, - INCLUYE LOS ACCESORIOS, ELEMENTOS HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	m	724,24	$ 61.619.864,88	70 días	mar 14/04/26	mié 1/07/26	89FC-15 días
383		12.05.19	Destronque, lijado, cristalizado y brillado de pisoGRANITO	m2	1050,78	$ 62.786.263,20	92 días	mar 14/04/26	sáb 25/07/26	89FC-15 días
384		**12.13**	**CENEFAS**			**$ 2.169.991,37**	**92 días**	**mar 14/04/26**	**sáb 25/07/26**	
385		12.13.41	CENEFA EN GRANITO PULIDO COLOR GRIS OSCURO TIPO BOCAPUERTAS	m	33,60	$ 2.169.991,37	92 días	mar 14/04/26	sáb 25/07/26	89FC-15 días
386		**12.14**	**PIRLANES**			**$ 2.617.702,85**	**92 días**	**mar 14/04/26**	**sáb 25/07/26**	
387		12.14.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIRLAN EN ALUMINIO PARA TAPAR JUNTAS DE TRANSICION PERFIL DE TRANSICIÓN O T - D= 4,5CM - (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	m	43,20	$ 2.617.702,85	92 días	mar 14/04/26	sáb 25/07/26	89FC-15 días
388		**12.19**	**ACABADOS PARA ESCALERAS**			**$ 4.273.578,70**	**92 días**	**mar 14/04/26**	**sáb 25/07/26**	
389		12.19.52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN GRANITO BALDOSA TERRAZO BH MAZZ 30X30-1 - INCLUYE LOS ACCESORIOS, ELEMENTOS HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	m	38,40	$ 4.273.578,70	92 días	mar 14/04/26	sáb 25/07/26	89FC-15 días
390		**13**	**CUBIERTAS, MARQUESINAS Y CLARABOYAS**			**$ 190.315.319,40**	**40 días**	**lun 1/06/26**	**mié 15/07/26**	
391		**13.01**	**CUBIERTAS METALICAS**			**$ 12.012.667,23**	**30 días**	**lun 1/06/26**	**vie 3/07/26**	
392		13.01.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL 26. PARA JUNTAS ENTRE TEJA TERMOACUSTICA Y ELEMENTOS DE CUBIERTA EXISTENTES (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	m	140,49	$ 12.012.667,23	30 días	lun 1/06/26	vie 3/07/26	89FC+27 días
393		**13.05**	**CUBIERTAS TERMOACUSTICAS**			**$ 102.344.572,70**	**30 días**	**lun 1/06/26**	**vie 3/07/26**	
394		13.05.01	SUMINISTRO Y E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA TERMOACÚSTICA TIPO SANDWICH DE DOS CAPAS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 CON AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, e = 3.8 cm, lamina inferior y superior con acabado en color a definir	m2	293,92	$ 102.344.572,70	30 días	lun 1/06/26	vie 3/07/26	89FC+27 días
395		**13.06**	**MARQUESINAS**			**$ 75.958.079,47**	**40 días**	**lun 1/06/26**	**mié 15/07/26**	
396		13.06.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLICARBONATO ARKOPAL INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	m2	140,26	$ 75.958.079,47	40 días	lun 1/06/26	mié 15/07/26	89FC+27 días
397		**14**	**IMPERMEABILIZACIONES Y CUBIERTAS VEGETALES**			**$ 32.718.454,92**	**47 días**	**sáb 20/06/26**	**mar 11/08/26**	
398		**14.02**	**IMPERMEABILIZACIONES CON MEMBRANA**			**$ 32.718.454,92**	**47 días**	**sáb 20/06/26**	**mar 11/08/26**	
399		14.02.01	IMPERMEABILIZACION CON MANTO ASFALTICO PARA CUBIERTA Y VIGA CANAL	m2	236,18	$ 20.964.568,34	32 días	mar 7/07/26	mar 11/08/26	381FC-15 días
400		14.02.02	IMPERMEABILIZACION MEMBRANA EN PVC TANQUE	m2	51,34	$ 11.753.886,58	30 días	sáb 20/06/26	jue 23/07/26	89FC+45 días
401		**15**	**METALISTERIA 0**			**$ 497.658.517,00**	**58 días**	**jue 16/07/26**	**vie 18/09/26**	
402		**15.01**	**PUERTAS EN ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO 0**			**$ 101.499.006,46**	**29 días**	**jue 16/07/26**	**lun 17/08/26**	
403		15.01.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10MM (INCLUYE MARCO, MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	m2	100,22	$ 101.499.006,46	29 días	jue 16/07/26	lun 17/08/26	381FC-7 días
404		**15.02**	**PUERTAS EN LAMINA COLD ROLLED 0**			**$ 66.931.326,49**	**29 días**	**jue 16/07/26**	**lun 17/08/26**	
405		15.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LAMINA SENCILLA CON PERSIANA INFERIOR (INCLUYE MARCO, MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	m2	39,97	$ 33.794.212,89	29 días	jue 16/07/26	lun 17/08/26	381FC-7 días
406		15.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LAMINA ENTAMBORADA CALIBRE 18 CON PERSIANA INFERIOR (INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION, ANTICORROSIVO, ESMALTE, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	m2	8,24	$ 6.529.171,78	29 días	jue 16/07/26	lun 17/08/26	381FC-7 días
407		15.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LAMINA ENTAMBORADA SENCILLA CON PERSIANA COMPLETA - (INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION, ANTICORROSIVO, ESMALTE, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	m2	18,93	$ 18.346.111,38	29 días	jue 16/07/26	lun 17/08/26	381FC-7 días
408		15.02.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LAMINA INGRESO ZONA DE PARQUEADEROS - (INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION, ANTICORROSIVO, ESMALTE, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	m2	7,50	$ 8.261.830,44	29 días	jue 16/07/26	lun 17/08/26	381FC-7 días
409		**15.06**	**VENTANAS EN ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO 0**			**$ 229.430.832,73**	**28 días**	**mar 18/08/26**	**vie 18/09/26**	
410		15.06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO FIJA EN VIDRIO CRUDO 3+3 (INCLUYEACCESORIOS DE FIJACION, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	m2	46,05	$ 38.604.345,19	28 días	mar 18/08/26	vie 18/09/26	89FC+98 días
411		15.06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINO CORREDIZA EN VIDRIO CRUDO 3+3 (INCLUYEACCESORIOS DE FIJACION, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	m2	169,64	$ 190.826.487,54	28 días	mar 18/08/26	vie 18/09/26	89FC+98 días
412		**15.10**	**BARANDAS Y PASAMANOS METALICOS 0**			**$ 23.802.359,35**	**28 días**	**mar 18/08/26**	**vie 18/09/26**	
413		15.10.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN LAMINA (INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	m	28,29	$ 23.802.359,35	28 días	mar 18/08/26	vie 18/09/26	89FC+98 días
414		**15.11**	**BARANDAS Y PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE 0**			**$ 23.488.410,78**	**29 días**	**jue 16/07/26**	**lun 17/08/26**	

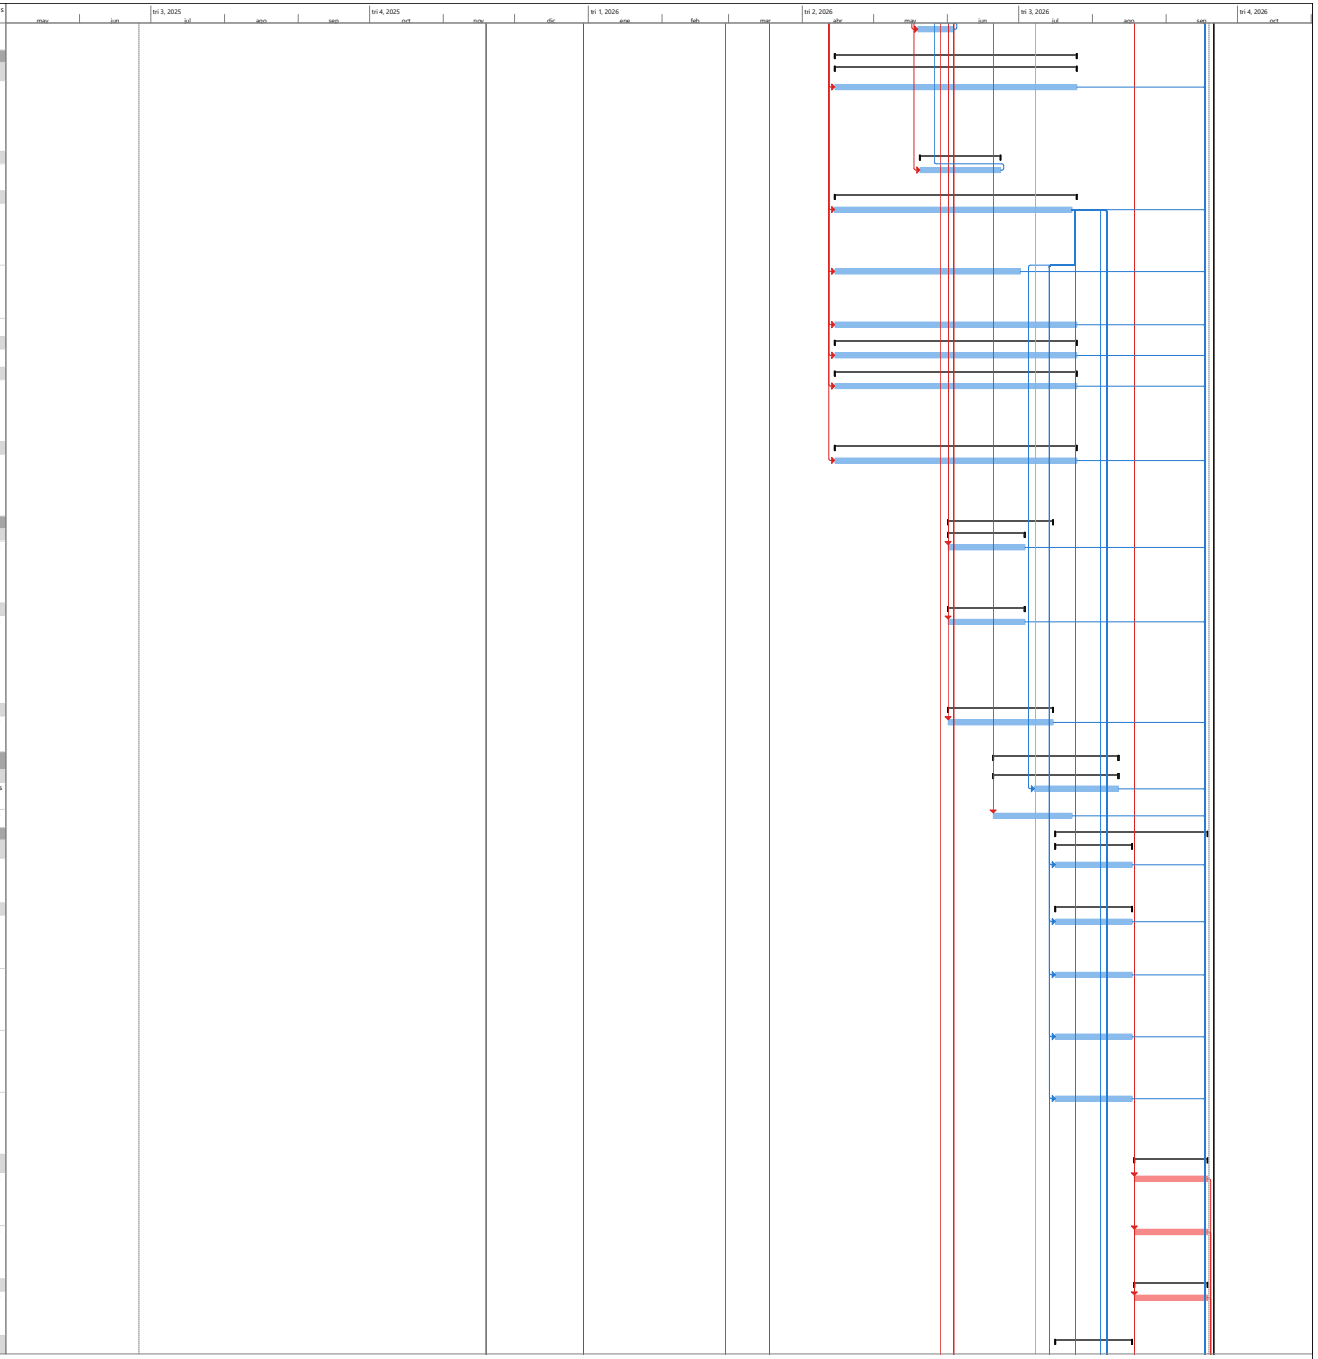

Proyecto: PROGRAMACION YO
Fecha: mié 8/07/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso


Id	Modo de Tarea	ITEM	Nombre de tarea	UNIDAD	CANTIDAD	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
415		15.11.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE (INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	m	38,52	$ 23.488.410,78	29 días	jue 16/07/26	lun 17/08/26	381FC-7 días
416		**15.17**	**PERSIANAS EN ALUMINIO 0**			**$ 39.893.947,11**	**29 días**	**jue 16/07/26**	**lun 17/08/26**	
417		15.17.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERSIANA EN ALUMINO PARA VENTILACIÓN EN EL VACIO CENTRAL CON MARQUESINA (INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	m2	35,81	$ 39.893.947,11	29 días	jue 16/07/26	lun 17/08/26	381FC-7 días
418		**15.23**	**ACCESORIOS EN LAMINA 0**			**$ 12.612.634,08**	**29 días**	**jue 16/07/26**	**lun 17/08/26**	
419		15.23.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA ESCALERA TIPO GATO CON JAULA DE SEGURIDAD PARA INSPECCION DE CUBIERTAS - (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	und	1,00	$ 1.253.637,50	29 días	jue 16/07/26	lun 17/08/26	381FC-7 días
420		15.23.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES CERTIFICADOS EN CUBIERTA 0	und	16,00	$ 9.265.680,00	29 días	jue 16/07/26	lun 17/08/26	381FC-7 días
421		15.23.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA DE GATO CON JAULA DE SEGURIDAD - (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	und	1,00	$ 1.770.443,67	29 días	jue 16/07/26	lun 17/08/26	381FC-7 días
422		15.23.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXOSTO PLANTA ELECTRICA 0	ml	1,00	$ 322.872,91	29 días	jue 16/07/26	lun 17/08/26	381FC-7 días
423		**16**	**CARPINTERIA EN MADERA 0**			**$ 125.465.234,61**	**58 días**	**jue 16/07/26**	**vie 18/09/26**	
424		**16.09**	**MUEBLES FIJOS 0**			**$ 53.502.249,79**	**29 días**	**jue 16/07/26**	**lun 17/08/26**	
425		16.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE ESPECIAL MF-1A - MUEBLE DE RECEPCIÓN SEGÚN DETALLE PLANO CAPITULO D800	und	1,00	$ 14.202.498,65	29 días	jue 16/07/26	lun 17/08/26	381FC-7 días
426		16.09.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE PARA COCINETA SEGÚN DETALLE PLANO CAPITULO DE800	und	3,00	$ 14.787.291,75	29 días	jue 16/07/26	lun 17/08/26	381FC-7 días
427		16.09.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE ESPECIAL MF-3A - MUEBLE PARA SALA AMIGA SEGÚN DETALLE PLANO CAPITULO D800	und	1,00	$ 6.112.775,00	29 días	jue 16/07/26	lun 17/08/26	381FC-7 días
428		16.09.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE ESPECIAL MF-4A - VENTANILLA DE ATENCIÓN SEGÚN DETALLE PLANO CAPITULO D800	und	8,00	$ 18.399.684,39	29 días	jue 16/07/26	lun 17/08/26	381FC-7 días
429		**16.10**	**FACHADAS Y RECUBRIMIENTOS EXTERIORES EN MADERA 0**			**$ 71.962.984,82**	**28 días**	**mar 18/08/26**	**vie 18/09/26**	
430		16.10.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTO EN MADERA TIPO PANEL WPC TIPO ARBOWOOD WALLPANEL EXT 3D. 220-24, 4 PASTILLAS, 24MM - 0,22MX2,90M COLOR TEKA CLARO CEPILLADO	m2	129,59	$ 71.962.984,82	28 días	mar 18/08/26	vie 18/09/26	89FC+98 días
431		**17**	**ENCHAPES Y REVESTIMIENTOS 0**			**$ 77.504.861,33**	**29 días**	**jue 16/07/26**	**lun 17/08/26**	
432		**17.01**	**ENCHAPESSOBRE MUROS 0**			**$ 77.504.861,33**	**29 días**	**jue 16/07/26**	**lun 17/08/26**	
433		17.01.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE BLANCO X M2 0,3X60,60 - (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	m2	344,48	$ 69.114.006,79	29 días	jue 16/07/26	lun 17/08/26	381FC-7 días
434		17.01.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN BLANCO X ML 0,30X0,60 - (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	m	62,38	$ 8.390.854,54	29 días	jue 16/07/26	lun 17/08/26	381FC-7 días
435		**18**	**CIELO RASOS 0**			**$ 172.907.786,97**	**30 días**	**mié 3/06/26**	**mar 7/07/26**	
436		**18.01**	**CIELO RASO EN YESO 0**			**$ 172.907.786,97**	**30 días**	**mié 3/06/26**	**mar 7/07/26**	
437		18.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PLANO DRY WALL MACLLADO, LIJADO Y PINTADO A UNA MANO, INSTALACION SEGÚN DETALLES ARQUITECTONICOS, (INCLUYE, CINTA PAPEL Y CINTA MALLA PARA JUNTAS DE LAMINAS, ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE, ANCLAJES, ACCESORIOS Y T	m2	850,05	$ 136.535.509,41	30 días	mié 3/06/26	mar 7/07/26	89FC+30 días
438		18.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINERO EN DRYWALL (INCLUYE, CINTA PAPEL Y CINTA MALLA PARA JUNTAS DE LAMINAS, ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE, ANCLAJES, ACCESORIOS Y TORNILLERIA, PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO)	m	283,90	$ 21.933.841,88	30 días	mié 3/06/26	mar 7/07/26	89FC+30 días
439		18.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PLANO DRY WALL R.H MACLLADO, LIJADO Y PINTADO A UNA MANO, INSTALACION SEGÚN DETALLES ARQUITECTONICOS, (INCLUYE, CINTA PAPEL Y CINTA MALLA PARA JUNTAS DE LAMINAS, ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE, ANCLAJES, ACCESORIOS	m2	102,50	$ 14.438.435,68	30 días	mié 3/06/26	mar 7/07/26	89FC+30 días
440		**19**	**ILUMINACION 0**			**$ 78.485.020,95**	**30 días**	**jue 16/07/26**	**mar 18/08/26**	
441		**19.01**	**LAMPARAS DESOBREPONER 0**			**$ 1.643.268,35**	**30 días**	**jue 16/07/26**	**mar 18/08/26**	
442		19.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA DE SOBREPONER LUMINARIA LED HERMÉTICA 2X18W	und	10,00	$ 1.643.268,35	30 días	jue 16/07/26	mar 18/08/26	381FC-7 días
443		**19.02**	**BALAS DE EMPOTRAR Y DE INCRUSTAR 0**			**$ 6.904.419,26**	**30 días**	**jue 16/07/26**	**mar 18/08/26**	
444		19.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA INCRUSTAR 9W	und	99,00	$ 5.938.513,30	30 días	jue 16/07/26	mar 18/08/26	381FC-7 días
445		19.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL REDONDO INCRUSTAR 18W	und	14,00	$ 965.905,96	30 días	jue 16/07/26	mar 18/08/26	381FC-7 días
446		**19.04**	**LUMINARIAS LINEALES 0**			**$ 53.884.380,59**	**30 días**	**jue 16/07/26**	**mar 18/08/26**	
447		19.04.01	LUMINARIA LINEAL 120CM 40W	und	119,00	$ 53.884.380,59	30 días	jue 16/07/26	mar 18/08/26	381FC-7 días
448		**19.06**	**PROYECTORES Y REFLECTORES 0**			**$ 318.335,31**	**30 días**	**jue 16/07/26**	**mar 18/08/26**	
449		19.06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR 50W	und	2,00	$ 318.335,31	30 días	jue 16/07/26	mar 18/08/26	381FC-7 días
450		**19.10**	**LUMINARIA DE EMERGENCIA 0**			**$ 15.734.617,44**	**30 días**	**jue 16/07/26**	**mar 18/08/26**	
451		19.10.02	Suministro e instalacion de rotulo de emergencia Incluye elementos de fijacion y todos sus elementos para su correcto funcionamiento	und	20,00	$ 4.313.431,42	30 días	jue 16/07/26	mar 18/08/26	381FC-7 días
452		19.10.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO MICKEY MOUSE	und	60,00	$ 11.421.186,02	30 días	jue 16/07/26	mar 18/08/26	381FC-7 días
453		**20**	**DOTACION BAÑOS 0**			**$ 99.853.913,08**	**30 días**	**jue 16/07/26**	**mar 18/08/26**	
454		**20.01**	**SANITARIOS Y TAZAS 0**			**$ 29.598.950,94**	**30 días**	**jue 16/07/26**	**mar 18/08/26**	
455		20.01.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZA BALTICÁ, ENTRADA POSTERIOR, CON ASIENTO INSTITUCIONAL FORTE (INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	und	9,00	$ 15.398.147,14	30 días	jue 16/07/26	mar 18/08/26	381FC-7 días
456		20.01.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZA ADRIÁTICA (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	und	1,00	$ 1.553.903,44	30 días	jue 16/07/26	mar 18/08/26	381FC-7 días
457		20.01.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUSH ANTIVANDALICO	UND	13,00	$ 12.646.900,36	30 días	jue 16/07/26	mar 18/08/26	381FC-7 días
458		**20.02**	**LAVAMANOS 0**			**$ 27.540.963,63**	**30 días**	**jue 16/07/26**	**mar 18/08/26**	
459		20.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE COLGAR TIPO AGUAJET PARA BAÑO ACCESIBLE	und	1,00	$ 905.608,26	30 días	jue 16/07/26	mar 18/08/26	381FC-7 días
460		20.02.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS CORRIDO GRANITO SILVER GRAY 20MM CON SALPICADERO INTEGRADO 0,25 M - DETALLE PLANO CAPITULO D-800 (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	m	11,31	$ 26.635.355,37	30 días	jue 16/07/26	mar 18/08/26	381FC-7 días
461		**20.03**	**ORINALES 0**			**$ 4.698.630,19**	**30 días**	**jue 16/07/26**	**mar 18/08/26**	

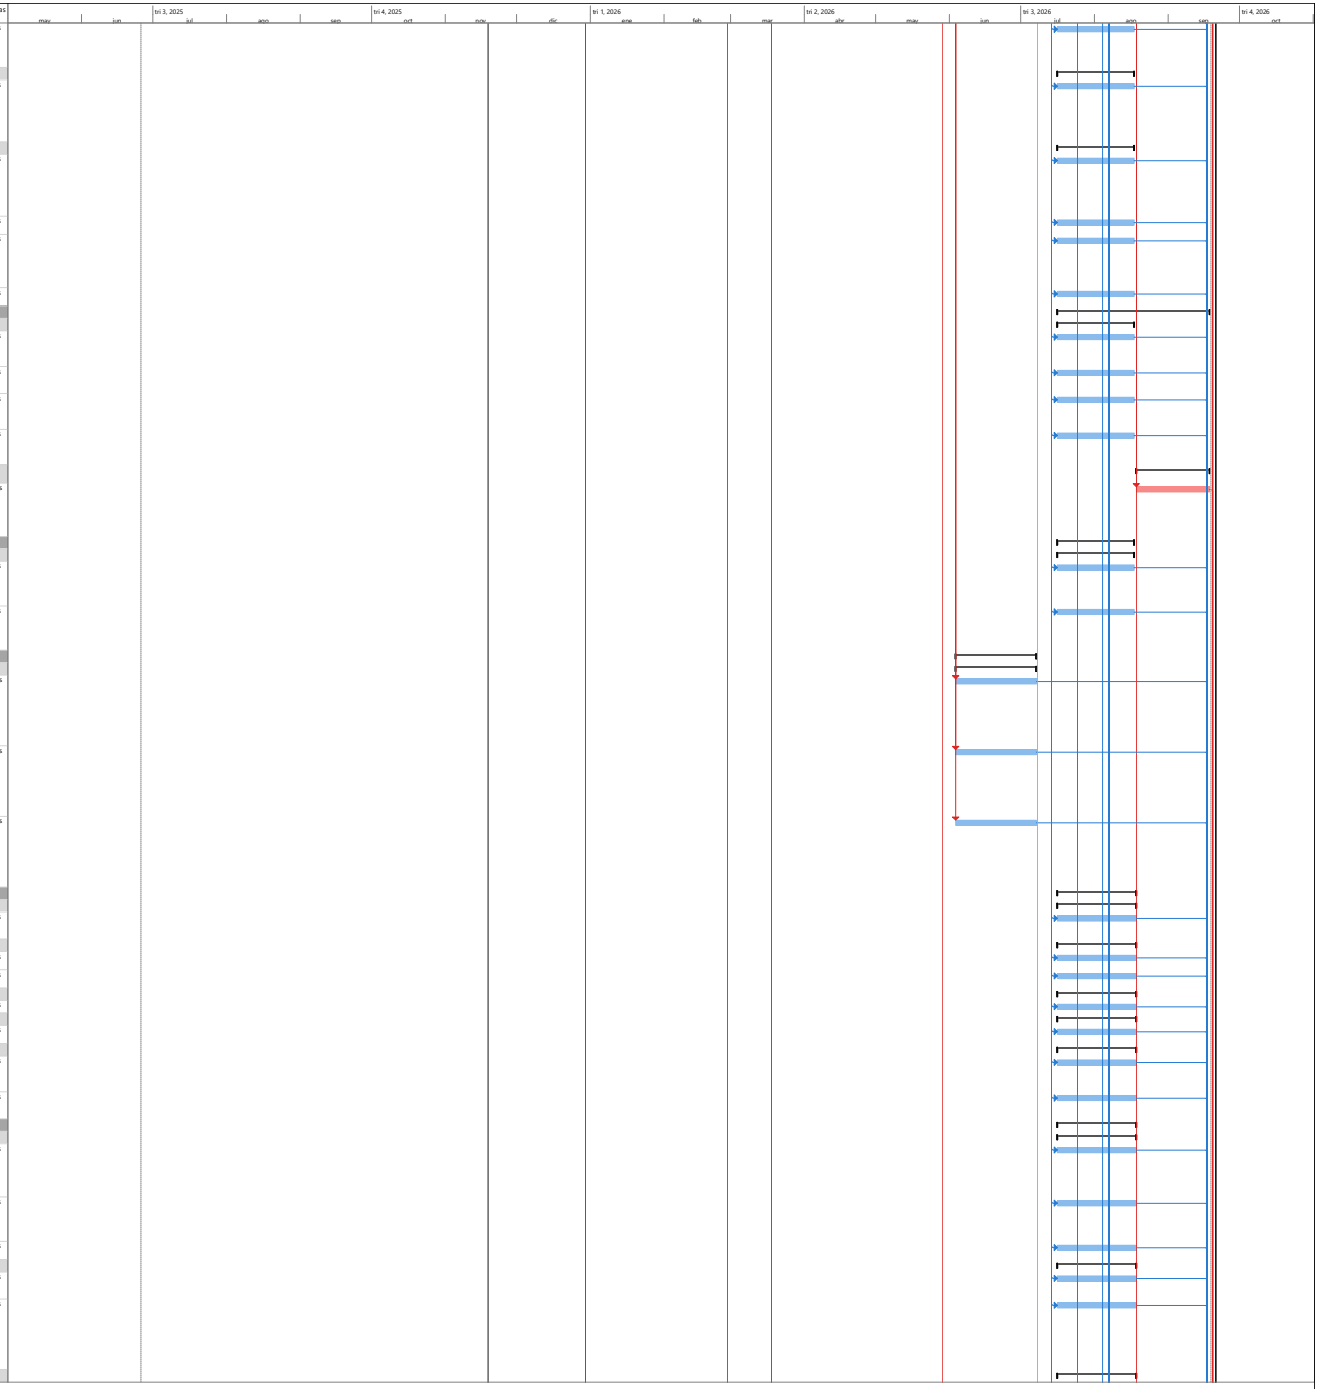

Proyecto: PROGRAMACION YO
Fecha: mié 8/07/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso


Id	Modo de Tarea	ITEM	Nombre de tarea	UNIDAD	CANTIDAD	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
462		20.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL TIPO GOTTA - (INCLUYE, ANCLAJES Y ACCESORIOS, PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO)	und	3,00	$ 4.698.630,19	30 días	jue 16/07/26	mar 18/08/26	381FC-7 días
463		**20.05**	**COMBOS SANITARIOS 0**			**$ 5.017.875,33**	**30 días**	**jue 16/07/26**	**mar 18/08/26**	
464		20.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO - SANITARIO CON TAZA REDONDA, LAVAMANOS CON PEDESTAL, GRIFERIA Y ACCESORIOS - (INCLUYE, ANCLAJES Y ACCESORIOS, PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO)	und	4,00	$ 5.017.875,33	30 días	jue 16/07/26	mar 18/08/26	381FC-7 días
465		**20.06**	**GRIFERIAS Y LLAVES 0**			**$ 6.646.520,64**	**30 días**	**jue 16/07/26**	**mar 18/08/26**	
466		20.06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE SOBREPONER (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	und	12,00	$ 6.106.345,65	30 días	jue 16/07/26	mar 18/08/26	381FC-7 días
467		20.06.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA DE DUCHA MONOCONTROL (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	und	1,00	$ 290.650,23	30 días	jue 16/07/26	mar 18/08/26	381FC-7 días
468		20.06.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE TERMINAL (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	und	3,00	$ 249.524,76	30 días	jue 16/07/26	mar 18/08/26	381FC-7 días
469		**20.07**	**ACCESORIOS DE BAÑO 0**			**$ 24.248.853,37**	**10 días**	**vie 7/08/26**	**mar 18/08/26**	
470		20.07.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO TIPO INSTITUCIONAL DE PAPEL HIGIÉNICO EN ACERO INOXIDABLE CORONA (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	und	7,00	$ 3.677.314,18	10 días	vie 7/08/26	mar 18/08/26	381FC+13 días
471		20.07.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERCHA PERCHA TIPO TORINO CORONA (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	und	11,00	$ 501.430,29	10 días	vie 7/08/26	mar 18/08/26	381FC+13 días
472		20.07.61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD TIPO_1 TIPO FIJA 24 PULGADAS EN ACERO INOXIDABLE (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	und	2,00	$ 674.533,78	10 días	vie 7/08/26	mar 18/08/26	381FC+13 días
473		20.07.62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD TIPO_2 TIPO PLEGABLE EN ACERO INOXIDABLE (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	und	1,00	$ 711.883,48	10 días	vie 7/08/26	mar 18/08/26	381FC+13 días
474		20.07.71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABON TIPO_1 DE EMPOTRAR A PARED EN ACERO INOXIDABLE	und	7,00	$ 4.205.768,08	10 días	vie 7/08/26	mar 18/08/26	381FC+13 días
475		20.07.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JABONERA PARA DUCHA ACABADO CROMADO	und	1,00	$ 81.218,83	10 días	vie 7/08/26	mar 18/08/26	381FC+13 días
476		20.07.81	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANECA DE SOBREPONER TIPO_1 14,5 LTS EN ACERO INOXIDABLE (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	und	14,00	$ 4.686.333,86	10 días	vie 7/08/26	mar 18/08/26	381FC+13 días
477		20.07.91	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SECADOR DE MANOS TIPO_1 ELÉCTRICO EN ACERO INOXIDABLE (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	und	7,00	$ 9.710.370,87	10 días	vie 7/08/26	mar 18/08/26	381FC+13 días
478		**20.08**	**REJILLAS DE BAÑOS 0**			**$ 1.082.454,06**	**10 días**	**vie 7/08/26**	**mar 18/08/26**	
479		20.08.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO PARA TUBERIA DE 2 PULGADAS - 4"x4"x2"	und	23,00	$ 1.082.454,06	10 días	vie 7/08/26	mar 18/08/26	381FC+13 días
480		**20.09**	**TAPAS DE REGISTRO 0**			**$ 1.019.664,92**	**10 días**	**vie 7/08/26**	**mar 18/08/26**	
481		20.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO 20 X 20CM PLASTICA	und	18,00	$ 1.019.664,92	10 días	vie 7/08/26	mar 18/08/26	381FC+13 días
482		**21**	**DOTACION COCINAS 0**			**$ 5.846.654,37**	**10 días**	**vie 7/08/26**	**mar 18/08/26**	
483		**21.02**	**GRIFERIA COCINA 0**			**$ 2.521.973,96**	**10 días**	**vie 7/08/26**	**mar 18/08/26**	
484		21.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA LAVAPLATOS MONOCONTROL TIPO KORAL COLOR CROMO (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	und	4,00	$ 2.521.973,96	10 días	vie 7/08/26	mar 18/08/26	381FC+13 días
485		**21.03**	**LAVAPLATOS 0**			**$ 3.324.680,41**	**10 días**	**vie 7/08/26**	**mar 18/08/26**	
486		21.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE 0,40 X 0,70 M DE SOBREPONER (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	und	4,00	$ 3.324.680,41	10 días	vie 7/08/26	mar 18/08/26	381FC+13 días
487		**22**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS, ESPEJOS Y DIVISIONES 0**			**$ 122.171.197,91**	**13 días**	**mar 4/08/26**	**mar 18/08/26**	
488		**22.03**	**ESPEJOS CANTO PULIDO 0**			**$ 8.517.668,40**	**10 días**	**vie 7/08/26**	**mar 18/08/26**	
489		22.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO CANTO PULIDO PARA BATERIAS SANITARIAS Y BAÑOS PRIVADOS (INCLUYE MATERIALES DE FIJACION, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	m2	14,14	$ 7.049.354,36	10 días	vie 7/08/26	mar 18/08/26	381FC+13 días
490		22.03.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO CANTO PULIDO CON INCLINACIÓN PARA BAÑO ACCESIBLE (INCLUYE MATERIALES DE FIJACION, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	m2	2,68	$ 1.468.314,04	10 días	vie 7/08/26	mar 18/08/26	381FC+13 días
491		**22.04**	**BARANDAS EN VIDRIO 0**			**$ 69.511.024,29**	**13 días**	**mar 4/08/26**	**mar 18/08/26**	
492		22.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM (INCLUYE MATERIALES DE FIJACION, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	m	61,40	$ 69.511.024,29	13 días	mar 4/08/26	mar 18/08/26	381FC+10 días
493		**22.07**	**DIVISIONES EN ACERO 0**			**$ 44.142.505,22**	**10 días**	**vie 7/08/26**	**mar 18/08/26**	
494		22.07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE PARA CABINAS SANITARIA Y DUCHA	m2	39,88	$ 44.142.505,22	10 días	vie 7/08/26	mar 18/08/26	381FC+13 días
495		**23**	**CERRADURAS, HERRAJES Y ACCESORIOS 0**			**$ 26.114.588,14**	**10 días**	**vie 7/08/26**	**mar 18/08/26**	
496		**23.01**	**CERRADURAS DESOBREPONER 0**			**$ 6.530.631,43**	**10 días**	**vie 7/08/26**	**mar 18/08/26**	
497		23.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURAS DESOBREPONER CERRADURA DE SOBREPONER SENCILLA VIDRIO MEDIA LUNA	und	25,00	$ 6.530.631,43	10 días	vie 7/08/26	mar 18/08/26	381FC+13 días
498		**23.05**	**CERRADURAS INSTITUCIONALES 0**			**$ 6.787.947,09**	**10 días**	**vie 7/08/26**	**mar 18/08/26**	
499		23.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURAS INSTITUCIONAL TIPO US26D INCLUYE MANIJA	und	25,00	$ 6.787.947,09	10 días	vie 7/08/26	mar 18/08/26	381FC+13 días
500		**23.10**	**CIERRAPUERTAS 0**			**$ 854.722,95**	**10 días**	**vie 7/08/26**	**mar 18/08/26**	
501		23.10.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIERRAPUERTAS AEREO HIDRAULICO SERIE 3005	und	2,00	$ 854.722,95	10 días	vie 7/08/26	mar 18/08/26	381FC+13 días
502		**23.11**	**BARRAS ANTIPANICO 0**			**$ 2.420.365,49**	**10 días**	**vie 7/08/26**	**mar 18/08/26**	
503		23.11.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAS ANTIPANICO DE EMPUJE TIPO ORLANDO DE 1 Y 2 PUNTOS - OPERACIÓN MECÁNICA. ACABADO DEL CUERPO COLOR NEGRO Y BARRA TIPO PUSH EN COLOR ROJO.	und	2,00	$ 2.420.365,49	10 días	vie 7/08/26	mar 18/08/26	381FC+13 días
504		**23.13**	**TOPES DE PUERTAS 0**			**$ 2.009.772,32**	**10 días**	**vie 7/08/26**	**mar 18/08/26**	
505		23.13.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOPE DE PUERTA MEDIALUNA EN ACERO INOXIDABLE	und	52,00	$ 2.009.772,32	10 días	vie 7/08/26	mar 18/08/26	381FC+13 días

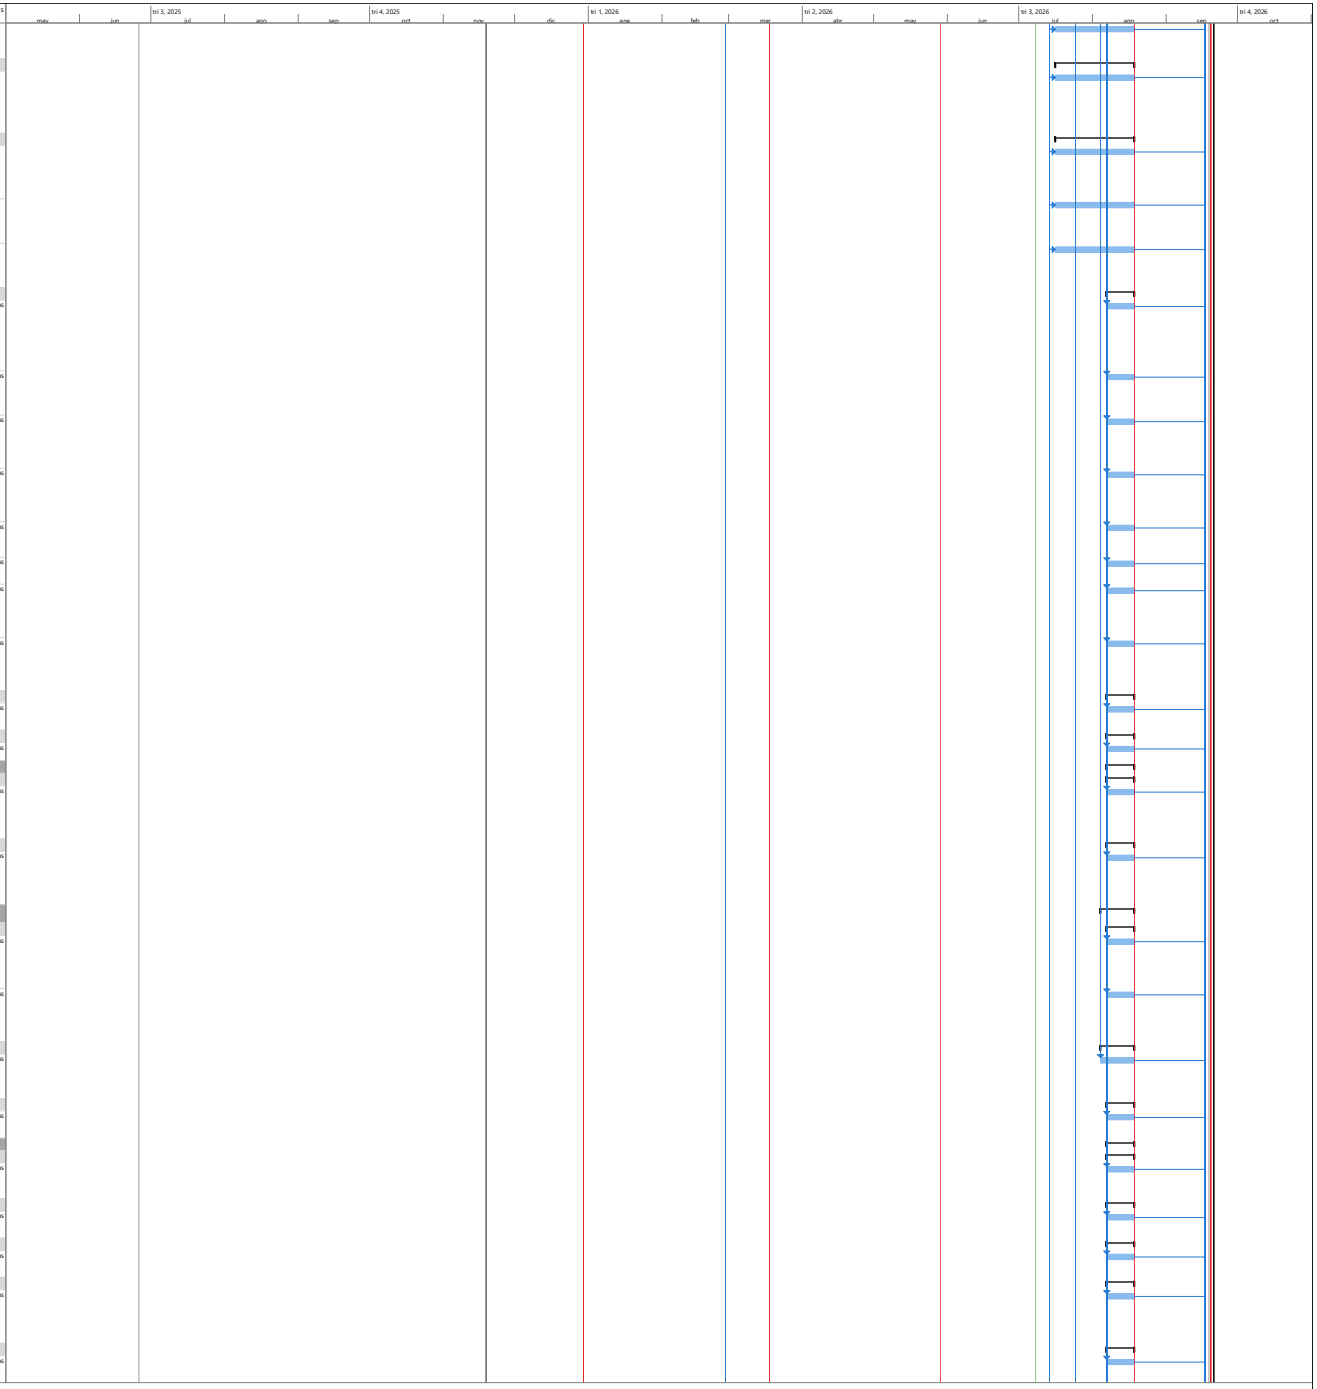

Proyecto: PROGRAMACION YO
Fecha: mié 8/07/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso


Id	Modo de Tarea	ITEM	Nombre de tarea	UNIDAD	CANTIDAD	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
506		**23.17**	**MANUAS DE PUERTAS 0**			**$ 7.511.148,86**	**10 días**	**vie 7/08/26**	**mar 18/08/26**	
507		23.17.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANIJA DE PUERTA ROMA TIRADOR DOBLE EN ACERO INOXIDABLE	und	25,00	$ 6.787.947,09	10 días	vie 7/08/26	mar 18/08/26	381FC+13 días
508		23.17.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANIJA DE PUERTA "ORION" PARA BARRA ANTIPÁNICO EN ZAMAKACABADO: NEGRO MATE	und	2,00	$ 723.201,77	10 días	vie 7/08/26	mar 18/08/26	381FC+13 días
509		**24**	**PINTURA 0**			**$ 186.236.414,98**	**50 días**	**jue 16/07/26**	**mié 9/09/26**	
510		**24.01**	**ESTUCOS Y PINTURAS INTERIORES 0**			**$ 116.610.399,15**	**50 días**	**jue 16/07/26**	**mié 9/09/26**	
511		24.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILOSOBRE PAÑETE (3 MANOS) X M2 0	m2	400,12	$ 27.425.887,18	50 días	jue 16/07/26	mié 9/09/26	381FC-7 días
512		24.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILOSOBRE PAÑETE (3 MANOS) X ML 0	m	66,65	$ 3.377.096,43	50 días	jue 16/07/26	mié 9/09/26	381FC-7 días
513		24.01.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILOSOBRE CIELO RASO (3 MANOS) X M2 PARA MUROS Y CIELORASOS EN DRYWALL	m2	1841,16	$ 85.807.415,54	50 días	jue 16/07/26	mié 9/09/26	381FC-7 días
514		**24.02**	**PINTURA PLASTICA PARA INTERIORES 0**			**$ 22.761.889,45**	**30 días**	**jue 16/07/26**	**mar 18/08/26**	
515		24.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PLASTICA PARA ZONA HÚMEDAS (3 MANOS) X M2 0	m2	108,66	$ 8.208.008,65	30 días	jue 16/07/26	mar 18/08/26	381FC-7 días
516		24.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PLASTICA PARA ZONA HÚMEDAS (3 MANOS) X ML 0	m	260,66	$ 14.553.880,80	30 días	jue 16/07/26	mar 18/08/26	381FC-7 días
517		**24.03**	**PINTURA PLACAS INTERIORES 0**			**$ 3.166.037,97**	**30 días**	**jue 16/07/26**	**mar 18/08/26**	
518		24.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO BAJO PLACA ESCALERA (3 MANOS) X M2 0	m2	55,43	$ 3.166.037,97	30 días	jue 16/07/26	mar 18/08/26	381FC-7 días
519		**24.04**	**EXTERIOR 0**			**$ 43.698.088,41**	**30 días**	**jue 16/07/26**	**mar 18/08/26**	
520		24.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA ACRILICA DE PROTECCION SOBRE MUROS (3 MANOS) X M2 0	m2	919,92	$ 43.698.088,41	30 días	jue 16/07/26	mar 18/08/26	381FC-7 días
521		**25**	**EQUIPOS 0**			**$ 457.602.291,46**	**58 días**	**jue 16/07/26**	**vie 18/09/26**	
522		**25.01**	**EQUIPOS HIDROSANITARIOS 0**			**$ 58.753.724,50**	**30 días**	**jue 16/07/26**	**mar 18/08/26**	
523		25.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PRESION TIPO 1 EQUIPO A PRESIÓN AGUA POTABLE IHM TIPO MONOBLOCK MODELO 20H-6.0TW ES O SIMILAR, Q= 5,80 l/s CDT= 38,70 mca, POT=6,00 HP (1 TITULAR + 1 SUPLENTE). CON VARIADOR DE VELOCIDAD. INCLUYE TANQUE HIDROACUMULADOR (	und	1,00	$ 58.753.724,50	30 días	jue 16/07/26	mar 18/08/26	381FC-7 días
524		**25.02**	**EQUIPOS ELECTRICOS 0**			**$ 205.813.566,96**	**30 días**	**jue 16/07/26**	**mar 18/08/26**	
525		25.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA ELECTRICA 150KVA, TIPO CABINADA. INCLUYE ADECUACIÓN DEL CUARTO, RAMPA REMOVIBLE, INSONORIZACIÓN Y DUCTO DE DESFOGUE	und	1,00	$ 145.586.883,75	30 días	jue 16/07/26	mar 18/08/26	381FC-7 días
526		25.02.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE PROTECCION UPS TRIFÁSCA - 20 KVA. INCLUYE CABLE FLEXIBLE PARA CONEXIÓN Y BYPASS	und	1,00	$ 60.226.683,21	30 días	jue 16/07/26	mar 18/08/26	381FC-7 días
527		**25.04**	**EQUIPOS DE TRANSPORTE VERTICAL 0**			**$ 193.035.000,00**	**28 días**	**mar 18/08/26**	**vie 18/09/26**	
528		25.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASCENSOR 1 PRIVADOS - 3 PARADAS DE 1.0 M/S CAP 8 KG	und	1,00	$ 193.035.000,00	28 días	mar 18/08/26	vie 18/09/26	89FC+98 días
529		**27**	**SISTEMAS ESPECIALES 0**			**$ 78.653.093,58**	**70 días**	**vie 29/05/26**	**vie 14/08/26**	
530		**27.01**	**AISLAMIENTO ACÚSTICO - SISTEMAS VERTICALES 0**			**$ 78.653.093,58**	**70 días**	**vie 29/05/26**	**vie 14/08/26**	
531		27.01.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE MURO LIVIANO DOS CARAS EN LÁMINA DE CÁRTON YESO e= 1/2"; d=535 kg/m3 + LÁMINA EN FIBROCEMENTO e=10mm, RELLENO EN FIBRA DE VIDRIO d=10 kg/m3; e=3,5" INCLUYE ESTRUCTURA INTERNA EN PERFILERÍA DE 90mm, MASILLA Y ESTUCO. e TOTAL=15.	m2	310,36	$ 78.653.093,58	70 días	vie 29/05/26	vie 14/08/26	89FC+25 días
532		**29**	**OBRAS EXTERIORES 0**			**$ 56.530.859,58**	**29 días**	**jue 16/07/26**	**lun 17/08/26**	
533		**29.03**	**PISOS EN CONCRETO Y/O CEMENTO 0**			**$ 35.186.000,17**	**29 días**	**jue 16/07/26**	**lun 17/08/26**	
534		29.03.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE PISO EN ADOQUIN DE CONCRETO COLOR COBRIZO DIMENSIONES 0,20X0,10X0,08 M (TRAFICO VEHICULAR) INCLUYE ARENA DE NIVELACION ESPESOR = 4CM	m2	172,42	$ 35.186.000,17	29 días	jue 16/07/26	lun 17/08/26	381FC-7 días
535		**29.14**	**CINTAS Y BORDILLOS 0**			**$ 7.692.055,69**	**29 días**	**jue 16/07/26**	**lun 17/08/26**	
536		29.14.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE CINTA DE CONFINAMIENTO 10 CM ANCHO RESISTENCIA 1750 PSI	m	124,66	$ 7.692.055,69	29 días	jue 16/07/26	lun 17/08/26	381FC-7 días
537		**29.31**	**CERRAMIENTOS 0**			**$ 4.310.790,70**	**29 días**	**jue 16/07/26**	**lun 17/08/26**	
538		29.31.02	CERRAMIENTO EN MALLA PARA PLANTA ELÉCTRICA, INCLUYE PUERTAS	m	17,00	$ 4.310.790,70	29 días	jue 16/07/26	lun 17/08/26	381FC-7 días
539		**29.32**	**RELLENOS PARA CONFORMACION DE TERRENO 0**			**$ 9.342.013,02**	**29 días**	**jue 16/07/26**	**lun 17/08/26**	
540		29.32.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENO SUBBASE GRANULAR SBG (ART 320)	m3	31,86	$ 9.342.013,02	29 días	jue 16/07/26	lun 17/08/26	381FC-7 días
541		**30**	**ASEO Y LIMPIEZA 0**			**$ 369.235.263,75**	**154 días**	**jue 26/02/26**	**lun 17/08/26**	
542		**30.02**	**ASEO EXTERIOR 0**			**$ 46.977.700,40**	**29 días**	**jue 16/07/26**	**lun 17/08/26**	
543		30.02.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE LIMPIEZA FACHADA MAS HIDROFUGO 0	m2	1197,42	$ 46.977.700,40	29 días	jue 16/07/26	lun 17/08/26	381FC-7 días
544		**30.03**	**RETIRO DE ESCOMBROS 0**			**$ 2.708.461,22**	**128 días**	**jue 26/02/26**	**sáb 18/07/26**	
545		30.03.01	RETIRO DE ESCOMBROS 0	M3	16,00	$ 2.708.461,22	128 días	jue 26/02/26	sáb 18/07/26	6
546		**31**	**NO PREVISTOS**			**$ 319.549.102,13**	**22 días**	**jue 23/07/26**	**lun 17/08/26**	
547		NP 1	DESMONTE DE CUBIERTA PARQUEADERO DE MOTOCICLETAS	m2	56,66	$ 2.822.937,06	12 días	jue 23/07/26	jue 6/08/26	381
548		NP 4	DESMONTE DE ESPEJO	m2	5,76	$ 97.949,36	10 días	jue 23/07/26	mar 4/08/26	381
549		NP 5	DESMONTE DE GABINETES RED CONTRA INCENDIOS	und	2,00	$ 211.818,59	10 días	jue 23/07/26	mar 4/08/26	381
550		NP 6	DESMONTE DE PAÑETE EXTERIOR	M2	540,26	$ 14.956.835,24	10 días	jue 23/07/26	mar 4/08/26	381
551		NP 7	DESMONTE DE PAÑETE DE TANQUE	M2	36,74	$ 712.168,47	10 días	jue 23/07/26	mar 4/08/26	381
552		NP 8	DESMONTE DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE 1000 LTS	UND	4,00	$ 125.252,12	10 días	jue 23/07/26	mar 4/08/26	381
553		NP 10	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO DOBLE EN LADRILLO COMUN POR METRO LINEAL	ml	29,10	$ 1.446.105,25	7 días	lun 3/08/26	mar 11/08/26	547FC-3 días;548FC-3 días;549FC-3
554		NP 12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CONDUIT TIPO SCH 40 ELECTRICO 1 1/4"	ml	50,00	$ 7.273.623,15	8 días	vie 7/08/26	lun 17/08/26	553FC-2 días
555		NP 13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT 4"	ml	6,00	$ 421.558,87	8 días	vie 7/08/26	lun 17/08/26	553FC-2 días
556		NP 14	SUMINISTRO E INSTALACION DE RUBATEX DE 1 1/2"	ml	151,22	$ 2.329.167,13	8 días	vie 7/08/26	lun 17/08/26	553FC-2 días
557		NP 15	INSTALACION DE GABINETES RED CONTRA INCENDIOS	und	2,00	$ 766.860,34	8 días	vie 7/08/26	lun 17/08/26	553FC-2 días
558		NP 16	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO LIVIANO DOS CARAS DRYWALL	m2	159,93	$ 30.810.796,17	8 días	vie 7/08/26	lun 17/08/26	553FC-2 días
559		NP 17	TRANSPORTE MATERIAL DE CUBIERTA FUERA DEL DEPARTAMENTO CON DISPOCIION ESPECIAL DE ASBESTO CEMENTO	gbl	1,00	$ 11.839.480,00	8 días	vie 7/08/26	lun 17/08/26	553FC-2 días
560		NP 18	SUBESTACION ELECTRICA: ACTUALMENTE EN TRAMITE DE APROBACION CON ENERCA	GBL	1,00	$ 245.734.550,38	8 días	vie 7/08/26	lun 17/08/26	553FC-2 días
561		**1**	**SEÑALIZACION Y DOTACION**			**$ 568.017.767,45**	**10 días**	**vie 7/08/26**	**mar 18/08/26**	
562		**28.02**	**SEÑALES INFORMATIVAS - INDICADOR DE PISO O NUMERACIÓN**			**$ 1.128.120,00**	**10 días**	**vie 7/08/26**	**mar 18/08/26**	
563		28.02.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE SUMINISTRO DE SEÑAL - INDICADOR DE PISO Modulo 1: Pieza base, fabricada en MDF de alta densidad de 15mm, acabado con pintura base Primer y posterior aplicación de pintura esmalte, color a tono, e instalada a muro con chazo plásti	und	3,00	$ 1.128.120,00	10 días	vie 7/08/26	mar 18/08/26	381FC+13 días
564		**28.03**	**SEÑALES INFORMATIVAS - HORARIO**			**$ 328.440,00**	**10 días**	**vie 7/08/26**	**mar 18/08/26**	

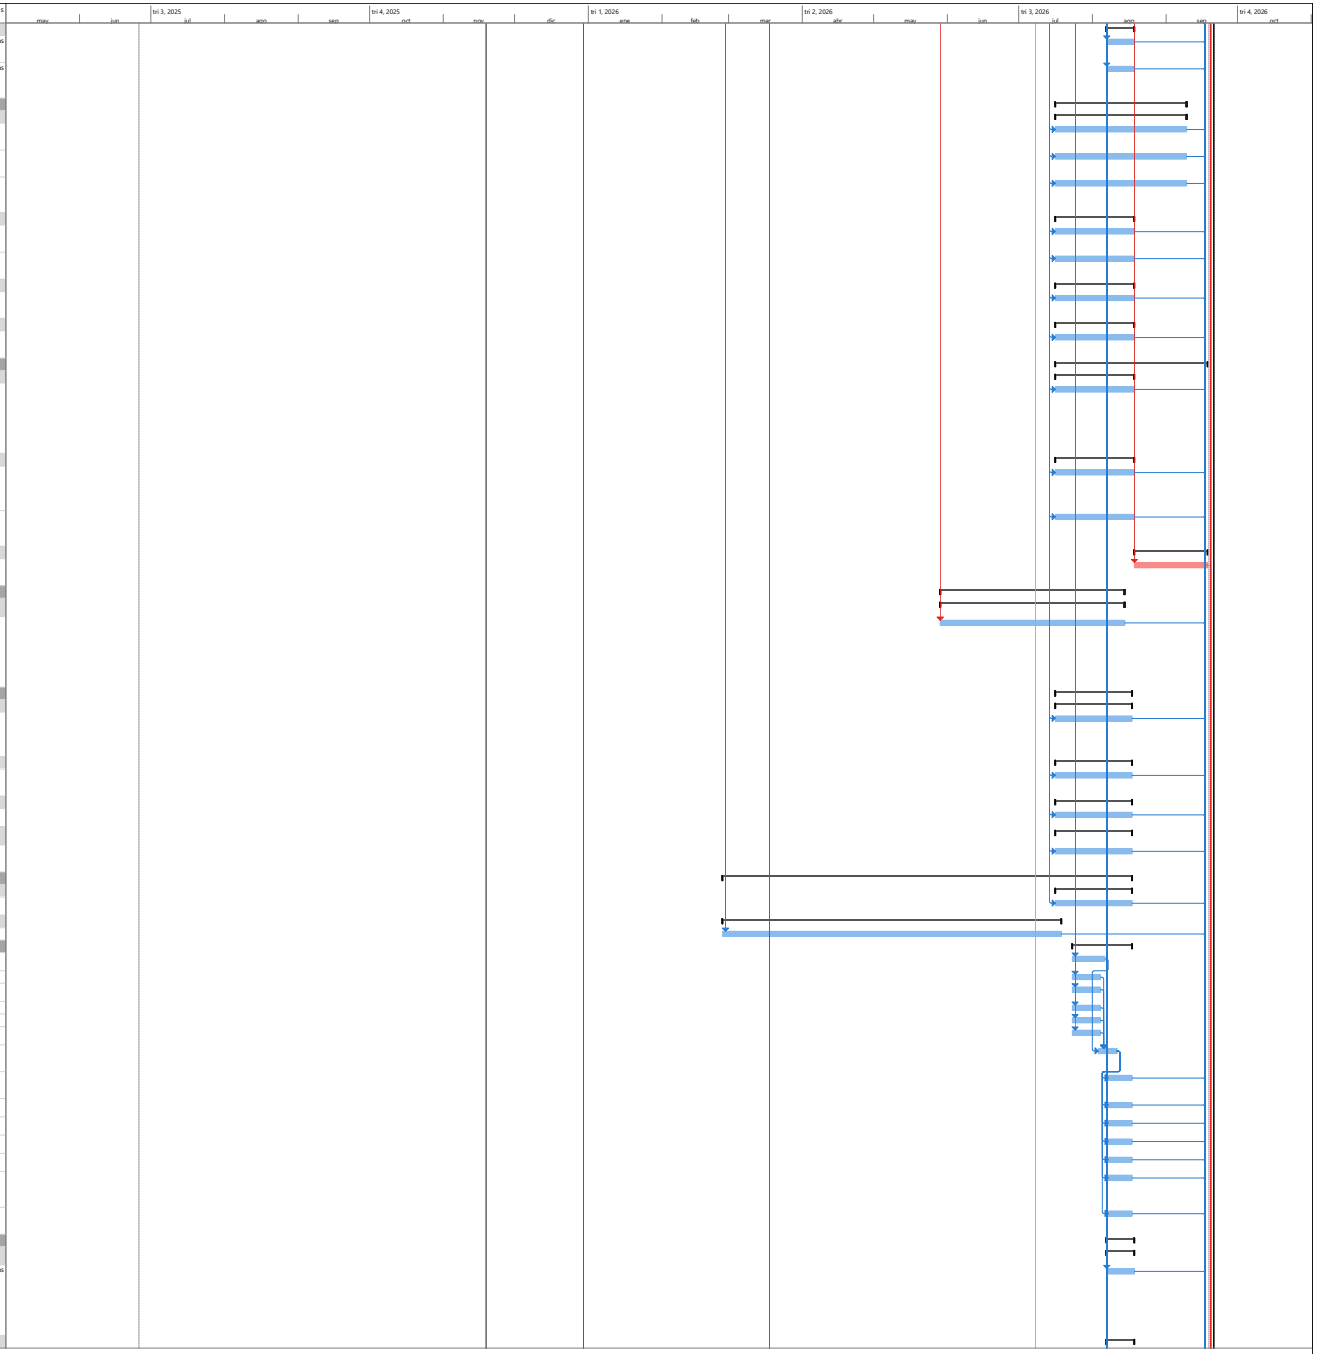

Proyecto: PROGRAMACION YO
Fecha: mié 8/07/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso

Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	UNIDAD	CANTIDAD	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
565		28.03.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE SUMINISTRO DE SEÑAL - HORARIO ACCESO PRINCIPAL Modulo 1: Pieza base, fabricada en MDF de alta densidad de 15mm, acabado con pintura base Primer y posterior aplicación de pintura esmalte, color a tono, e instalada a muro con chazo	und	1,00	$ 328.440,00	10 días	vie 7/08/26	mar 18/08/26	381FC+13 días
566		**28.11**	**SEÑALES INDICATIVAS - ESTÁNDAR**			**$ 6.464.080,00**	**10 días**	**vie 7/08/26**	**mar 18/08/26**	
567		28.11.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE SEÑALES INDICATIVAS - ESTÁNDAR ESPACIOS DE SERVICIOS - Modulo 1: Pieza base, fabricada en MDF de alta densidad de 9mm, acabado con pintura base Primer y posterior aplicación de pintura esmalte, color a tono, e instalada a muro co	und	20,00	$ 3.712.800,00	10 días	vie 7/08/26	mar 18/08/26	381FC+13 días
568		28.11.02	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE SEÑALES INDICATIVAS - ESTÁNDAR ESPACIOS PRINCIPALES - Modulo 1: Pieza base, fabricada en MDF de alta densidad de 9mm, acabado con pintura base Primer y posterior aplicación de pintura esmalte, color a tono, e instalada a muro con	und	17,00	$ 2.751.280,00	10 días	vie 7/08/26	mar 18/08/26	381FC+13 días
569		**28.12**	**SEÑALES INDICATIVAS - ESTÁNDAR DOBLE (PRECAUCIÓN)**			**$ 1.485.120,00**	**10 días**	**vie 7/08/26**	**mar 18/08/26**	
570		28.12.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE SEÑALES INDICATIVAS - ESTÁNDAR DOBLE PRECAUCIÓN, RIESGO Y/O PROHIBICIÓN Modulo 1: Pieza base, fabricada en MDF de alta densidad de 9mm, acabado con pintura base Primer y posterior aplicación de pintura esmalte, color a tono, e in	und	8,00	$ 1.485.120,00	10 días	vie 7/08/26	mar 18/08/26	381FC+13 días
571		**28.18**	**SEÑALES REGLAMENTARIAS - EVACUACIÓN -CONDICIÓN SEGURA**			**$ 1.899.240,00**	**10 días**	**vie 7/08/26**	**mar 18/08/26**	
572		28.18.01	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE SUMINISTRO DE SEÑAL REGLAMENTARIA (SALIDA DE EMERGENCIA, EVACU. DERECHA, EVACU. IZQUIERDA, BOTIQUÍN, BAJA ESCALERA IZQUIERDA, BAJA ESCALERA DERECHA) Fabricada en poliestireno calibre 100, con impresión fotoluminiscente laminada,	und	21,00	$ 1.899.240,00	10 días	vie 7/08/26	mar 18/08/26	381FC+13 días
573		**28.50**	**DOTACION**			**$ 556.712.767,45**	**10 días**	**vie 7/08/26**	**mar 18/08/26**	
574		28.50.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOTACION TIPO 1 A2 - MÓDULO ESTRADO JUEZ JUEZ PARA SALA DE AUDIENCIAS (1 PUESTO)	und	3,00	$ 18.340.335,93	10 días	vie 7/08/26	mar 18/08/26	381FC+13 días
575		28.50.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOTACION TIPO 2 A3 - MÓDULO ESTRADO SECRETARIO PARA SALA DE AUDIENCIAS	und	3,00	$ 18.339.911,10	10 días	vie 7/08/26	mar 18/08/26	381FC+13 días
576		28.50.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOTACION TIPO 3 B1 - ESCRITORIO DE 0.70m X 0.60m PARA SALA DE AUDIENCIAS	und	6,00	$ 10.425.328,20	10 días	vie 7/08/26	mar 18/08/26	381FC+13 días
577		28.50.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOTACION TIPO 4 B2 - ESCRITORIO DE 1.30m X 0,60m PARA SALA DE AUDIENCIAS	und	6,00	$ 12.106.384,08	10 días	vie 7/08/26	mar 18/08/26	381FC+13 días
578		28.50.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOTACION TIPO 5 B3 - MESA RECTANGULAR 0.90m x 0.70m	und	4,00	$ 3.257.030,00	10 días	vie 7/08/26	mar 18/08/26	381FC+13 días
579		28.50.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOTACION TIPO 6 B4 - MESA REDONDA R= 0.50m	und	2,00	$ 2.214.780,40	10 días	vie 7/08/26	mar 18/08/26	381FC+13 días
580		28.50.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOTACION TIPO 7 B7 - MESA TIPO SALA DE JUNTAS DE 2,10m x 0,60m CON GROMMET	und	3,00	$ 11.546.243,94	10 días	vie 7/08/26	mar 18/08/26	381FC+13 días
581		28.50.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOTACION TIPO 8 B8 - MESA MULTIPROPOSITO APILABLE T	und	2,00	$ 4.006.146,90	10 días	vie 7/08/26	mar 18/08/26	381FC+13 días
582		28.50.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOTACION TIPO 9 C1A - TANDEM 5 PUESTOS - SILLA PÚBLICO PARA SALA DE AUDIENCIAS	und	9,00	$ 11.890.991,70	10 días	vie 7/08/26	mar 18/08/26	381FC+13 días
583		28.50.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOTACION C2- TANDEM 3 PUESTOS - SILLA PÚBLICO PARA SALA DE AUDIENCIAS	und	3,00	$ 2.727.408,60	10 días	vie 7/08/26	mar 18/08/26	381FC+13 días
584		28.50.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOTACION C3 - SILLA ERGONOMICA TIPO EJECUTIVA CON BRAZOS	und	6,00	$ 5.837.164,20	10 días	vie 7/08/26	mar 18/08/26	381FC+13 días
585		28.50.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOTACION C4 - SILLA ERGONOMICA TIPO OPERATIVA CON BRAZOS	und	97,00	$ 47.389.786,50	10 días	vie 7/08/26	mar 18/08/26	381FC+13 días
586		28.50.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOTACION C5 - SILLA TIPO INTERLOCUTORA SIN BRAZOS - PARA OFICINA	und	34,00	$ 9.135.988,38	10 días	vie 7/08/26	mar 18/08/26	381FC+13 días
587		28.50.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOTACION C7 - SILLA TIPO BARRA	und	6,00	$ 1.221.389,82	10 días	vie 7/08/26	mar 18/08/26	381FC+13 días
588		28.50.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOTACION C8 - SILLA CAFETERIA	und	8,00	$ 2.401.705,60	10 días	vie 7/08/26	mar 18/08/26	381FC+13 días
589		28.50.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOTACION C9 - SILLA POLTRONA - SENCILLA	und	3,00	$ 8.369.151,00	10 días	vie 7/08/26	mar 18/08/26	381FC+13 días
590		28.50.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOTACION C11 - BANCA EN MADERA	und	2,00	$ 2.973.810,00	10 días	vie 7/08/26	mar 18/08/26	381FC+13 días
591		28.50.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOTACION D1 - PUESTO DE TRABAJO PARA MAGISTRADO	und	3,00	$ 17.830.115,10	10 días	vie 7/08/26	mar 18/08/26	381FC+13 días
592		28.50.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOTACION D2 - PUESTO DE TRABAJO EN L TIPO SECRETARIAL DE 1.50M X 1.50M - PARA OFICINA	und	65,00	$ 146.077.795,50	10 días	vie 7/08/26	mar 18/08/26	381FC+13 días
593		28.50.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOTACION E1 - MUEBLE - ARCHIVADOR METÁLICO PARA IMPRESORA - 0,90m X 0,50m	und	8,00	$ 14.982.338,00	10 días	vie 7/08/26	mar 18/08/26	381FC+13 días
594		28.50.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOTACION E3 - MUEBLE ARCHIVADOR SIN PUERTAS 0,90m x 0,40m x 2,00m	und	20,00	$ 23.110.752,00	10 días	vie 7/08/26	mar 18/08/26	381FC+13 días
595		28.50.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOTACION E6 - MUEBLE PALOMERA 1,50m x 1,00m x 0,40m	und	11,00	$ 17.555.391,70	10 días	vie 7/08/26	mar 18/08/26	381FC+13 días
596		28.50.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOTACION F1A - BIBLIOTECA PARA JUEZ de 2,15m x 0,50m PARA OFICINA	und	8,00	$ 26.577.364,80	10 días	vie 7/08/26	mar 18/08/26	381FC+13 días
597		28.50.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOTACION F4 - UNIDAD ARCHIVADOR RODANTE MANUAL	und	11,00	$ 128.978.388,00	10 días	vie 7/08/26	mar 18/08/26	381FC+13 días
598		28.50.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOTACION F11 - LOCKER METÁLICO - 16 puestos	und	1,00	$ 2.407.370,00	10 días	vie 7/08/26	mar 18/08/26	381FC+13 días
599		28.50.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOTACION G1 - BARANDA DE SEPARACION PARTE PROCESAL SALA DE AUDIENCIAS	und	3,00	$ 7.009.695,00	10 días	vie 7/08/26	mar 18/08/26	381FC+13 días
600		**2**	**TRAMITES**			**$ 30.000.000,00**	**105 días**	**mié 19/11/25**	**lun 16/03/26**	
601			LICENCIA DE CONTRUCCION	GBL	1,00	$ 30.000.000,00	105 días	mié 19/11/25	lun 16/03/26	2FC+130 días
602			FIN			$ 0,00	0 días	vie 18/09/26	vie 18/09/26	94;95;305;306

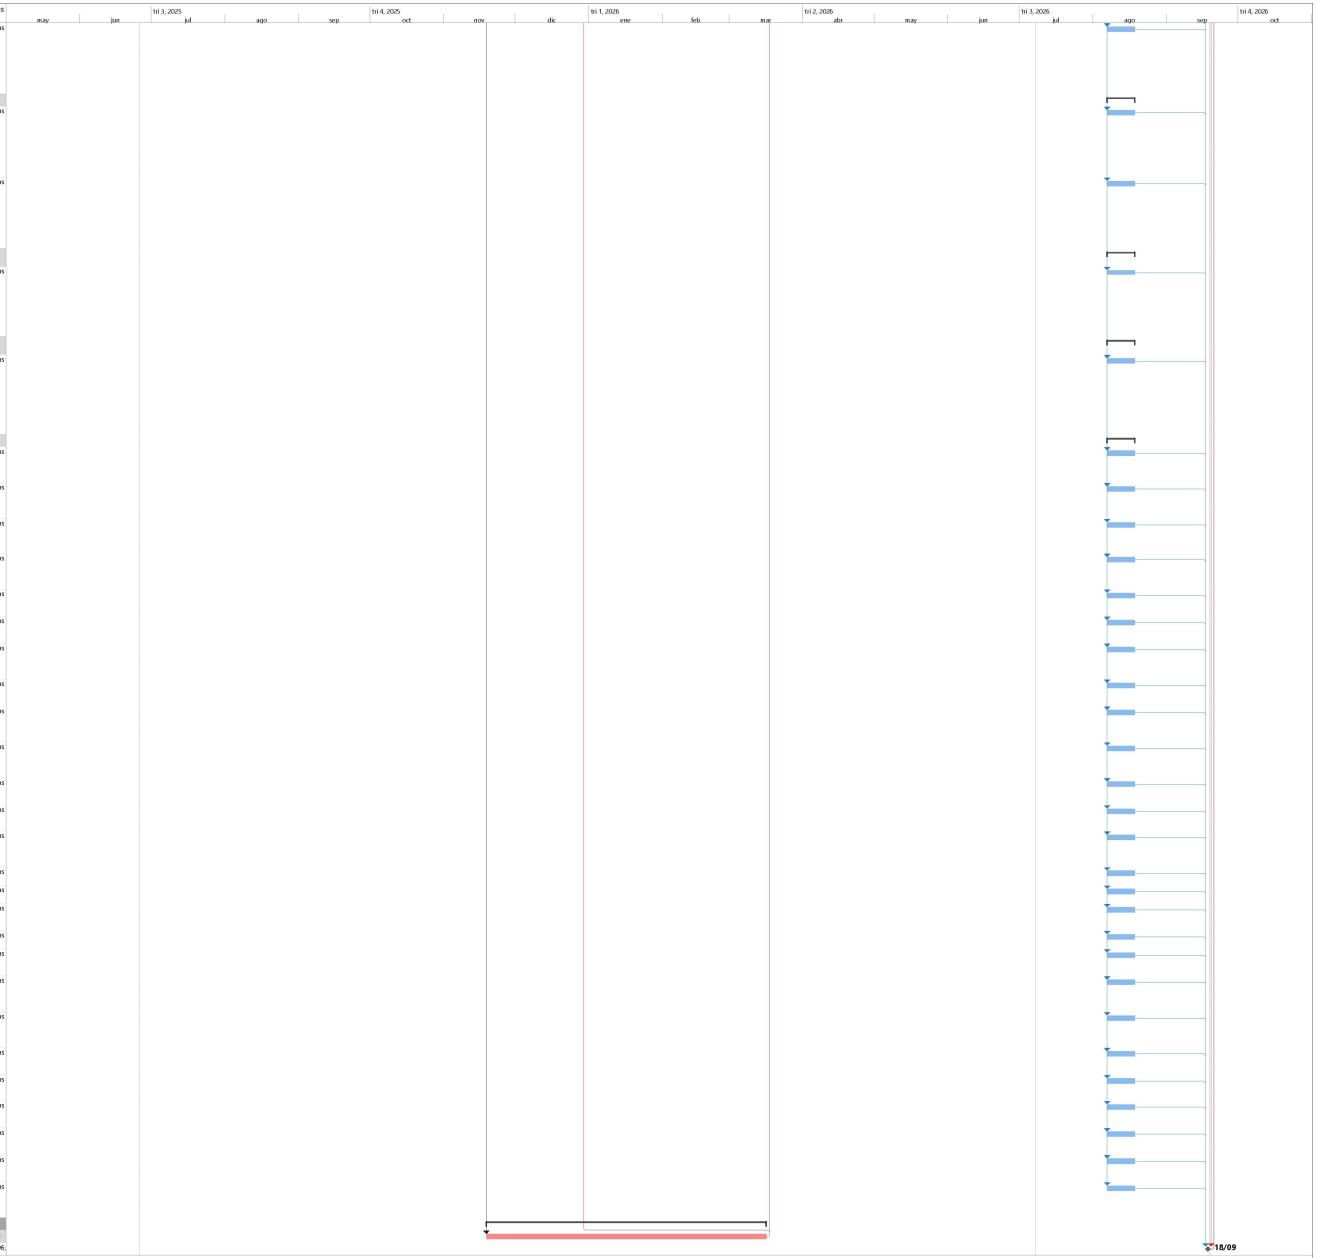

Proyecto: PROGRAMACION YO
Fecha: mié 8/07/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso
