	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-034
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	29/10/2025

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSULTORES DONOVAN S.A.S	CONSULTORES DONOVAN SAS	**FECHA**	jueves, 21 de mayo de 2026	**SEMANA No.**	**17**	DEL	**14-may-26**	AL	**21-may-26**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR VIAL VERGARA A NOCAIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
LOCALIZACIÓN PROYECTO	Corredor Vergara - Nocaima

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**	
CONTRATO No.:	ICCU-CTO-1624- 2025	**CONTRATO No.:**	ICCU-CTO-1586- 2025
PLAZO INICIAL:	NUEVE (9) MESES	**PLAZO INICIAL:**	NUEVE (9) MESES
CONTRATISTA:	CONSULTORES DONOVAN SAS	**CONTRATISTA:**	OPEN INGENIERIA S.A.S.
FECHA DE INICIACIÓN:	26 de enero de 2026	**FECHA DE INICIACIÓN:**	26 de enero de 2026
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N/A	***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N/A
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	N/A	***FECHA DE REINICIACIÓN:**	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	25 de octubre de 2026	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	25 de octubre de 2026
PLAZO ACTUALIZADO:	272 días	**PLAZO ACTUALIZADO:**	272 días
PLAZO TRANSCURRIDO:	115 días	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	115 días
VALOR INICIAL :	$ 970.900.948	**VALOR INICIAL :**	$ 7.943.403.636
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 970.900.948	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 7.943.403.636
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 970.900.948	**VALOR POR PAGAR:**	$ 7.943.403.636
VALOR ANTICIPO:	$ 293.717.933,83	**VALOR ANTICIPO:**	$ 1.588.680.727,20
SUPERVISOR:	MARIA DEL PILAR SUAREZ MONZÓN	**INTERVENTOR**	CONSULTORES DONOVAN SAS

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

A continuación, se relacionan las actividades realizadas durante la semana:

-Se realizó actividades de excavación mecánica, instalación de geotextil, material filtrante y ducto en el tramo 2, margen izquierda entre las abscisas K0+060 a K0+750.

-Se realizó actividades de excavación y vaciado de concreto para anillos de caissons para cimentación en muro 1, tramo 1 en abscisas K0+120 a K0+140.

-Se realizó actividades de excavación y vaciado de concreto para anillos de caissons para cimentación en muro 2, tramo 2 en abscisas K0+280 a K0+310, se culminó esta actividad.

- De acuerdo con la programación entregada por el contratista, se debió continuar con las actividades de excavación, transporte de materiales provenientes de la excavación, fresado de concreto asfaltico, afirmado, instalación de rajón para mejoramiento de la subrasante, instalación de concreto clase D para bases y elevaciones, instalación de concreto clase F para solados, demolición de concreto estructural, instalación de tubería en concreto reforzado en 36", figurado y armado de acero de refuerzo, atraques e instalación de geotextil T 2400. A la fecha estas actividades no se han iniciado.

-De acuerdo con la programación aprobada por la interventoría, se tiene un a avance acumulado programado del 23% y un avance acumulado ejecutado del 16%, esto de acuerdo con el avance físico del contrato, se presenta un atraso del 7% correspondiente a la no entrega de los informes compilados de todos los componentes de los diseño del contrato.

- El avance financiero programado acumulado del contrato es del 20,64% que corresponde a $ 1.639.900.062, el avance financiero ejecutado acumulado del contrato es del 3,13% que corresponde a $ 248.847.526 especto al flujo de caja Se presenta un atraso del 12.53% correspondiente a que el contratista no ha iniciado con las actividades de fresado concreto asfáltico, afirmado, instalación de rajón para mejoramiento de la subrasante, inatalación de concreto clase D para bases y elevaciones, instalación de concreto clase F para solados y atraques y el suministro e instalación de geotextil.

CORRESPONDENCIA ENVIADA

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-182-2026 del 15 de mayo de 2026 remitió al ICCU la remisión del informe semanal N.16 – Actividades realizadas del 07 de mayo de 2026 al 14 de mayo de 2026.

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-183-2026 del 20 de mayo de 2026 remitió a OPEN INGENIERÍA S.A.S. llamado de atención por no atención de observaciones – informe mensual SST N° 3

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-184-2026 del 20 de mayo de 2026 remitió a OPEN INGENIERÍA S.A.S. llamado de atención por no atención de observaciones – informe mensual ambiental N°3

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-185-2026 del 21 de mayo de 2026 remitió a OPEN INGENIERÍA S.A.S. respuesta a sus comunicados OFC-ICCU-1586-2025-156 entrega de la documentación del personal nuevo en obra – Respuesta al comunicado DON-1624-ICCU-155-2026 Y OFC-ICCU-1586-2025-169 alcance al comunicado OFC-ICCU-1586-2025-156, entrega de la documentación del personal nuevo en obra – respuesta al comunicado DON-1624-ICCU-155-2026 - aprobación parcial del personal presentado, solicitud de atención de las observaciones y entrega inmediata de la documentación de la totalidad del personal.

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-186-2026 del 21 de mayo de 2026 remitió a OPEN INGENIERÍA S.A.S. respuesta a su comunicado OFC-ICCU-1586-2025-171 entrega del informe del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo – SG-SST No. 3 V2 - Respuesta al comunicado DON-1624-ICCU-171-2026.– aprobación del informe mensual SST N°3 V2 del contratista.

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-187-2026 del 21 de mayo de 2026 remitió al ICCU la remisión informe mensual SST N.3 V1 de interventoría.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

- El contratista, mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-168 del 19 de mayo de 2026, remitió la entrega de respuesta técnica a observaciones del componente hidráulico – Respuesta al comunicado DON-1624-ICCU-181-2026.

- El contratista, mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-169 del 19 de mayo de 2026, remitió alcance al comunicado OFC-ICCU-1586-2025-156, entrega de la documentación del personal nuevo en obra – Respuesta al comunicado DON-1624-ICCU-155-2026.

- El contratista, mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-170 del 20 de mayo de 2026, remitió entrega de actas de vecindad, registro fotográfico y solicitud de firmas – Tramo 2

- El contratista, mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-171 del 21 de mayo de 2026, remitió la entrega del diseño hidráulico – Respuesta al comunicado DON-1624-ICCU-181-2026.

- El contratista, mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-172 del 21 de mayo de 2026, remitió la entrega del Informe del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST No. 3 V2 - Respuesta al comunicado DON-1624-ICCU-171-2026.

- El contratista, mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-173 del 21 de mayo de 2026, remitió la entrega del comunicado SPOP-095-2026 emitido por la Alcaldía Municipal de Vergara – Cundinamarca en respuesta al oficio OFC-ICCU-1586-2025-148 Solicitud de tala de individuos arbóreos ubicados en la zona de intervención del proyecto de la referencia.

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		

1	TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) EXPLANACIONES Y EXCAVACIONES - EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM	20-jun-26	15-jul-26	26			no iniciado	no iniciado	no iniciado
2	TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) ESTRUCTURA DE PAVIMENTO - RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	16-jul-26	22-jul-26	7			no iniciado	no iniciado	no iniciado
3	TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) ESTRUCTURA DE PAVIMENTO - AFIRMADO	9-jul-26	22-jul-26	14			no iniciado	no iniciado	no iniciado
4	TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) ESTRUCTURA DE PAVIMENTO - BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA Y CEMENTO	7-ago-26	10-sep-26	35			no iniciado	no iniciado	no iniciado
5	TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) ESTRUCTURA DE PAVIMENTO - SUBBASE GRANULAR	22-jul-26	22-ago-26	32			no iniciado	no iniciado	no iniciado
6	TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) ESTRUCTURA DE PAVIMENTO - RIEGO DE IMPRIMACION	25-ago-26	11-sep-26	18			no iniciado	no iniciado	no iniciado
7	TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) ESTRUCTURA DE PAVIMENTO - RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	4-sep-26	23-sep-26	20			no iniciado	no iniciado	no iniciado
8	TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) ESTRUCTURA DE PAVIMENTO - MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	29-ago-26	23-sep-26	26			no iniciado	no iniciado	no iniciado
9	TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES	24-sep-26	26-oct-26	33			no iniciado	no iniciado	no iniciado
10	TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL - TOPE DEFENSA METÁLICA	24-sep-26	26-oct-26	33			no iniciado	no iniciado	no iniciado
11	TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL -SECCIÓN FINAL DEFENSA METÁLICA	24-sep-26	26-oct-26	33			no iniciado	no iniciado	no iniciado
12	TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL -DEFENSA METÁLICA	24-sep-26	26-oct-26	33			no iniciado	no iniciado	no iniciado
13	TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPTAFAROS EN DEFENSA METÁLICA	24-sep-26	26-oct-26	33			no iniciado	no iniciado	no iniciado

Plazo del proyecto: 129 días


** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION

AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	1,88%	1,80%	-0,08%
Durante el periodo	0,40%	0,13%	-0,28%
Acumulado Actual	2,29%	1,93%	-0,36%

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO

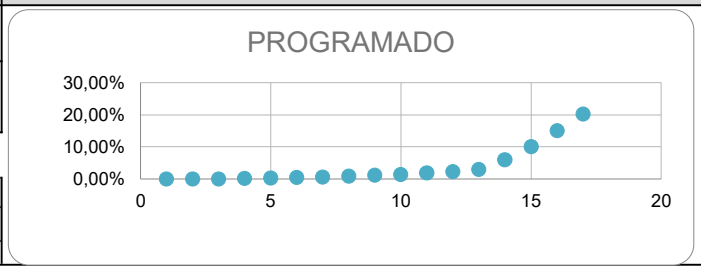

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO


DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRI.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
272 días	116,00	156 días	-0,98

3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 803.473.728	$ 187.043.503	23%
Durante el periodo	$ 1.195.934.532	$ 240.690.385	20%
Acumulado Actual	$ 1.999.408.259	$ 427.733.888	21%

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO

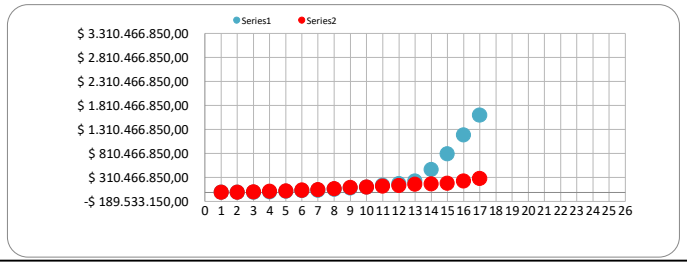


AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-79%

AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 857.887.593	$ -	0%
Durante el periodo	$ 915.080.099	$ -	0%
Acumulado Actual	$ 1.772.967.692	$ -	0%

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

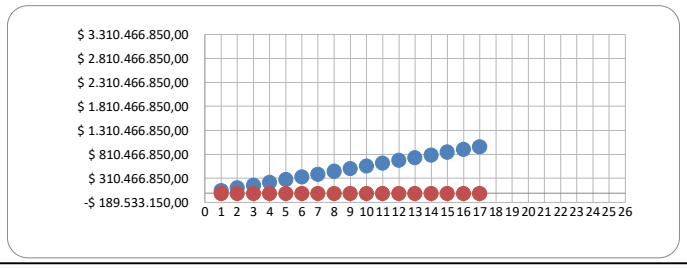

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-100%

4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

Durante el periodo evaluado, la interventoría adelantó actividades de seguimiento, control y gestión institucional en el marco del componente ambiental del proyecto, conforme a las obligaciones contractuales y la normativa vigente aplicable, así:

- El día 19 de mayo de 2026 se programó y desarrolló el Comité Ambiental N.° 4, espacio en el cual participaron el profesional ambiental del contratista, la interventoría y la supervisión ambiental del ICCU. Durante la reunión se realizó seguimiento a los compromisos ambientales del proyecto, el estado de las actividades en ejecución y los requerimientos pendientes asociados al componente ambiental. De dicha reunión se generó la respectiva acta, la cual a la fecha se encuentra en proceso de recolección de firmas.

- Mediante comunicado DON-1624-ICCU-184-2026 del 20 de mayo de 2026, la interventoría remitió llamado de atención al contratista por la no atención oportuna a las observaciones emitidas previamente al Informe Mensual Ambiental N.° 3, reiterando la necesidad de dar cumplimiento a los tiempos establecidos para la subsanación de requerimientos documentales y técnicos.

- Mediante oficio OFC-ICCU-1586-2025-173 del 21 de mayo de 2026, el contratista remitió a la interventoría la respuesta emitida por la Alcaldía Municipal de Vergara, Cundinamarca, relacionada con la aprobación para la intervención de los individuos arbóreos localizados en el área de influencia del proyecto. Como soporte, se anexó el comunicado oficial emitido por la administración municipal y el acta del Concejo Municipal mediante la cual se aprueba dicha intervención, dando continuidad a las gestiones requeridas para el manejo de estos individuos arbóreos dentro del desarrollo de las obras.

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Entregables sociales

Informe mensual social 3. El 19 de mayo de 2026, la interventoría recibió correo electrónico del ICCU, con el recibido sin novedad del informe mensual social N.º 3 de interventoría.

Subprograma de información y divulgación:
Para el corte de este informe semanal, no se requirió gestión social para el trámite de volantes.

Subprograma de servicio a la ciudadanía:
La interventoría informa que el Punto SAU físico, se encuentra ubicado en el balneario Casa Palma tramo 2 K0+030, con atención presencial los días Martes y miércoles de 9:00AM a 4:30 PM. Así mismo relaciona los canales de atención virtual, tales como: Línea móvil 3122229350 y el ccorreo electrónico socialcto1586@gmail.com.

PQRSD: La interventoría informa que a la fecha no se ha recibido PQRSD.

Subprograma de manejo a la infraestructura de predios y servicios públicos:
El 20 de mayo de 2026, la interventoría recibió del contratista el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-170 con la entrega de actas de vecindad, registro fotográfico y solicitud de firmas – Tramo 2, actas que se encuentra en revisión de interventoría.

En total se levantaron 34 actas de vecindad para el contrato.

Subprograma de MONC con enfoque de género:
La interventoría refiere que el porcentaje de cumplimiento para el personal MONC es del 38% realizado sobre el 30% requerido, el porcentaje de mujeres es del 11.76% sobre el 5% y 0% para personas en proceso de reintegración o reincorporación, dado a que según consulta con la agencia nacional de reintegración-ACN, no hay presencia de este tipo de personas en el área de influencia del contrato.

6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO
Durante el periodo evaluado, la interventoría adelantó actividades de seguimiento, revisión y articulación institucional en el marco del componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), conforme a las obligaciones contractuales y la normativa vigente aplicable, así: **Reporte de Accidentalidad:** Para la semana reportada en el presente informe NO se presentaron accidentes en interventoría ni contratista. **Personal de interventoría:** Personal presentado y aprobado por la supervision del ICCU. **Personal de contratista:** A la fecha la documentación de vinculación del personal contractual se encuentra en subsanacion por parte del contratista. Interventoria a la espera de subsanacion para revisión y aprobación, 22 trabajadores en obra. - Durante el periodo evaluado, la interventoría adelantó actividades de seguimiento, control documental y articulación institucional relacionadas con el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) del proyecto, conforme a las obligaciones contractuales y los lineamientos establecidos dentro del SG-SST aprobado. - La Supervisión SST del ICCU emitió visto bueno al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) del contratista, documento que había sido previamente revisado, aprobado y remitido por la interventoría para su respectivo proceso de revisión institucional. - El día 19 de mayo de 2026, mediante los oficios OFC-ICCU-1586-2025-156 y alcance OFC-ICCU-1586-2025-169, el contratista remitió a la interventoría documentación correspondiente al personal vinculado al proyecto y alcance relacionado con las observaciones previamente efectuadas por la interventoría. - El día 20 de mayo de 2026, mediante oficio DON-1624-ICCU-183-2026, la interventoría remitió al contratista llamado de atención formal debido a la no subsanación oportuna de las observaciones realizadas al Informe Mensual SST N.° 3 correspondiente al periodo de abril de 2026, reiterando la necesidad de dar cumplimiento a los tiempos establecidos para la atención de requerimientos documentales. - Mediante oficio DON-1624-ICCU-185-2026 del 21 de mayo de 2026, la interventoría emitió aprobación parcial del personal presentado por el contratista, una vez realizada la revisión documental correspondiente y evidenciando pendientes por subsanar en algunos soportes allegados. - Mediante comunicado OFC-ICCU-1586-2025-172 del 21 de mayo de 2026, el contratista remitió a la interventoría la subsanación de las observaciones efectuadas al Informe Mensual SST N.° 3 en su versión 2, para su respectiva revisión técnica. - Una vez verificada la atención de las observaciones realizadas, la interventoría emitió concepto de aprobación del Informe Mensual SST N.° 3 versión 2 del contratista, mediante comunicado DON-1624-ICCU-186-2026 del 21 de mayo de 2026. - Mediante comunicado DON-1624-ICCU-187-2026 del 21 de mayo de 2026, la interventoría remitió a la supervisión SST del ICCU el Informe Mensual SST N.° 3 versión 1, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 y el 30 de abril de 2026, para su respectivo proceso de revisión y seguimiento institucional. - Se informa el aplazamiento de la visita programada al frente de obra junto con la supervisión SST del ICCU, teniendo en cuenta la situación de calamidad familiar manifestada por parte de la supervisión, la cual imposibilitó el desarrollo de dicha actividad. La interventoría queda atenta a la respectiva reprogramación de la reunión y recorrido técnico en campo.

7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

El plan de calidad se encuentra aprobado por parte de la interventoria

8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Durante la semana se presentaron las siguientes situaciones problematicas: La comunidad en los sectores de descole de las ocho (8) alcantarillas previstas, no permiten la realización de dichas actividades, hasta que exista una conciliación con estos, la alcaldia municipal, contratista e interventoría.

8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

N/A

8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

N/A

8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

N/A

8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

N/A

8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

N/A

8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

N/A

8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

N/A

8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

N/A

9. PLAN DE ACCION RESULTADO DEL ANALISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAIZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
N/A		
N/A		

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N/A

11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

- Durante el periodo evaluado se evidencia la continuidad en el desarrollo de actividades técnicas en campo, incluyendo excavación manual y vaciado de concreto anillos de caissons en muro 1 tramo 1 entre abcisas K0+120 a K0+140, muro 2 tramo 2 entre abcisas K0+280 a K0+310 y excavación mecánica, instalación de geotextil, material filtrante y ducto en el tramo 2, margen izquierda, entre las abscisas K0+060 a K0+210.

- Durante el periodo evaluado, la interventoría adelantó seguimiento técnico y administrativo al componente ambiental del proyecto, evidenciando avances en la gestión institucional requerida para la intervención de los individuos arbóreos ubicados en el área de obra, tras la aprobación emitida por la Alcaldía Municipal de Vergara y el Concejo Municipal. Asimismo, se realizó seguimiento al cumplimiento de las obligaciones documentales del contratista, emitiéndose llamado de atención por la no atención oportuna de observaciones al Informe Mensual Ambiental N.° 3. De igual manera, se mantuvo articulación permanente con la supervisión ambiental del ICCU mediante el desarrollo del Comité Ambiental N.° 4 y el seguimiento a los compromisos ambientales asociados al proyecto.

- Desde el componente social, a corte de este semanal, la interventoría conto con el recibido a conformidad del informe mensual social N.º 3 por parte de la profesional social del ICCU. Al corte de este informe no se recibieron PQRSD, se cumple con el porcentaje de contratación del personal MONC y Mujeres. De otra parte, la interventoría recibió las actas de vecindad levantadas para el tramo 2, las cuales se encuentran en revisión.

- Durante el periodo evaluado, la interventoría adelantó seguimiento técnico y documental al componente SST, evidenciando avance en la consolidación y aprobación institucional del SG-SST del contratista, así como en la gestión de revisión y aprobación del Informe Mensual SST N.° 3. Se realizaron requerimientos y llamados de atención orientados al cumplimiento oportuno de las obligaciones documentales y la subsanación de observaciones identificadas durante el proceso de revisión. Asimismo, se efectuó seguimiento al personal vinculado al proyecto y se mantuvo articulación permanente con la supervisión SST del ICCU, quedando pendiente la reprogramación de la visita técnica a obra.

-De acuerdo con la programación aprobada por la interventoría, se tiene un a avance acumulado programado del 23% y un avance acumulado ejecutado del 16%, esto de acuerdo con el avance físico del contrato, se presenta un atraso del 7% correspondiente a la no entrega de los informes compilados de todos los componentes de los diseño del contrato.

- El avance financiero programado acumulado del contrato es del 20,64% que corresponde a $ 1.639.900.062, el avance financiero ejecutado acumulado del contrato es del 3,13% que corresponde a $ 248.847.526 especto al flujo de caja Se presenta un atraso del 12.53% correspondiente a que el contratista no ha iniciado con las actividades de fresado concreto asfáltico, afirmado, instalación de rajón para mejoramiento de la subrasante, inatalación de concreto clase D para bases y elevaciones, instalación de concreto clase F para solados y atraques y el suministro e instalación de geotextil.

12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Imagen 1. Excavación mecánica, para instalación de geotextil, material filtrante y ducto



Imagen 2. Instalación de geotextil, material filtrante y ducto



Imagen 3. Excavación y vaciado de anillos en caissons 6, actividad finalizada en muro 2, tramo 2



Imagen 4. Excavación y vaciado de anillos en muro 1, tramo 1

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

JUAN DIEGO ARENAS
