	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-034
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	29/10/2025

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSULTORES DONOVAN S.A.S	CONSULTORES DONOVAN SAS	**FECHA**	jueves, 28 de mayo de 2026	**SEMANA No.**	**18**	DEL	**21-may-26**	AL	**28-may-26**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR VIAL VERGARA A NOCAIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
LOCALIZACIÓN PROYECTO	Corredor Vergara - Nocaima

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**	
CONTRATO No.:	ICCU-CTO-1624- 2025	**CONTRATO No.:**	ICCU-CTO-1586- 2025
PLAZO INICIAL:	NUEVE (9) MESES	**PLAZO INICIAL:**	NUEVE (9) MESES
CONTRATISTA:	CONSULTORES DONOVAN SAS	**CONTRATISTA:**	OPEN INGENIERIA S.A.S.
FECHA DE INICIACIÓN:	26 de enero de 2026	**FECHA DE INICIACIÓN:**	26 de enero de 2026
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N/A	***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N/A
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	N/A	***FECHA DE REINICIACIÓN:**	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	25 de octubre de 2026	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	25 de octubre de 2026
PLAZO ACTUALIZADO:	272 días	**PLAZO ACTUALIZADO:**	272 días
PLAZO TRANSCURRIDO:	122 días	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	122 días
VALOR INICIAL :	$ 970.900.948	**VALOR INICIAL :**	$ 7.943.403.636
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 970.900.948	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 7.943.403.636
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 970.900.948	**VALOR POR PAGAR:**	$ 7.943.403.636
VALOR ANTICIPO:	$ 293.717.933,83	**VALOR ANTICIPO:**	$ 1.588.680.727,20
SUPERVISOR:	MARIA DEL PILAR SUAREZ MONZÓN	**INTERVENTOR**	CONSULTORES DONOVAN SAS

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

A continuación, se relacionan las actividades realizadas durante la semana:

-Se realizó actividades de excavación mecánica, instalación de geotextil, material filtrante y ducto en el tramo 2, margen izquierda entre las abscisas K0+750 a K1+050.

-Se realizo inspección de anillos de caissons en muro 1, tramo 1, en abscisas K0+120 a K0+140 el 23/05/2026

-Se realizó actividades de excavación y vaciado de concreto para anillos de caissons para cimentación en muro 1, tramo 1 en abscisas K0+120 a K0+140, se culminó esta actividad el 26/05/2026.

- De acuerdo con la programación entregada por el contratista, se debió continuar con las actividades de excavación, transporte de materiales provenientes de la excavación, fresado de concreto asfaltico, afirmado, instalación de rajón para mejoramiento de la subrasante, instalación de concreto clase D para bases y elevaciones, instalación de concreto clase F para solados, demolición de concreto estructural, instalación de tubería en concreto reforzado en 36", figurado y armado de acero de refuerzo, atraques e instalación de geotextil T 2400. A la fecha estas actividades no se han iniciado.

-De acuerdo con la programación aprobada por la interventoría, se tiene un a avance acumulado programado del 24% y un avance acumulado ejecutado del 16%, esto de acuerdo con el avance físico del contrato, se presenta un atraso del 8% correspondiente a la no entrega de los informes compilados de todos los componentes de los diseño del contrato.

- El avance financiero programado acumulado del contrato es del 22,69% que corresponde a $ 1.802.215.185,59, el avance financiero ejecutado acumulado del contrato es del 5,84% que corresponde a $ 464.202.033 respecto al flujo de caja se presenta un atraso del 16.85% correspondiente a que el contratista no ha iniciado con las actividades de fresado concreto asfáltico, afirmado, instalación de rajón para mejoramiento de la subrasante, inatalación de concreto clase D para bases y elevaciones, instalación de concreto clase F para solados y atraques y el suministro e instalación de geotextil.

CORRESPONDENCIA ENVIADA

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-188-2026 del 22 de mayo de 2026 remitió al ICCU La remisión informe semanal N.17 – Actividades realizadas del 14 de mayo de 2026 al 21 de mayo de 2026.

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-189-2026 del 25 de mayo de 2026 remitió al ICCU La solicitud de reemplazo del residente de interventoría.

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-190-2026 del 25 de mayo de 2026 remitió a OPEN INGENIERÍA S.A.S. La respuesta al comunicado OFC-ICCU-1586-2025-170 con la “Entrega de actas de vecindad, registro fotográfico y solicitud de firmas – Tramo 2.

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-191-2026 del 25 de mayo de 2026 remitió al OPEN INGENIERÍA S.A.S. La respuesta a su comunicado OFC-ICCU-1586-2025-174 Entrega del Informe Ambiental No. 3 V2 – Aprobación del informe mensual ambiental N°3 V2 del contratista.

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-192-2026 del 25 de mayo de 2026 remitió al ICCU La remisión informe mensual ambiental N.3 V1 de interventoría.

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-193-2026 del 26 de mayo de 2026 remitió al OPEN INGENIERÍA S.A.S. La respuesta a comunicado OFC-ICCU-1586-2025-176, Entrega y subsanación de ítems no previstos para aprobación formal – Respuesta al comunicado DON-1624-ICCU-165-2026.

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-194-2026 del 26 de mayo de 2026 remitió al OPEN INGENIERÍA S.A.S La revisión diseño estructural del muro de contención en tramo 2 V3 en su revisión 2

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-195-2026 del 27 de mayo de 2026 remitió al OPEN INGENIERÍA S.A.S La respuesta a comunicado OFC-ICCU-1586-2025-175, consolidado de aprobación de órdenes de operación No. 3, 4, 5, 6 y 7.

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-196-2026 del 27 de mayo de 2026 remitió al OPEN INGENIERÍA S.A.S La respuesta a comunicado OFC-ICCU-1586-2025-142 “Entrega del informe técnico No. 2 V2” y respuesta a comunicado OFC-ICCU-1586-2025-161 “Entrega del informe técnico No. 3 V1” Aprobación – Contrato de obra 1586-2025.

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-197-2026 del 27 de mayo de 2026 remitió al OPEN INGENIERÍA S.A.S La respuesta a su comunicado 26 mayo 2026 – Remisión de observaciones informe SST N°3 V1 - Informe mensual SST N.1 V2 de interventoría.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

- El contratista, mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-174 del 22 de mayo de 2026, remitió la entrega del Informe Ambiental No. 3 V2 - Respuesta al comunicado DON-1624-ICCU-177-2026.

- El contratista, mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-175 del 22 de mayo de 2026, remitió la solicitud de aprobación de pagos correspondientes al anticipo del contrato.

- El contratista, mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-176 del 22 de mayo de 2026, remitió entrega y subsanación de ítems no previstos para aprobación formal – Respuesta al comunicado DON-1624-ICCU-165-2026.

- El contratista, mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-177 del 25 de mayo de 2026, remitió solicitud de definición e información respecto al suministro de tubería PVC alcantarillado 12” y responsabilidades asociadas.

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programad a por	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1	TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) EXPLANACIONES Y EXCAVACIONES - EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM	20-jun-26	15-jul-26	26			no iniciado	no iniciado	no iniciado
2	TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) ESTRUCTURA DE PAVIMENTO - RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	16-jul-26	22-jul-26	7			no iniciado	no iniciado	no iniciado
3	TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) ESTRUCTURA DE PAVIMENTO - AFIRMADO	9-jul-26	22-jul-26	14			no iniciado	no iniciado	no iniciado
4	TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) ESTRUCTURA DE PAVIMENTO - BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA Y CEMENTO	7-ago-26	10-sep-26	35			no iniciado	no iniciado	no iniciado
5	TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) ESTRUCTURA DE PAVIMENTO - SUBBASE GRANULAR	22-jul-26	22-ago-26	32			no iniciado	no iniciado	no iniciado
6	TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) ESTRUCTURA DE PAVIMENTO - RIEGO DE IMPRIMACION	25-ago-26	11-sep-26	18			no iniciado	no iniciado	no iniciado
7	TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) ESTRUCTURA DE PAVIMENTO - RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	4-sep-26	23-sep-26	20			no iniciado	no iniciado	no iniciado
8	TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) ESTRUCTURA DE PAVIMENTO - MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	29-ago-26	23-sep-26	26			no iniciado	no iniciado	no iniciado
9	TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES	24-sep-26	26-oct-26	33			no iniciado	no iniciado	no iniciado
10	TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL - TOPE DEFENSA METÁLICA	24-sep-26	26-oct-26	33			no iniciado	no iniciado	no iniciado
11	TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL -SECCIÓN FINAL DEFENSA METÁLICA	24-sep-26	26-oct-26	33			no iniciado	no iniciado	no iniciado
12	TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL -DEFENSA METÁLICA	24-sep-26	26-oct-26	33			no iniciado	no iniciado	no iniciado
13	TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPTAFAROS EN DEFENSA METÁLICA	24-sep-26	26-oct-26	33			no iniciado	no iniciado	no iniciado

Plazo del proyecto: 129 días

** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION


AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	1,88%	1,80%	-0,08%
Durante el periodo	0,40%	0,13%	-0,28%
Acumulado Actual	2,29%	1,93%	-0,36%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRI.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
272 días	123,00	149 días	-0,98

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO

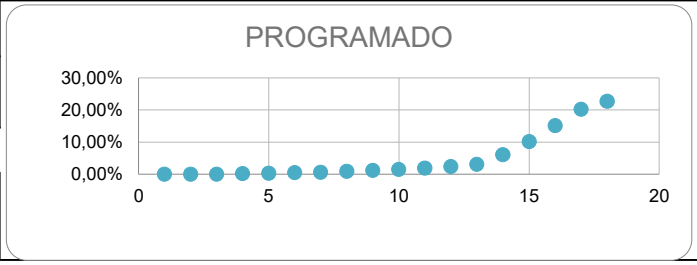

3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO


AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 1.608.828.816	$ 290.978.656	18%
Durante el periodo	$ 1.802.215.186	$ 464.202.033	26%
Acumulado Actual	$ 3.411.044.001	$ 755.180.689	22%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-78%

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO

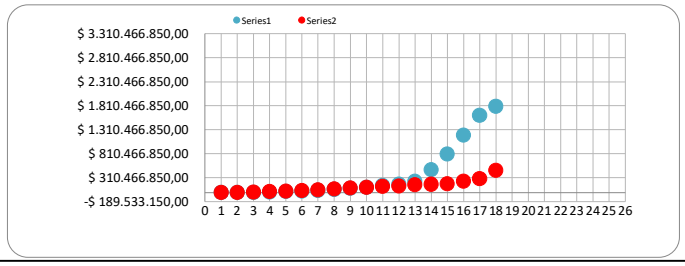


AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 972.272.605	$ -	0%
Durante el periodo	$ 1.029.465.112	$ -	0%
Acumulado Actual	$ 2.001.737.717	$ -	0%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-100%

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

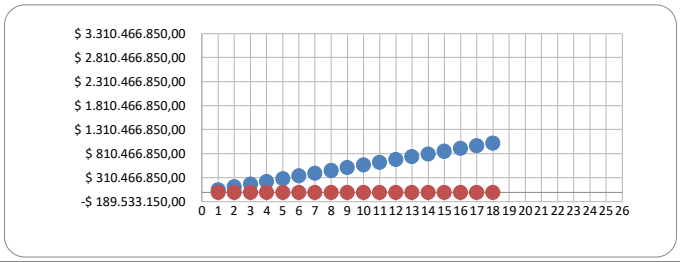

4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

Durante el periodo evaluado, la interventoría adelantó actividades de seguimiento, control y gestión institucional en el marco del componente ambiental del proyecto, conforme a las obligaciones contractuales y la normativa vigente aplicable, así:

-El día 22 de mayo de 2026, la interventoría realizó revisión al componente ambiental contenido en la presentación elaborada por el contratista para el Comité de Participación N.° 2, emitiendo observaciones y recomendaciones orientadas a fortalecer los temas a socializar con la comunidad del área de influencia del proyecto.

-El día 22 de mayo de 2026, mediante comunicado OFC-ICCU-1586-2025-174, el contratista remitió a la interventoría la subsanación de observaciones correspondientes al Informe Mensual Ambiental N.° 3, presentando la versión 2 del documento para revisión.

-La interventoría realizó la revisión técnica de la versión 2 del Informe Mensual Ambiental N.° 3 del contratista y, mediante comunicado DON-1624-ICCU-191-2026 del 25 de mayo de 2026, emitió concepto de aprobación del informe correspondiente al periodo comprendido entre el 1 y el 30 de abril de 2026.

-El día 25 de mayo de 2026, la supervisión ambiental del ICCU remitió mediante correo electrónico el visto bueno respecto a la gestión adelantada por el contratista ante la Alcaldía Municipal de Vergara, Cundinamarca, relacionada con el tratamiento e intervención de los individuos arbóreos presentes dentro de las áreas de intervención del proyecto.

-Mediante comunicado DON-1624-ICCU-192-2026 del 25 de mayo de 2026, la interventoría remitió a la supervisión ambiental del ICCU el Informe Mensual Ambiental N.° 3 de interventoría, para su respectiva revisión y/o aprobación.

-Posteriormente, la supervisión ambiental del ICCU remitió mediante correo electrónico concepto de visto bueno al Informe Mensual Ambiental N.° 3 de interventoría, indicando que no se presentaban observaciones sobre el documento.

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Entregables sociales

Subprograma de información y divulgación:
La interventoría reviso y aprobó el volante de inicio de actividades técnicas de las alcantarillas del tramo 1 y 2.

Subprograma de servicio a la ciudadanía:
La interventoría informa que el Punto SAU físico, se encuentra ubicado en el balneario Casa Palma tramo 2 K0+030, con atención presencial los días Martes y miércoles de 9:00AM a 4:30 PM. Así mismo relaciona los canales de atención virtual, tales como: Línea móvil 3122229350 y el ccorreo electrónico socialcto1586@gmail.com.

PQRSD: La interventoría informa que a la fecha no se ha recibido PQRSD.

Subprograma de manejo a la infraestructura de predios y servicios públicos:
El 25 de mayo de 2026, la interventoría remitió al contratista el comunicado DON-1624-ICCU-190-2026, con observaciones a las actas de vecindad del tramo 2, las cuales se encuentran en atención de observaciones por parte del contratista.

En total se levantaron 34 actas de vecindad para el contrato.

Subprograma de MONC con enfoque de género:
La interventoría refiere que el porcentaje de cumplimiento para el personal MONC es del 36% realizado sobre el 30% requerido, el porcentaje de mujeres es del 10.5% sobre el 5% y 0% para personas en proceso de reintegración o reincorporación, dado a que según consulta con la agencia nacional de reintegración-ACN, no hay presencia de este tipo de personas en el área de influencia del contrato.

Programa de cultura vial y participación ciudadana:
El 22 de mayo de 2026, la interventora recibió del contratista la PPT del comité de participación N.º 2, la cual fue devuelta con observaciones de interventoría.
El 27 de mayo de 2026, la interventora recibió la presentación ajustada por parte del contratista, la cual fue revisada, complementada y aprobada por interventoría y avalada por la profesional social el ICCU el mismo día.
El comité de participación N.º 2, se realizará el 29 de mayo de 2026 a las 3:00 pm.

6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO
Durante el periodo evaluado, la interventoría adelantó actividades de seguimiento, revisión y articulación institucional en el marco del componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), conforme a las obligaciones contractuales y la normativa vigente aplicable, así: **Reporte de Accidentalidad:** Para la semana reportada en el presente informe NO se presentaron accidentes en interventoría ni contratista. **Personal de interventoría:** Personal presentado y aprobado por la supervision del ICCU. **Personal de contratista:** A la fecha la documentación de vinculación del personal contractual se encuentra en subsanacion por parte del contratista. interventoria a la espera de subsanacion para revisión y aprobación. -22. trabajadores en obra. -El día 22 de mayo de 2026, la interventoría realizó revisión al componente SST contenido en la presentación elaborada por el contratista para el Comité de Participación N.° 2, emitiendo observaciones y recomendaciones orientadas a complementar los temas a tratar, teniendo en cuenta los posibles intereses, inquietudes y expectativas de la comunidad del área de influencia del proyecto. -Mediante oficio remitido por correo electrónico el día 26 de mayo de 2026, la supervisión SST del ICCU remitió a la interventoría las observaciones correspondientes al Informe Mensual SST N.° 3 de interventoría, para su respectiva revisión, ajuste y subsanación. Posteriormente, mediante oficio DON-1624-ICCU-197-2026 del 27 de mayo de 2026, la interventoría remitió a la supervisión SST del ICCU el Informe Mensual SST N.° 3 versión 2, incorporando la subsanación y atención de las observaciones efectuadas por la supervisión del ICCU.
7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD
El plan de calidad se encuentra aprobado por parte de la interventoria
8. IDENTIFICACION DE SITUACIONES PROBLEMATICAS - ANALISIS DE CAUSAS
Durante la semana se presentaron las siguientes situaciones problematicas: La comunidad en los sectores de descole de las ocho (8) alcantarillas previstas, no permiten la realización de dichas actividades, hasta que exista una conciliación con estos, la alcaldia municipal, contratista e interventoría.
8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)
N/A
8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL
N/A
8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO
N/A
8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS
N/A
8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)
N/A
8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)
N/A
8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)
N/A
8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)
N/A

9. PLAN DE ACCION RESULTADO DEL ANALISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAIZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA PROGRAMADA**
N/A		
N/A		

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N/A

11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

- Durante el periodo evaluado se evidencia la continuidad en el desarrollo de actividades técnicas en campo, incluyendo excavación manual y vaciado de concreto anillos de caissons en muro 1 tramo 1 entre abcisas K0+120 a K0+140 y excavación mecánica, instalación de geotextil, material filtrante y ducto en el tramo 2, margen izquierda, entre las abscisas K0+750 a K1+050.

- Durante el periodo reportado, la interventoría realizó seguimiento permanente al componente ambiental del proyecto, adelantando actividades de revisión técnica, control documental y articulación institucional con el contratista y la supervisión ambiental del ICCU. En este marco, se efectuó la revisión del componente ambiental de la presentación para el Comité de Participación N.° 2, emitiendo observaciones orientadas a fortalecer la socialización de información con la comunidad. Asimismo, se realizó la revisión y aprobación de la versión 2 del Informe Mensual Ambiental N.° 3 del contratista, así como la remisión del informe mensual de interventoría a la supervisión ambiental del ICCU, obteniendo concepto favorable sin observaciones. Adicionalmente, se recibió visto bueno por parte de la supervisión ambiental del ICCU respecto a la gestión adelantada por el contratista ante la Alcaldía Municipal de Vergara para la intervención de los individuos arbóreos presentes en el área de influencia del proyecto.

- Desde el componente social, para el corte de este informe semanal no se recibieron PQRSD, se aprobó el volante de inicio de actividades técnicas en alcantarillas y se programó el comité de participación N.º 2 del contrato a desarrollar el 29 de mayo de 2026. Asimismo, se dio cumplimiento con el porcentaje de contratación del personal MONC y Mujeres y la interventoría devolvió las actas de vecindad levantadas para el tramo 2 para atención del contratista.

- Durante el periodo reportado, la interventoría realizó seguimiento continuo al componente SST del proyecto, adelantando actividades de revisión técnica, control documental y articulación institucional con el contratista y la supervisión SST del ICCU. En este marco, se efectuó la revisión del componente SST de la presentación para el Comité de Participación N.° 2, emitiendo observaciones orientadas a fortalecer la socialización de temas de interés para la comunidad. Asimismo, la interventoría atendió y subsanó las observaciones realizadas por la supervisión SST del ICCU al Informe Mensual SST N.° 3 de interventoría, remitiendo oportunamente la versión ajustada del documento para su respectiva revisión y seguimiento.

-De acuerdo con la programación aprobada por la interventoría, se tiene un a avance acumulado programado del 24% y un avance acumulado ejecutado del 16%, esto de acuerdo con el avance físico del contrato, se presenta un atraso del 8% correspondiente a la no entrega de los informes compilados de todos los componentes de los diseño del contrato.

- El avance financiero programado acumulado del contrato es del 22,69% que corresponde a $ 1.802.215.185,59, el avance financiero ejecutado acumulado del contrato es del 5,84% que corresponde a $ 464.202.033 especto al flujo de caja se presenta un atraso del 16.85% correspondiente a que el contratista no ha iniciado con las actividades de fresado concreto asfáltico, afirmado, instalación de rajón para mejoramiento de la subrasante, inatalación de concreto clase D para bases y elevaciones, instalación de concreto clase F para solados y atraques y el suministro e instalación de geotextil.

12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Imagen 1. Excavación mecánica, para instalación de geotextil, material filtrante y ducto



Imagen 2. Instalación de geotextil, material filtrante y ducto



Imagen 3. Inspección de anillos en muro 1, tramo 1



Imagen 4. Excavación y vaciado de anillos en muro 1, tramo 1, actividad finalizada

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

JUAN DIEGO ARENAS
