ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**FORMATO**	**CÓDIGO**	MS-GP-FR-034
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	**VERSIÓN**	1
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	**FECHA**	29/10/2025

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSULTORES DONOVAN S.A.S	CONSULTORES DONOVAN SAS	**FECHA**	jueves, 11 de junio de 2026	**SEMANA No.**	**20**	DEL	**4-jun-26**	AL	**11-jun-26**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR VIAL VERGARA A NOCAIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
LOCALIZACIÓN PROYECTO	Corredor Vergara - Nocaima

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**	
CONTRATO No.:	ICCU-CTO-1624- 2025	**CONTRATO No.:**	ICCU-CTO-1586- 2025
PLAZO INICIAL:	NUEVE (9) MESES	**PLAZO INICIAL:**	NUEVE (9) MESES
CONTRATISTA:	CONSULTORES DONOVAN SAS	**CONTRATISTA:**	OPEN INGENIERIA S.A.S.
FECHA DE INICIACIÓN:	26 de enero de 2026	**FECHA DE INICIACIÓN:**	26 de enero de 2026
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N/A	***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N/A
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	N/A	***FECHA DE REINICIACIÓN:**	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	25 de octubre de 2026	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	25 de octubre de 2026
PLAZO ACTUALIZADO:	272 días	**PLAZO ACTUALIZADO:**	272 días
PLAZO TRANSCURRIDO:	136 días	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	136 días
VALOR INICIAL :	$ 970.900.948	**VALOR INICIAL :**	$ 7.943.403.636
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 970.900.948	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 7.943.403.636
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 970.900.948	**VALOR POR PAGAR:**	$ 7.943.403.636
VALOR ANTICIPO:	$ 293.717.933,83	**VALOR ANTICIPO:**	$ 1.588.680.727,20
SUPERVISOR:	MARIA DEL PILAR SUAREZ MONZÓN	**INTERVENTOR**	CONSULTORES DONOVAN SAS

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

A continuación, se relacionan las actividades realizadas durante la semana:

-Se realizó actividades de figurado y armado de acero de refuerzo para núcleo de caisson en muro 2 del tramo 2 en abscisas K0+280 a K0+310.

-El 5 y 10 de junio se realizó demolición, excavación, instalación de tubería PVC 36" y relleno para alcantarillas ubicadas en abscisas K1+345 y K0+303 del tramo 2.

-El 09/6/2026 se realizó demolición, excavación, instalación de tubería en concreto reforzado 36" y relleno para alcantarilla ubicada en abscisa K1+061 tramo 2.

-Se realizó actividades de reconexión de tubería de agua potable en las alcantarillas intervenidas, orden, aseo y relleno con material de subbase sobre el filtro construido en el costado izquierdo de la vía en tramo 2.

- De acuerdo con la programación entregada por el contratista, se debió continuar con las actividades de excavación, transporte de materiales provenientes de la excavación, fresado de concreto asfaltico, afirmado, instalación de rajón para mejoramiento de la subrasante, instalación de concreto clase D para bases y elevaciones, instalación de concreto clase F para solados, atraques, instalación de geotextil T2400 y subbase granular. A la fecha estas actividades no se han iniciado.

-De acuerdo con la programación aprobada por la interventoría, en el Tramo 1 se tiene un avance acumulado programado del 0% y un avance acumulado ejecutado del 5%. De acuerdo con el avance físico del contrato, se presenta un adelanto del 5%, correspondiente a la realización de la construcción de anillos de caisson.

-De acuerdo con la programación aprobada por la interventoría, en el Tramo 2 se tiene un avance acumulado programado del 33% y un avance acumulado ejecutado del 18%. De acuerdo con el avance físico del contrato, se presenta un atraso del 15%, correspondiente a la no ejecución de actividades de obra como el fresado de la carpeta asfáltica y el inicio de la instalación de la estructura de pavimento.

- El avance financiero programado acumulado del contrato es del 27,81% que corresponde a $ 2.208.945.664,59, el avance financiero ejecutado acumulado del contrato es del 12,11% que corresponde a $ 950.802.265 respecto al flujo de caja se presenta un atraso del 15.69% correspondiente a que el contratista no ha iniciado con las actividades de fresado de concreto asfaltico, afirmado, instalación de rajón para mejoramiento de la subrasante, instalación de concreto clase D para bases y elevaciones, instalación de concreto clase F para solados, atraques, instalación de geotextil T2400 y subbase granular. A la fecha estas actividades no se han iniciado.

CORRESPONDENCIA ENVIADA

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-204-2026 del 5 de junio de 2026 remitió al ICCU la remisión informe semanal N.19 – Actividades realizadas del 28 de mayo de 2026 al 4 de junio de 2026.

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-205-2026 del 5 de junio de 2026 remitió a OPEN INGENIERÍA S.A.S la revisión y firma acta de comité N.8 del 27 de mayo de 2026.

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-206-2026 del 5 de junio de 2026 remitió a OPEN INGENIERÍA S.A.S la respuesta al comunicado OFC-ICCU-1586-2025-184 “Entrega del Informe Social No. 4”.

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-207-2026 del 5 de junio de 2026 remitió a OPEN INGENIERÍA S.A.S la respuesta al comunicado OFC-ICCU-1586-2025-179. Entrega de actas de vecindad, registro fotográfico y solicitud de firmas del Tramo 2.

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-208-2026 del 9 de junio de 2026 remitió a OPEN INGENIERÍA S.A.S la revisión y firma acta de recorrido de obra N. 2 del 1 de junio de 2026.

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-209-2026 del 9 de junio de 2026 remitió a OPEN INGENIERÍA S.A.S la respuesta a su comunicado OFC- ICCU-1586-2025-189 Entrega del Informe Ambiental No. 4 – Observaciones informe mensual ambiental No. 4 V1.

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-210-2026 del 10 de junio de 2026 remitió a OPEN INGENIERÍA S.A.S la revisión y firma acta de comité N.9 del 3 de junio de 2026.

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-211-2026 del 10 de junio de 2026 remitió a OPEN INGENIERÍA S.A.S la respuesta a comunicado OFC-ICCU-1586-2025-171 observaciones concepto hidráulico.

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-212-2026 del 10 de junio de 2026 remitió a OPEN INGENIERÍA S.A.S la respuesta a OFC-ICCU-1586-2025-191 armado refuerzo caissons del muro de contención T2, R0

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-213-2026 del 11 de junio de 2026 remitió a OPEN INGENIERÍA S.A.S la respuesta al comunicado OFC-ICCU-1586-2025-192. Aprobación del informe mensual social del contratista N.°4 V2.

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-214-2026 del 11 de junio de 2026 remitió al ICCU la remisión informe mensual social N.4 V1 de interventoría.

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-215-2026 del 11 de junio de 2026 remitió al ICCU la remisión informe técnico mensual N.3 de las gestiones realizadas por la interventoría durante el periodo del 1 de abril de 2026 al 30 de abril de 2026.

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-216-2026 del 11 de junio de 2026 remitió al ICCU la respuesta a su comunicado OFC-ICCU-1586-2025-187 Entrega del Informe SST No. 4 – observaciones al informe mensual SST N°4 V1.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

- El contratista, mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-183 del 4 de junio de 2026, remitió Entrega del Diseño Estructural de los muros de contención V4 – Respuesta al comunicado DON-1624-ICCU-178-2026.

- El contratista, mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-184 del 4 de junio de 2026, remitió Entrega del Informe Social No. 4.

- El contratista, mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-185 del 5 de junio de 2026, remitió Entrega del Informe Técnico No. 4.

- El contratista, mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-186 del 5 de junio de 2026, remitió la Presentación de alternativa técnica al muro zapatero inicialmente planteado.

- El contratista, mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-187 del 5 de junio de 2026, remitió Entrega del Informe del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST No. 4.

- El contratista, mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-188 del 5 de junio de 2026, remitió Metodología – Actividad de cultura vial N°1.

- El contratista, mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-189 del 5 de junio de 2026, remitió Entrega del Informe Ambiental No. 4.

- El contratista, mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-190 del 9 de junio de 2026, remitió Solicitud de aprobación del acta para reconocimiento del cobro por concepto del PAGA.

- El contratista, mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-191 del 10 de junio de 2026, remitió Entrega de informe técnico, revisión y propuesta para la finalización del armado de acero de refuerzo en los caisson del Muro 2 en el Tramo 2.

- El contratista, mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-192 del 11 de junio de 2026, remitió Entrega del Informe Social No. 4 V2 – Respuesta al comunicado DON-1624-ICCU-206-2026.

- El contratista, mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-193 del 11 de junio de 2026, remitió Solicitud de aprobación de pagos correspondientes al anticipo del contrato.

- El contratista, mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-194 del 11 de junio de 2026, remitió Entrega y solicitud de aprobación del Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1.

- El contratista, mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-195 del 11 de junio de 2026, remitió Entrega y subsanación de ítems no previstos para aprobación formal – Respuesta al comunicado DON-1624-ICCU-193-2026.

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1	TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) EXPLANACIONES Y EXCAVACIONES - EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM	20-jun-26	15-jul-26	26			no iniciado	no iniciado	no iniciado
2	TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) ESTRUCTURA DE PAVIMENTO - RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	16-jul-26	22-jul-26	7			no iniciado	no iniciado	no iniciado
3	TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) ESTRUCTURA DE PAVIMENTO - AFIRMADO	9-jul-26	22-jul-26	14			no iniciado	no iniciado	no iniciado
4	TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) ESTRUCTURA DE PAVIMENTO - BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA Y CEMENTO	7-ago-26	10-sep-26	35			no iniciado	no iniciado	no iniciado
5	TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) ESTRUCTURA DE PAVIMENTO - SUBBASE GRANULAR	22-jul-26	22-ago-26	32			no iniciado	no iniciado	no iniciado
6	TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) ESTRUCTURA DE PAVIMENTO - RIEGO DE IMPRIMACION	25-ago-26	11-sep-26	18			no iniciado	no iniciado	no iniciado
7	TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) ESTRUCTURA DE PAVIMENTO - RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	4-sep-26	23-sep-26	20			no iniciado	no iniciado	no iniciado
8	TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) ESTRUCTURA DE PAVIMENTO - MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	29-ago-26	23-sep-26	26			no iniciado	no iniciado	no iniciado
9	TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES	24-sep-26	26-oct-26	33			no iniciado	no iniciado	no iniciado
10	TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL - TOPE DEFENSA METÁLICA	24-sep-26	26-oct-26	33			no iniciado	no iniciado	no iniciado
11	TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL -SECCIÓN FINAL DEFENSA METÁLICA	24-sep-26	26-oct-26	33			no iniciado	no iniciado	no iniciado
12	TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL -DEFENSA METÁLICA	24-sep-26	26-oct-26	33			no iniciado	no iniciado	no iniciado
13	TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPTAFAROS EN DEFENSA METÁLICA	24-sep-26	26-oct-26	33			no iniciado	no iniciado	no iniciado
Plazo del proyecto: 129 días									

** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION

AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	25,13%	10,91%	-14,22%
Durante el periodo	2,67%	1,20%	-1,47%
Acumulado Actual	27,81%	12,11%	-15,69%

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO


DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRI.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
272 días	137,00	135 días	-42,69

3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 1.996.553.123	$ 855.309.652	43%
Durante el periodo	$ 2.208.945.665	$ 950.802.265	43%
Acumulado Actual	$ 4.205.498.787	$ 1.806.111.917	43%

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO

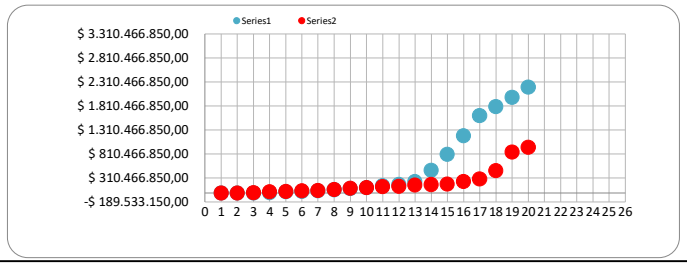


AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-57%

AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 1.086.657.618	$ -	0%
Durante el periodo	$ 1.143.850.124	$ -	0%
Acumulado Actual	$ 2.230.507.742	$ -	0%

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

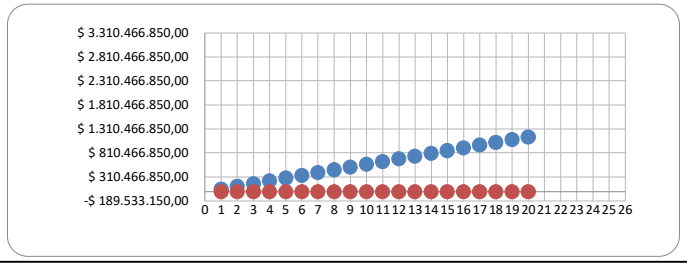

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-100%

4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

Durante el periodo evaluado, la interventoría adelantó actividades de seguimiento, control y gestión institucional en el marco del componente ambiental del proyecto, conforme a las obligaciones contractuales y la normativa vigente aplicable, así:

- El día 05 de junio de 2026, mediante oficio OFC-ICCU-1586-2025-189, el contratista remitió a la interventoría el Informe Mensual Ambiental N.° 4 correspondiente al periodo comprendido entre el 01 y el 31 de mayo de 2026, para su respectiva revisión y evaluación.

- La interventoría realizó la revisión técnica y documental detallada del Informe Mensual Ambiental N.° 4 presentado por el contratista, verificando el cumplimiento de las obligaciones ambientales, los compromisos establecidos en el PAGA y la información reportada para el periodo evaluado.

- Como resultado de dicha revisión, mediante comunicado DON-1624-ICCU-209-2026 del 09 de junio de 2026, la interventoría remitió al contratista las observaciones, recomendaciones y requerimientos de ajuste identificados en el informe, con el fin de garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable y de las disposiciones establecidas en el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA).

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Entregables sociales

El 4 de junio de 2026, la interventoría recibió del contratista el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-184 con la remisión del informe mensual social N.º 4 V1, el cual fue devuelto con observaciones de interventoría el 5 de junio de 2026, mediante el comunicado DON-1624-ICCU-206-2026.

El 11 de junio de 202, el contratista remitió a la interventoría el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-192 remisión del informe mensual social N.º 4 V2, informe que fue aprobado el mismo día por interventoría mediante el oficio DON-1624-ICCU-213-2026.

El 9 de junio de 2026, la interventoría participo en el comité de seguimiento social N.º 5, en la cual se socializo el reporte de la gestión social a la fecha.

El 11 de junio de 2026, la interventoría remitió al ICCU el comunicado DON-1624-ICCU-214-2026 con el informe mensual social de interventoría N.º 4.

Subprograma de información y divulgación:
A la fecha se encuentran instalados 3 PSI del contrato, en el puto SAU del proyecto y en las alcaldías municipales de Nocaima y Vergara Cundinamarca.

Subprograma de servicio a la ciudadanía:
La interventoría informa que el Punto SAU físico, se encuentra ubicado en el balneario Casa Palma tramo 2 K0+030, con atención presencial los días Martes y miércoles de 9:00AM a 4:30 PM. Así mismo relaciona los canales de atención virtual, tales como: Línea móvil 3122229350 y el ccorreo electrónico socialcto1586@gmail.com.

PQRSD: a la fecha se ha recibido una PQRSD, la cual se encuentra cerrada. El 4 de junio de 2026, la interventoría remitió al ICCU el comunicado DON-1624-ICCU-203-2026, con la respuesta formal al cierre de la PQRSD presentada por la señora Olga Lucia Gaitan Castañeda.

Subprograma de manejo a la infraestructura de predios y servicios públicos:
En total se levantaron 34 actas de vecindad para el contrato.

El 5 de junio de 2026, la interventoría remitió al contratista el comunicado DON-1624-ICCU-207-2026 con la aprobación de las actas de vecindad para el tramo 2.

Subprograma de MONC con enfoque de género:
La interventoría refiere que el porcentaje de cumplimiento para el personal MONC es del 36% realizado sobre el 30% requerido, el porcentaje de mujeres es del 10.5% sobre el 5% y 0% para personas en proceso de reintegración o reincorporación, dado a que según consulta con la agencia nacional de reintegración-ACN, no hay presencia de este tipo de personas en el área de influencia del contrato.

Programa de cultura vial y participación ciudadana:
El 9 de junio de 2026, la interventoría recibió del contratista el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-188 con la metodología del taller de cultura vial N.º 1, metodología que fue observada, revisada y aprobada por la interventoría y remitida a la profesional social del ICCU el mismo día.

6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

Durante el periodo evaluado, la interventoría adelantó actividades de seguimiento, revisión y articulación institucional en el marco del componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), conforme a las obligaciones contractuales y la normativa vigente aplicable, así:

- El día 04 de junio de 2026, la interventoría emitió el comunicado DON-1624-ICCU-201-2026, mediante el cual otorgó aprobación a la documentación correspondiente a la mano de obra no calificada presentada por el contratista, validando un total de veintidós (22) trabajadores para su vinculación al proyecto.

- El día 05 de junio de 2026, mediante oficio OFC-ICCU-1586-2025-187, el contratista remitió a la interventoría el Informe Mensual SST N.° 4 correspondiente al periodo comprendido entre el 01 y el 31 de mayo de 2026, para su respectiva revisión y evaluación.

- La interventoría realizó la revisión técnica y documental detallada del Informe Mensual SST N.° 4, verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), así como de las obligaciones contractuales y normativas aplicables al proyecto.

- Como resultado de dicha revisión, mediante comunicado DON-1624-ICCU-216-2026 del 11 de junio de 2026, la interventoría remitió al contratista las observaciones, no conformidades y requerimientos de ajuste identificados en el informe, con el fin de garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente y de los lineamientos establecidos en el SG-SST aprobado para el proyecto.

7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

El plan de calidad se encuentra aprobado por parte de la interventoria

8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Durante la semana se presentaron las siguientes situaciones problematicas: La comunidad en los sectores de descole de las ocho (8) alcantarillas previstas, no permiten la realización de dichas actividades, hasta que exista una conciliación con estos, la alcaldia municipal, contratista e interventoría.

8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

N/A

8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

N/A

8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

N/A

8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

N/A

8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

N/A

8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

N/A

8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

N/A

8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

N/A

9. PLAN DE ACCION RESULTADO DEL ANALISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAIZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
N/A		
N/A		

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N/A

11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

-Durante el periodo evaluado se evidencia la continuidad en el desarrollo de actividades técnicas en campo, incluyendo figurado y armado de acero de refuerzo para núcleo de caisson en muro 2 del tramo 2 en abscisas K0+280 a K0+310. Demolición, excavación, instalación de tubería 36" y relleno para alcantarillas ubicadas en tramo 2 en las abscisas K0+303, K1+061 y K1+345.

- Durante el periodo reportado, la interventoría efectuó el seguimiento técnico al componente ambiental mediante la revisión integral del Informe Mensual Ambiental N.° 4 presentado por el contratista, verificando el cumplimiento de los compromisos establecidos en el PAGA y la normatividad ambiental aplicable. Como resultado de esta actividad, se emitieron las respectivas observaciones y requerimientos de ajuste, orientados a fortalecer la calidad de la información reportada y asegurar la adecuada gestión ambiental durante la ejecución del proyecto.

- A la fecha, el componente social avanzó en la revisión y aprobación del informe mensual social N.º 4 del contratista y con la elaboración y remisión del informe mensual social de interventoría Nº4. Asimismo, se avanzó en la metodología para el taller de cultura ciudadana N.º 1, se dio aprobación a las actas de vecindad del tramo 2 por parte de interventoría y se participó en el comité se seguimiento social N.º 5. Al corte de este informe no se han recibido PQRSD y se encuentran activos los cales de atención del punto SAU.

- Durante el periodo reportado, la interventoría continuó ejerciendo seguimiento y control al componente de Seguridad y Salud en el Trabajo, destacándose la aprobación de la documentación correspondiente a la mano de obra no calificada presentada por el contratista y la revisión integral del Informe Mensual SST N.° 4. Como resultado de esta evaluación, se emitieron observaciones y requerimientos orientados a fortalecer el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el SG-SST, así como la calidad y trazabilidad de la información reportada por el contratista para el periodo evaluado.

-De acuerdo con la programación aprobada por la interventoría, en el Tramo 1 se tiene un avance acumulado programado del 0% y un avance acumulado ejecutado del 5%. De acuerdo con el avance físico del contrato, se presenta un adelanto del 5%, correspondiente a la realización de la construcción de anillos de caisson.

-De acuerdo con la programación aprobada por la interventoría, en el Tramo 2 se tiene un avance acumulado programado del 33% y un avance acumulado ejecutado del 18%. De acuerdo con el avance físico del contrato, se presenta un atraso del 15%, correspondiente a la no ejecución de actividades de obra como el fresado de la carpeta asfáltica y el inicio de la instalación de la estructura de pavimento.

- El avance financiero programado acumulado del contrato es del 27,81% que corresponde a $ 2.208.945.664,59, el avance financiero ejecutado acumulado del contrato es del 12,11% que corresponde a $ 950.802.265 respecto al flujo de caja se presenta un atraso del 15.69% correspondiente a que el contratista no ha iniciado con las actividades de fresado de concreto asfaltico, afirmado, instalación de rajón para mejoramiento de la subrasante, instalación de concreto clase D para bases y elevaciones, instalación de concreto clase F para solados, atraques, instalación de geotextil T2400 y subbase granular. A la fecha estas actividades no se han iniciado.

12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Imagen 1. Instalación tubería de 36" en PVC y relleno para alcantarilla en tramo 2



Imagen 2. Instalación tubería de 36" en concreto y relleno para alcantarilla en tramo 2



Imagen 3. Figurado y armado de acero de refuerzo para núcleo de caisson en muro 2 del tramo 2



Imagen 4. Reconexión de tuberías de agua potable y construcción de solados

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

JUAN DIEGO ARENAS
