	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-034
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	29/10/2025

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSULTORES DONOVAN S.A.S	CONSULTORES DONOVAN SAS	FECHA	jueves, 18 de junio de 2026	SEMANA No.	21	DEL	11-jun-26	AL	18-jun-26

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR VIAL VERGARA A NOCAIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
LOCALIZACIÓN PROYECTO	Corredor Vergara - Nocaima

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	
CONTRATO No.:	ICCU-CTO-1624- 2025	**CONTRATO No.:**	ICCU-CTO-1586- 2025
PLAZO INICIAL:	NUEVE (9) MESES	**PLAZO INICIAL:**	NUEVE (9) MESES
CONTRATISTA:	CONSULTORES DONOVAN SAS	**CONTRATISTA:**	OPEN INGENIERIA S.A.S.
FECHA DE INICIACIÓN:	26 de enero de 2026	**FECHA DE INICIACIÓN:**	26 de enero de 2026
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N/A	***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N/A
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	N/A	***FECHA DE REINICIACIÓN:**	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	25 de octubre de 2026	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	25 de octubre de 2026
PLAZO ACTUALIZADO:	272 días	**PLAZO ACTUALIZADO:**	272 días
PLAZO TRANSCURRIDO:	143 días	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	143 días
VALOR INICIAL :	$ 970.900.948	**VALOR INICIAL :**	$ 7.943.403.636
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 970.900.948	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 7.943.403.636
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 970.900.948	**VALOR POR PAGAR:**	$ 7.943.403.636
VALOR ANTICIPO:	$ 293.717.933,83	**VALOR ANTICIPO:**	$ 1.588.680.727,20
SUPERVISOR:	MARIA DEL PILAR SUAREZ MONZÓN	**INTERVENTOR**	CONSULTORES DONOVAN SAS

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

A continuación, se relacionan las actividades realizadas durante la semana:

-Se realizó actividades de figurado y armado de acero de refuerzo para núcleo de caissons en muro 2 del tramo 2 en abscisas K0+280 a K0+310.

-Se realizó actividades de figurado de acero de refuerzo y vaciado de concreto para construcción de descole de alcantarilla ubicada en la abscisa K0+121.

-Se realizaron actividades de excavación mecánica, instalación de geotextil, material filtrante y ducto en el tramo 2, margen izquierda entre las abscisas K0+215 a K0+305.

-Se realizó actividades de inspección de armado de acero de caissons en muro 2 del tramo 2 en abscisas K0+280 a K0+310.

- De acuerdo con la programación entregada por el contratista, se debió continuar con las actividades de excavación, transporte de materiales provenientes de la excavación, fresado de concreto asfaltico, afirmado, instalación de rajón para mejoramiento de la subrasante, instalación de concreto clase D para bases y elevaciones, atraques, instalación de geotextil T2400 y subbase granular. A la fecha estas actividades no se han iniciado.

-De acuerdo con la programación aprobada por la interventoría, en el Tramo 1 se tiene un avance acumulado programado del 0% y un avance acumulado ejecutado del 5%. De acuerdo con el avance físico del contrato, se presenta un adelanto del 5%, correspondiente a la realización de la construcción de anillos de caisson.

-De acuerdo con la programación aprobada por la interventoría, en el Tramo 2 se tiene un avance acumulado programado del 35% y un avance acumulado ejecutado del 30%. De acuerdo con el avance físico del contrato, se presenta un atraso del 5%, correspondiente a la no ejecución de actividades de obra como el fresado de la carpeta asfáltica y el inicio de la instalación de la estructura de pavimento.

- El avance financiero programado acumulado del contrato es del 30,11% que corresponde a $ 2.391.686.427,59, el avance financiero ejecutado acumulado del contrato es del 12,28% que corresponde a $ 963.780.686 respecto al flujo de caja se presenta un atraso del 17.83% correspondiente a que el contratista no ha iniciado con las actividades de fresado de concreto asfaltico, afirmado, instalación de rajón para mejoramiento de la subrasante, instalación de concreto clase D para bases y elevaciones, instalación de concreto clase F para solados, atraques, instalación de geotextil T2400 y subbase granular. A la fecha estas actividades no se han iniciado.

CORRESPONDENCIA ENVIADA

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-217-2026 del 12 de junio de 2026 remitió al ICCU Remisión informe semanal N.20 – Actividades realizadas del 4 de junio de 2026 al 11 de junio de 2026.

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-218-2026 del 12 de junio de 2026 remitió a OPEN INGENIERÍA S.A.S Respuesta al comunicado OFC-ICCU-1586-2025-188. Aprobación metodologia de cultura vial No.1.

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-219-2026 del 12 de junio de 2026 remitió a OPEN INGENIERÍA S.A.S Respuesta a comunicado OFC-ICCU-1586-2025-193 Observaciones “Solicitud de aprobación de pagos correspondientes al anticipo del contrato”.

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-220-2026 del 12 de junio de 2026 remitió a OPEN INGENIERÍA S.A.S Respuesta a su comunicado OFC- OFC-ICCU-1586-2025-190 Solicitud de aprobación del acta para reconocimiento del cobro por concepto del PAGA – Solicitud de soportes de acta de cobro del PAGA.

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-221-2026 del 13 de junio de 2026 remitió al ICCU Revisión y firma de actas, comité No.8, recorrido de obra No.2 y comité No.9.

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-222-2026 del 17 de junio de 2026 remitió a OPEN INGENIERÍA S.A.S Respuesta a comunicado OFC-ICCU-1586-2025-193 y OFC-ICCU-1586-2025-197, Consolidado de aprobación de órdenes de operación No. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15.

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-223-2026 del 16 de junio de 2026 remitió a OPEN INGENIERÍA S.A.S Llamado de atención por no atención de observaciones – Informe mensual ambiental N°4.

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-224-2026 del 17 de junio de 2026 remitió a OPEN INGENIERÍA S.A.S Respuesta a su comunicado OFC-ICCU-1586-2025-196 Solicitud de aprobación del acta para reconocimiento del cobro por concepto del PAGA, Respuesta al comunicado DON-1624-ICCU-220-2026 – aprobación acta de cobro N°1 P.A.G.A.

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-225-2026 del 17 de junio de 2026 remitió al ICCU Análisis de precios no

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-226-2026 del 17 de junio de 2026 remitió a OPEN INGENIERÍA S.A.S Solicitud de atención, subsanación y cierre de hallazgos derivados del informe de supervisión SST del ICCU, recorrido de obra.

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-227-2026 del 17 de junio de 2026 remitió al ICCU Acta de obra parcial N°1.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

- El contratista, mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-196 del 16 de junio de 2026, remitió Solicitud de aprobación del acta para reconocimiento del cobro por concepto del PAGA - Respuesta al comunicado DON-1624-ICCU-220-2026.

- El contratista, mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-197 del 16 de junio de 2026, remitió Solicitud de aprobación de pagos correspondientes al anticipo del contrato – Respuesta al comunicado DON-1624-ICCU-219-2026.

- El contratista, mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-198 del 16 de junio de 2026, remitió Solicitud de acompañamiento para jornada de capacitación en cultura vial en el municipio de Vergara – Cundinamarca.

- El contratista, mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-199 del 16 de junio de 2026, remitió Solicitud de cambio del profesional Inspector 1.

- El contratista, mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-200 del 16 de junio de 2026, remitió Solicitud de cambio del profesional Inspector 2.

- El contratista, mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-201 del 17 de junio de 2026, remitió Entrega del Informe del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST No. 4 V2 - Respuesta al comunicado DON-1624-ICCU-216-2026.

- El contratista, mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-202 del 17 de junio de 2026, remitió Entrega del Diseño Estructural del Muro No. 1 de contención V4 – Respuesta al comunicado DON-1624-ICCU-178-2026.

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1	TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) EXPLANACIONES Y EXCAVACIONES - EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM	20-jun-26	15-jul-26	26			no iniciado	no iniciado	no iniciado
2	TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) ESTRUCTURA DE PAVIMENTO - RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	16-jul-26	22-jul-26	7			no iniciado	no iniciado	no iniciado
3	TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) ESTRUCTURA DE PAVIMENTO - AFIRMADO	9-jul-26	22-jul-26	14			no iniciado	no iniciado	no iniciado
4	TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) ESTRUCTURA DE PAVIMENTO - BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA Y CEMENTO	7-ago-26	10-sep-26	35			no iniciado	no iniciado	no iniciado
5	TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) ESTRUCTURA DE PAVIMENTO - SUBBASE GRANULAR	22-jul-26	22-ago-26	32			no iniciado	no iniciado	no iniciado
6	TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) ESTRUCTURA DE PAVIMENTO - RIEGO DE IMPRIMACION	25-ago-26	11-sep-26	18			no iniciado	no iniciado	no iniciado
7	TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) ESTRUCTURA DE PAVIMENTO - RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	4-sep-26	23-sep-26	20			no iniciado	no iniciado	no iniciado
8	TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) ESTRUCTURA DE PAVIMENTO - MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	29-ago-26	23-sep-26	26			no iniciado	no iniciado	no iniciado
9	TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES	24-sep-26	26-oct-26	33			no iniciado	no iniciado	no iniciado
10	TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL - TOPE DEFENSA METÁLICA	24-sep-26	26-oct-26	33			no iniciado	no iniciado	no iniciado
11	TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL -SECCIÓN FINAL DEFENSA METÁLICA	24-sep-26	26-oct-26	33			no iniciado	no iniciado	no iniciado
12	TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL -DEFENSA METÁLICA	24-sep-26	26-oct-26	33			no iniciado	no iniciado	no iniciado
13	TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPTAFAROS EN DEFENSA METÁLICA	24-sep-26	26-oct-26	33			no iniciado	no iniciado	no iniciado
Plazo del proyecto: 129 días									


** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION

AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	27,81%	12,11%	-15,69%
Durante el periodo	2,30%	0,16%	-2,14%
Acumulado Actual	30,11%	12,28%	-17,83%

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO

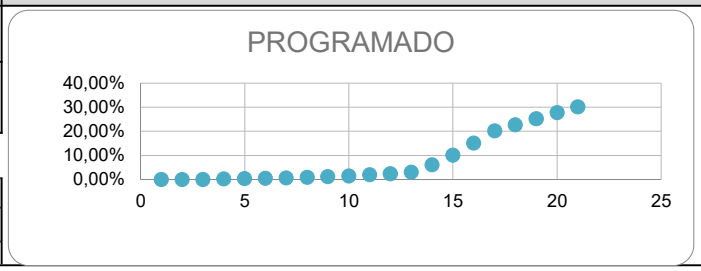

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO


DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRI.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
272 días	144,00	128 días	-48,50

3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 2.208.945.665	$ 950.802.265	43%
Durante el periodo	$ 2.391.686.428	$ 963.780.686	40%
Acumulado Actual	$ 4.600.632.092	$ 1.914.582.951	42%

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO

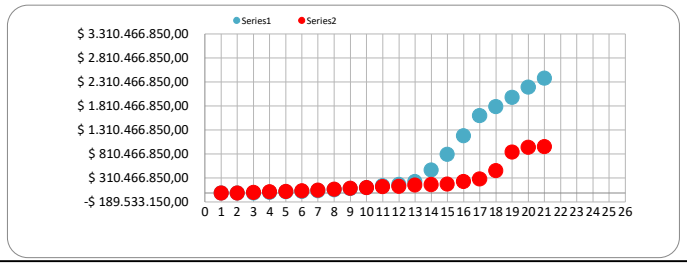


AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-58%

AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 1.143.850.124	$ -	0%
Durante el periodo	$ 1.201.042.630	$ -	0%
Acumulado Actual	$ 2.344.892.754	$ -	0%

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

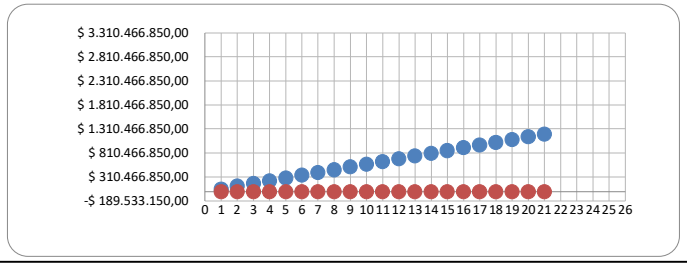

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-100%

4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

Durante el periodo evaluado, la interventoría adelantó actividades de seguimiento, control y gestión institucional en el marco del componente ambiental del proyecto, conforme a las obligaciones contractuales y la normativa vigente aplicable, así:

- El día 11 de junio de 2026, mediante comunicado OFC-ICCU-1586-2025-190, el contratista remitió a la interventoría la solicitud de aprobación del acta para reconocimiento del cobro correspondiente a la implementación del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA), con el fin de adelantar el trámite correspondiente.

- Posteriormente, mediante comunicado DON-1624-ICCU-220-2026 del 12 de junio de 2026, la interventoría realizó la revisión de la documentación allegada, evidenciando la ausencia de soportes que sustentaran las actividades ejecutadas y el cobro solicitado, por lo cual se requirió al contratista la remisión de la información faltante para continuar con el proceso de evaluación y aprobación.

- El día 16 de junio de 2026, mediante comunicado OFC-ICCU-1586-2025-196, el contratista remitió a la interventoría los soportes documentales requeridos para la revisión del acta de reconocimiento del cobro por concepto del PAGA.

- Una vez revisada y verificada la información presentada por el contratista, mediante comunicado DON-1624-ICCU-224-2026 del 17 de junio de 2026, la interventoría emitió concepto de aprobación y remitió el acta debidamente firmada para el reconocimiento del cobro correspondiente a la gestión e implementación del PAGA.

- Mediante comunicado DON-1624-ICCU-223-2026 del 16 de junio de 2026, la interventoría emitió llamado de atención al contratista por la falta de atención a las observaciones realizadas al Informe Mensual Ambiental N.° 4 y por el incumplimiento de los plazos establecidos para la subsanación de las mismas. A la fecha de elaboración del presente informe, no se ha recibido respuesta por parte del contratista frente a dicho requerimiento.

- La interventoría participó en el Comité Integral del proyecto realizado el día 17 de junio de 2026, espacio en el cual se expusieron los avances del componente ambiental, el estado de los compromisos pendientes y las gestiones adelantadas durante el periodo evaluado.

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Entregables sociales

Al corte de este informe, la interventoría recibio del ICCU la aprobacion del informe mensual social N.º 4 de interventoría.

Subprograma de información y divulgación:
A la fecha se encuentran instalados 3 PSI del contrato, en el puto SAU del proyecto y en las alcaldías municipales de Nocaima y Vergara Cundinamarca.

Subprograma de servicio a la ciudadanía:
La interventoría informa que el Punto SAU físico, se encuentra ubicado en el balneario Casa Palma tramo 2 K0+030, con atención presencial los días Martes y miércoles de 9:00AM a 4:30 PM. Así mismo relaciona los canales de atención virtual, tales como: Línea móvil 3122229350 y el ccorreo electrónico socialcto1586@gmail.com.

PQRSD: a la fecha se ha recibido una PQRSD, la cual se encuentra cerrada.

Subprograma de manejo a la infraestructura de predios y servicios públicos:
Para el corte de este informe semanal, el contratista realizo la entrega de las copias de las actas de vecindad del tramo 2.

El 5 de junio de 2026, la interventoría remitió al contratista el comunicado DON-1624-ICCU-207-2026 con la aprobación de las actas de vecindad para el tramo 2.

Subprograma de MONC con enfoque de género:
La interventoría refiere que el porcentaje de cumplimiento para el personal MONC es del 36% realizado sobre el 30% requerido, el porcentaje de mujeres es del 10.5% sobre el 5% y 0% para personas en proceso de reintegración o reincorporación, dado a que según consulta con la agencia nacional de reintegración-ACN, no hay presencia de este tipo de personas en el área de influencia del contrato.

Programa de cultura vial y participación ciudadana:
El 12 de junio de 2026, la interventoría dio concepto de aprobación de la metodología para el taller de cultura vial N.º 1, previo al aval de la profesional social del ICCU. Asimismo, se programo el recorrido del comité participación 3, para el 30 de junio de 2026.

6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

Durante el periodo evaluado, la interventoría adelantó actividades de seguimiento, revisión y articulación institucional en el marco del componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), conforme a las obligaciones contractuales y la normativa vigente aplicable, así:

Reporte de Accidentalidad: Para la semana reportada en el presente informe NO se presentaron accidentes en interventoría ni contratista.

Personal de interventoría: Personal presentado y aprobado por la supervision del ICCU.

Personal de contratista:

22. trabajadores en obra, aprobados por interventoria.

A la fecha se encuentra pendiente el allego de la documentación de vinculación del personal contractual de plantilla minima para revisión y aprobación.

- El día 16 de junio de 2026, mediante comunicación remitida por correo electrónico, la Supervisión SST del ICCU allegó a la interventoría el informe de supervisión derivado de la visita y recorrido efectuado al área de intervención del proyecto, en el cual se relacionaron las no conformidades, observaciones y oportunidades de mejora identificadas durante la verificación en campo.

- El día 17 de junio de 2026, mediante comunicado OFC-ICCU-1586-2025-201, el contratista remitió a la interventoría el Informe Mensual SST N.° 4 en su versión 2, correspondiente a la subsanación de las observaciones previamente realizadas por esta interventoría mediante comunicado DON-1624-ICCU-216-2026.

- La interventoría participó en el Comité Integral del proyecto desarrollado el día 17 de junio de 2026, espacio en el cual se presentaron los avances, estado actual y gestiones adelantadas dentro del componente de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Mediante comunicado DON-1624-ICCU-226-2026 del 17 de junio de 2026, la interventoría remitió al contratista las observaciones y no conformidades contenidas en el informe de la Supervisión SST del ICCU, solicitando la implementación de las acciones correctivas necesarias y la atención oportuna de los requerimientos formulados.

- Finalmente, mediante comunicado DON-1624-ICCU-230-2026 del 18 de junio de 2026, la interventoría remitió al ICCU el Informe Mensual SST N.° 4 correspondiente al periodo comprendido entre el 01 y el 31 de mayo de 2026, para su respectiva revisión y aprobación.

7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

El plan de calidad se encuentra aprobado por parte de la interventoria

8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Durante la semana se presentaron las siguientes situaciones problematicas: La comunidad en los sectores de descole de las ocho (8) alcantarillas previstas, no permiten la realización de dichas actividades, hasta que exista una conciliación con estos, la alcaldia municipal, contratista e interventoría.

8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

N/A

8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

N/A

8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

N/A

8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

N/A

8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

N/A

8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

N/A

8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

N/A

8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

N/A

9. PLAN DE ACCION RESULTADO DEL ANALISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAIZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
N/A		
N/A		

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N/A

11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

-Durante el periodo evaluado se evidencia la continuidad en el desarrollo de actividades técnicas en campo, incluyendo figurado y armado de acero de refuerzo para núcleo de caisson en muro 2 del tramo 2 en abscisas K0+280 a K0+310. figurado de acero de refuerzo y vaciado de concreto para construcción de descole de alcantarilla ubicada en la abscisa K0+121 y excavación mecánica, instalación de geotextil, material filtrante y ducto en el tramo 2, margen izquierda entre las abscisas K0+215 a K0+305.

- Durante el periodo evaluado, la interventoría adelantó actividades de seguimiento y control al componente ambiental, destacándose la revisión y aprobación del acta de reconocimiento del cobro correspondiente al PAGA, previa verificación de los soportes documentales aportados por el contratista. De igual manera, se efectuó seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales mediante la emisión de un llamado de atención por la falta de atención a las observaciones del Informe Mensual Ambiental N.° 4, manteniendo el control permanente sobre los compromisos ambientales y el adecuado desarrollo del proyecto.

- A la fecha, el componente social se encuentra al día con los informes mensuales del componente social del contrato, no se han recibido PQRSD nuevas, se cumple con el porcentaje de contratación MONCL y mujeres, se realizo entrega de las copias de las actas de vecindad y se programo el comité de participación N.º 3 y el taller de cultura ciudadana N.º 1.

- Durante el periodo evaluado, la interventoría mantuvo el seguimiento permanente al componente de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizando la articulación entre contratista y Supervisión SST del ICCU frente a las no conformidades identificadas durante la visita de campo, y verificando la subsanación de las observaciones realizadas al Informe Mensual SST N.° 4. Asimismo, se adelantó la gestión correspondiente para la remisión del informe ajustado ante el ICCU, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el SG-SST y promover la mejora continua de las condiciones de seguridad en la ejecución del proyecto.

-De acuerdo con la programación aprobada por la interventoría, en el Tramo 1 se tiene un avance acumulado programado del 0% y un avance acumulado ejecutado del 5%. De acuerdo con el avance físico del contrato, se presenta un adelanto del 5%, correspondiente a la realización de la construcción de anillos de caisson.

-De acuerdo con la programación aprobada por la interventoría, en el Tramo 2 se tiene un avance acumulado programado del 35% y un avance acumulado ejecutado del 30%. De acuerdo con el avance físico del contrato, se presenta un atraso del 5%, correspondiente a la no ejecución de actividades de obra como el fresado de la carpeta asfáltica y el inicio de la instalación de la estructura de pavimento.

- El avance financiero programado acumulado del contrato es del 30,11% que corresponde a $ 2.391.686.427,59, el avance financiero ejecutado acumulado del contrato es del 12,28% que corresponde a $ 963.780.686 respecto al flujo de caja se presenta un atraso del 17.83% correspondiente a que el contratista no ha iniciado con las actividades de fresado de concreto asfaltico, afirmado, instalación de rajón para mejoramiento de la subrasante, instalación de concreto clase D para bases y elevaciones, instalación de concreto clase F para solados, atraques, instalación de geotextil T2400 y subbase granular. A la fecha estas actividades no se han iniciado.

12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Imagen 1. Figurado y armado de acero de refuerzo para núcleo de caisson en muro 2 del tramo 2



Imagen 2. Construcción descole de alcantarilla ubicada en la abscisa K0+121



Imagen 3. Instalación de geotextil, material filtrante y ducto



Imagen 4. Inspección de armado de acero en muro 2, tramo 2

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

JUAN DIEGO ARENAS
