| | | | |
|---|---|---|---|
| ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA | **FORMATO** | **CÓDIGO** | MS-GP-FR-034 |
| | **GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA** | **VERSIÓN** | 1 |
| | **INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA** | **FECHA** | 29/10/2025 |

**PERIODO DE INFORME SEMANAL**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSULTORES DONOVAN S.A.S | CONSULTORES DONOVAN SAS | **FECHA** | jueves, 25 de junio de 2026 | **SEMANA No.** | **22** | DEL | **18-jun-26** | AL | **25-jun-26** |

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR VIAL VERGARA A NOCAIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. |
| **LOCALIZACIÓN PROYECTO** | Corredor Vergara - Nocaima |

| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | | **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA** | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.:** | ICCU-CTO-1624- 2025 | **CONTRATO No.:** | ICCU-CTO-1586- 2025 |
| **PLAZO INICIAL:** | NUEVE (9) MESES | **PLAZO INICIAL:** | NUEVE (9) MESES |
| **CONTRATISTA:** | CONSULTORES DONOVAN SAS | **CONTRATISTA:** | OPEN INGENIERIA S.A.S. |
| **FECHA DE INICIACIÓN:** | 26 de enero de 2026 | **FECHA DE INICIACIÓN:** | 26 de enero de 2026 |
| ***FECHA DE SUSPENSIÓN:** | N/A | ***FECHA DE SUSPENSIÓN:** | N/A |
| ***FECHA DE REINICIACIÓN:** | N/A | ***FECHA DE REINICIACIÓN:** | N/A |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 25 de octubre de 2026 | **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 25 de octubre de 2026 |
| **PLAZO ACTUALIZADO:** | 272 días | **PLAZO ACTUALIZADO:** | 272 días |
| **PLAZO TRANSCURRIDO:** | 150 días | **PLAZO TRANSCURRIDO:** | 150 días |
| **VALOR INICIAL :** | $ 970.900.948 | **VALOR INICIAL :** | $ 7.943.403.636 |
| **VALOR ADICION:** | $ - | **VALOR ADICION:** | $ - |
| **VALOR ACTUALIZADO:** | $ 970.900.948 | **VALOR ACTUALIZADO:** | $ 7.943.403.636 |
| **VALOR PAGADO:** | $ - | **VALOR PAGADO:** | $ - |
| **VALOR POR PAGAR:** | $ 970.900.948 | **VALOR POR PAGAR:** | $ 7.943.403.636 |
| **VALOR ANTICIPO:** | $ 293.717.933,83 | **VALOR ANTICIPO:** | $ 1.588.680.727,20 |
| **SUPERVISOR:** | MARIA DEL PILAR SUAREZ MONZÓN | **INTERVENTOR** | CONSULTORES DONOVAN SAS |

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones.

## 2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

A continuación, se relacionan las actividades realizadas durante la semana:

-Se realizó actividades de figurado y armado de acero de refuerzo para núcleo de caissons en muro 1 del tramo 1 en abscisas K0+120 a K0+140.
-Se realizó actividades de inspección de armado de acero de caissons en muro 2 del tramo 2 en abscisas K0+280 a K0+310.
-Se realizó actividades de figurado de acero de refuerzo y vaciado de concreto para construcción de encole de alcantarilla ubicada en la abscisa K0+121 del tramo 2.
-Se realizó actividades de figurado de acero de refuerzo y vaciado de concreto para construcción de encole de alcantarilla ubicada en la abscisa K0+303 del tramo 2.
-Se realizó actividades de excavación e instalación de tubería PVC 36" de longitud 5.50m para extensión de descole en la alcantarilla K0+677 del tramo 2.
-Se realizó actividades de fresado en tramo 2 desde la abscisa K0+000 a K0+303

- De acuerdo con la programación entregada por el contratista, se debió continuar con las actividades de excavación, transporte de materiales provenientes de la excavación, afirmado, instalación de rajón para mejoramiento de la subrasante, instalación de concreto clase D para bases y elevaciones, atraques, instalación de geotextil T2400 y subbase granular. A la fecha estas actividades no se han iniciado.

-De acuerdo con la programación aprobada por la interventoría, en el Tramo 1 se tiene un avance acumulado programado del 0% y un avance acumulado ejecutado del 5%. De acuerdo con el avance físico del contrato, se presenta un adelanto del 5%, correspondiente a la realización de la construcción de anillos de caisson.

-De acuerdo con la programación aprobada por la interventoría, en el Tramo 2 se tiene un avance acumulado programado del 37% y un avance acumulado ejecutado del 31%. De acuerdo con el avance físico del contrato, se presenta un atraso del 6%, correspondiente a la no ejecución de la instalación de la estructura de pavimento.

- El avance financiero programado acumulado del contrato es del 36,24% que corresponde a $ 2.878.599.376,59, el avance financiero ejecutado acumulado del contrato es del 12,71% que corresponde a $ 998.112.876 respecto al flujo de caja se presenta un atraso del 23.53% correspondiente a que el contratista no ha iniciado con las actividades de afirmado, instalación de rajón para mejoramiento de la subrasante, instalación de concreto clase D para bases y elevaciones, instalación de concreto clase F para solados, atraques, instalación de geotextil T2400 y subbase granular. A la fecha estas actividades no se han iniciado.

**CORRESPONDENCIA ENVIADA**

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-229-2026 del 18 de junio de 2026 remitió a OPEN INGENIERÍA S.A.S Respuesta a su comunicado OFC-ICCU-1586-2025-201 Entrega del Informe del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST No. 4 V2 - Respuesta al comunicado DON-1624-ICCU-216-2026 – Aprobación del informe mensual SST N°4 V2 del contratista.

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-230-2026 del 18 de junio de 2026 remitió al ICCU Remisión informe mensual SST N.4 V1 de interventoría.

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-231-2026 del 18 de junio de 2026 remitió al ICCU Remisión de acta de costos No. 3 – Contrato de interventoría No. ICCU-CTO-1624-2025 por el periodo comprendido del 1 de abril de 2026 al 30 de abril de 2026.

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-232-2026 del 19 de junio de 2026 remitió al ICCU Remisión informe semanal N.21 - Actividades realizadas del 11 de junio de 2026 al 18 de junio de 2026.

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-233-2026 del 19 de junio de 2026 remitió al ICCU Remisión hojas de vida de profesionales 1 y 2.

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-234-2026 del 23 de junio de 2026 remitió a OPEN INGENIERÍA S.A.S Respuesta a su comunicado OFC-ICCU-1586-2025-204 Entrega del Informe ambiental No. 4 V2 - Respuesta al comunicado DON-1624-ICCU-209-2026 – observaciones informe mensual ambiental No. 4 V2.

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-235-2026 del 23 de junio de 2026 remitió al ICCU Respuesta a su comunicado 22 junio 2026 – Revisión informe No 4, mes de mayo de 2026, componente de Seguridad y Salud en el Trabajo. – Subsanación de observaciones.

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-236-2026 del 23 de junio de 2026 remitió al ICCU Solicitud de cambio de vehículo asignado al contrato de interventoría.

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-237-2026 del 24 de junio de 2026 remitió a OPEN INGENIERÍA S.A.S Respuesta a OFC-ICCU-1586-2025-202 diseño estructural del muro No.1 de contención V4, R2.

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-238-2026 del 24 de junio de 2026 remitió a OPEN INGENIERÍA S.A.S Respuesta a comunicado OFC-ICCU-1586-2025-203: Solicitud de aprobación de pagos correspondientes al anticipo del contrato.

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-239-2026 del 24 de junio de 2026 remitió a OPEN INGENIERÍA S.A.S Respuesta a comunicado OFC-ICCU-1586-2025-181: Entrega del diseño de mezcla del concreto de 4000 PSI.

**CORRESPONDENCIA RECIBIDA**

- El contratista, mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-203 del 19 de junio de 2026, remitió Solicitud de aprobación de pagos correspondientes al anticipo del contrato

- El contratista, mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-204 del 22 de junio de 2026, remitó Entrega del Informe Ambiental No. 4 V2 - Respuesta al comunicado DON-1624-ICCU-209-2026.

- El contratista, mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-205 del 23 de junio de 2026, remitió Entrega del personal de obra, mano de obra no calificada.

- El contratista, mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-206 del 24 de junio de 2026, remitió Entrega del Informe del buen manejo del Anticipo No. 2

- El contratista, mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-207 del 24 de junio de 2026, remitió Entrega del Informe del buen manejo del Anticipo No. 3

## 3. CONTROL DE EJECUCIÓN

### 3.1. CONTROL DE RUTA CRÍTICA

| No. | Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica) | Programado | | | Real Ejecutado | | | Días desfase al inicio de la actividad | Días desfase al final de la actividad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha Inicial programada por actividad | Fecha Final programad a por | Días | **Fecha Inicial por actividad | **Fecha Final por actividad | Días | | |
| 1 | TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) EXPLANACIONES Y EXCAVACIONES - EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM | 20-jun-26 | 15-jul-26 | 26 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| 2 | TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) ESTRUCTURA DE PAVIMENTO - RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE | 16-jul-26 | 22-jul-26 | 7 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| 3 | TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) ESTRUCTURA DE PAVIMENTO - AFIRMADO | 9-jul-26 | 22-jul-26 | 14 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| 4 | TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) ESTRUCTURA DE PAVIMENTO - BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA Y CEMENTO | 7-ago-26 | 10-sep-26 | 35 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| 5 | TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) ESTRUCTURA DE PAVIMENTO - SUBBASE GRANULAR | 22-jul-26 | 22-ago-26 | 32 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| 6 | TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) ESTRUCTURA DE PAVIMENTO - RIEGO DE IMPRIMACION | 25-ago-26 | 11-sep-26 | 18 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| 7 | TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) ESTRUCTURA DE PAVIMENTO - RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 | 4-sep-26 | 23-sep-26 | 20 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| 8 | TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) ESTRUCTURA DE PAVIMENTO - MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO) | 29-ago-26 | 23-sep-26 | 26 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| 9 | TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES | 24-sep-26 | 26-oct-26 | 33 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| 10 | TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL - TOPE DEFENSA METÁLICA | 24-sep-26 | 26-oct-26 | 33 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| 11 | TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL -SECCIÓN FINAL DEFENSA METÁLICA | 24-sep-26 | 26-oct-26 | 33 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| 12 | TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL -DEFENSA METÁLICA | 24-sep-26 | 26-oct-26 | 33 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| 13 | TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPTAFAROS EN DEFENSA METÁLICA | 24-sep-26 | 26-oct-26 | 33 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| | **Plazo del proyecto:** 129 días | | | | | | | | |

** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica

## 3.2. CONTROL DE PROGRAMACION

**AVANCE FISICO DEL CONTRATO**

| | % PROGRAMADO A LA FECHA | % EJECUTADO HASTA LA FECHA | DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso) |
|---|---|---|---|
| Acumulado anterior | 30,11% | 12,28% | -17,83% |
| Durante el periodo | 6,13% | 0,43% | -5,70% |
| Acumulado Actual | 36,24% | 12,71% | -23,53% |

**GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO**




**AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO**

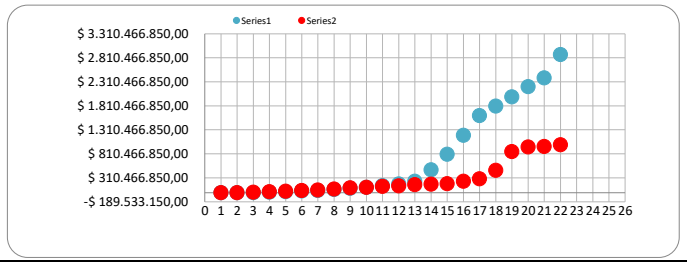
| DURACIÓN (DÍAS) | DIAS TRANSCURRI. | DIAS QUE FALTAN | DIFERENCIA EN DIAS |
|---|---|---|---|
| 272 días | 151,00 | 121 días | -64,00 |

## 3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

**AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO**

| | ACUMULADO PROGRAMADO ( $ ) MILLONES | ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES | INDICADOR ( % ) |
|---|---|---|---|
| Acumulado anterior | $ 2.391.686.428 | $ 963.780.686 | 40% |
| Durante el periodo | $ 2.878.599.377 | $ 998.112.876 | 35% |
| Acumulado Actual | $ 5.270.285.804 | $ 1.961.893.562 | 37% |

**GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO**



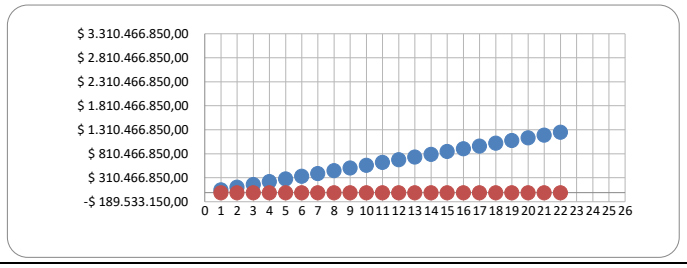

**AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO**

-63%

**AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO**

| | ACUMULADO PROGRAMADO ( $ ) MILLONES | ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES | INDICADOR ( % ) |
|---|---|---|---|
| Acumulado anterior | $ 1.201.042.630 | $ - | 0% |
| Durante el periodo | $ 1.258.235.136 | $ - | 0% |
| Acumulado Actual | $ 2.459.277.767 | $ - | 0% |

**GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO**




**AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO**

-100%

## 4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

Durante el periodo evaluado, la interventoría adelantó actividades de seguimiento, control y gestión institucional en el marco del componente ambiental del proyecto, conforme a las obligaciones contractuales y la normativa vigente aplicable, así:

- El día 19 de junio de 2026, la interventoría participó en el Comité Integral de Obra, en el cual se presentaron los avances del componente ambiental del proyecto y se informó el estado de atención de las observaciones formuladas por la Supervisión Ambiental del ICCU al documento PAGA. Durante la reunión se acordó coordinar una mesa de trabajo entre las partes involucradas con el fin de unificar criterios técnicos para la atención y subsanación de las observaciones pendientes.

- Mediante comunicado OFC-ICCU-1586-2025-204 del 22 de junio de 2026, el contratista remitió a la interventoría la versión 2 del Informe Mensual Ambiental N.° 4, correspondiente al periodo evaluado, en atención a las observaciones formuladas por la interventoría mediante comunicado DON-1624-ICCU-209-2026 del 09 de junio de 2026.

- Una vez efectuada la revisión de la documentación allegada, la interventoría evidenció que varias de las observaciones previamente emitidas no fueron atendidas ni subsanadas de manera satisfactoria. Por lo anterior, mediante comunicado DON-1624-ICCU-234-2026 del 23 de junio de 2026, se remitieron nuevamente las observaciones pendientes y se otorgó al contratista un (1) día hábil para su atención, considerando que las mismas habían sido comunicadas inicialmente desde el 09 de junio de 2026.

- Debido a que vencido el plazo otorgado no se recibió respuesta ni la documentación corregida por parte del contratista, la interventoría emitió el llamado de atención DON-1624-ICCU-236-2026 del 25 de junio de 2026, por incumplimiento en los plazos establecidos para la atención de observaciones y por la falta de respuesta a los requerimientos realizados. A la fecha de elaboración del presente informe, el contratista no ha presentado la subsanación solicitada ni ha emitido pronunciamiento frente a los requerimientos efectuados.

## 5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

**Entregables sociales**

A la fecha se encuentran aprobados los informes mensuales sociales del 1 al 4 del contratista y de interventoría por parte del ICCU.

**Subprograma de información y divulgación:**
Para el corte de este semanal, se tramito y divulgo el volante de inicio de actividades viales, así mismo se actualizaron los PSI del contrato.

**Subprograma de servicio a la ciudadanía:**
La interventoría informa que el Punto SAU físico, se encuentra ubicado en el balneario Casa Palma tramo 2 K0+030, con atención presencial los días Martes y miércoles de 9:00AM a 4:30 PM. Así mismo relaciona los canales de atención virtual, tales como: Línea móvil 3122229350 y el ccorreo electrónico socialcto1586@gmail.com.

PQRSD: A la fecha se ha recibido una PQRSD, la cual se encuentra cerrada. Para el corte de este semanal, no se recibieron PQRSD nuevas.

**Subprograma de MONC con enfoque de género:**
La interventoría refiere que el porcentaje de cumplimiento para el personal MONC es del 36% realizado sobre el 30% requerido, el porcentaje de mujeres es del 10.5% sobre el 5% y 0% para personas en proceso de reintegración o reincorporación, dado a que según consulta con la agencia nacional de reintegración-ACN, no hay presencia de este tipo de personas en el área de influencia del contrato.

**Programa de cultura vial y participación ciudadana:**
Para el corte de este informe, se programó el comité de participación N.º 3 mediante recorrido por los frentes de obra, para el 30 de junio de 2026.

Asimismo, se recibió comunicación de la secretaria de Movilidad, a través de la cual confirmo su participación en el primer taller de cultura vial a desarrollar el 14 de julio de 2026.

## 6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

Durante el periodo evaluado, la interventoría adelantó actividades de seguimiento, revisión y articulación institucional en el marco del componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), conforme a las obligaciones contractuales y la normativa vigente aplicable, así:

**Reporte de Accidentalidad:** Para la semana reportada en el presente informe NO se presentaron accidentes en interventoría ni contratista.

**Personal de interventoría:** Personal presentado y aprobado por la supervision del ICCU.

**Personal de contratista:**

22. trabajadores en obra, aprobados por interventoria.

A la fecha se encuentra pendiente el allego de la documentación de vinculación del personal contractual de plantilla minima para revisión y aprobación.

- Mediante oficio DON-1624-ICCU-229-2026 del 18 de junio de 2026, una vez realizada la revisión de las observaciones formuladas al informe mensual SST N.° 4 versión 2 presentado por el contratista, la interventoría emitió concepto de aprobación del documento.

- Mediante comunicado DON-1624-ICCU-230-2026 del 18 de junio de 2026, la interventoría remitió al ICCU el informe mensual SST N.° 4 correspondiente al periodo comprendido entre el 01 y el 31 de mayo de 2026, para su respectiva revisión y aprobación.

- El 22 de junio de 2026, la Supervisión SST del ICCU remitió vía correo electrónico las observaciones al informe mensual SST N.° 4 versión 1 de interventoría, para su respectiva atención y ajuste.

- Una vez revisadas y subsanadas las observaciones realizadas por la Supervisión SST del ICCU, la interventoría remitió mediante oficio DON-1624-ICCU-235-2026 del 23 de junio de 2026, la versión ajustada del informe mensual SST N.° 4.

- El 23 de junio de 2026, la Supervisión SST del ICCU comunicó vía correo electrónico la aprobación del informe mensual SST N.° 4 de interventoría correspondiente al periodo comprendido entre el 01 y el 31 de mayo de 2026.

- Mediante oficio OFC-ICCU-1586-2025-205 del 23 de junio de 2026, el contratista remitió a la interventoría la documentación correspondiente a cinco (5) trabajadores de Mano de Obra No Calificada (MONC) para su revisión y validación.
- Mediante comunicado DON-1624-ICCU-236-2026 del 23 de junio de 2026, la interventoría presentó al ICCU la solicitud de cambio del vehículo asignado para el desarrollo de las actividades de supervisión e interventoría del contrato.

- Finalmente, mediante oficio DON-1624-ICCU-241-2026 del 25 de junio de 2026, la interventoría realizó la revisión documental y emitió concepto de aprobación de la documentación presentada por el contratista para los cinco (5) trabajadores de Mano de Obra No Calificada relacionados en el oficio OFC-ICCU-1586-2025-205.

**7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD**

El plan de calidad se encuentra aprobado por parte de la interventoria

**8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS**

Durante la semana se presentaron las siguientes situaciones problematicas: La comunidad en los sectores de descole de las ocho (8) alcantarillas previstas, no permiten la realización de dichas actividades, hasta que exista una conciliación con estos, la alcaldia municipal, contratista e interventoría.

**8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)**

N/A

**8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL**

N/A

**8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

N/A

**8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS**

N/A

**8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)**

N/A

**8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)**

N/A

**8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)**

N/A

**8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)**

N/A

**9. PLAN DE ACCION RESULTADO DEL ANALISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAIZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA**

| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA |
|---|---|---|
| N/A | | |
| N/A | | |

**10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES**

N/A

**11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR**

-Durante el periodo evaluado se evidencia la continuidad en el desarrollo de actividades técnicas en campo, incluyendo figurado y armado de acero de refuerzo para núcleo de caisson en muro 1 del tramo 1 en abscisas K0+120 a K0+140, Inspección de armado de acero de caissons en muro 2 del tramo 2 en abscisas K0+280 a K0+310, figurado de acero de refuerzo y vaciado de concreto para construcción de encoles de alcantarillas ubicadas en las abscisas K0+121 y K0+303, excavación e instalación de tubería PVC de 36" para extensión de descole en la alcantarilla K0+677 del tramo 2 y actividades de fresado en tramo 2 desde la abscisa K0+000 a K0+303.

- Durante el periodo evaluado, la interventoría realizó seguimiento continuo al componente ambiental del proyecto, verificando el estado de atención de las observaciones formuladas al documento PAGA y al Informe Mensual Ambiental N.° 4. Se evidenció incumplimiento por parte del contratista en la atención oportuna de los requerimientos realizados, motivo por el cual fue necesario reiterar las observaciones y emitir un llamado de atención formal. A la fecha del presente informe persisten observaciones pendientes de subsanación, situación que continúa siendo objeto de seguimiento por parte de la interventoría para garantizar el cumplimiento de las obligaciones ambientales del contrato.

- A la fecha, el componente social se encuentra al día con los informes mensuales del componente social del contrato, no se han recibido PQRSD nuevas, se cumple con el porcentaje de contratación MONCL y mujeres, se tramito y socializo el volante de inicio de actividades viales, se programó el comité de participación N.º 3 para el 30 de junio de 2026 mediante recorrido por los frentes de obra y se programó el taller de cultura ciudadana N.º 1, para el 14 de julio de 2026.

- Durante la semana se dio continuidad a las actividades de seguimiento y control del componente SST, logrando la aprobación por parte de la Supervisión SST del ICCU del informe mensual N.° 4 de interventoría correspondiente al mes de mayo de 2026. Adicionalmente, se efectuó la revisión y aprobación de personal de Mano de Obra No Calificada presentado por el contratista y se gestionó ante el ICCU la solicitud de cambio del vehículo de apoyo de la interventoría. En términos generales, el componente se desarrolla conforme a las actividades programadas y a los requerimientos contractuales establecidos.

-De acuerdo con la programación aprobada por la interventoría, en el Tramo 1 se tiene un avance acumulado programado del 0% y un avance acumulado ejecutado del 5%. De acuerdo con el avance físico del contrato, se presenta un adelanto del 5%, correspondiente a la realización de la construcción de anillos de caisson.

-De acuerdo con la programación aprobada por la interventoría, en el Tramo 2 se tiene un avance acumulado programado del 37% y un avance acumulado ejecutado del 31%. De acuerdo con el avance físico del contrato, se presenta un atraso del 6%, correspondiente a la no ejecución de la instalación de la estructura de pavimento.

- El avance financiero programado acumulado del contrato es del 36,24% que corresponde a $ 2.878.599.376,59, el avance financiero ejecutado acumulado del contrato es del 12,71% que corresponde a $ 998.112.876 respecto al flujo de caja se presenta un atraso del 23.53% correspondiente a que el contratista no ha iniciado con las actividades de afirmado, instalación de rajón para mejoramiento de la subrasante, instalación de concreto clase D para bases y elevaciones, instalación de concreto clase F para solados, atraques, instalación de geotextil T2400 y subbase granular. A la fecha estas actividades no se han iniciado.

**12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA**




Imagen 1. Figurado y armado de acero de refuerzo para núcleo de caisson en muro 1 del tramo 1




Imagen 2. Inspección de armado de acero en muro 2, tramo 2




Imagen 3. Excavación e instalación tubería PVC 36" extensión descole alcantarilla K0+667 tramo 2




Imagen 4. Fresado tramo 2

**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

JUAN DIEGO ARENAS
