FORMATO				
AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**			
Principio de Procedencia: 4602.375	**Clave: GSAP 1.0-12-028**	**Versión:** 01	**Fecha:** 01/MARZO/2020	**Página:** ___ de #

UNIDAD EJECUTORA:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL			**FECHA:**	8/3/2025
Semana No	**1**	**Del :**	28/2/2025	AL:	8/3/2025
Plazo Total		518	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		9	días		
porcentaje del tiempo transcurrido(%)		1,74%			
Nombre del Supervisor :		ALDEMAR PINZÓN			

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

Contrato de Obra Pública 24001303 H4 de 2024, cuyo objeto es realizar estudios, diseños a fase III, mejoramiento de zonas de seguridad, sistema de drenaje, ayudas visuales, rehabilitación áreas cabecera 35 y obras complementarias, aeropuerto Palonegro de Bucaramanga (VF)

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

AEROPUERTO PALONEGRO. BUCARAMANGA - SANTANDER

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	**0,00%**		**(%) Ejecutado**	**0,00%**	**0,00%**
Valor programado ($)	**$ 0,00**		**Valor ejecutado ($)**	**$ 0,00**	
			Evaluación	**Porcentaje Adelanto**	**0,00%**
				Valor Adelanto	**$ 0,00**

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA			CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
Contratista:	CONSORCIO AERO BGA 2025		**Contratista:**	CONSORCIO AEROCONEXION BUCARAMANGA	
Contrato No:	24001303 H4 de 2024		**Contrato No:**	24001357 H3 de 2024.	
Valor Inicial:	$ 48.482.875.463		**Valor Inicial:**	$ 3.661.055.087	
Valor anticipo	$ 10.264.526.235		**Valor anticipo**	N/A	
Valor Actualizado al modificatorio :	N/A		**Valor Actualizado al modificatorio :**	N/A	
Valor actualizado 2:	N/A		**Valor actualizado 2:**	N/A	
Plazo inicial:	(20) MESES	SIN EXCEDER EL 31DE JULIO del 2026	**Plazo inicial:**	(20) MESES	SIN EXCEDER EL 31DE JULIO del 2026
Plazo actualizado:			**Plazo actualizado:**		
Fecha de iniciación:	28-feb-25		**Fecha de iniciación:**	28-feb-25	
Fecha de vencimiento:	viernes, 31 de julio de 2026		**Fecha de vencimiento:**	viernes, 31 de julio de 2026	
Modificatorio No. Prórroga No.	N/A		**Modificatorio No. Prórroga No.**	N/A	
Fecha de Terminación Según Prórroga No.	N/A		**Fecha de Terminación Según Prórroga No.**	N/A	
Suspensión No.	N/A		**Suspensión No.**	N/A	
Periodo de Suspensión No.	N/A		**Periodo de Suspensión No.**	N/A	
Levantamiento de la suspensión No.	N/A		**Levantamiento de la suspensión No.**	N/A	
Nueva fecha de terminación	N/A		**Nueva fecha de terminación**	N/A	
Valor total actual del contrato	$ 48.482.875.463		**Valor total actual del contrato**	$ 3.661.055.087	

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Martes 25 de febrero 2025, se realizó reunión en las instalaciones de la Aerocivil (Bogotá), con la asistencia del Ingeniero Aldemar Pinzón Supervisor de la Aeronáutica Civil, los representantes del Contratista de obra CONSORCIO AERO BGA 2025 y del CONSORCIO AEROCONEXION BUCARAMANGA Interventor del contrato, para hacer una primera socialización del proyecto.

El 28 de febrero del 2025 se suscribieron las actas de inicio de los contratos de obra e interventoría.

los días jueves 27 y viernes 28 de febrero del 2025, se adelantó la visita de reconocimiento de la pista, se expuso por parte de la Aerocivil el objeto del contrato y se dio respuesta a las preguntas de los contratistas.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

HOJAS DE VIDA PERSONAL MINIMO DE ESTUDIOS Y DISEÑOR CONTRATISTA

Mediante comunicados CAEROBUC-001-2025 del 28/02/2025 y CAEROBUC–005–2025 del 07/03/2025, se remitieron para evaluación del Supervisor Aerocivil, las hojas de vida del personal que hará parte de la interventoría del contrato No. 24001357 H3 de 2024.

Por parte del contratista mediante comunicado CON-1303-SKBG-2024-003 del 26 de febrero se remiten primeras hojas de vida de personal mínimo, el cual se responde observaciones por parte de la interventoría mediante comunicado CAEROBUC–003–2025 del 4 de marzo del 2025

AVANCE DE OBRA

FINANCIERO:

AMBIENTAL:
Actividades desarrolladas:


SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

Personal de Interventoría	**2**
Personal del Contratista	**2**
Total Personal en Obra	**4**

REGISTRO FOTOGRAFICO



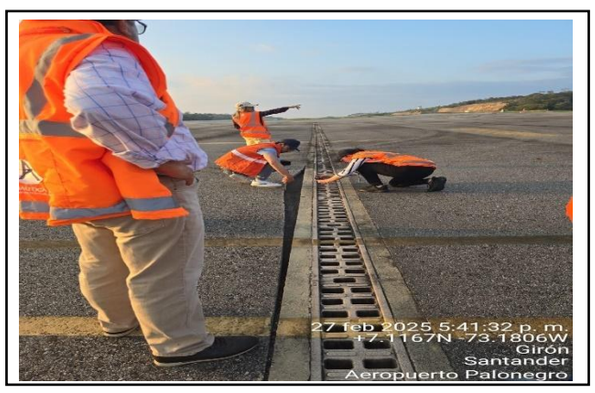



RELACION MAQUINARIA

TIPO	CONTRACTUAL	ACTUAL	OBSERVACIONES
Total Maquinaría			

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Total Acumulado	**$ 0,00**	

AVANCE FINANCIERO
Valor Total Contrato Obra
$ 48.482.875.463,00
Valor facturado Contrato Obra
$ 0,00
% Avance facturado Acumulado
0,00%

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

Acta Parcial de interventoría No.		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Total Acumulado	**$ 0,00**	

Valor Total Contrato interventoría
$ 3.661.055.087,00
Valor facturado Contrato Interventoría
$ 0,00
% Avance facturado Acumulado
0,00%

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
