FORMATO				
AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**			
Principio de Procedencia: 4602.375	**Clave: GSAP 1.0-12-028**	**Versión:** 01	**Fecha:** 01/MARZO/2020	**Página:** ___ **de #**

UNIDAD EJECUTORA:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL			**FECHA:**	14/6/2025
Semana No	**15**	**Del :**	8/6/2025	AL:	14/6/2025
Plazo Total		519	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		107	días		
porcentaje del tiempo transcurrido(%)		20,62%			
Nombre del Supervisor :		ALDEMAR PINZÓN			

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

Contrato de Obra Pública 24001303 H4 de 2024, cuyo objeto es realizar estudios, diseños a fase III, mejoramiento de zonas de seguridad, sistema de drenaje, ayudas visuales, rehabilitación áreas cabecera 35 y obras complementarias, aeropuerto Palonegro de Bucaramanga (VF)

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

AEROPUERTO PALONEGRO. BUCARAMANGA - SANTANDER

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	**0,00%**	**0,00%**	**(%) Ejecutado**	**0,00%**	**0,00%**
Valor programado ($)	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**Valor ejecutado ($)**	**$ 0,00**	**$ 0,00**
			Evaluación	**Porcentaje Adelanto**	**0,00%**
				Valor Adelanto	**$ 0,00**

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA			CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
Contratista:	CONSORCIO AERO BGA 2025		**Contratista:**	CONSORCIO AEROCONEXION BUCARAMANGA	
Contrato No:	24001303 H4 de 2024		**Contrato No:**	24001357 H3 de 2024.	
Valor Inicial:	$ 48.482.875.463		**Valor Inicial:**	$ 3.661.055.087	
Valor anticipo	$ 10.264.526.235		**Valor anticipo**	N/A	
Valor Actualizado al modificatorio :	N/A		**Valor Actualizado al modificatorio :**	N/A	
Valor actualizado 2:	N/A		**Valor actualizado 2:**	N/A	
Plazo inicial:	(20) MESES	SIN EXCEDER EL 31DE JULIO del 2026	**Plazo inicial:**	(20) MESES	SIN EXCEDER EL 31DE JULIO del 2026
Plazo actualizado:			**Plazo actualizado:**		
Fecha de iniciación:	28-feb-25		**Fecha de iniciación:**	28-feb-25	
Fecha de vencimiento:	viernes, 31 de julio de 2026		**Fecha de vencimiento:**	viernes, 31 de julio de 2026	
Modificatorio No. Prórroga No.	N/A		**Modificatorio No. Prórroga No.**	N/A	
Fecha de Terminación Según Prórroga No.	N/A		**Fecha de Terminación Según Prórroga No.**	N/A	
Suspensión No.	N/A		**Suspensión No.**	N/A	
Periodo de Suspensión No.	N/A		**Periodo de Suspensión No.**	N/A	
Levantamiento de la suspensión No.	N/A		**Levantamiento de la suspensión No.**	N/A	
Nueva fecha de terminación	N/A		**Nueva fecha de terminación**	N/A	
Valor total actual del contrato	$ 48.482.875.463		**Valor total actual del contrato**	$ 3.661.055.087	

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

LUNES 09 DE JUNIO
Se realiza comité técnico de seguimiento N°16 presencial en las instalaciones de la aeronáutica de Bogotá, donde se hablan temas contractuales, posibles costos como resultado del diseño planteado por el contratista de obra en lo referente a la nivelación de las franjas de seguridad.

MARTES 10 DE JUNIO
Se continúan desarrollando las actividades propias establecidas para la etapa de estudios y diseños de acuerdo a la programación de actividades para cada una de las especialidades materia de elaboración de los diseños, presentación de informes y planos correspondientes.

MIERCOLES 11 DE JUNIO
Se realiza levantamiento topográfico de las cajas de inspección existentes en las zonas de seguridad de los costados occidental y oriental de la pista y calles de rodaje.

JUEVES 12 DE JUNIO
Se realiza comité de obra No. 17 correspondiente al área de ayudas visuales y eléctrico, en el cual se habla de las observaciones realizadas por el especialista eléctrico de la interventoría, sobre el informe de diseño versión 1 radicado por el contratista. Y en las cuales se dejan compromisos que el contratista debe atender en la mayor brevedad posible.

VIERNES 13 DE JUNIO
Se realiza comité No. 18 de obra en las áreas de geotecnia y estructuras, en las cuales se habla de las observaciones que tiene el especialista de interventoría, sobre el informe de diseño geotécnico y estructural de la cabecera 35 y zonas de seguridad en especial del sector de la inestabilidad en el costado occidental del aeropuerto.

SABADO 14 DE JUNIO
Continúan con las actividades de control de asentamiento del muro del costado sur occidental de la cabecera 35, y se continúan actividades de replanteo del abscisado de la pista.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

La interventoría radica a la entidad bajo comunicado CAEROBUC-055-2025 el informe mensual No. 3, correspondiente al mes de mayo de 2025.

Se le remite al contratista de obra observaciones sobre el diseño geométrico v1 bajo el comunicado CAEROBUC-056-2025 Respuesta informe revisión estudios y diseños de las ayudas visuales aeropuerto Palonegro, remisión mediante oficioCON-1303-SKBG-2024-069.

Se le remite al contratista oficio donde se solicita que los informes de estudios de diseños que sean radicados cumplan ciertos parámetros indispensables para la apropiación de los estudios previos bajo comunicado CAEROBUC-058-2025 Observaciones y solicitud de entrega de la actividad de "…realizar, apropiar, ajustar, y/o complementar los Estudios y Diseños…" para el contrato de la referencia.

Se hace aprobación del contrato fiduciario del contratista bajo comunicado CAEROBUC-060-2025 Aprobación "CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS RECIBIDOS A TÍTULO DE ANTICIPO, CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. Y CONSORCIO AERO BGA 2025".

AVANCE DE OBRA

FINANCIERO:

AMBIENTAL:
Actividades desarrolladas:
Se reitera solicitud realizada al contratista de obra con relación al informe ambiental con relación a la periodicidad en su entrega.
Se presenta la respuesta por parte del contratista a la solicitud del área ambiental de la interventoría, del informe mensual correspondiente al periodo entre el 28 de febrero y el 30 de abril de 2025.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

Personal de Interventoría	**13**
Personal del Contratista	**13**
Total Personal en Obra	**26**

REGISTRO FOTOGRAFICO












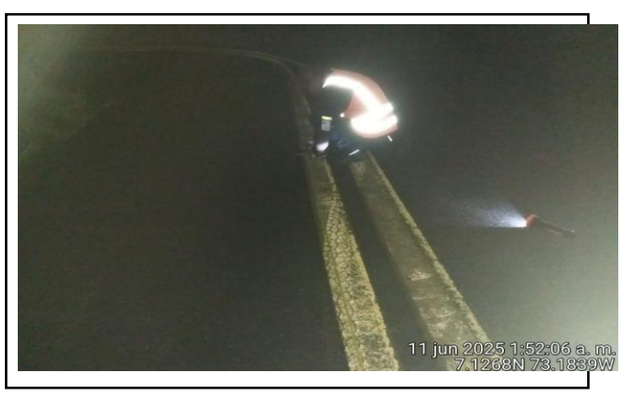

RELACION MAQUINARIA

	TIPO	ACTUAL	OBSERVACIONES
	TOPOGRAFIA	ESTACION TOTAL Y NIVEL	
		EQUIPOS DE SONDEO	
	HERRAMIENTA MENOR	EQUIPOS DE APIQUE	**SE REALIZA CON MANO DE OBRA**
		EQUIPO GEORADAR	
Total Maquinaría		EQUIPO DEFLECTOMETRIA	

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Total Acumulado	**$ 0,00**	

AVANCE FINANCIERO
Valor Total Contrato Obra
$ 48.482.875.463,00
Valor facturado Contrato Obra
$ 0,00
% Avance facturado Acumulado
0,00%

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

Acta Parcial de interventoría No.		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Total Acumulado	**$ 0,00**	

Valor Total Contrato interventoría
$ 3.661.055.087,00
Valor facturado Contrato Interventoría
$ 0,00
% Avance facturado Acumulado
0,00%

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
% avance físico: 0% En etapa de preconstrucción % avance físico programado: 0% En etapa de preconstrucción Avance financiero: En la etapa de preconstrucción se van a invertir el 0,82% de los recursos del proyecto. % avance financiero: 0% En etapa de preconstrucción % avance financiero programado: 0% En etapa de preconstrucción Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido de la etapa de estudios y diseños a la fecha se tiene una ejecución del 0,72% de la totalidad del proyecto.	**HECTOR ADOLFO POSSO MONCADA**
