Contrato No.	2000.13.05.003-2022	**Fecha de Suscripción**	Noviembre 09 del 2022
Valor Inicial del Contrato	**VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE** ($ 29.432.080.933) **M/Cte.**		
Valor Adicional No. 1	**DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEICIENTOS DIECISEIS PESOS** ($ 2.571.146.616) **M/Cte.**		
Valor Adicional No. 2	**TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN MILLON SEICIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS** ($ 13.531.646.339) **M/CTE.**		
Valor Total del Contrato	**CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PEOS** ($ 45.534.873.888) **M/CTE.**		
Contratante	VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.	**NIT:**	900.333.452-1
Contratista	CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE	**NIT:**	901.648.319-4

Entre los suscritos a saber: **MOISES CEPEDA RESTREPO,** mayor de edad, vecino de la ciudad de Palmira (v), identificado con la cedula de ciudadanía No. 14.705.330 de Palmira (v), en su calidad de **GERENTE**, según como consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido por la Cámara de Comercio de la Ciudad de Cali (v), y quien actúa en nombre y representación de **VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.**, Sociedad de Servicios Públicos Oficial constituida mediante Escritura Pública No. 4792, del 28 de octubre del 2009 de la Notaría Tercera del Círculo de Cali, modificada por la Escritura Pública No. 5969, del 31 de diciembre de 2009, igualmente de la Notaría Tercera del Círculo de Cali, cuyo domicilio social principal está establecido en la ciudad de Santiago de Cali, identificada tributariamente con NIT. 900.333.452-1, debidamente autorizado para contratar, quien para efectos legales se denominará **EL CONTRATANTE**, por una parte; y, por la otra el Señor **CARLOS ANDRES LEYVA BERNAL,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 89.008.184 de Armenia (Quindío), en calidad de representante legal del **CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE,** con NIT. 901.648.319-4, en adelante **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar la presente Adición en Tiempo No. 4, al Contrato de Obra No. 2000.13.05.003-2022, que se especifica a continuación, previas las siguientes consideraciones: **I). DE LOS ANTECEDENTES CONTRACTUALES. (1)**. Que **VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.**, mediante Resolución No. 2000.37.129-2022, del 26 de agosto del 2022, dio inicio a la **LICITACION PUBLICA No. 2000.46.01.005-2022**, cuyo objeto consistió en: ***"EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA".*** **(2).** Que **VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.**, realizó los respectivos estudios previos, donde se señalaba la necesidad de la presente contratación, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, y el Decreto 1082 de 2015. **(3).** Que mediante Resolución No. 2000-37-186-2022, del 25 de octubre de 2022, la Entidad adjudicó

Contrato No.	2000.13.05.003-2022	**Fecha de Suscripción**	Noviembre 09 del 2022	
Valor Inicial del Contrato	**VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE** ($ 29.432.080.933) **M/Cte.**			
Valor Adicional No. 1	**DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEICIENTOS DIECISEIS PESOS** ($ 2.571.146.616) **M/Cte.**			
Valor Adicional No. 2	**TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN MILLON SEICIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS** ($ 13.531.646.339) **M/CTE.**			
Valor Total del Contrato	**CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PEOS** ($ 45.534.873.888) **M/CTE.**			
Contratante	VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.		**NIT:**	900.333.452-1
Contratista	CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE		**NIT:**	901.648.319-4

el Contrato al Contratista, **CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE**. **(4).** Que como resultado de la Licitación Pública No. 2000.46.01.005-2022, se suscribió el Contrato de Obra No. 2000.13.05.003-2022, el 09 de noviembre de 2022, entre **VALLECAUCANA DE AGUAS S.A E.S.P.**, y el **CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE**, con NIT. No. 901.648.319-4, cuyo objeto consiste en: ***"EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA"***. **(5).** Que en la Cláusula Cuarta del Contrato de Obra No. 2000.13.05.003-2022, fechado 09 de noviembre de 2022, se estableció como plazo para la ejecución del mismo trece (13) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. **(6).** Que en la Cláusula Quinta del Contrato de Obra No. 2000.13.05.003-2022, del 09 de noviembre de 2022, se pactó como valor del mismo, la suma de **VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS** ($ 29.432.080.933) **M/Cte. (7).** Que en la Cláusula Séptima **"APROPIACION PRESUPUESTAL"**, del Contrato de Obra No. 2000.13.05.003-2022, se estipulo que el pago de la suma antes estipulada cuenta con el respaldo de la apropiación presupuestal correspondiente, y específicamente en los Certificados de Disponibilidad de Recursos (CDR) N° 13039 y (CDR) N° 13040, del 10 de agosto de 2022, respectivamente, expedidos por el Consorcio Fiduciario FIA. **(8).** Que en la Cláusula Octava **"FORMA DE PAGO"**, del Contrato de Obra No. 2000.13.05.003-2022, se estipulo que el valor pactado, se pagaría de la siguiente manera: *"La Entidad entregará un anticipo y posteriormente hará pagos parciales con su respectiva amortización, todo lo cual se regirá por las siguientes reglas: La entidad efectuará al Contratista pagos mensuales en pesos colombianos, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes*

Contrato No.	2000.13.05.003-2022	**Fecha de Suscripción**	Noviembre 09 del 2022
Valor Inicial del Contrato	**VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE** ($ 29.432.080.933) **M/Cte.**		
Valor Adicional No. 1	**DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEICIENTOS DIECISEIS PESOS** ($ 2.571.146.616) **M/Cte.**		
Valor Adicional No. 2	**TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN MILLON SEICIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS** ($ 13.531.646.339) **M/CTE.**		
Valor Total del Contrato	**CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PEOS** ($ 45.534.873.888) **M/CTE.**		
Contratante	VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.	**NIT:**	900.333.452-1
Contratista	CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE	**NIT:**	901.648.319-4

inmediatamente anterior, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del AIU pactado.

Parágrafo 1. *La entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, el cual se hará a la terminación de los trabajos recibidos a entera satisfacción de la entidad.*

Parágrafo 2. *El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.*

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda."

(9). Que en la Cláusula Dieciocho **"GARATIAS"** del Contrato de Obra No. 2000.13.05.003-2022, se pactaron las siguientes garantías:

"18.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características:

Contrato No.	2000.13.05.003-2022	**Fecha de Suscripción**	Noviembre 09 del 2022
Valor Inicial del Contrato	**VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE** ($ 29.432.080.933) **M/Cte.**		
Valor Adicional No. 1	**DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEICIENTOS DIECISEIS PESOS** ($ 2.571.146.616) **M/Cte.**		
Valor Adicional No. 2	**TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN MILLON SEICIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS** ($ 13.531.646.339) **M/CTE.**		
Valor Total del Contrato	**CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PEOS** ($ 45.534.873.888) **M/CTE.**		
Contratante	VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.	**NIT:**	900.333.452-1
Contratista	CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE	**NIT:**	901.648.319-4

Característica	*Condición*		
Clase	*Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria.*		
Asegurado/ beneficiario	*VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. identificada con NIT 900.333.452-1*		
Amparos, vigencia y valores asegurados	*Amparo*	*Vigencia*	*Valor Asegurado*
	***Cumplimiento general** del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan*	*Hasta la liquidación del contrato*	*El valor de esta garantía debe ser del veinte por ciento (20%) del valor del contrato.*
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	*Hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización del anticipo*	*El valor de esta garantía debe ser del cien por ciento (100%) del valor del anticipo.*
	***Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales** del personal que el Contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato*	*Plazo del contrato y tres (3) años más.*	*El valor de la garantía debe ser el cinco por ciento (5%) del valor total del contrato.*
	***Estabilidad y calidad de las obras** ejecutadas entregadas a satisfacción*	*Esta garantía debe estar vigente por un término de cinco (5) años contados a partir de la fecha en la cual la Entidad*	*Por el treinta por ciento (30%) del valor total del contrato*

Contrato No.	2000.13.05.003-2022	**Fecha de Suscripción**	Noviembre 09 del 2022
Valor Inicial del Contrato	**VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE** ($ 29.432.080.933) **M/Cte.**		
Valor Adicional No. 1	**DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEICIENTOS DIECISEIS PESOS** ($ 2.571.146.616) **M/Cte.**		
Valor Adicional No. 2	**TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN MILLON SEICIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS** ($ 13.531.646.339) **M/CTE.**		
Valor Total del Contrato	**CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PEOS** ($ 45.534.873.888) **M/CTE.**		
Contratante	VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.	**NIT:**	900.333.452-1
Contratista	CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE	**NIT:**	901.648.319-4

Característica	*Condición*
	Estatal recibe a satisfacción la obra
Tomador	*Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera.* *No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.* *Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.*
Información necesaria dentro de la póliza	*Número y año del contrato* *Objeto del contrato* *Firma del representante legal del Contratista* *En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $ 14.980.420,20 aproximar a $ 14.980.421*

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar.

Contrato No.	2000.13.05.003-2022	**Fecha de Suscripción**	Noviembre 09 del 2022
Valor Inicial del Contrato	**VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE** ($ 29.432.080.933) **M/Cte.**		
Valor Adicional No. 1	**DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEICIENTOS DIECISEIS PESOS** ($ 2.571.146.616) **M/Cte.**		
Valor Adicional No. 2	**TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN MILLON SEICIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS** ($ 13.531.646.339) **M/CTE.**		
Valor Total del Contrato	**CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PEOS** ($ 45.534.873.888) **M/CTE.**		
Contratante	VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.	**NIT:**	900.333.452-1
Contratista	CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE	**NIT:**	901.648.319-4

18.2 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA.

El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco (05) años contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas durante el período de garantía.

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.

18.3 GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:

Característica	*Condición*
Clase	*Contrato de seguro contenido en una póliza*
Asegurados	*VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P., identificada con NIT 900.333.452-1*
Tomador	*Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que*

Contrato No.	2000.13.05.003-2022	**Fecha de Suscripción**	Noviembre 09 del 2022
Valor Inicial del Contrato	**VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE** ($ 29.432.080.933) **M/Cte.**		
Valor Adicional No. 1	**DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEICIENTOS DIECISEIS PESOS** ($ 2.571.146.616) **M/Cte.**		
Valor Adicional No. 2	**TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN MILLON SEICIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS** ($ 13.531.646.339) **M/CTE.**		
Valor Total del Contrato	**CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PEOS** ($ 45.534.873.888) **M/CTE.**		
Contratante	VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.	**NIT:**	900.333.452-1
Contratista	CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE	**NIT:**	901.648.319-4

Caracteristica	*Condicion*
	en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. *No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.* *Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.*
Valor	*De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 del 2015 la garantía de responsabilidad civil extracontractual no podrá ser inferior al 5% del valor del contrato.*
Vigencia	*Igual al período de ejecución del contrato.*
Beneficiarios	*Terceros afectados y VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. identificada con NIT 900.333.452-1*
Amparos	*Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3° del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.*
Información necesaria dentro de la póliza	*Número y año del contrato* *Objeto del contrato* *Firma del representante legal del Contratista* *En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $ 14.980.420,20 aproximar a $ 14.980.421*

Contrato No.	2000.13.05.003-2022	**Fecha de Suscripción**	Noviembre 09 del 2022
Valor Inicial del Contrato	**VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE** ($ 29.432.080.933) **M/Cte.**		
Valor Adicional No. 1	**DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEICIENTOS DIECISEIS PESOS** ($ 2.571.146.616) **M/Cte.**		
Valor Adicional No. 2	**TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN MILLON SEICIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS** ($ 13.531.646.339) **M/CTE.**		
Valor Total del Contrato	**CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PEOS** ($ 45.534.873.888) **M/CTE.**		
Contratante	VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.	**NIT:**	900.333.452-1
Contratista	CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE	**NIT:**	901.648.319-4

(10). Que el día 1º de diciembre del 2022, se suscribió Acta de Inicio del Contrato de Obra No. 2000.13.05.003-2022, del 09 de noviembre de 2022, entre el Señor **CARLOS ANDRES LEYVA BERNAL**, identificado con la cédula de ciudadanía número 89.008.184 de Armenia (Quindío), en calidad de representante legal del **CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE**, con NIT. 901.648.319-4 (Contratista), y **EDUARDO CÁRDENAS RODRÍGUEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.254.057 de Palmira (v). en calidad de representante legal del **CONSORCIO INTERGUACARI**, con NIT. 901.652.925-3 (Interventor), estableciéndose como fecha de terminación, el día 1º de enero del 2024, publicándose el mencionado documento en la página del SECOP II. **(11).** Que el día 27/07/2023, se suspende el Contrato de Obra No. 2000.13.05.003-2022, reiniciándose el mismo el 09/01/2024, y se fija como nueva fecha de terminación el 14/06/2024. **(12).** Que el día 30/01/2024, se suscribe entre las partes, al Contrato de Obra No. 2000.13.05.003-2022, Adición en Valor No. 1, por la suma de **DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEICIENTOS DIECISEIS PESOS** ($ 2.571.146.616) **M/Cte.,** quedando como Valor Total del Contrato la suma de **TREINTA Y DOS MIL TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS** ($ 32.003.227.549) **M/CTE. (13).** Que el día 13/06/2024, se suscribe Adicional en Tiempo No. 1, al Contrato de Obra No. 2000.13.05.003-2022, por espacio de nueve (9) meses más, para su ejecución, fijándose como nueva fecha para su terminación, el 14/03/2025. **(14).** Que el día 11/03/2025, se suscribe Adicional en Tiempo No. 2, al Contrato de Obra No. 2000.13.05.003-2022, por espacio de diez (10) meses más, para su ejecución, fijándose como nueva fecha para su terminación, el 22/01/2026. **(15).** Que el día 04/07/2025, se suscribe entre las partes, al Contrato de Obra No. 2000.13.05.003-2022, Adición en Valor No. 2, por la suma de **TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN MILLON SEICIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS** ($ 13.531.646.339) **M/CTE.,** quedando como nuevo Valor del Contrato la suma de **CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES**

Contrato No.	2000.13.05.003-2022	**Fecha de Suscripción**	Noviembre 09 del 2022
Valor Inicial del Contrato	**VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE** ($ 29.432.080.933) **M/Cte.**		
Valor Adicional No. 1	**DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEICIENTOS DIECISEIS PESOS** ($ 2.571.146.616) **M/Cte.**		
Valor Adicional No. 2	**TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN MILLON SEICIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS** ($ 13.531.646.339) **M/CTE.**		
Valor Total del Contrato	**CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PEOS** ($ 45.534.873.888) **M/CTE.**		
Contratante	VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.	**NIT:**	900.333.452-1
Contratista	CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE	**NIT:**	901.648.319-4

MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PEOS ($ 45.534.873.888) **M/CTE. (16).** Que el día 21/01/2026, se suscribe Adicional en Tiempo No. 3, al Contrato de Obra No. 2000.13.05.003-2022, por espacio de seis (06) meses más, para su ejecución, fijándose como nueva fecha para su terminación, el 22/07/2026. **(17).** Que mediante oficio CRYPV-COP2000.13.05.003-2022-CONS289-2026, fechado 25 de junio de 2026, dirigido al Interventor de la Obra **"CONSORCIO INTERGUACARI",** el señor **CARLOS ANDRES LEYVA BERNAL,** *representante legal del* **"CONSORCIO REDES Y PTARS VALLE",** Contratista, solicita prórroga en tiempo, al Contrato No. 2000.13.05.003-2022, por espacio de seis (6) meses más para su ejecución, sustentando su petición, en el oficio antes mencionado, y que se anexa al presente documento, para que haga parte de este. Es de mencionar que el documento se compone de seis (6) hojas, por ambas partes. **(18).** Que mediante oficio CI-159-2026, fechado 29 de junio de 2026, suscrito por el Ing. **EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ,** representante legal del **CONSORCIO INTERGUACARI,** (Interventor), y dirigido al Ing. **DIEGO JOSE CALDERON VILLANUEVA,** director Técnico de **VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.,** y Supervisor del Contrato de Interventoría, emite concepto favorable a la solicitud de Adición en Tiempo, al Contrato de Obra No. 2000.13.05.003-2022, fechado 09 de noviembre del año 2022, sustentando su petición, en el oficio antes mencionado, y que se anexa al presente documento, para que haga parte de este. Es de mencionar que el documento se compone de cuatro (4) hojas, por ambas partes. **(19).** Que mediante oficio VA.3000.07.01.00463-2026, fechado 02 de julio de 2026, suscrito por el Ing. **DIEGO JOSE CALDERON VILLANUEVA,** director técnico, dirigido al Ing. **MOISES CEPEDA RESTREPO,** Gerente de **VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.,** Contratante, avala dicha solicitud, manifestando lo siguiente: *"Con base en el oficio CRYPV-COP200013.05.003-2022-Cons 289-2026, del 25 de junio del 2026, enviado por el representante legal del "CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE", mediante el cual expone las diferentes dificultades que se han tenido que sortear en la realización del proyecto, las cuales son aceptadas por la interventoría "CONSORCIO*

Contrato No.	2000.13.05.003-2022	**Fecha de Suscripción**	Noviembre 09 del 2022
Valor Inicial del Contrato	**VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE** ($ 29.432.080.933) **M/Cte.**		
Valor Adicional No. 1	**DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEICIENTOS DIECISEIS PESOS** ($ 2.571.146.616) **M/Cte.**		
Valor Adicional No. 2	**TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN MILLON SEICIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS** ($ 13.531.646.339) **M/CTE.**		
Valor Total del Contrato	**CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PEOS** ($ 45.534.873.888) **M/CTE.**		
Contratante	VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.	**NIT:**	900.333.452-1
Contratista	CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE	**NIT:**	901.648.319-4

INTERGUCARI", mediante oficio CI-0159-2026, de junio 29 de 2026, de las cuales se relacionan las más destacadas,

FUNDAMENTOS DE LA PRORROGA:

1.- Restricciones operativas para la optimización de la PTAP de Guacarí.

Durante el proceso de optimización de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) de Guacarí, ha sido necesario que todas las actividades sean previamente programadas y autorizadas por el operador del sistema, Acuavalle S.A. E.S.P., con el fin de garantizar la continuidad del servicio y evitar afectaciones en el suministro de agua potable a la población.

Adicionalmente, de los tres filtros que conforman la Batería A, solamente ha sido liberado uno para su intervención, situación que impide la ejecución simultánea de las actividades debido a las restricciones operativas de la planta y a la necesidad de mantener su capacidad de tratamiento y continuidad en la prestación del servicio.

Cabe señalar que el proceso de optimización de cada filtro requiere aproximadamente dos (2) meses para su ejecución, incluyendo actividades de intervención, adecuación, pruebas de funcionamiento y puesta en operación. En consecuencia, la liberación gradual de los filtros por parte del operador ha generado una extensión significativa en los tiempos de ejecución inicialmente previstos.

2.- Condiciones geológicas imprevistas en el Tramo 1 de la línea de conducción.

Durante la ejecución de las actividades correspondientes al Tramo 1 de la línea de conducción en tubería PEAD de 18, se han presentado condiciones geotécnicas diferentes a las inicialmente previstas, evidenciándose la presencia de formaciones rocosas y sectores de peña a lo largo del trazado.

Estas condiciones han generado afectaciones significativas en el desarrollo de las excavaciones requeridas para la instalación de la tubería, incrementando tanto los costos de ejecución como los tiempos necesarios para el cumplimiento de las actividades programadas. Adicionalmente, los rendimientos de excavación han sido considerablemente inferiores a los estimados inicialmente, debido a la dificultad para alcanzar las profundidades de instalación definidas en los diseños, las cuales son necesarias para garantizar la estabilidad y correcto funcionamiento de la línea de conducción.

3.- Demora en la expedición del permiso de ocupación de cauce para la bocatoma

Contrato No.	2000.13.05.003-2022	**Fecha de Suscripción**	Noviembre 09 del 2022
Valor Inicial del Contrato	**VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE** ($ 29.432.080.933) **M/Cte.**		
Valor Adicional No. 1	**DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEICIENTOS DIECISEIS PESOS** ($ 2.571.146.616) **M/Cte.**		
Valor Adicional No. 2	**TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN MILLON SEICIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS** ($ 13.531.646.339) **M/CTE.**		
Valor Total del Contrato	**CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PEOS** ($ 45.534.873.888) **M/CTE.**		
Contratante	VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.	**NIT:**	900.333.452-1
Contratista	CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE	**NIT:**	901.648.319-4

La demora en la expedición del permiso de ocupación de cauce para la bocatoma por parte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), entidad que a la fecha no ha emitido una respuesta definitiva que permita continuar con el trámite correspondiente y efectuar el pago de la visita técnica y del respectivo permiso.

Se debe precisar que este permiso debió ser solicitado nuevamente debido a una modificación del diseño inicial, originada por la optimización de las estructuras de cimentación y del diseño estructural del proyecto. Así, con ocasión de estos ajustes, la ubicación inicialmente prevista para la construcción de la bocatoma fue reubicada aproximadamente 15 metros aguas arriba sobre el cauce del rio Guabas.

4.- Permisos de ocupación de cauce para viaductos.

De igual forma, se encuentran en trámite ante la CVC los permisos de ocupación de cauce requeridos para la construcción de los tres pasos aéreos de la línea de conducción (viaductos), los cuales constituyen un requisito indispensable para la obtención de los permisos de intervención de espacio público ante las administraciones municipales correspondientes.

Los permisos pendientes corresponden a:

Permiso de ocupación de cauce - Puente Rojo.

Permiso de ocupación de cauce - Puente Amarillo.

Permiso de ocupación de cauce - Puente La Magdalena.

A la fecha, estos trámites continúan pendientes de aprobación por parte de la autoridad ambiental.

5.- Conflicto social en el Tramo 2 de la línea de conducción.

El 20 de noviembre de 2025, durante el inicio de las actividades de instalación de tubería PEAD de 10 pulgadas en el sector El Alto, correspondiente al Tramo 2 de la línea de conducción (entre Puente Rojo y el callejón de acceso a la Planta de Tratamiento de Agua Potable del municipio de Ginebra), miembros de la comunidad de Puente Rojo, líderes comunitarios y representantes del Cañón del Rio Guabas se presentaron en el sitio de las obras solicitando la suspensión de actividades.

La comunidad manifestó su inconformidad con la intervención de pavimentos y placas huella existentes, así como con presuntos compromisos adquiridos previamente por Vallecaucana de Aguas relacionados con la modificación del trazado de la tubería.

Contrato No.	2000.13.05.003-2022	**Fecha de Suscripción**	Noviembre 09 del 2022
Valor Inicial del Contrato	**VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE** ($ 29.432.080.933) **M/Cte.**		
Valor Adicional No. 1	**DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEICIENTOS DIECISEIS PESOS** ($ 2.571.146.616) **M/Cte.**		
Valor Adicional No. 2	**TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN MILLON SEICIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS** ($ 13.531.646.339) **M/CTE.**		
Valor Total del Contrato	**CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PEOS** ($ 45.534.873.888) **M/CTE.**		
Contratante	VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.	**NIT:**	900.333.452-1
Contratista	CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE	**NIT:**	901.648.319-4

Posteriormente, el 20 de enero de 2026 se intentó reanudar las actividades; sin embargo, nuevamente la comunidad se opuso a su ejecución y solicitó la suspensión de las obras hasta tanto hicieran presencia la Administración Municipal y la Gobernación del Valle del Cauca.

A la fecha, este tramo de la línea de conducción no ha podido ser ejecutado, situación que ha generado retrasos significativos y sobrecostos asociados a la movilización, desmovilización y permanencia de maquinaria, equipos y personal.

6.- Conflicto social en el Tramo 1 de la línea de conducción.

Situación similar se presenta en el Tramo 1 de la línea de conducción, específicamente en el sector de Regaderos, entre la Batea Bananos y Puente Amarillo (Puente Papas).

Desde el 6 de mayo de 2026, miembros de la comunidad opositora al proyecto, líderes comunitarios y representantes del Cañón del Rio Guabas han solicitado la suspensión de actividades, argumentando afectaciones sobre la infraestructura vial existente y el presunto incumplimiento de compromisos por parte de Vallecaucana de Aguas y de la Gobernación del Valle del Cauca.

La comunidad ha condicionado la reanudación de las obras a la realización de reuniones y acuerdos con las autoridades competentes. Como consecuencia, este tramo tampoco ha podido ejecutarse, generando retrasos.

7.- Optimización del diseño de la bocatoma y reformulación del proyecto.

Actualmente se encuentra en proceso de revisión la optimización del diseño de la bocatoma, dado las condiciones geomorfológicas donde se habla planteado inicialmente.

Paralelamente, se adelanta un balance técnico, financiero y contractual, con el propósito de revisar las condiciones económicas actuales del contrato.

8.- Trámite de servidumbres y afectaciones prediales.

Como consecuencia de los rediseños efectuados para los viaductos y de las condiciones encontradas en campo, se requiere adelantar la legalización de servidumbres necesarias para la construcción de los viaductos de Puente Amarillo, Puente Rojo y Puente La Magdalena.

Contrato No.	2000.13.05.003-2022	**Fecha de Suscripción**	Noviembre 09 del 2022
Valor Inicial del Contrato	**VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE** ($ 29.432.080.933) **M/Cte.**		
Valor Adicional No. 1	**DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEICIENTOS DIECISEIS PESOS** ($ 2.571.146.616) **M/Cte.**		
Valor Adicional No. 2	**TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN MILLON SEICIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS** ($ 13.531.646.339) **M/CTE.**		
Valor Total del Contrato	**CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PEOS** ($ 45.534.873.888) **M/CTE.**		
Contratante	VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.	**NIT:**	900.333.452-1
Contratista	CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE	**NIT:**	901.648.319-4

Así mismo, la presencia de ocupantes no autorizados en las áreas previstas para la construcción de la bocatoma, del Viaducto de la Magdalena y del viaducto de Puente Rojo constituye una afectación directa para la ejecución de estas estructuras.

Adicionalmente, se presenta una restricción para la construcción de un tramo de la línea de conducción ubicado a la salida de la bocatoma, debido a que el propietario de un predio colindante no autoriza el ingreso por la parte posterior de su propiedad, limitando el desarrollo de las actividades constructivas programadas (Predio Danilo Bermúdez).

9.- Afectaciones por condiciones climáticas

Durante el periodo de ejecución del contrato se registraron eventos de precipitación que afectaron significativamente el desarrollo de las actividades programadas en los diferentes frentes de obra.

El impacto generado no se limita al tiempo de ocurrencia de las lluvias, sino también al periodo requerido para la recuperación de las condiciones de estabilidad, transitabilidad y seguridad de los terrenos intervenidos, lo cual ha impedido la reanudación inmediata de las labores.

Como soporte de esta situación, se anexan los formatos de seguimiento climático correspondientes a los últimos cinco (5) meses, en los cuales se registran 17,3 días de afectación directa por lluvias, sin considerar las horas adicionales requeridas para la recuperación de las condiciones de trabajo posteriores a cada evento.

Con base a lo planteado por el Consorcio Redes y PTAPs Valle, y la corroboración de la interventoría "Interguacari" la supervisión de Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P., conceptúa que para la terminación de las actividades contractuales se requiere una prórroga al plazo de ejecución de seis (06) meses.

La nueva fecha para la terminación del contrato de obra N°. 2000-13-05-003-2022, a partir el 22 de Julio de 2026 hasta el 22 de enero de 2027, según programa de obra.

Adjunto: Oficio CRYPV-COP2000.13.05.003-2022-Cons289-2026 CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE Cronograma de obra.

Oficio CI-0159-2026, de junio 29 de 2026 "Consorcio Interguacari" **(20).** Que el presente Contrato Adicional, cuenta con la aprobación de la Gerencia de **VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.**

II) <u>DEL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL CONTRATO DE OBRA</u>. (21). Que la Ley 80 de 1993, prevé la suscripción de prorrogas dentro de la ejecución del contrato, con el fin de cumplir con el

Contrato No.	2000.13.05.003-2022	**Fecha de Suscripción**	Noviembre 09 del 2022	
Valor Inicial del Contrato	**VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE** ($ 29.432.080.933) **M/Cte.**			
Valor Adicional No. 1	**DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEICIENTOS DIECISEIS PESOS** ($ 2.571.146.616) **M/Cte.**			
Valor Adicional No. 2	**TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN MILLON SEICIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS** ($ 13.531.646.339) **M/CTE.**			
Valor Total del Contrato	**CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PEOS** ($ 45.534.873.888) **M/CTE.**			
Contratante	VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.		**NIT:**	900.333.452-1
Contratista	CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE		**NIT:**	901.648.319-4

objeto de este. **(22).** Que, dentro del principio de autonomía de la voluntad, las partes pueden acordar modificar los contratos a fin de dar cumplimiento a su objeto contractual. **(23).** Que teniendo en cuenta el negocio jurídico contenido en el citado Contrato de Obra, se debe precisar el régimen jurídico del acuerdo de voluntades suscrito entre las partes, en los términos del Decreto 4548 de 2009 (PDA), siendo necesario determinar que el presente contrato se rige por las disposiciones normativas contenidas en la Ley 80 de 1993, y las normas civiles y comerciales pertinentes. **(24).** Que, en dicho sentido, el artículo 40 de la precitada Ley 80 de 1993, a su vez, establece: *"(...) Del Contenido del Contrato Estatal. Las estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta Ley, correspondan a su esencia y naturaleza. Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales."* **(25).** Que, frente a la existencia del negocio Jurídico y sus modificaciones, el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, dispone: *"Del perfeccionamiento del contrato. Los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito."* **(26).** Que el artículo 1602 del Código Civil, establece que los contratos válidamente celebrados son ley para las partes, y sólo pueden ser invalidados por consentimiento mutuo de quienes los celebran o por causas legales (*"lex contractus, pacta sunt servanda"*), **(27).** Que conforme a la regulación legal y a la interpretación que de la misma han hecho el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, es viable jurídicamente modificar los contratos estatales, pero esta medida tienen carácter excepcional y solo procede cuando con ella se pretenda garantizar el interés público, cuando la entidad haya verificado y así pueda constatarse por cualquier medio que la causa de la modificación es real y cierta y cuando se deriva de previsiones legales, esto es, cuando la modificación encuentra sustento no solo en circunstancias fácticas propias de la ejecución del contrato, sino, además, cuando tales situaciones ponen de presente la necesidad de dar cumplimiento a previsiones establecidas por el legislador. Así las cosas, para establecer si un contrato determinado puede ser susceptible de modificación, se hace necesario que la Administración analice, en cada caso, la concurrencia de los

Contrato No.	2000.13.05.003-2022	**Fecha de Suscripción**	Noviembre 09 del 2022
Valor Inicial del Contrato	**VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE** ($ 29.432.080.933) **M/Cte.**		
Valor Adicional No. 1	**DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEICIENTOS DIECISEIS PESOS** ($ 2.571.146.616) **M/Cte.**		
Valor Adicional No. 2	**TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN MILLON SEICIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS** ($ 13.531.646.339) **M/CTE.**		
Valor Total del Contrato	**CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PEOS** ($ 45.534.873.888) **M/CTE.**		
Contratante	VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.	**NIT:**	900.333.452-1
Contratista	CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE	**NIT:**	901.648.319-4

aspectos antes referidos, como así se hizo. **(28).** Que, en tal sentido, la mutabilidad del contrato, la ha desarrollado el Consejo de Estado con el fin de garantizar la satisfacción de las necesidades del interés público, puesto que uno de los fines de la contratación es alcanzar ***"la continuidad y eficiente prestación de los servicios públicos***[1]." **(29).** Que el presente Contrato Adicional en Tiempo, del Contrato de Obra No. 2000.13.05.003-2022, del 09 de noviembre del 2022, en nada modifica las demás cláusulas por las cuales se rige el Contrato. **III) DEL ACUERDO DE VOLUNTADES: (30).** Que, en atención a lo antes manifestado, y con el fin de dar cumplimiento al objeto contractual, se requiere Adicionar seis (6) meses en Tiempo, el Contrato de Obra No. 2000.13.05.003-2022, del 09 de noviembre del 2022, suscrito entre **VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.,** y el **CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE**, adición que se acuerda en las siguientes cláusulas: **PRIMERA. ADICIONAR** al término pactado en la Cláusula Cuarta **"PLAZO"** del Contrato de Obra No 2000.13.05.003-2022, del 09 de noviembre de 2022, suscrito entre **VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.,** y el **CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE,** el termino de seis (06) meses más para su ejecución, pactándose como nueva fecha de terminación el veintidós (22) de enero del año 2027. **SEGUNDA. – EQUIVALENCIA ENTRE DERECHOS Y OBLIGACIONES:** El presente contrato adicional no afecta la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer y de contratar, por lo cual, no hay lugar a la suscripción de acuerdos y pactos necesarios sobre cuantías, condiciones y forma de pago de gastos adicionales, reconocimiento de costos financieros e intereses. **TERCERA. POLÍTICA ARCHIVÍSTICA:** Que la presente adición surtirá los trámites de Gestión Documental, Archivo Físico y/o Archivo Electrónico-Digital de conformidad con la Ley General de Archivo, y las disposiciones que le son aplicables. **CUARTA. PUBLICACIÓN**: Que la presente adición, se publicará en el SECOP II de conformidad con lo establecido en el artículo 223 del Decreto No. 019 del 2012, y el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto No. 1082 del 2015, o en la

[1] Ley 80 de 1993, Art. 3

Contrato No.	2000.13.05.003-2022	**Fecha de Suscripción**	Noviembre 09 del 2022
Valor Inicial del Contrato	**VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE** ($ 29.432.080.933) **M/Cte.**		
Valor Adicional No. 1	**DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEICIENTOS DIECISEIS PESOS** ($ 2.571.146.616) **M/Cte.**		
Valor Adicional No. 2	**TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN MILLON SEICIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS** ($ 13.531.646.339) **M/CTE.**		
Valor Total del Contrato	**CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PEOS** ($ 45.534.873.888) **M/CTE.**		
Contratante	VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.	**NIT:**	900.333.452-1
Contratista	CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE	**NIT:**	901.648.319-4

plataforma digital que para efecto se designe y le sea obligatoria normativamente a Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. **QUINTA. VIGENCIA:** Las demás cláusulas del contrato original quedan vigentes, en cuanto no se opongan a la presente adición. **SEXTA. GARANTIA:** El contratista deberá ampliar la Garantía de Cumplimiento y Responsabilidad Civil Extracontractual, en cuanto al tiempo adicionado, lo cual una vez hecho esto, cargarla en la plataforma del SECOP II, luego remitir a la Interventoría y Apoyo a la Supervisión del Contrato, para su revisión, y posterior a ello informar a la Dirección Jurídica de Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P., para su respectiva aprobación.

EL PRESENTE DOCUMENTO SE ENTIENDE FECHADO Y FIRMADO UNA VEZ SEA APROBADO POR AMBAS PARTES A TAVÉS DEL SISTEMA ELECTRONICO PARA LA CONTRATACION PUBLICA – SECOP II

Proyectó: Valentina Arcila Gutiérrez – Abogada CPSP - Dirección Jurídica
Reviso: Luis Eduardo Pineda Álzate - director Jurídico.
Aprobó: Los firmantes.

Al contestar por favor cite estos datos
Santiago de Cali D.E, julio 2 de 2026
Rad. Padre: VA.1000.07.02.00816-2026
TRD: VA.3000.07.01.00463-2026

Ingeniero
MOISES CEPEDA RESTREPO
Gerente
Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.
Santiago de Cali.

Referencia: Contrato de Obra N°. 2000-13-05-003-2022, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA".

Asunto: Solicitud de Prórroga N°. 04 al Plazo del Contrato N°. 2000-13-05-003-2022.

Con base en el oficio CRYPV-COP200013.05.003-2022-Cons 289-2026, del 25 de junio del 2026, enviado por el representante legal del "CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE", mediante el cual expone las diferentes dificultades que se han tenido que sortear en la realización del proyecto, las cuales son aceptadas por la interventoría "CONSORCIO INTERGUCARÍ", mediante oficio CI-0159-2026, de junio 29 de 2026, de las cuales se relacionan las más destacadas.

FUNDAMENTOS DE LA PRORROGA:

1.- Restricciones operativas para la optimización de la PTAP de Guacarí.
Durante el proceso de optimización de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) de Guacarí, ha sido necesario que todas las actividades sean previamente programadas y autorizadas por el operador del sistema, Acuavalle S.A. E.S.P., con el fin de garantizar la continuidad del servicio y evitar afectaciones en el suministro de agua potable a la población.

Adicionalmente, de los tres filtros que conforman la Batería A, solamente ha sido liberado uno para su intervención, situación que impide la ejecución simultánea de las actividades debido a las restricciones operativas de la planta y a la necesidad de mantener su capacidad de tratamiento y continuidad en la prestación del servicio.

Cabe señalar que el proceso de optimización de cada filtro requiere aproximadamente dos (2) meses para su ejecución, incluyendo actividades de intervención, adecuación, pruebas de funcionamiento y puesta en operación. En consecuencia, la liberación gradual de los filtros por parte del operador ha generado una extensión significativa en los tiempos de ejecución inicialmente previstos.

2.- Condiciones geológicas imprevistas en el Tramo 1 de la línea de conducción.

Durante la ejecución de las actividades correspondientes al Tramo 1 de la línea de conducción en tubería PEAD de 18", se han presentado condiciones geotécnicas diferentes a las inicialmente previstas, evidenciándose la presencia de formaciones rocosas y sectores de peña a lo largo del trazado.

Estas condiciones han generado afectaciones significativas en el desarrollo de las excavaciones requeridas para la instalación de la tubería, incrementando tanto los costos de ejecución como los tiempos necesarios para el cumplimiento de las actividades programadas. Adicionalmente, los rendimientos de excavación han sido considerablemente inferiores a los estimados inicialmente, debido a la dificultad para alcanzar las profundidades de instalación definidas en los diseños, las cuales son necesarias para garantizar la estabilidad y correcto funcionamiento de la línea de conducción.

3.- Demora en la expedición del permiso de ocupación de cauce para la bocatoma

La demora en la expedición del permiso de ocupación de cauce para la bocatoma por parte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), entidad que a la fecha no ha emitido una respuesta definitiva que permita continuar con el trámite correspondiente y efectuar el pago de la visita técnica y del respectivo permiso.
Se debe precisar que este permiso debió ser solicitado nuevamente debido a una modificación del diseño inicial, originada por la optimización de las estructuras de cimentación y del diseño estructural del proyecto. Así, con ocasión de estos ajustes, la ubicación inicialmente prevista para la construcción de la bocatoma fue reubicada aproximadamente 15 metros aguas arriba sobre el cauce del río Guabas.

4.- Permisos de ocupación de cauce para viaductos.

De igual forma, se encuentran en trámite ante la CVC los permisos de ocupación de cauce requeridos para la construcción de los tres pasos aéreos de la línea de conducción (viaductos), los cuales constituyen un requisito indispensable para la obtención de los permisos de intervención de espacio público ante las administraciones municipales correspondientes.

Los permisos pendientes corresponden a:
Permiso de ocupación de cauce – Puente Rojo.
Permiso de ocupación de cauce – Puente Amarillo.
Permiso de ocupación de cauce – Puente La Magdalena.

A la fecha, estos trámites continúan pendientes de aprobación por parte de la autoridad ambiental.

5.- Conflicto social en el Tramo 2 de la línea de conducción.

El 20 de noviembre de 2025, durante el inicio de las actividades de instalación de tubería PEAD de 10 pulgadas en el sector El Alto, correspondiente al Tramo 2 de la línea de conducción (entre Puente Rojo y el callejón de acceso a la Planta de Tratamiento de Agua Potable del municipio de Ginebra), miembros de la comunidad de Puente Rojo, líderes comunitarios y representantes del Cañón del Río Guabas se presentaron en el sitio de las obras solicitando la suspensión de actividades.

La comunidad manifestó su inconformidad con la intervención de pavimentos y placas huella existentes, así como con presuntos compromisos adquiridos previamente por Vallecaucana de Aguas relacionados con la modificación del trazado de la tubería.

Posteriormente, el 20 de enero de 2026 se intentó reanudar las actividades; sin embargo, nuevamente la comunidad se opuso a su ejecución y solicitó la suspensión de las obras hasta tanto hicieran presencia la Administración Municipal y la Gobernación del Valle del Cauca.

A la fecha, este tramo de la línea de conducción no ha podido ser ejecutado, situación que ha generado retrasos significativos y sobrecostos asociados a la movilización, desmovilización y permanencia de maquinaria, equipos y personal.

6.- Conflicto social en el Tramo 1 de la línea de conducción.

Situación similar se presenta en el Tramo 1 de la línea de conducción, específicamente en el sector de Regaderos, entre la Batea Bananos y Puente Amarillo (Puente Papas).

Desde el 6 de mayo de 2026, miembros de la comunidad opositora al proyecto, líderes comunitarios y representantes del Cañón del Río Guabas han solicitado la suspensión de actividades, argumentando afectaciones sobre la infraestructura vial existente y el presunto incumplimiento de compromisos por parte de Vallecaucana de Aguas y de la Gobernación del Valle del Cauca.

La comunidad ha condicionado la reanudación de las obras a la realización de reuniones y acuerdos con las autoridades competentes. Como consecuencia, este tramo tampoco ha podido ejecutarse, generando retrasos.

7.- Optimización del diseño de la bocatoma y reformulación del proyecto.

Actualmente se encuentra en proceso de revisión la optimización del diseño de la bocatoma, dado las condiciones geomorfológicas donde se había planteado inicialmente.

Paralelamente, se adelanta un balance técnico, financiero y contractual, con el propósito de revisar las condiciones económicas actuales del contrato.

8.- Trámite de servidumbres y afectaciones prediales.

Como consecuencia de los rediseños efectuados para los viaductos y de las condiciones encontradas en campo, se requiere adelantar la legalización de servidumbres necesarias para la construcción de los viaductos de Puente Amarillo, Puente Rojo y Puente La Magdalena.

Así mismo, la presencia de ocupantes no autorizados en las áreas previstas para la construcción de la bocatoma, del Viaducto de la Magdalena y del viaducto de Puente Rojo constituye una afectación directa para la ejecución de estas estructuras.

Adicionalmente, se presenta una restricción para la construcción de un tramo de la línea de conducción ubicado a la salida de la bocatoma, debido a que el propietario de un predio colindante no autoriza el ingreso por la parte posterior de su propiedad, limitando el desarrollo de las actividades constructivas programadas (Predio Danilo Bermúdez).

9.- Afectaciones por condiciones climáticas.

Durante el periodo de ejecución del contrato se registraron eventos de precipitación que afectaron significativamente el desarrollo de las actividades programadas en los diferentes frentes de obra.

El impacto generado no se limita al tiempo de ocurrencia de las lluvias, sino también al período requerido para la recuperación de las condiciones de estabilidad, transitabilidad y seguridad de los terrenos intervenidos, lo cual ha impedido la reanudación inmediata de las labores.

Como soporte de esta situación, se anexan los formatos de seguimiento climático correspondientes a los últimos cinco (5) meses, en los cuales se registran 17,3 días de afectación directa por lluvias, sin considerar las horas adicionales requeridas para la recuperación de las condiciones de trabajo posteriores a cada evento.

Con base a lo planteado por el Consorcio Redes y PTAPs Valle, y la corroboración de la interventoría "Interguacarí" la supervisión de Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P, conceptúa que para la terminación de las actividades contractuales se requiere una prórroga al plazo de ejecución de seis (06) meses.

La nueva fecha para la terminación del contrato de obra N°.2000-13-05-003-2022, a partir el 22 de Julio de 2026 hasta el 22 de enero de 2027, según programa de obra.

Adjunto: Oficio CRYPV-COP2000.13.05.003-2022-Cons289-2026 CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE
Cronograma de obra.
Oficio CI-0159-2026, de junio 29 de 2026 "Consorcio Interguacarí"

Atentamente,

DIEGO JOSÉ CALDERÓN VILLANUEVA
Director Técnico
Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.

Elaboró: Holmes Zúñiga García - Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.
Revisó: **Diego José Calderón Villanueva** – Director Técnico de Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.

CONSORCIO INTERGUACARI

INTERVENTORIA
NIT 901.652.925-3

Distrito Santiago de Cali, Junio 29 de 2026 CI-159-2026

VA-1000.07.02.00816-2026

Ingeniero
DIEGO JOSE CALDERON VILLANUEVA
Supervisor Contrato de Interventoría No. 2000.13.12.005-2022
VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.
La ciudad .

Referencia: Contrato de obra No. 2000.13.05.003.2022 "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA".

Asunto: Concepto Favorable a la solicitud de Adicional en Tiempo No. 04 presentada por CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE

Cordial saludo,

El suscrito, EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ en mi calidad de Representante Legal del CONSORCIO INTERGUACARI, interventoría del contrato de obra No. 2000.13.05.003.2022 "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA", me dirijo a usted de la manera más respetuosa, con el fin de dar el concepto al oficio relacionado con el adicional en tiempo No. 04 remitido por el contratista CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE.

De acuerdo con lo manifestado por el contratista en el oficio No. CRYPV-COP2000.13.05.003-2022-Cons289-2026, pone de manifiesto su argumentación en cuanto a la necesidad de realizar prórroga a la ejecución del contrato de obra de la referencia debido a que a la fecha se han presentado las siguientes situaciones:

CONSIDERACIONES PARA LA PRORROGA

1. ***Restricciones operativas para la optimización de la PTAP de Guacarí.***

   Durante el proceso de optimización de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) de Guacarí, ha sido necesario que todas las actividades sean previamente programadas y autorizadas por el operador del sistema, Acuavalle S.A. E.S.P., con el fin de garantizar la continuidad del servicio y evitar afectaciones en el suministro de agua potable a la población.

   Por esta razón, las intervenciones sobre las líneas y estructuras objeto de optimización deben ejecutarse de manera gradual, conforme a las ventanas de trabajo autorizadas por el operador. En este sentido, únicamente hasta el 16 de junio de 2026 fue autorizada la intervención de un filtro de la Batería A, una vez culminadas las pruebas de

funcionamiento y puesta en marcha de la Batería B, la cual ya fue optimizada y puesta en operación.

Adicionalmente, de los tres filtros que conforman la Batería A, solamente ha sido liberado uno para su intervención, situación que impide la ejecución simultánea de las actividades debido a las restricciones operativas de la planta y a la necesidad de mantener su capacidad de tratamiento y continuidad en la prestación del servicio.

Cabe señalar que el proceso de optimización de cada filtro requiere aproximadamente dos (2) meses para su ejecución, incluyendo actividades de intervención, adecuación, pruebas de funcionamiento y puesta en operación. En consecuencia, la liberación gradual de los filtros por parte del operador ha generado una extensión significativa en los tiempos de ejecución inicialmente previstos.

Por lo anterior, y considerando que aún se encuentran pendientes de intervención dos (2) filtros de la Batería A, se requiere contar con una ampliación del plazo contractual de seis (6) meses, tiempo estimado como necesario para culminar satisfactoriamente las actividades de optimización de la PTAP de Guacarí y garantizar su correcta puesta en funcionamiento.


2. ***Condiciones geológicas imprevistas en el Tramo 1 de la línea de conducción.***

Durante la ejecución de las actividades correspondientes al Tramo 1 de la línea de conducción en tubería PEAD de 18", se han presentado condiciones geotécnicas diferentes a las inicialmente previstas, evidenciándose la presencia de formaciones rocosas y sectores de peña a lo largo del trazado.

Estas condiciones han generado afectaciones significativas en el desarrollo de las excavaciones requeridas para la instalación de la tubería, incrementando tanto los costos de ejecución como los tiempos necesarios para el cumplimiento de las actividades programadas. Adicionalmente, los rendimientos de excavación han sido considerablemente inferiores a los estimados inicialmente, debido a la dificultad para alcanzar las profundidades de instalación definidas en los diseños, las cuales son necesarias para garantizar la estabilidad y correcto funcionamiento de la línea de conducción.

Como consecuencia de lo anterior, ha sido necesario emplear equipos de mayor capacidad y especialización, tales como retroexcavadoras equipadas con martillo hidráulico, compresores y equipos de demolición mecánica, así como implementar métodos alternativos de fracturamiento de roca mediante la aplicación de cemento expansivo, debido a la alta dureza del material encontrado en sitio.

Estas actividades adicionales, no previstas en las condiciones iniciales de ejecución, han impactado directamente la programación de obra, generando una disminución en los rendimientos constructivos y una ampliación en los tiempos requeridos para la instalación de la tubería en este tramo del proyecto.

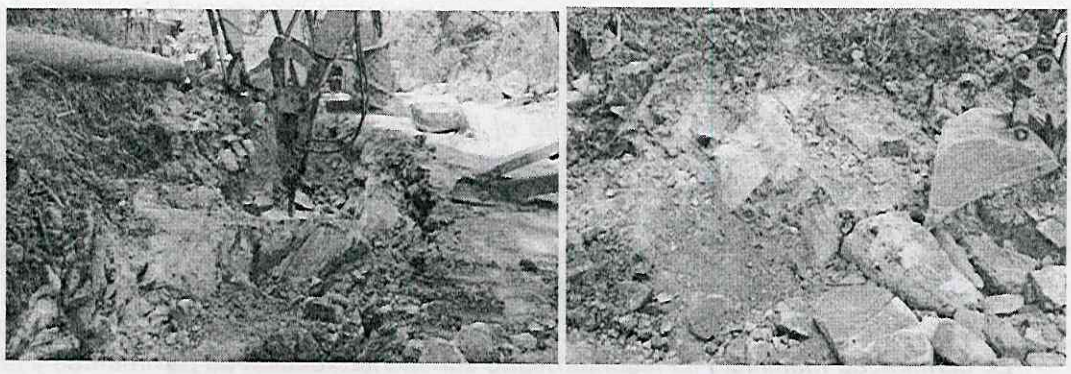

3. ***Demora en la expedición del permiso de ocupación de cauce para la bocatoma***

La demora en la expedición del permiso de ocupación de cauce para la bocatoma por parte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), entidad que a la fecha no ha emitido una respuesta definitiva que permita continuar con el trámite correspondiente y efectuar el pago de la visita técnica y del respectivo permiso.

Se debe precisar que este permiso debió ser solicitado nuevamente debido a una modificación del diseño inicial, originada por la optimización de las estructuras de cimentación y del diseño estructural del proyecto. Así, con ocasión de estos ajustes, la ubicación inicialmente prevista para la construcción de la bocatoma fue reubicada aproximadamente 15 metros aguas arriba sobre el cauce del río Guabas.

En consecuencia, este trámite lleva más de un año en proceso de evaluación por parte de la CVC, sin que hasta la fecha se haya obtenido una respuesta definitiva que permita continuar con el trámite correspondiente, para efectuar el pago de la visita técnica y del respectivo permiso.

4. ***Permisos de ocupación de cauce para viaductos.***

De igual forma, se encuentran en trámite ante la CVC los permisos de ocupación de cauce requeridos para la construcción de los tres pasos aéreos de la línea de conducción (viaductos), los cuales constituyen un requisito indispensable para la obtención de los permisos de intervención de espacio público ante las administraciones municipales correspondientes.

- *Los permisos pendientes corresponden a:*
  - *Permiso de ocupación de cauce – Puente Rojo.*
  - *Permiso de ocupación de cauce – Puente Amarillo.*
  - *Permiso de ocupación de cauce – Puente La Magdalena.*

A la fecha, estos trámites continúan pendientes de aprobación por parte de la autoridad ambiental.

5. ***Conflicto social en el Tramo 2 de la línea de conducción.***

El 20 de noviembre de 2025, durante el inicio de las actividades de instalación de tubería PEAD de 10 pulgadas en el sector El Alto, correspondiente al Tramo 2 de la línea de conducción (entre Puente Rojo y el callejón de acceso a la Planta de Tratamiento de Agua Potable del municipio de Ginebra), miembros de la comunidad de Puente Rojo, líderes comunitarios y representantes del Cañón del Río Guabas se presentaron en el sitio de las obras solicitando la suspensión de actividades.

La comunidad manifestó su inconformidad con la intervención de pavimentos y placas huella existentes, así como con presuntos compromisos adquiridos previamente por Vallecaucana de Aguas relacionados con la modificación del trazado de la tubería.

Posteriormente, el 20 de enero de 2026 se intentó reanudar las actividades; sin embargo, nuevamente la comunidad se opuso a su ejecución y solicitó la suspensión de las obras hasta tanto hicieran presencia la Administración Municipal y la Gobernación del Valle del Cauca.

A la fecha, este tramo de la línea de conducción no ha podido ser ejecutado, situación que ha generado retrasos significativos y sobrecostos asociados a la movilización, desmovilización y permanencia de maquinaria, equipos y personal.



6. ***Conflicto social en el Tramo 1 de la línea de conducción.***

Situación similar se presenta en el Tramo 1 de la línea de conducción, específicamente en el sector de Regaderos, entre la Batea Bananos y Puente Amarillo (Puente Papas).

Desde el 6 de mayo de 2026, miembros de la comunidad opositora al proyecto, líderes comunitarios y representantes del Cañón del Río Guabas han solicitado la suspensión de actividades, argumentando afectaciones sobre la infraestructura vial existente y el presunto incumplimiento de compromisos por parte de Vallecaucana de Aguas y de la Gobernación del Valle del Cauca.

La comunidad ha condicionado la reanudación de las obras a la realización de reuniones y acuerdos con las autoridades competentes. Como consecuencia, este tramo tampoco ha podido ejecutarse, generando retrasos y costos adicionales para el proyecto.



7. ***Optimización del diseño de la bocatoma y reformulación del proyecto.***

Actualmente se encuentra en proceso de revisión la optimización del diseño de la bocatoma, dado que la solución inicialmente planteada requiere recursos adicionales para su ejecución.

Paralelamente, se adelanta el balance técnico, financiero y contractual necesario para la gestión de la Reformulación No. 3 del proyecto, trámite indispensable para garantizar la viabilidad de las obras pendientes.

8. ***Trámite de servidumbres y afectaciones prediales.***

Como consecuencia de los rediseños efectuados para los viaductos y de las condiciones encontradas en campo, se requiere adelantar la legalización de servidumbres necesarias para la construcción de los viaductos de Puente Amarillo, Puente Rojo y Puente La Magdalena.

Así mismo, la presencia de ocupantes no autorizados en las áreas previstas para la construcción de la bocatoma, del Viaducto de la Magdalena y del viaducto de Puente Rojo constituye una afectación directa para la ejecución de estas estructuras.

Adicionalmente, se presenta una restricción para la construcción de un tramo de la línea de conducción ubicado a la salida de la bocatoma, debido a que el propietario de un predio colindante no autoriza el ingreso por la parte posterior de su propiedad, limitando el desarrollo de las actividades constructivas programadas (Predio Danilo Bermúdez).

9. ***Afectaciones por condiciones climáticas.***

Durante el periodo de ejecución del contrato se registraron eventos de precipitación que afectaron significativamente el desarrollo de las actividades programadas en los diferentes frentes de obra.

El impacto generado no se limita al tiempo de ocurrencia de las lluvias, sino también al período requerido para la recuperación de las condiciones de estabilidad, transitabilidad y seguridad de los terrenos intervenidos, lo cual ha impedido la reanudación inmediata de las labores.

Como resultado, se ha evidenciado una disminución en los rendimientos de ejecución y la acumulación de retrasos en la programación general del proyecto.

Como soporte de esta situación, se anexan los formatos de seguimiento climático correspondientes a los últimos cinco (5) meses, en los cuales se registran 17,3 días de afectación directa por lluvias, sin considerar las horas adicionales requeridas para la recuperación de las condiciones de trabajo posteriores a cada evento.

Con base a lo planteado por el Consorcio Redes y PTAPs Valle, se requiere para la terminación de las actividades contractuales una prórroga al plazo de ejecución de seis (06) meses.


En consecuencia, la Interventoría Consorcio Interguacari, considera que son válidas las apreciaciones del contratista, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo, tramites de otorgamiento de permisos ante la CVC y situación de orden social latente y verificable por la entidad Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P.

De esta manera, la interventoría considera acertada la solicitud realizada por el contratista, sin embargo, estará a discreción de la entidad territorial proceder o no con la aceptación de la misma.

Por lo tanto, las razones argumentadas por el contratista para solicitar el Adicional en Tiempo No. 04, esta interventoría las considera razonables, de tal manera que al ser hechos ciertos lo narrado en la comunicación, se hace necesario para la ejecución del contrato de obra civil la concesión del Adicional en Tiempo No. 04 por un tiempo de seis (06) meses partir del 22 de Julio de 2026 hasta el 22 de Enero de 2027, según programa de obra, la cual deberá entrar en vigencia a partir de la aprobación del acto y la suscripción del acta respectiva.

Adjunto: Oficio CRYPV-COP2000.13.05.003-2022-Cons289-2026 CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE
Cronograma de obra.

Atentamente,



Ing. EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ
C.C. No. 16.254.057 de Palmira - Valle
Representante Legal Consorcio Interguacari
Interventor

Copia: Ing. Holmes Zúñiga García – Apoyo a la Supervisión Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P
Archivo

Ginebra – Valle del Cauca, 25 de junio de 2026.

CRYPV-COP2000.13.05.003-2022-Cons289-2026

Señores:
CONSORCIO INTERGUACARI
Atención: Ing. Eduardo Cárdenas R.
Represente Legal
Interventoría
Cali – Valle del Cauca

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PUBLICA 2000.13.05.003-2022
"EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA"

ASUNTO: Solicitud de prórroga del contrato.

Cordial saludo

En mi condición de representante legal del CONSORCIO REDES Y PTATS VALLE, me permito solicitar la PRÓRROGA del plazo contractual con base a las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. **Restricciones operativas para la optimización de las PTAP de Guacarí.**

   Durante el proceso de optimización de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) de Guacarí, ha sido necesario que todas las actividades sean previamente programadas y autorizadas por el operador del sistema, Acuavalle S.A. E.S.P., con el fin de garantizar la continuidad del servicio y evitar afectaciones en el suministro de agua potable a la población.

   Por esta razón, las intervenciones sobre las líneas y estructuras objeto de optimización deben ejecutarse de manera gradual, conforme a las ventanas de trabajo autorizadas por el operador. En este sentido, únicamente hasta el 16 de junio de 2026 fue autorizada la intervención de un filtro de la Batería A, una vez culminadas las pruebas de funcionamiento y puesta en marcha de la Batería B, la cual ya fue optimizada y puesta en operación.

Adicionalmente, de los tres filtros que conforman la Batería A, solamente ha sido liberado uno para su intervención, situación que impide la ejecución simultánea de las actividades debido a las restricciones operativas de la planta y a la necesidad de mantener su capacidad de tratamiento y continuidad en la prestación del servicio.

Cabe señalar que el proceso de optimización de cada filtro requiere aproximadamente dos (2) meses para su ejecución, incluyendo actividades de intervención, adecuación, pruebas de funcionamiento y puesta en operación. En consecuencia, la liberación gradual de los filtros por parte del operador ha generado una extensión significativa en los tiempos de ejecución inicialmente previstos.

Por lo anterior, y considerando que aún se encuentran pendientes de intervención dos (2) filtros de la Batería A, se requiere contar con una ampliación del plazo contractual de seis (6) meses, tiempo estimado como necesario para culminar satisfactoriamente las actividades de optimización de la PTAP de Guacarí y garantizar su correcta puesta en funcionamiento.


2. **Condiciones geológicas imprevistas en el Tramo 1 de la línea de conducción.**

Durante la ejecución de las actividades correspondientes al Tramo 1 de la línea de conducción en tubería PEAD de 18", se han presentado condiciones geotécnicas diferentes a las inicialmente previstas, evidenciándose la presencia de formaciones rocosas y sectores de peña a lo largo del trazado.

Estas condiciones han generado afectaciones significativas en el desarrollo de las excavaciones requeridas para la instalación de la tubería, incrementando tanto los costos de ejecución como los tiempos necesarios para el cumplimiento de las actividades programadas. Adicionalmente, los rendimientos de excavación han sido considerablemente inferiores a los estimados inicialmente, debido a la dificultad para alcanzar las profundidades de instalación definidas en los diseños, las cuales son necesarias para garantizar la estabilidad y correcto funcionamiento de la línea de conducción.

Como consecuencia de lo anterior, ha sido necesario emplear equipos de mayor capacidad y especialización, tales como retroexcavadoras equipadas con martillo hidráulico, compresores y equipos de demolición mecánica, así como implementar métodos alternativos de fracturamiento de roca mediante la aplicación de cemento expansivo, debido a la alta dureza del material encontrado en sitio.

Estas actividades adicionales, no previstas en las condiciones iniciales de ejecución, han impactado directamente la programación de obra, generando una disminución en los rendimientos constructivos y una ampliación en los tiempos requeridos para la instalación de la tubería en este tramo del proyecto.

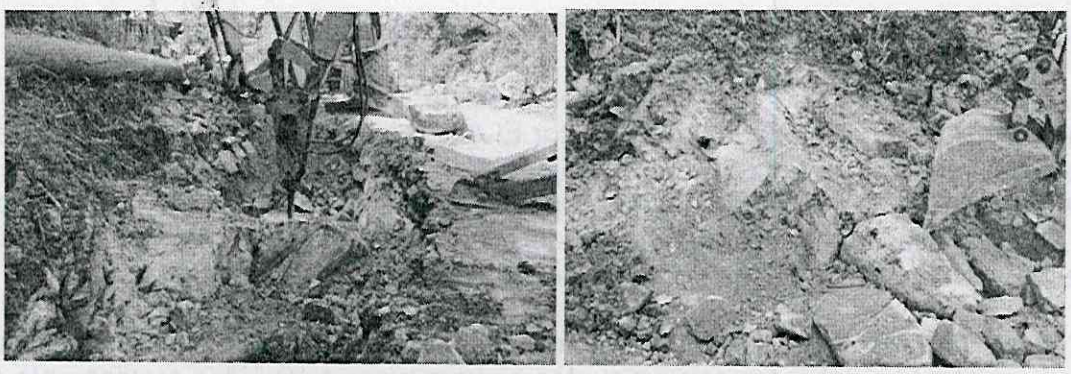

3. **Demora en la expedición del permiso de ocupación de cauce para la bocatoma**

La demora en la expedición del permiso de ocupación de cauce para la bocatoma por parte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), entidad que a la fecha no ha emitido una respuesta definitiva que permita continuar con el trámite correspondiente y efectuar el pago de la visita técnica y del respectivo permiso.

Se debe precisar que este permiso debió ser solicitado nuevamente debido a una modificación del diseño inicial, originada por la optimización de las estructuras de cimentación y del diseño estructural del proyecto. Así, con ocasión de estos ajustes, la ubicación inicialmente prevista para la construcción de la bocatoma fue reubicada aproximadamente 15 metros aguas arriba sobre el cauce del río Guabas.

En consecuencia, este trámite lleva más de un año en proceso de evaluación por parte de la CVC, sin que hasta la fecha se haya obtenido una respuesta definitiva que permita continuar con el trámite correspondiente, para efectuar el pago de la visita técnica y del respectivo permiso.

4. **Permisos de ocupación de cauce para viaductos.**

De igual forma, se encuentran en trámite ante la CVC los permisos de ocupación de cauce requeridos para la construcción de los tres pasos aéreos de la línea de conducción (viaductos), los cuales constituyen un requisito indispensable para la obtención de los permisos de intervención de espacio público ante las administraciones municipales correspondientes.

- Los permisos pendientes corresponden a:
  - Permiso de ocupación de cauce – Puente Rojo.
  - Permiso de ocupación de cauce – Puente Amarillo.
  - Permiso de ocupación de cauce – Puente La Magdalena.

A la fecha, estos trámites continúan pendientes de aprobación por parte de la autoridad ambiental.


5. **Conflicto social en el Tramo 2 de la línea de conducción.**

El 20 de noviembre de 2025, durante el inicio de las actividades de instalación de tubería PEAD de 10 pulgadas en el sector El Alto, correspondiente al Tramo 2 de la línea de conducción (entre Puente Rojo y el callejón de acceso a la Planta de Tratamiento de Agua Potable del municipio de Ginebra), miembros de la comunidad de Puente Rojo, líderes comunitarios y representantes del Cañón del Río Guabas se presentaron en el sitio de las obras solicitando la suspensión de actividades.

La comunidad manifestó su inconformidad con la intervención de pavimentos y placas huella existentes, así como con presuntos compromisos adquiridos previamente por Vallecaucana de Aguas relacionados con la modificación del trazado de la tubería.

Posteriormente, el 20 de enero de 2026 se intentó reanudar las actividades; sin embargo, nuevamente la comunidad se opuso a su ejecución y solicitó la suspensión de las obras hasta tanto hicieran presencia la Administración Municipal y la Gobernación del Valle del Cauca.

A la fecha, este tramo de la línea de conducción no ha podido ser ejecutado, situación que ha generado retrasos significativos y sobrecostos asociados a la movilización, desmovilización y permanencia de maquinaria, equipos y personal.

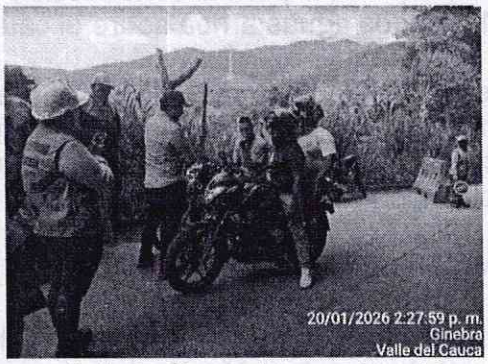

6. **Conflicto social en el Tramo 1 de la línea de conducción.**

Situación similar se presenta en el Tramo 1 de la línea de conducción, específicamente en el sector de Regaderos, entre la Batea Bananos y Puente Amarillo (Puente Papas).

Desde el 6 de mayo de 2026, miembros de la comunidad opositora al proyecto, líderes comunitarios y representantes del Cañón del Río Guabas han solicitado la suspensión de actividades, argumentando afectaciones sobre la infraestructura vial

existente y el presunto incumplimiento de compromisos por parte de Vallecaucana de Aguas y de la Gobernación del Valle del Cauca.

La comunidad ha condicionado la reanudación de las obras a la realización de reuniones y acuerdos con las autoridades competentes. Como consecuencia, este tramo tampoco ha podido ejecutarse, generando retrasos y costos adicionales para el proyecto.



7. **Optimización del diseño de la bocatoma y reformulación del proyecto.**

Actualmente se encuentra en proceso de revisión la optimización del diseño de la bocatoma, dado que la solución inicialmente planteada requiere recursos adicionales para su ejecución.

Paralelamente, se adelanta el balance técnico, financiero y contractual necesario para la gestión de la Reformulación No. 3 del proyecto, trámite indispensable para garantizar la viabilidad de las obras pendientes.

8. **Trámite de servidumbres y afectaciones prediales.**

Como consecuencia de los rediseños efectuados para los viaductos y de las condiciones encontradas en campo, se requiere adelantar la legalización de servidumbres necesarias para la construcción de los viaductos de Puente Amarillo, Puente Rojo y Puente La Magdalena.

Así mismo, la presencia de ocupantes no autorizados en las áreas previstas para la construcción de la bocatoma, del Viaducto de la Magdalena y del viaducto de Puente Rojo constituye una afectación directa para la ejecución de estas estructuras.

Adicionalmente, se presenta una restricción para la construcción de un tramo de la línea de conducción ubicado a la salida de la bocatoma, debido a que el propietario de un predio colindante no autoriza el ingreso por la parte posterior de su propiedad,

limitando el desarrollo de las actividades constructivas programadas (Predio Danilo Bermúdez).

9. Afectaciones por condiciones climáticas.

Durante el periodo de ejecución del contrato se registraron eventos de precipitación que afectaron significativamente el desarrollo de las actividades programadas en los diferentes frentes de obra.

El impacto generado no se limita al tiempo de ocurrencia de las lluvias, sino también al período requerido para la recuperación de las condiciones de estabilidad, transitabilidad y seguridad de los terrenos intervenidos, lo cual ha impedido la reanudación inmediata de las labores.

Como resultado, se ha evidenciado una disminución en los rendimientos de ejecución y la acumulación de retrasos en la programación general del proyecto.

Como soporte de esta situación, se anexan los formatos de seguimiento climático correspondientes a los últimos cinco (5) meses, en los cuales se registran 17,3 días de afectación directa por lluvias, sin considerar las horas adicionales requeridas para la recuperación de las condiciones de trabajo posteriores a cada evento.

10. Fundamentos Jurídicos

En ese sentido, la solicitud de prórroga se soporta en los siguientes fundamentos jurídicos.

La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente en Concepto C- 303 de 2024 desarrolló sobre la figura contractual de prórroga lo siguiente:

> *"(...) los artículos 14 y ss de Ley 80 de 1993 contemplan la posibilidad de modificar el contrato de manera unilateral o bilateral si durante su ejecución y con el fin de evitar la paralización o la afectación grave del servicio público fuere necesario introducir variaciones, lo que permitirá que se puedan cambiar algunas cláusulas del contrato argumentando el ius variandi o la autonomía de la voluntad de las partes artículos 13, 32 y 40, más situaciones de orden técnico, administrativo y jurídico.*
> *(...)*

En relación con la cláusula del plazo no hace parte de las cláusulas inmodificables, por lo tanto, la entidad estatal podrá modificarla de común acuerdo o de manera unilateral siempre y cuando exista una justa causa que evite la afectación grave del servicio público. ***En ese sentido se considera que los contratos estatales son susceptibles de prórroga,*** *adicionalmente debe destacarse que la Ley no fijó criterios para determinar el alcance de la ampliación del plazo, de manera que, en principio, sucede lo mismo que con la configuración del plazo inicial, el cual solo se restringe a que sea «razonable» cumpliendo con el principio de planeación y anualidad presupuestal. Por lo anterior, es posible que un mismo contrato presente diferentes prórrogas, atendiendo igualmente a que sean convenientes y razonables en su determinación, lo que en algunos casos afecta el principio de anualidad de la vigencia fiscal, pero argumentando las necesidades de realizar la prórroga la entidad estatal la tramita mediante un contrato modificatorio el cual debe atender a unas solemnidades.*

(...)

- *En ese orden de ideas, la Ley 80 de 1993 no se refirió a la posibilidad de prorrogar los contratos estatales, al igual que tampoco lo prohibió. En vista de ello, es necesario partir de las remisiones que hace la Ley 80 de 1993 al derecho privado y al principio de la autonomía de la voluntad para llenar este aspecto, tal y como lo contemplan los artículos 13, 32 y 40[1] del EGCAP.*
- *De esta manera, las partes del contrato tienen amplia libertad para prorrogar el plazo de este, salvo ciertas disposiciones específicas de algunas tipologías contractuales, como es el caso de la Concesión. Ahora bien, por regla general, no existen criterios que determinen límites a la prórroga del contrato, de manera que el principio de la autonomía de la voluntad en este*

---

[1] «Art. 13. De la normatividad aplicable a los contratos estatales. Los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2 del presente estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en esta ley».

«Art. 32. De los contratos estatales. Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación: [...]»

«Art. 40. Del contenido del contrato estatal. Las estipulaciones de los contratos serán las que de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley, correspondan a su esencia y naturaleza.

»Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales.

»En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración».

Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado" (Radicación No. 1.952 11001-03-06-000-2009-00033-00)".

Es así que la modificación del plazo, esto es, la prórroga, constituye una figura jurídica que permite asegurar la ejecución y cumplimiento del objeto contractual, ello con el propósito de garantizar el cumplimiento el fin de la contratación estatal, como lo dispone el artículo 3 de la Ley 80 de 1993:


> ***ARTÍCULO 3o. DE LOS FINES DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL.*** *Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.*
>
> *<Aparte tachado derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007> Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que,* ~~***además de la obtención de utilidades cuya protección garantiza el Estado***~~*, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones.*

En atención a las circunstancias expuestas, las cuales corresponden a situaciones ajenas al control del contratista y han generado afectaciones directas en la ejecución de las actividades programadas, solicitamos respetuosamente la aprobación de una prórroga al plazo contractual por un término de seis (6) meses a partir del 22 de julio de 2026, en aras de que se pueda cumplir con la totalidad del objeto contractual, en cumplimiento de la realización de los fines esenciales del Estado, la Contratación Estatal y la Función Pública.

Es importante precisar que para la ejecución de las actividades pendientes de la línea de conducción se requiere el acompañamiento y la gestión de la entidad contratante para la atención y solución del conflicto social que actualmente persiste con algunos sectores de la comunidad.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a cualquier información adicional que se requiera para el trámite de la presente solicitud.

Cordialmente



CARLOS ANDRES LEYVA BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE
c.c. Archivo – Ing. Holmes Zúñiga (Apoyo a la supervisión Vallecaucana de Aguas S.A E.S. P)

Anexos: 5 formatos de Lluvia.
Registro lluvia CVC

Carrera 100 B # 11A-19 Torre Pance, Oficina 501-502
Tel: 602- 4837200 – Centro Empresarial HOLGUINES TRADE CENTER
Santiago de Cali – Valle del Cauca **Correo: leyvabc1976@hotmail.com**

RESOLUCIÓN 0740 No. 0741 14366 DE 2025
(Noviembre 18 2025)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE PRORROGA UN PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE Y OBRAS HIDRÁULICAS EN EL PREDIO DENOMINADO PTAP, UBICADO EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE GINEBRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

La Directora de la Dirección Ambiental Regional Centro Sur de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC-, en uso de sus atribuciones legales, en especial las que le confiere el Decreto Ley 2811 de 1974, La Ley 99 de 1993, el Decreto 1076 de mayo de 2015, y demás normas concordantes y

C O N S I D E R A N D O:

Que a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC-, desde el año de 1968, le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción.

Que Mediante Resolución 0740 No. 742 0001430 del 9 de diciembre de 2021, se "OTORGA UN PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE Y OBRAS HIDRÁULICAS A LA SOCIEDAD ACUAVALLE S.A. E.S.P. NIT 890399032-8 EN PREDIO DENOMINADO PTAP UBICADO EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO GINEBRA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA".

Que mediante Resolución 0740 0741-0245 del 7 de marzo de 2023 se prorroga un permiso de Ocupación de Cauce y Obras Hidráulicas a la sociedad ACUAVALLE S.A. E.S.P. NIT 890399032-8, en el predio denominado PTAP, ubicado en jurisdicción del municipio de Ginebra, departamento del Valle del Cauca.

Que mediante Resolución 0740-0741-0502 del 31 de mayo de 2024, se prorroga un permiso de Ocupación de Cauce y Obras Hidráulicas a la sociedad ACUAVALLE S.A. E.S.P. NIT 890399032-8, en el predio denominado PTAP, ubicado en jurisdicción del municipio de Ginebra, departamento del Valle del Cauca.

Que mediante radicado 207222025 de fecha 20/2/2025, JORGE ENRIQUE SANCHEZ CERON identificado con cédula de ciudadanía. No. 6319264, actuando como representante representante legal de ACUAVALLE S.A E.S.P. NIT. 890399032-8 , radicó ante la CVC DAR Centro Sur con sede en Guadalajara de Buga , una solicitud de prórroga al permiso de Ocupación de Cauce y Aprobación Obras Hidráulicas, en el predio PTAP ubicado en Jurisdicción del Municipio de Ginebra, Departamento del Valle del Cauca.

Que con la solicitud escrita presentó los siguientes documentos:

- Solicitud de Prórroga Ocupación de Cauce y Aprobación Obras Hidráulicas
- Certificado de tradición.

Que, mediante Auto de fecha de 4/8/2025, previa revisión de la documentación presentada en la solicitud, por parte del sustanciador de la oficina de Atención al Ciudadano de la Dirección Ambiental Regional Centro Sur se da inicio al trámite de la presente solicitud.

Que mediante oficio 207222025 de fecha 4/8/2025 se le informa al peticionario la iniciación de la actuación administrativa.

RESOLUCIÓN 0740 No. 0741 14366 DE 2025
(Noviembre 18 2025)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE PRORROGA UN PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE Y OBRAS HIDRÁULICAS EN EL PREDIO DENOMINADO PTAP, UBICADO EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE GINEBRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

Que surtida la visita ocular en fecha 11/9/2025 por parte de los funcionarios de la CVC Dar Centro Sur, el coordinador de la UGC S.G.S.C., procede a la realización del concepto técnico el dia 10/11/2025, remitido al Proceso Atención al Ciudadano el 14 de noviembre de 2025, el cual consigna lo siguiente:

LOCALIZACION. :

Municipio Ginebra
Cuenca Guabas
Predio Baldío

Coordenadas		
Geográfica:	3°45'31" N	76°12'16"
Plana:	1.096.981 X	907.430 Y



Figura 1. Localización punto de intervención.

ANTECEDENTE(S

A continuación, se realiza un recuento cronológico de la información suministrada por el usuario y de las actuaciones adelantadas por la Corporación acorde con la información que obra en el expediente 0741-036-015-006-2020, en el marco de la solicitud de permiso de ocupación de cauce y construcción de obra hidráulica.

-La sociedad ACUAVALLE solicitó a través del radicado de número 963792019 un permiso de ocupación de cauce y construcción de obra hidráulica sobre el río Guabas. La solicitud tiene como fin la construcción de la captación en el marco del proyecto: "Estudios y diseños para el sistema de captación, aducción, conducción y optimización de almacenamiento y PTAP para los acueductos de los municipios de Ginebra y Guacarí en el Valle del Cauca"; en predio identificado con matricula inmobiliaria 373-20638, ubicado en el corregimiento de Cocuyos, jurisdicción del municipio de Ginebra.

-El 9 de enero de 2020 la Corporación emitió Auto de Iniciación del Trámite o Derecho Ambiental. Esto dado que el solicitante cumplió con la documentación requerida para dar inició respectivo al trámite. De lo cual se da debida notificación al señor Guillermo Arbey Rodríguez Buitrago, representante legal.

-El 14 de enero de 2020 se cancela la tarifa por el servicio de evaluación del trámite por un valor de UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y

RESOLUCIÓN 0740 No. 0741 14366 DE 2025
(Noviembre 18 2025)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE PRORROGA UN PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE Y OBRAS HIDRÁULICAS EN EL PREDIO DENOMINADO PTAP, UBICADO EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE GINEBRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

-Se realiza visita de inspección ocular a la zona el día 18 de agosto de 2021 por funcionarios de la DAR Centro Sur, tal como se indica en informe de visita.

En consonancia con los requisitos para el trámite de solicitud de Ocupación de Cauces, playas y lechos, se solicita presentar autorización expresa por parte de los propietarios o poseedores del terreno, antes señalados, en donde se destaque el alcance de las obras que autorizan dentro de su predio.

-Una vez revisada la información técnica referente a: "Estudios y diseños para el sistema de captación, aducción, conducción y optimización de almacenamiento y PTAP para los acueductos de los municipios de Ginebra y Guacarí en el Valle del Cauca"; y en especial lo relacionado con: la hidrología, el estudio de suelos, y la geotécnica; no se logró determinar la socavación máxima esperada en el sitio de emplazamiento de la obra, ni su nivel de protección respecto a riesgos de desastre tales como: inundaciones, avenidas torrenciales o movimientos en masa. Por lo tanto, se solicita presentar todo lo relacionado con el estudio de socavación en el punto donde se ejecutara la obra de captación, y el estudio de riesgo de desastre para las obras de: captación, aducción, y desarenador.

-Como respuesta el peticionario argumenta lo siguientes dos (2) puntos: En lo referente a la propiedad del predio a intervenir con la construcción de la captación y desarenador, se aclara que dicho predio es un baldío identificado con N° predial Nacional 76306000200000005012300000000. 1. Teniendo en cuenta que los predios baldíos son de propiedad de la Nación y carecen de matrícula inmobiliaria, se está tramitando ante la Oficina de Registro de Buga la expedición de CERTIFICACIÓN DE CARENCIA DE REGISTRO. 2. Anexa informe de cálculos hidráulicos y de socavación bocatoma, e informe de Geología Diagnostico de Riesgos y Amenazas de los posibles puntos de captación, para los acueductos de la cabecera municipal de los municipios de Ginebra y Guacarí, elaborados por el consorcio Diseños Guacarí – Ginebra 2019.

-Como respuesta la Corporación concede el plazo de un (1) mes solicitado para la entrega de la información complementaria y realiza aclaraciones sobre el: "informe de cálculos hidráulicos y de socavación bocatoma, e informe de Geología: Diagnostico de Riesgos y Amenazas de los posibles puntos de captación, para los acueductos de la cabecera municipal de los municipios de Ginebra y Guacarí, elaborados por el consorcio Diseños Guacarí – Ginebra 2019". En dichas aclaraciones reitera la solicitud de información complementaria en los siguientes términos:

En relación con la información complementaria entregada bajo el número de radicado 892312021, la Corporación se permite comunicarle que, una vez revisado el informe "CÁLCULOS HIDRÁULICOS Y DE SOCAVACIÓN – BOCATOMA"; se encontró que en la sección 6, "Metodología para el tratamiento del proceso de socavación en campo"; en la que se propone solución ante la socavación estimada en dos (2) metros, así:

"Construir por debajo de la bocatoma un concreto ciclópeo (60% concreto 3000 psi y 40% piedra), a todo lo ancho y largo de la bocatoma [illegible]

sección A-A, sección B-B, sección C-C, sección HEC 18"; y 02E – "Captación río Guabas planta, sección longitudinal D-D, sección E-E, sección HEC 18"; en los cuales se señala cimentación de 50 cm y placa de 50 cm, sin considerar el tratamiento ante la socavación. Por lo tanto, se solicita hacer llegar a la Corporación los planos de la estructura de captación del río Guabas, en los cuales se muestre la integración de la propuesta de protección ante la socavación, estimada en 2,0 metros, junto con el resto de la estructura.

Por su parte el peticionario hace llegar dos oficios como respuesta, los radicados números 971112021 y 1007752021. En el primero se anexan los documentos relacionados con la propiedad del predio donde se propone construir la bocatoma y el desarenador. En el segundo se adjunta, en palabras del solicitante: "(...) el plano complementario a Planos Estructurales elaborado por Consorcio Diseños Ginebra – Guacarí 2019, el cual contiene todas las secciones de la estructura de la bocatoma, con la solución planteada para la socavación de la misma".

-A través de la Resolución 0740 No. 0742 0001430 del 09 de diciembre de 2021 se otorgó permiso de Ocupación de Cauce y Construcción de Obras Hidráulicas a la sociedad ACUAVALLE con NIT 890.399.032, en el predio denominado PTAP, ubicado en el municipio de Ginebra, Valle del Cauca.

La Resolución, en su artículo 2do, párrafo 3ro, indica: *"Si el autorizado no hubiere terminado dichas obras o actividades, podrá solicitar una prórroga hasta por el mismo término otorgado, que deberá hacerse con una anterioridad de quince (15) días al vencimiento de la autorización"*. Mediante radicado 549892022 del 9 de junio de 2022, se realiza solicitud de prórroga del permiso de ocupación de cauces, playas y lechos y aprobación de obras hidráulicas; se hace visita técnica el 1 de diciembre de 2022 y se proyecta concepto técnico el 1 de marzo de 2023.

En el concepto técnico del 1 de marzo de 2023 se especificó que:

En la Resolución se impusieron obligaciones con tiempos perentorios para su cumplimiento. Una vez revisado la base de datos de la Corporación no se encontró evidencias del cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. *Presentar en un término no mayor a seis (6) meses notificado el acto administrativo el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las Entidades Públicas y Privadas (PGRDEPP), del que habla el Decreto 2157 de 2017 en su artículo 2.3.5.1.2.2. En este se deben abordar las medidas para prevenir, corregir y/o mitigar los escenarios de riesgo por eventos tales como: remoción en masa combinados con avenidas torrenciales.*
2. *Dado que en los estudios no se consideró los efectos generados por la socavación local, se debe presentar en un plazo no mayor a seis (6) meses notificado el acto administrativo una propuesta de manejo de la posible socavación local generada por el cambio de flujo en el vertedero tipo Azud. Dicha propuesta podrá consistir en cuenco de protección dimensionado conforme a la longitud de formación de resalto hidráulico, estimado con los valores determinados en el Estudio Hidráulico. En el caso que, a través de estudio técnico, se demuestre que no se presentará flujo supercrítico en los escenarios de caudal predominante (T: 1.57 – 2.33), o en eventos extremos (T: 20, 50,*

que contaría con un espesor promedio mayor a los 2 metros, este sería susceptible a fisuras y colapso, especialmente por procesos de asentamientos, lo cual afectará la integridad de la estructura. Se considera que lo propuesto no cumple con las características técnicas necesarias para garantizar la durabilidad de la obra, toda vez que podría presentar falla frágil y súbita que comprometería el servicio de agua potable generando escenario de riesgo de desastre. Por lo tanto, en un plazo no mayor a seis (6) meses notificado el acto administrativo se deberá presentar una propuesta estructural que dé solución al problema de socavación y que cumpla con condiciones técnicas, utilizando elementos tales como dentellones o cimentación profunda, con lo que se proteja la estructura de la socavación general y de las fuerzas boyantes.

4. *En relación con la intervención que se realizará sobre el predio con código catastral 76060002000000050123000000000, el cual se identificó como baldío, perteneciente al municipio de Ginebra, como consta en el certificado de pertenencia al EOT de Ginebra, se debe presentar en un plazo no mayor a seis (6) meses notificado el acto administrativo, autorización expresa para realizar las obras por parte del municipio de Ginebra, en el que se señale el alcance de lo autorizado.*
5. *En relación con el predio identificado con código catastral 76306000200000005012400000000, el cual será sujeto de intervención, no se presentó aclaración, sobre la propiedad del mismo. Se debe presentar a la Corporación, en un plazo no mayor a seis (6) meses notificado el acto administrativo, información de la pertenencia o dominio del predio y, en el caso que la propiedad sea distinta al peticionario, presentar autorización expresa por parte del propietario o quien ejerza la posesión del mismo.*
6. *Dado que la intervención requiere la construcción dentro del cauce del río Guabas, se debe presentar en un plazo no mayor a seis (6) meses notificado el acto administrativo un plan de construcción de obra en el que se señale el método constructivo que se utilizará para la construcción del vertedero tipo Azud. En caso de requerirse ataguía o desvío del cauce, en el plan de construcción de obra se deberá señalar las medidas que se tomaran para evitar la generación de impactos sobre el río y las comunidades aguas abajo. En ningún caso se podrá desviar el cauce de forma que altere las condiciones ecosistémicas normales del río Guabas. Tampoco se podrá generar cambios en las condiciones hidrodinámicas de forma que afecten la estabilidad de las orillas o márgenes, propiciando escenarios de riesgo de desastre.*

Las anteriores obligaciones no se encuentran sujetas a la etapa constructiva del proyecto, por lo tanto, no se encuentra justificado su no cumplimiento. Cabe recordar que el incumplimiento de las obligaciones previstas en el acto administrativo podrá acarrear las medidas preventivas y sanciones de las que habla la Ley 1333 de 2009.

Revisada la información contenida en el expediente no se encontró evidencia de que hayan sido cumplidas dichas obligaciones hasta la fecha.

El 03 de febrero del 2023 usuarios del rio Guabas trasladaron a la Corporación inquietudes entorno a posible afectación en la cantidad del recurso hídrico disponible aguas abajo de la futura captación. Para dar respuesta a la inquietud [illegible]

RESOLUCIÓN 0740 No. 0741 14366 DE 2025
(Noviembre 18 2025)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE PRORROGA UN PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE Y OBRAS HIDRÁULICAS EN EL PREDIO DENOMINADO PTAP, UBICADO EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE GINEBRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

ACUAVALLE con NIT 890.399.032, en el predio denominado PTAP, ubicado en el municipio de Ginebra, Valle del Cauca. La Resolución, en su artículo 1º, parágrafo 3º, indica: *"Si el autorizado no hubiere terminado dichas obras o actividades, podrá solicitar una prórroga hasta por el mismo término otorgado, que deberá hacerse con una anterioridad de quince (15) días al vencimiento de la autorización"*. Con radicado CVC 207602024 el usuario solicita prorroga a la Resolución.

Mediante radicado CVC 207602024 se realiza nuevamente solicitud de prórroga del permiso de ocupación de cauces, playas y lechos y aprobación de obras hidráulicas; para lo cual se realiza visita técnica el 14 de mayo de 2024.

Mediante Resolución 0740 No. 0741 0502 del 31 de mayo del 2024 se prorroga un permiso de ocupación de cauce y obras hidráulicas.

Mediante radicado CVC 207222025 se realiza nuevamente solicitud de prórroga del permiso de ocupación de cauces, playas y lechos y aprobación de obras hidráulicas, para lo cual se realiza visita técnica el 11 de septiembre de 2025.

NORMATIVIDAD:

- Decreto 2811 de 1974, "Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y Protección al Medio Ambiente".
- Decreto 1076 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible".
- Ley 1523 de 2012, "Por la cual se adopta la policía nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones".

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN:

Con radicado CVC 207222025 el usuario solicita prorroga a la Resolución 0740 No. 0741 0502 del 31 de mayo del 2024, en la que se otorgó prorroga al permiso de Ocupación de Cauce y Construcción de Obras Hidráulicas a la sociedad ACUAVALLE con NIT 890.399.032, en el predio denominado PTAP, ubicado en jurisdicción del municipio de Ginebra, Valle del Cauca.

En concepto técnico del 6 de marzo de 2023, que reposa en el expediente 0741-036-015-006-2020, se retomaron los aspectos ambientales, técnicos y legales de la propuesta de intervención; tenidas en cuenta en el concepto técnico del 26 de noviembre de 2021; así mismo se realizaron recomendaciones respecto a la posible futura afectación en la cantidad del recurso que acusan algunos usuarios. A continuación, se retoman algunos de los apuntes más importantes:

De lo ambiental

Acorde con el concepto del 26 de noviembre de 2021, no se encontraron afectaciones al medio natural distintas a las previstas para el tipo de obra que se plantea. Además, después de indagar en las bases de datos de la Corporación, el sitio no corresponde a zona de

"Las amenazas naturales de mayor relevancia que puedan afectar las estructuras de captación son los fenómenos de remoción en masa combinados con las avenidas torrenciales, teniendo en cuenta que los sitios de captación se encuentran en zonas de altas pendientes susceptibles de deforestación".

El principio de autoconservación, del que habla la Ley 1523 de 2012, indica que: *"Toda persona natural o jurídica, bien sea de derecho público o privado, tiene el deber de adoptar las medidas necesarias para una adecuada gestión del riesgo en su ámbito personal y funcional, con miras a salvaguardarse, que es condición necesaria para el ejercicio de la solidaridad social"*. Además, el artículo 42 de la Ley 1523 de 2012 señala:

"Análisis específicos del riesgo y planes de contingencia. Todas las entidades públicas o privadas encargadas de la prestación de servicios públicos, que ejecuten obras civiles mayores o que desarrollen actividades industriales o de otro tipo que puedan significar riesgo de desastre para la sociedad, así como las que específicamente determine la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, deberán realizar un análisis específico de riesgo que considere los posibles efectos de eventos naturales sobre la infraestructura expuesta y aquellos que se deriven de los daños de la misma en su área de influencia, así como los que se deriven de su operación. Con base en este análisis diseñará e implementarán las medidas de reducción del riesgo y planes de emergencia y contingencia que serán de su obligatorio cumplimiento".
Como conclusión se tiene:

- El reconocimiento de la amenaza sobre la estructura de captación del servicio público indica la posibilidad de riesgo de desastre. Es apremiante contar con un Plan de Gestión del Riesgo de Desastre, donde se contemplen los escenarios de amenaza, y se propongan medidas de prevención y/o mitigación. Así mismo, es prudente contar con un plan de contingencia y emergencia para los casos en que se materialicen las amenazas en riesgos.

De lo técnico

La información técnica no presenta de forma clara el grado de seguridad de la infraestructura para los casos de socavación general y local. Respecto la primera, lo previsto en el diseño geotécnico de cota de desplante 50 cm por debajo de la cota de terreno no esta acorde con la profundidad de socavación general estimada en más de 2 m. Además, la solución propuesta de cimentación en ciclópeo para una profundidad de hasta 2 m, buscando roca sana, contraria lo indicado en el estudio de suelos, que señala para la estratigrafía encontrada en el terreno de la bocatoma de Guabas:

"Un primer estrato (superior) en mi concepto hace parte de lo que llaman deposito coluvio aluvial, que consiste en una matriz limosa – arenosa con detritus. Podemos apreciar el material encontrado en los cinco primeros metros, le corresponde una velocidad de onda P de 420 m/seg y de 210 m/seg para velocidad de onda S".

Finalmente, cabe aclara que no se presenta protección de la estructura ante eventos de tubificación o fuerzas boyantes. Sin estas consideraciones no se tiene certeza del riesgo a falla por deslizamiento y/o volcamiento. Generalmente suele utilizarse dentellón para proteger la estructura de estos modos de falla.

Como conclusión se tiene:

- Se debe contemplar escenarios de modo de falla por socavación general y local. El tipo de cimentación debe responder a la socavación general estimada. La estructura debe contener elementos de protección ante la socavación local. En los escenarios donde se presente resalto hidráulico debe protegerse la estructura para asegurar su durabilidad.

De lo legal

Entre la información que reposa en el expediente 0741-036-015-006-2020 se hace mención a dos predios. El predio identificado con código catastral 76060002000000050123000000000 se identificó como baldío, y, según certificado de la administración municipal hace parte del municipio de Ginebra. Por otra parte, del predio identificado con código catastral 76306000200000005012400000000 se tiene certificado de tradición que establece "Predio de Dominio Privado". Para ambos casos se requiere presentar autorización escrita por parte de la persona que ejerza el dominio real de cada predio.

Como conclusión se tiene:

- Se requiere presentar autorización escrita suficiente para el alcance de las obras por parte del municipio de Ginebra, para el predio con código catastral 76060002000000050123000000000, y por parte de la persona que ejerza el dominio real del predio con código catastral 76306000200000005012400000000.

De lo constructivo

No se presentó plan de trabajo, por lo tanto, no se evaluaron impactos por los métodos constructivos y la intervención provisional del cauce. Cabe recordar que bajo ninguna condición se pueden generar alteraciones que supongan riesgo para terceros. Todas las obras provisionales deben ser diseñadas por un profesional idóneo. Los materiales y la calidad de las obras deben contar con características que aseguren su impermeabilidad y estabilidad ante escenarios de amenaza, tales como avenidas torrenciales y movimientos en masa.

Como conclusión se tiene:

- Se debe evitar que maquinaria y piezas de equipos de excavación entren en contacto directo con el agua del río; en el caso de las excavaciones con retroexcavadora, el equipo deberá estar montado sobre planchones.
- En el caso de requerirse ataguías y/o estructuras de desvío del cauce, estas deben ser diseñadas por un profesional idóneo, de forma tal que, no se afecten las orillas colindantes. Además, en el caso de requerir la obstrucción temporal del cauce no se podrá generar condiciones de riesgo de inundación para periodos de retorno acordes con el nivel de riesgo asumible por el proyecto.
- En ningún caso se podrán construir atagulas y/o desvíos de flujo que puedan provocar

de las condiciones actuales (previo a intervenciones). Una vez termine la vida útil de las obras temporales, se debe retornar las condiciones previas. El plan deberá contener las actividades de reposición de las condiciones naturales.

De la cantidad del recurso hídrico

En el ANEXO de la Resolución 0100 No. 0600 0290 de 2019, REGLAMENTACIÓN GENERAL DEL USO DE LAS AGUAS EN UN TRAMO DEL RÍO GUABAS Y SUS AFLUENTES: QUEBRADA LA MAGDALENA Y LOS ZANJONES EL PAILÓN Y EL ASOMBRO; respecto del agua superficial en el punto de cierre de la zona productora, se estableció con el modelo HBV para el río Guabas, los caudales mensuales que se muestra en la **Tabla 1**.

Tabla 1. Caudales medios mensuales multianuales del río Guabas (m^3/s)

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Valor medio	4,4	4,1	4,8	5,4	4,8	3,0	1,8	1,3	1,5	4,2	7,2	6,3
Valor máximo	16,4	18,7	21,2	16,3	14,9	10,7	12,0	8,6	9,1	20,2	36,6	32,6
Valor mínimo	0,9	0,8	0,8	0,9	1,5	1,0	0,5	0,2	0,2	0,4	1,1	1,8

Acorde con la **Tabla 1**, en época de estiaje extremo (caudales mínimos), el caudal podría oscilar entre 0,2 y 1,8 m^3/s. Por lo tanto, en este escenario podría verse afectada la disponibilidad del recurso aguas abajo de la nueva bocatoma, la cual cuenta con 233 l/s concesionados. Por otra parte, en la **Tabla 2** se presenta el resumen del balance crítico establecido.

Tabla 2. Balance oferta disponible para distribución – Demanda total de agua superficial (l/s)

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Caudal disponible	1677,0	1677,0	1677,0	1677,0	1677,0	1677,0	1677,0	1677,0	1677,0	1677,0	1677,0	1677,0
Oferta total	1677,0	1677,0	1677,0	1677,0	1677,0	1677,0	1677,0	1677,0	1677,0	1677,0	1677,0	1677,0
Demanda agrícola	1571,6	808,6	22,8	0,0	0,0	1227,4	2664,8	2669,8	455,5	0,0	0,0	0,0
Demanda doméstica	271,4	271,4	271,4	271,4	271,4	271,4	271,4	271,4	271,4	271,4	271,4	271,4
Demanda pecuaria	59,3	59,3	59,3	59,3	59,3	59,3	59,3	59,3	59,3	59,3	59,3	59,3
Demanda industrial	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0
Demanda total	2047,2	1284,2	498,4	475,7	475,7	1603,1	3140,5	3345,5	931,2	475,7	475,7	475,7
Balance Oferta - Demanda	-370,2	392,8	1178,6	1201,3	1201,3	73,9	-1463,5	-1668,5	745,8	1201,3	1201,3	1201,3

Según la **Tabla 2** se estima déficit en la oferta del recurso para los meses de enero, julio y agosto. Cabe aclarar que esto se está subsanando concesionando aguas subterráneas. Este escenario inquietó a parte de la comunidad que utiliza el recurso, ante lo cual, solicitaron reunión con las partes del proyecto. En los espacios de dialogo se concertó establecer una regla de operación para que todos puedan satisfacerse del recurso.

RESOLUCIÓN 0740 No. 0741 14366 DE 2025
(Noviembre 18 2025)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE PRORROGA UN PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE Y OBRAS HIDRÁULICAS EN EL PREDIO DENOMINADO PTAP, UBICADO EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE GINEBRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

- Ginebra expediente 0741-010-002-291-2016 RESOLUCION 0740-000144 28/1/2019 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES

Se requiere dar continuidad al uso de esta infraestructura para escenarios de estiaje crítico. En consecuencia, la nueva regla de operación podría consistir en el cierre del suministro de la nueva bocatoma, abasteciendo la planta a través de la infraestructura actual. Esto supondría un ajuste en la concesión de agua superficial otorgada a ACUAVALLE.

Se recomienda que, en el caso de modificar la concesión de agua superficial, se estudie las condiciones críticas para implementar la regla de operación y poder garantizar el suministro de la planta, sin afectar la cantidad del recurso para otros usuarios aguas abajo de la nueva bocatoma. Se recomienda que la modificación de la concesión se realice en concertación con el concesionario, la comunidad inquieta y el equipo técnico encargado de evaluar la capacidad de abastecimiento de la fuente. Lo anterior sin perjuicio de las actuaciones administrativas que se pueden adelantar por parte de la Corporación, especialmente de lo contemplado en el artículo 92 del Decreto-Ley 2811 de 1974, que indica:

"Para poder otorgarla, toda concesión de aguas estará sujeta a condiciones especiales previamente determinadas para defender las aguas, lograr su conveniente utilización, la de los predios aledaños y, en general, el cumplimiento de los fines de utilidad pública e interés social inherentes a la utilización.

No obstante lo anterior, por razones especiales de conveniencia pública, como la necesidad de un cambio en el orden de prelación de cada uso, o el acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales, podrán modificarse por el concedente las condiciones de la concesión, mediante resolución administrativa motivada y sujeta a los recursos contenciosos administrativos previstos por la ley."

Respecto a la competencia del permiso de Ocupación de Cauce y Construcción de Obra Hidráulica se debe incorporar un sistema de medición de caudal en tiempo real en la estructura de captación, en los términos descritos en el artículo 121 del Decreto-Ley 2811 de 1974, lo que facilitará la regla de operación.

Como conclusión general de dicho concepto se tiene:

En consecuencia, modifíquese las concesiones de agua otorgada a ACUAVALLE, según resoluciones 00001169 del 01/10/2021 acueducto de Guacarí y Resolución 0740-000144 del 28/1/2019 acueducto de Ginebra, en el siguiente sentido

- El punto de captación principal de las concesiones será la nueva captación ubicada en la coordenada la coordenada geográfica N 3°45'31,1" – W 76°12'16,1"
- El punto de captación alterno y de contingencia para el acueducto de Guacarí será Captación 3 Derivación 1 Acequia La "Chamba"
- El punto de captación alterno y de contingencia para el acueducto de Ginebra será Captación 3 Derivación 2 Acequia Grande y Santa Barbara.
- Las captaciones alternas deberán ser objeto de mantenimiento y responsabilidad de Acuavalle y entrarán en operación bajo las siguientes condiciones:
  - Cuando la captación principal y su conducción requiera labores de mantenimiento o reparación.
  - Cuando por condiciones de caudales bajos se afecte la disponibilidad de agua en

- En la modificatoria a la concesión de aguas debería imponerse, entre otras obligaciones, lo respectivo al artículo 121 y 122 del Decreto-Ley 2811 de 1974 que indican, respectivamente:
  - *"Las obras de captación de aguas públicas o privadas deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad de agua derivada y consumida en cualquier momento.*
  - *Los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión".*


En lo que respecta a la visita técnica realizada el 11 de septiembre de 2025, se cuentan con las siguientes anotaciones:

En atención a la solicitud, se procedió a verificar en campo los puntos de interés, de lo cual se presenta el siguiente informe:

6.1 La cuenca del río GUABAS, tiene un área igual a 23800 hectáreas, las áreas de drenaje definidas para esta cuenca son cuatro1:

No.	Área de drenaje	Área en hectáreas
1	Zona alta rio Guabas	8733
2	Cuenca del río Flautas	4193
3	Cuenca de la quebrada La Magdalena	3570
4	Zona baja río Guabas	8733

Áreas de drenaje del río GUABAS

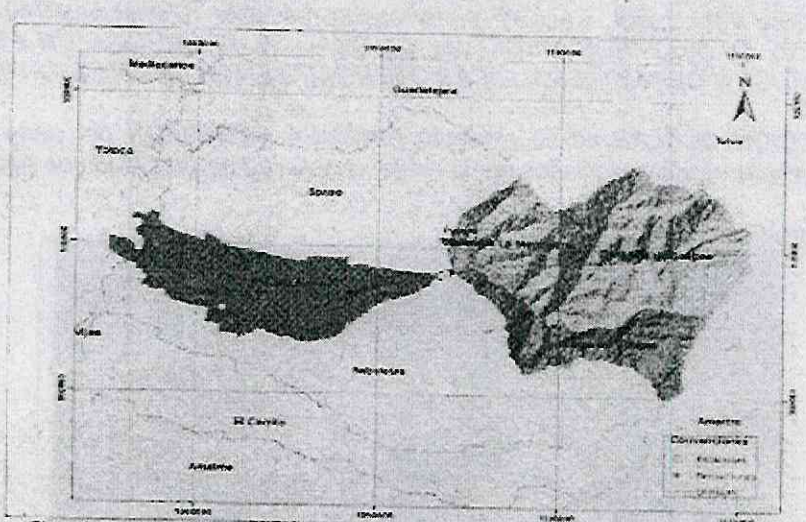

Fuente: Informe Final Caudales Especificos Para Las Cuencas En El Departamento Del Valle Del Cauca (CVC) – 2018

Caudales generados en el río GUABAS

periodo comprendido entre los años 1984 y 2014 en el sitio donde está localizada la primera derivación de agua del río Guabas. Con la serie de caudales diarios para el periodo 1984 – 2014, se obtuvo los caudales medios mensuales multianuales, donde se observa que el mes con el caudal medio multianual más bajo es agosto y el mes con el caudal más alto es noviembre[2].

Caudal medio mensual multianual, en l/s, antes de la primera derivación de agua del río GUABAS.

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
4414	4145	4819	5429	4810	2953	1796	1263	1487	4228	7173	6316	4067

Fuente. Informe Final Caudales Especificos Para Las Cuencas En El Departamento Del Valle Del Cauca (CVC) – 2018.

- *El punto inspeccionado correspondió, al sitio donde se realizará la implementación y construcción, del sistema de captación, que beneficiará a los sistemas de acueducto de los municipios de GINEBRA y GUACARÍ.*
- *El sistema de captación que se pretende ejecutar o construir, es una bocatoma transversal, según las consideraciones técnicas definidas, en la documentación técnica, presentada en la solicitud, para luego ser conducida por tubería a una estructura hidráulica, donde se dispondrá un partidor de caudales, desde donde se conducirá el agua por dos tuberías a las respectivas plantas de tratamiento, para beneficio de los dos municipios. Actualmente, el sistema de acueducto se encuentra tomando agua de dos acequias del rio GUABAS, correspondientes a la Subderivación 1-2 ZANJÓN PICHICHI, desde donde se deriva el agua para la PTAP del municipio de GUACARÍ y de la Derivación 2 ACEQUIA GRANDE Y SANTA BÁRBARA, desde donde se deriva el agua para la PTAP del municipio de GINEBRA.*
- *En la diligencia, se determinó que, hasta el momento de la presente inspección, no se ha ejecutado o construido alguna obra conexa al permiso otorgado mediante Resolución 0740 No. 0742 – 0001430, del 9 de diciembre del 2021, "POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE Y OBRAS HIDRÁULICAS A LA SOCIEDAD ACUAVALLE S.A. E.S.P. NIT. 890.399.032, EN PREDIO DENOMINADO PTAP, UBICADO EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO GINEBRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA" y prorrogado mediante Resolución 0740 No. 0741 – 0245 del 7 de marzo del 2023 "POR MEDIO DE LA CUAL SE PRORROGA UN PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE Y OBRAS HIDRÁULICAS OTORGADO EN LA RESOLUCIÓN 0740 – 01430 DEL 9/12/2023".*
- *Durante la **INSPECCIÓN OCULAR** no se presentó **NINGUNA OPOSICIÓN** por parte de posibles beneficiarios que pudieran resultar afectados por la presente solicitud de Concesión de Aguas.*

Evidencia fotográfica



RESOLUCIÓN 0740 No. 0741 14366 DE 2025
(Noviembre 18 2025)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE PRORROGA UN PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE Y OBRAS HIDRÁULICAS EN EL PREDIO DENOMINADO PTAP, UBICADO EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE GINEBRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

CONCLUSIONES:

Con base a lo conceptuado, se considera técnica y ambientalmente viable prorrogar por UN (1) año a favor de la Sociedad de Acueductos y Alcantarillados del Valle del Cauca (Acuavalle) S.A. E.S.P., identificada con NIT 890399032-8, a través del señor Jorge Enrique Sánchez Cerón identificado con cédula de ciudadanía 6319264, quien aparece como gerente de la sociedad Acuavalle S.A. E.S.P., el permiso de Ocupación de Cauce y Construcción de Obras Hidráulicas en el río Guabas, en la ronda hídrica del río Guabas, en el corregimiento de Cocuyos, en la coordenada geográfica N 3°45'31,1" – W 76°12'16,1", jurisdicción del municipio de Ginebra; otorgada en la Resolución 0740 No. 0742 0001430 de 2021, para la construcción de estructura: vertedero tipo Azud para captación lateral en un caudal de 233,0 l/s y estructura de desarenador. Lo anterior siempre que se cumplan las obligaciones del siguiente acápite.

OBLIGACIONES: Se imponen las siguientes obligaciones en el acto administrativo:

1. Construir obra consistente en: vertedero tipo Azud para captación lateral de un caudal no mayor a 233,0 l/s, y estructura de desarenador, en las condiciones técnicas que se muestran en los respectivos diseños presentados a la Corporación y que obran en el expediente 0741-036-015-006-2020. La construcción se permite en la coordenada N 3°45'31,1" – W 76°12'16,1", ubicada en la ronda hídrica del río Guabas, corregimiento de Cocuyos, jurisdicción del municipio de Ginebra

2. Presentar previo al inicio de las actividades de construcción un Plan de Gestión del Riesgo de Desastres, y un Plan de Contingencia y Emergencia en el que se aborden medidas para prevenir, corregir y/o mitigar los escenarios de riesgo por los eventos identificados: remoción en masa combinados con avenidas torrenciales.

3. Presentar previo al inicio de las actividades de construcción una propuesta técnica de manejo de posible socavación local generada por el cambio de flujo en el vertedero tipo Azud. La propuesta debe obedecer los lineamientos del Decreto 1076 de 2015. Por lo tanto, está debe ser suscrita por un profesional idóneo conforme indica el artículo 2.2.3.2.19.15; y contener la documentación en la forma estipulada en el artículo 2.2.3.2.19.8. Además, la propuesta deberá ser aprobada, previo al inicio de la obra, por la Autoridad Ambiental, tal como estipula el artículo 2.2.3.2.19.9. así:

   "Los planos acompañados de las memorias descriptivas y cálculos hidráulicos y estructurales serán presentados a la Autoridad Ambiental competente y una vez aprobados por ésta, tanto el original como los duplicados, con la constancia de la aprobación serán registrados en la forma prevista en el capítulo 4 del presente título"

4. Presentar previo al inicio de las actividades de construcción una propuesta técnica estructural que dé solución al problema de socavación general, estimado en más de 2 m de profundidad. La propuesta deberá estar sustentada en memorias descriptivas y cálculos estructurales, [illegible]

5. Presentar previo al inicio de las actividades de construcción el plan de obra señalando el método constructivo para la construcción del vertedero tipo Azud. En caso de requerir ataguía o desvió del flujo, el plan deberá señalar las medidas para evitar generar impactos sobre el río y las comunidades aguas abajo. En ningún caso se podrá desviar el flujo de forma que altere las condiciones ecosistémicas normales del río. Tampoco se podrá generar cambios en las condiciones hidrodinámicas afectando la estabilidad de las orillas o márgenes. El plan de obra debe contener el registro fotográfico previa intervención, y señalar las actividades para restablecer las condiciones actuales al término de la obra.

6. Presentar previo al inicio de las actividades de construcción el cronograma de obra de las estructuras permitidas por esta Autoridad Ambiental. Las actividades deben estar separadas en semanas.

7. Presentar previo al inicio de las actividades de construcción autorización escrita suficiente por parte de los propietarios que ejerzan el dominio real de los predios que serán intervenidos, a saber, con código catastral 76306000200000005012300000000 0 y 76306000200000005012400000000 0.

8. La responsabilidad por la estabilidad estructural y las condiciones de servicio de la obra recaerán sobre el diseñador de la estructura o el constructor, según lo determine un perito experto. En ningún caso se podrán generar condiciones de riesgo, daños, o perjuicios a terceros durante la construcción, mantenimiento, y/o la operación de la estructura.

9. Las personas que adelanten las labores de construcción deberán cumplir con las condiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo que establezca la norma. En el caso de realizar excavaciones, las paredes deberán ser entibadas, buscando siempre condiciones de seguridad.

10. Verificar previo y durante las intervenciones el debido cumplimiento en términos de calidad de todos los materiales de obra, así como su procedencia, la cual deberá contar con las autorizaciones, acreditaciones y/o permisos de las autoridades pertinentes. En ningún caso se podrá utilizar el material de arrastre o del lecho del río como suministro para actividades de obra. El cumplimiento de las disposiciones normativas ambientales corresponde al responsable del proyecto, para el caso el representante legal.

11. Disponer de forma adecuada, previo tratamiento, las aguas negras que se generen dentro del proyecto. Esta actividad se podrá realizar con la asistencia de una empresa especializada y debidamente acreditada en el manejo de aguas residuales de tipo doméstico, y la cual deberá contar con el respectivo permiso de vertimientos.

12. Acatar las obligaciones que se derivan del cumplimiento de la resolución 472 de 2017, en lo que respecta a la gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD), en especial lo que atañe al Capítulo IV, Obligaciones, el artículo 15, numeral 3:

"Los pequeños generadores tienen la obligación de entregar los RCD a un

En todo caso la Corporación tiene la potestad de solicitar en cualquier momento al responsable del proyecto las debidas constancias de las que habla el numeral 3, del artículo 16 de la mencionada resolución:

> *"Expedir constancia al generador que incluya la información contenida en el formato del Anexo II, que forma parte integral de la presente resolución.".*

13. El artículo 2do de la resolución 472 de 2017 establece en relación con las excavaciones:

> *"Residuos de Construcción y Demolición (RCD) (anteriormente conocidos como escombros): Son los residuos sólidos provenientes de las actividades de excavación, construcción, demolición, reparaciones o mejoras locativas de obras civiles o de otras actividades conexas, (...)."*
>
> (lo subrayado por fuera del texto original)

Por lo tanto, los residuos de la excavación, para la implantación de la cimentación y la construcción de las respectivas estructuras, y que no sean aprovechados, deberán disponerse en un sitio de disposición final de RCD debidamente acreditado.

14. Integrar en la nueva derivación un aparato de medición u otros elementos que permitan en cualquier momento conocer la cantidad de agua derivada, previo a la entrada en funcionamiento de la infraestructura. Esto debe realizarse en las condiciones previstas en el artículo 2.2.3.2.19.13 del Decreto 1076 de 2015, por lo cual, deben presentarse los planos de detalle de la estructura indicando la ubicación del sistema y sus especificaciones técnicas, previo al inicio de la etapa constructiva. Además, en el término de SEIS (6) meses debe presentarse la propuesta técnica para el sistema de medición del consumo, del que habla el mismo artículo señalado.

15. En el caso de requerir mejoramiento mecánico del suelo, deberá contar con materiales que provengan de una cantera acredita con los respectivos permisos, autorizaciones, licencias y/o registros que le avalen para realizar la explotación de dicho material.

16. Si durante la localización y replanteo, o en cualquier otra actividad que se adelante del proyecto, se prevea afectar el recurso forestal, deberá solicitarse los debidos permisos y/o autorizaciones de forma oportuna ante la Corporación.

17. Informar oportunamente a la CVC cualquier modificación a la programación o a las especificaciones constructivas del diseño presentado. En este caso se deberá justificar suficientemente los cambios y demostrar que dichos ajustes no generan perjuicios ambientales de ninguna índole.

18. Realizar todas las labores de intervención en el cauce del río Guabas, y autorizadas en este concepto técnico, en un término no mayor a un (1) año una vez notificado el respectivo acto administrativo.

19. Disponer las condiciones logísticas suficientes para permitir y facilitar la supervisión del cumplimiento de las obligaciones impuestas en el [illegible]

RESOLUCIÓN 0740 No. 0741 14366 DE 2025
(Noviembre 18 2025)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE PRORROGA UN PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE Y OBRAS HIDRÁULICAS EN EL PREDIO DENOMINADO PTAP, UBICADO EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE GINEBRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

Regional- Centro Sur de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC-, en virtud de sus facultades legales,

R E S U E L V E:

ARTÍCULO PRIMERO. PRORROGAR a ACUAVALLE S.A. E.S.P. identificada con NIT 890399032-8, el Permiso de Ocupación de Cauce y Obras Hidráulicas, autorizado mediante Resolución 0740 No 0742 0001430 de 9 de diciembre de 2021, en el predio denominado PTAP, ubicado en jurisdicción del municipio de Ginebra, departamento del Valle del Cauca.

PARÁGRAFO PRIMERO. Las obras o actividades deben ejecutarse en **UN (1) AÑO**, a partir de la ejecutoria de esta Resolución.
PARÁGRAFO SEGUNDO. Si el autorizado no hubiere terminado dichas obras o actividades, podrá solicitar una prórroga hasta por el mismo término otorgado, que deberá hacerse con una anterioridad de quince (15) días al vencimiento de la autorización.

ARTÍCULO SEGUNDO. CANCELACIÓN TARIFA SERVICIO DE SEGUIMIENTO: Conforme a la Resolución 0100 No.0700-0522 del 11 de Julio de 2018 en el Artículo 6, Parágrafo Segundo *"Para los permisos y autorizaciones con vigencia hasta de un (1) año, la tarifa por el servicio de seguimiento se liquidará con el valor del proyecto declarado por el peticionario en la solicitud, y el valor a cobrar se incluirá en el acto administrativo de otorgamiento del derecho ambiental o de la aprobación, certificación o establecimiento tratándose de otros instrumentos de control y manejo ambiental. El pago por el servicio de seguimiento deberá hacerse una vez ejecutoriado el acto administrativo de otorgamiento del derecho ambiental y demás instrumentos de control y manejo ambiental, para lo cual la Dirección Ambiental Regional remitirá al beneficiario la correspondiente factura dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de la ejecutoria"*

Por lo anterior ACUAVALLE S.A. E.S.P. identificada con NIT 890399032-8, representada legalmente por JORGE ENRIQUE SANCHEZ CERON identificado con cédula de ciudadanía No. 6319264 o quien haga sus veces, deberá PAGAR A FAVOR DE LA CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC, la suma de **SEISCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS PESOS MCTE ($611.826),** en los términos establecidos en la Resolución 0100-0700-0743 del 30 de enero de 2025 o norma que la sustituya o modifique, por concepto del servicio de seguimiento al Permiso de Ocupación de Cauce, en el predio denominado PTAP ubicado en jurisdicción del municipio de Ginebra, departamento del Valle del Cauca.

ARTÍCULO TERCERO 3. OBLIGACIONES, PROHIBICIONES, REQUERIMIENTOS Y SANCIONES A LAS QUE QUEDA SOMETIDO EL BENEFICIARIO SON LAS SIGUIENTES: El permisionario deberá cumplir con las siguientes obligaciones, prohibiciones, requerimientos y sanciones:

1. Construir obra consistente en: vertedero tipo Azud para captación lateral de un caudal no mayor a 233,0 l/s, y estructura de desarenador, en las condiciones técnicas que se muestran en los respectivos diseños presentados a la Corporación y que obran en el expediente 0741-036-015-006-2020. La construcción se permite en la coordenada N 3°45'24.1" W 76°12'16.1", ubicada en la ronda hídrica del río Guabas, corregimiento

medidas para prevenir, corregir y/o mitigar los escenarios de riesgo por los eventos identificados: remoción en masa combinados con avenidas torrenciales.

3. Presentar previo al inicio de las actividades de construcción una propuesta técnica de manejo de posible socavación local generada por el cambio de flujo en el vertedero tipo Azud. La propuesta debe obedecer los lineamientos del Decreto 1076 de 2015. Por lo tanto, está debe ser suscrita por un profesional idóneo conforme indica el artículo 2.2.3.2.19.15; y contener la documentación en la forma estipulada en el artículo 2.2.3.2.19.8. Además, la propuesta deberá ser aprobada, previo al inicio de la obra, por la Autoridad Ambiental, tal como estipula el artículo 2.2.3.2.19.9. así:

   "Los planos acompañados de las memorias descriptivas y cálculos hidráulicos y estructurales serán presentados a la Autoridad Ambiental competente y una vez aprobados por ésta, tanto el original como los duplicados, con la constancia de la aprobación serán registrados en la forma prevista en el capítulo 4 del presente título"

4. Presentar previo al inicio de las actividades de construcción una propuesta técnica estructural que dé solución al problema de socavación general, estimado en más de 2 m de profundidad. La propuesta deberá estar sustentada en memorias descriptivas y cálculos estructurales, y presentarse con planos constructivos; tal como indica el artículo 2.2.3.2.19.7. del Decreto 1076 de 2015. También debe ser avalada por un ingeniero idóneo, como señala el artículo 2.2.3.2.19.15. Se debe cumplir con lo estipulado en el inciso H.1.1.2.1 del título H de la Norma Sismo Resistencia Colombiana (NSR-10). La propuesta deberá ser aprobada por esta Autoridad Ambiental previo al inicio de la obra como indica el artículo 2.2.3.2.19.9.
5. Presentar previo al inicio de las actividades de construcción el plan de obra señalando el método constructivo para la construcción del vertedero tipo Azud. En caso de requerir ataguía o desvió del flujo, el plan deberá señalar las medidas para evitar generar impactos sobre el rio y las comunidades aguas abajo. En ningún caso se podrá desviar el flujo de forma que altere las condiciones ecosistémicas normales del río. Tampoco se podrá generar cambios en las condiciones hidrodinámicas afectando la estabilidad de las orillas o márgenes. El plan de obra debe contener el registro fotográfico previa intervención, y señalar las actividades para restablecer las condiciones actuales al término de la obra.
6. Presentar previo al inicio de las actividades de construcción el cronograma de obra de las estructuras permitidas por esta Autoridad Ambiental. Las actividades deben estar separadas en semanas.
7. Presentar previo al inicio de las actividades de construcción autorización escrita suficiente por parte de los propietarios que ejerzan el dominio real de los predios que serán intervenidos, a saber, con código catastral 76306000200000005012300000000 y 76306000200000005012400000000.
8. La responsabilidad por la estabilidad estructural y las condiciones de servicio de la obra recaerán sobre el diseñador de la estructura o el constructor, según lo determine un perito experto. En ningún caso se podrán generar condiciones de riesgo, daños, o perjuicios a terceros durante la construcción, mantenimiento, y/o la operación de la estructura.
9. Las personas que adelanten las labores de construcción deberán cumplir con las condiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo

como suministro para actividades de obra. El cumplimiento de las disposiciones normativas ambientales corresponde al responsable del proyecto, para el caso el representante legal.

11. Disponer de forma adecuada, previo tratamiento, las aguas negras que se generen dentro del proyecto. Esta actividad se podrá realizar con la asistencia de una empresa especializada y debidamente acreditada en el manejo de aguas residuales de tipo doméstico, y la cual deberá contar con el respectivo permiso de vertimientos.
12. Acatar las obligaciones que se derivan del cumplimiento de la resolución 472 de 2017, en lo que respecta a la gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD), en especial lo que atañe al Capítulo IV, Obligaciones, el artículo 15, numeral 3:

    "Los pequeños generadores tienen la obligación de entregar los RCD a un gestor de RCD para que se realicen las actividades de recolección y transporte hasta los puntos limpios, sitios de aprovechamiento o disposición final según sea el caso."

    En todo caso la Corporación tiene la potestad de solicitar en cualquier momento al responsable del proyecto las debidas constancias de las que habla el numeral 3, del artículo 16 de la mencionada resolución:

    "Expedir constancia al generador que incluya la información contenida en el formato del Anexo II, que forma parte integral de la presente resolución."
13. El artículo 2do de la resolución 472 de 2017 establece en relación con las excavaciones:

    "Residuos de Construcción y Demolición (RCD) (anteriormente conocidos como escombros): Son los residuos sólidos provenientes de las actividades de excavación, construcción, demolición, reparaciones o mejoras locativas de obras civiles o de otras actividades conexas, (...)."

    Por lo tanto, los residuos de la excavación, para la implantación de la cimentación y la construcción de las respectivas estructuras, y que no sean aprovechados, deberán disponerse en un sitio de disposición final de RCD debidamente acreditado.
14. Integrar en la nueva derivación un aparato de medición u otros elementos que permitan en cualquier momento conocer la cantidad de agua derivada, previo a la entrada en funcionamiento de la infraestructura. Esto debe realizarse en las condiciones previstas en el artículo 2.2.3.2.19.13 del Decreto 1076 de 2015, por lo cual, deben presentarse los planos de detalle de la estructura indicando la ubicación del sistema y sus especificaciones técnicas, previo al inicio de la etapa constructiva. Además, en el término de SEIS (6) meses debe presentarse la propuesta técnica para el sistema de medición del consumo, del que habla el mismo artículo señalado.
15. En el caso de requerir mejoramiento mecánico del suelo, deberá contar con materiales que provengan de una cantera acredita con los respectivos permisos, autorizaciones, licencias y/o registros que le avalen para realizar la explotación de dicho material.
16. Si durante la localización y replanteo, o en cualquier otra actividad que se adelante del proyecto, se prevea afectar el recurso forestal, deberá solicitarse los debidos permisos y/o autorizaciones de forma oportuna ante la Corporación.
17. Informar oportunamente a la CVC cualquier modificación a la programación o a las especificaciones constructivas del diseño presentado. En este caso se deberá justificar suficientemente los cambios y demostrar que dichos ajustes no generan perjuicios ambientales de ninguna índole.
18. Realizar todas las labores de intervención en el cauce del río Guabas, y autorizadas en este concepto técnico, en un término no mayor a un (1) año una vez notificado el

RESOLUCIÓN 0740 No. 0741 14366 DE 2025
(Noviembre 18 2025)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE PRORROGA UN PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE Y OBRAS HIDRÁULICAS EN EL PREDIO DENOMINADO PTAP, UBICADO EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE GINEBRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

ARTÍCULO CUARTO. El incumplimiento de las obligaciones impuestas en la presente Resolución, dará lugar a la imposición de las medidas establecidas en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, modificada por la Ley 2387 del 25 de julio de 2024.

ARTÍCULO QUINTO. PUBLICACIÓN. El encabezamiento y la parte resolutiva de esta Resolución, deberá publicarse en el Boletín de Actos Administrativos de la corporación, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 71 de la Ley 99 de 1993. Artículo 2.2.3.2.9 10 del Decreto Reglamentario 1076 del 26 de mayo de 2015 (que corresponde al artículo 63 del Decreto 1541 de 1978).

ARTÍCULO SEXTO. NOTIFÍQUESE el contenido de la presente Resolución a ACUAVALLE S.A. E.S.P. NIT 890399032-8, representada legalmente por JORGE ENRIQUE SANCHEZ CERON CC. No. 6319264 o quien haga sus veces de conformidad a lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO SÉPTIMO. RECURSOS. Contra la presente Resolución procede por la vía administrativa el recurso de reposición y subsidiario el de apelación, del cual deberá hacerse uso dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o por aviso, si hubiere lugar a este medio de notificación. Artículo 76 de la Ley 1437 del 18 de enero de 2011.

Dada en Guadalajara de Buga, a los dieciocho (18) días del mes de noviembre del año dos mil veinticinco (2025).

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

LUZ MERY GUTIÉRREZ CORREA
Directora Territorial
DAR Centro Sur

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA

Dirección Técnica Ambiental

Grupo Recursos Hídricos - Red de Monitoreo

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

ESTACIÓN:	COSTA RICA	SISTEMA COORD:	Origen unico
CÓDIGO:	2632010307	COORD. ESTE:	4641203.18
CUENCA:	Zabaletas	COORD. NORTE:	1973591.97
DEPARTAMENTO:	Valle del cauca	ALTURA:	1192
MUNICIPIO:	Ginebra	CATEGORÍA:	Pluviográfica
CORREGIMIENTO:	El Jardin	ENTIDAD:	CVC
		FECHA INICIO:	01/03/1975

Precipitación CANTIDAD DE DÍAS LLUVIA MENSUAL (mm)

AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
2026	23	25	21	9<	16	9<	***<	***<	***<	***<	***<	***<	103<
MÁXIMA	23	25	21	9<	16	9<							103<
PROMEDIO	23	25	21	9<	16	9<							103.0<
MÍNIMA	23	25	21	9<	16	9<							103.0<

***< = No Hay Dato

< = Dato Incompleto

Vacio = No Aplica Dato

CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE

CUADRO DE LLUVIAS - CONTRATO DE OBRA No. 2000.13.05.003- 2022

EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA"

ENERO DE 2026

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.

Hora / Fecha	DIA	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	TOTAL lluvia	TOTAL Tiempo perdido por lluvia	V/B DE INTERVENTORIA	OBSERVACIONES
1-Jan	Jueves																									-	-		
2-Jan	Viernes																									-	-		
3-Jan	Sábado																									-	-		
4-Jan	Domingo																									-	-		
5-Jan	Lunes															X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5.5	5.5		
6-Jan	Martes																X	X	X	X	X	X	X	X	X	4.0	4.0		
7-Jan	Miércoles																									-	-		
8-Jan	Jueves														X	X	X	X	X	X	X	X				4.0	4.0		
9-Jan	Viernes																X	X	X	X	X	X	X	X	X	4.0	4.0		
10-Jan	Sábado																									-	-		
11-Jan	Domingo																									-	-		
12-Jan	Lunes																									-	-		
13-Jan	Martes																		X	X	X	X	X	X	X	2.5	2.5		
14-Jan	Miércoles																	X	X	X	X	X	X	X	X	3.5	3.5		
15-Jan	Jueves																									-	-		
16-Jan	Viernes																									-	-		
17-Jan	Sábado																									-	-		
18-Jan	Domingo																									-	-		
19-Jan	Lunes																									-	-		
20-Jan	Martes																		X	X	X	X	X	X	X	2.5	2.5		
21-Jan	Miércoles																									-	-		
22-Jan	Jueves							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				9.0	9.0		
23-Jan	Viernes																									-	-		
24-Jan	Sábado																									-	-		
25-Jan	Domingo																									-	-		
26-Jan	Lunes																									-	-		
27-Jan	Martes												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	8.0	8.0		
28-Jan	Miércoles																									-	-		
29-Jan	Jueves																									-	-		
30-Jan	Viernes																									-	-		
31-Jan	Sábado																									-	-		
TOTAL																										43.0	43.0		

TOTAL	43.0	
DIAS PERDIDOS	5.4	

Convensiones

- Luz de dia
- Noche
- X Tiempo de lluvia
- Y Tiempo perdido despues de lluvia

CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE

CUADRO DE LLUVIAS - CONTRATO DE OBRA No. 2000.13.05.003- 2022

EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA"

FEBRERO DE 2026

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A E.S.P

Hora / Fecha	DIA	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	TOTAL lluvia	TOTAL Tiempo perdido por lluvia	V/B DE INTERVENTORIA	OBSERVACIONES
1-Feb	Domingo																									-	-		
2-Feb	Lunes																									-	-		
3-Feb	Martes																									-	-		
4-Feb	Miércoles																									-	-		
5-Feb	Jueves																									-	-		
6-Feb	Viernes															X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4.5	4.5		
7-Feb	Sábado																X	X	X	X	X	X	X	X	X	3.5	3.5		
8-Feb	Domingo																									-	-		
9-Feb	Lunes															X	X			X	X	X	X	X	X	3.5	3.5		
10-Feb	Martes																X	X	X	X	X	X	X	X	X	3.5	3.5		
11-Feb	Miércoles															X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5.0	5.0		
12-Feb	Jueves																									-	-		
13-Feb	Viernes																									-	-		
14-Feb	Sábado													X	X	X	X	X	X							3.0	3.0		
15-Feb	Domingo																									-	-		
16-Feb	Lunes																X	X	X	X	X	X	X	X		4.0	4.0		
17-Feb	Martes															X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5.0	5.0		
18-Feb	Miércoles					X	X	X	X	X	X	X	X	X												2.0	2.0		
19-Feb	Jueves																									-	-		
20-Feb	Viernes																									-	-		
21-Feb	Sábado																									-	-		
22-Feb	Domingo																									-	-		
23-Feb	Lunes					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											3.5	3.5		
24-Feb	Martes									X	X	X		X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	6.5	6.5		
25-Feb	Miércoles																									-	-		
26-Feb	Jueves																									-	-		
27-Feb	Viernes																									-	-		
28-Feb	Sábado																									-	-		
																										-	-		
																										-	-		
																										-	-		
TOTAL																										44.0	44.0		

TOTAL	44.0
DIAS PERDIDOS	5.5

Convensiones

- Luz de dia
- Noche
- X Tiempo de lluvia
- Y Tiempo perdido despues de lluvia

CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE

CUADRO DE LLUVIAS - CONTRATO DE OBRA No. 2000.13.05.003- 2022

EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA"

MAYO DE 2026

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.

Hora / Fecha	DIA	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	TOTAL lluvia	TOTAL Tiempo perdido por lluvia	V/B DE INTERVENTORIA	OBSERVACIONES
1-May	Viernes																									-	-		
2-May	Sábado							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									4.5	4.5		
3-May	Domingo																									-	-		
4-May	Lunes																									-	-		
5-May	Martes									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							5.5	5.5		
6-May	Miércoles																									-	-		
7-May	Jueves																									-	-		
8-May	Viernes																									-	-		
9-May	Sábado																									-	-		
10-May	Domingo																									-	-		
11-May	Lunes																									-	-		
12-May	Martes																									-	-		
13-May	Miércoles																									-	-		
14-May	Jueves																									-	-		
15-May	Viernes																									-	-		
16-May	Sábado																									-	-		
17-May	Domingo																									-	-		
18-May	Lunes																									-	-		
19-May	Martes															X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5.5	5.5		
20-May	Miércoles																X	X	X	X	X	X	X	X	X	4.0	4.0		
21-May	Jueves																									-	-		
22-May	Viernes																									-	-		
23-May	Sábado																									-	-		
24-May	Domingo																									-	-		
25-May	Lunes																									-	-		
26-May	Martes																									-	-		
27-May	Miércoles																									-	-		
28-May	Jueves																									-	-		
29-May	Viernes																									-	-		
30-May	Sábado																									-	-		
31-May	Domingo																									-	-		
TOTAL																										19.5	19.5		

TOTAL	19.5	

DIAS PERDIDOS	2.4	

Convensiones

- Luz de dia
- Noche
- X Tiempo de lluvia
- Y Tiempo perdido despues de lluvia

GOBERNACIÓN Departamento del Valle del Cauca | paraíso de todos | VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. | PDA VALLE DEL CAUCA

Al contestar por favor cite estos datos
Santiago de Cali D.E, julio 2 de 2026
Rad. Padre: VA.1000.07.02.00816-2026
TRD: VA.3000.07.01.00463-2025

Ingeniero
MOISES CEPEDA RESTREPO
Gerente
Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.
Santiago de Cali.

Referencia: Contrato de Obra N°. 2000-13-05-003-2022, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA".

Asunto: Solicitud de Prórroga N°. 04 al Plazo del Contrato N°. 2000-13-05-003-2022.

Con base en el oficio CRYPV-COP200013.05.003-2022-Cons 289-2026, del 25 de junio del 2026, enviado por el representante legal del "CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE", mediante el cual expone las diferentes dificultades que se han tenido que sortear en la realización del proyecto, las cuales son aceptadas por la interventoría "CONSORCIO INTERGUCARÍ", mediante oficio CI-0159-2026, de junio 29 de 2026, de las cuales se relacionan las más destacadas.

FUNDAMENTOS DE LA PRORROGA:

1.- Restricciones operativas para la optimización de la PTAP de Guacarí.
Durante el proceso de optimización de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) de Guacarí, ha sido necesario que todas las actividades sean previamente programadas y autorizadas por el operador del sistema, Acuavalle S.A. E.S.P., con el fin de garantizar la continuidad del servicio y evitar afectaciones en el suministro de agua potable a la población.

Adicionalmente, de los tres filtros que conforman la Batería A, solamente ha sido liberado uno para su intervención, situación que impide la ejecución simultánea de las actividades debido a las restricciones operativas de la planta y a la necesidad de mantener su capacidad de tratamiento y continuidad en la prestación del servicio.

Cabe señalar que el proceso de optimización de cada filtro requiere aproximadamente dos (2) meses para su ejecución, incluyendo actividades de intervención, adecuación, pruebas de funcionamiento y puesta en operación. En consecuencia, la liberación gradual de los filtros por parte del operador ha generado una extensión significativa en los tiempos de ejecución inicialmente previstos.

2.- Condiciones geológicas imprevistas en el Tramo 1 de la línea de conducción.

Durante la ejecución de las actividades correspondientes al Tramo 1 de la línea de conducción en tubería PEAD de 18", se han presentado condiciones geotécnicas diferentes a las inicialmente previstas, evidenciándose la presencia de formaciones rocosas y sectores de peña a lo largo del trazado.

Estas condiciones han generado afectaciones significativas en el desarrollo de las excavaciones requeridas para la instalación de la tubería, incrementando tanto los costos de ejecución como los tiempos necesarios para el cumplimiento de las actividades programadas. Adicionalmente, los rendimientos de excavación han sido considerablemente inferiores a los estimados inicialmente, debido a la dificultad para alcanzar las profundidades de instalación definidas en los diseños, las cuales son necesarias para garantizar la estabilidad y correcto funcionamiento de la línea de conducción.

3.- Demora en la expedición del permiso de ocupación de cauce para la bocatoma

La demora en la expedición del permiso de ocupación de cauce para la bocatoma por parte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), entidad que a la fecha no ha emitido una respuesta definitiva que permita continuar con el trámite correspondiente y efectuar el pago de la visita técnica y del respectivo permiso.
Se debe precisar que este permiso debió ser solicitado nuevamente debido a una modificación del diseño inicial, originada por la optimización de las estructuras de cimentación y del diseño estructural del proyecto. Así, con ocasión de estos ajustes, la ubicación inicialmente prevista para la construcción de la bocatoma fue reubicada aproximadamente 15 metros aguas arriba sobre el cauce del río Guabas.

4.- Permisos de ocupación de cauce para viaductos.

De igual forma, se encuentran en trámite ante la CVC los permisos de ocupación de cauce requeridos para la construcción de los tres pasos aéreos de la línea de conducción (viaductos), los cuales constituyen un requisito indispensable para la obtención de los permisos de intervención de espacio público ante las administraciones municipales correspondientes.

Los permisos pendientes corresponden a:
Permiso de ocupación de cauce – Puente Rojo.
Permiso de ocupación de cauce – Puente Amarillo.
Permiso de ocupación de cauce – Puente La Magdalena.

A la fecha, estos trámites continúan pendientes de aprobación por parte de la autoridad ambiental.

5.- Conflicto social en el Tramo 2 de la línea de conducción.

El 20 de noviembre de 2025, durante el inicio de las actividades de instalación de tubería PEAD de 10 pulgadas en el sector El Alto, correspondiente al Tramo 2 de la línea de conducción (entre Puente Rojo y el callejón de acceso a la Planta de Tratamiento de Agua Potable del municipio de Ginebra), miembros de la comunidad de Puente Rojo, líderes comunitarios y representantes del Cañón del Río Guabas se presentaron en el sitio de las obras solicitando la suspensión de actividades.

La comunidad manifestó su inconformidad con la intervención de pavimentos y placas huella existentes, así como con presuntos compromisos adquiridos previamente por Vallecaucana de Aguas relacionados con la modificación del trazado de la tubería.

Posteriormente, el 20 de enero de 2026 se intentó reanudar las actividades; sin embargo, nuevamente la comunidad se opuso a su ejecución y solicitó la suspensión de las obras hasta tanto hicieran presencia la Administración Municipal y la Gobernación del Valle del Cauca.

A la fecha, este tramo de la línea de conducción no ha podido ser ejecutado, situación que ha generado retrasos significativos y sobrecostos asociados a la movilización, desmovilización y permanencia de maquinaria, equipos y personal.

6.- Conflicto social en el Tramo 1 de la línea de conducción.

Situación similar se presenta en el Tramo 1 de la línea de conducción, específicamente en el sector de Regaderos, entre la Batea Bananos y Puente Amarillo (Puente Papas).

Desde el 6 de mayo de 2026, miembros de la comunidad opositora al proyecto, líderes comunitarios y representantes del Cañón del Río Guabas han solicitado la suspensión de actividades, argumentando afectaciones sobre la infraestructura vial existente y el presunto incumplimiento de compromisos por parte de Vallecaucana de Aguas y de la Gobernación del Valle del Cauca.

La comunidad ha condicionado la reanudación de las obras a la realización de reuniones y acuerdos con las autoridades competentes. Como consecuencia, este tramo tampoco ha podido ejecutarse, generando retrasos.

7.- Optimización del diseño de la bocatoma y reformulación del proyecto.

Actualmente se encuentra en proceso de revisión la optimización del diseño de la bocatoma, dado las condiciones geomorfológicas donde se había planteado inicialmente.

Paralelamente, se adelanta un balance técnico, financiero y contractual, con el propósito de revisar las condiciones económicas actuales del contrato.

8.- Trámite de servidumbres y afectaciones prediales.

Como consecuencia de los rediseños efectuados para los viaductos y de las condiciones encontradas en campo, se requiere adelantar la legalización de servidumbres necesarias para la construcción de los viaductos de Puente Amarillo, Puente Rojo y Puente La Magdalena.

Así mismo, la presencia de ocupantes no autorizados en las áreas previstas para la construcción de la bocatoma, del Viaducto de la Magdalena y del viaducto de Puente Rojo constituye una afectación directa para la ejecución de estas estructuras.

Adicionalmente, se presenta una restricción para la construcción de un tramo de la línea de conducción ubicado a la salida de la bocatoma, debido a que el propietario de un predio colindante no autoriza el ingreso por la parte posterior de su propiedad, limitando el desarrollo de las actividades constructivas programadas (Predio Danilo Bermúdez).

9.- Afectaciones por condiciones climáticas.

Durante el periodo de ejecución del contrato se registraron eventos de precipitación que afectaron significativamente el desarrollo de las actividades programadas en los diferentes frentes de obra.

El impacto generado no se limita al tiempo de ocurrencia de las lluvias, sino también al período requerido para la recuperación de las condiciones de estabilidad, transitabilidad y seguridad de los terrenos intervenidos, lo cual ha impedido la reanudación inmediata de las labores.

Como soporte de esta situación, se anexan los formatos de seguimiento climático correspondientes a los últimos cinco (5) meses, en los cuales se registran 17,3 días de afectación directa por lluvias, sin considerar las horas adicionales requeridas para la recuperación de las condiciones de trabajo posteriores a cada evento.

Con base a lo planteado por el Consorcio Redes y PTAPs Valle, y la corroboración de la interventoría "Interguacarí" la supervisión de Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P, conceptúa que para la terminación de las actividades contractuales se requiere una prórroga al plazo de ejecución de seis (06) meses.

La nueva fecha para la terminación del contrato de obra N°.2000-13-05-003-2022, a partir el 22 de Julio de 2026 hasta el 22 de enero de 2027, según programa de obra.

Adjunto: Oficio CRYPV-COP2000.13.05.003-2022-Cons289-2026 CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE
Cronograma de obra.
Oficio CI-0159-2026, de junio 29 de 2026 "Consorcio Interguacarí"

Atentamente,

DIEGO JOSÉ CALDERÓN VILLANUEVA
Director Técnico
Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.

Elaboró: Holmes Zúñiga García - Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.
Revisó: **Diego José Calderón Villanueva** – Director Técnico de Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.
