
17. ESTRUCTURA GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA EMPRESA

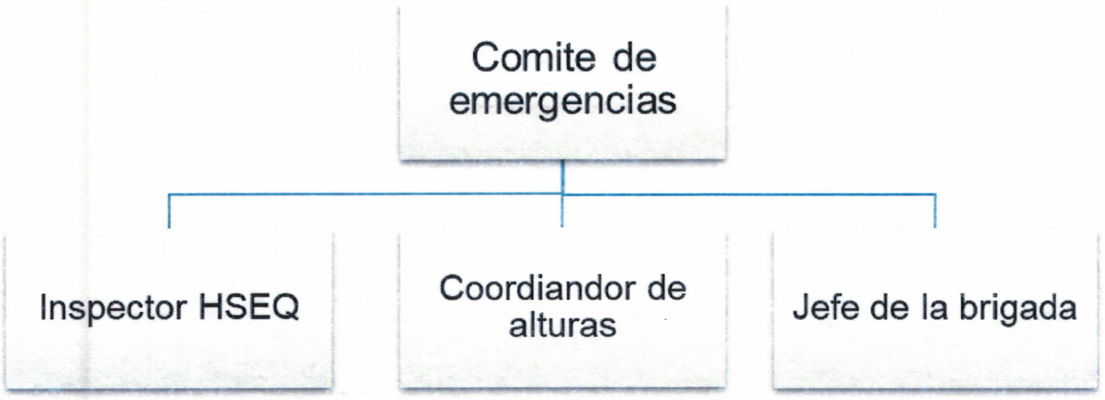

18. VERIFICACIÓN

18.1. Inspecciones

18.2. Inspecciones planeadas

Son las puntuales para trabajos de alto riesgo y son realizadas según procedimiento de inspecciones con la lista de verificación para trabajos en alturas. La lista se aplica y se suspende la actividad quien no cumpla uno de los ítems. Se volverá a aplicar una vez se tengan los correctivos para poder iniciar los trabajos.

18.3. Inspecciones no planeadas

Inspección Rutinaria: Aquella que es realizada dentro de las actividades diarias sin planeación o periodicidad definida, se documenta en la bitácora.

Para las inspecciones rutinarias de debe consignar las condiciones encontradas en la Bitácora de seguridad de cada cuadrilla, suspendiendo la actividad inmediatamente hasta tanto no se reali- cen las mejoras y se verifiquen con la lista de verificación para trabajo en alturas debe estar firmado por el ingeniero y/o el maestro o encargado de cuadrilla.

Realizadas diariamente para aplicar la lista de verificación de trabajos en alturas por salud ocupacional aplicando las listas de verificación para trabajos en alturas y suspendiendo la actividad que no cumpla uno de los ítems. Se volverá a aplicar una vez se tengan los correctivos para poder iniciar los trabajos.

CONSORCIO NAVAL W26	**PROGRAMA DE PROTECCION CONTRA CAIDAS EN ALTURAS**

CONSORCIO NAVAL W26	CONSORCIO W 26	REGISTRO ENTREGA Y CAMBIOS DE DOCUMENTOS			VERSIÓN 1
					Vigente desde:
DOCUMENTO:	PROCEDIMIENTO PARA BANCO DE DUCTOS				
FECHA DE MODIFICACIÓN	VERSIÓN CAMBIADA	CONTROL DE CAMBIOS REALIZADOS	VERSIÓN ACTUAL	RECIBIDO POR:	MEDIO:
Abril 2026		Emisión inicial	1		

Reviso y Aprobó	**VoBo**
Karen Lisseth Salamanca Rojas Directora HSEQ Coordinadora de alturas	Wilver Franciny Russy Ladino Representante Legal

CONSORCIO	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TRABAJAR EN ANDAMIOS	FECHA APROBACION 20/04/2026
		VERSION: 1

Fecha: Mayo. Tipo Andamio: Multidirect Altura del Andamio: 7 mts. Permiso Trabajo No. _____ Andamio No. 4 Piso 1.

Proyecto: ENAP Aulas Sixteen 5

DESCRIPCION	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Todos los empleados que trabajan como parte del equipo han sidos capacitados en sus responsabilidades individuales del trabajo asi como en los riesgos asociados al trabajo en andamios?				✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	
Se ha realizado una identificación y evaluación de riesgos?				✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	
Los elementos estructurales del andamio estan completos y se encuentran en buen estado?				✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	
nivelada? El andamio se encuentra nivelado (Verificar horizontalidad y verticalidad de los elementos)				✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	
No existen líneas eléctricas a por lo menos 3 mts de distancia del andamio?				✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	
Estan las ruedas dentro del marco de la torre. Esta habilitado el sistema de bloqueo de las ruedas?				✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	
Para andamios de dos o mas cuerpos. Estan los templetes o vientos y conectores funcionando correctamente y asegurados a una estructura fija? Para andamios convencionales se deben realizar amarres				✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	
centimetros de ancho? El espacio entre tablones no sobrepasa los 2,5 cm?				✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	
¿Está la plataforma o los tablones o plataforma libres de partiduras, astillados o cualquier defecto que disminuya su resistencia estructural?				✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	
¿Están los tablones amarrados cada uno en sus extremos con alambre o manila?				✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	
Cada tablon sobrepasa su soporte por una longitud no menor de 15 ni mayor de 30 cm				✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	
¿Las plataformas del andamio se encuentran libres de residuos, despuntes, materiales, etc?				✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	
¿Es el espacio entre el guarda pie y la baranda protectora 765 milimetros (30 pulgadas) o menos?				✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	
¿Las secciones de los andamios estan aseguradas entre si?				✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	
¿Están los conectores y pines de los andamios en buenas condiciones?				✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	
demarcado con cinta y con avisos para prevenir al personal del riesgo de objetos que caen?				✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	
¿Si se requiere de sistema de protección contra caidas, esta disponible un punto de anclaje independiente?				✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	
¿El andamio esta libre de conexiones de lineas a tierra de los equipos de soldadura y esta libre de cilindros amarrados a la estructura?				✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	
Se instala la tarjeta VERDE en un lugar visible?				✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	

Nomenclatura: √: Cumple X: No cumple, El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.
NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspeccion tecnica, favor reportar inmediatamente a mantenimiento para su devolución.

INSPECCIONADO POR:

1 →	6 Alfredo	16 Alfredo	21 Alfredo.	26 Alfredo	31 →
2 →	7 Alfredo	17 →	22 Alfredo	27 Alfredo	
3 →	8 Alfredo	18 →	23 Alfredo	28 Alfredo	
4 Alfredo	9 Alfredo	19 Alfredo	24 →	29 Alfredo	
5 Alfredo	10 →	20 Alfredo	25 Alfredo.	30 Alfredo.	

Observaciones derivadas de las inspecciones

Powered by CamScanner

Piso 1

CONSORCIO	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TRABAJAR EN ANDAMIOS	FECHA APROBACION 20/04/2026
		VERSION: 1

Fecha: Mayo. Tipo Andamio: Multidireccional. Altura del Andamio: 6mts Permiso Trabajo No. #1 Andamio No. 2.

Proyecto: ENAP Autos Sostenibles.

DESCRIPCION	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Todos los empleados que trabajan como parte del equipo han sido capacitados en sus responsabilidades individuales del trabajo así como en los riesgos asociados al trabajo en andamios?				✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Se ha realizado una identificación y evaluación de riesgos?				✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Los elementos estructurales del andamio estan completos y se encuentran en buen estado?				✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
[illegible] nivelada? El andamio se encuentra nivelado (Verificar horizontalidad y verticalidad de los elementos)				✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
No existen líneas eléctricas a por lo menos 3 mts de distancia del andamio?				✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Estan las ruedas dentro del marco de la torre. Esta habilitado el sistema de bloqueo de las ruedas?				✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Para andamios de dos o más cuerpos. Están los templetes o vientos y conectores funcionando correctamente y asegurados a una estructura fija? Para andamios convencionales se deben realizar amarres				✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
centímetros de ancho? El espacio entre tablones no sobrepasa los 2,5 cm?				✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿Está la plataforma o los tablones o plataforma libres de partiduras, astillados o cualquier defecto que disminuya su resistencia estructural?				✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿Están los tablones amarrados cada uno en sus extremos con alambre o manila?				✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Cada tablon sobrepasa su soporte por una longitud no menor de 15 ni mayor de 30 cm				✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿Las plataformas del andamio se encuentran libres de residuos, desputes, materiales, etc?				✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿Es el espacio entre el guarda pie y la baranda protectora 765 milimetros (30 pulgadas) o menos?				✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿Las secciones de los andamios estan aseguradas entre si?				✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿Están los conectores y pines de los andamios en buenas condiciones?				✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
[illegible] demarcado con cinta y con avisos para prevenir al personal del riesgo de objetos que caen?				✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿Si se requiere de sistema de protección contra caídas, esta disponible un punto de anclaje independiente?				✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿El andamio esta libre de conexiones de lineas a tierra de los equipos de soldadura y esta libre de cilindros amarrados a la estructura?				✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Se instala la tarjeta VERDE en un lugar visible?				✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Nomenclatura: √: Cumple X: No cumple, El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspeccion tecnica, favor reportar inmediatamente a mantenimiento para su devolución.

INSPECCIONADO POR:

1	[illegible]	6	[illegible]	11		16	Alfredo	21	Alfredo
2	[illegible]	7	[illegible]	12		17	[illegible]	22	Alfredo
3	[illegible]	8	[illegible]	13		18	[illegible]	23	Alfredo
4	Alfredo	9	[illegible]	14	[illegible]	19	Alfredo	24	[illegible]
5	Alfredo	10	[illegible]	15	[illegible]	20	Alfredo	25	Alfredo

26	Alfredo	31	[illegible]						
27	Alfredo								
28	Alfredo								
29	Alfredo								
30	Alfredo								

Observaciones derivadas de las inspecciones

Powered by CamScanner

Piso 1.

CONSORCIO	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TRABAJAR EN ANDAMIOS	FECHA APROBACION 20/04/2026
		VERSION: 1

Fecha: Mayo. Tipo Andamio: Multidireccional. Altura del Andamio: 6mts Permiso Trabajo No. #2 Andamio No. 1

Proyecto: ENAP Aulas Sextantis

DESCRIPCION	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Todos los empleados que trabajan como parte del equipo han sides capacitados en sus responsabilidades individuales del trabajo así como en los riesgos asociados al trabajo en andamios?				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Se ha realizado una identificación y evaluación de riesgos?				✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Los elementos estructurales del andamio estan completos y se encuentran en buen estado?				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
nivelada? El andamio se encuentra nivelado (Verificar horizontalidad y verticalidad de los elementos)				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
No existen líneas eléctricas a por lo menos 3 mts de distancia del andamio?				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Estan las ruedas dentro del marco de la torre. Esta habilitado el sistema de bloqueo de las ruedas?				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Para andamios de dos o mas cuerpos, estan los templetes o vientos y conectores funcionando correctamente y asegurados a una estructura fija? Para andamios convencionales se deben realizar amarres				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
centimetros de ancho? El espacio entre tablones no sobrepasa los 2,5 cm?				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿Está la plataforma o los tablones o plataforma libres de partiduras, astillados o cualquier defecto que disminuya su resistencia estructural?				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿Están los tablones amarrados cada uno en sus extremos con alambre o manila?				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Cada tablon sobrepasa su soporte por una longitud no menor de 15 ni mayor de 30 cm				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿Las plataformas del andamio se encuentran libres de residuos, despuntes, materiales, etc?				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿Es el espacio entre el guarda pie y la baranda protectora 765 milímetros (30 pulgadas) o menos?				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿Las secciones de los andamios estan aseguradas entre si?				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿Estan los conectores y pines de los andamios en buenas condiciones?				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
demarcado con cinta y con avisos para prevenir al personal del riesgo de objetos que caen?				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿Si se requiere de sistema de protección contra caídas, esta disponible un punto de anclaje independiente?				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿El andamio esta libre de conexiones de líneas a tierra de los equipos de soldadura y esta libre de cilindros amarrados a la estructura?				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Se instala la tarjeta VERDE en un lugar visible?				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Nomenclatura: √: Cumple X: No cumple, El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.
NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspeccion tecnica, favor reportar inmediatamente a mantenimiento para su devolución.

INSPECCIONADO POR:

1 ———	6 Alfredo	11 Alfredo	16 Alfredo.	21 X Alfredo	26 Alfredo
2 ———	7 Alfredo	12 Alfredo	17 ———	22 Alfredo	27 X Alfredo
3 ———	8 Alfredo	13 Alfredo	18 ———	23 Alfredo	28 Alfredo
4 X Alfredo	9 Alfredo	14 ———	19 Alfredo	24 ———	29 Alfredo
5 X Alfredo	10 ———	15 ———	20 Alfredo	25 Alfredo.	30 Alfredo

Observaciones derivadas de las inspecciones					

Powered by CamScanner

CONSORCIO	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TRABAJAR EN ANDAMIOS	FECHA APROBACION 20/04/2026
		VERSION: 1

Fecha: Mayo. Tipo Andamio: Multi Altura del Andamio: 6mts. Permiso Trabajo No. _____ Andamio No. #4. Piso 2

Proyecto: ENAP Refus Sostenibles.

DESCRIPCION	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Todos los empleados que trabajan como parte del equipo han sidos capacitados en sus responsabilidades individuales del trabajo así como en los riesgos asociados al trabajo en andamios?																										✓	✓	✓	✓	✓	
Se ha realizado una identificación y evaluación de riesgos?																										✓	✓	✓	✓	✓	
Los elementos estructurales del andamio estan completos y se encuentran en buen estado?																										✓	✓	✓	✓	✓	
nivelada? El andamio se encuentra nivelado (Verificar horizontalidad y verticalidad de los elementos)																										✓	✓	✓	✓	✓	
No existen líneas eléctricas a por lo menos 3 mts de distancia del andamio?																										✓	✓	✓	✓	✓	
Estan las ruedas dentro del marco de la torre. Esta habilitado el sistema de bloqueo de las ruedas?																										✓	✓	✓	✓	✓	
Para andamios de los 6 mts cuerpos. Estan los templetes o vientos y conectores funcionando correctamente y asegurados a una estructura fija? Para andamios convencionales se deben realizar amarres																										✓	✓	✓	✓	✓	
centimetros de ancho? El espacio entre tablones no sobrepasa los 2,5 cm?																										✓	✓	✓	✓		
¿Está la plataforma o los tablones o plataforma libres de partiduras, astillados o cualquier defecto que disminuya su resistencia estructural?																										✓	✓	✓	✓	✓	
¿Están los tablones amarrados cada uno en sus extremos con alambre o manila?																										✓	✓	✓	✓	✓	
Cada tablon sobrepasa su soporte por una longitud no menor de 15 ni mayor de 30 cm																										✓	✓	✓	✓	✓	
¿Las plataformas del andamio se encuentran libres de residuos, despuntes, materiales, etc?																										✓	✓	✓	✓	✓	
¿Es el espacio entre el guarda pie y la baranda protectora 765 milimetros (30 pulgadas) o menos?																										✓	✓	✓	✓	✓	
¿Las secciones de los andamios estan aseguradas entre si?																										✓	✓	✓	✓	✓	
¿Están los conectores y pines de los andamios en buenas condiciones?																										✓	✓	✓	✓	✓	
demarcado con cinta y con avisos para prevenir al personal del riesgo de objetos que caen?																										✓	✓	✓	✓	✓	
¿Si se requiere de sistema de protección contra caidas, esta disponible un punto de anclaje independiente?																										✓	✓	✓	✓	✓	
¿El andamio esta libre de conexiones de lineas a tierra de los equipos de soldadura y esta libre de cilindros amarrados a la estructura?																										✓	✓	✓	✓	✓	
Se instala la tarjeta VERDE en un lugar visible?																										✓	✓	✓	✓	✓	

Nomenclatura: √: Cumple X: No cumple. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspeccion tecnica, favor reportar inmediatamente a mantenimiento para su devolución.

INSPECCIONADO POR:

1	6	11	16	21	26 Alfredo	31
2	7	12	17	22	27 Alfredo	
3	8	13	18	23	28 Alfredo	
4	9	14	19	24	29 Alfredo	
5	10	15	20	25	30 Alfredo	

Observaciones derivadas de las inspecciones

Powered by CamScanner

CONSORCIO NAVAL WJR	ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	CÓDIGO HSE-FOR-26
		VERSIÓN 2
		FECHA DE APROBACION: 09/09/2019

Empresa: Metalika

Lugar de Trabajo: Edificio Asta Sextantis

Fecha de inicio: 04-05-2026.

Fecha de finalización: 10-05-2026.

Descripción de la tarea a realizar:
Mantenimiento de estructura Incluye (Lavado y grateado superficie Metalika (Armé y desarme de andamios.

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	✓	ESPACIO CONFINADO	N/A.	CALIENTE	N/A.
ENERGIA PELIGROSAS	N/A	ELECTRICO	N/A	OTRO, CUAL?	

Cedulas, Nombres y Apellidos de los Trabajadores (ejecutor)	
Florencio Muñoz. (10820030.)	~~ESTAR~~
Jesus Maria. (7313 6156)	Jesus Reyes.
Alfredo Arrieta (73570776)	Alfredo Arrieta
~~Leon~~ David (1052069374)	~~X~~
~~EDWIN~~ Fernando (1047365446	Edwin
~~EDWIN~~ Fernando (1047365446 7307283.0172	Edwin

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	✓	Martillos.
Eléctricas	✓	Pulidoras
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas	✓	Hidrolavadora.
Otras		

Powered by CamScanner

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	6 mts.
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	Andamios.
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	SPCC, Señalización de áreas, Demarcación.
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Arnes, eslingas Y, Visor, guante, Tapaboca.
¿Cuántos trabajadores se requieren?	8.
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Individuales, Extensiones, Pulidoras.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	Si
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, Etc.)	Físico (Ruido intermitente)

Pasos detallados de la tarea	PELIGRO	RIESGO	CONTROLES	RESPONSABLE
Ingreso del trabajador a obra.	Físico; locativo Biológico. Condiciones Seguridad	Caídas a nivel; picaduras; propagación virus- atropellamiento.	transitar por andenes y señales, no uso del celular.	Trabajadores.
traslado de trabajadores. y herramientas.	Biomecanico (esfuerzo) manipulación manual cargas, locativo Específicos; irregulares.	Lumbalgias, hernias discales, dolor lumbar, articular, distensión, esguince, fracturas.	Pausas activas, cuidado al trabajar los equipos y herramientas, uso de epp	Residente SST.
Arme y desarme de andamios	Biomecanicos (manipulación manual de cargas esfuerzo, movimiento repetitivos)	Hernias discales, dolor lumbar, articular, dolor muscular,	acordes a la tarea, en caso de novedades reportar al residente o incidente,	Residente SST.
Traslado de herramientas al bodega.	Postura prolongada pie, Mecanico: elementos y	Heridas, raspones, esguinces, Fracturas, resfriados, gripe.	acopiar piezas y herramta en lugares seguros, curso de andamiero, curso de	Residente SST. Trabajador
Laborado con individuales.	partes de herramientas equipos. Trabajo en alturas	Deshidratacion, golpe de calor, presion elevada.	trabajador autorizado. TA, Inspección de andamios	Residente SST
	Fenomenos naturales (precipitaciones lluvias).		orden y aseo en las areas de trabajo, no uso de celulares en el	Trabajadores
	Físicos (radiacion no ionizantes) Exposición altas temperaturas.		area de labores, hidratacion constante, uso de bloqueador (si aplica).	
	Ruido. (intermitente).	Sordera parcial, problemas de sueño, dolor de oido.	en caso de problemas de salud llevar las condiciones de salud.	
			Uso de tapaoidos. de acuerdo a la actividad.	trabajadores. Residente SST.

FIRMA INSPECTOR HSEQ	Raquel Peter Padilla.
FIRMA ASESORA HSEQ	
RESIDENTE DE OBRA	

Powered by CamScanner

CONSORCIO NAVAL W26	ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	CÓDIGO HSE-FOR-26 VERSIÓN 2 FECHA DE APROBACION: 09/09/2019

Empresa:	ENAP.
Lugar de Trabajo:	Aulas Sextantis.
Fecha de Inicio	11-05-2026
Fecha de finalizacion	16-05-2026
Descripción de la tarea a realizar:	Mantenimiento preventivo de estructura (lavado con hidrolavadora, Retiro manual mecanica de vigas - Columnas y barandas, arme y desarme de andamios) (piso 1 - 4).

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	✓	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	N/A
ENERGIA PELIGROSAS	N/A	ELECTRICO	☐	OTRO, CUAL?	☐

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	
Ronal Fernandez	T-047365646
Juan David	1052069374
JESUS REYES	73136196
Edwin Guerrero	73114017
Johan Carlos	7205007?
[illegible]	7919386
Williams Linarco	14372986
Pedro Diaz	1005474319
Julio Javier Julio	1037470599

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	✓	Martillos.
Electricas	✓	hidrolavadoras, Rotidoras.
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecanicas		
Otras		

Powered by CamScanner

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	6 mts.
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	Andamios.
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	Arnes y eslingas.
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Gafas, visor, guantes, tapabocas,
¿Cuántos trabajadores se requieren?	10.
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Hidro lavadoras
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	Si
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pasadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	PELIGRO	RIESGO	CONTROLES	RESPONSABLE
Ingreso de trabajadores a obra.	Físico, locativo Biológico Condiciones de Seguridad (Transito)	Caídas a mismo nivel. (Fracturas, esguinces) picaduras mordeduras (de insectos) (Atropellamiento.	transitar por los sitios demarcados (cebras y andenes no uso de celulares), y portar la Cedula en caso de pitadas o	Trabajadores Residente SST.
Traslado de herramientas y para labores	Biomecanico, mecanico locativo (Superficies irregulares,	dolor lumbar, articular. (movimiento repetitivo) esfuerzo, caidas a nivel tropezones, raspones.	no manipular equipos y herramientas por encima del Valor permitido de movimientos, caminar por los lugares designados	trabajadores. Residente SST.
Arme y desarme de andamios. DBO 1 y 2.	Trabajo en altura.	Caidas a desnivel. esguinces, fracturas, lesiones musculoesqueleticas	Inspección de andamios, formación TA autorizado, curso de andamiero, Inspección SPCC, Inspección de area	Residente SST.
Rutina manual mecanica de estructura.	Trabajo en alturas, Químico, Físico, Biomecanico, locativo	Caidas a desnivel, Fracturas, esguinces (muerte). lumbalgias, metalicos, EPOC.	Inspección de area de trabajo, inspección SPCC. Inspección de Lineas de vida	Residente SST
DBO 1 y 2.	Fenomenos Naturales. lluvias (precipitaciones.- Electrico (baja tension)	Gripitis, gripes, compromiso muscular, deshidratacion, golpe de calor, conjuntivitis, dolor	Arrestadores de caida Inspección de puntos de anclajes, Plan de rescate.	Residente -SST
		articular, dolor lumbar, hormigueo en pies. lluvias, AT por deslizamientos con lluvias electrocucion, paro cardiaco	Formación de trabajos. Trabajador autorizado, suspender actividades en caso de lluvias, o tormentas electricas, en caso de electrocución Reportar al	
			Jefe de area y trasladar EPS, o dar manejo de acuerdo se de el caso.	
Traslado de trabajadores a zonas Comunes.	locativo.	superficies de trabajos resbalosas, esguinces. tropezones.	trasladarse por los lugares seguros en el area de trabajo.	Trabajadores

FIRMA INSPECTOR HSEQ	
FIRMA ASESORA HSEQ	
RESIDENTE DE OBRA	

Powered by CamScanner

CONSORCIO NAVAL W26	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	FECHA: 16-05-2025 VERSION: 1

EMPRESA:	PROYECTO:	VALIDO DE:	A:
Consorcio Naval W26.	Aulas Sextantis	19-05-2026	24-05-2026.
		DESDES LAS: 7:30 am.	HASTA LAS: 5:00 pm

Descripción de la Tarea a realizar: Mantenimiento preventivo de estructura metálica incluye (Aplicación de anticorrosivo y pintura a vigas en primer y segundo piso, rutina mecánica de superficies)

Fecha de Elaboración	Fecha de Aprobación	Equipo de trabajo que elaboró el ATS (Area Técnico - Area HSE)	¿Cuántos trabajadores se requieren?
19-05-2026.	19-05-2026.	Residente SST + Arquitecto Residente	10.

Tareas de alto Riesgo a Realizar
Recuerde diligenciar los Formatos de Permisos de Trabajo Seguro.

TRABAJO EN ALTURAS		TRABAJO EN CALIENTE		ESPACIOS CONFINADOS	
		✓	NA		N/A.

OTRO. Cuál?

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

PSICOSOCIAL	✓	Gestión organizacional - Características de la organización de trabajo - características del grupo social de trabajo - Condiciones de las tareas - Jornada de trabajo - Interface persona - Tarea -	BIOLOGICO	✓	Virus - Bacterias - Hongos - Picaduras - Mordeduras - Parásitos - Fluidos o excrementos.
FISICO	✓	Iluminación - Temperatura extrema - Radiaciones ionizantes y no ionizantes - Vibraciones - Ruido - Presión atmosférica	QUIMICO	✓	Polvo - Humos - Líquidos - Fibras - Gases y vapores - Material particulado
CONDICIONES DE SEGURIDAD	✓	Mecánicos - Eléctricos - Locativo - Tecnológico - Accidente de transito - Publico - Trabajo en altura - Espacios confinados	FENOMENO NATURAL	✓	Sismo - Terremoto - Vendaval - Inudación - Derrumbe - Precipitaciones
BIOMECANICO	✓	Posturas - Esfuerzo - Movimiento repetitivo - Manipulación manual de cargas	Otro cual?		

IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD REQUERIDO PARA REALIZAR EL TRABAJO

Casco	✓	Arrestadores		Protectores auditivos	✓	Gafas de seguridad	✓	protección respiratoria	✓
Guantes	✓	Careta	✓	Mosqueton	N/A	Permiso de trabajo en altura	✓	Protector facial	✓
Barbuquejo	✓	Arnes	✓	Botas de seguridad	✓	Señalización/Delimitación	✓	Otro, cual?	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

Manuales	✓	Martillos
Eléctricas	✓	Pulidora, extensiones electricas.
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
otras, cuales ?		

SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (Procedimiento)	CONSECUENCIAS	CONTROLES (Preventivo, proyectivo)	RESPONSABLE DEL CARGO
INGRESO DEL PERSONAL A OBRA	Esguinces, torceduras de tobillo, fracturas, golpes, resbalones, choques, schok anafiláctico, alergias, atropellamiento	Inspección de áreas de trabajo antes, durante y después de las actividades, orden y aseo en las áreas de trabajo, transitar por las áreas señalizadas o demarcadas, autocuidado. Transitar por los senderos peatonales para evitar atropellamiento. Si se presenta algún caso de picadura o mordedura de algún roedor traslado del personal a eps más cercana , en caso de atropellamiento trasladar a la eps más cercana.	Trabajadores y residente sst
INSPECCIONN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Machucones ,laceraciones, electrocución, quemaduras	Inspección de equipos y herramientas, uso de epp, Separar las herramientas defectuosas no usarlas, etiquetarlas y reportarlas, mantenimiento preventivo de equipos y herramientas, almacenar de manera adecuada, pre operacional equipo .	Trabajadores y residente sst
TRASLADO E INSPECCION EN AREAS DE TRABAJO	Esguinces, torceduras de tobillo, fracturas, golpes, resbalones	Uso de calzado adecuado para la tarea con suela antideslizante, ojos en la vía, no uso del celular mientras se realiza el traslado a el área de labores, inspección visual de la zona, transitar por cebras o senderos peatonales	Trabajadores y residente sst
RUTINA MANUAL MECANICA(PULIDO Y GRATEADO DE SUPERFICIE DE VIGAS)	Laceraciones, compromiso de partes del cuerpo por mal uso de los equipos, compromiso ocular, cortes por mala instalación del disco en la pulidora.	Uso de visor de seguridad para evitar la proyección de material Particulado producido por la rutina mecánica, gafas de seguridad para evitar partículas que se alojen en los ojos, ropa de trabajo, pre operacional e inspección de equipos y herramientas(pulidora),verificar que el disco sea el adecuado para la realización de la tarea, en caso de accidente realizar el reporte inmediato a arl, Botiquín de primeros auxilios en campo, Socialización de procedimiento de trabajo, ats, permiso de trabajo en alturas, inspección de SPCC, inspección de líneas de vida, vigía de seguridad, plan de rescate, inspeccionar areas de trabajo , capacitación de trabajador autorizado TA, visor, y extintor, en caso de partículas en ojos no rasgarlo lavado inmediato , inspección de andamios.	Residente sst

Powered by CamScanner

LIMPIEZA DE VIGAS CON TINER Y AGUA	Dermatitis de contacto por uso de producto químico, intoxicación oral e inhalación	Uso de epps acordes a la tarea(guantes, gafas , tapabocas) en caso de contacto con los ojos lavar con ab undante agua si as molestias persisten traslado a su eps más cercana, en caso de quemaduras lavar con jabón neutro, tapar y trasladar, botiquín, en caso de intoxicación trasladar.	Trabajadores y residente sst
TRASLADO DE MATERIAL A AREA DE TRABAJO (PINTURA Y ANTICORROSIVO)	Caídas a desnivel, tropezones, Trabajo en alturas, lumbago, dolor articular, cansancio, deshidratación, golpe de calor	Socialización de actividades enfocadas en el traslado de material a la zotea para prevenir lesiones osteomusculares al cargar la pintura, medidas preventivas enfocadas en trabajo en alturas(no sacar el cuerpo a la mitad por las barandas, no subirse en la barandas),capacitación en manejo manual de cargas, pausas activas, estiramientos, hidratación constante, certificado de trabajador autorizado TA.	Trabajadores y residente sst
APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO	Dermatitis de contacto por uso de producto químico , salpicaduras de pintura que comprometen el campo visual, intoxicación por ingestión, alergia, deshidratación, golpe de calor, disconfort térmico, presión elevada, desmayos,	Uso de elementos de protección personal acordes a la tarea, uso de gafas para protección ocular , socialización de FSD de hemmpel , uso de ropa de trabajo, hidratación constante, en caso de presentar síntomas de cefaleas, presión alta, alergias, reportar la condición y en caso de desmayos trasladar a trabajador a eps más cercana , en caso de salpicadura lavar con abundante agua y si la molestia persiste trasladar a eps. certificado de trabajador autorizado TA.	Trabajadores y residente sst
APLICACIÓN DE PINTURA	Dermatitis de contacto por uso de producto químico, salpicaduras de pintura que comprometen el campo visual, intoxicación por ingestión, alergia, deshidratación, golpe de calor, disconfort térmico, presión elevada, desmayos,	Uso de elementos de protección personal acordes a la tarea, uso de gafas para protección ocular, sociafización de FSD de pintura , uso de ropa de trabajo, hidratación constante, en caso de presentar síntomas de cefaleas, presión alta, alergias, reportar la condición y en caso de desmayos trasladar a trabajador a eps más cercana , en caso de salpicadura lavar con abundante agua y si la molestia persiste trasladar a eps. certificado de trabajador autorizado TA.	Trabajadores y residente sst
ORDEN Y ASEO EN AREAS DE TRABAJO	Tropezones, Caída a nivel, golpes, raspones	Inspección de áreas de trabajo antes, durante y después de las actividades, orden y aseo en las áreas de trabajo, transitar por las áreas señalizadas o demarcadas.	Trabajadores y residente sst

Powered by CamScanner

	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	FOS-SST-020 FECHA: 24/04/2023

Observaciones

Cerrado.

Responsable de la Elaboración - SST

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	NUMERO DE CEDULA	NUMERO DE LICENCIA	FIRMA
Yobelita Padilla R	R. SST	1128660907.	1631	

Lider de Grupo de Trabajo			Aprobado por Ing. Residente y/o Supervisor		
NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA
Giovanny Jaen	Supervisor		XEDNA MENDOZA	Ing. Residente	

Firma del trabajador

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	NUMERO DE CEDULA	FIRMA
Jesus Maria Reyes	Ayudante.	73136156	
Ronal Fernandez	Oficial	1.047365646	Ronal
Juan David C.	Ayudante.	1052069374	
Pedro Diaz	Ayudante.	1006476319	Pedro
Julio Javier Julio V.	Ayudante.	1037470599	Julio Julio V.
Alfredo Arrieta	Ayudante.	73570776	Alfredo
Giovanny Jaen C	Supervisor.	73570554	
Luis Rafael	Ayudante.	79193886	
Emanuel Cardenas	Ayudante	73116467	
Jaime Flores	Ayudante	73208577	Jaime
Jose Soto	Ayudante	73559252	Soto
Florencio Navas	Ayudante	10820070	

Revalidaciones Ing. Residente VoBo. SISO

FECHA	19-05-2026
NOMBRE	Yobelita Padilla
FIRMA	
VoBo	

Powered by CamScanner

CONSORCIO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	FECHA: 18-05-2026 VERSION: 1

EMPRESA:	PROYECTO: Aulas Sextantis	VALIDO DE: 25-05-2026.	A: 30-05-2026.
METALIKA.		DESDES LAS: 7:30 a.m.	HASTA LAS:

Descripción de la Tarea a realizar: Mantenimiento preventivo de estructura metálica Incluye (Aplicación de anticorrosivo y pintura a vigas en primer y segundo piso, rutina mecánica de superficies)

Fecha de Elaboración	Fecha de Aprobación	Equipo de trabajo que elaboró el ATS (Area Técnico - Area HSE)	¿Cuántos trabajadores se requieren?
25-05-2026.	25-05-2026.	Arquitecto Residente - Residente SST.	10

Tareas de alto Riesgo a Realizar
Recuerde diligenciar los Formatos de Permisos de Trabajo Seguro.

TRABAJO EN ALTURAS	Si	TRABAJO EN CALIENTE	NA	ESPACIOS CONFINADOS	N/A.

OTRO. Cuál?

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

PSICOSOCIAL	✓	Gestión organizacional - Características de la organización de trabajo - características del grupo social de trabajo - Condiciones de las tareas - Jornada de trabajo - Interface persona - Tarea -	BIOLOGICO	✓	Virus - Bacterias - Hongos - Picaduras - Mordeduras - Parásitos - Fluidos o excrementos.
FISICO	✓	Iluminación - Temperatura extrema - Radiaciones ionizantes y no ionizantes - Vibraciones - Ruido - Presión atmosférica	QUIMICO	✓	Polvo - Humos - Líquidos - Fibras - Gases y vapores - Material particulado
CONDICIONES DE SEGURIDAD	✓	Mecánicos - Eléctricos - Locativo - Tecnológico - Accidente de transito - Publico - Trabajo en altura - Espacios confinados	FENOMENO NATURAL	✓	Sismo - Terremoto - Vendaval - Inudación - Derrumbe - Precipitaciones
BIOMECANICO	✓	Posturas - Esfuerzo - Movimiento repetitivo - Manipulación manual de cargas	Otro cual?		

IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD REQUERIDO PARA REALIZAR EL TRABAJO

Casco	✓	Arnes	N.A.	Protectores auditivos	✓	Gafas de seguridad	✓	protección respiratoria	✓
Guantes	✓	Careta	✓	Mosqueton	N.A.	Permiso de trabajo en altura	✓	Protector facial	✓
Barbuquejo	✓	Arnes	✓	Botas de seguridad	✓	Señalización/Delimitación	✓	Otro, cual?	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

Manuales	✓	piqueta - Martillos
Eléctricas	✓	pulidoras
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
otras, cuales ?		

SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (Procedimiento)	CONSECUENCIAS	CONTROLES (Preventivo, proyectivo)	RESPONSABLE DEL CARGO
INGRESO DEL PERSONAL A OBRA	Esguinces, torceduras de tobillo, fracturas, golpes, resbalones, choques, schok anafiláctico, alergias, atropellamiento	Inspección de áreas de trabajo antes, durante y después de las actividades, orden y aseo en las áreas de trabajo, transitar por las áreas señalizadas o demarcadas, autocuidado. Transitar por los senderos peatonales para evitar atropellamiento. Si se presenta algún caso de picadura o mordedura de algún roedor traslado del personal a eps más cercana , en caso de atropellamiento trasladar a la eps más cercana.	Trabajadores y residente sst
INSPECCIONN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Machucones ,laceraciones, electrocución, quemaduras	Inspección de equipos y herramientas, uso de epp, Separar las herramientas defectuosas no usarlas, etiquetarlas y reportarlas, mantenimiento preventivo de equipos y herramientas, almacenar de manera adecuada, pre operacional equipo .	Trabajadores y residente sst
TRASLADO E INSPECCION EN AREAS DE TRABAJO	Esguinces, torceduras de tobillo, fracturas, golpes, resbalones	Uso de calzado adecuado para la tarea con suela antideslizante, ojos en la vía, no uso del celular mientras se realiza el traslado a el área de labores, inspección visual de la zona, transitar por cebras o senderos peatonales	Trabajadores y residente sst
RUTINA MANUAL MECANICA(PULIDO Y GRATEADO DE SUPERFICIE DE VIGAS)	Laceraciones, compromiso de partes del cuerpo por mal uso de los equipos, compromiso ocular, cortes por mala instalación del disco en la pulidora.	Uso de visor de seguridad para evitar la proyección de material Particulado producido por la rutina mecánica, gafas de seguridad para evitar partículas que se alojen en los ojos, ropa de trabajo, pre operacional e inspección de equipos y herramientas(pulidora),verificar que el disco sea el adecuado para la realización de la tarea, en caso de accidente realizar el reporte inmediato a arl, Botiquín de primeros auxilios en campo, Socialización de procedimiento de trabajo, ats, permiso de trabajo en alturas, Inspección de SPCC, inspección de líneas de vida, vigía de seguridad, plan de rescate, inspeccionar areas de trabajo , capacitación de trabajador autorizado TA, visor, y extintor, en caso de partículas en ojos no rasgarlo lavado inmediato , inspección de andamios.	Residente sst

Powered by CamScanner

LIMPIEZA DE VIGAS CON TINER Y AGUA	Dermatitis de contacto por uso de producto químico, intoxicación oral e inhalación	Uso de epps acordes a la tarea(guantes, gafas , tapabocas) en caso de contacto con los ojos lavar con ab undante agua si as molestias persisten traslado a su eps más cercana, en caso de quemaduras lavar con jabón neutro, tapar y trasladar, botiquín, en caso de intoxicación trasladar.	Trabajadores y residente sst
TRASLADO DE MATERIAL A AREA DE TRABAJO (PINTURA Y ANTICORROSIVO)	Caídas a desnivel, tropezones, Trabajo en alturas, lumbago, dolor articular, cansancio, deshidratación, golpe de calor	Socialización de actividades enfocadas en el traslado de material a la zotea para prevenir lesiones osteomusculares al cargar la pintura, medidas preventivas enfocadas en trabajo en alturas(no sacar el cuerpo a la mitad por las barandas, no subirse en la barandas),capacitación en manejo manual de cargas, pausas activas, estiramientos, hidratación constante, certificado de trabajador autorizado TA.	Trabajadores y residente sst
APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO	Dermatitis de contacto por uso de producto químico , salpicaduras de pintura que comprometen el campo visual, intoxicación por ingestión, alergia, deshidratación, golpe de calor, disconfort térmico, presión elevada, desmayos,	Uso de elementos de protección personal acordes a la tarea, uso de gafas para protección ocular , socialización de FSD de hemmpel , uso de ropa de trabajo, hidratación constante, en caso de presentar síntomas de cefaleas, presión alta, alergias, reportar la condición y en caso de desmayos trasladar a trabajador a eps más cercana , en caso de salpicadura lavar con abundante agua y si la molestia persiste trasladar a eps. certificado de trabajador autorizado TA.	Trabajadores y residente sst
APLICACIÓN DE PINTURA	Dermatitis de contacto por uso de producto químico, salpicaduras de pintura que comprometen el campo visual, intoxicación por ingestión, alergia, deshidratación, golpe de calor, disconfort térmico, presión elevada, desmayos,	Uso de elementos de protección personal acordes a la tarea, uso de gafas para protección ocular, socialización de FSD de pintura , uso de ropa de trabajo, hidratación constante, en caso de presentar síntomas de cefaleas, presión alta, alergias, reportar la condición y en caso de desmayos trasladar a trabajador a eps más cercana , en caso de salpicadura lavar con abundante agua y si la molestia persiste trasladar a eps. certificado de trabajador autorizado TA.	Trabajadores y residente sst
ORDEN Y ASEO EN AREAS DE TRABAJO	Tropezones, Caída a nivel, golpes, raspones	Inspección de áreas de trabajo antes, durante y después de las actividades, orden y aseo en las áreas de trabajo, transitar por las áreas señalizadas o demarcadas,	Trabajadores y residente sst

Powered by CamScanner

	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	VERSION: 1 FECHA: 24/04/2026

Observaciones

Responsable de la Elaboración - SST

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	NUMERO DE CEDULA	NUMERO DE LICENCIA	FIRMA
Gabriela Padilla R.	Residente SST.	1128060902.	1631.	

Lider de Grupo de Trabajo			Aprobado por Ing. Residente y/o Supervisor		
NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA
			Ana [illegible]	Ing. Residente	

Firma del trabajador

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	NUMERO DE CEDULA	FIRMA
[illegible] Cordoba	Ayudante	7311647	
Luis Rafael	Pintor	7919386	
Julio Javier [illegible]	pintor	1037470599	
Juan David C.	Pintor	1052069374	
Alfredo Arrieta	pintor	73520776	
[illegible]	Soldador	73570577	
JESUS [illegible]	Ayudante.	73136156	
Pedro D'ol	Ayudante	1005474719	Pedro
Ronal Fernandez	Pintor	1.047365646	
Jaime Torres	Ayudante	73208574	
Jose Velasquez.	Ayudante	3814055	

Revalidaciones Ing. Residente VoBo. SISO

FECHA	25-05-26.
NOMBRE	Gabriela Padilla R.
FIRMA	
VoBo	

Powered by CamScanner

CONSORCIO NAVAL W26	CONSORCIO NAVAL W 26	EVALUACION CONDICIONESDE SALUD PARA TRABAJOS EN ALTURA	VERSION 1
			VIGENCIA MAYO 2026

NOMBRE DEL TRABAJADOR	Ronal Fernandez	FIRMA		CEDULA	1.004.736.514	CARGO	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	Giovanny Lozano	FIRMA		CEDULA	73.570.594	CARGO	Supervisor

Para asegurar que personal designado para realizar Trabajo en Altura se encuentra en buena condición de salud, se debe diligenciar este cuestionario:
Señor Colaborador, NO se limite a los aspectos mencionados en esta AUTOEVALUACIÓN. Tenga en cuenta y reporte cualquier otro aspecto que pueda poner en peligro su vida.

ITEM	CUESTIONARIO	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		25-05-26		26-05-26		27-05-26		28-05-26		29-05-26		30-05-26		FECHA	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	¿Toma de momento algún medicamento que le genere somnolencia?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2	¿Presenta algún tipo de enfermedad que le dificulte el desarrollo de las actividades?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
3	¿En este momento está libre de tratamientos medicos? Si la respuesta es NO indique cual:	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4	La ultima vez que consumio alcohol, fue ¿hace mas de 24 horas ?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
5	¿Presenta dificultades visuales?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
6	¿Presenta dificultades auditivas?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Autorizado para Realizar el Trabajo		SI/NO		SI/NO		SI/NO		SI/NO		SI/NO		SI/NO		SI/NO	
HORA		7:30		7:30		7:30		7:30		7:30		7:30		HORA	
Coordinador de trabajo en aturas		JPR		JPR		JPR		JPR		JPR		JPR			
Nombre del trabajador		RONAL		RONAL		RONAL		RONAL		RONAL		RONAL			

OBSERVACIONES/COMENTARIOS:

Powered by CamScanner

Espacios para ser diligenciados por el COLABORADOR DESIGNADO para realizar el Trabajo en Altura				
ITEM	CUESTIONARIO	SI	NO	
1	¿La noche/día anterior durmió por lo menos 6 horas?	✓		Si su respuesta es NO, no debe hacer el trabajo
2	¿Sus tres últimas comidas han sido de acuerdo a los horarios norm	✓		Si su respuesta es NO, no debe hacer el trabajo
3	¿En este momento está libre de tratamientos medicos?	✓		Si su respuesta es NO, no debe hacer el trabajo
4	Si la respuesta es NO indique cual: _____			Si su respuesta es NO, debe indicar el tratamiento médico al que está sometido y de esto dependerá la aprobación para realizar el trabajo
	La ultima vez que consumio alcohol, fue ¿hace mas de 72 horas ?	✓		
5	¿Ha realizado trabajos similares anteriormente?	✓		Si su respuesta es NO, no debe hacer el trabajo
6	¿Usted siempre ha terminado bien de salud cuando ha realizando trabajos similares anteriormente?	✓		Si su respuesta es NO, no debe hacer el trabajo
7	¿Le han explicado el procedimiento del trabajo que va a realizar?	✓		Si su respuesta es NO, no debe hacer el trabajo
8	¿Se siente apto para ejecutar el trabajo?	✓		Si su respuesta es NO, no debe hacer el trabajo
9	¿Usted esta en buenas condiciones de salud para realizar este trabajo?	✓		Si su respuesta es NO, no debe hacer el trabajo
10	¿Usted tiene conocimiento e identifica los peligros a los cuales estará expuesto?	✓		Si su respuesta es NO, no debe hacer el trabajo
11	¿Sabe que acciones debe tomar en caso de cambio en las condiciones del trabajo y del entorno?	✓		Si su respuesta es NO, no debe hacer el trabajo
12	¿Se compromete usted a cumplir al 100% lo acordado en el procedimiento y ATS de este trabajo?	✓		Si su respuesta es NO, no debe hacer el trabajo
13	Ud. realizó la revisión del estado y ajuste de su EPP respiratorio, antes de realizar el trabajo?	✓		Si su respuesta es NO, no debe hacer el trabajo

Espacios para ser diligenciados por el encargado en el area					
Autorizado para Realizar el Trabajo	SI	SI	NO	NO	
HORA	7:30	7:30	7:30	7:30	
Firma del Colaborador	Ronal	Ronal	Ronal	Ronal	
Firma del Supervisor					
Nombre del Interventor (Cuando aplique): _____					
OBSERVACIONES/COMENTARIOS:					

Powered by CamScanner

CONSORCIO NAVAL W26	CONSORCIO NAVAL W 26	EVALUACION CONDICIONESDE SALUD PARA TRABAJOS EN ALTURA	VERSION 1
			VIGENCIA MAYO 2026

NOMBRE DEL TRABAJADOR	Pedro Diaz	FIRMA		CEDULA	1003947316	CARGO	Ayudante
NOMBRE DEL SUPERVISOR	Giovanny Lopez	FIRMA		CEDULA	73705774	CARGO	Supervisor

Para asegurar que personal designado para realizar Trabajo en Altura se encuentra en buena condición de salud, se debe diligenciar este cuestionario:
Señor Colaborador, NO se limite a los aspectos mencionados en esta AUTOEVALUACIÓN. Tenga en cuenta y reporte cualquier otro aspecto que pueda poner en peligro su vida.

ITEM	CUESTIONARIO	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		25-05-26		26-05-26		27-05-26		28-05-26		29-05-26		30-05-26		FECHA	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	¿Toma de momento algún medicamento que le genere somnolencia?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2	¿Presenta algún tipo de enfermedad que le dificulte el desarrollo de las actividades?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
3	¿En este momento está libre de tratamientos medicos? Si la respuesta es NO indique cual:	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4	La ultima vez que consumio alcohol, fue ¿hace mas de 24 horas ?	✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓			
5	¿Presenta dificultades visuales?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
6	¿Presenta dificultades auditivas?		✓		✓		✓		✓				✓		
Autorizado para Realizar el Trabajo		SI/NO		SI/NO		SI/NO		SI/NO		SI/NO		SI/NO		SI/NO	
HORA		7:30		7:30		7:30		7:30		7:30		7:30		HORA	
Coordinador de trabajo en aturas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Nombre del trabajador		Pedro		Pedro		Pedro		Pedro		Pedro		Pedro			

OBSERVACIONES/COMENTARIOS:

Powered by CamScanner

Espacios para ser diligenciados por el COLABORADOR DESIGNADO para realizar el Trabajo en Altura				
ITEM	CUESTIONARIO	SI	NO	
1	¿La noche/día anterior durmió por lo menos 6 horas?	✓		Si su respuesta es NO, no debe hacer el trabajo
2	¿Sus tres últimas comidas han sido de acuerdo a los horarios norm	✓		Si su respuesta es NO, no debe hacer el trabajo
3	¿En este momento está libre de tratamientos medicos?	✓		Si su respuesta es NO, no debe hacer el trabajo
4	Si la respuesta es NO indique cual: _____			Si su respuesta es NO, debe indicar el tratamiento médico al que está sometido y de esto dependerá la aprobación para realizar el trabajo
	La ultima vez que consumio alcohol, fue ¿hace mas de 72 horas ?	✓		
5	¿Ha realizado trabajos similares anteriormente?	✓		Si su respuesta es NO, no debe hacer el trabajo
6	¿Usted siempre ha terminado bien de salud cuando ha realizando trabajos similares anteriormente?	✓		Si su respuesta es NO, no debe hacer el trabajo
7	¿Le han explicado el procedimiento del trabajo que va a realizar?	✓		Si su respuesta es NO, no debe hacer el trabajo
8	¿Se siente apto para ejecutar el trabajo?	✓		Si su respuesta es NO, no debe hacer el trabajo
9	¿Usted esta en buenas condiciones de salud para realizar este trabajo?	✓		Si su respuesta es NO, no debe hacer el trabajo
10	¿Usted tiene conocimiento e identifica los peligros a los cuales estará expuesto?	✓		Si su respuesta es NO, no debe hacer el trabajo
11	¿Sabe que acciones debe tomar en caso de cambio en las condiciones del trabajo y del entorno?	✓		Si su respuesta es NO, no debe hacer el trabajo
12	¿Se compromete usted a cumplir al 100% lo acordado en el procedimiento y ATS de este trabajo?	✓		Si su respuesta es NO, no debe hacer el trabajo
13	Ud. realizó la revisión del estado y ajuste de su EPP respiratorio, antes de realizar el trabajo?	✓		Si su respuesta es NO, no debe hacer el trabajo

Espacios para ser diligenciados por el encargado en el area					
Autorizado para Realizar el Trabajo	~~SI~~	~~NO~~	~~SI~~	~~SI~~	
HORA	7:30	7:30	7:30	7:30	
Firma del Colaborador	Pedro	Pedro	Pedro	Pedro	
Firma del Supervisor					
Nombre del Interventor (Cuando aplique): _____					
OBSERVACIONES/COMENTARIOS:					

Powered by CamScanner

CONSORCIO NAVAL W26	CONSORCIO NAVAL W 26	EVALUACION CONDICIONESDE SALUD PARA TRABAJOS EN ALTURA	VERSION 1
			VIGENCIA MAYO 2026

NOMBRE DEL TRABAJADOR	Alfredo Arrieta.	FIRMA		CEDULA	73570776	CARGO	Ayudante.
NOMBRE DEL SUPERVISOR	Gioseny Iguaran	FIRMA		CEDULA	73570571	CARGO	Supervisor

Para asegurar que personal designado para realizar Trabajo en Altura se encuentra en buena condición de salud, se debe diligenciar este cuestionario:
Señor Colaborador, NO se limite a los aspectos mencionados en esta AUTOEVALUACIÓN. Tenga en cuenta y reporte cualquier otro aspecto que pueda poner en peligro su vida.

ITEM	CUESTIONARIO	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		25-05-26		26-05-26		27-05-26		28-05-26		29-05-26		30-05-26		FECHA	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	¿Toma de momento algún medicamento que le genere somnolencia?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2	¿Presenta algún tipo de enfermedad que le dificulte el desarrollo de las actividades?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
3	¿En este momento está libre de tratamientos medicos? Si la respuesta es NO indique cual:	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4	La ultima vez que consumio alcohol, fue ¿hace mas de 24 horas ?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
5	¿Presenta dificultades visuales?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
6	¿Presenta dificultades auditivas?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Autorizado para Realizar el Trabajo		SI/NO		SI/NO		SI/NO		SI/NO		SI/NO		SI/NO		SI/NO	
HORA		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		HORA	

Coordinador de trabajo en aturas		a/PR	a/PR.	a/PR	a/PR.	a/PR	a/PR.	
Nombre del trabajador		Alfredo	Alfredo	Alfredo	Alfredo	Alfredo	Alfredo	

OBSERVACIONES/COMENTARIOS:

Powered by CamScanner

Espacios para ser diligenciados por el COLABORADOR DESIGNADO para realizar el Trabajo en Altura				
ITEM	CUESTIONARIO	SI	NO	
1	¿La noche/día anterior durmió por lo menos 6 horas?	✓		Si su respuesta es NO, no debe hacer el trabajo
2	¿Sus tres últimas comidas han sido de acuerdo a los horarios norm	✓		Si su respuesta es NO, no debe hacer el trabajo
3	¿En este momento está libre de tratamientos medicos?	✓		Si su respuesta es NO, no debe hacer el trabajo
4	Si la respuesta es NO indique cual: _____ La ultima vez que consumio alcohol, fue ¿hace mas de 72 horas ?	✓		Si su respuesta es NO, debe indicar el tratamiento médico al que está sometido y de esto dependerá la aprobación para realizar el trabajo
5	¿Ha realizado trabajos similares anteriormente?	✓		Si su respuesta es NO, no debe hacer el trabajo
6	¿Usted siempre ha terminado bien de salud cuando ha realizando trabajos similares anteriormente?	✓		Si su respuesta es NO, no debe hacer el trabajo
7	¿Le han explicado el procedimiento del trabajo que va a realizar?	✓		Si su respuesta es NO, no debe hacer el trabajo
8	¿Se siente apto para ejecutar el trabajo?	✓		Si su respuesta es NO, no debe hacer el trabajo
9	¿Usted esta en buenas condiciones de salud para realizar este trabajo?	✓		Si su respuesta es NO, no debe hacer el trabajo
10	¿Usted tiene conocimiento e identifica los peligros a los cuales estará expuesto?	✓		Si su respuesta es NO, no debe hacer el trabajo
11	¿Sabe que acciones debe tomar en caso de cambio en las condiciones del trabajo y del entorno?	✓		Si su respuesta es NO, no debe hacer el trabajo
12	¿Se compromete usted a cumplir al 100% lo acordado en el procedimiento y ATS de este trabajo?	✓		Si su respuesta es NO, no debe hacer el trabajo
13	Ud. realizó la revisión del estado y ajuste de su EPP respiratorio, antes de realizar el trabajo?	✓		Si su respuesta es NO, no debe hacer el trabajo

Espacios para ser diligenciados por el encargado en el area				
Autorizado para Realizar el Trabajo	✓ SI	NO	✓ SI	NO
HORA	7:30	7:30	7:30	7:30.
Firma del Colaborador	Alfredo	Alfredo	Alfredo	Alfredo
Firma del Supervisor				
Nombre del Interventor (Cuando aplique): _____				
OBSERVACIONES/COMENTARIOS:				

Powered by CamScanner

CONSORCIO NAVAL W26	CONSORCIO NAVAL W 26	EVALUACION CONDICIONESDE SALUD PARA TRABAJOS EN ALTURA	VERSION 1
			VIGENCIA MAYO 2026

NOMBRE DEL TRABAJADOR	Jaime Torres	FIRMA		CEDULA	73208535	CARGO	Ayudante
NOMBRE DEL SUPERVISOR	Gonzalez Jaime	FIRMA		CEDULA	73501771	CARGO	Supervisor

Para asegurar que personal designado para realizar Trabajo en Altura se encuentra en buena condición de salud, se debe diligenciar este cuestionario:
Señor Colaborador, NO se limite a los aspectos mencionados en esta AUTOEVALUACIÓN. Tenga en cuenta y reporte cualquier otro aspecto que pueda poner en peligro su vida.

ITEM	CUESTIONARIO	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		25-FEB-26		26-FEB-26		27-FEB-26		28-FEB-26		29-FEB-26		30-FEB-26		FECHA	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	¿Toma de momento algún medicamento que le genere somnolencia?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2	¿Presenta algún tipo de enfermedad que le dificulte el desarrollo de las actividades?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
3	¿En este momento está libre de tratamientos medicos? Si la respuesta es NO indique cual:	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4	La ultima vez que consumio alcohol, fue ¿hace mas de 24 horas ?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
5	¿Presenta dificultades visuales?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
6	¿Presenta dificultades auditivas?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Autorizado para Realizar el Trabajo		SI/NO		SI/NO		SI/NO		SI/NO		SI/NO		SI/NO		SI/NO	
HORA		7:30 AM		7:30 AM		7:30 AM		7:30 AM		7:30 AM		7:30 AM		HORA	
Coordinador de trabajo en aturas															
Nombre del trabajador		JAIME		JAIME		JAIME		JAIME		JAIME		JAIME			

OBSERVACIONES/COMENTARIOS:

Powered by CamScanner

Espacios para ser diligenciados por el COLABORADOR DESIGNADO para realizar el Trabajo en Altura				
ITEM	CUESTIONARIO	SI	NO	
1	¿La noche/día anterior durmió por lo menos 6 horas?	✓		Si su respuesta es NO, no debe hacer el trabajo
2	¿Sus tres últimas comidas han sido de acuerdo a los horarios norm	✓		Si su respuesta es NO, no debe hacer el trabajo
3	¿En este momento está libre de tratamientos medicos?	✓		Si su respuesta es NO, no debe hacer el trabajo
4	Si la respuesta es NO indique cual:			Si su respuesta es NO, debe indicar el tratamiento médico al que está sometido y de esto dependerá la aprobación para realizar el trabajo
	La ultima vez que consumio alcohol, fue ¿hace mas de 72 horas ?	✓		
5	¿Ha realizado trabajos similares anteriormente?	✓		Si su respuesta es NO, no debe hacer el trabajo
6	¿Usted siempre ha terminado bien de salud cuando ha realizando trabajos similares anteriormente?	✓		Si su respuesta es NO, no debe hacer el trabajo
7	¿Le han explicado el procedimiento del trabajo que va a realizar?	✓		Si su respuesta es NO, no debe hacer el trabajo
8	¿Se siente apto para ejecutar el trabajo?	✓		Si su respuesta es NO, no debe hacer el trabajo
9	¿Usted esta en buenas condiciones de salud para realizar este trabajo?	✓		Si su respuesta es NO, no debe hacer el trabajo
10	¿Usted tiene conocimiento e identifica los peligros a los cuales estará expuesto?	✓		Si su respuesta es NO, no debe hacer el trabajo
11	¿Sabe que acciones debe tomar en caso de cambio en las condiciones del trabajo,y del entorno?	✓		Si su respuesta es NO, no debe hacer el trabajo
12	¿Se compromete usted a cumplir al 100% lo acordado en el procedimiento y ATS de este trabajo?	✓		Si su respuesta es NO, no debe hacer el trabajo
13	Ud. realizó la revisión del estado y ajuste de su EPP respiratorio, antes de realizar el trabajo?	✓		Si su respuesta es NO, no debe hacer el trabajo

Espacios para ser diligenciados por el encargado en el area					
Autorizado para Realizar el Trabajo	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	
HORA	7:30	7:30	7:30	7:30	
Firma del Colaborador	Jaime	Jaime	Jaime	Jaime	
Firma del Supervisor					
Nombre del Interventor (Cuando aplique):					
OBSERVACIONES/COMENTARIOS:					

Powered by CamScanner

CONSORCIO NAVAL W26	CONSORCIO NAVAL W 26	EVALUACION CONDICIONESDE SALUD PARA TRABAJOS EN ALTURA	VERSION 1 VIGENCIA MAYO 2026

NOMBRE DEL TRABAJADOR	Jesus Maria Perez	FIRMA		CEDULA	73136 156	CARGO	Ayudante.
NOMBRE DEL SUPERVISOR	Giovanny Lozano	FIRMA		CEDULA	7357057	CARGO	Supervisor

Para asegurar que personal designado para realizar Trabajo en Altura se encuentra en buena condición de salud, se debe diligenciar este cuestionario:
Señor Colaborador, NO se limite a los aspectos mencionados en esta AUTOEVALUACIÓN. Tenga en cuenta y reporte cualquier otro aspecto que pueda poner en peligro su vida.

ITEM	CUESTIONARIO	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		25-05-26		26-05-26		27-05-26		28-05-26		29-05-26.		30-05-26.		FECHA	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	¿Toma de momento algún medicamento que le genere somnolencia?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2	¿Presenta algún tipo de enfermedad que le dificulte el desarrollo de las actividades?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
3	¿En este momento está libre de tratamientos medicos? Si la respuesta es **NO** indique cual:	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4	La ultima vez que consumio alcohol, fue ¿hace mas de 24 horas ?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
5	¿Presenta dificultades visuales?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
6	¿Presenta dificultades auditivas?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Autorizado para Realizar el Trabajo		SI/NO		SI/NO		SI/NO		SI/NO		SI/NO		SI/NO		SI/NO	
HORA		7:30.		7:30.		7:30		7:30		7:30		7:30.		HORA	
Coordinador de trabajo en aturas															
Nombre del trabajador															

OBSERVACIONES/COMENTARIOS:

Powered by CamScanner

Espacios para ser diligenciados por el COLABORADOR DESIGNADO para realizar el Trabajo en Altura				
ITEM	CUESTIONARIO	SI	NO	
1	¿La noche/día anterior durmió por lo menos 6 horas?	✓		Si su respuesta es NO, no debe hacer el trabajo
2	¿Sus tres últimas comidas han sido de acuerdo a los horarios norm	✓		Si su respuesta es NO, no debe hacer el trabajo
3	¿En este momento está libre de tratamientos medicos?	✓		Si su respuesta es NO, no debe hacer el trabajo
4	Si la respuesta es NO indique cual: _____			Si su respuesta es NO, debe indicar el tratamiento médico al que está sometido y de esto dependerá la aprobación para realizar el trabajo
	La ultima vez que consumio alcohol, fue ¿hace mas de 72 horas ?	✓		
5	¿Ha realizado trabajos similares anteriormente?	✓		Si su respuesta es NO, no debe hacer el trabajo
6	¿Usted siempre ha terminado bien de salud cuando ha realizando trabajos similares anteriormente?	✓		Si su respuesta es NO, no debe hacer el trabajo
7	¿Le han explicado el procedimiento del trabajo que va a realizar?	✓		Si su respuesta es NO, no debe hacer el trabajo
8	¿Se siente apto para ejecutar el trabajo?	✓		Si su respuesta es NO, no debe hacer el trabajo
9	¿Usted esta en buenas condiciones de salud para realizar este trabajo?	✓		Si su respuesta es NO, no debe hacer el trabajo
10	¿Usted tiene conocimiento e identifica los peligros a los cuales estará expuesto?	✓		Si su respuesta es NO, no debe hacer el trabajo
11	¿Sabe que acciones debe tomar en caso de cambio en las condiciones del trabajo y del entorno?	✓		Si su respuesta es NO, no debe hacer el trabajo
12	¿Se compromete usted a cumplir al 100% lo acordado en el procedimiento y ATS de este trabajo?	✓		Si su respuesta es NO, no debe hacer el trabajo
13	Ud. realizó la revisión del estado y ajuste de su EPP respiratorio, antes de realizar el trabajo?	✓		Si su respuesta es NO, no debe hacer el trabajo

Espacios para ser diligenciados por el encargado en el area				
Autorizado para Realizar el Trabajo	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO
HORA	7:30	7:30	7:30	7:30
Firma del Colaborador				
Firma del Supervisor				
Nombre del Interventor (Cuando aplique): _____				
OBSERVACIONES/COMENTARIOS:				

Powered by CamScanner

CONSORCIO NAVAL W26	CONSORCIO NAVAL W 26	EVALUACION CONDICIONESDE SALUD PARA TRABAJOS EN ALTURA	VERSION 1 VIGENCIA MAYO 2026

NOMBRE DEL TRABAJADOR	Jofo Julio	FIRMA		CEDULA	1037[illegible]5	CARGO	Ayudante
NOMBRE DEL SUPERVISOR	[illegible]	FIRMA		CEDULA	[illegible]	CARGO	Supervisor

Para asegurar que personal designado para realizar Trabajo en Altura se encuentra en buena condición de salud, se debe diligenciar este cuestionario:
Señor Colaborador, NO se limite a los aspectos mencionados en esta AUTOEVALUACIÓN. Tenga en cuenta y reporte cualquier otro aspecto que pueda poner en peligro su vida.

ITEM	CUESTIONARIO	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		25-05-26		26-05-26		27-05-26		28-05-26		29-05-26		30-05-26		FECHA	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	¿Toma de momento algún medicamento que le genere somnolencia?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2	¿Presenta algún tipo de enfermedad que le dificulte el desarrollo de las actividades?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
3	¿En este momento está libre de tratamientos medicos? Si la respuesta es NO indique cual:	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4	La ultima vez que consumio alcohol, fue ¿hace mas de 24 horas ?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
5	¿Presenta dificultades visuales?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
6	¿Presenta dificultades auditivas?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Autorizado para Realizar el Trabajo		SI/NO		SI/NO		SI/NO		SI/NO		SI/NO		SI/NO		SI/NO	
HORA		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		HORA	
Coordinador de trabajo en aturas		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]			
Nombre del trabajador		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]			

OBSERVACIONES/COMENTARIOS:

Powered by CamScanner

Espacios para ser diligenciados por el COLABORADOR DESIGNADO para realizar el Trabajo en Altura				
ITEM	CUESTIONARIO	SI	NO	
1	¿La noche/día anterior durmió por lo menos 6 horas?	✓		Si su respuesta es NO, no debe hacer el trabajo
2	¿Sus tres últimas comidas han sido de acuerdo a los horarios norm	✓		Si su respuesta es NO, no debe hacer el trabajo
3	¿En este momento está libre de tratamientos medicos?	✓		Si su respuesta es NO, no debe hacer el trabajo
4	Si la respuesta es NO indique cual: _____			Si su respuesta es NO, debe indicar el tratamiento médico al que está sometido y de esto dependerá la aprobación para realizar el trabajo
	La ultima vez que consumio alcohol, fue ¿hace mas de 72 horas ?	✓		
5	¿Ha realizado trabajos similares anteriormente?	✓		Si su respuesta es NO, no debe hacer el trabajo
6	¿Usted siempre ha terminado bien de salud cuando ha realizando trabajos similares anteriormente?	✓		Si su respuesta es NO, no debe hacer el trabajo
7	¿Le han explicado el procedimiento del trabajo que va a realizar?	✓		Si su respuesta es NO, no debe hacer el trabajo
8	¿Se siente apto para ejecutar el trabajo?	✓		Si su respuesta es NO, no debe hacer el trabajo
9	¿Usted esta en buenas condiciones de salud para realizar este trabajo?	✓		Si su respuesta es NO, no debe hacer el trabajo
10	¿Usted tiene conocimiento e identifica los peligros a los cuales estará expuesto?	✓		Si su respuesta es NO, no debe hacer el trabajo
11	¿Sabe que acciones debe tomar en caso de cambio en las condiciones del trabajo y del entorno?	✓		Si su respuesta es NO, no debe hacer el trabajo
12	¿Se compromete usted a cumplir al 100% lo acordado en el procedimiento y ATS de este trabajo?	✓		Si su respuesta es NO, no debe hacer el trabajo
13	Ud. realizó la revisión del estado y ajuste de su EPP respiratorio, antes de realizar el trabajo?	✓		Si su respuesta es NO, no debe hacer el trabajo

Espacios para ser diligenciados por el encargado en el area					
Autorizado para Realizar el Trabajo	SI ✓ NO	NO	SI ✓ NO	SI NO	
HORA	7:30	7:30	7:30	7:30	
Firma del Colaborador	Julio	Julio	Julio	Julio	
Firma del Supervisor					
Nombre del Interventor (Cuando aplique): _____					
OBSERVACIONES/COMENTARIOS:					

Powered by CamScanner

CONSORCIO NAVAL W26	CONSORCIO NAVAL W 26	EVALUACION CONDICIONESDE SALUD PARA TRABAJOS EN ALTURA	VERSION 1
			VIGENCIA MAYO 2026

NOMBRE DEL TRABAJADOR	Jose Soto	FIRMA		CEDULA	73559252	CARGO	SOTO. Ayudante
NOMBRE DEL SUPERVISOR	Gonzalez Izquierdo	FIRMA		CEDULA	73570577	CARGO	Supervisor

Para asegurar que personal designado para realizar Trabajo en Altura se encuentra en buena condición de salud, se debe diligenciar este cuestionario:
Señor Colaborador, NO se limite a los aspectos mencionados en esta AUTOEVALUACIÓN. Tenga en cuenta y reporte cualquier otro aspecto que pueda poner en peligro su vida.

ITEM	CUESTIONARIO	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		25-05-26		26-05-26		27-05-26		28-05-26		29-05-26		30-05-26		FECHA	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	¿Toma de momento algún medicamento que le genere somnolencia?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2	¿Presenta algún tipo de enfermedad que le dificulte el desarrollo de las actividades?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
3	¿En este momento está libre de tratamientos medicos? Si la respuesta es NO indique cual:	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4	La ultima vez que consumio alcohol, fue ¿hace mas de 24 horas ?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
5	¿Presenta dificultades visuales?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
6	¿Presenta dificultades auditivas?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Autorizado para Realizar el Trabajo		SI/NO		SI/NO		SI/NO		SI/NO		SI/NO		SI/NO		SI/NO	
HORA		7 HORA		7 HORA		7 HORA		7 HORA		7 HORA		7 HORA		HORA	
Coordinador de trabajo en aturas															
Nombre del trabajador		KSOTO		KSOTO		KSOTO		KSOTO		KSOTO		KSOTO			

OBSERVACIONES/COMENTARIOS:

Powered by CamScanner

Espacios para ser diligenciados por el COLABORADOR DESIGNADO para realizar el Trabajo en Altura				
ITEM	CUESTIONARIO	SI	NO	
1	¿La noche/día anterior durmió por lo menos 6 horas?	✓		Si su respuesta es NO, no debe hacer el trabajo
2	¿Sus tres últimas comidas han sido de acuerdo a los horarios norm	✓		Si su respuesta es NO, no debe hacer el trabajo
3	¿En este momento está libre de tratamientos medicos?	✓		Si su respuesta es NO, no debe hacer el trabajo
4	Si la respuesta es NO indique cual: _____			Si su respuesta es NO, debe indicar el tratamiento médico al que está sometido y de esto dependerá la aprobación para realizar el trabajo
	La ultima vez que consumio alcohol, fue ¿hace mas de 72 horas ?	✓		
5	¿Ha realizado trabajos similares anteriormente?	✓		Si su respuesta es NO, no debe hacer el trabajo
6	¿Usted siempre ha terminado bien de salud cuando ha realizando trabajos similares anteriormente?	✓		Si su respuesta es NO, no debe hacer el trabajo
7	¿Le han explicado el procedimiento del trabajo que va a realizar?	✓		Si su respuesta es NO, no debe hacer el trabajo
8	¿Se siente apto para ejecutar el trabajo?	✓		Si su respuesta es NO, no debe hacer el trabajo
9	¿Usted esta en buenas condiciones de salud para realizar este trabajo?	✓		Si su respuesta es NO, no debe hacer el trabajo
10	¿Usted tiene conocimiento e identifica los peligros a los cuales estará expuesto?	✓		Si su respuesta es NO, no debe hacer el trabajo
11	¿Sabe que acciones debe tomar en caso de cambio en las condiciones del trabajo y del entorno?	✓		Si su respuesta es NO, no debe hacer el trabajo
12	¿Se compromete usted a cumplir al 100% lo acordado en el procedimiento y ATS de este trabajo?	✓		Si su respuesta es NO, no debe hacer el trabajo
13	Ud. realizó la revisión del estado y ajuste de su EPP respiratorio, antes de realizar el trabajo?	✓		Si su respuesta es NO, no debe hacer el trabajo

Espacios para ser diligenciados por el encargado en el area				
Autorizado para Realizar el Trabajo	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO
HORA	7:30	7:30 HORA	7:30 a.m.	7:30 a.m.
Firma del Colaborador	SOTO	SOT	SOTO	SOTO
Firma del Supervisor				
Nombre del Interventor (Cuando aplique): _____				
OBSERVACIONES/COMENTARIOS:				

Powered by CamScanner

CONSORCIO	ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-02 VERSION 1 FECHA APROBACION: 08/01/2019

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Para dar cumplimiento a los art.230 CST modificado art.7 de la ley 11/84 "suministro de calzado y vestido de labor" y en seguridad y salud en el trabajo art 85 ley 9 de 1.979 y art. 91 decreto 1072 de 2015.

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE:	Alfredo Arrieta.	CARGO:	Ayudante.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	EPP	FIRMA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
1	Suéter Verde	Alfredo	2.	22-05-26.	
2	Camisa	Alfredo	2	09-05-26	
3	Pantalon	Alfredo	2	09-05-26	
4	Botas.	Alfredo	1	09-05-26	
5	Casco	Alfredo	1	09-05-26	
6	Gafas.	Alfredo	1	09-05-26	
7	Guantes	Alfredo.	1.	09-05-26.	
8					

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el Sistema de Gestion y Seguridad del trabajo como evidencia y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado en la **CONSORCIO NAVAL W26**

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DEL TRABAJADOR:	Alfredo	CEDULA:	73570776.

RESPONSABLE

NOMBRE	Gabrielita Revollo Romero	CEDULA No.	1128060903.
CARGO	Residente SST.	FIRMA	

Powered by CamScanner

CONSORCIO NAVAL W26	ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-02 VERSION 1 FECHA APROBACION: 08/01/2019

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Para dar cumplimiento a los art.230 CST modificado art.7 de la ley 11/84 "suministro de calzado y vestido de labor" y en seguridad y salud en el trabajo art 85 ley 9 de 1.979 y art. 91 decreto 1072 de 2015.

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE:	Ronal Fernandez	CARGO:	Oficial

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	EPP	FIRMA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
1	Overol Verde.	RONAL	2	22-05-26	
2	Casco	RONAL	1	09-05-26.	
3	Camisas.	RONAL	2	09-05-26	
4	Botas.	RONAL	1	09-05-26.	
5	Gafas.	RONAL	1	09-05-26.	
6	Guantes.	RONAL	1	09-05-26.	
7	Pantalones.	RONAL.	2.	09-05-26.	
8					

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el Sistema de Gestion y Seguridad del trabajo como evidencia y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado en la **CONSORCIO NAVAL W26**

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DEL TRABAJADOR:	RONAL	CEDULA:	1047.365646.

RESPONSABLE

NOMBRE	Gabrielita Padilla Romero	CEDULA No.	1.128060907
CARGO	Residente SST.	FIRMA	

Powered by CamScanner

CONSORCIO NAVAL W26	ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-02
		VERSION 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Para dar cumplimiento a los art.230 CST modificado art.7 de la ley 11/84 "suministro de calzado y vestido de labor" y en seguridad y salud en el trabajo art 85 ley 9 de 1.979 y art. 91 decreto 1072 de 2015.

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE:	Yuleis Padilla	CARGO: Auxiliar Logistica

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	EPP	FIRMA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
1	Sueter	Yleis	2.	28-05-26	
2	Botas.	Yleis	1	28-05-26	
3	Pantalon	Yleis	1	28-05-26.	
4	Gafas.	Yleis	1	28-05-26.	
5	Casco	Yleis	1	28-05-26.	
6					
7					
8					

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el Sistema de Gestion y Seguridad del trabajo como evidencia y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado en la **CONSORCIO NAVAL W26**

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DEL TRABAJADOR: Yuleis Padilla	CEDULA: 1047383173
RESPONSABLE	Patricia Padilla

Powered by CamScanner

CONSORCIO NAVAL W26	ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-02 VERSION 1 FECHA APROBACION: 08/01/2019

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Para dar cumplimiento a los art.230 CST modificado art.7 de la ley 11/84 "suministro de calzado y vestido de labor" y en seguridad y salud en el trabajo art 85 ley 9 de 1.979 y art. 91 decreto 1072 de 2015.

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE:	Ana Cuenta	CARGO:	Ingeniera Residente

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	EPP	FIRMA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
1	Sueteres.	Anadelr.	2.	26-05-26.	
2	Botas	Anadelr.	1	26-05-26	
3	Casco	Anadelr.	1	26-05-26.	
4					
5					
6					
7					
8					

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el Sistema de Gestion y Seguridad del trabajo como evidencia y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado en la **CONSORCIO NAVAL W26**

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DEL TRABAJADOR:	Anadelr.	CEDULA:	1128049464.

RESPONSABLE

NOMBRE	Gabriela Patiño Pareo.	CEDULA No.	1128060969.
CARGO	Residente SST.	FIRMA	

Powered by CamScanner

CONSORCIO NAVAL W26	ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-02 VERSION 1 FECHA APROBACION: 08/01/2019

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Para dar cumplimiento a los art.230 CST modificado art.7 de la ley 11/84 "suministro de calzado y vestido de labor" y en seguridad y salud en el trabajo art 85 ley 9 de 1.979 y art. 91 decreto 1072 de 2015.

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE:	Pedro Diaz	CARGO: Auxiliar

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	EPP	FIRMA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
1	Casco + Barbiquejo.	Pedro Diaz	1	16-05-26.	
2	Guantes.	Pedro Diaz	1	16-05-26.	
3	Gafas.	Pedro Diaz.	1	16-05-26.	
4	Camisa	Pedro Diaz	1	16-05-26	
5	Pantalon.	Pedro D	1	16-05-26	
6	Botas.	Pedro D.	1	16-05-26	
7	Sueteres	Pedro D	2	22-05-26	
8					

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el Sistema de Gestion y Seguridad del trabajo como evidencia y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado en la **CONSORCIO NAVAL W26**

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DEL TRABAJADOR: Pedro Diaz	CEDULA: 1003474316.

RESPONSABLE

NOMBRE	Gabriela Castro Rueda.	CEDULA No.	1128060909.
CARGO	Residente SST.	FIRMA	

Powered by CamScanner

CONSORCIO NAVAL W26	ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-02 VERSION 1 FECHA APROBACION: 08/01/2019

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Para dar cumplimiento a los art.230 CST modificado art.7 de la ley 11/84 "suministro de calzado y vestido de labor" y en seguridad y salud en el trabajo art 85 ley 9 de 1.979 y art. 91 decreto 1072 de 2015.

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE:	Julio Javier Julio Villalba	CARGO: Ayudante

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	EPP	FIRMA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
1	Casco	Julio Julio Villalba	1	16-05-26	
2	Guantes.	Julio Julio Villalba.	1	16-05-26	
3	Gafas.	Julio Julio V	1	16-05-26	
4	Barbuquejo.	Julio Julio V	1	16-05-26	
5	Camisa	Julio Julio V	1	16-05-26	
6	Pantalon	Julio Julio V	1	16-05-26	
7	Botas	Julio Julio V	1	16-05-26	
8	Tapaoidos.	Julio Julio V	1	16-05-26.	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el Sistema de Gestion y Seguridad del trabajo como evidencia y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado en la **CONSORCIO NAVAL W26**

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DEL TRABAJADOR: Julio Javier	CEDULA: 1374705595.

RESPONSABLE

NOMBRE	Gabriela Rosales.	CEDULA No.	1128060907.
CARGO	Residente SST.	FIRMA	

Powered by CamScanner

CONSORCIO NAVAL W26	ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-02 VERSION 1 FECHA APROBACION: 08/01/2019

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Para dar cumplimiento a los art.230 CST modificado art.7 de la ley 11/84 "suministro de calzado y vestido de labor" y en seguridad y salud en el trabajo art 85 ley 9 de 1.979 y art. 91 decreto 1072 de 2015.

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE:	Jose SOTO.	CARGO:	Ayudante.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	EPP	FIRMA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
1	Sueter	+SOTO	2	26-05-26	
2	Camisas	+SOTO	2.	26-05-26	
3	Pantalons	SOTO	2.	26-05-26	
4	Casco + barbuejo.	SOTO	1	26-05-26	
5	Botas.	SOTO	1	26-05-26	
6	Guantes.	SOTO	1	26-05-26	
7	Gafas.	+SOTO	1.	26-05-26.	
8					

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el Sistema de Gestion y Seguridad del trabajo como evidencia y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado en la **CONSORCIO NAVAL W26**

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DEL TRABAJADOR: Jose SOTO	CEDULA:

RESPONSABLE

NOMBRE	Gabriela Castillo	CEDULA No.	1128 060 907.
CARGO	Residente SST.	FIRMA	

Powered by CamScanner

CONSORCIO NAVAL W26	ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-02 VERSION 1 FECHA APROBACION: 08/01/2019

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Para dar cumplimiento a los art.230 CST modificado art.7 de la ley 11/84 "suministro de calzado y vestido de labor" y en seguridad y salud en el trabajo art 85 ley 9 de 1.979 y art. 91 decreto 1072 de 2015.

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE:	Juan Calle.	CARGO: Ayudante

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	EPP	FIRMA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
1	Suéter Verde	Juan S.	2	22-05-26.	
2	Casco + Barboquejo	Juan S.	1	09-05-26.	
3	Botas	Juan S.	1	09-05-26	
4	Pantalon	Juan S.	2	09-05-26	
5	Gafas.	Juan S.	1	09-05-26	
6	Guantes.	Juan S.	1	09-05-26.	
7	Camisas	Juan S.	2	09-05-26.	
8					

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el Sistema de Gestion y Seguridad del trabajo como evidencia y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado en la **CONSORCIO NAVAL W26**

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DEL TRABAJADOR: Juan S.	CEDULA: 1052069374.

RESPONSABLE

NOMBRE	Gabriela Padilla R.	CEDULA No.	1128060907.
CARGO	Presidente SST.	FIRMA	

Powered by CamScanner

CONSORCIO NAVAL W26	ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-02
		VERSION 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Para dar cumplimiento a los art.230 CST modificado art.7 de la ley 11/84 "suministro de calzado y vestido de labor" y en seguridad y salud en el trabajo art 85 ley 9 de 1.979 y art. 91 decreto 1072 de 2015.

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE:	Marlo Cardenas.	CARGO: Ayudant.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	EPP	FIRMA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
1	Camisas.		2	09-05-26.	
2	Sueter verde.		2	22-05-26	
3	Pantalons.		1	09-05-26	
4	Casco + barbuquejo		1	09-05-26	
5	Gafas.		1	09-05-26	
6	Guantes.		1	09-05-26	
7	Botas.		1	09-05-26.	
8					

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el Sistema de Gestion y Seguridad del trabajo como evidencia y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado en la **CONSORCIO NAVAL W26**

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DEL TRABAJADOR:		CEDULA: 73116967.

RESPONSABLE

Powered by CamScanner

CONSORCIO NAVAL W26	ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-02
		VERSION 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Para dar cumplimiento a los art.230 CST modificado art.7 de la ley 11/84 "suministro de calzado y vestido de labor" y en seguridad y salud en el trabajo art 85 ley 9 de 1.979 y art. 91 decreto 1072 de 2015.

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE:	Jose Velasquez.	CARGO: Ayudantes.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	EPP	FIRMA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
1	Camisa	Jose ✓	2	28-05-26.	
2	Suéter. Verde.	Jose ✓	2	28-05-26.	
3	Pantalón	Jose ✓	1	28-05-26.	
4	Botas.	Jose ✓	1	28-05-26	
5	Gafas.	Jose ✓	1	28-05-26.	
6	Guantes.	Jose ✓	1	28-05-26	
7	Casco.	Jose ✓.	1.	28-05-26.	
8					

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el Sistema de Gestion y Seguridad del trabajo como evidencia y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado en la **CONSORCIO NAVAL W26**

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DEL TRABAJADOR: Jose	CEDULA: 38 140 35

RESPONSABLE

Powered by CamScanner

CONSORCIO NAVAL W26	ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-02
		VERSION 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Para dar cumplimiento a los art.230 CST modificado art.7 de la ley 11/84 "suministro de calzado y vestido de labor" y en seguridad y salud en el trabajo art 85 ley 9 de 1.979 y art. 91 decreto 1072 de 2015.

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE:	Jaime torres.	CARGO: Ayudante.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	EPP	FIRMA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
1	Camisas	JAIME	2	26-05-26.	
2	Sueter. Verde.	JAIME	2	22-05-26.	
3	Pantalon.	JAIME	1	26-05-26	
4	Casco + barbuje 80.	JAIME	1	26-05-26	
5	Gafas.	JAIME	1	26-05-26	
6	Botas.	JAIME	1	26-05-26	
7	Guantes.	JAIME	1	26-05-26.	
8					

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el Sistema de Gestion y Seguridad del trabajo como evidencia y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado en la **CONSORCIO NAVAL W26**

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DEL TRABAJADOR: JAIME	CEDULA: 73208537.

RESPONSABLE

Powered by CamScanner

INFORME DE ACCIDENTE DE TRABAJO DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE

ARL | sura

EPS a la que está afiliado	Código EPS	ARL a la que está afiliado	Código ARL
COOSALUD E.S.S. COOP.SALUD Y DLLO INT. CARTAGENA	138	ARL SURA	40

AFP a la que está afiliado: PROTECCION — Código AFP: 002

Identificación general de la empresa

Tipo de vinculador laboral: (•) Empleador ( ) Contratante ( ) Cooperativa de trabajo asociado

Nombre de la actividad económica

ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA, INCLUYE ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE ARQUITECTURA: DISEÑO DE EDIFICIOS Y DIBUJO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, PLANIFICACIÓN URBANA Y ARQUITECTURA PAISAJISTA, DISEÑO DE INGENIERÍA, CONSULTORÍA EN MAQUINARIA, PROCESOS Y PLANTAS INDUSTRIALES, INGENIERÍA CIVIL, HIDRÁULICA Y DE TRÁFICO, PROYECTOS DE ORDENACIÓN HÍDRICA, PROYECTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA CON PRESENCIA EN LAS INSTALACIONES DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO (CON INTERVENCIÓN DIRECTA EN

Nombre o razón social: METALIKAS- INGENIERIA SAS

Tipo de identificación: (•) NI ( ) CC ( ) CE ( ) NU ( ) PA — Número: 901190708

Dirección	Teléfono	Fax
TR 57 29 C-131	3206685953	

Correo electrónico	Departamento	Municipio	Zona
METALIKASINGENIERIA@GMAIL.COM	BOLIVAR	CARTAGENA DE INDIAS	(•) U ( ) R

Centro de trabajo donde labora el trabajador

Son los datos del centro de trabajo son los mismos de la sede principal? (•) Si ( ) No

Nombre de la actividad económica del centro de trabajo — Código de la actividad económica del centro de trabajo: 5711001

ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA, INCLUYE ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE ARQUITECTURA: DISEÑO DE EDIFICIOS Y DIBUJO DE

Dirección	Teléfono	Fax
TV 57 # 29 C - 131 BRR	3112573557	

Departamento	Municipio	Zona
BOLIVAR	CARTAGENA DE INDIAS	(•) U ( ) R

Identificación de la persona que se accidentó

Tipo de vinculación: (•) Planta ( ) Misión ( ) Cooperado ( ) Estudiante o aprendíz ( ) Independiente — Código:

Primer apellido	Segundo apellido	Nombres
SOTO	VELASQUEZ	JOSE DEL ROSARIO

Tipo de identificación: ( ) NI (•) CC ( ) CE ( ) NU ( ) PA — Número: 73559252 — Fecha de nacimiento: 06061974 — Sexo: (•) M ( ) F

Dirección	Teléfono	Fax
SECTOR CAMPO VELLO 2 MP L2	3145907872	

Departamento	Municipio	Zona	Cargo
BOLIVAR	CARTAGENA DE INDIAS	(•) U ( ) R	AYUDANTE

Ocupación habitual	Tiempo de ocupación habitual al momento del accidente
PINTORES, BARNIZADORES Y ENLACADORES DE ARTÍCULOS METÁLICOS Y AFINES	1:9

Fecha de ingreso a la empresa	Salario u honorarios (mensual)	Jornada de trabajo habitual
24042026	1750905	(•) Diurna ( ) Nocturna ( ) Mixto ( ) Turnos

Información sobre el accidente

Fecha del accidente	Estaba dentro de la empresa?	Día de la semana en el que ocurrio el accidente
01062026 10:40:00	S	Lunes

Jornada en que sucede: (•) Normal ( ) Extra — ¿Estaba realizando su labor habitual? (•) Si ( ) No — ¿Cuál?

¿Causó la muerte al trabajador?	Departamento del accidente	Municipio del accidente	Zona donde ocurrio el accidente
( ) Si (•) No	BOLIVAR	CARTAGENA DE INDIAS	(•) U ( ) R

Total tiempo laborado previo al accidente: 3:10 — Tipo de accidente: ( ) Violencia ( ) Tránsito ( ) Deportivo ( ) Recreativo o cultural (•) Propios del trabajo

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Lugar donde ocurrió el accidente (•) Dentro de la empresa ( ) Fuera de la empresa

Indique cuál sitio

- ( ) Almacenes o depósitos
- ( ) Áreas de producción
- ( ) Áreas recreativas o deportivas
- (•) Corredores o pasillos
- ( ) Escaleras
- ( ) Parqueaderos o áreas de circulación vehícular
- ( ) Oficinas
- ( ) Otras áreas comunes
- ( ) Otro

Parte del cuerpo aparentemente afectado

- (•) Cabeza
- ( ) Ojo
- ( ) Cuello
- ( ) Tronco (incluye espalda, columna vertebral, médula espinal, pélvis)
- ( ) Tórax
- ( ) Abdomen
- ( ) Miembros superiores
- ( ) Manos
- ( ) Miembros inferiores
- ( ) Pies
- ( ) Ubicaciones múltiples
- ( ) Lesiones generales u otras

Tipo de Lesión

- ( ) Fractura
- ( ) Luxación
- ( ) Torcedura o esguince, desgarro muscular, hernia o laceración de tendón sin herida
- ( ) Conmoción o trauma interno
- ( ) Amputación o ennucleación
- ( ) Herida
- (•) Trauma superficial
- ( ) Golpe contusión o aplastamiento
- ( ) Quemadura
- ( ) Envenenamiento o intoxicación aguda o alergia
- ( ) Efecto del tiempo, del clima u otro relacionado con el ambiente
- ( ) Asfixia
- ( ) Efecto de la electricidad
- ( ) Efecto nocivo de la radiación
- ( ) Lesiones múltiples
- ( ) Otro

Agente del accidente (con que se lesionó el trabajador)

- ( ) Máquinas y/o equipos
- ( ) Medios de transporte
- ( ) Aparatos
- ( ) Herramientas, implementos o utensilios
- ( ) Materiales o sustancias
- ( ) Radiaciones
- ( ) Ambiente de trabajo (incluye superficies de tránsito y de trabajo, muebles, tejados, en el exterior, interior o subterráneos)
- ( ) Otros agentes no clasificados
- ( ) Animales (vivos o productos animales)
- (•) Agentes no clasificados por falta de datos

Mecanismos o forma del accidente

- ( ) Caída de personas
- ( ) Caída de objetos
- ( ) Pisadas, choques o golpes
- ( ) Atrapamientos
- ( ) Sobreesfuerzo, esfuerzo excesivo o falso movimiento
- ( ) Exposición o contacto con temperatura extrema
- ( ) Exposición o contacto con la electricidad
- ( ) Exposición o contacto con sustancias nocivas o radiaciones o salpicaduras
- (•) Golpes por o contra objetos
- ( ) Otro

Descripción del accidente

EL TRABAJADOR SE ENCONTRABA EN EL ANDAMIO PINTANDO UNA ESTRUCTURA, AL MOMENTO DE PASAR DE UN LADO A OTRO EN EL ANDAMIO SE TROPIEZA CON UNA VIGA Y PRESENTA TRAUMA CONTUNDENTE REGION PARIETAL DERECHA SIN PERDIDA DE CONOCIMIENTO Y TRAUMA EN PABELLON AURICULAR.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Personas que presenciaron el accidente — Hubo personas que presenciaron el accidente? ( ) Si (•) No

Apellidos y nombres — Documento de identidad ( ) CC ( ) TI ( ) CE ( ) NU ( ) PA — No.

Cargo

Apellidos y nombres — Documento de identidad ( ) CC ( ) TI ( ) CE ( ) NU ( ) PA — No.

Cargo

Persona responsable del informe (Representante o delegado)

Apellidos y nombres: LENGUA CAMACHO CATHERIN PAOLA — Documento de identidad (•) CC ( ) TI ( ) CE ( ) NU ( ) PA — No. 1047501213

Cargo: COORDINADORA SST

ARL | SURA

03-06-2026 10:41:56

03-06-2026 10:41:56

RECIBIDO

Fecha de diligenciamiento del informe del accidente

Fecha de recibido en ARL SURA

Fecha Impresión 03-06-2026 10:43:26

CONSORCIO
ESCUELAS
CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA

C. ACTAS DE COMITÉ

ACTA DE REUNION	CONSORCIO ESCUELAS

ACTA DE	Comité de seguimiento técnico N°4 del contrato de obra 0020 ARC-ENAP-2026 LOTE 1
FECHA	05 de mayo del 2026
HORA	14:00.
LUGAR	Edificio ALFA SEXTANTIS

FIRMA DE PARTICIPANTES		
Nombre Completo	**Cargo**	**Firma**
Julián Rodriguez	Teniente de Corbeta-Apoyo técnico de la oficina de planeación ENAP	
Daniel Mesa Aguirre	Teniente de Corbeta-Supervisor del contrato de Interventoría- oficina de planeación ENAP	
Wilver Russy Ladino	Director de obra - Representante legal	
Gabrielita Padilla romero	Residente SGSST de obra	
Rodrigo Gutierrez	Arquitecto de apoyo de obra	
Heraldo Gutierrez	Director de Interventoría	
Luz Darys Padilla Lara	Residente SST Interventoría	
Alba Pearson	Residente de Interventoría	
Zamir García	Coordinador SST de interventoría	
Alejandra Contreras Mejía	Coordinadora técnica de Interventoría	

ORDEN DEL DIA

1. Inicio de la reunión
2. Verificación de los compromisos del acta anterior
3. Estado general del contrato de obra
4. Cierre de la reunión y compromisos

DESARROLLO DEL DIA

1. Inicio de la reunión

Se da apertura al comité de seguimiento del contrato por parte de la interventoría, dando la bienvenida a los participantes.

2. Verificación de los compromisos anteriores

MATRIZ DE COMPROMISOS			
Compromiso	Responsable	Fecha de ejecución	Cumplimiento
Aprobar del cronograma de trabajo acorde a las observaciones emitidas.	interventoría	05/2/05/2026	Si cumple – no cerrado

Scanned with CamScanner

ACTA DE REUNION	CONSORCIO ESCUELAS

Presentación de APU´s	contratista	29/04/2026	Si cumple – no cerrado
Verificar las cantidades de obra	Contratista de obra	30/04/2026	Si cumple - se presentan en comité
Entregar el diseño de la valla del proyecto	ENAP	05/05/2026	Si cumple

3. Estado general del contrato de obra

- Aprobar el cronograma de trabajo acorde a las observaciones emitidas:

Se revisa la programación de obra radicada por el contratista, la cual presenta observaciones por la interventoría en los siguientes aspectos:

Definición de hitos: Se requiere una mejor estructuración y claridad en la identificación de los hitos del proyecto.

Ruta crítica: La ruta crítica planteada corresponde a la ejecución de la totalidad del cronograma de obra, lo cual no es técnicamente adecuado; por tanto, se recomienda su replanteamiento. Teniendo en cuenta que las actividades de pinturas no están garantizando los tiempos de secado.

Secuencia de actividades: Se evidencian inconsistencias en la lógica de precedencias, por lo que se requiere ajustar la secuencia de las actividades.

De acuerdo a lo presentado, por parte de la supervisión se realiza la solicitud que sea ajustada teniendo en cuenta los periodos se secado de la pintura, acorde a las recomendaciones del fabricante las cuales son de 24 a 72 horas entre capas. Para lo cual, el contratista de obra realizara el respectivo ajuste y enviara nuevamente para su validación.

- Presentación de APU´s, No previstos

Se realiza la presentación de los APU para los ítems no previstos:

NP- 1, Corte y desmonte controlado de ángulo residual existente adosado a viga metálica incluye trabajo en alturas, corte mediante equipos de pulidora, desmonte con cuadrilla de control de descuelgue y descenso retiro y disposición final en sitio autorizado.

N.P-2, Suministros e instalación de puerta de aluminio con vidrio de seguridad 6 mm transparente bisagra pivote y cerradura llave - pistillo.

N.P-3, suministros e instalación de ventana proyectante con vidrio 6 mm. Incluye todos los elementos para su instalación y correcto funcionamiento medidas 2.50 x 0.55 incluye todos los elementos para su instalación y correcto funcionamiento

Scanned with CamScanner

ACTA DE REUNION	CONSORCIO ESCUELAS

De acuerdo a los compromisos adquiridos, desde la interventoría se indica que posterior a la verificación y mesa de trabajo con el contratista se realizaron los ajustes:

1. Los APU revisados por la interventoría, corresponden al desmonte de ángulos y suministro e instalación de ventana en el edificio Alfa Sextantis.
2. El APU de la instalación de la puerta, no fue posible su aprobación, toda vez que no se presentaron las dimensiones.
3. Se utilizaron insumos y equipos contractuales.

Desde la supervisión, se realizan algunas observaciones:

- Para el NP-1, que corresponde al desmonte de los ángulos, se solicita que sean unificados los rendimientos de los equipos como el andamio, con los rendimientos de la Cuadrilla y su EPP, toda vez que deben guardar correlación.
- Para el NP-3, correspondiente al suministro e instalación de la ventana, se realiza la observación que se ajuste en la descripción interna del material, omitiendo la palabra instalación, toda vez que se incluye la mano de obra. El item de transporte se debe eliminar de APU debido que esta incluido en el suministro e instalación de la misma.
- Validar las tres cotizaciones que presente el contratista, cuyo valor final del precio unitario del insumo será el resultado del promedio de estas.

De acuerdo a lo presentado, entre las partes se manifiesta que el valor unitario para el NP-3 que corresponde al suministro e instalación de la ventana, se encuentra dentro de los precios de mercado. Con lo cual, no se presenta objeción al valor indicado, correspondiente a $706.886 Costo directo por M2.

- **Verificación de cantidades de obra en campo**

Se revisaron en el transcurso de la semana en conjunto interventoría - contratista el ITEM correspondiente a vigas metálicas así:

- Viga metalica: vigas de piso 1, fachada norte, fachada flotante norte para un total de intervencion en vigas de 4.500m2
- Columnas metalicas: Se realiza el recorrido y medicion de las columnas de los pisos 2, 3, 4 que estan a al intemperie arrojando 310.6 m2 aprox, quedando 389.4m2 de cantidad del contrato disponible para balanceo.
- Barandas metalicas: se realiza la medición de las escaleras en la fachada norte arrojando las siguientes cantidades 107,91 ml, quedando 192.09ml aproximadamente disponibles de la cantidad contractual.

Dentro del comité las tres partes establecen Qué es necesario realizar la intervencion de los peldaños y descanzos de la escalera que se intenvendra en la fachada norte, por tal motivo el residente y la interventoria del contratista tomaran las medidas pertinentes con el proposito de ser socializadas y aprobadas en el siguiente comité.

Scanned with CamScanner

ACTA DE REUNION	CONSORCIO ESCUELAS

Por otro lado, respecto a la instalación de la valla del proyecto, se deja claridad que este fue entregado por la supervisión, por lo cual se reitera al contratista de obra, su oportuna instalación. El director de obra, manifiesta que el proximo jueves 7 de mayo del 2026 se inicia con la instalación de la misma.

Desde la supervisión, se solicita a la interventoría, que para le proximo comité sea presentado el avance del proyecto junto con la Curva S del mismo y los hitos que presenten desviación, adicional requiere el envio oportuno de los informes semanales.

Se deja claridad desde la interventoría, que fue aprobada el tipo de pintura a implementar, desde la supervisión se recomienda el inicio de las actividades de preparación de la estructura. Acorde a lo manifestado por el contratista, se aclara que se encuentra en tramite el ingreso de personal el cual fue radicado a la interventoría el día de ayer e indica que hoy radicaran una nueva solicitud de ingreso.

Las referencias de pinturas aprobadas por esta interventoria fueron avaladas en el oficio CE-206-I1-010 del 5 de mayo de 2026 y corresponden al sistema Hempel así: Hempadur Mastic 45880, Hempaprime Multi 500 y Hempathane Topcoat 55210; se le hace claridad al contratista que por ningún motivo puede llegar a cambiar el sistema de pintura aprobado por la interventoría y si por cualquier motivo requiere cambiarlo debe enviar la nueva ficha técnica del esquema de pintura al ente de control para que sea aprobado.

Se reitera el cumplimiento de los tiempos para la gestión de ingreso de personal, el cual debe realizarse 48 horas con anterioridad a la interventoría. Lo anterior con el fin de evaluar la documentación recibida.

4. Cierre de la reunión y compromisos

No habiéndose presentado más intervenciones ni comentarios adicionales, se dio por concluida el comité de seguimiento técnico, deseando un buen día a los presentes y estableciéndose los siguientes compromisos.


MATRIZ DE COMPROMISOS		
Compromiso	**Responsable**	**Fecha de ejecución**
Programación de obra: presentación de ajustes	Contratista	06/05/2026
Presentación de APU´s – Np 1- 2- 3	Contratista - Interventoría	06/05/2026
Presentación de APU´s Np 4 (escalera)	Contratista - Interventoría	12/05/2026
Verificar las cantidades de obra, según indicación de la supervisión técnica	Contratista de obra	30/04/2026
Instalación de valla, de acuerdo a diseño compartido por ENAP	Contratista	07/05/2026
Presentar seguimiento a la programación (con curva S)	interventoría	07/05/2026

Scanned with CamScanner

ACTA DE REUNION	CONSORCIO ESCUELAS

Presentar informe semanal	Interventoría	07/05/2026
Presentar cantidades de viga piso 1 -2 – 3- 4 a la intemperie para tener en cuenta en el balance	Contratista- Interventoría	12/05/2026
Presentar recorrido y/o validación de las puertas - mantenimiento	Contratista- Interventoría	12/05/2026
Presentar balance del contrato de obra	Contratista- Interventoría	12/05/2026
Presentar validación de luminaria para presentación de NP-5 de ser necesario	Supervisión técnica – Contratista – Interventoría	12/05/2026

REGISTO FOTOGRAFICO

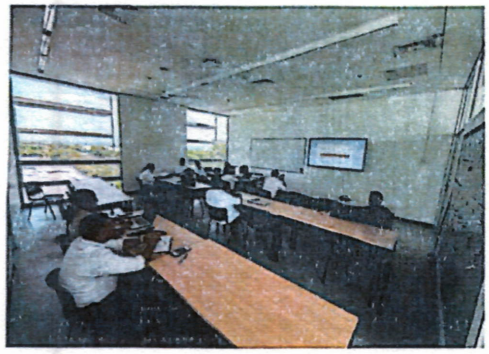

1. Comité de seguimiento en edificio alfa sextantis



2. Comité de seguimiento en edificio alfa sextantis



3. Comité de seguimiento en edificio alfa sextantis

Scanned with CamScanner

ACTA DE REUNION	CONSORCIO ESCUELAS

ACTA DE	Comité de seguimiento técnico N°5 del contrato de obra N°0020-ARC ENAP 2026 (Lote 1)
FECHA	14 de mayo del 2026
HORA	2:15 P.m.
LUGAR	Oficina de

FIRMA DE PARTICIPANTES		
Nombre Completo	**Cargo**	**Firma**
Christian Vargas	Capitán de Fragata - Gerente de Proyecto ENAP	
Julián Rodríguez	Teniente de Corbeta-Apoyo técnico de la oficina de planeación ENAP	
Daniel Mesa Aguirre	Teniente de Corbeta-Supervisor del contrato de Interventoría- oficina de planeación ENAP	
Abner Pérez	Apoyo a la dirección de obra	
Edwar Menco	Residente de obra	
Gabrielita Padilla Romero	Residente SST del contratista	
Rodrigo Gutiérrez	Ingeniero del contratista	
Ariel Grau	Sub contratista	P.P
Giovanny Lozano	Supervisor subcontratista	
Catherine Lengua	Residente sub contratista	
Heraldo Gutiérrez	Director de Interventoría	
Alba Pearson	Residente de Interventoría	
Luz Darys Padilla	Residente HSEQ Interventoría	Luz Darys Padilla P.
Zamir Garcia	Profesional HSEQ Interventoría	
Alejandra Contreras Mejía	Coordinadora de Interventoría	

ORDEN DEL DIA

1. Inicio de la reunión
2. Verificación de los compromisos del comité anterior
3. Estado general del contrato de obra
4. Cierre de la reunión y compromisos

DESARROLLO DEL DIA

1. Inicio de la reunión

La reunión inició con la instalación formal del comité por parte de la interventoría, realizando su presentación y dando la bienvenida a los asistentes.

Scanned with CamScanner

ACTA DE REUNION	CONSORCIO ESCUELAS

2. Verificación de los compromisos del comité anterior

Se continua con la lectura de los compromisos establecidos en el comité de seguimiento anterior.

- **Programación de obra ajustada conforme a las observaciones realizadas:** Desde la interventoría se aclara que, aunque se efectuaron ajustes en el horario laboral, la programación continúa contemplando semanas laborales de 51 horas y la ejecución de actividades en días feriados, situación que afecta los rendimientos reales del proyecto, considerando que actualmente se ejecutan 46 horas semanales.

  Adicionalmente, se evidenció que entre la aplicación del anticorrosivo, la base y el acabado se establecieron holguras considerables, las cuales no atienden las recomendaciones contenidas en las fichas técnicas del fabricante, dado que superan el tiempo máximo de aplicación del producto entre capa y capa.

  Desde la supervisión se precisa que, en caso de superarse este tiempo, deberán implementarse las recomendaciones y procedimientos técnicos necesarios para garantizar y mejorar la adherencia entre capas.

Debido a las observaciones anteriormente indicadas, se acuerda entre el contratista y la interventoría realizar una mesa de trabajo el día viernes 15-05-2026 a las 10:00am, con el fin de ajustar la programación y la subsanación de los APU no previstos

- ✓ **NP-1 – Retiro de ángulos:** Desde la interventoría se aclara que la observación no fue subsanada en su totalidad, toda vez que no fueron entregadas las tres (03) cotizaciones.
- ✓ **NP-2.– Suministro de puerta:** Se indica que el valor presentado en la subsanación difiere del previamente acordado, evidenciándose un incremento aproximado de $30.000.
- ✓ **NP-3 – Suministro de ventana:** Desde la interventoría se informa que el valor acordado en el comité anterior, correspondiente a $706.886 por m², fue ajustado en la subsanación presentada, estableciendo un valor final de $736.643,61 por m².
- ✓ **NP-8:** Se observa que las cotizaciones allegadas presentan diferencias en sus descripciones y unidades, lo que impide su validación y comparación técnica y económica.

Finalmente, se deja constancia de que los demás ítems de los NP 4-5-6-7 corresponden a actividades contractuales; por lo tanto, sus valores unitarios deberán mantenerse conforme a los precios establecidos en la propuesta económica presentada por el contratista.

- **Balance de cantidades de obra**

Desde la interventoría se presentan los avances en la verificación y conciliación de las cantidades de obra a ejecutar por cada piso, indicando los elementos que ya cuentan con la validación conjunta entre las partes. Asimismo, se señala que el balance realizado tiene como propósito ajustar el alcance del proyecto a la disponibilidad presupuestal existente.

En atención a los lineamientos impartidos por la supervisión, se desarrolla un ejercicio de balance presupuestal mediante el cual se evalúan posibles ajustes en los elementos a intervenir. Como resultado preliminar, se

Scanned with CamScanner

ACTA DE REUNION	CONSORCIO ESCUELAS

plantea excluir de la cuantificación de cantidades las actividades correspondientes a la fachada del piso 4 del edificio de alfa sextantis, específicamente en los componentes de vigas y columnas.

De igual manera, se analiza la viabilidad de incorporar dentro del balance los ítems no previstos relacionados con el suministro e instalación de puertas, considerando la necesidad funcional de estos elementos y el saldo a favor del balance conforme a la exclusión de las actividades en el piso N°4 de la fachada sur.

- **Color del anticorrosivo para la estructura metálica del edificio alfa sextantis**

Por solicitud de las partes, se procede a revisar los temas relacionados con la pintura de la estructura metálica, con el fin de evitar afectaciones en la continuidad de las actividades ejecutadas por el subcontratista encargado. En este sentido, se aborda la discrepancia existente respecto a la definición del color del anticorrosivo especificado para aplicar en la estructura metálica.

Desde la interventoría se da inicio a la intervención indicando que, de conformidad con las especificaciones técnicas del proyecto, el color establecido para la aplicación del anticorrosivo corresponde al color rojo.

Posteriormente, y luego de un intercambio de conceptos y observaciones entre las partes asistentes, se deja constancia en la presente acta que el sistema de pintura deberá ejecutarse estrictamente conforme a las especificaciones definidas, correspondientes a: anticorrosivo color rojo (2 capas), base color gris (2 capas) y acabado final color blanco (3 capas). Lo anterior, con el fin de garantizar la uniformidad y el cumplimiento técnico requerido para el adecuado sistema de protección de la estructura metálica.

Por su parte, desde la supervisión se indica que la interventoría deberá realizar la liberación previa de cada elemento metálico antes de cada intervención. Asimismo, recomienda dejar el respectivo registro en la bitácora de obra, identificando los ejes de cada elemento liberado, con las firmas correspondientes, de manera que exista trazabilidad y autorización formal para proceder con la ejecución de las actividades.

El contratista de obra manifiesta que el conducto regular de las comunicaciones técnicas y administrativas debe mantenerse directamente entre la interventoría y el contratista de obra, y no de manera directa con el subcontratista. Adicionalmente, informa que presentará las órdenes de remisión y documentación correspondiente de los materiales a utilizar, con el propósito de que la interventoría realice la respectiva validación y verificación de cumplimiento frente a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

- **Instalación de la valla del proyecto**

El contratista manifiesta que la valla ya se encuentra impresa; sin embargo, actualmente se están realizando las gestiones internas para la contratación de la estructura metálica. Asimismo, indica que el compromiso de instalación está previsto para el 23 de mayo de 2026. Solicitando la supervisión técnica, evidenciar para el martes 19 de mayo de 2026 el estado de fabricación de la misma.

- **Entrega a interventoría del Informe mensual de obra correspondiente al mes de abril**

El contratista manifiesta que el informe mensual se encuentra en proceso de ajustes por parte del área administrativa del Consorcio; por lo tanto, se indica que será entregado el día de mañana 15 de mayo de 2026.

Desde la supervisión se reitera que la entrega de los informes mensuales debe realizarse dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes; por lo tanto, se insta a las partes a dar estricto cumplimiento a lo establecido.

Scanned with CamScanner

ACTA DE REUNION	CONSORCIO ESCUELAS

3. Estado general del contrato

Continuando con el orden del día, la interventoría solicita aclaraciones al contratista respecto a varias comunicaciones emitidas previamente, en las cuales se han realizado diferentes recomendaciones y requerimientos:

- **Permanencia en obra del residente aprobado:** Por parte de la ENAP, el Capitán Vargas manifiesta que se deben adoptar acciones inmediatas, toda vez que no se está dando cumplimiento a las condiciones pactadas, situación que dificulta la toma de decisiones y el adecuado seguimiento de la obra. Asimismo, el supervisor solicita a la interventoría emitir un nuevo requerimiento formal y advierte que, en caso de persistir el incumplimiento, se procederá con las acciones legales correspondientes.

  Por su parte, el contratista indica que el residente de obra estará presente al 100% en la obra a partir del próximo martes.

- **Subsanación de los planes del proyecto:** La interventoría manifiesta que no se ha obtenido respuesta por parte del contratista de obra, antes los requerimientos realizados para la subsanación de los siguientes documentos: PMA, Plan SST, Plan de Gerencia y Plan de Calidad. Frente a ello, el contratista informa que las subsanaciones serán entregadas el próximo martes 19 de mayo de 2026.

  Adicionalmente, la supervisión solicita a la interventoría radicar un comunicado formal requiriendo al contratista la permanencia al 100% del profesional asignado al programa de gerencia de proyectos, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Por otro lado, se solicita la presentación de la propuesta del diseño de jardinería para su respectiva evaluación y aprobación el día 19 de mayo de 2026 en el espacio disponible en jardinera de piso 2 en edificio Alfa Sextantis, y la instalación de este debe ser el martes 26 de mayo de 2026,reiterando que el contratista deberá realizar los respectivos riegos y mantenimientos necesarios para su sostenimiento; la entrega de los jardines debidamente instalados y en óptimas condiciones lo recibirá el contratante al finalizar la obra con el recibo del contrato.

- **Vinculación de mano de obra femenina (5%):** Se reitera al contratista la obligación de dar cumplimiento al porcentaje de vinculación de mano de obra femenina establecido contractualmente. Frente a ello, el contratista manifiesta que actualmente se encuentra adelantando el proceso de consecución del personal requerido, para su posterior vinculación.

Se continúa con la presentación del avance de obra con corte al 10 de mayo de 2026, en el cual se evidencia un porcentaje ejecutado del 0,45% frente a un porcentaje programado del 3%, generándose una desviación negativa en la programación del 2.55%. En atención a lo anterior, se establece como compromiso que la interventoría remitirá un comunicado formal relacionado con la desviación presentada, solicitando al contratista la entrega de un plan de contingencia.

Desde la supervisión se manifiesta que la entidad adelanta procesos por presunto incumplimiento cuando se presenta una desviación negativa igual o superior al 5%; por lo tanto, se recomienda al contratista de obra

Scanned with CamScanner

ACTA DE REUNION	CONSORCIO ESCUELAS

implementar las medidas que considere pertinentes, con el fin de garantizar un adecuado ritmo de ejecución y avance del proyecto. Para ello debe presentar plan de contingencia con el cual mitigara los retrasos.

Por otro lado, la interventoría solicita dar cumplimiento a la dotación del personal con prendas de color verde, de conformidad con lo establecido en el Comité No. 1. Frente a ello, el contratista manifiesta que este requerimiento será atendido a más tardar el próximo martes.

De igual manera, el profesional HSEQ de la interventoría reitera que, a la fecha, no se ha dado cumplimiento con la entrega de la documentación SST requerida para la ejecución de trabajos en alturas. En consecuencia, la supervisión establece como fecha límite máxima el sábado 16 de mayo de 2026; de lo contrario, no se autorizará la ejecución de dichas actividades.

Por su parte, el contratista de obra solicita la realización de una mesa de trabajo, con el fin de que la documentación SST requerida para trabajos en alturas pueda ser revisada, validada y ajustada directamente en campo, evitando así posibles reprocesos y garantizando el cumplimiento de los requisitos exigidos.

Finalmente, por solicitud del contratista, se propone modificar el horario de los comités semanales, acordándose entre las partes su realización todos los martes a las 9:00 a.m.

No habiéndose presentado más intervenciones ni comentarios adicionales, se procede con realizar el recorrido en campo, con la finalidad de validar las actividades ejecutadas a la fecha.

En el recorrido de campo se revisan los avances del contratista en piso 3 y se identifican que elementos de la estructura metálica quedaron por fuera del balance, para lo cual se debe presentar a la supervisión debidamente referenciadas en plano, se aprueba la intervención de toda la fachada norte desde el piso 1 hasta piso 5 y vigas longitudinales del primer piso.

4. Cierre de la reunión y compromisos

Una vez finalizado el recorrido, se dio por concluida el comité de seguimiento técnico, deseando una buena tarde a los presentes y estableciéndose los siguientes compromisos.

MATRIZ DE COMPROMISOS

Compromiso	Responsable	Fecha de ejecución
Mesa de trabajo entre contratista e interventoría, para ajustar los APU de los ítems no previstos y la programación de obra	Contratista de obra/Interventoría	15/05/2026
Instalación de la valla del proyecto (Mostrar avance de esta instalación en el próximo comité)	Contratista de obra	23/05/2026
Entrega del informe mensual de obra correspondiente al mes de abril de 2026	Contratista de obra	15/05/2026
Dotación del personal con el color verde	Contratista de obra	19/05/2026
Requerimiento de interventoría al contratista de obra para la entrega de un Plan de contingencia	Interventoría	15/05/2026

Scanned with CamScanner

ACTA DE REUNION	CONSORCIO ESCUELAS

Presentación de plan de contingencia para mitigar retrasos	Contratista de obra	19/05/2026
Reiteración para la dedicación del residente de obra 100%	Interventoría	15/05/2026
Entrega de documentación SST para realizar los trabajos en alturas	Contratista de obra	16/05/2026
Presencia del residente de obra en campo	Contratista de obra	19/05/2026
Presentar la cotización de las puertas para el NP-8	Interventoría	19/05/2026
Presentación de diseño de jardinería	Contratista de obra	19/05/2026
Siembra de jardinería según diseño aprobado por supervisión técnica	Contratista de obra	26/05/2026
Instalar Ventana fachada norte	Contratista de obra	20/05/2026
Realizar el mantenimiento y la instalación de las dos puertas solicitadas en recorrido de obra	Contratista de obra	28/05/2026

REGISTO FOTOGRAFICO



Comité de seguimiento N°5



Comité de seguimiento N°5



Recorrido de campo



Recorrido de campo

Scanned with CamScanner

ACTA DE REUNION	CONSORCIO ESCUELAS

ACTA DE	Comité de seguimiento técnico N°6 del contrato de obra N°0020-ARC ENAP 2026 (Lote 1)
FECHA	19 de mayo del 2026
HORA	9:10 a.m.
LUGAR	Oficina de Gerencia de proyectos – Edificio Comando - ENAP

FIRMA DE PARTICIPANTES

Nombre Completo	Cargo	Firma
Julián Rodríguez	Teniente de Corbeta-Apoyo técnico de la oficina de planeación ENAP	
Jesús Varón	Ingeniero de apoyo ENAP	
Abner Pérez	Ing. Dirección de obra	
Edwar Menco	Ing. Residente de obra	
Gabrielita Padilla Romero	Residente SST del contratista	
Rodrigo Gutiérrez	Arq. De apoyo de obra	
Catherine Lengua	Ing. Residente sub contratista	
Heraldo Gutiérrez	Ing. Director de Interventoría	
Alba Pearson	Ing. Residente de Interventoría	
Luz Darys Padilla	Residente HSEQ Interventoría	
Zamir García	Profesional HSEQ Interventoría	
Alejandra Contreras Mejía	Coordinadora de Interventoría	

ORDEN DEL DIA

1. Inicio de la reunión
2. Verificación de los compromisos del comité anterior
3. Estado general del contrato de obra
4. Cierre de la reunión y compromisos

DESARROLLO DEL DIA

1. **Inicio de la reunión**

Se da inicio al comité de seguimiento, presidido por el ingeniero Jesús Varón, quien informa que, debido a asuntos internos de la ENAP relacionados con la etapa electoral, el supervisor del contrato de interventoría se ausentará aproximadamente durante las próximas tres semanas. No obstante, se aclara que, durante dicho periodo, las funciones de supervisión del contrato serán asumidas por el ingeniero Jesús Varón.

Posteriormente, se realiza la presentación de los asistentes y se proyecta por la interventoría los temas a tratar en el presente comité.

ACTA DE REUNION	CONSORCIO ESCUELAS

2. Verificación de los compromisos del comité anterior

Se continua con la lectura de los compromisos establecidos en el comité de seguimiento anterior.

- **Mesa de trabajo entre contratista e interventoría para la verificación de No previstos y programación:** Desde la interventoría se informa que se llevó a cabo una mesa de trabajo conjunta con el contratista, en la cual se revisaron y concertaron los aspectos relacionados con la programación de obra y la validación de la subsanación de los ítems no previstos requeridos para la ejecución del proyecto. No obstante, se deja constancia de que la programación ajustada aún no ha sido entregada formalmente por parte del contratista para su correspondiente revisión y aprobación.

  Asimismo, se indica que la documentación correspondiente a los ítems no previstos fue radicada y recibida por la interventoría el pasado viernes. Por otro lado, se precisa que durante el presente comité se realizará la presentación del avance del proyecto, tomando como referencia la programación previamente entregada.

- **Instalación de la valla del proyecto:** El contratista manifiesta que la valla informativa del proyecto ya se encuentra impresa. Sin embargo, indica que actualmente se adelanta el proceso de cotización para la fabricación e instalación de la estructura metálica que soportará dicha valla. El contratista mantiene el compromiso de realizar la instalación completa a más tardar el día 23 de mayo de 2026.

- **Entrega del Informe Mensual N° 1:** El contratista informa que este fue remitido el día sábado 16 de mayo del 2026. Actualmente, dicho informe se encuentra en proceso de verificación y revisión por parte de la interventoría.

- **Dotación de color verde:** El contratista manifiesta que se presentó un error relacionado con el color de la dotación requerida, razón por la cual solicita plazo hasta el jueves para realizar la entrega correspondiente al personal. Desde la ENAP se precisa que el plazo máximo autorizado será hasta el jueves de la presente semana; en caso de incumplimiento, no se permitirá el ingreso del personal que no cuente con la dotación reglamentaria, teniendo en cuenta que este compromiso fue establecido desde el primer comité de seguimiento y debe darse estricto cumplimiento a los lineamientos internos de identificación y seguridad institucional.

- **Requerimiento de interventoría para la entrega del Plan de Contingencia:** Se deja constancia de que el contratista manifestó que realizará la entrega formal del Plan de Contingencia durante la tarde del día de hoy. En consecuencia, las partes concertaron efectuar una reunión virtual de revisión del documento a las 4:00 p.m., con el fin de verificar su contenido y cumplimiento de los requerimientos establecidos por la interventoría.

  Desde la ENAP se reitera la disposición institucional para permitir el desarrollo de actividades en horario no laboral por ejemplo fines se semana, siempre que se cumpla previamente con los requisitos establecidos, la presentación de la documentación correspondiente y el aviso oportuno a la interventoría, garantizando así el adecuado control, seguimiento y supervisión de las actividades ejecutadas en obra.

ACTA DE REUNION	CONSORCIO ESCUELAS

- **Reiteración sobre la dedicación del residente de obra al 100 %:** La interventoría informa que el requerimiento efectuado previamente fue atendido satisfactoriamente. En consecuencia, el residente de obra se encuentra actualmente vinculado al proyecto y presente en este comité de seguimiento, conforme a las obligaciones contractuales.

  Adicionalmente, se reitera que la comunicación oficial y coordinación de las actividades debe realizarse directamente con el contratista de obra y no a través de subcontratistas, con el fin de mantener una adecuada trazabilidad y responsabilidad en la toma de decisiones.

- **Entrega de documentación SST para trabajos en alturas:** La interventoría informa que el día viernes 15 de mayo fue recibida la documentación, actualmente dicha documentación se encuentra en proceso de validación y revisión.

  Se deja constancia de que las actividades que actualmente se ejecutan, relacionadas con labores de limpieza mecánica y aplicación de anticorrosivo, cuentan con la documentación aprobada y la respectiva autorización de ingreso y ejecución.

  Por su parte, la ENAP reitera la obligación de dar estricto cumplimiento a toda la normatividad vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, especialmente en aquellas actividades catalogadas como de alto riesgo.

  De igual manera, la interventoría insiste en la necesidad de remitir oportunamente la documentación requerida para el ingreso del personal con una antelación mínima de 48 horas, permitiendo así su revisión y posterior trámite ante la supervisión. El contratista manifiesta que adoptará los correctivos internos necesarios para agilizar los procesos de radicación y aprobación de las solicitudes de ingreso del personal.

- **Presentación de cotización correspondiente al NP-8 – puertas:** La interventoría presenta la cotización correspondiente a la puerta asociada al ítem NP-8, en atención al requerimiento efectuado por la supervisión. Como resultado de dicha revisión, se evidenció que el valor presentado no se encuentra acorde con los precios actuales del mercado por lo que se le solicita al contratista validar otros proveedores.

- **Presentación del diseño de jardinería:** El contratista realizó la presentación formal de la propuesta de paisajismo y jardinería ante los asistentes al comité. Durante la exposición se socializaron las diferentes alternativas de especies vegetales a instalar, junto con el esquema de distribución y diseño planteado para las áreas intervenidas.

  Asimismo, se explicaron algunas recomendaciones relacionadas con el mantenimiento, riego y conservación de las especies propuestas. Desde la ENAP se indicó que posteriormente se definirá y comunicará al contratista el área o jardinera disponible para la implementación definitiva del diseño paisajístico. Como soporte de adjunta a la presente acta el diseño entregado por el contratista y socializado a las partes.

ACTA DE REUNION	CONSORCIO ESCUELAS

- **Instalación de la ventana en fachada norte:** El contratista informa que la actividad correspondiente a la instalación de la ventana ubicada en la fachada norte será ejecutada el día 20 de mayo de 2026, dando cumplimiento al compromiso adquirido en el presente comité.

- **Mantenimiento e instalación de puertas:** Continúa en ejecución el compromiso relacionado con el mantenimiento e instalación de las dos puertas contempladas dentro del alcance del proyecto, estableciéndose como fecha de cumplimiento el día 28 de mayo de 2026.

Adicionalmente, se acuerda que para el próximo comité la ENAP definirá y comunicará al contratista los puntos específicos donde serán sembrados los árboles, de acuerdo con las condiciones técnicas y criterios institucionales establecidos.

3. Estado general del contrato de obra

Continuando con la ejecución del contrato, se indica que, de acuerdo con el recorrido de campo realizado, se deja constancia que se debe intervenir las vigas ubicadas en la fachada sur en la zona de escaleras, con el fin de garantizar que dicho punto no constituya un foco de corrosión y asegurar así las condiciones adecuadas de protección de la estructura.

Por otro lado, una vez verificada la ficha técnica del material anticorrosivo, se validaron los tiempos de secado establecidos entre cada una de las capas de aplicación, determinándose la obligación de dar estricto cumplimiento a dichas especificaciones técnicas. No obstante, se recomienda realizar las respectivas verificaciones en campo, teniendo en cuenta las condiciones ambientales y los posibles comportamientos del material bajo las condiciones actuales de ejecución.

Adicionalmente, se informa que el contratista llevará para el próximo viernes 22 de mayo de 2026, en horas de la tarde, un profesional representante del proveedor del material correspondiente al sistema de pinturas aprobado para este contrato (Hempel) , con el propósito de verificar la correcta ejecución de las actividades, atender inquietudes técnicas y emitir las recomendaciones correspondientes respecto a la aplicación del producto.

Además, se deja constancia de que el contratista deberá presentar a la interventoría las remisiones correspondientes al material suministrado cada día que se suministre, documentación que será objeto de validación en campo por parte de la interventoría, conforme a los productos efectivamente evidenciados durante la ejecución de las actividades.

Finalmente, se procede a realizar el recorrido de campo. Durante la visita, la supervisión reitera la necesidad de que el equipo administrativo del contratista asista debidamente uniformado, con el fin de facilitar su identificación dentro de las instalaciones. Frente a este requerimiento, el director de obra manifiesta que dará cumplimiento a dicha disposición a partir del próximo comité.

Durante la inspección de campo se realizan las siguientes observaciones y/o recomendaciones:

En este recorrido, el contratista explica el procedimiento que se está ejecutando, el cual corresponde a la aplicación de la segunda mano de anticorrosivo en vigas metálicas de piso 1 en los ejes G y F´ con los ejes 6

ACTA DE REUNION	CONSORCIO ESCUELAS

– 7, y que además aplicara luego de transcurridas las 4 horas de secado la primera mano de base (gris) en esta misma área.

Se evidencia además que el director de obra y el ing. Residente por parte del contratista, no cuentan con los EPP necesarios para ingresar a la zona de trabajo.

Por su parte la interventoría de obra debe presentar el día viernes 22 de mayo los certificados de altura de la ing. Residente y de la residente SST.

El contratista de obra, debe realizar la protección adecuado del piso, mientras se ejecuten las actividades, dejando claridad que se debe entregar al final de la ejecución del contrato en las mismas condiciones en que fue recibido.

El contratista de obra se compromete en incrementar el personal de obra (7 personas) para el próximo viernes 22 de mayo del 2026, para lo cual deberá entregar toda la documentación de ingreso del personal con antelación a la interventoría.

4. Cierre de la reunión y compromisos

Una vez finalizado el recorrido, se dio por concluida el comité de seguimiento técnico, deseando un buen día a los presentes y estableciéndose los siguientes compromisos.

MATRIZ DE COMPROMISOS		
Compromiso	**Responsable**	**Fecha de ejecución**
Concertar los días de asistencia del director de obra	Contratista de obra/Interventoría	19/05/2026
Respuesta de interventoría respecto a la documentación SST para realizar los trabajos en alturas	Interventoría	19/05/2026
Entrega del Plan de contingencia y socialización con las partes	Contratista de obra	19/05/2026
Dotación del personal con el color verde	Contratista de obra	21/05/2026
Ingreso de nuevo personal operativo	Contratista de obra	22/05/2026
Ajuste del NP-8 acorde a la cotización de la interventoría	Contratista de obra	21/05/2026
Visita de profesional de HEMPEL al proyecto	Contratista de obra	22/05/2026
Presentación de los certificados de reentrenamiento de los cursos de altura del personal de interventoría (Ingeniera Residente y Residente HSEQ)	Interventoría	22/05/2026

ACTA DE REUNION	CONSORCIO ESCUELAS

Instalación de la valla del proyecto	Contratista de obra	23/05/2026
Definición del lugar donde se sembrarán los arboles	ENAP	26/05/2026
Dotación del personal administrativo	Contratista de obra	26/05/2026

REGISTO FOTOGRAFICO



Comité de seguimiento N°6



Recorrido de campo



Recorrido de campo

CONSORCIO	**ACTA DE REUNION**	CONSORCIO ESCUELAS

ACTA DE	Comité de seguimiento técnico N°7 del contrato de obra N°0020-ARC ENAP 2026 (Lote 1)
FECHA	26 de mayo del 2026
HORA	8:00 a.m.
LUGAR	Oficina de Gerencia de proyectos – Edificio Comando - ENAP

FIRMA DE PARTICIPANTES

Nombre Completo	Cargo	Firma
Christian Vargas	Capitan de Fragata – Gerente de proyecto ENAP	
Julián Rodriguez	Teniente de Corbeta-Apoyo técnico de la oficina de planeación ENAP	
Jesus Miguel Varon Cruz	Ingeniero de apoyo oficina de planeación ENAP, Supervisor del contrato de interventoría	
Abner Pérez Turizo	Ingeniero Director del contratista	
Ana María Cuentas Rúa	Ingeniera Residente de obra	
Gabrielita Padilla Romero	Residente SST del contratista	
Rodrigo Gutierrez	Arquitecto de apoyo del contratista	
Heraldo Gutierrez	Ingeniero Director de Interventoría	
Alba Pearson	Ingeniera Residente de Interventoría	
Luz Darys Padilla	Residente HSEQ Interventoría	
Zamir Garcia	Profesional HSEQ Interventoría	
Alejandra Contreras Mejia	Ingeniera Coordinadora de Interventoría	

ORDEN DEL DIA

1. **Inicio de la reunión**
2. **Verificación de los compromisos del comité anterior**
3. **Estado general del contrato de obra**
4. **Cierre de la reunión y compromisos**

DESARROLLO DEL DIA

1. **Inicio de la reunión**

Se da inicio al comité de seguimiento, presidido por el ingeniero Jesús Varón, quien informa a todos los presentes de realizar recorrido de obra.

2. **Verificación de los compromisos del comité anterior**

Se continua con la lectura de los compromisos establecidos en el comité de seguimiento anterior:

Scanned with CamScanner

ACTA DE REUNION	CONSORCIO ESCUELAS

MATRIZ DE COMPROMISOS

Compromiso	Responsable	Fecha de Ejecución	Seguimiento
Concertar los días de asistencia del director de obra teniendo en cuenta el porcentaje de dedicación	Contratista de obra/Interventoría	19/05/2026	No cumple
Respuesta de interventoría respecto a la documentación SST para realizar los trabajos en alturas	Interventoría	19/05/2026	Cumple
Entrega del Plan de contingencia y socialización con las partes	Contratista de obra	19/05/2026	Cumple – no Cerrado
Dotación del personal con el color verde	Contratista de obra	21/05/2026	Cumple
Ingreso de nuevo personal operativo	Contratista de obra	21/05/2026	No cumple
Ajuste del NP-8 acorde a la cotización de la interventoría	Contratista de obra	21/05/2026	Cumple
Visita de profesional de HEMPEL al proyecto	Contratista de obra	22/05/2026	No Cumple
Presentación de los certificados de reentrenamiento de los cursos de altura del personal de interventoría (Ingeniera Residente y Residente HSEQ)	Interventoría	22/05/2026	Cumple
Instalación de la valla del proyecto	Contratista de obra	23/05/2026	No cumple
Definición del lugar donde se sembrarán los arboles	ENAP	26/05/2026	
Dotación del personal administrativo	Contratista de obra	26/05/2026	

• **Concertar los días de asistencia del Director de Obra:** La interventoría aclara que la dedicación contractual establecida para el Director de Obra corresponde al 50%. Por su parte, la ENAP solicita fortalecer los canales de comunicación y evitar que este tipo de aclaraciones sean realizadas únicamente en el desarrollo de los comités. El contratista manifiesta que en horas de la tarde del día de hoy remitirá la programación correspondiente a los días de asistencia del profesional a obra, conforme a la dedicación contractual aprobada.

• **Respuesta de la interventoría respecto a la documentación SST para trabajos en alturas:** Desde la interventoría se informa que se dio cumplimiento a la verificación documental requerida, emitiéndose la respectiva aprobación formal para el desarrollo de las actividades.

No obstante, se deja constancia de que se encuentra pendiente la validación de la estructura colgante que será utilizada para la ejecución de las actividades de pintura en la fachada norte. El contratista manifiesta que

Scanned with CamScanner

el único equipo disponible en la zona actualmente se encuentra ocupado; sin embargo, el Capitán Vargas, reitera la necesidad de gestionar alternativas en otras ciudades, como Barranquilla, con el fin de garantizar el cumplimiento oportuno de las obligaciones contractuales.

• **Entrega y socialización del Plan de Contingencia:** El contratista informa que el Plan de Contingencia fue entregado y socializado virtualmente con las partes el pasado 22 de mayo de 2026. Sin embargo, se establece el compromiso de remitir el documento ajustado el día de hoy, 26 de mayo de 2026, incorporando las observaciones realizadas por la interventoría.

La interventoría indica que el plan deberá incluir de manera clara los rendimientos semanales proyectados, así como garantizar no solo la vinculación del personal requerido, sino también la disponibilidad de equipos, herramientas y materiales necesarios para asegurar la correcta ejecución de las actividades.

Adicionalmente, se deja constancia de que el plan contemplaba el ingreso de siete (7) personas adicionales; no obstante, el contratista informa que no fue posible dar cumplimiento a dicho compromiso debido a que el subcontratista no suministró oportunamente la información requerida para el ingreso.

Desde la ENAP, el Capitán Vargas manifiesta su conformidad con las observaciones emitidas por la interventoría, reiterando que el contratista tiene la obligación de cumplir integralmente con el alcance contractual, realizar seguimiento permanente a sus subcontratistas y garantizar una adecuada planificación para la ejecución de las actividades.

Por su parte, la interventoría manifiesta que, conforme al análisis de los rendimientos ejecutados durante la semana, se evidenció un promedio diario de 24,8 m², cuando técnicamente deberían ejecutarse aproximadamente 42 m² diarios en cada una de las actividades, con el fin de garantizar el cumplimiento del alcance contractual dentro del plazo establecido. El contratista informa que realizará las verificaciones internas correspondientes para implementar las medidas necesarias que permitan garantizar la ejecución.

• **Dotación color verde:** Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de obra respecto a la dotación requerida.

• **Ajuste del NP-8 conforme a la cotización de la interventoría:** Se deja constancia de que el contratista realizó la entrega del ítem en horas de la tarde del día anterior; sin embargo, actualmente se encuentra en proceso de revisión y verificación por parte de la interventoría. Dicho ítem corresponde a las puertas del primer nivel y resulta indispensable para el cierre del balance del proyecto.

• **Visita del profesional de HEMPEL al proyecto:** Se informa que la interventoría otorgó la autorización de ingreso el día anterior; no obstante, se reitera que deben cumplirse los tiempos mínimos establecidos por la ENAP para la aprobación del ingreso a las instalaciones de la Escuela Naval. Desde la ENAP se insiste en el cumplimiento estricto de los lineamientos internos para el ingreso del personal.

• **Presentación de certificados de reentrenamiento para trabajo en alturas del personal de interventoría:** La interventoría informa que se dio cumplimiento al requerimiento y que los certificados correspondientes de la Ingeniera Residente y del Residente HSEQ fueron radicados ante la supervisión.

Scanned with CamScanner

	ACTA DE REUNION	

• **Instalación de la valla del proyecto:** El contratista realizó la instalación de la estructura de soporte de la valla; sin embargo, se establece como compromiso para el día 26 de mayo de 2026 la instalación del respectivo pendón informativo.

• **Definición del lugar para siembra de árboles:** La supervisión informa que durante el día de hoy será definido el lugar destinado para la siembra de árboles, con el fin de que el contratista tenga claridad sobre el área aprobada para su ejecución.

Se deja constancia de que, en el comité anterior, fue presentado y aprobado el diseño del jardín correspondiente, quedando únicamente la recomendación de mejorar la simetría.

• **Instalación de ventana en fachada norte:** El contratista informa que la actividad correspondiente a la instalación de la ventana ubicada en la fachada norte será ejecutada el 20 de mayo de 2026, en cumplimiento del compromiso adquirido en el presente comité.

3. **Estado general del contrato de obra**

En continuidad con la ejecución del contrato, se realiza la presentación oficial de la nueva profesional asignada como Residente de Obra, Ingeniera Ana María Cuentas.

Durante el recorrido de campo, iniciado en el primer piso, se validaron los avances ejecutados del proyecto y se formularon diversas observaciones y recomendaciones por parte de la interventoría y la supervisión. Dentro de las principales observaciones, se indicó que los pisos deberán ser entregados completamente limpios una vez finalice cada actividad ejecutada. Así mismo, se estableció la necesidad de aplicar una mano de pintura a las columnas no contempladas dentro del alcance contractual, las cuales resultaron afectadas por salpicaduras generadas durante las actividades de pintura de vigas ejecutadas por el contratista.

Frente a lo anterior, se dejó claridad que el contratista deberá acoger las recomendaciones emitidas, con el fin de evitar posibles retenciones de garantía en las actas parciales de cobro.

Adicionalmente, se solicitó al contratista organizar adecuadamente la zona de campamento, garantizando la correcta señalización y los puntos de acopio. De igual manera, se requirió la presentación de las evidencias correspondientes al lavado del baño portátil.

Se estableció realizar una reunión entre el contratista, la interventoría y la supervisión el miércoles 27 de mayo de 2026 a las 10:00 a.m., con el fin de validar el balance contractual y definir el alcance definitivo del proyecto conforme a las condiciones reales evidenciadas en campo.

En el cuarto nivel, específicamente en la zona de escaleras, se ordenó la suspensión temporal de actividades debido a la ausencia de señalización adecuada. Adicionalmente, se solicitó al contratista mejorar el procedimiento de grateado de la estructura metálica.

En el tercer nivel, se solicitó la instalación del polarizado correspondiente a la ventana ubicada en la fachada norte del aula 312. El contratista manifiesta que, una vez se realice el retiro de las puertas, procederá con la

Scanned with CamScanner

ejecución de dicha actividad dentro de un plazo aproximado de una semana, estableciendo como fecha de verificación el próximo comité programado para el martes 02 de junio de 2026.

Así mismo, se evidenció la instalación de la estructura metálica correspondiente a la valla informativa del proyecto; no obstante, se estableció como compromiso pendiente la instalación del respectivo pendón impreso.

Posteriormente, las partes acordaron continuar el desarrollo del comité en el edificio Comando. Desde la interventoría se realizó la presentación del estado de avance del proyecto con corte al domingo 24 de mayo de 2026, evidenciándose un avance ejecutado acumulado del 3,30% frente a un avance programado del 6,34%, lo que representa una desviación negativa del -3,34%.

Por parte de la ENAP se manifestó preocupación respecto al bajo avance del proyecto y la desviación negativa evidenciada frente a la programación contractual. En ese sentido, se reiteró la disposición institucional de la Escuela para permitir la ejecución de actividades en horarios extendidos y fines de semana, siempre y cuando el contratista realice las solicitudes con la debida antelación y garantice el cumplimiento integral de los requisitos normativos y de seguridad aplicables.

Adicionalmente, desde la ENAP se solicita a la interventoría realizar las notificaciones correspondientes al contratista de obra, conforme a los avances y situaciones expuestas durante el presente comité.

Finalmente, el contratista socializó el plan de manejo para el cierre parcial de la vía de ingreso al edificio Alfa Sextantis (carril derecho), programado desde el jueves 28 de mayo de 2026 hasta el jueves 04 de junio de 2026, en horario comprendido entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m. Tanto la ENAP como la interventoría reiteraron la obligación de garantizar la correcta señalización y condiciones de seguridad en la zona intervenida. Así mismo, el contratista indicó que, una vez finalizada la jornada laboral diaria, procederá con el retiro de los andamios y de la señalización de cierre, habilitando nuevamente el acceso vehicular entre las 5:00 p.m. y las 8:00 a.m. del día siguiente.

4. Cierre de la reunión y compromisos

Una vez finalizado el recorrido, se dio por concluida el comité de seguimiento técnico, deseando un buen día a los presentes y estableciéndose los siguientes compromisos.

MATRIZ DE COMPROMISOS

Compromiso	Responsable	Fecha de ejecución
Definir los días de asistencia del director de obra (Dedicación del 50%)	Contratista de obra/Interventoría	26/05/2026
Instalación del pendón impreso de la valla del proyecto	Contratista de obra	26/05/2026
Entrega de la subsanación del Plan de contingencia	Contratista de obra	26/05/2026
Reunión de revisión del balance del contrato de obra	Contratista de obra/Interventoría/ENAP	27/05/2026

Scanned with CamScanner

ACTA DE REUNION	CONSORCIO ESCUELAS

Requerimiento de la interventoría al contratista conforme al avance del proyecto	Interventoría	27/05/2026
Visita de profesional de HEMPEL al proyecto	Contratista de obra	27/05/2026
Definición del lugar donde se sembrarán los arboles	ENAP	26/05/2026
Dotación del personal administrativo	Contratista de obra	02/05/2026
Entrega de las puertas de mantenimiento (2 unidades)	Contratista de obra	28/05/2026
Adquisición de elementos de seguridad para cierre de vía solicitado (acceso edificio Alfa sextantis)	Contratista de obra	28/05/2026
Definir sitio para la siembra de la jardinera compromiso	ENAP	26/05/2026
Presentar equipo bamba para intervenir la fachada norte (de no disponer de este equipo, presentar alternativa anticipada para dar cumplimiento al compromiso)	Contratista de obra	28/05/2026
Resisar y emitir respuesta al contratista del No previsto NP 8 - puertas piso 1	Interventoría	26/05/2026
Seguimiento al aseo de baños	Contratista	28/05/2026

REGISTO FOTOGRAFICO




Recorrido de campo



Recorrido de campo

Scanned with CamScanner

ACTA DE REUNION	CONSORCIO ESCUELAS

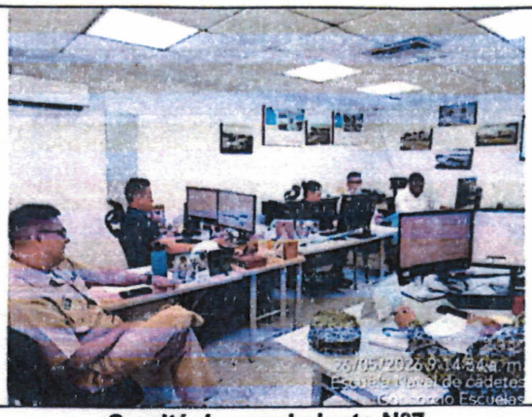

Comité de seguimiento N°7

Scanned with CamScanner

CONSORCIO
ESCUELAS
CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA

D. SS Y PARAFISCALES DEL INTERVENTOR

Nit 902.052.122-5

Cartagena de indias D.T Y C, 01 de junio del 2026

Señores:
ARMADA NACIONAL ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

El suscrito Contador Publico **EDINSON STIPK PALACIO DIAZ**, actuando en mi condición de contador publico del **CONSORCIO ESCUELA** con NIT. 902.052.122-5. Mediante la presente me permito **CERTIFICAR** que la citada sociedad desde el 13 de abril 2026 hasta la fecha se encuentra Paz y salvo por concepto de Aportes Parafiscales y Seguridad Social.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la ley 789 de 2002, Art. 1^0 de la Ley 828 de 2003 y del Art. 23 de la ley 1150 de 2007.

Atentamente,

EDINSON STIPK PALACIO DIAZ
Representante Legal Suplente
TP-238710-T




JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

238710-T

EDINSON STIPK
PALACIO DIAZ
C.C. 1036655958
RES. INSCRIPCION 207 DEL 09/03/2018
UNIVERSIDAD DEL SINU

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

244998 263803

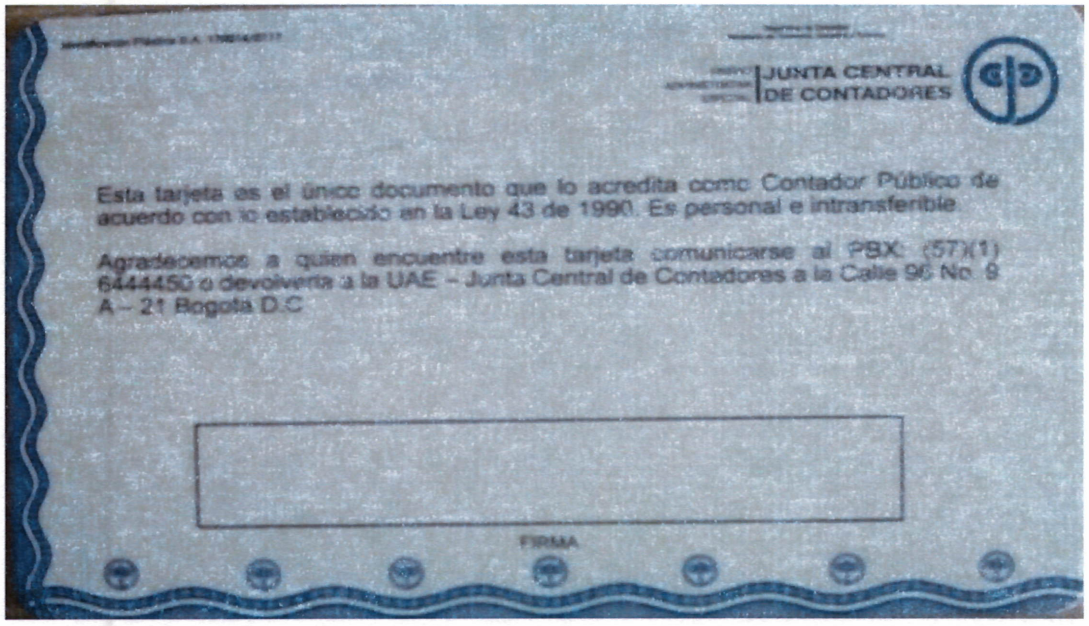

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

DDE51CEE63078BCA

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **EDINSON STIPK PALACIO DIAZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1036655958 de ITAGUI (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 238710-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.036.655.958**

PALACIO DIAZ

APELLIDOS

EDINSON STIPK

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **08-NOV-1994**

CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

22-NOV-2012 ITAGUI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-0115100-00427729-M-1036655958-20130309 **00325**12142A 2 39651952

CONSORCIO
ESCUELAS
CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA

E. COMUNICADOS

CONSORCIO ESCUELAS
CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA

CE-2026-L1-007
Cartagena D. T. y C., 04 de mayo de 2026

Señores:
ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA"
Atn. TK DANIEL ALFONSO MESA AGUIRRE
Supervisor del contrato
daniel.mesa@enap.edu.co
L.C.

Referencia: CONTRATO DE OBRA N° 0020 ARC-ENAP 2026 "CONTRATACIÓN A PRECIO UNITARIO FIJO Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MAYOR CONSISTENTES EN MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA" - LOTE 1: MANTENIMIENTO AULAS SEXTANTIS DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA.".".

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 0021 ARC-ENAP 2026 "INTERVENTORÍA TÉCNICA INTEGRAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, ECONÓMICA Y JURÍDICA DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MAYOR CONSISTENTES EN MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA".".

Asunto: Solicitud ingreso de personal para el contrato de obra de la referencia a la ENAP

Cordial saludo,

En calidad de interventoría del contrato de obra N° 0020 ARC-ENAP 2026, y en cumplimiento de las obligaciones y funciones establecidas en el contrato de interventoría N° 0021 ARC-ENAP 2026, nos permitimos remitir el listado del personal autorizado para el ingreso a la ENAP.

METALIKA ADMINISTRATIVOS						
Nombre	Cédula	Celular	Correo	Vehículo	Periodo	
					Desde	Hasta
Ariel Garu Sinning	73.134.227	3173638507	metalikasingenieria@gmail.com	PPM170	4/05/2026	15/05/2026
Giovanny Lozano Castillo	73.570.597	3003627933	giovanylozano.metalikas@gmail.com	RZL965	4/05/2026	15/05/2026
Wilinton Calderon Suarez	77.186.879	3156523643	wilinton837@gmail.com	IBW145	4/05/2026	15/05/2026
Catherin Lengua Camacho	1.047.501.213	3182766881	ingindustrialcathe@gmail.com	NO	4/05/2026	15/05/2026
Cesar Grau Sinning	73.105.643	3007794106	cesar.grau.sinning1963@gmail.com	WGQ134 / BPQ012	4/05/2026	15/05/2026

METALIKA OPERATIVOS						
Nombre	Cédula	Celular	Correo	Vehículo	Periodo	
					Desde	Hasta
Florencio Antonio Muñoz Salgado	10.820.030	3018119675	salgadoantonio1980@gmail.com	-	4/05/2026	15/05/2026

CONSORCIO ESCUELAS
CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA

Walberto Ramirez Martínez	3.829.237	3234720022	walbertoramirezm@gmail.com	-	4/05/2026	15/05/2026
Alfredo Arrieta Conde	73.570.776	3154009860	alfrdarrieta.conde1920@gmail.com	-	4/05/2026	15/05/2026
Jesus Maria Reyes Anaya	73.136.156	3184078975	metalikasingenieria@gmail.com	-	4/05/2026	15/05/2026

CONSORCIO NAVAL W 26 ADMINISTRATIVOS						
Nombre	**Cédula**	**Celular**	**Correo**	**Vehículo**	**Periodo**	
					Desde	**Hasta**
Gabrielita Padilla Romero	1.128.060.907	3104549167	gabylevis@hotmail.com	KPN400	4/05/2026	15/05/2026
Eduar Menco	73.007.930	3002808395	menco123@hotmail.com	KQO598	4/05/2026	15/05/2026
Rodrigo Gutierrez	73.166.357	3205653874	rzamora@hotmail.com	MUL964	4/05/2026	15/05/2026

En consecuencia, solicitamos respetuosamente se adelante el trámite correspondiente para autorizar el ingreso del personal y vehículos relacionados, conforme a los protocolos y requisitos establecidos por la ENAP.

Agradecemos de antemano su oportuna gestión y colaboración en este proceso.

Quedamos atentos a cualquier aclaración, información adicional o documentación que se requiera para dar continuidad al trámite y atender de manera ágil lo solicitado.

Atentamente,

FELIPE ANDRES ANGULO GUZMAN
Representante Legal de Interventoría
CONSORCIO ESCUELAS

Copia:
Archivo Interno

CONSORCIO ESCUELAS
CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA

CE-2026-L1-008
Cartagena D. T. y C., 04 de mayo de 2026

Señores:
CONSORCIO NAVAL W26
Atn. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
Contrista de obra
proyectos@wrussyingenieros.com
L.C.

Referencia: CONTRATO DE OBRA N° 0020 ARC-ENAP 2026 "CONTRATACIÓN A PRECIO UNITARIO FIJO Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MAYOR CONSISTENTES EN MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA" - LOTE 1: MANTENIMIENTO AULAS SEXTANTIS DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA.".".

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 0021 ARC-ENAP 2026 "INTERVENTORÍA TÉCNICA INTEGRAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, ECONÓMICA Y JURÍDICA DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MAYOR CONSISTENTES EN MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA".".

Asunto: Respuesta comunicado 1116-WR-2026 del contrato N°0020 ARC-ENAP 2026

Cordial saludo,

Resultado de la evaluación realizada por la interventoría sobre las fichas técnicas propuestas para los materiales a implementar. En consideración de los requisitos establecidos en las especificaciones técnicas, se presenta el siguiente análisis:

1. Teniendo en cuenta las condiciones ambientales en la ciudad de Cartagena de Indias que se presenta un entorno de corrosividad extremadamente alta, caracterizado por:

- Ambiente marino costero directo
- Alta concentración de cloruros (salinidad constante)
- Humedad relativa elevada (>80%)
- Temperaturas entre 28–34 °C
- Alta radiación UV durante todo el año

Y que además se clasifica según la ISO 12944 en ambiente marino extremo C5-M / CX, implica la necesidad de sistemas de protección de alto desempeño, larga durabilidad y alta resistencia a cloruros y radiación solar. Para los que el contratista sugiere el uso de 2 sistemas así:

- Sistema Hempel (recomendado para ambiente marino severo): Primer/Base: Hempadur Mastic 45880; Intermedio: Hempaprime Multi 500; Acabado: Hempathane Topcoat 55210.

CONSORCIO ESCUELAS
CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA

- Sistema Sika (alternativo industrial): Primer/Base: SikaCor 60 Epoxi Primer o SikaCor 90 Self Priming HS; Intermedio / autoimprimante: SikaCor 90 HS; Acabado: Sika Esmalte Uretano S36.

Se hace el análisis de las referencias presentadas por el contratista así:

Cuadro comparativo

Etapa del sistema	Sistema Hempel	Función	Sistema Sika	Función
Primer / base	**Hempadur Mastic 45880**	Epóxico de alto espesor, anticorrosivo, tolerante a superficie	**SikaCor 60 Epoxi Primer**	Primer epóxico anticorrosivo, rápido secado
Intermedio	**Hempaprime Multi 500**	Capa intermedia epóxica de alto sólidos, acelera el sistema	**SikaCor 90 Self-Priming HS**	Epóxico de alta resistencia química, puede ser intermedio o autoimprimante
Acabado	**Hempathane Topcoat 55210**	Poliuretano alifático: UV, color, brillo, intemperie	**Sika Esmalte Uretano S36**	Poliuretano de acabado resistente a UV y clima

Evaluación técnica comparativa

Criterio	Sistema Hempel	Sistema Sika
Resistencia a corrosión marina	Muy alta	Alta
Desempeño en ambiente C5-M / CX	Excelente	Bueno a muy bueno
Resistencia a cloruros	Muy alta	Alta
Tolerancia a superficie	Alta	Media
Durabilidad estimada	15–25 años	10–20 años
Resistencia UV (acabado)	Excelente	Buena
Espesor del sistema	Alto (heavy duty)	Medio-alto
Mantenimiento	Bajo	Medio

2. Análisis técnico de interventoría:

2.1. Protección anticorrosiva:

- El sistema Hempel con Hempadur Mastic 45880 presenta mayor tolerancia a condiciones de superficie y mayor capacidad de formación de película de alto espesor, lo cual lo hace altamente adecuado para ambientes marinos extremos como Cartagena de Indias.
- El sistema Sika es técnicamente competente, pero requiere condiciones de preparación de superficie más estrictas para alcanzar su máximo desempeño.

2.2. Resistencia a intemperie

- El acabado Hempathane Topcoat 55210 proporciona excelente estabilidad frente a radiación UV, salinidad y humedad constante.
- El sistema Sika ofrece un buen desempeño, aunque con menor durabilidad estética en exposición marina prolongada.

CONSORCIO ESCUELAS
CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA

2.3. Consideraciones de obra

- Hempel: sistema más robusto, controlado y de mayor espesor total
- Sika: mayor flexibilidad de aplicación y productos auto imprimantes

Acorde con lo anteriormente expuesto, y desde el punto de vista técnico, la interventoría concluye que el sistema Hempel, conforme a las especificaciones consignadas en sus fichas técnicas, resulta ser la alternativa más adecuada para la protección de las estructuras metálicas del edificio Alfa Sextantis de la Escuela Naval de Cadetes "Almirante Padilla", en la ciudad de Cartagena de Indias. Esta recomendación se fundamenta en su alto desempeño anticorrosivo en ambientes marinos, así como en su mayor durabilidad y capacidad de protección estructural bajo condiciones de alta agresividad ambiental.

Asimismo, se reitera al contratista la obligación de dar estricto cumplimiento a las recomendaciones del fabricante para la correcta preparación de superficies y aplicación del sistema, así como a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato de obra.

Quedamos atentos a cualquier aclaración requerida respecto al contenido de la presente comunicación.

Atentamente,

FELIPE ANDRES ANGULO GUZMAN
Representante Legal de Interventoría
CONSORCIO ESCUELAS

Copia:
Archivo Interno

CONSORCIO ESCUELAS
CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA

CE-2026-L1-009
Cartagena D. T. y C., 04 de mayo de 2026

Señores:
CONSORCIO NAVAL W26
Atn. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
Contrista de obra
proyectos@wrussyingenieros.com
L.C.

Referencia: CONTRATO DE OBRA N° 0020 ARC-ENAP 2026 "CONTRATACIÓN A PRECIO UNITARIO FIJO Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MAYOR CONSISTENTES EN MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA" - LOTE 1: MANTENIMIENTO AULAS SEXTANTIS DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA.".".

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 0021 ARC-ENAP 2026 "INTERVENTORÍA TÉCNICA INTEGRAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, ECONÓMICA Y JURÍDICA DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MAYOR CONSISTENTES EN MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA".".

Asunto: Observaciones información técnica del contrato N°0020 ARC-ENAP 2026

Cordial saludo,

En calidad de interventoría del contrato de obra N° 0019 ARC-ENAP 2026, y en cumplimiento de las obligaciones y funciones asignadas mediante el contrato de interventoría N° 0021 ARC-ENAP 2026, nos permitimos informar el resultado de la revisión efectuada a la información entregada por el contratista de obra, en los siguientes términos:

1. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)

Tras el análisis de la documentación, se emiten las siguientes observaciones y requerimientos para su ajuste y posterior aprobación definitiva:

1.1. Vigencia y Actualización Documental

- Desfase Cronológico: Se observa que el cuerpo principal del PMA (Código HSE-PLA-05) registra una fecha de aprobación del 08/01/2019. Dado que el contrato actual inició en abril de 2026 y aún no se tiene aprobación de interventoría del documento, se solicita eliminar las fechas de aprobación para que el documento refleje la realidad del proyecto actual.
- Inconsistencias en Anexos: El Programa de Capacitaciones (Anexo 6) presenta tablas de indicadores con datos del año 2023. Es imperativo ajustar estos registros al periodo de ejecución de 2026 para garantizar la trazabilidad de los informes mensuales.

CONSORCIO ESCUELAS
CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA

1.2. Análisis de Impactos Ambientales (Anexo 4)

La matriz de impactos, basada en la metodología de Conesa (2009), ha identificado correctamente áreas críticas que requieren supervisión estricta:

- Impactos Severos: Se resaltan las actividades de Pañetes, Enchapes e Instalaciones Hidrosanitarias, calificadas con una importancia de 52 (Severo) debido a la generación de Residuos de Construcción y Demolición (RCD).
- Residuos Peligrosos: El proceso de Iluminación presenta un impacto severo por la generación de residuos peligrosos (RESPEL), lo cual exige el cumplimiento riguroso de la ficha de manejo 8.5.
- Contaminación Auditiva: Se identifican niveles de ruido severos en las actividades de enchapes y aparatos sanitarios, por lo que se deben extremar las medidas de protección y control de emisiones sonoras.

1.3. Control Operativo y Formatos

- Gestión de RCD: Se valida el uso de los formatos para el Registro de Escombros (Anexo 2) y el Vale de Retiro (Anexo 3). Se recuerda que es obligatoria la firma del Residente SGSST y del Residente de Obra en cada planilla para su validación por parte de esta Interventoría.
- Marco Normativo: Si bien el PMA cita la Resolución 472 de 2017, se recomienda integrar plenamente las disposiciones de la Resolución 1257 de 2021, que modifica la gestión integral de RCD y se encuentra listada en su marco legal.

2. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (PLAN SST)

No se evidencia la presentación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). En los documentos adjuntos únicamente se incluyen algunos anexos, los cuales resultan insuficientes para su evaluación integral. En consecuencia, se solicita el envío completo y oportuno del Plan de SST, debidamente estructurado y conforme a la normativa vigente, a fin de proceder con su revisión y validación correspondiente.

3. PLAN DE CALIDAD

El Plan de Calidad presentado no evidencia alineación con los lineamientos establecidos en la norma ISO 10005, la cual proporciona las directrices para la estructuración y desarrollo de planes de calidad. Se recomienda ajustar su contenido conforme a mencionada guía, con el fin de garantizar coherencia metodológica y trazabilidad en la gestión de la calidad del proyecto.

4. PLAN DE GERENCIA

No ha sido remitido por parte del contratista, sin embargo, se deja aclaración que el contratista dentro de su propuesta, indicó: "*(…) en adelante el "Proponente" manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento el compromiso de implementar, a mi (nuestro) costo y riesgo, un programa de gerencia de proyectos con el fin de garantizar la ejecución efectiva y eficaz del objeto de la referencia. Para ello, en caso de resultar adjudicatario del citado proceso, dispondremos de un profesional en las áreas de la*


ingeniería o la arquitectura que cumpla con el perfil requerido por la Entidad. Para tal efecto se asignarán los recursos técnicos y humanos necesarios."

Por lo cual, se requiere la entrega inmediata del Plan de Gerencia de Proyectos, junto con los documentos que acrediten al profesional encargado.

5. PROGRAMACIÓN V2

Una vez revisada la programación del proyecto presentada por el contratista, la interventoría emite las siguientes observaciones:

5.1. Calendario laboral

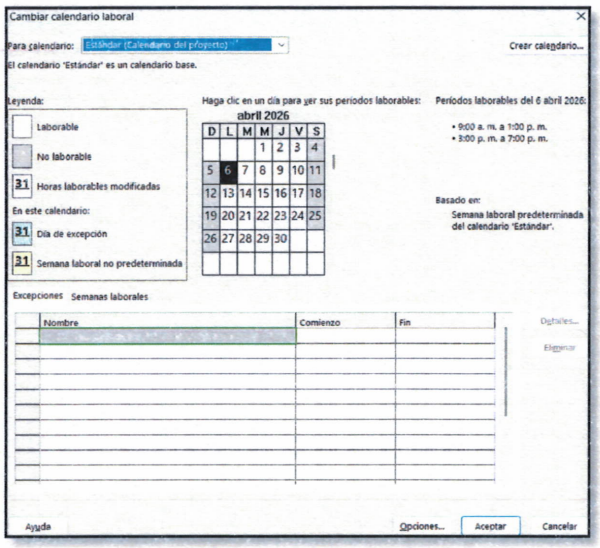

Se evidencia que el calendario laboral aplicado (estándar, sin ajuste) no se encuentra acorde con las condiciones reales de ejecución del contrato, por las siguientes razones:

- **Días laborales:** No se ajusta a la jornada legal establecida, la cual comprende de lunes a sábado. Se observa que el día sábado se encuentra configurado como no laboral, lo cual no corresponde a las condiciones del proyecto.
- **Períodos laborales:** El calendario define una jornada de trabajo de 09:00 a.m. a 01:00 p.m. y de 03:00 p.m. a 07:00 p.m. Al respecto, se solicita corregir dicha configuración o, en su defecto, aclarar formalmente el horario de trabajo previsto para la ejecución del contrato.
- **Excepciones:** En relación con las excepciones del calendario, se evidencia que no se están contemplando los días festivos oficiales conforme al calendario de Colombia.

En consecuencia, se solicita la revisión y ajuste del calendario laboral, de manera que refleje adecuadamente las condiciones reales de ejecución y cumpla con la normativa aplicable.

CONSORCIO ESCUELAS
CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA

5.2. Duración y secuencia de actividades

En el ítem 1.1 "Columnas metálicas", se evidencia un intervalo de 19 días entre la ejecución de la actividad 1.1.1 "Preliminar" (rutina manual mecánica y preparación de superficie de la estructura metálica) y la actividad 1.1.2 "Acabado" (aplicación y suministro de anticorrosivo epóxico Poli Epox 9101 o similar). De igual forma aplica para las actividades de Viga metálica y barandas metálicas.

	INICIO DE OBRA			$ 0,00	1 día	mié 29/04/26	mié 29/04/26
1	ESTRUCTURA METÁLICA			$ 1.513.665.462,65	107 días	jue 30/04/26	vie 25/09/26
1,1	COLUMNAS METALICAS			$ 196.629.991,25	107 días	jue 30/04/26	vie 25/09/26
1.1.1	PRELIMINARES			$ 39.169.064,55	103 días	jue 30/04/26	lun 21/09/26
1.1.1.1	RUTINA MANUAL MECANICA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE DE ESTRUCTURA METALICA en columna acero de 65*45cms, Consistente en limpieza manual y mecánica, lavado a presión, desengrase de la superficie, cepillado, rascado, picado y lijado, remover cloruros todo ti	M2	700,00	$ 39.169.064,55	103 días	jue 30/04/26	lun 21/09/26
1.1.2	ACABADOS			$ 157.460.926,70	94 días	mar 19/05/26	vie 25/09/26
1.1.2.1	Aplicación y suministro de ANTICORROSIVO EPOXICO POLI EPOX 9101 o similar con oxido de hierro y endurecedor poliamínico a columna metalica 65*45, 02 capas, componente A y B, catalizador o curador poli epox incoloro 9800, que al mezclarse en proporciones a	M2	700,00	$ 42.730.048,90	91 días	mar 19/05/26	mar 22/09/26
1.1.2.2	Aplicación y suministro de PINTURA EPOXICA BASE SOLVENTE POLI-EPOX USO MARINO o similar, COLUMNA METALICA 65*45cms, dos capas de pintura intermedia a las partes afectadas por la corrosión, pintura de dos componentes A y B, catalizador o curador poli epox	M2	700,00	$ 53.982.547,85	81 días	mié 3/06/26	mié 23/09/26
1.1.2.3	Aplicación y suministro de pintura ESMALTE POLIURETANO ACABADO BLANCO EN COLUMNA METALICA 65*45cms, 3 capas, (poliéster uretano) de dos componentes A y B, catalizador para poliuretano incoloro 111351, que al mezclarse proporcionan un acabado brillante de	M2	700,00	$ 60.748.329,95	72 días	jue 18/06/26	vie 25/09/26

1,2	VIGAS METALICAS			$ 1.317.035.471,40	87 días	jue 28/05/26	vie 25/09/26
1.2.1	PRELIMINARES			$ 251.801.129,25	79 días	jue 28/05/26	mar 15/09/26
1.2.1.1	RUTINA MANUAL MECANICA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE DE ESTRUCTURA METALICA viga de acero I de alto:55 cms, ancho:20 cms, Consistente en limpieza manual y mecánica, lavado a presión, desengrase de la superficie, cepillado, rascado, picado y lijado, remover	M2	4500,00	$ 251.801.129,25	79 días	jue 28/05/26	mar 15/09/26
1.2.2	ACABADOS			$ 1.012.248.814,50	73 días	mié 10/06/26	vie 18/09/26
1.2.2.1	Aplicación y suministro de ANTICORROSIVO EPOXICO POLI EPOX 9101 o similar con oxido de hierro y endurecedor poliamínico a viga de acero I de alto:55 cms, ancho:20 cms, componente A y B, catalizador o curador poli epox incoloro 9800, que al mezclarse en pr	M2	4500,00	$ 274.693.171,50	71 días	mié 10/06/26	mié 16/09/26
1.2.2.2	Aplicación y suministro de PINTURA EPOXICA BASE SOLVENTE POLI-EPOX USO MARINO o similar en viga de acero I de alto:55 cms, ancho:20 cms, dos capas de pintura intermedia a las partes afectadas por la corrosión, pintura de dos componentes A y B, catalizador	M2	4500,00	$ 347.030.664,75	61 días	jue 25/06/26	jue 17/09/26
1.2.2.3	Aplicación y suministro de pintura ESMALTE POLIURETANO ACABADO BLANCO en viga de acero I de alto:55 cms, ancho:20 cms, 3 capas, (poliéster uretano) de dos componentes A y B, catalizador para poliuretano incoloro 111351, que al mezclarse proporcionan un ac	M2	4500,00	$ 390.524.978,25	52 días	jue 9/07/26	vie 18/09/26

1.2.3	BARANDA METALICA			$ 52.985.527,65	46 días	vie 24/07/26	vie 25/09/26
1.2.3.1	PRELIMINARES			$ 10.682.575,20	42 días	vie 24/07/26	lun 21/09/26
1.2.3.1.1	RUTINA MANUAL MECANICA ESTRUCTURA METALICA, Baranda metalica de alto:0,93mts, con postes de lamina de 2" cada 0,99 mts, con 02 laminas intermedios metalicas de 1" cada 0,25 mts, y tubo y lamina de pasamanos de 2", Consistente en limpieza manual y mecánica	ML	300,00	$ 10.682.575,20	42 días	vie 24/07/26	lun 21/09/26
1.2.3.2	ACABADOS			$ 42.302.952,45	36 días	vie 7/08/26	vie 25/09/26
1.2.3.2.1	Aplicación y suministro de ANTICORROSIVO EPOXICO POLI EPOX 9101 o similar con oxido de hierro y endurecedor poliamínico a Baranda metalica de alto:0,93mts, con postes de lamina de 2" cada 0,99 mts, con 02 laminas intermedios metalicas de 1" cada 0,25 mts,	ML	300,00	$ 13.276.893,30	33 días	vie 7/08/26	mar 22/09/26
1.2.3.2.2	Aplicación y suministro de PINTURA EPOXICA BASE SOLVENTE POLI-EPOX USO MARINO o similar, Baranda metalica de alto:0,93mts, con postes de lamina de 2" cada 0,99 mts, con 02 laminas intermedios metalicas de 1" cada 0,25 mts, y tubo y lamina de pasamanos de	ML	300,00	$ 14.192.423,85	23 días	lun 24/08/26	mié 23/09/26
1.2.3.2.3	Aplicación y suministro de pintura ESMALTE POLIURETANO ACABADO BLANCO EN Baranda metalica de alto:0,93mts, con postes en lamina de 2" cada 0,99 mts, con 02 laminas intermedios metalicas de 1" cada 0,25 mts, y tubo y lamina de pasamanos de 2", aplicación d	ML	300,00	$ 14.833.635,30	13 días	mié 9/09/26	vie 25/09/26

La interventoría considera que dicho intervalo es técnicamente inconveniente, en la medida en que puede favorecer la aparición de procesos de oxidación en la superficie metálica antes de la aplicación del recubrimiento anticorrosivo.

En consecuencia, se recomienda ajustar la programación, garantizando la continuidad del proceso y la adecuada protección de la superficie, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.

5.3. Distribución de actividades en el plazo contractual

Se observa que la totalidad de las actividades se encuentran programadas con fecha de finalización en las dos últimas semanas del plazo contractual, lo cual no resulta técnicamente adecuado.

Esta condición genera un alto riesgo de incumplimiento en los tiempos de ejecución, al concentrar las actividades hacia el cierre del contrato y limitar los márgenes de maniobra ante posibles contingencias. Adicionalmente, ocasiona que la mayoría o la totalidad de las actividades se reflejen en la ruta crítica, desvirtuando el análisis de secuencias constructivas y dificultando la adecuada gestión y control del cronograma.

En consecuencia, se solicita revisar y ajustar la programación, de manera que se garantice una distribución lógica y coherente de las actividades en el tiempo, permitiendo una correcta identificación de la ruta crítica.

5.4. Definición de hitos

Se evidencia que la programación presentada no contempla la definición de hitos relevantes del proyecto.

La ausencia de estos puntos de control impide realizar un adecuado seguimiento al avance de la obra, así como la verificación oportuna del cumplimiento de etapas clave dentro del plazo contractual.

En consecuencia, se solicita incorporar en la programación los hitos principales del proyecto, tales como inicio y finalización de actividades críticas, entregas parciales y demás eventos representativos, con el fin de fortalecer el control y la gestión del cronograma.

6. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Los cuales son consistentes en cuanto al número de ítem, descripción y valores. Sin embargo, en las actividades que a la fecha se tiene previsto ejecutar acorde a su propuesta económica, se evidencian algunos faltantes en la descripción detallada de los APU, así:

N° ÍTEM	EQUIPOS	MATERIALES DE OBRA	TRANSPORTE
1.1.1.1	Extensiones eléctricas	Desengrasantes	
	Cepillo cerda rígida plástica	gratas	
	Cepillo metálico	EPP	
	Pulidora Manual	waipes	

CONSORCIO ESCUELAS
CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA

	manguera tipo jardín - presión		
	Andamio certificado		
	Arnés y slinga (equipo trabajo en alturas)		
1.1.2.1	Compresor	rodillos	
	Herramienta menor	waipes	
	Andamio certificado	Brochas	
	Arnés y slinga (equipo trabajo en alturas)	Cintas	
		Lijas	
		xilol	
		Solvente	
		Anticorrosivo epoxico poli epox 9101 o similar con óxido de hierro y endurecedor poliaminico	
		EPP	
1.1.2.2	Andamio certificado	Xiol	
	Arnés y slinga (equipo trabajo en alturas)	Pintura epoxica base solvente poli-epox uso marino o similar	
1.1.2.3	Andamio certificado	Xiol	
	Arnés y slinga (equipo trabajo en alturas)	Solvente	
1.2.1.1	Extensiones eléctricas	Desengrasantes	
	Cepillo cerda rígida plástico	Gratas	
	Cepillo metálico	EPP	
	Pulidora Manual	Waipes	
	manguera tipo jardín - presión		
	Andamio certificado		
	Arnés y slinga (equipo trabajo en alturas)		
1.2.2.1.	Compresor	rodillos	
	Herramienta menor	waipes	
	Andamio certificado	Brochas	
	Arnés y slinga (equipo trabajo en alturas)	Cintas	
		Lijas	
		xilol	

CONSORCIO ESCUELAS
CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA

		Solvente	
		Anticorrosivo epoxico poli epox 9101 o similar con óxido de hierro y endurecedor poliaminico	
		EPP	
1.2.2.2	Andamio certificado	xilol	
	Arnés y slinga (equipo trabajo en alturas)	Solvente	
		Pintura epoxica base solvente poli-epox uso marino o similar	
		EPP	
1.2.2.3	Andamio certificado	Xiol	
	Arnés y slinga (equipo trabajo en alturas)	Solvente	
1.2.3.1.1	Extensiones electricas	Desengrasantes	
	Cepillo cerda rígida plástica	Gratas	
	Cepillo metálico	EPP	
	Pulidora Manual	Waipes	
	manguera tipo jardín - presión		
	Andamio certificado		
	Arnés y slinga (equipo trabajo en alturas)		
1.2.3.2.1	Compresor	rodillos	
	Herramienta menor	waipes	
	Andamio certificado	Brochas	
	Arnés y slinga (equipo trabajo en alturas)	Cintas	
		Lijas	
		xilol	
		Solvente	
		Anticorrosivo epoxico poli epox 9101 o similar con óxido de hierro y endurecedor poliaminico	
		EPP	
1.2.3.2.2	Andamio certificado	xilol	
	Arnés y slinga (equipo trabajo en alturas)	Solvente	

CONSORCIO ESCUELAS
CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA

		Pintura epoxica base solvente poli-epox uso marino o similar	
		EPP	
1.2.3.2.3	Andamio certificado	Xiol	
	Arnés y slinga (equipo trabajo en alturas)	Solvente	
2.1.1			Transporte 2 - punto de acopio a Disposición final + Certificación disposición final de residuos de obra
2.1.2		Accesorios PVC - tapón, soldadura, etc.	
2.1.3		Accesorios PVC - tapón, soldadura, etc.	
2.1.4		Accesorios PVC - tapón, soldadura, etc.	
2.1.5		Accesorios PVC - tapón, soldadura, etc.	
2.1.6		Accesorios PVC - tapón, soldadura, etc.	

En atención a las observaciones anteriormente expuestas, los documentos deberán ser ajustados incorporando las precisiones y complementos necesarios que permitan consolidarlo como instrumentos efectivos de control y seguimiento durante la ejecución del proyecto.

Quedamos atentos a cualquier aclaración que resulte necesaria respecto al contenido de la presente comunicación. Así mismo, se solicita remitir las subsanaciones correspondientes dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de recepción del presente comunicado.

Quedamos atentos a cualquier aclaración requerida respecto al contenido de la presente comunicación.

Atentamente,

FELIPE ANDRES ANGULO GUZMAN
Representante Legal de Interventoría
CONSORCIO ESCUELAS

Copia:
Archivo Interno

CONSORCIO ESCUELAS
CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA

CE-2026-L1-010
Cartagena D. T. y C., 05 de mayo de 2026

Señores:
ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA"
Atn. TK DANIEL ALFONSO MESA AGUIRRE
Supervisor del contrato
daniel.mesa@enap.edu.co
L.C.

Referencia: CONTRATO DE OBRA N° 0020 ARC-ENAP 2026 "CONTRATACIÓN A PRECIO UNITARIO FIJO Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MAYOR CONSISTENTES EN MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA" - LOTE 1: MANTENIMIENTO AULAS SEXTANTIS DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA.".".

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 0021 ARC-ENAP 2026 "INTERVENTORÍA TÉCNICA INTEGRAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, ECONÓMICA Y JURÍDICA DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MAYOR CONSISTENTES EN MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA".".

Asunto: Solicitud ingreso de personal para el contrato de obra de la referencia a la ENAP

Cordial saludo,

En calidad de interventoría del contrato de obra N° 0020 ARC-ENAP 2026, y en cumplimiento de las obligaciones y funciones establecidas en el contrato de interventoría N° 0021 ARC-ENAP 2026, nos permitimos remitir el listado del personal autorizado para el ingreso a la ENAP.

METALIKA ADMINISTRATIVOS						
Nombre	Cédula	Celular	Correo	Vehículo	Periodo	
					Desde	Hasta
Wilver Franciny Russy Ladino	80212380	3132891767	proyectoswrusi@gmail.com	-	5/05/2026	15/05/2026

En consecuencia, solicitamos respetuosamente se adelante el trámite correspondiente para autorizar el ingreso del personal y vehículos relacionados, conforme a los protocolos y requisitos establecidos por la ENAP.

Agradecemos de antemano su oportuna gestión y colaboración en este proceso.

CONSORCIO
ESCUELAS
CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA

Quedamos atentos a cualquier aclaración, información adicional o documentación que se requiera para dar continuidad al trámite y atender de manera ágil lo solicitado.

Atentamente,

FELIPE ANDRES ANGULO GUZMAN
Representante Legal de Interventoría
CONSORCIO ESCUELAS

Copia:
Archivo Interno

CONSORCIO ESCUELAS
CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA

CE-2026-L1-012
Cartagena D. T. y C., 05 de mayo de 2026

Señores:
ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA"
Atn. TK DANIEL ALFONSO MESA AGUIRRE
Supervisor del contrato
daniel.mesa@enap.edu.co
L.C.

Referencia: CONTRATO DE OBRA N° 0020 ARC-ENAP 2026 "CONTRATACIÓN A PRECIO UNITARIO FIJO Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MAYOR CONSISTENTES EN MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA" - LOTE 1: MANTENIMIENTO AULAS SEXTANTIS DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA."."

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 0021 ARC-ENAP 2026 "INTERVENTORÍA TÉCNICA INTEGRAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, ECONÓMICA Y JURÍDICA DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MAYOR CONSISTENTES EN MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA"."

Asunto: Solicitud ingreso de personal para el contrato de obra de la referencia a la ENAP

Cordial saludo,

En calidad de interventoría del contrato de obra N° 0020 ARC-ENAP 2026, y en cumplimiento de las obligaciones y funciones establecidas en el contrato de interventoría N° 0021 ARC-ENAP 2026, nos permitimos remitir el listado del personal autorizado para el ingreso a la ENAP.

NOMBRE	CEDULA	TELEFONO
EDWIN GUERRERO	73.143.017	3164545210
WILLIAM LIZARAZO	14.322.986	3182766881
JUAN CALLE	1.052.069.374	3184078975
JHAN QUERALES	72.050.072	3007794106
RONAL FERNANDEZ	1.047.365.646	3104549167

Con fecha de ingreso autorizada para todo el personal desde el 06/05/2026 hasta el 15/05/2026.

En consecuencia, solicitamos respetuosamente se adelante el trámite correspondiente para autorizar el ingreso del personal y vehículos relacionados, conforme a los protocolos y requisitos establecidos por la ENAP.

Agradecemos de antemano su oportuna gestión y colaboración en este proceso.

CONSORCIO
ESCUELAS
CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA

Quedamos atentos a cualquier aclaración, información adicional o documentación que se requiera para dar continuidad al trámite y atender de manera ágil lo solicitado.

Atentamente,

FELIPE ANDRES ANGULO GUZMAN
Representante Legal de Interventoría
CONSORCIO ESCUELAS

Copia:
Archivo Interno

CONSORCIO ESCUELAS
CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA

CE-2026-L1-013
Cartagena D. T. y C., 07 de mayo de 2026

Señores:
ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA"
Atn. TK DANIEL ALFONSO MESA AGUIRRE
Supervisor del contrato
daniel.mesa@enap.edu.co
L.C.

Referencia: CONTRATO DE OBRA N° 0020 ARC-ENAP 2026 "CONTRATACIÓN A PRECIO UNITARIO FIJO Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MAYOR CONSISTENTES EN MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA" - LOTE 1: MANTENIMIENTO AULAS SEXTANTIS DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA."."

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 0021 ARC-ENAP 2026 "INTERVENTORÍA TÉCNICA INTEGRAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, ECONÓMICA Y JURÍDICA DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MAYOR CONSISTENTES EN MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA"."

Asunto: Solicitud ingreso de personal para el contrato de obra de la referencia a la ENAP

Cordial saludo,

En calidad de interventoría del contrato de obra N° 0020 ARC-ENAP 2026, y en cumplimiento de las obligaciones y funciones establecidas en el contrato de interventoría N° 0021 ARC-ENAP 2026, nos permitimos remitir el listado del personal autorizado para el ingreso a la ENAP.

SOLUAMBIETAL						
Nombre	Cédula	Celular	Correo	Vehículo	Periodo	
					Desde	Hasta
Felipe Gonzales Vega	15.049.215	3183514822	soluambiental28@gmail.com	TVB663	8/05/2026	15/05/2026

METALIKA ADMINISTRATIVOS						
Nombre	Cédula	Celular	Correo	Vehículo	Periodo	
					Desde	Hasta
Jaime Torres Mancilla	73.208.537	3182766881	metalika13@gmail.com	-	8/05/2026	15/05/2026
Jose Del Rosario Soto	73.559.252	3182766881	metalika13@gmail.com	-	8/05/2026	15/05/2026
Jose Antonio Velázquez Luca	3.814.035	3182766881	metalika13@gmail.com	-	8/05/2026	15/05/2026
Marlos Cárdenas Ubarnes	73.116.467	3182766881	metalika13@gmail.com	-	8/05/2026	15/05/2026
Luis Ortiz Esquina	7.919.386	3182766881	metalika13@gmail.com	-	8/05/2026	15/05/2026

CONSORCIO
ESCUELAS
CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA

En consecuencia, solicitamos respetuosamente se adelante el trámite correspondiente para autorizar el ingreso del personal y vehículos relacionados, conforme a los protocolos y requisitos establecidos por la ENAP.

Agradecemos de antemano su oportuna gestión y colaboración en este proceso.

Quedamos atentos a cualquier aclaración, información adicional o documentación que se requiera para dar continuidad al trámite y atender de manera ágil lo solicitado.

Atentamente,

FELIPE ANDRES ANGULO GUZMAN
Representante Legal de Interventoría
CONSORCIO ESCUELAS

Copia:
Archivo Interno

CONSORCIO ESCUELAS
CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA

CE-2026-L1-014
Cartagena D. T. y C., 11 de mayo de 2026

Señores:
CONSORCIO NAVAL W26
Atn. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
Contratista de obra
proyectos@wrussyingenieros.com
L.C.

Referencia: CONTRATO DE OBRA N° 0020 ARC-ENAP 2026 "CONTRATACIÓN A PRECIO UNITARIO FIJO Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MAYOR CONSISTENTES EN MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA" - LOTE 1: MANTENIMIENTO AULAS SEXTANTIS DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA."."

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 0021 ARC-ENAP 2026 "INTERVENTORÍA TÉCNICA INTEGRAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, ECONÓMICA Y JURÍDICA DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MAYOR CONSISTENTES EN MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA"."

Asunto: Reiteración de observaciones a la información técnica entregado para el contrato N°0020 ARC-ENAP 2026

Cordial saludo,

En calidad de interventoría del Contrato de Obra N°0019 ARC-ENAP-2026, y en cumplimiento de las obligaciones y funciones asignadas mediante el Contrato de Interventoría N°0021 ARC-ENAP-2026, nos permitimos reiterar las observaciones presentadas a través del comunicado CE-2026-L1-014 del 05 de mayo de 2026, conforme a la revisión efectuada sobre la información entregada por el contratista de obra, en los siguientes términos:

1. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)

Tras el análisis de la documentación, se emiten las siguientes observaciones y requerimientos para su ajuste y posterior aprobación definitiva:

1.1. Vigencia y Actualización Documental

- Desfase Cronológico: Se observa que el cuerpo principal del PMA (Código HSE-PLA-05) registra una fecha de aprobación del 08/01/2019. Dado que el contrato actual inició en abril de 2026 y aún no se tiene aprobación de interventoría del documento, se solicita eliminar las fechas de aprobación para que el documento refleje la realidad del proyecto actual.

- Inconsistencias en Anexos: El Programa de Capacitaciones (Anexo 6) presenta tablas de indicadores con datos del año 2023. Es imperativo ajustar estos registros al periodo de ejecución de 2026 para garantizar la trazabilidad de los informes mensuales.

1.2. Análisis de Impactos Ambientales (Anexo 4)

La matriz de impactos, basada en la metodología de Conesa (2009), ha identificado correctamente áreas críticas que requieren supervisión estricta:

- Impactos Severos: Se resaltan las actividades de Pañetes, Enchapes e Instalaciones Hidrosanitarias, calificadas con una importancia de 52 (Severo) debido a la generación de Residuos de Construcción y Demolición (RCD).
- Residuos Peligrosos: El proceso de Iluminación presenta un impacto severo por la generación de residuos peligrosos (RESPEL), lo cual exige el cumplimiento riguroso de la ficha de manejo 8.5.
- Contaminación Auditiva: Se identifican niveles de ruido severos en las actividades de enchapes y aparatos sanitarios, por lo que se deben extremar las medidas de protección y control de emisiones sonoras.

1.3. Control Operativo y Formatos

- Gestión de RCD: Se valida el uso de los formatos para el Registro de Escombros (Anexo 2) y el Vale de Retiro (Anexo 3). Se recuerda que es obligatoria la firma del Residente SGSST y del Residente de Obra en cada planilla para su validación por parte de esta Interventoría.
- Marco Normativo: Si bien el PMA cita la Resolución 472 de 2017, se recomienda integrar plenamente las disposiciones de la Resolución 1257 de 2021, que modifica la gestión integral de RCD y se encuentra listada en su marco legal.

2. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (PLAN SST)

No se evidencia la presentación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). En los documentos adjuntos únicamente se incluyen algunos anexos, los cuales resultan insuficientes para su evaluación integral. En consecuencia, se solicita el envío completo y oportuno del Plan de SST, debidamente estructurado y conforme a la normativa vigente, a fin de proceder con su revisión y validación correspondiente.

3. PLAN DE CALIDAD

El Plan de Calidad presentado no evidencia alineación con los lineamientos establecidos en la norma ISO 10005, la cual proporciona las directrices para la estructuración y desarrollo de planes de calidad. Se recomienda ajustar su contenido conforme a mencionada guía, con el fin de garantizar coherencia metodológica y trazabilidad en la gestión de la calidad del proyecto.

4. PLAN DE GERENCIA

No ha sido remitido por parte del contratista, sin embargo, se deja aclaración que el contratista dentro de su propuesta, indicó: "*(…) en adelante el "Proponente" manifiesto expresamente bajo la gravedad de*
