
Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor	Sucesoras
0		0	**REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL LADO AIRE, INCLUYE ROCERÍA, CANALES Y CERRAMIENTOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)**	**$ 9,015,664,972.00**	**360 días**	**lun 12/05/25**	**vie 31/07/26**		
1		**1**	**ACTA DE INICIO**	**$ 0.00**	0 días	lun 12/05/25	lun 12/05/25		2
2		2	PRESENTACION DE PROGRAMA DE TRABAJO	$ 0.00	15 días	lun 12/05/25	jue 29/05/25	1	4;13CC+41 días;34CC+30
3		**3**	**ROCERÍA**	**$ 2,899,068,357.00**	**320 días**	**jue 29/05/25**	**mar 30/06/26**		
4		3.1	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL Y FUMIGACIÓN)	$ 216,546,681.00	320 días	jue 29/05/25	mar 30/06/26	2	5CC+15 días;10CC+7 días
5		3.2	ROCERÍA Y LIMPIEZA CON EQUIPO CORTA CESPED (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL Y FUMIGACIÓN)	$ 2,603,994,861.00	305 días	mar 17/06/25	mar 30/06/26	4CC+15 días	6CC+10 días
6		3.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE REPELENTE - INSECTICIDA ORGANICO MEDIANTE FUMIGACIÓN	$ 69,958,830.00	295 días	lun 30/06/25	mar 30/06/26	5CC+10 días	7CC+10 días
7		3.4	PODA DE ARBUSTOS CON DIÁMETRO MAYOR A 4CM Y MENOR A 10CM (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	$ 8,567,985.00	285 días	vie 11/07/25	mar 30/06/26	6CC+10 días	40
8		**4**	**ESTRUCTURAS Y DRENAJES**	**$ 513,998,404.00**	**224 días**	**sáb 7/06/25**	**jue 12/03/26**		
9		4.1	REMOCIÓN DE MATERIALES SEDIMENTADOS, RECONFORMACIÓN DE PENDIENTES, LIMPIEZA DE LODOS Y ARENAS, CONTROL DE VEGETACIÓN DE CANALES DE DRENAJE, ENCOLES Y DESCOLES. (INCLUYE MATERIALES PARA RECONFORMACIÓN, Y RETIRO DE BASURAS, SEDIMENTOS Y DISPOSICIÓN FINAL).	$ 253,217,417.00	90 días	jue 26/06/25	mié 15/10/25	10	11CC+10%
10		4.2	LIMPIEZA MANUAL O MECÁNICA DE CÁRCAMOS, BOX COULVERTS Y CAJAS DE INSPECCIÓN SANITARIAS, DE LODOS, BASURA, ARENAS QUE AFECTEN SU CAPACIDAD O LA OBSTRUYAN. (INCLUYE RETIRO DE BASURAS Y DISPOSICIÓN FINAL).	$ 2,867,630.00	15 días	sáb 7/06/25	jue 26/06/25	4CC+7 días	9
11		4.3	RETIRO DE MALEZA, ESCOMBROS, BASURAS, LODOS, ARENAS, Y TODO ELEMENTO EXTRAÑO A QUE AFECTE LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DE REJILLAS, SUMIDEROS, ENCOLES Y DESCOLES (INCLUYE BARRIDO, RETIRO DE BASURAS Y DISPOSICIÓN FINAL).	$ 257,913,357.00	200 días	lun 7/07/25	jue 12/03/26	9CC+10%	40
12		**5**	**PISTA**	**$ 788,092,101.00**	**243.18 días**	**mar 1/07/25**	**mar 28/04/26**		
13		5.1	MEDICIÓN DEL COEFICIENTE DE ROZAMIENTO EN PISTA. Incluye movilización del equipo, personal y análisis del informe	$ 41,229,617.00	115 días	mar 1/07/25	jue 20/11/25	2CC+41 días	
14		5.2	DESCONTAMINACIÓN POR CAUCHO CON HIDROLAVADO	$ 745,634,668.00	25 días	mar 7/10/25	jue 23/04/26	2CC+120 días	15CC
15		5.3	RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL SOLIDO EXISTENTE EN PISTA	$ 1,227,816.00	25 días	mar 7/10/25	mar 28/04/26	14CC	40
16		**6**	**PAVIMENTOS**	**$ 3,121,076,509.00**	**157 días**	**jue 23/10/25**	**mar 5/05/26**		
17		6.1	ENSAYO PCI	$ 132,096,360.00	12 días	jue 23/10/25	jue 6/11/25	2CC+133 días	18CC+133 días;25CC+22 d
18		6.2	FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO PARA PARCHEO, MÍNIMO 5 CM DE PROFUNDIDAD (INCLUYE ILUMINACIÓN , RETIRO Y DISPOSICION INTERNA DEL MATERIAL FRESADO DENTRO DEL AEROPUERTO)	$ 157,395,685.00	24 días	lun 6/04/26	mar 5/05/26	17CC+133 días	19CC
19		6.3	RIEGO DE LIGA INVIAS 421-22 (1 CAPAS DE ACUERDO A ESPESOR DEL ASFALTO)	$ 106,131,137.00	24 días	lun 6/04/26	mar 5/05/26	18CC	20CC
20		6.4	SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA MODIFICADA P- 401 FAA, PARA BACHEOS Y PARCHEOS (INCLUYE ILUMINACIÓN Y TRANSPORTE).	$ 1,663,163,805.00	24 días	lun 6/04/26	mar 5/05/26	19CC	21CC
21		6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFALTICO CON RUTEO, BARRIDO, EQUIPO Y MATERIALES, SEGÚN ESPECIFICACION FAA. (INCLUYE EMULSION CRL-1h)	$ 8,883.00	1 día	lun 6/04/26	mar 7/04/26	20CC	40;22CC
22		6.6	DEMOLICIÓN LOSA DE PAVIMENTO RÍGIDO, REFORZADO Y SIN REFORZAR, (INCLUYE CORTE, EQUIPO,CARGUE, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE)	$ 200,055.00	1 día	lun 6/04/26	mar 7/04/26	21CC	23CC;33CC
23		6.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO MR 45 Mpa (NORMA P-501 FAA) (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, CORTE Y SELLO DE JUNTAS, MEMBRANA DE CURADO), ACELERADO A 3 DIAS. ENSAYOS DE RESISTENCIA A LOS 3 Y 7 DIAS. (e= 0,30m)	$ 944,980.00	1 día	lun 6/04/26	mar 7/04/26	22CC	24CC
24		6.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO RIGIDO CON RUTEO, BARRIDO, EQUIPO Y MATERIALES. (INCLUYE EMULSION CRL-1h)	$ 11,394.00	1 día	lun 6/04/26	mar 7/04/26	23CC	
25		NP 1	Sello de grietas con selladores asfálticos sólido de aplicación en caliente. Incluye aplicación con equipo sellador en caliente con regulador de temperatura y ruteadora de grietas.	$ 689,235,628.00	30 días	mié 19/11/25	vie 26/12/25	17CC+22 días	26CC+10 días;27CC
26		NP 2	Reparacion hombros de canales de drenaje en plataforma con selladores asfálticos sólido de aplicación en caliente, utilizando maquina selladora en caliente con temperatura controlada	$ 362,684,411.00	21 días	mar 2/12/25	sáb 27/12/25	25CC+10 días	
27		NP 3	SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, PARA PARCHEOS (INCLUYE ILUMINACIÓN Y TRANSPORTE).	$ 9,204,171.00	8 días	mié 19/11/25	vie 28/11/25	25CC	
28		**7**	**SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN EN PLATAFORMA Y PISTA.**	**$ 1,208,669,639.00**	**144.53 días**	**mar 1/07/25**	**vie 26/12/25**		
29		7.1	LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES (NO INCLUYE SUMINISTRO)	$ 6,352,491.00	24 días	mar 1/07/25	mié 30/07/25	2CC+41 días	40
30		7.2	LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO (NORMA FAA-P620). INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN DE PINTURA DE DEMARCACION. INCLUYE MICROESFERAS.	$ 339,722,416.00	45 días	sáb 1/11/25	vie 26/12/25		31CC
31		7.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE PISTA, CALLES DE RODAJE, PLATAFORMA, OTRAS SEGÚN NORMA FAA – P 620, INLCUYE MICROESFERAS, EQUIPO	$ 862,594,732.00	45 días	sáb 1/11/25	vie 26/12/25	30CC	40
32		**8**	**MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO**	**$ 484,759,962.00**	**237 días**	**mar 17/06/25**	**mar 7/04/26**		
33		8.1	CERRAMIENTO POR MEDIO DE POLISOMBRA (TELA VERDE). INLCUYE POSTES DE SOPORTE	$ 44,438.00	1 día	lun 6/04/26	mar 7/04/26	22CC	
34		8.2	MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO (INCLUYE PUERTAS, LIMPIEZA, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL VEGETAL, SOLDADURA DE LAS PARTES DE LA MALLA ESLABONADA O TUBOS O PLATINAS DESPRENDIDAS, PINTURA ANTICORROSIVA)	$ 223,644,881.00	120 días	mar 17/06/25	jue 13/11/25	2CC+30 días	40;35CC+168 días
35		NP 4	Reposición e instalación de alambre de púas calibre 12.5 - 4 PUNTAS, a tres hilos	$ 118,939,563.00	50 días	lun 12/01/26	sáb 14/03/26	34CC+168 días	36CC
36		NP 5	Reposición e instalación de alambre tensor	$ 3,933,530.00	50 días	lun 12/01/26	sáb 14/03/26	35CC	37CC
37		NP 6	Reposición e instalación de malla eslabonada calibre 9 plastificada, h= 2.0 mts	$ 59,244,714.00	50 días	lun 12/01/26	sáb 14/03/26	36CC	38CC
38		NP 7	Reposición e instalación de poste de 2 en acero galvanizado, h= 2.0 - 2.5 mts. Incluye pintura anticorrosiva y esmaltado	$ 9,211,983.00	50 días	lun 12/01/26	sáb 14/03/26	37CC	39CC
39		NP 8	Reposición e instalación de poste de 4x4 madera plastica, h= 2.0 - 2.5 mts. Incluye pintura anticorrosiva y esmaltado	$ 69,740,853.00	50 días	lun 12/01/26	sáb 14/03/26	38CC	40
40		**9**	**LIQUIDACION DEL PROYECTO**	**$ 0.00**	25 días	mar 30/06/26	vie 31/07/26	34;11;7;21;29;31	41
41		10	**FIN DEL PROYECTO**	**$ 0.00**	0 días	vie 31/07/26	vie 31/07/26	40	

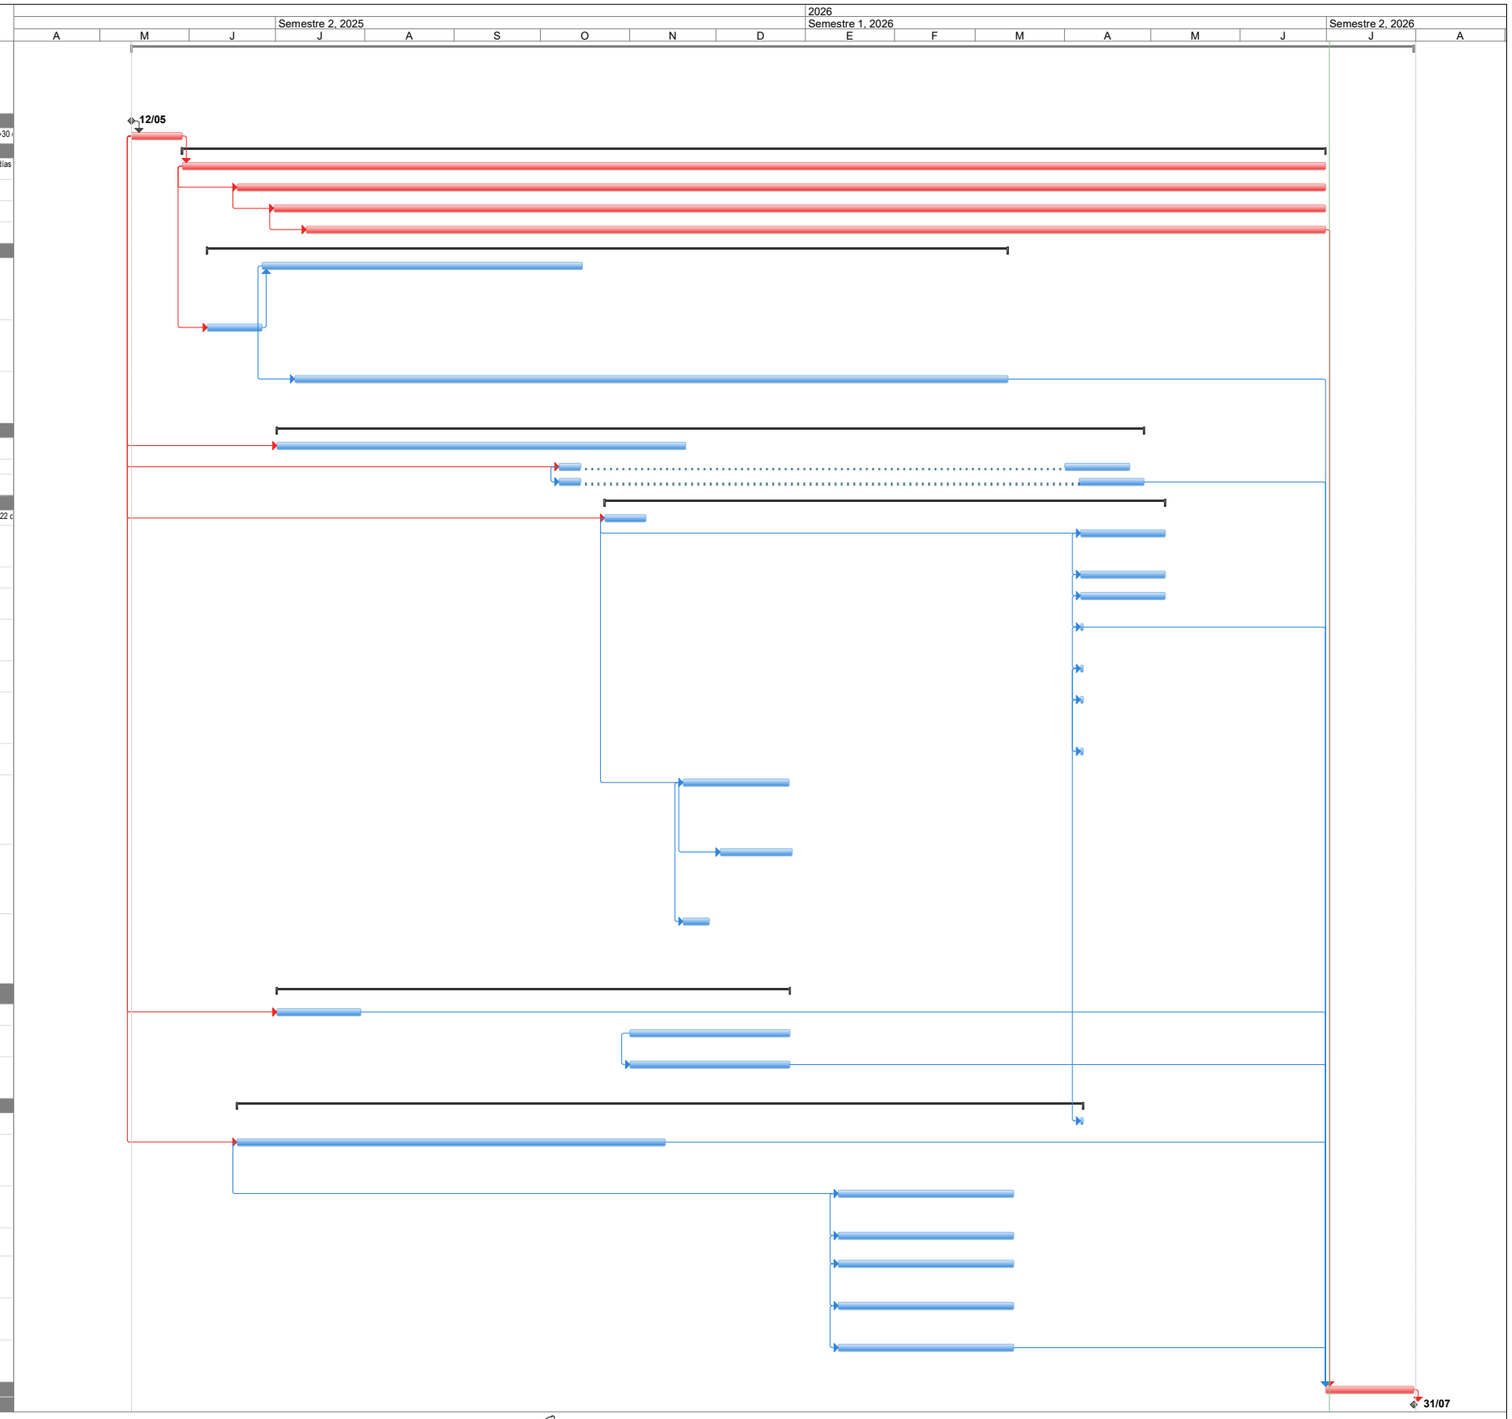

XIMENA CASTRO CELY
CONSORCIO AEREO SMP-25
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

NESTOR ARTUNDUAGA
CONSORCIO BELAIRE 25
REPRESENTANTE LEGAL
INTEVENTORIA

Fecha: jue 2/07/26

Tarea	Resumen	Hito externo	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	Sólo fin	División crítica
División	Resumen del proyecto	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Fecha límite	Progreso
Hito	Tareas externas	Hito inactivo	Sólo duración	Sólo el comienzo	Tareas críticas	Progreso manual
