

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		**PROYECTO PAVIMENTACION BARRIOS COMUNA 4,5 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA**	**214 días**	**mié 7/05/25**	**sáb 27/12/25**	
2		INICIO	0 días	mié 7/05/25	mié 7/05/25	
3		**1. ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**115 días**	**mié 7/05/25**	**mié 10/09/25**	
4		DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO	30 días	mié 7/05/25	lun 9/06/25	2
5		CORTE DE PISO EN TABLON Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.10MTS/0.15MTS CON CORTADORA	30 días	mié 7/05/25	lun 9/06/25	2
6		DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	30 días	lun 9/06/25	vie 11/07/25	5
7		DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	16 días	mié 7/05/25	sáb 24/05/25	2
8		EXCAVACIONES MECANICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO	80 días	sáb 14/06/25	mié 10/09/25	9CC+20 días
9		EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	90 días	vie 23/05/25	vie 29/08/25	2FC+15 días
10		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	90 días	lun 26/05/25	lun 1/09/25	9CC+2 días
11		REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ARBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	15 días	mié 7/05/25	vie 23/05/25	2
12		REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	7 días	vie 23/05/25	vie 30/05/25	11
13		REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ARBOLES ALTURAS ENTRE H= 10.1M A 15 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ)	3 días	vie 30/05/25	mar 3/06/25	12
14		PODA DE FORMACIÓN ARBOLES ALTURA MAYOR H=5.1 O IGUAL 10 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS)	1 día	mar 3/06/25	mié 4/06/25	13
15		SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOLES MADERABLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5 M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACION, ABONO ORGANICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO	75 días	mié 7/05/25	lun 28/07/25	
16		**2. SUBRASANTE Y SUBBASE**	**122 días**	**vie 23/05/25**	**vie 3/10/25**	
17		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL SELECCIONADO	90 días	vie 30/05/25	sáb 6/09/25	20CC+7 días
18		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR)	90 días	vie 30/05/25	sáb 6/09/25	20CC+7 días
19		SUBBASE GRANULAR CLASE A	60 días	mié 30/07/25	vie 3/10/25	17FC-35 días
20		GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	90 días	vie 23/05/25	vie 29/08/25	9FC-100 días;8FC-100 días
21		**3. PAVIMENTO Y BORDILLOS**	**119 días**	**vie 8/08/25**	**mié 17/12/25**	
22		PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (40 Kg/cm2)	100 días	mié 20/08/25	lun 8/12/25	26CC+7 días;19CC+7 días
23		PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (38 Kg/cm2)	45 días	sáb 4/10/25	sáb 22/11/25	19
24		ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANHOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI	45 días	vie 8/08/25	vie 26/09/25	17FC-27 días
25		BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	60 días	sáb 11/10/25	mié 17/12/25	22CC+7 días;23CC+7 días
26		ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	100 días	mié 13/08/25	lun 1/12/25	19FC-48 días
27		**4. SEÑALIZACION**	**5 días**	**mar 23/12/25**	**sáb 27/12/25**	
28		SENAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	2 días	mar 23/12/25	mié 24/12/25	36
29		SENAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	1 día	mié 24/12/25	jue 25/12/25	28
30		DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M2 (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACION CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	1 día	jue 25/12/25	vie 26/12/25	29
31		DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M (12 CM). (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	1 día	jue 25/12/25	vie 26/12/25	29
32		REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLÁSTICO PERNADO	1 día	vie 26/12/25	sáb 27/12/25	31
33		**5. ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS**	**60 días**	**vie 17/10/25**	**lun 22/12/25**	
34		SI TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.08m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H =0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS	60 días	vie 17/10/25	lun 22/12/25	25FC-55 días

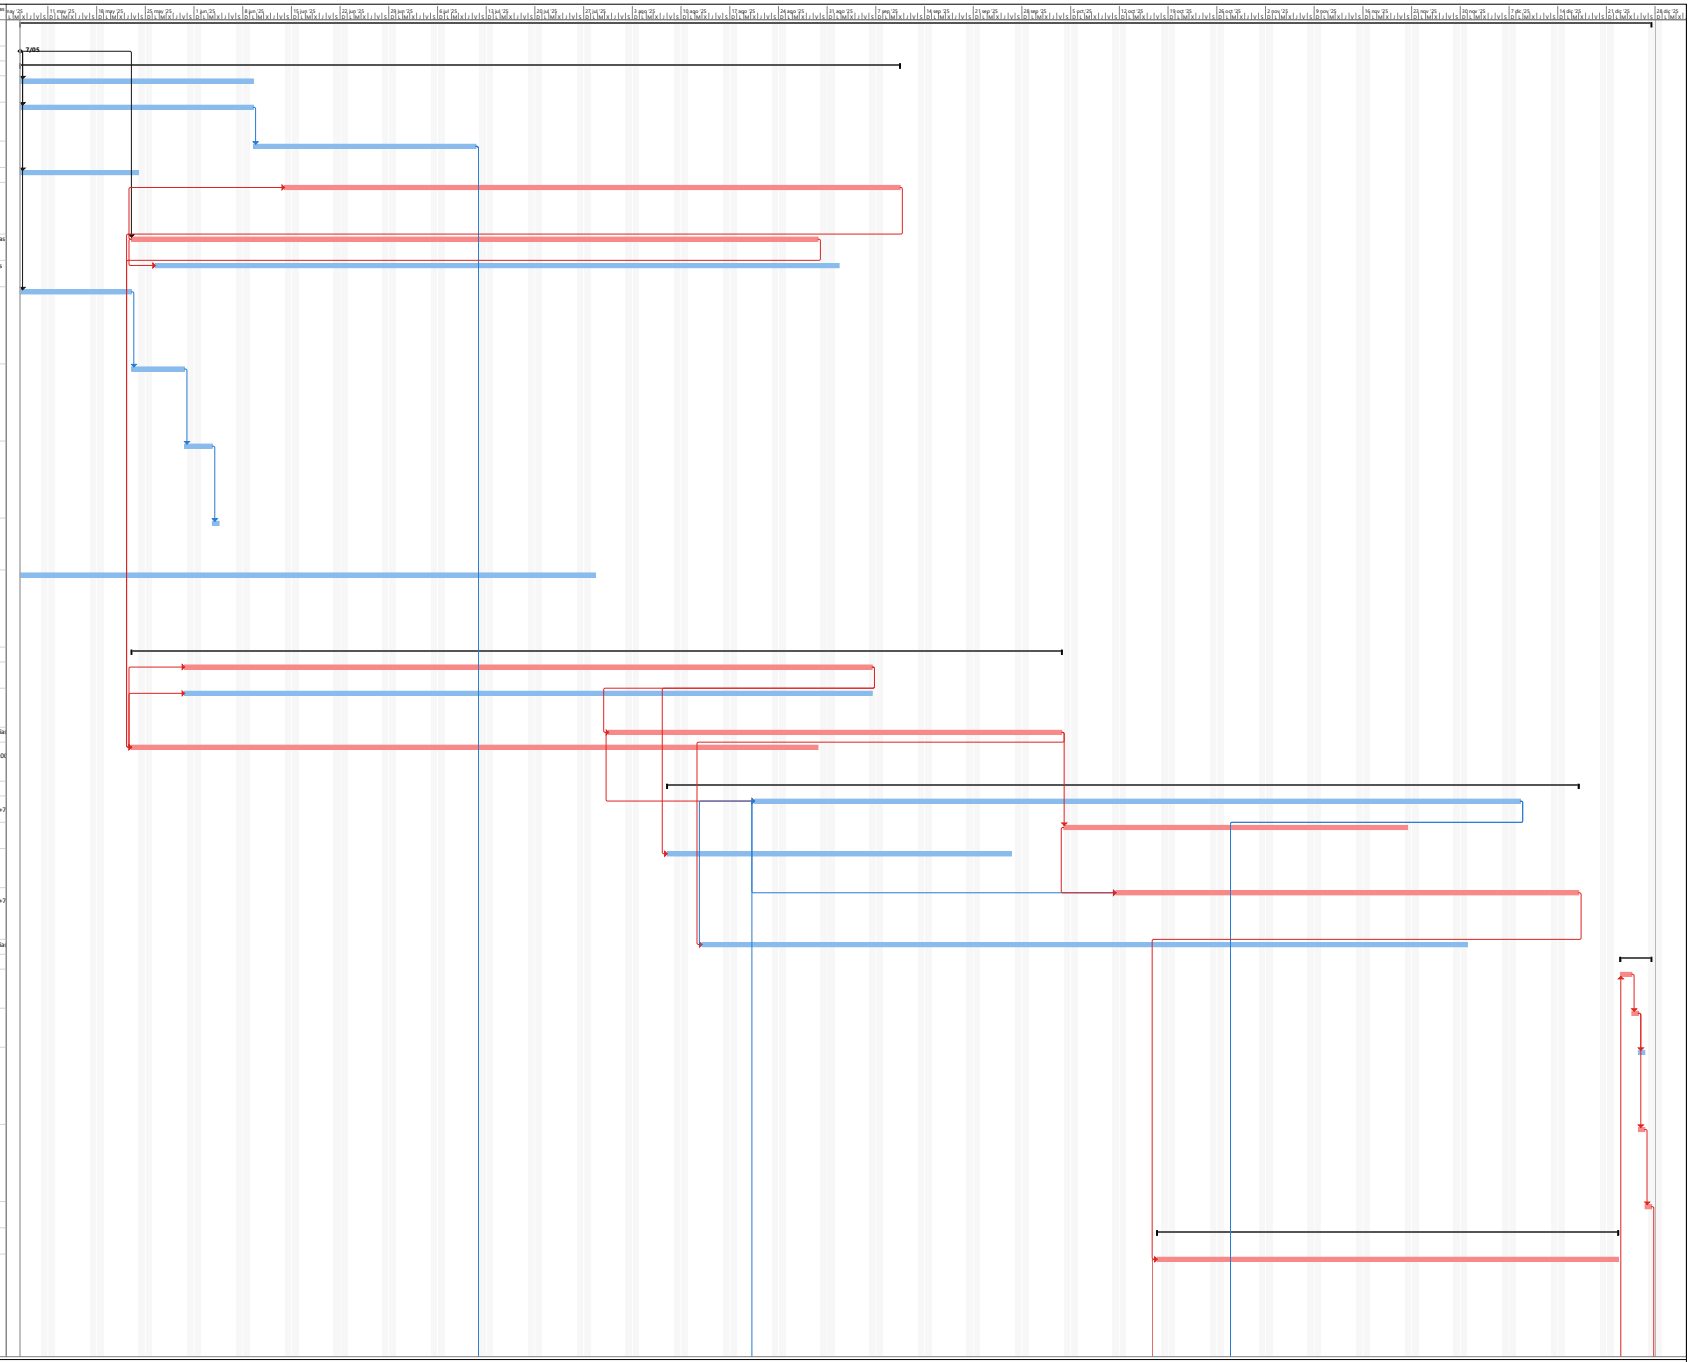

Proyecto: PROGRAMA PAVIME
Fecha: vie 17/04/26

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
35		FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H.=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA	60 días	vie 17/10/25	lun 22/12/25	34CC
36		CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI), E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, MATERIAL SELECCIONADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	60 días	vie 17/10/25	lun 22/12/25	35CC
37		RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TACTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO	29 días	jue 20/11/25	lun 22/12/25	36FF
38		RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA ENCONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACIONMANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	20 días	lun 1/12/25	lun 22/12/25	37FF
39		SI BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	7 días	lun 15/12/25	lun 22/12/25	38FF
40		**6. OTRAS ACTIVIDADES**	**45 días**	**vie 11/07/25**	**vie 29/08/25**	
41		SI TUBERÍA PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4". INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	30 días	vie 11/07/25	mié 13/08/25	6
42		REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	45 días	vie 11/07/25	vie 29/08/25	6
43		REUBICACIÓN TÍPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA.	15 días	vie 11/07/25	lun 28/07/25	6
44		**7. BOX CULVERT**	**24 días**	**mar 1/07/25**	**sáb 26/07/25**	
45		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA	2 días	mar 1/07/25	mié 2/07/25	
46		GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	1 día	jue 3/07/25	jue 3/07/25	45
47		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	2 días	mar 1/07/25	mié 2/07/25	45FF
48		RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	1 día	jue 24/07/25	vie 25/07/25	50FC+3 días
49		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)	1 día	jue 3/07/25	jue 3/07/25	46FF
50		CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA CLASE C (PARA ESTRUCTURA)	12 días	mar 8/07/25	mar 22/07/25	51CC+3 días
51		ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	6 días	vie 4/07/25	vie 11/07/25	55
52		BARANDA METALICA PARA TRAFICO VEHICULAR	5 días	mar 22/07/25	sáb 26/07/25	50
53		MANEJO DE CAUCE DE AGUA	15 días	mar 1/07/25	jue 17/07/25	45CC
54		JUNTA PARA MURO EN CINTA PVC	1 día	mar 15/07/25	mié 16/07/25	50CC+6 días
55		CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA CLASE F (SOLADO)	1 día	jue 3/07/25	vie 4/07/25	49
56		**8. CUNETAS Y SUMIDEROS**	**84 días**	**vie 5/09/25**	**sáb 6/12/25**	
57		EXCAVACION MANUAL	60 días	vie 5/09/25	mar 11/11/25	22CC+15 días
58		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	30 días	mié 8/10/25	mar 11/11/25	57FF
59		GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	50 días	mié 17/09/25	mar 11/11/25	57FF
60		RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	40 días	sáb 27/09/25	mar 11/11/25	59FC-40 días
61		ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA	45 días	lun 6/10/25	lun 24/11/25	60CC+7 días
62		CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU. NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	50 días	lun 13/10/25	sáb 6/12/25	61CC+7 días
63		SUMIDERO TIPO VENTANA EN CONCRETO	45 días	sáb 18/10/25	sáb 6/12/25	62FF
64		**9. RED DE MEDIA TENSION (13.2000) VOL**	**36 días**	**mar 28/10/25**	**sáb 6/12/25**	
65		LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES DE MEDIA TENSION.	30 días	mar 28/10/25	lun 1/12/25	22FC-37 días
66		SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	6 días	lun 3/11/25	lun 10/11/25	67FC-3 días
67		SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	5 días	vie 31/10/25	jue 6/11/25	65CC+3 días
68		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN DERIVACION COMPACTA CON DISPOSICIÓN CENTRAL BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	5 días	jue 6/11/25	mié 12/11/25	66FC-3 días
69		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION CON DISPOSICIÓN EN BANDERA BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	3 días	sáb 8/11/25	mié 12/11/25	68FC-3 días

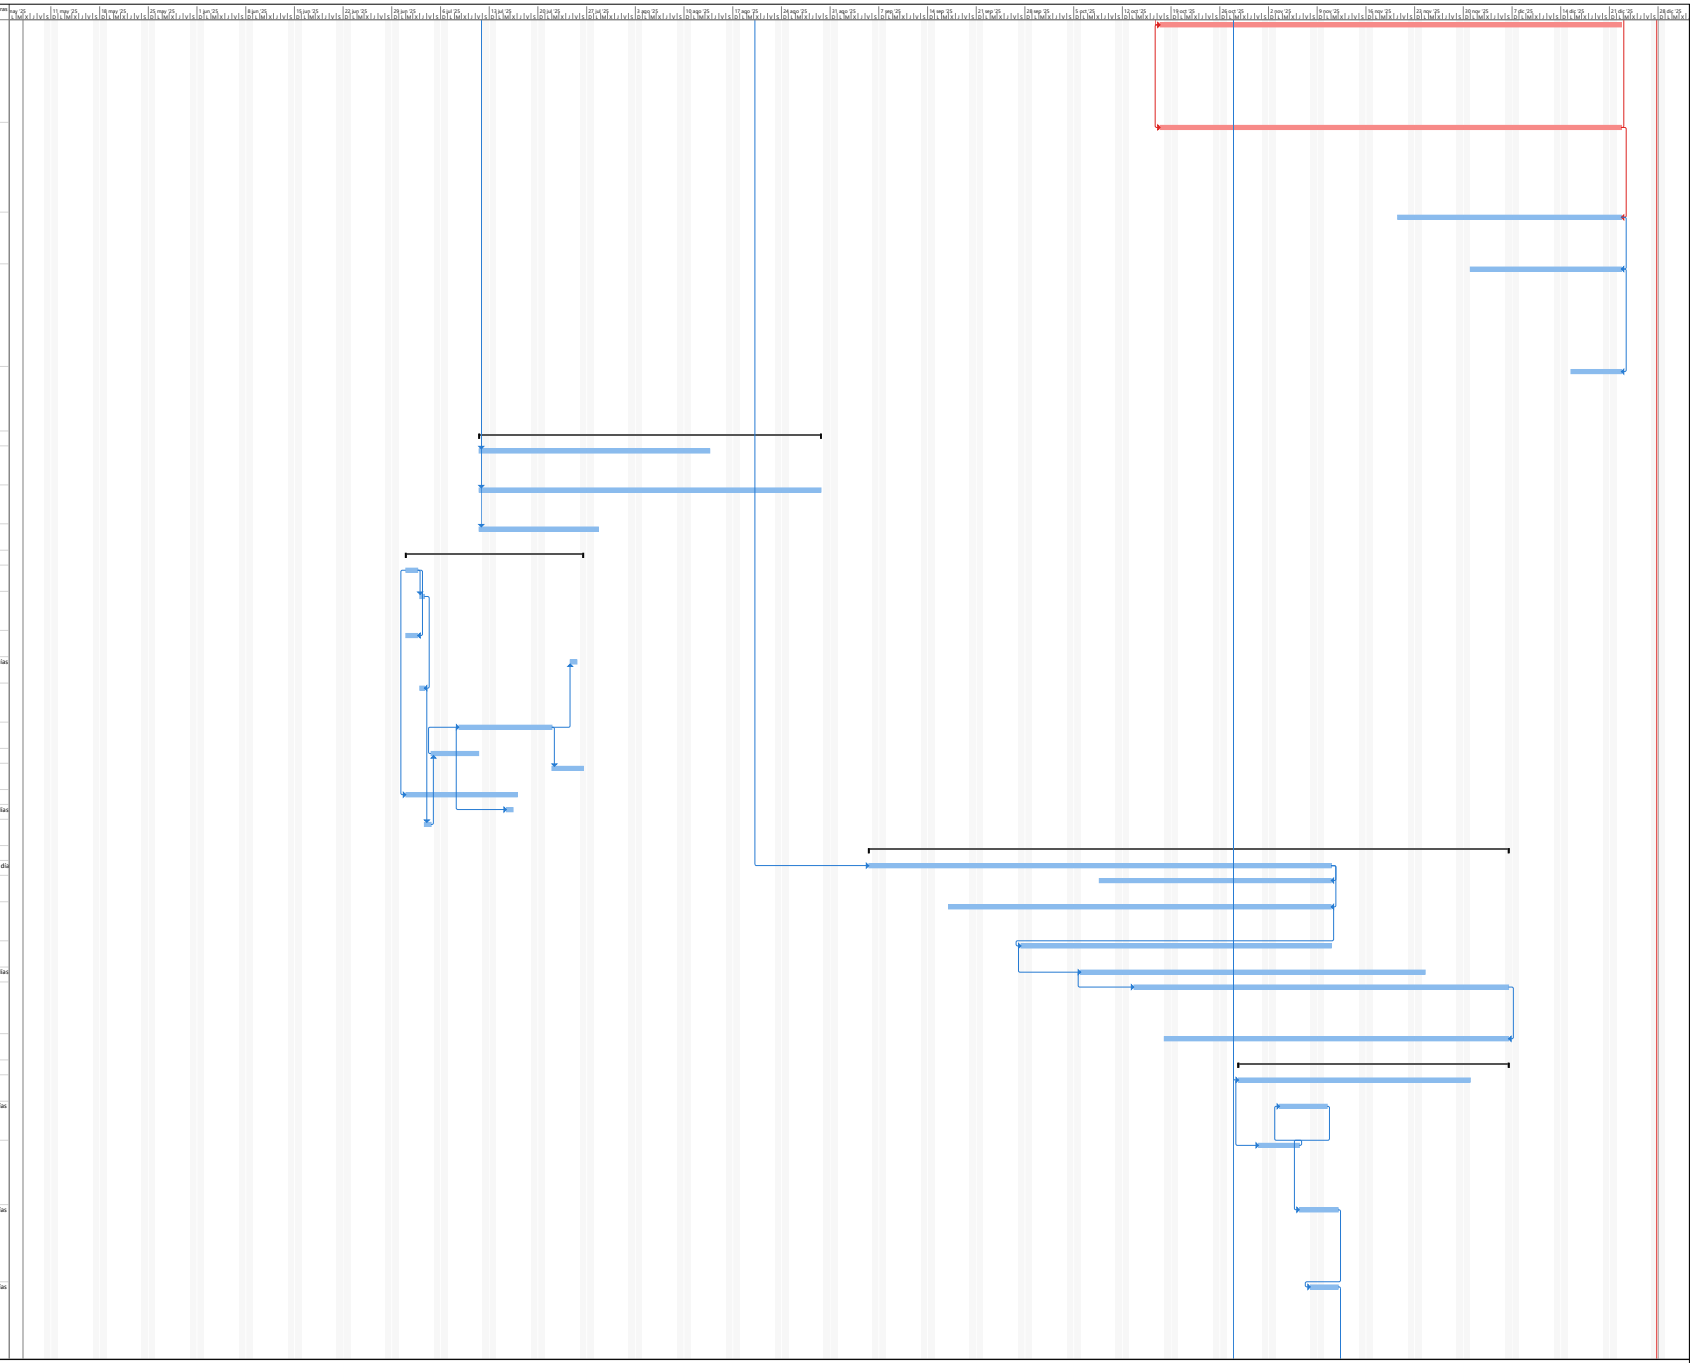

Proyecto: PROGRAMA PAVIME
Fecha: vie 17/04/26

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
70		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANGULO CON DISPOSICIÓN EN BANDERA A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	3 días	mié 12/11/25	vie 14/11/25	69
71		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANCLAJE COMPACTA CON DISPOSICIÓN CENTRAL BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	2 días	jue 13/11/25	vie 14/11/25	70FF
72		SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR - No. 1/0 AWG.	20 días	vie 14/11/25	sáb 6/12/25	71
73		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA A TIERRA EN POSTE DE 12 MTS.	1 día	vie 5/12/25	sáb 6/12/25	72FF
74		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA MT EN POSTE DE 12m A POSTE DE 9m	1 día	vie 5/12/25	sáb 6/12/25	73FF
75		INSTALACIÓN CON TENSION DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE MT BIFASICO A 13.2 KV.	1 día	vie 5/12/25	sáb 6/12/25	74FF
76		INSTALACION CON TENSION A 13.2 KV. DE POSTE EN CONCRETO	1 día	vie 5/12/25	sáb 6/12/25	75FF
77		**10. RED DE BAJA TENSION (240/120) VOL**	**46 días**	**mar 28/10/25**	**jue 18/12/25**	
78		LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES DE BAJA TENSION.	30 días	mar 28/10/25	lun 1/12/25	22FC-37 días
79		SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	6 días	mar 11/11/25	lun 17/11/25	80FC-4 días
80		SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	8 días	jue 6/11/25	vie 14/11/25	78CC+8 días
81		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION - ANGULO - FINAL DE CIRCUITO PARA BT A 240/120 VOL.	6 días	lun 17/11/25	lun 24/11/25	79
82		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANCLAJE PARA BT A 240/120 VOL.	1 día	lun 24/11/25	mar 25/11/25	81
83		SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFASICA AEREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO - No. 1/0 AWG.	18 días	mar 25/11/25	lun 15/12/25	82
84		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA A TIERRA EN POSTE DE 9 MTS.	1 día	lun 15/12/25	mar 16/12/25	83
85		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA CAJA DE CONEXIÓN (4 USUARIOS) A RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL.	2 días	mar 16/12/25	jue 18/12/25	84
86		DESINSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 750-510 KGF).	7 días	lun 3/11/25	mar 11/11/25	78CC+5 días
87		DESMONTE, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA RED DE TELECOMUNICACIONES	15 días	sáb 8/11/25	mar 25/11/25	78CC+10 días
88		**11. SUBESTACIONES ELECTRICAS (13.200/240/120) VOL.**	**1 día**	**lun 17/11/25**	**mar 18/11/25**	
89		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ADECUACION DE SUBESTACION BIFASICA EN POSTE A (13.200/240/120) VOL.,INCLUYE: INSTALACION PUENTES DE SECCIONADOR, ESTRUCTURA DE PROTECCIONES, SECCIONADOR, DPS, DESMONTE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR.	1 día	lun 17/11/25	mar 18/11/25	79
90		**12. ALUMBRADO PUBLICO, ALIMENTADORES Y MEDIDAS DE BAJA TENSION (240/120) VOL.**	**36 días**	**mar 18/11/25**	**sáb 27/12/25**	
91		SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE CABLE CONCENTRICO DE ALUMINIO - (2xNo. 6 + 1xNo. 6) AWG.	15 días	mar 18/11/25	jue 4/12/25	89
92		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REUBICACION DE MEDIDOR (240/120) VOL.	1 día	jue 4/12/25	vie 5/12/25	91
93		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REINSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO.	7 días	vie 5/12/25	sáb 13/12/25	92
94		FIN	0 días	sáb 27/12/25	sáb 27/12/25	92

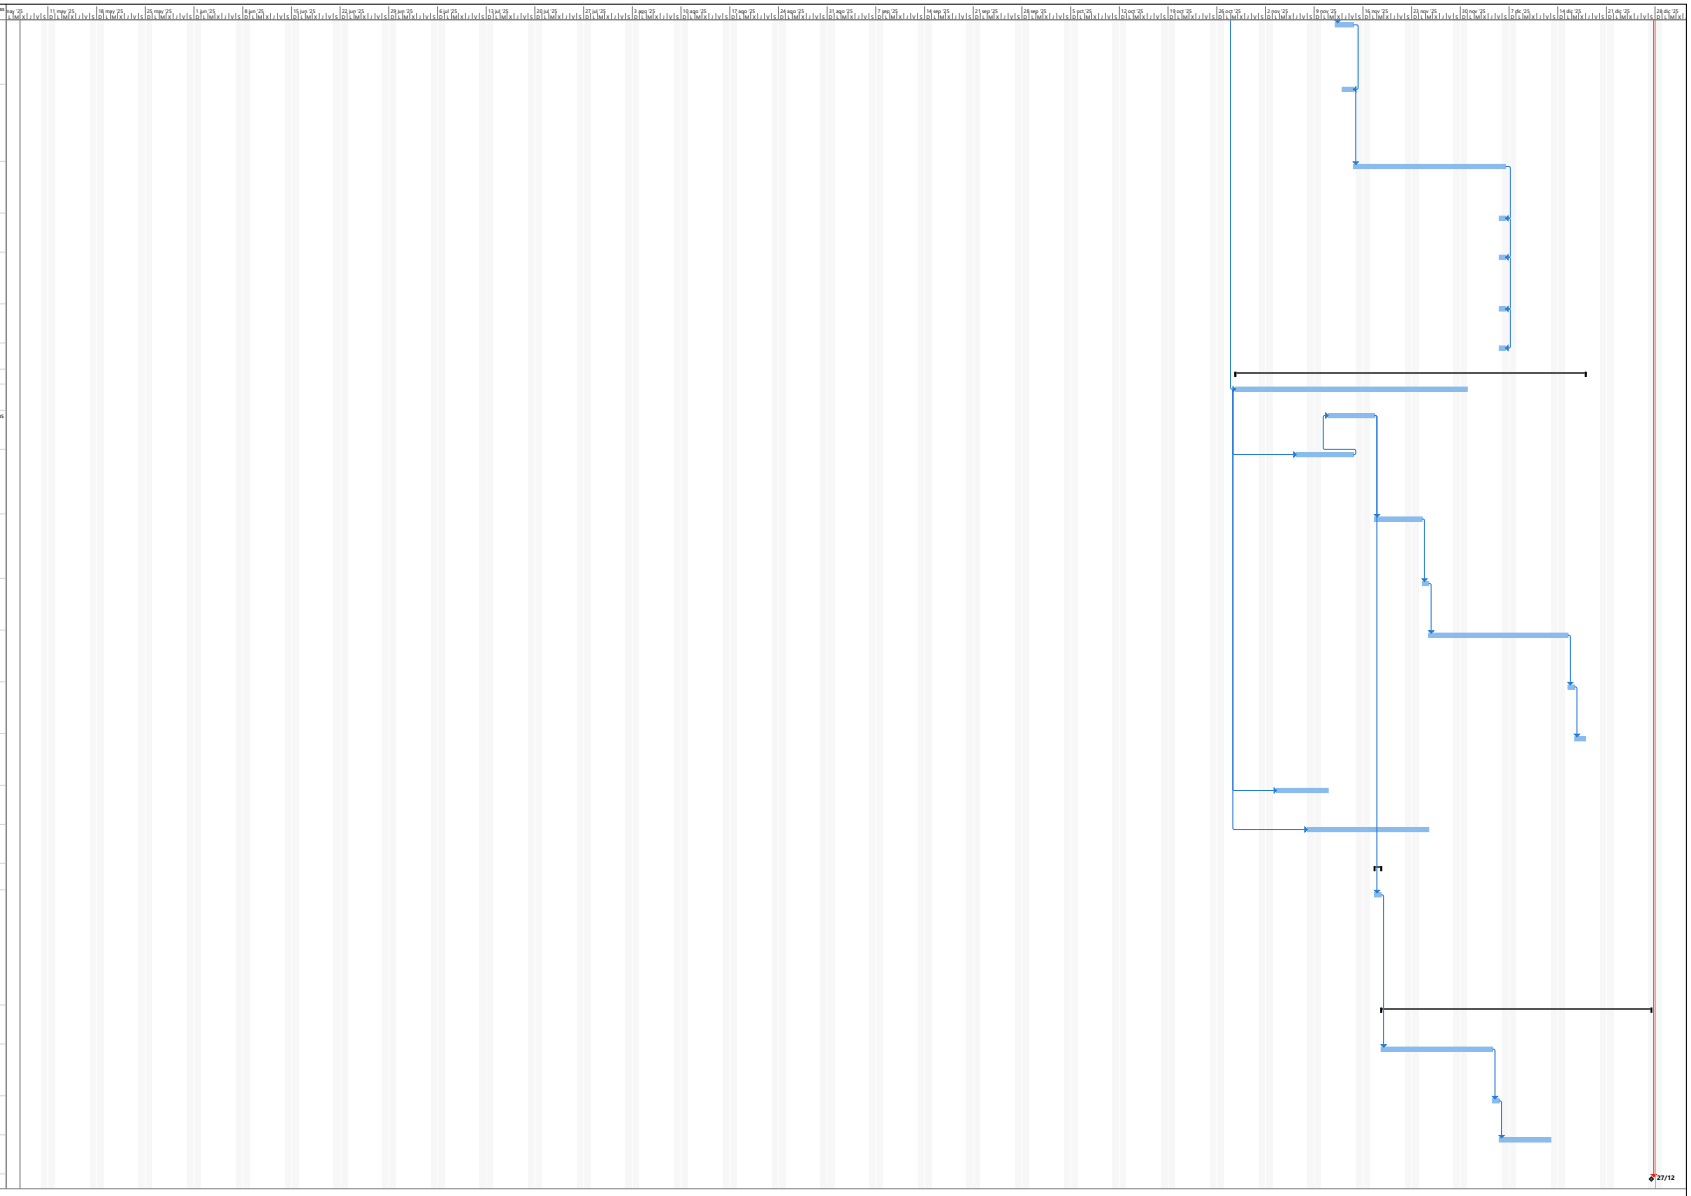

Proyecto: PROGRAMA PAVIME
Fecha: vie 17/04/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso
