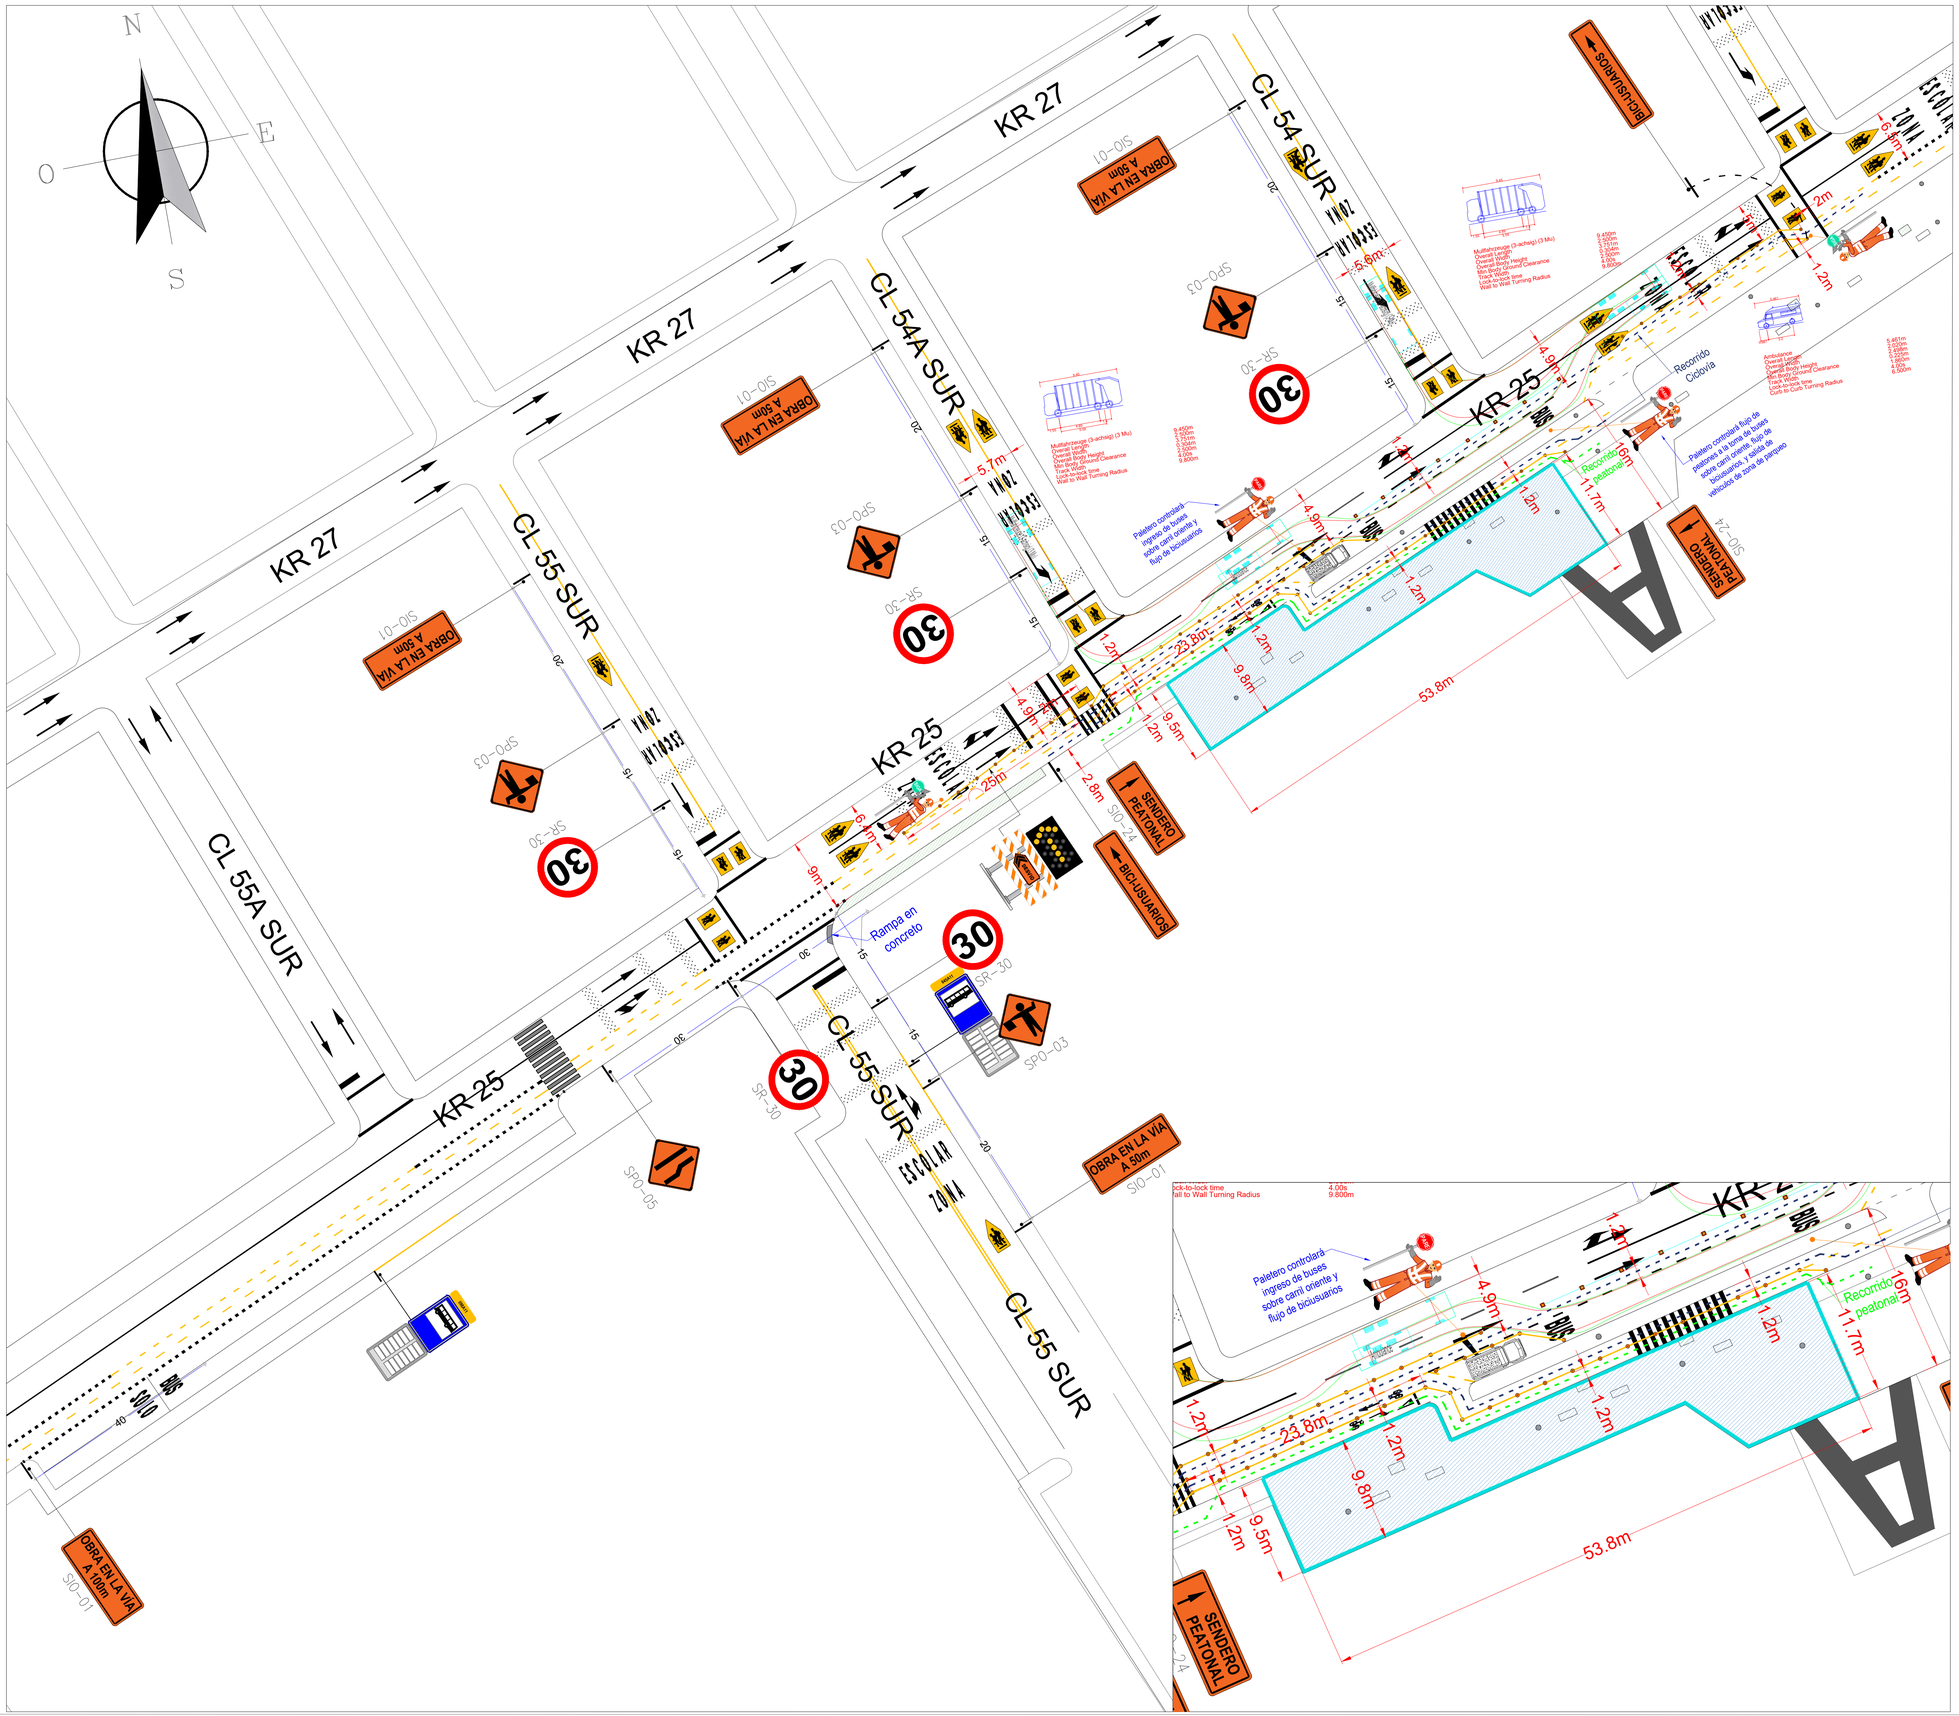


CONTENIDO:
INTERVENCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO

DIRECCIÓN:
1. KR 25 ENTRE CL 53B SUR Y CL 54A SUR

CIV: 6001206
PK ID: 323557

COSTADO: ORIENTE

LOCALIDAD: TUNJUELITO

CONVENCIONES

AFECTACIÓN A CIELO ABIERTO / POSICIONAMIENTO VEHICULOS DE OBRA	BARRERA DE SEGURIDAD
CIRCULACIÓN PEATONAL / CIRCULACIÓN BICI-USUARIOS	FLECHA LUMINOSA
PLAFONES / PLAFONES	CONOS 90cm
ACCESOS VEHICULARES EXISTENTES / IMPLEMENTACIÓN DESVIOS	DELINEADORES TUBULARES
OBRAS EXISTENTES / CERRAMIENTO EN POLISOMBRA	BARRERAS PLÁSTICAS / INDIVIDUOS ARBOREOS
OBRA EN LA VÍA A XXXm — OBRA EN LA VÍA SIO-01	PARADERO PROVISIONAL
VÍA CERRADA A XXXm — VÍA CERRADA SIO-01	SENDERO PEATONAL — SENDERO PEATONAL SIO-24
CARRIL DERECHO CERRADO — CARRIL CERRADO SIO-04	PEATONES — PEATONES SIO-24
CARRIL IZQUIERDO CERRADO — CARRIL CERRADO SIO-04	TRANSITE POR LA ACERA DE ENFRENTE — TRANSITE POR LA ACERA DE ENFRENTE
ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS — ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS	PARADERO
TRABAJOS EN LA VÍA SPO-01	CIRCULACIÓN VIAL
AUXILIAR DE TRÁNSITO SPO-03	AUXILIARES DE TRÁFICO
REDUCCIÓN A LA DERECHA SPO-05	SEMÁFOROS
REDUCCIÓN A LA IZQUIERDA SPO-06	BICI-USUARIOS — BICI-USUARIOS
30 VELOCIDAD MÁXIMA PERMITIDA SR-30	CONSERVE LA DERECHA SRC-01

UBICACION

HORARIO: 07:00 – 17:00 Horas
HORARIO CIERRE: 24 Horas

ESCALA: S / N | **REV:** 0

FECHA: 19 DE ENERO DE 2026

CAPÍTULO 4 SEÑALIZACIÓN DE CALLES Y CARRETERAS AFECTADAS POR OBRAS

PLANO 1 DE 5

CONSORCIO COCO



CONTENIDO:
INTERVENCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO

DIRECCIÓN:
1. KR 25 ENTRE CL 53B SUR Y CL 54A SUR

CIV: 6001206
PK ID: 323557

COSTADO: ORIENTE

LOCALIDAD: TUNJUELITO

CONVENCIONES

AFECTACIÓN A CIELO ABIERTO / POSICIONAMIENTO VEHICULOS DE OBRA	BARRERA DE SEGURIDAD
CIRCULACIÓN PEATONAL / CIRCULACIÓN BICI-USUARIOS	FLECHA LUMINOSA
PLAFONES / PLAFONES	CONOS 90cm
ACCESOS VEHICULARES EXISTENTES / IMPLEMENTACIÓN DESVIOS	DELINEADORES TUBULARES
OBRAS EXISTENTES / CERRAMIENTO EN POLISOMBRA	BARRERAS PLÁSTICAS / INDIVIDUOS ARBOREOS
OBRA EN LA VÍA A XXXm — OBRA EN LA VÍA SIO-01	PARADERO PROVISIONAL
VÍA CERRADA A XXXm — VÍA CERRADA SIO-01	SENDERO PEATONAL — SENDERO PEATONAL SIO-24
CARRIL DERECHO CERRADO — CARRIL CERRADO SIO-04	PEATONES — PEATONES SIO-24
CARRIL IZQUIERDO CERRADO — CARRIL CERRADO SIO-04	TRANSITE POR LA ACERA DE ENFRENTE — TRANSITE POR LA ACERA DE ENFRENTE
ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS — ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS	PARADERO
TRABAJOS EN LA VÍA SPO-01	CIRCULACIÓN VIAL
AUXILIAR DE TRÁNSITO SPO-03	AUXILIARES DE TRÁFICO
REDUCCIÓN A LA DERECHA SPO-05	SEMÁFOROS
REDUCCIÓN A LA IZQUIERDA SPO-06	BICI-USUARIOS — BICI-USUARIOS
30 VELOCIDAD MÁXIMA PERMITIDA SR-30	CONSERVE LA DERECHA SRC-01

UBICACION

HORARIO: 07:00 – 17:00 Horas
HORARIO CIERRE: 24 Horas

ESCALA: S / N
REV: 0

FECHA: 19 DE ENERO DE 2026

CAPÍTULO 4 SEÑALIZACIÓN DE CALLES Y CARRETERAS AFECTADAS POR OBRAS

PLANO 2 DE 5

CONSORCIO COCO



CONTENIDO:
INTERVENCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO

DIRECCIÓN:
1. KR 25 ENTRE CL 53B SUR Y CL 54A SUR

CIV: 6001200
PK ID: 323539

COSTADO: ORIENTE

LOCALIDAD: TUNJUELITO

CONVENCIONES

AFECTACIÓN A CIELO ABIERTO	BARRERA DE SEGURIDAD
POSICIONAMIENTO VEHICULOS DE OBRA	
CIRCULACIÓN PEATONAL	FLECHA LUMINOSA
CIRCULACIÓN BICI-USUARIOS	
PLAFONES	CONOS 90cm
PLAFONES	
ACCESOS VEHICULARES EXISTENTES	DELINEADORES TUBULARES
IMPLEMENTACIÓN DESVIOS	
OBRAS EXISTENTES	BARRERAS PLÁSTICAS / INDIVIDUOS ARBOREOS
CERRAMIENTO EN POLISOMBRA	
OBRA EN LA VÍA A XXXm — OBRA EN LA VÍA SIO-01	PARADERO PROVISIONAL
VÍA CERRADA A XXXm — VÍA CERRADA SIO-01	SENDERO PEATONAL — SENDERO PEATONAL SIO-24
CARRIL DERECHO CERRADO — CARRIL CERRADO SIO-04	PEATONES — PEATONES SIO-24
CARRIL IZQUIERDO CERRADO — CARRIL CERRADO SIO-04	TRANSITE POR LA ACERA DE ENFRENTE — TRANSITE POR LA ACERA DE ENFRENTE
ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS — ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS	PARADERO
TRABAJOS EN LA VÍA SPO-01	CIRCULACIÓN VIAL
AUXILIAR DE TRÁNSITO SPO-03	AUXILIARES DE TRÁFICO
REDUCCIÓN A LA DERECHA SPO-05	SEMÁFOROS
REDUCCIÓN A LA IZQUIERDA SPO-06	BICI-USUARIOS — BICI-USUARIOS
30 VELOCIDAD MÁXIMA PERMITIDA SR-30	CONSERVE LA DERECHA SRC-01

UBICACION

HORARIO: 07:00 – 17:00 Horas
HORARIO CIERRE: 24 Horas


ESCALA: S / N **REV:** 0

FECHA: 19 DE ENERO DE 2026

CAPÍTULO 4 SEÑALIZACIÓN DE CALLES Y CARRETERAS AFECTADAS POR OBRAS

PLANO 3 DE 5

CONSORCIO COCO

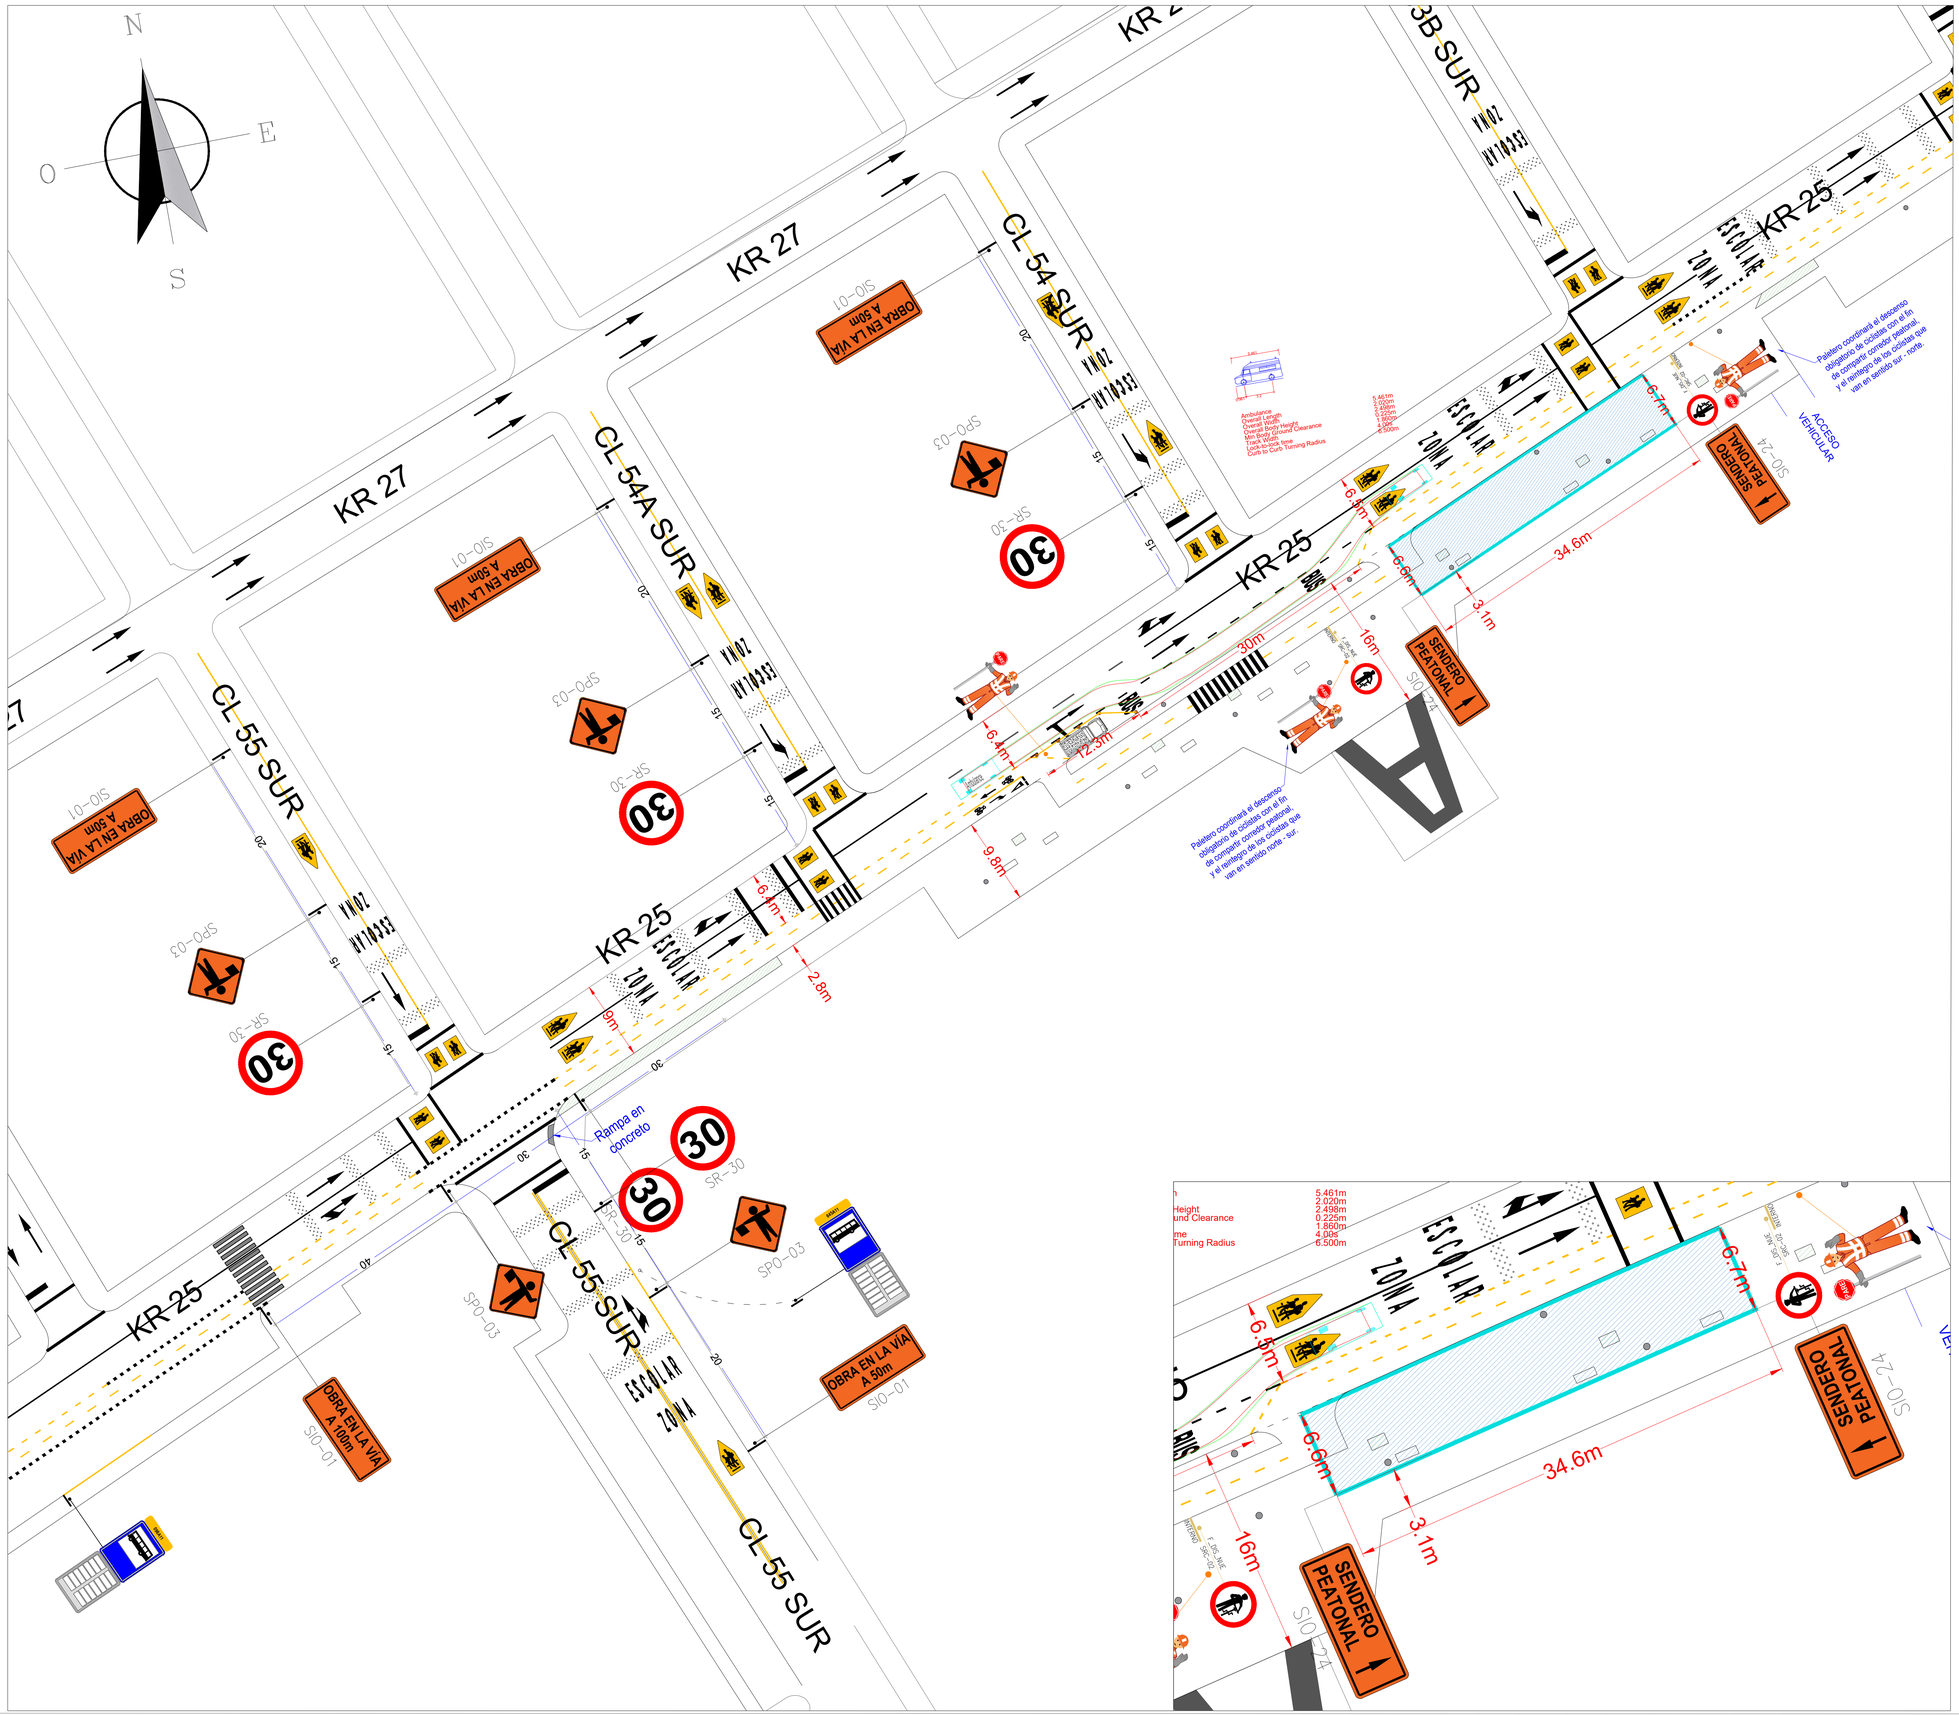

CONTENIDO:
INTERVENCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO

DIRECCIÓN:
1. KR 25 ENTRE CL 53B SUR Y CL 54A SUR

CIV: 6001200
PK ID: 323539

COSTADO: ORIENTE

LOCALIDAD: TUNJUELITO

CONVENCIONES

AFECTACIÓN A CIELO ABIERTO POSICIONAMIENTO VEHICULOS DE OBRA	BARRERA DE SEGURIDAD
CIRCULACIÓN PEATONAL CIRCULACIÓN BICI-USUARIOS	FLECHA LUMINOSA
PLAFONES PLAFONES	CONOS 90cm
ACCESOS VEHICULARES EXISTENTES IMPLEMENTACIÓN DESVÍOS	DELINEADORES TUBULARES
OBRAS EXISTENTES CERRAMIENTO EN POLISOMBRA	BARRERAS PLÁSTICAS / INDIVIDUOS ARBOREOS
OBRA EN LA VÍA A XXXm — OBRA EN LA VÍA SIO-01	PARADERO PROVISIONAL
VÍA CERRADA A XXXm — VÍA CERRADA SIO-01	SENDERO PEATONAL — SENDERO PEATONAL SIO-24
CARRIL DERECHO CERRADO — CARRIL CERRADO SIO-04	PEATONES — PEATONES SIO-24
CARRIL IZQUIERDO CERRADO — CARRIL CERRADO SIO-04	TRANSITE POR LA ACERA DE ENFRENTE — TRANSITE POR LA ACERA DE ENFRENTE
ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS — ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS	PARADERO
TRABAJOS EN LA VÍA SPO-01	CIRCULACIÓN VIAL
AUXILIAR DE TRÁNSITO SPO-03	AUXILIARES DE TRÁFICO
REDUCCIÓN A LA DERECHA SPO-05	SEMÁFOROS
REDUCCIÓN A LA IZQUIERDA SPO-06	BICI-USUARIOS — BICI-USUARIOS
30 VELOCIDAD MÁXIMA PERMITIDA SR-30	CONSERVE LA DERECHA SRC-01

UBICACION

HORARIO: 07:00 – 17:00 Horas
HORARIO CIERRE: 24 Horas


ESCALA: S / N
REV: 0

FECHA: 19 DE ENERO DE 2026

CAPÍTULO 4 SEÑALIZACIÓN DE CALLES Y CARRETERAS AFECTADAS POR OBRAS

PLANO 4 DE 5

CONSORCIO COCO

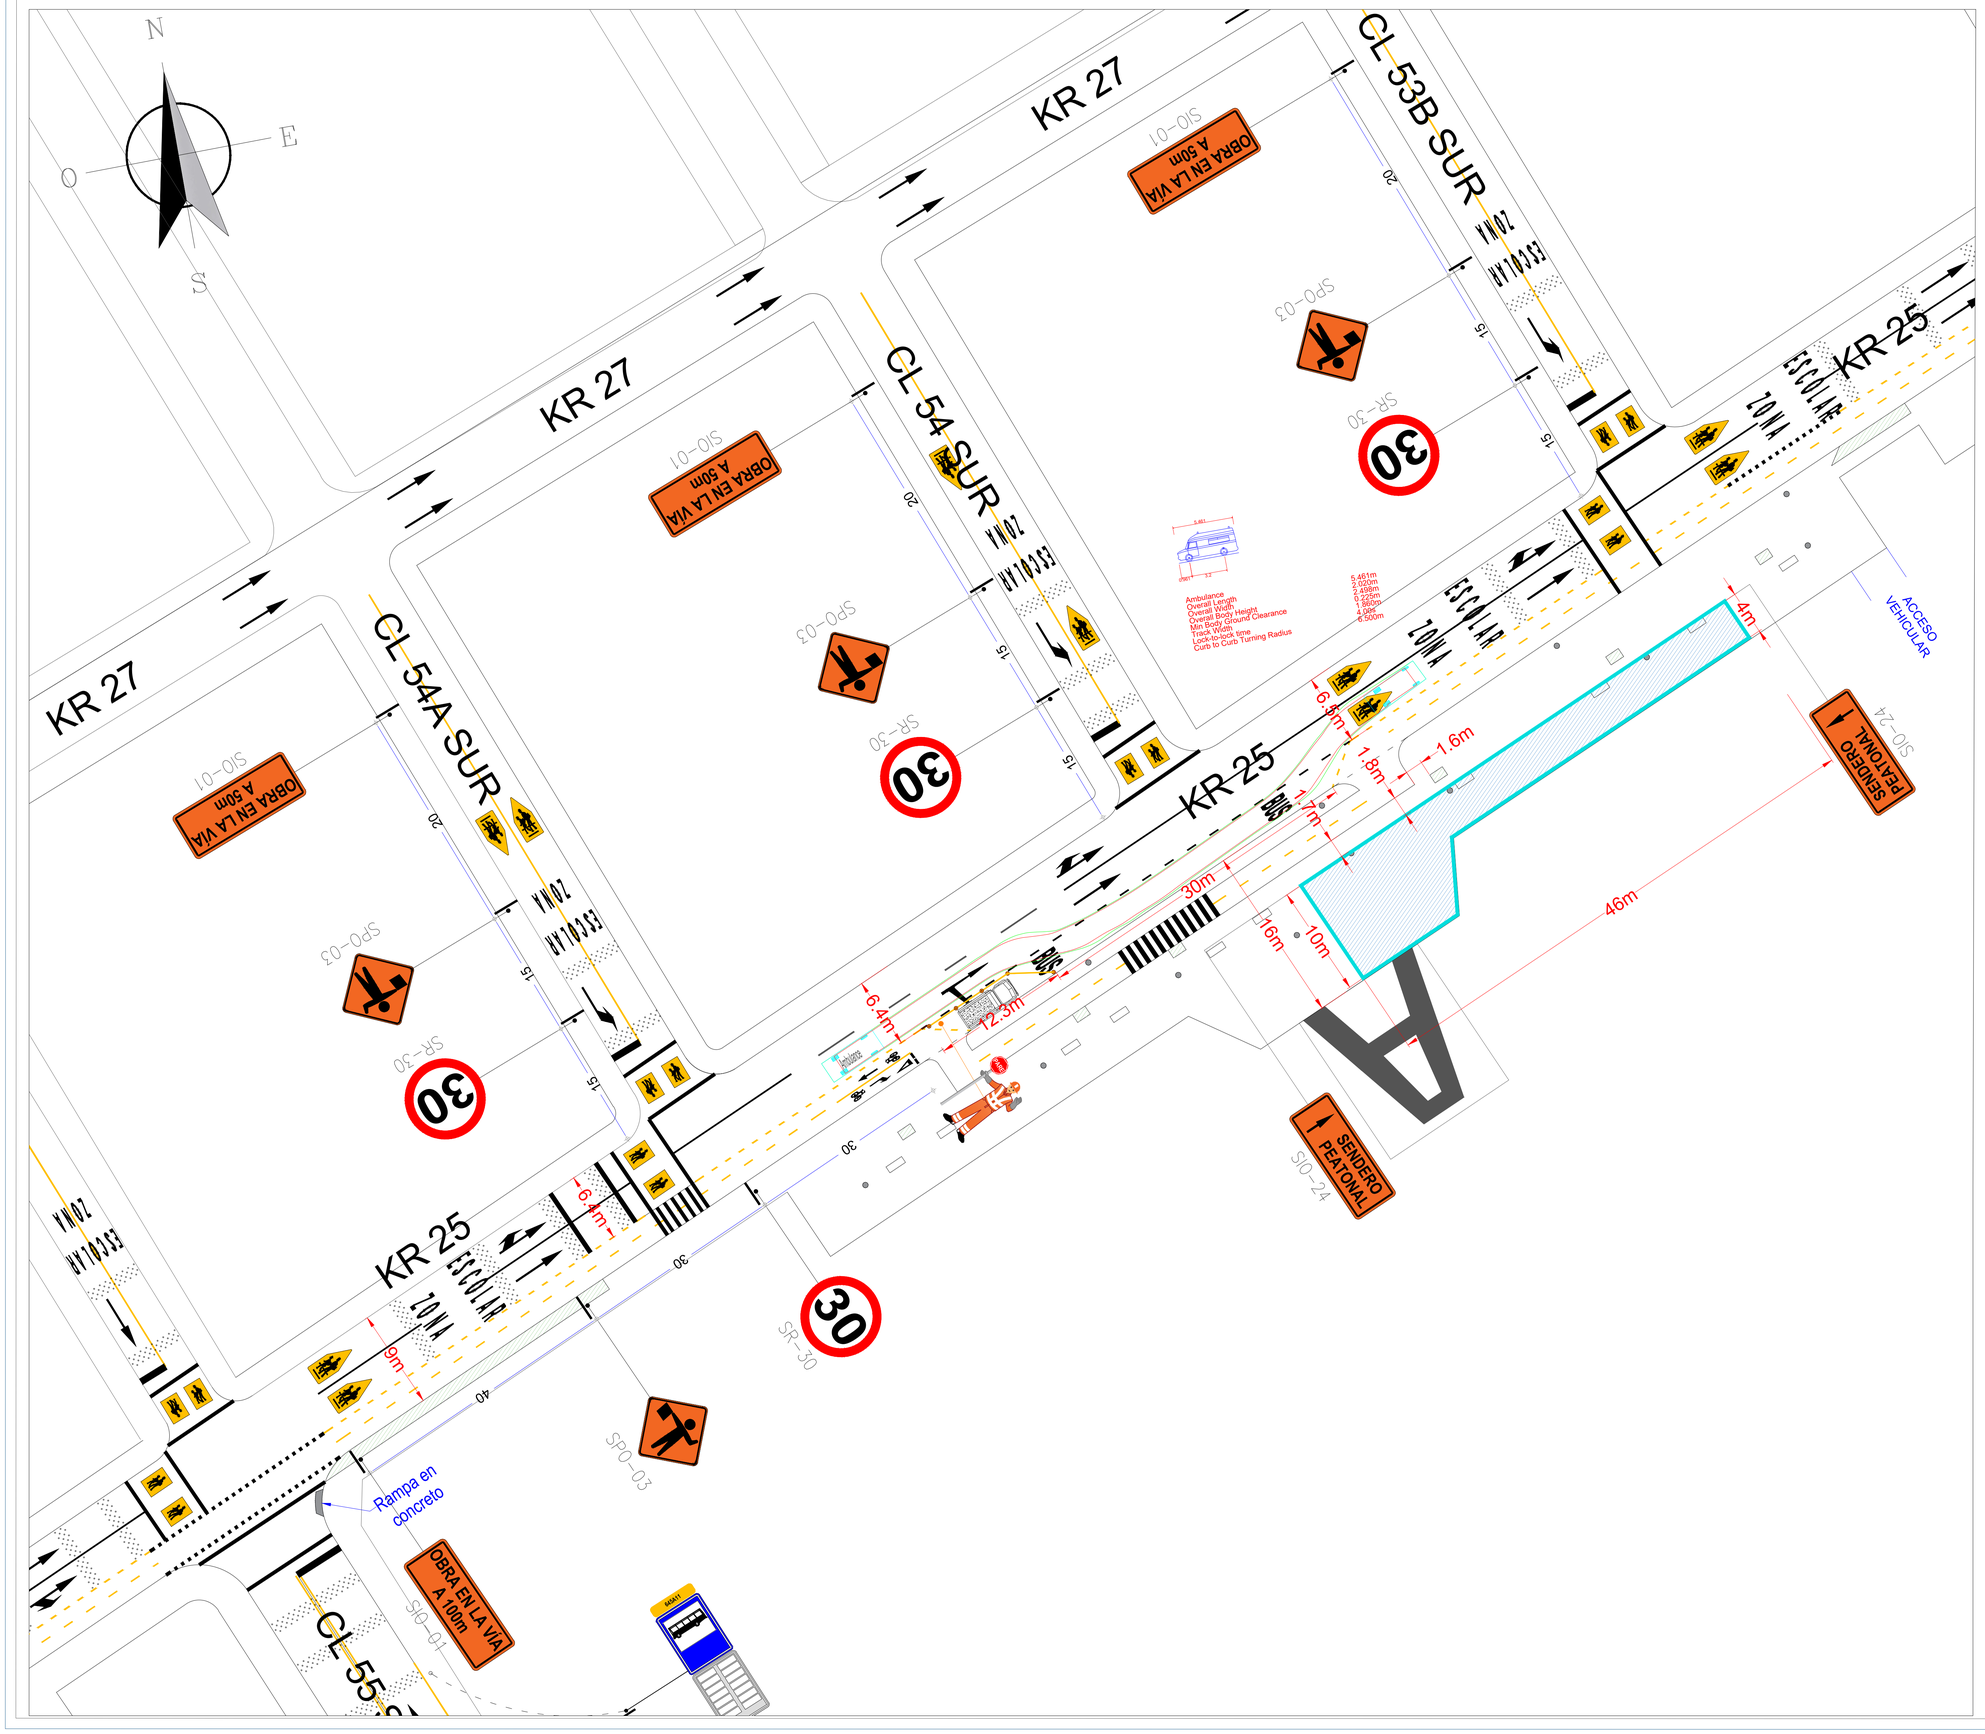

CONTENIDO:
INTERVENCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO

DIRECCIÓN:
1. KR 25 ENTRE CL 53B SUR Y CL 54A SUR

CIV: 6001200
PK ID: 323539

COSTADO: ORIENTE

LOCALIDAD: TUNJUELITO

CONVENCIONES

AFECTACIÓN A CIELO ABIERTO POSICIONAMIENTO VEHICULOS DE OBRA	BARRERA DE SEGURIDAD
CIRCULACIÓN PEATONAL CIRCULACIÓN BICI-USUARIOS	FLECHA LUMINOSA
PLAFONES PLAFONES	CONOS 90cm
ACCESOS VEHICULARES EXISTENTES IMPLEMENTACIÓN DESVIOS	DELINEADORES TUBULARES
OBRAS EXISTENTES CERRAMIENTO EN POLISOMBRA	BARRERAS PLÁSTICAS / INDIVIDUOS ARBOREOS
OBRA EN LA VÍA A XXXm — OBRA EN LA VÍA SIO-01	PARADERO PROVISIONAL
VÍA CERRADA A XXXm — VÍA CERRADA SIO-01	SENDERO PEATONAL — SENDERO PEATONAL SIO-24
CARRIL DERECHO CERRADO — CARRIL CERRADO SIO-04	PEATONES — PEATONES SIO-24
CARRIL IZQUIERDO CERRADO — CARRIL CERRADO SIO-04	TRANSITE POR LA ACERA DE ENFRENTE — TRANSITE POR LA ACERA DE ENFRENTE
ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS — ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS	PARADERO
TRABAJOS EN LA VÍA SPO-01	CIRCULACIÓN VIAL
AUXILIAR DE TRÁNSITO SPO-03	AUXILIARES DE TRÁFICO
REDUCCIÓN A LA DERECHA SPO-05	SEMÁFOROS
REDUCCIÓN A LA IZQUIERDA SPO-06	BICI-USUARIOS — BICI-USUARIOS
30 VELOCIDAD MÁXIMA PERMITIDA SR-30	CONSERVE LA DERECHA SRC-01

UBICACION

HORARIO: 07:00 – 17:00 Horas
HORARIO CIERRE: 24 Horas

ESCALA: S / N | **REV:** 0

FECHA: 19 DE ENERO DE 2026

CAPÍTULO 4 SEÑALIZACIÓN DE CALLES Y CARRETERAS AFECTADAS POR OBRAS

PLANO 5 DE 5

CONSORCIO COCO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	
	Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)	
	CÓDIGO: PM02-PR01-F01	VERSIÓN: 3.0

CONSOLIDADO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (COI)

SEÑORES: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD (SDM)

La interventoría y el contratista, compartiendo responsabilidades solicitan a la SDM, la aprobación del Plan de Manejo de Tráfico, para la realización de las obras que se relacionan a continuación al **Contratista**: **CONSORCIO COCO**

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)		DIRECCIÓN DE LA OBRA		FECHA		HORARIO DE TRABAJO	HORARIO DE CIERRE	LOCALIDAD	NÚMERO DE CONTRATO	OBJETO DE LA OBRA
INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN					
6001013	N/A	CL 48C S - KR 26	CL 48C S - KR 27	30-ene-26	30-may-26	07:00 - 17:00 HORAS	24 HORAS	TUNJUELITO	FDLT-613-2025	Cierre total de calzada para ejecutar actividades de conservación de la malla vial en la localidad de Tunjuelito y posicionamiento de vehículo de obra al interior del cerramiento.

N/A

OBRAS PROGRAMADAS POR:

Contratista de la Obra

Firma:

Nombre: CONSORCIO COCO

Especialista de tránsito: Carlos Andrés Muñoz León

Interventoria de la Obra

Firma:

Nombre: AHLA SHUGL

Director de Interventoria: Santiago Carrillo Vargas

Instituto de Desarrollo Urbano

Firma: N/A

Nombre: N/A

Otros

Firma: N/A

Nombre: N/A

NORMATIVIDAD

El Plan de Manejo de Tránsito debe cumplir con lo establecido en el Manual de Señalización Vial vigente.

La Secretaría Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningún caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, principalmente la reglamentación que rige la utilización del espacio público, la circulación de vehículos dentro del perímetro urbano, el manejo de tránsito y seguridad para peatones por la ejecución de obras civiles.

A. ESPACIO PÚBLICO

Según ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito Terrestre: Artículos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131.

B. RESTRICCIÓN PARA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS

Decreto 840 del 27 de diciembre de 2019 “Por medio del cual se establecen las condiciones y restricciones para el tránsito de los vehículos de transporte de carga en el Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones”
Decreto 077 del 04 de marzo de 2020 “Por medio del cual se modifica el Decreto Distrital 840 de 2019 y se dictan otras disposiciones”

NOTA

1. En el lugar de desarrollo de las actividades deberá permanecer copia del plano del PMT aprobado y de la autorización emitida por la SDM para la verificación por parte de las autoridades competentes del cumplimiento a la implementación del PMT.
2. No se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra.
3. El contratista y la interventoría son responsables solidariamente de la correcta implementación del PMT.
4. En horario nocturno y/o cuando las condiciones atmosféricas lo ameriten se debe garantizar la instalación de señalización luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de Señalización Vial vigente.
5. Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberán aislarse y/o canalizarse mediante maletines plásticos entrelazados.
6. En caso de congestión vehicular y/o por solicitud expresa de la Policía de Tránsito, deberá levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones óptimas de tránsito y seguridad vial.
7. La señalización a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Señalización Vial vigente.
8. La longitud de transición a implementar para cierres de carril deberá cumplir las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de Señalización Vial vigente.
9. Para trabajos nocturnos, dominicales y/o festivos se debe contar con la autorización por parte de la alcaldía local de acuerdo con lo estipulado en el decreto 1076 de 2015, articulo 2.2.5.1.5.15. o aquellas normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan
10. Si en el área de influencia del proyecto existen redes de semaforización, el contratista debe propender por su integridad, de igual manera durante la ejecución de obras el contratista es responsable de la custodia de redes y elementos de mobiliario semafórico, y de incidentes que se deriven por daños a los controles semafóricos.
11. Previo a la intervención se debe socializar las actividades, el PMT y demás restricciones con la comunidad directamente afectada, y es responsabilidad de la interventoría y la entidad contratante verificar el cumplimiento de esta condición.



CONTENIDO:
INTERVENCIÓN DE MALLA VIAL

DIRECCIÓN:
CL 48C S ENTRE KR 26 Y KR 27
CIV: 6001013

COSTADO: DOS COSTADOS

LOCALIDAD: TUNJUELITO

CONVENCIONES

ZONA DE OBRAS POSICIONAMIENTO VEHICULOS DE OBRA	BARRERA DE SEGURIDAD
CIRCULACIÓN PEATONAL CIRCULACIÓN BICI-USUARIOS	FLECHA LUMINOSA
PLAFONES (TABLA BURRA) PLAFONES DE ACERO	CONOS 90cm
ACCESOS VEHICULARES EXISTENTES IMPLEMENTACIÓN DESVIO	DELINEADORES TUBULARES
OBRAS EXISTENTES CERRAMIENTO EN POLISOMBRA	BARRERAS PLÁSTICAS / INDIVIDUOS ARBOREOS
OBRA EN LA VÍA A XXXm — OBRA EN LA VIA SIO-01	PARADERO PROVISIONAL
VÍA CERRADA A XXXm — VÍA CERRADA SIO-01	SENDERO PEATONAL — SENDERO PEATONAL SIO-24
CARRIL DERECHO CERRADO — CARRIL CERRADO SIO-04	PEATONES — PEATONES SIO-24
CARRIL IZQUIERDO CERRADO — CARRIL CERRADO SIO-04	TRANSITE POR LA ACERA DE ENFRENTE — TRANSITE POR LA ACERA DE ENFRENTE
ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS — ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS	PARADERO
TRABAJOS EN LA VÍA SPO-01	CIRCULACIÓN VIAL
AUXILIAR DE TRÁNSITO SPO-03	AUXILIARES DE TRÁFICO
REDUCCIÓN A LA DERECHA SPO-05	SEMÁFOROS
REDUCCIÓN A LA IZQUIERDA SPO-06	BICI-USUARIOS — BICI-USUARIOS
VELOCIDAD MÁXIMA PERMITIDA SR-30	CONSERVE LA DERECHA SRC-01

UBICACION

HORARIO: 07:00 – 17:00 Horas
HORARIO CIERRE: 24 Horas

ESCALA: S / N | **REV:** 0

FECHA: 23 DE ENERO DE 2026

CAPÍTULO 7 SEÑALIZACIÓN Y MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA OBRAS EN LA VÍA

PLANO 1 DE 1

CONSORCIO COCO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	
	Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)	
	CÓDIGO: PM02-PR01-F01	VERSIÓN: 3.0

CONSOLIDADO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (COI)

SEÑORES: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD (SDM)

La interventoría y el contratista, compartiendo responsabilidades solicitan a la SDM, la aprobación del Plan de Manejo de Tráfico, para la realización de las obras que se relacionan a continuación al **Contratista**: **CONSORCIO COCO**

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)		DIRECCIÓN DE LA OBRA		FECHA		HORARIO DE TRABAJO	HORARIO DE CIERRE	LOCALIDAD	NÚMERO DE CONTRATO	OBJETO DE LA OBRA
INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN					
6000372	N/A	CL 50A - KR 38	CL 50A - TV 44	30-ene-26	30-may-26	07:00 - 17:00 HORAS	24 HORAS	TUNJUELITO	FDLT-613-2025	Cierre total de calzada para ejecutar actividades de conservación de la malla vial en la localidad de Tunjuelito y posicionamiento de vehículo de obra al interior del cerramiento.
6000371	N/A	KR 38 - 18.3m AL NORTE de la CL 50A S	KR 38 - 33.3m AL NORTE de la CL 50A S	30-ene-26	30-may-26	07:00 - 17:00 HORAS	24 HORAS	TUNJUELITO	FDLT-613-2025	Cierre parcial de intersección para para realizar posicionamiento de zona de acopio de materiales, campamento, baño y/o actividades complementarias a la obra.

0

N/A

OBRAS PROGRAMADAS POR:

Contratista de la Obra

Firma:

Nombre: CONSORCIO COCO

Especialista de tránsito: Carlos Andrés Muñoz León

Interventoria de la Obra

Firma:

Nombre: AHLA SHUGL

Director de Interventoria: Santiago Carrillo Vargas

Instituto de Desarrollo Urbano

Firma: N/A

Nombre: N/A

Otros

Firma: N/A

Nombre: N/A

NORMATIVIDAD

El Plan de Manejo de Tránsito debe cumplir con lo establecido en el Manual de Señalización Vial vigente.

La Secretaría Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningún caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, principalmente la reglamentación que rige la utilización del espacio público, la circulación de vehículos dentro del perímetro urbano, el manejo de tránsito y seguridad para peatones por la ejecución de obras civiles.

A. ESPACIO PÚBLICO


Según ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito Terrestre: Artículos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131.

B. RESTRICCIÓN PARA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS

Decreto 840 del 27 de diciembre de 2019 “Por medio del cual se establecen las condiciones y restricciones para el tránsito de los vehículos de transporte de carga en el Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones”
Decreto 077 del 04 de marzo de 2020 “Por medio del cual se modifica el Decreto Distrital 840 de 2019 y se dictan otras disposiciones”

NOTA

1. En el lugar de desarrollo de las actividades deberá permanecer copia del plano del PMT aprobado y de la autorización emitida por la SDM para la verificación por parte de las autoridades competentes del cumplimiento a la implementación del PMT.
2. No se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra.
3. El contratista y la interventoría son responsables solidariamente de la correcta implementación del PMT.
4. En horario nocturno y/o cuando las condiciones atmosféricas lo ameriten se debe garantizar la instalación de señalización luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de Señalización Vial vigente.
5. Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberán aislarse y/o canalizarse mediante maletines plásticos entrelazados.
6. En caso de congestión vehicular y/o por solicitud expresa de la Policía de Tránsito, deberá levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones óptimas de tránsito y seguridad vial.
7. La señalización a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Señalización Vial vigente.
8. La longitud de transición a implementar para cierres de carril deberá cumplir las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de Señalización Vial vigente.
9. Para trabajos nocturnos, dominicales y/o festivos se debe contar con la autorización por parte de la alcaldía local de acuerdo con lo estipulado en el decreto 1076 de 2015, articulo 2.2.5.1.5.15. o aquellas normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan
10. Si en el área de influencia del proyecto existen redes de semaforización, el contratista debe propender por su integridad, de igual manera durante la ejecución de obras el contratista es responsable de la custodia de redes y elementos de mobiliario semafórico, y de incidentes que se deriven por daños a los controles semafóricos.
11. Previo a la intervención se debe socializar las actividades, el PMT y demás restricciones con la comunidad directamente afectada, y es responsabilidad de la interventoría y la entidad contratante verificar el cumplimiento de esta condición.

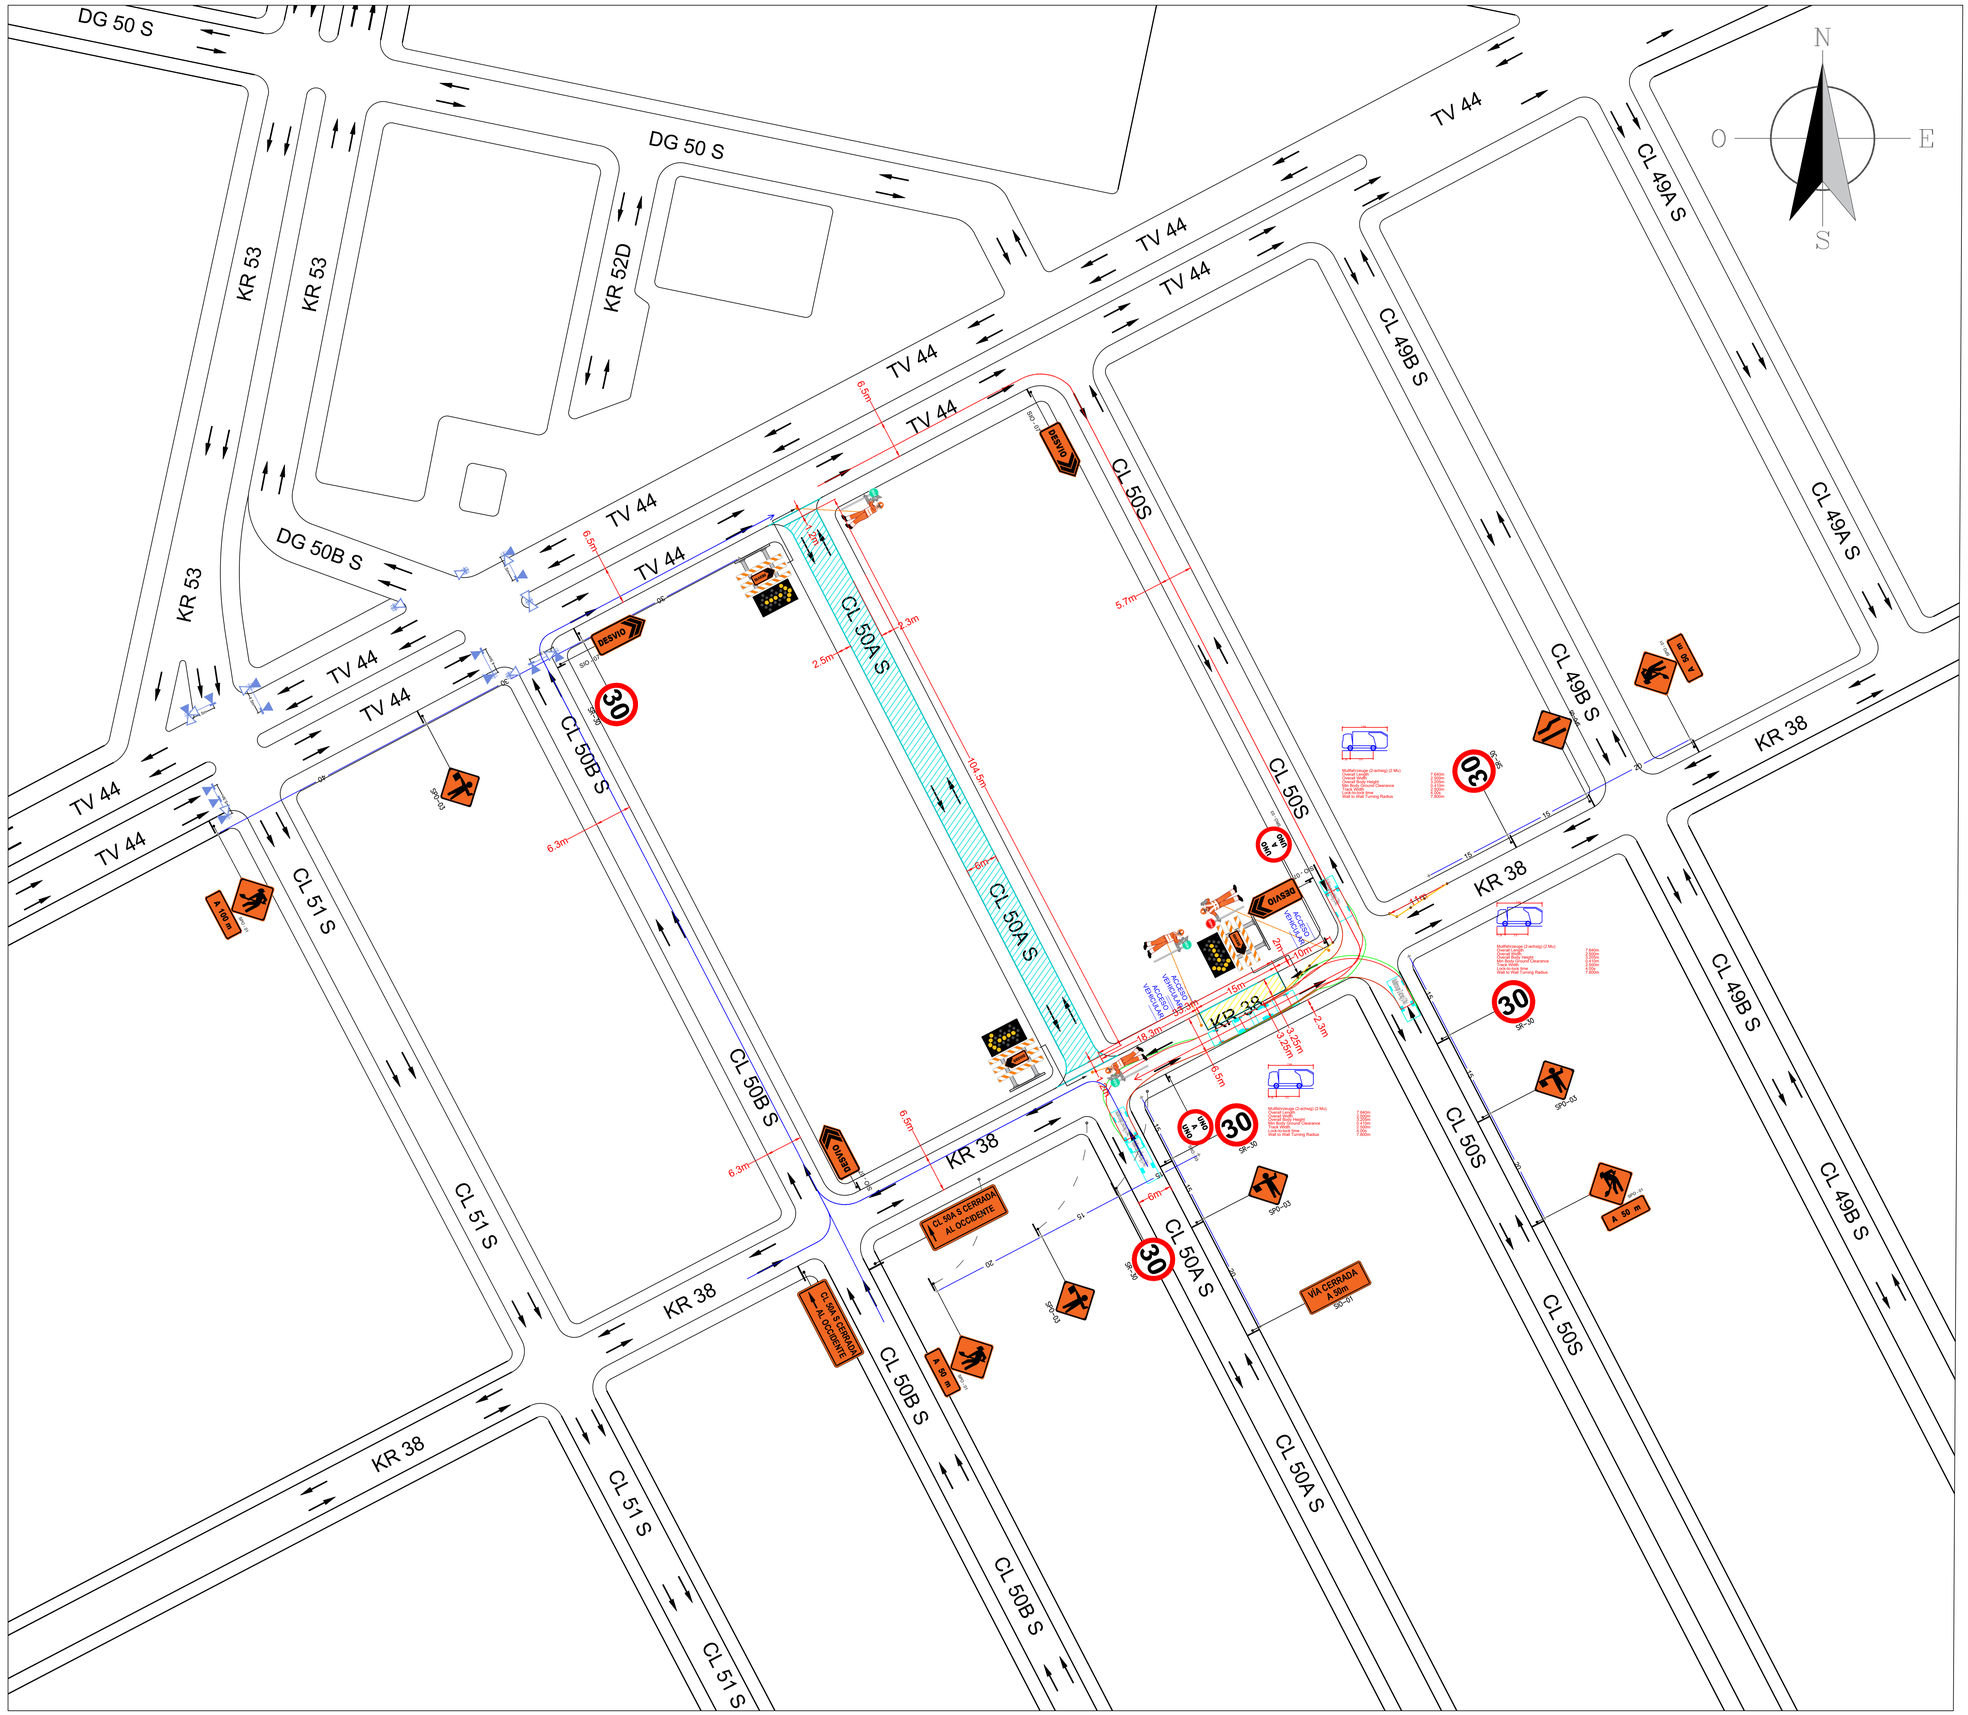

CONTENIDO:
INTERVENCIÓN DE MALLA VIAL

DIRECCIÓN:

1. CL 50A S ENTRE KR 38 Y TV 44
2. KR 38 ENTRE 18.3m Y 33.3m AL NORTE de la CL 50A S

CIV: 6000372, 6000371

COSTADO: DOS COSTADOS / OCCIDENTE

LOCALIDAD: TUNJUELITO

CONVENCIONES

ZONA DE OBRAS	
POSICIONAMIENTO VEHICULOS DE OBRA	BARRERA DE SEGURIDAD
CIRCULACIÓN PEATONAL	
CIRCULACIÓN BICI-USUARIOS	FLECHA LUMINOSA
PLAFONES (TABLA BURRA)	
PLAFONES DE ACERO	CONOS 90cm
ACCESOS VEHICULARES EXISTENTES	
IMPLEMENTACIÓN DESVIOS	DELINEADORES TUBULARES
OBRAS EXISTENTES	
CERRAMIENTO EN POLISOMBRA	BARRERAS PLÁSTICAS / INDIVIDUOS ARBOREOS
OBRA EN LA VÍA A XXXm — OBRA EN LA VÍA SIO-01	PARADERO PROVISIONAL
VÍA CERRADA A XXXm — VÍA CERRADA SIO-01	SENDERO PEATONAL — SENDERO PEATONAL SIO-24
CARRIL DERECHO CERRADO — CARRIL CERRADO SIO-04	PEATONES — PEATONES SIO-24
CARRIL IZQUIERDO CERRADO — CARRIL CERRADO SIO-04	TRANSITE POR LA ACERA DE ENFRENTE — TRANSITE POR LA ACERA DE ENFRENTE
ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS — ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS	PARADERO
TRABAJOS EN LA VÍA SPO-01	CIRCULACIÓN VIAL
AUXILIAR DE TRÁNSITO SPO-03	AUXILIARES DE TRÁFICO
REDUCCIÓN A LA DERECHA SPO-05	SEMÁFOROS
REDUCCIÓN A LA IZQUIERDA SPO-06	BICI-USUARIOS — BICI-USUARIOS
VELOCIDAD MÁXIMA PERMITIDA SR-30	CONSERVE LA DERECHA SRC-01

UBICACION

HORARIO: 07:00 – 17:00 Horas
HORARIO CIERRE: 24 Horas

ESCALA: S / N | **REV:** 0

FECHA: 22 DE ENERO DE 2026

CAPÍTULO 7 SEÑALIZACIÓN Y MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA OBRAS EN LA VÍA

PLANO 1 DE 1

CONSORCIO COCO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	
	Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)	
	CÓDIGO: PM02-PR01-F01	VERSIÓN: 3.0

CONSOLIDADO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (COI)

SEÑORES: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD (SDM)

La interventoría y el contratista, compartiendo responsabilidades solicitan a la SDM, la aprobación del Plan de Manejo de Tráfico, para la realización de las obras que se relacionan a continuación al **Contratista**: **CONSORCIO COCO**

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)		DIRECCIÓN DE LA OBRA		FECHA		HORARIO DE TRABAJO	HORARIO DE CIERRE	LOCALIDAD	NÚMERO DE CONTRATO	OBJETO DE LA OBRA
INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN					
6000830	N/A	KR 34 - CL 54 S	KR 34 - CL 54A S	30-ene-26	30-may-26	07:00 - 17:00 HORAS	24 HORAS	TUNJUELITO	FDLT-613-2025	Cierre total de calzada para ejecutar actividades de conservación de la malla vial en la localidad de Tunjuelito y posicionamiento de vehículo de obra al interior del cerramiento.
6000870	N/A	CL 53B S - KR 33A	CL 53B S - KR 34	30-ene-26	30-may-26	07:00 - 17:00 HORAS	24 HORAS	TUNJUELITO	FDLT-613-2025	Cierre total de calzada para ejecutar actividades de conservación de la malla vial en la localidad de Tunjuelito y posicionamiento de vehículo de obra al interior del cerramiento.
6000857	N/A	Cl 53A S - KR 33A	Cl 53A S - KR 34	30-ene-26	30-may-26	07:00 - 17:00 HORAS	24 HORAS	TUNJUELITO	FDLT-613-2025	Cierre total de calzada para ejecutar actividades de conservación de la malla vial en la localidad de Tunjuelito y posicionamiento de vehículo de obra al interior del cerramiento.
6000786	N/A	KR 34 - CL 52B S	KR 34 - CL 52G S	30-ene-26	30-may-26	07:00 - 17:00 HORAS	24 HORAS	TUNJUELITO	FDLT-613-2025	Cierre total de calzada para ejecutar actividades de conservación de la malla vial en la localidad de Tunjuelito y posicionamiento de vehículo de obra al interior del cerramiento.

Las obras se solicitan con las siguientes observaciones:

N/A

Contratista de la Obra

Firma:

Nombre: CONSORCIO COCO
Especialista de tránsito: Carlos Andrés Muñoz León

OBRAS PROGRAMADAS POR:

Interventoria de la Obra

Firma:

Nombre: AHLA SHUGL
Director de Interventoría: Santiago Carrillo Vargas

Instituto de Desarrollo Urbano

Firma: N/A

Nombre: N/A

Otros

Firma: N/A

Nombre: N/A

NORMATIVIDAD

El Plan de Manejo de Tránsito debe cumplir con lo establecido en el Manual de Señalización Vial vigente.

La Secretaría Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningún caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, principalmente la reglamentación que rige la utilización del espacio público, la circulación de vehículos dentro del perímetro urbano, el manejo de tránsito y seguridad para peatones por la ejecución de obras civiles.

A. ESPACIO PÚBLICO


Según ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito Terrestre: Artículos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131.

B. RESTRICCION PARA CIRCULACION DE VEHICULOS

Decreto 840 del 27 de diciembre de 2019 “Por medio del cual se establecen las condiciones y restricciones para el tránsito de los vehículos de transporte de carga en el Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones”
Decreto 077 del 04 de marzo de 2020 “Por medio del cual se modifica el Decreto Distrital 840 de 2019 y se dictan otras disposiciones”

NOTA

1. En el lugar de desarrollo de las actividades deberá permanecer copia del plano del PMT aprobado y de la autorización emitida por la SDM para la verificación por parte de las autoridades competentes del cumplimiento a la implementación del PMT.
2. No se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra.
3. El contratista y la interventoría son responsables solidariamente de la correcta implementación del PMT.
4. En horario nocturno y/o cuando las condiciones atmosféricas lo ameriten se debe garantizar la instalación de señalización luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de Señalización Vial vigente.
5. Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberán aislarse y/o canalizarse mediante maletines plásticos entrelazados.
6. En caso de congestión vehicular y/o por solicitud expresa de la Policía de Tránsito, deberá levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones óptimas de tránsito y seguridad vial.
7. La señalización a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Señalización Vial vigente.
8. La longitud de transición a implementar para cierres de carril deberá cumplir las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de Señalización Vial vigente.
9. Para trabajos nocturnos, dominicales y/o festivos se debe contar con la autorización por parte de la alcaldía local de acuerdo con lo estipulado en el decreto 1076 de 2015, articulo 2.2.5.1.5.15. o aquellas normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan
10. Si en el área de influencia del proyecto existen redes de semaforización, el contratista debe propender por su integridad, de igual manera durante la ejecución de obras el contratista es responsable de la custodia de redes y elementos de mobiliario semafórico, y de incidentes que se deriven por daños a los controles semafóricos.
11. Previo a la intervención se debe socializar las actividades, el PMT y demás restricciones con la comunidad directamente afectada, y es responsabilidad de la interventoría y la entidad contratante verificar el cumplimiento de esta condición.

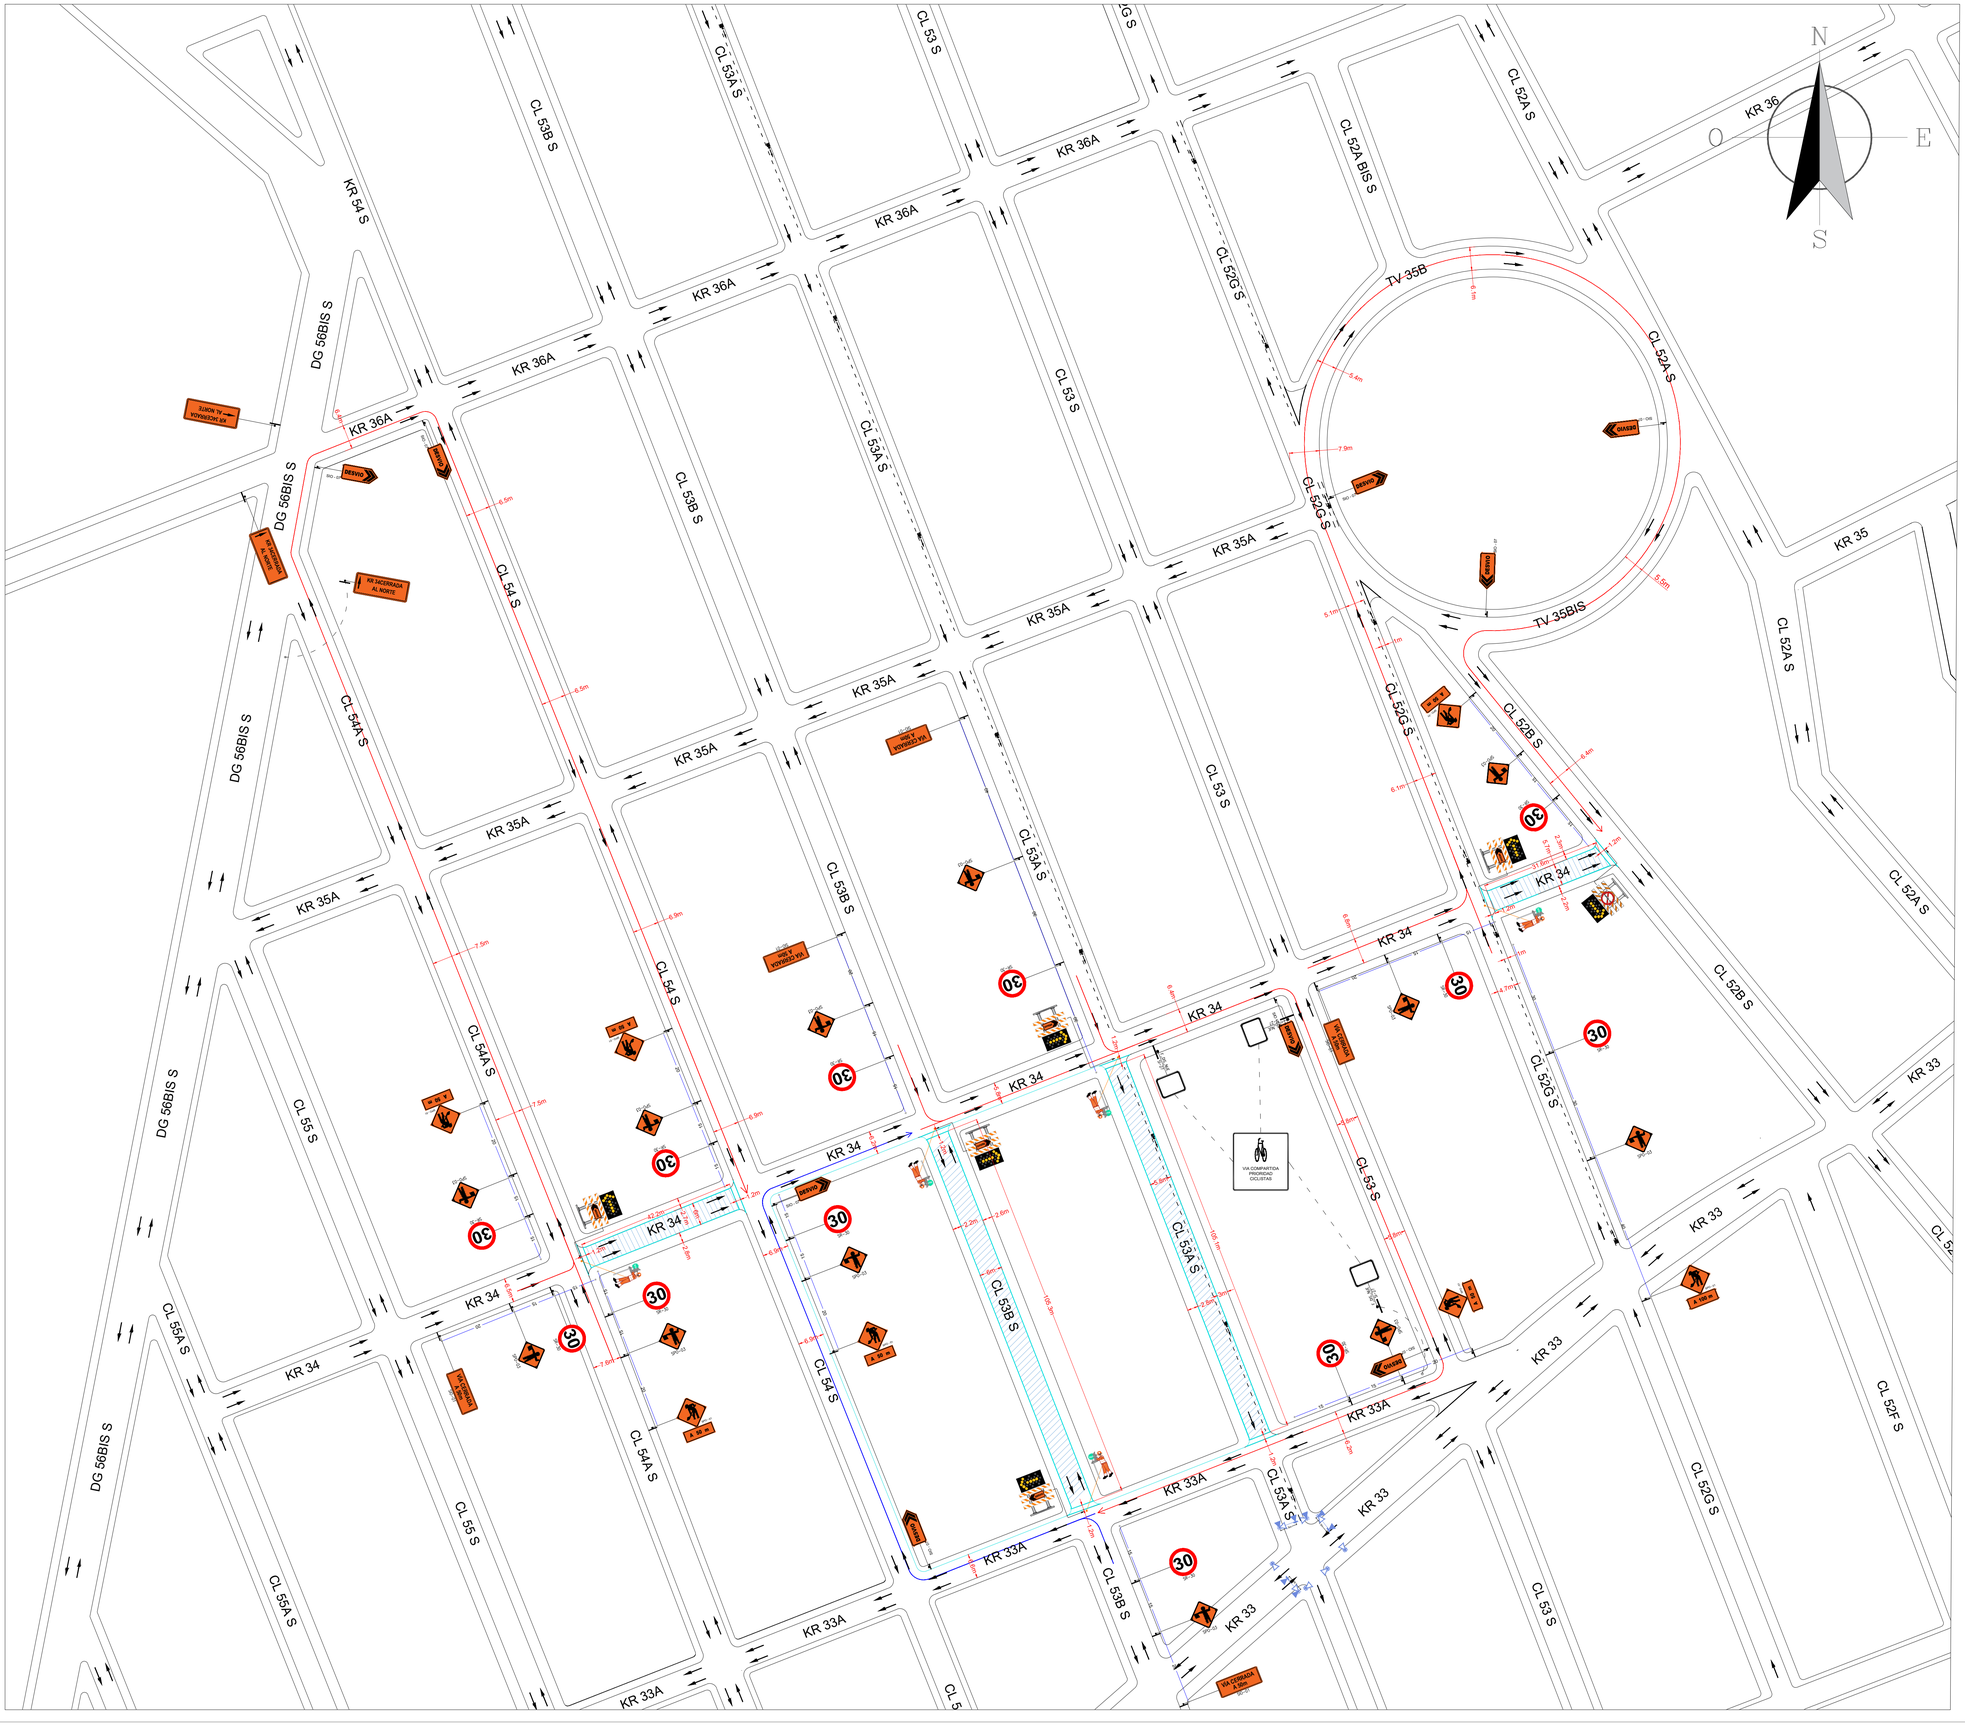

CONTENIDO:
INTERVENCIÓN DE MALLA VIAL

DIRECCIÓN:

1. KR 34 ENTRE CL 54 S Y CL 54A S
2. CL 53B S ENTRE KR 33A Y KR 34
3. CL 53A S ENTRE KR 33A Y KR 34
4. KR 34 ENTRE CL 52B S Y CL 52G S

CIV: 6000830, 6000870, 6000857 Y 6000786.

COSTADO: DOS COSTADOS

LOCALIDAD: TUNJUELITO

CONVENCIONES

ZONA DE OBRAS	BARRERA DE SEGURIDAD
POSICIONAMIENTO VEHICULOS DE OBRA	
CIRCULACIÓN PEATONAL	FLECHA LUMINOSA
CIRCULACIÓN BICI-USUARIOS	
PLAFONES (TABLA BURRA)	CONOS 90cm
PLAFONES DE ACERO	
ACCESOS VEHICULARES EXISTENTES	DELINEADORES TUBULARES
IMPLEMENTACIÓN DESVIOS	
OBRAS EXISTENTES	BARRERAS PLÁSTICAS / INDIVIDUOS ARBOREOS
CERRAMIENTO EN POLISOMBRA	
OBRA EN LA VÍA A XXXm — OBRA EN LA VIA SIO-01	PARADERO PROVISIONAL
VÍA CERRADA A XXXm — VÍA CERRADA SIO-01	SENDERO PEATONAL — SENDERO PEATONAL SIO-24
CARRIL DERECHO CERRADO — CARRIL CERRADO SIO-04	PEATONES — PEATONES SIO-24
CARRIL IZQUIERDO CERRADO — CARRIL CERRADO SIO-04	TRANSITE POR LA ACERA DE ENFRENTE — TRANSITE POR LA ACERA DE ENFRENTE
ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS — ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS	PARADERO
TRABAJOS EN LA VÍA SPO-01	CIRCULACIÓN VIAL
AUXILIAR DE TRÁNSITO SPO-03	AUXILIARES DE TRÁFICO
REDUCCIÓN A LA DERECHA SPO-05	SEMÁFOROS
REDUCCIÓN A LA IZQUIERDA SPO-06	BICI-USUARIOS — BICI-USUARIOS
30 — VELOCIDAD MÁXIMA PERMITIDA SR-30	CONSERVE LA DERECHA SRC-01

UBICACION

HORARIO: 07:00 – 17:00 Horas
HORARIO CIERRE: 24 Horas

ESCALA: S / N | **REV:** 0

FECHA: 22 DE ENERO DE 2026

CAPÍTULO 7 SEÑALIZACIÓN Y MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA OBRAS EN LA VIA

PLANO 1 DE 1

CONSORCIO COCO

Bogotá D.C., 23 de enero de 2026.

ACTA DE COMPROMISO

Señores Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), por medio de la presente y en mi calidad de representante legal de la empresa **CONSORCIO COCO** con NIT 902.010.258-8, contrato No. FDLT-613- 2025, Interventoría a cargo de **AHLA SHUGL**, entidad contratante **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO**, la cual se encuentra desarrollando intervención en andén y/o calzada de los tramos: **KR 34 ENTRE CL 54 S Y CL 54A S, CL 53B S ENTRE KR 33A Y KR 34, CL 53A S ENTRE KR 33A Y KR 34 Y KR 34 ENTRE CL 52B S Y CL 52G S,** ubicados en la localidad de **TUNJUELITO**, me comprometo a garantizar que la señalización vertical y/u horizontal afectada por la intervención, al finalizar las actividades, se dejará en iguales o mejores condiciones a las encontradas previo al inicio de la intervención, según especificaciones técnicas vigentes.



_____

Representante Legal Firma Contratista
Nombre: Jotam Maestre Diab.
Dirección de correspondencia: KR 15 No. 93A – 84
Teléfono: 318 453 3044

Bogotá D.C., 23 de enero de 2026.

ACTA DE COMPROMISO

Señores Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), por medio de la presente y en mi calidad de representante legal de la empresa **CONSORCIO COCO** con NIT 902.010.258-8, contrato No. FDLT-613- 2025, Interventoría a cargo de **AHLA SHUGL**, entidad contratante **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO**, la cual se encuentra desarrollando intervención en andén y/o calzada de los tramos: **KR 34 ENTRE CL 54 S Y CL 54A S, CL 53B S ENTRE KR 33A Y KR 34, CL 53A S ENTRE KR 33A Y KR 34 Y KR 34 ENTRE CL 52B S Y CL 52G S,** ubicados en la localidad de **TUNJUELITO**, me comprometo a realizar el retiro de todos los dispositivos de señalización implementados por la ejecución de la obra máximo ocho (8) días, posterior a la finalización de la misma.

Lo anterior en cumplimiento del artículo 101 de la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito Terrestre):

"…Una vez terminada la intervención, es responsabilidad de la persona de derecho público o privado, el retiro de todos los dispositivos de control de tránsito utilizados, so pena de ser multado por la autoridad de tránsito competente…"



_____

Representante Legal Firma Contratista
Nombre: Jotam Maestre Diab.
Dirección de correspondencia: KR 15 No. 93A – 84
Teléfono: 318 453 3044

Bogotá D.C., 23 de enero de 2026.

ACTA DE COMPROMISO

Señores Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), por medio de la presente y en mi calidad de representante legal de la empresa **CONSORCIO COCO** con NIT 902.010.258-8, contrato No. FDLT-613- 2025, Interventoría a cargo de **AHLA SHUGL**, entidad contratante **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO**, la cual se encuentra desarrollando intervención en andén y/o calzada de los tramos: **KR 34 ENTRE CL 54 S Y CL 54A S, CL 53B S ENTRE KR 33A Y KR 34, CL 53A S ENTRE KR 33A Y KR 34 Y KR 34 ENTRE CL 52B S Y CL 52G S,** ubicados en la localidad de **TUNJUELITO**, me comprometo a garantizar la restitución a las condiciones encontradas antes del inicio de las obras.



_____

Representante Legal Firma Contratista
Nombre: Jotam Maestre Diab.
Dirección de correspondencia: KR 15 No. 93A – 84
Teléfono: 318 453 3044

VoBo

_____

Director de Interventoria - Firma de Interventoria
Nombre: Santiago Carrillo Vargas .
Dirección de correspondencia: CL 52 No. 3 – 42 Oficina 402.
Teléfono: (601) 74 85 476.

COI No. 11
MARZO 12 DE 2026
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No.	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)		DIRECCIÓN DE LA OBRA		CONTRATISTA	FECHA		HORARIO DE TRABAJO	HORARIO DE CIERRE	No. CONTRATO	OBSERVACIONES	AUTORIZADO	LOCALIDAD	ING. RESPONSABLE	No RADICADO SDM
	INICIO	FIN	INICIO	FIN		INICIO	FIN								
8570	13001879	N/A	AK 40 CL 22B	N/A	CONSORCIO CCA VIAS	18-mar-26	10-sep-26	24 HORAS	N/A	IDU-1787-2023	NOTAS: 1. DEBE DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1801 DE 2016, MODIFICADO POR EL ARTICULO 6 DE LA LEY 200 DE 2019 POR LA CUAL SE EXPIDE EL CODIGO NACIONAL DE POLICIA Y CONVIVENCIA EN SU ARTICULO 135 LITERAL D NUMERAL 16, ASI COMO ACUERDO DISTRITAL 79 DEL 20 DE ENERO DE 2003 POR EL CUAL SE EXPIDE EL CODIGO DE POLICIA DE BOGOTA D.C. EN SU ARTICULO 23, EN LOS QUE SE ESTABLECE COMO OBLIGACION LIMPIAR LAS LLANTAS DE LOS VEHICULOS QUE SALEN DE LA OBRA PARA EVITAR QUE SE ARROJE BARRO O CEMENTO EN EL ESPACIO PUBLICO. 2. EN CASO DE ENCONTRAR A OTROS CONTRATISTAS EJECUTANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN LA ZONA, SE DEBERA COORDINAR EN CAMPO TANTO LA SEÑALIZACION COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS AL MOMENTO DE LA INTERVENCION. LA SDM AUTORIZA PMT PARA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS EN EL COSTADO ORIENTAL DEL SEPARADOR CENTRAL (SENTIDO SUR-NORTE), REFERENTES A LAS ACTIVIDADES DE REDES, PAVIMENTO, URBANISMO, CONSTRUCCION DE LA CICLO INFRAESTRUCTURA Y ESPACIO PUBLICO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE AUTORIZAN AL INTERIOR DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE LA OBRA FUERA DE LA ZONA VERDE, NI EN LAS VIAS ALEDAÑAS. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. SOCIALIZAR CON LOS CONDUCTORES Y CUMPLIR CON LOS RECORRIDOS DEFINIDOS PARA LA REALIZACION DE LAS MANIOBRAS. NO SE AUTORIZAN MANIOBRAS DE REVERSA, CONTRAVIA O AQUELLAS QUE ESTEN FUERA DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO.	SI	TEUSAQUILLO	DIEGO A. GALVIS H.	202661200367572 202661200382452 202661200775232
8571	13001917	N/A	AK 40 CL 22ABIS	N/A	CONSORCIO CCA VIAS	-	-	-	-	IDU-1787-2023	LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COI 06-26 - NUMERAL 3458 PARA CIERRE PARCIAL DE RETORNO (COSTADO NORTE (6.2m)) PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE REDES, PAVIMENTO, URBANISMO, CONSTRUCCION DE LA CICLO INFRAESTRUCTURA Y ESPACIO PUBLICO, POR SOLICITUD DIRECTA DEL CONTRATISTA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 27-FEB-26 EN LA ATENCON DE OBSERVACIONES NO. 2 DE LOS RADICADO SDM-202661200367572, SDM-202661200382452 Y SDM-202661200775232, DONDE INDICA "SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA SDM SU COLABORACION CON LA CANCELACION DEL ID-3458 APROBADO CON RADICADO SDM 202661200130112 – 202661200159742 MEDIANTE COI 06 DEL 2026, EL CUAL CUENTA CON VIGENCIA HASTA EL 09 DE JULIO DE 2026".	TERMINADO	TEUSAQUILLO	DIEGO A. GALVIS H.	202661200367572 202661200382452 202661200775232
8572	6000389	N/A	KR 38 CL 50A SUR	KR 38 CL 50B SUR	CONSORCIO COCO	13-mar-26	2-jul-26	07:00-17:00	24 HORAS	FDLTU-613-2025	NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y POSICIONAMIENTO DE VEHICULO DE OBRA EN EL INTERIOR DEL CERRAMIENTO. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN LOS ANDENES ADYACENTES AL CIERRE DE OBRA.DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. LA SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA CON POLISOMBRA. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA DE MINIMO 1.2m. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. EN LAS VIAS QUE HACEN PARTE DE LA RUTA DE DESVIO EL CONTRATISTA DEBE GARANTIZAR CONDICIONES OPTIMAS DE SEGURIDAD VIAL A LOS DIFERENTES ACTORES VIALES.	SI	TUNJUELITO	FERNEL E. BONZA R.	202661200745372

NORMATIVIDAD
El Plan de Manejo de Tránsito debe cumplir con lo establecido en el Manual de señalización vial vigente.
La Secretaría Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningún caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Disitrito Capital, principalmente la reglamentación que rige la utilización del espaco público, la circulación de vehículos dentro del perímetro urbano, el manejo de tránsito y seguridad para peatones por la ejecución de obras civiles.

A. ESPACIO PÚBLICO
Según ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito Terrestre: Artículos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131.

B. RESTRICCIÓN PARA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS
Decreto 840 del 27 de diciembre de 2019 "Por medio del cual se establecen las condiciones y restricciones para el tránsito de los vehículos de transporte de carga en el Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones"
Decreto 077 del 04 de marzo de 2020 "Por medio del cual se modifica el Decreto Distrital 840 de 2019 y se dictan otras disposiciones"

NOTA
1. En el lugar de desarrollo de las actividades deberá permanecer copia del plano del PMT aprobado y de la autorización emitida por la SDM para la verificación por parte de las autoridades competentes del cumplimiento a la implementación del PMT.
2. No se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra.
3. El contratista y la interventoría son responsables solidariamente de la correcta implementación del PMT.
4. En horario nocturno y/o cuando las condiciones atmosféricas lo ameriten se debe garantizar la instalación de señalización luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de Señalización Vial vigente.
5. Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberán aislarse y/o canalizarse mediante maletines plásticos entrelazados.
6. En caso de congestión vehicular y/o por solicitud expresa de la Policía de Tránsito, deberá levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones óptimas de tránsito y seguridad vial.
7. La señalización a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Señalización Vial vigente.
8. La longitud de transición a implementar para cierres de carril deberá cumplir las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de Señalización Vial vigente.
9. Para trabajos nocturnos, dominicales y/o festivos se debe contar con la autorización por parte de la alcaldía local de acuerdo con lo estipulado en el decreto 1076 de 2015, articulo 2.2.5.1.5.15. o aquellas normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan
10. Si en el área de influencia del proyecto existen redes de semaforización, el contratista debe propender por su integridad, de igual manera durante la ejecución de obras el contratista es responsable de la custodia de redes y elementos de mobiliario semafórico, y de incidentes que se deriven por daños a los controles semafóricos.
11. Previo a la intervención se debe socializar las actividades, el PMT y demás restricciones con la comunidad directamente afectada, y es responsabilidad de la interventoría y la entidad contratante verificar el cumplimiento de esta condición.

Arq. Juan Camilo Rodríguez Cárdenas
Director de Ingeniería de Tránsito

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez
Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
Los PMT señalados con * no fueron revisados y autorizados por la Subdirectora

COI No. 11
MARZO 12 DE 2026
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No.	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)		DIRECCIÓN DE LA OBRA		CONTRATISTA	FECHA		HORARIO DE TRABAJO	HORARIO DE CIERRE	No. CONTRATO	OBSERVACIONES	AUTORIZADO	LOCALIDAD	ING. RESPONSABLE	No RADICADO SDM
	INICIO	FIN	INICIO	FIN		INICIO	FIN								
8573	6000557	N/A	CL 50A SUR KR 36	CL 50A SUR KR 37	CONSORCIO COCO	13-mar-26	2-jul-26	07:00-17:00	24 HORAS	FDLTU-613-2025	NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y POSICIONAMIENTO DE VEHICULO DE OBRA EN EL INTERIOR DEL CERRAMIENTO. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN LOS ANDENES ADYACENTES AL CIERRE DE OBRA.DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. LA SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA CON POLISOMBRA. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA DE MINIMO 1.2m. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. EN LAS VIAS QUE HACEN PARTE DE LA RUTA DE DESVIO EL CONTRATISTA DEBE GARANTIZAR CONDICIONES OPTIMAS DE SEGURIDAD VIAL A LOS DIFERENTES ACTORES VIALES.	SI	TUNJUELITO	FERNEL E. BONZA R.	20266120074537 2
8574	N/A	N/A	VARIOS USAQUEN	N/A	CONSORCIO CON	-	-	-	-	FDLUSA-423-2025	LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA DE LA KR 7C ENTRE CL 182 Y CL 183 PARA CONSERVACION DE MALLA VIAS Y CIERRE TOTAL DE LA CL 182B ENTRE KR 7C Y 40.4m AL OCCIDENTE PARA ACOPIO DE MATERIALES, CAMPAMENTO, BAÑO Y/O ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE OBRA, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIO LA TOTALIDAD DE OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL DIA 28 DE ENERO DE 2026, EN LO REFERENTE A: 1. UNA VEZ VERIFICADA LA INTERFERENCIA CON EL CONTRATO IDU-1551-2017, ES NECESARIO QUE SE ENTREGUE POR PARTE DEL CONTRATISTA "CONSORCIO CON" UN ACTA DE COORDINACION FIRMADA ENTRE LAS PARTES, LA CUAL DESCRIBA LA SOLUCION A IMPLEMENTAR Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS. 2. PRESENTAR ACTAS DE SOCIALIZACION CON LA COMUNIDAD. 3. DE ACUERDO CON LO INFORMADO LA PROPUESTA PRESENTADA NO ES TECNICAMENTE VIABLE, TODA VEZ QUE LA VIA DE DESVIO SOLICITADA ES VIA DE DESVIO DEL CONTRATO IDU-1551-2017. 4. LAS OBRAS QUE POR SU DESARROLLO GENEREN CIRCULACION DE VEHICULOS PESADOS, DEBEN INDICAR EL RECORRIDO DE INGRESO Y SALIDA DEL SITIO DE LA OBRA HASTA LA VIA ARTERIA O CORREDOR DE MOVILIDAD MAS CERCANO. SI LAS VIAS INDICADAS EN EL RECORRIDO DE INGRESO Y SALIDA DEL SITIO DE LA INTERVENCION Y/U OBRA NO SON CORREDORES DE MOVILIDAD, SE DEBE ANEXAR EL REGISTRO FOTOGRAFICO (DETALLADO) DEL ESTADO ACTUAL DE DICHAS VIAS Y FORMATO PM02-PR01-F10 “ACTA DE COMPROMISO DE RESTITUCION DE VIAS”.	NO	USAQUEN	YURY Y. VALBUENA A.	20266120016326 2
8575	10007103	N/A	KR 80A CL 71	KR 80A CL 71B	CONSORCIO CON	-	-	-	-	FDLE-626-2025	LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVA Y POSICIONAMIENTO DE VEHICULO DE OBRA AL INTERIOR DEL CERRAMIENTO, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LA TOTALIDAD DE LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 10-FEB-26, EN LO REFERENTE A: 1. PRESENTAR ACTA DE SOCIALIZACION ESPECIFICAS CON EL 100% RESIDENCIAS Y LOCALES COMERCIALES DE LA KR 80A ENTRE CL 71 Y CL 71B. 2. FORMATO COI: AJUSTAR EL NOMBRE DEL CONTRATISTA, TENIENDO EN CUENTA QUE NO ES COHERENTE CON EL RELACIONADO EN EL DOCUMENTO TECNICO. 3. DOCUMENTO TECNICO: INDICAR DATOS COMPLETOS DE LOS PROFESIONALES DEL CONTRATISTA, INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE. 4. EL PLANO PRESENTADO NO CORRESPONDE CON LA DIRECCION REPORTADA EN EL FORMATO COI. 5. ADJUNTAR ACTA DE COMPROMISO "PM02-PR01-F10 ACTA DE COMPROMISO RESTITUCION DE VIAS",	NO	ENGATIVA	DIEGO A. GALVIS H.	20266120040519 2
8576	2000749	N/A	KR 10 AC 85	KR 10 20m AL SUR	CONSORCIO CONEXIONES PEATONALES 2025	-	-	-	-	IDU-1767-2023	LA SDM NO AUTORIZA PRORROGA DE LA ATENCION DE OBSERVACIONES DEL PMT CON RADICADO SDM-20266120045282 2 PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE REMATES DE ESPACIO PUBLICO Y CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL PARA AMPLIACION DE CERRAMIENTO (1,0m) Y PARA TRASLADO DE SENDERO PEATONAL A LA CALZADA (2,0m), TODA VEZ QUE, EL PMT SE ATENDIO EN COI EN COI 10-26, ID 7623.	VIGENTE	CHAPINERO	CAROLINA GUEVARA O.	20266120086533 2
8577	2000749	N/A	KR 10 20m AL SUR DE LA AC 85	KR 10 35m AL SUR DE LA AC 85	CONSORCIO CONEXIONES PEATONALES 2025	-	-	-	-	IDU-1767-2023	LA SDM NO AUTORIZA PRORROGA DE LA ATENCION DE OBSERVACIONES DEL PMT CON RADICADO SDM-20266120045282 2 PARA IERRE DEL CARRIL ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES REFERENTE A LAS ACTIVIDADES DE REMATES DE ESPACIO PUBLICO EN LA KR 10 (CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA), TODA VEZ QUE, EL PMT SE ATENDIO EN COI EN COI 10-26, ID 7624.	VIGENTE	CHAPINERO	CAROLINA GUEVARA O.	20266120086533 2

NORMATIVIDAD
El Plan de Manejo de Tránsito debe cumplir con lo establecido en el Manual de señalización vial vigente.
La Secretaría Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningún caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Disitrito Capital, principalmente la reglamentación que rige la utilización del espacio público, la circulación de vehículos dentro del perímetro urbano, el manejo de tránsito y seguridad para peatones por la ejecución de obras civiles.


A. ESPACIO PÚBLICO
Según ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito Terrestre: Artículos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131.

B. RESTRICCIÓN PARA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS
Decreto 840 del 27 de diciembre de 2019 "Por medio del cual se establecen las condiciones y restricciones para el tránsito de los vehículos de transporte de carga en el Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones"
Decreto 077 del 04 de marzo de 2020 "Por medio del cual se modifica el Decreto Distrital 840 de 2019 y se dictan otras disposiciones"

NOTA
1. En el lugar de desarrollo de las actividades deberá permanecer copia del plano del PMT aprobado y de la autorización emitida por la SDM para la verificación por parte de las autoridades competentes del cumplimiento a la implementación del PMT.
2. No se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra.
3. El contratista y la interventoría son responsables solidariamente de la correcta implementación del PMT.
4. En horario nocturno y/o cuando las condiciones atmosféricas lo ameriten se debe garantizar la instalación de señalización luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de Señalización Vial vigente.
5. Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberán aislarse y/o canalizarse mediante maletines plásticos entrelazados.
6. En caso de congestión vehicular y/o por solicitud expresa de la Policía de Tránsito, deberá levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones óptimas de tránsito y seguridad vial.
7. La señalización a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Señalización Vial vigente.
8. La longitud de transición a implementar para cierres de carril deberá cumplir las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de Señalización Vial vigente.
9. Para trabajos nocturnos, dominicales y/o festivos se debe contar con la autorización por parte de la alcaldía local de acuerdo con lo estipulado en el decreto 1076 de 2015, articulo 2.2.5.1.5.15. o aquellas normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan
10. Si en el área de influencia del proyecto existen redes de semaforización, el contratista debe propender por su integridad, de igual manera durante la ejecución de obras el contratista es responsable de la custodia de redes y elementos de mobiliario semafórico, y de incidentes que se deriven por daños a los controles semafóricos.
11. Previo a la intervención se debe socializar las actividades, el PMT y demás restricciones con la comunidad directamente afectada, y es responsabilidad de la interventoría y la entidad contratante verificar el cumplimiento de esta condición.

Arq. Juan Camilo Rodríguez Cárdenas
Director de Ingeniería de Tránsito

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez
Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
Los PMT señalados con * no fueron revisados y autorizados por la Subdirectora

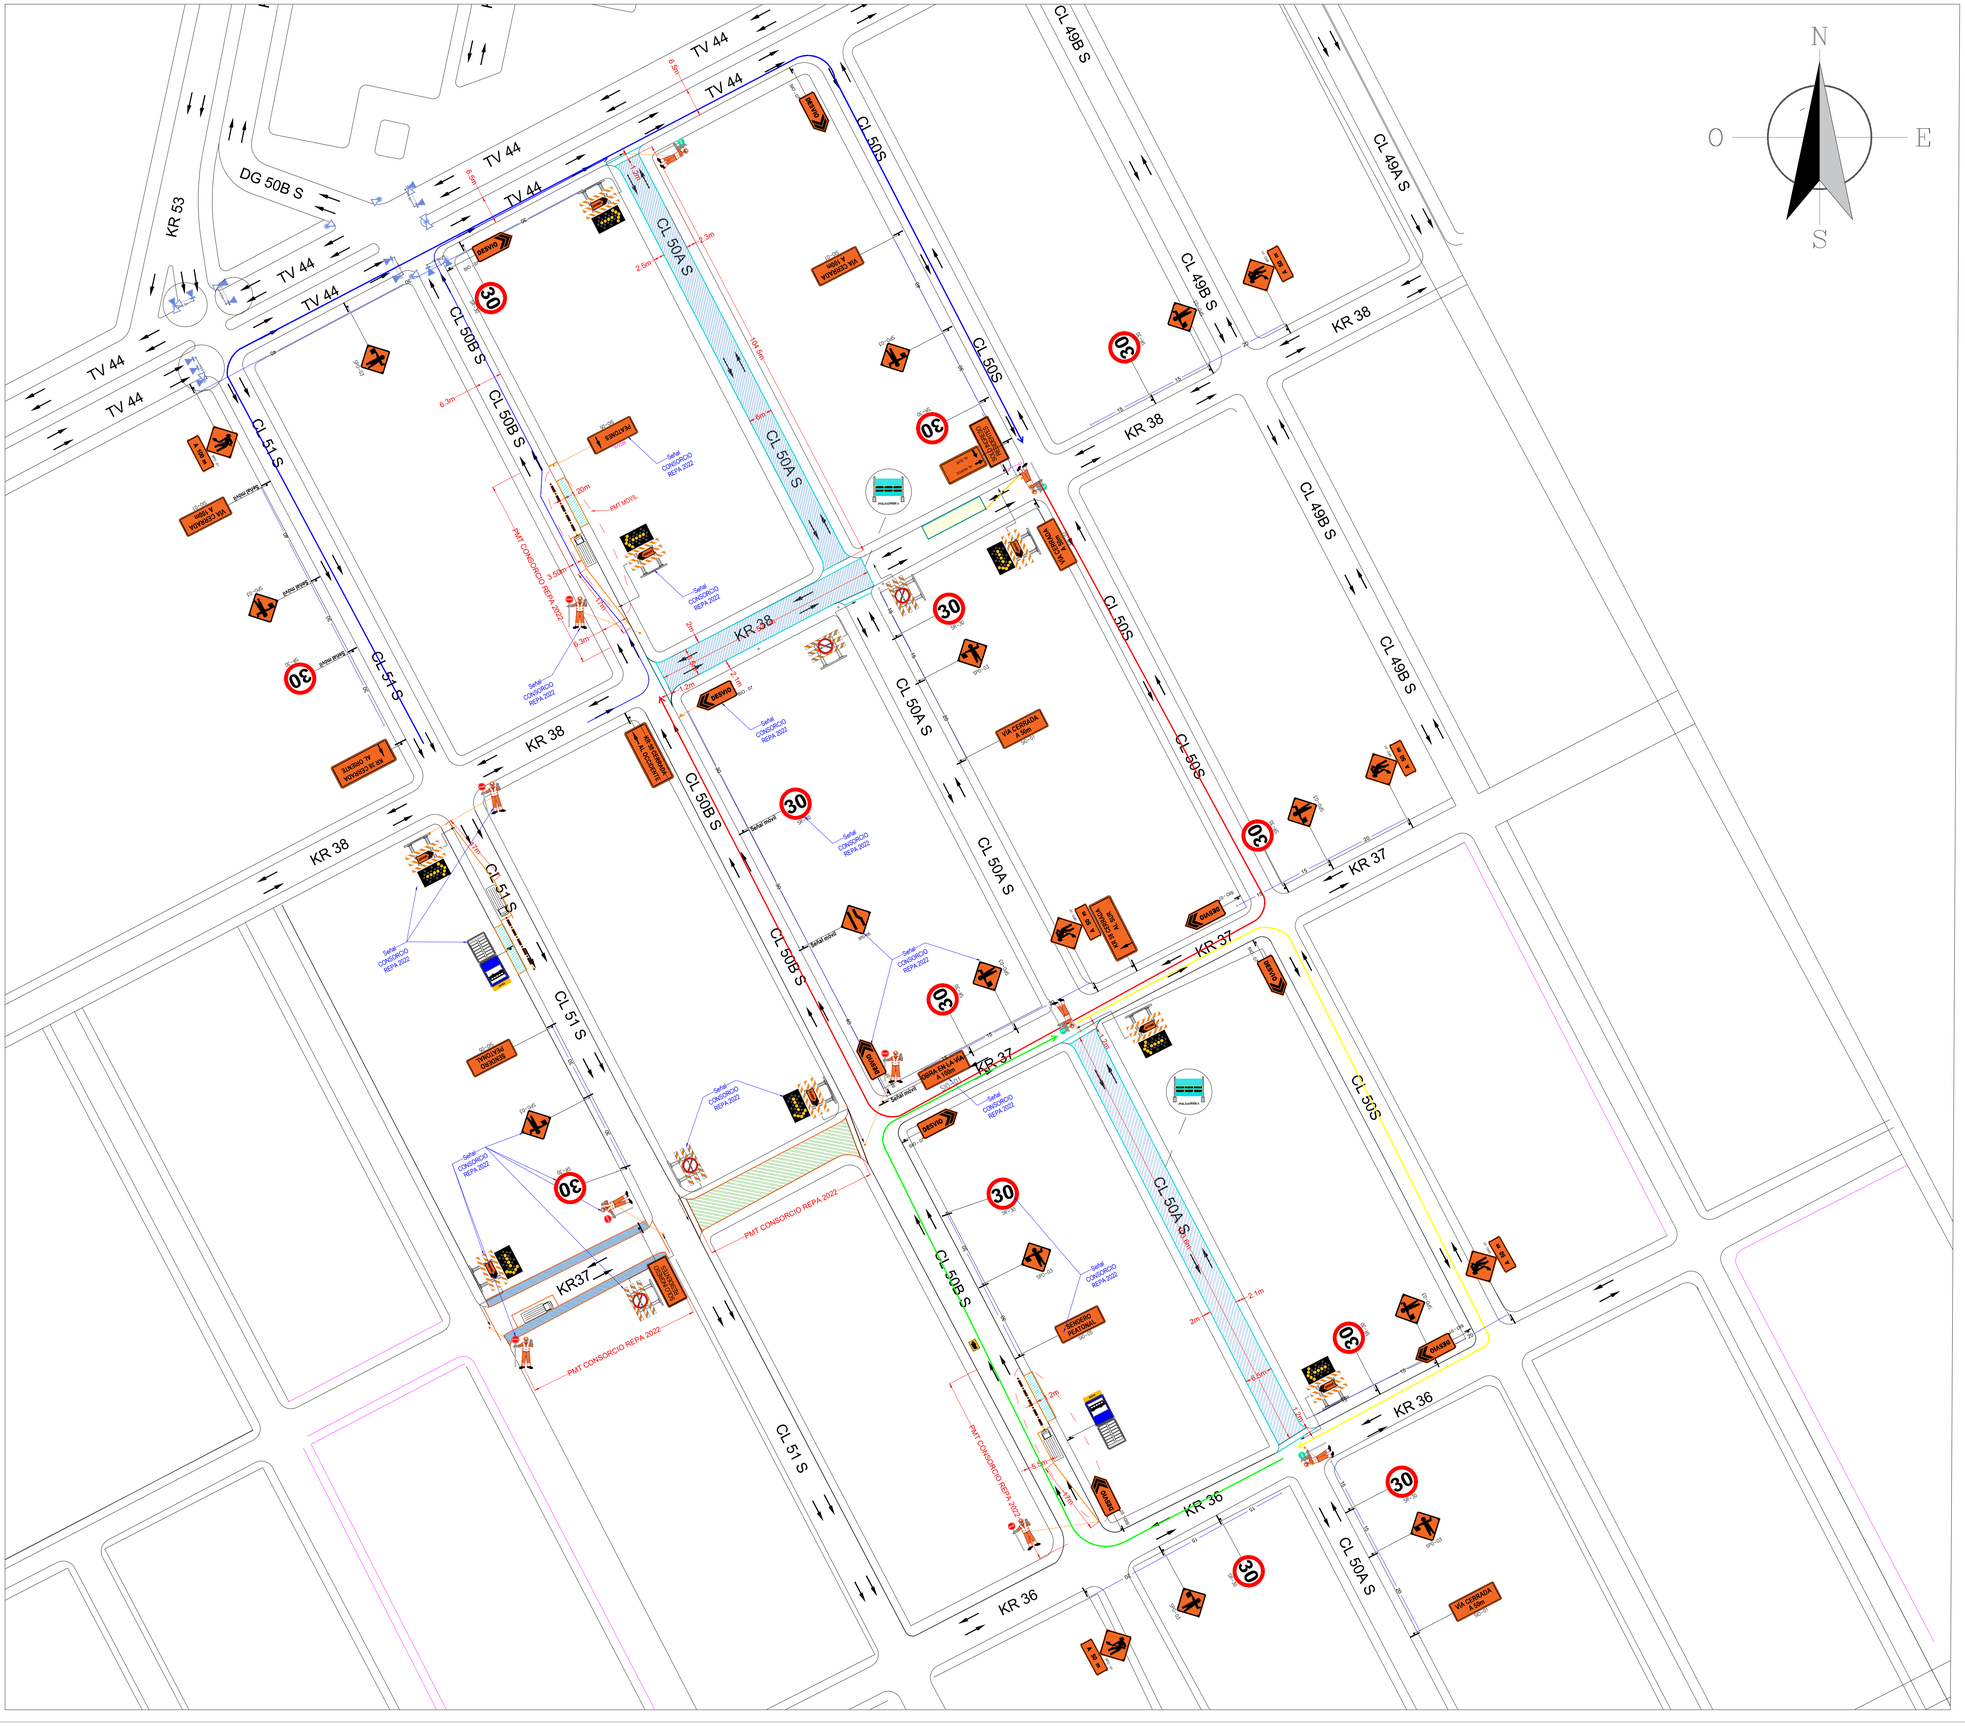

CONTENIDO:
INTERVENCIÓN DE MALLA VIAL

DIRECCIÓN:

1. KR 38 ENTRE CL 50 A SUR Y TV 44
2. CL 50 A SUR ENTRE KR 36 Y KR 37

CIV: 6000389, 6000557

COSTADO: DOS COSTADOS

LOCALIDAD: TUNJUELITO

CONVENCIONES

ZONA DE OBRAS	BARRERA DE SEGURIDAD
POSICIONAMIENTO VEHICULOS DE OBRA	
CIRCULACIÓN PEATONAL	FLECHA LUMINOSA
CIRCULACIÓN BICI-USUARIOS	
PLAFONES (TABLA BURRA)	CONOS 90cm
PLAFONES DE ACERO	
ACCESOS VEHICULARES EXISTENTES	DELINEADORES TUBULARES
IMPLEMENTACIÓN DESVIOS	
OBRAS EXISTENTES	BARRERAS PLÁSTICAS / INDIVIDUOS ARBOREOS
CERRAMIENTO EN POLISOMBRA	
OBRA EN LA VÍA A XXXm — OBRA EN LA VIA SIO-01	PARADERO PROVISIONAL
VÍA CERRADA A XXXm — VÍA CERRADA SIO-01	SENDERO PEATONAL — SENDERO PEATONAL SIO-24
CARRIL DERECHO CERRADO — CARRIL CERRADO SIO-04	PEATONES — PEATONES SIO-24
CARRIL IZQUIERDO CERRADO — CARRIL CERRADO SIO-04	TRANSITE POR LA ACERA DE ENFRENTE — TRANSITE POR LA ACERA DE ENFRENTE
ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS — ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS	PARADERO
TRABAJOS EN LA VIA SPO-01	CIRCULACIÓN VIAL
AUXILIAR DE TRÁNSITO SPO-03	AUXILIARES DE TRÁFICO
REDUCCIÓN A LA DERECHA SPO-05	SEMÁFOROS
REDUCCIÓN A LA IZQUIERDA SPO-06	BICI-USUARIOS — BICI-USUARIOS
VELOCIDAD MÁXIMA PERMITIDA SPO-30	CONSERVE LA DERECHA SRC-01

UBICACION

HORARIO: 07:00 – 17:00 Horas
HORARIO CIERRE: 24 Horas

ESCALA: S / N | **REV:** 0

FECHA: 23 DE ENERO DE 2026


CAPÍTULO 7 SEÑALIZACIÓN Y MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA OBRAS EN LA VIA

PLANO 1 DE 1

CONSORCIO COCO

5. PROGRAMACIÓN

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
0		**PROGRAMACIÓN POR CIV**	**156.1 día**	**17/12/25 07:**	**14/8/26 09:0**	**$ 6,274,083,791.00**
1	**01**	**CONSORCIO COCO - TUNJUELITO**	**156.1 días**	**17/12/25 07:0**	**14/8/26 09:00**	**$ 6,274,083,791.00**
2	01.01	INICIO				$ 0.00
3	**01.02**	**1. DIAGNOSTICO Y DISEÑOS**	**45 días?**	**17/12/25 07:0**	**20/2/26 09:00**	**$ 95,172,510.16**
4	**01.02.01**	**ACTIVIDADES DE DIAGNOSTICO QUE NO INCLUYEN IVA**	**44 días**	**17/12/25 08:0**	**18/2/26 17:00**	**$ 33,627,468.00**
5	01.02.01.01	APIQUE MANUAL HASTA 2 M DE 1.5 M X 1.5 M - RELLENO Y ADECUACIÓN DEL SITIO - INCLUYE TRANSPORTE	3 días	**17/12/25 08:00**	20/12/25 15:00	$ 4,312,512.00
6	01.02.01.02	DETERMINACION EN EL LABORATORIO DEL CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) DE MUESTRAS DE SUELO, ROCA Y MEZCLAS DE SUELO-AGREGADO. Norma técnica: INVE-122-13 NTC-1495-13 ASTM D2216-19.	15 días	23/12/25 08:00	13/1/26 15:00	$ 148,992.00
7	01.02.01.03	DETERMINACION DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTICULAS DE LOS SUELOS (GRANULOMETRIA POR TAMIZADO E HIDROMETRIA). Norma técnica: INVE-123-13 ASTM D422-63-98 (retirado 2016).	15 días	23/12/25 08:00	13/1/26 15:00	$ 2,156,240.00
8	01.02.01.04	METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA LA DETERMINACION DE LA DENSIDAD (PESO UNITARIO) EN LABORATORIO DE ESPECIMENES DE SUELO. Norma técnica: ASTM D7263-21.	15 días	23/12/25 08:00	13/1/26 15:00	$ 517,456.00
9	01.02.01.05	DETERMINACION DE LOS FACTORES DE CONTRACCION DE LOS SUELOS. Norma técnica: INVE-127-13 NTC-1503-01 ASTM D427-04 (retirado 2010).	15 días	23/12/25 08:00	13/1/26 15:00	$ 1,207,472.00
10	01.02.01.06	DETERMINACION DEL CONTENIDO ORGANICO DE UN SUELO MEDIANTE EL ENSAYO DE PERDIDA POR IGNICION. Norma técnica: INV E 121-13 AASHTO T-267-86 (18)	15 días	23/12/25 08:00	13/1/26 15:00	$ 948,720.00
11	01.02.01.07	DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS SUELOS - LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD DE LOS SUELOS. Norma técnica: INVE-125-13 INVE-126-13 NTC-4630-99 ASTM D4318-17e1 (18).	15 días	23/12/25 08:00	13/1/26 15:00	$ 879,712.00
12	01.02.01.08	DETERMINACION DEL POTENCIAL DE CAMBIO VOLUMETRICO DE UN SUELO EMPLEANDO EL APARATO DE LAMBE. Norma técnica: INVE-120-13 UNE-EN-103600-96	15 días	23/12/25 08:00	13/1/26 15:00	$ 3,535,056.00
13	01.02.01.09	CBR SOBRE MUESTRA INALTERADA (METODO II). Norma técnica: INVE-148-13 NTC-2122-13 ASTM D1883-21.	15 días	23/12/25 08:00	13/1/26 15:00	$ 4,191,720.00
14	01.02.01.10	EQUIPO VACTOR - SONDEO - LIMPIEZA - RECOLECCIÓN DE LODOS NO PELIGROSOS (No incluye ag	12 días	2/2/26 08:00	18/2/26 17:00	$ 15,148,188.00
15	01.02.01.11	TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS NO PELIGROSOS PROVENIENTES DE ALCANTARILLADO	12 días	2/2/26 08:00	18/2/26 17:00	$ 581,400.00
16	**01.02.02**	**IVA**	**0 días**	**17/12/25 07:0**	**17/12/25 07:0**	**$ 6,389,218.92**
17	01.02.02.01	IVA	0 días	13/1/26 15:00	13/1/26 15:00	$ 6,389,218.92
18	**01.02.03**	**ACTIVIDADES DE DIAGNOSTICO QUE INCLUYEN IVA**	**30.4 días**	**6/1/26 08:00**	**18/2/26 17:00**	**$ 55,155,823.24**
19	01.02.03.01	DISEÑO PARA RECONSTRUCCION DE VIAS - PAV. FLEXIBLE/RIGIDO (INCLUYE TOMA DE DEFLEXIONES, DETERMINACIÓN DE ESPESORES, EVALUACIÓN SUPERFICIAL Y PROCESAMIENTO Y ENTREGA DE LA INFORMACIÓN) IVA INCLUIDO	12 días	13/1/26 15:00	30/1/26 15:00	$ 27,100,411.32
20	01.02.03.02	INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMA CCTV PARA DIÁMETROS ENTRE 6" Y 36". INCL MANO DE OBRA IDÓNEA, INFORME ESCRITO DE DIAGNÓSTICO Y DVD CON VIDEO. INCL IVA	20 días	6/1/26 08:00	3/2/26 17:00	$ 8,287,805.86
21	01.02.03.03	INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMA CCTV PARA DIÁMETROS MAYORES A 36". INCL MANO DE OBRA IDÓNEA, INFORME ESCRITO DE DIAGNÓSTICO Y DVD CON VIDEO. INCL IVA	20 días	6/1/26 08:00	3/2/26 17:00	$ 0.00
22	01.02.03.04	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 6" Y 16" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCL MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE COMBUSTIBLE Y AGUA. INCL. IVA	12 días	2/2/26 08:00	18/2/26 17:00	$ 19,767,606.06
23	01.02.03.05	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 18" Y 36" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCLUYE MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE COMBUSTIBLE Y AGUA. INCL IVA	12 días	2/2/26 08:00	18/2/26 17:00	$ 0.00
24	**01.03**	**INTERVENCIÓN VIAL PRIORITARIA**	**112.9 días**	**18/2/26 07:0**	**14/8/26 09:00**	**$ 5,327,670,620.06**
25	**01.03.01**	**CIV 6000372**	**45 días?**	**18/2/26 07:0**	**29/4/26 09:00**	**$ 667,829,904.33**
26	**01.03.01.01**	**CAPITULO 02: RECONSTRUCCION - REHABILITACION VIA PAVIMENTO FLEXIBLE**	**39 días**	**18/2/26 08:0**	**20/4/26 15:00**	**$ 532,931,849.69**
27	01.03.01.01.1	REPLANTEO GENERAL	5 días	18/2/26 08:00	25/2/26 10:00	$ 727,534.08
28	01.03.01.01.2	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA	6 días	18/2/26 08:00	26/2/26 12:00	$ 707,421.00
29	01.03.01.01.3	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	6 días	19/2/26 10:00	27/2/26 15:00	$ 4,669,809.41
30	01.03.01.01.4	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	6 días	19/2/26 10:00	27/2/26 15:00	$ 2,395,665.79
31	01.03.01.01.5	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	6 días	19/2/26 10:00	27/2/26 15:00	$ 19,035,063.09
32	01.03.01.01.6	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	5 días	27/2/26 15:00	6/3/26 17:00	$ 1,408,431.36
33	01.03.01.01.7	ESTABILIZACION O MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON RAJON = 6" A 12" (15 - 30 cm) Y SELLO CON SUBBASE GRANULAR CLASE C - Gr1 (SBGC_Gr1). INCLUYE (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACIÓN MECANICA CON EXCAVADORA MEDIANA SOBRE ORUGAS Y RODILLO VIBROCOMP	5 días	2/3/26 08:00	9/3/26 10:00	$ 15,512,565.60
34	01.03.01.01.8	GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD-HDPE) CON ALTURA DE 150 MM. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	12 días	17/3/26 15:00	8/4/26 15:00	$ 59,115,475.20
35	01.03.01.01.9	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 90 KN/M Y 110 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	12 días	17/3/26 15:00	8/4/26 15:00	$ 28,717,504.86
36	01.03.01.01.10	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	13 días	20/3/26 10:00	13/4/26 12:00	$ 26,708,229.12
37	01.03.01.01.11	ESTABILIZACIÓN DE SUB BASE Y BASES GRANULARES CON ADITIVO POTENCIALIZADOR FLEXIBILIZANTE + CEMENTO 5%	4 días	10/4/26 08:00	15/4/26 17:00	$ 75,673,937.66

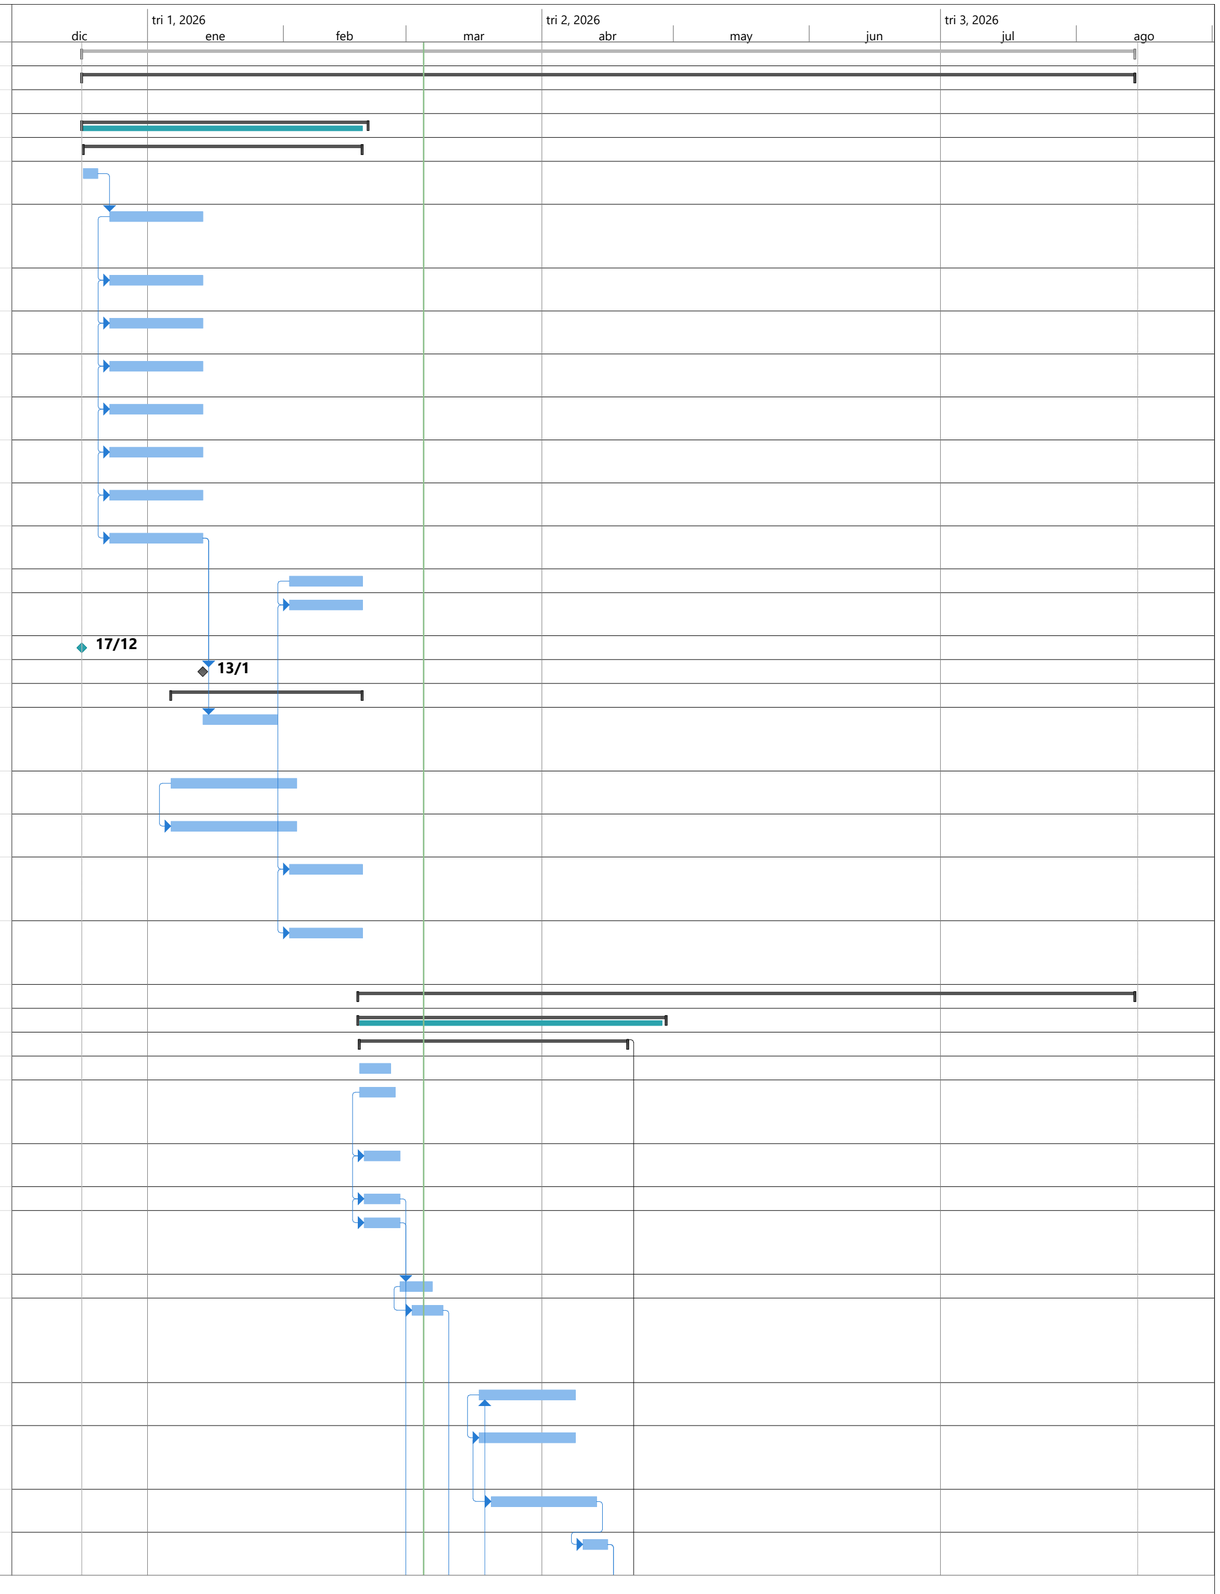

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: 5/3/26 15:07

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · Progreso manual
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Progreso


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
38	01.03.01.01.1	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	2 días	16/4/26 08:00	18/4/26 12:00	$ 2,557,695.36
39	01.03.01.01.1	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	2 días	16/4/26 08:00	18/4/26 12:00	$ 3,116,670.72
40	01.03.01.01.1	MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE MD12 CON CEMENTO ASFÁLTICO 60-70 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS)	2 días	17/4/26 10:00	20/4/26 15:00	$ 119,647,696.44
41	01.03.01.01.1	PERFORACIONES EN SECO DE 3" CON PROFUNDIDAD DE 1 METRO (INCLUYE AHOYADOR HIDRÁULICO DE ALTA RESISTENCIA, JUEGO DE BROCAS, OPERARIO Y COMBUSTIBLE)	5 días	9/3/26 10:00	16/3/26 12:00	$ 81,237,345.00
42	01.03.01.01.1	INYECCIÓN DE CAL COMERCIAL AL 6% EN PERFORACIONES EN SECO DE 3" CON COMPACTACIÓN MANUAL DE IMPACTO PARA PROFUNDIDAD DE 1 METRO. (INCLUYE CAL COMERCIAL AL 6%).	5 días	10/3/26 13:00	17/3/26 15:00	$ 91,700,805.00
43	**01.03.01.02**	**CAPITULO 06: ESPACIO PUBLICO EN CONCRETO**	**18 días**	**18/2/26 08:00**	**16/3/26 12:00**	**$ 41,395,188.05**
44	01.03.01.02.1	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	6 días	18/2/26 08:00	26/2/26 12:00	$ 621,601.92
45	01.03.01.02.2	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	6 días	18/2/26 08:00	26/2/26 12:00	$ 1,609,386.00
46	01.03.01.02.3	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	6 días	18/2/26 08:00	26/2/26 12:00	$ 2,280,428.76
47	01.03.01.02.4	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	6 días	18/2/26 08:00	26/2/26 12:00	$ 2,242,110.80
48	01.03.01.02.5	ANDEN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI (210 KG/CM2) PREMEZCLADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO)	10 días	2/3/26 08:00	16/3/26 12:00	$ 6,308,959.68
49	01.03.01.02.6	MALLA ELECTROSOLDADA 0.25X0.25M, D=4MM, 4MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	3 días	2/3/26 08:00	5/3/26 15:00	$ 135,303.05
50	01.03.01.02.7	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	7 días	5/3/26 15:00	16/3/26 12:00	$ 20,574,948.60
51	01.03.01.02.8	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA ESPACIO PÚBLICO	5 días	21/2/26 15:00	28/2/26 17:00	$ 320,836.20
52	01.03.01.02.9	CONCRETO 3000 PSI GRAVA COMÚN PARA PIEZA REMATE TIPO HOMBROS PARA RAMPA (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMIN., BOMBEO CON AUTOBOMBA, FORMALETEO Y COLOCACIÓN. NO INCL. REFUERZO, CURADO).	6 días	5/3/26 15:00	14/3/26 10:00	$ 2,500,187.92
53	01.03.01.02.1	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5	7 días	5/3/26 15:00	16/3/26 12:00	$ 4,801,425.12
54	**01.03.01.03**	**CAPITULO 07: REDES**	**23 días**	**18/2/26 08:00**	**24/3/26 15:00**	**$ 3,636,899.65**
55	01.03.01.03.1	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	5 días	27/2/26 15:00	6/3/26 17:00	$ 352,062.90
56	01.03.01.03.2	DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE).	5 días	27/2/26 15:00	6/3/26 17:00	$ 78,324.00
57	01.03.01.03.3	DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	5 días	27/2/26 15:00	6/3/26 17:00	$ 455,606.00
58	01.03.01.03.4	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	5 días	27/2/26 15:00	6/3/26 17:00	$ 346,147.20
59	01.03.01.03.5	RELLENO EN TRITURADO DE 3/4`` (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)	5 días	7/3/26 08:00	14/3/26 10:00	$ 84,596.40
60	01.03.01.03.6	RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN TRANSPORTE A 28 KM).	5 días	11/3/26 15:00	18/3/26 17:00	$ 446,983.15
61	01.03.01.03.7	NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA, H=0.15M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN)	2 días	19/3/26 08:00	21/3/26 12:00	$ 327,710.00
62	01.03.01.03.8	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	6 días	14/3/26 10:00	24/3/26 15:00	$ 642,936.00
63	01.03.01.03.9	CONEXIONES KIT SILLA YEE 315 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	5.5 días	18/2/26 08:00	25/2/26 16:00	$ 902,534.00
64	**01.03.01.04**	**CAPITULO 08: SEÑALIZACIÓN**	**5 días**	**21/4/26 07:00**	**28/4/26 09:00**	**$ 17,604,401.77**
65	01.03.01.04.1	DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	4.5 días	21/4/26 08:00	27/4/26 14:00	$ 4,559,580.00
66	01.03.01.04.2	FLECHA DIRECCIONAL "A LA DERECHA" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.51M2	4.5 días	21/4/26 08:00	27/4/26 14:00	$ 438,040.00
67	01.03.01.04.3	DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)	4.5 días	21/4/26 08:00	27/4/26 14:00	$ 2,335,815.11
68	01.03.01.04.4	DEMARCACION LINEA DISCONTINUA A=0.12M (E=15 MILS, ACRÍLICA BASE AGUA. INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)	4.5 días	21/4/26 08:00	27/4/26 14:00	$ 313,965.60
69	01.03.01.04.5	FLECHA DIRECCIONAL "A LA DERECHA" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.51M2	4.5 días	21/4/26 08:00	27/4/26 14:00	$ 275,600.00
70	01.03.01.04.6	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA DERECHA" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. INC. MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 2.18M2	4.5 días	21/4/26 08:00	27/4/26 14:00	$ 397,888.00
71	01.03.01.04.7	PINTURA TERMOPLASTICA (E=2.3MM. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS)	4.5 días	21/4/26 08:00	27/4/26 14:00	$ 2,335,815.11
72	01.03.01.04.8	ESTOPEROLES DE 10 CM X 2.5 CM. SUMINISTRO E INSTALACION.	4.5 días	21/4/26 08:00	27/4/26 14:00	$ 2,312,464.00
73	01.03.01.04.9	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	4.5 días	21/4/26 08:00	27/4/26 14:00	$ 1,626,146.10
74	01.03.01.04.10	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	4.5 días	21/4/26 08:00	27/4/26 14:00	$ 409,943.45
75	01.03.01.04.11	TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	4.5 días	21/4/26 08:00	27/4/26 14:00	$ 22,562.00
76	01.03.01.04.12	BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 3CM DE ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 1/2", PINTURA DE LARGA DURACIÓN BLANCA Y RESINA EPÓXICA.	4.5 días	21/4/26 08:00	27/4/26 14:00	$ 2,576,582.40



Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: 5/3/26 15:07

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
77	**01.03.01.05**	**CAPITULO 09: NO PREVISTOS**	**27 días**	**7/3/26 08:00**	**20/4/26 15:00**	**$ 72,261,565.17**
78	01.03.01.05.1	ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARALES METÁLICOS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	5 días	19/3/26 08:00	27/3/26 10:00	$ 1,558,507.17
79	01.03.01.05.2	GEOMALLA MULTIAXIAL RESISTENCIA A FLUENCIA 300KN/M	3 días	16/4/26 08:00	20/4/26 15:00	$ 53,162,407.60
80	01.03.01.05.3	SUMIDERO LATERAL SL-150, H=0.85M (PREFABRICADO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE SOBRETAPA Y TAPA)	5 días	7/3/26 08:00	14/3/26 10:00	$ 17,540,650.40
81	**01.03.02**	**CIV 6001013**	**45 días?**	**9/3/26 07:00**	**20/5/26 09:00**	**$ 1,016,686,648.53**
82	**01.03.02.01**	**CAPITULO 02: RECONSTRUCCION - REHABILITACION VIA PAVIMENTO FLEXIBLE**	**39 días**	**9/3/26 08:00**	**9/5/26 15:00**	**$ 624,142,496.04**
83	01.03.02.01.1	REPLANTEO GENERAL	5 días	9/3/26 08:00	16/3/26 10:00	$ 816,816.00
84	01.03.02.01.2	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA	6 días	9/3/26 08:00	17/3/26 12:00	$ 2,662,439.04
85	01.03.02.01.3	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	6 días	10/3/26 10:00	18/3/26 15:00	$ 5,242,881.60
86	01.03.02.01.4	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	6 días	10/3/26 10:00	18/3/26 15:00	$ 2,793,106.80
87	01.03.02.01.5	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	6 días	10/3/26 10:00	18/3/26 15:00	$ 22,192,980.48
88	01.03.02.01.6	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	5 días	18/3/26 15:00	26/3/26 17:00	$ 1,581,272.00
89	01.03.02.01.7	ESTABILIZACION O MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON RAJON = 6" A 12" (15 - 30 cm) Y SELLO CON SUBBASE GRANULAR CLASE C - Gr1 (SBGC_Gr1). INCLUYE (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACIÓN MECANICA CON EXCAVADORA MEDIANA SOBRE ORUGAS Y RODILLO VIBROCOMP	5 días	20/3/26 08:00	28/3/26 10:00	$ 17,416,245.00
90	01.03.02.01.8	GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD-HDPE) CON ALTURA DE 150 MM. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	12 días	9/4/26 15:00	27/4/26 15:00	$ 66,370,040.00
91	01.03.02.01.9	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 90 KN/M Y 110 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	12 días	9/4/26 15:00	27/4/26 15:00	$ 31,985,382.00
92	01.03.02.01.10	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	13 días	13/4/26 10:00	2/5/26 12:00	$ 29,985,824.00
93	01.03.02.01.11	ESTABILIZACIÓN DE SUB BASE Y BASES GRANULARES CON ADITIVO POTENCIALIZADOR FLEXIBILIZANTE + CEMENTO 5%	4 días	29/4/26 08:00	5/5/26 17:00	$ 93,456,586.08
94	01.03.02.01.12	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	2 días	6/5/26 08:00	8/5/26 12:00	$ 2,871,572.00
95	01.03.02.01.13	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	2 días	6/5/26 08:00	8/5/26 12:00	$ 3,499,144.00
96	01.03.02.01.14	MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE MD12 CON CEMENTO ASFÁLTICO 60-70 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS)	2 días	7/5/26 10:00	9/5/26 15:00	$ 134,330,687.04
97	01.03.02.01.15	PERFORACIONES EN SECO DE 3" CON PROFUNDIDAD DE 1 METRO (INCLUYE AHOYADOR HIDRÁULICO DE ALTA RESISTENCIA, JUEGO DE BROCAS, OPERARIO Y COMBUSTIBLE)	5 días	28/3/26 10:00	8/4/26 12:00	$ 98,147,976.00
98	01.03.02.01.16	INYECCIÓN DE CAL COMERCIAL AL 6% EN PERFORACIONES EN SECO DE 3" CON COMPACTACIÓN MANUAL DE IMPACTO PARA PROFUNDIDAD DE 1 METRO. (INCLUYE CAL COMERCIAL AL 6%).	5 días	30/3/26 13:00	9/4/26 15:00	$ 110,789,544.00
99	**01.03.02.02**	**CAPITULO 06: ESPACIO PUBLICO EN CONCRETO**	**18 días**	**9/3/26 08:00**	**8/4/26 12:00**	**$ 43,741,313.01**
100	01.03.02.02.1	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	6 días	9/3/26 08:00	17/3/26 12:00	$ 656,832.00
101	01.03.02.02.2	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	6 días	9/3/26 08:00	17/3/26 12:00	$ 1,700,600.00
102	01.03.02.02.3	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	6 días	9/3/26 08:00	17/3/26 12:00	$ 2,409,674.96
103	01.03.02.02.4	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	6 días	9/3/26 08:00	17/3/26 12:00	$ 2,369,185.28
104	01.03.02.02.5	ANDEN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI (210 KG/CM2) PREMEZCLADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO)	10 días	20/3/26 08:00	8/4/26 12:00	$ 6,666,528.00
105	01.03.02.02.6	MALLA ELECTROSOLDADA 0.25X0.25M, D=4MM, 4MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	3 días	20/3/26 08:00	25/3/26 15:00	$ 142,971.52
106	01.03.02.02.7	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	7 días	25/3/26 15:00	8/4/26 12:00	$ 21,741,060.00
107	01.03.02.02.8	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA ESPACIO PÚBLICO	5 días	12/3/26 15:00	19/3/26 17:00	$ 339,020.00
108	01.03.02.02.9	CONCRETO 3000 PSI GRAVA COMÚN PARA PIEZA REMATE TIPO HOMBROS PARA RAMPA (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMIN., BOMBEO CON AUTOBOMBA, FORMALETEO Y COLOCACIÓN. NO INCL. REFUERZO, CURADO).	6 días	25/3/26 15:00	7/4/26 10:00	$ 2,641,889.25
109	01.03.02.02.10	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5	7 días	25/3/26 15:00	8/4/26 12:00	$ 5,073,552.00
110	**01.03.02.03**	**CAPITULO 07: REDES**	**30 días**	**9/3/26 08:00**	**25/4/26 12:00**	**$ 166,567,417.25**
111	01.03.02.03.1	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	5 días	18/3/26 15:00	26/3/26 17:00	$ 16,769,616.53
112	01.03.02.03.2	DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE).	5 días	18/3/26 15:00	26/3/26 17:00	$ 3,696,892.80
113	01.03.02.03.3	DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	5 días	18/3/26 15:00	26/3/26 17:00	$ 911,212.00
114	01.03.02.03.4	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	5 días	18/3/26 15:00	26/3/26 17:00	$ 16,487,837.27

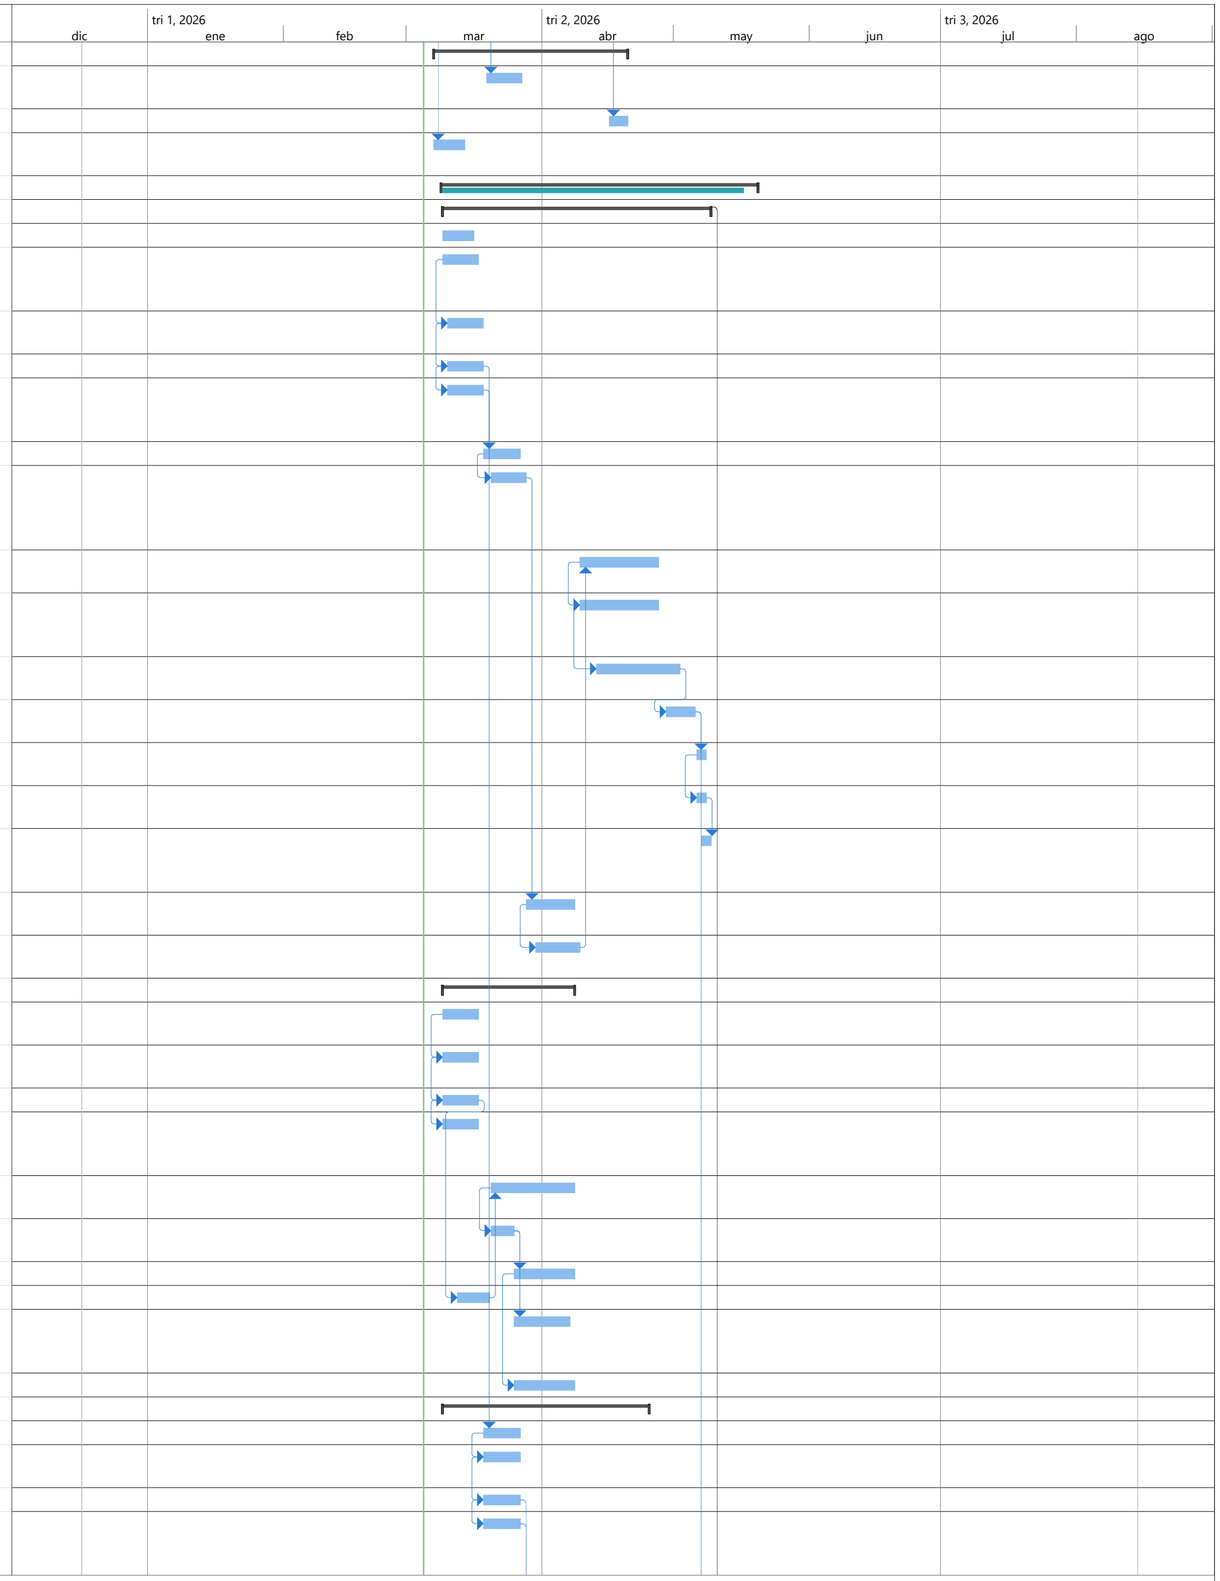

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: 5/3/26 15:07

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Progreso · Progreso manual


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
115	01.03.02.03.5	RELLENO EN TRITURADO DE 3/4`` (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)	5 días	27/3/26 08:00	7/4/26 10:00	$ 3,992,950.08
116	01.03.02.03.6	RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN TRANSPORTE A 28 KM).	5 días	31/3/26 15:00	10/4/26 17:00	$ 20,947,594.52
117	01.03.02.03.7	PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA)	2 días	23/4/26 08:00	25/4/26 12:00	$ 4,569,074.00
118	01.03.02.03.8	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST, ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE 450 N Y 500 N Y PAÑETE IMPERMEAB.)	3 días	18/4/26 10:00	22/4/26 17:00	$ 4,056,102.05
119	01.03.02.03.9	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	6 días	7/4/26 10:00	15/4/26 15:00	$ 12,330,240.00
120	01.03.02.03.1	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	6 días	7/4/26 10:00	15/4/26 15:00	$ 1,285,872.00
121	01.03.02.03.1	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	6 días	7/4/26 10:00	15/4/26 15:00	$ 23,672,812.00
122	01.03.02.03.1	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE TUBERIA PF D=1/2", REGISTROS Y ACCESORIOS, LOG. PROM. = 6.50M).	5 días	15/4/26 15:00	22/4/26 17:00	$ 6,014,164.00
123	01.03.02.03.1	CAJA DE INSPECCION 0.80X0.8M. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (H=0.6M.	5 días	15/4/26 15:00	22/4/26 17:00	$ 19,489,080.00
124	01.03.02.03.1	CONEXIONES KIT SILLA YEE 315 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	5.5 días	9/3/26 08:00	16/3/26 16:00	$ 6,955,546.00
125	01.03.02.03.1	CONEXIONES KIT SILLA YEE 315 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	5.5 días	9/3/26 08:00	16/3/26 16:00	$ 12,635,476.00
126	01.03.02.03.1	CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR. SUMINISTRO E INSTALACION	5 días	15/4/26 15:00	22/4/26 17:00	$ 12,752,948.00
127	**01.03.02.04**	**CAPITULO 08: SEÑALIZACIÓN**	**5 días**	**9/5/26 15:00**	**16/5/26 17:00**	**$ 18,238,928.47**
128	01.03.02.04.1	DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	5 días	9/5/26 15:00	16/5/26 17:00	$ 4,818,000.00
129	01.03.02.04.2	FLECHA DIRECCIONAL "A LA DERECHA" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.51M2	5 días	9/5/26 15:00	16/5/26 17:00	$ 438,040.00
130	01.03.02.04.3	DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)	5 días	9/5/26 15:00	16/5/26 17:00	$ 2,335,815.11
131	01.03.02.04.4	DEMARCACION LINEA DISCONTINUA A=0.12M (E=15 MILS, ACRÍLICA BASE AGUA. INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)	5 días	9/5/26 15:00	16/5/26 17:00	$ 331,760.00
132	01.03.02.04.5	FLECHA DIRECCIONAL "A LA DERECHA" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.51M2	5 días	9/5/26 15:00	16/5/26 17:00	$ 275,600.00
133	01.03.02.04.6	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA DERECHA" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. INC. MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 2.18M2	5 días	9/5/26 15:00	16/5/26 17:00	$ 397,888.00
134	01.03.02.04.7	PINTURA TERMOPLASTICA (E=2.3MM. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS)	5 días	9/5/26 15:00	16/5/26 17:00	$ 2,335,815.11
135	01.03.02.04.8	ESTOPEROLES DE 10 CM X 2.5 CM. SUMINISTRO E INSTALACION.	5 días	9/5/26 15:00	16/5/26 17:00	$ 2,417,576.00
136	01.03.02.04.9	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	5 días	9/5/26 15:00	16/5/26 17:00	$ 1,718,310.00
137	01.03.02.04.1	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	5 días	9/5/26 15:00	16/5/26 17:00	$ 409,943.45
138	01.03.02.04.1	TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	5 días	9/5/26 15:00	16/5/26 17:00	$ 22,562.00
139	01.03.02.04.1	BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 3CM DE ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 1/2", PINTURA DE LARGA DURACIÓN BLANCA Y RESINA EPÓXICA.	5 días	9/5/26 15:00	16/5/26 17:00	$ 2,737,618.80
140	**01.03.02.05**	**CAPITULO 09: NO PREVISTOS**	**27 días**	**27/3/26 08:00**	**9/5/26 15:00**	**$ 163,996,493.76**
141	01.03.02.05.1	ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARALES METÁLICOS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	5 días	11/4/26 08:00	18/4/26 10:00	$ 66,971,844.32
142	01.03.02.05.2	PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCL. SUMIN, INST.)	5 días	11/4/26 08:00	18/4/26 10:00	$ 2,256,928.00
143	01.03.02.05.3	GEOMALLA MULTIAXIAL RESISTENCIA A FLUENCIA 300KN/M	3 días	6/5/26 08:00	9/5/26 15:00	$ 59,686,420.64
144	01.03.02.05.4	SUMIDERO LATERAL SL-150, H=0.85M (PREFABRICADO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE SOBRETAPA Y TAPA)	5 días	27/3/26 08:00	7/4/26 10:00	$ 35,081,300.80
145	**01.03.03**	**CIV 6000857**	**45 días?**	**23/3/26 07:00**	**2/6/26 09:00**	**$ 878,612,797.85**
146	**01.03.03.01**	**CAPITULO 02: RECONSTRUCCION - REHABILITACION VIA PAVIMENTO FLEXIBLE**	**39 días**	**24/3/26 08:00**	**25/5/26 15:00**	**$ 526,887,386.37**
147	01.03.03.01.1	REPLANTEO GENERAL	5 días	24/3/26 08:00	31/3/26 10:00	$ 676,531.36
148	01.03.03.01.2	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA	6 días	24/3/26 08:00	1/4/26 12:00	$ 709,983.89
149	01.03.03.01.3	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	6 días	25/3/26 10:00	6/4/26 15:00	$ 4,342,439.19
150	01.03.03.01.4	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	6 días	25/3/26 10:00	6/4/26 15:00	$ 2,313,402.69
151	01.03.03.01.5	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	6 días	25/3/26 10:00	6/4/26 15:00	$ 18,381,431.33
152	01.03.03.01.6	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	5 días	6/4/26 15:00	13/4/26 17:00	$ 1,309,695.32
153	01.03.03.01.7	ESTABILIZACION O MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON RAJON = 6" A 12" (15 - 30 cm) Y SELLO CON SUBBASE GRANULAR CLASE C - Gr1 (SBGC_Gr1). INCLUYE (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACIÓN MECANICA CON EXCAVADORA MEDIANA SOBRE ORUGAS Y RODILLO VIBROCOMP	5 días	8/4/26 08:00	15/4/26 10:00	$ 14,425,079.67

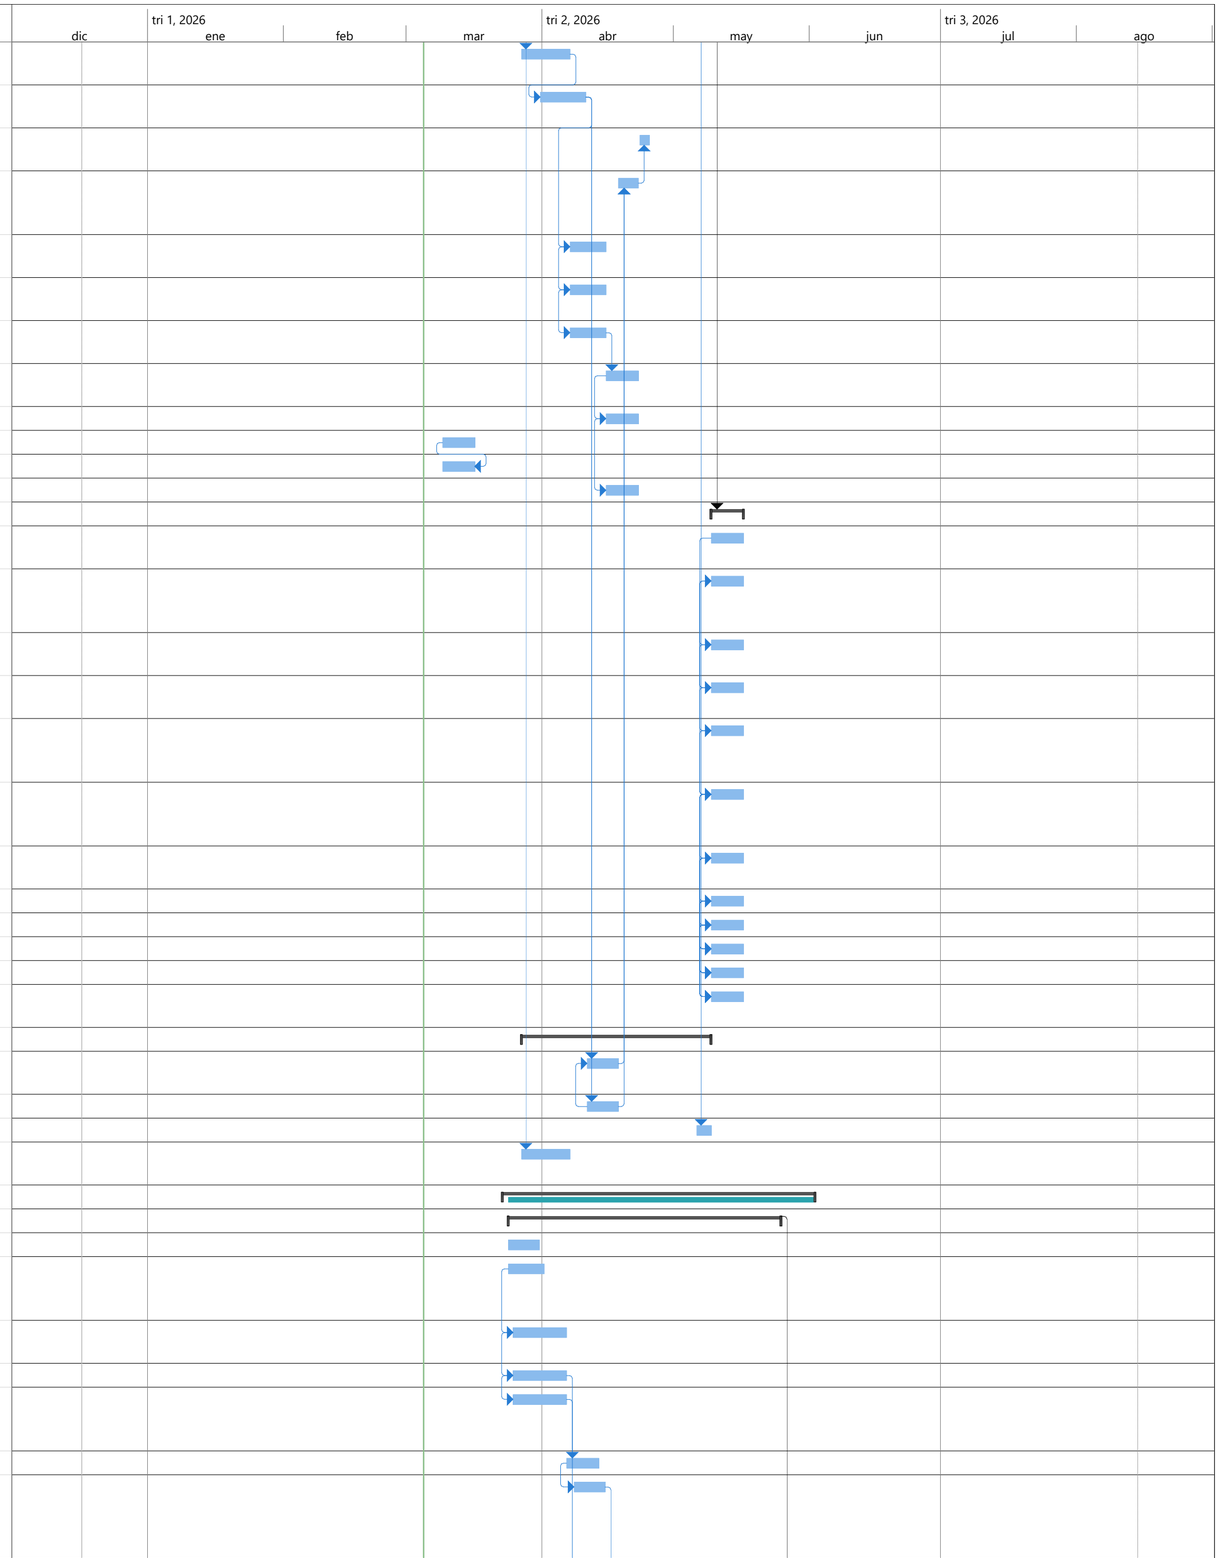

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: 5/3/26 15:07

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · Progreso manual
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Progreso


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
154	01.03.03.01.8	GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD-HDPE) CON ALTURA DE 150 MM. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	12 días	23/4/26 15:00	12/5/26 15:00	$ 54,971,270.47
155	01.03.03.01.9	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 90 KN/M Y 110 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	12 días	23/4/26 15:00	12/5/26 15:00	$ 27,009,910.82
156	01.03.03.01.1	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	13 días	27/4/26 10:00	16/5/26 12:00	$ 24,835,887.42
157	01.03.03.01.1	ESTABILIZACIÓN DE SUB BASE Y BASES GRANULARES CON ADITIVO POTENCIALIZADOR FLEXIBILIZANTE + CEMENTO 5%	4 días	14/5/26 08:00	20/5/26 17:00	$ 70,368,925.92
158	01.03.03.01.1	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	2 días	21/5/26 08:00	23/5/26 12:00	$ 2,378,391.83
159	01.03.03.01.1	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	2 días	21/5/26 08:00	23/5/26 12:00	$ 2,898,181.04
160	01.03.03.01.1	MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE MD12 CON CEMENTO ASFÁLTICO 60-70 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS)	2 días	22/5/26 10:00	25/5/26 15:00	$ 46,358,320.02
161	01.03.03.01.1	MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA)	2 días	22/5/26 10:00	25/5/26 15:00	$ 81,322,755.40
162	01.03.03.01.1	PERFORACIONES EN SECO DE 3" CON PROFUNDIDAD DE 1 METRO (INCLUYE AHOYADOR HIDRÁULICO DE ALTA RESISTENCIA, JUEGO DE BROCAS, OPERARIO Y COMBUSTIBLE)	5 días	15/4/26 10:00	22/4/26 12:00	$ 82,011,034.00
163	01.03.03.01.1	INYECCIÓN DE CAL COMERCIAL AL 6% EN PERFORACIONES EN SECO DE 3" CON COMPACTACIÓN MANUAL DE IMPACTO PARA PROFUNDIDAD DE 1 METRO. (INCLUYE CAL COMERCIAL AL 6%).	5 días	16/4/26 13:00	23/4/26 15:00	$ 92,574,146.00
164	**01.03.03.02**	**CAPITULO 06: ESPACIO PUBLICO EN CONCRETO**	**18 días**	**24/3/26 08:00**	**22/4/26 12:00**	**$ 41,753,071.52**
165	01.03.03.02.1	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	6 días	24/3/26 08:00	1/4/26 12:00	$ 626,976.00
166	01.03.03.02.2	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	6 días	24/3/26 08:00	1/4/26 12:00	$ 1,623,300.00
167	01.03.03.02.3	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	6 días	24/3/26 08:00	1/4/26 12:00	$ 2,300,144.28
168	01.03.03.02.4	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	6 días	24/3/26 08:00	1/4/26 12:00	$ 2,261,495.04
169	01.03.03.02.5	ANDEN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI (210 KG/CM2) PREMEZCLADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO)	10 días	8/4/26 08:00	22/4/26 12:00	$ 6,363,504.00
170	01.03.03.02.6	MALLA ELECTROSOLDADA 0.25X0.25M, D=4MM, 4MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	3 días	8/4/26 08:00	11/4/26 15:00	$ 136,472.82
171	01.03.03.02.7	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	7 días	11/4/26 15:00	22/4/26 12:00	$ 20,752,830.00
172	01.03.03.02.8	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA ESPACIO PÚBLICO	5 días	27/3/26 15:00	7/4/26 17:00	$ 323,610.00
173	01.03.03.02.9	CONCRETO 3000 PSI GRAVA COMÚN PARA PIEZA REMATE TIPO HOMBROS PARA RAMPA (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMIN., BOMBEO CON AUTOBOMBA, FORMALETEO Y COLOCACIÓN. NO INCL. REFUERZO, CURADO).	6 días	11/4/26 15:00	21/4/26 10:00	$ 2,521,803.38
174	01.03.03.02.1	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5	7 días	11/4/26 15:00	22/4/26 12:00	$ 4,842,936.00
175	**01.03.03.03**	**CAPITULO 07: REDES**	**30 días**	**24/3/26 08:00**	**11/5/26 12:00**	**$ 158,442,816.49**
176	01.03.03.03.1	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	5 días	6/4/26 15:00	13/4/26 17:00	$ 16,283,300.31
177	01.03.03.03.2	DEMOLICIÓN MANUAL DE TAPA EXISTENTE DE POZO DE INSPECCIÓN Y REPOSICIÓN TAPA PARA POZO DE D= 0.70 M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	5 días	6/4/26 15:00	13/4/26 17:00	$ 647,916.00
178	01.03.03.03.3	DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE).	5 días	6/4/26 15:00	13/4/26 17:00	$ 3,485,418.00
179	01.03.03.03.4	DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	5 días	6/4/26 15:00	13/4/26 17:00	$ 455,606.00
180	01.03.03.03.5	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	5 días	6/4/26 15:00	13/4/26 17:00	$ 16,009,692.61
181	01.03.03.03.6	RELLENO EN TRITURADO DE 3/4`` (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)	5 días	14/4/26 08:00	21/4/26 10:00	$ 3,849,136.20
182	01.03.03.03.7	RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN TRANSPORTE A 28 KM).	5 días	17/4/26 15:00	24/4/26 17:00	$ 20,910,007.30
183	01.03.03.03.8	PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA)	2 días	8/5/26 08:00	11/5/26 12:00	$ 4,569,074.00
184	01.03.03.03.9	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST, ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE 450 N Y 500 N Y PAÑETE IMPERMEAB.)	3 días	4/5/26 10:00	7/5/26 17:00	$ 4,073,931.07
185	01.03.03.03.1	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	6 días	21/4/26 10:00	29/4/26 15:00	$ 12,561,432.00
186	01.03.03.03.1	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	6 días	21/4/26 10:00	29/4/26 15:00	$ 642,936.00
187	01.03.03.03.1	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	6 días	21/4/26 10:00	29/4/26 15:00	$ 22,140,040.00
188	01.03.03.03.1	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE TUBERIA PF D=1/2", REGISTROS Y ACCESORIOS, LOG. PROM. = 6.50M).	5 días	29/4/26 15:00	7/5/26 17:00	$ 6,245,478.00
189	01.03.03.03.1	CAJA DE INSPECCION 0.80X0.8M. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (H=0.6M.	5 días	29/4/26 15:00	7/5/26 17:00	$ 20,238,660.00
190	01.03.03.03.1	CONEXIONES KIT SILLA YEE 315 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	5.5 días	24/3/26 08:00	31/3/26 16:00	$ 13,086,743.00
191	01.03.03.03.1	CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR. SUMINISTRO E INSTALACION	5 días	29/4/26 15:00	7/5/26 17:00	$ 13,243,446.00

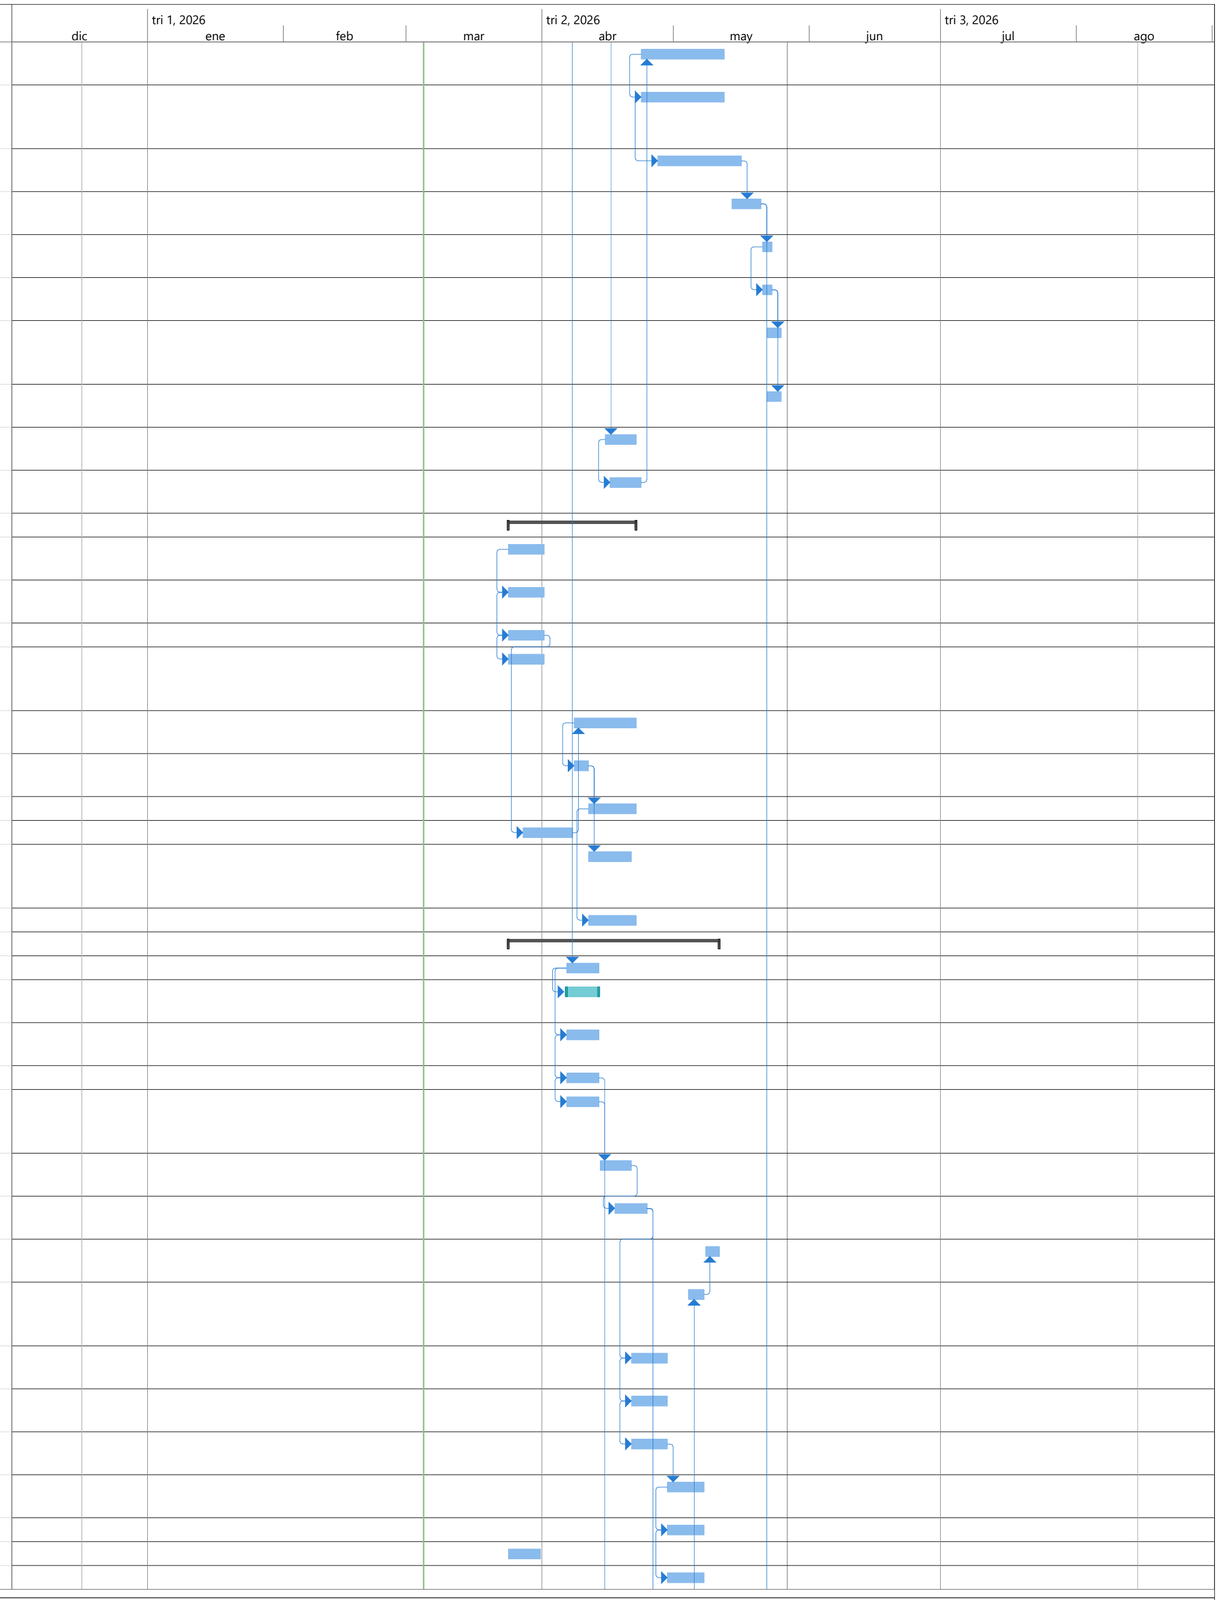

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: 5/3/26 15:07

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
192	**01.03.03.04**	**CAPITULO 08: SEÑALIZACIÓN**	**5 días**	**25/5/26 15:00**	**1/6/26 17:00**	**$ 17,249,206.74**
193	01.03.03.04.1	DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	5 días	25/5/26 15:00	1/6/26 17:00	$ 4,599,000.00
194	01.03.03.04.2	FLECHA DIRECCIONAL "A LA DERECHA" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.51M2	5 días	25/5/26 15:00	1/6/26 17:00	$ 438,040.00
195	01.03.03.04.3	DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)	5 días	25/5/26 15:00	1/6/26 17:00	$ 2,335,815.11
196	01.03.03.04.4	DEMARCACION LINEA DISCONTINUA A=0.12M (E=15 MILS, ACRÍLICA BASE AGUA. INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)	5 días	25/5/26 15:00	1/6/26 17:00	$ 316,680.00
197	01.03.03.04.5	FLECHA DIRECCIONAL "A LA DERECHA" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.51M2	5 días	25/5/26 15:00	1/6/26 17:00	$ 275,600.00
198	01.03.03.04.6	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA DERECHA" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. INC. MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 2.18M2	5 días	25/5/26 15:00	1/6/26 17:00	$ 397,888.00
199	01.03.03.04.7	PINTURA TERMOPLASTICA (E=2.3MM. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS)	5 días	25/5/26 15:00	1/6/26 17:00	$ 2,335,815.11
200	01.03.03.04.8	ESTOPEROLES DE 10 CM X 2.5 CM. SUMINISTRO E INSTALACION.	5 días	25/5/26 15:00	1/6/26 17:00	$ 2,102,240.00
201	01.03.03.04.9	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	5 días	25/5/26 15:00	1/6/26 17:00	$ 1,640,205.00
202	01.03.03.04.1	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	5 días	25/5/26 15:00	1/6/26 17:00	$ 409,943.45
203	01.03.03.04.1	TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	5 días	25/5/26 15:00	1/6/26 17:00	$ 22,562.00
204	01.03.03.04.1	BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 3CM DE ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 1/2", PINTURA DE LARGA DURACIÓN BLANCA Y RESINA EPÓXICA.	5 días	25/5/26 15:00	1/6/26 17:00	$ 2,375,418.07
205	**01.03.03.05**	**CAPITULO 09: NO PREVISTOS**	**27 días**	**14/4/26 08:00**	**25/5/26 15:00**	**$ 134,280,316.73**
206	01.03.03.05.1	ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARALES METÁLICOS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	5 días	25/4/26 08:00	4/5/26 10:00	$ 65,047,204.28
207	01.03.03.05.2	PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCL. SUMIN, INST.)	5 días	25/4/26 08:00	4/5/26 10:00	$ 2,256,928.00
208	01.03.03.05.3	GEOMALLA MULTIAXIAL RESISTENCIA A FLUENCIA 300KN/M	3 días	21/5/26 08:00	25/5/26 15:00	$ 49,435,534.05
209	01.03.03.05.4	SUMIDERO LATERAL SL-150, H=0.85M (PREFABRICADO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE SOBRETAPA Y TAPA)	5 días	14/4/26 08:00	21/4/26 10:00	$ 17,540,650.40
210	**01.03.04**	**CIV 6000830**	**45 días?**	**6/4/26 07:00**	**13/6/26 09:00**	**$ 489,624,246.74**
211	**01.03.04.01**	**CAPITULO 02: RECONSTRUCCION - REHABILITACION VIA PAVIMENTO FLEXIBLE**	**39 días**	**6/4/26 08:00**	**3/6/26 15:00**	**$ 267,954,135.59**
212	01.03.04.01.1	REPLANTEO GENERAL	5 días	6/4/26 08:00	13/4/26 10:00	$ 359,268.00
213	01.03.04.01.2	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA	6 días	6/4/26 08:00	14/4/26 12:00	$ 345,708.00
214	01.03.04.01.3	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	6 días	7/4/26 10:00	15/4/26 15:00	$ 2,306,026.80
215	01.03.04.01.4	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	6 días	7/4/26 10:00	15/4/26 15:00	$ 1,183,018.20
216	01.03.04.01.5	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	6 días	7/4/26 10:00	15/4/26 15:00	$ 9,399,819.52
217	01.03.04.01.6	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	5 días	15/4/26 15:00	22/4/26 17:00	$ 695,506.00
218	01.03.04.01.7	ESTABILIZACION O MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON RAJON = 6" A 12" (15 - 30 cm) Y SELLO CON SUBBASE GRANULAR CLASE C - Gr1 (SBGC_Gr1). INCLUYE (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACIÓN MECANICA CON EXCAVADORA MEDIANA SOBRE ORUGAS Y RODILLO VIBROCOMP	5 días	17/4/26 08:00	24/4/26 10:00	$ 7,660,353.75
219	01.03.04.01.8	GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD-HDPE) CON ALTURA DE 150 MM. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	12 días	4/5/26 15:00	22/5/26 15:00	$ 29,192,170.00
220	01.03.04.01.9	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 90 KN/M Y 110 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	12 días	4/5/26 15:00	22/5/26 15:00	$ 14,016,904.00
221	01.03.04.01.10	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	13 días	7/5/26 10:00	27/5/26 12:00	$ 13,188,952.00
222	01.03.04.01.11	ESTABILIZACIÓN DE SUB BASE Y BASES GRANULARES CON ADITIVO POTENCIALIZADOR FLEXIBILIZANTE + CEMENTO 5%	4 días	25/5/26 08:00	29/5/26 17:00	$ 37,369,004.40
223	01.03.04.01.12	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	2 días	30/5/26 08:00	2/6/26 12:00	$ 1,263,031.00
224	01.03.04.01.13	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	2 días	30/5/26 08:00	2/6/26 12:00	$ 1,539,062.00
225	01.03.04.01.14	MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE MD12 CON CEMENTO ASFÁLTICO 60-70 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS)	2 días	1/6/26 10:00	3/6/26 15:00	$ 59,083,951.92
226	01.03.04.01.15	PERFORACIONES EN SECO DE 3" CON PROFUNDIDAD DE 1 METRO (INCLUYE AHOYADOR HIDRÁULICO DE ALTA RESISTENCIA, JUEGO DE BROCAS, OPERARIO Y COMBUSTIBLE)	5 días	24/4/26 10:00	2/5/26 12:00	$ 42,442,368.00
227	01.03.04.01.16	INYECCIÓN DE CAL COMERCIAL AL 6% EN PERFORACIONES EN SECO DE 3" CON COMPACTACIÓN MANUAL DE IMPACTO PARA PROFUNDIDAD DE 1 METRO. (INCLUYE CAL COMERCIAL AL 6%).	5 días	25/4/26 13:00	4/5/26 15:00	$ 47,908,992.00
228	**01.03.04.02**	**CAPITULO 06: ESPACIO PUBLICO EN CONCRETO**	**18 días**	**6/4/26 08:00**	**2/5/26 12:00**	**$ 18,689,470.11**
229	01.03.04.02.1	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	6 días	6/4/26 08:00	14/4/26 12:00	$ 280,646.40

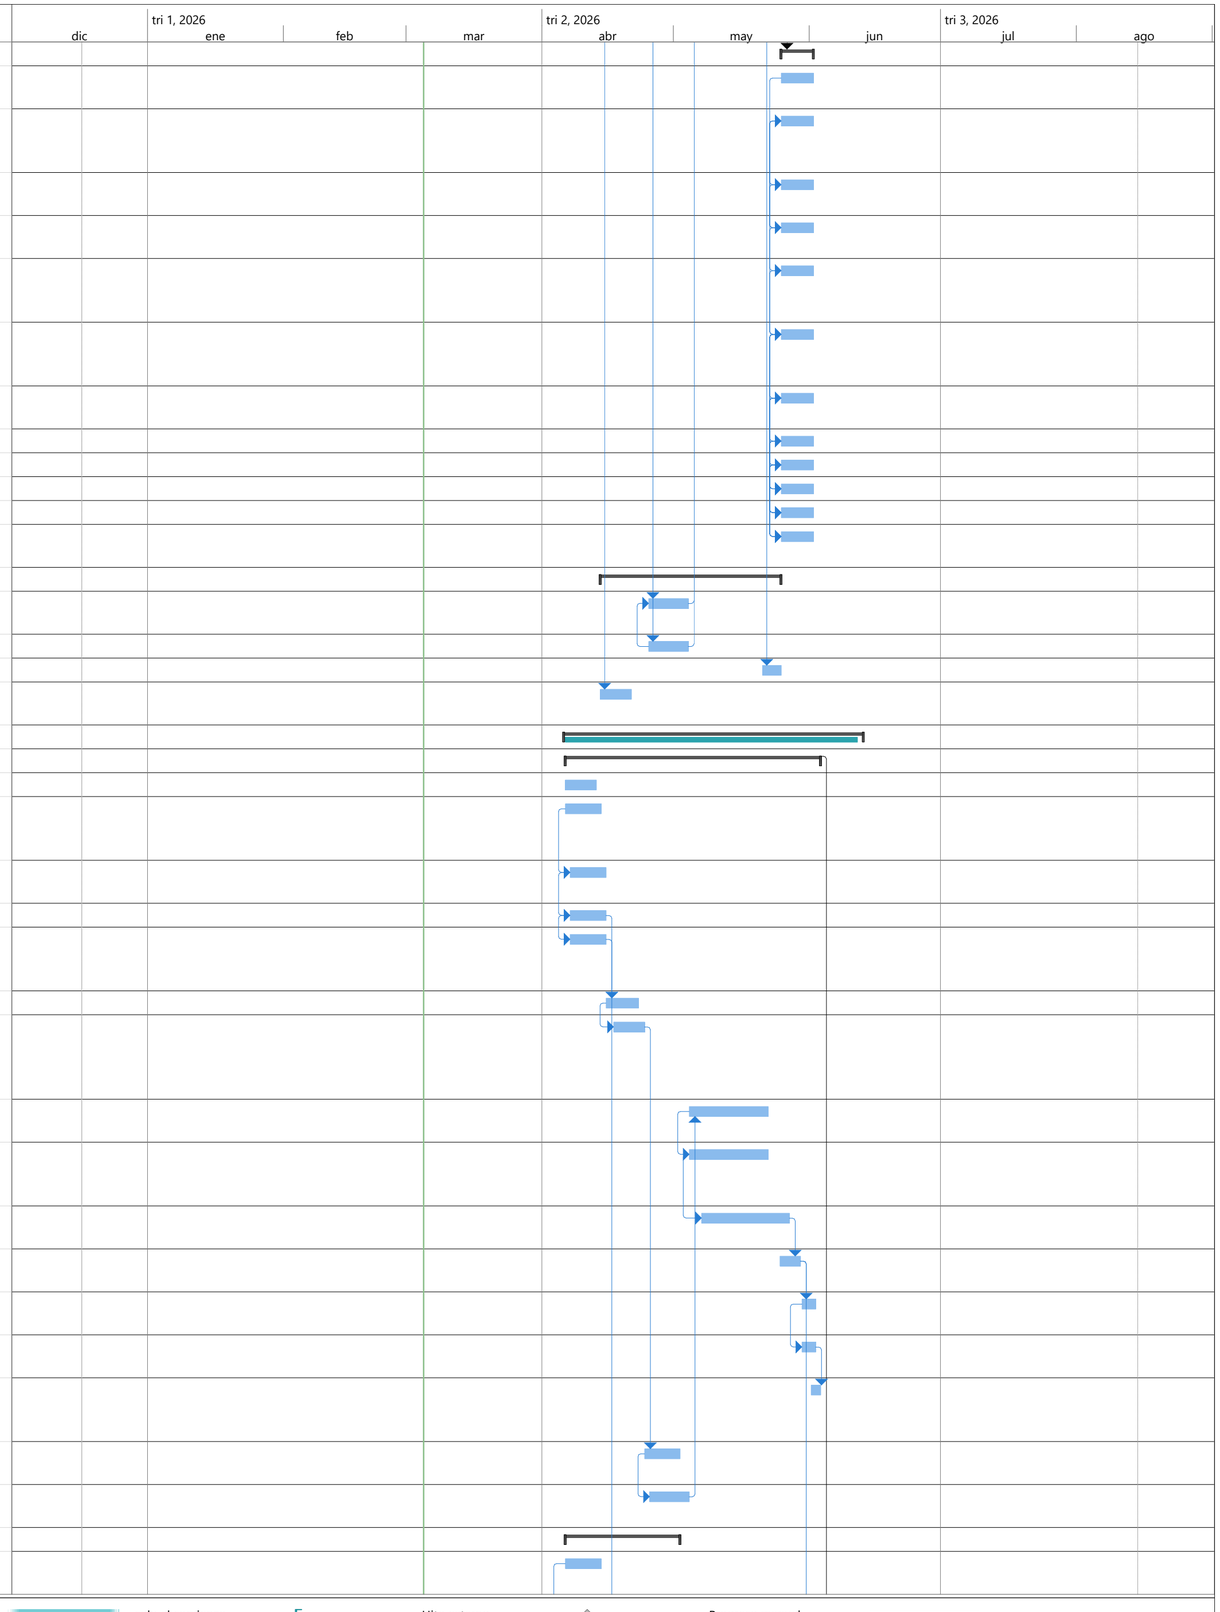

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: 5/3/26 15:07

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · Progreso manual
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Progreso


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
230	01.03.04.02.2	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	6 días	6/4/26 08:00	14/4/26 12:00	$ 726,620.00
231	01.03.04.02.3	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	6 días	6/4/26 08:00	14/4/26 12:00	$ 1,029,588.39
232	01.03.04.02.4	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	6 días	6/4/26 08:00	14/4/26 12:00	$ 1,012,288.26
233	01.03.04.02.5	ANDEN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI (210 KG/CM2) PREMEZCLADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO)	10 días	17/4/26 08:00	2/5/26 12:00	$ 2,848,425.60
234	01.03.04.02.6	MALLA ELECTROSOLDADA 0.25X0.25M, D=4MM, 4MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	3 días	17/4/26 08:00	21/4/26 15:00	$ 61,087.83
235	01.03.04.02.7	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	7 días	21/4/26 15:00	2/5/26 12:00	$ 9,289,362.00
236	01.03.04.02.8	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA ESPACIO PÚBLICO	5 días	9/4/26 15:00	16/4/26 17:00	$ 144,854.00
237	01.03.04.02.9	CONCRETO 3000 PSI GRAVA COMÚN PARA PIEZA REMATE TIPO HOMBROS PARA RAMPA (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMIN., BOMBEO CON AUTOBOMBA, FORMALETEO Y COLOCACIÓN. NO INCL. REFUERZO, CURADO).	6 días	21/4/26 15:00	30/4/26 10:00	$ 1,128,807.23
238	01.03.04.02.10	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5	7 días	21/4/26 15:00	2/5/26 12:00	$ 2,167,790.40
239	**01.03.04.03**	**CAPITULO 07: REDES**	**30 días**	**6/4/26 08:00**	**21/5/26 12:00**	**$ 95,391,044.39**
240	01.03.04.03.1	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	5 días	15/4/26 15:00	22/4/26 17:00	$ 8,945,429.31
241	01.03.04.03.2	DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE).	5 días	15/4/26 15:00	22/4/26 17:00	$ 1,708,115.90
242	01.03.04.03.3	DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	5 días	15/4/26 15:00	22/4/26 17:00	$ 683,409.00
243	01.03.04.03.4	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	5 días	15/4/26 15:00	22/4/26 17:00	$ 8,795,119.59
244	01.03.04.03.5	RELLENO EN TRITURADO DE 3/4`` (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)	5 días	23/4/26 08:00	30/4/26 10:00	$ 1,844,906.49
245	01.03.04.03.6	RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN TRANSPORTE A 28 KM).	5 días	27/4/26 15:00	5/5/26 17:00	$ 12,491,020.37
246	01.03.04.03.7	PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA)	2 días	19/5/26 08:00	21/5/26 12:00	$ 9,138,148.00
247	01.03.04.03.8	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST, ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE 450 N Y 500 N Y PAÑETE IMPERMEAB.)	3 días	13/5/26 10:00	16/5/26 17:00	$ 10,233,857.48
248	01.03.04.03.9	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	6 días	30/4/26 10:00	9/5/26 15:00	$ 5,548,608.00
249	01.03.04.03.10	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	6 días	30/4/26 10:00	9/5/26 15:00	$ 964,404.00
250	01.03.04.03.11	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	6 días	30/4/26 10:00	9/5/26 15:00	$ 10,612,317.25
251	01.03.04.03.12	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE TUBERIA PF D=1/2", REGISTROS Y ACCESORIOS, LOG. PROM. = 6.50M).	5 días	9/5/26 15:00	16/5/26 17:00	$ 2,775,768.00
252	01.03.04.03.13	CAJA DE INSPECCION 0.80X0.8M. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (H=0.6M.	5 días	9/5/26 15:00	16/5/26 17:00	$ 8,994,960.00
253	01.03.04.03.14	CONEXIONES KIT SILLA YEE 315 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	5.5 días	6/4/26 08:00	13/4/26 16:00	$ 6,769,005.00
254	01.03.04.03.15	CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR. SUMINISTRO E INSTALACION	5 días	9/5/26 15:00	16/5/26 17:00	$ 5,885,976.00
255	**01.03.04.04**	**CAPITULO 08: SEÑALIZACIÓN**	**5 días**	**3/6/26 15:00**	**11/6/26 17:00**	**$ 14,491,027.67**
256	01.03.04.04.1	DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	5 días	3/6/26 15:00	11/6/26 17:00	$ 2,058,600.00
257	01.03.04.04.2	FLECHA DIRECCIONAL "A LA DERECHA" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.51M2	5 días	3/6/26 15:00	11/6/26 17:00	$ 438,040.00
258	01.03.04.04.3	DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)	5 días	3/6/26 15:00	11/6/26 17:00	$ 2,335,815.11
259	01.03.04.04.4	DEMARCACION LINEA DISCONTINUA A=0.12M (E=15 MILS, ACRÍLICA BASE AGUA. INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)	5 días	3/6/26 15:00	11/6/26 17:00	$ 141,752.00
260	01.03.04.04.5	FLECHA DIRECCIONAL "A LA DERECHA" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.51M2	5 días	3/6/26 15:00	11/6/26 17:00	$ 275,600.00
261	01.03.04.04.6	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA DERECHA" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. INC. MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 2.18M2	5 días	3/6/26 15:00	11/6/26 17:00	$ 397,888.00
262	01.03.04.04.7	PINTURA TERMOPLASTICA (E=2.3MM. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS)	5 días	3/6/26 15:00	11/6/26 17:00	$ 2,335,815.11
263	01.03.04.04.8	ESTOPEROLES DE 10 CM X 2.5 CM. SUMINISTRO E INSTALACION.	5 días	3/6/26 15:00	11/6/26 17:00	$ 2,522,688.00
264	01.03.04.04.9	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	5 días	3/6/26 15:00	11/6/26 17:00	$ 734,187.00
265	01.03.04.04.10	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	5 días	3/6/26 15:00	11/6/26 17:00	$ 409,943.45
266	01.03.04.04.11	TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	5 días	3/6/26 15:00	11/6/26 17:00	$ 22,562.00
267	01.03.04.04.12	BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 3CM DE ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 1/2", PINTURA DE LARGA DURACIÓN BLANCA Y RESINA EPÓXICA.	5 días	3/6/26 15:00	11/6/26 17:00	$ 2,818,137.00
268	**01.03.04.05**	**CAPITULO 09: NO PREVISTOS**	**27 días**	**23/4/26 08:00**	**3/6/26 15:00**	**$ 93,098,568.98**

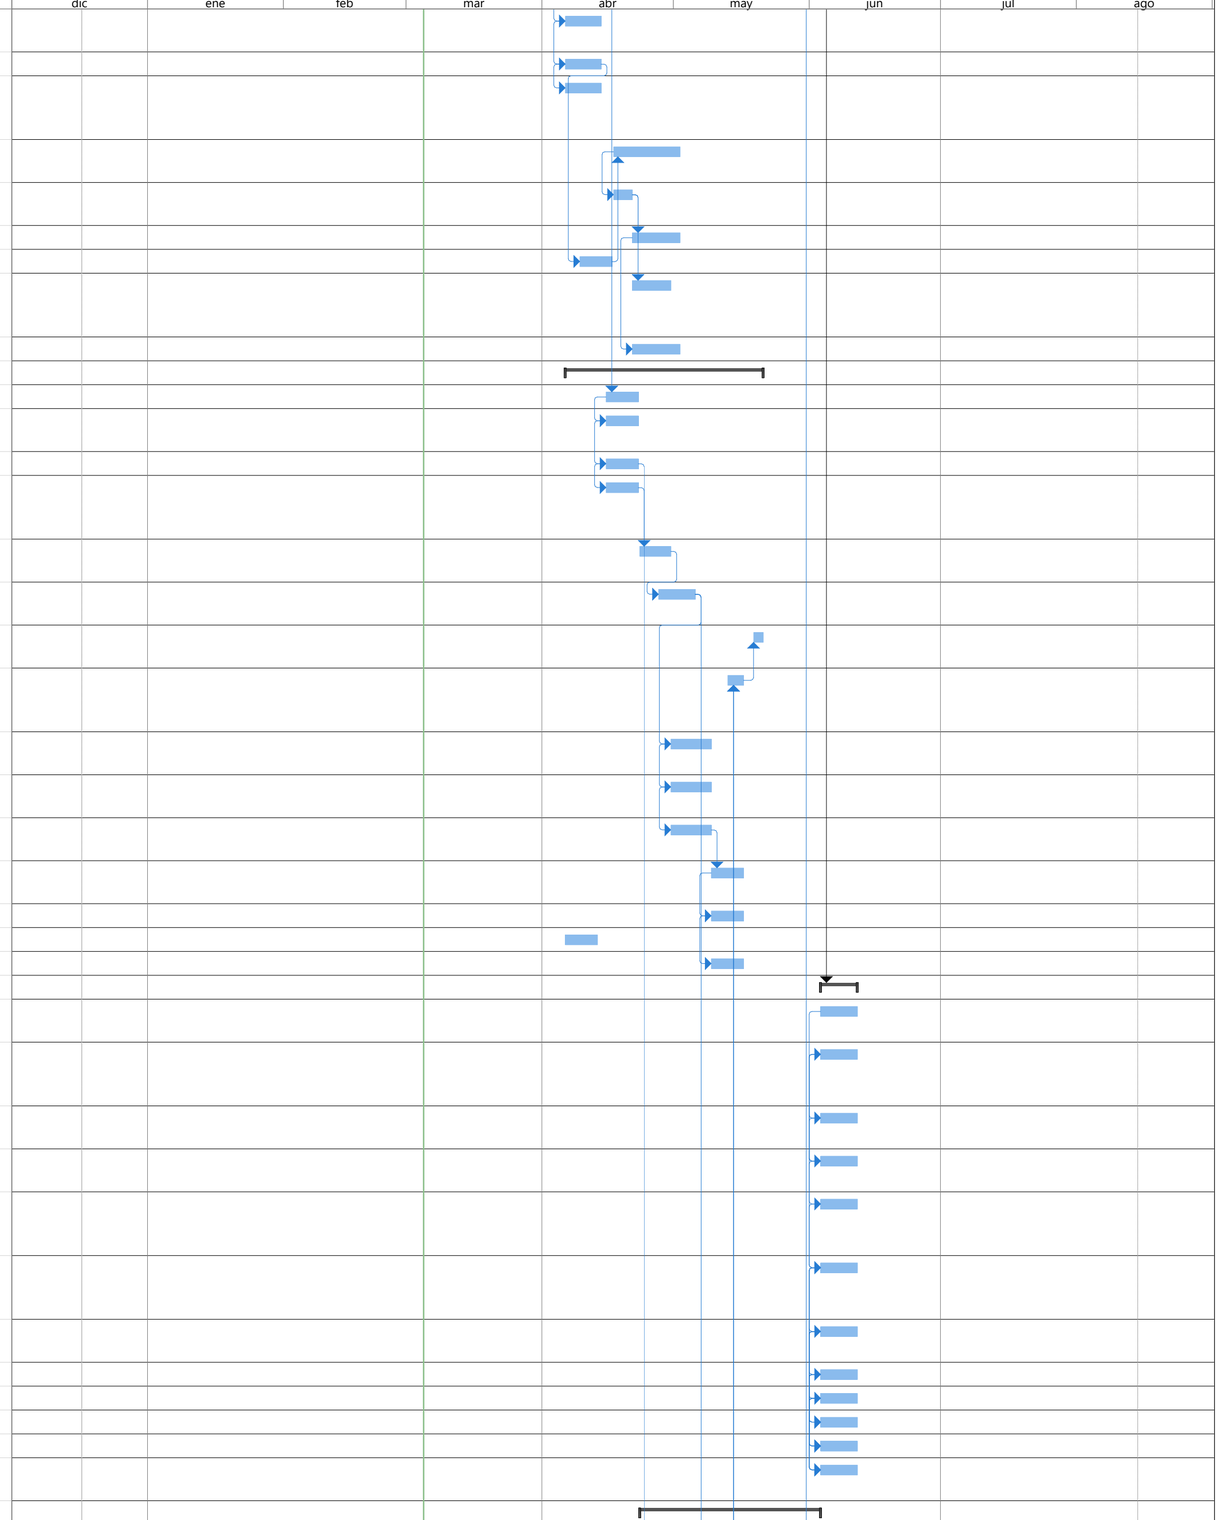

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: 5/3/26 15:07

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · Progreso manual
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Progreso


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
269	01.03.04.05.1	ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARALES METÁLICOS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	5 días	6/5/26 08:00	13/5/26 10:00	$ 36,021,287.66
270	01.03.04.05.2	PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCL. SUMIN, INST.)	5 días	6/5/26 08:00	13/5/26 10:00	$ 4,513,856.00
271	01.03.04.05.3	GEOMALLA MULTIAXIAL RESISTENCIA A FLUENCIA 300KN/M	3 días	30/5/26 08:00	3/6/26 15:00	$ 26,252,449.72
272	01.03.04.05.4	SUMIDERO LATERAL SL-150, H=0.85M (PREFABRICADO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE SOBRETAPA Y TAPA)	5 días	23/4/26 08:00	30/4/26 10:00	$ 26,310,975.60
273	**01.03.05**	**CIV 6000786**	**45 días?**	**30/4/26 07:00**	**10/7/26 09:00**	**$ 317,277,939.75**
274	**01.03.05.01**	**CAPITULO 02: RECONSTRUCCION - REHABILITACION VIA PAVIMENTO FLEXIBLE**	**39 días**	**30/4/26 08:00**	**1/7/26 15:00**	**$ 190,693,777.03**
275	01.03.05.01.1	REPLANTEO GENERAL	5 días	30/4/26 08:00	8/5/26 10:00	$ 248,430.00
276	01.03.05.01.2	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA	6 días	30/4/26 08:00	9/5/26 12:00	$ 265,683.00
277	01.03.05.01.3	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	6 días	2/5/26 10:00	11/5/26 15:00	$ 1,594,593.00
278	01.03.05.01.4	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	6 días	2/5/26 10:00	11/5/26 15:00	$ 818,044.50
279	01.03.05.01.5	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	6 días	2/5/26 10:00	11/5/26 15:00	$ 6,499,875.20
280	01.03.05.01.6	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	5 días	11/5/26 15:00	19/5/26 17:00	$ 480,935.00
281	01.03.05.01.7	ESTABILIZACION O MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON RAJON = 6" A 12" (15 - 30 cm) Y SELLO CON SUBBASE GRANULAR CLASE C - Gr1 (SBGC_Gr1). INCLUYE (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACIÓN MECANICA CON EXCAVADORA MEDIANA SOBRE ORUGAS Y RODILLO VIBROCOMP	5 días	13/5/26 08:00	21/5/26 10:00	$ 5,297,053.13
282	01.03.05.01.8	GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD-HDPE) CON ALTURA DE 150 MM. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	12 días	29/5/26 15:00	18/6/26 15:00	$ 20,186,075.00
283	01.03.05.01.9	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 90 KN/M Y 110 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	12 días	29/5/26 15:00	18/6/26 15:00	$ 9,785,737.50
284	01.03.05.01.10	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	13 días	2/6/26 10:00	23/6/26 12:00	$ 9,120,020.00
285	01.03.05.01.11	ESTABILIZACIÓN DE SUB BASE Y BASES GRANULARES CON ADITIVO POTENCIALIZADOR FLEXIBILIZANTE + CEMENTO 5%	4 días	20/6/26 08:00	25/6/26 17:00	$ 25,840,269.00
286	01.03.05.01.12	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	2 días	26/6/26 08:00	30/6/26 12:00	$ 873,372.50
287	01.03.05.01.13	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	2 días	26/6/26 08:00	30/6/26 12:00	$ 1,064,245.00
288	01.03.05.01.14	MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE MD12 CON CEMENTO ASFÁLTICO 60-70 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS)	2 días	27/6/26 10:00	1/7/26 15:00	$ 40,855,924.20
289	01.03.05.01.15	PERFORACIONES EN SECO DE 3" CON PROFUNDIDAD DE 1 METRO (INCLUYE AHOYADOR HIDRÁULICO DE ALTA RESISTENCIA, JUEGO DE BROCAS, OPERARIO Y COMBUSTIBLE)	5 días	21/5/26 10:00	28/5/26 12:00	$ 31,831,776.00
290	01.03.05.01.16	INYECCIÓN DE CAL COMERCIAL AL 6% EN PERFORACIONES EN SECO DE 3" CON COMPACTACIÓN MANUAL DE IMPACTO PARA PROFUNDIDAD DE 1 METRO. (INCLUYE CAL COMERCIAL AL 6%).	5 días	22/5/26 13:00	29/5/26 15:00	$ 35,931,744.00
291	**01.03.05.02**	**CAPITULO 06: ESPACIO PUBLICO EN CONCRETO**	**18 días**	**30/4/26 08:00**	**28/5/26 12:00**	**$ 13,917,690.51**
292	01.03.05.02.1	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	6 días	30/4/26 08:00	9/5/26 12:00	$ 208,992.00
293	01.03.05.02.2	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	6 días	30/4/26 08:00	9/5/26 12:00	$ 541,100.00
294	01.03.05.02.3	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	6 días	30/4/26 08:00	9/5/26 12:00	$ 766,714.76
295	01.03.05.02.4	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	6 días	30/4/26 08:00	9/5/26 12:00	$ 753,831.68
296	01.03.05.02.5	ANDEN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI (210 KG/CM2) PREMEZCLADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO)	10 días	13/5/26 08:00	28/5/26 12:00	$ 2,121,168.00
297	01.03.05.02.6	MALLA ELECTROSOLDADA 0.25X0.25M, D=4MM, 4MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	3 días	13/5/26 08:00	16/5/26 15:00	$ 45,490.94
298	01.03.05.02.7	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	7 días	16/5/26 15:00	28/5/26 12:00	$ 6,917,610.00
299	01.03.05.02.8	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA ESPACIO PÚBLICO	5 días	5/5/26 15:00	12/5/26 17:00	$ 107,870.00
300	01.03.05.02.9	CONCRETO 3000 PSI GRAVA COMÚN PARA PIEZA REMATE TIPO HOMBROS PARA RAMPA (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMIN., BOMBEO CON AUTOBOMBA, FORMALETEO Y COLOCACIÓN. NO INCL. REFUERZO, CURADO).	6 días	16/5/26 15:00	27/5/26 10:00	$ 840,601.13
301	01.03.05.02.10	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5	7 días	16/5/26 15:00	28/5/26 12:00	$ 1,614,312.00
302	**01.03.05.03**	**CAPITULO 07: REDES**	**30 días**	**30/4/26 08:00**	**17/6/26 12:00**	**$ 55,958,719.94**
303	01.03.05.03.1	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	5 días	11/5/26 15:00	19/5/26 17:00	$ 5,449,151.33
304	01.03.05.03.2	DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE).	5 días	11/5/26 15:00	19/5/26 17:00	$ 1,272,895.54
305	01.03.05.03.3	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	5 días	11/5/26 15:00	19/5/26 17:00	$ 5,357,589.44
306	01.03.05.03.4	RELLENO EN TRITURADO DE 3/4`` (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)	5 días	20/5/26 08:00	27/5/26 10:00	$ 1,374,832.49

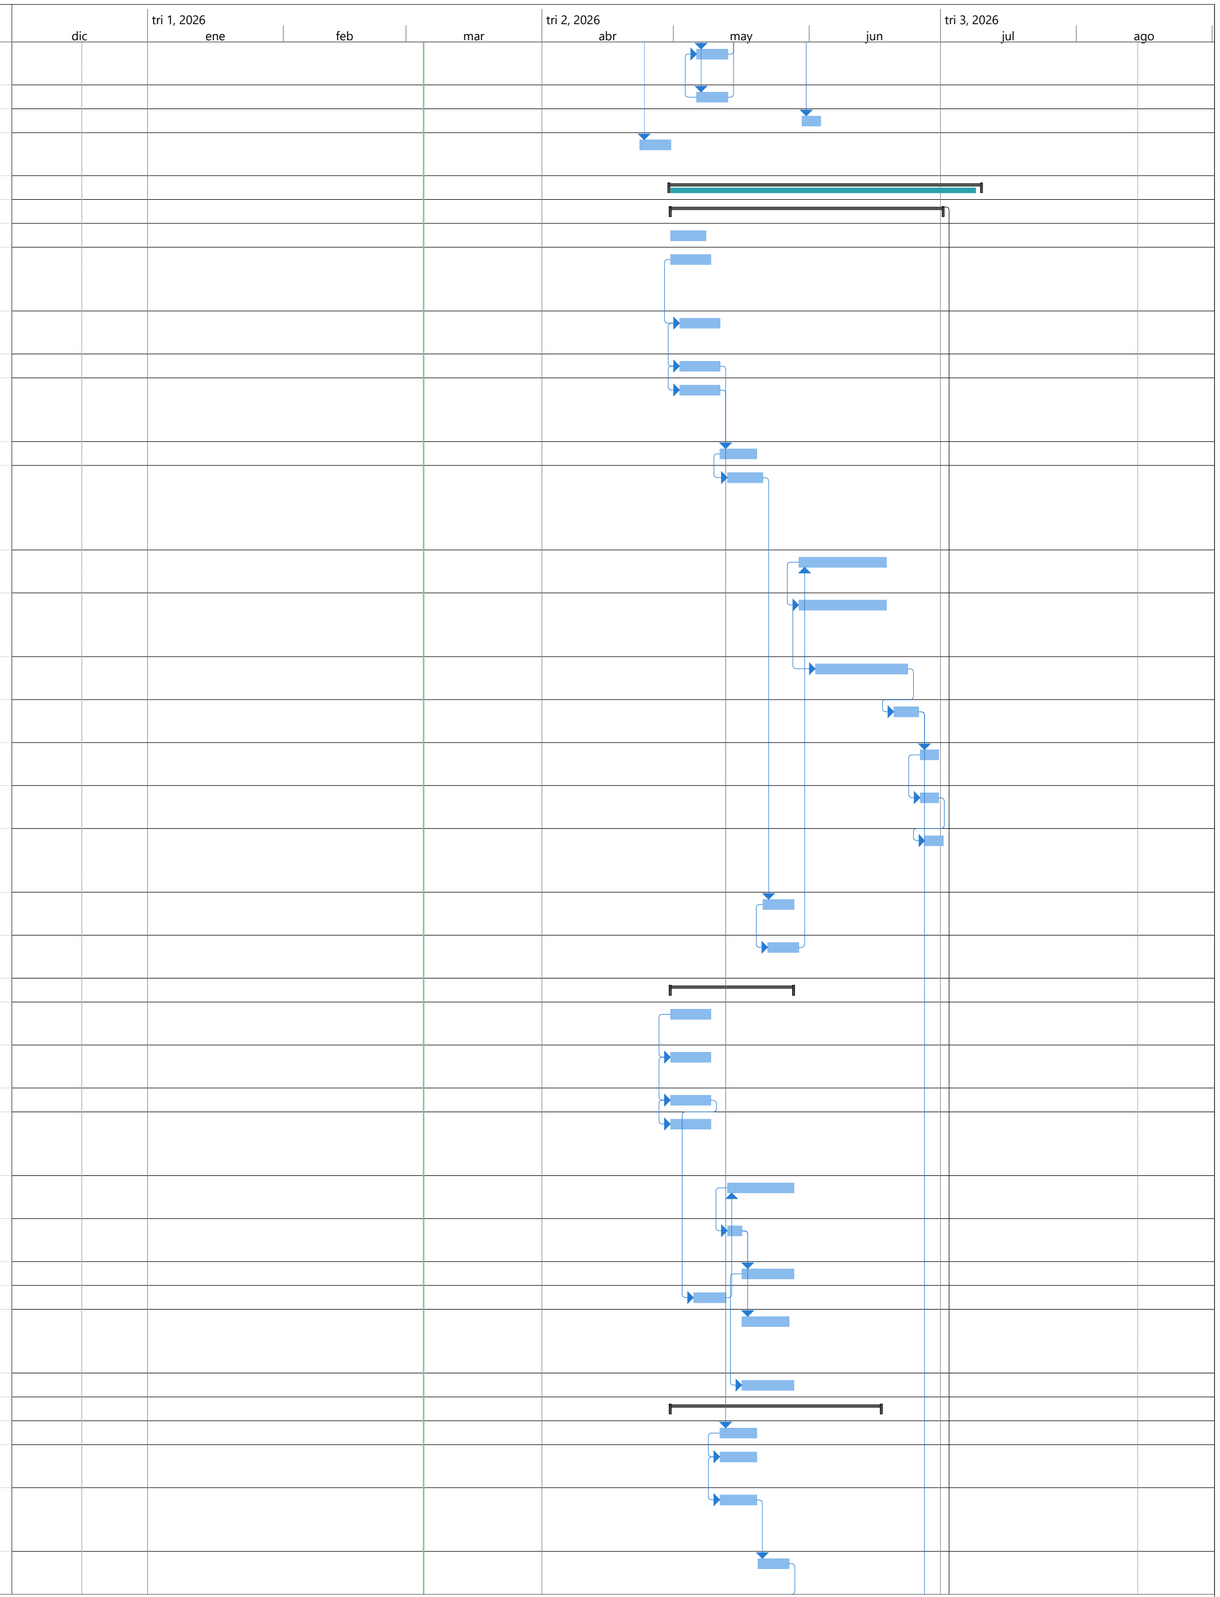

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: 5/3/26 15:07

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · Progreso manual
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Progreso


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
307	01.03.05.03.5	RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN TRANSPORTE A 28 KM).	5 días	23/5/26 15:00	30/5/26 17:00	$ 7,242,418.06
308	01.03.05.03.6	PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA)	2 días	13/6/26 08:00	17/6/26 12:00	$ 4,569,074.00
309	01.03.05.03.7	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST, ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE 450 N Y 500 N Y PAÑETE IMPERMEAB.)	3 días	9/6/26 10:00	12/6/26 17:00	$ 3,949,127.93
310	01.03.05.03.8	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	6 días	27/5/26 10:00	4/6/26 15:00	$ 3,544,944.00
311	01.03.05.03.9	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	6 días	27/5/26 10:00	4/6/26 15:00	$ 7,817,415.15
312	01.03.05.03.1	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE TUBERIA PF D=1/2", REGISTROS Y ACCESORIOS, LOG. PROM. = 6.50M).	5 días	30/4/26 08:00	8/5/26 10:00	$ 1,850,512.00
313	01.03.05.03.1	CAJA DE INSPECCION 0.80X0.8M. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (H=0.6M.	5 días	30/4/26 08:00	8/5/26 10:00	$ 5,996,640.00
314	01.03.05.03.1	CONEXIONES KIT SILLA YEE 315 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	5.5 días	30/4/26 08:00	8/5/26 16:00	$ 3,610,136.00
315	01.03.05.03.1	CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR. SUMINISTRO E INSTALACION	5 días	30/4/26 08:00	8/5/26 10:00	$ 3,923,984.00
316	**01.03.05.04**	**CAPITULO 08: SEÑALIZACIÓN**	**5 días**	**1/7/26 15:00**	**8/7/26 17:00**	**$ 13,330,264.17**
317	01.03.05.04.1	DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	5 días	1/7/26 15:00	8/7/26 17:00	$ 1,533,000.00
318	01.03.05.04.2	FLECHA DIRECCIONAL "A LA DERECHA" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.51M2	5 días	1/7/26 15:00	8/7/26 17:00	$ 438,040.00
319	01.03.05.04.3	DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)	5 días	1/7/26 15:00	8/7/26 17:00	$ 2,335,815.11
320	01.03.05.04.4	DEMARCACION LINEA DISCONTINUA A=0.12M (E=15 MILS, ACRÍLICA BASE AGUA. INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)	5 días	1/7/26 15:00	8/7/26 17:00	$ 105,560.00
321	01.03.05.04.5	FLECHA DIRECCIONAL "A LA DERECHA" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.51M2	5 días	1/7/26 15:00	8/7/26 17:00	$ 275,600.00
322	01.03.05.04.6	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA DERECHA" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. INC. MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 2.18M2	5 días	1/7/26 15:00	8/7/26 17:00	$ 397,888.00
323	01.03.05.04.7	PINTURA TERMOPLASTICA (E=2.3MM. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS)	5 días	1/7/26 15:00	8/7/26 17:00	$ 2,335,815.11
324	01.03.05.04.8	ESTOPEROLES DE 10 CM X 2.5 CM. SUMINISTRO E INSTALACION.	5 días	1/7/26 15:00	8/7/26 17:00	$ 2,312,464.00
325	01.03.05.04.9	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	5 días	1/7/26 15:00	8/7/26 17:00	$ 546,735.00
326	01.03.05.04.1	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	5 días	1/7/26 15:00	8/7/26 17:00	$ 409,943.45
327	01.03.05.04.1	TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	5 días	1/7/26 15:00	8/7/26 17:00	$ 22,562.00
328	01.03.05.04.1	BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 3CM DE ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 1/2", PINTURA DE LARGA DURACIÓN BLANCA Y RESINA EPÓXICA.	5 días	1/7/26 15:00	8/7/26 17:00	$ 2,616,841.50
329	**01.03.05.05**	**CAPITULO 09: NO PREVISTOS**	**19 días**	**1/6/26 08:00**	**1/7/26 15:00**	**$ 43,377,488.10**
330	01.03.05.05.1	ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARALES METÁLICOS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	5 días	1/6/26 08:00	9/6/26 10:00	$ 22,967,270.40
331	01.03.05.05.2	PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCL. SUMIN, INST.)	5 días	1/6/26 08:00	9/6/26 10:00	$ 2,256,928.00
332	01.03.05.05.3	GEOMALLA MULTIAXIAL RESISTENCIA A FLUENCIA 300KN/M	3 días	26/6/26 08:00	1/7/26 15:00	$ 18,153,289.70
333	**01.03.06**	**CIV 6000789**	**45 días?**	**4/5/26 07:00**	**13/7/26 09:00**	**$ 915,951,265.25**
334	**01.03.06.01**	**CAPITULO 02: RECONSTRUCCION - REHABILITACION VIA PAVIMENTO FLEXIBLE**	**39 días**	**4/5/26 08:00**	**3/7/26 15:00**	**$ 525,094,198.70**
335	01.03.06.01.1	REPLANTEO GENERAL	5 días	4/5/26 08:00	11/5/26 10:00	$ 666,139.11
336	01.03.06.01.2	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA	6 días	4/5/26 08:00	12/5/26 12:00	$ 697,321.85
337	01.03.06.01.3	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	6 días	5/5/26 10:00	13/5/26 15:00	$ 4,275,734.66
338	01.03.06.01.4	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	6 días	5/5/26 10:00	13/5/26 15:00	$ 2,277,866.35
339	01.03.06.01.5	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	6 días	5/5/26 10:00	13/5/26 15:00	$ 18,099,072.82
340	01.03.06.01.6	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	5 días	13/5/26 15:00	21/5/26 17:00	$ 1,289,577.00
341	01.03.06.01.7	ESTABILIZACION O MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON RAJON = 6" A 12" (15 - 30 cm) Y SELLO CON SUBBASE GRANULAR CLASE C - Gr1 (SBGC_Gr1). INCLUYE (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACIÓN MECANICA CON EXCAVADORA MEDIANA SOBRE ORUGAS Y RODILLO VIBROCOMP	5 días	15/5/26 08:00	23/5/26 10:00	$ 14,203,494.97
342	01.03.06.01.8	GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD-HDPE) CON ALTURA DE 150 MM. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	12 días	1/6/26 15:00	20/6/26 15:00	$ 54,126,852.78
343	01.03.06.01.9	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 90 KN/M Y 110 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	12 días	1/6/26 15:00	20/6/26 15:00	$ 26,580,579.38
344	01.03.06.01.1	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	13 días	4/6/26 10:00	25/6/26 12:00	$ 24,454,381.54

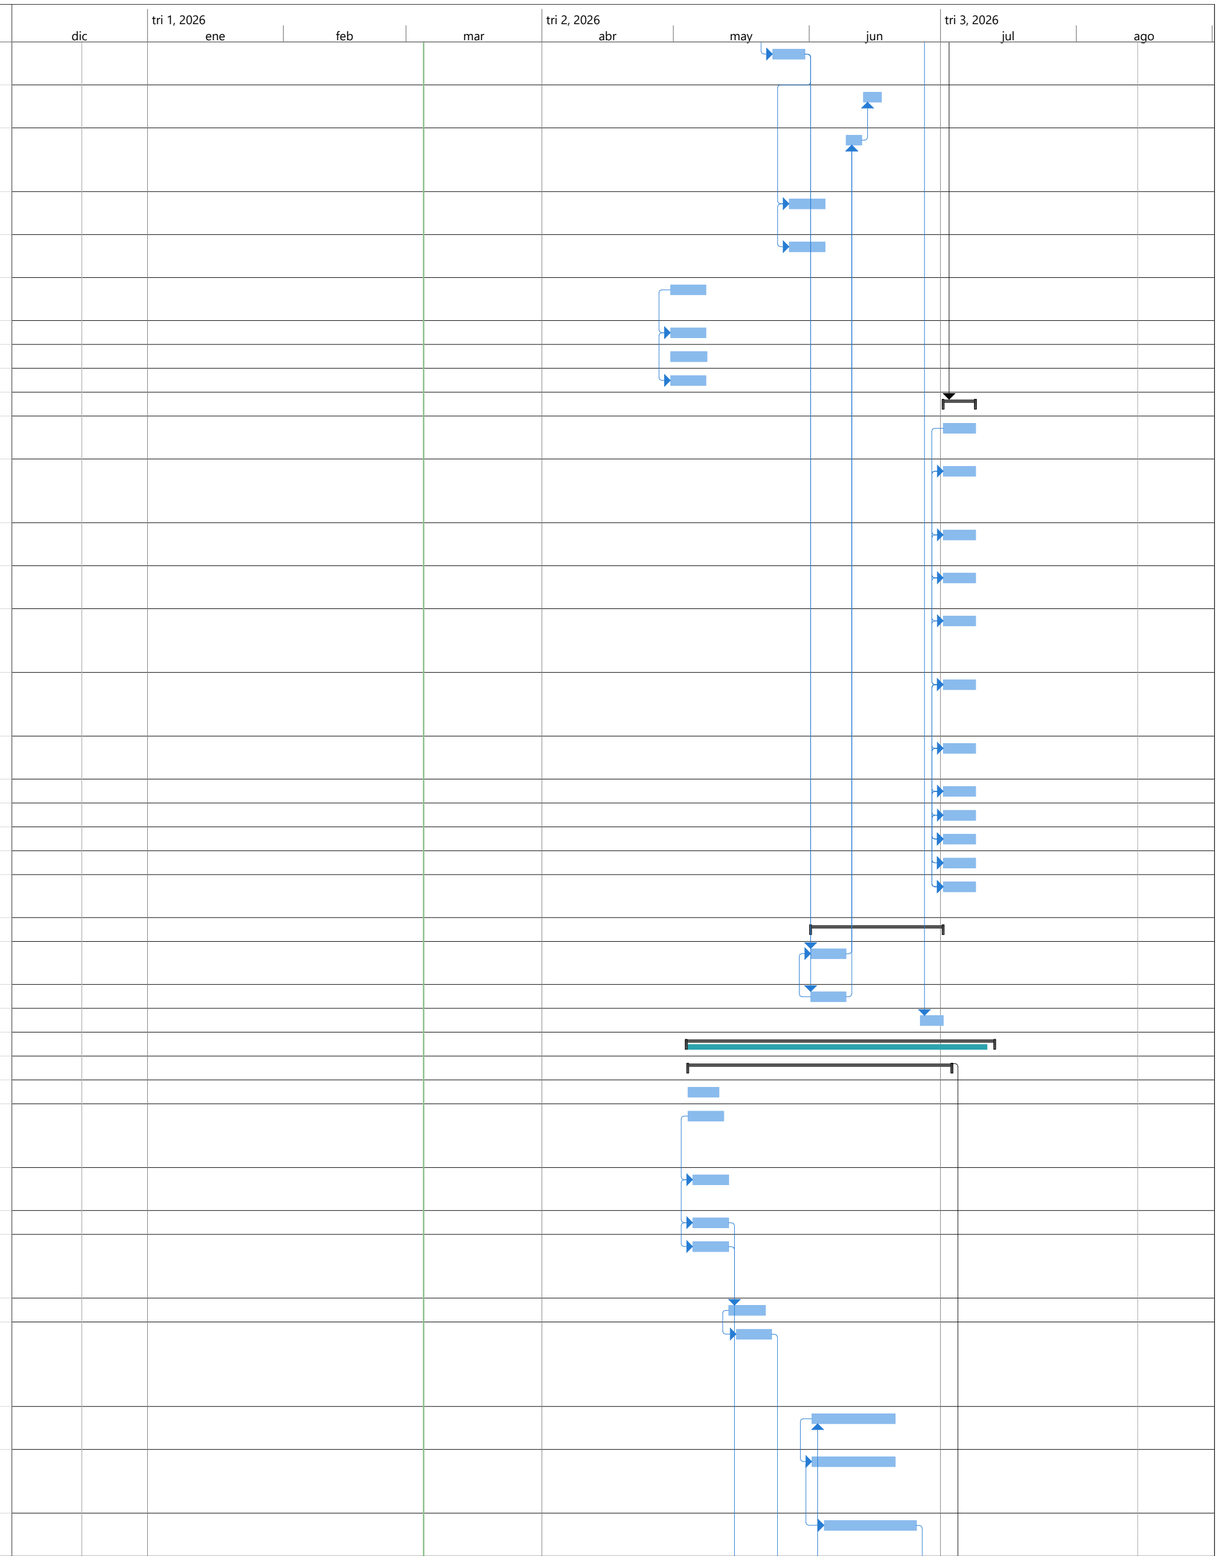


Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: 5/3/26 15:07

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · Progreso manual
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Progreso

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
345	01.03.06.01.1	ESTABILIZACIÓN DE SUB BASE Y BASES GRANULARES CON ADITIVO POTENCIALIZADOR FLEXIBILIZANTE + CEMENTO 5%	4 días	23/6/26 08:00	27/6/26 17:00	$ 76,216,782.08
346	01.03.06.01.1	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	2 días	30/6/26 08:00	2/7/26 12:00	$ 2,341,857.18
347	01.03.06.01.1	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	2 días	30/6/26 08:00	2/7/26 12:00	$ 2,853,661.87
348	01.03.06.01.1	MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE MD12 CON CEMENTO ASFÁLTICO 60-70 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS)	2 días	1/7/26 10:00	3/7/26 15:00	$ 45,646,206.48
349	01.03.06.01.1	MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA)	2 días	1/7/26 10:00	3/7/26 15:00	$ 80,073,550.63
350	01.03.06.01.1	PERFORACIONES EN SECO DE 3" CON PROFUNDIDAD DE 1 METRO (INCLUYE AHOYADOR HIDRÁULICO DE ALTA RESISTENCIA, JUEGO DE BROCAS, OPERARIO Y COMBUSTIBLE)	5 días	23/5/26 10:00	30/5/26 12:00	$ 80,463,656.00
351	01.03.06.01.1	INYECCIÓN DE CAL COMERCIAL AL 6% EN PERFORACIONES EN SECO DE 3" CON COMPACTACIÓN MANUAL DE IMPACTO PARA PROFUNDIDAD DE 1 METRO. (INCLUYE CAL COMERCIAL AL 6%).	5 días	25/5/26 13:00	1/6/26 15:00	$ 90,827,464.00
352	**01.03.06.02**	**CAPITULO 06: ESPACIO PUBLICO EN CONCRETO**	**22 días**	**4/5/26 08:00**	**5/6/26 12:00**	**$ 40,957,774.92**
353	01.03.06.02.1	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	6 días	4/5/26 08:00	12/5/26 12:00	$ 615,033.60
354	01.03.06.02.2	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	6 días	4/5/26 08:00	12/5/26 12:00	$ 1,592,380.00
355	01.03.06.02.3	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	6 días	4/5/26 08:00	12/5/26 12:00	$ 2,256,332.01
356	01.03.06.02.4	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	6 días	4/5/26 08:00	12/5/26 12:00	$ 2,218,418.94
357	01.03.06.02.5	ANDEN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI (210 KG/CM2) PREMEZCLADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO)	10 días	15/5/26 08:00	30/5/26 12:00	$ 6,242,294.40
358	01.03.06.02.6	MALLA ELECTROSOLDADA 0.25X0.25M, D=4MM, 4MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	3 días	15/5/26 08:00	20/5/26 15:00	$ 133,873.34
359	01.03.06.02.7	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	7 días	20/5/26 15:00	30/5/26 12:00	$ 20,357,538.00
360	01.03.06.02.8	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA ESPACIO PÚBLICO	5 días	7/5/26 15:00	14/5/26 17:00	$ 317,446.00
361	01.03.06.02.9	CONCRETO 3000 PSI GRAVA COMÚN PARA PIEZA REMATE TIPO HOMBROS PARA RAMPA (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMIN., BOMBEO CON AUTOBOMBA, FORMALETEO Y COLOCACIÓN. NO INCL. REFUERZO, CURADO).	4 días	30/5/26 13:00	5/6/26 12:00	$ 2,473,769.03
362	01.03.06.02.1	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5	7 días	20/5/26 15:00	30/5/26 12:00	$ 4,750,689.60
363	**01.03.06.03**	**CAPITULO 07: REDES**	**30 días**	**4/5/26 08:00**	**19/6/26 12:00**	**$ 184,832,401.94**
364	01.03.06.03.1	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	5 días	13/5/26 15:00	21/5/26 17:00	$ 19,332,759.62
365	01.03.06.03.2	DEMOLICIÓN MANUAL DE TAPA EXISTENTE DE POZO DE INSPECCIÓN Y REPOSICIÓN TAPA PARA POZO DE D= 0.70 M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	5 días	13/5/26 15:00	21/5/26 17:00	$ 1,295,832.00
366	01.03.06.03.3	DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE).	5 días	13/5/26 15:00	21/5/26 17:00	$ 3,680,836.38
367	01.03.06.03.4	DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	5 días	13/5/26 15:00	21/5/26 17:00	$ 455,606.00
368	01.03.06.03.5	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	5 días	13/5/26 15:00	21/5/26 17:00	$ 19,007,911.96
369	01.03.06.03.6	RELLENO EN TRITURADO DE 3/4`` (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)	5 días	22/5/26 08:00	29/5/26 10:00	$ 3,975,607.82
370	01.03.06.03.7	RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN TRANSPORTE A 28 KM).	5 días	26/5/26 15:00	2/6/26 17:00	$ 26,561,161.11
371	01.03.06.03.8	PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA)	2 días	17/6/26 08:00	19/6/26 12:00	$ 9,138,148.00
372	01.03.06.03.9	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST, ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE 450 N Y 500 N Y PAÑETE IMPERMEAB.)	3 días	11/6/26 10:00	16/6/26 17:00	$ 10,340,831.60
373	01.03.06.03.1	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	6 días	22/5/26 08:00	30/5/26 12:00	$ 12,946,752.00
374	01.03.06.03.1	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	6 días	22/5/26 08:00	30/5/26 12:00	$ 24,262,503.45
375	01.03.06.03.1	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE TUBERIA PF D=1/2", REGISTROS Y ACCESORIOS, LOG. PROM. = 6.50M).	5 días	30/5/26 13:00	6/6/26 15:00	$ 6,476,792.00
376	01.03.06.03.1	CAJA DE INSPECCION 0.80X0.8M. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (H=0.6M.	5 días	30/5/26 13:00	6/6/26 15:00	$ 20,988,240.00
377	01.03.06.03.1	CONEXIONES KIT SILLA YEE 315 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	5.5 días	4/5/26 08:00	11/5/26 16:00	$ 12,635,476.00
378	01.03.06.03.1	CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR. SUMINISTRO E INSTALACION	5 días	30/5/26 13:00	6/6/26 15:00	$ 13,733,944.00
379	**01.03.06.04**	**CAPITULO 08: SEÑALIZACIÓN**	**5.5 días**	**3/7/26 15:00**	**11/7/26 14:00**	**$ 17,135,509.78**
380	01.03.06.04.1	DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	5.5 días	3/7/26 15:00	11/7/26 14:00	$ 4,511,400.00
381	01.03.06.04.2	FLECHA DIRECCIONAL "A LA DERECHA" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.51M2	5.5 días	3/7/26 15:00	11/7/26 14:00	$ 438,040.00
382	01.03.06.04.3	DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)	5.5 días	3/7/26 15:00	11/7/26 14:00	$ 2,336,849.31

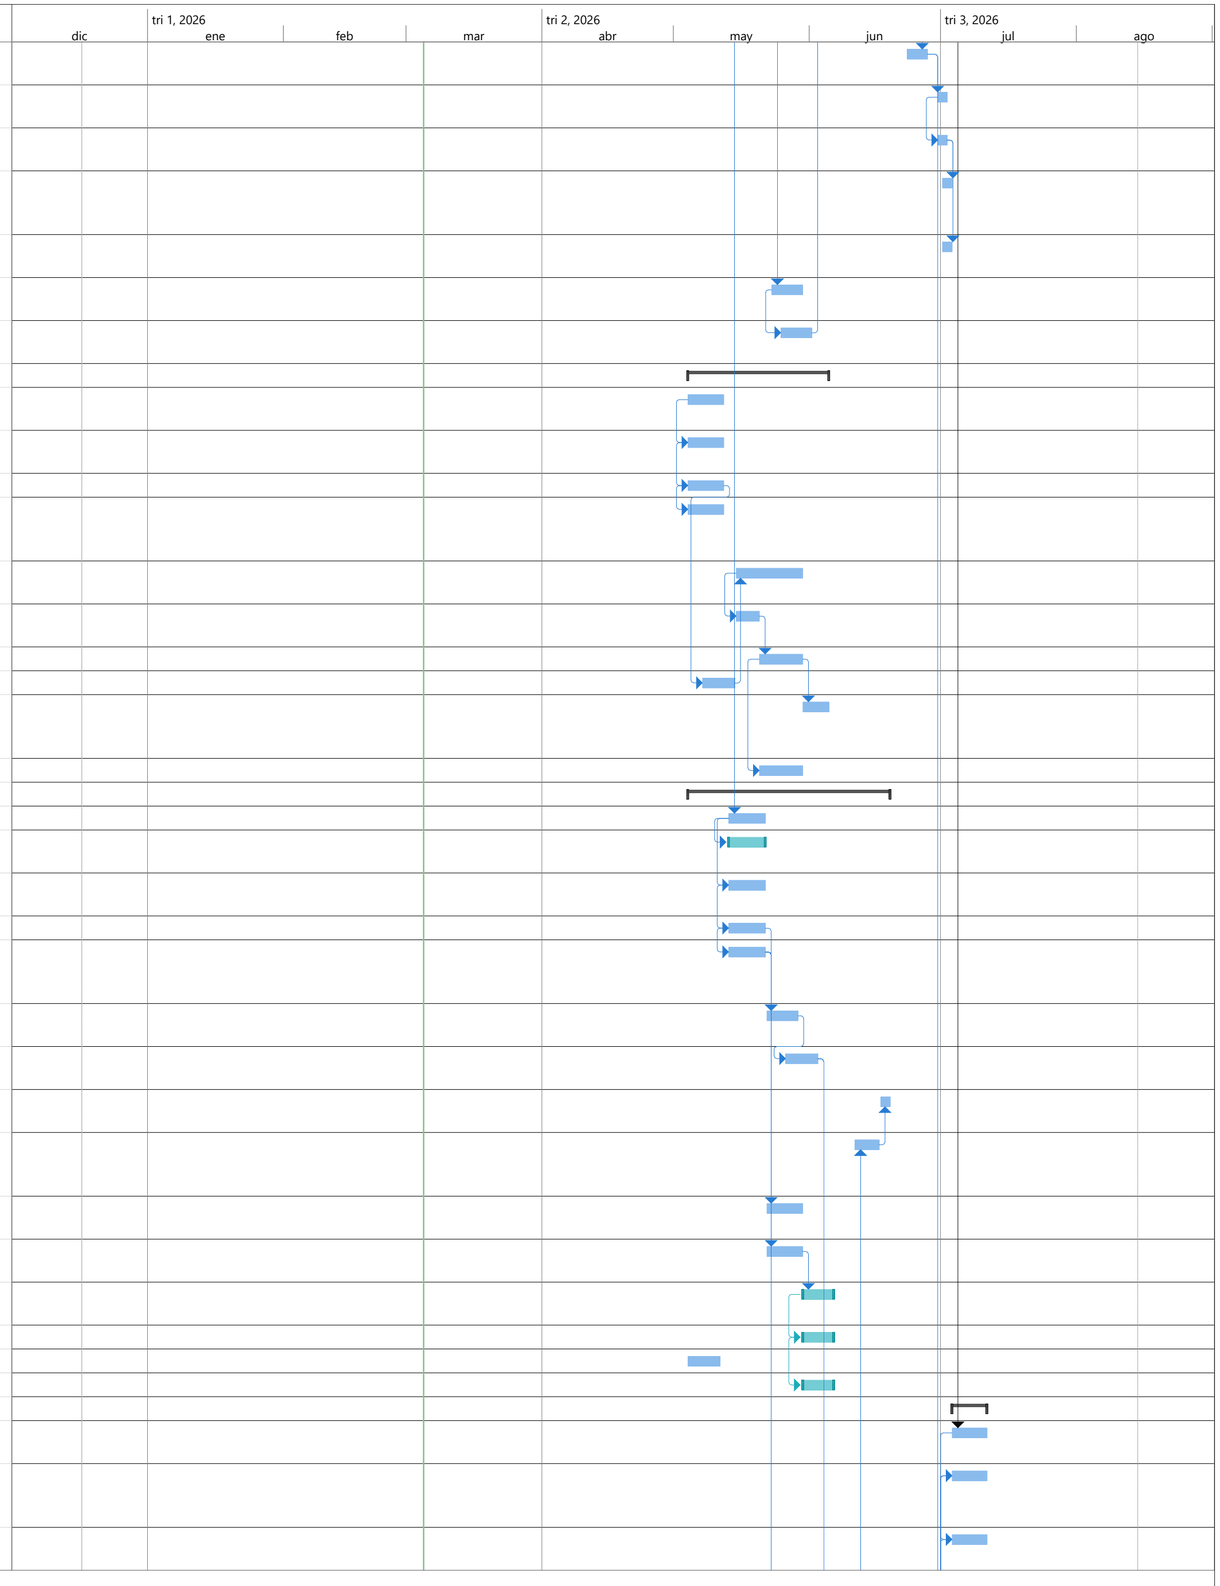


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
383	01.03.06.04.4	DEMARCACION LINEA DISCONTINUA A=0.12M (E=15 MILS, ACRÍLICA BASE AGUA. INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)	5.5 días	3/7/26 15:00	11/7/26 14:00	$ 310,648.00
384	01.03.06.04.5	FLECHA DIRECCIONAL "A LA DERECHA" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.51M2	5.5 días	3/7/26 15:00	11/7/26 14:00	$ 275,600.00
385	01.03.06.04.6	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA DERECHA" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. INC. MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 2.18M2	5.5 días	3/7/26 15:00	11/7/26 14:00	$ 397,888.00
386	01.03.06.04.7	PINTURA TERMOPLASTICA (E=2.3MM. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS)	5.5 días	3/7/26 15:00	11/7/26 14:00	$ 2,336,849.31
387	01.03.06.04.8	ESTOPEROLES DE 10 CM X 2.5 CM. SUMINISTRO E INSTALACION.	5.5 días	3/7/26 15:00	11/7/26 14:00	$ 2,102,240.00
388	01.03.06.04.9	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	5.5 días	3/7/26 15:00	11/7/26 14:00	$ 1,608,963.00
389	01.03.06.04.1	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	5.5 días	3/7/26 15:00	11/7/26 14:00	$ 410,124.96
390	01.03.06.04.1	TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	5.5 días	3/7/26 15:00	11/7/26 14:00	$ 22,562.00
391	01.03.06.04.1	BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 3CM DE ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 1/2", PINTURA DE LARGA DURACIÓN BLANCA Y RESINA EPÓXICA.	5.5 días	3/7/26 15:00	11/7/26 14:00	$ 2,384,345.20
392	**01.03.06.05**	**CAPITULO 09: NO PREVISTOS**	**27 días**	**22/5/26 08:00**	**3/7/26 15:00**	**$ 147,931,379.91**
393	01.03.06.05.1	ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARALES METÁLICOS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	5 días	3/6/26 08:00	11/6/26 10:00	$ 77,200,722.30
394	01.03.06.05.2	PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCL. SUMIN, INST.)	5 días	3/6/26 08:00	11/6/26 10:00	$ 4,513,856.00
395	01.03.06.05.3	GEOMALLA MULTIAXIAL RESISTENCIA A FLUENCIA 300KN/M	3 días	30/6/26 08:00	3/7/26 15:00	$ 48,676,151.21
396	01.03.06.05.4	SUMIDERO LATERAL SL-150, H=0.85M (PREFABRICADO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE SOBRETAPA Y TAPA)	5 días	22/5/26 08:00	29/5/26 10:00	$ 17,540,650.40
397	**01.03.07**	**CIV 6000389**	**45 días?**	**21/5/26 07:00**	**30/7/26 09:00**	**$ 323,154,008.08**
398	**01.03.07.01**	**CAPITULO 02: RECONSTRUCCION - REHABILITACION VIA PAVIMENTO FLEXIBLE**	**39 días**	**21/5/26 08:00**	**21/7/26 15:00**	**$ 259,137,404.24**
399	01.03.07.01.1	REPLANTEO GENERAL	5 días	21/5/26 08:00	28/5/26 10:00	$ 336,336.00
400	01.03.07.01.2	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA	6 días	21/5/26 08:00	29/5/26 12:00	$ 326,502.00
401	01.03.07.01.3	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	6 días	22/5/26 10:00	30/5/26 15:00	$ 2,158,833.60
402	01.03.07.01.4	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	6 días	22/5/26 10:00	30/5/26 15:00	$ 1,107,506.40
403	01.03.07.01.5	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	6 días	22/5/26 10:00	30/5/26 15:00	$ 8,799,831.04
404	01.03.07.01.6	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	5 días	30/5/26 15:00	6/6/26 17:00	$ 651,112.00
405	01.03.07.01.7	ESTABILIZACION O MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON RAJON = 6" A 12" (15 - 30 cm) Y SELLO CON SUBBASE GRANULAR CLASE C - Gr1 (SBGC_Gr1). INCLUYE (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACIÓN MECANICA CON EXCAVADORA MEDIANA SOBRE ORUGAS Y RODILLO VIBROCOMP	5 días	2/6/26 08:00	10/6/26 10:00	$ 7,171,395.00
406	01.03.07.01.8	GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD-HDPE) CON ALTURA DE 150 MM. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	12 días	19/6/26 15:00	8/7/26 15:00	$ 27,328,840.00
407	01.03.07.01.9	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 90 KN/M Y 110 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	12 días	19/6/26 15:00	8/7/26 15:00	$ 13,122,208.00
408	01.03.07.01.10	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	13 días	23/6/26 10:00	13/7/26 12:00	$ 12,347,104.00
409	01.03.07.01.11	ESTABILIZACIÓN DE SUB BASE Y BASES GRANULARES CON ADITIVO POTENCIALIZADOR FLEXIBILIZANTE + CEMENTO 5%	4 días	10/7/26 08:00	15/7/26 17:00	$ 34,983,748.80
410	01.03.07.01.12	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	2 días	16/7/26 08:00	18/7/26 12:00	$ 1,182,412.00
411	01.03.07.01.13	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	2 días	16/7/26 08:00	18/7/26 12:00	$ 1,440,824.00
412	01.03.07.01.14	MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE MD12 CON CEMENTO ASFÁLTICO 60-70 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS)	2 días	17/7/26 10:00	21/7/26 15:00	$ 23,046,931.60
413	01.03.07.01.15	MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA)	2 días	17/7/26 10:00	21/7/26 15:00	$ 40,429,419.80
414	01.03.07.01.16	PERFORACIONES EN SECO DE 3" CON PROFUNDIDAD DE 1 METRO (INCLUYE AHOYADOR HIDRÁULICO DE ALTA RESISTENCIA, JUEGO DE BROCAS, OPERARIO Y COMBUSTIBLE)	5 días	10/6/26 10:00	18/6/26 12:00	$ 39,789,720.00
415	01.03.07.01.17	INYECCIÓN DE CAL COMERCIAL AL 6% EN PERFORACIONES EN SECO DE 3" CON COMPACTACIÓN MANUAL DE IMPACTO PARA PROFUNDIDAD DE 1 METRO. (INCLUYE CAL COMERCIAL AL 6%).	5 días	11/6/26 13:00	19/6/26 15:00	$ 44,914,680.00
416	**01.03.07.02**	**CAPITULO 06: ESPACIO PUBLICO EN CONCRETO**	**18 días**	**21/5/26 08:00**	**18/6/26 12:00**	**$ 17,496,525.20**
417	01.03.07.02.1	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	6 días	21/5/26 08:00	29/5/26 12:00	$ 262,732.80
418	01.03.07.02.2	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	6 días	21/5/26 08:00	29/5/26 12:00	$ 680,240.00
419	01.03.07.02.3	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	6 días	21/5/26 08:00	29/5/26 12:00	$ 963,869.98
420	01.03.07.02.4	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	6 días	21/5/26 08:00	29/5/26 12:00	$ 947,674.11

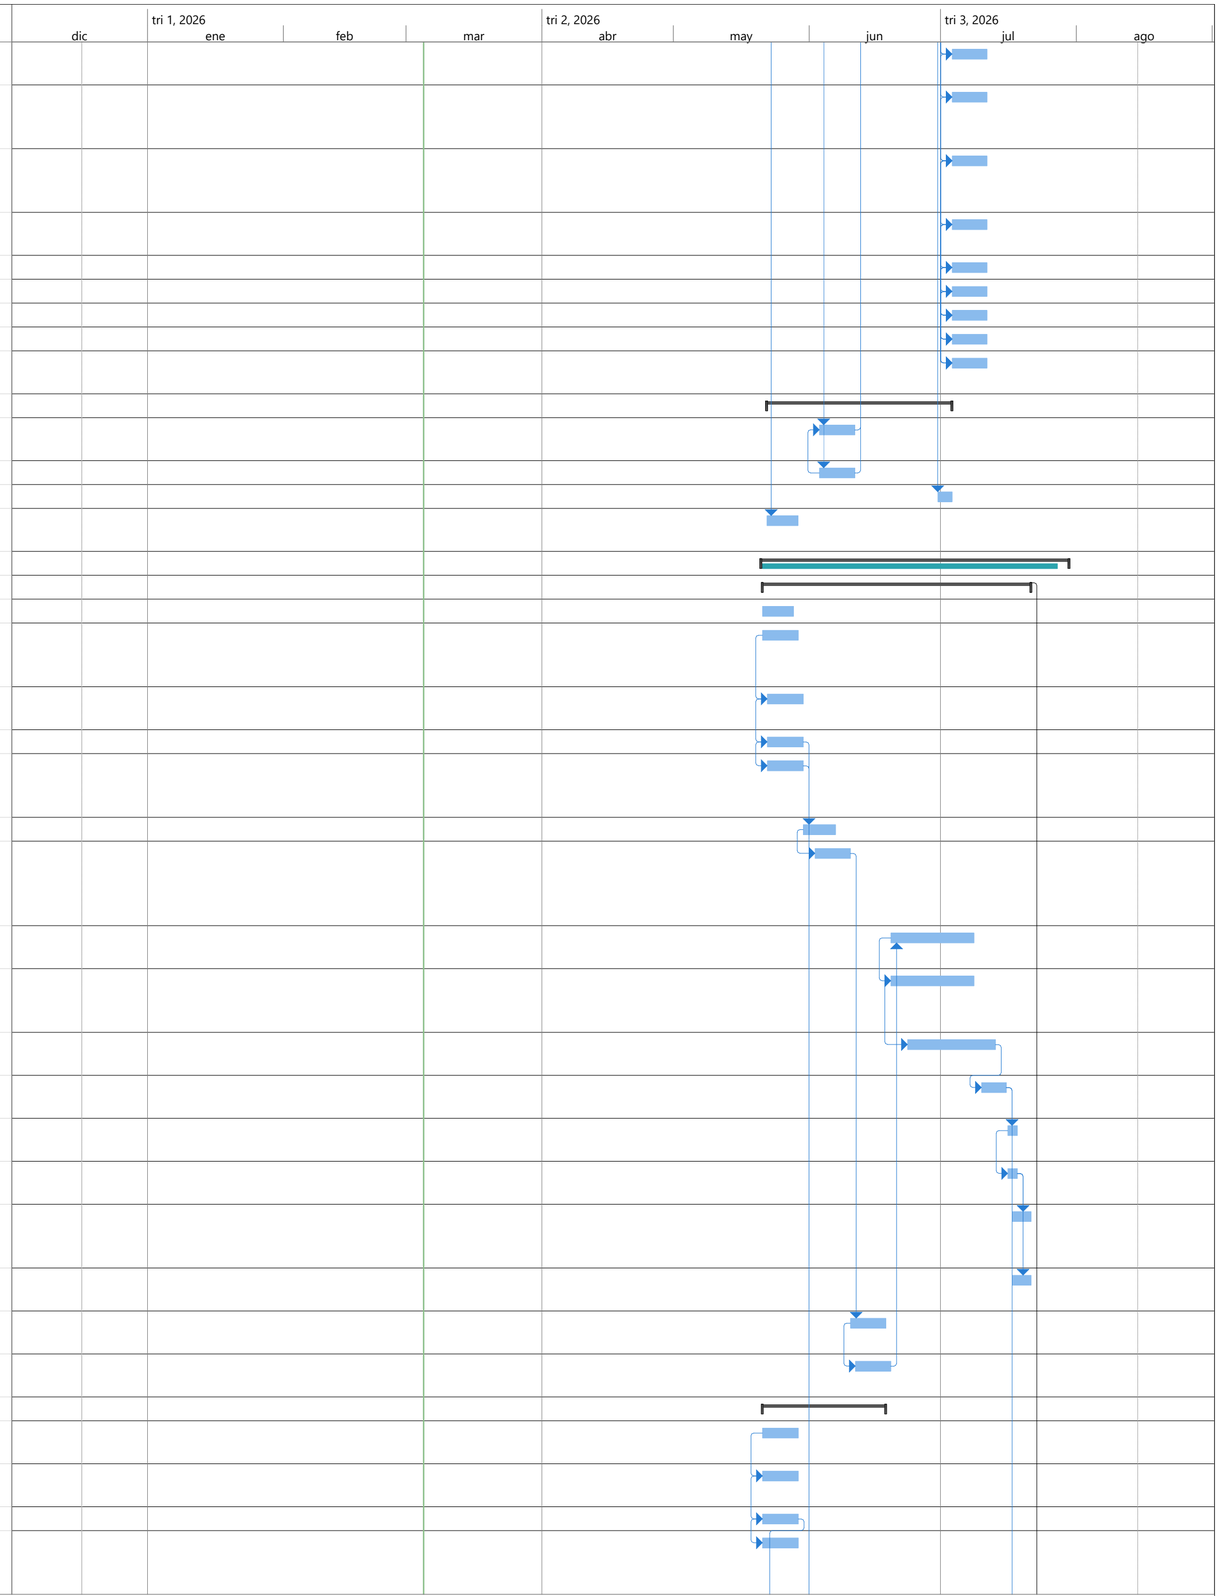

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: 5/3/26 15:07

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · Progreso manual
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Progreso


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
421	01.03.07.02.5	ANDEN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI (210 KG/CM2) PREMEZCLADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO)	10 días	2/6/26 08:00	18/6/26 12:00	$ 2,666,611.20
422	01.03.07.02.6	MALLA ELECTROSOLDADA 0.25X0.25M, D=4MM, 4MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	3 días	2/6/26 08:00	5/6/26 15:00	$ 57,188.61
423	01.03.07.02.7	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	7 días	5/6/26 15:00	18/6/26 12:00	$ 8,696,424.00
424	01.03.07.02.8	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA ESPACIO PÚBLICO	5 días	25/5/26 15:00	1/6/26 17:00	$ 135,608.00
425	01.03.07.02.9	CONCRETO 3000 PSI GRAVA COMÚN PARA PIEZA REMATE TIPO HOMBROS PARA RAMPA (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMIN., BOMBEO CON AUTOBOMBA, FORMALETEO Y COLOCACIÓN. NO INCL. REFUERZO, CURADO).	6 días	5/6/26 15:00	17/6/26 10:00	$ 1,056,755.70
426	01.03.07.02.1	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5	7 días	5/6/26 15:00	18/6/26 12:00	$ 2,029,420.80
427	**01.03.07.03**	**CAPITULO 07: REDES**	**16 días**	**30/5/26 15:00**	**25/6/26 15:00**	**$ 4,685,415.30**
428	01.03.07.03.1	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	5 días	30/5/26 15:00	6/6/26 17:00	$ 704,125.80
429	01.03.07.03.2	DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE).	5 días	30/5/26 15:00	6/6/26 17:00	$ 156,648.00
430	01.03.07.03.3	DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	5 días	30/5/26 15:00	6/6/26 17:00	$ 455,606.00
431	01.03.07.03.4	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	5 días	30/5/26 15:00	6/6/26 17:00	$ 692,294.40
432	01.03.07.03.5	RELLENO EN TRITURADO DE 3/4`` (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)	5 días	9/6/26 08:00	17/6/26 10:00	$ 169,192.80
433	01.03.07.03.6	RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN TRANSPORTE A 28 KM).	5 días	12/6/26 15:00	20/6/26 17:00	$ 893,966.30
434	01.03.07.03.7	NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA, H=0.15M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN)	2 días	22/6/26 08:00	24/6/26 12:00	$ 327,710.00
435	01.03.07.03.8	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	6 días	17/6/26 10:00	25/6/26 15:00	$ 1,285,872.00
436	**01.03.07.04**	**CAPITULO 08: SEÑALIZACIÓN**	**4 días**	**21/7/26 15:00**	**27/7/26 15:00**	**$ 14,303,716.67**
437	01.03.07.04.1	DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	4 días	21/7/26 15:00	27/7/26 15:00	$ 1,927,200.00
438	01.03.07.04.2	FLECHA DIRECCIONAL "A LA DERECHA" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.51M2	4 días	21/7/26 15:00	27/7/26 15:00	$ 438,040.00
439	01.03.07.04.3	DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)	4 días	21/7/26 15:00	27/7/26 15:00	$ 2,335,815.11
440	01.03.07.04.4	DEMARCACION LINEA DISCONTINUA A=0.12M (E=15 MILS, ACRÍLICA BASE AGUA. INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)	4 días	21/7/26 15:00	27/7/26 15:00	$ 132,704.00
441	01.03.07.04.5	FLECHA DIRECCIONAL "A LA DERECHA" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.51M2	4 días	21/7/26 15:00	27/7/26 15:00	$ 275,600.00
442	01.03.07.04.6	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA DERECHA" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. INC. MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 2.18M2	4 días	21/7/26 15:00	27/7/26 15:00	$ 397,888.00
443	01.03.07.04.7	PINTURA TERMOPLASTICA (E=2.3MM. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS)	4 días	21/7/26 15:00	27/7/26 15:00	$ 2,335,815.11
444	01.03.07.04.8	ESTOPEROLES DE 10 CM X 2.5 CM. SUMINISTRO E INSTALACION.	4 días	21/7/26 15:00	27/7/26 15:00	$ 2,522,688.00
445	01.03.07.04.9	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	4 días	21/7/26 15:00	27/7/26 15:00	$ 687,324.00
446	01.03.07.04.1	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	4 días	21/7/26 15:00	27/7/26 15:00	$ 409,943.45
447	01.03.07.04.1	TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	4 días	21/7/26 15:00	27/7/26 15:00	$ 22,562.00
448	01.03.07.04.1	BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 3CM DE ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 1/2", PINTURA DE LARGA DURACIÓN BLANCA Y RESINA EPÓXICA.	4 días	21/7/26 15:00	27/7/26 15:00	$ 2,818,137.00
449	**01.03.07.05**	**CAPITULO 09: NO PREVISTOS**	**19 días**	**22/6/26 08:00**	**21/7/26 15:00**	**$ 27,530,946.67**
450	01.03.07.05.1	ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARALES METÁLICOS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	5 días	22/6/26 08:00	30/6/26 10:00	$ 2,954,185.23
451	01.03.07.05.2	GEOMALLA MULTIAXIAL RESISTENCIA A FLUENCIA 300KN/M	3 días	16/7/26 08:00	21/7/26 15:00	$ 24,576,761.44
452	**01.03.08**	**CIV 6000557**	**45 días?**	**4/6/26 07:00**	**14/8/26 09:00**	**$ 718,533,809.53**
453	**01.03.08.01**	**CAPITULO 02: RECONSTRUCCION - REHABILITACION VIA PAVIMENTO FLEXIBLE**	**39 días**	**4/6/26 08:00**	**4/8/26 15:00**	**$ 550,553,801.85**
454	01.03.08.01.1	REPLANTEO GENERAL	5 días	4/6/26 08:00	12/6/26 10:00	$ 739,393.20
455	01.03.08.01.2	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA	6 días	4/6/26 08:00	13/6/26 12:00	$ 749,674.20
456	01.03.08.01.3	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	6 días	5/6/26 10:00	16/6/26 15:00	$ 4,745,929.32
457	01.03.08.01.4	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	6 días	5/6/26 10:00	16/6/26 15:00	$ 2,434,716.18
458	01.03.08.01.5	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	6 días	5/6/26 10:00	16/6/26 15:00	$ 19,345,342.85
459	01.03.08.01.6	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	5 días	16/6/26 15:00	23/6/26 17:00	$ 1,431,389.40

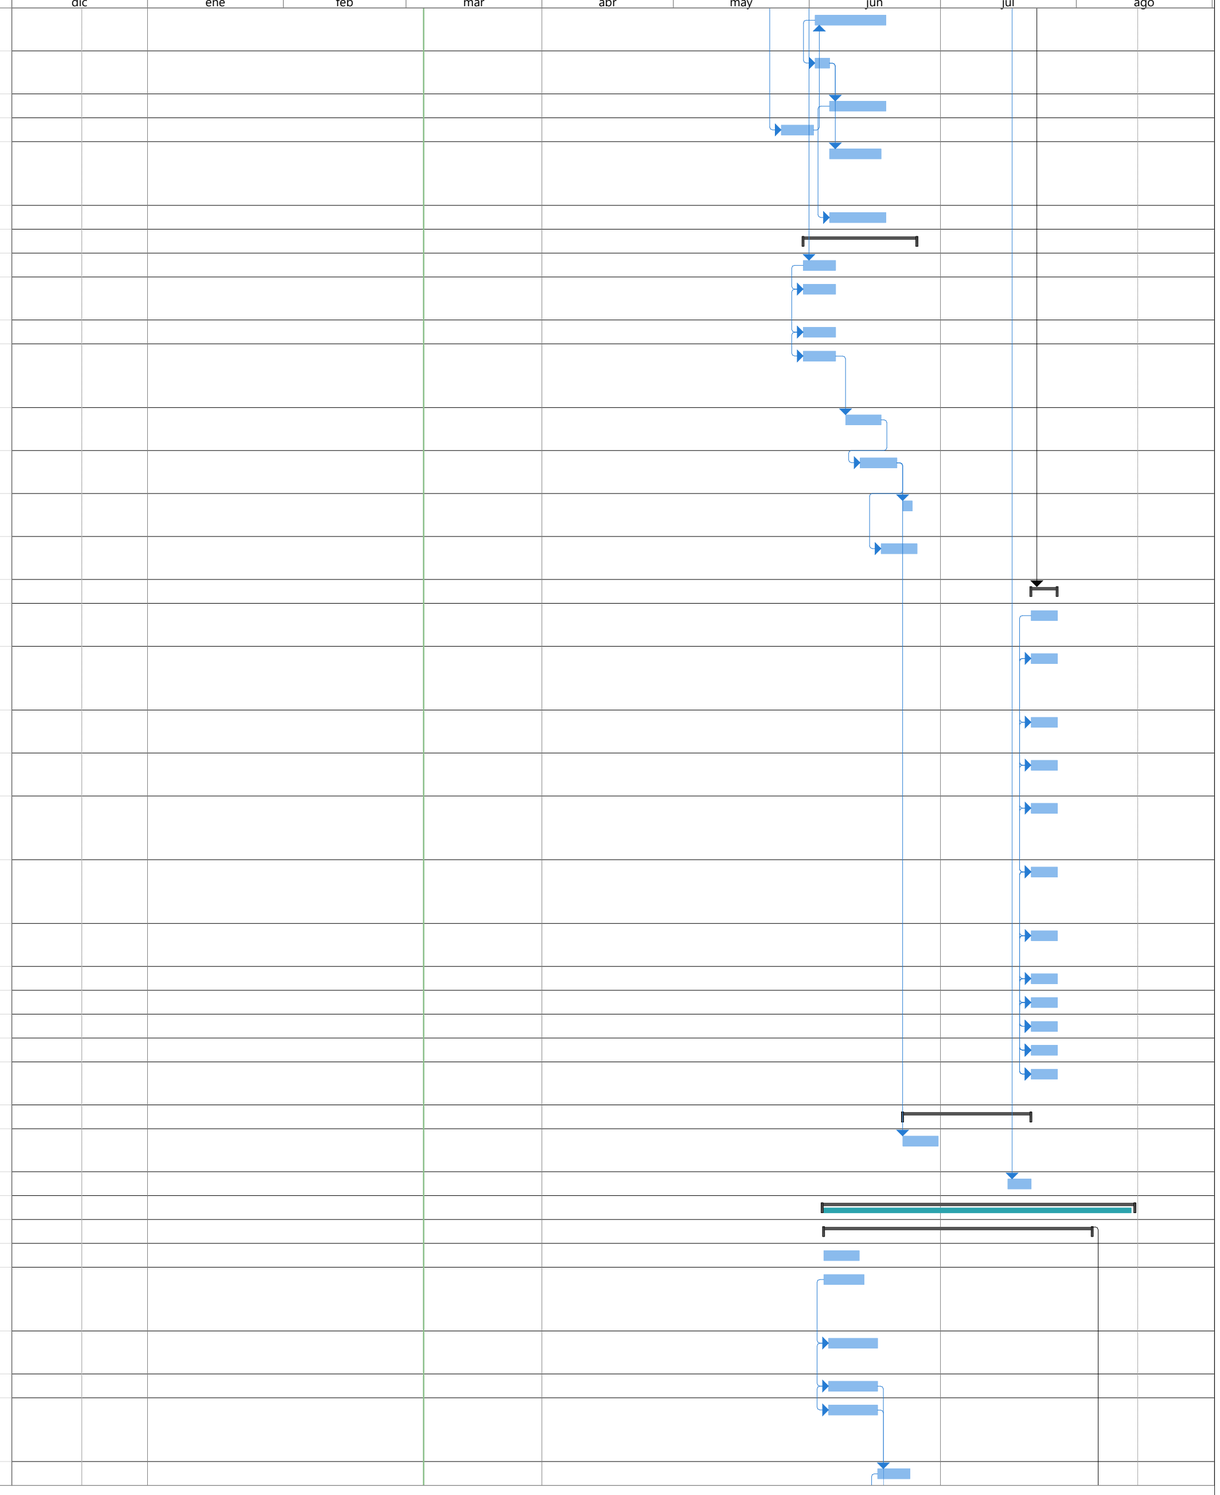

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: 5/3/26 15:07

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · Progreso manual
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Progreso


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
460	01.03.08.01.7	ESTABILIZACION O MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON RAJON = 6" A 12" (15 - 30 cm) Y SELLO CON SUBBASE GRANULAR CLASE C - Gr1 (SBGC_Gr1). INCLUYE (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACIÓN MECANICA CON EXCAVADORA MEDIANA SOBRE ORUGAS Y RODILLO VIBROCOMP	5 días	18/6/26 08:00	25/6/26 10:00	$ 15,765,427.13
461	01.03.08.01.8	GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD-HDPE) CON ALTURA DE 150 MM. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	12 días	4/7/26 15:00	23/7/26 15:00	$ 60,079,083.00
462	01.03.08.01.9	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 90 KN/M Y 110 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	12 días	4/7/26 15:00	23/7/26 15:00	$ 29,379,579.90
463	01.03.08.01.1	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	13 días	8/7/26 10:00	28/7/26 12:00	$ 27,143,584.80
464	01.03.08.01.1	ESTABILIZACIÓN DE SUB BASE Y BASES GRANULARES CON ADITIVO POTENCIALIZADOR FLEXIBILIZANTE + CEMENTO 5%	4 días	25/7/26 08:00	30/7/26 17:00	$ 76,907,455.56
465	01.03.08.01.1	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	2 días	31/7/26 08:00	3/8/26 12:00	$ 2,599,386.90
466	01.03.08.01.1	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	2 días	31/7/26 08:00	3/8/26 12:00	$ 3,167,473.80
467	01.03.08.01.1	MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE MD12 CON CEMENTO ASFÁLTICO 60-70 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS)	2 días	1/8/26 10:00	4/8/26 15:00	$ 121,598,005.61
468	01.03.08.01.1	PERFORACIONES EN SECO DE 3" CON PROFUNDIDAD DE 1 METRO (INCLUYE AHOYADOR HIDRÁULICO DE ALTA RESISTENCIA, JUEGO DE BROCAS, OPERARIO Y COMBUSTIBLE)	5 días	25/6/26 10:00	3/7/26 12:00	$ 86,653,168.00
469	01.03.08.01.1	INYECCIÓN DE CAL COMERCIAL AL 6% EN PERFORACIONES EN SECO DE 3" CON COMPACTACIÓN MANUAL DE IMPACTO PARA PROFUNDIDAD DE 1 METRO. (INCLUYE CAL COMERCIAL AL 6%).	5 días	26/6/26 13:00	4/7/26 15:00	$ 97,814,192.00
470	**01.03.08.02**	**CAPITULO 06: ESPACIO PUBLICO EN CONCRETO**	**18 días**	**4/6/26 08:00**	**3/7/26 12:00**	**$ 44,138,961.32**
471	01.03.08.02.1	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	6 días	4/6/26 08:00	13/6/26 12:00	$ 662,803.20
472	01.03.08.02.2	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	6 días	4/6/26 08:00	13/6/26 12:00	$ 1,716,060.00
473	01.03.08.02.3	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	6 días	4/6/26 08:00	13/6/26 12:00	$ 2,431,581.10
474	01.03.08.02.4	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	6 días	4/6/26 08:00	13/6/26 12:00	$ 2,390,723.33
475	01.03.08.02.5	ANDEN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI (210 KG/CM2) PREMEZCLADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO)	10 días	18/6/26 08:00	3/7/26 12:00	$ 6,727,132.80
476	01.03.08.02.6	MALLA ELECTROSOLDADA 0.25X0.25M, D=4MM, 4MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	3 días	18/6/26 08:00	22/6/26 15:00	$ 144,271.26
477	01.03.08.02.7	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	7 días	22/6/26 15:00	3/7/26 12:00	$ 21,938,706.00
478	01.03.08.02.8	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA ESPACIO PÚBLICO	5 días	9/6/26 15:00	17/6/26 17:00	$ 342,102.00
479	01.03.08.02.9	CONCRETO 3000 PSI GRAVA COMÚN PARA PIEZA REMATE TIPO HOMBROS PARA RAMPA (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMIN., BOMBEO CON AUTOBOMBA, FORMALETEO Y COLOCACIÓN. NO INCL. REFUERZO, CURADO).	6 días	22/6/26 15:00	2/7/26 10:00	$ 2,665,906.43
480	01.03.08.02.1	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5	7 días	22/6/26 15:00	3/7/26 12:00	$ 5,119,675.20
481	**01.03.08.03**	**CAPITULO 07: REDES**	**23 días**	**4/6/26 08:00**	**10/7/26 15:00**	**$ 11,175,898.61**
482	01.03.08.03.1	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	5 días	16/6/26 15:00	23/6/26 17:00	$ 1,408,251.60
483	01.03.08.03.2	DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE).	5 días	16/6/26 15:00	23/6/26 17:00	$ 313,296.00
484	01.03.08.03.3	DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	5 días	16/6/26 15:00	23/6/26 17:00	$ 911,212.00
485	01.03.08.03.4	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	5 días	16/6/26 15:00	23/6/26 17:00	$ 1,384,588.80
486	01.03.08.03.5	RELLENO EN TRITURADO DE 3/4`` (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)	5 días	24/6/26 08:00	2/7/26 10:00	$ 338,385.60
487	01.03.08.03.6	RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN TRANSPORTE A 28 KM).	5 días	27/6/26 15:00	6/7/26 17:00	$ 1,787,932.61
488	01.03.08.03.7	NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA, H=0.15M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN)	2 días	7/7/26 08:00	9/7/26 12:00	$ 655,420.00
489	01.03.08.03.8	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	6 días	2/7/26 10:00	10/7/26 15:00	$ 2,571,744.00
490	01.03.08.03.9	CONEXIONES KIT SILLA YEE 315 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	5.5 días	4/6/26 08:00	12/6/26 16:00	$ 1,805,068.00
491	**01.03.08.04**	**CAPITULO 08: SEÑALIZACIÓN**	**6 días**	**4/8/26 07:00**	**13/8/26 11:00**	**$ 17,809,327.77**
492	01.03.08.04.1	DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	5.5 días	4/8/26 08:00	12/8/26 16:00	$ 4,861,800.00
493	01.03.08.04.2	FLECHA DIRECCIONAL "A LA DERECHA" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.51M2	5.5 días	4/8/26 08:00	12/8/26 16:00	$ 438,040.00
494	01.03.08.04.3	DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)	5.5 días	4/8/26 08:00	12/8/26 16:00	$ 2,335,815.11
495	01.03.08.04.4	DEMARCACION LINEA DISCONTINUA A=0.12M (E=15 MILS, ACRÍLICA BASE AGUA. INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)	5.5 días	4/8/26 08:00	12/8/26 16:00	$ 334,776.00

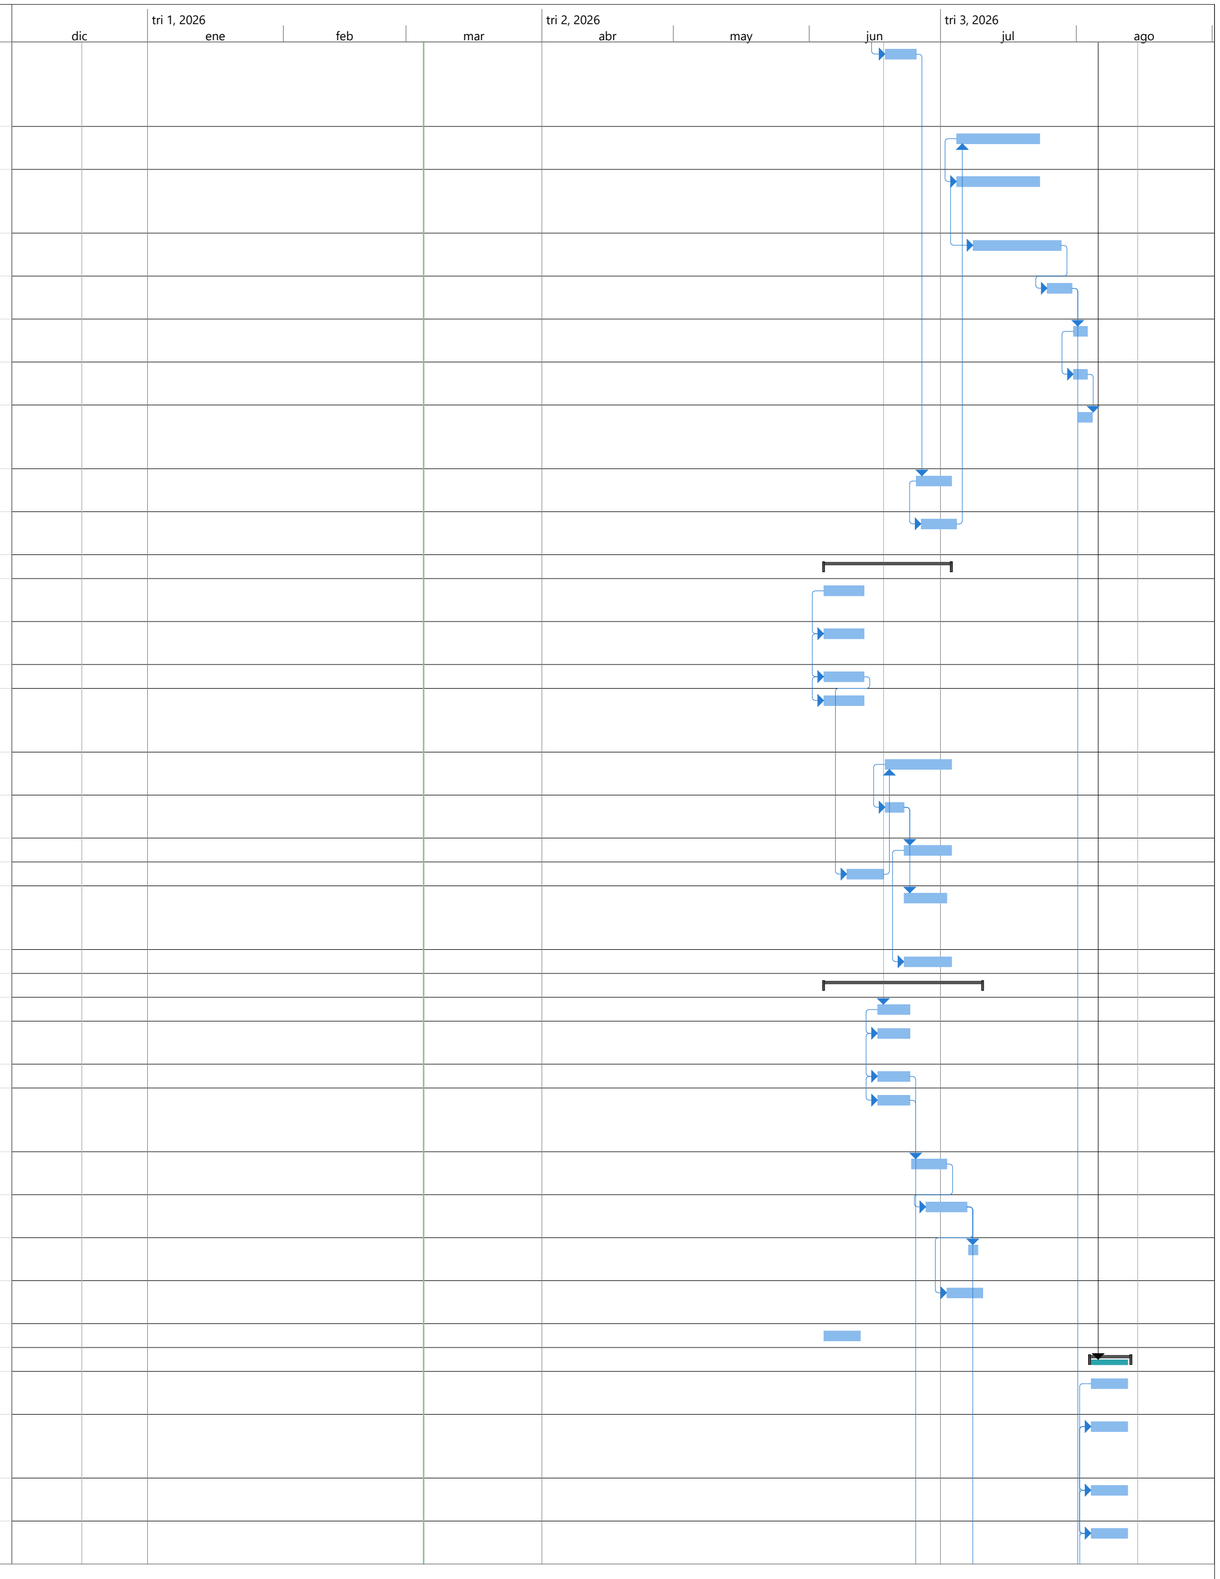


Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: 5/3/26 15:07

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · Progreso manual
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Progreso


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
496	01.03.08.04.5	FLECHA DIRECCIONAL "A LA DERECHA" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.51M2	5.5 días	4/8/26 08:00	12/8/26 16:00	$ 275,600.00
497	01.03.08.04.6	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA DERECHA" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. INC. MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 2.18M2	5.5 días	4/8/26 08:00	12/8/26 16:00	$ 397,888.00
498	01.03.08.04.7	PINTURA TERMOPLASTICA (E=2.3MM. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS)	5.5 días	4/8/26 08:00	12/8/26 16:00	$ 2,335,815.11
499	01.03.08.04.8	ESTOPEROLES DE 10 CM X 2.5 CM. SUMINISTRO E INSTALACION.	5.5 días	4/8/26 08:00	12/8/26 16:00	$ 2,207,352.00
500	01.03.08.04.9	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	5.5 días	4/8/26 08:00	12/8/26 16:00	$ 1,733,931.00
501	01.03.08.04.1	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	5.5 días	4/8/26 08:00	12/8/26 16:00	$ 409,943.45
502	01.03.08.04.1	TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	5.5 días	4/8/26 08:00	12/8/26 16:00	$ 22,562.00
503	01.03.08.04.1	BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 3CM DE ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 1/2", PINTURA DE LARGA DURACIÓN BLANCA Y RESINA EPÓXICA.	5.5 días	4/8/26 08:00	12/8/26 16:00	$ 2,455,805.10
504	**01.03.08.05**	**CAPITULO 09: NO PREVISTOS**	**27 días**	**24/6/26 08:00**	**4/8/26 15:00**	**$ 94,855,819.98**
505	01.03.08.05.1	ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARALES METÁLICOS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	5 días	7/7/26 08:00	14/7/26 10:00	$ 5,745,541.35
506	01.03.08.05.2	GEOMALLA MULTIAXIAL RESISTENCIA A FLUENCIA 300KN/M	3 días	31/7/26 08:00	4/8/26 15:00	$ 54,028,977.83
507	01.03.08.05.3	SUMIDERO LATERAL SL-150, H=0.85M (PREFABRICADO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE SOBRETAPA Y TAPA)	5 días	24/6/26 08:00	2/7/26 10:00	$ 35,081,300.80
508	**01.04**	**INTERVENCIÓN ESPACIO PÚBLICO PRIORITARIO**	**60.1 días?**	**9/2/26 07:00**	**13/5/26 09:00**	**$ 851,240,660.78**
509	**01.04.01**	**CIV 6000580 (6000528)**	**25 días?**	**9/2/26 07:00**	**17/3/26 09:00**	**$ 64,986,396.56**
510	**01.04.01.01**	**CAPITULO 02: RECONSTRUCCION - REHABILITACION VIA PAVIMENTO FLEXIBLE**	**8.4 días**	**20/2/26 15:00**	**5/3/26 10:00**	**$ 29,708,968.29**
511	01.04.01.01.1	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 90 KN/M Y 110 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	3 días	24/2/26 15:00	28/2/26 12:00	$ 7,716,753.00
512	01.04.01.01.2	ESTABILIZACIÓN DE SUB BASE Y BASES GRANULARES CON ADITIVO	4 días	27/2/26 10:00	5/3/26 10:00	$ 19,397,239.29
513	01.04.01.01.3	TRATAMIENTO SILVICULTURAL PODA DE RAÍCES (INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL, CORTE, CICATRIZACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A 28 KILÓMETROS)	4 días	20/2/26 15:00	26/2/26 15:00	$ 2,594,976.00
514	**01.04.01.02**	**CAPITULO 06: ESPACIO PUBLICO EN CONCRETO**	**22 días**	**9/2/26 08:00**	**12/3/26 12:00**	**$ 34,296,432.27**
515	01.04.01.02.1	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	3 días	9/2/26 08:00	12/2/26 15:00	$ 2,060,064.00
516	01.04.01.02.2	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	3 días	9/2/26 08:00	12/2/26 15:00	$ 69,570.00
517	01.04.01.02.3	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	4 días	12/2/26 15:00	18/2/26 15:00	$ 3,065,461.97
518	01.04.01.02.4	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	4 días	12/2/26 15:00	18/2/26 15:00	$ 3,013,953.12
519	01.04.01.02.5	ANDEN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI (210 KG/CM2) PREMEZCLADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO)	7 días	24/2/26 15:00	6/3/26 12:00	$ 20,908,656.00
520	01.04.01.02.6	MALLA ELECTROSOLDADA 0.25X0.25M, D=4MM, 4MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	2.5 días	24/2/26 15:00	27/2/26 16:00	$ 448,410.69
521	01.04.01.02.7	SARDINEL FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000PSI. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (GRAVA COMÚN) E=0.20M H=0.35M (INCLUYE FORMALETA METÁLICA, ACERO DE REFUERZO Y ALAMBRE NEGRO).	2.5 días	6/3/26 13:00	10/3/26 14:00	$ 233,405.96
522	01.04.01.02.8	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	4 días	6/3/26 13:00	12/3/26 12:00	$ 889,407.00
523	01.04.01.02.9	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA ESPACIO PÚBLICO	4 días	18/2/26 15:00	24/2/26 15:00	$ 637,974.00
524	01.04.01.02.1	CONCRETO 3000 PSI GRAVA COMÚN PARA PIEZA REMATE TIPO HOMBROS PARA RAMPA (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMIN., BOMBEO CON AUTOBOMBA, FORMALETEO Y COLOCACIÓN. NO INCL. REFUERZO, CURADO).	4 días	6/3/26 13:00	12/3/26 12:00	$ 2,761,975.13
525	01.04.01.02.1	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5	4 días	6/3/26 13:00	12/3/26 12:00	$ 207,554.40
526	**01.04.01.03**	**CAPITULO 07: REDES**	**3 días**	**9/2/26 08:00**	**12/2/26 15:00**	**$ 980,996.00**
527	01.04.01.03.1	CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR. SUMINISTRO E INSTALACION	3 días	9/2/26 08:00	12/2/26 15:00	$ 980,996.00
528	**01.04.02**	**CIV 6000528 (6000580)**	**25 días?**	**17/2/26 07:00**	**26/3/26 09:00**	**$ 67,678,243.45**
529	**01.04.02.01**	**CAPITULO 02: RECONSTRUCCION - REHABILITACION VIA PAVIMENTO FLEXIBLE**	**6 días**	**4/3/26 15:00**	**13/3/26 10:00**	**$ 28,167,901.38**
530	01.04.02.01.1	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 90 KN/M Y 110 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	3 días	4/3/26 15:00	9/3/26 12:00	$ 8,016,699.83
531	01.04.02.01.2	ESTABILIZACIÓN DE SUB BASE Y BASES GRANULARES CON ADITIVO	4 días	7/3/26 10:00	13/3/26 10:00	$ 20,151,201.55
532	**01.04.02.02**	**CAPITULO 06: ESPACIO PUBLICO EN CONCRETO**	**24 días**	**17/2/26 08:00**	**24/3/26 17:00**	**$ 39,019,844.07**
533	01.04.02.02.1	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	3 días	17/2/26 08:00	20/2/26 15:00	$ 2,140,137.79
534	01.04.02.02.2	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	3 días	17/2/26 08:00	20/2/26 15:00	$ 567,382.00
535	01.04.02.02.3	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	4 días	20/2/26 15:00	26/2/26 15:00	$ 3,184,615.14
536	01.04.02.02.4	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	4 días	20/2/26 15:00	26/2/26 15:00	$ 3,131,104.17
537	01.04.02.02.5	ANDEN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI (210 KG/CM2) PREMEZCLADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO)	4.5 días	13/3/26 10:00	19/3/26 16:00	$ 21,721,366.37

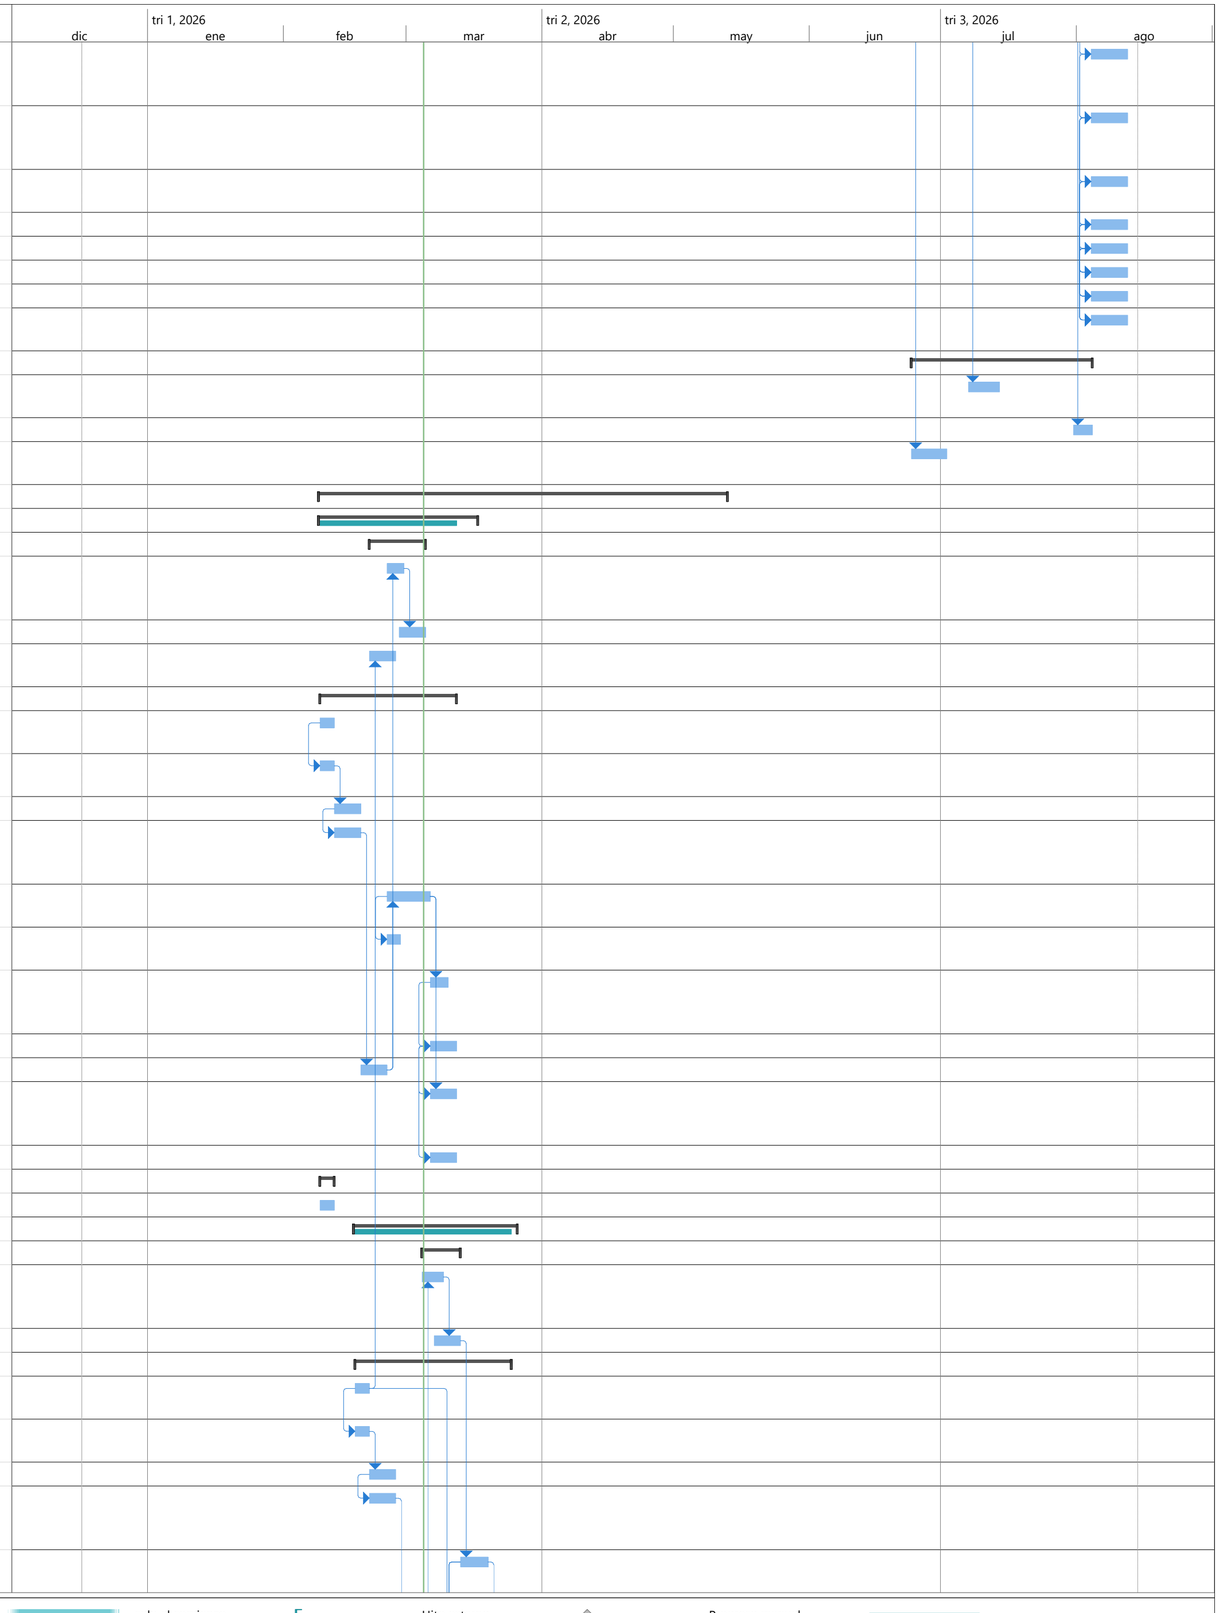

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
538	01.04.02.02.6	MALLA ELECTROSOLDADA 0.25X0.25M, D=4MM, 4MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	2.5 días	13/3/26 10:00	17/3/26 11:00	$ 465,840.21
539	01.04.02.02.7	SARDINEL FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000PSI. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (GRAVA COMÚN) E=0.20M H=0.35M (INCLUYE FORMALETA METÁLICA, ACERO DE REFUERZO Y ALAMBRE NEGRO).	2.5 días	19/3/26 16:00	24/3/26 17:00	$ 242,478.34
540	01.04.02.02.8	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	2.5 días	19/3/26 16:00	24/3/26 17:00	$ 5,680,346.04
541	01.04.02.02.9	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA ESPACIO PÚBLICO	4 días	26/2/26 15:00	4/3/26 15:00	$ 662,771.77
542	01.04.02.02.1	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5	2.5 días	19/3/26 16:00	24/3/26 17:00	$ 1,223,802.24
543	**01.04.02.03**	**CAPITULO 07: REDES**	**3 días**	**13/3/26 10:00**	**17/3/26 17:00**	**$ 490,498.00**
544	01.04.02.03.1	CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR. SUMINISTRO E INSTALACION	3 días	13/3/26 10:00	17/3/26 17:00	$ 490,498.00
545	**01.04.03**	**CIV 6001200**	**28 días?**	**24/2/26 07:00**	**9/4/26 16:00**	**$ 236,848,017.48**
546	**01.04.03.01**	**CAPITULO 02: RECONSTRUCCION - REHABILITACION VIA PAVIMENTO FLEXIBLE**	**6 días**	**13/3/26 08:00**	**21/3/26 12:00**	**$ 77,648,186.62**
547	01.04.03.01.1	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 90 KN/M Y 110 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	3 días	13/3/26 08:00	17/3/26 15:00	$ 22,098,991.20
548	01.04.03.01.2	ESTABILIZACIÓN DE SUB BASE Y BASES GRANULARES CON ADITIVO	4 días	16/3/26 13:00	21/3/26 12:00	$ 55,549,195.42
549	**01.04.03.02**	**CAPITULO 06: ESPACIO PUBLICO EN CONCRETO**	**24.5 días**	**24/2/26 08:00**	**1/4/26 14:00**	**$ 42,775,687.35**
550	01.04.03.02.1	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	3 días	24/2/26 08:00	27/2/26 15:00	$ 5,899,545.60
551	01.04.03.02.2	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	3 días	24/2/26 08:00	27/2/26 15:00	$ 463,800.00
552	01.04.03.02.3	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	4 días	27/2/26 15:00	5/3/26 15:00	$ 8,778,772.24
553	01.04.03.02.4	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	4 días	27/2/26 15:00	5/3/26 15:00	$ 8,631,262.85
554	01.04.03.02.5	ANDEN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI (210 KG/CM2) PREMEZCLADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO)	4 días	21/3/26 13:00	28/3/26 12:00	$ 0.00
555	01.04.03.02.6	MALLA ELECTROSOLDADA 0.25X0.25M, D=4MM, 4MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	2 días	21/3/26 13:00	25/3/26 17:00	$ 1,284,144.23
556	01.04.03.02.7	SARDINEL FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000PSI.	2.5 días	28/3/26 13:00	1/4/26 14:00	$ 668,420.53
557	01.04.03.02.8	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	2.5 días	28/3/26 13:00	1/4/26 14:00	$ 5,929,380.00
558	01.04.03.02.9	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA ESPACIO PÚBLICO	5 días	5/3/26 15:00	12/3/26 17:00	$ 1,827,009.60
559	01.04.03.02.1	CONCRETO 3000 PSI GRAVA COMÚN PARA PIEZA REMATE TIPO HOMBROS PARA RAMPA (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMIN., BOMBEO CON AUTOBOMBA, FORMALETEO Y COLOCACIÓN. NO INCL. REFUERZO, CURADO).	2.5 días	28/3/26 13:00	1/4/26 14:00	$ 7,909,656.30
560	01.04.03.02.1	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5	2.5 días	28/3/26 13:00	1/4/26 14:00	$ 1,383,696.00
561	**01.04.03.03**	**CAPITULO 07: REDES**	**3 días**	**28/3/26 13:00**	**6/4/26 10:00**	**$ 1,471,494.00**
562	01.04.03.03.1	CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR. SUMINISTRO E INSTALACION	3 días	28/3/26 13:00	6/4/26 10:00	$ 1,471,494.00
563	**01.04.03.04**	**CAPITULO 08: SEÑALIZACIÓN**	**3 días**	**1/4/26 14:00**	**9/4/26 11:00**	**$ 18,123,932.80**
564	01.04.03.04.1	DEMARCACION LINEA DISCONTINUA A=0.12M (E=15 MILS, ACRÍLICA BASE AGUA. INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)	3 días	1/4/26 14:00	9/4/26 11:00	$ 1,314,000.00
565	01.04.03.04.2	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.	3 días	1/4/26 14:00	9/4/26 11:00	$ 438,040.00
566	01.04.03.04.3	DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)	3 días	1/4/26 14:00	9/4/26 11:00	$ 7,212,992.80
567	01.04.03.04.4	DEMARCACION LINEA DISCONTINUA A=0.12M (E=15 MILS, ACRÍLICA BASE AGUA. INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)	3 días	1/4/26 14:00	9/4/26 11:00	$ 180,960.00
568	01.04.03.04.5	FLECHA DIRECCIONAL "A LA DERECHA" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.51M2	3 días	1/4/26 14:00	9/4/26 11:00	$ 275,600.00
569	01.04.03.04.6	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA DERECHA" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. INC. MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 2.18M2	3 días	1/4/26 14:00	9/4/26 11:00	$ 397,888.00
570	01.04.03.04.7	PINTURA TERMOPLASTICA (E=2.3MM. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS)	3 días	1/4/26 14:00	9/4/26 11:00	$ 2,336,192.00
571	01.04.03.04.8	ESTOPEROLES DE 10 CM X 2.5 CM. SUMINISTRO E INSTALACION.	3 días	1/4/26 14:00	9/4/26 11:00	$ 262,780.00
572	01.04.03.04.9	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	3 días	1/4/26 14:00	9/4/26 11:00	$ 4,071,960.00
573	01.04.03.04.1	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	3 días	1/4/26 14:00	9/4/26 11:00	$ 937,260.00
574	01.04.03.04.1	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE, SENDEROS PEATONALES, ACHURADOS, ETC).	3 días	1/4/26 14:00	9/4/26 11:00	$ 696,260.00
575	**01.04.03.05**	**CAPITULO 09: NO PREVISTOS**	**3 días**	**28/3/26 13:00**	**6/4/26 10:00**	**$ 96,828,716.71**
576	01.04.03.05.1	PISO EN CONCRETO ESTAMPADO DE COLOR SUPERFICIAL SALMON. E=0.12M.	3 días	28/3/26 13:00	6/4/26 10:00	$ 96,828,716.71
577	**01.04.04**	**CIV 6001206**	**28 días?**	**10/3/26 07:00**	**23/4/26 16:00**	**$ 185,131,734.41**
578	**01.04.04.01**	**CAPITULO 02: RECONSTRUCCION - REHABILITACION VIA PAVIMENTO FLEXIBLE**	**18 días**	**10/3/26 08:00**	**9/4/26 12:00**	**$ 61,001,433.12**
579	01.04.04.01.1	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 90 KN/M Y 110 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	3 días	28/3/26 08:00	1/4/26 15:00	$ 16,868,896.62

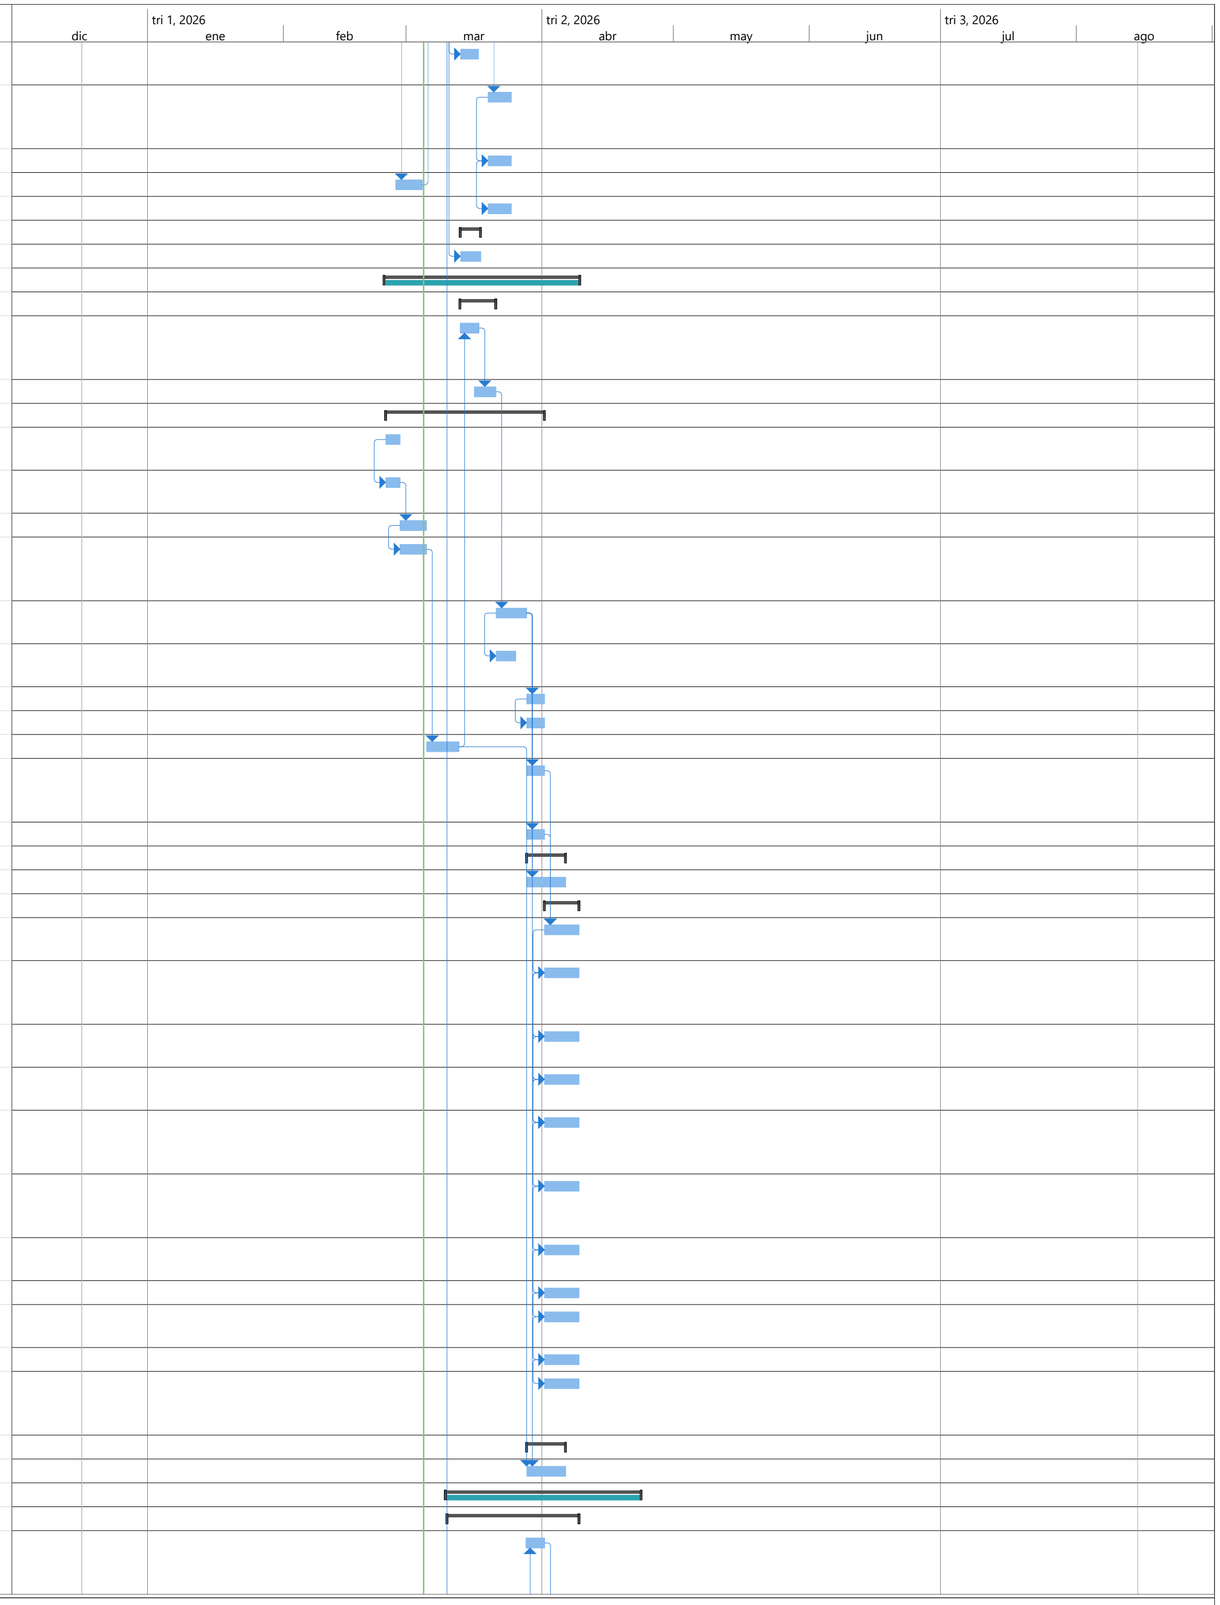


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
580	01.04.04.01.2	ESTABILIZACIÓN DE SUB BASE Y BASES GRANULARES CON ADITIVO	4 días	31/3/26 13:00	9/4/26 12:00	$ 42,402,552.50
581	01.04.04.01.3	TRATAMIENTO SILVICULTURAL PODA DE RAÍCES (INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL, CORTE, CICATRIZACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A 28 KILÓMETROS)	4 días	10/3/26 08:00	14/3/26 17:00	$ 1,729,984.00
582	**01.04.04.02**	**CAPITULO 06: ESPACIO PUBLICO EN CONCRETO**	**24.5 días**	**10/3/26 08:00**	**18/4/26 14:00**	**$ 32,652,108.00**
583	01.04.04.02.1	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	3 días	10/3/26 08:00	13/3/26 15:00	$ 4,503,319.81
584	01.04.04.02.2	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	3 días	10/3/26 08:00	13/3/26 15:00	$ 354,034.00
585	01.04.04.02.3	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	4 días	13/3/26 15:00	19/3/26 15:00	$ 6,701,129.47
586	01.04.04.02.4	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	4 días	13/3/26 15:00	19/3/26 15:00	$ 6,588,530.64
587	01.04.04.02.5	CONCRETO 3000 PSI GRAVA COMÚN PARA PIEZA REMATE TIPO HOMBROS PARA RAMPA (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMIN., BOMBEO CON AUTOBOMBA, FORMALETEO Y COLOCACIÓN. NO INCL. REFUERZO, CURADO).	4 días	9/4/26 13:00	15/4/26 12:00	$ 6,037,704.31
588	01.04.04.02.6	MALLA ELECTROSOLDADA 0.25X0.25M, D=4MM, 4MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	2 días	9/4/26 13:00	11/4/26 17:00	$ 980,230.09
589	01.04.04.02.7	SARDINEL FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000PSI.	2.5 días	15/4/26 13:00	18/4/26 14:00	$ 510,227.67
590	01.04.04.02.8	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	2.5 días	15/4/26 13:00	18/4/26 14:00	$ 4,526,093.40
591	01.04.04.02.9	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA ESPACIO PÚBLICO	5 días	19/3/26 15:00	27/3/26 17:00	$ 1,394,617.33
592	01.04.04.02.1	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5	2.5 días	15/4/26 13:00	18/4/26 14:00	$ 1,056,221.28
593	**01.04.04.03**	**CAPITULO 07: REDES**	**3 días**	**18/4/26 14:00**	**23/4/26 11:00**	**$ 980,996.00**
594	01.04.04.03.1	CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR. SUMINISTRO E INSTALACION	3 días	18/4/26 14:00	23/4/26 11:00	$ 980,996.00
595	**01.04.04.04**	**CAPITULO 08: SEÑALIZACIÓN**	**3 días**	**18/4/26 14:00**	**23/4/26 11:00**	**$ 16,584,610.20**
596	01.04.04.04.1	DEMARCACION LINEA DISCONTINUA A=0.12M (E=15 MILS, ACRÍLICA BASE AGUA. INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)	3 días	18/4/26 14:00	23/4/26 11:00	$ 1,003,020.00
597	01.04.04.04.2	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.	3 días	18/4/26 14:00	23/4/26 11:00	$ 438,040.00
598	01.04.04.04.3	DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)	3 días	18/4/26 14:00	23/4/26 11:00	$ 7,212,992.80
599	01.04.04.04.4	DEMARCACION LINEA DISCONTINUA A=0.12M (E=15 MILS, ACRÍLICA BASE AGUA. INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)	3 días	18/4/26 14:00	23/4/26 11:00	$ 138,132.80
600	01.04.04.04.5	FLECHA DIRECCIONAL "A LA DERECHA" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.51M2	3 días	18/4/26 14:00	23/4/26 11:00	$ 275,600.00
601	01.04.04.04.6	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA DERECHA" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. INC. MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 2.18M2	3 días	18/4/26 14:00	23/4/26 11:00	$ 397,888.00
602	01.04.04.04.7	PINTURA TERMOPLASTICA (E=2.3MM. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS)	3 días	18/4/26 14:00	23/4/26 11:00	$ 2,336,192.00
603	01.04.04.04.8	ESTOPEROLES DE 10 CM X 2.5 CM. SUMINISTRO E INSTALACION.	3 días	18/4/26 14:00	23/4/26 11:00	$ 262,780.00
604	01.04.04.04.9	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	3 días	18/4/26 14:00	23/4/26 11:00	$ 3,108,262.80
605	01.04.04.04.1	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	3 días	18/4/26 14:00	23/4/26 11:00	$ 715,441.80
606	01.04.04.04.1	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE, SENDEROS PEATONALES, ACHURADOS, ETC).	3 días	18/4/26 14:00	23/4/26 11:00	$ 696,260.00
607	**01.04.04.05**	**CAPITULO 09: NO PREVISTOS**	**3 días**	**15/4/26 13:00**	**20/4/26 10:00**	**$ 73,912,587.09**
608	01.04.04.05.1	PISO EN CONCRETO ESTAMPADO DE COLOR SUPERFICIAL SALMON. E=0.12M.	3 días	15/4/26 13:00	20/4/26 10:00	$ 73,912,587.09
609	**01.04.05**	**CIV 6001303 (6001683)**	**25 días?**	**24/3/26 07:00**	**4/5/26 09:00**	**$ 44,876,965.10**
610	**01.04.05.01**	**CAPITULO 02: RECONSTRUCCION - REHABILITACION VIA PAVIMENTO FLEXIBLE**	**6 días**	**11/4/26 15:00**	**21/4/26 10:00**	**$ 17,730,193.22**
611	01.04.05.01.1	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 90 KN/M Y 110 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	3 días	11/4/26 15:00	16/4/26 12:00	$ 5,046,085.44
612	01.04.05.01.2	ESTABILIZACIÓN DE SUB BASE Y BASES GRANULARES CON ADITIVO	4 días	15/4/26 10:00	21/4/26 10:00	$ 12,684,107.78
613	**01.04.05.02**	**CAPITULO 06: ESPACIO PUBLICO EN CONCRETO**	**24.5 días**	**24/3/26 08:00**	**2/5/26 14:00**	**$ 27,146,771.88**
614	01.04.05.02.1	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	3 días	24/3/26 08:00	27/3/26 15:00	$ 1,347,102.72
615	01.04.05.02.2	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	3 días	24/3/26 08:00	27/3/26 15:00	$ 326,979.00
616	01.04.05.02.3	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	4 días	27/3/26 15:00	6/4/26 15:00	$ 2,004,545.56
617	01.04.05.02.4	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	4 días	27/3/26 15:00	6/4/26 15:00	$ 1,970,863.26
618	01.04.05.02.5	ANDEN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI (210 KG/CM2) PREMEZCLADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO)	5 días	21/4/26 10:00	28/4/26 12:00	$ 13,672,442.88
619	01.04.05.02.6	MALLA ELECTROSOLDADA 0.25X0.25M, D=4MM, 4MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	3 días	21/4/26 10:00	24/4/26 17:00	$ 293,221.60

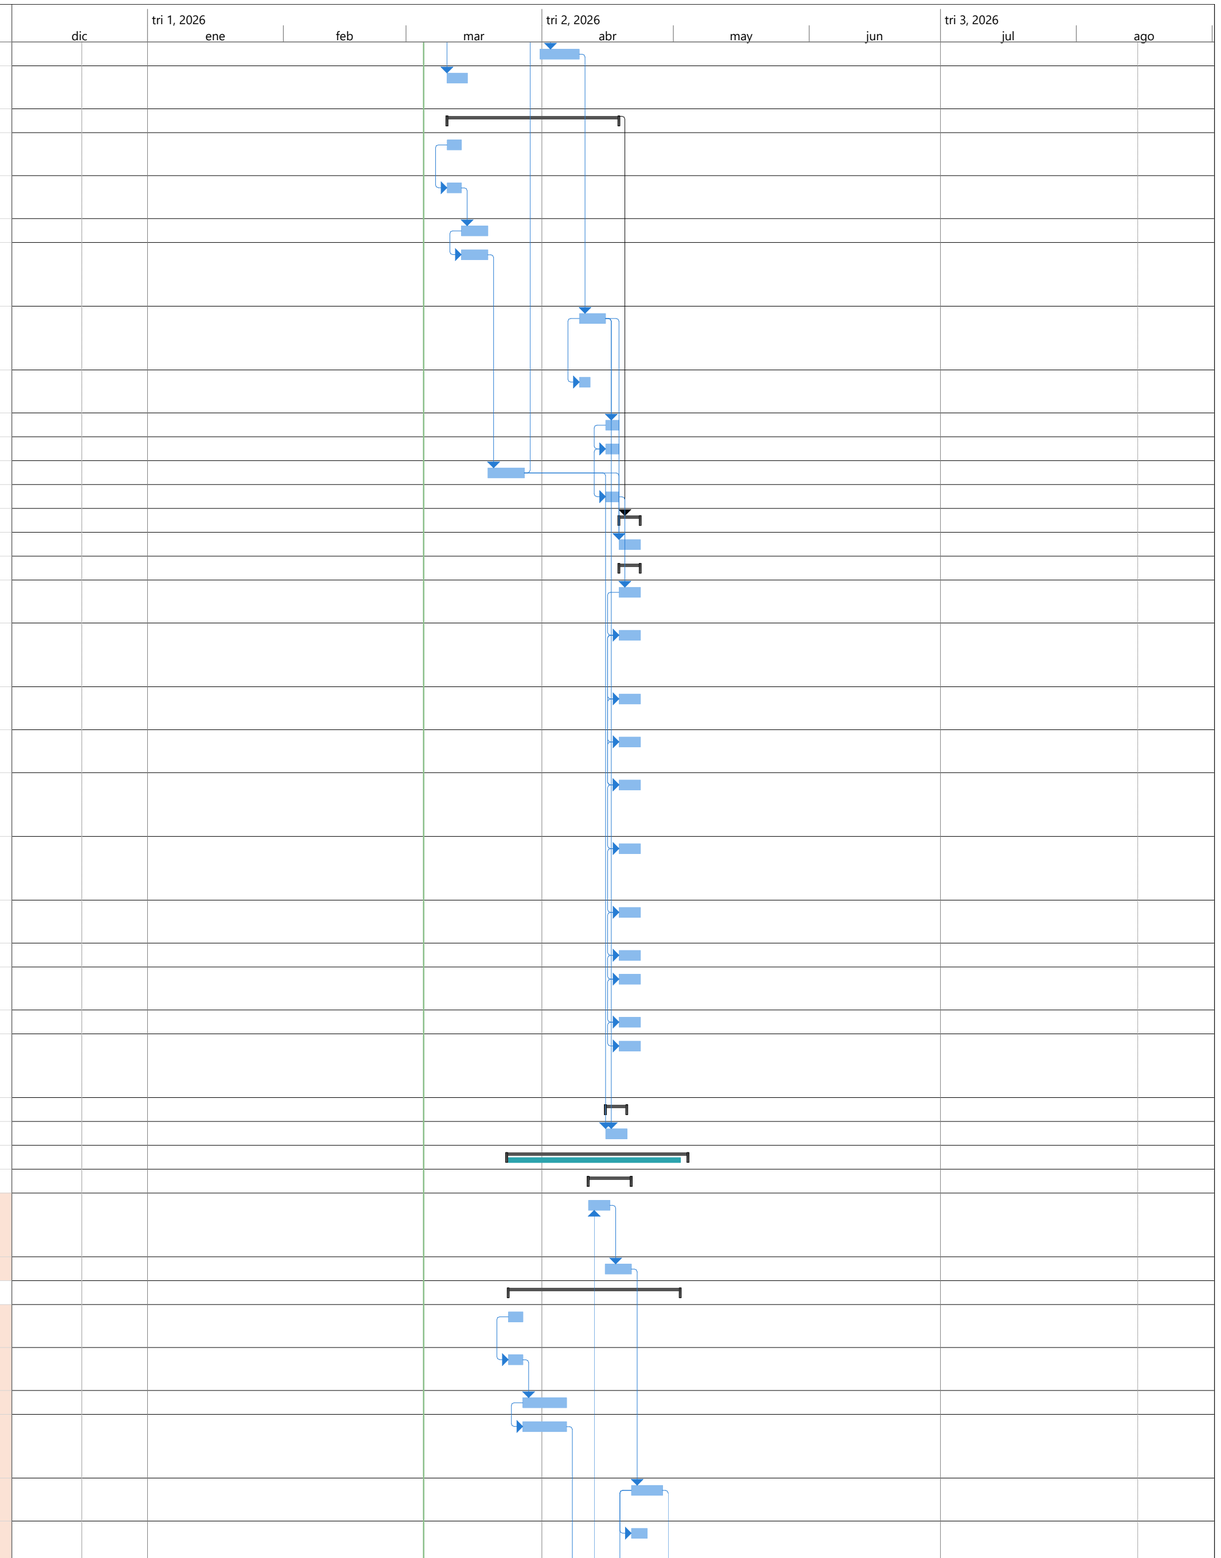

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: 5/3/26 15:07

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · Progreso manual
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Progreso

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
620	01.04.05.02.7	SARDINEL FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000PSI. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (GRAVA COMÚN) E=0.20M H=0.35M (INCLUYE FORMALETA METÁLICA, ACERO DE REFUERZO Y ALAMBRE NEGRO).	2.5 días	28/4/26 13:00	2/5/26 14:00	$ 152,627.20
621	01.04.05.02.8	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	2.5 días	28/4/26 13:00	2/5/26 14:00	$ 4,180,212.90
622	01.04.05.02.9	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA ESPACIO PÚBLICO	4 días	6/4/26 15:00	11/4/26 15:00	$ 417,179.52
623	01.04.05.02.10	CONCRETO 3000 PSI GRAVA COMÚN PARA PIEZA REMATE TIPO HOMBROS PARA RAMPA (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMIN., BOMBEO CON AUTOBOMBA, FORMALETEO Y COLOCACIÓN. NO INCL. REFUERZO, CURADO).	5 días	21/4/26 10:00	28/4/26 12:00	$ 1,806,091.56
624	01.04.05.02.11	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5	2.5 días	28/4/26 13:00	2/5/26 14:00	$ 975,505.68
625	**01.04.06**	**CIV 6001407**	**25 días?**	**6/4/26 07:00**	**13/5/26 09:00**	**$ 251,719,303.78**
626	**01.04.06.01**	**CAPITULO 02: RECONSTRUCCION - REHABILITACION VIA PAVIMENTO FLEXIBLE**	**6 días**	**21/4/26 15:00**	**30/4/26 10:00**	**$ 92,344,756.35**
627	01.04.06.01.1	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 90 KN/M Y 110 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	3 días	21/4/26 15:00	25/4/26 12:00	$ 26,281,695.00
628	01.04.06.01.2	ESTABILIZACIÓN DE SUB BASE Y BASES GRANULARES CON ADITIVO	4 días	24/4/26 10:00	30/4/26 10:00	$ 66,063,061.35
629	**01.04.06.02**	**CAPITULO 06: ESPACIO PUBLICO EN CONCRETO**	**24 días**	**6/4/26 08:00**	**11/5/26 17:00**	**$ 135,830,643.43**
630	01.04.06.02.1	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	3 días	6/4/26 08:00	9/4/26 15:00	$ 7,016,160.00
631	01.04.06.02.2	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	3 días	6/4/26 08:00	9/4/26 15:00	$ 1,932,500.00
632	01.04.06.02.3	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	4 días	9/4/26 15:00	15/4/26 15:00	$ 10,440,341.48
633	01.04.06.02.4	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	4 días	9/4/26 15:00	15/4/26 15:00	$ 10,264,912.80
634	01.04.06.02.5	ANDEN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI (210 KG/CM2) PREMEZCLADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO)	4.5 días	30/4/26 10:00	7/5/26 16:00	$ 71,210,640.00
635	01.04.06.02.6	MALLA ELECTROSOLDADA 0.25X0.25M, D=4MM, 4MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	2.5 días	30/4/26 10:00	5/5/26 11:00	$ 1,527,195.82
636	01.04.06.02.7	SARDINEL FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000PSI. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (GRAVA COMÚN) E=0.20M H=0.35M (INCLUYE FORMALETA METÁLICA, ACERO DE REFUERZO Y ALAMBRE NEGRO).	2.5 días	7/5/26 16:00	11/5/26 17:00	$ 794,933.33
637	01.04.06.02.8	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	2.5 días	7/5/26 16:00	11/5/26 17:00	$ 24,705,750.00
638	01.04.06.02.9	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA ESPACIO PÚBLICO	4 días	15/4/26 15:00	21/4/26 15:00	$ 2,172,810.00
639	01.04.06.02.1	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5	2.5 días	7/5/26 16:00	11/5/26 17:00	$ 5,765,400.00
640	**01.04.06.03**	**CAPITULO 07: REDES**	**3 días**	**30/4/26 10:00**	**5/5/26 17:00**	**$ 23,543,904.00**
641	01.04.06.03.1	CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR. SUMINISTRO E INSTALACION	3 días	30/4/26 10:00	5/5/26 17:00	$ 23,543,904.00
642	02	FIN DE OBRA	0 días			$ 0.00

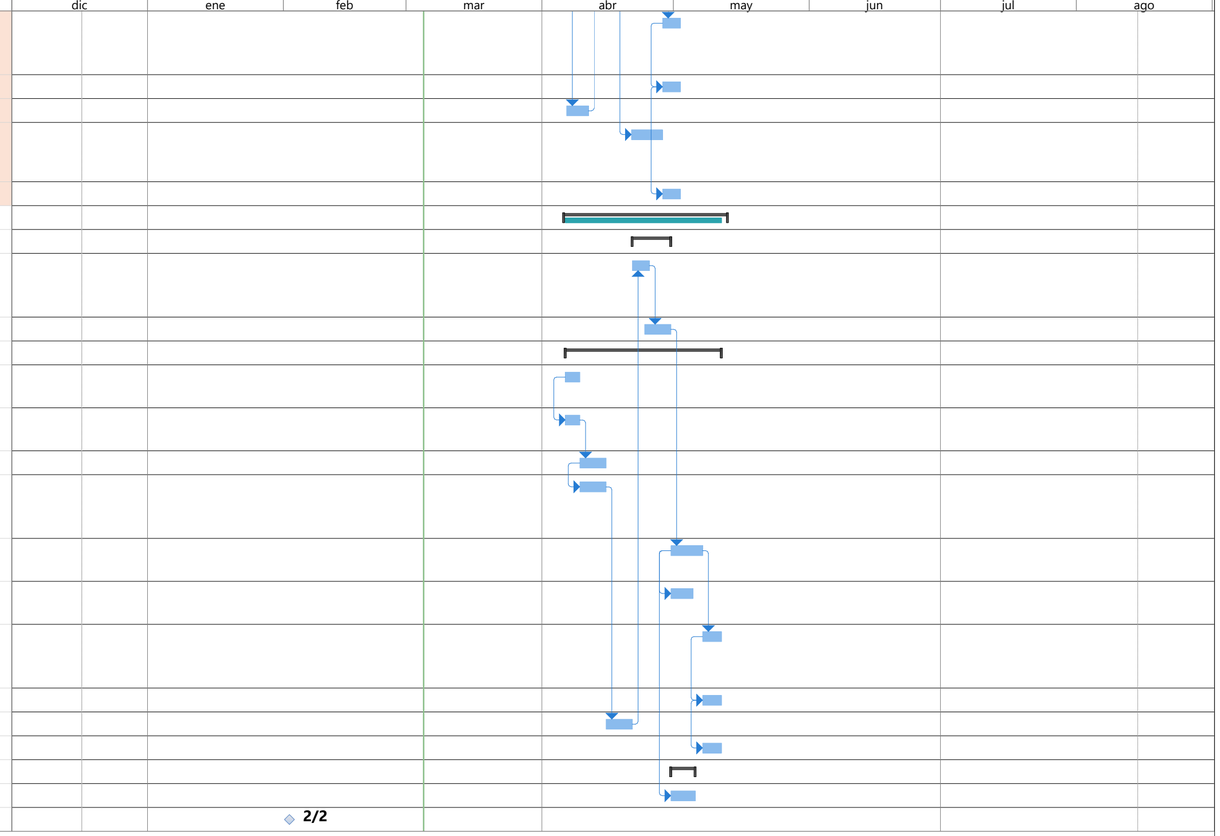

Proyecto: PROGRAMACIÓN PO
Fecha: 5/3/26 15:07

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	Progreso manual
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Progreso	

6. BALANCE

RESUMEN						
TIPO	**CIV**	**DIRECCIÓN**	**DISEÑOS Y DIAGNOSTICO**	**VÍA**	**ANDÉN**	**SUBTOTAL: VÍAS + ANDENES**
INTERMEDIA	**6000789**		**$ 14.321.275,0**	$ 700.680.189,0	$ 42.627.060,0	**$ 743.307.249,0**
LOCAL	**6000857**		**$ 11.788.495,0**	$ 730.119.858,0	$ 43.454.768,0	**$ 773.574.626,0**
LOCAL	**6000830**		**$ 10.910.516,0**	$ 401.754.503,0	$ 19.451.184,0	**$ 421.205.687,0**
LOCAL	**6000372**		**$ 21.911.170,0**	$ 703.395.420,0	$ 43.082.300,0	**$ 746.477.720,0**
LOCAL	**6000786**		**$ 7.939.406,0**	$ 285.471.573,0	$ 14.484.923,0	**$ 299.956.496,0**
INTERMEDIA	**6001013**		**$ 14.202.399,6**	$ 857.387.214,0	$ 45.524.044,0	**$ 902.911.258,0**
LOCAL	**6000389**		$ 9.040.634,0	$ 268.856.254,0	$ 17.877.930,0	**$ 286.734.184,0**
LOCAL	**6000557**		$ 15.076.901,0	$ 532.237.840,0	$ 45.101.148,0	**$ 577.338.988,0**
LOCAL	**6000870**		**$ 14.494.299,0**	$ 656.286.190,0	$ 45.524.044,0	**$ 701.810.234,0**
E.P	6000528 (6000580)		$ -	$ -	$ 14.403.184,0	**$ 14.403.184,0**
E.P	6001206		$ -	$ -	$ 224.955.291,0	**$ 224.955.291,0**
E.P	6001200		$ -	$ -	$ 302.948.762,0	**$ 302.948.762,0**
E.P	6001303		$ -	$ -	$ 50.389.938,0	**$ 50.389.938,0**
E.P	6000580 (6000528)		$ -	$ -	$ 67.426.302,0	**$ 67.426.302,0**
E.P	6001407		$ -	$ -	$ 40.958.792,0	$ 40.958.792,0
TOTAL			**$ 119.685.095,6**	**$ 5.136.189.041,0**	**$ 1.018.209.670,0**	**$ 6.154.398.711,0**

SUBTOTAL VÍAS + ANDENES	$ 6.154.398.711,0
DISEÑOS Y DIAGNOSTICO	$ 119.685.095,6
COMPONENTES	$ 521.453.410,0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 6.795.537.216,60

7. CORRESPONDENCIA ENVIADA

FDLT-CTO-613-2025/068

Bogotá D.C, 06 de mayo de 2026

Señores:
AHLA SHUGL INTERNATIONAL S.A.S.
Atn Ing Santiago Carrillo Vargas.
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Bogotá D.C

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA FDLT-CTO-613-2025

OBJETO: "EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

ASUNTO: Informe Mensual Componente Social No. 4

Respetados señores,

En cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el Contrato FDLT No. 613 de 2025, y conforme a los alcances definidos para el desarrollo de los procesos del mismo, por medio de la presente se remite a la Interventoría los siguientes documentos para su respectiva revisión y aprobación:

- **Informe Mensual Componente Social No. 4 V1**

Por lo anterior, la totalidad de la documentación se encuentra disponible para revisión en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1SOmoTohsQSKOnT0B2JjlSy6k_iYBnaGe?usp=drive_link

Cordialmente,

JOTAM MAESTRE DIAB
Representante Legal
CONSORCIO COCO

CONSORCIO COCO
E-mail: consorciococo2025@gmail.com; Tel 601-4770190

NIT: 9020201058

FDLT-CTO-613-2025/069

Bogotá D.C, 06 de mayo de 2026

Señores:
AHLA SHUGL INTERNATIONAL SAS
Ing. Santiago Carrillo Vargas
Director de Interventoría
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA FDLT-CTO-613-2025

OBJETO: "EJECUTAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE REAJUSTE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ."

ASUNTO: Radicación Acta Parcial N°3.

Cordial saludo

Por medio de la presente me permito radicar el Acta Parcial N°3 del contrato **FDLT-CTO-613-2025** con los respectivos soportes.

Atentamente,

ING. JOTAM MAESTRE BIAB
REPRESENTANTE LEGAL
CONCORCIO COCO

Bogotá D.C, 6 de mayo de 2026

Señores:
AHLA SHUGL INTERNATIONAL S.A.S.
Atn Ing Santiago Carrillo Vargas.
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Bogotá D.C

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA FDLT-CTO-613-2025

OBJETO: "EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

ASUNTO: Novedades en Cronograma de Ejecución de Obra

CONSORCIO

Respetados señores:

Dentro del alcance del contrato 613-2025 se priorizaron segmentos viales para su ejecución ajustados al presupuesto del contrato y sobre los cuales se adelantaron las actividades previas en los componentes social (actas de vecindad, socialización para PMT), Técnico (Presupuesto, Cronograma, Informe de redes, CCTVs , PMTs)

Cuadro Listado de Segmentos

MALLA VIAL					
NO.	**CIV**	**EJE VIAL**	**DESDE**	**HASTA**	**TIPO DE MALLA**
1	6000789	CL 49a sur	Kr 31	Kr33	Intermedia
2	6000557	CL 50a sur	Kr 36	Kr 37	Local

MALLA VIAL					
NO.	CIV	EJE VIAL	DESDE	HASTA	TIPO DE MALLA
3	6000389	Kr 38	CL 50a sur	CL 50b sur	Local
4	6000372	CL 50a sur	TV 44	Kr 38	Local
5	6000830	Kr 34	CL 54 sur	CL 54a sur	Local
6	6000870	CL 53b sur	Kr 33ª	Kr 34	Local
7	6000857	CL 53a sur	Kr 33a	Kr 34	Local
8	6001013	CL 48c sur	Kr 26	Kr 27	Intermedia
9	6000786	Kr 34	Dg 52b sur	CL 52g sur	Local

ESPACIO PUBLICO					
NO.	CIV	PK_ID	EJE VIAL	DESDE	HASTA
1	6001206	323557	Kr 25	CL 54 sur	CL 54a sur
2	6001200	323539	Kr 25	CL 52b sur	CL 54 sur
3	6001407	324176	Kr 18	CL 55 sur	CL 57 sur
4	6001683(1303)	323827	[illegible]	Dg 48 sur	Kr 19b
5	6000580	20007649	Kr 54b	Dg 52b sur	TV 44
6	6000528	321577	Kr 55a	Dg 52b sur	TV 44

CONSORCIO

A la fecha se han ejecutado los segmentos de Espacio Público CIVs 6000580, 6000528 terminados, 6001200 en ejecución, y los segmentos de malla vial CIVs 6000372, 6000389, 6000857, 60001013, 6000557, 6000786 los cuales se encuentran en ejecución, Por otro lado se tenía programado para ejecución el segmento 6000789 al cual se elaboró actas de vecindad, socialización, CCTV, PMT sin embargo este segmento fue excluido dado que este se encontraba dentro del polígono de un proyecto de la EAAB, Así las cosas se incluyó el CIV 6000931 como reemplazo de ese segmento.

Se dio inicio a los tramites con volanteo, levantamiento de actas de vecindad, socialización para PMT, elaboración del PMT, como también la programación para inicio de actividades, estando en este punto nuevamente aparece un contrato del IDU en etapa de diseño "Elaboración de los estudios y diseños, para la construcción de la Avenida Jorge Gaitán Cortes (Carrera 33) en el tramo comprendido entre la Calle 51 Sur (Avenida Congreso Eucarístico) hasta la Avenida Boyacá (Calle 56 Sur) en la localidad de Tunjuelito en Bogotá D.C." con el cual y a través de una mesa de trabajo se excluye este segmento vial dado que se encuentra dentro del polígono sobre el cual se ejecutaran las obras del proyecto sobre el corredor de la carrera 33.

Así las cosas, se realiza una visita conjunta inicialmente con la interventoría, contratista y luego una nueva visita interventoría y EAAB y delegado del FDLT al nuevo segmento vial CIV 6000617 con el fin de validar las condiciones hidráulicas y estructurales para su ejecución esta visita se llevó a cabo el día 4 de mayo de 2026.

De la reunión citada salen unas recomendaciones y requerimientos sobre la red sanitaria por parte del supervisor de la EAAB, a lo cual se debe dar una respuesta para continuar con el apoyo técnico por parte del supervisor, por otro lado programar el inicio de actividades sociales, transito (PMT), Técnicas etc esto nos genera re procesos para poder dar inicio a las ejecuciones en este segmento vial.

Con lo anterior el Consorcio Coco manifiesta que dadas las situaciones expuestas nos vemos en la imperiosa necesidad de alertar la posibilidad de atrasos no atribuibles al contratista del contrato 613-2025 de acuerdo a lo inicialmente programado. Esto aunado a que en los últimos meses el fenómeno climático ha estado pasado por intensas y continuas lluvias lo que ha perjudicado los rendimientos en la ejecución de las actividades de obra en los distintos segmentos viales que están en desarrollo.

Sin otro particular,

CONSORCIO

Cordialmente,

JOTAM MAESTRE DIAB
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO COCO

CONSORCIO COCO
E-mail: consorciococo2025@gmail.com; Tel 601-4770190

FDLT-CTO-613-2025/073

Bogotá D.C, 21 de mayo de 2026

Señores:
AHLA SHUGL INTERNATIONAL S.A.S.
Atn Ing Santiago Carrillo Vargas
DIRECTORA DE INTERVENTORIA
Bogotá D.C

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA FDLT-CTO-613-2025

OBJETO: "EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

ASUNTO: Dimensionamiento de contenedores para individuos arbóreos

Respetados señores,

Por medio de la presente se comunica que, para el dimensionamiento del contenedor de un individuo arbóreo, el criterio técnico principal corresponde al tamaño del cepellón, entendido como el bloque de suelo consolidado que protege y contiene el sistema radicular de la especie durante su establecimiento y desarrollo.

En este sentido, la selección del contenedor debe fundamentarse en el porte y desarrollo actual del árbol, garantizando que las dimensiones del recipiente sean, como mínimo, entre un 20 % y un 30 % superiores al ancho y profundidad del cepellón existente. Este criterio permite disponer de un volumen suficiente de sustrato para favorecer el adecuado crecimiento radicular, mejorar la estabilidad fisiológica del individuo y reducir riesgos asociados a restricciones mecánicas del sistema de raíces.

Adicionalmente, esta relación dimensional contribuye a optimizar las condiciones de aireación, retención de humedad y disponibilidad de nutrientes, promoviendo un desarrollo saludable y sostenible del material vegetal durante su permanencia en contenedor y posterior proceso de establecimiento.

Cordialmente,

JOTAM MAESTRE DIAB
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO COCO

CONSORCIO COCO
E-mail: consorciococo2025@gmail.com; Tel 601-4770190

FDLT-CTO-613-2025/074

Bogotá D.C, 25 de mayo de 2026

Señores:
AHLA SHUGL INTERNATIONAL S.A.S.
Atn Ing Santiago Carrillo Vargas.
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Bogotá D.C

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA FDLT-CTO-613-2025

OBJETO: "EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

ASUNTO: Informe Mensual Componente Seguridad y Salud en el Trabajo No.4

Respetados señores,

En atención al oficio INT-652-2025-074, nos permitimos dar cumplimiento a las observaciones señaladas en el Informe N.º 4 de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Cordialmente,

CONSORCIO

JOTAM MAESTRE DIAB
Representante Legal
CONSORCIO COCO

CONSORCIO COCO
E-mail: consorciococo2025@gmail.com; Tel 601-4770190

FDLT-CTO-613-2025/075

Bogotá D.C, 27 de mayo de 2026

Señores:
AHLA SHUGL INTERNATIONAL S.A.S.
Atn Ing Santiago Carrillo Vargas.
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Bogotá D.C

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA FDLT-CTO-613-2025

OBJETO: "EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

ASUNTO: Informe Mensual Ambiental No. 5 V1

Respetados señores,

En cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el Contrato FDLT No. 613 de 2025, y conforme a los alcances definidos para el desarrollo de los procesos del mismo, por medio de la presente se remite a la Interventoría el informe mensual ambiental número 4 en su versión 1, para su respectiva revisión y aprobación:

- **Informe Mensual Componente Ambiental No 5 V1**

Por lo anterior, la totalidad de la documentación se encuentra disponible para revisión en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/15HXxdbDvmXz92YzPxeS3YGtilL4SVYTR?usp=drive_link

Cordialmente,

JAVIER HERNANDO CASTRO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO COCO

CONSORCIO COCO
E-mail: consorciococo2025@gmail.com; Tel 601-4770190

Bogotá D.C, 28 de mayo de 2026

Señores:
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
Atn Martha Cecilia Bayona Gómez
SUBDIRECTORA DE PLANES DE MANEJO DE TRANSITO
Bogotá D.C

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA FDLT-CTO-613-2025

OBJETO: "EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

ASUNTO: Respuesta SPMT 202631206451091. Incumplimientos en la implementación del plan de manejo de tránsito (PMT)

Respetados señores,

En atención a la comunicación SPMT No. 202631206451091, mediante la cual se informan incumplimientos en la implementación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) en el área de intervención del proyecto, nos permitimos presentar la correspondiente respuesta a las observaciones realizadas durante la visita de seguimiento.

Incumplimientos:

Calle 48C Sur entre Carrera 26 y Carrera 27

Incumplimientos 27 de abril de 2026:

- Se evidenció la ausencia de barricada y señalización de desvío en el extremo del cierre de la Calle 48C Sur con Carrera 26, generando desinformación para los usuarios (ver fotografía 2).
- Se evidenció la implementación de un sendero peatonal transversal en condiciones inseguras en el extremo de la Calle 48C Sur con Carrera 26, toda vez que se observó superficie con relleno de material pétreo suelto. Adicionalmente, el sendero se encuentra delimitado con elementos no reglamentados que no cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Señalización Vial, teniendo en cuenta que, para

este tipo de intervención, los elementos d canalización deben corresponder a barreras plásticas flexibles tipo maletín (ver fotografías 3 y 4).

Respuesta:

En atención a las observaciones realizadas durante la visita de seguimiento, el contratista se permite informar que:

Respecto a la ausencia de barricada y señalización de desvío en el extremo del cierre ubicado en la Calle 48C Sur con Carrera 26, se informa que la situación identificada fue atendida mediante la instalación de los dispositivos de señalización y control de tránsito correspondientes, conforme a lo establecido en el PMT aprobado. (ver fotografía 1)

Adicionalmente, se reforzó la verificación en campo por parte del personal operativo con el fin de garantizar el mantenimiento permanente de la señalización y brindar información clara y oportuna a los usuarios de la vía, minimizando afectaciones a la movilidad y fortaleciendo las condiciones de seguridad en el sector. (ver fotografía 2).

En atención al sendero peatonal transversal se informa que se efectuaron las acciones correctivas correspondientes con el fin de garantizar condiciones adecuadas de seguridad y movilidad para los peatones. En ese sentido, se realizó el ajuste del cerramiento de obra estirando el mismo hasta la zona donde se encuentra el sendero peatonal. (ver fotografía 3).

Respecto al uso de elementos de canalización no reglamentados (colombinas artesanales), se precisa que, debido a las condiciones de seguridad del sector y a los constantes robos de los elementos de señalización, fue necesario implementar de manera temporal este tipo de elementos con el fin de delimitar el área de intervención y mantener la canalización básica del tránsito mientras se culmina las actividades de obras programadas. (ver fotografía 4). No obstante, el contratista prioriza las actividades de este frente de obra para finalizar las labores en el menor tiempo posible, reduciendo así el tiempo de ocupación del espacio público.

	
Fotografía 1. Barricada de desvío y señalización	Fotografía 2. Barricada de desvío y apoyo de auxiliar de trafico
	
Fotografía 3. Sendero peatonal y cerramiento ajustado Calle 48C Sur con carrera 26.	Fotografía 4. Señalización (aguja) de acuerdo al PMT.

CONSORCIO

Incumplimientos 8 de mayo de 2026:


- Se evidenció cierre de carril occidental de la Carrera 26 por Calle 48C Sur costado occidental, no contemplado en la propuesta de PMT presentada por el Contratista y autorizada por la SPMT. Adicionalmente, se observó canalización implementada con elementos no reglamentados que no cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Señalización Vial, considerando que para este tipo de intervenciones los dispositivos a utilizar deberían ser delineadores plásticos tipo colombina (ver Fotografía 5).
- Se evidenció la ausencia de barricadas y señalización de desvío que oriente a los usuarios sobre la ruta a tomar. Asimismo, se observó la ausencia de sendero peatonal transversal que garantice las condiciones de seguridad para los peatones (ver Fotografías 5 y 6).

Respuesta:

En atención a la observación realizada por la Secretaría de Movilidad respecto al cierre del carril occidental de la Carrera 26 por Calle 48C Sur costado occidental, el Contratista informa que dicha intervención sí se encuentra contemplada en los

planos presentados dentro del Plan de Manejo de Tránsito – PMT aprobado mediante COI No. 8 del 19 de febrero de 2026, (ver fotografías 5).

Respecto al uso de elementos de canalización no reglamentados (colombinas artesanales), se informa que, debido a las condiciones de seguridad del sector y a los constantes robos de los elementos de señalización, fue necesario implementar de manera temporal este tipo de elementos con el fin de mantener la canalización básica del tránsito debido a la actividad no prevista dentro del cronograma de la obra. Sin embargo, el Contratista ha priorizado la implementación y mantenimiento del PMT aprobado mediante el uso de dispositivos artesanales de canalización y apoyo permanente de auxiliares de tráfico, con el fin de garantizar la continuidad de las medidas de seguridad vial y la adecuada orientación de los usuarios en el sector intervenido. (ver fotografía 6)

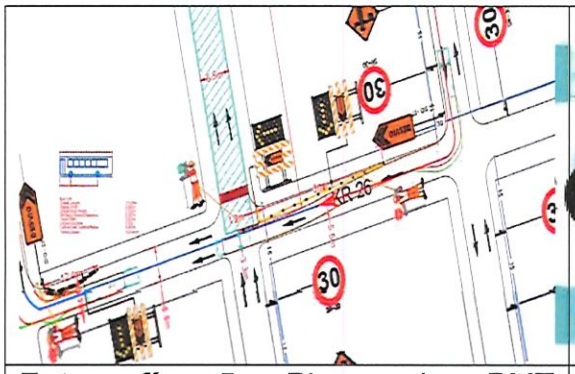

Fotografía 5. Plano de PMT aprobado por la SPMT para el CIV 6001013.



Fotografía 6. Señalización cierre de carril Carrera 26 por Calle 48C Sur costado occidental.

<u>Calle 53A Sur entre Carrera 33A y Carrera 34</u>

Incumplimientos 27 de abril de 2026:

- Se evidenciaron cerramientos deficientes, con broches abiertos que permiten el ingreso de usuarios a la zona de obra, generando una condición de riesgo para los transeúntes (ver fotografías 8 y 9).
- Se observó la ausencia de sendero peatonal transversal en el acceso occidental de la Calle 53A Sur con Carrera 33A. Adicionalmente, se evidenció el uso de elementos no reglamentados que no cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Señalización Vial, considerando que para este tipo de intervenciones los elementos de canalización deben corresponder a delineadores plásticos tipo colombina (ver fotografía 10).

Incumplimientos 8 de mayo de 2026:

- Se evidenció cierre de carril oriental de la Carrera 34 por Calle 53A Sur, que no se encuentra contemplado en la propuesta presentada por el Contratista y autorizada por la SDM. Adicionalmente, se evidenció el uso de elementos no reglamentados que no cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Señalización Vial, considerando que para este tipo de intervenciones los elementos de canalización deben corresponder a delineadores plásticos tipo colombina (ver fotografías 12, 13 y 14).
- Se evidenció la ausencia de barricada y señalización de desvío que oriente a los usuarios sobre la ruta a tomar. Asimismo, se observó la ausencia de sendero peatonal transversal que garantice las condiciones de seguridad para los peatones (ver fotografía 12).

Respuesta:

El Contratista considera pertinente aclarar que el sendero peatonal fue retirado de manera temporal para facilitar el ingreso y salida de vehículos de construcción, siendo restablecido posteriormente conforme a los parámetros establecidos en el Plan de Manejo de Tránsito (PMT). Así mismo, las barricadas y señales de desvío ya fueron instaladas en el corredor vial con el fin de garantizar la adecuada orientación y seguridad de los usuarios de la vía. (ver fotografía 7 y 8). Mientras que el uso temporal de canalizadores no reglamentarios (colombinas artesanales) obedece a los constantes hurtos de la señalización estándar en el sector.

CONSORCIO

Con el fin de solucionar esta situación y reducir la ocupación del espacio público, esta medida provisional delimita el área de intervención mientras el contratista prioriza los trabajos en este frente para concluir las labores en el menor tiempo posible. Sin embargo, el contratista reafirma su compromiso con la implementación del PMT aprobado y refuerza el área observada con el ajuste del cerramiento y el apoyo del auxiliar de tráfico. (ver fotografía 9 y 10).





Fotografía 7. Barricada de señalización de desvío Calle 53ª sur con carrera 33ª.	Fotografía 8. Barricada de señalización de desvío Calle 53ª sur con carrera 34.
	
Fotografía 9. Apoyo auxiliar de trafico y cerramiento completo de obra Calle 53ª sur con carrera 33ª.	Fotografía 10. Barricada de desvío y auxiliar de tráfico Calle 53ª sur con carrera 33ª.

Incumplimientos 8 de mayo de 2026:

- Se evidenció cierre de carril oriental de la Carrera 34 por Calle 53A Sur, que no se encuentra contemplado en la propuesta presentada por el Contratista y autorizada por la SDM. Adicionalmente, se evidenció el uso de elementos no reglamentados que no cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Señalización Vial, considerando que para este tipo de intervenciones los elementos de canalización deben corresponder a delineadores plásticos tipo colombina (ver fotografías 12, 13 y 14).
- Se evidenció la ausencia de barricada y señalización de desvío que oriente a los usuarios sobre la ruta a tomar. Asimismo, se observó la ausencia de sendero peatonal transversal que garantice las condiciones de seguridad para los peatones (ver fotografía 12).

Respuesta:

En atención a la observación realizada respecto al cierre del carril oriental de la Carrera 34 por Calle 53A Sur, el Contratista informa que dicha condición obedeció a una necesidad operativa temporal asociado al desarrollo de las actividades constructivas en el frente de obra, implementándose medidas de manejo y control de tránsito con el fin de preservar la seguridad de los usuarios y del personal operativo con el apoyo de los auxiliares de tráfico apoyando la orientación de los peatones de la zona. (ver fotografía 11 y 12.).

Así mismo, se aclara que, debido a situaciones recurrentes de hurto de dispositivos de señalización en la zona de intervención, actualmente no se cuenta de manera permanente con delineadores plásticos tipo colombina. No obstante, se ha

priorizado la implementación y mantenimiento del PMT mediante el uso de elementos de canalización artesanales y apoyo continuo de auxiliares de tráfico, garantizando la adecuada orientación y seguridad vial en el sector intervenido.

Adicionalmente, el Contratista considera pertinente aclarar que, en el marco de las obligaciones contractuales, se debe garantizar la conexión de los sumideros laterales al pozo de la red pluvial existente, el cual se localiza sobre el eje de la intersección del segmento vial que hace parte del CIV intervenido, razón por la cual fue necesario efectuar intervenciones temporales sobre el corredor vial para el desarrollo de dichas actividades constructivas. Sin embargo, el contratista mantiene el compromiso de mantener la valla de desvío.

	
Fotografía 11. Barricada de desvío con apoyo de auxiliar de trafico	Fotografía 12. Barricada de desvío con apoyo de auxiliar de trafico

CONSORCIO

<u>Carrera 34 entre Calle 52B Sur y Calle 52G Sur</u>

Incumplimientos 27 de abril de 2026:

- Se evidenció la ausencia de barricadas y señalización de desvío que oriente a los usuarios sobre la ruta a tomar. Asimismo, se observó la ausencia de senderos peatonales transversales que garanticen las condiciones de seguridad para los peatones (ver fotografías 16, 17 y 18).
- Se observó el cierre del carril sur de la Calle 52B Sur, sin la implementación de sendero peatonal sobre la calzada ni de la transición requerida para direccionar adecuadamente a los vehículos hacia el carril libre. Adicionalmente, esta afectación no se encuentra contemplada en la propuesta presentada por el Contratista y autorizada por la SPMT (ver fotografía 18).

Incumplimientos 8 de mayo de 2026:

- Se evidenció la ausencia de barricada y señalización de desvío en el extremo de la Carrera 34 con Calle 52G Sur que oriente a los usuarios sobre la ruta a tomar. Asimismo, se observó la ausencia de sendero peatonal transversal

que garantice las condiciones de seguridad para los peatones (ver fotografía 20).

Respuesta:

El contratista informa que considerando la observación realizada y teniendo claro la importancia de los senderos peatonales y las señales de desvíos (barricadas) en la prevención de accidentes, se procedió a instalar estos elementos de protección en ambos costados tanto en la carrera 34 con calle 52G sur como para la carrera 34 con calle 52B sur, para garantizar el correcto tránsito tanto vehicular como peatonal en el área. (ver fotografía 13 y 14)

En atención a la observación realizada respecto al cierre del carril sur de la Calle 52B Sur, el Contratista informa que dicha condición correspondió a una intervención temporal requerida para la ejecución de actividades constructivas asociadas al proyecto, implementada con el fin de garantizar la continuidad de las obras y la seguridad operativa en el frente de trabajo. Así mismo, se informa que el contratista, una vez identificada la observación, procedió a la adecuación e implementación del sendero peatonal correspondiente. (ver fotografías 15 y 16)



Fotografía 13. Sendero peatonal y barricada de desvío en el CIV 6000786. Carrera 34 con calle 52G sur



Fotografía 14. Instalación de barricada de desvío en el CIV 6000786. Carrera 34 con calle 52B sur

	
Fotografía 15. Sendero peatonal y barricada Carrera 34 con calle 52G sur	Fotografía 16. Sendero peatonal y barricada Carrera 34 con calle 52B sur

Calle 50A Sur entre Carrera 36 y Carrera 37

Incumplimientos 27 de abril de 2026:

- Se evidenciaron cerramientos deficientes, con broches abiertos que permiten el ingreso de usuarios a la zona de obra, generando una condición de riesgo para los transeúntes (ver fotografía 22).
- Se evidenció la ausencia de senderos peatonales transversales, obligando a los peatones a transitar por la calzada y generando conflicto peatón–vehículo (ver fotografías 23 y 24).
- Se evidenció la ausencia de barricadas y señales de desvío en los extremos del cierre, generando desinformación en los conductores (ver fotografías 23 y 24).

Incumplimientos 8 de mayo de 2026:

- Se evidenciaron cerramientos deficientes en ambos extremos de la obra, con broches abiertos que permiten el ingreso de usuarios a la zona de obra, generando una condición de riesgo para los transeúntes (ver fotografías 25 y 27).
- Se evidenció la ausencia de senderos peatonales transversales, obligando a los peatones a transitar a riesgo sobre la calzada (ver fotografías 26 y 28).

Respuesta:

De acuerdo a las observaciones realizadas en la calle 50ª sur entre carrera 36 y carrera 37 se procedió a instalar estos elementos de protección en ambos costados del tramo, para garantizar el correcto tránsito tanto vehicular como peatonal en el área y así dar cumplimiento en lo establecido en el PMT. (ver fotografías 17 y 18).

En atención a la observación realizada del sendero peatonal el contratista infroma que se atendió la observación priorizando el sendero peatonal para los transeúntes de la zona de influencia de la obra. (ver fotografía 19 y 20)




Fotografía 17. Ajuste de cerramiento e instalación de sendero peatonal y barricada de desvío en la Calle 50ª sur con carrera 36.



Fotografía 18. Ajuste de cerramiento e instalación de sendero peatonal y barricada de desvío en la Calle 50ª sur con carrera 37.



Fotografía 19. Sendero peatonal Calle 50ª sur con carrera 37.

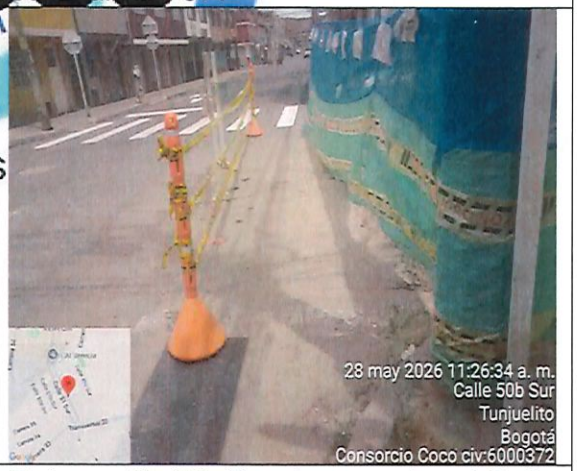

Fotografía 20. Sendero peatonal Calle 50ª sur con carrera 36.

En este sentido, el contratista ha venido realizando las acciones necesarias para asegurar el adecuado manejo del tránsito peatonal y vehicular en las áreas de intervención correspondientes al contrato 613-2025, dando cumplimiento a lo establecido en la normativa vigente y en el PMT aprobado por la SDM.

El contratista reitera su compromiso con el cumplimiento de los Planes de Manejo de Tránsito (PMT) previamente aprobados por la SDM y con la implementación de las medidas necesarias para garantizar la seguridad de todos los actores viales en los segmentos en intervención. Por tanto, se continuará trabajando en el

fortalecimiento, seguimiento y mejora de la señalización implementada, en cerramiento instalado y el manejo del tránsito, con el fin de evitar la ocurrencia nuevamente en el desarrollo de las actividades del proyecto.

Cordialmente,

JOTAM MAESTRE DIAB
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO COCO

CONSORCIO

CONSORCIO COCO
E-mail: consorciococo2025@gmail.com; Tel 601-4770190

CONSORCIO COCO
NIT:902.020.105-8

FDLT-CTO-613-2025/078

Bogotá D.C, junio 09 de 2026

Señores:
AHLA SHUGL INTERNATIONAL SAS
Atn. Ing. Santiago Carrillo Vargas
Director de Interventoría
Bogotá D.C.

Ref: 613-2025. "EJECUTAR A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE REAJUSTE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ."

Asunto: **Radicación Acta Parcial N°4**

Respetado Ingeniero:

Por medio de la presente me permito allegar el Acta Parcial N°4 del contrato **FDLT-CTO-613-2025** con los respectivos soportes para su revisión y aprobación.

Atentamente,

ING. JOTAM MAESTRE BIAB
REPRESENTANTE LEGAL
CONCORCIO COCO

FDLT-CTO-613-2025/079

Bogotá D.C, 27 de mayo de 2026

Señores:
AHLA SHUGL INTERNATIONAL S.A.S.
Atn Ing Santiago Carrillo Vargas.
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Bogotá D.C

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA FDLT-CTO-613-2025

OBJETO: "EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

ASUNTO: Informe Mensual Componente Seguridad y Salud en el Trabajo No.5

Respetados señores,

En cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el Contrato FDLT No. 613 de 2025, y conforme a los alcances definidos para el desarrollo de los procesos del mismo, por medio de la presente se remite a la Interventoría los siguientes documentos para su respectiva revisión y aprobación:

CONSORCIO

Cordialmente,

JOTAM MAESTRE DIAB
Representante Legal
CONSORCIO COCO

8. CORRESPONDENCIA RECIBIDA

AHLA SHUGL
INTERNATIONAL SAS

Un compromiso global:

Ingeniería líder en innovación sustentable

INT-652-2025-076

Bogotá D.C., 01 de mayo de 2026

Señores:
CONSORCIO COCO
ATT. ING., ANGELA PATRICIA CASTRO GOMEZ.
DIRECTOR DE OBRA C-613-2025.
Bogotá D.C.

Ref. C-613-2025 Objeto: "EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C"

Asunto: RESPUESTA AL OFICIO FDLT-CTO-613-2025/066- APROBACION INFORME No. 4 COMPONENTE AMBIENTAL

Cordial saludo,

En atención al cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de esta Interventoría, y en ejercicio de las funciones de seguimiento, control y verificación que le son propias, se informa que, una vez realizada la revisión administrativa y documental correspondiente a la subsanación del Informe No. 4 del componente ambiental, el cual comprende el periodo ejecutado entre el 01 al 30 de abril del 2026, se concluye que la información presentada cumple con los requerimientos establecidos, razón por la cual se emite concepto favorable y se otorga la aprobación respectiva.

Sin otro en particular, agradecemos la atención prestada.

ING.SANTIAGO CARRILLO VARGAS
DIR. INTERVENTORIA.
AHLA SHUGL INTERNATIONAL SAS

Un compromiso global:
Ingeniería líder en innovación sustentable

INT-652-2025-079

Bogotá D.C., 07 de mayo de 2026

Señores:
CONSORCIO COCO
ATT. ING., ANGELA PATRICIA CASTRO GOMEZ.
DIRECTOR DE OBRA C-613-2025.
Bogotá D.C.

Ref. C-613-2025 Objeto: "EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C"

Asunto: RESPUESTA AL OFICIO FDLT-CTO-613-2025/068 - APROBACION INFORME No. 4 GESTIÓN SOCIAL

Cordial saludo,

En atención al cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de esta Interventoría, y en ejercicio de las funciones de seguimiento, control y verificación que le son propias, se informa que, una vez realizada la revisión administrativa y documental correspondiente al Informe No. 4 del componente social, el cual comprende el periodo ejecutado entre el 01 al 30 de abril de 2026, se concluye que la información presentada cumple con los requerimientos establecidos, razón por la cual se emite concepto favorable y se otorga la aprobación respectiva.

Sin otro en particular, agradecemos la atención prestada.

ING.SANTIAGO CARRILLO VARGAS
DIR. INTERVENTORIA.
AHLA SHUGL INTERNATIONAL SAS

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

SPMT
202631206451091
Informacion Publica
Al contestar Cite el No. de radicación de este Documento

Atendido Mediante comsecutivo
FDLT-CTO-613-2025-076.
El dia 28 de Mayo del 2026.

Bogotá D.C., mayo 15 de 2026

Señores
CONSORCIO COCO
Angela Patricia Castro
Carrera 15 No. 93a-84
CP: 110221
Email: consorciococo2025@gmail.com
Bogota - D.C.

REF: Contrato FDLTU-613-2025.

Asunto: Incumplimientos en la implementación del plan de manejo de tránsito (PMT).

Localidad: Tunjuelito

Cordial saludo:

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) en calidad de cabeza del sector movilidad y en cumplimiento de sus funciones como autoridad de tránsito y transporte de la ciudad, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Distrital 652 de 2025[1] en cuanto a la autorización de cierres, desvíos y medidas de mitigación por afectación del espacio público asociado a obras, eventos, aglomeraciones o emergencias, en el marco de los planes de manejo de tránsito (PMT); y el seguimiento al cumplimiento de los mismos, a través de la Subdirección de Planes de Manejo de Tránsito (SPMT), informa que en visitas técnicas de seguimiento a PMT por obra efectuadas los días 27 de abril de 2026 y 8 de mayo de 2026 a las 08:30 horas y a las 15:03 horas, respectivamente, se evidenciaron incumplimientos en la implementación de los PMT autorizados, según se relacionan en la Tabla 1, y como se describen a continuación:

[1] *"Por medio del cual se expide el Decreto Único del Sector Movilidad"*

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020

Tabla 1. Frentes de obra con incumplimientos a lo autorizado por la SDM

Comité	Radicados SDM	Dirección	Tipo de Afectación
COI[2] 8 de 2026 (medio impacto)	202661200357972	Calle 48C Sur entre Carrera 26 y Carrera 27 (ID. 5755)	Cierre total de calzada para actividades de conservación de la malla vial y posicionamiento de vehículo de obra en el interior del cerramiento.
COI 8 de 2026 (alto impacto	202661200357862	Calle 53A Sur entre Carrera 33A y Carrera 34 (ID. 5338)	Cierre total de calzada para actividades de conservación de la malla vial y posicionamiento de vehículo de obra en el interior del cerramiento.
COI 8 de 2026 (bajo impacto	202661200357862	Carrera 34 entre Calle 52B Sur y Calle 52G Sur (ID. 5754)	Cierre total de calzada para actividades de conservación de la malla vial y posicionamiento de vehículo de obra en el interior del cerramiento.
COI 11 de 2026 (bajo impacto	202661200745372	Calle 50A Sur entre Carrera 36 y Carrera 37 (ID. 8573)	Cierre total de calzada para actividades de conservación de la malla vial y posicionamiento de vehículo de obra en el interior del cerramiento.

Fuente: SDM-SPMT


[2] Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020


Calle 48C Sur entre Carrera 26 y Carrera 27:

Incumplimientos 27 de abril de 2026:

- Se evidenció la ausencia de barricada y señalización de desvío en el extremo del cierre de la Calle 48C Sur con Carrera 26, generando desinformación para los usuarios (ver fotografía 2).
- Se evidenció la implementación de un sendero peatonal transversal en condiciones inseguras en el extremo de la Calle 48C Sur con Carrera 26, toda vez que se observó superficie con relleno de material pétreo suelto. Adicionalmente, el sendero se encuentra delimitado con elementos no reglamentados que no cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Señalización Vial, teniendo en cuenta que, para este tipo de intervención, los elementos de canalización deben corresponder a barreras plásticas flexibles tipo maletín (ver fotografías 3 y 4).




Fotografía 1. Nomenclatura vial.

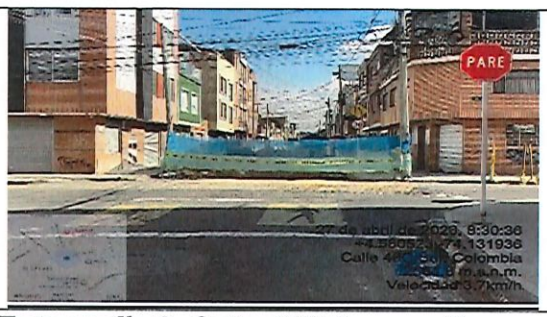

Fotografía 2. Calle 48C Sur con Carrera 26.



Fotografía 3. Calle 48C Sur con Carrera 26.

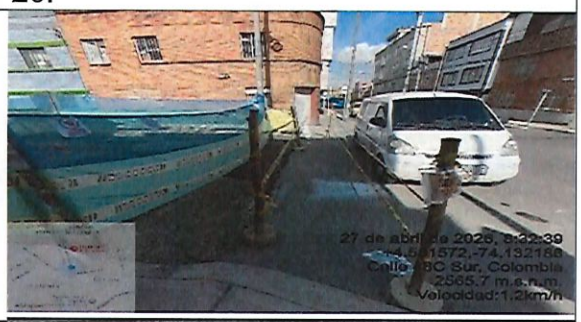


Fotografía 4. Calle 48C Sur con Carrera 27.


Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020

Incumplimientos 8 de mayo de 2026:

- Se evidenció cierre de carril occidental de la Carrera 26 por Calle 48C Sur costado occidental, no contemplado en la propuesta de PMT presentada por el Contratista y autorizada por la SPMT. Adicionalmente, se observó canalización implementada con elementos no reglamentados que no cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Señalización Vial, considerando que para este tipo de intervenciones los dispositivos a utilizar deberían ser delineadores plásticos tipo colombina (ver Fotografía 5).
- Se evidenció la ausencia de barricadas y señalización de desvío que oriente a los usuarios sobre la ruta a tomar. Asimismo, se observó la ausencia de sendero peatonal transversal que garantice las condiciones de seguridad para los peatones (ver Fotografías 5 y 6).

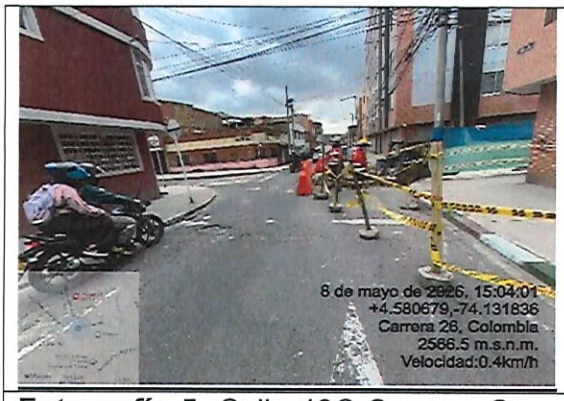

Fotografía 5. Calle 48C Sur con Carrera 26.

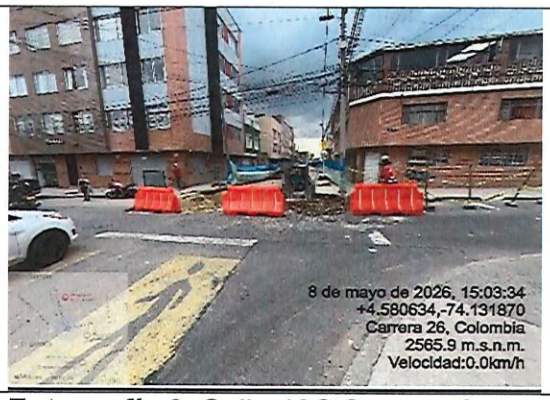

Fotografía 6. Calle 48C Sur con Carrera 26.


<u>Calle 53A Sur entre Carrera 33A y Carrera 34:</u>

Incumplimientos 27 de abril de 2026:


- Se evidenciaron cerramientos deficientes, con broches abiertos que permiten el ingreso de usuarios a la zona de obra, generando una condición de riesgo para los transeúntes (ver fotografías 8 y 9).

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020

- Se observó la ausencia de sendero peatonal transversal en el acceso occidental de la Calle 53A Sur con Carrera 33A. Adicionalmente, se evidenció el uso de elementos no reglamentados que no cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Señalización Vial, considerando que para este tipo de intervenciones los elementos de canalización deben corresponder a delineadores plásticos tipo colombina (ver fotografía 10).

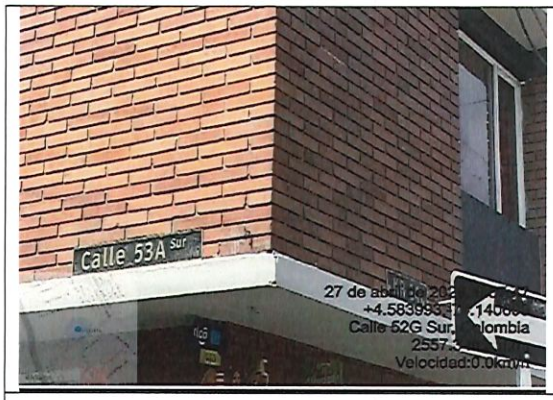

Fotografía 7. Nomenclatura vial.

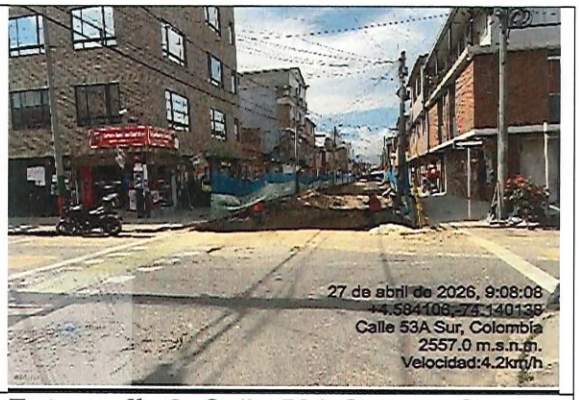

Fotografía 8. Calle 53A Sur con Carrera 34.



Fotografía 9. Calle 53A Sur con Carrera 33A.



Fotografía 10. Calle 53A Sur con Carrera 33A.


Incumplimientos 8 de mayo de 2026:

- Se evidenció cierre de carril oriental de la Carrera 34 por Calle 53A Sur, que no se encuentra contemplado en la propuesta presentada por el Contratista y

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020

autorizada por la SDM. Adicionalmente, se evidenció el uso de elementos no reglamentados que no cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Señalización Vial, considerando que para este tipo de intervenciones los elementos de canalización deben corresponder a delineadores plásticos tipo colombina (ver fotografías 12, 13 y 14).

- Se evidenció la ausencia de barricada y señalización de desvío que oriente a los usuarios sobre la ruta a tomar. Asimismo, se observó la ausencia de sendero peatonal transversal que garantice las condiciones de seguridad para los peatones (ver fotografía 12).

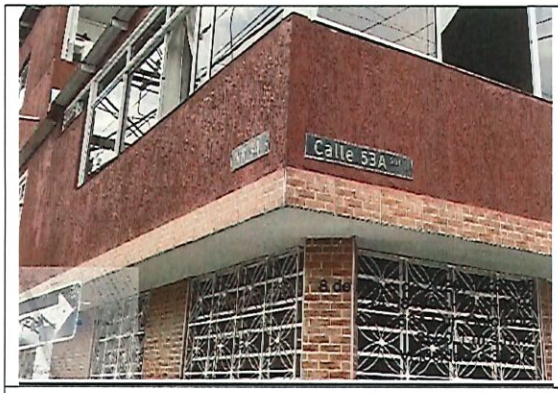

Fotografía 11. Nomenclatura vial.



Fotografía 12. Calle 53A Sur con Carrera 34.



Fotografía 13. Calle 53A Sur con Carrera 34.



Fotografía 14. Calle 53A Sur con Carrera 34.

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020

Carrera 34 entre Calle 52B Sur y Calle 52G Sur:

Incumplimientos 27 de abril de 2026:

- Se evidenció la ausencia de barricadas y señalización de desvío que oriente a los usuarios sobre la ruta a tomar. Asimismo, se observó la ausencia de senderos peatonales transversales que garanticen las condiciones de seguridad para los peatones (ver fotografías 16, 17 y 18).
- Se observó el cierre del carril sur de la Calle 52B Sur, sin la implementación de sendero peatonal sobre la calzada ni de la transición requerida para direccionar adecuadamente a los vehículos hacia el carril libre. Adicionalmente, esta afectación no se encuentra contemplada en la propuesta presentada por el Contratista y autorizada por la SPMT (ver fotografía 18).



Fotografía 15. Nomenclatura vial.




Fotografía 16. Carrera 34 con Calle 52G Sur.

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020

	
Fotografía 17. Carrera 34 con Calle 52G Sur.	**Fotografía 18.** Carrera 34 con Calle 52B Sur.

Incumplimientos 8 de mayo de 2026:

- Se evidenció la ausencia de barricada y señalización de desvío en el extremo de la Carrera 34 con Calle 52G Sur que oriente a los usuarios sobre la ruta a tomar. Asimismo, se observó la ausencia de sendero peatonal transversal que garantice las condiciones de seguridad para los peatones (ver fotografía 20).

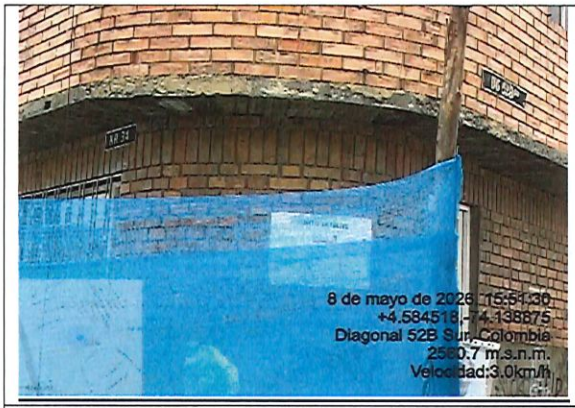
	
Fotografía 19. Nomenclatura vial.	**Fotografía 20.** Carrera 34 con Calle 52G Sur.

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020


Calle 50A Sur entre Carrera 36 y Carrera 37:

Incumplimientos 27 de abril de 2026:


- Se evidenciaron cerramientos deficientes, con broches abiertos que permiten el ingreso de usuarios a la zona de obra, generando una condición de riesgo para los transeúntes (ver fotografía 22).
- Se evidenció la ausencia de senderos peatonales transversales, obligando a los peatones a transitar por la calzada y generando conflicto peatón–vehículo (ver fotografías 23 y 24).
- Se evidenció la ausencia de barricadas y señales de desvío en los extremos del cierre, generando desinformación en los conductores (ver fotografías 23 y 24).



Fotografía 21. Nomenclatura vial.

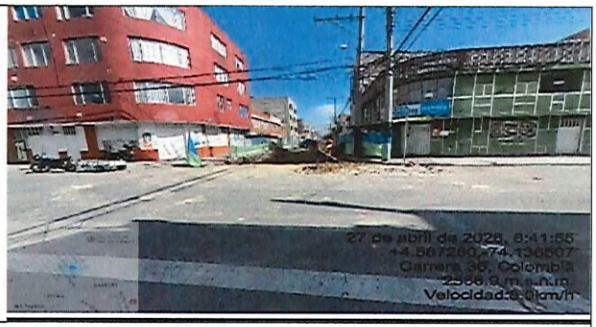

Fotografía 22. Calle 50A Sur con Carrera 36.

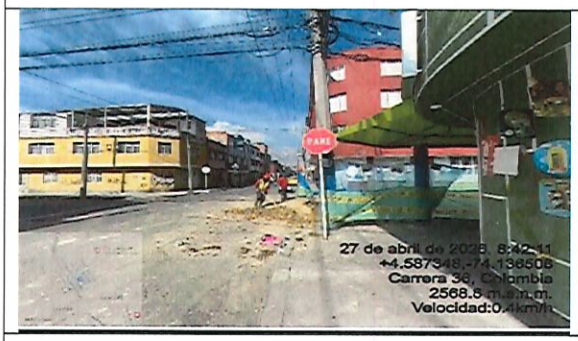

Fotografía 23. Calle 50A Sur con Carrera 36.



Fotografía 24. Calle 50A Sur con Carrera 37.

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020

Incumplimientos 8 de mayo de 2026:

- Se evidenciaron cerramientos deficientes en ambos extremos de la obra, con broches abiertos que permiten el ingreso de usuarios a la zona de obra, generando una condición de riesgo para los transeúntes (ver fotografías 25 y 27).
- Se evidenció la ausencia de senderos peatonales transversales, obligando a los peatones a transitar a riesgo sobre la calzada (ver fotografías 26 y 28).



Fotografía 25. Nomenclatura vial.



Fotografía 26. Calle 50A Sur entre Carrera 36 y Carrera 37.



Fotografía 27. Calle 50A Sur entre Carrera 36 y Carrera 37.



Fotografía 28 Calle 50A Sur entre Carrera 36 y Carrera 37.

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020

Otras consideraciones y/o recomendaciones:

- Se le recuerda al Contratista los compromisos adquiridos e indicados en la autorización del PMT.
- Implementar los PMT conforme a las propuestas presentadas; esto incluye la señalización, el cerramiento y el uso exclusivo de los espacios incluidos en el PMT. En caso de requerir una afectación diferente, se deberá tramitar la respectiva solicitud de PMT.
- Siempre que se tenga afectación a la infraestructura destinada a los modos no motorizados, se debe implementar medidas que brinden seguridad a estos usuarios.
- Garantizar senderos peatonales longitudinales y transversales a la obra, cómodos, seguros, libres de obstáculos y de mínimo 1,2m de ancho. Los senderos peatonales en calzada deben asilarse y protegerse de los vehículos mediante barreras plásticas flexibles tipo maletín.
- Se debe mantener el cerramiento de la zona de obra, hasta la recuperación total del espacio público en condiciones seguras para la movilidad de los usuarios.
- Todos los dispositivos y señales de obra deben cumplir con las especificaciones del Manual de Señalización Vial vigente.

Por todo lo anterior, deberá subsanar los incumplimientos evidenciados y acatar las recomendaciones dadas a la mayor brevedad, con el fin de mitigar los riesgos potenciales asociados a la movilidad y de garantizar óptimas condiciones de seguridad vial a los usuarios de la infraestructura, en el área de influencia de la obra. Asimismo, se solicita que de las acciones adelantadas se remita registro fotográfico al correo electrónico fbonza@movilidadbogota.gov.co y posteriormente se efectúe la radicación correspondiente al link https://www.movilidadbogota.gov.co/radicacionwebsdm/formulario.php


En este mismo sentido, se informa que de acuerdo al numeral 10.2 del "*Protocolo para gestionar los planes de manejo de tránsito (PMT) por obra y otros*", *"... La SDM como autoridad de tránsito y transporte de la ciudad, tendrá la potestad de no autorizar nuevos frentes de obra al contrato y/o proyecto, o de suspender el PMT autorizado (de acuerdo con su naturaleza y según la afectación presente en el espacio público), cuando el/la*

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020

contratista o peticionario/a no subsane en su totalidad los incumplimientos notificados por la SDM …".

Finalmente, se aclara que cualquier eventualidad que ocurra por la incorrecta implementación del PMT, es responsabilidad directa del Contratista, Interventoría y Entidad Contratante; de igual manera, se informa que la SDM continuará realizando seguimientos a la obra con el fin de verificar el cumplimiento del PMT, de conformidad con lo autorizado por esta Entidad.

Cordialmente,



Martha Cecilia Bayona Gómez
Subdirectora de Planes de Manejo de Tránsito
Firma mecánica generada en 15-05-2026 11:10 AM

Cc Valentina Martínez -- Diagonal 50 A No 18 - 48 Sur CP: Valentina.martinez@gobiernobogota.gov.co-110621(Bogota-D.C.)
cc . Naydu Lisbeth Lopez Orozco-- Calle 57 No. 3 ? 42 Oficina 402 CP: Cintunjuelito@gmail.com-110231(BOGOTA-D.C.)
Reviso: Katherine Castro Suescún - Subdirección de Planes de Manejo de Tránsito
Elaboró: Fernel Edmundo Bonza Romero -Subdirección De Planes De Manejo De Tránsito

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020

9. ACTAS DE COMITÉ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

Objeto de la reunión:	Seguimiento al COP 613-2025 Cometé Nº 18
Fecha:	8 mayo de 2026
Hora de inicio:	9:00am
Hora de finalización:	11 Wan
Modalidad:	X Presencial / Virtual / Telefónica / Mixta
Lugar:	FDLT
Dependencia:	Infraestructura
Nombre del Responsable:	Diego Caballero

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TÉCNICO/ TECNÓLOGO	CARGO: AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
	79'799.630	Misael Polido G.		Interventoría										3227892292	
	79518952	Santiago Camilo V		INTERVENTORIA									X	3013415140	
	98388497	Javier Castro		CONTRATISTA.			X						X	cuestodiantupelitovias@gmail.com 3184533044	
	37327329	Edna Ruth Cardenas		Interventoría										Contactofelito25@gmail.com	
	52843490	Marcela Medina		" "										Contactofelito@gmail.com	
	80029040	ERICSON CASTIBLANCO		CONTRATISTA			X							sst.tunjuelitovias@gmail.com	
	1014264950	Valentina Martinez M		FDLT/Infraest.			X						X	Valentina.martinez@gobiernobogota.gov.co	
	52828935	Martha Liliana Triana.		Contratista.			x							Contratotunjuelitozos@gmail.com.	
	80114502	David Bermudez		Contratista			x							ambientaltunjuelitovias@gmail.com	

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://guia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

Scanned with CamScanner

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se da inicio al comité de seguimiento al COP 613-2027, en las instalaciones del FDLT, en conjunto contratista, apoyo a la Supervisión del fondo e interventoría.
Para los compromisos anteriores, se informa que se corrio la mesa de trabajo los profesionales PIGA - Alcaldía tunjuelito para el martes 12 de mayo en los horas de la mañana.
para el CIV 15000 1200, El área Ambiental de Interventoría recomienda que se cuide y se realice una protección a capilla arboreas, Asi mismo desde el apoyo a la supervisión manifiesta que las inmobiliarias, se deben retirar, las partes están descubierta. Desde la supervisión indica para los medidas de junio. Se debe estar al dia la parte financiera, para el CIV 6000617 con respecto de el CCTV el contratista se compromete a entregarlo. entre la semana del 11 al 16 de mayo del 2026. Con respecto al CIV 600 1013, se va a realizar en cesión de movilidad.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Para el día 20 de mayo entregar por parte del Contratista los ajustes al presupuestos del acta N° 3 y la programación	Contratista	20/05/2026
2	para el dia 15 de mayo se debe tener las carpetas o link de registro fotografico al dia.	Contratista	15/05/2026

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formulación.
NOTA 2: Agregue o eliminar las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Scanned with CamScanner

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

Objeto de la reunión:	Seguimiento al cos 613-2025 Comité N° 19
Fecha:	12 de mayo 2026
Hora de inicio: :	8:00am
Hora de finalización:	
Modalidad:	X Presencial / Virtual / Telefónica / Mixta
Lugar:	Tramos Operación Infraestructura
Dependencia:	
Nombre del Responsable:	Diego Caballero

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TÉCNICO/ TECNÓLOGO	CARGO: AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
CC	1014264950	Valentina Martinez M.	—	FDCT / Infraestr.			X						X	Valentina.martinez@gob...	Valentina M.
CC	52.328.935	Martha Liliana Triana	—	Contratista										consejeriacco@gmail.com	
CC	1091145007	David Bermudez		Contratista			X							ambientalyvialitovias@gmail.com	David B.
CC	80229640	Ericson Hernan		Contratista			X							sstyvialitovias@gmail.com	Ericson H.
CC	98.386.447	Javier H. Castro	—	Contratista			X						X	direccionyvialitovias@gmail.com	
CC	79518952	Santiago Camilo U	—	INTERVENTORIA			X						X	ingsantiagocamilo@hotmail.com	
CC	79.797.630	Misael Polido G.	—	Interventoria			X						X	" " "	
CC	80128761	Luis Eduardo Cardon	—	Contratista			X						X	direccionyvialitovias@gmail.com	

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://guia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

Scanned with CamScanner

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se da inicio al comité de seguimiento al COP 613-2026, en conjunto contratista, apoyo a la supervisión del EDLT e interventoría, se realiza recorrido en los tramos en ejecución.

referente al comité anterior los compromisos son con fechas posteriores, continuan para el siguiente semana.

Tramos en ejecución.

CIV 6000377 se encuentran realizando construcción de cargamos para red de sumideros, limpieza de trama para posteriormente implementar estructura de pavimento.

CIV 6000389 se realizan actividades de construcción de cargamo para red de sumideros

CIV 6000557 se encuentran realizando construcción de pozo pluvial e instalación de la red de 12" pluvial, instalación de geoceldas y material granular ARSBG-50 reciclada.

CIV 6000786 se encuentran realizando actividades de perforación de barrenos e inyección de cal

CIV 6000857 instalación de material granular ARSBG-50, instalación de bordillo ABO para confinamiento de vía

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Ajustes al presupuesto del acta N°3	contratista	20 mayo
2	Registro fotografico al día (Links)	contratista	15 mayo
3	Finalización del CIV 6001200	contratista	21 mayo
4	Cargue en el SECOP del acta N°1, N°2, N°3	contratista interventoria	13 mayo

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Scanned with CamScanner
