DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

CIV 6001013 vía instalación de material granular AR6338 estabilizado, se encuentran realizando actividades de intervención en la intersección de la Cra 26 con calle 48 c Sur

CIV 6001200 Instalación de concreto estampado, material granular SBSPAEA estabilizado, instalación de bordillo para división de pasos, se realizara remisión de oficio a ENEL codensa informando que no estan funcionando las lamparas y que se deja ductos para acometida de iluminación los cuales estaban existentes.

Por parte del EDLT la ingeniera valentina solicita implementar mas personal y avanzar en actividades de obra.

Por parte del área ambiental y SST no se presentan observaciones, se recomienda implementar las actividades para el MAO, se realizara reunión con el área PIGA el dia de hoy para verificar cargue de RCD.

Por parte del área social se continua con la implementación de los PSI y vallas informativas, no se tienen PQRS a la fecha, se realizara convocatoria para veedurías ciudadanas el 19 de mayo de 2026

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.



Scanned with CamScanner

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

Objeto de la reunión:	Seguimiento al COP 613-2025 Comité No 20			
Fecha:	19 de mayo de 2026	**Hora de inicio: 3:00 pm**	**Modalidad:**	**Presencial**
Lugar:	Virtual	**Hora de finalización: 4:00 pm**		**Virtual X**
Dependencia:	Infraestructura	**Nombre del responsable: Diego Caballero**		**Telefónica**
				Mixta

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
					ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA		
CC	1014264950	Valentina Martínez Muñoz	N/A	FDLT/Infraestructura			X						X	valentinamartinez@gobiernobogota.gov.co	
CC	79518952	Santiago Carrillo Vargas	N/A	Interventoría			X						X	cintunjuelito@gmail.com	
CC	79797630	Misael Pulido Guzmán	N/A	Interventoría			X						X	cintunjuelito@gmail.com	
CC	1081145002	Hernán David Bermúdez	N/A	Contratista			X						X	ambientaltunjuelitovias@gmail.com	
CC	52328935	Martha Liliana Triana	N/A	Contratista			X						X	contratotunjuelito@gmail.com	
CC	37327329	Edna Ruth Casadiego	N/A	Interventoría			X						X	cintunjuelito@gmail.com	
CC	52843440	Marcela Mendoza	N/A	Interventoría			X						X	cintunjuelito@gmail.com	
CC	80229640	Erikson hernian Gutiérrez	N/A	Contratista			X						X	Sss.tunjuelitovias@gmail.com	
CC	52281375	Adriana Gutiérrez	N/A	Interventoría			X						X	cintunjuelito@gmail.com	
CC	98588497	Javier Castro	N/A	Contratista			X						X	contratotunjuelito@gmail.com	

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se da inicio al comité de seguimiento al COP 613-2025 de manera virtual, en conjunto contratista, apoyo a la supervisión del FDLT e interventoría, se realiza lectura del acta anterior.

Referente a los compromisos, del comité anterior se continua con los compromisos establecidos para fechas posteriores, referente al registró fotográfico y el cargué en el SECOP, se cumplió con los mismos.

La ingeniera Valentina pregunta sobre la entrega del presupuesto el Ing. Javier informa que se entregara en la fecha estimada.

Se realiza la presentación del comité por parte del contratista referente a las diferentes áreas, la cual se anexa a la presente acta.

Por parte del área ambiental se recomienda la entrega de las medidas referente a las materas de los individuos arbóreos del CIV 6001200 y SST de la interventoría se informa que referente a los recorridos realizados por los frentes de obra, se evidencia que continúan implementando los elementos para la atención de emergencias menores como lo son: camilla, botiquín, extintor y kit de control de derrames, así mismo se evidencia cerramientos perimetrales en buenas condiciones, adicional a ello referente al informe se encuentra pendiente planillas de seguridad social para informe No 4, se recomienda la entrega de las mismas para poder dar aprobación al mismo.

Por parte de área social se informa que se continua con la atención a la comunidad, se tienen instalados los PSI y vallas informativas en cada frente de obra en ejecución, se realizaron las veedurías ciudadanas y capacitaciones sociales.

El Ing. Santiago solicita hacer entrega del corte para el acta a fecha del 26 de mayo para evitar retrasos.

La ing. Valentina solicita realizar la actualización del acta de exclusión a la fecha, e Ing. Javier informa que hará la entrega de la misma el día 21 de mayo.

Referente al tema de RCD se solicita por parte de FDLT, realizar la revisión de las certificaciones por parte de la interventoría de manera mensual.

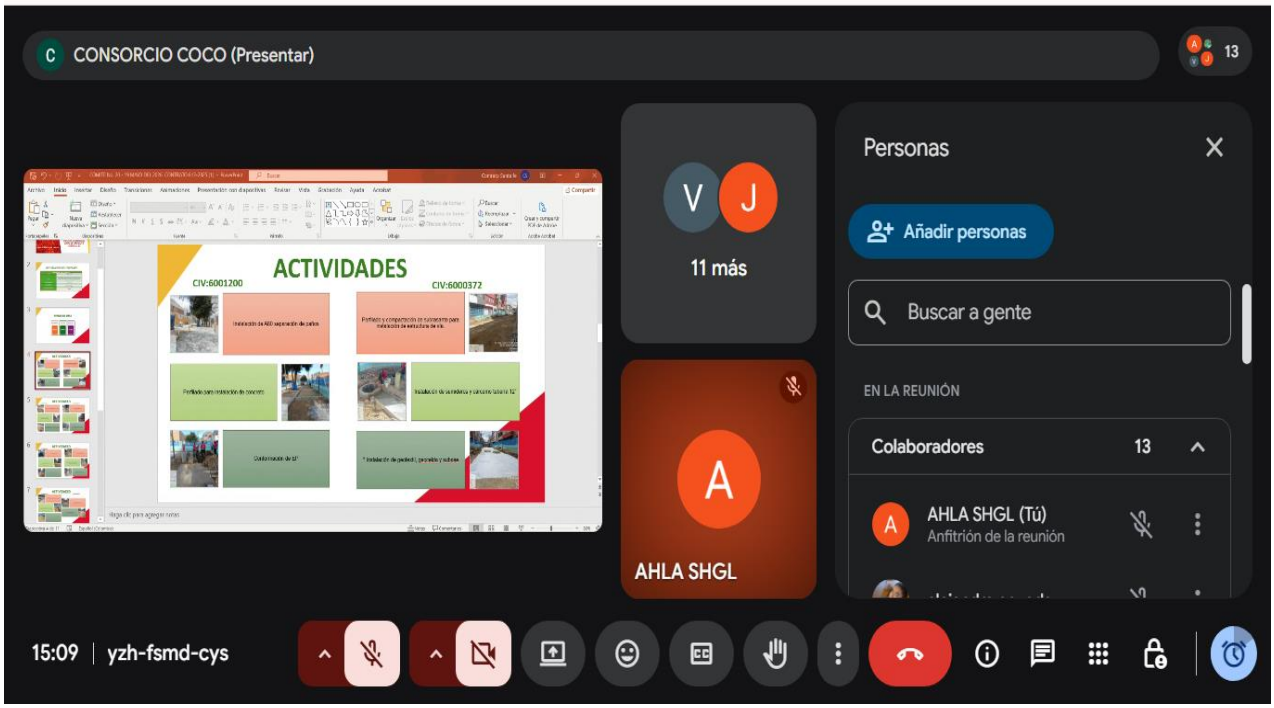
Personal contratado por parte del contratista:
Directo: 53
Indirecta: 15
Mujeres: 10
Menores de 28 años: 1

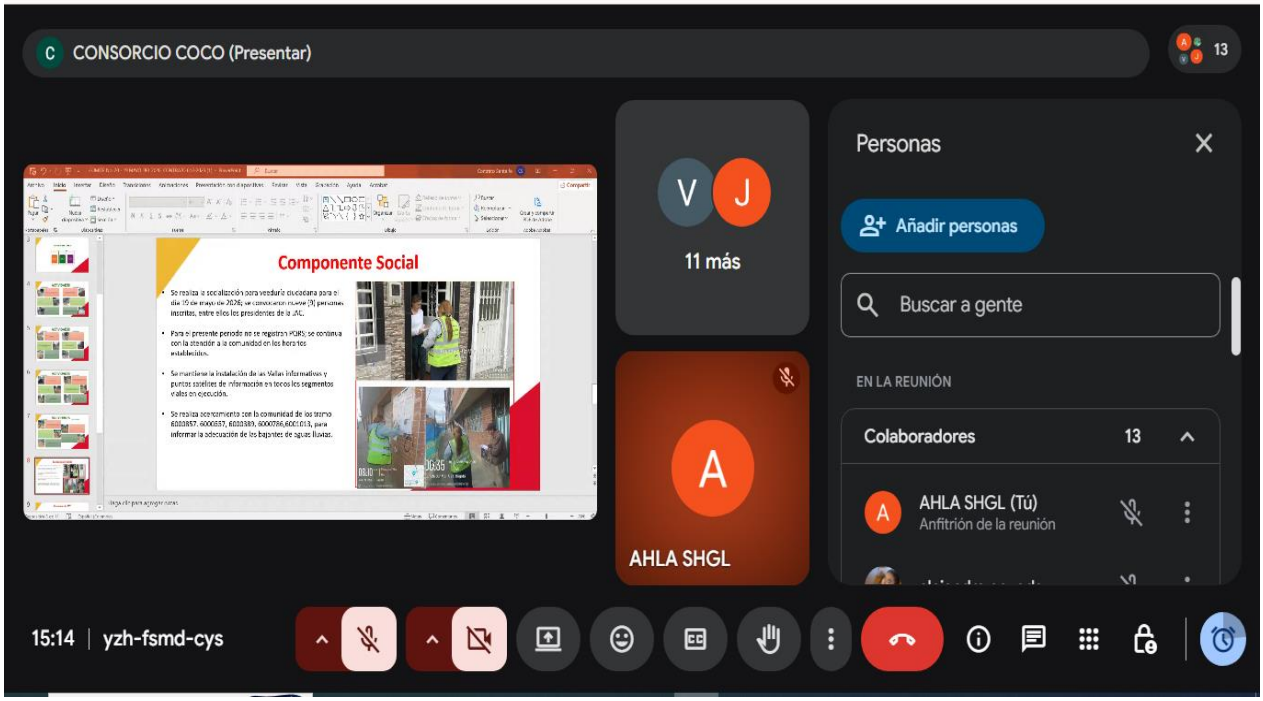
Personal contratado por parte de la interventoría:
Directa: 15
Indirecta: 1
Mujeres: 8
Menores de 28 años: 0

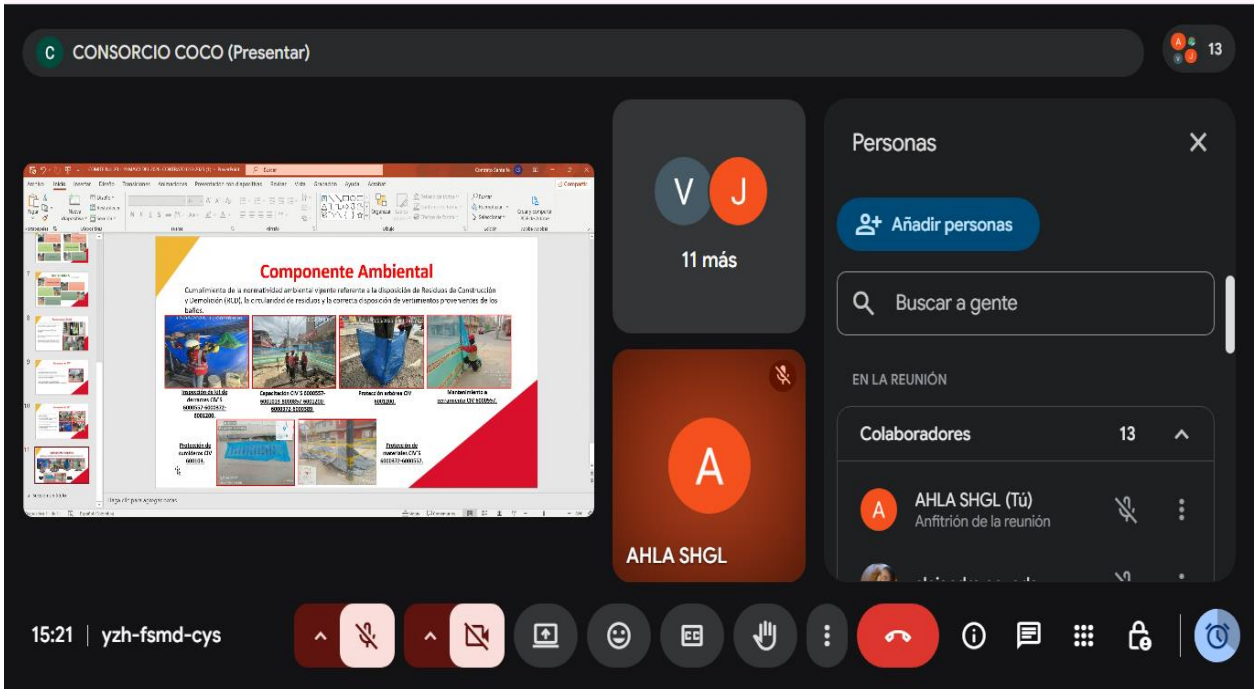
COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Ajustes al presupuesto del acta no 3	contratista	20 de mayo de 2026
2	Finalización del CIV 6001200	contratista	21 de mayo de 2026
3	Entrega de concepto técnico del ingeniero forestal referente a las materas del CIV 6001200	contratista	21 de mayo de 2026
4	Entrega acta exclusión	contratista	21 de mayo de 2026

REGISTRO FOTOGRÁFICO




CONSORCIO COCO (Presentar)
13
Componente Social
11 más
AHLA SHGL
Personas
Añadir personas
Buscar a gente
EN LA REUNIÓN
Colaboradores
13
AHLA SHGL (Tú)
Anfitrión de la reunión
15:14 | yzh-fsmd-cys


CONSORCIO COCO (Presentar)
13
Componente Ambiental
11 más
AHLA SHGL
Personas
Añadir personas
Buscar a gente
EN LA REUNIÓN
Colaboradores
13
AHLA SHGL (Tú)
Anfitrión de la reunión
15:21 | yzh-fsmd-cys



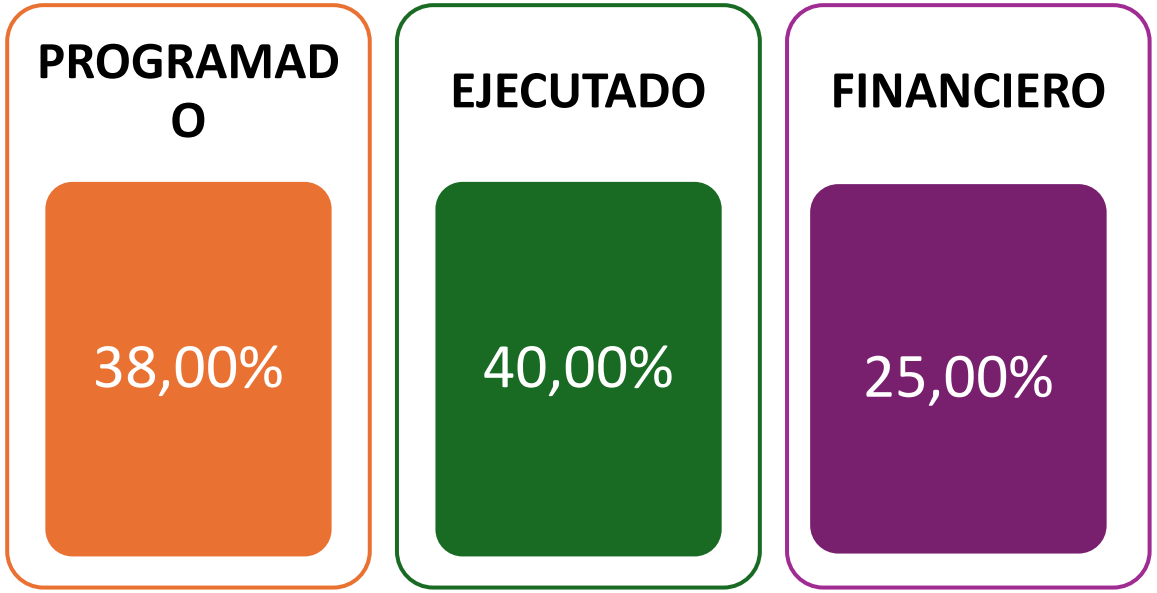
CONTRATO DE OBRA No. 613-2025

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
COMITÉ No 20

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATISTA – COP 613 DEL 2025	
Empresa	CONSORCIO COCO
NIT	902.010.258-8
Objeto	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTEMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO.
Valor Total del contrato	$6.795.537.201
Acta de Iniciación	17 de diciembre de 2025
Fecha de inicio de obra	17 de diciembre de 2025
Fecha de terminación de la obra	16 de agosto de 2026
Tiempo estimado de duración de la obra	8 meses

AVANCE DE OBRA



ACTIVIDADES

CIV:6001200



Instalación de A80 separación de paños

Perfilado para instalación de concreto





Conformación de EP

CIV:6000372

Perfilado y compactación de subrasante para instalación de estructura de vía.





Instalación de sumideros y cárcamo tubería 12"

* Instalación de geotextil, geocelda y subase



ACTIVIDADES

CIV:6001013



Cambio tubería sumidero cruce y confirmación estructura

Estructura de vía finalizada se procede a instalación de niveletas





retiro de escombros para proceder con asfalto la próxima semana una vez finalicé la intersección

CIV:6000857



Instalación de sardineles

Instalación de prefabricados





Cortes en andén para cinta de ajuste

ACTIVIDADES

CIV:6000389



Instalación de subase

Instalación de Geo textil





Instalación de Geo celda

CIV:6000557



Se finaliza instalación de tubería 12 " de pluvial solicitada por EAAB

rotura de tubería asbesto cemento bajo el andén se informo al acueducto, se hizo el cierre para proceder con la reparación





Drenaje de aguas en tramo.

ACTIVIDADES

CIV:6000786



Se realiza la instalación de los sumideros

Se realiza la instalación de los sumideros





Se realiza la instalación de barrenos

CIV:6000830



Excavación caja estructura

Retiro de carpeta asfáltica



Componente Social

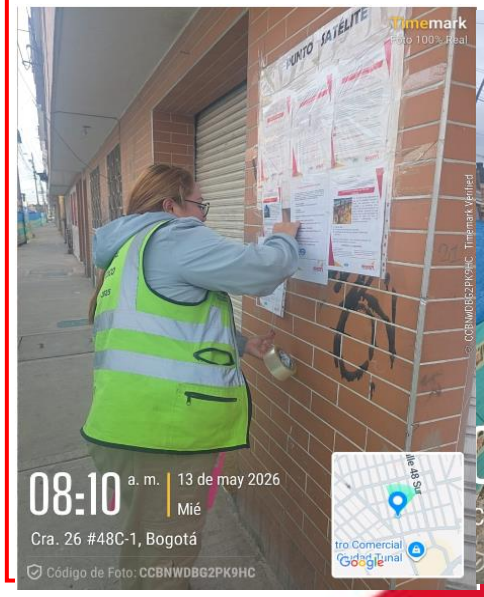
- Se realiza la socialización para veeduría ciudadana para el día 19 de mayo de 2026; se convocaron nueve (9) personas inscritas, entre ellos los presidentes de la JAC.

- Para el presente periodo no se registran PQRS; se continua con la atención a la comunidad en los horarios establecidos.

- Se mantiene la instalación de las Vallas informativas y puntos satélites de información en todos los segmentos viales en ejecución.

- Se realiza acercamiento con la comunidad de los tramo 6000857. 6000557, 6000389, 6000786,6001013, para informar la adecuación de las bajantes de aguas lluvias.







Componente SST

TOTAL DE EMPLEOS:

- TOTAL EMPLEOS DIRECTOS CONTRATO: **53**
- TOTAL EMPLEOS INDIRECTOS CONTRATO: **15**
- TOTAL EMPLOS DIRECTOS E INDIRECTOS MUJER CONTRATO: **10**
- TOTAL EMPLEOS DIRECTOS E INDIRECTOS JÓVENES CONTRATO: **3**
- TOTAL EMPLEOS DISCAPACIDAD: **1**

- TOTAL EMPLEOS DIRECTOS INTERVENTORIA: **15**
- TOTAL EMPLEOS INDIRECTOS INTERVENTORIA: **1**
- TOTAL EMPLEOS DIRECTOS E INDIRECTOS MUJER INTERVENTORIA: **8**
- TOTAL EMPLEOS DIRECTOS E INDIRECTOS JOVENES INTERVENTORIA: **0**



Componente SST

Se realizó capacitación en los frentes de obra CIV´S 6000557-6001013-8000857-6001200-6000372-6000389.

Se realizó inspección de dotación en los frentes de obra CIV´S 6001200-6000857.

Se realizó inspección de extintor y botiquín en los frentes de obra CIV´S 6000372-6000389-6000557-6000857-6001200.

Se realizó inspección de maquinaria en el frente de obra CIV 6000557.

Se realizó inspección de trabajos en obra CIV 6001200.









Componente Ambiental

Cumplimiento de la normatividad ambiental vigente referente a la disposición de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), la circularidad de residuos y la correcta disposición de vertimientos provenientes de los baños.



Inspección de kit de derrames CIV´S 6000557-6000372-6001200.



Capacitación CIV´S 6000557-6001013-8000857-6001200-6000372-6000389.



Protección arbórea CIV 6001200.



Mantenimiento a cerramiento CIV 6000557.

Protección de sumideros CIV 600103.





Protección de materiales CIV´S 6000372-6000557.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

Objeto de la reunión:	Seguimiento al COP 613-2025 Comité N° 21
Fecha:	29 de mayo de 2026
Hora de inicio:	9:00am
Hora de finalización:	
Modalidad:	X Presencial / Virtual / Telefónica / Mixta
Lugar:	FDLT
Dependencia:	Infraestructura
Nombre del Responsable:	Diego Caballero

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TÉCNICO/TECNÓLOGO	CARGO: AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
CC	1014264950	Valentina Martínez Muñoz	—	FDLT / Infraestructura			X						X	valentina.martinez@gobiernobogota.gov.co	Valentina Martinez
CC	80229640	ERICSON CASTIERREZ		CONTRATISTA			X							3017017810 VIAS@gmail.com	ERICSON CASTIERREZ
CC	1087145002	Hernán David Bermúdez		Contratista			X							ambiental tunjuelitovias@gmail.com	David Bermudez
CC	98.388.497	Javier H. Castro	—	Contratista.			X							direccióntunjuelitovias@gmail.com	
CC	1029587185	Diego Caballero	—	FDLT			X						X	diego.caballero@gobiernobogota.gov	
CC	79792.650	Misael Polido Cabrera	—	Interventoría			X							[illegible]	
CC	52 328 935	Martha Liliana Triana	—	Contratista			X							[illegible]	
CC	80128761	Juan Eduardo Cadena	—	Contratista			X							tercerovias.tunjuelito@gmail.com	
	37327374	Edna Casadiego		Interventoría										[illegible]	

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaa.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se da inicio al comité de seguimiento al COP 613-2025, en las instalaciones de la alcaldía local de Tunjuelito, en conjunto contratista apoyo a la supervisión del FDLT e interventoría.

Se verifican compromisos del acta anterior, Nº 1 se reprograma fecha Nº 2 se cumplio con la finalización del CIV 6000209 Nº 3 se envian observaciones por parte del área ambiental, las cuales se dan respuesta el día 29 de mayo Nº 4 corresponde a la entrega del acta de exclusión esta en revisión por parte de interventoría.

Se realiza la presentación por parte del contratista de los diferentes áreas de las actividades a la fecha, (presentación que se anexa a la presente acta)

Por parte del área ambiental y SST, se realiza revisión de los informes mensuales se envian observaciones por parte de la interventoría, así mismo se informa al contratista de obra que la adquisición de materiales se debe realizar con los proveedores adscritos en el eco directorio de la SDA y que tengan PIN - PRO.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Realizar Bacheo para los CIV 6000833, 6000870, 6000721	Contratista	30 junio 2026
2	Ajuste presupuesto acta Nº3 y programación	contratista	1 junio 2026

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Scanned with CamScanner

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Personal contratado:

Contratista	Interventoría
Directo = 53	Directo = 15
Indirecto = 15	Indirecto = 1
Mujeres = 10	Mujeres = 8
Menores 28 años = 3	Menores 28 años = 0

Por parte del área social se informa que se continua con la atención a la comunidad, se tienen 4 PQRS cerradas a la fecha, se tienen instaladas vallas informativas y PSI en los segmentos en ejecución de obra, se enviaron observaciones para el informe mensual N°5, se programara reunión extraordinaria solicitada por la comunidad para el CIV 372.389,857,el día 5 junio 11 am.

El ing Diego del FDLT solicita realizar los Bacheos para los CIV 6000833, 6000870 y 6000721 con plazo maximo de entrega de fecha a 30 de junio

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plantearnos una genuina formulación.
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Scanned with CamScanner



INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATISTA – COP 613 DEL 2025	
Empresa	CONSORCIO COCO
NIT	902.010.258-8
Objeto	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTEMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO.
Valor Total del contrato	$6.795.537.201
Acta de Iniciación	17 de diciembre de 2025
Fecha de inicio de obra	17 de diciembre de 2025
Fecha de terminación de la obra	16 de agosto de 2026
Tiempo estimado de duración de la obra	8 meses

Scanned with CamScanner

AVANCE DE OBRA

PROGRAMADO	EJECUTADO	FINANCIERO
54,00%	56,00%	47,00%

ACTIVIDADES

CIV:6001200



Colocación de concreto de 3.000PSI para andén estampado

Colocación de concreto de 3.000PSI para andén estampado





Instalación de sardineles

CIV:6000372

Instalación de estructura de vía





Compactación de subbase

Instalación de base estabilizada



Scanned with CamScanner

ACTIVIDADES

CIV:6001013



Construcción cárcamo en intersección calle 48C sur con carrera 26 costado sur oriental.

Confirmación de estructura intersección.





Confirmación de estructura intersección

CIV:6000857



Construcción de cinta de ajuste andenes e instalación de sardineles

* Instalación de sardineles
* Reconstrucción de andenes





* Instalación de sardineles
* Reconstrucción de andenes

ACTIVIDADES

CIV:6000389



Instalación de subbase

Humectación del material capa de subbase para compactación





Mezclado y extendido de primera capa de base mejorada.

CIV:6000557



Se continúa colocación y conformación de capa de SBG.

Excavación mecánica para sumideros e instalación de sumideros





Excavación mecánica para sumideros e instalación de sumideros

Scanned with CamScanner

ACTIVIDADES

CIV:6000786



Limpieza de subrasante y confirmación de estructura de vía

Instalación de geo textil, geocelda y subbase.





Compactación de subbase reciclada

CIV:6000830



Se continúa cajéo para el remplazo de la estructura

Se continúa cajéo para el remplazo de la estructura





Se continúa excavación mecánica "cajéo", se marca línea para la excavación del remplazo de la red de A.N

Componente Social

- Se llevo acabo la reunión de veeduría para el tramo 6000557 y del tramo 6001200; donde participo el FDLT , INTERVENTORIA Y CONTRATISTA, participaron doce (12) personas.
- Para el presente periodo no se registran PQRS; se continua con la atención a la comunidad en los horarios establecidos.
- Se realiza capacitación con el tema de lesiones osteomusculares
- Se realiza acercamiento con la comunidad de los tramo 6000557 y el 60001013 para informar y aclarar el tema de la instalación de material que va en este tramo





Scanned with CamScanner

Componente SST

TOTAL DE EMPLEOS:

- TOTAL EMPLEOS DIRECTOS CONTRATO: 53
- TOTAL EMPLEOS INDIRECTOS CONTRATO: 15
- TOTAL EMPLOS DIRECTOS E INDIRECTOS MUJER CONTRATO: 10
- TOTAL EMPLEOS DIRECTOS E INDIRECTOS JÓVENES CONTRATO: 3
- TOTAL EMPLEOS DISCAPACIDAD: 1

- TOTAL EMPLEOS DIRECTOS INTERVENTORIA: 15
- TOTAL EMPLEOS INDIRECTOS INTERVENTORIA: 1
- TOTAL EMPLEOS DIRECTOS E INDIRECTOS MUJER INTERVENTORIA: 8
- TOTAL EMPLEOS DIRECTOS E INDIRECTOS JOVENES INTERVENTORIA: 0



Componente SST

Se realizó recorrido en los frentes de obra en acompañamiento con profesionales de interventoría y del FDLT.

Se realizó inspección de maquinaria en el frente de obra CIV 6000372.

Se realizó inspección del kit de emergencias de los frentes de obra CIV´S 6000557-6000857-6001200-6001013-6000830.

Se realizó jornada de orden y aseo en los frentes de obra CIV´S 6000372-6000786-6000830-6000857-6001200.











Scanned with CamScanner

Componente Ambiental

Cumplimiento de la normatividad ambiental vigente referente a la disposición de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), la circularidad de residuos y la correcta disposición de vertimientos provenientes de los baños.



Recorrido con profesionales de interventoría y del FDLT.



Inspección de kit de derrames CIV´S 6000557-6001200.



Inspección de kit de derrames CIV´S 6000557-6001200.



Cargue de RCD CIV´S 6000830-6000372.



Protección de materiales CIV 6000372.

Scanned with CamScanner

10. FIDUCIA

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB
NIT: 900.250.203-5
EXTRACTO EXPEDIDO:02/02/2026
CONSECUTIVO: 00245

FIDEICOMISO FIDUBOGOTA - CONSORCIO COCO
CL 67 7 37 P3
BOGOTA
NIT. 830055897

Con la expedición de la Resolución 3548 del 30 de septiembre de 1.991, la Superintendencia Bancaria (hoy Superintendencia Financiera) autorizó a la Fiduciaria para desarrollar su objeto social con actividades como Fiducia de Inversión, Fiducia de Administración, Fiducia Mercantil y Encargos Fiduciarios, y en general, todas las operaciones autorizadas por la ley a las Sociedades Fiduciarias.

Cuenta de Inversión: 002010904031
Desde:01/01/2026 Hasta: 31/01/2026
Oficina: FIDUCIARIA BOGOTA DG1 0001
Próximo Vencimiento:
Tipo de Participación al cierre del período: 1100

Estado de la Inversión en el Período	En Unidades	En Pesos
Saldo Inicial		$
Incrementos	123.497,75	$ 2.004.683.474,00
Disminuciones		$
Retefuente		$
Rendimiento		$ 1.141.912,47
Otras Retenciones		
Saldo al Final del Período	123.568,10	$ 2.005.825.386,47
Comisión al cierre del período (%)	2.20 %	

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha Día | Mes | Año	Descripción de Movimiento	Valor de Transacción	Oficina / Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
30/01/2026	AJUSTE TRASLADO CAPITAL ENTRE ENCARGOS +	2.004.683.474,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.228,96	123.525,00	1100.00
30/01/2026	AJUSTE RENDIMIENTOS ENCARGOS +	699.482,31	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.228,96	43,10	1100.00

DETALLE DE RENTABILIDADES

Tipo de Participación	Tipo de Negocio	Saldo Mínimo ($)	Mensual (%)	Últimos 6 Meses (%)	Anual (%)
1091		1,00	4,14	6,29	7,27
1092		21.010.860,00	4,24	6,39	7,37
1094		509.513.355,00	4,36	6,50	7,48
1095		33.997.322.385,00	4,76	6,92	7,91
1096		1,00	3,53	5,66	6,64
1097		18.950.044.815,00	3,68	5,82	6,79
1098		59.840.680.185,00	4,14	6,29	7,27
1100		1,00	3,32	5,45	6,43
1099		1,00	4,66	6,82	7,80

Creer en Colombia es apostar por los sueños que nacen aquí. Cada inversión es una chispa que enciende un futuro posible. Siempre a tu lado, Aval Fiduciaria.

Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Fínancieras-FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva.

"Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras-FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva". El presente extracto de cuenta se emite en cumplimiento a lo establecido el en Decreto 2555 de 2010.

Para cualquier inquietud, comunícate al PBX (601) 7550340, a la línea nacional gratuita 01 8000 189 799, desde tu celular al #432, o al correo electrónico solicitudes@avalfiduciaria.com. También puedes radicar tu solicitud ingresando a www.avalfiduciaria.com.

Si tienes alguna inconformidad con la información registrada en el extracto, remítela a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S. Dirección Calle 90 Nro. 19C-74, Bogotá - al correo electrónico co-fmcolombia@kpmg.com o a través de atención telefónica al (601) 6188000.

Recuerda que cuentas con el Defensor del Consumidor Financiero, cuyos datos de contacto son: Carrera 10 No. 97 A – 13 Oficina 502 en Bogotá D.C., Teléfono: (601) 6108164, correo electrónico: defensoria.avalfiduciaria@legalcrc.com. Principal: Bertha María García Meza y Suplente: Camilo Alejandro Carreño Barreneche. Ten en cuenta que el Defensor del Consumidor Financiero actúa con total independencia frente a Aval Fiduciaria.

Además, el reglamento y la ficha técnica de cada Fondo de Inversión Colectiva están disponibles en nuestra página web www.avalfiduciaria.com, en el enlace correspondiente a cada Fondo."

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB
NIT: 900.250.203-5
EXTRACTO EXPEDIDO:02/03/2026
CONSECUTIVO: 00304

FIDEICOMISO FIDUBOGOTA - CONSORCIO COCO
CL 67 7 37 P3
BOGOTA
NIT. 830055897

Con la expedición de la Resolución 3548 del 30 de septiembre de 1.991, la Superintendencia Bancaria (hoy Superintendencia Financiera) autorizó a la Fiduciaria para desarrollar su objeto social con actividades como Fiducia de Inversión, Fiducia de Administración, Fiducia Mercantil y Encargos Fiduciarios, y en general, todas las operaciones autorizadas por la ley a las Sociedades Fiduciarias.

Cuenta de Inversión: 002010904031
Desde:01/02/2026 Hasta: 28/02/2026
Oficina: FIDUCIARIA BOGOTA DG1 0001
Próximo Vencimiento:
Tipo de Participación al cierre del período: 1100

Estado de la Inversión en el Período	En Unidades	En Pesos
Saldo Inicial	123.568,10	$ 2.005.825.386,47
Incrementos	492,83	$ 8.018.734,00
Disminuciones	-97.851,47	$ -1.592.111.467,60
Retefuente		$
Rendimiento		$ 2.500.670,88
Otras Retenciones		
Saldo al Final del Período	26.073,46	$ 424.233.323,75
Comisión al cierre del período (%)	2.20 %	

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha Día | Mes | Año	Descripción de Movimiento	Valor de Transacción	Oficina / Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
02/02/2026	APORTES INVERSIONISTAS	8.018.734,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.227,16	494,15	1100.00
09/02/2026	RETIRO INVERSIONISTAS	-30.000.000,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.245,20	-1.846,69	1100.00
09/02/2026	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-120.000,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.245,20	-7,38	1100.00
09/02/2026	RETIRO INVERSIONISTAS	-25.000.000,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.245,20	-1.538,91	1100.00
09/02/2026	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-100.000,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.245,20	-6,15	1100.00
09/02/2026	RETIRO INVERSIONISTAS	-4.247.727,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.245,20	-261,47	1100.00
09/02/2026	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-16.991,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.245,20	-1,04	1100.00
09/02/2026	RETIRO INVERSIONISTAS	-25.000.000,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.245,20	-1.538,91	1100.00
09/02/2026	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-100.000,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.245,20	-6,15	1100.00
09/02/2026	RETIRO INVERSIONISTAS	-200.000.000,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.245,20	-12.311,32	1100.00
09/02/2026	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-800.000,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.245,20	-49,24	1100.00
09/02/2026	RETIRO INVERSIONISTAS	-30.000.000,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.245,20	-1.846,69	1100.00
09/02/2026	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-120.000,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.245,20	-7,38	1100.00
09/02/2026	RETIRO INVERSIONISTAS	-20.000.000,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.245,20	-1.231,13	1100.00
09/02/2026	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-80.000,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.245,20	-4,92	1100.00
09/02/2026	RETIRO INVERSIONISTAS	-300.702.522,60	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.245,20	-18.510,23	1100.00

DETALLE DE RENTABILIDADES

Tipo de Participación	Tipo de Negocio	Saldo Mínimo ($)	Mensual (%)	Últimos 6 Meses (%)	Anual (%)
1091		1,00	3,92	5,54	6,87
1092		21.010.860,00	4,02	5,65	6,98
1094		509.513.355,00	4,14	5,76	7,08
1095		33.997.322.385,00	4,54	6,17	7,51
1096		1,00	3,31	4,92	6,25
1097		18.950.044.815,00	3,46	5,08	6,40
1098		59.840.680.185,00	3,92	5,54	6,87
1100		1,00	3,11	4,72	6,03
1099		1,00	4,44	6,07	7,40

Cuando tu ahorro tiene un propósito, se convierte en un plan con dirección. En Aval Fiduciaria te acompañamos para transformar tus metas en decisiones bien pensadas. Síguenos en nuestras redes sociales y descubre contenido, productos y canales pensados para ti.

Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Fínancieras-FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva.

"Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras-FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva". El presente extracto de cuenta se emite en cumplimiento a lo establecido el en Decreto 2555 de 2010.

Para cualquier inquietud, comunícate al PBX (601) 7550340, a la línea nacional gratuita 01 8000 189 799, desde tu celular al #432, o al correo electrónico solicitudes@avalfiduciaria.com. También puedes radicar tu solicitud ingresando a www.avalfiduciaria.com.

Si tienes alguna inconformidad con la información registrada en el extracto, remítela a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S. Dirección Calle 90 Nro. 19C-74, Bogotá - al correo electrónico co-fmcolombia@kpmg.com o a través de atención telefónica al (601) 6188000.

Recuerda que cuentas con el Defensor del Consumidor Financiero, cuyos datos de contacto son: Carrera 10 No. 97 A – 13 Oficina 502 en Bogotá D.C., Teléfono: (601) 6108164, correo electrónico: defensoria.avalfiduciaria@legalcrc.com. Principal: Bertha María García Meza y Suplente: Camilo Alejandro Carreño Barreneche. Ten en cuenta que el Defensor del Consumidor Financiero actúa con total independencia frente a Aval Fiduciaria.

Además, el reglamento y la ficha técnica de cada Fondo de Inversión Colectiva están disponibles en nuestra página web www.avalfiduciaria.com, en el enlace correspondiente a cada Fondo."

1152394

AVAL FIDUCIARIA S.A.
NIT. 800.140.887-8

CERTIFICA QUE:

CONSORCIO COCO el pasado 15 de diciembre de 2025, suscribió el contrato de Fiducia Mercantil de Administración No.3-1-128566 con FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. (Ahora Aval Asset Management), el cual tiene por objeto constituir una fiducia mercantil de carácter irrevocable para el manejo de los recursos que constituyen el anticipo.

En desarrollo de dicho contrato el 30 de enero de 2026, se realizó en FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. (Ahora Aval Asset Management), la apertura del Fondo de inversión Colectiva Abierto Fidugob No.10900201090403 con los recursos provenientes de la entidad **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO** por valor de **$2.004.683.474,00.**

Los recursos consignados, generaron rendimientos con corte al mes de febrero, por valor de $3.642.583,35 a nombre de FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO se encuentran pendientes por girar de acuerdo con la instrucción por parte del fideicomitente.

A la fecha el contrato fiduciario **128566 CONSORCIO COCO** se encuentra activo.

La presente certificación se expide a los seis (06) días del mes de abril de 2026.

Cordialmente,



Oscar Gilberto Galeano Cruz
Analista SAC
Aval Asset Management
JABA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Comunícate a través de nuestras Líneas de Atención Telefónica:
(601) 7550340 línea nacional gratuita 01 8000 189 799
desde tu celular al #432
Síguenos en: @Avalfiduciaria Aval Fiduciaria Aval Fiduciaria @Avalfiduciaria @AvalFiduciaria Aval Fiduciaria

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB
NIT: 900.250.203-5
EXTRACTO EXPEDIDO:01/04/2026
CONSECUTIVO: 00289

FIDEICOMISO FIDUBOGOTA - CONSORCIO COCO
CL 67 7 37 P3
BOGOTA
NIT. 830055897

Con la expedición de la Resolución 3548 del 30 de septiembre de 1.991, la Superintendencia Bancaria (hoy Superintendencia Financiera) autorizó a la Fiduciaria para desarrollar su objeto social con actividades como Fiducia de Inversión, Fiducia de Administración, Fiducia Mercantil y Encargos Fiduciarios, y en general, todas las operaciones autorizadas por la ley a las Sociedades Fiduciarias.

Cuenta de Inversión: 002010904031
Desde:01/03/2026 Hasta: 31/03/2026
Oficina: FIDUCIARIA BOGOTA DG1 0001
Próximo Vencimiento:
Tipo de Participación al cierre del período: 1100

Estado de la Inversión en el Período	En Unidades	En Pesos
Saldo Inicial	26.073,46	$ 424.233.323,75
Incrementos		$
Disminuciones	-6.026,22	$ -98.686.334,00
Retefuente		$
Rendimiento		$ 2.457.418,71
Otras Retenciones		
Saldo al Final del Período	20.029,38	$ 328.004.408,46
Comisión al cierre del período (%)	2.20 %	

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha Día | Mes | Año	Descripción de Movimiento	Valor de Transacción	Oficina / Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
17/03/2026	RETIRO INVERSIONISTAS	-6.882.116,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.327,78	-421,49	1100.00
17/03/2026	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-27.528,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.327,78	-1,68	1100.00
17/03/2026	RETIRO INVERSIONISTAS	-4.652.504,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.327,78	-284,94	1100.00
17/03/2026	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-18.610,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.327,78	-1,13	1100.00
17/03/2026	RETIRO INVERSIONISTAS	-1.104.224,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.327,78	-67,62	1100.00
17/03/2026	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-4.417,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.327,78	-0,27	1100.00
17/03/2026	RETIRO INVERSIONISTAS	-4.810.428,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.327,78	-294,61	1100.00
17/03/2026	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-19.242,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.327,78	-1,17	1100.00
17/03/2026	RETIRO INVERSIONISTAS	-13.518.838,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.327,78	-827,96	1100.00
17/03/2026	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-54.075,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.327,78	-3,31	1100.00
17/03/2026	RETIRO INVERSIONISTAS	-1.980.500,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.327,78	-121,29	1100.00
17/03/2026	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-7.922,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.327,78	-0,48	1100.00
17/03/2026	RETIRO INVERSIONISTAS	-1.831.524,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.327,78	-112,17	1100.00
17/03/2026	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-7.326,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.327,78	-0,44	1100.00
17/03/2026	RETIRO INVERSIONISTAS	-1.862.680,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.327,78	-114,08	1100.00
17/03/2026	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-7.451,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.327,78	-0,45	1100.00

DETALLE DE RENTABILIDADES

Tipo de Participación	Tipo de Negocio	Saldo Mínimo ($)	Mensual (%)	Últimos 6 Meses (%)	Anual (%)
1091		1,00	8,74	5,63	6,99
1092		21.010.860,00	8,85	5,74	7,10
1094		509.513.355,00	8,97	5,85	7,21
1095		33.997.322.385,00	9,39	6,26	7,63
1096		1,00	8,10	5,01	6,37
1097		18.950.044.815,00	8,26	5,17	6,52
1098		59.840.680.185,00	8,74	5,63	6,99
1100		1,00	7,90	4,81	6,16
1099		1,00	9,30	6,16	7,53

Manten tu información al día y evita contratiempos en tus procesos. Actualiza tus datos contactando con tu asesor comercial. Hemos dispuesto en nuestro sitio web: www.avalfiduciaria.com/actualizacion-de-datos, el formato según tu tipo de cliente: Persona natural o jurídica. Siempre a tu lado, Aval Fiduciaria.

Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Fínancieras-FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva.

"Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras-FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva". El presente extracto de cuenta se emite en cumplimiento a lo establecido el en Decreto 2555 de 2010.

Para cualquier inquietud, comunícate al PBX (601) 7550340, a la línea nacional gratuita 01 8000 189 799, desde tu celular al #432, o al correo electrónico solicitudes@avalfiduciaria.com. También puedes radicar tu solicitud ingresando a www.avalfiduciaria.com.

Si tienes alguna inconformidad con la información registrada en el extracto, remítela a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S. Dirección Calle 90 Nro. 19C-74, Bogotá - al correo electrónico co-fmcolombia@kpmg.com o a través de atención telefónica al (601) 6188000.

Recuerda que cuentas con el Defensor del Consumidor Financiero, cuyos datos de contacto son: Carrera 10 No. 97 A – 13 Oficina 502 en Bogotá D.C., Teléfono: (601) 6108164, correo electrónico: defensoria.avalfiduciaria@legalcrc.com. Principal: Bertha María García Meza y Suplente: Camilo Alejandro Carreño Barreneche. Ten en cuenta que el Defensor del Consumidor Financiero actúa con total independencia frente a Aval Fiduciaria.

Además, el reglamento y la ficha técnica de cada Fondo de Inversión Colectiva están disponibles en nuestra página web www.avalfiduciaria.com, en el enlace correspondiente a cada Fondo."

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB
NIT: 900.250.203-5
EXTRACTO EXPEDIDO:01/04/2026
CONSECUTIVO: 00289

FIDEICOMISO FIDUBOGOTA - CONSORCIO COCO
CL 67 7 37 P3
BOGOTA
NIT. 830055897

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha Día | Mes | Año	Descripción de Movimiento	Valor de Transacción	Oficina / Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
17/03/2026	RETIRO INVERSIONISTAS	-44.215.821,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.327,78	-2.708,01	1100.00
17/03/2026	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-176.863,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.327,78	-10,83	1100.00
17/03/2026	RETIRO INVERSIONISTAS	-17.434.527,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.327,78	-1.067,78	1100.00
17/03/2026	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-69.738,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.327,78	-4,27	1100.00

Manten tu información al día y evita contratiempos en tus procesos. Actualiza tus datos contactando con tu asesor comercial. Hemos dispuesto en nuestro sitio web: www.avalfiduciaria.com/actualizacion-de-datos, el formato según tu tipo de cliente: Persona natural o jurídica. Siempre a tu lado, Aval Fiduciaria.

Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Fínancieras-FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva.

"Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras-FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva". El presente extracto de cuenta se emite en cumplimiento a lo establecido el en Decreto 2555 de 2010.

Para cualquier inquietud, comunícate al PBX (601) 7550340, a la línea nacional gratuita 01 8000 189 799, desde tu celular al #432, o al correo electrónico solicitudes@avalfiduciaria.com. También puedes radicar tu solicitud ingresando a www.avalfiduciaria.com.

Si tienes alguna inconformidad con la información registrada en el extracto, remítela a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S. Dirección Calle 90 Nro. 19C-74, Bogotá - al correo electrónico co-fmcolombia@kpmg.com o a través de atención telefónica al (601) 6188000.

Recuerda que cuentas con el Defensor del Consumidor Financiero, cuyos datos de contacto son: Carrera 10 No. 97 A – 13 Oficina 502 en Bogotá D.C., Teléfono: (601) 6108164, correo electrónico: defensoria.avalfiduciaria@legalcrc.com. Principal: Bertha María García Meza y Suplente: Camilo Alejandro Carreño Barreneche. Ten en cuenta que el Defensor del Consumidor Financiero actúa con total independencia frente a Aval Fiduciaria.

Además, el reglamento y la ficha técnica de cada Fondo de Inversión Colectiva están disponibles en nuestra página web www.avalfiduciaria.com., en el enlace correspondiente a cada Fondo."

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB
NIT: 900.250.203-5
EXTRACTO EXPEDIDO:04/05/2026
CONSECUTIVO: 01114

FIDEICOMISO FIDUBOGOTA - CONSORCIO COCO
CL 67 7 37 P3
BOGOTA
NIT. 830055897

Con la expedición de la Resolución 3548 del 30 de septiembre de 1.991, la Superintendencia Bancaria (hoy Superintendencia Financiera) autorizó a la Fiduciaria para desarrollar su objeto social con actividades como Fiducia de Inversión, Fiducia de Administración, Fiducia Mercantil y Encargos Fiduciarios, y en general, todas las operaciones autorizadas por la ley a las Sociedades Fiduciarias.

Cuenta de Inversión: 002010904031
Desde:01/04/2026 Hasta: 30/04/2026
Oficina: FIDUCIARIA BOGOTA DG1 0001
Próximo Vencimiento:
Tipo de Participación al cierre del período: 1100

Estado de la Inversión en el Período	En Unidades	En Pesos
Saldo Inicial	20.029,38	$ 328.004.408,46
Incrementos		$
Disminuciones	-10.474,65	$ -172.938.393,00
Retefuente		$
Rendimiento		$ 1.907.485,17
Otras Retenciones		
Saldo al Final del Período	9.507,68	$ 156.973.500,63
Comisión al cierre del período (%)	2.20 %	

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha Día | Mes | Año	Descripción de Movimiento	Valor de Transacción	Oficina / Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
06/04/2026	RETIRO INVERSIONISTAS	-1.587.316,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.399,34	-96,79	1100.00
06/04/2026	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-6.349,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.399,34	-0,38	1100.00
06/04/2026	RETIRO INVERSIONISTAS	-1.914.190,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.399,34	-116,72	1100.00
06/04/2026	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-7.657,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.399,34	-0,46	1100.00
06/04/2026	RETIRO INVERSIONISTAS	-684.002,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.399,34	-41,70	1100.00
06/04/2026	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-2.736,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.399,34	-0,16	1100.00
06/04/2026	RETIRO INVERSIONISTAS	-3.331.483,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.399,34	-203,14	1100.00
06/04/2026	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-13.326,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.399,34	-0,81	1100.00
06/04/2026	RETIRO INVERSIONISTAS	-9.960.793,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.399,34	-607,38	1100.00
06/04/2026	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-39.843,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.399,34	-2,42	1100.00
06/04/2026	RETIRO INVERSIONISTAS	-82.200,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.399,34	-5,01	1100.00
06/04/2026	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-329,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.399,34	-0,02	1100.00
06/04/2026	RETIRO INVERSIONISTAS	-27.576.704,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.399,34	-1.681,57	1100.00
06/04/2026	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-110.307,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.399,34	-6,72	1100.00
15/04/2026	RETIRO INVERSIONISTAS	-77.451.785,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.449,53	-4.708,44	1100.00
15/04/2026	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-309.807,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.449,53	-18,83	1100.00

DETALLE DE RENTABILIDADES

Tipo de Participación	Tipo de Negocio	Saldo Mínimo ($)	Mensual (%)	Últimos 6 Meses (%)	Anual (%)
1091		1,00	11,30	6,19	7,26
1092		21.010.860,00	11,41	6,30	7,36
1094		509.513.355,00	11,52	6,41	7,47
1095		33.997.322.385,00	11,96	6,82	7,90
1096		1,00	10,64	5,57	6,63
1097		18.950.044.815,00	10,80	5,72	6,78
1098		59.840.680.185,00	11,30	6,19	7,26
1100		1,00	10,42	5,36	6,42
1099		1,00	11,85	6,72	7,79

Encuentra en nuestro sitio web: www.avalfiduciaria.com. El contenido exclusivo y los servicios que en Aval Fiduciaria hemos dispuesto para ti. Solo selecciona tu perfil entre Personas, Empresas e Inversionista Institucional.

Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Fínancieras-FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva.

"Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras-FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva". El presente extracto de cuenta se emite en cumplimiento a lo establecido el en Decreto 2555 de 2010.

Para cualquier inquietud, comunícate al PBX (601) 7550340, a la línea nacional gratuita 01 8000 189 799, desde tu celular al #432, o al correo electrónico solicitudes@avalfiduciaria.com. También puedes radicar tu solicitud ingresando a www.avalfiduciaria.com.

Si tienes alguna inconformidad con la información registrada en el extracto, remítela a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S. Dirección Calle 90 Nro. 19C-74, Bogotá - al correo electrónico co-fmcolombia@kpmg.com o a través de atención telefónica al (601) 6188000.

Recuerda que cuentas con el Defensor del Consumidor Financiero, cuyos datos de contacto son: Carrera 10 No. 97 A – 13 Oficina 502 en Bogotá D.C., Teléfono: (601) 6108164, correo electrónico: defensoria.avalfiduciaria@legalcrc.com. Principal: Bertha María García Meza y Suplente: Camilo Alejandro Carreño Barreneche. Ten en cuenta que el Defensor del Consumidor Financiero actúa con total independencia frente a Aval Fiduciaria.

Además, el reglamento y la ficha técnica de cada Fondo de Inversión Colectiva están disponibles en nuestra página web www.avalfiduciaria.com, en el enlace correspondiente a cada Fondo."

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB
NIT: 900.250.203-5
EXTRACTO EXPEDIDO:04/05/2026
CONSECUTIVO: 01114

FIDEICOMISO FIDUBOGOTA - CONSORCIO COCO
CL 67 7 37 P3
BOGOTA
NIT. 830055897

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha Día | Mes | Año	Descripción de Movimiento	Valor de Transacción	Oficina / Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
15/04/2026	RETIRO INVERSIONISTAS	-5.860.848,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.449,53	-356,29	1100.00
15/04/2026	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-23.443,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.449,53	-1,42	1100.00
15/04/2026	RETIRO INVERSIONISTAS	-931.340,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.449,53	-56,61	1100.00
15/04/2026	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-3.725,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.449,53	-0,22	1100.00
15/04/2026	RETIRO INVERSIONISTAS	-41.037.211,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.449,53	-2.494,73	1100.00
15/04/2026	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-164.149,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.449,53	-9,97	1100.00
15/04/2026	RETIRO INVERSIONISTAS	-1.831.524,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.449,53	-111,34	1100.00
15/04/2026	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-7.326,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.449,53	-0,44	1100.00

VIGILADO

Encuentra en nuestro sitio web: www.avalfiduciaria.com. El contenido exclusivo y los servicios que en Aval Fiduciaria hemos dispuesto para ti. Solo selecciona tu perfil entre Personas, Empresas e Inversionista Institucional.

Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Fínancieras-FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva.

"Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras-FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva". El presente extracto de cuenta se emite en cumplimiento a lo establecido el en Decreto 2555 de 2010.

Para cualquier inquietud, comunícate al PBX (601) 7550340, a la línea nacional gratuita 01 8000 189 799, desde tu celular al #432, o al correo electrónico solicitudes@avalfiduciaria.com. También puedes radicar tu solicitud ingresando a www.avalfiduciaria.com.

Si tienes alguna inconformidad con la información registrada en el extracto, remítela a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S. Dirección Calle 90 Nro. 19C-74, Bogotá - al correo electrónico co-fmcolombia@kpmg.com o a través de atención telefónica al (601) 6188000.

Recuerda que cuentas con el Defensor del Consumidor Financiero, cuyos datos de contacto son: Carrera 10 No. 97 A – 13 Oficina 502 en Bogotá D.C., Teléfono: (601) 6108164, correo electrónico: defensoria.avalfiduciaria@legalcrc.com. Principal: Bertha María García Meza y Suplente: Camilo Alejandro Carreño Barreneche. Ten en cuenta que el Defensor del Consumidor Financiero actúa con total independencia frente a Aval Fiduciaria.

Además, el reglamento y la ficha técnica de cada Fondo de Inversión Colectiva están disponibles en nuestra página web www.avalfiduciaria.com., en el enlace correspondiente a cada Fondo."

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB
NIT: 900.250.203-5
EXTRACTO EXPEDIDO:04/05/2026
CONSECUTIVO: 01115

FIDEICOMISO FIDUBOGOTA - CONSORCIO COCO
CL 67 7 37 P3
BOGOTA
NIT. 830055897

Con la expedición de la Resolución 3548 del 30 de septiembre de 1.991, la Superintendencia Bancaria (hoy Superintendencia Financiera) autorizó a la Fiduciaria para desarrollar su objeto social con actividades como Fiducia de Inversión, Fiducia de Administración, Fiducia Mercantil y Encargos Fiduciarios, y en general, todas las operaciones autorizadas por la ley a las Sociedades Fiduciarias.

Cuenta de Inversión: 002010904031
Desde:01/04/2026 Hasta: 30/04/2026
Oficina: FIDUCIARIA BOGOTA DG1 0001
Próximo Vencimiento:
Tipo de Participación al cierre del período: 1100

Estado de la Inversión en el Período	En Unidades	En Pesos
Saldo Inicial	20.029,38	$ 328.004.408,46
Incrementos		$
Disminuciones	-10.474,65	$ -172.938.393,00
Retefuente		$
Rendimiento		$ 1.907.485,17
Otras Retenciones		
Saldo al Final del Período	9.507,68	$ 156.973.500,63
Comisión al cierre del período (%)	2.20 %	

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha Día | Mes | Año	Descripción de Movimiento	Valor de Transacción	Oficina / Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
06/04/2026	RETIRO INVERSIONISTAS	-1.587.316,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.399,34	-96,79	1100.00
06/04/2026	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-6.349,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.399,34	-0,38	1100.00
06/04/2026	RETIRO INVERSIONISTAS	-1.914.190,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.399,34	-116,72	1100.00
06/04/2026	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-7.657,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.399,34	-0,46	1100.00
06/04/2026	RETIRO INVERSIONISTAS	-684.002,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.399,34	-41,70	1100.00
06/04/2026	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-2.736,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.399,34	-0,16	1100.00
06/04/2026	RETIRO INVERSIONISTAS	-3.331.483,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.399,34	-203,14	1100.00
06/04/2026	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-13.326,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.399,34	-0,81	1100.00
06/04/2026	RETIRO INVERSIONISTAS	-9.960.793,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.399,34	-607,38	1100.00
06/04/2026	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-39.843,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.399,34	-2,42	1100.00
06/04/2026	RETIRO INVERSIONISTAS	-82.200,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.399,34	-5,01	1100.00
06/04/2026	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-329,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.399,34	-0,02	1100.00
06/04/2026	RETIRO INVERSIONISTAS	-27.576.704,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.399,34	-1.681,57	1100.00
06/04/2026	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-110.307,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.399,34	-6,72	1100.00
15/04/2026	RETIRO INVERSIONISTAS	-77.451.785,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.449,53	-4.708,44	1100.00
15/04/2026	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-309.807,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.449,53	-18,83	1100.00

DETALLE DE RENTABILIDADES

Tipo de Participación	Tipo de Negocio	Saldo Mínimo ($)	Mensual (%)	Últimos 6 Meses (%)	Anual (%)
1091		1,00	11,30	6,19	7,26
1092		21.010.860,00	11,41	6,30	7,36
1094		509.513.355,00	11,52	6,41	7,47
1095		33.997.322.385,00	11,96	6,82	7,90
1096		1,00	10,64	5,57	6,63
1097		18.950.044.815,00	10,80	5,72	6,78
1098		59.840.680.185,00	11,30	6,19	7,26
1100		1,00	10,42	5,36	6,42
1099		1,00	11,85	6,72	7,79

Encuentra en nuestro sitio web: www.avalfiduciaria.com. El contenido exclusivo y los servicios que en Aval Fiduciaria hemos dispuesto para ti. Solo selecciona tu perfil entre Personas, Empresas e Inversionista Institucional.

Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Fínancieras-FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva.

"Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras-FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva". El presente extracto de cuenta se emite en cumplimiento a lo establecido el en Decreto 2555 de 2010.

Para cualquier inquietud, comunícate al PBX (601) 7550340, a la línea nacional gratuita 01 8000 189 799, desde tu celular al #432, o al correo electrónico solicitudes@avalfiduciaria.com. También puedes radicar tu solicitud ingresando a www.avalfiduciaria.com.

Si tienes alguna inconformidad con la información registrada en el extracto, remítela a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S. Dirección Calle 90 Nro. 19C-74, Bogotá - al correo electrónico co-fmcolombia@kpmg.com o a través de atención telefónica al (601) 6188000.

Recuerda que cuentas con el Defensor del Consumidor Financiero, cuyos datos de contacto son: Carrera 10 No. 97 A – 13 Oficina 502 en Bogotá D.C., Teléfono: (601) 6108164, correo electrónico: defensoria.avalfiduciaria@legalcrc.com. Principal: Bertha María García Meza y Suplente: Camilo Alejandro Carreño Barreneche. Ten en cuenta que el Defensor del Consumidor Financiero actúa con total independencia frente a Aval Fiduciaria.

Además, el reglamento y la ficha técnica de cada Fondo de Inversión Colectiva están disponibles en nuestra página web www.avalfiduciaria.com, en el enlace correspondiente a cada Fondo."

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB
NIT: 900.250.203-5
EXTRACTO EXPEDIDO:04/05/2026
CONSECUTIVO: 01115

FIDEICOMISO FIDUBOGOTA - CONSORCIO COCO
CL 67 7 37 P3
BOGOTA
NIT. 830055897

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha Día | Mes | Año	Descripción de Movimiento	Valor de Transacción	Oficina / Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
15/04/2026	RETIRO INVERSIONISTAS	-5.860.848,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.449,53	-356,29	1100.00
15/04/2026	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-23.443,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.449,53	-1,42	1100.00
15/04/2026	RETIRO INVERSIONISTAS	-931.340,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.449,53	-56,61	1100.00
15/04/2026	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-3.725,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.449,53	-0,22	1100.00
15/04/2026	RETIRO INVERSIONISTAS	-41.037.211,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.449,53	-2.494,73	1100.00
15/04/2026	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-164.149,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.449,53	-9,97	1100.00
15/04/2026	RETIRO INVERSIONISTAS	-1.831.524,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.449,53	-111,34	1100.00
15/04/2026	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-7.326,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.449,53	-0,44	1100.00

VIGILADO

Encuentra en nuestro sitio web: www.avalfiduciaria.com. El contenido exclusivo y los servicios que en Aval Fiduciaria hemos dispuesto para ti. Solo selecciona tu perfil entre Personas, Empresas e Inversionista Institucional.

Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Fínancieras-FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva.

"Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras-FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva". El presente extracto de cuenta se emite en cumplimiento a lo establecido el en Decreto 2555 de 2010.

Para cualquier inquietud, comunícate al PBX (601) 7550340, a la línea nacional gratuita 01 8000 189 799, desde tu celular al #432, o al correo electrónico solicitudes@avalfiduciaria.com. También puedes radicar tu solicitud ingresando a www.avalfiduciaria.com.

Si tienes alguna inconformidad con la información registrada en el extracto, remítela a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S. Dirección Calle 90 Nro. 19C-74, Bogotá - al correo electrónico co-fmcolombia@kpmg.com o a través de atención telefónica al (601) 6188000.

Recuerda que cuentas con el Defensor del Consumidor Financiero, cuyos datos de contacto son: Carrera 10 No. 97 A – 13 Oficina 502 en Bogotá D.C., Teléfono: (601) 6108164, correo electrónico: defensoria.avalfiduciaria@legalcrc.com. Principal: Bertha María García Meza y Suplente: Camilo Alejandro Carreño Barreneche. Ten en cuenta que el Defensor del Consumidor Financiero actúa con total independencia frente a Aval Fiduciaria.

Además, el reglamento y la ficha técnica de cada Fondo de Inversión Colectiva están disponibles en nuestra página web www.avalfiduciaria.com., en el enlace correspondiente a cada Fondo."

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB
NIT: 900.250.203-5
EXTRACTO EXPEDIDO:04/05/2026
CONSECUTIVO: 01116

FIDEICOMISO FIDUBOGOTA - CONSORCIO COCO
CL 67 7 37 P3
BOGOTA
NIT. 830055897

Con la expedición de la Resolución 3548 del 30 de septiembre de 1.991, la Superintendencia Bancaria (hoy Superintendencia Financiera) autorizó a la Fiduciaria para desarrollar su objeto social con actividades como Fiducia de Inversión, Fiducia de Administración, Fiducia Mercantil y Encargos Fiduciarios, y en general, todas las operaciones autorizadas por la ley a las Sociedades Fiduciarias.

Cuenta de Inversión: 002010904031
Desde:01/04/2026 Hasta: 30/04/2026
Oficina: FIDUCIARIA BOGOTA DG1 0001
Próximo Vencimiento:
Tipo de Participación al cierre del período: 1100

Estado de la Inversión en el Período	En Unidades	En Pesos
Saldo Inicial	20.029,38	$ 328.004.408,46
Incrementos		$
Disminuciones	-10.474,65	$ -172.938.393,00
Retefuente		$
Rendimiento		$ 1.907.485,17
Otras Retenciones		
Saldo al Final del Período	9.507,68	$ 156.973.500,63
Comisión al cierre del período (%)	2.20 %	

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha Día | Mes | Año	Descripción de Movimiento	Valor de Transacción	Oficina / Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
06/04/2026	RETIRO INVERSIONISTAS	-1.587.316,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.399,34	-96,79	1100.00
06/04/2026	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-6.349,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.399,34	-0,38	1100.00
06/04/2026	RETIRO INVERSIONISTAS	-1.914.190,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.399,34	-116,72	1100.00
06/04/2026	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-7.657,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.399,34	-0,46	1100.00
06/04/2026	RETIRO INVERSIONISTAS	-684.002,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.399,34	-41,70	1100.00
06/04/2026	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-2.736,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.399,34	-0,16	1100.00
06/04/2026	RETIRO INVERSIONISTAS	-3.331.483,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.399,34	-203,14	1100.00
06/04/2026	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-13.326,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.399,34	-0,81	1100.00
06/04/2026	RETIRO INVERSIONISTAS	-9.960.793,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.399,34	-607,38	1100.00
06/04/2026	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-39.843,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.399,34	-2,42	1100.00
06/04/2026	RETIRO INVERSIONISTAS	-82.200,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.399,34	-5,01	1100.00
06/04/2026	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-329,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.399,34	-0,02	1100.00
06/04/2026	RETIRO INVERSIONISTAS	-27.576.704,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.399,34	-1.681,57	1100.00
06/04/2026	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-110.307,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.399,34	-6,72	1100.00
15/04/2026	RETIRO INVERSIONISTAS	-77.451.785,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.449,53	-4.708,44	1100.00
15/04/2026	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-309.807,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.449,53	-18,83	1100.00

DETALLE DE RENTABILIDADES

Tipo de Participación	Tipo de Negocio	Saldo Mínimo ($)	Mensual (%)	Últimos 6 Meses (%)	Anual (%)
1091		1,00	11,30	6,19	7,26
1092		21.010.860,00	11,41	6,30	7,36
1094		509.513.355,00	11,52	6,41	7,47
1095		33.997.322.385,00	11,96	6,82	7,90
1096		1,00	10,64	5,57	6,63
1097		18.950.044.815,00	10,80	5,72	6,78
1098		59.840.680.185,00	11,30	6,19	7,26
1100		1,00	10,42	5,36	6,42
1099		1,00	11,85	6,72	7,79

Encuentra en nuestro sitio web: www.avalfiduciaria.com. El contenido exclusivo y los servicios que en Aval Fiduciaria hemos dispuesto para ti. Solo selecciona tu perfil entre Personas, Empresas e Inversionista Institucional.

Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Fínancieras-FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva.

"Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras-FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva". El presente extracto de cuenta se emite en cumplimiento a lo establecido el en Decreto 2555 de 2010.

Para cualquier inquietud, comunícate al PBX (601) 7550340, a la línea nacional gratuita 01 8000 189 799, desde tu celular al #432, o al correo electrónico solicitudes@avalfiduciaria.com. También puedes radicar tu solicitud ingresando a www.avalfiduciaria.com.

Si tienes alguna inconformidad con la información registrada en el extracto, remítela a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S. Dirección Calle 90 Nro. 19C-74, Bogotá - al correo electrónico co-fmcolombia@kpmg.com o a través de atención telefónica al (601) 6188000.

Recuerda que cuentas con el Defensor del Consumidor Financiero, cuyos datos de contacto son: Carrera 10 No. 97 A – 13 Oficina 502 en Bogotá D.C., Teléfono: (601) 6108164, correo electrónico: defensoria.avalfiduciaria@legalcrc.com. Principal: Bertha María García Meza y Suplente: Camilo Alejandro Carreño Barreneche. Ten en cuenta que el Defensor del Consumidor Financiero actúa con total independencia frente a Aval Fiduciaria.

Además, el reglamento y la ficha técnica de cada Fondo de Inversión Colectiva están disponibles en nuestra página web www.avalfiduciaria.com, en el enlace correspondiente a cada Fondo."

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB
NIT: 900.250.203-5
EXTRACTO EXPEDIDO:04/05/2026
CONSECUTIVO: 01116

FIDEICOMISO FIDUBOGOTA - CONSORCIO COCO
CL 67 7 37 P3
BOGOTA
NIT. 830055897

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha Día | Mes | Año	Descripción de Movimiento	Valor de Transacción	Oficina / Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
15/04/2026	RETIRO INVERSIONISTAS	-5.860.848,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.449,53	-356,29	1100.00
15/04/2026	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-23.443,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.449,53	-1,42	1100.00
15/04/2026	RETIRO INVERSIONISTAS	-931.340,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.449,53	-56,61	1100.00
15/04/2026	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-3.725,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.449,53	-0,22	1100.00
15/04/2026	RETIRO INVERSIONISTAS	-41.037.211,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.449,53	-2.494,73	1100.00
15/04/2026	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-164.149,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.449,53	-9,97	1100.00
15/04/2026	RETIRO INVERSIONISTAS	-1.831.524,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.449,53	-111,34	1100.00
15/04/2026	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-7.326,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.449,53	-0,44	1100.00

VIGILADO

Las obligaciones de la Fiduciaria son de medio y no de resultado.

Encuentra en nuestro sitio web: www.avalfiduciaria.com. El contenido exclusivo y los servicios que en Aval Fiduciaria hemos dispuesto para ti. Solo selecciona tu perfil entre Personas, Empresas e Inversionista Institucional.

Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Fínancieras-FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva.

"Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras-FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva". El presente extracto de cuenta se emite en cumplimiento a lo establecido el en Decreto 2555 de 2010.

Para cualquier inquietud, comunícate al PBX (601) 7550340, a la línea nacional gratuita 01 8000 189 799, desde tu celular al #432, o al correo electrónico solicitudes@avalfiduciaria.com. También puedes radicar tu solicitud ingresando a www.avalfiduciaria.com.

Si tienes alguna inconformidad con la información registrada en el extracto, remítela a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S. Dirección Calle 90 Nro. 19C-74, Bogotá - al correo electrónico co-fmcolombia@kpmg.com o a través de atención telefónica al (601) 6188000.

Recuerda que cuentas con el Defensor del Consumidor Financiero, cuyos datos de contacto son: Carrera 10 No. 97 A – 13 Oficina 502 en Bogotá D.C., Teléfono: (601) 6108164, correo electrónico: defensoria.avalfiduciaria@legalcrc.com. Principal: Bertha María García Meza y Suplente: Camilo Alejandro Carreño Barreneche. Ten en cuenta que el Defensor del Consumidor Financiero actúa con total independencia frente a Aval Fiduciaria.

Además, el reglamento y la ficha técnica de cada Fondo de Inversión Colectiva están disponibles en nuestra página web www.avalfiduciaria.com., en el enlace correspondiente a cada Fondo."

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB
NIT: 900.250.203-5
EXTRACTO EXPEDIDO:04/05/2026
CONSECUTIVO: 01117

FIDEICOMISO FIDUBOGOTA - CONSORCIO COCO
CL 67 7 37 P3
BOGOTA
NIT. 830055897

Con la expedición de la Resolución 3548 del 30 de septiembre de 1.991, la Superintendencia Bancaria (hoy Superintendencia Financiera) autorizó a la Fiduciaria para desarrollar su objeto social con actividades como Fiducia de Inversión, Fiducia de Administración, Fiducia Mercantil y Encargos Fiduciarios, y en general, todas las operaciones autorizadas por la ley a las Sociedades Fiduciarias.

Cuenta de Inversión: 002010904031
Desde:01/04/2026 Hasta: 30/04/2026
Oficina: FIDUCIARIA BOGOTA DG1 0001
Próximo Vencimiento:
Tipo de Participación al cierre del período: 1100

Estado de la Inversión en el Período	En Unidades	En Pesos
Saldo Inicial	20.029,38	$ 328.004.408,46
Incrementos		$
Disminuciones	-10.474,65	$ -172.938.393,00
Retefuente		$
Rendimiento		$ 1.907.485,17
Otras Retenciones		
Saldo al Final del Período	9.507,68	$ 156.973.500,63
Comisión al cierre del período (%)	2.20 %	

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha Día | Mes | Año	Descripción de Movimiento	Valor de Transacción	Oficina / Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
06/04/2026	RETIRO INVERSIONISTAS	-1.587.316,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.399,34	-96,79	1100.00
06/04/2026	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-6.349,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.399,34	-0,38	1100.00
06/04/2026	RETIRO INVERSIONISTAS	-1.914.190,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.399,34	-116,72	1100.00
06/04/2026	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-7.657,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.399,34	-0,46	1100.00
06/04/2026	RETIRO INVERSIONISTAS	-684.002,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.399,34	-41,70	1100.00
06/04/2026	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-2.736,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.399,34	-0,16	1100.00
06/04/2026	RETIRO INVERSIONISTAS	-3.331.483,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.399,34	-203,14	1100.00
06/04/2026	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-13.326,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.399,34	-0,81	1100.00
06/04/2026	RETIRO INVERSIONISTAS	-9.960.793,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.399,34	-607,38	1100.00
06/04/2026	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-39.843,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.399,34	-2,42	1100.00
06/04/2026	RETIRO INVERSIONISTAS	-82.200,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.399,34	-5,01	1100.00
06/04/2026	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-329,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.399,34	-0,02	1100.00
06/04/2026	RETIRO INVERSIONISTAS	-27.576.704,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.399,34	-1.681,57	1100.00
06/04/2026	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-110.307,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.399,34	-6,72	1100.00
15/04/2026	RETIRO INVERSIONISTAS	-77.451.785,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.449,53	-4.708,44	1100.00
15/04/2026	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-309.807,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.449,53	-18,83	1100.00

DETALLE DE RENTABILIDADES

Tipo de Participación	Tipo de Negocio	Saldo Mínimo ($)	Mensual (%)	Últimos 6 Meses (%)	Anual (%)
1091		1,00	11,30	6,19	7,26
1092		21.010.860,00	11,41	6,30	7,36
1094		509.513.355,00	11,52	6,41	7,47
1095		33.997.322.385,00	11,96	6,82	7,90
1096		1,00	10,64	5,57	6,63
1097		18.950.044.815,00	10,80	5,72	6,78
1098		59.840.680.185,00	11,30	6,19	7,26
1100		1,00	10,42	5,36	6,42
1099		1,00	11,85	6,72	7,79

Encuentra en nuestro sitio web: www.avalfiduciaria.com. El contenido exclusivo y los servicios que en Aval Fiduciaria hemos dispuesto para ti. Solo selecciona tu perfil entre Personas, Empresas e Inversionista Institucional.

Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Fínancieras-FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva.

"Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras-FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva". El presente extracto de cuenta se emite en cumplimiento a lo establecido el en Decreto 2555 de 2010.

Para cualquier inquietud, comunícate al PBX (601) 7550340, a la línea nacional gratuita 01 8000 189 799, desde tu celular al #432, o al correo electrónico solicitudes@avalfiduciaria.com. También puedes radicar tu solicitud ingresando a www.avalfiduciaria.com.

Si tienes alguna inconformidad con la información registrada en el extracto, remítela a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S. Dirección Calle 90 Nro. 19C-74, Bogotá - al correo electrónico co-fmcolombia@kpmg.com o a través de atención telefónica al (601) 6188000.

Recuerda que cuentas con el Defensor del Consumidor Financiero, cuyos datos de contacto son: Carrera 10 No. 97 A – 13 Oficina 502 en Bogotá D.C., Teléfono: (601) 6108164, correo electrónico: defensoria.avalfiduciaria@legalcrc.com. Principal: Bertha María García Meza y Suplente: Camilo Alejandro Carreño Barreneche. Ten en cuenta que el Defensor del Consumidor Financiero actúa con total independencia frente a Aval Fiduciaria.

Además, el reglamento y la ficha técnica de cada Fondo de Inversión Colectiva están disponibles en nuestra página web www.avalfiduciaria.com, en el enlace correspondiente a cada Fondo."

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB
NIT: 900.250.203-5
EXTRACTO EXPEDIDO:04/05/2026
CONSECUTIVO: 01117

FIDEICOMISO FIDUBOGOTA - CONSORCIO COCO
CL 67 7 37 P3
BOGOTA
NIT. 830055897

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha Día | Mes | Año	Descripción de Movimiento	Valor de Transacción	Oficina / Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
15/04/2026	RETIRO INVERSIONISTAS	-5.860.848,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.449,53	-356,29	1100.00
15/04/2026	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-23.443,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.449,53	-1,42	1100.00
15/04/2026	RETIRO INVERSIONISTAS	-931.340,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.449,53	-56,61	1100.00
15/04/2026	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-3.725,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.449,53	-0,22	1100.00
15/04/2026	RETIRO INVERSIONISTAS	-41.037.211,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.449,53	-2.494,73	1100.00
15/04/2026	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-164.149,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.449,53	-9,97	1100.00
15/04/2026	RETIRO INVERSIONISTAS	-1.831.524,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.449,53	-111,34	1100.00
15/04/2026	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-7.326,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.449,53	-0,44	1100.00

VIGILADO

Encuentra en nuestro sitio web: www.avalfiduciaria.com. El contenido exclusivo y los servicios que en Aval Fiduciaria hemos dispuesto para ti. Solo selecciona tu perfil entre Personas, Empresas e Inversionista Institucional.

Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Fínancieras-FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva.

"Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras-FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva". El presente extracto de cuenta se emite en cumplimiento a lo establecido el en Decreto 2555 de 2010.

Para cualquier inquietud, comunícate al PBX (601) 7550340, a la línea nacional gratuita 01 8000 189 799, desde tu celular al #432, o al correo electrónico solicitudes@avalfiduciaria.com. También puedes radicar tu solicitud ingresando a www.avalfiduciaria.com.

Si tienes alguna inconformidad con la información registrada en el extracto, remítela a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S. Dirección Calle 90 Nro. 19C-74, Bogotá - al correo electrónico co-fmcolombia@kpmg.com o a través de atención telefónica al (601) 6188000.

Recuerda que cuentas con el Defensor del Consumidor Financiero, cuyos datos de contacto son: Carrera 10 No. 97 A – 13 Oficina 502 en Bogotá D.C., Teléfono: (601) 6108164, correo electrónico: defensoria.avalfiduciaria@legalcrc.com. Principal: Bertha María García Meza y Suplente: Camilo Alejandro Carreño Barreneche. Ten en cuenta que el Defensor del Consumidor Financiero actúa con total independencia frente a Aval Fiduciaria.

Además, el reglamento y la ficha técnica de cada Fondo de Inversión Colectiva están disponibles en nuestra página web www.avalfiduciaria.com., en el enlace correspondiente a cada Fondo."

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB
NIT: 900.250.203-5
EXTRACTO EXPEDIDO:01/06/2026
CONSECUTIVO: 00277

FIDEICOMISO FIDUBOGOTA - CONSORCIO COCO
CL 67 7 37 P3
BOGOTA
NIT. 830055897

Con la expedición de la Resolución 3548 del 30 de septiembre de 1.991, la Superintendencia Bancaria (hoy Superintendencia Financiera) autorizó a la Fiduciaria para desarrollar su objeto social con actividades como Fiducia de Inversión, Fiducia de Administración, Fiducia Mercantil y Encargos Fiduciarios, y en general, todas las operaciones autorizadas por la ley a las Sociedades Fiduciarias.

Cuenta de Inversión: 002010904031
Desde:01/05/2026 Hasta: 31/05/2026
Oficina: FIDUCIARIA BOGOTA DG1 0001
Próximo Vencimiento:
Tipo de Participación al cierre del período: 1100

Estado de la Inversión en el Período	En Unidades	En Pesos
Saldo Inicial	9.507,68	$ 156.973.500,63
Incrementos		$
Disminuciones	-6.415,37	$ -106.801.173,00
Retefuente		$
Rendimiento		$ 965.862,09
Otras Retenciones		
Saldo al Final del Período	3.071,79	$ 51.138.189,72
Comisión al cierre del período (%)	2.20 %	

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha Día | Mes | Año	Descripción de Movimiento	Valor de Transacción	Oficina / Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
21/05/2026	RETIRO INVERSIONISTAS	-2.674.474,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.594,60	-161,16	1100.00
21/05/2026	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-10.698,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.594,60	-0,64	1100.00
21/05/2026	RETIRO INVERSIONISTAS	-19.865.919,80	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.594,60	-1.197,13	1100.00
21/05/2026	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-79.464,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.594,60	-4,78	1100.00
21/05/2026	RETIRO INVERSIONISTAS	-50.134.081,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.594,60	-3.021,10	1100.00
21/05/2026	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-200.536,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.594,60	-12,08	1100.00
21/05/2026	RETIRO INVERSIONISTAS	-931.340,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.594,60	-56,12	1100.00
21/05/2026	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-3.725,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.594,60	-0,22	1100.00
21/05/2026	RETIRO INVERSIONISTAS	-322.490,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.594,60	-19,43	1100.00
21/05/2026	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-1.290,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.594,60	-0,07	1100.00
21/05/2026	RETIRO INVERSIONISTAS	-2.466.980,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.594,60	-148,66	1100.00
21/05/2026	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-9.868,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.594,60	-0,59	1100.00
21/05/2026	RETIRO INVERSIONISTAS	-23.134.240,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.594,60	-1.394,08	1100.00
21/05/2026	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-92.537,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.594,60	-5,57	1100.00
21/05/2026	RETIRO INVERSIONISTAS	-1.106.510,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.594,60	-66,67	1100.00
21/05/2026	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-4.426,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.594,60	-0,26	1100.00

DETALLE DE RENTABILIDADES

Tipo de Participación	Tipo de Negocio	Saldo Mínimo ($)	Mensual (%)	Últimos 6 Meses (%)	Anual (%)
1091		1,00	11,13	7,36	7,36
1092		21.010.860,00	11,25	7,46	7,47
1094		509.513.355,00	11,35	7,58	7,58
1095		33.997.322.385,00	11,79	7,99	8,00
1096		1,00	10,48	6,73	6,74
1097		18.950.044.815,00	10,64	6,88	6,89
1098		59.840.680.185,00	11,13	7,36	7,36
1100		1,00	10,26	6,52	6,52
1099		1,00	11,68	7,89	7,90

¿Sabes cómo contactarnos? Elige el canal que más te convenga y recibe atención personalizada según tus necesidades. Ingresa al home de nuestro sitio web: **www.avalfiduciaria.com.** Haz clic en el botón **Experiencia del Cliente y SAC** > **Canales de Atención, Red de oficinas**. O en el pie de página, haz clic en **Mapas y oficinas.**

Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Fínancieras-FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva.

"Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras-FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva". El presente extracto de cuenta se emite en cumplimiento a lo establecido el en Decreto 2555 de 2010.

Para cualquier inquietud, comunícate al PBX (601) 7550340, a la línea nacional gratuita 01 8000 189 799, desde tu celular al #432, o al correo electrónico solicitudes@avalfiduciaria.com. También puedes radicar tu solicitud ingresando a www.avalfiduciaria.com.

Si tienes alguna inconformidad con la información registrada en el extracto, remítela a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S. Dirección Calle 90 Nro. 19C-74, Bogotá - al correo electrónico co-fmcolombia@kpmg.com o a través de atención telefónica al (601) 6188000.

Recuerda que cuentas con el Defensor del Consumidor Financiero, cuyos datos de contacto son: Carrera 10 No. 97 A – 13 Oficina 502 en Bogotá D.C., Teléfono: (601) 6108164, correo electrónico: defensoria.avalfiduciaria@legalcrc.com. Principal: Bertha María García Meza y Suplente: Camilo Alejandro Carreño Barreneche. Ten en cuenta que el Defensor del Consumidor Financiero actúa con total independencia frente a Aval Fiduciaria.

Además, el reglamento y la ficha técnica de cada Fondo de Inversión Colectiva están disponibles en nuestra página web www.avalfiduciaria.com, en el enlace correspondiente a cada Fondo."

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB
NIT: 900.250.203-5
EXTRACTO EXPEDIDO:01/06/2026
CONSECUTIVO: 00277

FIDEICOMISO FIDUBOGOTA - CONSORCIO COCO
CL 67 7 37 P3
BOGOTA
NIT. 830055897

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha Día | Mes | Año	Descripción de Movimiento	Valor de Transacción	Oficina / Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
21/05/2026	RETIRO INVERSIONISTAS	-204.057,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.594,60	-12,29	1100.00
21/05/2026	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-816,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.594,60	-0,04	1100.00
21/05/2026	RETIRO INVERSIONISTAS	-3.413.137,20	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.594,60	-205,67	1100.00
21/05/2026	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-13.653,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.594,60	-0,82	1100.00
21/05/2026	RETIRO INVERSIONISTAS	-1.751.756,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.594,60	-105,56	1100.00
21/05/2026	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-7.007,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.594,60	-0,42	1100.00
21/05/2026	RETIRO INVERSIONISTAS	-370.685,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.594,60	-22,33	1100.00
21/05/2026	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-1.483,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	16.594,60	-0,08	1100.00

¿Sabes cómo contactarnos? Elige el canal que más te convenga y recibe atención personalizada según tus necesidades. Ingresa al home de nuestro sitio web: **www.avalfiduciaria.com.** Haz clic en el botón **Experiencia del Cliente y SAC** > **Canales de Atención, Red de oficinas**. O en el pie de página, haz clic en **Mapas y oficinas.**

Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Fínancieras-FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva.

"Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras-FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva". El presente extracto de cuenta se emite en cumplimiento a lo establecido el en Decreto 2555 de 2010.

Para cualquier inquietud, comunícate al PBX (601) 7550340, a la línea nacional gratuita 01 8000 189 799, desde tu celular al #432, o al correo electrónico solicitudes@avalfiduciaria.com. También puedes radicar tu solicitud ingresando a www.avalfiduciaria.com.

Si tienes alguna inconformidad con la información registrada en el extracto, remítela a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S. Dirección Calle 90 Nro. 19C-74, Bogotá - al correo electrónico co-fmcolombia@kpmg.com o a través de atención telefónica al (601) 6188000.

Recuerda que cuentas con el Defensor del Consumidor Financiero, cuyos datos de contacto son: Carrera 10 No. 97 A – 13 Oficina 502 en Bogotá D.C., Teléfono: (601) 6108164, correo electrónico: defensoria.avalfiduciaria@legalcrc.com. Principal: Bertha María García Meza y Suplente: Camilo Alejandro Carreño Barreneche. Ten en cuenta que el Defensor del Consumidor Financiero actúa con total independencia frente a Aval Fiduciaria.

Además, el reglamento y la ficha técnica de cada Fondo de Inversión Colectiva están disponibles en nuestra página web www.avalfiduciaria.com., en el enlace correspondiente a cada Fondo."

11. BITÁCORA

Personal:
1 encargado
1 ayudante
1 boal.
Estado del tiempo.
soleado - seco.
observaciones.

28/04/2026 Pendientes de la llegada de la cal para hacer barrenos.
personal.
1 Boal.
Estado del tiempo.
soleado.
observaciones.

29/04/2026 Llega la cal para los barrenos y el equipo
personal.
1 boal.
Estado del tiempo.
Lluvia en la madrugada y asta las 11:30 a.m, en la tarde soleado.
observaciones: Las lluvias afectan notablemente el avance normal de la ejecución de actividades

personal.
1 cadenero 1
1 cadenero 2
3 Boal.
1 operador
Equipo
1 miñi cargador
Estado del tiempo.
Nublado.

Residente Obra.

04/05/2026. Excavación manual para sumideros que descolan en el pozo intermedio
personal:
1 encargado
1 oficial
3 ayudantes
1 boal
Estado del tiempo.
En la noche anterior lluvias y aún persiste la llovizna lo que atraza el inicio de actividades en campo
observaciones.

Residente Obra

05/05/2026 se continúa excavación para los sumide

3 ayudantes
1 boal.
~~Estado~~ del tiempo.
~~Lluvias~~ soleado.
Observaciones

Residente Obra.

06/05/2026 Se continúa excavación manual para los cárcamos de protección de los ductos de descole de los sumideros "ducto novafor #12"
personal:
1 encargado
1 oficial
3 oyudantes
1 boal
estado del tiempo.
Lluvias en la noche anterior retrazan actividades en horas de la mañana.
Observaciones.

Residente Obra.

07/05/2026 Se continúa excavación manual para cárcamo. y asimismo la construcción de los mismo en descole de los sumideros al pozo intermédio de la

2 ayudantes
1 boal.
~~Estado~~ del tiempo.
seco - soleado.
Observaciones:

Residente Obra

08/05/2026 Se hacen las ventanas en los sumideros intermédios para instalación de los ductos de 12" de descole al pozo intermédio.
personal.
1 encargado
2 ayudantes
1 boal.
Estado del tiempo.
Soleado.
Observaciones.

Residente Obra.

09/05/2026. Colocación de concreto para las losas superior de los cárcamos de los ductos de descole de los sumideros al pozo intermédio.
personal:
1 encargado
1 oficial

observaciones:

Residente Obra

11/05/2026 Apiques para verificar el sellado de los ventanas conectadas la red A.N al colector pluvial.
personal.
1 ayudante
1 boal.
Estado del tiempo.
Nublado
Observaciones.

Residente Obra.

12/05/2026 se realiza actividad de instalación de los sumideros que descolan en el pozo 2 de la red pluvial RCP004.
personal:
1 encargado
2 ayudantes
1 oficial
1 operador
1 boal.
Equipo
1 minicargador

Residente Obra

13/05/2026. se realizo tapado de las ventanas en la red pluvial generada por conexiones heiradas de las domiciliarias de A.N. "sellamiento con concreto. de los orificios en el ducto de la red pluvial. Asi mismo se inicio limpieza de subrasante y conformacion, compactacion de perimetro de los sumideros.
personal.
1 encargado
1 oficial
1 ayudante
1 boal.
Estado del tiempo.
soleado con algo de nubosidad
Observaciones: Debido a la actividad de instalación de los sumideros se hace necesario retirar los tubos instalados y se afectan los cárcamos, luego se hace la reinstalación de los ductos de desole y cárcamos de protección de los ductos.

Residente Obra.

14/05/2026. se continua construcción de cárcamo costado occidental y se finde la

Personal:
1 encargado
1 oficial
1 ayudante
1 boal.
Estado del tiempo.
soleado con algo de nubosidad.
Observaciones

Residente Obra.

15/05/2026. se continúa conformación de subrasante, se inicia instalación de Geo-textil, Geo-celda y capa de subbase., se realizo la fundida de concreto para la losa superior del córeamo del costado oriental.
personal.
1 encargado
2 oficiales
2 ayudantes
1 operador
1 boal.
Equipo
1 minicargador
Estado del tiempo.
Soleado.
Observaciones

base, conformación y humectación y compactación.
Personal:
1 encargado
1 oficial
3 ayudantes
1 operador
1 boal.
Equipo
1 minicargador
1 mini compactador
Estado del tiempo.
día nublado.
Observaciones

Residente Obra.

19/05/2026. se continúa instalación de Geo-textil, Geo-celda y capa de subbase.
personal:
1 encargado
1 oficial
2 ayudantes
1 operador
1 boal.
Equipo
1 minicargador
Estado del tiempo.
Nublado con amenaza de lluvia
Observaciones.

20/05/2026. Se continúa instalación de Geotextil Geo-celda y capa de SBG., se hace humectación de la subbase instalada y excavación manual para cárcamo de protección en la canalización de la red ETB K0+002.
personal.
1 oficial
2 ayudantes
1 operador
1 boal.
Equipo
1 mini cargador
Estado del tiempo.
soleado.
Observaciones.

Residente Obra

21/05/2026. Conformación, humectación y compactación de capa de SBG., se continúa excavación manual para cárcamo de protección canalización ETB en el K0+002.
personal.
1 oficial
1 encargado
1 ayudante
1 operador
1 boal.

Nublado.
Observaciones:

Residente Obra

22/05/2026. Se continúa instalación de Geotextil Geo celda y capa de SBG; de igual manera se humicta y se compacta. Se continúa excavación para la construcción de cárcamo de protección de la canalización de ETB.
Personal.
1 encargado
2 oficiales
2 ayudantes
2 operadores
1 boal.
Equipo
1 minicargador
1 minicompactador
Estado del tiempo.
Mayormente nublado
Observaciones.

Residente Obra.

23/05/2026 Se continúa compactación de capa de SBG, se inicia construcción de cárcamo para protección de la canalización de la red ETB.

1 operador
1 boal
Equipo
1 minicargador
1 minicompactador
Estado del tiempo
Nublado con amenaza de lluvia
Observaciones.

Residente Obra

25/05/2026. se realiza reparación de ductos de la canalización red ETB. se termina la construcción de cárcamo, se funde concreto de la losa superior del cárcamo, se realiza remate de sumideros instalados.
personal:
1 encargado
1 oficial
1 ayudante
1 boal.
Estado del tiempo.
Nublado con amenaza de lluvia.
Observaciones.

Residente Obra.

26/05/2026. se continúa remate de sumideros, conformación de subrasante en tramos

1 oficial
1 ayudante
1 boal.
Estado del tiempo.
Nublado con amenaza de lluvia
Observaciones.

Residente Obra

27/05/2026. Frente de obra sin actividad.
personal.
1 boal
Estado del tiempo.
soleado.
observaciones.

Residente Obra

28/05/2026. se continúa mezclado de base mejorada con cemento y aditivo, se realiza extendido y compactado de la misma.
personal:
1 encargado
2 oficiales
2 ayudantes
1 operador
1 boal.
Equipo
1 minicargador y 1 minicompactador
Estado del tiempo

29/05/2026. Se continúa mezclado de base mejorada con cemento y aditivo, se realiza extendido y compactación
personal.
1 encargado
2 oficiales
1 operador
2 ayudantes
1 peal.
Equipo
1 mini cargador
1 mini compactador
estado del tiempo.
soleado
observaciones

Residente Obra

30/05/2026. Mezclado, extendido y compactación de base mejorada con cemento y aditivo
personal:
1 encargado
2 oficiales
2 ayudantes
1 peal.
Equipo:
1 minicargador
1 mini compactador
Estado del tiempo.
soleado

01/06/2026.

29/04/2026 pendientes de la llegada de la cal y el equipo para los barrenos.
personal
1 boal.
Estado del tiempo.
soleado
Observaciones

Residente Obra.

29/04/2026. Llega al frente de obra la cal para los barrenos y el equipo.
personal.
1 boal.
Estado del tiempo.
Lluvia en la madrugada y astados.
11:30 a.m. en la forde soleado.
Observaciones

Residente Obra

30/04/2026 se realiza la actividad de los barrenos en total 93.
personal.
1 cadenero 1
1 cadenero 2
1 operador
1 boal.
equipo
1 minicargador

Residente Obra.

04/05/2026. Excavación para ductos de 12" novafor y para cárcamos de protección de los ductos. De descole de los sumideros.
personal
2 encargado
1 oficial
1 ayudante y 1 boal.
estado del tiempo.
Lluvia en la noche anterior y en la mañana llovizna.
observaciones.
por el terreno saturado se retraza el inicio de actividades en campo.

Residente Obra.

05/05/2026 se continúa excavación para ductos de descole de sumideros red pluvial. nova for de 12".
personal:
1 encargado
1 oficial
1 ayudante
1 boal.
estado del tiempo.
en la noche anterior llovio y el dia de hoy terreno saturado que atraza las actividades en el frente de obra.

06/05/2026 se continúa excavación manual para ductos de descole de sumideros:
personal
1 oficial
1 ayudante
1 boal.
Estado del tiempo.
Lluvias en la noche anterior terreno saturado, esto retraza la actividad en campo.
Observaciones

Residente Obra

07/05/2026 se continúa excavación manual para los ductos de descole de los sumideros "Novator 12"
personal.
1 encargado
1 oficial
1 ayudante
1 boal.
Estado del tiempo.
Ligeramente soleado con algo de nubosidad
Observaciones.

Residente Obra

08/05/2026. Instalación de sumideros.
Personal
1 encargado
1 oficial
1 ayudante
1 boal.

Equipo
1 minicargador
Estado del tiempo
soleado.
Observaciones.

Residente Obra

09/05/2026 se continúa excavación manual para cárcamos de protección ductos de descole de los sumideros.
personal.
1 encargado
1 ayudante
1 boal.
Estado del tiempo
soleado.
Observaciones.

Residente Obra.

11/05/2026. Instalación de ductos de descole de los sumideros y se inicia construcción de cárcamos.
personal
2oficiales
1 ayudante
1 boal.
Estado del tiempo.
Nublado.

12/05/2026 Se inicia instalación de Geo-textil, Geo-celda y Subbase.
personal.
1 encargado
1 oficial
1 ayudante
1 operador
1 boal.
Equipo
1 mini-cargador.
Estado del tiempo
Soleado. con algo de nubosidad.
observaciones.

Residente Obra.

13/05/2026. Se hace limpieza de subrasante, instalación de Geo-textil, Geo-Celda y Sub-base "continuación de actividad".
personal
1 encargado
1 oficial
2 ayudantes
1 operador
1 boal
Equipo
1 mini cargador.
Estado del tiempo.
Ligeramente soleado.
Observaciones.

personal.
1 encargado
1 oficial
2 ayudantes
1 operador
1 boal.
Equipo
1 mini cargador.
Estado del tiempo.
Ligeramente soleado.

Residente Obra.

14/05/2026. humectación de material granular extendido.
personal.
1 encargado
1 oficial
1 ayudante
Estado del tiempo.
Soleado.
observaciones.

Residente Obra.

16/05/2026. se humecta de nuevo el material granular SBG. extendido.
personal.
1 oficial
1 ayudante

19/05/2026. Sin actividad el día de hoy
1 boal.
Estado del tiempo.
Soleado.
Observaciones.

20/05/2026. Humectación de material granular instalado.
personal:
1 ayudante
1 boal.
Estado del tiempo.
soleado.
Observaciones

21/05/2026. Humectación de material
personal:
2 ayudantes
Estado del tiempo.
Nublado.
observaciones.

22/05/2026. Se continúa actividad de humecta-

1 oficial
1 ayudante
1 operador.
Equipo
1 minicompactador.
Estado del tiempo.
~~So~~ Mayormente nublado.
Observaciones.

Bendata Chm.

23/05/2026. En horas despues de las 10:40 se inicia mezclado y extendido de base mejorada, 1 viaje.
personal:
1 encargado
1 oficial
2 ayudantes
1 operador
Equipo:
1 minicargador
Estado del tiempo.
Soleado.
Observaciones: L
En la mañana se reporta un daño en el minicargador que se subsana acia las 11:00 am.

1- encargado
1 oficial
1 ayudante
1 operador
1 boal.
Equipo.
1 miñicargador
Estado del tiempo.
soleado.
Observaciónes.

Residente Obra

26/05/2026. excavación manual pera instalación de bordillo-sardinel, compactación de capa 1 de base mejirada.
personal.
1 encargado
1 oficial
1 ayudante
1 boal.
Estado del tiempo
Nublado em amenaza de lluvia
observaciònes.

Residente Obra

27/05/2026. Frente de obra sin actividad.
personal
1 boal.

28/05/2026. se inicia instalación de bordillo-sardinel.
personal.
1 oficial
2 ayudantes
1 boal.
1 encargado.
Estado del tiempo.
Soleado.
Observaciònes.

Residente Obra

29/05/2026. Se continúa instalación de bordillo sardinel.
personal
1 encargado
2 oficiales
1 ayudante
1 boal
Estado del tiempo.
Mayormente nublado.
Observaciones.

Residente Obra

30/05/2026. se continúa instalación de bordillo sardinel
personal.

1 minicargador
Estado del tiempo
soleado con nubosidad.
Observaciones.

Residente Obra.

28/04/2026 se continúa instalación de geotextil, Geoceldas y extendido de capa de SBG.
personal
1 encargado
1 ayudante
1 operador
1 boal.
Equipo
1 minicargador
estado del tiempo.
soleado.
Observaciones.

Residente Obra.

29/04/2026 No se adelanta actividad por terreno saturado por lluvias fuertes en la madrugada y asta las 11:30 del dia
personal
1 boal.
estado del tiempo,
lluvias asta las 11:30
Observaciones

madrugada

04/05/2026 No se adelanta actividad el dia de hoy.

Residente Obra

05/05/2026. No se adelanta actividad el dia de hoy

06/05/2026. se realiza toma de cotas y nivelación por topografia para inicio excavación mecánica bera la red pluvial de 12".
personal:
1 encargado
1 Cadenero 1
1 Cadenero 2
1 boal.
Estado del tiempo.
seco en la mañana y en la tarde lluvianos aisladas.

Residente Obra

07/05/2026. se continúa levantamiento topográfico para la red pluvial.
personal.

1 boal.
Estado del tiempo.
seco-
Observaciones:

Residente Obra

08/05/2026 excavación para la red pluvial de 12" y asimismo instalación de tubería.
personal.
1 topógrafo.
1 cadenero
1 encargado, 1 operador
2 ayudantes
1 boal.
estado del tiempo.
seco-soleado.
Observaciones:

Equipo.
1 excavadora

Residente Obra

09/05/2026. excavación mecánica para pozo inicial de la red pluvial, se realiza construcción de pozo y reparación de domicilias de A.N.
personal.
1 encargado
1 oficial
2 ayudantes
1 operador
1 boal.
Equipo:

Residente Obra

11/05/2026 se continúa excavación mecánica para la red pluvial de 12" y el pozo 2. se paleta por fuera el pozo inicial
personal.
1 encargado
1 ayudante
1 operador
1 topógrafo.
1 cadenero
1 boal.
Equipo
1 excavadora
estado del tiempo.
Nublado.

Residente Obra

12/05/2026. excavación para domiciliarios de A.N., se reparan y se funden los dados, se continúa excavación mecánica para la red pluvial de 12" y se continúa construcción del pozo inicial de la red pluvial.
personal
1 encargado
1 ayudante
1 operador
1 boal.
Equipo
1 excavadora
Estado del tiempo.
Nublado.
Observaciones.

13/05/2026 Se continúa construcción del pozo 2 de la red pluvial nueva K0+007.
personal.
1 encargado
1 ayudante
1 oficial
1 boal.
2 operadores.
Equipo
1 excavadora
1 minicargador
estado del tiempo
soleado.
Observaciones
se realiza instalación del cargue del pozo 2 de la red pluvial nueva.

14/05/2026 En la noche anterior se genera la ruptura del tubo de 3" asbesto cemento de la red potable causando inundación parcial del CIV, se procede en horas de la mañana a reportar a la EAAB y solicitar reparación entre tanto se adelanta conexión definitiva de algunas acometidas de acueducto. y el cambio de las mangueras. En horas de la tarde se retoma instalación de geotextil, Geomalla y Subbase luego de secar, retirar material saturado.
personal
1 encargado
1 Oficial

observaciones

13/05/2026. Se continúa instalación de bordillo A-80
personal.
1 oficial
3 oyudantes
1 boal.
Estado del tiempo.
nublado.
observaciones.
CIV 6000557.
Retiro de material saturado por la ruptura del tubo de agua potable.
se estabiliza parte de la subrasante y se continúa instalación de geotextil, Geocelda y subbase.
personal:
1 encargado
1 oficial
1 oyudante
1 operador
1 boal.
Equipo
1 minicargador.
estado del tiempo:
soleado.
Observaciones

06/05/2026 No se adelanta actividad en campo. por terreno saturado, se da tiempo. a que drene para retomar actividades.
estado del tiempo.
Nublado con amenaza de lluvia.
Observaciones

Residente Obra.

07/05/2026 se continúa colocación de geotextil, geo-celda y capa de SBG.
1 encargado
1 oficial
2 ayudantes
1 operador
1 boal
Equipo.
1 minicargador
Estado del tiempo.
Nublado con amenaza de lluvia.
Observaciones.

Residente Obra.

20/05/2026. sin avance de obra por subrasante saturada debido a la inundación del CIV por ruptura del tubo de agua potable.
Estado del tiempo.
Nubosidad moderada.
Observaciones.

21/05/2026. No se adelanta actividad por subrasante saturada entre el K0+000 y el K0+020.
personal.
1 boal
Estado del tiempo.
en la noche llovizna y en el día de hoy nublado.
Observaciones.

Residente Obra

22/05/2026. se continúa sin actividad en obra por subrasante saturada.
personal
1 boal.
Estado del tiempo.
Mayormente nublado.
Observaciones.

Residente Obra

23/05/2026 Excavación mecánica para instalación de sumideros y ductos de desde 12" al pozo 2 de la red pluvial nueva K0+002.
personal.
1 encargado
1 cadenero dos.
1 oyudante
1 operador
1 boal.

Residente Obra.

25/05/2026. Instalación de ducto novafor de 12" para descole de sumidero. al pozo 2 de la red pluvial Ko+002, se inicia mercelado de base mejorada para capa 1, se extiende y conforma. entre el Ko+030 y el Ko+060.
personal.
1 encargado
2 oficiales.
1 operador
3 ayudantes
1 boal.
Equipo.
1 excavadora
1 mini. cargador
Estado del tiempo.
Ligeramente nublado.

Residente Obra. Supervisor

26/05/2026. Mercado de base mejorada para la primera capa; conformación, humectación en carril occidental entre el Ko+000 al Ko+005.
personal:
1 encargado
1 oficial
2 operadores
1 ayudante
1 boal.
Estado del tiempo.
Nublado con amenaza de lluvia.
Observaciones:

28/05/2026. Se continúa mercelado de base mejorada con cemento y aditivo para capa 1, de igual manera conformación manual de subrazante entre el Ko+000 y el Ko+006.
Personal
1 encargado
1 oficial
2 ayudantes — 1 operador y 1 boal
1 minicargador
1 minicompactador.
Estado del tiempo
soleado:
Observaciones: El día 27/05/2026 no hay actividad en obra.

Residente Obra. Supervisor

29/05/2026. Se realiza instalación de geotextil, Geo-Célda y capa de SBO. Ko+000 al Ko+020.
personal:
1 encargado
1 oficial
1 ayudante
1 operador
Equipo.
1 minicargador
Estado del tiempo.
soleado.
Observaciones.

personal:
1 encargado
1 oficial
2 operadores.
1 peón.
Equipo
1 minicargador
1 minicompactador
Estado del tiempo:
Soleado
Observaciones:

Mauricio Ochoa

01/06/2026.

observaciones.

Interventoria

30/04/2026 Se continua lleno compactado sobre la red de 8", se descarga losa de fondo y cargue pera el pozo de inspeccion de la red de A.N.
personal:
1 encargado
1 ayudante
1 operador
1 boal.
Equipo
1 minicargador para descargar los prefabricados del pozo de inspeccios, cargue y losa de fondo.
Estado del tiempo
soleado.
Observaciones.

Interventoria

Residente Obra

04/05/2026 inicio construccion pozo adicional red residual, previo a la instalacion de la losa de fondo.
personal.
1 encargado
2 ayudantes
Estado del tiempo.
soleado.
Observaciones.

05/05/2026 se termina construccion mamposteria del pozo intermedio de la red residual y se coloca concreto para dados de empalme de las domiciliarias de A.N. y se inicia pañete interno del pozo.
personal.
1 encargado
2 ayudantes
1 boal.
Estado del tiempo.
soleado.
observaciones.

Interventoria

Residente Obra

06/05/2026 se Termina pañete interno del pozo y se pañeta por fuera, asi mismo se cubre con Geotextil.
personal.
1 encargado
1 ayudante
1 boal.
Estado del tiempo.
llovia en la noche anterior saturo el material de la subrasante lo que retraza el inicio de la actividad en campo.
observaciones.

Interventoria

Residente Obra

07/05/2026 Se continua lleno con material granular

1 encargado
1 ayudante
1 boal.
Estado del tiempo
En la mañana seco, en la tarde Nubes nas aisladas.
Observaciones.
El personal del frente de obra se traslada a las 13:00 para el frente CIV 6001013.

Interventoría

Residente Obra.

06/05/2026. Sin actividad por subrasante saturada.
personal.
1 boal.
estado del tiempo
soleado.
observaciones.

Interventoría

Residente Obra

07/05/2026 El frente de obra continua sin actividad.
por demora en el equipo de barrenos.
personal.
1 boal.
Estado del tiempo.
soleado.
observaciones.

Interventoría

Residente Obra.

Estado del tiempo.
parcialmente nublado.
observaciones.

Interventoría

Residente Obra.

12/05/2026. Se hacen barrenos.
personal
1 encargado
1 ayudante
1 operador
Equipo
1 minicargador con barreno
Estado del tiempo.
parcialmente nublado.
observaciones.

Interventoría

Residente Obra.

13/05/2026. Frente de obra sin actividad.
Estado del tiempo.
Nublado con amenaza de lluvia
observaciones.

Interventoría

Residente Obra.

14/05/2026. Se realiza conformación de subrasante y recolección de material sobrante de los barrenos,
personal.

Estado del tiempo.
Soleado con nubosidad.
Observaciones,

Residente Obra

15/05/2025 continuan conformacion de subrasante
personal.
1 encargado
1 ayudante
1 boal.
Estado del tiempo.
Nublado.
Observaciones.

Residente Obra

16/05/2026. se continua conformacion manual de subrasante.
personal.
1 encargado
1 ayudante
Estado del tiempo.
Ligeramente soleado con nubosidad.
Observaciones

Residente Obra

19/05/2026 se continua conformacion de subrasante
personal.
1 encargado

observaciones.

Residente Obra

20/05/2026. Limpieza del area de trabajo para instalacion de Geo-textil, Geo-celda y capa de subbase.
personal.
1 encargado
2 ayudantes
Estado del tiempo.
Nubosidad moderada.
Observaciones.

Residente Obra

21/05/2026. Instalacion de Geo-textil, Geo-celda y capa de SBG. PEA.
personal.
1 encargado
2 ayudantes
1 operador
Equipo.
1 minicargador
Estado del tiempo.
Mayormente nublado.
Observaciones.

Residente Obra

22/05/2026. Compactación de capa SBG PEA.

1 boal.
Equipo
1 minicompactador
Estado del tiempo.
Ligeramente soleado.
Observaciones

Residente Obra

23/05/2026 Humectación del material granular instalado en el frente de obra.
personal.
1 ayudante
Estado del tiempo.
Ligeramente soleado.
Observaciones.

Residente Obra

25/05/2026. Frente de obra en espera de material para continuar construcción estructura
personal.
1 boal.
Estado del tiempo.
Nublado con amenaza de lluvia.
Observaciones.

Residente Obra.

26/05/2026. Sin actividad.
Estado del tiempo.

27/05/2026. Frente de obra sin actividad.
personal.
1 boal
Estado del tiempo.
soleado.
Observaciones

Residente Obra.

28/05/2026. Se inicia mezclado y extendido de base mejorada con cemento y aditivo.
personal
1 encargado
1 ayudante
1 operador
1 boal.
Equipo
1 minicargador
Estado del tiempo.
soleado.
Observaciones.

Residente Obra.

29/05/2026. Se continúa mezclado y extendido de base mejorada con cemento y aditivo.
personal
1 encargado
1 ayudante
1 operador
1 boal.

30/05/2026 se continúa mezclado y extendido y compactación de base mejorada con cemento y aditivo

personal
1 encargado
1 ayudante
1 operador
1 boal

Equipo
1 minicargador

estado del tiempo
Soleado

observaciones

Intecuentería

Benedetti Obra

09/06/2026

14/05/2026. se instala cerramiento y se retira la carpeta asfáltica existente y se inicia excavación - cajeo.
personal:
1 encargado
1 oyudante
1 operador
1 boal.
Equipo
1 excavadora
estado del tiempo.
parcialmente soleado con nubosidad.
Observaciones.

Residente Obra.

15/05/2026. se continúa cajeo. excavación para remplazo de la estructura
personal.
1 operador
1 oyudante
1 boal.
estado del tiempo.
Soleado.
Equipo
1 excavadora.
Observaciones:

Residente Obra.

16/05/2026. se continúa cajeo para reemplazo de la estructura de la vía.
personal

1 boal.
Equipo
1 excavadora.
estado del tiempo;
soleado con algo de nubosidad.
Observaciones:

Residente Obra.

19/05/2026. se continúa cajeo.
personal:
1 encargado
1 operador
1 boal.
Equipo
1 excavadora.
estado del tiempo.
soleado.
Observaciones.

Residente Obra.

20/05/2026. se continúa cajeo
personal.
1 operador
1 boal.
Equipo.
1 excavadora
Estado del tiempo.
Nubosidad moderada.
Observaciones.

22/05/2026. Excavación mecánico. cajeo
personal.
1 operador
1 ayudante
1 boal.
Equipo.
1 excavadora
Estado del tiempo.
Soleado.
observaciones

Residente Obra

22/05/2026. se marca la lineo para excavación para el reemplazo de la red residual. se realizo conformación de subrasante.
personal.
1 operador
1 cadenero
1 ayudante
1 boal.
equipo
1 excavadora
estado del tiempo.
soleado.
observaciones.

Residente Obra

23/05/2026. frente de obra sin actividad el dia de hoy
personal:

23/05/2026. No hay actividad por no suministro del entibado.
personal.
1 boal.
Estado del tiempo.
soleado.
observaciones.

Residente Obra.

26/05/2026. frente de obra sin actividad por falta de entibado.
personal
1 boal
estado del tiempo.
soleado.

Residente Obra

27/05/2026. frente de obra sin actividad. por falta de entibado.
personal.
1 boal
estado del tiempo.
soleado.
observaciones.

1 encargado
1 operador
1 ayudante
1 boal.
Equipo
1 excavadora
Estado del tiempo.
Soleado.
Observaciones.

Residente Obra. Interventor

29/05/2026. Se continúa excavación para red residual al cámbio de tubería de gres por pvc- novafor de 8".
personal,
1 encargado
1 operador
1 ayudante
1 boal.
Equipo
1 excavadora
Estado del tiempo.
Soleado.
Observaciones

Residente Obra. Interventor

30/05/2026. Se continúa excavación e instalación de tubería novafor de 8" para cambio de la red residual existente.
personal,
1 encargado

1 excavadora.
Estado del tiempo.
Soleado.
Observaciones.

Residente Obra. Interventor

01/06/2026.

Estado del tiempo:
Soleado.
Observaciones.

Residente Obra.

29/04/2026 Excavación manual para ductos y cárcamos red pluvial K0+000. Se inicia la excavación para instalación de bordillo A-80 y se inicia instalación de bordillo A-80. como Sordinel
personal:
1 oficial
3 ayudantes
1 boal.
Estado del tiempo
En la madrugada y asta las 11:30 lluvia, en la tarde soleado.
Observaciones.

Residente Obra

30/04/2026 Instalación de bordillo A-80 como Sordinel, se realiza descargue de 3 cargues para los pozos de inspección, ~~instal~~ construcción de cárcamos para los ductos de descole de los sumideros K0+004.
personal.
1 encargado
1 oficial
4 ayudantes

Soleado.
Observaciones.

Residente Obra

04/05/2026 Instalación de ductos para descole de los sumideros al pozo existente. "Novafor 12"
y se continúa de igual manera instalación de bordillo A-80 y A-85.
personal.
1 oficial
1 encargado
3 ayudantes
1 boal
Estado del tiempo.
Llovia en la noche anterior y en la mañana llovizna esto retraza el inicio de las actividades en horas de la mañana.
Observaciones:

Residente Obra

05/05/2026 se realiza armado de acero para las losas de los cárcamos de los ductos de descole de los sumideros al pozo existente ("Novafor 12").
personal
1 encargado
1 oficial
3 ayudantes

06/05/2026 Se continúa instalación de bordillo A-80
y A-85.
Personal.
1 encargado
1 oficial
4 ayudantes
Estado del tiempo.
En la noche anterior y en la madrugada
lluvias que retraron el inicio de activi
dades en la mañana, por lo tanto s
cae el rendimiento.
Observaciones: Se realiza colocación de
concreto para las losas de los córcamos.

Residente Obra

07/05/2026 Se continúa instalación de bordillo A-8
y A-85. y emboquillado.
personal.
1 oficial
3 ayudantes
1 boal.
Estado del tiempo.
En la mañana seco y en la tarde
lloviznas aisladas.
observaciones.

Residente Obra

08/05/2026 Se continúa instalación de bordillo A-80
y A-85
personal.
1 oficial

observaciones:

Residente Obra

09/05/2026 Se continúa excavación para instalar
bordillo A-80 como sardinel y se
hace limpieza del CIV con mini-
cargador y volqueta.
personal.
1 encargado
1 oficial
2 ayudantes
1 operador
1 boal.
Equipo
1 minicargador
Estado del tiempo.
soleado y nublado
observaciones.

Residente Obra

11/05/2026 Se continúa limpieza con minicargador
y 1 volqueta, se continúa instala-
ción de bordillo A-80 y A-85
personal.
1 encargado
1 oficial
1 operador
1 boal.
Equipo

12/05/2026 se continúa instalación de bordillo A-3
y los hombros de las rampas vehiculares
personal:
1 encargado
1 oficial
2 ayudantes
1 boal.
estado del tiempo.
soleado.
observaciones.

Residente Obra. Interventoría

13/05/2026 se realiza la nivelación de los sumideros ubicados en el K0+004.
personal.
1 oficial
2 ayudantes
1 boal.
estado del tiempo.
Nublado con amenaza de lluvia.
observaciones.

Residente Obra. Interventoría

14/05/2026 se continúa instalación de bordillo A-35,
y se hacen cortes para la reparación de los andenes y adecuaciones de las rampas vehiculares.
personal.
1 encargado
1 oficial

15/05/2026. colocación de concreto para reparación de andenes y rampas vehiculares, asimismo se hace limpieza del área de trabajo con minicargador.
personal.
1 encargado
1 oficial
1 operador
2 ayudantes
1 boal.
Equipo
1 minicargador.
Estado del tiempo
nublado.
observaciones.

Residente Obra. Interventoría

16/05/2026. se continúa colocación de concreto de 3.000 psi para franja de ajuste en andenes.
personal.
1 oficial
2 ayudantes
1 boal
estado del tiempo.
Nublado con amenaza de lluvia
observaciones.

Residente Obra. Interventoría

1 oficial
2 ayudantes
1 operador
1 boal.
Equipo
1 minicargador
Estado del tiempo-
Soleado.
Observaciones

Residente Obra. Interventor

20/05/2026. Instalación de bordillo A-80 - A-85 y continuamos haciendo cortes para la reparación de andenes "franja de ajuste
personal
1 encargado
2 oficiales.
3 ayudantes y 1 boal.
Estado del tiempo:
Nubosidad moderada.
Observaciones.

Residente Obra Interventor

21/05/2026. Alistado para colocación de concreto para reparación de andenes. "cinta de ajuste
Acondicionamiento de ductos para las bajantes de A.ll. de los predios, demolición de concreto para adecuación de rampas vehiculares.
personal.

Estado del tiempo.
Nublado.
Observaciones.

Residente Obra Interventor

22/05/2026. Alistado para reparación de andenes. cortes, acondicionamiento de bajantes, instalación de bordillo A-80, A-85 y construcción "Fundida de hombros de las rampas vehiculares.
Personal.
2 oficiales
2 ayudantes
1 cadenero.
1 boal.
1 encargado.
Estado del tiempo.
Ligeramente soleado.
Observaciones

Residente Obra Interventor

23/05/2026. se continúa fundida de hombros de las rampas vehiculares, emboquillado de bordillo sardinel, cambio de los cargues de las redes húmedas de la boca-calle 53t-sur en Kra 34.
Nota: En la noche anterior se robaron la tapa de la cámara ETB aledaña al CIV. Km 000. esquina sur-oriental

Ligeramente soleado con nubosidad.
Observaciones.

Residente Obra | Inspector

25/05/2026. se continúa alistado para concreto de reparación de andenes y colocación de concreto de 3.000 psi para cintas de ajuste en andenes y rampas vehiculares.
personal:
1 oficial
1 ayudante
1 boal.
estado del tiempo.
Ligeramente soleado.
Observaciones.

Residente Obra | Inspector

26/05/2026 Colocación de concreto para reparación de andenes.
personal
1 oficial
1 ayudante
1 boal
estado del tiempo
soleado.
observaciones.

estado del tiempo.
soleado.
Observaciones.

Residente Obra | Inspector

28/05/2026 se continúa alistado para reparación de andenes y basantes de A.C. personal.
1 oficial
1 ayudante
1 boal.
estado del tiempo
soleado
observaciones.

Residente Obra | Inspector

29/05/2026 Alistado para reparación de rampas vehiculares y andenes.
personal:
1 oficial
1 ayudante
1 boal.
estado del tiempo.
soleado.
observaciones.

Residente Obra | Inspector

30/05/2026 Colocación de concreto de 3.000 psi para reparación de andenes "fraseo de ajuste".

Estado del tiempo.
Soleado.
Observaciones.

Mauricio Fernandez

Ricardo Ortiz

01/06/2026

Personal.
1 encargado
1 ayudante
1 operador
1 boal.
Equipo
1 minicargador con rodillo.
Estado del tiempo
Lluvia en la madrugada y astala 11:30, en la tarde Soleado.
Observaciones.

Residente Obra.

30/04/2026. Compactación de capa z de base mejorada con rodillo y compactación con canguro entre el Ko+000 y el Ko+005 debido a la presencia de z pozos de inspección que no permiten pasar el rodillo.
personal.
1 encargado
1 ayudante
1 operador
1 boal.
Equipo
un minicargador con rodillo
Estado del tiempo.
Soleado.
Observaciones.

Residente Obra

4/05/2026 El día de hoy no hay actividad en el frente de obra.
Estado del tiempo.
Lluvias en la noche anterior y en la mañana no permiten inicio de actividades por terreno Saturado en horas de la mañana.
Observaciones.

Residente Obra.

05/05/2026 El frente de obra continúa sin actividad pendiente definir actividad en la intersección de la carrera 26 por calle 48c sur.
Estado del tiempo.
Soleado.
Observaciones.

Residente Obra

06/05/2026 El frente de obra continúa sin actividad el día de hoy
Estado del tiempo
Soleado.
Observaciones.

Residente Obra

07/05/2026 se marcan cortes y se realizan para el inicio de la intervención en la

1 oficial
1 ayudante
1 boal.
Estado del tiempo
Soleado.
Observaciones.

Residente Obra

08/05/2026 Retiro de carpeta asfáltica existente con el minicargador, también se retira parte de la estructura, en la intersección de la calle 48C-sur con la KR 26.
Estado del tiempo.
Soleado.
personal
1 encargado
1 ayudante
1 oficial
1 operador
1 boal.
Observaciones: Al final de la tarde el minicargador queda fuera de servicio por manguera del hidraulico averiada.

Residente Obra

09/05/2026 Se continúa excavación manual para retiro de la estructura de la vía. en la intersección de la calle 48csur

1 boal.
Estado del tiempo
Soleado.
Observaciones.

Residente Obra

11/05/2026 se continúa excavación manual para retiro de la estructura de la vía en la intersección de la calle 48C-sur con la carrera 26.
Personal.
1 operador
1 ayudante
1 boal.
Estado del tiempo.
Semi - Nublado.
Observaciones: El minicargador aún continúa fuera de servicio

Residente Obra

12/05/2026 Se realiza instalación de Geotextil, Geoceda y capa de SBG. en la intersección de la calle 48csur con la KR 26. frente pareja y calzada.
personal:
1 encargado
2 ayudantes
1 boal.
Estado del tiempo.
Soleado; ligeramente nublado.

13/05/2026 excavación manual para cambio los ductos del sumidero costado oriental de la intersección calle 48c sur con KR 26.
personal.
2 ayudantes
1 boal.
Estado del tiempo.
nublado con amenaza de lluvia
Observaciones: Ducto de gres colapsado

Residente Obra.

14/05/2026. se continúa excavación manual para cambio de ductos de sumidero costado oriental calle 48c sur por KR 26.
personal:
1 encargado
2 ayudantes
1 boal.
Estado del tiempo.
soleado, ligeramente nublado.
Observaciones.

Residente Obra.

15/05/2026 se continúa excavación manual para cambio de ducto del desde de sumidero costado sur-oriental en la intersección de la calle 48c sur con KR-2
personal.
1 encargado

estado del tiempo.
soleado, ligeramente nublado.

Residente Obra

16-Mayo/2026. se continúa excavación manual para cambio de ducto de desole del sumidero costado sur-oriental en la intersección de la calle 48c-sur con KR 26.
personal.
1 encargado
2 ayudantes
1 boal
estado del tiempo.
Nublado con amenaza de lluvia
Observaciones: se temina excavación.

Residente Obra

19/05/2026. se realizo instalacion de ducto de 12" construccion de cárcamo para protección del mismo y se fundio la losa en concreto preparado en obra.
personal.
1 encargado
2 ayudantes
1 boal.
estado del tiempo.
Nublado con amenaza de lluvia

20/05/2026 Se realiza instalación de capa de SBG, se conforma en horas de la mañana, se nubla el cóncamo.
personal:
1 encargado
2 ayudantes
1 boal.
estado del tiempo.
nubosidad moderada.
observaciones.

Residente Obra

21/05/2026. humectación y compactación de capa de SBG. en intersección de la calle 48C sur con Kra 26
personal:
1 encargado
1 ayudante
1 boal.
Equipo
1 minicompactador
estado del tiempo
Nublado.
observaciones.

Residente Obra

22/05/2026. se realizo recolección y acopio de material RCD en el frente de obra
personal:
1 ayudante

23/05/2026. No hay actividad en obra.
personal.
1 boal.
estado del tiempo.
soleado.
observaciones: El personal se traslada al frente de obra 6000389 para apoyar actividad de mercado de base mejorada.

Residente Obra

26/05/2026. se continúa sin actividad en el frente de obra, personal y equipos se trasladan al frente de obra 6000389 para apoyar el mercado y extendido de la capa de base mejorada.
estado del tiempo.
Ligeramente nublado-
personal.
1 boal.

Residente Obra

27/05/2026. se realiza actividad de mercado, extendido y compactación de base mejorada en tramo perenal sobre la intersección de la calle 48sur con la KR 26. " perenal media calzada"
personal.
1 encargado
1 ayudante
Equipo.
1 minicargador

Observaciones

Residente Obra

28/05/2026. se hace limpieza del frente de obra y se reacomoda el cerramiento-
personal:
1 ayudante
1 boal.
Estado del tiempo:
soleado:
observaciones.

Residente Obra

29/05/2026 La topografía realiza nivelación de la base para verificación de cotas para la instalación de la carpeta asfáltica.
personal:
1 topógrafo.
1 cadenero z
1 ayudante
1 boal.
estado del tiempo:
soleado.
observaciones.

Residente Obra

30/05/2026 Frente de obra sin actividad.

observaciones.

Residente Obra

01/06/2026
