INFORME DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN	
1. IDENTIFICACION DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	
Contrato Numero	177-2026
Dependencia	Secretaría de planeación
Supervisor (a)	Jeisson Ferney Contreras Muñoz Secretario de Despacho Secretaría de planeación Yeiner Yerson Bolaños Narváez Director de Obras Públicas Secretaría de planeación
Contratista	GUARIUM SAS/NIT. 901.247.479-3
Objeto del Contrato	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA CIRCACIA HACIA LA VEREDA LA GUASIMA SECTOR SANTA ROSA MUNICIPIO DE ANAPOIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (CONVENIO ICCU 750-2026) Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LUTAIMA HACIA LA VEREDA PALMICHERA SECTOR NOPE MUNICIPIO DE ANAPOIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (CONVENIO ICCU 756-2026).
Fecha de Inicio del Contrato	9 de junio de 2026
Plazo Inicial de Ejecución	3 meses
Prorroga en tiempo	N/A
Suspensión	N/A
Reinicio	N/A
Modificación	N/A
Periodo de cumplimiento	19 DE JUNIO AL 6 DE JULIO DE 2026

2. INFORME SOBRE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO

RESUMEN DE ACTIVIDADES, SEGUIMIENTO, MONITORES Y CONTROL REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

Se ha realizado el seguimiento, monitoreo y seguimiento por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de las obligaciones generales y especificas del contratista así:

ACTIVIDAD	SE REALIZO SEGUIMIENTO Y CONTROL		
	SI	NO	NO APLICA
Seguimiento financiero y presupuestal del contrato	X		
Verificación de la ejecución de las actividades del contratista frente a las contratadas (*deben ser claras y precisas frente a las actividades ejecutadas y los beneficios o producto obtenidos con la pr0065stación del servicio y/o suministro*)	X		
Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, y sobre él % de conformidad con la normatividad vigente	X		
Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato	X		
Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago	X		

Trámite de reconocimiento y pago de honorarios, una vez recibido a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio prestado y/o suministro	X		
Seguimiento y actualización del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato: firmas, pólizas y demás requisitos de cada una de las actas celebradas (inicio, suspensión, reinicio, etc.)	X		
Verificación de que el servicio se realizó con idoneidad, eficiencia, eficacia, profesionalismo y respeto.	X		
Se verificó la entrega del producto en el Almacén General y beneficiarios dentro del plazo estipulado en el contrato			X
Se verificó que los productos entregados por el contratista cumplen con las especificaciones estipuladas en el contrato de suministro.			X
Certificación de que los suministros reposan en el Almacén General			X
Verificación de entrega de soportes de la gestión, ejecución y evidencias para ser archivadas en el expediente contractual en la secretaria de contratación.	X		
Certificación de que los soportes o productos de los informes de ejecución reposan en la secretaria supervisora			X

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES PRESENTADAS EN EL PERIODO DE SUPERVISION
El contratista desarrollo sus actividades acordes a las obligaciones durante el periodo.

Así mismo, se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrollada se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato y/o convenio.

Por lo anterior se firma en el despacho de la secretaria de planeación, el día veintiuno (21) del mes de julio de 2026.

Jeisson Ferney Contreras Muñoz
Secretario de Despacho
Secretaría de Planeación

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboro	Erika Tatiana Moreno Cifuentes	Secretaria	
Aprobó	Jeisson Ferney Contreras Muñoz	Secretario de Despacho	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.			

AUTORIZACIÓN DE PAGO			
GENERALIDADES DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO	177-2026		
PAGO No.	2		
CONTRATISTA	GUARIUM SAS/NIT. 901.247.479-3		
DEPENDENCIA	Secretaría de planeación		
SUPERVIOR(ES)	Jeisson Ferney Contreras Muñoz Secretario de Despacho Secretaría de planeación Yeiner Yerson Bolaños Narváez Director de Obras Públicas Secretaría de planeación		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 448.892.409		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO.	2026000347 26/02/2026 2026000348 26/02/2026		
REGISTRO PRESUPUESTAL NO.	2026000419 04/05/2026 2026000420 04/05/2026		
ADICIÓN EN VALOR	N/A		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO.	N/A		
REGISTRO PRESUPUESTAL NO.	N/A		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 448.892.409		
BALANCE FINANCIERO			
VALOR DEL CONTRATO	$ 448.892.409	**Valor Anticipo**	
VALOR PAGOS ANTERIORES	$ 103.679.587	**Amortización**	
VALOR PRESENTE PAGO	$ 51.979.799	**Amortización**	
SALDO POR EJECUTAR	$ 293.233.023		
INFORMACIÓN DEL PAGO			
ANTICIPO ( ) ÚNICO PAGO ( ) PARCIAL (X) TERMINACIÓN ( ) OTRO ( ), CUAL			
NUMERO Y FECHA DE FACTURA	FV 323- DEL 22 Julio 2026		
PERIODO DE CUMPLIMIENTO	19 DE JUNIO AL 6 DE JULIO DE 2026		
CUENTA BANCARIA	**Numero:** 19701349371 **Banco: Bancolombia**		

CÓDIGO PRESUPUESTAL	FUENTE	DENOMINACIÓN FUENTE	VALOR
2.3.24.2402042.2024250350030. MT143.8210110	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VUAL EN EL MUNICIPIO DE ANAPOIMA	8210110 – RB CONVENIO ICCU 750-2025 MEJORAMIENTO DE LA VÍA VEREDA CIRCASIA HACIA LA VEREDA LA GUASIMA SECTOR SANTA ROSA	$ 51.979.799

VALOR TOTAL A PAGAR	**$ 51.979.799**

VERIFICACION PAGO SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL						
DETALLE	**VALOR CANCELADO**	**PERIODO COTIZADO**	**ENTIDAD**		**FECHA DE PAGO**	
SALUD	N/A	N/A	N/A		N/A	
FONDO DE PENSIONES	N/A	N/A	N/A		N/A	
ARL	N/A	N/A	N/A		N/A	
NÚMERO PLANILLA (persona natural)			N/A			
RECIBO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL (persona natural)			SI		NO	X
COPIA DE PLANILLAS APORTE (persona natural)			SI		NO	X
VERIFICACIÓN PORTAL WEB PAGO DE PLANILLA (persona natural)			SI		NO	X
CERTIFICACION PAGO SISTEMA GENERAL DE SALUD (persona jurídica) Representante legal ( ) Contador (X) Revisor fiscal ( )			SI	X	NO	
Contador y revisor fiscal (Aportar antecedentes Junta de contadores, tarjeta profesional y copia cédula) (persona jurídica)			SI	X	NO	
Se autoriza a la secretaría de Hacienda realizar el pago al contratista por cuanto reúne los requisitos de Ley						

Por lo anterior se firma en el despacho de la secretaria de planeación, el día veintiuno (21) del mes de julio de 2026.

Jeisson Ferney Contreras Muñoz
Secretario de Despacho
Secretaría de Planeación

	Nombre	**Cargo**	**Firma**
Elaboro	Erika Tatiana Moreno Cifuentes	Secretaria	
Aprobó	Jeisson Ferney Contreras Muñoz	Secretario de Despacho	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.			

CONTRATO 177 DE 2026
PERIODO DE INFORME (19 DE JUNIO DE 2026 – 6 DE JULIO DE 2026)
INFORME PARCIAL 2

ASUNTO:	INFORME DE SUPERVISIÓN
FECHA DEL INFORME:	21 DE JULIO DEL 2026
SUPERVISOR (ES):	JEISSON FERNEY CONTRERAS MUÑOZ Secretario de Despacho. YEINER YERSON BOLAÑOS NARVAEZ Director Obras Publicas.
INFORME REALIZADO POR:	CESAR AUGUSTO CASTRO HERNÁNDEZ – PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION, DIRECCION DE OBRAS - SECRETARIA DE PLANEACIÓN.
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA CIRCACIA HACIA LA VEREDA LA GUASIMA SECTOR SANTA ROSA MUNICIPIO DE ANAPOIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA" (CONVENIO ICCU-750 2025) Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LUTAIMA HACIA LA VEREDA PALMICHERA SECTOR NOPE MUNICIPIO DE ANAPOIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (CONVENIO ICCU-756-2025)
VALOR:	CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE ($448.892.409,00).

CONTENIDO

1. PERIODO DEL PRESENTE INFORME 3
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 3
   2.1. UBICACIÓN DEL PROYECTO 3
   2.2. UBICACIÓN GENERAL DE LAS PLACA HUELLAS 4
3. EJECUCIÓN 6
   3.1. RESUMEN CONTRATO DERIVADO 6
   3.2. RESUMEN CONTRATO DERIVADO 6
   3.3. PRESUPUESTO Y CANTIDADES CONTRATADA 8
4. AVANCE DE OBRA 10
5. AVANCE FINANCIERO 22

DESARROLLO DEL INFORME

1. PERIODO DEL PRESENTE INFORME


El período de corte del presente informe comprende desde el 19 de junio de 2026 hasta el 6 de juLio de 2026. En este documento se presenta el avance de las actividades, conforme a la supervisión realizada por el Municipio.

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

2.1. UBICACIÓN DEL PROYECTO

El municipio de Anapoima está ubicado al suroccidente del departamento de Cundinamarca, en la zona cálida de la provincia del Tequendama, sobre las estribaciones bajas del flanco occidental de la cordillera Oriental. Se localiza a mitad de camino entre los altiplanos interandinos del centro-oriente del país, específicamente entre la Sabana de Bogotá y el valle cálido interandino del río Magdalena.

Ilustración 1. Ubicación Municipio de Anapoima

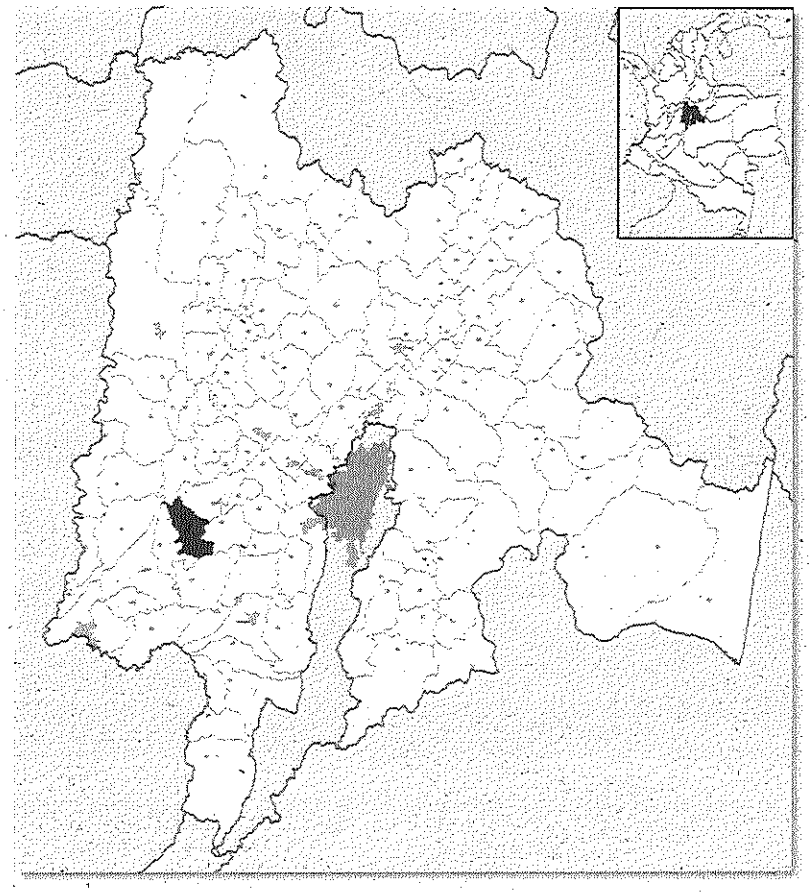


2.2. UBICACIÓN GENERAL DE LAS PLACA HUELLAS

- **Placa Huella 1:**

La vereda Circacia se encuentra ubicada al oeste del municipio de Anapoima, aproximadamente a 9 km de la zona urbana municipal. El proyecto beneficiará de manera directa a las comunidades asentadas en esta vereda, especialmente en el sector Santa Rosa, generando un impacto positivo en las condiciones de movilidad, conectividad y calidad de vida de sus habitantes. Asimismo, los beneficios derivados de la ejecución del proyecto se extenderán a la comunidad anapoimuna en general, contribuyendo al fortalecimiento de la infraestructura y al desarrollo integral del territorio.

Ilustración 2 Ubicación Placa huella Vereda Circacia Sector Santa Rosa

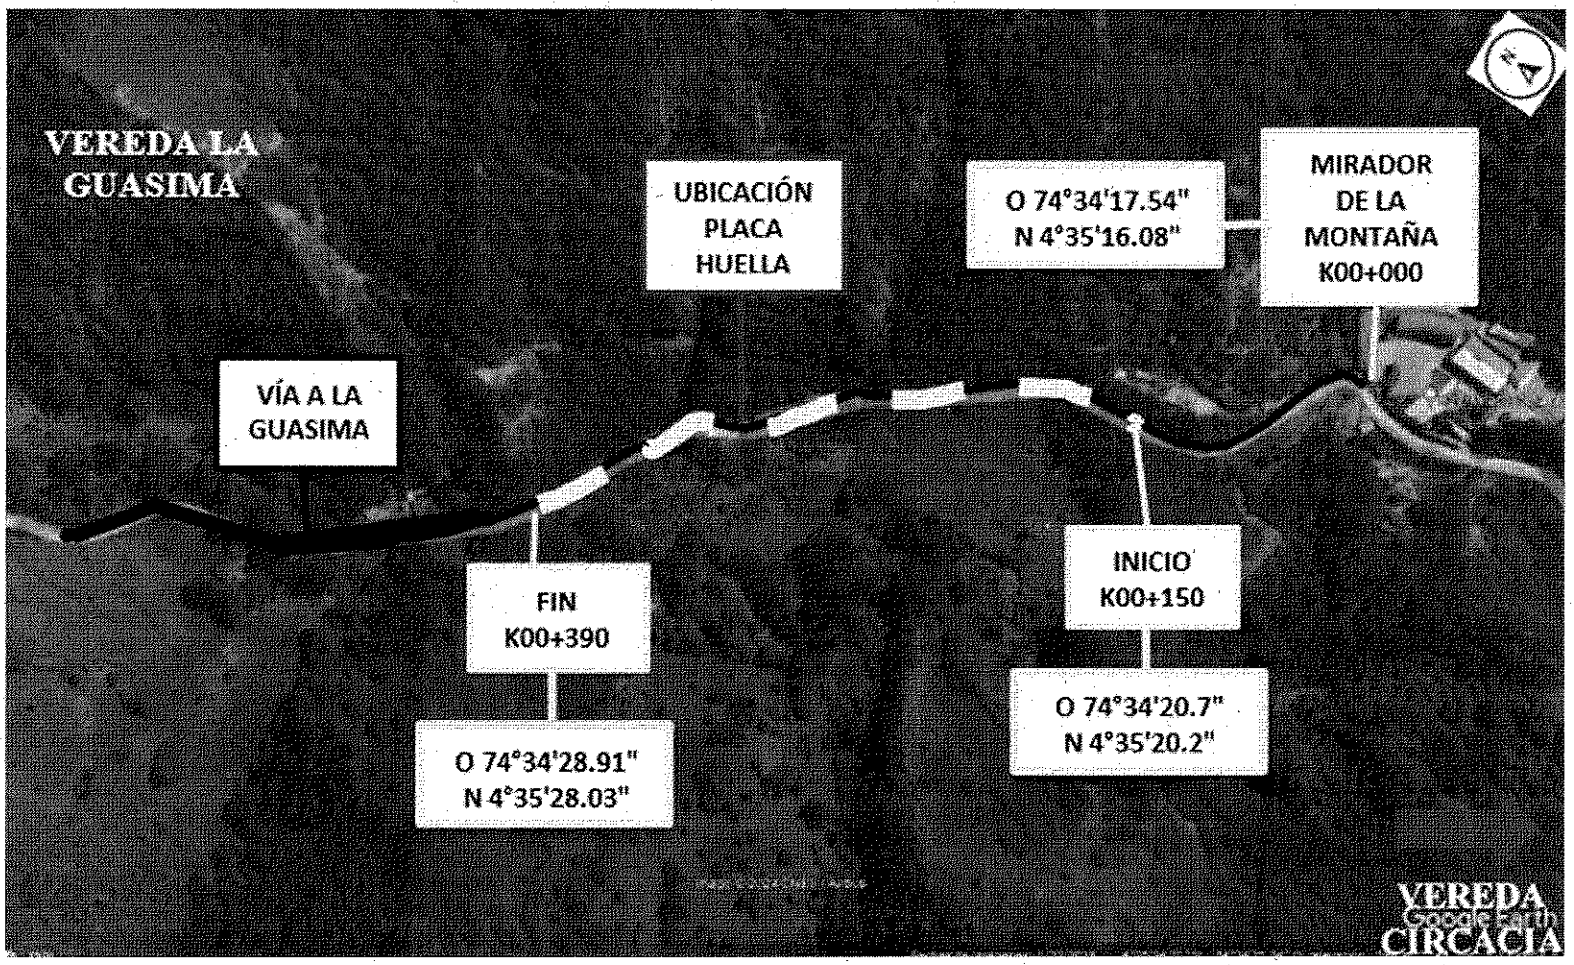


En la Ilustración 2 se evidencia la localización de la placa huella en la vereda Circacia sector Santa Rosa.

- **Placa Huella 2:**

La vereda Lutaima se encuentra ubicada al norte del municipio de Anapoima, aproximadamente a 12 km de la zona urbana municipal. El proyecto beneficiará de manera directa a las comunidades asentadas en esta vereda, especialmente en el sector Nope, generando un impacto positivo en las condiciones de movilidad, conectividad y calidad de vida de sus habitantes. Asimismo, los beneficios derivados de la ejecución del proyecto se extenderán a la comunidad anapoimuna en general, contribuyendo al fortalecimiento de la infraestructura y al desarrollo integral del territorio.

Ilustración 3 Ubicación Placa huella Vereda Lutaima sector Nope

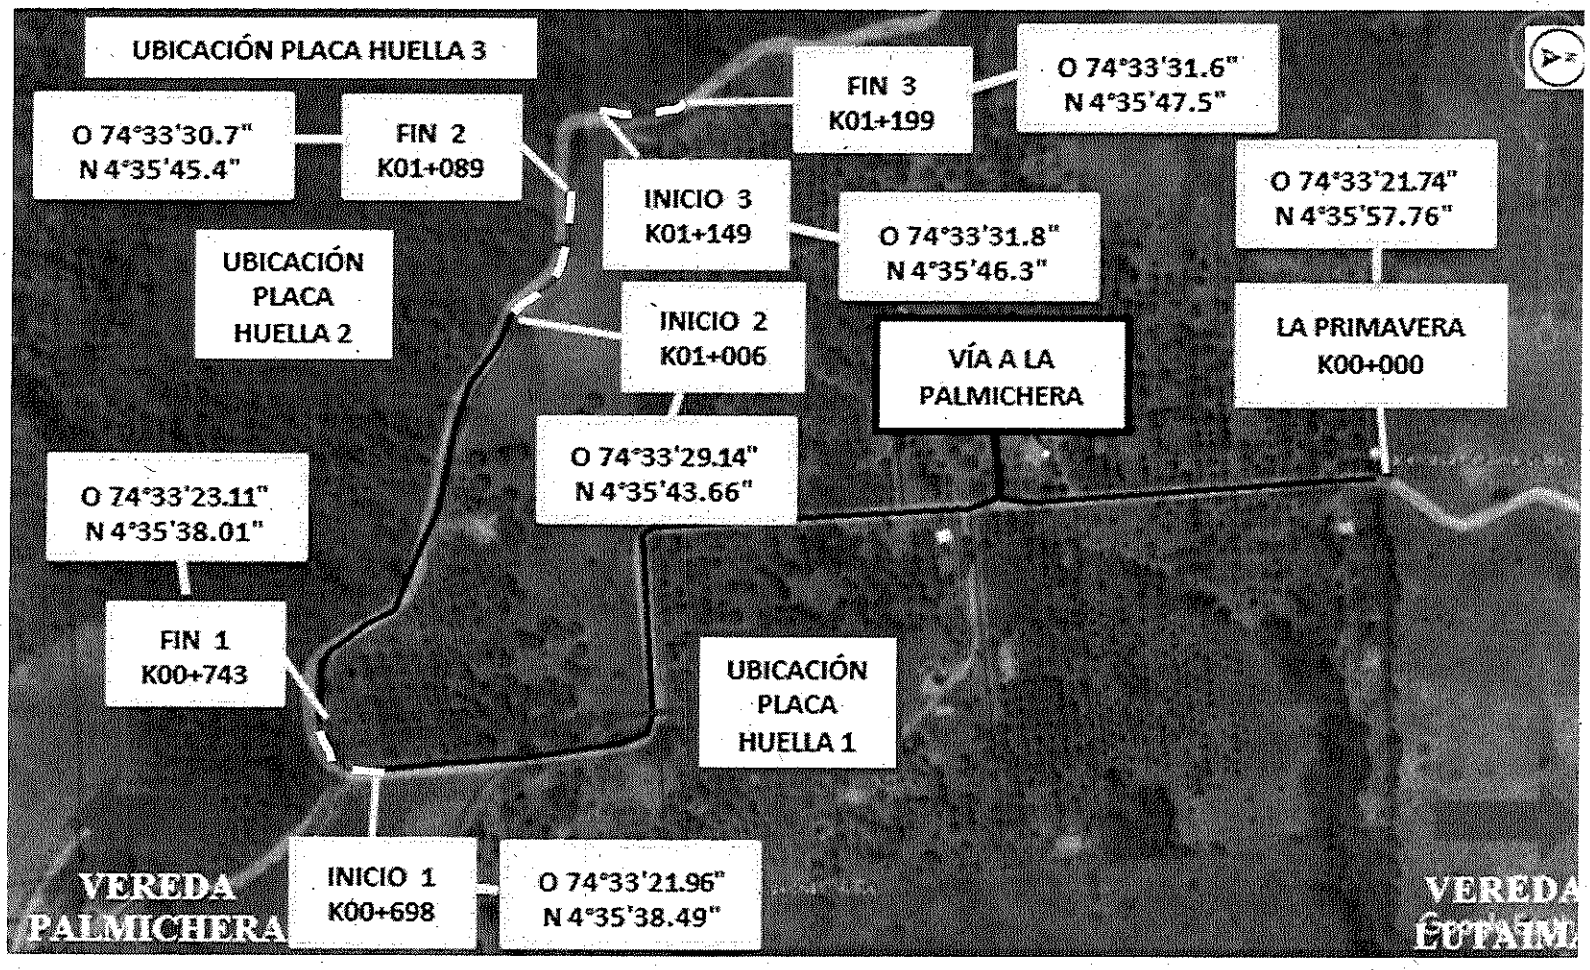

En la Ilustración 3 se evidencia la localización de la placa huella en la vereda Lutaima sector Nope, esta placa huella se encuentra en tres tramos.

3. EJECUCIÓN

En concordancia con los procesos anteriormente descritos, se adjudicó el Contrato No. 177-2026, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA CIRCACIA HACIA LA VEREDA LA GUASIMA SECTOR SANTA ROSA MUNICIPIO DE ANAPOIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA" (CONVENIO ICCU-750 2025) Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LUTAIMA HACIA LA VEREDA PALMICHERA SECTOR NOPE MUNICIPIO DE ANAPOIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (CONVENIO ICCU-756-2025)". Para dicho contrato, se suscribió el acta de inicio con fecha del 09 de junio de 2026.

3.1. RESUMEN CONTRATO DERIVADO

3.2. RESUMEN CONTRATO DERIVADO

Modalidad: Selección abreviada – Menor Cuantía

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 177 DE 2026

CONTRATANTE

RAZÓN SOCIAL:	MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA
IDENTIFICACIÓN:	Nit 890.680.097-1
REPRESENTANTE LEGAL:	CAMILO ANDRES FERRO CALDERON
IDENTIFICACIÓN:	Cedula de Ciudadanía No. 1.072.961.140 expedida en Anapoima Alcalde Municipal

CONTRATISTA

RAZÓN SOCIAL:	GUARIUM SAS.
IDENTIFICACIÓN:	Nit 901.247.479-3
REPRESENTANTE LEGAL:	LORENA PAOLA CASAS CANO
IDENTIFICACIÓN:	Cedula de Ciudadanía No. 1.070.943.849 expedida en Facatativa
DIRECCIÓN:	CL 5 11 160 BR EL FARO Riohacha (La Guajira) - Teléfono: 3008372995 - Correo electrónico: info@guarium.co

OBJETO:

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA CIRCACIA HACIA LA VEREDA LA GUASIMA SECTOR SANTA ROSA MUNICIPIO DE

ANAPOIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA" (CONVENIO ICCU-750 2025) Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LUTAIMA HACIA LA VEREDA PALMICHERA SECTOR NOPE MUNICIPIO DE ANAPOIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (CONVENIO ICCU-756-2025).

VALOR:

CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE ($448.892.409,00).

SUPERVISORES:

JEISSON FERNEY CONTRERAS MUÑOZ

Secretario de Despacho

YEINER YERSON BOLAÑOS NARVAEZ

Dirección de Obras Públicas

DEPENDENCIA: SECRETARIA PLANEACION.

3.3. PRESUPUESTO Y CANTIDADES CONTRATADA

- **Placa Huella Vereda Circacia Sector Santa Rosa.**

"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA CIRCACIA HACIA LA VEREDA LA GUASIMA SECTOR SANTA ROSA MUNICIPIO DE ANAPOIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA" (CONVENIO ICCU-750-2025)							
1	600.4 P		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	20.54	$ 86,910.00	$ 1,785,131.40
2	630.4		CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	M3	76.64	$1,032,198.00	$ 79,107,654.72
3	630.7		CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	70.11	$ 700,642.00	$ 49,122,010.62
4	671.1		CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	46.34	$ 849,542.00	$ 39,367,776.28
5	640.1		SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	7,463.25	$ 10,660.00	$ 79,558,245.00
						Subtotal	**$248,940,818.02**

- **Placa Huella Vereda Lutaima sector Nope.**

"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LUTAIMA HACIA LA VEREDA PALMICHERA SECTOR NOPE MUNICIPIO DE ANAPOIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA" (CONVENIO ICCU-756-2025)								
1	600.4 P			EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	16.51	$ 86,910.00	$ 1,434,884.10
2	630.4			CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	M3	61.14	$ 1,032,198.00	$ 63,108,585.72
3	630.7			CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	55.58	$ 700,642.00	$ 38,941,682.36
4	671.1			CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	36.86	$ 849,542.00	$ 31,314,118.12
5	640.1			SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	6,111.85	$ 10,660.00	$ 65,152,321.00
							Subtotal	$ 199,951,591.30

4. AVANCE DE OBRA

A la fecha del presente informe, y posterior a la presentación del acta parcial, se han ejecutado las actividades constructivas correspondientes a la obra, las cuales contemplan la construcción de las placas huellas en la vereda Circacia, en el sector Santa Rosa y en la vereda Lutaima en el sector Nope. El procedimiento constructivo implementado para la ejecución de las placas huellas se detallan a continuación:

Actividades Realizadas:

PLACA HUELLA VEREDA CIRCACIA SECTOR SANTA ROSA.

Conformación de la Vía:

- **Descripción**: Se ejecutaron las actividades de adecuación, conformación y perfilado de la vía, garantizando las condiciones geométricas y de soporte requeridas para la conformación de la estructura de pavimento.
- **Estado Actual**: Actividad ejecutada al 100%.

Excavaciones varias en material común seco:

- **Descripción:** La actividad contempla la ejecución de excavaciones para la conformación de las vigas de amarre, así como la construcción de cunetas en los costados derecho e izquierdo de la vía, conforme a las especificaciones técnicas y diseños establecidos en el proyecto, con el fin de garantizar el adecuado manejo de aguas superficiales y la estabilidad de la estructura vial.
- **Estado actual:** En ejecución.

Vaciado de concreto clase G:

- **Descripción**: A la fecha, se han ejecutado 33 losas centrales, equivalentes a una longitud total de 94,90 metros lineales. De igual manera, se han construido 30 losas de sobreancho (costado izquierdo), correspondientes a una longitud de 86,53 metros lineales y 29 losas de sobreancho (costado derecho), correspondientes a una longitud de 83,17 metros lineales por cada lado, conforme a la geometría definida en el diseño.
- **Progreso**: En ejecución.

Vaciado de concreto clase D:

- **Descripción**: A la fecha, se han ejecutado 62 losas correspondientes a las huellas en los costados derecho e izquierdo, con una longitud de 95,26 metros lineales por la izquierda, para un volumen total de 12,86 m^3 y con una longitud de 84,16 metros lineales por la derecha, para un volumen total de 11,36 m^3. También se ejecutaron 10 vigas de amarre para un volumen promedio de 0,145 m^3.
- **Progreso**: En ejecución.

Vaciado de Cunetas:

- **Descripción**: Se ha realizado el vaciado de concreto en una longitud total de 90,06 metros lineales, distribuidos en 43,14 metros lineales por el costado derecho y 46,92 metros lineales por el costado izquierdo, conforme a las especificaciones del diseño.
- **Progreso**: En ejecución.


Avance Actual

- **Progreso Total**: A la fecha de corte, el proyecto presenta un avance físico acumulado del 43,10% en la ejecución de las actividades programadas.

Registro Fotográfico: A continuación, se presenta el registro fotográfico del proyecto, en el cual se evidencian los avances de obra a la fecha de corte. Estas imágenes permiten documentar el progreso de las actividades ejecutadas y visualizar el estado actual del proyecto:

En las Ilustraciones 4 se evidencia la adecuada conformación y perfilado de la vía en el tramo intervenido, correspondiente al sector donde se adelantara la construcción de la placa huella. Estas actividades garantizan el cumplimiento de las condiciones geométricas y de soporte requeridas para la correcta ejecución de la estructura de pavimento. Así mismo, se verifica la preparación de la subrasante conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto.

Ilustración 4 Conformación de vía.

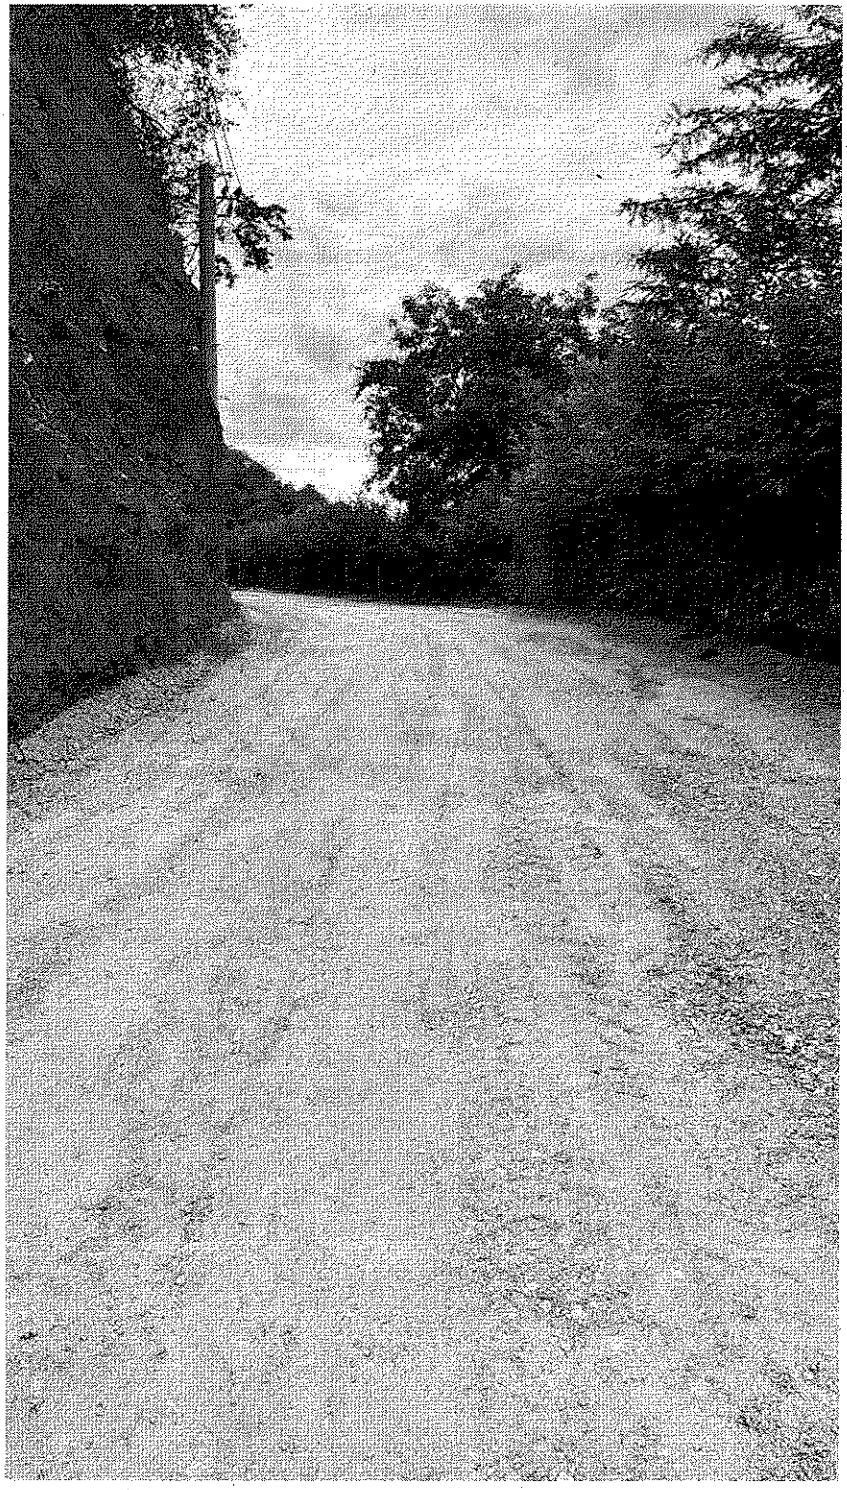

En las Ilustraciones 5 y 6 se evidencia el proceso de figuración, corte, doblado y disposición del acero de refuerzo, ejecutado conforme a los diseños estructurales del proyecto. Estas actividades garantizan el cumplimiento de las especificaciones técnicas, así como la adecuada configuración y comportamiento de los elementos estructurales. De igual manera, se verificó la correcta ubicación, alineación y amarre del refuerzo previo al vaciado de concreto.

Para las huellas reforzadas, el acero está conformado por 15 barras transversales de ½", dispuestas con una separación de 0,20 m, cada una con una longitud de 1,00 m (0,80 m de cuerpo y 0,10 m en cada extremo para la formación de ganchos). Adicionalmente, se disponen 5 barras longitudinales de ½", con una longitud de 2,95 m cada una, separadas igualmente cada 0,20 m.

Para las vigas de amarre, se utilizan barras de 3/8", con elementos transversales tipo "S" de 0.23 m de longitud dispuestos cada 0,20 m, garantizando la adecuada confinación del elemento.

Ilustración 5 Figurado de acero



Ilustración 6 Figurado de acero



En las Ilustraciones 7 y 8 se evidencia el proceso de vaciado de las losas centrales y los sobreanchos, empleando concreto ciclópeo clase G con una dosificación del 40 % de rajón. Las losas centrales presentan dimensiones de 2,85 m × 0,90 m × 0,15 m, mientras que los sobreanchos tienen medidas de 2,85 m × 0,55 m × 0,15 m, en concordancia con las especificaciones técnicas del proyecto.

Estas actividades comprenden la adecuada disposición y distribución del material, garantizando la correcta incorporación y confinamiento de la roca tipo rajón dentro de la matriz de concreto, así como la homogeneidad y estabilidad del elemento estructural.

Ilustración 7 Losa central en ciclópeo


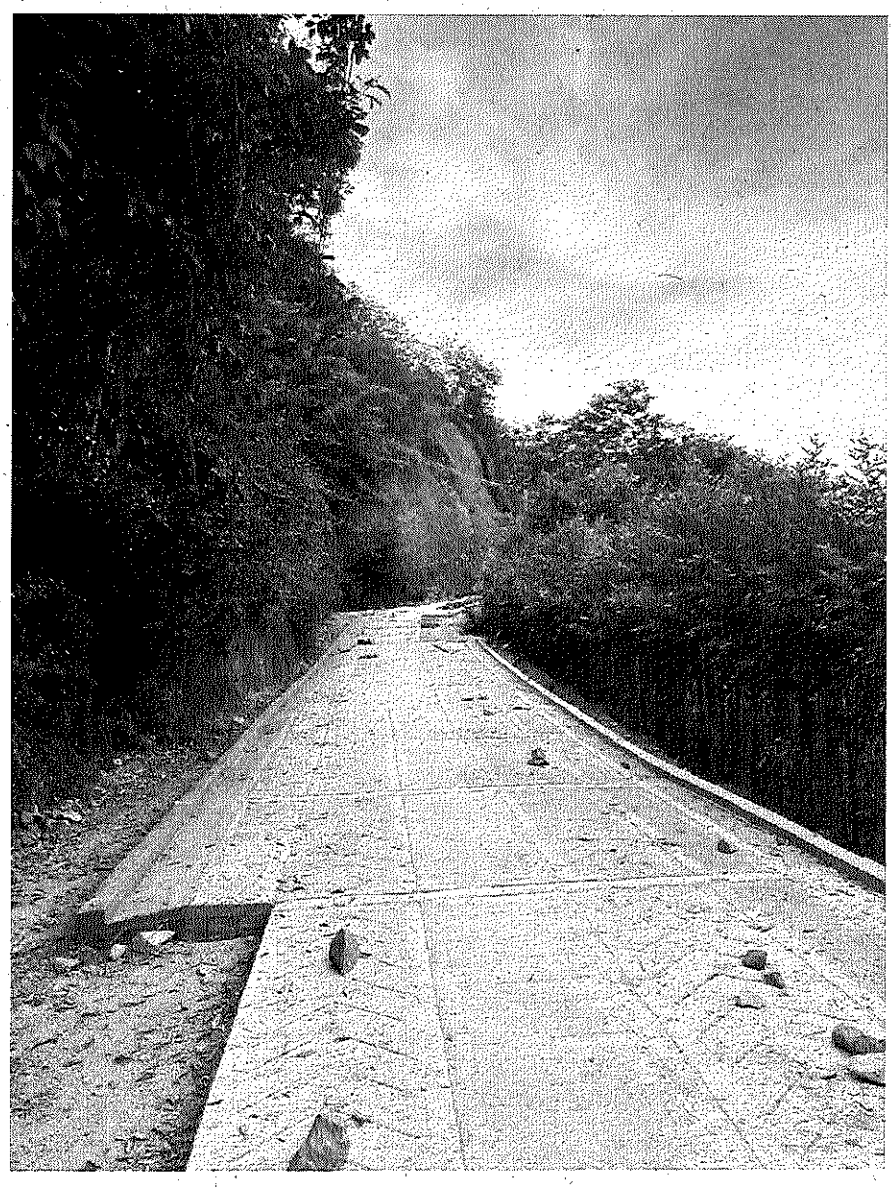



Ilustración 8 Sobre ancho en ciclópeo

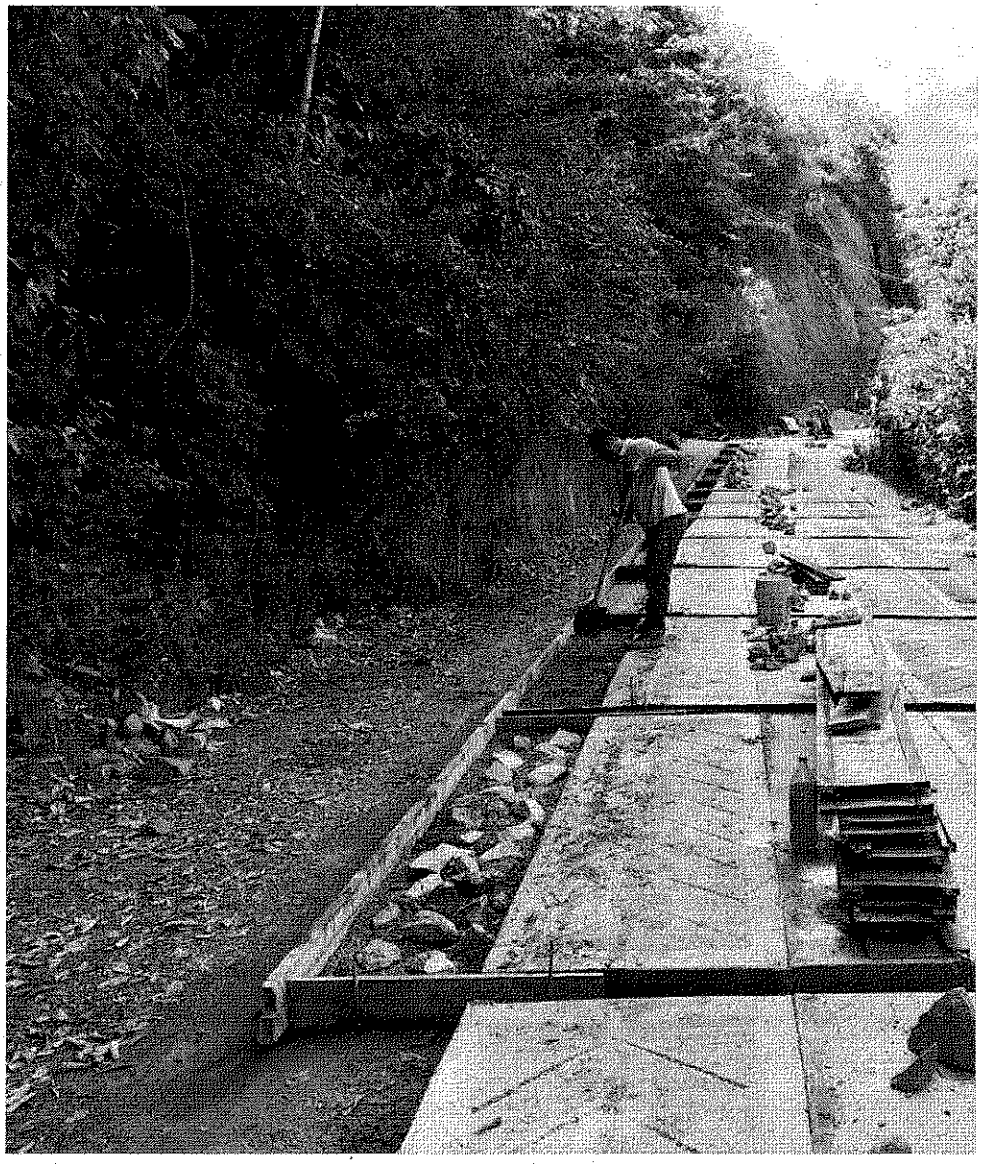

En las Ilustración 9 se evidencia el proceso de vaciado de las losas en concreto clase D, con una resistencia especificada de f'c = 3000 psi, en concordancia con las especificaciones técnicas del proyecto. Cada huella presenta dimensiones de 2,85 m de longitud, 0,90 m de ancho y 0,15 m de espesor, las cuales se encuentran reforzadas con parrillas de acero de ½".

Estas actividades incluyen la disposición, vibrado y nivelación del concreto, garantizando una adecuada compactación y la homogeneidad del material. Así mismo, se verifica el cumplimiento de las condiciones de acabado superficial y de la resistencia requerida para los elementos ejecutados.


Ilustración 9 Vaciado losas en concreto clase D

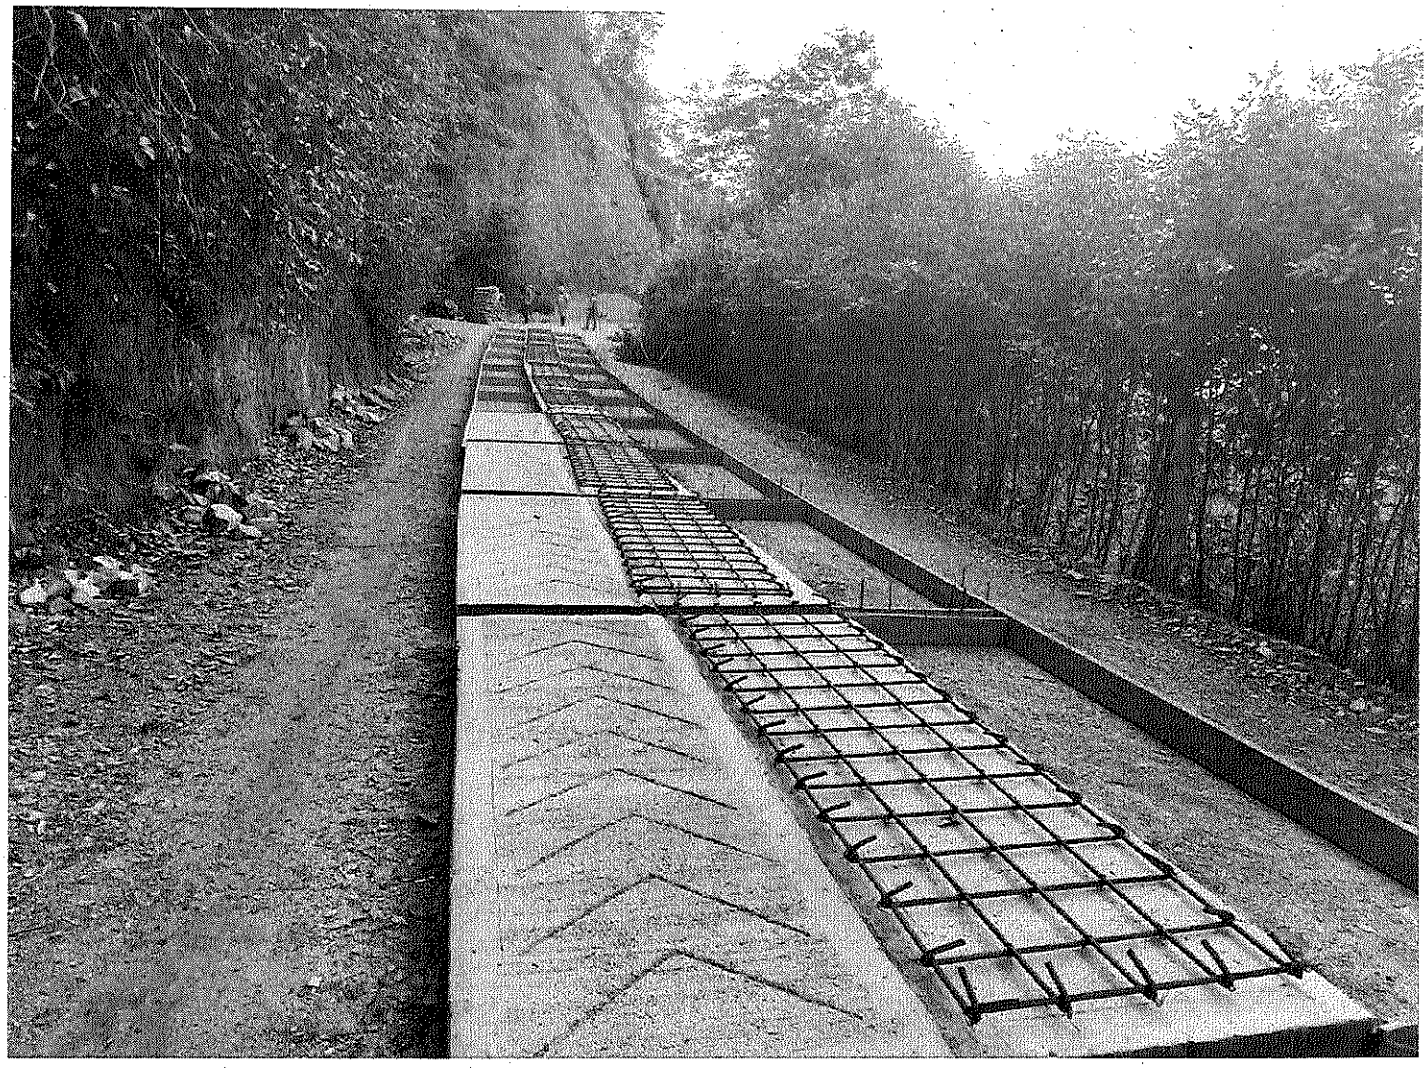

En las Ilustración 10 se evidencia el proceso de vaciado de cunetas en concreto clase E, con una resistencia especificada de f'c = 2500 psi, en concordancia con las especificaciones técnicas del proyecto. Cada cuneta se encuentra reforzadas con acero de 3/8".

Estas actividades incluyen la disposición, vibrado y nivelación del concreto, garantizando una adecuada compactación y la homogeneidad del material. Así mismo, se verifica el cumplimiento de las condiciones de acabado superficial y de la resistencia requerida para los elementos ejecutados.

Ilustración 10 Vaciado Cunetas en concreto clase E

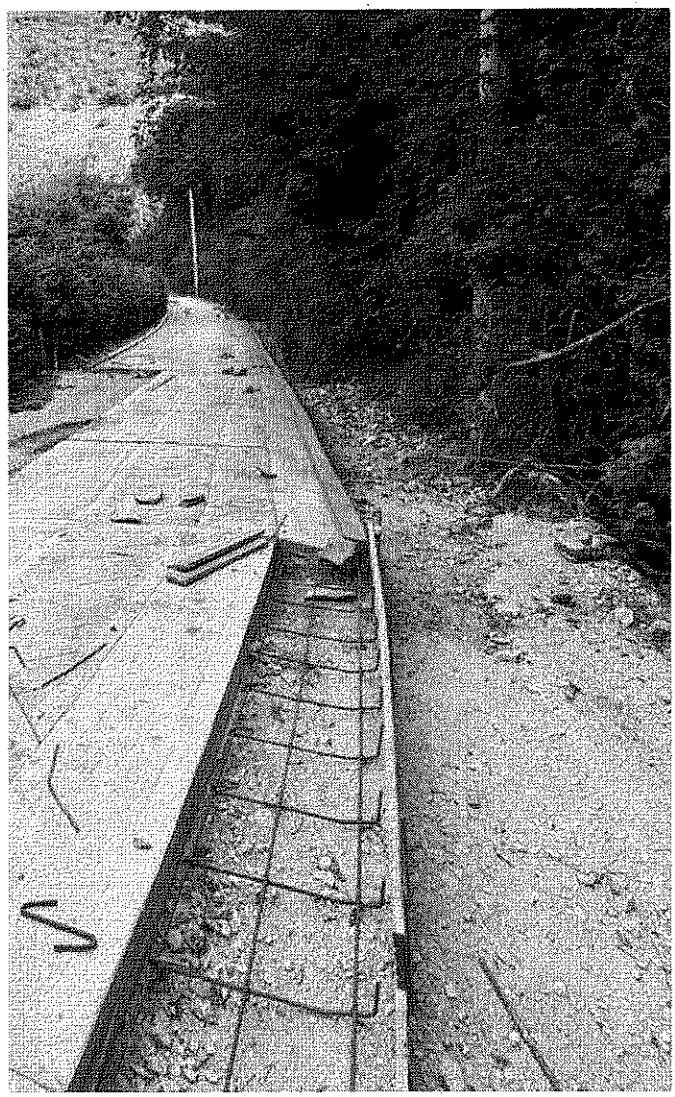

PLACA HUELLA VEREDA LUTAIMA SECTOR NOPE.

Conformación de la Vía:

- **Descripción**: Se ejecutaron las actividades de adecuación, conformación y perfilado de la vía, garantizando las condiciones geométricas y de soporte requeridas para la conformación de la estructura de pavimento.
- **Estado Actual**: Actividad ejecutada al 100%.

Excavaciones varias en material común seco:

- **Descripción:** La actividad contempla la ejecución de excavaciones para la conformación de las vigas de amarre, así como la construcción de cunetas en los costados derecho e izquierdo de la vía, conforme a las especificaciones técnicas y diseños establecidos en el proyecto, con el fin de garantizar el adecuado manejo de aguas superficiales y la estabilidad de la estructura vial.
- **Estado actual:** No ejecutada.

Vaciado de concreto clase G:

- **Descripción**: La actividad contempla el suministro, transporte, vaciado y conformación de concreto clase G, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto, garantizando las condiciones de resistencia, durabilidad y calidad requeridas para los elementos estructurales proyectados.
- **Progreso**: No ejecutada.

Vaciado de concreto clase D:

- **Descripción**: La actividad contempla el suministro, transporte, vaciado y colocación de concreto clase D, conforme a las especificaciones técnicas y parámetros de diseño establecidos en el proyecto, garantizando la resistencia, homogeneidad y calidad necesarias para el adecuado desempeño de los elementos construidos.
- **Progreso**: No ejecutada.

Vaciado de Cunetas:

- **Descripción**: La actividad contempla el vaciado y conformación de cunetas en concreto sobre los costados de la vía, de acuerdo con las especificaciones técnicas y dimensiones establecidas en el proyecto, con el propósito de garantizar el adecuado manejo y conducción de las aguas superficiales, contribuyendo a la estabilidad y conservación de la estructura vial.
- **Progreso**: No ejecutada.


Avance Actual

- **Progreso Total**: A la fecha de corte, el proyecto presenta un avance físico acumulado del 24,19% en la ejecución de las actividades programadas.

Registro Fotográfico: A continuación, se presenta el registro fotográfico del proyecto, en el cual se evidencian los avances de obra desde el inicio hasta su culminación. Estas imágenes permiten documentar el progreso de las actividades ejecutadas y visualizar el estado actual del proyecto:

En las Ilustracion 11 se evidencia la adecuada conformación y perfilado de la vía en el tramo intervenido, correspondiente al sector donde se llevo acabo la construcción de la placa huella. Estas actividades garantizaron el cumplimiento de las condiciones geométricas y de soporte requeridas para la correcta ejecución de la estructura de pavimento. Así mismo, se verifica la preparación de la subrasante conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto.

Ilustración 11 Conformación de vía.

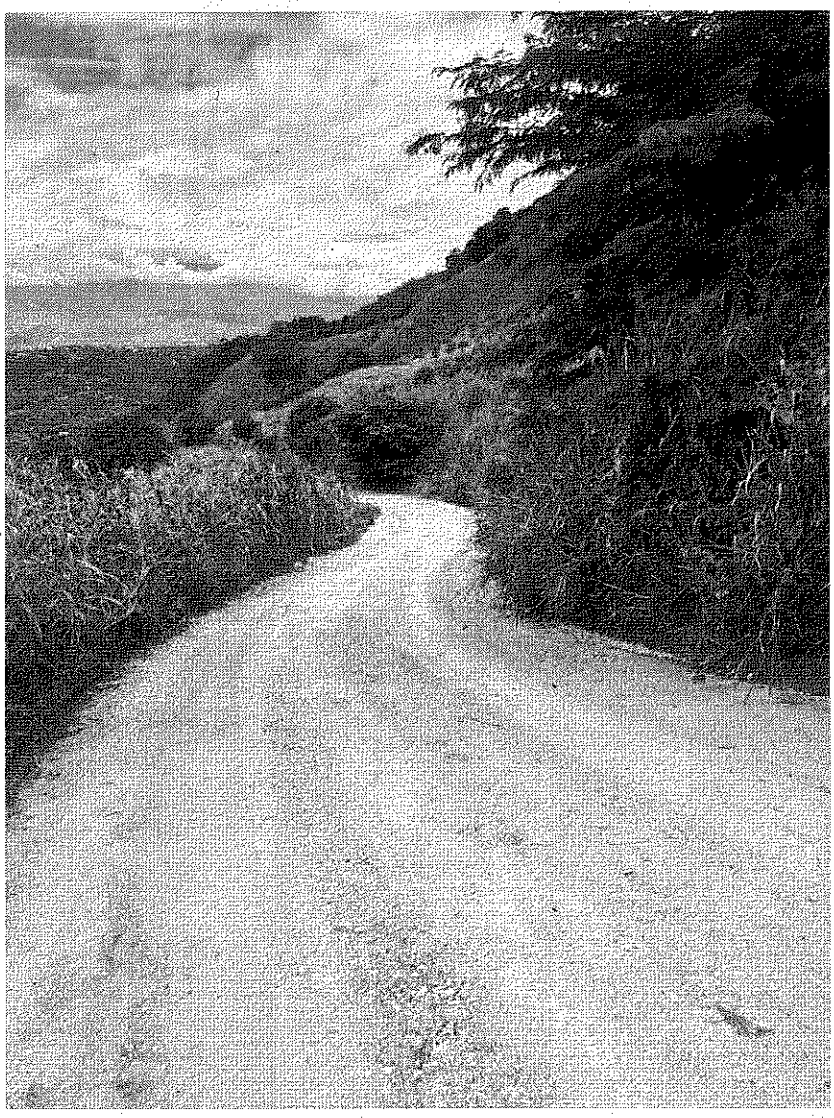

En las Ilustraciones 12 y 13 se evidencia el proceso de figuración, corte, doblado y disposición del acero de refuerzo, ejecutado conforme a los diseños estructurales del proyecto. Estas actividades garantizan el cumplimiento de las especificaciones técnicas, así como la adecuada configuración y comportamiento de los elementos estructurales. De igual manera, se verificó la correcta ubicación, alineación y amarre del refuerzo previo al vaciado de concreto.

Para las huellas reforzadas, el acero está conformado por 15 barras transversales de ½", dispuestas con una separación de 0,20 m, cada una con una longitud de 1,00 m (0,80 m de cuerpo y 0,10 m en cada extremo para la formación de ganchos). Adicionalmente, se disponen 5 barras longitudinales de ½", con una longitud de 2,95 m cada una, separadas igualmente cada 0,20 m.

Para las vigas de amarre, se utilizan barras de 3/8", con elementos transversales tipo "S" de 0.23 m de longitud dispuestos cada 0,20 m, garantizando la adecuada confinación del elemento.

Ilustración 12 Figurado de acero



Ilustración 13 Figurado de acero



5. AVANCE FINANCIERO

A la fecha del presente informe, el contratista ha radicado el acta parcial 1 ante el municipio de Anapoima como único cobro y pago realizado al contratista hasta la fecha. Sin otra particularidad de muestra el estado de la cuenta del contrato de obra 177 de 2026:

AVANCE FISICO DE OBRA SECTOR SANTA ROSA	**43,10%**
AVANCE FINANCIERO SECTOR SANTA ROSA	**43,10%**
VALOR A COBRAR SECTOR SANTA ROSA	**$51.979.799,00**
VALOR FINANCIERO POR COBRAR	**56,9%**
VALOR TOTAL POR COBRAR	**$141.653.634,02**

AVANCE FISICO DE OBRA SECTOR NOPE	**24,19%**
AVANCE FINANCIERO SECTOR NOPE	**24,19%**
VALOR A COBRAR SECTOR NOPE	**$48.372.202,00**
VALOR FINANCIERO POR COBRAR	**75,81%**
VALOR TOTAL POR COBRAR	**$151.579.389,30**

VALOR A COBRAR ACTA 1	
VALOR A COBRAR SECTOR SANTA ROSA	$55.307.385,00
VALOR A COBRAR SECTOR NOPE	$48.372.202,00
VALOR A COBRAR	***$ 103.679.587,00***

VALOR A COBRAR ACTA 2	
VALOR A COBRAR SECTOR SANTA ROSA	$51.979.799,00
VALOR A COBRAR	***$ 51.979.799,00***

VALOR DEL TOTAL CONTRATO 177-2026	**$448.892.409,00**
VALOR COBRADO ACTA 1	**$ 103.679.587,00**
VALOR A COBRAR ACTA 2	**$ 51.979.799,00**
AVANCE FINANCIERO TOTAL A COBRAR	**34,68%**
VALOR TOTAL POR COBRAR	***$293.233.023,00***
AVENCE FINANCIERO POR COBRAR	***65.32%***

JEISSON FERNEY CONTRERAS MUÑOZ
Secretario de Planeación

Proyectó: Cesar Augusto Castro Hernández/Profesional Contratista
