INFORME DE SUPERVISIÓN
INFORME PARCIAL Nº 1
(12 de mayo de 2026 hasta 17 de junio de 2026)

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO DE OBRA No.	MPX-MC-2026125	**FECHA CONTRATO**	11 de mayo de 2026
CONTRATISTA	**CONSTRUCCIONES AMBIENTE Y TECNOLOGIA S.A.S**		
NIT. Nº	900.557.745-4		
OBJETO DEL CONTRATO			
ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE MOMPOX, BOLÍVAR			
No. DE CDP	240	**FECHA DE EXPEDICIÓN CDP**	22 de abril de 2026
No. DE RP	408	**FECHA DE EXPEDICIÓN RP**	12 de mayo de 2026

NOMBRE DEL SUPERVISOR	HAROLD MAURICIO NARANJO CORTES
OFICINA GESTORA	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAZO INICIAl	SEIS (6) MESES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA MIL ($48.080.000)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	11 de mayo de 2026
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	12 de mayo de 2026

1. LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN DEL PROYECTO.

Como lugar de ejecución del objeto del contrato se ha establecido la Cabecera distrital de Santa Cruz de Mompox, Bolívar**.**

2. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO

En cumplimiento de las funciones de supervisión asignadas, se presenta el informe final correspondiente al contrato cuyo objeto es el "ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE MOMPOX, BOLÍVAR". Durante la ejecución contractual se efectuó seguimiento técnico, administrativo y financiero a las actividades desarrolladas por el contratista, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

3. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Las actividades objeto del contrato de alquiler de maquinaria amarilla se han venido ejecutando de conformidad con las condiciones técnicas y administrativas establecidas en el contrato. Durante el período objeto de la presente acta parcial, la maquinaria suministrada prestó los servicios requeridos para el desarrollo de las actividades programadas, registrándose las horas de operación y demás soportes correspondientes.
Así mismo, se realizaron visitas de seguimiento y verificación por parte de la supervisión, con el fin de constatar la correcta prestación del servicio, la disponibilidad de los equipos y el cumplimiento de las obligaciones contractuales, encontrándose que las actividades ejecutadas corresponden a las cantidades y períodos de servicio efectivamente prestados durante el corte objeto de pago.

4. CANTIDADES FINALES EJECUTADAS

Las cantidades finales ejecutadas corresponden a las siguientes actividades:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
ALQUILER RETROCARGADOR CAT 426 O SIMILAR (INCLUYE TRANSPORTE AL SITIO)	HR	196

Las cantidades anteriormente relacionadas corresponden a las actividades ejecutadas y reconocidas mediante el Acta Parcial N° 1.

5. PÓLIZAS DEL CONTRATO:

Las garantías contractuales que fueron aprobadas mediante acta firmada el día 12 de mayo de 2026 son las siguientes:

AMPAROS	VALOR ASEGURADO		POLIZA		
CONTRATO	PORCENTAJE	VALOR	N°	DESDE	HASTA
PRESTACIONES SOCIALES	5%	$2.404.000	CG-1075563	12/05/2026	11/11/2029
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10%	$4.408.000		12/05/2026	11/03/2027
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	HASTA 200 SMLMV	$350.181.000	CG-1019111	12/05/2026	11/11/2026

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO.

BALANCE FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA No. MPX-MC-2026125

VALOR DEL CONTRATO	$48.080.000
VALOR ANTICIPO	N/A
VALOR EJECUTADO	$45.080.000
Porcentaje ejecutado del valor total del contrato	**93,76%**

6. CUMPLIMIENTO DE APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

En cumplimiento del parágrafo 1 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, se deja constancia que el contratista ha cumplido con el pago de la seguridad social según planilla de pago número 9503006563 para el mes de mayo de 2025, discriminada así:

SALUD:	ESSC07 - MUTUAL SER
PENSIÓN:	231001 - COLFONDOS
CAJA DE COMPENSACIÓN	CCF08 - COMFENALCO CARTAGENA
ARL:	

PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	No. Planilla Integrada (PILA)	IBC	COTIZACIÓN
2026-05	28/05/2026	9503704878	EXONERADO	SALUD: $ 423.000.oo PENSIÓN: $ 280.200.oo CAJA DE COMPENSACIÓN: $ 70.100.oo ARL: $ 9.200.oo

PERIODO DE COBRO	Mayo de 2026
FECHA COBRO ANTERIOR	NO APLICA
No. COBROS REALIZADOS	NO APLICA

HAROLD MAURICIO NARANJO CORTES
Secretario de Planeación e Infraestructura

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO










Timemark
Foto 100% Real
11:41
23 de may 2026
Sáb
Calle 27, Mompóx, Bolívar
Código de Foto: BLPH1H3KB4H29P

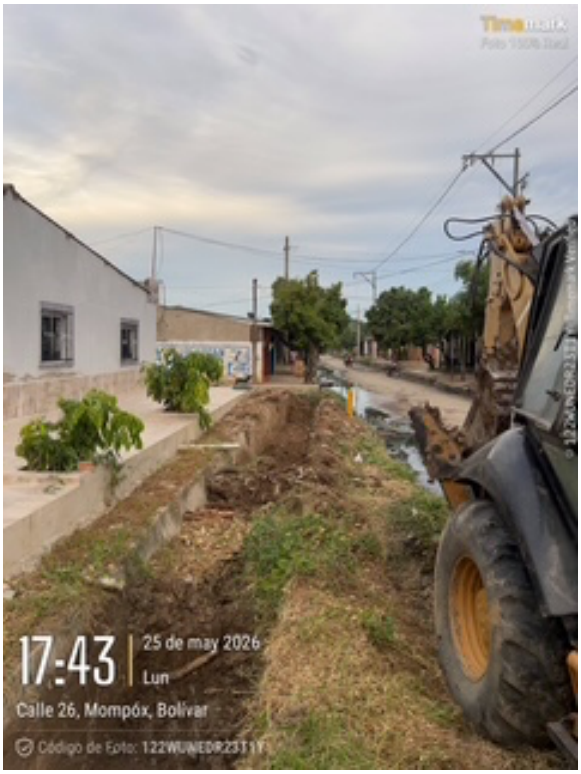

Timemark
Foto 100% Real
12:07
Sáb
Calle 27, Mompóx, Bolívar


Timemark
Foto 100% Real
12:10
Sáb
Calle 27, Mompóx, Bolívar


Timemark
12:24
23 de may 2026
Sáb
Calle 27, Mompóx, Bolívar
Código de Foto: YYTKXL19NK6AAW


Timemark
15:04
23 de may 2026
Sáb
Calle 26, Mompóx, Bolívar


Timemark
10:28
25 de may 2026
Lun
26H 20 Transversal 11, Mompóx 132560, Bolívar









Palacio San Carlos - Cra 2A # 18B - 21 (CP 132560)
alcaldia@santacruzdemompos-bolivar.gov.co
NIT 890480643-3









Palacio San Carlos - Cra 2A # 18B - 21 (CP 132560)
alcaldia@santacruzdemompos-bolivar.gov.co
NIT 890480643-3


Timemark
10:17
26 de may 2026
Mar
23A-37 Avenida Trisesquicentenario, Mompóx 132567, Bolívar

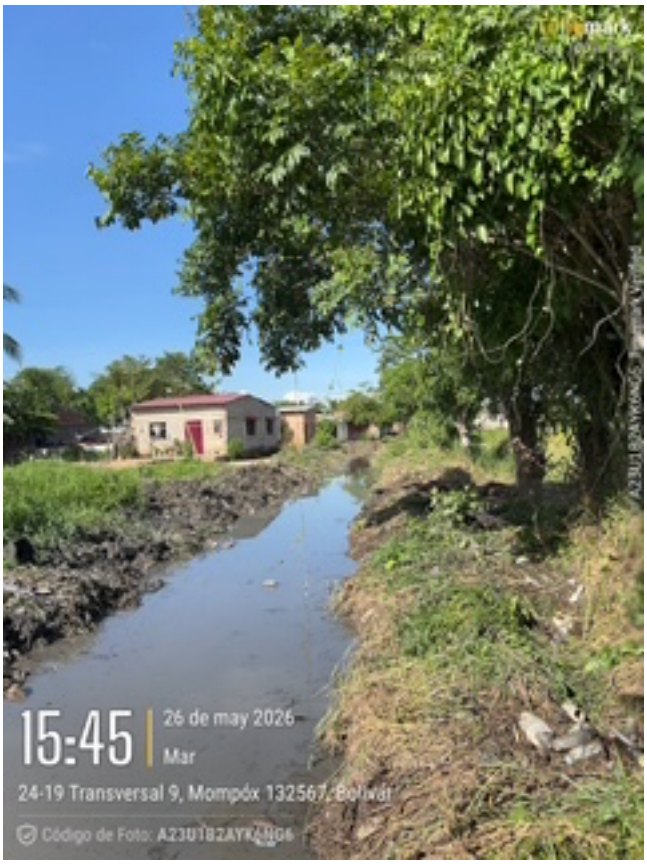

Timemark
10:17
26 de may 2026
Mar
23A-37 Avenida Trisesquicentenario, Mompóx 132567, Bolívar


Timemark
11:31
26 de may 2026
Mar
24-12 Transversal 9, Mompóx 132567, Bolívar


Timemark
11:31
26 de may 2026
Mar
24-12 Transversal 9, Mompóx 132567, Bolívar


14:24
26 de may 2026
Mar
24-12 Transversal 9, Mompox 132567, Bolívar

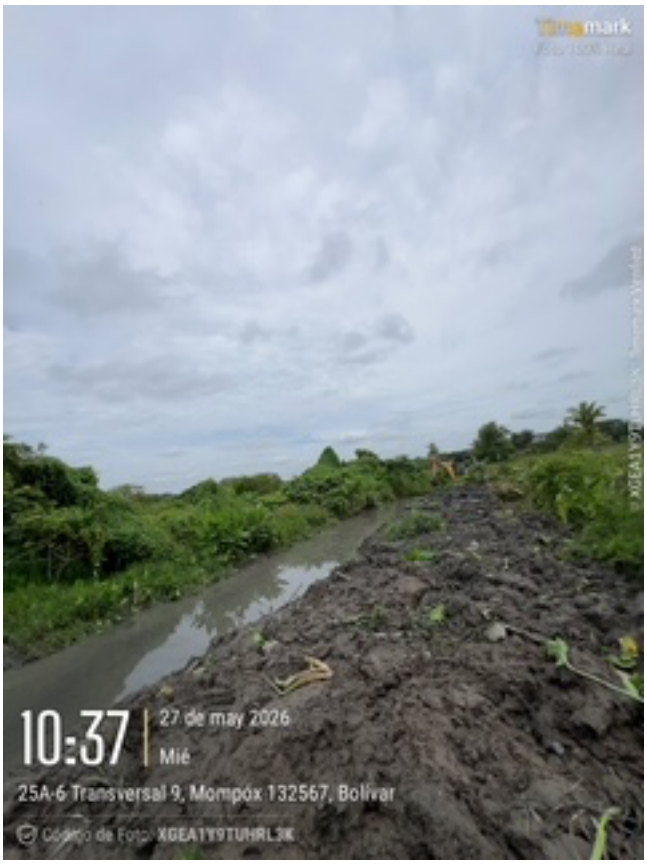

14:56
26 de may 2026
Mar
22D-99 Carrera 6, Mompox 132567, Bolívar

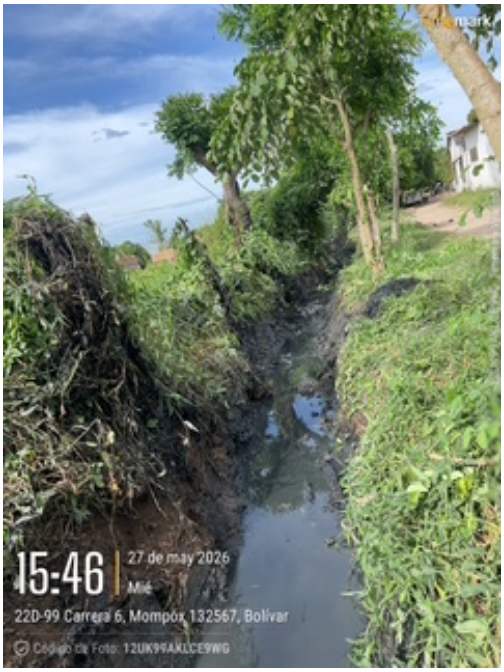

15:45
26 de may 2026
Mar
24-19 Transversal 9, Mompóx 132567, Bolívar


16:02
26 de may 2026
Mar
22D-99 Carrera 6, Mompóx 132567, Bolívar


Timemark
17:00
26 de may 2026
Mar
24-3 Transversal 8B, Mompóx 132560, Bolívar
Código de Foto: H0D3D2PRL1HGPK


08:01
27 de may 2026
Mié
24-4 Transversal 9, Mompóx 132567, Bolívar

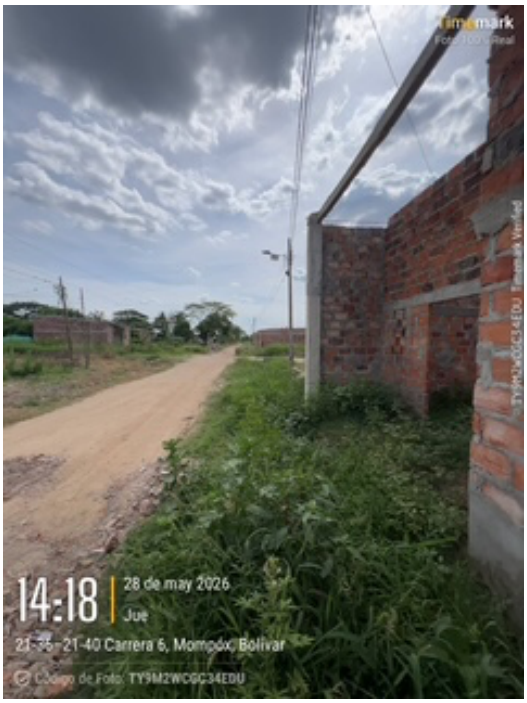

10:37
27 de may 2026
Mié
25A-6 Transversal 9, Mompóx 132567, Bolívar


15:46
27 de may 2026
Mié
22D-99 Carrera 6, Mompóx 132567, Bolívar


08:31
28 de may 2026
Jue
24-3 Transversal 8B, Mompóx 132560, Bolívar


Timemark
12:18
28 de may 2026
Jue
6-23 Calle 23, Mompóx 132567, Bolívar


Timemark
13:21
28 de may 2026
Jue
5-30 Calle 22B, Mompóx 132560, Bolívar


Timemark
14:18
28 de may 2026
Jue
21-35-21-40 Carrera 6, Mompóx, Bolívar


Timemark
14:18
28 de may 2026
Jue
21-36-21-40 Carrera 6, Mompóx, Bolívar




Timemark
16:14
28 de may 2026
Jue
Calle 21B, Mompóx, Bolívar

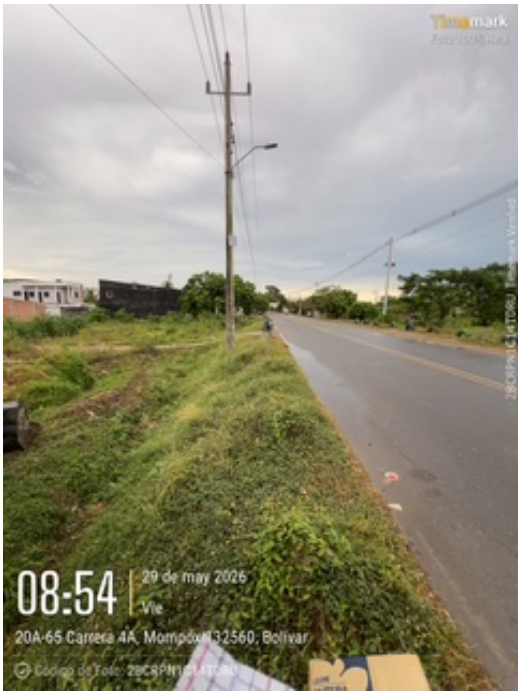

Timemark
16:13
28 de may 2026
Jue
Calle 21B, Mompóx, Bolívar


Timemark
16:43
28 de may 2026
Jue
22A-24-22A-49 Carrera 5A, Mompóx, Bolívar
Código de Foto: 26PEHMAG2UN6DW


16:45
28 de may 2026
Jue
22A-24-22A-49 Carrera 5A, Mompóx, Bolívar


16:45
28 de may 2026
Jue
22A-24-22A-49 Carrera 5A, Mompóx, Bolívar

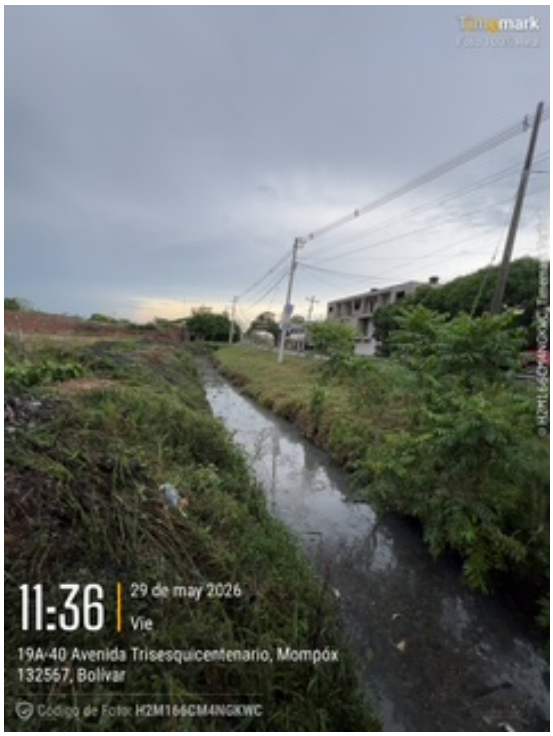

08:00
29 de may 2026
Vie


08:54
29 de may 2026
Vie
20A-65 Carrera 4A, Mompóx 132560, Bolívar


Timemark
09:49
29 de may 2026
Vie
20A-65 Carrera 4A, Mompóx 132560, Bolívar

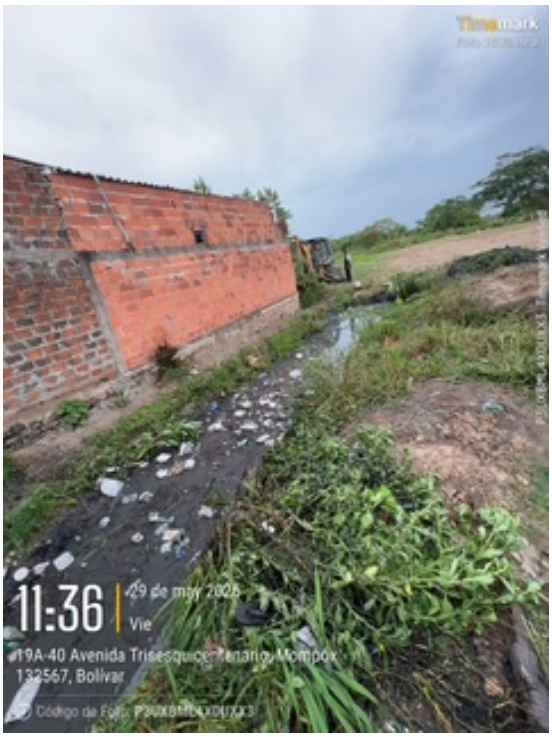



Timemark
10:18
29 de may 2026
Vie
19A-48 Avenida Trisesquicentenario, Mompóx
132567, Bolívar

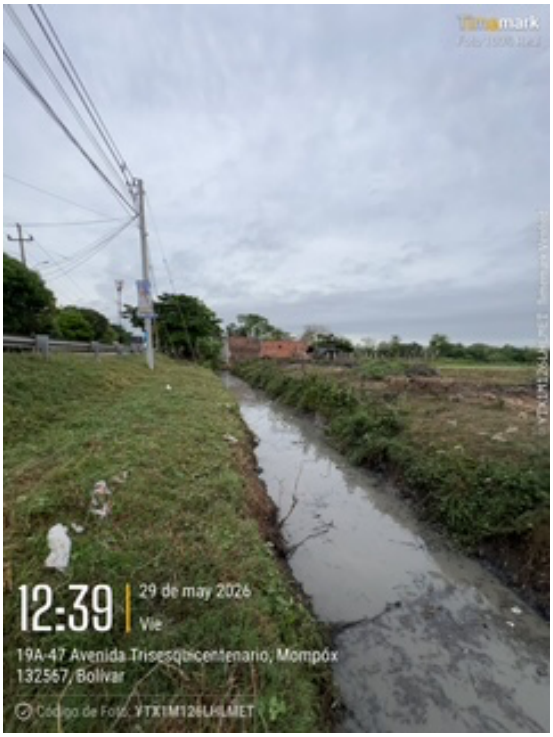

Timemark
11:36
29 de may 2026
Vie
19A-40 Avenida Trisesquicentenario, Mompóx
132557, Bolívar




11:36
29 de may 2026
Vie
19A-40 Avenida Trisesquicentenario, Mompox
132567, Bolívar


11:36
29 de may 2026
Vie
19A-40 Avenida Trisesquicentenario, Mompox
132567, Bolívar


11:54
29 de may 2026
Vie
19A-47 Avenida Trisesquicentenario, Mompox
132567, Bolívar









Palacio San Carlos - Cra 2A # 18B - 21 (CP 132560)
alcaldia@santacruzdemompos-bolivar.gov.co
NIT 890480643-3
