ANEXO 4

SEGUIMIENTO DE LA MATRIZ DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE CONCESIONARIO

Obligaciones Concesionario ML1


Fecha Corte

31/05/2026

Fecha Programada

2026 (Año) + mayo (Mes)

Obligaciones ML1 del periodo

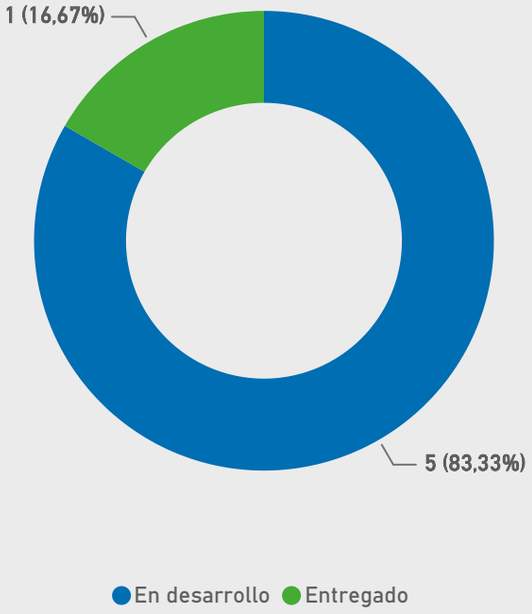

Estado Aprobación del periodo



Estado	Total
En desarrollo	5
Entregado	1
Total	**6**

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONCESIONARIO ML1

Número	Obligación	Documento	Sección del Contrato	Responsable	Avance
1370	Término UE033: Patios Talleres - Edificio- Locales Técnicos	Plan de Ejecución	V15	Concesionario	En desarrollo
1737	Término UE400: Estación 3- Instalación de todos los equipos Acorde al AT.8	Plan de Ejecución	V15	Concesionario	Entregado
1775	Término UE438: Tracción línea Instalación todos los equipos de Sub Estacion0 + 000 to 5 + 760	Plan de Ejecución	V15	Concesionario	En desarrollo
1825	Término UE488:Insfraestructura Vial - Superestructura de vía férrea 18: K5+760 to K6+170	Plan de Ejecución	V15	Concesionario	En desarrollo
1857	Término UE520: Señalización y control de trenes - Instalación de todos las equipos...-K0+ 000 al K5+ 760	Plan de Ejecución	V15	Concesionario	En desarrollo
1956	Finalización de la señalización y control de trenes e instalación de todos los equipos de acuerdo con el AT8 sección 0+000 a 5+760 con pruebas (UE520)	Modificatorio 6		Concesionario	En desarrollo

Número	Obligación	Documento	Sección del Contrato	Responsable
1322	El Concesionario deberá aplicar una encuesta de percepción y satisfacción semestral en cada una de las Etapas y Fases, para evaluar la apropiación, calidad del sistema y tomar las medidas correctivas a que haya lugar en los temas relacionados con el entendimiento de las tecnolog ías asociados a éste y el mejoramiento del servicio. Las medidas correctivas deberán contar con un plan de acción que permita medir y rea lizar seguimiento y control.	Apendice Técnico 15	Anexo 1 - 8.2.4.1	Concesionario
1369	Término UE032: Patios Talleres - Edificio - Hall de Cocheras	Plan de Ejecución	V15	Concesionario
1377	Término UE040:W6- Viaducto-Infraestructura-Cimentac.Pilas.Capiteles: K22+350 to K22+560	Plan de Ejecución	V15	Concesionario
1391	Término UE054:W4- Viaducto-Infraestructura-Cimentac.Pilas.Capiteles: K14+620 to K15+015	Plan de Ejecución	V15	Concesionario
1392	Término UE055:W4- Viaducto-Infraestructura-Cimentac.Pilas.Capiteles: K13+990 to K14+620	Plan de Ejecución	V15	Concesionario
1396	Término UE059:W3- Viaducto-Infraestructura-Cimentac.Pilas.Capiteles: K12+230 to K12+745	Plan de Ejecución	V15	Concesionario
1403	Término UE066:W3- Viaducto-Infraestructura-Cimentac.Pilas.Capiteles: K8+820 to K9+430	Plan de Ejecución	V15	Concesionario

Número	Obligación	Documento	Sección del Contrato	Responsable
1432	Término UE095:Construc.Tablero de viga U Viaductos/Sistemas drenaje cubierta Sect. 63: K22+350 to K22+560	Plan de Ejecución	V15	Concesionario
1433	Término UE096:Construc.Tablero de viga U Viaductos/Sistemas drenaje cubierta Sect.K22+040 a K22+350 (B11)	Plan de Ejecución	V15	Concesionario
1443	Término UE106:Construc.Tablero viga U Viaductos/Sistemas drenaje cubierta Sect.52:K18+820 to K19+110(B07)	Plan de Ejecución	V15	Concesionario
1457	Término UE120:Construc.Tablero viga U Viaducto/Sistema Drenaje Sect. 38:K13+990 to K14+620	Plan de Ejecución	V15	Concesionario
1471	Término UE134:Construcc.Tablero de viga U Viaductos/Sistemas drenaje cubierta Sect 24:K8+ 025 to K8+ 470	Plan de Ejecución	V15	Concesionario
1497	Término UE160: Estación 2 Estaciones Metro Nave Central - Estructura	Plan de Ejecución	V15	Concesionario
1505	Término UE168:Estacion 6 Estaciones Metro Nave Central - Estructura	Plan de Ejecución	V15	Concesionario
1538	Término UE201:W6- Viaducto-Infraestructura-Cimentac.Pilas.Capiteles: K20+340 to K20+800 (B09)	Plan de Ejecución	V15	Concesionario
1539	Término UE202:W6- Viaducto-Infraestructura-Cimentac.Pilas.Capiteles: K21+555 to K21+840 (E15+B10-T)	Plan de Ejecución	V15	Concesionario

Número	Obligación	Documento	Sección del Contrato	Responsable
1559	Término UE222: Adecuación Malla Existente /Separador entre calzada Secc.50: K17+ 940 to K18+ 190	Plan de Ejecución	V15	Concesionario
1631	Término UE294: Obras de Mejoramiento del espacio público - Sección 5: K1 + 340 to K1 + 600	Plan de Ejecución	V15	Concesionario
1632	Término UE295: Obras de Mejoramiento del espacio público - Sección 4: K1 + 030 to K1 + 340	Plan de Ejecución	V15	Concesionario
1633	Término UE296: Obras de Mejoramiento del espacio público - Sección 3: K0 + 650 to K1 + 030	Plan de Ejecución	V15	Concesionario
1634	Término UE297: Obras de Mejoramiento del espacio público - Sección 2: K0 + 300 to K0 + 650	Plan de Ejecución	V15	Concesionario
1635	Término UE298: Obras de Mejoramiento del espacio público - Sección 1: K0 + 000 to K0 + 300	Plan de Ejecución	V15	Concesionario
1647	Término UE310: Estación 4 Edificio de acceso Norte - Acabados	Plan de Ejecución	V15	Concesionario
1652	Término UE315: Estación 5 Edificio de acceso Sur - Estructura	Plan de Ejecución	V15	Concesionario
1662	Término UE325:Estacion 9 Edificio de acceso Oeste - Estructura	Plan de Ejecución	V15	Concesionario

Número	Obligación	Documento	Sección del Contrato	Responsable
1668	Término UE331: Estación 11 Edificio de acceso Este - Estructura	Plan de Ejecución	V15	Concesionario
1674	Término UE337: Estación 12 Edificio de acceso Occidental - Estructura	Plan de Ejecución	V15	Concesionario
1715	Término UE378: Suministro del 50% de acuerdo al AT8	Plan de Ejecución	V15	Concesionario
1721	Término UE384: SER-Suministro de equipos sub estaciones 3/3 (35%)	Plan de Ejecución	V15	Concesionario
1757	Término UE420: Traccion-CT-Estación 10 Suministro todos los equipos para la subestación Acorde AT.8	Plan de Ejecución	V15	Concesionario
1758	Término UE421: Traccion-CT-Estación 11 Suministro todos los equipos para la subestación Acorde AT.8	Plan de Ejecución	V15	Concesionario
1759	Término UE422: Traccion-CT-Estación 12 Suministro todos los equipos para la subestación Acorde AT.8	Plan de Ejecución	V15	Concesionario
1760	Término UE423: Traccion-CT-Estación 13 Suministro todos los equipos para la subestación Acorde AT.8	Plan de Ejecución	V15	Concesionario
1761	Término UE424: Traccion-CT-Estación 14 Suministro todos los equipos para la subestación Acorde AT.8	Plan de Ejecución	V15	Concesionario

Número	Obligación	Documento	Sección del Contrato	Responsable
1762	Término UE425: Traccion-CT-Estación 15 Suministro todos los equipos para la subestación Acorde AT.8	Plan de Ejecución	V15	Concesionario
1763	Término UE426: Traccion-CT-Estación 16 Suministro todos los equipos para la subestación Acorde AT.8	Plan de Ejecución	V15	Concesionario
1823	Término UE486:Insfraestructura Vial - Superestructura de vía férrea 20: K6+545 to K6+760	Plan de Ejecución	V15	Concesionario
1824	Término UE487:Insfraestructura Vial - Superestructura de vía férrea 19: K6+170 to K6 +545	Plan de Ejecución	V15	Concesionario
1875	Término UE538: Puerta de Anden Estación 1- Instalación todos Equipos Acorde AT.8	Plan de Ejecución	V15	Concesionario
1876	Término UE539: Puerta de Anden Estación 2- Instalación todos Equipos Acorde AT.8	Plan de Ejecución	V15	Concesionario
1877	Término UE540: Puerta de Anden Estación 3- Instalación todos Equipos Acorde AT.8	Plan de Ejecución	V15	Concesionario
1896	Término UE559: Sistema Peaje estación-1 Instalación de todos Equipos Acorde AT.8	Plan de Ejecución	V15	Concesionario
1955	Finalización del desmantelamiento del patio de prefabricados del costado norte que se instalará en los predios de patio taller	Modificatorio 6		Concesionario

Número	Obligación	Documento	Sección del Contrato	Responsable
1957	Finalización de instalación técnicas de los locales incluyendo CCO de respaldo (UE033)	Modificatorio 6		Concesionario
1958	Finalización Obra Civil - Nave Central - Estructura - Estación 1 (UE 158)	Modificatorio 6		Concesionario
