INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 18

CONSORCIO BETA REGIONALES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. USPEC-CTO-271-2024

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURÍDICA Y FINANCIERA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS A CARGO DEL INPEC (6 REGIONALES)

CONTRATISTA:

CONSORCIO MANTENIMIENTOS GMC

CONTRATANTE:

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC

PERIODO:

1 AL 31 DE MAYO DEL 2026

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 3
2. GENERALIDADES 3
2.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO *3*
3. ALCANCE DE LA INTERVENTORÍA 1
4. GENERALIDADES DEL PROYECTO 2
4.1 CONTRATO DE OBRA: *2*
4.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA: *3*
5. AVANCE PROGRAMACION DE OBRA. 3
6. ESTABLECIMIENTOS EN EJECUCION 10
7. CORRESPONDENCIA 125
8. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL: 125
9. CONTROL DE MANEJO DE ANTICIPO 125
13. CONTROL DE RECURSOS – EQUIPOS Y MATERIALES. 130
14. ACTAS DE COMITÉ *130*
15. INFORMES QUINCENALES *130*
16. BITACORA DE OBRA *130*
17. ESTADO LEGAL, ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DEL PROYECTO. 130
18. RECOMENDACIONES Y SOLICITUDES 133
19. ANEXOS 134

1. INTRODUCCIÓN

Este documento contiene la información correspondiente al informe mensual No.18 de Interventoría, realizado por CONSORCIO BETA REGIONALES, en el cual se describen las actividades realizadas del 1 al 31 de mayo del 2026, en el Proyecto: "**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS A CARGO DEL INPEC" CONTRATO NO. USPEC-256-2024"** y así mismo los avances, situación a la fecha, descripción y reporte de actividades en la ejecución de este. En consecuencia, que compete al Estado, a través de la Unidad de Servicios Penitenciarios y carcelarios – USPEC, es definir en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, los lineamientos que en materia de infraestructura se requieran, para la atención de los internos de los centros de reclusión del orden Nacional a cargo del INPEC, de conformidad con las condiciones y requerimientos técnicos establecidos en el presente proceso; de tal manera que es necesario por parte de la USPEC, atender mediante la contratación de obras civiles, bienes y servicios la ampliación de infraestructura física de los establecimientos penitenciarios y carcelarios a cargo del INPEC, identificados con mayores índices de hacinamiento y deterioro funcional.

2. GENERALIDADES

A través del presente documento se presenta informe técnico, administrativo y financiero, con el fin de comunicar a la entidad contratante Unidad de Servicios Penitenciarios y carcelarios – USPEC, el cumplimiento de las actividades contratadas y las eventualidades que se han presentado durante el desarrollo del contrato.

2.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO

El lugar de la ejecución del contrato será en ciento veinte seis (126) establecimientos a nivel nacional, que corresponden a la totalidad de los ERONES a cargo del INPEC a nivel nacional, repartidos en las 6 regionales, distribuidos así:

N°	REGIONAL	DPTO	COD.	ESTABLECIMIENTO	DIRECCION ESTABLECIMIENTO
1	CENTRAL	AMAZONAS	101	EPMSC LETICIA	DIRECCIÓN: CALLE 13 No. 10-120 Barrio Victoria Regia.
2	CENTRAL	BOYACA	103	EPMSC SANTA ROSA DE VITERBO	Vereda El Olivo Kilometro 2 vía Santa Rosa de Viterbo - Cerinza
3	CENTRAL	BOYACA	104	CPMSCHI CHIQUINQUIRÁ	DIRECCIÓN: Kilometro 2 vía Bogotá. Chiquinquirá-Boyacá
4	CENTRAL	BOYACA	105	EPMSC DUITAMA	DIRECCIÓN: Calle 7 No 15 -08 Duitama
5	CENTRAL	BOYACA	107	EPMSC GUATEQUE	DIRECCIÓN: CALLE 9 Nº 6 – 35
6	CENTRAL	BOYACA	109	EPMSC MONIQUIRÁ	Km 01 Vía Moniquirá - Barbosa
7	CENTRAL	BOYACA	110	EPMS RAMIRIQUÍ	DIRECCIÓN: Calle 8 No. 4-08
8	CENTRAL	BOYACA	112	EPMSC RM JP SOGAMOSO	DIRECCIÓN: Carrera 9ª 1ª -16 sur
9	CENTRAL	BOGOTA, D.C	113	COMEB BOGOTÁ (PICOTA)	DIRECCIÓN: Kilometro 5 vía usme
10	CENTRAL	BOGOTA, D.C	114	CPMS BOGOTÁ (MODELO)	DIRECCIÓN: Carrera 56 No 18ª47
11	CENTRAL	CUNDINAMARCA	116	EPC CÁQUEZA	DIRECCIÓN: Calle 2 Nº 4-32 palacio Municipal
12	CENTRAL	CUNDINAMARCA	117	EPMSC CHOCONTÁ	DIRECCIÓN: Carrera 5 N· 5-31
13	CENTRAL	CUNDINAMARCA	118	CPMMSFFA FACATATIVÀ	Dirección: Calle 8 No 2 - 29 Barrio CENTRAL Facatativá
14	CENTRAL	CUNDINAMARCA	119	EPMSC CMS FUSAGASUGÁ	DIRECCIÓN: CARRERA 8 No. 7-51
15	CENTRAL	CUNDINAMARCA	120	EPMSC GACHETÁ	DIRECCIÓN: Calle 5 No. 4 - 19
16	CENTRAL	CUNDINAMARCA	124	EPMSC LA MESA	DIRECCIÓN: Carrera 21 N°8-46
17	CENTRAL	CUNDINAMARCA	126	EPMSC UBATÉ	DIRECCIÓN: CRA 7 N°6-41
18	CENTRAL	CUNDINAMARCA	127	EPMSC VILLETA	DIRECCIÓN: Cra 6 N. 3-160 Villeta
19	CENTRAL	BOGOTA, D.C	129	RM PAS ERE BOGOTÁ (BUEN PASTOR)	DIRECCION: Cra 58 No. 80 - 95
20	CENTRAL	META	130	CAMIS ERE ACACÍAS	DIRECCIÓN: Km 3 vía Acacias-Villavicencio
21	CENTRAL	META	131	EPMSC RM VILLAVICENCIO	DIRECCIÓN: TV 26c No. 14ª - 22
22	CENTRAL	META	133	EPMSC GRANADA	DIRECCIÓN: Cra 14 Nº 14-31
23	CENTRAL	TOLIMA	136	EPMSC MELGAR	CARRERA 26 N° 5 – 71 Barrio el CENTRAL Melgar - Tolima
24	CENTRAL	CUNDINAMARCA	138	EPMSC GIRARDOT	DIRECCIÓN: CALLE 38 # 3 – 28 BARRIO DIAMANTE
25	CENTRAL	HUILA	139	EPMSC RM NEIVA	DIRECCIÓN: Vereda Río Frío - Municipio de Rivera, Kilómetro 15 vía Neiva – Rivera.
26	CENTRAL	HUILA	140	EPMSC GARZÓN	CALLE 3 SUR No. 18 A 19 BRÍO AGUAZUL
27	CENTRAL	HUILA	141	EPMSC LA PLATA	DIRECCIÓN: Kilometro 1 vía Neiva
28	CENTRAL	HUILA	142	EPMSC PITALITO	DIRECCIÓN: Calle 19 Sur Nro. 6-180
29	CENTRAL	CAQUETA	143	EPMSC FLORENCIA (CUNDUY)	DIRECCIÓN: KILÓMETRO 3 VÍA NEIVA - BARRIO EL CUNDUY
30	CENTRAL	TOLIMA	144	EPMSC CHAPARRAL	Dirección: carrera 6ªE N° 8ª- 44 barrio Carmenza Rocha

31	CENTRAL	TOLIMA	145	EPMSC JP ESPINAL	DIRECCIÓN: Calle 6 Carrera 12 Esquina # 12-56
32	CENTRAL	META	148	EPMSC ACACÍAS	DIRECCIÓN: KM 5 Vía antigua Villavicencio
33	CENTRAL	BOYACA	149	EPMSC TUNJA	DIRECCIÓN: Calle 31 No. 2 -15 Este. Barrio. El Dorado, en la ciudad de Tunja, departamento de Boyacá
34	CENTRAL	BOYACA	150	EPAMS CAS CÓMBITA	DIRECCIÓN: Kilometro 17 Via Tunja Paipa
35	CENTRAL	CASANARE	152	EPMSC PAZ DE ARIPORO	DIRECCIÓN: Calle 10 No. 6-69 Barrio Camilo Torres Paz de Ariporo
36	CENTRAL	CASANARE	153	EPC YOPAL	DIRECCIÓN: Kilómetro 12 Vía Yopal Aguazul
37	CENTRAL	CUNDINAMARCA	156	EPC LA ESPERANZA DE GUADUAS	DIRECCIÓN: Km 3.5 Vía a Cambao, Vereda la Unión, Finca la Esperanza
38	CENTRAL	CAQUETA	157	EP FLORENCIA (HELICONIAS)	DIRECCIÓN: Km 1.5 De La Variante San Martin Vereda San Isidro
39	CENTRAL	TOLIMA	158	EPC GUAMO	DIRECCIÓN: Calle 11 N. 8-04
40	OCCIDENTAL	CAUCA	202	EPMSC BOLÍVAR (CAUCA)	DIRECCION: calle 3 No. 3-32 Barrio Sur
41	OCCIDENTAL	CAUCA	204	EPMSC EL BORDO	DIRECCION: carrera 2 W 7-65
42	OCCIDENTAL	CAUCA	206	EPMSC PUERTO TEJADA	DIRECCION: Calle 17 N° 19-37 Barrio el CENTRAL Puerto Tejada Cauca
43	OCCIDENTAL	CAUCA	207	EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO	DIRECCION: CALLE 4 No. 27-34 B/ MORALES DUQUE
44	OCCIDENTAL	CAUCA	208	EPMSC SILVIA	DIRECCION: Carrera 3 N° 4 – 52 Barrio Caloto Silvia
45	OCCIDENTAL	CAUCA	209	RM POPAYÁN	DIRECCIÓN: Calle 3 N. 16-11 Barrio Alfonso López
46	OCCIDENTAL	NARIÑO	215	EPMSC RM PASTO	DIRECCION: Calle 24 No. 31-23 Barrio La Esperanza.
47	OCCIDENTAL	NARIÑO	217	EPMSC IPIALES	DIRECCION: Cra. 8 No. 1 – 49 Sector Las Animas.
48	OCCIDENTAL	NARIÑO	219	EPMSC LA UNIÓN	DIRECCION: Carrera 3 No. 13 – 48, Barrio Chapinero
49	OCCIDENTAL	NARIÑO	221	EPMSC TÚQUERRES	DIRECCIÓN: Carrera 15 No. 26-210 Barrio las Mercedes - Tuquerres Nariño
50	OCCIDENTAL	NARIÑO	222	EPMSC TUMACO	DIRECCION: km 19, vía Tumaco – Pasto, vereda Buchely
51	OCCIDENTAL	VALLE	225	EPAMS CAS JP PALMIRA	DIRECCION: Calle 23 vía CORPOICA
52	OCCIDENTAL	VALLE	226	EPMSC ERE CALI	DIRECCION: Transversal 25 No 31-116
53	OCCIDENTAL	VALLE	227	EPMSC BUGA	DIRECCIÓN: CARRERA 16 N°32-97 BARRIO EL JARDÍN
54	OCCIDENTAL	VALLE	228	EPMSC BUENAVENTURA	DIRECCIÓN: Calle 6 No. 51b-61 Barrio Transformación, avenida Simón Bolívar.
55	OCCIDENTAL	VALLE	233	EPMSC TULUÁ	DIRECCIÓN: CARRERA 29 14-02 BARRIO: EL POPULAR
56	OCCIDENTAL	CAUCA	235	EPAMS CAS ERE POPAYÁN	DIRECCIÓN: Kilómetro 3 Vía Vereda las Guacas
57	OCCIDENTAL	VALLE	238	EPMSC CARTAGO	DIRECCIÓN: Calle 10 Nº 13 - 72
58	OCCIDENTAL	VALLE	239	EPMSC CAICEDONIA	DIRECCION: Calle 18 No. 19-203 Barrio Lleras
59	OCCIDENTAL	VALLE	240	EPMSC ROLDANILLO	Dirección: calle 7 N° 6 -51 / Barrio CENTRAL
60	OCCIDENTAL	VALLE	241	EPMSC SEVILLA	DIRECCION: CRA 50 CON CALLE 62ª ESQUINA
61	OCCIDENTAL	VALLE	242	COJAM JAMUNDÍ	DIRECCION: Kilometro 2.7 vía Bocas del Palo, Jamundí, Valle del Cauca
62	NORTE	ATLÁNTICO	301	EC JP BARRANQUILLA (MODELO)	DIRECCION: Vía 40 # 54-332

63	NORTE	BOLIVAR	303	EPMSC CARTAGENA	DIRECCIÓN: Diagonal 31 # 85-180 Barrio Ternera
64	NORTE	BOLIVAR	305	EPMSC MAGANGUÉ	DIRECCIÓN: Cárcel Nacional Barrio Camilo Torres
65	NORTE	CESAR	307	EPMSC ERE VALLEDUPAR	Carrera 19 A N° 18-60 barrio dangond
66	NORTE	CORDOBA	308	EPMSC JP MONTERÍA	DIRECCIÓN: Calle 35 Carrera 23
67	NORTE	GUAJIRA	313	EPMSC RIOHACHA	DIRECCIÓN: Calle 9ª N° 17 – 13 Barrio José Antonio Galán
68	NORTE	MAGDALENA	314	EPMSC SANTA MARTA	DIRECCIÓN: CALLE 24 No. 17A-36
69	NORTE	MAGDALENA	316	EPMSC EL BANCO	DIRECCIÓN: KILOMETRO 2 VIA GUAMAL BARRIO LAS MARIAS
70	NORTE	SAN ANDRES	318	EPMSC SAN ANDRÉS	DIRECCIÓN: Av Circunvalar Schooner bight.
71	NORTE	SUCRE	319	EPMSC SINCELEJO	DIRECCIÓN: CARRERA 17 No 3 - 21
72	NORTE	ATLÁNTICO	322	EPMSC ERE PSM BARRANQUILLA (EL BOSQUE)	DIRECCIÓN: Calle 76 No. 8 - 100
73	NORTE	CESAR	323	EPAMS CAS VALLEDUPAR	DIRECCIÓN: Km 3.5 vía la mesa
74	NORTE	CORDOBA	324	EPC TIERRALTA	DIRECCIÓN: KILOMETRO 23 VIA URRA – VEREDA SANTA ANA
75	ORIENTE	ARAUCA	401	EPMSC ARAUCA	DIRECCIÓN: Calle 17 No. 25A-26 B. La Esperanza
76	ORIENTE	CESAR	405	EPMSC AGUACHICA	DIRECCIÓN: CALLE 10 # 8-90 BARRIO SAN ROQUE – AGUACHICA (CESAR)
77	ORIENTE	NORTE DE SANTANDER	407	EPMSC PAMPLONA	DIRECCIÓN: Av. Santander No. 12-129 B. Alpes
78	ORIENTE	NORTE DE SANTANDER	408	EPMSC OCAÑA	DIRECCIÓN: Carrera 16 No. 4-34 Barrio Tibet
79	ORIENTE	SANTANDER	410	EPMSC ERE JP BUCARAMANGA (LA MODELO)	DIRECCIÓN: Calle 45 No. 6-75 B. Alfonso López, Bucaramanga, Santander
80	ORIENTE	SANTANDER	411	EPMSC BARRANCABERMEJA	DIRECCIÓN: Carrera 5 No. 8-07 B. Sector Comercial
81	ORIENTE	SANTANDER	413	EPMSC MÁLAGA	DIRECCIÓN: Carrera 9 No. 11 – 40 Málaga.
82	ORIENTE	SANTANDER	415	EPMSC SAN GIL	DIRECCIÓN: Carrera 12 No. 20A-67
83	ORIENTE	SANTANDER	416	EPMSC SOCORRO	DIRECCIÓN: Vereda Naranjal. Km 7 Via San Gil.
84	ORIENTE	SANTANDER	417	EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURI	DIRECCIÓN: Calle 16 No. 17b - 26 Barrio Buenos Aires.
85	ORIENTE	SANTANDER	418	EPMSC VÉLEZ	DIRECCIÓN: CARRERA 3 SALIDA A CHIPATÁ VÉLEZ SANTANDER
86	ORIENTE	SANTANDER	420	RM BUCARAMANGA	DIRECCIÓN: PROLONGACIÓN CALLE 45 VIA CHIMITA
87	ORIENTE	SANTANDER	421	EPAMS CAS GIRÓN	DIRECCIÓN: KM 14 Vereda Palogordo, (Girón,
88	ORIENTE	NORTE DE SANTANDER	422	COCUC CÚCUTA	DIRECCIÓN: KM 3 Carretera Panamericana Vía al Salado
89	NOROESTE	ANTIOQUIA	501	EPAMS CAS ERE JP LA PAZ (ITAGUI)	CARRERA 70 N 23-10 BARRIO SAN FRANCISCO DE ITAGUI
90	NOROESTE	ANTIOQUIA	502	EPMSC MEDELLÍN (BELLAVISTA)	IRECCIÓN: Diagonal 44 No. 39–145 B. Las Vegas, Bello (Ant)
91	NOROESTE	ANTIOQUIA	505	EPMSC ANDES	DIRECCIÓN: calle 49 Nro. 55 – 154, Barrio San Pedro Andes Ant.

92	NOROESTE	ANTIOQUIA	507	EPMSC BOLIVAR	DIRECCION: calle 3 No. 3-32 Barrio Sur
93	NOROESTE	ANTIOQUIA	508	EPMSC CAUCASIA	DIRECCIÓN: Cra. 17 No 8 – 65 Barrio Pueblo Nuevo, Caucasia – Antioquia
94	NOROESTE	ANTIOQUIA	513	EPMSC JERICÓ	DIRECCIÓN: Carrera 6 #04-29 Barrio Las Quebraditas Jericó-Antioquia
95	NOROESTE	ANTIOQUIA	514	EPMSC LA CEJA	DIRECCIÓN: Carrera 18 N° 20-54
96	NOROESTE	ANTIOQUIA	515	EPMSC PUERTO BERRÍO	DIRECCIÓN: CALLE 50 Nro. 10 – 03 Esquina Barrio el Carmelo Puerto Berrio Antioquia
97	NOROESTE	ANTIOQUIA	517	EPMSC SANTA BÁRBARA	DIRECCIÓN: CALLE SUCRE BARRIO LA AZULITA #51-26, SANTA BARBARA ANTIOQUIA
98	NOROESTE	ANTIOQUIA	518	EPMSC SANTO DOMINGO	DIRECCIÓN: Carrera 15 No. 14-10 - Calle Uribe Restrepo
99	NOROESTE	ANTIOQUIA	519	EPMSC SANTA ROSA DE OSOS	DIRECCIÓN: Calle 27 Nº 35 a 03 barrio Camellón González
100	NOROESTE	ANTIOQUIA	521	EPMSC SONSÓN	DIRECCIÓN: Carrera 7 No. 12-17
101	NOROESTE	ANTIOQUIA	523	EPMSC TÁMESIS	DIRECCIÓN: Carrera 10 No.09-40
102	NOROESTE	ANTIOQUIA	527	EPMSC YARUMAL	DIRECCIÓN: Carrera 21 No. 20-07
103	NOROESTE	CHOCO	530	EPMSC QUIBDÓ	DIRECCIÓN: Calle 26 N° 8 -35 Barrio Alameda Reyes
104	NOROESTE	ANTIOQUIA	531	EPMSC APARTADÓ	DIRECCIÓN: Kilometro 5 vía Apartado-Carepa
105	NOROESTE	CHOCO	533	EPMSC ITSMINA	DIRECCIÓN: Carrera 7° N° 12 – 36 Barrio San Francisco
106	NOROESTE	ANTIOQUIA	535	EP PUERTO TRIUNFO - EL PESEBRE	DIRECCION: Vía Medellín - Bogotá Km 115 (Hacienda Nápoles)
107	NOROESTE	ANTIOQUIA	537	COPED PEDREGAL	DIRECCIÓN: kilometro 6 vía al mar, Finca la TERESITA Corregimiento San Cristóbal Medellín
108	VIEJO CALDAS	CALDAS	601	EPMSC MANIZALES	DIRECCIÓN: Vía Panamericana Barrio Estambul – Manizales Caldas
109	VIEJO CALDAS	CALDAS	602	EPMSC ANSERMA	DIRECCIÓN: Calle 3 No. 3 – 42 Barrio Pablo VI.
110	VIEJO CALDAS	CALDAS	607	EPMSC PÁCORA	DIRECCIÓN:KM 2 VIA A SALAMINA CALDAS
111	VIEJO CALDAS	CALDAS	608	EPMSC PENSILVANIA	DIRECCIÓN: Kilómetro 1 Vía a Manzanares
112	VIEJO CALDAS	CALDAS	609	EPMSC RIOSUCIO	DIRECCIÓN: Calle 6 N° 8- 14 Avenida el Ciprés, Barrio Guayaquil
113	VIEJO CALDAS	CALDAS	610	EPMSC SALAMINA	DIRECCIÓN: Kilómetro 1 vía Salamina - San Félix
114	VIEJO CALDAS	CALDAS	611	RM MANIZALES	DIRECCIÓN: Avenida Panamericana Granjas de Estambul
115	VIEJO CALDAS	QUINDIO	612	EPMSC CALARCÁ	DIRECCIÓN: Kilometro 1 Vía al Valle
116	VIEJO	QUINDIO	613	EPMSC ARMENIA	DIRECCIÓN: Calle 50 N° 21-97 Barrio Farallones

117	VIEJO CALDAS	QUINDIO	615	RM ARMENIA	DIRECCIÓN: Calle 50 N°23-29 B/ Farallones
118	VIEJO CALDAS	RISARALDA	616	EPMSC ERE PEREIRA	DIRECCIÓN: Carrera 8 # 41-97
119	VIEJO CALDAS	RISARALDA	617	EPMSC SANTA ROSA DE CABAL	DIRECCIÓN: Carrera 16 No. 14-27
120	VIEJO CALDAS	RISARALDA	620	RM PEREIRA	DIRECCIÓN: VIA LA BADEA TURIN LA POPA
121	VIEJO CALDAS	TOLIMA	626	EPMSC FRESNO	DIRECCIÓN: Calle 3 No. 4-50 Barrio CENTRAL
122	VIEJO CALDAS	TOLIMA	628	EPMSC HONDA	DIRECCIÓN: Kilometro 3 Vía La Dorada, Barrio Caracolí, Honda-Tolima
123	VIEJO CALDAS	TOLIMA	629	EPMSC LÍBANO	DIRECCIÓN: CARRERA 12 # 5 – 75 BARRIO CENTRAL
124	VIEJO CALDAS	BOYACA	633	EPMSC PUERTO BOYACÁ	DIRECCIÓN: Carrera 5 No, 6B-124
125	VIEJO CALDAS	CALDAS	637	EPAMS PC ERE LA DORADA	DIRECCIÓN: Km 3 antigua vía al Palmar, Barrio Las Ferias
126	VIEJO CALDAS	TOLIMA	639	COIBA IBAGUÉ	DIRECCIÓN: Carrera 45 Sur No. 134 - 95 Barrio Picaleña Ibagué

Tabla 1 Ubicación de los ERON objeto del contrato.

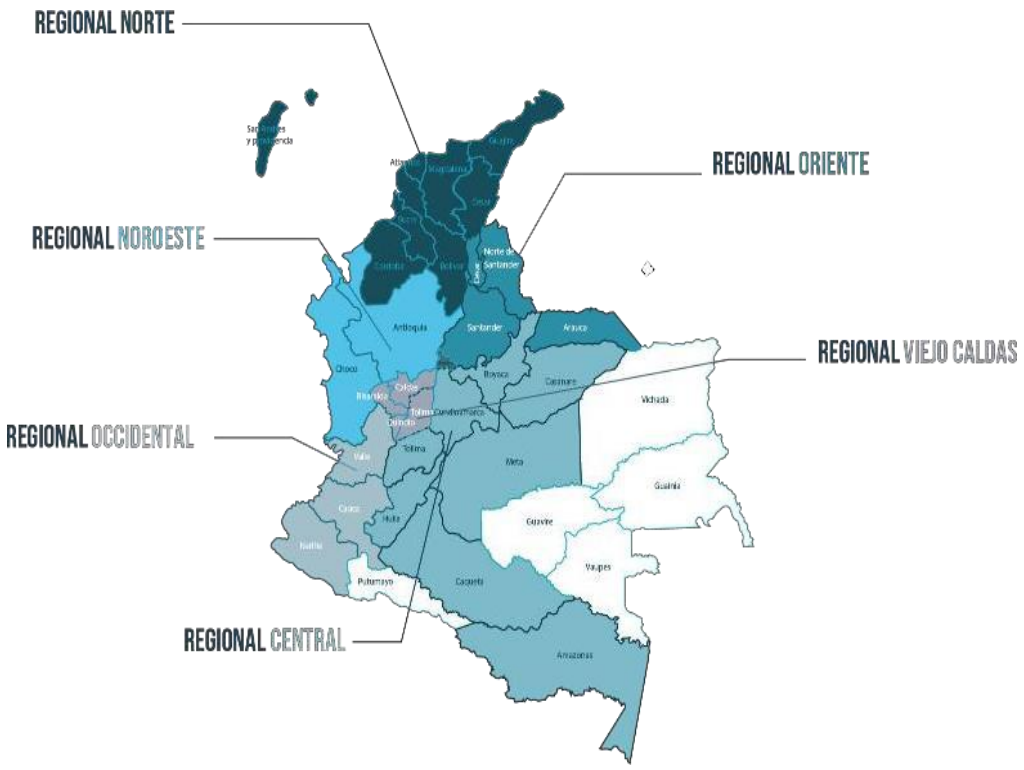


Ilustración 1 Mapa de Colombia tomado de Google.

3. ALCANCE DE LA INTERVENTORÍA

El alcance del contrato objeto de interventoría podrá extenderse a actividades de mantenimiento y/o adecuación y/o remodelación. Para dichas actividades se sustentará de forma objetiva y se fundamentará en la necesidad de cumplir objetivos de orden misional, todo lo anterior se elevará a modificatorio del contrato en aras de ejecutar actividades conexas y/o complementarias para lograr el adecuado funcionamiento del respectivo ERON.

La interventoría de acuerdo con la naturaleza propia de las obligaciones a su cargo deberá exigir la calidad de los bienes, obras y servicios adquiridos en el marco del contrato celebrado verificando que se cumplan dentro del plazo estipulado el objeto contratado y todas las condiciones técnicas, económicas y legales pactadas.

La interventoría debe garantizar que las intervenciones se adelanten dentro de los plazos previstos y con la debida calidad y oportunidad, con la colaboración y apoyo permanente que se requiera para el buen desarrollo del objeto del contrato en concordancia con los aspectos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros establecidos en los compromisos contractuales, de cada establecimiento de reclusión. Se requiere que la interventoría realice la inspección, verificación, seguimiento y control de la ejecución del contrato resultante de la licitación pública para las actividades de mantenimiento recurrente de los establecimientos de reclusión de orden nacional.

En todo momento durante la ejecución del contrato objeto de la presente interventoría, será responsabilidad de la interventoría, realizar el seguimiento y control de la inversión de los recursos asignados al contrato, de tal manera que no se permita superar el valor total del contrato y que se cuente con los respaldos presupuestales.

El interventor deberá hacer entrega de los informes mensuales de seguimientos y control al contrato de construcción y el desarrollo de actividades de interventoría, la interventoría controlará la totalidad de los trabajos para cada caso particular y que se describes en los pliegos de condiciones del contrato de construcción.

4. GENERALIDADES DEL PROYECTO

4.1 CONTRATO DE OBRA:

No. DE CONTRATO:	USPEC-CTO-256-2024
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS A CARGO DEL INPEC)
CONTRATISTA:	CONSORCIO MANTENIMENTO GMC
INTERVENTORIA:	CONSORCIO BETA REGIONALES
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($53.503.188.931,00) MCTE
VALOR TOTAL OBRA	CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL VEINTIDÓS PESOS M/CTE ($52.344.098.022,00)
VALOR TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS	MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVENTA MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS M/CTE ($1.159.090.909,00)
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($53.503.188.931,00) MCTE
ADICION	MIL SEISCIENTOS DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE $1.602.660.000
VALOR DEL ANTICIPO:	QUINCE MIL SETECIENTOS TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($15.703.229.406,60) MCTE
PLAZO INICIAL DE CONTRATO:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
PRÓRROGA No.1:	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2025
TIEMPO ADICIONADO:	3 MESES
PRÓRROGA No.2:	HASTA EL 31 DE MAYO DE 2025
TIEMPO ADICIONADO:	2 MESES
PRÓRROGA No.3:	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2025
TIEMPO ADICIONADO:	6.5 MESES
PRÓRROGA No.4:	HASTA EL 15 DE MAYO DE 2026
TIEMPO ADICIONADO:	5 MESES
PRÓRROGA No.5:	HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2026

Tabla 2 Información general contrato de Obra

4.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA:

No. DE CONTRATO:	USPEC-CTO-271-2024
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURÍDICA Y FINANCIERA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS A CARGO DEL INPEC (6 REGIONALES).
CONTRATISTA:	CONSORCIO MANTENIMIENTO GMC
INTERVENTORIA:	CONSORCIO BETA REGIONALES
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($5.488.260.537) M/CTE
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	7 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	29 DE NOVIEMBRE DE 2024
PLAZO INICIAL FINAL DE CONTRATO:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
OTRO SI 1	MODIFICACION CONTRATO DE INTERVENTORIA
OTRO SI 2 PRÓRROGA No.1:	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2025
PRÓRROGA No.2:	HASTA EL 31 DE MAYO DE 2025
TIEMPO ADICIONADO:	2 MESES
PRÓRROGA No.3:	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2025
TIEMPO ADICIONADO:	6.5 MESES
PRÓRROGA No.4:	HASTA EL 15 DE MAYO DE 2026
TIEMPO ADICIONADO:	5 MESES
PRÓRROGA No.5:	HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2026

Tabla 3 información General contrato de interventoría

5. AVANCE PROGRAMACION DE OBRA.

AVANCE DEL CRONOGRAMA DEL 1 al 31 de mayo de 2026

De acuerdo con lo establecido en el ANEXO TECNICO del contrato de interventoría Capitulo 4. ALCANCE DEL CONTRATO, Subcapítulo 4.1.6 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA DE METAS FISICAS. Segundo párrafo. Insumos, viñeta 2 Controles mensuales y quincenales de avance de actividades físicamente ejecutadas.

Una vez concluida la etapa “Visitas de diagnóstico” se inició la etapa II de ejecución de obra, la cual comprende a la ejecución física, administrativa, financiera, contable, legal, etc., del objeto contractual.

En el presente informe se presentan los avances al desarrollo de correspondientes a la Etapa II a corte del 31 de mayo de 2026.

En atención a la Programación presentada por el contratista, interventoría procedió a realizar la pertinente estructuración del CONTROL DE PROGRAMACIÓN, la cual se presenta en los anexos (CARPETA 5 – AVANCE GENERAL).

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

Con el fin de realizar un control detallado del avance de la programación, de acuerdo con el balance de FASE 2, el cual incluye los plazos de ejecución de la prórroga aprobada en otro si No 7 con fecha de terminación hasta el 31 de agosto de 2026.

Se realiza seguimiento semanal de las cantidades de obra ejecutadas por cada ítem que compone el presupuesto de cada ERON, que a su vez componen cada regional del contrato efectuando el seguimiento en detalle.


METODOLOGIA CONTROL DE ENTREGA DE INFORMES DIAGNOSTICOS.

El control de programación se realiza determinando las siguientes divisiones principales, por cada alcance determinado de cada ERON y cada Regional. Según anexo técnico (Tabla No 1 Ubicación de los ERON objeto del contrato).

- PRESUPUESTO
- CONTROL PROGRAMA DE OBRA
- CONSOLIDADO PROGRAMA DE OBRA
- CONTROL AVANCE SEGÚN PROGRAMA DE OBRA
- CONSOLIDADO REGIONAL
- CONTROL AVANCE REGIONAL
- CONSOLIDADO REGIONALES
- CONTROL AVANCE REGIONALES

PRESUPUESTO

De acuerdo con el balance presupuestado y como se indicó antes, se puede observar en el cuadro de seguimiento presupuesto, la desagregación de las cantidades de obra expresadas en porcentajes de cada ítem por cada frente, multiplicada por el valor del ítem, del balance aprobado. El seguimiento se realiza semanalmente, consignado en la columna de la semana correspondiente, las cantidades de obra ejecutadas de cada ítem, multiplicada por el valor del ítem y afectándolo por la división del valor del ítem ejecutado por el valor total de obra, lo cual nos arroja el porcentaje ejecutado del ítem con respecto al valor total del contrato de la fase II EJECUCIÓN DE OBRA.

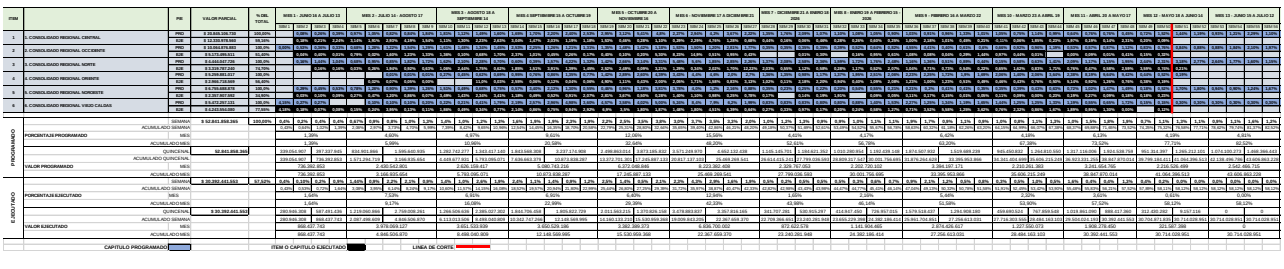

En la imagen anterior, se evidencia como ejemplo la cantidad ingresada en cada ítem en la semana 50, ejecutada de la Fase 2, generando el valor y el % ejecutado (el % se calcula sobre el valor total del presupuesto Fase 2, lo cual da como resultado su avance financiero). Al final de cada columna semanal se registra el valor en pesos y el porcentaje de ejecución de la semana.

AVANCE SEMANA			AVANCE ACUMULADO		
SEMANA 50	MAYO 25 A 31 DE 2026		SEMANA 1 A 50	JUNIO 16 2025 A 31 MAYO DE 2026	
PROGRAMADO	EJECUTADO	CUMPLIMIENTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	CUMPLIMIENTO
1,52%	0,09%	-1,43%	78,75%	59,45%	-19,30%
0,76%	0,32%	-0,43%	58,65%	52,08%	-6,57%
2,31%	0,74%	-1,57%	86,21%	79,23%	-6,97%
0,52%	0,19%	-0,33%	97,58%	56,97%	-40,60%
0,52%	0,23%	-0,29%	48,08%	35,31%	-12,77%
0,15%	0,12%	-0,03%	96,28%	76,69%	-19,59%
1,07%	**0,22%**	**-0,85%**	**75,32%**	**58,16%**	**-17,15%**
TOTAL INVERSION					
$ 565.547.638	**$ 115.917.433**	**-$ 449.630.205**	**$ 39.799.184.411**	**$ 30.734.372.311**	**-$ 9.064.812.101**


En la imagen anterior, se evidencia como ejemplo el valor total ejecutado en el proyecto en la semana 50, con el 58,16% ejecutado. De igual forma en este cuadro de control presupuestal se puede observar en el costado derecho la sumatoria, valores y porcentaje acumulado de las semanas incluyendo al final de la columna el valor total y porcentaje ejecutado el cual coincide con los resultados en el cuadro de consolidado total.

Las anteriores figuras son ilustrativas, el control de presupuesto se presenta en el (ANEXOS - CARPETA 5 – AVANCE GENERAL).

CONTROL PROGRAMACION FISICO COMPLETADO

El control de programación se realiza por cada ítem, consignando los porcentajes programados por cada semana correspondientes a porcentajes y valor de cada ítem

programado según programación presentada por el contratista. De igual forma se consignan los porcentajes de ejecución provenientes del control presupuestal de cada ítem en cada semana, sumatoria de porcentajes y valor de cada ítem ejecutado, de forma que se pueda realizar lectura fácil de programado con lo ejecutado en porcentaje y valor de cada ítem. (Se presentan imágenes ilustrativas).

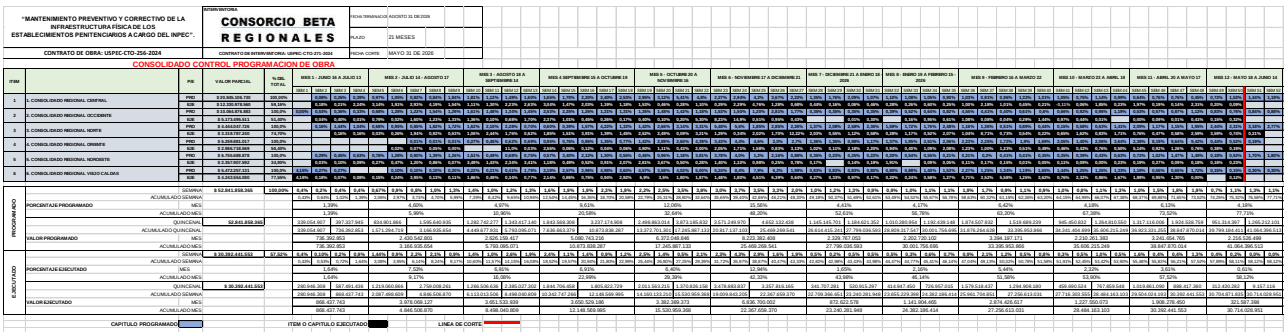

En la parte inferior de cada cuadro de control de cada frente, se registra la sumatoria de lo


programado tanto en porcentaje como en valor de cada semana por regional y del acumulado de las semanas e igualmente se registra lo ejecutado en porcentaje de ejecución y valor por cada semana y acumulado, esto nos permite hacer una correlación entre porcentaje de ejecución y valor ejecutado.

De igual forma en el costado derecho del control de programación se incluyó la sumatoria del cuadro de avance físico de obra en la semana y avance acumulado del mes, por cada ítem programado y ejecutado, estableciendo el cumplimiento de ejecución en avance o atraso.

PROGRAMADO	**PORCENTAJE PROGRAMADO**	SEMANA	**$ 52.841.858.365**	**100,00%**
		ACUMULADO SEMANA		
		MES		
		ACUMULADO MES		
	VALOR PROGRAMADO	QUINCENAL	**52.841.858.365**	
		ACUMULADO QUINCENAL		
		MES		
		ACUMULADO MES		
EJECUTADO	**PORCENTAJE EJECUTADO**	SEMANA	**$ 30.392.441.553**	**57,52%**
		ACUMULADO SEMANA		
		MES		
		ACUMULADO MES		
	VALOR EJECUTADO	QUINCENAL	**$ 30.392.441.553**	
		ACUMULADO SEMANA		
		MES		
		ACUMULADO MES		

CONTROL PROGRAMACION CONSOLIDADO

En base a la programación general, los datos se registran en hoja de cálculo denominada Consolidado Control de Programación, en el cual se registran los valores de los Capítulos que componen el balance y la programación, siguiendo la misma matemática descrita anteriormente. El consolidado control de programación se realiza por cada capítulo, se consignan los porcentajes de ejecución provenientes del control de programación de cada capítulo en cada semana, sumatoria de porcentajes y valor de cada capítulo ejecutado, de forma que se pueda realizar lectura fácil de programado con lo ejecutado en porcentaje y valor de cada capítulo. (Se presentan imágenes ilustrativas).

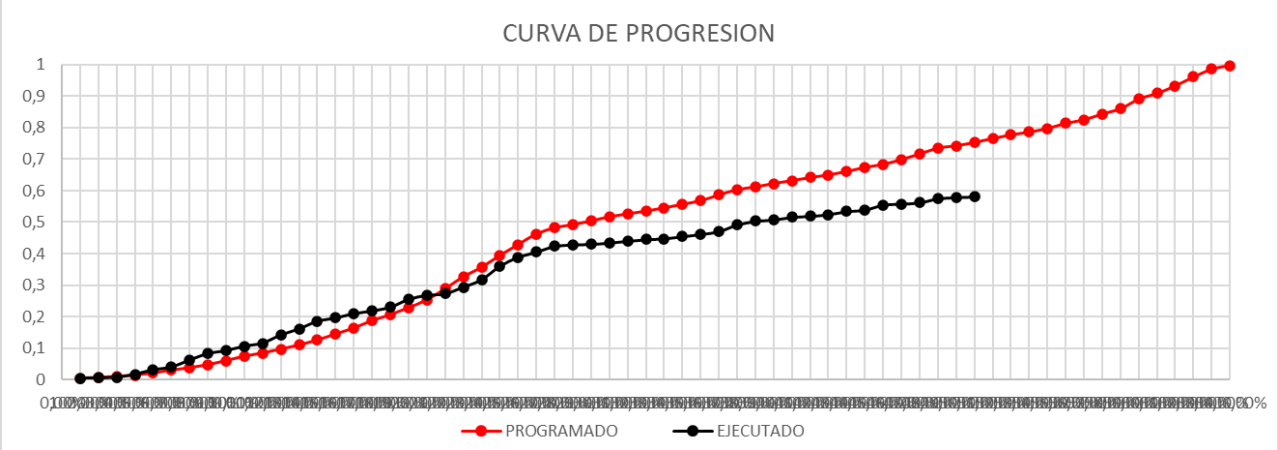

En el costado derecho del control consolidado se incluyó la sumatoria del cuadro de avance físico de obra en la semana y avance acumulado del mes, por cada ítem programado y ejecutado, estableciendo el cumplimiento de ejecución en avance o atraso. (Se pueden observar alertas en color naranja por cada ítem y sumatoria total de atraso).

Finalmente se presenta esquema de curva de progresión de las actividades del mes programadas y ejecutadas.

Las anteriores figuras son ilustrativas, el control de presupuesto se presenta en el anexo 5

DESVIACIONES

Es importante anotar que se estableció un cuadro en el costado derecho del control de programación por cada regional.

El cual indica la desviación en lo programado, ejecutado y cumplimiento, en color naranja.

Nº	Capitulos	POR CANTIDADES DE OBRA FISICO EJECUTADO						
		Porcentaje (%) del presupuesto	Programado semana	Ejecutado semana	Desv.	Programado acumulado	Ejecutado acumulado	Desv.
1	1. CONSOLIDADO REGIONAL CENTRAL	39,45%	0,60%	0,04%	-0,56%	31,07%	23,45%	-7,61%
2	2. CONSOLIDADO REGIONAL OCCIDENTE	19,05%	0,14%	0,06%	-0,08%	11,17%	9,92%	-1,25%
3	3. CONSOLIDADO REGIONAL NORTE	8,41%	0,19%	0,06%	-0,13%	7,25%	6,66%	-0,59%
4	4. CONSOLIDADO REGIONAL ORIENTE	9,95%	0,05%	0,02%	-0,03%	9,71%	5,67%	-4,04%
5	5. CONSOLIDADO REGIONAL NOROESTE	12,78%	0,07%	0,03%	-0,04%	6,15%	4,51%	-1,63%
6	6. CONSOLIDADO REGIONAL VIEJO CALDAS	10,36%	0,02%	0,01%	0,00%	9,97%	7,94%	-2,03%
		100,00%	**1,07%**	**0,22%**	**-0,85%**	**75,32%**	**58,16%**	**-17,15%**

AVANCE SEGÚN PROGRAMA DE OBRA.

Avance según programa de obra, mostrándonos el avance por cada frente en la semana de ejecución y el acumulado total, ilustrándonos sobre el comportamiento de la ejecución del contrato de obra.

A continuación, se presentan los avances de programa de obra, del mes 12 de la semana 46 a la 50 correspondientes al presente informe.

MES 12 DE EJECUCION DE FASE 2. Para el mes 12 de ejecución de la Fase 2, se reportan actividades del 1 al 31 de mayo de 2026, en consolidado de las regionales. Para observar en detalle los avances, por favor consultar los anexos reportados por cada regional.

MES 12 DE EJECUCION DE ETAPA II. Para el mes 12 de ejecución de la segunda etapa, se reportan actividades programadas del 1 al 31 de mayo de 2026, ofreciendo un programado al 31 de mayo de 2026 del 75,32 % programado vs 58,16% ejecutado, con una desviación negativa del -17,15%, en consecuencia, a que se han tenido dificultades en los algunos ERONES para su inicio de actividades en algunos casos, evaluación, aprobación de propuestas de diseños, cambios de algunos alcances por parte de la dirección de algunos establecimientos, horarios disponibles de trabajo dentro de los establecimientos y en otras el contratista no cumple con los inicios y/o entregas oportunas establecidas en los cronogramas avalados, bajo personal de mano de obra en los erones, entre otras .

ANEXOS DOCUMENTALES AL PRESENTE INFORME

Los soportes de la anterior información se presentan en el anexo 5, con corte al 31 de mayo de 2026, los cuales enunciamos a continuación: (Cada alcance de cada frente contiene: presupuesto, programación, consolidado y control avance.

6. ESTABLECIMIENTOS EN EJECUCION

ESTABLECIMIENTOS REGIONAL CENTRAL

COMEB BOGOTÁ (PICOTA)

Fecha de inicio: 26 de junio del 2025

Fecha de terminación: 31 de agosto del 2026

Presupuesto: $ 3.963.947.142

Alcances aprobados:

ALCANCE N°1: Hallazgo 1 2023-1 Obras complementarias en reparaciones generales de membranas y tanques subterráneos, y mantenimientos preventivos y correctivos de motobombas en las tres estructuras.

ALCANCE N° 2: - Complementación, modificación red de asbesto cemento por red 6" PVC de acometida principal (800 m) para Estruct. 1 y 2.

ALCANCE N°3 Adecuaciones generales de las redes verticales Hidrosanitarias a fachada en la estructura tres.

ALCANCE N°4 Iluminación perimetral y Guayana interna nueva malla de seguridad, junto con dos garitas (NyS) sobre troncales caracas.

Actividades desarrolladas:

ALCANCE N°1: Obras complementarias, membranas, tanques y motobombas.

Estado: En proceso de subsanación y ejecución de acabados.

Continuando con la subsanación de hallazgos, durante esta quincena se obtuvo el permiso de acceso al pabellón de máxima seguridad, lo que permitió avanzar en la instalación de las nuevas tapas y la reparación de los cuellos de las estructuras en el Tanque 6, continuando el recorrido de control en los tanques 7, 8 y 9. El contratista mantiene el compromiso de iniciar la corrección de los espesores y deficiencias de adherencia de la poliurea el próximo 5 de junio de 2026. Persiste la obligación de entregar los certificados de estanqueidad y subsanar las fisuras severas en el Tanque 10.

ALCANCE N°2: Sustitución de red de acueducto (Asbesto Cemento a PVC 6").

Estado: Ejecución de obra civil y pruebas técnicas.

Tras superar las exploraciones en el sector de "La Granja", se avanzó en la instalación de la tubería de 6” de la acometida de agua potable para las Estructuras 1 y 2. Se ejecutaron actividades de mampostería, terminando el pañete de las cajas de inspección para válvulas. El lunes 25 de mayo se realizó una prueba de presión hidrostática, la cual presentó fallas en el manómetro del contratista, por lo que se ordenó su repetición. Asimismo, tras detectar baja presión en el pasillo central de la Estructura 1, se verificó el funcionamiento de la válvula de corte existente de 4” frente a la Garita 11.

La Supervisión aprobó el cambio de dicho registro de 4” en la Garita 11 junto con la construcción de su caja, e instruyó colocar las mismas tapas de especificación de tanques en las cajas de inspección de la red de 6”.

.ALCANCE N°3: Redes verticales y Sello de Vanos (Estructura 3).

Estado: Condición de criticidad técnica y control de calidad.

Este frente concentra la mayor rigurosidad de control debido a los fallos de resistencia detectados en los sellos de vanos (especificación de 4000 PSI). Durante este período, el contratista radicó el oficio CE-CGMC-256–2196, objetando los resultados de los núcleos extraídos por el consorcio Beta Regionales.

Esta Interventoría se mantiene firme en que el muestreo aleatorio inicial sirvió como un diagnóstico macro estadístico que evidenció deficiencias sistemáticas en la mezcla, ya que ningún resultado se aproximó a la resistencia exigida.

Con el fin de blindar el proceso y verificar puntualmente lo exigido por la norma, se programó para la primera semana de junio una nueva extracción de núcleos concentrados en un solo vano. Asimismo, en comité con la entidad, se realizó un recorrido de inspección en el Edificio E (Pabellones 32 y 30) y Edificio C (Pabellón 25) para verificar las celdas reportadas con discontinuidades y se ordenó verificar, con base en las actas de recorrido, qué vanos deberán ser demolidos y vueltos a fundir por cuenta del contratista.

ALCANCE N°4: Iluminación perimetral, guayana y garitas.

Siguiendo la estrategia de aseguramiento de la infraestructura, este alcance continúa supeditado a la estabilización de los vanos en la Estructura 3. Hasta el momento no presenta asignación de recursos, lo cual imposibilita su ejecución.

Registro Fotográfico.









Recorrido verificación tapas tanques.













Cajas de inspección pañetadas

CPMS BOGOTÁ MODELO

Fecha de inicio: 14 de julio del 2025

Fecha de terminación: 31 de agosto del 2026

Presupuesto: $ 2.437.410.887,00

Alcances aprobados:

ALCANCE No. 1 Hallazgo 29 de 2023-1 impermeabilización cubiertas, humedad, filtración, perdida de baldosas entre otros.

ALCANCE No. 2 Modernización área de puerta de información, implementación zona de riesgo y control para el personal externo y puesto de servicio de guardia.

Actividades desarrolladas:

ALCANCE N°1: Impermeabilización de cubiertas Sanidad y Garita #1.

Estado: En fase de terminación, acabados y corrección de elementos de fachada.

Componente de Carpintería Aluminios y Rejas: Durante esta quincena, el recurso humano en sitio (conformado principalmente por 1 oficial y 2 ayudantes) concentró sus esfuerzos en frentes de carpintería metálica. Se ejecutó la instalación del ítem **NP-119** (Suministro e instalación de ventanería en aluminio, con una altura de h=0.48m, incorporando 0.10m de celosía y policarbonato blanco de 6mm con filtro UV). Esta especificación técnica fue previamente aprobada para optimizar la iluminación natural hacia el interior y, simultáneamente, disimular de manera estética la visual de la tubería interna sobre la placa, apoyada en los soportes de platina de 57 cm aprobados para descolgar redes eléctricas y de sistemas cada 2.00 metros.

Mantenimiento y Protección de Rejas Existentes: Se avanzó en la ejecución del ítem **NP-116** (Mantenimiento en sitio de ventanas de rejas, h=48 cm), ejecutando actividades de lijado mecánico y manual, remoción de óxido, retiro de ventanería antigua en mal estado, y aplicación de las capas de pintura anticorrosiva y esmalte de acabado en las caras exteriores.

Gestión Ambiental y Limpieza (RCD): Con el apoyo coordinado de personal PPL (Personas Privadas de la Libertad), se mitigó un riesgo ambiental crítico mediante la clasificación, segregación en la fuente y posterior evacuación de escombros no convencionales (mezclas de vidrio, láminas de asbesto-cemento y plásticos) que presentaban un acopio peligroso superior a los tres meses en el penal. El control documental del peso y volumen se validará bajo el ítem 1.4.1 mediante certificados de báscula autorizada.

Respecto a la intervención en la placa de cubierta de la zona contra la Garita #1, esta Interventoría precisa que se encuentra en total control estricto de recursos. Lo anterior, debido a que la

Interventoría ya notificó formalmente a la entidad que el proyecto se encuentra en saldo en rojo con un déficit estructurado alrededor de 850 millones de pesos en el Alcance N.° 2.

En concordancia con la política de austeridad y control presupuestal que defiende esta interventoría, no se autorizará el inicio de actividades adicionales ni complementarias en el Alcance 1 (incluyendo la Garita #1). Permitir la apertura de nuevos frentes de trabajo implicaría consumir de manera irresponsable los pocos recursos disponibles, incrementando la desviación financiera global del contrato. Esta postura busca salvaguardar el techo financiero ante la USPEC y evitar que el saldo en contra siga aumentando, línea de control que está plenamente alineada con las directrices del profesional de control y presupuesto en la revisión de los avances, razón por la cual se reitera el llamado a la Supervisión de no avalar más intervenciones que agudicen el déficit actual, a menos que se estipule el valor a consumir y se sume a la posible adición que se tramite.

ALCANCE N°2: Modernización Puerta de Información y Zona de Control.

Estado Contractual: Suspendido formalmente debido a inviabilidad financiera y falta de recursos.

Análisis del Déficit Económico: Este alcance se encuentra paralizado debido a un déficit financiero estructurado aproximado de **$850.000.000,00** para poder ejecutar el 100% de los diseños civiles y de seguridad diseñados y aprobados. Las razones técnicas del sobrecosto, expuestas en mesa técnica conjunta por la Interventoría y el Constructor el pasado 29 de abril de 2026, radican en las altas especificaciones de seguridad blindada (Nivel 3 y Nivel 5) requeridas para la carpintería metálica del portón (cuyo capítulo exclusivo asciende a 487 millones de pesos) y en la necesidad de implementar cimentaciones profundas debido a las condiciones de capacidad portante del suelo.

Trazabilidad:

- **Directriz de la USPEC (Oficio E-2026-00582):** La entidad ratificó formalmente que, bajo los principios de la contratación pública y por restricciones presupuestales vigentes de la Dirección de Infraestructura, no es viable realizar adiciones de recursos ni ampliaciones de alcance monetario para este frente. En consecuencia, ordenó al contratista reformular el proyecto y presentar una propuesta técnica y económica estructurada de manera estricta por etapas o fases funcionales. La primera fase debe garantizar una solución completamente operativa y utilizable con los saldos y recursos disponibles actuales del contrato de obra.
- **Acción de la Interventoría (Oficio USPEC-BETAREGIONALES-2623 del 04 de junio de 2026):** En estricto cumplimiento de la orden de la Supervisión, se le otorgó un plazo perentorio de cinco (5) días hábiles al contratista de obra para que radique ante esta

Interventoría la reformulación por fases del Portón de Ingreso, incluyendo las cantidades de obra ajustadas, precios, cronogramas específicos, análisis de impacto presupuestal y la justificación técnica donde se delimite con total precisión cuáles actividades y componentes físicos quedarán excluidos por insuficiencia financiera. Mientras se entrega y evalúa esta reingeniería, los tiempos de este frente continúan formalmente suspendidos.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SUPERVISIÓN

El pasado 29 de mayo de 2026, el profesional de apoyo a la supervisión de la USPEC, Ing. Leonardo Cabrales, realizó una visita de inspección en conjunto con el personal técnico del contratista y, mediante anotación en bitácora de obra, autorizó de manera directa y unilateral la fabricación y mantenimiento de ventanería adicional para el pasillo 2, la Oficina de Comando, el Comando de Vigilancia y la Sala de Audiencias Virtuales (modificando las cantidades del ítem NP-119 e instruyendo la fabricación de una ventana especial de 2.00 metros). Asimismo, el funcionario de la entidad autorizó la aplicación de esmalte en el interior de las rejas, liberando deliberadamente al contratista de la obligación técnica de aplicar la capa base de pintura anticorrosiva.

Posición y Cese de Responsabilidad de la Interventoría: Mediante el oficio USPEC-BETAREGIONALES-2623 (04 de junio de 2026), esta Interventoría NO dio el aval técnico ni financiero a estas obras adicionales, argumentando que incrementan severamente el déficit presupuestal y alteran el equilibrio del contrato sin un análisis de impacto económico previo. Aunque la USPEC respaldó formalmente a su funcionario a través del oficio No. 6034 (05 de junio de 2026) aduciendo "facultades propias de supervisión ante necesidades de campo", esta Interventoría deja constancia oficial de que cesa su responsabilidad civil, técnica y contractual sobre dichas áreas intervenidas. No se convalidará un proceso constructivo donde se omitan elementos normativos de protección contra la corrosión (anticorrosivo) y que modifiquen los ítems contractuales sin el consentimiento de este equipo de control. (Se aclara que la no asistencia física del residente de interventoría a dicha visita obedeció a una incapacidad médica por un cuadro viral severo).

Registro Fotográfico.

Estado actual de alcance #1	
	
Instalación de ventanería actividad NP-119	
	
Instalación de ventanería actividad NP-119	**Mantenimiento y retiro de ventanería actividad NP-116**

	
Mantenimiento y retiro de ventanería actividad NP-116	





Espacio audiencias virtuales donde se solicitó la instalación de la ventanería

RM PAS ERE BOGOTÁ (BUEN PASTOR)

Fecha de inicio: 27 de abril del 2026

Fecha de terminación: 31 de agosto del 2026.

Presupuesto: $1.068.549.121

Alcance aprobado:

ALCANCE 5 Mantenimiento Rancho

Estado Contractual: Ejecución de obra civil (Fase de demoliciones, mampostería e instalaciones hidrosanitarias iniciales).

Demoliciones y Desmontes: Continuando con la liberación de áreas, el personal en sitio (conformado por 1 maestro, 3 oficiales y 3 ayudantes) ejecutó los ítems 1.3.8.6 y 1.3.8.7 (Demolición manual de enchapes y acabados de muros de tipo liviano cerámico y arcilla, incluyendo su correspondiente pega en zonas donde el muro de soporte estructural se conserva). Asimismo, se avanzó en el ítem 1.3.8.8, realizando la demolición manual de pañetes en franjas lineales menores o iguales a 50 cm, con el respectivo raspado y limpieza hasta descubrir el material original de muros, vigas y columnas.

Mampostería y Confinamiento Estructural: Se inició la construcción de muros divisorios bajo el ítem 5.2.4 (Muros en bloque hueco de arcilla No. 5 de 33x11.5x23 cm, superficie estriada), incorporando piezas de arcilla para dovelado vertical cada 1.36 m para asegurar el confinamiento. Para el reforzamiento y confinamiento de vanos de ventanas, rejas y puertas, se avanzó en el ítem 5.4.5 (Columnetas en concreto a la vista f'c=3000 PSI de 0.12 x 0.20 m utilizando formaletas) y el ítem 5.5.6 (Corte, figurado y fijación de acero de refuerzo de 60.000 PSI - 420 MPa). Adicionalmente, se aplicó el ítem 13.1.8 correspondiente al pañete liso común 1:3 con un espesor de e=4 cm, incluyendo la definición de filos y dilataciones.

Nivelación y Alturas: El pasado 2 de junio se realizó una comisión topográfica conjunta entre los residentes de obra e interventoría para tomar alturas entre la placa de cubierta y el piso a ras de demolición. Se determinaron alturas variables que oscilan entre 2.51 m y 2.60 m. Estos datos son críticos para definir los niveles de la placa de contrapiso, excavaciones, rellenos y el tendido de las redes sanitarias subterráneas que están próximas a iniciar.

Programación de la Siguiente Quincena (Oficio CE-CGMC-256-2229): Con la entrega de la reprogramación por parte del contratista el 4 de junio, se tienen programadas las demoliciones manuales de pañetes restantes (ítems 1.3.8.7 y 1.3.8.8), la construcción de obras hidráulicas mayores como la Caja de inspección en mampostería de 120x120x200 cm (ítem 3.2.7.12) y la Caja para Trampa de Grasas de 1.70x1.00x1.50 m (ítem 3.2.7.13), la cual contempla pañete liso impermeabilizado interno 1:4. Asimismo, se programó el tendido de redes de acueducto en alturas mayores a 10.00 m en diámetros de 1/2", 3/4", 1" y 1 1/2" en PVC RDE 13.5 y 21, junto con tuberías sanitarias de 2", 3" y 4" en PVC-S para alturas de hasta 10.00 m.

Exclusión de Equipos Especiales: En estricto cumplimiento del oficio USPEC-BETAREGIONALES-2623 (4 de junio de 2026), esta Interventoría ratificó al contratista que el techo financiero asignado para el Buen Pastor es inmodificable. En consecuencia, se formalizó la exclusión definitiva de todos los componentes asociados a cuartos fríos, cocinas industriales, campanas extractoras y equipos especializados. Los recursos disponibles deben concentrarse única y exclusivamente en obras civiles básicas que garanticen la funcionalidad habitable del espacio intervenido, evitando reprocesos derivados de la falta de coordinación con proveedores de equipos.

Debido al impacto económico que representan ítems de alta gama como los pisos en tecnología Ucrete, la Interventoría consideró urgente citar al contratista a una mesa técnica virtual para concertar los acabados finales de piso. Esto permitirá definir el nivel definitivo de la placa de contrapiso, excavaciones y rellenos sin poner en riesgo el balance económico del proyecto.

EXIGENCIAS DE SEGURIDAD Y CALIDAD:

Apuntalamiento de Placa Superior: Al haberse ejecutado el 100% de las demoliciones de los muros divisorios internos, esta Interventoría emitió una alerta de riesgo estructural y requirió al contratista reforzar de manera inmediata el apuntalamiento de la placa superior para mitigar las vibraciones. Se deja constancia de que el constructor ha hecho caso omiso a esta recomendación técnica, por lo que la Interventoría no asumirá responsabilidades ante un eventual siniestro o falla estructural de la placa vieja.

Diseño de Mezclas Pendiente: Habiéndose iniciado la fundición de elementos estructurales de confinamiento (columnetas y dovelas), se le exigió formalmente al contratista la entrega inmediata del diseño de mezclas de concreto para 3000 PSI. A la fecha de cierre de este informe, el documento no ha sido radicado.

GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL:

Memorando USPEC I-2026-002373 (Dirección de Logística): Se reporta la articulación institucional derivada de los hallazgos de la Contraloría General de la República (CGR-OCI. 2025C1068). Logística solicitó a Infraestructura detallar el alcance, cronograma y especificaciones técnicas para no afectar la inocuidad alimentaria del penal. En la inspección se evidenció la necesidad de evaluar filtraciones en el techo, capacidad de la red de gas, ventilación por extractores, control de plagas y adecuación de pendientes de pisos.

Respuesta de la Interventoría (Oficios USPEC-BETAREGIONALES-2628 y 2629 del 5 de junio de 2026): Esta dirección realizó el traslado perentorio al contratista otorgándole 2 días para radicar los soportes documentales de estos 8 puntos para la mesa técnica interinstitucional programada para el 10 de junio de 2026. Con respecto a las humedades del techo, se le ordenó al constructor suministrar los equipos de seguridad en alturas para subir y verificar conjuntamente la cubierta, actividad que sigue frenada por negligencia del contratista.

ASPECTOS AMBIENTALES Y MANEJO DE RESIDUOS (RCD):

De acuerdo con las directrices ambientales del oficio *CBR-2623*, y ante la falta de una autorización escrita y firmada por la USPEC que permita mantener los escombros dentro del establecimiento, se le exigió al constructor el retiro inmediato de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD).

Registro Fotográfico

<table>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td colspan="2">Picada de pañete existente, para colocar nuevo</td></tr>
</table>

	
Hechura de muro en bloque y pañete contra lindero bodega de panadería	Panorámica rancho
	
Raspado de pintura sobre superficie pañetada	Inicio raspado de pintura techo
	
Demolición de enchape existente	Red sanitaria existente baterías de baños, la cual será retirada

	
Acopio de escombros, para posterior colocación en calle destapada dispuesta y autorizada por el establecimiento	Acopio de elementos desmontados, los cuales ya se le solicito al Contratista entregarlos en el sitio acordado con el Establecimiento.

	
Retiro y disposición de escombros desde frente rancho hasta vía cuarto de basuras, autorizada por el Establecimiento Penitenciario.	

EPMSC GUATEQUE

Fecha de inicio: 13 de enero del 2026

Fecha de terminación: 3 de Junio 2026

Presupuesto: $110.342.163

Alcances aprobados:

Alcance #1: Mantenimiento de la red eléctrica en la parte interna, celdas, talleres.

Alcance #2: Mantenimiento baterías sanitarias en la parte interna áreas comunes.

Alcance #3: Instalación campana extractora en el rancho.

Actividades desarrolladas:

Estado Contractual: Finalizado en campo / En etapa de conciliación de cantidades finales.

ALCANCE N.° 1: Mantenimiento de la Red Eléctrica Interna (Celdas, Talleres y Pasillos)

Estado Contractual: Finalizado en campo / En etapa de conciliación de cantidades finales.

Desarrollo de Actividades y Control de Cierre: Durante este período se consolidó la ejecución física de las actividades eléctricas replanteadas de acuerdo con el nuevo balance de obra concertado con la Dirección del Establecimiento. Se culminó la disposición, distribución e instalación de las luminarias y los nuevos puntos eléctricos en las áreas internas, celdas y talleres de reclusión.

El equipo técnico de la Interventoría realizó el seguimiento al ingreso de los materiales e insumos reportados y validó la funcionalidad de las redes. No obstante, el recibo definitivo queda supeditado a la entrega de las cantidades reales ejecutadas (*As-Built*), debido a las inconsistencias detectadas en los informes de medición.

ALCANCE N.° 2: Mantenimiento de Baterías Sanitarias (Áreas Comunes)

Estado Contractual: Finalizado en campo / En etapa de conciliación y verificación de planos.

Desarrollo de Actividades y Control de Cierre: Se completaron los trabajos civiles en las baterías sanitarias de las áreas comunes. Posterior a los llamados de atención y demoras logísticas derivadas de la fabricación de la carpintería metálica en la ciudad de Bogotá (debido a la falta de acuerdos económicos con los ornamentadores locales de Guateque), el contratista realizó el traslado, instalación y ajuste de la totalidad de las puertas metálicas para los módulos de los baños.

Las obras fueron dadas por concluidas físicamente por el constructor en la fecha límite del contrato. Sin embargo, se mantiene bajo observación la validación técnica de los acabados e instalaciones hidráulicas conexas hasta que se resuelva la planimetría de soporte.

ALCANCE N.° 3: Instalación de Campana Extractora (Rancho)

Estado Contractual: Excluido definitivamente del contrato.

Justificación Técnico-Financiera: Con el fin de optimizar el presupuesto asignado al establecimiento ($110.342.163) y atender las necesidades críticas prioritarias de las redes

eléctricas y sanitarias del penal, este alcance fue retirado formalmente y sus recursos fueron redireccionados mediante balance de obra hacia los Alcances 1 y 2.

Registro fotográfico









AMAZONAS LETICIA

Alcances a ejecutar:

ALCANCE N°1: Mantenimiento y reparación del área de rancho

Programación: Inicio 12 de septiembre de 2025 Final: 30 de noviembre de 2025

Recurso asignado: $ 134,646,686.00

Se culminaron satisfactoriamente las actividades de obra priorizadas en el informe diagnóstico, ejecutadas de conformidad con las especificaciones técnicas contractuales, y que, una vez verificadas, se encuentran en óptimas condiciones de funcionamiento y uso

Estado: Terminado, pendiente por la entrega y recibo de USPEC.

ESTABLECIMIENTO EPMSC MONIQUIRÁ

Alcances a ejecutar:
ALCANCE No.1: Mantenimiento y remodelación área de caniles, área de descanso de los semovientes caninos y adecuación de la caja de desagüe a la PTAR. (por requerimiento de la secretaría de salud departamental).

ALCANCE No.: 2 Mantenimiento y adecuación de los alojamientos del cuerpo de custodia y auxiliares.

Programación: Inicio 04 de julio de 2025 Final: 20/03/26
Recurso asignado: $ 155,292,942
Estado: En ejecución.

Se ejecutaron las actividades correspondientes a la aplicación de pañetes en muros, tanto en superficies interiores como exteriores del proyecto.

Se realizaron actividades de instalaciones eléctricas de luminarias y tomacorrientes.

culminó la instalación de la estructura soporte de cubierta y retomó las actividades correspondientes a los acabados generales en las instalaciones del alojamiento intervenido. No obstante, la interventoría deja constancia del bajo rendimiento observado en la ejecución de las actividades pendientes, situación que continúa impactando el ritmo esperado de avance de obra.

A la fecha presentación del presente informe, se encuentran en ejecución las actividades relacionadas con la instalación de enchapes en las áreas de baño y la conformación de elementos de mampostería a nivel de cubierta, correspondientes a la construcción de cuchillas laterales y calados faltantes. Se recomienda al contratista fortalecer la programación y asignación de recursos para garantizar el cumplimiento de los compromisos contractuales y la recuperación de los rendimientos requeridos para la culminación de las obras.

Registro Fotográfico.





Instalaciones de redes eléctricas y regatas de muro.



Instalación de enchapes de baño.

EPMS RAMIRIQUÍ

Alcances a ejecutar:

ALCANCE No.1 Tutela 2021 -05 fallo juzgado penal del circuito de Ramiriquí de fecha 25 de febrero de 2021 refuerzo de muro perimetral, dotación planta eléctrica y cuarto eléctrico, campana extractora área de rancho.

ALCANCE No.2 Revisión y mantenimiento de red eléctrica, cambio de bombillos y reflectores perimetrales e internos 20 reflectores de 100 w luz led.

ALCANCE 3: Mantenimiento de pintura en área de sanidad por humedad. Se realiza acta de reconocimiento y recibo de espacios para la intervención del objeto contractual en compañía del director del Establecimiento, constructor e Interventoría

Programación: Inicio 07 de julio de 2025 Final: 5/02/26

Recurso asignado: $ 137.324.642.00

Actividades ejecutadas en el periodo del informe:

Durante el periodo las actividades de obras de los alcances contractuales fueron ejecutados a satisfacción.

Registro Fotográfico.



Instalación de reflectores exteriores.

ESTABLECIMIENTO EPMSC RM JP SOGAMOSO

Alcances a ejecutar:

Alcance 1: estructura losa de entrepiso cafetería
Alcance 2: Pabellón de maternas y CDI ER

Programación: Inicio 22 de septiembre de 2025 Final: 15/05/26

Recurso asignado: $ 379,696,386.00

Novedades en el periodo del informe:

En el periodo reportado, se adelantó de manera conjunta entre la interventoría y el contratista de obra el levantamiento de cantidades de obra y la priorización de actividades, en atención a las directrices impartidas por la Subdirección del establecimiento, debidamente delegada por la Dirección del mismo.

Se iniciaron actividades de Demolición manual de alistado de piso, demoliciones de placa entre piso.

Conformación de andamios entrepisos para inicio de actividades de reforzamiento y fundida de vigas y columnas.

Registro fotográfico.





ESTABLECIMIENTO EPAMS CAS CÓMBITA

Programación: Inicio 06 de agosto de 2025 Final: 15 de mayo de 2026

Alcance no. 1: hallazgo 36 de 2021-1 continuación construcción alojamiento de rancheros estructura 2.

Alcance 2: tutela 2020-00162. iniciación de la construcción de centros de acopio (shut de basuras) de residuos sólidos del rancho y pabellones rancheros estructura 2.

Alcance 3: mantenimiento de las áreas de sanidad de las dos estructuras para atender observaciones de los entes de control.


Alcance no. 5: homogenización eléctrica de pabellones (taponamiento de las lámparas en celdas por cuestión de seguridad).

Presupuesto: $ 2,489,215,150.00

Actividades ejecutadas en el periodo.

Mantenimiento general correctivo de la estructura metálica existente de cubierta, contemplando el tratamiento a la totalidad de los elementos que componen las cerchas y las correas.
Levante de mampostería de área de rancho.
Suministro e instalación de acero para dovelas y columnetas.

Registro fotográfico.

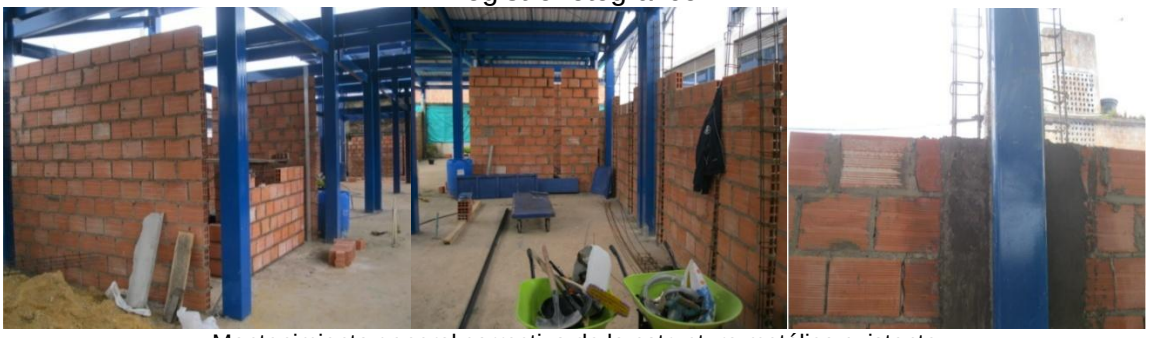

Mantenimiento general correctivo de la estructura metálica existente

ESTABLECIMIENTO EPMSC PAZ DE ARIPORO

Alcances a ejecutar:

Alcance n°2 el cambio de los pisos de los pasillos de circulación
Alcance n°4 cambio del piso de la cancha

Programación: Inicio 15 de septiembre de 2025 Final: 15 de diciembre de 2025
Recurso asignado: $ 137,321,439.00

Novedades en el periodo del informe:

Se iniciaron actividades de obras el día 04 de noviembre de 2025.

Actividades ejecutadas en el periodo.

Estado: terminado

El contratista culminó las actividades de obra civil programadas en el establecimiento de Paz de Ariporo, ejecutando las labores conforme al alcance contractual y especificaciones técnicas establecidas.

Registro Fotográfico







Instalación de cerámica de piso área de pasillo

EPC CÁQUEZA

Alcances a ejecutar:

Alcance no.1: tanques de almacenamiento de agua potable
Alcance no.2: adecuación de celdas de patios 1 y 2

Programación: Inicio 17 de septiembre de 2025 Final: 30 de enero de 2026

Recurso asignado: $ 71,491,358.00

Durante el período reportado, la interventoría realizó seguimiento técnico y presupuestal al trámite correspondiente al APU del ítem no previsto relacionado con el suministro e instalación del sistema de presión constante para el establecimiento de Cáqueza, efectuando la devolución formal del análisis presentado por el contratista mediante oficio de observaciones técnicas y solicitud de ajustes.
Dentro de las observaciones emitidas se solicitó al contratista la corrección de los costos asociados a mano de obra y acometidas eléctricas, el ajuste de rendimientos conforme a los APU contractuales vigentes y la complementación del alcance técnico del ítem, incluyendo todos los elementos requeridos para la correcta instalación, pruebas y puesta en funcionamiento del sistema.

No obstante, a la fecha de cierre del presente informe mensual, el contratista de obra no ha remitido respuesta formal ni presentado el APU corregido conforme a las observaciones emitidas por esta interventoría, situación que mantiene pendiente la revisión definitiva y la emisión del respectivo concepto técnico y presupuestal

ESTABLECIMIENTO EPMSC VILLETA

Alcances a ejecutar:
Alcance no.1: Cambio de unidades sanitarias para el personal de PPL zonas comunes y en celdas.
Alcance no.2: acondicionar la guardia interna para separar los funcionarios de los PPL, y adecuación de un baño
Programación: Inicio 10 de octubre de 2025 Final: 20 de enero de 2026
Recurso asignado: $ 45,618,824.00

Durante el período reportado se ejecutaron actividades de adecuación y mejoramiento de infraestructura en el establecimiento penitenciario de Villeta, contemplando labores preliminares, obras civiles, hidrosanitarias, eléctricas y acabados arquitectónicos.

Las actividades desarrolladas incluyeron desmontes y demoliciones de elementos metálicos, cielos rasos, pañetes, pisos y placas de contrapiso existentes, con el correspondiente cargue, retiro y disposición final de escombros conforme a la normatividad ambiental aplicable.

En el componente estructural y arquitectónico se ejecutaron actividades de construcción y reforzamiento de muros en mampostería, instalación de acero de refuerzo, construcción de columnetas, viguetas y vigas de confinamiento en concreto, así como instalación de cielo raso en PVC, cornisas, pañetes impermeabilizados, alistados de piso y enchapes en muros y pisos.

En el componente hidrosanitario se realizó la instalación de redes hidráulicas y sanitarias en tubería PVC/PVCP, puntos hidráulicos y sanitarios para aparatos, regatas y resanes, así como suministro e instalación de aparatos sanitarios, lavamanos y griferías, garantizando su correcta conexión y funcionamiento.

Respecto al componente eléctrico, se ejecutó el suministro e instalación de tuberías, redes eléctricas, salidas para tomacorrientes, tomacorrientes tipo GFCI y luminarias LED, incluyendo accesorios, canalizaciones y elementos necesarios para su adecuada operación.

Adicionalmente, se efectuó la instalación de elementos metálicos y de carpintería arquitectónica, incluyendo ventanas en aluminio anodizado y puertas metálicas de seguridad, junto con actividades de acabados finales mediante aplicación de pintura epóxica aséptica en áreas intervenidas.

Las actividades fueron ejecutadas conforme a las necesidades identificadas en el establecimiento, orientadas al mejoramiento funcional, sanitario, eléctrico y de seguridad de las áreas intervenidas.

Registro Fotográfico.



Demolición manual de placa de contrapiso, construcción de columnas y vigas.

ESTABLECIMIENTO EPMSC GRANADA

Alcances a ejecutar:

Alcance n° 2. concertinas para reforzar la seguridad perimetral e interna.

Alcance no.3. El cambio de tomas, interruptores, e iluminación del establecimiento.

Programación: Inicio 15 de septiembre de 2025 Final: 05 de febrero de 2026
Recurso asignado: $ 137,358,766.00

Se continúan actividades de desmonte de la concertina existe en el establecimiento.

10.2.2.5 Suministro e instalación de red eléctrica trenzada 3x12. 1x12 (fase roja, fase azul, o fase amarilla) + 1Nx12 (Blanco)+ 1Tx12(verde), con aislamiento LS-HFFR, para uso en salidas en Suministro e instalación de redes reguladas, normales y de iluminación en oficina.

Se ejecuta esta actividad en e patio 1, esta parcial va por la coraza de ¾" instalada y la cual deriva a las celdas.

10.2.1.32 Suministro e instalación de coraza PVC flexible de ¾.

Registro fotográfico.







Trabajos de instalación de coraza ¾ a celdas patio 1

EPC GUAMO

Alcances a ejecutar:

Alcance 2: Reposición e instalación de reflectores, reposición e instalación de luminarias, reposición y/o mantenimiento ventiladores de techo dependencias.

Programación: Inicio 01 de septiembre de 2025 Final: 15 de diciembre de 2025.
Recurso asignado: $ 95,930,416.19

Novedades en el periodo del informe:

Estado: terminado

Se culminaron satisfactoriamente las actividades de obra priorizadas en el informe diagnóstico, ejecutadas de conformidad con las especificaciones técnicas contractuales, y que, una vez verificadas, se encuentran en óptimas condiciones de funcionamiento y uso

Registro Fotográfico.



Instalación de luminarias herméticas led 2*18w

Establecimiento EPC YOPAL.

alcances contractuales:

Alcance°1 tutela 2022-00137. solicita garantizar el servicio sanitario de manera adecuada
Alcance n°2 mantenimiento correctivo de la tubería hidráulica e hidrosanitaria de todo el establecimiento. ya que se encuentra cristalizada por exposición uv por la intemperie.
Alcance n°3mantenimiento a cajas de desagüe de aguas sanitarias y aguas lluvias
Alcance n°4instalación de concertinas en mallas perimetrales del establecimiento

Alcances aprobados:
Alcance n°1 tutela 2022-00137. solicita garantizar el servicio sanitario de manera adecuada
Alcance n°2 mantenimiento correctivo de la tubería hidráulica e hidrosanitaria de todo el establecimiento. ya que se encuentra cristalizada por exposición UV por la intemperie.

Fecha de inicio: 09 de febrero del 2026
Fecha de terminación en el eron: 20 de marzo del 2025
Recurso asignado al eron o inversión en el eron: $ 424.535.284

Actividades ejecutadas en el periodo:

Orinal antivandálico tipo corrido en acero inoxidable
Se ejecutó la instalación de orinal antivandálico tipo corrido en acero inoxidable SAE 304 calibre 18, con una longitud de 2,00 m, fijado mediante pernos pasantes, equivalente o superior en calidad al tipo especificado.

La actividad incluyó el suministro del elemento, perforaciones para fijación, anclajes y su respectivo montaje.

Se precisa que este ítem no contempla el suministro ni la instalación de grifería (válvula o sistema tipo push), ni la ejecución de puntos hidrosanitarios.
La cantidad ejecutada corresponde a unidades instaladas en el Pabellón 3.

Grifería válvula antivandálica de alta descarga (fluxómetro) para ducha
Se realizó la instalación de grifería antivandálica de alta descarga tipo fluxómetro para ducha, con sistema de accionamiento mediante botón tipo push empotrado en muro, para suministro de agua fría.

El sistema instalado corresponde a elementos metálicos cromados, incluyendo válvula en bronce, botón de accionamiento, escudo, regadera y accesorios requeridos para su correcto funcionamiento.

La actividad incluyó la ejecución de regatas, resanes, instalación de accesorios hidráulicos desde la acometida hasta la conexión final con la regadera, así como las pruebas de funcionamiento correspondientes.

Las cantidades ejecutadas corresponden a instalaciones realizadas en el Pabellón 7 – segundo piso.

Grifería antivandálica para orinal
Se continuaron actividades de suministro e instalación de elementos de grifería antivandálica en los puntos definidos en planos, no incluidos dentro del suministro de los aparatos sanitarios.

Registro fotográfico.




Demoliciones de puntos sanitarios





Suministro e instalación de sanitarios y lavamanos antivandálicos

EPMSC CHOCONTÁ.

Alcances contractuales:

Presupuesto: $75.537.121

Alcance no.1: Se requiere arreglo y mantenimiento de la tubería de los tanques de abastecimiento de agua para cada una de las celdas de los PPL ya que actualmente tan solo están en funcionamiento 02 tanques de 4 que se encuentran instalados en la terraza de la estructura.
Alcance no.2: Cambio e instalación de 02 tanques de agua para la zona de alojamientos del personal del ccv.
Alcance no.3: Intervención total del área del rancho con el fin de que sea intervenido tantos muros, pisos, puertas, rejas, mesones, trampa de grasa, acueducto, alcantarillado, y bodegas, que conforman actualmente la zona de preparación de alimentos ya que esta zona nunca ha sido intervenida y siempre se llama la atención por parte de secretaria de salud por los diferentes hallazgos en los puntos ya mencionados.

Alcances aprobados:

Alcance no.3: Intervención total del área del rancho con el fin de que sea intervenido tantos muros, pisos, puertas, rejas, mesones, trampa de grasa, acueducto, alcantarillado y bodegas, que conforman actualmente la zona de preparación de alimentos ya que esta zona nunca ha sido intervenida y siempre se llama la atención por parte de secretaria de Salud por los diferentes hallazgos en los puntos ya mencionados.

Estado: terminado.
Fecha de inicio: 04 de julio
Fecha de terminación en el eron: 25 de agosto del 2025

CPMS FACATATIVA.

Alcances contractuales:
Alcance no.1: mantenimiento de la cubierta de la estructura en la zona del auditorio y Adecuación de shut de residuos sólidos.

Alcances aprobados:
Alcance: intervención pared armadillo y respaldo pared de batería baños y ajuste de humedades

Fecha de inicio: 09 de febrero de 2025
Fecha de terminación en el eron: 25 de marzo del 2026
Recurso asignado al eron o inversión en el eron: $ 24.931.785.

Actividades ejecutadas presente periodo:

Se realizaron visita a campo para verificación de cantidades para cierre de balance.
Falta programar entrega de actividades parciales al establecimiento.

Estado: terminado.

Registro fotográfico.




EPMSC CMS FUSAGASUGA:

Alcances contractuales:
Alcance no.1: reubicación alojamiento guardia y área administrativos (incluyendo oficina Atención al ciudadano)
Alcance no.2: instalación red eléctrica general eron.

Alcances aprobados: batería de baños, alojamiento, mejoramiento del muro, pintura de fachada.

Fecha de inicio: 12 de octubre de 2025

Fecha de terminación en el eron: 12 de diciembre de 2025
Recurso asignado: $ 105.119.613
Actividades ejecutadas presente periodo:
Actividades terminadas al 100% y entregadas parcialmente el 14 de enero del 2026 al establecimiento.

EMPSC GACHETA:

Alcances contractuales:
Alcance no.1: mantén. y adecu. archivo de gestión documental.
Alcance no.2: adecuación del área de sanidad, para la atención de los ppl, para que cumpla con el mínimo de requisitos.
Alcance no.3: adecuación área administrativa
Alcance no.4: mejoramiento de la bodega de almacenamiento de materia prima del rancho.

Alcances aprobados:
Alcance modificado: intervención área de caniles y cocineta y lavadero

Fecha de inicio: 12 de octubre de 2025
Fecha de terminación en el eron: 12 de diciembre de 2025
Recursos: $ 32.683.681 + $ 6.794.352,60.

Actividades terminadas y entregadas al establecimiento y Uspec.

EPMSC UBATE:

Alcances contractuales:
Alcance no. 1: techos lavables área de sanidad
Alcance no. 2: paredes media caña área de sanidad
Alcance no. 3: adecuación y reestructuración de zona administrativa, áreas comunes, oficinas
Alcance no. 4: adecuación zona de almacenamiento talleres

Alcances aprobados:
Alcance no. 3: adecuación y reestructuración de zona administrativa, áreas comunes, oficinas

Las actividades ya están ejecutadas a un 100%, se hizo entrega parcial y se está a la espera de entregar al establecimiento de manera formal con el USPEC.

Fecha de inicio: 07 de julio de 2025
Fecha de terminación en el eron: 14 de agosto de 2025
Recursos: $69.663.991

EPMSC GIRARDOT:

alcances contractuales
alcance no.1: impermeabilización de placas de todas las estructuras del establecimiento, zona administrativa, alojamientos, zona plantas eléctricas, zona motobombas, pabellones, educativas, zona alimentación, talleres.
patios y celdas: reemplazo y/o instalación de baterías sanitarias
alcance no.2: mantenimiento y adecuación archivo de gestión documental de acuerdo a la ley 594 de 2000 art. 16, y el plan de mejoramiento archivístico

alcances aprobados: alcance no.1: impermeabilización de placas de todas las estructuras del establecimiento, zona administrativa, alojamientos, plantas eléctricas, zona motobombas, pabellones, educativas, zona alimentación, talleres

Fecha de inicio: 26 de agosto del 2025
Fecha de terminación en el eron: 15 de diciembre de 2025
Recurso asignado: $408.998.714

Actividades ejecutadas:
Las actividades fueron finalizadas a un 100% y entregadas parcialmente al establecimiento desde el 3 de octubre del 2025. esperando se programe la estrega formal con el uspec

EPC LA ESPERANZA DE GUADUAS.

Alcances contractuales
Alcance no.1: hallazgo 43 de 2022-1 suministro de agua potable. pendiente visita con el ente de control.
Alcance no.2: reposición y/o mantenimiento correctivo de redes eléctricas (incluye cableado, tuberías embebidas y expuestas) iluminación de perimetral (guayanas internas y externas).
Alcance no.3: mantenimiento y/o adecuación batería sanitaria (baños, lavamos) áreas de sanidad.

Alcance no.4: adecuación de garita por puntos ciegos entre las garitas 3 y 4, en reemplazo del retén 3 y 4

Alcances aprobados:
Alcance no 2: reposición y/o mantenimiento correctivo de redes eléctricas (incluye cableado, tuberías embebidas y expuestas) iluminación de perimetral (guayanas internas y externas).

Fecha de inicio: 01 de julio de 2025
Fecha de terminación en el eron: 15 de diciembre de 2025
Recursos asignados: $1.392.260.179.
Estado: terminado.
Actividades ejecutadas en el periodo: se terminaron las actividades de obra.

Registro fotográfico





EPMSC RM NEIVA

Alcances contractuales
Alcance no.1: hallazgo 122 de 2017-1 condiciones técnicas para visitas conyugales.
Alcance no.2: tutela 202300051. se intervendrán baterías sanitarias y lavaderos
Alcance no 3: mantenimiento de plancha de alojamientos de los pabellones 1a,1b, 2a, 2b, 3, 4 y rm.

Alcances aprobados:
Alcance 3: mantenimiento de plancha de alojamientos de los pabellones 1a,1b, 2a, 2b, 3, 4 y rm,

Fecha de inicio: 02 de julio del 2025

Fecha de terminación en el eron: 14 de noviembre de 2025

Recurso asignado: $ 743.280.495

Actividades ejecutadas en el periodo:
Actividades al 100%, se realizó la entrega final al establecimiento en compañía del supervisor de apoyo del INPEC ingeniero leonardo cabrales el día 09 de octubre del 2025.
Estado: terminado.

EPMSC GARZON.

Alcances contractuales
Alcance no.1: hallazgo 122 de 2017-condiciones técnicas para visitas conyugales
Alcance no.2: mantenimiento a la red eléctrica perimetral.

Alcances aprobados:
Alcance no .2: mantenimiento a la red eléctrica perimetral

Fecha de inicio: 15 de agosto de 2025
Fecha de terminación en el eron: 31 de octubre de 2025

Recurso asignado : $201.787.386

las actividades terminadas al 100%, se realizó la entrega final al establecimiento en compañía del supervisor de apoyo del INPEC ingeniero leonardo cabrales el día 08 de octubre del 2025.

LA PLATA.

Alcances contractuales
Alcance no.1: hallazgo 122 de 2017-1 condiciones técnica (construcción) para visitas conyugales
Alcance no.2: cambio de pisos área del rancho eliminación de aposamiento de agua, mejoramiento sistema hidráulico.

Alcances aprobados:
Alcance no.2: cambio de pisos área del rancho eliminación de pasamiento de agua, mejoramiento sistema hidráulico

Fecha de inicio en el eron: pendiente por reprogramar

Fecha de terminación en el eron: pendiente por reprogramar

Recurso asignado: $303.000.820

Actividades ejecutadas.

Se retoman actividades por parte del contratista, el día lunes 13 de abril.
se continúa con boquilla de piso tipo granito de 30x30
se realiza aseo y bote de escombros
se continúa con estuco, retocando detalles.

Registro fotográfico.





Pulida de piso área de rancho.

EPMSC PITALITO:

Alcances contractuales
Alcance no.1: hallazgo 122 de 2017-1 condiciones técnicas para visitas conyugales
Alcance no. 2: tutela 2020-00020. implementación de acciones para reducir el hacinamiento
Alcance no. 4: reposición hidrosanitarias pabellones 11 y 12
Alcance no. 5: adecuación placa de cubierta patio 6

Alcances aprobados:
Alcance no.5: adecuación placa de cubierta patio 6
Alcance no. 2: tutela 2020 00020. implementación de acciones para reducir el hacinamiento.
Alcance no. 4: reposición hidrosanitarias pabellones 11 y 12

Fecha de inicio en el eron: 07 de julio del 2025

Fecha de terminación en el eron: 09 de diciembre de 2025
Recurso asignado: $538.930.092

Actividades terminadas al 100% está pendiente entregar al establecimiento la entrega de las ultimas iluminarias por parte del contratista e interventoría.

EPMSC COLONIA PENAL DE ORIENTE – CAMIS

Alcances contractuales
Alcance: patio n°3, mantenimiento y mejoramiento patio 3 cola de pato
Valor: $ 448.767.840,00
Actividades ejecutadas: durante la semana el contratista realizo las siguientes actividades:

Actividades realizadas en zona de duchas:
Demoliciones de enchapes.
Demolición de piso para cárcamos.

Registro fotográfico




Demoliciones de enchapes y fundida de placa.

EPMSC RM VILLAVICENCIO:

Alcances contractuales
Alcance no.1: hallazgo 22 2022-1 impermeabilización ute
Alcance no.2: tutela 202100155. implementación de rampas para personas en condiciones de discapacidad.
Alcance no.3: mantenimiento y/o adecuación alojamientos ccv

Alcances aprobados:
Alcance no1: hallazgo 22 2022-1 impermeabilización ute
Alcance no.2: tutela 202100155. implementación de rampas para personas en condiciones de discapacidad.
Alcance no.3: mantenimiento y/o adecuación alojamientos ccv

programación: inicio 02 de septiembre de 2025 final: 09 de diciembre de 2025

Fecha de inicio en el eron: 02 de septiembre de 2025

Fecha de terminación en el eron: 09 de diciembre de 2025

Recurso asignado: $604.115.802

Actividades ejecutadas:

1.3.4.8 desmonte manual de tejas metálicas termoacústicas y/o de tipo bandeja sencilla de cubierta y/o de zinc (indiferente del tipo y tamaño) y sus correspondientes listones, cabios, y correas de apoyo (siempre y cuando estas últimas no sean de carga). incluye elementos de soporte necesario para la cubierta durante la ejecución de la labor, implementos para trabajos en altura, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables.

se realiza el desmonte de las cubiertas existentes en la habitación 3 y 4, dentro de esta actividad se incluye el desmonte de las correas y/o cerchas existentes, ya que la proyección de ejecución que se quiere es que está cubierta se instale totalmente sobre una estructura nueva.

4.4.3.4 estructura metálica de cubierta y pasillo técnico (inc. anticorrosivo y pintura tipo esmalte) – esta actividad se refiere a la instalación de la estructura metálica tipo c, según diseño entregado, vale la pena aclarar que una vez revisado este plano y revisadas las actividades en sitio, se evidencia que estas estructuras instaladas no coinciden con los diseños, por este motivo no se cuantifica.

10.2.1.7 suministro e instalación de tubería pvc de 3/4". incluye conectores, terminales, fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.
esta actividad se realiza para la construcción de la red eléctrica de tomas e interruptores de las 4 habitaciones, esta actividad consiste en cortar el murto e instalar esta tubería y las cajas para tomas e interruptores.

1.3.9.1 desmonte y/o demolición manual de estructura de soporte de cubierta, ya sea metálica de tipología perfiles menores (perfil tipo c o z, doble c / cajón, peinazos, cerchas de ángulos, etc.) y/o de madera (contemplando también maderas gramíneas como la guadua o el bambú). incluye apuntalamientos técnicos y cualquier otra tarea de soporte provisional según solicitud de carga y comportamiento en sitio, implementos para trabajos en altura, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. el pago por m2 será medido en el área cubierta proyectada en planta.
se retira las estructuras de soporte




Pañete de cuchillas

EPMSC ACACIAS

Alcances contractuales:

Alcance no.1: pabellones 4 y 5, celdas de la segunda planta. $450.478.376
alcance no.2: tutela 2021-00377. se solicita el arreglo de la celda 78 del pabellón 6. $ 13.857.844

Alcance no.3: tutela 2021-00164. mantenimiento de barandas, rejas, cubículos, escaleras. $ 350.942.198
Alcance no.4: tutela 2021-00237. mantenimiento canales de desagüe. $ 233.430.466
Alcance no.5tutela 2022-00260. destapar los sifones de las duchas del segundo piso y del orinal del primer piso $4.265.512

Alcances aprobados

Alcance no.1: pabellones 4 y 5, celdas de la segunda planta
Alcance no.2: tutela 2021-00377. se solicita el arreglo de la celda 78 del pabellón 6.
alcance no.3: tutela 2021-00164. mantenimiento de barandas, rejas, cubículos, escaleras
alcance no.4: tutela 2021-00237. mantenimiento canales de desagüe
alcance no.5tutela 2022-00260. destapar los sifones de las duchas del segundo piso y del orinal del primer piso

Recursos asigando al eron o inversión en el eron: $1.052.974.364

Actividades ejecutadas:

pinturas y recubrimientos

21.5.3 pintura esmalte a base de aceite sobre tubo 2,1/2" - 4".




Trabajos de ornamentación.

EPMSC MELGAR

Alcances contractuales:
alcance no.1: realizar mantenimiento en la infraestructura deficiente en pisos, paredes, techos, escaleras y extractores e implementar un lavamanos al interior del rancho

Alcances aprobados:
Alcance no.1: realizar mantenimiento en la infraestructura deficiente en pisos, paredes, techos, escaleras y extractores e implementar un lavamanos al interior del rancho.

Fecha de inicio en el eron: 22 de septiembre del 2025

Observaciones novedades y/o generalidades del frente de obra: este establecimiento ya fue terminadas las actividades al 100%, se realizó la entrega al establecimiento, pendiente entrega de las ultimas actividades.

EPMSC CHAPARRAL

Alcances contractuales:
Alcance no.1: cambio de techos de asbesto por techos en material adecuado en todo el establecimiento.
Alcance no.2: instalación de concertina de los patios.

Alcances aprobados:
Alcance no.1: cambio de techos de asbesto por techos en material adecuado en todo el establecimiento.
Alcance no.2: instalación de concertina de los patios.

Fecha de inicio en el eron: 07 de julio del 2025
Fecha de terminación en el eron: 09 de octubre de 2025
Recursos asigando al eron o inversión en el eron: $ 147.128.771.

Observaciones novedades y/o generalidades del frente de obra
estas actividades fueron terminadas en un 100%, quedando recursos del presupuesto contractual.

EPMSC JP ESPINAL

Alcances contractuales:
Alcance no.1: adecuación de cuarto plomado para dar uso al equipo de rx
Alcance no.2: remodelación baño del área de sanidad se encuentra dañado, techo en drywall deteriorado por humedad
Alcance no.3: mantenimiento cerraduras especiales
Alcance no.4: mantenimiento, mejora de la red hidráulica y de alcantarillado patios 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, utey educativas.
Alcance no.5: mantenimiento y mejora de la red eléctrica patios 1, 2, 3 ,4,5,6,7,8,9,10, ute y área de talleres sector 1 y 2, educativas
Alcance no. 6 adecuación área de caniles

Alcances aprobados:
Alcance no.4: “mantenimiento, mejora de la red hidráulica y de alcantarillado”.
Alcance no. 5: “mantenimiento y mejora de la red eléctrica”

Aecha de inicio en el eron: 11 de agosto de 2025
Fecha de terminación en el eron: 15 de diciembre de 2025
Recursos asigando al eron o inversión en el eron: $892.785.935

ACTIVIDADES REALIZADAS EN PABELLON 5

NP 30 Suministro e instalación luminaria antivandálica tria lens l10 1205x230x145 sobreponer led. Para sobreponer en temperatura de color 4000k flujo lumínico 4400 lm con sistema de control on/of

con potencia máxima 28,56wMantenimiento y sondeo de los puntos de desagüe en PVCP Ø2” a Ø4”, retirando las obstrucciones existentes.

Registro fotográfico.



Instalación de lámparas antivandálica en celdas pabellón 5

ESTABLECIMIENTOS REGIONAL OCCIDENTE

EPMSC BOLIVAR (CAUCA)

Fecha de inicio: 28 de agosto del 2025

Fecha de terminación: 5 de mayo del 2026.

Presupuesto $ 44.957.403,00

Alcances aprobados:

ALCANCE No.1: "Mantenimiento y/o Adecuación Archivo de Gestión Documental de acuerdo con la Ley 594 de 2000 Art. 16, y el Plan de Mejoramiento Archivístico".

Actividades desarrolladas:

Estado Contractual: 100% Finalizado / En etapa de programación para entrega formal.

Al cierre de esta quincena, se ratifica la **culminación satisfactoria y total** de la infraestructura civil proyectada para este frente, la cual fue ejecutada estrictamente dentro de la vigencia temporalizada (con fecha de terminación técnica al 5 de mayo de 2026).

Las áreas correspondientes al Archivo de Gestión, Bodega y Oficinas se encuentran completamente desocupadas, limpias y listas para su entrada en operación. Se mantienen verificadas a satisfacción por parte de la Interventoría las especificaciones técnicas de los muros

en drywall, los acabados de pintura, el cambio de piso, guardaescobas, los sistemas de carpintería metálica (instalación de 2 puertas y 2 ventanas correderas con sus respectivos vidrios) y el correcto funcionamiento de las redes eléctricas e iluminación. Las obras cumplen a cabalidad con los estándares exigidos por el Plan de Mejoramiento Archivístico de la entidad.

El frente se encuentra cerrado económicamente con un cumplimiento del 100% del valor asignado, sin presentar desviaciones, reclamaciones por mayores cantidades ni saldos en rojo, garantizando la optimización de los recursos dispuestos por la USPEC.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN (Logística de Entrega):

Esta Interventoría reporta que durante este período el principal esfuerzo se ha centrado en coordinar las agendas institucionales para llevar a cabo el recibo final. Sin embargo, debido a complejidades logísticas y de acceso físico al establecimiento, no ha sido posible concertar una fecha presencial conjunta entre la Dirección del EPMSC, los delegados de la USPEC, el Contratista y la Interventoría.

Con el fin de no dilatar el cierre administrativo de este frente y dar trámite oportuno a la entrega de la infraestructura, se está ventilando y gestionando ante la Supervisión la viabilidad de realizar la mesa de entrega de forma virtual. Para esto, se utilizarán los registros fotográficos de récord, las carteras de campo validadas y el informe técnico del residente de interventoría como soporte para la firma digital de las actas de recibo a satisfacción.

Registro fotográfico











EPMSC EL BORDO

Fecha de inicio: 4 de septiembre del 2025 (reinicio 30 de abril 2026)

Fecha de terminación: 15 de junio del 2026.

Presupuesto $ 46.134.443

Alcances aprobados:

ALCANCE No.1: " Cambio de cubierta total del establecimiento, incluye estructura metálica".

Actividades desarrolladas:

Estado Contractual: En ejecución activa de infraestructura de soporte (Fase de cimentaciones y preparación para montaje de estructura metálica).

Durante el desarrollo de las labores de supervisión en sitio, la Interventoría, en conjunto con la Dirección del establecimiento penitenciario, concertó la ampliación del área de cubierta originalmente contemplada. Esta modificación técnica tiene como objetivo proteger el pasillo que sirve de acceso peatonal hacia los baños del casino y el corredor de circulación de motocicletas destinado al parqueadero del personal administrativo.

Para sustentar la nueva estructura proyectada, se ejecutaron excavaciones manuales para zapatas con dimensiones de 1 x 1 m y una profundidad de 0.5 m. Durante el desarrollo de esta actividad se

reportó un imprevisto técnico debido a la presencia de material rocoso severo en el subsuelo, situación que afectó directamente los rendimientos y el avance diario de la cuadrilla.

Tras superar el estrato rocoso y liberar los niveles de fundación, se procedió con el figurado, armado y colocación del acero de refuerzo para zapatas, complementado con la fundición de pedestales.

Se instalaron platinas metálicas de soporte, fijadas sólidamente mediante varillas roscadas del mismo diámetro, dejando los pedestales listos y nivelados para recibir la posterior instalación de los pórticos metálicos.

Al cierre del periodo, se ejecutaron actividades de acabado final que consistieron en pañete fino, resanes técnicos y aplicación de pintura decorativa en cuatro columnas existentes. Adicionalmente, se acondicionaron y sellaron las áreas de piso afectadas por las excavaciones utilizando material mineral rojo, garantizando la entrega del área de trabajo en óptimas condiciones de orden y aseo.

Esta Interventoría dejó constancia de que, previo al inicio del montaje físico de la estructura metálica (pórticos, diagonales, correas y teja arquitectónica), el contratista deberá respetar de manera obligatoria un tiempo mínimo de fraguado y secado de 10 días calendario, contados a partir del sábado 30 de mayo de 2026, para asegurar que los elementos de concreto alcancen la resistencia estructural requerida ante los esfuerzos de carga.

Debido a que el establecimiento se encuentra en total funcionamiento administrativo y penitenciario, la Interventoría exigió y verificó la aplicación permanente de **humectación continua** con agua durante las actividades de demolición de pisos y excavaciones, minimizando la dispersión de polvo y material particulado para salvaguardar la salud de la comunidad penitenciaria.

Atendiendo los requerimientos urgentes de la Dirección del penal, se obligó al contratista a realizar jornadas diarias de limpieza profunda en el pasillo de acceso a los baños y parqueadero. Al ser este el único corredor habilitado para el tránsito interno, la medida garantizó condiciones seguras de movilidad y seguridad física.


Control de Mano de Obra Regional: Se mantiene la limitación operativa reportada la quincena anterior, donde las dinámicas económicas informales de la zona (minería y cultivos) elevan considerablemente el costo del jornal local, restringiendo la vinculación de más personal bajo los precios unitarios del contrato de obra.

Revisión de Balance y Programación: El contratista radicó la actualización del balance de cantidades y la programación de obra para El Bordo. La Interventoría ya realizó la primera revisión técnica emitiendo observaciones y correcciones perentorias. El constructor deberá ajustar el

documento de manera inmediata, incluyendo con precisión las actividades pendientes por ejecutar en el área del comedor.

En el marco del estricto seguimiento a los contratos *USPEC-CTO-256-2024* y *USPEC-CTO-271-2024*, la Interventoría solicitó formalmente al contratista la presentación inmediata de un Plan de Contingencia actualizado. Este plan debe estructurar las acciones operativas y administrativas definitivas para mitigar los atrasos físicos acumulados, asegurando que la reactivación final del proyecto cumpla con las condiciones técnicas y de seguridad exigidas por la USPEC.

Registro fotográfico
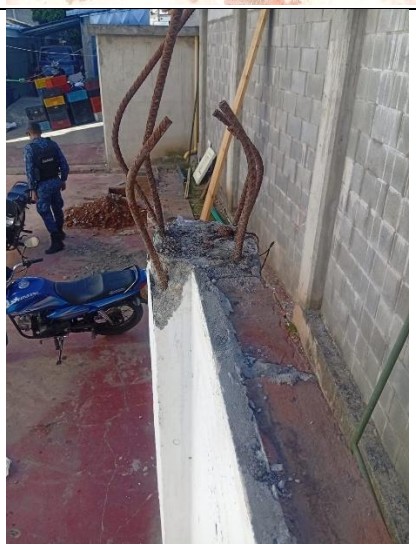
<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

EPMSC PUERTO TEJADA

Fecha de inicio: 20 de enero del 2026

Fecha de terminación: 20 de abril del 2026.

Presupuesto $45.633.398

Alcances aprobados:

- Alcance contractual No.1: Mantenimiento de baños y duchas Baterías Sanitarias Piso 1
- Alcance contractual No.1: Mantenimiento de baños y duchas Baterías Sanitarias Piso 2

Actividades desarrolladas:

Estado Contractual: 100% Finalizado / En etapa de liquidación y coordinación de entrega definitiva a la USPEC.

Se ratifica el cumplimiento y la culminación satisfactoria de la totalidad del alcance físico proyectado para las baterías sanitarias del establecimiento (Pabellón Único). La intervención ejecutada abarcó la adecuación integral de seis (6) unidades sanitarias y tres (3) duchas distribuidas entre el primer y segundo piso.

Los trabajos incluyeron la reposición completa de aparatos sanitarios, instalación de enchapes cerámicos, aplicación de pintura especializada para zonas húmedas y la optimización general de las redes hidráulicas y sanitarias internas. La infraestructura cumple a cabalidad con los requisitos técnicos de habitabilidad exigidos para el ERON.

El proyecto se encuentra cerrado económicamente al 100% de su valor contractual. No se registran desviaciones negativas, mayores cantidades de obra ni saldos en rojo, garantizando un cierre financiero óptimo y ajustado al techo presupuestal asignado por la entidad.

Al cierre de este periodo, la Interventoría y el Constructor se encuentran a la espera de la visita oficial por parte de la Supervisión de la USPEC para realizar el recibo definitivo de las zonas intervenidas. Actualmente se están adelantando las coordinaciones logísticas de fechas, una vez el contratista complete y radique la totalidad del soporte documental y el dossier de calidad exigido por este equipo de control.

ALCANCE N°1: Batería Sanitaria Piso 1



Descripción: Batería Sanitaria Piso 1 (enchape de lava trapero)



Descripción: Batería Sanitaria Piso 1 (enchape de lava trapero

EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO

Fecha de inicio: 11 de noviembre del 2025

Fecha de fin: 15 de Julio 2026.

Presupuesto $ 171.637.436

Alcances aprobados en diagnóstico:

- Instalaciones eléctricas del área de alojamiento de guardia
- Mantenimiento del área de sanidad. .

Actividades desarrolladas:

Estado Contractual: SUSPENDIDO. Sin actividades operativas en el periodo.

Antes de la parálisis, se reportó la aplicación de estuco y primera mano de pintura epóxica en el área de Sanidad (Odontología, bodega de odontología, medicamentos, baño PPL, archivo, procedimientos, bodegas 1 y 2, área de aseo, bodega general, consultorio, cuarto de papelería y baño de funcionarios).

Esta Interventoría deja constancia crítica de que no es posible verificar el estado actual de las áreas intervenidas. El contratista mantiene asegurada la reja de acceso principal con candado, restringiendo el ingreso del personal del establecimiento y del equipo de control. Por tal motivo, no se pueden realizar entregas parciales, ya que ninguna zona ha sido concluida al 100% y el alcance se concibe como una unidad integral e indivisible.

CONTROVERSIA TÉCNICA Y RECLAMACIÓN POR DAÑOS (Contrato de Emergencia 212-2024):

Dirección del penal reportó que las fuertes lluvias recientes han incrementado severamente la humedad por capilaridad en los muros bajos de farmacia, medicamentos y consultorios, así como filtraciones en el cielo raso del pasillo de acceso a Sanidad. Estos daños están directamente asociados a fallas o vicios constructivos derivados de la cubierta de emergencia ejecutada en 2025 bajo el contrato *USPEC-CTO-212-2024*.

En mesa técnica virtual, el constructor de la emergencia alegó que su alcance no incluía flanches ni canales de recolección. Por su parte, esta Interventoría y el contratista del contrato *256-2024* ratificaron la imposibilidad de ejecutar intervenciones adicionales en dicha cubierta, ya que violaría y anularía las garantías vigentes del contrato de emergencia. Cualquier acción correctiva debe ser definida y asumida contractualmente por la USPEC.

Al cierre de este informe, la Interventoría acumula cuatro (4) solicitudes escritas formalizadas ante la USPEC exigiendo definir la responsabilidad técnica y legal de estas afectaciones, sin obtener respuesta alguna. El apoyo a la supervisión de la entidad se comprometió hace cuatro semanas a emitir un pronunciamiento oficial y un lineamiento tras las mesas de abril, pero ha hecho caso omiso, manteniendo el proyecto paralizado.

Adicionalmente, la entidad no ha determinado de fondo si los saldos presupuestales remanentes se redireccionarán a celdas primarias, archivo, asadero o panadería. Esto impide adelantar cualquier planeación contractual.

Se constató la permanencia mínima de un (1) residente de obra y un (1) residente de interventoría, registrando cero (0) personal operativo y cero (0) personal de SST en el establecimiento.

Registro fotográfico

No existe registro fotográfico por inactividad en el periodo evaluado.

EPMSC SILVIA

Fecha de inicio: 4 de septiembre del 2025

Fecha de terminación: 07 de abril del 2026.

Presupuesto $ 44.330.231

Alcances aprobados en diagnóstico:

ALCANCE No.1: "Mantenimiento y reparación a toda el área administrativa del ERON, incluye cambio de pisos, luminarias y baños".

Actividades desarrolladas:

Estado: 100% Finalizado físicamente / Pendiente cierre documental.

Gestión del Periodo: Se ratifica la culminación total de las adecuaciones del área administrativa (oficinas, baños y cambio de pisos), las cuales se encuentran operativas por el INPEC desde el acta de recibo del 7 de abril de 2026. Durante esta quincena, el frente se mantuvo en etapa de cierre administrativo posterior, el cual continúa temporalmente postergado para la firma del acta final de liquidación ante la sede central de la USPEC. Este retraso obedece estrictamente a las alteraciones de orden público y restricciones de seguridad vigentes en el departamento del Cauca, las cuales impiden el desplazamiento del contratista.

EPMSC RM POPAYÁN

Fecha de inicio: 5 de septiembre del 2025

Fecha de terminación: 22 de diciembre del 2025.

Presupuesto $ 69.572.532

Alcances aprobados en diagnóstico:

ALCANCE NO. 2 – “Mantenimiento y/o adecuación de escaleras de alojamiento femenino (actualmente no cumplen normas)”.

ALCANCE NO. 3 – “Mantenimiento y Adecuación Archivo de Gestión”.

Actividades desarrolladas:

Estado: Finalizado con entrega técnica parcial – Pendiente cierre documental.

Las obras civiles correspondientes a la modernización normativa de las escaleras del alojamiento femenino y la adecuación del Archivo de Gestión se encuentran totalmente terminadas y estables, habiéndose subsanado en su totalidad las observaciones previas de filtraciones y acabados. Al igual que en el frente de Silvia, la protocolización del cierre documental definitivo y la entrega del dossier final (planos récord y manuales) ante la USPEC siguen suspendidas debido a las condiciones de movilidad y orden público en la región del Cauca. La Interventoría reactivará los trámites de firmas apenas se restablezcan las garantías de seguridad.

EPAMS CAS ERE POPAYÁN

Presupuesto $ 1.397.671.798

Alcances aprobados en diagnóstico:

Alcance NO. 1 – “Tutela 2023-000195 construcción de las cubiertas de los pabellones 11,12,13 (se construye pabellón 11, porque el muro perimetral no tiene la resistencia para la cubierta en pabellones 12,13, por seguridad no es pertinente)”.

Alcance NO. 2 – “Intervención patio de visita familiar de mediana seguridad: instalación de sobre cubierta donde se requiere, construcción de mesas y sillas en concreto”.

Nuevo alcance No.1: “Intervención área visita intima: construcción de sobre cubierta de las dos alas”.

Nuevo alcance No. 2: “Adecuación y mantenimiento del pabellón 12”.

Nuevo alcance No.4: “adecuación y mantenimiento de celda UTE”.

Actividades desarrolladas:

NUEVO ALCANCE N.° 1 y ALCANCE N.° 2: Intervención con Sobrecubiertas en Áreas de Visitas (Íntima y Familiar)

Estado Contractual: En ejecución activa / Ritmo constructivo favorable.

Desarrollo de Actividades en el Periodo (Item 4.4.3.1): Durante la quincena se avanzó de forma continua en el suministro, fabricación y armado de la estructura metálica para las sobrecubiertas en ambas alas del área de visitas conyugales (íntimas) y en el patio de visita familiar. Las labores incluyeron el montaje de perfilería, pernos de anclaje, tornillería, soldadura y la aplicación de capas de pintura anticorrosiva de acabado especial.

Con base en el cronograma autorizado, se tienen programadas actividades complementarias de obra civil y acabados que abarcan la demolición manual de alistados de piso pesados (ítem 1.3.5.7), aplicación de pañete liso impermeabilizado integralmente bajo placa 1:4 (ítem 13.2.3), mantenimiento correctivo en sitio de puertas metálicas entamboradas (ítem 16.2.3.25) y el desmonte manual de aparatos sanitarios cerámicos (ítem 1.3.6.22).

. **Obras Ejecutadas No Contempladas:** En las visitas de verificación e inspección visual en campo, esta Interventoría constató que el contratista ejecutó actividades indispensables para el correcto funcionamiento e inocuidad de las sobrecubiertas, tales como el suministro e instalación de canales en lámina galvanizada calibre 20 y el desmonte manual de la concertina de seguridad existente.

Se advierte a la Supervisión de la USPEC que dichos ítems no se encuentran incluidos en el presupuesto contractual vigente. Por tal razón, la Interventoría cataloga como imperativo y urgente

la elaboración de un balance de obra (rebalanceo presupuestal) que incorpore legalmente estas actividades, garantizando la continuidad técnica y el blindaje financiero del proyecto.

Registro fotográfico

	
Instalación canal galvanizado en estructura para sobrecubierta – Área de visitas conyugales.	Instalación canal galvanizado en estructura para sobrecubierta – Área de visitas conyugales.

	
Instalación de estructura para sobrecubierta – Área de visitas conyugales.	Instalación de estructura para sobrecubierta (Soporte de nivelación)– Área de visitas conyugales.

	
Instalación de estructura para sobrecubierta (Soporte de nivelación)– Área de visitas conyugales.	Instalación de estructura para sobrecubierta – Área de visitas conyugales.
	
Instalación de estructura para sobrecubierta – Área de visitas conyugales.	Instalación de estructura para sobrecubierta – Área de visitas familiares.
	
Instalación de estructura para sobrecubierta – Área de visitas conyugales.	Instalación de estructura para sobrecubierta – Área de visitas familiares.

	
Desmonte de concertina – Área de visitas familiares.	Desmonte de concertina – Área de visitas familiares.

EPMSC RM PASTO

Fecha de inicio: 1 de septiembre del 2025

Fecha de terminación: 15 de julio del 2026.

Presupuesto $ 361.450.189

Alcances aprobados en diagnóstico:

Alcance No. 1 – Tutela 267 de 2022: Construcción centro de acopio de residuos sólidos

Alcance No. 2 – Tutela 2022-00060: Adecuación y mantenimiento de baterías sanitarias

Actividades desarrolladas:

ALCANCE N° 1: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS (TUTELA 267/2022)

Estado Contractual: En ejecución activa (Fase de mampostería, confinamientos y preparación de losas aéreas).

Desarrollo de Actividades en el Periodo: Durante la quincena se concentraron los esfuerzos operativos en el sector del *shut* de basuras. Se ejecutó de manera conforme el armado de mampostería para muros de cerramiento en ladrillo tolete recocido común (ítem 5.2.5), junto con el figurado de acero (ítem 2.4.1) y la fundición de columnetas y viguetas de confinamiento en concreto de 3000 PSI (ítem 5.4.3).

Asimismo, se avanzó en el armado estructural de vigas metálicas (ítem 4.4.2.1) y en la colocación de la lámina colaborante para la posterior fundición de la placa maciza aérea (ítem 4.1.3.1). En el

componente hidrosanitario se realizó la instalación y emboquille de rejillas de piso plásticas con retícula anti cucarachas (ítem 20.4.3).

ALCANCE N° 2: ADECUACIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS (TUTELA 2022-00060)

Estado Contractual: PARALIZADO. Sin novedades de avance físico en la quincena.

Este frente (que contempla la intervención de las baterías comunitarias del patio 4, celdas del patio 5 y mantenimiento general en pasillos de los patios 1 al 6) se encuentra congelado temporalmente. La reactivación de las cuadrillas está estrictamente supeditada a que se culmine y apruebe el balance de obra del acopio de basuras. Una vez consolidados estos valores, los saldos presupuestales remanentes y sobrantes se reasignarán formalmente para continuar con la compra de aparatos y adecuación de los pasillos de los pabellones

Debido a que la fecha límite de la prórroga está pactada para el **15 de julio de 2026**, la Interventoría notificó formalmente al contratista sobre la obligación de implementar de manera perentoria e inmediata las medidas correctivas consignadas en su plan de contingencia. El constructor deberá incrementar los rendimientos, optimizar las jornadas de trabajo y garantizar el suministro fluido de materiales para nivelar el cronograma dentro del periodo contractual vigente.

Registro Fotográfico

	
Armado de mampostería en ladrillo tolete - Alcance Shut de basuras.	Armado de mampostería en ladrillo tolete - Alcance Shut de basuras.

	
Armado de mampostería en ladrillo tolete - Alcance Shut de basuras.	Armado de refuerzo para fundición de viguetas y columnetas de confinamiento de mampostería - Alcance Shut de basuras.
	
Armado de encofrado para fundición de viguetas y columnetas de confinamiento de mampostería - Alcance Shut de basuras.	Fundición de viguetas y columnetas de confinamiento de mampostería - Alcance Shut de basuras.
	
Armado de mampostería en ladrillo tolete - Alcance Shut de basuras.	Armado de mampostería en ladrillo tolete - Alcance Shut de basuras.

EPMSC IPIALES

Fecha de inicio: 25 de junio del 2025

Fecha de terminación: 30 de enero del 2026.

Presupuesto $ 319 790 814.00

Alcances aprobados en diagnóstico:

ALCANCE NO.2: Mantenimiento de redes hidrosanitarias y duchas pabellones 1 y 3 estructura 1.

ALCANCE N°.3: Impermeabilización techo pabellones 1,2,3,4 y estructura 1.

Actividades desarrolladas.

Estado: 100% Finalizado físicamente / En trámite de liquidación.

Durante el presente periodo, se ratifica la culminación exitosa de las intervenciones en el establecimiento. El pasado 15 de abril de 2026, se oficializó el Acta de Recibo a Satisfacción y Entrega de Espacios, en una diligencia conjunta que contó con la validación de la Gestión del Periodo: Se ratifica la culminación total y exitosa de las obras de mantenimiento hidrosanitario (pabellones 1 y 3) e impermeabilización de cubiertas (pabellones 1 al 4), las cuales cuentan con Acta de Recibo a Satisfacción desde el 15 de abril de 2026. Durante esta quincena el frente se mantuvo sin modificaciones en su estado, avanzando estrictamente en el trámite documental de cierre ante la sede central de la USPEC, habiéndose liberado por completo la responsabilidad física del contratista.

EPMSC LA UNIÓN (2.10)

Fecha de inicio: 26 de junio del 2025

Fecha de terminación: 3 de diciembre del 2025.

Presupuesto $ 39 143 002.00

•Alcances aprobados en diagnóstico:

ALCANCE No. 2: Mantenimiento y/o Adecuación Archivo de Gestión Documental de acuerdo con la Ley 594 de 2000 Art. 16, y el Plan de Mejoramiento Archivístico

ALCANCE No. 3: Mantenimiento y/o adecuación de la Guardia Externa y Armerillo.

Actividades desarrolladas.

Estado: 100% Finalizado físicamente / En trámite de liquidación.

Gestión del Periodo: Las adecuaciones del Archivo de Gestión Documental (Ley 594 de 2000) y las mejoras en la Guardia Externa y Armerillo continúan recibidas a satisfacción y en pleno uso operativo por el INPEC desde abril de 2026. Al no registrarse movimientos físicos en este período,

los esfuerzos de la Interventoría se concentran exclusivamente en la revisión y consolidación del dossier final (planos récord y manuales) para la firma de la liquidación definitiva

- **EPMSC TUQUERRES**

Fecha de inicio: 18 de septiembre del 2025

Fecha de terminación: 9 de diciembre del 2025.

Presupuesto: $40.621.671

Alcance aprobado

ALCANCE No.1: Mantenimiento y/o adecuación del área de sanidad y zona odontológica

Actividades desarrolladas.

Estado: 100% Finalizado físicamente / En trámite de liquidación.

Se mantiene el estado de culminación técnica del área de Sanidad y zona Odontológica, entregadas formalmente el 15 de abril de 2026 antes de la suspensión general de la Regional Occidente. Al estar las instalaciones operativas y conformes a los estándares de salud, la gestión quincenal se limitó al componente administrativo, avanzando en la recopilación de certificados de calidad de insumos y planos de récord de obra.

EPMSC CAICEDONIA

Fecha de inicio: 22 de septiembre del 2025

Fecha de terminación: 11 de diciembre del 2025

- Presupuesto

$ 39.136.555

- Alcances aprobados:

ALCANCE No.1: Mantenimiento y/o adecuación de pisos y paredes de patios de PPL y pabellón en general. (Patio 8 de Pabellón Ala A)

Actividades desarrolladas.

Estado: RECHAZADO POR CALIDAD / Sin viabilidad de cierre

El proyecto continúa congelado y sin viabilidad de cierre administrativo debido a los defectos constructivos ratificados en la visita técnica del 29 de abril (humedades, desprendimiento de pintura y fallas gravísimas de pendiente en lavaderos y patios). Se reitera que el pago del ítem de piso epóxico se encuentra suspendido por el incumplimiento de calidad exigido mediante el oficio

USPEC-BETAREGIONALES-2452. La Interventoría se mantiene a la espera de que el Consorcio Mantenimientos GMC radique el cronograma de reparaciones obligatorias.

EPMSC SEVILLA

Fecha de inicio: 14 de agosto del 2025

Fecha de terminación: 11 de diciembre del 2025.

- Presupuesto

$ 48.223.407

- Alcances aprobados:

ALCANCE No.1: Mantenimiento y/o adecuación de cubierta patios 1 y 2

- Actividades desarrolladas.

Estado: 100% Finalizado físicamente / Cierre postergado por orden público.

El mantenimiento de cubiertas en los patios 1 y 2, junto con la aplicación de pintura ejecutada con los saldos remanentes, se encuentra completamente terminado y con aval técnico de esta dirección. Sin embargo, la protocolización del cierre financiero y la firma de las actas de liquidación final ante la sede central de la USPEC continúan congeladas debido a las restricciones de movilidad y orden público que afectan al Valle del Cauca desde el pasado 27 de abril.

EPAMS CAS JP PALMIRA

Alcances a ejecutar:

ALCANCE No.2: Tutela 2021-00019 - Hallazgo contraloría 13 de 2023-1 Iniciación de reparación filtraciones de aguas lluvias EPMSC Palmira – Valle del Cauca, y red hidrosanitaria obsoleta. Celdas patio 2 piso2 pasillo A (filtraciones de agua lluvia por techo de pabellón), Celdas Patio 1 Piso 2 pasillo D Piso 1 (filtraciones por deterioro de canales y tejas), Patio 3 piso 2 pasillo D(filtración en techos y paredes por fallas en las tejas)

ALCANCE No 4: Tutela 2023-00092- 01-107423 Iniciación del cumplimiento de lo ordenado en el fallo de la tutela, con el mantenimiento de garitas, red eléctrica e iluminación, marcos, puertas y ventanas, vidrios, paredes, baños y adecuación acceso a las mismas. (Requerimiento procuraduría).

Programación: Inicio 24 de junio de 2025 Final: 15 de mayo de 2026
Recurso asignado: $ 1,979,965,945.00
Actividades ejecutadas en el periodo del informe.
Seguimiento Técnico – Alcances Contractuales y Actividades Ejecutadas
Alcance No. 2 – Tutela 2021-00019 / Hallazgo Contraloría 13 de 2023-1

Se da inicio a las actividades de reparación asociadas a filtraciones de aguas lluvias y a la intervención de la red hidrosanitaria en condición de obsolescencia en el EPMSC Palmira (Valle del Cauca). Las intervenciones se concentran en:

Celdas del patio 2, piso 2, pasillo A (filtraciones por cubierta).
Celdas del patio 1, piso 2 pasillo D y piso 1 (filtraciones por deterioro de canales y tejas).
Patio 3, piso 2 pasillo D (filtraciones en cubierta y muros).

Con corte a la fecha del presente informe, se han ejecutado las siguientes actividades correspondientes al componente hidráulico contemplado dentro del alcance antes mencionado:

Excavaciones y adecuación de terreno

Ejecución de excavaciones perimetrales en terreno natural para conformación de zanjas destinadas al tendido de redes hidráulicas de agua potable. (470 ml)
Adecuación y preparación de áreas intervenidas para instalación de tuberías subterráneas.

Instalación de redes hidráulicas

Suministro e instalación parcial de tubería hidráulica para conducción de agua potable hacia las garitas perimetrales e internas del establecimiento. (670 ml)
Avance en el tendido de red hidráulica subterránea conforme a los trazados definidos en sitio.

Rellenos y restitución.

Ejecución de rellenos manuales en los tramos intervenidos posterior a la instalación de tubería, incluyendo compactación y conformación del terreno.

Registro fotográfico



Excavaciones y suministro e instalación parcial de tubería hidráulica



Estructura metálica de cubierta

EPAMS ERE CALI.

ALCANCE NO. 1: Mantenimiento Infraestructura Física Alojamientos de Guardias, Concertina e Iluminación Perimetral.

ALCANCE NO. 2: Mantenimiento General patios del 1 al 9.

ALCANCE NO. 3: Mantenimiento y/o Adecuación de Garitas, Mantenimiento a Escaleras.
ALCANCE NO. 4: Mantenimiento a Infraestructura Rancho y Mantenimiento Baterías Sanitarias y Redes Hidrosanitarias.

Programación: Inicio 25de junio de 2025 Final: 15 de mayo de 2026

Recurso asignado: $ 1,979,965,945.00

ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante el periodo reportado por parte del contratista no se desarrollaron actividades de obra en sitio.

Registro fotográfico



Trabajos de demolición de alojamientos masculinos.



Adecuación área de lavados de ollas, construcción de cubierta y suministro de teja arq.

EPMSC TUMACO

Alcances a ejecutar:

ALCANCE No.1: Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física de los establecimientos penitenciarios a cargo del inpec" el cual tiene como alcance: mejoramiento redes sanitarias y pluviales de todo el establecimiento etapa 2 (pabellón 2, 3, 4, 5 y 6 y zona administrativa 2).

Programación: Inicio 24 de septiembre de 2025 Final: 15 de mayo de 2026.

Recurso asignado: $ 475.347.312.

Se iniciaron actividades de obra civil en el establecimiento el 12 de mayo de 2026.

Actividades de excavaciones y retiro de tubería.
Instalación de tubería para desviar las aguas de manera provisional.
Construcción de cajas y pozos de inspección.

Se socializaron los alcances técnicos, administrativos y jurídicos correspondientes a las intervenciones contempladas en el Contrato No. 256 de 2024, orientadas al mejoramiento y reposición de redes sanitarias y pluviales en los pabellones 2, 3, 4, 5 y 6, así como en la zona administrativa 2 del establecimiento. Se indicó que dichas actividades corresponden a la continuidad de intervenciones ejecutadas en una primera etapa por el contrato 321 y fueron priorizadas debido a requerimientos operativos y acciones judiciales entre otras la Tutela 52835310400120240010400 donde el juez Ordena como punto 2. Solucionar los problemas de drenaje por lluvias en todos los pabellones y área educativa. del EPMSC Tumaco.

Durante la reunión se precisó que el principal problema identificado en el establecimiento correspondía a la interconexión entre las redes de aguas lluvias y aguas sanitarias, situación que generaba reboses, filtraciones y afectaciones en diferentes pabellones. En este sentido, se informó que las obras actualmente en ejecución permitirán independizar ambos sistemas mediante la adecuación de redes y la implementación de diámetros hidráulicos adecuados, solucionando integralmente los problemas de drenaje por aguas lluvias y las filtraciones presentadas en el pabellón 4. Asimismo, se indicó que para la ejecución integral de estas actividades fue necesaria una adición presupuestal realizada mediante el Otrosí No. 6 del contrato 256-2024, de diciembre de 2025, debido a que los recursos inicialmente asignados resultaban insuficientes para atender los requerimientos derivados de la acción de tutela.

Registro fotográfico



Construcción de cajas y excavaciones para reemplazos de tubería.

EPMSC CARTAGO

Alcances a ejecutar:

ALCANCE No.1: Mantenimiento y/o adecuación de la iluminación perimetral

Programación: Inicio 26 de septiembre de 2025 Final: 12 de marzo de 2026.

Recurso asignado: $ 240,701,830.00

Novedades en el periodo del informe:

Mantenimiento y/o adecuación batería sanitaria puesto de información se interviene 5 alojamientos femeninos de manera integral, y la instalación de sobre cubierta en pasillo.

Mantenimiento y/o adecuación batería sanitaria puesto de información.

Registro fotográfico.



Adecuación de batería sanitaria puesto de información, instalación de cerámica piso

EPMSC BUENAVENTURA

Conforme al análisis técnico, al informe de reconocimiento y diagnóstico, y a la revisión detallada del presupuesto objeto del presente informe, se precisa que los recursos contemplados se orientan a la ejecución de obras integrales en cinco (5) alojamientos, en los cuales se intervendrán de manera completa los componentes arquitectónicos, hidrosanitarios, eléctricos y de acabados, con el fin de garantizar condiciones adecuadas de habitabilidad, funcionalidad y seguridad para los funcionarios del CCV.

Presupuesto del establecimiento: $ 243,733,144.00

Programación de actividades:


Fecha de Inicio 15 de septiembre de 2025
Fecha Final: 15 de mayo de 2026.

De conformidad con el seguimiento realizado al Contrato de Obra No. USPEC-CTO-256-2024, se deja constancia de que el atraso presentado en la ejecución de las actividades en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad – EPMSC Buenaventura obedece a factores ajenos a la voluntad y gestión del contratista, los cuales han impactado de manera directa la continuidad de los frentes de obra y el cumplimiento del cronograma inicialmente aprobado.

Actividades ejecutadas en el periodo:

Se finalizan actividades de obras civiles a conformidad en el establecimiento.

Registro fotográfico de actividades ejecutadas.

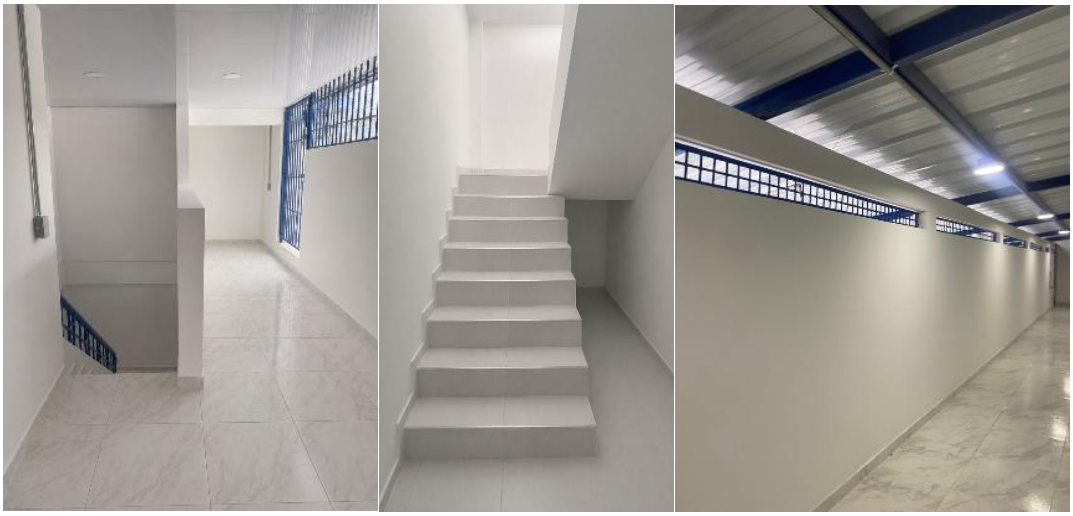



Espacios terminados en el establecimiento de buenaventura.

COJAM JAMUNDI

Alcances a ejecutar:

Alcance contractual No.2: Atención Parcial por bloques Suministro de agua 24/7, acometida hidráulica y puesta en funcionamiento en todos los bloques del establecimiento. Adecuación del sistema de agua, para que el flujo sea constante durante todo el día. Unidad de atención primaria.

Alcance contractual No.3: Mantenimiento general de la iluminación perimetral en Guayanas e iluminación interna en bloques y celdas, incluye cambio de luminarias.

Programación: Inicio 26 de septiembre de 2025 Final: 15 de mayo de 2026.

Recurso asignado: $ 2,299,720,961.00

Actividades ejecutadas en el periodo:


Durante el periodo reportado se realizó recorrido técnico de verificación a las actividades de impermeabilización ejecutadas en el tanque No. 9, ubicado en el bloque 1 del establecimiento. En la inspección se evidencian avances en las labores programadas.

Durante el periodo reportado se adelantaron actividades de intervención sobre los equipos de bombeo instalados en el establecimiento, en el marco de las afectaciones previamente identificadas en los cuartos de máquinas. En este sentido, el contratista realizó las labores correspondientes de revisión, ajuste y adecuación de los equipos, orientadas a restablecer sus condiciones operativas y mitigar las fallas evidenciadas.

Las actividades ejecutadas comprenden acciones de mantenimiento correctivo y ajustes técnicos en componentes electromecánicos, conforme a las condiciones encontradas durante las inspecciones realizadas en sitio.

Durante el periodo de mayo de 2026, se presentó una emergencia hidráulica en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamundí – COJAM, correspondiente a la rotura de una tubería de 6” ubicada entre los bloques 1 y 4, situación que generó afectación en el suministro de agua del establecimiento. En atención a la novedad reportada por la supervisión, la interventoría solicitó al contratista la realización del diagnóstico técnico, identificación de las actividades requeridas para la atención de la emergencia y la entrega prioritaria del costeo y presupuesto detallado de intervención, con el fin de efectuar la respectiva revisión técnica y presupuestal y emitir concepto de viabilidad para su posible ejecución dentro del contrato

Registro fotográfico

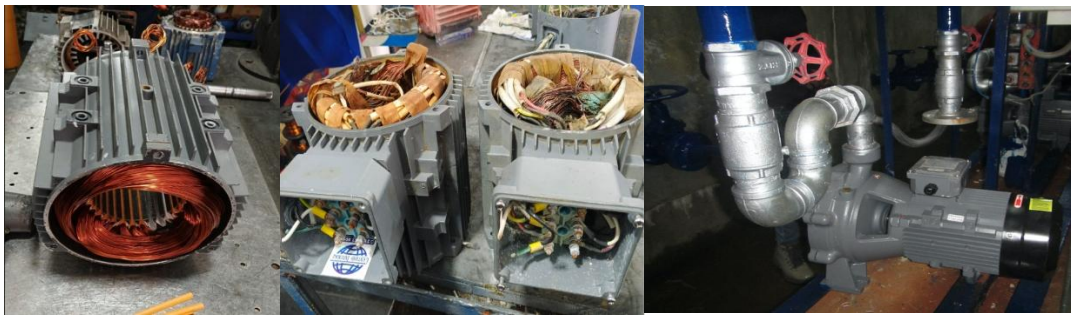

Reparación de bombas, impermeabilización de tanques.



ESTABLECIMIENTOS REGIONAL ORIENTE.

EPMSC ARAUCA

Alcances a ejecutar:

Alcance N°3: Mantenimiento ÁREA DEL RANCHO (mesones y trampas de grasas) Hecho sobreviniente tema nacional.

Fechas según ultima programación

Inicio: 20 de octubre del 2025

Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 30 de abril del 2026

Recurso asignado: $ 165.275.117,00

Actividades ejecutadas en el periodo:
Se realiza entrega formal del establecimiento

Alistado y pendientado de pisos con mortero impermeabilizado
Acabado de piso en baldosa de grano de mármol vibroprensado 30 × 30 cm
Demolición de alistado y acabados livianos de piso
Demolición de enchapes y acabados livianos en muros
Ejecución de placa de contrapiso en concreto f'c = 3000 PSI
Construcción de dinteles en concreto
Media caña en granito fundido y pulido
Pulida de granito granito fundido y pulido
Suministro e instalación de puerta entamborada en lámina metálica

Acabado de mesón en granito fundido y pulido
Lavaplatos de empotrar con doble poceta
Pintura de cielo raso / techo
Enchape de pared con baldosas cerámicas 30 × 60 cm
Enchape de piso con baldosas cerámicas 55.2 × 55.2 cm
Enchape de pared con baldosas cerámicas 30 × 60 cm
Demolición manual de guarda escoba
Raspado de pintura existente en muros
Placa de contrapiso en concreto
Desmonte manual de puertas
Demolición manual de camarotes en concreto
Construcción de muros en bloque de concreto de 15 cm
Aplicación de pañete liso impermeabilizado
Limpieza de cajas de inspección existentes de redes sanitarias y/o aguas lluvias
Sondeo y limpieza de red sanitaria de 2" a 4" de diámetro
Suministro e instalación de tubería PVCP 1/2" RDE 9 para redes hidrosanitarias
Punto de agua fría para lavaplatos / poceta / vertedero en tubería PVCP 1/2”
Punto de agua fría para lavaderos en tubería PVCP 1/2”
Construcción de muros en bloque hueco de arcilla

REGISTRO FOTOGRÁFICO








EPMSC AGUACHICA

Alcances a ejecutar:

Alcance N°7: adecuación del espacio de consumo de alimentos de los funcionarios (cafetería) presenta riesgo para seguridad y salud en el trabajo, techo actual de palma seca.

Fechas según ultima programación


Inicio: 14 de enero del 2026

Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 15 de mayo del 2026

Recurso asignado: $ 182.218.317,68

Actividades ejecutadas en el periodo:
Instalación de lavamanos

Instalación de ventanas de aluminio anodizado color natural

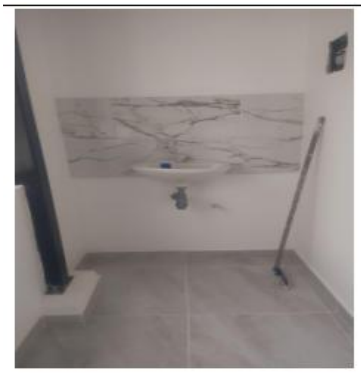	
Lavamanos cerámico de sobreponer	Grifería mezclador 8" de sobreponer para lavaplatos cuello de ganso





Ventana Compuesta con perfiles de aluminio anodizado color natural





Ventana Compuesta con perfiles de aluminio anodizado color natural

COCUC CUCUTA

Alcances a ejecutar:

Alcance N°1: Condiciones de funcionamiento En los ranchos de hombres y mujeres Complejo Carcelario de Cúcuta (PARCIAL - Adecuación rancho de hombres)

Fechas según ultima programación

Inicio: 7 de noviembre del 2025

Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 15 de junio del 2026

Recurso asignado: $683.129.671 y $ 1.295.190.834 Adicional

Actividades ejecutadas en el periodo:

Instalacion de cableado electrico y tuberia.





Levante de muros en mamposteria y aplicación de pañete





EPMSC ERE JP BUCARAMANGA (LA MODELO)

Alcances a ejecutar:

Alcance N°2: Hallazgo 31-2023-1 Mantenimiento Generales (complementación pabellones) ADECUACIÓN DE CELDAS DE LOS PABELLONES 1,2,3,4,6, 9, 7, 5, 2, 8: Cambio de la red hidrosanitaria general, retiro de aparatos sanitarios en mal estado, reposición de aparatos sanitarios en aluminio, construcción de orinales y lavamanos corridos en aluminio anti vandálicos, remodelación general de la batería: cambiando pisos en cerámica y enchape de muros. Celdas: Resanes de pañetes, pintura en general, cambio de puertas metálicas en mal estado, retiro y suministro de barandas sobre el corredor frente a las celdas.

Alcance N°4: Mantenimiento de RED sanitaria en los puntos críticos

Fechas según ultima programación

Inicio: 7 de noviembre del 2025

Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 15 de junio del 2026

Recurso asignado: $ 1.020’415.578,00

Actividades ejecutadas en el periodo:

Demolición manual de alistado de piso
Demolición manual de enchapes y acabados de muros de tipo liviano





Tuberia hidráulica en piso 3 pabellón 6





Puntos hidráulicos en duchas y sanitarios en piso en piso 3 del pabellón 6





Pañete en muros piso en piso 3 del pabellón 6





Pañete en muros piso en piso 3 del pabellón 6

EPMSC SAN GIL

Alcances a ejecutar:

Alcance No.1: Mantenimiento y/o adecuación zona de rancho de acuerdo a exigencias autoridades departamentales

Fechas según ultima programación

Inicio: 9 de diciembre del 2025

Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 15 de mayo del 2026

Recurso asignado: $ 163.336.492,00

Actividades ejecutadas en el periodo:





ENCHAPE EN BALDOSA CERAMICA PARA PISO en zona caliente

	
Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada cal. 18	

CPMSM BUCARAMANGA (RM)
Alcances a ejecutar:

Alcance No.1: MANTENIMIENTO RED HIDRÁULICA Y HIDROSANITARIA DE TODO EL ESTABLECIMIENTO: Se hace necesaria del cambio y mantenimiento de toda la red hidráulica e hidrosanitaria de todo el establecimiento ya que esta se encuentra obsoleta y en mal estado por su tubería en gres al igual se hace necesario de que se presentan daños como tubos rotos y debido a esto se presenta mucho desperdicio de agua.

Alcance No.2: Mantenimiento general pabellón maternas (Mantenimiento y/o Adecuación área de sala cuna).

Fechas según ultima programación

Inicio: 20 de septiembre del 2025

Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 7 de mayo del 2025

Recurso asignado: $ 139.425.314

Actividades ejecutadas en el periodo:

Sanitario cerámico de tanque
Demolición manual de alistado de piso y material de acabado de tipo liviano
Desmonte manual de aparatos sanitarios de tipo cerámico
Punto AF Duchas PVCP 1/2"
Media caña en mortero impermeabilizado integralmente
Rejilla de piso metálica redonda en aluminio
Estuco acrílico, de tipo monocomponente

EPAMS CAS GIRON

Alcances a ejecutar:

Alcance No.5: (ADICIONAL) – Mantenimiento de redes eléctricas subestación eléctrica portal 2.

Fechas según ultima programación

Inicio: 25 de agosto del 2025

Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 28 de febrero del 2026

Recurso asignado: $ 694.225.319

Actividades ejecutadas en el periodo:

Se realiza entrega formal del establecimiento

EPMSC PAMPLONA

ALCANCES EJECUTADOS:
Alcance No. 2 Reparación de humedades presentes en las celdas de las plantas 1,2,3,4 del pabellón 1, ocasionadas por filtraciones de la red hidrosanitaria de este pabellón de celdas.

FECHA DE INICIO:
1 de septiembre del 2025

FECHA DE TERMINACION EN EL ERON:
12 de septiembre del 2026

FECHA DE ENTREGA FINAL CON USPEC DEL ERON:
12 de septiembre del 2026

RECURSO ASIGNADO:
$ 229.779.224,00

ACTIVIDADES EJECUTADAS:
Desmonte manual de tejas de asbesto cemento
Suministro, fabricación y montaje de estructura metálica para Cubierta
Instalación teja arquitectónica para cubierta

REGISTRO FOTOGRÁFICO









EPMSC OCAÑA

ALCANCES EJECUTADOS:
Alcance No. 3 Mantenimiento y adecuación Alojamiento de Cuerpo de Custodia y Vigilancia y Auxiliares bachilleres, casino, casa fiscal.

FECHA DE INICIO:
6 de octubre del 2025

FECHA DE TERMINACION EN EL ERON:
23 de diciembre del 2025

FECHA DE ENTREGA FINAL CON USPEC DEL ERON:
7 de mayo del 2026

RECURSO ASIGNADO:
$ 197.754.871

ACTIVIDADES EJECUTADAS:
Desmonte manual de marco divisiones y vidrios de ventanas metálicas
Desmonte manual de marco y hoja de puerta
Desmonte manual de tejas de asbesto cemento
Demolición manual de guarda escobas.
Demolición manual de alistado de piso y material de acabado de tipo liviano
Desmonte manual de aparatos sanitarios de tipo cerámico
Demolición manual de cielo raso en panelería liviana
Raspado de pintura existente en muros

Picada de pañete de muros realizado con herramienta menor
Demolición manual de enchapes y acabados de muros de tipo liviano
Desmonte y/o demolición manual de estructura de soporte de cubierta
Demolición manual de placa de contrapiso
Placa de contrapiso en concreto e.>8,1<=10,0 cm f'c=3000 PSI
Estructura metálica de cubierta
Mesones con superficie en plaqueta de concreto y apoyos en mampostería;
Cielo raso en láminas de PVC e=10mm con acabado liso.
Tubería PVCP 1/2" RDE 9
Suministro e instalación de red eléctrica
Limpieza y mantenimiento de tablero de 24 circuitos existente.
Suministro e instalación de interruptor monopolar tipo enchufable
Suministro e instalación de tomacorriente
Suministro e instalación de tomacorriente tipo GFCI
Salida para interruptor sencillo
Suministro e instalación de luminaria panel redondo LED
Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 18.000
Pañete liso impermeabilizado
Filos y dilataciones con mortero 1:4 (e=2cm)
Alistado de pisos con mortero 1:3 h.=4 cm
Ventana Compuesta con perfiles de aluminio anodizado color natural
Suministro e instalación de carpintería metálica en aluminio anodizado en machimbre para puerta doble hoja.
Lavamanos cerámico
Lavaplatos / vertedero en acero inoxidable 60x40 cm de sobreponer
Sanitario cerámico de tanque
Estuco acrílico, de tipo monocomponente con presentación plástica
Pintura vinilo acrílica plástica lavable Tipo 1, aplicado en tres (3) capas.
Teja arquitectónica o similar Cal. 26
Enchape de pared con baldosas de cerámica

REGISTRO FOTOGRÁFICO













EPMSC MÁLAGA

ALCANCES EJECUTADOS:
Alcance No. 2 Instalación lava traperos y 01 ducha área de sanidad

Alcance No. 5 Adecuación de terraza y zona de lavado.

FECHA DE INICIO:
11 de noviembre del 2025

FECHA DE TERMINACION EN EL ERON:
6 de marzo del 2026

FECHA DE ENTREGA FINAL CON USPEC DEL ERON:
4 de marzo del 2026

RECURSO ASIGNADO:
$ 89.584.616

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Desmonte manual de tejas metálicas termoacústicas
Demolición manual de alistado de piso y material de
Sellado de puntos hidráulicos
Demolición manual y retiro de puntos sanitarios existentes de 2" a 4"

Desmonte manual de aparatos sanitarios de tipo cerámico

Demolición manual de enchapes y acabados de muros de tipo liviano

Demolición manual de lavadero de piso existente en mampostería

Mantenimiento general correctivo de la estructura metálica existente de cubierta

Estructura metálica de cubierta y pasillo técnico

Poceta de aseo medidas 60x60x40 cm (a x L x h) fabricada en bloque de arcilla No.4,

Suministro e instalación de tubería EMT de 1/2".

Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en

Suministro e instalación de interruptor monopolar tipo enchufable de 1x50 A.

Salida para luminaria en tubería EMT.

Salida para interruptor sencillo cableado en 3x12

Suministro e instalación de luminaria panel cuadrado LED de potencia igual o mayor a 40W. 100-240V. 60x60cm.

Pañete liso impermeabilizado integralmente 1:3 e.=2 cm.

Alistado de pisos con mortero impermeabilizado integralmente

Acabado de piso con baldosa de cerámica de 33,8x33,8 cm

Guarda escoba en baldosa de cerámica

Ventana Compuesta con perfiles de aluminio anodizado color natural

Puerta entamborada en lámina figurada CR cal. 18

Juego completo de aparatos sanitarios para baño

Estuco acrílico, de tipo mono componente con presentación plástica


Pintura vinilo acrílica plástica lavable Tipo 1,

Instalación de teja arquitectónica o similar Cal. 26

Enchape de pared con baldosas de cerámica de 30x60 cm

Suministro e instalación de lavadero prefabricado con tanque de almacenamiento de agua, medidas (80 a 90)x60x25 cm (a x L x h

REGISTRO FOTOGRÁFICO











EPMSC SOCORRO

ALCANCES EJECUTADOS:
Alcance No. 1 Mantenimiento (rancho) del ERON, techos y paredes, teniendo en cuenta que presenta filtraciones y humedad, desprendimientos de mampostería; adecuación de espacios físicos como bodegas de almacenamiento y cuarto frio.

FECHA DE INICIO:
30 de septiembre del 2025

FECHA DE TERMINACION EN EL ERON:
10 de octubre del 2025

FECHA DE ENTREGA FINAL CON USPEC DEL ERON:
12 de noviembre del 2025

RECURSO ASIGNADO:
$ 232.295.537

ACTIVIDADES EJECUTADAS:
Desmonte y/o demolición manual de estructura de soporte de cubierta,
Estructura metálica de cubierta
Mortero pendientado alta resistencia
Suministro, transporte e instalación de teja arquitectónica o similar cal. 26
Impermeabilización con poliurea de elongación del 300% al 350%

REGISTRO FOTOGRÁFICO












EPMSC VÉLEZ

ALCANCES EJECUTADOS:
Alcance No. 1: “Mantenimiento y/o adecuación Alojamiento personal de guardia CCV Masculino”

Alcance No. 6: “Garitas, cambio de escaleras, baterías sanitarias, cambio de vidrios, mantenimiento general” en alojamiento de guardia y garitas 2 y 4.

FECHA DE INICIO:
4 de noviembre del 2025

FECHA DE TERMINACION EN EL ERON:
30 de diciembre del 2025

FECHA DE ENTREGA FINAL CON USPEC DEL ERON:
2 de marzo del 2026

RECURSO ASIGNADO:
$ 90.058.922

ACTIVIDADES EJECUTADAS:
Desmonte manual de marco divisiones y vidrios de ventanas metálicas blindadas antibalas
Picada de piso en concreto realizado con herramienta menor
Mortero pendientado alta resistencia
Ventana estructura metálica - corrediza + vidrio blindado CAT 2
Impermeabilización de cubierta con Poliurea

REGISTRO FOTOGRÁFICO








EPMSC BARRANCABERMEJA.

Durante el período evaluado el contratista en compañía de la interventoría hizo presencia en el establecimiento para toma de medidas para organizar balance de obra.

El contratista manifiesta que el problema financiero que se tiene en el contrato ha sido factor determinante para no iniciar las obras, a la fe ha del presente informe no ha entregado a esta interventoría el balance presupuestal de las actividades finales a ejecutar.

REGIONAL VIEJO CALDAS.

EPMSC FRESNO.

VALOR: $ 83.474.182,00
ALCANCES: ALCANCE No.1: Mantenimiento general de las redes hidrosanitarias
ALCANCE No. 2: Mantenimiento humedad cuarto de Armerillo y comedor CCV.

Actividades ejecutadas.

Durante este periodo las actividades de obra civil en el establecimiento se culminaron a satisfacción en su 100%.

ESTABLECIMIENTOS REGIONAL NOROESTE.

EPMSC BELLAVISTA MEDELLIN

Alcances a ejecutar:

Alcance N°1: Hallazgo 157 de 2023-1 - Condiciones de funcionamiento del rancho, problemas en cuartos fríos, problemas de humedad.

Alcance N°2: Hallazgo 139 de 2023-1 - Zona de sanidad sin lavamanos, para que el medico se lave las manos en cada consulta. visita técnica para verificación.

Alcance N°3: Hallazgo 47 de 2023-1 - Adecuación de galpones. diagnostico ambiental, manejo de aguas residuales no domésticas.

Alcance N°4: Terminación del edificio de locativas, atención primaria.

Fechas según ultima programación

Inicio: 04 de agosto de 2025

Final: 04 de mayo de 2025

Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 04 de mayo de 2025

Recurso asignado: $ 1.586´805.392.00

Actividades ejecutadas en el periodo:

ALCANCE N.° 1: Condiciones de Funcionamiento del Rancho, Cuartos Fríos y Humedades (Hallazgo 157 de 2023-1)

Estado Contractual: En ejecución activa / Fase de control de calidad, conciliación y revisión de interferencias de diseño.
Desarrollo de Actividades en el Periodo: Durante la presente quincena se llevó a cabo un recorrido técnico exhaustivo para verificar las observaciones de obra en la zona del Rancho. Actualmente, las partes se encuentran en mesas de conciliación de cantidades y ajuste del balance técnico-financiero.
Se aprobó el reconocimiento de los metros cuadrados de enchape en la bodega del Rancho como medida estética para mitigar las humedades. No obstante, se ratifica la salvedad contractual de que la Interventoría no se hace responsable si la patología de humedad persiste en el tiempo, dado que el origen proviene de la falta de aislamiento térmico del cuarto frío colindante (infraestructura ejecutada bajo un contrato ajeno e independiente al nuestro). Asimismo, se ordenó subsanar de inmediato los pendientes en baños (emboquilles, pintura de ventanas y divisiones de acero inoxidable).

ALCANCE N.° 3: Adecuación de Galpones y Manejo de Aguas Residuales (Hallazgo 47 de 2023-1)

Estado Contractual: Restricción total de inicio de obras físicas.
En mesa de seguimiento con la USPEC y la Coordinación, se formalizó el estado de NO APROBACIÓN de los diseños eléctricos para el área de galpones, debido a incumplimientos normativos graves frente al RETILAP 2024. La Interventoría mantiene la suspensión y prohibición estricta de iniciar cualquier obra civil, adecuación o suministro de materiales en este frente hasta que el contratista subsane la carpeta técnica.
Restricción de Espacio e Implantación de Diseño: En las inspecciones de campo de este periodo, la Interventoría evidenció y notificó la existencia de limitaciones críticas de espacio real a intervenir en la infraestructura. En consecuencia, se solicitó formalmente al contratista realizar la implantación detallada del diseño en sitio para evitar interferencias constructivas y garantizar la viabilidad funcional de las áreas.


10:28
29 de may 2026
Vie
EPMSC BELLAVISTA


10:25
29 de may 2026
Vie
EPMSC BELLAVISTA


10:27
29 de may 2026
Vie
EPMSC BELLAVISTA


10:32
29 de may 2026
Vie
EPMSC BELLAVISTA





COPED PEDREGAL

Alcances a ejecutar:

Alcance Adicional N°1: Obras necesarias para la estabilización de talud, con base en los diseños realizados.

Alcance Adicional N°2: Mantenimiento y Adecuación de tuberías aguas lluvias y aguas residuales, entre las Garitas 5 y 6

Alcance Adicional N°3: Reparación del Cerramiento perimetral, mallas, concertinas entre las Garitas 5 y 6.

Se ha solicitado por parte del ejecutor un cambio de alcances estos se encuentran justificados técnicamente:

ALCANCE ADICIONAL No.4 Impermeabilización de cubiertas pabellón No 16, 17, 18 y unidad de medidas especiales del pabellón de mujeres.

ALCANCE ADICIONAL No 6 impermeabilización de portal No 2 pabellón de mujeres.

ALCANCE ADICIONAL No 7 Cerramiento provisional en costado sur del establecimiento (zona de afectación por deslizamiento)

Fechas según ultima programación

Inicio: 30 de enero de 2026

Final: 15 de mayo de 2026

Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 15 de mayo de 2026

Recurso asignado: $ 1.794´711.480.00

Actividades ejecutadas en el periodo:

ALCANCES ADICIONALES N.° 4 y N.° 6: Impermeabilización de Cubiertas (Pabellones 16, 17, 18, UME y Portal N.° 2 de Mujeres)

Estado Contractual: En ejecución activa / Inicio formal de labores en campo.

Desarrollo de Actividades en el Periodo: Posterior al recorrido de reconocimiento técnico realizado el 26 de mayo de 2026 y a la concertación de los alcances aprobados en el informe de diagnóstico, la Dirección del establecimiento efectuó la entrega formal de espacios y autorizaciones de seguridad. El 27 de mayo se registró el ingreso de personal y materiales por parte del contratista (*Consorcio Mantenimientos GMC*), dando inicio inmediato a las actividades críticas mediante el **retiro mecánico y manual del manto impermeabilizante existente en la placa de cubierta del Pabellón 18**.

De acuerdo con el cronograma autorizado, para la siguiente quincena se dará continuidad al rasqueteo y preparación de superficies de las losas, coordinando simultáneamente las actividades

de trasiego manual de material sobrante y escombros a distancias mayores ($>150 \leq 250\text{ m}$) hacia el punto de acopio general para su posterior cargue y disposición final.

ALCANCE ADICIONAL N.° 7: Cerramiento Provisional Costado Sur del Establecimiento

Estado Contractual: En etapa de balance para inclusión presupuestal y revisión estricta de responsabilidades.

Justificación de Control y Alerta Geológica: Atendiendo la alta preocupación manifestada por la Dirección de Pedregal respecto a las vulnerabilidades de seguridad física en la zona afectada por la falla geológica y el deslizamiento activo, en mesas anteriores se dio paso a la inclusión de un Nuevo Ítem (NP) de Cerramiento Provisional de Obra. Es imperativo aclarar en este informe que dicho elemento perimetral funcionará única y exclusivamente como una barrera transitoria de mitigación de seguridad física.

Delimitación de Responsabilidades Técnicas (Concepto de Especialistas): Esta Interventoría deja constancia técnica e histórica en actas de que los ingenieros especialistas y geotecnistas emitieron un NO rotundo a la aplicación de las soluciones de estabilización inicialmente planteadas, argumentando la extrema inestabilidad geológica activa del terreno. En consecuencia, la Interventoría se encuentra recopilando y exigiendo los soportes pertinentes para trasladar de forma oficial a la USPEC la necesidad de determinar el responsable de la solución provisional ta que no cuenta con tiempo alguno de estabilidad.

Se solicitó el ajuste al balance con algunas exclusiones y modificaciones en actividades generales.









EPMSC SANTO DOMINGO

ALCANCES EJECUTADOS:
Alcance No. 1: Adecuación de garita

FECHA DE INICIO:
24 de junio de 2025

FECHA DE TERMINACION EN EL ERON:
17 de octubre de 2025

FECHA DE ENTREGA FINAL CON USPEC DEL ERON:
25 de noviembre del 2025

RECURSO ASIGNADO:
$ 94.601.546

ACTIVIDADES EJECUTADAS:
Desmonte manual de marco y hoja de puerta
Demolición manual de alistado de piso y material de acabado
Desmonte manual de luminarias
Demolición manual de pañetes bajo
Picada de pañete de muros realizado con herramienta menor garantizando
Demolición manual de Pañetes
Demolición manual de muros sencillos en mampostería
Demolición manual de placa de contrapiso
Excavación manual en material común
Relleno manual con material seleccionado de sitio.
Placa de contrapiso en concreto
Columnetas y/o Viguetas en concreto f'c=3000 PSI,
Suministro e instalación de tubería IMC de 3/4".
Suministro e instalación de luminaria tipo reflector LED de 400w,
Guardaescoba en baldosa de cerámica
Ventana Fija en lámina CR cal. 12 con mayor desarrollo en su perfilería para uso con vidrio blindado antibalas.
Ventana Malla fabricada con marco en ángulo de acero
Puerta entamborada

Ventana reja con barrotes en varilla de 3/4"
Puerta reja con barrotes en varilla de 3/4"
Suministro e instalación de vidrio multilaminado blindado incoloro antibalas nivel IV
Estuco acrílico, de tipo monocomponente con presentación plástica
Pintura vinilo acrílica plástica lavable Tipo 1, aplicado en tres (3) capas.

REGISTRO FOTOGRÁFICO






EPMSC SANTA ROSA DE OSOS

ALCANCES EJECUTADOS:
Alcance No. 1: mantenimiento áreas de aislamiento (UTE) mantenimiento de los puntos realizando pruebas posteriormente mejorar y reparar las superficies pañetadas, impermeabilizando para luego pintar.

Alcance N°2: Adicional 1: Mantenimiento de alojamientos hasta agotar recurso restante.

FECHA DE INICIO:
24 de junio de 2025


FECHA DE TERMINACION EN EL ERON:
15 de diciembre de 2025

FECHA DE ENTREGA FINAL CON USPEC DEL ERON:
26 de febrero de 2026

RECURSO ASIGNADO:
$ 82.130.251

ACTIVIDADES EJECUTADAS:
Demolición manual del listado de piso D
Demolición manual y retiro de puntos sanitarios existentes
Demolición manual de batería sanitaria
Demolición manual de ducha existente
Rapado de pintura en muros existentes
Demolición manual de luminarias
Demolición manual de pañete
Demolición manual de placa de contrapiso
Excavación manual de material común relleno con material placa de contrapiso
Tubería de alcantarillado
Limpieza de cajas de inspección
Puntos sanitarios
Suministro instalación de lámparas herméticas led
Aplicación de pañete
Alistado de piso
Instalación de lavamanos y sanitarios antivandálico
Aplicación de estuco
Aplicación de pintura

REGISTRO FOTOGRÁFICO

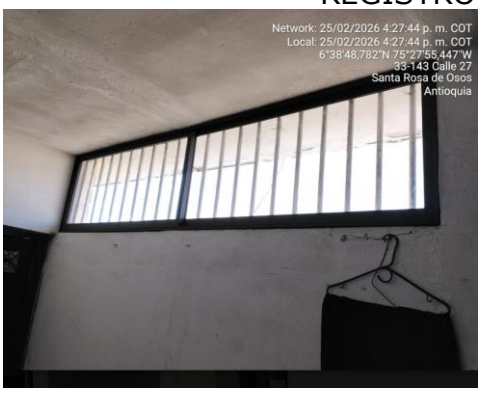









EPMSC YARUMAL

ALCANCES EJECUTADOS:
Alcance No. 3: Mejoramiento iluminación perimetral.

FECHA DE INICIO:
24 de junio de 2025

FECHA DE TERMINACION EN EL ERON:
25 de octubre del 2025

FECHA DE ENTREGA FINAL CON USPEC DEL ERON:
25 de noviembre del 2025

RECURSO ASIGNADO:
$ 130.988.728

ACTIVIDADES EJECUTADAS:
Instalación de reflectores en fachada
Remplazo de tableros eléctricos
Instalación de reflectores en la entrada principal
Instalación de tubería IMC

REGISTRO FOTOGRÁFICO









EPMSC APARTADÓ

ALCANCES EJECUTADOS:
Alcance No. 1: Iluminación perimetral

Alcance N°3: Mantenimiento tanques elevados.

FECHA DE INICIO:
23 de julio de 2025

FECHA DE TERMINACION EN EL ERON:
15 de diciembre de 2025

FECHA DE ENTREGA FINAL CON USPEC DEL ERON:
24 de noviembre del 2025

RECURSO ASIGNADO:
$ 447´964.914.00

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Suministro e instalación de tapa de 72x72cm
Excavación en suelo para instalación de tubería eléctrica,
Suministro e instalación de tubería PVC de 3/4".
Suministro e instalación de caja de paso de 15x15x10 cm con tapa.
Suministro e instalación de red de entrada y salida en cable encauchetado
Suministro e instalación de red eléctrica Monofásica en Cable
Suministro e instalación de luminaria tipo reflector LED de 400w
Suministro e instalación de luminaria tipo urbana (alumbrado público) LED
Desmonte de lámparas de exterior a cualquier tipo de altura,
Suministro e Instalación de fotocelda para control automático.
Pañete liso impermeabilizado integralmente bajo placa 1:4 e.=2 cm

REGISTRO FOTOGRÁFICO






EPMSC ANDES

Alcances a ejecutar:
Alcance N°2: Mantenimiento y/o adecuación muro cerramiento parqueadero al lado del rancho.
Alcance N°3: Impermeabilización techos y lozas de todo el establecimiento.
Fechas según ultima programación
Inicio: 23 de diciembre de 2025
Final: 31 de agosto de 2026
Recurso asignado: $ 323´441.427.00

Actividades ejecutadas en el periodo:

- El ejecutor realiza la entrega de los certificados del material de relleno pendientes a utilizar (Limite Liquido, Índice de Plasticidad y porcentaje de Materia orgánica) cumpliendo la norma invias.
- Se reitera la solicitud al contratista el aumento de personal ya que se viene presentando un avance muy reducido el cual viene arrojando un atraso referente a la programación aprobada.
- Se entregaron los resultados de laboratorio la los elementos de concretos fundidos a la fecha, aunque no fueron fallados en a las edades solicitadas en la >NSR-10 ellos están dando de acuerdo al diseño de mezcla de 21 Mpa.

Registro fotográfico.







EPMSC JERICO

Alcances a ejecutar:

Alcance N°1: Verificación del estado de la paredes-techos del establecimiento en general, por humedades ya identificadas (celda COVID-celdas patio 1.
Fechas según ultima programación
Inicio: 18 de noviembre de 2025
Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: No han presentado nueva programación de obra
Recurso asignado: $ 178´860.711.00.

Actividades ejecutadas en el periodo:

- Se reitera subsanar las observaciones de pintura que se vienen presentando en la estructura metálica suministrada (Producto no conforme) ya que dicha estructura está presentando problemas de oxidación en diferentes sectores de la estructura.

- Retoman actividades en obra a partir del 20 de abril de 2026, con la continuación de la instalación de la estructura de la cubierta de la zona de la celda COVID y patio 1, al igual que la cubierta de patio de ingreso.

EPMSC PUERTO BERRÍO

Alcances a ejecutar:

Alcance N°1: Encerramiento con malla de seguridad para el techo de los pabellones 1, 2, 3 y 4 en las áreas comunes de los pabellones
Fechas según ultima programación
Inicio: 26 de enero 2026
Final: 15 de mayo de 2026
Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 15 de mayo de 2026
Recurso asignado: $152´994.514.00
Actividades ejecutadas en el periodo:

- En la actualidad no se realizan actividades de obra, el ejecutor informa que se están realizando actividades en taller para llegar a realizar el montaje en obra.
- Se encuentra pendiente el envío del balance de obra, programación de obra con el ajuste a la fecha del nuevo, plan de contingencia y plan de trabajo, adicionalmente el envío de la documentación del personal para el reinicio de actividades.

EP PUERTO TRIUNFO - EL PESEBRE

Alcances a ejecutar:

Alcance N°1: Tutela 2021-00014. Insuficiencia de baños. Tutela 2022-00043. Baños patio 6 y 2.
Alcance N°3: ALCANCE NO.3: Mantenimiento Iluminación del ERON
Fechas según ultima programación
Inicio: 26 de enero de 2026
Final: 14 de mayo de 2026
Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 31 de agosto de 2026
Recurso asignado: $ 1.205´663.854.00

Actividades ejecutadas en el periodo:

- En la actualidad no se realizan actividades de obra, se ha realizado reuniones de manera conjunta entre establecimiento, infraestructura del INPEC, USPEC, ejecutor e interventoría con el fin de ajustar la logística de inicio de actividades, se presenta plan de trabajo para ser revisado entre las partes.
- Se encuentra pendiente el envío del balance de obra, programación de obra ajustada a la nueva fecha de ejecución, plan de contingencia y plan de trabajo, adicionalmente el envío de la documentación del personal para el reinicio de actividades.

ESTABLECIMIENTOS REGIONAL VIEJO CALDAS

EPMSC MANIZALES

Alcances a ejecutar:

Alcance No.2: Adecuación de Armerillo, es un hallazgo debido a que no cumple con los estándares de contención de gases (PRIORIZADO)
Alcance No.3: Concertina: reforzamiento al alambre de seguridad del perímetro del ERON. (PRIORIZADO)

Alcance No.4: Mantenimiento de las escaleras metálicas o de concreto de Área educativa y tratamiento (PRIORIZADO)

Fechas según ultima programación

Inicio: 4 de julio del 2025

Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 6 de noviembre del 2026

Recurso asignado: $ 312.872.125

Actividades ejecutadas en el periodo:
Se realiza entrega formal del establecimiento


- Desmonte manual de Marco de puertas
- Desmonte manual de baranda metálica
- Demolición y listado de piso
- Desmonte manual de tubería existente
- Desmonte manual de aparato sanitario
- Desmonte manual de luminarias
- Raspado de pintura existente
- Demolición manual de enchape
- Demolición manual de muros en mampostería
- Cielo raso en sistema de drywall
- Sistema de instalación de tubería y emt
- Suministro de red eléctrica
- Instalación de tomacorrientes
- Salidas de luminarias
- Aplicación de pañete
- Alistado de piso en mortero
- Puerta entamborada
- Enchape de pared con baldosa
- Instalación de lavamanos cerámico y Sanitario
- Aplicación de pintura
- Aplicación de estuco
- Instalación de concertina

REGISTRO FOTOGRÁFICO







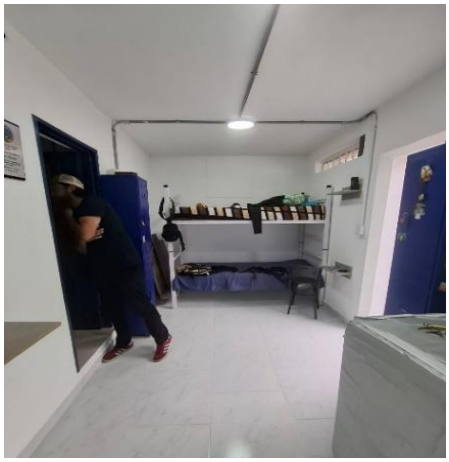

EPMSC ANSERMA

Alcances a ejecutar:

Alcance No.1: Cambio de lámparas reflectores (12 lámparas) en la parte interna.

Alcance No.2: Arreglo de las paredes patio 1, 2 y 3 debido a la humedad.

Fechas según ultima programación

Inicio: 20 de agosto del 2025

Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 31 de octubre del 2025.

Recurso asignado: $ 103.945.445,00

Actividades ejecutadas en el periodo:
Se realiza finalización de actividades

EPMSC PÁCORA

Alcances a ejecutar:

Alcance No.3: Mantenimiento y adecuación archivo de gestión documental de acuerdo con la ley 594 de 2000. Art 16, y el plan de mejoramiento archivístico. $ 84,353,246.00

Fechas según ultima programación

Inicio: 8 de septiembre del 2025.

Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 13 de noviembre del 2025.

Recurso asignado: $ 84,353,246.00.

Actividades ejecutadas en el periodo:
Se realiza finalización de actividades

EPMSC PENSILVANIA

Alcances a ejecutar:

Alcance No.2: Mantenimiento y Adecuación Archivo de Gestión Documental de acuerdo con la Ley 594 de 2000 Art. 16, y el Plan de Mejoramiento Archivístico. $ 83.767.768,00.

Fechas según ultima programación

Inicio: 11 de agosto del 2025

Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 7 de noviembre del 2025

Recurso asignado: $ 83.767.768,00

Actividades ejecutadas en el periodo:
Se realiza finalización de actividades

EPMSC RIOSUCIO

Alcances a ejecutar:

Alcance No.1: Mantenimiento y/o adecuación de alojamiento para masculino Cuerpo de custodia y vigilancia Posesión Municipio. Reubicación taller de maderas. Ampliación zona administrativa. Ampliación patio 1 zona deportiva. Reubicación caniles Mantenimiento y adecuación zona de aislamiento. Mantenimiento y adecuación de esclusa patio 1 y 2. Mantenimiento y/o adecuación patio 3. Mantenimiento y/o adecuación segunda planta. Subalcance No 1 Reubicación taller de maderas los cuales fueron presupuestados en su totalidad arrojando un presupuesto para la intervención de $ 65.478.361

Fechas según ultima programación

Inicio: 21 de agosto del 2025

Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 15 de diciembre del 2025

Recurso asignado: $ 65.478.361,00

Actividades ejecutadas en el periodo:
Se realiza finalización de actividades

EPMSC SALAMINA
Alcances a ejecutar:

Alcance No.1: Mantenimiento y adecuación de la red hidrosanitaria de los dormitorios y patios 1, 2

Fechas según ultima programación

Inicio: 15 de septiembre del 2025

Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 30 de abril del 2026

Recurso asignado: $106,260,117.00
Actividades ejecutadas en el periodo:
Se realiza finalización de actividades

RM MANIZALES

Alcances a ejecutar:

Alcance No.2: Mantenimiento de Cubierta que se encuentra en terraza que es de asbesto cemento y cambio de canales y bajantes que no son suficientes y reflejan humedad en área de tratamiento, biblioteca, en esta área se encuentra un muro próximo a desplomarse

Fechas según ultima programación

Inicio: 14 de octubre del 2025

Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 15 de enero del 2026

Recurso asignado: $ 271.867.490

Actividades ejecutadas en el periodo:
Se realiza finalización de actividades

- Suministro del servicio de acometida hidráulica
- Suministro y fabricación de estructura metálica para cubierta
- Alistado para superficie mortero impermeabilizado
- Impermeabilización de placa de cubierta
- Retiro de cubierta en Eternit
- Retiro e instalación de puerta metálica
- Instalación de teja arquitectónica calibre 26

- ✓ **REGISTRO FOTOGRÁFICO**











EPMSC CALARCÁ

Alcances a ejecutar:

Alcance No.1: Mantenimiento redes de alcantarillado e hidrosanitarias del ERON (ACCIÓN POPULAR).

Alcance 2: Mantenimiento y Adecuación Archivo de Gestión Documental de acuerdo a la Ley 594 de 2000 Art. 16, y el Plan de Mejoramiento Archivístico

Fechas según ultima programación

Inicio: 15 de diciembre del 2025
Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 15 de mayo del 2026

Recurso asignado: $ 511.567.488,00

Actividades ejecutadas en el periodo:
Se realiza finalización de actividades

- Desmonte manual de bajantes existentes
- Picada de piso en concreto
- Demolición manual de alistado A
- Acabado retiro de tubería potable y sanitaria
- Desmonte manual de tubería potable
- Desmonte manual de aparatos sanitario
- Desmonte manual de luminarias
- Demolición manual de pañete bajo placa
- Rapado de pintura existente muros
- Demolición manual de enchape
- Demolición manual de muro
- Demolición manual de lavamanos
- Placa de contrapiso en concreto
- Instalación de cielo raso en láminas de PVC
- Instalación de tubería PVC
- Suministro instalación de tablero trifásico de distribución
- Suministro instalación de interruptores y tomacorrientes
- Salidas de luminaria y salidas de interruptores
- Suministro e instalación de lámparas LED
- Suministro instalación de equipo de aire acondicionado mini split
- Aplicación de pañete
- Alistado de piso en mortero

- Acabado de piso en baldosa
- Acabado de piso epóxico
- Impermeabilización en placa de cubierta
- Marcos de puerta instalación de lavamanos y sanitario
- Aplicación de estuco muros
- Aplicación de pintura
- Suministro instalación de cajas estacionarias metálicas para almacenamiento temporal de residuos sólidos

REGISTRO FOTOGRÁFICO






EPMSC ARMENIA

Alcances a ejecutar:

Alcance No.1: Reposición de o mantenimiento de motobombas (Alojamiento y patio No. 1) (PRIORIZADO)
Alcance No.2: Reparación red eléctrica de alumbrado perimetral, aumento de luminarias en sector muro posterior (PRIORIZADO)

Fechas según ultima programación

Inicio: 2 de febrero del 2026

Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 31 de marzo del 2026

Recurso asignado: $ 226.765.868

Actividades ejecutadas en el periodo:
Se realiza finalización de actividades

- Suministro instalación de tubería imc de 3/4
- Suministro instalación de cajas de inspección de 2 * 4
- Suministro instalación de red de entrada y salida de cable enchufado Suministro instalación de red eléctrica monofásica
- Suministro instalación de tubería emt
- Suministro instalación de lámina tipo reflector
- Luminaria tipo reflector LED
- Instalación de Bombas

REGISTRO FOTOGRÁFICO











RM ARMENIA
Alcances a ejecutar:

Alcance No.1: Mantenimiento de baños comunitarios y red hidrosanitaria en patios de las PPL (salón primer piso) (PRIORIZADO)

Alcance 3 Mantenimiento y adecuación por humedades a la bodega de comisos, la cual está siendo afectada por las filtraciones de la tubería de los baños del módulo 7 (PRIORIZADO)

Alcance 4 Mantenimiento de baños comunitarios y red hidrosanitaria en patio de sindicadas. (PRIORIZADO)
Fechas según ultima programación

Inicio: 12 de febrero del 2026
Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 31 de marzo del 2026
Recurso asignado: $ 173.475.794

Actividades ejecutadas en el periodo:
Se realiza finalización de actividades

- Desmonte manual de Marco de hojas de puerta
- Desmonte manual de luminarias
- Desmonte manual de cielo raso existente
- Raspado de pintura existente
- Instalación de cielorraso en láminas PVC
- Suministro instalación de lámparas herméticas
- Suministro e instalación de reflector
- Aplicación de pañete liso común
- Instalación de puerta entamborada en lámina figurada CR calibre 18
- Aplicación de estuco en muros
- Aplicación de pintura epóxica
- Aplicación de esmalte sintético en puerta de acceso a decomiso

REGISTRO FOTOGRÁFICO






EPMSC ERE PEREIRA

Alcances a ejecutar:

Alcance No.3: Realizar impermeabilización en los pasillos y celdas de las PPL. (Requerimiento Secretaría de Salud Pereira) (PRIORIZADO)

Fechas según ultima programación

Inicio: 28-04-2025 se realiza reinicio de actividades el día 15 de octubre del 2025.

Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 22 de enero del 2026.

Recurso asignado: $ 436.214.804

Actividades ejecutadas en el periodo:
Se realiza finalización de actividades

EPMSC SANTA ROSA DE CABAL

Alcances a ejecutar:

Alcance No.2: Hallazgo 34-2023-1. Mantenimiento de la fachada del establecimiento y adecuación del área administrativa y escaleras. (PRIORIZADO)

Fechas según ultima programación

Inicio: 5 de septiembre del 2025

Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 26 de enero del 2026

Recurso asignado: $ 289.925.487

Actividades ejecutadas en el periodo:
Se realiza finalización de actividades

RM PEREIRA

Alcances a ejecutar:

Alcance No.1: Mantenimiento y/o adecuación sala amiga para familias lactantes (PRIORIZADO)
Alcance No. 3 Intervención red eléctrica pabellón 2 (PRIORIZADO)
Fechas según ultima programación

Inicio: 26 de enero del 2026

Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 31 de marzo del 2026

Recurso asignado: $ 217.408.581

Actividades ejecutadas en el periodo:

Se realiza finalización de actividades

EPMSC HONDA

Alcances a ejecutar:

Alcance No.1: Mantenimiento de las redes hidráulicas e hidrosanitarias.

Fechas según ultima programación

Inicio: 13 noviembre del 2025.

Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 18 de octubre del 2025

Recurso asignado: $ 110.400.739,00

Actividades ejecutadas en el periodo:

Se realiza finalización de actividades

EPMSC LÍBANO

Alcances a ejecutar:

Alcance No.3: Nuevo Alcance dentro de las prioridades y necesidades del Establecimiento Penitenciario EPMSC LIBANO, adecuación y construcción de un espacio para archivo, almacén, oficina de comando y batería sanitaria.

Fechas según ultima programación

Inicio: 24 de noviembre del 2025

Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 30 de abril del 2026

Recurso asignado: $ 65.531.152,00

Actividades ejecutadas en el periodo:

Se realiza finalización de actividades

EPMSC PUERTO BOYACÁ

Alcances a ejecutar:

Alcance No.1: Iluminación: arreglo y mantenimiento general de la iluminación perimetral e interna.

Fechas según ultima programación

Inicio: 13 de abril del 2026



Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 7 de julio del 2026

Recurso asignado: $ 110.347.361,00

Actividades ejecutadas en el periodo:

En ejecución, se encuentran realizando instalación de tubería para iluminación perimetral.

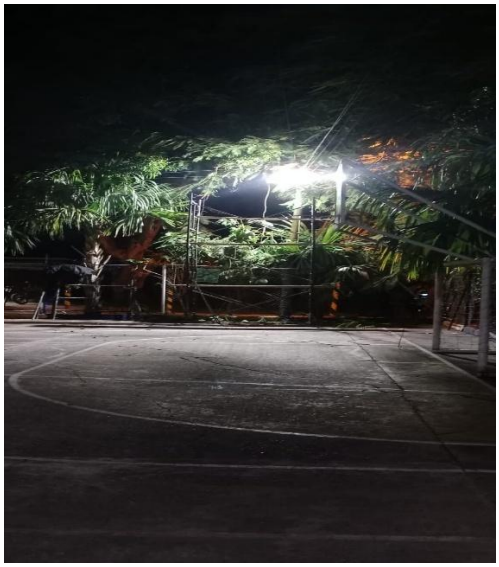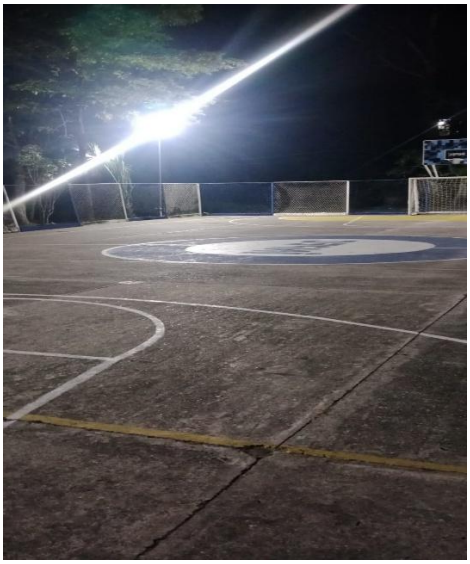

EPAMS PC ERE LA DORADA

Alcances a ejecutar:

Alcance No.1: Acción popular 2014-00389 Mantenimiento área de sanidad (atención médica y odontológica), arreglo griferías, sanitarios, tuberías en celdas visitas conyugales, área administrativa.

Fechas según ultima programación

Inicio: 2 de julio del 2025

Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 15 de mayo del 2026

Recurso asignado: $ 110.347.361,00

Actividades ejecutadas en el periodo:

En ejecución, se encuentran realizando instalación de llaves de lavamanos, controles y duchas en patios.





COIBA IBAGUÉ

Alcances a ejecutar:

Alcance No.1: Mantenimiento de redes hidrosanitarias estructura 2 y 3 a la USPEC (PRIORIZADO)

Alcance No. 2: Adecuación, mantenimiento y reparación rancho de las estructuras 1, 2 y 3 cambio de pisos y pintura epóxica en techos (PRIORIZADO)

Fechas según ultima programación

Inicio: 24 de septiembre del 2025

Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 31 de agosto del 2026

Recurso asignado: **$** 1.457.494.665

Actividades ejecutadas en el periodo:

En ejecución, se encuentran realizando instalación de piso epóxido en área del rancho 5






Sika Ucrete RG Part 3











ESTABLECIMIENTOS REGIONAL NORTE

EC JP BARRANQUILLA (MODELO)
Alcances a ejecutar:

Alcance N°1: Hallazgo 3-2022-1 Redes eléctricas CMSBA La Modelo Barranquilla (D) (F). la estructura se encuentra deteriorada por la carencia de calidad y estabilidad en la ejecución y adecuación de la red eléctrica, generando riesgo de nuevo gasto de recursos públicos y riesgo de imposición de acciones legales por las deficientes condiciones laborales.
Alcance N°3: Mantenimiento correctivo a cubiertas del patio. (PRIORIZADO patio 1 y 3)

Fechas según ultima programación

Inicio: 31 de octubre del 2025

Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 15 de julio del 2026

Recurso asignado: $ 662. 695. 564

Actividades ejecutadas en el periodo:
Durante el período reportado se realiza instalación de tubería eléctrica.

Comentarios sobre lo ejecutado en el periodo:
Se evidencia falta de personal en el establecimiento por lo que se le solicita al contratista presencia del personal.

Registro Fotográfico.

Instalación de tubería eléctrica.








EPMSC ERE PSM BARRANQUILLA (EL BOSQUE)

Alcances a ejecutar:

Alcance N°1: Mantenimiento celdas UTE y Celdas primarias

Alcance N°3: Mantenimiento y/o adecuación de celdas (**rancheros**, íntimas, tercera edad, talleres, comedores, expendios, zonas de reparto de alimentos, áreas deportivas, lavaderos y baños). Observación: Ampliación de las áreas concerniente, en razón a la apertura de los nuevos pabellones modulares, ya que estos no cuentan con asignación para este servicio (PARCIAL)
Fechas según ultima programación

Inicio: 26 de junio del 2025

Fin: 15 de diciembre del 2025

Recurso asignado: $ 368.352.806 y $ 185.000.000 adicional

Actividades ejecutadas en el periodo:
Se realiza entrega formal del establecimiento

Demolición manual y retiro de impermeabilización existente en celdas UTE y rancho
Demolición manual y alistado de piso en celdas UTE.
Demolición y desmonte de aparatos sanitarios antivandálicos existente en celdas UTE.
Raspado de pintura y estuco en muros existentes en ranchos y celdas UTE.
Demolición manual de enchapes en celdas UTE.
Suministro instalación de tubería sanitaria en celdas UTE.
Suministro instalación de red eléctrica para instalación de luminarias en celdas UTE.
Limpieza y mantenimiento de tablero de distribución de circuitos en celdas UTE.
Suministro instalaciones de interruptores en celdas UTE.
Mantenimiento preventivo y correctivo de luminarias LED en rancho.
Resanes sobre superficies en celdas UTE.
Aplicación de pañete en muros en celdas UTE.
Alistado y acabado de piso en celdas UTE.
Suministro instalación de malla para patio de sol en celdas UTE.
Instalación de sanitarios antivandálicos en celdas UTE.
Instalación de duchas en celdas UTE.
Instalación de rejillas de piso en patio de sol y en baños de celdas UTE.
Aplicación de pintura acrílica en celdas UTE y rancho.
Aplicación de estuco en rancho y en celdas UTE.
Impermeabilización con poliuria en cubierta de celdas UTE y rancho.
Suministro instalación de luminarias antivandálicas en celdas UTE.

REGISTRO FOTOGRÁFICO













EPMSC CARTAGENA

Alcances a ejecutar:

Alcance N°2: Mantenimiento y/o Adecuación de Archivos y Gestión Documental y área de Sanidad

Alcance N°3: Mantenimiento y/o Adecuación de Garitas, Vidrios de Seguridad, Mantenimiento a Escaleras, Suministro de Aire Acondicionado, Sillas

Fechas según ultima programación

Inicio: 25 de junio del 2025

Fin: 01 de febrero del 2026

Recurso asignado: $ 937.691.354

Actividades ejecutadas en el periodo:
Se realiza entrega formal del establecimiento

Desmonte Manual de marcos de ventanearía existente en garitas.
Desmonte Manual de marcos de Puertas en garitas y archivo.
Desmonte Manual de Escaleras metálicas existentes en garitas.
Desmonte Manual de impermeabilización existente en garitas.
Demoliciones en guarda escobas, Pisos.
Retiro y cambio de tubería de agua potable y sanitaria en Garitas
Retiro y cambio de aparatos sanitarios en Garitas y archivo
Desmontes de luminarias existentes en garitas y archivo
Raspado de pintura existente en garitas y archivo
Picada de pañete en muros existentes
Demolición de enchapes en garitas y archivo
Descapote de capa vegetal y relleno con recebo para acceso a garitas.
Anden en concreto para acceso a garitas.
Instalación de tubería de alcantarillado en garitas
Instalación de cielo raso en láminas de PVC en archivo
Instalación de malla puesta atierra en garitas
Instalación de tubería eléctrica para redes de iluminación en garitas y archivo.
Suministro e instalación de cableado eléctrico para redes en garitas y archivo.
Limpieza y mantenimiento de tablero de distribución en archivo
Suministro en instalación de interruptores en garitas y archivo.
Salidas e instalación de tomacorrientes en archivo y garitas.
Salidas e instalación de luminarias en archivo y garitas.
Instalación de reflectores en garitas.
Instalación de ventana en archivo
Instalación de puertas en archivo y ahorita
Instalación de puerta de escotillas
Instalación de ventana blindadas en garitas
Aplicación de estuco y pintura en garitas y archivo
Instalación de escalera metálica en garitas
Instalación de enchape en baños de archivo y garitas

REGISTRO FOTOGRÁFICO













EPMSC MAGANGUÉ

Alcances a ejecutar:

Alcance N°1: Cambio de la totalidad de las rejas por mal estado, patios, pabellones, áreas sociales, corredizas de emergencia de patios, pasillos, UTE, guardia externa, Armerillo y puerta de información (PARCIAL)
Alcance N°2: Cambio de las redes eléctricas internas, todo el establecimiento. (PARCIAL)
Alcance N°3: Mantenimiento correctivo a cubiertas del patio. (PRIORIZADO patio 1 y 3)

Fechas según ultima programación

Inicio: 18 de noviembre del 2025

Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 15 de mayo del 2026

Recurso asignado: $ 186.076.441

Actividades ejecutadas en el periodo:
Durante el período reportado se realiza instalación de puertas de baños y se encuentran a la espera de la llegada de las luminarias antivandálicas para ser instaladas.

Comentarios sobre lo ejecutado en el periodo:
Posterior a las instalaciones pendientes se procederá a realizar entrega del establecimiento

Registro Fotográfico.



EPMSC ERE VALLEDUPAR

Alcances a ejecutar:

Alcance N°1: Mantenimiento y/o adecuación de área de rancho en el ERON incluyendo redes sanitarias, aguas servidas, Aguas residuales y ÁREA de RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS (ZONA DE BASURAS). - requerimiento procuraduría. (PRIORIZADO)

Fechas según ultima programación

Inicio: 11 de noviembre del 2025

Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 15 de mayo del 2026


Recurso asignado: $ 107.680.472

Actividades ejecutadas en el periodo:
Se realiza entrega formal del establecimiento

Demolición manual de encapes en muros en zona caliente y área húmeda.
Demolición de placa de contrapiso en zona caliente y área húmeda.
Demolición de lavadero área de húmeda.
Excavación manual para cárcamo zona caliente.
Placa de contrapiso en zona caliente y área húmeda.

Cárcamos en concreto zona caliente y área húmeda.
Rejillas en cárcamos de concreto zona caliente y área húmeda.
Puntos sanitarios PVC 4” para tanques de acopio (Area caliente – Área Húmeda)
Instalación de tapa para caja de inspección en Área Húmeda
Salidas para luminarias en tubería PVC en zona caliente.
Salidas para interruptor doble zona caliente.
Aplicación de pañete en muros zona caliente.
Acabado de piso con tablón en Área Húmeda.
Enchape de pared Área Caliente y Área Húmeda
Aplicación de estuco Área Caliente y Área Húmeda
Aplicación de pintura epoxica en muros de área Caliente y Área Húmeda
Instalación de piso en granito pulido en Área Caliente.
Instalación de piso en tablón en Área Húmeda.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

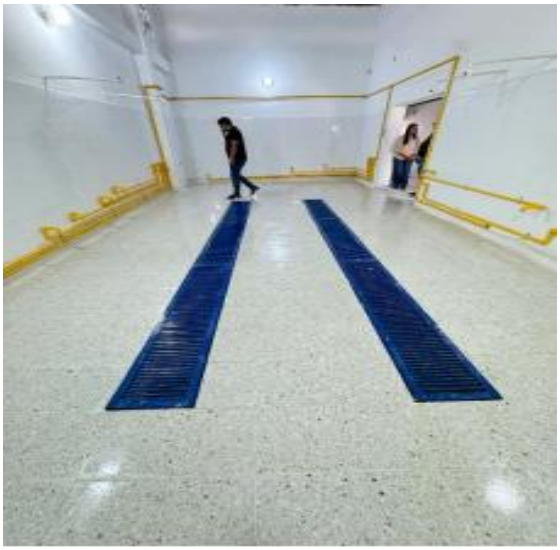




EPAMS CAS VALLEDUPAR

Alcances a ejecutar:

Alcance N°1: Mantenimiento y/o adecuación de celdas visita íntima
Alcance N°2: ADICIONAL: atención a Sentencia T-386 del 2024

Fechas según ultima programación

Inicio: 1 de junio del 2025

Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 7 de noviembre del 2025

Recurso asignado: $ 383.262.796

Actividades ejecutadas en el periodo:
Se realiza entrega formal del establecimiento

Demolición manual de mesones en celdas conyugales
Demolición manual y retiro de puntos hidráulicos existente en celdas conyugales.
Demolición manual de punto sanitarios existentes en celdas conyugales.
Desmonte manual de aparatos sanitarios existentes en celdas conyugales.
Instalación de tubería sanitaria subterránea PVC para baños de celdas conyugales.
Instalación de tubería de acero galvanizado para lavamanos de celdas conyugales.
Mantenimiento correctivo de puertas entamboradas metálicas en acceso a celdas conyugales.
Instalación de lavamanos antivandálicos en celdas conyugales.
Instalación de sanitarios antivandálicos en celdas conyugales.
Instalación de rejillas de piso en duchas de celdas conyugales.
Instalación de tubería antivandálica para sanitarios en celdas conyugales.
Aplicación de estuco acrílico en celdas conyugales.
Aplicación de pintura vinílica acrílica en celdas conyugales.
Aplicación de pintura a base de aceite sobre bajantes de tubería de sanitarios.
Reforzamiento y anclaje de estructura para cubierta en polisombra en patios de sol pabellón 9 y 11.
Suministro instalación de polisombra en malla tejida en patios de sol en pabellones 9 y 11.

REGISTRO FOTOGRÁFICO













EPMSC JP MONTERÍA

Alcances a ejecutar:

Alcance N°1: Mantenimiento general Alojamientos Para CCV y auxiliares

Alcance Adicional: Intervención en la Panadería

Fechas según ultima programación

Inicio: 10 de octubre del 2025

Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 15 de junio del 2026

Recurso asignado: $ 476.892.912

Actividades ejecutadas en el periodo:
Aplicación de estuco en muros en muros de alojamiento de auxiliares

Aplicación de estuco en muros en muros de Panadería

Registro Fotográfico.

Aplicación de estuco en muros en muros de alojamiento de auxiliares





Aplicación de estuco en muros en muros de Panadería





EPC TIERRALTA

Alcances a ejecutar:

Alcance N°1: Mantenimiento del Alumbrado del área perimetral. Las luminarias no tienen durabilidad, se requiere que sean para exteriores y de alta intensidad. (PRIORIZADO)

Fechas según ultima programación

Inicio: 5 de septiembre del 2025

Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 15 de octubre del 2025

Recurso asignado: $ 62.419.007

Comentarios sobre lo ejecutado en el periodo:
Se realiza finalización de la instalación de 37 luminarias en el establecimiento el día 27 de marzo se realiza reunión en el establecimiento, contratista, interventoría, USPEC y la dirección.

En atención a la visita técnica realizada conjuntamente entre director del establecimiento penitenciario, la profesional de apoyo de USPEC, el contratista de obra y la Interventoría de obra, en donde se manifestó el inconformismo por parte del director del establecimiento, el cual informo que las lámparas instaladas presentan las siguientes condiciones. Se llegaron a unos compromisos el cual el contratista debe cumplir y esta interventoría realizara el respectivo seguimiento para que se cumplan los compromisos adquiridos por el contratista.

EPMSC RIOHACHA

Alcances a ejecutar:

Alcance N°1: Mantenimiento y Reparación de Red hidrosanitaria

Alcance N°3: Mantenimiento y/o adecuación de la Garita de Seguridad de la Terraza del establecimiento Y Mantenimiento Garitas 1 y 2

Fechas según ultima programación

Inicio: 18 de noviembre del 2025

Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 15 de julio del 2026

Recurso asignado: $ 163.837.031

Comentarios sobre lo ejecutado en el periodo:
Se requiere continuar con las intervenciones cuanto antes para realizar entrega del establecimiento.

EPMSC SANTA MARTA

Alcances a ejecutar:

Alcance N°1: Adecuación de Área de Ingreso.

Alcance N°2: Mantenimiento y/o Adecuación de Oficinas Área Administrativa, Parqueaderos, Portón Eléctrico.

Fechas según ultima programación

Inicio: 18 de noviembre del 2025

Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 15 de junio del 2026

Recurso asignado: $ 500.193.727

Actividades ejecutadas en el periodo:
Se solicito al contratista el incremento del personal para poder cumplir con los tiempos.

Armado de acero para zapatas y vaciado de concreto en vigas de cimentación.

Registro Fotográfico.

Se solicito al contratista el incremento del personal para poder cumplir con los tiempos.

Armado de acero para zapatas










Vaciado de concreto y cierre de exavaciones en cimentacion

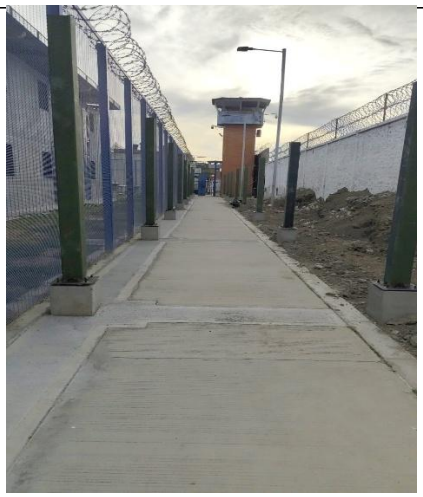





EPMSC EL BANCO

Alcances a ejecutar:

Alcance N°1: Tutela incidente de desacato, Adecuación de rancho, se está dando la alimentación desde la parte externa

Fechas según ultima programación

Inicio: 24 de noviembre del 2025

Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 31 de julio del 2026

Recurso asignado: $ 225.167.920

Actividades ejecutadas en el periodo:
Se solicitó al contratista, los ensayos de los materiales usados en la fabricación de concretos en obra, para poder continuar con dicha actividad.

Registro Fotográfico.
Aplicación de Pañete en muros




EPMSC SAN ANDRÉS

Alcances a ejecutar:

Alcance N°2: Mantenimiento de las redes eléctricas de todo el Establecimiento incluyendo celdas

Fechas según ultima programación

Inicio: 15 de diciembre del 2025

Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 4 marzo del 2026

Recurso asignado: $ 102.557.305

Actividades ejecutadas en el periodo:
Se realiza finalización de actividades en el establecimiento y se procede a realizar entrega parcial de las obras, se le solicita al contratista se realice entrega de la documentación para cierre del contrato.

Suministro instalación de tubería PVC de ¾ para instalación de luminarias antivandálicas.
Desmonte de tubería existente.
Suministro e instalación de red eléctrica trenzada para instalación de luminarias.
Suministro instalación de red trifásica en cable de cobre para acometida desde el taller de soldadura hasta la subestación eléctrica.
Mantenimiento preventivo del tablero principal de distribución existente.
Suministro instalación de tablero trifásico de distribución de 12 circuitos en pabellón de mujeres.
Limpieza y mantenimiento de tablero de 12 circuitos.
Suministro instalación de interruptores.
Suministro instalación de cajas de paso.
Suministro e instalación de tomacorrientes.

Suministro de instalación de reflectores en muro perimetral de Guayana
Suministros instalación de luminarias antivandálicas.
Suministro instalación de fotocelda para control automático ubicado en el taller de soldadura.
Revisión y prueba de megóhmetro para determinar el nivel de aislamiento en el establecimiento.

REGISTRO FOTOGRÁFICO











EPMSC SINCELEJO

Alcances a ejecutar:

Alcance N°: Mantenimiento, adecuación y ampliación del aula virtual

Fechas según ultima programación

Inicio: 15 de diciembre del 2025

Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 4 marzo del 2026

Recurso asignado: $ 102.557.305


Actividades ejecutadas en el periodo:
Se realiza entrega formal del establecimiento

Desmonte manual de marcos de puertas de zona interna de cuarto de audiovisuales.
Desmonte manual de luminarias de cuarto de audiovisuales-
Desmonte Manal de cielo raso.
Raspado de pintura existente en muros.
Demolición manual de pañete existente en muros externos de audiovisuales.
Instalación de tubería PVC para acometida de agua potable.
Alfajías en concreto perimetral en cubierta de cuarto de audiovisuales.
Suministro instalación de divisiones en sistema de drywall para cubículos en cuarto audiovisuales.
Mantenimiento de cielo raso en sistema drywall.
Instalación de tubería PVC para canalizaciones internas en puntos eléctricos y puntos de voz datos.
Limpieza y mantenimiento de tablero de 12 circuitos existentes.
Suministro e instalación de interruptores.
Salidas de tomacorrientes en tuberías PVC para interruptores y Tomas de computadores.
Salidas de luminaria externas para instalación de reflectores.
Salidas de luminarias para instalación de luces en cuarto audiovisuales, cuarto de rack baño y oficinas internas audiovisuales.
Suministro instalación de luminarias panel redondo LED en cuarto de rack y baño.
Suministro instalación de reflectores en exteriores.
Suministro instalación de equipo de aire acondicionado en cuarto de audiovisuales.
Raspado de estuco y pintura existente en muros internos y externos.
Alistado de superficie con mortero impermeabilizado para losa de contrapiso en cubierta.
Impermeabilización en cubierta.
Instalación de puertas entamboradas de oficina y baño.
Mantenimiento de puertas de entrada principal.
Aplicación de estuco y pintura y murió internos y externos.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





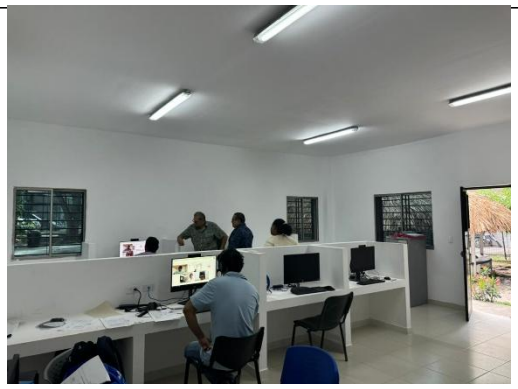




7. CORRESPONDENCIA

Se Carga archivo digital a la CARPETA 7 - CORRESPONDENCIA ENVIADA
Se Carga archivo digital a la CARPETA 7 - CORRESPONDENCIA RECIBIDA

8. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL:

FACTURACION
CONTROL DE FACTURACION CONTRATISTA
No hay facturación para el contrato de obra de acuerdo con la forma de pago.
CONTROL DE FACTURACION INTERVENTORIA
información de la facturación de interventoría se relaciona en la CARPETA 8.

9. CONTROL DE MANEJO DE ANTICIPO

CONTROL PRESUPUESTAL Y GESTION DE PAGOS
Anticipo aprobado.
PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO Y CONTROL ORDENES DE PAGO
El plan de inversión del anticipo fue avalado por esta interventoría el pasado 4 de diciembre de 2024 bajo el oficio USPEC-BETAREGIONALES-00. No hay pagos aprobados para el contratista cargados al anticipo aprobado.

10. GESTION AMBIENTAL.

Ver CARPETA 10 – GESTION AMBIENTAL

11. CONTROL DE CALIDAD

Para el seguimiento y control esta interventoría adjunta certificados de calidad emitidos por el contratista para el establecimiento:

12. INFORME SST

Ver CARPETA 11 – INFORME SST

PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROYECTO

12.1 PERSONAL DEL CONTRATISTA.

PERSONAL CONTRATISTA	CARGO	EMPRESA
Sergio Méndez	Residente de Obra	CONSORCIO MANTENIMIENTO GMC
Adriana Arévalo	Coordinador de Obra	CONSORCIO MANTENIMIENTO GMC
Alejandro Fonseca	Residente de Obra	CONSORCIO MANTENIMIENTO GMC
Arquímedes Contreras Gutierrez	Director de Obra	CONSORCIO MANTENIMIENTO GMC
Carlos Cujia	Residente de Obra	CONSORCIO MANTENIMIENTO GMC
Daniel Achinte	Residente de Obra	CONSORCIO MANTENIMIENTO GMC
Jeison Mogollón	Apoyo Residente de	CONSORCIO MANTENIMIENTO GMC
Johana Diaz Juan Camilo Cristancho	Residente de Obra Residente de Obra	CONSORCIO MANTENIMIENTO GMC CONSORCIO MANTENIMIENTO GMC
Lorenzo Cardona	Residente de Obra	CONSORCIO MANTENIMIENTO GMC
Luisa Proaños	Coordinador de Obra	CONSORCIO MANTENIMIENTO GMC
María Angela Tarazona	SST - HSEQ	CONSORCIO MANTENIMIENTO GMC
Terecita Argoty	Presupuesto y	CONSORCIO MANTENIMIENTO GMC
Doris De Leon Polo	Coordinador de Obra	CONSORCIO MANTENIMIENTO GMC
sandra Pinzon	Coordinador de Obra	CONSORCIO MANTENIMIENTO GMC
Irene Zambrano	Residente de Obra	CONSORCIO MANTENIMIENTO GMC
Jisseth Romero	Residente de Obra	CONSORCIO MANTENIMIENTO GMC
Pedro Mora	Residente de Obra	CONSORCIO MANTENIMIENTO GMC
Francisco Cuentas	Residente de Obra	CONSORCIO MANTENIMIENTO GMC
Yuliana Serna	Residente de Obra	CONSORCIO MANTENIMIENTO GMC

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
1	Dairo Alonso Montaño Niño	1024503523	Oficial	Regional Occidente y viejo caldas	11/06/2025

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
2	Diego Mauricio Ávila Pérez	79976026	Oficial	Regional Occidente y viejo caldas	11/06/2025
3	Dilmer Jovanny Bayona Rodríguez	80777530	Ayudante	Regional Occidente y viejo caldas	11/06/2025
4	James Avilés Narváez	16704152	Oficial	Regional Occidente y viejo caldas	11/06/2025
5	José Leonardo Diaz Ulloa	1020748096	Ayudante	Regional Occidente y viejo caldas	11/06/2025
6	Luis Alfonso Rodríguez Bonilla	93413044	Oficial	Regional Occidente y viejo caldas	11/06/2025
7	Pablo José Pacacira	7177181	Supervisor	Regional Occidente y viejo caldas	11/06/2025
8	Edgar Moreno Reyes	1005195748	Instalador	Regional central	11/06/2025
9	Frannkyn Roosevelth Méndez	1024484580	Instalador	Regional central	11/06/2025
10	Johan Estiven Rozo Leyton	1233692117	Instalador	Regional central	11/06/2025
11	Jorge Emanuel Ospina Solano	1006596186	Residente de obra	Regional central	11/06/2025
12	Yesid Alexis Pantoja Trejo	1087408073	Residente de obra	Regional central	11/06/2025
13	Wbeimar Martínez Mosquera	1078917036	Oficial	Regional Occidente y viejo caldas	12/06/2025
14	Juan José Ávila Perez	11622036	Oficial	Regional Occidente y viejo caldas	12/06/2025
15	John Jairo Hincapie	79482086	Oficial	Regional Occidente y viejo caldas	12/06/2025
16	John Alexander Bernal Vargas	79566080	Oficial	Regional Occidente y viejo caldas	12/06/2025
17	Guillermo Hincapie	79410724	Oficial	Regional Occidente y viejo caldas	12/06/2025
18	José Calderón Jaimes	4342875	Oficial	Regional Occidente y viejo caldas	12/06/2025
19	Breyner Jhoan Villamizar Rozo	1148963473	Oficial	Regional Occidente y viejo caldas	12/06/2025
20	Ermis Bastos Mora	1094276006	Oficial	Regional Occidente y viejo caldas	13/06/2025
21	Carlos Alfonso Cujia Manjarrez	1065577261	Residente de obra	Regional Occidente y viejo caldas	13/06/2025
22	Daniel Andrés Achinte Gaona	76328148	Residente de obra	Regional Occidente y viejo caldas	13/06/2025
23	Erick Fernando Colmenares Quesada	1094947865	Residente de obra	Regional Occidente y viejo caldas	13/06/2025
24	Luisa Fernanda Proaños Casallas	53036744	Coordinadora	Regional Occidente y viejo caldas	13/06/2025
25	Teresita Del Pilar Argoty Cepeda	1085254230	Residente de obra	Regional Occidente y viejo caldas	13/06/2025
26	Andrés Mauricio Dueñas Santa Cruz	98394727	Oficial	Regional Occidente y viejo caldas	18/06/2025
27	Arnulfo Jesús Cárdenas Calpa	13005773	Oficial	Regional Occidente y viejo caldas	18/06/2025
28	Dany Mauricio Telag Maya	1087958143	Oficial	Regional Occidente y viejo caldas	18/06/2025
29	Delfín Edmundo Jamanoy López	5249734	Oficial	Regional Occidente y viejo caldas	18/06/2025
30	Jaime Florentino Montilla Barrera	98382147	Oficial	Regional Occidente y viejo caldas	18/06/2025
31	Jorge Alonso Ramirez Miranda	98399710	Oficial	Regional Occidente y viejo caldas	18/06/2025
32	Juan Alexander Guerra Vallejo	1083752233	Oficial	Regional Occidente y viejo caldas	18/06/2025
33	Daniel Andrés Achinte Gaona	76328148	Oficial	Regional Occidente y viejo caldas	18/06/2025

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
34	Andrés Collazos Cosme	76045921	Oficial	Regional Occidente y viejo caldas	19/06/2025
35	Daniel Andrés Achinte Gaona	76328148	Residente de obra	Regional Occidente y viejo caldas	19/06/2025
36	Juan José Ávila Pérez	11522038	Oficial	Regional Occidente y viejo caldas	19/06/2025
37	Pablo Estifer Cuero Pino	1113513135	Oficial	Regional Occidente y viejo caldas	19/06/2025
38	ANDRES FELIPE TORRES CAMARGO	1014290145	INSPECTOR DE OBRA	REGIONAL CENTRAL	24/06/2025
39	CRISTIAN ALEJANDROO RODRIGUEZ MARQUEZ	1022429478	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	24/06/2025
40	FELIX JOSE DEVIA LOZANO	1108928763	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	24/06/2025
41	ADRIANA AREVALO MANCILLA	60382557	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL CENTRAL	24/06/2025
42	FABIO DE JESUS PATIÑO CARDENAS	18414360	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	24/06/2025
43	JHON ALEXANDER MARTINEZ HERNANDEZ	1010048944	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	24/06/2025
44	JORGE HERNAN PATIÑO SANCHEZ	1023017718	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	24/06/2025
45	JOSE ANTONIO GARAVITO BEMTRAL	3099451	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	24/06/2025
46	JOSE GIOVANNY BERMUDEZ PALACIO	1024512750	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	24/06/2025
47	JUAN PABLO VANEGAS BERMUDEZ	1073328596	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	24/06/2025
48	SONIA DANIELA GUTIERREZ CIFUENTES	1023017719	INSPECTOR DE OBRA	REGIONAL CENTRAL	24/06/2025
49	JEYSON DAVID ROJAS PAYARES	1033712661	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	24/06/2025
50	JOAN JOSE RUZ PRADA	5289478	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	24/06/2025
51	JOSE ALEJANDRO RODRIGUEZ GOMEZ	79616417	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	24/06/2025
52	JOSE MIGUEL MALAMBO AGUJA	93445450	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	24/06/2025
53	PAOLA CRISTINA JARAMILLO BELALCAZAR	27253926	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL NOROESTE	24/06/2025
54	OSCAR RICARDO JARAMILLO BELALCAZAR	1045021324	AYUDANTE	REGIONAL NOROESTE	24/06/2025
55	WBEIMAR MENA PALACIOS	1001637157	AYUDANTE	REGIONAL NOROESTE	24/06/2025
56	ADOLFO JOSE FLOREZ HERNANDEZ	1102854417	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL NORTE	24/06/2025
57	ALEJANDRO FONSECA CACERES	1098764868	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL NORTE	24/06/2025
58	ELKIN ANTONIO BANQUEZ ALVAREZ	92532211	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	24/06/2025
59	JORGE ANDRES ALVARADO BERRIO	1101450710	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	24/06/2025
60	JOSE ARMANDO HERRERA OJEDA	1065596250	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	24/06/2025

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
61	JUAN PABLO PUELLO ZAGARRA	1065577385	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	24/06/2025
62	LEINER RICARDO TAPIAS ALMANZA	1002163243	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	24/06/2025
63	OSCAR JULIAN ARRIETA GALE	1100623119	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	24/06/2025
64	ALEX ALFONSO PRIMERA NIEBLES	1002093520	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	24/06/2025
65	ANDERSON LONDOÑO SALAMANCA	1110518853	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	24/06/2025
66	ARCESIO GONZALEZ LEON	16802506	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	24/06/2025
67	ARNULFO JESUS CARDENAS CALPA	13005773	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	24/06/2025
68	BRANDON PRIMERA CORTES	1047222741	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	24/06/2025
69	BREYNER JHOAN VILLAMIZAR ROZO	1148963473	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	24/06/2025
70	CARLOS ERNESTO SALAS RIVERA	75036072	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	24/06/2025
71	DANY MAURICIO TELAG MAYA	1087958143	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	24/06/2025
72	EDUARD YAMITH NORIEGA GONZALEZ	78027776	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	24/06/2025
73	EIDER ANDRES QUINTERO BERNATE	1022977870	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	24/06/2025
74	GERMAN JARAMILLO RODRIGUEZ	10254889	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	24/06/2025
75	HUGO HERNAN VILLAMAR MOSQUERA	10692253	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	24/06/2025
76	JESUS EDUARDO GARZON AGUIRRE	76329032	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	24/06/2025
77	JORGE GENTIL OCAMPO MONTOYA	16630816	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	24/06/2025
78	JOSE CALDERONJAIMES	4342875	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	24/06/2025
79	JOSEPH ALEJANDRO CIFUENTES GAITAN	1000018036	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	24/06/2025
80	JUAN CARLOS ANGULO OBANDO	1059912736	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	24/06/2025
81	JUAN SEBASTIAN GOMEZ MOYANO	1023967457	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	24/06/2025
82	LUIS EDUARDO VILLAMAR PEREZ	1059901577	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	24/06/2025
83	VLADIMIRO VASQUEZ ARCE	10185609	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	24/06/2025
84	YOVANY ORDOÑEZ SANCHEZ	76328284	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	24/06/2025
85	CRISTIAN MAURICIO ALVARADO	1012358977	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	24/06/2025
86	CRISTIAN CAMILO GONZALEZ PENAGOS	1007718421	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	24/06/2025
87	MELQUISEDEC CALDERON ARRIETA	1192896362	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL NOROESTE	24/06/2025
88	ALEXANDER VILLAMIZAR CORREA	1117515429	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	25/06/2025
89	ASTRID CAROLINA MEDINA BOBADILLA	1119217740	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	25/06/2025

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
90	JAIR DIAZ CARDOZO	96340837	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL	25/06/2025
91	JHON JEISLER DUQUE HOLGUIN	10177384	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL	25/06/2025
92	BREINER ALEXIS VALBUENA OBANDO	1117504580	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	25/06/2025
93	LUIS EDUARDO ROBLES CERON	1048283235	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	25/06/2025
94	BRIAN STIVEN VELASQUEZ ROBLES	1002230143	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	25/06/2025
95	TITO ALONSO GORDILLO SIERRA	79910341	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	26/06/2025
96	JOSE ALBERTO CONTRERAS	80296805	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	26/06/2025
97	PEDRO FELIPE MORA CARVAJALINO	1072705806	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL CENTRAL	26/06/2025
98	DAIRO ALONSO MONTAÑO NIÑO	1024503523	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	26/06/2025
99	DIEGO MAURICIO ÁVILA PÉREZ	79976026	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	26/06/2025
100	DILMER JOVANNY BAYONA RODRÍGUEZ	80777530	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	26/06/2025
101	JAMES AVILÉS NARVÁEZ	16704152	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	26/06/2025
102	JOSÉ LEONARDO DIAZ ULLOA	1020748096	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	26/06/2025
103	LUIS ALFONSO RODRÍGUEZ BONILLA	93413044	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	26/06/2025
104	PABLO JOSÉ PACACIRA	7177181	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	26/06/2025
105	LORENZO ALEJANDRO CARDONA GALVIS	75102901	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	26/06/2025
106	DIEGO ANDRES AGUIRRE REYES	1079035142	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	26/06/2025
107	HERNANDO RODRIGUEZ	4276349	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	26/06/2025
108	YOMAR SANTIAGO URIBE ROJAS	1043302232	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	26/06/2025
109	ISRAEL TORRES CASTEL	1054678525	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	26/06/2025
110	CARLOS ARTURO GONZALEZ SANCHEZ	1054680256	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	26/06/2025
111	GENEISY YULIANA SERNA ARIAS	1077441917	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	27/06/2025
112	FRANKLIN HERNAN CASTELLANOS JAIMES	1090479205	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	28/06/2025
113	GUILLERMO ALEXANDER SANCHEZ AVENDAÑO	11275648	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	28/06/2025
114	JESUS IVAN IBARRA FUENTES	1127337620	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	28/06/2025
115	JOHN JAIRO MARTINEZ VELASQUEZ	1024468589	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	28/06/2025
116	LUIS ANGEL MOJICA VILLALOBOS	1003314689	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	28/06/2025

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
117	LUIS CARLOS AGUIRRE ALONSO	1033689852	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	28/06/2025
118	LUIS EUSTORGIO PRECIADO MORENO	79769687	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	28/06/2025
119	YIMMY ANDRES SANTAFE JIMENEZ	1069257709	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	28/06/2025
120	DISNARDO CHACON MENESES	1003175221	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	2/07/2025
121	CARLOS MARIO CHACON MEJIA	1064838716	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	2/07/2025
122	WBEIMAR ORLANDO MUÑOZ TORRES	1007847136	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	4/07/2025
123	ROSENDO GARCIA PRADA	1022978343	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	4/07/2025
124	JOSE DANIEL RUBIO GUTIERREZ	79805550	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	4/07/2025
125	JONATHAN ORLANDO ESPITIA RODRIGUEZ	1022967079	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	4/07/2025
126	YOIMER JESUS MOENO MARRUGO	1044909113	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	4/07/2025
127	RAFAEL MONROY CABALLERO	13456598	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	7/07/2025
128	JOSE ALEJANDRO RODRIGUEZ GOMEZ	79616417	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	7/07/2025
129	CRISTIAN ALEJANDRO RODRIGUEZ MARQUEZ	1022429478	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	7/07/2025
130	ANDRES PABON LAGUADO	1090475005	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	7/07/2025
131	ANGUIE LIZETH MURCIA MOLINA	1065611154	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	8/07/2025
132	JHONATAN DE JESUS HERAZO BARRIOS	1001934780	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	8/07/2025
133	JIMMY ALEXANDER GARZON	79704838	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	8/07/2025
134	JUAN PABLO VANEGAS BERMUDEZ	1073328596	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	8/07/2025
135	KEVIN ALEXANDER GARZON MORENO	1015468890	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	8/07/2025
136	MARCO JOSE DE LA HOZ RIVERA	1043606712	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	8/07/2025
137	NESTOR GUILLERMO VARGAS ROJAS	1022357442	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	8/07/2025
138	WRAYAN ESTIVEN GOMEZ ACOSTA	1012454441	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	8/07/2025
139	YEISON MOGOLLON ORTEGA	1093775476	RESIDENTE	REGIONAL CENTRAL	8/07/2025
140	YESID ALEXIS PANTOJA TREJO	1087408073	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	9/07/2025
141	JHONATAN DE JESUS HERAZO BARRIOS	1001934780	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	9/07/2025
142	JOSE DANIEL HERNANDEZ VASQUEZ	79742171	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	10/07/2025
143	JOSE ANDRES SANCHEZ ROMERO	79650231	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	10/07/2025

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
144	MOISES GAONA MARTINEZ	72325741	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	10/07/2025
145	JOSE RAMON SUAREZ SALCEDO	8980183	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	10/07/2025
146	DIEGO MAURICIO POVEDA ROCHA	1076653980	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	10/07/2025
147	WRAYNT JHONATAN CHAVARRO ANDRADE	1006523262	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	14/07/2025
148	PEDRO NEL OCAMPO ESTERLING	1125178774	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	14/07/2025
149	NELSON VALDERRAMA LOZANO	1117524890	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	14/07/2025
150	LUIS ALBERTO SEGURA ROMERO	15888239	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	14/07/2025
151	ANDRES ALEJANDRO PAYAN MEDINA	1006772962	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	15/07/2025
152	CRISTHIAN ALEJANDRO OCAÑA CHAVEZ	1111542219	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	15/07/2025
153	DIEGO ALEJNDRO GASCA CORREA	1024591885	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	15/07/2025
154	JOSE LIBARDO RUBIANO MANCERA	1032387698	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	15/07/2025
155	ROBINSON CARMONA CAICEDO	1117530555	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	15/07/2025
156	AMIN MANUEL MANRIQUE MORALES	85270284	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	15/07/2025
157	ROBERTO ALEXANDER CASTRO SANTAFE	80130122	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	15/07/2025
158	AMIN MANUEL MANRIQUE MORALES	85270284	AYUDANTE	REGIONAL NOROESTE	17/07/2025
159	ROBERTO ALEXANDER CASTRO SANTAFE	80130122	AYUDANTE	REGIONAL NOROESTE	17/07/2025
160	CAMILO ANDRES MEZA TORRES	1062906307	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	17/07/2025
161	JORGE ENRIQUE CUELLAR PLAZAS	7710284	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	17/07/2025
162	YORLEY ALVARADO RAMOS	1023006152	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	18/07/2025
163	JAROL HUMBERTO ROA BUITRAGO	1022967445	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	18/07/2025
164	MIGUEL ANGEL GARCIA BUITRAGO	1022939993	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	18/07/2025
165	EDISSON NOE DIAZ VARGAS	1101691571	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	18/07/2025
166	JANER ESTEVEN DAZA YARPA	1004580102	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	22/07/2025
167	JESUS MANUEL TAIMBUD QUENGUAN	87100688	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	22/07/2025
168	JOSE BOLIVAR MARTINEZ TENGANAN	87103284	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	22/07/2025

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
169	HENRY LISARDO HERNADEZ	13073245	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	22/07/2025
170	DANNY DANIEL SANCHEZ NIÑO	80129218	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	24/07/2025
171	JAVIER FLORENCIO TORRES NIÑO	1033677695	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	24/07/2025
172	JEFFERSON DANIEL CRUZ NARANJO	80247323	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	24/07/2025
173	JESUSALDO CENTENO MONTENEGRO	7997248	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL	28/07/2025
174	JOHN JAIRO MARTINEZ VELASQUEZ	1024468589	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL	28/07/2025
175	JOSE ANIBAL TORRES SANCHEZ	79529020	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL	28/07/2025
176	LUIS CARLOS AGUIRRE ALONSO	1033689852	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL	28/07/2025
177	LUIS EUSTORGIO PRECIADO MORENO	79769687	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL	28/07/2025
178	DIEGO CASTIBLANCO HERNANDEZ	1070331867	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL	28/07/2025
179	JESUS MAURICIO MACIAS GONZALEZ	1024569383	INSPECTOR DE OBRA	REGIONAL CENTRAL	28/07/2025
180	JORGE ELIECER VANOY HERRERA	1000985335	INSPECTOR DE OBRA	REGIONAL CENTRAL	28/07/2025
181	SANTIAGO JOSE RINCON MATEUS	1002998707	TECNICO ELECTRICO	REGIONAL CENTRAL	28/07/2025
182	BRAYAN STEVEN HURTADO JURADO	1094961642	TECNICO	REGIONAL CENTRAL	28/07/2025
183	MARLON SEGUNDO CANOLES PEREZ	73190904	TECNICO EN MANTENIMIENTO	REGIONAL CENTRAL	28/07/2025
184	JESUS ALBERTO CHAMARRO RODRIGUEZ	87532204	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	28/07/2025
185	EDISON OSWALDO FLOREZ GOMEZ	1128430135	AYUDANTE	REGIONAL NOROESTE	30/07/2025
186	ALBEIRO QUINTERO BERNATE	14278474	AYUDANTE	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
187	ALEX ALFONSO PRIMERA	1002093520	AYUDANTE	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
188	ANDERSON LONDOÑO SALAMANCA	1110518853	AYUDANTE	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
189	BRANDON Y ALEX PRIMERA MAYO	1047222741	OFICIAL	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
190	CARLOS ALBERTO TORO RESTREPO	98535012	AYUDANTE	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
191	DILMER BAYONA	80777530	AYUDANTE	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
192	EIDER ANDRES QUINTERO BERNATE	1022977870	AYUDANTE	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
193	FREDDY JOSE REYES VELAIDES	1043434375	AYUDANTE	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
194	JOHN ESTIVEN CLAVIJO FERNANDEZ	5826934	AYUDANTE	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
195	JOSEP ALEJANDRO CIFUENTES GAITAN	1000018036	AYUDANTE	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
196	LUIS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	93413044	OFICIAL	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
197	VLADIMIRO VASQUEZ ARCE	10185609	OFICIAL	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
198	CHRISTIAN DAVID HURTADO QUILINDO	1061776071	OFICIAL	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
199	ERICK FERNANDO COLMENARES	1094947865	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
200	HUELMER GERSAIN GAON MUÑOZ	76331652	MAESTRO	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
201	HUGO HERNAN VILLAMAR	10692253	OFICIAL	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
202	JAIME SOLARTE	10720889	OFICIAL	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
203	JESUS EDUARDO GARZON	76329032	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
204	JOSE FREDY LAME CAPOTE	4616328	OFICIAL	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
205	JOSE LUIS MOLINA	1061774713	AYUDANTE	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
206	JOSE MARIA RIVERA	10720643	MAESTRO	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
207	JUAN CARLOS ANGULO OBANDO	1059912736	OFICIAL	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
208	LUIS CARLOS CAPOTE COTAZO	1061719679	OFICIAL	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
209	LUIS ESUARDO VILLAMAR	1059901577	MAESTRO	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
210	MILLER DANIEL OROZCO	1064434924	OFICIAL	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
211	YOVANY ORDOÑEZ SANCHEZ	76328284	MAESTRO	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
212	BREYNER VILLAMIZAR	1148963473	OFICIAL	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
213	ERMIS BASTOS	1094276006	OFICIAL	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
214	FERNANDO DUARTE HERNANDEZ	69882265	AYUDANTE	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
215	GRATINIANO NATVAEZ NARVAEZ	12580397	AYUDANTE	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
216	JOSE CALDERON	4342875	OFICIAL	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
217	JOSE GREGORIO CAICEDO GARCIA	88162737	AYUDANTE	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
218	OSCAR LARRARTE	93286333	AYUDANTE	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
219	GUILLERMO HINCAPIE	79410724	OFICIAL	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
220	JHON BERNAL	79566080	OFICIAL	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
221	JOHN HINCAPIE	79482086	OFICIAL	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
222	CARLOS ERNESTO SALAS RIVERA	75036072	AYUDANTE	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
223	DAIRO MONTAÑO	1024503523	OFICIAL	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
224	JUAN SEBASTIAN GOMEZ MOYANO	1023967457	OFICIAL	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
225	MAURICIO AVILA	79976026	OFICIAL	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
226	JUAN JOSE AVILA PERES	11522038	OFICIAL	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
227	DANIEL SANTIAGO VALLEJO PORTILLA	1192891870	MAESTRO	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
228	CARLOS JONATHAN SANCHEZ GALINDO	1019058760	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	14/08/2025
229	JHON EDWAR ARANGON OYOLA	1110232752	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	14/08/2025
230	JOHN ALEXANDER PAIPILLA NORENO	1000142579	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	14/08/2025
231	PABLO JOSE PACACIRA	7177181	SUPERVISOR	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	19/08/2025
232	JAMES AVILÉS NARVÁEZ	16704152	AYUDANTE	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	19/08/2025
233	JOSÉ LEONARDO DIAZ ULLOA	1020748096	AYUDANTE	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	19/08/2025
234	EDUARD YAMITH NORIEGA GONZALEZ	78027776	AYUDANTE	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	19/08/2025
235	ROBERTO ALEXANDER CASTRO SANTAFE	80130122	AYUDANTE	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	19/08/2025
236	AMIN MANUEL MANRIQUE MORALES	85270284	AYUDANTE	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	19/08/2025
237	ANGEL MARIA GARZON FUENTES	83115511	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	19/08/2025
238	LEONARDO JAIDER BRAVO GUZMAN	12266998	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	19/08/2025
239	DANIELA DEL PILAR GAITAN GARZON	1121851915	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL CENTRAL-NORTE	20/08/2025
240	JACKSON FABIAN ROJAS MORENO	86053901	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-NORTE	20/08/2025
241	JUAN CAMILO CRISTANCHO BOHADA	1018843507	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL CENTRAL-NORTE-ORIENTE	21/08/2025
242	DANIEL FELIPE GRIMALDOS PEREZ	1006876619	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-NORTE-ORIENTE	21/08/2025
243	CARLOS JAVIER RODRIGUEZ BARRERA	1022938529	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	23/08/2025
244	DULIS CESAR ALVARADO PADILLA	7617663	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	23/08/2025
245	KEVIN ROBIN ELLIS MORALES	1000930480	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	23/08/2025
246	LEONARDO CASTIBLANCO PUENTES	79247553	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	23/08/2025
247	MIGUEL ANGEL MALDONADO LOPEZ	1030646964	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	23/08/2025
248	HERNAN DARIO DE LA ROSA ARIAS	1103119376	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	26/08/2025
249	JAIDER MANUEL SIERRA ATENCIA	1047338449	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	26/08/2025
250	JAIRO ALFONSO PALLARES PACHECO	72224929	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	26/08/2025
251	JULIO CESAR AGAMEZ	1003562850	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	26/08/2025

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
252	DIANA LUCIA BASTIDAS FERNANDEZ	1045724856	SST	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	26/08/2025
253	JUAN CAMILO CRISTANCHO BOHADA	1018843507	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	26/08/2025
254	JOHAN ESTIVEN ROZO LEYTON	1233692117	INSTALADOR	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	26/08/2025
255	EDGAR MORENO REYES	1005195748	INSTALADOR	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	26/08/2025
256	JOHN JAIRO MARTINEZ VELASQUEZ	1024468589	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	26/08/2025
257	LUIS EUSTORGIO PRECIADO MORENO	79769687	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	26/08/2025
258	LUIS CARLOS AGUIRRE ALONSO	1033689852	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	26/08/2025
259	FRANNKYN ROOSEVELTH MÉNDEZ	1024484580	Instalador	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	26/08/2025
260	ALEXIS JOSE RAUSEO UGAS	6197399	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	26/08/2025
261	AMIN MANUEL MANRIQUE MORALES	85270284	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	26/08/2025
262	CESAR GIOVANNY ESPITIA HOME	1019098213	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	26/08/2025
263	EDUARD YAMITH NORIEGA GONZALEZ	78027776	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	26/08/2025
264	IRBIN ALEXANDER MENA MORENO	1010102279	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	26/08/2025
265	YOHAN MANUEL MOSQUERA PEREA	1077422862	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	26/08/2025
266	CARLOS GUILLERMO TUTALCHA BOTINA	98390352	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	26/08/2025
267	FABIO ALIRIO PAZ OBANDO	87066132	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	26/08/2025
268	JESUS ESPERIDION OBANDO TORO	12746343	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	26/08/2025
269	LUIS EDUARDO POTOSI YAQUENO	1085296983	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	26/08/2025
270	LUIS ORLANDO LUNA MARTINEZ	12746960	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	26/08/2025
271	OSMALDO OBANDO TORO	13068176	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	26/08/2025

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
272	SEGUNDO DARIO OBANDO TORO	5252424	MAESTRO	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	26/08/2025
273	HERNAN DARIO DE LA ROSA ARIAS	1103119376	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	27/08/2025
274	JAIDER MANUEL SIERRA ATENCIA	1047338449	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	27/08/2025
275	JAIRO ALFONSO PALLARES PACHECO	72224929	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	27/08/2025
276	JADER ENRIQUE PEREZ MARQUEZ	72280530	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	27/08/2025
278	RUBEN DARIO MARIN CASTRO	71172895	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	28/08/2025
279	JESUS DAVID ROMERO PAYARES	1102861496	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	28/08/2025
280	VICTOR ALFONSO RIOS RESTREPO	1020400695	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	3/09/2025
281	JOSE ALEXANDER SALDARRIAGA PIMIENTA	71878546	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	3/09/2025
282	BLADIMIR RUGELES LUGO	86009466	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	03/0925
283	EDUARDO ANTONIO HERNANDEZ DIAZ	1120354645	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	03/0925
284	GUSTAVO MORENO GARCIA	7332092	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	03/0925
285	SANTIAGO JOSE RINCON MATEUS	1002998707	TECNICO ELECTRICO	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	4/09/2025
286	VICTOR MANUEL OCHOA DUCUARA	1015408267	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	4/09/2025
287	JULIO ENRIQUE SOTO DIAZ	92130029	SUPERVISOR	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	4/09/2025
288	ALEXANDER QUIROGA HERREÑO	1099207267	INSTALADOR	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	10/09/2025
289	JHONATAN STHIVEN RUCINQUE LOPEZ	1106901060	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	10/09/2025
290	PEDRO MALAMBO GUARDO	73200173	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	10/09/2025
291	CAMILO ANDRES SEGURA SALDAÑA	1117535618	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	10/09/2025
292	PEDRO ANTONIO BAUTUISTA CARDENAS	91257451	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	10/09/2025

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
293	CIRO ALFONSO ORTIZ VILLABONA	1101597947	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	10/09/2025
294	ALEXIS OJEDA BETANCOURT	1121930159	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	11/09/2025
295	MIGUEL ANGEL AVILA LIZCANO	91347317	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	15/09/2025
296	LUIS FERNANDO CORREA JAIME.	79622344	VISITANTE	EPMSC SOGAMOSO	15/09/2025
297	KEVIN DUVAN BALLESTEROS SOTO	1007184968	VISITANTE	EPMSC SOGAMOSO	15/09/2025
298	ESTEFANIA BALLESTEROS SOTO	1003292614	VISITANTE	EPMSC SOGAMOSO	15/09/2025
299	NICOLAS SANTIAGO BOHORQUEZ BERNAL	1006799502	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	16/09/2025
300	OSCAR FIDEL MONROY	86062113	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	16/09/2025
301	LUIS EUCLIDES RAMIREZ MENDEZ	91349612	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	17/09/2025
302	YORLIN URBINA MARQUEZ	1137195346	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	17/09/2025
303	JEAN CARLOS PALOMINO PADILLA	1049940525	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	17/09/2025
304	JHONNY ALEXANDER MENDOZA ZAMBRANO	1032364379	INSTALADOR	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	17/09/2025
305	MAICOL FABIAN DIAZ LOAIZA	1019096220	INSTALADOR	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	17/09/2025
306	MARTIN GUERRERO DIAZ	1019037888	INSTALADOR	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	17/09/2025
307	ALCIDES MANUEL LEAL NARVAEZ	1045703284	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	17/09/2025
308	JHON EDWAR ARANGON OYOLA	1110232752	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	18/09/2025
309	JORGE FERNANDO MENESES VILLAREAL	1010069951	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	18/09/2025
310	MARTIN JOSE GONZALEZ AÑEZ	5067052	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	19/09/2025
311	VICTOR MANUEL OCHOA DUCUARA	1015408267	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	19/09/2025
312	RONAL ALBERTO MOLANO ROBLES	8787336	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	19/09/2025
313	VICTOR ALFONSO ORTEGA MALDONADO	1129573469	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	19/09/2025

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
314	JESUS ALBERTO ESTRADA MENDOZA	5462085	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	23/09/2025
315	JONNY ALEJANDRO GONZALEZ CELIS	86082783	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	23/09/2025
316	MAURICIO HERNANDEZ PACHON	86053533	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	23/09/2025
317	MERQUECIDED QUINTERO ARCIRA	1002047944	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	23/09/2025
318	REINALDO ISIDRO GUTIERREZ MARQUEZ	3161886	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	23/09/2025
319	CRISTIAN ANDRES ARTUNDUAGA MOYA	1057215930	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	23/09/2025
320	WILLIAM RICARDO ARIAS ARIAS	1053346103	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	23/09/2025
321	YEISON MONROY CORTES	1053340982	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	23/09/2025
322	ALDEMAR PINEDA	10274501	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	23/09/2025
323	FRANK EDUAR ESPINOSA QUINTERO	1093984533	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	23/09/2025
324	ISRAEL ANTONIO REMOLINA SILVA	80072455	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	25/09/2025
325	EDILSON GIOVANY BERMUDEZ QUINTERO	1053841049	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	25/09/2025
326	GABRIELA MORGENSZTERN	1090534584	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	26/09/2025
327	DARIO ALEXANDER PALACIOS ARDILA	1001021842	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	26/09/2025
328	MELKIN ESCOBAR BERONA	1028014959	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	26/09/2025
329	RONAL ALBERTO MOLANO ROBLES	8787336	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	26/09/2025
330	ANGELA FAHISURY CARVAJAL BARRERA	1052400259	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	26/09/2025
331	JUAN JOSE MARTINEZ MARTINEZ	92524885	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	30/09/2025
332	RAFAEL GERMAN DE LA ROSA SALASAR	92534621	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	30/09/2025
333	JADER PATIÑO JIMENEZ	13568486	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	30/09/2025

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
334	WILLIAM CAICEDO CASTILLO	80372534	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	30/09/2025
335	EDER MANUEL ANGULO MARTINEZ	8527321	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	30/09/2025
336	SAMIR JUNIOR GONZALEZ	1045229070	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	30/09/2025
337	NICOLAS ESTEBAN RINCON MATEUS	1002998708	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	30/09/2025
338	ROQUE ANTONIO MACHADO DAZA	13279123	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	30/09/2025
339	JULIO CESAR BELTRAN GOMEZ	92601891	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	30/09/2025
340	RUBEN DARIO CABALLERO RODIRGUEZ	1000241016	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	30/09/2025
341	RONIEL JOSE GARCIA	6530626	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	30/09/2025
342	JOSE ORLANDO ALARCON MONTES	7713367	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	30/09/2025
343	HECTOR CHARRY GALINDO	12137324	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	30/09/2025
344	JUNIOR ALEXANDER PINEDA PINEDA	6263639	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	30/09/2025
345	JESUS RAMON CONTRERAS ALBARRACIN	6721275	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	30/09/2025
346	ANGEL SIMON LUNA VIDES	1081930172	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	30/09/2025
347	ANGEL MAURICIO ALVAREZ SALAS	1111760404	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	30/09/2025
348	AGUSTIN RAFAEL OLIVO ANAYA	1001851618	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	30/09/2025
349	JORGE ARMANDO CANO MOSCOSO	1116437317	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	30/09/2025
350	JOSE JOAQUIN FRIAS MUÑOZ	9146684	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	30/09/2025
351	LEONARDO ANDRES GIRALDO CASIERRA	94230398	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	30/09/2025
352	LUIS ALEXANDER RIASCOS CAICEDO	1111786654	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	30/09/2025
353	JOHN ALEXANDER PAIPILLA MORENO	1000142579	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	1/10/2025

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
354	SEBASTIAN GIRALDO MOSCOSO	1059990047	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	1/10/2025
355	JAVIER GUILOMBO MONTES	7687771	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	1/10/2025
356	JHONNY ALEXANDER MENDOZA ZAMBRANO	1032364379	INSTALADOR	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	2/10/2025
357	MAICOL FABIAN DIAZ LOAIZA	1019096220	INSTALADOR	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	2/10/2025
358	MARTIN GUERRERO DIAZ	1019037888	INSTALADOR	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	2/10/2025
359	EDINSON BENITO ARIAS	1096219784	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	2/10/2025
360	WILLIAM JOSE PEREZ MARTINEZ	1005486694	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	2/10/2025
361	YEINER JOSE BELTRAN GOMEZ	1101783832	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	2/10/2025
362	ROMARIO ANDRES PINZON SANGUINO	1090501941	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	3/10/2025
363	YEISON JOHAN RINCON DURAN	1090454019	MAESTRO	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	3/10/2025
364	MISAEL NAVARRO BONILLA	5035440	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	3/10/2025
365	ANDRYS JESUS SANTIAGO JIMENEZ	1007961913	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	3/10/2025
366	RHASID NAIR HERNANDEZ ANDRADE	1073823274	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	3/10/2025
367	JAIME ORLANDO ACOSTA RIOS	79157190	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	6/10/2025
368	JESUS EDUARDO YAÑEZ LOPEZ	1110514830	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	6/10/2025
369	DUVAN DAVID ARIAS BAQUERO	1005776670	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	6/10/2025
370	ALBER ESNEIDER MUÑOZ APONTE	86081922	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	7/10/2025
371	ROSNEY ARGEMIRO SUAREZ CRUZ	19001680	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	7/10/2025
372	CARLOS MATERAN	6838108	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	7/10/2025
373	JOSE IGNACIO RODRIGUEZ BARRERA	9396959	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	7/10/2025

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
374	JHON ALEXANDER MUÑOZ LOPEZ	1054545625	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	7/10/2025
375	JHONATHAN ERNESTO ALVAREZ BAEZ	1052383633	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	7/10/2025
376	JUAN SEBASTIAN LUGO AVILES	1140920050	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	7/10/2025
377	AZAEL NOGUERA FRANCO	10546961	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	9/10/2025
378	HERNAN CHICANGANA BELTRAN	76331869	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	9/10/2025
379	DIEGO ANDRES PINZON LOPEZ	1005064061	INSPECTOR DE OBRA	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	9/10/2025
380	CIRO ALFONSO SANCHEZ SANTIAGO	1065641069	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	9/10/2025
381	MIGUEL GEOVANY SUAREZ AYALA	1004944826	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	9/10/2025
382	DANILO ANDRES SUAREZ AYALA	1004944825	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	9/10/2025
383	ALDAIR SOTO SANDOVAL	1042242931	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	10/10/2025
384	CRISTIAN EDUARDO ARANGO BAQUERO	1072395652	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	10/10/2025
385	DARIUN DANIEL ARANGO CASTRO	1121836458	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	10/10/2025
386	FERNANDO ALFONSO MANCHEGO CANEO	1045674440	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	10/10/2025
387	JOHAN ALEJANDRO ARANGO BAQUERO	1121955360	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	10/10/2025
388	DEIVIS ALBERTO FERRER RUDAS	1048290350	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	14/10/2025
389	DIVIER ALEXANDER FONSECA	1007419879	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	14/10/2025
390	ANDERSON LEINER QUILCE JURADO	1109419579	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	14/10/2025
391	JORGE MARIO LEAL GONZALEZ	93413074	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	14/10/2025
392	JUAN GABRIEL VARON MURCIA	5822926	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	14/10/2025
393	ROBERTO CARVAJAL GONZALEZ	10109284	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	15/10/2025

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
394	FERNANDO JOSE DE LA OSSA COGOLLO	1007781505	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	15/10/2025
395	JAIRO AGUSTIN BRAVO PEÑATA	1067895836	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	15/10/2025
396	WILLIAM VALENCIA SOTO	1055755645	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	16/10/2025
397	DUVAN ALBERTO TENORIO PUYO	1007150565	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	16/10/2025
398	LUIS ALEJANDRO ROZO SANTOS	1245278762	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	16/10/2025
399	GUSTAVO MATEUS CARDONA	94252218	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	16/10/2025
400	MAX RAFAEL RIVERO RODRIGUEZ	4990730	MAESTRO	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	16/10/2025
401	RANDY JOSE GONZALEZ PIÑERO	4870728	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	16/10/2025
402	CARLOS MARIO SERNA GIL	98707930	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	16/10/2025
403	NESTOR IRIARTE PEREZ	1047365945	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	17/10/2025
404	LUIS RAFAEL DOMINIQUETTI SERRA	9148961	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	17/10/2025
405	EDUARDO ENRIQUE CERVANTES CABALLERO	1041976650	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	17/10/2025
406	JUAN ROMAN APOLINAR GUEVARA	17337676	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	17/10/2025
407	JAIR ARTURO TREJOS ORTIZ	15915439	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	17/10/2025
408	OSCAR DE JESUS ORTIZ	15920158	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	17/10/2025
409	CARLOS EFREN LOZANO	17700924	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	17/10/2025
410	EDUARDO ANTONIO TOVAR YANCE	17589709	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	20/10/2025
411	CARLOS SANCHEZ FAJARDO	17287335	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	20/10/2025
412	FABIO ESTEVAN GARCIA BARROS	1030625946	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	21/10/2025
413	JORGE LUIS GONZALEZ CASTELLANOS	80744773	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	21/10/2025

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
414	JAN CARLOS LOZANO VALDERRAMA	1015459196	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	22/10/2025
415	REINEL GUEVARA NAVARRO	18972384	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	23/10/2025
416	EILER CHONA LAZARO	13379544	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	23/10/2025
417	ISMAEL ANTONIO VERA SANCHEZ	1127666567	MAESTRO	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	23/10/2025
418	WILLIGTON ALEXANDER RUIZ RIAÑO	1094045357	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	23/10/2025
419	DANIEL ALEJANDRO CASTRILLON MOLINA	1054925165	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	24/10/2025
420	OSCAR ANDRES VILLEGAS GONZALEZ	4519439	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	24/10/2025
421	VICTOR HUGO CORTES BEDOYA	1054922390	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	24/10/2025
422	EDINSON BENITO ARIAS DIAZ	1096219784	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	24/10/2025
423	HORACIO GELVES NIÑO	91470413	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	24/10/2025
424	OMAR HERNANDEZ SANCHEZ	91435391	MAESTRO	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	24/10/2025
425	ADALBERTO ORTIZ VELASQUEZ	71985421	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	24/10/2025
426	ARBENIS EZEQUIEL HERNANDEZ PARRA	5505505	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	24/10/2025
427	LUIS ALBERTO VENERA MATUTE	1193546254	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	24/10/2025
428	CARLOS RONALDO TIQUE HURTADO	1116807138	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	24/10/2025
429	ANDRES FANDIÑO PEÑA	80748984	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	24/10/2025
430	RODRIGO SUAREZ VIVAS	80165589	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	24/10/2025
431	JOSE ABELARDO GOMEZ PIAMBA	76336429	MAESTRO	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	29/10/2025
432	ALVARO ALEXANDER GOMEZ NARVAEZ	1004631289	OFICIAL	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS	4/11/2025
433	ANGELA MERCEDES GONZALEZ SANTACRUZ	1085269054	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS	4/11/2025

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
434	FIDENCIO FERNANDO URBANO MUÑOZ	1084222993	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS	4/11/2025
435	JESUS ADRIANO OCAMPO GOMEZ	9870154	OFICIAL	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS	4/11/2025
436	JOHN ANDERSON GELPUD LOPEZ	1004439559	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS	4/11/2025
437	JOSE JUVENCIO GARCIA TABLA	12975881	MAESTRO	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS	4/11/2025
438	LUIS ARMANDO GARCIA TABLA	12986773	MAESTRO	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS	4/11/2025
439	MARCELINO CASTILLO MOYA	7477740	VISITANTE	EPMSC SAN ANDRÉS	5/11/2025
440	CRISTIAN CAMILO DOMINGUEZ OROZCO	1123620560	VISITANTE	EPMSC SAN ANDRÉS	5/11/2025
441	IVAN ALFONSO HERRERA MONTAÑEZ	1123622310	VISITANTE	EPMSC SAN ANDRÉS	5/11/2025
442	GUILLERMO MORALES JOHNSON	18001008	VISITANTE	EPMSC SAN ANDRÉS	5/11/2025
443	SANDY JOHANA FLOREZ PABON	30188331	APOYO DE OBRA	REGIONAL NOROESTE	5/11/2025
444	ANDRES FELIPE NOGUERA CARDENAS	1106895862	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL NOROESTE	5/11/2025
445	ANDERSON POSADA MORENO	1001021122	AYUDANTE	REGIONAL NOROESTE	5/11/2025
446	DAIRO ALEXANDER PALACIOS ARDILA	1001021842	AYUDANTE	REGIONAL NOROESTE	5/11/2025
447	JADER STIVEN ORTIZ ORTEGA	1028035015	AYUDANTE	REGIONAL NOROESTE	5/11/2025
448	JOHAN ANDRES RIVAS MURILLO	1192751615	AYUDANTE	REGIONAL NOROESTE	5/11/2025
449	SADIR DE JESUS MORALES FERREIRA	78645193	VISITANTE	REGIONAL NOROESTE	6/11/2025
450	LUIS FELIPE MIGUEZ LOPEZ	1051240768	VISITANTE	REGIONAL NOROESTE	6/11/2025
451	EDISON REINEL SUAREZ DAVILA	13271080	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	8/11/2025
452	HERNRY ALBERTO VARGAS	88178439	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	8/11/2025
453	HILARIO VILLARRUEL BAÑOS	3886487	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	8/11/2025
454	PASTOR MAJIN VARGAS	16726720	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	8/11/2025
455	RONALDO CORTES	1093292094	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	8/11/2025
456	WILLIAM ALEJANDRO HERNANDEZ	1090389025	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	8/11/2025
457	JAIME ALEXANDER CARDENAS BUENO	1233489884	OFICIAL	REGIONAL ORIENTE	9/11/2025
458	ADRIANA AREVALO MANCILLA	60382557	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL NOROESTE	9/11/2025
459	JONIER STIVEN MARTINEZ VALENCIA	1007825351	VISITANTE	REGIONAL NOROESTE	9/11/2025
460	ADRIANA NIETO MORENO	1022929595	SST	REGIONAL OCCIDENTE	9/11/2025
461	MARCELINO CASTILLO MOYA	7477740	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	11/11/2025

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
462	CRISTIAN CAMILO DOMINGUEZ OROZCO	1123620560	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	11/11/2025
463	IVAN ALFONSO HERRERA MONTAÑEZ	1123622310	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	11/11/2025
464	GUILLERMO MORALES JOHNSON	18001008	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	11/11/2025
465	GILDARDO ANTONIO DAVID MAZO	1027946372	OFICIAL	REGIONAL NOROESTE	13/11/2025
466	LUIS EDGAR YANEZ PEÑARANDA	1148694641	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	13/11/2025
467	JUAN DIEGO ROLON LUNA	1092154433	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	13/11/2025
468	OLIER MANUEL UBARNE CUADRADO	1068808704	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	13/11/2025
469	CESAR AUGUSTO TRIANA	1102348912	OFICIAL	REGIONAL ORIENTE	13/11/2025
470	PEDRO JESUS GONZALEZ DIAZ	91353046	OFICIAL	REGIONAL ORIENTE	13/11/2025
471	YHERSON ANDRES LUNA BARRAGAN	1095790466	OFICIAL	REGIONAL ORIENTE	13/11/2025
472	JOHN EDUARDO ROJAS	98363542	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL NOROESTE	14/11/2025
473	FRANCISCO ALBERTO BENAVIDEZ PAZ	79728853	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	14/11/2025
474	JAVIER ARMANDO PARRA SALCEDO	12968327	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	14/11/2025
475	MARIO ALBERTO CAICEDO CHAVES	1085244357	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	14/11/2025
476	MICAHEL SALCEDO CASTEÑO	1113641869	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	14/11/2025
477	LUIS FERNANDO CORREA JAIME	79622344	VISITANTE	REGIONAL NOROESTE	18/11/2025
478	JOHN JAIRO JAMES ACEVEDO	1092342458	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	18/11/2025
479	JOHN MARCOS PALENCIA VELASCO	1093776437	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	18/11/2025
480	JHON FREDY PANCHE PRADA	1023032909	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL	18/11/2025
481	CAMILO ANDRES URREA PINEDA	1023027096	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	18/11/2025
482	EDUARDO ALEXIS NIÑO ORTIZ	1102370775	OFICIAL	REGIONAL ORIENTE	18/11/2025
483	ADREANYER MANUEL HURTADO ABAD	7165651	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	19/11/2025
484	WELFER ESTEBAN HERNÁNDEZ CIRO	1098820760	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL ORIENTE	19/11/2025
485	CRISTIAN GIOVAN LUNA BARRAGAN	91526410	OFICIAL	REGIONAL NORTE	19/11/2025
486	GABRIEL OVIEDO GIL	1065233222	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	19/11/2025
487	OMAR ENRIQUE OVIEDO GIL	73015076	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	19/11/2025
488	DALCIA PAOLA RIVADENEIRA CASTRILLO	1118839606	APOYO DE OBRA	REGIONAL NORTE	19/11/2025
489	JOSE ANTONIO VARGAS	7592807	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	19/11/2025

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
490	EIMAR ALFONOS YACUMAL	1061789307	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	20/11/2025
491	GERMAN ALONSO YACUMAL MOMPOTES	76325358	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	20/11/2025
492	ARGEL RAAD ALTAMAR	1098741210	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	21/11/2025
493	CARMEN PAOLA CACERES AMADO	63505804	TECNICO	REGIONAL NORTE	21/11/2025
494	CRISTOBAL FLOREZ ESCOBAR	18974955	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	21/11/2025
495	ELADIO JOSE MENDEZ SERPA	1102858170	OFICIAL	REGIONAL NORTE	21/11/2025
496	GREGORIO BENEDITO PERALTA GONZALEZ	7167818	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	21/11/2025
497	JHON JAIDER STIVEN HERRERA CABEZA	1099940062	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	21/11/2025
498	MAYCOL DE JESUS ARRIETA ALMARIO	1066754180	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	21/11/2025
499	BRAYANT BEDOYA CHAVEZ	1124243021	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL CENTRAL	21/11/2025
500	EDICSON DARLEY CRUZ ROMERO	1124244654	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	21/11/2025
501	FAVIO ALEXANDER GONZALEZ MONTAÑO	17293348	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	21/11/2025
502	JOHN EMILIANO YEPES JARAMILLO	71269407	OFICIAL	REGIONAL NOROESTE	21/11/2025
503	SERGIO ANDRES CASTAÑO DAVID	1151447546	OFICIAL	REGIONAL NOROESTE	21/11/2025
504	ALEJANDRO ENRIQUE MANJARRES CARRASCO	8534857	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	24/11/2025
505	CRISPINIANO HURTADO CARO	1052944045	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	24/11/2025
506	CHRISTIAN DAVID RAMOS VILLALBA	11255087	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	24/11/2025
507	JHON WILMAR RODRIGUEZ NIETO	1122119531	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	24/11/2025
508	LUIS ALBERTO SILVA CRUZ	80262833	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	24/11/2025
509	SERGIO STEVEN GOMEZ PEREZ	1122142205	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	24/11/2025
510	CARLOS ANTONIO CARDENAS CARDENAS	88311818	AYUDANTE	OCCIDNETE , VIEJO CALDAS - NOROESTE	24/11/2025
511	LUISA FERNANDA LEGARDA ORELLANA	1004509882	RESIDENTE	OCCIDNETE , VIEJO CALDAS - NOROESTE	24/11/2025
512	VICTOR JULIO MILQUES ROJAS	19497338	AYUDANTE	OCCIDNETE , VIEJO CALDAS - NOROESTE	24/11/2025
513	WILMER POVEDA HERNANDEZ	1090439158	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	24/11/2025
514	MARCELINO CASTILLO MOYA	7477740	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	24/11/2025
515	CARLOS MARIO VILLADA NAVAS	1042061980	AYUDANTE	OCCIDNETE , VIEJO CALDAS - NOROESTE	26/11/2025
516	CARLOS MAURO BENAVIDES PALACIO	1071579008	AYUDANTE	OCCIDNETE , VIEJO CALDAS - NOROESTE	26/11/2025

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
517	CRISTIAN DAVID ATENCIA	1038107816	AYUDANTE	OCCIDNETE , VIEJO CALDAS - NOROESTE	26/11/2025
518	EDWIN GUSTAVO CASTAÑEDA DELGADO	1104711901	AYUDANTE	OCCIDNETE , VIEJO CALDAS - NOROESTE	26/11/2025
519	HERASMO JOSE ROMERO HERNANDEZ	1002442293	AYUDANTE	OCCIDNETE , VIEJO CALDAS - NOROESTE	26/11/2025
520	ISAIAS MANUEL SANDOVAL MAESTRA	1002206793	AYUDANTE	OCCIDNETE , VIEJO CALDAS - NOROESTE	26/11/2025
521	JAIME ALBERTO RAMIREZ PALACIOS	79214638	AYUDANTE	OCCIDNETE , VIEJO CALDAS - NOROESTE	26/11/2025
522	RODRIGO DE JESUS GRAJALES	16856730	AYUDANTE	OCCIDNETE , VIEJO CALDAS - NOROESTE	26/11/2025
523	LUIS CARLOS CADENA SEGOVIA	85434555	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	27/11/2025
524	MANUEL ESTEBAN PINEDA CORONADO	12583746	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	27/11/2025
525	TITO LUCIANO RANGEL CADENA	85272423	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	27/11/2025
526	MARCO AURELIO ARIAS	1093747032	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	28/11/2025
527	ABIGAIL PRADA	88213982	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	28/11/2025
528	DANIEL JEOVANI ACOSTA COLON	9140839	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	28/11/2025
529	JESUS LISANGEL AGRIZONES	5281178	AYUDANTE	OCCIDNETE , VIEJO CALDAS - NOROESTE	28/11/2025
530	CARLOS EDUARDO MORALES MARIN	1058198303	AYUDANTE	OCCIDNETE , VIEJO CALDAS - NOROESTE	29/11/2025
531	JESUS ALEJANDRO RODRIGUEZ MARTINEZ	1105465903 4	AYUDANTE	OCCIDNETE , VIEJO CALDAS - NOROESTE	29/11/2025
532	JHON ALEXANDER OCHOA FIGUEROA	1002444097	AYUDANTE	OCCIDNETE , VIEJO CALDAS - NOROESTE	29/11/2025
533	JAIRO ALBERTO GARAVITO QUINTERO	7171245	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	1/12/2025
534	VICTOR ALBERTO GALINDO VEGA	1049633563	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	1/12/2025
535	WILMAR YAIR BENITEZ GUEVARA	1056028443	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	1/12/2025
536	YUSEPI ALEJANDRO LUNA RIVAS	7166272	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	1/12/2025
537	LUIS CARLOS VIDAL REINES	84007805	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	1/12/2025
538	EDILBERTO RINCON VILORIA	85443431	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	1/12/2025
539	HENRY SERRANO QUINTERO	1065205036	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	2/12/2025
540	JAIRO ALONSO LEAL LUNA	88263537	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	2/12/2025
541	JHON ALEXANDER MUÑOZ LOPEZ	1054545625	AYUDANTE	OCCIDNETE , VIEJO CALDAS - NOROESTE	2/12/2025
542	JULIO ESTEBAN BONILLA ROJAS	1001090565	AYUDANTE	OCCIDNETE , VIEJO CALDAS - NOROESTE	2/12/2025
543	ALBER SANABRIA PALENCIA	72294692	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	2/12/2025
544	ENDER ENRIQUE HERRERA PAREJO	1007122386	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	2/12/2025

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
545	JOSE CARLOS PEREZ DE LA HOZ	72210275	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	2/12/2025
546	JOSE DAVID MARTINEZ MARTINEZ	1045679572	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	2/12/2025
547	EDISON FABIAN POBLADOR OCHOA	1023024591	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	4/12/2025
548	JAROL HUMBERTO ROA BUITRAGO	1022967445	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	4/12/2025
549	JHONATAN ESNEIDER VELASCO LEON	1033817675	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	4/12/2025
550	MIGUEL ANGEL MALDONADO LOPEZ	1030646964	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	4/12/2025
551	NIXON NICOLAS AVILA AGUILERA	1014303660	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	4/12/2025
552	DIEGO ALEJANDRO PARRA ALMEYDA	1120505380	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	4/12/2025
553	BRAYANT BEDOYA CHAVEZ	1124243021	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	4/12/2025
554	JORGE LUIS ACONCHA LUNA	18927275	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	4/12/2025
555	ALDREY MOROMBIA TOCRESAMA	11205000063	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	4/12/2025
556	MICHAEL JAVIER RUBIANO SERRANO	1006697596	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	4/12/2025
557	ALBINO PEREZ AVILA	79650369	AYUDANTE	OCCIDNETE , VIEJO CALDAS - NOROESTE	4/12/2025
558	LUIS ALEXANDER VERDUGO RANGEL	91522205	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	4/12/2025
559	MIGUEL ANGEL MALDONADO LOPEZ	1030646964	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	4/12/2025
560	ANDERSON FABIÁN BAUTISTA PABÓN	1098734552	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	5/12/2025
561	HARLEY ANTHONY BENT BARRANCO	1123627567	AYUDANTE	OCCIDNETE , VIEJO CALDAS - NOROESTE	17/12/2025
562	LUIS ANTONIO AGUILAR ALONSO	80643994	AYUDANTE	OCCIDNETE , VIEJO CALDAS - NOROESTE	17/12/2025
563	JHONATHAN ERNESTO ALVAREZ BAEZ	1052383633	AYUDANTE	OCCIDNETE , VIEJO CALDAS - NOROESTE	17/12/2025
564	JIAN FRANCO SANCHEZ OSORI	1007764073	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	17/12/2025
565	JACKELINE EDELMIRA STEELE PARRA	40986214	RESIDENTE	REGIONAL NORTE	18/12/2025
566	MARCOS FIDEL CASTILLO RINCON	1120378902	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	19/12/2025
567	MAYCOL ESTIBEN ROJAS TAPIERO	1006688684	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	19/12/2025
568	JESUS DAVID ALEMAN ANGULO	1103116668	RESIDENTE	REGIONAL NORTE	19/12/2025
569	RENSSON ALBERTO PINZON ALFONSO	17594026	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	19/12/2025
570	CESAR AUGUSTO SILVA MARTINEZ	1100952723	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	29/12/2025
571	JHON MARIO ACEVEDO FLÓREZ	1098714434	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	29/12/2025
572	JHONNY ANDRES MARULANDA CARVAJAL	1039693860	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	29/12/2025

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
573	MIGUEL ANGEL VILLAMIZAR CONTRERAS	1098788331	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	29/12/2025
574	MANUEL JOSE LOZANO BETANCOURT	93134611	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	29/12/2025
575	CLIMACO CARDENAS PEREZ	3171665	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	29/12/2025
576	DUBAN ARLEY CARDENAS GOMEZ	1000353254	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	29/12/2025
577	RICHARD ARLEY SEPULVEDA ONTIVEROS	1093738984	AYUDANTE	REGIONAL VIEJO CALDAS	8/01/2026
578	RICARDO SANDOVAL PEÑA	18262125	AYUDANTE	REGIONAL VIEJO CALDAS	8/01/2026
579	JESUS MARIA FUYA MOZO	1056708491	AYUDANTE	REGIONAL VIEJO CALDAS	8/01/2026
580	HUGO ENRIQUE SEPULVEDA JACOME	1090496944	AYUDANTE	REGIONAL VIEJO CALDAS	8/01/2026
581	CARLOS ALBERTO CAMACHO JAIMES	1098622542	AYUDANTE	REGIONAL VIEJO CALDAS	8/01/2026
582	JHORMAN SNEYDER GOMEZ PITA	1006408695	AYUDANTE	REGIONAL VIEJO CALDAS	8/01/2026
583	CESAR AUGUSTO SILVA MARTINEZ	1100952723	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	8/01/2026
584	ANDRES FELIPE GONZALEZ MARTIN	1000774243	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	9/01/2026
585	LEONARDO JAIDER BRAVO GUZMAN	12266998	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	9/01/2026
586	RAFAEL MONROY CABALLERO	13456598	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	9/01/2026
587	DENIS MANUEL TORO MORALES	15671609	AYUDANTE	OCCIDNETE , VIEJO CALDAS - NOROESTE	13/01/2026
588	HINZ EDUARDO BERJAN AMAYA	4437661	AYUDANTE	OCCIDNETE , VIEJO CALDAS - NOROESTE	13/01/2026
589	JOSE SILVESTRE MORALES HOYOS	15676942	AYUDANTE	OCCIDNETE , VIEJO CALDAS - NOROESTE	13/01/2026
590	JUAN DAVID LUNA GAITAN	1054538753	AYUDANTE	OCCIDNETE , VIEJO CALDAS - NOROESTE	13/01/2026
591	ROBERTO ANTONIO SIERRA MALDONADO	7166646	AYUDANTE	OCCIDNETE , VIEJO CALDAS - NOROESTE	13/01/2026
592	ULISES MURILLO MADRID	1054555053	AYUDANTE	OCCIDNETE , VIEJO CALDAS - NOROESTE	13/01/2026
593	YULEYDA PATRICIA MORALES GOMEZ	50936407	AYUDANTE	OCCIDNETE , VIEJO CALDAS - NOROESTE	13/01/2026
594	ANDERSON JULIAN FLORES ALVIS	1030670601	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL	15/01/2026
595	JORGE DIONICIO VEGA CACERES	1010113402	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	15/01/2026
596	JUAN ANDRES JURADO BENAVIDES	1006947590	APOYO DE OBRA	REGIONAL CENTRAL	15/01/2026
597	LUIS FERNANDO TORRES CASTEL_	74245031	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	15/01/2026
598	NAZAEL RODRIGUEZ LOPEZ	4050800	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	15/01/2026
599	ANGELA FAHISURY CARVAJAL BARRERA	1052400259	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL CENTRAL	16/01/2026
600	ANGUIE LIZETH MURCIA MOLINA	1065611154	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	16/01/2026

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
601	EDISON FABIAN POBLADOR OCHOA	1023024591	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	16/01/2026
602	HUMBERTO ROA	13444945	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	16/01/2026
603	JAROL HUMBERTO ROA BUITRAGO	1022967445	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	16/01/2026
604	JHONATAN ESNEIDER VELASCO LEON	1033817675	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	16/01/2026
605	JUAN FELIPE CORDERO NAVARRO	1136911704	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	16/01/2026
606	MIGUEL ANGEL MALDONADO LOPEZ	1030646964	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	16/01/2026
607	OMAR NARANJO PICO	1098406778	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	16/01/2026
608	KEVIN STEPHAN CARO VERGARA	1005581365	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	16/01/2026
609	MANUEL JOSE NAVARRO MARTINEZ	1100624160	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	16/01/2026
610	JOSE ORLANDO OSSA GONZALEZ	4403296	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	16/01/2026
611	BRAYAN RENE CALDERON CAMARGO	1090476702	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	16/01/2026
612	DANIEL DAVID CASAS VEGA	88245358	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	16/01/2026
613	ISMAEL CRESPO JAIMES	1127361855	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	16/01/2026
614	JOSE VICENTE VERA GUTIERREZ	88226733	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	16/01/2026
615	JUNIOR ANDRES HERRERA CALDERON	1090373365	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	16/01/2026
616	LUIS CARLOS VILLEGAS BALLENA	5092805	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	16/01/2026
617	LUIS GUILLERMO MARTÍNEZ BARRAGAN	1101622267	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	16/01/2026
618	MILLER ANDRES MENDEZ BARRAGAN	1101546565	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	16/01/2026
619	PLUTARCO SOLANO MARTINEZ	91344588	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	16/01/2026
620	ROQUE ANTONIO MACHADO DAZA	13279123	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	16/01/2026
621	ALBERTO MARIO PEREZ NAVARRO	3738522	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	16/01/2026
622	CARLOS JAVIER BORJA JORDAN	1143227061	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	16/01/2026
623	LORENZO ALEJANDRO CARDONA GALVIS	75102901	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL VIEJO CALDAS , OCCIDENTE Y NOROESTE	16/01/2026
624	CARLOS ALFONSO CUJIA MANJARREZ	1065577261	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL VIEJO CALDAS , OCCIDENTE Y NOROESTE	16/01/2026
625	LORENZO ALEJANDRO CARDONA GALVIS	75102901	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL VIEJO CALDAS , OCCIDENTE Y NOROESTE	20/01/2026

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
626	CARLOS ALFONSO CUJIA MANJARREZ	1065577261	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL VIEJO CALDAS , OCCIDENTE Y NOROESTE	20/01/2026
627	JOHAN STIVEN RUIZ ALMECIGA	1071169654	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	20/01/2026
628	JOSE ALEJANDRO RODRIGUEZ	79616417	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	20/01/2026
629	ADRIANA AREVALO MANCILLA	60382557	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL CENTRAL	20/01/2026
630	DULIS CESAR ALVARADO PADILLA	7617663	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	20/01/2026
631	IGNACIO MILLAN ORJUELA	17267505	AYUDANTE	REGIONAL VIEJO CALDAS ,OCCIDENTE Y NOROESTE	21/01/2026
632	JORGE MARIO LEAL GONZALEZ	93413074	AYUDANTE	REGIONAL VIEJO CALDAS ,OCCIDENTE Y NOROESTE	21/01/2026
633	LEONARDO MONTOYA TOVAR	5973089	AYUDANTE	REGIONAL VIEJO CALDAS ,OCCIDENTE Y NOROESTE	21/01/2026
634	ANDRES FELIPE GONZALEZ MARTIN	1000774243	ELECTRICO	REGIONAL CENTRAL	22/01/2026
635	CHRISTIAN DAVID RAMOS VILLALBA	11255087	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	22/01/2026
636	ELIO JOSE CARPAVIRE	8296978	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	22/01/2026
637	FRANKLIN HERNAN CASTELLANOS	1090479205	MAESTRO	REGIONAL CENTRAL	22/01/2026
638	JUAN DIEGO ROLON LUNA	1092154433	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	22/01/2026
639	LUIS ALBERTO SILVA CRUZ	80262833	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	22/01/2026
640	LUIS EDGAR YANEZ PEÑARANDA	1148694641	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL	22/01/2026
641	WILLIAN JOSE DURAN	5731911	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	22/01/2026
642	BENJAMIN ANTOLINEZ QUINTERO	1129593	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	22/01/2026
643	HAROLD SNEIDER PINTO SUAREZ	1019602207	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	22/01/2026
644	CRISTANCHO CARDENAS SAENZ	74328190	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	22/01/2026
645	ARGEL RAAD ALTAMAR	1098741210	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	22/01/2026
646	CARLOS JAVIER BORJA JORDAN	1143227061	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	22/01/2026
647	CARMEN PAOLA CACERES AMADO	63505804	ELECTRICO	REGIONAL NORTE	22/01/2026
648	CRISTIAN GIOVANNY LUNA BARRAGÁN	91526410	OFICIAL	REGIONAL NORTE	22/01/2026
649	DALCIA PAOLA RIVADENEIRA	1118839606	APOYO DE OBRA	REGIONAL NORTE	22/01/2026

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
650	ENDER ENRIQUE HERRERA PAREJO	1007122386	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	22/01/2026
651	GREGORIO BENEDITO PERALTA	7167818	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	22/01/2026
652	JADER LUIS ARAUJO PINEDA	19595428	OFICIAL	REGIONAL NORTE	22/01/2026
653	JHON JAIDER STIVEN HERRERA	1099940062	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	22/01/2026
654	JOHANA LICETH DIAZ OSORIO	1098787392	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL NORTE	22/01/2026
655	JOSÉ ANTONIO VARGAS	7592807	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	22/01/2026
656	JOSE DAVID MARTINEZ MARTINEZ	1045679572	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	22/01/2026
657	ALBERTO MARIO PEREZ NAVARRO	3738522	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	22/01/2026
658	MANUEL ANTONIO PEREZ LINERO	1129524006	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	22/01/2026
659	EDUARDO ENRIQUE CERVANTES CABALLERO	1041976650	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	23/01/2026
660	JOSE CARLOS PEREZ DE LA HOZ	72210275	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	23/01/2026
661	PEDRO MALAMBO GUARDO	73200173	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	23/01/2026
662	ALEXANDER DIONISIO RAMOS CARO	73182082	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	24/01/2026
663	CARLOS ANDRES VILLANUEVA NUÑEZ	1143454702	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	24/01/2026
664	EDILBERTO CHINCHILLA PALLARES	12568317	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	24/01/2026
665	RAFAEL MERCADO SILGADO	9042982	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	24/01/2026
666	CAMILO ANTONIO LOPEZ OCAMPO	1123531291	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	24/01/2026
667	CARLOS ALBERTO SALDARRIAGA ALVAREZ	86013281	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	24/01/2026
668	ANDRES FELIPE GONZALEZ PEREZ	1100627390	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	24/01/2026
669	CARLOS ANDRES ZAPATA PRESIGA	1001145197	AYUDANTE	REGIONAL VIEJO CALDAS ,OCCIDENTE Y NOROESTE	24/01/2026
670	JAVIER ARMANDO PARRA SALCEDO	12968327	AYUDANTE	REGIONAL VIEJO CALDAS ,OCCIDENTE Y NOROESTE	24/01/2026
671	JESUS DANIEL ARTEAGA LUGO	1003071663	AYUDANTE	REGIONAL VIEJO CALDAS ,OCCIDENTE Y NOROESTE	24/01/2026

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
672	MICHAEL SALCEDO CASTAÑO	1113641869	AYUDANTE	REGIONAL VIEJO CALDAS ,OCCIDENTE Y NOROESTE	24/01/2026
673	ASTRID CAROLINA MEDINA BOBADILLA	1119217740	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	28/01/2026
674	DEYBI ANDRÉS JAIMES TARAZONA	80921707	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	28/01/2026
675	JESUS MAURICIO MACIAS GONZALEZ	1024569383	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	28/01/2026
676	JORGE ARMANDO MARTINEZ CAMELO	80226139	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	28/01/2026
677	JORGE LUIS GONZÁLEZ PALLARES	1091803887	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	28/01/2026
678	WILLIAM CAICEDO CASTILLO	80372534	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	28/01/2026
679	MAICOL ESTEBAN BRACAMONTE MARTÍNEZ	1005108009	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	28/01/2026
680	ALEJANDRO FONSECA CACERES	1098764868	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	28/01/2026
681	JAIRO AGUSTIN BRAVO PEÑATA	1067895836	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	28/01/2026
682	CARLOS ALBERTO CAMACHO JAIMES	1098622452	AYUDANTE	REGIONAL VIEJO CALDAS , OCCIDENTE Y NOROESTE	28/01/2026
683	CARLOS AUGUSTO VAQUIRO	11316941	AYUDANTE	REGIONAL VIEJO CALDAS , OCCIDENTE Y NOROESTE	28/01/2026
684	HAROLD ANDRES MEJIA OSORIO	9874579	AYUDANTE	REGIONAL VIEJO CALDAS , OCCIDENTE Y NOROESTE	28/01/2026
685	JEFFERSON ESTIVEN OSORIO	1088022764	AYUDANTE	REGIONAL VIEJO CALDAS , OCCIDENTE Y NOROESTE	28/01/2026
686	VICTOR MANUEL SANDOVAL MORALES	1003304880	AYUDANTE	REGIONAL VIEJO CALDAS , OCCIDENTE Y NOROESTE	28/01/2026
687	ANDRES FERNANDO TIBAQUIRA PIRAVAN	1010050473	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	28/01/2026
688	DAVID SEBASTIAN HERNANDEZ GALVIS	1023037023	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	28/01/2026
689	DIEGO ALEXANDER MARIN ARCILA	1032465108	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	28/01/2026
690	JAIME EDUARDO MANZANO BALDION	16801648	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	28/01/2026
691	MARTIN ACOSTA LINARES	79610836	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	28/01/2026
692	ANDRES FELIPE TORRES CAMARGO	1014290145	APOYO DE OBRA	REGIONAL CENTRAL	3/02/2026
693	HUGO ARMANDO DOMINGUEZ OTERO	15647682	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	3/02/2026
694	ERASMO MARTINEZ	323432	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	3/02/2026
695	JORGE HERNAN PATIÑO SANCHEZ	1023017718	APOYO DE OBRA	REGIONAL CENTRAL	3/02/2026
696	MILLER ALEJANDRO MENDEZ CHIVATA	80742891	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL	3/02/2026
697	SONIA DANIELA GUTIERREZ CIFUENTES	1023017719	APOYO DE OBRA	REGIONAL CENTRAL	3/02/2026

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
698	STEED BARCENAS ROBAYO	80232649	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	3/02/2026
699	JESUS MAURICIO MACIAS GONZALEZ	1024569383	APOYO DE OBRA	REGIONAL CENTRAL	3/02/2026
700	JESUS ORLANDO COLORADO OLAYA	1006693731	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	3/02/2026
701	JUAN ESTEBAN BARON GALINDO	1050603645	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	3/02/2026
702	WILIAN ORLEY MARTINEZ CUESTA	79667092	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	3/02/2026
703	FAVIO ALEXANDER GONZALEZ MONTAÑA	17293348	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	3/02/2026
704	PEDRO JESUS GONZALEZ DIAZ	91353046	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	3/02/2026
705	ERICK FERNANDO COLMENARES	1094947866	APOYO DE OBRA	REGIONAL VIEJO CALDAS ,OCCIDENTE Y NOROESTE	3/02/2026
706	HUGO ARMANDO DOMINGUEZ OTERO	1064983252	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	4/02/2026
707	EDWIN ESPINOSA UZETA	1015396112	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL	10/02/2026
708	JEYSON DAVID ROJAS PAYARES	1033712661	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL	10/02/2026
709	JOSE GIOVANNY BERMUDEZ PALACIO	1024512750	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL	10/02/2026
710	ELVER JAVIER MORA MOLINA	1003045498	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	10/02/2026
711	FILIBERTO MIGUEL PICO SANCHEZ	6877061	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	10/02/2026
712	LUIS CARLOS CHIMA NORIEGA	1067952224	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	10/02/2026
713	MAURICIO JOSE OROZCO HERNANDEZ	1067950867	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	10/02/2026
714	LUIS FELIPE MIGUEZ LOPEZ	1051240768	APOYO DE OBRA	REGIONAL VIEJO CALDAS ,OCCIDENTE Y NOROESTE	11/02/2026
715	MIGUEL ANTONIO GÓMEZ FLOREZ	1064983252	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	12/02/2026
716	JOSE MIGUEL GARCES FUENTES	1045492912	AYUDANTE	REGIONAL NOROESTE	12/02/2026
717	URIEL ANTONIO MANCO MANCO	3420743	MAESTRO	REGIONAL NOROESTE	12/02/2026
718	HUGO ARMANDO DOMINGUEZ OTERO	15647682	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	13/02/2026
719	ANTONIO ALEXANDER LABRADOR CONTRERAS	5496954	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	13/02/2026
720	LUISA FERNANDA PROAÑOS CASALLAS	53036744	COORDINADORA	REGIONAL VIEJO CALDAS ,OCCIDENTE Y NOROESTE	14/02/2026

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
721	JAIME ORLANDO ACOSTA RIOS	79157190	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL VIEJO CALDAS ,OCCIDENTE Y NOROESTE	14/02/2026
722	CARLOS ALFONSO CUJIA MANJARREZ	1065577261	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL VIEJO CALDAS ,OCCIDENTE Y NOROESTE	14/02/2026
723	NIXON NICOLAS AVILA AGUILERA	1014303660	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	14/02/2026
724	OSCAR IVAN CUESTAS ESPINOSA	1032939738	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	14/02/2026
725	YEISON MOGOLLON ORTEGA	1093775476	RESIDENTE	REGIONAL CENTRAL	19/02/2026
726	JOHN MARCOS PALENCIA VELASCO	1093776437	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	19/02/2026
727	JOSE LEONARDO DIAZ ULLUA	1020748096	AYUDANTE	REGIONAL VIEJO CALDAS ,OCCIDENTE Y NOROESTE	19/02/2026
728	ANDRES FANDIÑO PEÑA.	80748984	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	19/02/2026
729	MERQUECIDED QUINTERO ARCIRIA	1002047944	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	19/02/2026
730	WILFRAN ANTONIO DE HOYOS MORELO	1001671387	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	19/02/2026
731	JOSE ALFREDO JIMENEZ REINOS	14013920	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	19/02/2026
732	JOSE LUIS AVILA CARDALES	6494532	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	19/02/2026
733	CRISTIAN FERNANDO HINCAPIE TORO	1058842570	AYUDANTE	REGIONAL VIEJO CALDAS ,OCCIDENTE Y NOROESTE	19/02/2026
734	DANILO RIOS VALENCIA	1055918321	AYUDANTE	REGIONAL VIEJO CALDAS ,OCCIDENTE Y NOROESTE	19/02/2026
735	GEIMAR ANDRES ORTIZ CORREDOR	16115435	AYUDANTE	REGIONAL VIEJO CALDAS ,OCCIDENTE Y NOROESTE	19/02/2026
736	JESUS BERNARDO CORREA MARTINEZ	1054550756	AYUDANTE	REGIONAL VIEJO CALDAS ,OCCIDENTE Y NOROESTE	19/02/2026
737	LUIS ALBERTO ECHAVARRIA AVILA	1054543717	AYUDANTE	REGIONAL VIEJO CALDAS ,OCCIDENTE Y NOROESTE	19/02/2026
738	ANTHONY DUVAN VILLASMIL PUCHE	5413107	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	20/02/2026
739	FRANKLIN JAVIER SALINAS SAAVEDRA	5024133	APOYO DE OBRA	REGIONAL CENTRAL	20/02/2026

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
740	REINALDO ISIDRO GUTIERREZ MARQUEZ	3161886	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	20/02/2026
741	DAVID FELIPE DUARTE ESPITIA	1122133473	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	20/02/2026
742	BAIRON STEVEN MULFORD OCAMPO	1121932950	INSPECTOR DE OBRA	REGIONAL CENTRAL	20/02/2026
743	EDWIN LEONARDO HERRERA	1122131303	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	20/02/2026
744	DANIEL FELIPE QUINTERO HERRERA	1027891496	AYUDANTE	REGIONAL VIEJO CALDAS ,OCCIDENTE Y NOROESTE	23/02/2026
745	YOHAN DAVID FLOREZ IBARRA	1013556518	AYUDANTE	REGIONAL VIEJO CALDAS ,OCCIDENTE Y NOROESTE	23/02/2026
746	ADOLFO PACANCHIQUE	79134013	AYUDANTE	REGIONAL VIEJO CALDAS ,OCCIDENTE Y NOROESTE	23/02/2026
747	WILSON PAVA CARDENA	18921693	AYUDANTE	REGIONAL VIEJO CALDAS ,OCCIDENTE Y NOROESTE	23/02/2026
748	MARCO FIDEL PEDRAZA GALLO	79838222	AYUDANTE	REGIONAL VIEJO CALDAS ,OCCIDENTE Y NOROESTE	23/02/2026
749	KEVIN ANDRES GONZALEZ MURILLO	1033770247	AYUDANTE	REGIONAL VIEJO CALDAS ,OCCIDENTE Y NOROESTE	23/02/2026
750	EDWIN CAICEDO MINA	1006190692	AYUDANTE	REGIONAL VIEJO CALDAS ,OCCIDENTE Y NOROESTE	23/02/2026
751	NELSON ANDRES PARDO MANCERA	1071304077	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	24/02/2026
752	FARY CABRERA	18261964	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	24/02/2026
753	EDUARD ARIEL BERNAL BUENO	1057690218	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	24/02/2026
754	DANIEL DAVID ESPITIA GUZMAN	1004307150	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	24/02/2026
755	JESUS ALBERTO TRESPALACIOS SANCHEZ	1090478543	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	24/02/2026
756	SAMIR ALFONSO RODRIGUEZ GUERRERO	1093737726	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	24/02/2026
757	DAVID TRESPALACIOS CAPATAZ	13470788	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	24/02/2026
758	GEYLER JHANS SIERRA SANABRIA	1013630766	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	4/03/2026

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
759	RAFAEL STEVEN ROJAS BECERRA	1014226170	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	4/03/2026
760	JUAN DAVID MONTOYA BLANCO	1006423850	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	4/03/2026
761	JUAN JOSE AVILA PEREZ	11522038	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	4/03/2026
762	FRANKY JAVIER GUERRERO CALDERON	1090414551	AYUDANTE	REGIONAL VIEJO CALDAS	5/03/2026
763	ANDREY ALBARRACIN TORRES	1118553052	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	9/03/2026
764	ALEXANDER SUAREZ FIGUEROA	13541878	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	9/03/2026
765	MAIKOL STICK MAHECHA MAHECHA	1120955621	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	9/03/2026
766	HECTOR ANDRES ZAPATA CARDONA	14567661	OFICIAL	REGIONAL VIEJO CALDAS	13/03/2026
767	ROBERT MANUEL VELASCO CONTRERAS	4372065	OFICIAL	REGIONAL VIEJO CALDAS	13/03/2026
768	ROBINSON BLANCO FIGUEROA	91279527	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	16/03/2026
769	CRISTIAN FABIAN MARTINEZ POVEDA	1095814349	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	16/03/2026
770	EDGAR BENAVIDES	79634045	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	16/03/2026
771	ENRIQUE YOHANNY SILVA AVENDAÑO	1149465700	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	16/03/2026
772	DUVAN FERNANDO SICHACA GONZALEZ	1057187035	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	16/03/2026
773	GEYLER JHANS SIERRA SANABRIA	1013630766	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	16/03/2026
774	RAFAEL STEVEN ROJAS BECERRA	1014226170	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	16/03/2026
775	CONAL YEFRY FERREIRA NIÑO	1098741598	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	19/03/2026
776	ERWIN GIOVANNI MURILLO PIMIENTO	137720769	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	19/03/2026
777	LUIS ALBERTO PASACHOA HERNANDEZ	1098708028	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	19/03/2026
778	DUVAN FERNANDO SICHACA GONZALEZ	1057187035	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	19/03/2026
779	JOSE ALEJANDRO SANTAMARIA ESPEJO	80243991	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL	26/03/2026
780	JOHN ALEXANDER ENCISO BELLO	80049708	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL	26/03/2026
781	OSCAR ANDRES RIAÑO RAMIREZ	80201646	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL	26/03/2026
782	CRISTIAN CAMILO GONZALEZ PENAGOS	1007718421	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL	26/03/2026

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
783	JOHAN SEBASTIAN VARGAS CARDENAS	1028784824	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	26/03/2026
784	JORGE ARIEL SEGURA URUEÑA	1122120225	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	26/03/2026
785	MANUEL MARIA VILORIA RIVALDO	1082243908	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	26/03/2026
786	ROBERTH DANIEL ROJAS VARGAS	1082920794	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	26/03/2026
787	ANGELA MERCEDES GONZALEZ SANTACRUZ	1085269054	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	13/04/2026
788	CARLOS ALBERTO TORO RESTREPO	98535012	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	13/04/2026
789	CARLOS ANTONIO CARDENAS CARDENAS	88311818	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	13/04/2026
790	DILMER JOVANNY BAYONA RODRÍGUEZ	80777530	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	13/04/2026
791	FRANKLIN QUIÑONES QUIÑONES	16938024	OFICIAL	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	13/04/2026
792	GERARDO BORJA RUIZ	87941998	OFICIAL	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	13/04/2026
793	HECTOR LUIS ROSERO PRECIADO	1004614796	OFICIAL	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	13/04/2026
794	JAVIER GUILOMBO MONTES	7687771	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	13/04/2026
795	JESUS ALEJANDRO RODRIGUEZ MARTINEZ	1105465903 4	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	13/04/2026
796	LUIS ALFONSO RODRÍGUEZ BONILLA	93413044	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	13/04/2026
797	MICAHEL SALCEDO CASTEÑO	1113641869	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	13/04/2026

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
798	VICTOR JULIO MILQUES ROJAS	19947338	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	13/04/2026
799	VLADIMIRO VASQUEZ ARCE	10185609	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	13/04/2026
800	DANIEL ADOLFO TABARES BASTIDAS	1110443602	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	17/04/2026
801	JHON JAIRO POLO FUENTES	78036808	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	17/04/2026
802	DANIEL MARIA CARVAJAL LOPEZ	6212586	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	17/04/2026
803	ALBERSON MOLINA ORDOÑEZ	1117544255	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	17/04/2026
804	PAVA ROMAN WILSON	1093762615	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	17/04/2026
805	WILMAR CAMILO PEREZ AVILA	1000323598	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	17/04/2026
806	HELI YIMMI CORDERO GALVIS	80361570	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	17/04/2026
807	JOHN JAIRO CORDERO MOLINA	1033681680	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	17/04/2026
808	JIMMY CORDERO MOLINA	1033707764	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	17/04/2026
809	CESAR AUGUSTO MORENO MONTES	79954245	INGENEIRO	REGIONAL CENTRAL	20/04/2026
810	JOSE DEL CARMEN MERCHAN CARDENAS	79127801	OPERADOE	REGIONAL CENTRAL	20/04/2026
811	ANGELO FERNANDO RIOS	1027886187	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	21/04/2026
812	CLAUIDO GUALTERO BERMUDEZ	17711065	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	21/04/2026
813	SEBASTIAN ZAPATA ROJAS	1001020775	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	21/04/2026

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
814	NEY DE JESUS GARCIA	7252410	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	21/04/2026
815	MAICOL MONTOYA CARMONA	1056780119	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	21/04/2026
816	LUIS ALBERTO FONSECA RIVERA	1042436454	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	21/04/2026
817	OSCAR DANIEL PACHECO CAMARGO	1048315979	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	21/04/2026
818	DAVID JESUS CHAPAL BOTINA	1085320313	OFICIAL	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	22/04/2026
819	HERMES FROILAN DELGADO LUNA	1083752578	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	22/04/2026
820	JESUS ESPERIDION DOBANDO TORO	12746343	MAESTRO	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	22/04/2026
821	JUAN ALEXANDER GUERRA VALLEJO	1083752233	OFICIAL	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	22/04/2026
822	LUIS ORLANDO LUNA MARTINEZ	12746960	OFICIAL	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	22/04/2026
823	OBANDO TORO OSMALDO	13068176	MAESTRO	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	22/04/2026
824	OSCAR HERNAN GELPUD CORAL	1085291531	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	22/04/2026
825	SEGUNDO DARIO OBANDO TORO	5252424	MAESTRO	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	22/04/2026
826	JESUS MARIA FUYA MOZO	1056708491	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	22/04/2026
827	JOAQUIN DIAZ GONZALEZ	79631616	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	22/04/2026
828	JORGE ELIECER VIASUS MOLINA	7173051	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	22/04/2026
829	JOSE LUIS HERNANDEZ OCHOA	4081320	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	22/04/2026
830	PEDRO ANTONIO BONILLA ARTUNDUAGA	93061247	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	22/04/2026
831	MICHAEL STIVEN HERRERA GUTIERREZ	1109292308	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	22/04/2026
832	RAFAEL ANTONIO BAEZ RODRIGUEZ	79318824	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	23/04/2026
833	ROSANA DE FREITAS PEREZ	5306212	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	23/04/2026
834	YEREMY GUEVARA GONZALEZ	6271724	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	23/04/2026
835	DIEGO FERNEY ROJAS ABRIL	79223760	MAESTRO	REGIONAL CENTRAL	23/04/2026
836	EDUARDO PARRA	79332484	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	23/04/2026

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
837	JHON ALEXANDER PUENTES ROJAS	79836472	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	23/04/2026
838	CRISTIAN FABIAN VARGAS MOROS	1090413023	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	23/04/2026
839	JOSE GREGORIO ALEAN BUITRAGO	88176564	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	23/04/2026
840	LUIS ALEXIS BURGOS CASTELLANOS	88241324	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	23/04/2026
841	DIDIAN ANDRES GAVIRIA ESPINOSA	1061535954	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	23/04/2026
842	ARMANDO GOMEZ PIAMBA	10316793	MAESTRO	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	23/04/2026
843	ROBERTO JOSE FERNANDEZ MURILLO	5639720	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	27/04/2026
844	GERMAN LUIS DONADO GUZMAN	8566318	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	29/04/2026
845	CAMILO ALBERTO VARGAS BAEZ	1052404026	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	30/04/2026
846	CRISTIAN FABIAN ACUÑA LOZANO	1007139969	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	30/04/2026
847	JHONATHAN ERNESTO ALVAREZ BAEZ	1052383633	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	30/04/2026
848	ALFONSO CORONADO	80371284	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	4/05/2026
849	FABIAN CAMILO DEL VALLE PINZON	1012391807	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	4/05/2026
850	FRANKLIN JOSE OVALLE DOVALES	1127669165	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	4/05/2026
851	JAMER ROJAS RAMOS	1083908005	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	4/05/2026
852	JORGE ENRIQUE BERMUDEZ DIAZ	1023936707	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	4/05/2026
853	LUIS ALBERTO BERMUDEZ DIAZ	1023912742	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	4/05/2026
854	OLGA PIEDAD MEJIA GONZALEZ	24645529	APOYO DE OBRA	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	4/05/2026
855	YOLANDA MORA AGUILAR	52489217	APOYO DE OBRA	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	4/05/2026
856	MARTIN JAVIER CARDOZO RAMIREZ	79453907	APOYO DE OBRA	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	4/05/2026

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
857	ALEXANDER CASTAÑO RAMOS	93382606	APOYO DE OBRA	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	4/05/2026
858	BENJAMIN ROJAS ABRIL	79219297	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL	4/05/2026
859	JEISSON ALEXANDER RIGUEROS BARRETO	1013628069	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL	4/05/2026

Tabla 4 Personal del Contratista

12.2 PERSONAL DE INTERVENTORIA

PERSONAL INTERVENTORIA	CARGO
Diego Alejandro Leiva Ortiz	Representante Legal
Angelica María Artunduaga	Secretaria
Luis Jorge Cortes	Costos y Presupuestos
Paulo Cesar Silva Morales	Director
María Amelia Zabaleta Andrade	profesional SST
Greis Leiva Bolaños	profesional SST
Natalia Isabel Martínez Campo	Coordinador
Jarkelys Ospino Gómez	Coordinador
Jesús David Polo Meza	Coordinador
Yazmin Dominguez Suarez	Coordinador
Juan Sebastián González	Asistente Administrativo
Augusto Angarita Joya	Residente
Camilo Andrés Macualo Pérez	Residente
Carlos Armando Oviedo Morales	Residente
Diana Olaya Castro	Residente
Eva Evans Pineda	Residente
francisco Alban	Residente
Hernán Rodrigo Aza Rodríguez	Residente
Huber Villareal Rubio	Residente
Iván Ochoa Barajas	Residente
Javier Mamian Vargas	Residente
Janner Murillo Riascos	Residente
John Leandro Hernández Parra	Residente
Juan Sebastián Bermeo Llanos	Residente
Lenin Lupercio Bohórquez Martínez	Residente
Kelin Yanida Marín ruiz	Residente
Plinio Rafael Gómez Archbold	Residente
Miguel Garzón Rojas	Residente
Miguel Ángel Tovar Perdomo	Residente
Ricardo Sarmiento Chaves	Residente
Rodrigo Alberto ascanio mantilla	Residente
Alejandro Torres Torres	Residente

Tabla 5 Personal de Interventoría

13. CONTROL DE RECURSOS – EQUIPOS Y MATERIALES.

Para el seguimiento y control la interventoría informa que durante este periodo se presentó de ingreso de materiales en los establecimientos en ejecución.

14. ACTAS DE COMITÉ

Para el seguimiento y control de la interventoría se adjunta las actas de comité de los establecimientos en ejecución.

15. INFORMES QUINCENALES

Se realiza entrega de 2 informes quincenales los cuales informan el avance del contrato y el registro de actividades realizadas en los periodos del 1 al 15 de diciembre y del 16 al 31 de diciembre del 2025.

16. BITACORA DE OBRA

Para el seguimiento y control la interventoría se adjunta la bitácora de los establecimientos en ejecución.

17. ESTADO LEGAL, ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DEL PROYECTO.

Pólizas Contrato de Obra

POLIZAS PRORROGA 1

Póliza No.	Fecha de Expedición	Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Valor Asegurado
81880 Berkley internacional seguros Endoso 0	10/10/2024	CUMPLIMIENTO	1/10/2024	30/06/2025	$ 16.050.956.679,00
	10/10/2024	BUEN MANEJO DE ANTICIPO	1/10/2024	30/06/2025	$ 16.050.956.679,00
	10/10/2024	PRESTACIONES SOCIALES	1/10/2024	30/06/2025	$ 5.350.318.893,00
	10/10/2024	CALIDAD DEL SERVICIO	1/10/2024	31/12/2029	$ 16.050.956.679,00
	10/10/2024	ESTABILIDAD DE LA OBRA	31/12/2024	31/12/2029	$ 10.700.637.786,00
23731 Berkley internacional seguros Endoso 0	10/10/2024	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1/10/2024	31/12/2024	$ 2.675.159.447,00

POLIZAS PRORROGA

Ilustración 7 Pólizas del Contrato de Obra

Pólizas Contrato de interventoría

CONSORCIO BETA REGIONALES			CONTRATO DE INTERVENTORIA USPEC-CTO-271-2024		
POLIZAS DE LEGALIZACION DEL CONTRATO					
Poliza No.	**Amparo**	**Anexo**	**Vigencia**		**Valor Asegurado**
			Desde	Hasta	
21-44-101455286	CUMPLIMIENTO	0	7/11/2024	30/06/2025	$ 778.940.802,70
seguros del	PAGO DE SALARIOS	0	7/11/2024	31/12/2027	$ 259.613.600,90
Estado	PRESTACIONES SOCIALES	0	7/11/2024	31/12/2027	$ 778.940.802,70
POLIZAS DE LEGALIZACION DEL CONTRATO OTROSI 1					
Poliza No.	**Amparo**	**Anexo**	**Vigencia**		**Valor Asegurado**
			Desde	Hasta	
21-44-101455286	CUMPLIMIENTO	2	7/11/2024	30/06/2025	$ 778.940.802,70
seguros del	PAGO DE SALARIOS	2	7/11/2024	31/12/2027	$ 259.613.600,90
Estado	PRESTACIONES SOCIALES	2	31/12/2024	31/12/2029	$ 778.940.802,70
POLIZAS DEL ACTA DE INICIO					
Poliza No.	**Amparo**	**Anexo**	**Vigencia**		**Valor Asegurado**
			Desde	Hasta	
21-44-101455286	CUMPLIMIENTO	4	29/11/2024	22/07/2025	$ 778.940.802,70
seguros del	PAGO DE SALARIOS	4	29/11/2024	22/01/2029	$ 259.613.600,90
Estado	PRESTACIONES SOCIALES	4	22/01/2025	22/01/2030	$ 778.940.802,70
POLIZAS OTROSI 2					
Poliza No.	**Amparo**	**Anexo**	**Vigencia**		**Valor Asegurado**
			Desde	Hasta	
21-44-101455286	CUMPLIMIENTO	6	29/11/2024	22/07/2025	$ 778.940.802,70
seguros del	PAGO DE SALARIOS	6	29/11/2024	22/01/2029	$ 259.613.600,90
Estado	PRESTACIONES SOCIALES	6	22/01/2025	22/01/2030	$ 778.940.802,70

POLIZAS OTROSI 2						
Poliza No.	Amparo	Anexo	Vigencia		Valor Asegurado	
			Desde	Hasta		
21-44-101455286 seguros del Estado	CUMPLIMIENTO	7	29/11/2024	30/09/2025	$	778.940.802,70
	PAGO DE SALARIOS	7	29/11/2024	31/03/2029	$	259.613.600,90
	PRESTACIONES SOCIALES	7	31/03/2025	22/01/2030	$	778.940.802,70

POLIZAS OTROSI 2						
Poliza No.	Amparo	Anexo	Vigencia		Valor Asegurado	
			Desde	Hasta		
21-44-101455286 seguros del Estado	CUMPLIMIENTO	8	29/11/2024	30/09/2025	$	778.940.802,70
	PAGO DE SALARIOS	8	29/11/2024	31/03/2029	$	259.613.600,90
	PRESTACIONES SOCIALES	8	31/03/2025	31/03/2030	$	778.940.802,70

POLIZAS OTROSI 3						
Poliza No.	Amparo	Anexo	Vigencia		Valor Asegurado	
			Desde	Hasta		
21-44-101455286 seguros del Estado	CUMPLIMIENTO	9	29/11/2024	30/11/2025	$	778.940.802,70
	PAGO DE SALARIOS	9	29/11/2024	31/05/2029	$	259.613.600,90
	PRESTACIONES SOCIALES	9	31/03/2025	31/03/2030	$	778.940.802,70

CONSORCIO BETA REGIONALES		CONTRATO DE INTERVENTORIA USPEC-CTO-271-2024				
POLIZAS OTROSI 5						
Poliza No.	Amparo	Anexo	Vigencia		Valor Asegurado	
			Desde	Hasta		
21-44-101455286 seguros del Estado	CUMPLIMIENTO	13	29/11/2024	15/06/2026	$	778.940.802,70
	PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	13	29/11/2024	15/12/2028	$	549.926.053,70
	CALIDAD DEL SERVICIO	13	15/12/2025	15/12/2030		$ 1.646.479.161,10

Tabla 6 Pólizas Contrato de interventoría

18. RECOMENDACIONES Y SOLICITUDES

Durante el periodo correspondiente al presente informe se resalta:

Se presenta un atraso significativo (-17,15%) en el avance general del proyecto, es decir se presenta una disminución del atraso con respecto al mes inmediatamente anterior.

Se entiende que en una pequeña parte de esta desviación está representada en situaciones ajenas al contratista, pero en la mayoría de los casos, es decir de un peso porcentual mayor, son por causas inherentes a la actividad del contratista como son:

- Establecimientos que iniciaron actividades, pero no se evidencia avance.
- La no entrega de diseños completos en la documentación respectiva requerida para aprobación por parte de la interventoría.
- Poco personal en obra para la ejecución de actividades y en algunos casos ausencia total de personal operativo en el frente de obra.
- Falta de planeación en la compra de insumos, como también en la vinculación del personal para el proceso constructivo.
- Productos no conformes por la calidad de obra.

Y en otros no imputables al contratista de obra como son:

- Orden público en algunas zonas del país.
- Horario de ingreso a los establecimientos para realizar actividades de obra.

Durante el periodo informado se evidenció avance en la ejecución de las actividades programadas en los diferentes establecimientos penitenciarios objeto del contrato, manteniéndose la continuidad de las intervenciones orientadas al mejoramiento de las condiciones de infraestructura, seguridad y habitabilidad.

Se destaca que un número importante de establecimientos presentan actividades culminadas al 100%, encontrándose en proceso de entrega formal y recibo por parte de la USPEC, lo cual refleja el cumplimiento de los alcances aprobados en dichos frentes de trabajo.

En los establecimientos que continúan en ejecución, se observó desarrollo de actividades conforme a los alcances contractuales; sin embargo, la interventoría dejó constancia de situaciones puntuales que requieren seguimiento, especialmente relacionadas con bajos rendimientos en obra y la necesidad de fortalecer la programación y asignación de recursos por parte del contratista para garantizar el cumplimiento oportuno de los compromisos adquiridos.

En términos generales, el comportamiento del contrato durante el periodo evaluado puede considerarse favorable, dado que la mayoría de las intervenciones reportadas registran avances satisfactorios o se encuentran finalizadas; no obstante, resulta indispensable

mantener el seguimiento permanente a los frentes de obra activos y a los compromisos pendientes del contratista, con el fin de asegurar el cumplimiento integral de los objetivos contractuales.

Con base en el informe mensual correspondiente al periodo del 1 al 31 de mayo de 2026, se evidenció la continuidad en la ejecución de las actividades de mantenimiento, adecuación y mejoramiento de la infraestructura en los establecimientos penitenciarios de las Regionales.

Durante el periodo se avanzó en obras civiles, eléctricas, hidrosanitarias y de seguridad, logrando la entrega formal y finalización de múltiples establecimientos, mientras que otros continúan en ejecución conforme a los cronogramas establecidos. Asimismo, se identificaron algunos aspectos que requieren seguimiento, tales como el incremento de personal en determinados frentes de trabajo, la entrega de documentación para cierres contractuales y la culminación de actividades pendientes para garantizar la entrega oportuna de las obras. En términos generales, el proyecto presenta avances significativos que contribuyen al mejoramiento de las condiciones de infraestructura y funcionamiento de los establecimientos intervenidos.

Se prorroga el contrato tanto de obra como de interventoría hasta el 31 de agosto de 2026 con el fin de darle continuidad al contrato.

Además, se han presentado observaciones a los informes mensuales ambientales y sst presentados por el contratista, los cuales se les han pedido la subsanación respectiva.

- Se han enviado solicitud de subsanaciones a los informes técnicos, ambientales y sst.
- Se le ha reiterado al contratista el cumplimiento de entrega de informes sst y ambiental al igual del cumplimiento de normas ambientales y de seguridad en algunos frentes de obra.

19. ANEXOS

A continuación, se enuncian los anexos del Informe enumerados de acuerdo con el capítulo referido:

- CARPETA 5 AVANCE GENERAL
- CARPETA 6 ACTIVIDADES EJECUTADAS
- CARPETA 7 – CORRESPONDENCIA
- CARPETA 9 – GESTION AMBIENTAL
- CARPETA 8- CONTROL DE FACTURACION INTERVENTORIA
- CARPETA 11 – INFORME DE HSE Y ANEXOS
- CARPETA 14 – ACTAS DE COMITE
- CARPETA 15 – INFORMES QUICENALES
- CARPETA 17 – DOCUMENTOS LEGALES DE LOS CONTRATOS (Actas de suspensión y reinicio, Otro si y prorrogas).



PAULO CESAR SILVA MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO BETA REGIONALES
