INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 19

CONSORCIO BETA REGIONALES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. USPEC-CTO-271-2024

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURÍDICA Y FINANCIERA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS A CARGO DEL INPEC (6 REGIONALES)

CONTRATISTA:

CONSORCIO MANTENIMIENTOS GMC

CONTRATANTE:

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC

PERIODO:

1 AL 30 DE JUNIO DEL 2026

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 3
2. GENERALIDADES 3
2.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO *3*
3. ALCANCE DE LA INTERVENTORÍA 1
4. GENERALIDADES DEL PROYECTO 2
4.1 CONTRATO DE OBRA: *2*
4.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA: *3*
5. AVANCE PROGRAMACION DE OBRA. 3
6. ESTABLECIMIENTOS EN EJECUCION 10
7. CORRESPONDENCIA 125
8. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL: 125
9. CONTROL DE MANEJO DE ANTICIPO 125
13. CONTROL DE RECURSOS – EQUIPOS Y MATERIALES. 130
14. ACTAS DE COMITÉ *130*
15. INFORMES QUINCENALES *130*
16. BITACORA DE OBRA *130*
17. ESTADO LEGAL, ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DEL PROYECTO. 130
18. RECOMENDACIONES Y SOLICITUDES 133
19. ANEXOS 134

1. INTRODUCCIÓN

Este documento contiene la información correspondiente al informe mensual No.19 de Interventoría, realizado por CONSORCIO BETA REGIONALES, en el cual se describen las actividades realizadas del 1 al 30 de junio del 2026, en el Proyecto: "**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS A CARGO DEL INPEC" CONTRATO NO. USPEC-256-2024"** y así mismo los avances, situación a la fecha, descripción y reporte de actividades en la ejecución de este. En consecuencia, que compete al Estado, a través de la Unidad de Servicios Penitenciarios y carcelarios – USPEC, es definir en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, los lineamientos que en materia de infraestructura se requieran, para la atención de los internos de los centros de reclusión del orden Nacional a cargo del INPEC, de conformidad con las condiciones y requerimientos técnicos establecidos en el presente proceso; de tal manera que es necesario por parte de la USPEC, atender mediante la contratación de obras civiles, bienes y servicios la ampliación de infraestructura física de los establecimientos penitenciarios y carcelarios a cargo del INPEC, identificados con mayores índices de hacinamiento y deterioro funcional.

2. GENERALIDADES

A través del presente documento se presenta informe técnico, administrativo y financiero, con el fin de comunicar a la entidad contratante Unidad de Servicios Penitenciarios y carcelarios – USPEC, el cumplimiento de las actividades contratadas y las eventualidades que se han presentado durante el desarrollo del contrato.

2.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO

El lugar de la ejecución del contrato será en ciento veinte seis (126) establecimientos a nivel nacional, que corresponden a la totalidad de los ERONES a cargo del INPEC a nivel nacional, repartidos en las 6 regionales, distribuidos así:

N°	REGIONAL	DPTO	COD.	ESTABLECIMIENTO	DIRECCION ESTABLECIMIENTO
1	CENTRAL	AMAZONAS	101	EPMSC LETICIA	DIRECCIÓN: CALLE 13 No. 10-120 Barrio Victoria Regia.
2	CENTRAL	BOYACA	103	EPMSC SANTA ROSA DE VITERBO	Vereda El Olivo Kilometro 2 vía Santa Rosa de Viterbo - Cerinza
3	CENTRAL	BOYACA	104	CPMSCHI CHIQUINQUIRÁ	DIRECCIÓN: Kilometro 2 vía Bogotá. Chiquinquirá-Boyacá
4	CENTRAL	BOYACA	105	EPMSC DUITAMA	DIRECCIÓN: Calle 7 No 15 -08 Duitama
5	CENTRAL	BOYACA	107	EPMSC GUATEQUE	DIRECCIÓN: CALLE 9 Nº 6 – 35
6	CENTRAL	BOYACA	109	EPMSC MONIQUIRÁ	Km 01 Vía Moniquirá - Barbosa
7	CENTRAL	BOYACA	110	EPMS RAMIRIQUÍ	DIRECCIÓN: Calle 8 No. 4-08
8	CENTRAL	BOYACA	112	EPMSC RM JP SOGAMOSO	DIRECCIÓN: Carrera 9ª 1ª -16 sur
9	CENTRAL	BOGOTA, D.C	113	COMEB BOGOTÁ (PICOTA)	DIRECCIÓN: Kilometro 5 vía usme
10	CENTRAL	BOGOTA, D.C	114	CPMS BOGOTÁ (MODELO)	DIRECCIÓN: Carrera 56 No 18ª47
11	CENTRAL	CUNDINAMARCA	116	EPC CÁQUEZA	DIRECCIÓN: Calle 2 Nº 4-32 palacio Municipal
12	CENTRAL	CUNDINAMARCA	117	EPMSC CHOCONTÁ	DIRECCIÓN: Carrera 5 N· 5-31
13	CENTRAL	CUNDINAMARCA	118	CPMMSFFA FACATATIVÀ	Dirección: Calle 8 No 2 - 29 Barrio CENTRAL Facatativá
14	CENTRAL	CUNDINAMARCA	119	EPMSC CMS FUSAGASUGÁ	DIRECCIÓN: CARRERA 8 No. 7-51
15	CENTRAL	CUNDINAMARCA	120	EPMSC GACHETÁ	DIRECCIÓN: Calle 5 No. 4 - 19
16	CENTRAL	CUNDINAMARCA	124	EPMSC LA MESA	DIRECCIÓN: Carrera 21 N°8-46
17	CENTRAL	CUNDINAMARCA	126	EPMSC UBATÉ	DIRECCIÓN: CRA 7 N°6-41
18	CENTRAL	CUNDINAMARCA	127	EPMSC VILLETA	DIRECCIÓN: Cra 6 N. 3-160 Villeta
19	CENTRAL	BOGOTA, D.C	129	RM PAS ERE BOGOTÁ (BUEN PASTOR)	DIRECCION: Cra 58 No. 80 - 95
20	CENTRAL	META	130	CAMIS ERE ACACÍAS	DIRECCIÓN: Km 3 vía Acacias-Villavicencio
21	CENTRAL	META	131	EPMSC RM VILLAVICENCIO	DIRECCIÓN: TV 26c No. 14ª - 22
22	CENTRAL	META	133	EPMSC GRANADA	DIRECCIÓN: Cra 14 Nº 14-31
23	CENTRAL	TOLIMA	136	EPMSC MELGAR	CARRERA 26 N° 5 – 71 Barrio el CENTRAL Melgar - Tolima
24	CENTRAL	CUNDINAMARCA	138	EPMSC GIRARDOT	DIRECCIÓN: CALLE 38 # 3 – 28 BARRIO DIAMANTE
25	CENTRAL	HUILA	139	EPMSC RM NEIVA	DIRECCIÓN: Vereda Río Frío - Municipio de Rivera, Kilómetro 15 vía Neiva – Rivera.
26	CENTRAL	HUILA	140	EPMSC GARZÓN	CALLE 3 SUR No. 18 A 19 BRÍO AGUAZUL
27	CENTRAL	HUILA	141	EPMSC LA PLATA	DIRECCIÓN: Kilometro 1 vía Neiva
28	CENTRAL	HUILA	142	EPMSC PITALITO	DIRECCIÓN: Calle 19 Sur Nro. 6-180
29	CENTRAL	CAQUETA	143	EPMSC FLORENCIA (CUNDUY)	DIRECCIÓN: KILÓMETRO 3 VÍA NEIVA - BARRIO EL CUNDUY
30	CENTRAL	TOLIMA	144	EPMSC CHAPARRAL	Dirección: carrera 6ªE N° 8ª- 44 barrio Carmenza Rocha

31	CENTRAL	TOLIMA	145	EPMSC JP ESPINAL	DIRECCIÓN: Calle 6 Carrera 12 Esquina # 12-56
32	CENTRAL	META	148	EPMSC ACACÍAS	DIRECCIÓN: KM 5 Vía antigua Villavicencio
33	CENTRAL	BOYACA	149	EPMSC TUNJA	DIRECCIÓN: Calle 31 No. 2 -15 Este. Barrio. El Dorado, en la ciudad de Tunja, departamento de Boyacá
34	CENTRAL	BOYACA	150	EPAMS CAS CÓMBITA	DIRECCIÓN: Kilometro 17 Via Tunja Paipa
35	CENTRAL	CASANARE	152	EPMSC PAZ DE ARIPORO	DIRECCIÓN: Calle 10 No. 6-69 Barrio Camilo Torres Paz de Ariporo
36	CENTRAL	CASANARE	153	EPC YOPAL	DIRECCIÓN: Kilómetro 12 Vía Yopal Aguazul
37	CENTRAL	CUNDINAMARCA	156	EPC LA ESPERANZA DE GUADUAS	DIRECCIÓN: Km 3.5 Vía a Cambao, Vereda la Unión, Finca la Esperanza
38	CENTRAL	CAQUETA	157	EP FLORENCIA (HELICONIAS)	DIRECCIÓN: Km 1.5 De La Variante San Martin Vereda San Isidro
39	CENTRAL	TOLIMA	158	EPC GUAMO	DIRECCIÓN: Calle 11 N. 8-04
40	OCCIDENTAL	CAUCA	202	EPMSC BOLÍVAR (CAUCA)	DIRECCION: calle 3 No. 3-32 Barrio Sur
41	OCCIDENTAL	CAUCA	204	EPMSC EL BORDO	DIRECCION: carrera 2 W 7-65
42	OCCIDENTAL	CAUCA	206	EPMSC PUERTO TEJADA	DIRECCION: Calle 17 N° 19-37 Barrio el CENTRAL Puerto Tejada Cauca
43	OCCIDENTAL	CAUCA	207	EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO	DIRECCION: CALLE 4 No. 27-34 B/ MORALES DUQUE
44	OCCIDENTAL	CAUCA	208	EPMSC SILVIA	DIRECCION: Carrera 3 N° 4 – 52 Barrio Caloto Silvia
45	OCCIDENTAL	CAUCA	209	RM POPAYÁN	DIRECCIÓN: Calle 3 N. 16-11 Barrio Alfonso López
46	OCCIDENTAL	NARIÑO	215	EPMSC RM PASTO	DIRECCION: Calle 24 No. 31-23 Barrio La Esperanza.
47	OCCIDENTAL	NARIÑO	217	EPMSC IPIALES	DIRECCION: Cra. 8 No. 1 – 49 Sector Las Animas.
48	OCCIDENTAL	NARIÑO	219	EPMSC LA UNIÓN	DIRECCION: Carrera 3 No. 13 – 48, Barrio Chapinero
49	OCCIDENTAL	NARIÑO	221	EPMSC TÚQUERRES	DIRECCIÓN: Carrera 15 No. 26-210 Barrio las Mercedes - Tuquerres Nariño
50	OCCIDENTAL	NARIÑO	222	EPMSC TUMACO	DIRECCION: km 19, vía Tumaco – Pasto, vereda Buchely
51	OCCIDENTAL	VALLE	225	EPAMS CAS JP PALMIRA	DIRECCION: Calle 23 vía CORPOICA
52	OCCIDENTAL	VALLE	226	EPMSC ERE CALI	DIRECCION: Transversal 25 No 31-116
53	OCCIDENTAL	VALLE	227	EPMSC BUGA	DIRECCIÓN: CARRERA 16 N°32-97 BARRIO EL JARDÍN
54	OCCIDENTAL	VALLE	228	EPMSC BUENAVENTURA	DIRECCIÓN: Calle 6 No. 51b-61 Barrio Transformación, avenida Simón Bolívar.
55	OCCIDENTAL	VALLE	233	EPMSC TULUÁ	DIRECCIÓN: CARRERA 29 14-02 BARRIO: EL POPULAR
56	OCCIDENTAL	CAUCA	235	EPAMS CAS ERE POPAYÁN	DIRECCIÓN: Kilómetro 3 Vía Vereda las Guacas
57	OCCIDENTAL	VALLE	238	EPMSC CARTAGO	DIRECCIÓN: Calle 10 Nº 13 - 72
58	OCCIDENTAL	VALLE	239	EPMSC CAICEDONIA	DIRECCION: Calle 18 No. 19-203 Barrio Lleras
59	OCCIDENTAL	VALLE	240	EPMSC ROLDANILLO	Dirección: calle 7 N° 6 -51 / Barrio CENTRAL
60	OCCIDENTAL	VALLE	241	EPMSC SEVILLA	DIRECCION: CRA 50 CON CALLE 62ª ESQUINA
61	OCCIDENTAL	VALLE	242	COJAM JAMUNDÍ	DIRECCION: Kilometro 2.7 vía Bocas del Palo, Jamundí, Valle del Cauca
62	NORTE	ATLÁNTICO	301	EC JP BARRANQUILLA (MODELO)	DIRECCION: Vía 40 # 54-332

63	NORTE	BOLIVAR	303	EPMSC CARTAGENA	DIRECCIÓN: Diagonal 31 # 85-180 Barrio Ternera
64	NORTE	BOLIVAR	305	EPMSC MAGANGUÉ	DIRECCIÓN: Cárcel Nacional Barrio Camilo Torres
65	NORTE	CESAR	307	EPMSC ERE VALLEDUPAR	Carrera 19 A N° 18-60 barrio dangond
66	NORTE	CORDOBA	308	EPMSC JP MONTERÍA	DIRECCIÓN: Calle 35 Carrera 23
67	NORTE	GUAJIRA	313	EPMSC RIOHACHA	DIRECCIÓN: Calle 9ª N° 17 – 13 Barrio José Antonio Galán
68	NORTE	MAGDALENA	314	EPMSC SANTA MARTA	DIRECCIÓN: CALLE 24 No. 17A-36
69	NORTE	MAGDALENA	316	EPMSC EL BANCO	DIRECCIÓN: KILOMETRO 2 VIA GUAMAL BARRIO LAS MARIAS
70	NORTE	SAN ANDRES	318	EPMSC SAN ANDRÉS	DIRECCIÓN: Av Circunvalar Schooner bight.
71	NORTE	SUCRE	319	EPMSC SINCELEJO	DIRECCIÓN: CARRERA 17 No 3 - 21
72	NORTE	ATLÁNTICO	322	EPMSC ERE PSM BARRANQUILLA (EL BOSQUE)	DIRECCIÓN: Calle 76 No. 8 - 100
73	NORTE	CESAR	323	EPAMS CAS VALLEDUPAR	DIRECCIÓN: Km 3.5 vía la mesa
74	NORTE	CORDOBA	324	EPC TIERRALTA	DIRECCIÓN: KILOMETRO 23 VIA URRA – VEREDA SANTA ANA
75	ORIENTE	ARAUCA	401	EPMSC ARAUCA	DIRECCIÓN: Calle 17 No. 25A-26 B. La Esperanza
76	ORIENTE	CESAR	405	EPMSC AGUACHICA	DIRECCIÓN: CALLE 10 # 8-90 BARRIO SAN ROQUE – AGUACHICA (CESAR)
77	ORIENTE	NORTE DE SANTANDER	407	EPMSC PAMPLONA	DIRECCIÓN: Av. Santander No. 12-129 B. Alpes
78	ORIENTE	NORTE DE SANTANDER	408	EPMSC OCAÑA	DIRECCIÓN: Carrera 16 No. 4-34 Barrio Tibet
79	ORIENTE	SANTANDER	410	EPMSC ERE JP BUCARAMANGA (LA MODELO)	DIRECCIÓN: Calle 45 No. 6-75 B. Alfonso López, Bucaramanga, Santander
80	ORIENTE	SANTANDER	411	EPMSC BARRANCABERMEJA	DIRECCIÓN: Carrera 5 No. 8-07 B. Sector Comercial
81	ORIENTE	SANTANDER	413	EPMSC MÁLAGA	DIRECCIÓN: Carrera 9 No. 11 – 40 Málaga.
82	ORIENTE	SANTANDER	415	EPMSC SAN GIL	DIRECCIÓN: Carrera 12 No. 20A-67
83	ORIENTE	SANTANDER	416	EPMSC SOCORRO	DIRECCIÓN: Vereda Naranjal. Km 7 Via San Gil.
84	ORIENTE	SANTANDER	417	EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURI	DIRECCIÓN: Calle 16 No. 17b - 26 Barrio Buenos Aires.
85	ORIENTE	SANTANDER	418	EPMSC VÉLEZ	DIRECCIÓN: CARRERA 3 SALIDA A CHIPATÁ VÉLEZ SANTANDER
86	ORIENTE	SANTANDER	420	RM BUCARAMANGA	DIRECCIÓN: PROLONGACIÓN CALLE 45 VIA CHIMITA
87	ORIENTE	SANTANDER	421	EPAMS CAS GIRÓN	DIRECCIÓN: KM 14 Vereda Palogordo, (Girón,
88	ORIENTE	NORTE DE SANTANDER	422	COCUC CÚCUTA	DIRECCIÓN: KM 3 Carretera Panamericana Vía al Salado
89	NOROESTE	ANTIOQUIA	501	EPAMS CAS ERE JP LA PAZ (ITAGUI)	CARRERA 70 N 23-10 BARRIO SAN FRANCISCO DE ITAGUI
90	NOROESTE	ANTIOQUIA	502	EPMSC MEDELLÍN (BELLAVISTA)	IRECCIÓN: Diagonal 44 No. 39–145 B. Las Vegas, Bello (Ant)
91	NOROESTE	ANTIOQUIA	505	EPMSC ANDES	DIRECCIÓN: calle 49 Nro. 55 – 154, Barrio San Pedro Andes Ant.

92	NOROESTE	ANTIOQUIA	507	EPMSC BOLIVAR	DIRECCION: calle 3 No. 3-32 Barrio Sur
93	NOROESTE	ANTIOQUIA	508	EPMSC CAUCASIA	DIRECCIÓN: Cra. 17 No 8 – 65 Barrio Pueblo Nuevo, Caucasia – Antioquia
94	NOROESTE	ANTIOQUIA	513	EPMSC JERICÓ	DIRECCIÓN: Carrera 6 #04-29 Barrio Las Quebraditas Jericó-Antioquia
95	NOROESTE	ANTIOQUIA	514	EPMSC LA CEJA	DIRECCIÓN: Carrera 18 N° 20-54
96	NOROESTE	ANTIOQUIA	515	EPMSC PUERTO BERRÍO	DIRECCIÓN: CALLE 50 Nro. 10 – 03 Esquina Barrio el Carmelo Puerto Berrio Antioquia
97	NOROESTE	ANTIOQUIA	517	EPMSC SANTA BÁRBARA	DIRECCIÓN: CALLE SUCRE BARRIO LA AZULITA #51-26, SANTA BARBARA ANTIOQUIA
98	NOROESTE	ANTIOQUIA	518	EPMSC SANTO DOMINGO	DIRECCIÓN: Carrera 15 No. 14-10 - Calle Uribe Restrepo
99	NOROESTE	ANTIOQUIA	519	EPMSC SANTA ROSA DE OSOS	DIRECCIÓN: Calle 27 Nº 35 a 03 barrio Camellón González
100	NOROESTE	ANTIOQUIA	521	EPMSC SONSÓN	DIRECCIÓN: Carrera 7 No. 12-17
101	NOROESTE	ANTIOQUIA	523	EPMSC TÁMESIS	DIRECCIÓN: Carrera 10 No.09-40
102	NOROESTE	ANTIOQUIA	527	EPMSC YARUMAL	DIRECCIÓN: Carrera 21 No. 20-07
103	NOROESTE	CHOCO	530	EPMSC QUIBDÓ	DIRECCIÓN: Calle 26 N° 8 -35 Barrio Alameda Reyes
104	NOROESTE	ANTIOQUIA	531	EPMSC APARTADÓ	DIRECCIÓN: Kilometro 5 vía Apartado-Carepa
105	NOROESTE	CHOCO	533	EPMSC ITSMINA	DIRECCIÓN: Carrera 7° N° 12 – 36 Barrio San Francisco
106	NOROESTE	ANTIOQUIA	535	EP PUERTO TRIUNFO - EL PESEBRE	DIRECCION: Vía Medellín - Bogotá Km 115 (Hacienda Nápoles)
107	NOROESTE	ANTIOQUIA	537	COPED PEDREGAL	DIRECCIÓN: kilometro 6 vía al mar, Finca la TERESITA Corregimiento San Cristóbal Medellín
108	VIEJO CALDAS	CALDAS	601	EPMSC MANIZALES	DIRECCIÓN: Vía Panamericana Barrio Estambul – Manizales Caldas
109	VIEJO CALDAS	CALDAS	602	EPMSC ANSERMA	DIRECCIÓN: Calle 3 No. 3 – 42 Barrio Pablo VI.
110	VIEJO CALDAS	CALDAS	607	EPMSC PÁCORA	DIRECCIÓN:KM 2 VIA A SALAMINA CALDAS
111	VIEJO CALDAS	CALDAS	608	EPMSC PENSILVANIA	DIRECCIÓN: Kilómetro 1 Vía a Manzanares
112	VIEJO CALDAS	CALDAS	609	EPMSC RIOSUCIO	DIRECCIÓN: Calle 6 N° 8- 14 Avenida el Ciprés, Barrio Guayaquil
113	VIEJO CALDAS	CALDAS	610	EPMSC SALAMINA	DIRECCIÓN: Kilómetro 1 vía Salamina - San Félix
114	VIEJO CALDAS	CALDAS	611	RM MANIZALES	DIRECCIÓN: Avenida Panamericana Granjas de Estambul
115	VIEJO CALDAS	QUINDIO	612	EPMSC CALARCÁ	DIRECCIÓN: Kilometro 1 Vía al Valle
116	VIEJO	QUINDIO	613	EPMSC ARMENIA	DIRECCIÓN: Calle 50 N° 21-97 Barrio Farallones

117	VIEJO CALDAS	QUINDIO	615	RM ARMENIA	DIRECCIÓN: Calle 50 N°23-29 B/ Farallones
118	VIEJO CALDAS	RISARALDA	616	EPMSC ERE PEREIRA	DIRECCIÓN: Carrera 8 # 41-97
119	VIEJO CALDAS	RISARALDA	617	EPMSC SANTA ROSA DE CABAL	DIRECCIÓN: Carrera 16 No. 14-27
120	VIEJO CALDAS	RISARALDA	620	RM PEREIRA	DIRECCIÓN: VIA LA BADEA TURIN LA POPA
121	VIEJO CALDAS	TOLIMA	626	EPMSC FRESNO	DIRECCIÓN: Calle 3 No. 4-50 Barrio CENTRAL
122	VIEJO CALDAS	TOLIMA	628	EPMSC HONDA	DIRECCIÓN: Kilometro 3 Vía La Dorada, Barrio Caracolí, Honda-Tolima
123	VIEJO CALDAS	TOLIMA	629	EPMSC LÍBANO	DIRECCIÓN: CARRERA 12 # 5 – 75 BARRIO CENTRAL
124	VIEJO CALDAS	BOYACA	633	EPMSC PUERTO BOYACÁ	DIRECCIÓN: Carrera 5 No, 6B-124
125	VIEJO CALDAS	CALDAS	637	EPAMS PC ERE LA DORADA	DIRECCIÓN: Km 3 antigua vía al Palmar, Barrio Las Ferias
126	VIEJO CALDAS	TOLIMA	639	COIBA IBAGUÉ	DIRECCIÓN: Carrera 45 Sur No. 134 - 95 Barrio Picaleña Ibagué

Tabla 1 Ubicación de los ERON objeto del contrato.

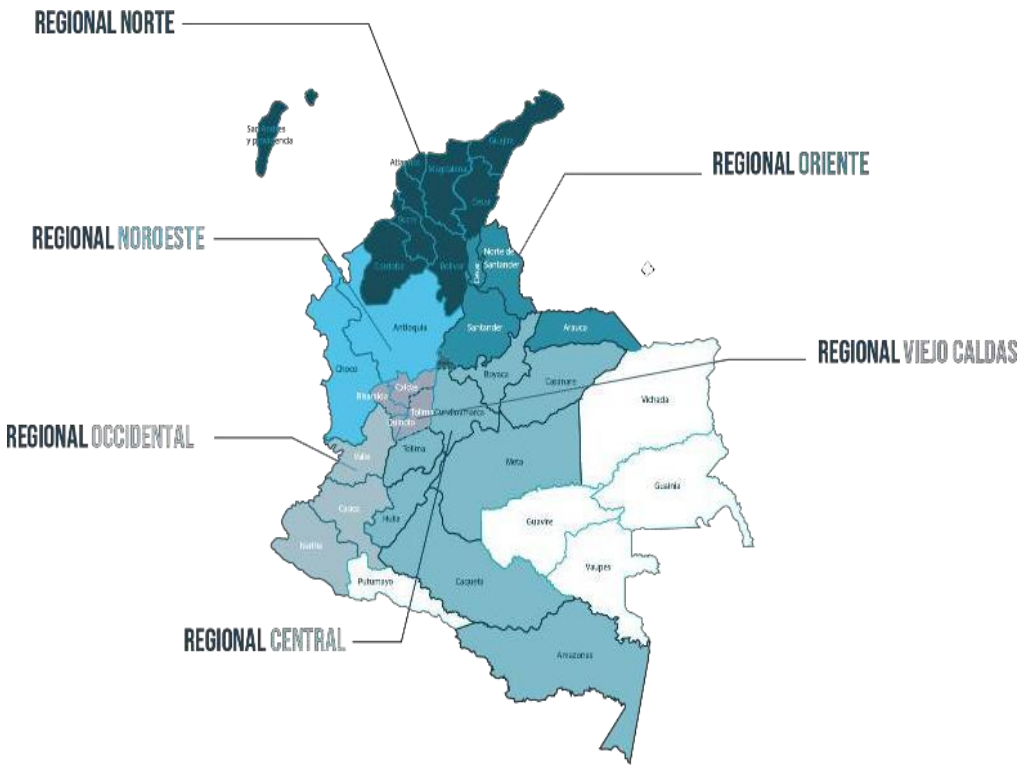


Ilustración 1 Mapa de Colombia tomado de Google.

3. ALCANCE DE LA INTERVENTORÍA

El alcance del contrato objeto de interventoría podrá extenderse a actividades de mantenimiento y/o adecuación y/o remodelación. Para dichas actividades se sustentará de forma objetiva y se fundamentará en la necesidad de cumplir objetivos de orden misional, todo lo anterior se elevará a modificatorio del contrato en aras de ejecutar actividades conexas y/o complementarias para lograr el adecuado funcionamiento del respectivo ERON.

La interventoría de acuerdo con la naturaleza propia de las obligaciones a su cargo deberá exigir la calidad de los bienes, obras y servicios adquiridos en el marco del contrato celebrado verificando que se cumplan dentro del plazo estipulado el objeto contratado y todas las condiciones técnicas, económicas y legales pactadas.

La interventoría debe garantizar que las intervenciones se adelanten dentro de los plazos previstos y con la debida calidad y oportunidad, con la colaboración y apoyo permanente que se requiera para el buen desarrollo del objeto del contrato en concordancia con los aspectos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros establecidos en los compromisos contractuales, de cada establecimiento de reclusión. Se requiere que la interventoría realice la inspección, verificación, seguimiento y control de la ejecución del contrato resultante de la licitación pública para las actividades de mantenimiento recurrente de los establecimientos de reclusión de orden nacional.

En todo momento durante la ejecución del contrato objeto de la presente interventoría, será responsabilidad de la interventoría, realizar el seguimiento y control de la inversión de los recursos asignados al contrato, de tal manera que no se permita superar el valor total del contrato y que se cuente con los respaldos presupuestales.

El interventor deberá hacer entrega de los informes mensuales de seguimientos y control al contrato de construcción y el desarrollo de actividades de interventoría, la interventoría controlará la totalidad de los trabajos para cada caso particular y que se describes en los pliegos de condiciones del contrato de construcción.

4. GENERALIDADES DEL PROYECTO

4.1 CONTRATO DE OBRA:

No. DE CONTRATO:	USPEC-CTO-256-2024
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS A CARGO DEL INPEC)
CONTRATISTA:	CONSORCIO MANTENIMENTO GMC
INTERVENTORIA:	CONSORCIO BETA REGIONALES
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($53.503.188.931,00) MCTE
VALOR TOTAL OBRA	CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL VEINTIDÓS PESOS M/CTE ($52.344.098.022,00)
VALOR TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS	MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVENTA MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS M/CTE ($1.159.090.909,00)
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($53.503.188.931,00) MCTE
ADICION	MIL SEISCIENTOS DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE $1.602.660.000
VALOR DEL ANTICIPO:	QUINCE MIL SETECIENTOS TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($15.703.229.406,60) MCTE
PLAZO INICIAL DE CONTRATO:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
PRÓRROGA No.1:	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2025
TIEMPO ADICIONADO:	3 MESES
PRÓRROGA No.2:	HASTA EL 31 DE MAYO DE 2025
TIEMPO ADICIONADO:	2 MESES
PRÓRROGA No.3:	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2025
TIEMPO ADICIONADO:	6.5 MESES
PRÓRROGA No.4:	HASTA EL 15 DE MAYO DE 2026
TIEMPO ADICIONADO:	5 MESES
PRÓRROGA No.5:	HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2026

Tabla 2 Información general contrato de Obra

4.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA:

No. DE CONTRATO:	USPEC-CTO-271-2024
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURÍDICA Y FINANCIERA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS A CARGO DEL INPEC (6 REGIONALES).
CONTRATISTA:	CONSORCIO MANTENIMIENTO GMC
INTERVENTORIA:	CONSORCIO BETA REGIONALES
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($5.488.260.537) M/CTE
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	7 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	29 DE NOVIEMBRE DE 2024
PLAZO INICIAL FINAL DE CONTRATO:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
OTRO SI 1	MODIFICACION CONTRATO DE INTERVENTORIA
OTRO SI 2 PRÓRROGA No.1:	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2025
PRÓRROGA No.2:	HASTA EL 31 DE MAYO DE 2025
TIEMPO ADICIONADO:	2 MESES
PRÓRROGA No.3:	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2025
TIEMPO ADICIONADO:	6.5 MESES
PRÓRROGA No.4:	HASTA EL 15 DE MAYO DE 2026
TIEMPO ADICIONADO:	5 MESES
PRÓRROGA No.5:	HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2026

Tabla 3 información General contrato de interventoría

5. AVANCE PROGRAMACION DE OBRA.

AVANCE DEL CRONOGRAMA DEL 1 al 30 de junio de 2026

De acuerdo con lo establecido en el ANEXO TECNICO del contrato de interventoría Capitulo 4. ALCANCE DEL CONTRATO, Subcapítulo 4.1.6 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA DE METAS FISICAS. Segundo párrafo. Insumos, viñeta 2 Controles mensuales y quincenales de avance de actividades físicamente ejecutadas.

Una vez concluida la etapa “Visitas de diagnóstico” se inició la etapa II de ejecución de obra, la cual comprende a la ejecución física, administrativa, financiera, contable, legal, etc., del objeto contractual.

En el presente informe se presentan los avances al desarrollo de correspondientes a la Etapa II a corte del 30 de junio de 2026.

En atención a la Programación presentada por el contratista, interventoría procedió a realizar la pertinente estructuración del CONTROL DE PROGRAMACIÓN, la cual se presenta en los anexos (CARPETA 5 – AVANCE GENERAL).

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

Con el fin de realizar un control detallado del avance de la programación, de acuerdo con el balance de FASE 2, el cual incluye los plazos de ejecución de la prórroga aprobada en otro si No 7 con fecha de terminación hasta el 31 de agosto de 2026.

Se realiza seguimiento semanal de las cantidades de obra ejecutadas por cada ítem que compone el presupuesto de cada ERON, que a su vez componen cada regional del contrato efectuando el seguimiento en detalle.


METODOLOGIA CONTROL DE ENTREGA DE INFORMES DIAGNOSTICOS.

El control de programación se realiza determinando las siguientes divisiones principales, por cada alcance determinado de cada ERON y cada Regional. Según anexo técnico (Tabla No 1 Ubicación de los ERON objeto del contrato).

- PRESUPUESTO
- CONTROL PROGRAMA DE OBRA
- CONSOLIDADO PROGRAMA DE OBRA
- CONTROL AVANCE SEGÚN PROGRAMA DE OBRA
- CONSOLIDADO REGIONAL
- CONTROL AVANCE REGIONAL
- CONSOLIDADO REGIONALES
- CONTROL AVANCE REGIONALES

PRESUPUESTO

De acuerdo con el balance presupuestado y como se indicó antes, se puede observar en el cuadro de seguimiento presupuesto, la desagregación de las cantidades de obra expresadas en porcentajes de cada ítem por cada frente, multiplicada por el valor del ítem, del balance aprobado.
El seguimiento se realiza semanalmente, consignado en la columna de la semana correspondiente, las cantidades de obra ejecutadas de cada ítem, multiplicada por el valor del ítem y afectándolo por la división del valor del ítem ejecutado por el valor total de obra, lo cual nos arroja el porcentaje ejecutado del ítem con respecto al valor total del contrato de la fase II EJECUCIÓN DE OBRA.

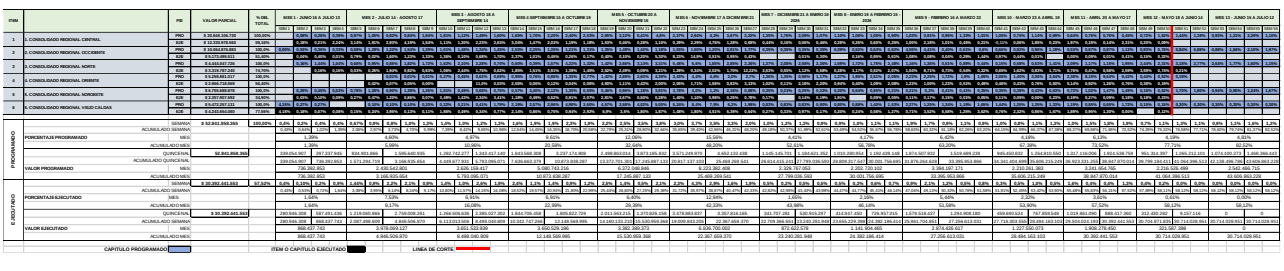

En la imagen anterior, se evidencia como ejemplo la cantidad ingresada en cada ítem en la semana 54, ejecutada de la Fase 2, generando el valor y el % ejecutado (el % se calcula sobre el valor total del presupuesto Fase 2, lo cual da como resultado su avance financiero). Al final de cada columna semanal se registra el valor en pesos y el porcentaje de ejecución de la semana.

AVANCE SEMANA			AVANCE ACUMULADO		
SEMANA 54	JUNIO 22 A 28 DE 2026		SEMANA 1 A 54	JUNIO 16 2025 A JUNIO 28 DE 2026	
PROGRAMADO	EJECUTADO	CUMPLIMIENTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	CUMPLIMIENTO
2,31%	2,80%	0,49%	75,79%	65,60%	-10,19%
2,41%	0,63%	-1,78%	61,02%	56,90%	-4,12%
1,88%	0,30%	-1,58%	96,04%	84,71%	-11,34%
1,34%	2,03%	0,70%	98,15%	70,25%	-27,90%
0,90%	0,09%	-0,81%	52,95%	36,85%	-16,09%
0,30%	2,36%	2,06%	97,47%	81,19%	-16,28%
1,81%	**1,69%**	**-0,12%**	**75,99%**	**63,78%**	**-12,21%**
TOTAL INVERSION					
$ 969.671.732	**$ 906.328.826**	**-$ 63.342.906**	**$ 40.716.814.570**	**$ 34.173.692.755**	**-$ 6.543.121.815**


En la imagen anterior, se evidencia como ejemplo el valor total ejecutado en el proyecto en la semana 54, con el 63,78% ejecutado. De igual forma en este cuadro de control presupuestal se puede observar en el costado derecho la sumatoria, valores y porcentaje acumulado de las semanas incluyendo al final de la columna el valor total y porcentaje ejecutado el cual coincide con los resultados en el cuadro de consolidado total.

Las anteriores figuras son ilustrativas, el control de presupuesto se presenta en el (ANEXOS - CARPETA 5 – AVANCE GENERAL).

CONTROL PROGRAMACION FISICO COMPLETADO

El control de programación se realiza por cada ítem, consignando los porcentajes programados por cada semana correspondientes a porcentajes y valor de cada ítem

programado según programación presentada por el contratista. De igual forma se consignan los porcentajes de ejecución provenientes del control presupuestal de cada ítem en cada semana, sumatoria de porcentajes y valor de cada ítem ejecutado, de forma que se pueda realizar lectura fácil de programado con lo ejecutado en porcentaje y valor de cada ítem. (Se presentan imágenes ilustrativas).

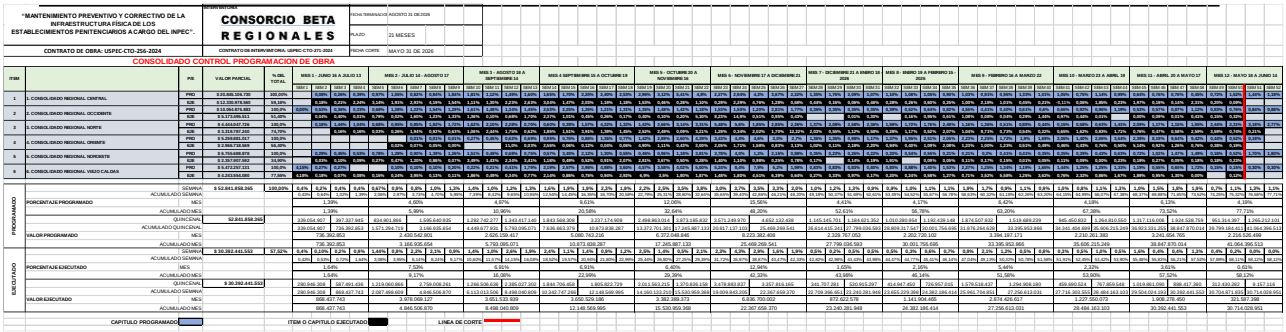


"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS A CARGO DEL INPEC".	INTERVENTORIA: CONSORCIO BETA REGIONALES	FECHA TERMINACIÓN: AGOSTO 31 DE 2026
		PLAZO: 21 MESES
CONTRATO DE OBRA: USPEC-CTO-256-2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA: USPEC-CTO-271-2024	FECHA CORTE: MAYO 31 DE 2026

CONSOLIDADO CONTROL PROGRAMACION DE OBRA

ITEM		PIE	VALOR PARCIAL	% DEL TOTAL	MES 1 - JUNIO 16 A JULIO 13	MES 2 - JUL 02 14 - AGOSTO 17	MES 3 - AGOSTO 18 A SEPTIEMBRE 14	MES 4 SEPTIEMBRE 15 A OCTUBRE 19	MES 5 - OCTUBRE 20 A NOVIEMBRE 16	MES 6 - NOVIEMBRE 17 A DICIEMBRE 21	MES 7 - DICIEMBRE 21 A ENERO 16	MES 8 - ENERO 16 A FEBRERO 15 - 2026	MES 9 - FEBRERO 16 A MARZO 22	MES 10 - MARZO 23 A ABRIL 19	MES 11 - ABRIL 20 A MAYO 17	MES 12 - MAYO 18 A JUNIO 16
1	1. CONSOLIDADO REGIONAL CENTRAL	PRO	$ 23.345.324.730	100,00%	0,00%	0,26%	0,26%	0,87%	0,87%	0,87%	1,91%	2,61%	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%
		EJE	$ 12.320.878.560	55,16%	0,00%	0,21%	2,24%	3,16%	1,91%	2,61%	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%
2	2. CONSOLIDADO REGIONAL OCCIDENTE	PRO	$ 13.364.979.883	100,0%	0,00%	0,00%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	1,40%	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%
		EJE	$ 5.177.099.511	51,49%		0,04%	0,45%	0,91%	0,79%	0,02%	1,80%	1,21%	1,35%	1,35%	0,69%	1,05%
3	3. CONSOLIDADO REGIONAL NORTE	PRO	$ 4.444.647.704	100,0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		EJE	$ 3.215.787.200	74,79%			0,16%	0,39%	0,22%	0,26%	1,51%	0,92%	0,63%	1,26%	2,61%	1,79%
4	4. CONSOLIDADO REGIONAL ORIENTE	PRO	$ 9.284.885.817	100,0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		EJE	$ 2.966.738.989	66,48%					0,02%	0,07%	0,55%	0,05%		11,0%	0,03%	2,05%
5	5. CONSOLIDADO REGIONAL NOROESTE	PRO	$ 6.765.648.870	100,0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		EJE	$ 2.317.997.992	34,26%	0,03%	0,10%	0,09%	0,27%	0,47%	1,20%	0,96%	0,07%	2,09%	2,21%	2,33%	2,11%
6	6. CONSOLIDADO REGIONAL VIEJO CALDAS	PRO	$ 5.417.237.151	100,0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		EJE	$ 4.153.554.080	77,09%	0,18%	0,28%	0,57%	0,39%	0,16%	0,24%	3,95%	0,13%	0,11%	1,86%	0,48%	0,24%

| | | | | |

sumatoria de porcentajes y valor de cada capítulo ejecutado, de forma que se pueda realizar lectura fácil de programado con lo ejecutado en porcentaje y valor de cada capítulo. (Se presentan imágenes ilustrativas).

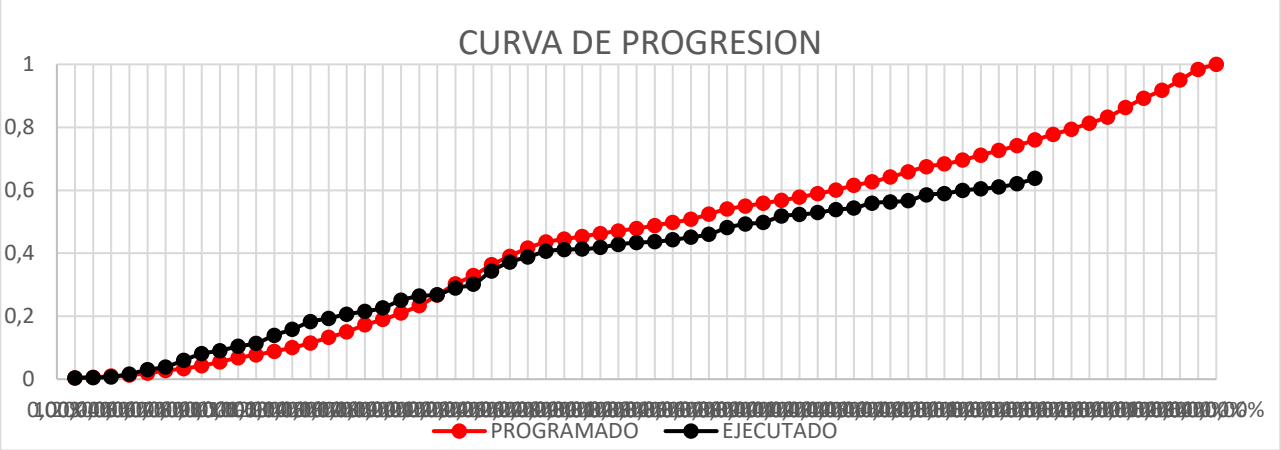

En el costado derecho del control consolidado se incluyó la sumatoria del cuadro de avance físico de obra en la semana y avance acumulado del mes, por cada ítem programado y ejecutado, estableciendo el cumplimiento de ejecución en avance o atraso. (Se pueden observar alertas en color naranja por cada ítem y sumatoria total de atraso).

Finalmente se presenta esquema de curva de progresión de las actividades del mes programadas y ejecutadas.

Las anteriores figuras son ilustrativas, el control de presupuesto se presenta en el anexo 5

DESVIACIONES

Es importante anotar que se estableció un cuadro en el costado derecho del control de programación por cada regional.

El cual indica la desviación en lo programado, ejecutado y cumplimiento, en color naranja.

N°	Capitulos	POR CANTIDADES DE OBRA FISICO EJECUTADO						
		Porcentaje (%) del presupuesto	Programado semana	Ejecutado semana	Desv.	Programado acumulado	Ejecutado acumulado	Desv.
1	1. CONSOLIDADO REGIONAL CENTRAL	38,91%	0,90%	1,09%	0,19%	29,49%	25,52%	-3,96%
2	2. CONSOLIDADO REGIONAL OCCIDENTE	19,78%	0,48%	0,12%	-0,35%	12,07%	11,25%	-0,82%
3	3. CONSOLIDADO REGIONAL NORTE	8,29%	0,16%	0,02%	-0,13%	7,97%	7,03%	-0,94%
4	4. CONSOLIDADO REGIONAL ORIENTE	9,82%	0,13%	0,20%	0,07%	9,64%	6,90%	-2,74%
5	5. CONSOLIDADO REGIONAL NOROESTE	12,99%	0,12%	0,01%	-0,10%	6,88%	4,79%	-2,09%
6	6. CONSOLIDADO REGIONAL VIEJO CALDAS	10,21%	0,03%	0,24%	0,21%	9,95%	8,29%	-1,66%
		100,00%	**1,81%**	**1,69%**	**-0,12%**	**75,99%**	**63,78%**	**-12,21%**

AVANCE SEGÚN PROGRAMA DE OBRA.

Avance según programa de obra, mostrándonos el avance por cada frente en la semana de ejecución y el acumulado total, ilustrándonos sobre el comportamiento de la ejecución del contrato de obra.

A continuación, se presentan los avances de programa de obra, del mes 13 de la semana 51 a la 54 correspondientes al presente informe.

MES 12 DE EJECUCION DE FASE 2. Para el mes 13 de ejecución de la Fase 2, se reportan actividades del 1 al 30 de junio de 2026, en consolidado de las regionales. Para observar en detalle los avances, por favor consultar los anexos reportados por cada regional.

MES 12 DE EJECUCION DE ETAPA II. Para el mes 13 de ejecución de la segunda etapa, se reportan actividades programadas del 1 al 30 de junio de 2026, ofreciendo un programado al 28 de junio de 2026 del 75,99% programado vs 63,78% ejecutado, con una desviación negativa del -12,21% en consecuencia, a que se han tenido dificultades en los algunos ERONES para su inicio de actividades en algunos casos, evaluación, aprobación de propuestas de diseños, cambios de algunos alcances por parte de la dirección de algunos establecimientos, horarios disponibles de trabajo dentro de los establecimientos y en otras el contratista no cumple con los inicios y/o entregas oportunas establecidas en los cronogramas avalados, bajo personal de mano de obra en los erones, entre otras .

ANEXOS DOCUMENTALES AL PRESENTE INFORME

Los soportes de la anterior información se presentan en el anexo 5, con corte al 31 de mayo de 2026, los cuales enunciamos a continuación: (Cada alcance de cada frente contiene: presupuesto, programación, consolidado y control avance.

6. ESTABLECIMIENTOS EN EJECUCION

ESTABLECIMIENTOS REGIONAL CENTRAL

AMAZONAS LETICIA

Alcances a ejecutar:

ALCANCE N°1: Mantenimiento y reparación del área de rancho

Programación: Inicio 12 de septiembre de 2025 Final: 30 de noviembre de 2025

Recurso asignado: $ 134,646,686.00

Se culminaron satisfactoriamente las actividades de obra priorizadas en el informe diagnóstico, ejecutadas de conformidad con las especificaciones técnicas contractuales, y que, una vez verificadas, se encuentran en óptimas condiciones de funcionamiento y uso

Estado: Terminado, pendiente por la entrega y recibo de USPEC.

EPMSC MONIQUIRÁ

Alcances a ejecutar:

ALCANCE No.1: Mantenimiento y remodelación área de caniles, área de descanso de los semovientes caninos y adecuación de la caja de desagüe a la PTAR. (por requerimiento de la secretaría de salud departamental).

ALCANCE No.: 2 Mantenimiento y adecuación de los alojamientos del cuerpo de custodia y auxiliares.

Programación: Inicio 04 de julio de 2025 Final: 20/03/26
Recurso asignado: $ 155,292,942
Estado: En ejecución.

En el establecimiento penitenciario de Moniquirá se culminaron satisfactoriamente las actividades correspondientes a la adecuación y mantenimiento de las áreas objeto de intervención, ejecutándose en su totalidad las obras contempladas en el alcance contractual. Las labores finalizaron con la ejecución de los trabajos preliminares de desmonte, demolición y preparación de superficies, seguidos de la construcción de las cimentaciones y elementos estructurales en concreto reforzado, incluyendo zapatas, vigas de cimentación, placas de contrapiso, columnas, vigas aéreas y la instalación de la estructura metálica de cubierta y pasillo técnico, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.


Asimismo, se concluyó la construcción de mampostería, elementos de confinamiento y reforzamiento estructural, así como la ejecución de pañetes, alistados de piso, instalación de guardaescobas, suministro y montaje de puertas metálicas, puertas especiales, ventanas de aluminio y demás elementos arquitectónicos previstos para la recuperación integral de las áreas intervenidas.

En el componente hidrosanitario quedaron completamente instaladas y puestas en funcionamiento las redes de abastecimiento y evacuación de aguas, incluyendo tuberías, puntos hidráulicos y sanitarios para lavamanos, sanitarios y duchas, así como el suministro e instalación de todos los aparatos sanitarios, griferías y accesorios requeridos, garantizando la operatividad del sistema.

De igual manera, finalizaron las actividades correspondientes a las instalaciones eléctricas, mediante la ejecución de canalizaciones en tubería EMT, instalación de tomacorrientes, salidas eléctricas, luminarias tipo panel LED y reflectores LED, mejorando las condiciones de iluminación y funcionamiento de los espacios intervenidos.

Finalmente, se ejecutaron y concluyeron los trabajos de acabados mediante la aplicación de estuco, pintura para interiores y exteriores, así como las actividades no previstas consistentes en la instalación de cubierta en teja arquitectónica, enchapes cerámicos en pisos y muros, permitiendo la entrega de las áreas completamente terminadas, funcionales y en condiciones adecuadas de servicio, conforme a los requisitos técnicos y de calidad establecidos en el Contrato de Obra No. USPEC-CTO-256-2024.

Registro Fotográfico.

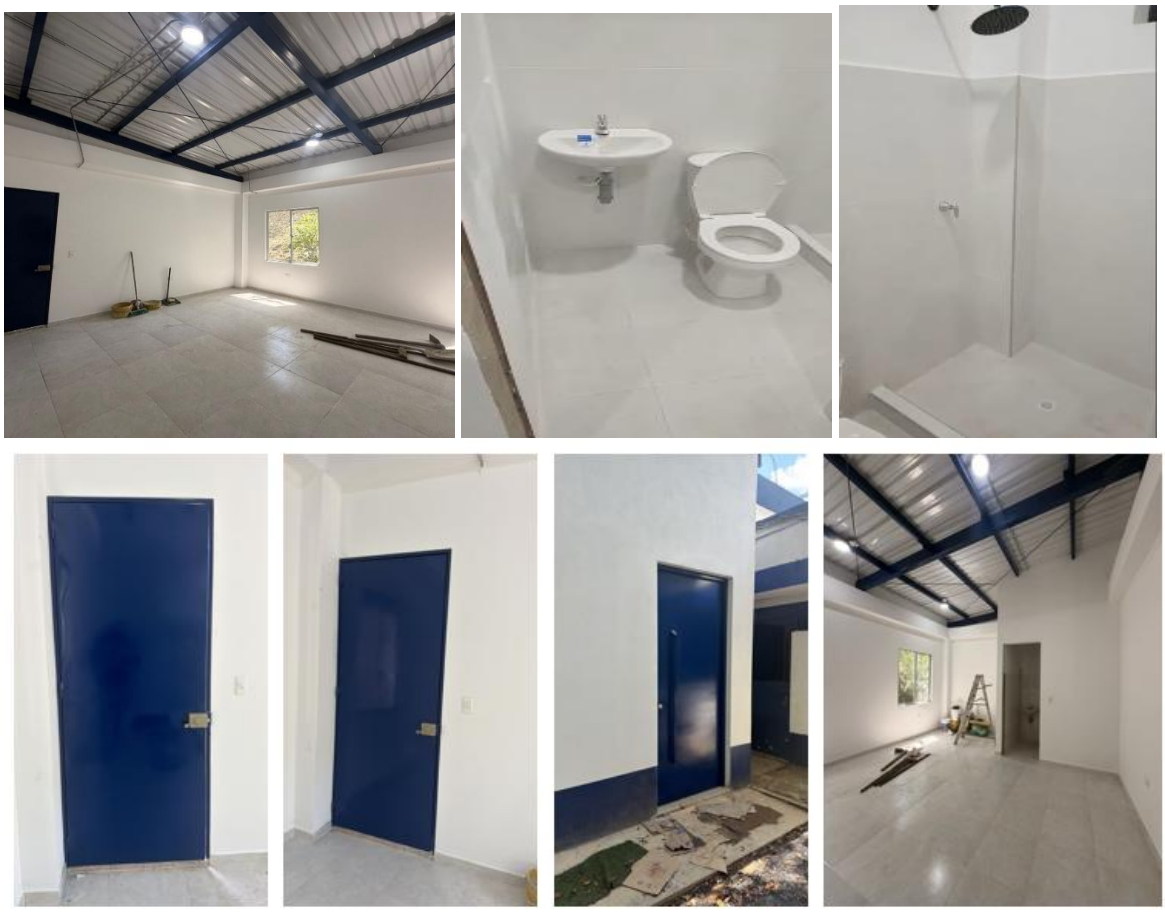

Acabados finales

EPMS RAMIRIQUÍ

Alcances a ejecutar:

ALCANCE No.1 Tutela 2021 -05 fallo juzgado penal del circuito de Ramiriquí de fecha 25 de febrero de 2021 refuerzo de muro perimetral, dotación planta eléctrica y cuarto eléctrico, campana extractora área de rancho.

ALCANCE No.2 Revisión y mantenimiento de red eléctrica, cambio de bombillos y reflectores perimetrales e internos 20 reflectores de 100 w luz led.

ALCANCE 3: Mantenimiento de pintura en área de sanidad por humedad. Se realiza acta de reconocimiento y recibo de espacios para la intervención del objeto contractual en compañía del director del Establecimiento, constructor e Interventoría

Programación: Inicio 07 de julio de 2025 Final: 5/02/26

Recurso asignado: $ 137.324.642.00

Actividades ejecutadas en el periodo del informe:

Durante el periodo las actividades de obras de los alcances contractuales fueron ejecutados a satisfacción.

Registro Fotográfico.



Instalación de reflectores exteriores.

EPMSC RM JP SOGAMOSO

Alcances a ejecutar:

Alcance 1: estructura losa de entrepiso cafetería
Alcance 2: Pabellón de maternas y CDI ER

Programación: Inicio 22 de septiembre de 2025 Final: 15/05/26

Recurso asignado: $ 379,696,386.00

Novedades en el periodo del informe:

Se ejecutaron las actividades del alcance N.° 1 – Estructura de losa de entrepiso de la cafetería

Con corte al mes de junio, continúan en ejecución las actividades correspondientes a la construcción de la estructura de la losa de entrepiso de la cafetería. Durante el período se adelantaron las obras preliminares mediante la instalación del campamento, cerramiento provisional y localización y replanteo del área de intervención, permitiendo el desarrollo organizado y seguro de las actividades constructivas.

De igual manera, se ejecutaron labores de desmonte y demolición de elementos existentes, incluyendo mesones, pisos, enchapes, placas de contrapiso, puertas, ventanas blindadas y aparatos sanitarios, así como la suspensión controlada de las redes hidráulicas necesarias para la intervención, garantizando la preparación del área conforme a los requerimientos del proyecto.

En el componente estructural se avanzó en las actividades de excavación, conformación de cimentaciones mediante concretos de limpieza, zapatas, vigas de cimentación y placas de contrapiso, complementadas con la instalación del acero de refuerzo, mallas electrosoldadas y la construcción de columnas en concreto reforzado. Asimismo, se continúa con la fabricación y montaje de la estructura metálica destinada a la cubierta y al pasillo técnico, de acuerdo con los diseños aprobados y las especificaciones técnicas del contrato.

Como parte de las actividades de obra gris y acabados iniciales, se ejecutó la aplicación de pañete impermeabilizado en las superficies intervenidas, dando continuidad al proceso constructivo y preparando las áreas para las etapas posteriores de la obra.

Registro fotográfico.



Instalación de acero en zapatas , vigas y pedestal, fundida de concreto

ESTABLECIMIENTO EPAMS CAS CÓMBITA

Programación: Inicio 06 de agosto de 2025 Final: 15 de mayo de 2026

Alcance no. 1: hallazgo 36 de 2021-1 continuación construcción alojamiento de rancheros estructura 2.

Alcance 2: tutela 2020-00162. iniciación de la construcción de centros de acopio (shut de basuras) de residuos sólidos del rancho y pabellones rancheros estructura 2.

Alcance 3: mantenimiento de las áreas de sanidad de las dos estructuras para atender observaciones de los entes de control.

Alcance no. 5: homogenización eléctrica de pabellones (taponamiento de las lámparas en celdas por cuestión de seguridad).

Presupuesto: $ 2,489,215,150.00

Actividades ejecutadas en el periodo.

Mantenimiento general correctivo de la estructura metálica existente de cubierta, contemplando el tratamiento a la totalidad de los elementos que componen las cerchas y las correas.
Levante de mampostería de área de rancho.
Suministro e instalación de acero para dovelas y columnetas.

Registro fotográfico.



Levante de mampostería perimetral de alojamientos rancheros según diseños

EPMSC PAZ DE ARIPORO

Alcances a ejecutar:

Alcance n°2 el cambio de los pisos de los pasillos de circulación
Alcance n°4 cambio del piso de la cancha

Programación: Inicio 15 de septiembre de 2025 Final: 15 de diciembre de 2025
Recurso asignado: $ 137,321,439.00

Novedades en el periodo del informe:

Se iniciaron actividades de obras el día 04 de noviembre de 2025.

Actividades ejecutadas en el periodo.

Estado: terminado

El contratista culminó las actividades de obra civil programadas en el establecimiento de Paz de Ariporo, ejecutando las labores conforme al alcance contractual y especificaciones técnicas establecidas.

Registro Fotográfico



Instalación de cerámica de piso área de pasillo

EPC CÁQUEZA

Alcances a ejecutar:

Alcance no.1: tanques de almacenamiento de agua potable
Alcance no.2: adecuación de celdas de patios 1 y 2

Programación: Inicio 17 de septiembre de 2025 Final: 30 de enero de 2026

Recurso asignado: $ 71,491,358.00

Durante el período reportado, la interventoría realizó seguimiento técnico y presupuestal al trámite correspondiente al APU del ítem no previsto relacionado con el suministro e instalación del sistema de presión constante para el establecimiento de Cáqueza, efectuando aval del NP presentado por el contratista.

En este orden por parte de la interventoría se solicitó al contratista la entrega del balance final para socializar las actividades a desarrollar a la dirección del establecimiento y a la supervisión.

ESTABLECIMIENTO EPMSC VILLETA
Alcances a ejecutar:

Alcance no.1: Cambio de unidades sanitarias para el personal de PPL zonas comunes y en celdas.

Alcance no.2: acondicionar la guardia interna para separar los funcionarios de los PPL, y adecuación de un baño

Programación: Inicio 10 de octubre de 2025 Final: 20 de enero de 2026

Recurso asignado: $ 45,618,824.00

Estado: terminado.

Durante el período reportado se ejecutaron actividades de adecuación y mejoramiento de infraestructura en el establecimiento penitenciario de Villeta, contemplando labores preliminares, obras civiles, hidrosanitarias, eléctricas y acabados arquitectónicos.

Las actividades desarrolladas incluyeron desmontes y demoliciones de elementos metálicos, cielos rasos, pañetes, pisos y placas de contrapiso existentes, con el correspondiente cargue, retiro y disposición final de escombros conforme a la normatividad ambiental aplicable.

En el componente estructural y arquitectónico se ejecutaron actividades de construcción y reforzamiento de muros en mampostería, instalación de acero de refuerzo, construcción de columnetas, viguetas y vigas de confinamiento en concreto, así como instalación de cielo raso en PVC, cornisas, pañetes impermeabilizados, alistados de piso y enchapes en muros y pisos.

En el componente hidrosanitario se realizó la instalación de redes hidráulicas y sanitarias en tubería PVC/PVCP, puntos hidráulicos y sanitarios para aparatos, regatas y resanes, así como suministro e instalación de aparatos sanitarios, lavamanos y griferías, garantizando su correcta conexión y funcionamiento.

Respecto al componente eléctrico, se ejecutó el suministro e instalación de tuberías, redes eléctricas, salidas para tomacorrientes, tomacorrientes tipo GFCI y luminarias LED, incluyendo accesorios, canalizaciones y elementos necesarios para su adecuada operación.

Adicionalmente, se efectuó la instalación de elementos metálicos y de carpintería arquitectónica, incluyendo ventanas en aluminio anodizado y puertas metálicas de seguridad, junto con actividades de acabados finales mediante aplicación de pintura epóxica aséptica en áreas intervenidas.

Las actividades fueron ejecutadas conforme a las necesidades identificadas en el establecimiento, orientadas al mejoramiento funcional, sanitario, eléctrico y de seguridad de las áreas intervenidas.

Registro Fotográfico.





Acabados finales.

EPMSC GRANADA

Alcances a ejecutar:

Alcance n° 2. concertinas para reforzar la seguridad perimetral e interna.

Alcance no.3. El cambio de tomas, interruptores, e iluminación del establecimiento.

Programación: Inicio 15 de septiembre de 2025 Final: 05 de febrero de 2026
Recurso asignado: $ 137,358,766.00

Estado: Terminado.

Se terminaron actividades de instalación de la concertina en el perímetro de los patios en el establecimiento.

Se culminaron actividades de suministro e instalación de red eléctrica trenzada y actividades de sistema eléctrico cableado interno y exterior.

Registro fotográfico.






Trabajos de instalación de coraza ¾ a celdas patio 1

EPC GUAMO
Alcances a ejecutar:

Alcance 2: Reposición e instalación de reflectores, reposición e instalación de luminarias, reposición y/o mantenimiento ventiladores de techo dependencias.

Programación: Inicio 01 de septiembre de 2025 Final: 15 de diciembre de 2025.
Recurso asignado: $ 95,930,416.19

Novedades en el periodo del informe:

Estado: terminado
Se culminaron satisfactoriamente las actividades de obra priorizadas en el informe diagnóstico, ejecutadas de conformidad con las especificaciones técnicas contractuales, y que, una vez verificadas, se encuentran en óptimas condiciones de funcionamiento y uso

Registro Fotográfico.



Instalación de luminarias herméticas led 2*18w

EPC YOPAL.

alcances contractuales:

Alcance°1 tutela 2022-00137. solicita garantizar el servicio sanitario de manera adecuada
Alcance n°2 mantenimiento correctivo de la tubería hidráulica e hidrosanitaria de todo el establecimiento. ya que se encuentra cristalizada por exposición uv por la intemperie.
Alcance n°3mantenimiento a cajas de desagüe de aguas sanitarias y aguas lluvias
Alcance n°4instalación de concertinas en mallas perimetrales del establecimiento

Alcances aprobados:
Alcance n°1 tutela 2022-00137. solicita garantizar el servicio sanitario de manera adecuada
Alcance n°2 mantenimiento correctivo de la tubería hidráulica e hidrosanitaria de todo el establecimiento. ya que se encuentra cristalizada por exposición UV por la intemperie.

Fecha de inicio: 09 de febrero del 2026
Fecha de terminación en el eron: 20 de marzo del 2025
Recurso asignado al eron o inversión en el eron: $ 424.535.284

Actividades ejecutadas en el periodo:

En el CPMSYOV de Yopal se culminaron las actividades correspondientes a la intervención de los baños comunes de los patios objeto del alcance contractual, ejecutándose la adecuación integral de estos espacios de conformidad con las especificaciones técnicas del contrato. Las obras comprendieron actividades preliminares de demolición, desmontes y retiro de elementos existentes, preparación de superficies y adecuación de las áreas para el desarrollo de las nuevas intervenciones.

En el componente de obra civil se ejecutaron trabajos de construcción y adecuación de mampostería, alistados de piso, pañetes impermeabilizados y demás actividades requeridas para la recuperación de las áreas intervenidas. De igual manera, se realizaron las adecuaciones hidrosanitarias mediante el mantenimiento e instalación de redes de abastecimiento y desagüe, así como la instalación de aparatos sanitarios antivandálicos, lavamanos, orinales, griferías tipo push, válvulas y accesorios necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios sanitarios.

Como parte de los acabados, se ejecutó la instalación de enchapes, aplicación de estuco y pintura, dejando las superficies en condiciones óptimas de funcionamiento y servicio. Una vez verificadas las actividades ejecutadas en campo, la interventoría, el contratista y el establecimiento suscribieron el acta de recibo y entrega parcial de los espacios intervenidos, dejando constancia de que las obras fueron recibidas de conformidad para las áreas priorizadas, sin perjuicio de las obligaciones contractuales relacionadas con la estabilidad y garantía de las obras ejecutadas

Registro fotográfico.





EPMSC CHOCONTÁ.

Alcances contractuales:

Presupuesto: $75.537.121

Estado: terminado

Alcance no.1: Se requiere arreglo y mantenimiento de la tubería de los tanques de abastecimiento de agua para cada una de las celdas de los PPL ya que actualmente tan solo están en funcionamiento 02 tanques de 4 que se encuentran instalados en la terraza de la estructura.
Alcance no.2: Cambio e instalación de 02 tanques de agua para la zona de alojamientos del personal del ccv.
Alcance no.3: Intervención total del área del rancho con el fin de que sea intervenido tantos muros, pisos, puertas, rejas, mesones, trampa de grasa, acueducto, alcantarillado, y bodegas, que conforman actualmente la zona de preparación de alimentos ya que esta zona nunca ha sido intervenida y siempre se llama la atención por parte de secretaria de salud por los diferentes hallazgos en los puntos ya mencionados.

Alcances aprobados:

Alcance no.3: Intervención total del área del rancho con el fin de que sea intervenido tantos muros, pisos, puertas, rejas, mesones, trampa de grasa, acueducto, alcantarillado y bodegas, que conforman actualmente la zona de preparación de alimentos ya que esta zona nunca ha sido intervenida y siempre se llama la atención por parte de secretaria de Salud por los diferentes hallazgos en los puntos ya mencionados.

Se estan adelantando trabajos de post venta en el área de rancho.

Estado: terminado.
Fecha de inicio: 04 de julio
Fecha de terminación en el eron: 25 de agosto del 2025

CPMS FACATATIVA.

Alcances contractuales:
Alcance no.1: mantenimiento de la cubierta de la estructura en la zona del auditorio y Adecuación de shut de residuos sólidos.

Alcances aprobados:
Alcance: intervención pared armadillo y respaldo pared de batería baños y ajuste de humedades

Fecha de inicio: 09 de febrero de 2025
Fecha de terminación en el eron: 25 de marzo del 2026
Recurso asignado al eron o inversión en el eron: $ 24.931.785.

Actividades ejecutadas presente periodo:

Se realizaron visita a campo para verificación de cantidades para cierre de balance.
Falta programar entrega de actividades parciales al establecimiento.

Estado: terminado.

Registro fotográfico.





EPMSC CMS FUSAGASUGA:

Alcances contractuales:
Alcance no.1: reubicación alojamiento guardia y área administrativos (incluyendo oficina Atención al ciudadano)
Alcance no.2: instalación red eléctrica general eron.

Alcances aprobados: batería de baños, alojamiento, mejoramiento del muro, pintura de fachada.

Fecha de inicio: 12 de octubre de 2025

Fecha de terminación en el eron: 12 de diciembre de 2025
Recurso asignado: $ 105.119.613
Actividades ejecutadas presente periodo:

Actividades terminadas al 100% y entregadas parcialmente el 14 de enero del 2026 al establecimiento.

EMPSC GACHETA:
Alcances contractuales:
Alcance no.1: mantén. y adecu. archivo de gestión documental.
Alcance no.2: adecuación del área de sanidad, para la atención de los ppl, para que cumpla con el mínimo de requisitos.
Alcance no.3: adecuación área administrativa
Alcance no.4: mejoramiento de la bodega de almacenamiento de materia prima del rancho.

Alcances aprobados:
Alcance modificado: intervención área de caniles y cocineta y lavadero

Fecha de inicio: 12 de octubre de 2025
Fecha de terminación en el eron: 12 de diciembre de 2025
Recursos: $ 32.683.681 + $ 6.794.352,60.

Actividades terminadas y entregadas al establecimiento y Uspec.

EPMSC UBATE:

Alcances contractuales:
Alcance no. 1: techos lavables área de sanidad
Alcance no. 2: paredes media caña área de sanidad
Alcance no. 3: adecuación y reestructuración de zona administrativa, áreas comunes, oficinas
Alcance no. 4: adecuación zona de almacenamiento talleres

Alcances aprobados:
Alcance no. 3: adecuación y reestructuración de zona administrativa, áreas comunes, oficinas

Las actividades ya están ejecutadas a un 100%, se hizo entrega parcial y se está a la espera de entregar al establecimiento de manera formal con el USPEC.

Fecha de inicio: 07 de julio de 2025
Fecha de terminación en el eron: 14 de agosto de 2025
Recursos: $69.663.991

EPMSC GIRARDOT:

alcances contractuales
alcance no.1: impermeabilización de placas de todas las estructuras del establecimiento, zona administrativa, alojamientos, zona plantas eléctricas, zona motobombas, pabellones, educativas, zona alimentación, talleres.
patios y celdas: reemplazo y/o instalación de baterías sanitarias
alcance no.2: mantenimiento y adecuación archivo de gestión documental de acuerdo a la ley 594 de 2000 art. 16, y el plan de mejoramiento archivístico

alcances aprobados: alcance no.1: impermeabilización de placas de todas las estructuras del establecimiento, zona administrativa, alojamientos, plantas eléctricas, zona motobombas, pabellones, educativas, zona alimentación, talleres

Fecha de inicio: 26 de agosto del 2025
Fecha de terminación en el eron: 15 de diciembre de 2025
Recurso asignado: $408.998.714

Actividades ejecutadas:
Las actividades fueron finalizadas a un 100% y entregadas parcialmente al establecimiento desde el 3 de octubre del 2025. esperando se programe la estrega formal con el uspec.

EPC LA ESPERANZA DE GUADUAS.

Alcances contractuales
Alcance no.1: hallazgo 43 de 2022-1 suministro de agua potable. pendiente visita con el ente de control.
Alcance no.2: reposición y/o mantenimiento correctivo de redes eléctricas (incluye cableado, tuberías embebidas y expuestas) iluminación de perimetral (guayanas internas y externas).
Alcance no.3: mantenimiento y/o adecuación batería sanitaria (baños, lavamos) áreas de sanidad.
Alcance no.4: adecuación de garita por puntos ciegos entre las garitas 3 y 4, en reemplazo del retén 3 y 4

Alcances aprobados:
Alcance no 2: reposición y/o mantenimiento correctivo de redes eléctricas (incluye cableado, tuberías embebidas y expuestas) iluminación de perimetral (guayanas internas y externas).

Fecha de inicio: 01 de julio de 2025
Fecha de terminación en el eron: 15 de diciembre de 2025
Recursos asignados: $1.392.260.179.
Estado: terminado.
Actividades ejecutadas en el periodo: se terminaron las actividades de obra.

Registro fotográfico





EPMSC RM NEIVA

Alcances contractuales
Alcance no.1: hallazgo 122 de 2017-1 condiciones técnicas para visitas conyugales.
Alcance no.2: tutela 202300051. se intervendrán baterías sanitarias y lavaderos
Alcance no 3: mantenimiento de plancha de alojamientos de los pabellones 1a,1b, 2a, 2b, 3, 4 y rm.

Alcances aprobados:
Alcance 3: mantenimiento de plancha de alojamientos de los pabellones 1a,1b, 2a, 2b, 3, 4 y rm,

Fecha de inicio: 02 de julio del 2025

Fecha de terminación en el eron: 14 de noviembre de 2025

Recurso asignado: $ 743.280.495

Actividades ejecutadas en el periodo:
Actividades al 100%, se realizó la entrega final al establecimiento en compañía del supervisor de apoyo del INPEC ingeniero leonardo cabrales el día 09 de octubre del 2025.
Estado: terminado.

EPMSC GARZON.

Alcances contractuales
Alcance no.1: hallazgo 122 de 2017-condiciones técnicas para visitas conyugales
Alcance no.2: mantenimiento a la red eléctrica perimetral.

Alcances aprobados:
Alcance no .2: mantenimiento a la red eléctrica perimetral

Fecha de inicio: 15 de agosto de 2025
Fecha de terminación en el eron: 31 de octubre de 2025

Recurso asignado: $201.787.386
las actividades terminadas al 100%, se realizó la entrega final al establecimiento en compañía del supervisor de apoyo del INPEC ingeniero leonardo cabrales el día 08 de octubre del 2025.

LA PLATA.
Alcances contractuales
Alcance no.1: hallazgo 122 de 2017-1 condiciones técnica (construcción) para visitas conyugales
Alcance no.2: cambio de pisos área del rancho eliminación de aposamiento de agua, mejoramiento sistema hidráulico.

Alcances aprobados:
Alcance no.2: cambio de pisos área del rancho eliminación de pasamiento de agua, mejoramiento sistema hidráulico

Fecha de inicio en el eron: pendiente por reprogramar

Fecha de terminación en el eron: pendiente por reprogramar

Recurso asignado: $303.000.820

Actividades ejecutadas.
Se retoman actividades por parte del contratista, el día lunes 13 de abril.
se continúa con boquilla de piso tipo granito de 30x30
se realiza aseo y bote de escombros
se continúa con estuco, retocando detalles.

Registro fotográfico.





Pulida de piso área de rancho.

EPMSC PITALITO:

Alcances contractuales
Alcance no.1: hallazgo 122 de 2017-1 condiciones técnicas para visitas conyugales
Alcance no. 2: tutela 2020-00020. implementación de acciones para reducir el hacinamiento
Alcance no. 4: reposición hidrosanitarias pabellones 11 y 12
Alcance no. 5: adecuación placa de cubierta patio 6

Alcances aprobados:
Alcance no.5: adecuación placa de cubierta patio 6
Alcance no. 2: tutela 2020 00020. implementación de acciones para reducir el hacinamiento.
Alcance no. 4: reposición hidrosanitarias pabellones 11 y 12

Fecha de inicio en el eron: 07 de julio del 2025

Fecha de terminación en el eron: 09 de diciembre de 2025
Recurso asignado: $538.930.092

Actividades terminadas al 100% está pendiente entregar al establecimiento la entrega de las ultimas iluminarias por parte del contratista e interventoría.

EPMSC COLONIA PENAL DE ORIENTE – CAMIS

Alcances contractuales

Alcance: patio n°3, mantenimiento y mejoramiento patio 3 cola de pato
Valor: $ 448.767.840,00
Actividades ejecutadas: durante la semana el contratista realizo las siguientes actividades:

Actividades realizadas.

Alcance 1: Alcance : Mantenimiento y mejoramiento de patio 3 cola de pato.

Intervención: Mejoramiento zona comedores patio 3 cola de pato, se realiza el cambio de la placa de contrapiso existente en la zona de comedores, cambio de la cubierta, se realizan actividades de cambio de duchas, se realiza el cambio de enchape en baños y zona de expendio, se realiza el cambio de enchape en tanque ubicado en alojamiento 2.

Desmonte de puerta y marco con embalaje y almacenamiento, demolición de alistado y acabado de piso, demolición de placa de contrapiso ,excavación mecánica en material común ,Relleno con recebo-cemento compactado Nivelación manual de terreno ,placa de contrapiso en concreto 3000 PSI, instalación de acero de refuerzo 60.000 PSI, instalación de malla electrosoldada, mantenimiento de estructura metálica de cubierta, construcción de Bordillo en concreto 3000 PSI, Cárcamo en concreto, Mesón en concreto, instalación de Tubería PVC sanitaria 3", pañete impermeabilizado, alistado de piso impermeabilizado instalación de cubierta en teja de fibrocemento, retiro de cubierta de Eternit, Instalación de puerta metálica tipo celosía, comedor antivandálico de 8 puestos, instalación de orinal cerámico y sanitario de tanque dos piezas - Grifería para orinal - Ducha monocontrol - Enchape cerámico para piso 55x55 cm - Enchape cerámico para muro 30x60 cm - construcción de rampa de acceso en concreto construcción de rejilla para cárcamo en acero inoxidable.

Registro fotográfico



Demoliciones de enchapes y fundida de placa.

EPMSC RM VILLAVICENCIO:

Alcances contractuales
Alcance no.1: hallazgo 22 2022-1 impermeabilización ute
Alcance no.2: tutela 202100155. implementación de rampas para personas en condiciones de discapacidad.
Alcance no.3: mantenimiento y/o adecuación alojamientos ccv

Alcances aprobados:
Alcance no1: hallazgo 22 2022-1 impermeabilización ute
Alcance no.2: tutela 202100155. implementación de rampas para personas en condiciones de discapacidad.
Alcance no.3: mantenimiento y/o adecuación alojamientos ccv

Fecha de inicio en el eron: 02 de septiembre de 2025

Fecha de terminación en el eron: 31 de agosto de 2026

Recurso asignado: $604.115.802

Actividades ejecutadas:

Alcance 1: ALCANCE No.1: Hallazgo 22 2022-1 Impermeabilización UTE

Se realizo, Demolición manual y retiro de impermeabilización existente, instalación de Bajante PVC sanitario 3" , aplicación de Mortero pendiente alta resistencia , instalación de acabado media caña , instalación de Sosco/Tragante en lámina para bajantes , aplicación de Impermeabilización con poliurea.

Alcance 2: ALCANCE NO.2: Tutela 202100155. Implementación de rampas para personas en condiciones de discapacidad.

Intervención: Adecuar y/o construir las rampas de acceso requeridas para garantizar la accesibilidad de personas con movilidad reducida, dando cumplimiento a la tutela 202100155 y a la normativa de accesibilidad vigente.

Actividades ejecutadas: Se realizaron actividades de preparación y adecuación de superficies mediante la picada de pisos en concreto y la demolición de escaleras y/o rampas existentes. Asimismo, se ejecutaron labores de relleno y compactación con material granular para la conformación de niveles de apoyo requeridos para las nuevas estructuras.
Posteriormente, se llevó a cabo la instalación de concreto de limpieza como base para la ejecución de obras civiles, seguida de la construcción de placas de contrapiso en concreto.
Como parte del reforzamiento estructural, se realizaron anclajes para la fijación de acero de refuerzo y se suministró e instaló malla electrosoldada, garantizando las condiciones técnicas necesarias para la estabilidad y desempeño de los elementos construidos.

Alcance 3: ALCANCE NO.3: Mantenimiento y/o Adecuación alojamientos ccv

Intervención: Ejecutar actividades de mantenimiento, reparación y adecuación de los alojamientos COV, mejorando sus condiciones físicas, funcionales y de habitabilidad para el personal usuario de las instalaciones.
Se realizaron actividades preliminares de desmonte, demolición y adecuación de áreas, incluyendo el retiro de cubiertas metálicas, estructuras de soporte, aparatos sanitarios, tuberías existentes, cielorrasos, acabados de pisos y muros, así como el raspado de pintura, picado de pañetes y demolición de elementos de mampostería y contrapiso deteriorados.
En el componente civil se ejecutaron excavaciones manuales, rellenos con material seleccionado y recebo compactado, construcción de placas de contrapiso, cajas de inspección, muros en bloque de arcilla, elementos de confinamiento en concreto reforzado, anclajes estructurales y suministro e instalación de acero de refuerzo y malla electrosoldada.
Para la cubierta se realizó el suministro, fabricación e instalación de la estructura metálica de soporte, incluyendo el pasillo técnico, así como la instalación de teja arquitectónica, caballetes, canales y elementos de remate tipo flashing, garantizando la correcta evacuación de aguas lluvias y protección de la edificación.
En las redes hidrosanitarias se ejecutó la instalación y adecuación de tuberías para suministro de agua potable y evacuación de aguas residuales, construcción de puntos hidráulicos y sanitarios, suministro e instalación de tanques de almacenamiento de agua, flotadores mecánicos y demás accesorios requeridos para el correcto funcionamiento del sistema.

Registro fotográfico



Pañete de cuchillas

EPMSC ACACIAS

Alcances contractuales:

Alcance no.1: pabellones 4 y 5, celdas de la segunda planta. $450.478.376
alcance no.2: tutela 2021-00377. se solicita el arreglo de la celda 78 del pabellón 6. $ 13.857.844
Alcance no.3: tutela 2021-00164. mantenimiento de barandas, rejas, cubículos, escaleras. $ 350.942.198
Alcance no.4: tutela 2021-00237. mantenimiento canales de desagüe. $ 233.430.466
Alcance no.5tutela 2022-00260. destapar los sifones de las duchas del segundo piso y del orinal del primer piso $4.265.512
Alcances aprobados

Alcance no.1: pabellones 4 y 5, celdas de la segunda planta
Alcance no.2: tutela 2021-00377. se solicita el arreglo de la celda 78 del pabellón 6.
alcance no.3: tutela 2021-00164. mantenimiento de barandas, rejas, cubículos, escaleras
alcance no.4: tutela 2021-00237. mantenimiento canales de desagüe
alcance no.5tutela 2022-00260. destapar los sifones de las duchas del segundo piso y del orinal del primer piso

Recursos asignado al eron o inversión en el eron: $1.052.974.364

Actividades ejecutadas:

Alcance 3: "ALCANCE 3 Mantenimiento de barandas, rejas, cubículos y escaleras"

Intervención: se continúan actividades de cambio y mantenimiento escaleras patios del 8-9 ya que presentaban un peligro tanto para el personal de guardia como para los ppl, se realiza cambio de esclusas ya que por su deterioro presenta un posible riesgo de fuga del establecimiento, se retira barandas de primer piso ya que representan un foco de inseguridad para el establecimiento, se realiza cambio de barandas de segundo piso en los patios.

Se realizaron actividades de desmonte y adecuación de elementos metálicos en los patios 8 al 16, incluyendo el retiro de barandas metálicas en primero y segundo nivel, desmontaje de estructuras metálicas de esclusas y retiro de vidrios blindados existentes.

Asimismo, se ejecutó el mantenimiento correctivo de barandas y estructuras metálicas mediante limpieza, preparación de superficies y aplicación de pintura de acabado con esmalte sintético, con el fin de mejorar sus condiciones de conservación y funcionalidad.
Dentro de las actividades de reposición y mejoramiento, se efectuó la instalación de nuevos vidrios laminados de seguridad, montaje de barandas metálicas tubulares en acero al carbón y reinstalación de estructuras metálicas asociadas a las esclusas.

Finalmente, se realizaron labores de mantenimiento, desmonte y reposición de los pasos de las escaleras, así como el mantenimiento integral de sus estructuras metálicas, garantizando condiciones adecuadas de seguridad y tránsito para la población privada de la libertad y el personal del establecimiento.

Alcance 4: "ALCANCE 4 Mantenimiento de canales de desagüe"

Intervención: Se realiza demolición y fundida en canales laterales patios 8-9-15, debido a que el desagüe era incorrecto y generaban pozos que podían ser perjudiciales para la salud de los ppls

Actividades ejecutadas: Actividades correspondientes al alcance 4, demolición alistada de piso, alistado de piso con mortero impermeabilizado integralmente:



Trabajos de ornamentación y pintura de barandas.

EPMSC MELGAR

Alcances contractuales:
alcance no.1: realizar mantenimiento en la infraestructura deficiente en pisos, paredes, techos, escaleras y extractores e implementar un lavamanos al interior del rancho

Alcances aprobados:
Alcance no.1: realizar mantenimiento en la infraestructura deficiente en pisos, paredes, techos, escaleras y extractores e implementar un lavamanos al interior del rancho.

Fecha de inicio en el eron: 22 de septiembre del 2025

Observaciones novedades y/o generalidades del frente de obra: este establecimiento ya fue terminadas las actividades al 100%, se realizó la entrega al establecimiento, pendiente entrega de las ultimas actividades.

EPMSC CHAPARRAL

Alcances contractuales:
Alcance no.1: cambio de techos de asbesto por techos en material adecuado en todo el establecimiento.
Alcance no.2: instalación de concertina de los patios.

Alcances aprobados:
Alcance no.1: cambio de techos de asbesto por techos en material adecuado en todo el establecimiento.
Alcance no.2: instalación de concertina de los patios.

Fecha de inicio en el eron: 07 de julio del 2025
Fecha de terminación en el eron: 09 de octubre de 2025
Recursos asignados al eron o inversión en el eron: $ 147.128.771.

Observaciones novedades y/o generalidades del frente de obra
estas actividades fueron terminadas en un 100%, quedando recursos del presupuesto contractual.

EPMSC JP ESPINAL

Alcances contractuales:
Alcance no.1: adecuación de cuarto plomado para dar uso al equipo de rx
Alcance no.2: remodelación baño del área de sanidad se encuentra dañado, techo en drywall deteriorado por humedad
Alcance no.3: mantenimiento cerraduras especiales
Alcance no.4: mantenimiento, mejora de la red hidráulica y de alcantarillado patios 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, utey educativas.
Alcance no.5: mantenimiento y mejora de la red eléctrica patios 1, 2, 3 ,4,5,6,7,8,9,10, ute y área de talleres sector 1 y 2, educativas
Alcance no. 6 adecuación área de caniles

Alcances aprobados:
Alcance no.4: “mantenimiento, mejora de la red hidráulica y de alcantarillado”.
Alcance no. 5: “mantenimiento y mejora de la red eléctrica”

Fecha de inicio en el eron: 11 de agosto de 2025
Fecha de terminación en el eron: 15 de diciembre de 2025
Recursos asigando al eron o inversión en el eron: $892.785.935

ACTIVIDADES REALIZADAS.

Alcance 1: Mantenimiento Cerraduras especiales.

Intervención: Realizar mantenimiento de electrocerraduras, pulsadores, llaves, baterías y tarjetas para el correcto funcionamiento de las exclusas
Actividades ejecutadas: Se realizo mantenimiento de electrocerraduras, pulsadores, botoneras. Cambio de llaves , baterías, tijeras para el correcto funcionamiento de exclusas en pabellones 1,2,3,4,5,6,7, guardia interna y externa. De acuerdo con los requerimientos y prioridades del establecimiento.

Alcance 2: Mantenimiento, mejora de la red hidráulica y de alcantarillado patios 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,UTEy educativas.

Intervención: Se realizo el cambio de tubería, accesorios y aparatos de la red hidráulica y sanitaria.

Actividades ejecutadas: Se realizo cambio de tuberías hidráulicas y sanitarias, así como también el cambio de aparatos sanitarios para el correcto funcionamiento de baterías en celdas de los pabellones 4,5,6, UTE y educativas.

Alcance 3: Mantenimiento y mejora de la red eléctrica patios 1, 2, 3 ,4,5,6,7,8,9,10,UTE y área de talleres sector 1 y 2, educativas.

Intervención: Se realizo cambio de tuberías, cableado y luminarias.

Actividades ejecutadas: Se realizo cambio de tuberías, cableado y luminarias para el correcto funcionamiento en celdas de los pabellones 6 , 7 y del pabellón 5 se realizó en 7 celdas.

Registro fotográfico.




Instalación de lámparas antivandálica en celdas pabellón 5

COMEB BOGOTÁ (PICOTA)

Fecha de Inicio Contractual: 26 de junio de 2025

Fecha de Terminación Actualizada: 31 de agosto de 2026

Presupuesto Asignado al Establecimiento: $3.963.947.142

Alcances aprobados:

ALCANCE N°1: Hallazgo 1 2023-1 Obras complementarias en reparaciones generales de membranas y tanques subterráneos, y mantenimientos preventivos y correctivos de motobombas en las tres estructuras.

ALCANCE N° 2: - Complementación, modificación red de asbesto cemento por red 6" PVC de acometida principal (800 m) para Estruct. 1 y 2.

ALCANCE N°3 Adecuaciones generales de las redes verticales Hidrosanitarias a fachada en la estructura tres.

ALCANCE N°4 Iluminación perimetral y Guayana interna nueva malla de seguridad, junto con dos garitas (NyS) sobre troncales caracas.

Actividades desarrolladas:

ALCANCE 1: Reparaciones Generales de Tanques Subterráneos

Este capítulo contempla la intervención de los 11 tanques y el tanque de emergencia en la estructura 3; dicha intervención consiste en desocupar los tanques, reparar todas las fisuras, impermeabilizar

las paredes y el fondo con membrana, cambiar las tapas de las esclusas e impermeabilizar las cubiertas con poliurea.

Actividades en ejecución:

Restricciones de Agua en Tanque 10: Durante el destronque del Tanque 10, se presentaron filtraciones constantes desde las redes verticales hidrosanitarias que humedecen la superficie y dificultan el avance. Se solicitó apoyo al área de mantenimiento para concientizar a la Población Privada de la Libertad (PPL) y controlar los flujos.

Inspección de Tanques 7, 8 y 9: Aunque se retiraron los escombros, se evidenció que estos tanques contienen agua detenida por un periodo prolongado, presentando un alto grado de contaminación. Asimismo, se detectó que los sistemas de bombeo están fuera de servicio y la tapa del Tanque 8 se encuentra deformada en una de sus esquinas, impidiendo un ajuste hermético.

Pendientes críticos: Sigue pendiente el cambio de la válvula de 4 pulgadas ubicada frente a la garita del Tanque 11. Adicionalmente, el contratista no ha presentado el esquema de conexión para enlazar el tanque de incendios a la red de la Estructura 3, situación que retrasa la impermeabilización del Tanque 10.

ALCANCE 2: Suministro e Instalación de Red Matriz de Agua Potable de 6”

En el periodo anterior se culminó la sustitución de la tubería matriz conforme a los diseños aprobados, reemplazando 447 metros lineales de red obsoleta de asbesto-cemento por tubería de PVC. El ítem incluyó la reconexión de las derivaciones de 2 pulgadas existentes, la previsión de futuros empalmes en 2 y 3 pulgadas, y la construcción de diez cajas de inspección para válvulas y registros.

Durante la presente quincena, se adelantaron labores de orden, aseo técnico y preparación de las áreas destinadas a la instalación de la acometida de agua potable para las Estructuras 1 y 2. Asimismo, se ejecutaron los acabados de las cajas de válvulas y la instalación de sus respectivas tapas.

ALCANCE 3: Adecuaciones generales de las redes verticales Hidrosanitarias a fachada en la estructura tres.

Sello de Vanos (Estructura 3)

Durante las actividades de demolición en los vanos de las celdas 12, 30 y 54 (Pabellón 30), se detectó una No Conformidad Estructural: el refuerzo instalado no coincide con los diseños aprobados, evidenciando solo una varilla horizontal fijada en sus extremos a dos varillas verticales sin los anclajes requeridos. El concreto demolido presentó baja resistencia mecánica. A la fecha, el contratista no ha entregado los resultados de los ensayos de laboratorio de los cilindros tomados en la reconstrucción, ni ha dado respuesta formal al oficio de observaciones emitido por esta Interventoría.

Redes verticales:

El contratista solicitó apoyo para gestionar con el INPEC las condiciones de seguridad necesarias para el ingreso a los pabellones. Esta Interventoría ya dio traslado de la solicitud a la entidad y se encuentra a la espera de una respuesta formal. Por este motivo, no se registra el inicio de las actividades asociadas al ítem No Previsto (NP 51) de andamios colgantes para la intervención de las líneas en fachada.

ALCANCE N°4: Iluminación perimetral, guayana y garitas.

Bajo la estrategia de aseguramiento de la infraestructura, la ejecución de este alcance permanece supeditada a la estabilización previa de los vanos en la Estructura 3. Al no presentar asignación de recursos activos en el periodo, el alcance no registra avances físicos.

Gestión Operativa y Cumplimiento de Cronograma

Afectaciones al Rendimiento Laboral: El rendimiento del contratista se vio seriamente impactado por restricciones logísticas ajenas a su control: el lunes 15 fue festivo; los días martes 16 y miércoles 17 las jornadas se redujeron significativamente debido a la disponibilidad limitada de la guardia (laborando solo de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. y de 9:45 a.m. a 3:00 p.m.). El viernes 19 se suspendió el acceso por el traslado de los días de visita carcelaria con motivo de la jornada electoral, y el martes 23 no se autorizó el ingreso de personal externo al establecimiento.

Registro Fotográfico.

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Placa tanque 10 destronque placa cubierta.</td></tr>
</table>





Placa tanque 10 zona contaminada por lo que no se ha podido destroncar





Borde de placa tanque 10, se evidencia escombro y basura que a la fecha no lo ha retirado Mantenimiento.





Placa tanque 10 zona llenado dilataciones





Placa tanque 10 zona sello de dilataciones





Borde de placa tanque 10: inicio dilatación a 30cm, se solicitó que sea a 50cm





Puntos de desagüe que contaminan parte de la placa de cubierta del tanque 10





Fondo tanques contaminados por el agua detenida durante mucho tiempo.

CPMS BOGOTÁ MODELO

Fecha de inicio: 14 de julio del 2025

Fecha de terminación: 31 de agosto del 2026

Presupuesto: $ 2.437.410.887,00

Alcances aprobados:

ALCANCE No. 1 Hallazgo 29 de 2023-1 impermeabilización cubiertas, humedad, filtración, perdida de baldosas entre otros.

ALCANCE No. 2 Modernización área de puerta de información, implementación zona de riesgo y control para el personal externo y puesto de servicio de guardia.

Actividades desarrolladas:

ALCANCE 1: Impermeabilización de Cubiertas

Este capítulo contempla la intervención técnica del bloque de cubiertas de Sanidad, Bloque Administrativo y el área perimetral contra la Garita Número 1. Durante las dos semanas del periodo reportado se ejecutaron las siguientes actividades:

Actividades de Obra y Suministros (Semana del 15 al 21 de junio): Se avanzó en la instalación de ventanería de aluminio de 0.48 metros de altura con celosía y policarbonato de 6 milímetros (Ítem NP-119), el mantenimiento en sitio de las ventanas de rejas (Ítem NP-116), y el alquiler y transporte de maquinaria pesada tipo "Pajarita" (Ítems NP-96 y NP-98). Asimismo, se concertó con el contratista la instalación de soportes tipo pera de 2.1/2" a 4" en lámina galvanizada (Actividad 8.5.3.10) para la fijación de una platina especial anclada a la cubierta que soportará las canaletas de voz, datos y la tubería eléctrica.

Control Técnico y Rechazo de Obras: En visita de inspección del 18 de junio, la Interventoría constató con profunda preocupación fallas técnicas y acabados regulares en la ejecución de los ítems NP-116 y NP-119. Pese a las reiteradas advertencias en bitácora por parte del personal de interventoría y el caso omiso a estas anotaciones; se organizó un Oficio formal USPEC BETAREGIONALES 2693 del 20 de junio de 2026, rechazando el recibo de las actividades hasta que sean corregidas.

Subsanaciones (Semana del 22 al 28 de junio): El contratista dedicó la última semana a realizar reparaciones y arreglos sobre la ventanería del ítem NP-119. De igual forma, ejecutó la repintada

de la rampa de acceso a la cubierta para subsanar los daños y rayones ocasionados durante el cargue de materiales; no obstante, la inspección fotográfica evidenció la presencia de óxido superficial y una aplicación deficiente, por lo cual se le exigirá un nuevo proceso de acabado técnico.

Ajuste Presupuestal: Mediante el oficio de respuesta USPEC BETAREGIONALES 2715 del 25 de junio de 2026, se determinó retirar la priorización de la intervención en la cubierta contra la Garita Número 1 y el Bloque Administrativo. El oficio previo USPEC-BETAREGIONALES-1723 queda sin validez debido a que el proyecto presenta saldo en rojo. No se autorizarán más obras adicionales en el Alcance 1 con el fin de liberar y salvaguardar los recursos existentes para la construcción del nuevo bloque de acceso.

ALCANCE 2: MODERNIZACIÓN DE LA PUERTA DE INFORMACIÓN, IMPLEMENTACIÓN DE LA ZONA DE RIESGO Y CONTROL PARA PERSONAL EXTERNO, Y PUESTO DE SERVICIO DE GUARDIA

Estado de Ejecución Física: Durante todo el periodo comprendido entre el 15 y el 30 de junio de 2026, este alcance no registró inicio de actividades físicas en terreno, lo cual sustenta la desviación negativa del -19.03% en el cronograma general.

Estructuración y Viabilidad por Fases: Debido a que el costo total proyectado para ejecutar el 100% de este alcance asciende a $2.061.173.532, y el contrato solo dispone de un saldo remanente de $1.149.784.262, el proyecto afronta un Déficit Presupuestal Crítico de $911.389.270. En atención a esto, la Interventoría evaluó el balance por etapas enviado por el contratista en el oficio CE-CGMC-256-2238 y remitió a la Dirección de Infraestructura de la USPEC el Análisis Técnico y Presupuestal mediante el Oficio USPEC BETAREGIONALES 2715 del 25 de junio de 2026, proponiendo la siguiente división:

- Fase 1 (Financieramente Viable - Con Recursos Actuales por $1.149.784.261): Incluye demoliciones, preliminares, reubicación de poste eléctrico, movimiento de tierras, cimentaciones, redes subterráneas, estructuras, mampostería, instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y el portón automatizado de la esclusa.
- Fase 2 (Pendiente de Recursos Adicionales por $911.389.269): Contempla mesones, cielos rasos, acabados de pisos, impermeabilizaciones, carpintería metálica, enchapes, aparatos sanitarios, pinturas, cerramientos y andenes.

Condicionamientos Técnicos de Interventoría para Fase 1: La aprobación de esta fase queda sujeta al planteamiento que realice la USPEC, con respecto al saldo para poder organizar el alcance en su totalidad.


Sin embargo, dentro de la sabana presentada, el contratista debe revisar dentro de lo presentado el presupuesto del portón de la esclusa para validar cantidades y justificar costos. De igual forma, la actividad de reubicación del poste eléctrico permanece congelada hasta que el contratista presente los soportes económicos y atienda las observaciones del especialista eléctrico.

Finalmente, se aclara que los rellenos se pagarán exclusivamente bajo la especificación de recebo común y que cualquier modificación de cantidades detectada en planos deberá concertarse sin superar el techo presupuestal disponible.

Registro Fotográfico.

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Ornamentador atendiendo arreglos solicitados por la Interventoría para el recibo de las actividades NP-116 y NP-119</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

Arreglos a observaciones generadas por la Interventoría actividad NP-119	Abrazadera tipo J que se pagara por la actividad 8.5.3.10 para colocar canaleta y tubería eléctrica

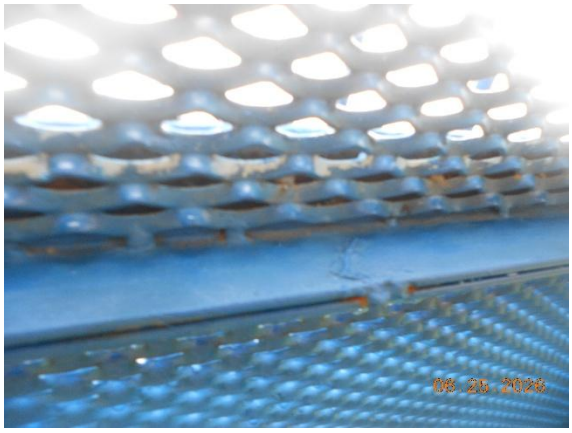	
Aplicación de pintura a rampa la cual fue dañada durante los procesos constructivos que se realizaron	Evidencia de oxido en rampa por debajo lo que demuestra que la aplicación de anticorrosivo no se hizo de manera correcta y por ende de esmalte tampoco

	
Registro de corrosión activa (óxido) en la cara inferior de la rampa por deficiencia en la aplicación de la base anticorrosiva y esmalte.	Deficiencia en la terminación y homogeneidad del acabado final de pintura en rampa para recibo técnico.

	
Vista interior desde el hall de sanidad con las ventanas instaladas y rejas a las cuales se le realizo mantenimiento	

RM PAS ERE BOGOTÁ (BUEN PASTOR)

Fecha de inicio: 27 de abril del 2026

Fecha de terminación: 31 de agosto del 2026.

Presupuesto: $1.068.549.121

Alcance aprobado:

ALCANCE 5 Mantenimiento Rancho

El avance real de la quincena se limitó estrictamente a las siguientes actividades preliminares y de redes hidrosanitarias:

Demoliciones y Desmontes: Retiro manual de tubería hidrosanitaria obsoleta entre 1/2" y 2" (Ítem 1.3.6.7) y de 2.1/2" a 6" (Ítem 1.3.6.8). Desmonte de tubería metálica para gases o aire comprimido (Ítem 1.3.6.17), demolición manual de pañetes en muros, columnas y vigas (Ítem 1.3.8.7) y demolición lineal de pañetes menores a 50 cm (Ítem 1.3.8.8).

Adecuación del Terreno: Excavación manual en material común hasta 2.00 metros de profundidad con entibado (Ítem 3.1.6), nivelación manual del terreno (Ítem 2.1.21) y relleno manual compactado con recebo.

Instalaciones Hidrosanitarias y Acabados: Encofrado y vaciado de columnetas de confinamiento de 0.12x0.20 m (Ítem 5.4.5), aplicación de pañete liso común proporción 1:3 (Ítem 13.1.8) e instalación de tubería de alcantarillado PVCS de 2", 3" y 4" (Ítems 8.1.8.1, 8.1.8.3 y 8.1.8.5).

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y ALERTAS DE INTERVENTORÍA

Se registra un retraso considerable frente a la programación en la construcción de cárcamos, redes de agua potable, válvulas de corte y canalizaciones eléctricas. Asimismo, el contratista incluyó el inicio de mampostería en su cronograma sin haber fundido la placa de contrapiso, por lo que se exige una reprogramación inmediata y coherente de los procesos constructivos.

No se autorizará el vaciado de ningún elemento estructural hasta que el contratista presente los diseños de mezcla correspondientes. Adicionalmente, la Interventoría exigió en bitácora reforzar de inmediato el sistema de apuntalamiento de la placa existente, dado que ya se demolieron todos los muros de soporte y las medidas actuales son insuficientes ante riesgos de deformación o sobrecargas.

En inspección del 23 de junio, se detectó un desfase en la profundidad de la red sanitaria debido a que la residencia de obra asumió, sin consultar, que el cárcamo tendría una altura fija de 10 cm. Al verificar que en los planos la altura es variable, la Interventoría determinó que debe ser de 20 cm libres para asegurar la capacidad hidráulica ante taponamientos. Esto obligará a realizar un relleno general de contrapiso de 10 cm, lo cual dejará el Rancho a +10 cm sobre el nivel de la vía, mitigando

riesgos de inundación externa. Además, se detectaron desalineaciones en los centros de los puntos sanitarios, por lo que se ordenó a la contratista entregar planos de cotas detallados a sus maestros antes de colocar la malla y fundir la placa.

Ajustes de Alturas e Inconsistencias de Diseño (Rancho y Ventanería):

La altura libre final del Rancho se fijó en 2.30 metros para poder absorber el cárcamo de 20 cm y la profundidad de descole de la red sanitaria en cuartos fríos.

Se detectaron contradicciones entre el modelo 3D y los planos de corte arquitectónicos: en los cortes, las ventanas aparecían de 60 cm y en el 3D de 1.22 metros. Para unificar el lenguaje arquitectónico y garantizar la visual del Ecónomo hacia la zona de lavado y descomide, se acordó que las ventanas tendrán 1.30 metros de alto. Los dinteles se estandarizaron todos en 20 cm para que funcionen adecuadamente como vigas cinta de confinamiento, corrigiendo las variaciones erróneas del plano original (que mostraba dinteles de 15 y 38 cm).

Inviabilidad de la Trampa de Grasas: La residencia de obra consultó sobre el diseño de la trampa de grasas, la cual cuenta con unas dimensiones desproporcionadas en planos (5.58 m de largo x 2.46 m de ancho x 1.95 m de profundidad). La Interventoría ratifica que esta estructura no corresponde a las necesidades ni escala de este proyecto, por lo que se escalará una revisión conjunta para su rediseño técnico.

Ensayos Requeridos: Se ordenó formalmente al contratista realizar pruebas de estanqueidad a toda la red sanitaria instalada antes de tapar, así como revisar los empozamientos en la cubierta para proyectar bajantes de aguas lluvias integradas a los muros antes de intervenir la placa.

4. ASPECTOS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD (SISO)

Durante la visita del 23 de junio, la subdirectora del establecimiento y el área SISO manifestaron su rechazo por el acopio de escombros en la vía interna. El contratista incumplió el acuerdo de depositar únicamente material aprovechable, mezclándolo con elementos de concreto de gran tamaño (dinteles colapsados). Se ordenó la demolición manual inmediata de estos bloques para evitar accidentes con el personal o el camión recolector de basura. Asimismo, se exigió despejar las áreas contiguas a los contenedores antes del 26 de junio para evitar sanciones de la Secretaría de Salud. El contratista muestra disposición, pero los trámites de seguridad para el ingreso de volquetas limitan la gestión a un (1) solo viaje diario, por lo que la Interventoría mediará ante la dirección del penal para agilizar los permisos.

Registro Fotográfico





Excavación y cama de arena para colocación de tubería sanitaria de 2”, 3” y 4”





Retiro de rejas existentes contra predio vecino para levantar muro en bloque y realizar pañete completo



Regata y colocación de columna tuvo PVC 2” para desagües lavamanos baterías de baño



Panorámica procesos constructivos sobre zona cocción rancho

	
Inspección trampa de grasas actual para determinar cota de descole tubería principal	

	
Avance ejecución redes sanitarias tuberías 2”, 3”, 4”	

	
Avance ejecución redes sanitarias tuberías 2”, 3”, 4”	

	
Muro en bloque, hechura de columnatas y viga cinta de confinamiento	**Fleje de refuerzo para hechura de columnatas**

	
Tipo de cemento utilizado para el desarrollo de procesos constructivos	**Cargue de escombros**

	
Escombro que debe ser retirado	**Por solicitud del establecimiento esta zona debe ser despejada de escombro y material para el desarrollo de procesos constructivos, dado que este aledaño a los containers donde se guardan alimentos para procesamiento de comida y se genera contaminación cruzada.**





Salida de red aguas lluvias y de cárcamos, futura ubicación de trampa de grasas, foto derecha trampa de grasas actual

EPMSC GUATEQUE

Fecha de inicio: 13 de enero del 2026

Fecha de terminación: 3 de Junio 2026

Fecha de entrega final: 17 de Junio 2026

Presupuesto: $110.342.163

Alcances aprobados:

Alcance #1: Mantenimiento de la red eléctrica en la parte interna, celdas, talleres.

Alcance #2: Mantenimiento baterías sanitarias en la parte interna áreas comunes.

Alcance #3: Instalación campana extractora en el rancho.

Actividades desarrolladas:

El frente de EPMSC Guateque finalizó su ejecución contractual el 3 de junio de 2026 con un presupuesto total invertido de $110.342.163, logrando la modernización integral de su infraestructura y el cumplimiento del objeto del contrato. El 17 de junio de 2026 se formalizó el recibo definitivo de las obras mediante la firma de las Actas de Corte Final en una mesa técnica conformada por el contratista (Consorcio Mantenimientos GMC), la dirección del ERON (INPEC) y el profesional de apoyo a la supervisión (USPEC). El cierre exitoso del frente consolidó la entrega

a entera satisfacción del Alcance No. 1, el cual estabilizó el sistema eléctrico interno mediante el tendido de 263.71 m de tubería EMT, redes trenzadas de seguridad, dos tableros trifásicos nuevos y renovación de iluminación con reflectores exteriores y lámparas herméticas LED; y del Alcance No. 2, que resolvió los problemas de salubridad y filtraciones en las baterías sanitarias comunes tras intervenir 42.2 m² de cubierta con teja arquitectónica, reconstruir pañetes y pisos asépticos con 55.65 m² de enchape cerámico y pintura epóxica, e instalar nuevos aparatos hidrosanitarios de alta eficiencia, dejando una línea base completamente renovada y operativa bajo los estándares técnicos de la USPEC.

Registro fotográfico

No se presenta registro fotográfico para periodo, 100% Finalizado

ESTABLECIMIENTOS REGIONAL OCCIDENTE

EPAMS CAS JP PALMIRA

Alcances a ejecutar:

ALCANCE No.2: Tutela 2021-00019 - Hallazgo contraloría 13 de 2023-1 Iniciación de reparación filtraciones de aguas lluvias EPMSC Palmira – Valle del Cauca, y red hidrosanitaria obsoleta. Celdas patio 2 piso2 pasillo A (filtraciones de agua lluvia por techo de pabellón), Celdas Patio 1 Piso 2 pasillo D Piso 1 (filtraciones por deterioro de canales y tejas), Patio 3 piso 2 pasillo D(filtración en techos y paredes por fallas en las tejas)

ALCANCE No 4: Tutela 2023-00092- 01-107423 Iniciación del cumplimiento de lo ordenado en el fallo de la tutela, con el mantenimiento de garitas, red eléctrica e iluminación, marcos, puertas y ventanas, vidrios, paredes, baños y adecuación acceso a las mismas. (Requerimiento procuraduría).

Programación: Inicio 24 de junio de 2025 Final: 15 de mayo de 2026

Recurso asignado: $ 1,979,965,945.00

Actividades ejecutadas en el periodo del informe.

Se continúan actividades de fabricación y montaje de estructura metálica para cubierta de patio de sol.
.
Excavaciones y adecuación de terreno

Ejecución de excavaciones perimetrales en terreno natural para conformación de zanjas destinadas al tendido de redes hidráulicas de agua potable. (570 ml)
Adecuación y preparación de áreas intervenidas para instalación de tuberías subterráneas.

Se continuaron actividades de instalación de la última columna en perfiles tubulares estructurales (PTE) y la construcción en sitio de la tercera cercha metálicas a dos aguas, tipo perfil en C (PHR), sobre las cuales se dispone un sistema de cubierta liviana con lámina tipo trapezoidal.

Registro fotográfico



Estructura metálica de cubierta

EPAMS ERE CALI.

ALCANCE NO. 1: Mantenimiento Infraestructura Física Alojamientos de Guardias, Concertina e Iluminación Perimetral.

ALCANCE NO. 2: Mantenimiento General patios del 1 al 9.

ALCANCE NO. 3: Mantenimiento y/o Adecuación de Garitas, Mantenimiento a Escaleras.
ALCANCE NO. 4: Mantenimiento a Infraestructura Rancho y Mantenimiento Baterías Sanitarias y Redes Hidrosanitarias.

Programación: Inicio 25de junio de 2025 Final: 15 de mayo de 2026

Recurso asignado: $ 1,979,965,945.00

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se continúan actividades de Mantenimiento Infraestructura Física alojamientos de guardias masculinos, Pañete liso común 1:3 e.=4 cm. Incluye filos y dilataciones, se realizan actividades de montaje para estructura metálica

Registro fotográfico



Trabajos de instalación de cubierta, pañetes interiores y fundida de placa andenes en alojamientos masculinos.

TUMACO

Alcances a ejecutar:

ALCANCE No.1: Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física de los establecimientos penitenciarios a cargo del inpec" el cual tiene como alcance: mejoramiento redes sanitarias y pluviales de todo el establecimiento etapa 2 (pabellón 2, 3, 4, 5 y 6 y zona administrativa 2).

Programación: Inicio 24 de septiembre de 2025 Final: 15 de mayo de 2026.

Recurso asignado: $ 475.347.312.

Se iniciaron actividades de obra civil en el establecimiento el 12 de mayo de 2026.

Se continuaron actividades de intervención de las redes pluvial y sanitaria en el exterior de los pabellones y contigua al cerramiento perimetral del establecimiento. En esta área, el contratista adelantó la construcción de nuevas cajas de inspección, así como la limpieza y mejoramiento de pozos y cajas de inspección existentes. Adicionalmente, se realizó el arreglo de la tubería de desagüe de la batería sanitaria aledaña al acceso del establecimiento. Las labores técnicas reportadas incluyen, entre otras, la excavación manual, la nivelación manual del terreno, la limpieza de cajas de inspección, la instalación de tubería PVCS de 4” y 6”, y la limpieza de pozos de inspección, todas ellas enmarcadas dentro de los ítems técnicos programados para el alcance

adiciona. Es importante resaltar que, durante la semana, las condiciones climáticas fueron variables, con presencia de lluvia y sol en diferentes días. Lo que a afectado la ejecución de las actividades.

Registro fotográfico




Construcción de caja de inspección y cárcamo de desagüe de red Pluvial

EPMSC CARTAGO

Alcances a ejecutar:

ALCANCE No.1: Mantenimiento y/o adecuación de la iluminación perimetral

Programación: Inicio 26 de septiembre de 2025 Final: 12 de marzo de 2026.

Recurso asignado: $ 240,701,830.00


Novedades en el periodo del informe:

Mantenimiento y/o adecuación batería sanitaria puesto de información se interviene 5 alojamientos femeninos de manera integral, y la instalación de sobre cubierta en pasillo.

Mantenimiento y/o adecuación batería sanitaria puesto de información.

Registro fotográfico.



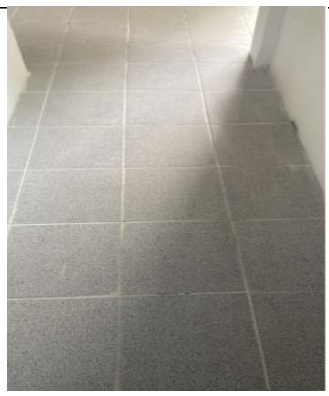

Adecuación de batería sanitaria puesto de información, instalación de cerámica piso

CPMS BUGA.

Alcance No. 1: Mantenimiento y Adecuación de los marcos de las ventanas (carpintería metálica) e instalación de vidrios blindados de acuerdo al diagnóstico estructural para las garitas 1 y 3, puesto de información (mitigación de hostigamiento y ataques terroristas).

ALCANCE No.2: Continuación Mantenimiento preventivo y correctivo, sistema eléctrico de los pabellones 1, 2, 3, 4 y 5 (Mantenimiento preventivo general da la red eléctrica del Establecimiento, área interna y semi externas.).

Alcance No. 3: Continuación de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema Eléctrico
Valor contractual: $ 229.890.446.

Actividades ejecutadas.

Continuación mantenimiento preventivo y correctivo, sistema eléctrico de los pabellones 1, 2, 3, 4 y 5 (Mantenimiento preventivo general da la red eléctrica del Establecimiento, área interna y semi externas.),
Se realizo suministro e instalación de luminaria tipo reflector LED de 200w.

Registro fotográfico.






Instalaciones eléctricas exteriores

EPMSC BUENAVENTURA

Conforme al análisis técnico, al informe de reconocimiento y diagnóstico, y a la revisión detallada del presupuesto objeto del presente informe, se precisa que los recursos contemplados se orientan a la ejecución de obras integrales en cinco (5) alojamientos, en los cuales se intervendrán de manera completa los componentes arquitectónicos, hidrosanitarios, eléctricos y de acabados, con el fin de garantizar condiciones adecuadas de habitabilidad, funcionalidad y seguridad para los funcionarios del CCV.

Presupuesto del establecimiento: $ 243,733,144.00

Programación de actividades:


Fecha de Inicio 15 de septiembre de 2025
Fecha Final: 15 de mayo de 2026.

De conformidad con el seguimiento realizado al Contrato de Obra No. USPEC-CTO-256-2024, se deja constancia de que el atraso presentado en la ejecución de las actividades en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad – EPMSC Buenaventura obedece a factores ajenos a la voluntad y gestión del contratista, los cuales han impactado de manera directa la continuidad de los frentes de obra y el cumplimiento del cronograma inicialmente aprobado.

Actividades ejecutadas en el periodo:

Se finalizan actividades de obras civiles a conformidad en el establecimiento.

Registro fotográfico de actividades ejecutadas.

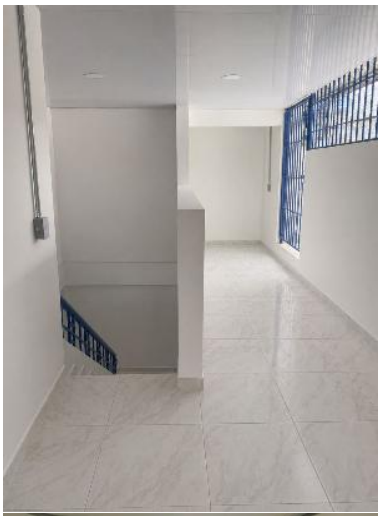





Espacios terminados en el establecimiento de buenaventura.

COJAM JAMUNDI

Alcances a ejecutar:

Alcance contractual No.2: Atención Parcial por bloques Suministro de agua 24/7, acometida hidráulica y puesta en funcionamiento en todos los bloques del establecimiento. Adecuación del sistema de agua, para que el flujo sea constante durante todo el día. Unidad de atención primaria.

Alcance contractual No.3: Mantenimiento general de la iluminación perimetral en Guayanas e iluminación interna en bloques y celdas, incluye cambio de luminarias.

Programación: Inicio 26 de septiembre de 2025 Final: 15 de mayo de 2026.

Recurso asignado: $ 2,299,720,961.00

Actividades ejecutadas en el periodo:

Se continuaron actividades de impermeabilización, reparación de fisuras y tratamiento de filtraciones en diferentes tanques de almacenamiento. Igualmente, se realizó el suministro e instalación de luminarias herméticas LED en los cuartos de máquinas intervenidos.

Se continuaron actividades de retito de tubería de succión tanque 5.

Registro fotográfico





Reparación de bombas, impermeabilización de tanques, instalación de lámparas herméticas

EPMSC BOLIVAR (CAUCA)

Fecha de inicio: 28 de agosto del 2025

Fecha de terminación: 5 de mayo del 2026.

Presupuesto $ 44.957.403,00

Alcances aprobados:

ALCANCE No.1: "Mantenimiento y/o Adecuación Archivo de Gestión Documental de acuerdo con la Ley 594 de 2000 Art. 16, y el Plan de Mejoramiento Archivístico".

Actividades desarrolladas:

Estado Contractual: 100% Finalizado / En etapa de programación para entrega formal.

Para el frente del EPMSC Bolívar (Cauca), la ejecución técnica y económica finalizó con éxito el 5 de mayo de 2026, logrando un cumplimiento del 100% del presupuesto asignado ($44.957.403,00) sin desviaciones ni reclamaciones. Las obras del Alcance No. 1 ("Mantenimiento y/o Adecuación Archivo de Gestión Documental") se encuentran totalmente culminadas y verificadas a satisfacción por la Interventoría, habiéndose ejecutado muros en drywall, acabados de pintura, cambio de pisos y guardaescobas, redes eléctricas, iluminación y la instalación de carpintería metálica (2 puertas y 2 ventanas correderas), cumpliendo estrictamente con la Ley 594 de 2000 y el Plan de Mejoramiento Archivístico. Como novedad administrativa, aunque el pasado 11 de junio de 2026 se intentó formalizar la entrega en modalidad virtual, el establecimiento no aceptó el recibo por esta vía, razón por la cual el comité técnico programó y postergó la diligencia para llevar a cabo el recibo definitivo de manera presencial durante la segunda semana de julio de 2026.

Registro fotográfico

No se presenta registro fotográfico para este periodo, 100% Finalizado en obra, pendiente entrega formal

EPMSC EL BORDO

Fecha de inicio: 4 de septiembre del 2025 (reinicio 30 de abril 2026)

Fecha de terminación: 26 de agosto del 2026.

Presupuesto $ 46.134.443

Alcances aprobados:

ALCANCE No.1: " Cambio de cubierta total del establecimiento, incluye estructura metálica”.

Actividades desarrolladas:

Restricción Crítica por Orden Público: Las actividades programadas para el armado, montaje y acoplamiento de la estructura metálica principal se encuentran suspendidas de forma temporal en terreno. Esta parálisis obedece a las graves restricciones de movilidad, limitaciones de acceso y la

exigencia de permisos especiales de ingreso impuestos de manera ilegal por los grupos armados al margen de la ley que operan en la zona.

Se deja expresa constancia y advertencia formal del riesgo público para el personal, materializado durante la quincena con el asesinato de un ayudante de construcción local del municipio, ajeno al proyecto, pero representa una amenaza a la zona. Esto sucedió como retaliación al presunto desacato de las órdenes emitidas por dichos grupos organizados. Debido a esto, el contratista ejecutó labores mínimas en obra con un único trabajador que cuenta con las condiciones de seguridad y permisos especiales para operar transitoriamente en el sector.

A pesar de las restricciones, el frente registra la culminación técnica y conforme de las siguientes actividades preliminares y de cimentación:

Excavaciones para zapatas y figurado e instalación de acero estructural.

Fundición de zapatas y construcción de pedestales con la debida instalación de platinas de anclaje.

Aplicación de pañete fino, resanes y acabados de pintura en las cuatro (4) columnas de concreto existentes.

Acabados arquitectónicos de las áreas de piso intervenidas mediante la aplicación de material mineral rojo en los sectores afectados por las excavaciones.

Entrega de las áreas de trabajo en condiciones óptimas de orden, aseo y limpieza general.

PLAN DE CONTINGENCIA ADOPTADO

Como medida de mitigación inmediata frente al bloqueo de acceso que impidió el montaje de la estructura en la obra (inicialmente proyectado en el cronograma), la Interventoría ordenó formalmente al contratista activar las siguientes acciones:

Optimización de Labores Extramurales: Trasladar y adelantar al máximo el plan de trabajo fuera del establecimiento penitenciario, concentrando los recursos en las actividades de taller: fabricación de elementos, preensamble, corte, soldadura y alistamiento de materiales. El objetivo es minimizar el tiempo de montaje en sitio una vez se logre el ingreso seguro.

Proyección de Reinicio (Semana 55): Se proyecta el inicio de las maniobras de montaje en terreno a partir del miércoles 1º de julio, supeditado estrictamente a la evolución de las condiciones de orden público, al monitoreo de seguridad y a la gestión del ingreso del personal técnico bajo condiciones que salvaguarden la vida de los trabajadores.

ASPECTOS TÉCNICOS Y AMBIENTALES EVALUADOS

La Interventoría verificó mediante seguimiento continuo en campo que los procesos de excavación, el armado de formaletas de madera y el vaciado de los pedestales se ejecutaron siguiendo los lineamientos de ingeniería y las normas de seguridad industrial establecidas, logrando operar de forma segura dentro de las limitaciones de espacio y sin alterar la rutina o la seguridad interna del penal.

Durante las demoliciones de pisos y las excavaciones manuales, se constató la aplicación permanente de humectación continua para evitar la dispersión de material particulado. Asimismo, se controló el retiro oportuno de los escombros y residuos de obra hacia los sitios de disposición autorizados, garantizando el cumplimiento de la matriz ambiental del proyecto.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y COMPONENTE HUMANO

Equipo en Obra: Durante el periodo evaluado, la permanencia de personal estuvo restringida a un equipo mínimo de supervisión: un (1) residente de obra por parte del contratista y un (1) residente de interventoría. Se registra la ausencia de personal de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y de cuadrillas de trabajadores debido a la situación de seguridad descrita.

Alerta de Afectación al Cronograma Final: Si bien la mesa técnica fijó el 10 de julio de 2026 como la fecha máxima de entrega final de las obras a la USPEC, la Interventoría advierte de manera formal que las restricciones de fuerza mayor derivadas del orden público actual rompen la viabilidad del cumplimiento de este plazo. El contratista deberá presentar la reprogramación respectiva una vez se estabilice el ingreso, evaluando el impacto real de los días de parálisis sobre la entrega definitiva.

Registro fotográfico

	
Pedestales finalizados con platinas	Acabado de piso en mineral rojo
	
Área de intervención en orden y limpieza	Área de intervención en orden y limpieza



Noticia de asesinato de ayudante de construcción por presunto desacato de restricción de grupos armados.

EPMSC PUERTO TEJADA

Fecha de inicio: 20 de enero del 2026

Fecha de terminación: 20 de abril del 2026.

Presupuesto $45.633.398

Alcances aprobados:

- Alcance contractual No.1: Mantenimiento de baños y duchas Baterías Sanitarias Piso 1
- Alcance contractual No.1: Mantenimiento de baños y duchas Baterías Sanitarias Piso 2

Actividades desarrolladas:

Estado Contractual: 100% Finalizado / En etapa de liquidación y coordinación de entrega definitiva a la USPEC.

El frente de EPMSC Puerto Tejada finalizó con éxito su ejecución técnica y económica el 20 de abril de 2026, logrando un cumplimiento del 100% del presupuesto asignado ($45.633.398) sin reportar saldos en rojo, sobrecostos ni reclamaciones. Las obras de mantenimiento de baños y duchas en las baterías sanitarias del primer y segundo piso del Pabellón Único se encuentran totalmente culminadas y verificadas por la Interventoría, habiéndose ejecutado la adecuación integral de seis

(6) unidades sanitarias y tres (3) duchas mediante la reposición de aparatos hidrosanitarios, revestimientos cerámicos nuevos, recubrimiento de pintura para alta humedad y la optimización de los sistemas de distribución hidráulica y desagües. Como novedad administrativa al corte del presente informe, el frente se encuentra en etapa de liquidación y cierre definitivo, a la espera de que la Supervisión de la USPEC programe la fecha para la visita oficial de recibo formal de las áreas, mientras se gestiona en paralelo el acopio, revisión y radicación del dossier documental y de calidad final por parte del contratista.

Registro fotográfico

No se presenta registro fotográfico para este periodo, 100% Finalizado en obra, pendiente entrega formal

EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO

Fecha de inicio: 11 de noviembre del 2025

Fecha de fin: 15 de Julio 2026.

Presupuesto $ 171.637.436

Alcances aprobados en diagnóstico:

- Instalaciones eléctricas del área de alojamiento de guardia
- Mantenimiento del área de sanidad. .

Actividades desarrolladas:

Estado Contractual: SUSPENDIDO. Sin actividades operativas en el periodo.

El frente de EPMSC Santander de Quilichao se mantiene formalmente suspendido y sin actividad operativa debido a que el nuevo alcance ordenado por la USPEC, enfocado en el mejoramiento integral de la cubierta, desborda técnica y presupuestalmente la intervención inicial que estaba limitada al muro de Sanidad. Un diagnóstico de campo realizado por la Interventoría determinó que la reanudación está supeditada a complejas obras civiles que incluyen la sustitución total de 31.50 metros de un canal de aguas lluvias insuficiente (11x10 cm), el desmontaje completo de la cubierta del Rancho para reparar pañetes deteriorados y desprendimientos en los muros de las culatas que impiden sellar los flanches, la adición de una nueva bajante en el Patio 5 y la corrección de humedades críticas por capilaridad en Farmacia y pasillos. Aunque antes de la suspensión se lograron finalizar los estucos y la primera mano de pintura epóxica en áreas clave de Sanidad (Odontología, Bodega de Medicamentos, Procedimientos, Consultorio y baños) junto con los

levantamientos de las celdas de aislamiento, la Interventoría deja constancia de que el contratista aún no ha entregado el levantamiento actualizado ni el balance ajustado de cantidades de obra, razón por la cual el plan de contingencia y la reprogramación del frente solo podrán estructurarse una vez se defina el presupuesto remanente final, se aprueben los precios unitarios de los ítems no previstos y se firme el acta de reinicio de las obligaciones contractuales.

Registro fotográfico

No existe registro fotográfico por inactividad en el periodo evaluado.

EPMSC SILVIA

Fecha de inicio: 4 de septiembre del 2025

Fecha de terminación: 22 de diciembre 2025.

Presupuesto $ 44.330.231

Alcances aprobados en diagnóstico:

ALCANCE No.1: "Mantenimiento y reparación a toda el área administrativa del ERON, incluye cambio de pisos, luminarias y baños".

Actividades desarrolladas:

Estado: 100% Finalizado físicamente / Pendiente cierre documental.

El frente de EPMSC Silvia finalizó su ejecución física al 100% el 22 de diciembre de 2025, tras una inversión de $44.330.231 destinada a la renovación integral del área administrativa, incluyendo el cambio de pisos, sistemas de iluminación y baterías sanitarias, obras que ya se encuentran bajo la puesta en funcionamiento y uso efectivo por parte del INPEC. Actualmente, el proyecto se mantiene en etapa de post-cierre administrativo, con la firma del acta final de liquidación ante la sede central de la USPEC temporalmente suspendida debido a las graves alteraciones de orden público y restricciones de movilidad que afectan al departamento del Cauca, situación de fuerza mayor que, a la fecha, impide el desplazamiento físico del contratista para formalizar la protocolización documental de cierre ante la entidad.

EPMSC RM POPAYÁN

Fecha de inicio: 5 de septiembre del 2025

Fecha de terminación: 22 de diciembre del 2025.

Presupuesto $ 69.572.532

Alcances aprobados en diagnóstico:

ALCANCE NO. 2 – “Mantenimiento y/o adecuación de escaleras de alojamiento femenino (actualmente no cumplen normas)”.

ALCANCE NO. 3 – “Mantenimiento y Adecuación Archivo de Gestión”.

Actividades desarrolladas:

El frente de EPMSC RM Popayán culminó con éxito su ejecución civil el 22 de diciembre de 2025 tras una inversión de $69.572.532, logrando la modernización del Archivo de Gestión y la adecuación bajo estándares normativos de las escaleras del alojamiento femenino, obras que fueron recibidas a conformidad mediante entrega técnica ante la USPEC el pasado 20 de mayo de 2026 una vez subsanadas las observaciones de acabados y filtraciones. Al corte del presente informe, el frente se encuentra en etapa de liquidación y cierre documental definitivo, compartiendo la misma condición de fuerza mayor que el frente de Silvia, toda vez que las complejas alteraciones de orden público y las restricciones de seguridad vial en el departamento del Cauca mantienen bloqueada la tramitación, firma y radicación del dossier final con sus respectivos planos récord, procesos administrativos que serán reactivados formalmente una vez la región brinde plenas garantías de movilidad.

EPAMS CAS ERE POPAYÁN

Presupuesto $ 1.397.671.798

Alcances aprobados en diagnóstico:

Alcance NO. 1 – “Tutela 2023-000195 construcción de las cubiertas de los pabellones 11,12,13 (se construye pabellón 11, porque el muro perimetral no tiene la resistencia para la cubierta en pabellones 12,13, por seguridad no es pertinente)”.

Alcance NO. 2 – “Intervención patio de visita familiar de mediana seguridad: instalación de sobre cubierta donde se requiere, construcción de mesas y sillas en concreto”.

Nuevo alcance No.1: “Intervención área visita intima: construcción de sobre cubierta de las dos alas”.

Nuevo alcance No. 2: “Adecuación y mantenimiento del pabellón 12”.

Nuevo alcance No.4: “adecuación y mantenimiento de celda UTE”.

Actividades desarrolladas:

Gestión contractual y modificaciones de alcance (mesa técnica)

En atención a la mesa de trabajo de seguimiento y definición adelantada el 25 de junio de 2026, denominada *"Seguimiento y definición CPAMSPY CTO-256-2024"*, la Interventoría solicitó formalmente a la USPEC los documentos y soportes que validen administrativamente el cambio de alcance concertado bajo las siguientes conclusiones:

Exclusión del Rancho: Se determinó descartar el mantenimiento integral del Rancho del establecimiento. Esta actividad no se encuentra incluida dentro de los contratos de mantenimiento asignados para el año 2025 (retirada previamente del Contrato 331 por falta de recursos) y su costo estimado de quince millones de pesos ($15.000.000) supera el valor total disponible del Contrato 256 asignado al ERON.

Inclusión y Priorización del Área Educativa de Mediana Seguridad: Con el respaldo del establecimiento, se aprobó trasladar los recursos hacia este frente para ejecutar: limpieza y mantenimiento de cerchas, instalación de sobrecubierta, cambio de canales, bajantes y caballetes, reparación de pañetes internos y adecuación del salón de profesores. Se aclara que esta intervención excluye pisos (en buen estado) y baterías sanitarias (a cargo de otro contratista).

ALCANCE: Adecuación y Mantenimiento del Pabellón 12 y Celda UTE

Actividades Ejecutadas en el Periodo: Se avanzó de forma conforme en la batería sanitaria del piso 4 del Pabellón 12 con la aplicación de pañete liso impermeabilizado integralmente proporción 1:3 y espesor de 2 cm (Ítem 13.1.14), incluyendo la definición de filos y dilataciones según el diseño técnico.

Ítems Ejecutados Pendientes de Legalización: En este mismo bloque ya se culminaron las labores de demolición manual de alistados de piso y acabados livianos cerámicos (Ítem 1.3.5.5), la demolición manual de enchapes en muros donde el soporte no sufrió demolición (Ítem 1.3.8.6), y la demolición de pisos en los pasillos/corredores.

Alertas Administrativas del Alcance: Aunque las demoliciones y adecuaciones físicas ya se ejecutaron en campo para abrirle paso a los nuevos revestimientos, no han podido ser reportadas ni pagadas debido a que son ítems faltantes en el presupuesto actual. El contratista debe incluir de forma urgente estos códigos, junto con los puntos hidráulicos y sanitarios de 3", en el balance general de obra.

ALCANCE: Cubiertas de Pabellones, Patio de Visita Familiar y Sobrecubierta de Visita Íntima

Estado Actual: Sin actividades operativas reportadas durante la semana No. 54.

Condicionante Contractual: El desarrollo de estos frentes se encuentra ligado a la estabilización financiera y a las definiciones del balance general que el contratista debe presentar.

Registro fotográfico

	
Revoque de muros – Batería sanitaria piso 04 pabellón 12.	Revoque de muros – Batería sanitaria piso 04 pabellón 12.

	
Revoque de muros – Batería sanitaria piso 04 pabellón 12.	Revoque de muros – Batería sanitaria piso 04 pabellón 12.

	
Revoque de muros – Batería sanitaria piso 04 pabellón 12.	Demolición de enchapes de muro y recubrimiento de Escombro por desalojar en sanitaria piso 04 pabellón 12

	
Demolición de enchapes en muros – Batería sanitaria piso 04 pabellón 12.	Demolición de enchapes en muros – Batería sanitaria piso 04 pabellón 12.

EPMSC RM PASTO

Fecha de inicio: 1 de septiembre del 2025

Fecha de terminación: 15 de julio del 2026.

Presupuesto $ 361.450.189

Alcances aprobados en diagnóstico:

Alcance No. 1 – Tutela 267 de 2022: Construcción centro de acopio de residuos sólidos

Alcance No. 2 – Tutela 2022-00060: Adecuación y mantenimiento de baterías sanitarias

Actividades desarrolladas:

ALCANCE No. 1: Tutela 267 de 2022 – Construcción Centro de Acopio de Residuos Sólidos (Shut de Basuras)

Actividades Ejecutadas en el Periodo: Se avanzó conforme a las especificaciones técnicas en labores de acabados dentro de la estructura del Shut, ejecutando la aplicación de pañete liso común en proporción 1:3 con espesor de 2 cm (Ítem 13.1.5) sobre vigas aéreas y pocetas, incluyendo la definición de filos y dilataciones según diseño.

Modificación Técnica y Requerimiento de Obra: Durante la visita de campo del 24 de junio de 2026 (con asistencia del Director del ERON, contratista e Interventoría), la dirección del establecimiento solicitó formalmente una modificación interna para independizar un espacio seguro destinado a residuos aprovechables (cartón y plásticos). La Interventoría otorgó viabilidad técnica a la solicitud, lo cual requerirá la construcción de una división en muro de ladrillo tolete macizo común (Ítem 5.2.5), revestimiento en enchape cerámico e instalación de una puerta metálica de seguridad.

Condicionante Presupuestal: Aunque la modificación ya fue formalizada mediante acta de visita con el INPEC, su ejecución física queda estrictamente supeditada a que el contratista presente el balance de obra y verifique la suficiencia de recursos dentro del presupuesto del frente.


ALCANCE No. 2: Tutela 2022-00060 – Adecuación de Baterías Sanitarias Comunitarias y Celdas

Estado Actual: Sin actividades operativas durante el periodo evaluado.

Este alcance se encuentra congelado temporalmente a la espera del balance financiero definitivo del Alcance No. 1. Si tras consolidar las cantidades finales y la modificación del Shut de basuras se determina la existencia de un presupuesto remanente (sobrante), estos recursos se indexarán para continuar con el mantenimiento general de las baterías sanitarias en los pasillos de los patios 1, 2, 3, 4, 5 y 6.

Plan de Contingencia Urgente (Alerta por Atraso): Ante el panorama de la fecha de terminación del 15 de julio de 2026 y una desviación negativa aproximadamente del -12.10%, la Interventoría exige formalmente al contratista implementar de manera inmediata un plan de contingencia que incluya la inyección de mano de obra (cuadrillas adicionales) y la extensión de jornadas laborales. Asimismo, es obligatorio que el constructor radique a la mayor brevedad el balance general de obra con el cronograma actualizado para legalizar las nuevas cantidades del Shut y definir la viabilidad del alcance de las baterías sanitarias antes del vencimiento del término contractual.

Registro Fotográfico

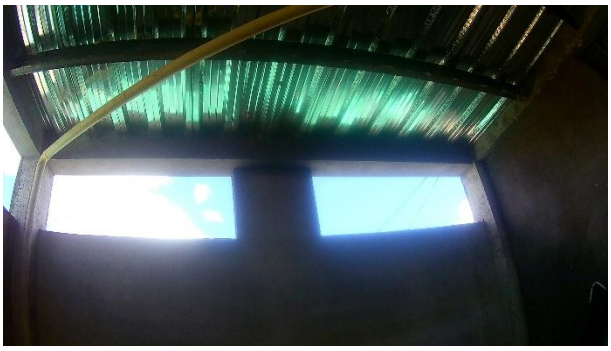	
Pañete liso común 1:3 en vigas aéreas - Alcance Shut de basuras.	Pañete liso común 1:3 en vigas aéreas - Alcance Shut de basuras.

	
Pañete liso común 1:3 en vigas aéreas - Alcance Shut de basuras.	Pañete liso común 1:3 en vigas aéreas - Alcance Shut de basuras.

	
Pañete liso común 1:3 en vigas aéreas - Alcance Shut de basuras.	Pañete liso común 1:3 en vigas aéreas - Alcance Shut de basuras.

	
Pañete liso común 1:3 en pocetas - Alcance Shut de basuras.	Pañete liso común 1:3 en pocetas - Alcance Shut de basuras.

	
Revisión de obra con personal encargado del establecimiento.	

EPMSC IPIALES

Fecha de inicio: 25 de junio del 2025

Fecha de terminación: 30 de enero del 2026.

Presupuesto $ 319 790 814.00

Alcances aprobados en diagnóstico:

ALCANCE NO.2: Mantenimiento de redes hidrosanitarias y duchas pabellones 1 y 3 estructura 1.

ALCANCE N°.3: Impermeabilización techo pabellones 1,2,3,4 y estructura 1.

Actividades desarrolladas.

Estado: 100% Finalizado físicamente / En trámite de liquidación.

El frente de EPMSC Ipiales, ejecutado con un presupuesto total de $319.790.814, se encuentra al 100% finalizado físicamente y en trámite de liquidación tras haber culminado de forma absoluta sus obligaciones contractuales el 30 de enero de 2026. Las obras civiles correspondientes al Alcance No. 2 (Mantenimiento de redes hidrosanitarias y duchas en los pabellones 1 y 3 de la Estructura 1) y al Alcance No. 3 (Impermeabilización total de las cubiertas y protección contra filtraciones en los pabellones 1, 2, 3, 4 y Estructura 1) se encuentran plenamente operativas, funcionales y desocupadas de actividades constructivas. El hito definitivo de cierre técnico y legal de este establecimiento se consolidó formalmente el pasado 15 de abril de 2026 mediante la suscripción del Acta de Recibo a Satisfacción y Entrega de Espacios por las partes institucionales, liberando por completo al contratista de la ejecución física y avanzando hacia el cierre administrativo definitivo del frente.

EPMSC LA UNIÓN (2.10)

Fecha de inicio: 26 de junio del 2025

Fecha de terminación: 3 de diciembre del 2025.

Presupuesto $ 39 143 002.00

•Alcances aprobados en diagnóstico:

ALCANCE No. 2: Mantenimiento y/o Adecuación Archivo de Gestión Documental de acuerdo con la Ley 594 de 2000 Art. 16, y el Plan de Mejoramiento Archivístico

ALCANCE No. 3: Mantenimiento y/o adecuación de la Guardia Externa y Armerillo.

Actividades desarrolladas.

Estado: 100% Finalizado físicamente / En trámite de liquidación.

El frente de EPMSC La Unión mantiene consolidado su cierre técnico al 100% desde la finalización de actividades el 3 de diciembre de 2025, operando bajo un presupuesto ejecutado de $39.143.002,00. Las obras civiles del Alcance No. 2 (Adecuación del Archivo de Gestión

Documental bajo los estándares de la Ley 594 de 2000) y del Alcance No. 3 (Mantenimiento de la Guardia Externa y Armerillo) se encuentran completamente estables, funcionales y en uso operativo por parte del INPEC tras la entrega técnica efectuada en abril de 2026. Al no registrarse novedades ni intervenciones en campo por cumplimiento absoluto de los ítems, la gestión de la Interventoría durante este periodo se concentró exclusivamente en el aseguramiento de la calidad y la auditoría del dossier documental; esto incluye la revisión final, validación rigurosa de los planos récord y los manuales técnicos de operación recopilados por el contratista, insumos indispensables que se dejan listos y organizados para dar paso a la firma del acta de liquidación definitiva del establecimiento.

EPMSC TUQUERRES

Fecha de inicio: 18 de septiembre del 2025

Fecha de terminación: 9 de diciembre del 2025.

Presupuesto: $40.621.671

Alcance aprobado

ALCANCE No.1: Mantenimiento y/o adecuación del área de sanidad y zona odontológica

Actividades desarrolladas.

Estado: 100% Finalizado físicamente / En trámite de liquidación.

El establecimiento de EPMSC Túquerres se reporta sin novedades constructivas y plenamente estabilizado al 100% de su ejecución física, habiendo cumplido el plazo contractual al 9 de diciembre de 2025 con una inversión total de $40.621.671. Las obras civiles del Alcance No. 1 (Mantenimiento y adecuación del área de sanidad y zona odontológica) fueron recibidas formalmente por el INPEC el pasado 15 de abril de 2026 —hito consolidado de manera previa a la orden de suspensión general de la Regional Occidente—, por lo cual los espacios médicos se encuentran prestando servicio continuo a la población carcelaria. Con el frente totalmente desocupado de mano de obra, los esfuerzos de la Interventoría durante este periodo se enfocaron en el blindaje jurídico y el control administrativo del proyecto, registrando un avance estricto en la auditoría del expediente final mediante la validación y acopio de los planos récord, memorias de cálculo y certificados de conformidad técnica de los insumos instalados, requisitos esenciales para dar trámite a la firma de la liquidación definitiva.

EPMSC TULUÁ

Fecha de inicio: 16 de junio del 2026

Fecha de terminación: 28 de agosto 2026.

Presupuesto: $404.282.136

Alcance aprobado

Reparación y Adecuación de las Garitas No. 1 y No. 6

Actividades ejecutadas:

Las actividades se concentraron en el desmonte, demolición y renovación estructural e hidrosanitaria de ambas estructuras, con un frente de trabajo más avanzado en la Garita No. 6:

Preliminares, Desmontes y Demoliciones (Garitas 1 y 6):

Desmonte manual de carpintería metálica (marcos, divisiones y vidrios de ventanas — Ítem 1.3.3.3).

Retiro de aparatos sanitarios (Ítem 1.3.6.22), griferías tipo push (Ítem 1.3.6.24) y luminarias existentes (Ítem 1.3.6.34).

Raspado general de pintura en muros (Ítem 1.3.8.3) y cielorrasos (Ítem 1.3.7.1).

Demolición manual del alistado de piso antiguo (Ítem 1.3.5.8), junto con el desmonte y taponado de las redes hidráulicas (Ítem 1.3.6.5) y sanitarias (Ítem 1.3.6.6) obsoletas.

Redes Hidrosanitarias (Garita 6):

Instalación de nuevos puntos de agua fría para lavamanos (Ítem 8.1.6.1) y sanitario (Ítem 8.1.6.4).

Montaje de tubería PVCS de 4" en alturas (Ítem 8.1.8.6) y configuración de nuevos puntos sanitarios de 2" (Ítem 8.1.9.1) y 4" (Ítem 8.1.9.4).

Acabados y Obra Civil (Garitas 1 y 6):

Aplicación de pañete liso e impermeabilizado en muros internos y externos (Ítems 13.1.17 y 13.1.18).

Vaciado de mortero para el nuevo alistado de pisos (Ítem 14.1.4).

Preparación de superficies con estuco acrílico en muros y cielorrasos (Ítems 21.1.1, 21.1.2, 21.2.1).

Inicio de los trabajos para el cerramiento del corredor interior a una altura de 3.00 metros (Ítem 23.3.4.39).

Nota de Cambio de Alcance: Recordar que este Alcance No. 1 originalmente incluía la Oficina de Atención al Ciudadano y el muro perimetral. La concentración de recursos exclusivamente en las garitas responde a la solicitud formal de la entidad mediante el oficio No. 233-CPMSTUL-DIR-PLC, motivada por razones de orden público en el municipio.

Vidrios de Seguridad: El especialista del contratista ya visitó el sitio para evaluar calibres y espesores. El contratista tiene pendiente remitir las fichas técnicas definitivas para la revisión y aprobación por parte de esta interventoría.

Balance de Cantidades: Se solicitó al contratista una revisión integral del presupuesto, ya que se identificó que algunas intervenciones ejecutadas en campo difieren sutilmente de las cantidades contractuales iniciales.

Gestión Ambiental: Sigue pendiente la entrega formal de las Licencias de las Escombreras autorizadas para la disposición final de los RCD (Residuos de Construcción y Demolición), requisito indispensable bajo la *Resolución 472 de 2017* y el *Manual de Interventoría V09*.

Registro Fotográfico

	
Garita No.6 ITEM: 1.3.3.3Desmonte manual de marco divisiones	Garita No.6 ITEM: 1.3.8.3 Raspado de pintura

 Garita No.6 ITEM: 1.3.7.1Raspado de pintura existente	 Garita No.6 ITEM: 1.3.5.8 Demolición manual de alistado de piso
 Garita No.6 ITEM: 1.3.6.5 Demolición manual y retiro de puntos hidráulicos existentes de 1/2" a 1,1/2"	 Garita No.6 ITEM: 1.3.6.6 Demolición manual y retiro de puntos sanitarios existentes de 2" a 4"
 Garita No.6 ITEM: 21.1.2Estuco acrílico	 Garita No.6 ITEM: 21.1.2Estuco acrílico

- **EPMSC CAICEDONIA**

Fecha de inicio: 22 de septiembre del 2025

Fecha de terminación: 11 de diciembre del 2025

- Presupuesto

$ 39.136.555

- Alcances aprobados:

ALCANCE No.1: Mantenimiento y/o adecuación de pisos y paredes de patios de PPL y pabellón en general. (Patio 8 de Pabellón Ala A)

Actividades desarrolladas.

Estado: RECHAZADO POR CALIDAD / Sin viabilidad de cierre

El frente de EPMSC Caicedonia, que cuenta con un presupuesto de $39.136.555 y cuya fecha de terminación contractual fue el 11 de diciembre de 2025, se mantiene bajo un estado técnico de PENDIENTES POR CALIDAD, congelando de forma absoluta cualquier viabilidad de cierre administrativo o liquidación. Las áreas intervenidas bajo el Alcance No. 1 (Mantenimiento y/o adecuación de pisos y paredes en el Patio 8 del Pabellón Ala A) continúan registrando graves patologías constructivas y defectos críticos de mano de obra evidenciados desde el 29 de abril de 2026, tales como humedades severas, desprendimiento generalizado de las capas de pintura y fallas estructurales en las pendientes de lavaderos y patios que impiden el drenaje. Ante la reincidencia y la falta de gestión del Consorcio Mantenimientos GMC para organizar los pendientes, la Interventoría ratifica que el reconocimiento económico del ítem de piso epóxico se encuentra completamente suspendido bajo el amparo del oficio No. USPEC-BETAREGIONALES-2452; asimismo, se deja constancia de que al corte de este informe el contratista no ha radicado el cronograma obligatorio de reparaciones ni las actividades de post-venta exigidas, por lo cual se mantiene el bloqueo de cualquier trámite de recibo definitivo hasta que se subsanen a entera satisfacción las deficiencias técnicas que comprometen la salubridad y habitabilidad del ERON.

EPMSC SEVILLA

Fecha de inicio: 14 de agosto del 2025

Fecha de terminación: 11 de diciembre del 2025.

- Presupuesto

$ 48.223.407

- Alcances aprobados:

ALCANCE No.1: Mantenimiento y/o adecuación de cubierta patios 1 y 2

- Actividades desarrolladas.

Estado: 100% Finalizado físicamente / Cierre postergado por orden público.

El frente de EPMSC Sevilla, ejecutado con un presupuesto de $48.223.407 y finalizado contractualmente el 11 de diciembre de 2025, se encuentra al 100% terminado físicamente, con el cierre administrativo postergado debido a las alteraciones de orden público en la región. Las obras civiles del Alcance No. 1 (Mantenimiento y/o adecuación de cubierta en los patios 1 y 2) cuentan con el aval técnico definitivo de la Interventoría al haberse verificado el cumplimiento absoluto de las metas en el sistema de techados. Asimismo, se deja constancia de que los excedentes financieros y saldos remanentes del frente fueron optimizados e invertidos eficientemente en la aplicación de recubrimientos de pintura general para las zonas intervenidas, actividad que también se reporta ejecutada a entera satisfacción, quedando el establecimiento a la espera de condiciones seguras en el entorno para proceder con los trámites legales de liquidación.

ESTABLECIMIENTOS REGIONAL ORIENTE

EPMSC ARAUCA

Alcance Iniciales:

ALCANCE NO. 3: Mantenimiento ÁREA DEL RANCHO (mesones y trampas de grasas) Hecho sobreviniente tema nacional

Alcances a ejecutar:

ALCANCE NO. 3: Mantenimiento ÁREA DEL RANCHO (mesones y trampas de grasas) Hecho sobreviniente tema nacional

Fechas según ultima programación

Inicio: 20 de octubre del 2025

Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 30 de abril del 2026

Recurso asignado: $ 165.275.117,00

Actividades ejecutadas en el periodo:
Se realiza entrega formal del establecimiento

Alistado y pendientado de pisos con mortero impermeabilizado

Acabado de piso en baldosa de grano de mármol vibroprensado 30 × 30 cm

Demolición de alistado y acabados livianos de piso

Demolición de enchapes y acabados livianos en muros

Ejecución de placa de contrapiso en concreto f’c = 3000 PSI

Construcción de dinteles en concreto

Media caña en granito fundido y pulido

Pulida de granito granito fundido y pulido

Suministro e instalación de puerta entamborada en lámina metálica

Acabado de mesón en granito fundido y pulido

Lavaplatos de empotrar con doble poceta

Pintura de cielo raso / techo

Enchape de pared con baldosas cerámicas 30 × 60 cm

Enchape de piso con baldosas cerámicas 55.2 × 55.2 cm

Enchape de pared con baldosas cerámicas 30 × 60 cm

Demolición manual de guarda escoba

Raspado de pintura existente en muros

Placa de contrapiso en concreto

Desmonte manual de puertas

Demolición manual de camarotes en concreto

Construcción de muros en bloque de concreto de 15 cm

Aplicación de pañete liso impermeabilizado

Limpieza de cajas de inspección existentes de redes sanitarias y/o aguas lluvias

Sondeo y limpieza de red sanitaria de 2" a 4" de diámetro

Suministro e instalación de tubería PVCP 1/2" RDE 9 para redes hidrosanitarias

Punto de agua fría para lavaplatos / poceta / vertedero en tubería PVCP 1/2”

Punto de agua fría para lavaderos en tubería PVCP 1/2”

Construcción de muros en bloque hueco de arcilla

REGISTRO FOTOGRÁFICO











EPMSC AGUACHICA

Alcances iniciales:

ALCANCE NO. 3: Mantenimiento ÁREA DEL RANCHO (mesones y trampas de grasas) Hecho sobreviniente tema nacional

Alcances a ejecutar:

Alcance N°7: adecuación del espacio de consumo de alimentos de los funcionarios (cafetería) presenta riesgo para seguridad y salud en el trabajo, techo actual de palma seca.

Fechas según ultima programación


Inicio: 14 de enero del 2026

Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 15 de mayo del 2026

Recurso asignado: $ 182.218.317,68

Actividades ejecutadas en el periodo:
Instalación de lavamanos

Instalación de ventanas de aluminio anodizado color natural

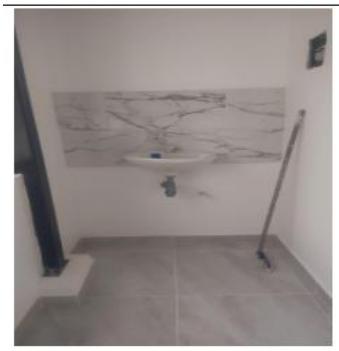

Lavamanos cerámico de sobreponer



Grifería mezclador 8" de sobreponer para lavaplatos cuello de ganso





Ventana Compuesta con perfiles de aluminio anodizado color natural





Ventana Compuesta con perfiles de aluminio anodizado color natural

COCUC CUCUTA

Alcance Inicial:
ALCANCE No.1: Condiciones de funcionamiento En los ranchos de hombres y mujeres Complejo Carcelario de Cúcuta

Alcances a ejecutar:
Alcance N°1: Condiciones de funcionamiento En los ranchos de hombres y mujeres Complejo Carcelario de Cúcuta (PARCIAL - Adecuación rancho de hombres)

Fechas según ultima programación
Inicio: 7 de noviembre del 2025
Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 15 de junio del 2026
Recurso asignado: $683.129.671 y $ 1.295.190.834 Adicional
Actividades ejecutadas en el periodo:

Estuco acrílico, de tipo monocomponente con presentación plástica



Dintel en concreto sobre puertas y ventanas





Corte y demoliciones cara conexiones sanitarias a cajas existentes





EPMSC ERE JP BUCARAMANGA (LA MODELO)

Alcances a ejecutar:

Alcance N°2: Hallazgo 31-2023-1 Mantenimiento Generales (complementación pabellones) ADECUACIÓN DE CELDAS DE LOS PABELLONES 1,2,3,4,6, 9, 7, 5, 2, 8: Cambio de la red hidrosanitaria general, retiro de aparatos sanitarios en mal estado, reposición de aparatos sanitarios en aluminio, construcción de orinales y lavamanos corridos en aluminio anti vandálicos, remodelación general de la batería: cambiando pisos en cerámica y enchape de muros. Celdas: Resanes de pañetes, pintura en general, cambio de puertas metálicas en mal estado, retiro y suministro de barandas sobre el corredor frente a las celdas.

Alcance N°4: Mantenimiento de RED sanitaria en los puntos críticos

Fechas según ultima programación

Inicio: 7 de noviembre del 2025

Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 15 de junio del 2026

Recurso asignado: $ 1.020’415.578,00

Actividades ejecutadas en el periodo:

Puerta con marco para batería sanitaria de acero inoxidable 304 cal.20 baños de visita en piso 3





Lavaplatos de acero inoxidable 304 cal.20 satinado en piso 3



Tabique Mayor (División intermedia) de acero inoxidable 304 cal.20 satinado en piso 3



Taza antivandálica de piso en acero inoxidable, con asiento alongado en piso 3 del pabellón 6



Poceta lavatraperos en piso 3 del pabellón 6



Estado actual de piso 2 del pabellón 6





EPMSC SAN GIL

Alcances Iniciales:

ALCANCE No.1: Mantenimiento y/o adecuación zona de rancho de acuerdo a exigencias autoridades departamentales

Alcances a ejecutar:

ALCANCE No.1: Mantenimiento y/o adecuación zona de rancho de acuerdo a exigencias autoridades departamentales. Se ejecutó el mantenimiento integral de la zona caliente del rancho, realizando la demolición de los enchapes existentes y el reemplazo de la estructura de madera deteriorada en las áreas de preparación de alimentos, baños y lockers. Asimismo, se efectuó el suministro e instalación de cubierta en teja termoacústica, la ampliación del cárcamo, la instalación de enchapes en pisos y paredes, y la aplicación de estuco y pintura epóxica

Fechas según ultima programación

Inicio: 9 de diciembre del 2025

Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 15 de mayo del 2026

Recurso asignado: $ 163.336.492,00

Actividades ejecutadas en el periodo:





ENCHAPE EN BALDOSA CERAMICA PARA PISO en zona caliente





Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada cal. 18

CPMSM BUCARAMANGA (RM)

Alcances iniciales:

Alcance No.1 MANTENIMIENTO RED HIDRÁULICA Y HIDROSANITARIA DE TODO EL ESTABLECIMIENTO: Se hace necesaria del cambio y mantenimiento de toda la red hidráulica e hidrosanitaria de todo el establecimiento ya que esta se encuentra obsoleta y en mal estado por su tubería en gres al igual se hace necesario de que se presentan daños como tubos rotos y debido a esto se presenta mucho desperdicio de agua.

ALCANCE No.2 Mantenimiento general pabellón maternas (Mantenimiento y/o Adecuación área de sala cuna).

Alcances a ejecutar:

Alcance No.1 MANTENIMIENTO RED HIDRÁULICA Y HIDROSANITARIA DE TODO EL ESTABLECIMIENTO: Se hace necesaria del cambio y mantenimiento de toda la red hidráulica e hidrosanitaria de todo el establecimiento ya que esta se encuentra obsoleta y en mal estado por su tubería en gres al igual se hace necesario de que se presentan daños como tubos rotos y debido a esto se presenta mucho desperdicio de agua. Se realizó la intervención integral de los baños de las celdas de los pabellones 1 y 3

ALCANCE No.2 Mantenimiento general pabellón maternas (Mantenimiento y/o Adecuación área de sala cuna). Se realizó la intervención de los baños del Pabellón 2 (Pabellón Maternas) y del baño de la Sala Cuna

Fechas según ultima programación

Inicio: 20 de septiembre del 2025

Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 7 de mayo del 2025

Recurso asignado: $ 139.425.314

Actividades ejecutadas en el periodo:

Se realiza finalización de actividades y entrega a la USPEC

Estuco acrílico, de tipo monocomponente con presentación plástica en celda 2 pabellón 1



Terminación de Duchas en celda 2 pabellón 1



Sanitarios en celda 2 pabellón 1





EPAMS CAS GIRON

Alcances Iniciales:

ALCANCE No. 5 (ADICIONAL) – MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PORTAL 2.

Alcances a ejecutar:

ALCANCE No. 5 (ADICIONAL) – MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PORTAL 2. • Se ejecutaron actividades de mantenimiento mantenimiento y/o reparación en seco de transformadores de 20 kVA, 30 kVA y 112,5 kVA que prestan servicio a las áreas educativas, sanidad, talleres y pabellones 2 y 8. Asimismo, se realiza la verificación de las redes eléctricas, circuitos y acometidas asociadas a la Garita 8, Talleres 1 y 2, área de visitas y Garitas 1, 2 y 3.

De igual manera, se adelantaron labores de inspección y mantenimiento del sistema eléctrico de la subestación del Portal 2, incluyendo la atención provisional de una emergencia eléctrica presentada en el tablero de la subestación. Adicionalmente, se ejecuto el mantenimiento correctivo del tablero de transferencia automática de 440 V, contemplando el transporte del equipo y la respectiva certificación RETIE.

• Se realizó el suministro e instalación de un tablero trifásico de distribución de 36 circuitos en el taller de madera.

Fechas según ultima programación

Inicio: 25 de agosto del 2025

Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 28 de febrero del 2026

Recurso asignado: $ 694.225.319

Actividades ejecutadas en el periodo:

Se realiza entrega formal del establecimiento

EPMSC PAMPLONA

Alcances Iniciales:

ALCANCE No. 2: Reparación de humedades presentes en las celdas de las plantas 1,2,3,4 del pabellón 1, ocasionadas por filtraciones de la red hidrosanitaria de este pabellón de celdas.

ALCANCES EJECUTADOS:
ALCANCE No. 2: Reparación de humedades presentes en las celdas de las plantas 1,2,3,4 del pabellón 1, ocasionadas por filtraciones de la red hidrosanitaria de este pabellón de celdas.

FECHA DE INICIO:
1 de septiembre del 2025

FECHA DE TERMINACION EN EL ERON:
12 de septiembre del 2026

FECHA DE ENTREGA FINAL CON USPEC DEL ERON:
12 de septiembre del 2026

RECURSO ASIGNADO:
$ 229.779.224,00

ACTIVIDADES EJECUTADAS:
Desmonte manual de tejas de asbesto cemento
Suministro, fabricación y montaje de estructura metálica para Cubierta
Instalación teja arquitectónica para cubierta

REGISTRO FOTOGRÁFICO











EPMSC OCAÑA

ALCANCES EJECUTADOS:
Alcance No. 3 Mantenimiento y adecuación Alojamiento de Cuerpo de Custodia y Vigilancia y Auxiliares bachilleres, casino, casa fiscal.

FECHA DE INICIO:
6 de octubre del 2025

FECHA DE TERMINACION EN EL ERON:
23 de diciembre del 2025

FECHA DE ENTREGA FINAL CON USPEC DEL ERON:
7 de mayo del 2026

RECURSO ASIGNADO:
$ 197.754.871

ACTIVIDADES EJECUTADAS:
Desmonte manual de marco divisiones y vidrios de ventanas metálicas

Desmonte manual de marco y hoja de puerta

Desmonte manual de tejas de asbesto cemento

Demolición manual de guarda escobas.

Demolición manual de alistado de piso y material de acabado de tipo liviano

Desmonte manual de aparatos sanitarios de tipo cerámico

Demolición manual de cielo raso en panelería liviana
Raspado de pintura existente en muros
Picada de pañete de muros realizado con herramienta menor
Demolición manual de enchapes y acabados de muros de tipo liviano
Desmonte y/o demolición manual de estructura de soporte de cubierta
Demolición manual de placa de contrapiso
Placa de contrapiso en concreto e.>8,1<=10,0 cm f'c=3000 PSI
Estructura metálica de cubierta
Mesones con superficie en plaqueta de concreto y apoyos en mampostería;
Cielo raso en láminas de PVC e=10mm con acabado liso.
Tubería PVCP 1/2" RDE 9
Suministro e instalación de red eléctrica
Limpieza y mantenimiento de tablero de 24 circuitos existente.
Suministro e instalación de interruptor monopolar tipo enchufable
Suministro e instalación de tomacorriente
Suministro e instalación de tomacorriente tipo GFCI
Salida para interruptor sencillo
Suministro e instalación de luminaria panel redondo LED
Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 18.000
Pañete liso impermeabilizado
Filos y dilataciones con mortero 1:4 (e=2cm)
Alistado de pisos con mortero 1:3 h.=4 cm
Ventana Compuesta con perfiles de aluminio anodizado color natural
Suministro e instalación de carpintería metálica en aluminio anodizado en machimbre para puerta doble hoja.
Lavamanos cerámico
Lavaplatos / vertedero en acero inoxidable 60x40 cm de sobreponer
Sanitario cerámico de tanque
Estuco acrílico, de tipo monocomponente con presentación plástica
Pintura vinilo acrílica plástica lavable Tipo 1, aplicado en tres (3) capas.
Teja arquitectónica o similar Cal. 26
Enchape de pared con baldosas de cerámica

REGISTRO FOTOGRÁFICO













EPMSC MÁLAGA

ALCANCES EJECUTADOS:
Alcance No. 2 Instalación lava traperos y 01 ducha área de sanidad

Alcance No. 5 Adecuación de terraza y zona de lavado.

FECHA DE INICIO:
11 de noviembre del 2025

FECHA DE TERMINACION EN EL ERON:
6 de marzo del 2026

FECHA DE ENTREGA FINAL CON USPEC DEL ERON:


4 de marzo del 2026

RECURSO ASIGNADO:
$ 89.584.616

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Desmonte manual de tejas metálicas termoacústicas
Demolición manual de alistado de piso y material de
Sellado de puntos hidráulicos
Demolición manual y retiro de puntos sanitarios existentes de 2" a 4"
Desmonte manual de aparatos sanitarios de tipo cerámico
Demolición manual de enchapes y acabados de muros de tipo liviano
Demolición manual de lavadero de piso existente en mampostería
Mantenimiento general correctivo de la estructura metálica existente de cubierta
Estructura metálica de cubierta y pasillo técnico
Poceta de aseo medidas 60x60x40 cm (a x L x h) fabricada en bloque de arcilla No.4,
Suministro e instalación de tubería EMT de 1/2".
Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en
Suministro e instalación de interruptor monopolar tipo enchufable de 1x50 A.
Salida para luminaria en tubería EMT.
Salida para interruptor sencillo cableado en 3x12
Suministro e instalación de luminaria panel cuadrado LED de potencia igual o mayor a 40W. 100-240V. 60x60cm.
Pañete liso impermeabilizado integralmente 1:3 e.=2 cm.
Alistado de pisos con mortero impermeabilizado integralmente
Acabado de piso con baldosa de cerámica de 33,8x33,8 cm
Guarda escoba en baldosa de cerámica
Ventana Compuesta con perfiles de aluminio anodizado color natural
Puerta entamborada en lámina figurada CR cal. 18
Juego completo de aparatos sanitarios para baño
Estuco acrílico, de tipo mono componente con presentación plástica
Pintura vinilo acrílica plástica lavable Tipo 1,
Instalación de teja arquitectónica o similar Cal. 26
Enchape de pared con baldosas de cerámica de 30x60 cm
Suministro e instalación de lavadero prefabricado con tanque de almacenamiento de agua, medidas (80 a 90)x60x25 cm (a x L x h

REGISTRO FOTOGRÁFICO

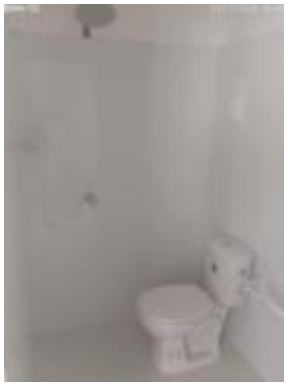









EPMSC SOCORRO

ALCANCES EJECUTADOS:
Alcance No. 1 Mantenimiento (rancho) del ERON, techos y paredes, teniendo en cuenta que presenta filtraciones y humedad, desprendimientos de mampostería; adecuación de espacios físicos como bodegas de almacenamiento y cuarto frio.

FECHA DE INICIO:
30 de septiembre del 2025

FECHA DE TERMINACION EN EL ERON:
10 de octubre del 2025

FECHA DE ENTREGA FINAL CON USPEC DEL ERON:

12 de noviembre del 2025

RECURSO ASIGNADO:
$ 232.295.537

ACTIVIDADES EJECUTADAS:
Desmonte y/o demolición manual de estructura de soporte de cubierta,
Estructura metálica de cubierta
Mortero pendientado alta resistencia
Suministro, transporte e instalación de teja arquitectónica o similar cal. 26
Impermeabilización con poliurea de elongación del 300% al 350%

REGISTRO FOTOGRÁFICO












EPMSC VÉLEZ

ALCANCES EJECUTADOS:
Alcance No. 1: “Mantenimiento y/o adecuación Alojamiento personal de guardia CCV Masculino”

Alcance No. 6: “Garitas, cambio de escaleras, baterías sanitarias, cambio de vidrios, mantenimiento general” en alojamiento de guardia y garitas 2 y 4.

FECHA DE INICIO:
4 de noviembre del 2025

FECHA DE TERMINACION EN EL ERON:
30 de diciembre del 2025

FECHA DE ENTREGA FINAL CON USPEC DEL ERON:
2 de marzo del 2026

RECURSO ASIGNADO:
$ 90.058.922

ACTIVIDADES EJECUTADAS:
Desmonte manual de marco divisiones y vidrios de ventanas metálicas blindadas antibalas
Picada de piso en concreto realizado con herramienta menor
Mortero pendientado alta resistencia
Ventana estructura metálica - corrediza + vidrio blindado CAT 2
Impermeabilización de cubierta con Poliurea

REGISTRO FOTOGRÁFICO








EPMSC BARRANCABERMEJA.

Durante el período evaluado el contratista en compañía de la interventoría hizo presencia en el establecimiento para toma de medidas para organizar balance de obra.

El contratista manifiesta que el problema financiero que se tiene en el contrato ha sido factor determinante para no iniciar las obras, a la fe ha del presente informe no ha entregado a esta interventoría el balance presupuestal de las actividades finales a ejecutar.

ESTABLECIMIENTOS REGIONAL NOROESTE

EPMSC SANTO DOMINGO

ALCANCES EJECUTADOS:
Alcance No. 1: Adecuación de garita

FECHA DE INICIO:
24 de junio de 2025
FECHA DE TERMINACION EN EL ERON:
17 de octubre de 2025

FECHA DE ENTREGA FINAL CON USPEC DEL ERON:
25 de noviembre del 2025
RECURSO ASIGNADO:
$ 94.601.546

ACTIVIDADES EJECUTADAS:
Desmonte manual de marco y hoja de puerta
Demolición manual de alistado de piso y material de acabado
Desmonte manual de luminarias
Demolición manual de pañetes bajo
Picada de pañete de muros realizado con herramienta menor garantizando
Demolición manual de Pañetes
Demolición manual de muros sencillos en mampostería

Demolición manual de placa de contrapiso
Excavación manual en material común
Relleno manual con material seleccionado de sitio.
Placa de contrapiso en concreto
Columnetas y/o Viguetas en concreto f'c=3000 PSI,
Suministro e instalación de tubería IMC de 3/4".
Suministro e instalación de luminaria tipo reflector LED de 400w,
Guardaescoba en baldosa de cerámica
Ventana Fija en lámina CR cal. 12 con mayor desarrollo en su perfilería para uso con vidrio blindado antibalas.
Ventana Malla fabricada con marco en ángulo de acero
Puerta entamborada
Ventana reja con barrotes en varilla de 3/4"
Puerta reja con barrotes en varilla de 3/4"
Suministro e instalación de vidrio multilaminado blindado incoloro antibalas nivel IV
Estuco acrílico, de tipo monocomponente con presentación plástica
Pintura vinilo acrílica plástica lavable Tipo 1, aplicado en tres (3) capas.

REGISTRO FOTOGRÁFICO









EPMSC SANTA ROSA DE OSOS

ALCANCES EJECUTADOS:
Alcance No. 1: mantenimiento áreas de aislamiento (UTE) mantenimiento de los puntos realizando pruebas posteriormente mejorar y reparar las superficies pañetadas, impermeabilizando para luego pintar.

Alcance N°2: Adicional 1: Mantenimiento de alojamientos hasta agotar recurso restante.

FECHA DE INICIO:
24 de junio de 2025

FECHA DE TERMINACION EN EL ERON:
15 de diciembre de 2025

FECHA DE ENTREGA FINAL CON USPEC DEL ERON:
26 de febrero de 2026

RECURSO ASIGNADO:
$ 82.130.251

ACTIVIDADES EJECUTADAS:
Demolición manual del listado de piso D
Demolición manual y retiro de puntos sanitarios existentes
Demolición manual de batería sanitaria
Demolición manual de ducha existente
Rapado de pintura en muros existentes
Demolición manual de luminarias
Demolición manual de pañete
Demolición manual de placa de contrapiso
Excavación manual de material común relleno con material placa de contrapiso
Tubería de alcantarillado
Limpieza de cajas de inspección
Puntos sanitarios
Suministro instalación de lámparas herméticas led
Aplicación de pañete
Alistado de piso
Instalación de lavamanos y sanitarios antivandálico
Aplicación de estuco

Aplicación de pintura

REGISTRO FOTOGRÁFICO











EPMSC YARUMAL

ALCANCES EJECUTADOS:
Alcance No. 3: Mejoramiento iluminación perimetral.

FECHA DE INICIO:
24 de junio de 2025

FECHA DE TERMINACION EN EL ERON:
25 de octubre del 2025

FECHA DE ENTREGA FINAL CON USPEC DEL ERON:
25 de noviembre del 2025

RECURSO ASIGNADO:
$ 130.988.728

ACTIVIDADES EJECUTADAS:
Instalación de reflectores en fachada
Remplazo de tableros eléctricos
Instalación de reflectores en la entrada principal
Instalación de tubería IMC

REGISTRO FOTOGRÁFICO






EPMSC APARTADÓ

ALCANCES EJECUTADOS:
Alcance No. 1: Iluminación perimetral

Alcance N°3: Mantenimiento tanques elevados.

FECHA DE INICIO:
23 de julio de 2025

FECHA DE TERMINACION EN EL ERON:
15 de diciembre de 2025

FECHA DE ENTREGA FINAL CON USPEC DEL ERON:
24 de noviembre del 2025

RECURSO ASIGNADO:
$ 447´964.914.00

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Suministro e instalación de tapa de 72x72cm

Excavación en suelo para instalación de tubería eléctrica,

Suministro e instalación de tubería PVC de 3/4".

Suministro e instalación de caja de paso de 15x15x10 cm con tapa.

Suministro e instalación de red de entrada y salida en cable encauchetado

Suministro e instalación de red eléctrica Monofásica en Cable

Suministro e instalación de luminaria tipo reflector LED de 400w

Suministro e instalación de luminaria tipo urbana (alumbrado público) LED

Desmonte de lámparas de exterior a cualquier tipo de altura,

Suministro e Instalación de fotocelda para control automático.

Pañete liso impermeabilizado integralmente bajo placa 1:4 e.=2 cm

REGISTRO FOTOGRÁFICO









ESTABLECIMIENTOS REGIONAL VIEJO CALDAS

EPMSC FRESNO.

VALOR: $ 83.474.182,00
ALCANCES: ALCANCE No.1: Mantenimiento general de las redes hidrosanitarias
ALCANCE No. 2: Mantenimiento humedad cuarto de Armerillo y comedor CCV.

Actividades ejecutadas.

Durante este periodo las actividades de obra civil en el establecimiento se culminaron a satisfacción en su 100%.

EPMSC MANIZALES

Alcances a ejecutar:

Alcance No.2: Adecuación de Armerillo, es un hallazgo debido a que no cumple con los estándares de contención de gases (PRIORIZADO)
Alcance No.3: Concertina: reforzamiento al alambre de seguridad del perímetro del ERON. (PRIORIZADO)
Alcance No.4: Mantenimiento de las escaleras metálicas o de concreto de Área educativa y tratamiento (PRIORIZADO)

Fechas según ultima programación

Inicio: 4 de julio del 2025

Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 6 de noviembre del 2026

Recurso asignado: $ 312.872.125

Actividades ejecutadas en el periodo:
Se realiza entrega formal del establecimiento

- Desmonte manual de Marco de puertas


- Desmonte manual de baranda metálica
- Demolición y listado de piso
- Desmonte manual de tubería existente
- Desmonte manual de aparato sanitario
- Desmonte manual de luminarias
- Raspado de pintura existente
- Demolición manual de enchape
- Demolición manual de muros en mampostería
- Cielo raso en sistema de drywall
- Sistema de instalación de tubería y emt
- Suministro de red eléctrica
- Instalación de tomacorrientes
- Salidas de luminarias
- Aplicación de pañete
- Alistado de piso en mortero
- Puerta entamborada
- Enchape de pared con baldosa
- Instalación de lavamanos cerámico y Sanitario
- Aplicación de pintura
- Aplicación de estuco
- Instalación de concertina

REGISTRO FOTOGRÁFICO







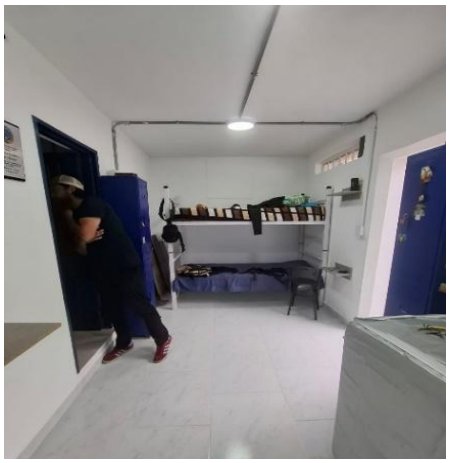

EPMSC ANSERMA

Alcances a ejecutar:

Alcance No.1: Cambio de lámparas reflectores (12 lámparas) en la parte interna.

Alcance No.2: Arreglo de las paredes patio 1, 2 y 3 debido a la humedad.

Fechas según ultima programación

Inicio: 20 de agosto del 2025

Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 31 de octubre del 2025.

Recurso asignado: $ 103.945.445,00

Actividades ejecutadas en el periodo:
Se realiza finalización de actividades

EPMSC PÁCORA

Alcances a ejecutar:

Alcance No.3: Mantenimiento y adecuación archivo de gestión documental de acuerdo con la ley 594 de 2000. Art 16, y el plan de mejoramiento archivístico. $ 84,353,246.00

Fechas según ultima programación

Inicio: 8 de septiembre del 2025.

Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 13 de noviembre del 2025.

Recurso asignado: $ 84,353,246.00.

Actividades ejecutadas en el periodo:
Se realiza finalización de actividades

EPMSC PENSILVANIA

Alcances a ejecutar:

Alcance No.2: Mantenimiento y Adecuación Archivo de Gestión Documental de acuerdo con la Ley 594 de 2000 Art. 16, y el Plan de Mejoramiento Archivístico. $ 83.767.768,00.

Fechas según ultima programación

Inicio: 11 de agosto del 2025

Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 7 de noviembre del 2025

Recurso asignado: $ 83.767.768,00

Actividades ejecutadas en el periodo:
Se realiza finalización de actividades

EPMSC RIOSUCIO

Alcances a ejecutar:

Alcance No.1: Mantenimiento y/o adecuación de alojamiento para masculino Cuerpo de custodia y vigilancia Posesión Municipio. Reubicación taller de maderas. Ampliación zona administrativa. Ampliación patio 1 zona deportiva. Reubicación caniles Mantenimiento y adecuación zona de aislamiento. Mantenimiento y adecuación de esclusa patio 1 y 2. Mantenimiento y/o adecuación patio 3. Mantenimiento y/o adecuación segunda planta. Subalcance No 1 Reubicación taller de maderas los cuales fueron presupuestados en su totalidad arrojando un presupuesto para la intervención de $ 65.478.361

Fechas según ultima programación

Inicio: 21 de agosto del 2025

Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 15 de diciembre del 2025

Recurso asignado: $ 65.478.361,00

Actividades ejecutadas en el periodo:
Se realiza finalización de actividades

EPMSC SALAMINA
Alcances a ejecutar:

Alcance No.1: Mantenimiento y adecuación de la red hidrosanitaria de los dormitorios y patios 1, 2

Fechas según ultima programación

Inicio: 15 de septiembre del 2025

Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 30 de abril del 2026

Recurso asignado: $106,260,117.00
Actividades ejecutadas en el periodo:
Se realiza finalización de actividades

RM MANIZALES

Alcances a ejecutar:

Alcance No.2: Mantenimiento de Cubierta que se encuentra en terraza que es de asbesto cemento y cambio de canales y bajantes que no son suficientes y reflejan humedad en área de tratamiento, biblioteca, en esta área se encuentra un muro próximo a desplomarse

Fechas según ultima programación

Inicio: 14 de octubre del 2025

Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 15 de enero del 2026

Recurso asignado: $ 271.867.490

Actividades ejecutadas en el periodo:
Se realiza finalización de actividades

- Suministro del servicio de acometida hidráulica
- Suministro y fabricación de estructura metálica para cubierta
- Alistado para superficie mortero impermeabilizado
- Impermeabilización de placa de cubierta
- Retiro de cubierta en Eternit
- Retiro e instalación de puerta metálica
- Instalación de teja arquitectónica calibre 26

REGISTRO FOTOGRÁFICO











EPMSC CALARCÁ

Alcances a ejecutar:

Alcance No.1: Mantenimiento redes de alcantarillado e hidrosanitarias del ERON (ACCIÓN POPULAR).

Alcance 2: Mantenimiento y Adecuación Archivo de Gestión Documental de acuerdo a la Ley 594 de 2000 Art. 16, y el Plan de Mejoramiento Archivístico

Fechas según ultima programación

Inicio: 15 de diciembre del 2025
Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 15 de mayo del 2026

Recurso asignado: $ 511.567.488,00

Actividades ejecutadas en el periodo:
Se realiza finalización de actividades

- Desmonte manual de bajantes existentes
- Picada de piso en concreto
- Demolición manual de alistado A
- Acabado retiro de tubería potable y sanitaria
- Desmonte manual de tubería potable
- Desmonte manual de aparatos sanitario
- Desmonte manual de luminarias
- Demolición manual de pañete bajo placa
- Rapado de pintura existente muros
- Demolición manual de enchape
- Demolición manual de muro
- Demolición manual de lavamanos
- Placa de contrapiso en concreto
- Instalación de cielo raso en láminas de PVC
- Instalación de tubería PVC
- Suministro instalación de tablero trifásico de distribución
- Suministro instalación de interruptores y tomacorrientes
- Salidas de luminaria y salidas de interruptores
- Suministro e instalación de lámparas LED
- Suministro instalación de equipo de aire acondicionado mini split
- Aplicación de pañete
- Alistado de piso en mortero
- Acabado de piso en baldosa
- Acabado de piso epóxico

- Impermeabilización en placa de cubierta
- Marcos de puerta instalación de lavamanos y sanitario
- Aplicación de estuco muros
- Aplicación de pintura
- Suministro instalación de cajas estacionarias metálicas para almacenamiento temporal de residuos sólidos

REGISTRO FOTOGRÁFICO









EPMSC ARMENIA

Alcances a ejecutar:

Alcance No.1: Reposición de o mantenimiento de motobombas (Alojamiento y patio No. 1) (PRIORIZADO)
Alcance No.2: Reparación red eléctrica de alumbrado perimetral, aumento de luminarias en sector muro posterior (PRIORIZADO)

Fechas según ultima programación

Inicio: 2 de febrero del 2026

Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 31 de marzo del 2026

Recurso asignado: $ 226.765.868

Actividades ejecutadas en el periodo:
Se realiza finalización de actividades

- Suministro instalación de tubería imc de 3/4
- Suministro instalación de cajas de inspección de 2 * 4
- Suministro instalación de red de entrada y salida de cable enchufado Suministro instalación de red eléctrica monofásica
- Suministro instalación de tubería emt
- Suministro instalación de lámina tipo reflector
- Luminaria tipo reflector LED
- Instalación de Bombas

REGISTRO FOTOGRÁFICO











RM ARMENIA
Alcances a ejecutar:

Alcance No.1: Mantenimiento de baños comunitarios y red hidrosanitaria en patios de las PPL (salón primer piso) (PRIORIZADO)

Alcance 3 Mantenimiento y adecuación por humedades a la bodega de comisos, la cual está siendo afectada por las filtraciones de la tubería de los baños del módulo 7 (PRIORIZADO)

Alcance 4 Mantenimiento de baños comunitarios y red hidrosanitaria en patio de sindicadas. (PRIORIZADO)

Fechas según ultima programación

Inicio: 12 de febrero del 2026

Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 31 de marzo del 2026
Recurso asignado: $ 173.475.794

Actividades ejecutadas en el periodo:
Se realiza finalización de actividades

- Desmonte manual de Marco de hojas de puerta

- Desmonte manual de luminarias
- Desmonte manual de cielo raso existente
- Raspado de pintura existente
- Instalación de cielorraso en láminas PVC
- Suministro instalación de lámparas herméticas
- Suministro e instalación de reflector
- Aplicación de pañete liso común
- Instalación de puerta entamborada en lámina figurada CR calibre 18
- Aplicación de estuco en muros
- Aplicación de pintura epóxica
- Aplicación de esmalte sintético en puerta de acceso a decomiso

REGISTRO FOTOGRÁFICO






EPMSC ERE PEREIRA

Alcances a ejecutar:

Alcance No.3: Realizar impermeabilización en los pasillos y celdas de las PPL. (Requerimiento Secretaría de Salud Pereira) (PRIORIZADO)

Fechas según ultima programación

Inicio: 28-04-2025 se realiza reinicio de actividades el día 15 de octubre del 2025.

Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 22 de enero del 2026.

Recurso asignado: $ 436.214.804

Actividades ejecutadas en el periodo:
Se realiza finalización de actividades

EPMSC SANTA ROSA DE CABAL

Alcances a ejecutar:

Alcance No.2: Hallazgo 34-2023-1. Mantenimiento de la fachada del establecimiento y adecuación del área administrativa y escaleras. (PRIORIZADO)

Fechas según ultima programación

Inicio: 5 de septiembre del 2025

Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 26 de enero del 2026

Recurso asignado: $ 289.925.487

Actividades ejecutadas en el periodo:
Se realiza finalización de actividades

RM PEREIRA

Alcances a ejecutar:

Alcance No.1: Mantenimiento y/o adecuación sala amiga para familias lactantes (PRIORIZADO)
Alcance No. 3 Intervención red eléctrica pabellón 2 (PRIORIZADO)

Fechas según ultima programación

Inicio: 26 de enero del 2026

Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 31 de marzo del 2026

Recurso asignado: $ 217.408.581

Actividades ejecutadas en el periodo:

Se realiza finalización de actividades

EPMSC HONDA

Alcances a ejecutar:

Alcance No.1: Mantenimiento de las redes hidráulicas e hidrosanitarias.

Fechas según ultima programación

Inicio: 13 noviembre del 2025.

Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 18 de octubre del 2025

Recurso asignado: $ 110.400.739,00

Actividades ejecutadas en el periodo:

Se realiza finalización de actividades

EPMSC LÍBANO

Alcances a ejecutar:

Alcance No.3: Nuevo Alcance dentro de las prioridades y necesidades del Establecimiento Penitenciario EPMSC LIBANO, adecuación y construcción de un espacio para archivo, almacén, oficina de comando y batería sanitaria.

Fechas según ultima programación

Inicio: 24 de noviembre del 2025

Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 30 de abril del 2026

Recurso asignado: $ 65.531.152,00

Actividades ejecutadas en el periodo:

Se realiza finalización de actividades

EPMSC PUERTO BOYACÁ

Alcances a ejecutar:

Alcance No.1: Iluminación: arreglo y mantenimiento general de la iluminación perimetral e interna.

Fechas según ultima programación

Inicio: 13 de abril del 2026

Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 7 de julio del 2026


Recurso asignado: $ 110.347.361,00


Actividades ejecutadas en el periodo:

En ejecución, se encuentran realizando instalación de tubería para iluminación perimetral.





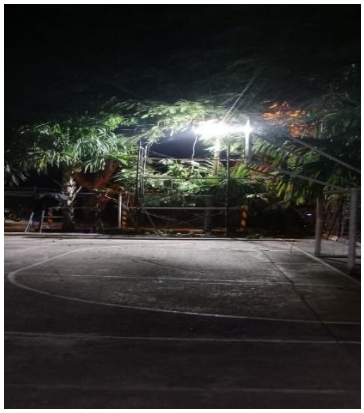

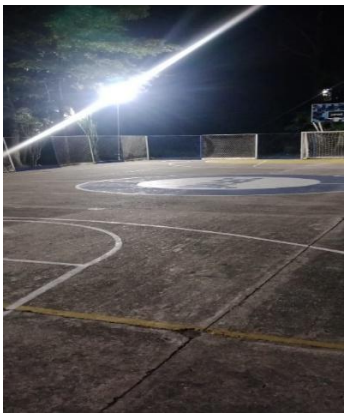

EPAMS PC ERE LA DORADA

Alcances a ejecutar:

Alcance No.1: Acción popular 2014-00389 Mantenimiento área de sanidad (atención médica y odontológica), arreglo griferías, sanitarios, tuberías en celdas visitas conyugales, área administrativa.

Fechas según ultima programación

Inicio: 2 de julio del 2025

Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 15 de mayo del 2026

Recurso asignado: $ 110.347.361,00

Actividades ejecutadas en el periodo:

Sondeo de sifones de ducha





Remplazo de válvulas de bola para inodoros



COIBA IBAGUÉ

Alcances a ejecutar:

Alcance No.1: Mantenimiento de redes hidrosanitarias estructura 2 y 3 a la USPEC (PRIORIZADO)

Alcance No. 2: Adecuación, mantenimiento y reparación rancho de las estructuras 1, 2 y 3 cambio de pisos y pintura epóxica en techos (PRIORIZADO)
Fechas según ultima programación

Inicio: 24 de septiembre del 2025

Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 31 de agosto del 2026

Recurso asignado: **$** 1.457.494.665

Actividades ejecutadas en el periodo:

Resanes en pasillo hacia expendio



Resanes en pasillo hacia expendio



Resanes en zona de lavado de ollas



Resanes en zona de lavado de ollas



Resane muros en zona de marmitas Rancho 2



Resane muros en pasillos hacia lavandería



EPMSC ANDES


Alcances a ejecutar:
Alcance N°2: Mantenimiento y/o adecuación muro cerramiento parqueadero al lado del rancho.
Alcance N°3: Impermeabilización techos y lozas de todo el establecimiento.
Fechas según ultima programación
Inicio: 23 de diciembre de 2025
Final: 31 de agosto de 2026
Recurso asignado: $ 323´441.427.00

Actividades ejecutadas en el periodo:

- Suministro e Instalación de Concertina doble Vuelta.
- Suministro e Instalación de Alistado en Mortero Impermeabilizado en Losas de Cubierta.
- Suministro e Instalación de Media Caña en Mortero 1:3.
- Trasiego de material granular para el suministro de Mortero para Media Cañas.

Registro fotográfico.



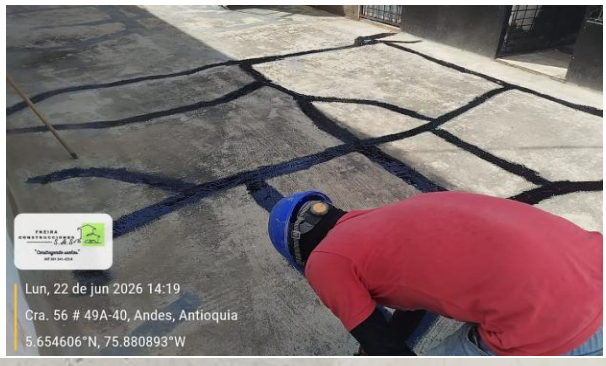



JERICO

Alcances a ejecutar:

Alcance N°1: Verificación del estado de la paredes-techos del establecimiento en general, por

humedades ya identificadas (celda COVID-celdas patio 1.
Fechas según ultima programación
Inicio: 18 de noviembre de 2025
Fecha de terminación: 15 mayo de 2026
Recurso asignado: $ 178´860.711.00.

Actividades ejecutadas en el periodo:

Se culminaron actividades de suministro e instalación de canal en lámina galvanizada cal. 20 Ds.>25,1<=50,0 cm.

Se culminaron actividades de suministro, transporte e instalación de teja arquitectónica o similar Cal. 26.

Se terminan las actividades de obra en el establecimiento.





suministro, transporte e instalación de teja arquitectónica

EPMSC PUERTO BERRÍO

Alcances a ejecutar:

Alcance N°1: Encerramiento con malla de seguridad para el techo de los pabellones 1, 2, 3 y 4 en las áreas comunes de los pabellones

Fechas según ultima programación

Inicio: 26 de enero 2026

Final: 31 de agosto de 2026

Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 15 de mayo de 2026

Recurso asignado: $152´994.514.00

Actividades ejecutadas en el periodo:

- En la actualidad no se realizan actividades de obra, el ejecutor informa que se están realizando actividades en taller para llegar a realizar el montaje en obra.
- Se encuentra pendiente el envío del balance de obra, programación de obra con el ajuste a la fecha del nuevo, plan de contingencia y plan de trabajo, adicionalmente el envío de la

documentación del personal para el reinicio de actividades.

EP PUERTO TRIUNFO - EL PESEBRE

Alcances a ejecutar:

Alcance N°1: Tutela 2021-00014. Insuficiencia de baños. Tutela 2022-00043. Baños patio 6 y 2.
Alcance N°3: ALCANCE NO.3: Mantenimiento Iluminación del ERON
Fechas según ultima programación Inicio: 26 de enero de 2026
Final: 31 de agosto de 2026
Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 31 de agosto de 2026
Recurso asignado: $ 1.205´663.854.00

Actividades ejecutadas en el periodo:

- Se continua intervención de las baterías sanitarias comunales de primer y segundo nivel, incluyendo acabados y redes hidrosanitarias exteriores, adicionalmente se tiene contemplada la intervención hidrosanitaria exterior de todas las baterías sanitarias de las celdas incluyendo la limpieza y sondeo de cajas externas, incluyendo el cambio de aparatos sanitarios de ser necesario, lo anterior corresponde a los pabellones 3, 4 y 5.
- Instalación de enchape en orinales y sanitarios pabellón 3

Registro fotográfico.









Instalación de redes hidrosanitarias exteriores

EPMSC BELLAVISTA MEDELLIN

Fecha Inicio: 14 de agosto de 2025

Fecha de terminación actualizada: 31 de agosto del 2026.

Recurso asignado: $ 1.586´805.392.00

Alcances a ejecutar:

Alcance N°1: Hallazgo 157 de 2023-1 - Condiciones de funcionamiento del rancho, problemas en cuartos fríos, problemas de humedad.

Alcance N°2: Hallazgo 139 de 2023-1 - Zona de sanidad sin lavamanos, para que el medico se lave las manos en cada consulta. visita técnica para verificación.

Alcance N°3: Hallazgo 47 de 2023-1 - Adecuación de galpones. diagnostico ambiental, manejo de aguas residuales no domésticas.

Alcance N°4: Terminación del edificio de locativas, atención primaria.

Actividades ejecutadas en el periodo:

Alcance No. 1: Condiciones de Funcionamiento del Rancho, Problemas en Cuartos Fríos y Humedad

El contratista se encuentra ejecutando los arreglos y correcciones solicitados por la interventoría en las divisiones de acero inoxidable.

Cubierta: Continúan los trabajos de corrección en la cubierta instalada, concentrándose en las actividades pendientes para la colocación del remate definitivo.

Acabados: Se realizó el suministro e instalación de enchape para pared en la Bodega de Sólidos del Rancho.

Alcance No. 2: Adecuación Zona Sanidad

El contratista finalizó el 100% de las actividades de obra que se encontraban programadas contractual para este periodo.
Alcance No. 3: Adecuación de Galpones

Fase de Diseño y Topografía: Las obras físicas no han iniciado formalmente debido a que este componente se encuentra en etapa de diseño. No obstante, se avanzó en el trazado de puntos topográficos en campo para las estructuras de los galpones.

Alcance No. 4: Edificio Locativas

Estado: Sin iniciar. De acuerdo con el cronograma de ejecución vigente, las actividades en este sector están programadas para comenzar el 23 de julio de 2026.

Debido al atraso registrado del -23.05%, la interventoría exige formalmente la presentación e implementación de un Plan de Contingencia detallado por alcances y por capítulos para recuperar la ruta crítica del proyecto.

Se solicita formalmente al contratista realizar y presentar el trazado definitivo del área de construcción de los galpones directamente en el sitio de ejecución.

Conciliación y Balance: Una vez concluida la conciliación de cantidades en campo, el contratista debe presentar de manera inmediata el Balance de Obra Actualizado.
Inclusión de Ítems: Dicho balance debe incorporar formalmente la inclusión de los nuevos ítems necesarios, ajustándose estrictamente a las condiciones técnicas y comerciales actualizadas del proyecto.

REGISTRO FOTOGRAFICO





ALCANCE N°1: - Hallazgo 157 de 2023-1 - Condiciones de funcionamiento del rancho, problemas en cuartos fríos, problemas de humedad.





ALCANCE N°1: - Hallazgo 157 de 2023-1 - Condiciones de funcionamiento del rancho, problemas en cuartos fríos, problemas de humedad.





ALCANCE No3: Hallazgo 47 2023-1 – Adecuación de Galpones Diagnostico Ambiental, Manejo de Aguas Residuales no Domésticas.





ALCANCE No3: Hallazgo 47 2023-1 – Adecuación de Galpones Diagnostico Ambiental, Manejo de Aguas Residuales no Domésticas.

COPED PEDREGAL

Fecha Inicio: 26 de mayo de 2026

Fecha de terminación: 31 de agosto del 2026

Recurso asignado: $ 1.794´711.480.00

Alcances modificados:

ALCANCE ADICIONAL No.4 Impermeabilización de cubiertas pabellón No 16, 17, 18 y unidad de medidas especiales del pabellón de mujeres.

ALCANCE ADICIONAL No 6 impermeabilización de portal No 2 pabellón de mujeres.

ALCANCE ADICIONAL No 7 Cerramiento provisional en costado sur del establecimiento (zona de afectación por deslizamiento)

Actividades ejecutadas en el periodo:

Las actividades del periodo se concentraron firmemente en el capítulo de cubiertas y manejo de materiales en los sectores asignados:

Remociones y Demoliciones: Continuación de los trabajos de retiro del impermeabilizante existente sobre la placa de concreto en las cubiertas del Pabellón 16 y el Portal 2.

Manejo de Materiales: Avance en las labores de trasiego manual de material granular a distancias mayores a las del trasiego ordinario, necesarias para el abastecimiento de los frentes de obra.

Acabados y Aislamientos: Suministro e instalación de alistado en mortero impermeabilizado con dosificación 1:3 en la cubierta del Pabellón 18 (Planta No. 3).

Rendimiento y Personal: Se solicita formalmente al contratista aumentar el personal de obra de manera inmediata, debido a que se evidencia un rezago en el rendimiento de las actividades ejecutadas en comparación con el cronograma programado.

Calidad de Morteros: Se notificó formalmente al residente de obra la obligación de cumplir estrictamente con los espesores de alistado contratados y mantener las dosificaciones de mortero indicadas (1:4) para salvaguardar la calidad y estabilidad de las obras de impermeabilización.

Mantenimiento de Canales: Se exige al contratista realizar el aseo diario de las cunetas, ya que se detectó que se encuentran obstruidas con residuos de material de mortero.

Trabajo en Alturas: Se recomienda e insta al contratista a implementar de forma estricta la señalización preventiva en todos los frentes de obra abiertos, considerando el alto riesgo por actividades en cubiertas.

Uso de EPP: Es obligatorio que el personal de obra permanezca en todo momento con sus Elementos de Protección Personal (EPP) debidamente instalados y certificados.

Componente Presupuestal y Administrativo

Balance de Obra: Esta interventoría (Consorcio Beta Regionales) solicita al contratista la entrega urgente de la actualización del balance de obra, el cual debe incluir la proyección de mayores y menores cantidades, así como la inclusión de nuevos ítems ajustados detalladamente a las necesidades de cada uno de los alcances contractualmente definidos.

Registro fotográfico





ALCANCE No.4_Suministro e Instalación de Alistado en Mortero Impermeabilizado 1:4 para Cubiertas del Pabellón No 18.





ALCANCE No.4_Suministro e Instalación de Alistado en Mortero Impermeabilizado 1:4 para Cubiertas del Pabellón No 18.

ESTABLECIMIENTOS REGIONAL NORTE

EC JP BARRANQUILLA (MODELO)
Alcances Iniciales:

ALCANCE No.1: Hallazgo 3-2022-1 Redes eléctricas CMSBA La Modelo Barranquilla (D) (F). la estructura se encuentra deteriorada por la carencia de calidad y estabilidad en la ejecución y adecuación de la red eléctrica, generando riesgo de nuevo gasto de recursos públicos y riesgo de imposición de acciones legales por las deficientes condiciones laborales.

ALCANCE No.3: Mantenimiento correctivo a cubiertas del patio.

Alcances a ejecutar:

ALCANCE No.1: Adecuación de la red eléctrica, canalización para la Instalación de tubería TDP de 4", Construcción de cajas de inspección eléctricas. Instalación de tubería EMT de 4" entre el patio N. 2 y el patio N. 1, instalación de tableros y perdido de cableado eléctrico.

ALCANCE No.3: Mantenimiento a las cubiertas del pabellón 1 patio N.1 y Pabellón N. 3.

Fechas según ultima programación

Inicio: 31 de octubre del 2025

Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 15 de julio del 2026

Recurso asignado: $ 662. 695. 564

Actividades ejecutadas en el periodo:
Durante el período reportado se realiza instalación de bajantes de aguas lluvias en

Registro Fotográfico.






EPMSC ERE PSM BARRANQUILLA (EL BOSQUE)

Alcances Iniciales:

ALCANCE No.1: Mantenimiento celdas UTE y Celdas primarias

ALCANCE No 3: Mantenimiento y/o adecuación del Rancho

Alcances a ejecutar:

Alcance N°1: Mantenimiento celdas UTE y Celdas primarias

Alcance N°3: Mantenimiento y/o adecuación de celdas (rancheros, íntimas, tercera edad, talleres, comedores, expendios, zonas de reparto de alimentos, áreas deportivas, lavaderos y baños). Observación: Ampliación de las áreas concerniente, en razón a la apertura de los nuevos pabellones modulares, ya que estos no cuentan con asignación para este servicio (PARCIAL)

Fechas según ultima programación

Inicio: 26 de junio del 2025

Fin: 15 de diciembre del 2025

Recurso asignado: $ 368.352.806 y $ 185.000.000 adicional

Actividades ejecutadas en el periodo:
Se realiza entrega formal del establecimiento

Demolición manual y retiro de impermeabilización existente en celdas UTE y rancho

Demolición manual y alistado de piso en celdas UTE.

Demolición y desmonte de aparatos sanitarios antivandálicos existente en celdas UTE.

Raspado de pintura y estuco en muros existentes en ranchos y celdas UTE.

Demolición manual de enchapes en celdas UTE.

Suministro instalación de tubería sanitaria en celdas UTE.

Suministro instalación de red eléctrica para instalación de luminarias en celdas UTE.

Limpieza y mantenimiento de tablero de distribución de circuitos en celdas UTE.

Suministro instalaciones de interruptores en celdas UTE.

Mantenimiento preventivo y correctivo de luminarias LED en rancho.

Resanes sobre superficies en celdas UTE.

Aplicación de pañete en muros en celdas UTE.

Alistado y acabado de piso en celdas UTE.

Suministro instalación de malla para patio de sol en celdas UTE.

Instalación de sanitarios antivandálicos en celdas UTE.

Instalación de duchas en celdas UTE.

Instalación de rejillas de piso en patio de sol y en baños de celdas UTE.

Aplicación de pintura acrílica en celdas UTE y rancho.

Aplicación de estuco en rancho y en celdas UTE.

Impermeabilización con poliuria en cubierta de celdas UTE y rancho.

Suministro instalación de luminarias antivandálicas en celdas UTE.

REGISTRO FOTOGRÁFICO










EPMSC CARTAGENA

Alcances Iniciales:

ALCANCE NO.2: Mantenimiento y/o Adecuación de Archivos y Gestión Documental y Área de Sanidad

ALCANCE No.3: Mantenimiento y/o Adecuación de Garitas, Vidrios de Seguridad, Mantenimiento a Escaleras, Suministro de Aire Acondicionado, Sillas

Alcances a ejecutar:

ALCANCE NO.2: Mantenimiento y/o Adecuación de Archivo.

ALCANCE No.3: Mantenimiento y/o Adecuación de Garitas, Vidrios de Seguridad, Mantenimiento a Escaleras, Suministro de Aire Acondicionado, Garitas 2,3,4,5 y 6.

Fechas según ultima programación

Inicio: 25 de junio del 2025

Fin: 01 de febrero del 2026

Recurso asignado: $ 937.691.354

Actividades ejecutadas en el periodo:
Se realiza entrega formal del establecimiento

Desmonte Manual de marcos de ventanearía existente en garitas.

Desmonte Manual de marcos de Puertas en garitas y archivo.
Desmonte Manual de Escaleras metálicas existentes en garitas.
Desmonte Manual de impermeabilización existente en garitas.
Demoliciones en guarda escobas, Pisos.
Retiro y cambio de tubería de agua potable y sanitaria en Garitas
Retiro y cambio de aparatos sanitarios en Garitas y archivo
Desmontes de luminarias existentes en garitas y archivo
Raspado de pintura existente en garitas y archivo
Picada de pañete en muros existentes
Demolición de enchapes en garitas y archivo
Descapote de capa vegetal y relleno con recebo para acceso a garitas.
Anden en concreto para acceso a garitas.
Instalación de tubería de alcantarillado en garitas
Instalación de cielo raso en láminas de PVC en archivo
Instalación de malla puesta atierra en garitas
Instalación de tubería eléctrica para redes de iluminación en garitas y archivo.
Suministro e instalación de cableado eléctrico para redes en garitas y archivo.
Limpieza y mantenimiento de tablero de distribución en archivo
Suministro en instalación de interruptores en garitas y archivo.
Salidas e instalación de tomacorrientes en archivo y garitas.
Salidas e instalación de luminarias en archivo y garitas.
Instalación de reflectores en garitas.
Instalación de ventana en archivo
Instalación de puertas en archivo y ahorita
Instalación de puerta de escotillas
Instalación de ventana blindadas en garitas
Aplicación de estuco y pintura en garitas y archivo
Instalación de escalera metálica en garitas
Instalación de enchape en baños de archivo y garitas

REGISTRO FOTOGRÁFICO













EPMSC MAGANGUÉ

Alcances Iniciales:

ALCANCE No.1: Cambio de la totalidad de las rejas por mal estado, patios, pabellones, áreas sociales, corredizas de emergencia de patios, pasillos, UTE, guardia externa, Armerillo y puerta de información (PARCIAL - patios)

ALCANCE NO.2: Cambio de las redes eléctricas internas, todo el establecimiento. (PRIORIZADO)

ALCANCE No 3: Cambio de las redes hidrosanitarias internas (PARCIAL)

Alcances a ejecutar:

ALCANCE No.1: Cambio de la totalidad de las rejas por mal estado, Ventanas de patios y puerta de acceso principal.

ALCANCE NO.2: Cambio de las redes eléctricas internas, todo el establecimiento.

ALCANCE No 3: Cambio de las redes hidrosanitarias internas se intervinieron de manera parcial, mantenimiento a redes y aparatos sanitarios, instalación de lavadero construcción y limpieza de cajas de inspección, instalación de puertas de duchas y baños.

Fechas según ultima programación

Inicio: 18 de noviembre del 2025


Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 15 de mayo del 2026

Recurso asignado: $ 186.076.441

Actividades ejecutadas en el periodo:
Se realiza entrega formal del establecimiento

Registro Fotográfico



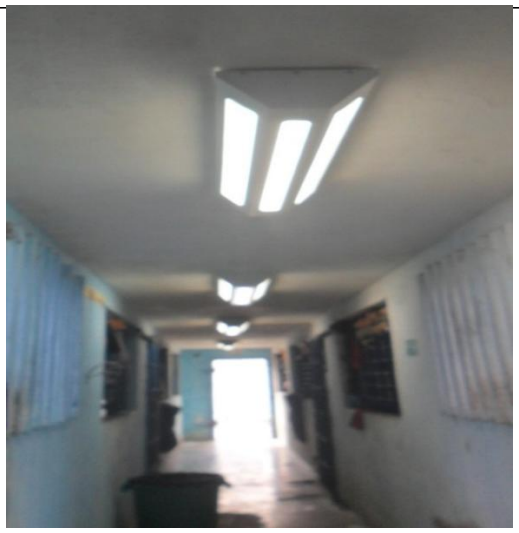

EPMSC ERE VALLEDUPAR

Alcances Iniciales:

ALCANCE No. 1: Mantenimiento y/o adecuación de área de rancho en el ERON incluyendo redes sanitarias, aguas servidas, Aguas residuales y ÁREA de RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS (ZONA DE BASURAS). - requerimiento procuraduría.

Alcances a ejecutar:

ALCANCE No 1: Mantenimiento y/o adecuación de área de rancho en el ERON, para el cual se contempla únicamente la ejecución de las actividades: intervención en los pisos, redes hidrosanitarias y adecuación de zona de lavado.

Fechas según ultima programación

Inicio: 11 de noviembre del 2025

Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 15 de mayo del 2026

Recurso asignado: $ 107.680.472

Actividades ejecutadas en el periodo:
Se realiza entrega formal del establecimiento

Demolición manual de encapes en muros en zona caliente y área húmeda.

Demolición de placa de contrapiso en zona caliente y área húmeda.

Demolición de lavadero área de húmeda.

Excavación manual para cárcamo zona caliente.

Placa de contrapiso en zona caliente y área húmeda.

Cárcamos en concreto zona caliente y área húmeda.

Rejillas en cárcamos de concreto zona caliente y área húmeda.

Puntos sanitarios PVC 4” para tanques de acopio (Área caliente – Área Húmeda)

Instalación de tapa para caja de inspección en Área Húmeda

Salidas para luminarias en tubería PVC en zona caliente.

Salidas para interruptor doble zona caliente.

Aplicación de pañete en muros zona caliente.

Acabado de piso con tablón en Área Húmeda.

Enchape de pared Área Caliente y Área Húmeda


Aplicación de estuco Área Caliente y Área Húmeda

Aplicación de pintura epóxica en muros de área Caliente y Área Húmeda

Instalación de piso en granito pulido en Área Caliente.

Instalación de piso en tablón en Área Húmeda.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

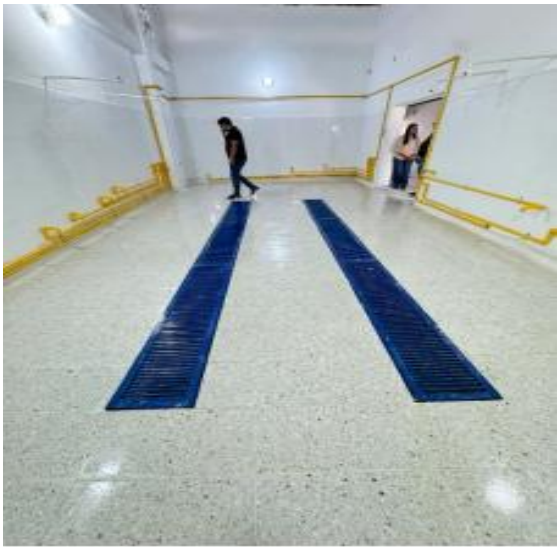







EPAMS CAS VALLEDUPAR

Alcances Iniciales:

ALCANCE No. 1: Mantenimiento y/o adecuación de celdas visita íntima

ALCANCE No. 2: ADICIONAL Atención a Sentencia T-386 del 2024

Alcances a ejecutar:

Alcance N°1: Mantenimiento y/o adecuación de celdas visita íntima
Alcance N°2: ADICIONAL: atención a Sentencia T-386 del 2024

Fechas según ultima programación

Inicio: 1 de junio del 2025

Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 7 de noviembre del 2025

Recurso asignado: $ 383.262.796

Actividades ejecutadas en el periodo:
Se realiza entrega formal del establecimiento

Demolición manual de mesones en celdas conyugales

Demolición manual y retiro de puntos hidráulicos existente en celdas conyugales.

Demolición manual de punto sanitarios existentes en celdas conyugales.

Desmonte manual de aparatos sanitarios existentes en celdas conyugales.

Instalación de tubería sanitaria subterránea PVC para baños de celdas conyugales.

Instalación de tubería de acero galvanizado para lavamanos de celdas conyugales.

Mantenimiento correctivo de puertas entamboradas metálicas en acceso a celdas conyugales.

Instalación de lavamanos antivandálicos en celdas conyugales.

Instalación de sanitarios antivandálicos en celdas conyugales.

Instalación de rejillas de piso en duchas de celdas conyugales.

Instalación de tubería antivandálica para sanitarios en celdas conyugales.

Aplicación de estuco acrílico en celdas conyugales.

Aplicación de pintura vinílica acrílica en celdas conyugales.

Aplicación de pintura a base de aceite sobre bajantes de tubería de sanitarios.

Reforzamiento y anclaje de estructura para cubierta en polisombra en patios de sol pabellón 9 y 11.

Suministro instalación de polisombra en malla tejida en patios de sol en pabellones 9 y 11.

REGISTRO FOTOGRÁFICO













EPMSC JP MONTERÍA

Alcances Iniciales:

ALCANCE No.1: Mantenimiento general Alojamientos Para CCV y auxiliares (PARCIAL - Auxiliares)

ALCANCE No. 2 ADICIONAL: Intervención en panadería (PRIORIZADO)

Alcances a ejecutar:

ALCANCE No.1: Mantenimiento general Alojamientos y auxiliares.

ALCANCE No. 2 ADICIONAL: Intervención en panadería

Fechas según ultima programación

Inicio: 10 de octubre del 2025

Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 15 de junio del 2026

Recurso asignado: $ 476.892.912

Actividades ejecutadas en el periodo:
Aplicación de estuco en muros en muros de alojamiento de auxiliares

Aplicación de estuco en muros en muros de Panadería

Registro Fotográfico.
Aplicación de estuco en muros en de alojamiento de auxiliares








Aplicación de estuco en muros en de panadería

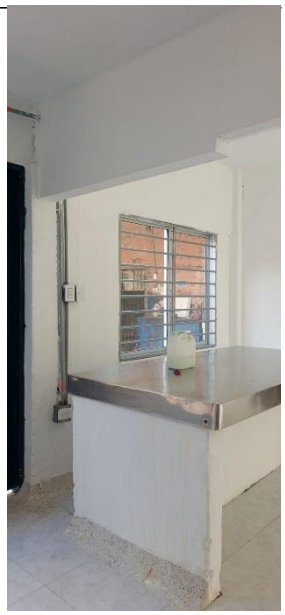


EPC TIERRALTA

Alcances Iniciales:

ALCANCE No.1: Mantenimiento del Alumbrado del área perimetral. Las luminarias no tienen durabilidad, se requiere que sean para exteriores y de alta intensidad.

Alcances a ejecutar:

ALCANCE No.1: Mantenimiento del Alumbrado del área perimetral. Instalación de 38 luminarias con panel solar.

Fechas según ultima programación

Inicio: 5 de septiembre del 2025

Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 15 de octubre del 2025

Recurso asignado: $ 62.419.007

Comentarios sobre lo ejecutado en el periodo:
Se realiza finalización de la instalación de 38 luminarias en el establecimiento el día 27 de marzo se realiza reunión en el establecimiento, contratista, interventoría, USPEC y la dirección.

En atención a la visita técnica realizada conjuntamente entre director del establecimiento penitenciario, la profesional de apoyo de USPEC, el contratista de obra y la Interventoría de obra, en donde se manifestó el inconformismo por parte del director del establecimiento, el cual informo que las lámparas instaladas presentan las siguientes condiciones. Se llegaron a unos compromisos el cual el contratista debe cumplir y esta interventoría realizara el respectivo seguimiento para que se cumplan los compromisos adquiridos por el contratista.

EPMSC RIOHACHA

Alcances Iniciales:

ALCANCE No. 2: Mantenimiento y Reparación de Red hidrosanitaria (PRIORIZADO - Intervención en cajas sanitarias)

ALCANCE No. 3: Mantenimiento y/o adecuación de la Garita de Seguridad de la Terraza del establecimiento Y Mantenimiento Garitas 1 y 2. (PRIORIZADO - garita 2 diseño - Garita 1 acabados)

Alcances a ejecutar:

ALCANCE No. 2: Mantenimiento y Reparación de Red hidrosanitaria (PRIORIZADO - Intervención en cajas sanitarias)

ALCANCE No. 3: Mantenimiento y/o adecuación de la Garita de Seguridad de la Terraza del establecimiento Y Mantenimiento Garitas 1 y 2. (PRIORIZADO - garita 2 diseño - Garita 1 acabados)

Fechas según ultima programación

Inicio: 18 de noviembre del 2025

Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 15 de julio del 2026

Recurso asignado: $ 163.837.031

Comentarios sobre lo ejecutado en el periodo:
Instalación de estructura metálica para garita

Registro Fotográfico.












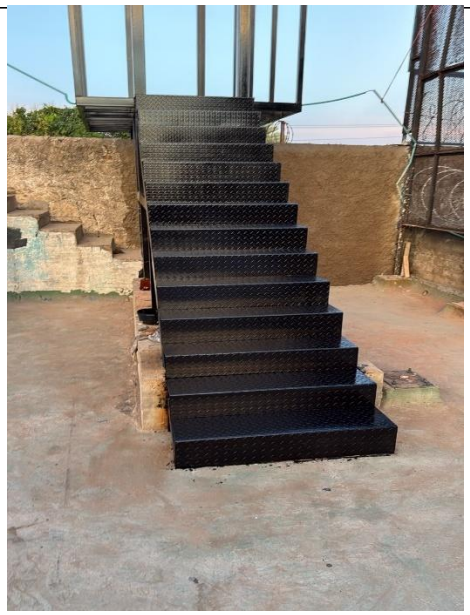

EPMSC SANTA MARTA

Alcances Iniciales:

ALCANCE No. 2: Mantenimiento y Reparación de Red hidrosanitaria (PRIORIZADO - Intervención en cajas sanitarias)

ALCANCE No. 3: Mantenimiento y/o adecuación de la Garita de Seguridad de la Terraza del establecimiento Y Mantenimiento Garitas 1 y 2. (PRIORIZADO - garita 2 diseño - Garita 1 acabados)

Alcances a ejecutar:

ALCANCE No. 2: Mantenimiento y Reparación de Red hidrosanitaria (PRIORIZADO - Intervención en cajas sanitarias)

ALCANCE No. 3: Mantenimiento y/o adecuación de la Garita de Seguridad de la Terraza del establecimiento Y Mantenimiento Garitas 1 y 2. (PRIORIZADO - garita 2 diseño - Garita 1 acabados)

Fechas según ultima programación

Inicio: 18 de noviembre del 2025

Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 15 de junio del 2026

Recurso asignado: $ 500.193.727

Actividades ejecutadas en el periodo:
Instalación de láminas de cubierta

Registro Fotográfico.







EPMSC EL BANCO

Alcances Iniciales:

ALCANCE No.1: Tutela incidente de desacato, Adecuación de rancho, se está dando la alimentación desde la parte externa

Alcances a ejecutar:

Alcance N°1: Tutela incidente de desacato, Adecuación de rancho, se está dando la alimentación desde la parte externa

Fechas según ultima programación

Inicio: 24 de noviembre del 2025

Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 31 de julio del 2026

Recurso asignado: $ 225.167.920

Actividades ejecutadas en el periodo:
Se solicitó al contratista, los ensayos de los materiales usados en la fabricación de concretos en obra, para poder continuar con dicha actividad.

EPMSC SAN ANDRÉS

Alcances iniciales:

ALCANCE N°2: Mantenimiento de las redes eléctricas de todo el Establecimiento incluyendo celdas (PARCIAL Patio 4 y Patio de Mujeres y Mantenimiento del tablero eléctrico)

Alcances a ejecutar:

ALCANCE N°2: Mantenimiento de las redes eléctricas de todo el Establecimiento incluyendo celdas (SOLO se intervino el Patio 4 y Patio de Mujeres y Mantenimiento del tablero eléctrico, e instalación de Reflectores para muro perimetral).

Fechas según ultima programación

Inicio: 15 de diciembre del 2025

Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 4 marzo del 2026

Recurso asignado: $ 102.557.305

Actividades ejecutadas en el periodo:
Se realiza finalización de actividades en el establecimiento y se procede a realizar entrega parcial de las obras, se le solicita al contratista se realice entrega de la documentación para cierre del contrato.

Suministro instalación de tubería PVC de ¾ para instalación de luminarias antivandálicas.

Desmonte de tubería existente.

Suministro e instalación de red eléctrica trenzada para instalación de luminarias.

Suministro instalación de red trifásica en cable de cobre para acometida desde el taller de soldadura hasta la subestación eléctrica.

Mantenimiento preventivo del tablero principal de distribución existente.

Suministro instalación de tablero trifásico de distribución de 12 circuitos en pabellón de mujeres.

Limpieza y mantenimiento de tablero de 12 circuitos.

Suministro instalación de interruptores.

Suministro instalación de cajas de paso.

Suministro e instalación de tomacorrientes.

Suministro de instalación de reflectores en muro perimetral de Guayana

Suministros instalación de luminarias antivandálicas.

Suministro instalación de fotocelda para control automático ubicado en el taller de soldadura.

Revisión y prueba de megohmetro para determinar el nivel de aislamiento en el establecimiento.

REGISTRO FOTOGRÁFICO











EPMSC SINCELEJO

Alcances Iniciales:

ALCANCE No.1: Mantenimiento, adecuación y ampliación del aula virtual

Alcances a ejecutar:

Alcance N°: Mantenimiento, adecuación y ampliación del aula virtual

Fechas según ultima programación

Inicio: 15 de diciembre del 2025

Fecha de terminación actualizada según ultimo cronograma: 4 marzo del 2026

Recurso asignado: $ 102.557.305

Actividades ejecutadas en el periodo:
Se realiza entrega formal del establecimiento

Desmonte manual de marcos de puertas de zona interna de cuarto de audiovisuales.

Desmonte manual de luminarias de cuarto de audiovisuales-

Desmonte Manal de cielo raso.

Raspado de pintura existente en muros.

Demolición manual de pañete existente en muros externos de audiovisuales.

Instalación de tubería PVC para acometida de agua potable.

Alfajías en concreto perimetral en cubierta de cuarto de audiovisuales.

Suministro instalación de divisiones en sistema de drywall para cubículos en cuarto audiovisuales.

Mantenimiento de cielo raso en sistema drywall.

Instalación de tubería PVC para canalizaciones internas en puntos eléctricos y puntos de voz datos.

Limpieza y mantenimiento de tablero de 12 circuitos existentes.

Suministro e instalación de interruptores.

Salidas de tomacorrientes en tuberías PVC para interruptores y Tomas de computadores.

Salidas de luminaria externas para instalación de reflectores.

Salidas de luminarias para instalación de luces en cuarto audiovisuales, cuarto de rack baño y oficinas internas audiovisuales.

Suministro instalación de luminarias panel redondo LED en cuarto de rack y baño.

Suministro instalación de reflectores en exteriores.

Suministro instalación de equipo de aire acondicionado en cuarto de audiovisuales.

Raspado de estuco y pintura existente en muros internos y externos.

Alistado de superficie con mortero impermeabilizado para losa de contrapiso en cubierta.


Impermeabilización en cubierta.


Instalación de puertas entamboradas de oficina y baño.

Mantenimiento de puertas de entrada principal.

Aplicación de estuco y pintura y murió internos y externos.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

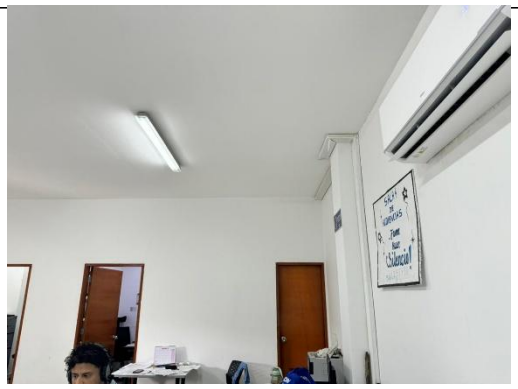






7. CORRESPONDENCIA

Se Carga archivo digital a la CARPETA 7 - CORRESPONDENCIA ENVIADA
Se Carga archivo digital a la CARPETA 7 - CORRESPONDENCIA RECIBIDA

8. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL:

FACTURACION
CONTROL DE FACTURACION CONTRATISTA
No hay facturación para el contrato de obra de acuerdo con la forma de pago.
CONTROL DE FACTURACION INTERVENTORIA
información de la facturación de interventoría se relaciona en la CARPETA 8.

9. CONTROL DE MANEJO DE ANTICIPO

CONTROL PRESUPUESTAL Y GESTION DE PAGOS
Anticipo aprobado.

PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO Y CONTROL ORDENES DE PAGO
El plan de inversión del anticipo fue avalado por esta interventoría el pasado 4 de diciembre de 2024 bajo el oficio USPEC-BETAREGIONALES-00. No hay pagos aprobados para el contratista cargados al anticipo aprobado.

10. GESTION AMBIENTAL.

Ver CARPETA 10 – GESTION AMBIENTAL

11. CONTROL DE CALIDAD

Para el seguimiento y control esta interventoría adjunta certificados de calidad emitidos por el contratista para el establecimiento:

12. INFORME SST

Ver CARPETA 11 – INFORME SST

PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROYECTO

12.1 PERSONAL DEL CONTRATISTA.

PERSONAL CONTRATISTA	CARGO	EMPRESA
Sergio Méndez	Residente de Obra	CONSORCIO MANTENIMIENTO GMC
Adriana Arévalo	Coordinador de Obra	CONSORCIO MANTENIMIENTO GMC
Alejandro Fonseca	Residente de Obra	CONSORCIO MANTENIMIENTO GMC
Arquímedes Contreras Gutierrez	Director de Obra	CONSORCIO MANTENIMIENTO GMC
Carlos Cujia	Residente de Obra	CONSORCIO MANTENIMIENTO GMC
Daniel Achinte	Residente de Obra	CONSORCIO MANTENIMIENTO GMC
Jeison Mogollón	Apoyo Residente de	CONSORCIO MANTENIMIENTO GMC
Johana Diaz	Residente de Obra	CONSORCIO MANTENIMIENTO GMC
Juan Camilo Cristancho	Residente de Obra	CONSORCIO MANTENIMIENTO GMC
Lorenzo Cardona	Residente de Obra	CONSORCIO MANTENIMIENTO GMC
Luisa Proaños	Coordinador de Obra	CONSORCIO MANTENIMIENTO GMC
María Angela Tarazona	SST - HSEQ	CONSORCIO MANTENIMIENTO GMC
Terecita Argoty	Presupuesto y	CONSORCIO MANTENIMIENTO GMC
Doris De Leon Polo	Coordinador de Obra	CONSORCIO MANTENIMIENTO GMC
sandra Pinzon	Coordinador de Obra	CONSORCIO MANTENIMIENTO GMC
Irene Zambrano	Residente de Obra	CONSORCIO MANTENIMIENTO GMC
Jisseth Romero	Residente de Obra	CONSORCIO MANTENIMIENTO GMC
Pedro Mora	Residente de Obra	CONSORCIO MANTENIMIENTO GMC
Francisco Cuentas	Residente de Obra	CONSORCIO MANTENIMIENTO GMC
Yuliana Serna	Residente de Obra	CONSORCIO MANTENIMIENTO GMC

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
1	Dairo Alonso Montaño Niño	1024503523	Oficial	Regional Occidente y viejo caldas	11/06/2025

CONSORCIO BETA REGIONALES

Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios

Justicia

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
2	Diego Mauricio Ávila Pérez	79976026	Oficial	Regional Occidente y viejo caldas	11/06/2025
3	Dilmer Jovanny Bayona Rodríguez	80777530	Ayudante	Regional Occidente y viejo caldas	11/06/2025
4	James Avilés Narváez	16704152	Oficial	Regional Occidente y viejo caldas	11/06/2025
5	José Leonardo Diaz Ulloa	1020748096	Ayudante	Regional Occidente y viejo caldas	11/06/2025
6	Luis Alfonso Rodríguez Bonilla	93413044	Oficial	Regional Occidente y viejo caldas	11/06/2025
7	Pablo José Pacacira	7177181	Supervisor	Regional Occidente y viejo caldas	11/06/2025
8	Edgar Moreno Reyes	1005195748	Instalador	Regional central	11/06/2025
9	Frannkyn Roosevelth Méndez	1024484580	Instalador	Regional central	11/06/2025
10	Johan Estiven Rozo Leyton	1233692117	Instalador	Regional central	11/06/2025
11	Jorge Emanuel Ospina Solano	1006596186	Residente de obra	Regional central	11/06/2025
12	Yesid Alexis Pantoja Trejo	1087408073	Residente de obra	Regional central	11/06/2025
13	Wbeimar Martínez Mosquera	1078917036	Oficial	Regional Occidente y viejo caldas	12/06/2025
14	Juan José Ávila Perez	11622036	Oficial	Regional Occidente y viejo caldas	12/06/2025
15	John Jairo Hincapie	79482086	Oficial	Regional Occidente y viejo caldas	12/06/2025
16	John Alexander Bernal Vargas	79566080	Oficial	Regional Occidente y viejo caldas	12/06/2025
17	Guillermo Hincapie	79410724	Oficial	Regional Occidente y viejo caldas	12/06/2025
18	José Calderón Jaimes	4342875	Oficial	Regional Occidente y viejo caldas	12/06/2025
19	Breyner Jhoan Villamizar Rozo	1148963473	Oficial	Regional Occidente y viejo caldas	12/06/2025
20	Ermis Bastos Mora	1094276006	Oficial	Regional Occidente y viejo caldas	13/06/2025
21	Carlos Alfonso Cujia Manjarrez	1065577261	Residente de obra	Regional Occidente y viejo caldas	13/06/2025
22	Daniel Andrés Achinte Gaona	76328148	Residente de obra	Regional Occidente y viejo caldas	13/06/2025
23	Erick Fernando Colmenares Quesada	1094947865	Residente de obra	Regional Occidente y viejo caldas	13/06/2025
24	Luisa Fernanda Proaños Casallas	53036744	Coordinadora	Regional Occidente y viejo caldas	13/06/2025
25	Teresita Del Pilar Argoty Cepeda	1085254230	Residente de obra	Regional Occidente y viejo caldas	13/06/2025
26	Andrés Mauricio Dueñas Santa Cruz	98394727	Oficial	Regional Occidente y viejo caldas	18/06/2025
27	Arnulfo Jesús Cárdenas Calpa	13005773	Oficial	Regional Occidente y viejo caldas	18/06/2025
28	Dany Mauricio Telag Maya	1087958143	Oficial	Regional Occidente y viejo caldas	18/06/2025
29	Delfín Edmundo Jamanoy López	5249734	Oficial	Regional Occidente y viejo caldas	18/06/2025
30	Jaime Florentino Montilla Barrera	98382147	Oficial	Regional Occidente y viejo caldas	18/06/2025
31	Jorge Alonso Ramirez Miranda	98399710	Oficial	Regional Occidente y viejo caldas	18/06/2025
32	Juan Alexander Guerra Vallejo	1083752233	Oficial	Regional Occidente y viejo caldas	18/06/2025
33	Daniel Andrés Achinte Gaona	76328148	Oficial	Regional Occidente y viejo caldas	18/06/2025

CONSORCIO BETA REGIONALES

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
34	Andrés Collazos Cosme	76045921	Oficial	Regional Occidente y viejo caldas	19/06/2025
35	Daniel Andrés Achinte Gaona	76328148	Residente de obra	Regional Occidente y viejo caldas	19/06/2025
36	Juan José Ávila Pérez	11522038	Oficial	Regional Occidente y viejo caldas	19/06/2025
37	Pablo Estifer Cuero Pino	1113513135	Oficial	Regional Occidente y viejo caldas	19/06/2025
38	ANDRES FELIPE TORRES CAMARGO	1014290145	INSPECTOR DE OBRA	REGIONAL CENTRAL	24/06/2025
39	CRISTIAN ALEJANDROO RODRIGUEZ MARQUEZ	1022429478	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	24/06/2025
40	FELIX JOSE DEVIA LOZANO	1108928763	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	24/06/2025
41	ADRIANA AREVALO MANCILLA	60382557	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL CENTRAL	24/06/2025
42	FABIO DE JESUS PATIÑO CARDENAS	18414360	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	24/06/2025
43	JHON ALEXANDER MARTINEZ HERNANDEZ	1010048944	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	24/06/2025
44	JORGE HERNAN PATIÑO SANCHEZ	1023017718	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	24/06/2025
45	JOSE ANTONIO GARAVITO BEMTRAL	3099451	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	24/06/2025
46	JOSE GIOVANNY BERMUDEZ PALACIO	1024512750	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	24/06/2025
47	JUAN PABLO VANEGAS BERMUDEZ	1073328596	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	24/06/2025
48	SONIA DANIELA GUTIERREZ CIFUENTES	1023017719	INSPECTOR DE OBRA	REGIONAL CENTRAL	24/06/2025
49	JEYSON DAVID ROJAS PAYARES	1033712661	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	24/06/2025
50	JOAN JOSE RUZ PRADA	5289478	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	24/06/2025
51	JOSE ALEJANDRO RODRIGUEZ GOMEZ	79616417	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	24/06/2025
52	JOSE MIGUEL MALAMBO AGUJA	93445450	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	24/06/2025
53	PAOLA CRISTINA JARAMILLO BELALCAZAR	27253926	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL NOROESTE	24/06/2025
54	OSCAR RICARDO JARAMILLO BELALCAZAR	1045021324	AYUDANTE	REGIONAL NOROESTE	24/06/2025
55	WBEIMAR MENA PALACIOS	1001637157	AYUDANTE	REGIONAL NOROESTE	24/06/2025
56	ADOLFO JOSE FLOREZ HERNANDEZ	1102854417	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL NORTE	24/06/2025
57	ALEJANDRO FONSECA CACERES	1098764868	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL NORTE	24/06/2025
58	ELKIN ANTONIO BANQUEZ ALVAREZ	92532211	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	24/06/2025
59	JORGE ANDRES ALVARADO BERRIO	1101450710	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	24/06/2025
60	JOSE ARMANDO HERRERA OJEDA	1065596250	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	24/06/2025

CONSORCIO BETA REGIONALES

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
61	JUAN PABLO PUELLO ZAGARRA	1065577385	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	24/06/2025
62	LEINER RICARDO TAPIAS ALMANZA	1002163243	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	24/06/2025
63	OSCAR JULIAN ARRIETA GALE	1100623119	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	24/06/2025
64	ALEX ALFONSO PRIMERA NIEBLES	1002093520	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	24/06/2025
65	ANDERSON LONDOÑO SALAMANCA	1110518853	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	24/06/2025
66	ARCESIO GONZALEZ LEON	16802506	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	24/06/2025
67	ARNULFO JESUS CARDENAS CALPA	13005773	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	24/06/2025
68	BRANDON PRIMERA CORTES	1047222741	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	24/06/2025
69	BREYNER JHOAN VILLAMIZAR ROZO	1148963473	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	24/06/2025
70	CARLOS ERNESTO SALAS RIVERA	75036072	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	24/06/2025
71	DANY MAURICIO TELAG MAYA	1087958143	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	24/06/2025
72	EDUARD YAMITH NORIEGA GONZALEZ	78027776	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	24/06/2025
73	EIDER ANDRES QUINTERO BERNATE	1022977870	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	24/06/2025
74	GERMAN JARAMILLO RODRIGUEZ	10254889	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	24/06/2025
75	HUGO HERNAN VILLAMAR MOSQUERA	10692253	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	24/06/2025
76	JESUS EDUARDO GARZON AGUIRRE	76329032	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	24/06/2025
77	JORGE GENTIL OCAMPO MONTOYA	16630816	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	24/06/2025
78	JOSE CALDERONJAIMES	4342875	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	24/06/2025
79	JOSEPH ALEJANDRO CIFUENTES GAITAN	1000018036	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	24/06/2025
80	JUAN CARLOS ANGULO OBANDO	1059912736	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	24/06/2025
81	JUAN SEBASTIAN GOMEZ MOYANO	1023967457	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	24/06/2025
82	LUIS EDUARDO VILLAMAR PEREZ	1059901577	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	24/06/2025
83	VLADIMIRO VASQUEZ ARCE	10185609	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	24/06/2025
84	YOVANY ORDOÑEZ SANCHEZ	76328284	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	24/06/2025
85	CRISTIAN MAURICIO ALVARADO	1012358977	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	24/06/2025
86	CRISTIAN CAMILO GONZALEZ PENAGOS	1007718421	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	24/06/2025
87	MELQUISEDEC CALDERON ARRIETA	1192896362	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL NOROESTE	24/06/2025
88	ALEXANDER VILLAMIZAR CORREA	1117515429	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	25/06/2025

CONSORCIO BETA REGIONALES

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
89	ASTRID CAROLINA MEDINA BOBADILLA	1119217740	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	25/06/2025
90	JAIR DIAZ CARDOZO	96340837	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL	25/06/2025
91	JHON JEISLER DUQUE HOLGUIN	10177384	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL	25/06/2025
92	BREINER ALEXIS VALBUENA OBANDO	1117504580	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	25/06/2025
93	LUIS EDUARDO ROBLES CERON	1048283235	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	25/06/2025
94	BRIAN STIVEN VELASQUEZ ROBLES	1002230143	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	25/06/2025
95	TITO ALONSO GORDILLO SIERRA	79910341	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	26/06/2025
96	JOSE ALBERTO CONTRERAS	80296805	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	26/06/2025
97	PEDRO FELIPE MORA CARVAJALINO	1072705806	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL CENTRAL	26/06/2025
98	DAIRO ALONSO MONTAÑO NIÑO	1024503523	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	26/06/2025
99	DIEGO MAURICIO ÁVILA PÉREZ	79976026	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	26/06/2025
100	DILMER JOVANNY BAYONA RODRÍGUEZ	80777530	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	26/06/2025
101	JAMES AVILÉS NARVÁEZ	16704152	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	26/06/2025
102	JOSÉ LEONARDO DIAZ ULLOA	1020748096	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	26/06/2025
103	LUIS ALFONSO RODRÍGUEZ BONILLA	93413044	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	26/06/2025
104	PABLO JOSÉ PACACIRA	7177181	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	26/06/2025
105	LORENZO ALEJANDRO CARDONA GALVIS	75102901	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	26/06/2025
106	DIEGO ANDRES AGUIRRE REYES	1079035142	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	26/06/2025
107	HERNANDO RODRIGUEZ	4276349	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	26/06/2025
108	YOMAR SANTIAGO URIBE ROJAS	1043302232	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	26/06/2025
109	ISRAEL TORRES CASTEL	1054678525	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	26/06/2025
110	CARLOS ARTURO GONZALEZ SANCHEZ	1054680256	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	26/06/2025
111	GENEISY YULIANA SERNA ARIAS	1077441917	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	27/06/2025
112	FRANKLIN HERNAN CASTELLANOS JAIMES	1090479205	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	28/06/2025
113	GUILLERMO ALEXANDER SANCHEZ AVENDAÑO	11275648	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	28/06/2025
114	JESUS IVAN IBARRA FUENTES	1127337620	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	28/06/2025
115	JOHN JAIRO MARTINEZ VELASQUEZ	1024468589	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	28/06/2025

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
116	LUIS ANGEL MOJICA VILLALOBOS	1003314689	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	28/06/2025
117	LUIS CARLOS AGUIRRE ALONSO	1033689852	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	28/06/2025
118	LUIS EUSTORGIO PRECIADO MORENO	79769687	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	28/06/2025
119	YIMMY ANDRES SANTAFE JIMENEZ	1069257709	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	28/06/2025
120	DISNARDO CHACON MENESES	1003175221	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	2/07/2025
121	CARLOS MARIO CHACON MEJIA	1064838716	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	2/07/2025
122	WBEIMAR ORLANDO MUÑOZ TORRES	1007847136	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	4/07/2025
123	ROSENDO GARCIA PRADA	1022978343	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	4/07/2025
124	JOSE DANIEL RUBIO GUTIERREZ	79805550	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	4/07/2025
125	JONATHAN ORLANDO ESPITIA RODRIGUEZ	1022967079	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	4/07/2025
126	YOIMER JESUS MOENO MARRUGO	1044909113	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	4/07/2025
127	RAFAEL MONROY CABALLERO	13456598	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	7/07/2025
128	JOSE ALEJANDRO RODRIGUEZ GOMEZ	79616417	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	7/07/2025
129	CRISTIAN ALEJANDRO RODRIGUEZ MARQUEZ	1022429478	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	7/07/2025
130	ANDRES PABON LAGUADO	1090475005	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	7/07/2025
131	ANGUIE LIZETH MURCIA MOLINA	1065611154	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	8/07/2025
132	JHONATAN DE JESUS HERAZO BARRIOS	1001934780	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	8/07/2025
133	JIMMY ALEXANDER GARZON	79704838	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	8/07/2025
134	JUAN PABLO VANEGAS BERMUDEZ	1073328596	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	8/07/2025
135	KEVIN ALEXANDER GARZON MORENO	1015468890	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	8/07/2025
136	MARCO JOSE DE LA HOZ RIVERA	1043606712	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	8/07/2025
137	NESTOR GUILLERMO VARGAS ROJAS	1022357442	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	8/07/2025
138	WRAYAN ESTIVEN GOMEZ ACOSTA	1012454441	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	8/07/2025
139	YEISON MOGOLLON ORTEGA	1093775476	RESIDENTE	REGIONAL CENTRAL	8/07/2025
140	YESID ALEXIS PANTOJA TREJO	1087408073	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	9/07/2025
141	JHONATAN DE JESUS HERAZO BARRIOS	1001934780	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	9/07/2025
142	JOSE DANIEL HERNANDEZ VASQUEZ	79742171	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	10/07/2025

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
143	JOSE ANDRES SANCHEZ ROMERO	79650231	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	10/07/2025
144	MOISES GAONA MARTINEZ	72325741	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	10/07/2025
145	JOSE RAMON SUAREZ SALCEDO	8980183	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	10/07/2025
146	DIEGO MAURICIO POVEDA ROCHA	1076653980	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	10/07/2025
147	WRAYNT JHONATAN CHAVARRO ANDRADE	1006523262	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	14/07/2025
148	PEDRO NEL OCAMPO ESTERLING	1125178774	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	14/07/2025
149	NELSON VALDERRAMA LOZANO	1117524890	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	14/07/2025
150	LUIS ALBERTO SEGURA ROMERO	15888239	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	14/07/2025
151	ANDRES ALEJANDRO PAYAN MEDINA	1006772962	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	15/07/2025
152	CRISTHIAN ALEJANDRO OCAÑA CHAVEZ	1111542219	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	15/07/2025
153	DIEGO ALEJNDRO GASCA CORREA	1024591885	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	15/07/2025
154	JOSE LIBARDO RUBIANO MANCERA	1032387698	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	15/07/2025
155	ROBINSON CARMONA CAICEDO	1117530555	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	15/07/2025
156	AMIN MANUEL MANRIQUE MORALES	85270284	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	15/07/2025
157	ROBERTO ALEXANDER CASTRO SANTAFE	80130122	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	15/07/2025
158	AMIN MANUEL MANRIQUE MORALES	85270284	AYUDANTE	REGIONAL NOROESTE	17/07/2025
159	ROBERTO ALEXANDER CASTRO SANTAFE	80130122	AYUDANTE	REGIONAL NOROESTE	17/07/2025
160	CAMILO ANDRES MEZA TORRES	1062906307	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	17/07/2025
161	JORGE ENRIQUE CUELLAR PLAZAS	7710284	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	17/07/2025
162	YORLEY ALVARADO RAMOS	1023006152	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	18/07/2025
163	JAROL HUMBERTO ROA BUITRAGO	1022967445	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	18/07/2025
164	MIGUEL ANGEL GARCIA BUITRAGO	1022939993	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	18/07/2025
165	EDISSON NOE DIAZ VARGAS	1101691571	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	18/07/2025
166	JANER ESTEVEN DAZA YARPA	1004580102	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	22/07/2025
167	JESUS MANUEL TAIMBUD QUENGUAN	87100688	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	22/07/2025

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
168	JOSE BOLIVAR MARTINEZ TENGANAN	87103284	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	22/07/2025
169	HENRY LISARDO HERNADEZ	13073245	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	22/07/2025
170	DANNY DANIEL SANCHEZ NIÑO	80129218	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	24/07/2025
171	JAVIER FLORENCIO TORRES NIÑO	1033677695	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	24/07/2025
172	JEFFERSON DANIEL CRUZ NARANJO	80247323	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	24/07/2025
173	JESUSALDO CENTENO MONTENEGRO	7997248	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL	28/07/2025
174	JOHN JAIRO MARTINEZ VELASQUEZ	1024468589	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL	28/07/2025
175	JOSE ANIBAL TORRES SANCHEZ	79529020	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL	28/07/2025
176	LUIS CARLOS AGUIRRE ALONSO	1033689852	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL	28/07/2025
177	LUIS EUSTORGIO PRECIADO MORENO	79769687	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL	28/07/2025
178	DIEGO CASTIBLANCO HERNANDEZ	1070331867	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL	28/07/2025
179	JESUS MAURICIO MACIAS GONZALEZ	1024569383	INSPECTOR DE OBRA	REGIONAL CENTRAL	28/07/2025
180	JORGE ELIECER VANOY HERRERA	1000985335	INSPECTOR DE OBRA	REGIONAL CENTRAL	28/07/2025
181	SANTIAGO JOSE RINCON MATEUS	1002998707	TECNICO ELECTRICO	REGIONAL CENTRAL	28/07/2025
182	BRAYAN STEVEN HURTADO JURADO	1094961642	TECNICO	REGIONAL CENTRAL	28/07/2025
183	MARLON SEGUNDO CANOLES PEREZ	73190904	TECNICO EN MANTENIMIENTO	REGIONAL CENTRAL	28/07/2025
184	JESUS ALBERTO CHAMARRO RODRIGUEZ	87532204	AYUDANTE	REGIONAL VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	28/07/2025
185	EDISON OSWALDO FLOREZ GOMEZ	1128430135	AYUDANTE	REGIONAL NOROESTE	30/07/2025
186	ALBEIRO QUINTERO BERNATE	14278474	AYUDANTE	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
187	ALEX ALFONSO PRIMERA	1002093520	AYUDANTE	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
188	ANDERSON LONDOÑO SALAMANCA	1110518853	AYUDANTE	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
189	BRANDON Y ALEX PRIMERA MAYO	1047222741	OFICIAL	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
190	CARLOS ALBERTO TORO RESTREPO	98535012	AYUDANTE	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
191	DILMER BAYONA	80777530	AYUDANTE	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
192	EIDER ANDRES QUINTERO BERNATE	1022977870	AYUDANTE	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
193	FREDDY JOSE REYES VELAIDES	1043434375	AYUDANTE	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025

CONSORCIO BETA REGIONALES

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
194	JOHN ESTIVEN CLAVIJO FERNANDEZ	5826934	AYUDANTE	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
195	JOSEP ALEJANDRO CIFUENTES GAITAN	1000018036	AYUDANTE	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
196	LUIS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	93413044	OFICIAL	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
197	VLADIMIRO VASQUEZ ARCE	10185609	OFICIAL	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
198	CHRISTIAN DAVID HURTADO QUILINDO	1061776071	OFICIAL	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
199	ERICK FERNANDO COLMENARES	1094947865	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
200	HUELMER GERSAIN GAON MUÑOZ	76331652	MAESTRO	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
201	HUGO HERNAN VILLAMAR	10692253	OFICIAL	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
202	JAIME SOLARTE	10720889	OFICIAL	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
203	JESUS EDUARDO GARZON	76329032	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
204	JOSE FREDY LAME CAPOTE	4616328	OFICIAL	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
205	JOSE LUIS MOLINA	1061774713	AYUDANTE	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
206	JOSE MARIA RIVERA	10720643	MAESTRO	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
207	JUAN CARLOS ANGULO OBANDO	1059912736	OFICIAL	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
208	LUIS CARLOS CAPOTE COTAZO	1061719679	OFICIAL	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
209	LUIS ESUARDO VILLAMAR	1059901577	MAESTRO	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
210	MILLER DANIEL OROZCO	1064434924	OFICIAL	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
211	YOVANY ORDOÑEZ SANCHEZ	76328284	MAESTRO	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
212	BREYNER VILLAMIZAR	1148963473	OFICIAL	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
213	ERMIS BASTOS	1094276006	OFICIAL	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
214	FERNANDO DUARTE HERNANDEZ	69882265	AYUDANTE	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
215	GRATINIANO NATVAEZ NARVAEZ	12580397	AYUDANTE	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
216	JOSE CALDERON	4342875	OFICIAL	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
217	JOSE GREGORIO CAICEDO GARCIA	88162737	AYUDANTE	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
218	OSCAR LARRARTE	93286333	AYUDANTE	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
219	GUILLERMO HINCAPIE	79410724	OFICIAL	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
220	JHON BERNAL	79566080	OFICIAL	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
221	JOHN HINCAPIE	79482086	OFICIAL	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
222	CARLOS ERNESTO SALAS RIVERA	75036072	AYUDANTE	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
223	DAIRO MONTAÑO	1024503523	OFICIAL	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
224	JUAN SEBASTIAN GOMEZ MOYANO	1023967457	OFICIAL	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
225	MAURICIO AVILA	79976026	OFICIAL	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
226	JUAN JOSE AVILA PERES	11522038	OFICIAL	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
227	DANIEL SANTIAGO VALLEJO PORTILLA	1192891870	MAESTRO	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	12/08/2025
228	CARLOS JONATHAN SANCHEZ GALINDO	1019058760	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	14/08/2025
229	JHON EDWAR ARANGON OYOLA	1110232752	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	14/08/2025
230	JOHN ALEXANDER PAIPILLA NORENO	1000142579	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	14/08/2025
231	PABLO JOSE PACACIRA	7177181	SUPERVISOR	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	19/08/2025
232	JAMES AVILÉS NARVÁEZ	16704152	AYUDANTE	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	19/08/2025
233	JOSÉ LEONARDO DIAZ ULLOA	1020748096	AYUDANTE	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	19/08/2025
234	EDUARD YAMITH NORIEGA GONZALEZ	78027776	AYUDANTE	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	19/08/2025
235	ROBERTO ALEXANDER CASTRO SANTAFE	80130122	AYUDANTE	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	19/08/2025
236	AMIN MANUEL MANRIQUE MORALES	85270284	AYUDANTE	REGIONAL NOROESTE-VIEJJO CALDAS Y OCCIDENTE	19/08/2025
237	ANGEL MARIA GARZON FUENTES	83115511	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	19/08/2025
238	LEONARDO JAIDER BRAVO GUZMAN	12266998	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	19/08/2025
239	DANIELA DEL PILAR GAITAN GARZON	1121851915	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL CENTRAL-NORTE	20/08/2025
240	JACKSON FABIAN ROJAS MORENO	86053901	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-NORTE	20/08/2025
241	JUAN CAMILO CRISTANCHO BOHADA	1018843507	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL CENTRAL-NORTE-ORIENTE	21/08/2025
242	DANIEL FELIPE GRIMALDOS PEREZ	1006876619	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-NORTE-ORIENTE	21/08/2025
243	CARLOS JAVIER RODRIGUEZ BARRERA	1022938529	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	23/08/2025
244	DULIS CESAR ALVARADO PADILLA	7617663	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	23/08/2025
245	KEVIN ROBIN ELLIS MORALES	1000930480	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	23/08/2025
246	LEONARDO CASTIBLANCO PUENTES	79247553	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	23/08/2025
247	MIGUEL ANGEL MALDONADO LOPEZ	1030646964	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	23/08/2025
248	HERNAN DARIO DE LA ROSA ARIAS	1103119376	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	26/08/2025
249	JAIDER MANUEL SIERRA ATENCIA	1047338449	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	26/08/2025

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
250	JAIRO ALFONSO PALLARES PACHECO	72224929	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	26/08/2025
251	JULIO CESAR AGAMEZ	1003562850	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	26/08/2025
252	DIANA LUCIA BASTIDAS FERNANDEZ	1045724856	SST	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	26/08/2025
253	JUAN CAMILO CRISTANCHO BOHADA	1018843507	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	26/08/2025
254	JOHAN ESTIVEN ROZO LEYTON	1233692117	INSTALADOR	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	26/08/2025
255	EDGAR MORENO REYES	1005195748	INSTALADOR	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	26/08/2025
256	JOHN JAIRO MARTINEZ VELASQUEZ	1024468589	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	26/08/2025
257	LUIS EUSTORGIO PRECIADO MORENO	79769687	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	26/08/2025
258	LUIS CARLOS AGUIRRE ALONSO	1033689852	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	26/08/2025
259	FRANNKYN ROOSEVELTH MÉNDEZ	1024484580	Instalador	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	26/08/2025
260	ALEXIS JOSE RAUSEO UGAS	6197399	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	26/08/2025
261	AMIN MANUEL MANRIQUE MORALES	85270284	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	26/08/2025
262	CESAR GIOVANNY ESPITIA HOME	1019098213	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	26/08/2025
263	EDUARD YAMITH NORIEGA GONZALEZ	78027776	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	26/08/2025
264	IRBIN ALEXANDER MENA MORENO	1010102279	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	26/08/2025
265	YOHAN MANUEL MOSQUERA PEREA	1077422862	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	26/08/2025
266	CARLOS GUILLERMO TUTALCHA BOTINA	98390352	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	26/08/2025
267	FABIO ALIRIO PAZ OBANDO	87066132	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	26/08/2025
268	JESUS ESPERIDION OBANDO TORO	12746343	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	26/08/2025
269	LUIS EDUARDO POTOSI YAQUENO	1085296983	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	26/08/2025

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
270	LUIS ORLANDO LUNA MARTINEZ	12746960	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	26/08/2025
271	OSMALDO OBANDO TORO	13068176	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	26/08/2025
272	SEGUNDO DARIO OBANDO TORO	5252424	MAESTRO	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	26/08/2025
273	HERNAN DARIO DE LA ROSA ARIAS	1103119376	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	27/08/2025
274	JAIDER MANUEL SIERRA ATENCIA	1047338449	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	27/08/2025
275	JAIRO ALFONSO PALLARES PACHECO	72224929	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	27/08/2025
276	JADER ENRIQUE PEREZ MARQUEZ	72280530	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	27/08/2025
278	RUBEN DARIO MARIN CASTRO	71172895	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	28/08/2025
279	JESUS DAVID ROMERO PAYARES	1102861496	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	28/08/2025
280	VICTOR ALFONSO RIOS RESTREPO	1020400695	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	3/09/2025
281	JOSE ALEXANDER SALDARRIAGA PIMIENTA	71878546	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	3/09/2025
282	BLADIMIR RUGELES LUGO	86009466	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	03/0925
283	EDUARDO ANTONIO HERNANDEZ DIAZ	1120354645	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	03/0925
284	GUSTAVO MORENO GARCIA	7332092	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	03/0925
285	SANTIAGO JOSE RINCON MATEUS	1002998707	TECNICO ELECTRICO	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	4/09/2025
286	VICTOR MANUEL OCHOA DUCUARA	1015408267	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	4/09/2025
287	JULIO ENRIQUE SOTO DIAZ	92130029	SUPERVISOR	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	4/09/2025
288	ALEXANDER QUIROGA HERREÑO	1099207267	INSTALADOR	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	10/09/2025
289	JHONATAN STHIVEN RUCINQUE LOPEZ	1106901060	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	10/09/2025
290	PEDRO MALAMBO GUARDO	73200173	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	10/09/2025

CONSORCIO BETA REGIONALES

Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios

Justicia

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
291	CAMILO ANDRES SEGURA SALDAÑA	1117535618	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	10/09/2025
292	PEDRO ANTONIO BAUTUISTA CARDENAS	91257451	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	10/09/2025
293	CIRO ALFONSO ORTIZ VILLABONA	1101597947	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	10/09/2025
294	ALEXIS OJEDA BETANCOURT	1121930159	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	11/09/2025
295	MIGUEL ANGEL AVILA LIZCANO	91347317	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	15/09/2025
296	LUIS FERNANDO CORREA JAIME.	79622344	VISITANTE	EPMSC SOGAMOSO	15/09/2025
297	KEVIN DUVAN BALLESTEROS SOTO	1007184968	VISITANTE	EPMSC SOGAMOSO	15/09/2025
298	ESTEFANIA BALLESTEROS SOTO	1003292614	VISITANTE	EPMSC SOGAMOSO	15/09/2025
299	NICOLAS SANTIAGO BOHORQUEZ BERNAL	1006799502	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	16/09/2025
300	OSCAR FIDEL MONROY	86062113	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	16/09/2025
301	LUIS EUCLIDES RAMIREZ MENDEZ	91349612	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	17/09/2025
302	YORLIN URBINA MARQUEZ	1137195346	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	17/09/2025
303	JEAN CARLOS PALOMINO PADILLA	1049940525	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	17/09/2025
304	JHONNY ALEXANDER MENDOZA ZAMBRANO	1032364379	INSTALADOR	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	17/09/2025
305	MAICOL FABIAN DIAZ LOAIZA	1019096220	INSTALADOR	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	17/09/2025
306	MARTIN GUERRERO DIAZ	1019037888	INSTALADOR	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	17/09/2025
307	ALCIDES MANUEL LEAL NARVAEZ	1045703284	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	17/09/2025
308	JHON EDWAR ARANGON OYOLA	1110232752	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	18/09/2025
309	JORGE FERNANDO MENESES VILLAREAL	1010069951	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	18/09/2025
310	MARTIN JOSE GONZALEZ AÑEZ	5067052	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	19/09/2025
311	VICTOR MANUEL OCHOA DUCUARA	1015408267	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	19/09/2025

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
312	RONAL ALBERTO MOLANO ROBLES	8787336	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	19/09/2025
313	VICTOR ALFONSO ORTEGA MALDONADO	1129573469	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	19/09/2025
314	JESUS ALBERTO ESTRADA MENDOZA	5462085	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	23/09/2025
315	JONNY ALEJANDRO GONZALEZ CELIS	86082783	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	23/09/2025
316	MAURICIO HERNANDEZ PACHON	86053533	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	23/09/2025
317	MERQUECIDED QUINTERO ARCIRA	1002047944	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	23/09/2025
318	REINALDO ISIDRO GUTIERREZ MARQUEZ	3161886	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	23/09/2025
319	CRISTIAN ANDRES ARTUNDUAGA MOYA	1057215930	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	23/09/2025
320	WILLIAM RICARDO ARIAS ARIAS	1053346103	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	23/09/2025
321	YEISON MONROY CORTES	1053340982	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	23/09/2025
322	ALDEMAR PINEDA	10274501	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	23/09/2025
323	FRANK EDUAR ESPINOSA QUINTERO	1093984533	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	23/09/2025
324	ISRAEL ANTONIO REMOLINA SILVA	80072455	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	25/09/2025
325	EDILSON GIOVANY BERMUDEZ QUINTERO	1053841049	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	25/09/2025
326	GABRIELA MORGENSZTERN	1090534584	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	26/09/2025
327	DARIO ALEXANDER PALACIOS ARDILA	1001021842	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	26/09/2025
328	MELKIN ESCOBAR BERONA	1028014959	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	26/09/2025
329	RONAL ALBERTO MOLANO ROBLES	8787336	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	26/09/2025
330	ANGELA FAHISURY CARVAJAL BARRERA	1052400259	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	26/09/2025
331	JUAN JOSE MARTINEZ MARTINEZ	92524885	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	30/09/2025

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
332	RAFAEL GERMAN DE LA ROSA SALASAR	92534621	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	30/09/2025
333	JADER PATIÑO JIMENEZ	13568486	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	30/09/2025
334	WILLIAM CAICEDO CASTILLO	80372534	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	30/09/2025
335	EDER MANUEL ANGULO MARTINEZ	8527321	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	30/09/2025
336	SAMIR JUNIOR GONZALEZ	1045229070	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	30/09/2025
337	NICOLAS ESTEBAN RINCON MATEUS	1002998708	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	30/09/2025
338	ROQUE ANTONIO MACHADO DAZA	13279123	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	30/09/2025
339	JULIO CESAR BELTRAN GOMEZ	92601891	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	30/09/2025
340	RUBEN DARIO CABALLERO RODIRGUEZ	1000241016	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	30/09/2025
341	RONIEL JOSE GARCIA	6530626	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	30/09/2025
342	JOSE ORLANDO ALARCON MONTES	7713367	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	30/09/2025
343	HECTOR CHARRY GALINDO	12137324	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	30/09/2025
344	JUNIOR ALEXANDER PINEDA PINEDA	6263639	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	30/09/2025
345	JESUS RAMON CONTRERAS ALBARRACIN	6721275	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	30/09/2025
346	ANGEL SIMON LUNA VIDES	1081930172	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	30/09/2025
347	ANGEL MAURICIO ALVAREZ SALAS	1111760404	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	30/09/2025
348	AGUSTIN RAFAEL OLIVO ANAYA	1001851618	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	30/09/2025
349	JORGE ARMANDO CANO MOSCOSO	1116437317	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	30/09/2025
350	JOSE JOAQUIN FRIAS MUÑOZ	9146684	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	30/09/2025
351	LEONARDO ANDRES GIRALDO CASIERRA	94230398	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	30/09/2025

CONSORCIO BETA REGIONALES

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
352	LUIS ALEXANDER RIASCOS CAICEDO	1111786654	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	30/09/2025
353	JOHN ALEXANDER PAIPILLA MORENO	1000142579	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	1/10/2025
354	SEBASTIAN GIRALDO MOSCOSO	1059990047	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	1/10/2025
355	JAVIER GUILOMBO MONTES	7687771	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	1/10/2025
356	JHONNY ALEXANDER MENDOZA ZAMBRANO	1032364379	INSTALADOR	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	2/10/2025
357	MAICOL FABIAN DIAZ LOAIZA	1019096220	INSTALADOR	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	2/10/2025
358	MARTIN GUERRERO DIAZ	1019037888	INSTALADOR	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	2/10/2025
359	EDINSON BENITO ARIAS	1096219784	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	2/10/2025
360	WILLIAM JOSE PEREZ MARTINEZ	1005486694	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	2/10/2025
361	YEINER JOSE BELTRAN GOMEZ	1101783832	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	2/10/2025
362	ROMARIO ANDRES PINZON SANGUINO	1090501941	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	3/10/2025
363	YEISON JOHAN RINCON DURAN	1090454019	MAESTRO	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	3/10/2025
364	MISAEL NAVARRO BONILLA	5035440	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	3/10/2025
365	ANDRYS JESUS SANTIAGO JIMENEZ	1007961913	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	3/10/2025
366	RHASID NAIR HERNANDEZ ANDRADE	1073823274	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	3/10/2025
367	JAIME ORLANDO ACOSTA RIOS	79157190	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	6/10/2025
368	JESUS EDUARDO YAÑEZ LOPEZ	1110514830	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	6/10/2025
369	DUVAN DAVID ARIAS BAQUERO	1005776670	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	6/10/2025
370	ALBER ESNEIDER MUÑOZ APONTE	86081922	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	7/10/2025
371	ROSNEY ARGEMIRO SUAREZ CRUZ	19001680	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	7/10/2025

CONSORCIO BETA REGIONALES

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
372	CARLOS MATERAN	6838108	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	7/10/2025
373	JOSE IGNACIO RODRIGUEZ BARRERA	9396959	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	7/10/2025
374	JHON ALEXANDER MUÑOZ LOPEZ	1054545625	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	7/10/2025
375	JHONATHAN ERNESTO ALVAREZ BAEZ	1052383633	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	7/10/2025
376	JUAN SEBASTIAN LUGO AVILES	1140920050	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	7/10/2025
377	AZAEL NOGUERA FRANCO	10546961	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	9/10/2025
378	HERNAN CHICANGANA BELTRAN	76331869	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	9/10/2025
379	DIEGO ANDRES PINZON LOPEZ	1005064061	INSPECTOR DE OBRA	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	9/10/2025
380	CIRO ALFONSO SANCHEZ SANTIAGO	1065641069	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	9/10/2025
381	MIGUEL GEOVANY SUAREZ AYALA	1004944826	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	9/10/2025
382	DANILO ANDRES SUAREZ AYALA	1004944825	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	9/10/2025
383	ALDAIR SOTO SANDOVAL	1042242931	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	10/10/2025
384	CRISTIAN EDUARDO ARANGO BAQUERO	1072395652	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	10/10/2025
385	DARIUN DANIEL ARANGO CASTRO	1121836458	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	10/10/2025
386	FERNANDO ALFONSO MANCHEGO CANEO	1045674440	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	10/10/2025
387	JOHAN ALEJANDRO ARANGO BAQUERO	1121955360	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	10/10/2025
388	DEIVIS ALBERTO FERRER RUDAS	1048290350	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	14/10/2025
389	DIVIER ALEXANDER FONSECA	1007419879	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	14/10/2025
390	ANDERSON LEINER QUILCE JURADO	1109419579	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	14/10/2025
391	JORGE MARIO LEAL GONZALEZ	93413074	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	14/10/2025

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
392	JUAN GABRIEL VARON MURCIA	5822926	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	14/10/2025
393	ROBERTO CARVAJAL GONZALEZ	10109284	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	15/10/2025
394	FERNANDO JOSE DE LA OSSA COGOLLO	1007781505	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	15/10/2025
395	JAIRO AGUSTIN BRAVO PEÑATA	1067895836	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	15/10/2025
396	WILLIAM VALENCIA SOTO	1055755645	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	16/10/2025
397	DUVAN ALBERTO TENORIO PUYO	1007150565	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	16/10/2025
398	LUIS ALEJANDRO ROZO SANTOS	1245278762	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	16/10/2025
399	GUSTAVO MATEUS CARDONA	94252218	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	16/10/2025
400	MAX RAFAEL RIVERO RODRIGUEZ	4990730	MAESTRO	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	16/10/2025
401	RANDY JOSE GONZALEZ PIÑERO	4870728	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	16/10/2025
402	CARLOS MARIO SERNA GIL	98707930	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	16/10/2025
403	NESTOR IRIARTE PEREZ	1047365945	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	17/10/2025
404	LUIS RAFAEL DOMINIQUETTI SERRA	9148961	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	17/10/2025
405	EDUARDO ENRIQUE CERVANTES CABALLERO	1041976650	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	17/10/2025
406	JUAN ROMAN APOLINAR GUEVARA	17337676	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	17/10/2025
407	JAIR ARTURO TREJOS ORTIZ	15915439	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	17/10/2025
408	OSCAR DE JESUS ORTIZ	15920158	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	17/10/2025
409	CARLOS EFREN LOZANO	17700924	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	17/10/2025
410	EDUARDO ANTONIO TOVAR YANCE	17589709	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	20/10/2025
411	CARLOS SANCHEZ FAJARDO	17287335	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	20/10/2025

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
412	FABIO ESTEVAN GARCIA BARROS	1030625946	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	21/10/2025
413	JORGE LUIS GONZALEZ CASTELLANOS	80744773	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	21/10/2025
414	JAN CARLOS LOZANO VALDERRAMA	1015459196	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	22/10/2025
415	REINEL GUEVARA NAVARRO	18972384	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	23/10/2025
416	EILER CHONA LAZARO	13379544	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	23/10/2025
417	ISMAEL ANTONIO VERA SANCHEZ	1127666567	MAESTRO	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	23/10/2025
418	WILLIGTON ALEXANDER RUIZ RIAÑO	1094045357	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	23/10/2025
419	DANIEL ALEJANDRO CASTRILLON MOLINA	1054925165	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	24/10/2025
420	OSCAR ANDRES VILLEGAS GONZALEZ	4519439	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	24/10/2025
421	VICTOR HUGO CORTES BEDOYA	1054922390	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	24/10/2025
422	EDINSON BENITO ARIAS DIAZ	1096219784	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	24/10/2025
423	HORACIO GELVES NIÑO	91470413	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	24/10/2025
424	OMAR HERNANDEZ SANCHEZ	91435391	MAESTRO	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	24/10/2025
425	ADALBERTO ORTIZ VELASQUEZ	71985421	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	24/10/2025
426	ARBENIS EZEQUIEL HERNANDEZ PARRA	5505505	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	24/10/2025
427	LUIS ALBERTO VENERA MATUTE	1193546254	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	24/10/2025
428	CARLOS RONALDO TIQUE HURTADO	1116807138	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	24/10/2025
429	ANDRES FANDIÑO PEÑA	80748984	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	24/10/2025
430	RODRIGO SUAREZ VIVAS	80165589	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	24/10/2025
431	JOSE ABELARDO GOMEZ PIAMBA	76336429	MAESTRO	REGIONAL CENTRAL-OCCIDENTAL-NORTE-ORIENTE-NOROESTE-VIEJO CALDAS	29/10/2025

CONSORCIO BETA REGIONALES

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
432	ALVARO ALEXANDER GOMEZ NARVAEZ	1004631289	OFICIAL	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS	4/11/2025
433	ANGELA MERCEDES GONZALEZ SANTACRUZ	1085269054	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS	4/11/2025
434	FIDENCIO FERNANDO URBANO MUÑOZ	1084222993	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS	4/11/2025
435	JESUS ADRIANO OCAMPO GOMEZ	9870154	OFICIAL	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS	4/11/2025
436	JOHN ANDERSON GELPUD LOPEZ	1004439559	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS	4/11/2025
437	JOSE JUVENCIO GARCIA TABLA	12975881	MAESTRO	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS	4/11/2025
438	LUIS ARMANDO GARCIA TABLA	12986773	MAESTRO	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS	4/11/2025
439	MARCELINO CASTILLO MOYA	7477740	VISITANTE	EPMSC SAN ANDRÉS	5/11/2025
440	CRISTIAN CAMILO DOMINGUEZ OROZCO	1123620560	VISITANTE	EPMSC SAN ANDRÉS	5/11/2025
441	IVAN ALFONSO HERRERA MONTAÑEZ	1123622310	VISITANTE	EPMSC SAN ANDRÉS	5/11/2025
442	GUILLERMO MORALES JOHNSON	18001008	VISITANTE	EPMSC SAN ANDRÉS	5/11/2025
443	SANDY JOHANA FLOREZ PABON	30188331	APOYO DE OBRA	REGIONAL NOROESTE	5/11/2025
444	ANDRES FELIPE NOGUERA CARDENAS	1106895862	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL NOROESTE	5/11/2025
445	ANDERSON POSADA MORENO	1001021122	AYUDANTE	REGIONAL NOROESTE	5/11/2025
446	DAIRO ALEXANDER PALACIOS ARDILA	1001021842	AYUDANTE	REGIONAL NOROESTE	5/11/2025
447	JADER STIVEN ORTIZ ORTEGA	1028035015	AYUDANTE	REGIONAL NOROESTE	5/11/2025
448	JOHAN ANDRES RIVAS MURILLO	1192751615	AYUDANTE	REGIONAL NOROESTE	5/11/2025
449	SADIR DE JESUS MORALES FERREIRA	78645193	VISITANTE	REGIONAL NOROESTE	6/11/2025
450	LUIS FELIPE MIGUEZ LOPEZ	1051240768	VISITANTE	REGIONAL NOROESTE	6/11/2025
451	EDISON REINEL SUAREZ DAVILA	13271080	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	8/11/2025
452	HERNRY ALBERTO VARGAS	88178439	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	8/11/2025
453	HILARIO VILLARRUEL BAÑOS	3886487	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	8/11/2025
454	PASTOR MAJIN VARGAS	16726720	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	8/11/2025
455	RONALDO CORTES	1093292094	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	8/11/2025
456	WILLIAM ALEJANDRO HERNANDEZ	1090389025	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	8/11/2025
457	JAIME ALEXANDER CARDENAS BUENO	1233489884	OFICIAL	REGIONAL ORIENTE	9/11/2025
458	ADRIANA AREVALO MANCILLA	60382557	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL NOROESTE	9/11/2025

CONSORCIO BETA REGIONALES

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
459	JONIER STIVEN MARTINEZ VALENCIA	1007825351	VISITANTE	REGIONAL NOROESTE	9/11/2025
460	ADRIANA NIETO MORENO	1022929595	SST	REGIONAL OCCIDENTE	9/11/2025
461	MARCELINO CASTILLO MOYA	7477740	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	11/11/2025
462	CRISTIAN CAMILO DOMINGUEZ OROZCO	1123620560	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	11/11/2025
463	IVAN ALFONSO HERRERA MONTAÑEZ	1123622310	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	11/11/2025
464	GUILLERMO MORALES JOHNSON	18001008	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	11/11/2025
465	GILDARDO ANTONIO DAVID MAZO	1027946372	OFICIAL	REGIONAL NOROESTE	13/11/2025
466	LUIS EDGAR YANEZ PEÑARANDA	1148694641	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	13/11/2025
467	JUAN DIEGO ROLON LUNA	1092154433	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	13/11/2025
468	OLIER MANUEL UBARNE CUADRADO	1068808704	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	13/11/2025
469	CESAR AUGUSTO TRIANA	1102348912	OFICIAL	REGIONAL ORIENTE	13/11/2025
470	PEDRO JESUS GONZALEZ DIAZ	91353046	OFICIAL	REGIONAL ORIENTE	13/11/2025
471	YHERSON ANDRES LUNA BARRAGAN	1095790466	OFICIAL	REGIONAL ORIENTE	13/11/2025
472	JOHN EDUARDO ROJAS	98363542	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL NOROESTE	14/11/2025
473	FRANCISCO ALBERTO BENAVIDEZ PAZ	79728853	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	14/11/2025
474	JAVIER ARMANDO PARRA SALCEDO	12968327	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	14/11/2025
475	MARIO ALBERTO CAICEDO CHAVES	1085244357	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	14/11/2025
476	MICAHEL SALCEDO CASTEÑO	1113641869	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	14/11/2025
477	LUIS FERNANDO CORREA JAIME	79622344	VISITANTE	REGIONAL NOROESTE	18/11/2025
478	JOHN JAIRO JAMES ACEVEDO	1092342458	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	18/11/2025
479	JOHN MARCOS PALENCIA VELASCO	1093776437	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	18/11/2025
480	JHON FREDY PANCHE PRADA	1023032909	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL	18/11/2025
481	CAMILO ANDRES URREA PINEDA	1023027096	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	18/11/2025
482	EDUARDO ALEXIS NIÑO ORTIZ	1102370775	OFICIAL	REGIONAL ORIENTE	18/11/2025
483	ADREANYER MANUEL HURTADO ABAD	7165651	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	19/11/2025
484	WELFER ESTEBAN HERNÁNDEZ CIRO	1098820760	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL ORIENTE	19/11/2025
485	CRISTIAN GIOVAN LUNA BARRAGAN	91526410	OFICIAL	REGIONAL NORTE	19/11/2025
486	GABRIEL OVIEDO GIL	1065233222	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	19/11/2025

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
487	OMAR ENRIQUE OVIEDO GIL	73015076	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	19/11/2025
488	DALCIA PAOLA RIVADENEIRA CASTRILLO	1118839606	APOYO DE OBRA	REGIONAL NORTE	19/11/2025
489	JOSE ANTONIO VARGAS	7592807	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	19/11/2025
490	EIMAR ALFONOS YACUMAL	1061789307	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	20/11/2025
491	GERMAN ALONSO YACUMAL MOMPOTES	76325358	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	20/11/2025
492	ARGEL RAAD ALTAMAR	1098741210	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	21/11/2025
493	CARMEN PAOLA CACERES AMADO	63505804	TECNICO	REGIONAL NORTE	21/11/2025
494	CRISTOBAL FLOREZ ESCOBAR	18974955	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	21/11/2025
495	ELADIO JOSE MENDEZ SERPA	1102858170	OFICIAL	REGIONAL NORTE	21/11/2025
496	GREGORIO BENEDITO PERALTA GONZALEZ	7167818	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	21/11/2025
497	JHON JAIDER STIVEN HERRERA CABEZA	1099940062	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	21/11/2025
498	MAYCOL DE JESUS ARRIETA ALMARIO	1066754180	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	21/11/2025
499	BRAYANT BEDOYA CHAVEZ	1124243021	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL CENTRAL	21/11/2025
500	EDICSON DARLEY CRUZ ROMERO	1124244654	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	21/11/2025
501	FAVIO ALEXANDER GONZALEZ MONTAÑO	17293348	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	21/11/2025
502	JOHN EMILIANO YEPES JARAMILLO	71269407	OFICIAL	REGIONAL NOROESTE	21/11/2025
503	SERGIO ANDRES CASTAÑO DAVID	1151447546	OFICIAL	REGIONAL NOROESTE	21/11/2025
504	ALEJANDRO ENRIQUE MANJARRES CARRASCO	8534857	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	24/11/2025
505	CRISPINIANO HURTADO CARO	1052944045	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	24/11/2025
506	CHRISTIAN DAVID RAMOS VILLALBA	11255087	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	24/11/2025
507	JHON WILMAR RODRIGUEZ NIETO	1122119531	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	24/11/2025
508	LUIS ALBERTO SILVA CRUZ	80262833	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	24/11/2025
509	SERGIO STEVEN GOMEZ PEREZ	1122142205	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	24/11/2025
510	CARLOS ANTONIO CARDENAS CARDENAS	88311818	AYUDANTE	OCCIDNETE , VIEJO CALDAS - NOROESTE	24/11/2025
511	LUISA FERNANDA LEGARDA ORELLANA	1004509882	RESIDENTE	OCCIDNETE , VIEJO CALDAS - NOROESTE	24/11/2025
512	VICTOR JULIO MILQUES ROJAS	19497338	AYUDANTE	OCCIDNETE , VIEJO CALDAS - NOROESTE	24/11/2025

CONSORCIO BETA REGIONALES

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
513	WILMER POVEDA HERNANDEZ	1090439158	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	24/11/2025
514	MARCELINO CASTILLO MOYA	7477740	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	24/11/2025
515	CARLOS MARIO VILLADA NAVAS	1042061980	AYUDANTE	OCCIDNETE , VIEJO CALDAS - NOROESTE	26/11/2025
516	CARLOS MAURO BENAVIDES PALACIO	1071579008	AYUDANTE	OCCIDNETE , VIEJO CALDAS - NOROESTE	26/11/2025
517	CRISTIAN DAVID ATENCIA	1038107816	AYUDANTE	OCCIDNETE , VIEJO CALDAS - NOROESTE	26/11/2025
518	EDWIN GUSTAVO CASTAÑEDA DELGADO	1104711901	AYUDANTE	OCCIDNETE , VIEJO CALDAS - NOROESTE	26/11/2025
519	HERASMO JOSE ROMERO HERNANDEZ	1002442293	AYUDANTE	OCCIDNETE , VIEJO CALDAS - NOROESTE	26/11/2025
520	ISAIAS MANUEL SANDOVAL MAESTRA	1002206793	AYUDANTE	OCCIDNETE , VIEJO CALDAS - NOROESTE	26/11/2025
521	JAIME ALBERTO RAMIREZ PALACIOS	79214638	AYUDANTE	OCCIDNETE , VIEJO CALDAS - NOROESTE	26/11/2025
522	RODRIGO DE JESUS GRAJALES	16856730	AYUDANTE	OCCIDNETE , VIEJO CALDAS - NOROESTE	26/11/2025
523	LUIS CARLOS CADENA SEGOVIA	85434555	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	27/11/2025
524	MANUEL ESTEBAN PINEDA CORONADO	12583746	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	27/11/2025
525	TITO LUCIANO RANGEL CADENA	85272423	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	27/11/2025
526	MARCO AURELIO ARIAS	1093747032	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	28/11/2025
527	ABIGAIL PRADA	88213982	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	28/11/2025
528	DANIEL JEOVANI ACOSTA COLON	9140839	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	28/11/2025
529	JESUS LISANGEL AGRIZONES	5281178	AYUDANTE	OCCIDNETE , VIEJO CALDAS - NOROESTE	28/11/2025
530	CARLOS EDUARDO MORALES MARIN	1058198303	AYUDANTE	OCCIDNETE , VIEJO CALDAS - NOROESTE	29/11/2025
531	JESUS ALEJANDRO RODRIGUEZ MARTINEZ	1105465903 4	AYUDANTE	OCCIDNETE , VIEJO CALDAS - NOROESTE	29/11/2025
532	JHON ALEXANDER OCHOA FIGUEROA	1002444097	AYUDANTE	OCCIDNETE , VIEJO CALDAS - NOROESTE	29/11/2025
533	JAIRO ALBERTO GARAVITO QUINTERO	7171245	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	1/12/2025
534	VICTOR ALBERTO GALINDO VEGA	1049633563	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	1/12/2025
535	WILMAR YAIR BENITEZ GUEVARA	1056028443	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	1/12/2025
536	YUSEPI ALEJANDRO LUNA RIVAS	7166272	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	1/12/2025
537	LUIS CARLOS VIDAL REINES	84007805	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	1/12/2025
538	EDILBERTO RINCON VILORIA	85443431	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	1/12/2025
539	HENRY SERRANO QUINTERO	1065205036	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	2/12/2025
540	JAIRO ALONSO LEAL LUNA	88263537	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	2/12/2025

CONSORCIO BETA REGIONALES

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
541	JHON ALEXANDER MUÑOZ LOPEZ	1054545625	AYUDANTE	OCCIDNETE , VIEJO CALDAS - NOROESTE	2/12/2025
542	JULIO ESTEBAN BONILLA ROJAS	1001090565	AYUDANTE	OCCIDNETE , VIEJO CALDAS - NOROESTE	2/12/2025
543	ALBER SANABRIA PALENCIA	72294692	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	2/12/2025
544	ENDER ENRIQUE HERRERA PAREJO	1007122386	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	2/12/2025
545	JOSE CARLOS PEREZ DE LA HOZ	72210275	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	2/12/2025
546	JOSE DAVID MARTINEZ MARTINEZ	1045679572	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	2/12/2025
547	EDISON FABIAN POBLADOR OCHOA	1023024591	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	4/12/2025
548	JAROL HUMBERTO ROA BUITRAGO	1022967445	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	4/12/2025
549	JHONATAN ESNEIDER VELASCO LEON	1033817675	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	4/12/2025
550	MIGUEL ANGEL MALDONADO LOPEZ	1030646964	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	4/12/2025
551	NIXON NICOLAS AVILA AGUILERA	1014303660	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	4/12/2025
552	DIEGO ALEJANDRO PARRA ALMEYDA	1120505380	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	4/12/2025
553	BRAYANT BEDOYA CHAVEZ	1124243021	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	4/12/2025
554	JORGE LUIS ACONCHA LUNA	18927275	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	4/12/2025
555	ALDREY MOROMBIA TOCRESAMA	1120500006 3	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	4/12/2025
556	MICHAEL JAVIER RUBIANO SERRANO	1006697596	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	4/12/2025
557	ALBINO PEREZ AVILA	79650369	AYUDANTE	OCCIDNETE , VIEJO CALDAS - NOROESTE	4/12/2025
558	LUIS ALEXANDER VERDUGO RANGEL	91522205	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	4/12/2025
559	MIGUEL ANGEL MALDONADO LOPEZ	1030646964	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	4/12/2025
560	ANDERSON FABIÁN BAUTISTA PABÓN	1098734552	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	5/12/2025
561	HARLEY ANTHONY BENT BARRANCO	1123627567	AYUDANTE	OCCIDNETE , VIEJO CALDAS - NOROESTE	17/12/2025
562	LUIS ANTONIO AGUILAR ALONSO	80643994	AYUDANTE	OCCIDNETE , VIEJO CALDAS - NOROESTE	17/12/2025
563	JHONATHAN ERNESTO ALVAREZ BAEZ	1052383633	AYUDANTE	OCCIDNETE , VIEJO CALDAS - NOROESTE	17/12/2025
564	JIAN FRANCO SANCHEZ OSORI	1007764073	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	17/12/2025
565	JACKELINE EDELMIRA STEELE PARRA	40986214	RESIDENTE	REGIONAL NORTE	18/12/2025
566	MARCOS FIDEL CASTILLO RINCON	1120378902	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	19/12/2025
567	MAYCOL ESTIBEN ROJAS TAPIERO	1006688684	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	19/12/2025
568	JESUS DAVID ALEMAN ANGULO	1103116668	RESIDENTE	REGIONAL NORTE	19/12/2025

CONSORCIO BETA REGIONALES

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
569	RENSSON ALBERTO PINZON ALFONSO	17594026	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	19/12/2025
570	CESAR AUGUSTO SILVA MARTINEZ	1100952723	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	29/12/2025
571	JHON MARIO ACEVEDO FLÓREZ	1098714434	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	29/12/2025
572	JHONNY ANDRES MARULANDA CARVAJAL	1039693860	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	29/12/2025
573	MIGUEL ANGEL VILLAMIZAR CONTRERAS	1098788331	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	29/12/2025
574	MANUEL JOSE LOZANO BETANCOURT	93134611	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	29/12/2025
575	CLIMACO CARDENAS PEREZ	3171665	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	29/12/2025
576	DUBAN ARLEY CARDENAS GOMEZ	1000353254	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	29/12/2025
577	RICHARD ARLEY SEPULVEDA ONTIVEROS	1093738984	AYUDANTE	REGIONAL VIEJO CALDAS	8/01/2026
578	RICARDO SANDOVAL PEÑA	18262125	AYUDANTE	REGIONAL VIEJO CALDAS	8/01/2026
579	JESUS MARIA FUYA MOZO	1056708491	AYUDANTE	REGIONAL VIEJO CALDAS	8/01/2026
580	HUGO ENRIQUE SEPULVEDA JACOME	1090496944	AYUDANTE	REGIONAL VIEJO CALDAS	8/01/2026
581	CARLOS ALBERTO CAMACHO JAIMES	1098622542	AYUDANTE	REGIONAL VIEJO CALDAS	8/01/2026
582	JHORMAN SNEYDER GOMEZ PITA	1006408695	AYUDANTE	REGIONAL VIEJO CALDAS	8/01/2026
583	CESAR AUGUSTO SILVA MARTINEZ	1100952723	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	8/01/2026
584	ANDRES FELIPE GONZALEZ MARTIN	1000774243	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	9/01/2026
585	LEONARDO JAIDER BRAVO GUZMAN	12266998	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	9/01/2026
586	RAFAEL MONROY CABALLERO	13456598	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	9/01/2026
587	DENIS MANUEL TORO MORALES	15671609	AYUDANTE	OCCIDNETE , VIEJO CALDAS - NOROESTE	13/01/2026
588	HINZ EDUARDO BERJAN AMAYA	4437661	AYUDANTE	OCCIDNETE , VIEJO CALDAS - NOROESTE	13/01/2026
589	JOSE SILVESTRE MORALES HOYOS	15676942	AYUDANTE	OCCIDNETE , VIEJO CALDAS - NOROESTE	13/01/2026
590	JUAN DAVID LUNA GAITAN	1054538753	AYUDANTE	OCCIDNETE , VIEJO CALDAS - NOROESTE	13/01/2026
591	ROBERTO ANTONIO SIERRA MALDONADO	7166646	AYUDANTE	OCCIDNETE , VIEJO CALDAS - NOROESTE	13/01/2026
592	ULISES MURILLO MADRID	1054555053	AYUDANTE	OCCIDNETE , VIEJO CALDAS - NOROESTE	13/01/2026
593	YULEYDA PATRICIA MORALES GOMEZ	50936407	AYUDANTE	OCCIDNETE , VIEJO CALDAS - NOROESTE	13/01/2026
594	ANDERSON JULIAN FLORES ALVIS	1030670601	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL	15/01/2026
595	JORGE DIONICIO VEGA CACERES	1010113402	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	15/01/2026

CONSORCIO BETA REGIONALES

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
596	JUAN ANDRES JURADO BENAVIDES	1006947590	APOYO DE OBRA	REGIONAL CENTRAL	15/01/2026
597	LUIS FERNANDO TORRES CASTEL_	74245031	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	15/01/2026
598	NAZAEL RODRIGUEZ LOPEZ	4050800	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	15/01/2026
599	ANGELA FAHISURY CARVAJAL BARRERA	1052400259	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL CENTRAL	16/01/2026
600	ANGUIE LIZETH MURCIA MOLINA	1065611154	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	16/01/2026
601	EDISON FABIAN POBLADOR OCHOA	1023024591	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	16/01/2026
602	HUMBERTO ROA	13444945	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	16/01/2026
603	JAROL HUMBERTO ROA BUITRAGO	1022967445	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	16/01/2026
604	JHONATAN ESNEIDER VELASCO LEON	1033817675	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	16/01/2026
605	JUAN FELIPE CORDERO NAVARRO	1136911704	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	16/01/2026
606	MIGUEL ANGEL MALDONADO LOPEZ	1030646964	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	16/01/2026
607	OMAR NARANJO PICO	1098406778	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	16/01/2026
608	KEVIN STEPHAN CARO VERGARA	1005581365	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	16/01/2026
609	MANUEL JOSE NAVARRO MARTINEZ	1100624160	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	16/01/2026
610	JOSE ORLANDO OSSA GONZALEZ	4403296	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	16/01/2026
611	BRAYAN RENE CALDERON CAMARGO	1090476702	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	16/01/2026
612	DANIEL DAVID CASAS VEGA	88245358	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	16/01/2026
613	ISMAEL CRESPO JAIMES	1127361855	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	16/01/2026
614	JOSE VICENTE VERA GUTIERREZ	88226733	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	16/01/2026
615	JUNIOR ANDRES HERRERA CALDERON	1090373365	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	16/01/2026
616	LUIS CARLOS VILLEGAS BALLENA	5092805	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	16/01/2026
617	LUIS GUILLERMO MARTÍNEZ BARRAGAN	1101622267	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	16/01/2026
618	MILLER ANDRES MENDEZ BARRAGAN	1101546565	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	16/01/2026
619	PLUTARCO SOLANO MARTINEZ	91344588	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	16/01/2026
620	ROQUE ANTONIO MACHADO DAZA	13279123	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	16/01/2026
621	ALBERTO MARIO PEREZ NAVARRO	3738522	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	16/01/2026
622	CARLOS JAVIER BORJA JORDAN	1143227061	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	16/01/2026

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
623	LORENZO ALEJANDRO CARDONA GALVIS	75102901	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL VIEJO CALDAS , OCCIDENTE Y NOROESTE	16/01/2026
624	CARLOS ALFONSO CUJIA MANJARREZ	1065577261	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL VIEJO CALDAS , OCCIDENTE Y NOROESTE	16/01/2026
625	LORENZO ALEJANDRO CARDONA GALVIS	75102901	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL VIEJO CALDAS , OCCIDENTE Y NOROESTE	20/01/2026
626	CARLOS ALFONSO CUJIA MANJARREZ	1065577261	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL VIEJO CALDAS , OCCIDENTE Y NOROESTE	20/01/2026
627	JOHAN STIVEN RUIZ ALMECIGA	1071169654	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	20/01/2026
628	JOSE ALEJANDRO RODRIGUEZ	79616417	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	20/01/2026
629	ADRIANA AREVALO MANCILLA	60382557	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL CENTRAL	20/01/2026
630	DULIS CESAR ALVARADO PADILLA	7617663	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	20/01/2026
631	IGNACIO MILLAN ORJUELA	17267505	AYUDANTE	REGIONAL VIEJO CALDAS ,OCCIDENTE Y NOROESTE	21/01/2026
632	JORGE MARIO LEAL GONZALEZ	93413074	AYUDANTE	REGIONAL VIEJO CALDAS ,OCCIDENTE Y NOROESTE	21/01/2026
633	LEONARDO MONTOYA TOVAR	5973089	AYUDANTE	REGIONAL VIEJO CALDAS ,OCCIDENTE Y NOROESTE	21/01/2026
634	ANDRES FELIPE GONZALEZ MARTIN	1000774243	ELECTRICO	REGIONAL CENTRAL	22/01/2026
635	CHRISTIAN DAVID RAMOS VILLALBA	11255087	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	22/01/2026
636	ELIO JOSE CARPAVIRE	8296978	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	22/01/2026
637	FRANKLIN HERNAN CASTELLANOS	1090479205	MAESTRO	REGIONAL CENTRAL	22/01/2026
638	JUAN DIEGO ROLON LUNA	1092154433	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	22/01/2026
639	LUIS ALBERTO SILVA CRUZ	80262833	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	22/01/2026
640	LUIS EDGAR YANEZ PEÑARANDA	1148694641	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL	22/01/2026
641	WILLIAN JOSE DURAN	5731911	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	22/01/2026
642	BENJAMIN ANTOLINEZ QUINTERO	1129593	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	22/01/2026

CONSORCIO BETA REGIONALES

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
643	HAROLD SNEIDER PINTO SUAREZ	1019602207	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	22/01/2026
644	CRISTANCHO CARDENAS SAENZ	74328190	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	22/01/2026
645	ARGEL RAAD ALTAMAR	1098741210	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	22/01/2026
646	CARLOS JAVIER BORJA JORDAN	1143227061	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	22/01/2026
647	CARMEN PAOLA CACERES AMADO	63505804	ELECTRICO	REGIONAL NORTE	22/01/2026
648	CRISTIAN GIOVANNY LUNA BARRAGÁN	91526410	OFICIAL	REGIONAL NORTE	22/01/2026
649	DALCIA PAOLA RIVADENEIRA	1118839606	APOYO DE OBRA	REGIONAL NORTE	22/01/2026
650	ENDER ENRIQUE HERRERA PAREJO	1007122386	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	22/01/2026
651	GREGORIO BENEDITO PERALTA	7167818	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	22/01/2026
652	JADER LUIS ARAUJO PINEDA	19595428	OFICIAL	REGIONAL NORTE	22/01/2026
653	JHON JAIDER STIVEN HERRERA	1099940062	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	22/01/2026
654	JOHANA LICETH DIAZ OSORIO	1098787392	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL NORTE	22/01/2026
655	JOSÉ ANTONIO VARGAS	7592807	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	22/01/2026
656	JOSE DAVID MARTINEZ MARTINEZ	1045679572	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	22/01/2026
657	ALBERTO MARIO PEREZ NAVARRO	3738522	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	22/01/2026
658	MANUEL ANTONIO PEREZ LINERO	1129524006	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	22/01/2026
659	EDUARDO ENRIQUE CERVANTES CABALLERO	1041976650	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	23/01/2026
660	JOSE CARLOS PEREZ DE LA HOZ	72210275	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	23/01/2026
661	PEDRO MALAMBO GUARDO	73200173	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	23/01/2026
662	ALEXANDER DIONISIO RAMOS CARO	73182082	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	24/01/2026
663	CARLOS ANDRES VILLANUEVA NUÑEZ	1143454702	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	24/01/2026
664	EDILBERTO CHINCHILLA PALLARES	12568317	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	24/01/2026
665	RAFAEL MERCADO SILGADO	9042982	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	24/01/2026
666	CAMILO ANTONIO LOPEZ OCAMPO	1123531291	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	24/01/2026
667	CARLOS ALBERTO SALDARRIAGA ALVAREZ	86013281	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	24/01/2026
668	ANDRES FELIPE GONZALEZ PEREZ	1100627390	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	24/01/2026

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
669	CARLOS ANDRES ZAPATA PRESIGA	1001145197	AYUDANTE	REGIONAL VIEJO CALDAS ,OCCIDENTE Y NOROESTE	24/01/2026
670	JAVIER ARMANDO PARRA SALCEDO	12968327	AYUDANTE	REGIONAL VIEJO CALDAS ,OCCIDENTE Y NOROESTE	24/01/2026
671	JESUS DANIEL ARTEAGA LUGO	1003071663	AYUDANTE	REGIONAL VIEJO CALDAS ,OCCIDENTE Y NOROESTE	24/01/2026
672	MICHAEL SALCEDO CASTAÑO	1113641869	AYUDANTE	REGIONAL VIEJO CALDAS ,OCCIDENTE Y NOROESTE	24/01/2026
673	ASTRID CAROLINA MEDINA BOBADILLA	1119217740	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	28/01/2026
674	DEYBI ANDRÉS JAIMES TARAZONA	80921707	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	28/01/2026
675	JESUS MAURICIO MACIAS GONZALEZ	1024569383	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	28/01/2026
676	JORGE ARMANDO MARTINEZ CAMELO	80226139	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	28/01/2026
677	JORGE LUIS GONZÁLEZ PALLARES	1091803887	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	28/01/2026
678	WILLIAM CAICEDO CASTILLO	80372534	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	28/01/2026
679	MAICOL ESTEBAN BRACAMONTE MARTÍNEZ	1005108009	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	28/01/2026
680	ALEJANDRO FONSECA CACERES	1098764868	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	28/01/2026
681	JAIRO AGUSTIN BRAVO PEÑATA	1067895836	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	28/01/2026
682	CARLOS ALBERTO CAMACHO JAIMES	1098622452	AYUDANTE	REGIONAL VIEJO CALDAS , OCCIDENTE Y NOROESTE	28/01/2026
683	CARLOS AUGUSTO VAQUIRO	11316941	AYUDANTE	REGIONAL VIEJO CALDAS , OCCIDENTE Y NOROESTE	28/01/2026
684	HAROLD ANDRES MEJIA OSORIO	9874579	AYUDANTE	REGIONAL VIEJO CALDAS , OCCIDENTE Y NOROESTE	28/01/2026
685	JEFFERSON ESTIVEN OSORIO	1088022764	AYUDANTE	REGIONAL VIEJO CALDAS , OCCIDENTE Y NOROESTE	28/01/2026
686	VICTOR MANUEL SANDOVAL MORALES	1003304880	AYUDANTE	REGIONAL VIEJO CALDAS , OCCIDENTE Y NOROESTE	28/01/2026
687	ANDRES FERNANDO TIBAQUIRA PIRAVAN	1010050473	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	28/01/2026
688	DAVID SEBASTIAN HERNANDEZ GALVIS	1023037023	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	28/01/2026
689	DIEGO ALEXANDER MARIN ARCILA	1032465108	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	28/01/2026
690	JAIME EDUARDO MANZANO BALDION	16801648	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	28/01/2026

CONSORCIO BETA REGIONALES

Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios

Justicia

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
691	MARTIN ACOSTA LINARES	79610836	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	28/01/2026
692	ANDRES FELIPE TORRES CAMARGO	1014290145	APOYO DE OBRA	REGIONAL CENTRAL	3/02/2026
693	HUGO ARMANDO DOMINGUEZ OTERO	15647682	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	3/02/2026
694	ERASMO MARTINEZ	323432	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	3/02/2026
695	JORGE HERNAN PATIÑO SANCHEZ	1023017718	APOYO DE OBRA	REGIONAL CENTRAL	3/02/2026
696	MILLER ALEJANDRO MENDEZ CHIVATA	80742891	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL	3/02/2026
697	SONIA DANIELA GUTIERREZ CIFUENTES	1023017719	APOYO DE OBRA	REGIONAL CENTRAL	3/02/2026
698	STEED BARCENAS ROBAYO	80232649	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	3/02/2026
699	JESUS MAURICIO MACIAS GONZALEZ	1024569383	APOYO DE OBRA	REGIONAL CENTRAL	3/02/2026
700	JESUS ORLANDO COLORADO OLAYA	1006693731	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	3/02/2026
701	JUAN ESTEBAN BARON GALINDO	1050603645	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	3/02/2026
702	WILIAN ORLEY MARTINEZ CUESTA	79667092	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	3/02/2026
703	FAVIO ALEXANDER GONZALEZ MONTAÑA	17293348	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	3/02/2026
704	PEDRO JESUS GONZALEZ DIAZ	91353046	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	3/02/2026
705	ERICK FERNANDO COLMENARES	1094947866	APOYO DE OBRA	REGIONAL VIEJO CALDAS ,OCCIDENTE Y NOROESTE	3/02/2026
706	HUGO ARMANDO DOMINGUEZ OTERO	1064983252	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	4/02/2026
707	EDWIN ESPINOSA UZETA	1015396112	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL	10/02/2026
708	JEYSON DAVID ROJAS PAYARES	1033712661	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL	10/02/2026
709	JOSE GIOVANNY BERMUDEZ PALACIO	1024512750	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL	10/02/2026
710	ELVER JAVIER MORA MOLINA	1003045498	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	10/02/2026
711	FILIBERTO MIGUEL PICO SANCHEZ	6877061	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	10/02/2026
712	LUIS CARLOS CHIMA NORIEGA	1067952224	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	10/02/2026
713	MAURICIO JOSE OROZCO HERNANDEZ	1067950867	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	10/02/2026
714	LUIS FELIPE MIGUEZ LOPEZ	1051240768	APOYO DE OBRA	REGIONAL VIEJO CALDAS ,OCCIDENTE Y NOROESTE	11/02/2026
715	MIGUEL ANTONIO GÓMEZ FLOREZ	1064983252	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	12/02/2026
716	JOSE MIGUEL GARCES FUENTES	1045492912	AYUDANTE	REGIONAL NOROESTE	12/02/2026
717	URIEL ANTONIO MANCO MANCO	3420743	MAESTRO	REGIONAL NOROESTE	12/02/2026

CONSORCIO BETA REGIONALES

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
718	HUGO ARMANDO DOMINGUEZ OTERO	15647682	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	13/02/2026
719	ANTONIO ALEXANDER LABRADOR CONTRERAS	5496954	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	13/02/2026
720	LUISA FERNANDA PROAÑOS CASALLAS	53036744	COORDINADORA	REGIONAL VIEJO CALDAS ,OCCIDENTE Y NOROESTE	14/02/2026
721	JAIME ORLANDO ACOSTA RIOS	79157190	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL VIEJO CALDAS ,OCCIDENTE Y NOROESTE	14/02/2026
722	CARLOS ALFONSO CUJIA MANJARREZ	1065577261	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL VIEJO CALDAS ,OCCIDENTE Y NOROESTE	14/02/2026
723	NIXON NICOLAS AVILA AGUILERA	1014303660	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	14/02/2026
724	OSCAR IVAN CUESTAS ESPINOSA	1032939738	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	14/02/2026
725	YEISON MOGOLLON ORTEGA	1093775476	RESIDENTE	REGIONAL CENTRAL	19/02/2026
726	JOHN MARCOS PALENCIA VELASCO	1093776437	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	19/02/2026
727	JOSE LEONARDO DIAZ ULLUA	1020748096	AYUDANTE	REGIONAL VIEJO CALDAS ,OCCIDENTE Y NOROESTE	19/02/2026
728	ANDRES FANDIÑO PEÑA.	80748984	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	19/02/2026
729	MERQUECIDED QUINTERO ARCIRIA	1002047944	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	19/02/2026
730	WILFRAN ANTONIO DE HOYOS MORELO	1001671387	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	19/02/2026
731	JOSE ALFREDO JIMENEZ REINOS	14013920	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	19/02/2026
732	JOSE LUIS AVILA CARDALES	6494532	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	19/02/2026
733	CRISTIAN FERNANDO HINCAPIE TORO	1058842570	AYUDANTE	REGIONAL VIEJO CALDAS ,OCCIDENTE Y NOROESTE	19/02/2026
734	DANILO RIOS VALENCIA	1055918321	AYUDANTE	REGIONAL VIEJO CALDAS ,OCCIDENTE Y NOROESTE	19/02/2026
735	GEIMAR ANDRES ORTIZ CORREDOR	16115435	AYUDANTE	REGIONAL VIEJO CALDAS ,OCCIDENTE Y NOROESTE	19/02/2026

CONSORCIO BETA REGIONALES

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
736	JESUS BERNARDO CORREA MARTINEZ	1054550756	AYUDANTE	REGIONAL VIEJO CALDAS ,OCCIDENTE Y NOROESTE	19/02/2026
737	LUIS ALBERTO ECHAVARRIA AVILA	1054543717	AYUDANTE	REGIONAL VIEJO CALDAS ,OCCIDENTE Y NOROESTE	19/02/2026
738	ANTHONY DUVAN VILLASMIL PUCHE	5413107	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	20/02/2026
739	FRANKLIN JAVIER SALINAS SAAVEDRA	5024133	APOYO DE OBRA	REGIONAL CENTRAL	20/02/2026
740	REINALDO ISIDRO GUTIERREZ MARQUEZ	3161886	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	20/02/2026
741	DAVID FELIPE DUARTE ESPITIA	1122133473	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	20/02/2026
742	BAIRON STEVEN MULFORD OCAMPO	1121932950	INSPECTOR DE OBRA	REGIONAL CENTRAL	20/02/2026
743	EDWIN LEONARDO HERRERA	1122131303	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	20/02/2026
744	DANIEL FELIPE QUINTERO HERRERA	1027891496	AYUDANTE	REGIONAL VIEJO CALDAS ,OCCIDENTE Y NOROESTE	23/02/2026
745	YOHAN DAVID FLOREZ IBARRA	1013556518	AYUDANTE	REGIONAL VIEJO CALDAS ,OCCIDENTE Y NOROESTE	23/02/2026
746	ADOLFO PACANCHIQUE	79134013	AYUDANTE	REGIONAL VIEJO CALDAS ,OCCIDENTE Y NOROESTE	23/02/2026
747	WILSON PAVA CARDENA	18921693	AYUDANTE	REGIONAL VIEJO CALDAS ,OCCIDENTE Y NOROESTE	23/02/2026
748	MARCO FIDEL PEDRAZA GALLO	79838222	AYUDANTE	REGIONAL VIEJO CALDAS ,OCCIDENTE Y NOROESTE	23/02/2026
749	KEVIN ANDRES GONZALEZ MURILLO	1033770247	AYUDANTE	REGIONAL VIEJO CALDAS ,OCCIDENTE Y NOROESTE	23/02/2026
750	EDWIN CAICEDO MINA	1006190692	AYUDANTE	REGIONAL VIEJO CALDAS ,OCCIDENTE Y NOROESTE	23/02/2026
751	NELSON ANDRES PARDO MANCERA	1071304077	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	24/02/2026
752	FARY CABRERA	18261964	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	24/02/2026

CONSORCIO BETA REGIONALES

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
753	EDUARD ARIEL BERNAL BUENO	1057690218	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	24/02/2026
754	DANIEL DAVID ESPITIA GUZMAN	1004307150	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	24/02/2026
755	JESUS ALBERTO TRESPALACIOS SANCHEZ	1090478543	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	24/02/2026
756	SAMIR ALFONSO RODRIGUEZ GUERRERO	1093737726	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	24/02/2026
757	DAVID TRESPALACIOS CAPATAZ	13470788	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	24/02/2026
758	GEYLER JHANS SIERRA SANABRIA	1013630766	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	4/03/2026
759	RAFAEL STEVEN ROJAS BECERRA	1014226170	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	4/03/2026
760	JUAN DAVID MONTOYA BLANCO	1006423850	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	4/03/2026
761	JUAN JOSE AVILA PEREZ	11522038	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	4/03/2026
762	FRANKY JAVIER GUERRERO CALDERON	1090414551	AYUDANTE	REGIONAL VIEJO CALDAS	5/03/2026
763	ANDREY ALBARRACIN TORRES	1118553052	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	9/03/2026
764	ALEXANDER SUAREZ FIGUEROA	13541878	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	9/03/2026
765	MAIKOL STICK MAHECHA MAHECHA	1120955621	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	9/03/2026
766	HECTOR ANDRES ZAPATA CARDONA	14567661	OFICIAL	REGIONAL VIEJO CALDAS	13/03/2026
767	ROBERT MANUEL VELASCO CONTRERAS	4372065	OFICIAL	REGIONAL VIEJO CALDAS	13/03/2026
768	ROBINSON BLANCO FIGUEROA	91279527	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	16/03/2026
769	CRISTIAN FABIAN MARTINEZ POVEDA	1095814349	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	16/03/2026
770	EDGAR BENAVIDES	79634045	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	16/03/2026
771	ENRIQUE YOHANNY SILVA AVENDAÑO	1149465700	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	16/03/2026
772	DUVAN FERNANDO SICHACA GONZALEZ	1057187035	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	16/03/2026
773	GEYLER JHANS SIERRA SANABRIA	1013630766	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	16/03/2026
774	RAFAEL STEVEN ROJAS BECERRA	1014226170	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	16/03/2026
775	CONAL YEFRY FERREIRA NIÑO	1098741598	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	19/03/2026
776	ERWIN GIOVANNI MURILLO PIMIENTO	137720769	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	19/03/2026
777	LUIS ALBERTO PASACHOA HERNANDEZ	1098708028	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	19/03/2026

CONSORCIO BETA REGIONALES

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
778	DUVAN FERNANDO SICHACA GONZALEZ	1057187035	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	19/03/2026
779	JOSE ALEJANDRO SANTAMARIA ESPEJO	80243991	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL	26/03/2026
780	JOHN ALEXANDER ENCISO BELLO	80049708	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL	26/03/2026
781	OSCAR ANDRES RIAÑO RAMIREZ	80201646	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL	26/03/2026
782	CRISTIAN CAMILO GONZALEZ PENAGOS	1007718421	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL	26/03/2026
783	JOHAN SEBASTIAN VARGAS CARDENAS	1028784824	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	26/03/2026
784	JORGE ARIEL SEGURA URUEÑA	1122120225	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	26/03/2026
785	MANUEL MARIA VILORIA RIVALDO	1082243908	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	26/03/2026
786	ROBERTH DANIEL ROJAS VARGAS	1082920794	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	26/03/2026
787	ANGELA MERCEDES GONZALEZ SANTACRUZ	1085269054	RESIDENTE DE OBRA	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	13/04/2026
788	CARLOS ALBERTO TORO RESTREPO	98535012	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	13/04/2026
789	CARLOS ANTONIO CARDENAS CARDENAS	88311818	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	13/04/2026
790	DILMER JOVANNY BAYONA RODRÍGUEZ	80777530	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	13/04/2026
791	FRANKLIN QUIÑONES QUIÑONES	16938024	OFICIAL	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	13/04/2026
792	GERARDO BORJA RUIZ	87941998	OFICIAL	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	13/04/2026
793	HECTOR LUIS ROSERO PRECIADO	1004614796	OFICIAL	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	13/04/2026
794	JAVIER GUILOMBO MONTES	7687771	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	13/04/2026

CONSORCIO BETA REGIONALES

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
795	JESUS ALEJANDRO RODRIGUEZ MARTINEZ	1105465903 4	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	13/04/2026
796	LUIS ALFONSO RODRÍGUEZ BONILLA	93413044	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	13/04/2026
797	MICAHEL SALCEDO CASTEÑO	1113641869	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	13/04/2026
798	VICTOR JULIO MILQUES ROJAS	19947338	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	13/04/2026
799	VLADIMIRO VASQUEZ ARCE	10185609	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	13/04/2026
800	DANIEL ADOLFO TABARES BASTIDAS	1110443602	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	17/04/2026
801	JHON JAIRO POLO FUENTES	78036808	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	17/04/2026
802	DANIEL MARIA CARVAJAL LOPEZ	6212586	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	17/04/2026
803	ALBERSON MOLINA ORDOÑEZ	1117544255	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	17/04/2026
804	PAVA ROMAN WILSON	1093762615	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	17/04/2026
805	WILMAR CAMILO PEREZ AVILA	1000323598	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	17/04/2026
806	HELI YIMMI CORDERO GALVIS	80361570	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	17/04/2026
807	JOHN JAIRO CORDERO MOLINA	1033681680	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	17/04/2026
808	JIMMY CORDERO MOLINA	1033707764	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	17/04/2026

CONSORCIO BETA REGIONALES

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
809	CESAR AUGUSTO MORENO MONTES	79954245	INGENEIRO	REGIONAL CENTRAL	20/04/2026
810	JOSE DEL CARMEN MERCHAN CARDENAS	79127801	OPERADOE	REGIONAL CENTRAL	20/04/2026
811	ANGELO FERNANDO RIOS	1027886187	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	21/04/2026
812	CLAUIDO GUALTERO BERMUDEZ	17711065	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	21/04/2026
813	SEBASTIAN ZAPATA ROJAS	1001020775	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	21/04/2026
814	NEY DE JESUS GARCIA	7252410	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	21/04/2026
815	MAICOL MONTOYA CARMONA	1056780119	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	21/04/2026
816	LUIS ALBERTO FONSECA RIVERA	1042436454	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	21/04/2026
817	OSCAR DANIEL PACHECO CAMARGO	1048315979	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	21/04/2026
818	DAVID JESUS CHAPAL BOTINA	1085320313	OFICIAL	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	22/04/2026
819	HERMES FROILAN DELGADO LUNA	1083752578	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	22/04/2026
820	JESUS ESPERIDION DOBANDO TORO	12746343	MAESTRO	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	22/04/2026
821	JUAN ALEXANDER GUERRA VALLEJO	1083752233	OFICIAL	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	22/04/2026
822	LUIS ORLANDO LUNA MARTINEZ	12746960	OFICIAL	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	22/04/2026
823	OBANDO TORO OSMALDO	13068176	MAESTRO	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	22/04/2026
824	OSCAR HERNAN GELPUD CORAL	1085291531	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	22/04/2026
825	SEGUNDO DARIO OBANDO TORO	5252424	MAESTRO	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	22/04/2026
826	JESUS MARIA FUYA MOZO	1056708491	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	22/04/2026
827	JOAQUIN DIAZ GONZALEZ	79631616	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	22/04/2026
828	JORGE ELIECER VIASUS MOLINA	7173051	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	22/04/2026
829	JOSE LUIS HERNANDEZ OCHOA	4081320	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	22/04/2026

CONSORCIO BETA REGIONALES

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
830	PEDRO ANTONIO BONILLA ARTUNDUAGA	93061247	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	22/04/2026
831	MICHAEL STIVEN HERRERA GUTIERREZ	1109292308	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	22/04/2026
832	RAFAEL ANTONIO BAEZ RODRIGUEZ	79318824	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	23/04/2026
833	ROSANA DE FREITAS PEREZ	5306212	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	23/04/2026
834	YEREMY GUEVARA GONZALEZ	6271724	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	23/04/2026
835	DIEGO FERNEY ROJAS ABRIL	79223760	MAESTRO	REGIONAL CENTRAL	23/04/2026
836	EDUARDO PARRA	79332484	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	23/04/2026
837	JHON ALEXANDER PUENTES ROJAS	79836472	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	23/04/2026
838	CRISTIAN FABIAN VARGAS MOROS	1090413023	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	23/04/2026
839	JOSE GREGORIO ALEAN BUITRAGO	88176564	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	23/04/2026
840	LUIS ALEXIS BURGOS CASTELLANOS	88241324	AYUDANTE	REGIONAL ORIENTE	23/04/2026
841	DIDIAN ANDRES GAVIRIA ESPINOSA	1061535954	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	23/04/2026
842	ARMANDO GOMEZ PIAMBA	10316793	MAESTRO	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	23/04/2026
843	ROBERTO JOSE FERNANDEZ MURILLO	5639720	AYUDANTE	REGIONAL CENTRAL	27/04/2026
844	GERMAN LUIS DONADO GUZMAN	8566318	AYUDANTE	REGIONAL NORTE	29/04/2026
845	CAMILO ALBERTO VARGAS BAEZ	1052404026	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	30/04/2026
846	CRISTIAN FABIAN ACUÑA LOZANO	1007139969	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	30/04/2026
847	JHONATHAN ERNESTO ALVAREZ BAEZ	1052383633	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	30/04/2026
848	ALFONSO CORONADO	80371284	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	4/05/2026
849	FABIAN CAMILO DEL VALLE PINZON	1012391807	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	4/05/2026
850	FRANKLIN JOSE OVALLE DOVALES	1127669165	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	4/05/2026
851	JAMER ROJAS RAMOS	1083908005	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	4/05/2026

ITEM	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Regional	Fecha de ingreso
852	JORGE ENRIQUE BERMUDEZ DIAZ	1023936707	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	4/05/2026
853	LUIS ALBERTO BERMUDEZ DIAZ	1023912742	AYUDANTE	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	4/05/2026
854	OLGA PIEDAD MEJIA GONZALEZ	24645529	APOYO DE OBRA	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	4/05/2026
855	YOLANDA MORA AGUILAR	52489217	APOYO DE OBRA	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	4/05/2026
856	MARTIN JAVIER CARDOZO RAMIREZ	79453907	APOYO DE OBRA	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	4/05/2026
857	ALEXANDER CASTAÑO RAMOS	93382606	APOYO DE OBRA	REGIONAL OCCIDENTE - VIEJO CALDAS-NOROESTE	4/05/2026
858	BENJAMIN ROJAS ABRIL	79219297	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL	4/05/2026
859	JEISSON ALEXANDER RIGUEROS BARRETO	1013628069	OFICIAL	REGIONAL CENTRAL	4/05/2026

Tabla 4 Personal del Contratista

12.2 PERSONAL DE INTERVENTORIA

PERSONAL INTERVENTORIA	CARGO
Diego Alejandro Leiva Ortiz	Representante Legal
Angelica María Artunduaga	Secretaria
Luis Jorge Cortes	Costos y Presupuestos
Paulo Cesar Silva Morales	Director
María Amelia Zabaleta Andrade	profesional SST
Natalia Isabel Martínez Campo	Coordinador
Jarkelys Ospino Gómez	Coordinador
Jesús David Polo Meza	Coordinador
Juan Sebastián González	Asistente Administrativo
Augusto Angarita Joya	Residente
Camilo Andrés Macualo Pérez	Residente
Carlos Armando Oviedo Morales	Residente
Diana Olaya Castro	Residente
francisco Alban	Residente
Hernán Rodrigo Aza Rodríguez	Residente
Huber Villareal Rubio	Residente
Iván Ochoa Barajas	Residente
Javier Mamian Vargas	Residente
Janner Murillo Riascos	Residente
John Leandro Hernández Parra	Residente
Juan Sebastián Bermeo Llanos	Residente
Lenin Lupercio Bohórquez Martínez	Residente
Kelin Yanida Marín ruiz	Residente
Plinio Rafael Gómez Archbold	Residente
Miguel Garzón Rojas	Residente
Miguel Ángel Tovar Perdomo	Residente
Ricardo Sarmiento Chaves	Residente
Rodrigo Alberto ascanio mantilla	Residente
Alejandro Torres Torres	Residente

Tabla 5 Personal de Interventoría

13. CONTROL DE RECURSOS – EQUIPOS Y MATERIALES.

Para el seguimiento y control la interventoría informa que durante este periodo se presentó de ingreso de materiales en los establecimientos en ejecución.

14. ACTAS DE COMITÉ

Para el seguimiento y control de la interventoría se adjunta las actas de comité de los establecimientos en ejecución.

15. INFORMES QUINCENALES

Se realiza entrega de 2 informes quincenales los cuales informan el avance del contrato y el registro de actividades realizadas en los periodos del 1 al 15 de junio y del 16 al 30 de junio del 2026.

16. BITACORA DE OBRA

Para el seguimiento y control la interventoría se adjunta la bitácora de los establecimientos en ejecución.

17. ESTADO LEGAL. (ver carpeta 17)

Pólizas Contrato de Obra

Pólizas otro si 7

Pólizas Contrato de interventoría

Pólizas otro si 7

18. RECOMENDACIONES Y SOLICITUDES

Durante el periodo correspondiente al presente informe se resalta:

Se presenta un atraso significativo (-12,21%) en el avance general del proyecto, es decir se presenta una disminución del atraso con respecto al mes inmediatamente anterior.

Se entiende que en una pequeña parte de esta desviación está representada en situaciones ajenas al contratista, pero en la mayoría de los casos, es decir de un peso porcentual mayor, son por causas inherentes a la actividad del contratista como son:

- Establecimientos que iniciaron actividades, pero no se evidencia avance.
- La no entrega de diseños completos en la documentación respectiva requerida para aprobación por parte de la interventoría.
- Poco personal en obra para la ejecución de actividades y en algunos casos ausencia total de personal operativo en el frente de obra.
- Falta de planeación en la compra de insumos, como también en la vinculación del personal para el proceso constructivo.
- Productos no conformes por la calidad de obra.
- La no entrega de balances y planes de contingencia.

Y en otros no imputables al contratista de obra como son:

- Orden público en algunas zonas del país.
- Horario de ingreso a los establecimientos para realizar actividades de obra.

Un número importante de establecimientos presentan actividades culminadas al 100%, (ver cuadro de avance a 28 de junio de 2026) encontrándose en proceso de entrega formal y recibo por parte de la USPEC, lo cual refleja el cumplimiento de los alcances aprobados en dichos frentes de trabajo.

En los establecimientos que continúan en ejecución, se observó desarrollo de actividades conforme a los alcances contractuales; sin embargo, la interventoría dejó constancia de situaciones puntuales que requieren seguimiento, especialmente relacionadas con bajos rendimientos en obra y la necesidad de fortalecer la programación y asignación de recursos por parte del contratista para garantizar el cumplimiento oportuno de los compromisos adquiridos.

En términos generales, el comportamiento del contrato durante el periodo evaluado puede considerarse desfavorable, debido a que teniendo en cuenta los avances mensuales de obra reflejados en los últimos meses lanzan una alerta ante la proximidad de la culminación del contrato según el otro si 7 (31 de agosto de 2026), no se puedan culminar el 100% de los establecimientos contratados.

Con base en el informe mensual correspondiente al periodo del 1 al 30 de junio de 2026, se evidenció la continuidad en la ejecución de las actividades de mantenimiento, adecuación y mejoramiento de la infraestructura en los establecimientos penitenciarios de las regionales sin mostrar un avance importante que permita entregar las obras de los frentes relacionados en el otro si 7 en su totalidad. Se le ha solicitado al contratista mediante comunicados la necesidad e implementar un plan de contingencia para mitigar estos atrasos, pero a la fecha de la culminación de este informe, no ha sido entregado.

Durante el periodo se avanzó en obras civiles, eléctricas, hidrosanitarias y de seguridad, logrando la entrega formal y finalización de múltiples establecimientos, mientras que otros continúan en ejecución conforme a los cronogramas establecidos. Asimismo, se identificaron algunos aspectos que requieren seguimiento, tales como el incremento de personal en determinados frentes de trabajo, la entrega de documentación para cierres contractuales y la culminación de actividades pendientes para garantizar la entrega oportuna de las obras. En términos generales, el proyecto presenta avances significativos que contribuyen al mejoramiento de las condiciones de infraestructura y funcionamiento de los establecimientos intervenidos.

Además, se han presentado observaciones a los informes mensuales ambientales y sst presentados por el contratista, los cuales se les han pedido la subsanación respectiva.

- Se han enviado solicitud de subsanaciones a los informes técnicos, ambientales y sst.
- Se le ha reiterado al contratista el cumplimiento de entrega de informes sst y ambiental al igual del cumplimiento de normas ambientales y de seguridad en algunos frentes de obra.

19. ANEXOS

A continuación, se enuncian los anexos del Informe enumerados de acuerdo con el capítulo referido:

- CARPETA 5 AVANCE GENERAL
- CARPETA 6 ACTIVIDADES EJECUTADAS
- CARPETA 7 – CORRESPONDENCIA
- CARPETA 9 – GESTION AMBIENTAL
- CARPETA 8- CONTROL DE FACTURACION INTERVENTORIA
- CARPETA 11 – INFORME DE HSE Y ANEXOS
- CARPETA 14 – ACTAS DE COMITE
- CARPETA 15 – INFORMES QUICENALES
- CARPETA 17 – ESTADO LEGAL (pólizas)

PAULO CESAR SILVA MORALES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO BETA REGIONALES
