PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
Contrato Interadministrativo 859 de 2019 (Numeración ENTerritorio 219141)

Proyecto: Programa de Conexiones Intradomiciliarias Atrato, Chocó

Informe correspondiente al periodo entre el 24 de agosto y el 24 de septiembre de 2020

Fecha de elaboración: 25 de septiembre de 2020

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO

1. ACTIVIDADES TRANSVERSALES

- El 30 de julio de 2020 se dio inicio a la ejecución del contrato.
- El 14 de septiembre de 2020 se aprobó por parte de la interventoría el chequeo de los diseños realizado por el contratista de obra.
- Se inició la Actividad 3 ejecución de obras en el presente periodo.
- El 30 de agosto de 2020 se realiza comité de seguimiento de los contratos derivados 2200813 y 2200827 en el marco de ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias en el municipio de Atrato.
- El 06 de septiembre de 2020 se realiza comité de seguimiento de los contratos derivados 2200813 y 2200827 en el marco de ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias en el municipio de Atrato.
- El 13 de septiembre de 2020 se realiza comité de seguimiento de los contratos derivados 2200813 y 2200827 en el marco de ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias en el municipio de Atrato.
- El 20 de septiembre de 2020 se realiza comité de seguimiento de los contratos derivados 2200813 y 2200827 en el marco de ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias en el municipio de Atrato.

2. DATOS CONTRATO DE OBRA


Contrato No.	2200814
Objeto	Chequeo, validación de prototipos, diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en los municipios de María la Baja (Bolívar), Sabanas de San Ángel (Magdalena), Astrea (Cesar), Tadó (Chocó) y Atrato (Chocó) - grupo 5 Atrato - Chocó
CONTRATISTA	CONSORCIO TERRITORIAL 21
Plazo inicial	6 MESES
Valor inicial	**$ 4.838.871.936,00**

FECHAS IMPORTANTES DEL CONTRATO DE OBRA		
EVENTO		**Fecha**
Adjudicación del contrato		25 de junio de 2020
Suscripción de contratos		06 de julio de 2020
Aprobación de protocolos de bioseguridad por parte del municipio		24 de julio de 2020
Acta de inicio del contrato		30 de Julio de 2020

	ALCANCE DE OBRAS					
Barrio	**Viabilizadas**	**Diagnosticadas**	**Aprobadas**	**Ejecutadas**	**Avance (%)**	**Observaciones**
Malvi Club	110	102	84			Se encuentran en ejecución 15 viviendas
Yuto Nuevo	111	71	55			
Carretera	60	50	35			
Pueblo Nuevo	68					
San Antonio	106					
Santander	78					
Centro	32					
Potenciales inclusiones	54					

ASPECTOS TÉCNICOS – SITUACIÓN ACTUAL

Finaliza la Actividad 1 de Chequeo de los diseños mediante la aprobación de la Interventoría. Continúa la ejecución de la Actividad 2 de Diagnósticos en el municipio de Atrato.

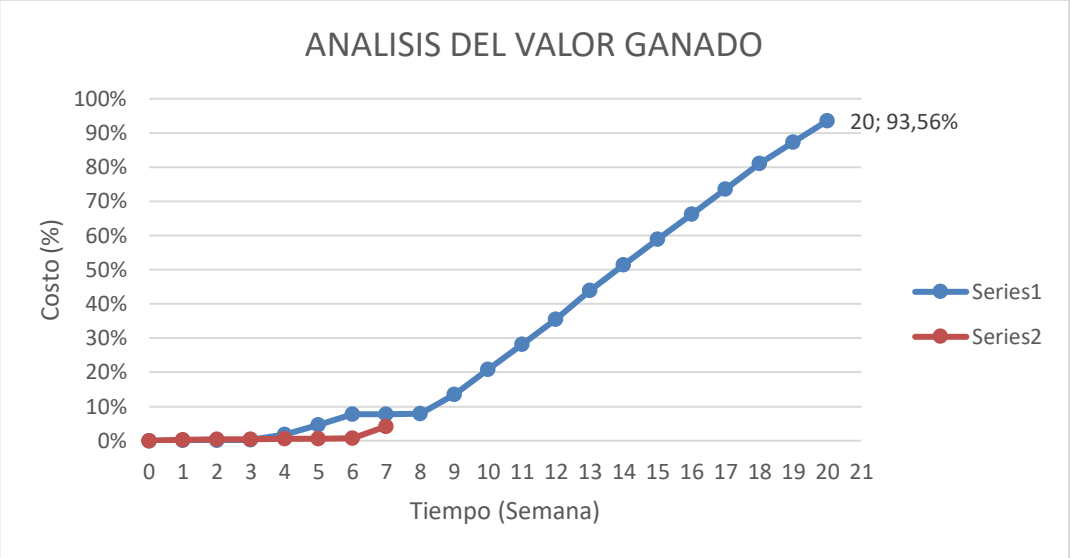

Curva S de acuerdo a programación aprobada a contratista de obra a la fecha.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PROYECTO





17 de septiembre de 2020: Instalación red hidráulica y aparato sanitario en Malvi Club




05 de septiembre de 2020: Visitas de diagnóstico realizadas en Atrato

PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA

A continuación, se presentan las pólizas que actualmente amparan la ejecución del contrato de Obra:

CONCEPTO AMPARO	No. PÓLIZA CERTIFICADO	% CUBRIMIENTO	VALOR AMPARADO	VIGENCIAS		ASEGURADORA	OBS
				DESDE	HASTA		
Cumplimiento	45-45-101086779	30%	$ 1.451.661.580,80	30/07/2020	30/09/2021	SEGUROS DEL ESTADO S.A	
Calidad del Servicio	45-45-101086779	30%	$ 34.550.345,00	30/01/2021	30/01/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A	
Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones	45-45-101086779	5%	$ 241.943.596,80	30/07/2020	30/01/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A	
Estabilidad de Obra	45-45-101086779	50%	$ 2.419.435.968,00	5 años 0 meses 0 dias A partir del acta de recibo final		SEGUROS DEL ESTADO S.A	

Responsabilidad Civil Extracontractual	45-40-101059774	15% Del valor de la perdida - Minimo: 1,00 SMMLV	$ 1.451.661.580,80	30/07/2020	30/01/2021	SEGUROS DEL ESTADO S.A	
Buen manejo del anticipo	45-45-101086779	100%	$ 472.370.412,00	30/07/2020	30/09/2021	SEGUROS DEL ESTADO S.A	

MANEJO DE ANTICIPOS

En el periodo contemplado en el presente informe todavía se encuentra en trámite el desembolso del anticipo.

3. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No.	2200817
Objeto	Interventoría técnica, administrativa, de control financiero, presupuestal, social y ambiental para el chequeo, validación de prototipos, diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias, en los municipios de María la Baja (Bolívar) Sabanas de San Ángel (Magdalena), Astrea (Cesar), Tadó (Chocó) y Atrato (Chocó) - Grupo 5. Atrato - Chocó.
CONTRATISTA	GNG INGENIERIA SAS
Plazo inicial	6 MESES
Valor inicial	$424.452.579,6
Fecha de Inicio	30-07-2020
Fecha de Terminación Inicial	30-12-2020
Si hay modificaciones al contrato… incluirlas (suspensiones, prórrogas, adiciones)	N/A

PERSONAL APROBADO DE INTERVENTORÍA – PARA EL PERIODO DEL INFORME

CARGO A DESEMPEÑAR	NOMBRE	PROFESIÓN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	GUILLERMO EMILIO NARVAEZ VELEZ	Ingeniero Civil
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	CAMILO ANDRÉS ESTUPIÑAN GONZALES	ING CIVIL
AUXILIAR DE INTERVENTORÍA	MAYRA ALEJANDRA PEÑA ZAMBRANO	ING CIVIL
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	JAIRO ANDRES MEZA ROSAS	ING CIVIL - ESP. EN ESTRUCTURAS
PROFESIONAL SOCIAL	LUZ AYDA ESCOBAR OSPINA	TRABAJADORA SOCIAL
PROFESIONAL SOCIAL DE APOYO	OLGA YOLANDA ROBAYO CRUZ	TRABAJADORA SOCIAL
PROFESIONAL DE CALIDAD	MILETH ESCALANTE TAPIAS	INGENIERA INDUSTRIAL- ESP Gestión de Calidad
INSPECTOR DE INTERVENTORÍA 1	ANDRÉS ALBERTO SALGADO SALGADO	ING CIVIL

CARGO A DESEMPEÑAR	NOMBRE	PROFESIÓN
INSPECTOR DE INTERVENTORÍA 2	JOHAN ELIAS MUÑOZ VEGA	ING CIVIL
TECNICO PGIO	MARÍA EUGENIA CUBURUCO AGUIRRE	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL

PÓLIZAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

A continuación, se presentan las pólizas que actualmente amparan la ejecución del contrato de Interventoría:

CONCEPTO AMPARO	No. PÓLIZA CERTIFICADO	% CUBRIMIENTO	VALOR AMPARADO	VIGENCIAS		ASEGURADORA	OBS
				DESDE	HASTA		
Cumplimiento	15-45-101116708	20%	$ 84.890.515,92	30/07/2020	30/09/2021	SEGUROS DEL ESTADO S.A	
Calidad del Servicio	15-45-101116708	30%	$ 127.335.773,88	30/01/2021	30/01/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A	
Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones	15-45-101116708	5%	$ 21.222.628,98	30/07/2020	30/01/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A	
Responsabilidad Civil Extracontractual	15-40-101065073	15% del valor de la perdida - Minimo: 1,00 SMMLV	$ 219.450.750,00	30/07/2020	30/01/2021	SEGUROS DEL ESTADO S.A	

PROBLEMÁTICAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS
Se identificaron deficiencias en la revisión realizada por la Interventoría de los diagnósticos entregados por el contratista de Obra.	Se realiza revisión aleatoria de diagnósticos aprobados por la Interventoría con el fin de verificar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.	Se enviaron dos correos a la Interventoría con la solicitud de realizar la revisión minuciosa de los diagnósticos; se verifican

		aleatoriamente diagnósticos; se realiza revisión conjunta de los diagnósticos con la participación de Obra, Interventoría y Supervisión.

SEGUIMIENTO A LOS INFORMES DE INTERVENTORIA
La Interventoría ha presentado en este periodo 4 Informes semanales de interventoría con corte a: 30 de agosto de 2020 6 de septiembre de 2020 13 de septiembre de 2020 20 de septiembre de 2020 Y ha presentado 1 Informe mensual con corte al 31 de agosto de 2020
COMUNICACIONES Y SEGUIMIENTO A CORRESPONDENCIA
Se anexa Matriz de comunicaciones
REUNIONES REALIZADAS EN EL PERIODO
26 de agosto de 2020: Reunión con contratista de obra e interventoría de seguimiento del proyecto. 02 de septiembre de 2020: Reunión con contratista de obra e interventoría de seguimiento del proyecto. 09 de septiembre de 2020: Reunión con contratista de obra e interventoría de seguimiento del proyecto. 15 de septiembre de 2020: Reunión con contratista de obra e interventoría de seguimiento del proyecto.

Elaborado por:

ALEXANDER BUSTAMANTE DUQUE
SUPERVISOR
