PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
Contrato Interadministrativo 859 de 2019 (Numeración ENTerritorio 219141)

Proyecto: Programa de Conexiones Intradomiciliarias Atrato, Chocó

Informe correspondiente al periodo entre el 24 de septiembre y el 24 de octubre de 2020

Fecha de elaboración: 25 de octubre de 2020

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO

1. ACTIVIDADES TRANSVERSALES

- El 30 de julio de 2020 se dio inicio a la ejecución del contrato. Se inicia ejecución de las Actividades 1 y 2
- Se aprobó por parte de la interventoría el 14 de septiembre de 2020 la Actividad No. 2: chequeo de los diseños, realizado por el contratista de obra.
- Se inició la Actividad 3 ejecución de obras en septiembre de 2020.
- El 07 de octubre de 2020: Se realiza comité de seguimiento de los contratos derivados 2200814 y 2200817 en el marco de ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias en el municipio de Atrato.
- El 14 de octubre de 2020: Se realiza comité de seguimiento de los contratos derivados 2200814 y 2200817 en el marco de ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias en el municipio de Atrato.
- El 21 de octubre de 2020: Se realiza comité de seguimiento de los contratos derivados 2200814 y 2200817 en el marco de ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias en el municipio de Atrato.
- Entre el 21 y 22 de octubre se realiza visita de seguimiento en campo a la ejecución del contrato.


2. DATOS CONTRATO DE OBRA

Contrato No.	2200814
Objeto	Chequeo, validación de prototipos, diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en los municipios de María la Baja (Bolívar), Sabanas de San Ángel (Magdalena), Astrea (Cesar), Tadó (Chocó) y Atrato (Chocó) - grupo 5 Atrato - Chocó
CONTRATISTA	CONSORCIO TERRITORIAL 21
Plazo inicial	6 MESES
Valor inicial	**$ 4.838.871.936,00**

FECHAS IMPORTANTES DEL CONTRATO DE OBRA	
EVENTO	**Fecha**
Adjudicación del contrato	25 de junio de 2020
Suscripción de contratos	06 de julio de 2020
Aprobación de protocolos de bioseguridad por parte del municipio	24 de julio de 2020
Acta de inicio del contrato	30 de Julio de 2020
Fecha de Terminación Inicial	30 de diciembre de 2020

	ALCANCE DE OBRAS					
Barrio	**Viabilizadas**	**Diagnosticadas**	**Aprobadas**	**Ejecutadas**	**Avance (%)**	**Observaciones**
Malvi Club	110	133	116	104	78	Se encuentran en ejecución 48 viviendas
Yuto Nuevo	111	88	77	42	55	
Carretera	60	63	53	7	11	
Pueblo Nuevo	68	73	71			
San Antonio	106	93	83			
Santander	78					
Centro	32					
Potenciales inclusiones	54					
ASPECTOS TÉCNICOS – SITUACIÓN ACTUAL						

Finaliza la Actividad 1 de Chequeo de los diseños mediante la aprobación de la Interventoría. Continúa la ejecución de las Actividades 2, 3 y 4 en el municipio de Atrato.

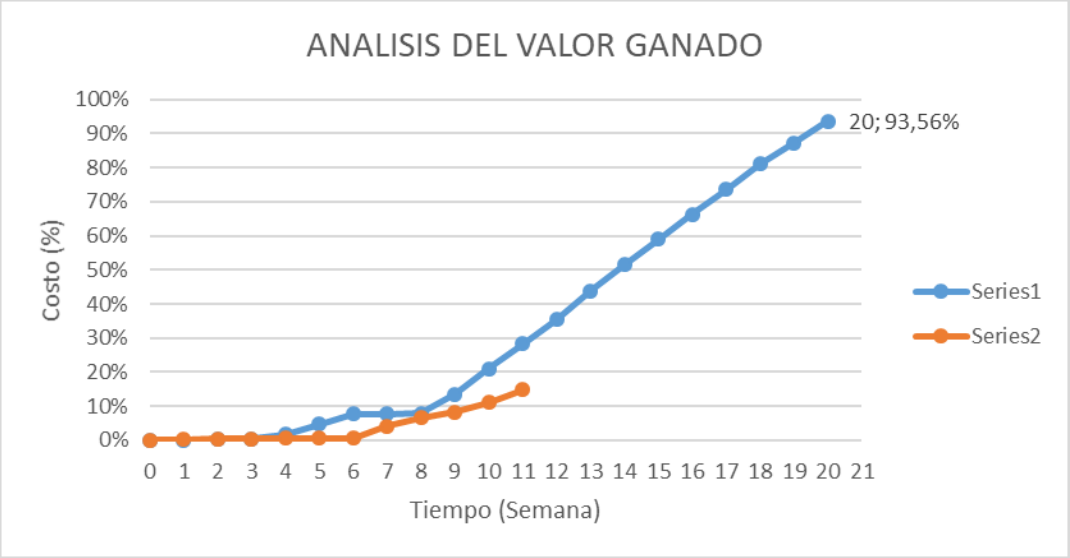

Curva S de acuerdo a programación aprobada a contratista de obra a la fecha.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PROYECTO





15 de octubre de 2020: Pañete de unidad sanitaria. Enchape zona humeda.





09 de octubre de 2020: cimentación de unidad sanitaria. Capacitación en protocolos de bioseguridad a trabajadores del contratista de obra

PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA

A continuación, se presentan las pólizas que actualmente amparan la ejecución del contrato de Obra:

CONCEPTO AMPARO	No. PÓLIZA CERTIFICADO	% CUBRIMIENTO	VALOR AMPARADO	VIGENCIAS		ASEGURADORA	OBS
				DESDE	HASTA		
Cumplimiento	45-45-101086779	30%	$ 1.451.661.580,80	30/07/2020	30/09/2021	SEGUROS DEL ESTADO S.A	
Calidad del Servicio	45-45-101086779	30%	$ 34.550.345,00	30/01/2021	30/01/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A	
Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones	45-45-101086779	5%	$ 241.943.596,80	30/07/2020	30/01/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A	
Estabilidad de Obra	45-45-101086779	50%	$ 2.419.435.968,00	5 años 0 meses 0 dias A partir del acta de recibo final		SEGUROS DEL ESTADO S.A	

Responsabilidad Civil Extracontractual	45-40-101059774	15% Del valor de la perdida - Minimo: 1,00 SMMLV	$ 1.451.661.580,80	30/07/2020	30/01/2021	SEGUROS DEL ESTADO S.A	
Buen manejo del anticipo	45-45-101086779	100%	$ 472.370.412,00	30/07/2020	30/09/2021	SEGUROS DEL ESTADO S.A	

MANEJO DE ANTICIPOS

Se realizó el desembolso del anticipo el 29 de septiembre de 2020 por valor de $472.370.412

3. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No.	2200817
Objeto	Interventoría técnica, administrativa, de control financiero, presupuestal, social y ambiental para el chequeo, validación de prototipos, diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias, en los municipios de María la Baja (Bolívar) Sabanas de San Ángel (Magdalena), Astrea (Cesar), Tadó (Chocó) y Atrato (Chocó) - Grupo 5. Atrato - Chocó.
CONTRATISTA	GNG INGENIERIA SAS
Plazo inicial	6 MESES
Valor inicial	$424.452.579,6
Fecha de Inicio	30-07-2020
Fecha de Terminación Inicial	30-12-2020
Si hay modificaciones al contrato… incluirlas (suspensiones, prórrogas, adiciones)	N/A

PERSONAL APROBADO DE INTERVENTORÍA – PARA EL PERIODO DEL INFORME

CARGO A DESEMPEÑAR	NOMBRE	PROFESIÓN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	DORIS XIOMARA CASTAÑEDA	ING CIVIL
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	LUIS FELIPE QUIMBAYO ORTIZ	ING CIVIL
AUXILIAR DE INTERVENTORÍA	MAYRA ALEJANDRA PEÑA ZAMBRANO	ING CIVIL
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	JAIRO ANDRES MEZA ROSAS	ING CIVIL - ESP. EN ESTRUCTURAS
PROFESIONAL SOCIAL	LUZ AYDA ESCOBAR OSPINA	TRABAJADORA SOCIAL
PROFESIONAL SOCIAL DE APOYO	OLGA YOLANDA ROBAYO CRUZ	TRABAJADORA SOCIAL
PROFESIONAL DE CALIDAD	MILETH ESCALANTE TAPIAS	INGENIERA INDUSTRIAL- ESP Gestión de Calidad
INSPECTOR DE INTERVENTORÍA 1	ANDRÉS ALBERTO SALGADO SALGADO	ING CIVIL

CARGO A DESEMPEÑAR	NOMBRE	PROFESIÓN
INSPECTOR DE INTERVENTORÍA 2	JOHAN ELIAS MUÑOZ VEGA	ING CIVIL
TECNICO PGIO	MARÍA EUGENIA CUBURUCO AGUIRRE	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL

PÓLIZAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

A continuación, se presentan las pólizas que actualmente amparan la ejecución del contrato de Interventoría:

CONCEPTO AMPARO	No. PÓLIZA CERTIFICADO	% CUBRIMIENTO	VALOR AMPARADO	VIGENCIAS		ASEGURADORA	OBS
				DESDE	HASTA		
Cumplimiento	15-45-101116708	20%	$ 84.890.515,92	30/07/2020	30/09/2021	SEGUROS DEL ESTADO S.A	
Calidad del Servicio	15-45-101116708	30%	$ 127.335.773,88	30/01/2021	30/01/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A	
Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones	15-45-101116708	5%	$ 21.222.628,98	30/07/2020	30/01/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A	
Responsabilidad Civil Extracontractual	15-40-101065073	15% del valor de la perdida - Minimo: 1,00 SMMLV	$ 219.450.750,00	30/07/2020	30/01/2021	SEGUROS DEL ESTADO S.A	

PROBLEMÁTICAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS
De acuerdo con el cronograma aprobado, se presenta retraso en la ejecución de la Actividad 3.	Se realiza requerimiento a la interventoría para que se de cumplimiento del cronograma por parte del contratista de obra	Se realiza por parte del contratista de obra un plan de contingencia con el fin de dar cumplimiento al cronograma.

SEGUIMIENTO A LOS INFORMES DE INTERVENTORIA
La Interventoría ha presentado en este periodo 4 Informes semanales de interventoría con corte a: 27 de septiembre de 2020 10 de octubre de 2020 11 de octubre de 2020 18 de octubre de 2020 Y ha presentado en este periodo 1 Informe mensual con corte al 30 de septiembre de 2020
COMUNICACIONES Y SEGUIMIENTO A CORRESPONDENCIA
Se anexa Matriz de comunicaciones
REUNIONES REALIZADAS EN EL PERIODO
07 de octubre de 2020: Reunión con contratista de obra e interventoría de seguimiento del proyecto. 14 de octubre de 2020: Reunión con contratista de obra e interventoría de seguimiento del proyecto. 21 de octubre de 2020: Reunión con contratista de obra e interventoría de seguimiento del proyecto.

Elaborado por:



ALEXANDER BUSTAMANTE DUQUE
SUPERVISOR
