

Id	EDT	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
0	0	PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN VÍA DESDE EL SECTOR DE CASA BLANCA A HUMEDAL GUALÍ DEL MUNICIPIO DE FUNZA, DEPARTAMENTO DE	$ 5.867.702.874,00	453 días	22/04/25	29/05/26
1	1	INICIO DEL PROYECTO	$ 0,00	0 días	22/04/25	22/04/25
2	2	ETAPA 1 - PRELIMINARES DE OBRA Y ACTUALIZACIÓN DE E&D	$ 81.661.617,00	50 días	22/04/25	5/06/25
3	2.1	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	$ 0,00	0 días	22/04/25	22/04/25
4	2.2	ENTREGA DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	$ 0,00	7 días	22/04/25	28/04/25
5	2.3	ENTRADA DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	$ 0,00	7 días	22/04/25	28/04/25
6	2.4	ENTREGA DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL	$ 0,00	7 días	22/04/25	28/04/25
7	2.5	ENTREGA DEL PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL	$ 0,00	7 días	22/04/25	28/04/25
8	2.6	REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 81.661.617,00	50 días	22/04/25	5/06/25
9	2.6.1	INICIO ETAPA DE REVISIÓN Y/O AJUSTE DE LOS E&D	$ 0,00	0 días	22/04/25	22/04/25
10	2.6.2	Revisión y/o ajuste del VOLUMEN I - Estudio de transporte	$ 8.166.161,70	40 días	22/04/25	27/05/25
11	2.6.3	Revisión y/o ajuste del VOLUMEN II - ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA, TRAZADO Y DISEÑO GEOME	$ 8.166.161,70	40 días	22/04/25	27/05/25
12	2.6.4	Revisión y/o ajuste del VOLUMEN III - GEOLOGÍA PARA INGENIERIA	$ 8.166.161,70	40 días	22/04/25	27/05/25
13	2.6.5	Revisión y/o ajuste del VOLUMEN IV - ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE ESTRUCTURAS	$ 8.166.161,70	40 días	22/04/25	27/05/25
14	2.6.6	Revisión y/o ajuste del VOLUMEN V- ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓ DE TALUDE	$ 8.166.161,70	40 días	22/04/25	27/05/25
15	2.6.7	Revisión y/o ajuste del VOLUMEN VI - ESTUDIO GEOTECNICO Y DISEÑO DE PAVIMENTOS	$ 8.166.161,70	40 días	22/04/25	27/05/25
16	2.6.8	Revisión y/o ajuste del VOLUMEN VII - ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES	$ 8.166.161,70	40 días	22/04/25	27/05/25
17	2.6.9	Revisión y/o ajuste del VOLUMEN VIII - ESTUDIO DE HIDRÁULICA	$ 8.166.161,70	40 días	22/04/25	27/05/25
18	2.6.10	Revisión y/o ajuste del VOLUMEN IX - ESTUDIO DE DISEÑO DE ESTRUCTURAS	$ 8.166.161,70	40 días	22/04/25	27/05/25
19	2.6.11	Revisión y/o ajuste del VOLUMEN X - GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO	$ 8.166.161,70	40 días	22/04/25	27/05/25
20	2.6.12	Entrega del informe final de E&D	$ 0,00	5 días	27/05/25	1/06/25
21	2.6.13	Revisión y aprobación del informe final de E&D por parte de interventoría	$ 0,00	5 días	1/06/25	5/06/25
22	2.6.14	Desarrollo y conclusión de las actividades Insterinstitucionales con ENEL para el trasldo de la red de postes emplazada en la vía	$ 0,00	45 días	22/04/25	1/06/25
23	2.6.15	FIN DE LA ETAPA DE REVISIÓN Y/O AJUSTE DE LOS E&D	$ 0,00	0 días	5/06/25	5/06/25
24	2.7	FIN DE LA ETAPA 1	$ 0,00	0 días	5/06/25	5/06/25
25	3	ETAPA 2 - EJECUCIÓN DE OBRA	$ 5.786.041.257,00	353 días	20/07/25	29/05/26
26	3.1	INICIO ETAPA 2	$ 0,00	0 días	24/07/25	24/07/25
27	3.2	FRENTE DE OBRA No.1	$ 1.811.484.459,92	329 días	20/07/25	8/05/26
28	3.2.1	INICIO FRENTE DE OBRA No.1	$ 0,00	0 días	24/07/25	24/07/25
29	3.2.2	OBRAS COMPLEMENTARIAS	$ 127.592.068,00	130 días	20/07/25	12/11/25
30	3.2.2.1	TRASLADO DE POSTERIA	$ 127.592.068,00	130 días	20/07/25	12/11/25
31	3.2.3	EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES	$ 79.836.845,66	91 días	11/11/25	31/01/26
32	3.2.3.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	$ 9.242.675,73	40 días	12/11/25	18/12/25
33	3.2.3.2	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	$ 15.814.904,77	85 días	17/11/25	31/01/26
34	3.2.3.3	NP 04 - EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 10,9 KM)	$ 54.779.265,16	65 días	11/11/25	8/01/26
35	3.2.4	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	$ 1.026.121.025,39	164 días	26/11/25	20/04/26

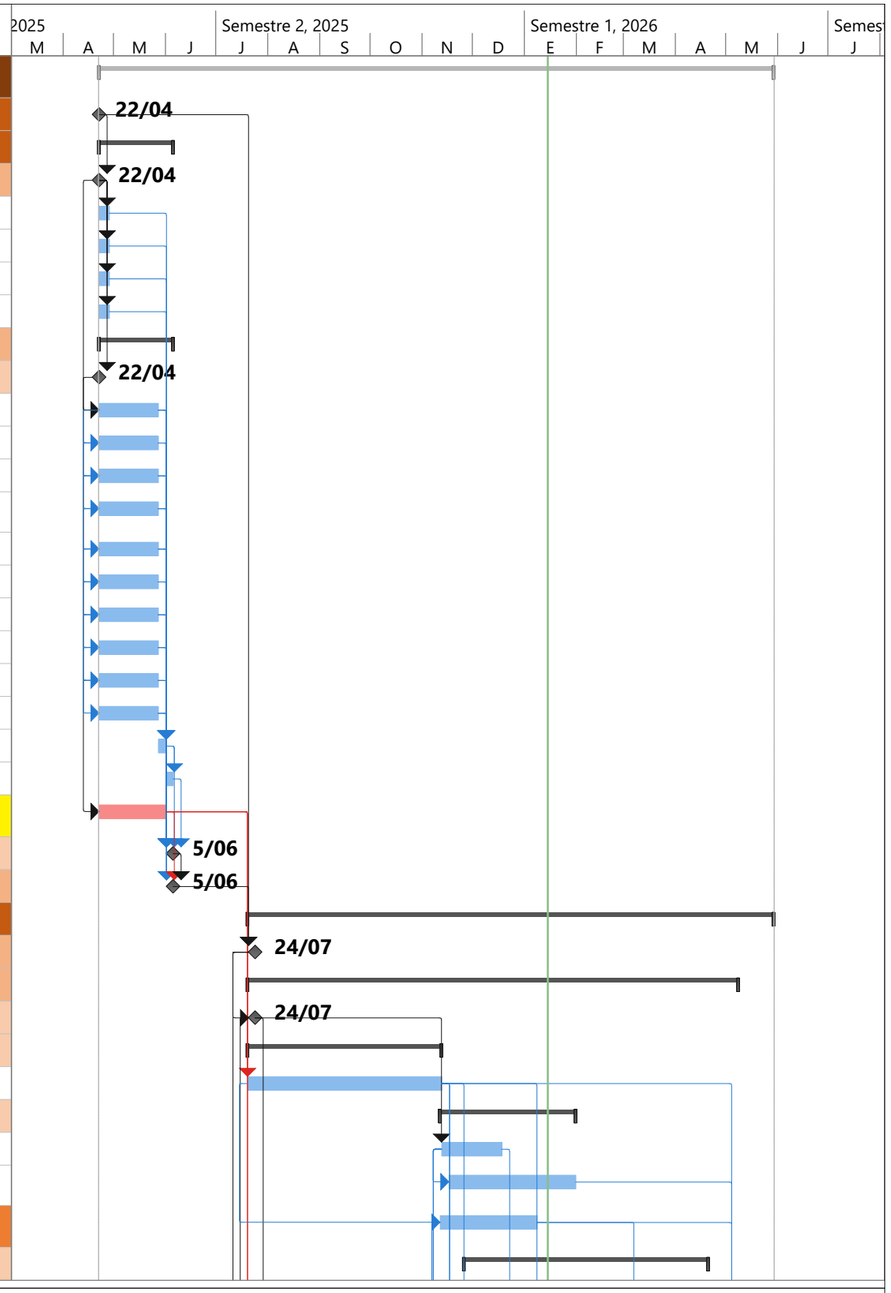

Proyecto: PLAN DE CONTINGEN
Fecha: 15/01/26

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	


Id	EDT	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
36	3.2.4.1	COMPACTACION DE LA SUBRASANTE, SIN ADICION DE MATERIAL	$ 4.097.869,38	105 días	4/12/25	7/03/26
37	3.2.4.2	AFIRMADO	$ 18.857.007,67	99 días	4/12/25	1/03/26
38	**3.2.4.3**	**NP01 - BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 6%**	**$ 159.571.064,08**	**135 días**	**4/12/25**	**2/04/26**
39	**3.2.4.4**	**NP 05 - ESTABILIZACION CON ESTABILIZANTE QUIMICO**	**$ 102.264.526,92**	**135 días**	**4/12/25**	**2/04/26**
40	**3.2.4.5**	**NP02 - SARDINEL PREFABRICADO A-10**	**$ 61.285.547,92**	**40 días**	**7/03/26**	**11/04/26**
41	3.2.4.6	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-43, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	$ 448.175.886,93	75 días	8/01/26	16/03/26
42	**3.2.4.7**	**NP 06 - CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-43 ACELERADO 3 DIAS, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNION**	**$ 60.175.796,49**	**80 días**	**17/01/26**	**29/03/26**
43	3.2.4.8	EXACAVACIÓN MANUAL Y CONSTRUCCIÓN DE FILTROS DE DRENAJE (0.40x1.00)m (NO INC. LLENOS DIEFERENTES A LA SECCION DEL FILTRO)	$ 49.402.156,80	115 días	26/11/25	8/03/26
44	3.2.4.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TR 4000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPAF	$ 62.979.278,46	50 días	7/03/26	20/04/26
45	**3.2.4.1**	**NP - 08 GEODRÉN PLANAR H = 2.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 59.311.890,74**	**100 días**	**5/01/26**	**3/04/26**
46	**3.2.5**	**OBRAS DE ARTE Y ESTRUCTURAS DE CONTENCION**	**$ 511.859.440,88**	**318 días**	**28/07/25**	**6/05/26**
47	3.2.5.1	ENTIBADO TIPO 2 (1/7 UTILIZACIONES)	$ 7.131.570,00	140 días	28/07/25	29/11/25
48	3.2.5.2	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	$ 122.921.077,67	160 días	17/11/25	8/04/26
49	3.2.5.3	RELLENO TIPO 1 "GRAVILLA"	$ 4.764.809,16	40 días	18/12/25	22/01/26
50	3.2.5.4	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	$ 31.057.128,98	150 días	21/11/25	3/04/26
51	3.2.5.5	CONCRETOS CLASE D, f´c =4000 psi (bases)	$ 8.209.768,33	140 días	30/11/25	3/04/26
52	3.2.5.6	CONCRETOS CLASE D, f´c =4000 psi (elevaciones)	$ 7.962.034,74	130 días	3/12/25	28/03/26
53	3.2.5.7	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	$ 2.322.686,34	130 días	21/11/25	17/03/26
54	3.2.5.8	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	$ 196.549.168,95	135 días	6/01/26	6/05/26
55	3.2.5.9	CONCRETOS CLASE D, f´c =4000 psi (box-coulvert)	$ 104.242.877,71	150 días	4/12/25	17/04/26
56	**3.2.5.1**	**NP 07 - TRASLADO REDES DE GAS VANTI**	**$ 26.698.319,00**	**15 días**	**12/11/25**	**25/11/25**
57	**3.2.6**	**SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL**	**$ 19.669.222,99**	**60 días**	**16/03/26**	**8/05/26**
58	3.2.6.1	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	$ 5.082.232,32	60 días	16/03/26	8/05/26
59	3.2.6.2	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	$ 2.997.633,00	60 días	16/03/26	8/05/26
60	3.2.6.3	SEÑAL VERTICAL GRUPO I 0.60x0.60M POSTE 3.5M	$ 5.760.063,00	60 días	16/03/26	8/05/26
61	3.2.6.4	TACHAS REFLECTIVAS	$ 5.829.294,67	60 días	16/03/26	8/05/26
62	3.2.7	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	$ 17.805.968,00	160 días	12/11/25	3/04/26
63	3.2.8	PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL	$ 28.599.889,00	160 días	24/07/25	13/12/25
64	**3.2.9**	**FIN FRENTE DE OBRA No.1**	**$ 0,00**	**0 días**	**8/05/26**	**8/05/26**
65	**3.3**	**FRENTE DE OBRA No.2 -**	**$ 2.006.671.880,48**	**345 días**	**20/07/25**	**22/05/26**
66	**3.3.1**	**INICIO FRENTE DE OBRA No.2**	**$ 0,00**	**0 días**	**24/07/25**	**24/07/25**
67	**3.3.2**	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**	**$ 127.592.068,00**	**130 días**	**20/07/25**	**12/11/25**
68	3.3.2.1	TRASLADO DE POSTERIA	$ 127.592.068,00	130 días	20/07/25	12/11/25
69	**3.3.3**	**EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES**	**$ 79.836.845,01**	**200 días**	**11/11/25**	**8/05/26**
70	3.3.3.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	$ 9.242.675,73	105 días	11/11/25	13/02/26
71	3.3.3.2	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	$ 15.814.904,12	185 días	25/11/25	8/05/26

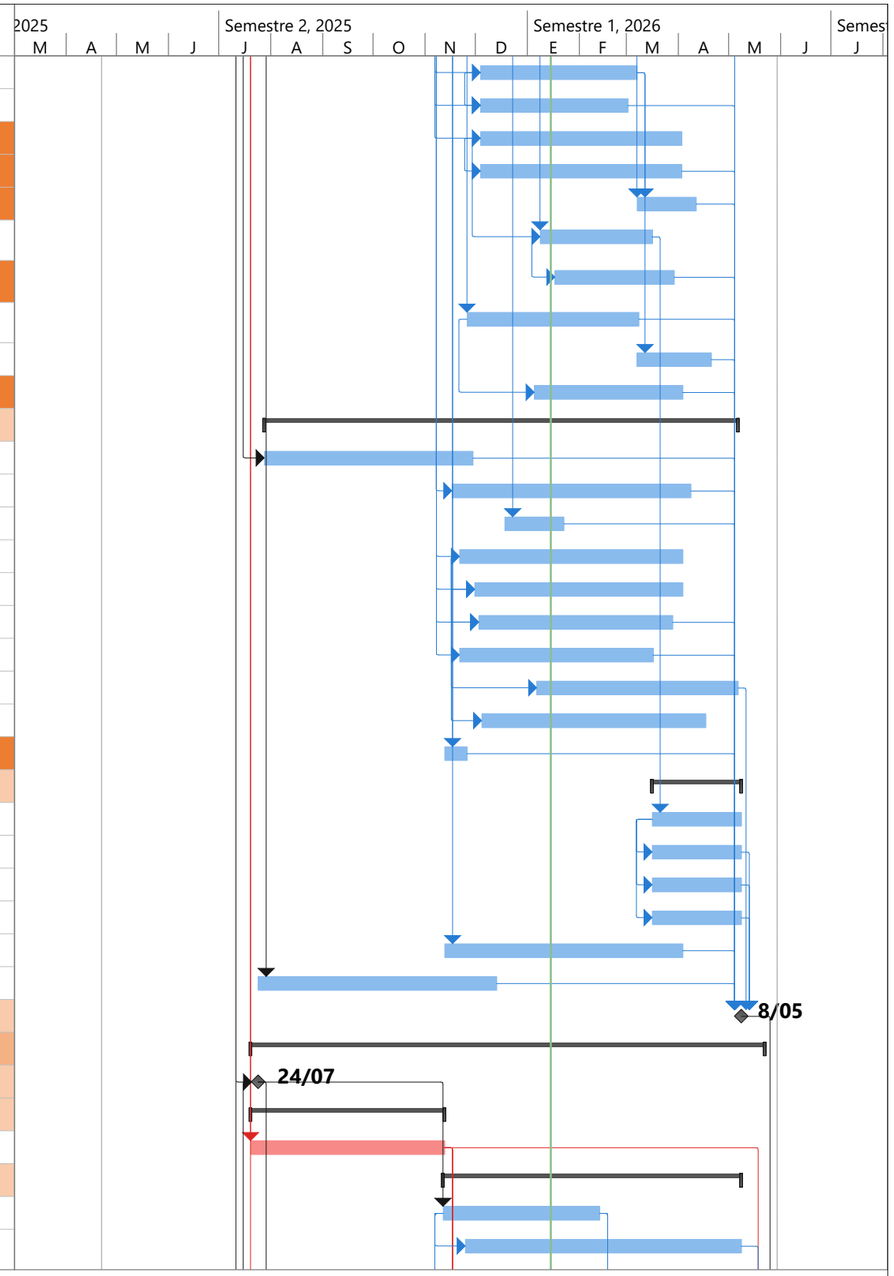

Proyecto: PLAN DE CONTINGEN
Fecha: 15/01/26

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	


Id	EDT	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
72	**3.3.3.3**	**NP 04 - EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 10,9 KM)**	**$ 54.779.265,16**	**105 días**	**12/11/25**	**13/02/26**
73	**3.3.4**	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**	**$ 1.290.778.442,35**	**216 días**	**11/11/25**	**22/05/26**
74	3.3.4.1	COMPACTACION DE LA SUBRASANTE, SIN ADICION DE MATERIAL	$ 4.097.869,38	95 días	11/11/25	4/02/26
75	3.3.4.2	AFIRMADO	$ 18.857.007,67	60 días	4/02/26	29/03/26
76	3.3.4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TR 4000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPAR	$ 62.979.278,46	70 días	4/02/26	7/04/26
77	**3.3.4.4**	**NP01 - BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 6%**	**$ 159.571.064,08**	**80 días**	**31/01/26**	**12/04/26**
78	**3.3.4.5**	**NP 05 - ESTABILIZACION CON ESTABILIZANTE QUIMICO**	**$ 102.264.526,92**	**100 días**	**6/02/26**	**6/05/26**
79	**3.3.4.6**	**NP02 - SARDINEL PREFABRICADO A-10**	**$ 61.285.547,92**	**120 días**	**4/02/26**	**21/05/26**
80	3.3.4.7	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-43, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	$ 448.175.886,93	95 días	31/01/26	26/04/26
81	**3.3.4.8**	**NP 06 - CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-43 ACELERADO 3 DIAS, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNION**	**$ 324.833.213,45**	**45 días**	**12/04/26**	**22/05/26**
82	3.3.4.9	EXACAVACIÓN MANUAL Y CONSTRUCCIÓN DE FILTROS DE DRENAJE (0.40x1.00)m (NO INC. LLENOS DIEFERENTES A LA SECCION DEL FILTRO)	$ 49.402.156,80	115 días	12/11/25	22/02/26
83	**3.3.4.1**	**NP 08 - GEODRÉN PLANAR H = 2.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 59.311.890,74**	**135 días**	**12/11/25**	**12/03/26**
84	**3.3.5**	**OBRAS DE ARTE Y ESTRUCTURAS DE CONTENCION**	**$ 442.389.445,13**	**315 días**	**28/07/25**	**4/05/26**
85	3.3.5.1	ENTIBADO TIPO 2 (1/7 UTILIZACIONES)	$ 7.131.570,00	170 días	28/07/25	26/12/25
86	3.3.5.2	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	$ 122.921.077,67	180 días	25/11/25	4/05/26
87	3.3.5.3	RELLENO TIPO 1 "GRAVILLA"	$ 4.764.809,16	70 días	13/02/26	16/04/26
88	3.3.5.4	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	$ 31.057.128,98	60 días	14/02/26	9/04/26
89	3.3.5.5	CONCRETOS CLASE D, f´c =4000 psi (bases)	$ 8.209.768,33	180 días	16/11/25	25/04/26
90	3.3.5.6	CONCRETOS CLASE D, f´c =4000 psi (elevaciones)	$ 7.962.034,74	40 días	17/02/26	25/03/26
91	3.3.5.7	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	$ 2.322.686,34	170 días	16/11/25	16/04/26
92	3.3.5.8	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	$ 196.549.168,95	75 días	19/02/26	26/04/26
93	**3.3.5.9**	**NP 04- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE III, INCLUYE EMBOQUILLADA**	**$ 61.471.200,96**	**25 días**	**26/02/26**	**20/03/26**
94	**3.3.6**	**SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL**	**$ 19.669.222,99**	**30 días**	**26/04/26**	**22/05/26**
95	3.3.6.1	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	$ 5.082.232,32	30 días	26/04/26	22/05/26
96	3.3.6.2	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	$ 2.997.633,00	30 días	26/04/26	22/05/26
97	3.3.6.3	SEÑAL VERTICAL GRUPO I 0.60x0.60M POSTE 3.5M	$ 5.760.063,00	30 días	26/04/26	22/05/26
98	3.3.6.4	TACHAS REFLECTIVAS	$ 5.829.294,67	30 días	26/04/26	22/05/26
99	3.3.7	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	$ 17.805.968,00	120 días	12/11/25	27/02/26
100	3.3.8	PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL	$ 28.599.889,00	290 días	24/07/25	8/04/26
101	**3.3.9**	**FIN FRENTE DE OBRA No.2**	**$ 0,00**	**0 días**	**22/05/26**	**22/05/26**
102	**3.4**	**FRENTE DE OBRA No.3**	**$ 1.967.884.916,60**	**353 días**	**20/07/25**	**29/05/26**
103	**3.4.1**	**INICIO FRENTE DE OBRA No.3**	**$ 0,00**	**0 días**	**24/07/25**	**24/07/25**
104	**3.4.2**	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**	**$ 127.592.068,00**	**130 días**	**20/07/25**	**12/11/25**
105	3.4.2.1	TRASLADO DE POSTERIA	$ 127.592.068,00	130 días	20/07/25	12/11/25
106	**3.4.3**	**EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES**	**$ 79.836.845,01**	**296 días**	**28/07/25**	**17/04/26**

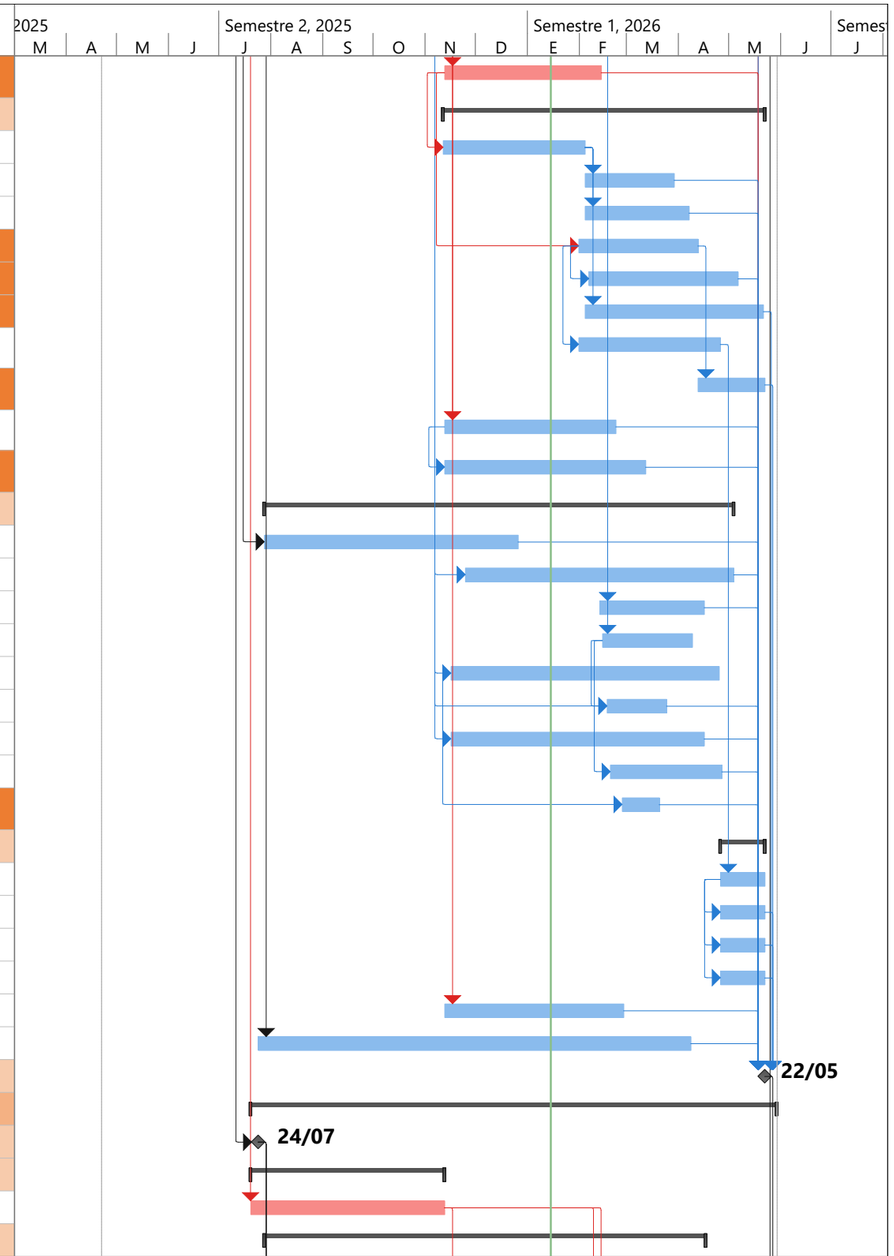

Proyecto: PLAN DE CONTINGEN
Fecha: 15/01/26

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	

Id	EDT	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
107	3.4.3.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	$ 9.242.675,73	210 días	28/07/25	30/01/26
108	3.4.3.2	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	$ 15.814.904,12	200 días	10/08/25	4/02/26
109	**3.4.3.3**	**NP 04 - EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 10,9 KM)**	**$ 54.779.265,16**	**70 días**	**14/02/26**	**17/04/26**
110	**3.4.4**	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**	**$ 1.251.991.478,47**	**120 días**	**9/02/26**	**27/05/26**
111	3.4.4.1	COMPACTACION DE LA SUBRASANTE, SIN ADICION DE MATERIAL	$ 4.097.869,38	60 días	14/02/26	8/04/26
112	3.4.4.2	AFIRMADO	$ 18.857.007,67	60 días	14/02/26	8/04/26
113	**3.4.4.3**	**NP01 - BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 6%**	**$ 159.571.064,08**	**100 días**	**14/02/26**	**13/05/26**
114	**3.4.4.4**	**NP 05 - ESTABILIZACION CON ESTABILIZANTE QUIMICO**	**$ 102.264.526,92**	**100 días**	**14/02/26**	**13/05/26**
115	**3.4.4.5**	**NP02 - SARDINEL PREFABRICADO A-10**	**$ 61.285.547,92**	**100 días**	**13/02/26**	**12/05/26**
116	**3.4.4.6**	**NP - 06 CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-43 ACELERADO 3 DIAS, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN**	**$ 734.222.136,50**	**70 días**	**26/03/26**	**27/05/26**
117	3.4.4.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TR 4000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPAF	$ 62.979.278,46	110 días	14/02/26	22/05/26
118	3.4.4.8	EXACAVACIÓN MANUAL Y CONSTRUCCIÓN DE FILTROS DE DRENAJE (0.40x1.00)m (NO INC. LLENOS DIEFERENTES A LA SECCION DEL FILTRO)	$ 49.402.156,80	70 días	9/02/26	12/04/26
119	**3.4.4.9**	**NP 08 - GEODRÉN PLANAR H = 2.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 59.311.890,74**	**75 días**	**16/03/26**	**21/05/26**
120	**3.4.5**	**OBRAS DE ARTE Y ESTRUCTURAS DE CONTENCION**	**$ 442.389.445,13**	**205 días**	**28/07/25**	**26/01/26**
121	3.4.5.1	ENTIBADO TIPO 2 (1/7 UTILIZACIONES)	$ 7.131.570,00	150 días	28/07/25	8/12/25
122	3.4.5.2	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	$ 122.921.077,67	190 días	10/08/25	26/01/26
123	3.4.5.3	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	$ 31.057.128,98	150 días	29/07/25	10/12/25
124	3.4.5.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =4000 psi (bases)	$ 8.209.768,33	21 días	11/11/25	30/11/25
125	3.4.5.5	CONCRETOS CLASE D, f´c =4000 psi (elevaciones)	$ 7.962.034,74	40 días	25/11/25	30/12/25
126	3.4.5.6	RELLENO TIPO 1 "GRAVILLA"	$ 4.764.809,16	40 días	16/11/25	21/12/25
127	3.4.5.7	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	$ 2.322.686,34	40 días	16/11/25	21/12/25
128	3.4.5.8	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	$ 196.549.168,95	40 días	13/11/25	19/12/25
129	**3.4.5.9**	**NP 04- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE III, INCLUYE EMBOQUILLADA**	**$ 61.471.200,96**	**30 días**	**12/11/25**	**9/12/25**
130	**3.4.6**	**SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL**	**$ 19.669.222,99**	**43 días**	**21/04/26**	**29/05/26**
131	3.4.6.1	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	$ 5.082.232,32	38 días	21/04/26	25/05/26
132	3.4.6.2	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	$ 2.997.633,00	38 días	21/04/26	25/05/26
133	3.4.6.3	SEÑAL VERTICAL GRUPO I 0.60x0.60M POSTE 3.5M	$ 5.760.063,00	38 días	21/04/26	25/05/26
134	3.4.6.4	TACHAS REFLECTIVAS	$ 5.829.294,67	43 días	21/04/26	29/05/26
135	3.4.7	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	$ 17.805.968,00	200 días	12/11/25	9/05/26
136	3.4.8	PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL	$ 28.599.889,00	330 días	24/07/25	13/05/26
137	**3.4.9**	**FIN FRENTE DE OBRA No.3**	**$ 0,00**	**0 días**	**29/05/26**	**29/05/26**
138	**3.5**	**FIN DE LA ETAPA 2**	**$ 0,00**	**0 días**	**29/05/26**	**29/05/26**
139	**4**	**FIN DEL PROYECTO**	**$ 0,00**	**0 días**	**29/05/26**	**29/05/26**

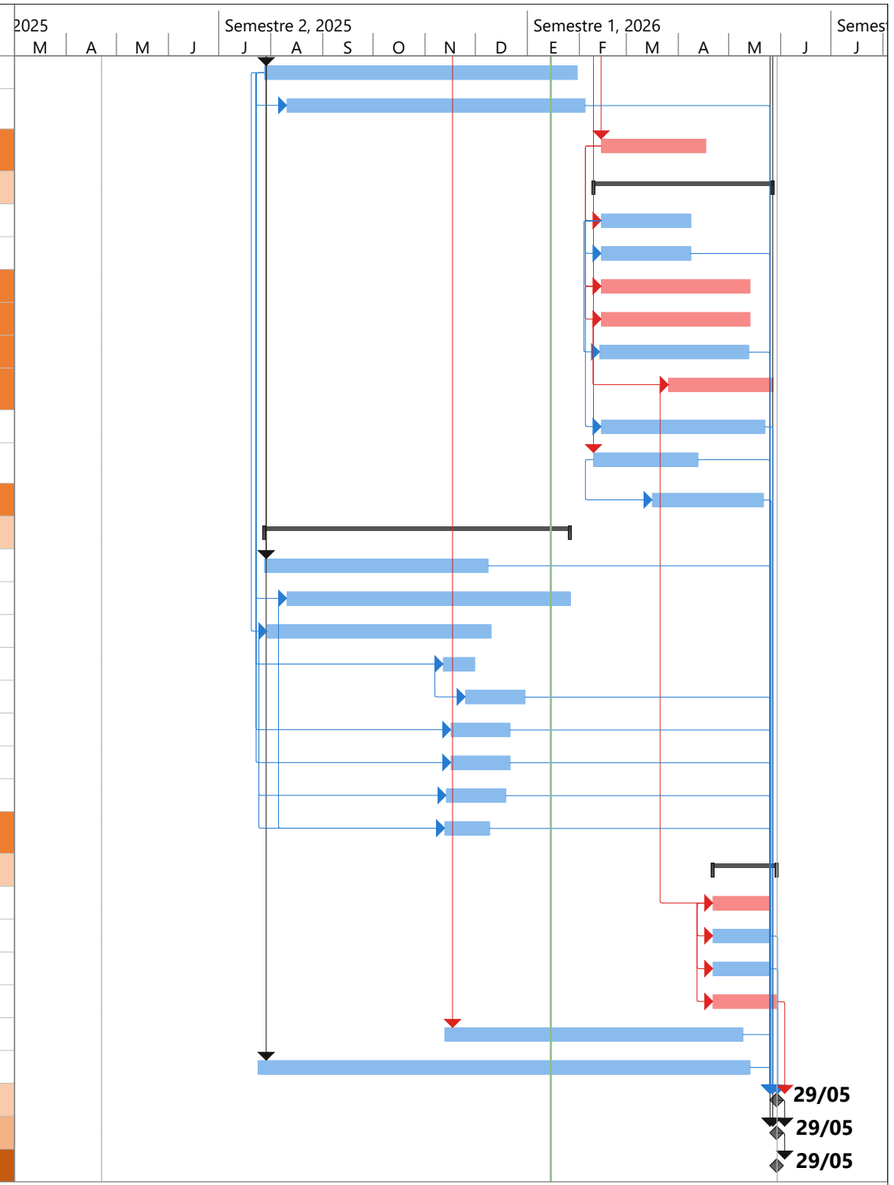

Proyecto: PLAN DE CONTINGEN
Fecha: 15/01/26

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	
