INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO No. 2000 DE 2024 SUSCRITO CON LESATH SAS

HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA

DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

TABLA DE CONTENIDO

1. CONTRATO DE OBRA 3
1.1. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 3
1.2. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 4
1.2.1. ESTADO PRESUPUESTAL 4
1.2.2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL 4
1.2.3. ACTAS DE OBRA TRAMITADAS DURANTE EL CONTRATO 4
1.3. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 5
1.4. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 5
1.4.1. PRÓRROGAS 5
1.4.2. ADICIONES 5
1.5. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONTRATO 6
1.6. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 7
1.7. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 7
1.7.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS 7
1.7.2. REGISTRO FOTÓGRAFICO 8

1. CONTRATO DE OBRA

1.1. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA NO.	2000-2024		
CONTRATISTA:	LESATH SAS	NIT:	901239041
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	LESATH SAS, con Nit. 901.239.041-8, representado legalmente por GLADIS MACIAS VARGAS, identificada con la cedula de ciudadanía No. 46.368.055 expedida en Sogamoso		
OBJETO:	HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA		
FECHA DE INICIO:	15/08/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VHUI-055913
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($ 274.502.885,63) M/CTE		
VALOR ADICIONES:	DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON TRES CENTAVOS ($ 287.999.654.03) M/CTE		
ADICIÓN 1:	TRECE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($13.496.768,40) M/CTE		
VALOR ACTUAL:	DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON TRES CENTAVOS ($ 287.999.654,03) M/CTE		
ANTICIPO	NO APLICA		
PLAZO INICIAL:	TRES MESES		
PRÓRROGA No. 1:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
PRORROGA No. 2:	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2025		
PRORROGA No. 3:	HASTA EL 31 DE MAYO DE 2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE MAYO 2025		

1.2. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

1.2.1. ESTADO PRESUPUESTAL

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
552924	2024	11	C-2409-0600-4-51102D-2409046-02	$287.999.654.03	$256.258.928	$31.740.726,03
TOTAL				$287.999.654.03	$256.258.928	$31.740.726,03

1.2.2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

ITEM	VALOR (MILLONES)
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 274.502.885,63
VALOR ADICIONAL No. 1	$ 13.496.768,40
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	$ 287.999.654,03
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 286.566.723,00
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 286.566.723,00

1.2.3. ACTAS DE OBRA TRAMITADAS DURANTE EL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4	$34.970.658	$255.555	$0.00	$35.226.213
Acta de Recibo	$15.158.700	$110.775	$0.00	$15.269.475

Parcial de Obra No. 5				
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 6	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 7	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 8	$57.059.263	$416.972	$0.00	$57.476.235
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 9	$147.211.231	$1.075.774	$0.00	$148.287.005
Acta final de Obra	$30.087.922	$219.873	$0.00	$30.307.795

1.3. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/a	N/a	N/a	N/a	N/a

1.4. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

1.4.1. PRÓRROGAS

CONTRATO ADICIONAL No.	FECHA	PERÍODO	
		Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
1	14/11/2024	15/11/2024	31/12/2024
2	26/12/2024	01/01/2025	31/03/2025
3	31/03/2025	01/04/2025	31/05/2025

1.4.2. ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No.	FECHA	VALOR	SMMLV DEL AÑO DE LA ADICIÓN
1	14/11/2024	$13.496.768,40	10.38

1.5. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONTRATO

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No. 2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27/12/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 31/05/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: NO

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: JMalucelli Travelers Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$28.799.965.50	2059252 Anexo 4	27/12/2024	30/09/2025
Estabilidad y calidad de la obra	$86.399.896.50	2059252 Anexo 4	31/13/2025	31/03/2030
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$57.599.931.00	2059252 Anexo 4	27/12/2024	31/03/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$260.000.000,00	2059251- Anexo 3	27/12/2024	31/03/2025
Contratistas y subcontratistas	$260.000.000,00	2059251- Anexo 3	27/12/2024	31/03/2025
Lucro cesante	$260.000.000,00	2059251- Anexo 3	27/12/2024	31/03/2025
Perjuicios extrapatrimoniales	$260.000.000,00	2059251- Anexo 3	27/12/2024	31/03/2025
Responsabilidad civil patronal	$260.000.000,00	2059251- Anexo 3	27/12/2024	31/03/2025
Vehículos propios y no propios	$260.000.000,00	2059251- Anexo 3	27/12/2024	31/03/2025

1.6. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a
…					…

1.7. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

1.7.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se ejecutaron las siguientes actividades durante la ejecución del contrato de obra:

- Demolición de estructuras.
- Excavación sin clasificar de la explanación y canales.
- Excavación en roca de la explanación y canales.
- Remoción de derrumbes.
- Excavación varias sin clasificar.
- Rellenos para estructuras con recebo.
- Rellenos con material filtrante.
- Tipo de concreto clase D.
- Tipo de concreto clase F.
- Acero de refuerzo FY 4200Mpa.
- Tubería de concreto reforzado, clase II de 600mm de diámetro interior.
- Geotextil tipo tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 1400 N.
- Gaviones o colchogaviones de malla de alambre de acero entrelazado estilo 1: recubrimiento de zinc (galvanizado).
- Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos.
- Transporte de materiales provenientes de derrumbes.
- Transporte de mezclas asfálticas, bases y subbases granulares, agregados, material de afirmado.

Donde, se atendieron diferentes puntos críticos en la red vial a cargo del INVIAS, a través del sistema de monto agotable, en vías a cargo de la dirección territorial Huila, con el objetivo de habilitar y brindar transitabilidad en los corredores viales.

1) PR37+0200 código vía 2003.
2) PR29+0600 código vía 4301.

3) PR31+0500 código vía 2003.
4) PR19+0300 código vía 2003.
5) Atención de derrumbes:

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL
PR38+025	PR36+600
PR30+050	PR30+030
PR35+000	PR35+010
PR31+650	PR31+680
PR31+610	PR31+625
PR31+370	PR31+385
PR31+360	PR31+365
PR31+340	PR31+345
PR29+970	PR30+050
PR29+090	PR29+912
PR28+350	PR28+376

1.7.2. REGISTRO FOTÓGRAFICO

Vía 2003 PR19+0300




Vía 2003 PR31+0500





Vía 2003 PR37+0200

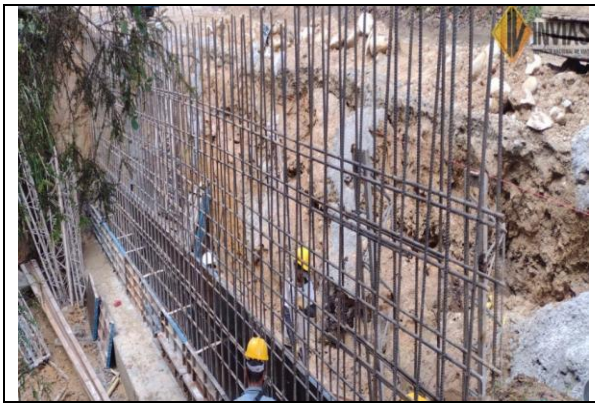



Vía 4301 PR29+0600









Cordialmente,

Firmado digitalmente por RINCON SILVA JESUS EDUARDO

JESÚS EDUARDO RINCON SILVA
M.P. 19202-65504 CAU.
Supervisor del proyecto
Dirección Territorial Huila
Correo electrónico: jerincon@invias.gov.co
