CDMB	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB		
	Elaboró Equipo Líder SIGC	Revisó Representante de la Dirección para el SIGC	Aprobó Director(a) General
Código E-GE-FO02 / Versión 2	CONTROL DE PROCESOS		

Proceso	Gestion Riesgo Ambiental Territorial				
Producto	Acta de pago parcial No. 4 - contrato de interventoria 210,16226,4				
Fuente de Identificación	Petición, Queja o Recurso	☐	Servicios y Trámites	☐	
	Actas de Interventoria / Sup.	■	Otro	☐	
	¿Cual?				
Entregado por					
Fecha de Entrega para Verificación		**Número de Verificación**			

Item.	Aspecto a Verificar	¿Cumple? SI	¿Cumple? NO	Observaciones de la Verificación
✓ 5	ACTA PARCIAL DE PAGO	X		Se Anexa Documento
✓ 7	INFORME DE CUMPLIMIENTO (A-BS-FO07)	X		Se Anexa Documento
✓ 8	INFORME DE CUMPLIMIENTO SUPERVISION	X		Se Anexa Documento
✓ 9	INFORME DE CONTRATISTA (CONTIENE TODAS LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMINETO A LA OBRA PUBLICA, ASI COMO EL BALANCE PRESUPUESTAL, SORTES DE PAGOS DE COSTOS DIRECTOE E INDIRECTOS REGUISTRADOS DURANTE EL PERIODO DE COBRO)	X		Se Anexa Documento
✓ 10	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	X		Se Anexa Documento
✓ 11	CERTIFICADO DE PARAFISCALES POR REVISOR FISCAL	X		Se Anexa Documento
✓ 12	CERTIFICADO DE RETEICA	X		Se Anexa Documento
✓ 13	FACTURA DE VENTA	X		Se Anexa Documento

Fecha de Verificación	22/07/2026	**Conclusión de la Verificación**	Aprobado	X	Rechazado ☐
Verificado por	Jesus Evelio Sanchez Sanchez	**Firma**			
Recibido por		**Firma**			

Acciones de Tratamiento a la No Conformidad / Producto No Conforme	

Nueva Fecha de Entrega		**Nueva Fecha de Verificación**			
Verificado por		**Firma**			
		Conclusión de la Verificación	Aprobado	☐	Rechazado ☐

OBSERVACIÓN

CDMB	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA- CDMB		
	ELABORÓ: Jefe Oficina de Contratación	REVISÓ: Representante de la Dirección SIGC	APROBÓ: Director(a) General
CÓDIGO: A-BS-FO45 / VERSIÓN: 03	**ACTA DE RECIBO Y PAGO PARCIAL**		

Acta No.	5
Fecha acta	22/07/2026
Contrato No.	210-16226-4
Fecha de suscripción del contrato	08 de Septiembre de 2025
Objeto del contrato	GRUPO 2 . INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSION EN PUNTOS CRITICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER
Contratista	CONSORCIO INTER BUCARAMANGA
NIT Contratista	901982945
Representante legal contratista	QUIROS GOMEZ MIGUEL FERNANDO
Valor	$ 1.707.465.489,00
Plazo	16 MESES
Supervisor o interventor	DIAZ BARRERA CARLOS ALBERTO
Cargo supervisor o contrato suscrito con el interventor	Subdirector de Gestión del Riesgo y Seguridad Territorial - SURYT
Funcionario competente para aprobar acta	DIAZ BARRERA CARLOS ALBERTO
Acto administrativo que delega funciones a funcionario competente	Resolución 0041 del 2024
Fecha acta de inicio	15 de Octubre de 2025
Fecha estimada de terminación	31 de Diciembre de 2026
Periodo que comprende el acta	Desde el 01/04/2026 hasta el 30/06/2026

En Bucaramanga, en la fecha indicada, se reunieron con el fin de evaluar y aprobar el recibo y pago parcial del objeto del contrato antes referenciado, el funcionario delegado DIAZ BARRERA CARLOS ALBERTO, el supervisor o interventor UNION TEMPORAL INTER PANTALLAS 2025 y el contratista CONSORCIO INTER BUCARAMANGA representado legalmente por QUIROS GOMEZ MIGUEL FERNANDO, para lo cual procedieron como se señala.

1. ALCANCE DEL OBJETO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA

ACTIVIDAD O BIENES O SERVICIOS QUE COMPRENDE EL ACTA	CTDAD	VALOR UNITARIO	

Los indicados en el Informe anexo en formato único de presentación de informe de cumplimiento a las obligaciones contractuales (A-BS-FO07 V.3) del período antes indicado

2. EVIDENCIAS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

1- Que el Supervisor verificó que el contratista realizó el pago a los aportes de seguridad social integral, de acuerdo a lo establecido en las obligaciones contractuales, planillas que se adjunta a la presente acta.

2- Que se aprobó por parte del supervisor el cumplimiento de las obligaciones del contratista, en el periodo comprendido entre el entre 01/04/2026 hasta el 30/06/2026, conllevando a que el SUBDIRECTOR DE GESTION DEL RIESGO Y SEGURIDAD TERRITORIAL autorizara el pago mediante acta 5 de pago parcial Nº4.

3. CONCEPTO SUPERVISOR O INTERVENTOR

EL Supervisor (o Interventor) manifiesta que revisó el informe y las evidencias presentadas por el contratista y certifica que cumplió a cabalidad el objeto contractual correspondiente al lapso que comprende la presente cuenta, de conformidad con las condiciones y especificaciones estipuladas en el contrato, dando cumplimiento a las obligaciones a su cargo incluyendo las relacionadas con la seguridad social, riesgos y parafiscales, por lo tanto, da concepto favorable para el pago.

4. ORDENACION DEL PAGO

El SUBDIRECTOR GESTIÓN DEL RIESGO Y SEGURIDAD TERRITORIAL con fundamento en las evidencias y el concepto del Supervisor o Interventor aprueba el pago correspondiente al periodo comprendido entre él 01/04/2026 y el 30/06/2026, por valor detrescientos noventa y nueve millones ochocientos ochenta y ocho mil cuatrocientos diecisiete pesos con cincuenta y dos centavos ($ 399.888.417,52).

5. En consecuencia, **ACUERDAN**

1. **APROBAR** el pago correspondiente al periodo comprendido entre el 01/04/2026 y el 30/06/2026, por valor de trescientos noventa y nueve millones ochocientos ochenta y ocho mil cuatrocientos diecisiete pesos con cincuenta y dos centavos ($ 399.888.417,52) , de conformidad con la siguiente liquidación:

Valor fiscal del contrato.....$ 1.707.465.489,00
Valor bruto a pagar ..... $ 336.040.686,99
Valor IVA .....$ 63.847.730,53
Total ejecutado.....$ 399.888.417,52
Valor amortizado..... .$ 0
Neto.....$ 399.888.417,52
% valor ejecutado..... 53,24
% tiempo transcurrido..... 58,37

2. La SURYT - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO Y SEGURIDAD TERRITORIAL remitirá el siguiente día hábil la presente acta a la Oficina de Contratación para su publicación en el SECOP II y archivo en el expediente contractual.

6. ANEXOS

1. Informe de cumplimiento (a-bs-fo07)
2. Informe de cumplimiento supervisión
3. Informe de contratista (contiene todas las actividades de seguimiento a la obra pública, así como el balance presupuestal, soportes de pagos de costos directos e indirectos registrados durante el periodo de cobro)

4. Pago de seguridad social
5. Certificado de parafiscales por revisor fiscal
6. Certificado de reteICA
7. Factura de venta

Nombre: DIAZ BARRERA CARLOS ALBERTO
SUBDIRECTOR GESTIÓN DEL RIESGO Y SEGURIDAD TERRITORIAL
C.C. No. 91496579

Nombre: DIAZ BARRERA CARLOS ALBERTO
Supervisor o Interventor
C.C. No. 91496579

Nombre: CONSORCIO INTER BUCARAMANGA
Contratista o representante legal
C.C. No. 901982945

CONSORCIO INTER
BUCARAMANGA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSION EN PUNTOS CRITICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

CDMB 60 Años

ACTA DE COBRO No. 3 - CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 210.16226.4 DE 2025

CONDICIONES CONTRACTUALES								1				2				3				4				ACUMULADOS			
								PERIODO: 15 DE OCTUBRE A 14 DE DICIEMBRE DE 2025				PERIODO: 15 DE DICIEMBRE DE 2025 A 31 DE ENERO DE 2026				PERIODO: 01 DE FEBRERO A 31 DE MARZO DE 2026				PERIODO: 01 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2026							
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 210.16226.4 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025				CONTRATO DE OBRA No. 210.16222.6 DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2025				EJECUTADO OBRA		EJECUTADO INTERVENTORIA		EJECUTADO OBRA		EJECUTADO INTERVENTORIA		EJECUTADO OBRA		EJECUTADO INTERVENTORIA		EJECUTADO OBRA		EJECUTADO INTERVENTORIA		OBRA		INTERVENTORIA	
OBJETO	VR INICIAL	VR FINAL	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	OBJETO	VR INICIAL	VR FINAL	CONTRATISTA DE OBRA	VR EJECUTADO	% PONDERADO	VR COSTO	% EJECUTADO	VR EJECUTADO	% PONDERADO	VR COSTO	% EJECUTADO	VR EJECUTADO	% PONDERADO	VR COSTO	% EJECUTADO	VR EJECUTADO	% PONDERADO	VR COSTO	% EJECUTADO	VR ACUMULADO	% EJECUTADO	VR ACUMULADO	% EJECUTADO
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSION EN PUNTOS CRITICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	$ 1.434.844.948,74	$ 1.434.844.948,74	CONSORCIO INTER BUCARAMANGA	"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSION EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA- GRUPO 2. CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSION EN PUNTOS CRITICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER."	$ 20.436.277.836,05	$ 20.436.277.836,05	CONSORCIO EROSION METROPOLITANA	$ 949.390.445,23	4,65%	$ 66.720.290,12	4,65%	$ 1.875.041.914,47	9,18%	$ 131.575.281,80	9,17%	$ 3.269.433.409,99	16,00%	$ 229.575.191,80	16,00%	$ 4.785.389.831,64	23,42%	$ 336.048.686,99	23,42%	$ 10.879.255.601,33	53,24%	$ 763.911.430,71	53,24%
VALOR COSTO BASICO	$ 1.434.844.948,74	$ 1.434.844.948,74	VALOR COSTO BASICO	$ 20.436.277.836,05	$ 20.436.277.836,05		$ 949.390.445,23		$ 66.720.290,12		$ 1.875.041.914,47		$ 131.575.281,80		$ 3.269.433.409,99		$ 229.575.191,80		$ 4.785.389.831,64		$ 336.048.686,99		$ 10.879.255.601,33		$ 763.911.430,71		
IVA (19%)	$ 272.620.540,26	$ 272.620.540,26	IVA (19%)	$ 3.882.892.788,85	$ 3.882.892.788,85		$ 180.384.184,59		$ 12.676.855,12		$ 356.257.963,75		$ 24.999.303,54		$ 621.192.347,90		$ 43.619.286,44		$ 909.224.068,01		$ 63.847.730,53		$ 2.067.758.564,25		$ 145.143.175,65		
VALOR COSTO TOTAL	$ 1.707.465.489,00	$ 1.707.465.489,00	VALOR COSTO TOTAL	$ 24.319.170.624,90	$ 24.319.170.624,90		$ 1.129.774.629,82		$ 79.397.145,24		$ 2.231.299.878,22		$ 156.574.585,34		$ 3.890.625.757,89		$ 273.194.478,24		$ 5.694.613.899,65		$ 399.888.417,52		$ 12.946.314.163,58		$ 909.054.626,36		

MIGUEL FERNANDO QUIROS GOMEZ
R.L CONSORCIO INTER BUCARAMANGA
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA
SUPERVISOR Y SUBDIRECTOR
C.C. 91.466.579

CDMB	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – CDMB		
	ELABORÓ: Jefe Oficina de Contratación	REVISÓ: Delegado Dirección SIGC	APROBÓ: Director(a) General
CÒDIGO A-BS-FO07 / VERSIÓN 03	**FORMATO ÚNICO DE PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN: (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN – CONSULTORÍA – SUMINISTROS – OBRA PÚBLICA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS GENERALES).**		

NÚMERO DE CONTRATO:	210.16226.4
FECHA DE CONTRATO:	08 DE SEPTIEMBRE DE 2025
OBJETO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA. – GRUPO 2. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER."
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTER BUCARAMANGA
NIT CONTRATISTA:	901.982.945-6
VALOR:	MIL SETECIENTOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($1.707.465.489,00).
PLAZO:	DIECISEIS (16) MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026
FECHA ACTA DE INICIO:	15 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME:	01 DE ABRIL DE 2026 A 30 DE JUNIO DE 2026	
FECHA DE PRESENTACIÓN:	22 DE JULIO DE 2026	
NÚMERO DE INFORME:	4	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:	FÍSICA	PRESUPUESTAL
	58.37 %	53,24 %

NOMBRE DEL SUPERVISOR	CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA

CDMB	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – CDMB		
	ELABORÓ: Jefe Oficina de Contratación	REVISÓ: Delegado Dirección SIGC	APROBÓ: Director(a) General
CÒDIGO A-BS-FO07 / VERSIÓN 03	**FORMATO ÚNICO DE PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN: (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN – CONSULTORÍA – SUMINISTROS – OBRA PÚBLICA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS GENERALES).**		

SUBDIRECCIÓN O OFICINA	**SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO Y SEGURIDAD TERRITORIAL**
CARGO	SUBDIRECTOR Y SUPERVISOR

1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIAS
1	Realizar seguimiento cada una de las actividades ejecutadas por el contratista de obra, en las que se debe incluir su vigilancia continua por medio de la elaboración de ensayos a los materiales, verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, los análisis de precios unitarios, planos de detalles y cantidades ejecutadas, dando concepto durante y al finalizar cada actividad desarrollada.	• Recorridos de obra permanentes en los cuales se corroboró el desarrollo de las actividades realizadas. • Permanente comunicación con los profesionales que permanentemente se encuentran en obra. • Asistencia a comités en los cuales se verifica el avance de los trabajos en pro del cumplimiento del objeto contractual. • Verificación de las cantidades reportadas mediante medición realizada en obra con el acompañamiento del residente de obra e interventoría. • Se realizó seguimiento al diligenciamiento del libro de bitácora de obra.	• Informe semanal de interventoría • Informe mensual de interventoría • Revisión y verificación de cantidades de obra reportadas mediante informe de obra para aprobación del cobro parcial de obra e interventoría. • Seguimiento y diligenciamiento a la bitácora de obra
2	Agendar, programar y coordinar con el contratista vigilado y con la entidad (supervisor del contrato) (oficina gestora) las reuniones de seguimiento a la ejecución del contrato de obra. En estas reuniones se presenta el estado de avance del contrato, así como también se tratan y analizan temas y problemas relacionados con el desarrollo del proyecto, acordando entre las partes soluciones prácticas y oportunas, elaborando para este caso la respectiva acta de reunión garantizando la suscripción de las mismas por quienes en ella participen.	• Se realizaron comités de obra en los que se realiza seguimiento, y se contó con la presencia del personal del contratista de obra e interventoría	• Visitas de seguimiento y verificación de avance de obra. • Acta de comité de obra
3	Entrega de los informes semanales y demás informes requeridos por la entidad en los cuales se presente el estado de ejecución avance y terminación del contrato las cuales son el soporte para controlar el avance de obra y determinar oportunamente posibles modificaciones o actividades no previstas durante la ejecución	• Se elaboraron informes en los cuales se puede apreciar mediante registro fotográfico el avance de las actividades ejecutadas.	• Informes de Interventoría a los cuales se anexaron las evidencias de ejecución y cumplimiento del contrato. • Informe semanal de interventoría

CDMB	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – CDMB		
	ELABORÓ: Jefe Oficina de Contratación	REVISÓ: Delegado Dirección SIGC	APROBÓ: Director(a) General
CÒDIGO A-BS-FO07 / VERSIÓN 03	**FORMATO ÚNICO DE PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN: (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN – CONSULTORÍA – SUMINISTROS – OBRA PÚBLICA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS GENERALES).**		

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIAS
4	Velar por el cumplimiento del cronograma y flujo de inversión del contrato, efectuando controles periódicos de las actividades programadas, así mismo recomendar los ajustes a los que haya lugar. En caso de incumplimiento, el interventor deberá informar oportunamente a la CDMB y sugerir si es el caso la aplicación de los procedimientos sancionatorios establecidos en el contrato.	• Se realizó seguimiento a la programación establecida por el contratista y aprobada por la interventoría en la cual se pudo apreciar un avance satisfactorio entre lo programado y lo ejecutado.	• Informes de Interventoría a los cuales se anexan las evidencias de ejecución y cumplimiento del contrato.
5	Abrir, diligenciar y tener la custodia el libro o bitácora para registrar en él las novedades, órdenes e instrucciones impartidas durante el plazo del contrato, registro que se deberá llevar a diario.	• Verificar la bitácora de obra en el cual se consignaron las actividades ejecutadas diariamente.	• Bitácora de obra
6	Verificar que el contratista cumpla con los requisitos exigidos por la CDMB para la entrega del anticipo o pago anticipado pactado. Constatar la correcta inversión del anticipo, para este efecto deberá exigir según corresponda la programación de los trabajos, el flujo de inversión del contrato y el plan de inversión del anticipo, si aplica, y emitir el respectivo concepto técnico, así como reportar el flujo de gastos del mismo.	• El contratista de obra durante el tiempo de ejecución de la primera acta de obro le entregó a la interventoría para su revisión todos los documentos exigidos para el desembolso del anticipo: 1) contrato fiduciario; 2) certificación bancaria para el desembolso del anticipo; 3) el plan de manejo del anticipo; 4) las pólizas del contrato con el amparo del anticipo.	• La interventoría ha revisado y aprobado todas las órdenes de pago que se han realizado con el anticipo a través de la fiducia.
7	Verificar que el contratista vigilado cumpla con los requerimientos establecidos por la autoridad ambiental competente, así como las normas de salud ocupacional y seguridad industrial y lo establecido por las entidades competentes a través de los requerimientos indicados en las licencias o permisos expedidos.	• La interventoría verificó, aprobó y elaboró el respectivo informe de seguimiento al PASA. • La interventoría verificó los componentes referentes a la seguridad y salud en el trabajo, afiliaciones de seguridad social, verificación de planillas de pago de seguridad social, exámenes de ingreso y/o egreso, entrega y reposición de elementos de protección personal, reunión de los comités paritario y convivencia laboral, seguimiento de indicadores de accidentalidad, entre otras.	• Informes de verificación de cumplimiento del Plan de Manejo Socio Ambiental. • Informe SST mensuales.
8	Diligenciar y preparar los informes mensuales y final de índole ambiental, y demás que sean requeridos por la entidad y que deba cumplir el contratista vigilado, a efectos de verificar el cumplimiento de las directrices ambientales para la ejecución del objeto contractual.	• La interventoría garantizó durante el tiempo de ejecución del proyecto, que se dé cumplimiento a todos los programas que conforman el PASA.	• Informes socio-ambientales mensuales. • Informe SST mensual.
9	El contratista deberá dotar a todo el personal con herramientas propias de trabajo, así como para sus	• La interventoría verificó que se dé cumplimiento de las normas SST,	• Informe SST mensual.

NUMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIAS
	diferentes actividades misionales, deberá contar con sus propios elementos de protección personal (EPP) y demás dispositivos para la prevención, protección y control de los riesgos profesionales atendiendo la normatividad en seguridad y salud en el trabajo. Los (EPP) utilizados deben cumplir con las normas técnicas NTC NIOSH Y ANSI.	principalmente a lo referente al porte adecuado y permanente de los elementos de protección personal. • La interventoría revisó todos los implementos utilizados en el sistema SST.	

2. **RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:**

CONTRATISTA: CONSORCIO INTER BUCARAMANGA

ABRIL

CONSORCIO INTER BUCARAMANGA – PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS

Abril: 1081642399 (Omar Ruiz Rueda)
1081642404 (Cristian Ricardo Caballero)

ITEM	PERÍODO DE COTIZACIÓN AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR PAGADO
PENSIÓN	2026-04 2026-04	2026-05-11 2026-05-11	$ 560.000 $ 0
SALUD	2026-04 2026-04	2026-05-11 2026-05-11	$ 140.000 $ 0
RIESGOS PROFESIONALES	2026-04 2026-04	2026-05-11 2026-05-11	$ 243.600 $ 121.900

CRISTIAN RICARDO CABALLERO – PLANILLA INDEPENDIENTE

Abril: 9505127126 (Cristian Ricardo Caballero)

ITEM	PERÍODO DE COTIZACIÓN AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR PAGADO
PENSIÓN	2026-04	2026-05-22	$ 280.200
SALUD	2026-04	2026-05-22	$ 218.900
RIESGOS PROFESIONALES	2026-04	2026-05-22	$ 9.200

CONSTRUINGENIERÍA DE COLOMBIA SAS - PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS

Abril:1079396127 (Miguel Fernando Quirós)
1079396109 (Karen Tatiana Martinez Martinez)
1079396109 (Yeison Jaramillo Bedoya)
1079396109 (Oscar Javier Leon Jaimes)
1079396109 (Diana Contreras Vargas)
1079396109 (Flor Emilce Hernández)
1079396109 (Angie Daniela Merchán)
1079396109 (Alfonso Vega Albino)
1079396109 (Juan Sebastian Saavedra Velandia)

ITEM	PERÍODO DE COTIZACIÓN AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR PAGADO
PENSIÓN	2026-04	2026-05-11	$ 852.000
	2026-04	2026-05-11	$ 560.000
	2026-04	2026-05-11	$ 523.200
	2026-04	2026-05-11	$ 603.700
	2026-04	2026-05-11	$ 560.000
	2026-04	2026-05-11	$ 387.200
	2026-04	2026-05-11	$ 672.000
	2026-04	2026-05-11	$ 384.000
	2026-04	2026-05-11	$ 560.000
SALUD	2026-04	2026-05-11	$ 213.000
	2026-04	2026-05-11	$ 140.000
	2026-04	2026-05-11	$ 130.800
	2026-04	2026-05-11	$ 151.000
	2026-04	2026-05-11	$ 140.000
	2026-04	2026-05-11	$ 96.800
	2026-04	2026-05-11	$ 168.000
	2026-04	2026-05-11	$ 96.000
	2026-04	2026-05-11	$140.000
RIESGOS PROFESIONALES	2026-04	2026-05-11	$ 370.700
	2026-04	2026-05-11	$ 243.600
	2026-04	2026-05-11	$ 227.600
	2026-04	2026-05-11	$ 262.600
	2026-04	2026-05-11	$ 243.600
	2026-04	2026-05-11	$ 168.500
	2026-04	2026-05-11	$ 292.400
	2026-04	2026-05-11	$ 167.100
	2026-04	2026-05-11	$ 243.600

CONTRATISTA: CONSORCIO INTER BUCARAMANGA

MAYO

CONSORCIO INTER BUCARAMANGA – PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS

Mayo: 1082465537 (Omar Ruiz Rueda)
1082465547 (Cristian Ricardo Caballero)

ITEM	PERÍODO DE COTIZACIÓN AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR PAGADO
PENSIÓN	2026-05 2026-05	2026-06-09 2026-06-09	$ 560.000 $ 0
SALUD	2026-05 2026-05	2026-06-09 2026-06-09	$ 140.000 $ 0
RIESGOS PROFESIONALES	2026-05 2026-05	2026-06-09 2026-06-09	$ 243.600 $ 121.900

CRISTIAN RICARDO CABALLERO – PLANILLA INDEPENDIENTE

Mayo: 9506176960 (Cristian Ricardo Caballero)

ITEM	PERÍODO DE COTIZACIÓN AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR PAGADO
PENSIÓN	2026-05	2026-06-10	$ 280.200
SALUD	2026-05	2026-06-10	$ 218.900
RIESGOS PROFESIONALES	2026-05	2026-06-10	$ 9.200

CONSTRUINGENIERÍA DE COLOMBIA SAS - PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS

Mayo: 1081972671 (Miguel Fernando Quirós Gómez)
1081972668 (Juan Sebastián Saavedra Velandia)
1081972668 (Karen Tatiana Martinez Martinez)
1081972668 (Alfonso Vega Albino)
1081972668 (Angie Daniela Merchán)
1081972668 (Yeison Jaramillo Bedoya)
1081972668 (Diana Contreras Vargas)
1081972668 (Flor Emilce Hernández)
1081972668 (Oscar Javier Leon)

ITEM	PERÍODO DE COTIZACIÓN AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR PAGADO
PENSIÓN	2026-05	2026-06-09	$ 852.000
	2026-05	2026-06-09	$ 523.200
	2026-05	2026-06-09	$ 560.000
	2026-05	2026-06-09	$ 384.000
	2026-05	2026-06-09	$ 672.000
	2026-05	2026-06-09	$ 523.200
	2026-05	2026-06-09	$ 560.000
	2026-05	2026-06-09	$ 387.200
	2026-05	2026-06-09	$ 603.700
SALUD	2026-05	2026-06-09	$ 213.000
	2026-05	2026-06-09	$ 130.800
	2026-05	2026-06-09	$ 140.000
	2026-05	2026-06-09	$ 96.000
	2026-05	2026-06-09	$ 168.000
	2026-05	2026-06-09	$ 130.800
	2026-05	2026-06-09	$ 140.000
	2026-05	2026-06-09	$ 96.800
	2026-05	2026-06-09	$ 151.000
RIESGOS PROFESIONALES	2026-05	2026-06-09	$ 370.700
	2026-05	2026-06-09	$ 227.600
	2026-05	2026-06-09	$ 243.600
	2026-05	2026-06-09	$ 167.100
	2026-05	2026-06-09	$ 292.400
	2026-05	2026-06-09	$ 227.600
	2026-05	2026-06-09	$ 243.600
	2026-05	2026-06-09	$ 168.500
	2026-05	2026-06-09	$ 262.600

CONTRATISTA: CONSORCIO INTER BUCARAMANGA

JUNIO

CONSORCIO INTER BUCARAMANGA – PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS

Junio: 1083243594 (Omar Ruiz Rueda)
1083243584 (Cristian Ricardo Caballero)

ITEM	PERÍODO DE COTIZACIÓN AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR PAGADO
PENSIÓN	2026-06 2026-06	2026-07-10 2026-07-10	$ 560.000 $ 0
SALUD	2026-06 2026-06	2026-07-10 2026-07-10	$ 140.000 $ 0
RIESGOS PROFESIONALES	2026-06 2026-06	2026-07-10 2026-07-10	$ 243.600 $ 121.900

CRISTIAN RICARDO CABALLERO – PLANILLA INDEPENDIENTE

Junio: 9507870695 (Cristian Ricardo Caballero)


ITEM	PERÍODO DE COTIZACIÓN AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR PAGADO
PENSIÓN	2026-06	2026-07-14	$ 280.200
SALUD	2026-06	2026-07-14	$ 218.900
RIESGOS PROFESIONALES	2026-06	2026-07-14	$ 9.200

CONSTRUINGENIERÍA DE COLOMBIA SAS - PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS

Junio: 1083248645 (Miguel Fernando Quirós Gómez)
1083253593 (Juan Sebastián Saavedra Velandia)
1083253593 (Karen Tatiana Martinez Martinez)
1083253593 (Alfonso Vega Albino)
1083253593 (Angie Daniela Merchán)
1083253593 (Yeison Jaramillo Bedoya)
1083253593 (Diana Contreras Vargas)
1083253593 (Flor Emilce Hernández)
1083253593 (Oscar Javier Leon)

ITEM	PERÍODO DE COTIZACIÓN AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR PAGADO
PENSIÓN	2026-06	2026-07-10	$ 852.000
	2026-06	2026-07-10	$ 560.000
	2026-06	2026-07-10	$ 560.000
	2026-06	2026-07-10	$ 384.000
	2026-06	2026-07-10	$ 672.000
	2026-06	2026-07-10	$ 523.200
	2026-06	2026-07-10	$ 560.000
	2026-06	2026-07-10	$ 387.200
	2026-06	2026-07-10	$ 603.700
SALUD	2026-06	2026-07-10	$ 213.000
	2026-06	2026-07-10	$ 140.000
	2026-06	2026-07-10	$ 140.000
	2026-06	2026-07-10	$ 96.000
	2026-06	2026-07-10	$ 168.000
	2026-06	2026-07-10	$ 130.800
	2026-06	2026-07-10	$ 140.000
	2026-06	2026-07-10	$ 96.800
	2026-06	2026-07-10	$ 151.000
RIESGOS PROFESIONALES	2026-06	2026-07-10	$ 370.700
	2026-06	2026-07-10	$ 243.600
	2026-06	2026-07-10	$ 243.600
	2026-06	2026-07-10	$ 167.100
	2026-06	2026-07-10	$ 292.400
	2026-06	2026-07-10	$ 227.600
	2026-06	2026-07-10	$ 243.600
	2026-06	2026-07-10	$ 168.500
	2026-06	2026-07-10	$ 262.600





3. ANEXOS (PRUEBAS DE LAS EVIDENCIAS REFERIDAS). SE ANEXAN INFORMES CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES MENCIONADOS EN EL PRESENTE INFORME

CONTRATISTA	SUPERVISOR – CDMB
FIRMA 	FIRMA 
MIGUEL FERNANDO QUIRÓS GÓMEZ R/L CONSORCIO INTER BUCARAMANGA CC. 1.096.949.307	**CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA** SUBDIRECTOR C.C. 91.496.579


Copia: EXPEDIENTE DEL CONTRATO

INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA DE LA VISITA REALIZADA: 01 DE JULIO DE 2026; **FECHA EN QUE SE GENERA EL INFORME:** 03 DE JULIO DE 2026

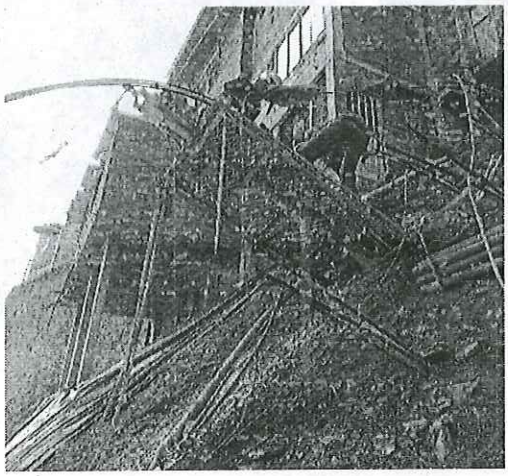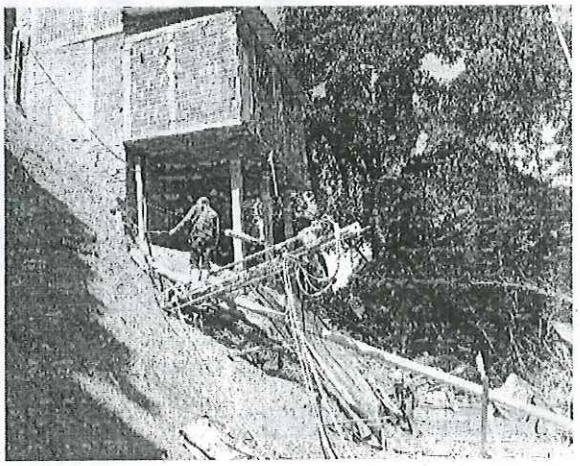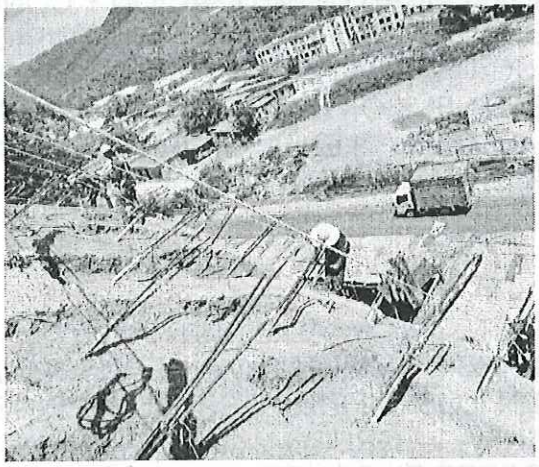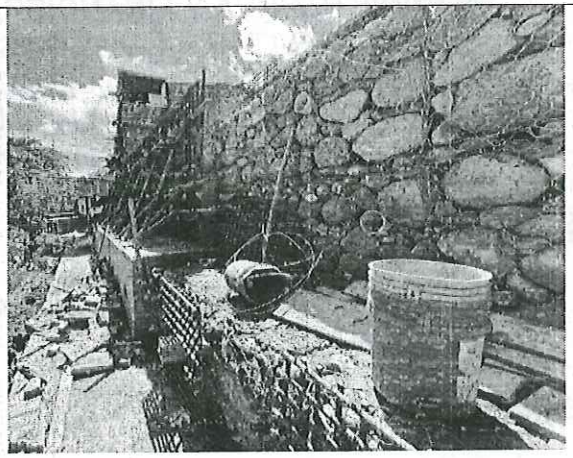Frente 1: Sector Alfonso López		
Frente 2: Sector estación de Ferrocarriles Nacionales.		
Frente 3: Sector barrio las casitas		

Cra. 23 #37-63 Bucaramanga. Santander
PBX: (607) 6 970241 / E-mail: info@cdmb.gov.co

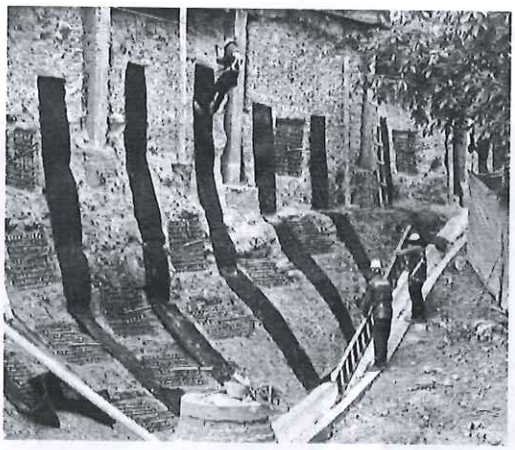Frente 4: Sector barrio la libertad		

CONTRATO DE OBRA:

- **N°. 210.16222.6***:* "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA- GRUPO 2: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER."

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

- **N°. 210.16226.4:** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA. – GRUPO 2. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER."

SUPERVISOR DEL CONTRATO:

- Arquitecto Carlos Alberto Díaz Barrera - Subdirector De Gestión Del Riesgo Y Seguridad Territorial

CONTRATISTAS:

- CONSORCIO EROSION METROPOLITANA.
- CONSORCIO INTER BUCARAMANGA

1. INFORME DE SUPERVISIÓN

En el presente informe se registra el desarrollo del proyecto de obra correspondiente al contrato **N.° 210.16222.6**, evidenciando el avance físico de las actividades programadas y ejecutadas en los cuatro (04) frentes de obra: Sector barrio Alfonso López, Sector Ferrocarriles Nacionales, Sector barrio las casitas, Sector barrio la libertad:

Sector barrio Alfonso López

Durante el período evaluado, la Supervisión verificó que el contratista de obra ejecutó actividades de perfilamiento del talud mediante personal descolgado y excavación mecánica. Asimismo, se dio inicio a las actividades de construcción de anclajes y perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1, utilizando equipo de perforación descolgado, tanto para anclajes con longitudes entre 0,00 m y 15,00 m como para aquellos con longitudes superiores a 15,00 m. Adicionalmente, se observó el avance en la instalación de los anclajes y en las labores de suministro e inyección de lechada cementicia, conforme a las actividades previstas para la estabilización del talud.

Sector Ferrocarriles Nacionales

Durante el período evaluado, el contratista de obra ejecutó las actividades correspondientes al llenado de inyección con lechada cementicia para anclajes, así como el suministro e instalación de tres (3) cables de Ø = 1/2" con longitud de 20 m. De igual manera, se llevó a cabo la ejecución de perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1, mediante el uso de equipo de perforación descolgado, tanto para anclajes entre 0,00 m y 15,00 m como para aquellos superiores a 15,00 m. Adicionalmente, se realizó la instalación de jacket de respaldo para el revestimiento de perforaciones horizontales en anclajes y drenes de penetración, en cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto.

Sector barrio las casitas

Durante el período evaluado, el contratista de obra continua ejecutando actividades correspondientes al suministro y colocación de concreto con resistencia de 3000 psi para revestimiento de gaviones, así como el suministro e instalación de tela geotextil no tejido para la conformación de filtros y barrera de separación. De igual manera, se evidenció la construcción de estructuras en gaviones tipo cuerpo con dimensiones de 2,00 x 1,00 x 1,00 m, las cuales fueron implementadas conforme a las especificaciones técnicas del proyecto y orientadas al control y estabilización del terreno. Adicionalmente se observa que el contratista se encuentra adelantando las actividades de instalación de las parrillas de refuerzo para zapatas, para posteriormente proceder al suministro de concreto

Sector barrio la libertad

Durante el período evaluado, el contratista de obra ejecutó las actividades correspondientes a la excavación de zapatas mediante personal descolgado, así como la fabricación, armado e instalación del acero de refuerzo para dichas cimentaciones. Adicionalmente, se verificó la instalación del geodren destinado a la protección del trasdós de la estructura estabilizadora. Posteriormente, se realizó la colocación de la malla electrosoldada y se ejecutaron actividades de concreto lanzado

2. LOCALIZACIÓN

El proyecto contemplado en el contrato **N°. 210.16222.6** se ejecuta en cuatro (4) puntos críticos "Sector Alfonso López, Sector Café Madrid, Sector las casitas, Sector la libertad", definidos por la CDMB (Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga). A continuación, se detalla la localización específica de cada uno de estos frentes de obra.

1. **SECTOR ALFONSO LOPEZ:** Calle 34 con carrera 7 A zona de Escarpa Norte.

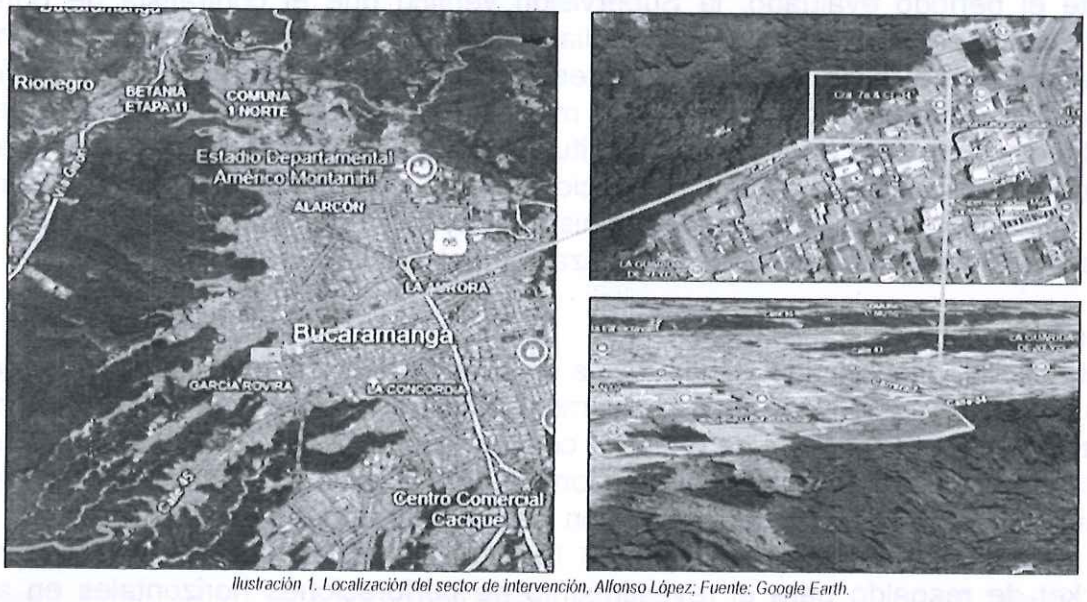


Ilustración 1. Localización del sector de intervención, Alfonso López; Fuente: Google Earth.

2. **SECTOR CAFÉ MADRID:** Anillo Vial Talud Oriental Frente al Edificio de Estación del ferrocarril.

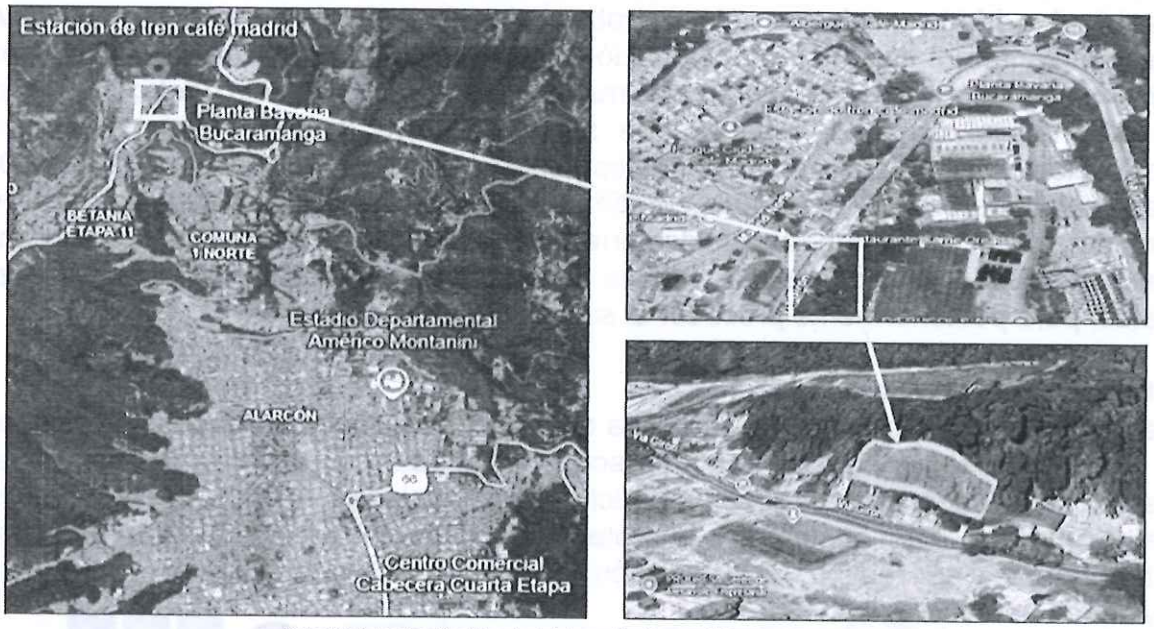


Ilustración 2. Localización del sector de intervención, Ferrocarril; Fuente: Google Earth

3. **SECTOR LAS CASITAS:** Calle 102 entre carrera 30 y 31 zona de Escarpa Norte.

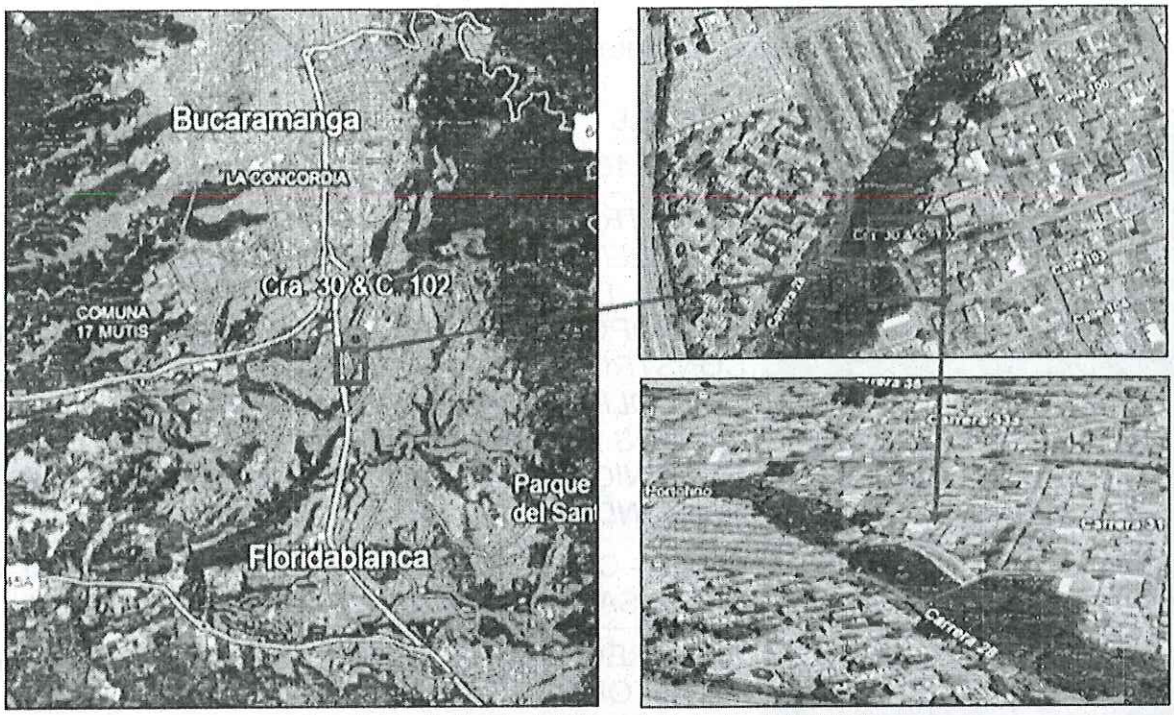


Ilustración 3. Localización del sector de intervención, Casitas; Fuente: Google Earth

4. **SECTOR LA LIBERTAD:** Carrera 32 entre calle 98 y 100 zona de Escarpa occidental.

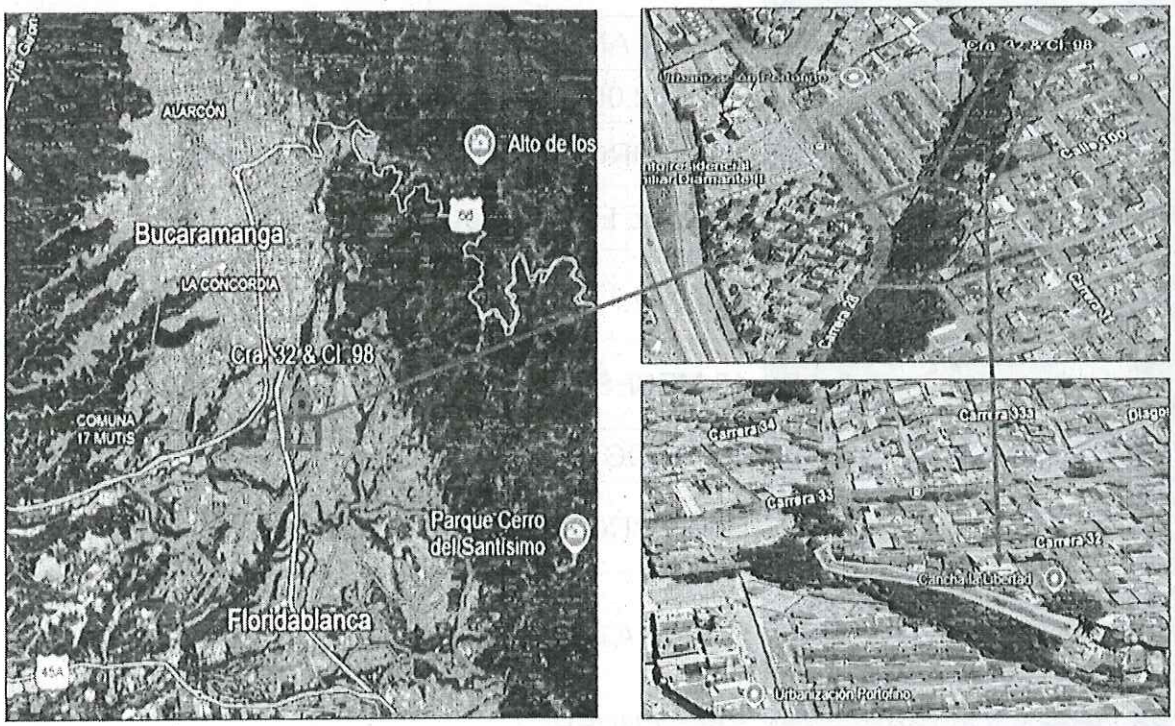


Ilustración 4. Localización del sector de intervención, La libertad; Fuente: Google Eart

3. GENERALIDADES CONTRACTUALES

A continuación, se presenta tabla con los datos generales del contrato:

3.1 CONTRATO SUSCRITO 210.16222.6

CONTRATO DE OBRA	**N°. 210.16222.6**
OBJETO DEL CONTRATO	*"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA- GRUPO 2: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER."*
ENTIDAD CONTRATANTE	CDMB – CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA.
SUPERVISOR CONTRATANTE	SUBDIRECCION DE GESTION DEL RIESGO Y SEGURIDAD TERRITORIAL - SURYT.
CONTRATISTA	CONSORCIO EROSION METROPOLITANA
REPRESENTANTE LEGAL	JULIÁN ANDRÉS SERRANO GÓMEZ
NIT	901.982.007-2
INTERVENTORIA	CONSORCION INTER BUCARAMANGA
REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL FERNANDO QUIROS GOMEZ
VALOR FISCAL DEL CONTRATO	$24.319.170.624,90 COP
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	16 MESES O HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2026
FECHA DE INICIO	15 DE OCTUBRE DEL 2025.
SUPERVISOR O INTERVENTOR	CONSORCIO INTER BUCARAMANGA
CARGO SUPERVISOR O CONTRATO SUSCRITO CON EL INTERVENTOR	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 210.16226.4
DEPARTAMENTO	SANTANDER

3.2. ACTAS DEL CONTRATO

CONTRATO SUSCRITO 210.16222.6

RELACIÓN DE ACTAS			
ACTA	**FECHA**	**OBSERVACIONES**	**VALOR**
CONTRATO	05/09/2025	**210.16222.6**	$24.319.170.624,90
INICIO	15/10/2025	Se da apertura a las actividades de obra.	N/A
PARCIAL No. 1	15/12/2025	Cobro parcial No. 1	$ 1.129.774.629,82
PARCIAL No. 2	24/02/2026	Cobro parcial No. 2	$ 2.231.299.878,22
PARCIAL No. 3	20/04/2026	Cobro parcial No. 3	$ 3.890.625.757,89

4. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA

4.1. ACTIVIDADES TECNICAS

Las actividades técnicas realizadas conforme a la ejecución del contrato, en el periodo comprendido entre el 01 de abril de 2026 y el 30 de junio de 2026, corresponden a la verificación del avance físico observado en los cuatro (04) frentes de obra actualmente activos: sector barrio Alfonso López, Sector ferrocarriles nacionales, Sector las casitas, sector la libertad

A continuación, se detallan los ítems de intervención ejecutados durante el periodo evaluado.

- **FRENTE DE OBRA – ALFONSO LOPEZ**

Durante la visita técnica realizada el 01 de julio de 2026, se evidenció la ejecución parcial de las siguientes actividades:

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANT CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	% DE EJECUCIÓN
SECCIÓN PRIMERA						
1.01	Replanteo, control y medición de la obra	mes	1,00	0,00	0,70	70,00%
1.03	Vallas y señales especiales					
1.03.01.A	Valla tipo 1A (5,00m x 2,80 m)	und	1,00	0,00	1,00	100,00%
1.04	Desmonte y limpieza	m^2	756,00	0,00	756,00	100,00%
1.05	Retiro de basuras y escombros	m^3	453,60	0,00	453,60	100,00%
1.06	Perfilado a mano descolgado de talud	m^3	589,68	80,91	589,68	100,00%

Actividades ejecutadas al corte (01/07/2026):	Actividades pendientes:	Observaciones
- Replanteo, control y medición (70%) - Valla informativa 1A - Desmonte y limpieza (100%) - Retiro de basuras y escombros (100%) - Perfilado a mano descolgado del talud (100%)		- La ejecución de las actividades avanza de acuerdo a las especificaciones técnicas, ambientales y SST establecidas inicialmente

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANT CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	% DE EJECUCIÓN
SECCIÓN SEGUNDA						
2.01	**Excavación a tajo abierto en taludes**					
2.01.A	**Excavación con acarreo libre**					
2.01.A.02	Excavación con acarreo libre en material granular a cualquier profundidad	m^3	1.562,40	0	1562,40	100,00%
2.01.A.03	Excavación con acarreo libre en roca a cualquier profundidad	m^3	390,60	0	390,60	100,00%
2.01.A.04	Excavación a mano con acarreo libre descolgado para zapata	m^3	42,00	0	0,00	0,00%
2.02	Terraplenes y Rellenos					
2.02.01	Suministro y conformación de material granular para llave cortante	m^3	478,80	0	0,00	0,00%
2.03	Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1.000,00 m	m^3-km	32.059,40	1409,45	31211,89	97,36%

Actividades ejecutadas al corte (01/07/2026):	Actividades pendientes:	Observaciones
- Excavación granular (100%) - Excavacion en roca (100%) - Sobreacarreos (97,36%)	-excavación descolgado para zapata -Conformación material para llave cortante	- Todavía no se realizan las demás actividades porque están en función del avance físico de obra

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANT CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	% DE EJECUCIÓN
SECCIÓN TERCERA						
3.00	Concretos					
3.01	Suministro y colocación de concreto de 3000 psi con mezcla humeda para zapatas	m^3	42,00	0	0	0,00%
3.03	Suministro y colocación de concreto lanzado con mezcla húmeda de espesor 10 cm	m^2	756,00	0	0	0,00%
3.08	Llenado de inyeccion con lechada cementicia para anclajes	m^3	126,00	5,4	9,60	7,62%

Actividades ejecutadas al corte (01/07/2026):	Actividades pendientes:	Observaciones
- Llenado de inyección con lechada cementicia (7,62%)	- Suministro de concreto para zapatas - Suministro de concreto lanzado	- Todavía no se realizan las demás actividades porque están en función del avance físico de obra

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANT CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	% DE EJECUCIÓN
SECCIÓN CUARTA						
4.00	**Aceros**					
4.01	Suministro y colocacion acero de refuerzo fy 4200 kg/cm²	kg	8.468,00	0	0	0,00%
4.02	**Suministro y colocación de anclajes**					
4.02.02	Suministro e instalación de 3 cables Ø=1/2" de L=25m	und	210,00	9	16	7,62%
4.03	Tensionamiento de anclajes	und	210,00	0	0	0,00%
4.04	Suministro y colocación					
4.04.01	Malla electrosoldada 4mm y abertura de 0,15m x 0,15m	m^2	756,00	0	0	0,00%
4.05	Suministro e instalación de platina de 200mm x 200mm x 12 mm con tres agujeros	und	210,00	0	0	0,00%
4.06	Suministro e instalación de popora de 3 agujeros cónicos para cuña de Ø=1/2"	und	210,00	0	0	0,00%
4.07	Suministro e instalacion de kit de cuñas de Ø=1/2" para anclaje	und	210,00	0	0	0,00%

Actividades ejecutadas al corte (01/07/2026):	Actividades pendientes:	Observaciones
- Suministro e instalación de 3 cables L=25 m (7,62%)	-suministro de acero de refuerzo -Tensionamiento de anclajes -malla electrosoldada -suministro de platina -suministro de popora -suministro kit de cuñas	- Todavía no se realizan las demás actividades porque están en función del avance físico de obra

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANT CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	% DE EJECUCIÓN
SECCIÓN QUINTA						
5.00	**Perforaciones horizontales**					
5.02	Ejecución perforación horizontal en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes de 0,00m a 15,00m	m	3.150,00	135	240	7,62%
5.03	Ejecución de perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes mayores a 15,00m	m	2.100,00	90	160	7,62%
5.08	Jacket de respaldo para revestimiento de perforacion horizontal en anclajes y drenes de penetracion	m	5.250,00	225	400	7,62%

Actividades ejecutadas al corte (01/07/2026):	Actividades pendientes:	Observaciones
- Ejecucion de perforaciones entre 0-15 m (7,62%) - Ejecución de perforaciones mayores a 15 m (7,62%) - Jacket de respaldo para revestimiento (7,62%)		- La ejecución de las actividades avanza de acuerdo a las especificaciones técnicas, ambientales y SST establecidas inicialmente

- **FRENTE DE OBRA – FERROCARRILES NACIONALES**

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANT CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	% DE EJECUCIÓN
SECCIÓN PRIMERA						
1.01	Replanteo, control y medición de la obra	mes	1,00	0,00	0,70	70,00%
1.03	Vallas y señales especiales					
1.03.01.A	Valla tipo 1A (5,00m x 2,80 m)	und	1,00	0,00	1,00	100,00%
1.04	Desmonte y limpieza	m^2	1.298,00	45,14	1046,05	80,59%
1.05	Retiro de basuras y escombros	m^3	259,60	6,49	210,90	81,24%
1.06	Perfilado a mano descolgado de talud	m^3	723,52	99,99	588,20	81,30%

Actividades ejecutadas al corte (01/07/2026):	Actividades pendientes:	Observaciones
- Replanteo, control y medición (70%) - Valla informativa 1A - Desmonte y limpieza (80,59%) - Retiro de basuras y escombros (81,24%) - Perfilado a mano descolgado del talud (81,30%)		- La ejecución de las actividades avanza de acuerdo a las especificaciones técnicas, ambientales y SST establecidas inicialmente

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANT CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	% DE EJECUCIÓN
SECCIÓN SEGUNDA						
2.01	**Excavación a tajo abierto en taludes**					
2.01.A	**Excavación con acarreo libre**					
2.01.A.02	Excavación con acarreo libre en material granular a cualquier profundidad	m^3	1.447,04	0,00	1176,00	81,27%
2.01.A.03	Excavación con acarreo libre en roca a cualquier profundidad	m^3	361,76	0,00	294,00	81,27%
2.01.A.04	Excavación a mano con acarreo libre descolgado para zapata	m^3	59,00	0,00	0,00	0,00%
2.03	Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1.000,00 m	m^3-km	32.506,40	7315,85	32187,95	99,02%

Actividades ejecutadas al corte (01/07/2026):	Actividades pendientes:	Observaciones
- Excavación granular (81,27%) - Excavacion en roca (81,27%) - Sobreacarreos (99,02%)	-excavación descolgado para zapata	-Todavía no se realizan las demás actividades porque están en función del avance físico de obra

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANT CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	% DE EJECUCIÓN
SECCIÓN TERCERA						
3.00	Concretos					
3.01	Suministro y colocación de concreto de 3000 psi con mezcla humeda para zapatas	m^3	59,00	0	0	0,00%
3.03	Suministro y colocación de concreto lanzado con mezcla húmeda de espesor 10 cm	m^2	1.298,00	0	0	0,00%
3.08	Llenado de inyeccion con lechada cementicia para anclajes	m^3	148,00	25,5	99,5	67,23%

Actividades ejecutadas al corte (01/07/2026):	Actividades pendientes:	Observaciones
-Llenado de inyección con lechada cementicia para anclajes (67,23%)	-Suministro y colocación de concreto de 3000 psi -Suministro y colocación de concreto lanzado con mezcla húmeda e=10 cm	-Todavía no se realizan las demás actividades porque están en función del avance físico de obra

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANT CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	% DE EJECUCIÓN
SECCIÓN CUARTA						
4.00	**Aceros**					
4.01	Suministro y colocacion acero de refuerzo fy 4200 kg/cm²	kg	11.895,00	0	0	0,00%
4.02	**Suministro y colocación de anclajes**					
4.02.02	Suministro e instalación de 3 cables Ø=1/2" de L=20m	und	295,00	26	174	58,98%
4.03	Tensionamiento de anclajes	und	295,00	0	0	0,00%
4.04	Suministro y colocación			0		
4.04.01	Malla electrosoldada 4mm y abertura de 0,15m x 0,15m	m^2	1.298,00	0	0	0,00%
4.05	Suministro e instalación de platina de 200mm x 200mm x 12 mm con tres agujeros	und	295,00	0	0	0,00%
4.06	Suministro e instalación de popora de 3 agujeros cónicos para cuña de Ø=1/2"	und	295,00	0	0	0,00%
4.07	Suministro e instalacion de kit de cuñas de Ø=1/2" para anclaje	und	295,00	0	0	0,00%

Actividades ejecutadas al corte (01/07/2026):	Actividades pendientes:	Observaciones
-Suministro e instalación de 3 cables L=20 m (59,98%)	-suministro de acero de refuerzo -Tensionamiento de anclajes -malla electrosoldada -suministro de platina -suministro de popora -suministro kit de cuñas	-Todavía no se realizan las demás actividades porque están en función del avance físico de obra

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANT CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	% DE EJECUCIÓN
SECCIÓN QUINTA						
5.00	**Perforaciones horizontales**					
5.02	Ejecución perforación horizontal en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes de 0,00m a 15,00m	m	4.425,00	390,00	3375	76,27%
5.03	Ejecución de perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes mayores a 15,00m	m	1.475,00	130,00	1125	76,27%
5.04	Jacket de respaldo para revestimiento de perforacion horizontal en anclajes y drenes de penetracion	m	5.900,00	520,00	4500	76,27%

Actividades ejecutadas al corte (01/07/2026):	Actividades pendientes:	Observaciones
-Ejecucion y perforación con pendientes mayores a 1.1 con equipo entre 0-15 m (76,27%) -Ejecucion y perforación con pendientes mayores a 1.1 con equipo mayores a 15 m (76,27%) -Jacket de respaldo revestimiento en perforación horizontal (76,27%)		- La ejecución de las actividades avanza de acuerdo a las especificaciones técnicas, ambientales y SST establecidas inicialmente

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANT CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	% DE EJECUCIÓN
SECCIÓN SEXTA						
6.00	Varios					
6.02	Canaleta (ancho = 1m; e =10cm)	m	83,00	2,00	7	8,43%
6.06	Sistema de abatimiento para lineas hidráulicas de infiltración interna y protección del trasdós de la estructura estabilizadora	m	750,00	0	0	0,00%

Actividades ejecutadas al corte (01/06/2026):	Actividades pendientes:	Observaciones
- Canaleta (ancho=1 m e=10 cm) (8,43%)	- Sistema de abatimiento para líneas hidraulicas de infiltración externa y proteccion de trasdos	- La ejecución de las actividades avanza de acuerdo a las especificaciones técnicas, ambientales y SST establecidas inicialmente

- **FRENTE DE OBRA – LAS CASITAS**

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANT CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	% DE EJECUCIÓN
SECCIÓN PRIMERA						
1.01	Replanteo, control y medición de la obra	mes	1,00	0,10	0,80	80,00%
1.03	Vallas y señales especiales					
1.03.01.A	Valla tipo 1A (5,00m x 2,80 m)	und	1,00	0,00	1,00	100,00%
1.04	Desmonte y limpieza	m^2	760,00	0,00	760,00	100,00%
1.05	Retiro de basuras y escombros	m^3	380,00	0,00	380,00	100,00%
1.06	Perfilado a mano descolgado de talud	m^3	647,79	32,42	231,04	35,67%

Actividades ejecutadas al corte (01/07/2026):	Actividades pendientes:	Observaciones
- Replanteo, control y medición (80%) - Valla informativa 1A - Desmonte y limpieza (100%) - Retiro de basuras y escombros (100%) - Perfilado a mano descolgado del talud (35,67%)		- La ejecución de las actividades avanza de acuerdo a las especificaciones técnicas, ambientales y SST establecidas inicialmente

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANT CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	% DE EJECUCIÓN
SECCIÓN SEGUNDA						
2.01	**Excavación a tajo abierto en taludes**					
2.01.A	**Excavación con acarreo libre**					
2.01.A.02	Excavación con acarreo libre en material granular a cualquier profundidad	m^3	1.295,59	405,49	1295,59	100,00%
2.01.A.03	Excavación con acarreo libre en roca a cualquier profundidad	m^3	323,90	101,37	323,90	100,00%
2.03	Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1.000,00 m	m^3-km	19.531,00	7318,61	18528,52	94,87%

Actividades ejecutadas al corte (01/07/2026):	Actividades pendientes:	Observaciones
- Excavación granular (100%) - Excavacion en roca (100%) - Sobreacarreos (94,87%)		-La ejecución de las actividades avanza de acuerdo a las especificaciones técnicas, ambientales y SST establecidas inicialmente

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANT CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	% DE EJECUCIÓN
SECCIÓN TERCERA						
3.00	**Concretos**					
3.04	Suministros y colocacion de concreto de 3000 psi	m^3	84,00	8,00	63,48	75,57%
3.08	Llenado de inyeccion con lechada cementicia para anclajes	m^3	68,00	0,00	0,00	0,00%
3.09	Suministro y colocación de concreto de 2000 psi para solado e=10cm	m^2	456,00	0,00	444,60	97,50%

Actividades ejecutadas al corte (01/07/2026):	Actividades pendientes:	Observaciones
- Suministro y colocación concreto 3000 psi (75,57%) - suministro y colocación de concreto 2000 psi para solado e=10cm (97,50%)	- Llenado de inyección con lechada cementica para anclajes	- La ejecución de las actividades avanza de acuerdo a las especificaciones técnicas, ambientales y SST establecidas inicialmente

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANT CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	% DE EJECUCIÓN
SECCIÓN SEXTA						
6.00	**Varios**					
6.05	**Filtro con tela**					
6.05.01	Suministro y colocación de tela geotextil no tejido para filtros	m^2	684,00	0,00	619,26	90,54%
6.07.01	Gaviones de cuerpo 2.00 x 1.00 x 1.00	m^3	2.204,00	0,00	2115,00	95,96%
6.07.02	Estructura estabilizante en muro flexible en gaviones con anclaje activo y recubrimiento en concreto reforzado (e=10cm) de sección 2m x 1m x 1m. Incluye zapata de concreto reforzado del anclaje. (no incluye perforación, ni anclaje)	und	190,00	54,00	102	53,68%
6.12	Suministro e instalación de tubería sanitaria de 2" - pasamuros o lloraderos	m	19,00	0,00	19,00	100,00%

Actividades ejecutadas al corte (01/07/2026):	**Actividades pendientes:**	**Observaciones**
- Suministro y colocación de tela geotextil no tejido para filtros (90,54%) - Gaviones cuerpo 2mx1mx1m (95,96%) - Estructura estabilizante en muro flexible en gaviones con anclaje activo y recubrimiento en concreto reforzado (53,68%) - Suministro e instalación de tubería 2" pasamuro o lloraderos (100%)		- La ejecución de las actividades avanza de acuerdo a las especificaciones técnicas, ambientales y SST establecidas inicialmente

- **FRENTE DE OBRA – LA LIBERTAD**

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANT CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	% DE EJECUCIÓN
SECCIÓN TERCERA						
3.00	**Concretos**					
3.01	Suministro y colocación de concreto de 3000 psi con mezcla humeda para zapatas	m^3	42,00	36	36,00	85,71%
3.03	Suministro y colocación de concreto lanzado con mezcla húmeda de espesor 10 cm	m^2	1.008,00	867	867,00	86,01%
3.08	Llenado de inyeccion con lechada cementicia para anclajes	m^3	105,00	0	105,00	100,00%

Actividades ejecutadas al corte (01/07/2026):	Actividades pendientes:	Observaciones
-Suministro y colocacion de concreto de 3000 psi con mezcla humeda (85,71%) -Suministro y colocacion de concreto lanzado e=10 cm (86,01%) -Llenado de inyección con lechada para anclajes (100%)		-La ejecución de las actividades avanza de acuerdo a las especificaciones técnicas, ambientales y SST establecidas inicialmente

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANT CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	% DE EJECUCIÓN
SECCIÓN CUARTA						
4.00	**Aceros**					
4.01	Suministro y colocacion acero de refuerzo fy 4200 kg/cm²	kg	8.468,00	0	8467,2	99,99%
4.02	**Suministro y colocación de anclajes**					
4.02.02	Suministro e instalación de 3 cables Ø= 1/2" de L=20 m	und	210,00	0	210	100,00%
4.03	Tensionamiento de anclajes	und	210,00	0	0	0,00%
4.04	Suministro y colocacion					
4.04.01	Malla electrosoldada 4mm y abertura de 0,15m x 0,15m	m^2	1.008,00	353,8	1008	100,00%
4.05	Suministro e instalación de platina de 200mm x 200mm x 12 mm con tres agujeros	und	210,00	0	0	0,00%
4.06	Suministro e instalación de popora de 3 agujeros cónicos para cuña de Ø=1/2"	und	210,00	0	0	0,00%
4.07	Suministro e instalacion de kit de cuñas de Ø=1/2" para anclaje	und	210,00	0	0	0,00%

Actividades ejecutadas al corte (01/07/2026):	Actividades pendientes:	Observaciones
-Suministro y colocación de refuerzo (99,99%) -Suministro e instalación de 3 cables Ø = ½ L=20 (100%) -Malla electrosoldada 4mm y abertura 0,15mx 0,15m (100%)	-Todavía no se realizan las demás actividades porque están en función del avance físico de obra	-La ejecución de las actividades avanza de acuerdo a las especificaciones técnicas, ambientales y SST establecidas inicialmente

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANT CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	% DE EJECUCIÓN
SECCIÓN SEXTA						
6.00	Varios					
6.02	Canaleta (ancho = 1m; e =10cm)	m	137,00	100	100	72,99%
6.06	Sistema de abatimiento para líneas hidráulicas de infiltración interna y protección del trasdós de la estructura estabilizadora	m	770,00	381,16	731,16	94,96%

Actividades ejecutadas al corte (01/07/2026):	Actividades pendientes:	Observaciones
-Canaleta (ancho=1 m e=10 cm) (72,99%) ,-Sistema de abatimiento para líneas hidráulicas de infiltración externa y protección de trasdos (94,96%)		-La ejecución de las actividades avanza de acuerdo a las especificaciones técnicas, ambientales y SST establecidas inicialmente

5. ACTIVIDADES FINANCIERAS

Las actividades financieras realizadas fueron:

- Variaciones financieras:

  Durante el periodo comprendido entre el 01 de abril de 2026 al 30 de junio de 2026, No hubo variaciones financieras.

DETALLE	*PERIODO*	*CONTRATADO*	*PAGO ANTICIPO*	*PORCENTAJE %*
Contrato Inicial	15 de octubre del 2025	$24.319.170.624,90	N/A	N/A

- **Valor ejecutado según avance – ALFONSO LOPEZ**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL BARRIO ALFONSO LOPEZ DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER			AVANCE No. 8 (1/05/2026 AL 31/05/2026)		AVANCE No. 9 (1/06/2026 AL 30/06/2026)		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V/R PARCIAL	CANTIDAD	V/R PARCIAL	CANTIDAD	V/R PARCIAL
SECCIÓN PRIMERA								
1.01	Replanteo, control y medición de la obra	mes	0,00	$ -		$ -	0,70	$ 8.174.587,40
1.03	Vallas y señales especiales							
1.03.01.A	Valla tipo 1A (5,00m x 2,80 m)	und	1	$ 2.685.970,00		$ -	1,00	$ 2.685.970,00
1.04	Desmonte y limpieza	m^2		$ -		$ -	756,00	$ 4.155.732,00
1.05	Retiro de basuras y escombros	m^3		$ -		$ -	453,60	$ 39.603.362,40
1.06	Perfilado a mano descolgado de talud	m^3	209,23	$ 40.256.688,92	80,91	$ 15.567.407,64	589,68	$ 113.456.790,72
	SUBTOTAL SECCIÓN PRIMERA:			$ 42.942.658,92		$ 15.567.407,64		$ 168.076.442,52
SECCIÓN SEGUNDA								
2.01	**Excavación a tajo abierto en taludes**							
2.01.A	**Excavación con acarreo libre**							
2.01.A.02	Excavación con acarreo libre en material granular a cualquier profundidad	m^3		$ -		$ -	1562,40	$ 78.627.780,00
2.01.A.03	Excavación con acarreo libre en roca a cualquier profundidad	m^3		$ -		$ -	390,60	$ 35.905.514,40
2.01.A.04	Excavación a mano con acarreo libre descolgado para zapata	m^3		$ -		$ -	0,00	$ -
2.02	Terraplenes y Rellenos			$ -		$ -	0,00	
2.02.01	Suministro y conformación de material granular para llave cortante	m^3		$ -		$ -	0,00	$ -
2.03	Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1.000,00 m	m^3-km		$ -	1409,45	$ 5.665.989,00	31211,89	$ 125.471.797,80
	SUBTOTAL SECCIÓN SEGUNDA:			$ -		$ 5.665.989,00		$ 240.005.092,20
SECCIÓN TERCERA								
3.00	**Concretos**							
3.01	Suministro y colocación de concreto de 3000 psi con mezcla humeda para zapatas	m^3		$ -		$ -	0,00	$ -
3.03	Suministro y colocación de concreto lanzado con mezcla húmeda de espesor 10 cm	m^2		$ -		$ -	0,00	$ -
3.08	Llenado de inyeccion con lechada cementicia para anclajes	m^3	4,2	$ 4.898.607,00	5,4	$ 6.298.209,00	9,60	$ 11.196.816,00
	SUBTOTAL SECCIÓN TERCERA:			$ 4.898.607,00		$ 6.298.209,00		$ 11.196.816,00
SECCIÓN CUARTA								
4.00	**Aceros**							
4.01	Suministro y colocacion acero de refuerzo fy 4200 kg/cm²	kg		$ -		$ -	0,00	$ -
4.02	**Suministro y colocación de anclajes**							
4.02.03	Suministro e instalación de 3 cables Ø=1/2" de L=25m	und	7	$ 7.657.678,00	9	$ 9.845.586,00	16,00	$ 17.503.264,00
4.03	Tensionamiento de anclajes	und		$ -		$ -	0,00	$ -
4.04	Suministro y colocación							
4.04.01	Malla electrosoldada 4mm y abertura de 0,15m x 0,15m	m^2		$ -		$ -	0,00	$ -
4.05	Suministro e instalación de platina de 200mm x 200mm x 12 mm con tres agujeros	und		$ -		$ -	0,00	$ -
4.06	Suministro e instalación de popora de 3 agujeros cónicos para cuña de Ø=1/2"	und		$ -		$ -	0,00	$ -
4.07	Suministro e instalacion de kit de cuñas de Ø=1/2" para anclaje	und		$ -		$ -	0,00	$ -
	SUBTOTAL SECCIÓN CUARTA:			$ 7.657.678,00		$ 9.845.586,00		$ 17.503.264,00
SECCIÓN QUINTA								
5.00	**Perforaciones horizontales**							
5.02	Ejecución perforación horizontal en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes de 0,00m a 15,00m	m	105	$ 46.343.220,00	135	$ 59.584.140,00	240,00	$ 105.927.360,00
5.03	Ejecución de perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes mayores a 15,00m	m	70	$ 32.811.730,00	90	$ 42.186.510,00	160,00	$ 74.998.240,00
5.08	Jacket de respaldo para revestimiento de perforacion horizontal en anclajes y drenes de penetracion	m	175	$ 36.670.025,00	225	$ 47.147.175,00	400,00	$ 83.817.200,00
	SUBTOTAL SECCIÓN QUINTA:			$ 115.824.975,00		$ 148.917.825,00		$ 264.742.800,00
SECCIÓN SEXTA								
6.00	**Varios**							
6.02	Canaleta (ancho = 1m; e =10cm)	m		$ -		$ -	0,00	$ -
6.06	Sistema de abatimiento para lineas hidráulicas de infiltración interna y protección del trasdós de la estructura estabilizadora	m		$ -		$ -	0,00	$ -
	SUBTOTAL SECCIÓN SEXTA:			$ -		$ -		$ -
	VALOR COSTOS DIRECTOS:			$ 171.323.918,92		$ 186.295.016,64		$ 701.524.414,72
	ADMINISTRACIÓN:			$ 41.117.740,54		$ 44.710.803,99		$ 168.365.859,55
	IMPREVISTOS:			$ 1.713.239,19		$ 1.862.950,17		$ 7.015.244,15
	UTILIDAD:			$ 8.566.195,95		$ 9.314.750,83		$ 35.076.220,74
	A.I.U.:			$ 51.397.175,68		$ 55.888.504,99		$ 210.457.324,44
	IVA:			$ 1.627.577,23		$ 1.769.802,66		$ 6.664.481,94
	VALOR TOTAL:			$ 224.348.671,83		$ 243.953.324,29		$ 918.646.221,10

- **Valor ejecutado según avance – FERROCARRILES NACIONALES**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL SECTOR DENOMINADO ESTACIÓN DE FERROCARRILES NACIONALES TALUD ORIENTAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA			AVANCE No. 8 (1/05/2026 AL 31/05/2026)		AVANCE No. 9 (1/06/2026 AL 30/06/2026)		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V/R PARCIAL	CANTIDAD	V/R PARCIAL	CANTIDAD	V/R PARCIAL
SECCIÓN PRIMERA								
1.01	Replanteo, control y medición de la obra	mes		$ -	0,00	$ -	0,70	$ 8.174.587,40
1.03	Vallas y señales especiales					$ -		
1.03.01.A	Valla tipo 1A (5,00m x 2,80 m)	und		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 2.685.970,00
1.04	Desmonte y limpieza	m^2		$ -	45,14	$ 248.134,58	1046,05	$ 5.750.136,85
1.05	Retiro de basuras y escombros	m^3		$ -	6,49	$ 566.635,41	210,90	$ 18.413.468,10
1.06	Perfilado a mano descolgado de talud	m^3		$ -	99,99	$ 19.238.475,96	588,20	$ 113.172.032,80
	SUBTOTAL SECCIÓN PRIMERA:			$ -		$ 20.053.245,95		$ 148.196.195,15
SECCIÓN SEGUNDA								
2.01	**Excavación a tajo abierto en taludes**							
2.01.A	**Excavación con acarreo libre**							
2.01.A.02	Excavación con acarreo libre en material granular a cualquier profundidad	m^3		$ -	0,00	$ -	1176,00	$ 59.182.200,00
2.01.A.03	Excavación con acarreo libre en roca a cualquier profundidad	m^3		$ -		$ -	294,00	$ 27.025.656,00
2.01.A.04	Excavación a mano con acarreo libre descolgado para zapata	m^3		$ -		$ -	0,00	$ -
2.03	Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1.000,00 m	m^3-km		$ -	7315,85	$ 29.409.717,00	32187,95	$ 129.395.559,00
	SUBTOTAL SECCIÓN SEGUNDA:			$ -		$ 29.409.717,00		$ 215.603.415,00
SECCIÓN TERCERA								
3.00	**Concretos**							
3.01	Suministro y colocación de concreto de 3000 psi con mezcla humeda para zapatas	m^3		$ -		$ -	0,00	$ -
3.03	Suministro y colocación de concreto lanzado con mezcla húmeda de espesor 10 cm	m^2		$ -		$ -	0,00	$ -
3.08	Llenado de inyeccion con lechada cementicia para anclajes	m^3	25,50	$ 29.741.542,50	13,00	$ 15.162.355,00	112,50	$ 131.212.687,50
	SUBTOTAL SECCIÓN TERCERA:			$ 29.741.542,50		$ 15.162.355,00		$ 131.212.687,50
SECCIÓN CUARTA								
4.00	**Aceros**							
4.01	Suministro y colocacion acero de refuerzo fy 4200 kg/cm²	kg		$ -		$ -	0,00	$ -
4.02	**Suministro y colocación de anclajes**							
4.02.02	Suministro e instalación de 3 cables Ø=1/2" de L=20m	und	51,00	$ 45.402.852,00	26,00	$ 23.146.552,00	174,00	$ 154.903.848,00
4.03	Tensionamiento de anclajes	und		$ -		$ -	0,00	$ -
4.04	Suministro y colocación							
4.04.01	Malla electrosoldada 4mm y abertura de 0,15m x 0,15m	m^2		$ -		$ -	0,00	$ -
4.05	Suministro e instalación de platina de 200mm x 200mm x 12 mm con tres agujeros	und		$ -		$ -	0,00	$ -
4.06	Suministro e instalación de popora de 3 agujeros cónicos para cuña de Ø=1/2"	und		$ -		$ -	0,00	$ -
4.07	Suministro e instalacion de kit de cuñas de Ø=1/2" para anclaje	und		$ -		$ -	0,00	$ -
	SUBTOTAL SECCIÓN CUARTA:			$ 45.402.852,00		$ 23.146.552,00		$ 154.903.848,00
SECCIÓN QUINTA								
5.00	**Perforaciones horizontales**							
5.02	Ejecución perforación horizontal en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes de 0,00m a 15,00m	m	765,00	$ 337.643.460,00	390,00	$ 172.131.960,00	3375,00	$ 1.489.603.500,00
5.03	Ejecución de perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes mayores a 15,00m	m	255,00	$ 119.528.445,00	130,00	$ 60.936.070,00	1125,00	$ 527.331.375,00
5.08	Jacket de respaldo para revestimiento de perforacion horizontal en anclajes y drenes de penetracion	m	1020,00	$ 213.733.860,00	520,00	$ 108.962.360,00	4500,00	$ 942.943.500,00
	SUBTOTAL SECCIÓN QUINTA:			$ 670.905.765,00		$ 342.030.390,00		$ 2.959.878.375,00
SECCIÓN SEXTA								
6.00	**Varios**							
6.02	Canaleta (ancho = 1m; e =10cm)	m	5,00	$ 678.520,00	2,00	$ 271.408,00	7,00	$ 949.928,00
6.06	Sistema de abatimiento para lineas hidráulicas de infiltración interna y protección del trasdós de la estructura estabilizadora	m		$ -		$ -	0,00	$ -
	SUBTOTAL SECCIÓN SEXTA:			$ 678.520,00		$ 271.408,00		$ 949.928,00
	VALOR COSTOS DIRECTOS:			$ 746.728.679,50		$ 430.073.667,95		$ 3.610.744.448,65
	ADMINISTRACIÓN:			$ 179.214.883,05		$ 103.217.680,31		$ 866.578.667,68
	IMPREVISTOS:			$ 7.467.286,80		$ 4.300.736,68		$ 36.107.444,49
	UTILIDAD:			$ 37.336.433,98		$ 21.503.683,40		$ 180.537.222,43
	A.I.U.:			$ 224.018.603,83		$ 129.022.100,39		$ 1.083.223.334,60
	IVA:			$ 7.093.922,46		$ 4.085.699,85		$ 34.302.072,26
	VALOR TOTAL:			$ 977.841.205,79		$ 563.181.468,19		$ 4.728.269.855,51

- **Valor ejecutado según avance – LAS CASITAS**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL BARRIO LAS CASITAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER			AVANCE No. 8 (1/05/2026 AL 31/05/2026)		AVANCE No. 9 (1/06/2026 AL 30/06/2026)		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V/R PARCIAL	CANTIDAD	V/R PARCIAL	CANTIDAD	V/R PARCIAL
SECCIÓN PRIMERA								
1.01	Replanteo, control y medición de la obra	mes		$ -	0,10	$ 1.167.798,20	0,80	$ 9.342.385,60
1.03	Vallas y señales especiales							
1.03.01.A	Valla tipo 1A (5,00m x 2,80 m)	und		$ -		$ -	1,00	$ 2.685.970,00
1.04	Desmonte y limpieza	m^2		$ -		$ -	760,00	$ 4.177.720,00
1.05	Retiro de basuras y escombros	m^3		$ -		$ -	380,00	$ 33.177.420,00
1.06	Perfilado a mano descolgado de talud	m^3		$ -	32,42	$ 6.237.737,68	231,04	$ 44.453.020,16
	SUBTOTAL SECCIÓN PRIMERA:			**$ -**		**$ 7.405.535,88**		**$ 93.836.515,76**
SECCIÓN SEGUNDA								
2.01	**Excavación a tajo abierto en taludes**							
2.01.A	**Excavación con acarreo libre**							
2.01.A.02	Excavación con acarreo libre en material granular a cualquier profundidad	m^3		$ -	405,49	$ 20.406.284,25	1295,59	$ 65.200.566,75
2.01.A.03	Excavación con acarreo libre en roca a cualquier profundidad	m^3		$ -	101,37	$ 9.318.335,88	323,90	$ 29.774.183,60
2.03	Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1.000,00 m	m^3-km		$ -	7318,61	$ 29.420.812,20	18528,52	$ 74.484.650,40
	SUBTOTAL SECCIÓN SEGUNDA:			**$ -**		**$ 59.145.432,33**		**$ 169.459.400,75**
SECCIÓN TERCERA								
3.00	**Concretos**							
3.04	Suministros y colocacion de concreto de 3000 psi	m^3	18,30	$ 23.630.973,00	8,00	$ 10.330.480,00	63,48	$ 81.972.358,80
3.08	Llenado de inyeccion con lechada cementicia para anclajes	m^3		$ -		$ -	0,00	$ -
3.09	Suministro y colocación de concreto de 2000 psi para solado e=10cm	m^2	69,00	$ 6.680.925,00		$ -	444,60	$ 43.048.395,00
	SUBTOTAL SECCIÓN TERCERA:			**$ 30.311.898,00**		**$ 10.330.480,00**		**$ 125.020.753,80**
SECCIÓN CUARTA								
4.00	**Aceros**							
4.01	Suministro y colocacion acero de refuerzo fy 4200 kg/cm²	kg					0,00	$ -
4.02	**Suministro y colocación de anclajes**							
4.02.01	Suministro e instalación de 3 cables Ø= 1/2" de L=15 m	und					0,00	$ -
4.03	Tensionamiento de anclajes	und					0,00	$ -
4.04	Suministro y colocación							
4.05	Suministro e instalación de platina de 200mm x 200mm x 12 mm con tres agujeros	und					0,00	$ -
4.06	Suministro e instalación de popora de 3 agujeros cónicos para cuña de Ø=1/2"	und					0,00	$ -
4.07	Suministro e instalacion de kit de cuñas de Ø=1/2" para anclaje	und					0,00	$ -
	SUBTOTAL SECCIÓN CUARTA:							**$ -**
SECCIÓN QUINTA								
5.00	**Perforaciones horizontales**							
5.02	Ejecución perforación horizontal en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes de 0,00m a 15,00m	m					0,00	$ -
5.08	Jacket de respaldo para revestimiento de perforacion horizontal en anclajes y drenes de penetracion	m					0,00	$ -
	SUBTOTAL SECCIÓN QUINTA:							**$ -**
SECCIÓN SEXTA								
6.00	**Varios**							
6.05	**Filtro con tela**							
6.05.01	Suministro y colocación de tela geotextil no tejido para filtros	m^2	150,00	$ 4.225.500,00		$ -	619,26	$ 17.444.554,20
6.07.01	Gaviones de cuerpo 2.00 x 1.00 x 1.00	m^3	45,00	$ 18.007.920,00		$ -	2115,00	$ 846.372.240,00
6.07.02	Estructura estabilizante en muro flexible en gaviones con anclaje activo y recubrimiento en concreto reforzado (e=10cm) de sección 2m x 1m x 1m. Incluye zapata de concreto reforzado del anclaje. (no incluye perforación, ni anclaje)	und	48,00	$ 77.960.448,00	54,00	$ 87.705.504,00	102,00	$ 165.665.952,00
6.12	Suministro e instalación de tubería sanitaria de 2" - pasamuros o lloraderos	m	5,00	$ 73.235,00		$ -	19,00	$ 278.293,00
	SUBTOTAL SECCIÓN SEXTA:			**$ 100.267.103,00**		**$ 87.705.504,00**		**$ 1.029.761.039,20**
	VALOR COSTOS DIRECTOS:			**$ 130.579.001,00**		**$ 164.586.952,21**		**$ 1.418.077.709,51**
	ADMINISTRACIÓN:			$ 31.338.960,24		$ 39.500.868,53		$ 340.338.650,28
	IMPREVISTOS:			$ 1.305.790,01		$ 1.645.869,52		$ 14.180.777,10
	UTILIDAD:			$ 6.528.950,05		$ 8.229.347,61		$ 70.903.885,48
	A.I.U.:			$ 39.173.700,30		$ 49.376.085,66		$ 425.423.312,86
	IVA:			$ 1.240.500,51		$ 1.563.576,05		$ 13.471.738,24
	VALOR TOTAL:			**$ 170.993.201,81**		**$ 215.626.613,92**		**$ 1.856.972.760,61**

- **Valor ejecutado según avance – LA LIBERTAD**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL BARRIO LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER			AVANCE No. 8 (1/05/2026 AL 31/05/2026)		AVANCE No. 9 (1/06/2026 AL 30/06/2026)		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V/R PARCIAL	CANTIDAD	V/R PARCIAL	CANTIDAD	V/R PARCIAL
SECCIÓN PRIMERA								
1.01	Replanteo, control y medición de la obra	mes		$ -		$ -	0,70	$ 8.174.587,40
1.03	Vallas y señales especiales							
1.03.01.A	Valla tipo 1A (5,00m x 2,80 m)	und		$ -		$ -	1,00	$ 2.685.970,00
1.04	Desmonte y limpieza	m^2		$ -		$ -	1008,00	$ 5.540.976,00
1.05	Retiro de basuras y escombros	m^3		$ -		$ -	508,79	$ 44.421.946,11
1.06	Perfilado a mano descolgado de talud	m^3		$ -		$ -	544,32	$ 104.729.345,28
	SUBTOTAL SECCIÓN PRIMERA:			$ -		$ -		$ 165.552.824,79
SECCIÓN SEGUNDA								
2.01	Excavación a tajo abierto en taludes							
2.01.A	Excavación con acarreo libre							
2.01.A.02	Excavación con acarreo libre en material granular a cualquier profundidad	m^3		$ -		$ -	1088,64	$ 54.785.808,00
2.01.A.03	Excavación con acarreo libre en roca a cualquier profundidad	m^3		$ -		$ -	272,16	$ 25.018.035,84
2.01.A.04	Excavación a mano con acarreo libre descolgado para zapata	m^3	23,60	$ 6.032.632,00		$ -	42,00	$ 10.736.040,00
2.03	Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1.000,00 m	m^3-km		$ -		$ -	16587,82	$ 66.683.036,40
	SUBTOTAL SECCIÓN SEGUNDA:			$ 6.032.632,00		$ -		$ 157.222.920,24
SECCIÓN TERCERA								
3.00	Concretos							
3.01	Suministro y colocación de concreto de 3000 psi con mezcla humeda para zapatas	m^3		$ -	36	$ 39.537.324,00	36,00	$ 39.537.324,00
3.03	Suministro y colocación de concreto lanzado con mezcla húmeda de espesor 10 cm	m^2		$ -	867	$ 332.341.041,00	867,00	$ 332.341.041,00
3.08	Llenado de inyeccion con lechada cementicia para anclajes	m^3	25,00	$ 29.158.375,00		$ -	105,00	$ 122.465.175,00
	SUBTOTAL SECCIÓN TERCERA:			$ 29.158.375,00		$ 371.878.365,00		$ 494.343.540,00
SECCIÓN CUARTA								
4.00	Aceros							
4.01	Suministro y colocacion acero de refuerzo fy 4200 kg/cm²	kg	8467,2	$ 103.265.971,20		$ -	8467,20	$ 103.265.971,20
4.02	Suministro y colocación de anclajes							
4.02.02	Suministro e instalación de 3 cables Ø= 1/2" de L=20 m	und	50,00	$ 44.512.600,00		$ -	210,00	$ 186.952.920,00
4.03	Tensionamiento de anclajes	und		$ -		$ -	0,00	$ -
4.04	Suministro y colocación							
4.04.01	Malla electrosoldada 4mm y abertura de 0,15m x 0,15m	m^2	654,2	$ 24.402.314,20	353,8	$ 13.197.093,80	1008,00	$ 37.599.408,00
4.05	Suministro e instalación de platina de 200mm x 200mm x 12 mm con tres agujeros	und		$ -		$ -	0,00	$ -
4.06	Suministro e instalación de popora de 3 agujeros cónicos para cuña de Ø=1/2"	und		$ -		$ -	0,00	$ -
4.07	Suministro e instalacion de kit de cuñas de Ø=1/2" para anclaje	und		$ -		$ -	0,00	$ -
	SUBTOTAL SECCIÓN CUARTA:			$ 172.180.885,40		$ 13.197.093,80		$ 327.818.299,20
SECCIÓN QUINTA								
5.00	Perforaciones horizontales							
5.01	Sistema de abatimiento para perforación horizontal para niveles freaticos (Incluye tubería PVC ranurada Ø=2") para drenes de 0,00m a 15,00m	m	150	$ 68.488.500,00		$ -	150,00	$ 68.488.500,00
5.01.B	Sistema de abatimiento para perforación horizontal para niveles freaticos (Incluye tubería PVC ranurada Ø=2") para drenes mayores a 15,00m	m	50	$ 25.466.650,00		$ -	50,00	$ 25.466.650,00
5.02	Ejecución perforación horizontal en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes de 0,00m a 15,00m	m	750,00	$ 331.023.000,00		$ -	3150,00	$ 1.390.296.600,00
5.03	Ejecución de perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes mayores a 15,00m	m	250,00	$ 117.184.750,00		$ -	1050,00	$ 492.175.950,00
5.08	Jacket de respaldo para revestimiento de perforacion horizontal en anclajes y drenes de penetracion	m	1200,00	$ 251.451.600,00		$ -	4400,00	$ 921.989.200,00
	SUBTOTAL SECCIÓN QUINTA:			$ 793.614.500,00		$ -		$ 2.898.416.900,00
SECCIÓN SEXTA								
6.00	Varios							
6.02	Canaleta (ancho = 1m; e =10cm)	m		$ -	100	$ 13.570.400,00	100,00	$ 13.570.400,00
6.06	Sistema de abatimiento para líneas hidráulicas de infiltración interna y protección del trasdós de la estructura estabilizadora	m	350	$ 26.523.700,00	381,16	$ 28.885.067,12	731,16	$ 55.408.767,12
	SUBTOTAL SECCIÓN SEXTA:			$ 26.523.700,00		$ 42.455.467,12		$ 68.979.167,12
	VALOR COSTOS DIRECTOS:			$ 1.027.510.092,40		$ 427.530.925,92		$ 4.112.333.651,35
	ADMINISTRACIÓN:			$ 246.602.422,18		$ 102.607.422,22		$ 986.960.076,32
	IMPREVISTOS:			$ 10.275.100,92		$ 4.275.309,26		$ 41.123.336,51
	UTILIDAD:			$ 51.375.504,62		$ 21.376.546,30		$ 205.616.682,57
	A.I.U.:			$ 308.253.027,72		$ 128.259.277,78		$ 1.233.700.095,40
	IVA:			$ 9.761.345,88		$ 4.061.543,80		$ 39.067.169,69
	VALOR TOTAL:			$ 1.345.524.466,00		$ 559.851.747,50		$ 5.385.100.916,44

6. CONTROL DE PÓLIZAS DEL CONTRATISTA

6.2 PÓLIZAS SUSCRIPCIÓN CONTRATO DE OBRA – 12/09/2025

POLIZA No.	AMPAROS	VIGENCIAS		
		VALOR AFIANZADO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
AB002680	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$4.863.834.124,98	05/09/2025	05/05/2027
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIÓN LABORAL	$1.215.958.532,05	05/09/2025	05/01/2030
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	$4.863.834.124,98	05/01/2027	05/01/2032
AB002681	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	$1.215.958.531,00	05/09/2025	05/01/2027

6.1. PÓLIZAS ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA – 15/10/2025

POLIZA No.	AMPAROS	VIGENCIAS		
		VALOR AFIANZADO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
AB002680	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$4.863.834.124,98	15/10/2025	30/04/2027
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIÓN LABORAL	$1.215.958.532,05	15/10/2025	31/12/2029
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	$4.863.834.124,98	31/12/2026	31/12/2031
AB002681	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	$1.215.958.532,00	15/10/2025	31/12/2026

7. AVANCE DEL PROYECTO

7.1. CONTRATO SUSCRITO: **N°. 210.16222.6**

Conforme al desarrollo del contrato **N°. 210.16222.6**, al día de la visita el 01 de julio de 2026, se pudo identificar que las obras se encuentran en ejecución en los cuatro (04) frentes de trabajo, se evidencio un avance positivo en los frentes incluidos en el alcance del proyecto. En el **frente 1** sector Alfonso López se identificó que el contratista de obra ha realizado actividades correspondientes al perfilamiento del talud manual y mecánicamente y además dio inicio a la construcción de los anclajes y perforación horizontal en él talud, asi como el suministro de lechada de inyeccion. En el **frente 2** sector ferrocarriles nacionales se identificó que el contratista de obra continúa ejecutando perforaciones horizontales en el talud y, de manera paralela, la construcción de anclajes, para posteriormente proceder con la instalación de los anclajes activos y la aplicación de lechada cementicia, adicionalmente se identificó la construcción de canaleta de recolección en la corona del talud conforme a las especificaciones técnicas del proyecto. En el **frente 3** sector las casitas, se identifica que el contratista de obra ya tiene adelantado la construcción del muro gavión, además que ya ha realizado actividades complementarias, como la instalación del geotextil para retención de finos, y el suministro de concreto para solado y recubrimiento de gaviones. Adicionalmente se identificó que el contratista de obra se encuentra realizando la instalación de las parrillas de refuerzo para zapata. En el **frente 4** sector la libertad se identifica que el contratista de obra

continúa ejecutando perforaciones horizontales en el talud y, de manera paralela, la construcción de anclajes, para posteriormente proceder con la instalación de los anclajes activos y la aplicación de lechada cementicia, así como la excavación para zapatas mediante personal descolgado y la instalación de los refuerzos incluyendo la malla electrosoldada. Adicionalmente se identifica que el contratista de obra ya ejecuto actividades de lanzamiento de concreto en el talud, y se encuentra interviniendo el talud mas pequeño que se encontraba en mediaciones con el frente las casitas


Finalmente, durante la visita técnica realizada, no se observaron afectaciones ni condiciones que comprometieran la estabilidad o el desarrollo del proyecto, manteniéndose la obra en condiciones adecuadas para su ejecución en cada uno de los frentes activos.

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO.

FRENTE 1 – SECTOR ALFONSO LOPEZ

Registro fotográfico, visita técnica realizada el 01 de julio de 2026



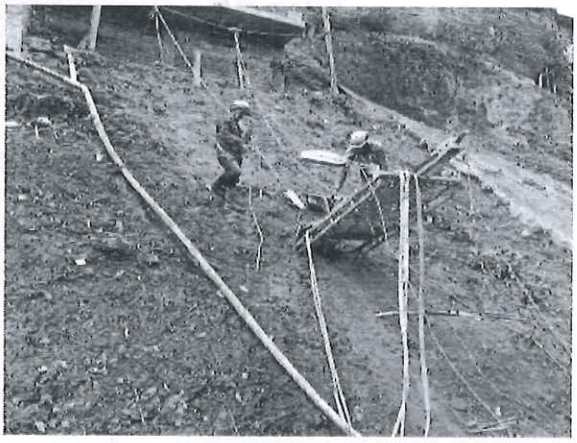








FRENTE 2 - SECTOR FERROCARRILES NACIONALES

Registro fotográfico, visita técnica realizada el 01 de julio de 2026

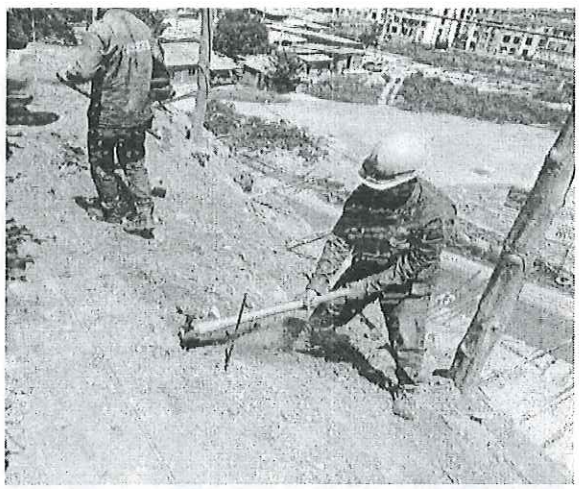

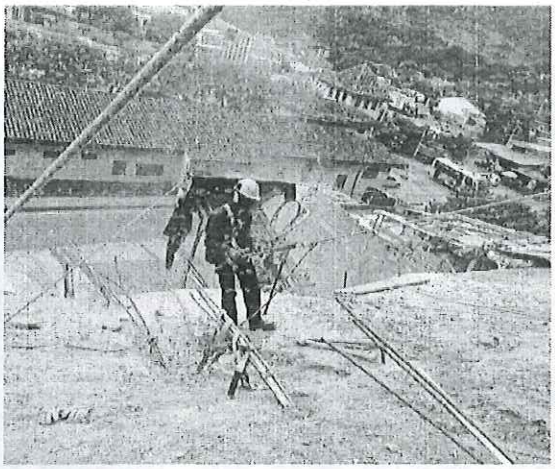



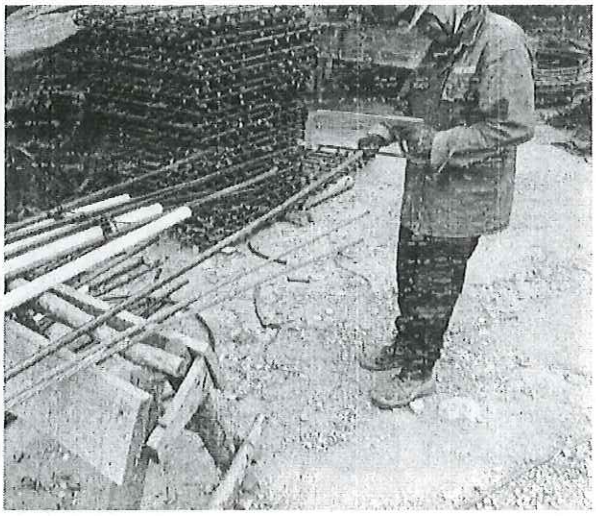



FRENTE 3- SECTOR LAS CASITAS

Registro fotográfico, visita técnica realizada el 01 de julio de 2026






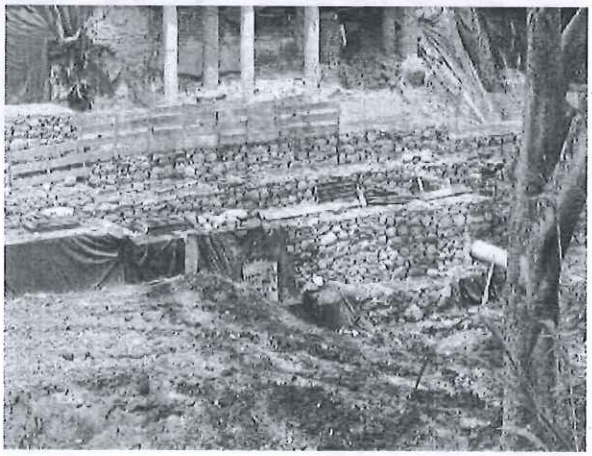

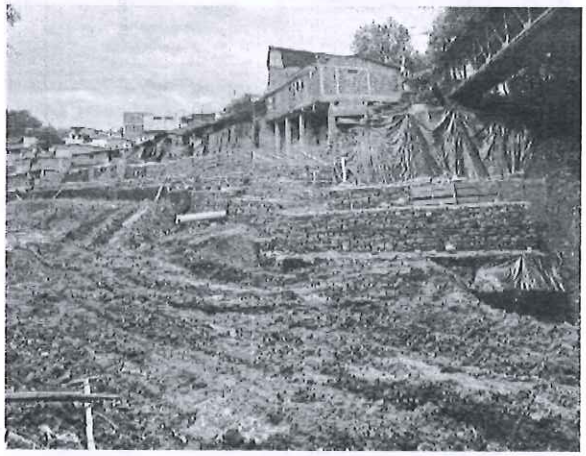

FRENTE 4- SECTOR LA LIBERTAD

Registro fotográfico, visita técnica realizada el 01 de julio de 2026.

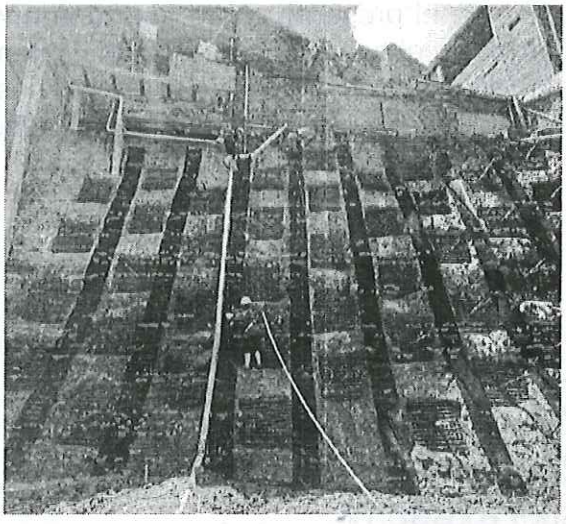







1. CONCLUSIÓN

El Supervisor manifiesta que revisó el informe y las evidencias presentadas por el contratista CONSORCIO INTER BUCARAMANGA y certifica que cumplió a cabalidad el objeto contractual correspondiente a las labores de interventoría sobre el contrato de obra pública No. 210.16222.6 correspondientes al periodo comprendido entre el 01 de abril de 2026 y el 30 de junio 2026 que comprende el presente cobro, de conformidad con las condiciones y especificaciones estipuladas en el contrato, dando cumplimiento a las obligaciones a su cargo incluyendo las relacionadas con la seguridad social, riesgos y parafiscales, por lo tanto, da concepto favorable para el pago, y que a la fecha presenta un porcentaje de ejecución de 53.24%.

CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA
Subdirector de Gestión del Riesgo y
Seguridad Territorial - SURYT

Proyectó:	Jesús Evelio Sánchez Sánchez	Coordinador Gestión del Riesgo; SURYT	
Subdirección Responsable:	Subdirección de Gestión del Riesgo y Seguridad Territorial – SURYT.		

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-05-12, 04:41:01 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1081642399

Periodo Cotización: abril de 2026 **Periodo Servicio:** mayo de 2026

PAGADO 11/05/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO INTER BUCARAMANGA		
Documento	NI901982945	**Dirección**	AV. CALLE 41 #4 - 133
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6844527
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	QUIROS GOMEZ MIGUEL FERNANDO	**Identificación**	CC 1096949307
Total Afiliados	1	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 91487908	OMAR RUIZ RUEDA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.500.000	$ 560.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.500.000	$ 140.000	6,960	$ 3.500.000	$ 243.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.083.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 3.500.000	$ 3.500.000	$ 3.500.000	$ 3.500.000	$ 560.000	$ 140.000	$ 243.600	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.083.600	$ 0	$ 1.083.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1098643473		CABALLERO RAMIREZ CRISTIAN RICARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 147 N 58A-66 Recodo de la Florida	BUCARAMANGA-SANTANDER	6187185	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	328289543	9505127126	I	2026/05/20	2026/05/22	BANCOLOMBIA	2	$509,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
1	CC 1098643473	CABALLERO CRISTIAN	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1098643473		CABALLERO RAMIREZ CRISTIAN RICARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 147 N 58A-66 Recodo de la Florida	BUCARAMANGA-SANTANDER	6187185	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	328289543	9505127126	I	2026/05/20	2026/05/22	BANCOLOMBIA	2	$509,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$500	$0	$280,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$280,200	$500	$0	$280,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$100	$0	$9,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,200	$100	$0	$9,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$400	$0	$219,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$400	$0	$219,300
TOTAL				**1**	**$508,300**	**$1,000**	**$0**	**$509,300**

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-05-12, 04:41:05 PM **Tipo Planilla:** Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS **Numéro Planilla:** 1081642404

Periodo Cotización: abril de 2026 **Periodo Servicio:** abril de 2026

PAGADO 11/05/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO INTER BUCARAMANGA		
Documento	NI901982945	**Dirección**	AV. CALLE 41 #4 - 133
Tipo de Empresa	CONTRATANTE	**Teléfono**	6844527
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	QUIROS GOMEZ MIGUEL FERNANDO	**Identificación**	CC 1096949307
Total Afiliados	1	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1098643473	CRISTIAN RICARDO CABALLERO RAMIREZ	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 0	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.900	$ 0	$ 121.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: martes, 12 de mayo de 2026 04:44:51 PM

Período del informe: 202604

Pagada 11/05/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA SAS	**Sucursal**	0012 REPRESENTANTE LEGAL
Documento	NI901053614	**Dirección**	CR 27 #36 - 14 OFC 309 EDIFICIO SURA
Tipo de Empresa		**Teléfono**	6844527
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	QUIROS GOMEZ MIGUEL FERNANDO	**Identificación**	CC1096949307

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																Administradoras								IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 1096949307	QUIROS GOMEZ MIGUEL FERNANDO	1081189761	11/05/2026	202604	202605																		30	30	30	30	25-14	EPS002	14-4	CCF40	$5.325.000	$5.325.000	$5.325.000	$5.325.000	$852.000	$213.000	$370.700	$213.000	$0	$0	$0	$0	$1.648.700
CC 1098614129	MARTINEZ MARTINEZ KAREN TATIANA	1081189758	11/05/2026	202604	202605																		30	30	30	30	230301	EPS005	14-4	CCF40	$3.500.000	$3.500.000	$3.500.000	$3.500.000	$560.000	$140.000	$243.600	$140.000	$0	$0	$0	$0	$1.083.600
CC 1095954050	JARAMILLO BEDOYA YEISON ENRIQUE	1081189758	11/05/2026	202604	202605																		30	30	30	30	230201	EPS041	14-4	CCF40	$3.270.000	$3.270.000	$3.270.000	$3.270.000	$523.200	$130.800	$227.600	$130.800	$0	$0	$0	$0	$1.012.400
CC 1098605313	LEON JAIMES OSCAR JAVIER	1081189758	11/05/2026	202604	202605																		30	30	30	30	25-14	EPS005	14-4	CCF40	$3.772.800	$3.772.800	$3.772.800	$3.772.800	$603.700	$151.000	$262.600	$151.000	$0	$0	$0	$0	$1.168.300
CC 33369716	CONTRERAS VARGAS DIANA EDITH	1081189758	11/05/2026	202604	202605																		30	30	30	30	230301	EPS002	14-4	CCF40	$3.500.000	$3.500.000	$3.500.000	$3.500.000	$560.000	$140.000	$243.600	$140.000	$0	$0	$0	$0	$1.083.600
CC 33702314	HERNANDEZ ORTIZ FLOR EMILCE	1081189758	11/05/2026	202604	202605																		30	30	30	30	25-14	EPS041	14-4	CCF40	$2.420.000	$2.420.000	$2.420.000	$2.420.000	$387.200	$96.800	$168.500	$96.800	$0	$0	$0	$0	$749.300
CC 1098770897	MERCHAN PEREZ ANGIE DANIELA	1081189758	11/05/2026	202604	202605																		30	30	30	30	230301	EPS010	14-4	CCF40	$4.200.000	$4.200.000	$4.200.000	$4.200.000	$672.000	$168.000	$292.400	$168.000	$0	$0	$0	$0	$1.300.400
CC 91497873	VEGA ALBINO ALFONSO	1081189758	11/05/2026	202604	202605																		30	30	30	30	25-14	EPS046	14-4	CCF40	$2.400.000	$2.400.000	$2.400.000	$2.400.000	$384.000	$96.000	$167.100	$96.000	$0	$0	$0	$0	$743.100
CC 1098802297	SAAVEDRA VELANDIA JUAN SEBASTIAN	1081189758	11/05/2026	202604	202605																		30	30	30	30	230301	EPS005	14-4	CCF40	$3.500.000	$3.500.000	$3.500.000	$3.500.000	$560.000	$140.000	$243.600	$140.000	$0	$0	$0	$0	$1.083.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-06-10, 08:11:25 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1082465537

Periodo Cotización: mayo de 2026 **Periodo Servicio:** junio de 2026

PAGADO 09/06/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO INTER BUCARAMANGA		
Documento	NI901982945	**Dirección**	AV. CALLE 41 #4 - 133
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6844527
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	QUIROS GOMEZ MIGUEL FERNANDO	**Identificación**	CC 1096949307
Total Afiliados	1	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 91487908	OMAR RUIZ RUEDA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.500.000	$ 560.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.500.000	$ 140.000	6,960	$ 3.500.000	$ 243.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.083.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 3.500.000	$ 3.500.000	$ 3.500.000	$ 3.500.000	$ 560.000	$ 140.000	$ 243.600	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.083.600	$ 0	$ 1.083.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-06-10, 08:11:28 AM **Tipo Planilla:** Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS **Numéro Planilla:** 1082465547

Periodo Cotización: mayo de 2026 **Periodo Servicio:** mayo de 2026

PAGADO 09/06/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO INTER BUCARAMANGA		
Documento	NI901982945	**Dirección**	AV. CALLE 41 #4 - 133
Tipo de Empresa	CONTRATANTE	**Teléfono**	6844527
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	QUIROS GOMEZ MIGUEL FERNANDO	**Identificación**	CC 1096949307
Total Afiliados	1	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1098643473	CRISTIAN RICARDO CABALLERO RAMIREZ	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 0	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.900	$ 0	$ 121.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: miércoles, 10 de junio de 2026 08:16:17 AM

Período del informe: 202605

Pagada 09/06/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA SAS	**Sucursal**	0012 REPRESENTANTE LEGAL
Documento	NI901053614	**Dirección**	CR 27 #36 - 14 OFC 309 EDIFICIO SURA
Tipo de Empresa		**Teléfono**	6844527
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	QUIROS GOMEZ MIGUEL FERNANDO	**Identificación**	CC1096949307

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																Administradoras								IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 1096949307	QUIROS GOMEZ MIGUEL FERNANDO	1081972671	09/06/2026	202605	202606																		30	30	30	30	25-14	EPS002	14-4	CCF40	$5.325.000	$5.325.000	$5.325.000	$5.325.000	$852.000	$213.000	$370.700	$213.000	$0	$0	$0	$0	$1.648.700
CC 1098614129	MARTINEZ MARTINEZ KAREN TATIANA	1081972668	09/06/2026	202605	202606																		30	30	30	30	230301	EPS005	14-4	CCF40	$3.500.000	$3.500.000	$3.500.000	$3.500.000	$560.000	$140.000	$243.600	$140.000	$0	$0	$0	$0	$1.083.600
CC 1098802297	SAAVEDRA VELANDIA JUAN SEBASTIAN	1081972668	09/06/2026	202605	202606																		30	30	30	30	230301	EPS005	14-4	CCF40	$3.500.000	$3.500.000	$3.500.000	$3.500.000	$560.000	$140.000	$243.600	$140.000	$0	$0	$0	$0	$1.083.600
CC 1098770897	MERCHAN PEREZ ANGIE DANIELA	1081972668	09/06/2026	202605	202606																		30	30	30	30	230301	EPS010	14-4	CCF40	$4.200.000	$4.200.000	$4.200.000	$4.200.000	$672.000	$168.000	$292.400	$168.000	$0	$0	$0	$0	$1.300.400
CC 1095954050	JARAMILLO BEDOYA YEISON ENRIQUE	1081972668	09/06/2026	202605	202606																		30	30	30	30	230201	EPS041	14-4	CCF40	$3.270.000	$3.270.000	$3.270.000	$3.270.000	$523.200	$130.800	$227.600	$130.800	$0	$0	$0	$0	$1.012.400
CC 1098605313	LEON JAIMES OSCAR JAVIER	1081972668	09/06/2026	202605	202606																		30	30	30	30	25-14	EPS005	14-4	CCF40	$3.772.800	$3.772.800	$3.772.800	$3.772.800	$603.700	$151.000	$262.600	$151.000	$0	$0	$0	$0	$1.168.300
CC 33369716	CONTRERAS VARGAS DIANA EDITH	1081972668	09/06/2026	202605	202606																		30	30	30	30	230301	EPS002	14-4	CCF40	$3.500.000	$3.500.000	$3.500.000	$3.500.000	$560.000	$140.000	$243.600	$140.000	$0	$0	$0	$0	$1.083.600
CC 33702314	HERNANDEZ ORTIZ FLOR EMILCE	1081972668	09/06/2026	202605	202606																		30	30	30	30	25-14	EPS041	14-4	CCF40	$2.420.000	$2.420.000	$2.420.000	$2.420.000	$387.200	$96.800	$168.500	$96.800	$0	$0	$0	$0	$749.300
CC 91497873	VEGA ALBINO ALFONSO	1081972668	09/06/2026	202605	202606																		30	30	30	30	25-14	EPS046	14-4	CCF40	$2.400.000	$2.400.000	$2.400.000	$2.400.000	$384.000	$96.000	$167.100	$96.000	$0	$0	$0	$0	$743.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1098643473		CABALLERO RAMIREZ CRISTIAN RICARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 147 N 58A-66 Recodo de la Florida	BUCARAMANGA-SANTANDER	6187185	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	378697564	9506176960	I	2026/06/18	2026/06/10	BANCOLOMBIA	0	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
1	CC	1098643473 CABALLERO CRISTIAN	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1098643473		CABALLERO RAMIREZ CRISTIAN RICARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 147 N 58A-66 Recodo de la Florida	BUCARAMANGA-SANTANDER	6187185	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	378697564	9506176960	I	2026/06/18	2026/06/10	BANCOLOMBIA	0	$508,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				**1**	**$508,300**	**$0**	**$0**	**$508,300**

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-07-15, 11:52:48 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1083243594

Periodo Cotización: junio de 2026 **Periodo Servicio:** julio de 2026

PAGADO 10/07/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO INTER BUCARAMANGA		
Documento	NI901982945	**Dirección**	AV. CALLE 41 #4 - 133
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6844527
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	QUIROS GOMEZ MIGUEL FERNANDO	**Identificación**	CC 1096949307
Total Afiliados	1	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 91487908	OMAR RUIZ RUEDA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.500.000	$ 560.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.500.000	$ 140.000	6,960	$ 3.500.000	$ 243.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.083.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 3.500.000	$ 3.500.000	$ 3.500.000	$ 3.500.000	$ 560.000	$ 140.000	$ 243.600	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.083.600	$ 0	$ 1.083.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: miércoles, 15 de julio de 2026 11:55:30 AM

Período del informe: 202606

Pagada 08/07/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA SAS	**Sucursal**	001 GENERAL
Documento	NI901053614	**Dirección**	CR 27 #36 - 14 OFC 309 EDIFICIO SURA
Tipo de Empresa		**Teléfono**	6844527
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	QUIROS GOMEZ MIGUEL FERNANDO	**Identificación**	CC1096949307

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																Administradoras								IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 1098614129	MARTINEZ MARTINEZ KAREN TATIANA	1083253593	08/07/2026	202606	202607																		30	30	30	30	230301	EPS005	14-4	CCF40	$3.500.000	$3.500.000	$3.500.000	$3.500.000	$560.000	$140.000	$243.600	$140.000	$0	$0	$0	$0	$1.083.600
CC 91497873	VEGA ALBINO ALFONSO	1083253593	08/07/2026	202606	202607																		30	30	30	30	25-14	EPS046	14-4	CCF40	$2.400.000	$2.400.000	$2.400.000	$2.400.000	$384.000	$96.000	$167.100	$96.000	$0	$0	$0	$0	$743.100
CC 1098802297	SAAVEDRA VELANDIA JUAN SEBASTIAN	1083253593	08/07/2026	202606	202607																		30	30	30	30	230301	EPS005	14-4	CCF40	$3.500.000	$3.500.000	$3.500.000	$3.500.000	$560.000	$140.000	$243.600	$140.000	$0	$0	$0	$0	$1.083.600
CC 1098770897	MERCHAN PEREZ ANGIE DANIELA	1083253593	08/07/2026	202606	202607																		30	30	30	30	230301	EPS010	14-4	CCF40	$4.200.000	$4.200.000	$4.200.000	$4.200.000	$672.000	$168.000	$292.400	$168.000	$0	$0	$0	$0	$1.300.400
CC 1095954050	JARAMILLO BEDOYA YEISON ENRIQUE	1083253593	08/07/2026	202606	202607																		30	30	30	30	230201	EPS041	14-4	CCF40	$3.270.000	$3.270.000	$3.270.000	$3.270.000	$523.200	$130.800	$227.600	$130.800	$0	$0	$0	$0	$1.012.400
CC 1098605313	LEON JAIMES OSCAR JAVIER	1083253593	08/07/2026	202606	202607																		30	30	30	30	25-14	EPS005	14-4	CCF40	$3.772.800	$3.772.800	$3.772.800	$3.772.800	$603.700	$151.000	$262.600	$151.000	$0	$0	$0	$0	$1.168.300
CC 33369716	CONTRERAS VARGAS DIANA EDITH	1083253593	08/07/2026	202606	202607																		30	30	30	30	230301	EPS002	14-4	CCF40	$3.500.000	$3.500.000	$3.500.000	$3.500.000	$560.000	$140.000	$243.600	$140.000	$0	$0	$0	$0	$1.083.600
CC 33702314	HERNANDEZ ORTIZ FLOR EMILCE	1083253593	08/07/2026	202606	202607																		30	30	30	30	25-14	EPS041	14-4	CCF40	$2.420.000	$2.420.000	$2.420.000	$2.420.000	$387.200	$96.800	$168.500	$96.800	$0	$0	$0	$0	$749.300
CC 1096949307	QUIROS GOMEZ MIGUEL FERNANDO	1083248645	08/07/2026	202606	202607																		30	30	30	30	25-14	EPS002	14-4	CCF40	$5.325.000	$5.325.000	$5.325.000	$5.325.000	$852.000	$213.000	$370.700	$213.000	$0	$0	$0	$0	$1.648.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-07-15, 11:53:27 AM **Tipo Planilla:** Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS **Numéro Planilla:** 1083243584

Periodo Cotización: junio de 2026 **Periodo Servicio:** junio de 2026

PAGADO 10/07/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO INTER BUCARAMANGA		
Documento	NI901982945	**Dirección**	AV. CALLE 41 #4 - 133
Tipo de Empresa	CONTRATANTE	**Teléfono**	6844527
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	QUIROS GOMEZ MIGUEL FERNANDO	**Identificación**	CC 1096949307
Total Afiliados	1	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1098643473	CRISTIAN RICARDO CABALLERO RAMIREZ	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 0	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.900	$ 0	$ 121.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1098643473		CABALLERO RAMIREZ CRISTIAN RICARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 147 N 58A-66 Recodo de la Florida	BUCARAMANGA-SANTANDER	6187185	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-06	479253052	9507870695	I	2026/07/17	2026/07/14	BANCOLOMBIA	0	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
1	CC 1098643473	CABALLERO CRISTIAN	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1098643473		CABALLERO RAMIREZ CRISTIAN RICARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 147 N 58A-66 Recodo de la Florida	BUCARAMANGA-SANTANDER	6187185	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-06	479253052	9507870695	I	2026/07/17	2026/07/14	BANCOLOMBIA	0	$508,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$508,300	$0	$0	$508,300

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PÚBLICO EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN LA LEY,

CERTIFICAN

Que, el CONSORCIO INTER BUCARAMANGA, identificado con Nit. 901.982.945-6 se encuentra a paz y salvo por concepto de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales, del contrato de interventoría No. 210.16226.4 de 2025 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA" así:

A las Entidades Promotoras de Salud (EPS), a las Entidades Administradoras de Fondos de Pensiones, a las Empresas Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP), a la Caja de Compensación Familiar, Icbf y Sena: exonerados según ley 1607 de 2012, 1943 de 2018, además que todo personal que se encuentra por prestación de servicios está al día con el pago de su seguridad social ya que esto es requisito indispensable para el pago de la prestación del servicio, correspondiente al periodo desde el 01 de abril hasta el 30 de junio de 2026.


La presente certificación se expide en la ciudad de Bucaramanga, a los veintidós (22) días del mes de julio de 2026.

Cordialmente,

MIGUEL FERNANDO QUIROS GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTER BUCARAMANGA

NATHALIA ALEJANDRA MUÑOZ CÉSPEDES
CONTADOR PÚBLICO
T.P 233481-T


República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
233481-T
NATHALIA ALEJANDRA
MUÑOZ CESPEDES
C.C. 1098741585
RES. INSCRIPCION 853 DEL 20/10/2017
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS
SANDRA LILIANA DUARTE CUADROS
DIRECTOR GENERAL (E)
239019
253295
VALIDO SOLO PARA CONSORCIO INTERBUCARAMANGA

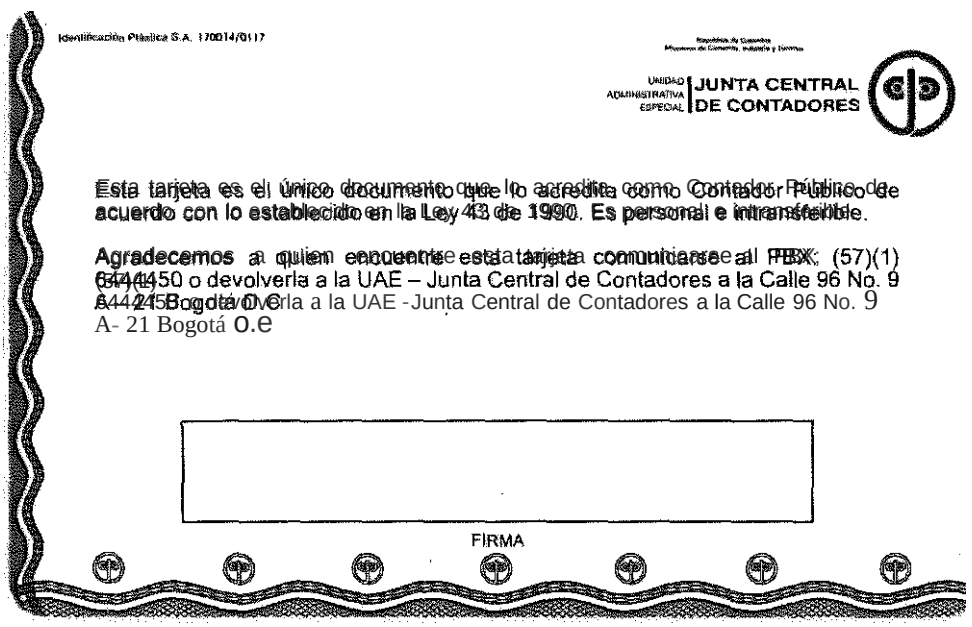
Identificación Plástica S.A. 170014/0117
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A-21 Bogotá D.C.
FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C65A6AF3950871 9E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **NATHALIA ALEJANDRA MUÑOZ CESPEDES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1098741585 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 233481-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.098.741.595**

MUÑOZ CESPEDES

APELLIDOS

NATHALIA ALEJANDRA

NOMBRES

Nathalia Muñoz Cespedes

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **24-JUL-1993**

BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.56	**B-**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

08-AGO-2011 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2700100-00700551-F-1098741585-20150504 **0044**035519A 3 7173353607

CONSORCIO INTER
BUCARAMANGA

CERTIFICACIÓN

El suscrito **MIGUEL FERNANDO QUIROS GOMEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.096.949.307**, en calidad de **Representante Legal** del **CONSORCIO INTER BUCARAMANGA**, identificado con **NIT 901.982.945-6**, se permite certificar que:

Que el **CONSORCIO INTER BUCARAMANGA**, identificado con **NIT 901.982.945-6**, **NO tiene la calidad de autorretenedor del Impuesto de Industria y Comercio (ICA)** en el municipio de **Bucaramanga y su área metropolitana**, de conformidad con la normatividad tributaria municipal vigente.

En consecuencia, el consorcio **no se encuentra obligado a practicar autorretenciones por concepto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros** en dichas jurisdicciones.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, para los fines que estime convenientes.

Se firma en **Bucaramanga**, a los **22** días del mes de julio de **2026**. Atentamente,

MIGUEL FERNANDO QUIROS GOMEZ
Representante Legal
C.C. 1.096.949.307

NATHALIA ALEJANDRA MUÑOZ CÉSPEDES
Contadora
C.C. 1.098.741.585
T.P. No. 233581-T

CONSORCIO INTER BUCARAMANGA

Nit 901982945
Tel.: 6076844527

Factura electrónica de venta
No. FE4

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA L	**22/07/2026**	**$ 399.888.417,52**
NIT No. : 890201573-0	VENDEDOR	
DIRECCION : CRA 23 37 63	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BUCARAMANGA **PAIS :** Colombia	21/08/2026	

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	IMPUESTOS	VALOR TOTAL
1	413095	ACTA DE PAGO PARCIAL N° 2 DEL CONTRATRO DE INTERVENTORIA N° 210-16226-4 CUYO OBJETO ES NTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSION EN PUNTOS CRITICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER	1	$ 336.040.686,99		IVA 19%	$ 336.040.686,99
2		PERIODO: 01 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2026.	1				

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 336.040.686,99
IVA liquidado	$ 336.040.686,99	19%	$ 63.847.730,53
VALOR TOTAL :			$ 399.888.417,52

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 21/08/2026	$ 399.888.417,52

VALOR (en letras) : TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESO CON 52 CENTAVOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 21/08/2026.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
aQMK2QDWZRWf9tXhvbXBSWKwuo0g//ZDMDpIPRydSjJK7mOTdKJK9vOW0zHZjB8OsmrZ9xZL7bXnrG6bYw+5mvZvAV+9VwqfDgmFsKtr+SW8zQVrDcD
P/3ejr8KfScBmcRtxFW2LdHqgvI0zj8npda+BiwT32efgtnbMhpom++fOsp7w0S2BSjPQTC0h4E/FEOH8j2K3w6L+uceEjI2jLNeYaathOdsBhVMTokC//pR4Rqcyx
eyuscnG+RiPPNQ5ljICAPhuZv0QgxFU+Qk6A446D4etnYcXq0Sx2u/3Fzww8hHSQUjUoIWA1Xs5R5HYRN9OIahIZdlSDjhsII/XOQ==

CUFE: 5fab45f17c2f64a590818d6bdc0383f258c5844056f872850373151785486afbbc16f7e40fd3433763cee6f7fd11d7df
Fecha emisión: 2026-07-22 08:37:22 **Fecha validación DIAN:** 2026-07-22 08:37:26-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764101207924. Prefijo: FE. Rango: 1 al 150. Vigencia: 6/11/2025 hasta 6/11/2027.

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

CONSORCIO INTER BUCARAMANGA Identificado con NI 9019829456

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina CARRERA 33, con las siguientes características:

Cuenta de Ahorros

Número:	24149966429
Fecha de apertura:	16 de Octubre de 2025
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

VIGILADO

Esta constancia se expide con destino a QUIEN PUEDA INTERESAR, realizada en la Oficina 0529 CARRERA 33 de la ciudad de BUCARAMANGA, el día Jueves, 16 de Octubre de 2025.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

CDMB
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

REGISTRO PRESUPUESTAL Nro: 25001229

CONTRATO No: 04 210-16226-4 **Septiembre 08 de 2025**

CONTRATISTA: NIT: 901982945 - 6 CONSORCIO INTER BUCARAMANGA

OBJETO DEL CONTRATO: GRUPO 2 . INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSION EN PUNTOS CRITICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO: $1,707,465,489.00

VALOR DEL REGISTRO: $1,148,879,514.68

PLAZO: 16 Mes(es)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO	OBJETO DEL GASTO	VALOR
3205-R101 2_3.2.02.02.008.05	TERRITORIOS MAS ADAPTADOS Y RESILIENTES FRENTE AL RIESGO EN Realizar Estudios, diseños, construcción, adecuación y mantenimiento de infraestructura para la mitigación de amenazas ambientales a causa de fenómenos de erosión, remoción en masa, avenidas torrenciales y/o inundación en el área de jurisdicción de la CDMB	$ 994,363,183.77
3205-R108 2_3.2.02.02.008.05	TERRITORIOS MAS ADAPTADOS Y RESILIENTES FRENTE AL RIESGO EN Realizar Estudios, diseños, construcción, adecuación y mantenimiento de infraestructura para la mitigación de amenazas ambientales a causa de fenómenos de erosión, remoción en masa, avenidas torrenciales y/o inundación en el área de jurisdicción de la CDMB	$ 154,516,330.91

Fecha	Valor fiscal	Valor reajustes
2025-06-09	$ 1,148,879,514.68	
Valor total:	$ 1,148,879,514.68	

KARYN JOHANNA SANTANDER GOMEZ
Coord. GESTION PRESUPUESTALY EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO

Expedido en Bucaramanga, en Septiembre 22 de 2025

Registrado por : RIOS PATIÑO NANCY MIREYA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 25 Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio

4. Número de formulario 141202268200

(415)7707212489984(8020) **000014120226820 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 8 2 9 4 5	6	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO INTER BUCARAMANGA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Floridablanca 2 7 6

41. Dirección principal
CL 41 4 133 BRR LAGOS II

42. Correo electrónico construingenieriadecolombiasas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 2 4 6 6 9 8 0 7	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 5 0 8 0 8							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	14	48	55																						

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre QUIROS GOMEZ MIGUEL FERNANDO

985. Cargo Representante Legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141202268200

(415)7707212489984(8020) **000014120226820 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 8 2 9 4 5	6	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 5 0 8 0 8	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 5 0 8 0 8	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141202268200

(415)7707212489984(8020) **000014120226820 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 8 2 9 4 5	6	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 5 0 8 0 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 9 6 9 4 9 3 0 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
QUIROS	GOMEZ	MIGUEL	FERNANDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141202268200

(415)7707212489984(8020) **000014120226820 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 8 2 9 4 5	6	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 0 5 3 6 1 4	8	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
1,451,345,666	8 5	2 0 2 5 0 8 0 8	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 2 9 2 2 0 2	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
256,119,823	1 5	2 0 2 5 0 8 0 8	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO
