CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 210-16223-6

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 3: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER

INFORME TÉCNICO MENSUAL DE OBRA

PERIODO DE EJECUCIÓN:

01 DE JUNIO DE 2026 AL 30 DE JUNIO DE 2026



CONTRATISTA: CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB
PIEDECUESTA, SANTANDER
2026

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
2. OBJETIVO GENERAL 4
2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 4
3. DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 5
4. INFORMACIÓN CONTRACTUAL 6
4.1 CONTROL DE GARANTÍAS - PÓLIZAS 7
4.2 RELACIÓN DE ACTAS DEL CONTRATISTA 8
4.3 CAMBIOS TÉCNICOS Y/O MODIFICACIONES DEL CONTRATO 8
5 INFORME DE AVANCE 9
5.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS 9
5.2 CONTROL DE EQUIPOS USADOS EN OBRA 12
5.3 CONTROL DE PERSONAL 14
6 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 15
7 ACTIVIDADES DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 16
8 ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SOCIO-AMBIENTAL 16
9 ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y PLAN GERENCIAL DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 16
10 CONCLUSIONES 17

ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Localización zonas a intervenir – Barrios Brisas de Primavera y Halcón de Granada ... 5
Ilustración 2. Registro fotográfico actividades ejecutadas en el periodo – Frente Brisas de Primavera ... 10

TABLAS

Tabla 1 Control de Garantías - Contrato de Obra ... 7
Tabla 2 Control de Garantías actualizado a Acta de inicio ... 7
Tabla 3 Relación de actas a la fecha ... 8
Tabla 4 Actividades ejecutadas durante el presente periodo – Frente Brisas de Primavera ... 9
Tabla 5 Relación de equipo ... 12
Tabla 6 Relación de personal del contratista ... 15
Tabla 7 Relación de Actas de Cobro ... 16

1. INTRODUCCIÓN

El Contratista CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB, identificado con NIT 901.983.966-5, representado legalmente por el ingeniero Julián Andrés Serrano Gómez, fue seleccionado mediante licitación para ejecutar el Contrato de Obra No. 210.16223.6 cuyo objeto es la: **CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 3: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.**

Dado lo anterior y en cumplimiento al objeto contractual, se presenta documento correspondiente al Informe técnico de obra, con información detallada de las actividades ejecutadas en el periodo comprendido del 01 de junio de 2026 al 30 de junio de 2026.

2. OBJETIVO GENERAL

Realizar, evidenciar y soportar técnicamente el desarrollo de las actividades de obra comprendidas en cumplimiento del objeto contractual "**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 3: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER"**, durante el plazo establecido del contrato, comprendido desde el 15 de octubre de 2025 hasta el 14 de agosto de 2026.

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Ejecutar los ítems contractuales conforme a las especificaciones técnicas dadas, garantizando la calidad, estabilidad y seguimiento de las obras contempladas en el contrato.

Desarrollar las actividades administrativas, de seguridad y gestión ambiental, consolidando los resultados mediante documentación técnica, reportes fotográficos y demás soportes que respalden la gestión realizada durante el periodo evaluado.


Verificar y evidenciar el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social del personal vinculado a la ejecución del proyecto, asegurando el cumplimiento de la normatividad laboral vigente.

Monitorear el avance físico y financiero de la obra, comparando lo ejecutado con lo programado, con el fin de garantizar el cumplimiento del cronograma, la adecuada utilización de los recursos asignados y el correcto control y seguimiento del proyecto.

3. DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra localizado en dos frentes de acción ubicados en los barrios Brisas de Primavera y Halcón de Granada, los cuales se encuentran adscritos al municipio de Piedecuesta, Santander que pertenece al Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB).

Ilustración 1. Localización zonas a intervenir – Barrios Brisas de Primavera y Halcón de Granada

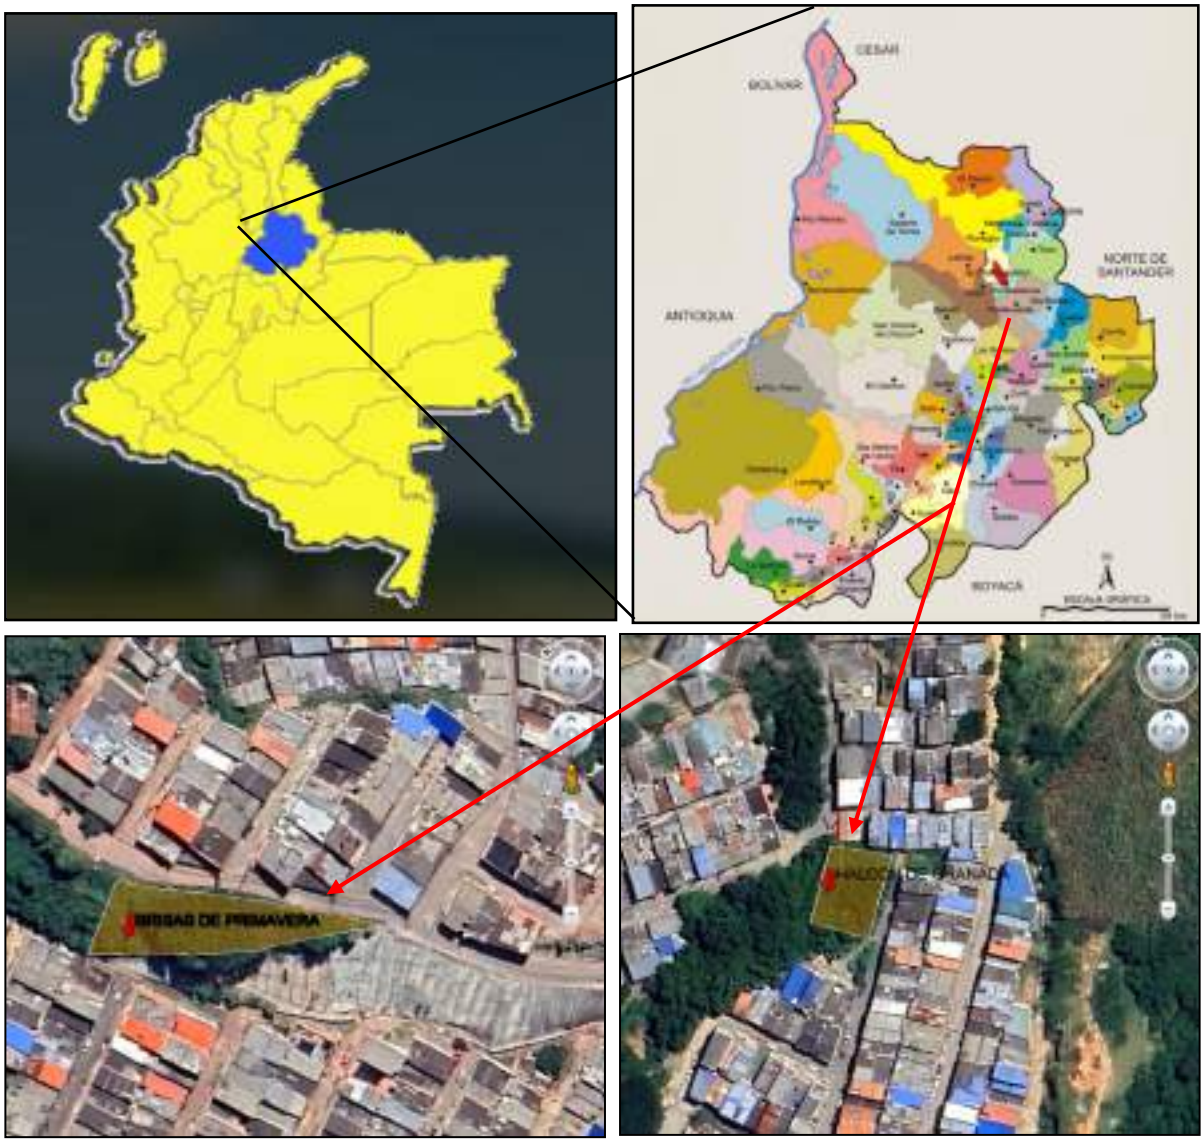

4. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

A continuación, se relaciona la información del contrato de obra N°210.16223.6 suscrito para la ejecución del proyecto.

CONTRATO DE OBRA	N° 210.16223.6 del 05 de septiembre de 2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 3: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.
ENTIDAD CONTRATANTE	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA (CDMB)
SUPERVISOR CONTRATANTE	CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA
CONTRATISTA	CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB
REPRESENTANTE LEGAL	JULIÁN ANDRÉS SERRANO GÓMEZ
NIT	901.983.966-5
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER PIEDECUESTA
REPRESENTANTE LEGAL	EDITH COSTANZA TOLOZA ROJAS
NIT	901.982.939-1
VALOR FISCAL DEL CONTRATO	$ 9.651.664.101,92
PLAZO DEL CONTRATO	DIEZ (10) MESES
FECHA DE INICIO	15 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	14 DE AGOSTO DE 2026
MUNICIPIO	PIEDECUESTA, SANTANDER

4.1 CONTROL DE GARANTÍAS - PÓLIZAS

Tabla 1 Control de Garantías - Contrato de Obra

ASEGURADORA: LA EQUIDAD SEGUROS			FECHA DE EXPEDICIÓN 12/09/2025	
PÓLIZA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTOS RCE CONTRATOS				
RIESGOS AMPARADOS	CUANTIA DE LOS AMPAROS	Vigencia		PÓLIZA
		DESDE	HASTA	
Predios, Labores y operaciones	$ 711.750,00	5/09/2025	5/07/2026	AB002677

ASEGURADORA: LA EQUIDAD SEGUROS			FECHA DE EXPEDICIÓN 12/09/2025	
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO				
RIESGOS AMPARADOS	CUANTIA DE LOS AMPAROS	Vigencia		PÓLIZA
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	$ 1.930.332.821,00	05/09/2025	05/11/2026	AB002676
Pago de salarios prestacionales	$ 482.583.205,25	05/09/2025	05/07/2029	
Estabilidad y calidad de la obra	$ 1.930.332.821,00	05/07/2026	05/07/2031	

Tabla 2 Control de Garantías actualizado a Acta de inicio

ASEGURADORA: LA EQUIDAD SEGUROS			FECHA DE EXPEDICIÓN 22/10/2025	
PÓLIZA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTOS RCE CONTRATOS				
RIESGOS AMPARADOS	CUANTIA DE LOS AMPAROS	Vigencia		PÓLIZA
		DESDE	HASTA	
Predios, Labores y operaciones	$ 711.750,00	15/10/2025	15/08/2026	AB002677

ASEGURADORA: LA EQUIDAD SEGUROS			FECHA DE EXPEDICIÓN 22/10/2025	
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO				
RIESGOS AMPARADOS	CUANTIA DE LOS AMPAROS	Vigencia		PÓLIZA
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	$ 1.930.332.821,00	15/10/2025	15/12/2026	AB002676
Pago de salarios prestacionales	$ 482.583.205,25	05/09/2025	15/08/2029	
Estabilidad y calidad de la obra	$ 1.930.332.821,00	15/08/2026	15/08/2031	

4.2 RELACIÓN DE ACTAS DEL CONTRATISTA

Tabla 3 Relación de actas a la fecha

RELACION DE ACTAS			
ACTA	**FECHA**	**OBSERVACIONES**	**VALOR**
ACTA DE INICIO	15/10/2025	Se suscribe acta de inicio de obra el 15 de octubre de 2025, con un plazo para la ejecución total del proyecto de diez meses.	N/A
ACTA DE MODIFICATORIA 01	23/12/2025	Se suscribe acta de mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos el 23 de diciembre de 2025, sin afectar el equilibrio financiero y el plazo contractual.	N/A
ACTA DE RECIBO Y PAGO PARCIAL No.1	29/12/2025	Se presenta el acta para pago parcial No.1 correspondiente al periodo entre el 15 de octubre de 2025 al 14 de diciembre de 2025.	$ 1.010.210.915,17
ACTA DE RECIBO Y PAGO PARCIAL No.2	25/03/2026	Se presenta el acta para pago parcial No.2 correspondiente al periodo entre el 15 de diciembre de 2025 al 28 de febrero de 2026.	$ 2.644.450.919,64
ACTA DE RECIBO Y PAGO PARCIAL No.3	25/05/2026	Se presenta el acta para pago parcial No.3 correspondiente al periodo entre el 01 de marzo de 2026 al 30 de abril de 2026.	$ 3.117.644.041,29

4.3 CAMBIOS TÉCNICOS Y/O MODIFICACIONES DEL CONTRATO

El contrato de obra No. 210.16223.6 durante el periodo comprendido entre el 01 de junio de 2026 al 30 de junio de 2026, no presentó cambios técnicos y/o modificaciones.

5 INFORME DE AVANCE

5.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

Para el periodo comprendido entre el 01 de junio de 2026 al 30 de junio de 2026 se relacionan todas las actividades de obra ejecutadas en los frentes de obra Brisas de Primavera y Halcón de Granada, tal y como se especifica en los siguientes cuadros.

Tabla 4 Actividades ejecutadas durante el presente periodo – Frente Brisas de Primavera

DESCRIPCION ITEM	UND	CANT. CONTRACTUAL	CANT. EJECUTADAS EN EL PERIODO	CANT. ACUMULADAS	% DE EJECUCIÓN
Replanteo, control y medición de la obra	mes	1,00	0,10	0,90	90,00%
Valla tipo 1A (5,00m x 2,80 m)	m2	1,00		1,00	100,00%
Desmonte y Limpieza	m2	1964,00		1964,00	100,00%
Retiro de basuras y escombros	m3	392,82		392,82	100,00%
Perfilado a mano descolgado de talud (en roca)	m3	496,41		496,41	100,00%
Excavación en material granular a cualquier profundidad	m3	1553,94		1553,94	100,00%
Excavación en suelo rocoso a cualquier profundidad	m3	1035,93		1035,93	100,00%
Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1000.00 m	m3-km	107965,80		107965,80	100,00%
Llenado de inyección con lechada cementicia para anclajes	m3	259,60	30,00	259,60	100,00%
Ejecución perforaciones horizontales (en roca) - para anclajes de 0,00m a 15,00m	m	5841,00	675,00	5841,00	100,00%
Canaleta (ancho = 1m; e =10cm)	m	99,26		99,25	99,99%
Suministro e instalación de nails Ø=1-1/4" de L=9m	und	649,00	75,00	649,00	100,00%
Suministro e instalación del sistema para control de erosión superficial	m2	1964,00	750,00	750,00	38,19%
Suministro e instalación de platina de 200mm x 200mm x 12mm	und	649,00	202,00	202,00	31,12%

Ver Anexo 2

Ilustración 2. Registro fotográfico actividades ejecutadas en el periodo – Frente Brisas de Primavera




Replanteo, control y medición de la obra




Llenado de inyección con lechada cementicia para anclajes




Ejecución perforaciones horizontales (en roca) - para anclajes de 0,00m a 15,00m




Suministro e instalación de nails Ø=1-1/4" de L=9m




Suministro e instalación del sistema para control de erosión superficial mediante manto de fibra sintética no degradable con estabilización UV




Suministro e instalación de platina de 200mm x 200mm x 12mm con un agujero

5.2 CONTROL DE EQUIPOS USADOS EN OBRA

Relación de equipos utilizados en el desarrollo del presente contrato en el periodo comprendido del 01 de junio de 2026 al 30 de junio de 2026. **Ver Anexo 2**

Tabla 5 Relación de equipo

RELACIÓN DE EQUIPO UTILIZADO	
CANTIDAD	**MAQUINARIA / EQUIPO**
1	Equipo RTK - GNSS STONEX S900
1	Estación total Topcon
1	Minicargador CASE-2018
1	Unidad neumática de perforación (#10)
1	Compresor Denair 460 CFM (#25)
1	Unidad de bombeo e inyección de lechada (#2)

RELACIÓN DE EQUIPO UTILIZADO	
EQUIPO	**FOTOGRAFIA**
Equipo RTK - GNSS STONEX S900	

Estación TOPCON GM-50	
Minicargador CASE-2018	
Unidad neumática de perforación (#10)	

Compresor Denair 460 CFM (#25)	
Unidad de bombeo e inyección de lechada (#2)	

5.3 CONTROL DE PERSONAL

Durante este periodo el Contratista presenta el personal operativo y profesional, que desarrolló labores en el marco del proyecto contractual, el cual se expresa en la siguiente tabla.

Tabla 6 Relación de personal del contratista

PERSONAL CONTRACTUAL: PROFESIONALES SEGÚN PLIEGO			
NOMBRE Y APELLIDOS	**CEDULA**	**CARGO**	**INGRESO**
Julián Andrés Serrano Gómez	13.870.690	Director de obra	15/10/2025
Jhon Alexander González Rivera	1.098.760.722	Residente de obra	15/10/2025
William Eduardo Cortés Peña	91.278.912	Asesor en Geotecnia	15/10/2025
Lissette Ximena Niño Carvajal	63.395.720	Asesor Ambiental	15/10/2025
Víctor Julio Gamboa	91.265.828	Profesional SST	15/10/2025
Andrés Leonardo Lasso Aguirre	80.187.378	PMP	15/10/2025
José Orlando Alba Jaimes	91.499.520	Profesional SST 2	02/02/2026
Jhonatan Alberto Giraldo Arenas	1.098.753.057	Asesor Ambiental 2	06/04/2026
PERSONAL CONTRACTUAL: OPERATIVO			
Edgar Iván Palomino Holguín	1.098.636.620	Topógrafo	15/10/2025
Yeiner García Cadena	1.005.187.293	Operador de Perforación I	15/10/2025
Gumercindo Parra Solano	91.291.101	Oficial de Obra	15/10/2025
Alexander Prada López	13.745.736	Ayudante de Perforación II	15/10/2025
Harley Prada López	1.098.822.751	Operador de Perforación II	15/10/2025
Yoel Ardila Narváez	1.046.427.115	Operador de Perforación I	15/10/2025
Mauricio Villamizar Solano	1.005.541.892	Operador de inyección	16/10/2025
Luis Alberto Prada Rincón	5.691.822	Ayudante obra	16/10/2025
Yefferson Dyfred Gonzalez Ortega	5.823.211	Ayudante obra	4/11/2025
Andrés Francisco García Farias	6.656.491	Ayudante obra	4/11/2025
Luis Alfonso Fuentes Navarro	1.098.699.422	Ayudante de Perforación II	4/11/2025
José Alberto Ospino Baracamonte	1.050.719.060	Ayudante obra	4/11/2025
Juan Andrés Diaz Quintero	1.095.802.634	Almacenista	10/11/2025
Rodolfo Jesús Quiñonez Gutiérrez	6.356.621	Ayudante obra	13/01/2026
Kelvin Nicol Páez Buitrago	7.014.092	Ayudante de Perforación II	13/01/2026
Diego Andres Flores Rincón	1.063.560.222	Ayudante de Perforación II	13/01/2026
Pedro Jesus Vergel Vergel	3.285.355	Ayudante obra	27/01/2026
Carlos Daniel Diaz Quintero	1.005.540.379	Ayudante obra	08/05/2026
Baudillo Rivera Gómez	1.093.738.325	Ayudante obra	01/06/2026
Darlin Martin Orduz Rey	1.005.327.109	Ayudante obra	01/06/2026
Luis Eduardo Cifuentes Velazco	2.000.006.746	Ayudante obra	01/06/2026

6 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO

Durante el periodo reportado no se tramitaron actas parciales de pago, ni se presentaron ajustes o novedades de índole financiera relacionadas con la ejecución contractual del proyecto. A continuación, se describen las actas que han tenido lugar desde el inicio del proyecto.

Tabla 7 Relación de Actas de Cobro

RELACIÓN DE ACTAS PRESENTADAS			
CONCEPTO	**PERIODO**	**VALOR**	**ESTADO**
Acta de Inicio	15/10/2025	N/A	RADICADA
Anticipo		N/A	N/A
Acta de Cobro 01	15/10/2025-14/12/2025	$ 1.010.210.915,17	RADICADA
Acta de Cobro 02	15/12/2025-28/02/2026	$ 2.644.450.919,64	RADICADA
Acta de Cobro 03	01/03/2026-30/04/2026	$ 3.117.644.041,29	RADICADA

7 ACTIVIDADES DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Respecto a las actividades correspondientes al componente de seguridad y salud en el trabajo desarrolladas durante el periodo del 01 de junio de 2026 al 30 de junio de 2026, se presenta el respectivo informe, en el cual a su vez se anexa como soporte del personal en obra, su respectiva Seguridad Social. **Ver Anexo 3**

8 ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SOCIO-AMBIENTAL

Respecto a las actividades ambientales desarrolladas durante el periodo del 01 de junio de 2026 al 30 de junio de 2026, se presenta el respectivo informe. A su vez, se anexa como uno de sus componentes, el informe social de obra en el que se desglosan todas las actividades afines desarrolladas desde el inicio del proyecto. **Ver Anexo 4**

9 ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y PLAN GERENCIAL DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Para el presente periodo, se realiza la actividad de aseguramiento de la calidad a los materiales y/o actividades desarrolladas en obra, con el debido seguimiento y enfoque conceptual en los fundamentos del manejo gerencial de proyectos, concebidas por el PMI (Project Management Institute), para lo cual se presenta el respectivo informe.

Ver Anexo 5

10 CONCLUSIONES

- A la fecha de corte del presente informe, el proyecto registra un avance físico acumulado del 96,29%, en contraste con un avance programado del 91,76%, evidenciando un adelanto del 4,53% respecto a la línea base. Este comportamiento indica un desempeño favorable en la ejecución de las actividades contractuales, manteniendo una tendencia positiva en el cumplimiento del cronograma. Dicho rendimiento se atribuye principalmente a la optimización de recursos en obra y a la ejecución planificada de las actividades, conforme a las especificaciones técnicas establecidas.

- En el frente de obra del barrio **Brisas de Primavera**, con corte al periodo reportado en el presente informe, se finalizaron las actividades de perforación, instalación y llenado de Pernos tipo Nails de 1 ¼" de diámetro y 9 ml de profundidad, de acuerdo a los parámetros de diseño dados. Por lo cual se procede al desarrollo de la fase final del proyecto la cual consiste en la instalación del sistema para control de erosión superficial mediante manto de fibra sintética no degradable con estabilización UV.

- Si bien a la fecha de corte del presente informe se han registrado avances iniciales en la instalación del geomanto y de las platinas, se precisa que, para efectos de facturación, dichos ítems serán considerados únicamente una vez se haya completado la totalidad de las actividades asociadas. Lo anterior, con el fin de garantizar la correcta conformación y funcionamiento integral del sistema de bioingeniería (geomanto, malla triple torsión, trenzado en guaya de ½" y fijación de platinas para ajustar todo el sistema), asegurando el cumplimiento pleno de los factores de estabilización previstos en el diseño. En consecuencia, en caso de generarse un acta de cobro con corte al presente periodo, no se incluirán las cantidades correspondientes a estas actividades, en tanto se encuentran en ejecución parcial.

ING JULIÁN ANDRÉS SERRANO GÓMEZ
Representante legal
CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB

LISTA DE ANEXOS DEL INFORME

ANEXO NO.1: ESTADO DEL TIEMPO PARA EL PERIODO 01 DE JUNIO DE 2026 AL 30 DE JUNIO DE 2026.

ANEXO NO.2: BITACORA DE OBRA PERIODO 01 DE JUNIO DE 2026 AL 30 DE JUNIO DE 2026.

ANEXO NO.3: PROGRAMA SG-SST E INFORME SST DE OBRA PARA EL PRESENTE PERIODO

ANEXO NO.4: INFORME SOCIO-AMBIENTAL DE OBRA PARA EL PRESENTE PERIODO

ANEXO NO.5: PROGRAMA GERENCIAL DE IMPLEMENTACIÓN PARA EL PROYECTO Y SEGUIMIENTO MENSUAL - PERIODO 01 DE JUNIO DE 2026 AL 30 DE JUNIO DE 2026.

ANEXO NO.6: ACTAS DE REUNIÓN O COMITÉS DE OBRA PARA EL PERIODO 01 DE JUNIO DE 2026 AL 30 DE JUNIO DE 2026.

ANEXO NO.1: ESTADO DEL TIEMPO PARA EL PERIODO 01 DE JUNIO DE 2026 AL 30 DE JUNIO DE 2026.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

FECHA	1 (Día)	7 (Mes)	2026 (Año)

CONTRATO DE OBRA No: 210.16223.6

CONTRATISTA: CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB

PERIODO DEL INFORME MENSUAL: 01 DE JUNIO DE 2026 AL 30 DE JUNIO DE 2026

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 3: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DIA DEL MES																														Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Seco	24	24	22	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	22	24	24	24	24	24	22	24	24	24	24	24	24	24	24	24	714
Lluvias moderadas	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

OBSERVACIONES:

ANEXO NO.2: BITACORA DE OBRA PERIODO 01 DE JUNIO DE 2026 AL 30 DE JUNIO DE 2026.

esta medida complementaria y garantizar condiciones adecuadas de seguridad tanto para la comunidad como para la integridad de la obra. Personal: Ing residente de obra e interventoria, siso, oficial, almacenista, ayudantes de obra y perforacion. Equipos: Minicargador, Estacion total, unidad de inyeccion, 3 unidades neumaticas de perforacion y 3 compresores

Sabado 30 de Mayo 2026
Estado del clima: Dia soleado
Se continúa con las labores de perforación e instalación de pernos tipo Nails según las especificaciones. Personal: Ing residente de obra e Interventoria, siso, oficial, almacenista, ayudantes de obra y perforacion. Equipos: Estacion total, unidad de inyeccion, Minicargador, 3 unidades neumaticas de perforacion y 3 compresores

Jorge E Ascanio C.

Lunes 01 de Junio 2026
Estado del clima: Dia soleado
Se perfora e instalan pernos tipo Nails de 1/4" de diametro. Se llenan pernos con lechada. Dado que cada canasta de perforacion requiere de un espacio considerable de despliegee sobre el talud y que el area pendiente por perforar da para maniobra estricta de un solo equipo, se retira de obra las unidades de perforacion #18 y #13, junto con los compresores Doosan 460 (#23) y el Atlas Copco 450 (#16) Personal: Ing. residente de obra e interventoria, siso, oficial, almacenista, ayudantes de obra y perforacion. Equipos: Estacion total, Minicargador, Unidad neumatica de perforacion (#10), Compresor

Perfil 460 (#25) y unidad de bombeo e inyección de lechada (#)

Jorge E Alvarez C.

Martes 2 de Junio 2026
Estado del clima: Día soleado
se perfora e instalan pernos tipo Nails de 1 1/4" de diametro y a 9ml de profundidad. Personal: Ing residente de obra, interventoria, siso, oficial, almacenista, ayudantes de obra y perforación. Equipos: Estación total, Minicargador, Unidad neumatica de perforación, Compresor y unidad de inyección.

Miercoles 3 de Junio 2026
Estado del clima: Día nublado
frente Brisas: Se perfora e instalan pernos tipo Nails de 1 1/4" de diámetro y a 9ml de profundidad
frente Halcon: Dada la culminación de las actividades contractuales, se empieza a retirar de obra los equipos y materiales resultantes de obra Personal: Ing. residente de obra e interventoria, siso, oficial, almacenista, ayudantes de obra y perforación. equipos: Estación total, Minicargador, Unidad neumatica de perforación, compresor y unidad de inyección.

Jorge E Alvarez C.

Jueves 4 de Junio 2026
Estado del clima: Día soleado
frente Brisas: Se continua con la perforación e instalación de pernos tipo Nails de 1 1/4" de diametro a 9ml de profundidad
frente Halcon: Se hidratan los arboles sembrados

de la compensacion hecha. Personal: Ing residente de obra, interventoria, siso, oficial, almacenista, ayudantes de obra y perforacion. Equipos: Estacion total, Minicargador, unidad neumatica de perforacion, compresor y unidad de inyeccion.

Jorge E. Alonso

Viernes 05 de Junio 2026
Estado del clima: Dia soleado
Se perfora e instalan pernos tipo Nails de 1 1/4" de diametro y a 9ml de profundidad. Se realiza llenado con lechada cementicia para los pernos. Personal: Ing residente de obra e interventoria, siso oficial, almacenista, ayudantes de obra y perforacion. Equipos: Estacion total, Minicargador, unidad neumatica de perforacion, compresor y unidad de inyeccion

Edilson Betancur

Sabado 06 de Junio 2026
Estado del clima: Dia soleado
Se realizó la perforación e instalación de pernos tipo Nails de 1 1/4" de diámetro y a 9m de profundidad, de acuerdo con las especificaciones del diseño. Asimismo, se continúa el llenado con lechada cementicia de los pernos instalados para garantizar su correcta adherencia. Personal: Ing. residente de Obra e interventoria, siso, oficial, almacenista, ayudantes de obra y Perforacion. Equipos: Estacion total, Minicargador, Unidad neumatica de perforacion, compresor y unidad de inyeccion.

Jorge E. Alonso P.

Edilson Betancur

Martes 09 de Junio del 2026
Estado del Clima: Dia soleado
Frente Brisas: Se perfora e instalan pernos tipo Nails de 1¼" de diametro y a 9ml de profundidad. Se realiza llenado con lechada cementicia para los pernos. Frente Halcon: Se inicia con el desmantelamiento de una parte del campamento correspondiente al acopio de materiales y parte del vestier. Personal: Ing. residente de obra e interventoria, siso, oficial, almacenista, ayudantes de obra y perforacion. Equipos: Municargador, estacion total, unidad neumatica de perforacion, Compresor y unidad de inyeccion.

Miercoles 10 de Junio 2026
Estado del Clima: Dia soleado
Frente Brisas: Se da continuidad a la perforación e instalación de pernos tipo nails de 1¼" de diámetro con una profundidad de 9ml. Paralelamente, se ejecutó el llenado con lechada cementica en los pernos previamente instalados. Frente Halcon: Se continua con la actividad de desmantelamiento de campamento. Personal: Ing. residente de obra e interventoria, siso, oficial, almacenista, ayudantes de obra y perforacion. Equipos: Estacion total, Municargador, unidad neumatica de perforacion, Compresor y unidad de inyeccion.

Jueves 11 de Junio 2026
Estado del Clima: Dia soleado
Se perfora e instalan pernos tipo Nails de 1¼" de diametro y a 9ml de profundidad. Personal: Ing. residente de obra e interventoria, siso, oficial, almacenista, ayudantes de obra y perforacion.

Equipos: Estacion total, Minicargador, unidad neumatica de perforacion, compresor y unidad de inyeccion

Viernes 12 de Junio 2026
Estado del clima: Dia soleado
Se realiza la perforación e instalación de pernos tipo Nails de 1 1/4" de diámetro y 9mt de profundidad. Durante la Jornada se culminan las actividades de perforación e instalación de los pernos programados. Posteriormente, se retiran del frente de obra la Unidad de perforación #10 y el compresor Demit #25. Se efectúa el llenado de los pernos instalados mediante lechada cementicia. Personal: Ing residente de obra e interventoria, siso, oficial, almacenista, ayudantes de obra y perforacion. Equipos: Estacion total, Minicargador y unidad de inyeccion

Jorge E. Alvarez C.

Martes 16 de Junio 2026
Estado del Clima: Dia soleado
Se procede a realizar una reperfilado de talud
Personal: Ing residente de obra e interventoria, siso, oficial, almacenista, ayudantes de obra y perforacion. Equipos: Estacion total, Minicargador y unidad de inyeccion

Miercoles 17 de Junio 2026
Estado del clima: Dia soleado
se reperfila el talud para garantizar una superficie homogenea previo a la instalacion del geomanto
Personal: Ing residente de obra e interventoria, siso, oficial, almacenista, ayudantes de obra y perforacion. Equipos: Estacion total, Minicargador y unidad de inyeccion

Jorge E. Alvarez C.

Jueves 18 de Junio 2026
Estado del Clima: Dia soleado
Se trasladan los rollos de geomanto con minicargador hacia la corona del talud para proseguir instalando el geomanto. Personal: Ing residente de obra, interventoria, siso, oficial, almacenista, ayudantes de obra y perforación. Equipos: Estacion total, Minicargador y unidad de inyeccion.

Viernes 19 de Junio 2026
Estado del Clima: Dia soleado
Se instala geomanto en fibra sintetica no degradable sobre el talud, el cual corresponde a la fase inicial del sistema de bioingeniería a implementar en obra. Personal: Ing. residente de obra e interventoría, siso, oficial, almacenista, ayudantes de obra y perforacion Equipos: Estacion total, Minicargador y unidad de inyeccion.

Sabado 20 de Junio 2026
Estado del clima: Dia soleado
Continua la instalación de geomanto sobre talud, el cual se traslapa en franjas de 20cm, y se asegura con grapas de acero, de acuerdo a las especificaciones tecnicas dadas. Personal: Ing. residente de obra e interventoria, siso, oficial, almacenista, ayudantes de obra y perforación. Se retira del frente de obra la unidad de inyeccion #2. Equipos: Estacion total y Minicargador

Lunes 22 de Junio 2026 2

Estado del clima: Dia soleado

Se realizan excavaciones previas para el hincado de postes de cerramiento por la corona de talud en la zona inicial de cobertura con geomanto. Personal: Ing residente de obra e interventoria, siso, oficial, almacenista, ayudantes de obra y perforacion. Equipos: Estacion total y Minicargador.

Martes 23 de Junio 2026

Estado del clima: Dia soleado

Se continua instalando geomanto a nivel superficial del talud, en franjas de corona a pie del talud. Se Pintan con anticorrosivo las platinas de 1 agujero proximas a instalar. Personal: Ing residente de obra e interventoria, siso, oficial, almacenista, ayudantes de obra y perforacion. Equipos: Estacion total y Minicargador

Miercoles 24 de Junio 2026

Estado del clima: Dia soleado

Se inicia con la instalación de la malla tripletorsión que va superpuesta al geomanto, posteriormente se inicia con la instalación de platinas de 200mm x 200mm x 12mm con un agujero, en cada uno de los pernos instalados y que ya poseen la cobertura del geomanto. Personal: Ing. residente de obra e interventoria, siso, oficial, almacenista, ayudantes de obra y perforacion. Equipos: Estacion total y Minicargador.

Jueves 25 de Junio 2026
Estado del Clima: Dia soleado
Se continua con la instalación de platinas de un agujero sobre cada perno tipo Nails instalados.
Personal: Ing. residente de obra e interventoría, siso, oficial, almacenista, ayudantes de obra y perforación
Equipos: Estacion total y Minicargador

Jose E Alvarez C.

Viernes 26 de Junio 2026
Estado del Clima: Dia soleado
se prosigue con la instalacion de l geomanto y platinas en la zona ya recubierta con dicho sistema
Personal: Ing residente de obra e interventoria, siso, oficial, almacenista, ayudantes de obra y perforación Equipos: Estacion total y Minicargador.

Martes 30 de Junio 2026
Estado del Clima: Dia soleado
Se realiza control topografico del area ya cubierta en geomanto, continua la instalacion del mismo. Personal: Ing residente de obra e interventoria, siso, oficial, almacenista, topografo, ayudantes de obra y perforacion.
Equipos: Estacion total y Minicargador.

Jose E Alvarez C

Miercoles 01 de Julio 2026
Estado del Clima: Dia soleado
Se continua con el Suministro e instalación del sistema para control de erosión superficial mediante manto de fibra sintética no degradable con estabilización UV, siguiendo las especificaciones

ANEXO NO.3: PROGRAMA SG-SST E INFORME SST DE OBRA PARA EL PRESENTE PERIODO

CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB	INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CDMB

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

INFORME SST No 09

CONTRATISTA: CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB

CONSORCIO MITIGACIÓN
PIEDECUESTA CDMB

ELABORADO POR:
VICTOR JULIO GAMBOA
PROFESIONAL SISO

PERIODO DEL INFORME
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB	**INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	CDMB

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN 3
2. OBJETIVOS DEL INFORME. 4
2.1 OBJETIVO GENERAL 4
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 4
3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 5
4. RELACIÓN DE PERSONAL Y NOVEDADES. 6
4.1 PERSONAL 6
4.2 NOVEDADES DE INGRESO. 9
5. PARTICIPACIÓN Y CONSULTA. 10
5.1 COMITÉ PARIOTARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 11
5.2 COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL 11
5.3 REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS. (RACI) 11
6. ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 11
7. PROCESOS DE FORMACIÓN. 12
8. INSPECCIONES DE SEGURIDAD 12
9. GESTIÓN DE LOS PELIGROS Y RIESGOS. 13
9.1 MEDIDAS PREVENTIVAS. 13
10. REPORTE DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO 14

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento describe la gestión en Seguridad y Salud en el trabajo del proyecto **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER"** en el periodo comprendido entre el **1 al 30 de Junio de 2026;** en el mismo se reflejan y relacionan actividades ejecutadas, registros fotográficos y evidencias necesarias para respaldar la conformidad del sistema de Gestión SST en el marco de la prevención de riesgos, cumplimiento legal y contractual aplicables.

La estructura del informe esta direccionada desde un objetivo general y el cumplimiento de cada uno de los objetivos específicos descritos en el mismo, dentro de los cuales se podrá encontrar la relación del personal disponible para la ejecución del proyecto, rotación durante el periodo, conformación de los diferentes comités, mecanismos de participación y consulta dirigidos hacia la prevención de riesgos laborales, entre otros mecanismos necesarios para el eficaz desempeño de las actividades realizadas y registros de afiliación a seguridad social de la población trabajadora.

Comprometidos con el bienestar de la población trabajadora y la prevención continua de riesgos y accidentes laborales, presentamos este documento para que sea un soporte y ayuda para verificar el cumplimiento del plan de trabajo direccionado desde el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

2. OBJETIVOS DEL INFORME.

2.1 OBJETIVO GENERAL

Soportar la ejecución de actividades y cumplimiento del plan de trabajo del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud el trabajo del proyecto "**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER"** por medio de fotografías, actas, soportes y otros asociados al mejoramiento de la calidad de vida de la población trabajadora.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Presentar los soportes de inducción y/o re inducción y seguridad social vigente de toda la población trabajadora del proyecto.
- Describir las actividades desarrolladas en los diferentes comités y demás mecanismos de participación y consulta en materia de Seguridad y salud en el trabajo.
- Soportar la entrega de elementos de protección personal especifico y acordes a los factores de riesgos expuestos, suministrados a los trabajadores involucrados en el proyecto.
- Comunicar el avance y ejecución de las actividades del Sistema de seguridad y salud en el trabajo.
- Establecer medidas de control preventivas con el fin de mitigar y minimizar los riesgos potenciales que pueden generar accidentes de trabajo o enfermedades laborales a los trabajadores.
- Sensibilización a los trabajadores del contrato en mención la importancia de mantener ambientes y conductas de trabajo seguro.
- Establecer lineamientos técnicos para el desarrollo de las actividades y la correcta ejecución.

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

NOMBRE DE LA EMPRESA	CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB
NIT	901.983.966-5
REPRESENTANTE LEGAL	JULIAN ANDRÉS SERRANO GÓMEZ
CONTRATO	210.16223.6
OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER"
DIRECCIÓN	Centro Industrial y Logístico San Jorge, bodega 16
TELÉFONO	6076159848
CLASE DE RIESGO	V
	Actividad económica: construcción de obras de ingeniería civil incluye solamente a empresas dedicadas a el montaje y/o reparación de oleoductos

4. RELACIÓN DE PERSONAL Y NOVEDADES.

En este numeral se presentan las relaciones del personal disponible, novedades de ingreso y retiro del personal dispuesto para la ejecución del proyecto en el periodo de tiempo descrito para el presente informe.

4.1 PERSONAL

A continuación, se presenta el personal vinculado para la ejecución del proyecto, en el periodo.

Tabla No. 1. Personal Staff

PERSONAL ACTIVO EN OBRA							
PERIODO: DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026							
CONTRATISTA: CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB							
NOMBRE COMPLETO	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN**	**CARGO**	**FECHA DE INGRESO**	**ARL**	**EPS**	**AFP**	**CCF**
Julián Andrés Serrano Gómez	13.870.690	Director de obra	15/10/2025	Axa Colpatria	Sanitas	Colpensiones	No cotiza
Yeiner García Cadena	1005187293	Operador de perforación I	29/09/2025	Axa Colpatria	Sura	Porvenir	Comfenalco
Gumersindo Parra Solano	91291101	Oficial	6/10/2025	Axa Colpatria	Sanitas	Protección	Comfenalco
Alexander Prada López	13745736	Ayudante de perforación II	6/10/2025	Axa Colpatria	Sura	Porvenir	Comfenalco
Harley Prada López	1098822751	Operador de perforación II	6/10/2025	Axa Colpatria	Nueva EPS	Porvenir	Comfenalco
Yoel Ardila Narváez	1046427115	Operador de perforación I	6/10/2025	Axa Colpatria	Salud Total	Colfondos	Comfenalco
Mauricio Villamizar Solano	1005541892	Operador de inyección	16/10/2025	Axa Colpatria	Salud Mia	Porvenir	Comfenalco

Luis Alberto Prada Rincón	5691822	Ayudante de obra	16/10/2025	Axa Colpatria	Nueva EPS	Porvenir	Comfenalco
Yefferson Dyfred González Ortega	5.823.211	Ayudante de obra	4/11/2025	Axa Colpatria	Nueva EPS	Porvenir	Comfenalco
Andrés Francisco García Farías	6.656.491	Ayudante de obra	4/11/2025	Axa Colpatria	Nueva EPS	Porvenir	Comfenalco
Luis Alfonso Fuentes Navarro	1.098.699.422	Ayudante de perforación II	4/11/2025	Axa Colpatria	Salud Total	Porvenir	Comfenalco
José Alberto Ospino Baracamonte	1.050.719.060	Ayudante de obra	4/11/2025	Axa Colpatria	Salud Total	Porvenir	Comfenalco
Juan Andrés Diaz Quintero	1.095.802.634	Almacenista	10/11/2025	Axa Colpatria	Sanitas	Porvenir	Comfenalco
Kelvin Nicol Páez Buitrago	7.014.092	Ayudante de perforación II	13/01/2026	Axa Colpatria	Nueva eps	Porvenir	Comfenalco
Diego Andrés Flores Rincón	1.063.560.222	Ayudante de perforación II	13/01/2026	Axa Colpatria	Nueva eps	Porvenir	Comfenalco
Rodolfo Jesús Quiñonez Gutiérrez	6.356.621	Ayudante de obra	13/01/2026	Axa Colpatria	Nueva eps	Porvenir	Comfenalco
Pedro Jesús Vergel Vergel	13.285.355	Ayudante de obra	27/01/2026	Axa Colpatria	Nueva eps	Porvenir	Comfenalco
Carlos Daniel Diaz Quintero	1.005.540.379	Ayudante de obra	8/05/26	Axa Colpatria	Sanitas	Porvenir	Comfenalco
Baudillo Rivera Gómez	1.093.738.325	Ayudante de obra	1/06/26	Axa Colpatria	Salud total	Colpensiones	Comfenalco
Darlin Martin Orduz Rey	1.005.327.109	Ayudante de obra	1/06/26	Axa Colpatria	Nueva eps	Porvenir	Comfenalco
Luis Eduardo Cifuentes	2.000.006.746	Ayudante de obra	1/06/26	Axa Colpatria	Sanitas	Colpensiones	Comfenalco

TOTAL, PERSONAL CONTRATISTA					**21**		
CONTRATISTA: MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S.							
NOMBRE COMPLETO	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN**	**CARGO**	**FECHA DE INGRESO**	**ARL**	**EPS**	**AFP**	**CCF**
William Eduardo Cortés Peña	91.278.912	Geotecnista	15/10/2025	Axa Colpatria	Sura	Porvenir	Comfenalco
Jhon Alexander González Rivera	1.098.760.722	Residente de obra	15/10/2025	Axa Colpatria	Salud total	Porvenir	Comfenalco
Lissette Ximena Niño	63.395.720	Asesor Ambiental	15/10/2025	Axa Colpatria	Sura	Colpensiones	Ninguna
Víctor Julio Gamboa	91.265.828	Profesional SST	15/10/2025	Axa Colpatria	Nueva EPS	Colpensiones	Comfenalco
Andrés Leonardo Lasso Aguirre	80.187.378	PMP	15/10/2025	Axa Colpatria	Sura	Colpensiones	Comfenalco
Edgar Iván Palomino Holguín	1.098.636.620	Topógrafo	15/10/2025	Axa Colpatria	Sura	Colfondos	Comfenalco
José Orlando Alba Jaimes	91499520	Profesional SST 2	2/02/2026	Positiva	Coosalud	Protección	Comfenalco
Jhonatan Alberto Giraldo Arenas	1.098.753.057	Asesor Ambiental	6/04/26	Axa Colpatria	Eps Sura	Colpensiones	Comfenalco
TOTAL, PERSONAL CONTRATISTA					**8**		
TOTAL, PERSONAL EN OBRA					**29**		

Para la ejecución de la obra se cuenta con personal de mano de obra calificado y no calificado. Todos se encuentran afiliados a ARL, EPS, AFP, conforme a las disposiciones laborales aplicables.

Ver anexo No 1. Afiliaciones y/o planilla de pagos de seguridad social.

4.2 NOVEDADES DE INGRESO.

Durante el periodo del informe, se presentó el ingreso de los siguientes trabajadores:

Tabla No 2. Novedades de Ingreso

NOVEDADES DE INGRESO			
PERIODO: DEL 01 AL 30 JUNIO 2026			
NOMBRE COMPLETO	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN**	**CARGO**	**FECHA DE INGRESO**
Baudillo Rivera Gómez	1.093.738.325	Ayudante de obra	1/06/26
Darlin Martin Orduz Rey	1.005.327.109	Ayudante de obra	1/06/26
Luis Eduardo Cifuentes	2.000.006.746	Ayudante de obra	1/06/26

Ver anexo No 2. Inducciones.

4.3 NOVEDADES DE RETIRO

Durante el periodo del mes de junio, se presentó el retiro del ayudante de obra Carlos Daniel Diaz Quintero.

NOVEDADES DE RETIRO DE PERSONAL		
PERIODO: 01 AL 30 JUNIO 2026		
NOMBRE COMPLETO	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN**	**FECHA DE RETIRO**
Carlos Daniel Diaz Quintero	1.005.540.379	30 JUNIO 2026

Ver anexo No 3. Retiro.

4.4 MAQUINARIA Y/O EQUIPOS

Durante este periodo de mayo No se requirió de volqueta.

Tabla No 3. Personal rotativo

PLACA	SOAT	FECHA VIGENTE DE SOAT	RTM	FECHA RTM	CONDUCTOR
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Tabla No. 4. Relación Maquinaria

TIPO DE MAQUINARIA	MARCA	MODELO	No SERIE	MOTOR	OPERADOR
Minicargador	Case	2018	JAFSR175EJM446321	126894	Yeferson Acevedo Suarez
Compresor #25	Denair 460 CFM-2000PSI	DACY-13/13	CZG21111143	6BT5.9-C180	Harley Prada López
Unidad de perforación neumática No10	Core -Dril	A 432 HD	43218250621	378C0189	Harley Prada López
Unidad de inyección #2	American manufacturing	Al0918	Al0918	Motor diésel 10HP @ 3600 RPM .	Mauricio Villamizar

Ver anexo No 4. Documentos maquinaria

5. PARTICIPACIÓN Y CONSULTA.

Dentro de los mecanismos de participación y consulta se encuentra el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo COPASST o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, el comité de convivencia laboral CCL y mecanismos de notificación de riesgos por parte de la población trabajadora.

5.1 COMITÉ PARIOTARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Para el informe en mención y dando cumplimiento a la Resolución 2013 de 1986, modificada por el Decreto 1295 de 1994 y el Decreto 1072 de 2015, el día 26 de Junio de 2026 se realizó la reunión del comité de Seguridad y Salud en el Trabajo donde se dan a conocer las actividades realizadas en el periodo, dando cumpliendo con la realización de inspecciones en el área de trabajo, garantizando que los riesgos de accidentes y enfermedades laborales sean reducidos al máximo, se adjunta acta de reunión.

Ver anexo No 5. Acta de reunión comité Copasst

5.2 COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

El comité de convivencia laboral se realizará de manera mensual, de acuerdo a la resolución 3461 del 2025, el día 27 junio de 2026, se realizó la reunión del comité de convivencia laboral.

Ver anexo No 6. Acta de reunión comité Convivencia laboral

5.3 REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS. (RACI)

Durante el periodo en reporte no se presentaron situaciones para reporte por parte de la población trabajadora los siguientes RACI.

6. ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.

Es responsabilidad del empleador el suministro de los elementos de protección individual y dotación para la ejecución de las actividades de manera segura y de acuerdo a los perfiles del personal y las exigencias de las tareas a ejecutar; se realizó entrega de los elementos de protección de acuerdo a la vida útil del EPP y la necesidad del trabajador, a su vez se realizaron inspecciones periódicas de estos elementos con el fin de tener abastecido al personal.

Tabla 4. Entrega de dotación y EPP

ACTIVIDAD DESARROLLADA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Entrega y/o reposición de elementos de protección personal	De acuerdo a la necesidad y desgaste normal de los elementos de protección personal, se realiza la inspección de los elementos de protección personal.

Ver anexo No 7. Entrega de epp

7. PROCESOS DE FORMACIÓN.

La formación es una estrategia indispensable para alcanzar los objetivos propuestos en el SGSST. Mediante estas se pretende lograr que todos los trabajadores involucrados en este proyecto, de todos los niveles, adquieran los conocimientos, actitudes y prácticas necesarios para generar ambientes de trabajos sanos, seguro y confortable.

Tabla N° 5. Capacitaciones SST en el periodo

CAPACITACIONES		
ITEM	**FECHA**	**TEMA**
1	1/06/26	Prevención de accidentes de trabajo en manos
2	9/06/26	Almacenamiento adecuado de productos químicos
3	16/06/26	Riesgo químico: SGA (pictogramas de peligro)
4	26/06/26	Recomendaciones para cuidar la salud mental

Ver anexo No 8. Registro de asistencia a capacitaciones SST.

8. INSPECCIONES DE SEGURIDAD

Una de las herramientas más utilizadas para Identificar peligros, para posteriormente ser evaluados, son las Inspecciones a sitios de trabajo, pues determinan el tipo de peligro al que está expuesto el trabajador en su área de trabajo, constituye una prueba real de las condiciones laborales ya que se basa en la verificación de las diferentes zonas con las cuales tiene contacto el trabajador, además permite encontrar las fallas que pueden acarrear algún tipo de accidente y los posibles causales de enfermedad laboral.

Tabla 6. Inspecciones de seguridad realizadas en el periodo

INSPECCIÓN DESARROLLADA	FECHA DE INSPECCIÓN
Inspección de Elementos de Protección Personal	9/06/26
Inspección Locativa	9/06/26
Inspección de botiquín y camilla	9/06/26

Inspección de extintores	9/06/26
Inspección Preoperacional de Herramienta Menor	1/06/26
	9/06/26
	16/06/26
	22/06/26

Ver anexo No 9. Inspecciones de Seguridad.

9. GESTIÓN DE LOS PELIGROS Y RIESGOS.

La gestión de los riesgos peligros prioritarios en el trabajo requiere mecanismos de prevención adicionales que permitan la gestión adecuada del riesgo, permitiendo ambientes de trabajo más seguros, en este numeral se relacionan las gestiones desarrolladas.

9.1 MEDIDAS PREVENTIVAS.

Tabla No. 9. Medidas preventivas adoptadas en el periodo

PELIGRO	GESTIÓN DE LOS PELIGROS	FECHA (S) DE REALIZACIÓN.
- Caídas, golpes, electrocución, heridas	- Señalización de riesgos y peligros; encerramiento - Delimitación áreas de trabajo. - Análisis de trabajo seguro para las actividades de alto riesgo - Permiso de trabajo para actividades en alturas	Del 1 al 30 junio de 2026

Ver anexo No 10. Registro Fotográfico.

Ver anexo No 11. Medidas Preventivas.

10. REPORTE DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO

Se hace relación al número de incidentes/accidentes/enfermedad laboral registrados en el espacio del informe que sea por causa u ocasión de las labores desempeñadas dentro del área de trabajo o encomendadas por personal supervisor o subcontratista. Dentro del presente informe se presenta la relación del número de eventos presentados, la gestión y plan de trabajo se anexará dentro de las investigaciones pertinentes.

Para el periodo que corresponde al presente informe no se presentaron eventos relacionados con accidentes de trabajo.

Tabla No. 10. Consolidado de incidentes y/o accidentes:

N°	MES	N° AT			N° TRABAJ	DIAS INCAPACIDAD	DÍAS CARGADOS	TOTAL DIAS TRABAJADOS	TOTAL HORAS EXTRAS	HORAS HOMBRE TRABAJADAS	INDICES				
		SI	CI	TOTAL							MES	IF	IS	TASA	ILI
1	oct-25	0	0	0	13	0	0	14	0	1456	oct-25	0,00	0,00	0,00	0,00
2	nov-25	0	0	0	19	0	0	24	0	3648	nov-25	0,00	0,00	0,00	0,00
3	dic-25	0	0	0	19	0	0	23	0	3496	dic-25	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ene-26	0	0	0	24	0	0	23	0	4416	ene-26	0,00	0,00	0,00	0,00
5	feb-26	0	0	0	25	0	0	22	0	4400	feb-26	0,00	0,00	0,00	0,00
6	mar-26	0	0	0	25	0	0	21	0	4200	mar-26	0,00	0,00	0,00	0,00
7	abr-26	0	0	0	26	0	0	20	0	4160	abr-26	0,00	0,00	0,00	0,00
8	mayo	0	0	0	26	0	0	24	0	4992	mayo	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Junio	0	0	0	29	0	0	21	0	4872	Junio	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0	0	0	13,0	0,0	0,0	56,0	0,0	17472,0	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Imagen 1. Distribución del índice de frecuencia

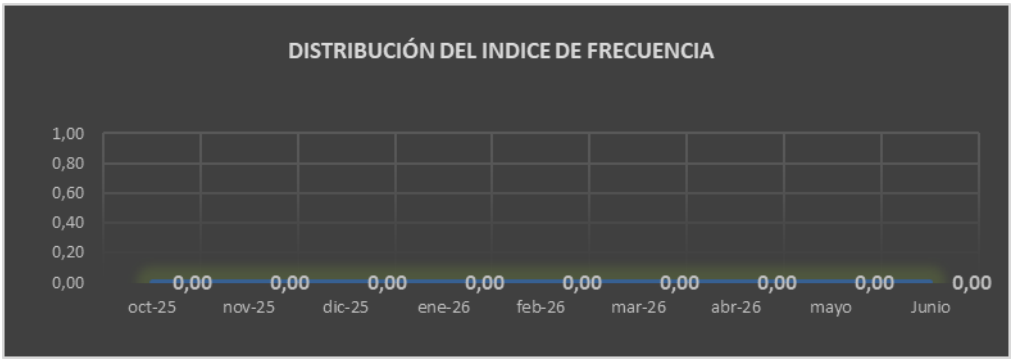


Imagen 2. Tasa de accidentalidad



Imagen 3. Número de trabajadores mensual


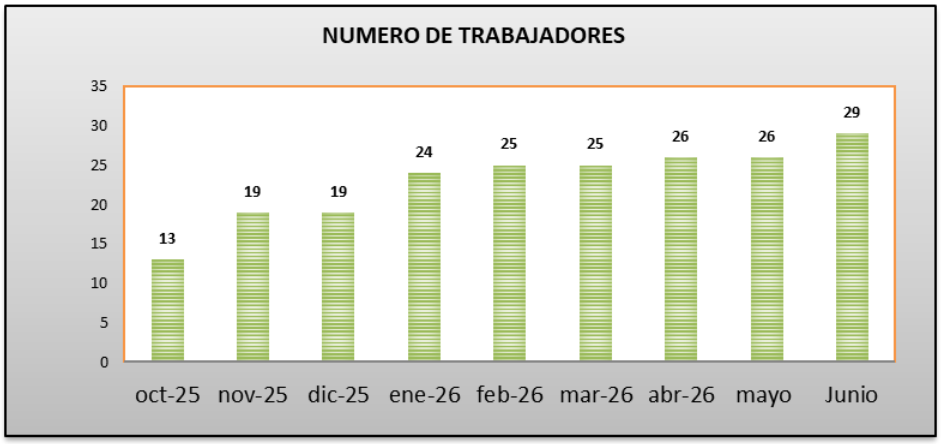


Imagen 4. Total, de accidentes de trabajo

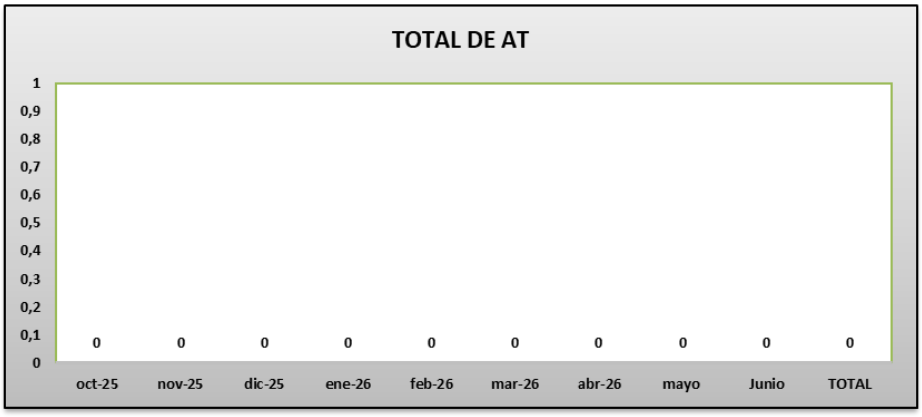

ANEXO N° 1
AFILIACIONES Y PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL

SANDIEGO
SERVICIOS EN SALUD

CERTIFICADO MÉDICO DE PREINGRESO OCUPACIONAL

Fecha: 2026-05-29

1. INFORMACIÓN GENERAL

Empresa Usuaria:	CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB	Actividad económica:	Construcción de obras de ingeniería civil
Nombre:	BAUDILLO RIVERA GOMEZ	Documento:	CC 1093738325
Fecha de nacimiento:	1986-02-16	Lugar de nacimiento:	BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Edad:	40 años	Identidad de Género:	Masculino
Estado civil:	Union_libre	No. hijos vivos:	0
Dirección actual:	MANZ B CASA 15 CHACARITA ETAPA 1	Municipio:	PIEDECUESTA
Teléfono:	3183141088	Escolaridad:	Primaria_completa
Ocupación:	AYUDANTE DE OBRA	EPS:	SALUD TOTAL EPS
AFP:	PORVENIR	ARL:	NO SABE
RH:	A+		
Responsable**:	ANGIE RUBIO (ESPOSA)	Teléfono:	3183141088
Acompañante:	El trabajador asiste a la evaluación sin acompañante.		



*** La información de responsable se encuentra actualizada de acuerdo a la última suministrada por el paciente en la historia para efectos de un contacto oportuno ante cualquier eventualidad.*

INMUNIZACIONES Relación de biológicos aplicados:

No presenta carnet de vacunación para revisión.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Visiometría: Su capacidad visual es adecuada para la ocupación.
Audiometría: Su capacidad auditiva es adecuada para la ocupación.
Espirometría computarizada: NO APLICA.

CONCLUSIONES OCUPACIONALES

De acuerdo al examen ocupacional realizado a BAUDILLO RIVERA GOMEZ con documento de identificación No. 1093738325 se considera No presenta restricciones para desempeñar la ocupación de AYUDANTE DE OBRA del sector económico Construcción de obras de ingeniería civil

RECOMENDACIONES MEDICAS Y TERAPEUTICAS (Para el manejo de enfermedades generales o comunes)

1. Solicitar en su entidad de salud valoración de su alteración del peso por Nutricionista..
2. Solicitar en su entidad de salud valoración de su alteración metabólica de los carbohidratos..

CONCEPTO MEDICO OCUPACIONAL

NO PRESENTA RESTRICCIONES

OBSERVACIONES FINALES

CLASIFICACIóN EN EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA OSTEOMUSCULAR: De acuerdo con la información disponible y el examen realizado, se clasifica como NO CASO.
RESULTADO DE EXÁMENES DE LABORATORIO CLÍNICO METABÓLICOS: Los siguientes son los resultados de los exámenes de Laboratorio Clínico realizados: - Glucosa en suero: alterado ; - Triglicéridos: Normal; - Colesterol total: Normal.

CONSIDERACIONES OCUPACIONALES ESPECIALES POR PATOLOGÍA METABÓLICA: Su alteración leve del peso constituye una enfermedad metabólica de origen común que NO le genera restricción ocupacional, pero requiere que sea evaluada y manejada en la EPS en que esté afiliado, para su control y seguimiento.

ENFASIS EN EL EXAMEN DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR: En el Examen Médico Ocupacional realizado se hizo una completa revisión de su sistema osteomuscular, extremidades y columna, buscando patologías o secuelas de estas que pudieran constituir un riesgo aumentado para la realización de las actividades de su trabajo habitual, o de aquellas que impliquen posturas forzadas o movimientos repetitivos. Cualquier alteración significativa encontrada se ampliará en el Certificado Médico, con el objeto de definir su estado, implicaciones ocupacionales o la necesidad de tratamiento.



KAREN SOFIA AÑEZ OROZCO
C.C 55305817
Médico Cirujana
Universidad Libre
Especialista en Salud Ocupacional y Riesgos Laborales
U. Manuela Beltrán UMB
Lic. S.O. 00-12012 de 11/08/17



Firma para identificación de usuario
BAUDILLO RIVERA GOMEZ
Documento: 1093738325

Indice der

Escanee el código si desea verificar datos

CONSIDERACIONES LEGALES RELATIVAS A LOS EXAMENES MéDICOS: La Resolución 1843 de 2025 del Ministerio de la Protección Social (actualmente Ministerios de Trabajo y de Salud y Protección Social) reglamentan la práctica y contenido de las evaluaciones médicas ocupacionales, con el objeto de determinar la existencia de restricciones para el trabajo a desempeñar, acorde con los requerimientos definidos por el empleador en el perfil del cargo. También establece que la Empresa solo puede conocer el CERTIFICADO MéDICO correspondiente del aspirante. Los documentos completos de la Historia Clinica Ocupacional están sometidos a reserva profesional y quedan bajo nuestra guarda y custodia, segun lo establecido en la Resolución 1843 de 2025 el trabajador puede obtener una copia de ellos cuando lo requiera, entendiendo que hacen parte integral de su historial médico.

Calle 50 No 28-25 - Piso 3 - Centro Empresarial Sotomayor Bucaramanga - Santander - Colombia PBX: 6351618
www.sandiegoses.com historiasclinicas@sandiegoses.com

Impreso por:
Fecha: 2026-05-29 Hora: 15:59

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901983966
Número Afiliación:	9030857
Razón social:	CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	1093738325
Nombre:	BAUDILLO RIVERA GOMEZ
Fecha Ingreso:	01/06/2026
Salario básico:	1,750,905
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	1
Centro de trabajo:	5
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	29/05/2026 03:57:49 p. m.

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

SaludTotal EPS S

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **BAUDILLO RIVERA GOMEZ** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **1093738325,** se encuentra afiliado/a desde **26/06/2017** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 03 de junio de 2026.



Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
COMFENALCO SANTANDER

PROCESO AFILIACIÓN Y SUBSIDIO

C E R T I F I C A C I Ó N

Fecha: 18/06/2026

Nombre: BAUDILLO RIVERA GOMEZ
Identificación: 1093738325
Categoria: A

Se encuentra afiliado(a) en esta Caja de Compensación Familiar, en calidad de trabajador dependiente del empleador **CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB**, NIT 901983966, desde el 03 de junio del 2026 con fecha de vinculación laboral del 01 de junio del 2026. Y no cuenta con grupo familiar a su cargo.

Se expide a solicitud del interesado.

ALEXANDER GARZÓN VALDERRAMA
Subdirector Aportes y Subsidio

www.comfenalcosantander.com.co

Avenida González
Valencia 52 - 69
Centro de contacto
PBX: 607 657 7000

Bucaramanga, Santander
Colombia
Código Postal
680003

Vigilado Supersubsidio

SANDIEGO
SERVICIOS EN SALUD

CERTIFICADO MÉDICO DE PREINGRESO OCUPACIONAL

Fecha: 2026-05-29

1. INFORMACIÓN GENERAL

Empresa Usuaria:	CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB	Actividad económica:	Construcción de obras de ingeniería civil
Nombre:	DARLIN MARTIN ORDUZ REY	Documento:	CC 1005327109
Fecha de nacimiento:	2001-10-20	Lugar de nacimiento:	BUCARAMANGA (SANTANDER)
Edad:	24 años	Identidad de Género:	Masculino
Estado civil:	Union_libre	No. hijos vivos:	0
Dirección actual:	CARRERA 7 #12-03	Municipio:	PIEDECUESTA
Teléfono:	3143334919	Escolaridad:	Secundaria_incompleta
Ocupación:	AYUDANTE DE OBRA	EPS:	NUEVA EPS
AFP:	NO SABE	ARL:	NO SABE
RH:	O+		
Responsable**:	OLGA (MAMA)	Teléfono:	3142937571
Acompañante:	El trabajador asiste a la evaluación sin acompañante.		



*** La información de responsable se encuentra actualizada de acuerdo a la última suministrada por el paciente en la historia para efectos de un contacto oportuno ante cualquier eventualidad.*

INMUNIZACIONES Relación de biológicos aplicados:

No presenta carnet de vacunación para revisión.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Visiometría: Su capacidad visual es adecuada para la ocupación.
Audiometría: Su capacidad auditiva es adecuada para la ocupación.
Espirometría computarizada: NO APLICA.

CONCLUSIONES OCUPACIONALES

De acuerdo al examen ocupacional realizado a DARLIN MARTIN ORDUZ REY con documento de identificación No. 1005327109 se considera No presenta restricciones para desempeñar la ocupación de AYUDANTE DE OBRA del sector económico Construcción de obras de ingeniería civil

RECOMENDACIONES MEDICO LABORALES

1. Adoptar buena higiene postural..

RECOMENDACIONES MEDICAS Y TERAPEUTICAS (Para el manejo de enfermedades generales o comunes)

No se generan recomendaciones médicas

CONCEPTO MEDICO OCUPACIONAL

NO PRESENTA RESTRICCIONES


OBSERVACIONES FINALES

CLASIFICACIóN EN EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA OSTEOMUSCULAR: De acuerdo con la información disponible y el examen realizado, se clasifica como NO CASO.
RESULTADO DE EXÁMENES DE LABORATORIO CLÍNICO METABÓLICOS: Los siguientes son los resultados de los exámenes de Laboratorio Clínico realizados: - Glucosa en suero: Normal; - Trigliceridos: Normal; - Colesterol total: Normal.

ENFASIS EN EL EXAMEN DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR: En el Examen Médico Ocupacional realizado se hizo una completa revisión de su sistema osteomuscular, extremidades y columna, buscando patologías o secuelas de estas que pudieran constituir un riesgo aumentado para la realización de las actividades de su trabajo habitual, o de aquellas que impliquen posturas forzadas o movimientos repetitivos. Cualquier alteración significativa encontrada se ampliará en el Certificado Médico, con el objeto de definir su estado, implicaciones ocupacionales o la necesidad de tratamiento.



KAREN SOFIA AÑEZ OROZCO
C.C 55305817
Médico Cirujana
Universidad Libre
Especialista en Salud Ocupacional y Riesgos Laborales
U. Manuela Beltrán UMB
Lic. S.O. 00-12012 de 11/08/17



Firma para identificación de usuario
DARLIN MARTIN ORDUZ REY
Documento: 1005327109

Indice der

Escanee el código si desea verificar datos

CONSIDERACIONES LEGALES RELATIVAS A LOS EXAMENES MéDICOS: La Resolución 1843 de 2025 del Ministerio de la Protección Social (actualmente Ministerios de Trabajo y de Salud y Protección Social) reglamentan la práctica y contenido de las evaluaciones médicas ocupacionales, con el objeto de determinar la existencia de restricciones para el trabajo a desempeñar, acorde con los requerimientos definidos por el empleador en el perfil del cargo. También establece que la Empresa solo puede conocer el CERTIFICADO MéDICO correspondiente del aspirante. Los documentos completos de la Historia Clinica Ocupacional están sometidos a reserva profesional y quedan bajo nuestra guarda y custodia, segun lo establecido en la Resolución 1843 de 2025 el trabajador puede obtener una copia de ellos cuando lo requiera, entendiendo que hacen parte integral de su historial médico.

Calle 50 No 28-25 - Piso 3 - Centro Empresarial Sotomayor Bucaramanga - Santander - Colombia PBX: 6351618
www.sandiegoses.com historiasclinicas@sandiegoses.com

Impreso por:
Fecha: 2026-05-29 Hora: 15:59

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901983966
Número Afiliación:	9030857
Razón social:	CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	1005327109
Nombre:	DARLIN MARTIN ORDUZ REY
Fecha Ingreso:	01/06/2026
Salario básico:	1,750,905
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	1
Centro de trabajo:	5
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	29/05/2026 03:53:17 p. m.

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 03/06/2026, el empleador CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB identificado con NIT número 901983966 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
10410111	03/06/2026	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1005327109	DARLINMARTIN ORDUZ REY	1750905	AYUDANTE DE OBRA	2026-06-01

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 3 días del mes de Junio del año 2026.

Cordialmente,



GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR

NIT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

DARLIN MARTIN ORDUZ REY, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.005.327.109**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir y al Fondo de Cesantías Porvenir**.

La presente certificación se expide el 3 de Junio del 2026.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
COMFENALCO SANTANDER

PROCESO AFILIACIÓN Y SUBSIDIO

C E R T I F I C A C I Ó N

Fecha: 18/06/2026

Nombre: DARLIN MARTIN ORDUZ REY
Identificación: 1005327109
Categoria: A

Se encuentra afiliado(a) en esta Caja de Compensación Familiar, en calidad de trabajador dependiente del empleador **CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB**, NIT 901983966, desde el 03 de junio del 2026 con fecha de vinculación laboral del 01 de junio del 2026. Y no cuenta con grupo familiar a su cargo.

Se expide a solicitud del interesado.

ALEXANDER GARZÓN VALDERRAMA
Subdirector Aportes y Subsidio

Comfenalco SANTANDER
Se preocupa por ti.
www.comfenalcosantander.com.co
Avenida González Valencia 52 - 69
Centro de contacto
PBX: 607 657 7000
Bucaramanga, Santander
Colombia
Código Postal
680003

Vigilado Supersubsidio

SANDIEGO SERVICIOS EN SALUD

CERTIFICADO MÉDICO DE PREINGRESO OCUPACIONAL

Fecha: 2026-05-29

1. INFORMACIÓN GENERAL

Empresa Usuaria:	CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB	Actividad económica:	Construcción de obras de ingeniería civil
Nombre:	LUIS EDUARDO CIFUENTES VELAZCO	Documento:	CC 2000006746
Fecha de nacimiento:	1997-04-14	Lugar de nacimiento:	VILLA DEL ROSARIO (NORTE DE SANTANDER)
Edad:	29 años	Identidad de Género:	Masculino
Estado civil:	Union_libre	No. hijos vivos:	2
Dirección actual:	CRA 7 #13-03	Municipio:	PIEDECUESTA
Teléfono:	3243942822	Escolaridad:	Tecnico_completo
Ocupación:	AYUDANTE DE OBRA	EPS:	SANITAS EPS
AFP:	COLPENSIONES	ARL:	SURA
RH:	O+		
Responsable**:	LORIELIS VILLASMIL (ESPOSA)	Teléfono:	3202362126
Acompañante:	El trabajador asiste a la evaluación sin acompañante.		



*** La información de responsable se encuentra actualizada de acuerdo a la última suministrada por el paciente en la historia para efectos de un contacto oportuno ante cualquier eventualidad.*

INMUNIZACIONES Relación de biológicos aplicados:

No presenta carnet de vacunación para revisión.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Visiometría: Su capacidad visual es adecuada para la ocupación.
Audiometría: Su capacidad auditiva es adecuada para la ocupación.
Espirometría computarizada: NO APLICA.

CONCLUSIONES OCUPACIONALES

De acuerdo al examen ocupacional realizado a LUIS EDUARDO CIFUENTES VELAZCO con documento de identificación No. 2000006746 se considera No presenta restricciones para desempeñar la ocupación de AYUDANTE DE OBRA del sector económico Construcción de obras de ingeniería civil

RECOMENDACIONES MEDICAS Y TERAPEUTICAS (Para el manejo de enfermedades generales o comunes)

No se generan recomendaciones médicas

CONCEPTO MEDICO OCUPACIONAL

NO PRESENTA RESTRICCIONES


OBSERVACIONES FINALES

CLASIFICACIóN EN EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA OSTEOMUSCULAR: De acuerdo con la información disponible y el examen realizado, se clasifica como NO CASO.
RESULTADO DE EXÁMENES DE LABORATORIO CLÍNICO METABÓLICOS: Los siguientes son los resultados de los exámenes de Laboratorio Clínico realizados: - Glucosa en suero: Normal; - Triglicéridos: Normal; - Colesterol total: Normal.

ENFASIS EN EL EXAMEN DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR: En el Examen Médico Ocupacional realizado se hizo una completa revisión de su sistema osteomuscular, extremidades y columna, buscando patologías o secuelas de estas que pudieran constituir un riesgo aumentado para la realización de las actividades de su trabajo habitual, o de aquellas que impliquen posturas forzadas o movimientos repetitivos. Cualquier alteración significativa encontrada se ampliará en el Certificado Médico, con el objeto de definir su estado, implicaciones ocupacionales o la necesidad de tratamiento.



KAREN SOFIA AÑEZ OROZCO
C.C 55305817



Firma para identificación de usuario Indice der
LUIS EDUARDO CIFUENTES VELAZCO
Documento: 2000006746

Escanee el código si

Médico Cirujana
Universidad Libre
Especialista en Salud Ocupacional y Riesgos Laborales
U. Manuela Beltrán UMB
Lic. S.O. 00-12012 de 11/08/17

desea verificar datos

CONSIDERACIONES LEGALES RELATIVAS A LOS EXAMENES MéDICOS: La Resolución 1843 de 2025 del Ministerio de la Protección Social (actualmente Ministerios de Trabajo y de Salud y Protección Social) reglamentan la práctica y contenido de las evaluaciones médicas ocupacionales, con el objeto de determinar la existencia de restricciones para el trabajo a desempeñar, acorde con los requerimientos definidos por el empleador en el perfil del cargo. También establece que la Empresa solo puede conocer el CERTIFICADO MéDICO correspondiente del aspirante. Los documentos completos de la Historia Clinica Ocupacional están sometidos a reserva profesional y quedan bajo nuestra guarda y custodia, segun lo establecido en la Resolución 1843 de 2025 el trabajador puede obtener una copia de ellos cuando lo requiera, entendiendo que hacen parte integral de su historial médico.

Calle 50 No 28-25 - Piso 3 - Centro Empresarial Sotomayor Bucaramanga - Santander - Colombia **PBX: 6351618**
www.sandiegoses.com historiasclinicas@sandiegoses.com

Impreso por:
Fecha: 2026-05-29 Hora: 16:00

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901983966
Número Afiliación:	9030857
Razón social:	CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	2000006746
Nombre:	LUIS EDUARDO CIFUENTES VELAZCO
Fecha Ingreso:	01/06/2026
Salario básico:	1,750,905
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	1
Centro de trabajo:	5
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	29/05/2026 03:49:11 p. m.

EPS Sanitas

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Fecha de Radicado

(Lea las instrucciones que se encuentran al respaldo antes de diligenciar este formulario)

I DATOS DEL TRÁMITE

1. Tipo de Trámite: A. Afiliación X B. Reporte de Novedades
2. Tipo de Afiliado: A. Individual Cotizante o Cabeza de Familia X B. Colectivo C. Institucional D. Sin Labor Beneficiario o Afiliado adicional
3. Régimen: A. Contributivo X D. Subsidiado
4. Contribución solidaria: SI NO
5. Tipo de Afiliado: A. Cotizante X B. Cabeza de Familia C. Beneficiario D. Afiliado adicional
6. Tipo de Cotizante: A. Dependiente X B. Independiente G. Pensionado
7. Código (a registrar por la EPS)

II DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante, cabeza de familia o beneficiario cuando aplique o afiliado adicional)

8. Apellidos y nombres

Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
cifuentes	Velazco	luis	Eduardo

9. Tipo de documento de identidad	10. Número del documento de identidad	11. Sexo biológico	12. Sexo identificación	13. Nacionalidad
Cedula ciudadania	2.000.006.766	Femenino Masculino X	F M X T NB Otro Cual	colombiano

14. Lugar de nacimiento	País	Departamento	Municipio	15. Fecha de nacimiento
Villa del Rosario	colombia	Nte. santander	Villa del Rosario	14 04 1991

III DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos Personales

16. Etnia	17. Comunidad	18. Discapacidad SI NO	Categoría de discapacidad visual	19. Tiene encuesta SISBÉN SI NO	20. Clasificación SISBÉN Nivel	Grupo	21. Grupo de población especial

22. Administradora de Riesgos Laborales - ARL	23. Administradora de Pensiones	24. Ingreso base de cotización - IBC	25. Tarifa Contribución Solidaria
Axa colpatria	Colpensiones	1'750.905	

26. Residencia: Dirección: CRA 7 12 03 Teléfono Fijo

Teléfono Celular: 3243942822 Correo Electrónico: lafuentes284@gmail.com

Departamento	Municipio / Distrito	Localidad / Comuna	Zona: Cabecera Municipal / Centro Poblado	Rural Disperso / Resto Rural
Santander	Piedecuesta	candelaria	X	

IV DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos Básicos de identificación del Cónyuge o compañero(a) permanente del cotizante

27. Apellidos y nombres

Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

28. Tipo de documento de identidad	29. Número del documento de identidad	30. Sexo biológico Femenino Masculino	31. Sexo identificación F M T NB Otro	Cual	32. Nacionalidad

33. Lugar de nacimiento: País Departamento Municipio 34. Fecha de nacimiento

Datos Básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	35. Apellidos y nombres: Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	36. Tipo de documento de identidad	37. Número del documento de identidad	38. Nacionalidad	39. Sexo biológico Femenino Masculino	40. Sexo identificación F M T NB Otro Cual	41. Lugar de nacimiento País Departamento Municipio	42. Fecha de nacimiento
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

Datos complementarios del Beneficiario

	43. Parentesco	44. Etnia	45. Escolaridad	46. Grupo de población especial	47. Tiene encuesta SISBÉN SI NO	48. Clasificación SISBÉN Nivel Grupo	49. Discapacidad SI NO Categoría de discapacidad	50. Incapacidad permanente SI NO
B1								
B2								
B3								
B4								
B5								

51. Datos de residencia

	Departamento	Municipio / Distrito	Zona: Cabecera Municipal / Centro Poblado / Rural Disperso / Resto Rural	Teléfono fijo y/o celular	52. Lugar de SISBÉN (Municipio donde se encuentra)
B1					
B2					
B3					
B4					
B5					

	Dirección	Localidad / Comuna	Barrio / Vereda
B1			
B2			
B3			
B4			
B5			

A. AFILIACIÓN

ADM - [illegible]

30. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS

C		34. Código de la IPS (Asignado por la EPS)
01		
02		
03		
04		
05		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL APORTANTE O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA O RESPONSABLES DEL PAGO

35. Nombre o razón social: Mitigacion Ambiental | 36. Tipo documento de identificación: NIT | 37. Número del documento de identificación: 901983966-5 | 38. Tipo de aportante o cotizante de Pensiones (si requiere por la EPS)

39. Ubicación
Dirección: Centro Industrial San Jorge - Bodega 16. | Teléfono fijo o Celular: 6459859
Correo Electrónico: contratacion@dsyingenieria.com.co | Departamento: Santander | Municipio / Distrito: Girón

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- ☐ 1. Modificación de datos básicos de identificación.
- ☐ 2. Corrección de datos básicos de identificación.
- ☐ 3. Actualización del documento de identificación
- ☐ 4. Actualización y corrección de datos complementarios.
- ☐ 5. Terminación de la inscripción en la EPS. Código: ____
- ☐ 6. Reporte de pago a través de un tercero. Código: ____
- ☐ 7. Inclusión de beneficiarios o de nuevos aportantes
- ☐ 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☒ 9. Retiro por relación laboral o cumplimiento de condiciones para pensionado
- ☐ 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando.
- ☐ 11. Inscripción + (2) retiro en pila
- ☐ 12. Vinculación a una entidad Administradora que realiza afiliaciones colectivas
- ☐ 13. Desvinculación de una entidad administradora que realiza afiliaciones colectivas
- ☐ 14. Movilidad: ☐ A. Régimen Contributivo ☐ B. Régimen Subsidiado
- ☐ 15. Traslado: ☐ A. Mismo Régimen ☐ B. Diferente Régimen
- ☐ 16. Reporte de Vinculación del Cónyuge o Cónyuge de hecho
- ☐ 17. Reporte cotizante no pensionado al pasivo
- ☐ 18. Pérdida de la calidad de Pensionado
- ☐ 19. Reporte de la calidad de Pensionado
- ☐ 20. Inclusión a Contribución Solidaria
- ☐ 21. Retiro de Contribución Solidaria

VI. DATOS ACTUALIZADOS AL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación
Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	43. Sexo biológico: Femenino / Masculino	44. Sexo identificación: F / M / I / NR	Cual	45. Fecha de nacimiento

46. EPS anterior	47. Fecha de novedad	48. Motivo de traslado: Código	49. Caja de compensación Familiar o pagador de pensiones
	01/06/2016		

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- ☐ 50. Declaraciones de dependientes económicos de los beneficiarios y afiliados adicionales
- ☐ 51. Declaración de no cotización al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
- ☐ 52. Declaración de no cotización en mora o cuya mora se origina en el pago de los documentos que soportan la condición de pensionado.
- ☐ 53. Declaración de no inclusión del cónyuge, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
- ☒ 54. Autorización para que la EPS solicite y obtenga del (los) copia de la historia clínica del cónyuge o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales
- ☒ 55. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones lo requieran
- ☒ 56. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del nacimiento o retiro de la(s) beneficiario(s) mediante mensajes de texto y/o correo electrónico de conformidad con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013
- ☒ 57. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como Mensajes de Texto.
- ☒ 58. Aceptación de las condiciones para inscribirse a la Contribución Solidaria y de realizar los pagos correspondientes.
- ☒ 59. Aceptación de la actualización del grupo familiar y las tarifas en Contribución Solidaria, según la encuesta del Sisbén vigente.

VIII. CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA

78. En caso de muerte o fallecimiento del cabeza de familia reporte la persona de su grupo familiar que se hará cargo del pago de la Contribución Solidaria
Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre | Fecha de nacimiento del cotizante | No. de documento de identidad

IX. FIRMAS

80. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario cuando aplique o afiliado adicional
Luis Cifuentes

81. Aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de Oficio
Contratación

X. ANEXOS

- ☐ 82. Anexo copia del documento de identidad. Cantidad de documentos de identidad anexos: CN RC TI CC CE PA CD SC PT
- ☐ 83. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente
- ☐ 84. Copia del registro civil de nacimiento, o de la escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital de
- ☐ 85. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- ☐ 86. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
- ☐ 87. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
- ☐ 88. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración jurada por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.
- ☐ 89. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud numeral 4 y 5 del artículo 2.1.7.3 del Decreto 780 de 2016.
- ☐ 90. Certificación de vinculación a una entidad administradora para realizar afiliaciones colectivas.
- ☐ 91. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

Total Anexos

XI. DATOS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL O LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE POBLACIÓN ESPECIAL

92. Nombre de la Entidad Territorial | Código del municipio | Código del departamento | 93. Nombre de la Institución

XII. DATOS DEL FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD TERRITORIAL O DE LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE POBLACIÓN ESPECIAL

94. Apellidos y nombres
Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	96. Firma del funcionario	97. Fecha de radicación	98. Fecha de validación

OBSERVACIONES

Recuerde que con la firma del formulario el Afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario

Doc. Identificación y nombre del Ejecutivo Comercial	Sello de Radicación	Sector presupuestado

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **LUIS EDUARDO CIFUENTES VELAZCO** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **2000006746,** se encuentra afiliado/a desde **17/01/2022** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 03 de junio de 2026.



Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Comfenalco SANTANDER
Se preocupa por ti.
N.I.T 890.201.578-7

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DEL TRABAJADOR DEPENDIENTE

Canal de recepción: PLATAFORMA WEB

Radicado No.
Fecha de creación : 04/06/2026 12:34:43 PM
Fecha de radicación : 04/06/2026 12:34:00 PM
ITD_202606041234_2000006746

1. DATOS DEL EMPLEADOR

Documento de identificación		Razón social
NIT 901983966	5 D.V	CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB

Sucursal	Agencia
PRI - CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB	PRINCIPAL

2. DATOS DEL TRABAJADOR

Documento de identificación	Fecha de expedición	Lugar de expedición		Fecha de nacimiento
CC 2.000.006.746	2021/10/26	SANTANDER	PIEDECUESTA	1997/04/14

Nombres y apellidos			
LUIS	EDUARDO	CIFUENTES	VELAZCO

Sexo	Estado civil	Dirección y barrio de residencia	
MASCULINO	UNIÓN LIBRE	CR 7 12 03	LA CANDELARIA

Municipio y departamento de residencia		Zona de residencia	Teléfono fijo	Teléfono celular
PIEDECUESTA	SANTANDER	URBANA		3243942822

Correo electrónico	Nivel de escolaridad
LCIFUENTES284@GMAIL.COM	MEDÍA (10° A 11°)

3. INFORMACIÓN DE VINCULACIÓN LABORAL

Fecha de inicio	Cargo actual
2026/06/01	

¿Trabajador servicio doméstico?	Jornada laboral	Tipo de salario	Salario básico mes	Comisiones mes	Salario/ingreso total mes
NO	TIEMPO COMPLETO	FIJO	1,750,905		1,750,905

Municipio y departamento del lugar de trabajo		Zona del lugar de trabajo
BUCARAMANGA	SANTANDER	URBANA

4. DATOS DEL CÓNYUGE O COMPAÑERO(A) PERMANENTE

Documento de identificación	Fecha de expedición	Lugar de expedición		Fecha de nacimiento
PT 6557982	2022/03/25	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	1997/07/16

Nombres y apellidos			
LORIELI	JOSELIN	VILLASMIL	NOGUERA

Sexo	Municipio y departamento de residencia		Zona de residencia	Ocupación
FEMENINO	PIEDECUESTA	SANTANDER	URBANA	HOGAR

Razón social de la empresa o nombre del pagador de la pensión	Salario/ingreso total mes	¿Recibe subsidio en dinero?	¿En cúal Caja de Compensación Familiar?
		NO	

5. DATOS DE PERSONAS A CARGO

Documento de identificación	Nombres y apellidos				Fecha de nacimiento	Municipio y departamento residencia		Zona de residencia	Sexo M, F o NB	Parentesco	Estudiante Solo si aplica	Nivel de escolaridad	Certificado de Discapacidad
PT 7127714	LUIS	SANTIAGO	CIFUENTES	PENALOZA	2015/11/03	PIEDECUESTA	SANTANDER	URBANA	M	1	X	2	

Medio de pago	BANCO DAVIVIENDA	¿Cuenta con certificado bancario?	NO	Tipo de cuenta		Número de cuenta	

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS

1. TIPO DE DOCUMENTO
(N.I.T) Número de identificación tributaría
(T.I) Tarjeta de identidad
(C.C) Cédula de ciudadanía
(P.A) Pasaporte
(R.C) Registro civil
(C.E) Cédula de extranjería
(P.T) Permiso por protección temporal
(C.D) Carné diplomático

2. SEXO
(F) Femenino
(M) Masculino
(NB) No binario

3. PARENTESCO
1. Hijo(a)
2. Padre/Madre
3. Hermano(a)
4. Hijastro(a)
5. Dependiente por custodia legal o judicial

4. NIVEL DE ESCOLARIDAD
1. Preescolar
2. Básica (1° a 5°)
3. Secundaria (6° a 9°)
4. Media (10° a 11°)
5. Básica adultos (1° a 5°)
6. Secundaria adultos (6° a 9°)
7. Media adultos (10° a 11°)
8. Primera infancia
9. Técnico/Tecnológico
10. Profesional universitario
11. Posgrado/Maestría
12. Ninguno

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES (TDP)
Al diligenciar este formulario autorizo a la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Santander, ubicada en la Avenida González Valencia No. 52-69 de Bucaramanga y con teléfono de contacto 607 6577000, para que recolecte, almacene, use, circule y/o suprima mis datos personales y los de mis representados, consignados en este medio y en sus anexos, incluyendo el consentimiento para tratar datos sensibles y de menores de edad, aun conociendo que no estoy obligado a autorizar su tratamiento, con el fin de que sean consultados y reportados en centrales de riesgo, transmitidos y transferidos nacional e internacionalmente, usados para contactarme para adelantar gestiones de cobro y/o enviar mensajes publicitarios o comerciales, a través de los canales: correo electrónico, correspondencia, llamada telefónica, aplicaciones web y mensajes SMS; y en general para las demás finalidades incorporadas en la Política de Tratamiento de Información disponible en www.comfenalcosantander.com.co la cual declaro conocer y saber que en esta se especifican cuáles datos sensibles. Así mismo, conozco que como titular me asisten los derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mis datos y revocar la autorización. Igualmente declaro que poseo autorización de los otros titulares de datos que suministro (Beneficiarios, Grupo Familiar, Dependientes, entre otros), para que Comfenalco Santander les dé tratamiento conforme a las finalidades consignadas en la Política mencionada.

DECLARACIÓN DE VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN (DVI)
Bajo gravedad de juramento declaramos que los datos relacionados en este formulario son exactos, verídicos y corresponden a la conformación actual del grupo familiar del trabajador, aceptando que esta información es la que quedará registrada en la afiliación en Comfenalco Santander.

Señor trabajador:
Conserve esta copia como soporte del trámite de radicación de su inscripción.

CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB
Firma del empleador
Número documento empleador 901983966

LUIS EDUARDO CIFUENTES VELAZCO
Firma del trabajador
Número documento trabajador 2.000.006.746

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-07-08, 12:29:09 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2026
Empresa	JULIAN ANDRES SERRANO GOMEZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 13870690
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1083126087
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	463342144
Banco	(1052) - BANCO AV VILLAS
Valor	$ 16.397.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 7.879.200	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	$ 5.471.600	$ 0
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	$ 3.046.600	$ 0
		SubTotales:		$ 16.397.400	$ 0
		Total a Pagar:			$ 16.397.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-07-08, 01:27:54 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1083126087

Periodo Cotización: junio de 2026 **Periodo Servicio:** junio de 2026

PAGADO 08/07/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JULIAN ANDRES SERRANO GOMEZ		
Documento	CC13870690	**Dirección**	CR 26 #36 - 14 OFICINA 403
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6914305
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 13870690	JULIAN ANDRES SERRANO GOMEZ	57	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 43.772.625	$ 7.879.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 43.772.625	$ 5.471.600	6,960	$ 43.772.625	$ 3.046.600	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.397.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 43.772.625	$ 43.772.625	$ 43.772.625	$ 0	$ 7.879.200	$ 5.471.600	$ 3.046.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.397.400	$ 0	$ 16.397.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-06-24, 06:34:22 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2026
Empresa	LISSETTH XIMENA NIÑO CARVAJAL
CEDULA CIUDADANIA	CC 63395720
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1082266370
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	418798595
Banco	(1507) - NEQUI
Valor	$ 649.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 335.700	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 262.200	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 51.100	$ 0
		SubTotales:		$ 649.000	$ 0
		Total a Pagar:			$ 649.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-07-08, 01:41:24 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1082266370

Periodo Cotización: junio de 2026 **Periodo Servicio:** junio de 2026

PAGADO 24/06/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LISSETTH XIMENA NIÑO CARVAJAL		
Documento	CC63395720	**Dirección**	CR 26 #36 - 14
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6914305
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 63395720	LISSETTE XIMENA NIÑO CARVAJAL	59	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.097.511	$ 335.700	(EPS010) EPS SURA	$ 2.097.511	$ 262.200	2,436	$ 2.097.511	$ 51.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 649.000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.097.511	$ 2.097.511	$ 2.097.511	$ 0	$ 335.700	$ 262.200	$ 51.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 649.000	$ 0	$ 649.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-07-02, 04:03:21 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2026
Empresa	MAQUINOBRAS
NIT	NI 900849507
Código Sucursal (Nombre)	01 (MAQUINOBRAS)
Referencia de Pago/ Número Planilla	1083143703
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	443760937
Banco	(1023) - BANCO DE OCCIDENTE
Valor	$ 63.403.100
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	30	$ 13.254.500	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	15	$ 7.104.900	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	19	$ 10.476.900	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	4	$ 1.957.300	$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	1	$ 521.800	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	16	$ 1.829.400	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	8	$ 1.231.800	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	2	$ 261.000	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	16	$ 1.674.200	$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	1	$ 70.200	$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	8	$ 814.200	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	3	$ 220.200	$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	1	$ 200.100	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	14	$ 1.986.600	$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	$ 81.600	$ 0
N860002183	14-4	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	70	$ 13.422.100	$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	70	$ 8.296.300	$ 0
		SubTotales:		$ 63.403.100	$ 0
		Total a Pagar:			$ 63.403.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-07-02, 04:11:21 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1083143703

Periodo Cotización: junio de 2026 **Periodo Servicio:** julio de 2026

PAGADO 02/07/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MAQUINOBRAS	**Nombre Sucursal**	MAQUINOBRAS	**Código Sucursal**	01
Documento	NI900849507	**Dirección**	AV 0 #22 - 31 CENTRO IND SAN JORGE BD 16		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6914305		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER		
Representante Legal	SERRANO GOMEZ JULIAN ANDRES	**Identificación**	CC 13870690		
Total Afiliados	70	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1005209676	LUISA FERNANDA AREVALO PULIDO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.250.000	$ 360.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.250.000	$ 90.000	6,960	$ 2.250.000	$ 156.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.250.000	$ 90.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 696.600
CC 1005289460	ANA MARIA GIRALDO ARENAS	01	00																	0	29	29	29	29	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.692.542	$ 270.900	(EPS010) EPS SURA	$ 1.692.542	$ 67.800	6,960	$ 1.692.542	$ 117.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.692.542	$ 67.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 524.400
CC 1005289460	ANA MARIA GIRALDO ARENAS	01	00														L			0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 58.364	$ 9.400	(EPS010) EPS SURA	$ 58.364	$ 2.400	0,000	$ 58.364	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.200
CC 1037479814	JESUS ALBERTO MEDRANO LANZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.385.738	$ 541.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 3.385.738	$ 135.500	6,960	$ 3.385.738	$ 235.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.385.738	$ 135.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.048.500
CC 1063562221	MAURICIO ANDRES BECERRA ORTIZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.790.774	$ 446.600	(EPS010) EPS SURA	$ 2.790.774	$ 111.700	6,960	$ 2.790.774	$ 194.300	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.790.774	$ 111.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 864.300
CC 1085047138	MILTON JOSE DIAZ RIBON	01	00										X							0	22	22	22	22	(230201) PROTECCION	$ 2.761.052	$ 441.800	(EPS046) SALUD MIA EPS046	$ 2.761.052	$ 110.500	6,960	$ 2.761.052	$ 192.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.761.052	$ 110.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 855.000
CC 1085047138	MILTON JOSE DIAZ RIBON	01	00														X			0	8	8	8	8	(230201) PROTECCION	$ 974.874	$ 156.000	(EPS046) SALUD MIA EPS046	$ 974.874	$ 39.000	0,000	$ 974.874	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 766.656	$ 30.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 225.700
CC 1094282858	RAFAEL EDUARDO CASTRO ESTEBAN	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1095786179	OSCAR JULIAN PALOMINO DUARTE	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.000.992	$ 480.200	(EPS010) EPS SURA	$ 3.000.992	$ 120.100	6,960	$ 3.000.992	$ 208.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.000.992	$ 120.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 929.300
CC 1095798988	SERGIO ANDRES OROSTEGUI ARDILA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.800.000	$ 72.000	6,960	$ 1.800.000	$ 125.300	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 557.300
CC 1095808270	SERGIO ANDRES PORRAS VILLAMIZAR	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 3.419.709	$ 547.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 3.419.709	$ 136.800	6,960	$ 3.419.709	$ 238.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.419.709	$ 136.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.058.900
CC 1095814603	RUBEN DARIO BAUTISTA CONTRERAS	01	00										X							0	28	28	28	28	(230201) PROTECCION	$ 2.284.091	$ 365.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.284.091	$ 91.400	6,960	$ 2.284.091	$ 159.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.284.091	$ 91.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 707.300
CC 1095814603	RUBEN DARIO BAUTISTA CONTRERAS	01	00											X						0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 82.415	$ 9.900	(EPS005) EPS SANITAS	$ 82.415	$ 0	0,000	$ 82.415	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.900
CC 1095814603	RUBEN DARIO BAUTISTA CONTRERAS	01	00											X						0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 82.415	$ 9.900	(EPS005) EPS SANITAS	$ 82.415	$ 0	0,000	$ 82.415	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.900
CC 1095828352	ENDER GIOVANY RINCON JAIMES	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.446.773	$ 391.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.446.773	$ 97.900	6,960	$ 2.446.773	$ 170.300	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.446.773	$ 97.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 757.600
CC 1095832559	DEIVER FABIAN LOPEZ PADILLA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 3.103.977	$ 496.700	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 3.103.977	$ 124.200	6,960	$ 3.103.977	$ 216.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.103.977	$ 124.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 961.200
CC 1095909154	FREDDY ALEXANDER GALVIS MUÑOZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.314.348	$ 530.300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 3.314.348	$ 132.600	6,960	$ 3.314.348	$ 230.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.314.348	$ 132.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.026.200
CC 1095924911	EDWIN EDUARDO PEREZ TOBO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1095947638	LIZETH YOLANDA PEREZ PRADO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS046) SALUD MIA EPS046	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 02/07/2026 **Empresa NI900849507 MAQUINOBRAS** **Planilla Nro: 1083143703** **Periodo Cotización: junio de 2026** **Periodo Servicio: julio de 2026**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1095947756	JAIRO ANDRES GARCIA DOMINGUEZ	01	00	X																0	29	29	29	29	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.416.667	$ 386.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.416.667	$ 96.700	6,960	$ 2.416.667	$ 168.300	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.416.667	$ 96.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 748.400
CC 1095947756	JAIRO ANDRES GARCIA DOMINGUEZ	01	00													L				0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 83.333	$ 13.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 83.333	$ 3.400	0,000	$ 83.333	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 83.333	$ 3.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.200
CC 1096214445	MIGUEL ANGEL ALVAREZ ESCANDON	01	00									X								0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.779.982	$ 604.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 3.779.982	$ 151.200	6,960	$ 3.779.982	$ 263.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.779.982	$ 151.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.170.300
CC 1096249196	JUAN FELIPE GUAYARA RAMOS	01	00									X								0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.175.000	$ 348.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.175.000	$ 87.000	6,960	$ 2.175.000	$ 151.400	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.175.000	$ 87.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 673.400
CC 1098636620	EDGAR IVAN PALOMINO HOLGUIN	01	00																	0	29	29	29	29	(231001) COLFONDOS	$ 2.900.000	$ 464.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.900.000	$ 116.000	6,960	$ 2.900.000	$ 201.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.900.000	$ 116.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 897.900
CC 1098636620	EDGAR IVAN PALOMINO HOLGUIN	01	00													L				0	1	1	1	1	(231001) COLFONDOS	$ 100.000	$ 16.000	(EPS010) EPS SURA	$ 100.000	$ 4.000	0,000	$ 100.000	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 100.000	$ 4.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.000
CC 1098636979	LUIS ALBERTO RIVERA PEÑUELA	01	00									X								0	22	22	22	22	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.094.091	$ 335.100	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.094.091	$ 83.800	6,960	$ 2.094.091	$ 145.800	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.094.091	$ 83.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 648.500
CC 1098636979	LUIS ALBERTO RIVERA PEÑUELA	01	00													X				0	8	8	8	8	(25-14) COLPENSIONES	$ 749.195	$ 119.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 749.195	$ 30.000	0,000	$ 749.195	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 711.850	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.400
CC 1098664993	YURIS MILADYS ESCOBAR MEDINA	01	00																	0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 1.692.542	$ 270.900	(EPS046) SALUD MIA EPS046	$ 1.692.542	$ 67.800	0,522	$ 1.692.542	$ 8.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.692.542	$ 67.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 415.400
CC 1098664993	YURIS MILADYS ESCOBAR MEDINA	01	00													L				0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 58.364	$ 9.400	(EPS046) SALUD MIA EPS046	$ 58.364	$ 2.400	0,000	$ 58.364	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.200
CC 1098681601	ALEJANDRO LOAIZA GUTIERREZ	01	00																	0	29	29	29	29	(230901) OLD MUTUAL SKANDIA	$ 3.152.300	$ 504.400	(EPS010) EPS SURA	$ 3.152.300	$ 126.100	6,960	$ 3.152.300	$ 219.500	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.152.300	$ 126.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 976.100
CC 1098681601	ALEJANDRO LOAIZA GUTIERREZ	01	00													L				0	1	1	1	1	(230901) OLD MUTUAL SKANDIA	$ 108.700	$ 17.400	(EPS010) EPS SURA	$ 108.700	$ 4.400	0,000	$ 108.700	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 108.700	$ 4.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.200
CC 1098695301	JHOHAIDER HENAO CASTRILLON	01	00									X								0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.077.898	$ 492.500	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 3.077.898	$ 123.200	6,960	$ 3.077.898	$ 214.300	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.077.898	$ 123.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 953.200
CC 1098714157	YEFERSON ACEVEDO SUAREZ	01	00									X								0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 3.054.631	$ 488.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 3.054.631	$ 122.200	6,960	$ 3.054.631	$ 212.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.054.631	$ 122.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 945.900
CC 1098717464	YESICA PAOLA MURILLO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.657.880	$ 425.300	(EPS046) SALUD MIA EPS046	$ 2.657.880	$ 106.400	0,522	$ 2.657.880	$ 13.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.657.880	$ 106.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 652.000
CC 1098732608	JHON JAIRO MARTINEZ HENAO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.669.436	$ 427.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.669.436	$ 106.800	6,960	$ 2.669.436	$ 185.800	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.669.436	$ 106.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 826.600
CC 1098746750	EDER ESNEIDER GARCIA MARTINEZ	01	00																	0	24	24	24	24	(230201) PROTECCION	$ 2.800.000	$ 448.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.800.000	$ 112.000	6,960	$ 2.800.000	$ 194.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.800.000	$ 112.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 866.900
CC 1098746750	EDER ESNEIDER GARCIA MARTINEZ	01	00													X				0	6	6	6	6	(230201) PROTECCION	$ 700.000	$ 112.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 700.000	$ 28.000	0,000	$ 700.000	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 700.000	$ 28.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 168.000
CC 1098748181	DARLY PAOLA PEÑARANDA RODRIGUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.000.000	$ 640.000	(EPS046) SALUD MIA EPS046	$ 4.000.000	$ 160.000	6,960	$ 4.000.000	$ 278.400	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.238.400
CC 1098753057	JHONATAN ALBERTO GIRALDO ARENAS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.192.314	$ 510.800	(EPS010) EPS SURA	$ 3.192.314	$ 127.700	6,960	$ 3.192.314	$ 222.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.192.314	$ 127.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 988.400
CC 1098757795	JULIAN ANDRES ALVAREZ PINZON	01	00																	0	27	27	27	27	(230201) PROTECCION	$ 1.620.000	$ 259.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.620.000	$ 64.800	6,960	$ 1.620.000	$ 112.800	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.620.000	$ 64.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 501.600
CC 1098757795	JULIAN ANDRES ALVAREZ PINZON	01	00												X					0	3	3	3	3	(230201) PROTECCION	$ 178.365	$ 28.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 178.365	$ 7.200	0,000	$ 178.365	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 178.365	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.800
CC 1098760722	JHON ALEXANDER GONZALEZ RIVERA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.640.782	$ 582.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 3.640.782	$ 145.700	6,960	$ 3.640.782	$ 253.400	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.640.782	$ 145.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.127.400
CC 1098773024	JOSE FERNEY PICO VALERO	01	00	X																0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 676.667	$ 108.300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 676.667	$ 27.100	6,960	$ 676.667	$ 47.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 676.667	$ 27.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 209.600
CC 1098789071	MAIRA ALEJANDRA PEREZ SANDOVAL	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1098797670	FRANCY VANESSA CAICEDO GONZALEZ	01	00																	0	29	29	29	29	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.585.833	$ 413.800	(EPS010) EPS SURA	$ 2.585.833	$ 103.500	6,960	$ 2.585.833	$ 180.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.585.833	$ 103.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 800.800
CC 1098797670	FRANCY VANESSA CAICEDO GONZALEZ	01	00													L				0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 89.128	$ 14.300	(EPS010) EPS SURA	$ 89.128	$ 3.600	0,000	$ 89.128	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 89.167	$ 3.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.500
CC 1098801120	JORGE IVAN HERNANDEZ DELGADO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1098803975	DIEGO MAURICIO NIÑO MECON	01	00																	0	29	29	29	29	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.585.833	$ 413.800	(EPS010) EPS SURA	$ 2.585.833	$ 103.500	6,960	$ 2.585.833	$ 180.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.585.833	$ 103.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 800.800
CC 1098803975	DIEGO MAURICIO NIÑO MECON	01	00													L				0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 89.167	$ 14.300	(EPS010) EPS SURA	$ 89.167	$ 3.600	0,000	$ 89.167	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 89.167	$ 3.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.500
CC 1098822060	SANTIAGO SERRANO TRUJILLO	01	00																	0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 3.383.333	$ 541.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.383.333	$ 135.400	6,960	$ 3.383.333	$ 235.500	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.383.333	$ 135.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.047.700
CC 1098822060	SANTIAGO SERRANO TRUJILLO	01	00													L				0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 116.667	$ 18.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 116.667	$ 4.700	0,000	$ 116.667	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 116.667	$ 4.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.100
CC 1099622802	MARLON DAVID TOLOZA BARRIOS	01	00																	0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 641.999	$ 102.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 641.999	$ 25.700	6,960	$ 641.999	$ 44.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 641.999	$ 25.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 198.900
CC 1099622802	MARLON DAVID TOLOZA BARRIOS	01	00												X					0	19	19	19	19	(230301) PORVENIR	$ 1.108.908	$ 177.500	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.108.908	$ 44.400	0,000	$ 1.108.908	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.108.908	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 221.900
CC 1100890118	MAURICIO SUAREZ PEDRAZA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS046) SALUD MIA EPS046	$ 2.000.000	$ 80.000	6,960	$ 2.000.000	$ 139.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.200
CC 1100952471	EDER ANDRES GARCIA LOPEZ	01	00									X								0	28	28	28	28	(230201) PROTECCION	$ 2.402.586	$ 384.500	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.402.586	$ 96.200	6,960	$ 2.402.586	$ 167.300	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.402.586	$ 96.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 744.200
CC 1100952471	EDER ANDRES GARCIA LOPEZ	01	00												X					0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION	$ 170.061	$ 27.300	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 170.061	$ 6.900	0,000	$ 170.061	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 170.061	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34.200
CC 1102350911	JOHN ALEJANDRO PEREZ ARANGO	01	00									X								0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.611.364	$ 417.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.611.364	$ 104.500	6,960	$ 2.611.364	$ 181.800	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.611.364	$ 104.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 808.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 02/07/2026 **Empresa NI900849507 MAQUINOBRAS** **Planilla Nro: 1083143703** **Periodo Cotización: junio de 2026** **Periodo Servicio: julio de 2026**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1102351122	SANDRA MILENA GUTIERREZ BECERRA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1102383610	URIEL ALONSO RIVERA BARAJAS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 2.000.000	$ 80.000	6,960	$ 2.000.000	$ 139.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.200
CC 1102389388	JONATAN RAMIRO CORDOBA CADENA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.376.000	$ 380.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.376.000	$ 95.100	6,960	$ 2.376.000	$ 165.400	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.376.000	$ 95.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 735.800
CC 1102391061	JHON FREDY AZA DIAZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.195.640	$ 351.400	(EPS046) SALUD MIA EPS046	$ 2.195.640	$ 87.900	0,522	$ 2.195.640	$ 11.500	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.195.640	$ 87.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 538.700
CC 1193513547	ANGELA TATIANA MANTILLA CAICEDO	01	00													L				0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 58.364	$ 9.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 58.364	$ 2.400	0,000	$ 58.364	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.200
CC 1193513547	ANGELA TATIANA MANTILLA CAICEDO	01	00																	0	29	29	29	29	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.692.542	$ 270.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.692.542	$ 67.800	0,522	$ 1.692.542	$ 8.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.692.542	$ 67.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 415.400
CC 13724968	WILINTON PEREZ BARON	01	00	X																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 13745185	JAVIER HUMBERTO DIAZ GOMEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 5.097.095	$ 815.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 5.097.095	$ 203.900	6,960	$ 5.097.095	$ 354.800	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 5.097.095	$ 203.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.578.200
CC 13862051	DIEGO ANTONIO LOPEZ SANTAMARIA	01	00																	0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 5.000.000	$ 800.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 5.000.000	$ 200.000	6,960	$ 5.000.000	$ 348.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 5.000.000	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.548.000
CC 13862051	DIEGO ANTONIO LOPEZ SANTAMARIA	01	00														L			0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 200.000	$ 32.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 200.000	$ 8.000	0,000	$ 200.000	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 200.000	$ 8.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48.000
CC 13862051	DIEGO ANTONIO LOPEZ SANTAMARIA	01	00														X			0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 800.000	$ 128.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 800.000	$ 32.000	0,000	$ 800.000	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 800.000	$ 32.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 192.000
CC 13873494	JESUS ALEXIS MANTILLA AMADO	01	00									X								0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 5.259.436	$ 841.600	(EPS010) EPS SURA	$ 5.259.436	$ 210.400	6,960	$ 5.259.436	$ 366.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 5.259.436	$ 210.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.628.500
CC 26719394	CARMEN EDITH CORTES CALDERON	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 7.030.400	$ 1.195.300	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 7.030.400	$ 281.300	6,960	$ 7.030.400	$ 489.400	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 7.030.400	$ 281.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.247.300
CC 37535732	ALBA LORENA VELASCO GOMEZ	01	00		X															0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 7.000.000	$ 1.120.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 7.000.000	$ 280.000	6,960	$ 7.000.000	$ 487.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 7.116.667	$ 284.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.171.900
CC 37750630	LINETH MARITZA RODRIGUEZ VEGA	01	00																	0	29	29	29	29	(231001) COLFONDOS	$ 3.094.208	$ 495.100	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 3.094.208	$ 123.800	6,960	$ 3.094.208	$ 215.400	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.094.208	$ 123.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 958.100
CC 37750630	LINETH MARITZA RODRIGUEZ VEGA	01	00														L			0	1	1	1	1	(231001) COLFONDOS	$ 106.697	$ 17.100	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 106.697	$ 4.300	0,000	$ 106.697	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 106.697	$ 4.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25.700
CC 37752831	PERLA JOHANNA OREJUELA RAMOS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.989.276	$ 638.300	(EPS010) EPS SURA	$ 3.989.276	$ 159.600	6,960	$ 3.989.276	$ 277.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.989.276	$ 159.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.235.200
CC 5641480	ANGEL DE JESUS GOMEZ LOPEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.038.994	$ 326.300	(MIN002) ADRES MIN002 antes FOSYGA	$ 2.038.994	$ 81.600	6,960	$ 2.038.994	$ 142.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.038.994	$ 81.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 631.500
CC 63302660	ALBA LUCIA SANTOS RUEDA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.926.885	$ 628.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 3.926.885	$ 157.100	6,960	$ 3.926.885	$ 273.400	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.926.885	$ 157.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.216.000
CC 63514916	ADRIANA XIMENA SERRANO ARENAS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 12.000.000	$ 2.040.000	(EPS010) EPS SURA	$ 12.000.000	$ 480.000	6,960	$ 12.000.000	$ 835.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 12.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.835.200
CC 80187378	ANDRES LEONARDO LASSO AGUIRRE	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 91079903	JUAN DE DIOS GARCIA SANABRIA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.828.581	$ 772.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 4.828.581	$ 193.200	6,960	$ 4.828.581	$ 336.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 4.828.581	$ 193.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.495.100
CC 91110220	WILSON MORENO NIÑO	01	00										X							0	22	22	22	22	(230301) PORVENIR	$ 2.185.095	$ 349.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.185.095	$ 87.500	6,960	$ 2.185.095	$ 152.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.185.095	$ 87.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 676.800
CC 91110220	WILSON MORENO NIÑO	01	00														L			0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 91.004	$ 14.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 91.004	$ 3.700	0,000	$ 91.004	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 88.981	$ 3.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.900
CC 91110220	WILSON MORENO NIÑO	01	00														X			0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 637.025	$ 102.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 637.025	$ 25.500	0,000	$ 637.025	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 622.869	$ 25.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 152.500
CC 91217581	LUIS ANTONIO SANABRIA REY	01	01										X							0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS046) SALUD MIA EPS046	$ 2.250.311	$ 90.100	6,960	$ 2.250.311	$ 156.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.250.311	$ 90.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.900
CC 91250524	VICTOR MANUEL TRUJILLO ARIAS	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.451.068	$ 392.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.451.068	$ 98.100	6,960	$ 2.451.068	$ 170.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.451.068	$ 98.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 759.000
CC 91265828	VICTOR JULIO GAMBOA CARDOZO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 91274996	EDUARDO SANTOS USECHE	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.754.150	$ 440.700	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.754.150	$ 110.200	6,960	$ 2.754.150	$ 191.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.754.150	$ 110.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 852.800
CC 91496535	JAVIER MAURICIO LOPEZ OSORIO	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.231.421	$ 357.100	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.231.421	$ 89.300	6,960	$ 2.231.421	$ 155.400	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.231.421	$ 89.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 691.100
CC 91499520	JOSE ORLANDO ALBA JAIMES	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 5.001.822	$ 800.300	(EPS042) COOSALUD	$ 5.001.822	$ 200.100	6,960	$ 5.001.822	$ 348.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 5.001.822	$ 200.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.548.700
CC 91521017	CESAR ALBERTO CONTRERAS PICO	01	00																	0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 2.333.333	$ 373.400	(EPS010) EPS SURA	$ 2.333.333	$ 93.400	6,960	$ 2.333.333	$ 162.400	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.333.333	$ 93.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 722.600
CC 91521017	CESAR ALBERTO CONTRERAS PICO	01	00											X						0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 166.668	$ 26.700	(EPS010) EPS SURA	$ 166.668	$ 6.700	0,000	$ 166.668	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 166.668	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.400
CC 93408591	JAIRO ALBERTO YEPES CARBONELL	01	00		X															0	25	25	25	25	(230201) PROTECCION	$ 1.459.088	$ 233.500	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 1.459.088	$ 58.400	6,960	$ 1.459.088	$ 101.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.540.326	$ 61.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 455.200
CC 93408591	JAIRO ALBERTO YEPES CARBONELL	01	00																	2	2	2	2	2	(230201) PROTECCION	$ 116.727	$ 18.700	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 116.727	$ 4.700	0,000	$ 116.727	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 116.727	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.400
CC 93408591	JAIRO ALBERTO YEPES CARBONELL	01	00														L			0	3	3	3	3	(230201) PROTECCION	$ 175.091	$ 28.100	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 175.091	$ 7.100	0,000	$ 175.091	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 175.091	$ 7.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.300
CE 538468	JOSE LUIS BRICEÑO HERNANDEZ	01	00																	0	29	29	29	29	(230201) PROTECCION	$ 2.175.000	$ 348.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.175.000	$ 87.000	6,960	$ 2.175.000	$ 151.400	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.175.000	$ 87.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 673.400
CE 538468	JOSE LUIS BRICEÑO HERNANDEZ	01	00														L			0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 85.474	$ 13.700	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 85.474	$ 3.500	0,000	$ 85.474	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 75.000	$ 3.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 02/07/2026 | **Empresa NI900849507 MAQUINOBRAS** | **Planilla Nro: 1083143703** | **Periodo Cotización: junio de 2026** | **Periodo Servicio: julio de 2026**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
PT 5338041	ANNEL EDGARDO HERNANDEZ ESCOBAR	01	00										X							0	29	29	29	29	(230201) PROTECCION	$ 1.856.689	$ 297.100	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.856.689	$ 74.300	6,960	$ 1.856.689	$ 129.300	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.856.689	$ 74.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 575.000
PT 5338041	ANNEL EDGARDO HERNANDEZ ESCOBAR	01	00														L			0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 64.333	$ 10.300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 64.333	$ 2.600	0,000	$ 64.333	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 207.047.341	$ 209.297.652	$ 209.297.652	$ 209.052.581	$ 33.315.400	$ 8.369.300	$ 13.422.100	$ 8.296.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 63.403.100	$ 0	$ 63.403.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-07-02, 04:07:33 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2026
Empresa	MAQUINOBRAS
NIT	NI 900849507
Código Sucursal (Nombre)	01 (MAQUINOBRAS)
Referencia de Pago/ Número Planilla	1083080472
Tipo de Planilla	Y
Número Transacción Bancaria/ CUS	443780198
Banco	(1023) - BANCO DE OCCIDENTE
Valor	$ 365.700
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N860002183	14-4	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	3	$ 365.700	$ 0
		SubTotales:		$ 365.700	$ 0
		Total a Pagar:			$ 365.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-07-02, 04:11:41 PM **Tipo Planilla:** Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS **Numéro Planilla:** 1083080472

Periodo Cotización: junio de 2026 **Periodo Servicio:** junio de 2026

PAGADO 02/07/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MAQUINOBRAS	**Nombre Sucursal**	MAQUINOBRAS	**Código Sucursal**	01
Documento	NI900849507	**Dirección**	AV 0 #22 - 31 CENTRO IND SAN JORGE BD 16		
Tipo de Empresa	CONTRATANTE	**Teléfono**	6914305		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER		
Representante Legal	SERRANO GOMEZ JULIAN ANDRES	**Identificación**	CC 13870690		
Total Afiliados	3	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1098724789	DANIEL RICARDO ZAMBRANO LESMES	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.900
CC 63395720	LISSETTE XIMENA NIÑO CARVAJAL	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.900
CC 91278912	WILLIAM EDUARDO CORTES PEÑA	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 0	$ 5.252.715	$ 0	$ 0	$ 0	$ 365.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 365.700	$ 0	$ 365.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	91278912
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			WILLIAM EDUARDO CORTES PENA
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORIDABLANCA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	TRAN 154#157A-89 T-B APTO 101	TELÉFONO:	6380581
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades profesionales, científicas y té
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - INDEPENDIENTE
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6021971601**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES junio AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	3		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/07/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	454693448

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 384.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 900	$ 0	$ 384.000	$ 900	$ 384.900
SUBTOTALES:										**$ 384.000**	**$ 900**	**$ 384.900**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 300.000	$ 0	$ 700	$ 0	$ 300.000	$ 700	$ 0	$ 300.700
SUBTOTALES:													**$ 300.000**	**$ 700**	**$ 0**	**$ 300.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																					SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																															PENSIÓN								SALUD							ARP												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 91278912	CORTES PEÑA WILLIAM EDUARDO	INDEPEND		$ 2.400.000				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 2.400.000	$ 384.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 384.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.400.000	$ 300.000	$ 0	$ 300.000			$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 685.600

Planilla Pagada SOI Planilla Pagada



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-07-08, 12:22:48 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2026
Empresa	CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB
NIT	NI 901983966
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1083123620
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	463320290
Banco	(1023) - BANCO DE OCCIDENTE
Valor	$ 11.147.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	14	$ 4.110.300	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	3	$ 931.300	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	2	$ 571.600	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	1	$ 317.700	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	3	$ 210.600	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	4	$ 311.300	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	3	$ 223.300	$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	1	$ 73.600	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	6	$ 436.500	$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	1	$ 70.200	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	2	$ 155.000	$ 0
N860002183	14-4	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	20	$ 2.347.700	$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	20	$ 1.388.700	$ 0
			SubTotales:	$ 11.147.800	$ 0
			Total a Pagar:		$ 11.147.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-07-08, 01:20:42 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1083123620

Periodo Cotización: junio de 2026 **Periodo Servicio:** julio de 2026

PAGADO 08/07/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB		
Documento	NI901983966	**Dirección**	KM 7 #22 - 31 CENT IND SAN JORGE BOD 16
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6076159848
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	GIRON	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	SERRANO GOMEZ JULIAN ANDRES	**Identificación**	CC 13870690
Total Afiliados	20	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1005187293	YEINER GARCIA CADENA	01	00										X							0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 1.871.180	$ 299.400	(EPS010) EPS SURA	$ 1.871.180	$ 74.900	6,960	$ 1.871.180	$ 130.300	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.871.180	$ 74.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 579.500
CC 1005187293	YEINER GARCIA CADENA	01	00														L			0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 61.282	$ 9.900	(EPS010) EPS SURA	$ 61.282	$ 2.500	0,000	$ 61.282	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 61.282	$ 2.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900
CC 1005327109	DARLIN MARTIN ORDUZ REY	01	00	X									X							0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 1.742.284	$ 278.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.742.284	$ 69.700	6,960	$ 1.742.284	$ 121.300	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.742.284	$ 69.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 539.500
CC 1005327109	DARLIN MARTIN ORDUZ REY	01	00														L			0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 58.364	$ 9.400	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 58.364	$ 2.400	0,000	$ 58.364	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.200
CC 1005540379	CARLOS DANIEL DIAZ QUINTERO	01	00														L			0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 58.364	$ 9.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 58.364	$ 2.400	0,000	$ 58.364	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.200
CC 1005540379	CARLOS DANIEL DIAZ QUINTERO	01	00		X								X							0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 1.772.129	$ 283.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.772.129	$ 70.900	6,960	$ 1.772.129	$ 123.400	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.904.431	$ 76.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 554.100
CC 1005541892	MAURICIO VILLAMIZAR SOLANO	01	00																	0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 1.777.168	$ 284.400	(EPS046) SALUD MIA EPS046	$ 1.777.168	$ 71.100	6,960	$ 1.777.168	$ 123.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.777.168	$ 71.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 550.300
CC 1005541892	MAURICIO VILLAMIZAR SOLANO	01	00														L			0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 61.978	$ 10.000	(EPS046) SALUD MIA EPS046	$ 61.978	$ 2.500	0,000	$ 61.978	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 61.282	$ 2.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.000
CC 1046427115	YOEL ARDILA NARVAEZ	01	00										X							0	29	29	29	29	(231001) COLFONDOS	$ 1.923.408	$ 307.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.923.408	$ 77.000	6,960	$ 1.923.408	$ 133.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.923.408	$ 77.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 595.700
CC 1046427115	YOEL ARDILA NARVAEZ	01	00														L			0	1	1	1	1	(231001) COLFONDOS	$ 61.282	$ 9.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 61.282	$ 2.500	0,000	$ 61.282	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 61.282	$ 2.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900
CC 1050719060	JOSE ALBERTO OSPINO BARACAMONTE	01	00										X							0	12	12	12	12	(230301) PORVENIR	$ 770.000	$ 123.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 770.000	$ 30.800	6,960	$ 770.000	$ 53.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 770.000	$ 30.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 238.400
CC 1050719060	JOSE ALBERTO OSPINO BARACAMONTE	01	00												X					0	18	18	18	18	(230301) PORVENIR	$ 1.050.544	$ 168.100	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.050.544	$ 42.100	0,000	$ 1.050.544	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.050.544	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 210.200
CC 1063560222	DIEGO ANDRES FLOREZ RINCON	01	00																	0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 1.692.542	$ 270.900	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.692.542	$ 67.800	6,960	$ 1.692.542	$ 117.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.692.542	$ 67.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 524.400
CC 1063560222	DIEGO ANDRES FLOREZ RINCON	01	00														L			0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 58.364	$ 9.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 58.364	$ 2.400	0,000	$ 58.364	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.200
CC 1093738325	BAUDILLO RIVERA GOMEZ	01	00	X									X							0	29	29	29	29	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.712.439	$ 274.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.712.439	$ 68.500	6,960	$ 1.712.439	$ 119.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.712.439	$ 68.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 530.200
CC 1093738325	BAUDILLO RIVERA GOMEZ	01	00														L			0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 58.364	$ 9.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 58.364	$ 2.400	0,000	$ 58.364	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.200
CC 1095802634	JUAN ANDRES DIAZ QUINTERO	01	00										X							0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 1.905.758	$ 305.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.905.758	$ 76.300	6,960	$ 1.905.758	$ 132.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.905.758	$ 76.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 590.300
CC 1095802634	JUAN ANDRES DIAZ QUINTERO	01	00												X					0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 243.395	$ 39.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 243.395	$ 9.800	0,000	$ 243.395	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 243.395	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48.800
CC 1098699422	LUIS ALFONSO FUENTES NAVARRO	01	00																	0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 1.692.542	$ 270.900	(EPS042) COOSALUD	$ 1.692.542	$ 67.800	6,960	$ 1.692.542	$ 117.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.692.542	$ 67.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 524.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 08/07/2026

Empresa NI901983966
CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB

Planilla Nro: 1083123620

Periodo Cotización: junio de 2026

Periodo Servicio: julio de 2026

II. DETALLE DEL APORTANTE

Total

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1098699422	LUIS ALFONSO FUENTES NAVARRO	01	00														L			0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 58.364	$ 9.400	(EPS042) COOSALUD	$ 58.364	$ 2.400	0,000	$ 58.364	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.200
CC 1098822751	HARLEY PRADA LOPEZ	01	00										X							0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 1.712.439	$ 274.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.712.439	$ 68.500	6,960	$ 1.712.439	$ 119.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.712.439	$ 68.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 530.200
CC 1098822751	HARLEY PRADA LOPEZ	01	00														L			0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 58.364	$ 9.400	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 58.364	$ 2.400	0,000	$ 58.364	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.200
CC 13285355	PEDRO JESUS VERGEL VERGEL	01	00																	0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 641.999	$ 102.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 641.999	$ 25.700	6,960	$ 641.999	$ 44.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 641.999	$ 25.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 198.900
CC 13285355	PEDRO JESUS VERGEL VERGEL	01	00												X					0	9	9	9	9	(230301) PORVENIR	$ 525.273	$ 84.100	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 525.273	$ 21.100	0,000	$ 525.273	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 525.273	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 105.200
CC 13285355	PEDRO JESUS VERGEL VERGEL	01	00												X					0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 583.636	$ 93.400	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 583.636	$ 23.400	0,000	$ 583.636	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 583.636	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 116.800
CC 13745736	ALEXANDER PRADA LOPEZ	01	00										X							0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 1.871.612	$ 299.500	(EPS010) EPS SURA	$ 1.871.612	$ 74.900	6,960	$ 1.871.612	$ 130.300	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.871.612	$ 74.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 579.600
CC 13745736	ALEXANDER PRADA LOPEZ	01	00														L			0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 65.327	$ 10.500	(EPS010) EPS SURA	$ 65.327	$ 2.700	0,000	$ 65.327	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.600
CC 2000006746	LUIS EDUARDO CIFUENTES VELAZCO	01	00	X									X							0	29	29	29	29	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.742.284	$ 278.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.742.284	$ 69.700	6,960	$ 1.742.284	$ 121.300	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.742.284	$ 69.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 539.500
CC 2000006746	LUIS EDUARDO CIFUENTES VELAZCO	01	00														L			0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 58.364	$ 9.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 58.364	$ 2.400	0,000	$ 58.364	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.200
CC 5691822	LUIS ALBERTO PRADA RINCON	01	00										X							0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 1.811.922	$ 290.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.811.922	$ 72.500	6,960	$ 1.811.922	$ 126.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.811.922	$ 72.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 561.200
CC 5691822	LUIS ALBERTO PRADA RINCON	01	00														L			0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 61.680	$ 9.900	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 61.680	$ 2.500	0,000	$ 61.680	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.800
CC 91291101	GUMERSINDO PARRA SOLANO	01	00										X							0	29	29	29	29	(230201) PROTECCION	$ 1.931.302	$ 309.100	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.931.302	$ 77.300	6,960	$ 1.931.302	$ 134.500	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.931.302	$ 77.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 598.200
CC 91291101	GUMERSINDO PARRA SOLANO	01	00														L			0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 62.343	$ 10.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 62.343	$ 2.500	0,000	$ 62.343	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900
PT 5823211	YEFFERSON DYFRED GONZALEZ ORTEGA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.920.027	$ 307.300	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.920.027	$ 76.900	6,960	$ 1.920.027	$ 133.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.920.027	$ 76.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 594.800
PT 6356621	RODOLFO JESUS QUIÑONEZ GUTIERREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
PT 6565491	ANDRES FRANCISCO GARCIA FARIAS	01	00										X							0	29	29	29	29	(230201) PROTECCION	$ 1.841.767	$ 294.700	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.841.767	$ 73.700	6,960	$ 1.841.767	$ 128.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.841.767	$ 73.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 570.300
PT 6565491	ANDRES FRANCISCO GARCIA FARIAS	01	00														L			0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 63.669	$ 10.200	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 63.669	$ 2.600	0,000	$ 63.669	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.200
PT 7014092	KELVIN NICOL PAEZ BUITRAGO	01	00																	0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 1.634.178	$ 261.500	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.634.178	$ 65.400	6,960	$ 1.634.178	$ 113.800	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.634.178	$ 65.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 506.100
PT 7014092	KELVIN NICOL PAEZ BUITRAGO	01	00											X						0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 58.364	$ 7.100	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 58.364	$ 0	0,000	$ 58.364	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.100
PT 7014092	KELVIN NICOL PAEZ BUITRAGO	01	00											X						0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 58.364	$ 7.100	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 58.364	$ 0	0,000	$ 58.364	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 37.083.570	$ 37.083.570	$ 37.083.570	$ 37.078.885	$ 5.930.900	$ 1.480.500	$ 2.347.700	$ 1.388.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.147.800	$ 0	$ 11.147.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-07-08, 12:24:27 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2026
Empresa	CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB
NIT	NI 901983966
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1083125060
Tipo de Planilla	Y
Número Transacción Bancaria/ CUS	463326077
Banco	(1023) - BANCO DE OCCIDENTE
Valor	$ 121.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N860002183	14-4	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	1	$ 121.900	$ 0
		SubTotales:		$ 121.900	$ 0
		Total a Pagar:			$ 121.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-07-08, 01:20:46 PM **Tipo Planilla:** Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS **Numéro Planilla:** 1083125060

Periodo Cotización: junio de 2026 **Periodo Servicio:** junio de 2026

PAGADO 08/07/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB		
Documento	NI901983966	**Dirección**	KM 7 #22 - 31 CENT IND SAN JORGE BOD 16
Tipo de Empresa	CONTRATANTE	**Teléfono**	6076159848
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	GIRON	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	SERRANO GOMEZ JULIAN ANDRES	**Identificación**	CC 13870690
Total Afiliados	1	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 13870690	JULIAN ANDRES SERRANO GOMEZ	59	00																0		0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 0	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.900	$ 0	$ 121.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

ANEXO N° 2
INDUCCION

	FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	SST-F-02
		Fecha	28/07/2025
		Versión	5

1. DATOS PERSONALES

NOMBRE: Darlin Morton Ordue Rey — DOCUMENTO: 1.005.327.104

DIRECCIÓN: Cra 7 # 12-03 Cartagena — TELÉFONO: 312 3953167

CARGO: Ayudante de obra — PROYECTO: Consorcio Mitigacion Pedregal Cdad

TIPO DE CONTRATO: Obra labor — ARL: DXA

JEFE INMEDIATO: — FECHA: 1 Jun 2026

ETAPA — INDUCCIÓN: X — REINDUCCIÓN:

2. RESPONSABILIDADES EN EL SGSST















3. POLÍTICAS SIG









POLITICA DE USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL



Política Ambiental





5. REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL



6. REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO



7. COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COPASST



RESPONSABILIDADES COPASST



8. COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL - COCOLA



RESPONSABILIDADES COCOLA

Busca prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo, conforme lo establece la resolución 0652 del 30 de abril del año 2012.

Conformado por un Número Igual de Representantes del Empleador y de los Trabajadores con sus Respectivos Suplentes.

Scanned with CamScanner

9. DEFINICIONES BÁSICAS













10. REPORTE DE INCIDENTES, ACCIENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES LABORALES









11. PROGRAMAS AMBIENTALES



Scanned with CamScanner

12. SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO

1. Clasificación.
2. Etiquetado.
3. Fichas de datos de seguridad.



13. CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS



14. ACOSO SEXUAL Y VIOLENCIA DE GENERO

Establece medidas integrales para prevenir, proteger y atender el acoso sexual y violencia de genero, en el ámbito laboral y educativo en Colombia.

Derechos y garantías Ley 2365 de 2024: Atención psicológica a través de la ARL, traslado de area, teletrabajo o terminación contractual sin penalización, confidencialidad y protección de confrontación con el agresor, entre otros.

Para Investigados. Art 8

Presunción de inocencia y derecho a conocer los cargos en 5 días hábiles





15. MANUAL DE FUNCIONES



Documento que detalla las responsabilidades, tareas, y requisitos de cada puesto de trabajo dentro de una organización. Sirve como guía para los empleados, define perfiles laborales, y facilita la gestión del talento humano.

16. EMERGENCIAS



RECURSOS INTERNOS PARA ATENDER EMERGENCIAS





Vía de evacuación segura y eficiente: un lugar seguro donde puedan comprobar si se ha evacuado a todo el personal, alumnado y el estado en que se encuentre el mismo.



La señalización de emergencia y evacuación es crucial para guiar a las personas de forma segura hacia las salidas en caso de situaciones críticas como incendios o terremotos

EMERGENCIAS POR DERRAME DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y/O COMBUSTIBLES



- Verificar la información sobre la sustancia derramada en la hoja de seguridad del producto
- Utilizar los elementos de protección personal
- Interrumpa la fuente del derrame para evitar que siga fluyendo el producto
- Contar el derrame utilizando rollos formando un dique con material absorbente
- Limpiar el derrame utilizando los paños absorbentes
- Recoger todos los residuos en las bolsas correspondientes.

He recibido a satisfacción la Induccion en Seguridad y Salud en el Trabajo y me comprometo a cumplir con los reglamentos y las normas de seguridad estipuladas por la empresa, asi como, las establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo y en el Contrato de Trabajo.

Firma del Trabajador

Firma de quien realiza la Inducción

Scanned with CamScanner

	FORMATO EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	SST-F-03
		Fecha	28/07/2025
		Versión	5

NOMBRE DEL PARTICIPANTE:	Darly Martin Ochoa Rey	DOCUMENTO:	1.025.327.104
CARGO:	Ayudante de obra	AREA DE TRABAJO:	Obra
TEMA:	INDUCCIÓN X REINDUCCIÓN	FECHA:	1 Julio 2026

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - AMBIENTAL

Lea atentamente las siguientes preguntas y marque con una X la(s) respuesta(s) que considere correctas

1. Entre las siguientes opciones, seleccione TODAS aquellas que correspondan a políticas de la empresa — Puntaje: 3

a. Política SST ✓ 

b. Política de Vacaciones 

c. Política de Seguridad Vial ✓ 

d. Política de prevención del consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas ✓ 

2. Seleccione TRES (03) peligros a los cuales está expuesto en el desarrollo de las actividades de su cargo — Puntaje: C

a. Físicos y mecánicos 

b. Fenómenos Naturales 

c. Biomecánico 

d. Locativo 

e. Materiales radiactivos 

f. Eléctrico 

g. Tránsito 

h. Químico 

3. Seleccione UNA afirmación que describa por qué se debe implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa — Puntaje: 1

a. Para desmejorar las condiciones laborales de la empresa

b. Para que nos paguen mejor

c. Para evitar que se presenten accidentes de trabajo y enfermedades laborales ✓

d. Todas las anteriores

4. Seleccione UNA afirmación que describa el Procedimiento a seguir para reportar un incidente o accidente de trabajo — Puntaje: 1

a. Informar al compañero de trabajo

b. Dirigirse a la clínica para recibir atención médica

c. Continuar laborando normalmente

d. Notificar al área SST o Jefe inmediato, recibir atención de primeros auxilios y dirigirse a centro médico, si es necesario ✓

Lea atentamente las siguientes preguntas y encierre en un círculo la(s) respuesta(s) que considere correctas

5. Encierre TODAS las buenas prácticas que estén relacionadas con el autocuidado — Puntaje: 3




6. Encierre TODOS los recursos que sean necesarios para atender una emergencia — Puntaje: 7



Lea atentamente la siguiente pregunta y una con una línea la(s) respuesta(s) que considere correctas

7. Una con una línea cada uno de los residuos con alguna de las tres canecas para disposición — Puntaje:



INDUCCIÓN AL CARGO

Lea atentamente las siguientes preguntas y marque con una X la(s) respuesta(s) que considere correctas

8. De los siguientes documentos, seleccione cuál es la norma reguladora de las relaciones internas entre la empresa y el trabajador, que sirve de guía y herramienta para mantener el orden de la empresa — Puntaje: 1

a. Manual de Urbanidad y Buenas Maneras 

b. Manual de Ingeniero de Mantenimiento 

c. Reglamento Interno de Trabajo ✓ 

9. De los siguientes documentos, seleccione en cuál de ellos se establecen la funciones y responsabilidades del cargo que va a desempeñar en la empresa: — Puntaje: 1

a. Manual de Funciones ✓ 

b. Manual de Calidad 

c. Manual Ecológico 

10. Seleccione opciones del ahorro de agua y energía. — Puntaje: 3



11. Segun la ley 2365 de 2024, cuales son los derechos y las garantias para las victimas :  — Puntaje: 1

a. Atención psicológica a través de la ARL y traslado de área, teletrabajo o terminación contractual sin penalización.

b. Confidencialidad y prohibición de confrontación con el agresor.

c. Protección contra represalias por denunciar (estabilidad laboral reforzada por 6 meses).

d. Todas las anteriores. ✓

Scanned with CamScanner

	FORMATO EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	SG
		Fecha	28/07/
		Versión	5

12. Los pictogramas en el SGA me permite verificar la peligrosidad de la sustancia o mezcla, encierre las que informen alto grado de toxicidad.	Puntaje: C	13. ¿Cuál de los siguientes enunciados refleja un compromiso de la empresa según su Política Integrada?	Puntaje: 1
		a. Solo cumplir con los requisitos del cliente para evitar sanciones.	
		b. Ejecutar obras sin considerar el impacto ambiental para cumplir con los plazos.	
		c. Promover condiciones de trabajo seguras, proteger el medio ambiente y satisfacer al cliente.	
		d. Aplicar mejoras al sistema de gestión únicamente cuando lo exija una auditoría externa.	

14. ¿Sabes dónde encontrar los formatos, políticas y procedimientos del SIG?	Puntaje: 1	15. ¿Dónde puedo veo la organización de los procesos de la empresa?	Puntaje: 1
a. Workflow	c. Trello	b. En el mapa de procesos del Sistema de Gestión Integrado (SGI), incluido en el manual de calidad.	c. Preguntando directamente a cualquier compañero de trabajo.
b. Buk-Iplan	d. copasst	b. En los estados financieros de la empresa.	d. En el cronograma de capacitaciones anuales.

Lea atentamente la siguiente pregunta y encierre en un círculo la(s) respuesta(s) que considere correctas

16. Seleccione TODOS los aspectos que están establecidos en el Reglamento Interno de Trabajo	Puntaje: 5



17. De las siguientes afirmaciones cuales corresponden a nuestra Política Ambiental	Puntaje: 1
a. Reducción de la contaminación y protección del medio ambiente	b. Cumplimiento de la normatividad ambiental
c. Minimización de la generación de residuos	d. Todas las anteriores

18. Seleccione los Programas Ambientales que hacen parte del Sistema de Gestión:	Puntaje: 1
a. Uso y Ahorro Eficiente de Energía y Agua	c. Gestión Integral de Residuos
b. Uso y Ahorro Eficiente de Papel	d. a, b y c son correctas

PUNTAJE TOTAL:	FIRMA DEL TRABAJADOR:	FIRMA DEL EVALUADOR:
OBSERVACIONES:		

Scanned with CamScanner

	FORMATO NOTIFICACIÓN DE RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO:	SST-F-06
		VERSIÓN:	3
		FECHA:	2/01/2024
		PÁGINA	1 DE 1

A continuación, se describen los peligros asociados a la actividad a realizar y las recomendaciones a seguir para su mitigación

CLASIFICACIÓN DE PELIGROS			RECOMENDACIONES
GRUPO	DESCRIPCIÓN	APLICA	
Biológico	Virus	X	Inspección áreas, inspección y desinfección de elementos de trabajo (epp- dotación), lavado de manos e higiene personal), aplicación repelente, desinfección de áreas, uso de gel antibacterial- alcohol para desinfección. Uso obligatorio de EPP, informar diariamente sobre estado de salud, aplicar protocolo de limpieza y desinfección, vacunación
	Bacterias	X	
	Hongos	X	
	Ricketsias	X	
	Picaduras	X	
	Mordeduras	X	
	Fluidos o excrementos	X	
Físico	Ruido	X	Uso adecuado de epp, dotación manga larga, uso de protector solar, hidratación constante, realizar pausas activas.
	Iluminación	X	
	Vibración	X	
	Temperaturas extremas		
	Presión atmosférica		
	Radiaciones no ionizantes		
	Radiaciones ionizantes		
Químico	Polvos orgánicos e inorgánicos		Uso adecuado de epp, conocer hojas de seguridad, etiquetado de sustancias químicas, ventilación
	Fibras		
	Líquidos		
	Gases y vapores		
	Humos metálicos, no metálicos		
	Material particulado	X	
Psicosocial	Gestión organizacional		Planeación de actividades, Realización de pausas activas, trabajo en equipo, comunicación asertiva.
	Características de la organización		
	Características del grupo social		
	Condiciones de la tarea		
	Interfase persona - tarea	X	
	Jornada de trabajo	X	
Biomecánicos	Posturas	X	Levantamiento y movimiento de cargas adecuado, realización de pausas activas y calistenia, mantener una buena higiene postural, no exceder pesos permitidos.
	Esfuerzo	X	
	Movimiento repetitivo	X	
	Manipulación de cargas	X	
Condiciones de seguridad	Mecánico	X	Realizar inspecciones a epp, herramientas, equipos, áreas de trabajo, autocuidado, atender a normas de tránsito, reportar estado de salud, reporte de actos y condiciones inseguras, atender a señalización, certificación de competencias (cuando se requiera)
	Eléctrico	X	
	Locativo	X	
	Tecnológico		
	Accidentes de tránsito	X	
	Públicos	X	
	Trabajo en alturas	X	
	Espacios confinados		
Fenómenos naturales	Sismos	X	Ubicación de señalización de emergencia, autocuidado, reconocimiento de brigada.
	Terremotos	X	
	Vendaval		
	Inundación	X	
	Derrumbe		
	Precipitaciones		

Yo, Darlin Martin Ordaz Rey identificado con documento 1.005 327 109

declaro que he sido notificado de los riesgos a los cuales estoy expuesto para el cargo de Ayudante de obra

que desempeño en la empresa/proyecto Consorcio Mitigación Pacho desde la fecha 10/2/26

Firma del trabajador

Firma de quien realiza la notificación

Scanned with CamScanner

	FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	SST-F-02
		Fecha	28/07/2025
		Versión	5

1. DATOS PERSONALES

NOMBRE Luis eduardo Cifuentes Velasco DOCUMENTO 2.000.036 796

DIRECCIÓN cra 7 # 12-03 Cordoba TELÉFONO 324 34 42 822

CARGO Ayudante de obra PROYECTO Cosecha Mitigación Piedecuesta Cdmb

TIPO DE CONTRATO obra labor ARL Axa

JEFE INMEDIATO FECHA 1 Junio 2026

ETAPA INDUCCIÓN [X] REINDUCCIÓN [ ]

2. RESPONSABILIDADES EN EL SGSST















3. POLÍTICAS SIG









Scanned with CamScanner

POLITICA DE USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL



Política Ambiental





5. REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL



6. REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO




7. COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COPASST



RESPONSABILIDADES COPASST



8. COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL - COCOLA

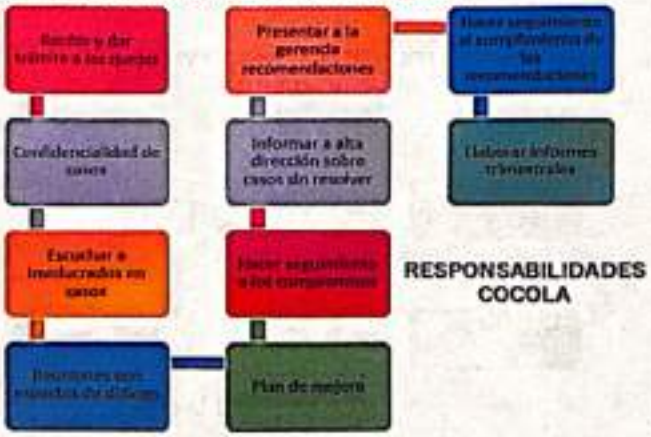

RESPONSABILIDADES COCOLA

Busca prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo, conforme lo establece la resolución 0652 del 30 de abril del año 2012.

Conformado por un Número Igual de Representantes del Empleador y de los Trabajadores con sus Respectivos Suplentes.

Scanned with CamScanner

INICIONES BÁSICAS

PELIGRO

Fuente o situación con potencial de daños a las personas, al ambiente, a la propiedad, a la calidad, etc.



RIESGO

La combinación en la probabilidad de que ocurra un evento peligroso y la gravedad de las consecuencias de esa ocurrencia





Accidente de Trabajo



- Lesión repentina
- Ocurrido en el trabajo o con ocasión del trabajo
- Causa lesión, enfermedad, perturbación funcional o psiquiátrica, invalidez o la muerte
- Por Culpa(s) del empleador
- Durante empleo - ocasión
- Durante tránsito
- Actividades recreativas, deportivas o culturales

Incidente de Trabajo

Enfermedad Laboral

- Contraída como producto de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad o medio de trabajo
- Tabla de enfermedades laborales

Todo debe ser reportado e investigado

ACOSO LABORAL





ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES



Se refieren a los elementos de la oficina u obras que interactúan con el medio ambiente y los cambios que se genera, ya sean positivos o negativos, que afectan al entorno. Es importante identificar y gestionar estos aspectos e impactos para minimizar los impactos negativos en el medio ambiente

ASPECTOS	IMPACTOS AMBIENTAL NEGATIVO	IMPACTOS AMBIENTAL POSITIVO
• Consumo de recursos • Generación de residuos • Consumo de Papel y Energía • Emisiones • Alteración del suelo y paisaje	• Contaminación • Degradación del suelo • Deforestación o tala de árboles • Alteración de la calidad del agua	• Conservación de la flora y Fauna • Residuos aprovechables: Reutilización, reciclaje y posconsumo • Generación de empleo

10. REPORTE DE INCIDENTES, ACCIENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES LABORALES









11. PROGRAMAS AMBIENTALES









Scanned with CamScanner

12. SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO



13. CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS



14. ACOSO SEXUAL Y VIOLENCIA DE GENERO

Establecimiento de medidas integrales para prevenir, proteger y atender el acoso sexual y violencia de género, en el ámbito laboral y educativo en Colombia.

Derechos y garantías Ley 2365 de 2024: Atención psicológica a través de la ARL, traslado de área, teletrabajo o terminación contractual sin penalización, confidencialidad y prohibición de confrontación con el agresor, entre otros.

Para investigados, Art 6:
Presunción de inocencia y derecho a conocer los cargos en 5 días hábiles





15. MANUAL DE FUNCIONES



Documento que detalla las responsabilidades, tareas, y requisitos de cada puesto de trabajo dentro de una organización. Sirve como guía para los empleados, define perfiles laborales, y facilita la gestión del talento humano.

16. EMERGENCIAS



RECURSOS INTERNOS PARA ATENDER EMERGENCIAS





Vía de evacuación segura y eficiente, un lugar seguro donde poder comprobar si se ha evacuado a todo el personal, alumnado y el estado en que se encuentra el mismo.



La señalización de emergencia y evacuación es crucial para guiar a las personas de forma segura hacia las salidas en caso de situaciones críticas como incendios o terremotos

EMERGENCIAS POR DERRAME DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y/O COMBUSTIBLES



- Verificar la información sobre la sustancia derramada en la hoja de seguridad del producto
- Utilizar los elementos de protección personal
- Interrumpir la fuente del derrame para evitar que siga fluyendo el producto
- Contar el derrame utilizando rollos formando un dique con material absorbente
- Limpiar el derrame utilizando los paños absorbentes
- Recoger todos los residuos en las bolsas correspondientes.

He recibido a satisfacción la Induccion en Seguridad y Salud en el Trabajo y me comprometo a cumplir con los reglamentos y las normas de seguridad estipuladas por la empresa, asi como, las establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo y en el Contrato de Trabajo.

Firma del Trabajador

Firma de quien realiza la inducción

Scanned with CamScanner

FORMATO EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	SST-F-03
	Fecha	28/07/2025
	Versión	5

PARTICIPANTE:	Luis Eduardo Cifuentes V.	DOCUMENTO:	7.032.026.796
	Ayudante de obra	AREA DE TRABAJO:	Estabilización talud
INDUCCIÓN [X]	REINDUCCIÓN [ ]	FECHA:	1 Julio 2025

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - AMBIENTAL

Lea atentamente las siguientes preguntas y marque con una X la(s) respuesta(s) que considere correctas

1. De las siguientes opciones, seleccione TODAS aquellas que corresponden a políticas de la empresa — Puntaje: 3

a. Política SST 

b. Política de Vacaciones 

c. Política de Seguridad Vial 

d. Política de prevención de consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas 

2. Seleccione TRES (03) peligros a los cuales está expuesto en el desarrollo de las actividades de su cargo — Puntaje: 6

a. Picaduras y mordeduras 

b. Fenómenos Naturales 

c. Biomecánico 

d. Locativo 

e. Materiales radiactivos 

f. Eléctrico 

g. Tránsito 

h. Químico 

3. Seleccione UNA afirmación que describa por qué se debe implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa — Puntaje: 1

a. Para desmejorar las condiciones laborales de la empresa

b. Para que nos paguen mejor

c. Para evitar que se presenten accidentes de trabajo y enfermedades laborales

d. Todas las anteriores

4. Seleccione UNA afirmación que describa el Procedimiento a seguir para reportar un incidente o accidente de trabajo — Puntaje: 1

a. Informar al compañero de trabajo

b. Dirigirse a la clínica para recibir atención médica

c. Continuar laborando normalmente

d. Comunicar al área SST o Jefe Inmediato, recibir atención de primeros auxilios y dirigirse a centro médico, si es necesario

Lea atentamente las siguientes preguntas y encierre en un círculo la(s) respuesta(s) que considere correctas

5. Encierre TODAS las buenas prácticas que estén relacionadas con el autocuidado — Puntaje: 3




6. Encierre TODOS los recursos que sean necesarios para atender una emergencia — Puntaje: 3



Lea atentamente la siguiente pregunta y una con una línea la(s) respuesta(s) que considere correctas

7. Una con una línea cada uno de los residuos con alguna de las tres canecas para disposición — Puntaje:



INDUCCIÓN AL CARGO

Lea atentamente las siguientes preguntas y marque con una X la(s) respuesta(s) que considere correctas

8. De los siguientes documentos, seleccione cuál es la norma reguladora de las relaciones internas entre la empresa y el trabajador, que sirve de guía y herramienta para mantener el orden de la empresa — Puntaje: 1

a. Manual de Urbanidad y Buenas Maneras 

b. Manual de Ingeniero de Mantenimiento 

c. Reglamento Interno de Trabajo 

9. De los siguientes documentos, seleccione en cuál de ellos se establecen la funciones y responsabilidades del cargo que va a desempeñar en la empresa: — Puntaje: 1

a. Manual de Funciones 

b. Manual de Calidad 

c. Manual Esotérico 

10. Seleccione opciones del ahorro de agua y energía. — Puntaje: 3



11. Según la ley 2365 de 2024, cuales son los derechos y las garantías para las víctimas :  — Puntaje: 1

a. Atención psicológica a través de la ARL y traslado de área, teletrabajo o terminación contractual sin penalización.

b. Confidencialidad y prohibición de confrontación con el agresor.

c. Protección contra represalias por denunciar (estabilidad laboral reforzada por 6 meses).

d. Todas las anteriores.


Scanned with CamScanner

	FORMATO EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código Fecha Versión

12. Los pictogramas en el SGA me permite verificar la peligrosidad de la sustancia o mezcla, enciérre las que informen alto grado de toxicidad.	Puntaje:	13. ¿Cuál de los siguientes enunciados refleja un compromiso de la empresa según su Política Integrada?
		a. Solo cumplir con los requisitos del cliente para evitar sanciones. b. Ejecutar obras sin considerar el impacto ambiental para cumplir con los plazos. c. Promover condiciones de trabajo seguros, proteger el medio ambiente y satisfacer al cli d. Aplicar mejoras al sistema de gestión únicamente cuando lo exija una auditoría externa.

14. ¿Sabes dónde encontrar los formatos, políticas y procedimientos del SIG?		Puntaje:	15. ¿Dónde puedo veo la organización de los procesos de la empresa?		Puntaje
a. Workflow	c. Trello		a. En el mapa de procesos del Sistema de Gestión Integrado (SGI), incluido en el manual de calidad	c. Preguntando directamente a cualquier compañero de trabajo	
b. Buk-Iplan	d. copasst		b. En los estados financieros de la empresa	d. En el cronograma de capacitaciones anuales.	

Lea atentamente la siguiente pregunta y encierre en un círculo la(s) respuesta(s) que considere correctas

16. Seleccione TODOS los aspectos que están establecidos en el Reglamento Interno de Trabajo					Puntaje:
 Permisos	 Horario de Trabajo	 Incapacidades	 Obligaciones, faltas y sanciones	 Proceso Disciplinario	

17. De las siguientes afirmaciones cuales corresponden a nuestra Política Ambiental		Puntaje:
a. Reducción de la contaminación y protección del medio ambiente	b. Cumplimiento de la normatividad ambiental	
c. Minimización de la generación de residuos	d. Todas las anteriores	

18. Seleccione los Programas Ambientales que hacen parte del Sistema de Gestión:		Puntaje:
a. Uso y Ahorro Eficiente de Energía y Agua	c. Gestión Integral de Residuos	
b. Uso y Ahorro Eficiente de Papel	d. a, b y c son correctas	

PUNTAJE TOTAL:	FIRMA DEL TRABAJADOR:	FIRMA DEL EVALUADOR:
OBSERVACIONES:		

Scanned with CamScanner

	FORMATO NOTIFICACIÓN DE RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO:	SST-F-06
		VERSIÓN:	3
		FECHA:	2/01/2024
		PÁGINA	1 DE 1

A continuación, se describen los peligros asociados a la actividad a realizar y las recomendaciones a seguir para su mitigación

CLASIFICACIÓN DE PELIGROS			RECOMENDACIONES
GRUPO	DESCRIPCIÓN	APLICA	
Biológico	Virus	X	Inspección áreas, inspección y desinfección de elementos de trabajo (epp- dotación), lavado de manos e higiene personal), aplicación repelente, desinfección de áreas, uso de gel antibacterial- alcohol para desinfección. Uso obligatorio de EPP, informar diariamente sobre estado de salud, aplicar protocolo de limpieza y desinfección, vacunación
	Bacterias	X	
	Hongos	X	
	Ricketsias	X	
	Picaduras	X	
	Mordeduras	X	
	Fluidos o excrementos	X	
Físico	Ruido	X	Uso adecuado de epp, dotación manga larga, uso de protector solar, hidratación constante, realizar pausas activas.
	Iluminación	X	
	Vibración	X	
	Temperaturas extremas		
	Presión atmosférica		
	Radiaciones no ionizantes		
	Radiaciones ionizantes		
Químico	Polvos orgánicos e inorgánicos		Uso adecuado de epp, conocer hojas de seguridad, etiquetado de sustancias químicas, ventilación
	Fibras		
	Líquidos	X	
	Gases y vapores	X	
	Humos metálicos, no metálicos	X	
	Material particulado	X	
Psicosocial	Gestión organizacional	X	Planeación de actividades, Realización de pausas activas, trabajo en equipo, comunicación asertiva.
	Características de la organización		
	Características del grupo social		
	Condiciones de la tarea		
	Interfase persona - tarea		
	Jornada de trabajo	X	
Biomecánicos	Posturas	X	Levantamiento y movimiento de cargas adecuado, realización de pausas activas y calistenia, mantener una buena higiene postural, no exceder pesos permitidos.
	Esfuerzo	X	
	Movimiento repetitivo	X	
	Manipulación de cargas	X	
Condiciones de seguridad	Mecánico		Realizar inspecciones a epp, herramientas, equipos, áreas de trabajo, autocuidado, atender a normas de tránsito, reportar estado de salud, reporte de actos y condiciones inseguras, atender a señalización, certificación de competencias (cuando se requiera)
	Eléctrico	X	
	Locativo	X	
	Tecnológico		
	Accidentes de tránsito	X	
	Públicos	X	
	Trabajo en alturas	X	
	Espacios confinados		
Fenómenos naturales	Sismos	X	Ubicación de señalización de emergencia, autocuidado, reconocimiento de brigada.
	Terremotos	X	
	Vendaval	X	
	Inundación		
	Derrumbe	X	
	Precipitaciones		

Yo, Luis Eduardo Cifuentes V. *identificado con documento* 2.030.006.716

declaro que he sido notificado de los riesgos a los cuales estoy expuesto para el cargo de Ayudante de obra

que desempeño en la empresa/proyecto Construcción Mitigación Redondel *desde la fecha* 1 Enero 2026

Firma del trabajador

Firma de quien realiza la notificación

Scanned with CamScanner

	FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	SST-F-02
		Fecha	28/07/2025
		Versión	5

1. DATOS PERSONALES

NOMBRE Bonilla Rivera Gomez DOCUMENTO 1.093.738.325

DIRECCIÓN Calle 7 H 2-14 Cortera TELÉFONO 3129109109

CARGO Ayudante de obra PROYECTO Consorcio Intagricon Arboleda Colo

TIPO DE CONTRATO Obra labor ARL AXA

JEFE INMEDIATO FECHA 1 Junio 2026

ETAPA INDUCCIÓN [X] REINDUCCIÓN [ ]

2. RESPONSABILIDADES EN EL SGSST
















3. POLÍTICAS SIG

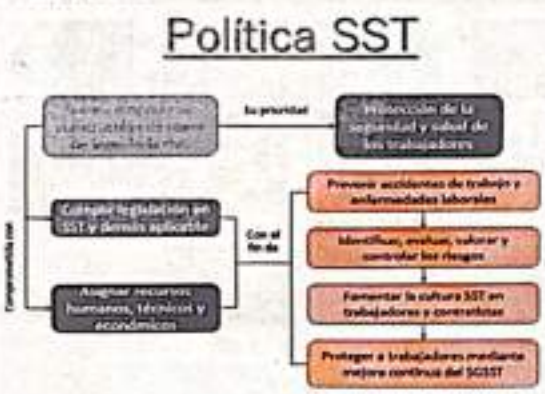







Scanned with CamScanner

POLITICA DE USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Empresa
- Suministrar EPP's
- Capacitar y sensibilizar

Trabajadores
- Usar obligatoriamente los EPP's
- Reportar los daños y faltantes

COPASST
- Inspeccionar periódicamente
- Proponer mejoras

Política Ambiental





5. REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL



6. REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO



7. COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COPASST



RESPONSABILIDADES COPASST



8. COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL - COCOLA



RESPONSABILIDADES COCOLA

Busca prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo, conforme lo establece la resolución 0652 del 30 de abril del año 2012.

Conformado por un Número Igual de Representantes del Empleador y de los Trabajadores con sus Respectivos Suplentes.

Scanned with CamScanner


INICIONES BÁSICAS











Todo debe ser reportado e investigado





10. REPORTE DE INCIDENTES, ACCIENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES LABORALES









11. PROGRAMAS AMBIENTALES









Scanned with CamScanner

12. SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO

1. Clasificar.
2. Etiquetado.
3. Fichas de datos de seguridad



13. CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS



14. ACOSO SEXUAL Y VIOLENCIA DE GENERO

Establece medidas integrales para prevenir, proteger y atender el acoso sexual y violencia de genero, en el ámbito laboral y educativo en Colombia.

Derechos y garantías Ley 2365 de 2024: Atención psicologica a través de la ARL, traslado de arm, teletrabajo o terminación contractual sin penalización, confidencialidad y prohibición de confrontación con el agresor, entre otros

Para investigados. Art 6

Presunción de inocencia y derecho a conocer los cargos en 5 días hábiles





15. MANUAL DE FUNCIONES



Documento que detalla las responsabilidades, tareas, y requisitos de cada puesto de trabajo dentro de una organización. Sirve como guía para los empleados, define perfiles laborales, y facilita la gestión del talento humano.

16. EMERGENCIAS



RECURSOS INTERNOS PARA ATENDER EMERGENCIAS







La señalización de emergencia y evacuación es crucial para guiar a las personas de forma segura hacia las salidas en caso de situaciones críticas como incendios o terremotos

EMERGENCIAS POR DERRAME DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y/O COMBUSTIBLES



- Verificar la información sobre la sustancia derramada en la hoja de seguridad del producto
- Utilizar los elementos de protección personal
- Interrumpa la fuente del derrame para evitar que siga fluyendo el producto
- Cortar el derrame utilizando rollos formando un cique con material absorbente
- Limpiar el derrame utilizando los paños absorbentes
- Recoger todos los residuos en las bolsas correspondientes.

He recibido a satisfacción la Induccion en Seguridad y Salud en el Trabajo y me comprometo a cumplir con los reglamentos y las normas de seguridad estipuladas por la empresa, así como, las establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo y en el Contrato de Trabajo.

Firma del Trabajador

Firma de quien realiza la inducción

Scanned with CamScanner

FORMATO EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN

Código	SST-F-03
Fecha	28/07/2025
Versión	5

PARTICIPANTE: Bonilla Rivera Gomez | DOCUMENTO: 1.043.737.325

Ayudante de cocina | AREA DE TRABAJO: cocina Principal de Primavera

INDUCCIÓN X | REINDUCCIÓN | FECHA: 1 Junio 2026

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - AMBIENTAL

Lea atentamente las siguientes preguntas y marque con una X la(s) respuesta(s) que considere correctas

1. De las siguientes opciones, seleccione TODAS aquellas que corresponden a políticas de la empresa — Puntaje: 3

- a. Política SST ✓ 
- b. Política de Vacaciones ✓ 
- c. Política de Seguridad Vial ✓ 
- d. Política de prevención de consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas ✓ 

2. Seleccione TRES (03) peligros a los cuales está expuesto en el desarrollo de las actividades de su cargo — Puntaje: 7

- a. Picaduras y mordeduras ✓ 
- b. Fenómenos Naturales ✓ 
- c. Biomecánico ✓ 
- d. Locativo ✓ 
- e. Materiales radiactivos ✓ 
- f. Eléctrico ✓ 
- g. Tránsito ✓ 
- h. Químico ✓ 

3. Seleccione UNA afirmación que describa por qué se debe implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa — Puntaje: 1

- a. Para desmejorar las condiciones laborales de la empresa
- b. Para que nos paguen mejor
- c. Para evitar que se presenten accidentes de trabajo y enfermedades laborales ✓
- d. Todas las anteriores

4. Seleccione UNA afirmación que describa el Procedimiento a seguir para reportar un incidente o accidente de trabajo — Puntaje: 1

- a. Informar al compañero de trabajo
- b. Dirigirse a la clínica para recibir atención médica
- c. Continuar laborando normalmente
- d. Informar al área SST o Jefe inmediato, recibir atención de primeros auxilios y dirigirse a centro médico si es necesario ✓

Lea atentamente las siguientes preguntas y encierre en un círculo la(s) respuesta(s) que considere correctas

5. Encierre TODAS las buenas prácticas que estén relacionadas con el autocuidado — Puntaje: 7




6. Encierre TODOS los recursos que sean necesarios para atender una emergencia — Puntaje: 5



Lea atentamente la siguiente pregunta y una con una línea la(s) respuesta(s) que considere correctas

7. Una con una línea cada uno de los residuos con alguna de las tres canecas para disposición — Puntaje: 6



INDUCCION AL CARGO

Lea atentamente las siguientes preguntas y marque con una X la(s) respuesta(s) que considere correctas

8. De los siguientes documentos, seleccione cuál es la norma reguladora de las relaciones internas entre la empresa y el trabajador, que sirve de guía y herramienta para mantener el orden de la empresa — Puntaje: 1

- a. Manual de Urbanidad y Buenas Maneras 
- b. Manual de Ingeniero de Mantenimiento 
- c. Reglamento Interno de Trabajo ✓ 

9. De los siguientes documentos, seleccione en cuál de ellos se establecen la funciones y responsabilidades del cargo que va a desempeñar en la empresa: — Puntaje: 1

- a. Manual de Funciones ✓ 
- b. Manual de Calidad 
- c. Manual Esotérico 

10. Seleccione opciones del ahorro de agua y energía. — Puntaje: 2



11. Segun la ley 2365 de 2024, cuales son los derechos y las garantías para las victimas :  — Puntaje: 1

- a. Atención psicológica a través de la ARL y traslado de área, teletrabajo o terminación contractual sin penalización.
- b. Confidencialidad y prohibición de confrontación con el agresor.
- c. Protección contra represalias por denunciar (estabilidad laboral reforzada por 6 meses).
- d. Todas las anteriores. ✓

Scanned with CamScanner

	FORMATO EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Cód. Fecha Versión

12. Los pictogramas en el SGA me permite verificar la peligrosidad de la sustancia o mezcla, enciérre las que informen alto grado de toxicidad.	Puntaje: 5	13. ¿Cuál de los siguientes enunciados refleja un compromiso de la empresa según su Política Integrada?
		a. Solo cumplir con los requisitos del cliente para evitar sanciones. b. Ejecutar obras sin considerar el impacto ambiental para cumplir con los plazos. c. Promover condiciones de trabajo seguras, proteger el medio ambiente y satisfacer al cli d. Aplicar mejoras al sistema de gestión únicamente cuando lo exija una auditoría externa.

14. ¿Sabes dónde encontrar los formatos, políticas y procedimientos del SIG?		Puntaje: 1	15. ¿Dónde puedo veo la organización de los procesos de la empresa?		Puntaje: 1
a. Workflow	c. Trello		a. En el mapa de procesos del Sistema de Gestión Integrado (SGI), incluido en el manual de calidad.	c. Preguntando directamente a cualquier compañero de trabajo.	
b. Buk-iplan	d. copasst		b. En los estados financieros de la empresa.	d. En el cronograma de capacitaciones anuales.	

Lea atentamente la siguiente pregunta y encierre en un círculo la(s) respuesta(s) que considere correctas

16. Seleccione TODOS los aspectos que están establecidos en el Reglamento Interno de Trabajo	Puntaje: 5



17. De las siguientes afirmaciones cuales corresponden a nuestra Política Ambiental:		Puntaje: 1
a. Reducción de la contaminación y protección del medio ambiente	b. Cumplimiento de la normatividad ambiental	
c. Minimización de la generación de residuos	d. Todas las anteriores	

18. Seleccione los Programas Ambientales que hacen parte del Sistema de Gestión:		Puntaje: 1
a. Uso y Ahorro Eficiente de Energía y Agua	c. Gestión Integral de Residuos	
b. Uso y Ahorro Eficiente de Papel	d. a, b y c son correctas	

PUNTAJE TOTAL:	FIRMA DEL TRABAJADOR:	FIRMA DEL EVALUADOR:
OBSERVACIONES:		

Scanned with CamScanner

	FORMATO NOTIFICACIÓN DE RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO:	SST-F-06
		VERSION:	3
		FECHA:	2/01/2024
		PÁGINA	1 DE 1

A continuación, se describen los peligros asociados a la actividad a realizar y las recomendaciones a seguir para su mitigación

CLASIFICACIÓN DE PELIGROS			RECOMENDACIONES
GRUPO	DESCRIPCIÓN	APLICA	
Biológico	Virus	✓	Inspección áreas, inspección y desinfección de elementos de trabajo (epp- dotación), lavado de manos e higiene personal), aplicación repelente, desinfección de áreas, uso de gel antibacterial- alcohol para desinfección. Uso obligatorio de EPP, informar diariamente sobre estado de salud, aplicar protocolo de limpieza y desinfección, vacunación
	Bacterias	✓	
	Hongos	✓	
	Ricketsias	✓	
	Picaduras	✓	
	Mordeduras	✓	
	Fluidos o excrementos	✓	
Físico	Ruido	✓	Uso adecuado de epp, dotación manga larga, uso de protector solar, hidratación constante, realizar pausas activas.
	Iluminación	✓	
	Vibración	✓	
	Temperaturas extremas		
	Presión atmosférica		
	Radiaciones no ionizantes	✓	
	Radiaciones ionizantes		
Químico	Polvos orgánicos e inorgánicos		Uso adecuado de epp, conocer hojas de seguridad, etiquetado de sustancias químicas, ventilación
	Fibras	✓	
	Líquidos	✓	
	Gases y vapores	✓	
	Humos metálicos, no metálicos	✓	
	Material particulado	✓	
Psicosocial	Gestión organizacional	✓	Planeación de actividades, Realización de pausas activas, trabajo en equipo, comunicación asertiva.
	Características de la organización		
	Características del grupo social		
	Condiciones de la tarea		
	Interfase persona - tarea	✓	
	Jornada de trabajo	✓	
Biomecánicos	Posturas	✓	Levantamiento y movimiento de cargas adecuado, realización de pausas activas y calistenia, mantener una buena higiene postural, no exceder pesos permitidos.
	Esfuerzo	✓	
	Movimiento repetitivo	✓	
	Manipulación de cargas	✓	
Condiciones de seguridad	Mecánico	✓	Realizar inspecciones a epp, herramientas, equipos, áreas de trabajo, autocuidado, atender a normas de tránsito, reportar estado de salud, reporte de actos y condiciones inseguras, atender a señalización, certificación de competencias (cuando se requiera)
	Eléctrico	✓	
	Locativo	✓	
	Tecnológico	✓	
	Accidentes de tránsito	✓	
	Públicos	✓	
	Trabajo en alturas		
	Espacios confinados		
Fenómenos naturales	Sismos	✓	Ubicación de señalización de emergencia, autocuidado, reconocimiento de brigada.
	Terremotos	✓	
	Vendaval	✓	
	Inundación	✓	
	Derrumbe	✓	
	Precipitaciones		

Yo, Bravillo Rivera Gomez *identificado con documento* 1.093 738 325

declaro que he sido notificado de los riesgos a los cuales estoy expuesto para el cargo de Ayudante de obra

que desempeño en la empresa/proyecto Consorcio Mitigación Rebeca *desde la fecha* 1 Enero

Firma del trabajador

Firma de quien realiza la notificación

Scanned with CamScanner

ANEXO N° 3
RETIRO

CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB	**FORMATO ORDEN EXAMEN DE RETIRO OCUPACIONAL**	**Código** SST-F-37 **Fecha** 22/08/2022 **Versión** 2

Girón, 2026-06-30

Carlos Daniel Diaz Quintero

Cédula de Ciudadanía No. **1.005.540.379**

Ayudante de Obra

CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB

Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, y en la Resolución 1443 de 2007, me permito notificarle que a partir de la fecha de terminación del vinculo laboral con **CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB** dispone de 5 (cinco) días para presentarse a la práctica del correspondiente EVALUACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL DE RETIRO, en:

IPS: Dr. Sergio Serrano Gomez

Dirección: Centro Industrial San Jorge - Bodega 16 - Girón.

**Debe confirmar con el area de gestión humana previamente para asigar hora de la consulta.*

Finalizado tal tiempo sin que usted asista a la citación, se entenderá que renuncia a la práctica de tal, y la empresa no se hará responsable de las condiciones de salud que el trabajador reporte después del retiro.

La presente orden se expide digitalmente a los **2026-06-30.**



Jose Orlando Alba Jaimes

Coordinador SST

Contacto: sst@jsgingenieria.com.co

ANEXO N° 4
DOCUMENTOS MAQUINARIA



MARCA:
CASE

TIPO:
MINICARGADOR SR175

SERIE:
JAFSR175EJM446321

MOTOR:
126894

MODELO:
2018

MQ-047
MINICARGADOR SR175

MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS

Cra 26# 36 -14
Edificio Fenix Business Center
Oficina 403
Bucaramanga

11/06/2019

MAQUINOBRAS DE COLOMBIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 78805

No. DE REGISTRO MC10R909	MARCA CASE	LINEA SR175	AÑO MODELO 2018
TIPO DE MAQUINARIA CONSTRUCCION	CLASE MINICARGADOR		No. SERIE JAFSR175EJM463121
COLOR(ES) AMARILLO	No. MOTOR 126894		MODULO NEUMATICOS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
2812 Kg	1970 mm	1350 mm	3300 mm

PROPIETARIO APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
INVERNOTA S.A.S

IDENTIFICACIÓN
NIT 901 178.054

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S):

IDENTIFICACIÓN

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRANSITO EXPEDIDOR
DIR TTOYTTE BUCARAMANGA

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
26-11-2019	25-07-2021	
ORIGEN	DEC. IMPORTACIÓN	FECHA DE LEVANTE
IMPORTACIÓN	46201B000509768	16/06/2016

ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM0300C03943

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año **2018**

4. Número de formulario
4820180000509768-6

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 890903024 | 6. DV: 1 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S. A.S.

12. Dirección: CL 11 SUR CR 50 50 | 13. Teléfono: 3605181 | 14. Cód. Admón.: 48 | 15. Cód. Dpto.: 05 | 17. Cód. Ciudad Municipio: 001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 900081358 | 25. DV: 1 | 26. Razón social del declarante autorizado: Agencia de Aduanas ML S.A. Nivel 1 | 27. Tipo usuario: 26 | 28. Cód. usuario: 513

29. Número documento de identificación: 73099540 | 30. Apellidos y nombres: Suarez Rojas Ewind Eduar

31. Clase importador	32. Tipo declaración	33. Cód.	34. No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Importación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Anticipada	3	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cód. lugar ingreso de las mercancías	41. Cód. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
CTG	7201	No. 116575009196511	2018 - 08 - 12	No. SUDU2800fAC6NAF9	2018 - 08 - 03

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: CNHI INTERNATIONAL S.A. | 47. Ciudad: LUGANO | 48. Cod.País Exportador: 707

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: RIVA PARADISO 14 CH 6902 LUGANO | 50. E-mail: 41919853643

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Aduana	56. Cod. Depto Destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ Cot.
FTCMH180044284	2018 - 07 - 28	249	1	434	5	EDUARDO L GERLEIN S A	2,904.90

59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complejo/Unidad	61. Cod. Sub-complejo/Unidad	62. Cod. Modalidad	63. No. Sucesivo de la venta	64. Valor aduana USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
8479504000	XX	XX	C102	XX	XXXX	XX	249	XXX

68. Puerto de carga de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs.	72. Peso neto kgs.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartida	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad unid. com.
01	01	767	2,936.56	2,805.56	Y Y	5	1	U	1.00

78. Valor FOB USD	79. Valor Fletes USD	80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD	82. Subtotal de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD
23,416.80	368.55	7.01	71.85	447.41	0.00

84. Valor aduana USD	85. Código Régimen o Modelo	86. Número	87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No	90. Cod Interno del Producto
23,884.35	X	XXXXXXXXX	99	XXXX	XXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	69,323,550	0	0	0
I.V.A.	5.00	69,323,550	3,466,000	0	0
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0
Derechos Antidumping	0	0	0	0	0
Sanción	0	0	0	0	
Tasa cuota	0	0	0	0	
		Total	3,466,000		0

91. Descripción de las mercancías (Arancel de la descripción de las mercancías a importar con la exactitud en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - incluya marcas, modelos y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

Doc IDENTIFICACION, Doc Packing / Other Comprobante0202180002; Declaracion: 4/4; Codigo UAP: 1516 ; MERCANCIA NUEVA, NOS ACOGEMOS AL DECRETO 2153 DE 2016 Y AL DECRETO 0272 DE 2018, -ESTATUTO TRIBUTARIO- DECRETO EXTRAORDINARIO 624 DE 1989, MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO ARTICULO 868-1, DECRETO 1165 DE 2013 PARA LA NO PRESENTACION DE REGISTRO DE IMPORTACION/ Nits: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, Marca: CASE CONSTRUCTION, Ref: 8010, Modo: 28175 LOADER , C. Cap: PRODUCTO: MINICARGADOR CON BALDE FRONTAL,USO O DESTINO: PARA LA CONSTRUCCIÓN, MODELO SERIAL: (NTEN: 1C6884, CONTIENE PARTES Y AC CCKFDIE PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO, MARCA: CASE CONSTRUCTION, Serial/es / CHASIS/VIN: [illegible], CANTIDAD: 1 UNIDADES; [illegible]

97. Valor pagos anteriores	98. Pólizas cambiarias pago anticipado No.	109. Fecha

130. Espacio reservado DIAN - Actividad Importadora (Estado del Inventario, Levante automático)	131. Espacio reservado exclusivamente Autoridades de Fiscalización Extranjeras	110. No. Ampliación (validez en)
No hay declaración pendiente.		40120180000500758
		111. Fecha: 25 - 8 - 18 - 30

134. Levante No. 452018000347599	135. Fecha: 2018 - 08 - 15	Firma funcionario autorizado	196. Horatio: 113. C.C. No.

Firma declarante

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Espacio reservado para la validación mecánica

201. Pago Total $: 0

998. Espacio para autoliquidación de los contribuyentes (Número de autoadhesivo)

SYGA
Autoadhesivo 92481810097388
Fecha presentación 2018-08-06 10:33:42
Valor pagado $0

Fecha de impresión: 2018-08-16 15:36:17

20181741148810

UNIDAD DE PERFORACION NEUMÁTICA No. 10

MARCA:	CORE-DRIL
SERIE:	432 1825 0621
MOTOR DE ROTACIÓN:	378 C 0189
MODELO:	A 432 HD



DIAN

Declaración de Importación | Privada | **500**

Año **2021**

Espacio reservado para la DIAN [illegible]

4. Número de formulario: **482021000546911-1**

Campo	Valor
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	900049807
6. DV	1
11. Apellidos y nombres o Razón Social	MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S.
12. Dirección	CR 26 76 14 OF 408 ED FENIX
13. Teléfono	8814006
14. Cód. Admón	40
15. Cód. Dpto	68
16. Cód. Ciudad/Mun	001
24. Número de Identificación Tributaria (NIT)	900107358
25. DV	7
26. Razón social del declarante autorizado	AGENCIA DE ADUANAS GEOCARGA DE COLOMBIA LTDA NIVEL 2
27. Tipo usuario	26
28. Cód. usuario	528
29. Número documento de identificación	1126001898
30. Apellidos y nombres	RUBEN TELLO ARAGON
31. Clase importación	02
32. Tipo declaración	Inicial
33. Cód.	7
34. No. Formulario Anterior	XXXXXXXXXXXXXXX
35. Año-Mes-Día	XXXX - XX - XX
36. Cód. Admón	XX
37. Declaración de Exportación	No. XXXXXXXXXXXXXXX
38. Año-Mes-Día	XXXX - XX - XX
39. Cód. Admón	XX
40. Cód. Lugar ingreso de mercancía	CTG
41. Cód. Depósito	14004
42. Manifiesto de carga	No. 1[illegible]5750[illegible]1764732
43. Año-Mes-Día	2021 - 08 - 02
44. Documento de transporte	No. 21EM-0011MEX
45. Año-Mes-Día	2021 - 08 - 02
46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	CORE-DRIL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.
47. Ciudad	CUERNAVACA
48. Cód. país exportador	493
49. Dirección exportador o proveedor en el exterior	NACIONAL 89 SANTA MARIA AHUACATITLAN MORELOS
50. E-mail	EXPORTACIONES@COREDRIL.COM
51. No. de factura	C2109
52. Año-Mes-Día	2021 - 06 - 15
53. Cód. país procedencia	493
54. Cód. Modo Transporte	1
55. Cód. Bandera	169
56. Cód. Clase embalaje	00
57. Empresa transportadora	GERLEINCO S.A.S.
58. Tasa de cambio $ cts	3,782.65
59. Subpartida arancelaria	8430490000
60. Cód. Complementario	10
61. Cód. Suplementario	XX
62. Cód. Modalidad	C100
63. No. cuotas o meses	XX
64. Valor cuota USD	XXXX
65. Periodicidad del pago de la cuota	XX
66. Cód. país origen	493
67. Cód. Acuerdo	XXX
68. Forma de pago de la importación	10
69. Tipo de importación	01
70. Cód. país compra	493
71. Peso bruto kgs	2,770.88
72. Peso neto kgs	2,440.00
73. Código embalaje	PK
74. No. bultos	74
75. Subpartidas	3
76. Cód. Unidad comercial	U
77. Cantidad	4.00
78. Valor FOB USD	59,197.60
79. Valor fletes USD	1,020.24
80. Valor Seguros USD	238.73
81. Valor Otros Gastos USD	0.00
82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	1,282.08
83. Ajuste valor USD	0.00
84. Valor aduana USD	60,556.56
85. Código registro o licencia	X
86. Número	XXXXXXXXXXX
87. Cód. Valor	99
88. Año	XXXX
89. Programa	XXXXXXXXXXX
90. Cod. Producto	0

Liquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	230,479,408	0	0	0
IVA	19.00	230,479,408	43,791,000	0	0
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0
Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0
Sanción		0	0	0	
Rescate		0	0	0	
Total			43,791,000		0

91. Descripción de las mercancías [illegible]

[illegible] DECLARACION [illegible] ACUERDO A LA LEY [illegible] ARTICULO [illegible] INCISO [illegible] PREVALENCIA [illegible] SUSTANCIAL [illegible] APLICACION [illegible] ACTUALIZADA [illegible] DE [illegible] IMPORTACION [illegible] ACUERDO AL [illegible] DE MAYO DE 2011 [illegible] MODELO [illegible] REFERENCIA [illegible] MOTOR [illegible]

127. Valor pagos anteriores	0
128. Número del recibo oficial de pago	XXXXXXXXXXXXXXX
129. Fecha	XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN	No hay declaración anterior
131. [illegible]	
132. No. Aceptación declaración	482021000546911
133. Fecha	2021 08 08
134. Levante No.	482021000493487
135. Fecha	2021 - 08 - 09
Firma funcionario responsable	
136. [illegible]	[illegible]

Firma declarante

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $ 0

996. Espacio para Número adhesivo

9104801699935

Fecha de impresión 2021-08-08 12:14:18

20213732318353

DIAN

MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación : 482021000546911-1
Subpartida : 9403490000

482021000546911-1



MARCA:
ATLAS COPCO

TIPO:
COMPRESOR

SERIE:
WUX543518

MOTOR:
82445954

MODELO:
2021

MQ-060
COMPRESOR
XAVS450

MAQUINOBRAS DE COLOMBIA

MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS

Cra 26# 36 -14
Edificio Fenix Business Center
Oficina 403
Bucaramanga

06/04/2022



Factura Electrónica De Venta No

MCFE No. 849

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764023721705 que habilita desde MCFE 725 hasta MCFE 1000. Vence 2022-07-04

HENRY BLANCO PEREZ

Nit 13.839.427-0

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 7730 10.00 X 1000
Autoretenedor ICA Girón Acuerdo 59 de 2018

CLIENTE	MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S.	ORDEN DE SERVICIO	
NIT	900849507 1	FACTURA DE VENTA N°849	
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
CR 26 36 14 OF 403 ED FENIX BUSSINES		Bucaramanga	6382809
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/04/2022	14/04/2022	HENRY BLANCO PEREZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	COM-100003	COMPRESOR DE AIRE PORTATIL, ATLAS COPCO, MODELO XAVS450 SERIAL:WUX543519	1	Und.	152.635.367	19%	29.000.720	152.635.367
2	COM-100009	COMPRESOR DE AIRE PORTATIL, ATLAS COPCO, MODELO XAVS450 SERIAL:WUX543518	1	Und.	152.635.367	19%	29.000.720	152.635.367

Total lineas o items: 2

Valor en Letras

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	306.270.734
DESCUENTO	0
IVA	56.001.439
TOTAL DE LA OPERACIÓN	363.272.173
RETEFUENTE	7.631.768
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	355.640.405

FAVOR CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS N°60490193001 O CUENTA CORRIENTE N°79660827660 a nombre de Henry Blanco Perez

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/04/2022 16:14:00

De acuerdo con la Ley 1581 del 2012 de Protección de Datos y el Decreto 1377 del 2007 informamos que los datos proporcionados por usted estaran incorporados en una base de datos bajo la responsabilidad de la empresa MOTORES Y COMPRESORES.

CALLE 47 # 32-53 GIRÓN -SANTANDER Teléfono 6465686

Celular: 310-2774197

Correo Electrónico motoresycompresores@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534066-3 Software: World Office (ws_2)
CUFE: 0378f71cab8da90b4e2b9f4643d285723d4d0ec467b4472ce642a7d5e11acbbbefeese001e8ae9f63a68f15b2997e7fe --Fecha y Hora de Expedición : 06/04/2022 4:38:13 p. m.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DIAN

Declaración de Importación

Privada **500**

1. Año **2021**

Espacio reservado para la DIAN

6. Número de formulario
352021000516503-9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 830923891 | 5. DV: 1 | 31. Apellidos y nombres o Razón Social: RODRIGUEZ Y LONDOTO S A
12. Dirección: AV CL 80 116 B 61 | 13. Teléfono: 9938830 | 32. Cód. Admón.: 35 | 34. Cód. Ciudad: 11 | 37. Cód. Ciudad Vivienda: 001

Importador

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 830147508 | 25. DV: 2 | 26. Razón social o nombre declarante: AGENCIA DE ADUANAS CUSTOM INTERNACIONAL S.A. NIVEL 2 | 27. Tipo usuario: 26 | 28. Cód. Intermediario: 476
29. Número documento de identificación: 28470953 | 30. Apellidos y nombres: BALANTA ARIZALA ANYELA YESENIA

21. Clase declaración	22. Tipo declaración	23. Cód.	24. No. Formulario anterior	25. Año - Mes - Día	26. Cód. Admón.	27. Declaración de Importación	28. Año - Mes - Día	29. Cód. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cód. lugar ingreso de las mercancías	37. Cód. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BUN	907	No. 957033654	2021 - 12 - 28	No. SH080356576	2021 - 11 - 08

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: ATLAS COPCO (WUXI) COMPRESSOR CO, LTD | 47. Ciudad: WUX | 48. Cód.País Exportador: 215
49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: 22 CHANG JIANG ROAD NEW DIST, WUXI 214028 PR | 50. E-Mail: 510-85211410

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cód. país procedencia	54. Cód. Modo Transporte	55. Código de Aduana	56. Cód. Depto. destino	57. Persona consignataria	58. Tasa de cambio
960529	2021 - 11 - 01	215	1	467	76	FRONTIER AGENCIA MARITIMA DEL CARIBE S.A.S.	3.997,09

59. Subpartida arancelaria	60. Cód. Complementaria	61. Cód. Suplementaria	62. Cód. Medidores	63. No. carros o mares	64. Valor aduana USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cód. país de origen	67. Cód. Acuerdo
8414409500	XX	XX	C200	XX	XXXX	XX	215	XXX

68. Puerto de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cód. país compra	71. Peso bruto kgs.	72. Peso neto kgs.	73. Código unidades	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cód. unidad comercial	77. Cantidad
01	01	215	5,810.00	5,229.00	PK	3	1	U	3.00

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD	80. Valor seguros USD	81. Valor otros gastos USD	82. Subtotal de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

84. Valor aduana USD	85. Código régimen y tratamiento	86. Modalidad
[redacted]	X	XXXXXXXXXX

87. Cód. oficina	88. Año	89. Programa No.	90. Cód. tratamiento del Producto
09	XXXX	XXXXXXXXXX	0

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	[redacted]	0	0	0
I.V.A.	19.00	[redacted]	[redacted]	0	0
Safeguarda	0.00	0	0	0	0
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0
Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0
Sanción		0	0	0	
Recargo		0	0	0	
		Total	[redacted]		0

Autoliquidación

DECLARACION 1 DE 1; O.C. 585-21-IMP CODIGO DTS 830184 PEDIDO ATLAS 19575 DO CUSTOM 03-4549-1221-1 NOS ACOGEMOS AL DECRETO 0925 DE 2013. MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR, IMPORTACION EXENTA DE REGISTRO DE IMPORTACION. MERCANCIA NUEVA Y EN BUEN ESTADO. ///// RE FERENCIA: 8162008191, PRODUCTO: COMPRESOR DE AIRE CON ACCESORIOS PARA NORMAL FUNCIONAMIENTO, MARCA: ATLAS COPCO, AÑO FABRICACION: 2021, MODELO: XAVS450 Y2/XAVS450 SERIAL MAQUINA: WUX543518, SERIAL MOTOR: 82447251/ SERIAL MAQUINA: WUX543519, SERIAL MOTOR: 824 45654/ SERIAL MAQUINA: WUX543520, SERIAL MOTOR: 82443964/ MARCA MOTOR: DONG FENG CUMMINS ENGINE LTD. USO O DESTINO: EQUIPOS DE CO NSTRUCCION Y MINERIA POTENCIA: 176.9 HP (132 KW), TIPODE COMPRESOR: TORNILLO, PRESION: 203 PSI (14 BAR). Sicontinúa al respaldo)

97. Valor pagos anticipados: 0	128. Medio oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera: Código de levante. Levante automático. No hay declaración posterior	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Preplanilla declaración: 352021000516503 133. Fecha: 2021 12 30
134. Levante No. 352020000002047	135. Fecha: 2022 - 01 - 04	136. Firma funcionario responsable	138. Nombre 137. C.C. No.

Firma declarante

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

998. Pago Total $ 0

999. Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo)

SIGA
Autoadhesivo 923521023374777
Fecha presentación 2021-12-30 10:01:51
Valor pagado $0

Fecha de impresión: 2022-01-04 10:33:27

20212533302004

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación : 352021000516503-9
Subpartida : 8414409000

Página 1 de 1

SISTEMA MOTRIZ: MOTOR DIESEL, SISTEMA DE REFRIGERACION: AGUA, DATOS FACTURA: XAV8450 T2 4X BOX REFERENCIA FABRICA, SIZE 1.5 TONELADA 4 AXEL SR BARRA DE ENGANCHE TAMAÑO 1.5 CON CAJA ACME Y FRENOS EN EL EJE, CANTIDAD: 1 UNIDAD /// FACTURA 960939 DE 01/11/2021


352021000516503-9

EL COMPRESOR XAVS 450 Cud

Portable, seguro y ultra confiable

Productividad Sustentable

Atlas Copco

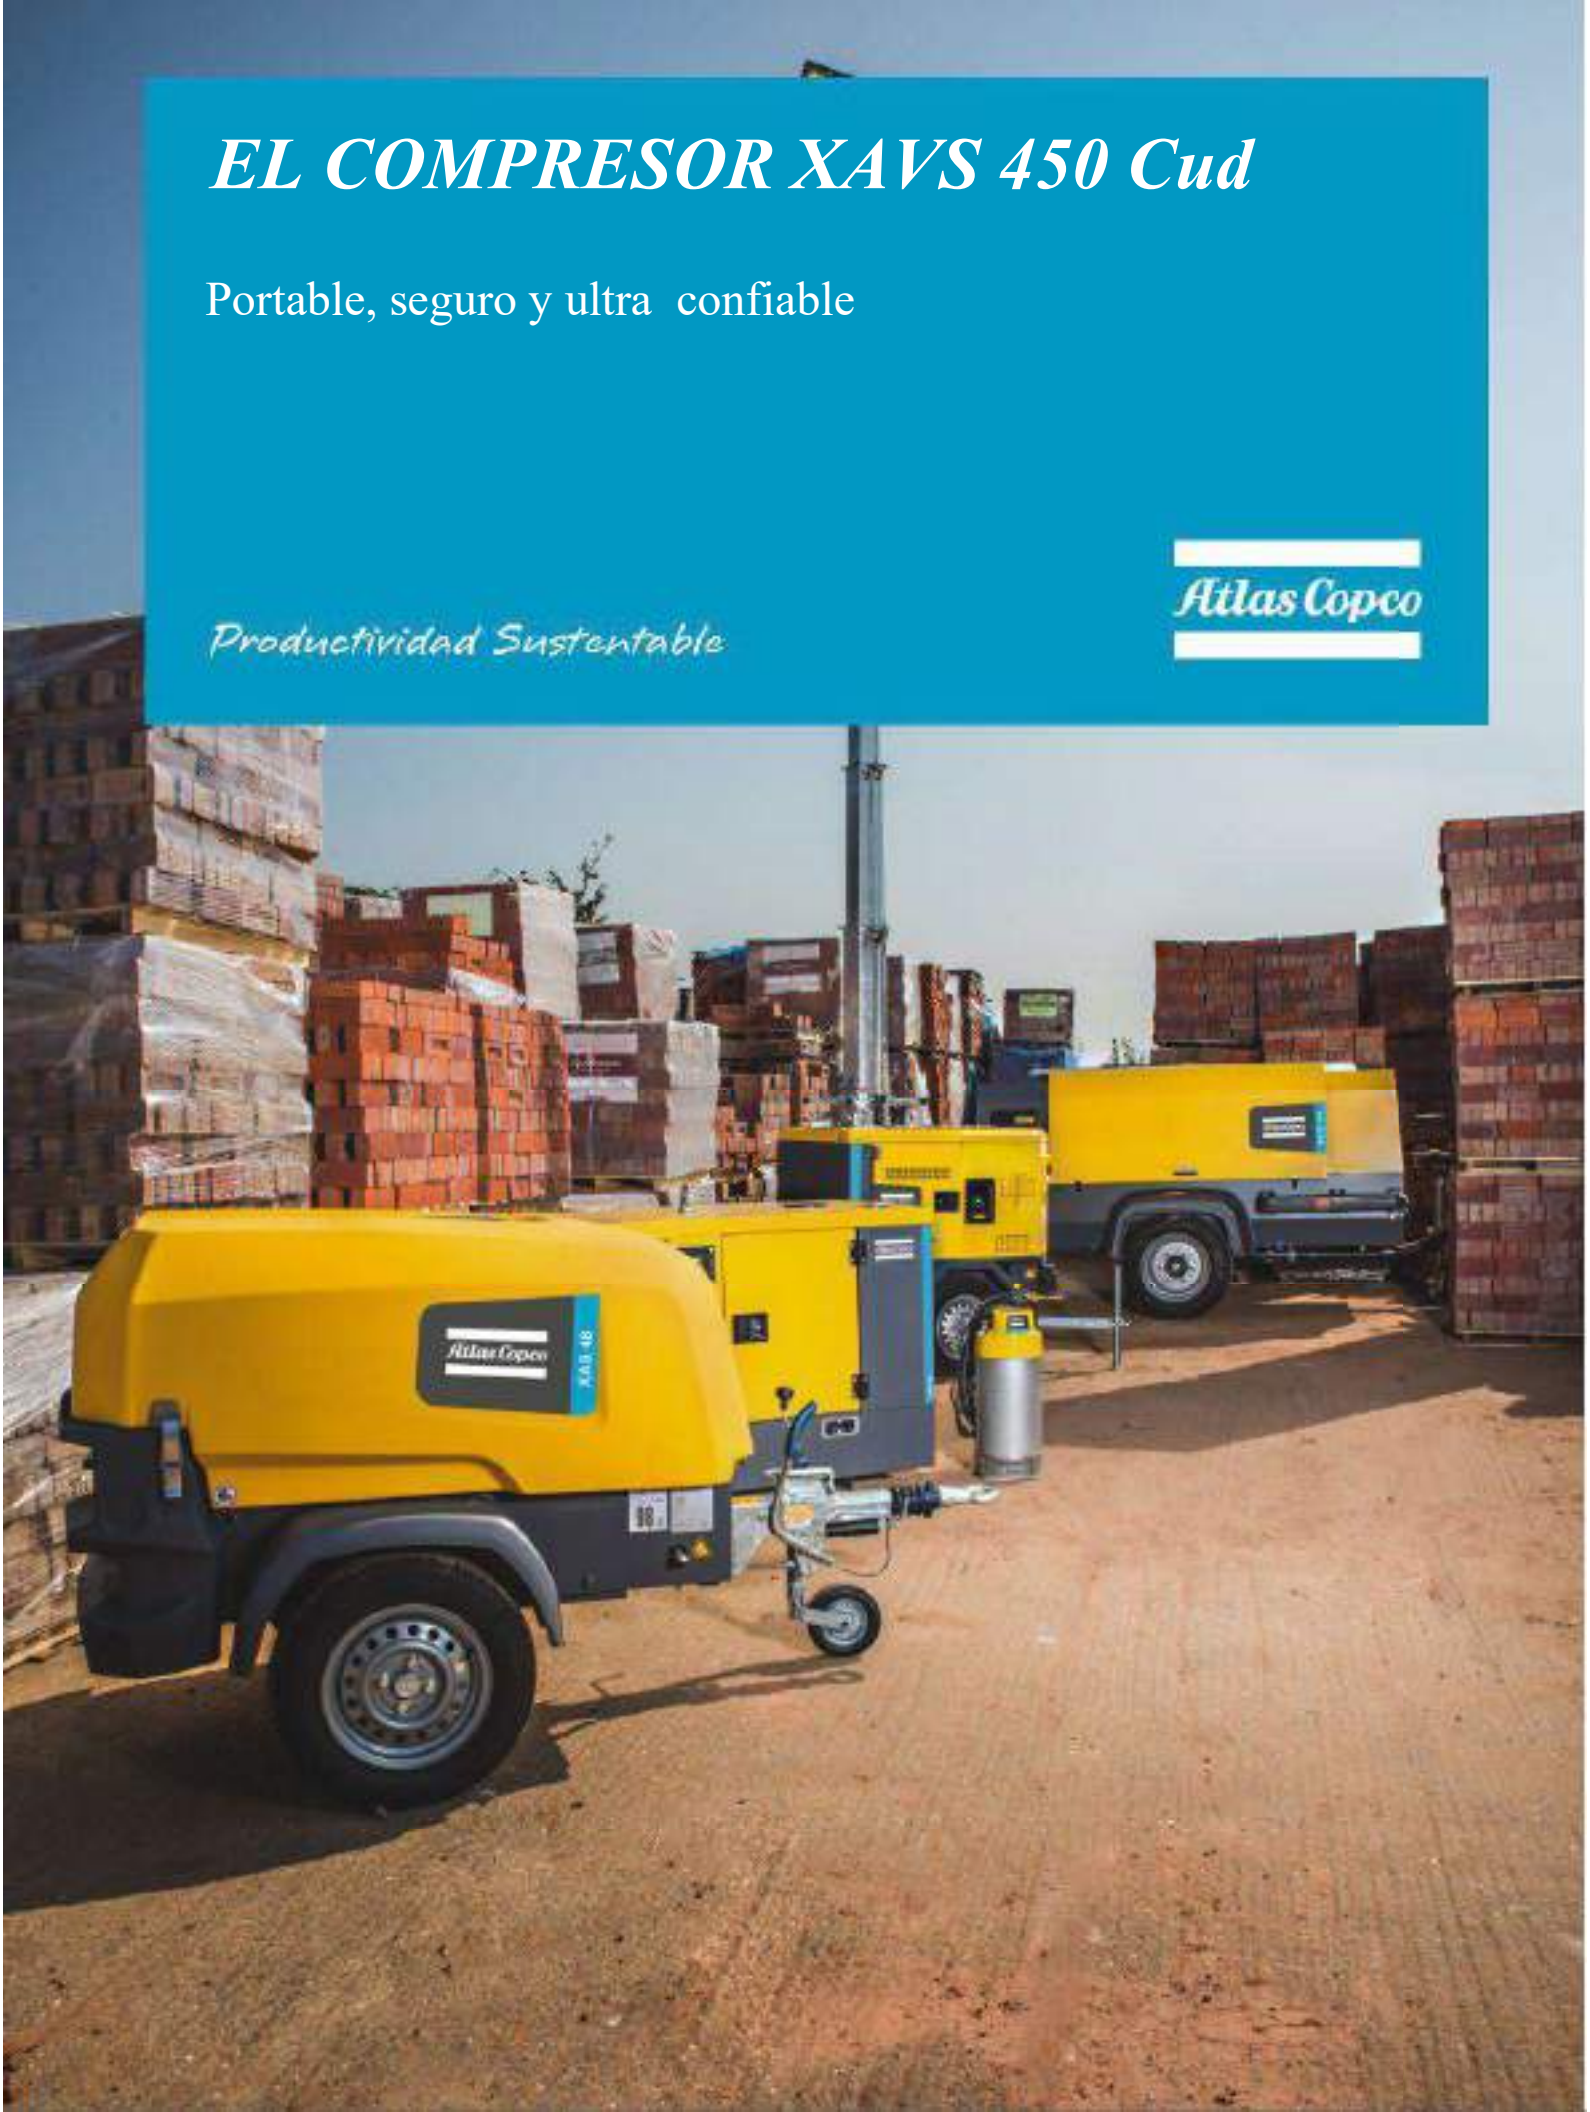

Altas Copco es el fabricante líder en compresores de aire en el mundo. A través de los años, hemos escuchado constantemente a nuestros clientes, por lo que diseñamos máquinas que exceden sus espectativas.



DATOS TÉCNICOS

Rendimiento		XAVS 450 Cud
Presión de trabajo	Bar - psi	14 - 200
Aire libre entregado	cfm - l/s	438 - 202
Nivel de presión acústica (Lp) 7 m	dB(A)	80
Nivel de ruidos (Lw)	dB(A)	104
Máxima temperatura ambiente al nivel del mar	°C	48
Temperatura mínima de arranque	°C	-25

Motor		
Marca		Cummnis
Modelo		6BTAA5.9
Número de cilindros		6
Entrega de potencia a velocidad de eje normal	kW	132
rpm a plena carga	rpm	2400
rpm en descarga	rpm	1500
Capacidad		
Capacidad del aceite del motor	Litros	16.3
Capacidad del aceite del compresor	Litros	26.5
Capacidad del tanque de combustible	Litros	175

Consumo de Combustible		
Consumo de combustible al 0%	l/h	10.42
Consumo de combustible al 100% (carga completa)	l/h	26.83

Dimensiones de Transporte: Montado en Remolque		
Largo	mm	3947
Ancho	mm	1716
Alto	mm	1791
Peso con remolque	Kg	1850
Salidas de aire	In	1 x 1 1/2" NTP/ 3 x 3/4"

PELIGRO: El aire comprimido nunca debe suministrarse como aire respirable, a menos que sea purificado adecuadamente. Atlas Copco no asumirá ninguna responsabilidad relacionada con el sistema de aire respirable entre comprador/usuario.

CARACTERISTICAS

. Listo para operar con una gama completa de opciones.
. Uso en todas las condiciones meteorológicas (-25 °C a + 48 °C).
. Mínimas dimensiones y peso ligero.
. Intervalos de servicio y mantenimiento ampliados.

VENTAJAS

. Fácil de transportar o trasladar en el sitio
. Fácil de operar
. Coste total de operación más bajo
. Construcción robusta, construida para durar



www.atlascopco.com

2935 9840 00 - Subject to modifications without prior notice. Copyright 2013, Atlas Copco (Wuxi) Compressor Co.Ltd., Wuxi, China

Las fotografías e ilustraciones contenidas en este documento pueden representar productos con componentes opcionales y/o adicionales que no se incluyen con la versión estándar del producto y, por lo tanto, no se incluyen en la compra de dicho producto a menos que el cliente adquiera especialmente componentes opcionales o adicionales. Nos reservamos el derecho de cambiar las especificaciones y el diseño de los productos descritos en esta literatura sin previo aviso. No todos los productos están disponibles en todos los mercados.



MARCA:
CORE-DRIL

TIPO:
MAQUINA DE PERFORACIÓN

SERIE:
432 1849 1221

MOTOR:
378 C 5151

MODELO:
2022

MQ-061
MAQUINA DE PERFORACION #11

MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS

Cra 26# 36 -14
Edificio Fenix Business Center
Oficina 403
Bucaramanga

12/03/2022

MAQUINOBRAS DE COLOMBIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada **500**

1. Año **2022**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

4820220002216248

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 900849507 | 6. DV: 1 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S.

12. Dirección: CR 25 38 14 OF 403 ED FENIX | 13. Teléfono: 6914305 | 14. Cód. Adenda: 48 | 16. Cód. Dpto: 68 | 17. Cód. Ciudad Municipio: 001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 900107358 | 25. DV: 7 | 26. Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS GEOCARGA DE COLOMBIA LTDA NIVEL 2 | 27. Tipo usuario: 28 | 28. Cód. usuario: 528

29. Número documento de identificación: 1128061999 | 30. Apellidos y nombres: RUBEN TELLO ARAGON

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34. No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
CTG	7201	No. 116575012279608	2022 - 04 - 08	No. 3020220220131	2022 - 03 - 21

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: CORE-DRIL INTERNACIONAL S.A. DE C.V. | 47. Ciudad: CUERNAVACA | 48. Cod.País Exportador: 493

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: NACIONAL 83 SANTA MARIA AHUACATITLAN, MORELOS | 50. E-mail: EXPORTACIONES@COREDRIL.COM

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Oficina	56. Cod. Depto Destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ x/x.
C2688	2021 - 12 - 15	493	1	434	68	HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA.	3,771.83

S | 59. Subpartida arancelaria: 8430490000 | 60. Cod. Complementario: XX | 61. Cod. Suplementario: XX | 62. Cod. Modalidad: C100 | 63. No. cuotas o meses: XX | 64. Valor cuota USD: XXXX | 65. Periodicidad del pago de la cuota: XX | 66. Cod. país de origen: 493 | 67. Cod. Arancel: XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs.	dcms.	72. Peso neto kgs.	dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
01	01	493	1,572.31		1,460.00		YY	4	3	U	2.00

78. Valor FOB USD	79. Valor Bruto USD	80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD	82. Deducciones (Fletes, Seguros y otros gastos) USD	83. Ajuste valor USD	84. Valor Aduana USD	85. Código régimen o licencia	86. Numero
34,047.16	1,171.21	136.19	0.00	1,307.40	0.00	35,354.56	X	XXXXXXXXXX

87. Cod. adicional	88. Año	89. Programa No.	90. Cód Interno del Producto
99	XXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	133,351,390	0	0	0
IVA	19.00	133,351,390	25,337,000	0	0
Sobretasa/tasa	0.00	0	0	0	0
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0
Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0
Bancos	0	0	0	0	
Rezago	0	0	0	0	
		Total	25,337,000		0

91. Descripción de las mercancías (No. ítem de mercancías a importar con la variedad en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - factura marca, modelo y referencia, comercial - cantidad en reposición de este formulario)

DO 2022030481 DECLARACION(1-3) NOS ACOGEMOS A LA DEF 49 DE MAYO/1981 ARTICULO VIII DEL GATT. PARRAFO 2, PARRAFO 3 PRINCIPIO DE JU STICIA Y PREVALENCIA DE LO SUSTANCIAL ESTABLECIDO COMO DE OBLIGATORIA APLICACIÓN EN LAS ACTUACIONES ADUANERAS, DE CONFORMIDAD CON EL ART 2 DEL DECRETO 1165 DE 2019. NOS ACOGEMOS AL DECRETO 0925 DE MAYO 09 DE 2013. NO REQUIERE PERMISO ICA POR NO SER MERCANCIA USADA. PRODUCTO: EQUIPO DE PERFORACION NUEVO, MARCA: CORE DRIL, MODELO: A 432 HD, REFERENCIA: 101104, USO O DESTINO: EQUIPO DE P ERFORACION - REALIZAR PERFORACIONES VERTICALES, SERIAL: 43218481221, 43218481221, INFORMACION SEGUN FACTURA: EQUIPO DE PERFORACIÓ N, MODELO AIRMOBIL 432HD. EQUIPADOS CON LUBRICADOR DE LÍNEA Y GUÍA PARA MARTILLO COES Y TUBERÍA COED. EQUIP(continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera. Estado de levante: Levante automático. No hay declaración posterior.	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración: 4820220002216248. 133. Fecha: 2022 04 12
134. Levante No. 4820220002201123	135. Fecha: 2022 - 04 - 13	Firma funcionario responsable / 136. Revisión / 137. C.C. No.

Firma declarante

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $: 0

996. Espacio para Número autoadhesivo

9104801799850 1

Fecha de Impresión: 2022-04-13 11:33:12

20220971552197

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación : **482022000221624-8**
Subpartida : **8430490000**

106. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, modelos y otros)

O 1. NO. DE CHASIS: 432 1869 1221., MOTOR DE ROTACIÓN: 380 042., MOTOR DE AVANCE: 378 C 5151. // EQUIPO 2. NO. DE CHASIS: 432 186
8 1221., MOTOR DE ROTACIÓN: 380 040., MOTOR DE AVANCE: 378 C 5152 HECHO EN MEXICO CANT (2) PIEZAS //XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

COMPRESOR DENAIR DACY 13/13

460 CFM - 2000 PSI

HIGHT PRESSURE

(#25)

SERIE: CZG 21111143



(EQUIPO ALQUILADO)

DIESEL DRIVEN COMPRESSED AIR SOLUTION







Denair Energy Saving Technology (Shanghai) PLC.

DENAIR

TABLA DE CONTENIDO

1. PERFIL DE DENAIR 2
2. DENAIR DISTRIBUIDOR AUTORIZADO EN COLOMBIA 3
3. SOLUCIÓN TÉCNICA 5
3.1 COMPRESOR DE AIRE CON MOTOR DIÉSEL 5
3.1.1 Características y ventajas 5
3.1.2 Especificación técnica DACY-13/13 7
3.1.3 Dibujo dimensional DACY-13/13 8
3.1.4 Diagrama de tuberías e instrumentos 8
3.1.5 Curva de rendimiento de unidad de compresora 9
3.1.6 Documentación y opciones 10
3.2 KITS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (PRIMER AÑO) 10
3. PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS 11
3.1 Equipo de gestión de proyectos 11
3.2 Flujo de trabajo de gestión de proyectos 12
3.3 Plan de programación del proyecto (Tener stock) 12
3.4 Política internacional de servicio posventa 13
3.5 Certificado de garantía 16
5. PROYECTOS Y CLIENTES EXITOSOS 17

1. PERFIL DE DENAIR



DENAIR Group es una empresa que cotiza en bolsa y se considera uno de fabricantes líderes de productos de compresores de aire y gas en Shanghai, China. DENAIR tiene 23 sucursales y subsidiarias con más de 500 empleados. Nuestro objetivo es proporcionar un servicio excepcional a los clientes junto con productos de calidades y soluciones de ahorro energético.

Los negocios principales de DENAIR se centran en las siguientes áreas clave:

- Compresores de tornillo rotativo con inyección de aceite (accionados por correa y accionados directamente, Velocidad fija y Velocidad variable, Presión alta, normal y baja)
- **Compresores de aire portátiles (con motor diésel** y con motor eléctrico**)**
- Compresores de aire libre de aceite (Tipo seco, Tipo scroll y Tipo lubricado con agua)
- Compresores centrífugos
- Compresores de gas de proceso
- Bombas de vacío
- Bombas de calor

En DENAIR, nos ganamos la confianza y satisfacción de nuestros clientes mediante la fabricación de los productos superiores de aire comprimido de calidad para todas las industrias.Todos nuestros productos están diseñados para un rendimiento fiable, mantenimiento fácil y la máxima eficiencia energética. DENAIR ha estado exportando a más de 150 países en todo el mundo.Contamos con el equipo de servicio y ventas internacionales más grande de la industria de compresores de China. Nuestro personal bien capacitado y motivado, que puede hablar inglés, español, francés, ruso, árabe y coreano, ofrece asesoramiento experto y asistencia para todos los desafíos.

DENAIR innova continuamente en el desarrollo y la gestión de productos para satisfacer las demandas de los clientes. La poderosa cultura de la empresa y la innovación continua hacen DENAIR mejoró rápidamente hasta alcanzar el principio de negocio "Ahorro de energía en el primer lugar, valores compartidos mutuos". La misión de DENAIR ser una empresa de clase mundial promoviendo un desarrollo sostenible que busca la mejora constante de nuestro propio valor y compartirlo con nuestros clientes y nuestros personales, comprometido a satisfacer continuamente las necesidades de las empresas globales proporcionando una gama completa de soluciones de compresión de aire y gas industrial.

2. DENAIR DISTRIBUIDOR AUTORIZADO EN COLOMBIA

Distribuidor autorizado: HENRY BLANCO PEREZ (MOTORES Y COMPRESORES)
Dirección: CALLE 47 # 32-53, BARRIO BELLAVISTA, GIRON, SANTANDER, COLOMBIA
Experiencia: Mayor de 35 años de experiencia en industria de aire comprimido, es experto para Compresor portátil diésel, Compresor tornillo lubricado, etc....
Servicios autorizados ofrecidos: Vender compresor DENAIR y ofrecer servicios de instalación, puesta en marcha, mantenimiento y reparación autorizado por DENAIR en Colombia.







TOP



NO.: DNRZJT(X)LMC2021120201

DENAIR

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Este certificado es para certificar que

MOTORES Y COMPRESORES

Nit # 13.839.427-0

Dirección: Calle 47 # 32-53, Barrio Bellavista, Girón, Santander, Colombia

Representada por Henry Blanco Pérez

es distribuidor autorizado para

DENAIR

Vender Compresor de Aire y Ofrecer servicios autorizados

Válido hasta

24 . Febrero, 2025

Regional Manager

Denair Energy Saving Technology (Shanghai) PLC.

DENAIR ENERGY SAVING TECHNOLOGY (SHANGHAI) PLC

3. SOLUCIÓN TÉCNICA

3.1 COMPRESOR DE AIRE CON MOTOR DIÉSEL



- ✓ **Rendimiento superior**
- ✓ **Durabilidad excelente**
- ✓ **Alta confiabilidad**
- ✓ **Unidad Compresora DENAIR con tecnología alemana**
- ✓ **Motor Cummins 180HP**

3.1.1 Características y ventajas

- **Unidada de compresora de última generación y motor de alta eficiencia**

- La unidad de compresora DENAIR adopta una nueva generación de perfil asimétrico de 5-6 dientes tipo - α , mayor eficiencia volumétrica



- El último diseño de puerto de mariposa optimiza el punto de inyección y reduce el consumo total de energía
- Adopte la máquina herramienta de procesamiento avanzada de Holpoyd, y su equilibrio dinámico puede alcanzar el estándar G2.5, menor ruido
- Motor diésel de CUMMINS u otro motor diesel famoso para un funcionamiento prolongado. Adopte la tecnología de turbocompresor de escape para mejorar la propiedad dinámica y reducir el consumo de combustible. El tanque de combustible de gran capacidad mantiene el compresor en funcionamiento continuo durante 10 horas para ahorrar tiempo de repostaje.

- **Solución de rendimiento excepcional**



- El sistema de separación de aceite y gas patentado hace que el aire comprimido sea más limpio y menos contenido de aceite <3PPM, caída de presión <0.02MPa
- Los filtros de aire distintivos incluyen los filtros de aire dobles de carcasa de hierro y el indicador de filtro de

aire mecánico para garantizar un aire purificado y limpio incluso en el área polvorienta
- Sistema automático de disparo / apagado

- **Protección y control inteligente confiable**



- El sistema de monitoreo y alerta está equipado para monitorear la operación en cualquier momento.
- Panel de control inteligente instalado verticalmente con parámetros en tiempo real, fácil de leer y operar
- Deflector de la correa del motor para garantizar la operación segura
- Cubierta de red protectora ampliada para el ventilador para protección de seguridad
- Parada de emergencia en caso de emergencias
- Correas de ventilador antiestáticas, aspas para evitar destellos

- **Control avanzado de ruido y vibraciones**




- Adopta algodón compuesto que absorbe el sonido y respetuoso con el medio ambiente, con resistencia al calor y retardante de llama, gran área de superficie, que puede reducir eficazmente el ruido de alta frecuencia en la banda de 1000-2000Hz
- Almohadilla de choque específica para la industria de compresores de aire con las ventajas de una mayor deformación vertical y rigidez lateral, que pueden reducir efectivamente la vibración generada por el motor y el cuerpo durante el funcionamiento, y garantizar que la vibración del compresor de aire esté dentro de los 7.1 mm / s


3.1.2 Especificación técnica DACY-13/13

Modelo	**DACY-13/13**
Unidad compresora	DENAIR
Medio	air
Etapa de compresión	1
Presión atmosférica	0.1033 Mpa
Temperatura ambiental	≤46 ℃
Humedad relativa	≤80 %
Caudal	13m3/min (459cfm)
Presión de trabajo	13bar (190psi)
Volumen de lubricante	55 Litros (14.6 Galones)
Volumen del recipiente de aire comprimido	155 Litros (40.95 Galones)
Cantidad de ruedas	2
Dimensiones (L * W * H)	3790*2110*2390mm (Incluido remolque) 2970*1600*1630mm (Montado en skid)
Peso	2650kg (Incluido remolque) 2050kg (Montado en skid)
Conexión de salida de aire	G1”*2, G2”*1
Motor diésel	
Modelo	6BT5.9-C180
Marca	Cummins
Estándar de emisión	EU Stage II / Tier 2
Potencia	132kW=180HP
Calibre * Carrera * No. de cilindros	102mm*120mm*6
Velocidad de motor (nominal)	2400 RPM
Velocidad de motor (descarga)	1400 RPM
Volumen de aceite de motor diésel	16.3 Litros (4.3 Galons)
Volumen de refrigerante	35 Litros (93 Galons)
Capacidad de tanque de combustible	190 Litros (50.2 Galons)
Voltaje y corriente de la batería	24 V 135 Ah


3.1.3 Dibujo dimensional DACY-13/13

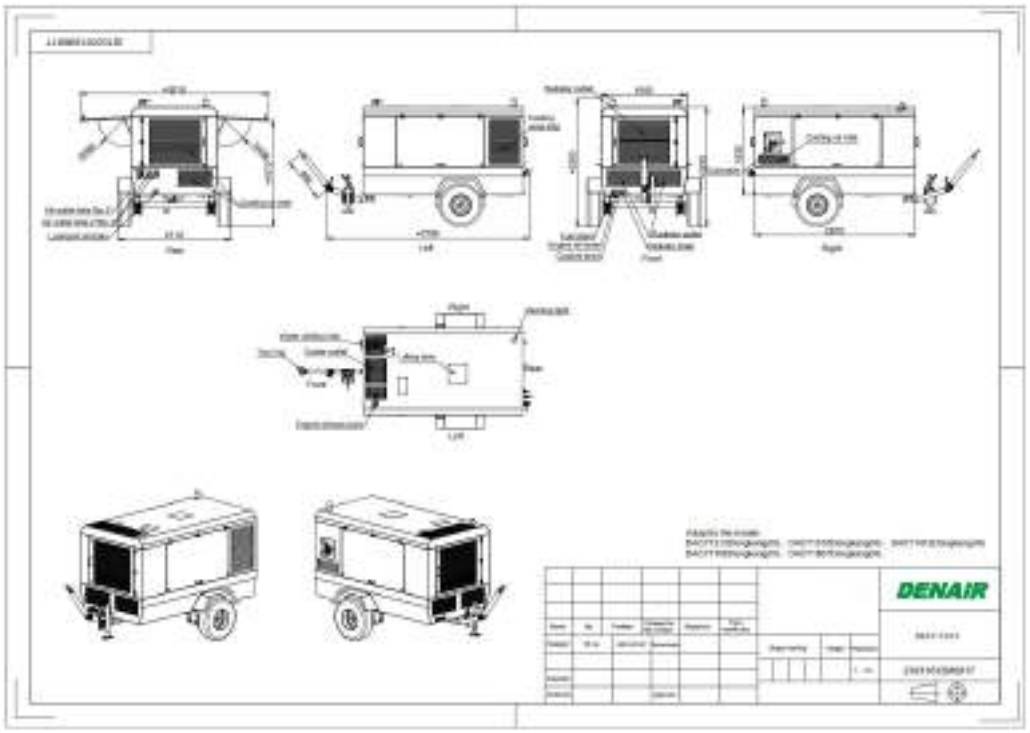


3.1.4 Diagrama de tuberías e instrumentos

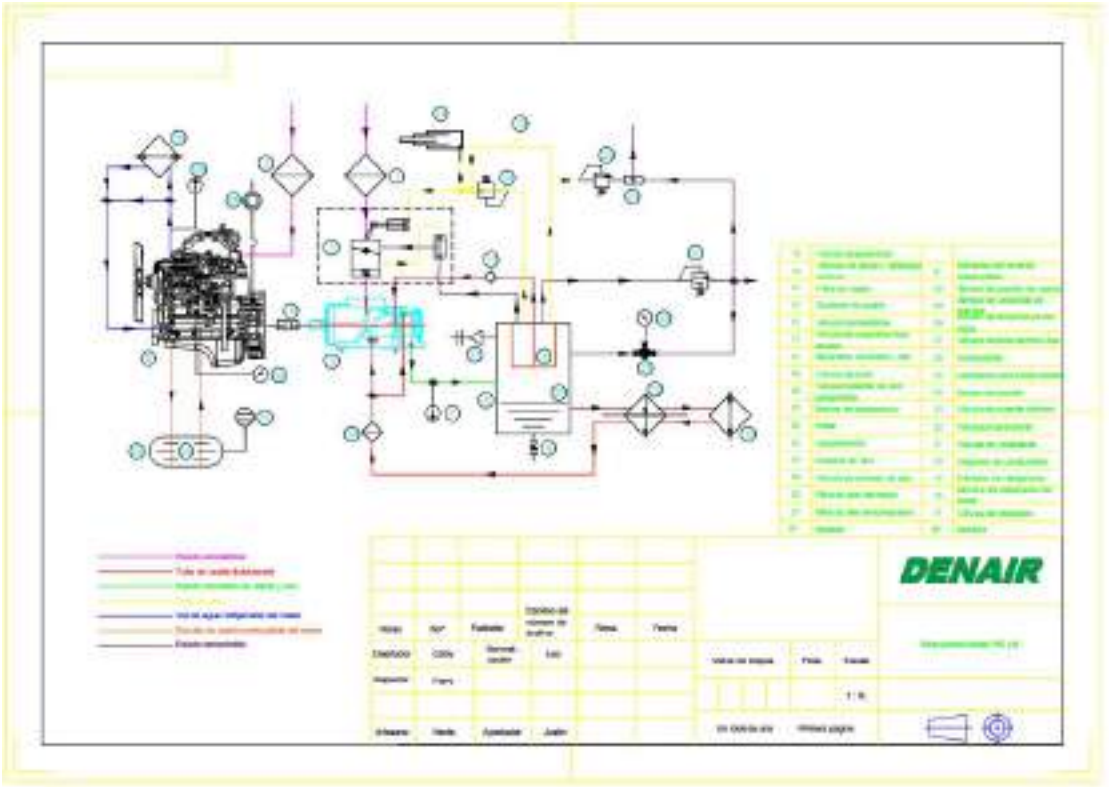

3.1.5 Curva de rendimiento de unidad de compresora

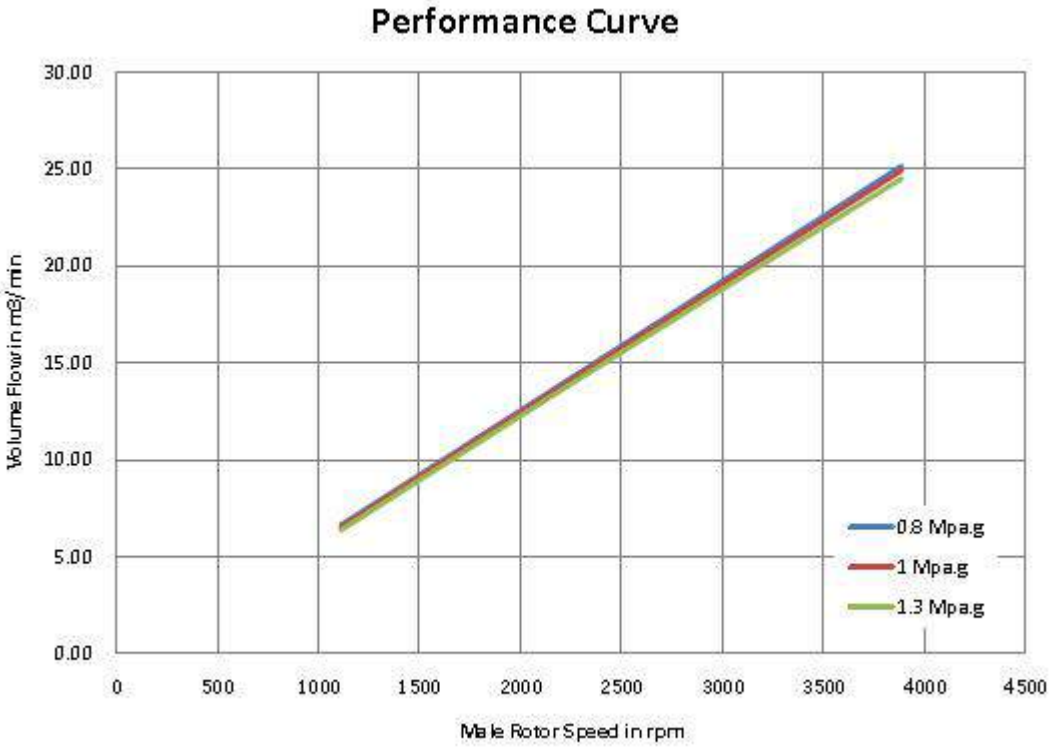

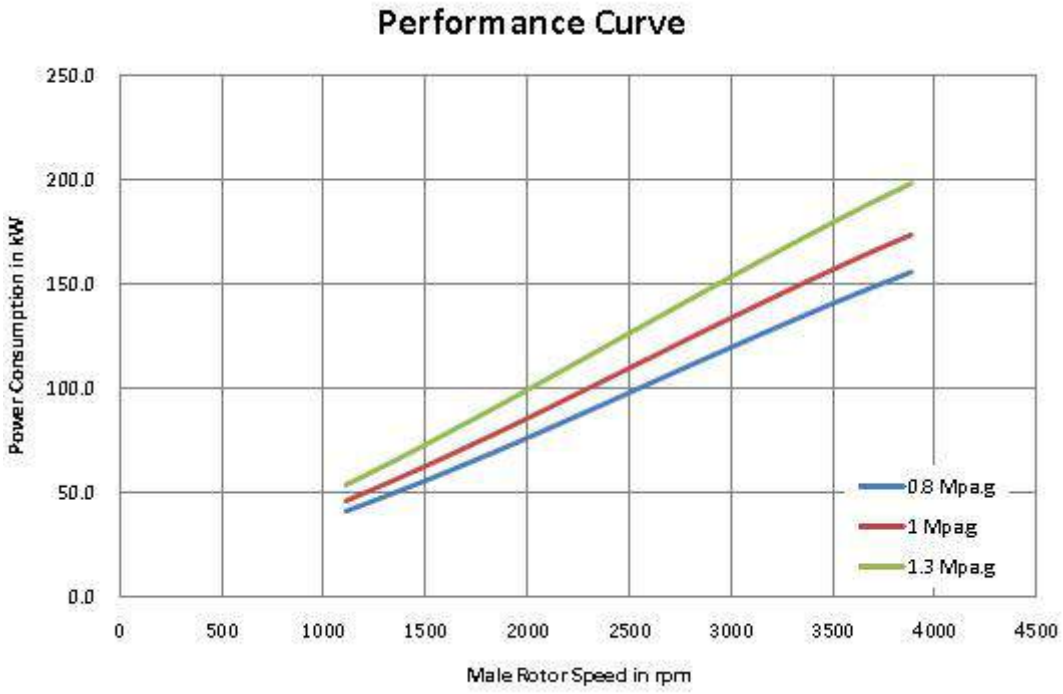

TOP

3.1.6 Documentación y opciones

Documentación disponible (En español)

- Catálogo
- Manual de operación
- Manual de lista de partes
- Diagrama eléctrico
- Reporte de test

Certificado disponible

- Certificados de conformidad con ISO 45001: 2018, ISO 14001: 2015, ISO 9001: 2015

Opciones adicionales

- Monitor remoto
- Recipiente de aire comprimido con certificado ASME / CE
- Emisiones Tier 3 / Tier 4
- Tipo montado en un skid
- DNV 2.7.1 Crash Frame
- Filtración para aire de calidad instrumental
- Frenos de estacionamiento mecánicos
- Auxiliar de arranque en temperatura baja
- Diseño de sastrería
- OEM


3.2 KITS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (PRIMER AÑO)

Kits para compresor								
Partes	**No. de parte**	**50h**	**250h**	**450h**	**650h**	**750h**	**850h**	**1050h**
Elemento filtro de aire			○			○		
Elemento de seguridad de filtro de aire								○
Filtro de aceite			○			○		
Separador de aceite								○
Kits para motor diésel								
Partes	**No. de parte**	**50h**	**250h**	**450h**	**650h**	**750h**	**850h**	**1050h**
Elemento filtro de aire		○	○	○	○		○	○
Elemento de seguridad de filtro de aire				○			○	
Separador combustible		○	○	○	○		○	○
Esparador combustible (fino)		○	○	○	○		○	○
Filtro de combustible		○	○	○	○		○	○
Filtro de lubricante		○	○	○	○		○	○


TOP

3. PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS

3.1 Equipo de gestión de proyectos

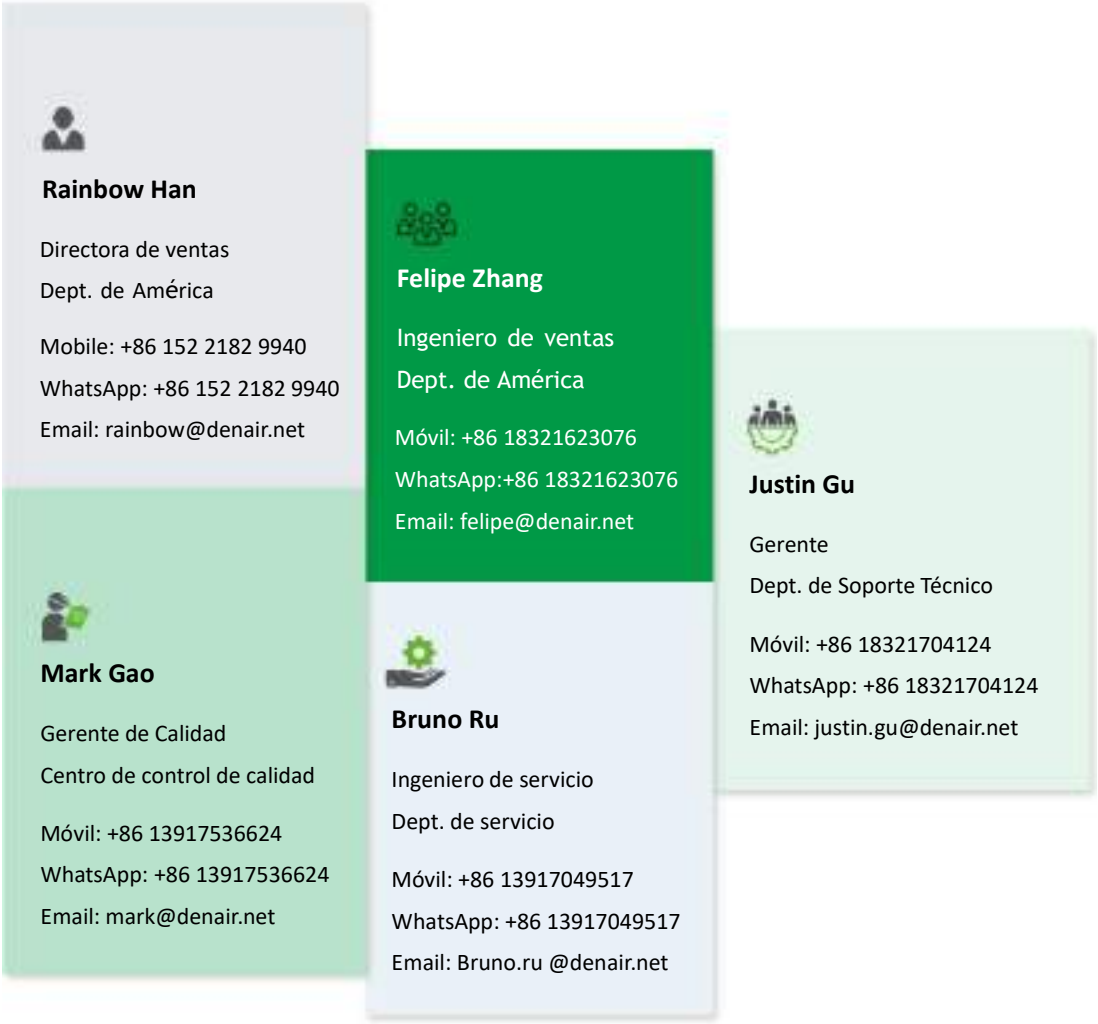

3.2 Flujo de trabajo de gestión de proyectos

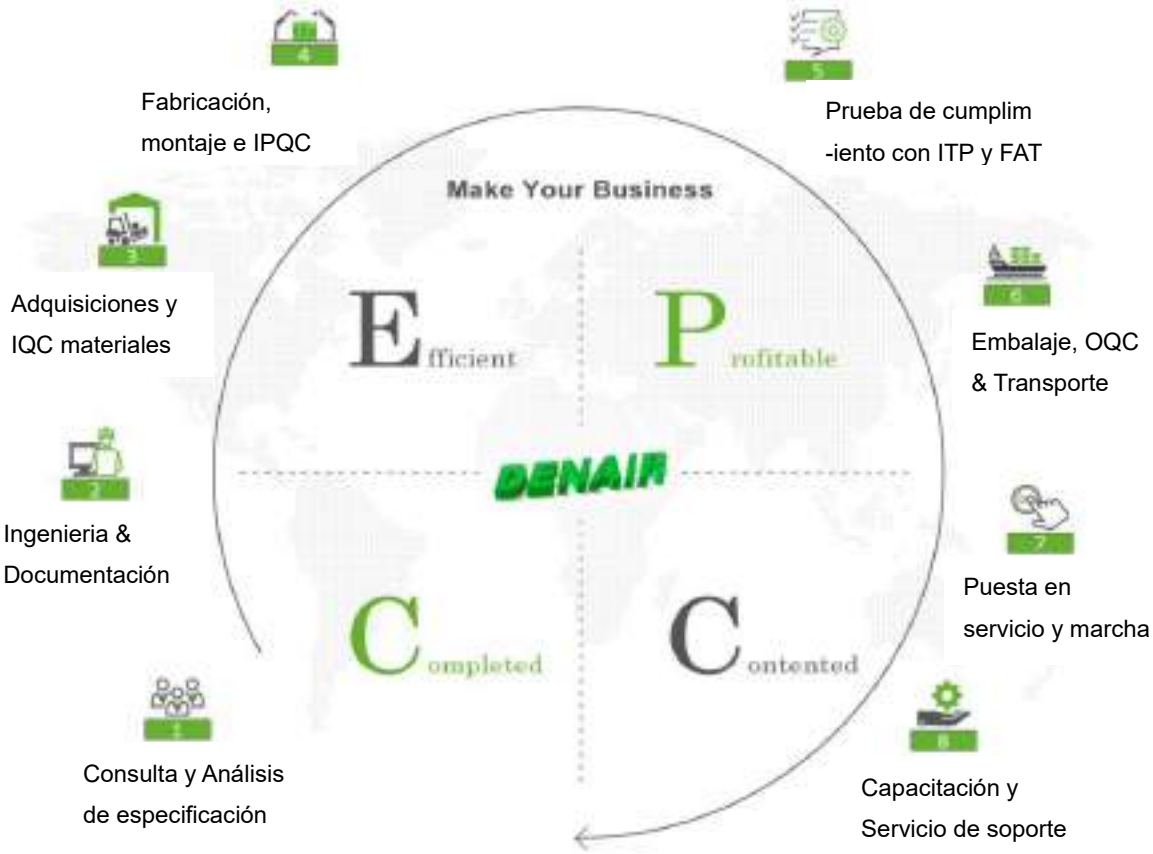

3.3 Plan de programación del proyecto (Tener stock)

TRABAJO / Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Análisis de especificación													
Ingeniería y documentación													
Adquisición e IQC de materiales													
Montaje y IPQC													
Pruebas y OQC													
Embalaje y transporte													
Puesta en servicio y puesta en marcha													
Servicio de soporte												24horas En español	

TOP

3.4 Política internacional de servicio posventa

By Al elegir DENAIR, se ha seleccionado un producto bien elaborado, de alta ingeniería de una empresa con casi 20 años de experiencia en la industria.

Para demostrar nuestra confianza, cada pieza de equipo DENAIR está respaldado por una garantía completa. Para obtener detalles específicos de garantía, la disponibilidad y los detalles, consulte el certificado de garantía.

Todos los productos de Denair son revisadas y inspeccionada en serio de embalaje y envío,poreso es responsabilidad de la parte receptora de inspeccionar todos los bienes al llegar, para evitar el daño / o daños ocultos debido al mal manejo por parte del transportista de carga.

Cercanía con el cliente

Creemos que es esencial para estar cerca de nuestros clientes y ser capaz de proporcionar apoyo rápidamente. Por lo tanto, estamos trabajando en la construcción de centros de servicio autorizados en cada países para proporcionar servicio local profesional y eficiente para nuestros clientes cada día.

Instalación y Puesta en Marcha

Todas las unidades están completamente DENAIR envasados, listos para su funcionamiento. Sólo una potencia y una conexión de tuberías de aire, y usted tiene un aire limpio y seco. Su contacto (s) DENAIR trabajará estrechamente con usted, proporcionando la información necesaria y ayudar, de principio a fin, asegurando que su equipo se ha instalado y puesto en marcha de forma segura y con éxito.

Servicios del Sitio

En el servicio de sitio pueden ser prestados por cualquiera de los técnicos DENAIR o centro de servicio autorizado local que está más cercano al sitio de trabajo del cliente. Todos los trabajos de servicio se completan con un informe detallado de servicio que se le entrega al cliente. Puede ponerse en contacto con la compañía DENAIR para solicitar una oferta de servicios.

Piezas de Repuesto

DENAIR y los distribuidores locales tienen como objetivo almacenar todas las piezas de repuesto necesarias pertinentes para el mantenimiento de los equipos de nuestros clientes. Actualizamos continuamente nuestra acción y somos capaces de entregar piezas de repuesto originales para muchos tipos de productos. Las piezas de desgaste y los repuestos más comúnmente utilizados son todos ellos disponibles de nuestras reservas centrales en Shanghai y depósitos de todos los distribuidores. Sin embargo, se recomienda tener en stock algunas piezas de repuesto en su extremo para todos los equipos. Es imprescindible disponer de piezas de

repuesto también es esencial a fin de minimizar los cierres del sistema molestos y posteriores pérdidas de producción. Podemos proporcionarle con listas de piezas adecuadas para su acción y llevar a cabo la tarea de asesorar a las piezas de repuesto originales para cumplir con las especificaciones exactas del sistema.

Hacer una reclamación y nuestro procedimiento de quejas

Si se descubre un problema en el equipo, la acción que debe tomar depende de diferentes situaciones siguientes:

- Problema durante los 2 primeros años

En los dos primeros años de la política de la garantía original, empresa DENAIR es responsable de la puesta correctas posibles defectos cubiertos por la póliza, debe comunicarse con la compañía DENAIR o su contratista en primera instancia.

- Nuestro procedimiento de quejas

Nuestro compromiso es brindar un servicio de tramitación de reclamaciones que es eficaz, profesional, amable y rápido para proporcionar el mejor servicio posible a todos los clientes DENAIR.

Si no está satisfecho con la forma en que hemos manejado su reclamo, tenemos un procedimiento de reclamación completa. El procedimiento tiene tres etapas. Esperamos que resolver la mayoría de las quejas en la etapa 1.

Etapa 1

Usted presenta una queja a nosotros. Que será procesada por la sección responsable del servicio que se está quejando.

Reconoceremos su queja por escrito, por correo electrónico o por teléfono dentro de 2 días laborables. Nuestro objetivo es resolver su queja dentro de los 3 días hábiles ..

Etapa 2

Hemos investigado su queja pero usted no está satisfecho. Por favor sepamos dentro de 7 días laborables desde la recepción de nuestra etapa 1
carta de respuesta.

En esta etapa, su queja será procesada por nuestro equipo de servicios de atención al cliente o el director del departamento responsable del servicio que se está quejando.

Reconoceremos su insatisfacción dentro de 2 días hábiles. Nuestro objetivo es resolver su queja dentro de los 5 días hábiles.

Etapa 3

Hemos investigar más a fondo su queja pero usted no está satisfecho. Por favor sepamos dentro de 10 días hábiles desde la recepción de nuestra carta de respuesta de la etapa 2.

En esta etapa, su queja será procesada por el Jefe Ejecutivo. Reconoceremos su insatisfacción dentro de 2 días hábiles.

Nuestro objetivo es resolver su queja dentro de los 10 días hábiles. Si no está satisfecho con la respuesta del Jefe del Ejecutivo, a continuación, puede enviar su reclamación a la alta dirección de DENAIR. Le daremos todos los datos de contacto que necesita en nuestra respuesta final.

3.5 Certificado de garantía



DENAIR

WARRANTY CERTIFICATE

The company warrants that the equipment manufactured by it and delivered here under will be free of defects in material and workmanship for a period of eighteen month for the whole machine from the date of shipment from the factory except consumables. The purchaser shall be obligated to promptly report any failure to conform to this warranty, in writing to the company in said period, whereupon the company shall, at its option, correct such nonconformity, by suitable repair to such equipment or, furnish a replacement part, provided the purchaser has stored, installed, maintained and operated such equipment in accordance with good industry practices and has complied with specific recommendations of the company. Accessories or equipment furnished by the company, but manufactured by others, shall carry whatever warranty the manufacturers have conveyed to the company and which can be passed on to the purchaser. The company shall not be liable for any repairs, replacements, or adjustments to the equipment or any costs of labor performed by the purchaser or others without company's prior written approval.

The effects of corrosion, erosion and normal wear and tear are specifically excluded. Performance warranties are limited to those specifically stated within the company's proposal. Unless responsibility for meeting such performance warranties are limited to specified tests, the company's obligation shall be to correct in the manner and for the period of time provided above. The purchaser shall not operate equipment which is considered to be defective, without first notifying the company in writing of its intention to do so. Any such use of equipment will be at purchaser's sole risk and liability.

Note that this is DENAIR Company standard warranty. Any warranty in force at the time of purchase of the equipment or negotiated as part of the purchase order may take precedence over this warranty.

Authorized Signature
Denair Energy Saving Technology (Shanghai) PLC.

5. PROYECTOS Y CLIENTES EXITOSOS




Desarrollamos soluciones innovadoras a medida al éxito de estos clientes



IMPOMIN S.A.S. NIT 900.535.843-3

UNIDAD DE BOMBEO 420 AMERICAN MANUFACTURING

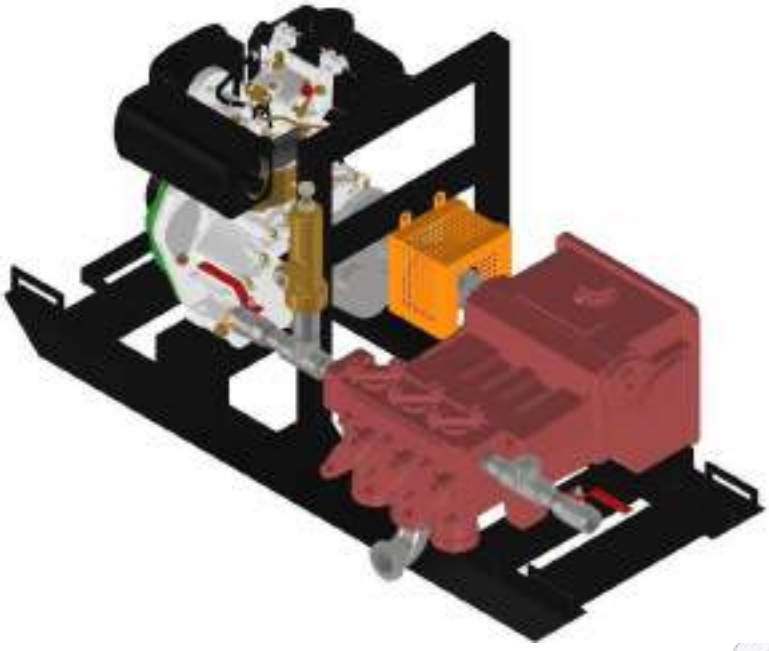

Equipo de alta presión, diseñado para uso continuo como bomba de lodos en los diferentes escenarios de perforación.

APLICACIONES:

- Inyección de Fluidos de perforación.
- Bombeo de agua a alta presión.
- Extracción de agua en pozo o cuencas hidrográficas.

COMPONENTES:

1. Bloque 420.
2. Válvula de alivio.
3. Caja reductora.
4. Guarda de seguridad.
5. Motor diésel.
6. Chasis.
7. Acople mecánico.
8. Accesorios hidráulicos. (opcional)

Nota: El equipo se entrega sin batería y sin aceites lubricantes.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Bombeo de fluido hasta 450 metros en vertical y 600 metros horizontal garantizando una presión de hasta 1000 PSI sin perdidas en el recorrido.

- Caudal de 105 lt/min @ 625 RPM.
- Válvula de alivio ajustable hasta 700 PSI.
- Motor diésel 10HP @ 3600 RPM .
- Arranque Eléctrico y regulador, para usar con batería de 450A a 500A.
- Acople elastómero.
- Chasis en perfil de acero con pintura electrostática.
- Peso total del equipo 180 Kg.

Calle 61 SUR No. 43 A-85 Bodega 09 CELULAR (310) 430 9710 // (313) 627 3404
Sabaneta - Antioquia – Colombia
www.impomin.com

IMPOMIN S.A.S. NIT 900.535.843-3

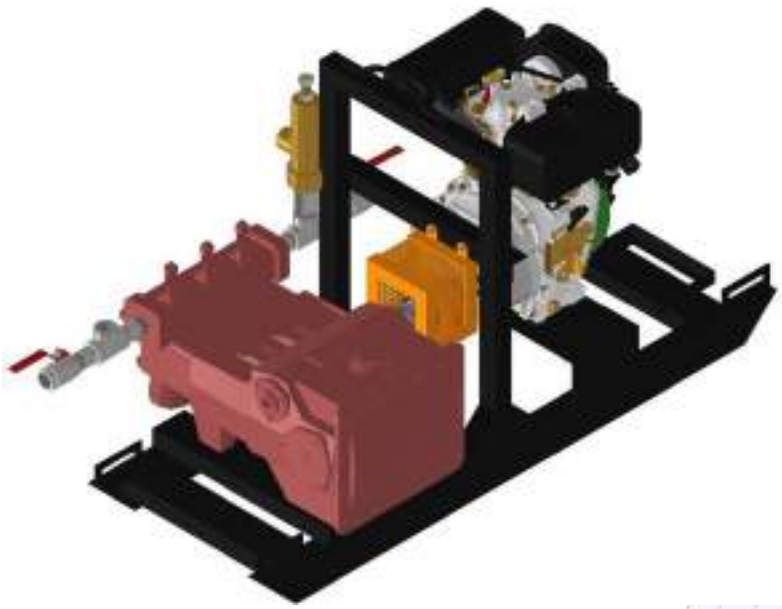

Specifications	
Pump Model	AL0918
Configuration	Horizontal Triplex Piston
Number of Pistons	3
Stroke Length	2.25 Inches (57.2 mm)
Frame Load Rating	2800 lbs. (1,270 kg)
Pump Weight	200 lbs. (90.7 kg)
Direction of Rotation	Top of Shaft away from head
Internal Gear Rotation	3.6:1
Intermittent Duty Speed Rating	890 RPM (Jackshaft)
Continuous Duty Speed Rating	750 RPM (Jackshaft)
Ball Valve Max Speed Rating	625 RPM
Minimum Speed	360 RPM
Mechanical Efficiency	85%
Lubrication System	Splash, Gravity Return
Lube Oil Capacity	2.25 Quarts
Lube Oil Type	SAE 30
Maximum Fluid Temperature	140 °F (250 °F Capability)
Minimum Fluid Temperature	0 °F (-20 °F Capability)
Standard Suction Size	1.50 Inch NPT (38.1 mm)
Standard Discharge Size	1.00 Inch NPT (25.4 mm)
Fluid End Material	Cast Iron
Valve Type	Disc Valve / Ball Valve
Hydraulic Motor Mount	SAE C - 4 Bolt with 1.25"-14T

Performance Rating

Pump Model	Diameter		Displacement/ REV		Maximum Pressure		Pump Capacity @ Input Speed (RPM)									
							350 RPM		625 RPM		700 RPM		750 RPM		890 RPM	
	Inch	mm	Gallon	Liter	PSI	kg/cm²	gpm	lpm	gpm	lpm	gpm	lpm	gpm	lpm	gpm	lpm
AL0918	2.25	57.2	0.0323	0.122	700	49.2	11.3	43	20.2	76	22.6	86	24.2	92	28.7	109

Calle 61 SUR No. 43 A-85 Bodega 09 CELULAR (310) 430 9710 // (313) 627 3404
Sabaneta - Antioquia – Colombia
www.impomin.com

COMPRESOR DENAIR DACY 13/13
460 CFM - 2000 PSI
HIGHT PRESSURE

(#23)
SERIE: CZG 20101756





DIESEL DRIVEN COMPRESSED AIR SOLUTION







Denair Energy Saving Technology (Shanghai) PLC.

DENAIR

TABLA DE CONTENIDO

1. PERFIL DE DENAIR 2
2. DENAIR DISTRIBUIDOR AUTORIZADO EN COLOMBIA 3
3. SOLUCIÓN TÉCNICA 5
3.1 COMPRESOR DE AIRE CON MOTOR DIÉSEL 5
3.1.1 Características y ventajas 5
3.1.2 Especificación técnica DACY-13/13 7
3.1.3 Dibujo dimensional DACY-13/13 8
3.1.4 Diagrama de tuberías e instrumentos 8
3.1.5 Curva de rendimiento de unidad de compresora 9
3.1.6 Documentación y opciones 10
3.2 KITS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (PRIMER AÑO) 10
3. PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS 11
3.1 Equipo de gestión de proyectos 11
3.2 Flujo de trabajo de gestión de proyectos 12
3.3 Plan de programación del proyecto (Tener stock) 12
3.4 Política internacional de servicio posventa 13
3.5 Certificado de garantía 16
5. PROYECTOS Y CLIENTES EXITOSOS 17

1. PERFIL DE DENAIR



DENAIR Group es una empresa que cotiza en bolsa y se considera uno de fabricantes líderes de productos de compresores de aire y gas en Shanghai, China. DENAIR tiene 23 sucursales y subsidiarias con más de 500 empleados. Nuestro objetivo es proporcionar un servicio excepcional a los clientes junto con productos de calidades y soluciones de ahorro energético.

Los negocios principales de DENAIR se centran en las siguientes áreas clave:

- Compresores de tornillo rotativo con inyección de aceite (accionados por correa y accionados directamente, Velocidad fija y Velocidad variable, Presión alta, normal y baja)
- **Compresores de aire portátiles (con motor diésel** y con motor eléctrico**)**
- Compresores de aire libre de aceite (Tipo seco, Tipo scroll y Tipo lubricado con agua)
- Compresores centrífugos
- Compresores de gas de proceso
- Bombas de vacío
- Bombas de calor

En DENAIR, nos ganamos la confianza y satisfacción de nuestros clientes mediante la fabricación de los productos superiores de aire comprimido de calidad para todas las industrias.Todos nuestros productos están diseñados para un rendimiento fiable, mantenimiento fácil y la máxima eficiencia energética. DENAIR ha estado exportando a más de 150 países en todo el mundo.Contamos con el equipo de servicio y ventas internacionales más grande de la industria de compresores de China. Nuestro personal bien capacitado y motivado, que puede hablar inglés, español, francés, ruso, árabe y coreano, ofrece asesoramiento experto y asistencia para todos los desafíos.

DENAIR innova continuamente en el desarrollo y la gestión de productos para satisfacer las demandas de los clientes. La poderosa cultura de la empresa y la innovación continua hacen DENAIR mejoró rápidamente hasta alcanzar el principio de negocio "Ahorro de energía en el primer lugar, valores compartidos mutuos". La misión de DENAIR ser una empresa de clase mundial promoviendo un desarrollo sostenible que busca la mejora constante de nuestro propio valor y compartirlo con nuestros clientes y nuestros personales, comprometido a satisfacer continuamente las necesidades de las empresas globales proporcionando una gama completa de soluciones de compresión de aire y gas industrial.

2. DENAIR DISTRIBUIDOR AUTORIZADO EN COLOMBIA

Distribuidor autorizado: HENRY BLANCO PEREZ (MOTORES Y COMPRESORES)
Dirección: CALLE 47 # 32-53, BARRIO BELLAVISTA, GIRON, SANTANDER, COLOMBIA
Experiencia: Mayor de 35 años de experiencia en industria de aire comprimido, es experto para Compresor portátil diésel, Compresor tornillo lubricado, etc....
Servicios autorizados ofrecidos: Vender compresor DENAIR y ofrecer servicios de instalación, puesta en marcha, mantenimiento y reparación autorizado por DENAIR en Colombia.







TOP



NO.: DNRZJT(X)LMC2021120201

DENAIR

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Este certificado es para certificar que

MOTORES Y COMPRESORES

Nit # 13.839.427-0

Dirección: Calle 47 # 32-53, Barrio Bellavista, Girón, Santander, Colombia

Representada por Henry Blanco Pérez

es distribuidor autorizado para

DENAIR

Vender Compresor de Aire y Ofrecer servicios autorizados

Válido hasta

24 . Febrero, 2025

Regional Manager

Denair Energy Saving Technology (Shanghai) PLC.

DENAIR ENERGY SAVING TECHNOLOGY (SHANGHAI) PLC

3. SOLUCIÓN TÉCNICA

3.1 COMPRESOR DE AIRE CON MOTOR DIÉSEL



- ✓ **Rendimiento superior**
- ✓ **Durabilidad excelente**
- ✓ **Alta confiabilidad**
- ✓ **Unidad Compresora DENAIR con tecnología alemana**
- ✓ **Motor Cummins 180HP**

3.1.1 Características y ventajas

- **Unidada de compresora de última generación y motor de alta eficiencia**

- La unidad de compresora DENAIR adopta una nueva generación de perfil asimétrico de 5-6 dientes tipo - α , mayor eficiencia volumétrica



- El último diseño de puerto de mariposa optimiza el punto de inyección y reduce el consumo total de energía
- Adopte la máquina herramienta de procesamiento avanzada de Holpoyd, y su equilibrio dinámico puede alcanzar el estándar G2.5, menor ruido
- Motor diésel de CUMMINS u otro motor diesel famoso para un funcionamiento prolongado. Adopte la tecnología de turbocompresor de escape para mejorar la propiedad dinámica y reducir el consumo de combustible. El tanque de combustible de gran capacidad mantiene el compresor en funcionamiento continuo durante 10 horas para ahorrar tiempo de repostaje.

- **Solución de rendimiento excepcional**



- El sistema de separación de aceite y gas patentado hace que el aire comprimido sea más limpio y menos contenido de aceite <3PPM, caída de presión <0.02MPa
- Los filtros de aire distintivos incluyen los filtros de aire dobles de carcasa de hierro y el indicador de filtro de

aire mecánico para garantizar un aire purificado y limpio incluso en el área polvorienta
- Sistema automático de disparo / apagado

- **Protección y control inteligente confiable**



- El sistema de monitoreo y alerta está equipado para monitorear la operación en cualquier momento.
- Panel de control inteligente instalado verticalmente con parámetros en tiempo real, fácil de leer y operar
- Deflector de la correa del motor para garantizar la operación segura
- Cubierta de red protectora ampliada para el ventilador para protección de seguridad
- Parada de emergencia en caso de emergencias
- Correas de ventilador antiestáticas, aspas para evitar destellos

- **Control avanzado de ruido y vibraciones**




- Adopta algodón compuesto que absorbe el sonido y respetuoso con el medio ambiente, con resistencia al calor y retardante de llama, gran área de superficie, que puede reducir eficazmente el ruido de alta frecuencia en la banda de 1000-2000Hz
- Almohadilla de choque específica para la industria de compresores de aire con las ventajas de una mayor deformación vertical y rigidez lateral, que pueden reducir efectivamente la vibración generada por el motor y el cuerpo durante el funcionamiento, y garantizar que la vibración del compresor de aire esté dentro de los 7.1 mm / s


3.1.2 Especificación técnica DACY-13/13

Modelo	**DACY-13/13**
Unidad compresora	DENAIR
Medio	air
Etapa de compresión	1
Presión atmosférica	0.1033 Mpa
Temperatura ambiental	≤46 ℃
Humedad relativa	≤80 %
Caudal	13m3/min (459cfm)
Presión de trabajo	13bar (190psi)
Volumen de lubricante	55 Litros (14.6 Galones)
Volumen del recipiente de aire comprimido	155 Litros (40.95 Galones)
Cantidad de ruedas	2
Dimensiones (L * W * H)	3790*2110*2390mm (Incluido remolque) 2970*1600*1630mm (Montado en skid)
Peso	2650kg (Incluido remolque) 2050kg (Montado en skid)
Conexión de salida de aire	G1”*2, G2”*1
Motor diésel	
Modelo	6BT5.9-C180
Marca	Cummins
Estándar de emisión	EU Stage II / Tier 2
Potencia	132kW=180HP
Calibre * Carrera * No. de cilindros	102mm*120mm*6
Velocidad de motor (nominal)	2400 RPM
Velocidad de motor (descarga)	1400 RPM
Volumen de aceite de motor diésel	16.3 Litros (4.3 Galons)
Volumen de refrigerante	35 Litros (93 Galons)
Capacidad de tanque de combustible	190 Litros (50.2 Galons)
Voltaje y corriente de la batería	24 V 135 Ah


3.1.3 Dibujo dimensional DACY-13/13

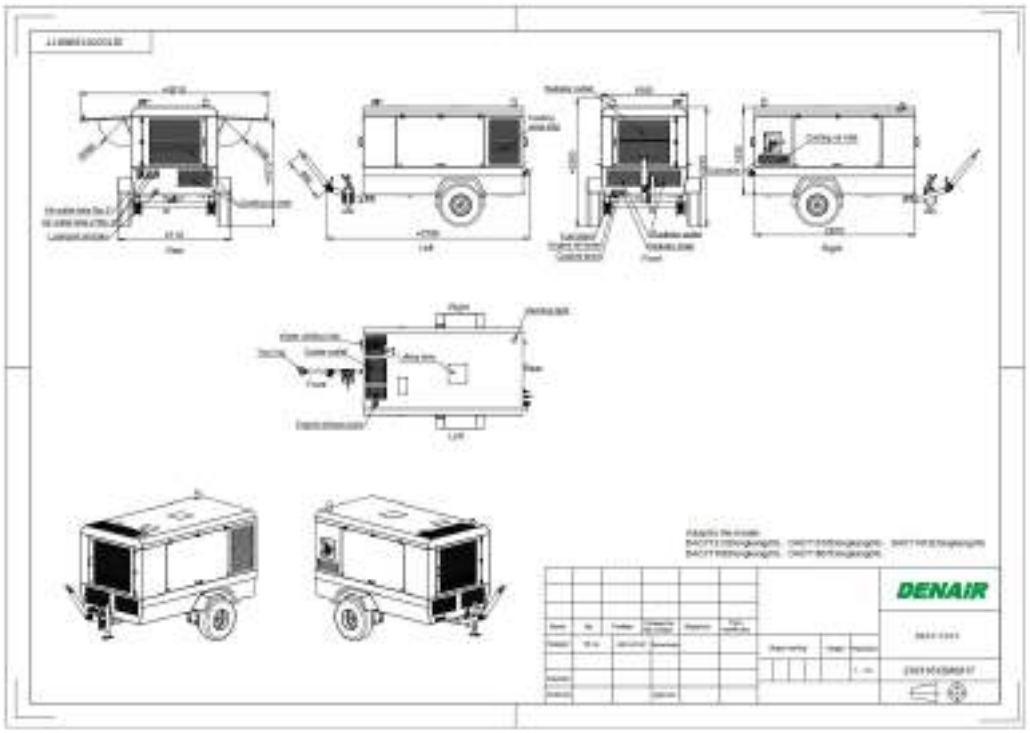


3.1.4 Diagrama de tuberías e instrumentos

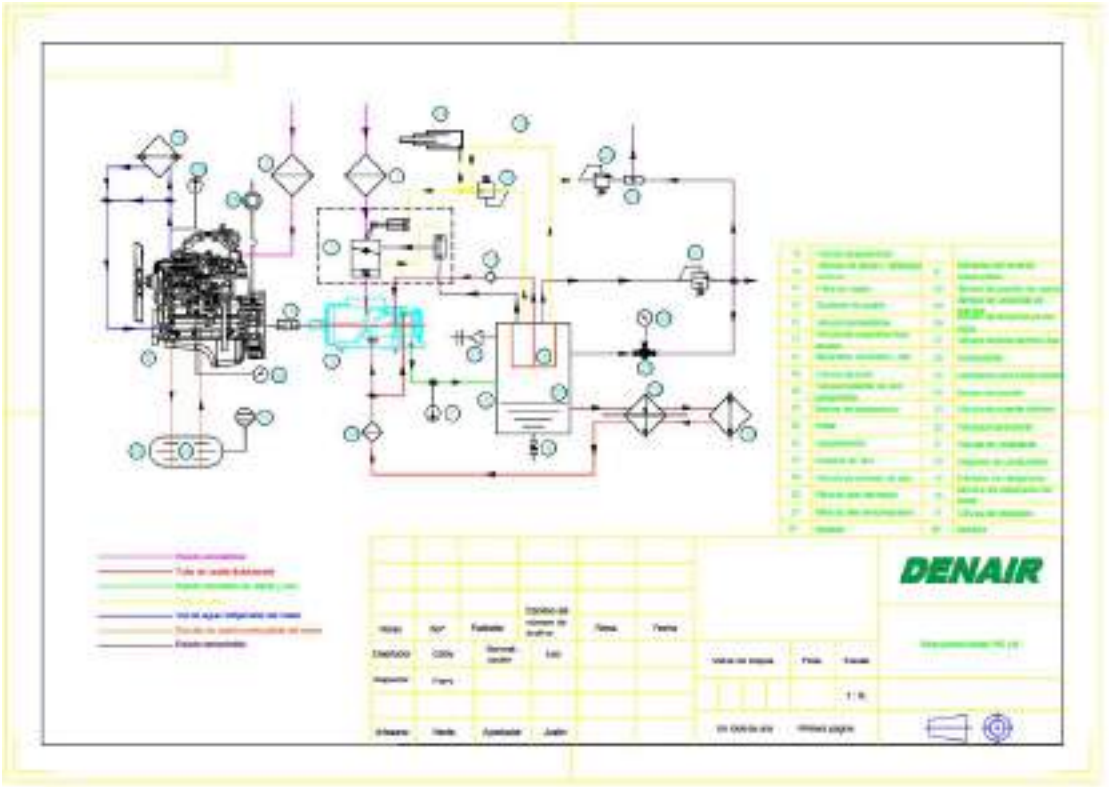

3.1.5 Curva de rendimiento de unidad de compresora

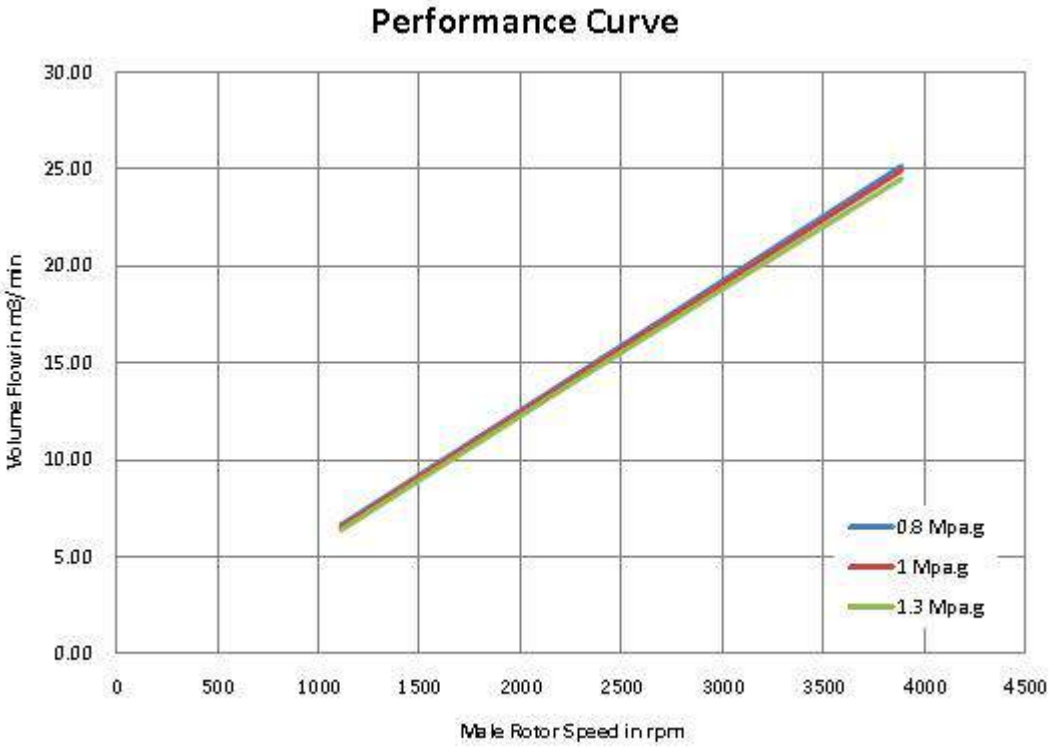

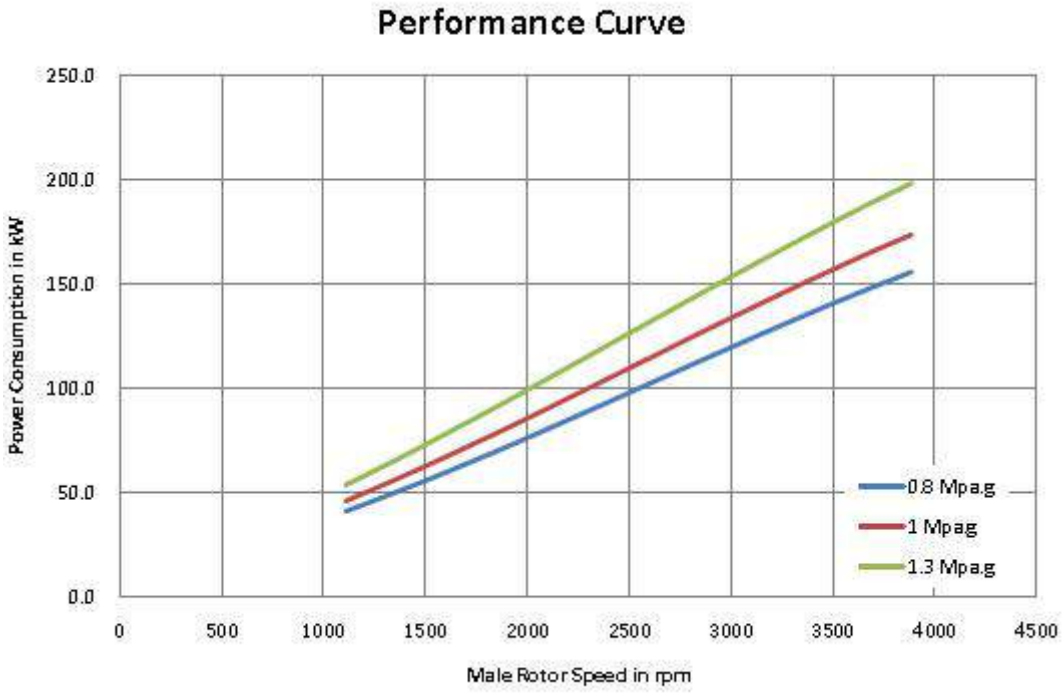

TOP

3.1.6 Documentación y opciones

Documentación disponible (En español)

- Catálogo
- Manual de operación
- Manual de lista de partes
- Diagrama eléctrico
- Reporte de test

Certificado disponible

- Certificados de conformidad con ISO 45001: 2018, ISO 14001: 2015, ISO 9001: 2015

Opciones adicionales

- Monitor remoto
- Recipiente de aire comprimido con certificado ASME / CE
- Emisiones Tier 3 / Tier 4
- Tipo montado en un skid
- DNV 2.7.1 Crash Frame
- Filtración para aire de calidad instrumental
- Frenos de estacionamiento mecánicos
- Auxiliar de arranque en temperatura baja
- Diseño de sastrería
- OEM


3.2 KITS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (PRIMER AÑO)

Kits para compresor								
Partes	**No. de parte**	**50h**	**250h**	**450h**	**650h**	**750h**	**850h**	**1050h**
Elemento filtro de aire			○			○		
Elemento de seguridad de filtro de aire								○
Filtro de aceite			○			○		
Separador de aceite								○
Kits para motor diésel								
Partes	**No. de parte**	**50h**	**250h**	**450h**	**650h**	**750h**	**850h**	**1050h**
Elemento filtro de aire		○	○	○	○		○	○
Elemento de seguridad de filtro de aire				○			○	
Separador combustible		○	○	○	○		○	○
Esparador combustible (fino)		○	○	○	○		○	○
Filtro de combustible		○	○	○	○		○	○
Filtro de lubricante		○	○	○	○		○	○


TOP

3. PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS

3.1 Equipo de gestión de proyectos

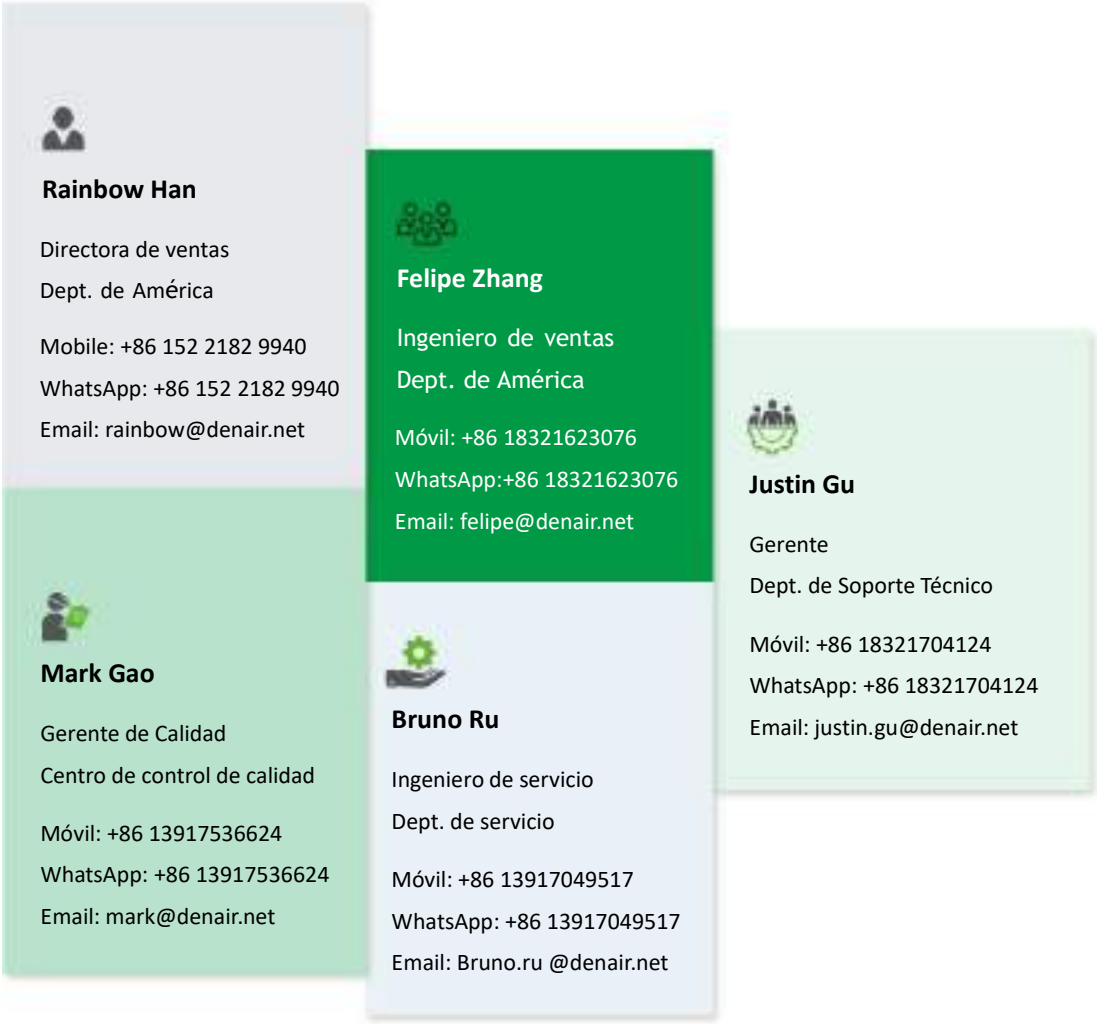

3.2 Flujo de trabajo de gestión de proyectos

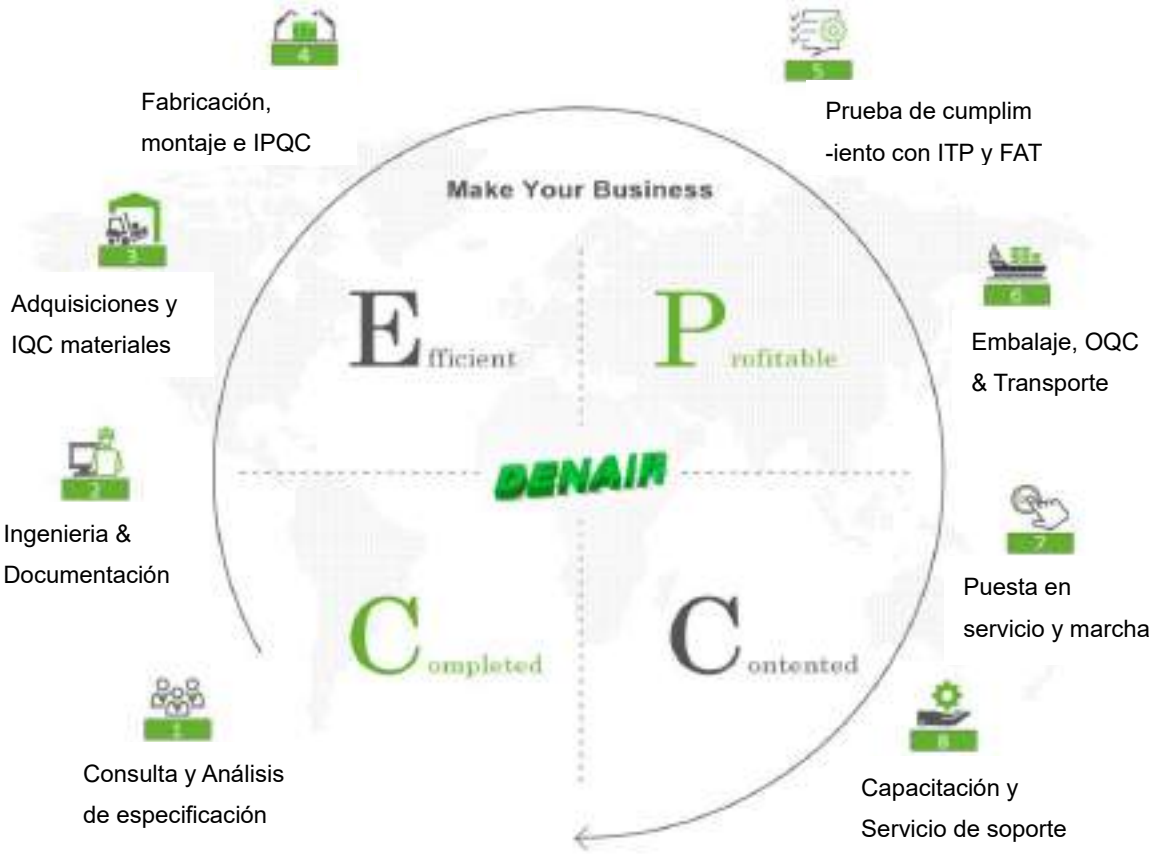

3.3 Plan de programación del proyecto (Tener stock)

TRABAJO / Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Análisis de especificación													
Ingeniería y documentación													
Adquisición e IQC de materiales													
Montaje y IPQC													
Pruebas y OQC													
Embalaje y transporte													
Puesta en servicio y puesta en marcha													
Servicio de soporte												24horas En español	

TOP

3.4 Política internacional de servicio posventa

By Al elegir DENAIR, se ha seleccionado un producto bien elaborado, de alta ingeniería de una empresa con casi 20 años de experiencia en la industria.

Para demostrar nuestra confianza, cada pieza de equipo DENAIR está respaldado por una garantía completa. Para obtener detalles específicos de garantía, la disponibilidad y los detalles, consulte el certificado de garantía.

Todos los productos de Denair son revisadas y inspeccionada en serio de embalaje y envío,poreso es responsabilidad de la parte receptora de inspeccionar todos los bienes al llegar, para evitar el daño / o daños ocultos debido al mal manejo por parte del transportista de carga.

Cercanía con el cliente

Creemos que es esencial para estar cerca de nuestros clientes y ser capaz de proporcionar apoyo rápidamente. Por lo tanto, estamos trabajando en la construcción de centros de servicio autorizados en cada países para proporcionar servicio local profesional y eficiente para nuestros clientes cada día.

Instalación y Puesta en Marcha

Todas las unidades están completamente DENAIR envasados, listos para su funcionamiento. Sólo una potencia y una conexión de tuberías de aire, y usted tiene un aire limpio y seco. Su contacto (s) DENAIR trabajará estrechamente con usted, proporcionando la información necesaria y ayudar, de principio a fin, asegurando que su equipo se ha instalado y puesto en marcha de forma segura y con éxito.

Servicios del Sitio

En el servicio de sitio pueden ser prestados por cualquiera de los técnicos DENAIR o centro de servicio autorizado local que está más cercano al sitio de trabajo del cliente. Todos los trabajos de servicio se completan con un informe detallado de servicio que se le entrega al cliente. Puede ponerse en contacto con la compañía DENAIR para solicitar una oferta de servicios.

Piezas de Repuesto

DENAIR y los distribuidores locales tienen como objetivo almacenar todas las piezas de repuesto necesarias pertinentes para el mantenimiento de los equipos de nuestros clientes. Actualizamos continuamente nuestra acción y somos capaces de entregar piezas de repuesto originales para muchos tipos de productos. Las piezas de desgaste y los repuestos más comúnmente utilizados son todos ellos disponibles de nuestras reservas centrales en Shanghai y depósitos de todos los distribuidores. Sin embargo, se recomienda tener en stock algunas piezas de repuesto en su extremo para todos los equipos. Es imprescindible disponer de piezas de

repuesto también es esencial a fin de minimizar los cierres del sistema molestos y posteriores pérdidas de producción. Podemos proporcionarle con listas de piezas adecuadas para su acción y llevar a cabo la tarea de asesorar a las piezas de repuesto originales para cumplir con las especificaciones exactas del sistema.

Hacer una reclamación y nuestro procedimiento de quejas

Si se descubre un problema en el equipo, la acción que debe tomar depende de diferentes situaciones siguientes:

- Problema durante los 2 primeros años

En los dos primeros años de la política de la garantía original, empresa DENAIR es responsable de la puesta correctas posibles defectos cubiertos por la póliza, debe comunicarse con la compañía DENAIR o su contratista en primera instancia.

- Nuestro procedimiento de quejas

Nuestro compromiso es brindar un servicio de tramitación de reclamaciones que es eficaz, profesional, amable y rápido para proporcionar el mejor servicio posible a todos los clientes DENAIR.

Si no está satisfecho con la forma en que hemos manejado su reclamo, tenemos un procedimiento de reclamación completa. El procedimiento tiene tres etapas. Esperamos que resolver la mayoría de las quejas en la etapa 1.

Etapa 1

Usted presenta una queja a nosotros. Que será procesada por la sección responsable del servicio que se está quejando.

Reconoceremos su queja por escrito, por correo electrónico o por teléfono dentro de 2 días laborables. Nuestro objetivo es resolver su queja dentro de los 3 días hábiles ..

Etapa 2

Hemos investigado su queja pero usted no está satisfecho. Por favor sepamos dentro de 7 días laborables desde la recepción de nuestra etapa 1
carta de respuesta.

En esta etapa, su queja será procesada por nuestro equipo de servicios de atención al cliente o el director del departamento responsable del servicio que se está quejando.

Reconoceremos su insatisfacción dentro de 2 días hábiles. Nuestro objetivo es resolver su queja dentro de los 5 días hábiles.

Etapa 3

Hemos investigar más a fondo su queja pero usted no está satisfecho. Por favor sepamos dentro de 10 días hábiles desde la recepción de nuestra carta de respuesta de la etapa 2.

En esta etapa, su queja será procesada por el Jefe Ejecutivo. Reconoceremos su insatisfacción dentro de 2 días hábiles.

Nuestro objetivo es resolver su queja dentro de los 10 días hábiles. Si no está satisfecho con la respuesta del Jefe del Ejecutivo, a continuación, puede enviar su reclamación a la alta dirección de DENAIR. Le daremos todos los datos de contacto que necesita en nuestra respuesta final.

3.5 Certificado de garantía



DENAIR

WARRANTY CERTIFICATE

The company warrants that the equipment manufactured by it and delivered here under will be free of defects in material and workmanship for a period of eighteen month for the whole machine from the date of shipment from the factory except consumables. The purchaser shall be obligated to promptly report any failure to conform to this warranty, in writing to the company in said period, whereupon the company shall, at its option, correct such nonconformity, by suitable repair to such equipment or, furnish a replacement part, provided the purchaser has stored, installed, maintained and operated such equipment in accordance with good industry practices and has complied with specific recommendations of the company. Accessories or equipment furnished by the company, but manufactured by others, shall carry whatever warranty the manufacturers have conveyed to the company and which can be passed on to the purchaser. The company shall not be liable for any repairs, replacements, or adjustments to the equipment or any costs of labor performed by the purchaser or others without company's prior written approval.

The effects of corrosion, erosion and normal wear and tear are specifically excluded. Performance warranties are limited to those specifically stated within the company's proposal. Unless responsibility for meeting such performance warranties are limited to specified tests, the company's obligation shall be to correct in the manner and for the period of time provided above. The purchaser shall not operate equipment which is considered to be defective, without first notifying the company in writing of its intention to do so. Any such use of equipment will be at purchaser's sole risk and liability.

Note that this is DENAIR Company standard warranty. Any warranty in force at the time of purchase of the equipment or negotiated as part of the purchase order may take precedence over this warranty.

Authorized Signature
Denair Energy Saving Technology (Shanghai) PLC.

5. PROYECTOS Y CLIENTES EXITOSOS



Desarrollamos soluciones innovadoras a medida al éxito de estos clientes



UNIDAD DE PERFORACION NEUMÁTICA No. 18

MARCA:	CORE-DRIL
SERIE:	432 1828 0621
MOTOR DE ROTACIÓN:	378 D 0035
MODELO:	ECOMOBIL 432



DIAN

Declaración de Importación | Privada | **500**

2021

Espacio reservado para la DIAN

Número de formulario: **482021000546911-1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 900048807	6. DV: 1	11. Apellidos y nombres o Razón Social: MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S.
12. Dirección: CR 26 76 14 OF 403 ED FENIX	13. Teléfono: 6814006	14. Cod. Admón: 40 / 15. Cód. Dpto: 68 / 16. Cód. Ciudad/Mun: 001

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 800107358	25. DV: 7	26. Razón social declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS GEOCARGA DE COLOMBIA LTDA NIVEL 2
27. Número documento de identificación: 1120001898		28. Apellidos y nombres: RUBEN TELLO ARAGON
29. Tipo usuario: 26	30. Cód. usuario: 528	

Campo	Valor
31. Clase importador	02
32. Tipo declaración	Inicial
33. Cod.	7
34. No. Formulario anterior	XXXXXXXXXXXXXXX
35. Año - Mes - Día	XXXX - XX - XX
36. Cod. Admón	XX
37. Declaración de Exportación	No. XXXXXXXXXXXXXXX
38. Año - Mes - Día	XXXX - XX - XX
39. Cod. Admón	XX
40. Cod. lugar ingreso	CTG
41. Cod. Depósito	14004
42. Manifiesto de carga	No. 1157501184732
43. Año - Mes - Día	2021 - 08 - 02
44. Documento de transporte	No. 21EM-0011MEX
45. Año - Mes - Día	2021 - 08 - 02
46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	CORE-DRIL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.
47. Ciudad	CUERNAVACA
48. Cód. país exportación	493
49. Dirección exportador o proveedor en el exterior	NACIONAL 81 SANTA MARIA AHUACATITLAN MORELOS
50. E-mail	EXPORTACIONES@COREDRIL.COM
51. No. de factura	C2808
52. Año - Mes - Día	2021 - 06 - 10
53. Cod. país procedencia	493
54. Cod. modo transporte	1
55. Código de bandera	159
56. Cod. Depto. destino	68
57. Empresa transportadora	GERLEINCO S.A.S.
58. Tasa de cambio	3,785.65
59. Subpartida arancelaria	8430490000
60. Cod. Complementario	00
61. Cod. Suplementario	XX
62. Cód. Modalidad	C100
63. No. cuotas o meses	XX
64. Valor cuota USD	XXXX
65. Periodicidad del pago de la cuota	XX
66. Cod. país origen	493
67. Cod. Acuerdo	XXX
68. Forma de pago de la importación	10
69. Tipo de importación	01
70. Cod. país compra	493
71. Peso bruto kgs	2,720.88
72. Peso neto kgs	2,440.00
73. Código embalaje	PK
74. No. bultos	74
75. Subpartidas	3
76. Cod. unidad comercial	U
77. Cantidad	4.00
78. Valor FOB USD	58,497.80
79. Valor fletes USD	1,920.24
80. Valor Seguros USD	239.75
81. Valor Otros Gastos USD	0.00
82. Sumatoria fletes, seguros y otros gastos USD	1,782.00
83. Ajuste valor USD	0.00
84. Valor aduana USD	60,556.58
85. Código registro o licencia	X
86. Número	XXXXXXXXXXX
87. Cod. Ofic.	99
88. Año	XXXX
89. Programa	XXXXXXXXXX
90. Cantidad a descargar del producto	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	230,479,408	0	0	0
IVA	19.00	230,479,408	43,791,000	0	0
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0
Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0
Sanción		0	0	0	
Rescate		0	0	0	
		Total	43,791,000		0

91. Descripción de las mercancías

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Número declaración anterior: XXXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN: No hay declaración anterior	131.	132. No. Aceptación declaración: 482021000546911 / 133. Fecha: 2021 08 08
134. Levante No. 482021000483487	135. Fecha: 2021 - 08 - 09	136. Firma funcionario

Firma declarante

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $ 0

996. Espacio para Número adhesivo

91048016999335

Fecha de impresión 2021-08-08 12:14:18

20213732318353

DIAN

MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación : 482021000546911-1
Subpartida : 9403490000

482021000546911-1

MAQUICOBRAS DE LA OBRA	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL UNIDAD DE BOMBEO DE INYECCIÓN DE CONCRETO	Código	GM-F-68
		Fecha	12/04/2024
		Versión	1
		Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA	UNIDAD DE BOMBEO DE INYECCIÓN DE CONCRETO	ID INTERNO	# 2
OBRA/PROYECTO	Brisas de Primavera I	MES	Junio 2026
INSPECCIONADO POR	Mauricio Villamizar	SEMANA	1 al 6/2026

ITEM		ACTIVIDADES	DIAS DE LA SEMANA						
			0 DIA	1 DIA	3 DIA	4 DIA	5 DIA	6 DIA	DIA
1	ESTADO DE LA BOMBA	Válvulas de alivio en buen funcionamiento.	✓	✓	✓	✓	–	✓	
2		Válvula de seguridad funcionando.	✓	–	✓	✓	✓	✓	
3		Chupas en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4		Manómetros de presión en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5		Nivel y estado de valvulina.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6		Estado de camisas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7		Estado de esferas y canastilla.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8		*Estado de base de copa de pistón.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9		Estado de eje central de la bomba.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	ESTADO DEL MOTOR	Estructura de soporte en buena condición.	✓	–	✓	✓	✓	✓	
11		*Motor en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12		Tubo de escape en buena condición.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13		*Encendido del motor en buena condición.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14		*Control de fugas de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15		Indicadores de aceite de motor.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16		Revisión de tiro y partes móviles para facilitar el traslado.	✓	✓	✓	✓	✓	–	
17		Estado de sistema eléctrico (cables, bateria y terminales).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	SISTEMA HIDRÁULICO	*Estado de válvula de paso de obturador.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19		Estado de válvula y manguera de retorno.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20		Mangueras con abrazaderas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21		Racores de empalme en buena condición.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22		Acoples rápidos de mangueras con seguros.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
23		Estado de empaque dixon.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24		Estado e inspección de orings.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
25	ASPECTOS GENERALES	Pintura – mantenimiento.	✓	–	✓	✓	✓	✓	
26		Tanque de combustible en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
27		Estado de llantas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
28		Limpieza general.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		FIRMA DEL RESPONSABE							

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR.

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación.

✕ Se ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, si no cumple diligenciar observaciones.

OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL UNIDAD DE BOMBEO DE INYECCIÓN DE CONCRETO	Código	GM.F.68
		Fecha	12/04/2024
		Versión	1
		Página	2 de 2

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: Brisas de Primavera

INSPECCIONADO POR: Mauricio Villamizar

PROYECTO: Consorcio Mitigación Piedecuesta

REPORTE DE HOROMETROS Y CONSUMOS

FECHA	1	2	3	4	5	6	
COMBUSTIBLE	1/2 g	1/2 g	1/2 g	1/2 g	1/2 g	1/2 g	
ACEITE DE MOTOR							
OTRO: _____							

OBSERVACIONES

FIRMA INSPECTOR	
FECHA	06/06/26
FIRMA SUPERVISOR	
FECHA	

Scanned with CamScanner

	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL UNIDAD DE BOMBEO DE INYECCIÓN DE CONCRETO	Código	GM-F-68
		Fecha	12/04/2024
		Versión	1
		Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA	UNIDAD DE BOMBEO DE INYECCIÓN DE CONCRETO	ID INTERNO	# 2
OBRA/PROYECTO	Brisas de Primavera	MES	Junio
INSPECCIONADO POR	Mauricio Villamizar	SEMANA	9 al 12

ITEM		ACTIVIDADES	DIAS DE LA SEMANA						
			DIA	DIA 9	DIA 10	DIA 11	DIA 12	DIA	DIA
1	ESTADO DE LA BOMBA	Válvulas de alivio en buen funcionamiento.		✓	✓	✓	✓		
2		Válvula de seguridad funcionando.		✓	✓	✓	✓		
3		Chupas en buen estado.		✓	✓	✓	✓		
4		Manómetros de presión en buen estado.		✓	✓	✓	✓		
5		Nivel y estado de valvulina.		✓	✓	✓	✓		
6		Estado de camisas.		✓	✓	✓	✓		
7		Estado de esferas y canastilla.		✓	✓	✓	✓		
8		*Estado de base de copa de pistón.		✓	✓	✓	✓		
9		Estado de eje central de la bomba.		✓	✓	✓	✓		
10	ESTADO DEL MOTOR	Estructura de soporte en buena condición.		✓	✓	✓	✓		
11		*Motor en buen estado.		✓	✓	✓	✓		
12		Tubo de escape en buena condición.		✓	✓	✓	✓		
13		*Encendido del motor en buena condición.		✓	✓	✓	✓		
14		*Control de fugas de combustible.		✓	✓	✓	✓		
15		Indicadores de aceite de motor.		✓	✓	✓	✓		
16		Revisión de tiro y partes móviles para facilitar el traslado.		✓	✓	✓	✓		
17		Estado de sistema eléctrico (cables, bateria y terminales).		✓	✓	✓	✓		
18	SISTEMA HIDRÁULICO	*Estado de válvula de paso de obturador.		✓	✓	✓	✓		
19		Estado de válvula y manguera de retorno.		✓	✓	✓	✓		
20		Mangueras con abrazaderas.		✓	✓	✓	✓		
21		Racores de empalme en buena condición.		✓	✓	✓	✓		
22		Acoples rápidos de mangueras con seguros.		MA	NIA	~A	NA		
23		Estado de empaque dixon.		✓	✓	✓	✓		
24		Estado e inspección de orings.		✓	✓	✓	✓		
25	ASPECTOS GENERALES	Pintura – mantenimiento.		✓	✓	✓	✓		
26		Tanque de combustible en buen estado.		✓	✓	✓	✓		
27		Estado de llantas.		✓	✓	✓	✓		
28		Limpieza general.		✓	✓	✓	✓		
		FIRMA DEL RESPONSABE							

DISTINTO

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR.

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación.

✗ Se ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, si no cumple diligenciar observaciones .

OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL UNIDAD DE BOMBEO DE INYECCIÓN DE CONCRETO	Código	GM-F-68
		Fecha	12/04/2024
		Versión	1
		Página	2 de 2

INFORMACIÓN

UBICACIÓN:	Brisas de Primavera
INSPECCIONADO POR:	Mauricio Villamea1
PROYECTO:	Consorcio Mitigacion Piedecuesta

REPORTE DE HOROMETROS Y CONSUMOS

FECHA		9	10	11	12		
COMBUSTIBLE		1/2,	1/2,	1/2,	1/2,		
ACEITE DE MOTOR							
OTRO: _____							

OBSERVACIONES

FIRMA INSPECTOR	
FECHA	12/06/26
FIRMA SUPERVISOR	
FECHA	

Scanned with CamScanner

	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL UNIDAD DE BOMBEO DE INYECCIÓN DE CONCRETO	Código	GM-F-68
		Fecha	12/04/2024
		Versión	1
		Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA	UNIDAD DE BOMBEO DE INYECCIÓN DE CONCRETO	ID INTERNO	# 2
OBRA/PROYECTO	Gisas de Primavera 1	MES	Junio
INSPECCIONADO POR	Mauricio Villamizar	SEMANA	16 al 20

ITEM		ACTIVIDADES	DIAS DE LA SEMANA						
			DIA	16	17	18	19	20	DIA
1	ESTADO DE LA BOMBA	Válvulas de alivio en buen funcionamiento.		✓	✓	✓	✓	✓	
2		Válvula de seguridad funcionando.		✓	✓	✓	✓	✓	
3		Chupas en buen estado.		✓	✓	✓	✓	✓	
4		Manómetros de presión en buen estado.		✓	✓	✓	✓	✓	
5		Nivel y estado de valvulina.		✓	✓	✓	✓	✓	
6		Estado de camisas.		✓	✓	✓	✓	✓	
7		Estado de esferas y canastilla.		✓	✓	✓	✓	✓	
8		*Estado de base de copa de pistón.		✓	✓	✓	✓	✓	
9		Estado de eje central de la bomba.		✓	✓	✓	✓	✓	
10	ESTADO DEL MOTOR	Estructura de soporte en buena condición.	FUERA DE SERVICIO	✓	✓	✓	✓	✓	
11		*Motor en buen estado.		✓	✓	✓	✓	✓	
12		Tubo de escape en buena condición.		✓	✓	✓	✓	✓	
13		*Encendido del motor en buena condición.		✓	✓	✓	✓	✓	
14		*Control de fugas de combustible.		✓	✓	✓	✓	✓	
15		Indicadores de aceite de motor.		✓	✓	✓	✓	✓	
16		Revisión de tiro y partes móviles para facilitar el traslado.		✓	✓	✓	✓	✓	
17		Estado de sistema eléctrico (cables, bateria y terminales).		✓	✓	✓	✓	✓	
18	SISTEMA HIDRÁULICO	*Estado de válvula de paso de obturador.		✓	✓	✓	✓	✓	
19		Estado de válvula y manguera de retorno.		✓	✓	✓	✓	✓	
20		Mangueras con abrazaderas.		✓	✓	✓	✓	✓	
21		Racores de empalme en buena condición.		✓	✓	✓	✓	✓	
22		Acoples rápidos de mangueras con seguros.		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
23		Estado de empaque dixon.		✓	✓	✓	✓	✓	
24		Estado e inspección de orings.		✓	✓	✓	✓	✓	
25	ASPECTOS GENERALES	Pintura – mantenimiento.		✓	✓	✓	✓	✓	
26		Tanque de combustible en buen estado.		✓	✓	✓	✓	✓	
27		Estado de llantas.		✓	✓	✓	✓	✓	
28		Limpieza general.		✓	✓	✓	✓	✓	
		FIRMA DEL RESPONSABE							

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR.

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación.

✕ Se ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, si no cumple diligenciar observaciones .

OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL UNIDAD DE BOMBEO DE INYECCIÓN DE CONCRETO	Código	GM-F-68
		Fecha	12/04/2024
		Versión	1
		Página	2 de 2

INFORMACIÓN

UBICACIÓN:	Brisas de Primavera
INSPECCIONADO POR:	Mauricio Villamizar
PROYECTO:	Consorcio Mitigacion Piedecuesta

REPORTE DE HOROMETROS Y CONSUMOS

FECHA	~~15~~	16	17	18	19	20	
COMBUSTIBLE		1/2,	1/2,	1/2,	1/2,	1/1,	
ACEITE DE MOTOR							
OTRO: _____							

OBSERVACIONES

FIRMA INSPECTOR	
FECHA	20/06/26
FIRMA SUPERVISOR	
FECHA	

Scanned with CamScanner

	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM-F-28
		Fecha	12/04/2024
		Versión	3
		Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA	COMPRESOR	ID INTERNO	#23
OBRA/PROYECTO	Migracion Redeuesta	MES	Junio
INSPECCIONADO POR	Harley Plata	SEMANA	01 AL 06

INSPECCIÓN

ITEM		ACTIVIDADES	DIAS DE LA SEMANA 1	2	3	4	5	6
1	ESTADO DEL MOTOR	*Unidad en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2		*Motor en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3		Tanque de combustible en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4		*Válvula de seguridad funcionando	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5		*Salida de Aire en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6		*Nivel de aceite de motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7		*Nivel de refrigerante	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8		*Nivel de aceite en la unidad	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9		Encendido del motor en buena condición	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10		Control de fugas	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	SISTEMA NEUMÁTICO	*Válvulas de alivio operando	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12		Mangueras con abrazaderas en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13		Racores de empalme en buena condición	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14		Acoples rápidos de mangueras con seguros	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15		Indicadores de tablero (horómetro, manometro de presión de aire, aceite de motor, refrigerante)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16		*Sistema de enfriamiento	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	ASPECTOS GENERALES	Estado de llantas	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18		Estado de sistema de muelles de amortiguacion	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19		Revisión de tiro y partes móviles para facilitar el traslado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20		Estado de baterías y cables	✓	✓	X	X	✓	✓
21		*Estado del radiador	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22		Estado de seguros de las puertas laterales	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23		Estado de la pintura.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24		Estado de limpieza general	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		FIRMA DEL RESPONSABE	Harley	Harley	Harley	Harley	Harley	Harley

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

X Se ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM-F-28
		Fecha	12/04/2024
		Versión	3
		Página	2 de 2

INFORMACIÓN

UBICACIÓN:	Brisas de Primavera
INSPECCIONADO POR:	Harley Prada
PROYECTO:	Coosaico Mitigacion Piedecuesta

REPORTE DE HOROMETROS Y CONSUMOS

FECHA	01/06	02/06	03/06	04/06	05/06	06/06	
HOROMETRO	0051	0058	0064	0071	0075	0077	
COMBUSTIBLE	30 gl	30 gl	30 gl	30 gl	30 gl	15 gl	
ACEITE MOTOR							
REFRIGERANTE							
ACEITE DE LA UNIDAD							
OTRO: _____							

OBSERVACIONES

FIRMA INSPECTOR	Harley Prada
FECHA	06/06/26
FIRMA SUPERVISOR	
FECHA	

Scanned with CamScanner

	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM-F-38
		Fecha	12/04/2024
		Versión	3
		Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA	COMPRESOR	ID INTERNO	# 25
OBRA/PROYECTO	Mitigación Piedecuesta	MES	Junio
INSPECCIONADO POR	Hailey Prada	SEMANA	9 AL 12

INSPECCIÓN

ITEM		ACTIVIDADES	DIAS DE LA SEMANA						
			DM	9	10	11	12	DM	DM
1	ESTADO DEL MOTOR	*Unidad en buen estado	NO TESTIVO	✓	✓	✓	✓		
2		*Motor en buen estado		✓	✓	✓	✓		
3		Tanque de combustible en buen estado		✓	✓	✓	✓		
4		*Válvula de seguridad funcionando		✓	✓	✓	✓		
5		*Salida de Aire en buen estado		✓	✓	✓	✓		
6		*Nivel de aceite de motor		✓	✓	✓	✓		
7		*Nivel de refrigerante		✓	✓	✓	✓		
8		*Nivel de aceite en la unidad		✓	✓	✓	✓		
9		Encendido del motor en buena condición		✓	✓	✓	✓		
10		Control de fugas		✓	✓	✓	✓		
11	SISTEMA NEUMÁTICO	*Válvulas de alivio operando		✓	✓	✓	✓		
12		Mangueras con abrazaderas en buen estado		✓	✓	✓	✓		
13		Racores de empalme en buena condición		✓	✓	✓	✓		
14		Acoples rápidos de mangueras con seguros		✓	✓	✓	✓		
15		Indicadores de tablero (horómetro, manometro de presión de aire, aceite de motor, refrigerante)		✓	✓	✓	✓		
16		*Sistema de enfriamiento		✓	✓	✓	✓		
17	ASPECTOS GENERALES	Estado de llantas		✓	✓	✓	✓		
18		Estado de sistema de muelles de amortiguacion		✓	✓	✓	✓		
19		Revisión de tiro y partes móviles para facilitar el traslado.		✓	✓	✓	✓		
20		Estado de baterías y cables		X	X	X	✓		
21		*Estado del radiador		✓	✓	✓	✓		
22		Estado de seguros de las puertas laterales		✓	✓	✓	✓		
23		Estado de la pintura.		✓	✓	✓	✓		
24		Estado de limpieza general		✓	✓	✓	✓		
FIRMA DEL RESPONSABE				Hailey	Hailey	Hailey	Hailey		

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

X Se ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM-F-28
		Fecha	12/04/2024
		Versión	3
		Página	2 de 2

INFORMACIÓN

UBICACIÓN:	Brisas de primavera
INSPECCIONADO POR:	Harley Prada
PROYECTO:	Consorcio Mitigacion Piedecuesta

REPORTE DE HOROMETROS Y CONSUMOS

FECHA		9/06	10/06	11/06	12/06		
HOROMETRO		0084	0091	0095	0103		
COMBUSTIBLE		30g	30g	30g	30g		
ACEITE MOTOR							
REFRIGERANTE							
ACEITE DE LA UNIDAD							
OTRO: _____							

OBSERVACIONES

FIRMA INSPECTOR	Harley Prada
FECHA	12/06/26
FIRMA SUPERVISOR	
FECHA	

Scanned with CamScanner

MAQUINARIAS S.A.S.	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EQUIPO DE PERFORACIÓN NEUMÁTICA	Código	GM-F-39
		Fecha	11/02/2022
		Versión	1
		Página 1 de 2	

TIPO DE MAQUINARIA	UNIDAD NEUMÁTICA DE PERFORACIÓN	ID INTERNO	H 70
OBRA/PROYECTO	mitigacion Bucaramanga	MES	
OPERADOR	Hector Prada	Junio	

ITEM		ACTIVIDADES	DIAS DE LA SEMANA						
			LU	MA	MI	JU	VI	SA	DM
1	CANASTA DE PERFORACIÓN	Inspeccionar estado de riel canasta.	-	✓	-	—	-	-	
2		Inspeccionar estado de teflones.	-	-	—	-	-	—	
3		Inspeccionar estado motor de rotación.	✓	✓	-	-	—	—	
4		Inspeccionar fugas de rotaria.	—	-	-	-	—	-	
5		Inspeccionar estado de rosca de eje principal de rotaria.	-	-	—	—	—	✓	
6		Inspeccionar estado motor de avance.	—	-	-	-	—	—	
7		Inspeccionar estado de tensión de cadena de avance.	—	✓	✓	—	✓	✓	
8		Inspeccionar estado de piñon de avance.	✓	✓	✓	—	✓	—	
9		Inspeccionar el nivel de grasa a la rotaria	-	✓	✓	—	-	—	
10		Inspeccionar estado de acoples rapidos.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
11		Inspeccionar motor de giro.	✓	—	-	-	—	—	
12		Inspeccionar estado de mandos	-	—	✓	✓	-	✓	
13		Engrasar sistema rotario	-	-	-	—	—	—	
14		Inspeccionar estado de mangueras y abrazaderas	✓	✓	—	✓	-	—	
15		Inspeccionar estado del pulmón	-	-	-	—	-	—	
16	ASPECTOS GENERALES	Pintura – mantenimiento	✓	✓	-	—	—	✓	
17		Estado del martillo	—	✓	—	✓	—	—	
18		Estado de mano de angel.	✓	-	—	—	✓	✓	
19		Estado de acoples.	✓	✓	-	—	—	—	

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

X Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

IV. OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

MAQUINARIAS DE COLOMBIA	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EQUIPO DE PERFORACIÓN NEUMÁTICA	Código	GM-F-39
		Fecha	11/02/2022
		Versión	2
		Página 2 de 2	

INFORMACIÓN

UBICACIÓN:	Piedecuesta barrio el primavera
CONDUCTOR:	Harley Prada
PROYECTO:	consorcio antigaleria Piedecuesta

REPORTE DE HOROMETROS Y CONSUMOS

FECHA	07/06	2/06	3/06	4/06	5/06	6/06	
GRASA	1L	1L	1L	1L	1L	1L	
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Harley Prada
FECHA	06/06/26
FIRMA INSPECCION	
FECHA	

Scanned with CamScanner

MAQUINOBRAS S.A.S.	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EQUIPO DE PERFORACIÓN NEUMÁTICA	Código	GALF-39
		Fecha	11/02/2022
		Versión	1
		Página 1 de 2	

TIPO DE MAQUINARIA	UNIDAD NEUMÁTICA DE PERFORACIÓN	ID INTERNO	#10
OBRA/PROYECTO	Mitigacion Bienvenido Andes Pradera	MES	
OPERADOR		Junio	

ITEM		ACTIVIDADES	DIAS DE LA SEMANA						
			DIA	9	10	11	12	DIA	DIA
1	CANASTA DE PERFORACIÓN	Inspeccionar estado de riel canasta.		✓	✓	✓	✓		
2		Inspeccionar estado de teflones.		✓	✓	✓	✓		
3		Inspeccionar estado motor de rotación.		✓	✓	✓	✓		
4		Inspeccionar fugas de rotaria.		✓	✓	✓	✓		
5		Inspeccionar estado de rosca de eje principal de rotaria.		✓	✓	✓	✓		
6		Inspeccionar estado motor de avance.		✓	✓	✓	✓		
7		Inspeccionar estado de tensión de cadena de avance.		✓	✓	✓	✓		
8		Inspeccionar estado de piñon de avance.		✓	✓	✓	✓		
9		Inspeccionar el nivel de grasa a la rotaria		✓	✓	✓	✓		
10		Inspeccionar estado de acoples rapidos.	FESTIVO	NA	NA	NA	NA		
11		Inspeccionar motor de giro.		✓	✓	✓	✓		
12		Inspeccionar estado de mandos		✓	✓	✓	✓		
13		Engrasar sistema rotario		✓	✓	✓	✓		
14		Inspeccionar estado de mangueras y abrazaderas		✓	✓	✓	✓		
15		Inspeccionar estado del pulmón		✓	✓	✓	✓		
16	ASPECTOS GENERALES	Pintura – mantenimiento		✓	✓	✓	✓		
17		Estado del martillo		✓	✓	✓	✓		
18		Estado de mano de angel.		✓	✓	✓	✓		
19		Estado de acoples.		✓	✓	✓	✓		

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

X Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

IV. OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

MAQUINARIAS EN LA OBRA	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EQUIPO DE PERFORACIÓN NEUMÁTICA	Código	GM-F-78
		Fecha	11/02/2022
		Versión	2
		Página 2 de 2	

INFORMACIÓN

UBICACIÓN:	Piedecuesta brisas de primavera
CONDUCTOR:	Harley Prada bpl2
PROYECTO:	consorcio mitigacion Piedecuesta

REPORTE DE HOROMETROS Y CONSUMOS

FECHA	9/06	10/06	11/06	12/06			
GRASA	7L	7L	7L	7L			
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Harley Prada
FECHA	12/06/26
FIRMA INSPECCION	
FECHA	

Scanned with CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	GM-F-13
Fecha	1/11/2025
Versión	1
Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA: MINICARGADOR

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	ID INTERNO	SERIE	UBICACIÓN
YEFERSON ACEVEDO	1.098.714.157		JAGTSMHG32L	Alto de Pinturas

INSPECCIÓN

MES: JUNIO — AÑO: 2026

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	DÍA 1	DÍA 2	DÍA 3	DÍA 4	DÍA 5	DÍA 6	DÍA 7
1	REVISION DIARIA	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces indicadoras.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2		Verificar estado de extintor de incendios.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3		Verificar estado de asientos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4		Verificar escaleras y apoyos accesos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5		Verificar pito-alarma de retroceso.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6		Revisar cinturón de seguridad, retractores del cinturón de seguridad, barra de asiento y enclavamiento de control.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7		Verificar estado de espejos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8		Revisar freno de parqueo, pedales, controles manuales y palancas de dirección o palancas de mandos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9		Verificar freno de servicios.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10		Revisar el nivel de aceite de motor.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11		Limpiar filtro y sistema de aire del motor.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12		Revisar radiador y nivel del refrigerante.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13		Revisar filtro de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14		Limpiar y drenar separador de agua.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15		Lubricar los brazos elevadores, eslabones de elevación, cilindros, enganche rapido, pines de pivote y cuñas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16		Verificar estado de las llantas (presiones de neumaticos, cortaduras, abultamientos)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17		Revisar mangueras y tuberias hidráulicas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18		Revisar niveles de fluido Hidraulico.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19		Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	REVISION SEMANAL	Verificar estado de bobquin.							
21		Verificar estado de la bateria.							
22		Verificar estado de los cilindros.							
23		Revisar tuercas de las ruedas.							
24		Revisar el nivel de la transmisión final.							
25		Verificar estado general de la pala (bujes, pasadores, esquineras, cuchillas)							
26		Revisar motor/ correa de transmisión hidrostatica.							

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM-F-13
		Fecha	1/11/2020
		Versión	1
		Página	2 de 3

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: Brisas de Primavera
OPERADOR: YEFERSON ACEVEDO
PROYECTO: Consorcio Mitigacion Piedecuesta Cdmb

REPORTE DE HOROMETROS Y CONSUMOS

FECHA	1/06/26	2/06/26	3/06/26	4/06/26	5/06/26	6/06/26	
HOROMETRO	15990	15995	15999	15100	15109	15120	
COMBUSTIBLE							
ACEITE MOTOR							
ACEITE HIDRÁULICO							
ACEITE TRANSMISIÓN							
GRASA							
REFRIGERANTE							
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	YEFERSON ACEVEDO
FECHA	6 Junio 2026
FIRMA INSPECCIÓN	
FECHA	6 Junio 2026

Scanned with CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM-F-13
		Fecha	1/11/2025
		Versión	1
		Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA MINICARGADOR

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	EQUIPO	SERIE	UBICACIÓN
YEFERSON AVENDO	1.093.784.167		JAFSFSMTG32C	Brasil Bioenergy

INSPECCIÓN

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	MES	Junio					2025	
			DIA	9/6/25	10/6/25	11/6/25	12/6/25			DIA
1	REVISION DIARIA	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces indicadoras.		✓	✓	✓	✓			
2		Verificar estado de extintor de incendios.		✓	✓	✓	✓			
3		Verificar estado de asientos.		✓	✓	✓	✓			
4		Verificar escaleras y apoyos accesos.		✓	✓	✓	✓			
5		Verificar pito-alarma de retroceso.		✓	✓	✓	✓			
6		Revisar cinturón de seguridad, retractores del cinturón de seguridad, barra de asiento y enclavamiento de control.		✓	✓	✓	✓			
7		Verificar estado de espejos.		✓	✓	✓	✓			
8		Revisar freno de parqueo, pedales, controles manuales y palancas de dirección o palancas de mandos.		✓	✓	✓	✓			
9		Verificar freno de servicios.		✓	✓	✓	✓			
10		Revisar el nivel de aceite de motor.		✓	✓	✓	✓			
11		Limpiar filtro y sistema de aire del motor.		✓	✓	✓	✓			
12		Revisar radiador y nivel del refrigerante.		✓	✓	✓	✓			
13		Revisar filtro de combustible.		✓	✓	✓	✓			
14		Limpiar y drenar separador de agua.		✓	✓	✓	✓			
15		Lubricar los brazos elevadores, eslabones de elevación, cilindros, enganche rapido, pines de pivote y cuñas.		✓	✓	✓	✓			
16		Verificar estado de las llantas (presiones de neumaticos; cortaduras, abultamientos).		✓	✓	✓	✓			
17		Revisar mangueras y tuberias hidráulicas.		✓	✓	✓	✓			
18		Revisar niveles de fluido Hidráulico.		✓	✓	✓	✓			
19		Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.		✓	✓	✓	✓	✓		
20	REVISION SEMANAL	Verificar estado de botiquin.								
21		Verificar estado de la bateria.								
22		Verificar estado de los cilindros.								
23		Revisar tuercas de las ruedas.								
24		Revisar el nivel de la transmisión final.								
25		Verificar estado general de la pala (bujes, pasadores, esquineras, cuchillas).								
26		Revisar motor/ correa de transmisión hidrostatica.								

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM-F-13
		Fecha	1/11/2020
		Versión	1
		Página	2 de 2

INFORMACIÓN

UBICACIÓN:	Brisas de Primavera
OPERADOR:	YEFERSON ACEVEDO
PROYECTO:	Consorcio Mitigacion Pedeciesta cdmb

REPORTE DE HOROMETROS Y CONSUMOS

FECHA	/	9/06/26	10/06/26	11/06/26	12/06/26	/	/
HOROMETRO	/	15125	15130	15135	15140	/	/
COMBUSTIBLE							
ACEITE MOTOR							
ACEITE HIDRÁULICO							
ACEITE TRANSMISIÓN							
GRASA							
REFRIGERANTE							
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	YEFERSON ACEVEDO
FECHA	12 Junio 2026
FIRMA INSPECCIÓN	
FECHA	12 Junio 2026

Scanned with CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM-F-13
		Fecha	1/11/2025
		Versión	1
		Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA MINICARGADOR

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CEDULA	ID INTERNO	SERIE	UBICACIÓN
YEFERSON ARENEDO	1098 719 157		JAESFSM1632LB111334	Brisa Bronce

INSPECCIÓN

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	MES / DIA	Junio			Año	2026	DIA
				16/6/26	17/6/26	18/6/26	19/6/26	20/6/26	
1	REVISIÓN DIARIA	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces indicadoras.		✓	✓	✓	✓	✓	
2		Verificar estado de extintor de incendios.		✓	✓	✓	✓	✓	
3		Verificar estado de asientos.		✓	✓	✓	✓	✓	
4		Verificar escaleras y apoyos accesos.		✓	✓	✓	✓	✓	
5		Verificar pito-alarma de retroceso.		✓	✓	✓	✓	✓	
6		Revisar cinturón de seguridad, retractores del cinturón de seguridad, barra de asiento y enclavamiento de control.		✓	✓	✓	✓	✓	
7		Verificar estado de espejos.		✓	✓	✓	✓	✓	
8		Revisar freno de parqueo, pedales, controles manuales y palancas de dirección o palancas de mandos.		✓	✓	✓	✓	✓	
9		Verificar freno de servicios.		✓	✓	✓	✓	✓	
10		Revisar el nivel de aceite de motor.		✓	✓	✓	✓	✓	
11		Limpiar filtro y sistema de aire del motor.		✓	✓	✓	✓	✓	
12		Revisar radiador y nivel del refrigerante.		✓	✓	✓	✓	✓	
13		Revisar filtro de combustible.		✓	✓	✓	✓	✓	
14		Limpiar y drenar separador de agua.		✓	✓	✓	✓	✓	
15		Lubricar los brazos elevadores, eslabones de elevación, cilindros, enganche rapido, pines de pivote y cuñas.		✓	✓	✓	✓	✓	
16		Verificar estado de las llantas (presiones de neumaticos, cortaduras, abultamientos).		✓	✓	✓	✓	✓	
17		Revisar mangueras y tuberias hidráulicas.		✓	✓	✓	✓	✓	
18		Revisar niveles de fluido Hidraulico.		✓	✓	✓	✓	✓	
19		Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.		✓	✓	✓	✓	✓	
20	REVISIÓN SEMANAL	Verificar estado de botiquin.							
21		Verificar estado de la bateria.							
22		Verificar estado de los cilindros.							
23		Revisar tuercas de las ruedas.							
24		Revisar el nivel de la transmisión final.							
25		Verificar estado general de la pala (bujes, pasadores, esquineras, cuchillas).							
26		Revisar motor/ correa de transmisión hidrostatica.							

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM-F-13
		Fecha	1/11/2020
		Versión	1
		Página	2 de 2

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: Bridas de Primavera
OPERADOR: YEFERSON ACEVEDO
PROYECTO: Consorcio Metropolitano Piedecuesta cdmt

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	/	16/06/24	17/06/24	18/06/24	19/06/24	20/6/24	/
HOROMETRO	/	15195	15150	15155	15157	15159	/
COMBUSTIBLE							
ACEITE MOTOR							
ACEITE HIDRÁULICO							
ACEITE TRANSMISIÓN							
GRASA							
REFRIGERANTE							
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	YEFERSON ACEVEDO
FECHA	20 Junio 2024
FIRMA INSPECCIÓN	
FECHA	20 Junio 2024

Scanned with CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM-F-13
		Fecha	1/11/2025
		Versión	1
		Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA MINICARGADOR

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	EQUIPO	SERIE	UBICACIÓN
JEFERSON ACEVEDO	1093.714.137		[illegible]	[illegible]

INSPECCIÓN

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	MES: Junio				AÑO: 2026	
			22/06/26	23/06/26	24/06/26	25/06/26	26/06/26	DÍA
1	REVISIÓN DIARIA	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces indicadoras.	✓	✓	✓	✓	✓	
2		Verificar estado de extintor de incendios.	✓	✓	✓	✓	✓	
3		Verificar estado de asientos.	✓	✓	✓	✓	✓	
4		Verificar escaleras y apoyos accesos.	✓	✓	✓	✓	✓	
5		Verificar pito-alarma de retroceso.	✓	✓	✓	✓	✓	
6		Revisar cinturón de seguridad, retractores del cinturón de seguridad, barra de asiento y enclavamiento de control.	✓	✓	✓	✓	✓	
7		Verificar estado de espejos.	✓	✓	✓	✓	✓	
8		Revisar freno de parqueo, pedales, controles manuales y palancas de dirección o palancas de mandos.	✓	✓	✓	✓	✓	
9		Verificar freno de servicios.	✓	✓	✓	✓	✓	
10		Revisar el nivel de aceite de motor.	✓	✓	✓	✓	✓	
11		Limpiar filtro y sistema de aire del motor.	✓	✓	✓	✓	✓	
12		Revisar radiador y nivel del refrigerante.	✓	✓	✓	✓	✓	
13		Revisar filtro de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	
14		Limpiar y drenar separador de agua.	✓	✓	✓	✓	✓	
15		Lubricar los brazos elevadores, eslabones de elevación, cilindros, enganche rapido, pines de pivote y cuñas.	✓	✓	✓	✓	✓	
16		Verificar estado de las llantas (presiones de neumaticos, cortaduras, abultamientos).	✓	✓	✓	✓	✓	
17		Revisar mangueras y tuberias hidráulicas.	✓	✓	✓	✓	✓	
18		Revisar niveles de fluido Hidraulico.	✓	✓	✓	✓	✓	
19		Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.	✓	✓	✓	✓	✓	
20	REVISIÓN SEMANAL	Verificar estado de bobquin.						
21		Verificar estado de la bateria.						
22		Verificar estado de los cilindros.						
23		Revisar tuercas de las ruedas.						
24		Revisar el nivel de la transmisión final.						
25		Verificar estado general de la pala (bujes, pasadores, esquineras, cuchillas).						
26		Revisar motor/ correa de transmisión hidrostatica.						

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM-F-12
		Fecha	1/11/2020
		Versión	1
		Página	2 de 2

INFORMACIÓN

UBICACIÓN:	Brisas de Primavera
OPERADOR:	YEFERSON ACEVEDO
PROYECTO:	Consorcio Mantenimiento Redcarter. Cdmb

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	22/oct/26	23/oct/26	24/oct/26	25/oct/26	26/oct/26		
HOROMETRO	15165	15170	15175	15178	15180		
COMBUSTIBLE							
ACEITE MOTOR							
ACEITE HIDRÁULICO							
ACEITE TRANSMISIÓN							
GRASA							
REFRIGERANTE							
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	YEFERSON ACEVEDO
FECHA	26 JUNIO 2026
FIRMA INSPECCIÓN	
FECHA	26 JUNIO 2026

Scanned with CamScanner

ANEXO N° 5
ACTA DE REUNION COPASST

	ACTA DE REUNIÓN COMITÉS	Código	SST-F-28
		Fecha	12/07/2021
		Versión	3
		Página 1 de 2	

FECHA			LUGAR	HORA INICIO	HORA FIN	ACTA NO.	TIPO REUNIÓN	
DD	MM	AA	Campamento	02:00 pm	4:20 pm	7	Mensual	x
26	06	2026					Trimestral	
							Extraordinaria	

Señalar con X el Comité a realizar:

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	x	COMITÉ CONVIVENCIA LABORAL		Otro: _____	

En las instalaciones de la empresa, se reunieron los integrantes del Comité para tratar los siguientes temas:

ORDEN DEL DIA
1. Verificación del quórum 2. Revisión de Acta anterior 3. Seguimiento al plan de formación 4. Inspecciones de lugares de trabajo 5. Incidentes y accidentes de trabajo, enfermedades laborales/Análisis de causas 6. Ausentismo 7. Visitas o auditorías gubernamentales, ARL, clientes, proveedores 8. Sugerencias, recomendaciones, quejas o reclamos de los trabajadores 9. Otros programas y actividades 10. Compromisos

Asistentes Comité	Firmas
Yeiner García Cadena	
Mauricio Villamizar Solano	

TEMAS TRATADOS
1. Verificación del quórum Se procede a tomar asistencia para verificar Quorum y se inicia la reunión al contar con el personal suficiente para la toma de decisiones. 2. Revisión de acta anterior Se realiza la revisión del acta anterior y se verifica el grado de cumplimiento de los compromisos pactados: - Dar cumplimiento y acompañamiento a las actividades programadas en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo: se evidencia seguimiento y participación del comité.

Scanned with CamScanner

3. Seguimiento al plan de formación

Siguiendo el cronograma de capacitación, se capacitó a todo el personal en:

- Prevención de accidentes de trabajo en manos
- Almacenamiento adecuado de productos químicos
- Riesgo químico: SGA (pictogramas de peligro)
- Recomendaciones para cuidar la salud mental

4. Inspecciones de lugares de trabajo

Se observa la participación del comité en la realización de las inspecciones de seguridad: inspección locativa de obra, inspección de botiquines y camillas, inspección de extintores, de las cuales no se reportan hallazgos que requieran atención.

5. Incidentes y accidentes de trabajo, enfermedades laborales/Análisis de causas

Durante el mes de junio de 2026 no se presentaron accidentes de trabajo. No se notificaron presuntos casos de enfermedad laboral.

6. Ausentismo

En el mes de junio de 2026 no se presentaron casos de ausentismo laboral.

7. Visitas o auditorias gubernamentales, ARL, clientes, proveedores

Durante el periodo no se registraron visitas de entes de control o partes interesadas.

8. Sugerencias, recomendaciones, quejas o reclamos de los trabajadores

Durante el periodo no se recibieron comunicaciones por parte de los trabajadores en materia de SST, ni se encuentra en proceso ningún proceso entre la empresa y los colaboradores.

9. Verificación normatividad

Se verifica la normatividad legal vigente que entra en vigencia que aplica a las actividades y funcionamiento del SG-SST durante el periodo

10. Otros programas y actividades

- El equipo SST realiza visitas permanentes a los frentes de obra.

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
Dar cumplimiento y acompañamiento a las actividades programadas en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	COPASST - SST	Junio 2026

Fecha próxima reunión: julio 2026

Yeiner Garcia Cadena
Presidente del COPASST

Mauricio Villamizar Solano
secretario del COPASST

Scanned with CamScanner

ANEXO N° 6
ACTA DE REUNION COCOLA

	ACTA DE REUNIÓN COMITÉS	Código	SST-F-28
		Fecha	12/07/2021
		Versión	3
		Página 1 de 2	

FECHA			LUGAR	HORA INICIO	HORA FIN	ACTA NO.	TIPO REUNIÓN	
DD	MM	AA					Mensual	x
27	06	26	Campamento	2:00 pm	4:00 pm	07	Trimestral	
							Extraordinaria	

Señalar con X el Comité a realizar:

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		COMITÉ CONVIVENCIA LABORAL	X	Otro: _____	

En las instalaciones de la empresa, se reunieron los integrantes del Comité para tratar los siguientes temas:

ORDEN DEL DIA
1. Verificación del quórum 2. Revisión de Acta anterior 3. Quejas de Acoso laboral/ Eventos que involucran el comité 4. Casos no Resueltos 5. Otros Compromisos

Asistentes Comité	Firmas
Yefferson Dyfred González Ortega	
Yeiner García Cadena	

TEMAS TRATADOS

1. Verificación del quórum

Se procede a tomar asistencia para verificar Quorum y se inicia la reunión al contar con el personal suficiente para la toma de decisiones.

2. Revisión de acta anterior

Se realiza la revisión del acta anterior para dar continuidad a los compromisos y actividades definidas anteriormente.

Scanned with CamScanner

3. Quejas de Acoso Laboral:
Durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 junio 2026 no se evidenciaron reportes de acoso laboral ni quejas de convivencia.

Estadísticas de las quejas del periodo:

- Número de quejas presentadas en el periodo: 0
- Número de quejas abiertas de periodos anteriores: 0
- Número de quejas abiertas al final del periodo: 0
- Número de quejas cerradas en el periodo:0

4. Casos No resueltos:
En el periodo no se presentaron casos no resueltos que deban remitirse a entidades externas.

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
Dar cumplimiento y acompañamiento a las actividades programadas	COCOLA	Junio 2026

Fecha próxima reunión: julio 2026

Yefferson Dyfred González Ortega
Presidente

Yainer García Cadena
secretario

Scanned with CamScanner

ANEXO N° 7
ENTREGA DE EPP

	FORMATO ENTREGA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
		Fecha	25/07/2025
		Versión	2
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Yefferson Gonzales	ID	5823211	CARGO	Ayudante obra
PROYECTO	Consorcio Mitigacion Piedecuesta COMB				

II. INSTRUCCIONES/COMPROMISOS

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor.
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA Y REPOSICIÓN

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Guantes vaqueta	1	02	03	26		
Gafas	1	02	03	26		
Guantes vaqueta	1	11	03	26		
Botas	1	17	03	26		
Pantalones	2	17	03	26		
Guantes vaqueta	1	06	03	26		
Gafas	1	18	04	26		
Guantes vaqueta	1	20	04	26		
Camisas	2	19	03	26		
Guantes vaqueta	1	27	04	26		
Guantes vagueta	1	06	05	26		
Gafas	1	06	05	26		
Guantes vaqueta	1	14	05	26		
Tapabocas	1	21	05	26		
Tapabocas	1	28	05	26		
Tapabocas	1	02	06	26		
Guantes vaqueta	1	04	06	26		
Guantes vaqueta	1	09	06	26		

Yefferson

Scanned with CamScanner

	FORMATO ENTREGA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
		Fecha	26/07/2023
		Versión	2
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Harley Prada	ID	1098822751	CARGO	Operador
PROYECTO	Consorcio Mitigacion Piedecuesta COMB				

II. INSTRUCCIONES/COMPROMISOS

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP´s en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA Y REPOSICIÓN

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Tapabocas	1	08	05	26	Harley	
Guantes Nitrilo	1	11	05	26	Harley	
tapabocas	1	12	05	26	Harley	
Tapabocas	1	20	05	26	Harley	
Tapaoidos de Inserna	1	21	05	26	Harley	
Hotapabocas	1	23	05	26	Harley	
tapabocas	1	25	05	26	Harley	
Guantes vaqueta	1	25	05	26	Harley	
tapabocas	1	26	05	26	Harley	
Tapabocas	2	27	05	26	Harley	
tapabocas	1	28	05	26	Harley	
Tapatocois	1	29	05	26	Harley	
Tapabocas	1	01	06	26	Harley	
Tapabocas	1	02	06	26	Harley	
Tapabocas	1	03	06	26	Harley	
Tapabocas	1	05	06	26	Harley	
Tapabocas	1	04	06	26	Harley	
Tapabocas	1	09	06	26	Harley	
Tapabocas	1	10	06	26	Harley	
Gafas oscuras	1	11	06	26	Harley	
Tapabocas	1	11	06	26	Harley	
Tapabocas	1	16	06	26	Harley	
Guantes Nitrilo	1	16	06	26	Harley	
Tapabocas	1	18	06	26	Harley	
Tapabocas	1	19	06	26	Harley	
Gafas oscuras	1	23	06	26	Harley	
Guantes vaqueta	1	30	06	26	Harley	

Harley

Scanned with CamScanner

	FORMATO ENTREGA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	GST-F-17
		Fecha	25/07/2025
		Versión	2
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Baudilio Rivera	ID	1093738325	CARGO	Ayu. Obra
PROYECTO	Consorcio Mitigacion Piedecuesta COMB				

II. INSTRUCCIONES/COMPROMISOS

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor con el CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA COMB
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA Y REPOSICIÓN

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Tapabocas	1	01	06	26		
Tapabocas	1	02	06	26		
Tapabocas	1	05	06	26		

Baudilio

Scanned with CamScanner

FORMATO ENTREGA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Código	SST-F-17
Fecha	25/07/2025
Versión	2
Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Dailin Oiduc	ID	1005327109	CARGO	Ayu. obra
PROYECTO	Consorcio Mitigacion Piedecuesta COMB				

II. INSTRUCCIONES/COMPROMISOS

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor con el CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA COMB
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP´s en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA Y REPOSICIÓN

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Tapabocas	1	06	06	26		
Tapabocas	1	09	06	26		
Tapabocas	1	16	06	26		
tapabocas	1	23	06	26		

Dailf

Scanned with CamScanner

	FORMATO ENTREGA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	GSST-F-17
		Fecha	25/07/2025
		Versión	2
		Página	1 de 1

I. INFORMACION DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Andres Garcia	ID	6565491	CARGO	Ayudante obra
PROYECTO	Consorcio Mitigacion Piedecuesta COMB				

II. INSTRUCCIONES/COMPROMISOS

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor con el CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA COMB
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA Y REPOSICIÓN

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Guantes vaqueta	1	18	06	26		
Tapabocas	1	18	06	26		
Gafas oscuras	1	23	06	26		
Guantes vaqueta	1	23	06	26		

Chimu

Scanned with CamScanner

FORMATO ENTREGA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Código	SST-F-17
Fecha	25/07/2025
Versión	2
Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Jose Ospino	ID	1050719060	CARGO	Ayu. Obra
PROYECTO	Consorcio Mitigacion Piedecuesta COMB				

II. INSTRUCCIONES/COMPROMISOS

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las Instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA Y REPOSICIÓN

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Gafas oscuras	1	26	05	26		
Guantes vaqueta	1	27	05	26		
tapabocas	1	28	05	26		
Tapabocas	2	29	05	26		
Tapabocas	1	29	05	26		
Gafas oscuras	1	29	05	26		

Callo

Scanned with CamScanner

FORMATO ENTREGA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Código	SST-F-17
Fecha	25/07/2025
Versión	2
Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR


NOMBRE	Luis Cifuentes	ID		CARGO	Ayu. Obra
PROYECTO	Consorcio Mitigacion Piedecuesta CDMB				

II. INSTRUCCIONES/COMPROMISOS

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor con el CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA Y REPOSICIÓN

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Guantes vaqueta	1	01	06	26		
Tapabocas	1	06	06	26		

Luis C.

Scanned with CamScanner

	FORMATO ENTREGA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
		Fecha	25/07/2025
		Versión	2
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Mauricio villamizar	ID	1005541892	CARGO	Operador Inyeccion
PROYECTO	Consorcio Mitigacion Piedecuesta				

II. INSTRUCCIONES/COMPROMISOS

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA Y REPOSICIÓN

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Tapabocas	1	24	03	26		
Tapabocas	1	26	03	26		
Guantes vaqueta	1	10	04	26		
Arma Casco	1	13	04	26		
Tapabocas	1	16	04	26		
Guantes Nitrilo	1	17	04	26		
Tapabocas	1	21	04	26		
Tapabocas	1	23	04	26		
Tapabocas	1	27	04	26		
Tapabocas	1	12	05	26		
Guantes nitrilo	1	12	05	26		
Tapabocas	1	19	05	26		
tapabocas	2	23	05	26		
Tapabocas	1	27	05	26		
tapabocas	1	28	05	26		
Tapabocas	1	29	05	26		
Tapabocas	1	02	06	26		
Tapabocas	1	05	06	26		
Tapabocas	1	06	06	26		
Tapabocas	1	09	06	26		
Tapabocas	1	10	06	26		
Tapabocas	1	11	06	26		
Guantes Nitrilo	1	16	06	26		
Tapabocas	1	16	06	26		
Guantes vaqueta	1	30	06	26		

Fundago

Scanned with CamScanner

	FORMATO ENTREGA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
		Fecha	25/07/2025
		Versión	2
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Yoel Ardila	ID	1046427115	CARGO	Operador
PROYECTO	Consorcio Mitigacion Piedecuesta				

II. INSTRUCCIONES/COMPROMISOS

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA Y REPOSICIÓN

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Gafas	1	26	03	26		
Tapabocas	1	27	03	26		
Guantes vaqueta	1	06	09	26		
Tapabocas	1	06	04	26		
Tapaoidos	1	07	04	26		
Tapabocas	1	07	04	26		
Tapabocas	1	08	04	26		
Tapabocas	1	10	04	26		
Tapabocas	1	15	04	26		
Tapabocas	1	17	04	26		
Tapabocas	1	20	04	26		
Tapabocas	1	21	04	26		
Guantes Nitrilo	1	11	05	26		
Tapaoidos Goma	1	12	05	26		
Tapabocas	1	26	05	26		
Tapabocas	1	28	05	26		
Tapabocas	1	29	05	26		
Tapabocas	1	01	06	26		
Tapabocas	1	02	06	26		

Yoel

Scanned with CamScanner

	FORMATO ENTREGA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
		Fecha	25/07/2025
		Versión	2
		Página	1 de 1

I. INFORMACION DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Yeiner Garcia	ID	1005187293	CARGO	Operador Perfor.
PROYECTO	Consorcio Mitigacion Piedecuesta COMB				

II. INSTRUCCIONES/COMPROMISOS

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA Y REPOSICIÓN

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Tapabocas	1	19	05	26		
Tapabocas	1	21	05	26		
Tapabocas	1	26	05	26		
Guantes vaqueta	1	27	05	26		
Tapabocas	1	28	05	26		
Tapabocas	1	29	05	26		
Tapabocas	1	01	06	26		
Tapabocas	1	02	06	26		
Tapabocas	1	03	06	26		
Tapabocas	1	04	06	26		
Tapabocas	1	05	06	26		
Guantes nitrilo	1	15	06	26		
Guantes vaqueta	1	23	06	26		

Yeiner

Scanned with CamScanner

	FORMATO ENTREGA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
		Fecha	25/07/2025
		Versión	2
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Carlos Daniel Diaz	ID	1005540379	CARGO	Ayudante obra
PROYECTO	Consorcio Mitigacion Piedecuesta CDMB				

II. INSTRUCCIONES/COMPROMISOS

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor con el CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA Y REPOSICIÓN

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
equipo de altas completo	1	14	05	26		
Casco	1	14	05	26		
Guantes Nitrilo	1	14	05	26		
Tapabocas	2	25	05	26		
Gafas Oscuras	1	26	05	26		
Tapabocas	1	26	05	26		
Guantes vaqueta	1	09	06	26		
Gafas Oscuras	1	09	06	26		
Guantes Nitrilo	1	17	06	26		

Daniel

Scanned with CamScanner

	FORMATO ENTREGA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
		Fecha	25/07/2025
		Versión	2
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Alexander Prada	ID		CARGO	Ayu. Perforacion
PROYECTO	Consorcio Mitigacion Piedecuesta CDMB				

II. INSTRUCCIONES/COMPROMISOS

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor con el CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA Y REPOSICIÓN

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Guantes vaqueta	1	17	06	26	Alex Prada	

Alex

Scanned with CamScanner

FORMATO ENTREGA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Código	SST-F-17
Fecha	25/07/2025
Versión	2
Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Diego Florez	ID	1006356022	CARGO	Aux. Perforacion
PROYECTO	Consorcio Mitigacion Pierdecuesta CDMB				

II. INSTRUCCIONES/COMPROMISOS

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor.
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA Y REPOSICIÓN

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
tapabocas	1	12	05	26		
Tapabocas	2	13	05	26		
tapabocas	2	14	05	26		
tapabocas	1	14	05	26		
Guantes nitrilo	1	14	05	26		
Tapabocas	1	19	05	26		
tapabocas	20	20	05	26		
tapabocas	2	21	05	26		
Tapabocas	2	22	05	26		
tapabocas	1	23	05	26		
tapabocas	2	25	05	26		
tapabocas	2	26	05	26		
Tapabocas	2	27	05	26		
tapabocas	3	28	05	26		
tapabocas	2	29	05	26		
tapabocas	2	01	06	26		
Tapabocas	2	02	06	26		
tapabocas	2	03	06	26		
tapabocas	2	04	06	26		
Tapabocas	2	05	06	26		
Guantes vaqueta	1	05	06	26		
Gafas	1	06	06	26		
Gafas oscuras	1	23	06	26		

Diego

Scanned with CamScanner

FORMATO ENTREGA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Código	SST-F-17
Fecha	25/07/2025
Versión	2
Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Rodolfo Quiñonez	ID	6356621	CARGO	Ayudante obra
PROYECTO	Consorcio Mitigacion Piedecuesta COMB				

II. INSTRUCCIONES/COMPROMISOS

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor con el CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA COMB
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA Y REPOSICIÓN

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Guantes vaqueta	1	02	06	26	Rodolfo	
Tapabocas	1	02	06	26	Rodolfo	
Gafas oscuras	1	03	06	26	Rodolfo	
Tapabocas	1	04	06	26	Rodolfo	
Tapabocas	2	09	06	26	Rodolfo	
Tapabocas	1	10	06	26	Rodolfo	
Guantes vaqueta	1	10	06	26	Rodolfo	
Tapabocas	1	11	06	26	Rodolfo	
Tapabocas	1	16	06	26	Rodolfo	
Tapabocas	1	17	06	26	Rodolfo	
Tapabocas	1	18	06	26	Rodolfo	
Camisas	2	03	07	26	Rodolfo	

Rodolfo

Scanned with CamScanner

FORMATO ENTREGA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Código	SST-F-17
Fecha	25/07/2025
Versión	2
Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Luis Prada	ID	5691822	CARGO	Ayudante obra
PROYECTO	Brisas de Primavera - Consacia Mitigacion Piedecuesta				

II. INSTRUCCIONES/COMPROMISOS

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA Y REPOSICIÓN

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Guantes Nitrilo	1	02	03	26		
Guantes vaqueta	1	09	03	26		
Pantalones	2	17	03	26		
Camisas	2	17	03	26		
Guantes Nitrilos	1	15	04	26		
Botas	1	19	03	26		
Guantes Nitrilo	1	24	04	26		
Guantes Nitrilo	1	11	05	26		
Tapabocas	1	20	05	26		
Tapabocas	1	02	06	26		
Tapabocas	1	03	06	26		
Tapabocas	1	04	06	26		
Guantes vaqueta	1	04	06	26		

Don Luis

Scanned with CamScanner

FORMATO ENTREGA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Código	SST-F-17
Fecha	25/07/2025
Versión	2
Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Luis fuentes	ID	1098697422	CARGO	Ayu. Perforacion
PROYECTO	Consorcio Mitigacion Piedecuesta COMB				

II. INSTRUCCIONES/COMPROMISOS

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA Y REPOSICIÓN

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Tapabocas	1	27	05	26	Luis F	
tapabocas	1	28	05	26	Luis F	
Guantes Camaza	1	28	05	26	Luis F	
Gafas oscuras	1	29	05	26	Luis F	
Tapabocas	1	29	05	26	Luis F	
Tapabocas	1	01	06	26	Luis F	
Gafas oscuras	1	01	06	26	Luis F	
Tapabocas	2	02	06	26	Luis F	
Guantes vaqueta	1	02	06	26	Luis F	
Tapabocas	1	030	6	26	Luis F	
Tapabocas	2	03	06	26	Luis F	
Tapabocas	1	05	06	26	Luis F	
Guantes vaqueta	1	17	06	26	Luis F	

LUIS F

Scanned with CamScanner

	FORMATO ENTREGA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
		Fecha	25/07/2025
		Versión	2
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Kelvin Paez	ID	7014092	CARGO	Ayu. Perforacion
PROYECTO	Consorcio Mitigacion Piedecuesta CDMB				

II. INSTRUCCIONES/COMPROMISOS

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA Y REPOSICION

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Guantes Vaqueta	1	28	05	26	Kelvin	
Tapatolas	2	29	05	26	Kelvin	
Tapabocas	2	01	06	26	Kelvin	
Guantes vaqueta	1	02	06	26	Kelvin	
Gafas oscuras	1	02	06	26	Kelvin	
Tapabocas	2	03	06	26	Kelvin	
Tapabocas	1	04	06	26	Kelvin	
Guantes Vaqueta	1	04	06	26	Kelvin	
Guantes Nitrilo	1	12	06	26	Kelvin Franco	

Kelvin

Scanned with CamScanner

ANEXO N° 8
CAPACITACIONES

	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	RH-F-28
		Fecha	31/10/2022
		Versión	2
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO ☐ CAPACITACION ☑ CHARLA ☐

OBRA Consorcio Mitigacion Redecuesta Cdmb

TEMA DE CAPACITACIÓN Prevencion de accidentes de trabajo en moto

LUGAR: obra FECHA 1 Junio 2026

CAPACITADOR Victor Gamboa DURACIÓN 30 min

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Consejo Ingeniero	91291701	oficial	
2	Luis Fuentes	2000006746	A.Y	
3	Fredy Rojas Patiño	16'671 077	operador	
4	DAYLIN MARTIN ORDUZ	1005327464	A Y	
5	Jefferson Gonzalez	5823241	Ayudante	
6	Yeiner Garcia	7005187293	Operador	
7	Andres garcia	6565491	A Y	
8	Bayardo Rivera Gomez	1049739325	Ayudante de perforacion	
9	Kelvin Jesid Pacheco Peñaloza	7074092	Asistente de perforacion	
10	Rodolfo Quijano	635621	Ayudante	
11	Luis Alberto Prada	5.697 822	Ayudante	
12	Harby prada lopez	1098822751	operador	Harby Prada.
13	Juan Andres Diaz Q	1045802634	Almacenista	
14	Diego Andres Flores Gomez	1053560222	Asistente de perforacion	
15	Mauricio Villamizar	1005341892	Operador	
16	Alexander Prada	1374573 6	Ayudante Perforacion	Alexander Prada
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES:

CAPACITADOR
FIRMA

Scanned with CamScanner

	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	RH-F-28
		Fecha	31/10/2022
		Versión	2
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO ☐ CAPACITACION ☒ CHARLA ☐

OBRA Consorcio Mitigacion Piedecuesta Cdmb

TEMA DE CAPACITACIÓN Almacenamiento adecuado de Productos Quimicos

LUGAR: obra FECHA 9 Junio 2026

CAPACITADOR Victor Gamboa DURACIÓN 30 min

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Jefferson Gonzalez	5823211	AY	
2	Heiner Garcia	1005184293	Operador	
3	Darlin martin ordoz	1005327109	AY	
4	Andres garcia	6565491	AY	
5	Bastillo Rivera Rodriguez	1095725725	Ayudante TF	
6	Yhelgis Paez	7014092	Ayudante de Perforacion	
7	Rodulfo Quintero	6356621	Ayudante	
8	Fredy Reyes Prieto	13871071	operador	
9	Luis Ayuste	2000.006.746	AY	
10	Luis Alberto gordo	5.697.822	Ayudante	
11	Yhelvy Prada Lopez	1098822751	operador	
12	Juan Andres Diaz Q	1095802634	Almacenista	
13	Mauricio villamizar	1005541892	Operador	
14	yoel adrian Novoa	P9697115	operador perforacion	
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES:

CAPACITADOR

FIRMA

Scanned with CamScanner

	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	RH-F-28
		Fecha	31/10/2022
		Versión	2
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO [ ] CAPACITACION [X] CHARLA [ ]

OBRA Consorcio Mitigacion Relleno Cdmb

TEMA DE CAPACITACIÓN Riesgo Quimico: SGA (Pictogramas de Peligro)

LUGAR: obra FECHA 16 JULIO 2026

CAPACITADOR Victor Gamboa DURACIÓN 30 min

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Consorcio Mitigacion	9129170?	oficial	
2	Luis Gamboa	2000006746	A-Y	
3	Freddy Reyes Patiño	16'871 071	operador	
4	DAYLIN MARTINEZ DIAZ	1005374164	A Y	
5	Jefferson Gonzalez	5823211	Ayudante	
6	Yeiner Garcia	7005187293	Operador	
7	Andres Garcia	6565491	A Y	
8	Bastidas Vera Gomez	1093731325	Ayudante	
9	Yhelvin Piedad Pardo Peñaloza	7074092	Auxiliar de Perforacion	
10	Rodolfo Quiñonez	635621	Ayudante	
11	Luis Alberto Pinda	5.697 822	Ayudante	
12	Harley Pinda Lopez	1098221751	operador	
13	Juan Andres Diaz Q	1045002634	Almacenista	
14	Diego Andres Hoyos Jimenez	1063460222	Auxiliar de Laboratorio	
15	Mauricio Villarraga	1005541892	Operador	
16	Yader Andres Herrera	1046927915	Operador Perforadora	
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES:

CAPACITADOR

FIRMA

Scanned with CamScanner

	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	RH-F-28
		Fecha	31/10/2022
		Versión	2
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO [ ] CAPACITACION [X] CHARLA [ ]

OBRA: Consorcio Hitiquecia Piedecuesta Colombia

TEMA DE CAPACITACIÓN: Recomendaciones para Cuidar la Salud Mental

LUGAR: obra FECHA: 26 Junio 2026

CAPACITADOR: Victor Gamboa DURACIÓN: 30 min

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Jefferson Gonzalez	5823211	AY	
2	Heiner Garcia	1005187293	Operador	
3	Darlin martinez Diaz	1005327109	AY	
4	Andres aparicio	6565491	AY	
5	Bonfillo Rivera Gomez	1095732375	Ayudante TC	
6	Viviana Paez	7014092	Ayudante de Perforacion	
7	Rodolfo Quintero	G356641	Ayudante	
8	Freddy Lopez Patiño	13'871 041	operador	
9	luis Ayuso	2000.006.746	AY	
10	Luis Alberto pedraza	5.697.822	Ayudante	
11	Yeiny Paola Lopez	1098622951	operador	
12	Gumersindo Rivadeneira	91.291.101	Oficial	
13	Mauricio Villamizar	1005541892	Operador	
14	Jose ardila Narvaez	109.697.115	operador perforacion	
15	Alexander Prada	1.279.573	Ayudante Perforacion II	
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES:

CAPACITADOR

FIRMA

Scanned with CamScanner

ANEXO N° 9
INSPECCIONES DE SEGURIDAD

INSPECCIÓN LOCATIVA DE OBRA

Código	SST-F-18
Fecha	15/08/2023
Versión	3
Página	de

Frente de Obra	Brisas de Primavera	Fecha:	9 Junio 2026
Área Inspeccionada:	Almacen	V.B. Copasst:	Yeiner Garcia

Marque según criterio: B= Bueno R= Regular M= Malo NA= No aplica

BUENO	REGULAR	MALO	NO APLICA
Cuando el ítem a revisar NO presenta algún daño, avería, riesgo (salud ocupacional, ambiental) y está todo en perfecto orden.	Cuando alguno de los ítems inspeccionados presenta daño, avería, riesgo (salud ocupacional, ambiental) o no está en orden o aseo	Cuando la mayoría de los ítems inspeccionados presenta un daño, avería, riesgos y está todo en desorden y desaseo.	No es utilizado en alguno de los ítems.

PARÁMETROS A INSPECCIONAR	B	R	M	NA	CORRECCIÓN	FECHA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
ALMACENAMIENTO								
Las áreas de almacenamiento están señalizadas y demarcadas adecuadamente	✓							
Se tienen TODAS las hojas de seguridad de las sustancias químicas presentes en el área	✓							
El almacenamiento de sustancias químicas esta acorde a las recomendaciones dadas en las hojas de seguridad o fichas técnicas.	✓							
El orden de productos es el recomendado	✓							
INSTALACIONES								
Los pisos tienen superficies seguras y adecuadas para el trabajo	✓							
Los pisos están limpios, secos, sin desperdicios	✓							
Los pisos están libres de obstáculos	✓							
Las áreas de trabajo están debidamente señalizadas y demarcadas	✓							
Los senderos son seguros y libres de obstáculos	✓							
Las vías de circulación están debidamente demarcadas	✓							
Los recipientes se encuentran debidamente rotulados o marcados con el contenido	✓							
En las instalaciones se cuenta con baterías sanitarias	✓							
Las áreas se encuentran libres o aseguradas de elementos que cuenten con	✓							
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS								
La maquinaria y/o equipo están debidamente protegidos	✓							
Las herramientas, maquinaria y equipos están operativos para su uso	✓							
Los equipos y/o maquinaria se encuentran libres de fugas	✓							
El cable de alimentación de la herramienta y/o equipo está en buen estado? (libre de cortes)	✓							
ORDEN Y ASEO								

Scanned with CamScanner

INSPECCIÓN LOCATIVA DE OBRA

Código	SST-F-18
Fecha	15/08/2023
Versión	3
Página	de

Frente de Obra	Buses de Primavera	Fecha:	9 Junio 2026
Área Inspeccionada :	Almacen	V.B. Copasst:	Yeiner Garcia

El área y todas sus zonas se encuentran libres de objetos fuera de uso o que no pertenecen a este lugar.	✓								
En la área se cuenta con puntos ecológicos para la clasificación y disposición de los residuos	✓								
Se mantienen aseos aluvios al orden y aseo en lugares apropiados y se dictan charlas de sensibilización periodicas al personal sobre el orden y aseo.	✓								
Se aplica un programa de reciclaje y protección al medio ambiente	✓								
El sitio para el almacenamiento de residuos es el adecuado y esta ordenado	✓								
Los recipientes donde se disponen los residuos son adecuados en tamaño y número	✓								
Las baterias sanitarias se encuentran en condiciones adecuadas de orden y aseo	✓								
SISTEMA DE EMERGENCIA									
En el área hay disponibilidad de recursos para la atención de emergencias (botiquín, camilla, extintor)	✓								
Se organizaron y asignaron las responsabilidades de las brigadas de emergencias	✓								
Se encuentran definidas y señalizadas las rutas de evacuación y punto de encuentro	✓								
Se encuentran definidas y señalizadas las salidas de emergencia	✓								
Se encuentra establecido y en funcionamiento un sistema de comunicación oportuno en caso de emergencia	✓								
Se cuenta con MEDEVAC	✓								
Los extintores se encuentran recargados, señalizados y funcionales	✓								
PRIMEROS AUXILIOS									
El botiquín de primeros auxilios se encuentra dotado y es de fácil acceso	✓								
Se cuenta con camilla en el área	✓								
Se realiza control de los insumos que se utilizan para la atención de emergencias con el fin de realizar la reposición oportuna de los mismos	✓								

OBSERVACIONES	
Responsable de la Inspección:	Victor Gamboa
Cargo:	Profesional SST

Scanned with CamScanner

	INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-35
		Fecha	4/06/2021
		Versión	2
		Pagina	de

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA: Victor Gamboa Firma: CARGO: Profesional SST

FRENTE DE OBRA Y/O PROYECTO: Consorcio Mutagua Redaverte cdmb – Bisagra primera

Vo Bo COPASST (Nombre y firma): yeiner Garcia CARGO: operador de Reparacion

Tenga en cuenta que:

Ut: Usa y se califica con SI ó NO

Nota: La calificación se sujeta al momento de la observación

DATOS BÁSICOS		FECHA	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL																				OBSERVACIONES
			Casco		Protector Auditivo		Proteccion ocular		Protector Respiratorio		Dotación		Guantes		Botas		Barbuquejo		otro		otro		
NOMBRE	CARGO		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	
Diego Flores	Ayudante Perforac	9/Junio	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Luis Alfredo Fonte	Ayudante	9/Junio	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Andres Garcia	Ayudante	9/Junio	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Rodolfo Quiroz	Ayudante	9/Junio	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Andres Quintero	Almacenista	9/Junio	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Hadley Prada	operador II	9/Junio	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Kelvin Ruiz	Ayudante Perfor	9/Junio	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Alexander Prada	Ayudante P.	9/Junio	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Mauricio Ulloa	Operador	9/Junio	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Gumercindo	OFICIAL	9/Junio	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Jefferson G.	Ayudante	9/Junio	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
yeiner Garcia	operador	9/Junio	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Yoel Ardila	Operador	9/Junio	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							

Scanned with CamScanner

	INSPECCIÓN DE BOTIQUINES Y CAMILLAS	Código	SST-F-18
		Fecha	13/05/2025
		Versión	4
		Página	de

Inspección realizada por

Nombre: Victor Gamboa	Fecha inspección: 9/06/26	Próxima inspección: 9/10/26	
Cargo: Profesional SST	Lugar: Almacen	Firma:	
Ubicación del botiquín: Almacen	Ubicación de la camilla: Almacen		
V.B. Copasst: Yeiner Garcia	V.B. Brigadas de emergencia		

Resultado de la inspección

Aceptable	Aceptable con observaciones	No Aceptable	No aplica

Elementos	Parámetros previstos								Plan de acción			
	Medida	Cantidad Dada	Cantidad Existente	Fecha vencimiento	Novedad encontrada				Acción Correctiva Propuesta	Fecha Propuesta	Fecha Ejecución	Responsable
					B	R	M	NA				
Alcohol Antiséptico	Frasco	1	1		✓							
Termómetro Digital	Unidad	1	1		✓							
Algodón	Paquete	1	1		✓							
Gasa Estéril	Paquete	8	5	3/07/24	✓							
Gasa Limpia	Unidad	20	0									
Aplicadores x/o copitos	Unidad	10	10	1/07/27	✓							
Esparadrapo de tela	Unidad	1	1		✓							
Esparadrapo micropore	Unidad	1	1		✓							
Apósito ocular	Unidad	1	3		✓							
Baja lenguas	Unidad	10	10		✓							
Yodopovidona Espuma	Frasco	1	1		✓							
Clorhexidina (Jabón Quirurgico)	Frasco	1	1		✓							
Linterna con pilas	Unidad	1	2	27/04/27	✓							
Inmolizador Miembros superiores	Unidad	1	0									
Inmolizador Cervical	Unidad	1	0									
Inmovilizador miembros inferiores	Unidad	1	10	2/04/29	✓							
Solución salina 250 ml ó 500 ml	Bolsa	2	3		✓							
Silbato de emergencias	Unidad	1	4		✓							
Tijeras	Unidad	1	3		✓							
Curitas	Unidad	10	12		✓							
Sales de Rehidratación Oral	Sobre	3	10		✓							
Tapabocas desechable	Unidad	10	1		✓							
Compresas Estériles	Unidad	1	1		✓							
Guantes de nitrilo / latex	Unidad	20	1		✓							
Venda de algodón 3*5 yardas	Unidad	1	1		✓							
Vendas elástica 2*5 yardas	Unidad	1	1		✓							
Vendas elástica 3*5 yardas	Unidad	1	1		✓							
Vendas elástica 5*5 yardas	Unidad	1	1		✓							
Mascarilla o Protector facial RCP	Unidad	1	0									
Manual primeros auxilios	Unidad	1	1		✓							

INSPECCIÓN DE CAMILLA

La camilla debe ser plástica en polietileno de alta densidad, impermeable a todos los fluidos, de fácil manejo, con anclajes para sujeción del paciente

Descripción	Estado				Observaciones
	B	R	M	NA	
Instalación (Sitio de ubicación con fácil acceso)	✓				
Se encuentra señalizado	✓				
Estado del soporte	✓				
Estado de las correas de seguridad	✓				
Estado general (sin fisuras o fracturas, limpia y libre de polvo)	✓				
Juego de inmovilizadores de miembro inferior y superior	✓				

Conclusiones y Sugerencias

Scanned with CamScanner

	INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Código	SST-F-15
		Fecha	15/08/2023
		Versión	3
		Pagina	de

FECHA: 9 Enero 2026 PROYECTO: Consorcio Mitigacion Pradocosta Club

INSPECCIÓN REALIZADA POR: Victor Gamboa

V.B. BRIGADAS DE EMERGENCIA: Yeiner Garcia

V.B. COPASST: _____

No. Interno	Descripción Agente extintor	Ubicación	Capacidad	Ultimo mantenimiento	Fecha de próximo mantenimiento	Presa	Señalización	Acceso	Visibilidad	Manómetro	Presión	Pasador	Manguera	Boquilla	Anclaje	Tarjeta	Vainilla	Observaciones
1	Multipropósito	Almacen	10lbs	01/26	01/27	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	

OBSERVACIONES:

Nota: Para el diligenciamiento del estado de los extintores coloque B (Bueno), R (Regular) o M (Malo), según lo evidenciado en la inspección.

Scanned with CamScanner

	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	Código	SST-F-16
		Fecha	15/08/2023
		Versión	3
		Página	1 de 1

EMPRESA: Consorcio Mitigacion Arcewelles | INSPECCIONADO POR: Juan Andres Diaz

FRENTE: Brisas de Primavera | FECHA: 1 Junio al 6 Junio 2026

¿Se realiza limpieza de herramientas? SI [X] NO [ ] | Periocidad de la limpieza: Diaria

HERRAMIENTA	REVISION	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIERCOL		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Alicates	Mango, aislamiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Barras	Estado general	5	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Caretas para esmerilar	Acetato, tafilete	N/A	—		—		—		—		—		—		—	
Cinceles	Estado general	3	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cinta métrica	Estado general	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Destornilladores	Mango, punta	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Extensiones	Mango	N/A	—		—		—		—		—		—		—	
Limas	Mango, estado general	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Llaves Expansivas	Estado general	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Machetes con funda	Mango	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Martillos de uña	Mango	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Palas	Cabo, hoja	12	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Paladragas	Cabo, cavadora	3	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Parasoles	Estado general	N/A	—		—		—		—		—		—		—	
Picas	Cabo	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Porras (9", 12", 18")	Mango	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Extensiones electricas	Clevija, contacto	N/A	—		—		—		—		—		—		—	
Tijeras industriales	Estado general	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Serruchos	Mango, hoja, marco	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Carretillas	Platon, mangos, neumáticos	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Taladro (Mandril 3/8")	Cable, broca, mandril, mango	3	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cizalla (12", 24", 42")	Empuñadura, mango, pernos	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Pulidora Grande	Cable, swithc, mandril, disco	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Juego de Llaves	Estado general	3	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Llave de Tubo	Mordaza, regulador	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Nivel de Mano	Gota de nivel	3	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Hachas	Cabo - filo	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tirfor	Guaya, palanca, carcasa, mordaza	3	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

NOMBRE ALMACENISTA: Juan Andres Diaz Quintero

FIRMA: [signature]

V.B. del Copasst y/o Vigia: Yeiner Garcia

OBSERVACIONES:

Scanned with CamScanner

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR

Código	SST-F-16
Fecha	15/08/2023
Versión	3
Página	1 de 1

EMPRESA: Consorcio Mitigacion Pedregales | INSPECCIONADO POR: Juan Andres Diaz

FRENTE: Brisas de primavera | FECHA: 9 Junio al 13 Junio /26

¿Se realiza limpieza de herramientas? SI [X] NO [ ] | Periocidad de la limpieza: Diario

HERRAMIENTA	REVISION	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIERCOL.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Alicates	Mango, aislamiento	1			✓		✓		✓		✓					
Barras	Estado general	5			✓		✓		✓		✓					
Caretas para esmerilar	Acetato, tafilete	N/A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cinceles	Estado general	3			✓		✓		✓		✓					
Cinta métrica	Estado general	1			✓		✓		✓		✓					
Destornilladores	Mango, punta	2			✓		✓		✓		✓					
Extensiones	Mango	N/A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Limas	Mango,estado general	2			✓		✓		✓		✓					
Llaves Expansivas	Estado general	2			✓		✓		✓		✓					
Machetes con funda	Mango	4			✓		✓		✓		✓					
Martillos de uña	Mango	2			✓		✓		✓		✓					
Palas	Cabo, hoja	12			✓		✓		✓		✓					
Paladragas	Cabo, cavadera	3			✓		✓		✓		✓					
Parasoles	Estado general	N/A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Picas	Cabo	10			✓		✓		✓		✓					
Porras (9", 12", 18")	Mango	4			✓		✓		✓		✓					
Extensiones electricas	Clavija, contacto	N/A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tijeras industriales	Estado general	1			✓		✓		✓		✓					
Serruchos	Mango, hoja, marco	1			✓		✓		✓		✓					
Carretillas	Platon, mangos, neumáticos	2			✓		✓		✓		✓					
Taladro (Mandril 3/8")	Cable, broca, mandril, mango	3			✓		✓		✓		✓					
Cizalla (12", 24", 42")	Empuñadura, mango, pernos	1			✓		✓		✓		✓					
Pulidora Grande	Cable, swithc, mandril, disco	2			✓		✓		✓		✓					
Juego de Llaves	Estado general	3			✓		✓		✓		✓					
Llave de Tubo	Mordaza, regulador	1			✓		✓		✓		✓					
Nivel de Mano	Gota de nivel	3			✓		✓		✓		✓					
Hachas	Cabo - filo	1			✓		✓		✓		✓					
Tirfor	Guaya, palanca, carcasa, mordaza	3			✓		✓		✓		✓					

NOMBRE ALMACENISTA: Juan Andres Diaz Quintero

FIRMA: [signature]

V.B. del Copasst y/o Vigia: [signature]

OBSERVACIONES:

Scanned with CamScanner

	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	Código	SST-F-16
		Fecha	15/06/2023
		Versión	3
		Página	1 de 1

EMPRESA: Consorcio Mitigacion Redeweeter
INSPECCIONADO POR: Juan Andres Diaz
FRENTE: Brisas de Primavera
FECHA: 16 Julio al 20 Julio
¿Se realiza limpieza de herramientas? SI X NO Periocidad de la limpieza: Diaria

HERRAMIENTA	REVISION	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIERCOL		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Alicates	Mango, aislamiento	1			✓		✓		✓		✓		✓			
Barras	Estado general	5			✓		✓		✓		✓		✓			
Caretas para esmerilar	Acetato, tafilete	N/A			✓											
Cinceles	Estado general	3			✓		✓		✓		✓		✓			
Cinta métrica	Estado general	1			✓		✓		✓		✓		✓			
Destornilladores	Mango, punta	2			✓		✓		✓		✓		✓			
Extensiones	Mango	N/A														
Limas	Mango,estado general	2			✓		✓		✓		✓		✓			
Llaves Expansivas	Estado general	2			✓		✓		✓		✓		✓			
Machetes con funda	Mango	4			✓		✓		✓		✓		✓			
Martillos de uña	Mango	2			✓		✓		✓		✓		✓			
Palas	Cabo, hoja	12			✓		✓		✓		✓		✓			
Paladragas	Cabo, cavadora	3			✓		✓		✓		✓		✓			
Parasoles	Estado general	N/A														
Picas	Cabo	10			✓		✓		✓		✓		✓			
Porras (9", 12", 18")	Mango	4			✓		✓		✓		✓		✓			
Extensiones electricas	Clavija, contacto	N/A														
Tijeras industriales	Estado general	1			✓		✓		✓		✓		✓			
Serruchos	Mango, hoja, marco	1			✓		✓		✓		✓		✓			
Carretillas	Platon, mangos, neumáticos	2			✓		✓		✓		✓		✓			
Taladro (Mandril 3/8")	Cable, broca, mandril, mango	3			✓		✓		✓		✓		✓			
Cizalla (12", 24", 42")	Empuñadura, mango, pernos	1			✓		✓		✓		✓		✓			
Pulidora Grande	Cable, swithc, mandril, disco	2			✓		✓		✓		✓		✓			
Juego de Llaves	Estado general	3			✓		✓		✓		✓		✓			
Llave de Tubo	Mordaza, regulador	1			✓		✓		✓		✓		✓			
Nivel de Mano	Gota de nivel	3			✓		✓		✓		✓		✓			
Hachas	Cabo - filo	1			✓		✓		✓		✓		✓			
Tirfor	Guaya, palanca, carcasa, mordaza	3			✓		✓		✓		✓		✓			

NOMBRE ALMACENISTA: Juan Andres Diaz Quintero
FIRMA:

V.B. del Copasst y/o Vigia: Yeimer Garcia

OBSERVACIONES:

Scanned with CamScanner

	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	Código	SST-F-16
		Fecha	15/08/2023
		Versión	3
		Página	1 de 1

EMPRESA: Consorcio Mitigacion Pedeguetes | INSPECCIONADO POR: Bandillo Rivera

FRENTE: Brisas de Primavera | FECHA: 22 al 27 Junio 2026

¿Se realiza limpieza de herramientas? | SI [X] | NO [ ] | Periocidad de la limpieza: Diaria

HERRAMIENTA	REVISION	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIERCOL		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Alicates	Mango, aislamiento	1	✓		✓		✓		✓		✓					
Barras	Estado general	5	✓		✓		✓		✓		✓					
Caretas para esmerilar	Acetato, tafilete	N/A	—													
Cinceles	Estado general	3	✓		✓		✓		✓		✓					
Cinta métrica	Estado general	1	✓		✓		✓		✓		✓					
Destornilladores	Mango, punta	2	✓		✓		✓		✓		✓					
Extensiones	Mango	N/A	—													
Limas	Mango,estado general	2	✓		✓		✓		✓		✓					
Llaves Expansivas	Estado general	2	✓		✓		✓		✓		✓					
Machetes con funda	Mango	4	✓		✓		✓		✓		✓					
Martillos de uña	Mango	2	✓		✓		✓		✓		✓					
Palas	Cabo, hoja	12	✓		✓		✓		✓		✓					
Paladragas	Cabo, cavadora	3	✓		✓		✓		✓		✓					
Parasoles	Estado general	N/A	—													
Picas	Cabo	10	✓		✓		✓		✓		✓					
Porras (9", 12", 18")	Mango	4	✓		✓		✓		✓		✓					
Extensiones electricas	Clavija, contacto	N/A	—													
Tijeras Industriales	Estado general	1	✓		✓		✓		✓		✓					
Serruchos	Mango, hoja, marco	1	✓		✓		✓		✓		✓					
Carretillas	Platon, mangos, neumáticos	2	✓		✓		✓		✓		✓					
Taladro (Mandril 3/8")	Cable, broca, mandril, mango	3	✓		✓		✓		✓		✓					
Cizalla (12", 24", 42")	Empuñadura, mango, pernos	1	✓		✓		✓		✓		✓					
Pulidora Grande	Cable, swithc, mandril, disco	2	✓		✓		✓		✓		✓					
Juego de Llaves	Estado general	3	✓		✓		✓		✓		✓					
Llave de Tubo	Mordaza, regulador	1	✓		✓		✓		✓		✓					
Nivel de Mano	Gota de nivel	3	✓		✓		✓		✓		✓					
Hachas	Cabo - filo	1	✓		✓		✓		✓		✓					
Tirfor	Guaya, palanca, carcasa, mordaza	3	✓		✓		✓		✓		✓					

NOMBRE ALMACENISTA: Bandillo Rivera Gomez

FIRMA: Bandillo Rivera

V.B. del Copasst y/o Vigia: Yeiser Garcia

OBSERVACIONES:

Scanned with CamScanner

ANEXO N° 10
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB	**INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	CDMB





CAPACITACIONES SST





CAPACITACIONES SST





SEÑALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN DE ÁREAS





INSTALACION DE PLATINAS Y GEOMANTO





LLENADO CON LECHADA CEMENTICA, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO PARA PLATINAS



PERFORACION E INSTALACION DE ANCLAJES

ANEXO N° 11
MEDIDAS PREVENTIVAS

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO
ATS

CÓDIGO:	SST-F-55
FECHA:	15/08/2023
VERSIÓN:	2
PÁGINA:	1 DE 3

1. DATOS GENERALES

Empresa:	Consorcio Mitigacion Piedecuesta	Ciudad:	Piedecuesta
Frente de obra:	Bajas de Primavera		
Fecha de inicio :	09/06/2026	Fecha de finalización:	12/06/2026
Actividad a realizar:	ESTABILIZACIÓN DE TALUD		
Descripción de la tarea a realizar:	PERFORACIÓN E INSTALACIÓN DE ANCLAJES		
Herramientas, insumos y equipos a utilizar:	Almadara pequeña, llave de tubo de 24", llave en Y para tubería, almadana de 14 libras, barra de 18 libras, pines de anclaje, tubería de 7/8. Tubería de perforación, Tifor, torre de perforación, plataforma, compresor, manguera de aire, controles, brocas de perforación (trialeta mano de angel y martillo de fondo.		
Elementos de Protección Personal requeridos:	Casco de seguridad, barbuquejo, protector auditivo, gafas de seguridad, tapabocas, guantes, botas de seguridad, dotación, Equipo de Protección Contra Caídas		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

Trabajo en alturas	X	Espacios confinados		Otro ¿Cuál?	
Excavacion		Caliente			

2. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Paso a paso de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles requeridos
Descargue de herramientas y torre de perforación	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	Golpes, tropezones, caídas al mismo nivel	1.Inspección del área y herramientas de trabajo antes y durante la ejecución de actividades. 2. Reporte de actos y condiciones inseguras 3.Trabajar en equipo. 4. Cumplir recomendaciones de seguridad. 5. Mantener condiciones de orden y aseo 6. Adoptar técnicas de manipulación manual de carga seguras. 7. Uso adecuado de EPP 8. Inducción al cargo y capacitación.
	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramienta. Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas.	
	Biomecánico: manipulación manual de cargas	Lesiones osteomusculares	
Inspección general del área de trabajo	Condiciones de seguridad: Locativo (superficies irregulares)	Golpes, tropezones, caídas al mismo nivel	1. Estar atento a las condiciones del entorno 2. Reporte de actos y condiciones inseguras 3. Atender la señalización 4. Cumplir recomendaciones de seguridad. 5. Mantener condiciones de orden y aseo 6. Uso adecuado de EPI. 7. Inducción al cargo y capacitación.
	Biológico: picaduras y mordeduras	Alergias, irritación, afectaciones al estado de salud	
Posicionamiento, instalación y anclaje de torre de perforacion y sus complementos	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	Golpes, tropezones, caídas al mismo nivel	1. Inspección del área de trabajo. 2. Inspecciones de herramientas, maquinaria y equipos 3. Reporte de actos y condiciones inseguras 4.Verificar puntos de anclajes 5.Diligenciamiento de permisos necesarios 6.Trabajar en equipo 7.Atender señalización y seguir recomendaciones de seguridad. 8. Mantener condiciones de orden y aseo. 9. Adoptar técnicas de manipulación manual de carga seguras. 10. Realizar pausas activas. 11. Uso adecuado de EPCC y EPI. 12. Personal idoneo para trabajo seguro en altura. 13. Inducción al cargo y capacitación.
	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramienta. Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas.	
	Biomecánico: manipulación manual de cargas	Lesiones osteomusculares	
	Biológico: picaduras y mordeduras	Alergias, irritación, afectaciones al estado de salud	
Inspección preoperacional de maquinaria, equipos y herramientas (anclajes de la torre)	Químico: sustancias químicas (grasas, aceites, lubricantes)	Irritación, quemaduras, afecciones respiratorias	1.Inspección del área de trabajo 2. Reporte de actos y condiciones inseguras 3.Atender a señalización y recomendaciones de seguridad. 4. Mantenar áreas en orden y aseo 5. Uso adecuado de EPI. 6. Inducción al cargo y capacitación.
	Biomecánico: posturas inadecuadas	Lesiones osteomusculares	
	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	Golpes, tropezones, caídas al mismo nivel	

Scanned with CamScanner

Engrasado de rotaria y motor de avance	Químico: sustancias químicas (grasas, aceites, lubricantes)	Irritación, quemaduras, afecciones respiratorias	1.Inspección maquinarias, equipos y herramientas. 2. Reporte de actos y condiciones inseguras. 3.Atender a señalización y recomendaciones de seguridad. 4. Rotulación, manipulacion y almacenamiento seguro de sustancias químicas. 5. Mantener áreas en orden y aseo. 6. Uso adecuado de EPI. 7. Inducción al cargo y capacitación.
	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramienta. Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas	
Instalación de tubería de perforación	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramienta. Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas	1.Inspección del área de trabajo. 2. Inspecciones de herramientas, maquinaria y equipos. 3. Reporte de actos y condiciones inseguras. 4.Verificar puntos de anclajes. 5.Diligenciamiento de permisos de trabajo necesario. 6. Atender señalización y seguir recomendaciones de seguridad. 7. Mantener áreas en orden y aseo. 8. Pausas activas. 10.Inspeccion preoperacional de EPCC y EPI. 11. Uso adecuado de EPCC y EPI. 12. Personal idóneo para trabajo seguro en altura. 13. Inducción al cargo y capacitación.
	Condiciones de seguridad: trabajo en alturas	Golpes, caídas a distinto nivel, fracturas, politraumatismos	
	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	Golpes, tropezones, caidas al mismo nivel	
	Biomecánico: posturas inadecuadas	Lesiones osteomusculares	
	Fenomenos naturales: sismos, derrumbes	lesiones severas, perdidas humanas y materiales	
	Físico: ruido	Migraña, estrés, hipoacusia	
Perforación del talud	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramientas y partes en movimiento)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas, atrapamiento	1.Inspección del área de trabajo. 2. Inspecciones de herramientas, maquinaria y equipos. 3. Reporte de actos y condiciones inseguras. 4.Verificar puntos de anclajes. 5.Diligenciamiento de permisos necesarios. 6.Trabajar en equipo. 7.Atender a señalización y seguir recomendaciones de seguridad. 8. Mantener condiciones de orden y aseo. 9. Pausas activas. 10.Inspeccion preoperacional de EPCC y EPI. 11. Uso adecuado de EPCC y EPI. 12. Personal idóneo para trabajo seguro en altura. 13. Inducción al cargo y capacitación.
	Condiciones de seguridad: trabajo en alturas	Golpes, caídas a distinto nivel, fracturas, politraumatismos	
	Químico: material particulado	Afecciones respiratorias	
	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	Golpes, tropezones, caidas al mismo nivel	
	Físico: ruido, radiaciones no ionizantes	Migraña, estrés, hipoacusia, golpe de calor, deshidratación, quemaduras 1er grado	
	Biomecánico: posturas inadecuadas, manipulación manual de cargas	Lesiones osteomusculares	
Desmonte de tubería de perforación	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramienta. Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas	1.Inspección del área de trabajo. 2. Inspecciones de herramientas, maquinaria y equipos. 3. Reporte de actos y condiciones inseguras. 4.Verificar puntos de anclajes. 5.Diligenciamiento de permisos necesarios. 6.Trabajar en equipo. 7.Atender a señalización y seguir recomendaciones de seguridad. 8. Mantener áreas en orden y aseo. 9. Pausas activas y estiramiento. 10.Inspeccion preoperacional de EPCC y EPI. 11. Uso adecuado de EPCC y EPI. 12. Personal idóneo para trabajo seguro en altura. 13. Inducción al cargo y capacitación.
	Condiciones de seguridad: trabajo en alturas	Golpes, caídas a distinto nivel, fracturas, politraumatismos	
	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	Golpes, tropezones, caidas al mismo nivel	
	Biomecánico: posturas inadecuadas	Lesiones osteomusculares	
	Físico: ruido	Migraña, estrés, hipoacusia	
Instalación de anclajes en el	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	Golpes, tropezones, caidas al mismo nivel	1.Inspección del área de trabajo. 2. Inspecciones de herramientas, maquinaria y equipos. 3. Reporte de actos y condiciones inseguras. 4.Verificar puntos de anclajes. 5.Diligenciamiento de permisos necesarios. 6.Trabajar en equipo. 7.Atender a señalización y seguir recomendaciones de
	Condiciones de seguridad: trabajo en alturas	Golpes, caídas a distinto nivel, fracturas, politraumatismos	

Scanned with CamScanner

talud	Biomecánico: Manipulación manual de cargas	Lesiones osteomusculares	seguridad 8. Mantener áreas en orden y aseo 9. Pausas activas y estiramiento 10 Inspección preoperacional de EPCC y EPI. 11. Uso adecuado de EPCC y EPI. 12. Personal idóneo para trabajo seguro en altura 13. Inducción al cargo y capacitación.
	Biológico: picaduras y mordeduras	Alergias, irritación, afectaciones al estado de salud	
Organización de herramientas y equipos, limpieza del área de trabajo	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	lesiones severas, pérdidas humanas y materiales	1. Estar atento a las condiciones del entorno 2. Reporte de actos y condiciones inseguras 3. Atender a señalización 4. Seguir recomendaciones e indicaciones de seguridad. 5. Mantener condiciones de orden y aseo 6. Uso adecuado de EPI. 7. Inducción al cargo y capacitación.
	Biológico: picaduras y mordeduras	Alergias, irritación, afectaciones al estado de salud	

Riesgos: todas las actividades: condiciones de seguridad (accidentes de tránsito, riesgo público); fenómenos naturales (sismos, derrumbes)

Controles generales: 1. Plan de emergencias y evacuación; 2. Conformación de brigadas de emergencias; 3. Disponibilidad de elementos para la atención de emergencias; 4. Verificar interferencia con trabajos adyacentes; 5. Emplear herramienta adecuada y en buen estado; 6. Realizar mantenimiento preventivo y/o correctivo de la maquinaria y equipos 7. Fomentar cultura de autocuidado

IDENTIFICACIÓN DE TRABAJADORES EJECUTORES

Nombres y Apellidos	No. de Identificación	Firma
Andres garcia	G565491	
Audrey Prado lopez	1098827731	
Rodolfo Quiñonez	635621	
Yoner Garcia	1003184293	
Diego Florez	1063160221	

IDENTIFICACIÓN RESPONSABLE DE LA TAREA (Residente de Obra, Auxiliar de Ingeniería, Supervisor)

Nombres y Apellidos	No. de Identificación	Firma
Jhon Gonzalez	1.098.760.722	

IDENTIFICACIÓN DEL EMISOR (Responsable SST)

Nombres y Apellidos	No. de Identificación	Firma
Victor Gamboa	91.265.828	

Scanned with CamScanner

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

09	06	26	7:30
12	06	26	4:30

Brisas de Primavera
Mantenimiento

1	Andres garcia	6565 491	AYUDANTE	Si	Si	Si	Festivo	Andres	Andres	Andres			
2	Andres G.	7511 6355668	Oficial	Si	Si	Si	Festivo	Andres	Andres	Andres			
3	Rodolfo		Ayudante	Si	Si	Si	festivo	Rodolfo	Rodolfo	Rodolfo			
4	Pedro Andres H.	101 852327	Ayudante fijo	si	si	si	festivo	Pedro	Pedro	Pedro	Pedro		
5	Moises Gil	7003 1284723	Operador	Si	Si	Si	festivo				420		
6							festivo						
7							festivo						
8							festivo						
9							festivo						
10							festivo						

CONDICIONES DE SALUD ACTUAL





CASCO ANTIGOLPE	GUANTES DE CARNAZA	ROPA DE SEGURIDAD	PUNTO DE ANCLAJE
GAFAS OSCURAS	GUANTES DE PRECISIÓN N/A	ARNES DE CUERPO COMPLETO	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL
GAFAS TRANSPARENTES	ZAPATOS DE SEGURIDAD	LÍNEA DE VIDA VERTICAL	BANDAS
TAPA OIDOS DE COPA	BOTAS PANTANERAS N/A	CUERDA ESTÁTICA/DINÁMICA	MOSQUETÓN
TAPA OIDOS INSERCIÓN	CARETA	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	DISPOSITIVOS RETRÁCTILES
TAPABOCAS DESECHABLE	TAPABOCAS MEDIOS	ESCALERA DE EXTENSIÓN	CONECTORES PARA TRABAJO VERTICAL
CARETA	Otros	ESCALERA DE TIJERA	Otros

Scanned with CamScanner

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS



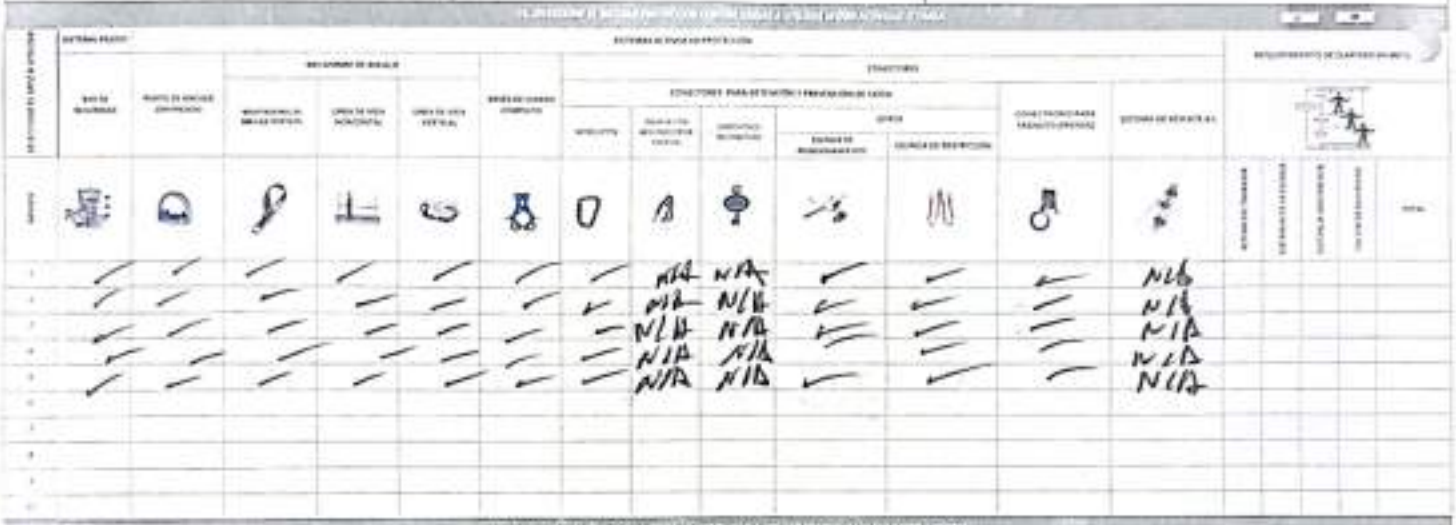

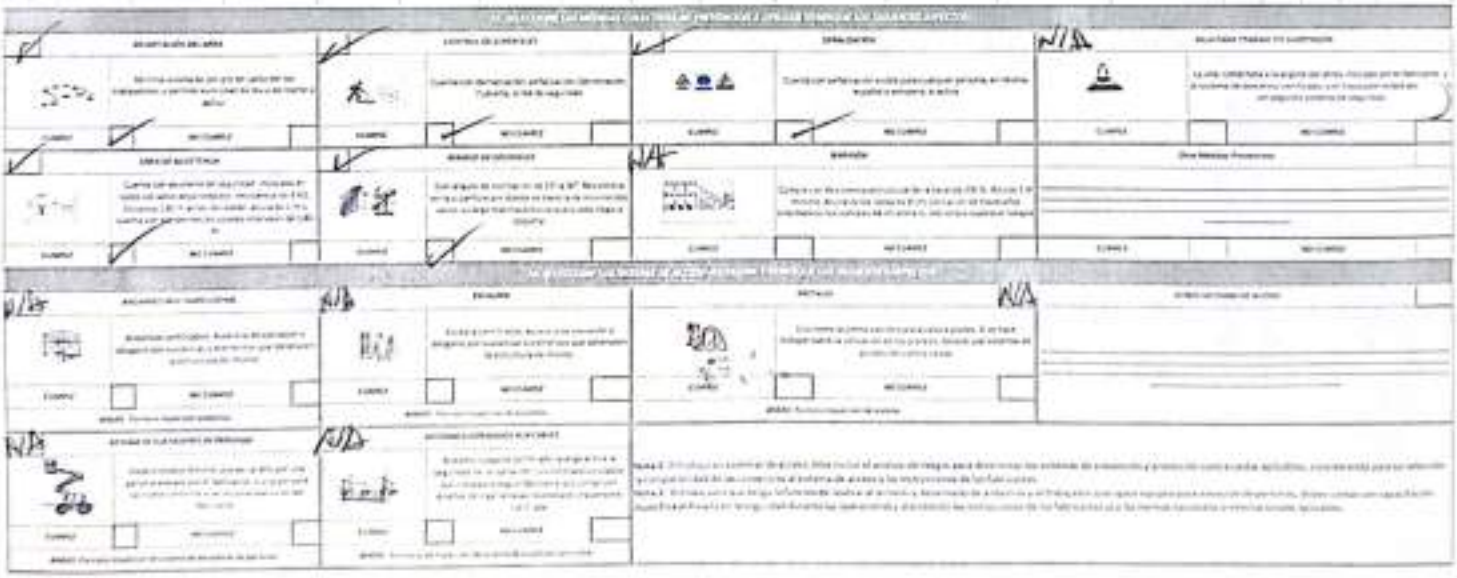

Scanned with CamScanner

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

Día	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Fecha		9 Junio 26	10 Junio 26	11 Junio 26	12 Junio 26		
Nombre		Jhon Gonzalez	Jhon Gonzalez	Jhon Gonzalez	Jhon Gonzalez		
Firma							
Hora		7:30	7:30	7:30	7:50		
Nombre		Victor Gamboa	Victor Gamboa	Victor Gamboa	Victor Gamboa		
Firma							
Hora		7:20	7:20	7:30	7:30		
Nombre		Juan Andres	Juan Andres	Juan Andres	Juan Andres		
Firma		JuanA	JuanA	JuanA	JuanA		
Hora		7:30	7:30	7:30	7:30		
Nombre							
Firma							
Hora							

NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	FIRMA	HORA DE CIERRE	OBSERVACIONES

Día	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Nombre							
Firma							
Hora							

Día	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Nombre		Victor Gamboa	Victor Gamboa	Victor Gamboa	Victor Gamboa		
Firma							
Hora		Fin tarea 9:30	Fin tarea 9:30	Fin tarea 9:30	Fin tarea 9:30		

Scanned with CamScanner

	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	CÓDIGO:	SST-F-55
		FECHA:	15/08/2023
		VERSIÓN:	2
		PÁGINA:	1 DE 2

1. DATOS GENERALES

Empresa:	Consorcio Mitigación Piedecuesta	Ciudad:	Piedecuesta
Frente de obra:	Brisas de Pinares		
Fecha de inicio :	16 Jun 2026	Fecha de finalización:	20 Jun 2026
Actividad a realizar:	ESTABILIZACIÓN DE TALUD		
Descripción de la tarea a realizar:	INSTALACION DE BIOMANTO		
Herramientas y equipos a utilizar:	Pona, anclajes metálicos, malla de triple torsión, cortafrio, tijeras.		
Elementos de Protección Personal requeridos:	Casco de seguridad, barbuquejo, protector auditivo, gafas de seguridad, tapabocas, guantes, botas de seguridad, dotación, Equipo de Protección Contra Caídas (cuando se requiera).		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

Trabajo en alturas	X	Espacios confinados		Otro ¿Cuál?	
Excavación		Caliente			

2. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Paso a paso de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles requeridos
Alistamiento e inspección de maquinaria, herramientas y equipos a utilizar	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	Golpes, tropezones, caídas al mismo nivel	1.Inspección del área y herramientas de trabajo antes y durante la ejecución de actividades. 2. Reporte de actos y condiciones inseguras. 3.Trabajar en equipo. 4. Cumplir recomendaciones de seguridad. 5. Mantener condiciones de orden y aseo 6. Adoptar técnicas de manipulación manual de cargas seguras. 7. Uso adecuado de EPP 8. Inducción al cargo y capacitación.
	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramienta, Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas.	
	Biomecánico: manipulación manual de cargas	Lesiones osteomusculares	
Inspección general del área de trabajo	Condiciones de seguridad: Locativo (superficies irregulares)	Golpes, tropezones, caídas al mismo nivel	1. Estar atento a las condiciones del entorno. 2. Reporte de actos y condiciones inseguras 3. Atender la señalización 4. Cumplir recomendaciones de seguridad. 5. Mantener condiciones de orden y aseo 6. Uso adecuado de EPI. 7. Inducción al cargo y capacitación.
	Biológico: picaduras y mordeduras	Alergias, irritación, afectaciones al estado de salud	
Descargue y alistamiento de Biomanto y malla triple torsión.	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	Golpes, tropezones, caídas al mismo nivel	1.Inspección del área y herramientas de trabajo antes y durante la ejecución de actividades. 2. Reporte de actos y condiciones inseguras. 3.Trabajar en equipo. 4. Cumplir recomendaciones de seguridad. 5. Mantener condiciones de orden y aseo 6. Adoptar técnicas de manipulación manual de cargas seguras. 7. Uso adecuado de EPP 8. Inducción al cargo y capacitación.
	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramienta, Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas.	
	Biomecánico: manipulación manual de cargas	Lesiones osteomusculares	
Aplicación de biomanto en talud (colocación en talud)	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	Golpes, tropezones, caídas al mismo nivel	1. Inspección del área de trabajo. 2. Inspecciones de herramientas, maquinaria y equipos 3. Reporte de actos y condiciones inseguras 4.Verificar puntos de anclajes 5.Diligenciamiento de permisos necesarios 6.Trabajar en equipo 7.Atender señalización y seguir recomendaciones de seguridad. 8. Mantener condiciones de orden y aseo. 9. Adoptar técnicas de manipulación manual de cargas
	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramienta, Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas.	
	Biomecánico: manipulación manual de cargas	Lesiones osteomusculares	

Scanned with CamScanner

	Condiciones de seguridad: trabajo en alturas	Golpes, caídas a distinto nivel, fracturas, politraumatismos	seguras. 10. Realizar pausas activas. 11.Inspeccion preoperacional de EPCC y EPI. 12. Uso adecuado de EPCC y EPI. 13. Personal idóneo para trabajo seguro en altura. 14. Inducción al cargo y capacitación.
	Biológico: picaduras y mordeduras	Alergias, irritación, afectaciones al estado de salud	
Fijación de biomanto con malla de triple torsión al talud	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	Golpes, tropezones, caídas al mismo nivel	1. Inspección del área de trabajo. 2. Inspecciones de herramientas, maquinaria y equipos. 3. Reporte de actos y condiciones inseguras. 4.Verificar puntos de anclajes. 5.Diligenciamiento de permisos necesarios. 6.Trabajar en equipo. 7.Atender señalización y seguir recomendaciones de seguridad. 8. Mantener condiciones de orden y aseo. 9. Adoptar técnicas de manipulación manual de cargas seguras. 10. Realizar pausas activas. 11.Inspeccion preoperacional de EPCC y EPI. 12. Uso adecuado de EPCC y EPI. 13. Personal idóneo para trabajo seguro en altura. 14. Inducción al cargo y capacitación.
	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramienta. Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas.	
	Biomecánico: manipulación manual de cargas	Lesiones osteomusculares	
	Condiciones de seguridad: trabajo en alturas	Golpes, caídas a distinto nivel, fracturas, politraumatismos	
	Biológico: picaduras y mordeduras	Alergias, irritación, afectaciones al estado de salud	
Organización de herramientas y equipos, limpieza del área de trabajo	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	lesiones severas, perdidas humanas y materiales	1. Estar atento a las condiciones del entorno. 2. Reporte de actos y condiciones inseguras. 3. Atender a señalización. 4. Seguir recomendaciones e indicaciones de seguridad. 5. Mantener condiciones de orden y aseo. 6. Uso adecuado de EPI. 7. Adoptar posturas adecuadas durante la ejecución de la actividad. 8. Inducción al cargo y capacitación.
	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramienta. Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas.	
	Biomecánico: manipulación manual de cargas	Lesiones osteomusculares	
	Biológico: picaduras y mordeduras	Alergias, irritación, afectaciones al estado de salud	

Riesgos: todas las actividades: condiciones de seguridad (accidentes de tránsito, riesgo público); fenómenos naturales (sismos, derrumbes)

Controles generales: 1. Plan de emergencias y evacuación; 2. Conformación de brigadas de emergencias; 3. Disponibilidad de elementos para la atención de emergencias; 4. Verificar interferencia con trabajos adyacentes; 5. Emplear herramienta adecuada y en buen estado; 6. Realizar mantenimiento preventivo y/o correctivo de la maquinaria y equipos. 7. Fomentar cultura de autocuidado.

IDENTIFICACIÓN DE TRABAJADORES EJECUTORES

Nombres y Apellidos	No. de Identificación	Firma
Harley Pinda	1.098322751	Harley
Andrés Gonzalez	6565491	Andrés
Yeiner Gonzalez	1005117243	
Diego Florez	1063360222	
Alexander Pinda	1376113736	Alexander P
Rodolfo	6556621	Rodolfo

IDENTIFICACIÓN RESPONSABLE DE LA TAREA (Residente de Obra, Auxiliar de Ingeniería, Supervisor)

Nombres y Apellidos	No. de Identificación	Firma
Jhon Gonzalez	1.098760722	

IDENTIFICACIÓN DEL EMISOR (Responsable SST)

Nombres y Apellidos	No. de Identificación	Firma
Victor Gamboa	91265828	

Scanned with CamScanner

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

16	06	26	7:30
20	06	26	12:00

Brisas de Primavera
12 mts

1	Harley prada	[illegible] 751	operador	✓	✓	✓	—	Harley	Harley	Harley	Harley P.	Harley	
2	Adrian garcia	6565 491	AYUDANTE	/	/	/	—	Andrés	Andrés	Andrés			
3	[illegible]	7005 [illegible]	Oficial	/	/	/	Festivo	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
5	José [illegible]	060	AYUDANTE OFICIAL	SI	SI	SI							
6	[illegible]	13745 356	Ayudante P.	/	/	/						Alexander Hernandez P	
7	Rodillo	[illegible]	Ayudante	/	/	/	Festivo	Rodillo	Rodillo	Rodillo	Rodillo	Rodillo	

Tratamiento de sustancias de abuso			Pico	Pluma de 22 mts		Cargadora	✓
Reforzamiento de salud mental o psicológico			Pala	Grúa		Unidad Hidráulica	Escalera
Tratamiento de intervención de aspectos de riesgos			Azadón	Manlift		Con o sin perforadora	Maquina de soldar
Reintegro al trabajo			Palustre/llana	Tijeras		Equipos de perforación	
Evaluación e intervención de los estilos de vida			Machete	Andamios		Maquina de perforación	
Evaluación y concepto médico	✓		Lima de hoja	Jacks		Compactador	
Tratamiento de salud			Serrucho	Arnés		Taller	
Otros			Cuchara	Otros		Maquina de perforación	
			Cinta métrica			Maquina hidrosuccion	

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA	Se anexan al presente documento los registros correspondientes en formato GST-F-33 Análisis de Trabajo Seguro

CONDICIONES DE SALUD ACTUAL



	✓	N/A
CASCO BARBUQUEJO	✓	
GUANTES DE CARNAZA	✓	
ROPA DE SEGURIDAD	✓	
PUNTO DE ANCLAJE	✓	
GAFAS ORDINARIAS		
GUANTES DE PRECISIÓN		N/A
ARNES DE SEGURIDAD	✓	
LINEA DE VIDA HORIZONTAL	✓	
GAFAS TRANSPARENTES		
CAPATAZ ANTIDESLIZANTE	✓	
LINEA DE VIDA VERTICAL	✓	
BOLSO	✓	
TAPA OIDOS DE COPA	✓	
BOTAS PUNTERA DIELECTRICA		N/A
ESLINGAS CON AMORTIGUADOR	✓	
EXTINTOR	✓	
TAPA OIDOS INSERCIÓN	✓	
CAMISETA	✓	
ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	✓	
CONECTORES ESPECIALES	✓	
TAPABOCAS QUIRÚRGICO	✓	
PANTALONES REFLECTIVOS	✓	
ESLINGA DE RESTRICCIÓN	✓	
LÍNEAS DE VIDA PARA TRABAJO VERTICAL	✓	
LAMPARA	✓	
Otros		
ROPA DE ALTA VISIBILIDAD	✓	
Otros		

Scanned with CamScanner

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

Scanned with CamScanner

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

Día	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Fecha		16/06/26	17/06/26	18/06/26	19/06/26	20/06/25	
Nombre		Jhon Gonzalez	Jhon Gonz	Jhon Gonz	Jhon Gonzalez	Jhon Gonzalez	
Firma							
Hora		7:30	7:30	7:30	7:30	7:30	

Día	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Nombre		Victor G.	Victor G	Victor G	Victor G	Victor G	
Firma							
Hora		7:30	7:30	7:30	7:30	7:30	

Día	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Nombre		Juan Andres	Juan Andres	Juan Andres	Juan Andres	Juan Andres	
Firma							
Hora		7:30	7:30	7:30	7:30	7:30	

Día	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Nombre							
Firma							
Hora							

NÚMERO Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	FIRMA	HORA DE CIERRE	SALIDA EPP

Día	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Nombre							
Firma							
Hora							

Día	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Nombre		Victor G	Victor G	Victor G	Victor G	Victor G	
Firma							
Hora		Fin Tarea 9:30	Fin Tarea 9:30	Fin Tarea 9:30	Fin Tarea 9:30	Fin Tarea 12:00	

Scanned with CamScanner

	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	CÓDIGO:	SST-F-55
		FECHA:	15/08/2023
		VERSIÓN:	2
		PÁGINA:	1 DE 2

1. DATOS GENERALES

Empresa:	Consorcio Mitigacion Piedecuesta	Ciudad:	Piedecuesta
Frente de obra:	Barrio La Primavera		
Fecha de inicio :	22 Junio 26	Fecha de finalización:	26 Junio 2026
Actividad a realizar:	ESTABILIZACIÓN DE TALUD		
Descripción de la tarea a realizar:	INSTALACION DE BIOMANTO		
Herramientas y equipos a utilizar:	Porra, anclajes metálicos, malla de triple torsión, cortafrio, tijeras.		
Elementos de Protección Personal requeridos:	Casco de seguridad, barbuquejo, protector auditivo, gafas de seguridad, tapabocas, guantes, botas de seguridad, dotación, Equipo de Protección Contra Caídas (cuando se requiera).		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

Trabajo en alturas	X	Espacios confinados		Otro ¿Cuál?	
Excavación		Caliente			

2. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Paso a paso de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles requeridos
Alistamiento e inspección de maquinaria, herramientas y equipos a utilizar	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	Golpes, tropezones, caídas al mismo nivel	1.Inspección del área y herramientas de trabajo antes y durante la ejecución de actividades. 2. Reporte de actos y condiciones inseguras. 3.Trabajar en equipo. 4. Cumplir recomendaciones de seguridad. 5. Mantener condiciones de orden y aseo 6. Adoptar técnicas de manipulación manual de carga seguras. 7. Uso adecuado de EPP 8. Inducción al cargo y capacitación.
	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramienta. Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas.	
	Biomecánico: manipulación manual de cargas	Lesiones osteomusculares	
Inspección general del área de trabajo	Condiciones de seguridad: Locativo (superficies irregulares)	Golpes, tropezones, caídas al mismo nivel	1. Estar atento a las condiciones del entorno. 2. Reporte de actos y condiciones inseguras 3. Atender la señalización 4. Cumplir recomendaciones de seguridad. 5. Mantener condiciones de orden y aseo 6. Uso adecuado de EPI. 7. Inducción al cargo y capacitación.
	Biológico: picaduras y mordeduras	Alergias, irritación, afectaciones al estado de salud	
Descargue y alistamiento de Biomanto y malla triple torción.	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	Golpes, tropezones, caídas al mismo nivel	1.Inspección del área y herramientas de trabajo antes y durante la ejecución de actividades. 2. Reporte de actos y condiciones inseguras. 3.Trabajar en equipo. 4. Cumplir recomendaciones de seguridad. 5. Mantener condiciones de orden y aseo 6. Adoptar técnicas de manipulación manual de carga seguras. 7. Uso adecuado de EPP 8. Inducción al cargo y capacitación.
	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramienta. Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas.	
	Biomecánico: manipulación manual de cargas	Lesiones osteomusculares	
Aplicación de biomanto en talud (colocación en talud)	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	Golpes, tropezones, caídas al mismo nivel	1. Inspección del área de trabajo. 2. Inspecciones de herramientas, maquinaria y equipos 3. Reporte de actos y condiciones inseguras 4.Verificar puntos de anclajes 5.Diligenciamiento de permisos necesarios 6.Trabajar en equipo 7.Atender señalización y seguir recomendaciones de seguridad. 8. Mantener condiciones de orden y aseo. 9. Adoptar técnicas de manipulación manual de carga
	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramienta. Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas.	
	Biomecánico: manipulación manual de cargas	Lesiones osteomusculares	

Scanned with CamScanner

	Condiciones de seguridad: trabajo en alturas	Golpes, caídas a distinto nivel, fracturas, politraumatismos	seguras. 10. Realizar pausas activas. 11.Inspección preoperacional de EPCC y EPI. 12. Uso adecuado de EPCC y EPI. 13. Personal idóneo para trabajo seguro en altura. 14. Inducción al cargo y capacitación.
	Biológico: picaduras y mordeduras	Alergias, irritación, afectaciones al estado de salud	
Fijación de biomanto con malla de triple torsión al talud	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	Golpes, tropezones, caídas al mismo nivel	1. Inspección del área de trabajo. 2. Inspecciones de herramientas, maquinaria y equipos 3. Reporte de actos y condiciones inseguras 4.Verificar puntos de anclajes 5.Diligenciamiento de permisos necesarios 6.Trabajar en equipo 7.Atender señalización y seguir recomendaciones de seguridad. 8. Mantener condiciones de orden y aseo. 9. Adoptar técnicas de manipulación manual de carga seguras. 10. Realizar pausas activas. 11.Inspeccion preoperacional de EPCC y EPI. 12. Uso adecuado de EPCC y EPI. 13. Personal idóneo para trabajo seguro en altura. 14. Inducción al cargo y capacitación.
	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramienta. Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas.	
	Biomecánico: manipulación manual de cargas	Lesiones osteomusculares	
	Condiciones de seguridad: trabajo en alturas	Golpes, caídas a distinto nivel, fracturas, politraumatismos	
	Biológico: picaduras y mordeduras	Alergias, irritación, afectaciones al estado de salud	
Organización de herramientas y equipos, limpieza del área de trabajo	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	lesiones severas, perdidas humanas y materiales	1. Estar atento a las condiciones del entorno. 2. Reporte de actos y condiciones inseguras 3. Atender a señalización 4. Seguir recomendaciones e indicaciones de seguridad. 5. Mantener condiciones de orden y aseo 6. Uso adecuado de EPI. 7. Adoptar posturas adecuadas durante la ejecución de la actividad. 8. Inducción al cargo y capacitación.
	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramienta. Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas.	
	Biomecánico: manipulación manual de cargas	Lesiones osteomusculares	
	Biológico: picaduras y mordeduras	Alergias, irritación, afectaciones al estado de salud	

Riesgos: todas las actividades: condiciones de seguridad (accidentes de tránsito, riesgo público); fenómenos naturales (sismos, derrumbes)

Controles generales: 1. Plan de emergencias y evacuación; 2. Conformación de brigadas de emergencias; 3. Disponibilidad de elementos para la atención de emergencias; 4. Verificar interferencia con trabajos adyacentes; 5. Emplear herramienta adecuada y en buen estado; 6. Realizar mantenimiento preventivo y/o correctivo de la maquinaria y equipos. 7. Fomentar cultura de autocuidado.

IDENTIFICACION DE TRABAJADORES EJECUTORES

Nombres y Apellidos	No. de Identificación	Firma
Yeiner Garcia	1001 777293	
Alexander Acuña	13795736	Alexander

IDENTIFICACIÓN RESPONSABLE DE LA TAREA (Residente de Obra, Auxiliar de Ingeniería, Supervisor)

Nombres y Apellidos	No. de Identificación	Firma
Jhon Gonzalez	1.098.760 722	

IDENTIFICACIÓN DEL EMISOR (Responsable SST)

Nombres y Apellidos	No. de Identificación	Firma
Victor Gamboa	91 265 828	

Scanned with CamScanner

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

22 06 26 7:30
26 06 26 4:30

Brisas de Primavera
11 mts

	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO	CARGO				FECHA DEL PERMISO						
							LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
	Yina García	1003 787293	Operador	Si	Si	Si	X	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
	Alexander Prada	1324/5 956	Ayudante Ep.	Si	Si	Si	X	Alexander	Alexander	Alexander			

P.E. SOLUCIONES ANTIMICROBIANAS

	Ducha de Emergencia	Pinza de Disección	
	Fajas	Gorros	
	Guantes	Mascara	
	Fotosensibilidad	Tapabocas	
	Mosquetones	Botiquines	
	Línea de vida	Silla	
✓	Arnés de cuerpo completo	Lupas	
	Línea de anclaje	Otros	
	Puntos de anclaje		

P.E. SOLUCIONES EXTRAS

	Linternas		
	Cuerda de rescate	Arnés de cuerpo completo	
	Línea de perforación	Arnés	
	Puntos de perforación	Mosquetones	
	Puntos de anclaje	Línea de vida	
	Linternas	Otros	
	Cinta		
	Puntos de perforación		
	Arnés de cuerpo completo		

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA

Se anexan el siguiente documento con los registros correspondientes del Formato GST-P-01 Análisis de Trabajo Seguro

CONDICIONES DE SALUD ACTUAL



CASCO BARBUQUEJO	GUANTES DE CARNAZA	ARNES DE CUERPO	PUNTO DE ANCLAJE
✓	✓	✓	✓
ARNES OCULAR	CUBIERTAS DE PROTECCIÓN	ANCLAJE PORTATIL	LINEA DE VIDA HORIZONTAL
✓	N/A	✓	✓
CHALECO FOSFORESCENTE	CHAQUETA IMPERMEABLE	LINEAS DE VIDA VERTICAL	BANDA
✓	✓	✓	✓
TAPA OIDOS DE COPA	BOTAS IMPERMEABLES	PANTALON IMPERMEABLE	MOSQUETON
✓	N/A	✓	✓
TAPA OIDOS DE INSERCION	CAPUCHA	PROTECTOR RESPIRATORIO	CONECTORES ESTRUCTURALES
✓	✓	✓	✓
CHALECO REFLECTIVO	TAPABOCAS	ESCALERAS DE REPOSICION	CONECTORES TIPO Y
✓	✓	✓	✓
GAFAS	Otros	ESCALERAS DE RESCATE	Otros
✓		✓	

Scanned with CamScanner

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

Observaciones de su condición de salud actual:

Observaciones de su cumplimiento de criterios EPP:

Observaciones de su cumplimiento de criterios EPC:

2. SELECCIONE LA O LAS MEDIDAS DE CONTROL CONTRA CAÍDAS A UTILIZAR DURANTE LA TAREA

3. SELECCIONE LOS MEDIOS ADICIONALES DE PREVENCIÓN A UTILIZAR DURANTE LOS TRABAJOS EN ALTURAS

4. SELECCIONE LOS MEDIOS DE RESCATE Y EVACUACIÓN A UTILIZAR DURANTE LOS TRABAJOS EN ALTURAS

Nota 1: El trabajo en altura que se vaya desarrollar, el análisis de riesgos que determinar los sistemas de prevención y protección contra caídas aplicables, considerando para su selección la probabilidad de ocurrencia al sistema de acceso más restrictivo de la tarea.

Nota 2: El trabajador que tenga la función de realizar el armado y desarmado de andamios y el trabajador que realice rescate para alturas (+ de personas, deben contar con capacitación específica avalada en la seguridad durante los cursos vistos y plasmando las exigencias de los fabricantes y/o las normas nacionales e internacionales aplicables.

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

22/06/26	23/06/26	29/06/26	25/06/26	26/06/26		
Jhon G	Jhon G.	Jhon G	Jhon G	Jhon G.		
7:30	7:30	7:30	7:30	7:30		
Victor G	Victor G	Victor G	Victor G	Victor G		
7:30	7:30	7:30	7:30	7:30		
Juan Ant	Juan Ant	Juan Ant	Juan Ant	Juan Ant		
7:30	7:30	7:30	7:30	7:30		

NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	FIRMA	HORA DEL CORTE	OBSERVACIÓN

Victor G	Victor G	Victor G	Victor G	Victor G		
Fin tarea	Fin tarea	Fin tarea	Fin tarea	Fin tarea		

Scanned with CamScanner

ANEXO NO.4: INFORME SOCIO-AMBIENTAL DE OBRA PARA EL PRESENTE PERIODO

INFORME DE CUMPLIMIENTO
PLAN DE ACCION SOCIO AMBIENTAL

"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRITICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER."

ELABORADO POR:

LISETTE XIMENA NIÑO CARVAJAL

CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB

PIEDECUESTA

01 AL 30 DE JUNIO

2026

1. CONSIDERACIONES GENERALES

1.1 INTRODUCCION

El presente documento, corresponde a la información obtenida por el CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA durante la ejecución de las obras de mitigación y consolidación para el control de la erosión en puntos críticos determinados por la CDMB en el Municipio de Piedecuesta, Departamento de Santander, teniendo claro que el proyecto no requiere de trámite de Licencia Ambiental, el CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB en cumplimiento de su responsabilidad ambiental aplica los programas basados en los lineamientos establecidos en el Manual de Gestión Socio Ambiental para obras de construcción.

El objetivo del Plan de acción socio ambiental, es definir las medidas de prevención y/o corrección de los impactos negativos directos e indirectos que se puedan generar durante las etapas de desarrollo de la obra, teniendo como base, las características del área y las actividades a realizar para cumplir con las especificaciones del proyecto, en el cual se dispone que el desarrollo del mismo mejorara la calidad de vida de los habitantes del área de influencia indirecta de la obra.

El Plan de acción se encuentra enmarcado en la normatividad legal vigente en el país, que requiere imponer una práctica apropiada del manejo del espacio físico y de todos sus recursos naturales, tratando de conservar, mejorar y recuperar la calidad ambiental que conlleva al desarrollo sustentable del área a intervenir.

Todos los proyectos que se desarrollan en el Departamento de Santander deben realizarse dentro de un marco de actuación respetuoso con el ambiente, garantizando el uso racional, sostenible de los recursos naturales renovables, que intervienen y que deben incluir, para la ejecución, la presentación del plan de acción socio ambiental a las Autoridades que lo exijan según el marco de sus competencias.

Para la ejecución de este proyecto, se hace indispensable el cumplimiento de la normativa establecida por la autoridad ambiental y la legislación correspondiente; por lo cual se busca disponer de las acciones de la ley 99 de 1993 para el manejo ambiental de los proyectos como parte del buen ejercicio de la ingeniería.

En este sentido, el Plan de acción socio ambiental, propone con el presente documento, la orientación en el cumplimiento de las normas ambientales, con el fin de ejercer control antes, durante y después de la ejecución de las obras civiles necesarias para construir y mejorar las áreas que se puedan ver afectadas con el desarrollo del proyecto.

La aplicación de las medidas planteadas en este Plan, optimizarán el uso racional y el usufructo de los recursos naturales en este sector, ayudarán a mejorar la gestión ambiental al interior de la ejecución de la obra, con el desarrollo de los programas establecidos según las necesidades y dinámica propia del proyecto, proporcionando el mejoramiento de la calidad de vida del entorno social, otorgando una mejor comprensión de la variable ambiental en la ejecución del proyecto por parte del ejecutor, el cual es completamente conscientes de su significado e importancia.

Por último, se busca, unificar y armonizar los lenguajes ingenieril y ambiental, de tal manera que las actividades desarrolladas en el proyecto sean compatibles con el entorno en el cual se ejecutan y de esta manera permitir la sostenibilidad de los recursos naturales, acorde con los lineamientos consagrados en la Constitución Nacional, la ley 99 de 1993 y demás normatividad para la protección del medio ambiente.

El objetivo principal de este Plan de Acción es formular los mecanismos que permitan aplicar oportunamente una medida, bien sea de manejo, prevención, mitigación, control, protección, vigilancia o compensación, en las áreas de interés humano y ecológico para la zona de influencia del proyecto.

Los principales aspectos relacionados con el manejo y protección ambiental que se deben considerar para la ejecución del proyecto, son los siguientes programas:

1. PROGRAMA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS
2. PROGRAMA CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS
3. PROGRAMA USO Y ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
4. PROGRAMA PROTECCIÓN DEL SUELO – PREVENCIÓN DE PROCESOS EROSIVOS Y CONTROL SOBRE LA ESCORRENTÍA.
5. PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE CUERPOS DE AGUA Y REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS
6. PROGRAMA PARA EL MANEJO DE LA VEGETACION LA FAUNA Y EL PAISAJE.
7. PROGRAMA DE SEÑALIZACION
8. PROGRAMA DE ADECUACION DE CAMPAMENTOS.
9. PROGRAMA DE GESTION SOCIAL

Las medidas de manejo ambiental que se presentan a continuación corresponden a las acciones que se implementaron para controlar, mitigar, prevenir y/o compensar los diferentes impactos que se pueden presentar con la ejecución de las Obras de Mitigación y Consolidación para el Control de la Erosión en Puntos Críticos Determinados por la CDMB en el Municipio de Piedecuesta, Santander.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo General

Implementar las medidas de manejo que se deben aplicar en el desarrollo de las actividades de intervención correctiva mediante la construcción de pantallas ancladas para mitigar el riesgo por deslizamiento y movimientos en masa en los barrios Brisas de Primavera y Halcón de Granada, del municipio de Piedecuesta, Departamento de Santander, con el fin de prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos o afectaciones que se pueden generar sobre los recursos naturales y el medio ambiente y así mismo realizar una adecuada gestión social en la población influenciada directamente por el proyecto.

1.2.2 Objetivos específicos

- Implementar las medidas de manejo ambiental para prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los impactos identificados y analizados para el proyecto.

- Lograr satisfactoriamente el cumplimiento de los indicadores de seguimiento y monitoreo para las medidas de manejo planteadas.

2. INFORME MENSUAL

En el desarrollo de las Obras de Mitigación y Consolidación para el Control de la Erosión en Puntos Críticos Determinados por la CDMB en el Municipio de Piedecuesta, Santander, se busca fomentar la educación ambiental e implementar políticas y acciones enfocadas al desarrollo sostenible dando cumplimiento a la normatividad ambiental vigente.

El presente informe está contemplado desde el 01 al 30 de Junio de 2026; se tiene en cuenta que en este primer periodo de ejecución se realizaron las siguientes actividades:

- ✓ Replanteo, control y medición de la obra
- ✓ Llenado de inyección con lechada cementicia para anclajes
- ✓ Ejecución perforaciones horizontales (en roca) - con equipo de perforación descolgado para anclajes de 0,00m a 15,00m
- ✓ Suministro e instalación de nails Ø=1-1/4" de L=9m
- ✓ Suministro e instalación del sistema para control de erosión superficial mediante manto de fibra sintética no degradable con estabilización UV
- ✓ Suministro e instalación de platina de 200mm x 200mm x 12mm con un agujero

3. PROGRAMAS IMPLEMENTADOS EN EL CUMPLIMIENTO DEL MANEJO AMBIENTAL.

Las medidas de manejo ambiental que se presentan a continuación corresponden a las acciones que se implementaron para controlar, mitigar, prevenir y/o compensar los diferentes impactos que se pueden presentar con las Obras de Mitigación y Consolidación para el Control de la Erosión en Puntos Críticos Determinados por la CDMB en el Municipio de Piedecuesta, Santander. Las medidas ejecutadas abordan los aspectos físicos, bióticos y sociales que pueden ser impactados por el proyecto con el cumplimiento de sus indicadores para su seguimiento y monitoreo, además de los proyectos relacionados con la aplicación de la gestión ambiental.

Los principales aspectos relacionados con el manejo y protección ambiental que se consideran para la ejecución del proyecto, son:

3.1 PROGRAMA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS

PROGRAMA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS							PASA -01
OBJETIVO							
Prevenir y controlar la contaminación de los recursos: agua, suelo y aire, así como la afectación a la salud de las personas, mediante un manejo integral de los residuos sólidos convencionales y especiales que se generan durante el desarrollo de la obra.							
TIPO DE MEDIDA							
Control	X	Prevención	X	Mitigación		Compensación	

BENEFICIOS

A través de un adecuado manejo de los residuos de la obra se logra:

- Reducir la generación de emisiones atmosféricas.
- Prevenir el aporte de sólidos en las redes de alcantarillado y corrientes superficiales.
- Reducir el impacto visual de la obra y minimizar el área de afectación por presencia de residuos o escombros.
- Minimizar las necesidades de transporte de residuos.
- Asegurar el buen funcionamiento de las escombreras y maximizar su vida útil.
- Reducir costos financieros.
- Optimizar la administración de materiales.
- Reducir riesgos inherentes al almacenamiento de residuos.

ACCIONES A EJECUTAR

Durante las actividades de de intervención correctiva mediante la construcción de pantallas ancladas para mitigar el riesgo por deslizamiento y movimiento, se generarán diferentes tipos de residuos los cuales se consideran domésticos, reciclables y de disposición especial o peligrosa, los cuales recibirán el tratamiento adecuado.

A continuación, se describe el procedimiento aplicado con el fin de dar cumplimiento al manejo integral de residuos sólidos, con lo cual se busca minimizar los impactos temporales que se puedan generar por su inadecuado manejo, estas son:

- Clasificar y reducir en la fuente.
- Recolectar y almacenar temporalmente.
- Disposición final adecuada.

Los residuos sólidos generados durante el proceso de construcción son de diversa naturaleza. Una adecuada gestión y clasificación de estos residuos resulta fundamental para identificar materiales que pueden ser reciclados o reutilizados, minimizando así la cantidad de desechos no aprovechables y favoreciendo prácticas más sostenibles en el desarrollo de las actividades; de esta forma, se reducen costos de disposición final, se optimiza el uso de los materiales y se alcanza un menor impacto ambiental.

Los residuos sólidos generados durante el periodo correspondiente del 01 al 30 de Junio de 2026, teniendo en cuenta las actividades del periodo son:

RESIDUOS ORDINARIOS	RESIDUOS RECICLABLES
8.9 Kg	161.1 Kg

(Ver Anexo No 1. Manejo de Residuos Sólidos)

En el periodo de ejecución se realizó la clasificación de los residuos sólidos generados en la ejecución de la obra, los cuales son dispuestos temporalmente en el punto ecológico adaptado, y posteriormente son entregados a la empresa de servicio de recolección de aseo de Piedecuesta, entidad responsable de la recolección y el transporte de residuos sólidos en la ciudad, de acuerdo con las rutas de recolección de aseo, son transportados y finalmente dispuestos en el relleno sanitario El Carrasco, único sitio autorizado a nivel regional para la disposición final de residuos sólidos, sitio que opera bajo la figura de emergencia sanitaria.

Generación de residuos reciclables.
Teniendo en cuenta la finalización de las actividades en el frente de obra Halcón de Granada, se realizó la entrega de los residuos reciclables generados durante el periodo relacionado, así como de aquellos almacenados de periodos anteriores y de los residuos provenientes del desmantelamiento del campamento. Dichos residuos fueron entregados a la empresa RECICLAYMAS, gestor legalmente constituido para realizar su aprovechamiento conforme a la normativa ambiental vigente. La cantidad total entregada correspondió a **71.3 kg** de residuos sólidos aprovechables. (ver Anexo No 1. Manejo de Residuos Sólidos).

Manejo Adecuado de Bolsas de Cemento Vacías
En el periodo relacionado se realizó la entrega de bolsas de cemento vacías que se encontraban en almacenamiento temporal a Cemex, para su aprovechamiento mediante co procesamiento en los Hornos 1 y 2 de la Planta Caracolito, durante la producción de clínker y cemento. Las cantidades entregadas correspondieron a **109.10 kg** de bolsas de cemento vacías. Este proceso permite la valorización energética de los residuos, contribuyendo a la reducción de su disposición final y al uso eficiente de recursos, en cumplimiento de la normativa ambiental vigente. (Ver Anexo No 1. Manejo de Residuos Sólidos)

Generación de residuos sólidos especiales
En el periodo relacionado no se generaron residuos sólidos peligrosos, cuando se generen residuos peligrosos, estos serán entregados a un gestor autorizado para realizar su tratamiento y disposición final adecuada.

Manejo de material sobrante y RCD
En el periodo de ejecución relacionado no se realizaron en el frente de obra, actividades generadoras de RCD´s ni materiales sobrantes de excavación,

Actividades de Capacitación:
En el periodo relacionado se realizó capacitación a los trabajadores del frente de obra en el tema “Importancia de la gestión Ambiental en Obra” (ver Anexo No 2 Registro de Asistencia a Capacitación).

	
Punto Ecológicos de los frentes de obra	Jornadas de Orden y Aseo





Entrega de Bolsas de Cemento Vacías a Cemex





Actividades de Capacitación ambiental

–

ETAPA			
PRECONSTRUCCIÓN		OPERACIÓN	X
CONSTRUCCIÓN	X	DESMANTELAMIENTO	X
LUGAR DE APLICACIÓN			
Frentes de obra Brisas de Primavera y Halcón de Granada del municipio de Piedecuesta			
CRONOGRAMA DE EJECUCION			

ACTIVIDADES	MESES DE EJECUCIÓN									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Manejo para separación en la fuente de residuos sólidos										
Recolección de Residuos ordinarios y disposición final										
Recolección de residuos reciclables y especiales con disposición final										

RESPONSABLE DE LA EJACUCION

CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB

Indicador

- Volumen de residuos ordinarios
- Volumen de residuos especiales
- Volumen de residuos reciclables

Descripción del Indicador

Cantidad de residuos ordinarios generados en la obra

Indicador de calificación

- Volumen residuos entregados gestor ambiental / Volumen residuos generados en el periodo X 100

5.0 kg / 5.0 Kg *100 = 100%

- Volumen de RESPEL entregados a empresa autorizada/ Volumen RESPEL generado en el periodo X 100

No aplica, no se generaron residuos peligrosos

- Volumen residuos reciclables entregados a empresas recicladoras / Volumen residuos reciclables generados en el periodo X 100

180.4 Kg / 161.1 Kg * 100 = 98%

*de las cantidades entregadas, 19,3 Kg de Reciclables corresponden a residuos aprovechables que se encontraban en almacenamiento temporal de periodos anteriores

Frecuencia de verificación

Mensual a medida que la necesidad lo amerite, y las actividades de la obra los generen

Tipo de indicador

Cuantitativo.

Registro de cumplimiento

Informe mensual
Registro fotográfico

Cronograma

La aplicación de las medidas establecidas en el Plan de Acción Socio-Ambiental tiene el mismo tiempo y duración de las actividades constructivas, o el tiempo que sea necesario, con el fin de asegurar el manejo integral de los residuos sólidos durante la ejecución de la obra.

3.2 PROGRAMA CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS

Programa control de emisiones atmosféricas.							**PASA - 02**
OBJETIVO							
Controlar las emisiones de material particulado y gases a la atmósfera como resultado de los movimientos de tierra y operación de vehículos, equipos y maquinaria. Prevenir el incremento en los niveles de ruido durante las actividades constructivas del proyecto.							
Tipo de medida							
Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Compensación	
BENEFICIOS							
A través de la aplicación de las medidas ambientales se espera: • Minimizar los efectos adversos al medio ambiente controlando la generación de material particulado. • Controlar los niveles de ruido, durante la ejecución de la obra, garantizando que este se encuentre por debajo de los límites permisibles. • Minimizar las quejas y reclamos por parte de la comunidad durante la ejecución del proyecto.							
ACCIONES A EJECUTAR							
De acuerdo con las actividades técnicas realizadas durante el periodo del 01 al 30 de Junio de 2026, se aplicaron las siguientes medidas para dar cumplimiento al presente programa: • Dentro de la implementación de medidas de manejo para el uso de maquinaria y equipos de construcción se garantizan las condiciones óptimas de funcionamiento. • En el frente de obra está prohibido el uso de corneta, pitos ni sirenas de los vehículos que hacen parte del proyecto, salvo la alarma de reversa. • Se restringe la operación de los equipos y herramientas de construcción, perforación y compresión generadores de ruido ambiental en la zona con uso residenciales, en horarios comprendidos entre las 7:00 p.m. y las 7:00 a.m. de lunes a sábado, o en cualquier horario los días domingos y feriados. • Se prohíbe realizar quemas a cielo abierto de llantas, baterías, plásticos, lubricantes usados o cualquier otro elemento que emita contaminantes tóxicos al aire. • Se realiza limpieza mediante barrido con hidratación previa, del área de influencia directa del proyecto. • Los equipos y maquinaria presente en el frente de obra son sometidos a chequeos y mantenimientos preventivos con el fin de evitar afectaciones al medio ambiente y garantizar su buen funcionamiento. • En el periodo de ejecución relacionado no se requirió el uso de vehículos tipo volqueta teniendo en cuenta que no fue necesario realizar retiro de RCD´s ni material sobrante hasta sitios de disposición final.							





Cerramiento perimetral para controlar emisiones de material particulado

_

ETAPA			
PRECONSTRUCCIÓN		OPERACIÓN	X
CONSTRUCCIÓN	X	DESMANTELAMIENTO	X

LUGAR DE APLICACIÓN

Frentes de obra Brisas de Primavera y Halcón de Granada del municipio de Piedecuesta

CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDADES	MESES DE EJECUCIÓN									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Manejo adecuado de material de construcción										
Mantenimiento de vehículos y maquinaria										

_

RESPONSABLE DE LA EJECUCION

CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB

Indicador

- Acopio de materiales
- Control de emisiones atmosféricas, generadas por los vehículos maquinaria y los equipos

Descripción del Indicador

- Manejo de acopio de materiales
- Verificación de estado de equipos y vehículos

Indicador de calificación

- Acopio de materiales autorizado / Número total de acopios

2 / 2 * 100 = 100%

- Vehículos con certificados técnico mecánico/ vehículos en obra x 100 = 100%

No aplica para el periodo

Frecuencia de verificación

Mensual a medida que la necesidad lo amerite, y las actividades de la obra los generen.

Tipo de indicador
Cuantitativo.
Registro de cumplimiento
Informe mensual
Cronograma
Estas actividades tienen el mismo tiempo y duración de las actividades constructivas y en la etapa de desmantelamiento o el tiempo que sea necesario.

3.3 PROGRAMA USO Y ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Programa Uso y almacenamiento adecuado de materiales de construcción							PASA -03
OBJETIVO							
Establecer los procedimientos que serán implementados para el adecuado manejo del material de construcción, desde el almacenamiento temporal, transporte, uso hasta su disposición final, esto con fin de prevenir, controlar y minimizar los posibles impactos que se generen sobre el ambiente. Garantizar la mínima incidencia ambiental, producto del empleo de diferentes insumos, materiales, y dispositivos para las obras.							
TIPO DE MEDIDA							
Control	X	Prevención	X	Mitigación		Compensación	
Beneficios							
Al establecer un sistema de manejo adecuado para el transporte, cargue, descargue y manipulación de los materiales de construcción (arenas, grava, triturados, recebos, ladrillos, triturados de arcilla y otros) se evitan pérdidas del mismo y por lo tanto se generan múltiples ventajas de orden financiero, logístico y ambiental. Al mismo tiempo, se reduce la cantidad de escombros y residuos generados, y el aporte de sedimentos y otros contaminantes a las redes de servicios públicos y fuentes de agua.							
ACCIONES A EJECUTAR							
Se consideran materiales de construcción, los productos pétreos explotados en minas y canteras usados, generalmente, en la industria de la construcción como agregados en la fabricación de piezas de concreto, morteros, pavimentos, obras de tierra y otros productos similares. Durante las actividades de intervención correctiva mediante la construcción de pantallas ancladas para mitigar el riesgo por deslizamiento y movimiento, se requiere la utilización de cemento y concreto, los cuales serán adquiridos a través de proveedores externos que cuenten con los respectivos permisos mineros y ambientales. **Manejo de materiales de construcción:** El CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB verificara que las empresas que suministren materiales de construcción cumplan con las exigencias normativas, así mismo se verificara que cuenten con el plan de contingencia establecido, el cual contempla todo el sistema de seguridad, prevención, organización de respuesta, equipos personales capacitado y presupuesto para la prevención y control de emisiones contaminantes y reparación de daños.							

Medidas aplicadas para el manejo de concreto

- El cemento en sacos estará almacenado en sitios secos y aislados del suelo.
- El procedimiento para la mezcla y el vaciado del concreto y/o cemento, se realizará considerando una adecuada regulación de la mezcla.
- Se protegerá el suelo mediante material impermeable (plástico) evitando afectaciones temporales en el área de influencia directa de esta actividad.
- El personal de obra deberá utilizar los respectivos elementos de protección personal para la manipulación del cemento y concreto con el fin de prevenir accidentes de trabajo.
- En caso de derrame de mezcla se ha de limpiar la zona en forma inmediata, recogiendo y depositando el residuo en el sitio adecuado. Está prohibido depositar estas mezclas cerca de los cuerpos de agua, sobre zonas de cultivo y/o áreas verdes.
- Se prohíbe el lavado de mezcladoras de concreto en los frentes de obra o en cuerpos de agua.

Almacenamiento temporal de materiales

- Para el almacenamiento de materiales durante la construcción, se dispondrá de un área localizada de forma estratégica que favorezca la cercanía entre el sitio de almacenamiento y los sitios de obra.
- La zona de almacenamiento temporal estará señalizada, los materiales acopiados cubiertos completamente para evitar la contaminación y dispersión por efecto del agua o del viento.
- Se dispondrá de un sitio debidamente demarcado para el almacenamiento de materiales, el apilamiento de estos materiales no supera el 1.5 metros de altura.
- El sitio de almacenamiento en lo posible se establecerá en el área de influencia directa para facilitar su acceso y no interfiere con el tráfico vehicular y peatonal en la zona.
- Se prohíbe el almacenamiento temporal de materiales de construcción cerca a zonas verdes, ríos, quebradas, canales y caños.

Manejo de prefabricados

- En caso de ser necesario se dispondrá de uno a más sitios debidamente demarcados para el almacenamiento de prefabricados y tubería, y no se apilará a alturas superiores de 1.5 metros. Se verificará la estabilidad del sitio de acopio, previniendo que se generen accidentes de trabajo.
- Las varillas se han de proteger y/o aislar estas áreas mediante encerramiento con cinta, malla y con avisos que indiquen el peligro, de acuerdo con el programa de señalización.
- El hierro se protegerá para evitar que las condiciones climáticas afecten su estructura.





Almacenamiento adecuado de materiales

Teniendo en cuenta las actividades del periodo relacionado, se manejaron las siguientes cantidades de materiales pétreos:

MATERIALES	CANTIDADES USADAS
Cemento	250 bultos

ETAPA			
PRECONSTRUCCIÓN		OPERACIÓN	X
CONSTRUCCIÓN	X	DESMANTELAMIENTO	X

LUGAR DE APLICACIÓN

Frentes de obra Brisas de Primavera y Halcón de Granada del municipio de Piedecuesta

CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDADES	MESES DE EJECUCIÓN									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Identificación y obtención de los materiales de construcción										
Transporte y disposición de materiales										
Medidas de manejo para concretos										

RESPONSABLE DE LA EJECUCION

CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB

Indicador

Cumplir con los procedimientos propuestos para el manejo de materiales de construcción durante el proyecto

Descripción del Indicador

1. Cumplir con el 100% de las acciones propuestas para el manejo de materiales de construcción.
2. Aprovechamiento de material de construcción

Indicador de calificación

1. Número de acciones realizadas en obra para el manejo de los materiales de construcción / Número de acciones establecidas*100 **8 / 8 * 100 = 100%** 2. Cantidad total de material utilizado en obra / Cantidad de material de fuentes autorizadas *100 **Cemento (bultos)** 250 / 250 * 100 = 100%
Frecuencia de verificación
Mensual
Tipo de indicador
Cuantitativo
Registro de cumplimiento
Informe mensual
Cronograma
Estas actividades tienen el mismo tiempo y duración de las actividades constructivas y en la etapa de desmantelamiento o el tiempo que sea necesario.

3.4 PROGRAMA PROTECCIÓN DEL SUELO – PREVENCIÓN DE PROCESOS EROSIVOS Y CONTROL SOBRE LA ESCORRENTÍA

Programa Protección del suelo – prevención de procesos erosivos y control sobre la escorrentía							PASA -04
OBJETIVO							
Garantizar la mínima incidencia ambiental, producto de la remoción de cobertura vegetal necesaria para la ejecución de la obra. Controlar los sedimentos generados por el retiro de materiales de recubrimiento en los sitios de obras que pueden ser arrastrados por la escorrentía, así mismo controlar la sedimentación y erosión causados por las obras hidráulicas requeridos por el proyecto, vertimientos de aguas con contenido de sedimentos, entre otros y evitar la aparición de focos erosivos en los frentes de obra.							
TIPO DE MEDIDA							
Control	X	Prevención	X	Mitigación		Compensación	
BENEFICIOS							
El suelo es uno de los recursos que puede resultar más afectado a causa de las actividades asociadas con la construcción de obras civiles. La necesidad de retirar la cobertura vegetal y remover grandes volúmenes de tierra acelera procesos erosivos. Igualmente, el suelo se puede ver afectado por la compactación, manipulación inadecuada de ciertas sustancias contaminantes y el almacenamiento de escombros o materiales de construcción. La acción de los agentes erosivos provoca una degradación progresiva de la estructura física del suelo lo que, a su vez, aumenta la vulnerabilidad de este a ser degradado y afecta al resto de las funciones							

del suelo. Por todo lo anterior, el suelo manifiesta una disminución progresiva en su capacidad de retención de agua y nutrientes disponibles para las plantas, lo que repercute en una reducción drástica de su fertilidad.

ACCIONES A EJECUTAR

La obra de intervención correctiva mediante la construcción de pantallas ancladas para mitigar el riesgo por deslizamiento y movimiento se presenta como respuesta al alto riesgo de ocurrencia de fenómenos de erosión (remoción en masa) que tiene como finalidad contrarrestar los altos nivel de deterioro del talud, el deficiente drenaje superficial, las altas pendientes y el aumento del área de expansión urbana.

Teniendo en cuenta lo anterior el objeto de la obra está conectado con la mitigación de impactos de erosión que presenta el suelo del sector; sin embargo, se plantea controlar los procesos de arrastre de sedimentos durante las actividades de obra mediante la protección y transporte inmediato de materiales resultantes de perfilado y pequeñas excavaciones para evitar el arrastre por lluvias y/o vientos.

El CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB implementara las siguientes acciones con el fin de proteger el suelo de procesos erosivos y control de la escorrentía:

- En cuanto al almacenamiento del ACPM necesario para proveer el combustible a maquinaria y equipos, se capacitará al personal que, en caso de presentar derrames accidentales, será recogido inmediatamente; si el volumen derramado es superior a 5 galones, debe removerse el suelo contaminado en su totalidad y restaurar la zona afectada.

- Cuando el derrame se presenta en cantidades pequeñas, será utilizado materiales absorbentes, trapos, aserrín y arena; estos residuos deberán ser dispuestos separadamente en canecas de 55 galones hasta que sean entregados a un gestor autorizado por la Autoridad Ambiental.

- Para prevenir la contaminación del suelo se realizará la mezcla de concreto sobre una plataforma o geotextil.

- Se ha de evitar el derrame de aceite o combustible sobre el suelo. Serán instaladas barreras y se dispondrá la maquinaria sobre una superficie que permita la fácil recolección.

- El sitio para la ubicación del campamento y despachos (almacén y depósito), se realizará donde se necesitó menor intervención sobre el suelo.

- Mediante la ejecución de las actividades propias de la obra se asegura la estabilidad del talud intervenido mediante un adecuado diseño geotécnico, que especifica el diseño de las pendientes, anclajes, barreras contra la erosión, obras de drenaje. Esto teniendo en cuenta que los taludes son un elemento crítico en el desarrollo de las obras civiles por lo cual su conformación debe contar con un estudio riguroso y acompañamiento técnico.

- El ACPM usado es almacenado de manera temporal en recipiente metálico con capacidad para 55 galones.

	
Instalación de Geomanto	Instalación de Platinas
	
Llenado de Pernos con lechada cementicia	Perforaciones Horizontales

—

ETAPA			
PRECONSTRUCCIÓN		OPERACIÓN	X
CONSTRUCCIÓN	X	DESMANTELAMIENTO	

LUGAR DE APLICACIÓN

Frentes de obra Brisas de Primavera y Halcón de Granada del municipio de Piedecuesta.

CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDADES	MESES DE EJECUCIÓN									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Cumplir con las acciones propuestas para manejo y disposición de material sobrante										

_

RESPONSABLE DE LA EJECUCION

CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB

Indicador
• Cumplir con las acciones propuestas para manejo de la erosión y arrastre de sedimentos. • Cumplir con los requerimientos ambientales
Descripción del Indicador
• Aplicación de acciones de manejo para el control de la erosión y arrastre de materiales
Indicador de calificación
• Número de acciones realizadas / Número de acciones establecidas en el PASA*100 **7 / 7 * 100 = 100%**
Frecuencia de verificación
Mensual
Tipo de indicador
Cuantitativo.
Cronograma
El proyecto tiene el mismo tiempo de las actividades del desarrollo del mismo, teniendo en cuenta la necesidad en la obra de mitigación del talud.

3.5. PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE CUERPOS DE AGUA Y REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS

Programa de prevención de la contaminación de cuerpos de agua y redes de servicios públicos						PASA-05
OBJETIVO						
Implementar medidas ambientales que minimicen las afectaciones por arrastre de materiales hacia cuerpos hídricos o redes de servicios públicos.						
TIPO DE MEDIDA						
Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Compensación
BENEFICIOS						
En las obras de construcción, el agua debe manejarse considerando los siguientes criterios de manejo: • Reducir el consumo • Prevenir la contaminación. • Recolectar separadamente aguas grises, aguas residuales, aguas de escorrentía. • Recircular aguas grises. • Tratar las aguas grises antes de su descarga para retirar grasas y/o sedimentos. • Verter las aguas residuales domésticas a las redes de alcantarillado o tratarlas en pozos sépticos.						
ACCIONES A EJECUTAR						
Para el periodo de ejecución del 01 al 30 de Junio de 2026, con el fin de dar cumplimiento al programa se ejecutaron las siguientes medidas de manejo:						

- El abastecimiento de agua se realizará por medio de un punto de agua que se encuentra dentro de un predio privado contiguo a la obra y al área que se definió para adecuación y construcción de campamento; dicho punto de agua es abastecido por el acueducto metropolitano.

- Se prohíbe el vertimiento de residuos líquidos en las calles y zonas aledañas al frente de obra.

- Inicialmente se cuenta con una unidad sanitaria portátil en el área destinada a campamento, del frente de obra, con el propósito de garantizar condiciones higiénicas adecuadas para los trabajadores. La unidad es sometida a jornadas de aseo y limpieza con lo cual se asegura las condiciones higiénicas para los trabajadores. (ver anexo No 3 Mantenimientos Unidad Sanitaria)

- El lavado de maquinaria, reparación y mantenimiento de vehículos está prohibido en el frente de obra con el fin de evitar verter aceites y residuos líquidos al suelo.

- No se registraron derrames o fugas de combustibles o residuos líquidos dentro o fuera del área de influencia, de presentarse un derrame este será recolectado, almacenado y enviado a tratamiento con una empresa autorizada para el tratamiento y disposición final de residuos peligrosos

	
Mantenimiento de Unidad Sanitaria Portátil	Punto de Lavado de manos

ETAPA			
PRECONSTRUCCIÓN		OPERACIÓN	X
CONSTRUCCIÓN	X	DESMANTELAMIENTO	

LUGAR DE APLICACIÓN

Frentes de obra Brisas de Primavera y Halcón de Granada del municipio de Piedecuesta.

CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDADES	MESES DE EJECUCIÓN									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Transporte adecuado de ACPM										
Tanqueo de maquinaria con ACPM										
Aplicación del plan de contingencia										

RESPONSABLE DE LA EJECUCION
CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB
SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MONITOREO
Indicador
Cumplir con las actividades propuestas para controlar la totalidad de los vertimientos generados durante el proyecto
Descripción del Indicador
• Indicador servicio de baños. • Manejo de Residuos líquidos, Domésticos e Industriales.
Indicador de calificación
• No de US utilizadas/ No de US requeridas*100 2 / 2 * 100 = 100%
Frecuencia de verificación
Mensual
Tipo de indicador
Cuantitativo.
Registro de cumplimiento
Informe Mensual Registro fotográfico
Cronograma
Este programa se ejecutará durante el periodo de construcción de la obra de mitigación.

3.6 PROGRAMA PARA EL MANEJO DE LA VEGETACION LA FAUNA Y EL PAISAJE.

Programa para el manejo de la vegetación la fauna y el paisaje.							PASA -06
OBJETIVO							
Implementar medidas ambientales que minimicen las alteraciones del paisaje debido a la ejecución de las obras civiles de mitigación.							
TIPO DE MEDIDA							
Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Compensación	
BENEFICIOS							
La intervención racional y la adecuación del paisaje posterior a la terminación de la obra, permitirá que la comunidad que habita la zona pueda disfrutar de la mejora de su entorno.							
ACCIONES A EJECUTAR							
Para el periodo de ejecución del 01 al 30 de Junio de 2026, se ejecutaron las siguientes acciones para dar cumplimiento al programa: • Se realiza la intervención únicamente en las áreas establecidas en los diseños técnicos. Están prohibidas la quema a cielo abierto y la aplicación de herbicidas. • Se encuentra prohibido el uso de árboles o arbustos para disponer elementos (alambres, carteles, sogas, cables, ropa, etc.).							

- Está prohibido arrojar basuras, material sobrante de excavación en las zonas verdes, en la cobertura vegetal, ubicada en área de influencia de la obra.
- Se prohíbe el uso o porte de armas de fuego.
- Se prohíbe la caza y compra de especies de fauna silvestre.
- Se prohíbe el tránsito de maquinaria fuera de los frentes de obra.

Ahuyentamiento de fauna silvestre

- Teniendo en cuenta que las áreas a intervenir son zonas urbanizadas la presencia de fauna silvestre es baja, sin embargo, en caso de evidenciarse presencia de fauna dentro de los frentes de obra su Ahuyentamiento será útil para animales tales como aves, serpientes y lagartijas. Su desplazamiento será dirigido hacia las coberturas de vegetación secundaria y rastrojo. La presencia de maquinaria pesada y todo lo relativo al inicio de las obras se constituye en una actividad de Ahuyentamiento por cuanto el instinto de conservación de los animales que aún quedan, hace que se desplacen hacia sitios que consideran más seguros.
- A partir de las condiciones identificadas en el área de Influencia directa se prevé que las acciones de rescate y relocalización serán muy poco frecuentes o nulas. En caso de requerirse si la situación lo amerita se pedirá asistencia a la autoridad ambiental o al cuerpo de bomberos en busca de minimizar las afectaciones a la fauna.

ETAPA			
PRECONSTRUCCIÓN		OPERACIÓN	X
CONSTRUCCIÓN	X	DESMANTELAMIENTO	

LUGAR DE APLICACIÓN

Frentes de obra Brisas de Primavera y Halcón de Granada del municipio de Piedecuesta

CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDADES	MESES DE EJECUCIÓN									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Manejos preventivos en la cobertura de vegetación natural										
Manejo de la vegetación que permanecerá										

—

RESPONSABLE DE LA EJECUCION

CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB

SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MONITOREO

Por parte del Interventor Ambiental

Descripción del Indicador

- Aplicación de acciones para el manejo de la vegetación presente en el área de influencia del proyecto.
- % de especies identificadas para intervención

Indicador de calificación

- No. de acciones de Manejo implementadas/No. de acciones de manejo propuestas X 100.

8 / 8 * 100 = 100% • Especie forestales intervenidas / especies forestales solicitadas *100 ***No aplica para este periodo***
Frecuencia de verificación
Mensual
Tipo de indicador
Cuantitativo.
Cronograma
Este programa se ejecutará durante el periodo de construcción de la obra de mitigación.

3.7 PROGRAMA DE SEÑALIZACION

Programa de señalización							PASA-.07
OBJETIVO							
Prevenir los impactos que se puedan generar por la no señalización de los sitios donde se realice intervención por el desarrollo de la obra; a fin de garantizar la seguridad de los peatones y trabajadores.							
TIPO DE MEDIDA							
Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Compensación	
BENEFICIOS							
El adecuado manejo de tránsito evitará accidentes que se puedan generar en el periodo de ejecución del proyecto.							
ACCIONES A EJECUTAR							

Para el periodo del 01 al 30 de Junio del 2026, con el fin de dar cumplimiento al programa establecido se realizó la ejecución de las siguientes actividades:

- Se inicia la instalación de señalización requerida en áreas de campamento y de trabajo del frente de obra
- La señalización instalada corresponde a Seguridad y Salud en el Trabajo, atención a emergencias, evacuación y Gestión Ambiental





Señalización áreas de campamento

	
Señalización áreas de campamento	

_

ETAPA			
PRECONSTRUCCIÓN		OPERACIÓN	X
CONSTRUCCIÓN	X	DESMANTELAMIENTO	

LUGAR DE APLICACIÓN

Frentes de obra Brisas de Primavera y Halcón de Granada del municipio de Piedecuesta.

CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDADES	MESES DE EJECUCIÓN									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Señalización frentes de Obras, sitios temporales de almacenamiento y señalización vial cuando la obra lo amerite natural										

__

RESPONSABLE DE LA EJECUCION

CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB

SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MONITOREO

Por parte del Interventor Ambiental

Indicador

Cumplir con las medidas propuestas para la señalización adecuada del área de trabajo establecidas para las etapas de operación y desmantelamiento de las instalaciones temporales del proyecto.

Descripción del Indicador

Numero de áreas señalizadas en el área de ejecución del proyecto.

Indicador de calificación

- # de áreas señalizadas /# de áreas necesarias a señalizar

1 / 1 * 100 = 100%

- # De acopios en obra / # de puntos de acopio señalizados.

1 / 1 * 100 = 100%

Frecuencia de verificación
Mensual
Tipo de indicador
Cuantitativo.
Cronograma
Este programa se ejecutará durante el periodo de construcción de la obra de mitigación.

3.8 PROGRAMA DE ADECUACION DE CAMPAMENTOS.

PROGRAMA DE ADECUACION DE CAMPAMENTOS.							PASA-08
OBJETIVO							
Prevenir, minimizar y controlar los impactos generados por la operación de las instalaciones temporales para el almacenamiento de herramienta menor y maquinaria, y las instalaciones de infraestructura básica de saneamiento.							
TIPO DE MEDIDA							
Control	X	Prevención	X	Mitigación		Compensación	
BENEFICIOS							

- Pérdida de suelo
- Cambios en la calidad de los suelos
- Cambios en la calidad del aire
- Cambios en los niveles de ruido
- Alteración a las unidades de paisaje
- Cambios en la cobertura vegetal y alteración de hábitat
- Afectación de la fauna silvestre
- Generación de expectativas y conflictos
- Incomodidades a los residentes y establecimientos de la zona.

ACCIONES A EJECUTAR

Para dar cumplimiento al objetivo planteado en el periodo del 01 al 30 de Junio de 2026, se ejecutaron las siguientes actividades:

- Se mantienen las áreas de campamento y almacén temporal para el frente de obra brisas de primavera, se cuenta con los elementos básicos para la atención de emergencias (Botiquín, extintor, camilla, inmovilizador, listado de instituciones de apoyo extremo en caso de emergencia) y contará con señalización informativa y preventiva.

- De igual forma en caso de ser necesario se realiza la utilización del área alterna al acampamento, que igualmente debe contar con la señalización pertinente.

Teniendo en cuenta la finalización de las actividades constructivas en el frente Halcón de Granadas, se llevó a cabo el desmantelamiento de las áreas de campamento y de almacenamiento temporal, garantizando la limpieza y recuperación de las zonas intervenidas. se realizó una clasificación rigurosa de los materiales y elementos resultantes del desmantelamiento, con el fin de garantizar su disposición adecuada de acuerdo con sus características y potencial de aprovechamiento. Elementos como

madera, tejas de zinc, tubos y otros materiales reutilizables fueron trasladados para ser empleados en la adecuación de otros frentes de obra, promoviendo el aprovechamiento eficiente de recursos y contribuyendo a la reducción en la generación de residuos. Por su parte, los residuos no reutilizables fueron debidamente embalados y entregados a los gestores autorizados, conforme a su naturaleza y a la normativa ambiental aplicable.





Áreas de Campamento temporal frentes de obra





Desmantelamiento Areas de Campamento temporal Halcón de Granada





Desmantelamiento Areas de Campamento temporal Halcón de Granada

ETAPA			
PRECONSTRUCCIÓN		OPERACIÓN	X
CONSTRUCCIÓN	X	DESMANTELAMIENTO	X

LUGAR DE APLICACIÓN

Frentes de obra Los Brisas de Primavera y Halcón de Granada del municipio de Piedecuesta

CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDADES	MESES DE EJECUCIÓN									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Instalación de infraestructura temporal										
Desmantelamiento de las instalaciones temporales										

RESPONSABLE DE LA EJECUCION

CONSORCIO MITIGACIÓN CDMB PIEDECUESTA

SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MONITOREO

Indicador

Cumplir con las medidas propuestas para reducir el impacto generado por la instalación, operación y desmantelamiento de las instalaciones temporales del proyecto.

Descripción del Indicador

- Número de sitios de uso temporal

Indicador de calificación

- Número sitios de uso temporal/Número de sitios desmantelados*100

2 / 1 * 100 = 50%

**se desmantela el campamento temporal de Halcón de Granada*

• No de medidas ambientales ejecutadas / No de medias ambientales programadas*100 **4 / 4 * 100 = 100%**
Frecuencia de verificación
Mensual
Tipo de indicador
Cuantitativo.
Registro de cumplimiento
Informe mensual
Cronograma
Este programa se ejecutará durante el periodo de construcción de la obra de mitigación.

ANEXOS

ANEXO No 1. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB	**REGISTRO DE MANEJO DE RESIDUOS**	**Código:** SST-F-96 **Fecha:** 27/07/2021 **Versión:** 1

PROYECTO: **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRITICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER."**	TIPO DE RESIDUO :
LUGAR: Frente de obra Brisas de Primavera y Halcón de Granada	ORDINARIO __X_____ RECICLAJE _____

FECHA	LIQUIDO	SÓLIDO	PESO (KG)	DESCRIPCIÓN DISPOSICIÓN FINAL
5/06/2026		X	1,2	Los residuos sólidos generados y acopiados en el punto ecológico son entregados a la empresa de aseo de Piedecuesta, de acuerdo con las rutas de recolección de aseo municipal.
12/06/2026		X	1,5	
19/06/2026		X	1,0	
25/06/2026		X	1,3	
TOTAL			**5,0**	

PROYECTO: **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRITICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER."**	TIPO DE RESIDUO :
LUGAR: Frente de obra Brisas de Primavera y Halcón de granada	ORDINARIO _____ RECICLAJE ___X_____

FECHA	LIQUIDO	SÓLIDO	PESO (KG)	DESCRIPCIÓN DISPOSICIÓN FINAL
25/06/2026		X	2,0	Los residuos reciclables generados en el periodo fueron entregados junto con los que se encontraban en almacenamiento temporal y los resultantes del desmantelamiento de campamento a RECICLAYMAS, gestor legalmente constituido para realizar su aprovechamiento. se entregaron bolsas de cemento vacías (109,1 Kg) a Cemex
			50,0	
			109,1	
TOTAL			**161,1**	

Revisó: Sandra Bermudez

Cargo: Ing. Ambiental

Firma: 

Certificado de aprovechamiento de sacos usados de cemento y mezclas secas

Cemex Colombia S.A.
NIT. 860.002.523-1

Certifica que:

La empresa CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB con NIT. 901. 983. 966 - 5, hizo entrega de 109.10 Kg de Sacos Usados no Contaminados provenientes de la Obra Ubicada en el Municipio de Piedecuesta, durante el periodo comprendido del mes de Junio de 2026, mediante la(s) planilla(s) de recolección No. 4082

Los Sacos Usados no contaminados fueron debidamente transportados, almacenados y posteriormente aprovechados bajo la siguiente opción:

- El co-procesamiento de los combustibles derivados de residuos se efectuó en los Hornos 1 y 2 de la Planta Caracolito durante el proceso de producción de Clinker y cemento en la Planta Caracolito de Cemex. Lo anterior, en cumplimiento de la Resolución 554 del 22 de febrero de 2021 y la Resolución 1872 del 06 de mayo de 2022 expedidas por la Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA.

La presente se expide a solicitud del interesado a los 08 días del mes de Julio de 2026. En constancia se firma:

Salome Fique.

SALOME ESTEPHANIA FIQUE ESPITIA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL CENTRO DE CIRCULARIDAD
CEMEX COLOMBIA S.A.

Anexo: Ficha de Seguridad

Copia archivo **0173/2026 RSU BUCARAMANGA**

***Cemex entregará copia de la certificación emitida por la empresa que realizó el uso y aprovechamiento de los sacos usados como materia prima en su proceso productivo.**

RECICLA Y MÁS
NIT: 901.384.346-0

CERTIFICACIÓN DE DISPOSICIÓN FINAL

La empresa ***CORPORACIÓN SOLIDARIA NACIONAL PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS Y ENERGÍAS RENOVABLES,*** identificada con NIT. 901.384.346–0, Certifica que recibió el día 29 de Junio de 2026 de **CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA** identificado con NIT: 901.983.966 - 5 de obra ubicada en Sector Halcón de Piedecuesta del Municipio de PIEDECUESTA, el siguiente material para el proceso de reciclaje y aprovechamiento.

TIPO DE MATERIAL	CANTIDAD EN KILOS
Chatarra	30
Plástico Negro	20
Botellas PET	9.2
Cartón	7.5
Plástico	4.6
TOTAL	**71.3 *Kg***

Estos materiales se despachan junto al vidrio, otros metales, otros plásticos, otros papeles para su destrucción y transformación.

El siguiente certificado se expide a los dos días (2) días del mes de Julio del año 2026 con destino a ***CONSORCIO MITIGACION***



MIGUEL EDUARDO SOTO AYALA
Representante Legal

Vereda Guatiguará predio La Carola- Piedecuesta Santander
reciclamasesp@gmail.com www.reciclaymas.com
3024678877
3005794555

ANEXO No 2. REGISTROS DE ASISTENCIA A CAPACITACION

	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	RH-F-29
		Fecha	31/10/2022
		Versión	2
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO [ ] CAPACITACIÓN [X] CHARLA [ ]

OBRA: Consorcio Mitigación Pedregosa

TEMA DE CAPACITACIÓN: Importancia de la Gestión Ambiental en obra

LUGAR: Frente de obra | FECHA: 16 JUNIO 2026

CAPACITADOR: Maryluz Pinilla | DURACIÓN: 30 min

No.	PARTICIPANTE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Alexander Prada	1774575C	Ayudante de P.	
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
4	Yeiner García	7005184293	Operador	
5	Mauricio villamizar	1005-41892	Operador	
6	Walmi nical Paez Martinez	7014092	Ayudante de Perforacion	
7	Freddy Reyes Petrie	1'871 071	operador	
8	Andres Garcia	6565491	AYUDANTE	
9	Luis Titular	2000.006746	AY	
10	Rodolfo Jesus Quiroz	635624	Ayudante	
11	Hayley Pinda	1098822451	operador	Hayley
12	José Ospino	1062794048	Ayudante de obra	
13	Pedro	1 [illegible] 91	Ayudante	Pedro
14	Brandi Yo Rivera Lobo	1097739725	Ayudante	
15	Luis Al berto Pinilla	5.697822	Ayudante	
16	[illegible]	91291100	Oficial	
17	Jefferson Gonzalez	5823211	Ayudante	
18	Juan Andres Diaz Q.	1075802634	Almacenista	
19	Ihan Camacho R.	1098700???	Ing. Residente	
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES:

CAPACITADOR

FIRMA

ANEXO No 3. MANTENIMIENTOS UNIDAD SANITARIA

MASSI
MAS SOLUCIONES INTEGRALES COLOMBIA S.A.S.

NIT. 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES SERVICIO AL CLIENTE

17041

Cliente: Coos mitiGacion

Ubicación: Brisas 2 Campo: Primavera

Hora de Inicio: 11:45 Hora Final: 12:00

Fecha: 2-Junio-26

TIPO USP / TANQUE	CANT
USP Propiedad de MASSI	1
USP Propiedad Cliente	
Pozo Séptico	
ISOTANQUE	

INSUMOS UTILIZADOS

UNIDADES			VOLUMEN		
PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
2	1	1	8	/	/

Observaciones: _____

Nombre de quien Revisó: Juan Andres Diaz C.C.

Firma:

Nombre Operador MASSI: Freddy C.C.

Firma: Sierra

IMPRESO POR IDENTICAS 310 - 30 84 724

Cel: 317 681 9912 contabilidadmassi@gmail.com Cra. 6 No. 11-05 Bodg 01 Girón

FO19 - V01

Scanned with CamScanner

MASSI
MAS SOLUCIONES INTEGRALES COLOMBIA S.A.S.

NIT. 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES SERVICIO AL CLIENTE

17205

Cliente: Cons mitigacion

Ubicación: Brisas D Campo: Primavera

Hora de Inicio: 9:10 Hora Final: 9:20

Fecha: 16-Junio-26

TIPO USP / TANQUE	CANT
USP Propiedad de MASSI	1
USP Propiedad Cliente	
Pozo Séptico	
ISOTANQUE	

INSUMOS UTILIZADOS

UNIDADES			VOLUMEN		
PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
2	1	1	8	/	/

Observaciones: _____

Nombre de quien Revisó: Juan Andres Diaz C.C.

Firma:

Nombre Operador MASSI: FREDDY C.C.

Firma: Sierra

IMPRESO POR: IDENTIDAD 310 - 30 94 724

Scanned with CamScanner

MASSI
MÁS SOLUCIONES INTEGRALES COLOMBIA S.A.S.

NIT. 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES SERVICIO AL CLIENTE

17065

Cliente: Cons Mitigacion

Ubicación: Brisas DE Campo: Primavera

Hora de Inicio: 8:25 Hora Final: 8:40

Fecha: 19 - Junio - 26

TIPO USP / TANQUE	CANT
USP Propiedad de MASSI	1
USP Propiedad Cliente	
Pozo Séptico	
ISOTANQUE	

INSUMOS UTILIZADOS

UNIDADES			VOLUMEN		
PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
2	1	1	8		

Observaciones:

Nombre de quien Revisó: Ivan Andres Diaz Firma:

Nombre Operador MASSI: Freddy Firma: Sierra

C.C.

IDENTIDAD 310 - 30 64 724

Cel: 317 681 9912 contabilidadmassi@gmail.com Cra. 6 No. 11-05 Bodg 01 Girón

FO19 - VO1

Scanned with CamScanner

MASSI
MÁS SOLUCIONES INTEGRALES COLOMBIA S.A.S.

NIT. 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES SERVICIO AL CLIENTE

17253

Cliente: Cons Mitigacion

Ubicación: Brisas Campo: Primavera

Hora de Inicio: 7:45 Hora Final: 8:00

Fecha: 23-Junio-26

TIPO USP / TANQUE	CANT
USP Propiedad de MASSI	1
USP Propiedad Cliente	
Pozo Séptico	
ISOTANQUE	

INSUMOS UTILIZADOS

UNIDADES			VOLUMEN		
PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
2	1	1	8	/	/

Observaciones:

Nombre de quien Revisó: Firma:

Nombre Operador MASSI: Firma:

C.C

Cel: 317 681 9912 contabilidadmassi@gmail.com Cra. 6 No. 11-05 Bodg 01 Girón

IMPRESO DE IDENTIDAD | 310 - 30 94 724

Scanned with CamScanner

MASSI
MÁS SOLUCIONES INTEGRALES COLOMBIA S.A.S.

NIT. 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES SERVICIO AL CLIENTE

17278

Cliente: Cons mitigacion

Ubicación: Brisas D Campo: Primavera

Hora de Inicio: 1:00 Hora Final: 1:20

Fecha: 26-Junio-26

TIPO USP / TANQUE	CANT
USP Propiedad de MASSI	1
USP Propiedad Cliente	
Pozo Séptico	
ISOTANQUE	

INSUMOS UTILIZADOS					
UNIDADES			VOLUMEN		
PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
2	1	1	8	/	/

Observaciones: _____

Nombre de quien Revisó: Juan Andres Diaz

Firma: [signature]

Nombre Operador MASSI: FREDDY

Firma: [signature]

CC

IMPRESO IDENTICAD | 310 - 30 94 724

Cel: 317 681 9912 contabilidadmassi@gmail.com Cra. 6 No. 11-05 Bodg 01 Girón

FO19 - V01

Scanned with CamScanner

MASSI
MÁS SOLUCIONES INTEGRALES COLOMBIA S.A.S.

NIT. 901.380.775-7

PROCESO DE OPERACIONES
SERVICIO AL CLIENTE

17351

Cliente: Cons Mitigacion

Ubicación: Brisas D Campo: Primavera

Hora de Inicio: 11:05 Hora Final: 11:23

Fecha: 30-Junio-26

TIPO USP / TANQUE	CANT
USP Propiedad de MASSI	1
USP Propiedad Cliente	
Pozo Séptico	
ISOTANQUE	

INSUMOS UTILIZADOS

UNIDADES			VOLUMEN		
PH	R	BB	GAL	LTS	MTS
2	1	1	83	/	/

Observaciones:

Nombre de quien Revisó: Juan Andres Diaz **Firma:**

Nombre Operador MASSI: Freddy **Firma:**

C.C

Cel: 317 681 9912 contabilidadmassi@gmail.com Cra. 6 No. 11-05 Bodg 01 Girón

IMPRESO POR IDENTIDAD 310 - 30 94 724

Scanned with CamScanner

CONTRATO DE OBRA No. 210.16223.6

CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB

"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 3: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER".

Junio de 2026

2.6.1. Proyecto de atención a la Comunidad

Proyecto de Atención a la Comunidad	**PGS-6.1-15**
OBJETIVO DEL PROYECTO	
Establecer las acciones necesarias para recibir, atender y dar respuesta oportuna a las solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias presentadas por la comunidad o autoridades competentes sobre el desarrollo del proyecto.	
ACCIONES DESARROLLADAS	
Instalación de la oficina de atención a la comunidad Se ubica y adecúa la oficina de atención a la comunidad en zona aferente al sector de obras, con volante informativo que incluye número telefónico y correo electrónico, para recibir, atender y brindar, respuesta oportuna a las solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias presentadas por la comunidad o autoridades competentes sobre el desarrollo del proyecto. (ver anexo de registro fotográfico y volante informativo) Se entrega el volante informativo de la oficina de atención a la comunidad, por correo electrónico, WhatsApp y físico, a quienes lo requieran, el cual incluye horario, días de atención, número telefónico y correo electrónico; en la oficina del Campamento del Contratista en zona aferente al campamento ubicado en el barrio Brisas de Primavera I. (ver anexo de información de la oficina de atención a la comunidad)	
LUGAR DE APLICACIÓN	
Comunidad del área de influencia directa de la obra (AID) y actores sociales para la construcción de obras de mitigacion y consolidación para el control de la erosión en los diferentes municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga – grupo 3: construcción de obras de mitigación y consolidación para el control de la erosión en puntos críticos determinados por la CDMB en el municipio de Piedecuesta, departamento de Santander".	
CRONOGRAMA DE EJECUCION	

ACTIVIDAD	Atención a la comunidad en temas de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias										
EJECUCION (PERÍODOS)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ACTIVIDAD	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

RESPONSABLE DE EJECUCION	Profesional Social
SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
Indicador:	Descripción del indicador:
Número de peticiones recibidas / número de peticiones atendidas * 100	Atención a PQRS
Número de peticiones atendidas / número de peticiones cerradas * 100	Cierre a reclamaciones recibidas
Tipo de indicador:	Cuantitativo.
Periodicidad de evaluación:	Mensual
Registro de cumplimiento:	Formatos de registro, recepción y seguimiento de PQRS, e Informes mensuales.

2.6.2. Proyecto de Información y Divulgación

Proyecto de Información y Divulgación	**PGS-6.2-16**
OBJETIVO DEL PROYECTO	
Informar de forma clara, veraz, oportuna y suficiente a la población que cubre las comunidades del área de influencia directa, a las autoridades locales, gremios, organizaciones, administración municipal, Concejo Municipal, Personería Municipal, Juntas de Acción Comunal y líderes comunitarios, vinculados con el desarrollo del proyecto y mantenerlos informados de los eventos de la obra constructiva. Ubicar en áreas lindantes a la obra, la valla informativa de la obra de mitigación y control a la erosión los datos específicos requeridos para conocimiento de la comunidad de influencia directa de la obra, entidades y personas interesadas en esta información. Colocar y entregar el aviso inherente a la oficina de atención a la comunidad, con los datos de dirección, teléfono y correo electrónico, entre otros, para conocimiento de la comunidad del área de influencia de la obra.	
ACCIONES DESARROLLADAS	
Información a la comunidad El proyecto de mitigación y control a la erosión cuenta con valla informativa de la obra con los datos e información a lugar y aviso informativo de la oficina de atención a la comunidad, el cual contiene días y horario de atención, número telefónico y correo electrónico. (ver anexo de registro fotográfico y volante informativo) La información es entregada a los actores sociales del proyecto inmersos en las actividades a desarrollar, entre ellos, la Administración Municipal, Instituciones Educativas, empresas, funcionarios, unidades residenciales y otros, por medio físico, correo electrónico y WhatsApp, en caso de requerirse. **Atención a la comunidad en PQRS** Desde la apertura de la oficina de atención a la comunidad del área de influencia del proyecto de mitigación y control a la erosión, los interesados, pueden acceder a los formatos de recepción, registro y seguimiento a las PQRS, conforme las comunidades lo requieran, en la oficina de atención a la comunidad, en el horario de lunes a viernes.	

LUGAR DE APLICACIÓN
Comunidad del área de influencia directa de la obra (AID) y actores sociales para la construcción de obras de mitigacion y consolidación para el control de la erosión en los diferentes municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga – grupo 3: construcción de obras de mitigación y consolidación para el control de la erosión en puntos críticos determinados por la CDMB en el municipio de Piedecuesta, departamento de Santander".

CRONOGRAMA DE EJECUCION	
ACTIVIDAD 1	Realizar las reuniones informativas de inicio, de avance, de finalización de la obra y las extraordinarias que se requieran
ACTIVIDAD 2	Invitar a las comunidades y actores sociales de la obra de mitigación y control a la erosión
ACTIVIDAD 3	Distribución de comunicaciones (volantes, cartas, llamadas telefónicas, mensajes) para las invitaciones a las reuniones informativas

EJECUCION (PERÍODOS)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ACTIVIDAD 1	X		X	X						
ACTIVIDAD 2	X		X	X						
ACTIVIDAD 3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

RESPONSABLE DE EJECUCION	Profesional Social

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
Indicador:	Descripción del indicador:
Número de reuniones informativas programadas / número de reuniones realizadas * 100	Reuniones informativas efectuadas
Número de actores sociales invitados a las reuniones informativas / número de volantes, comunicaciones, mensajes entregados a los actores sociales * 100	Invitación a las reuniones informativas
Número de actores sociales asistentes a las reuniones informativas / número de actores sociales invitados * 100	Actores sociales presentes en las reuniones informativas
Tipo de indicador:	Cuantitativo
Periodicidad de evaluación:	Mensual
Registro de cumplimiento:	Actas de reuniones, listados de asistencia, registro fotográfico y comunicaciones de convocatoria, entre otros documentos.

2.6.3. Proyecto para el manejo de la Infraestructura de predios y Servicios Públicos

Proyecto para el manejo de la Infraestructura de predios y Servicios Públicos	**PGS-6.3-17**

	CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB **CONTRATO No. 210-16223-6** **PLAN DE ACCIÓN SOCIO AMBIENTAL**	

OBJETIVO DEL PROYECTO
Registrar el estado físico de las construcciones e infraestructuras físicas que lo requieran, previo al inicio de las actividades edificativas a desarrollar. Cumplir los compromisos establecidos con las comunidades del área de influencia directa del proyecto.
ACCIONES DESARROLLADAS
Levantamiento de actas de vecindad El Contratista, realizó 47 actas de vecindad de inicio, de forma conjunta entre el residente técnico del proyecto y el área social, conforme lo establece el protocolo y aplicando el formato establecido para ello; previamente se informó a la comunidad, la importancia de la participación del responsable de la unidad social o del dueño del predio y se contactó al propietario, residente y/o testigo de las viviendas objeto de esta labor. El área social cuenta con el archivo digital y físico de las Actas de vecindad a la fecha elaboradas para la obra de mitigación y control a la erosión, para los casos de personas que no colaboran con la elaboración del documento, el Contratista realiza la actividad con un testigo. **Manejo de la infraestructura de predios y servicios públicos.** Conforme el proyecto lo requiera, se debe informar cuando proceda, respecto a los cortes de agua, luz u otros servicios, para la obra constructiva, en caso de presentarse estas acciones.
LUGAR DE APLICACIÓN
Comunidad del área de influencia directa de la obra (AID) y actores sociales para la construcción de obras de mitigacion y consolidación para el control de la erosión en los diferentes municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga – grupo 3: construcción de obras de mitigación y consolidación para el control de la erosión en puntos críticos determinados por la CDMB en el municipio de Piedecuesta, departamento de Santander".

CRONOGRAMA DE EJECUCION	
ACTIVIDAD 1	Realizar visitas domiciliarias para informar la elaboración de las actas de vecindad
ACTIVIDAD 2	Entrega de volantes informativos de la elaboración de actas de vecindad
ACTIVIDAD 3	Elaboración de actas de vecindad (iniciales, de seguimiento y cierre) conforme se requiera

EJECUCION (PERÍODOS)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ACTIVIDAD 1	X	X	X							
ACTIVIDAD 2	X	X	X							
ACTIVIDAD 3	X	X	X							

RESPONSABLE DE EJECUCION	Profesional Social

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
Indicador:	Descripción del indicador:
Número de informaciones sobre la elaboración de actas de vecindad en el AID de la obra / número de actas de vecindad realizadas * 100	Informar la elaboración de actas de vecindad

Número de volantes de elaboración de actas de vecindad entregados / número de actas de vecindad realizadas * 100	Entrega de información sobre la elaboración de actas de vecindad
Número de actas de vecindad realizadas / número de actas de vecindad cerradas * 100	Cierre de actas de vecindad elaboradas
Atención de PQRS relacionadas con daño a infraestructura = (# De quejas atendidas por daño a la infraestructura de predios / # de quejas por daño a infraestructura de predios presentadas) *100	Atención a PQRS, inherentes a afectaciones de predios
Tipo de indicador:	Cuantitativo
Periodicidad de evaluación:	Mensual
Registro de cumplimiento:	Actas de vecindad elaboradas, formatos de entrega de volantes, fichas socioeconómicas elaboradas e Informes mensuales.

6.4. Proyecto de recuperación del Derecho de vía (No aplica)

4. Proyecto de recuperación del Derecho de la vía	**PGS-6.4-18**
OBJETIVO DEL PROYECTO	
Recuperar el derecho de vía o área para la ejecución de las obras. Evitar conflictos con las comunidades.	
ACCIONES A DESARROLLAR	
Teniendo en cuenta que se está construyendo una obra de mitigacion y consolidación para el control de la erosión en los diferentes municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga – grupo 3: construcción de obras de mitigación y consolidación para el control de la erosión en puntos críticos determinados por la CDMB, este proyecto no aplica.	
LUGAR DE APLICACIÓN	
Comunidad del área de influencia directa de la obra (AID) y actores sociales para la construcción de obras de mitigacion y consolidación para el control de la erosión en los diferentes municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga – grupo 3: construcción de obras de mitigación y consolidación para el control de la erosión en puntos críticos determinados por la CDMB en el municipio de Piedecuesta, departamento de Santander".	

2.6.5. Proyecto de cultura vial y participación comunitaria

Proyecto de Cultura vial y participación comunitaria	**PGS-6.5-19**
OBJETIVO DEL PROYECTO	
Generar estrategias de apropiación del proyecto a través de procesos de educación y sensibilización con las comunidades educativas, población en general, líderes del AID y Comité de Participación Comunitaria.	
ACCIONES DESARROLLADAS	

Desarrollo de talleres pedagógicos de sostenibilidad

Este proyecto aplica, conforme las actividades constructivas, en algunos momentos, implican acciones de cierre de vías o pasos restringidos y las tareas de obra se concentran en áreas de cerramiento, acciones presentes para algunos espacios en la construcción programada.

Las inquietudes e información a la comunidad, en temas viales y otros, se ofrece a través de volantes informativos, de forma virtual, presencial o por teléfono en algunos momentos, brindando claridad en las actividades desarrolladas y por efectuar.

En temas de educación y seguridad vial, los colaboradores vinculados a la obra de mitigación y control a la erosión, recibieron capacitación el viernes 19 de junio en temas de cultura vial. (ver anexo de registro fotográfico y de asistencia)

LUGAR DE APLICACIÓN

Comunidad del área de influencia directa de la obra (AID) y actores sociales para la construcción de obras de mitigacion y consolidación para el control de la erosión en los diferentes municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga – grupo 3: construcción de obras de mitigación y consolidación para el control de la erosión en puntos críticos determinados por la CDMB en el municipio de Piedecuesta, departamento de Santander".

CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDAD	Atención a la comunidad y trabajadores en temas de información sobre cultura vial y participación comunitaria

EJECUCION (PERÍODOS)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ACTIVIDAD 1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

RESPONSABLE DE EJECUCION	Profesional Social

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Indicador:	Descripción del indicador:
Número de informaciones elaboradas 1 / número de informaciones entregadas 1 * 100 = 100%	Capacitación mensual a los trabajadores de la obra de mitigación y control a la erosión

Tipo de indicador:	Cuantitativo.
Periodicidad de evaluación:	Mensual
Registro de cumplimiento:	Formatos de registro de asistencia a reuniones y formaciones en temas viales, registro fotográfico e Informes mensuales.

2.6.6. Proyecto de Contratación de mano de obra

Proyecto de Contratación de mano de obra	**PGS-6.6-20**
OBJETIVO DEL PROYECTO	

Generar ingresos en los hogares de las comunidades del AID

Evitar la migración de población foránea al AID para vincularse al proyecto

Respaldar los compromisos generados con la comunidad para la construcción de la obra.

Apoyar la mano de obra disponible conforme la información de la ARN (Agencia para la Reincorporación y la Normalización).

ACCIONES DESARROLLADAS

El Contratista se encuentra vinculando mano de obra requerida para el proyecto, conforme listados emitidos por la oficina de empleo de la Administración municipal.

A las personas que envían las hojas de vida a través del correo del Contratista, se les solicita registrarla en Piedecuesta Emplea o en la plataforma del SENA, Agencia pública de empleo, entidad estatal donde se postulan los perfiles ocupacionales del tipo de trabajador, en caso de requerirse de estas acciones.

Los colaboradores vinculados a la obra de mitigación y control a la erosión, recibieron formación en temas varios de fortalecimiento del valor del emprendimiento y oficina de atención a la comunidad, el viernes 19 de junio. (ver anexo de registro fotográfico y de asistencia)

LUGAR DE APLICACIÓN

Comunidad del área de influencia directa de la obra (AID) y actores sociales para la construcción de obras de mitigacion y consolidación para el control de la erosión en los diferentes municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga – grupo 3: construcción de obras de mitigación y consolidación para el control de la erosión en puntos críticos determinados por la CDMB en el municipio de Piedecuesta, departamento de Santander".

CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDAD 1	Gestión con la Agencia Colombiana para la Reintegración y Normalización, respecto a la mano de obra no calificada disponible para laborar en el proyecto
ACTIVIDAD 2	Informar en la reunión de inicio la vinculación de mano de obra no calificada del AID del proyecto
ACTIVIDAD 3	Recepción de hojas de vida para la vinculación de mano de obra no calificada al proyecto
ACTIVIDAD 4	Inducciones y capacitaciones en diversos temas del área social al personal vinculado para trabajar en la obra
ACTIVIDAD 5	Coordinación con la bolsa de empleo de la Alcaldía de Piedecuesta y Junta de Acción Comunal local, para la vinculación de mano de obra no calificada.

EJECUCION (PERÍODOS)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ACTIVIDAD 1	X									
ACTIVIDAD 2	X									
ACTIVIDAD 3	X	X	X	X						
ACTIVIDAD 4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

ACTIVIDAD 5	X	X	X	X						

RESPONSABLE DE EJECUCION	Profesional social
SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
Indicador:	Descripción del indicador:
# De personas contratadas como mano de obra no calificada que residen en la localidad y área de influencia 16 / # total de personas registradas como mano de obra no calificada 20 * 100 = 80 %	Mano de obra del sector del AID contratada para el proyecto
Registros afiliación de mano de obra loca 16 / registro en planillas de pago de seguridad social 16 * 100 = 100%	Pago seguridad social de trabajadores locales contratados
Tipo de indicador:	Cuantitativo
Periodicidad de evaluación:	Mensual
Registro de cumplimiento:	Formatos de registro de mano de obra local, laborando en la obra

2.6.7. Proyectos productivos (No aplica)

7. Proyectos productivos	**PGS-6.7-21**
OBJETIVO DEL PROYECTO	
Apoyar a las comunidades organizadas en el desarrollo de proyectos productivos que contribuyan al mejoramiento del entorno y calidad de vida de la comunidad.	
ACCIONES A DESARROLLAR	
Conforme se está desarrollando una obra de mitigacion y consolidación para el control de la erosión en los diferentes municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga – grupo 3: construcción de obras de mitigación y consolidación para el control de la erosión en puntos críticos determinados por la CDMB, este proyecto no aplica, ni tiene rubro presupuestal.	
LUGAR DE APLICACIÓN	
Comunidad del área de influencia directa de la obra (AID) y actores sociales para la construcción de obras de mitigacion y consolidación para el control de la erosión en los diferentes municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga – grupo 3: construcción de obras de mitigación y consolidación para el control de la erosión en puntos críticos determinados por la CDMB en el municipio de Piedecuesta, departamento de Santander".	

2.6.8. Proyecto protección al Patrimonio Arqueológico y Cultural (No aplica)

Proyecto de Protección al Patrimonio Arqueológico y Cultural	**PGS-6.8-22**
OBJETIVO DEL PROYECTO	
Proteger el Patrimonio Arqueológico y Cultural de la Nación. Atender los compromisos con la comunidad del Área de Influencia Directa del proyecto.	
ACCIONES A DESARROLLAR	
Acorde a lo sugerido por el ICANH, no se van a realizar excavaciones que impliquen algún hallazgo arqueológico o antropológico, por tanto, este proyecto no aplica para la construcción de obras de mitigacion y consolidación para el control de la erosión en los diferentes municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga – grupo 3: construcción de obras de mitigación y consolidación para el control de la erosión en puntos críticos determinados por la CDMB. En caso de encontrar restos de fósiles, cerámicas y demás, se contactará al antropólogo autorizado para acordonar la zona y demás acciones de recolección de estos elementos de interés para el ICANH.	
LUGAR DE APLICACIÓN	
Comunidad del área de influencia directa de la obra (AID) y actores sociales para la construcción de obras de mitigacion y consolidación para el control de la erosión en los diferentes municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga – grupo 3: construcción de obras de mitigación y consolidación para el control de la erosión en puntos críticos determinados por la CDMB en el municipio de Piedecuesta, departamento de Santander".	

2.6.9. Proyecto de Gestión socio predial (no aplica)

Proyecto de Gestión socio predial	**PGS-6.9-23**
OBJETIVO DEL PROYECTO	
Mantener o mejorar las condiciones de vida, de las unidades sociales que deben ser trasladadas por la ejecución de las obras.	
ACCIONES A DESARROLLAR	
Compra de unidades sociales requeridas para la construcción de la obra En el desarrollo de la actividad constructiva no se requiere la compra de predios o bienes inmuebles, conforme el área a construir son taludes de espacio público y propiedad estatal.	
LUGAR DE APLICACIÓN	
Comunidad del área de influencia directa de la obra (AID) y actores sociales para la construcción de obras de mitigacion y consolidación para el control de la erosión en los diferentes municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga – grupo 3: construcción de obras de mitigación y consolidación para el control de la erosión en puntos críticos determinados por la CDMB en el municipio de Piedecuesta, departamento de Santander".	

ANEXOS SOCIALES

ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO



Valla informativa de la obra de intervención en Brisas de Primavera I – Piedecuesta, adecuada en la zona de obras



Volante informativo de la Oficina de Atención a la Comunidad ubicado en la zona de obras de Brisas



Volante informativo de la Oficina de atención a la comunidad en el campamento de obra de Halcón de Granada



Actividad de capacitación con los trabajadores en el campamento de Brisas de Primavera I

ANEXO 2. VOLANTE INFORMATIVO DE LA OFICINA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD EN EL BARRIO BRISAS DE PRIMAVERA I DE PIEDECUESTA

Volante: 01

INFORMACIÓN DE LA OFICINA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

La Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga y el Consorcio Mitigación Piedecuesta CDMB

Informa a los actores sociales, líderes, Alcaldía, Personería, sector comercial, financiero, comunidad y residentes del área de influencia directa de la obra de CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 3, la oficina de atención a la comunidad, así:

Dirección: Campamento de Obra, barrio Brisas de Primavera I

Horario: De lunes a viernes

Hora: De 8 a 10:00 a.m.

En esta oficina usted puede presentar sus peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y demás, en temas civiles, ambientales y sociales para ser atendidos por el Consorcio MITIGACIÓN Piedecuesta CDMB.

MAYOR INFORMACIÓN

Contratista: CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB
Centro industrial logístico San Jorge Bodega 16 Tel: 3115557728
Correo electrónico:: conmitigacionptacdmb@hotmail.com

ANEXO 3. VOLANTE INFORMATIVO A LA COMUNIDAD DEL BARRIO HALCÓN DE GRANADA PARA CONOCIMIENTO DE LOS RESIDENTES DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE LA OBRA DE CONTROL A LA EROSIÓN.

Volante: 02

INFORMACIÓN DE LA OFICINA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

La Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga y el Consorcio Mitigación Piedecuesta CDMB

Informa a los actores sociales, líderes, Alcaldía, Personería, sector comercial, financiero, comunidad y residentes del área de influencia directa de la obra de CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 3, la oficina de atención a la comunidad, así:

Dirección: Campamento de Obra, barrios Halcón de Granada y Granadillo

Horario: De lunes a viernes

Hora: De 8 a 10:00 a.m.

En esta oficina usted puede presentar sus peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y demás, en temas civiles, ambientales y sociales para ser atendidos por el Consorcio MITIGACIÓN Piedecuesta CDMB.

MAYOR INFORMACIÓN
Contratista: CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB
Centro industrial logístico San Jorge Bodega 16 Tel: 3115557728
Correo electrónico:: conmitigacionptacdmb@hotmail.com

ANEXO 4. REGISTRO DE ACTAS DE VECINDAD DE INICIO ELABORADAS EN LOS BARRIOS BRISAS DE PRIMAVERA I, BRISAS DE PRIMAVERA II, HALCÓN DE GRANADA Y GRANADILLO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

BARRIO	NÚMERO DE ACTAS DE VECINDAD DE INICIO REALIZADAS	PORCENTAJE
Brisas de Primavera I	28	60%
Brisas de Primavera II	5	10%
Halcón de Granada	8	17%
Granadillo	6	13%
TOTAL	**47**	**100%**

BRISAS DE PRIMAVERA I

No.	Nombre	Dirección vivienda	Barrio	No. de Cédula de Ciudadanía	No. telefónico
1	ADOLFO TORRES ROPERO	Manzana C Casa 3	Brisas de Primavera I	13.480.725	3156694907

No.	Nombre	Dirección vivienda	Barrio	No. de Cédula de Ciudadanía	No. telefónico
2	CAMILO RÍOS ARNACHE	Manzana C Casa 10	Brisas de Primavera I	1.065.874.471	3105966785
3	CHERRYS POLANCO MEDINA	Manzana B Casa 2	Brisas de Primavera I	15.950.322	3209997334
4	CRISANTO MARTÍNEZ	Manzana B Casa 5	Brisas de Primavera I	5.670.293	3203330392
5	DIANA ROCÍO LAGOS	Manzana B Casa 3	Brisas de Primavera I	63.341.445	3016893592
6	FAUSTINO JIMÉNEZ	Manzana C Casa 11	Brisas de Primavera I	5.422.805	3212597205
7	JAIME TORRES PRIETO	Manzana B Casa 7	Brisas de Primavera I	19.284.692	3152487337
8	JAN CARLOS GRIMALDO MENA	MANZANA A CASA 12	Brisas de Primavera I	1.102.384.103	3182844206
9	JAVIER MARTÍNEZ HERNÁNDEZ	Manzana D Casa 3	Brisas de Primavera I	78.714.853	3185182952 - 3144085822
10	JEFERSON GONZÁLEZ ORTEGA	Manzana A Casa 10 piso 1	Brisas de Primavera I	5.823.211	3112802947
11	KELLY LEÓN DÍAZ	Manzana D Casa 1	Brisas de Primavera I	28.259.440	3028421645
12	LEIDY SERRANO RUGELES	Manzana A Casa 13	Brisas de Primavera I	28.078.590	3102096505
13	LILIANA GARNICA ROJAS	Manzana A Casa 9	Brisas de Primavera I	37.725.956	3025981705
14	LUIS EDUARDO GÉLEVEZ TARAZONA	Manzana A Casa 11 Taller	Brisas de Primavera I	1.097.303.276	3205890997
15	MARÍA CARREÑO ROJAS	Manzana A Casa 8-201 y 301	Brisas de Primavera I	37.542.792	3204753055
16	MARÍA FERNANDA DÍAZ NIÑO	Manzana D Casa 2	Brisas de Primavera I	1.102.386.883	3112239900
17	MARINA DÍAZ FUENTE	Manzana A Casa 8 piso 101	Brisas de Primavera I	37.796.087	3178621074
18	MARTHA BUITRAGO REYES	Manzana C Casa 9	Brisas de Primavera I	63.336.981	3167559614
19	MERCEDES MONCADA GÉLVEZ	Manzana B Casa 6	Brisas de Primavera I	1.097.303.966	3152841112
20	YENNY CABALLERO FLÓREZ	MANZANA B Casa 9	Brisas de Primavera I	1.116.792.286	3202180004
21	YOLANDA PABÓN REY	MANZANA A CASA 14	Brisas de Primavera I	28.162.431	3103020181
22	VÍCTOR JULIO GAMBOA CARDOZO	MANZANA B Casa 4	Brisas de Primavera I	91265828	3172113522
23	VÍCTOR JULIO GAMBOA CARDOZO	Manzana B Casa 8	Brisas de Primavera I	91265828	3172113522
24	VÍCTOR JULIO GAMBOA CARDOZO	Manzana C Casa 1	Brisas de Primavera I	91265828	3172113522
25	VÍCTOR JULIO GAMBOA CARDOZO	Manzana C Casa 2	Brisas de Primavera I	91265828	3172113522

No.	Nombre	Dirección vivienda	Barrio	No. de Cédula de Ciudadanía	No. telefónico
26	VÍCTOR JULIO GAMBOA CARDOZO	Manzana D Casa 2	Brisas de Primavera I	91265828	3172113522
27	VÍCTOR JULIO GAMBOA CARDOZO	MANZANA B Casa 1	Brisas de Primavera I	91265828	3172113522
28	ANAHIL JIMÉNEZ	Vías y entorno	Brisas de Primavera I	37.753.450	3115562986

BRISAS DE PRIMAVERA II

No.	Nombre	Dirección vivienda	Barrio	No. de Cédula de Ciudadanía	No. telefónico
1	BLANCA BENAVIDES PERILLA	Calle 15 C No. 0 - 58	Brisas de Primavera II	63.480.359	3116607711
2	MARÍA LEONOR VARGAS	Calle 15 B No. 0 - 58	Brisas de Primavera II	63.475.291	3132583994
3	MYRIAM ALMEIDA VILLAMIZAR	Calle 15 D No. 0 - 63	Brisas de Primavera II	63.303.495	3172470230
4	VÍCTOR JULIO GAMBOA CARDOZO	Calle 15 C No. 0 - 57	Brisas de Primavera II	91265828	3172113522
5	VÍCTOR JULIO GAMBOA CARDOZO	Calle 15 B No. 0 - 63	Brisas de Primavera II	91265828	3172113522

HALCÓN DE GRANADA

No.	Nombre	Dirección vivienda	Barrio	No. de Cédula de Ciudadanía	No. telefónico
1	LIZETH CÁRDENAS CADENA	Calle 1 NA No. 19 – 120 APTO 101	Halcón de Granada	1.102.359411	3043493916
2	JAIME ANGARITA MAYA	Calle 1 NA No. 19 – 118 Piso 3	Halcón de Granada	5.670.471	3023964385
3	LEIDY KATHERINE RUGELES GONZÁLEZ	Calle 1 NA No. 19 – 114 Piso 1	Halcón de Granada	1.095.804.944	315669.3515
4	JENNIFER GARCÍA CORZO	Calle 1 NA No. 19 – 108 PISO 1	Halcón de Granada	1.102.714.486	3007599442
5	GLADYS FERREIRA ESTÉVEZ	Calle 1 NA No. 19 – 100 Piso 2	Halcón de Granada	63.356.193	3123428238
6	HUGO ANDRÉS PÉREZ CABALLERO	Calle 1 NA No. 19 – 96 PISO 1	Halcón de Granada	1.102.366.785	3022824765
7	VIVIANA OVIEDO RIAÑO	Calle 1 NA No. 19 – 126 - 128	Halcón de Granada	37.618.699	3243445819
8	DORELBA ROJAS B.	Áreas de entorno, fachadas, andenes y vías	Halcón de Granada y San Carlos	63.444.237	3185173381

GRANADILLO

No.	Nombre	Dirección vivienda	Barrio	No. de Cédula de Ciudadanía	No. telefónico
1	EDINSON FABIÁN LUNA MANTILLA	Carrera 20 A No. 1N - 47	Granadillo	1.102.365.817	3194124965
2	JOHAN SEBASTIÁN NIÑO RAMÍREZ	Carrera 20 A No. 1N - 41	Granadillo	1.102.348.605	3157435741
3	CIRO ALFONSO MONTAÑEZ LEÓN	Carrera 20 A No. 1N - 37	Granadillo	5.630.410	3178724846
4	DIANA YOLIMA BRICEÑO RINCÓN	Carrera 20 A No. 1N - 31	Granadillo	37.620.775	3043249688
5	PAOLA ANDREA SILVA RÍOS	Carrera 20 A No. 1N - 25	Granadillo	1.102.365.934	3185269906
6	VÍCTOR JULIO GAMBOA CARDOZO	Carrera 20 A No. 1N - 19	Brisas de Primavera II	91265828	3172113522

ANEXO 5. REGISTRO DE LA MANO DE OBRA LOCAL PARA LA OBRA DE MITIGACIÓN Y CONTROL A LA EROSIÓN– PROGRAMA DE GENERACIÓN DE EMPLEO –

CONTRATO DE OBRA No. 210.16223.6
CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB
"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 3: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER".

No.	NOMBRE COMPLETO	C.C. No.	FECHA DE NACIMIENTO	LUGAR DE NACIMIENTO	DIRECCIÓN	NÚMERO TELEFÓNICO	CARGO
1	HARLEY PRADA LÓPEZ	1098822751	23/06/1999	Bucaramanga - Santander	Vereda Granadillo - Piedecuesta	3187720633	Ayudante de obra
2	ALEXANDER PRADA LÓPEZ	13745736	13/01/1980	Bucaramanga - Santander	Vereda Granadillo - Piedecuesta	3202778747	Ayudante de obra
3	LUIS ALBERTO PRADA RINCÓN	5691822	23/02/1968	Molagavita - Santander	Brisas de Primavera I - Piedecuesta	3008327899	Ayudante de obra
4	ANDRÉS GARCÍA FARÍAS	6565491	27/07/1986	Farinas - Venezuela	Villas de Andalucía	3042807099	Ayudante de obra
5	JOSÉ OSPINO	105.071.906	7/07/1999	Magangué - Bolívar	Vereda El Granadillo - Piedecuesta	3209902704	Ayudante de obra
6	JEFERSON GONZÁLEZ ORTEGA	5.823.211	24/01/1979	Maracay - Venezuela	Brisas de Primavera I	3112802947	Ayudante de obra
7	KELVIN NICOL PÁEZ BUITRAGO	7.014.092	23/11/1997	Caracas - Venezuela	Brisas de Primavera I	3209898603	Ayudante de obra
8	DIEGO ANDRÉS FLÓREZ RINCÓN	1.063.560.222	22/05/2002	La Gloria - Cesar	Brisas de Primavera I	3226918975	Ayudante de obra
9	RODOLFO JESÚS QUIÑONES GUTIÉRREZ	6.356.621	4/02/1987	Guanare - Venezuela	Barrio Villa Andalucía	3245517143	Ayudante de obra
10	FRANK JAN PIER JAIMES CAÑAS	1.005.060.412	5/01/2002	Pamplona - Norte de Santander	Barrio Villas de San Juan	3164184403	Almacenista
11	LUIS EDUCARDO CIFUENTES VELASCO	2000006746	14/04/1997	Villa del Rosario - Norte de Santander	San Rafael - Piedecuesta	3202362126	Ayudante de perforación
12	PEDRO JESÚS VERGEL	13.285.355	28/12/1986	Piedecuesta - Santander	Barrio San Pedro Bajo	No tiene	Ayudante de perforación
13	DARLIN MARTÍN ORDUZ REY	1.005.327.109	20/10/2001	Bucaramanga - Santander	La Candelaria - Piedecuesta	3143324919	Ayudante de perforación
14	BAUDILIO RIVERA GÓMEZ	1.093.738.325	16/02/1986	Barrancabermeja - Santander	Chacarita - Piedecuesta	3183141088	Ayudante de perforación
15	JAIRO CALDERÓN QUINTERO	91.239.254	8/09/1962	Bucaramanga - Santander	Argentina - Piedecuesta	3241895714	Ayudante de perforación
16	ARLEY JESÚS GALVIS MENDOZA	1.007.437.553	10/06/2000	Pamplona - Norte de Santander	Villa de San Juan	3236920304	Ayudante de perforación

ANEXO 6. CAPACITACIÓN A LOS COLABORADORES DE LA OBRA EN TEMAS VARIOS DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD, CULTURA VIAL Y FORTALECIMIENTO DE VALORES

	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	RH-F-28
		Fecha	31/10/2022
		Versión	2
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO [ ] CAPACITACION [X] CHARLA [ ]

OBRA: CONTRATO DE OBRA No. 210.16223.6 - CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB - "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 3: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE

TEMA DE CAPACITACIÓN: Fortalecimiento de valores (emprendimiento), educación vial y oficina de atencion a la comunidad

LUGAR: Campamento en obra - Consorcio Mitigación Piedecuesta CDMB		FECHA:	19/06/2026
CAPACITADOR	ALBA LUCÍA SANTOS RUEDA	DURACIÓN:	30 MINUTOS

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Mauricio Villamizar	1005841892	Operador	
2	Gracia	912911	Oficios	
3	Harley Prada Lopez	1095822751	operador	
4	Rodolfo Quiñonez	635664	Ayudante	
5	Adan garcia	6565491	AYUDANTE	
6	Luis Alberto Bautista	5.694822	Ayudante	
7	Alexander Rueda (obra	1374576	Ayudante P.	
8	Darlin mayra ordoz	1005327109	Ayudante	
9	Luis Tibata	2000.006744	Ay	
10	Jefferson Gonzalez	5623211	AYUDANTE	
11	Robinson Paez Pulg	7014092	Ayudante Perforacion	
12	Bayrilla Rivera Gonzalez	1093838325	Ayuda	
13	Yeiney García	1005181273	Operador	
14	Pedro J. Vega	13285355	Ayudante	
15	Freddy Rojas	13891091	operador	
16	Samuel Portilla	91429307	Maestro	
17	Jhon Gonzalez R.	1098760722	Ing. Civil	
18	Diego Andres Flores Juarez	1005150722	Ayudante de Ayudante	
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES:

CAPACITADOR

ANEXO NO.5: PROGRAMA GERENCIAL DE IMPLEMENTACIÓN PARA EL PROYECTO Y SEGUIMIENTO MENSUAL - PERIODO 01 DE JUNIO DE 2026 AL 30 DE JUNIO DE 2026.

CONSORCIO MITIGACIÓN
PIEDECUESTA CDMB

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 210-16223-6

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 3: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER

ANEXO: PROGRAMA GERENCIAL SEGUIMIENTO 09 DEL PROYECTO Y CONTROL DE CALIDAD

PERIODO:
01 DE JUNIO DE 2026 AL 30 DE JUNIO DE 2026

PRESENTA:

Ing. ANDRÉS LEONARDO LASSO AGUIRRE
PROFESIONAL PMP-GERENCIA DE PROYECTOS

SANTANDER
PIEDECUESTA
2026

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. GESTIÓN DEL ALCANCE 3
3. CONTROL DEL COSTO Y AVANCE 4
4. CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 6
5. GESTION DEL RIESGO 6
6. INDICADORES DE GESTION DE RECURSOS 7
7. CONCLUSIONES 7

1. INTRODUCCIÓN

El presente Programa de Gerencia de Proyecto es parte integral del Informe Técnico de Obra No. 9 donde se describe el desarrollo de la ejecución del proyecto de CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER. Ejecución contratada con el CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB mediante contrato de Obra Pública Nro. 210-16223-6. Las actividades corresponden a las desarrolladas durante el periodo del 01 de junio del 2026 hasta el 30 de junio del 2026.

Los capítulos a continuación se enfocarán en los índices claves de desempeño (KPIs), los mismos son medidas cuantificables del desempeño a lo largo del plazo de ejecución del contrato para un objetivo específico. Los KPI brindan objetivos que los equipos deben alcanzar, hitos para medir el progreso y perspectivas que ayudan a todos los interesados principalmente a los ejecutores a tomar mejores decisiones.

2. GESTIÓN DEL ALCANCE

La gestión del alcance es un componente crítico del Programa de Gestión del Proyecto de Construcción, que garantiza que todos los objetivos, entregables y tareas del proyecto estén claramente definidos, documentados y controlados a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

Desde el informe inicial se establece que, la minuta del contrato define que el alcance del contrato y sus especificaciones, son los plasmados en los documentos que hacen parte integral del presente contrato, definidos como Estudios Previos, Pliego de Condiciones, Especificaciones Técnicas y planos. Así mismo, los mencionados documentos derivan las actividades del contrato como actividades necesarias para lograr cumplir con el objeto C*onstrucción de obras de mitigación y consolidación para el control de la erosión en puntos críticos determinados por la CDMB en el municipio de Piedecuesta, departamento de Santander.*

Del alcance del presente contrato se definió, a partir del programa de gerencia presentado, que el objetivo general del proyecto es el control de la erosión y la estabilización del talud mediante la implementación de un sistema de pantalla anclada en concreto con anclajes activos, en ambos frentes de obra. Dada la modificatoria presentada y avalada bajo el Otrosí 01 del 23 de diciembre de 2025, se presentó un cambio en el sistema de estabilización del frente Brisas de Primavera, el cual pasa a ser un sistema de bioingeniería con la instalación de pernos tipo Nails y cobertura en geomanto, garantizando factores de estabilidad y control de erosión. Es por todo lo

anterior que el indicador clave del cumplimiento del alcance corresponde a cumplimiento del área establecida a estabilizar, estimada contractualmente en **2482.00 m2** (1964.00 m2 a estabilizar con Bioingeniería en el frente Brisas de Primavera y 518.00 m2 a estabilizar en concreto lanzado en el frente Halcon de Granada).

El indicador como tal es la evaluación del porcentaje de área estabilizada. También es claro que por proceso de ejecución de este tipo de proyecto las primeras medidas se reflejarán en los últimos meses de la ejecución del contrato, a medida que la interventoría acepte las áreas ya estabilizadas.

Durante el periodo evaluado, el valor esperado del indicador se mantiene en **20,87%,** en concordancia con el avance reportado en el corte anterior, correspondiente a la estabilización efectiva de 518,00 m² mediante la implementación del sistema de concreto lanzado con anclajes tensionados en el frente Halcón de Granada. Para el presente periodo en el frente de Brisas de Primavera, si bien se evidencia el inicio de las actividades asociadas a la instalación del sistema de bioingeniería, incluyendo la colocación de geomanto en fibra sintética, dichas intervenciones se encuentran en fase de ejecución parcial.

En este sentido, y conforme a los criterios de medición establecidos para el indicador, el porcentaje de área estabilizada será reconocido únicamente una vez se haya completado la instalación integral del sistema de bioingeniería y se verifique su funcionamiento conjunto, garantizando el cumplimiento de las condiciones de estabilidad y control de erosión definidas en el diseño.

3. CONTROL DEL COSTO Y AVANCE

Esta sección se centra en el monitoreo y seguimiento de un calendario detallado del proyecto junto con un presupuesto desglosado en actividades unitarias, buscando la asignación eficiente de los recursos y el tratamiento proactivo ante posibles retrasos o riesgos de ejecución, el plan pretende mantener el impulso del proyecto y cumplir los plazos y el valor del proyecto, en consonancia con las expectativas del cliente y los compromisos contractuales.

El indicador clave establecido para el monitoreo del cumplimiento del costo del proyecto, correspondiente a la relación entre el valor ejecutado y el valor inicialmente presupuestado, evidenció que durante el periodo evaluado no se presentaron modificaciones en los costos del contrato. En consecuencia, el valor del índice para el presente plazo corresponde a **1,0**, al mantenerse un costo actual de **$ 9.651.664.101,92**, igual al costo inicial establecido de **$ 9.651.664.101,92**.

Con respecto al indicador establecido para el control del avance de obra, se estableció como el valor resultante entre la comparación del Avance Real sobre el Avance Programado, para el periodo 9 según el programa actualizado de obra al Otrosí 01, el avance se estimó en **$1.268.377.940,43** que representa al **13,14%** del valor total del proyecto, con un acumulado proyectado de **$8.856.775.437,35** que corresponde al

91,76% del total del valor del contrato; pero el real ejecutado del mes 9 correspondió a **$764.303.397,40** que es el **7,92%** del valor total del proyecto, con un acumulado real de **$9.293.404.123,53** que corresponde al **96,29%** del valor total del contrato, dando como resultado un indicador de **0,60** durante el corte y **1,05** del acumulado del proyecto, lo que nos muestra que mientras el resultado sea igual o superior a 1, el avance real es superior al programado, tal y como se muestra en la siguiente ilustración:

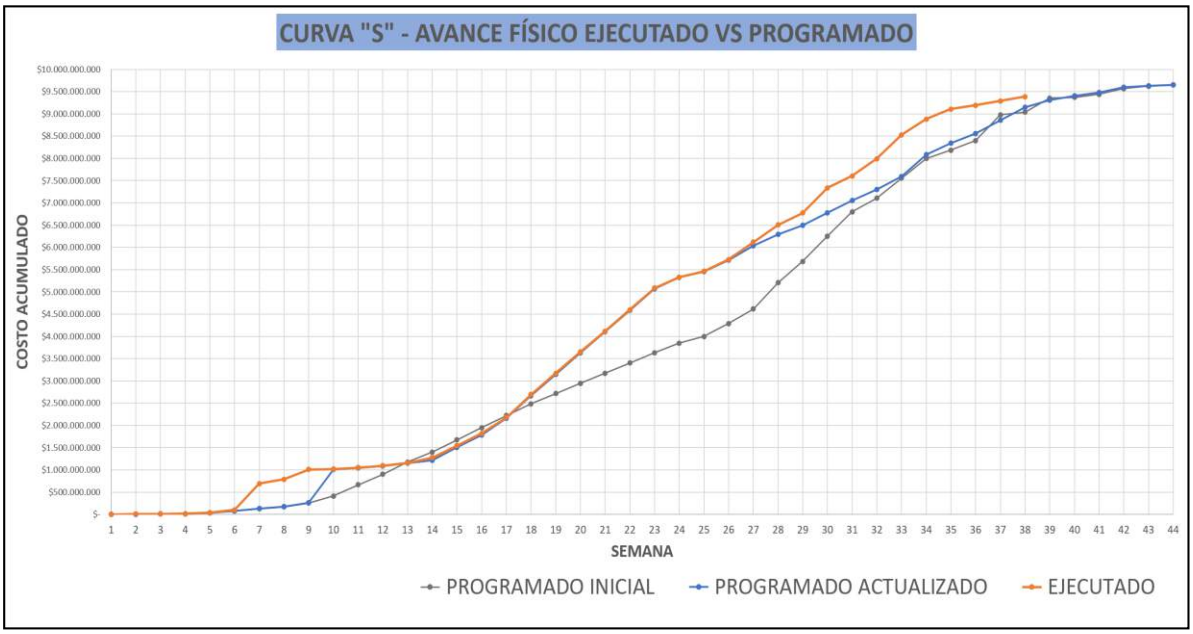


Ilustración 1. Avance Programado Vs Avance Ejecutado Acumulado (Curva S)

Descripción	Periodo 9
Estimado	$ 1.268.377.940,43
Acumulado Estimado	$ 8.856.775.437,35
Ejecutado	$ 764.303.397,40
Acumulado Ejecutado	$ 9.293.404.123,53
KPI Mensual	0,60
KPI Acumulado	1,05
% Programado	13,14%
% Acumulado	91,76%
% Ejecutado	7,92%
% Acumulado	96,29%

Tabla 1. Datos de avance de obra – Periodo 9

4. CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Para el presente reporte, las actividades correspondieron principalmente al desarrollo de las perforaciones e instalación de pernos tipo Nails en el frente de Brisas de Primavera, la cuales fueron finalizadas con éxito y de acuerdo a las especificaciones técnicas dadas. Por otra parte se dio inicio con la instalación del sistema de bioingeniería brindando cobertura al talud.

Por lo anterior, se adjuntan certificados de calidad de los materiales usados, ensayos de laboratorio de la lechada empleada en el proceso de llenado e inyección de anclajes, entre otros documentos afines al control de calidad presentados el respectivo informe. Ver informe de calidad anexo.

Con respecto al indicador de porcentaje de actividades aceptadas, el informe técnico de obra en su numeral 5.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS, menciona que se presentaron a interventoría un total **de 6 (seis) actividades**, de las cuales no se presentó ninguna objeción, dando como resultado del indicador un cumplimiento del 100%.

5. GESTION DEL RIESGO

La minuta contractual, en su cláusula décima segunda, establece las garantías mínimas exigidas para la adecuada cobertura de los riesgos asociados a la ejecución del contrato. Dichas garantías comprenden el cumplimiento del contrato, el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones al personal vinculado, la responsabilidad civil extracontractual, y la estabilidad de la obra, todas ellas en concordancia con las condiciones estipuladas en el pliego de condiciones y demás documentos contractuales.

Las pólizas de garantía correspondientes fueron presentadas por el contratista una vez suscrito el contrato de obra, y posteriormente revisadas y aprobadas tanto por la interventoría como por la entidad contratante, asegurando el cumplimiento de las coberturas y montos establecidos. Así mismo, dichas pólizas fueron actualizadas conforme al acta de inicio de obra, suscrita el 15 de octubre del presente año, garantizando su vigencia y aplicabilidad durante la ejecución del proyecto.

6. INDICADORES DE GESTION DE RECURSOS

En esta sección se describen los KPI que se utilizarán para hacer un seguimiento de aspectos críticos como la gestión de recursos. Mediante el establecimiento de objetivos claros y mensurables, el proyecto puede supervisar continuamente el rendimiento, identificar áreas de mejora y garantizar la alineación tanto con las expectativas del cliente como con los objetivos de la organización durante todo el ciclo de vida del proyecto.

Así mismo el índice de tiempo productivo de recursos se encuentra en 100%, indicando que las condiciones laborales correspondieron a condiciones ideales, esto igual se refleja en el resultado de los indicadores previamente mencionados correspondientes a costo y avance.

7. CONCLUSIONES

Luego de la evaluación del octavo periodo de ejecución del proyecto, las condiciones ideales de una obra se han presentado ayudando a que el avance sea superior al estimado; este avance físico a la fecha representa una ejecución positiva del presupuesto, en un tiempo acorde del mismo. Por lo que no se hace necesario implementar ninguna medida correctiva al desarrollo del proyecto, todo lo contrario, continuar con el plan existente y seguir su monitoreo con el fin de seguir interpretando los datos emitidos que permitan la toma de decisiones adecuadas para el cumplimiento del mismo dentro de los límites preestablecidos con relación a calidad, costo, tiempo, alcance, entre otros.
