1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Informe Número: 2 _____

Tipo de Convenio

ASOCIACIÓN [ ] INTERADMINISTRATIVO [X]

OTRO [ ] ¿Cuál?: _____

2. ASPECTOS GENERALES DEL CONVENIO Y SU EJECUCIÓN

Convenio Nº: 4151.010.27.1.1075-2025

Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, JURIDICOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS ENTRE LAS PARTES, EN EL MARCO DE SUS COMPETENCIAS, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CAÑASGORDAS DE LA SUBREGIÓN SUR EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA", ORIENTADO A FORTALECER LA MOVILIDAD, LA CONECTIVIDAD Y EL DESARROLLO REGIONAL, EN BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE JAMUNDÍ, SANTIAGO DE CALI Y COMUNIDADES CONEXAS"

Asociado(s):
Distrito Especial de Santiago de Cali
Departamento del Valle del Cauca

VALOR TOTAL APORTES

Asociado	Económico	En especie
Distrito Especial de Santiago de Cali	$70.000.000.000	N/A

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Total aportes del convenio	$70.000.000.000	N/A
Nombre del (los) supervisor (es): SEBASTIÁN TARAPUEZ MARTINEZ		
Organismo: Secretaría de Infraestructura del Distrito Especial de Santiago de Cali	Nº Teléfono:	
3. INFORME JURÍDICO		
Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
16/01/2026	31/12/2026	
Modificación del convenio: N/A		
Suspensión: N/A		
Reanudación: N/A		
Cesión: N/A		
Terminación anticipada: N/A		
4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO		
Adición: N/A		
Prórroga:N/A		

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Asociado:

Concepto	Requisito de cumplimiento	Porcentaje de ejecución	Valor
Económico	Avance financiero del contrato de obra 1.360.17.12-16281- Informe de interventoría	63.71%	$144.548.047.248
Total aportes en el periodo			

Información sobre los aportes de la Administración Central de Santiago de Cali Distrito Especial:

Valor total del convenio	Valor a cancelar	Valor acumulado cancelado	Saldo por cancelar
$70.000.000.000	$20.000.000.000	$20.000.000.000	$30.000.000.000

Certificación de seguridad social y parafiscales:
Fecha de certificación: 10 de julio de 2026. Óscar Armando Trujillo Trujillo, identificado con cédula de ciudadanía No. 94.329.997, en calidad de director del Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional del Departamento del Valle del Cauca – Secretaría de Infraestructura, identificado con NIT 890399029-5, certifica que los aportes correspondientes a seguridad social y parafiscales del periodo junio de 2026 fueron pagados mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes —PILA— No. 93221513, el 7 de julio de 2026, por un valor total de $3.129.477.600, sin que se registren valores por concepto de mora.

Observaciones al Informe contable y financiero: El Convenio Interadministrativo No. 4151.010.27.1.1075-2025 establece en su cláusula décima segunda que todo pago a cargo del Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría de Infraestructura estará sujeto a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales correspondientes, así como a la disponibilidad de recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

—PAC—. En ese sentido, el Plan Anualizado de Caja de la entidad quedó registrado en el Registro Presupuestal de Compromiso No. 4500402795.

5. INFORME TÉCNICO

No.	Obligaciones	Estado de avance de la obligación
1	Remitir informes de seguimiento mensuales por parte de la Interventoría a cargo del contrato de obra pública No. 1.360.17.12- 16281 celebrado entre la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación del Valle del Cauca y CONSORCIO AV CAÑASGORDAS con Nit. 901992721-6, que permitan evidenciar los avances de obra y ejecución financiera.	Actividades realizadas: Teniendo en cuenta que el último Informe de Supervisión No. 1 tuvo fecha de suscripción el 9 de abril de 2026, en dicho documento se registró un valor acumulado ejecutado de $35.766.856.320 correspondiente al anticipo y las actas parciales de obra No. 01, 02 y 03, con un avance físico del 51,10% y un avance financiero del 50%. Para el presente periodo de seguimiento se efectúa el análisis de las actividades y documentos generados entre el 9 de abril de 2026 y el 24 de junio de 2026. De la revisión documental de los soportes de pago adjuntos al informe se evidenció que la ejecución financiera acumulada del contrato derivado se soporta mediante el anticipo y las actas parciales de obra No. 01, 02, 03, 04 y 05. En las copias aportadas se identifica el valor total reconocido en cada soporte; por ello se incorpora el siguiente cuadro resumen con el valor ejecutado y las actividades generales asociadas al avance reportado

Relación de evidencias (si aplica)

Soporte	Fecha	Valor	Actividades Generadas
Anticipo perteneciente Cali	nov-2025	$16.040.847.648	Pago anticipado para el inicio del contrato derivado, movilización, instalación y puesta en marcha de actividades preliminares de obra.
Acta parcial No. 01	05/12/2025	$3.272.740.113	Reconocimiento de los primeros avances

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

				ejecutados y certificados por la interventoría en el periodo inicial.
		Acta parcial No. 02	19/01/2026	$4.384.774.605	Continuidad de actividades constructivas, con mayores cantidades ejecutadas y avance físico soportado en el periodo.
		Acta parcial No. 03	feb-2026	$12.068.493.954	Avance acumulado en frentes de obra, incluyendo cimentación profunda, excavaciones, obras hidráulicas, aproches, urbanismo y pavimentos según soportes revisados.
		Acta parcial No. 04	abr-2026	$11.577.334.163	Avance en obras de pavimento, estructuras, alcantarillado, bordillos e iluminación en los frentes de obra correspondientes a Cali.
		Acta parcial No. 05	may-2026	$8.832.325.376	Avance en estructuras de puente, instalación de vigas metálicas, neoprenos, obras hidráulicas,

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

		box culvert e iluminación en los frentes de obra de Cali. Informe de Seguimiento de Supervisión del Departamento del Valle del Cauca - Solicitud Desembolso 002 (5 de junio de 2026); actas parciales 01, 02, 03, 04 y 05; distribución financiera por jurisdicción; Acta de Visita No. 002 (2 de junio de 2026) y Acta de Visita No. 003 (18 de junio de 2026) Total reconocido en los soportes evidenciados pertenecientes a Cali: $56.176.515.858. Este valor corresponde al anticipo y a las actas parciales No. 01, 02, 03, 04 y 05 del contrato derivado, según la distribución por jurisdicción reportada por la Gobernación del Valle del Cauca (participación Cali: 45% por longitud de intervención).
2	Convocar al Distrito Especial de Cali - Secretaría de Infraestructura, para realizar seguimiento al recibo de las obras que se ubiquen en su jurisdicción.	Actividades realizadas: En el marco de las actividades de seguimiento al Convenio Interadministrativo No. 4151.010.27.1.1075-2025, durante el periodo comprendido entre el 9 de abril de 2026 y el 24 de junio de 2026 se realizaron dos (2) visitas técnicas de acompañamiento con el propósito de evidenciar el avance de las obras en los frentes del proyecto ubicados en jurisdicción del Distrito Especial de Santiago de Cali. Acta de Visita No. 002 – 2 de junio de 2026: El día 2 de junio de 2026 se efectuó visita técnica de acompañamiento con la participación de la Secretaria de Infraestructura Luz Adriana Vásquez Trujillo, el Subsecretario de Infraestructura Sebastián Tarapuez Martínez y la contratista de apoyo a la supervisión, así como representantes de la Gobernación del Valle del Cauca. En el Frente I (K0+000 a K0+350) se verificó la finalización de la construcción de los pilotes del estribo 2 y la ejecución de la viga cabezal, evidenciando avance significativo en uno de los apoyos principales del puente; se constató la presencia de la piloteadora para el estribo 1 y avances en los aproches. En el Frente II (K0+350 a K2+400) se observaron avances en estructura de pavimento (mejoramiento, subbase, base y carpeta asfáltica en sectores), obras hidráulicas, canal en


Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

		concreto, ciclorruta, andenes y bordillos. En el Frente III, hasta el límite de Cali (K2+750), se evidenciaron actividades de mejoramiento, obras hidráulicas, box culvert (paso de fauna) y avances en aproches hacia el puente sobre el río Jamundí. Los porcentajes de avance por componente reportados por el planeador para la fecha de la visita fueron: Frente I (excavación 59,08%, roca muerta 77,82%, subbase 481,33%, asfalto 7,36%); Frente II (excavación 123,66%, subbase 94,41%, base 62,56%, asfalto 39,07%, espacio público 30%); Frente III sector Cali (excavación 69,37%, pedraplén 58,33%, alcantarillas 60%). Acta de Visita No. 003 – 18 de junio de 2026: El día 18 de junio de 2026, entre las 2:30 p.m. y las 5:00 p.m., se realizó visita técnica de acompañamiento con la participación de la contratista de apoyo a la supervisión de la Secretaría de Infraestructura de Santiago de Cali. En el Frente I se observó el proceso de finalización del muro de aproximación del estribo 2, el alistamiento de las vigas metálicas y el inicio de la instalación de bordillos en la zona de espacio público. Se identificó una situación técnica particular en el estribo 1: un pilote alcanzó únicamente 7 metros de profundidad frente a los 13 metros de diseño; los especialistas se encuentran evaluando la solución alternativa, la cual deberá ser presentada formalmente con sus respectivos soportes técnicos. En el Frente II se observaron tramos con base estabilizada con cemento, imprimación asfáltica, inicio de instalación de postes de iluminación, bordillos, y una obra nueva tipo alcantarilla ejecutada por flujo de agua activo no previsto originalmente; así mismo se verificó la ejecución de un box culvert de cinco (5) compartimientos. En el Frente III, hasta K2+750, se evidenció el aproche 1 en etapa avanzada de finalización, alistamiento de vigas metálicas del puente sobre el río Jamundí, inicio de instalación de neoprenos, y ejecución de bordillos en el sector. De acuerdo con la información reportada por la Gobernación del Valle del Cauca en el Informe de


Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Seguimiento - Solicitud Desembolso 002 (corte 30/05/2026), el avance físico del contrato de obra reporta los siguientes porcentajes por frente: Frente I 42,43%; Frente II 78,66%; Frente III (general) 60,23%. Para efectos del seguimiento de Cali, el avance del Frente III se discrimina aplicando el 50% de participación de la jurisdicción del Distrito, resultando en un avance de 30,12% para el componente del Frente III correspondiente a Cali. El avance físico general del contrato se reporta en 57,95%, valor que incluye todas las jurisdicciones del proyecto.

Relación de evidencias (si aplica)




Frente 1 – Muro de aproximación puente Pance, estribo 2 (Acta 002)



Excavación de Pilotes Puente Pance



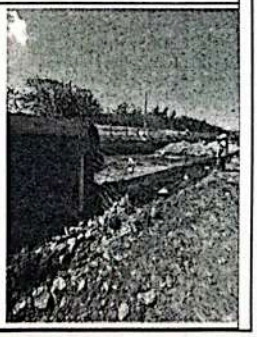


Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

		Frente 2 – Zona peatonal y ciclorruta (Acta 002)	Frente 2 – Canal en concreto, manejo aguas Quebrada Pancesito (Acta 002)
			
		Frente 3 – Preparación vigas metálicas puente río Jamundí (Acta 002)	Frente 3 – Box culvert paso de fauna (Acta 002)
			
		Frente 1 – Alistamiento vigas metálicas puente Pance (Acta 003)	Frente 2 – Obra nueva alcantarilla por flujo de agua activo (Acta 003)


Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.



Frente 2 – Imprimación asfáltica e instalación de bordillos (Acta 003)

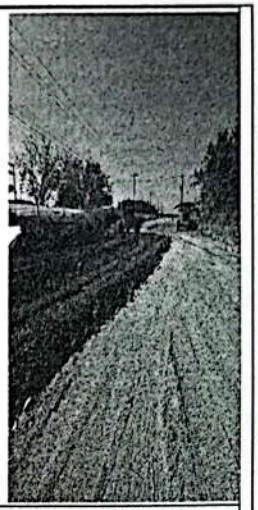

Frente 2 – Box culvert de cinco compartimientos (Acta 003)

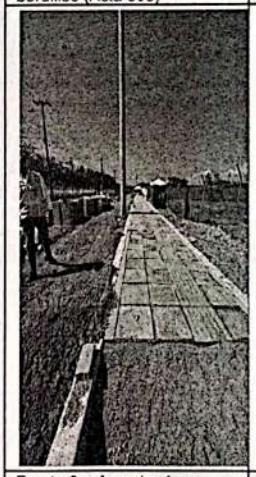

Frente 3 – Aproche 1 en etapa avanzada de finalización (Acta 003)



Construcción de Obra Hidráulica tipo Box

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

		El avance de obra de los frentes que están dentro del Distrito de Cali, con corte al 27/06/26, es el siguiente: el Frente I (Puente Pance, K0+000–K0+350) registra un avance de 49,49%, y el Frente II (K0+350–K2+400) presenta un avance de 80,75%. El Frente III (Puente Río Jamundí), con un avance de 35,42%, corresponde ya a jurisdicción de Jamundí y no al Distrito de Cali.

Observaciones al informe técnico:

La información del presente informe corresponde a la verificación documental y técnica efectuada con base en el Informe de Seguimiento de Supervisión - Solicitud Desembolso 002 remitido por la Gobernación del Valle del Cauca con fecha del 5 de junio de 2026, las visitas técnicas de acompañamiento realizadas el 2 y el 18 de junio de 2026 (Actas 002 y 003), y los soportes documentales allegados para revisión dentro del marco del Convenio Interadministrativo No. 4151.010.27.1.1075-2025.

El seguimiento se circunscribe a las actividades y avances correspondientes a la jurisdicción de Santiago de Cali, comprendiendo el Frente I completo, el Frente II completo y el Frente III hasta el límite de la jurisdicción de Cali (K2+750). Se deja constancia de las siguientes situaciones que requieren seguimiento: (i) situación técnica en el estribo 1 del puente Pance, donde un pilote alcanzó 7 m de profundidad frente a 13 m de diseño, pendiente de solución formal documentada; (ii) ejecución de obra nueva tipo alcantarilla en el Frente II por flujo de agua activo, actividad no prevista originalmente que deberá tramitarse formalmente si genera reconocimiento económico adicional.

Dicha verificación permitió constatar, de manera general, el estado de avance del convenio, así como la correspondencia entre las actividades observadas en campo durante las visitas técnicas de junio de 2026, el seguimiento reportado por la Gobernación y los valores reconocidos en los documentos de soporte asociados al anticipo y a las actas parciales de pago No. 01 a 05.

Se registra que a la fecha del presente informe el Desembolso 01 por valor de $20.000.000.000 fue girado por el Distrito de Cali, y el Desembolso 02 por valor de $20.000.000.000 se encuentra solicitado y pendiente de giro, para un saldo pendiente de cancelar de $30.000.000.000.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

6. RECOMENDACIONES AL ASOCIADO

1. Continuar remitiendo de manera mensual los informes de interventoría y los soportes técnicos, físicos y financieros del contrato derivado.
2. Mantener la trazabilidad entre el avance físico, el avance financiero y la discriminación por jurisdicción para futuros desembolsos.

7. FIRMA RESPONSABLES

Firmas responsables:

SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ
Nombre y firma del Supervisor

TATIANA ROJAS ALZA
Nombre y firma del Apoyo a la Supervisión

Fecha de suscripción del informe de supervisión: 17-07-2026

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
