
Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		**PROYECTO**	**103 días**	**lun 27/04/26**	**lun 24/08/26**	
2		**PRELIMINARES**	**8 días**	**lun 27/04/26**	**mar 5/05/26**	
3		Localización y replanteo	8 días	lun 27/04/26	mar 5/05/26	
4		**DEMOLICIÓN Y MOVIMIENTOS DE TIERRA**	**50 días**	**lun 27/04/26**	**mar 23/06/2**	
5		Demolición de concreto	45 días	lun 27/04/26	mié 17/06/26	
6		Excavación en material común, bajo cualquier grado de humedad	45 días	lun 27/04/26	mié 17/06/26	
7		Conformación y nivelación de terreno, incluye mejoramiento del suelo con afirmado compactado.	45 días	lun 27/04/26	mié 17/06/26	
8		Conformación y nivelación de terreno, con material de sitio compactado.	35 días	lun 27/04/26	vie 5/06/26	
9		Cargue, descargue y Disposición en botadero, de material proveniente de demoliciones y excavaciones	50 días	lun 27/04/26	mar 23/06/26	
10		**ACERO**	**60 días**	**lun 27/04/26**	**sáb 4/07/26**	
11		Suministro, transporte e instalación de acero de refuerzo	60 días	lun 27/04/26	sáb 4/07/26	
12		Malla electrosoldada ojo 0,15 x 0,15 m 6,0 m 2,35 m de 5 mm (incluye alambre negro, colocación y traslapo).	60 días	lun 27/04/26	sáb 4/07/26	
13		**CONCRETO**	**103 días**	**lun 27/04/26**	**lun 24/08/26**	
14		Pavimento en concreto 20,7 Mpa (3000 psi) e = 0.18 - 0.20 m, incluye refuerzo, corte con disco y todos los elementos necesarios para su correcta construcción	103 días	lun 27/04/26	lun 24/08/26	
15		Cuneta - Bordillo en concreto reforzado 20,7 Mpa, incluye los elementos necesarios para su construcción, a =0,70 m. el acero de refuerzo o malla electrosoldada se pagará en su respectivo ítem	70 días	jue 4/06/26	lun 24/08/26	
16		Bordillo de Concreto Vaciado In Situ; incluye la preparacion de la superficie de apoyo	103 días	lun 27/04/26	lun 24/08/26	
17		Cuneta en concreto, según medidas existentes a=0.50m	103 días	lun 27/04/26	lun 24/08/26	
18		Anden de concreto reforzado de 20.7 Mpa (3000 psi). el acero de refuerzo o malla electrosoldada se pagará en su respectivo ítem	70 días	lun 27/04/26	jue 16/07/26	
19		**SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE AGUAS**	**35 días**	**lun 27/04/26**	**vie 5/06/26**	
20		Construcción de SUMIDERO de aguas lluvias TIPO B (1.10m x 0.80m medidas externas y prof=0.90m e=0.20m), en concreto de 21 Mpa. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, reja metálica, formaleta, vibrado y todo lo necesario para su correcta	35 días	lun 27/04/26	vie 5/06/26	
21		Tubería PVC de alcantarillado de pared estructural d = 10", exterior corrugado	25 días	lun 27/04/26	lun 25/05/26	
22		**ENTREGA**	103 días	lun 27/04/26	lun 24/08/26	

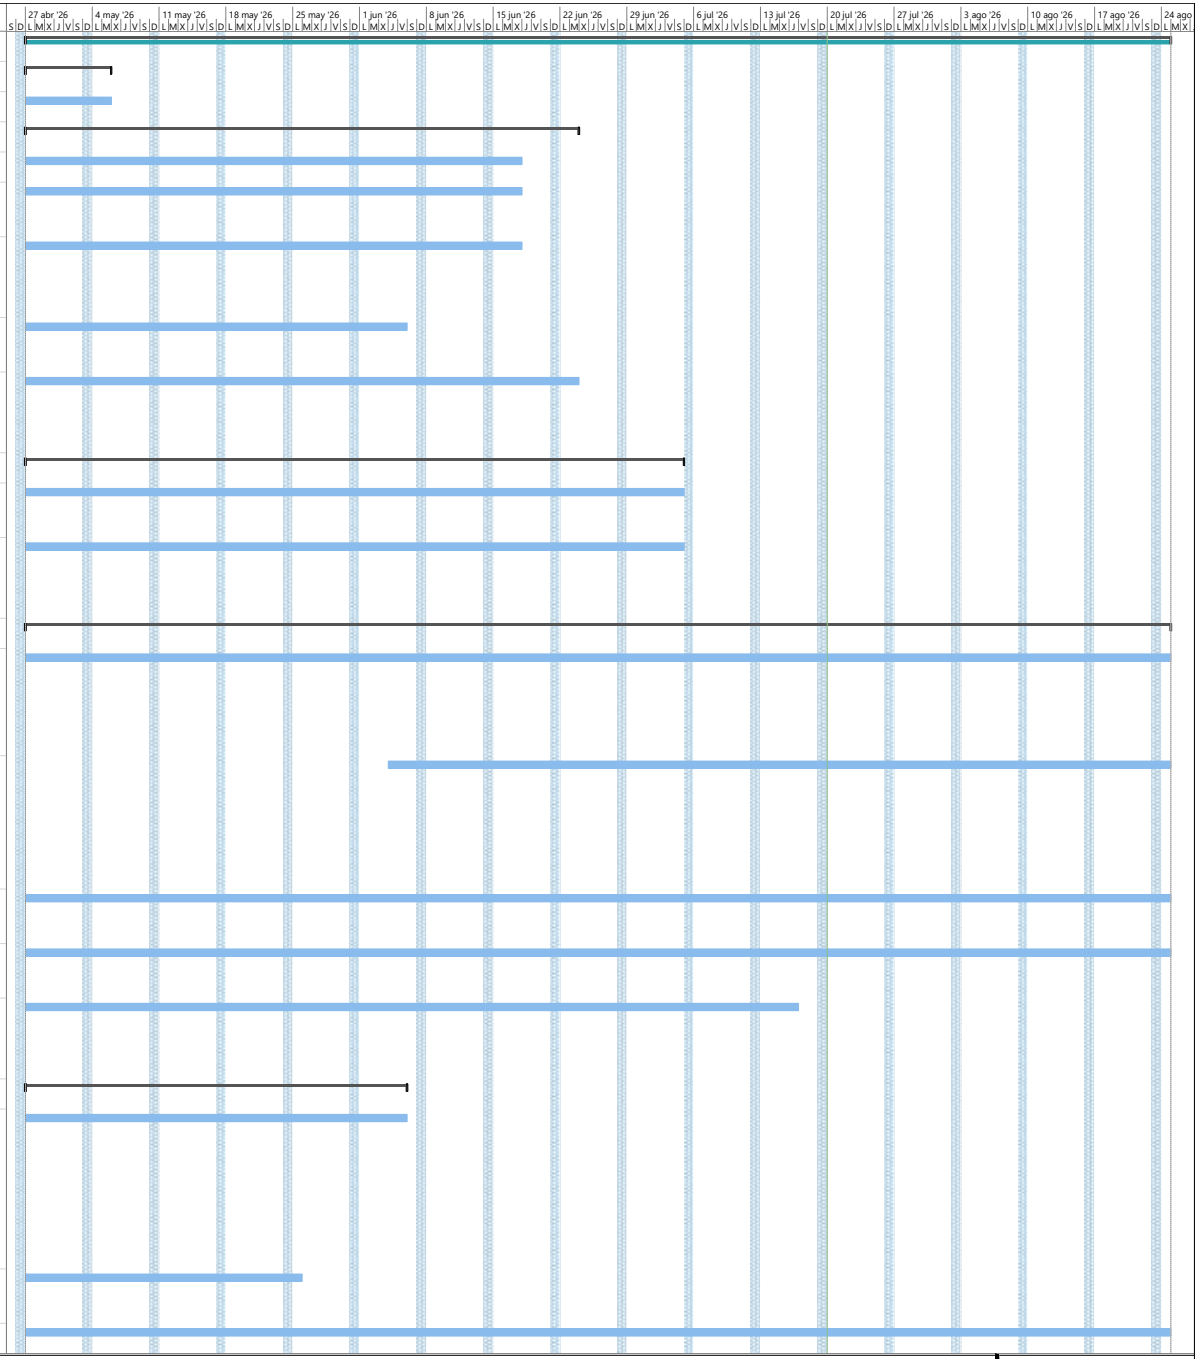

Proyecto: PROGRAMACION DE
Fecha: lun 20/07/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual
