INFORME DE INTERVENTORIA FINAL

15 de mayo de 2026

CONTRATO DE OBRA N°CO-2025-10-003

"AMPLIACIÓN POR CONTINGENCIA DE PLATAFORMA DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS ORDINARIOS EN EL PARQUE DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE FRONTINO ANTIOQUIA, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. CI-006-2025"



FRONTINO, ANTIOQUIA

LAURA URIBE ARTEAGA
INGENIERA CIVIL
CEL. 3116026230
uribearteagalaura@gmail.com

Tabla de contenido

1. INFORMACION CONTRACTUAL 3
1.1. CONTRATO DE OBRA 3
1.2. CONTRATO DE INTERVENTORIA 3
2. INFORMACION GENERAL 4
2.1. UBICACIÓN GENERAL 4
3. SEGUIMIENTO TECNICO DEL PROYECTO 5
3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS 5
3.2. ESTADO DEL TIEMPO 10
3.3. PERSONAL EN OBRA 11
4. DESARROLLO DE LA OBRA 11
4.1. AVANCE FISICO DE LA OBRA 11
4.2. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA 16
4.3. TIEMPO DE EJECUCION DE LA OBRA 17
4.3.1 Contrato inicial ..... **¡Error! Marcador no definido.**
4.3.2 Otro si No.1 ..... **¡Error! Marcador no definido.**
4.4. TIEMPO DE EJECUCION DE LA INTERVENTORIA 17
4.4.1 Contrato inicial ..... **¡Error! Marcador no definido.**
4.4.2 Otro si No.1 ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5. PÓLIZAS 17
5.1 Pólizas iniciales ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5.2 Pólizas prórroga ..... **¡Error! Marcador no definido.**

1. INFORMACION CONTRACTUAL

1.1. CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No.	CO-2025-10-003
CONTRATISTA	ASINCOL S.A.S E.S.P.
NIT	830512695-7
SUPERVISOR	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FRONTINO
PLAZO INICIAL	Dos (02) meses 31 de Octubre a 31 de Diciembre
VALOR DEL CONTRATO	TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS (362.520.649 COP)
Otro Si No. 1	OTROSÍ 001 DE 2025 AL CONTRATO DE OBRA CO-2025-10-003
Fecha	29 de diciembre 2026
Prórroga 001-2025	1 Mes
Fecha Terminación Prórroga 001-2025	30 de enero de 2026
Fecha Otrosí 002-2026	30 de enero de 2026
Prórroga 002-2026	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
Fecha Terminación Prórroga 002-2026	16 de marzo de 2026
Prórroga 003-2026	TREINTA (30) DÍAS, a partir del 17 de marzo de 2026
Fecha Terminación Prórroga 003-2026	15 de abril de 2026
Valor Adicional	TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL SETECIENTOS VEINTE MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS ($36.620.741 COP)
Valor Total del Contrato	TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS ($399.141.390 COP).

1.2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA No.	CC-2025-10-005
CONTRATISTA	LAURA URIBE ARTEAGA
NIT	1128480571
SUPERVISOR	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FRONTINO
VALOR DEL CONTRATO	VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS ($22.857.520 COP)
FECHA DE INICIO	31 de octubre de 2025
FECHA DE TERMINACION	30 de diciembre de 2026
OTRO SÍ No. 1	30 de enero de 2026
OTRO SÍ No. 2	16 de marzo de 2026
OTRO SI No. 3	15 de abril de 2026

Adición No. 001-2026	ONCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS ($11.428.760 COP), soportado en el CDP00051 Y CRP0075 del 12 de marzo de 2026
Valor Total	TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA (34.286.280 COP)

2. INFORMACION GENERAL

2.1. UBICACIÓN GENERAL

Frontino es un municipio de Colombia, localizado en la subregión Occidente del departamento de Antioquia. Limita con los municipios de Uramita, Dabeiba, Murindó, Vigía del Fuerte, Urrao, Abriaquí y Cañasgordas. Su cabecera municipal está a 172 kilómetros de Medellín.



Ilustración 1 Ubicación del proyecto

3. SEGUIMIENTO TECNICO DEL PROYECTO

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS

En el periodo del 25 de marzo de 2026 al 15 de abril de 2026 del presente año, se desarrollaron actividades que pertenecen a los capítulos de movimientos de tierra para explanación de plataforma, preparación de la plataforma, sistema de recolección y transporte de lixiviados y sistema de monitoreo y control. A continuación de muestran cada uno de los ítems ejecutados:

- Se ejecutó la localización, trazado y replanteo del proyecto, en coordinación con la comisión de topografía, donde se definieron y verificaron en campo ejes, cotas, alineamientos y límites de las áreas definitivas de intervención, conforme a los criterios técnicos y a las referencias establecidas para diseñar el plano récord.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT CONTRACTUAL	CANT EJECUTADA
1.3	Localización, trazado y replanteo	día	2,00	2,00





Localización, trazado y replanteo para plano record

- Se culminaron las actividades de cargue, retiro y movimiento de material sobrante dentro del área de operación del actual relleno sanitario (zona inferior del Relleno Sanitario) para que la celda de contingencia cumpla su función y permita mayor vida útil.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT CONTRACTUAL	CANT EJECUTADA
2.5	Cargue, retiro y movimiento de material sobrante dentro del área de operación (zona inferior del Relleno Sanitario)	m3	1513,00	489.49





Cargue, retiro y movimiento de material sobrante dentro del área de operación

- Se culminaron las actividades de suministro, transporte e instalación de geomembrana de polietileno de alta densidad (HDPE) de 40 mils de espesor, incluyendo la ejecución de los elementos complementarios necesarios para su adecuada fijación y anclaje, tales como botas, zapatas y llaves de anclaje, de conformidad con las especificaciones técnicas y los requerimientos del proyecto.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT CONTRACTUAL	CANT EJECUTADA
3.1	Suministro, transporte e Instalación de geomembrana HPDE de 40 Mils, incluye (botas, zapatos y llaves)	m2	1426,31	1018,61





Instalación de geomembrana HPDE

- Se culminó el suministro del geotextil no tejido tipo NT 1600, destinado a la protección de la geomembrana, garantizando su adecuada disposición conforme a las especificaciones técnicas del proyecto y a los requerimientos de protección del sistema de impermeabilización.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT CONTRACTUAL	CANT EJECUTADA
3.2	Geotextil NT 1600 no tejido para protección de geomembrana	m2	1015,35	620,15

		
Instalación de Geotextil NT 1600		

- Suministro de arena para soporte de geomembrana, con los siguientes requisitos: Límite líquido menor del 30%. Índice de plasticidad menor del 4%. Porcentaje de material que pasa por el tamiz 200 menor de 35%, o limo de buenas condiciones sin material granular, puede ser (descapotado, excavado y transportado dentro del mismo área construcción), plano 5/6.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT CONTRACTUAL	CANT EJEECUTADA
3.3	Arena para soporte de geomembrana, con los siguientes requisitos: Límite líquido menor del 30%. Índice de plasticidad menor del 4%. Porcentaje de material que pasa por el tamiz 200 menor de 35%, o limo de buenas condiciones sin material granular, puede ser (descapotado, excavado y transportado dentro del mismo área construcción), plano 5/6	m3	113,75	113,75

		
Arena para soporte de geomembrana		

- Se efectuó el movimiento de residuos sólidos de la plataforma actual de operación, en un volumen de 1793,73 m3, para garantizar el funcionamiento de la celda de contingencia, mientras se colocaba en operación.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT CONTRACTUAL	CANT EJECUTADA
3.4	Movimiento de Residuos Sólidos (basura), para adecuar plataforma	m3	1978,73	1738.74





Movimiento de Residuos Sólidos (basura), para adecuar plataforma

Adecuación de bermas, llenos y protección de taludes con suministro, transporte e instalación de Manto "TRM 15" o Similar. Una vez recibido a satisfacción la colocación del geotextil y la geomembrana en la celda de contingencia, se efectuó el lleno de la celda con los residuos sólidos existentes en el área de operación.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT CONTRACTUAL	CANT EJECUTADA
3.7	Adecuación de Bermas, llenos y protección de taludes con Suministro, transporte e instalación de Manto "TRM 15" o Similar	m2	300	300,00

		
Adecuación de Bermas, llenos y protección de taludes con Suministro, transporte e instalación de Manto "TRM 15" o Similar		

- Suministro y construcción de chimeneas para el desfogue de gases con gaviones 1,0 m x 1,0 m x 1,0 m, piedra de 3 a 5", incluye una tubería perforada en su interior de PVC-S 100 mm (4").

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT CONTRACTUAL	CANT ACTUALIZADA
4.2	Suministro y construcción de chimeneas para el desfogue de gases con gaviones 1,0 m x 1,0 m x 1,0 m, piedra de 3 a 5", incluye una tubería perforada en su interior de PVC-S 100 mm (4")	m	3,00	3,00

		
Construcción de chimeneas para el desfogue de gases con gaviones		

3.2. ESTADO DEL TIEMPO

En el municipio de Frontino, en los meses de terminación de la obra, aunque se presentaron periodos de lluvia, también se tuvieron días soleados que permitieron el avance y culminación de las actividades constructivas, movimientos de tierra y traslado de los residuos de la plataforma de operación a la celda de contingencia.

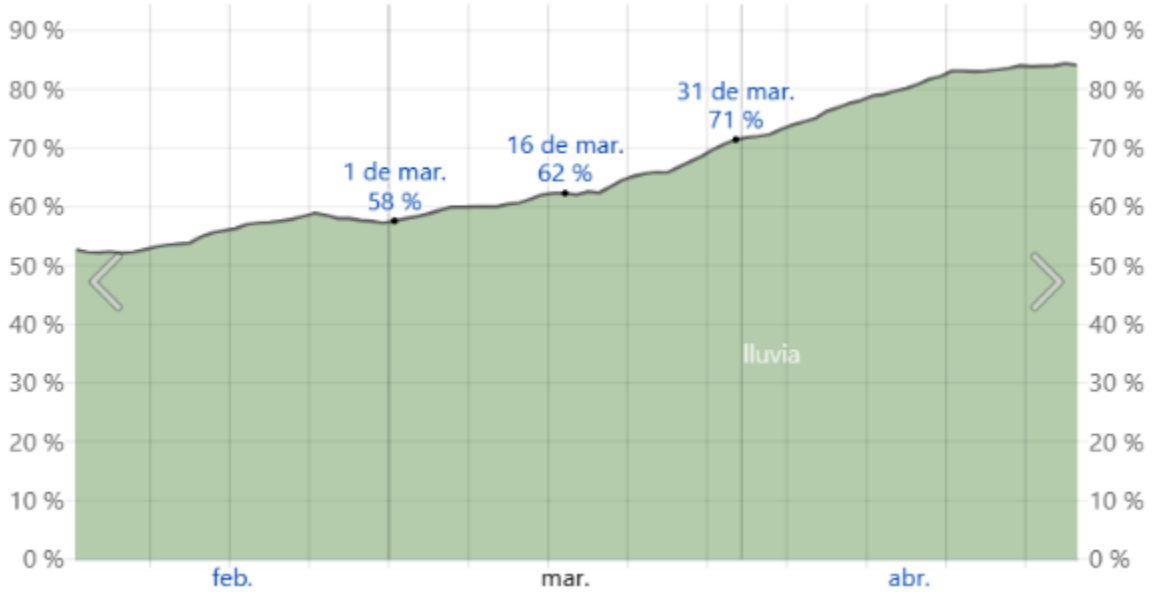


Ilustración 2 Precipitaciones promedio

3.3. PERSONAL EN OBRA

PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRE	**CARGO**
CARLOS ANDRES MEJIA GIRALDO	DIRECTOR DE OBRA
JORGE VALENCIA OCHOA	RESIDENTE DE OBRA
GUIILERMO LEÓN GUTIÉRREZ ORTÍZ	AUXILIAR DE RESIDENCIA

PERSONAL DE INTERVENTORÍA

NOMBRE	**CARGO**
LINA MARÍA HERNÁNDEZ RUIZ	DIRECTOR DE OBRA
LAURA URIBE ARTEAGA	RESIDENTE DE OBRA

4. DESARROLLO DE LA OBRA

4.1. AVANCE FISICO DE LA OBRA


En la siguiente tabla se presenta la descripción de cada una de las obras y actividades ejecutadas en todo el proyecto, con sus correspondientes cantidades acumuladas.

ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANT**
1	**Obras preliminares**		
1.1	Rocería y desmonte (incluye limpieza de áreas intervenidas)	m2	688,84
1.2	Limpieza y descapote a máquina	m3	263,15
1.3	Localización, trazado y replanteo	día	2,00
2	**Movimientos de tierra para explanación de plataforma**		

2.1	Excavación mecánica en material común seco o húmedo a cualquier profundidad, incluye retiro y botada de material sobrante a cualquier distancia	m3	1869,22
2.2	Excavación manual en material común seco o húmedo a cualquier profundidad, incluye retiro y botada de material sobrante a cualquier distancia (llaves Geomembrana) y canales perimetrales	m3	119,17
2.3	Lleno mecánico con material selecto de la excavación	m3	82,44
2.4	Lleno con Big Bag, hasta 1,5 m, muro bolsillo en zona de contrapeso No. 1	Un	89,00
2.5	Cargue, retiro y movimiento de material sobrante dentro del área de operación (zona inferior del Relleno Sanitario)	m3	1536.52
2.6	Suministro, transporte y construcción de Cajas en Concreto de 21 Mpa, de dimensiones 1,20 m x 1,20 m interno, muros de 0,20 m y pared reforzada con acero No. 4 cada / 25 cm, en ambos sentidos	m	0,00
3	**Preparación de la plataforma**		
3.1	Suministro, transporte e Instalación de geomembrana HPDE de 40 Mils, incluye (botas, zapatos y llaves)	m2	1426,31
3.2	Geotextil NT 1600 no tejido para protección de geomembrana	m2	1015,35
3.3	Arena para soporte de geomembrana, con los siguientes requisitos: Límite líquido menor del 30%. Índice de plasticidad menor del 4%. Porcentaje de material que pasa por el tamiz 200 menor de 35%, o limo de buenas condiciones sin material granular, puede ser (descapotado, excavado y transportado dentro del mismo área construcción), plano 5/6	m3	113,75
3.4	Movimiento de Residuos Sólidos (basura), para adecuar plataforma	m3	1923,74
3.5	Suministro, transporte e Instalación de Tubería de 250 mm (10"), PVC-S, para transportar aguas lluvias de cuneta, sobre trinchera escalonada	m	48,00

3.6	Suministro, transporte e instalación de Concreto 17,5 Mpa, para empotramiento de tubería de Aguas Lluvias	m3	9,52
3.7	Adecuación de Bermas, llenos y protección de taludes con Suministro, transporte e instalación de Manto "TRM 15" o Similar	m2	300,00
4	**Sistema de recolección y/o Tratamiento de Lixiviados**		
4.1	Suministro y construcción de filtros de lixiviados 1,2 x 0,6 m con piedra canto rodado de 3" a 6" y tubería de PVC-S 4" perforada y geotextil NT 1600 no tejido	m	29,50
4.2	Suministro y construcción de chimeneas para el desfogue de gases con gaviones 1,0 m x 1,0 m x 1,0 m, piedra de 3 a 5", incluye una tubería perforada en su interior de PVC-S 100 mm (4")	m	3,00
4.3	Suministro, transporte e Instalación de filtros de lixiviados centrales y de talud por metro lineal. Incluye suministro, transporte y colocación de tubería corrugada de Ø=6", las respectivas conexiones y accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación funcionamiento. Suministro, transporte e instalación de material granular de 12 a 25 mm para filtro. Incluye transporte interno y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	62,00
4.4	Construcción de cuneta "canal" en geomembrana. Ancho 0.3 m Según diseños.	m	35,00
4.5	Instalación de energía para laguna de lixiviados, incluye red eléctrica y dos postes intermedios	m	187,50
5	**Sistema de monitoreo y control**		
5.1	Instalación de Mojones de 0,30 m x 0,30 m y H=1,0, incluye: excavación, acero de Refuerzo y Pintura	Un	6,00
OE	**OBRAS EXTRAS**		

OE 1	Suministro Transporte e Instalación de afirmado o balastro para vía Interna Relleno Sanitario	m3	94,30
OE 2	Suministro, transporte e instalación de tapas de concreto de 0,40 m x 0,80 m x 0,15 m (incluye acero de refuerzo)	Un	35,00
OE 3	Suministro, transporte e instalación de tapas de concreto de 0,80 m x 0,90 m x 0,15 m (incluye acero de refuerzo)	Un	6,00
OE 4	Suministro, transporte e instalación de Rejilla para cribado de aguas lluvias de 0,60 m x 0,60m, ángulos de soporte y varilla de 1/2" lisa	Un	1,00
OE 5	Suministro, transporte e instalación de Acero de refuerzo 3/8" y 1/2",para empotramiento de tubería	kg	284,92
OE 6	Suministro, transporte y construcción de Cajas en Concreto de 21 Mpa, de dimensiones internas 0,60 m x 0,60 m interno, muros de 0,15 m + Losa de Piso y Tapas de concreto	m	2,40
OE 7	Suministro, transporte e Instalación de Tubería PVC-S 50 mm (2") unión soldada, incluye uniones para su correcta operación (Descole dren de Lixiviados)	m	25,00
OE 8	Suministro, transporte e Instalación de Accesorios PVC-S 50 mm (2"), (Para descole dren de lixiviados)	Un	9,00
OE 9	Tala de Árbol para vía de acceso plataforma 2	Un	1,00
OE 10	Poda de Árbol a 12 m de altura, para protección de red de energía	Un	1,00
OE 11	Champeado de Big Bag con Angeo (malla de gallinero) y mortero 1:4	m2	79,37
OE 12	Suministro, transporte e Instalación de Tubería PVC-P 150 mm (6") unión soldada, para descarga de cuneta en geomembrana (canal perimetral)	m	42,00

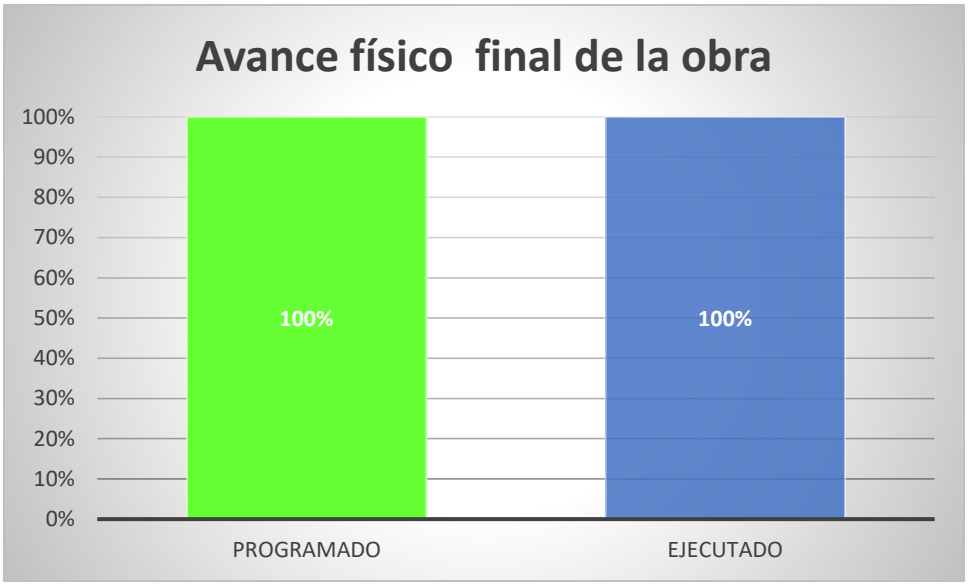

Se verificó la ejecución integral de las actividades contempladas dentro del alcance contractual, evidenciándose el cumplimiento del objeto del contrato conforme a las especificaciones técnicas, cantidades y condiciones establecidas.

La interventoría realizó la correspondiente verificación en campo, constatando que las actividades ejecutadas cumplen con los requerimientos técnicos y funcionales definidos contractualmente, así como con las condiciones de calidad exigidas para la correcta ejecución del proyecto.

Gráfica 1. Avance físico de la obra

4.2. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

A la fecha, se realizó un anticipo del 45% del valor del contrato de la obra, del cual el contratista presentó el plan de inversión del anticipo y fue aprobado por la interventoría.

A continuación se hace un resumen financiero final del contrato:

ACTA	VALOR	PORCENTAJE
ANTICIPO	$163.134.292	45%
EJECUTADO ACTA N°1	$ 205.996.012	56,82%
IVA ACTA N°1	$ 1.164.425	
TOTAL PAGADO ACTA N°1	$ 207.160.469	
Amortización de Anticipo	$73.410.431	45%

A la fecha, el contratista presenta el Acta N°2 y Final por un valor ejecutado de $ 192.968.145.

Se realizó la corrección del balance financiero del contrato, teniendo en cuenta el ajuste efectuado sobre el Acta Parcial No. 1, correspondiente a la devolución del valor reconocido por concepto de IVA.

Lo anterior, debido a que, una vez revisadas las condiciones contractuales y la estructura económica del contrato de obra, se evidenció que dicho impuesto no correspondía ser reconocido dentro de los pagos efectuados al contratista, conforme a lo establecido contractualmente.

En consecuencia, se efectuó el respectivo ajuste financiero y contable, reflejando la devolución del valor pagado por este concepto y actualizando el balance financiero del contrato de acuerdo con los valores efectivamente reconocidos.

RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA	
VALOR COSTOS DIRECTOS	$ 269.629.579
A.U 34,45%	$ 92.891.070
VALOR TOTAL	$ 362.520.649
ADICION No. 1 OTROSI No. 3	$ 36.620.741
VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 399.141.390**
Total, Acta N°1	$ 207.160.436,07
Total, Acta N°2	$ 191.980.953,93
IVA Acta N°1	$ (1.164.425)
IVA Acta N°2	$ (911.935,11)

Saldo Contrato	$ 0
Anticipo	**$163.134.292**
Amortización Acta No. 1	$73.410.431,40
Amortización Acta No. 2	$89.723.860,60
Saldo Amortización del Anticipo	$ 0

4.3. TIEMPO DE EJECUCION DE LA OBRA

Concepto	**Periodo / Adición**	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**	**Tiempo Acumulado**
Contrato inicial	Plazo contractual inicial	31/10/2025	31/12/2025	2 meses
Otrosí No. 1	Adición de 1 mes	01/01/2026	31/01/2026	3 meses
Otrosí No. 2	Adición de 45 días	01/02/2026	17/03/2026	4 meses y 15 días
Otrosí No. 3	Adición de 30 días	18/03/2026	16/04/2026	5 meses y 15 días

4.4. TIEMPO DE EJECUCION DE LA INTERVENTORIA

Concepto	**Periodo / Adición**	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**	**Tiempo Acumulado**
Contrato inicial	Plazo contractual inicial	31/10/2025	31/12/2025	2 meses
Otrosí No. 1	Adición de 1 mes	01/01/2026	31/01/2026	3 meses
Otrosí No. 2	Adición de 45 días	01/02/2026	17/03/2026	4 meses y 15 días
Otrosí No. 3	Adición de 30 días	18/03/2026	16/04/2026	5 meses y 15 días

5. PÓLIZAS

POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA CO-2025-10-003					
No. PÓLIZA	**ANEXO**	**GARANTÍA**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**VR. CUBIERTO**
65-40-101084632	1	Predios, labores y operaciones	30/10/2025	31/12/2025	$284.700.000
65-40-101244163	2	Cumplimiento del contrato	30/10/2025	30/06/2026	$72.504.129,80
65-40-101244163	2	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	30/10/2025	30/06/2026	$163.134.292.05
65-40-101244163	2	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	30/10/2025	31/12/2028	$54.378.097,35
65-40-101244163	2	Estabilidad y calidad de la obra	5 AÑOS		$72.504.129,80

Con el Otro Si No. 1, se amplía la vigencia de la póliza.

POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA CO-2025-10-003					
No. PÓLIZA	**ANEXO**	**GARANTÍA**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**VR. CUBIERTO**
65-40-101084632	1	Predios, labores y operaciones	30/10/2025	31/01/2026	$284.700.000
65-40-101244163	4	Cumplimiento del contrato	30/10/2025	30/07/2026	$72.504.129,80
65-40-101244163	4	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	30/10/2025	30/07/2026	$163.134.292.05
65-40-101244163	4	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	30/10/2025	31/01/2029	$54.378.097,35
65-40-101244163	4	Estabilidad y calidad de la obra	5 AÑOS		$72.504.129,80

Con el Otro Si No. 2, se amplía la vigencia de la póliza.

POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA CO-2025-10-003					
No. PÓLIZA	**ANEXO**	**GARANTÍA**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**VR. CUBIERTO**
65-40-101084632	3	Predios, labores y operaciones	30/10/2025	16/03/2026	$350.181.000,00
65-40-101244163	6	Cumplimiento del contrato	30/10/2025	16/09/2026	$72.504.129,80
65-40-101244163	6	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	30/10/2025	16/09/2026	$163.134.292.05
65-40-101244163	6	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	30/10/2025	16/03/2029	$54.378.097,35
65-40-101244163	6	Estabilidad y calidad de la obra	5 AÑOS		$72.504.129,80

Con el Otro Si No. 3, se amplía la vigencia de la póliza.

POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA CO-2025-10-003					
No. PÓLIZA	**ANEXO**	**GARANTÍA**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**VR. CUBIERTO**
65-40-101084832	4	Predios, labores y operaciones	30/10/2025	16/04/2029	$350.181.000,00
65-40-101244163	8	Cumplimiento del contrato	30/10/2025	16/10/2026	$79.828.278,00
65-40-101244163	8	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	30/10/2025	16/10/2026	$163.134.292.05
65-40-101244163	8	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	30/10/2025	16/04/2029	$59.871.208,50
65-40-101244163	8	Estabilidad y calidad de la obra	5 AÑOS		$79.828.278,00

ACTA DE RECIBO 001-2026 DE OBRA:

El acta de recibo de la obra, finalizó el día diecisiete (17) del mes de abril de 2026, a las 5:30 p.m., donde finiquitamos el contrato de obra CO-2025-10-003 cuyo objeto es "***AMPLIACIÓN POR CONTINGENCIA DE PLATAFORMA DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS ORDINARIOS EN EL PARQUE DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE FRONTINO ANTIOQUIA, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. CI-006-2025".***

Dicha reunión se llevó a cabo en las instalaciones de la Empresa de Servicios Públicos de Frontino con NIT 811019874-6, donde asistimos: La señora Ana Lucia Restrepo Londoño, Gerente identificada con la cédula de ciudadanía 32.278.609 de Frontino, Mauricio Piedrahita Valencia Director Técnico Operativo con cédula de ciudadanía 1.214.730.599 de Medellín, Y el señor ESTEBAN PALENCIA ACEVEDO identificado con número de cédula 1.000.748.527 de Medellin, representante legal de ASINCOL S.A.S E.S.P NIT 830512695-7; con el fin de recibir de manera formal la obra y posterior actualización de pólizas, con la firma del acta de recibo a satisfacción.

POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA CO-2025-10-003					
No. PÓLIZA	**ANEXO**	**GARANTÍA**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**VR. CUBIERTO**
65-40-101084832	4	Predios, labores y operaciones	30/10/2025	16/04/2029	$350.181.000,00
65-40-101244163	8	Cumplimiento del contrato	30/10/2025	16/10/2026	$79.828.278,00
65-40-101244163	8	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	30/10/2025	16/10/2026	$163.134.292.05
65-40-101244163	8	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	30/10/2025	16/04/2029	$59.871.208,50
65-40-101244163	8	Estabilidad y calidad de la obra	17/04/2026	17/04/2031	$79.828.278,00

LAURA URIBE ARTEAGA
Ingeniera Civil
M.P 011037-0506971 ANT
Interventoría
