CONTRATO DE OBRA No CO1.PCCNTR.8353935-2025 DERIVADO DEL PROCESO SAMC-NRÑ-CIPLL-00087-2025	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA PARCIAL No. 2

OBJETO:	CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE LA RED CONTRA INCENDIOS (FASE I) PARA EL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA LOPE - SENA REGIONAL NARIÑO.

CAPITULO:	DESCRIPCION	FECHA DE PRESENTACIÓN:	lunes, 22 de junio de 2026
ITEM 4,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO CARBON D= 2 SCH-10	UNIDAD:	ML

PLANO/FOTO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	ANCHO	LARGO	ALTO	+/-	MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Tuberia Enterrada AC 2"		172			172,00	1,00	172,00

CANTIDAD CONTRATADA:	289,30
CANTIDAD ACTA No. 1	0,00
CANTIDAD EJECUTADA:	**172,00**
PENDIENTE POR EJECUTAR	117,30
TOTAL	**172,00**

Presenta

JAVIER MENESES DIAZ
R/L: UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES CIVILES
CONTRATISTA DE OBRA

Avala:

JOSE LUIS FREIRE BASTIDAS
NIT: 12978732-4
INTERVENTORIA

Vo,Bo

GUSTAVO ADOLFO JURADO CHAVES

SUPERVISOR

CONTRATO DE OBRA No CO1.PCCNTR.8353935-2025 DERIVADO DEL PROCESO SAMC-NRÑ-CIPLL-00087-2025	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA PARCIAL No. 2

OBJETO:	CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE LA RED CONTRA INCENDIOS (FASE I) PARA EL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA LOPE - SENA REGIONAL NARIÑO.

CAPITULO:		DESCRIPCION	FECHA DE PRESENTACIÓN:	lunes, 22 de junio de 2026		
ITEM	30,00	EXCAVACION TIERRA CONGLOMERADO			UNIDAD:	M3

PLANO/FOTO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	ANCHO	LARGO	ALTO	+/-	MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
 	Cuarto de Maquinas (Sector agropecuario)	2,67	6	3,05		48,86	1,00	48,86
	Cuarto de Maquinas (Sector agropecuario) Carcamo Eyector aguas de decarte	1,55	1,55	0,77		1,85	1,00	1,85
	Tramo Ceramiento en Malla (Mecatronica)-Ambiente Soldadura AC 2"	0,6	89,9	1		53,94	1	53,94
	Tramo Tanque (Sector Fresas) - Cerramiemto en Malla AC 2"	0,6	7	1		4,2	1	4,2
	Tramo Parqueadero de Buses - Ebanisteria AC 2"	0,6	41,6	1		24,96	1	24,96
	Tramo Tanque - Bodega Fertilizante AC 2"	0,6	49,6	1		29,76	1	29,76
							CANTIDAD CONTRATADA:	170,40
							CANTIDAD ACTA No. 1	0,00
							CANTIDAD EJECUTADA:	**163,57**
							PENDIENTE POR EJECUTAR	6,83
							TOTAL	**163,57**

Presenta

JAVIER MENESES DIAZ
R/L: UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES CIVILES
CONTRATISTA DE OBRA

Avala:

JOSE LUIS FREIRE BASTIDAS
NIT: 12978732-4
INTERVENTORIA

Vo,Bo

GUSTAVO ADOLFO JURADO CHAVES
SUPERVISOR

CONTRATO DE OBRA No CO1.PCCNTR.8353935-2025 DERIVADO DEL PROCESO SAMC-NRÑ-CIPLL-00087-2025	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA PARCIAL No. 2

OBJETO:	CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE LA RED CONTRA INCENDIOS (FASE I) PARA EL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA LOPE - SENA REGIONAL NARIÑO.

CAPITULO:	DESCRIPCION	FECHA DE PRESENTACIÓN:	lunes, 22 de junio de 2026

ITEM	39,00	REPELLO IMPERMEABILIZADO PARA TANQUES DE CONCRETO, CON MORTERO 1:3 Y ADITIVO LÍQUIDO MEJORADO CON POLIMEROS SINTÉTICOS, INCLUYE ADITIVO LATEX LIQUIDO CONCENTRADO PARA	UNIDAD:	M2

PLANO/FOTO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



LOCALIZACION	ANCHO	LARGO	ALTO	+/-	MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
Tanque Sector Agropecuario (Cuarto de Bombas) Pared B2-B1	2,4		2,7		6,48	1,00	6,48
Tanque Sector Agropecuario (Cuarto de Bombas)Pared B1-A1	5,5		2,7		14,85	1,00	14,85
Tanque Sector Agropecuario (Cuarto de Bombas) Carcamo Eyector de Aguas de Descarte- Pared	1		0,74		0,74	2,00	1,48
Tanque Tuberia Succion Pared	1		1,15		1,15	1,00	1,15
Tanque Tuberia Succion Pared	1		1,15		1,15	1,00	1,15
Tanque Sector Agropecuario (Cuarto de Bombas)) Carcamo Eyector de Aguas de Descarte- Pared	1		0,74		0,74	2,00	1,48
Tanque Sector Agropecuario (Cuarto de Bombas)) Piso	2,4	5,5			13,20	1,00	13,27
						CANTIDAD CONTRATADA:	393,86
						CANTIDAD ACTA No. 1	354,00
						CANTIDAD EJECUTADA:	**39,86**
						PENDIENTE POR EJECUTAR	0,00
						TOTAL	**393,86**

Presenta

JAVIER MENESES DIAZ
R/L: UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES CIVILES
CONTRATISTA DE OBRA

Avala:

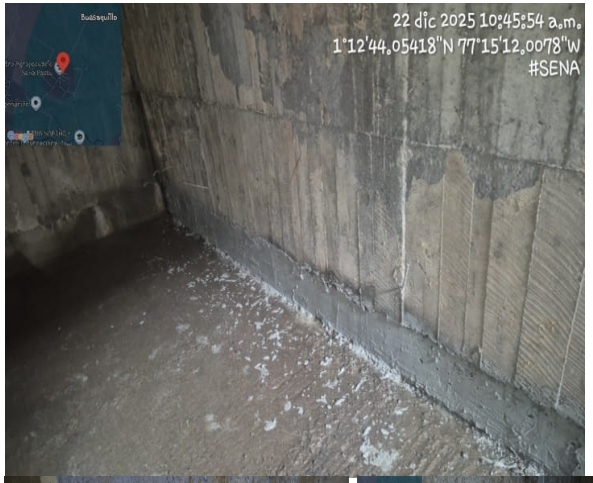
JOSE LUIS FREIRE BASTIDAS
NIT: 12978732-4
INTERVENTORIA

Vo,Bo

GUSTAVO ADOLFO JURADO CHAVES
SUPERVISOR

CAPITULO:	DESCRIPCION	FECHA DE PRESENTACIÓN:	lunes, 22 de junio de 2026

CONTRATO DE OBRA No CO1.PCCNTR.8353935-2025 DERIVADO DEL PROCESO SAMC-NRÑ-CIPLL-00087-2025				MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA PARCIAL No. 2	
OBJETO:	CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE LA RED CONTRA INCENDIOS (FASE I) PARA EL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA LOPE - SENA REGIONAL NARIÑO.				
CAPITULO:	DESCRIPCION	FECHA DE PRESENTACIÓN:	lunes, 22 de junio de 2026		
ITEM	40,00	SELLADO DE JUNTAS DE CONCRETO CON MORTERO DE DOS COMPONENTES CON BASE EN CEMENTO Y POLÍMEROS MODIFICADOS Y ADITIVO LÁTEX DE ÚLTIMA GENERACIÓN		UNIDAD:	ML

PLANO/FOTO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	ANCHO	LARGO	ALTO	+/-	MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Tanque Sector Fresas (Cuarto de Bombas) Pared A1		2,7			2,7	1	2,7
	Tanque Sector Fresas (Cuarto de Bombas) Pared A2		2,7			2,7	1	2,7
	Tanque Sector Fresas (Cuarto de Bombas) Pared B2		2,7			2,7	1	2,7
	Tanque Sector Fresas (Cuarto de Bombas) Pared B1		2,7			2,7	1	2,7
	Tanque Tuberia Succion Pared		1			1	2	2
	Tanque Tuberia Succion Pared		1			1	2	2
	Tanque Tuberia Succion Esquina		0,74			0,74	2	1,48
	Tanque Tuberia Succion Esquina		0,74			0,74	2	1,48
	Tanque Sector Agropecuario (Tanque Almacenamiento) Pared A2-A3		5,55			5,55	1	5,55
	Tanque Sector Agropecuario (Tanque Almacenamiento) Pared A3-B3		6,65			6,65	1	6,65
	Tanque Sector Agropecuario (Tanque Almacenamiento) Pared B3-B2		5,55			5,55	1	5,55
	Tanque Sector Agropecuario (Tanque Almacenamiento) Pared B2-A2		6,65			6,65	1	6,65
	Tanque Sector Agropecuario (Tanque Almacenamiento) Esquina A2		2,7			2,7	1	2,7
	Tanque Sector Agropecuario (Tanque Almacenamiento) Esquina A3		2,7			2,7	1	2,7
	Tanque Sector Agropecuario (Tanque Almacenamiento) Esquina B2		2,7			2,7	1	2,7
	Tanque Sector Agropecuario (Tanque Almacenamiento) Esquina B3		2,7			2,7	1	2,7
	Tanque Tuberia Succion Pared		1			1	2	2
	Tanque Tuberia Succion Pared		1			1	2	2
	Tanque Tuberia Succion Esquina		0,74			0,74	2	1,48
	Tanque Tuberia Succion Esquina		0,74			0,74	2	1,48
 	Tanque Sector Agropecuario (Tanque Almacenamiento) Pared A2-A3		2,4			2,4	1	2,4
	Tanque Sector Agropecuario (Tanque Almacenamiento) Pared A3-B3		5,55			5,55	1	5,55
	Tanque Sector Agropecuario (Tanque Almacenamiento) Pared B3-B2		2,4			2,4	1	2,4
	Tanque Sector Agropecuario (Tanque Almacenamiento) Pared B2-A2		5,3			5,3	1,0	5,3
	Tanque Sector Agropecuario (Tanque Almacenamiento) Esquina A2		2,7			2,7	1	2,7
	Tanque Sector Agropecuario (Tanque Almacenamiento) Esquina A3		2,7			2,7	1	2,7
	Tanque Sector Agropecuario (Tanque Almacenamiento) Esquina B2		2,7			2,7	1	2,7
	Tanque Sector Agropecuario (Tanque Almacenamiento) Esquina B3		2,7			2,7	1	2,7
	Tanque Tuberia Succion Pared		1			1	2	2
	Tanque Tuberia Succion Pared		1			1	2	2
	Tanque Tuberia Succion Esquina		0,74			0,74	2	1,48
	Tanque Tuberia Succion Esquina		0,74			0,74	2	1,48
	Grieta Ttanque Sector Agropecuario		0,5			0,5	1	0,5
							CANTIDAD CONTRATADA:	155,84
							CANTIDAD ACTA No. 1	62,00
							CANTIDAD EJECUTADA:	**93,84**
							PENDIENTE POR EJECUTAR	0,00
							TOTAL	**155,84**

Presenta

JAVIER MENESES DIAZ
R/L: UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES CIVILES
CONTRATISTA DE OBRA

Avala:

JOSE LUIS FREIRE BASTIDAS
NIT: 12978732-4
INTERVENTORIA

Vo,Bo

GUSTAVO ADOLFO JURADO CHAVES
SUPERVISOR

CAPITULO:	DESCRIPCION	FECHA DE PRESENTACIÓN:	lunes, 22 de junio de 2026

CONTRATO DE OBRA No CO1.PCCNTR.8353935-2025 DERIVADO DEL PROCESO SAMC-NRÑ-CIPLL-00087-2025				MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA PARCIAL No. 2	
OBJETO:	CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE LA RED CONTRA INCENDIOS (FASE I) PARA EL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA LOPE - SENA REGIONAL NARIÑO.				
CAPITULO:	DESCRIPCION	FECHA DE PRESENTACIÓN:	lunes, 22 de junio de 2026		
ITEM	42,00	CONCRETO PREMEZCLADO IMPERMEABILIZADO PARA TANQUE SUBTERRANEO 4000PSI		UNIDAD:	M3

PLANO/FOTO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	LARGO	ESPESOR	ALTO	+/-	MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Tapa Cuarto de Maquinas (Sector Agropecuario)	2,65	0,25	6		3,98	1,00	3,98
	Tapa Cuarto de Maquinas (Sector Agropecuario) Tapa 0,85x0,85	0,85	0,25	0,85		0,18	-1,00	-0,18
							CANTIDAD CONTRATADA:	17,23
							CANTIDAD ACTA No. 1	13,44
							CANTIDAD EJECUTADA:	**3,79**
							PENDIENTE POR EJECUTAR	0,00
							TOTAL	**17,23**

Presenta

JAVIER MENESES DIAZ
R/L: UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES CIVILES
CONTRATISTA DE OBRA

Avala:

JOSE LUIS FREIRE BASTIDAS
NIT: 12978732-4
INTERVENTORIA

Vo,Bo

GUSTAVO ADOLFO JURADO CHAVES
SUPERVISOR

CAPITULO:	DESCRIPCION	FECHA DE PRESENTACIÓN:	lunes, 22 de junio de 2026

CONTRATO DE OBRA No CO1.PCCNTR.8353935-2025 DERIVADO DEL PROCESO SAMC-NRÑ-CIPLL-00087-2025	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA PARCIAL No. 2

OBJETO:	CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE LA RED CONTRA INCENDIOS (FASE I) PARA EL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA LOPE - SENA REGIONAL NARIÑO.

CAPITULO:		DESCRIPCION	FECHA DE PRESENTACIÓN:	lunes, 22 de junio de 2026		
ITEM	43,00	ACERO REFUERZO 60000 PSI 420Mpa			UNIDAD:	KG

PLANO/FOTO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	No. ELEMENTOS	LONGITUD	KG/ML	+/-	KILOGRAMO PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	TOTAL KG
	Tanque Sector Agropecuario (Cuarto de Bombas) Cuarto parrilla Inferior X A1-B1	4	7,32	0,994		7,28	20	145,52
	Tanque Sector Agropecuario (Cuarto de Bombas) Cuarto parrilla Superior Y A1-B1	4	7,32	0,994		7,28	20	145,52
	Tapa	4	0,85	0,994		0,84	-20,00	-16,90
							CANTIDAD CONTRATADA:	2395,44
							CANTIDAD ACTA No. 1	2121,29
							CANTIDAD EJECUTADA:	**274,15**
							PENDIENTE POR EJECUTAR	0,00
							TOTAL	**2395,44**

Presenta

JAVIER MENESES DIAZ
R/L: UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES CIVILES
CONTRATISTA DE OBRA

Avala:

JOSE LUIS FREIRE BASTIDAS
NIT: 12978732-4
INTERVENTORIA

Vo,Bo

GUSTAVO ADOLFO JURADO CHAVES
SUPERVISOR

CAPITULO:	DESCRIPCION	FECHA DE PRESENTACIÓN:	lunes, 22 de junio de 2026

CONTRATO DE OBRA No CO1.PCCNTR.8353935-2025 DERIVADO DEL PROCESO SAMC-NRÑ-CIPLL-00087-2025	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA PARCIAL No. 2

OBJETO:	CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE LA RED CONTRA INCENDIOS (FASE I) PARA EL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA LOPE - SENA REGIONAL NARIÑO.

CAPITULO:	ITEMS NO PREVISTOS	FECHA DE PRESENTACIÓN:	lunes, 22 de junio de 2026

ITEM NP	NP-1	DEMOLICION DE CONCRETO E<=20CM INCLUYE CORTE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO)	UNIDAD:	M2

PLANO/FOTO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





LOCALIZACION	ANCHO	LARGO	ALTO	+/-	MEDIDA PARCIAL	UND	MEDIDA TOTAL
Unidad Caprina Anden	0,6	8,5			5,10	1,00	5,10
Planta Electrica Anden	0,6	4,1			2,46	1,00	2,46
Acopio Anden	0,6	1,55			0,93	1,00	0,93
Anden Bodega Fertilizante	0,6	2			1,20	1,00	1,20
Metal Mecanica Anden	0,60	1			0,60	1,00	0,60
Automotriz Anden	0,60	1			0,60	1,00	0,60
Ebanisteria Via	0,60	7,896			4,74	1,00	4,74
Tramo Buses Ebanisteria	0,60	42,5			25,50	1,00	25,50
Soldadura Anden	0,60	2			1,20	1,00	1,20
Taller Automotriz	0,60	3,9			2,34	1,00	2,34
Cultura Fisica	0,60	6,5			3,90	1,00	3,90
Mecatronica	0,60	1			0,60	1,00	0,60
						CANTIDAD CONTRATADA:	49,17
						CANTIDAD ACTA No. 1	0,00
						CANTIDAD EJECUTADA:	**49,17**
						PENDIENTE POR EJECUTAR	0,00
						TOTAL	**49,17**

Presenta

JAVIER MENESES DIAZ
R/L: UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES CIVILES
CONTRATISTA DE OBRA

Avala:

JOSE LUIS FREIRE BASTIDAS
NIT: 12978732-4
INTERVENTORIA

Vo,Bo

GUSTAVO ADOLFO JURADO CHAVES
SUPERVISOR

CAPITULO:	DESCRIPCION	FECHA DE PRESENTACIÓN:	lunes, 22 de junio de 2026

CONTRATO DE OBRA No CO1.PCCNTR.8353935-2025 DERIVADO DEL PROCESO SAMC-NRÑ-CIPLL-00087-2025			MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA PARCIAL No. 2
OBJETO:	CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE LA RED CONTRA INCENDIOS (FASE I) PARA EL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA LOPE - SENA REGIONAL NARIÑO.		
CAPITULO:	ITEMS NO PREVISTOS	FECHA DE PRESENTACIÓN:	lunes, 22 de junio de 2026
ITEM NP	NP-8	SUMINISTRO TUBERIA PVC-C-900 (PARA RED CONTRA INCENDIOS ENTERRADA)-INCLUYE RESTRICTOR, EXCAVACION MANUAL, CAMA EN ARENA, RELLENO INICIAL Y FINAL CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION EN 4".	UNIDAD: ML

PLANO/FOTO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





LOCALIZACION	ANCHO	LARGO	ALTO	+/-	MEDIDA PARCIAL	UND	MEDIDA TOTAL
Tramo Tanque - Cerramiento Malla		7			7,00	1,00	7,00
Cerramiento Malla - Ambiente Soldadura		79,89			79,89	1,00	79,89
Ingreso Ambiete Soldadura		4,27			4,27	1,00	4,27
Tramo Ambinete Soldadura - Taller Automotriz		45,16			45,16	1,00	45,16
Anden - Taller Automotriz		3,85			3,85	1,00	3,85
Taller Automotriz - Cultura Fisica		34,72			34,72	1,00	34,72
Ingreso Ambiente Mecatronica		5			5,00	1,00	5,00
Tanque de Fresas - Unidad Caprina		152,68			152,68	1,00	152,68
Ingreso Centro de Acopio		6,47			6,47	1,00	6,47
Ingreso Ambiente Aulas de Formacion		19,26			19,26	1,00	19,26
Unidad Sanitarias Aulas de Formacion Hasta Ebanisteria		53,7			53,70	1,00	53,70
						CANTIDAD CONTRATADA:	420,30
						CANTIDAD ACTA No. 1	0,00
						CANTIDAD EJECUTADA:	**412,00**
						PENDIENTE POR EJECUTAR	8,30
						TOTAL	**412,00**

Presenta

JAVIER MENESES DIAZ
R/L: UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES CIVILES
CONTRATISTA DE OBRA

Avala:

JOSE LUIS FREIRE BASTIDAS
NIT: 12978732-4
INTERVENTORIA

Vo,Bo

GUSTAVO ADOLFO JURADO CHAVES
SUPERVISOR

CAPITULO:	DESCRIPCION	FECHA DE PRESENTACIÓN:	lunes, 22 de junio de 2026

CONTRATO DE OBRA No CO1.PCCNTR.8353935-2025 DERIVADO DEL PROCESO SAMC-NRÑ-CIPLL-00087-2025	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA PARCIAL No. 2

OBJETO:	CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE LA RED CONTRA INCENDIOS (FASE I) PARA EL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA LOPE - SENA REGIONAL NARIÑO.

CAPITULO:	ITEMS NO PREVISTOS	FECHA DE PRESENTACIÓN:	lunes, 22 de junio de 2026

ITEM NP	NP-9	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO C900 90° INCLUYE RESTRICTORES Ø 4".	UNIDAD:	Und

PLANO/FOTO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	ANCHO	LARGO	ALTO	+/-	MEDIDA PARCIAL	UND	MEDIDA TOTAL
	Tuberia red enterrada gabinetes						18,00	18,00
						CANTIDAD CONTRATADA:		20,00
						CANTIDAD ACTA No. 1		0,00
						CANTIDAD EJECUTADA:		**18,00**
						PENDIENTE POR EJECUTAR		2,00
						TOTAL		**18,00**

Presenta

JAVIER MENESES DIAZ
R/L: UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES CIVILES
CONTRATISTA DE OBRA

Avala:

JOSE LUIS FREIRE BASTIDAS
NIT: 12978732-4
INTERVENTORIA

Vo,Bo

GUSTAVO ADOLFO JURADO CHAVES
SUPERVISOR

CAPITULO:	DESCRIPCION	FECHA DE PRESENTACIÓN:	lunes, 22 de junio de 2026

CONTRATO DE OBRA No CO1.PCCNTR.8353935-2025 DERIVADO DEL PROCESO SAMC-NRÑ-CIPLL-00087-2025	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA PARCIAL No. 2
OBJETO:	CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE LA RED CONTRA INCENDIOS (FASE I) PARA EL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA LOPE - SENA REGIONAL NARIÑO.

CAPITULO:		ITEMS NO PREVISTOS	FECHA DE PRESENTACIÓN:	lunes, 22 de junio de 2026		
ITEM NP	NP-10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE C900 INCLUYE RESTRICTORES Ø 4".			UNIDAD:	Und

PLANO/FOTO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	ANCHO	LARGO	ALTO	+/-	MEDIDA PARCIAL	UND	MEDIDA TOTAL
 	Conexiones enterrada gabinetes						9,00	9,00
						CANTIDAD CONTRATADA:		12,00
						CANTIDAD ACTA No. 1		0,00
						CANTIDAD EJECUTADA:		**9,00**
						PENDIENTE POR EJECUTAR		3,00
						TOTAL		**9,00**

Presenta

JAVIER MENESES DIAZ
R/L: UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES CIVILES
CONTRATISTA DE OBRA

Avala:

JOSE LUIS FREIRE BASTIDAS
NIT: 12978732-4
INTERVENTORIA

Vo,Bo

GUSTAVO ADOLFO JURADO CHAVES
SUPERVISOR

CAPITULO:	DESCRIPCION	FECHA DE PRESENTACIÓN:	lunes, 22 de junio de 2026

CONTRATO DE OBRA No CO1.PCCNTR.8353935-2025 DERIVADO DEL PROCESO SAMC-NRÑ-CIPLL-00087-2025	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA PARCIAL No. 2

OBJETO:	CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE LA RED CONTRA INCENDIOS (FASE I) PARA EL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA LOPE - SENA REGIONAL NARIÑO.

CAPITULO:	DESCRIPCION	FECHA DE PRESENTACIÓN:	lunes, 22 de junio de 2026

ITEM NP	NP-25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES QUÍMICOS EN MURO DE CONCRETO MEDIANTE VARILLA DE ACERO DE 1/2" Ø, CON PROFUNDIDAD DE EMPOTRAMIENTO DE 15 CM, FIJADA CON ADHESIVO EPÓXICO	UNIDAD:	UND

PLANO/FOTO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





LOCALIZACION	ANCHO	LARGO	ALTO	CANT	MEDIDA PARCIAL	UND	MEDIDA TOTAL
Cuarto de Maquinas (Sector agropecuario) Pared A1-A2 Inferior X				20	20,00	1,00	20,00
Cuarto de Maquinas (Sector agropecuario) Pared A1-A2 Superior X				20	20,00	1,00	20,00
Cuarto de Maquinas (Sector agropecuario) Pared B1-B2 Superior X				20	20,00	1,00	20,00
Cuarto de Maquinas (Sector agropecuario) Pared B1-B2 Inferior Y				19	19,00	1,00	19,00
Cuarto de Maquinas (Sector agropecuario) Pared A1-B1 Inferior Y				44	44,00	1,00	44,00
Cuarto de Maquinas (Sector agropecuario) Pared A1-B1 Superior Y				44	44,00	1,00	44,00
Cuarto de Maquinas (Sector agropecuario) Tapa A1-A2 Parrilla Inferior X				44	44,00	1,00	44,00
Tanque Sector Agropecuario (Cuarto de Bombas) Tapa parrilla Superior A1-A2 Y				44	44,00	1,00	44,00

CANTIDAD CONTRATADA:	255,00
CANTIDAD ACTA No. 1	0,00
CANTIDAD EJECUTADA:	**255,00**
PENDIENTE POR EJECUTAR	0,00
TOTAL	**255,00**

Presenta

JAVIER MENESES DIAZ
R/L: UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES CIVILES
CONTRATISTA DE OBRA

Avala:

JOSE LUIS FREIRE BASTIDAS
NIT: 12978732-4
INTERVENTORIA

Vo,Bo

GUSTAVO ADOLFO JURADO CHAVES
SUPERVISOR

CAPITULO:	DESCRIPCION	FECHA DE PRESENTACIÓN:	lunes, 22 de junio de 2026

CONTRATO DE OBRA No CO1.PCCNTR.8353935-2025 DERIVADO DEL PROCESO SAMC-NRÑ-CIPLL-00087-2025				MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS			
OBJETO:	CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE LA RED CONTRA INCENDIOS (FASE I) PARA EL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA LOPE - SENA REGIONAL NARIÑO.						
CAPITULO:	DESCRIPCION	FECHA DE PRESENTACIÓN:	lunes, 22 de junio de 2026				
ITEM NP	NP-26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT ADAPTADOR BRIDA SERIE 4200 (TUBO PVC A ACERO IPS) 4"		UNIDAD:	UND		

PLANO/FOTO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	ANCHO	LARGO	ALTO	CANT	MEDIDA PARCIAL	UND	MEDIDA TOTAL
  	Gabinetes				11	11,00	1,00	11,00
						CANTIDAD CONTRATADA:		12,00
						CANTIDAD ACTA No. 1		0,00
						CANTIDAD EJECUTADA:		**11,00**
						PENDIENTE POR EJECUTAR		1,00
						TOTAL		**11,00**

Presenta

JAVIER MENESES DIAZ
R/L: UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES CIVILES
CONTRATISTA DE OBRA

Avala:

JOSE LUIS FREIRE BASTIDAS
NIT: 12978732-4
INTERVENTORIA

Vo,Bo

GUSTAVO ADOLFO JURADO CHAVES
SUPERVISOR

CAPITULO:	DESCRIPCION	FECHA DE PRESENTACIÓN:	lunes, 22 de junio de 2026

CONTRATO DE OBRA No CO1.PCCNTR.8353935-2025 DERIVADO DEL PROCESO SAMC-NRÑ-CIPLL-00087-2025	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA PARCIAL No. 2

OBJETO:	CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE LA RED CONTRA INCENDIOS (FASE I) PARA EL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA LOPE - SENA REGIONAL NARIÑO.

CAPITULO:	DESCRIPCION	FECHA DE PRESENTACIÓN:	lunes, 22 de junio de 2026

ITEM NP	NP-27	SUMINISTRO TUBERIA PVC (PARA ACOMETIDA ENTERRADA)- EXCAVACION MANUAL, CAMA EN ARENA, RELLENO INICIAL Y FINAL CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION EN 2 1/2".	UNIDAD:	ML

PLANO/FOTO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	ANCHO	LARGO	ALTO	CANT	MEDIDA PARCIAL	UND	MEDIDA TOTAL
	Tuberia conexión tanque Suministro (Sector fresas)		98			98,00	1,00	98,00
						CANTIDAD CONTRATADA:		98,00
						CANTIDAD ACTA No. 1		0,00
						CANTIDAD EJECUTADA:		**98,00**
						PENDIENTE POR EJECUTAR		0,00
						TOTAL		**98,00**

Presenta

JAVIER MENESES DIAZ
R/L: UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES CIVILES
CONTRATISTA DE OBRA

Avala:

JOSE LUIS FREIRE BASTIDAS
NIT: 12978732-4
INTERVENTORIA

Vo,Bo

GUSTAVO ADOLFO JURADO CHAVES
SUPERVISOR
