

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
1	**Red contra incendios SENA**	**301,38 días**	**mar 14/10/25**
2	GABINETE CONTRA INCENDIO CLASE III DOTADOS DE ACUERDO CON LA NORMA NTC 1669	1 día	lun 18/05/26
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO CARBON D=1 SCH-40	0 días	mar 14/10/25
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO CARBON D=1,1/2 SCH-10	4 días	jue 21/05/26
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO CARBON D= 2 SCH-10	4 días	lun 18/05/26
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO CARBON D=2,1/2 SCH-10	4 días	mié 13/05/26
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO CARBON D=3 SCH-10	0 días	mar 14/10/25
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO CARBON D=4 SCH-10	3 días	lun 11/05/26
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE MECANICA H.D. 1"	0 días	mar 14/10/25
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE MECANICA H.D. BOLTED BRANCH (STRAP) 1 1/2"x1"	0 días	mar 14/10/25
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE MECANICA H.D. BOLTED BRANCH (STRAP) 2"x1"	0 días	mar 14/10/25
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE MECANICA H.D. BOLTED BRANCH (STRAP) 2.1/2"x1"	0 días	mar 14/10/25
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE MECANICA H.D. BOLTED BRANCH (STRAP)3"x1"	0 días	mar 14/10/25
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLAMIENTO COUPLING FLEXIBLE Ø 1”	0 días	mar 14/10/25
15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLAMIENTO COUPLING FLEXIBLE Ø 1 1/2”	1 día	jue 21/05/26
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLAMIENTO COUPLING FLEXIBLE Ø 2”	1 día	lun 18/05/26
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLAMIENTO COUPLING FLEXIBLE Ø 2 1/2”	1 día	mié 13/05/26
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLAMIENTO COUPLING FLEXIBLE Ø 3”	0 días	mar 14/10/25
19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLAMIENTO COUPLING FLEXIBLE Ø 4”	1 día	lun 11/05/26
20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE TIPO PERA DE 1" UL-FM	0 días	mar 14/10/25
21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE DE 1 1/2". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	0 días	mar 14/10/25
22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE TIPO PERA DE 2" UL-FM	0 días	mar 14/10/25
23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE TIPO PERA DE 2 1/2" UL-FM	1 día	mié 13/05/26
24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE TIPO PERA DE 3" UL-FM	1 día	jue 14/05/26
25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ROCIADOR PENDENT K:5.6	1 día	jue 21/05/26
26	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESTACIÓN DE CONTROL, I	3 días	vie 22/05/26
27	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESTACIÓN DE CONTROL, PRUEBA Y DRENAJE DE 2 1/2" RED DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	0 días	mar 14/10/25
28	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESTACIÓN DE CONTROL, PRUEBA Y DRENAJE DE 3" RED DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	0 días	mar 14/10/25

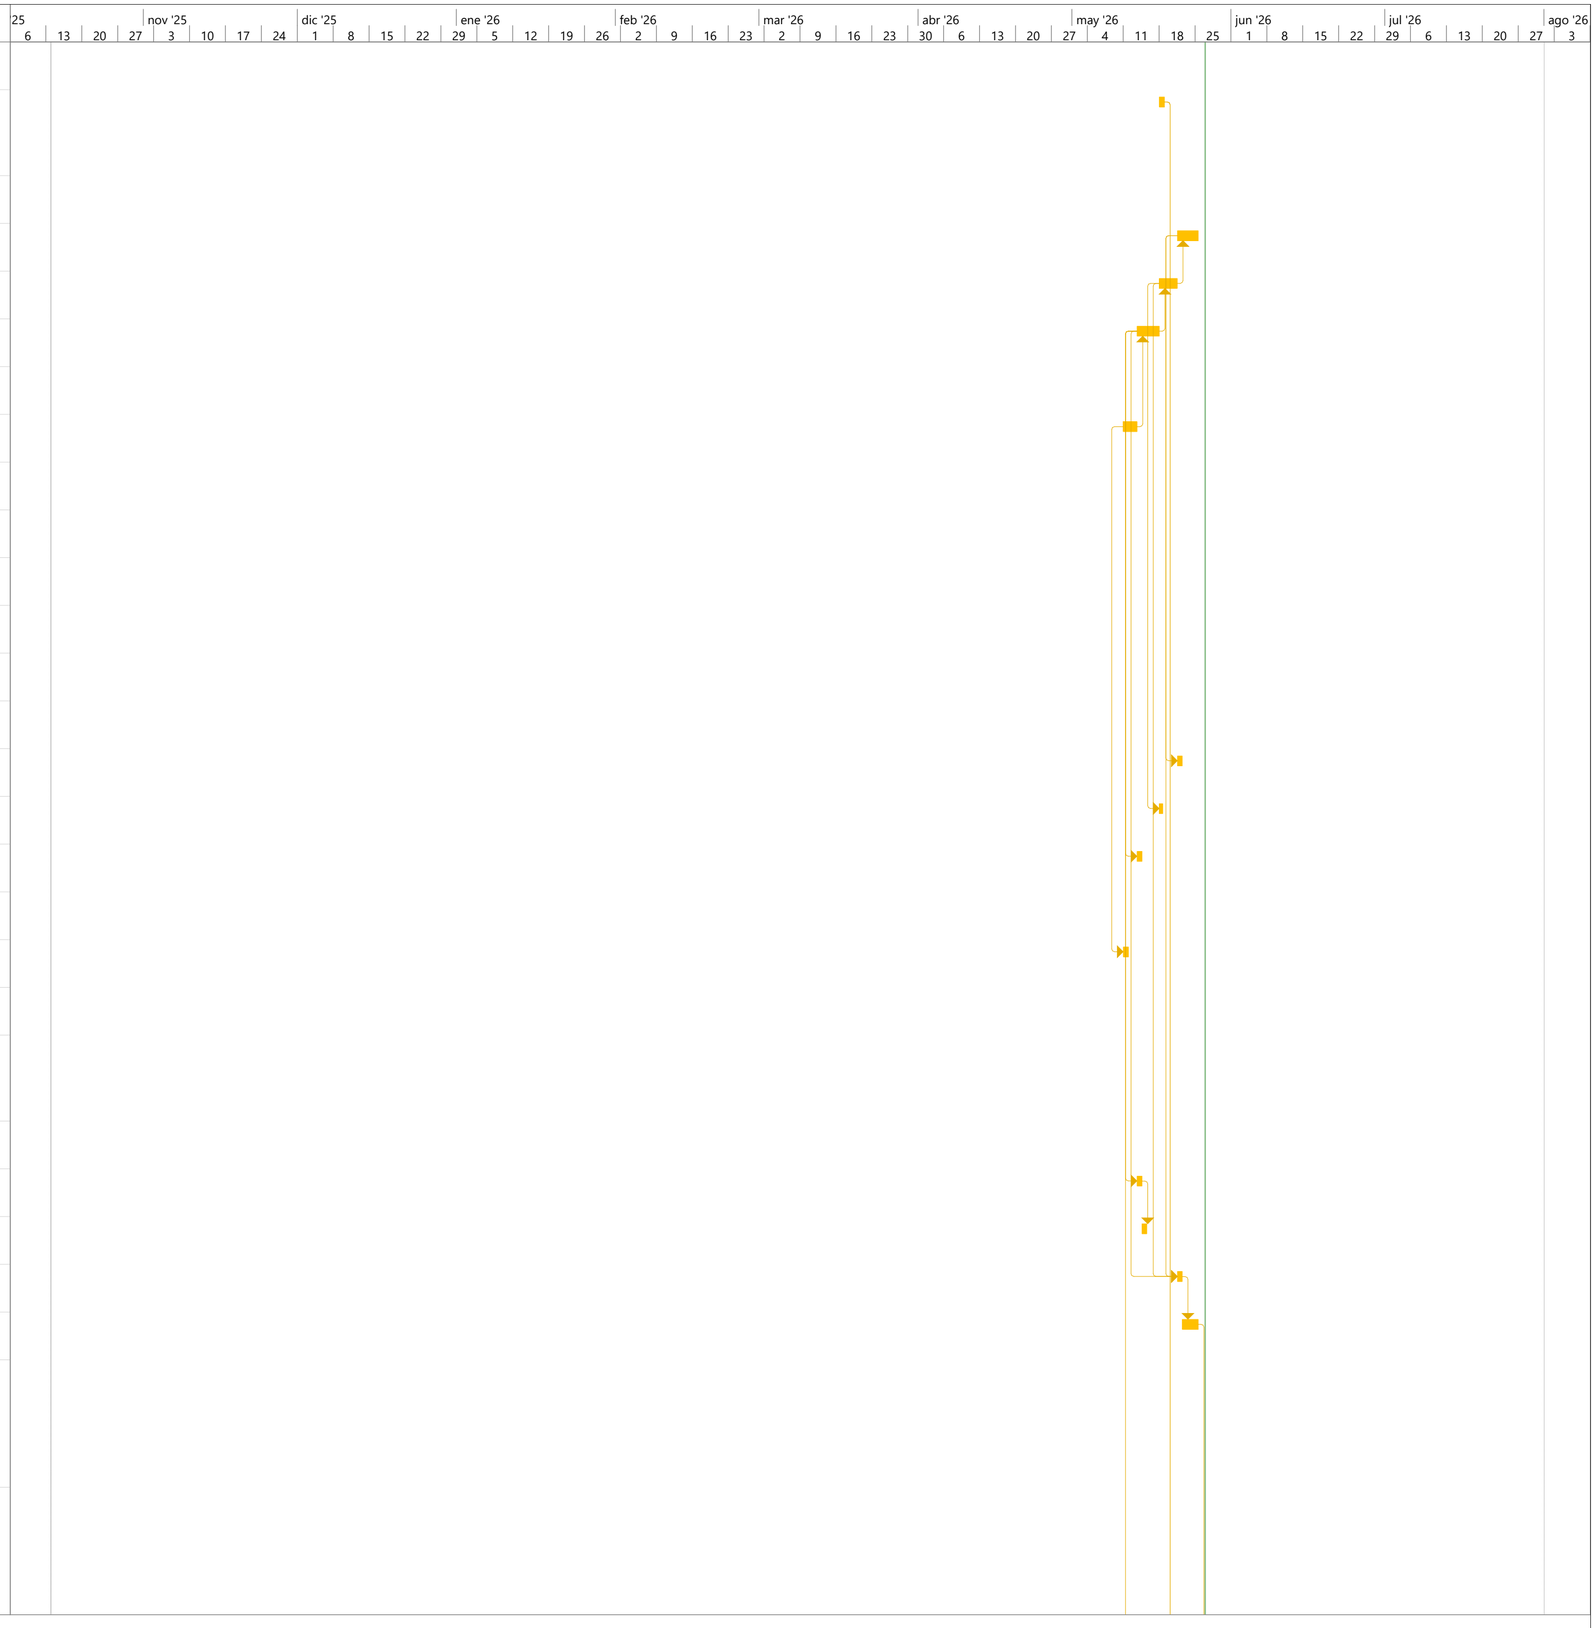


Tarea Tareas críticas

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
29	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESTACIÓN DE CONTROL, I	0 días	mar 14/10/25
30	SUMINISTRO TUBERIA PVC-C-900 (PARA RED CONTRA INCENDIOS ENTERRADA) IN	0 días	mar 14/10/25
31	EXCAVACION TIERRA CONGLOMERADO	14 días	lun 20/04/26
32	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	15 días	dom 3/05/26
33	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC C900 Ø 6". INCLUYE RESTRICTOR	0 días	mar 14/10/25
34	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° PVC C900 Ø 6". INCLUYE RESTRICTOR	0 días	mar 14/10/25
35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRIDA RANURADA 6"	0 días	mar 14/10/25
36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIAMESA EN BRONCE 4"x 2 1/2" x 2 1/2" (Red Contra Incendi	1 día	mié 13/05/26
37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIAMESA EN BRONCE 6"x 2 1/2" x 2 1/2" (Red Contra Incendi	0 días	mar 14/10/25
38	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO CO	0 días	mar 14/10/25
39	SUMINISTRO TUBERIA PVC-C-900 (PARA RED CONTRA INCENDIOS ENTERRADA)-IN	0 días	mar 14/10/25
40	REPELLO IMPERMEABILIZADO PARA TANQUES DE CONCRETO, CON MORTERO 1:3 Y ADITIV	21 días	sáb 20/12/25
41	SELLADO DE JUNTAS DE CONCRETO CON MORTERO DE DOS COMPONENTES CON BASE EN	16 días	lun 15/12/25
42	SOLADO ESPESOR E=0.05M 2500 PSI 210 MPA	6 días	lun 15/12/25
43	CONCRETO PREMEZCLADO IMPERMEABILIZADO PARA TANQUE SUBTERRANEO 4000PSI	20 días	mar 3/02/26
44	ACERO REFUERZO 60000 PSI 420Mpa	42 días	dom 28/12/25
45	CINTA PVC V-15	0 días	mar 14/10/25
46	TAPA CAJA MARCO ANGULO 81X81-90X90	3 días	mié 25/02/26
47	TUBERIA GALVANIZADA 4"	0 días	mar 14/10/25
48	CODO GALVANIZADA 4 x90	0 días	mar 14/10/25
49	DEMOLICION DE CONCRETO E<=20CM INCLUYE CORTE TRANSPORTE Y DISPOSICI	2 días	lun 11/05/26
50	PASE EN MURO DE MAMPOSTERÍA DE ARCILLA ESPESOR MENOR A 15 CM, PARA	2 días	lun 11/05/26
51	REPOSICION FRANJA VIAL EN CONCRETO 4000 PSI E = 20CM, INCLUYE JUNTAS	2 días	mié 13/05/26
52	REPOSICION ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI E =10CM	2 días	jue 14/05/26
53	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TABLEROS DE CONTROL DEL CUARTO DE BOMBAS PARA EL SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIO, INCLUYENDO CONTROLADORES PARA 2 BOMBAS PRINCIPALES Y 2 BOMBAS JOCKEY, SISTEMAS DE ARRANQUE, PROTECCIONES ELÉCTRICAS, SEÑALIZACIÓ	1 día	lun 25/05/26
54	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE PRESION PARA RED CONTRA INCENDIO. MOTOBOMBA NACIONAL. CAUDAL: 6.36 LPS . POTENCIA: 5 HP. RED ROCIADORES INCLUYE BOMBA JOCKEY POTENCIA 1 HP, Q (GAL/MIN)= 2.PARA RED CONTRA INCENDIO ROCIADORES.	1 día	mié 27/05/26

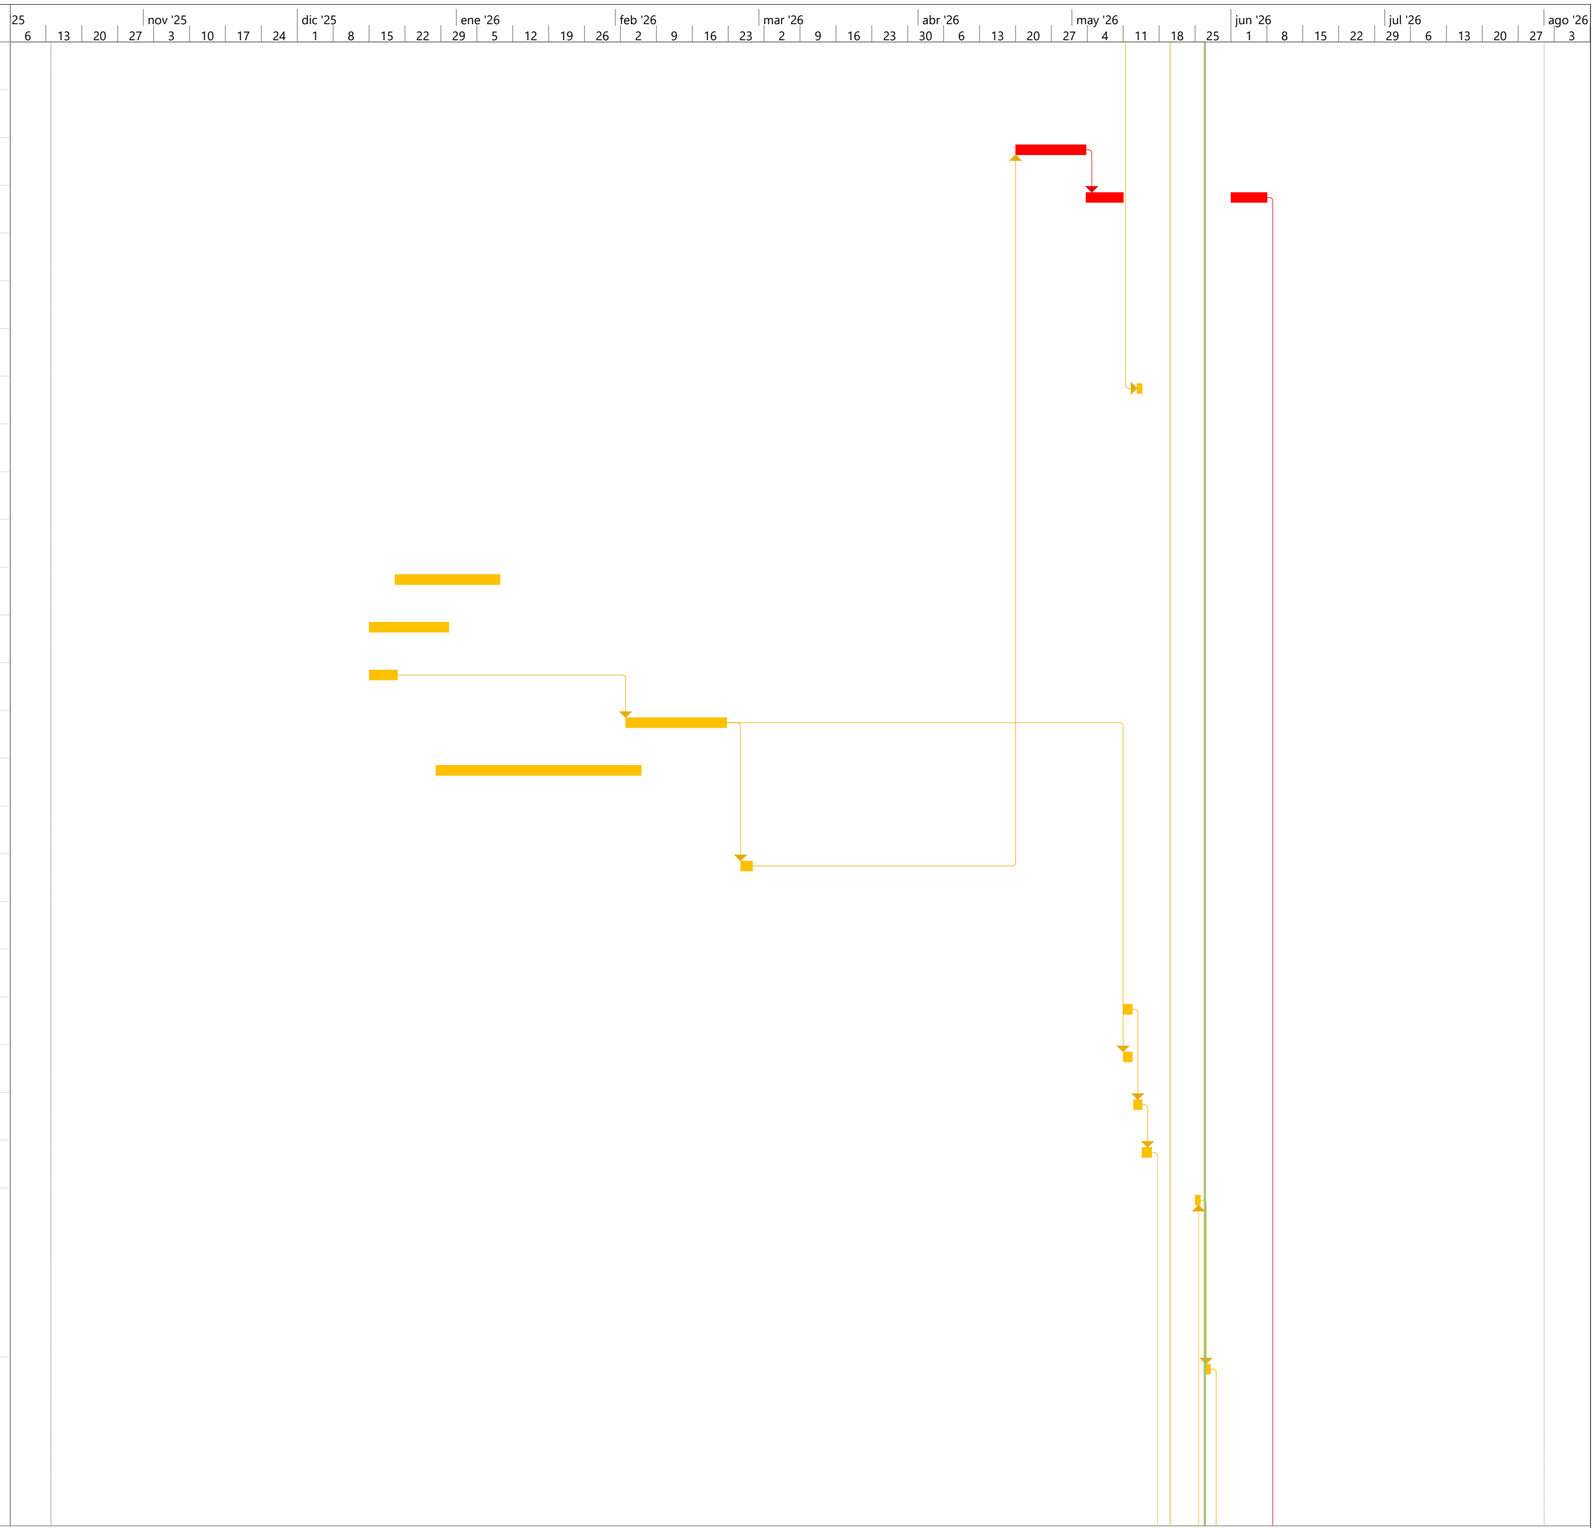

Tarea Tareas críticas

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
55	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE PRESION PARA RED CONTRA INCENDIO. MOTOBOMBA NACIONAL. CAUDAL: 37.88 LPS . POTENCIA: 75 HP, RED GABINETES. INCLUYE BOMBA JOCKEY POTENCIA HP, Q (GAL/MIN)= 7.5 HP PARA RED CONTRA INCENDIO GABINETES Y ACCESORIOS PARA CORR	1 día	vie 29/05/26
56	SUMINISTRO TUBERIA PVC-C-900 (PARA RED CONTRA INCENDIOS ENTERRADA)-INCLUYE RESTRICTOR, EXCAVACION MANUAL, CAMA EN ARENA, RELLENO INICIAL Y FINAL CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION EN 4".	15 días	lun 8/06/26
57	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO C900 90° INCLUYE RESTRICTORES Ø 4".	7 días	lun 22/06/26
58	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE C900 INCLUYE RESTRICTORES Ø 4".	7 días	lun 29/06/26
59	TEE RANURADA REDUCIDA 2" X 1 1/2"	1 día	lun 11/05/26
60	TEE RANURADA REDUCIDA 2 1/2" X 1 1/2"	1 día	mar 12/05/26
61	REDUCCION RANURADA 4 X 2 1/2	6 días	lun 6/07/26
62	REDUCCION RANURADA 2 1/2 X 2	6 días	dom 12/07/26
63	REDUCCION RANURADA 2 X 1 1/2	6 días	vie 17/07/26
64	EXTINTOR MULTIPROPOSITO TIPO ABC 10 LB	1 día	mar 19/05/26
65	EXTINTOR CLASE K 1,5 GAL	1 día	mar 19/05/26
66	SUMISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMAS DE REDES CONTRAINCENCIO	1 día	lun 13/07/26
67	SOPORTES ANTISISMICOS DE DOS VÍAS 4"	1 día	lun 6/07/26
68	DERIVACION PARA INSTALACION DE ROCIADOR DE 2" A 1/2"	6 días	jue 23/07/26
69	DERIVACION PARA INSTALACION DE ROCIADOR DE 1 1/2" A 1/2"	3 días	mié 29/07/26
70	VÁLVULA DE CIERRE 4"	15 días	lun 22/06/26
71	VÁLVULA DE CIERRE 2"	15 días	lun 25/05/26
72	VÁLVULA CHECK 4"	15 días	mar 7/07/26
73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES QUÍMICOS EN MURO DE CONCRETO M	2 días	dom 17/05/26
74	SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT ADAPTADOR BRIDA SERIE 4200 (TUBO PVC A AC	2 días	lun 18/05/26
75	SUMINISTRO TUBERIA PVC (PARA ACOMETIDA ENTERRADA)- EXCAVACION MANU	2 días	mié 20/05/26
76	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA TRIFÁSICA PARA ALIMENTACIÓN DE TABLERO DEL CUARTO DE BOMBAS CONTRA INCENDIO	2 días	vie 22/05/26

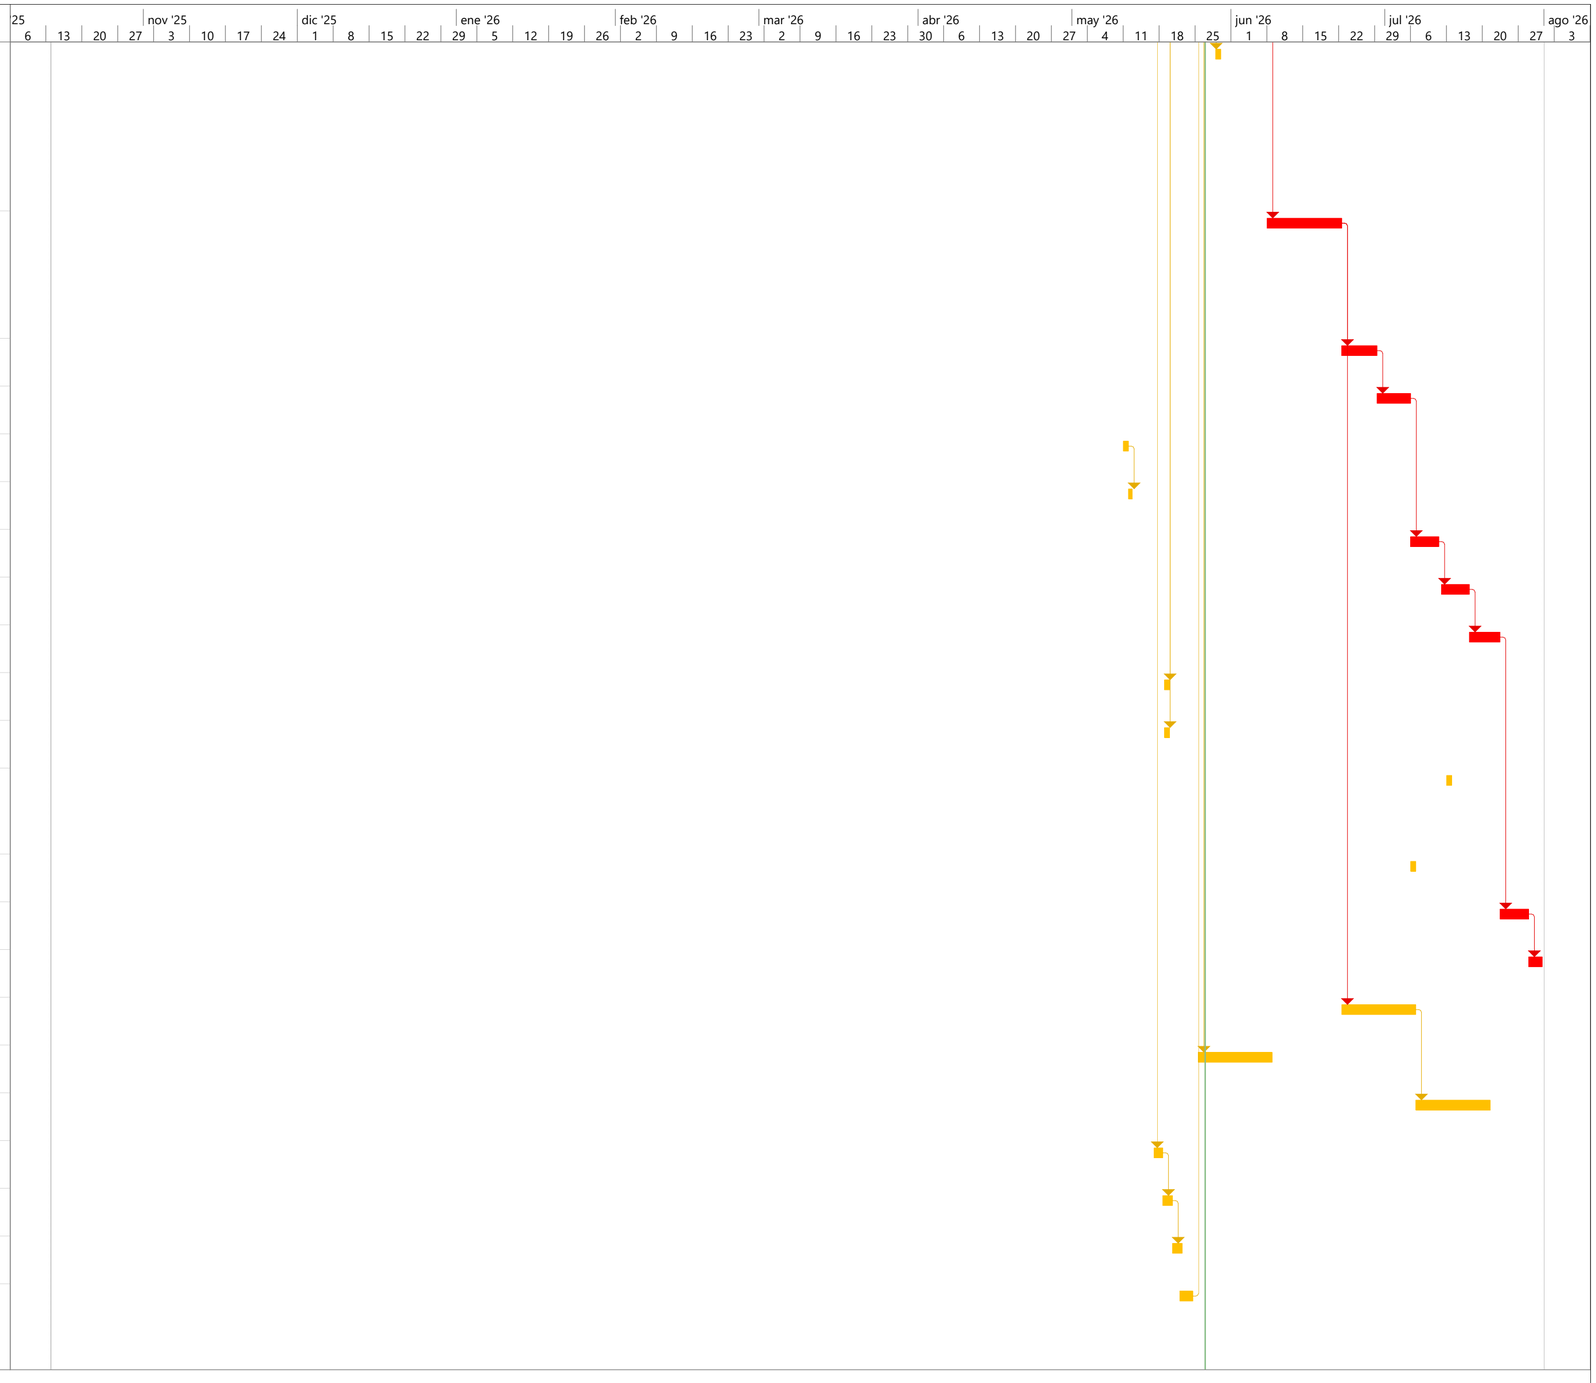

Tarea Tareas críticas
