INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

	OBRA	INTERVENTORIA
NO. CONTRATO	C-613-2025	INT-652-2025
OBJETO	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".
CONTRATISTA	Consorcio COCO	AHLA SHUGL INTERNATIONAL S.A.S.
VALOR INICIAL	$6.795.537.201	$ 636.794.760
ADICIONES	-	-
VALOR TOTAL	$6.795.537.201	$ 636.794.760
PLAZO	8 Meses	8 Meses
FECHA DE INICIO	17 de diciembre de 2025	17 de diciembre del 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	16 de agosto de 2026	16 de agosto del 2026
PRÓRROGAS	-	-
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	16 de agosto de 2026	16 de agosto del 2026
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	AHLA SHUGL INTERNATIONAL S.A.S.	FDLT
NO. EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS	12	15
NO. EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS	5	1

SEMANA N. 16 **DEL** 6/04/2026 **AL** 11/04/2026

AVANCES DE OBRA

PROGRAMADO			**EJECUTADO**		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Avance físico general	11,70%	11,20%	Aavance físico general	11,70%	11,20%
Avance financiero general	11,92%	11,20%	Avance financiero general	11,92%	11,20%

METAS FISICAS DEL CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN META FISICA	UNIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO				VARIACIÓN		NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSITIFCIACIÓN DE RETRASOS
		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	
DOCUMENTACION INCIAL	**GLB**	**0%**	**100%**	**0%**	**100%**	**0%**	**100%**	**0%**	**100%**	**0%**	**0%**	
CRONOGRAMA DEL PROYECTO	**GLB**	**0%**	**100%**	**0%**	**100%**	**0%**	**100%**	**0%**	**100%**	**0%**	**0%**	
DOCUMENTOS TÉCNICOS	**GLB**	**0%**	**100%**	**0%**	**100%**	**0%**	**100%**	**0%**	**100%**	**0%**	**0%**	
DOCUMENTOS AMBIENTAL	**GLB**	**0%**	**100%**	**0%**	**100%**	**0%**	**100%**	**0%**	**100%**	**0%**	**0%**	
DOCUMENTOS SOCIAL	**GLB**	**0%**	**100%**	**0%**	**100%**	**0%**	**100%**	**0%**	**100%**	**0%**	**0%**	
DOCUMENTOS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	**GLB**	**0%**	**100%**	**0%**	**100%**	**0%**	**100%**	**0%**	**100%**	**0%**	**0%**	
DESCRIPCIÓN META FISICA (CIV 6000580)	**UNIDAD**	**PROGRAMADO**				**EJECUTADO**				**VARIACIÓN**		**NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSITIFCIACIÓN DE RETRASOS**
		SEMANAL		**ACUMULADO**		**SEMANAL**		**ACUMULADO**		**SEMANAL**	**ACUMULADO**	
DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	**M2**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	**M2**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	**M3**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE..	**M3**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
ANDEN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI (210 KG/CM2) PREMEZCLADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO)	**M3**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
ESTABILIZACION O MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON RAJON = 6" A 12" (15 - 30 cm) Y SELLO CON SUBBASE GRANULAR CLASE C - Gr1 (SBGC_Gr1). INCLUYE (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACIÓN MECANICA CON EXCAVADORA MEDIANA SOBRE ORUGAS Y RODILLO VIBROCOMPACTADOR TANDEM (2,5 - 3,0 TON), TRANSPORTE DEL RAJON Y SELLO HASTA 21 KM)	**M3**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA ESPACIO PÚBLICO	**M2**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 90 KN/M Y 110 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	**M2**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
ESTABILIZACIÓN DE SUB BASE Y BASES GRANULARES CON ADITIVO POTENCIALIZADOR FLEXIBILIZANTE + CEMENTO 5%	**M3**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA	**ML**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
CAÑUELA TIPO A120 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)	**ML**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN)	**M2**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR. SUMINISTRO E INSTALACION	**UN**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	

DESCRIPCIÓN META FISICA (CIV 6000528)	UNIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO				VARIACIÓN		NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSITIFICACIÓN DE RETRASOS
		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	
DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE..	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
ANDEN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI (210 KG/CM2) PREMEZCLADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO)	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
ESTABILIZACION O MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON RAJON = 6" A 12" (15 - 30 cm) Y SELLO CON SUBBASE GRANULAR CLASE C - Gr1 (SBGC_Gr1). INCLUYE (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACIÓN MECANICA CON EXCAVADORA MEDIANA SOBRE ORUGAS Y RODILLO VIBROCOMPACTADOR TANDEM (2,5 - 3,0 TON), TRANSPORTE DEL RAJON Y SELLO HASTA 21 KM)	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA ESPACIO PÚBLICO	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 90 KN/M Y 110 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
ESTABILIZACIÓN DE SUB BASE Y BASES GRANULARES CON ADITIVO POTENCIALIZADOR FLEXIBILIZANTE + CEMENTO 5%	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
CAÑUELA TIPO A120 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)	ML	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN)	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR. SUMINISTRO E INSTALACION	UN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

DESCRIPCIÓN META FISICA (CIV 6000372)	UNIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO				VARIACIÓN		NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSITIFICACIÓN DE RETRASOS
		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	
REPLANTEO GENERAL	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	ML	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	
EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	Se presenta represamiento en la red de aguas residuales en la transversal 44 desde la calle 50 a sur hasta el pozo inspeccionado en la calle 49 a sur, lo anterior esta generando imprevistos en la ejecución del segmento, la tubería a reponer se encuentra trabajando a flujo lleno, obligando a realizar bombeo continuo a lo largo de toda la semana de intervención. Incrementando los costos de ejecución para el tramo intervenido, en el recorrido realizado con los representantes del EAAB se solicito la colaboración para bajar los niveles de la red.
DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE).	ML	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	M2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	UND	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	

DESCRIPCIÓN META FISICA (CIV 6001013)	UNIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO				VARIACIÓN		NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSITIFICACIÓN DE RETRASOS
		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	
REPLANTEO GENERAL	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	ML	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE).	ML	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	UND	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

DESCRIPCIÓN META FISICA (CIV 6001200)	UNIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO				VARIACIÓN		NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSITIFCIACIÓN DE RETRASOS
		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	
REPLANTEO GENERAL	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Demolicón de andenes	ML	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE).	ML	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	UND	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	M2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
COMPACTACIÓN DE SUBRASANTES	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
INSTALACIÓN DE SUBBASE	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
INSTALACIÓN DE BASE	M3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
CONCRETO ESTAMPADO	M2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
ASFALTO	ML	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

DESCRIPCIÓN META FISICA (CIV 6000857)	UNIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO				VARIACIÓN		NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSITIFCIACIÓN DE RETRASOS
		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	
REPLANTEO GENERAL	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	ML	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	
EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	
DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE).	ML	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	
GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	M2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	UND	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	

DESCRIPCIÓN META FISICA (CIV 6000557)	UNIDAD	PROGRAMADO		EJECUTADO		VARIACIÓN		NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSITIFCIACIÓN DE RETRASOS
		SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	
DESCRIPCIÓN META FISICA (CIV 6000830)	UNIDAD	PROGRAMADO		EJECUTADO		VARIACIÓN		NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSITIFCIACIÓN DE RETRASOS
		SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	
DESCRIPCIÓN META FISICA (CIV 6001206)	UNIDAD	PROGRAMADO		EJECUTADO		VARIACIÓN		NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSITIFCIACIÓN DE RETRASOS
		SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	
DESCRIPCIÓN META FISICA (CIV 6000786)	UNIDAD	PROGRAMADO		EJECUTADO		VARIACIÓN		NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSITIFCIACIÓN DE RETRASOS
		SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	
DESCRIPCIÓN META FISICA (CIV 6000931)	UNIDAD	PROGRAMADO		EJECUTADO		VARIACIÓN		NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSITIFCIACIÓN DE RETRASOS
		SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	
DESCRIPCIÓN META FISICA (CIV 6000870)	UNIDAD	PROGRAMADO		EJECUTADO		VARIACIÓN		NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSITIFCIACIÓN DE RETRASOS
		SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	
DESCRIPCIÓN META FISICA (CIV 6000389)	UNIDAD	PROGRAMADO		EJECUTADO		VARIACIÓN		NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSITIFCIACIÓN DE RETRASOS
		SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	
REPLANTEO GENERAL	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	ML	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	80%	80%	80%	80%	80%	80%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	80%	80%	80%	80%	80%	80%	
EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	70%	70%	70%	70%	70%	70%	
DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE).	ML	80%	80%	80%	80%	80%	80%	
GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	M2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	UND	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	70%	70%	70%	70%	70%	70%	
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	65%	65%	65%	65%	65%	65%	
DESCRIPCIÓN META FISICA (CIV 6001303)	UNIDAD	PROGRAMADO		EJECUTADO		VARIACIÓN		NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSITIFCIACIÓN DE RETRASOS
		SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	

3.1. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN TÉCNICA

CIV	**6000580**	**Estado**	Ejecutado	Se finaliza con limpieza el segmento de espacio público
	6000528	**Estado**	Ejecutado	Se finaliza con limpieza el segmento de espacio público
	6000372	**Estado**	En ejecución	Construcción de pozo de aguas lluvias, lleno de tuberías
	60001013	**Estado**	En ejecución	Instalación de AR SBG - 50
	6001200	**Estado**	En ejecución	Instalación de tubería eléctrica de iluminación
	6000857	**Estado**	En ejecución	Instalación de tubería sanitaria, excavación para estructura y lleno de tuberías
	6000557	**Estado**	Por ejecutar	
	6000830	**Estado**	Por ejecutar	
	6001206	**Estado**	Por ejecutar	
	6000786	**Estado**	Por ejecutar	
	6000931	**Estado**	Por ejecutar	
	6000870	**Estado**	Por ejecutar	
	6000389	**Estado**	En ejecución	Instalación de tubería sanitaria 8"
	6001303	**Estado**	Por ejecutar	

3.2 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN SOCIAL

Se llevó a cabo la reunión de finalización de los CIV 6000528 y 6000580, así como la reunión de inicio de obra correspondiente al CIV 6000557, se realizó la actualización de todos los puntos satélite mediante el volante No. 9, relacionado con la contratación de mano de obra no calificada.
De igual manera, se hizo entrega de los volantes informativos de inicio de obra para el CIV 6000557 y se efectuó el cierre de las actas de vecindad correspondientes al CIV 6000528.

3.3 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN SST

Se realizó acompañamiento a reunión de inicio en el frente de obra CIV 6000557.
Se realizó acompañamiento a reunión de finalización en los frentes de obra CIV´S 6000580-6000528.
Se realizó instalación de sticker de identificación a las maquinarias y vehículos que se encuentran en los frentes de obra.
Se realizó entrega de dotación y EPP en el punto crea.
Se realizó inducción en el punto crea.

3.4 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN AMBIENTAL

Se realizó acompañamiento a reunión de inicio en el frente de obra CIV 6000557.
Se realizó acompañamiento a reunión de finalización en los frentes de obra CIV´S 6000580-6000528.
Se realizó cargue de RCD en los frentes de obra CIV´S 6000857-6000389.
Se realizó aseo de baños portátiles en los frentes de obra CIV´S 6000372-6001200.
Se realizó instalación de protección de materiales en los frentes de obra CIV´S 6001013-6000372-6001200.

4. PRECIOS NO PREVISTOS - (deberán ser notificados mediante comunicación a la entidad)

No Aplica

6. REGISTRO FOTOGRAFICO (TODAS LAS ÁREAS)

SST



Se realizó acompañamiento a reunión de inicio en el frente de obra CIV 6000557.



Se realizó acompañamiento a reunión de finalización en los frentes de obra CIV´S 6000580-6000528.



Se realizó instalación de sticker de identificación a las maquinarias y vehículos que se encuentran en los frentes de obra.



Se realizó entrega de dotación y EPP en el punto crea.



Se realizó inducción en el punto crea.



Se realizó inducción en el punto crea.



Se realizó entrega de dotación y EPP en el punto crea.

AMBIENTAL



Se realizó inducción en el punto crea.



Se realizó acompañamiento a reunión de inicio en el frente de obra CIV 6000557.



Se realizó acompañamiento a reunión de finalización en los frentes de obra CIV´S 6000580-6000528.



Se realizó cargue de RCD en los frentes de obra CIV´S 6000857-6000389.



Se realizó aseo de baños portátiles en los frentes de obra CIV´S 6000857-6001200.



Se realizó instalación de protección de materiales en los frentes de obra CIV´S 6001013-6000372-6001200.



Se realizó cargue de RCD en los frentes de obra CIV´S 6000857-6000389.



Se realizó aseo de baños portátiles en los frentes de obra CIV´S 6000857-6001200.

TÉCNICO



Construcción de carcamos de protección de tubería domiciliaria en el CIV 6000372



Construcción de carcamos de protección de tubería domiciliaria en el CIV 6000372



* Construcción de pozo aguas lluvias
* Lleno tuberías en el CIV 6000372



Instalación de tubería sanitaria 8 pulgadas



Instalación de AR SBG-50 en el CIV 60001013



Instalación de AR SBG-50 en el CIV 60001013

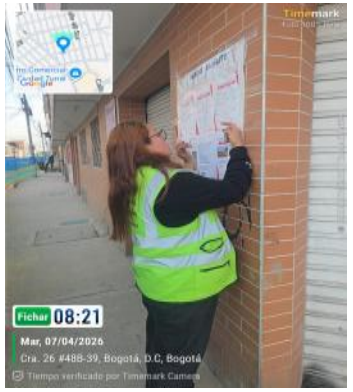


Instalación de tubería eléctrica de iluminación en el CIV 6001200



Instalación de tubería eléctrica de iluminación en el CIV 6001200

SOCIAL

			
Cierre de actas de vecindad	Cierre de actas de vecindad	Actualización Punto Satelite	Reunión CIV 6000557
			
Reunión de finalización de obra CIV 6000580 y 6000528			

Nota: Las fotografías deberán contar con la fecha y ubicación del sector

APROBADO CONTRATISTA

JOTAM MAESTRE DIAB

FIRMA

APROBADO INTERVENTORÍA

SANTIAGO CARILLO VARGAS

FIRMA
