INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

	OBRA	INTERVENTORÍA
NO. CONTRATO	C-613-2025	INT-652-2025
OBJETO	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".
CONTRATISTA	Consorcio COCO	AHLA SHUGL INTERNATIONAL S.A.S.
VALOR INICIAL	$6.795.537.201	$ 636.794.760
ADICIÓNES	-	-
VALOR TOTAL	$6.795.537.201	$ 636.794.760
PLAZO	8 Meses	8 Meses
FECHA DE INICIO	17 de diciembre de 2025	17 de diciembre del 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	16 de agosto de 2026	16 de agosto del 2026
PRÓRROGAS	-	-
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	16 de agosto de 2026	16 de agosto del 2026
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	AHLA SHUGL INTERNATIONAL S.A.S.	FDLT
NO. EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS	12	15
NO. EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS	5	1

SEMANA N. 20 **DEL** 4/5/2026 **AL** 9/5/2026

AVANCES DE OBRA

PROGRAMADO			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Avance físico general	30,23%	25,00%	Aavance físico general	30,23%	25,00%
Avance financiero general	35,28%	25,00%	Avance financiero general	35,28%	25,00%

METAS FISICAS DEL CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN META FISICA	UNIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO				VARIACIÓN		NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSITIFICIACIÓN DE RETRASOS
		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	
DOCUMENTACIÓN INCIAL	**GLB**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**0%**	**0%**	
CRONOGRAMA DEL PROYECTO	**GLB**	**100%**	**100%**	**100%**	**200%**	**100%**	**100%**	**100%**	**200%**	**0%**	**0%**	
DOCUMENTOS TÉCNICOS	**GLB**	**100%**	**100%**	**100%**	**300%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300%**	**0%**	**0%**	
DOCUMENTOS AMBIENTAL	**GLB**	**100%**	**100%**	**100%**	**400%**	**100%**	**100%**	**100%**	**400%**	**0%**	**0%**	
DOCUMENTOS SOCIAL	**GLB**	**100%**	**100%**	**100%**	**500%**	**100%**	**100%**	**100%**	**500%**	**0%**	**0%**	
DOCUMENTOS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	**GLB**	**100%**	**100%**	**100%**	**600%**	**100%**	**100%**	**100%**	**600%**	**0%**	**0%**	
DESCRIPCIÓN META FISICA (CIV 6000580)	**UNIDAD**	**PROGRAMADO**				**EJECUTADO**				**VARIACIÓN**		**NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSITIFICIACIÓN DE RETRASOS**
		SEMANAL		**ACUMULADO**		**SEMANAL**		**ACUMULADO**		**SEMANAL**	**ACUMULADO**	
DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	**M2**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	**M2**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	**M3**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE..	**M3**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
ANDEN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI (210 KG/CM2) PREMEZCLADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO)	**M3**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
ESTABILIZACION O MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON RAJON = 6" A 12" (15 - 30 cm) Y SELLO CON SUBBASE GRANULAR CLASE C - Gr1 (SBGC_Gr1). INCLUYE (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACIÓN MECANICA CON EXCAVADORA MEDIANA SOBRE ORUGAS Y RODILLO VIBROCOMPACTADOR TANDEM (2,5 - 3,0 TON), TRANSPORTE DEL RAJON Y SELLO HASTA 21 KM)	**M3**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA ESPACIO PÚBLICO	**M2**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 90 KN/M Y 110 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	**M2**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
ESTABILIZACIÓN DE SUB BASE Y BASES GRANULARES CON ADITIVO POTENCIALIZADOR FLEXIBILIZANTE + CEMENTO 5%	**M3**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA	**ML**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
CAÑUELA TIPO A120 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)	**ML**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN)	**M2**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR. SUMINISTRO E INSTALACION	**UN**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	

DESCRIPCIÓN META FISICA (CIV 6000528)	UNIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO				VARIACIÓN		NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSITIFCIACIÓN DE RETRASOS
		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	
DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE..	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
ANDEN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI (210 KG/CM2) PREMEZCLADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO)	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
ESTABILIZACION O MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON RAJON = 6" A 12" (15 - 30 cm) Y SELLO CON SUBBASE GRANULAR CLASE C - Gr1 (SBGC_Gr1). INCLUYE (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACIÓN MECANICA CON EXCAVADORA MEDIANA SOBRE ORUGAS Y RODILLO VIBROCOMPACTADOR TANDEM (2,5 - 3,0 TON), TRANSPORTE DEL RAJON Y SELLO HASTA 21 KM)	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA ESPACIO PÚBLICO	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 90 KN/M Y 110 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
ESTABILIZACIÓN DE SUB BASE Y BASES GRANULARES CON ADITIVO POTENCIALIZADOR FLEXIBILIZANTE + CEMENTO 5%	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
CAÑUELA TIPO A120 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)	ML	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN)	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR. SUMINISTRO E INSTALACION	UN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

DESCRIPCIÓN META FISICA (CIV 6000372)	UNIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO				VARIACIÓN		NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSITIFCIACIÓN DE RETRASOS
		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	
REPLANTEO GENERAL	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	ML	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se presenta represamiento en la red de aguas residuales en la transversal 44 desde la calle 50 a sur hasta el pozo inspeccionado en la calle 49 a sur, lo anterior esta generando imprevistos en la ejecución del segmento, la tubería a reponer se encuentra trabajando a flujo lleno, obligando a realizar bombeo continuo a lo largo de toda la semana de intervención. Incrementando los costos de ejecución para el tramo intervenido, en el recorrido realizado con los representantes del EAAB se solicito la colaboración para bajar los niveles de la red.
DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE).	ML	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	M2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	UND	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

DESCRIPCIÓN META FISICA (CIV 6001013)	UNIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO				VARIACIÓN		NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSITIFCIACIÓN DE RETRASOS
		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	
REPLANTEO GENERAL	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	ML	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE).	ML	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	UND	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

DESCRIPCIÓN META FISICA (CIV 6001200)	UNIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO				VARIACIÓN		NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSITIFCIACIÓN DE RETRASOS
		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	
REPLANTEO GENERAL	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Demolicón de andenes	ML	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE).	ML	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	UND	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	M2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
COMPACTACIÓN DE SUBRASANTES	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
INSTALACIÓN DE SUBBASE	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
INSTALACIÓN DE BASE	M3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
CONCRETO ESTAMPADO	M2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
ASFALTO	ML	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

DESCRIPCIÓN META FISICA (CIV 6000857)	UNIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO				VARIACIÓN		NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSITIFCIACIÓN DE RETRASOS
		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	
REPLANTEO GENERAL	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	ML	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	
EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	
DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE).	ML	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	
GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	M2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	UND	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	

DESCRIPCIÓN META FISICA (CIV 6000557)	UNIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO				VARIACIÓN		NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSITFICIACIÓN DE RETRASOS
		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	
REPLANTEO GENERAL	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	ML	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	
EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	
DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE).	ML	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	
GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	M2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	UND	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	

DESCRIPCIÓN META FISICA (CIV 6000830)	UNIDAD	PROGRAMADO		EJECUTADO		VARIACIÓN		NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSITFICIACIÓN DE RETRASOS
		SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	

DESCRIPCIÓN META FISICA (CIV 6001206)	UNIDAD	PROGRAMADO		EJECUTADO		VARIACIÓN		NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSITFICIACIÓN DE RETRASOS
		SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	

DESCRIPCIÓN META FISICA (CIV 6000786)	UNIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO				VARIACIÓN		NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSITFICIACIÓN DE RETRASOS
		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	
REPLANTEO GENERAL	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	ML	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	
DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE).	ML	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	
GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	M2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	UND	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	

DESCRIPCIÓN META FISICA (CIV 6000931)	UNIDAD	PROGRAMADO		EJECUTADO		VARIACIÓN		NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSITFICIACIÓN DE RETRASOS
		SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	

DESCRIPCIÓN META FISICA (CIV 6000870)	UNIDAD	PROGRAMADO		EJECUTADO		VARIACIÓN		NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSITFICIACIÓN DE RETRASOS
		SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	

DESCRIPCIÓN META FISICA (CIV 6000389)	UNIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO				VARIACIÓN		NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSITFICIACIÓN DE RETRASOS
		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	
REPLANTEO GENERAL	M2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	ML	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE).	ML	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	M2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	UND	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

DESCRIPCIÓN META FISICA (CIV 6001303)	UNIDAD	PROGRAMADO		EJECUTADO		VARIACIÓN		NOVEDADES DE LA SEMANA/ JUSITFICIACIÓN DE RETRASOS
		SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	

3.1. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN TÉCNICA

CIV	6000580	Estado	Ejecutado	Se finaliza con limpieza el segmento de espacio público
	6000528	Estado	Ejecutado	Se finaliza con limpieza el segmento de espacio público
	6000372	Estado	En ejecución	Excavación para cárcamos de los dúctos de descole de los sumideros, instalación de tubería de 12", construcción de cárcamos
	60001013	Estado	En ejecución	Se realiza la excavación sobre la intersección del segmento vial para conformación de la estructura de pavimento
	6001200	Estado	En ejecución	Instalación de concreto estampado 3000 PSI en la franja sobre el muro del colegio, como tambien se realiza el inicio de instalación del concreto de 3000, texturizado sobre la franja central del area de espacio publico del segmento
	6000857	Estado	En ejecución	Se continua la instalación de prefabricados bordillo A80, Bajo rampa A85
	6000557	Estado	En ejecución	Se inicia la excavación para la construcción de pozos y Red Pluvial de acuerdo a lo establecido con la EAAB y el FDLT
	6000830	Estado	Por ejecutar	
	6001206	Estado	Por ejecutar	
	6000786	Estado	En ejecución	Se realiza el lleno total sobre la Red principal Sanitaria de 8" y la construcción del pozo PZ-1 del segmento vial
	6000931	Estado	Por ejecutar	
	6000870	Estado	Por ejecutar	
	6000389	Estado	En ejecución	Instalación de sumideros laterales sobre final del segmento con iinstalación de la tubería de 12" al pozo pluvial
	6001303	Estado	Por ejecutar	

3.2 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN SOCIAL

Se remite respuesta de Derecho de petición por correo electrónico al ciudadano con Nº de oficio FDLT-CTO-613-2025/063. Se realiza recorrido de obra, se proyecta los volantes de bajantes de aguas lluvias y el no parque vehicular así mismo, se remite para aprobación a Interventoría. Se atiende dudas de la comunidad en los frentes de obra, se realiza acercamiento a un predio para solicitar que retiren el vehiculo que dejaron frente a la obra. Se remite informe mensual No 4 con oficio FDLT-CTO-613-2025/068, posteriormente se recibe oficio de aprobación por parte de Interventoría, con No de radicado. INT-652-2025-079,

3.3 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN SST

Se realizó entrega de dotación y EPP en los frentes de obra CIV´S 6000557-6001013.
Se realizó reposición de señalización que se encontraba en mal estado CIV 6000372.
Se realizó inspección de extintor y botiquín en los frentes de obra CIV´S 6000557-6000857-6001200.
Se realizó inspección de maquinaria en el frente de obra CIV 6000557.
Se realizó inspección de trabajos en obra CIV 6000557.

3.4 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN AMBIENTAL

Se realizó reposición de malla de cerramiento que se encontraba en mal estado en los frentes de obra CIV´S 6000372-6000857.
Se realizó inspección de kit de derrames en los frentes de obra CIV 6000557-6001200.
Se realizó inspección de frentes de obra CIV´S 6000857-6001013-6000557.
Se realizó mantenimiento de protección a sumideros CIV´S 6000372-6000557.
Se realizó jornada de orden y aseo en el frente de obra CIV 6000372.
Se realizó cargue de RCD en los frentes de obra CIV´S 6000786-6000557.

4. PRECIOS NO PREVISTOS - (deberán ser notificados mediante comunicación a la entidad)

No Aplica

6. REGISTRO FOTOGRAFICO (TODAS LAS ÁREAS)

SST



Se realizó entrega de dotación y EPP en los frentes de obra CIV´S 6000557-6001013.



Se realizó entrega de dotación y EPP en los frentes de obra CIV´S 6000557-6001013.



Se realizó inspección de extintor y botiquín en los frentes de obra CIV´S 6000557-6000857-6001200.



Se realizó inspección de maquinaria en el frente de obra CIV 6000557.



Se realizó inspección de trabajos en obra CIV 6000557.



Se realizó inspección de extintor y botiquín en los frentes de obra CIV´S 6000557-6000857-6001200.




Se realizó inspección de extintor y botiquín en los frentes de obra CIV´S 6000557-6000857-6001200.




Se realizó inspección de extintor y botiquín en los frentes de obra CIV´S 6000557-6000857-6001200.

AMBIENTAL

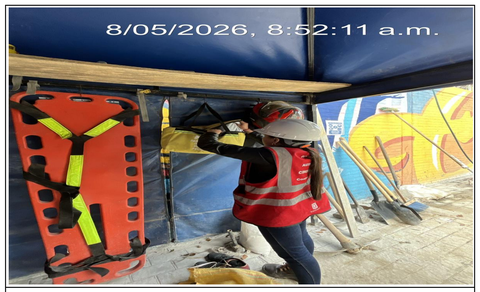

Se realizó inspección de kit de derrames en los frentes de obra CIV 6000557-6001200.

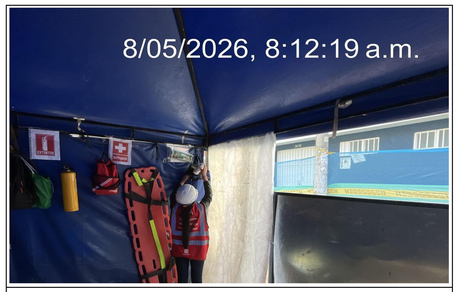

Se realizó inspección de kit de derrames en los frentes de obra CIV 6000557-6001200.



Se realizó inspección de frentes de obra CIV´S 6000857-6001013-6000557.



Se realizó mantenimiento de protección a sumideros CIV´S 6000372-6000557.



Se realizó jornada de orden y aseo en el frente de obra CIV 6000372.



Se realizó reposición de malla de cerramiento que se encontraba en mal estado en los frentes de obra CIV´S 6000372-6000857.




Se realizó cargue de RCD en los frentes de obra CIV´S 6000786-6000557.




Se realizó cargue de RCD en los frentes de obra CIV´S 6000786-6000557.

SOCIAL



Trazabilidad de Derecho de Peticion Oficio FDLT-CTO-613-2025 - 063



Trazabilidad de Informe Mensual No 4



Proyeccion de Volantes



Solicitando el retiro de un vehiculo



Consultas con comunidad



Recorrido de obra



Recorrido de obra, vallas Instaladas



Consulta de comunidad

TÉCNICO



Instalación de bordillo A-80 y perfilado y limpieza de paños para la colocación de concreto en el CIV 6001200



Excavación para cárcamos de los dúctos de descole de los sumideros en el CIV 6000372



Armado de acero para los cárcamos de los descoles de los sumideros en el K0+003 en el CIV 6000857



Se pañeta el pozo de inspección por fuera y por dentro, se cubre con geotextil en el CIV 6000786



Colocación de concreto de 3.000PSI para estampado en andén en el CIV 6001200



Se continúa instalación de bordillo A-80 como sardinel en el CIV 6000857



Se termina la construcción del pozo de inspección de A.N y se construyen los dados de las domiciliarias en el CIV 6000786



Se continúa instalación de bordillo A-80 y A-85 en el CIV 6000857

Nota: Las fotografías deberán contar con la fecha y ubicación del sector

APROBADO CONTRATISTA

JOTAM MAESTRE DIAB

FIRMA

APROBADO INTERVENTORÍA

SANTIAGO CARILLO VARGAS

FIRMA
