UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO MENSUAL ENERO

No. 5

BOGOTÁ D.C. 15 FEBRERO DE 2026

Contrato/Convenio **No. 257 DE 2025**

Subdirección de Construcción y Conservación

USPEC

USPEC

INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO MENSUAL

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL INFORME

No. del Informe	1	Periodo del Informe				Fecha de Elaboración del Informe
		Desde	1-01-2026	Hasta	31-01-2026	15-02-2026

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

No. del Contrato de Interventoría	257-2025	Fecha de Suscripción	Plazo	Fecha de Inicio	Fecha Inicial de Terminación	Fecha de Terminación Actual
		miércoles, 27 de agosto de 2025	3.8	16-09-2025	miércoles, 31 de diciembre de 2025	31-03-2025

Contratista	Nombre	Dirección	NIT o C.C.	Teléfono	Correo electrónico
	TOTALL INC SAS BIC	CARRERA 47 A NO. 93 – 41 BOGOTÁ	901.620.351-9.	3112004625	totallincsasbic@gmail.com
	Representante legal	EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL			

Información del Contrato de interventoría	Estado	Plazo Faltante	Enlace SECOP II	Enlace Carpetas	Valor Inicial del Contrato	Valor Final del Contrato
	Ejecución	0,80	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE	\\192.168.70.23\proyectos_inversion\002 SUBDIR. CYC\Ctos de Mtto\2025\Contratos de emergencia 2025\CTO-257-2025-INTER	$ 666.337.578,00	$ 666.337.578,00

Objeto del contrato de interventoria	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURÍDICA Y FINANCIERA PARA REALIZAR LA ATENCIÓN PRIMARIA O DE EMERGENCIA A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSION DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC.

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

No. del Contrato de Obra	238-239-240 de 2024	Fecha de Suscripción	Plazo	Fecha de Inicio	Fecha Inicial de Terminación	Fecha de Terminación Actual
		28-07-2025	3,00	16-09-2024	31-12-2025	31-12-2024

Contratista	Nombre	Dirección	NIT o C.C.	Teléfono	Correo electrónico
	CTO 238 GRUPO 1-H.A.H. CONSTRUCCIONES S.A.S.	Cra. 6 N°. 53-29 OF 604 TORRE EMPRESARIAL SANTA MONICA - Urb Rincón de piedra pintada, en Ibagué (Tolima)	900431716-9	608-2553520	gerencia@hahconstrucciones.com
	Representante legal				

Contratista	Nombre	Dirección	NIT o C.C.	Teléfono	Correo electrónico
	CTO 239 GRUPO 2 CONSORCIO MANTENIMIENTOS EMERGENCIAS 2025	Calle 145 # 7 A – 40, casa 26, en Bogotá D.C.	901972552-2	3183903694	licitaciones.cau@gmail.com
	Representante legal				

Contratista	Nombre	Dirección	NIT o C.C.	Teléfono	Correo electrónico
	CTO 240 GRUPO 3 CONSORCIO ADECUACIONES 2025	Calle 9 A No. 13-35, Valledupar-Cesar	901974032-3	3215389809	agcanadas02@gmail.com
	Representante legal				

Localización	Regional	Departamento	Municipio	ERON	Coordenada	
					Latitud N	Longitud E
	G1-CENTRAL					
	G2-OCCIDENTE-VIEJO CALDAS					
	G3-ORIENTE-NORTE-NOROESTE					

4. INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR

Supervisor actual	No. Identificación CC.	Nombre	Cargo	Documento de Designación de Supervisión	Desde	Hasta
	1.065.372.283	KARINA JOHANA ROMERO SUÁREZ	Sub. De Construcción y Conservación		16-09-2025	A LA FECHA

Apoyo Supervisor actual	No. Identificación CC.	Nombre	Cargo	Documento de Designación de Supervisión	Desde	Hasta
	1,026,554,798	OSCAR JULIAN COBOS CORTES	Sub. De Construcción y Conservación		16-09-2025	A LA FECHA

Supervisores anteriores	No. Identificación CC.	Nombre	Cargo	Documento de Designación de Supervisión	Desde	Hasta

Supervisores anteriores	No. Identificación CC.	Nombre	Cargo	Documento de Designación de Supervisión	Desde	Hasta

Relación de Visitas Realizadas por el Supervisor o Apoyo a la Supervisión	Nº de Visitas	Fecha de la Visita	Recomendaciones de la Visita

Relación de Comités Realizados	Nº de Comites	Fecha del comité	Compromisos
	1	28-01-2025	En EL comitÉ realizado durante el mes de ENERO se socializaron las ODS que fueron aprobadas por parte de la Supervisión, y de igual forma se evaluaron los avances de obra de las ODS aprobadas previamente. En concreto, se presentaron los lineamientos de las nuevas ODS aprobadas, se actualizó el estado de ejecución de obra de las ODS anteriores, se revisaron los indicadores de avance y se resaltaron los logros y las dificultades encontradas hasta la fecha. \\192.168.70.23\proyectos_inversion\002 SUBDIR. CYC\Ctos de Mtto\2025\Contratos de emergencia 2025\CTO-257-2025-INTER\2. Actas\6-ACTAS DE REUNION COMITES\5-ENERO

5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Información presupuestal	Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP			Certificado de Registro Presupuestal-RP			
	No.	Fecha	Valor	No.	Fecha	Valor	
	CDP No: 23925	26-02-2025	666.337.578,00	RP-123925	11-09-2025	$	666.337.578,00

6. MODIFICACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Modificaciones al contrato	Tipo de Modificación	Descripción	Fecha	N°. Registro Presupuestal	Valor de la Modificación	Saldo de la Modificación
			Total de Modificaciones		$ -	$ -

7. RELACIÓN DE ACTAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Relación de Actas	Acta No.	Tipo de acta	Fecha de inicio de la suspensión (Si aplica)	Fecha de reinicio (Si aplica)	Plazo de la suspensión días (Si aplica)	Fecha de terminación final
	Acta Nº. 1	Acta de Inicio				31-12-2025

8. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor del Contrato	Valor Inicial del Contrato	Valor Adicional	Valor Actualizado	Valor del Anticipo	Valor Anticipo en Fiducia	Valor anticipo pagado
	666.337.578,00	$ -	$ 666.337.578,00	N/A	N/A	N/A

Pagos Realizados	Periodo Facturado Desde	Hasta	N°. de Factura	Fecha de la Factura	Concepto	Valor del Acta
	08-10-2025	31-10-2025	FEV-246	19-11-2025	ACTAS: G-2. CTO 239-2025 CUENTA DE COBRO No. 1: EPMSC PUERTO TEJADA ACTA PARCIAL No. 1 , COJAM JAMUNDÍ ACTA PARCIAL No. 1, COIBA IBAGUÉ (Picaleña) ACTA PARCIAL 1.	$38.444.854,90
	08-10-2025	29-10-2025	FEV247	19-11-2025	SOBRE ACTAS: G-1. CTO 238-2025 1.00 79,985,957.28 79.985.957 28 CUENTA DE COBRO No. 1: DE LOS ESABLECIMIENTOS EPMSC CHIQUINQUIRÁ - EPMSC-RM VILLAMCENCIO EPMSC FLORENCIA - RM PAS ERE BOGOTÁ D.C - EPMSC JP ESPINAL - EPMSC SANTA ROSA DE VITERBO - COMEB BOGOTA LA PICOTA PERIODO DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2025 AL 29 DE OCTUBRE DE 2025.	$95.183.289,16
	08-10-2025	04-12-2025	FEV-250	11-12-2025	EPMSC PUERTO TEJADA ACTA PARCIAL No.2 (ODS G2-007 P1), EPAMS CAS ERE POPAYAN ACTA PARCIAL No.1 (ODS-G2-009 P1 Y ODS-G2-010 P1), COJAM JAMUNDI ACTA PARCIAL No.2 (ODS G2-002 FINAL), COJAM JAMUNDI ACTA PARCIAL No.3 (ODS G2-001 FINAL Y ODS G2-003 FINAL), COMPLEJO CARCELARIO COIBA IBAGUE ACTA PARCIAL No.2 (ODS G2-004 FINAL Y ODS G2-005 FINAL), COMPLEJO CARCELARIO COIBA IBAGUE ACTA PARCIAL No.3 (ODS G2-011 FINAL),	$85.379.667,87
	08-10-2025	04-12-2025	FEV-251	11-12-2025	COCUT CUCUTA ACTA PARCIAL No.1 (ODS G3-004 FINAL) – EP PUERTO TRIUNFO ACTA PARCIAL No.1 (ODS G3-001 FINAL - ODS G3-002 FINAL - ODS G3-003 FINAL)	$31.375.171,98
	(DD/MM/AAAA)	(DD/MM/AAAA)		(DD/MM/AAAA)		$ -
			Valor Acumulado Pagado			$250.382.983,91

Facturación del contrato 238 GRUPO 1	Acta N°	Valor del Acta	N°. Registro Presupuestal a Afectar	Valor del Registro Presupuestal a Afectar	Saldo en el Registro Presupuestal	Memorando Número / Fecha
	No. 1	$ 542.812.698,51	101725	$ 1.356.600.000,00	$ 813.787.301,49	INT-USPEC-257-058-14- nov-25
	No. 2	$ 316.648.897,60	101725	$ 1.356.600.000,00	$ 497.138.403,89	INT-USPEC-257-095 09-12-2025
Total, facturado:		Saldo del Contrato:	$ 497.138.403,89			EN PROCESO DE RADICACION

Facturación del contrato 239 GRUPO 2	Acta N°	Valor del Acta	N°. Registro Presupuestal a Afectar	Valor del Registro Presupuestal a Afectar	Saldo en el Registro Presupuestal	Memorando Número / Fecha
	No. 1	$ 219.243.898,99	$ 101.525,00	$ 1.179.520.000,00	$ 960.276.101,01	INT-USPEC-257-058 - 14-NOV-25
	No. 2	$ 486.904.458,96	$ 101.525,00	$ 1.179.520.000,00	$ 473.371.642,05	INT-USPEC-257-089 03- dic-25
Total, facturado:		Saldo del Contrato:	$ 473.371.642,05			EN PROCESO DE RADICACION

Facturación del contrato 240 GRUPO 3	Acta N°	Valor del Acta	N°. Registro Presupuestal a Afectar	Valor del Registro Presupuestal a Afectar	Saldo en el Registro Presupuestal	Memorando Número / Fecha
	No. 1	$ 178.926.804,51	101825	$ 1.263.880.000,00	$ 1.084.953.195,49	CA25-023-2025 - 04- dic-25
Total, facturado:		Saldo del Contrato:	$ 1.084.953.195,49			EN PROCESO DE RADICACION


Porcentaje del Plazo de Ejecución	0,00%

Fecha de Corte	(30/09/2025)	(31/10/2025)	(30/11/2025)	(31/12/2025)		
Mes	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	
% Plazo	14%	28,00%	42%	56%	70,00%	
			INVERSIÓN ACUMULADA (MILLONES DE $)			
Inversión Programada	$ 93.287.261	$ 186.574.522	$ 279.861.783	$ 373.149.044	$ 466.436.305	$ -
Inversión Ejecutada	93.287.261	$ 186.574.522	$ 279.861.783	$ 373.149.044	$ 466.436.305	$ -
Inversión Pagada	$ -	$ -	$ 133.628.144	$ 250.382.984	$ 250.382.984	

9. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

% Programada	14%	28,00%	42%	56%	70,00%	
% Ejecutada	14,00%	28,00%	42,00%	56,00%	70,00%	
% Atraso Acumulado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	

Acciones de mejora o plan de contingencia (ver anexo tecnico)



10. RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	ERON	Resumen de Actividades	Observación
Actividades Ejecutadas del Contrato	G1 - EPMSC Chiquinquirá – COMEB Bogotá – La Picota - CPMS Bogotá – La Modelo - EPMSC Leticia - EPMSC JP Espinal - EPMSC RM Villavicencio	Se observa que en varios establecimientos penitenciarios las ODS presentan distintos grados de avance y pendientes: • En EPMSC Chiquinquirá, la ODS G1-001 está físicamente terminada, pero pendiente de informe final y cierre documental. • En EPMSC RM Villavicencio, la ODS G1-002 presenta retrasos por imprevistos técnicos (redes no contempladas), con intervención en curso y llamados de atención al contratista para mejorar la ejecución. • En RM PAS ERE Bogotá (Buen Pastor), la ODS G1-004 está culminada físicamente, con ampliaciones por actividades adicionales, y se espera la documentación de cierre. • En EPMSC JP Espinal, la ODS G1-005 presenta atrasos por sustitución de componentes, con avance significativo bajo seguimiento de la Interventoría. • En COMEB Bogotá (La Picota), varias ODS presentan avances mixtos: – G1-008 y G1-010 finalizadas físicamente, pendientes de cierre documental e informe final. – G1-011 parcialmente ejecutada, con solución definitiva de fugas aún en desarrollo y pendiente técnico y documental. • En EPMSC Leticia, la ODS G1-009 muestra retraso frente a su cronograma y continúa ejecución bajo seguimiento. • En CPMS Bogotá (La Modelo), las ODS G1-012 y G1-013 presentan retrasos en ejecución, con actividades preliminares desarrolladas, pero avance no proporcional al tiempo transcurrido. Este resumen refleja que, si bien varias intervenciones físicas han sido completadas, existe atraso en informes finales, cierres documentales y desarrollo de algunos trabajos técnicos, lo cual requiere atención prioritaria para completar la formalización contractual y corregir desviaciones de cronograma.	
	G2-CPAMSLDO LA DORADA - COIBA Ibagué - CPAMSY Popayán - PMSC Puerto Tejada - CPMSTUM Tumaco - COJAM Jamundí	A la fecha de corte del presente informe, el Grupo 2 cuenta con trece (13) ODS aprobadas, de las cuales nueve (9) están físicamente finalizadas (algunas pendientes de cierre documental), una (1) presenta ampliación de plazo justificada y tres	

	Puerto Tejada - CPMSM Palmira - COPED Jamundí	Iniciamente finalizadas (seguirán pendientes de cierre documental), una (1) presenta ampliación de plazo justificada y tres (3) continúan en ejecución bajo cronograma ajustado con seguimiento técnico. El avance físico general consolidado es del 71 %, reflejando un progreso significativo en el desarrollo del contrato.	
	G3 - EP PUERTO TRIUNFO (EL PESEBRE) - CPMSM RM Bucaramanga - Complejo Penitenciario de Cúcuta - EPMSC Cartagena - EPMSC Barranquilla - COPED Pedregal	A la fecha de corte del presente informe, cinco (5) Órdenes de Servicio (G3-005 a G3-009) se encuentran en ejecución, desarrollando actividades relacionadas con atención de emergencias, intervenciones estructurales y adecuaciones hidrosanitarias, y han requerido ajustes operativos por contingencias sanitarias, restricciones de ingreso a los establecimientos y necesidades técnicas identificadas. Las ODS G3-005 y G3-006, en el EPAMS CAS Girón, continúan con actividades activas bajo condiciones especiales por la contingencia sanitaria; la ODS G3-007 avanza en la intervención estructural de celdas; la ODS G3-008 continúa con acciones correctivas en el COPED Pedregal; y la ODS G3-009 desarrolla actividades hidrosanitarias en el EPMSC Cartagena y se encuentra en evaluación de mayores cantidades de obra. Paralelamente, cuatro (4) Órdenes de Servicio (G3-001 a G3-004) están finalizadas físicamente, pendientes únicamente de la entrega y validación de los informes finales y documentación de cierre para su culminación administrativa. En términos generales, las ODS del Grupo 3 avanzan con frentes de trabajo activos y control técnico continuo por parte de la Interventoría, garantizando el cumplimiento de especificaciones, avances físicos y adecuada gestión documental.	

11. POLIZAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Seguimiento a Pólizas del Contrato

Póliza No.	21-44-101479104	Nombre de la Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Anexo No.	0
Descripción del amparo		Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Valor Asegurado	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		16-09-2025	14-07-2026	$ 199,901,273.40	
PRESTACIONES SOCIALES		16-09-2025	14-01-2029	$66,633,757.80	
CALIDAD DEL SERVICIO		14-01-2026	14-01-2031	$133,267,515.60	

Aclaración:

12. PERSONAL MINIMO REQUERIDO EN EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Seguimiento al Personal Minimo Requerido en el Contrato

Nº. Identificación CC.	Nombre	Profesión	Cargo	% Dedicación	Observaciones
80.073.262	RICARDO JOSÉ MANSILLA B		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	100%	
79505973	JAVIER CRISTOBAL PEREZ AMARIS		RESIDENTE DE OBRA NO.1	100%	
1022388512	JAVIER RICARDO MORENO MOLINA		RESIDENTE DE OBRA NO.2	100%	
1070307635	PAULA ANDREA ESPINEL ALFONSO		RESIDENTE DE OBRA NO.3	100%	
1233491368	CRISTIAN STIVEN RODRIGUEZ LEAL		RESIDENTE DE OBRA NO.4	100%	
27.602.678	CARLA MARIA BECERRA BARRIOS		RESIDENTE DE OBRA NO.5	100%	
52.058.434	NELLY YANETH ALGARRA RODRIGUEZ		RESIDENTE DE OBRA NO.6	100%	
1.094.411.216	INGRID LIZETH RIVERA VEGA		PROFESIONAL SST	100%	
10.260.102	JESUS ALBERTO LOPEZ VELANDIA		PROFESIONAL ELECTRICO	30%	
19079511	JUAN GUSTAVO MAHECHA BAUTISTA		PROFESIONAL MECANICO	30%	

Observaciones

13. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Nombrey Apellido	Nº. Identificación CC.	Cotización Salud	Cotización Pensión	Cotización ARL	Periodo	
					No. de planilla	Desde Hasta
RICARDO JOSE MANSILLA B	80.073.262	SANITAS	PORVENIR	COLMENA		
JAVIER CRISTOBAL PEREZ AMARIS	79.505.973	SANITAS	PORVENIR	COLMENA	9492697774	
JAVIER RICARDO MORENO MOLINA	1.022.388.512	SANITAS	PORVENIR	COLMENA	9492697774	
PAULA ANDREA ESPINEL ALFONSO	1.070.307.635	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA SEGUROS	9492629830	
CRISTIAN STIVEN RODRIGUEZ	1.233.491.368	COMPENSAR	PORVENIR	COLMENA	9493725718	
CARLA MARIA BECERRA BARRIOS	27602678	COMPENSAR	PORVENIR	COLMENA	9493148583	
NELLY YANETH ALGARRA	52.058.434	COMPENSAR	PORVENIR	COLMENA	9493275260	
INGRID LIZETH RIVERA VEGA	1.094.411.216	COMPENSAR	PORVENIR	COLMENA	9491754195	
JESUS ALBERTO LOPEZ VELANDIA	10.260.102	COMPENSAR	PORVENIR	COLMENA	9491754195	
JUAN GUSTAVO MAHECHA	19.079.511		PORVENIR	COLMENA	9491754195	

Observaciones

14. RELACIÓN DE INFORMES DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Relación de Informes de Supervisión

No. de Informe	Desde	Hasta	Mes	Nombre del Supervisor	Publicado en SECOP II
Informe N1	16-09-2025	26-09-2024	Septiembre	KARINA JOHANA ROMERO	
Informe N2	26-09-2025	26-10-2025	Octubre	KARINA JOHANA ROMERO	
Informe N3	26-10-2025	26-11-2025	Noviembre	KARINA JOHANA ROMERO	
Informe N4	26-11-2025	26-12-2025	Diciembre	KARINA JOHANA ROMERO	
Informe N5	26-12-2025	26-01-2026	Enero	KARINA JOHANA ROMERO	

Observaciones

15. COMUNICACIONES PRESENTADAS DURANTE EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME

Nº de Radicado	Fecha de radicado	Asunto	Remitente	Medio de Radicación	Fecha de Respuesta	Respuesta o Tramite
1	\\192.168.70.23\proyectos_inversion\002_SUBDIR_CYC\Ctos de Mtto\2025\Contratos de emergencia 2025\CTO-257-2025-INTER\4_Correspondencia\1	CORRESPONDENCIA ENVIADA	Interventor	Correo electrónico		
2	\\192.168.70.23\proyectos_inversion\002_SUBDIR_CYC\Ctos de Mtto\2025\Contratos de emergencia 2025\CTO-257-2025-INTER\4_Correspondencia\2	CORRESPONDENCIA RECIMDA	Interventor	Correo electrónico		

Seguimiento a Control del Riesgo del Contrato

No se han amterializado riesgos en el periodo del presente informe

Seguimiento a Gestión Ambiental del Contrato	A la fecha del corte del informe, el contrato cuenta con el personal encargado de realizar el buen manejo de la seguridad industrial. Se presenta el informe mensual de Interventoria
Seguimiento a Seguridad Industrial y Señalización	A la fecha del corte del informe, el contrato cuenta con el personal encargado de realizar el buen manejo de la seguridad industrial. Se presenta el informe mensual de Interventoria.

16. REGISTRO FOTOGRAFICO

ESTABLECIMIENTO DE COIBA IBAGUE



Establecimiento Rm Buen Pastor



Establecimiento neiva



Establecimiento de Villavicencio




Establecimiento Girardot

ESTABLECIMIENTO DE LA DORADA

Registro Fotográfico



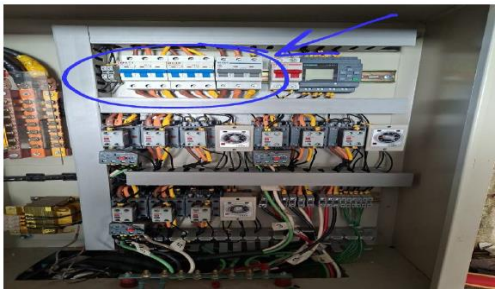

ESTABLECIMIENTO DE JAMUNDI DIER








ESTABLECIMIENTO DE POPAYAN






ESTABLECIMIENTO DE PUERTO TEJADA





ESTABLECIMIENTO DE GIRON





ESTABLECIMIENTO DE CARTEGENA





Diagnostico basado en la programación	Se han ejecutado a cabalidad las correspondientes funciones de la interventoria, acorde a tiempos de validacion de ordenes de servicio, visitas diagnosticos, presentacion de informes,
Problemas, Dificultades y Soluciones Planteadas	• Existen jornadas reducidas de trabajo causadas por los procesos de la guardia • No se permite trabajar los fines de semana • No se permiten jornadas extendidas de trabajo • El seguimiento al total de los frentes de obra por parte de la interventoria con el contratista de obra, se evidencia un buen tiempo de ejecución de las ods por cada establecimiento,
Desempeño de la Interventoria	El contrato de Interventoria Contratada por la USPEC, tiene la obligación de ejercer la representación de la Entidad ante el contratista y que está encargada de hacer el seguimiento técnico del contrato. Dada la naturaleza del objeto contractual y los proyectos que ejecuta la entidad, el control que ejerce el interventor puede incluir el seguimiento administrativo, financiero, legal y ambiental, por medio de la vigilancia y seguimiento al cumplimiento del contrato y a las obligaciones del contratista. De acuerdo a lo definido en el Manual de Supervisión e Interventoria de la USPEC, el cual forma parte integral del contrato238-239-240 de 2025. La interventoria en cumplimiento de sus funciones contractuales ha ejecutado la revision de documentos radicados por contratista y socializado las notificaciones emitidas por la USPEC a contratista, ha revisado y aprobado la informacion presentada para la ejecucion de ODS, ha llevedo el seguimiento a la ejecucion de ODS aprobadas y la verificacion del cumplimiento de los requerimientos tecnicos contractuales hacia el contratista.

Alertas jurídicas del contrato	Dado que el contrato aún se encuentra en su fase de inicio y de diagnósticos, no se han identificado alertas jurídicas relacionadas con el cumplimiento del mismo. El desempeño de los contratistas ha sido receptivo y están trabajando conforme a lo acordado en el anexo técnico. Por el momento se están llevando a cabo las visitas de diagnóstico.

18. ANEXOS AL INFORME DE SUPERVISIÓN MENSUAL DEL CONTRATO

No.	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	NUMERO DE FOLIO	SI /NO

Firmas

Nombre del supervisor: KARINA JOHANA ROMERO SUAREZ

Firma:

Nombre del apoyo a la supervisiòn: OSCAR JULIAN COBOS CORTES

Firma:
