F - IP - 226

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

La equidad es de todos — Prosperidad Social	**FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Código:** F-IP-226
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	**Versión: 4**

FECHA DE INFORME:	23/10/2022		INFORME N°:		PERÍODO DEL	17/10/2022
			ETAPA:	CONSTRUCCION	AL	23/10/2022
N° Y AÑO DE CONVENIO/CONTRATO (DPS):	601/2021		ID DEL PROYECTO:	E-2020-2203-224170		
DEPARTAMENTO:	CESAR		MUNICIPIO:	MANAURE		
N° Y AÑO CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	406 FIP DE 2021		SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO DE INTERVENTORÍA (DPS):	SANDRA MILENA GALAVIS PAEZ		

1. INFORMACIÓN GENERAL


OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:	**CONSTRUCCIÓN EN PLACA HUELLA DE LA VÍA DE ACCESO ALTERNA AL CORREGIMIENTO DE SABANAS DE LEÓN EN EL MUNICIPIO DE MANAURE, CESAR.**		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	MUNICIPIO DE MANAURE - DEPARTAMENTO DEL CESAR	No. Beneficiarios	1658
N° ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA (o su equivalente):			


PROYECTO DE INTERVENTORÍA (PI)				**CONTRATO DE OBRA**			
N° ACTA DE ASIGNACIÓN PROYECTO DE INTERVENTORÍA (o su equivalente):	017-RIII			N° Y AÑO DE CONTRATO:	004 DE 2022		
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO ADMINISRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - FIP			CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MANAURE BALCON DEL CESAR / CESAR		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERDI - BATEMAN			CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS SABANAS DE LEON		
PLAZO PRECONSTRUCCIÓN:	N/A			PLAZO PRECONSTRUCCIÓN:	N/A		
PLAZO CONSTRUCCIÓN:	5 MESES			PLAZO CONSTRUCCIÓN:	5 MESES		
PLAZO TOTAL INICIAL:	5 MESES			PLAZO TOTAL INICIAL:	5 MESES		
FECHA DE INICIO:	29/07/2022			FECHA DE INICIO:	29/07/2022		
*FECHA DE SUSPENSIÓN N° :	N/A			*FECHA DE SUSPENSIÓN N°:	N/A		
*FECHA DE REINICIO N°:	N/A			*FECHA DE REINICIO N°:	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN:	29/12/2022			FECHA DE TERMINACIÓN:	28/12/2022		
PLAZO ACTUALIZADO:	153			PLAZO ACTUALIZADO:	152		
PLAZO TRANSCURRIDO:	86	EQUIVALE AL	56%	PLAZO TRANSCURRIDO:	86	EQUIVALE AL	57%
VALOR INICIAL :	$	133.182.995,00		VALOR INICIAL :	$	1.329.194.953,45	
*VALOR ADICIÓN N° :	N/A			*VALOR ADICIÓN N° :	N/A		
VALOR ACTUALIZADO:	$	133.182.995,00		VALOR ACTUALIZADO:	$	1.329.194.953,45	
PORCENTAJE DE EJECUCION		13,07%		PORCENTAJE DE EJECUCION		13,07%	
VALOR EJECUTADO	$	17.402.747,48		VALOR EJECUTADO:	$	173.683.165,24	
PORCENTAJE DE PAGO		0,00%		PORCENTAJE DE PAGO	$	-	
VALOR PAGADO:	$	-		VALOR PAGADO:	$	-	
VALOR POR EJECUTAR:	$	115.780.247,52		VALOR POR EJECUTAR:	$	1.155.511.788,21	
SUPERVISOR DE CONVENIO O CONTRATO:	SANDRA MILENA GALAVIS PAEZ			SUPERVISOR DESIGNADO POR EL CONTRATANTE:	DANIEL ALEJANDRO MAHECHA CALDERON		

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones.

2. PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	Planeado	Ejecutado	Avance
2.1 AVANCE FÍSICO (%)	63,37%	13,07%	21%
2.2 AVANCE - EJECUCIÓN PRESUPUESTO ($)	$ 842.301.765,05	$ 173.683.165,24	
DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO (en $)	$ 668.618.599,81	$ 173.683.165,24	

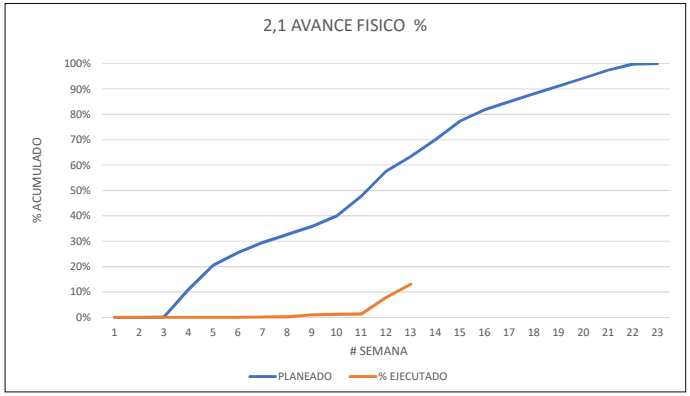

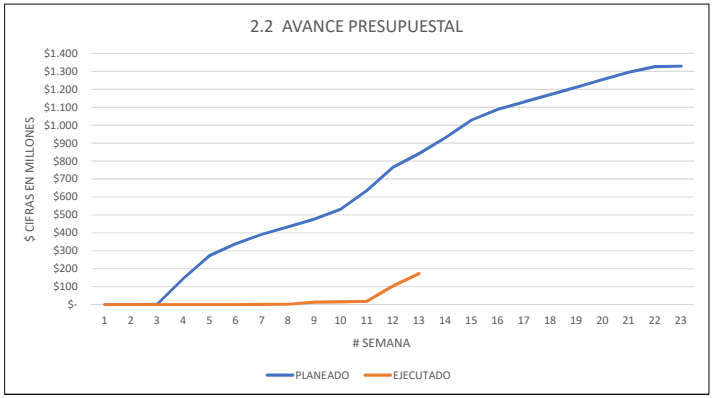

3. PROGRAMACIÓN DE AUDITORÍAS VISIBLES E INTERMEDIAS

No.	FECHA PROGRAMADA	HORA INICIO/ HORA FIN	LUGAR	FECHA REAL
1				
2				
3				

4. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que estan originando dicha situación, correspondientes a los siguientes aspectos:

4.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES) :
SE REFLEJA UN AVANCE SIGNIFICATIVO EN EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A EJECUTAR.

4.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS (ECONÓMICOS, PERSONAL, EQUIPOS, ETC) AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL:
EL CONTRATISTA MUESTRA CAPACIDAD ECONOMICA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES Y DESARROLLO ADECUADO DEL PROYECTO, PRESENTA EN CAMPO EL PERSONAL TECNICO PARA CUMPLIR LAS ACTIVIDADES.

4.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO :
SE INICIA POR PARTE DEL CONTRATISTA LA ENTREGA DE EL ACTA #1

4.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS :
SE REALIZAN OBSERVACIONES EN EL ACOPIO DEL MATERIAL PETREO (TRITURADO, ARENA DE TRITURACION), DEBIDO A QUE SE HA IDO SEGREGANDO POR LAS PRECIPITACIONES AFECTANDO LA RESANTE CONFORMADA DE SUBBASE.

4.5. MANEJO AMBIENTAL :
SE HAN PRESENTADO MUCHAS PRECIPITACIONES LAS CUALES AFECTAN EJECUCION DE ACTIVIDADES Y EL ACCESO DE LOS MATERIALES A OBRA, COMUNIDAD AFECTADA POR EL MOVIMIENTO DE TIERRA PRODUCIDO POR LAS LLUVIAS.

4.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL :
EL CONTRATISTA PROPORCIONA EL MATERIAL PARA SEGURIDAD DEL PERSONAL Y DESARROLLO ADECUADO DE LAS ACTIVIDADES.

4.7 SALUD OCUPACIONAL

4.8 ASPECTOS SOCIALES :

EL CONTRATISTA ESTA PRESTO A LA ESPERA DE ALGUNA PQRS POR PARTE DE LA COMUNIDAD.

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ID ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	ESTADO	NOMBRE Y CARGO RESPONSABLE	FECHA INICIO PROGRAMADA	FECHA FIN PROGRAMADA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N/A

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

SE REALIZA FUNDICION DE HUELLAS Y SOBRE ANCHOS, SE RECOMIENDA REALIZAN MEJORA DE RASANTE DE SUBBASE DEBIDO A AFECTACIONES PRESENTADAS POR LAS FUERTES LLUVIAS, SE REALIZAN OBSERVACIONES EN CUANTO LA DISTRIBUCION DEL ACERO Y EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO, SE RECOMIENDA CUMPLIR CON EL PLAN DE CONTIGENCIA PRESENTADO.

8. ANEXOS

1. Reporte de Seguimiento al avance del Contrato de Obra (F-IP-170) - (Infraestructura Social)

2. Registro Fotográfico del avance durante la semana (F-IP-209) (aplica para Infraestructura Social) <inserte aquí de cuatro a seis fotografías que muestren el avance general del proyecto durante la semana. Deben ser fotografías a color, con resolución no menor a 3MB>

3. Copia de la Bitácora de Obra correspondiente al perídodo reportado

4. Otros. Anexos que la Interventoría considere relevantes, por ejemplo: informes especiales (si aplica).

FIRMA:_____
INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA)
NOMBRE: CLARA LUZ JARAMILLO
TP N°:

Notas:
1. El informe debe ser enviado del correo registrado por parte del Interventor.
2. El informe debe incluir todos los anexos relacionados.
3. El informe ejecutivo debe ser diligenciado conforme al formato establecido.
