La equidad es de todos · Prosperidad Social	**FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Código:** F-IP-226
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	**Versión: 4**

FECHA DE INFORME:	lunes, 28 de agosto de 2023	INFORME N°:	27	PERÍODO DEL	21/08/2023
		ETAPA:	Obra	AL	27/08/2023
N° Y AÑO DE CONVENIO/CONTRATO (DPS):	683-2021	ID DEL PROYECTO:	11053		
DEPARTAMENTO:	SUCRE	MUNICIPIO:	SAMPUÉS		
N° Y AÑO CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	CONTRATO 205 FIP 2019	SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO DE INTERVENTORÍA (DPS):	JORGE SANDOVAL/JONATAN ISAZA		

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CONCRETO RÍGIDO DE LAS CALLES Y CARRERAS DEL BARRIO DOCE DE OCTUBRE MUNICIPIO DE SAMPUÉS, DEPARTAMENTO DE SUCRE		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BARRIO DOCE DE OCTUBRE - MUNICIPIO DE SAMPUES	No. Beneficiarios	5031
N° ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA (o su equivalente):		**Nota: Verificar que el Acta se encuentra suscrita por todas las partes intervinientes**	


PROYECTO DE INTERVENTORÍA (PI)		**CONTRATO DE OBRA**	
N° ACTA DE ASIGNACIÓN PROYECTO DE INTERVENTORÍA (o su equivalente):	075-ZONA 2	N° Y AÑO DE CONTRATO:	MS-670-112-2022
CONTRATANTE:	PROSPERIDAD SOCIAL	CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE SAMPUES SUCRE
INTERVENTOR:	UNION TEMPORAL 3G	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAVIMENTO SAMPUES 2022
PLAZO PRECONSTRUCCIÓN:	N/A	PLAZO PRECONSTRUCCIÓN:	N/A
PLAZO CONSTRUCCIÓN:	6 MESES	PLAZO CONSTRUCCIÓN:	6 MESES
PLAZO TOTAL INICIAL:	6 MESES	PLAZO TOTAL INICIAL:	6 MESES
FECHA DE INICIO (Acta de Asignación):	23 de junio de 2022	FECHA DE INICIO (Acta de Asignación):	23 de junio de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	23 de diciembre de 2022	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	23 de diciembre de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN N°1:	20 de diciembre de 2022	FECHA DE SUSPENSIÓN N°1:	20 de diciembre de 2022
FECHA DE PRÓRROGA N°1	11 de enero de 2023	FECHA DE PRÓRROGA N°1	11 de enero de 2023
FECHA DE PRÓRROGA N°2	26 de enero de 2023	FECHA DE PRÓRROGA N°2	26 de enero de 2023
FECHA DE PRÓRROGA N°3	10 de febrero de 2023	FECHA DE PRÓRROGA N°3	10 de febrero de 2023
FECHA DE PRÓRROGA N°4	13 de marzo de 2023	FECHA DE PRÓRROGA N°4	13 de marzo de 2023
FECHA DE PRÓRROGA N°5	13 de abril de 2023	FECHA DE PRÓRROGA N°5	13 de abril de 2023
FECHA DE PRÓRROGA N°6	14 de mayo de 2023	FECHA DE PRÓRROGA N°6	14 de mayo de 2023
FECHA DE PRÓRROGA N°7	14 de junio de 2023	FECHA DE PRÓRROGA N°7	14 de junio de 2023
FECHA DE PRÓRROGA N°8	1 de agosto de 2023	FECHA DE PRÓRROGA N°8	1 de agosto de 2023
FECHA DE REINICIÓ N°1	14 de agosto de 2023	FECHA DE REINICIÓ N°1	14 de agosto de 2023
PRÓRROGA N°1 AL CONTRATO DE OBRA	17 de agosto de 2023	PRÓRROGA N°1 AL CONTRATO DE OBRA	17 de agosto de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	17 de octubre de 2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	17 de octubre de 2023
PLAZO ACTUALIZADO:	244	PLAZO ACTUALIZADO:	244
PLAZO TRANSCURRIDO:	193 EQUIVALE AL 79,10%	PLAZO TRANSCURRIDO:	193 EQUIVALE AL 79,10%
VALOR INICIAL :	$ 299.860.198,90	VALOR INICIAL :	$ 2.878.512.991,55
VALOR ADICIÓN N°1:	$ -	VALOR ADICIÓN N°1 :	$ 93.030.716,31
VALOR ACTUALIZADO:	$ 299.860.198,90	VALOR ACTUALIZADO:	$ 2.971.543.707,86
VALOR EJECUTADO	$ 270.125.732,96	VALOR EJECUTADO:	$ 2.676.882.177,27
VALOR PAGADO:	$ 30.000.000,00	VALOR PAGADO:	$ 2.014.959.094,09
VALOR POR EJECUTAR:	$ 29.734.465,94	VALOR POR EJECUTAR:	$ 956.584.613,78
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA (DPS):	JONATAN FABIAN ISAZA HERNANDEZ	SUPERVISOR (POR PARTE DEL ENTE TERRITORIAL):	YESSICA GARAY DE LA OSSA

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones.

2. PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	Programado	Ejecutado	Avance
2.1 AVANCE FÍSICO (%)	**80,77%**	**90,08%**	**9,32%**
2.2 AVANCE - EJECUCIÓN PRESUPUESTO ($)	$ 2.400.078.869,00	$ 2.676.882.177,00	
DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO (en $)	**$**	**276.803.308,00**	



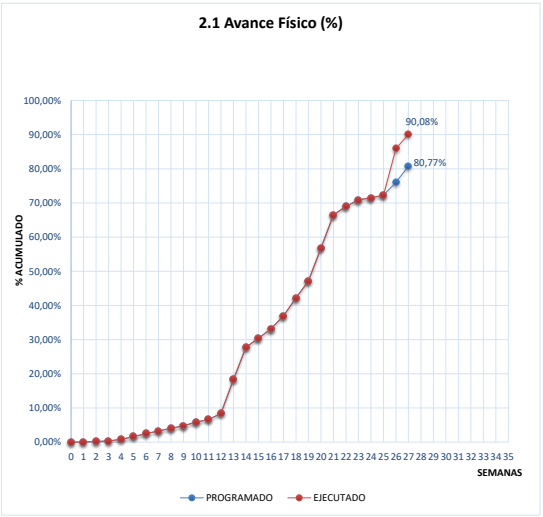

La equidad es de todos · Prosperidad Social	FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**Código:** F-IP-226
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 4

FECHA DE INFORME:	lunes, 28 de agosto de 2023	INFORME N°:	27	PERÍODO DEL	21/08/2023
		ETAPA:	Obra	AL	27/08/2023

3. PROGRAMACIÓN DE AUDITORÍAS VISIBLES E INTERMEDIAS

No.	FECHA PROGRAMADA	HORA INICIO/ HORA FIN	LUGAR	FECHA REAL	OBSERVACIONES
1	20/09/2022	09:00am-10:00am	ESTADIO DE FÚTBOL DOCE DE OCTUBRE	22/09/2022	
2					
3					

4. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que están originando dicha situación, correspondientes a los siguientes aspectos:

4.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)
SIN NOVEDADES.

4.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS (ECONÓMICOS, PERSONAL, EQUIPOS, ETC) AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL:
SIN NOVEDADES.

4.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO:
SIN NOVEDADES.

4.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS:
SIN NOVEDADES.

4.5. MANEJO AMBIENTAL :
SIN NOVEDADES.

4.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL :
SIN NOVEDADES.

4.7 SALUD OCUPACIONAL:
SIN NOVEDADES.

4.8 ASPECTOS SOCIALES :
SIN NOVEDADES.

5. PLAN DE ACCION RESULTADO DEL ANALISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAIZ DE LA SITUACION PROBLEMATICA

ID ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	ESTADO	NOMBRE Y CARGO RESPONSABLE	FECHA INICIO PROGRAMADA	FECHA FIN PROGRAMADA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N/A

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Teniendo en cuenta la reprogramación entregada por el contratista de obra, el porcentaje acumulado de avance de obra programada VS ejecutada para esta semana:

El porcentaje de obra programado es:	80,77%
El porcentaje de obra ejecutado es:	90,08%
Avance:	**9,32%**

Según las actividades realizadas por el contratista y cuantificadas por esta interventoría, el contrato presenta el siguiente avance financiero:

Valor programado:	$ 2.400.078.869,00
Valor ejecutado:	$ 2.676.882.177,00

Durante la presente semana, el contrato de obra se encuentra en estado de ejecución. Se trabajó en excavaciones, retiro de material proveniente de las excavaciones, relleno para estructura de andenes, instalación de subbase granular, fundición de losas de concreto y concreto para estructuras de drenaje de 21mpa, instalación de bordillos prefabricados, instalación de adoquines para andenes e implementación de PGIO. Los rendimientos y avances de obra continúan a buen ritmo. El contratista lleva una jecución del 90,08% correspondiente a un valor de $2,676,882,177. De igual manera se desarrollarón actividades de control, como chequeos de cotas de subrasante, subbase granular y rasante, se tomarón densidades en campo y muestras de viguetas de concreto.

8. ANEXOS

1. Reporte de Seguimiento al avance del Contrato de Obra (F-GI-IH-116) - (Infraestructura Social)
1. Informe de Seguimiento al estado de Avance de las Intervenciones - Mejoramiento de Vivienda: Preconstrucción: (F-GI-IH-12 Registro de Vistas por vivienda) y/o Ejecución: (F-GI-IH-67 Informe de seguimiento al estado de avance de las intervenciones)
2. Registro Fotográfico del avance durante la semana (F-GI-IH-112) (aplica para Infraestructura Social) <inserte aquí de cuatro a seis fotografías que muestren el avance general del proyecto durante la semana. Deben ser fotografías a
3. Copia de la Bitácora de Obra correspondiente al período reportado
4. Otros. Anexos que la Interventoría considere relevantes, por ejemplo: informes especiales (si aplica).

INTERVENTOR :

FIRMA: Moralba Sánchez O.

NOMBRE:MORALBA SANCHEZ ORDONEZ
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE INTERVENTORÍA

Notas:
1. El informe debe ser enviado del correo registrado por parte del Interventor.
2. El informe debe incluir todos los anexos relacionados.
3. El informe ejecutivo debe ser diligenciado conforme al formato establecido.
