La equidad es de todos · Prosperidad Social	**FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Código:** F-IP-226
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	**Versión: 4**

FECHA DE INFORME:	lunes, 28 de noviembre de 2022	INFORME N°:	22	PERÍODO DEL	21/11/2022
		ETAPA:	Obra	AL	27/11/2022
N° Y AÑO DE CONVENIO/CONTRATO (DPS):	683-2021	ID DEL PROYECTO:	11053		
DEPARTAMENTO:	SUCRE	MUNICIPIO:	SAMPUÉS		
N° Y AÑO CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	CONTRATO 205 FIP 2019	SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO DE INTERVENTORÍA (DPS):	JORGE SANDOVAL/JONATAN ISAZA		

1. INFORMACIÓN GENERAL


OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CONCRETO RÍGIDO DE LAS CALLES Y CARRERAS DEL BARRIO DOCE DE OCTUBRE MUNICIPIO DE SAMPUÉS, DEPARTAMENTO DE SUCRE		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BARRIO DOCE DE OCTUBRE - MUNICIPIO DE SAMPUES	No. Beneficiarios	5.031
N° ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA (o su equivalente):		**Nota: Verificar que el Acta se encuentra suscrita por todas las partes intervinientes**	


PROYECTO DE INTERVENTORÍA (PI)		**CONTRATO DE OBRA**	
N° ACTA DE ASIGNACIÓN PROYECTO DE INTERVENTORÍA (o su equivalente):	075-ZONA 2	N° Y AÑO DE CONTRATO:	MS-670-112-2022
CONTRATANTE:	PROSPERIDAD SOCIAL	CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE SAMPUES SUCRE
INTERVENTOR:	UNION TEMPORAL 3G	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAVIMENTO SAMPUES 2022
PLAZO PRECONSTRUCCIÓN:	N/A	PLAZO PRECONSTRUCCIÓN:	N/A
PLAZO CONSTRUCCIÓN:	6 MESES	PLAZO CONSTRUCCIÓN:	6 MESES
PLAZO TOTAL INICIAL:	6 MESES	PLAZO TOTAL INICIAL:	6 MESES
FECHA DE INICIO (Acta de Asignación):	23 de junio de 2022	FECHA DE INICIO:	23 de junio de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	23 de diciembre de 2022	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	23 de diciembre de 2022
PLAZO ACTUALIZADO:	183	PLAZO ACTUALIZADO:	183
PLAZO TRANSCURRIDO:	157 EQUIVALE AL 85,79%	PLAZO TRANSCURRIDO:	157 EQUIVALE AL 85,79%
VALOR INICIAL :	$ 299.860.198,90	VALOR INICIAL :	$ 2.878.512.991,55
*VALOR ADICIÓN N° :		*VALOR ADICIÓN N° :	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 299.860.198,90	VALOR ACTUALIZADO:	$ 2.878.512.991,55
VALOR EJECUTADO	$ 150.115.596,24	VALOR EJECUTADO:	$ 1.441.037.175,33
VALOR PAGADO:	$ 30.000.000,00	VALOR PAGADO:	
VALOR POR EJECUTAR:	$ 149.744.602,66	VALOR POR EJECUTAR:	$ 1.437.475.816,22
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA (DPS):	JONATAN FABIAN ISAZA HERNANDEZ	SUPERVISOR (POR PARTE DEL ENTE TERRITORIAL):	YESSICA GARAY DE LA OSSA

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones.

2. PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	Programado	Ejecutado	Avance
2.1 AVANCE FÍSICO (%)	**93,97%**	**50,06%**	**-43,90%**
2.2 AVANCE - EJECUCIÓN PRESUPUESTO ($)	$ 2.704.824.887,00	$ 1.441.037.175,00	
DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO (en $)	**$**	**-1.263.787.712,00**	

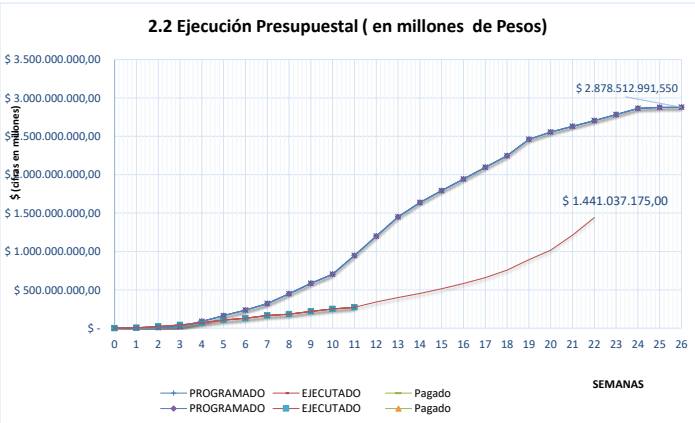

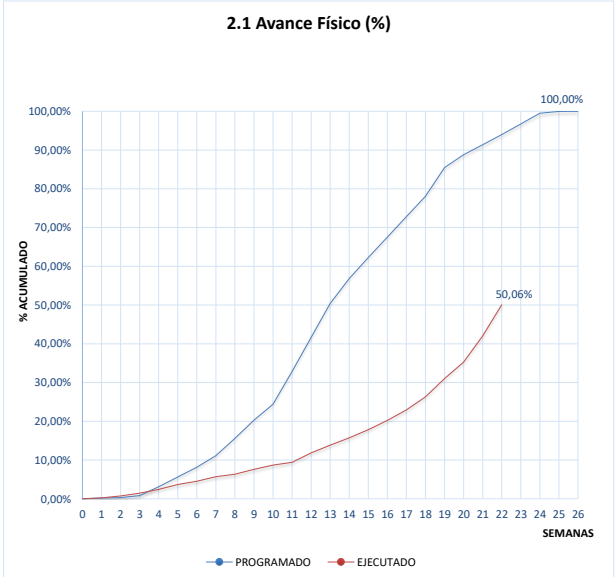

3. PROGRAMACIÓN DE AUDITORÍAS VISIBLES E INTERMEDIAS

No.	FECHA PROGRAMADA	HORA INICIO/ HORA FIN	LUGAR	FECHA REAL	OBSERVACIONES
1	20/09/2022	09:00am-10:00am	ESTADIO DE FÚTBOL DOCE DE OCTUBRE	22/09/2022	
2					
3					

La equidad es de todos · Prosperidad Social	**FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Código:** F-IP-226
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	**Versión: 4**

FECHA DE INFORME:	lunes, 28 de noviembre de 2022	INFORME Nº:	22	PERÍODO DEL	21/11/2022
		ETAPA:	Obra	AL	27/11/2022

4. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que están originando dicha situación, correspondientes a los siguientes aspectos:

4.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

DE ACUERDO CON PROGRAMACIÓN DE OBRA Y FLUJO DE INVERSIÓN SEMANAL, SE TIENEN PROGRAMADAS LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE BORDILLOS PREFABRICADOS Y ANDENES EN ADOQUINES, ES IMPORTANTE RECALCAR QUE PARA LA FECHA DE CORTE DEL PRESENTE INFORME SE TENDRÍA QUE HABER EJECUTADO EL 100% DE LOS ÍTEMS DE EXCAVACIONES MECÁNICAS Y MANUALES, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR Y CONCRETO HIDRÁULICO MR: 40KG/CM2, ACTIVIDADES QUE AÚN SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN; EL PROYECTO TIENE UN PORCENTAJE EJECUTADO DEL 50,06% CON RESPECTO AL PROGRAMADO DEL 93,97%, REFLEJANDO UN ATRASO DEL 43,90%.

4.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS (ECONÓMICOS, PERSONAL, EQUIPOS, ETC) AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

DURANTE LA PRESENTE SEMANA SE DESARROLLARON ACTIVIDADES DE EXCAVACIONES MECÁNICAS Y MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EMPLEANDO PIEDRA RAJÓN, RELLENO PARA ESTRUCTURA DE ANDENES, INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR, FUNDICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO MR: 40KG/CM2, NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN, INSTALACIÓN DE BORDILLOS PREFABRICADOS Y ADOQUINES PARA ANDENES.

4.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO:

PARA EL PRESENTE INFORME EL CONTRATISTA LLEVA UNA EJECUCIÓN DEL 50,06% CORRESPONDIENTE A UN VALOR DE $ 1.441.037.175; LO ANTERIOR EN ACTIVIDADES DE EXCAVACIONES MECÁNICAS Y MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE, RELLENO PARA ESTRUCTURA DE ANDENES, SUBBASE GRANULAR, CONCRETO HIDRÁULICO MR: 40kg/cm2, NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN, BORDILLOS PREFABRICADOS, ANDENES EN ADOQUINES E IMPLEMENTACIÓN DEL

4.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS:

DE ACUERDO CON LOS AVANCES Y ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA, SE REALIZARON CHEQUEOS DE COTAS DE SUBRASANTE, SUBBASE GRANULAR Y RASANTE, DE IGUAL MANERA SE TOMARON DENSIDADES EN CAMPO Y MUESTRAS DE VIGUETAS DE CONCRETO.

4.5. MANEJO AMBIENTAL :

SE PROTEGE CON PLÁSTICO LOS MATERIALES GRANULARES ACOPIADOS.

4.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL :

PERSONAL CUENTA CON EPP.

4.7 SALUD OCUPACIONAL:

SIN NOVEDADES.

4.8 ASPECTOS SOCIALES :

SIN NOVEDADES.

5. PLAN DE ACCION RESULTADO DEL ANALISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAIZ DE LA SITUACION PROBLEMATICA

ID ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	ESTADO	NOMBRE Y CARGO RESPONSABLE	FECHA INICIO PROGRAMADA	FECHA FIN PROGRAMADA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N/A

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Teniendo en cuenta la programación entregada por el contratista de obra, el porcentaje acumulado de avance de obra programada VS ejecutada para esta semana:

El porcentaje de obra programado es:	93,97%
El porcentaje de obra ejecutado es:	50,06%
Avance:	**-43,90%**

Según las actividades realizadas por el contratista y cuantificadas por esta interventoría, el contrato presenta el siguiente avance financiero:

Valor programado:	$ 2.704.824.887,00
Valor ejecutado:	$ 1.441.037.175,00

Durante la presente semana, el contrato de obra se encuentra en estado de ejecución, se trabajó en excavaciones mecánicas y manuales, retiro de material proveniente de las excavaciones, mejoramiento de subrasante empleando piedra rajón, relleno para estructura de andenes, instalación de subbase granular, fundición de losas de concreto, nivelación de pozos de inspección, instalación de bordillos prefabricados, instalación de adoquines para andenes e implementación de PGIO. Los rendimientos y avances de obra han aumentado considerablemente durante las últimas semanas, se ha logrado reducir el porcentaje de atraso del proyecto, no obstante el porcentaje de atraso sigue siendo alto; se reitera al contratista de obra la solicitud de presentar un plan de contingencia para cumplir con los plazos contractuales del proyecto.

8. ANEXOS

1. Reporte de Seguimiento al avance del Contrato de Obra (F-GI-IH-116) - (Infraestructura Social)

1. Informe de Seguimiento al estado de Avance de las Intervenciones - Mejoramiento de Vivienda: Preconstrucción: (F-GI-IH-12 Registro de Vistas por vivienda) y/o Ejecución: (F-GI-IH-67 Informe de seguimiento al estado de avance de las intervenciones)

2. Registro Fotográfico del avance durante la semana (F-GI-IH-112) (aplica para Infraestructura Social) <inserte aquí de cuatro a seis fotografías que muestren el avance general del proyecto durante la semana. Deben ser fotografías a color,
3. Copia de la Bitácora de Obra correspondiente al período reportado

4. Otros. Anexos que la Interventoría considere relevantes, por ejemplo: informes especiales (si aplica).

INTERVENTOR :

FIRMA: Moralba Sánchez O.

NOMBRE:MORALBA SANCHEZ ORDOÑEZ
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE INTERVENTORÍA

Notas:
1. El informe debe ser enviado del correo registrado por parte del Interventor.
2. El informe debe incluir todos los anexos relacionados.
3. El informe ejecutivo debe ser diligenciado conforme al formato establecido.

La equidad es de todos · Prosperidad Social	FORMATO SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA	Código: F-IP-170
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 2
		Fecha de Aprobación: Noviembre de 2021

INFORMACIÓN GENERAL

N° Y AÑO DE CONVENIO:	683-2021				
PERÍODO:	21 de noviembre de 2022	-	27 de noviembre de 2022	**SEMANA:**	**22**
CONTRATISTA:	CONSORCIO PAVIMENTO SAMPUÉS 2022			**CONTRATO No.**	**MS-670-112-2022**
INTERVENTOR:	UNIÓN TEMPORAL 3G			**ACTA DE SERVICIO No.**	**075-ZONA-2**

No./ ID	Descripción del ítem/Actividad	Cantidades de Obra Contractuales	Cantidadaes de Obra Programadas - Período Anterior	Cantidadaes de Obra Programadas - Período Actual	Cantidades de Obra Programadas Acumuladas	Cantidadaes de Obra Ejecutadas - Período Anterior	Cantidadaes de Obra Ejecutadas - Período Actual	Cantidades de Obra Ejecutadas Acumuladas	Unidad	Valor Unitario	Valor Total del ítem	Peso en % del ítem en relación al valor Total del Contrato (A)	% Acumulado programado por ítem (B)	% Total Programado del ítem (C) = (A)x (B)	% Acumulado de ejecución física por ítem (D)	% Total ejecutado por ítem (E) = (A)x (D)	% Acumulado programado -% Ejecución Física F = (E)-(C)	Desviación por Actividad	Actividad de Ruta crítica SI/NO	Observaciones
1,0	**EXPLANACION Y PRELIMINARES**																			
1,1	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS INCLUYE RETIRO	**33,54**	33,54	0,00	33,54	0,00	0,00	0,00	**M3**	$ 146.681,00	$ 4.919.681,00	0,171%	100,00%	0,17%	0,00%	0,00%	-0,17%	-1,00	NO	
1,2	EXCAVACION MECANICA SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION	**3926,65**	3926,65	0,00	3926,65	2811,07	482,30	3293,37	**M3**	$ 18.694,00	$ 73.404.795,00	2,550%	100,00%	2,55%	83,87%	2,14%	-0,41%	-0,16	NO	
1,3	EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMUN	**877,21**	877,21	0,00	877,21	148,20	70,20	218,40	**M3**	$ 26.261,00	$ 23.036.412,00	0,800%	100,00%	0,80%	24,90%	0,20%	-0,60%	-0,75	NO	
1,4	Mejoramiento de la subrasante empleando piedra rajon.Inlcuye transporte de material al sitio de la obra	**2324,60**	2324,60	0,00	2324,60	1128,90	95,40	1224,30	**M3**	$ 150.429,00	$ 349.687.253,00	12,148%	100,00%	12,15%	52,67%	6,40%	-5,75%	-0,47	NO	
1,5	Relleno para estructuras andenes incluye transporte de material al sitio de obra	**438,60**	438,60	0,00	438,60	42,50	82,00	124,50	**M3**	$ 163.087,00	$ 71.529.958,00	2,485%	100,00%	2,48%	28,39%	0,71%	-1,78%	-0,72	NO	
1,6	Cargue,transporte y disposición final de material (Transporte hasta el botadero aprobado y derecho de botadero)	**124900,26**	124900,26	0,00	124900,26	57333,91	10773,75	68107,66	**M3-KM**	$ 1.931,00	$ 241.182.402,00	8,379%	100,00%	8,38%	54,53%	4,57%	-3,81%	-0,45	NO	
2,0	**PAVIMENTO**																			
2,1	Subbase granular inlcuye transporte de material al sitio de obra	**1462,01**	1462,01	0,00	1462,01	680,52	146,28	826,80	**M3**	$ 169.888,00	$ 248.377.955,00	8,63%	100,00%	8,63%	56,55%	4,88%	-3,75%	-0,43	NO	
2,2	Concreto hidráulico MR-40kg/cm2 E=0.20m, incluye canastilla para dovelas,acero de refuerzo transversal (7/8"),longitudinal (1/2",cdón de polopropileno Sikarod 3/8 y curado con Antisol	**1462,01**	1462,01	0,00	1462,01	690,00	116,00	806,00	**M3**	$ 920.234,00	$ 1.345.391.310,00	46,74%	100,00%	46,74%	55,13%	25,77%	-20,97%	-0,45	NO	
2,3	ANDEN EN ADOQUINES INCLUYE VIGA DE CONFINAMIENTO	**2924,02**	1392,39	487,34	1879,73	148,00	295,00	443,00	**M2**	$ 85.889,00	$ 251.141.154,00	8,72%	64,29%	5,61%	15,15%	1,32%	-4,29%	-0,76	NO	
2,4	Bordillo prefabricado de 3000 psi	**2924,02**	1392,39	487,34	1879,73	866,00	60,00	926,00	**ML**	$ 61.947,00	$ 181.134.267,00	6,29%	64,29%	4,05%	31,67%	1,99%	-2,05%	-0,51	NO	
2,5	Acero de refuerzo de 6000 PSI	**1043,70**	1043,70	0,00	1043,70	690,00	720,00	1410,00	**KG**	$ 8.159,00	$ 8.515.548,00	0,30%	100,00%	0,30%	135,10%	0,40%	0,10%	0,35	NO	
3,0	**SEÑALIZACION**																			
3,1	Señal vertical de transito	**24,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**UND**	$ 472.643,00	$ 11.343.432,00	0,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#¡DIV/0!	NO	
4,0	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**																			
4,1	Nivelacion de pozo de inspeccion en concreto reforzado	**24,00**	24,00	0,00	24,00	2,00	8,00	10,00	**UND**	$ 508.589,00	$ 12.206.136,00	0,42%	100,00%	0,42%	41,67%	0,18%	-0,25%	-0,58	NO	
5,0	**OTROS COSTOS ASOCIADOS A LA OBRA**																			
5,1	PGIO	**1,00**	0,82	0,04	0,86	0,77	0,00	0,77	**GLOBAL**	$ 56.642.688,00	$ 56.642.688,00	1,97%	85,95%	1,69%	76,92%	1,51%	-0,18%	-0,10	NO	
	Totales- costo directo										**$ 2.878.512.991,00**	**100,00%**		**93,97%**		**50,06%**	**-43,90%**			

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO EXPRESADO EN COSTOS

Valor Total del Contrato		$ 2.878.512.991
Valor programado del contrato (Es el valor total del contrato multiplicado por el % Total programado (C)		$ 2.704.824.886
Valor de avance físico del contrato (Valor total del contrato multiplicado por el % total ejecutado (E)		$ 1.441.037.175,05
Diferencia entre el valor programado y ejecutado del contrato		-$ 1.263.787.711

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Plazo Total de Ejecución de Obra (Días o meses)	Dias	183,00
Tiempo de Adelanto(+) o atraso (-) (Días o meses)	dias	-80,34
(Plazo total multiplicado por el % total de adelanto o atraso)		-80,34

Firma:
MARIA FERNANDA ARRAZOLA MORALES
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

Firma:
YESSICA GARAY DE LA OSSA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Firma:
HERNÁN CÓRDOBA RAMOS
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Firma:
GERMÁN ARIAS LEWING
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

La equidad es de todos · Prosperidad Social	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**	**Código:** F-IP-209
		Versión: 03
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	**Fecha de Aprobación:** Febrero 2022

N° Y AÑO CONVENIO (DPS): 683-2021

ID PROYECTO (DPS):11053

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: BARRIO DOCE DE OCTUBRE MUNICIPIO DE SAMPUÉS, DEPARTAMENTO DE SUCRE

FECHA (D/M/A): 28/11/2022

SEMANA DEL 21/11/2022 AL 27/11/2022

POTENCIAL BENEFICIARIO:

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN POTENCIAL BENEFICIARIO:5031

DIRECCIÓN: CALLE 29, CALLE 29A, CALLE 29B, CALLE 29F, CALLE 29E Y CALLE 29G.

SECTOR: ☒ Vías y Transporte ☐ Social Comunitario ☐ Espacio Público, Recreación y Deporte

MODALIDAD DE INTERVENCIÓN: ☐ Unidad Sanitaria ☒ Unidad de Cocina ☒ Unidad Habitacional Pisos ☐ Cubierta ☒ Área Aprendizaje

KIT: ☐ KIT A - Sistema Séptico y Tanque de filtración
☐ KIT B - Tanque de almacenamiento
☐ KIT C -Personas con Discapacidad – Movilidad Reducida (barras y accesorios de apoyo)
☐ KIT D - Adecuaciones Especiales Personas con Discapacidad (eliminación de barreras arquitectónicas para personas con movilidad reducida) - Unidad Cocinas/ Habitacional

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DURANTE LA INTERVENCIÓN

Texto explicativo de la fotografía y Fecha. CALLE 29B, CALLE 29D Y CALLE 29E, EXCAVACIONES MECÁNICAS.



Observación Técnica y/o Social (según el caso):

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DURANTE LA INTERVENCIÓN

Texto explicativo de la fotografía y Fecha. CALLE 29B Y CALLE 29E, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EMPLEANDO PIEDRA RAJÓN.



Observación Técnica y/o Social (según el caso):

La equidad es de todos · Prosperidad Social	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**	**Código:** F-IP-209
		Versión: 03
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	**Fecha de Aprobación:** Febrero 2022

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DURANTE LA INTERVENCIÓN

Texto explicativo de la fotografía y Fecha. CALLE 29B Y CALLE 29E, INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR..



Observación Técnica y/o Social (según el caso):

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DURANTE LA INTERVENCIÓN

Texto explicativo de la fotografía y Fecha. CALLE 29E, FUNDICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO.



Observación Técnica y/o Social (según el caso):

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DURANTE LA INTERVENCIÓN

Texto explicativo de la fotografía y Fecha. CALLE 29A, CALLE 29C, CALLE 29F Y CALLE 29G, INSTALACIÓN DE ADOQUINES PARA ANDENES.



Observación Técnica y/o Social (según el caso):

Nota: Garantice que durante cada período se evidencie el cumplimiento de las actividades.
Las fotografías debe ser nítidas, a color y bien encuadradas.
En este formato se pueden eliminar fotografías para cuando se requiera evidenciar y soportar una situación puntual del Proyecto.
Algunos campos no son aplicables a la situación que se desea presentar, en cuyo caso se registrará N.A. (No aplica)

Nombre:	Hernán Córdoba Ramos
Cargo:	Ing residente
Entidad:	Union Temporal 3G

SABADO 19 DE NOVIEMBRE DEL 2022.
HORA DE INICIO: 7:30 AM. HORA FINAL: 6: P.M.
ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA (SOLEADO) TARDE (LLUVIOSO).
EQUIPOS: MINI CARGADOR (2) RETRO CARGADOR (1) VIBRO COMPACTADOR (1)
VOLTEO (1) CAMION (1) HERRAMIENTAS MENORES.
PERSONAL CONTRATISTA: ING. RESIDENTE, ING AUXILIAR 2, TOPOGRAFO 1
ALMACENISTA (1) OPERADORES (4) CONDUCTORES (2) MAESTRO DE OBRA 2
SISO (1) SOCIAL (1) OBREROS (30)
PERSONAL INTERVENTORIA: ING RESIDENTE Y INSPECTOR
ACTIVIDADES:
EXCAVACIONES MECANICAS DE LA EXPLANACION: CALLE 29E (K0+000 – K0+020). CONCRETO HIDRAULICO MR40 KG/CM²: CALLE 29A (K0+000 – K0+020). CARRIL IZQUIERDO; CALLE 29E (K0+109 – K0+130) CARRIL DERECHO: VOLUMEN DE CONCRETO: 20.5 M³.
SE TOMARON DENSIDADES EN CALLE 29E.
ADICIONES EN RODADURA: CALLE 29A Y CALLE 29G. 15 M².

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

DOMINGO 20 NOVIEMBRE DEL 2022.
ESTADO DEL TIEMPO: (LLUVIOSO).
(DIA NO LABORAL (FESTIVO).

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

LUNES 21 NOVIEMBRE DEL 2022.
HORA DE INICIO: 7:30. AM. HORA FINAL: 6: PM.
ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA Y TARDE (SOLEADO.)
EQUIPOS: MINI CARGADOR (2) RETRO CARGADOR (1) VIBRO COMPACTADOR (1)
VOLTEO (1) CAMION (1) HERRAMIENTAS MENORES.
PERSONAL CONTRATISTA: ING. RESIDENTE, ING. AUXILIAR (2) TOPOGRAFO, SISO, SOCIAL, MAESTROS (2) OPERADORES (4) CONDUCTORES (2) ALMACENISTA (1) OBREROS (24).

PERSONAL INTERVENTORIA: ING. RESIDENTE - INSPECTOR.
ACTIVIDADES:
EXCAVACIONES MECANICAS DE LA EXPLANACION: CALLE 29B. (K0+060 - K0+080).
EXCAVACIONES MANUALES PARA ANDENES EN CALLE 29, CALLE 29A Y 29C.
MEJORAMIENTO DE SUBBASANTE CON PIEDRA PAJON: CALLE 29E (K0+000 - K0+020)
RELLENO PARA ESTRUCTURA DE ANDENES: CALLE 29A, 29C Y 29G.
INSTALACION DE SUBBASE GRANULAR: CALLE 29E (K0+000 - K0+020).
RELLENO PARA ESTRUCTURA DE ANDENES: CALLES: 29A, 29C Y 29G.
INSTALACION DE SUBBASE EN CALLE 29E (K0+000 - K0+020).
ANDENES EN ADOQUIN: CALLE 29A Y CALLE 29G, 40 ml. LADO DERECHO.
BORDILLOS PREFABRICADOS DE 3.000 PSI: CALLE 29A, 20 ml.
✓ LADO DERECHO.

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

MARTES 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022.
HORA DE INICIO: 7:30 Am. HORA FINAL: 5:pm.
ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA (SOLEADO) Y TARDE (LLUVIOSO).
EQUIPOS: MINI CARGADOR (2) VIBRO COMPACTADOR (1) RETRO CARGADOR (1) VOLTEO (1) CAMION (1) HERRAMIENTAS MENORES.
PERSONAL CONTRATISTA: ING RESIDENTE (1) ING. AUXILIAR (2) TOPOGRAFO, SISO, SOCIAL, OPERADORES (4) CONDUCTORES (2) ALMACENISTA MAESTRO DE OBRA, OBREROS (24).
PERSONAL INTERVENTORIA: ING. RESIDENTE Y INSPECTOR.
ACTIVIDADES:
EXCAVACION MECANICA DE LA EXPLANACION: CALLE 29B (K0+060 - K0+080) SE INICIO EXCAVACIONES EN CALLE 29D.
EXCAVACIONES MANUALES PARA ANDENES: CALLE 29C Y CALLE 29F.
MEJORAMIENTO CON PIEDRA PAJON: CALLE 29D (K0+080 - K0+105).
RELLENO PARA ESTRUCTURA DE ANDENES: CALLE 29, CALLE 29C CALLE 29F. ANDENES EN ADOQUIN: CALLE 29A Y 29G.
✓ 30 ml.

CONTRATISTA:

INTERVENTORIA:

MIERCOLES 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022.
HORA DE INICIO: 7:30 Am. HORA FINAL: 6:Pm.
ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA Y TARDE (SOLEADO).
EQUIPOS: MINICARGADOR (2) VIBRO COMPACTADOR (1) RETRO CARGADOR (1), VOLTEO (1) CAMION (1) EQUIPOS MENORES.
PERSONAL CONTRATISTA: ING RESIDENTE, ING. AUXILIAR (2) TOPOGRAFO OPERADORES (4) CONDUCTORES (2) SISO (1) SOCIAL (1) MAESTRO DE OBRA (2) OBRERO (24).
PERSONAL INTERVENTORIA: ING RESIDENTE Y INSPECTOR.
ACTIVIDADES:
EXCAVACION MECANICA SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION: CALLE 29D (K0+000 - K0+030).
CONCRETO HIDRAULICO HE-40 KG/Cm2: CALLE 29E (K0+000 - K0+027).
CARRIL IZQUIERDO.
VOLUMEN DE CONCRETO: 13,5 m3.
✓ ANDENES EN ADOQUINES CALLE 29 Y CALLE 29A.

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

JUEVES 24 NOVIEMBRE DEL 2022.
HORA DE INICIO: 7:30 Am. HORA FINAL: 6:pm.
ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA Y TARDE (SOLEADO).
EQUIPOS: MINI CARGADOR (2) VIBRO COMPACTADOR (1) RETRO CARGADOR (1) VOLTEO (1) CAMION (1) HERRAMIENTAS MENORES.
PERSONAL CONTRATISTA: ING. RESIDENTE, ING. AUXILIAR (2) SISO, SOCIAL, OPERADORES (4) CONDUCTORES (2) TOPOGRAFO MAESTRO OBRA (2) OBRERO (24).
PERSONAL INTERVENTORIA: ING. RESIDENTE Y INSPECTOR.
ACTIVIDADES:
EXCAVACIONES MECANICAS SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION: CALLE 29 (K0+115 - K0+165).

Powered by CamScanner

CONCRETO HIDRAULICO HE-40 KG/cm²: CALLE 29ª C.Ko+000-Ko-027). CARRIL DERECHO.
VOLUMEN DE CONCRETO: 13.2 m³
AUDENES EN ADOQUIN: CALLE 29, CALLE 29ª Y CALLE 29 B.

CONTRATISTA — INTERVENTORIA

VIERNES 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022.
HORA DE INICIO: 7:AM. HORA FINAL: 5:P.M.
ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA (SECO) TARDE C.LLUVIOSO).
EQUIPOS: MINI CARGADOR (2) VOLTEOS (1) CAMION (1)
VIBRO COMPACTADOR (1) HERRAMIENTAS MENORES.
PERSONAL CONTRATISTA: ING. RESIDENTE, ING. AUXILIAR (2).
TOPOGRAFO, SISO, SOCIAL, CONDUCTORES (2) OPERADORES (2)
MAESTROS DE OBRA (7) OBREROS (24)
PERSONAL INTERVENTORIA: ING. RESIDENTE Y INSPECTOR
ACTIVIDADES:
EXCAVACIONES MECANICAS DE LA EXPLANACION: CALLE 29B. C.Ko+030-Ko+060)
MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON PIEDRA BASO: CALLE 29ª C.Ko+130-Ko+140).
AUDENES EN ADOQUIN: CALLE 29, CALLE 29ª Y CALLE 29 C.
LAS FUERTES LLUVIAS PRESENTADAS EN HORAS DE LA TARDE, OBLIGARON A SUSPENDER ACTIVIDADES.

CONTRATISTA — INTERVENTORIA

SABADO 26 DE NOVIEMBRE DEL 2022.
HORA DE INICIO: 7:AM. HORA FINAL 1 P.M.
ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA (SOLEADO Y TARDE (LLUVIOSO)
EQUIPOS. MINI CARGADOR, RETRO CARGADOR, VIBRO COMPACT, VOLTEO (1) CAMION (HERRAMIENTAS MENORES

PERSONAL CONTRATISTA: ING. RESIDENTES (1) ING. AUX. (2)

PERSONAL INTERVENTORIA: ING. RES. RESIDENTE Y INSPECTOR.
ACTIVIDADES:
AUDENES EN ADOQUIN: CALLE 27.B Y CALLE 29 C.
LAS FUERTES LLUVIAS PRESENTADAS EL DIA ANTERIOR IMPIDIERON EL DESARROLLO DE LA MAYORIA DE LAS ACTIVIDES.
SE REALIZO LIMPIEZA EN LA OBRA:

CONTRATISTA: — INTERVENTORIA:

DOMINGO 27 DE NOVIEMBRE DEL 2022.
ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA (SOLEADO) TARDE (LLUVIOSO).
HORA DE INICIO: 8:AM. HORA FINAL (3.P.M).
EQUIPOS: MINI CARGADOR (2) VIBRO COMPACTADOR, HERRAMIENTAS MENORES.
PERSONAL CONTRATISTA: TOPOGRAFO, OPERADORES (2) OBREROS (10).
PERSONAL INTERVENTORIA: ING. RESIDENTE.
ACTIVIDADES:
MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON PIEDRA BASO C CALLE 29ª C.Ko+140-Ko+140).
LAS LLUVIAS PRESENTADAS EN HORAS DE LA TARDE, OBLIGARON A SUSPENDER ACTIVIDADES.

CONTRATISTA — INTERVENTORIA

Powered by CamScanner
