La equidad es de todos · Prosperidad Social	**FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Código:** F-IP-226
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	**Versión: 4**

FECHA DE INFORME:	martes, 08 de noviembre de 2022	INFORME N°:	19	PERÍODO DEL	31/10/2022
		ETAPA:	Obra	AL	6/11/2022
N° Y AÑO DE CONVENIO/CONTRATO (DPS):	683-2021	ID DEL PROYECTO:	E-2220-2203-125612		
DEPARTAMENTO:	SUCRE	MUNICIPIO:	SAMPUÉS		
N° Y AÑO CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	CONTRATO 205 FIP 2019	SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO DE INTERVENTORÍA (DPS):	JORGE SANDOVAL/JONATAN ISAZA		

1. INFORMACIÓN GENERAL


OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CONCRETO RÍGIDO DE LAS CALLES Y CARRERAS DEL BARRIO DOCE DE OCTUBRE MUNICIPIO DE SAMPUÉS, DEPARTAMENTO DE SUCRE		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BARRIO DOCE DE OCTUBRE - MUNICIPIO DE SAMPUES	No. Beneficiarios	5.031
N° ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA (o su equivalente):		**Nota: Verificar que el Acta se encuentra suscrita por todas las partes intervinientes**	


PROYECTO DE INTERVENTORÍA (PI)		**CONTRATO DE OBRA**	
N° ACTA DE ASIGNACIÓN PROYECTO DE INTERVENTORÍA (o su equivalente):	075-ZONA 2	N° Y AÑO DE CONTRATO:	MS-670-112-2022
CONTRATANTE:	PROSPERIDAD SOCIAL	CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE SAMPUES SUCRE
INTERVENTOR:	UNION TEMPORAL 3G	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAVIMENTO SAMPUES 2022
PLAZO PRECONSTRUCCIÓN:	N/A	PLAZO PRECONSTRUCCIÓN:	N/A
PLAZO CONSTRUCCIÓN:	6 MESES	PLAZO CONSTRUCCIÓN:	6 MESES
PLAZO TOTAL INICIAL:	6 MESES	PLAZO TOTAL INICIAL:	6 MESES
FECHA DE INICIO (Acta de Asignación):	23 de junio de 2022	FECHA DE INICIO:	23 de junio de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	23 de diciembre de 2022	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	23 de diciembre de 2022
PLAZO ACTUALIZADO:	183	PLAZO ACTUALIZADO:	183
PLAZO TRANSCURRIDO:	136 EQUIVALE AL 74,32%	PLAZO TRANSCURRIDO:	136 EQUIVALE AL 74,32%
VALOR INICIAL :	$ 299.860.198,90	VALOR INICIAL :	$ 2.878.512.991,55
*VALOR ADICIÓN N° :		*VALOR ADICIÓN N° :	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 299.860.198,90	VALOR ACTUALIZADO:	$ 2.878.512.991,55
VALOR EJECUTADO	$ 93.008.135,27	VALOR EJECUTADO:	$ 892.833.149,22
VALOR PAGADO:	$ 30.000.000,00	VALOR PAGADO:	
VALOR POR EJECUTAR:	$ 206.852.063,63	VALOR POR EJECUTAR:	$ 1.985.679.842,33
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA (DPS):	JONATAN FABIAN ISAZA HERNANDEZ	SUPERVISOR (POR PARTE DEL ENTE TERRITORIAL):	YESSICA GARAY DE LA OSSA

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones.

2. PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	Programado	Ejecutado	Avance
2.1 AVANCE FÍSICO (%)	**85,49%**	**31,02%**	**-54,47%**
2.2 AVANCE - EJECUCIÓN PRESUPUESTO ($)	$ 2.460.902.048,00	$ 892.833.149,00	
DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO (en $)	**$**	**-1.568.068.899,00**	

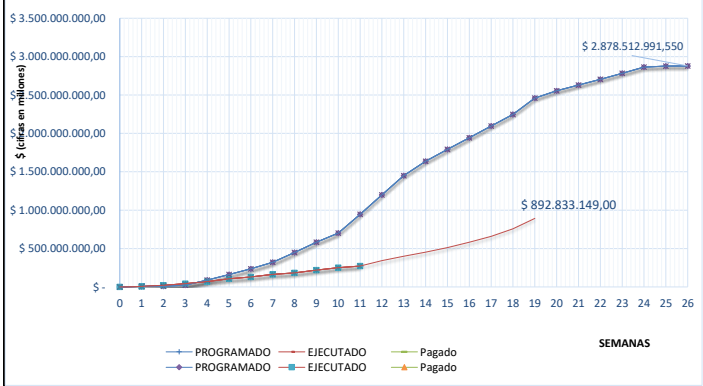

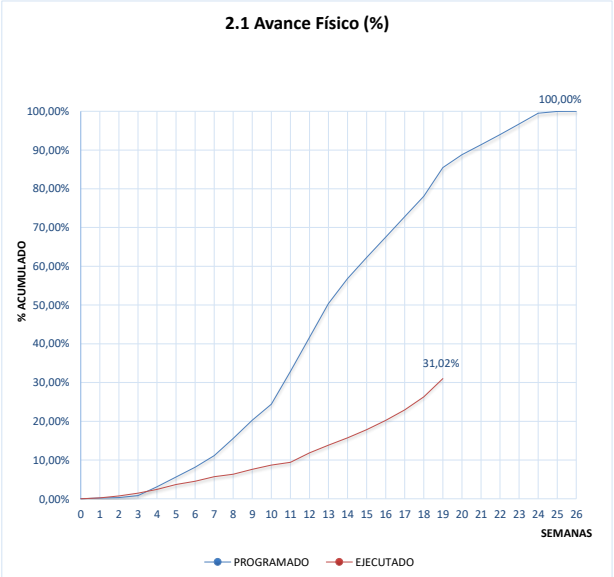

3. PROGRAMACIÓN DE AUDITORÍAS VISIBLES E INTERMEDIAS

No.	FECHA PROGRAMADA	HORA INICIO/ HORA FIN	LUGAR	FECHA REAL	OBSERVACIONES
1	20/09/2022	09:00am-10:00am	ESTADIO DE FÚTBOL DOCE DE OCTUBRE	22/09/2022	
2					
3					

La equidad es de todos — Prosperidad Social	**FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Código:** F-IP-226
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	**Versión: 4**

FECHA DE INFORME:	martes, 08 de noviembre de 2022	INFORME N°:	19	PERÍODO DEL	31/10/2022
		ETAPA:	Obra	AL	6/11/2022

4. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que están originando dicha situación, correspondientes a los siguientes aspectos:

4.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

DE ACUERDO CON PROGRAMACIÓN DE OBRA Y FLUJO DE INVERSIÓN SEMANAL, SE TIENEN PROGRAMADAS LAS ACTIVIDADES DE CONCRETO HIDRÁULICO MR: 40KG/CM2, BORDILLOS PREFABRICADOS Y ANDENES EN ADOQUINES, ES IMPORTANTE RECALCAR QUE PARA LA FECHA DE CORTE DEL PRESENTE INFORME SE TENDRÍA QUE HABER EJECUTADO EL 100% DE LOS ÍTEMS DE EXCAVACIONES MECÁNICAS Y MANUALES, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR, ACTIVIDADES QUE AÚN SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN; EL PROYECTO TIENE UN PORCENTAJE EJECUTADO DEL 31,02% CON RESPECTO AL PROGRAMADO DEL 85,49%, REFLEJANDO UN ATRASO DEL 54,47%.

4.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS (ECONÓMICOS, PERSONAL, EQUIPOS, ETC) AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

DURANTE LA PRESENTE SEMANA SE DESARROLLARON ACTIVIDADES DE EXCAVACIONES MECÁNICAS Y MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES, INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR Y FUNDICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO MR: 40KG/CM2.

4.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO:

PARA EL PRESENTE INFORME EL CONTRATISTA LLEVA UNA EJECUCIÓN DEL 31,02% CORRESPONDIENTE A UN VALOR DE $ 892.833.149 LO ANTERIOR EN ACTIVIDADES DE EXCAVACIONES MECÁNICAS Y MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE, RELLENO PARA ESTRUCTURA DE ANDENES, SUBBASE GRANULAR, CONCRETO HIDRÁULICO MR: 40kg/cm2, BORDILLOS PREFABRICADOS E IMPLEMENTACIÓN DEL PGIO.

4.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS:

DE ACUERDO CON LOS AVANCES Y ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA, SE REALIZARON CHEQUEOS DE COTAS DE SUBRASANTE, SUBBASE GRANULAR Y RASANTE, DE IGUAL MANERA SE TOMARON MUESTRAS DE VIGUETAS DE CONCRETO.

4.5. MANEJO AMBIENTAL :

SE PROTEGE CON PLÁSTICO LOS MATERIALES GRANULARES ACOPIADOS.

4.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL :

PERSONAL CUENTA CON EPP.

4.7 SALUD OCUPACIONAL:

SIN NOVEDADES.

4.8 ASPECTOS SOCIALES :

SIN NOVEDADES.

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ID ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	ESTADO	NOMBRE Y CARGO RESPONSABLE	FECHA INICIO PROGRAMADA	FECHA FIN PROGRAMADA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N/A

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Teniendo en cuenta la programación entregada por el contratista de obra el porcentaje acumulado de avance de obra programada VS ejecutada para esta semana :

El porcentaje de obra programado es:	85,49%
El porcentaje de obra ejecutado es:	31,02%
Avance:	**-54,47%**

Según las actividades realizadas por el contratista y cuantificadas por esta interventoría, el contrato presenta el siguiente avance financiero:

Valor programado:	$ 2.460.902.048,00
Valor ejecutado:	$ 892.833.149,00

Durante la presente semana, el contrato de obra se encuentra en estado de ejecución, se trabajó en excavaciones mecánicas y manuales, retiro de material proveniente de las excavaciones, instalación de subbase granular y fundición de losas de concreto, instalación de bordillo e implementación de PGIO. Los rendimientos y avances de obra han aumentado considerablemente respecto a las semanas anteriores, pero el atraso sigue siendo significativo; el contratista de obra debe presentar y aplicar un plan de contingencia para cumplir con los plazos contractuales del proyecto.

8. ANEXOS

1. Reporte de Seguimiento al avance del Contrato de Obra (F-GI-IH-116) - (Infraestructura Social)
1. Informe de Seguimiento al estado de Avance de las Intervenciones - Mejoramiento de Vivienda: Preconstrucción: (F-GI-IH-12 Registro de Vistas por vivienda) y/o Ejecución: (F-GI-IH-67 Informe de seguimiento al estado de avance de las intervenciones)
2. Registro Fotográfico del avance durante la semana (F-GI-IH-112) (aplica para Infraestructura Social) <inserte aquí de cuatro a seis fotografías que muestren el avance general del proyecto durante la semana. Deben ser fotografías a color,
3. Copia de la Bitácora de Obra correspondiente al período reportado
4. Otros. Anexos que la Interventoría considere relevantes, por ejemplo: informes especiales (si aplica).

INTERVENTOR :

FIRMA: Moralba Sánchez O.

NOMBRE:MORALBA SANCHEZ ORDOÑEZ
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE INTERVENTORÍA

Notas:
1. El informe debe ser enviado del correo registrado por parte del Interventor.
2. El informe debe incluir todos los anexos relacionados.
3. El informe ejecutivo debe ser diligenciado conforme al formato establecido.

La equidad es de todos · Prosperidad Social	FORMATO SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA	Código: F-IP-170
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 2
		Fecha de Aprobación: Noviembre de 2021

INFORMACIÓN GENERAL					
N° Y AÑO DE CONVENIO:	683-2021				
PERÍODO:	31 de octubre de 2022	-	6 de noviembre de 2022	SEMANA:	19
CONTRATISTA:	CONSORCIO PAVIMENTO SAMPUÉS 2022			CONTRATO No.	MS-670-112-2022
INTERVENTOR:	UNIÓN TEMPORAL 3G			ACTA DE SERVICIO No.	075-ZONA-2

No./ ID	Descripción del ítem/Actividad	Cantidades de Obra Contractuales	Cantidades de Obra Programadas - Período Anterior	Cantidades de Obra Programadas - Período Actual	Cantidades de Obra Programadas Acumuladas	Cantidades de Obra Ejecutadas - Período Anterior	Cantidades de Obra Ejecutadas - Período Actual	Cantidades de Obra Ejecutadas Acumuladas	Unidad	Valor Unitario	Valor Total del ítem	Peso en % del ítem en relación al valor Total del Contrato (A)	% Acumulado programado por ítem (B)	% Total Programado del ítem (C) = (A)x (B)	% Acumulado de ejecución física por ítem (D)	% Total ejecutado por ítem (E) = (A)x (D)	% Acumulado programado -% Ejecución Física F = (E)-(C)	Desviación por Actividad	Actividad de Ruta crítica SI/NO	Observaciones
1,0	**EXPLANACION Y PRELIMINARES**																			
1,1	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS INCLUYE RETIRO	**33,54**	33,54	0,00	33,54	0,00	0,00	0,00	M3	$ 146.681,00	$ 4.919.681,00	0,171%	100,00%	0,17%	0,00%	0,00%	-0,17%	-1,00	NO	
1,2	EXCAVACION MECANICA SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION	**3926,65**	3926,65	0,00	3926,65	2514,27	74,20	2588,47	M3	$ 18.694,00	$ 73.404.795,00	2,550%	100,00%	2,55%	65,92%	1,68%	-0,87%	-0,34	NO	
1,3	EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMUN	**877,21**	877,21	0,00	877,21	28,60	20,80	49,40	M3	$ 26.261,00	$ 23.036.412,00	0,800%	100,00%	0,80%	5,63%	0,05%	-0,76%	-0,94	NO	
1,4	Mejoramiento de la subrasante empleando piedra rajon.Inlcuye transporte de material al sitio de la obra	**2324,60**	2324,60	0,00	2324,60	930,15	0,00	930,15	M3	$ 150.429,00	$ 349.687.253,00	12,148%	100,00%	12,15%	40,01%	4,86%	-7,29%	-0,60	NO	
1,5	Relleno para estructuras andenes incluye transporte de material al sitio de obra	**438,60**	438,60	0,00	438,60	16,50	0,00	16,50	M3	$ 163.087,00	$ 71.529.958,00	2,485%	100,00%	2,48%	3,76%	0,09%	-2,39%	-0,96	NO	
1,6	Cargue,transporte y disposición final de material (Transporte hasta el botadero aprobado y derecho de botadero)	**124900,26**	124900,26	0,00	124900,26	49214,11	1852,50	51066,61	M3-KM	$ 1.931,00	$ 241.182.402,00	8,379%	100,00%	8,38%	40,89%	3,43%	-4,95%	-0,59	NO	
2,0	**PAVIMENTO**																			
2,1	Subbase granular inlcuye transporte de material al sitio de obra	**1462,01**	1462,01	0,00	1462,01	454,74	42,40	497,14	M3	$ 169.888,00	$ 248.377.955,00	8,63%	100,00%	8,63%	34,00%	2,93%	-5,69%	-0,66	NO	
2,2	Concreto hidráulico MR-40kg/cm2 E=0.20m, incluye canastilla para dovelas,acero de refuerzo transversal (7/8"),longitudinal (1/2",cdón de polopropileno Sikarod 3/8 y curado con Antisol	**1462,01**	1276,36	162,45	1438,80	358,00	131,00	489,00	M3	$ 920.234,00	$ 1.345.391.310,00	46,74%	98,41%	46,00%	33,45%	15,63%	-30,36%	-0,66	NO	
2,3	ANDEN EN ADOQUINES INCLUYE VIGA DE CONFINAMIENTO	**2924,02**	0,00	417,72	417,72	0,00	0,00	0,00	M2	$ 85.889,00	$ 251.141.154,00	8,72%	14,29%	1,25%	0,00%	0,00%	-1,25%	-1,00	NO	
2,4	Bordillo prefabricado de 3000 psi	**2924,02**	0,00	417,72	417,72	421,00	0,00	421,00	ML	$ 61.947,00	$ 181.134.267,00	6,29%	14,29%	0,90%	14,40%	0,91%	0,01%	0,01	NO	
2,5	Acero de refuerzo de 6000 PSI	**1043,70**	1043,70	0,00	1043,70	0,00	0,00	0,00	KG	$ 8.159,00	$ 8.515.548,00	0,30%	100,00%	0,30%	0,00%	0,00%	-0,30%	-1,00	NO	
3,0	**SEÑALIZACION**																			
3,1	Señal vertical de transito	**24,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UND	$ 472.643,00	$ 11.343.432,00	0,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#¡DIV/0!	NO	
4,0	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**																			
4,1	Nivelacion de poso de inspeccion en concreto reforzado	**24,00**	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	UND	$ 508.589,00	$ 12.206.136,00	0,42%	100,00%	0,42%	0,00%	0,00%	-0,42%	-1,00	NO	
5,0	**OTROS COSTOS ASOCIADOS A LA OBRA**																			
5,1	PGIO	**1,00**	0,71	0,04	0,75	0,69	0,04	0,73	GLOBAL	$ 56.642.688,00	$ 56.642.688,00	1,97%	74,59%	1,47%	73,08%	1,44%	-0,03%	-0,02	NO	
	Totales- costo directo										**$ 2.878.512.991,00**	**100,00%**		**85,49%**		**31,02%**	**-54,47%**			

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO EXPRESADO EN COSTOS	
Valor Total del Contrato	$ 2.878.512.991
Valor programado del contrato (Es el valor total del contrato multiplicado por el % Total programado (C)	$ 2.460.902.047
Valor de avance físico del contrato (Valor total del contrato multiplicado por el % total ejecutado (E)	$ 892.833.149,05
Diferencia entre el valor programado y ejecutado del contrato	-$ 1.568.068.898

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO		
Plazo Total de Ejecución de Obra (Días o meses)	Dias	183,00
Tiempo de Adelanto(+) o atraso (-) (Días o meses)	dias	-99,69
(Plazo total multiplicado por el % total de adelanto o atraso)		-99,69

Firma:
NILSON MONTERROZA YEPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

Firma:
YESSICA GARAY DE LA OSSA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Firma:
HERNÁN CÓRDOBA RAMOS
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Firma:
GERMÁN ARIAS LEWING
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

La equidad es de todos · Prosperidad Social	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**	**Código:** F-IP-209
		Versión: 03
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	**Fecha de Aprobación:** Febrero 2022

N° Y AÑO CONVENIO (DPS): 683-2021

ID PROYECTO (DPS): E-2020-2203-125612

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: BARRIO DOCE DE OCTUBRE MUNICIPIO DE SAMPUÉS, DEPARTAMENTO DE SUCRE

FECHA (D/M/A): 08/11/2022

SEMANA DEL 31/11/2022 AL 06/11/2022

POTENCIAL BENEFICIARIO:

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN POTENCIAL BENEFICIARIO:5031

DIRECCIÓN: CALLE 29A Y CALLE 29F.

SECTOR: ■ Vías y Transporte ☐ Social Comunitario ☒ Espacio Público, Recreación y Deporte

MODALIDAD DE INTERVENCIÓN: ☐ Unidad Sanitaria ☒ Unidad de Cocina Unidad Habitacional Pisos ☐ Cubierta ☒ Área Aprendizaje ☒

KIT: ☐ KIT A - Sistema Séptico y Tanque de filtración
☐ KIT B - Tanque de almacenamiento
☐ KIT C -Personas con Discapacidad – Movilidad Reducida (barras y accesorios de apoyo)
☐ KIT D - Adecuaciones Especiales Personas con Discapacidad (eliminación de barreras arquitectónicas para personas con movilidad reducida) - Unidad Cocinas/ Habitacional

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DURANTE LA INTERVENCIÓN

Texto explicativo de la fotografía y Fecha. CALLE 29E Y CALLE 29F, EXCAVACIONES MECÁNICAS DE LA EXPLANACIÓN.







Observación Técnica y/o Social (según el caso):

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DURANTE LA INTERVENCIÓN

Texto explicativo de la fotografía y Fecha. CALLE 29E, INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR







Observación Técnica y/o Social (según el caso):

La equidad es de todos · Prosperidad Social	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**	**Código:** F-IP-209
		Versión: 03
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	**Fecha de Aprobación:** Febrero 2022

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DURANTE LA INTERVENCIÓN

Texto explicativo de la fotografía y Fecha. CALLE 29A, CALLE 29E Y CALLE 29F, FUNDICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO.







Observación Técnica y/o Social (según el caso):

Nota: Garantice que durante cada período se evidencie el cumplimiento de las actividades.
Las fotografías debe ser nítidas, a color y bien encuadradas.
En este formato se pueden eliminar fotografías para cuando se requiera evidenciar y soportar una situación puntual del Proyecto.
Algunos campos no son aplicables a la situación que se desea presentar, en cuyo caso se registrará N.A. (No aplica)

Nombre:	Hernán Córdoba Ramos
Cargo:	Ing residente
Entidad:	Union Temporal 3G

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA (LLUVIOSO) Y TARDE (SECO
EQUIPOS: MINI CARGADOR (3) VIBRO COMPACTADOR (1
HERRAMIENTAS MENORES:
PERSONAL CONTRATISTA: ING. RESIDENTE, TOPOGRAFO.
OPERADORES (4) SOCIAL, SISO. Y AYUDANTES (14)
PERSONAL INTERVENTORIA: ING. RESIDENTE Y INSPECTOR.
ACTIVIDADES: CONCRETO HIDRAULICO MR 40 Kg/cm2
CALLE 29 B (K0+018-K0+048) CARRIL DERECHO.
VOLUMEN DE CONCRETO: 14 m3.
SE TOMARON MUESTRAS DE VIGETAS. DE CONCRETO.

Maria F. Arbeláez M
CONTRATISTA

INTERVENTORIA

SABADO 01. DE OCTUBRE. DEL. 2022.
HORA DE INICIO: 7:30. Am. HORA FINAL: 1. PM.
ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA Y TARDE (SECO).
EQUIPOS: MINI CARGADOR (3) VIBRO COMPACTADOR (1
HERRAMIENTAS MENORES
PERSONAL CONTRATISTA: ING. RESIDENTE, TOPOGRAFO
OPERADORES; SISO, SOCIAL, AYUDANTES (8)
PERSONAL INTERVENTORIA: ING. RESIDENTE. Y INSPEC
ACTIVIDADES:
EXCAVACION MECANICA SIN CLASIFICAR DE LA EXPLAN
CION: CALLE 29 B (K0+020-K0+040.).
BORDILLO PREFABRICADO DE 3000 PSI CALLE 29 C. 30 M
LADO DERECHO.

Maria F. Arbeláez M.
CONTRATISTA

INTERVENTORIA:

DOMINGO 02 DE OCTUBRE DEL. 2022.
ESTADO DEL TIEMPO. MAÑANA Y TARDE (SECO)
DIA NO LABORAL: (FESTIVO)

María f. Arrázola M.
CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

LUNES 3 DE "SEPTIEMBE" OCTUBRE. DEL 2022.
HORA DE INICIO: 7:30. Am. HORA FINAL: 7: Pm.
ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA Y TARDE (SECO)
EQUIPOS: MINI CARGADORES (4) RETRO EXCAVADORA (1) VIBRO COMPACTADOR (1) HERRAMIENTAS MENORES.
PERSONAL CONTRATISTA: ING: RESIDENTE, SISO, SOCIAL, ALMACENISTA, OPERADORES (6) AYUDANTES. (10).
PERSONAL INTERVENTORIA: ING: RESIDENTE Y INSPECTOR.
ACTIVIDADES:
EXCAVACION MECANICA SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION: CALLE 29A. (K0+000 – K0+020).
MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE EMPLEANDO PIEDRA BASE: CALLE 29G (K0+044 – K0+058).
INSTALACION DE BORDILLOS PREFABRICADOS DE 3.000 PSI: CALLE 29. 20.mL. LADO DERECHO.

María f. Arrázola M.
CONTRATISTA:

INTERVENTORÍA:

MARTES 4 DE OCTUBRE DEL 2022.
HORA DE INICIO: 7:30. Am. HORA FINAL: 6: Pm.
ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA (SECO) TARDE (LLUVIOSO).
EQUIPOS: MINI CARGADOR (4) RETRO CARGADOR (1) VIBRO COMPACTADOR (1) Y HERRAMIENTAS MENORES.
PERSONAL CONTRATISTA: ING. RESIDENTE, SISO, SOCIAL, ALMACENISTA, TOPOGRAFO, OPERADORES. (6) AYUDANTES (10)
PERSONAL INTERVENTORIA: 1 ING. RESIDENTE, 1. INSPECTOR.
ACTIVIDADES:
EXCAVACION MECANICA SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION: CALLE 29A (K.0+000 – K.0+030.).
MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EMPLEANDO PIEDRA BASE: CALLE 29A (K0+000 – K0+020: Y EN CALLE 29G (K0+058-K0+

070). INSTALACION DE BORDILLOS PREFABRICADOS de 3000. PSI CALLE 29 – 20 ml. lado derecho.

María f. Arrázola M.
CONTRATISTA

INTERVENTORIA

MIERCOLES 5 DE OCTUBRE DEL 2022.
HORA DE INICIO: 7:30 Am HORA final. 6:00 Pm
ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA (LLUVIOSO) Y TARDE (SECO)
EQUIPOS: MINICARGADOR (4) RETRO CARGADOR (1) VIBRO COMPACTADOR (1). HERRAMIENTAS MENORES.
PERSONAL CONTRATISTA: ING. RESIDENTE, SISO. Social, OPERADORES (6) TOPOGRAFO, AYUDANTES (10)
PERSONAL INTERVENTORIA: ING. RESIDENTE Y INSPECTOR
ACTIVIDADES:
EXCAVACION MECANICA SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION CALLE 29A (K0+030 – K0+040.)
MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE EMPLEANDO PIEDRA PASON: CALLE 29G (K0+070 – K0+075). Calle 29A (K0+020 – K0+035).
BORDILLOS PREFABRICADO DE 3000 PSI: CALLE 29 – 20 ml. LADO DERECHO; CALLE 29C. 20. ml. LADO. IZQUIERDO:

María f. Arrázola M.
CONTRATISTA

INTERVENTORIA:

JUEVES 6 DE OCTUBRE. DEL. 2022.
HORA DE INICIO: 7:30. Am. HORA FINAL 6: Pm
ESTADO DEL TIEMPO. MAÑANA Y TARDE (SECO).
EQUIPOS: MINICARGADOR (4) RETRO CARGADOR (1) VIBRO COMPACTADOR (1) HERRAMIENTAS MENORES.
PERSONAL CONTRATISTA: ING. RESIDENTE, SESO. Social, topografo, operadores, AYUDANTES (10)

MAESTRO DE OBRA (1)
PERSONAL INTERVENTORIA: ING. RESIDENTE Y INSPECTOR.
ACTIVIDADES: SE PRESENTO LLUVIAS POR LA NOCHE. SE EMPEZO TARDE.
EXCAVACION MECANICA SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION: CALLE 29 C (K0+040 - K0+050).
INSTALACION DE SUBBASE GRANULAR: CALLE 29C (K0+030 - K0+070)
BORDILLO PREFABRICADO DE 3000 PSI calle 29 > 48 ml. LADO IZQUIERDO.

María F. Arrázola M.
CONTRATISTA

INTERVENTORIA

VIERNES 7 DE OCTUBRE DEL 2022.
HORA DE INICIO: 7:30 am. HORA FINAL: 6:pm.
ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA Y TARDE (SECO)
EQUIPOS: MINICARGADOR (1) RETROCARGADOR (1) VIBRO COMPACTADOR (1) HERRAMIENTAS MENORES.
PERSONAL CONTRATISTA: ING. RESIDENTE (2) ING. AUXILIAR, TOPOGRAFO, SISO, SOCIAL, OPERADORES (6) AYUDANTES (10) MAESTRO OBRA:
PERSONAL INTERVENTORIA: ING. RESIDENTE Y INSPECTOR
ACTIVIDADES:
EXCAVACION MECANICA SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION: CALLE 29A (K0+050 - K0+070) CALLE 29 F (K0+075 - K0+085).
MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EMPLEANDO PIEDRA. BAJON. CALLE 29A: (K0+035 - K0+065).
BORDILLOS PREFABRICADOS DE 3000 PSI. CALLE 29 - 30. ml. LADO IZQUIERDO.
SE TOMARON DENSIDADES EN SUBBASE GRANULAR, CALLE 29 G. ENTRE LAS ABSCISAS. (K0+027 - K0+075).

María F. Arrázola M.
CONTRATISTA

INTERVENTORIA

SABADO 8 DE OCTUBRE DEL 2022.

HORA DE INICIO: 7:30 AM. HORA FINAL: 1:PM.
ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA Y TARDE (SECO).
EQUIPOS: MINI CARGADOR (4). RETROCARGADOR (1). VIBRO COMPACTADOR (1) HERRAMIENTAS MENORES.
PERSONAL CONTRATISTA: ING RESIDENTE, AUXILIAR RESI (2) TOPOGRAFO, OPERADORES (6) AYUDANTES (10) SISO, SOCIAL
PERSONAL INTERVENTORIA: ING. RESIDENTE Y INSPECTOR
ACTIVIDADES:
EXCAVACION MECANICA SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION CALLE 29A (K0+100-K0+125).
MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EMPLEANDO PIEDRA BASON: CALLE 29 f. (K0+045-K0+075).
ENCOFRADO EN EL CARRIL IZQUIERDO. CALLE 29.6.

María f. Arrázola M.
CONTRATISTA

INTERVENTORIA

DOMINGO 9 DE OCTUBRE DEL. 2022.
ESTADO DEL TIEMPO: (SECO)
DIA NO LABORAL (FESTIVO).

María f. Arrázola M.
CONTRATISTA

INTERVENTORIA

LUNES 10 DE OCTUBRE DEL. 2022.
HORA DE INICIO: 7:30 AM HORA FINAL: 5:30 PM.
ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA (SECO) TARDE (LLUVIOSO)
EQUIPOS: MINI CARGADOR (2) RETRO CARGADOR (1) VIBRO COMPACTADOR (1) VOLQUETAS (2) HERRAMIENTAS MENORES.
PERSONAL CONTRATISTA: ING. RESIDENTE, ING. AUXILIAR (3) SOCIAL, SISO, TOPOGRAFO, OPERADORES (4) CONDUCT. (2) OBRERO
PERSONAL INTERVENTORIA: ING. RESIDENTE. INSPECTOR
ACTIVIDADES:
EXCAVACION MECANICA SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION: CALLE 29A (K0+125-K0+135) CALLE 29 f (K0+085-K0+

120) MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EMPLEANDO PIEDRA BALON: CALLE 29 F (K0+025 - K0+135).
CONCRETO HIDRAULICO Mr-40 Kg/cm2 CALLE 29 G (K0+035 - K0+074) CARRIL IZQUIERDO. VOLUMEN DE CONCRETO 19.3 m³.

María F. Arrázola M.
CONTRATISTA

INTERVENTORIA:

MARTES 11 DE OCTUBRE DEL 2022.
HORA DE INICIO: 7:30 am. HORA FINAL: 6:Pm.
ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA Y TARDE (SECO).
EQUIPOS: MINI CARGADOR (2) VIBRO COMPACTADOR (1) RETRO CARGADOR (1) CONDUCTORES (3) VOLTEO Y CAMION
PERSONAL CONTRATISTA: ING: RESIDENTE, ING AUXILIAR (3) OPERADORES (4) TOPOGRAFO, SOCIAL, SISO. CONDUCTORES (2) AYUDANTES. (14).
PERSONAL INTERVENTORIA: ING. RESIDENTE Y INSPECTOR.
ACTIVIDADES: EXCAVACION MECANICA SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION: CALLE 29A (K0+180 - K0+220).
MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EMPLEANDO PIEDRA BALON: CALLE 29 F (K0+025 - K0+095). SE REALIZO ENCOFRADO EN CARRIL DERECHO CALLE 29.G.

María F. Arrázola M.
CONTRATISTA:

INTERVENTORIA:

MIERCOLES 12 DE OCTUBRE DEL 2022.
HORA DE INICIO: HORA FINAL:
ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA (LLUVIOSO) TARDE (SECO)
EQUIPOS: MINI CARGADOR (2) RETRO CARGADOR (1) VIBRO COMPACTADOR (1)
HERRAMIENTAS MENORES.
PERSONAL CONTRATISTA: ING. RESIDENTE, ING. AUXILIAR (3) OPERADORES (4) CONDUCTORES. (3) SISO, SOCIAL, OBREROS (14)
PERSONAL INTERVENTORIA: ING. RESIDENTE, INSPECTOR.
ACTIVIDADES: LAS FUERTES PRECIPITACIONES PRESENTADAS DURANTE LA MAÑANA IMPIDIERON EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.

María F. Arrázola M.
CONTRATISTA.

INTERVENTORIA

JUEVES 13 DE OCTUBRE DEL. 2022.

HORA DE INICIO: 7.30. AM. HORA FINAL: 6:PM.

ESTADO DEL. TIEMPO: MAÑANA Y TARDE (SECO)

EQUIPOS: MINI CARGADOR (2) RETRO CARGADOR (1) VIBRO COMPACTADOR

HERRAMIENTAS MENORES:

PERSONAL CONTRATISTA: ING. RESIDENTE, ING. AUXILIAR (3) TOPOGRAFO SOCIAL, SISO, OBREROS (14)

PERSONA INTERVENTORIA: ING. RESIDENTE Y INSPECTOR.

ACTIVIDADES:

EXCAVACION MECANICA SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION: CALLE 294 (K0+220 - K0+227.7).

MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE EXPANDIDO PRIMER BANDO CALLE 29 f. (K0+090 - K0+120).

BORDILLO PREFABRICADO de 3.000 PSI CALLE 296. 27 m L. IZQUIERDO.

María J. Arrázola M.
CONTRATISTA

INTERVENTORIA:

VIERNES 14 DE OCTUBRE DEL. 2022.

HORA DE INICIO: 7:30. am. HORA FINAL: 5:PM.

ESTADO DEL. TIEMPO: MAÑANA Y TARDE (LLUVIOSO)

EQUIPOS: MINI CARGADOR (2) RETROCARGADOR (1) VIBROCOMPACTADOR

HERRAMIENTAS MENORES.

PERSONAL CONTRATISTA: ING. RESIDENTE, ING. AUXILIAR (3) TOPO SOCIAL, SISO, OPERADORES (4) CONDUCTORES (2) OBREROS 14.

PERSONAL INTERVENTORIA: ING. RESIDENTE, INSPECTOR.

ACTIVIDADES: EXCAVACION MECANICA SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION CALLE 294 (K0+180 - K0+187)

BORDILLOS PREFABRICADOS DE 3000 PSI CALLE 296 27 m. LADO DERECHO

María J. Arrázola M.
CONTRATISTA

INTERVENTORIA

SABADO 15 DE OCTUBRE DEL 2022.
HORA DE INICIO: 7:30 AM. HORA FINAL: 2:00 PM.
ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA (SECO)
EQUIPOS: MINI CARGADOR (2) RETRO CARGADOR (1) LIBRO COMPACTADOR (1) VOLTEOS (2) HERRAMIENTAS MENORES.
PERSONAL CONTRATISTA: ING. RESIDENTE (1) ING. AUXILIAR (3) SISO (1) SOCIAL (1) OPERADORES (4) TOPOGRAFO (1) OBREROS (14)
PERSONAL INTERVENTORIA: ING. RESIDENTE Y INSPECTOR:
ACTIVIDADES:
MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EMPLEANDO PIEDRA BOLA CALLE 29A. (K0+185-K0+220).
SE REALIZO SELLO DE JUNTAS DE LOS BORDILLOS Y REPARACION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO EN CALLE 29A:
SE RECOMIENDA QUE LAS JUNTAS EN LOS BORDILLOS SEA DE MENOR ESPESOR:

María F. Arízola M.
CONTRATISTA

INTERVENTORIA

DOMINGO 16 DE OCTUBRE DEL 2022.
ESTADO DEL TIEMPO: (SECO).
DIA NO LABORAL (FESTIVO).

María F. Arízola M.
CONTRATISTA

INTERVENTORIA

LUNES 17 DE OCTUBRE DEL 2022.
ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA Y TARDE (SECO).
DIA (FESTIVO)
ACTIVIDAD: ACOPIO DE MATERIAL.
EQUIPOS: 2 VOLTEOS.

María F. Arízola M.
CONTRATISTA

INTERVENTORIA

MARTES 18 DE OCTUBRE DEL 2022.
HORA DE INICIO: 7:30 am HORA FINAL: 6: pm
ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA Y TARDE (SECO)
EQUIPOS: MINI CARGADOR, (2) RETRO CARGADOR
VIBRO COMPACTADOR, VOLQUETAS,
PERSONAL CONTRATISTA: Y HERRAMIENTAS MENORES
ING. RESIDENTE, SISO, SOCIAL, TOPOGRAFO. AYUDANTES
PERSONAL INTERVENTORIA: ING. RESIDENTE (INSPECT
ACTIVIDADES:
MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EMPLEANDO PIEDRA
BASON: CALLE 29 F (K0+080 - K0+115).
CONCRETO HIDRAULICO ME-40 Kg/cm2: CALLE 29G
(K0+035 - K0+074) CARRIL DERECHO.
VOLUMEN DE CONCRETO: 19.5 m3.

Maria F. Arrázola M
CONTRATISTA

INTERVENTORIA

MIERCOLES 19 DE OCTUBRE DEL 2022
HORA DE INICIO: 8: pm. HORA FINAL: 5:30 pm
ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA (SECO) TARDE (LLUVIOSO).
EQUIPOS MINI CARGADOR (2) RETROCARGADOR (1) VIBRO COMPACTADOR (1) VOLQUETAS (2) HERRAMIENTAS MENORES.
PERSONAL CONTRATISTA: ING RESIDENTE, ING AUXILIAR TOPOGRAFIA, OPERADORES (4) AYUDANTES (14)
PERSONAL INTERVENTORIA: ING. RESIDENTE Y INSPECTOR
ACTIVIDADES:
MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EMPLEANDO PIEDRA
BASON: CALLE 29A. (K0+205 - K0+220); CALLE 29F (K0+120 K0+125).
CONCRETO HIDRAULICO ME-40 Kg/cm2: CALLE 29G (K0+027 - K0+039) CARRIL DERECHO: VOLUMEN DE CONCRETO: 6 m3

Maria F. Arrázola M
CONTRATISTA:

INTERVENTORIA:

JUEVES 20 DE OCTUBRE DEL 2022.
HORA DE INICIO: 7:30 AM. HORA FINAL: 6: PM.
ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA Y TARDE (SECO)
EQUIPOS: MINI CARGADOR (2) RETRO CARGADOR (1) VIBRO COMPACTADOR
HERRAMIENTAS MENORES:
PERSONAL CONTRATISTA: ING. RESIDENTE, TOPOGRAFO, ALMACENISTA, SISO, SOCIAL, AYUDANTES (14)
PERSONAL: INTERVENTORIA: ING. RESIDENTE Y INSPECTOR
ACTIVIDADES:
INSTALACION DE SUBBASE GRANULAR: CALLE 29A. (K0+200-K0+220); CALLE 29F (K0+040-K0+080).
INSTALACION DE BORDILLOS PREFABRICADOS DE 3000 PSI CALLE 29G. 39 M. LADO IZQUIERDO:

María J. Arrázola M.
CONTRATISTA

INTERVENTORIA

VIERNES 21 DE OCTUBRE DEL 2022.
HORA DE INICIO: 7:30 AM. HORA FINAL: 6: PM.
ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA (SECO) TARDE (LLUVIOSO)
EQUIPOS: MINI CARGADOR (2) RETRO (1) VIBRO COMPACTADOR HERRAMIENTAS M.
PERSONAL CONTRATISTA: ING. RESIDENTE, SISO, SOCIAL, TOPO, AYUDANTES (14) ALMACEN.
PERSONAL INTERVENTORIA: ING RESIDENTE Y INSPECTOR.
ACTIVIDADES:
INSTALACION DE SUBBASE GRANULAR: CALLE 29A (K0+080-K0+110)
CONCRETO HIDRAULICO MR-40 KG/CM2: CALLE 29C (K0+070-K0+075).
CARRIL IZQUIERDO: CALLE 29G (K0+027-K0+035). CARRIL IZQUIERDO
VOLUMEN DE CONCRETO 6.5 M³.

María J. Arrázola M.
CONTRATISTA:

INTERVENTORIA:

SABADO 22 DE OCTUBRE DEL 2022.
HORA DE INICIO: 7:30 AM. HORA FINAL: 5:PM
ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA Y TARDE (SECO)
EQUIPOS: MINI CARGADOR (2) RETRO CARGADOR (1)
VIBRO COMPACTADOR (1) HERRAMIENTAS MENORES.
PERSONAL CONTRATISTA: ING. RESIDENTE, TOPOGRAFO
SOCIAL, SISO, ALMACENISTA, AYUDANTES (14)
PERSONAL INTERVENTORIA: ING. RESIDENTE Y INSP.
ACTIVIDADES:
MEJORAMIENTO DE SUBBASANTE EMPLEANDO PIEDRA
BASO: CALLE 29A. (K0+170-K0+185).
CONCRETO HIDRAULICO MR-40 KG/cm²: CALLE 29A
(K0+070-K0+075) CARRIL DERECHO.
VOLUMEN DE CONCRETO: 6.5 M³.

María F. Arrázola M.
CONTRATISTA:

INTERVENTORIA:

DOMINGO 23 DE OCTUBRE DEL 2022.
HORA DE INICIO: 8:AM. HORA FINAL: 3:PM.
ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA Y TARDE (SECO)
EQUIPOS: MINI CARGADOR (2) 1 CAMION, 1 MOTO CARRO.
HERRAMIENTAS MENORES.
PERSONAL CONTRATISTA: ING RESIDENTE, ALMACENISTA,
TOPOGRAFO, MAESTRO DE OBRA, AYUDANTES (14) OPERADORES 2
PERSONAL INTERVENTORIA: ING. RESIDENTE Y INSPECTOR.
ACTIVIDADES:
INSTALACION DE SUBBASE GRANULAR CALLE 29 F. (K0+080-
K0+110). SE REALIZO ENCOFRADO Y TOMA DE MUESTRA
"DENSIDADES" EN SUBBASE GRANULAR. CALLE 29A (K0+
190 - K0+220).

María F. Arrázola M.
CONTRATISTA

INTERVENTORIA:

LUNES 24 DE OCTUBRE DEL 2022.
HORA DE INICIO: 7:30. Am. HORA FINAL: 6:Pm.
ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA Y TARDE (SECO).
EQUIPOS: MINI CARGADOR (2) VIBRO COMPACTADOR (1) CAMIÓN (1).
HERRAMIENTAS MENORES:
PERSONAL CONTRATISTA: ING: RESIDENTES, ING. AUXILIAR (3)
TOPOGRAFO, SISO, SOCIAL, AYUDANTES (16).
PERSONAL INTERVENTORIA: ING. RESIDENTES Y INSPECTOR.
ACTIVIDADES:
EL CONTRATISTA DE OBRA REALIZA DESENCOFRADO, CURADO Y CORTE DE LOSAS DE CONCRETO FUNDIDAS EL DIA ANTERIOR.
SE REALIZA NIVELACION E INSTALACION DE RIELES EN CALLE 29 F, CARRI DERECHO. SE CONTINUO CON LAS EXCAVACIONES MANUALES PARA INSTALACION DE ANDENES EN CALLE 29G.
SE REALIZÓ COMITÉ Y VISITA TÉCNICA DE OBRA:

María F. Arizola M.
CONTRATISTA

INTERVENTORIA:

MARTES 25 DE OCTUBRE DEL 2022.
HORA DE INICIO: 7:30 Am. HORA FINAL: 6:pm.
ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA Y TARDE (SECO)
EQUIPOS: MINI CARGADOR (2) VIBROCOMPACTADOR (1)
HERRAMIENTAS MENORES.
PERSONAL CONTRATISTA: ING. RESIDENTES, ING. AUXILIAR (3)
SISO, SOCIAL, TOPOGRAFO. MAESTROS (2) OBREROS (16)
PERSONAL INTERVENTORIA: ING. RESIDENTE Y INSPECTOR
ACTIVIDADES:
INSTALACION DE SUBBASE GRANULAR CALLE 29F (K0+110 K0+125). CONCRETO HIDRAULICO MR-40 K9/cm² CALLE 29A (K0+196 - K0+220). CARRIL IZQUIERDO.
VOLUMEN DE CONCRETO 12. m³. SE REALIZA EXCAV. PARA ANDEN

María F. Arizola M.
CONTRATISTA

INTERVENTORIA:

MIERCOLES 26 DE OCTUBRE DEL 2022.
HORA DE INICIO: 7:30. Am. HORA FINAL: 5:30. Pm
ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA Y TARDE (SECO).
EQUIPOS: MINI CARGADOR (2) PETRO CARGADOR 1
CAMION (1) HERRAMIENTAS MENORES:
PERSONAL CONTRATISTA: ING. RESIDENTE, ING. AUXILIAR (3)
TOPOGRAFO, SISO, SOCIAL, ALMACENISTA. OBRERO (16)
PERSONAL INTERVENTORIA: ING. RESIDENTE Y INSPECTOR
ACTIVIDADES:
MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EMPLEANDO PIEDRA
BASON CALLE 29A (K0+042 — K0+052)
BORDILLO PREFABRICADO DE 3000 PSI. CALLE 29C.
30 m. Lado IZQUIERDO. SE INSTALO RELLENO en
ANDENES CALLE 29C.

Maria F. Arázola M.
CONTRATISTA:

INTERVENTORIA:

JUEVES 27 DE OCTUBRE DEL. 2022.
HORA DE INICIO: 7:30 Am. HORA FINAL: 5:pm
ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA Y TARDE (SECO).
EQUIPOS: MINI CARGADOR (2), VIBRO COMPACTADOR
VOLTEO (1) HERRAMIENTAS MENORES:
PERSONAL CONTRATISTA: ING. RESIDENTE, ING AUX.
(3), SISO, SOCIAL, TOPOGRAFO, MAESTRO (1) OBRERO (16)
PERSONAL INTERVENTORIA:
ACTIVIDADES:
MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EMPLEANDO PIEDRA
BASON: CALLE 29A (K0+068 — K0+078); CALLE
29E (K0+020 — K0+030). CARRIL IZQUIERDO
SE PUSO CONCRETO HIDRAULICO MR-40 Kg/cm² EN
CALLE 29F (K0+048 — K0+098).
VOLUMEN DE CONCRETO 25 m³.

Maria F. Arázola M.
CONTRATISTA

INTERVENTORIA

VIERNES 28 DE OCTUBRE DEL. 2022.
HORA DE INICIO: 7:30 Am. HORA FINAL: 5: Pm.
ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA Y TARDE (SECO)
EQUIPOS: MINI CARGADOR, VOLTEO, VIBRO COMPACTADOR.
HERRAMIENTAS MENORES.
PERSONAL CONTRATISTA: ING. RESIDENTE, SISO, SOCIAL, TOPOGRAFO, OPERADORES (3) AYUDANTES (18) ALMACENISTA.
PERSONAL INTERVENTORIA: ING. RESIDENTE Y INSPECTOR
ACTIVIDADES:
MEJORAMIENTO CON PIEDRA BAJON: CALLE 29E (K0+030 - K0+045).
CONCRETO HIDRAULICO MR 40 KG/cm² CALLE 29A (K0+169 - K0+196). CARRIL IZQUIERDO.
VOLUMEN DE CONCRETO 13.5 m³. SE CONTINUA CON LAS EXCAVACIONES MANUALES PARA INSTALACION DE ADOQUINES. EN ANDENES.

María F. Arrizola M.
CONTRATISTA

INTERVENTORIA

SABADO 29 DE OCTUBRE DEL. 2022
HORA DE INICIO: 7:30 Am. HORA FINAL: 6: Pm.
ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA Y TARDE (SECO).
EQUIPOS: MINI CARGADOR (2) VIBRO COMPACTADOR, VOLTEOS 1
HERRAMIENTAS MENORES.
PERSONAL CONTRATISTA: ING. RESIDENTE, SISO, SOCIAL, OPERADORES, ALMACENISTA, AYUDANTES - 18.
PERSONAL INTERVENTORIA: ING. RESIDENTE Y INSPECTOR.
ACTIVIDADES:
INSTALACION DE SUBBASE GRANULAR CALLE 29A (K0+113 - K0+135); CALLE 29F. (K0+125 - K0+130) SE TOMARON DENSIDADES. SE REALIZÓ ENCOFRADO: CALLE 29A (K0+169 - K0+220) CARRIL DERECHO.
CONCRETO HIDRAULICO MR-40 KG/cm² CALLE F. (K0+048 - K0+098). CARRIL DERECHO. VOLUMEN DE CONCRETO.

25 m³.

María f. Arizola M.
CONTRATISTA

INTERVENTORÍA:

DOMINGO 30 DE OCTUBRE DEL 2022.
ESTADO DEL TIEMPO: (SECO)
DÍA NO LABORAL. (FESTIVO).

María f. Arizola M.
CONTRATISTA

INTERVENTORÍA:

LUNES 31. DE OCTUBRE. DEL. 2022.
HORA DE INICIO: 7:30 am. HORA FINAL: 6 pm.
ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA Y TARDE (SECO)
EQUIPOS: MINI CARGADOR (2) VIBRO COMPACTADOR, CAMION
HERRAMIENTAS MENORES.
PERSONAL CONTRATISTA: ING. RESIDENTE, ING. AUX. 3.
TOPOGRAFO, ALMACENISTA, OFERIDORES (3) CONDUCTOR 1 OBRERO 18
PERSONAL INTERVENTORIA: ING. RESIDENTE Y INSPECTOR.
ACTIVIDADES:
EXCAVACION MECANICA SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION
CALLE 29E. (K0+050 - K0+070).
CONCRETO HIDRAULICO MR-40 K9/cm²: CALLE 29F.
(K0+098 - K0+114) - CARRIL IZQUIERDO. CALLE 29F
(K0+156 - K0+183).
VOLUMEN DE CONCRETO. 21.5 m³.

CONTRATISTA

INTERVENTORIA.
