INFORME DE INSTALACIÓN

Datos del cliente

- Empresa: FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
- Ciudad: Bogotá
- Contrato: CO1.PCCNTR.8246293

Datos del equipo instalado

- Tipo de equipo: BLOQUE SECO DE CALENTAMIENTO CON AGITACIÓN
- Marca: BENCHMARCK
- Modelo: H5000-H
- Número de serie: 057-16031-25040010
- Laboratorio: LS2
- Tensión de alimentación: 110 V / 50 Hz
- Fecha de entrega: 27 / 11 / 2025
- Fecha de instalación: 28 / 11 / 2025

Condiciones del sitio de instalación

Se verifica las condiciones mínimas:

1. **Ubicación física**
    - Superficie estable, firme y nivelada
    - Espacio suficiente para ventilación del equipo
    - Área libre de derrames frecuentes o salpicaduras
2. **Condiciones eléctricas**
    - Tomacorriente adecuado y exclusivo para el equipo
    - Voltaje dentro del rango especificado por el fabricante
3. **Condiciones ambientales**
    - Ambiente limpio y ordenado
    - Temperatura y humedad dentro del rango recomendado
    - Equipo alejado de fuentes de calor externo y vibraciones

Observaciones del sitio:

Se encuentra en buenas condiciones para uso

Procedimiento de instalación

Se realizan las siguientes actividades:


1. **Desempaque y verificación física**
    - Verificación del estado del embalaje
    - Desempaque del equipo y accesorios
    - Inspección visual de daños físicos
    - Verificación de la lista de componentes entregados
2. **Montaje y conexiones**
    - Colocación del equipo en la superficie definitiva de trabajo
    - Instalación de bloques o insertos de aluminio según referencia
    - Verificación de correcta fijación de los bloques
    - Conexión eléctrica del equipo al tomacorriente adecuado
3. **Configuración básica**
    - Encendido y verificación del panel de control
    - Verificación de lectura de temperatura en pantalla
    - Verificación de lectura y control de rpm de agitación
4. **Pruebas de funcionamiento – Calentamiento**
    - Programación de un set point de temperatura
    - Verificación del incremento de temperatura hasta el set point
5. **Pruebas de funcionamiento – Agitación**
    - Ensayo de agitación con los accesorios
    - Verificación de funcionamiento del sistema de agitación
    - Verificación de ausencia de ruidos o vibraciones anormales

Observaciones del procedimiento de instalación:


Sin novedades, lista para su uso

Fotografías de la instalación:


Benchmark
MULTI-THERM
HEAT - SHAKE

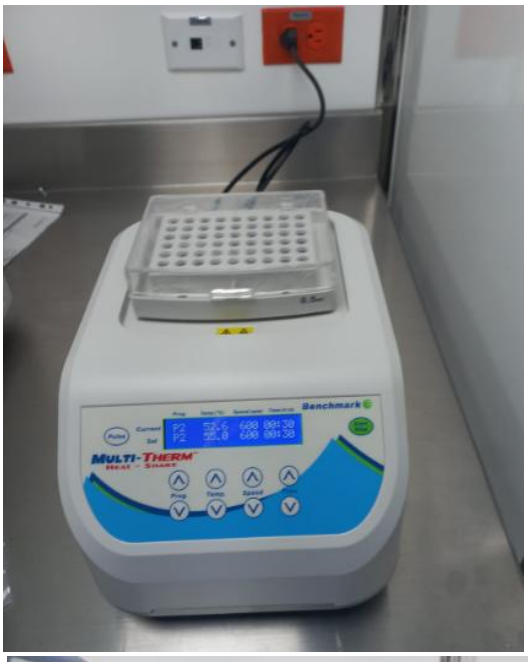
Benchmark
MULTI-THERM
HEAT - SHAKE


Benchmark
MULTI-THERM
HEAT - SHAKE

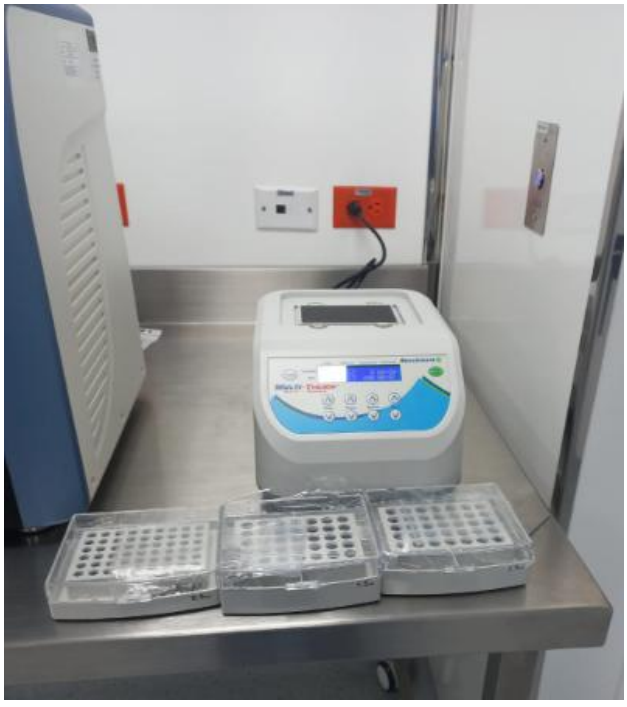



TATIANA VARGAS
