
CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

INFORME DE OBRA

PERIODO DEL 25 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2026

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO°. 20260000183

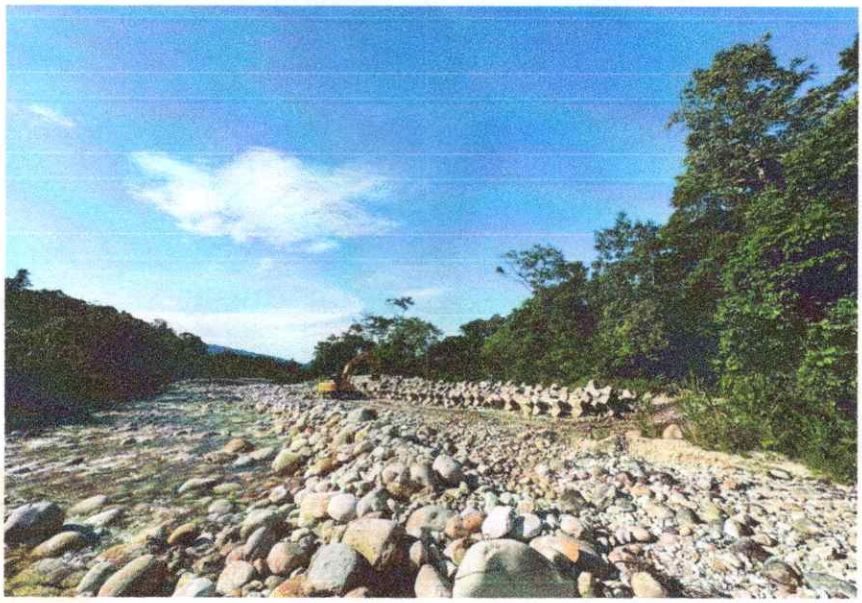

OBRAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONCRETO PARA LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA LA GAITANA, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.

PCA GROUP SAS

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

2026

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 4
1 ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA 5
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 5
1.1.1 DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN. 5
1.1.2 ANTECEDENTES 6
1.2 ETAPA CONTRACTUAL. 7
1.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 7
2 INFORMACIÓN CONTRACTUAL 8
2.1 PERSONAL PROFESIONAL 8
3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 8
3.1 FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO DE OBRA 8
1.1 RELACIÓN DE PÓLIZAS 9
1.2 CONTROL DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 13
3.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PERSONAL OPERATIVO. 13
4 ASPECTOS FINANCIEROS 14
4.1 FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO 14
5 AVANCE DE OBRA 16
5.1 AVANCE EN TIEMPO. 16
5.2 AVANCE FINANCIERO 17
5.3 AVANCE FÍSICO DE OBRA 18
6 EQUIPO Y MAQUINARIA 19
7 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 21
7.1 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 21
8 REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 22
9 CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS 23
10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 24

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

Tabla De Imágenes

Ilustración 1. Ubicación geográfica de Cubará en el departamento de Boyacá 5
Ilustración 2.. Margen derecha, Quebrada la Gaitana. 6
Ilustración 3 Grafica de avance en tiempo. 17
Ilustración 4. Avance financiero de obra. 18
Ilustración 6. Entrega de dotación 21
Ilustración 6. Entrega de dotación 21

Lista De Tablas

Tabla 1 Ficha técnica del contrato No. 20260000183 8
Tabla 2. Póliza Anexo 0 9
Tabla 3. Póliza Anexo 2 10
Tabla 4. Pólizas anexo 3 12
Tabla 5. Relación del personal contratado en la ejecución del contrato 20260000183 14
Tabla 6. Presupuesto general. 15
Tabla 7.Consolidado inversión del anticipo 16
Tabla 8. Evidencia muestras de laboratorio 23

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

INTRODUCCIÓN

En el presente informe se describen las actividades técnicas, administrativas, jurídicas, económicas y financieras desarrolladas por la empresa PCA GROUP S.A.S. durante el periodo comprendido entre el 25 de mayo y el 24 de junio de 2026, en el marco de la ejecución del Contrato de Obra Pública No. 20260000183, cuyo objeto es el "Suministro e instalación de hexápodos de concreto para la protección de la margen del río Cobaría en el sector del barrio El Comercio, municipio de Cubará, Boyacá".

Durante el periodo objeto del presente informe se ejecutaron las actividades correspondientes al capítulo de suministro e instalación de hexápodos de concreto, orientadas a la estabilización y protección de la margen de la quebrada la Gaitana, con el propósito de mitigar los procesos de erosión y socavación que afectan este sector. Las actividades desarrolladas comprendieron, entre otras, el suministro de materiales, la fabricación de los hexápodos de concreto, su transporte al sitio de intervención, la preparación del área de trabajo, la instalación y correcta disposición de los elementos de protección conforme a las especificaciones técnicas del contrato, así como las labores de control de calidad, seguimiento y supervisión de las actividades ejecutadas, garantizando el cumplimiento de las condiciones técnicas, ambientales y de seguridad establecidas para el proyecto.

Durante el periodo de ejecución se llevaron a cabo las actividades contempladas en el contrato, destacándose la instalación de ochenta y cinco (85) hexápodos de concreto de 4.000 PSI, ejecutada de conformidad con las especificaciones técnicas, planos, cantidades de obra y estándares de calidad establecidos. Asimismo, se realizaron, actividades indispensables para la conformación, adecuación y preparación del terreno, garantizando la correcta ubicación e instalación de los elementos de protección sobre la margen de la quebrada la Gaitana. Todas las labores fueron ejecutadas bajo la supervisión e interventoría de la entidad contratante, cumpliendo con los requisitos técnicos, administrativos, ambientales y de seguridad establecidos en el contrato, así como con la normatividad aplicable.

El presente informe se presenta para efectos de la liquidación del Contrato de Obra Pública No. 20260000183, dejando constancia de que las actividades programadas fueron ejecutadas de conformidad con el cronograma de trabajo y las especificaciones contractuales, alcanzando un cumplimiento físico y financiero del cien por ciento (100%) del objeto contractual. En consecuencia, se evidencia la terminación satisfactoria de las obligaciones adquiridas por el contratista, permitiendo adelantar el proceso de liquidación del contrato conforme a la normativa vigente.

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

1 ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.1.1 DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN.

Es un municipio colombiano. Se sitúa en el extremo nororiental del departamento, en la región del Sarare, en la subregión del Piedemonte Llanero, Orinoquía colombiana, a una altitud de 357 metros sobre el nivel del mar. Se extiende sobre la planicie en la ribera del río Cobaría, (afluente del Río Arauca). El municipio limita al norte con Toledo (Norte de Santander) y el municipio de Páez, estado Apure (Venezuela); al occidente con Concepción, (Santander); al sur con Chiscas y Güicán en Boyacá y al oriente con Saravena en Arauca.

Cubará se comunica con los departamentos de Arauca a través de la Carretera de la Soberanía siendo su primera ciudad de encuentro Saravena, igualmente en sentido contrario esta vía comunica a los corregimientos de Gibraltar, Samoré, San Bernardo de Bata y los municipios de Toledo y Pamplona.



Ilustración 1. Ubicación geográfica de Cubará en el departamento de Boyacá

Las actividades se ejecutaron en la margen derecha de la quebrada la Gaitana, específicamente en las coordenadas (7.007952,-72.041465), jurisdicción del municipio de Cubará, departamento de Boyacá.

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com



Ilustración 2.. Margen derecha, Quebrada la Gaitana.

1.1.2 ANTECEDENTES.

El municipio de Cubará, departamento de Boyacá, presenta condiciones de alta susceptibilidad a fenómenos hidrológicos debido a la presencia de numerosas fuentes hídricas y a la intensidad de las precipitaciones durante las temporadas de lluvia. Estas condiciones han propiciado procesos de erosión lateral, socavación, sedimentación y desbordamiento en diferentes cauces del municipio, generando afectaciones sobre la infraestructura, los predios rurales y la seguridad de las comunidades asentadas en sus áreas de influencia.

Como resultado de las visitas de inspección técnica realizadas por la Secretaría de Planeación y Obras Públicas del municipio de Cubará, se identificó un proceso activo de desviación del cauce, elevación del lecho, sedimentación y erosión lateral sobre la margen derecha de la quebrada La Gaitana, situación que incrementó el riesgo de desbordamientos y comprometió la estabilidad del jarillón existente, así como la protección de las viviendas, los predios productivos y la infraestructura ubicada en este sector.

Durante la inspección también se evidenció que el jarillón existente había sido construido de manera empírica con material extraído de la misma quebrada, presentando un comportamiento inestable frente a las crecientes, debido al constante arrastre del material por efecto de la corriente. Esta condición hacía insuficiente la protección de la ribera, por lo que se determinó la necesidad de implementar una solución de ingeniería que permitiera estabilizar la margen y reducir los procesos de erosión y socavación.

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

En atención a esta problemática y en el marco de las acciones contempladas en el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres analizó la situación presentada y recomendó la ejecución de obras de protección ribereña mediante la instalación de hexápodos de concreto, como medida para disminuir el riesgo asociado a las crecientes de la quebrada y garantizar la estabilidad de la margen intervenida.

En consecuencia, el municipio de Cubará adelantó el proceso contractual para la ejecución del proyecto denominado **"OBRAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONCRETO PARA LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA LA GAITANA, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ"**, cuyo propósito fue ejecutar las obras necesarias para fortalecer la protección de la ribera, disipar la energía del flujo, controlar los procesos erosivos y contribuir a la reducción del riesgo de inundaciones, garantizando la seguridad de la población, la conservación de la infraestructura existente y la estabilidad del cauce.

1.2 ETAPA CONTRACTUAL.

En el municipio de Cubará, Boyacá, a los veinticinco (25) días del mes de mayo de 2026, se reunieron en las instalaciones de la alcaldía de Cubará, Boyacá, **PCA GROUP SAS** con **NIT No. 901.490.923-2** representada legalmente por **XIMENA DAMARIS MORA** identificada con cedula de ciudadanía No. 1.094.276.314 de pamplona, Norte de Santander, y que los sucesivos se denominará **EL CONTRATISTA**, y **JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA** secretario de planeación y obras públicas, en su condición de **SUPERVISOR** del contrato, con el fin de firmar la presente **ACTA DE INICIO** del contrato No. **20260000183.**

1.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las actividades contempladas para el desarrollo del proyecto denominado "OBRAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONCRETO PARA LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA LA GAITANA, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ" son las mencionadas a continuación

- Inicialmente se efectuó la localización y replanteo del área de intervención, verificando las condiciones del terreno y definiendo la ubicación de los elementos de protección de acuerdo con los diseños y especificaciones técnicas del proyecto. Posteriormente, se ejecutaron las actividades de adecuación del sitio mediante movimiento de tierras con maquinaria, permitiendo la conformación de la superficie donde serían instalados los hexápodos.


- De manera simultánea se realizaron el suministro, transporte e instalación de los hexápodos de concreto reforzado de 4.000 PSI, garantizando su correcta disposición sobre la margen derecha de la quebrada La Gaitana, con el fin de

conformar una estructura de protección capaz de disipar la energía del flujo, reducir los procesos de erosión y socavación, y estabilizar la ribera.

- Durante toda la ejecución del contrato se llevaron a cabo actividades permanentes de control de calidad, supervisión técnica, seguimiento administrativo, control de cantidades de obra y verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, así como de las disposiciones ambientales y de seguridad y salud en el trabajo aplicables al proyecto.

2 INFORMACIÓN CONTRACTUAL

2.1 PERSONAL PROFESIONAL.

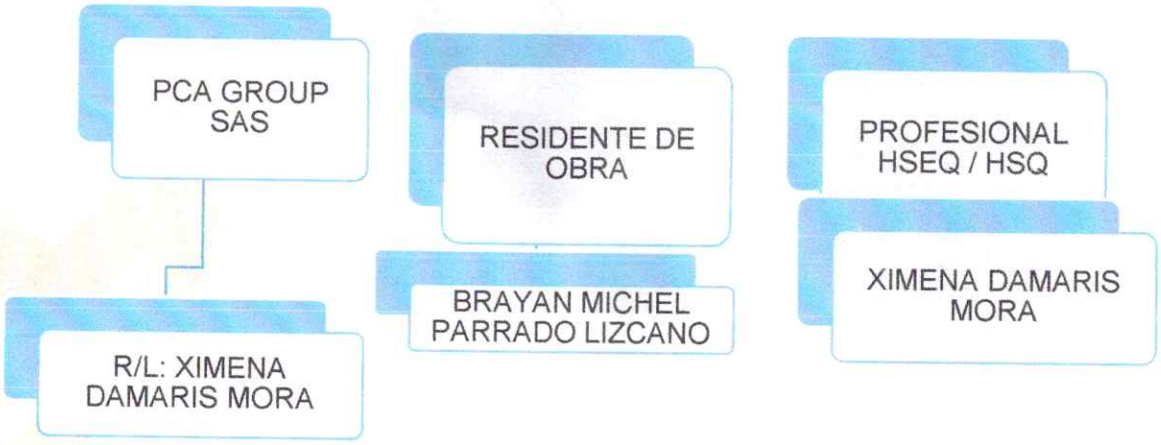

3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

3.1 FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO DE OBRA

Tabla 1 Ficha técnica del contrato No. 20260000183.

OBJETO:	OBRAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONCRETO PARA LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA LA GAITANA, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.
VALOR	**DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS ($ 259.181.150,00) M/CTE** equivalente a **148,0270 SMLMV.**
CONTRATISTA	**PCA Group SAS** NIT. No. 901490923-2 **R/L: XIMENA DAMARIS MORA.** C.C. No. 1.094.276.314 de pamplona N.S.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.
SUPERVISOR	**JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA**

	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	2026000206 de 06/04/2026.
REGISTRO PRESUPUESTAL:	2026000360 de 20/05/2026.
PLAZO	UN (01) MES.
ACTA DE INICIO	VEINTICINCO (25) DE MAYO DE 2026.
FECHA DE TERMINACION:	VEINTICUATRO (24) DE JUNIO DE 2026

1.1 RELACIÓN DE PÓLIZAS

1.1.1. PÓLIZAS SEGÚN MINUTA CONTRACTUAL:

Las pólizas iniciales fueron expedidas el día Veintidós (22) de mayo de 2026 por la **Aseguradora SEGUROS MUNDIAL** tomadas por la empresa **PCA Group SAS** con Nit. 901490923-2 Representada legalmente por **XIMENA DAMARIS MORA** como beneficiario el municipio de Cubará. Dichas pólizas fueron aprobadas por la secretaria de Planeación y Obras Públicas. Póliza según contrato:

Tabla 2. Póliza Anexo 0

PCA GROUP SAS

RELACIÓN DE POLIZAS				CONTRATO DE OBRA No. 20260000183			
Anexo No.	**FECHA**	**NOMBRE/TIPO DE POLIZA**	**ENTIDAD ASEGURADORA**	**NÚMERO DE LA POLIZA**	**VALOR ASEGURADO**	**FECHA INICIAL**	**FECHA VENCIMIENTO**
0	Veintidós (22) de mayo de 2026	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS MUNDIAL	1000666290	$25.918.115,00	00:00 horas del 20/05/2026	24:00 horas del 30/12/2026
		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION			$77.754.345,00	00:00 horas del 20/05/2026	24:00 horas del 30/12/2026

		DEL ANTICIPO					
		PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES			$12.959.057,50	00:00 horas del 20/05/2026	24:00 horas del 30/06/2028
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			$51.836.230,00	00:00 horas del 20/06/2026	24:00 horas del 20/06/2028
		GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS BIENES			$25.918.115,00	00:00 horas del 25/05/2026	24:00 horas del 04/01/2027
0	Veintidós (22) de mayo de 2026	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS MUNDIAL	10001523	$ 350.181.000,00	20/05/2026	30/06/2026

1.1.2. PÓLIZA SEGÚN ACTA DE INICIO.

Las pólizas iniciales según el acta de inicio fueron expedidas el día veintinueve (29) de mayo de 2026 por la Aseguradora SEGUROS MUNDIAL tomadas por la empresa PCA Group SAS con Nit. 901490923-2 Representada legalmente por **XIMENA DAMARIS MORA** como beneficiario el municipio de Cubará. Dichas pólizas fueron aprobadas por la secretaria de Planeación y Obras Públicas. Póliza según acta de Inicio:

Tabla 3. Póliza Anexo 2

PCA GROUP SAS

RELACIÓN DE POLIZAS **CONTRATO DE OBRA No. 20260000183**

PCA GROUP
CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

No.	FECHA	NOMBRE/TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NÚMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO
		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			$25.918.115,00	00:00 horas del 25/05/2026	24:00 horas del 04/01/2027
		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO			$77.754.345,00	00:00 horas del 25/05/2026	24:00 horas del 04/01/2027
2	Veinti nueve (29) de mayo de 2026	PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SEGUROS MUNDIAL	10006629 0	$12.959.057,50	00:00 horas del 25/05/2026	24:00 horas del 05/07/2028
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			$51.836.230,00	00:00 horas del 25/06/2026	24:00 horas del 25/06/2028
		GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS BIENES			$25.918.115,00	00:00 horas del 25/05/2026	24:00 horas del 04/01/2027
2	Veinti nueve (29) de mayo	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS MUNDIAL	10001152 3	$ 350.181.000,00	25/05/2026	05/07/2026

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

1.1.3. PÓLIZA SEGÚN ACTA DE RECIBO.

Las pólizas iniciales según el acta de recibo final fueron expedidas el día tres (03) de julio de 2026 por la Aseguradora SEGUROS MUNDIAL tomadas por la empresa PCA Group SAS con Nit. 901490923-2 Representada legalmente por **XIMENA DAMARIS MORA** como beneficiario el municipio de Cubará. Dichas pólizas fueron aprobadas por la secretaria de Planeación y Obras Públicas. Póliza según acta de RECIBO FINAL:

Tabla 4. Pólizas anexo 3

PCA GROUP SAS

RELACIÓN DE POLIZAS				CONTRATO DE OBRA No. 20260000183			
Anexo No.	**FECHA**	**NOMBRE/TIPO DE POLIZA**	**ENTIDAD ASEGURADORA**	**NÚMERO DE LA POLIZA**	**VALOR ASEGURADO**	**FECHA INICIAL**	**FECHA VENCIMIENTO**
3	Tres (03) de Julio de 2026	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS MUNDIAL	10006 6290	$25.918.115,00	00:00 horas del 25/05/2026	24:00 horas del 04/01/2027
		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO			$ 72,772,395.60	00:00 horas del 25/05/2026	24:00 horas del 04/01/2027
		PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES			$ 12,128,732.60	00:00 horas del 25/05/2026	24:00 horas del 05/07/2028

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$51.836.230,00	00:00 horas del 02/07/2026	24:00 horas del 02/07/2028
GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS BIENES	$25.918.115,00	00:00 horas del 25/05/2026	24:00 horas del 04/01/2027

1.2 CONTROL DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

3.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PERSONAL OPERATIVO.

Durante el periodo correspondiente al presente informe se realizó el seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales del personal vinculado a la ejecución del proyecto, de conformidad con la normatividad vigente y las obligaciones contractuales.

El personal profesional, técnico y administrativo vinculado por el contratista para la ejecución de la obra corresponde al equipo de trabajo presentado dentro de la propuesta y aprobado durante el proceso de selección, sin que se hayan presentado modificaciones durante el periodo objeto del presente informe. Dicho personal permaneció desarrollando las funciones asignadas para la dirección técnica, administrativa y de apoyo al contrato.

En cuanto al personal operativo, su vinculación se realizó de acuerdo con las necesidades propias de la ejecución de las actividades constructivas. Específicamente, este personal fue contratado únicamente durante los periodos en los que se ejecutaron actividades de obra física correspondientes a la fabricación, transporte, suministro e instalación de los hexápodos de concreto, por lo que los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral fueron efectuados exclusivamente para los periodos en los cuales dicho personal estuvo efectivamente vinculado y desarrollando labores en el proyecto.

A continuación, se relaciona el personal administrativo y operativo vinculado por el contratista durante el periodo del presente informe, junto con las respectivas planillas de pago de seguridad social correspondientes a los meses en los que se presentó vinculación laboral, las cuales hacen parte integral de los anexos del presente informe como soporte del cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social del contratista.

Tabla 5. Relación del personal contratado en la ejecución del contrato 20260000183

RELACIÓN PERSONAL CONTRATO DE OBRA No. 20260000183, PERIODO 25/05/2026 A 24/06/2026						
ITEM	ID	NOMBRE DEL EMPLEADO	SUELDO BASICO MES	FECHA ING	FECHA RET	D/T
1	1094266290	BRAYAN MICHEL PARRADO LIZCANO	$ 3.000.000	25/05/2026	24/06/2026	30
2	1094276314	XIMENA DAMARIS MORA BUITRAGO	$ 2.250.000	15/06/2026	24/06/2026	10
3	9466646	LUIS ERMINIO RINCON ARIAS	$ 2.877.900	15/06/2026	24/06/2026	10
4	9466912	JOSUE LOPEZ CHAPETA	$ 2.142.990	15/06/2026	24/06/2026	10
5	1007545405	PABLO EMILIO PATIÑO CALDERON	$ 2.142.990	15/06/2026	24/06/2026	10
6	9466531	ALIRIO VERA SOLANO	$ 2.142.990	15/06/2026	24/06/2026	10
7	91541508	JULIO CESAR GAMBOA CAMARGO	$ 2.142.990	15/06/2026	24/06/2026	10
8	9467221	LUIS ADOLFO BARAJAS SILVA	$ 2.142.990	15/06/2026	24/06/2026	10
9	9467022	ENOC QUIÑONEZ VILLAMOZAR	$ 2.142.990	15/06/2026	24/06/2026	10
10	5492350	JESUS ANTONIO VERA	$ 2.142.990	15/06/2026	24/06/2026	10
11	1049394576	DANIEL ADULFO MENDEZ RAMIREZ	$ 2.142.990	15/06/2026	24/06/2026	10
12	9467072	FREDY JEREZ ARIAS	$ 2.142.990	15/06/2026	24/06/2026	10
13	1049394930	JUAN SANTAFE PEDRAZA	$ 2.142.990	15/06/2026	24/06/2026	10

El pago de seguridad social del personal mencionado en la tabla anterior por la empresa PCA GROUP SAS, podrá verificarse en el ANEXO 9 del presente informe.

4 ASPECTOS FINANCIEROS

4.1 FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO

El contrato de obra 20260000183 cuyo objeto es "OBRAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONCRETO PARA LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA LA GAITANA, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ" el día veinte (20) de mayo del año 2026 se suscribe contrato en mención con la empresa **PCA GROUP SAS** con NIT No. 901.490.923-2 representada legalmente por **XIMENA DAMARIS MORA** identificada con cedula de ciudadanía

No. 1.094.276.314 de pamplona, Norte de Santander por un valor de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS ($ 259.181.150,00) M/CTE equivalente a 148,0270 SMLMV. a continuación se presenta el presupuesto desglosado.

Tabla 6. Presupuesto general.

CONDICIONES INICIALES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,0	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS**				
1,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS EN CONCRETO REFORZADO DE 4000 PSI H=1,8M	UND	85,00	$ 3.049.190,00	$ 259.181.150,00
				Subtotal	**$ 259.181.150,00**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 194.873.045,11**
				ADMINISTRACION 24%	**$ 46.769.530,83**
				IMPREVISTO 2%	**$ 3.897.460,90**
				UTILIDAD 7%	**$ 13.641.113,16**
				TOTAL COSTO INDIRECTO	**$ 64.308.104,89**
				COSTO TOTAL	**$ 259.181.150,00**

4.2 PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

En cumplimiento de lo establecido en el Contrato de Obra No. 20260000183 y conforme al Plan de Inversión del Anticipo aprobado, el contratista recibió un anticipo por valor de SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($77.754.345,00), destinado a garantizar el inicio oportuno y la adecuada ejecución de las actividades contractuales.

Los recursos del anticipo fueron invertidos principalmente en la adquisición de materiales requeridos para la ejecución del proyecto, así como en los demás costos indispensables para el desarrollo de las actividades programadas. Conforme a la relación de facturación presentada, la inversión efectivamente realizada asciende a SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE ($77.935.581,60).

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

La anterior evidencia una inversión superior al valor del anticipo recibido, presentándose una diferencia de CIENTO OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($181.236,60), la cual fue asumida con recursos propios del contratista, sin generar costos adicionales para la entidad contratante.

La presente relación de facturación se encuentra soportada mediante las respectivas facturas, comprobantes de pago y demás documentos contables que permiten verificar la correcta aplicación de los recursos, en concordancia con el Plan de Inversión del Anticipo aprobado y con los principios de eficiencia, transparencia y responsabilidad contractual. En el ANEXO 13 se adjuntan los soportes correspondientes a la inversión del anticipo.

Tabla 7.Consolidado inversión del anticipo.

RELACION FACTURACION ANTICIPO CONTRATO DE OBRA N°20260000183			
		VALOR ANTICIPO	$ 77.754.345,00
ITEM	DESCRIPCION	N° DE FACTURA	VALOR TOTAL
1	COMPRA DE MATERIALES	CM47425	$ 569.999,60
2	COMPRA DE MATERIALES	FEDP21676	$ 18.481.000,00
3	COMPRA DE MATERIALES	FEV2562	$ 54.480.882,00
4	COMPRA DE MATERIALES	FEC185	$ 4.403.700,00
		TOTAL	$ 77.935.581,60

5 AVANCE DE OBRA

5.1 AVANCE EN TIEMPO.

AVANCE DE TIEMPO AL 20 DE NOVIEMBRE	
PLAZO EJECUCION DEL CONTRATO	30
ADICIONAL EN TIEMPO	0
DIAS TRABAJADOS EN OBRA	10
DIAS TRASCURRIDOS	30
PORCENTAJE TOTAL	100%

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

ACUMULADO PLAZO INICIAL VS PROGRAMADO (%)	
PERIODO 25/05/26 AL 24/06/26	100%
TIEMPO ACUMULADO	100%
TIEMPO RESTANTE	0%



Ilustración 3 Grafica de avance en tiempo.

Según la imagen anterior, se observa que al día 24 de junio de 2026, se están cumpliendo 30 días de ejecución del contrato No. 20260000183, esto corresponde a un 100% del tiempo contratado, teniendo en cuenta a la ejecución en obra tanto física como financiera se puede concluir que la obra se llevó en los tiempos establecidos.

5.2 AVANCE FINANCIERO.

AVANCE FINANCIERO			
CAPITULOS	VALOR CONTRATADO	VALOR EJECUTADO	%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS EN CONCRETO REFORZADO DE 4000 PSI H=1,8M	$ 259.181.150,00	$ 259.181.150,00	100%
RELACION DE AVANCE FINANCIERO			
VALOR INICIAL CONTRATADO		$ 259.181.150,00	

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 259.181.150,00**
PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO	100%

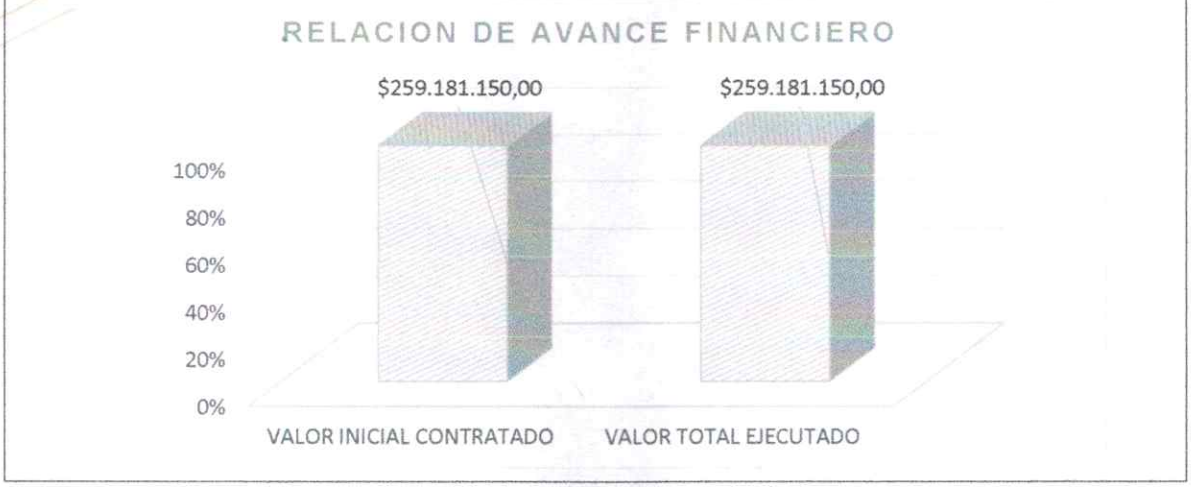


Ilustración 4. Avance financiero de obra.

La imagen anterior presenta la ejecución presupuestal del Contrato de Obra No. 20260000183 con corte al 24 de junio de 2026, elaborada por PCA GROUP S.A.S., en la cual se detalla el avance financiero discriminado por capítulos, indicando para cada uno de ellos el valor contratado, el monto ejecutado y el porcentaje de ejecución alcanzado durante el período informado. Esta información permite evidenciar el comportamiento de la inversión de los recursos y el cumplimiento de las metas financieras establecidas para el proyecto.

De acuerdo con la ejecución presupuestal presentada, se observa un avance financiero del 100%, reflejando la ejecución total de los recursos contratados conforme a las actividades desarrolladas en obra. Lo anterior demuestra que la inversión se realizó de acuerdo con la programación establecida y en concordancia con el cronograma aprobado para el contrato.

5.3 AVANCE FÍSICO DE OBRA.

OBRAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONCRETO PARA LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA LA GAITANA, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ					
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANTIDAD CONTRATADA**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**AVACE FISICO (%)**
1,00	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS**				

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

OBRAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONCRETO PARA LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA LA GAITANA, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ					
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANTIDAD CONTRATADA**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**AVACE FISICO (%)**
1,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS EN CONCRETO REFORZADO DE 4000 PSI H=1,8M	UND	85	85	100%
TOTAL					100%

En la anterior tabla, se puede observar la ejecución física de cada una de las actividades ejecutadas al 24 de junio de 2026. Dichas actividades promedian un avance físico de obra de un 100%, lo cual, comparado con el avance en tiempo, nos arroja que las actividades son ejecutadas dentro de los tiempos establecidos.

6 EQUIPO Y MAQUINARIA

Durante el período de ejecución del contrato se llevó un control permanente de la maquinaria, equipos y herramientas utilizadas en el desarrollo de las actividades, verificando su disponibilidad, estado operativo y correcta utilización en obra.

La empresa PCA GROUP S.A.S. presenta la relación de la maquinaria y herramientas empleadas durante el período del presente informe, indicando su aplicación en las diferentes actividades ejecutadas, así como las respectivas fichas técnicas que respaldan sus características y funcionamiento.

La utilización de estos equipos contribuyó al cumplimiento de la programación de obra y al desarrollo eficiente de las actividades contratadas, garantizando el adecuado rendimiento de los recursos y el cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto.

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

DESCRIPCION	REGISTRO FOTOGRAFICO
VOLQUETA: La volqueta fue utilizada como equipo de apoyo para el transporte de materiales requeridos durante la ejecución de la obra, garantizando el abastecimiento oportuno de los diferentes frentes de trabajo. Entre sus principales funciones se encuentran el cargue, transporte y descargue de agregados pétreos, arena, recebo, material de préstamo, así como el traslado de los hexápodos de concreto desde el sitio de fabricación hasta el frente de instalación.	
MEZCLADORA: La mezcladora de concreto fue utilizada para la preparación de las mezclas requeridas durante la ejecución de las diferentes actividades de la obra, garantizando la adecuada dosificación, homogeneidad y trabajabilidad del concreto empleado, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.	
EXCAVADORA: La excavadora hidráulica fue utilizada como equipo fundamental para la ejecución de las actividades relacionadas con la instalación de los hexápodos de concreto destinados a la protección de la margen intervenida. Su principal función consistió en apoyar las labores de cargue, transporte interno, izaje, manipulación y posicionamiento de los elementos prefabricados, permitiendo su instalación de manera segura y conforme a la distribución establecida en los planos del proyecto.	

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

7 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

7.1 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

El sector de la construcción representa uno de los ambientes laborales más peligrosos, teniendo en cuenta la cantidad de riesgos que allí se encuentran, por esto es fundamental que se cumpla con la utilización de los elementos de protección personal ya que las condiciones de trabajo en la construcción son tales que pese a todas las medidas preventivas que se adopten en la planificación del proyecto, siempre se necesitarán algún tipo de protección para el trabajador frente a los riesgos existentes.

PCA GROUP SAS atendiendo a esta necesidad, dotó de un kit completo de protección personal para los trabajadores durante el tiempo de ejecución del contrato, el cual incluye los siguientes elementos.

- Casco de protección.
- Gafas de protección.
- Guantes.
- Botas con puntera de seguridad.
- Tapabocas.
- Tapa oídos.
- Camisa manga larga en Jean industrial.
- Pantalón en Jeans industrial.



Ilustración 5. Entrega de dotación

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

En el anexo 19 se presenta los protocolos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) implementados durante la fabricación e instalación de los hexápodos de concreto, con el propósito de prevenir accidentes y proteger la integridad del personal. Se incluyen las medidas de identificación y control de riesgos, uso obligatorio de elementos de protección personal (EPP), inspección de herramientas y equipos, señalización y delimitación de las áreas de trabajo, procedimientos para el izaje y manipulación de cargas, realización de charlas de seguridad, verificación de condiciones de trabajo y demás controles preventivos aplicados durante la ejecución de las actividades.

8 REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

El inicio de actividades en obra, se inicia el 15 de junio de 2026 se dio inicio a las labores de obra con la fabricación de los hexápodos de concreto, actividad desarrollada de acuerdo con las especificaciones técnicas del contrato, con el fin de garantizar la calidad y resistencia de cada elemento antes de su instalación en el sitio de intervención. Una vez alcanzadas las condiciones requeridas, los hexápodos fueron trasladados e instalados en el sector objeto del proyecto, conforme al procedimiento constructivo establecido.


A continuación, se presenta la descripción de cada una de las actividades ejecutadas, indicando la cantidad contratada y la cantidad ejecutada, así como el respectivo registro fotográfico que evidencia el desarrollo de las labores realizadas durante la ejecución del contrato:

1.1. INSTALACIÓN DE HEXÁPODO EN CONCRETO DE 4000 PSI	UNIDAD: UND








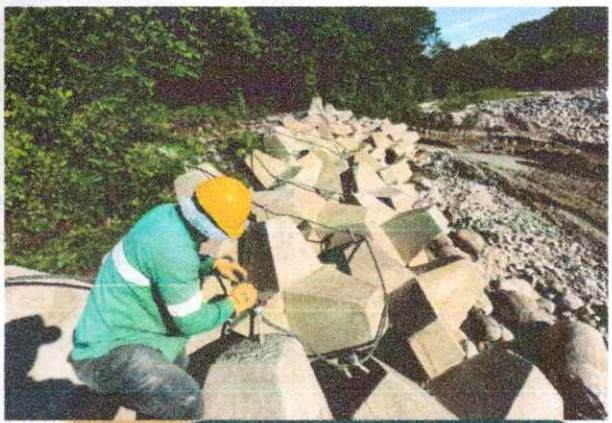

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

La actividad consiste en la instalación de hexápodos prefabricados en concreto de 4.000 psi, utilizando maquinaria de izaje para su posicionamiento y colocación conforme a los planos del proyecto. Finalmente, se verifica la alineación, estabilidad y correcto acople entre las unidades, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y su adecuado desempeño hidráulico.

CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA
85	85

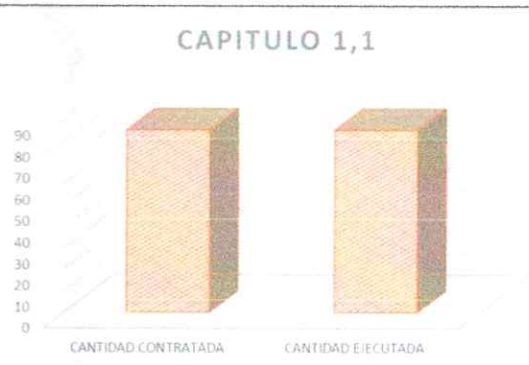

9 CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS

Con el fin de garantizar las obras construidas en la ejecución del contrato de obra No.20260000183 el contratista PCA GROUP SAS realiza ensayos a la compresión a los concretos fundidos en obra como se muestra en el anexo 17 ENSAYOS DE LABORATORIO y a continuación se muestra la evidencia de ello.

Tabla 8. Evidencia muestras de laboratorio.

Registro Fotográfico	
	
Durante la toma de muestras del concreto, se realizó el llenado de los moldes cilíndricos con la mezcla recién preparada, efectuando la compactación manual de cada capa mediante una varilla para eliminar vacíos y garantizar una adecuada consolidación d	

PCA GROUP

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo con la ejecución del contrato de obra No. 20260000183 cuyo objeto es "OBRAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONCRETO PARA LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA LA GAITANA, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ." se puede resaltar lo siguiente.

- Se realizo la respectiva revisión de los diseños del contrato de obra 20260000183 los cuales se han venido ejecutando dentro de los parámetros técnicos requeridos, dando cumplimiento a las especificaciones técnicas generales del contrato, garantizando así la calidad de las obras ejecutadas.

- La empresa PCA GROUP SAS. ve conveniente liquidación de contrato debido que las actividades realizadas en obra, siguiendo la ejecución del contrato 20260000183, como se presenta en este informe, el avance financiero, físico y en tiempo, se encuentra al 100% del valor total de las actividades que conforman el contrato.

- La empresa PCA GROUP SAS ha realizado las actividades cumpliendo las especificaciones técnicas realizadas por la administración municipal, además de las recomendaciones u observaciones realizadas por la supervisión del contrato de obra 20260000183.

- De acuerdo con este informe, la empresa PCA GROUP SAS, en la ejecución del contrato de obra 20260000183 se presenta los siguientes avances de obras

- ☐ Avance físico 100%
- ☐ Avance financiero 100%
- ☐ Avance en tiempo 100%

Como se puede observar en los anteriores avances, la ejecución de la obra se hizo en los tiempos establecidos por la entidad, cumpliendo con especificaciones técnicas, planos, detalles e información de apoyo del proyecto. Por lo descrito anteriormente la empresa PCA GROUP SAS ve viable realizar la liquidación del proyecto 20260000183.

Aprobó:

R/L XIMENA DAMARIS MORA
PCA GROUP SAS
CONTRATISTA

Elaboró:

ING BRAYAN PARRADO LIZCANO
M.P. No. 54202-328201 NTS
RESIDENTE DE OBRA

PCA GROUP

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

ANEXOS

1. OFICIO DE ENTREGA DE INFORME.
2. ACTOS ADMINISTRATIVOS.
3. POLIZAS.
4. CORRESPONDENCIA.
5. ACTA DE SOCIALIZACION.
6. NOMINA DEL PERSONAL UTILIZADO.
7. VINCULACIÓN LABORAL.
8. SEGURIDAD SOCIAL DEL R/L.
9. SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL UTILIZADO.
10. PAZ Y SALVO DEL PERSONAL
11. CERTIFICACION DE PARAFISCALES FIC, CERTIFICACION DE LA CAJA DE COMPENSACION CONFABOY Y CERTIFICACION SENA.
12. BITACORA DE OBRA.
13. PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO.
14. MEMORIAS DE CANTIDADES.
15. REGISTRO FOTOGRAFICO.
16. ACTA DE AVANCE DE OBRA.
17. ENSAYOS DE LABORATORIO Y CERTIFICACIONES DE CALIDAD DE MATERIALES.
18. INFORME DE IMPREVISTOS.
19. INFORME DE GESTION AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
20. FACTURA ELECTRONICA.
21. CERTIFICACION BANCARIA.

PCA GROUP

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

1. OFICIO DE ENTREGA DE INFORME

PCA GROUP

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

Cubara 25 de junio de 2026

Señores:

MUNICIPIO DE CUBARA
Arq. JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA
Secretaria de planeación y obras publicas
Supervisor contrato de obra N° 20260000183

Cordial saludo.

Por medio de la presente me dirijo a ustedes con el fin de realizar entrega formal del informe de obra que comprende las actividades desde el 25 de mayo de 2026 al 24 de junio de 2026.

Atentamente,

XIMENA DAMARIS MORA BUITRAGO
R/L. PCA GROUP SAS

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

2. ACTOS ADMINISTRATIVOS

ACTA DE INICIO

CONTRATO No. 20260000183, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ Y **PCA GROUP S.A.S.** NIT. No. 901490923-2.

OBJETO:	**OBRAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONCRETO PARA LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA LA GAITANA, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.**
CONTRATISTA:	**PCA GROUP S.A.S.** NIT. No.:901490923-2 **R/L: XIMENA DAMARIS MORA BUITRAGO** C.C. No. 1.094.276.314 de Pamplona, Norte de Santander.
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.
VALOR:	**DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS ($ 259.181.150,00) M/CTE** equivalente a **148,0270 SMLMV.**
PLAZO:	**UN (01) MES.**
No. DE DISPONIBILIDAD:	2026000206 del 06/04/2026.

En el Municipio de Cubará, Boyacá, a los veinticinco (25) días del mes de mayo de dos mil veintiséis (2026), se reunieron en las instalaciones de la alcaldía de Cubará, Boyacá, **PCA GROUP S.A.S. NIT. No. 901490923-2** representada legalmente por **XIMENA DAMARIS MORA BUITRAGO** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.094.276.314 de Pamplona, Norte de Santander, y que en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATISTA,** y **JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA** Secretario de Planeación y Obras Públicas, en su condición de **SUPERVISOR** del contrato, con el fin de firmar la presente **ACTA DE INICIO** del contrato No. **20260000183.**

CONSIDERANDO:

1. Que se trata de un **CONTRATO DE OBRA**, cuyo plazo de ejecución es a partir de la firma del acta de inicio.

2. Que el Municipio de Cubará, seleccionó al contratista siguiendo la normatividad contractual vigente, ajustándose así a las especificaciones legales y a partir de los respectivos estudios previos, respaldados por el CDP No. 2026000206 del 06/04/2026, por el valor de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS ($ 259.181.150,00) M/CTE** equivalente a **148,0270 SMLMV**, documento que hace parte integral del presente contrato.

3. Que el municipio ha designado al Secretario de Planeación y Obras Públicas, para efectos de que supervise la correcta ejecución del Contrato de Obra No. **20260000183** el veinticinco (25) días del mes de mayo de dos mil veintiséis (2026).

En razón a lo anterior, las partes:

ACUERDAN:

1. Firmar la presente acta de inicio del Contrato de Obra No. **20260000183** el veinticinco (25) días del mes de mayo de dos mil veintiséis (2026).
2. Fijar como fecha de inicio el día: 25 de mayo de 2026.
3. Fijar como fecha de terminación el día: 24 de junio de 2026.

En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los veinticinco (25) días del mes de mayo de dos mil veintiséis (2026).

SUPERVISOR	CONTRATISTA
JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA Secretario De Planeación y Obras Publicas	**PCA GROUP S.A.S.** NIT. No.:901490923-2 **R/L: XIMENA DAMARIS MORA BUITRAGO** C.C. No. 1.094.276.314 de Pamplona, Norte de Santander.

Proyectó: Helmer Eduardo Becerra Santander;
Apoyo a la Sec. de Planeación y Obras Públicas.

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Código: JUR-02-P06-F06 Versión 02
CUBARÁ	ACTA DE RECIBO FINAL	Fecha: 02/07/2024

Contrato	No. 20260000183	Valor inicial del contrato	Fecha de inicio del contrato 25/05/2026
Objeto	OBRAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONCRETO PARA LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA LA GAITANA, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ	$ 259.181.150,00	Plazo de ejecución inicial Un (01) Mes
		Valor adicional al contrato (M Y M 1)	Valor anticipo $ 77.754.345,00
Contratista	PCA Group SAS NIT. No. 901490923-2 R/L: XIMENA DAMARIS MORA. C.C. No. 1.094.276.314 de pamplona N.S.	$ 0,00	Valor ejecutado acumulado $ 259.181.150,00
		Saldo a favor del municipio (M Y M 1)	Porcentaje acumulado 100%
Interventoría	N/A	$ 0,00	Fecha de terminación del contrato 24/06/2026
Supervisor	JESUS IVÁN QUIÑONES RUEDA Secretario de Planeación y Obras Publicas	Valor del contrato actualizado	Fecha de la presente acta 2/07/2026
Contratante	MUNICIPIO DE CUBARÁ	$ 259.181.150,00	Estado Terminado

En el Municipio de Cubará, Boyacá, se reunieron el , el Arquitecto, **JESÚS IVÁN QUIÑONES RUEDA**, Secretario de Planeación y obras públicas con funciones de encargo de Alcalde Municipal de Cubará, según Decreto No. 087 del 01 de julio de 2026, en calidad de Supervisor del Contrato No. 20260000183, suscrito por el Municipio de Cubará, Boyacá y **PCA Group SAS** NIT. No. 901490923-2 representada legalmente por **XIMENA DAMARIS MORA** identificada con cédula de ciudadanía No. 1.094.276.314 de pamplona N.S. en calidad de contratista, para dejar constancia de la presente Acta de Recibo final comprendida entre el **25/05/2026** al **24/06/2026**, en la cual se consignan las siguientes cantidades del Contrato de Obra ejecutadas y recibidas a satisfacción por el municipio de Cubará (Boyacá)

CONDICIONES INICIALES						CANTIDADES EJECUTADAS EN ACTA DE RECIBO FINAL		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS								
1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS EN CONCRETO REFORZADO DE 4000 PSI H=1,8M	UND	85,00	$ 3.049.190,00	$ 259.181.150,00	85,00	$ 259.181.150,00	85,00	$ 259.181.150,00
				Subtotal	$ 259.181.150,00		$ 259.181.150,00		$ 259.181.150,00
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 194.873.045,11		$ 194.873.045,11		$ 194.873.045,11
				ADMINISTRACION 24%	$ 46.769.530,83		$ 46.769.530,83		$ 46.769.530,83
				IMPREVISTO 2%	$ 3.897.460,90		$ 3.897.460,90		$ 3.897.460,90
				UTILIDAD 7%	$ 13.641.113,16		$ 13.641.113,16		$ 13.641.113,16
				TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 64.308.104,89		$ 64.308.104,89		$ 64.308.104,89
				COSTO TOTAL	$ 259.181.150,00		$ 259.181.150,00		$ 259.181.150,00

BALANCE ECONÓMICO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 259.181.150,00
VALOR ANTICIPO (30%)	$ 77.754.345,00
VALOR ACTA DE RECIBO FINAL	$ 259.181.150,00
VALOR ACTA DE RECIBO FINAL ARMONIZADO	$ 181.426.805,00
VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ 259.181.150,00
VALOR NETO A PAGAR	$ 181.426.805,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ -

Para constancia de lo anterior firman la presente ACTA DE RECIBO FINAL, por los que en ella intervinieron, en Cubará a los dos (02) días del mes de julio del año 2026

JESÚS IVÁN QUIÑONES RUEDA
Secretario de Planeación y obras públicas con funciones de encargo de Alcalde Municipal de Cubará, según Decreto No. 087 del 01 de julio de 2026
Supervisor

Ximena Mora B.
R/L: XIMENA DAMARIS MORA.
PCA Group SAS
Contratista

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

3. POLIZAS

seguros mundial®

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2026.05.22 17:35:32 -05:00

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: o4WWxMcIb/19pHAmjwFLzw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	BY-100066290	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	36229362	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	22/05/2026	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BOYACA CASAN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	20/05/2026	24:00 Horas Del	30/06/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	PCA GROUP S.A.S.	**No. DOC. IDENTIDAD**	901490923-2
DIRECCIÓN	CALLE 10 11A-27	**TELÉFONO**	3008794816
ASEGURADO	MUNICIPIO DE CUBARA BOYACA	**No. DOC. IDENTIDAD**	800099196-2
DIRECCIÓN	CALLE 4 NO. 4-43 CUBARA	**TELÉFONO**	3102574494
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE CUBARA BOYACA	**No. DOC. IDENTIDAD**	800099196-2
DIRECCIÓN	CALLE 4 NO. 4-43 CUBARA	**TELÉFONO**	3102574494

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO OBRA PUBLICA NO.20260000183 , CUYO OBJETO ES

OBRAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONCRETO PARA LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA LA GAITANA, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ

****NOTA ACLARATORIA***
EL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA TIENE VIGENCIA DE 2 AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 20/05/2026	24:00 Horas Del 30/12/2026	25.918.115,00	31.812,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 20/05/2026	24:00 Horas Del 30/12/2026	77.754.345,00	95.435,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 20/05/2026	24:00 Horas Del 30/06/2028	12.959.057,50	54.819,00
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	00:00 Horas Del 20/05/2026	24:00 Horas Del 30/12/2026	25.918.115,00	31.812,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 20/06/2026	24:00 Horas Del 20/06/2028	51.836.230,00	207.629,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 194.385.862,50	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
CAS CASANARE SEGUROS LIMITADA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	421.507,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	421.507,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	81.036,00
TOTAL A PAGAR	$	507.543,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 22/05/2026

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA / FASE - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	BY-100066290	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	36229362	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	22/05/2026	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BOYACA CASAN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	20/05/2026	24:00 Horas Del	30/06/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

ARTÍCULOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2026.05.29 10:05:40 -05:00

Código de Seguridad: 7tMYz5lXOgi7t0K97oo0lw==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	BY-100066290	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	36229904	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	29/05/2026	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BOYACA CASAN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	25/05/2026	24:00 Horas Del	05/07/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	PCA GROUP S.A.S.	No. DOC. IDENTIDAD	901490923-2
DIRECCIÓN	CALLE 10 11A-27	TELÉFONO	3008794816
ASEGURADO	MUNICIPIO DE CUBARA BOYACA	No. DOC. IDENTIDAD	800099196-2
DIRECCIÓN	CALLE 4 NO. 4-43 CUBARA	TELÉFONO	3102574494
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE CUBARA BOYACA	No. DOC. IDENTIDAD	800099196-2
DIRECCIÓN	CALLE 4 NO. 4-43 CUBARA	TELÉFONO	3102574494

OBJETO DE CONTRATO

OBJETO DE LA MODIFICACION: SE REALIZA EL PRESENTE ANEXO SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 25/05/2026, ACTUALIZANDO VIGENCIA A LOS AMPAROS. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.20260000183 , CUYO OBJETO ES

OBRAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONCRETO PARA LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA LA GAITANA, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ

****NOTA ACLARATORIA***
EL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA TIENE VIGENCIA DE 2 AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA OBRA A ENTERA

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 25/05/2026	24:00 Horas Del 04/01/2027	25.918.115,00	31.812,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 25/05/2026	24:00 Horas Del 04/01/2027	77.754.345,00	95.435,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 25/05/2026	24:00 Horas Del 05/07/2028	12.959.057,50	54.819,00
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	00:00 Horas Del 25/05/2026	24:00 Horas Del 04/01/2027	25.918.115,00	31.812,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 25/06/2026	24:00 Horas Del 25/06/2028	51.836.230,00	287.629,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 194.385.862,50	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
CAS CASANARE SEGUROS LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	421.507,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	421.507,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	81.036,00
TOTAL A PAGAR	$	507.543,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 29/05/2026

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA** DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA

DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	BY-100066290	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	36229904	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	29/05/2026	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BOYACA CASAN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	25/05/2026	24:00 Horas Del	05/07/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

SATISFACCION DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA: APF

seguros mundial®

Aliados

CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **BY-100066290** y endoso, **2** cuyo afianzado es: **PCA GROUP S.A.S.** Asegurado o Beneficiario: **MUNICIPIO DE CUBARA BOYACA / MUNICIPIO DE CUBARA BOYACA** , expedida por la Compañía en **29/05/2026,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

AGENCIA BOYACA CASAN a los **29** días del mes **MAYO** del año **2026.**

Firma Autorizada
Compañia mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2026.07.03 15:27:35 -05:00

Código de Seguridad: ltq7qBBKMhRt9CDFYuYyYw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	BY-100066290	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	36232736	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	03/07/2026	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BOYACA CASAN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	25/05/2026	24:00 Horas Del	06/07/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	PCA GROUP S.A.S.	**No. DOC. IDENTIDAD**	901490923-2
DIRECCIÓN	CALLE 10 11A-27	**TELÉFONO**	3008794816
ASEGURADO	MUNICIPIO DE CUBARA BOYACA	**No. DOC. IDENTIDAD**	800099196-2
DIRECCIÓN	CALLE 4 NO. 4-43 CUBARA	**TELÉFONO**	3102574494
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE CUBARA BOYACA	**No. DOC. IDENTIDAD**	800099196-2
DIRECCIÓN	CALLE 4 NO. 4-43 CUBARA	**TELÉFONO**	3102574494

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LA POLIZA DE ACUERDO CON ACTA DE RECIBO FINAL DE FECHA 02/07/2026
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.20260000183 , CUYO OBJETO ES

OBRAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONCRETO PARA LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA LA GAITANA, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ

****NOTA ACLARATORIA***
EL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA TIENE VIGENCIA DE 2 AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 25/05/2026	24:00 Horas Del 04/01/2027	25.918.115,00	0,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 25/05/2026	24:00 Horas Del 04/01/2027	77.754.345,00	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 25/05/2026	24:00 Horas Del 05/07/2028	12.959.057,50	0,00
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	00:00 Horas Del 25/05/2026	24:00 Horas Del 04/01/2027	25.918.115,00	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 02/07/2026	24:00 Horas Del 02/07/2028	51.836.230,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 194.385.862,50	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
CAS CASANARE SEGUROS LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 03/07/2026

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	BY-100066290	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	36232736	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	03/07/2026	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BOYACA CASAN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	25/05/2026	24:00 Horas Del	06/07/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

Aliados

CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **BY-100066290** y endoso, **3** cuyo afianzado es: **PCA GROUP S.A.S.** Asegurado o Beneficiario: **MUNICIPIO DE CUBARA BOYACA / MUNICIPIO DE CUBARA BOYACA** , expedida por la Compañía en **03/07/2026,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

AGENCIA BOYACA CASAN a los **03** días del mes **JULIO** del año **2026.**

Firma Autorizada
Compañia mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

seguros mundial®

NIT 860 037 013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2026.05.22 17:40:57 -05:00

Código de Seguridad: XSTAgQpTK49J2Y7z/b5qUQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 12-05-2025-1317-P-06-PPSU58R000000027-D00I

No. PÓLIZA	BY-100011523	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	36229363	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	22/05/2026	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BOYACA CASAN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	20/05/2026	24:00 Horas Del	30/06/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	PCA GROUP S.A.S.	No. DOC. IDENTIDAD	901490923-2
DIRECCIÓN	CALLE 10 11A-27	TELÉFONO	3008794816
ASEGURADO	PCA GROUP S.A.S.	No. DOC. IDENTIDAD	901490923-2
DIRECCIÓN	CALLE 10 11A-27	TELÉFONO	3008794816
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE CUBARA BOYACA Y TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN		TELÉFONO	1

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.20260000183 , CUYO OBJETO ES

OBRAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONCRETO PARA LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN
DERECHA DE LA QUEBRADA LA GAITANA, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ

ASEGURADO Y O BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUBARA BOYACA NIT: 800.099.196-2 , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE CUBARA BOYACA COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA PCA GROUP S.A.S., EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	350181000.00	350181000.00	350.181.000,00	86.538,00
PATRONAL	350181000.00	350181000.00	350.181.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	350181000.00	350181000.00	350.181.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	350181000.00	350181000.00	350.181.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 350.181.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
CAS CASANARE SEGUROS LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	86.538,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	86.538,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	17.392,00
TOTAL A PAGAR	$	108.930,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 22/05/2026

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y VIALA - AFF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 12-05-2025-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	BY-100011523	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	36229363	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	22/05/2026	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BOYACA CASAN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	20/05/2026	24:00 Horas Del	30/05/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

INDEPENDIENTE DE MUNICIPIO DE CUBARA BOYACA BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE CUBARA BOYACA COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Lineas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2026.05.29 10:08:47 -05:00

Código de Seguridad: bkAPdV6lhk2mtpi/+O0hWA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 12-05-2025-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D001

No. PÓLIZA	BY-100011523	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	36229907	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	29/05/2026	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BOYACA CASAN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	25/05/2026	24:00 Horas Del	05/07/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	PCA GROUP S.A.S.	No. DOC. IDENTIDAD	901490923-2
DIRECCIÓN	CALLE 10 11A-27	TELÉFONO	3008794816
ASEGURADO	PCA GROUP S.A.S.	No. DOC. IDENTIDAD	901490923-2
DIRECCIÓN	CALLE 10 11A-27	TELÉFONO	3008794816
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE CUBARA BOYACA Y TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN		TELÉFONO	1

OBJETO DE CONTRATO

OBJETO DE LA MODIFICACION: SE REALIZA EL PRESENTE ANEXO SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 25/05/2026, ACTUALIZANDO VIGENCIA A LOS AMPAROS. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.20260000183 , CUYO OBJETO ES

OBRAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONCRETO PARA LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN
DERECHA DE LA QUEBRADA LA GAITANA, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ

ASEGURADO Y O BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CUBARA BOYACA NIT: 800.099.196-2 , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE CUBARA

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	350181000.00	350181000.00	350.181.000,00	86.538,00
PATRONAL	350181000.00	350181000.00	350.181.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	350181000.00	350181000.00	350.181.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	350181000.00	350181000.00	350.181.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 350.181.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
CAS CASANARE SEGUROS LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	86.538,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	86.538,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	17.392,00
TOTAL A PAGAR	$	108.930,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 29/05/2026

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y FASA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 12-05-2025-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	BY-100011523	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	36229907	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	29/05/2026	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BOYACA CASAN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	25/05/2026	24:00 Horas Del	05/07/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

BOYACA COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA PCA GROUP S.A.S., EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE MUNICIPIO DE CUBARA BOYACA BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE CUBARA BOYACA COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

4. CORRESPONDENCIA.

PCA GROUP

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

Cubará, 25 de mayo de 2026.

Señores:

MUNICIPIO DE CUBARA
Arq. JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA
Secretaría de planeación y obras públicas
Supervisor contrato de obra N° 20260000183

Cordial saludo.

Por medio de la presente me dirijo a ustedes con el fin de realizar entrega formal de los siguientes documentos del contrato de obra publica N°.20260000183 el cual tiene por objeto "OBRAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONCRETO PARA LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA LA GAITANA, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ". Suscrito entre el municipio de Cubará y PCA Group SAS.

- Cronograma de actividades
- APU propuesta económica
- Diseño de mezcla concreto de 4000 psi.

Atentamente,

XIMENA DAMARIS MORA BUITRAGO
R/L. PCA Group SAS

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

"OBRAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONCRETO PARA LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA LA GAITANA, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ".

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	DURACION EN MESES	VALOR TOTAL
				MES 1	
1	**SUMINISTRO E INSTALACION DE HEXAPODOS**				
1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS EN CONCRETO REFORZADO DE 4000 PSI H=1,8M	UND	85,00	X	$ 259.181.150,00
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 259.181.150,00**

YIMENA DAMARIS MORA BUITRAGO
R/L. PCA Garoup SAS

Fecha: 24/11/2021___
Página 1 de 1_____

	ALCALDIA DE CUBARA, BOYACA SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	VERSIÓN			
		PÁGINA		DE	

FECHA	DD	MM	AA

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE HEXAPODOS EN CONCRETO REFORZADO DE 4000 PSI H=1.8M	UND	66,00

I. EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		% M. O.	$ 14.551,63	10%	$ 1.455,16
EXCAVADORA SOBRE ORUGA x 2		HR	$ 611.728,00	4,00	$ 152.932,00
PLANTA ELECTRICA		DIA	$ 100.000,00	32,00	$ 3.125,00
				SUBTOTAL $	157.512,160

II. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
GUAYA DE 3/4"	M	2,00	$ 50.000,00	$ 100.000,00
PERRO TIPO PESADO PARA CONEXION DE GUAYA	UND	1,00	$ 65.000,00	$ 65.000,00
HEXAPODO EN CONCRETO REFORZADO SEGUN DISEÑO 4000PSI H=1,8M	UND	1,00	$ 1.837.870,00	$ 1.837.870,00
DESPERDICIO	%	5,00%	$ 165.000,00	$ 8.250,00
			SUBTOTAL $	2.011.120,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
HEXAPODOS V=0,97M3	2400,000	9,12		$ 5,00	109.440,00
				SUBTOTAL $	109.440,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
2 AYUDANTES	$ 142.866,00	1,95	$ 278.588,70	32,000	$ 8.705,90
OFICIAL x1	$ 95.930,00	1,95	$ 187.063,50	32,000	$ 5.845,73
				SUBTOTAL $	14.551,63
				TOTAL COSTO DIRECTO $	2.292.624,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	24%	$ 550.229,76	
IMPREVISTOS	2%	$ 45.852,48	
UTILIDAD	7%	$ 160.483,68	
		SUBTOTAL $	756565,92
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	3.049.190,00

XIMENA DAMARIS MORA BUITRAGO
R/L. PCA Group SAS

	JOAQUIN EDUARDO DELGADO MONTAGUT Ingeniero Civil UFPS – Esp. Geotecnia Ambiental UDES	Fecha: Mayo de 2026
SEINCO SAS	DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO OBRAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONCRETO PARA LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA LA GAITANA, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ	2026000183 Página 1

Saravena, mayo 25 de 2026

Señores:
PCA GROUP S.A.S
R/L XIMENA DAMARIS MORA BUITRAGO
Cubará

Asunto: OBRAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES MEDIANTE ELSUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONCRETO PARA LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA LA GAITANA, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ

Cordial saludo.

Atendiendo su petición, estamos haciendo entrega del diseño de mezcla solicitado para el proyecto en referencia empleando CEMENTO GRIS DE USO GENERAL (Portland Tipo I) de 42.5 kg/bulto, arena de trituración y triturado TMN ¾" de la Cantera Royota (Luis Hernando Valencia Mora).

A continuación, resumimos la dosificación en volumen del diseño:

	Resistencia de diseño f´c	
Material	**4000 psi 280 Mpa**	
CEMENTO GRIS CEMEX DE USO GENERAL	409 Kg	1 Bto.42.5 Kg
ARENA DE TRITURACIÓN (arrocillo)	0.60 m3	7 Balde 9.0 L
Triturado TMN 3/4"	0.60 m3	7 Balde 9.0 L
Agua Potable	170 L	18 L
El agua es adecuada para producir concreto si su composición química indica que es apta para el consumo humano.	**a/c = 0.44**	

Especificaciones Técnicas:		
Tipo de concreto	**Convencional**	**Unidad**
Resistencia de especificación	4000	psi
Edad de especificación	28	días
Tamaño máximo nominal de gravilla	3/4	pulgada
Tiempo de manejabilidad	1.5	horas
Asentamiento de diseño	8±1	cm
Densidad	2325	Kg/m^3

Agregados con humedad natural

Atentamente.

Ing. JOAQUIN EDUARDO DELGADO MONTAGUT
Jefe de Laboratorio

Carrera 18 # 27-21 Barrio Modelo
seincojedm@gmail.com Cel. 3132635714
Saravena-Arauca

PRECAUCIONES

- Este concreto se especifica para obtener la resistencia de diseño a los 28 días.
- Como norma general se considera que el agua es adecuada para producir concreto si su composición química indica que es apta para el consumo humano.
- El agua empleada para concretos y morteros (amasar y curar) será de propiedades colorantes nulas, claras, libe de glúcidos (azucares), ácidos, álcalis, materias orgánicas y de aceites, de preferencia debe ser agua potable.
- Para mejor acabado y evitar fisuras en el concreto se recomienda utilizar aditivo ANTISOL BLANCO. La aplicación del curador debe hacerse tan pronto desaparezca el agua de exudación del concreto, situación fácilmente detectable pues la superficie cambia de brillante a mate. Consumo: Aplicado con fumigadora agrícola, aproximadamente 200 gr/m^2.
- El momento de descimbrar los elementos debe estar de acuerdo con el criterio del calculista.
- Cualquier adición de agua, cemento o aditivo en obra alterará su diseño y puede ser perjudicial para la calidad del concreto.
- El concreto que haya empezado con el proceso de fraguado no debe vibrarse, ni mezclarse, ni utilizarse en caso de demoras en obra.
- Se debe mantener la superficie húmeda en las primeras horas para evitar retracciones por secado.
- Todo proceso de curado, especialmente en las primeras edades, trae como consecuencia mayor hidratación del cemento y mejor calidad de su obra.
- En conclusión, es importante conocer que el agua más recomendable en la fabricación del concreto es el agua potable, debido a que esta carece de impurezas que dañen o modifiquen sus propiedades internas, pudiendo ser estas muy perjudiciales en la construcción.

DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO

CEMENTO GRIS DE USO GENERAL–PORTLAND TIPO I
ARENA DE TRITURACIÓN (ARROCILLO)
TRITURADO TMN 3/4"

Carrera 18 # 27-21 Barrio Modelo
seincojedm@gmail.com Cel. 3132635714
Saravena-Arauca

DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO

F'c = 28 Mpa (4000 psi)

PROYECTO: OBRAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONCRETO PARA LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA LA GAITANA, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ

CONTRATISTA: PCA GROUP S.A.S. - R/L XIMENA DAMARIS MORA BUITRAGO **FECHA:** MAYO DE 2026 .

ESPECIFICACIONES DE DISEÑO:			**MATERIALES A UTILIZAR**	
Resistencia F'c:	280.0 Kg/cm2	(4000 PSI)	Cemento:	GRIS DE USO GENERAL
Asentamiento:	8.0 cm		Agredado grueso:	TRITURADO 3/4
Coeficiente de variación:	5.0 %		Agregado fino:	ARENA DE TRITURACION
Dimensión mín. elemento:	10.0 cm			

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

Agregado Fino		**Agregado Grueso**		
Densidad aparente seca	2.580 gr/cm3	Densidad especifico aparente	2.588	gr/cm3
Modulo de finura	2.47	Tamaño máximo nominal	3/4	"
Absorción	1.45 %	Absorción	1.29	%
Humedad natural	3.35 %	Humedad natural	0.57	%
Particulas finas (0,074 mm)	3.10 %	Forma de las particulas	Angular	
Masa unitaria suelta	1.446 gr/cm3	Masa unitaria suelta	1.464	gr/cm3
Masa unitaria compacta	1.538 gr/cm3	Masa unitaria compacta	1.555	gr/cm3

DETERMINACIONES

Estimación del agua de la mezcla	A =	180 Lts	
Resistencia de diseño	Fcr =	300.6 Kg/cm2	4294.3 PSI
Relación agua cemento	A/C =	0.44	
Contenido de cemento	C =	409.1 Kg	
Aire atrapado	a=	0.020 m3	
Contenido total de agregados	V =	0.661	
Contenido agregado grueso	51%	0.337 m3	
Contenido agregado fino	49%	0.324 m3	

PROPORCIONES INICIALES / METRO CUBICO

	En peso	Densidad	En volumen		
Cemento	409.1 Kg	2950 Kg/m3	0.139 m3		
Agregado fino	837.0 Kg	2584 Kg/m3	0.324 m3		
Agregado grueso	872.0 Kg	2584 Kg/m3	0.337 m3		
Agua	180.0 Kg	1000 Kg/m3	0.180 m3		
Aire atrapado			0.020 m3	1.000	m3

AJUSTE POR HUMEDAD AL PESO DE MEZCLADO/ METRO CUBICO

Agregado fino	HL	1.90 %
Agregado grueso	HL	-0.72 %
Agua de mezclado	Aa	169.9 Kg

PROPORCIONES EN VOLUMEN SUELTO

	En peso	Relación	En volumen	Relación
Cemento	409.1 Kg	1	9.630 Bulto	1
Agregado fino	865.0 Kg	2.11	0.598 m3	1.97
Agregado grueso	877.0 Kg	2.14	0.599 m3	1.98
Agua	169.9 Kg	0.42	0.170 m3	0.56

REDUCCIÓN A UN BULTO DE CEMENTO

	En peso	En volumen
Cemento	42.5 Kg	1 Bulto 42.5 Kg
Agregado fino	89.9 Kg	62.130 L
Agregado grueso	91.1 Kg	62.220 L
Agua	17.7 Kg	17.653 L

NÚMERO DE BALDES PARA LA MEZCLA EN OBRA

	Mezcladora 1 Bulto	**Carmix de 2,0 M3 - Capacidad cuchara 0,50 m3 (0,48 m3 efectiva)**			
VOLUMEN CONCRETO	**0.10 m3**	**2.00 m3**	**Cuchara Carmix**	**Cuchara Carmix**	**Baldes 9 L**
Cemento:	1.0 Bulto (42.5 Kg)	20.0 Butos (42.5 Kg)			
Arena	6.9 Baldes 9 L	138.0 Baldes 9 L	2.6	2 +	31
Triturado	6.9 Baldes 9 L	138.0 Baldes 9 L	2.6	2 +	31
Agua	17.7 L	353.1 L			

NOTA: METODO DE DISEÑO I.C.P.C. / R.N.L.

ING. JOAQUIN EDUARDO DELGADO MONTAGUT
MP. 5420272031 NTS

Carrera 18 # 27-21 Barrio Modelo
seincojedm@gmail.com Cel. 3132635714
Saravena-Arauca

ENSAYOS A LOS MATERIALES

DENSIDAD DEL CEMENTO HIDRÁULICO

PROYECTO : OBRAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONCRETO PARA LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA LA GAITANA, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ

SOLICITANTE : PCA GROUP S.A.S. - R/L XIMENA DAMARIS MORA BUITRAGO

MATERIAL : CEMENTO HIDRÁULICO GRIS DE USO GENERAL (PORTLAND TIPO I)
FECHA : MAYO DE 2026
MUESTRA : Nº 1

A	Peso cemento utilizado	60.32 gr
B	Volumen inicial del líquido	0.0 cm^3
C	Volúmen final del líquido	21.20 cm^3
	Temperatura	25.7 °C
V	**Volúmen desplazado por el cemento= (C-B)**	**21.20** cm^3
D	**Densidad del cemento = A / V**	**2.85** gr/cm3
G	**Gravedada específica del cemento = D / (1 gr/cm3)**	**2.85**

LIQUIDO UTILIZADO: KEROSENE

REF: INVIAS E-307 / ASTM C188-09

Enderson Cacua
ENDERSON JADIR CACUA RICO
Laboratorista

ING. JOAQUIN EDUARDO DELGADO MONTAGUT
MP. 5420272031 NTS

MODULO DE FINURA

OBRA : OBRAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONCRETO PARA LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA LA GAITANA, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ

SOLICITANTE: : PCA GROUP S.A.S. - R/L XIMENA DAMARIS MORA BUITRAGO

DESCRIPCIÓN : ARENA DE TRITURACION
FECHA : MAYO DE 2026
MUESTRA : Nº 1

TAMIZ	% RETENIDO	% RETENIDO ACUMULADO
1"	0.0	0.0
3/4"	0.0	0.0
1/2"	0.0	0.0
3/8"	0.0	0.0
Nº 4	3.1	3.1
Nº 8	7.9	11.0
Nº 16	7.4	18.4
Nº 30	29.1	47.5
Nº 50	28.3	75.8
Nº 100	5.3	81.1
	TOTAL	**237.0**

$$\text{MODULO DE FINURA} = \frac{\text{TOTAL ACUMULADO}}{100} = 2.37$$

REF. NORMA NTC 174

En la apreciación del módulo de finura, se estima que las arenas comprendidas entre los módulos 2.2 y 2.8 producen concretos de buena trabajabilidad y reducida segregación; y que las que se encunetran.entre 2.8 y 3.2 son las más favorables para los concretos de alta resistencia.

Enderson Cacua

ENDERSON JADIR CACUA RICO
Laboratorista

ING. JOAQUIN EDUARDO DELGADO MONTAGUT
MP. 5420272031 NTS

DENSIDAD ESPECIFICA Y ABSORCIÓN

PROYECTO : OBRAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONCRETO PARA LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA LA GAITANA, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ

SOLICITANTE : PCA GROUP S.A.S. - R/L XIMENA DAMARIS MORA BUITRAGO

MATERIAL : ARENA DE TRITURACION
FECHA : MAYO DE 2026
MUESTRA : Nº 1

A	Peso al aire de la muestra desecada	495.3 gr
B	Peso del picnómetro aforado lleno de agua	670.8 gr
C	Peso total del picnómetro aforado con la muestra y lleno de agua	981.3 gr
S	Peso de la muestra saturada, con superficie seca	502.5 gr
	Peso especifico aparente = A / (B+S-C)	**2.580**
	Peso especifico aparente (S.S.S.) = S / (B+S-C)	**2.617**
	Peso especifico nominal = A / (B+A-C)	**2.680**
	Absorción (%) = (S-A) / A x 100	**1.454**

REF: INVIAS E-222 / NTC 237

Enderson Cacua

ENDERSON JADIR CACUA RICO
Laboratorista

ING. JOAQUIN EDUARDO DELGADO MONTAGUT
MP. 5420272031 NTS

PESO ESPECIFICO Y ABSORCIÓN
AGREGADO GRUESO

OBRA : OBRAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONCRETO PARA LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA LA GAITANA, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ

SOLICITANTE : PCA GROUP S.A.S. - R/L XIMENA DAMARIS MORA BUITRAGO

DESCRIPCIÓN : TRITURADO 3/4
FECHA : MAYO DE 2026
MUESTRA : Nº 1

PESO MUESTRA SECA	grs	6218.00
PESO MUESTRA SATURADA	grs	6298.00
PESO MUESTRA SUMERGIDA EN AGUA	grs	3895.00
PESO ESPECIFICO NOMINAL	gr/cm3	2.677
PESO ESPECIFICO APARENTE SECO	gr/cm3	2.588
PESO ESPECIFICO APARENTE SATURADO	gr/cm3	2.621
ABSORCIÓN	%	**1.29**

REF: **INV. E-223 / NTC 176**

Enderson Cacua

ENDERSON JADIR CACUA RICO
Laboratorista

ING. JOAQUIN EDUARDO DELGADO MONTAGUT
MP. 5420272031 NTS

ENSAYO PESO UNITARIO AGREGADO FINO

PROYECTO : OBRAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONCRETO PARA LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA LA GAITANA, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ

SOLICITANTE : PCA GROUP S.A.S. - R/L XIMENA DAMARIS MORA BUITRAGO

MATERIAL : ARENA DE TRITURACION
FECHA : MAYO DE 2026
MUESTRA : Nº 1

ENSAYO	SUELTO	APISONADO
1 PESO MOLDE + MATERIAL (Gr.)	9018.00	9198.00
1 PESO MOLDE + MATERIAL (Gr.)	9002.00	9214.00
1 PESO MOLDE + MATERIAL (Gr.)		
PROMEDIO	9010.00	9206.00
PESO MOLDE (Gr.)	5948.00	5948.00
VOLUMEN MOLDE (Cm3)	2118.00	2118.00
PESO UNITARIO	**1.446**	**1.538**

PESO UNITARIO SUELTO PROMEDIO **1.446 gr/cm3**
PESO UNITARIO COMPACTO PROMEDIO **1.538 gr/cm3**

REF. INVIAS E-217 / NTC 92

Enderson Cacua

ENDERSON JADIR CACUA RICO
Laboratorista

ING. JOAQUIN EDUARDO DELGADO MONTAGUT
MP. 5420272031 NTS

ENSAYO PESO UNITARIO AGREGADO GRUESO

PROYECTO : OBRAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONCRETO PARA LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA LA GAITANA, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ

SOLICITANTE : PCA GROUP S.A.S. - R/L XIMENA DAMARIS MORA BUITRAGO

MATERIAL : TRITURADO 3/4
FECHA : MAYO DE 2026
MUESTRA : Nº 1

ENSAYO	SUELTO	APISONADO
1 PESO MOLDE + MATERIAL (Gr.)	9065.00	9258.00
1 PESO MOLDE + MATERIAL (Gr.)	9041.00	9236.00
1 PESO MOLDE + MATERIAL (Gr.)		
PROMEDIO	9053.00	9247.00
PESO MOLDE (Gr.)	5953.00	5953.00
VOLUMEN MOLDE (Cm3)	2118.00	2118.00
PESO UNITARIO	**1.464**	**1.555**

PESO UNITARIO SUELTO PROMEDIO **1.464 gr/cm3**
PESO UNITARIO COMPACTO PROMEDIO **1.555 gr/cm3**

REF. INVIAS E-217 / NTC 92

Enderson Cacua

ENDERSON JADIR CACUA RICO
Laboratorista

ING. JOAQUIN EDUARDO DELGADO MONTAGUT
MP. 5420272031 NTS

ENSAYO DE GRANULOMETRIA

SONDEO:
MUESTRA: M1


Peso Total Lavado	4,128.0 grs
Peso Total Seco	4,000.0 grs
Perdida por lavado	128.0 grs

Descripción: ARENA MEDIA

LL: -
IP: -
USC: SP
MODULO FINURA: 2.47

GRAVAS		ARENAS			LIMO Y/O ARCILLA
Gruesa	Fina	Gruesa	Media	Fina	

CURVA GRANULOMETRICA

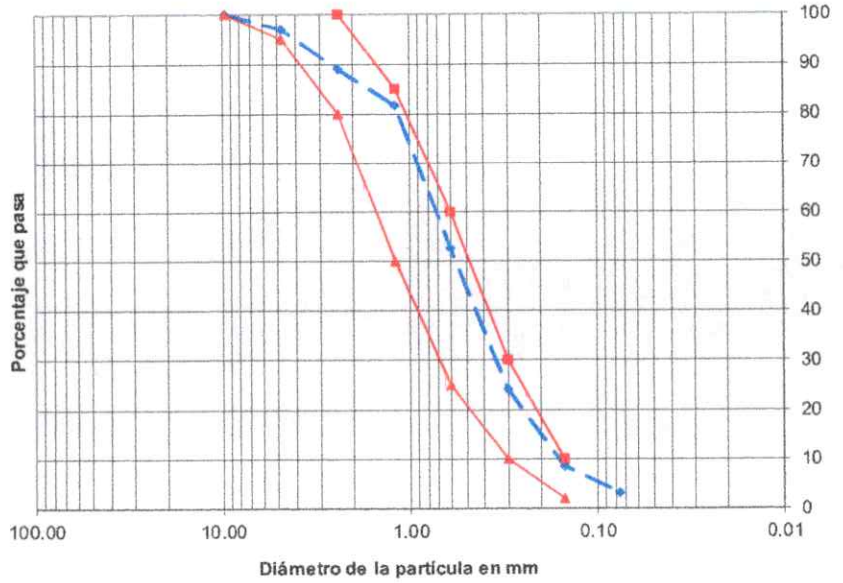

Ref: NTC 77-78

TAMIZ Normal	TAMIZ Alterno	Peso Ret.	% Ret.	% Reten Acum	% Pasa	NORMA ICONTEC 174
25.000 mm	1"	0.00	0.00	0.00	100.00	100 - 100
19.000 mm	3/4"	0.00	0.00	0.00	100.00	100 - 100
12.500 mm	1/2"	0.00	0.00	0.00	100.00	100 - 100
9.500 mm	3/8"	0.00	0.00	0.00	100.00	100 - 100
4.750 mm	No. 4	128.00	3.10	3.10	96.90	95 - 100
2.360 mm	No.8	326.00	7.90	11.00	89.00	80 - 100
1.180 mm	No. 16	306.00	7.41	18.41	81.59	50 - 85
0.600 mm	No. 30	1,202.00	29.12	47.53	52.47	25 - 60
0.300 mm	No. 50	1,168.00	28.29	75.82	24.18	10 - 30
0.150 mm	No. 100	652.00	15.79	91.62	8.38	2 - 10
0.075 mm	No. 200	218.00	5.28	96.90	3.10	-
Fondo		128.00	3.10	100.00	0.00	-
Suma=		4,128.0	100.0			

Cu= 4.7
Cc= 1.2

GRAVAS	3.10 %
ARENAS	93.80 %
FINOS	3.10 %

PROYECTO:
OBRAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONCRETO PARA LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA LA GAITANA, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ

SOLICITANTE:
PCA GROUP S.A.S. - R/L XIMENA DAMARIS MORA BUITRAGO

MATERIAL: ARENA DE TRITURACION

LABORATORISTA: Enderson Cacua
ENDERSON JADIR CACUA RICO

REVISO:
ING. JOAQUIN EDUARDO DELGADO MONTAGUT MP. 5420272031 NTS

FECHA: MAYO DE 2026

SEINCO SAS

JOAQUIN EDUARDO DELGADO MONTAGUT
Ingeniero Civil UFPS - Esp. Geotecnia Ambiental UDES
DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO

OBRAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONCRETO PARA LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA LA GAITANA, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ

202600183

Página 12

Fecha: Mayo de 2026

Carrera 18 # 27-21 Barrio Modelo
seincojedm@gmail.com Cel. 3132635714
Saravena-Arauca

ENSAYO DE GRANULOMETRIA


SONDEO:
MUESTRA: M2

Peso Total Lavado	6,125.0 grs
Peso Total Seco	6,080.0 grs
Perdida por lavado	45.0 grs

Descripción: GRAVA TRITURADA
TM = 1" - TMN = 3/4"

LL: -
IP: -
USC: GP
AASHO: A-1-a

GRAVAS		ARENAS	
Gruesa	Fina	Gruesa	Media

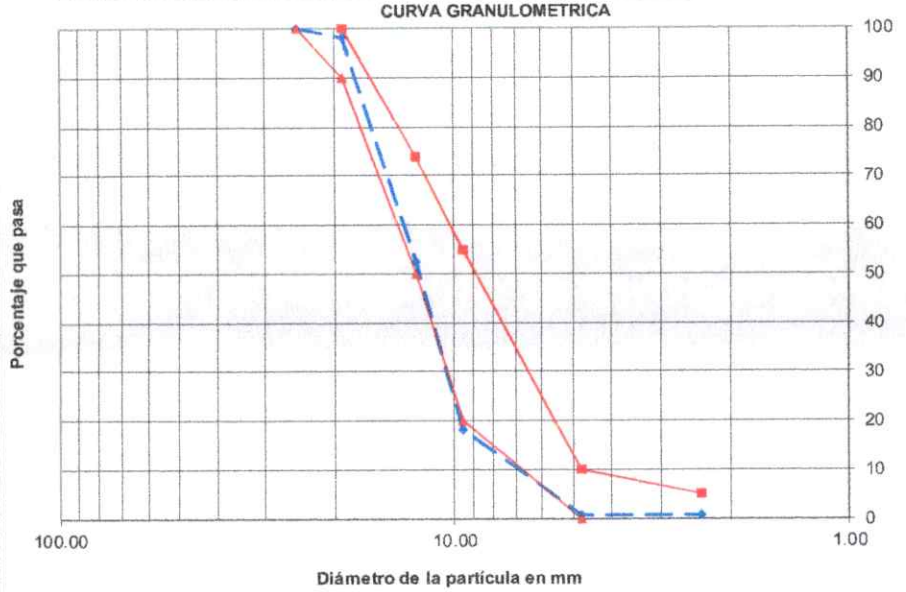

Ref: NTC 77-78

TAMIZ Normal	TAMIZ Alterno	Peso Ret.	% Ret.	% Reten Acum	% Pasa	NORMA ICONTEC 174
37.500 mm	1 1/2"	0.00	0.00	0.00	100.00	100 - 100
25.000 mm	1"	0.0	0.00	0.00	100.00	100 - 100
19.000 mm	3/4"	108.0	1.76	1.76	98.24	90 - 100
12.500 mm	1/2"	2,806.0	45.81	47.58	52.42	-
9.500 mm	3/8"	2,104.0	34.35	81.93	18.07	20 - 55
4.750 mm	No. 4	1,062.0	17.34	99.27	0.73	0 - 10
2.360 mm	No.8	0.0	0.00	99.27	0.73	0 - 5
1.180 mm	No. 16	0.0	0.00	99.27	0.73	-
0.600 mm	No. 30	0.0	0.00	99.27	0.73	-
0.300 mm	No. 50	0.0	0.00	99.27	0.73	
0.150 mm	No. 100	0.0	0.00	99.27	0.73	
Fondo		45.0	0.73	100.00	0.00	-
Suma=		6,125.0	100.0			

Cu=	1.86	GRAVAS	99.27 %
Cc=	1.21	ARENAS	0.00 %
		FINOS	0.73 %

PROYECTO:
OBRAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONCRETO PARA LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA LA GAITANA, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ

SOLICITANTE:
PCA GROUP S.A.S. - R/L XIMENA DAMARIS MORA BUITRAGO

MATERIAL: TRITURADO 3/4

LABORATORISTA: Enderson Cacua
ENDERSON JADIR CACUA RICO

REVISO:
ING. JOAQUIN EDUARDO DELGADO MONTAGUT MP. 5420272031 NTS

FECHA: MAYO DE 2026

Carrera 18 # 27-21 Barrio Modelo
seincojedm@gmail.com Cel. 3132635714
Saravena-Arauca

JOAQUIN EDUARDO DELGADO MONTAGUT
Ingeniero Civil UFPS – Esp. Geotecnia Ambiental UDES

DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO


OBRAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONCRETO PARA LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA LA GAITANA, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ

2026000183

Página 13

Fecha: Mayo de 2026

OPTIMIZACIÓN GRANULOMÉTRICA

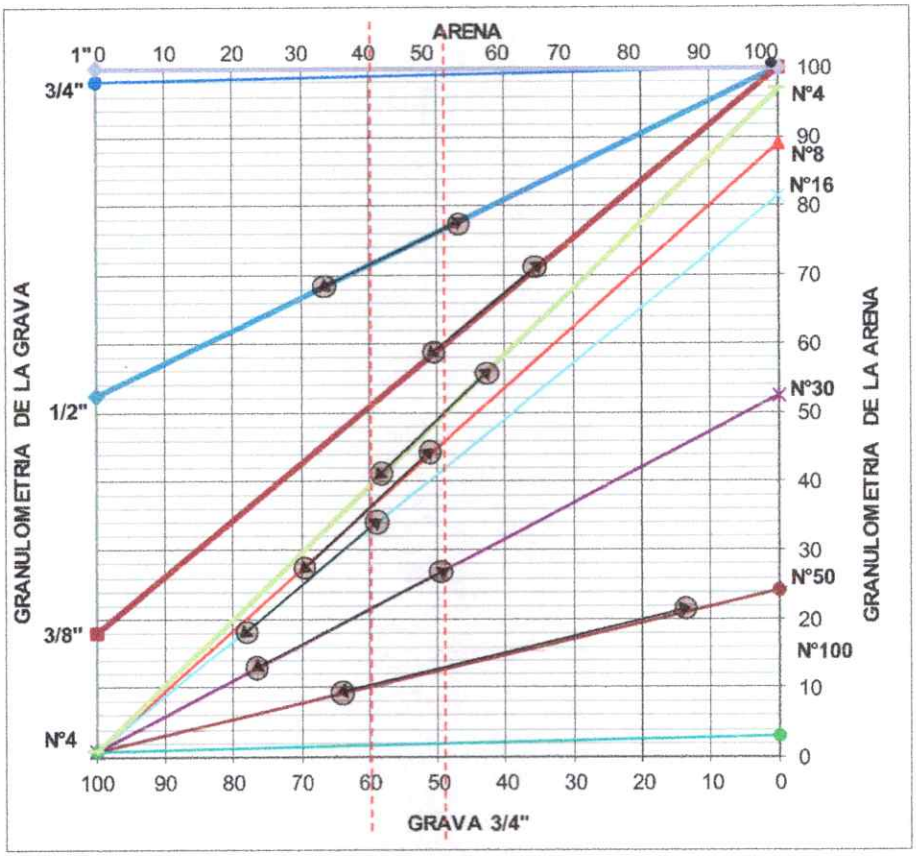

PCA GROUP

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

Cubara 25 de junio de 2026

Señores:

MUNICIPIO DE CUBARA
Arq. JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA
Secretaria de planeación y obras publicas
Supervisor contrato de obra N° 20260000183

Cordial saludo.

Por medio de la presente me dirijo a ustedes con el fin de realizar entrega formal del informe de obra que comprende las actividades desde el 25 de mayo de 2026 al 24 de junio de 2026.

Atentamente,

XIMENA DAMARIS MORA BUITRAGO
R/L. PCA GROUP SAS

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

5. ACTA DE SOCIALIZACION

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

6. NOMINA DEL PERSONAL UTILIZADO

NOMINA PCA GROUP SAS	PERÍODO DE PAGO
	MAYO - JUNIO 2026

OBJETO: "OBRAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONCRETO PARA LAPROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA LA GAITANA, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ".

ITEM	CEDULA	NOMBRE DEL EMPLEADO	SUELDO BASICO MES	D/T	BASE DE COTIZACIO	SUELDO	HORAS	AUXILIO DE	TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES SALUD	DEDUCCIONES PENSION	DEDUCCIONES OTRO	TOTAL DEDUCIDO	NETO PAGADO	RECIBI A CONFORMIDAD
1	1094266290	BRAYAN MICHEL PARRADO LIZCANO	$ 3.000.000	30		$3.000.000			$3.000.000	$ 120.000	$ 120.000		$ 240.000	$ 2.760.000	
2	1094276314	XIMENA DAMARIS MORA BUITRAGO	$ 2.250.000	10		$750.000			$750.000	$ 30.000	$ 30.000		$ 60.000	$ 690.000	
3	9.466.646	LUIS ERMINIO RINCON ARIAS	$ 2.877.900	10		$959.300			$959.300	$ 38.372	$ 38.372		$ 76.744	$ 882.556	
4	9.466.912	JOSUE LOPEZ CHAPETA	$ 2.142.990	10		$714.330			$714.330	$ 28.573	$ 28.573		$ 57.146	$ 657.184	
5	1.007.545.405	PABLO EMILIO PATIÑO CALDERON	$ 2.142.990	10		$714.330			$714.330	$ 28.573	$ 28.573		$ 57.146	$ 657.184	
6	9.466.531	ALIRIO VERA SOLANO	$ 2.142.990	10		$714.330			$714.330	$ 28.573	$ 28.573		$ 57.146	$ 657.184	
7	91.541.508	JULIO CESAR GAMBOA CAMARGO	$ 2.142.990	10		$714.330			$714.330	$ 28.573	$ 28.573		$ 57.146	$ 657.184	
8	9.467.221	LUIS ADOLFO BARAJAS SILVA	$ 2.142.990	10		$714.330			$714.330	$ 28.573	$ 28.573		$ 57.146	$ 657.184	
9	9.467.022	ENOC QUIÑONEZ VILLAMOZAR	$ 2.142.990	10		$714.330			$714.330	$ 28.573	$ 28.573		$ 57.146	$ 657.184	
10	5.492.350	JESUS ANTONIO VERA	$ 2.142.990	10		$714.330			$714.330	$ 28.573	$ 28.573		$ 57.146	$ 657.184	
11	1.049.394.576	DANIEL ADULFO MENDEZ RAMIREZ	$ 2.142.990	10		$714.330			$714.330	$ 28.573	$ 28.573		$ 57.146	$ 657.184	
12	9.467.072	FREDY JEREZ ARIAS	$ 2.142.990	10		$714.330			$714.330	$ 28.573	$ 28.573		$ 57.146	$ 657.184	
13	1.049.394.930	JUAN SANTAFE PEDRAZA	$ 2.142.990	10		$714.330			$714.330	$ 28.573	$ 28.573		$ 57.146	$ 657.184	
						$11.852.600			$11.852.600	$ 474.104	$ 474.104		$ 948.208,00		
													NETO PAGADO	$ 10.904.392	

OBSERVACIONES

SEGURIDAD SOCIAL	%	VALOR
Salud	0	$ -
Pensiones	12	$ 1.422.312
A.R.P	6,96	$ 824.941
Sub-total		**$ 2.247.253**

PROVISIONES	VALOR
Cesantías	$ 987.322
Int/Cesantías	$ 118.526
Prima Servicio	$ 987.322
Vacaciones	$ 551.146
Sub-total	**$ 2.644.315**

APORTES PARAFISCALES		
SENA	0	$ -
CAJA	4%	$ 474.104
ICBF	0	$ -
Sub-Total		$ 474.104

Elaborado — RESIDENTE DE OBRA

Revisado

Aprobado — R/L. PCA GROUP SAS

Contabilizado

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

7. VINCULACIÓN LABORAL

PCA GROUP

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

CONTRATO DE TRABAJO POR OBRA O LABOR CONTRATADA

Entre los suscritos a saber **PCA GROUP S.A.S.**, identificada con **NIT 901490923-2**, representada legalmente por **XIMENA DAMARIS MORA BUITRAGO**, identificada con cédula de ciudadanía No. **1094276314**, quien para efectos del presente contrato se denominará **EL EMPLEADOR**; y por la otra parte **BRAYAN MICHEL PARRADO LIZCANO** identificado con cédula de ciudadanía No. **1094266290**, quien en adelante se denominará **EL TRABAJADOR**, se celebra el presente **Contrato de Trabajo por Obra o Labor Contratada**, regido por las siguientes cláusulas:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO

El EMPLEADOR contrata los servicios personales del TRABAJADOR para realizar labores de **Ingeniero residente de obra**, específicamente en el:

"OBRAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONCRETO PARA LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA LA GAITANA, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ."

El TRABAJADOR desarrollará todas las actividades necesarias, complementarias o conexas para la ejecución adecuada de la labor asignada.

SEGUNDA. DURACIÓN

El presente contrato inicia el **25 de mayo de 2026** y finaliza automáticamente el **24 de junio de 2026**, fecha en la cual concluyen las actividades asignadas.

TERCERA. PERÍODO DE PRUEBA

El período de prueba será el **reglamentario**, de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo, siempre y cuando su extensión sea proporcional al tiempo pactado.

CUARTA. SALARIO

El TRABAJADOR devengará un **salario básico mensual de $3´000.000.**

El salario se pagará **mensualmente**, con los derechos legales correspondientes: prestaciones sociales, auxilios, recargos y demás conceptos establecidos por la ley.

QUINTA. JORNADA DE TRABAJO

El TRABAJADOR cumplirá la jornada máxima legal, sin exceder las horas semanales, distribuidas según las necesidades de la obra.

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

SEXTA. OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR

a) Ejecutar la labor contratada con eficiencia y responsabilidad.
b) Cumplir instrucciones del EMPLEADOR relacionadas con su actividad.
c) Hacer uso correcto de herramientas y equipos asignados.
d) Cumplir las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

SÉPTIMA. OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

a) Pagar puntualmente el salario y prestaciones correspondientes.
b) Garantizar los elementos de protección personal.
c) Afiliar al TRABAJADOR al Sistema General de Seguridad Social.
d) Cumplir con los estándares de seguridad laboral.

OCTAVA. TERMINACIÓN

El contrato termina por:
a) Conclusión de la obra o labor (24 de junio de 2026).
b) Mutuo acuerdo.
c) Justa causa conforme al CST.
d) Las demás causales de ley.

NOVENA. LUGAR DE TRABAJO

El TRABAJADOR prestará sus servicios en **Cubará, Boyacá**, o en los lugares donde se desarrolle la labor contratada.

DÉCIMA. DISPOSICIONES FINALES

Para todo lo no previsto en este contrato aplicarán las normas laborales vigentes.

En constancia, se firma el presente contrato en dos (2) ejemplares del mismo valor jurídico, el 25 de mayo de 2026.

EL EMPLEADOR
PCA GROUP S.A.S.
XIMENA DAMARIS MORA BUITRAGO
C.C. 1094276314

EL TRABAJADOR
BRAYAN MICHEL PARRADO LIZCANO
C.C. **1.094.266.290**

PCA GROUP

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

CONTRATO DE TRABAJO POR OBRA O LABOR CONTRATADA

Entre los suscritos a saber **PCA GROUP S.A.S.**, identificada con **NIT 901.490.923-2**, representada legalmente por **XIMENA DAMARIS MORA BUITRAGO**, identificada con cédula de ciudadanía No. **1094276314**, quien para efectos del presente contrato se denominará **EL EMPLEADOR**; y por la otra parte **XIMENA DAMARIS MORA BUITRAGO** identificado con cédula de ciudadanía No. **1.094.276.314**, quien en adelante se denominará **EL TRABAJADOR**, se celebra el presente **Contrato de Trabajo por Obra o Labor Contratada**, regido por las siguientes cláusulas:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO

El EMPLEADOR contrata los servicios personales del TRABAJADOR para realizar labores de **Ingeniero residente ambiental** , específicamente en el:

"OBRAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONCRETO PARA LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA LA GAITANA, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ."

El TRABAJADOR desarrollará todas las actividades necesarias, complementarias o conexas para la ejecución adecuada de la labor asignada.

SEGUNDA. DURACIÓN

El presente contrato inicia el **15 de junio de 2026** y finaliza automáticamente el **24 de junio de 2026**, fecha en la cual concluyen las actividades asignadas.

TERCERA. PERÍODO DE PRUEBA

El período de prueba será el **reglamentario**, de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo, siempre y cuando su extensión sea proporcional al tiempo pactado.

CUARTA. SALARIO

El TRABAJADOR devengará un **salario básico mensual de $2´250.000.**

El salario se pagará **mensualmente**, con los derechos legales correspondientes: prestaciones sociales, auxilios, recargos y demás conceptos establecidos por la ley.

QUINTA. JORNADA DE TRABAJO

El TRABAJADOR cumplirá la jornada máxima legal, sin exceder las horas semanales, distribuidas según las necesidades de la obra.

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

SEXTA. OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR

a) Ejecutar la labor contratada con eficiencia y responsabilidad.
b) Cumplir instrucciones del EMPLEADOR relacionadas con su actividad.
c) Hacer uso correcto de herramientas y equipos asignados.
d) Cumplir las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

SÉPTIMA. OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

a) Pagar puntualmente el salario y prestaciones correspondientes.
b) Garantizar los elementos de protección personal.
c) Afiliar al TRABAJADOR al Sistema General de Seguridad Social.
d) Cumplir con los estándares de seguridad laboral.

OCTAVA. TERMINACIÓN

El contrato termina por:
a) Conclusión de la obra o labor (24 de junio de 2026).
b) Mutuo acuerdo.
c) Justa causa conforme al CST.
d) Las demás causales de ley.

NOVENA. LUGAR DE TRABAJO

El TRABAJADOR prestará sus servicios en **Cubará, Boyacá**, o en los lugares donde se desarrolle la labor contratada.

DÉCIMA. DISPOSICIONES FINALES

Para todo lo no previsto en este contrato aplicarán las normas laborales vigentes.

En constancia, se firma el presente contrato en dos (2) ejemplares del mismo valor jurídico, el 15 de junio de 2026.

EL EMPLEADOR
PCA GROUP S.A.S.
XIMENA DAMARIS MORA BUITRAGO
C.C. 1094276314

EL TRABAJADOR
XIMENA DAMARIS MORA BUITRAGO
C.C. 1094276314

PCA GROUP

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

CONTRATO DE TRABAJO POR OBRA O LABOR CONTRATADA

Entre los suscritos a saber **PCA GROUP S.A.S.**, identificada con **NIT 901.490.923-2**, representada legalmente por **XIMENA DAMARIS MORA BUITRAGO**, identificada con cédula de ciudadanía No. **1094276314**, quien para efectos del presente contrato se denominará **EL EMPLEADOR**; y por la otra parte **LUIS ERMINIO RINCON ARIAS** identificado con cédula de ciudadanía No. **9466646**, quien en adelante se denominará **EL TRABAJADOR**, se celebra el presente **Contrato de Trabajo por Obra o Labor Contratada**, regido por las siguientes cláusulas:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO

El EMPLEADOR contrata los servicios personales del TRABAJADOR para realizar labores de **oficial de obra,** específicamente en el:

"OBRAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONCRETO PARA LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA LA GAITANA, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ."

El TRABAJADOR desarrollará todas las actividades necesarias, complementarias o conexas para la ejecución adecuada de la labor asignada.

SEGUNDA. DURACIÓN

El presente contrato inicia el **15 de junio de 2026** y finaliza automáticamente el **24 de junio de 2026**, fecha en la cual concluyen las actividades asignadas.

TERCERA. PERÍODO DE PRUEBA

El período de prueba será el **reglamentario**, de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo, siempre y cuando su extensión sea proporcional al tiempo pactado.

CUARTA. SALARIO

El TRABAJADOR devengará un **salario básico mensual de $2´877.900.**

El salario se pagará **mensualmente**, con los derechos legales correspondientes: prestaciones sociales, auxilios, recargos y demás conceptos establecidos por la ley.

QUINTA. JORNADA DE TRABAJO

El TRABAJADOR cumplirá la jornada máxima legal, sin exceder las horas semanales, distribuidas según las necesidades de la obra.

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

SEXTA. OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR

a) Ejecutar la labor contratada con eficiencia y responsabilidad.
b) Cumplir instrucciones del EMPLEADOR relacionadas con su actividad.
c) Hacer uso correcto de herramientas y equipos asignados.
d) Cumplir las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

SÉPTIMA. OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

a) Pagar puntualmente el salario y prestaciones correspondientes.
b) Garantizar los elementos de protección personal.
c) Afiliar al TRABAJADOR al Sistema General de Seguridad Social.
d) Cumplir con los estándares de seguridad laboral.

OCTAVA. TERMINACIÓN

El contrato termina por:
a) Conclusión de la obra o labor (24 de junio de 2026).
b) Mutuo acuerdo.
c) Justa causa conforme al CST.
d) Las demás causales de ley.

NOVENA. LUGAR DE TRABAJO

El TRABAJADOR prestará sus servicios en **Cubará, Boyacá**, o en los lugares donde se desarrolle la labor contratada.

DÉCIMA. DISPOSICIONES FINALES

Para todo lo no previsto en este contrato aplicarán las normas laborales vigentes.

En constancia, se firma el presente contrato en dos (2) ejemplares del mismo valor jurídico, el 15 de junio de 2026.

EL EMPLEADOR
PCA GROUP S.A.S.
XIMENA DAMARIS MORA BUITRAGO
C.C. 1094276314

EL TRABAJADOR
LUIS ERMINIO RINCON ARIAS
C.C. 9466646

PCA GROUP

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

CONTRATO DE TRABAJO POR OBRA O LABOR CONTRATADA

Entre los suscritos a saber **PCA GROUP S.A.S.**, identificada con **NIT 901.490.923-2**, representada legalmente por **XIMENA DAMARIS MORA BUITRAGO**, identificada con cédula de ciudadanía No. **1094276314**, quien para efectos del presente contrato se denominará **EL EMPLEADOR**; y por la otra parte **JOSUE LOPEZ CHAPETA** identificado con cédula de ciudadanía No. **9466912**, quien en adelante se denominará **EL TRABAJADOR**, se celebra el presente **Contrato de Trabajo por Obra o Labor Contratada**, regido por las siguientes cláusulas:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO

El EMPLEADOR contrata los servicios personales del TRABAJADOR para realizar labores de **ayudante de obra,** específicamente en el:

"OBRAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONCRETO PARA LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA LA GAITANA, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ."

El TRABAJADOR desarrollará todas las actividades necesarias, complementarias o conexas para la ejecución adecuada de la labor asignada.

SEGUNDA. DURACIÓN

El presente contrato inicia el **15 de junio de 2026** y finaliza automáticamente el **24 de junio de 2026**, fecha en la cual concluyen las actividades asignadas.

TERCERA. PERÍODO DE PRUEBA

El período de prueba será el **reglamentario**, de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo, siempre y cuando su extensión sea proporcional al tiempo pactado.

CUARTA. SALARIO

El TRABAJADOR devengará un **salario básico mensual de $2´142.990.**

El salario se pagará **mensualmente**, con los derechos legales correspondientes: prestaciones sociales, auxilios, recargos y demás conceptos establecidos por la ley.

QUINTA. JORNADA DE TRABAJO

El TRABAJADOR cumplirá la jornada máxima legal, sin exceder las horas semanales, distribuidas según las necesidades de la obra.

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

SEXTA. OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR

a) Ejecutar la labor contratada con eficiencia y responsabilidad.
b) Cumplir instrucciones del EMPLEADOR relacionadas con su actividad.
c) Hacer uso correcto de herramientas y equipos asignados.
d) Cumplir las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

SÉPTIMA. OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

a) Pagar puntualmente el salario y prestaciones correspondientes.
b) Garantizar los elementos de protección personal.
c) Afiliar al TRABAJADOR al Sistema General de Seguridad Social.
d) Cumplir con los estándares de seguridad laboral.

OCTAVA. TERMINACIÓN

El contrato termina por:
a) Conclusión de la obra o labor (24 de junio de 2026).
b) Mutuo acuerdo.
c) Justa causa conforme al CST.
d) Las demás causales de ley.

NOVENA. LUGAR DE TRABAJO

El TRABAJADOR prestará sus servicios en **Cubará, Boyacá**, o en los lugares donde se desarrolle la labor contratada.

DÉCIMA. DISPOSICIONES FINALES

Para todo lo no previsto en este contrato aplicarán las normas laborales vigentes.

En constancia, se firma el presente contrato en dos (2) ejemplares del mismo valor jurídico, el 15 de junio de 2026.

EL EMPLEADOR
PCA GROUP S.A.S.
XIMENA DAMARIS MORA BUITRAGO
C.C. 1094276314

EL TRABAJADOR
JOSUE LOPEZ CHAPETA
C.C. **9466912**

PCA GROUP

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

CONTRATO DE TRABAJO POR OBRA O LABOR CONTRATADA

Entre los suscritos a saber **PCA GROUP S.A.S.**, identificada con **NIT 901.490.923-2**, representada legalmente por **XIMENA DAMARIS MORA BUITRAGO**, identificada con cédula de ciudadanía No. **1094276314**, quien para efectos del presente contrato se denominará **EL EMPLEADOR**; y por la otra parte **PABLO EMILIO PATIÑO CALDERON** identificado con cédula de ciudadanía No. **1007545405**, quien en adelante se denominará **EL TRABAJADOR**, se celebra el presente **Contrato de Trabajo por Obra o Labor Contratada**, regido por las siguientes cláusulas:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO

El EMPLEADOR contrata los servicios personales del TRABAJADOR para realizar labores de **ayudante de obra,** específicamente en el:

"OBRAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONCRETO PARA LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA LA GAITANA, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ."

El TRABAJADOR desarrollará todas las actividades necesarias, complementarias o conexas para la ejecución adecuada de la labor asignada.

SEGUNDA. DURACIÓN

El presente contrato inicia el **15 de junio de 2026** y finaliza automáticamente el **24 de junio de 2026**, fecha en la cual concluyen las actividades asignadas.

TERCERA. PERÍODO DE PRUEBA

El período de prueba será el **reglamentario**, de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo, siempre y cuando su extensión sea proporcional al tiempo pactado.

CUARTA. SALARIO

El TRABAJADOR devengará un **salario básico mensual de $2´142.990.**

El salario se pagará **mensualmente**, con los derechos legales correspondientes: prestaciones sociales, auxilios, recargos y demás conceptos establecidos por la ley.

QUINTA. JORNADA DE TRABAJO

El TRABAJADOR cumplirá la jornada máxima legal, sin exceder las horas semanales, distribuidas según las necesidades de la obra.

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

SEXTA. OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR

a) Ejecutar la labor contratada con eficiencia y responsabilidad.
b) Cumplir instrucciones del EMPLEADOR relacionadas con su actividad.
c) Hacer uso correcto de herramientas y equipos asignados.
d) Cumplir las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

SÉPTIMA. OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

a) Pagar puntualmente el salario y prestaciones correspondientes.
b) Garantizar los elementos de protección personal.
c) Afiliar al TRABAJADOR al Sistema General de Seguridad Social.
d) Cumplir con los estándares de seguridad laboral.

OCTAVA. TERMINACIÓN

El contrato termina por:
a) Conclusión de la obra o labor (24 de junio de 2026).
b) Mutuo acuerdo.
c) Justa causa conforme al CST.
d) Las demás causales de ley.

NOVENA. LUGAR DE TRABAJO

El TRABAJADOR prestará sus servicios en **Cubará, Boyacá**, o en los lugares donde se desarrolle la labor contratada.

DÉCIMA. DISPOSICIONES FINALES

Para todo lo no previsto en este contrato aplicarán las normas laborales vigentes.

En constancia, se firma el presente contrato en dos (2) ejemplares del mismo valor jurídico, el 15 de junio de 2026.

EL EMPLEADOR
PCA GROUP S.A.S.
XIMENA DAMARIS MORA BUITRAGO
C.C. 1094276314

EL TRABAJADOR
PABLO EMILIO PATIÑO CALDERON
C.C. **1007545405**

PCA GROUP

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

CONTRATO DE TRABAJO POR OBRA O LABOR CONTRATADA

Entre los suscritos a saber **PCA GROUP S.A.S.**, identificada con **NIT 901.490.923-2**, representada legalmente por **XIMENA DAMARIS MORA BUITRAGO**, identificada con cédula de ciudadanía No. **1094276314**, quien para efectos del presente contrato se denominará **EL EMPLEADOR**; y por la otra parte **ALIRIO VERA SOLANO** identificado con cédula de ciudadanía No. **9466531**, quien en adelante se denominará **EL TRABAJADOR**, se celebra el presente **Contrato de Trabajo por Obra o Labor Contratada**, regido por las siguientes cláusulas:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO

El EMPLEADOR contrata los servicios personales del TRABAJADOR para realizar labores de **ayudante de obra,** específicamente en el:

"OBRAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONCRETO PARA LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA LA GAITANA, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ."

El TRABAJADOR desarrollará todas las actividades necesarias, complementarias o conexas para la ejecución adecuada de la labor asignada.

SEGUNDA. DURACIÓN

El presente contrato inicia el **15 de junio de 2026** y finaliza automáticamente el **24 de junio de 2026**, fecha en la cual concluyen las actividades asignadas.

TERCERA. PERÍODO DE PRUEBA

El período de prueba será el **reglamentario**, de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo, siempre y cuando su extensión sea proporcional al tiempo pactado.

CUARTA. SALARIO

El TRABAJADOR devengará un **salario básico mensual de $2´142.990.**

El salario se pagará **mensualmente**, con los derechos legales correspondientes: prestaciones sociales, auxilios, recargos y demás conceptos establecidos por la ley.

QUINTA. JORNADA DE TRABAJO

El TRABAJADOR cumplirá la jornada máxima legal, sin exceder las horas semanales, distribuidas según las necesidades de la obra.

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

SEXTA. OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR

a) Ejecutar la labor contratada con eficiencia y responsabilidad.
b) Cumplir instrucciones del EMPLEADOR relacionadas con su actividad.
c) Hacer uso correcto de herramientas y equipos asignados.
d) Cumplir las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

SÉPTIMA. OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

a) Pagar puntualmente el salario y prestaciones correspondientes.
b) Garantizar los elementos de protección personal.
c) Afiliar al TRABAJADOR al Sistema General de Seguridad Social.
d) Cumplir con los estándares de seguridad laboral.

OCTAVA. TERMINACIÓN

El contrato termina por:
a) Conclusión de la obra o labor (24 de junio de 2026).
b) Mutuo acuerdo.
c) Justa causa conforme al CST.
d) Las demás causales de ley.

NOVENA. LUGAR DE TRABAJO

El TRABAJADOR prestará sus servicios en **Cubará, Boyacá**, o en los lugares donde se desarrolle la labor contratada.

DÉCIMA. DISPOSICIONES FINALES

Para todo lo no previsto en este contrato aplicarán las normas laborales vigentes.

En constancia, se firma el presente contrato en dos (2) ejemplares del mismo valor jurídico, el 15 de junio de 2026.

EL EMPLEADOR
PCA GROUP S.A.S.
XIMENA DAMARIS MORA BUITRAGO
C.C. 1094276314

EL TRABAJADOR
ALIRIO VERA SOLANO
C.C. **9466531**

PCA GROUP

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

CONTRATO DE TRABAJO POR OBRA O LABOR CONTRATADA

Entre los suscritos a saber **PCA GROUP S.A.S.**, identificada con **NIT 901.490.923-2**, representada legalmente por **XIMENA DAMARIS MORA BUITRAGO**, identificada con cédula de ciudadanía No. **1094276314**, quien para efectos del presente contrato se denominará **EL EMPLEADOR**; y por la otra parte **JULIO CESAR GAMBOA CAMARGO** identificado con cédula de ciudadanía No. **91541508**, quien en adelante se denominará **EL TRABAJADOR**, se celebra el presente **Contrato de Trabajo por Obra o Labor Contratada**, regido por las siguientes cláusulas:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO

El EMPLEADOR contrata los servicios personales del TRABAJADOR para realizar labores de **ayudante de obra,** específicamente en el:

"OBRAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONCRETO PARA LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA LA GAITANA, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ."

El TRABAJADOR desarrollará todas las actividades necesarias, complementarias o conexas para la ejecución adecuada de la labor asignada.

SEGUNDA. DURACIÓN

El presente contrato inicia el **15 de junio de 2026** y finaliza automáticamente el **24 de junio de 2026**, fecha en la cual concluyen las actividades asignadas.

TERCERA. PERÍODO DE PRUEBA

El período de prueba será el **reglamentario**, de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo, siempre y cuando su extensión sea proporcional al tiempo pactado.

CUARTA. SALARIO

El TRABAJADOR devengará un **salario básico mensual de $2´142.990.**

El salario se pagará **mensualmente**, con los derechos legales correspondientes: prestaciones sociales, auxilios, recargos y demás conceptos establecidos por la ley.

QUINTA. JORNADA DE TRABAJO

El TRABAJADOR cumplirá la jornada máxima legal, sin exceder las horas semanales, distribuidas según las necesidades de la obra.

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

SEXTA. OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR

a) Ejecutar la labor contratada con eficiencia y responsabilidad.
b) Cumplir instrucciones del EMPLEADOR relacionadas con su actividad.
c) Hacer uso correcto de herramientas y equipos asignados.
d) Cumplir las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

SÉPTIMA. OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

a) Pagar puntualmente el salario y prestaciones correspondientes.
b) Garantizar los elementos de protección personal.
c) Afiliar al TRABAJADOR al Sistema General de Seguridad Social.
d) Cumplir con los estándares de seguridad laboral.

OCTAVA. TERMINACIÓN

El contrato termina por:
a) Conclusión de la obra o labor (24 de junio de 2026).
b) Mutuo acuerdo.
c) Justa causa conforme al CST.
d) Las demás causales de ley.

NOVENA. LUGAR DE TRABAJO

El TRABAJADOR prestará sus servicios en **Cubará, Boyacá**, o en los lugares donde se desarrolle la labor contratada.

DÉCIMA. DISPOSICIONES FINALES

Para todo lo no previsto en este contrato aplicarán las normas laborales vigentes.

En constancia, se firma el presente contrato en dos (2) ejemplares del mismo valor jurídico, el 15 de junio de 2026.

EL EMPLEADOR
PCA GROUP S.A.S.
XIMENA DAMARIS MORA BUITRAGO
C.C. 1094276314

EL TRABAJADOR
JULIO CESAR GAMBOA CAMARGO
C.C. **91541508**

PCA GROUP

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

CONTRATO DE TRABAJO POR OBRA O LABOR CONTRATADA

Entre los suscritos a saber **PCA GROUP S.A.S.**, identificada con **NIT 901.490.923-2**, representada legalmente por **XIMENA DAMARIS MORA BUITRAGO**, identificada con cédula de ciudadanía No. **1094276314**, quien para efectos del presente contrato se denominará **EL EMPLEADOR**; y por la otra parte **LUIS ADOLFO BARAJAS SILVA** identificado con cédula de ciudadanía No. **9467221** , quien en adelante se denominará **EL TRABAJADOR**, se celebra el presente **Contrato de Trabajo por Obra o Labor Contratada**, regido por las siguientes cláusulas:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO

El EMPLEADOR contrata los servicios personales del TRABAJADOR para realizar labores de **ayudante de obra,** específicamente en el:

"OBRAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONCRETO PARA LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA LA GAITANA, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ."

El TRABAJADOR desarrollará todas las actividades necesarias, complementarias o conexas para la ejecución adecuada de la labor asignada.

SEGUNDA. DURACIÓN

El presente contrato inicia el **15 de junio de 2026** y finaliza automáticamente el **24 de junio de 2026**, fecha en la cual concluyen las actividades asignadas.

TERCERA. PERÍODO DE PRUEBA

El período de prueba será el **reglamentario**, de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo, siempre y cuando su extensión sea proporcional al tiempo pactado.

CUARTA. SALARIO

El TRABAJADOR devengará un **salario básico mensual de $2´142.990.**

El salario se pagará **mensualmente**, con los derechos legales correspondientes: prestaciones sociales, auxilios, recargos y demás conceptos establecidos por la ley.

QUINTA. JORNADA DE TRABAJO

El TRABAJADOR cumplirá la jornada máxima legal, sin exceder las horas semanales, distribuidas según las necesidades de la obra.

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

SEXTA. OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR

a) Ejecutar la labor contratada con eficiencia y responsabilidad.
b) Cumplir instrucciones del EMPLEADOR relacionadas con su actividad.
c) Hacer uso correcto de herramientas y equipos asignados.
d) Cumplir las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

SÉPTIMA. OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

a) Pagar puntualmente el salario y prestaciones correspondientes.
b) Garantizar los elementos de protección personal.
c) Afiliar al TRABAJADOR al Sistema General de Seguridad Social.
d) Cumplir con los estándares de seguridad laboral.

OCTAVA. TERMINACIÓN

El contrato termina por:
a) Conclusión de la obra o labor (24 de junio de 2026).
b) Mutuo acuerdo.
c) Justa causa conforme al CST.
d) Las demás causales de ley.

NOVENA. LUGAR DE TRABAJO

El TRABAJADOR prestará sus servicios en **Cubará, Boyacá**, o en los lugares donde se desarrolle la labor contratada.

DÉCIMA. DISPOSICIONES FINALES

Para todo lo no previsto en este contrato aplicarán las normas laborales vigentes.

En constancia, se firma el presente contrato en dos (2) ejemplares del mismo valor jurídico, el 15 de junio de 2026.

EL EMPLEADOR
PCA GROUP S.A.S.
XIMENA DAMARIS MORA BUITRAGO
C.C. 1094276314

EL TRABAJADOR
LUIS ADOLFO BARAJAS SILVA
C.C. **9467221**

PCA GROUP

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

CONTRATO DE TRABAJO POR OBRA O LABOR CONTRATADA

Entre los suscritos a saber **PCA GROUP S.A.S.**, identificada con **NIT 901.490.923-2**, representada legalmente por **XIMENA DAMARIS MORA BUITRAGO**, identificada con cédula de ciudadanía No. **1094276314**, quien para efectos del presente contrato se denominará **EL EMPLEADOR**; y por la otra parte **ENOC QUIÑONES VILLAMIZAR** identificado con cédula de ciudadanía No. **9467022** , quien en adelante se denominará **EL TRABAJADOR**, se celebra el presente **Contrato de Trabajo por Obra o Labor Contratada**, regido por las siguientes cláusulas:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO

El EMPLEADOR contrata los servicios personales del TRABAJADOR para realizar labores de **ayudante de obra,** específicamente en el:

"OBRAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONCRETO PARA LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA LA GAITANA, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ."

El TRABAJADOR desarrollará todas las actividades necesarias, complementarias o conexas para la ejecución adecuada de la labor asignada.

SEGUNDA. DURACIÓN

El presente contrato inicia el **15 de junio de 2026** y finaliza automáticamente el **24 de junio de 2026**, fecha en la cual concluyen las actividades asignadas.

TERCERA. PERÍODO DE PRUEBA

El período de prueba será el **reglamentario**, de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo, siempre y cuando su extensión sea proporcional al tiempo pactado.

CUARTA. SALARIO

El TRABAJADOR devengará un **salario básico mensual de $2´142.990.**

El salario se pagará **mensualmente**, con los derechos legales correspondientes: prestaciones sociales, auxilios, recargos y demás conceptos establecidos por la ley.

QUINTA. JORNADA DE TRABAJO

El TRABAJADOR cumplirá la jornada máxima legal, sin exceder las horas semanales, distribuidas según las necesidades de la obra.

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

SEXTA. OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR

a) Ejecutar la labor contratada con eficiencia y responsabilidad.
b) Cumplir instrucciones del EMPLEADOR relacionadas con su actividad.
c) Hacer uso correcto de herramientas y equipos asignados.
d) Cumplir las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

SÉPTIMA. OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

a) Pagar puntualmente el salario y prestaciones correspondientes.
b) Garantizar los elementos de protección personal.
c) Afiliar al TRABAJADOR al Sistema General de Seguridad Social.
d) Cumplir con los estándares de seguridad laboral.

OCTAVA. TERMINACIÓN

El contrato termina por:
a) Conclusión de la obra o labor (24 de junio de 2026).
b) Mutuo acuerdo.
c) Justa causa conforme al CST.
d) Las demás causales de ley.

NOVENA. LUGAR DE TRABAJO

El TRABAJADOR prestará sus servicios en **Cubará, Boyacá**, o en los lugares donde se desarrolle la labor contratada.

DÉCIMA. DISPOSICIONES FINALES

Para todo lo no previsto en este contrato aplicarán las normas laborales vigentes.

En constancia, se firma el presente contrato en dos (2) ejemplares del mismo valor jurídico, el 15 de junio de 2026.

EL EMPLEADOR
PCA GROUP S.A.S.
XIMENA DAMARIS MORA BUITRAGO
C.C. 1094276314

EL TRABAJADOR
ENOC QUIÑONES VILLAMIZAR
C.C. **9467022**

PCA GROUP

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

CONTRATO DE TRABAJO POR OBRA O LABOR CONTRATADA

Entre los suscritos a saber **PCA GROUP S.A.S.**, identificada con **NIT 901.490.923-2**, representada legalmente por **XIMENA DAMARIS MORA BUITRAGO**, identificada con cédula de ciudadanía No. **1094276314**, quien para efectos del presente contrato se denominará **EL EMPLEADOR**; y por la otra parte **JESUS ANTONIO VERA** identificado con cédula de ciudadanía No. **5492350** , quien en adelante se denominará **EL TRABAJADOR**, se celebra el presente **Contrato de Trabajo por Obra o Labor Contratada**, regido por las siguientes cláusulas:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO

El EMPLEADOR contrata los servicios personales del TRABAJADOR para realizar labores de **ayudante de obra,** específicamente en el:

"OBRAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONCRETO PARA LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA LA GAITANA, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ."

El TRABAJADOR desarrollará todas las actividades necesarias, complementarias o conexas para la ejecución adecuada de la labor asignada.

SEGUNDA. DURACIÓN

El presente contrato inicia el **15 de junio de 2026** y finaliza automáticamente el **24 de junio de 2026**, fecha en la cual concluyen las actividades asignadas.

TERCERA. PERÍODO DE PRUEBA

El período de prueba será el **reglamentario**, de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo, siempre y cuando su extensión sea proporcional al tiempo pactado.

CUARTA. SALARIO

El TRABAJADOR devengará un **salario básico mensual de $2´142.990.**

El salario se pagará **mensualmente**, con los derechos legales correspondientes: prestaciones sociales, auxilios, recargos y demás conceptos establecidos por la ley.

QUINTA. JORNADA DE TRABAJO

El TRABAJADOR cumplirá la jornada máxima legal, sin exceder las horas semanales, distribuidas según las necesidades de la obra.

PCA GROUP

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

SEXTA. OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR

a) Ejecutar la labor contratada con eficiencia y responsabilidad.
b) Cumplir instrucciones del EMPLEADOR relacionadas con su actividad.
c) Hacer uso correcto de herramientas y equipos asignados.
d) Cumplir las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

SÉPTIMA. OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

a) Pagar puntualmente el salario y prestaciones correspondientes.
b) Garantizar los elementos de protección personal.
c) Afiliar al TRABAJADOR al Sistema General de Seguridad Social.
d) Cumplir con los estándares de seguridad laboral.

OCTAVA. TERMINACIÓN

El contrato termina por:
a) Conclusión de la obra o labor (24 de junio de 2026).
b) Mutuo acuerdo.
c) Justa causa conforme al CST.
d) Las demás causales de ley.

NOVENA. LUGAR DE TRABAJO

El TRABAJADOR prestará sus servicios en **Cubará, Boyacá**, o en los lugares donde se desarrolle la labor contratada.

DÉCIMA. DISPOSICIONES FINALES

Para todo lo no previsto en este contrato aplicarán las normas laborales vigentes.

En constancia, se firma el presente contrato en dos (2) ejemplares del mismo valor jurídico, el 15 de junio de 2026.

EL EMPLEADOR
PCA GROUP S.A.S.
XIMENA DAMARIS MORA BUITRAGO
C.C. 1094276314

EL TRABAJADOR
JESUS ANTONIO VERA
C.C. **5492350**

PCA GROUP

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

CONTRATO DE TRABAJO POR OBRA O LABOR CONTRATADA

Entre los suscritos a saber **PCA GROUP S.A.S.**, identificada con **NIT 901.490.923-2**, representada legalmente por **XIMENA DAMARIS MORA BUITRAGO**, identificada con cédula de ciudadanía No. **1094276314**, quien para efectos del presente contrato se denominará **EL EMPLEADOR**; y por la otra parte **DANIEL ADULFO MEDEZ RAMIREZ** identificado con cédula de ciudadanía No. **1049394576** , quien en adelante se denominará **EL TRABAJADOR**, se celebra el presente **Contrato de Trabajo por Obra o Labor Contratada**, regido por las siguientes cláusulas:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO

El EMPLEADOR contrata los servicios personales del TRABAJADOR para realizar labores de **ayudante de obra,** específicamente en el:

"OBRAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONCRETO PARA LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA LA GAITANA, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ."

El TRABAJADOR desarrollará todas las actividades necesarias, complementarias o conexas para la ejecución adecuada de la labor asignada.

SEGUNDA. DURACIÓN

El presente contrato inicia el **15 de junio de 2026** y finaliza automáticamente el **24 de junio de 2026**, fecha en la cual concluyen las actividades asignadas.

TERCERA. PERÍODO DE PRUEBA

El período de prueba será el **reglamentario**, de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo, siempre y cuando su extensión sea proporcional al tiempo pactado.

CUARTA. SALARIO

El TRABAJADOR devengará un **salario básico mensual de $2´142.990.**

El salario se pagará **mensualmente**, con los derechos legales correspondientes: prestaciones sociales, auxilios, recargos y demás conceptos establecidos por la ley.

QUINTA. JORNADA DE TRABAJO

El TRABAJADOR cumplirá la jornada máxima legal, sin exceder las horas semanales, distribuidas según las necesidades de la obra.

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

SEXTA. OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR

a) Ejecutar la labor contratada con eficiencia y responsabilidad.
b) Cumplir instrucciones del EMPLEADOR relacionadas con su actividad.
c) Hacer uso correcto de herramientas y equipos asignados.
d) Cumplir las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

SÉPTIMA. OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

a) Pagar puntualmente el salario y prestaciones correspondientes.
b) Garantizar los elementos de protección personal.
c) Afiliar al TRABAJADOR al Sistema General de Seguridad Social.
d) Cumplir con los estándares de seguridad laboral.

OCTAVA. TERMINACIÓN

El contrato termina por:
a) Conclusión de la obra o labor (24 de junio de 2026).
b) Mutuo acuerdo.
c) Justa causa conforme al CST.
d) Las demás causales de ley.

NOVENA. LUGAR DE TRABAJO

El TRABAJADOR prestará sus servicios en **Cubará, Boyacá**, o en los lugares donde se desarrolle la labor contratada.

DÉCIMA. DISPOSICIONES FINALES

Para todo lo no previsto en este contrato aplicarán las normas laborales vigentes.

En constancia, se firma el presente contrato en dos (2) ejemplares del mismo valor jurídico, el 15 de junio de 2026.

EL EMPLEADOR
PCA GROUP S.A.S.
XIMENA DAMARIS MORA BUITRAGO
C.C. 1094276314

EL TRABAJADOR
DANIEL ADULFO MENDEZ RAMIREZ
C.C. **1049394576**

PCA GROUP

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

CONTRATO DE TRABAJO POR OBRA O LABOR CONTRATADA

Entre los suscritos a saber **PCA GROUP S.A.S.**, identificada con **NIT 901.490.923-2**, representada legalmente por **XIMENA DAMARIS MORA BUITRAGO**, identificada con cédula de ciudadanía No. **1094276314**, quien para efectos del presente contrato se denominará **EL EMPLEADOR**; y por la otra parte **FREDY JEREZ ARIAS** identificado con cédula de ciudadanía No. **9467072** , quien en adelante se denominará **EL TRABAJADOR**, se celebra el presente **Contrato de Trabajo por Obra o Labor Contratada**, regido por las siguientes cláusulas:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO

El EMPLEADOR contrata los servicios personales del TRABAJADOR para realizar labores de **ayudante de obra,** específicamente en el:

"OBRAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONCRETO PARA LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA LA GAITANA, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ."

El TRABAJADOR desarrollará todas las actividades necesarias, complementarias o conexas para la ejecución adecuada de la labor asignada.

SEGUNDA. DURACIÓN

El presente contrato inicia el **15 de junio de 2026** y finaliza automáticamente el **24 de junio de 2026**, fecha en la cual concluyen las actividades asignadas.

TERCERA. PERÍODO DE PRUEBA

El período de prueba será el **reglamentario**, de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo, siempre y cuando su extensión sea proporcional al tiempo pactado.

CUARTA. SALARIO

El TRABAJADOR devengará un **salario básico mensual de $2´142.990.**

El salario se pagará **mensualmente**, con los derechos legales correspondientes: prestaciones sociales, auxilios, recargos y demás conceptos establecidos por la ley.

QUINTA. JORNADA DE TRABAJO

El TRABAJADOR cumplirá la jornada máxima legal, sin exceder las horas semanales, distribuidas según las necesidades de la obra.

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

SEXTA. OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR

a) Ejecutar la labor contratada con eficiencia y responsabilidad.
b) Cumplir instrucciones del EMPLEADOR relacionadas con su actividad.
c) Hacer uso correcto de herramientas y equipos asignados.
d) Cumplir las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

SÉPTIMA. OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

a) Pagar puntualmente el salario y prestaciones correspondientes.
b) Garantizar los elementos de protección personal.
c) Afiliar al TRABAJADOR al Sistema General de Seguridad Social.
d) Cumplir con los estándares de seguridad laboral.

OCTAVA. TERMINACIÓN

El contrato termina por:
a) Conclusión de la obra o labor (24 de junio de 2026).
b) Mutuo acuerdo.
c) Justa causa conforme al CST.
d) Las demás causales de ley.

NOVENA. LUGAR DE TRABAJO

El TRABAJADOR prestará sus servicios en **Cubará, Boyacá**, o en los lugares donde se desarrolle la labor contratada.

DÉCIMA. DISPOSICIONES FINALES

Para todo lo no previsto en este contrato aplicarán las normas laborales vigentes.

En constancia, se firma el presente contrato en dos (2) ejemplares del mismo valor jurídico, el 15 de junio de 2026.

EL EMPLEADOR
PCA GROUP S.A.S.
XIMENA DAMARIS MORA BUITRAGO
C.C. 1094276314

EL TRABAJADOR
FREDY JEREZ ARIAS
C.C. **9467072**

PCA GROUP

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

CONTRATO DE TRABAJO POR OBRA O LABOR CONTRATADA

Entre los suscritos a saber **PCA GROUP S.A.S.**, identificada con **NIT 901.490.923-2**, representada legalmente por **XIMENA DAMARIS MORA BUITRAGO**, identificada con cédula de ciudadanía No. **1094276314**, quien para efectos del presente contrato se denominará **EL EMPLEADOR**; y por la otra parte **JUAN SANTAFE PEDRAZA** identificado con cédula de ciudadanía No. **1049394930** , quien en adelante se denominará **EL TRABAJADOR**, se celebra el presente **Contrato de Trabajo por Obra o Labor Contratada**, regido por las siguientes cláusulas:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO

El EMPLEADOR contrata los servicios personales del TRABAJADOR para realizar labores de **ayudante de obra,** específicamente en el:

"OBRAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONCRETO PARA LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA LA GAITANA, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ."

El TRABAJADOR desarrollará todas las actividades necesarias, complementarias o conexas para la ejecución adecuada de la labor asignada.

SEGUNDA. DURACIÓN

El presente contrato inicia el **15 de junio de 2026** y finaliza automáticamente el **24 de junio de 2026**, fecha en la cual concluyen las actividades asignadas.

TERCERA. PERÍODO DE PRUEBA

El período de prueba será el **reglamentario**, de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo, siempre y cuando su extensión sea proporcional al tiempo pactado.

CUARTA. SALARIO

El TRABAJADOR devengará un **salario básico mensual de $2´142.990.**

El salario se pagará **mensualmente**, con los derechos legales correspondientes: prestaciones sociales, auxilios, recargos y demás conceptos establecidos por la ley.

QUINTA. JORNADA DE TRABAJO

El TRABAJADOR cumplirá la jornada máxima legal, sin exceder las horas semanales, distribuidas según las necesidades de la obra.

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

SEXTA. OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR

a) Ejecutar la labor contratada con eficiencia y responsabilidad.
b) Cumplir instrucciones del EMPLEADOR relacionadas con su actividad.
c) Hacer uso correcto de herramientas y equipos asignados.
d) Cumplir las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

SÉPTIMA. OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

a) Pagar puntualmente el salario y prestaciones correspondientes.
b) Garantizar los elementos de protección personal.
c) Afiliar al TRABAJADOR al Sistema General de Seguridad Social.
d) Cumplir con los estándares de seguridad laboral.

OCTAVA. TERMINACIÓN

El contrato termina por:
a) Conclusión de la obra o labor (24 de junio de 2026).
b) Mutuo acuerdo.
c) Justa causa conforme al CST.
d) Las demás causales de ley.

NOVENA. LUGAR DE TRABAJO

El TRABAJADOR prestará sus servicios en **Cubará, Boyacá**, o en los lugares donde se desarrolle la labor contratada.

DÉCIMA. DISPOSICIONES FINALES

Para todo lo no previsto en este contrato aplicarán las normas laborales vigentes.

En constancia, se firma el presente contrato en dos (2) ejemplares del mismo valor jurídico, el 15 de junio de 2026.

EL EMPLEADOR
PCA GROUP S.A.S.
XIMENA DAMARIS MORA BUITRAGO
C.C. 1094276314

EL TRABAJADOR
JUAN SANTAFE PEDRAZA
C.C. **1049394930**

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

8. SEGURIDAD SOCIAL DEL R/L

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 37818819
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-06-30

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES PCA GROUP SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901490923	D.V.	2	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CL 25B 20A 04 B MODELO	DEPARTAMENTO	ARAUCA	MUNICIPIO	SARAVENA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	SASPCAGROUP@GMAIL.COM	TELÉFONO	3177016684
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1094276314	PRIMER APELLIDO	MORA	SEGUNDO APELLIDO	BUITRAGO
PRIMER NOMBRE	XIMENA	SEGUNDO NOMBRE	DAMARIS		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 05	Año: 2026	Mes: 06	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$1.750.905		37818819

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1094276314	01	No	No	No	81	736	5429001	Fijo	MORA BUITRAGO XIMENA DAMARIS	$1.750.905

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1094276314																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1094276314	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1094276314	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	90149092 3	0.0696000	$121.900

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1094276314	COMFIAR	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 05											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	1	$280.200	$0	$0	$0	$0	25	$5.200	$0	$0	$285.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$70.100	$0	0	$0	0	$0	$70.100	25	$1.300	$0	$71.400	$0	0	$0	$0	$71.400	$0	$0	$71.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA												
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	1	$121.900	0	$0	$0	$121.900	25	$2.300	$124.200	0	$0	$1.242	$124.200

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFIAR	1	$70.100	25	$1.300	$71.400
SENA	0	$0	25	$0	$0
ICBF	0	$0	25	$0	$0
ESAP	0	$0	25	$0	$0
MinEdu	0	$0	25	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$71.400
PENSIONES	1	$285.400
RIESGOS PROFESIONALES	1	$124.200

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$71.400
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$552.400

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 37852605
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-07-03

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES PCA GROUP SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901490923	D.V.	2	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CL 25B 20A 04 B MODELO	DEPARTAMENTO	ARAUCA	MUNICIPIO	SARAVENA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	SASPCAGROUP@GMAIL.COM	TELÉFONO	3177016684
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1094276314	PRIMER APELLIDO	MORA	SEGUNDO APELLIDO	BUITRAGO
PRIMER NOMBRE	XIMENA	SEGUNDO NOMBRE	DAMARIS		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 06	Año: 2026	Mes: 07	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$1.750.905		37852605

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1094276314	01	No	No	No	81	736	5429001	Fijo	MORA BUITRAGO XIMENA DAMARIS	$1.750.905

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1094276314																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1094276314	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1094276314	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	90149092 3	0.0696000	$121.900

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1094276314	COMFIAR	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 06											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	1	$280.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$280.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$70.100	$0	0	$0	0	$0	$70.100	0	$0	$0	$70.100	$0	0	$0	$0	$70.100	$0	$0	$70.100

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	1	$121.900	0	$0	$0	$121.900	0	$0	$121.900	0	$0	$0	$121.900

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFIAR	1	$70.100	0	$0	$70.100
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$70.100
PENSIONES	1	$280.200
RIESGOS PROFESIONALES	1	$121.900

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$70.100
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$542.300

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

9. SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL UTILIZADO

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 37818709
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-06-30

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES PCA GROUP SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901490923	D.V.	2	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CL 25B 20A 04 B MODELO	DEPARTAMENTO	ARAUCA	MUNICIPIO	SARAVENA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	SASPCAGROUP@GMAIL.COM	TELÉFONO	3177016684
FAX	0	SUCURSAL	0001	NOMBRE SUCURSAL	CONTRATO
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1094276314	PRIMER APELLIDO	MORA	SEGUNDO APELLIDO	BUITRAGO
PRIMER NOMBRE	XIMENA	SEGUNDO NOMBRE	DAMARIS		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 05	Año: 2026	Mes: 06	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$600.000		37818709

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1094266290	01	No	No	No	15	223	5422001	Fijo	PARRADO LIZCANO BRAYAN MICHEL	$3.000.000

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1094266290	X	2026-05-25																											0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1094266290	PORVENIR	6	$600.000	0.1600000	$96.000	$0	$0	$96.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1094266290	NUEVA E.P.S. S.A.	6	$600.000	0.0400000	$24.000	$0	0	$0	0	$0	6	$600.000	90149092 3	0.0696000	$41.800

APORTES PARAFISCALES														
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1094266290	COMFABOY	6	$600.000	0.0400000	$24.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 05											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	1	$96.000	$0	$0	$0	$0	25	$1.800	$0	$0	$97.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$24.000	$0	0	$0	0	$0	$24.000	25	$500	$0	$24.500	$0	0	$0	$0	$24.500	$0	$0	$24.500

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	1	$41.800	0	$0	$0	$41.800	25	$800	$42.600	0	$0	$426	$42.600

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFABOY	1	$24.000	25	$500	$24.500
SENA	0	$0	25	$0	$0
ICBF	0	$0	25	$0	$0
ESAP	0	$0	25	$0	$0
MinEdu	0	$0	25	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$24.500
PENSIONES	1	$97.800
RIESGOS PROFESIONALES	1	$42.600

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$24.500
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$189.400

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 37818773
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-06-30

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES PCA GROUP SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901490923	D.V.	2	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CL 25B 20A 04 B MODELO	DEPARTAMENTO	ARAUCA	MUNICIPIO	SARAVENA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	SASPCAGROUP@GMAIL.COM	TELÉFONO	3177016684
FAX	0	SUCURSAL	0001	NOMBRE SUCURSAL	CONTRATO
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1094276314	PRIMER APELLIDO	MORA	SEGUNDO APELLIDO	BUITRAGO
PRIMER NOMBRE	XIMENA	SEGUNDO NOMBRE	DAMARIS		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 06	Año: 2026	Mes: 07	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
13		$11.746.450		37818773

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-9467221	01	No	No	No	15	223	5422001	Fijo	BARAJAS SILVA LUIS ADOLFO	$2.142.990
CC-91541508	01	No	No	No	15	223	5422001	Fijo	GAMBOA CAMARGO JULIO CESAR	$2.142.990
CC-9467072	01	No	No	No	15	223	5422001	Fijo	JEREZ ARIAS FREDY	$2.142.990
CC-9466912	01	No	No	No	15	223	5422001	Fijo	LOPEZ CHAPETA JOSUE	$2.142.990
CC-1049394576	01	No	No	No	15	223	5429001	Fijo	MENDEZ RAMIREZ DANIEL ADULFO	$2.142.990
CC-1094276314	01	No	No	No	15	223	5422001	Fijo	MORA BUITRAGO XIMENA DAMARIS	$2.250.000
CC-1094266290	01	No	No	No	15	223	5422001	Fijo	PARRADO LIZCANO BRAYAN MICHEL	$3.000.000
CC-1007545405	01	No	No	No	15	223	5422001	Fijo	PATIÑO CALDERON PABLO EMILIO	$2.142.990
CC-9467022	01	No	No	No	15	223	5422001	Fijo	QUIÑONEZ VILLAMIZAR ENOC	$2.142.990
CC-9466646	01	No	No	No	15	223	5422001	Fijo	RINCON ARIAS LUIS ERMINIO	$2.877.900
CC-1049394930	01	No	No	No	15	223	5422001	Fijo	SANTAFE PEDRAZA JUAN	$2.142.990
CC-5492350	01	No	No	No	15	223	5422001	Fijo	VERA JESUS ANTONIO	$2.142.990
CC-9466531	01	No	No	No	15	223	5422001	Fijo	VERA SOLANO ALIRIO	$2.142.990

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 9467221	X	2026-06-15	X	2026-06-24																									0		
CC - 91541508	X	2026-06-15	X	2026-06-24																									0		
CC - 9467072	X	2026-06-15	X	2026-06-24																									0		
CC - 9466912	X	2026-06-15	X	2026-06-24																									0		
CC - 1049394576	X	2026-06-15	X	2026-06-24																									0		
CC - 1094276314	X	2026-06-15	X	2026-06-24																									0		
CC - 1094266290			X	2026-06-24																									0		
CC - 1007545405	X	2026-06-15	X	2026-06-24																									0		
CC - 9467022	X	2026-06-15	X	2026-06-24																									0		
CC - 9466646	X	2026-06-15	X	2026-06-24																									0		
CC - 1049394930	X	2026-06-15	X	2026-06-24																									0		
CC - 5492350	X	2026-06-15	X	2026-06-24																									0		
CC - 9466531	X	2026-06-15	X	2026-06-24																									0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 9467221	PORVENIR	10	$714.330	0.1600000	$114.300	$0	$0	$114.300	$0	$0	$0
CC - 91541508	PORVENIR	10	$714.330	0.1600000	$114.300	$0	$0	$114.300	$0	$0	$0
CC - 9467072	PROTECCION	10	$714.330	0.1600000	$114.300	$0	$0	$114.300	$0	$0	$0
CC - 9466912	COLPENSIONES	10	$714.330	0.1600000	$114.300	$0	$0	$114.300	$0	$0	$0
CC - 1049394576	PORVENIR	10	$714.330	0.1600000	$114.300	$0	$0	$114.300	$0	$0	$0
CC - 1094276314	PORVENIR	10	$750.000	0.1600000	$120.000	$0	$0	$120.000	$0	$0	$0
CC - 1094266290	PORVENIR	24	$2.400.000	0.1600000	$384.000	$0	$0	$384.000	$0	$0	$0
CC - 1007545405	PORVENIR	10	$714.330	0.1600000	$114.300	$0	$0	$114.300	$0	$0	$0
CC - 9467022	COLPENSIONES	10	$714.330	0.1600000	$114.300	$0	$0	$114.300	$0	$0	$0
CC - 9466646	PORVENIR	10	$959.300	0.1600000	$153.500	$0	$0	$153.500	$0	$0	$0
CC - 1049394930	PORVENIR	10	$714.330	0.1600000	$114.300	$0	$0	$114.300	$0	$0	$0
CC - 5492350	PROTECCION	10	$714.330	0.1600000	$114.300	$0	$0	$114.300	$0	$0	$0
CC - 9466531	PROTECCION	10	$714.330	0.1600000	$114.300	$0	$0	$114.300	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 9467221	EPS-S COOSALUD	10	$714.330	0.0400000	$28.600	$0	0	$0	0	$0	10	$714.330	90149092 3	0.0696000	$49.800
CC - 91541508	NUEVA E.P.S. S.A.	10	$714.330	0.0400000	$28.600	$0	0	$0	0	$0	10	$714.330	90149092 3	0.0696000	$49.800
CC - 9467072	NUEVA E.P.S. S.A.	10	$714.330	0.0400000	$28.600	$0	0	$0	0	$0	10	$714.330	90149092 3	0.0696000	$49.800
CC - 9466912	EPS-S COOSALUD	10	$714.330	0.0400000	$28.600	$0	0	$0	0	$0	10	$714.330	90149092 3	0.0696000	$49.800

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1049394576	EPS-S COOSALUD	10	$714.330	0.0400000	$28.600	$0	0	$0	0	$0	10	$714.330	90149092 3	0.0696000	$49.800
CC - 1094276314	NUEVA E.P.S. S.A.	10	$750.000	0.0400000	$30.000	$0	0	$0	0	$0	10	$750.000	90149092 3	0.0696000	$52.200
CC - 1094266290	NUEVA E.P.S. S.A.	24	$2.400.000	0.0400000	$96.000	$0	0	$0	0	$0	24	$2.400.000	90149092 3	0.0696000	$167.100
CC - 1007545405	NUEVA E.P.S. S.A.	10	$714.330	0.0400000	$28.600	$0	0	$0	0	$0	10	$714.330	90149092 3	0.0696000	$49.800
CC - 9467022	EPS-S COOSALUD	10	$714.330	0.0400000	$28.600	$0	0	$0	0	$0	10	$714.330	90149092 3	0.0696000	$49.800
CC - 9466646	NUEVA E.P.S. S.A.	10	$959.300	0.0400000	$38.400	$0	0	$0	0	$0	10	$959.300	90149092 3	0.0696000	$66.800
CC - 1049394930	EPS-S COOSALUD	10	$714.330	0.0400000	$28.600	$0	0	$0	0	$0	10	$714.330	90149092 3	0.0696000	$49.800
CC - 5492350	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	10	$714.330	0.0400000	$28.600	$0	0	$0	0	$0	10	$714.330	90149092 3	0.0696000	$49.800

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 9466531	EPS-S COOSALUD	10	$714.330	0.0400000	$28.600	$0	0	$0	0	$0	10	$714.330	90149092 3	0.0696000	$49.800

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-9467221	COMFABOY	10	$744.093	0.0400000	$29.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-91541508	COMFABOY	10	$744.093	0.0400000	$29.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-9467072	COMFABOY	10	$744.093	0.0400000	$29.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-9466912	COMFABOY	10	$744.093	0.0400000	$29.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1049394576	COMFABOY	10	$744.093	0.0400000	$29.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1094276314	COMFABOY	10	$781.250	0.0400000	$31.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1094266290	COMFABOY	24	$2.525.000	0.0400000	$101.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1007545405	COMFABOY	10	$744.093	0.0400000	$29.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-9467022	COMFABOY	10	$744.093	0.0400000	$29.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-9466646	COMFABOY	10	$999.270	0.0400000	$40.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1049394930	COMFABOY	10	$744.093	0.0400000	$29.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-5492350	COMFABOY	10	$744.093	0.0400000	$29.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-9466531	COMFABOY	10	$744.093	0.0400000	$29.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 06											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	8	$1.229.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.229.000
PROTECCION	3	$342.900	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$342.900
COLPENSIONES	2	$228.600	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$228.600

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	6	$250.200	$0	0	$0	0	$0	$250.200	0	$0	$0	$250.200	$0	0	$0	$0	$250.200	$0	$0	$250.200
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$28.600	$0	0	$0	0	$0	$28.600	0	$0	$0	$28.600	$0	0	$0	$0	$28.600	$0	$0	$28.600
EPS-S COOSALUD	6	$171.600	$0	0	$0	0	$0	$171.600	0	$0	$0	$171.600	$0	0	$0	$0	$171.600	$0	$0	$171.600

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	13	$784.100	0	$0	$0	$784.100	0	$0	$784.100	0	$0	$0	$784.100

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFABOY	13	$470.300	0	$0	$470.300
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	$450.400
PENSIONES	3	$1.800.500
RIESGOS PROFESIONALES	1	$784.100
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$470.300
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$3.505.300

PCA GROUP

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

10. PAZ Y SALVO DEL PERSONAL

PCA GROUP

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

PAZ Y SALVO LABORAL

Yo, **BRAYAN MICHEL PARRADO LIZCANO**, identificado con cédula de ciudadanía No. **1094266290**, declaro que recibí de **PCA GROUP S.A.S.**, NIT **901490923-2**, **todas las sumas y conceptos derivados de mi relación laboral**, incluyendo salario, prestaciones sociales, auxilios, liquidación final y cualquier otro pago a que hubiera lugar.

Manifiesto que **no tengo reclamación pendiente** contra la empresa por ningún concepto y que me encuentro **a Paz y Salvo total y definitivo**.

Se firma en Cubará, Boyacá, a los **25 días del mes de junio de 2026**.

Firma del Trabajador

BRAYAN MICHEL PARRADO LIZCANO
C.C. **1094266290**

Firma del Representante de la Empresa

XIMENA DAMARIS MORA BUITRAGO
C.C. 1094276314
Representante Legal
PCA GROUP S.A.S.

PCA GROUP

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

PAZ Y SALVO LABORAL

Yo, **XIMENA DAMARIS MORA BUITRAGO**, identificado con cédula de ciudadanía No. **1094276314**, declaro que recibí de **PCA GROUP S.A.S.**, NIT **901490923-2**, **todas las sumas y conceptos derivados de mi relación laboral**, incluyendo salario, prestaciones sociales, auxilios, liquidación final y cualquier otro pago a que hubiera lugar.

Manifiesto que **no tengo reclamación pendiente** contra la empresa por ningún concepto y que me encuentro **a Paz y Salvo total y definitivo**.

Se firma en Cubará, Boyacá, a los **25 días del mes de junio de 2026**.

Firma del Trabajador

XIMENA DAMARIS MORA BUITRAGO
C.C. **1094276314**

Firma del Representante de la Empresa

XIMENA DAMARIS MORA BUITRAGO
C.C. 1094276314
Representante Legal
PCA GROUP S.A.S.

PCA GROUP

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

PAZ Y SALVO LABORAL

Yo, **LUIS ERMINIO RINCON ARIAS**, identificado con cédula de ciudadanía No. **9466646**, declaro que recibí de **PCA GROUP S.A.S.**, NIT **901490923-2**, **todas las sumas y conceptos derivados de mi relación laboral**, incluyendo salario, prestaciones sociales, auxilios, liquidación final y cualquier otro pago a que hubiera lugar.

Manifiesto que **no tengo reclamación pendiente** contra la empresa por ningún concepto y que me encuentro **a Paz y Salvo total y definitivo**.

Se firma en Cubará, Boyacá, a los **25 días del mes de junio de 2026**.

Firma del Trabajador

Luis A

LUIS ERMINIO RINCON ARIAS
C.C. **9466646**

Firma del Representante de la Empresa

XIMENA DAMARIS MORA BUITRAGO
C.C. 1094276314
Representante Legal
PCA GROUP S.A.S.

PCA GROUP

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

PAZ Y SALVO LABORAL

Yo, **JOSUE LOPEZ CHAPETA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **9466912**, declaro que recibí de **PCA GROUP S.A.S.**, NIT **901490923-2**, **todas las sumas y conceptos derivados de mi relación laboral**, incluyendo salario, prestaciones sociales, auxilios, liquidación final y cualquier otro pago a que hubiera lugar.

Manifiesto que **no tengo reclamación pendiente** contra la empresa por ningún concepto y que me encuentro **a Paz y Salvo total y definitivo**.

Se firma en Cubará, Boyacá, a los **25 días del mes de junio de 2026**.

Firma del Trabajador

Josue C
JOSUE LOPEZ CHAPETA
C.C. **9466912**

Firma del Representante de la Empresa

XIMENA DAMARIS MORA BUITRAGO
C.C. 1094276314
Representante Legal
PCA GROUP S.A.S.

PCA GROUP

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

PAZ Y SALVO LABORAL

Yo, **PABLO EMILIO PATIÑO CALDERON**, identificado con cédula de ciudadanía No. **1007545405**, declaro que recibí de **PCA GROUP S.A.S.**, NIT **901490923-2**, **todas las sumas y conceptos derivados de mi relación laboral**, incluyendo salario, prestaciones sociales, auxilios, liquidación final y cualquier otro pago a que hubiera lugar.

Manifiesto que **no tengo reclamación pendiente** contra la empresa por ningún concepto y que me encuentro **a Paz y Salvo total y definitivo**.

Se firma en Cubará, Boyacá, a los **25 días del mes de junio de 2026**.

Firma del Trabajador

Pablo C

PABLO EMILIO PATIÑO CALDERON
C.C. **1007545405**

Firma del Representante de la Empresa

XIMENA DAMARIS MORA BUITRAGO
C.C. 1094276314
Representante Legal
PCA GROUP S.A.S.

PCA GROUP

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

PAZ Y SALVO LABORAL

Yo, **ALIRIO VERA SOLNO**, identificado con cédula de ciudadanía No. **9466531**, declaro que recibí de **PCA GROUP S.A.S.**, NIT **901490923-2**, **todas las sumas y conceptos derivados de mi relación laboral**, incluyendo salario, prestaciones sociales, auxilios, liquidación final y cualquier otro pago a que hubiera lugar.

Manifiesto que **no tengo reclamación pendiente** contra la empresa por ningún concepto y que me encuentro **a Paz y Salvo total y definitivo**.

Se firma en Cubará, Boyacá, a los **25 días del mes de junio de 2026**.

Firma del Trabajador

ALIRIO VERA SOLANO
C.C. **9466531**

Firma del Representante de la Empresa

XIMENA DAMARIS MORA BUITRAGO
C.C. 1094276314
Representante Legal
PCA GROUP S.A.S.

PCA GROUP

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

PAZ Y SALVO LABORAL

Yo, **JULIO CESAR GAMBOA CAMARGO**, identificado con cédula de ciudadanía No. **91541508**, declaro que recibí de **PCA GROUP S.A.S.**, NIT **901490923-2**, **todas las sumas y conceptos derivados de mi relación laboral**, incluyendo salario, prestaciones sociales, auxilios, liquidación final y cualquier otro pago a que hubiera lugar.

Manifiesto que **no tengo reclamación pendiente** contra la empresa por ningún concepto y que me encuentro **a Paz y Salvo total y definitivo**.

Se firma en Cubará, Boyacá, a los **25 días del mes de junio de 2026**.

Firma del Trabajador

Julio C

JULIO CESAR GAMBOA CAMARGO
C.C. **91541508**

Firma del Representante de la Empresa

XIMENA DAMARIS MORA BUITRAGO
C.C. 1094276314
Representante Legal
PCA GROUP S.A.S.

PCA GROUP

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

PAZ Y SALVO LABORAL

Yo, **LUIS ADOLFO BARAJAS SILVA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **9467221**, declaro que recibí de **PCA GROUP S.A.S.**, NIT **901490923-2**, **todas las sumas y conceptos derivados de mi relación laboral**, incluyendo salario, prestaciones sociales, auxilios, liquidación final y cualquier otro pago a que hubiera lugar.

Manifiesto que **no tengo reclamación pendiente** contra la empresa por ningún concepto y que me encuentro **a Paz y Salvo total y definitivo**.

Se firma en Cubará, Boyacá, a los **25 días del mes de junio de 2026**.

Firma del Trabajador

Luis B
LUIS ADOLFO BARAJAS SILVA
C.C. **9467221**

Firma del Representante de la Empresa

XIMENA DAMARIS MORA BUITRAGO
C.C. 1094276314
Representante Legal
PCA GROUP S.A.S.

PCA GROUP

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

PAZ Y SALVO LABORAL

Yo, **ENOC QUIÑONES VILLAMIZAR**, identificado con cédula de ciudadanía No. **9467022**, declaro que recibí de **PCA GROUP S.A.S.**, NIT **901490923-2**, **todas las sumas y conceptos derivados de mi relación laboral**, incluyendo salario, prestaciones sociales, auxilios, liquidación final y cualquier otro pago a que hubiera lugar.

Manifiesto que **no tengo reclamación pendiente** contra la empresa por ningún concepto y que me encuentro **a Paz y Salvo total y definitivo**.

Se firma en Cubará, Boyacá, a los **25 días del mes de junio de 2026**.

Firma del Trabajador

Enoc G

ENOC QUIÑONES VILLAMIZAR
C.C. **9467022**

Firma del Representante de la Empresa

XIMENA DAMARIS MORA BUITRAGO
C.C. 1094276314
Representante Legal
PCA GROUP S.A.S.

PCA GROUP

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

PAZ Y SALVO LABORAL

Yo, **JESUS ANTONIO VERA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **5492350**, declaro que recibí de **PCA GROUP S.A.S.**, NIT **901490923-2**, **todas las sumas y conceptos derivados de mi relación laboral**, incluyendo salario, prestaciones sociales, auxilios, liquidación final y cualquier otro pago a que hubiera lugar.

Manifiesto que **no tengo reclamación pendiente** contra la empresa por ningún concepto y que me encuentro **a Paz y Salvo total y definitivo**.

Se firma en Cubará, Boyacá, a los **25 días del mes de junio de 2026**.

Firma del Trabajador

Jesus V

JESUS ANTONIO VERA
C.C. **5492350**

Firma del Representante de la Empresa

XIMENA DAMARIS MORA BUITRAGO
C.C. 1094276314
Representante Legal
PCA GROUP S.A.S.

PCA GROUP

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

PAZ Y SALVO LABORAL

Yo, **DANIEL ADULFO MENDEZ RAMIREZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. **1049394576**, declaro que recibí de **PCA GROUP S.A.S.**, NIT **901490923-2, todas las sumas y conceptos derivados de mi relación laboral**, incluyendo salario, prestaciones sociales, auxilios, liquidación final y cualquier otro pago a que hubiera lugar.

Manifiesto que **no tengo reclamación pendiente** contra la empresa por ningún concepto y que me encuentro **a Paz y Salvo total y definitivo**.

Se firma en Cubará, Boyacá, a los **25 días del mes de junio de 2026**.

Firma del Trabajador

Daniel Z

DANIEL ADULFO MENDEZ RAMIREZ
C.C. **1049394576**

Firma del Representante de la Empresa

XIMENA DAMARIS MORA BUITRAGO
C.C. 1094276314
Representante Legal
PCA GROUP S.A.S.

PCA GROUP

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

PAZ Y SALVO LABORAL

Yo, **FREDY JEREZ ARIAS**, identificado con cédula de ciudadanía No. **9467072**, declaro que recibí de **PCA GROUP S.A.S.**, NIT **901490923-2**, **todas las sumas y conceptos derivados de mi relación laboral**, incluyendo salario, prestaciones sociales, auxilios, liquidación final y cualquier otro pago a que hubiera lugar.

Manifiesto que **no tengo reclamación pendiente** contra la empresa por ningún concepto y que me encuentro **a Paz y Salvo total y definitivo**.

Se firma en Cubará, Boyacá, a los **25 días del mes de junio de 2026**.

Firma del Trabajador

Fredy A.
FREDY JEREZ ARIAS
C.C. **9467072**

Firma del Representante de la Empresa

XIMENA DAMARIS MORA BUITRAGO
C.C. 1094276314
Representante Legal
PCA GROUP S.A.S.

PCA GROUP

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

PAZ Y SALVO LABORAL

Yo, **JUAN SANTAFE PEDRAZA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **1049394930**, declaro que recibí de **PCA GROUP S.A.S.**, NIT **901490923-2, todas las sumas y conceptos derivados de mi relación laboral**, incluyendo salario, prestaciones sociales, auxilios, liquidación final y cualquier otro pago a que hubiera lugar.

Manifiesto que **no tengo reclamación pendiente** contra la empresa por ningún concepto y que me encuentro **a Paz y Salvo total y definitivo**.

Se firma en Cubará, Boyacá, a los **25 días del mes de junio de 2026**.

Firma del Trabajador

Juan S

JUAN SANTAFE PEDRAZA
C.C. **1049394930**

Firma del Representante de la Empresa

XIMENA DAMARIS MORA BUITRAGO
C.C. 1094276314
Representante Legal
PCA GROUP S.A.S.

PCA GROUP

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

11. CERTIFICACION DE PARAFISCALES FIC, CERTIFICACION DE LA CAJA DE COMPENSACION CONFABOY Y CERTIFICACION SENA

Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA:

Que el constructor con razón social PCA GROUP SAS identificado con el NIT 901490923, por concepto de Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC, realizó a través del botón electrónico de pagos las siguientes transacciones:

N° Licencia/Contrato	Nombre Obra	Ciudad Ejecución	Valor Pago	Periodo	Fecha	Ticket
20260000183	SUMINISTRO E INSTALACION	CUBARA	648,000	2026-07	21-JUL-2026	166451649
		Total	648,000			

Expedido por el SENA, a los veintiun (21) dias del mes de Julio de 2026

"LA EXPEDICIÓN DE ESTA CERTIFICACIÓN, NO IMPIDE QUE EL SENA VERIFIQUE LA BASE DE LIQUIDACIÓN DE FIC Y QUE CONSTATE EL CUMPLIMIENTO EN FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN FIC."

NO TIENE VALIDEZ PARA FINES TRIBUTARIOS

Este documento no tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2026-07-21

Generado por : Sandra Milena Estepa Fonseca

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor ingrese a la página web https://certificadoempresarios.sena.edu.co/ enlace CONSULTAR CODIGO CERTIFICADO y digite:

el código de verificación: 279800955 y el Número de Certificado: 540903

comfaboy
unidos para crecer

CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES

LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA COMFABOY

NIT. 891.800.213-8

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIOS

CERTIFICA

Que la empresa Pca Group Sas identificada con Nit canceló a COMFABOY por concepto de aportes parafiscales, desde el periodo 2026 hasta el periodo 15/07/2026

No.	Fecha Recaudo	Año	Mes	Nº Planilla	Monto De Aporte	Valor Interes
1	2026-06-30	2026	05	37818709	$24.000	$500
2	2026-06-30	2026	06	37818773	$470.300	$0
TOTALES:					**$494.300**	**$500**

Se expide en Tunja, a los 15/07/2026 a solicitud del interesado

LUIS VICENTE AVENDAÑO ALBA

JEFE DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIO

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

12. BITACORA DE OBRA

BITACORA DIARIA

CONTRATO DE OBRA:	20260000183	**FECHA:**	25/05/2026
CONTRATISTA:	PCA Group SAS	N°	1
PROYECTO:	OBRAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONCRETO PARA LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA LA GAITANA, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.		

PERSONAL EN OBRA	
CARGO	**CANT**
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	1
OFICIAL	
AYUDANTE	

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA	
TIPO-MARCA	CANT

ESTADO DEL CLIMA		
CLIMA	**MAÑANA**	**TARDE**
SOLEADO	X	X
LLOVIZNAS		
LLUVIAS FUERTES		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

Suscripción del acta de inicio del contrato.

RESIDENTE DE OBRA
BRAYAN MICHEL PARRADO LIZCANO
54202-328201 NTS

PCA GROUP SAS
R/L XIMENA DAMARIS MORA B
NIT: 901.490.923-2

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

BITACORA DIARIA

CONTRATO DE OBRA:	20260000183	**FECHA:**	26/05/2026
CONTRATISTA:	PCA Group SAS	N°	2
PROYECTO:	OBRAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONCRETO PARA LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA LA GAITANA, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.		

PERSONAL EN OBRA	
CARGO	**CANT**
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	1
OFICIAL	
AYUDANTE	

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA	
TIPO-MARCA	CANT

ESTADO DEL CLIMA		
CLIMA	**MAÑANA**	**TARDE**
SOLEADO	X	X
LLOVIZNAS		
LLUVIAS FUERTES		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

Revisión de los estudios, diseños, planos y especificaciones técnicas del proyecto.

RESIDENTE DE OBRA
BRAYAN MICHEL PARRADO LIZCANO
54202-328201 NTS

PCA GROUP SAS
R/L XIMENA DAMARIS MORA B
NIT: 901.490.923-3

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

BITACORA DIARIA

CONTRATO DE OBRA:	20260000183	**FECHA:**	27/05/2026
CONTRATISTA:	PCA Group SAS	N°	3
PROYECTO:	OBRAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONCRETO PARA LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA LA GAITANA, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.		

PERSONAL EN OBRA	
CARGO	**CANT**
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	1
OFICIAL	
AYUDANTE	

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA	
TIPO-MARCA	CANT

ESTADO DEL CLIMA		
CLIMA	**MAÑANA**	**TARDE**
SOLEADO	X	X
LLOVIZNAS		
LLUVIAS FUERTES		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

Elaboración del cronograma de ejecución y programación general de la obra.

RESIDENTE DE OBRA
BRAYAN MICHEL PARRADO LIZCANO
54202-328201 NTS

PCA GROUP SAS
R/L XIMENA DAMARIS MORA B
NIT: 901.490.923-2

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

BITACORA DIARIA

CONTRATO DE OBRA:	20260000183	**FECHA:**	28/05/2026
CONTRATISTA:	PCA Group SAS	N°	4
PROYECTO:	OBRAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONCRETO PARA LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA LA GAITANA, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.		

PERSONAL EN OBRA	
CARGO	**CANT**
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	1
OFICIAL	
AYUDANTE	

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA	
TIPO-MARCA	CANT

ESTADO DEL CLIMA		
CLIMA	**MAÑANA**	**TARDE**
SOLEADO	X	X
LLOVIZNAS		
LLUVIAS FUERTES		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

Solicitud de cotizaciones y gestión para la adquisición de materiales e insumos.

RESIDENTE DE OBRA
BRAYAN MICHEL PARRADO LIZCANO
54202-328201 NTS

PCA GROUP SAS
R/L XIMENA DAMARIS MORA B
NIT: 901.490.923-2

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

BITACORA DIARIA

CONTRATO DE OBRA:	20260000183	**FECHA:**	29/05/2026
CONTRATISTA:	PCA Group SAS	N°	5
PROYECTO:	OBRAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONCRETO PARA LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA LA GAITANA, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.		

PERSONAL EN OBRA	
CARGO	**CANT**
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	1
OFICIAL	
AYUDANTE	

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA	
TIPO-MARCA	CANT

ESTADO DEL CLIMA		
CLIMA	**MAÑANA**	**TARDE**
SOLEADO	X	X
LLOVIZNAS		
LLUVIAS FUERTES		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

Coordinación logística para el suministro de materiales y equipos.

RESIDENTE DE OBRA
BRAYAN MICHEL PARRADO LIZCANO
54202-328201 NTS

PCA GROUP SAS
R/L XIMENA DAMARIS MORA B
NIT: 901.490.923-2

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 901490923 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

BITACORA DIARIA

CONTRATO DE OBRA:	20260000183	**FECHA:**	30/05/2026
CONTRATISTA:	PCA Group SAS	N°	6
PROYECTO:	OBRAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONCRETO PARA LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA LA GAITANA, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.		

PERSONAL EN OBRA

CARGO	CANT
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	1
OFICIAL	
AYUDANTE	

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA

TIPO-MARCA	CANT

ESTADO DEL CLIMA

CLIMA	MAÑANA	TARDE
SOLEADO		x
LLOVIZNAS	x	
LLUVIAS FUERTES		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

Reconocimiento e inspección del sitio de intervención.

RESIDENTE DE OBRA
BRAYAN MICHEL PARRADO LIZCANO
54202-328201 NTS

PCA GROUP SAS
R/L XIMENA DAMARIS MORA B
NIT: 901.490.923-2

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

BITACORA DIARIA

CONTRATO DE OBRA:	20260000183	**FECHA:**	31/05/2026
CONTRATISTA:	PCA Group SAS	N°	7
PROYECTO:	OBRAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONCRETO PARA LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA LA GAITANA, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.		

PERSONAL EN OBRA

CARGO	CANT
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	1
OFICIAL	
AYUDANTE	

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA

TIPO-MARCA	CANT

ESTADO DEL CLIMA

CLIMA	MAÑANA	TARDE
SOLEADO	X	X
LLOVIZNAS		
LLUVIAS FUERTES		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

No se laboro descanso dominical

RESIDENTE DE OBRA
BRAYAN MICHEL PARRADO LIZCANO
54202-328201 NTS

PCA GROUP SAS
R/L XIMENA DAMARIS MORA B
NIT: 901.490.923-2

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

BITACORA DIARIA

CONTRATO DE OBRA:	20260000183	**FECHA:**	1/06/2026
CONTRATISTA:	PCA Group SAS	N°	8
PROYECTO:	OBRAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONCRETO PARA LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA LA GAITANA, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.		

PERSONAL EN OBRA	
CARGO	**CANT**
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	1
OFICIAL	
AYUDANTE	

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA	
TIPO-MARCA	CANT

ESTADO DEL CLIMA		
CLIMA	**MAÑANA**	**TARDE**
SOLEADO	X	X
LLOVIZNAS		
LLUVIAS FUERTES		X

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

Seguimiento al proceso de adquisición de insumos.

Se retrasan con las actividades anteriormente mensionadas por fuertes lluvias en horas de la tarde.

RESIDENTE DE OBRA
BRAYAN MICHEL PARRADO LIZCANO
54202-328201 NTS

PCA GROUP SAS
R/L XIMENA DAMARIS MORA B
NIT: 901.490.923-2

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

BITACORA DIARIA

CONTRATO DE OBRA:	20260000183	**FECHA:**	2/06/2026
CONTRATISTA:	PCA Group SAS	N°	9
PROYECTO:	OBRAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONCRETO PARA LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA LA GAITANA, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.		

PERSONAL EN OBRA	
CARGO	**CANT**
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	1
OFICIAL	
AYUDANTE	

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA	
TIPO-MARCA	CANT

ESTADO DEL CLIMA		
CLIMA	**MAÑANA**	**TARDE**
SOLEADO	X	X
LLOVIZNAS		
LLUVIAS FUERTES		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

Seguimiento al proceso de adquisición de insumos.

RESIDENTE DE OBRA
BRAYAN MICHEL PARRADO LIZCANO
54202-328201 NTS

PCA GROUP SAS
R/L XIMENA DAMARIS MORA B
NIT: 901.490.923-2

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

BITACORA DIARIA

CONTRATO DE OBRA:	20260000183	**FECHA:**	3/06/2026
CONTRATISTA:	PCA Group SAS	N°	10
PROYECTO:	OBRAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONCRETO PARA LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA LA GAITANA, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.		

PERSONAL EN OBRA	
CARGO	**CANT**
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	1
OFICIAL	
AYUDANTE	

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA	
TIPO-MARCA	CANT

ESTADO DEL CLIMA		
CLIMA	**MAÑANA**	**TARDE**
SOLEADO	X	X
LLOVIZNAS	X	
LLUVIAS FUERTES		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

Amanecio el caudal un poco alto en la cañaguata y se retrasaron algunas actividades, y se vuelve a montar el manejo de agua con costales.

Seguimiento al proceso de adquisición de insumos.

RESIDENTE DE OBRA
BRAYAN MICHEL PARRADO LIZCANO
54202-328201 NTS

PCA GROUP SAS
R/L XIMENA DAMARIS MORA B
NIT: 901.490.923-2

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

BITACORA DIARIA

CONTRATO DE OBRA:	20260000183	**FECHA:**	4/06/2026
CONTRATISTA:	PCA Group SAS	N°	11
PROYECTO:	OBRAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONCRETO PARA LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA LA GAITANA, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.		

PERSONAL EN OBRA	
CARGO	**CANT**
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	1
OFICIAL	
AYUDANTE	

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA	
TIPO-MARCA	CANT

ESTADO DEL CLIMA		
CLIMA	**MAÑANA**	**TARDE**
SOLEADO	X	X
LLOVIZNAS		
LLUVIAS FUERTES		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

Coordinación logística para el transporte de materiales y equipos.

RESIDENTE DE OBRA
BRAYAN MICHEL PARRADO LIZCANO
54202-328201 NTS

PCA GROUP SAS
R/L XIMENA DAMARIS MORA B
NIT: 901.490.923-2

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

BITACORA DIARIA

CONTRATO DE OBRA:	20260000183	**FECHA:**	5/06/2026
CONTRATISTA:	PCA Group SAS	N°	12
PROYECTO:	OBRAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONCRETO PARA LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA LA GAITANA, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.		

PERSONAL EN OBRA	
CARGO	**CANT**
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	1
OFICIAL	
AYUDANTE	

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA	
TIPO-MARCA	CANT

ESTADO DEL CLIMA		
CLIMA	**MAÑANA**	**TARDE**
SOLEADO	X	X
LLOVIZNAS		
LLUVIAS FUERTES		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

Coordinación logística para el transporte de materiales y equipos.

RESIDENTE DE OBRA
BRAYAN MICHEL PARRADO LIZCANO
54202-328201 NTS

PCA GROUP SAS
R/L XIMENA DAMARIS MORA B
NIT: 901.490.923-2

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

BITACORA DIARIA

CONTRATO DE OBRA:	20260000183	**FECHA:**	6/06/2026
CONTRATISTA:	PCA Group SAS	N°	13
PROYECTO:	OBRAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONCRETO PARA LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA LA GAITANA, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.		

PERSONAL EN OBRA	
CARGO	**CANT**
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	1
OFICIAL	
AYUDANTE	

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA	
TIPO-MARCA	CANT

ESTADO DEL CLIMA		
CLIMA	**MAÑANA**	**TARDE**
SOLEADO	X	X
LLOVIZNAS		
LLUVIAS FUERTES		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

Coordinación logística para el transporte de materiales y equipos.

RESIDENTE DE OBRA
BRAYAN MICHEL PARRADO LIZCANO
54202-328201 NTS

PCA GROUP SAS
R/L XIMENA DAMARIS MORA B
NIT: 901.490.923-2

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

BITACORA DIARIA

CONTRATO DE OBRA:	20260000183	**FECHA:**	7/06/2026
CONTRATISTA:	PCA Group SAS	N°	14
PROYECTO:	OBRAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONCRETO PARA LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA LA GAITANA, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.		

PERSONAL EN OBRA	
CARGO	**CANT**
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	1
OFICIAL	
AYUDANTE	

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA	
TIPO-MARCA	CANT

ESTADO DEL CLIMA		
CLIMA	**MAÑANA**	**TARDE**
SOLEADO	X	X
LLOVIZNAS		
LLUVIAS FUERTES		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

No se laboro descanso dominical

RESIDENTE DE OBRA
BRAYAN MICHEL PARRADO LIZCANO
54202-328201 NTS

PCA GROUP SAS
R/L XIMENA DAMARIS MORA B
NIT: 901.490.923-2

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

BITACORA DIARIA

CONTRATO DE OBRA:	20260000183	**FECHA:**	8/06/2026
CONTRATISTA:	PCA Group SAS	N°	15
PROYECTO:	OBRAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONCRETO PARA LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA LA GAITANA, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.		

PERSONAL EN OBRA	
CARGO	**CANT**
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	1
OFICIAL	
AYUDANTE	

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA	
TIPO-MARCA	CANT

ESTADO DEL CLIMA		
CLIMA	**MAÑANA**	**TARDE**
SOLEADO	X	X
LLOVIZNAS		
LLUVIAS FUERTES		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

No se laboro descanso festivo

RESIDENTE DE OBRA
BRAYAN MICHEL PARRADO LIZCANO
54202-328201 NTS

PCA GROUP SAS
R/L XIMENA DAMARIS MORA B
NIT: 901.490.923-2

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

BITACORA DIARIA

CONTRATO DE OBRA:	20260000183	**FECHA:**	9/06/2026
CONTRATISTA:	PCA Group SAS	N°	16
PROYECTO:	OBRAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONCRETO PARA LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA LA GAITANA, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.		

PERSONAL EN OBRA	
CARGO	**CANT**
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	1
OFICIAL	
AYUDANTE	

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA	
TIPO-MARCA	CANT

ESTADO DEL CLIMA		
CLIMA	**MAÑANA**	**TARDE**
SOLEADO	X	X
LLOVIZNAS		
LLUVIAS FUERTES		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

Revisión técnica de los procedimientos constructivos.

RESIDENTE DE OBRA
BRAYAN MICHEL PARRADO LIZCANO
54202-328201 NTS

PCA GROUP SAS
R/L XIMENA DAMARIS MORA B
NIT: 901.490.923-2

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

BITACORA DIARIA

CONTRATO DE OBRA:	20260000183	**FECHA:**	10/06/2026
CONTRATISTA:	PCA Group SAS	N°	17
PROYECTO:	OBRAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONCRETO PARA LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA LA GAITANA, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.		

PERSONAL EN OBRA

CARGO	CANT
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	1
OFICIAL	
AYUDANTE	

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA

TIPO-MARCA	CANT

ESTADO DEL CLIMA

CLIMA	MAÑANA	TARDE
SOLEADO	X	X
LLOVIZNAS		
LLUVIAS FUERTES		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

Coordinación del ingreso del personal operativo.

RESIDENTE DE OBRA
BRAYAN MICHEL PARRADO LIZCANO
54202-328201 NTS

PCA GROUP SAS
R/L XIMENA DAMARIS MORA B
NIT: 901.490.923-2

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

BITACORA DIARIA

CONTRATO DE OBRA:	20260000183	**FECHA:**	11/06/2026
CONTRATISTA:	PCA Group SAS	N°	18
PROYECTO:	OBRAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONCRETO PARA LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA LA GAITANA, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.		

PERSONAL EN OBRA	
CARGO	**CANT**
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	1
OFICIAL	
AYUDANTE	

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA	
TIPO-MARCA	CANT

ESTADO DEL CLIMA		
CLIMA	**MAÑANA**	**TARDE**
SOLEADO	X	X
LLOVIZNAS		
LLUVIAS FUERTES		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

Preparación de la documentación para afiliación y contratación del personal.

RESIDENTE DE OBRA
BRAYAN MICHEL PARRADO LIZCANO
54202-328201 NTS

PCA GROUP SAS
R/L XIMENA DAMARIS MORA B
NIT: 901.490.923-2

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

BITACORA DIARIA

CONTRATO DE OBRA:	20260000183	**FECHA:**	12/06/2026
CONTRATISTA:	PCA Group SAS	N°	19
PROYECTO:	OBRAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONCRETO PARA LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA LA GAITANA, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.		

PERSONAL EN OBRA	
CARGO	**CANT**
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	1
OFICIAL	
AYUDANTE	

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA	
TIPO-MARCA	CANT

ESTADO DEL CLIMA		
CLIMA	**MAÑANA**	**TARDE**
SOLEADO	X	X
LLOVIZNAS		
LLUVIAS FUERTES		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

Preparación de la documentación para afiliación y contratación del personal.

RESIDENTE DE OBRA
BRAYAN MICHEL PARRADO LIZCANO
54202-328201 NTS

PCA GROUP SAS
R/L XIMENA DAMARIS MORA B
NIT: 901.490.923-2

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

BITACORA DIARIA

CONTRATO DE OBRA:	20260000183	**FECHA:**	13/06/2026
CONTRATISTA:	PCA Group SAS	N°	20
PROYECTO:	OBRAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONCRETO PARA LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA LA GAITANA, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.		

PERSONAL EN OBRA	
CARGO	**CANT**
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	1
OFICIAL	
AYUDANTE	

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA	
TIPO-MARCA	CANT

ESTADO DEL CLIMA		
CLIMA	**MAÑANA**	**TARDE**
SOLEADO	X	X
LLOVIZNAS		
LLUVIAS FUERTES		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

Alistamiento final para el ingreso del personal operativo

RESIDENTE DE OBRA
BRAYAN MICHEL PARRADO LIZCANO
54202-328201 NTS

PCA GROUP SAS
R/L XIMENA DAMARIS MORA B
NIT: 901.490.923-2

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

BITACORA DIARIA

CONTRATO DE OBRA:	20260000183	**FECHA:**	14/06/2026
CONTRATISTA:	PCA Group SAS	N°	21
PROYECTO:	OBRAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONCRETO PARA LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA LA GAITANA, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.		

PERSONAL EN OBRA	
CARGO	**CANT**
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	1
OFICIAL	
AYUDANTE	

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA	
TIPO-MARCA	CANT

ESTADO DEL CLIMA		
CLIMA	**MAÑANA**	**TARDE**
SOLEADO	X	X
LLOVIZNAS		
LLUVIAS FUERTES		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

No se laboro descanso dominical

RESIDENTE DE OBRA
BRAYAN MICHEL PARRADO LIZCANO
54202-328201 NTS

PCA GROUP SAS
R/L XIMENA DAMARIS MORA B
NIT: 901.490.923-2

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

BITACORA DIARIA

CONTRATO DE OBRA:	20260000183	**FECHA:**	15/06/2026
CONTRATISTA:	PCA Group SAS	N°	22
PROYECTO:	OBRAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONCRETO PARA LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA LA GAITANA, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.		

PERSONAL EN OBRA	
CARGO	**CANT**
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	
OFICIAL	
AYUDANTE	

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA	
TIPO-MARCA	CANT

ESTADO DEL CLIMA		
CLIMA	**MAÑANA**	**TARDE**
SOLEADO	X	X
LLOVIZNAS		
LLUVIAS FUERTES		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

No se laboro descanso festivo

RESIDENTE DE OBRA
BRAYAN MICHEL PARRADO LIZCANO
54202-328201 NTS

PCA GROUP SAS
R/L XIMENA DAMARIS MORA B
NIT: 901.490.923-2

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

BITACORA DIARIA

CONTRATO DE OBRA:	20260000183	**FECHA:**	16/06/2026
CONTRATISTA:	PCA Group SAS	N°	23
PROYECTO:	OBRAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONCRETO PARA LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA LA GAITANA, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.		

PERSONAL EN OBRA	
CARGO	**CANT**
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	1
OFICIAL	1
AYUDANTE	10
PROFESIONAL HSEQ	1

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA	
TIPO-MARCA	CANT
HERRAMIENTA MENOR	GL
MEZCLADORA	2

ESTADO DEL CLIMA		
CLIMA	**MAÑANA**	**TARDE**
SOLEADO	X	X
LLOVIZNAS		
LLUVIAS FUERTES		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

Se inicio con la fabricacion de hexapodos con resistencia de 4000PSI
La fabricacion incluye figurado de acero y encofrado de los hexapodos.

RESIDENTE DE OBRA
BRAYAN MICHEL PARRADO LIZCANO
54202-328201 NTS

PCA GROUP SAS
R/L XIMENA DAMARIS MORA B
NIT: 901.490.923-2

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

BITACORA DIARIA

CONTRATO DE OBRA:	20260000183	**FECHA:**	17/06/2026
CONTRATISTA:	PCA Group SAS	N°	24
PROYECTO:	OBRAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONCRETO PARA LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA LA GAITANA, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.		

PERSONAL EN OBRA	
CARGO	**CANT**
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	1
OFICIAL	1
AYUDANTE	10
PROFESIONAL HSEQ	1

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA	
TIPO-MARCA	CANT
HERRAMIENTA MENOR	GL
MEZCLADORA	2

ESTADO DEL CLIMA		
CLIMA	**MAÑANA**	**TARDE**
SOLEADO	X	X
LLOVIZNAS		
LLUVIAS FUERTES		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

Se continua con la fabricacion de hexapodos

RESIDENTE DE OBRA
BRAYAN MICHEL PARRADO LIZCANO
54202-328201 NTS

PCA GROUP SAS
R/L XIMENA DAMARIS MORA B
NIT: 901.490.923-2

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

BITACORA DIARIA

CONTRATO DE OBRA:	20260000183	**FECHA:**	18/06/2026
CONTRATISTA:	PCA Group SAS	N°	25
PROYECTO:	OBRAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONCRETO PARA LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA LA GAITANA, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.		

PERSONAL EN OBRA	
CARGO	**CANT**
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	1
OFICIAL	1
AYUDANTE	10
PROFESIONAL HSEQ	1

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA	
TIPO-MARCA	CANT
HERRAMIENTA MENOR	GL
MEZCLADORA	2

ESTADO DEL CLIMA		
CLIMA	**MAÑANA**	**TARDE**
SOLEADO	X	X
LLOVIZNAS		
LLUVIAS FUERTES		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

Se continua con la fabricacion de hexapodos

RESIDENTE DE OBRA
BRAYAN MICHEL PARRADO LIZCANO
54202-328201 NTS

PCA GROUP SAS
R/L XIMENA DAMARIS MORA B
NIT: 901.490.923-2

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

BITACORA DIARIA

CONTRATO DE OBRA:	20260000183	**FECHA:**	19/06/2026
CONTRATISTA:	PCA Group SAS	N°	26
PROYECTO:	OBRAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONCRETO PARA LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA LA GAITANA, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.		

PERSONAL EN OBRA	
CARGO	**CANT**
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	1
OFICIAL	1
AYUDANTE	10
PROFESIONAL HSEQ	1

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA	
TIPO-MARCA	CANT
HERRAMIENTA MENOR	GL
MEZCLADORA	2

ESTADO DEL CLIMA		
CLIMA	**MAÑANA**	**TARDE**
SOLEADO	X	X
LLOVIZNAS		
LLUVIAS FUERTES		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

Se continua con la fabricacion de hexapodos

RESIDENTE DE OBRA
BRAYAN MICHEL PARRADO LIZCANO
54202-328201 NTS

PCA GROUP SAS
R/L XIMENA DAMARIS MORA B
NIT: 901.490.923-2

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

BITACORA DIARIA

CONTRATO DE OBRA:	20260000183	**FECHA:**	20/06/2026
CONTRATISTA:	PCA Group SAS	N°	27
PROYECTO:	OBRAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONCRETO PARA LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA LA GAITANA, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.		

PERSONAL EN OBRA	
CARGO	**CANT**
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	1
OFICIAL	1
AYUDANTE	10
PROFESIONAL HSEQ	1

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA	
TIPO-MARCA	CANT
HERRAMIENTA MENOR	GL
MEZCLADORA	2

ESTADO DEL CLIMA		
CLIMA	**MAÑANA**	**TARDE**
SOLEADO	X	X
LLOVIZNAS		
LLUVIAS FUERTES		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

Continua la fabricacion de hexapodos y Se inicia desencofrado de hexapodos

RESIDENTE DE OBRA
BRAYAN MICHEL PARRADO LIZCANO
54202-328201 NTS

PCA GROUP SAS
R/L XIMENA DAMARIS MORA B
NIT: 901.490.923-2

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

BITACORA DIARIA

CONTRATO DE OBRA:	20260000183	**FECHA:**	21/06/2026
CONTRATISTA:	PCA Group SAS	N°	28
PROYECTO:	OBRAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONCRETO PARA LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA LA GAITANA, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.		

PERSONAL EN OBRA	
CARGO	**CANT**
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	
OFICIAL	
AYUDANTE	
PROFESIONAL HSEQ	

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA	
TIPO-MARCA	CANT
HERRAMIENTA MENOR	
MEZCLADORA	

ESTADO DEL CLIMA		
CLIMA	**MAÑANA**	**TARDE**
SOLEADO		
LLOVIZNAS		
LLUVIAS FUERTES		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

No se laboro descanso dominical

RESIDENTE DE OBRA
BRAYAN MICHEL PARRADO LIZCANO
54202-328201 NTS

PCA GROUP SAS
R/L XIMENA DAMARIS MORA B
NIT: 901.490.923-2

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

BITACORA DIARIA

CONTRATO DE OBRA:	20260000183	**FECHA:**	22/06/2026
CONTRATISTA:	PCA Group SAS	N°	29
PROYECTO:	OBRAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONCRETO PARA LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA LA GAITANA, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.		

PERSONAL EN OBRA	
CARGO	**CANT**
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	1
OFICIAL	1
AYUDANTE	10
PROFESIONAL HSEQ	1

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA	
TIPO-MARCA	CANT
HERRAMIENTA MENOR	GL
MEZCLADORA	0
EXCAVADORA	1

ESTADO DEL CLIMA		
CLIMA	**MAÑANA**	**TARDE**
SOLEADO		
LLOVIZNAS	x	
LLUVIAS FUERTES		x

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

Se inicia desencofrado de hexapodos y se inicia con el transporte y la instalacion.

No es posible adelantar trabajos en la tarde

RESIDENTE DE OBRA
BRAYAN MICHEL PARRADO LIZCANO
54202-328201 NTS

PCA GROUP SAS
R/L XIMENA DAMARIS MORA B
NIT: 901.490.923-2

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

BITACORA DIARIA

CONTRATO DE OBRA:	20260000183	**FECHA:**	23/06/2026
CONTRATISTA:	PCA Group SAS	N°	30
PROYECTO:	OBRAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONCRETO PARA LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA LA GAITANA, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.		

PERSONAL EN OBRA	
CARGO	**CANT**
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	1
OFICIAL	1
AYUDANTE	10
PROFESIONAL HSEQ	1

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA	
TIPO-MARCA	CANT
HERRAMIENTA MENOR	GL
MEZCLADORA	0
EXCAVADORA	1

ESTADO DEL CLIMA		
CLIMA	**MAÑANA**	**TARDE**
SOLEADO	X	
LLOVIZNAS		
LLUVIAS FUERTES		x

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

Se continua con desencofrado de hexapodos y se inicia con el transporte y la instalacion.

No es posible adelantar trabajos en la tarde

RESIDENTE DE OBRA
BRAYAN MICHEL PARRADO LIZCANO
54202-328201 NTS

PCA GROUP SAS
R/L XIMENA DAMARIS MORA B
NIT: 901.490.923-2

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

BITACORA DIARIA

CONTRATO DE OBRA:	20260000183	**FECHA:**	24/06/2026
CONTRATISTA:	PCA Group SAS	N°	31
PROYECTO:	OBRAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONCRETO PARA LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA LA GAITANA, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.		

PERSONAL EN OBRA	
CARGO	**CANT**
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	1
OFICIAL	1
AYUDANTE	10
PROFESIONAL HSEQ	1

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA	
TIPO-MARCA	CANT
HERRAMIENTA MENOR	GL
MEZCLADORA	0
EXCAVADORA	1

ESTADO DEL CLIMA		
CLIMA	**MAÑANA**	**TARDE**
SOLEADO	X	X
LLOVIZNAS		
LLUVIAS FUERTES		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

Se continua y se termina la instalacion de hexapodos.
Se realiza aseo general.

RESIDENTE DE OBRA
BRAYAN MICHEL PARRADO LIZCANO
54202-328201 NTS

PCA GROUP SAS
R/L XIMENA DAMARIS MORA B
NIT: 901.490.923-2

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

PCA GROUP

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

13. PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO

PCA GROUP

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°.	20260000183
FECHA DE CONTRATO	19 DE MAYO DE 2026
FECHA ACTA DE INICIO	25 DE MAYO DE 2026
PLAZO DE EJECUCION	1 MES
FECHA DE TERMINACION	24 DE JUNIO DE 2026
VALOR DEL CONTRATO	$ 259.181.150,00
ANTICIPO 30%	**$** 77.754.345,00
CONTRATISTA	PCA Group SAS

DESCRIPCION PLAN DE INVERSION			
ITEM	**DESCRIPCION**	**VALOR**	**%**
1	COMPRA DE MATERIALES DE OBRA	$ 77.754.345,00	100%
TOTAL		**$ 77.754.345,00**	**100%**

Nota: los porcentajes son tomados con base en el 100% del valor del anticipo sin retenciones.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por quienes en ella intervienen, bajo su responsabilidad y en cumplimiento de las funciones que les han sido asignadas.

En el municipio de cubará a los 26 días del mes de mayo de 2026.

PCA Group SAS
R/L. XIMENA MORA BUITRAGO
CONTRATISTA DE OBRA

JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

RELACION FACTURACION ANTICIPO CONTRATO DE OBRA N°20260000183			
		VALOR ANTICIPO	$ 77.754.345,00
ITEM	DESCRIPCION	N° DE FACTURA	VALOR TOTAL
1	COMPRA DE MATERIALES	CM47425	$ 569.999,60
2	COMPRA DE MATERIALES	FEDP21676	$ 18.481.000,00
3	COMPRA DE MATERIALES	FEV2562	$ 54.480.882,00
4	COMPRA DE MATERIALES	FEC185	$ 4.403.700,00
		TOTAL	$ 77.935.581,60

Central de Materiales S.A.S.
construyamos juntos..!
Nit 901.243.065-1

Factura Electrónica De Venta No

CM No. 47425

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764108644109 que habilita desde CM 46270 hasta CM 50000. Vence 2028-04-20

EL DESCARGUE ES RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE * POR FAVOR CONSERVE SU FACTURA PARA GARANTIAS Y/O DEVOLUCIONES

Responsable de Iva No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Economica ICA COMER 5*1000

CENTRAL DE MATERIALES S.A.S

Nit 901.243.065-1

CLIENTE	PCA GROUP SAS
NIT	901490923 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 4 5 80 BRR EL COMERCIO	Cubará	3177016684

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
12/06/2026	12/06/2026	LORELEY HURTADO VARGAS	sferencia Credito Ban

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	77018450166	Accelguard HE X 24 Kg Cñt Ref. 000481 Toxement ********** CERRADA **********	2,00	Und.	239.495,80	0,19	45.504,20	478.991,60

Valor en Letras
QUINIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**478.991,60**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**91.008,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**569.999,60**

RECUERDE: 1. Vencido el plazo se cobraran intereses por mora a la tasa máxima legal vigente.

2. A esta Factura de Venta aplican las normas relativas a la Letra de Cambio (Art. 5 Ley 1231 de 2008) Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestacion de servicios descritos en este titulo valor

FAVOR CONSIGNAR A LAS CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA 506169997521- CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA 31700040464- CUENTA CORRIENTE BANCO BOGOTA 137407615- CUENTA CORRIENTE BANCO BBVA: 842003436

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/06/2026 11:52:27
Medios de Pago: Transferencia Crédito Bancario

CR 12 26 47 Teléfono 3123427784
Correo Electrónico centraldematerialesl2@hotmail.com

CUFE: b9d883dbb90a4497aee15fd3e06368697f90ebbee8f067e2ae2efbcb7b452dabf587dff7e1eae00aa15e33c00bc81ca8 --Expedición: 12/06/2026 11:55 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEDP21676
Fecha y Hora de Generación: 2026-06-04 15:34:16
Fecha validación: 2026-06-04 15:34:09-05:00
Fec. Vcto.: 2026-06-04

N° Resolución: 18764092579159 **Prefijo:** FEDP **Consecutivo:** 15001 hasta 30000 **Fecha:** 2025-04-30 **hasta** 2027-04-30

Datos del Emisor

Razón social/Nombre: DISTRIBUIDORA EL PICASO S.A.S ZESE
NIT: 901358899-1
Actividad Económica: 4752
Responsabilidad: No aplica – Otros -
Dirección: CALLE 21 12 15 - SARAVENA - Arauca - CO
Teléfonos: 0378821232
Contacto: DISTRIBUIDORA EL PICASO S.A.S ZESE
E-mail: distribuidoraelpicaso09@gmail.com
Nota: Favor practicar el 50 por ciento de Retefuente

Datos del Adquirente

Razón social/Nombre: PCA GROUP S.A..S
NIT: 901490923-2
Actividad Económica: 4290
Dirección: CLL 25B 20A 04 BR MODELO - SARAVENA - Arauca - CO
Teléfonos: 3177016684
Contacto: PCA GROUP S.A..S
E-mail: saspcagroup@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	0963	553.00	94	CEMENTO HOLCIM X 42.5 KG	22,268.91	IVA 19.00	2,339,794.12		14,654,500.00
2	0195	57.00	94	VARILLA CORRUGADA 1/2 X 1/2 X 6 MTS	23,109.24	IVA 19.00	250,273.11		1,567,500.00
3	0910	37.00	94	VARILLA CORRUGADA 3/4 X 6 MTS	47,899.16	IVA 19.00	336,731.09		2,109,000.00
4	0719	40.00	94	ALAMBRE NEGRO	3,151.26	IVA 19.00	23,949.58		150,000.00
Total Items		4							

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	15,530,252.10	2,950,747.90

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	15,530,252.10	1.250	194,128.15

Totales

SUBTOTAL:	15,530,252.10
TOTAL Base Imponible:	15,530,252.10
IVA	2,950,747.90
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	18,481,000.00
TOTAL en letras:	**Dieciocho Millones Cuatrocientos Ochenta Y Un Mil Con Cero COP**
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional

REMISION 47863

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Instrumento no definido	2026-06-04			0				

Ésta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y s.s. 772-774 del Código de Comercio. con ésta, el comprador declara haber recibido real y materialmente la mercancía descrita en este título valor.

Sociedad beneficiada del incentivo Tributario (Decreto 2112 del 24/11/2019) FAVOR APLICAR EL 50% DE LA TARIFA DE RETEFUENTE. Clasificada por su tamaño como microempresa. Agente retenedores de ICA compras 0.5% y servicios de 0.7%

Pagos por consignación o transferencia **banco Davivienda** a la cuenta corriente No. **5061 6999 7372** o **banco BBVA** a la cuenta corriente **0013 0842 0001 0000 3584**

DIR. CLL 21 No. 12 - 15
TEL. 0378821232
CORREO: distribuidoraelpicaso09@gmail.com
Saravena - Aracua

CUFE: fe6488f4a453e2b35442d81575968a891612a2bf9653b9ead70b54e1182872e5e35890a7b3d002143072562c6090428b
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-794



ConstruCubara

Sulay Deny González
NIT: 33.645.027-7
Resp. de IVA

Comercio al por menor de artículos de Ferretería, pinturas y productos de vidrio en Establecimientos especializados

SULAY DENY GONZALEZ JAIMES
NIT: 33645027-7 RESPONSABLE DE IVA || REPRESENTACIÓN GRÁFICA PDF
No somos grandes contribuyentes NO somos Autorretenedores
Cubara -Boyaca MZ B CA 11 BRR VILLAS DEL COLEGIO Telefono 3115118136 sulayd.4758@gmail.com
Nº .Resolucion: 18764110712499 **Prefijo:** FEV **Consecutivo:** 2530 al 50000600 **Fecha:** 2026-06-03 **Hasta:** 2026-12-03
CUFE:713a4a6f9573c0b0b26a91636a4625877ae4a6b78688799d12d8d13a22a68bdf491898c454be503e48a2ed7524c033b2

Razón social / Nombre: PCA GROUP SAS

Ced. ó NIT: 901490923-2
Direccion: C L 4 5 80 BRR EL COMERCIO Cubará - Boyacá
Telefono: 3177016684
Email: facturacionpcagroup@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO.FEV2562

Fecha de Emision: 24/06/2026 **Hora:** 14:34:19
Fecha Vencimiento: 24/06/2026
Cond.Pago: Contado

ITEM	CODIGO	CANT	U.M	DESCRIPCION	DTO	%IVA	P. UNIT.	P.TOTAL
1	920	80		VARILLA CORRUGADA 1/2" X 6 MT	0 %	19	30.000	2.400.000
2	863	120	kilo	ALAMBRE NEGRO #17 KILO	0 %	19	7.500	900.000
3	1559	60		VARILLA CORRUGADA 3/4 x 6 MTS	0 %	19	75.000	4.500.000
4	029	1.650	BULTO	CEMENTO GRIS USO GENERAL X 42.5 KG	0 %	19	29.000	47.850.000

Observaciones:

Valor en letras: cincuenta y cuatro millones cuatrocientos ochenta mil ochocientos ochenta y dos Pesos M/Cte

SUBTOTAL:		$	46.764.706
BASE 19% $	46.764.706 IVA 19%	$	8.885.294
BASE 5% $	0 IVA 5%	$	0
Descuento 0, 00%		$	0
TOTAL:		$	55.650.000
Rete.Fuente 0, 00%		$	1.169.118
Rete.Iva 0, 00%		$	0
Rete.Ica 0, 00%		$	0
Total A Pagar:		**$**	**54.480.882**

Recibi,
Nombre: _____
C.C: _____

Firma y Sello:

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO.ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO
Si dentro de los 10(Diez)dias calendario siguientes a la fecha de entrega de esta factura, no recibimos reclamacion por escrito sobre el contenido de la misma se entendera revocablemente aceptada.Ley 1231 de 2008

Impreso por AccaSoft ERP SoftWare de facturación electrónica directa-----Direccion Nacional de Derechos de Autor 1328215-----Original SoftWare



CANTERA FAMIVAL SAS
NIT 901.927.901-9
VDA LA ESPERANZA VIA PRINCIPAL
Tel: (608) 3115932160
Cubará - Colombia
canterafamival2025@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEC 185

Señores	PCA GROUP SAS		
NIT	901.490.923-2	**Teléfono**	(608) 0000000
Dirección	C L 4 5 80 BRR EL COMERCIO	**Ciudad**	Cubará - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/06/2026, 08:21
Expedición	09/06/2026, 08:21
Vencimiento	09/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	MTAERIAL DE CANTERA - TRITURADO	35.00	unidad	85,000.00	2,975,000.00	19 %	565,250.00	3,465,875.00
2	MATERIAL DE CANTERA - ARROCILLO	35.00	unidad	23,000.00	805,000.00	19 %	152,950.00	937,825.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Cuatro millones cuatrocientos tres mil setecientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - Consignación $ 4,403,700.00

Total Bruto	3,780,000.00
IVA 19%	718,200.00
Retefuente 2.5%	94,500.00
Total a Pagar	**4,403,700.00**

Observaciones:
se sirvan emitir y remitir el comprobante de pago correspondiente al correo electrónico canterafamival2025@gmail.com

Realizar los depósitos a la cuenta de Davivienda No. 506100274014 a nombre de CANTERA FAMIIVAL S.A.S

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764103192073 aprobado en 20251215 prefijo FEC desde el número 101 al 500 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 0811 Extracción de piedra, arena, arcillas comunes, yeso y anhidrita Tarifa
CUFE: 54c445ab6b8a162fd5e6c8107a569950b11975095c7b640f34132e3af0ba641a36d37386f95f5dde4001da77f3876656

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.145-9. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

14. MEMORIAS DE CANTIDADES

PCA GROUP
CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

OBRAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONCRETO PARA LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA LA GAITANA, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.

Formato Memoria de Cantidades de Obra

Entidad Proponente:	Alcaldia de Cubara					
Entidad Ejecutora:	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS					
Fecha:	24/06/2026				**Departamento:**	BOYACÁ
Etapa:	**Año Calendario:**	2026	**Año del Proyecto:**	2026	**Municipio:**	CUBARA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Item	Actividad	Und.	Localización de los Elementos	Formula de Cálculo		Dimensiones						Cantidades	
						A (m2) Area	P(m) Perimetro	a (m) Ancho	L (m) Largo	h (m) Alto - Espesor	V (m3) Volumen	C (Und) Cant. De elementos	Cant. Parcial
1,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS EN CONCRETO REFORZADO DE 4000 PSI H=1,8M	UND											
			Suministro de Hexapodos	UND= Cant de elementos	UND	-						85,00	85,00





Cantidad Parcial Hoja 1 de1		85,00
Cantidad Total		85,00

Proyectó

RESIDENTE DE OBRA
ING BRAYAN MICHEL PARRADO LIZCANO
M.P. No. 54202-328201 NTS

Vo. Bo.

PCA GROUP SAS
R/L XIMENA DAMARIS MORA
NIT: 901490923-2

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

15. REGISTRO FOTOGRAFICO.

PCA GROUP
CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

REGISTRO FOTOGRAFICO SAMC-003-2026.

OBRAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONCRETO PARA LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA LA GAITANA, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.


Nº	DESCRIPCIÓN
1,00	**REGISTRO FOTOGRAFICO ANTES, DURANTE Y FINAL DE LA OBRA**
1,10	ANTES




1,20	DURANTE




1,30	DESPUES

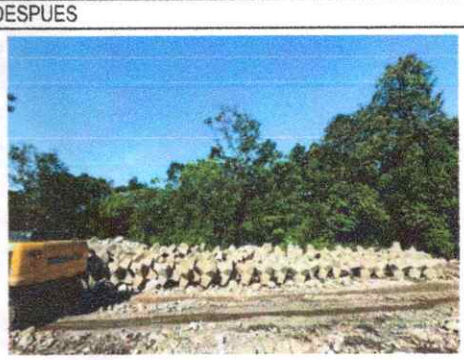RESIDENTE DE OBRA
ING BRAYAN MICHEL PARRADO LIZCANO
M.P. No. 54202-328201 NTS

PCA GROUP

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

16. ACTA DE AVANCE DE OBRA

PCA GROUP

ACTA AVANCE DE OBRA

Contrato	No. 20260000183	**Valor inicial del contrato**	**Fecha de inicio del contrato**
			25/05/2026
Objeto	OBRAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONCRETO PARA LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA LA GAITANA, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.	$ 259.181.150,00	**Plazo de ejecución inicial**
			Un (01) Mes.
		Valor adicional al contrato (M Y M 1)	**Valor anticipo**
			$ 77.754.345,00
Contratista	**PCA Group SAS** NIT. No. 901490923-2 **R/L: XIMENA DAMARIS MORA.** C.C. No. 1.094.276.314 de pamplona N.S.	$ 0,00	**Valor ejecutado acumulado**
			$ 259.181.150,00
		Saldo a favor del municipio (M Y M 1)	**Porcentaje acumulado**
			100%
Interventoria	N/A	$ 0,00	**Fecha de terminación del contrato**
			24/06/2026
Supervisor	JESÚS IVÁN QUIÑONES RUEDA Secretario de Planeación y Obras Públicas	**Valor del contrato actualizado**	**Fecha de la presente acta**
			24/06/2026
Contratante	MUNICIPIO DE CUBARÁ	$ 259.181.150,00	**Estado**
			Terminado

CONDICIONES INICIALES						CANTIDADES EJECUTADAS EN ACTA DE AVANCE		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
1,0	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS**								
1,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS EN CONCRETO REFORZADO DE 4000 PSI H=1,8M	UND	85,00	$ 3.049.190,00	$ 259.181.150,00	85,00	$ 259.181.150,00	85,00	$ 259.181.150,00
				Subtotal	**$ 259.181.150,00**		**$ 259.181.150,00**		**$ 259.181.150,00**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 194.873.045,11**		**$ 194.873.045,11**		**$ 194.873.045,11**
				ADMINISTRACION 24%	$ 46.769.530,83		$ 46.769.530,83		$ 46.769.530,83
				IMPREVISTO 2%	$ 3.897.460,90		$ 3.897.460,90		$ 3.897.460,90
				UTILIDAD 7%	$ 13.641.113,16		$ 13.641.113,16		$ 13.641.113,16
				TOTAL COSTO INDIRECTO	**$ 64.308.104,89**		**$ 64.308.104,89**		**$ 64.308.104,89**
				COSTO TOTAL	**$ 259.181.150,00**		**$ 259.181.150,00**		**$ 259.181.150,00**

BALANCE ECONÓMICO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 259.181.150,00
VALOR ANTICIPO (30%)	$ 77.754.345,00
VALOR ACTA DE RECIBO FINAL	$ 259.181.150,00
VALOR ACTA DE RECIBO FINAL ARMONIZADO	$ 181.426.805,00
VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ 259.181.150,00
PORCENTAJE EJECUTADO	100%
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ -

Para constancia de lo anterior firman la presente ACTA DE AVANCE, por los que en ella intervinieron, en Cubará a los veinticuatro (24) días del mes de junio del año 2026.

ING BRAYAN MICHEL PARRADO LIZCANO
M.P. No. 54202-328201 NTS
RESIDENTE DE OBRA

R/L: XIMENA DAMARIS MORA.
PCA Group SAS
CONTRATISTA

PCA GROUP S.A.S.
COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

17. ENSAYOS DE LABORATORIO Y CERTIFICACIONES DE CALIDAD DE MATERIALES

SEINCO SAS	**JOAQUIN EDUARDO DELGADO MONTAGUT** **Ingeniero Civil U.F.P.S. – Esp. Geotecnia Ambiental UDES**	Fecha: Julio de 2026
	ROTURA DE CILINDROS DE CONCRETO OBRAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONCRETO PARA LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA LA GAITANA, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ	**Contrato No. 20260000183** **Página 1**


RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO
INV E-410-13 NTC 673

OBJETO	:	OBRAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONCRETO PARA LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA LA GAITANA, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ		
CONTRATISTA	:	PCA GROUP SAS / RL XIMENA MORA BUITRAGO	**CONTRATO DE OBRA No. :**	20260000183
SUPERVISOR	:	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUBARA	**CONTRATO DE CONSULTORÍA No. :**	N/A

FECHA DE TOMA	ELEMENTO ESTRUCTURAL	No. POZO	REF. CILINDRO	SLUMP (CM)	EDAD CILINDRO (DÍAS)	FECHA DE ROTURA	CARGA		DIMENSION CILINDRO (cm)		RESISTENCIA PSI				%	FALLA	OBSERVACIONES
											Nominal		Resultado				
							KN	Lb	D	H	PSI	MPa	PSI	MPa			
15/06/2026	HEXAPODOS		1	8.0	7	22/06/2026	167.2	37,594	10.0	20.0	4000	28	3088	22	77%	Corte	
			1		14	29/06/2026	189.6	42,635	10.0	20.0	4000	28	3502	25	88%	Corte	
			1		28	13/07/2026	225.1	50,612	10.0	20.0	4000	28	4158	29	104%	Corte	
			1		28	13/07/2026	224.7	50,522	10.0	20.0	4000	28	4150	29	104%	Corte	
19/06/2026	HEXAPODOS		2	8.2	7	26/06/2026	169.4	38,089	10.0	20.0	4000	28	3129	22	78%	Corte	
			2		14	3/07/2026	195.5	43,957	10.0	20.0	4000	28	3611	25	90%	Corte	
			2		28	17/07/2026	227.3	51,107	10.0	20.0	4000	28	4198	29	105%	Columnar	
			2		28	17/07/2026	228.0	51,264	10.0	20.0	4000	28	4211	30	105%	Columnar	

OBSERVACIONES

CILINDROS SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA Y ENSAYADOS EN EL LABORATORIO



REF: NTC 673

Enderson Cacua

ENDERSON JADIR CACUA RICO
LABORATORISTA

ING. JOAQUIN EDUARDO DELGADO MONTAGUT
M.P. 5420272031 NTS

Carrera 18 # 27-21 Barrio Modelo
seincojedm@gmail.com Cel. 3132635714
Saravena-Arauca

Certificado de calidad Fuerte Ecoplanet

Interval From 01.04.2026 00:00 To 01.05.2026 00:00 Max. Records Period Primary log values

13.04.2026 10:17:21

INFORME DE RESULTADOS **Cemento hidráulico tipo UG** **FUERTE ECOPLANET**	Proveedor:	Holcim Colombia S.A.
	Planta:	Nobsa:
	Dirección:	Km 15 vía Duitama - Belencito
	Municipio:	Nobsa, Boyacá, Colombia
	Teléfono:	57-8-730555
	Cliente:	**General**

Autor: Ingeniero de Control de Calidad	Revisa: Coordinador de Control de Calidad	Aprueba: Coordinador de Control de Calidad

Alcance

El cemento Fuerte Ecoplanet cumple con las especificaciones de la NTC 121 para cemento tipo UG. Los métodos de ensayo empleados corresponden a los establecidos en el numeral 7.2 de la norma NTC 121, bajo el programa de seguimiento y medición de producto y la ficha técnica de frecuencia y análisis de muestras. Los datos presentados corresponden al Cemento Fuerte Ecoplanet producido por Holcim Colombia S.A. en la fecha especificada, la ejecución de los ensayos se lleva a cabo dentro de la semana señalada de análisis.

METODOS DE ENSAYO EMPLEADOS

NTC 33: Método para determinar la finura del cemento hidráulico por medio del aparato Blaine.

NTC 221: Método para determinar la densidad del cemento hidráulico.

NTC 4985: Método de ensayo para determinar la finura del cemento hidráulico por barrido de aire utilizando tamiz 45 um.

NTC 107: Método de ensayo para determinar la expansión en autoclave del cemento portland.

NTC 118: Método de ensayo para determinar el tiempo de fraguado del cemento hidráulico mediante aguja de Vicat.

NTC 224: Método para determinar el contenido de mortero de cemento hidráulico.

NTC 220: Determinación de la reistencia a la compresion de morteros de cemento hidráulico.

NTC 4927: Método de ensayo para medir la expansión del cemento en barras de mortero sumergidas en agua.

NTC 184: Métodos de análisis químico de los cementos hidráulicos.

NTC 110: Método para determinar la consistencia normal del cemento hidráulico.

NTC 5784: Método para determinar la fluidez de morteros de cemento hidráulico.

INFORME DE RESULTADOS

Composición Química - Oxidos (%)

FECHA	SiO2	Al2O3	Fe2O3	CaO	MgO	SO3	P.I.	Na2O	K2O	TiO2	P2O5	Cl	Suma
03/04/2026	29.0	4.7	2.8	48.0	0.6	1.9	11.5	0.08	0.83	0.33	0.25	0.04	100.3
07/04/2026	27.8	5.0	2.8	50.3	0.7	2.4	9.6	0.07	0.82	0.33	0.26	0.06	100.4
10/04/2026	29.3	4.8	2.7	47.3	0.7	1.9	11.8	0.08	0.80	0.33	0.24	0.05	100.3
Min	27.8	4.7	2.7	47.3	0.6	1.9	9.6	0.07	0.80	0.33	0.24	0.04	100.3
Max	29.3	5.0	2.8	50.3	0.7	2.4	11.8	0.08	0.83	0.33	0.26	0.06	100.4
Avg	28.7	4.8	2.8	48.5	0.7	2.1	11.0	0.07	0.82	0.33	0.25	0.05	100.3
Std	0.8	0.2	0.0	1.5	0.1	0.2	1.2	0.01	0.02	0.00	0.01	0.01	0.1

	Finura			Fraguado Vicat			Resistencias a la compresión				
FECHA	Blaine	Densidad	Ret. 45 um	Inicial	Final	C.Nor	1 día	3 días	7 días	28 días	A/C
	m2/kg	g/cm3	%	min	min	%	MPa	MPa	MPa	MPa	%
03/04/2026	567	2.89	6.50	144	225	28.6	6.4	12.1			53.2
07/04/2026	524	2.91	6.69	144	240	28.6	8.3	15.4			52.7
10/04/2026	572	2.87	5.95	145	250	28.6	6.9				52.7
Min	524	2.87	5.95	144	225	28.6	6.4	12.1			52.7
Max	572	2.91	6.69	145	250	28.6	8.3	15.4			53.2
Avg	554	2.89	6.38	144	238	28.6	7.2	13.8			52.9
Std	27	0.02	0.38	1	13	0.0	1.0	2.3	0.0	0.0	0.3

NTC 4927
Exp. Barras Mortero sumergidas en agua (%)

Holcim	NTC 121
N/D	Máximo 0.02%

NTC 224
Contenido de aire en mortero de cemento (%)

Holcim	NTC 121
N/D	Máximo 12 %

Comentarios

N/D.: Resultado de ensayo no disponible.

Fecha de reporte: 13.04.2026

Luis Alberto Quintana Granados
Coordinador Control Calidad
Holcim Colombia S.A.
Planta Nobsa

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S.A.
Carretera Central del Norte Km 27, Tuta, Colombia.
C.P - 150408 Tel/Fax: 7426350

N°: 10008131739965

CLIENTE	FACTURA	N° PEDIDO DEL CLIENTE	PEDIDO DEL CLIENTE	ESPECIFICACIÓN	PESO (Kg)
DISTRIBUIDORA EL PICASO ZESE	9007803893/40	PEDIDO 2605	4118276 6/000040	NTC 2289	3.000

COMPOSICION QUIMICA (%)

Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
110000167	BAR COR NTC 2289 1/2" 6m	1727556201	GR 60	0,28	1,00	0,015	0,020	0,16	0,22	0,15	0,21	0,04	0,002	0,003	0,48
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

PROPIEDADES MECÁNICAS

Ensayo según método NTC3353

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamient o	Masa Lineal	Doblado	Espacl	Altura	Separa	Ángulo
110000167	BAR COR NTC 2289 1/2" 6m	1727556201	4	491	654	1,33	14,8	0,972	BUENO	8,30	0,82	3,21	62
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	mín 550,0 MPa	mín 1,250	mín 14,00%	mín 0,934 kg/m		máx 8,90 mm	mín 0,51 mm	máx 4,90 mm	mín 45,0 deg

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto esta libre de radioactividad.

Diaco S.A. certifica que para la producción de nuestro acero, el porcentaje de contenido reciclado mínimo post-consumo corresponde al 90%.

RESPONSABLE DE CALIDAD

TUTA, 27.06.2026

PAOLA KATHERIN MATEUS

DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S.A.
Carretera Central del Norte Km 27, Tuta, Colombia.
C.P - 150408 Tel/Fax: 7426360

N°: 10008131566654

CLIENTE	FACTURA	N° PEDIDO DEL CLIENTE	PEDIDO DEL CLIENTE	ESPECIFICACIÓN	PESO (Kg)
DISTRIBUIDORA EL PICASO ZESE	9007659338/92	003 - 2025	11036523/000050	NTC 2289	1.000

COMPOSICION QUIMICA (%)

Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
110000139	BAR COR NTC 2289 3/4" 6m	1726804301	GR 60	0,24	1,02	0,016	0,038	0,15	0,22	0,18	0,34	0,07	0,003	0,002	0,46
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

PROPIEDADES MECÁNICAS / **CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS**

Ensayo según método NTC3353

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Separa	Ángulo
110000139	BAR COR NTC 2289 3/4" 6m	1726804301	6	481	626	1,30	16,8	2,155	OK	2,90	1,20	3,62	63
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	mín 550,0 MPa	mín 1,250	mín 12,00%	mín 2,101 kg/m		máx 3,330 mm	mín 0,97 mm	máx 7,30 mm	mín 45,0 deg

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

TUTA, 22.04.2025

PAOLA KATHERIN MATEUS

PCA GROUP

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

18. INFORME DE IMPREVISTOS

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

INFORME DE IMPREVISTOS

PERIODO DEL 25 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2026

CONTRATO 20260000183

OBRAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONCRETO PARA LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA LA GAITANA, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.

PCA GROUP SAS

SECRETARÍA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

2026

PCA GROUP
CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 4
1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA 5
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 5
1.1.1 DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN. 5
1.1.2 ANTECEDENTES. 6
1.2 ETAPA CONTRACTUAL 7
1.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 8
2 INFORMACIÓN CONTRACTUAL 8
2.1 PERSONAL PROFESIONAL. 8
3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 9
3.1 FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO DE OBRA 9
4 ASPECTOS FINANCIEROS 10
4.1 FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO 10
5 PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES DE IMPREVISTOS 11
6 REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 12
7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 13

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Ubicación geográfica de Cubará en el departamento de Boyacá.....5
Ilustración 2.. Margen derecha, Quebrada la Gaitana.....6

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Ficha técnica del contrato No. 20260000183. 9
Tabla 2. Presupuesto general. 10
Tabla 3. Presupuestos imprevistos. 11

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como finalidad documentar, analizar y justificar los imprevistos presentados durante la ejecución del contrato de obra pública No. 20260000183, cuyo objeto es **"OBRAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONCRETO PARA LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA LA GAITANA, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ"**, originados por condiciones climáticas no previstas inicialmente que afectaron el normal desarrollo de las actividades. En particular, las lluvias presentadas durante el proceso de fabricación de los hexápodos impidieron realizar oportunamente el desencofrado de los elementos de concreto, debido a la necesidad de garantizar el adecuado fraguado y evitar afectaciones en su calidad.

Como consecuencia de esta situación, se generó un retraso equivalente a un (1) día en la programación de la actividad de desencofrado, ocasionando la permanencia del personal operativo en obra sin poder ejecutar la labor programada, lo que representó un día adicional de costos de nómina no contemplados inicialmente.

El presente documento consolida los antecedentes, la descripción detallada de los eventos ocurridos, el análisis técnico de sus causas, la evaluación del impacto generado en la programación y los rendimientos de obra, así como la justificación técnica y contractual de los imprevistos, con el propósito de dejar constancia formal de su ocurrencia y de su incidencia en la ejecución del contrato.

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.1.1 DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN.

Es un municipio colombiano. Se sitúa en el extremo nororiental del departamento, en la región del Sarare, en la subregión del Piedemonte Llanero, Orinoquía colombiana, a una altitud de 357 metros sobre el nivel del mar. Se extiende sobre la planicie en la ribera del río Cobaría, (afluente del Río Arauca). El municipio limita al norte con Toledo (Norte de Santander) y el municipio de Páez, estado Apure (Venezuela); al occidente con Concepción, (Santander); al sur con Chiscas y Güicán en Boyacá y al oriente con Saravena en Arauca.

Cubará se comunica con los departamentos de Arauca a través de la Carretera de la Soberanía siendo su primera ciudad de encuentro Saravena, igualmente en sentido contrario esta vía comunica a los corregimientos de Gibraltar, Samoré, San Bernardo de Bata y los municipios de Toledo y Pamplona.

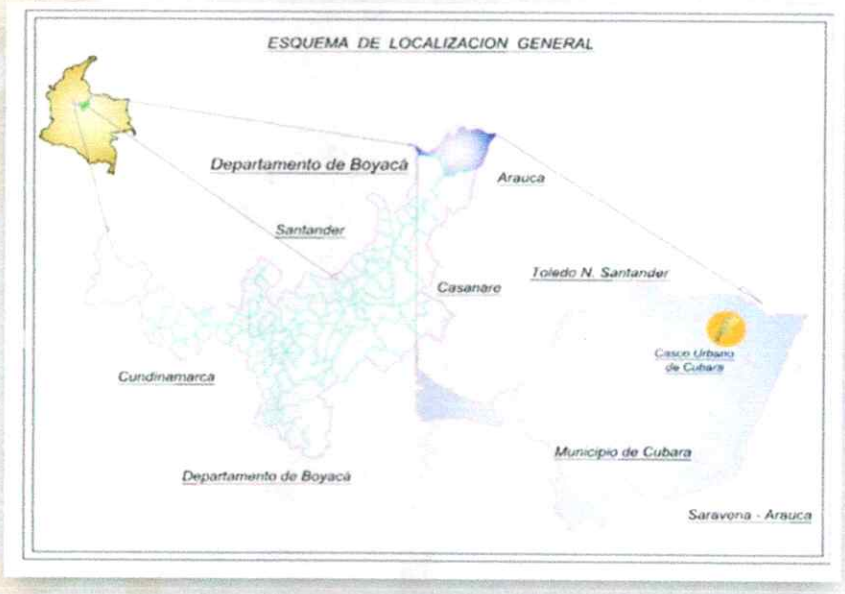


Ilustración 1. Ubicación geográfica de Cubará en el departamento de Boyacá

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

Las actividades se ejecutaron en la margen derecha de la quebrada la Gaitana, específicamente en las coordenadas (7.007952,-72.041465), jurisdicción del municipio de Cubará, departamento de Boyacá.



Ilustración 2.. Margen derecha, Quebrada la Gaitana.

1.1.2 ANTECEDENTES.

El municipio de Cubará, departamento de Boyacá, presenta condiciones de alta susceptibilidad a fenómenos hidrológicos debido a la presencia de numerosas fuentes hídricas y a la intensidad de las precipitaciones durante las temporadas de lluvia. Estas condiciones han propiciado procesos de erosión lateral, socavación, sedimentación y desbordamiento en diferentes cauces del municipio, generando afectaciones sobre la infraestructura, los predios rurales y la seguridad de las comunidades asentadas en sus áreas de influencia.

Como resultado de las visitas de inspección técnica realizadas por la Secretaría de Planeación y Obras Públicas del municipio de Cubará, se identificó un proceso activo de desviación del cauce, elevación del lecho, sedimentación y erosión lateral sobre la margen derecha de la quebrada La Gaitana, situación que incrementó el riesgo de desbordamientos y comprometió la estabilidad del jarillón existente, así como la protección de las viviendas, los predios productivos y la infraestructura ubicada en este sector.

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

Durante la inspección también se evidenció que el jarillón existente había sido construido de manera empírica con material extraído de la misma quebrada, presentando un comportamiento inestable frente a las crecientes, debido al constante arrastre del material por efecto de la corriente. Esta condición hacía insuficiente la protección de la ribera, por lo que se determinó la necesidad de implementar una solución de ingeniería que permitiera estabilizar la margen y reducir los procesos de erosión y socavación.

En atención a esta problemática y en el marco de las acciones contempladas en el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres analizó la situación presentada y recomendó la ejecución de obras de protección ribereña mediante la instalación de hexápodos de concreto, como medida para disminuir el riesgo asociado a las crecientes de la quebrada y garantizar la estabilidad de la margen intervenida.

En consecuencia, el municipio de Cubará adelantó el proceso contractual para la ejecución del proyecto denominado **"OBRAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONCRETO PARA LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA LA GAITANA, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ"**, cuyo propósito fue ejecutar las obras necesarias para fortalecer la protección de la ribera, disipar la energía del flujo, controlar los procesos erosivos y contribuir a la reducción del riesgo de inundaciones, garantizando la seguridad de la población, la conservación de la infraestructura existente y la estabilidad del cauce.

1.2 ETAPA CONTRACTUAL.

En el municipio de Cubará, Boyacá, a los veinticinco (25) días del mes de mayo de 2026, se reunieron en las instalaciones de la alcaldía de Cubará, Boyacá, **PCA GROUP SAS** con **NIT No. 901.490.923-2** representada legalmente por **XIMENA DAMARIS MORA** identificada con cedula de ciudadanía No. 1.094.276.314 de pamplona, Norte de Santander, y que los sucesivos se denominará **EL CONTRATISTA**, y **JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA** secretario de planeación y obras públicas, en su condición de **SUPERVISOR** del contrato, con el fin de firmar la presente **ACTA DE INICIO** del contrato No. **20260000183.**

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

1.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las actividades contempladas para el desarrollo del proyecto denominado "OBRAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONCRETO PARA LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA LA GAITANA, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ" son las mencionadas a continuación

- Inicialmente se efectuó la localización y replanteo del área de intervención, verificando las condiciones del terreno y definiendo la ubicación de los elementos de protección de acuerdo con los diseños y especificaciones técnicas del proyecto. Posteriormente, se ejecutaron las actividades de adecuación del sitio mediante movimiento de tierras con maquinaria, permitiendo la conformación de la superficie donde serían instalados los hexápodos.

- De manera simultánea se realizaron el suministro, transporte e instalación de los hexápodos de concreto reforzado de 4.000 PSI, garantizando su correcta disposición sobre la margen derecha de la quebrada La Gaitana, con el fin de conformar una estructura de protección capaz de disipar la energía del flujo, reducir los procesos de erosión y socavación, y estabilizar la ribera.

- Durante toda la ejecución del contrato se llevaron a cabo actividades permanentes de control de calidad, supervisión técnica, seguimiento administrativo, control de cantidades de obra y verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, así como de las disposiciones ambientales y de seguridad y salud en el trabajo aplicables al proyecto.

2 INFORMACIÓN CONTRACTUAL

2.1 PERSONAL PROFESIONAL.



CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

3.1 FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO DE OBRA

Tabla 1 Ficha técnica del contrato No. 20260000183.

OBJETO:	OBRAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONCRETO PARA LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA LA GAITANA, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.
VALOR CONTRATO	**DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS ($ 259.181.150,00) M/CTE** equivalente a **148,0270 SMLMV.**
VALOR ANTICIPO:	SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS ($77.754.345,00) M/CTE.
VALOR IMPREVISTO (2%)	TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS CON NOVENTA CENTAVOS ($ 3.897.460,90) M/CTE.
CONTRATISTA	**PCA Group SAS** NIT. No. 901490923-2 **R/L: XIMENA DAMARIS MORA.** C.C. No. 1.094.276.314 de pamplona N.S.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.
SUPERVISOR	**JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA.** SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	2026000206 de 06/04/2026.
REGISTRO PRESUPUESTAL:	2026000360 de 20/05/2026.
PLAZO	UN (01) MES.
ACTA DE INICIO	VEINTICINCO (25) DE MAYO DE 2026.
FECHA DE TERMINACION:	VEINTICUATRO (24) DE JUNIO DE 2026

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

4 ASPECTOS FINANCIEROS

4.1 FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO

El contrato de obra 20260000183 cuyo objeto es "OBRAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONCRETO PARA LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA LA GAITANA, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ" el día veinte (20) de mayo del año 2026 se suscribe contrato en mención con la empresa **PCA GROUP SAS** con **NIT No. 901.490.923-2** representada legalmente por **XIMENA DAMARIS MORA** identificada con cedula de ciudadanía No. 1.094.276.314 de pamplona, Norte de Santander por un valor de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS ($ 259.181.150,00) M/CTE equivalente a 148,0270 SMLMV. a continuación, se presenta el presupuesto desglosado.

Tabla 2. Presupuesto general.

CONDICIONES INICIALES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,0	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS**				
1,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS EN CONCRETO REFORZADO DE 4000 PSI H=1,8M	UND	85,00	$ 3.049.190,00	$ 259.181.150,00
				Subtotal	**$ 259.181.150,00**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 194.873.045,11**
				ADMINISTRACION 24%	**$ 46.769.530,83**
				IMPREVISTO 2%	**$ 3.897.460,90**
				UTILIDAD 7%	**$ 13.641.113,16**
				TOTAL COSTO INDIRECTO	**$ 64.308.104,89**
				COSTO TOTAL	**$ 259.181.150,00**

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

5 PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES DE IMPREVISTOS

Tabla 3. Presupuestos imprevistos.

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**GASTOS EN NOMINA POR LLUVIAS**				
1.1	AYUDANTES DE CONSTRUCCION (10)	HR	8	$ 174.117,94	$ 1.392.943,50
1.2	OFICIAL DE CONTRUCCION (01)	HR	8	$ 23.382,94	$ 187.063,50
1.3	EXCAVADORA (01)	HR	8	$ 305.864,00	$ 2.446.912,00
TOTAL					$ 4.026.919,00

El presupuesto de las cantidades a ejecutar es de **CUATRO MILLONES VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS COLOMBIANOS ($4.026.919,00). M/CTE.**

- **Aclaración sobre el valor del imprevisto**

De acuerdo con el presupuesto contractual, el rubro destinado para imprevistos corresponde al 2% del valor del contrato, equivalente a TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS CON NOVENTA CENTAVOS ($3.897.460,90) M/CTE.

Como resultado de las condiciones climáticas presentadas durante la ejecución de la obra, el costo real de los imprevistos ascendió a CUATRO MILLONES VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS ($4.026.919,00) M/CTE, presentándose un excedente de CIENTO VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON DIEZ CENTAVOS ($129.458,10) M/CTE.

Este valor excedente no será objeto de reconocimiento por parte de la entidad contratante y será asumido en su totalidad por el contratista, como parte de los riesgos propios de la ejecución del contrato, sin que ello implique modificación del valor contractual ni genere costos adicionales para la entidad.

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

6 REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

Las actividades que se mencionan en el presente informe y se describen a continuación hacen parte de actividades complementarias para la correcta ejecución de la obra y garantizar estabilidad de la obra:

1. **GASTOS EN NOMINA POR LLUVIAS**	UNIDAD: HR





Durante la ejecución del contrato se presentaron lluvias de alta intensidad durante dos (2) jornadas en horas de la tarde, las cuales obligaron a suspender las actividades programadas por razones de seguridad y para garantizar la calidad del proceso de fabricación y desencofrado de los hexápodos. Estas interrupciones ocasionaron un total de ocho (8) horas de improductividad, correspondientes a la permanencia del personal operativo (10 ayudantes y 1 oficial de construcción) y de la excavadora en obra sin posibilidad de ejecutar las actividades previstas.

Como consecuencia de este imprevisto climático se generaron costos adicionales por concepto de nómina y disponibilidad de maquinaria por un valor de CUATRO MILLONES VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE ($4.026.919,00), los cuales no pudieron preverse al momento de la programación de la obra y obedecen exclusivamente a las condiciones climáticas presentadas durante la ejecución del contrato.

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El presente informe evidencia que, durante la ejecución del Contrato de Obra No. 20260000183, se presentaron condiciones climáticas adversas no previsibles que afectaron el desarrollo normal de las actividades programadas, ocasionando la suspensión temporal de las labores en dos jornadas durante horas de la tarde.

- Como consecuencia de estas precipitaciones se generó un total de ocho (8) horas de improductividad, correspondientes a la permanencia del personal operativo y de la excavadora, sin que fuera posible ejecutar las actividades previstas, principalmente las relacionadas con el proceso de fabricación y desencofrado de los hexápodos.

- Los costos derivados de este imprevisto ascienden a la suma de **CUATRO MILLONES VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS ($4.026.919,00) M/CTE,** valor que corresponde exclusivamente a la disponibilidad de personal y maquinaria durante el tiempo de suspensión ocasionado por las lluvias.

- Las condiciones descritas ocasionaron tiempos improductivos en la mano de obra y en los equipos, pese a que el personal permaneció disponible en obra, bajo la coordinación del ingeniero residente, afectando los rendimientos previstos y la programación inicialmente establecida, sin que dichas pérdidas sean atribuibles al contratista.

- Las actividades adicionales ejecutadas y los tiempos improductivos registrados se encuentran técnica y contractualmente justificados como imprevistos, al derivarse de factores externos no controlables, siendo necesarias para garantizar la seguridad del personal, la estabilidad de las estructuras en ejecución y el correcto funcionamiento hidráulico del sistema de captación.

- En consecuencia, se concluye que los imprevistos presentados tuvieron un impacto directo en el desarrollo normal de la obra, por lo cual resulta procedente su reconocimiento dentro del marco contractual, de conformidad con la normativa vigente y las condiciones pactadas en el contrato.

- La evidencia fotográfica y los registros en campo permiten demostrar que la suspensión de actividades obedeció a causas externas, imprevisibles y no atribuibles al contratista.

RESIDENTE DE OBRA
ING BRAYAN MICHEL PARRADO LIZCANO
M.P. No. 54202-328201 NTS

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

19. INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

PCA GROUP

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PERIODO DEL 15 DE JUNIO DE 2026 AL 24 DE JUNIO DE 2026 CONTRATO DE OBRA N°. 20260000183

OBJETO: " OBRAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONCRETO PARA LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA LA GAITANA, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ"

CONTRATISTA DE OBRA: PCA GROUP S.A.S
R/L. XIMENA DAMARIS MORA BUITRAGO
NIT: 901.490.923-2

SUPERVISOR: SECRETRARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CUBARA

Año: 2026

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

INTRODUCCIÓN

Las actividades relacionadas con la ejecución de obras de infraestructura representan importantes desafíos en materia de seguridad, salud y protección del entorno, por lo que resulta indispensable gestionarlas bajo los lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). La implementación de este sistema permite garantizar el cumplimiento de la normatividad laboral vigente y de los demás requisitos aplicables, fortaleciendo la identificación, evaluación y control de los riesgos laborales y ambientales.

Durante el desarrollo de los proyectos de infraestructura es posible que se presenten diversos impactos sobre el entorno, tanto favorables como adversos. Estos pueden incidir en los componentes físico, biótico y social, afectando recursos como el suelo y el agua, así como la flora, la fauna, las comunidades aledañas, las actividades económicas y la prestación de servicios. Dichos efectos pueden originarse por la operación de maquinaria y vehículos, la instalación de áreas temporales de trabajo, la captación de recursos hídricos, la generación y manejo de residuos, y el transporte de materiales e insumos.

En PCA GROUP S.A.S. mantenemos un firme compromiso con la protección de la vida, la salud y el bienestar de nuestros colaboradores. En este sentido, el presente informe de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) tiene como propósito presentar las medidas, acciones y controles implementados para prevenir riesgos, promover condiciones de trabajo seguras y garantizar el desarrollo responsable de nuestras actividades durante la ejecución de las obras.

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

OBJETIVOS

Coordinar, controlar y fortalecer la implementación de las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), así como las acciones orientadas a la protección del medio ambiente durante la ejecución del proyecto **"OBRAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONCRETO PARA LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA LA GAITANA, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ"**, garantizando el cumplimiento de la política de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Plan Anual de Trabajo y la normatividad legal vigente.

Para el desarrollo del proyecto se establecen los siguientes objetivos específicos:

- Garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables para todo el personal vinculado a la ejecución de las actividades del proyecto.
- Dar cumplimiento a la legislación vigente y a los demás requisitos legales aplicables en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como a las disposiciones ambientales correspondientes.
- Identificar los peligros, valorar los riesgos e implementar los controles necesarios para prevenir incidentes, accidentes de trabajo y afectaciones al medio ambiente.
- Prevenir y mitigar los impactos que puedan generarse sobre el entorno físico, biótico y social como consecuencia de las actividades constructivas.
- Promover una cultura de prevención mediante la ejecución de programas de capacitación, sensibilización y seguimiento que fortalezcan el bienestar, la seguridad y la salud de los trabajadores, en concordancia con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

PCA GROUP

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

✓ **Exámenes médicos preocupacionales:**

Los exámenes médicos ocupacionales tienen como finalidad valorar las condiciones de salud física, mental y social de los trabajadores, con el propósito de establecer su aptitud para desempeñar las funciones del cargo asignado. Esta evaluación permite verificar que el desarrollo de las actividades laborales no represente un riesgo para su integridad ni para la de otras personas, considerando las exigencias propias del cargo y los factores de riesgo a los que estarán expuestos durante la ejecución de sus labores.

AFILIACIONES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Con el propósito de cumplir con las obligaciones legales y los requisitos establecidos en el contrato, **PCA GROUP S.A.S.** garantiza la afiliación de todo el personal al Sistema de Seguridad Social Integral, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y la normatividad vigente. En este sentido, los trabajadores son afiliados a la Entidad Promotora de Salud (EPS), Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y Caja de Compensación Familiar, asegurando el acceso a la protección social y a las prestaciones correspondientes para el adecuado desarrollo de sus funciones.

SEGURIDAD SOCIAL REPRESENTANTE LEGAL PCA GROUP SAS

SEGURIDAD SOCIAL MAYO 2026								
ITEM	CEDULA	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	No. PLANILLA	ARL	AFP	EPS	No. PLANILLA
1	1.094.276.314	XIMENA DAMARIS MORA BUITRAGO	R/L	37818819	POSITIVA	PORVENIR	NUEVA EPS	37818819

SEGURIDAD SOCIAL JUNIO 2026								
ITEM	CEDULA	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	No. PLANILLA	ARL	AFP	EPS	No. PLANILLA
1	1.094.276.314	XIMENA DAMARIS MORA BUITRAGO	R/L	37852605	POSITIVA	PORVENIR	NUEVA EPS	37852605

SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO MES MAYO DE 2026

SEGURIDAD SOCIAL MAYO 2026								
ITEM	CEDULA	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	No. PLANILLA	ARL	AFP	EPS	No. PLANILLA
1	1.094.266.290	BRAYAN MICHEL PARRADO LIZCANO	RESIDENTE DE OBRA	37818709	POSITIVA	PORVENIR	NUEVA EPS	37818709

PCA GROUP

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO MES JUNIO DE 2026

ITEM	NOMBRES	APELLIDOS	CEDULA	CARGO	NUMERO DE PLANILLA	ARL	AFP	EPS	N° DE PLANILLA
1	BRAYAN MICHEL	PARRADO LIZCANO	1.094.266.290	RESIDENTE DE OBRA	37818773	POSITIVA	PORVENIR	NUEVA EPS	37818773
2	XIMENA DAMARIS	MORA BUITRAGO	1.094.276.314	RESIDENTE AMBIENTAL	37818773	POSITIVA	PORVENIR	NUEVA EPS	37818773
3	LUIS ERMINIO	RINCON ARIAS	9466646	OFICIAL DE OBRA	37818773	POSITIVA	PORVENIR	NUEVA EPS	37818773
4	JOSUE	LOPEZ CHAPETA	9466912	OBRERO	37818773	POSITIVA	COLPENSIONES	COOSALUD	37818773
5	PATIÑO CALDERON	PABLO EMILIO	1007545405	OBRERO	37818773	POSITIVA	PORVENIR	NUEVA EPS	37818773
6	VERA SOLANO	ALIRIO	9466531	OBRERO	37818773	POSITIVA	PROTECCION	COOSALUD	37818773
7	GAMBOA CAMARGO	JULIO CESAR	91541508	OBRERO	37818773	POSITIVA	PORVENIR	NUEVA EPS	37818773
8	BARAJAS SILVA	LUIS ADOLFO	9467221	OBRERO	37818773	POSITIVA	PORVENIR	COOSALUD	37818773

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

9	QUIÑONEZ VILLAMOZAR	ENOC	9467022	OBRERO	37818773	POSITIVA	COLPENSIONES	COOSALUD	37818773
10	VERA	JESUS ANTONIO	5492350	OBRERO	37818773	POSITIVA	PROTECCION	NUEVA EPS	37818773
11	MENDEZ RAMIREZ	DANIEL ADULFO	1049394576	OBRERO	37818773	POSITIVA	PORVENIR	COOSALUD	37818773
12	JEREZ ARIAS	FREDY	9467072	OBRERO	37818773	POSITIVA	PROTECCION	NUEVA EPS	37818773
13	SANTAFE PEDRAZA	JUAN	1049394930	OBRERO	37818773	POSITIVA	PORVENIR	COOSALUD	37818773

CHARLAS DE SEGURIDAD LABORAL

Con el propósito de fortalecer la cultura de prevención y promover condiciones de trabajo seguras, el profesional responsable del área de HSEQ desarrolló jornadas de capacitación y sensibilización dirigidas al personal del proyecto, abordando diferentes aspectos relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo.

A continuación, se presentan los temas tratados durante las actividades de formación y capacitación realizadas.

✓ USO ADECUADO E IMPORTANCIA DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP):

Durante esta capacitación se brindó orientación al personal sobre la correcta utilización, cuidado y conservación de los elementos de protección personal, resaltando su importancia como medida fundamental para controlar los riesgos presentes en las actividades de la obra. Así mismo, se enfatizó que el uso permanente y adecuado de los EPP contribuye a la prevención de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, garantizando una mayor protección para los trabajadores durante el desarrollo de sus funciones.

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com



✓ **PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS LABORALES:** Se desarrolló una jornada de capacitación enfocada en las actividades ejecutadas durante la obra, en la cual se socializaron los peligros y factores de riesgo identificados en las diferentes áreas y frentes de trabajo. Igualmente, se presentaron las medidas de prevención y control implementadas por el proyecto, orientadas a reducir la probabilidad de incidentes, accidentes de trabajo y afectaciones a la salud de los trabajadores durante la ejecución de sus labores.



CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

✓ **ORDEN Y ASEO EN EL ÁREA DE TRABAJO:** Se llevó a cabo una capacitación orientada a fortalecer las buenas prácticas de orden y limpieza en los frentes de trabajo, destacando su importancia para prevenir accidentes, facilitar la movilidad del personal y mantener condiciones seguras durante la ejecución de las actividades. Asimismo, se promovió la adecuada disposición de materiales, herramientas, equipos y residuos, con el fin de reducir la ocurrencia de actos y condiciones inseguras y contribuir al cumplimiento de los estándares establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).



✓ **SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO:** Se realizó una capacitación dirigida al personal sobre la importancia de la señalización preventiva y la adecuada demarcación de las áreas de trabajo, con el propósito de controlar el acceso a zonas de riesgo, orientar la circulación segura de trabajadores, maquinaria y vehículos, y prevenir la ocurrencia de incidentes y accidentes laborales. Durante la jornada se reforzó el cumplimiento de la señalización temporal de obra, el respeto por las áreas restringidas y la obligación de mantener visibles y en buen estado los dispositivos de seguridad implementados en el proyecto.

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com



✓ **PREVENCIÓN DEL RIESGO POR INUNDACIONES Y CRECIENTES SÚBITAS:** Se desarrolló una capacitación dirigida al personal sobre los riesgos asociados a la ejecución de actividades en zonas cercanas a cuerpos de agua, haciendo énfasis en la identificación de condiciones que puedan generar inundaciones o crecientes súbitas. Durante la jornada se socializaron las medidas preventivas, los procedimientos de respuesta ante emergencias, las rutas de evacuación y los mecanismos de comunicación establecidos para garantizar una reacción oportuna, salvaguardando la integridad de los trabajadores, los equipos y el entorno durante el desarrollo de las actividades.



PCA GROUP

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

GESTION AMBIENTAL

Con el propósito de prevenir, controlar y mitigar los impactos ambientales derivados de la ejecución del proyecto **"Obras para la prevención y control de inundaciones mediante el suministro e instalación de hexápodos de concreto para la protección de la margen derecha de la quebrada La Gaitana, municipio de Cubará, Boyacá"**, **PCA GROUP S.A.S.** implementó una serie de acciones orientadas a la protección de los recursos naturales y al cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.

Como parte de la gestión ambiental desarrollada, se promovieron actividades de sensibilización y capacitación dirigidas al personal del proyecto, fortaleciendo la cultura de responsabilidad ambiental y el cumplimiento de las buenas prácticas durante la ejecución de las obras. Estas acciones estuvieron enfocadas en la protección del recurso hídrico, el control de emisiones de material particulado y la conservación de la flora y la fauna presentes en el área de influencia del proyecto.

A través de estas actividades se buscó generar conciencia sobre la importancia de prevenir la contaminación de las fuentes hídricas, implementar medidas para reducir la generación de polvo y emisiones asociadas a la operación de maquinaria y al transporte de materiales, así como proteger los ecosistemas y la biodiversidad, evitando intervenciones innecesarias fuera de las áreas autorizadas para la ejecución de la obra.

A continuación, se presentan las principales actividades de capacitación y sensibilización ambiental desarrolladas durante la ejecución del proyecto, las cuales evidencian el compromiso de **PCA GROUP S.A.S.** con la protección del medio ambiente y la ejecución responsable y sostenible de sus actividades.

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com


✓ **PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO:** Con el fin de prevenir la contaminación de la quebrada La Gaitana y de los cuerpos de agua presentes en el área de influencia del proyecto, se desarrolló una jornada de capacitación orientada a sensibilizar al personal sobre la importancia de la conservación del recurso hídrico durante la ejecución de las actividades constructivas. En esta charla se socializaron las medidas de manejo ambiental implementadas para evitar vertimientos, controlar posibles derrames de combustibles, aceites y lubricantes, realizar una adecuada disposición de residuos y restringir cualquier actividad que pudiera afectar la calidad del agua. Asimismo, se resaltó la responsabilidad de todos los trabajadores en el cumplimiento de las buenas prácticas ambientales, con el propósito de minimizar los impactos sobre el ecosistema y garantizar el desarrollo sostenible de la obra.



✓ **CONTROL DE EMISIONES DE MATERIAL PARTICULADO:** Se realizó una capacitación dirigida al personal del proyecto con el objetivo de sensibilizar sobre la importancia de prevenir y controlar la generación de material particulado durante el desarrollo de las actividades constructivas. Durante la jornada se explicaron las principales fuentes de generación de polvo asociadas a la operación de maquinaria, tránsito de vehículos, transporte y manipulación de materiales.

Asimismo, se socializaron las medidas de manejo ambiental aplicables, tales como el adecuado mantenimiento de equipos y maquinaria, la conducción responsable en las zonas de trabajo, el control de la velocidad de los vehículos, la disposición adecuada de materiales y la implementación de acciones preventivas cuando las condiciones del terreno puedan favorecer la dispersión de partículas. Estas medidas buscan reducir las afectaciones al entorno, proteger la calidad del aire y contribuir al bienestar de los trabajadores y comunidades cercanas al área de intervención.

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

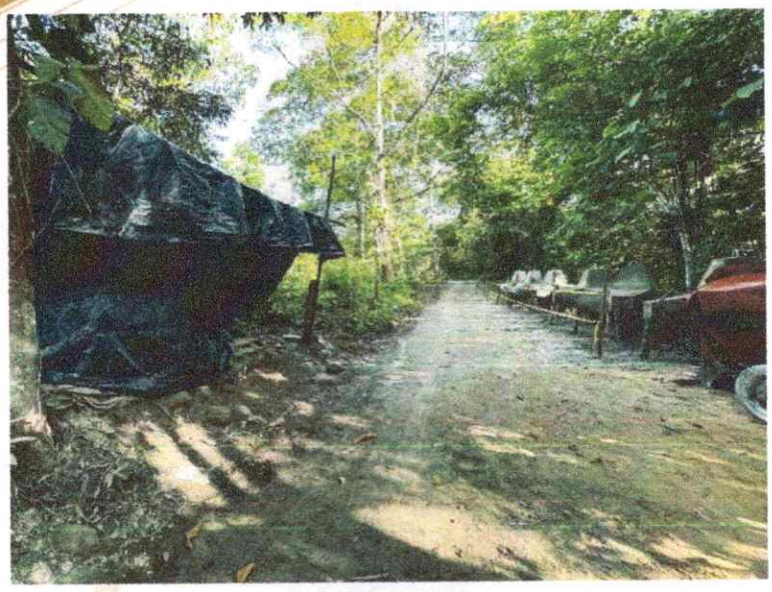

✓ **PROTECCIÓN DE LA FLORA Y FAUNA:** Se desarrolló una capacitación dirigida al personal del proyecto con el propósito de fortalecer la conciencia ambiental y promover prácticas responsables frente a la protección de los recursos naturales presentes en el área de influencia de la obra. Durante la jornada se resaltó la importancia de conservar la cobertura vegetal, evitar afectaciones innecesarias a la flora existente y prevenir cualquier alteración sobre las especies de fauna que puedan encontrarse en el entorno.

Asimismo, se socializaron las medidas preventivas establecidas para minimizar los impactos ambientales asociados a las actividades constructivas, tales como evitar la intervención de áreas no autorizadas, prohibir la captura, caza o manipulación de especies, mantener una adecuada disposición de residuos y reportar oportunamente la presencia de fauna silvestre en las zonas de trabajo. Estas acciones buscan garantizar el desarrollo de la obra bajo criterios de responsabilidad ambiental y conservación del ecosistema.



CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

✓ **PREVENCIÓN Y CONTROL DE DERRAMES DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES:** Se realizó una capacitación dirigida al personal del proyecto con el propósito de sensibilizar sobre los riesgos ambientales asociados al manejo, abastecimiento y operación de maquinaria, equipos y vehículos utilizados durante la ejecución de las actividades constructivas.

Durante la jornada se socializaron las medidas preventivas para evitar la contaminación del suelo y del recurso hídrico por posibles derrames de combustibles, aceites o lubricantes, haciendo énfasis en la inspección periódica de los equipos, la manipulación adecuada de sustancias, la atención oportuna ante fugas y el reporte inmediato de cualquier incidente ambiental.

Asimismo, se destacó la importancia de mantener prácticas responsables durante la operación de maquinaria, con el fin de minimizar impactos sobre el entorno y garantizar el desarrollo de las actividades bajo criterios de protección ambiental y cumplimiento de los estándares establecidos en el proyecto.



CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

CONCLUSIONES

- ✓ La implementación de las actividades contempladas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) permitió fortalecer las condiciones de seguridad durante la ejecución del proyecto, promoviendo la prevención de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
- ✓ El desarrollo de capacitaciones, charlas de sensibilización e inspecciones periódicas contribuyó a fortalecer la cultura de autocuidado entre los trabajadores, mejorando el cumplimiento de los procedimientos de seguridad y el uso adecuado de los elementos de protección personal.
- ✓ El cumplimiento de los requisitos legales en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, incluyendo la afiliación del personal al Sistema de Seguridad Social Integral, la realización de exámenes médicos preocupacionales y la implementación de medidas de control, evidenció el compromiso de **PCA GROUP S.A.S.** con la protección de sus colaboradores y el cumplimiento de la normatividad vigente.
- ✓ Las medidas preventivas implementadas para controlar los riesgos propios de la obra, así como las acciones orientadas a la protección del medio ambiente y la prevención de emergencias, permitieron desarrollar las actividades de manera organizada, minimizando los impactos sobre el entorno y favoreciendo un ambiente de trabajo seguro.
- ✓ En términos generales, las acciones desarrolladas durante la ejecución del proyecto reflejan el compromiso de **PCA GROUP S.A.S.** con el mejoramiento continuo, la gestión integral de los riesgos y la protección de la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, garantizando el cumplimiento de los estándares establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

- ✓ Durante la ejecución del proyecto se desarrollaron actividades de sensibilización y capacitación ambiental orientadas a fortalecer la responsabilidad del personal frente a la protección de los recursos naturales y la prevención de impactos asociados a las actividades constructivas. Las acciones implementadas estuvieron enfocadas en la protección del recurso hídrico, mediante la prevención de posibles afectaciones a la quebrada La Gaitana; el control de emisiones de material particulado generado por la operación de maquinaria y transporte de materiales; la conservación de la flora y fauna presente en el área de influencia del proyecto; y la prevención de derrames de combustibles y lubricantes que pudieran ocasionar alteraciones sobre el suelo o las fuentes hídricas.

  Asimismo, se promovieron buenas prácticas ambientales entre los trabajadores, resaltando la importancia del cumplimiento de las medidas de manejo establecidas, el uso responsable de los recursos naturales y la ejecución de las actividades bajo criterios de prevención, control y mitigación de impactos ambientales.

PCA GROUP

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

De esta manera **PCA GROUP S.A.S.** reafirma su compromiso con el desarrollo de obras responsables y sostenibles, garantizando la protección del entorno y el cumplimiento de los lineamientos ambientales aplicables al proyecto.

XIMENA DAMARIS MORA BUITRAGO
ING. AMBIENTAL ESP. HSEQ
MAT.121021-0749217 NTS
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nº 20260000183

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

ANEXOS

PCA GROUP

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE OBRA MES DE MAYO DE 2026.

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 37818709
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-06-30

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES PCA GROUP SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901490923	D.V.	2	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CL 25B 20A 04 B MODELO	DEPARTAMENTO	ARAUCA	MUNICIPIO	SARAVENA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	SASPCAGROUP@GMAIL.COM	TELÉFONO	3177016684
FAX	0	SUCURSAL	0001	NOMBRE SUCURSAL	CONTRATO
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1094276314	PRIMER APELLIDO	MORA	SEGUNDO APELLIDO	BUITRAGO
PRIMER NOMBRE	XIMENA	SEGUNDO NOMBRE	DAMARIS		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 05	Año: 2026	Mes: 06	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$600.000		37818709

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1094266290	01	No	No	No	15	223	5422001	Fijo	PARRADO LIZCANO BRAYAN MICHEL	$3.000.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1094266290	X	2026-05-25																											0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1094266290	PORVENIR	6	$600.000	0.1600000	$96.000	$0	$0	$96.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1094266290	NUEVA E.P.S. S.A.	6	$600.000	0.0400000	$24.000	$0	0	$0	0	$0	6	$600.000	90 14 90 92 3	0.0696000	$41.800

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1094266290	COMFABOY	6	$600.000	0.0400000	$24.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 05											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	1	$96.000	$0	$0	$0	$0	25	$1.800	$0	$0	$97.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$24.000	$0	0	$0	0	$0	$24.000	25	$500	$0	$24.500	$0	0	$0	$0	$24.500	$0	$0	$24.500

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA												
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	1	$41.800	0	$0	$0	$41.800	25	$800	$42.600	0	$0	$426	$42.600

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFABOY	1	$24.000	25	$500	$24.500
SENA	0	$0	25	$0	$0
ICBF	0	$0	25	$0	$0
ESAP	0	$0	25	$0	$0
MinEdu	0	$0	25	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$24.500
PENSIONES	1	$97.800
RIESGOS PROFESIONALES	1	$42.600

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$24.500
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$189.400

PCA GROUP

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE OBRA MES DE JUNIO DE 2026.

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 37818773
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-06-30

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES PCA GROUP SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901490923	D.V.	2	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CL 25B 20A 04 B MODELO	DEPARTAMENTO	ARAUCA	MUNICIPIO	SARAVENA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	SASPCAGROUP@GMAIL.COM	TELÉFONO	3177016684
FAX	0	SUCURSAL	0001	NOMBRE SUCURSAL	CONTRATO
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1094276314	PRIMER APELLIDO	MORA	SEGUNDO APELLIDO	BUITRAGO
PRIMER NOMBRE	XIMENA	SEGUNDO NOMBRE	DAMARIS		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 06	Año: 2026	Mes: 07	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
13		$11.746.450		37818773

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-9467221	01	No	No	No	15	223	5422001	Fijo	BARAJAS SILVA LUIS ADOLFO	$2.142.990
CC-91541508	01	No	No	No	15	223	5422001	Fijo	GAMBOA CAMARGO JULIO CESAR	$2.142.990
CC-9467072	01	No	No	No	15	223	5422001	Fijo	JEREZ ARIAS FREDY	$2.142.990
CC-9466912	01	No	No	No	15	223	5422001	Fijo	LOPEZ CHAPETA JOSUE	$2.142.990
CC-1049394576	01	No	No	No	15	223	5429001	Fijo	MENDEZ RAMIREZ DANIEL ADULFO	$2.142.990
CC-1094276314	01	No	No	No	15	223	5422001	Fijo	MORA BUITRAGO XIMENA DAMARIS	$2.250.000
CC-1094266290	01	No	No	No	15	223	5422001	Fijo	PARRADO LIZCANO BRAYAN MICHEL	$3.000.000
CC-1007545405	01	No	No	No	15	223	5422001	Fijo	PATIÑO CALDERON PABLO EMILIO	$2.142.990
CC-9467022	01	No	No	No	15	223	5422001	Fijo	QUIÑONEZ VILLAMIZAR ENOC	$2.142.990
CC-9466646	01	No	No	No	15	223	5422001	Fijo	RINCON ARIAS LUIS ERMINIO	$2.877.900
CC-1049394930	01	No	No	No	15	223	5422001	Fijo	SANTAFE PEDRAZA JUAN	$2.142.990
CC-5492350	01	No	No	No	15	223	5422001	Fijo	VERA JESUS ANTONIO	$2.142.990
CC-9466531	01	No	No	No	15	223	5422001	Fijo	VERA SOLANO ALIRIO	$2.142.990

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 9467221	X	2026-06-15	X	2026-06-24																									0		
CC - 91541508	X	2026-06-15	X	2026-06-24																									0		
CC - 9467072	X	2026-06-15	X	2026-06-24																									0		
CC - 9466912	X	2026-06-15	X	2026-06-24																									0		
CC - 1049394576	X	2026-06-15	X	2026-06-24																									0		
CC - 1094276314	X	2026-06-15	X	2026-06-24																									0		
CC - 1094266290			X	2026-06-24																									0		
CC - 1007545405	X	2026-06-15	X	2026-06-24																									0		
CC - 9467022	X	2026-06-15	X	2026-06-24																									0		
CC - 9466646	X	2026-06-15	X	2026-06-24																									0		
CC - 1049394930	X	2026-06-15	X	2026-06-24																									0		
CC - 5492350	X	2026-06-15	X	2026-06-24																									0		
CC - 9466531	X	2026-06-15	X	2026-06-24																									0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 9467221	PORVENIR	10	$714.330	0.1600000	$114.300	$0	$0	$114.300	$0	$0	$0
CC - 91541508	PORVENIR	10	$714.330	0.1600000	$114.300	$0	$0	$114.300	$0	$0	$0
CC - 9467072	PROTECCION	10	$714.330	0.1600000	$114.300	$0	$0	$114.300	$0	$0	$0
CC - 9466912	COLPENSIONES	10	$714.330	0.1600000	$114.300	$0	$0	$114.300	$0	$0	$0
CC - 1049394576	PORVENIR	10	$714.330	0.1600000	$114.300	$0	$0	$114.300	$0	$0	$0
CC - 1094276314	PORVENIR	10	$750.000	0.1600000	$120.000	$0	$0	$120.000	$0	$0	$0
CC - 1094266290	PORVENIR	24	$2.400.000	0.1600000	$384.000	$0	$0	$384.000	$0	$0	$0
CC - 1007545405	PORVENIR	10	$714.330	0.1600000	$114.300	$0	$0	$114.300	$0	$0	$0
CC - 9467022	COLPENSIONES	10	$714.330	0.1600000	$114.300	$0	$0	$114.300	$0	$0	$0
CC - 9466646	PORVENIR	10	$959.300	0.1600000	$153.500	$0	$0	$153.500	$0	$0	$0
CC - 1049394930	PORVENIR	10	$714.330	0.1600000	$114.300	$0	$0	$114.300	$0	$0	$0
CC - 5492350	PROTECCION	10	$714.330	0.1600000	$114.300	$0	$0	$114.300	$0	$0	$0
CC - 9466531	PROTECCION	10	$714.330	0.1600000	$114.300	$0	$0	$114.300	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 9467221	EPS-S COOSALUD	10	$714.330	0.0400000	$28.600	$0	0	$0	0	$0	10	$714.330	90149092 3	0.0696000	$49.800
CC - 91541508	NUEVA E.P.S. S.A.	10	$714.330	0.0400000	$28.600	$0	0	$0	0	$0	10	$714.330	90149092 3	0.0696000	$49.800
CC - 9467072	NUEVA E.P.S. S.A.	10	$714.330	0.0400000	$28.600	$0	0	$0	0	$0	10	$714.330	90149092 3	0.0696000	$49.800
CC - 9466912	EPS-S COOSALUD	10	$714.330	0.0400000	$28.600	$0	0	$0	0	$0	10	$714.330	90149092 3	0.0696000	$49.800

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1049394576	EPS-S COOSALUD	10	$714.330	0.0400000	$28.600	$0	0	$0	0	$0	10	$714.330	90149092 3	0.0696000	$49.800
CC - 1094276314	NUEVA E.P.S. S.A.	10	$750.000	0.0400000	$30.000	$0	0	$0	0	$0	10	$750.000	90149092 3	0.0696000	$52.200
CC - 1094266290	NUEVA E.P.S. S.A.	24	$2.400.000	0.0400000	$96.000	$0	0	$0	0	$0	24	$2.400.000	90149092 3	0.0696000	$167.100
CC - 1007545405	NUEVA E.P.S. S.A.	10	$714.330	0.0400000	$28.600	$0	0	$0	0	$0	10	$714.330	90149092 3	0.0696000	$49.800
CC - 9467022	EPS-S COOSALUD	10	$714.330	0.0400000	$28.600	$0	0	$0	0	$0	10	$714.330	90149092 3	0.0696000	$49.800
CC - 9466646	NUEVA E.P.S. S.A.	10	$959.300	0.0400000	$38.400	$0	0	$0	0	$0	10	$959.300	90149092 3	0.0696000	$66.800
CC - 1049394930	EPS-S COOSALUD	10	$714.330	0.0400000	$28.600	$0	0	$0	0	$0	10	$714.330	90149092 3	0.0696000	$49.800
CC - 5492350	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	10	$714.330	0.0400000	$28.600	$0	0	$0	0	$0	10	$714.330	90149092 3	0.0696000	$49.800

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 9466531	EPS-S COOSALUD	10	$714.330	0.0400000	$28.600	$0	0	$0	0	$0	10	$714.330	90149092 3	0.0696000	$49.800

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-9467221	COMFABOY	10	$744.093	0.0400000	$29.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-91541508	COMFABOY	10	$744.093	0.0400000	$29.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-9467072	COMFABOY	10	$744.093	0.0400000	$29.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-9466912	COMFABOY	10	$744.093	0.0400000	$29.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1049394576	COMFABOY	10	$744.093	0.0400000	$29.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1094276314	COMFABOY	10	$781.250	0.0400000	$31.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1094266290	COMFABOY	24	$2.525.000	0.0400000	$101.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1007545405	COMFABOY	10	$744.093	0.0400000	$29.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-9467022	COMFABOY	10	$744.093	0.0400000	$29.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-9466646	COMFABOY	10	$999.270	0.0400000	$40.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1049394930	COMFABOY	10	$744.093	0.0400000	$29.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-5492350	COMFABOY	10	$744.093	0.0400000	$29.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-9466531	COMFABOY	10	$744.093	0.0400000	$29.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 06											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	8	$1.229.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.229.000
PROTECCION	3	$342.900	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$342.900
COLPENSIONES	2	$228.600	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$228.600

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	6	$250.200	$0	0	$0	0	$0	$250.200	0	$0	$0	$250.200	$0	0	$0	$0	$250.200	$0	$0	$250.200
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$28.600	$0	0	$0	0	$0	$28.600	0	$0	$0	$28.600	$0	0	$0	$0	$28.600	$0	$0	$28.600
EPS-S COOSALUD	6	$171.600	$0	0	$0	0	$0	$171.600	0	$0	$0	$171.600	$0	0	$0	$0	$171.600	$0	$0	$171.600

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	13	$784.100	0	$0	$0	$784.100	0	$0	$784.100	0	$0	$0	$784.100

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFABOY	13	$470.300	0	$0	$470.300
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	$450.400
PENSIONES	3	$1.800.500
RIESGOS PROFESIONALES	1	$784.100
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$470.300
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$3.505.300

PCA GROUP

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

REGISTRO DE ENTREGA DE DOTACIÓN

ENTREGA ELEMENTOS DE DOTACIÓN

GESTION HSEQ

NOMBRE EMPLEADO: BRAYAN MICHEL PARRADO LIZCANO **CEDULA:** 1.094.266.290

CARGO: INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

FECHA DE ENTREGA	ORDINARIA	DESGASTE	DAÑO	PERDIDA	PANTALON		CAMISA		BOTAS DE SEGURIDAD		IMPERMEABLE		BOTAS INVIERNO		CASCO DE SEGURIDAD	LENTES DE SEGURIDAD	PROTECCION AUDITIVA INSERCION	PROTECCIÓN AUDITIVA COPA	GUANTES SEGURIDAD	ENTREGADO POR	FIRMA RECIBIDO	OBSERVACIONES
					TALLA	CANTIDAD:	TALLA	CANTIDAD	TALLA	CANTIDAD	TALLA	CANTIDAD	TALLA	CANTIDAD								
25 DE MAYO DE 2026					34	1	L	1	39	1	L	1	39	1	SI	SI	SI	SI	SI	XIMENA MORA B.		

DETALLES DE LA ENTREGA

ORDINARIA	Entrega Inicial o periodicidad establecida	DESGASTE		Repocision por desgaste no intensionado de la prenda						DAÑO	Reposicion por daño	PERDIDA	Repocision por perdida

ENTREGA ELEMENTOS DE DOTACIÓN

GESTION HSEQ

NOMBRE EMPLEADO: XIMENA DAMARIS MORA BUITRAGO **CEDULA:** 1.094.276.314

CARGO: RESIDENTE AMBIENTAL

FECHA DE ENTREGA	ORDINARIA	DESGASTE	DAÑO	PERDIDA	PANTALON		CAMISA		BOTAS DE SEGURIDAD		IMPERMEABLE		BOTAS INVIERNO		CASCO DE SEGURIDAD	LENTES DE SEGURIDAD	PROTECCION AUDITIVA INSERCION	PROTECCIÓN AUDITIVA COPA	GUANTES SEGURIDAD	ENTREGADO POR	FIRMA RECIBIDO	OBSERVACIONES
					TALLA	CANTIDAD:	TALLA	CANTIDAD	TALLA	CANTIDAD	TALLA	CANTIDAD	TALLA	CANTIDAD								
15 DE JUNIO DE 2026					8	1	M	1	38	1	M	1	38	1	SI	SI	SI	SI	SI	XIMENA MORA B.		

DETALLES DE LA ENTREGA

ORDINARIA	Entrega Inicial o periodicidad establecida	DESGASTE		Repocision por desgaste no intensionado de la prenda						DAÑO	Reposicion por daño	PERDIDA	Repocision por perdida

ENTREGA ELEMENTOS DE DOTACIÓN

GESTION HSEQ

NOMBRE EMPLEADO: LUIS ERMINIO RINCON ARIAS **CEDULA:** 9.466.646

CARGO: OFICIAL DE OBRA

FECHA DE ENTREGA	ORDINARIA	DESGASTE	DAÑO	PERDIDA	PANTALON		CAMISA		BOTAS DE SEGURIDAD		IMPERMEABLE		BOTAS INVIERNO		CASCO DE SEGURIDAD	LENTES DE SEGURIDAD	PROTECCION AUDITIVA INSERCION	PROTECCION AUDITIVA COPA	GUANTES SEGURIDAD	ENTREGADO POR	FIRMA RECIBIDO	OBSERVACIONES
					TALLA	CANTIDAD:	TALLA	CANTIDAD	TALLA	CANTIDAD	TALLA	CANTIDAD	TALLA	CANTIDAD								
15 DE JUNIO DE 2026					30	1	M	1	40	1	L	1	40	1	SI	SI	SI	SI	SI	XIMENA MORA B.	Luis A	

DETALLES DE LA ENTREGA

ORDINARIA	Entrega Inicial o periodicidad establecida	DESGASTE		Repocision por desgaste no intensionado de la prenda						DAÑO	Reposicion por daño	PERDIDA	Repocision por perdida

ENTREGA ELEMENTOS DE DOTACIÓN

GESTION HSEQ

NOMBRE EMPLEADO: JOSUE LOPEZ CHAPETA **CEDULA:** 9.466.912

CARGO: AYUDANTE DE OBRA

FECHA DE ENTREGA	ORDINARIA	DESGASTE	DAÑO	PERDIDA	PANTALON		CAMISA		BOTAS DE SEGURIDAD		IMPERMEABLE		BOTAS INVIERNO		CASCO DE SEGURIDAD	LENTES DE SEGURIDAD	PROTECCION AUDITIVA INSERCION	PROTECCIÓN AUDITIVA COPA	GUANTES SEGURIDAD	ENTREGADO POR	FIRMA RECIBIDO	OBSERVACIONES
					TALLA	CANTIDAD:	TALLA	CANTIDAD	TALLA	CANTIDAD	TALLA	CANTIDAD	TALLA	CANTIDAD								
15 DE JUNIO DE 2026					34	1	L	1	40	1	L	1	40	1	SI	SI	SI	SI	SI	XIMENA MORA B.	Josue C	

DETALLES DE LA ENTREGA

ORDINARIA	Entrega Inicial o periodicidad establecida	DESGASTE		Repocision por desgaste no intensionado de la prenda						DAÑO	Reposicion por daño	PERDIDA	Repocision por perdida

ENTREGA ELEMENTOS DE DOTACIÓN

GESTION HSEQ

NOMBRE EMPLEADO: PABLO EMILIO PATIÑO **CEDULA:** 1.007.545.405

CARGO: AYUDANTE DE OBRA

FECHA DE ENTREGA	ORDINARIA	DESGASTE	DAÑO	PERDIDA	PANTALON		CAMISA		BOTAS DE SEGURIDAD		IMPERMEABLE		BOTAS INVIERNO		CASCO DE SEGURIDAD	LENTES DE SEGURIDAD	PROTECCION AUDITIVA INSERCION	PROTECCIÓN AUDITIVA COPA	GUANTES SEGURIDAD	ENTREGADO POR	FIRMA RECIBIDO	OBSERVACIONES
					TALLA	CANTIDAD:	TALLA	CANTIDAD	TALLA	CANTIDAD	TALLA	CANTIDAD	TALLA	CANTIDAD								
15 DE JUNIO DE 2026					34	1	L	1	41	1	L	1	41	1	SI	SI	SI	SI	SI	XIMENA MORA B.	Pablo C	

DETALLES DE LA ENTREGA

ORDINARIA	Entrega Inicial o periodicidad establecida	DESGASTE		Repocision por desgaste no intensionado de la prenda						DAÑO	Reposicion por daño	PERDIDA	Repocision por perdida

ENTREGA ELEMENTOS DE DOTACIÓN

GESTION HSEQ

NOMBRE EMPLEADO: ALIRIO VERA **CEDULA:** 9.466.531

CARGO: AYUDANTE DE OBRA

FECHA DE ENTREGA	ORDINARIA	DESGASTE	DAÑO	PERDIDA	PANTALON		CAMISA		BOTAS DE SEGURIDAD		IMPERMEABLE		BOTAS INVIERNO		CASCO DE SEGURIDAD	LENTES DE SEGURIDAD	PROTECCION AUDITIVA INSERCION	PROTECCIÓN AUDITIVA COPA	GUANTES SEGURIDAD	ENTREGADO POR	FIRMA RECIBIDO	OBSERVACIONES
					TALLA	CANTIDAD:	TALLA	CANTIDAD	TALLA	CANTIDAD	TALLA	CANTIDAD	TALLA	CANTIDAD								
15 DE JUNIO DE 2026					34	1	L	1	41	1	L	1	41	1	SI	SI	SI	SI	SI	XIMENA MORA B.	Alirio	

DETALLES DE LA ENTREGA

ORDINARIA	Entrega Inicial o periodicidad establecida	DESGASTE		Repocision por desgaste no intensionado de la prenda						DAÑO	Reposicion por daño	PERDIDA	Repocision por perdida

ENTREGA ELEMENTOS DE DOTACIÓN

GESTION HSEQ

NOMBRE EMPLEADO: JULIO CESAR GAMBOA CAMARGO **CEDULA:** 91.541.508

CARGO: AYUDANTE DE OBRA

FECHA DE ENTREGA	ORDINARIA	DESGASTE	DAÑO	PERDIDA	PANTALON		CAMISA		BOTAS DE SEGURIDAD		IMPERMEABLE		BOTAS INVIERNO		CASCO DE SEGURIDAD	LENTES DE SEGURIDAD	PROTECCION AUDITIVA INSERCION	PROTECCIÓN AUDITIVA COPA	GUANTES SEGURIDAD	ENTREGADO POR	FIRMA RECIBIDO	OBSERVACIONES
					TALLA	CANTIDAD:	TALLA	CANTIDAD	TALLA	CANTIDAD	TALLA	CANTIDAD	TALLA	CANTIDAD								
15 DE JUNIO DE 2026					32	1	M	1	40	1	M	1	40	1	SI	SI	SI	SI	SI	XIMENA MORA B.	Julio C	

DETALLES DE LA ENTREGA

ORDINARIA	Entrega Inicial o periodicidad establecida	DESGASTE		Repocision por desgaste no intensionado de la prenda						DAÑO	Reposicion por daño	PERDIDA	Repocision por perdida

ENTREGA ELEMENTOS DE DOTACIÓN

GESTION HSEQ

NOMBRE EMPLEADO: LUIS ADOLFO BARAJAS **CEDULA:** 9.467.221

CARGO: AYUDANTE DE OBRA

FECHA DE ENTREGA	ORDINARIA	DESGASTE	DAÑO	PERDIDA	PANTALON		CAMISA		BOTAS DE SEGURIDAD		IMPERMEABLE		BOTAS INVIERNO		CASCO DE SEGURIDAD	LENTES DE SEGURIDAD	PROTECCION AUDITIVA INSERCION	PROTECCIÓN AUDITIVA COPA	GUANTES SEGURIDAD	ENTREGADO POR	FIRMA RECIBIDO	OBSERVACIONES
					TALLA	CANTIDAD:	TALLA	CANTIDAD	TALLA	CANTIDAD	TALLA	CANTIDAD	TALLA	CANTIDAD								
15 DE JUNIO DE 2026					32	1	M	1	40	1	M	1	40	1	SI	SI	SI	SI	SI	XIMENA MORA B.	Luis B	

DETALLES DE LA ENTREGA

ORDINARIA	Entrega Inicial o periodicidad establecida	DESGASTE		Repocision por desgaste no intensionado de la prenda						DAÑO	Reposicion por daño	PERDIDA	Repocision por perdida

ENTREGA ELEMENTOS DE DOTACIÓN

GESTION HSEQ

NOMBRE EMPLEADO: ENOC QUIÑONEZ **CEDULA:** 9.467.022

CARGO: AYUDANTE DE OBRA

FECHA DE ENTREGA	ORDINARIA	DESGASTE	DAÑO	PERDIDA	PANTALON		CAMISA		BOTAS DE SEGURIDAD		IMPERMEABLE		BOTAS INVIERNO		CASCO DE SEGURIDAD	LENTES DE SEGURIDAD	PROTECCION AUDITIVA INSERCION	PROTECCIÓN AUDITIVA COPA	GUANTES SEGURIDAD	ENTREGADO POR	FIRMA RECIBIDO	OBSERVACIONES
					TALLA	CANTIDAD:	TALLA	CANTIDAD	TALLA	CANTIDAD	TALLA	CANTIDAD	TALLA	CANTIDAD								
15 DE JUNIO DE 2026					30	1	M	1	38	1	M	1	38	1	SI	SI	SI	SI	SI	XIMENA MORA B.	Enoc Q	

DETALLES DE LA ENTREGA

ORDINARIA	Entrega Inicial o periodicidad establecida	DESGASTE		Repocision por desgaste no intensionado de la prenda						DAÑO	Reposicion por daño	PERDIDA	Repocision por perdida

ENTREGA ELEMENTOS DE DOTACIÓN

GESTION HSEQ

NOMBRE EMPLEADO: JESUS ANTONIO VERA **CEDULA:** 5.492.350

CARGO: AYUDANTE DE OBRA

FECHA DE ENTREGA	ORDINARIA	DESGASTE	DAÑO	PERDIDA	PANTALON		CAMISA		BOTAS DE SEGURIDAD		IMPERMEABLE		BOTAS INVIERNO		CASCO DE SEGURIDAD	LENTES DE SEGURIDAD	PROTECCION AUDITIVA INSERCION	PROTECCIÓN AUDITIVA COPA	GUANTES SEGURIDAD	ENTREGADO POR	FIRMA RECIBIDO	OBSERVACIONES
					TALLA	CANTIDAD:	TALLA	CANTIDAD	TALLA	CANTIDAD	TALLA	CANTIDAD	TALLA	CANTIDAD								
15 DE JUNIO DE 2026					32	1	L	1	40	1	L	1	40	1	SI	SI	SI	SI	SI	XIMENA MORA B.	Jesus V.	

DETALLES DE LA ENTREGA

ORDINARIA	Entrega Inicial o periodicidad establecida	DESGASTE		Repocision por desgaste no intensionado de la prenda						DAÑO	Reposicion por daño	PERDIDA	Repocision por perdida

ENTREGA ELEMENTOS DE DOTACIÓN

GESTION HSEQ

NOMBRE EMPLEADO: DANIEL MENDEZ RAMIREZ **CEDULA:** 1.049.394.576

CARGO: AYUDANTE DE OBRA

FECHA DE ENTREGA	ORDINARIA	DESGASTE	DAÑO	PERDIDA	PANTALON		CAMISA		BOTAS DE SEGURIDAD		IMPERMEABLE		BOTAS INVIERNO		CASCO DE SEGURIDAD	LENTES DE SEGURIDAD	PROTECCION AUDITIVA INSERCION	PROTECCIÓN AUDITIVA COPA	GUANTES SEGURIDAD	ENTREGADO POR	FIRMA RECIBIDO	OBSERVACIONES
					TALLA	CANTIDAD:	TALLA	CANTIDAD	TALLA	CANTIDAD	TALLA	CANTIDAD	TALLA	CANTIDAD								
15 DE JUNIO DE 2026					34	1	L	1	40	1	L	1	40	1	SI	SI	SI	SI	SI	XIMENA MORA B.	Daniel R	

DETALLES DE LA ENTREGA

ORDINARIA	Entrega Inicial o periodicidad establecida	DESGASTE		Repocision por desgaste no intensionado de la prenda						DAÑO	Reposicion por daño	PERDIDA	Repocision por perdida

ENTREGA ELEMENTOS DE DOTACIÓN

GESTION HSEQ

NOMBRE EMPLEADO: FREDY JEREZ **CEDULA:** 9.467.072

CARGO: AYUDANTE DE OBRA

FECHA DE ENTREGA	ORDINARIA	DESGASTE	DAÑO	PERDIDA	PANTALON		CAMISA		BOTAS DE SEGURIDAD		IMPERMEABLE		BOTAS INVIERNO		CASCO DE SEGURIDAD	LENTES DE SEGURIDAD	PROTECCION AUDITIVA INSERCION	PROTECCIÓN AUDITIVA COPA	GUANTES SEGURIDAD	ENTREGADO POR	FIRMA RECIBIDO	OBSERVACIONES
					TALLA	CANTIDAD:	TALLA	CANTIDAD	TALLA	CANTIDAD	TALLA	CANTIDAD	TALLA	CANTIDAD								
15 DE JUNIO DE 2026					34	1	L	1	41	1	L	1	41	1	SI	SI	SI	SI	SI	XIMENA MORA B.	Fredy J.	

DETALLES DE LA ENTREGA

ORDINARIA	Entrega Inicial o periodicidad establecida	DESGASTE		Repocision por desgaste no intensionado de la prenda						DAÑO	Reposicion por daño	PERDIDA	Repocision por perdida

ENTREGA ELEMENTOS DE DOTACIÓN

GESTION HSEQ

NOMBRE EMPLEADO: JUAN SANTAFE **CEDULA:** 1.049.394.930

CARGO: AYUDANTE DE OBRA

FECHA DE ENTREGA	ORDINARIA	DESGASTE	DAÑO	PERDIDA	PANTALON		CAMISA		BOTAS DE SEGURIDAD		IMPERMEABLE		BOTAS INVIERNO		CASCO DE SEGURIDAD	LENTES DE SEGURIDAD	PROTECCION AUDITIVA INSERCION	PROTECCION AUDITIVA COPA	GUANTES SEGURIDAD	ENTREGADO POR	FIRMA RECIBIDO	OBSERVACIONES
					TALLA	CANTIDAD:	TALLA	CANTIDAD	TALLA	CANTIDAD	TALLA	CANTIDAD	TALLA	CANTIDAD								
15 DE JUNIO DE 2026					34	1	XL	1	41	1	XL	1	41	1	SI	SI	SI	SI	SI	XIMENA MORA B.	Juan S	

DETALLES DE LA ENTREGA










ORDINARIA	Entrega Inicial o periodicidad establecida	DESGASTE		Repocision por desgaste no intensionado de la prenda						DAÑO	Reposicion por daño	PERDIDA	Repocision por perdida

PCA GROUP

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

CONTROL DE ASISTENCIA CHARLAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

CONTROL DE ASISTENCIA CHARLA DE SEGURIDAD					
USO ADECUADO E IMPORTANCIA DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP):					
N°	NOMBRES	APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	BRAYAN MICHEL	PARRADO LIZCANO	1.094.266.290	RESIDENTE DE OBRA	
2	XIMENA DAMARIS	MORA BUITRAGO	1.094.276.314	RESIDENTE AMBIENTAL	
3	LUIS ERMINIO	RINCON ARIAS	9466646	OFICIAL DE OBRA	Luis A.
4	JOSUE	LOPEZ CHAPETA	9466912	OBRERO	Josue C
5	PATIÑO CALDERON	PABLO EMILIO	1007545405	OBRERO	Pablo C
6	VERA SOLANO	ALIRIO	9466531	OBRERO	Alirio S
7	GAMBOA CAMARGO	JULIO CESAR	91541508	OBRERO	Julio C
8	BARAJAS SILVA	LUIS ADOLFO	9467221	OBRERO	Luis B.
9	QUIÑONEZ VILLAMOZAR	ENOC	9467022	OBRERO	Enoc Q
10	VERA	JESUS ANTONIO	5492350	OBRERO	Jesus V.
11	MENDEZ RAMIREZ	DANIEL ADULFO	1049394576	OBRERO	Daniel R
12	JEREZ ARIAS	FREDY	9467072	OBRERO	Fredy A.
13	SANTAFE PEDRAZA	JUAN	1049394930	OBRERO	Juan S

CONTROL DE ASISTENCIA CHARLA DE SEGURIDAD					
PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS LABORALES					
N°	NOMBRES	APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	BRAYAN MICHEL	PARRADO LIZCANO	1.094.266.290	RESIDENTE DE OBRA	
2	XIMENA DAMARIS	MORA BUITRAGO	1.094.276.314	RESIDENTE AMBIENTAL	
3	LUIS ERMINIO	RINCON ARIAS	9466646	OFICIAL DE OBRA	
4	JOSUE	LOPEZ CHAPETA	9466912	OBRERO	
5	PATIÑO CALDERON	PABLO EMILIO	1007545405	OBRERO	
6	VERA SOLANO	ALIRIO	9466531	OBRERO	
7	GAMBOA CAMARGO	JULIO CESAR	91541508	OBRERO	
8	BARAJAS SILVA	LUIS ADOLFO	9467221	OBRERO	
9	QUIÑONEZ VILLAMOZAR	ENOC	9467022	OBRERO	
10	VERA	JESUS ANTONIO	5492350	OBRERO	
11	MENDEZ RAMIREZ	DANIEL ADULFO	1049394576	OBRERO	
12	JEREZ ARIAS	FREDY	9467072	OBRERO	
13	SANTAFE PEDRAZA	JUAN	1049394930	OBRERO	

CONTROL DE ASISTENCIA CHARLA DE SEGURIDAD					
ORDEN Y ASEO EN EL ÁREA DE TRABAJO					
N°	NOMBRES	APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	BRAYAN MICHEL	PARRADO LIZCANO	1.094.266.290	RESIDENTE DE OBRA	
2	XIMENA DAMARIS	MORA BUITRAGO	1.094.276.314	RESIDENTE AMBIENTAL	
3	LUIS ERMINIO	RINCON ARIAS	9466646	OFICIAL DE OBRA	
4	JOSUE	LOPEZ CHAPETA	9466912	OBRERO	
5	PATIÑO CALDERON	PABLO EMILIO	1007545405	OBRERO	
6	VERA SOLANO	ALIRIO	9466531	OBRERO	
7	GAMBOA CAMARGO	JULIO CESAR	91541508	OBRERO	
8	BARAJAS SILVA	LUIS ADOLFO	9467221	OBRERO	
9	QUIÑONEZ VILLAMOZAR	ENOC	9467022	OBRERO	
10	VERA	JESUS ANTONIO	5492350	OBRERO	
11	MENDEZ RAMIREZ	DANIEL ADULFO	1049394576	OBRERO	
12	JEREZ ARIAS	FREDY	9467072	OBRERO	
13	SANTAFE PEDRAZA	JUAN	1049394930	OBRERO	

CONTROL DE ASISTENCIA CHARLA DE SEGURIDAD					
SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO					
N°	NOMBRES	APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	BRAYAN MICHEL	PARRADO LIZCANO	1.094.266.290	RESIDENTE DE OBRA	
2	XIMENA DAMARIS	MORA BUITRAGO	1.094.276.314	RESIDENTE AMBIENTAL	
3	LUIS ERMINIO	RINCON ARIAS	9466646	OFICIAL DE OBRA	LUIS A.
4	JOSUE	LOPEZ CHAPETA	9466912	OBRERO	Josue C
5	PATIÑO CALDERON	PABLO EMILIO	1007545405	OBRERO	Pablo C
6	VERA SOLANO	ALIRIO	9466531	OBRERO	Alirio S
7	GAMBOA CAMARGO	JULIO CESAR	91541508	OBRERO	JULIO C
8	BARAJAS SILVA	LUIS ADOLFO	9467221	OBRERO	Luis B
9	QUIÑONEZ VILLAMOZAR	ENOC	9467022	OBRERO	Enoc Q
10	VERA	JESUS ANTONIO	5492350	OBRERO	Jesus V
11	MENDEZ RAMIREZ	DANIEL ADULFO	1049394576	OBRERO	Daniel R
12	JEREZ ARIAS	FREDY	9467072	OBRERO	Fredy A.
13	SANTAFE PEDRAZA	JUAN	1049394930	OBRERO	Juan S

CONTROL DE ASISTENCIA CHARLA DE SEGURIDAD					
PREVENCIÓN DEL RIESGO POR INUNDACIONES Y CRECIENTES SÚBITAS					
N°	NOMBRES	APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	BRAYAN MICHEL	PARRADO LIZCANO	1.094.266.290	RESIDENTE DE OBRA	
2	XIMENA DAMARIS	MORA BUITRAGO	1.094.276.314	RESIDENTE AMBIENTAL	
3	LUIS ERMINIO	RINCON ARIAS	9466646	OFICIAL DE OBRA	
4	JOSUE	LOPEZ CHAPETA	9466912	OBRERO	
5	PATIÑO CALDERON	PABLO EMILIO	1007545405	OBRERO	
6	VERA SOLANO	ALIRIO	9466531	OBRERO	
7	GAMBOA CAMARGO	JULIO CESAR	91541508	OBRERO	
8	BARAJAS SILVA	LUIS ADOLFO	9467221	OBRERO	
9	QUIÑONEZ VILLAMOZAR	ENOC	9467022	OBRERO	
10	VERA	JESUS ANTONIO	5492350	OBRERO	
11	MENDEZ RAMIREZ	DANIEL ADULFO	1049394576	OBRERO	
12	JEREZ ARIAS	FREDY	9467072	OBRERO	
13	SANTAFE PEDRAZA	JUAN	1049394930	OBRERO	

PCA GROUP

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

CONTROL DE ASISTENCIA CHARLAS DE GESTIÓN AMBIENTAL.

CONTROL DE ASISTENCIA CHARLA DE GESTION AMBIENTAL					
PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO					
N°	NOMBRES	APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	BRAYAN MICHEL	PARRADO LIZCANO	1.094.266.290	RESIDENTE DE OBRA	
2	XIMENA DAMARIS	MORA BUITRAGO	1.094.276.314	RESIDENTE AMBIENTAL	
3	LUIS ERMINIO	RINCON ARIAS	9466646	OFICIAL DE OBRA	
4	JOSUE	LOPEZ CHAPETA	9466912	OBRERO	
5	PATIÑO CALDERON	PABLO EMILIO	1007545405	OBRERO	
6	VERA SOLANO	ALIRIO	9466531	OBRERO	
7	GAMBOA CAMARGO	JULIO CESAR	91541508	OBRERO	
8	BARAJAS SILVA	LUIS ADOLFO	9467221	OBRERO	
9	QUIÑONEZ VILLAMOZAR	ENOC	9467022	OBRERO	
10	VERA	JESUS ANTONIO	5492350	OBRERO	
11	MENDEZ RAMIREZ	DANIEL ADULFO	1049394576	OBRERO	
12	JEREZ ARIAS	FREDY	9467072	OBRERO	
13	SANTAFE PEDRAZA	JUAN	1049394930	OBRERO	

CONTROL DE ASISTENCIA CHARLA DE GESTION AMBIENTAL					
CONTROL DE EMISIONES DE MATERIAL PARTICULADO					
N°	NOMBRES	APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	BRAYAN MICHEL	PARRADO LIZCANO	1.094.266.290	RESIDENTE DE OBRA	
2	XIMENA DAMARIS	MORA BUITRAGO	1.094.276.314	RESIDENTE AMBIENTAL	
3	LUIS ERMINIO	RINCON ARIAS	9466646	OFICIAL DE OBRA	
4	JOSUE	LOPEZ CHAPETA	9466912	OBRERO	
5	PATIÑO CALDERON	PABLO EMILIO	1007545405	OBRERO	
6	VERA SOLANO	ALIRIO	9466531	OBRERO	
7	GAMBOA CAMARGO	JULIO CESAR	91541508	OBRERO	
8	BARAJAS SILVA	LUIS ADOLFO	9467221	OBRERO	
9	QUIÑONEZ VILLAMOZAR	ENOC	9467022	OBRERO	
10	VERA	JESUS ANTONIO	5492350	OBRERO	
11	MENDEZ RAMIREZ	DANIEL ADULFO	1049394576	OBRERO	
12	JEREZ ARIAS	FREDY	9467072	OBRERO	
13	SANTAFE PEDRAZA	JUAN	1049394930	OBRERO	

CONTROL DE ASISTENCIA CHARLA DE GESTION AMBIENTAL					
PROTECCIÓN DE LA FLORA Y FAUNA					
N°	NOMBRES	APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	BRAYAN MICHEL	PARRADO LIZCANO	1.094.266.290	RESIDENTE DE OBRA	
2	XIMENA DAMARIS	MORA BUITRAGO	1.094.276.314	RESIDENTE AMBIENTAL	
3	LUIS ERMINIO	RINCON ARIAS	9466646	OFICIAL DE OBRA	
4	JOSUE	LOPEZ CHAPETA	9466912	OBRERO	
5	PATIÑO CALDERON	PABLO EMILIO	1007545405	OBRERO	
6	VERA SOLANO	ALIRIO	9466531	OBRERO	
7	GAMBOA CAMARGO	JULIO CESAR	91541508	OBRERO	
8	BARAJAS SILVA	LUIS ADOLFO	9467221	OBRERO	
9	QUIÑONEZ VILLAMOZAR	ENOC	9467022	OBRERO	
10	VERA	JESUS ANTONIO	5492350	OBRERO	
11	MENDEZ RAMIREZ	DANIEL ADULFO	1049394576	OBRERO	
12	JEREZ ARIAS	FREDY	9467072	OBRERO	
13	SANTAFE PEDRAZA	JUAN	1049394930	OBRERO	

CONTROL DE ASISTENCIA CHARLA DE GESTION AMBIENTAL					
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DERRAMES DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
N°	NOMBRES	APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	BRAYAN MICHEL	PARRADO LIZCANO	1.094.266.290	RESIDENTE DE OBRA	
2	XIMENA DAMARIS	MORA BUITRAGO	1.094.276.314	RESIDENTE AMBIENTAL	
3	LUIS ERMINIO	RINCON ARIAS	9466646	OFICIAL DE OBRA	
4	JOSUE	LOPEZ CHAPETA	9466912	OBRERO	
5	PATIÑO CALDERON	PABLO EMILIO	1007545405	OBRERO	
6	VERA SOLANO	ALIRIO	9466531	OBRERO	
7	GAMBOA CAMARGO	JULIO CESAR	91541508	OBRERO	
8	BARAJAS SILVA	LUIS ADOLFO	9467221	OBRERO	
9	QUIÑONEZ VILLAMOZAR	ENOC	9467022	OBRERO	
10	VERA	JESUS ANTONIO	5492350	OBRERO	
11	MENDEZ RAMIREZ	DANIEL ADULFO	1049394576	OBRERO	
12	JEREZ ARIAS	FREDY	9467072	OBRERO	
13	SANTAFE PEDRAZA	JUAN	1049394930	OBRERO	

PCA GROUP

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

INSPECCIÓN DE MAQUINARIA

FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EXCAVADORA

PROYECTO: construcción de Hexapodos.

EMPRESA: PCA GROUP S.A.S.

FECHA: 20/06/2026

HORA: 7:00am

OPERADOR: Jose Parra.

INSPECTOR HSEQ: Ximena M.

MARCA: Komatsu

MODELO: PC 200-8

Ítem	Cumple	No cumple	N/A	Observaciones
Estado general de la excavadora	☒	☐	☐	
Limpieza general	☒	☐	☐	
Sin fugas de aceite/combustible/refrigerante	☒	☐	☐	
Nivel aceite motor	☒	☐	☐	
Nivel aceite hidráulico	☒	☐	☐	
Nivel refrigerante	☒	☐	☐	
Nivel combustible	☒	☐	☐	
Estado batería	☒	☐	☐	
Funcionamiento motor	☒	☐	☐	
Sistema hidráulico	☒	☐	☐	
Cilindros hidráulicos	☒	☐	☐	
Mangueras hidráulicas	☒	☐	☐	
Estado cucharón	☒	☐	☐	
Pasadores y bujes	☒	☐	☐	
Brazo y pluma	☒	☐	☐	
Estado orugas	☒	☐	☐	
Tensión orugas	☒	☐	☐	
Giro torreta	☒	☐	☐	
Luces	☒	☐	☐	
Alarma reversa	☒	☐	☐	
Bocina	☒	☐	☐	
Cabina	☒	☐	☐	
Cinturón seguridad	☒	☐	☐	
Espejos y vidrios	☒	☐	☐	
Limpiaparabrisas	☒	☐	☐	
Extintor vigente	☒	☐	☐	

Botiquín (si aplica)	☒	☐	☐	
Manual operación	☒	☐	☐	
Área de trabajo segura	☒	☐	☐	

OBSERVACIONES:

CONCEPTO: ☒ APTA PARA OPERAR ☐ NO APTA PARA OPERAR

Firma Operador: Jose Parra
Firma Inspector HSEQ: Ximena M.

PCA GROUP

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

20. FACTURA ELECTRONICA

PCA GROUP SAS
NIT 901.490.923-2
CALLE 25B 20A 04 BARRIO MODELO
Tel: (037) 3177016684
Saravena - Colombia
saspcagroup@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. PCA 115

Señores	MUNICIPIO DE CUBARA		
NIT	800.099.196-2	**Teléfono**	(037) 3102574494
Dirección	CALLE 4 4 43	**Ciudad**	Cubará - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	23/07/2026, 15:13
Expedición	23/07/2026, 15:35
Vencimiento	23/07/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	AROS-1	SUMINISTRO E INSTALACION DE HEXAPODOS EN CONCRETO REFORZADO DE 4000 PSI H: 1,6M	85.00	3,049,190.00	0 %	0.00	259,181,150.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Doscientos cincuenta y nueve millones ciento ochenta y un mil ciento cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 259,181,150.00

Total Bruto	259,181,150.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	259,181,150.00

Observaciones:
CONTRATO DE OBRA NUMERO 20260000183 El objeto del Contrato es "OBRAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONCRETO PARA LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA LA GAITANA, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ".

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764112095546 aprobado en 20260703 prefijo PCA desde el número 114 al 200 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: bebda7c30c77c0d8d3b8c31d6a833c9dd274722e2df87368aba3cd5895ab7a696db0142096430ad7da772aa22d5459f6

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

CL 25 B 20 A 04 BRR MODELO
NIT: 9 0 1 4 9 0 9 2 3 2 3008794816
saspcagroup@gmail.com

21. CERTIFICACION BANCARIA

BBVA

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **COMPAÑIA DE CONSTRUCIONES PCA GROUP SAS** identificado(a) con **número 901.490.923** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta De Ahorros Ahorrodiario No 00130842000200214413** aperturada el **21 de septiembre de 2021**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **25** de **agosto** de **2022** a las **15:50**, con destino a **Quien Interese.**

Para BBVA es importante que estés enterado de cómo usar tu cuenta, ten presente que para otros trámites puedes usar las siguientes opciones:

16 dígitos: **0842000200214413** Transferencias nacionales y/o otros
20 dígitos: **00130842000200214413** Transferencias internacionales

---

FIRMA AUTOGRAFICA



FIRMA AUTORIZADA

BBVACOLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDECIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO
