	HOSPITAL SAN SEBASTIAN E.S.E. DE PIEDRAS - TOLIMA NIT: 809.005.249-4 **INFORME Y CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS**

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

MODALIDAD DE SELECCIÓN:	CONVOCATORIA PÚBLICA	**TIPO DE CONTRATO:**	OBRA	
CONTRATO N°:	102 de 2026	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:**	25 de Febrero de 2026	
CONTRATISTA:	INCOBELCI S.A.S.	**NIT CONTRATISTA:**	900.088.145 – 2	
DIRECCIÓN DOMICILIO:	CARRERA 6 No. 53-29 TORRE EMPRESARIAL OFF 904. IBAGUE	**TELÉFONO**	3112292671	
CORREO ELECTRONICO:	incobelcisas@yahoo.com.ar	**CUENTA BANCARIA TIPO/No:**	CORRIENTE	6800002014
RÉGIMEN TRIBUTARIO:	RESPONSABLE DE IVA	**BANCO:**	BANCOLOMBIA	
OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALÁ, MUNICIPIO DE PIEDRAS – TOLIMA			
VALOR DEL CONTRATO	$ 190.252.096.60	CIENTO NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE		
VALOR ANTICIPO	N/A			
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (03) MESES			
FECHA DE INICIO	11 de marzo de 2026	**FECHA DE TERMINACIÓN**	10 de junio de 2026	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2026000132	**REGISTRO PRESUPUESTAL**	2026000125	
FECHA	25 de febrero de 2026	**FECHA:**	10 de marzo de 2026	
VALOR	$ 190.252.097.00	**VALOR:**	$ 190.252.097.00	
INTERVENTOR:	ALBERTO CASABIANCA MORENO	**NIT INTERVENTOR:**	93.132.900-9	
CORREO ELECTRONICO:	albertocasabianca61@gmail.com	**TELÉFONO**	3144746027	

2. INFORMACIÓN PARA EL PAGO

No. DE LA FACTURA	FEI1 61	**TIPO DE PAGO**	PARCIAL
ACTA DE COBRO No.	01	**FECHA:**	2026/07/02
No. DE LA FACTURA	FEI1 62	**TIPO DE PAGO**	PARCIAL
ACTA DE COBRO No.	01	**FECHA:**	2026/07/02

3. INFORMACIÓN SOBRE ADICIONES, MODIFICACIONES Y OTROS

DESCRIPCION	SI	NO	IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO	FECHA	OBJETO
ADICIÓN	X				
EN VALOR		X			
EN TIEMPO	X		OTROSI No 1 PRORROGA	2026/06/05	PRORROGA POR UN (01) MES
EN TIEMPO	X		OTROSI No 02 PRORROGA	2026/07/07	PRORROGA POR UN (01) MES
MODIFICACIONES		X			
OTROS		X			

4. CONTROL DE GARANTÍAS Y PÓLIZAS DEL CONTRATO

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	**Valor asegurado**		**VIGENCIA**	
No DE POLIZA	25-44-101212683				
AMPARO		**%**	**SUMA ASEGURADA**	**DESDE**	**HASTA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		10%	$ 19.025.209.70	2026/03/11	2026/11/12
CALIDAD DEL SERVICIO		15%	$ 28.537.214.55	2026/06/08	2027/07/12
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		20%	$ 38.050.419.40	2026/03/11	2029/07/12
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		15%	$ 28.537.814.55		5 AÑOS
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	**Valor asegurado**		**VIGENCIA**	
No DE POLIZA	25-40-101056425				
AMPARO		**%**	**SUMA ASEGURADA**	**DESDE**	**HASTA**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL - PREDIOS LABORES Y OPERACIONES		200 SMMLV	$ 350.181.000.00	2026/03/11	2026/07/12
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL - CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS		200 SMMLV	$ 350.181.000.00	2026/03/11	2026/07/12
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL - VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS		200 SMMLV	$ 350.181.000.00	2026/03/11	2026/07/12

	HOSPITAL SAN SEBASTIAN E.S.E. DE PIEDRAS - TOLIMA NIT: 809.005.249-4 **INFORME Y CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS**

5. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Concepto Económico	Valor
A. VALOR DEL CONTRATO:	$ 190.252.096.60
B. VALOR ADICIONES:	$ 0.00
C. VALOR TOTAL ACTUALIZADO (A + B):	**$ 190.252.096.60**
D. PAGOS ACUMULADOS ANTERIORES A LA PRESENTE ACTA	$ 0.00
E. SALDO ANTES DE ESTA ACTA: (C - D)	$ 190.252.096.60
F. VALOR AUTORIZADO A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA:	**$ 171.226.881.81**
G. NUEVO SALDO PENDIENTE DE EJECUCIÓN (E - F)	$ 19.025.214.79

6. VERIFICACIÓN DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PERIODO COTIZADO:	No. PLANILLA:	FECHA DE PAGO	TITULAR	VERIFICACION
PRESENTA CERTIFICACION REVISOR(A) FISCAL (Estar al día hasta el 02 de julio de 2026)	N/A	2026/07/02	INCOBELCI S.A.S	SI CUMPLE

7. EVALUACIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES ESPÉCIFICAS	CUMPLIMIENTO	DOCUMENTOS QUE EVIDENCIA CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1. Cumplir con el objeto del contrato, en los términos y condiciones establecidos, de conformidad con lo estipulado en el presento proceso contractual: **"OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALÁ, MUNICIPIO DE PIEDRAS – TOLIMA."**	SI	* ACTA PARCIAL No 1 INFORME DE AVANCE CONTRATISTA. * INFORME INTERVENTORIA ACTA PARCIAL OBRA No 1 * CERTIFICACION AVAL PAGO SUSCRITO POR INTERVENTORIA	
2. Realizar las actividades contratadas, cumpliendo con las especificaciones técnicas, administrativas, legales, financieras, ambientales y presupuestales establecidas en el contrato de obra y en los demás documentos previos que hacen parte del proceso de selección contractual	SI	* ACTA PARCIAL No 1 INFORME DE AVANCE CONTRATISTA. * INFORME INTERVENTORIA ACTA PARCIAL OBRA No 1 * CERTIFICACION AVAL PAGO SUSCRITO POR INTERVENTORIA	
3. Cumplir lo pactado dentro del objeto respectivo, por el valor descrito en la oferta presentada, documento que hace parte integral del presente proceso, atendiendo a las condiciones técnicas exigidas, y demás condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación	SI	* INFORME DE AVANCE CONTRATISTA. * INFORME INTERVENTORIA ACTA PARCIAL OBRA No 1 * CERTIFICACION AVAL PAGO SUSCRITO POR INTERVENTORIA	
4. Emplear para la ejecución del contrato, personal idóneo ampliamente experimentado y calificado en las actividades objeto del contrato; contar con los elementos necesarios para ello, teniendo en cuenta las normas de seguridad y sanitarias pertinentes para ejecutarlas.	SI	* INFORME DE AVANCE CONTRATISTA. * INFORME INTERVENTORIA ACTA PARCIAL OBRA No 1 * CERTIFICACION AVAL PAGO SUSCRITO POR INTERVENTORIA	
5. Presentar el cronograma de obra.	SI	CRONOGRAMA DE OBRA CTO 088	

6. Tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de intervención de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal, incluyendo todo lo relacionado con la implementación de medidas de Bioseguridad.	PARCIALMENTE	* INFORME DE AVANCE CONTRATISTA. * INFORME INTERVENTORIA ACTA PARCIAL OBRA No 1 * CERTIFICACION AVAL PAGO SUSCRITO POR INTERVENTORIA	
7. Se debe garantizar que el Personal Operativo de obra, en aras de fomentar empleo en la zona, deberá acreditar en lo posible ser del Municipio.	SI	PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL MANO DE OBRA	SUB CONTRATO MANO DE OBRA
8. Realizar el retiro de los residuos y su disposición en sitios aprobados.	PARCIALMENTE	* INFORME DE AVANCE CONTRATISTA. * INFORME INTERVENTORIA ACTA PARCIAL OBRA No 1 * CERTIFICACION AVAL PAGO SUSCRITO POR INTERVENTORIA	
9. Presentar los productos objeto del presente contrato en las condiciones establecidas en los estudios previos y la propuesta presentada.	PARCIALMENTE	* ACTA PARCIAL No 1 INFORME DE AVANCE CONTRATISTA. * INFORME INTERVENTORIA ACTA PARCIAL OBRA No 1 * CERTIFICACION AVAL PAGO SUSCRITO POR INTERVENTORIA	PRODUCTOS EJECUTADOS SEGÚN ACTA PARCIAL No 1
10. Elaborar plan de contingencia para atender eventos o imprevistos que puedan afectar la seguridad, costos o plazo de la obra, de manera que eviten o mitiguen las implicaciones de tales eventos.	PARCIALMENTE		EN EDICION Y APROBACIÓN POR INTERVENTORIA
11. Suministrar, transportar e instalar todos los materiales requeridos para la ejecución de cada uno de los ítems del contrato, los cuales deberán ser nuevos y de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones.	SI	* ACTA PARCIAL No 1 INFORME DE AVANCE CONTRATISTA. * INFORME INTERVENTORIA ACTA PARCIAL OBRA No 1 * CERTIFICACION AVAL PAGO SUSCRITO POR INTERVENTORIA	
12. Cumplir a cabalidad con los parámetros de seguridad y estándares, así como materiales, mano de obra y transporte necesarios para el desarrollo de cada uno de los ítems.	SI	* INFORME DE AVANCE CONTRATISTA. * INFORME INTERVENTORIA ACTA PARCIAL OBRA No 1 * CERTIFICACION AVAL PAGO SUSCRITO POR INTERVENTORIA	
13. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.	SI	* INFORME DE AVANCE CONTRATISTA. * INFORME INTERVENTORIA ACTA PARCIAL OBRA No 1 * CERTIFICACION AVAL PAGO SUSCRITO POR INTERVENTORIA	

14. Ejecutar el objeto del presente contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con su propuesta y la solicitud de cotización y la presente invitación los cuales hacen parte vinculante del contrato.	SI	* CRONOGRAMA DE OBRA CTO 088 * INFORME DE AVANCE CONTRATISTA. * INFORME INTERVENTORIA ACTA PARCIAL OBRA No 1 * CERTIFICACION AVAL PAGO SUSCRITO POR INTERVENTORIA	
15. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia Responsabilidad.	SI	* INFORME DE AVANCE CONTRATISTA. * INFORME INTERVENTORIA	
16. Garantizar de la ejecución de las obras el cumplimiento de requisitos técnicos conforme a disposiciones de Ministerio de Salud y demás autoridades competentes.	SI	* INFORME DE AVANCE CONTRATISTA. * INFORME INTERVENTORIA ACTA PARCIAL OBRA No 1 * CERTIFICACION AVAL PAGO SUSCRITO POR INTERVENTORIA	
17. Ejecutar con buena fe contractual el contrato, atendiendo diligentemente lo requerido por la supervisión e interventoría.	SI	* INFORME INTERVENTORIA ACTA PARCIAL OBRA No 1 * CERTIFICACION AVAL PAGO SUSCRITO POR INTERVENTORIA	
18. Las demás que por ley o contrato le corresponda.	SI	* INFORME DE AVANCE CONTRATISTA. * INFORME INTERVENTORIA ACTA PARCIAL OBRA No 1 * CERTIFICACION AVAL PAGO SUSCRITO POR INTERVENTORIA	

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLIMIENTO	DOCUMENTOS QUE EVIDENCIA CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso de contratación.	SI	* INFORME DE AVANCE CONTRATISTA. * INFORME INTERVENTORIA ACTA PARCIAL OBRA No 1 * CERTIFICACION AVAL PAGO SUSCRITO POR INTERVENTORIA	
2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del proceso de contratación.	SI	* INFORME DE AVANCE CONTRATISTA. * INFORME INTERVENTORIA ACTA PARCIAL OBRA No 1 * CERTIFICACION AVAL PAGO SUSCRITO POR INTERVENTORIA	
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones técnicas de la obra previstas en la Invitación y demás Documentos del proceso.	SI	* INFORME DE AVANCE CONTRATISTA. * INFORME INTERVENTORIA ACTA PARCIAL OBRA No 1 * CERTIFICACION AVAL PAGO SUSCRITO POR INTERVENTORIA	
4. Dar a conocer inmediatamente a la entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.	NO APLICA		En el desarrollo de las actividades a la fecha no se presenta ninguna reclamación descrita en esta obligación
5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).	SI		

6. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.	SI		
7. Informar inmediatamente a la entidad estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.	SI		No se presenta en este periodo a facturar ninguna situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes en la celebración del contrato.
8. Estar en permanente comunicación con el supervisor o el interventor del contrato.	SI		
9. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor o el interventor, atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.	SI		
10. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad establecida.	SI		
11. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.	SI		Verficacion personal profesional Ofertado
12. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.	SI	* INFORME DE AVANCE CONTRATISTA. * INFORME INTERVENTORIA ACTA PARCIAL OBRA No 1 * CERTIFICACION AVAL PAGO SUSCRITO POR INTERVENTORIA	
13. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por la entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscales que le corresponda (Art. 50 Ley 789 de 2002).	SI	CERTIFICACION REVISOR(A) FISCAL	PLANILLAS DE SEGURIDAD COMO INDEPENDIENTE DE PERSONAL NO VINCULADO LABORALMENTE PERO QUE HACEN PARTE DEL EQUIPO DE TRABAJO OPERATIVO OFERTADO
14. Reportar de manera inmediata al supervisor del contrato, sobre cualquier novedad, anomalía, eventualidad o irregularidad que pueda afectar la ejecución del contrato.	SI		
15. Guardar total reserva de la información que por razón de sus obligaciones y desarrollo de sus actividades obtenga. Esta es de propiedad del Hospital San Sebastián de Piedras y solo salvo expreso requerimiento de autoridad competente podrá ser divulgada.	SI		

16. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta el Hospital San Sebastián de Piedras, a través del supervisor del contrato.	SI		
17. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le imparta por parte del supervisor del contrato.	SI		
18. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y entrabamientos.	SI		
19. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho.	SI		
20. Guardar la debida confidencialidad y reserva sobre la información y documentos que conozca durante la ejecución del contrato, aún después de su terminación y cualquiera sea la causa de esta. En consecuencia, la información que conozca con ocasión de la ejecución del contrato no podrá divulgarla ni usarla en su propio beneficio o en el de un tercero.	SI		
21. Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos de este, si a ello hubiere lugar.	SI		Las Polizas que respaladan el contrato se encuentran vigentes y actualizadas.
22. La suscripción del acta de inicio correspondiente. Así mismo se deberán efectuar los pagos de impuestos del orden nacional, Departamental o municipal a que hubiere lugar. Así como suscribir el acta de liquidación, previa terminación del contrato.	si	* ACTA DE INICIO * Comprobante pago Estampillas	
23. Las demás que por ley o contrato le corresponda.	SI		

8. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR

Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, del informe de actividades y/o del producto establecido en el contrato, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el mismo, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.

La presente certificación se expide a los 27 días del mes de julio de 2026

Elaborado por:	Revisador por:	Aprobado por:
JUAN DANIEL GAMBOA GALEANO	MARIA PAZ GAITAN OÑATE	HECTOR JAVIER CALDERON TORRES
Cargo: CONTRATISTA/ APOYO A LA SUPERVISION	Cargo: Profesional Universitario Grado 02/Supervisión de la ESE	GERENTE HOSPITAL SAN SEBASTIAN E.S.E.

INCOBELCI

INCOBELCI S.A.S. / DIDIER PORTELA TORRES
Nit: 900088145-2 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

CR 6 NUMERO 53-29 TORRE 1 OF 904 IBAGUE TOLIMA Tel. 2765914

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEI1 61

Adquiriente	HOSPITAL SAN SEBASTIAN E.S.E DE PIEDRAS - TOLIMA	Fecha	Información de pago
Identific.	NIT 809005249-4 Tels: 3213728023	Jul-02-2026	Forma CREDITO CUENTAS X COBRAR
Direccion	CARRERA 3 CALLE 5 ESQUINA Piedras - Tolima	Vencimiento Jul-10-2026	Medio

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	0004	CONTRATO DE OBRA CIVIL		0	1.00	96,322,779.09	96,322,779.09
2	0001	(AIU) Administración 24.00%		0	1.00	23,117,466.98	23,117,466.98
3	0001	(AIU) Imprevistos 1.00%		0	1.00	963,227.79	963,227.79
4	0004	(AIU) Utilidad 5.00%		0	1.00	4,816,138.95	4,816,138.95

OBSERVACIONES: *VALOR CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL ACTA 1 DEL CONTRATO DE OBRA No. 102 Del 25 de febrero de 2026 CUYO OBJET ES CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALÁ, MUNICIPIO DE PIEDRAS – TOLIMA*

Total items : 4

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	125,219,612.81
		IVA 0.00%	125,219,612.81	0.00		

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Habilitación DIAN No.18764100111745 de Oct-15-2025 Vigencia: 12 meses Vence: Oct-15-2026 Rango: FEI1 55-500

Son: CIENTO VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS mcte.

TOTAL COP$ 125,219,612.81

CUFE: 267ff96a3ebadb313c2c4ac70ffd78189dab1084f06bd4805abdd361da2983650a86c985ecc01c1cdd911650e74bcce8
Fecha generación: 2026-07-02T10:02:00 Fecha expedición: 2026-07-02T17:27:19 Elaboró: CONTADOR Pág: 1/1

INCOBELCI

INCOBELCI S.A.S. / DIDIER PORTELA TORRES
Nit: 900088145-2 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

CR 6 NUMERO 53-29 TORRE 1 OF 904 IBAGUE TOLIMA Tel. 2765914

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEI1 62

Adquiriente	HOSPITAL SAN SEBASTIAN E.S.E DE PIEDRAS - TOLIMA	Fecha	Información de pago
Identific.	NIT 809005249-4 Tels: 3213728023	Jul-02-2026	Forma CREDITO CUENTAS X COBRAR
Dirección	CARRERA 3 CALLE 5 ESQUINA Piedras - Tolima	Vencimiento	Medio
		Jul-10-2026	

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	014	SUMINISTRO E INSTALACION		19	1.00	38,661,570.59	38,661,570.59

OBSERVACIONES: *VALOR CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL ACTA 1 DEL CONTRATO DE OBRA No. 102 Del 25 de febrero de 2026 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALÁ, MUNICIPIO DE PIEDRAS – TOLIMA CORRESPONDIENTE SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO ILUMINADO, PLANTA SOLAR Y AIRE ACONDICIONADO.*

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	38,661,570.59	7,345,698.41	Subtotal	38,661,570.59
					Iva/Inc	7,345,698.41

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Habilitación DIAN No.18764100111745 de Oct-15-2025 Vigencia: 12 meses Vence: Oct-15-2026 Rango: FEI1 55-500

Son: CUARENTA Y SEIS MILLONES SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS mcte.

TOTAL COP$ 46,007,269.00

CUFE: 0496c2a1553db8183a6ca175eea791e822ccbb9176a00d21ec18ed98f57f09d264e9c234de319d844e9e8cad76e8cc2c
Fecha generación: 2026-07-02T15:03:00 Fecha expedición: 2026-07-02T17:27:30 Elaboró: CONTADOR Pág: 1/1

ALBERTO CASABIANCA MORENO
INGENIERO CIVIL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - UN

Piedras Tolima, 22 de Julio de 2026.

Doctora
MARIA PAZ GAITÁN OÑATE
Supervisora
Hospital San Sebastián E.S.E. de Piedras – Tolima
administracion@esehospitalsansebastiandepiedrastolima.gov.co
hssesepiedras_tolima@outlook.com
E.S.D.

REFERENCIA: Contrato De Interventoría No. 099 del 16 de febrero de 2026 - Contrato de Obra No. **102 Del 25 de febrero de 2026.**

ASUNTO: Radicación del **Acta Parcial de Obra No. 1** con Condiciones Contractuales Iniciales – **Contrato de Obra No. 102 Del 25 de febrero de 2026** – Puesto de Salud – Chicalá.

Cordial saludo,

En calidad de **Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera**, según contrato que tiene por objeto la **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS PUESTOS DE SALUD RURAL DE CHIPALO, SAN MIGUEL DE DOIMA Y CHICALA, EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS, TOLIMA"**, me permito **radicar ante la supervisión del contrato el Acta Parcial de Obra No. 01 con condiciones contractuales iniciales**, correspondiente al **Contrato de Obra Pública** de la referencia, suscrito con **INCOBELCI S.A.S.**, cuyo objeto corresponde a la **CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS, TOLIMA.**

De conformidad con la verificación realizada por esta interventoría, se deja constancia que **la radicación del Acta Parcial de Obra No. 01 cumple con la Lista de Chequeo de los Requisitos Técnicos y Financieros exigidos para la radicación de actas parciales de obra,** adjuntando la documentación soporte correspondiente.

Información del Acta Parcial de Obra No. 01

Valor ejecutado – Acta Parcial de Obra No. 01: **$ 171.226.881,81 M/CTE**
Valor pendiente por ejecutar: **$ 19.025.214,79 M/CTE**

Documentos que se radican (Lista de Chequeo)

Requisitos Técnicos

ALBERTO CASABIANCA MORENO
INGENIERO CIVIL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - UN

1. Acta de pago parcial firmada por las partes (contratista – interventoría – supervisión).
2. Memorias de cálculo de actividades ejecutadas.
3. Acta de mayores y menores cantidades y modificatorios No. 1
4. Copia de modificaciones contractuales durante el periodo
5. Reporte de seguridad industrial y social con planillas de seguridad social certificadas por contador o revisor fiscal.
6. Formatos de control correspondientes al periodo. (No aplica).
7. Resultados de ensayos de calidad del contratista e interventoría. (No aplica).
8. Copia de la bitácora de obra.
9. Informe de Obra del periodo ejecutado con registro fotográfico.
10. Programación de obra actualizada.
11. Informe de interventoría del periodo correspondiente.

Requisitos Financieros

13. Factura electrónica.
14. Certificación de aval del pago suscrita por la interventoría.
15. Certificación bancaria.
16. Registro Único Tributario – RUT.

En virtud de lo anterior, **se solicita muy respetuosamente dar trámite a la revisión, aprobación y Pago del Acta Parcial de Obra No. 01**, conforme a las condiciones contractuales establecidas y los procedimientos administrativos de la entidad.

Se deja constancia que la totalidad de los documentos físicos con firmas originales, se le entregaron al **Ing. JUAN DANIEL GAMBOA GALEANO** - Apoyo a la Supervisión.

Sin otro particular.

Cordialmente,

Ing. ALBERTO CASABIANCA MORENO
C.C. No. 93.132.900 – M.P. No. 17.20.20.93.597 CLD
Interventor Externo

Con Copia a:
Ingeniero
JUAN DANIEL GAMBOA GALEANO
ing.daniel4801@gmail.com
HOSPITAL SAN SEBASTIAN E.S.E DE PIEDRAS – TOLIMA
Apoyo a la Supervisión

Ingeniero
DIDIER PORTELA TORRES
Rep. Legal de **INCOBELCI S.A.S.**
NIT No. 900.088.145 – 2
incobelcisas@yahoo.com.ar
Contratista de Obra

ALBERTO CASABIANCA MORENO
INGENIERO CIVIL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - UN

CERTIFICACIÓN DE AVAL PARA PAGO

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1

CONTRATO DE OBRA No. 102 DEL 25 DE FEBRERO DE 2026

OBJETO
"ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALÁ, MUNICIPIO DE PIEDRAS – TOLIMA."

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 099 DEL 16 DE FEBRERO DE 2026

1. OBJETO DE LA CERTIFICACIÓN

El suscrito Interventor Externo del **Contrato de Interventoría No. 099 del 16 de febrero de 2026**, actuando dentro de las funciones establecidas en el contrato, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y demás normas aplicables, certifica que efectuó la revisión técnica, administrativa, financiera y contable del **Acta Parcial de Obra No. 1**, presentada por el contratista de obra.

Como resultado de las verificaciones realizadas en campo, revisión de cantidades de obra, memorias de cálculo, especificaciones técnicas, registros fotográficos, ensayos de calidad y demás soportes contractuales, se constató que las actividades relacionadas en el **Acta Parcial de Obra No. 1** fueron ejecutadas conforme a las obligaciones contractuales.

2. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

De acuerdo con la verificación efectuada por esta Interventoría, el comportamiento financiero del contrato es el siguiente:

Concepto	Valor
Valor Inicial del Contrato	**$190.252.096,60**
Valor Acta Parcial No. 01	**$171.226.881,81**
Avance Financiero	**90,00 %**
Valor Pendiente por Ejecutar	**$19.025.214,79**
Anticipo	**No aplica**

ALBERTO CASABIANCA MORENO
INGENIERO CIVIL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - UN

CERTIFICACIÓN DE AVAL PARA PAGO - ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1

CONTRATO DE OBRA No. 102 DEL 25 DE FEBRERO DE 2026
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 099 DEL 16 DE FEBRERO DE 2026

Concepto	Valor
Amortización de Anticipo	**$0,00**

Se deja expresa constancia que el presente contrato **no contempló anticipo**, razón por la cual el valor certificado corresponde íntegramente a obra efectivamente ejecutada y recibida a satisfacción por la Interventoría.

3. VERIFICACIÓN TÉCNICA

La Interventoría verificó que:

- Las cantidades de obra relacionadas en el **Acta Parcial No. 1** corresponden a actividades realmente ejecutadas.
- Las mediciones fueron efectuadas directamente en obra.
- Los materiales empleados cumplen las especificaciones técnicas del contrato.
- Los procesos constructivos se ejecutaron conforme a los planos aprobados y a las especificaciones técnicas.
- Las actividades ejecutadas cumplen con las normas técnicas aplicables al proyecto.
- Los registros fotográficos y las memorias de obra soportan las cantidades reconocidas.
- La ejecución física acumulada corresponde al **90,00 %** del valor contractual.

4. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

La Interventoría certifica que durante el período evaluado:

- El contrato se encuentra en ejecución normal.
- Las actividades ejecutadas corresponden al cronograma aprobado.
- El contratista ha dado cumplimiento a las obligaciones técnicas, administrativas y contractuales exigidas para el período evaluado.
- No existen observaciones que impidan el reconocimiento económico de las obras ejecutadas mediante el **Acta Parcial No. 1.**

Así mismo, se deja constancia que la forma de pago establecida en el contrato corresponde al reconocimiento de las cantidades de obra efectivamente ejecutadas y verificadas por la Interventoría, conforme a las actas parciales de obra debidamente aprobadas.

ALBERTO CASABIANCA MORENO
INGENIERO CIVIL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - UN



CERTIFICACIÓN DE AVAL PARA PAGO - ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1

CONTRATO DE OBRA No. 102 DEL 25 DE FEBRERO DE 2026
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 099 DEL 16 DE FEBRERO DE 2026

5. AVAL PARA PAGO

Con fundamento en las verificaciones técnicas, administrativas, financieras y contables efectuadas por esta Interventoría, se **CERTIFICA Y AVALA** el pago del **ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1**, de fecha **01 de junio de 2026**, por valor de:

CIENTO SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($171.226.881,81 M/CTE.)

por corresponder a cantidades de obra efectivamente ejecutadas, verificadas, medidas y recibidas a satisfacción por la Interventoría.

En consecuencia, esta Interventoría emite **CONCEPTO FAVORABLE** para que el **Hospital San Sebastián E.S.E. del Municipio de Piedras – Tolima** continúe con el trámite administrativo y financiero correspondiente al pago del **Acta Parcial de Obra No. 1**, previa verificación por parte de la Entidad Contratante del cumplimiento de las obligaciones legales, tributarias, parafiscales, laborales y de seguridad social a cargo del contratista.

6. RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORÍA

La presente certificación se expide como resultado de las actividades de seguimiento, control y vigilancia ejercidas por la Interventoría en desarrollo del **Contrato de Interventoría No. 099 del 16 de febrero de 2026**, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015 y las demás normas que regulan el ejercicio de la interventoría en la contratación estatal.

La aprobación del **Acta Parcial de Obra No. 1** obedece exclusivamente a la verificación técnica, administrativa, financiera y contable de las cantidades de obra efectivamente ejecutadas, medidas y recibidas a satisfacción por esta Interventoría, sin que ello implique la aceptación de obras futuras o de actividades que no hayan sido ejecutadas conforme a las especificaciones técnicas del contrato.

7. TRAZABILIDAD Y SOPORTE TÉCNICO DEL ACTA

La Interventoría deja constancia de que las cantidades de obra reconocidas en el **Acta Parcial de Obra No. 1** fueron verificadas mediante los siguientes mecanismos de control:

- Inspecciones técnicas permanentes en obra.
- Medición directa de cantidades ejecutadas.

ALBERTO CASABIANCA MORENO
INGENIERO CIVIL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - UN

- Revisión de memorias de cálculo.
- Revisión del presupuesto contractual y de las especificaciones técnicas.
- Registro fotográfico del avance de las actividades.
- Verificación del cumplimiento del cronograma de ejecución.
- Seguimiento diario consignado en la Bitácora Oficial de Obra.
- Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista.

Todos los soportes anteriormente relacionados reposan en el expediente contractual y en los archivos físicos y digitales de la Interventoría, formando parte integral de la presente certificación.

8. CERTIFICACIÓN FINAL

En mérito de lo anteriormente expuesto, el suscrito **Interventor Externo** certifica que el **Acta Parcial de Obra No. 1**, de fecha **01 de junio de 2026,** por valor de **CIENTO SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($171.226.881,81 M/CTE.)**, corresponde a obra efectivamente ejecutada, medida, revisada y recibida a satisfacción, razón por la cual **SE OTORGA AVAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y CONTABLE** para que el **Hospital San Sebastián E.S.E. del Municipio de Piedras** continúe con el trámite de pago correspondiente, previa verificación de los requisitos legales, presupuestales, tributarios, laborales y de seguridad social exigidos por la normatividad vigente.

La presente certificación constituye el soporte técnico de la aprobación del **Acta Parcial de Obra No. 1** y hace parte integral del expediente contractual, dejando constancia de que las cantidades de obra aquí reconocidas fueron verificadas mediante inspección en sitio, revisión de memorias de cálculo, registros fotográficos, ensayos de laboratorio y demás documentos técnicos que reposan en los archivos de la Interventoría.

Se expide en el Municipio de **Piedras, Tolima**, al **veintidós (22) día del mes de julio de dos mil veintiséis (2026).**

Ing. ALBERTO CASABIANCA MORENO
C.C. No. 93.132.900 – M.P. No. 17.20.20.93.597 CLD
Interventor Externo

Certificado
Bancario

2 de Julio de 2026

Señores:
A QUIEN PUEDA INTERESAR.

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que INCOBELCI S.A.S. identificado (a) con 900088145, a la fecha de expedición de ésta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta corriente	06800002014	2021-01-25	Activa

*Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01 800 09 1 2345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 71 7 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141190900892

(415)7707212489984(8020) 000014119090089 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 8 8 1 4 5	2	Impuestos y Aduanas de Ibagué	9

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INCOBELCI S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
INCOBELCI	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Tolima 7 3	Ibagué 0 0 1

41. Dirección principal
CR 6 53 29 TO EMPRESARIAL OF 904

42. Correo electrónico incobelcisas@yahoo.com.ar

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 8 2 7 6 5 9 1 4	3 1 1 2 2 9 2 6 7 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 0 6 0 5 3 0	4 2 2 0	2 0 0 6 0 5 3 0	4 1 1 2	4 2 1 0		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 4 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2025-07-11 / 05:22:14PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PORTELA TORRES DIDIER

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141190900892

(415)7707212489984(8020) 000014119090089 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 8 8 1 4 5	2	Impuestos y Aduanas de Ibagué	9

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 1	0 1
72. Número	0 0 0 0 1	8
73. Fecha	2 0 0 6 0 5 2 6	2 0 1 0 1 0 0 6
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 6 0 5 3 0	2 0 1 0 1 0 1 1
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 1 7 3 5 0 3	1 7 3 5 0 3
78. Departamento	7 3	7 3
79. Ciudad/Municipio	1 6	1 6

Vigencia

80. Desde	2 0 0 6 0 5 2 6	2 0 1 0 1 0 0 6
81. Hasta	2 0 1 0 1 0 0 6	2 9 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Cámara de Comercio — 3 2

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	2 1	2 0 1 0 1 0 1 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141190900892

(415)7707212489984(8020) 000014119090089 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
900088145	2	Impuestos y Aduanas de Ibagué	9

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 18	20130219

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 13	14244520		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PORTELA	TORRES	DIDIER	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141190900892

(415)7707212489984(8020) 000014119090089 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 8 8 1 4 5	2	Impuestos y Aduanas de Ibagué	9

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 1 0 5 3 7 1 9 5	3	2 7 1 8 6 4 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
MATOMA	CAMPOS	NEIDY	ANGELICA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 5 0 5 2 1

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 5 de 5 **Hoja 6**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141190900892

(415)7707212489984(8020) 000014119090089 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 8 8 1 4 5	2	Impuestos y Aduanas de Ibagué	9

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Construcción de otras obras de ingeniería civil 4 2 9 0

162. Nombre del establecimiento: INCOBELCI

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Tolima 7 3	Ibagué 0 0 1

165. Dirección: CR 5 43 86 ED RIVERA AP 501

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 0 1 7 3 5 0 4	2 0 0 6 0 5 3 0
168. Teléfono: 6 0 8 2 7 8 2 2 9 4	169. Fecha de cierre

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

El suscrito **DIDIER PORTELA TORRES** identificado con la cedula de ciudanía No. 14.244.520 de armero guayabal, en condición de representante legal y **NEIDY ANGELICA MATOMA CAMPOS**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.110.537.195 de Ibagué, con tarjeta profesional No. 271864-T, en mi condición de revisora fiscal de la empresa INCOBELCI S.A.S identificada con NIT 900.088.145-2, certifico que la empresa se encuentra al día con el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de los dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Para constancia de lo anterior se firma en Ibagué, el día 02 de julio de 2026.

Cordialmente,

DIDIER PORTELA TORRES
C.C. No. 14.244.520 de guayabal

Neidy Angelica Matoma C

NEIDY ANGELICA MATOMA CAMPOS
C.C. No. 1.110.537.195 de Ibagué
T.P. No. 271864-T

Ibagué, 28 de julio de 2026

CERTIFICACIÓN

Yo, **NEIDY ANGÉLICA MATOMA CAMPOS**, identificada con cédula de ciudadanía No. **1.110.537.195** y Tarjeta Profesional No. **271864-T**, en mi calidad de **Revisora Fiscal de INCOBELCI S.A.S.**, certifico que:

Para la ejecución del **Contrato No. 102 del FECHA: 25 de febrero de 2026**, cuyo objeto es **"CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALÁ, MUNICIPIO DE PIEDRAS – TOLIMA"**, INCOBELCI S.A.S. se subcontrató al señor **DIEGO GONZÁLEZ BAZURTO identificado con cedula de ciudadania N°** 93.395.334 para realizar la ejecución de las actividades requeridas dentro del mencionado contrato.

Durante los meses de **abril y mayo de 2026**, el señor Diego González Bazurto realizó directamente la afiliación del personal dispuesto para el desarrollo de las actividades a su cargo.

Posteriormente, en el mes de **junio de 2026**, el señor Diego González constituyó la sociedad **DJG CONSTRUCCIONES S.A.S.**, identificada con **NIT No. 902.070.443-0**, empresa a través de la cual se dio continuidad a las actividades contratadas y al personal que venía participando en la ejecución de la obra.

En consecuencia, a partir de junio de 2026, **DJG CONSTRUCCIONES S.A.S.** continuó con el personal requerido para el desarrollo de las actividades relacionadas con el Contrato No. 102 de 2026.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado para los fines pertinentes.

Atentamente,

Neidy Angelica Matoma C.

NEIDY ANGÉLICA MATOMA CAMPOS
C.C. No. 1.110.537.195 | T.P. No. 271864-T
Revisora Fiscal - INCOBELCI S.A.S.




UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

271864-T

NEIDY ANGELICA
MATOMA CAMPOS
C.C. 1110537196
RES. INSCRIPCION 927 DEL 30/06/2020
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

292507 305425

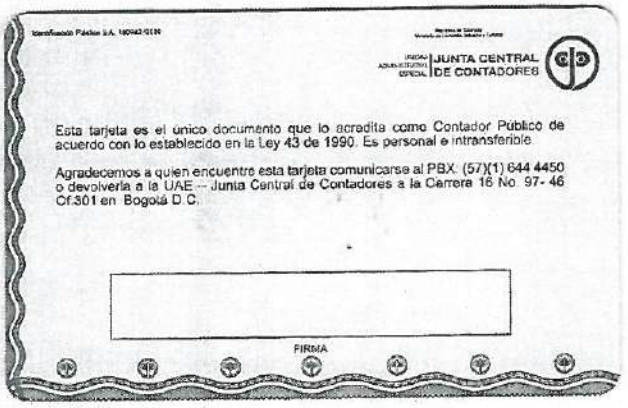

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX. (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.110.537.195

MATOMA CAMPOS

APELLIDOS

NEIDY ANGELICA

NOMBRES

Neidy Angélica Matoma C.

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 25-JUN-1993

SAN ANTONIO
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.50 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

21-JUL-2011 IBAGUE

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-2900100-00331801-F-1110537195-20110907 0027962498A 1 36890228

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.110.537.195

MATOMA CAMPOS

APELLIDOS

NEIDY ANGELICA

NOMBRES

Neidy Angélica Matoma C.

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 25-JUN-1993

SAN ANTONIO
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.50 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

21-JUL-2011 IBAGUE

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-2900100-00331801-F-1110537195-20110907 0027962496A 1 36890228

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A513A3C54B848BE

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **NEIDY ANGELICA MATOMA CAMPOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1110537195 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 271864-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 28 días del mes de Mayo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	93382200
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			RODRIGO DIAZ MELO
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	AV AMBALA N. 40 A 13	TELÉFONO:	2795491
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:				60152766 91	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERÍODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo	AÑO 2026		PERÍODO COTIZACION SALUD:	MES mayo	AÑO 2026
DIAS DE MORA:				34			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):				2026/07/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		405625548

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.000	$ 0	$ 280.200	$ 7.000	$ 287.200
SUBTOTALES										$ 280.200	$ 7.000	$ 287.200

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 216.900	$ 0	$ 5.500	$ 0	$ 216.900	$ 5.500	$ 0	$ 224.400
SUBTOTALES													$ 216.900	$ 5.500	$ 0	$ 224.400

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES / LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES	PENSIÓN ADMIN	PENSIÓN DIAS COT	PENSIÓN IBC	PENSIÓN COTIZACIÓN	PENSIÓN FSP SUBSISTENCIA	PENSIÓN FSP SOLIDARIDAD	PENSIÓN APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	PENSIÓN APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	PENSIÓN INDICADOR TARIFA ESPECIAL	PENSIÓN TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	SALUD DIAS COT	SALUD IBC	SALUD COTIZACIÓN	SALUD VALOR ADRES	SALUD TOTAL APORTE	ARP ADMIN	ARP DIAS COT	ARP IBC	ARP CENTRO DE TRABAJO	ARP TOTAL APORTE	PARAFISCALES DIAS COT	PARAFISCALES IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 93382200	DIAZ MELO RODRIGO	INDEPEND		$ 1.750.905				NO		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 216.900	$ 0	$ 216.900		0	$ 0		$ 0	0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 511.600

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	93380200
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			RODRIGO DIAZ MELO
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	AV AMBALA N. 40 A 18	TELÉFONO:	2730491
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			6015274328	TIPO DE PLANILLA:			INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/04/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			210116837

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
				EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
250301	250301-PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										$ 280.200	$ 0	$ 280.200

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002 SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																					SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	CON	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP					CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																											ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 93380200	DIAZ MELO RODRIGO	INDEPEND		$ 1.750.905				NO																		250301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900			$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 499.100

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	93380200
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			RODRIGO DIAZ MELO
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	AV AMBALA N. 40 A 13	TELÉFONO:	2793481
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6026935271	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES junio AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	4		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/07/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	455640485

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 900	$ 0	$ 280.200	$ 900	$ 281.100
SUBTOTALES:										$ 280.200	$ 900	$ 281.100

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 700	$ 0	$ 218.900	$ 700	$ 0	$ 219.600
SUBTOTALES:													$ 218.900	$ 700	$ 0	$ 219.600

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 93380200	DIAZ MELO RODRIGO	INDEPEND		$ 1.750.905			NO																	

SEGURIDAD SOCIAL – PENSIÓN

ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200

SEGURIDAD SOCIAL – SALUD

ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900

SEGURIDAD SOCIAL – ARP

ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
		$ 0		$ 0

PARAFISCALES

DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 500.700

Planilla Pagada

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93395334		GONZALEZ BAZURTO DIEGO JAVIER	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRAS SALADA	Conj brisas del cedro to 2 ap106	IBAGUE-TOLIMA	3102112605	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	291314025	9504493407	E	2026/05/11	2026/05/08	NEQUI	0	$181,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OBRAS SALADA (5 Afiliados)																						$583,635	$93,500			$583,635	$23,500			$583,635	$23,500			$583,635		$41,000		$0	$0		$181,500
Centro de Trabajo: OBRAS SALADO (5 Afiliados)																						$583,635	$93,500			$583,635	$23,500			$583,635	$23,500			$583,635		$41,000		$0	$0		$181,500
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (5 Afiliados)																						$583,635	$93,500			$583,635	$23,500			$583,635	$23,500			$583,635		$41,000		$0	$0		$181,500
1	CC	1005780853	AMORTEGUI AGATON NELSON ENRIQUE	X																23030 1	2	$116,727	$18,700	EPS002	2	$116,727	$4,700	CCF50	2	$116,727	$4,700	14-11	2	$116,727	6.960%	$8,200	2	$0	$0	SI	$36,300
2	CC	1006125356	GARCIA ORTEGA JHON FABER	X																23030 1	2	$116,727	$18,700	EPS041	2	$116,727	$4,700	CCF50	2	$116,727	$4,700	14-11	2	$116,727	6.960%	$8,200	2	$0	$0	SI	$36,300
3	CC	93391513	MORENO GIRALDO CARLOS JULIO	X																23030 1	2	$116,727	$18,700	EPS005	2	$116,727	$4,700	CCF50	2	$116,727	$4,700	14-11	2	$116,727	6.960%	$8,200	2	$0	$0	SI	$36,300
4	CC	6014565	NAICIPA JHON JAIRO	X																25-14	2	$116,727	$18,700	EPS002	2	$116,727	$4,700	CCF50	2	$116,727	$4,700	14-11	2	$116,727	6.960%	$8,200	2	$0	$0	SI	$36,300
5	CC	1110473038	ROA CUBILLOS JULIO CESAR	X																23030 1	2	$116,727	$18,700	EPS002	2	$116,727	$4,700	CCF50	2	$116,727	$4,700	14-11	2	$116,727	6.960%	$8,200	2	$0	$0	SI	$36,300
Total		Afiliados(5)																				$583,635	$93,500			$583,635	$23,500			$583,635	$23,500			$583,635		$41,000		$0	$0		$181,500

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$93,500	$0	$0	$93,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$18,700	$0	$0	$18,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$74,800	$0	$0	$74,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$41,000	$0	$0	$41,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$41,000	$0	$0	$41,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$23,500	$0	$0	$23,500
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	5	$23,500	$0	$0	$23,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$23,500	$0	$0	$23,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$4,700	$0	$0	$4,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$14,100	$0	$0	$14,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$4,700	$0	$0	$4,700
TOTAL				**5**	**$181,500**	**$0**	**$0**	**$181,500**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93395334		GONZALEZ BAZURTO DIEGO JAVIER	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRAS SALADA	Conj brisas del cedro to 2 ap106	IBAGUE-TOLIMA	3102112605	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	364459002	9506020393	E	2026/06/09	2026/06/04	BANCOLOMBIA	0	$6,901,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificacion		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OBRAS SALADA (17 Afiliados)																								$16,983,781	$2,718,300			$16,983,781	$680,400			$17,640,371	$706,500			$16,983,781		$1,182,800		$0	$0		$5,288,000
Centro de Trabajo: OBRAS SALADO (17 Afiliados)																								$16,983,781	$2,718,300			$16,983,781	$680,400			$17,640,371	$706,500			$16,983,781		$1,182,800		$0	$0		$5,288,000
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (17 Afiliados)																								$16,983,781	$2,718,300			$16,983,781	$680,400			$17,640,371	$706,500			$16,983,781		$1,182,800		$0	$0		$5,288,000
1	CC	1005780853	AMORTEGUI AGATON NELSON ENRIQUE		X															X	23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,828,723	$73,200	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$545,400
2	PT	7727763	BARRIOS COLLASO ERLIS JOSE	X	X															X	25-14	27	$1,575,815	$252,200	EPS037	27	$1,575,815	$63,100	CCF50	27	$1,641,474	$65,700	14-11	27	$1,575,815	6.960%	$109,700	27	$0	$0	SI	$490,700
3	CC	14273068	BERNAL MORENO DAIRO	X	X															X	23030 1	26	$1,517,451	$242,800	EPS037	26	$1,517,451	$60,700	CCF50	26	$1,580,678	$63,300	14-11	26	$1,517,451	6.960%	$105,700	26	$0	$0	SI	$472,500
4	CC	93403465	CARDONA GONZALEZ JUAN DARWIN	X	X															X	25-14	1	$58,364	$9,400	EPS005	1	$58,364	$2,400	CCF50	1	$60,796	$2,500	14-11	1	$58,364	6.960%	$4,100	1	$0	$0	SI	$18,400
5	CC	1122403914	CORDOBA OSPINO FABIAN JOSE	X	X															X	25-14	6	$350,181	$56,100	EPSIC1	6	$350,181	$14,100	CCF50	6	$364,772	$14,600	14-11	6	$350,181	6.960%	$24,400	6	$0	$0	SI	$109,200
6	CC	14239504	GALEANO CABRILLO IDUVIN DARIO	X	X															X	23020 1	27	$1,575,815	$252,200	EPS041	27	$1,575,815	$63,100	CCF50	27	$1,641,474	$65,700	14-11	27	$1,575,815	6.960%	$109,700	27	$0	$0	SI	$490,700
7	CC	1006125356	GARCIA ORTEGA JHON FABER		X															X	23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,828,723	$73,200	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$545,400
8	CC	93391513	MORENO GIRALDO CARLOS JULIO		X															X	23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,828,723	$73,200	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$545,400
9	CC	6014565	NAICIPA JHON JAIRO		X															X	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,828,723	$73,200	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$545,400
10	CC	1005856213	OSORIO DAZA YOHAN CAMILO	X	X															X	23030 1	6	$350,181	$56,100	EPS002	6	$350,181	$14,100	CCF50	6	$364,772	$14,600	14-11	6	$350,181	6.960%	$24,400	6	$0	$0	SI	$109,200
11	CC	1105610411	PEÑA VILLALOBOS HECTOR JAVIER	X	X																23020 1	4	$233,454	$37,400	EPS017	4	$233,454	$9,400	CCF50	4	$233,454	$9,400	14-11	4	$233,454	6.960%	$16,300	4	$0	$0	SI	$72,500
12	CC	1105611458	PEÑA VILLALOBOS LUIS MIGUEL	X	X															X	23030 1	4	$233,454	$37,400	EPS037	4	$233,454	$9,400	CCF50	4	$252,908	$10,200	14-11	4	$233,454	6.960%	$16,300	4	$0	$0	SI	$73,300
13	CC	1110473038	ROA CUBILLOS JULIO CESAR		X															X	23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,755,769	$70,300	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,500
14	CC	93358340	SALGUERO NARANJO FELIPE ANTONIO	X	X															X	25-14	27	$1,575,815	$252,200	EPS002	27	$1,575,815	$63,100	CCF50	27	$1,641,474	$65,700	14-11	27	$1,575,815	6.960%	$109,700	27	$0	$0	SI	$490,700
15	CC	1054553134	VALENCIA CUADROS FABIAN	X	X															X	23030 1	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF50	1	$60,796	$2,500	14-11	1	$58,364	6.960%	$4,100	1	$0	$0	SI	$18,400
16	CC	1058198492	VALENCIA CUADROS JONATHAN DAVID	X	X															X	25-14	2	$116,727	$18,700	EPS002	2	$116,727	$4,700	CCF50	2	$119,159	$4,800	14-11	2	$116,727	6.960%	$8,200	2	$0	$0	SI	$36,400
17	CC	1110531873	VARON BOHORQUEZ YUWAR ALEXANDER	X	X															X	23030 1	10	$583,635	$93,400	EPS037	10	$583,635	$23,400	CCF50	10	$607,953	$24,400	14-11	10	$583,635	6.960%	$40,700	10	$0	$0	SI	$181,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PIEDRAS (5 Afiliados)																								$5,194,353	$831,100			$5,194,353	$208,100			$5,303,784	$212,300			$5,194,353		$361,800		$0	$0		$1,613,500

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: PIEDRAS (5 Afiliados)									$5,194,353	$831,300			$5,194,353	$208,100			$5,303,784	$212,300			$5,194,353		$361,800		$0	$0		$1,613,500
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (5 Afiliados)									$5,194,353	$831,300			$5,194,353	$208,100			$5,303,784	$212,300			$5,194,353		$361,800		$0	$0		$1,613,500
18	CC	1005815592	BOCANEGRA PEREZ MIGUEL ANDREY	X	X	X	230301	15	$875,453	$140,100	EPS037	15	$875,453	$35,100	CCF50	15	$911,930	$36,500	14-11	15	$875,453	6.960%	$61,000	15	$0	$0	Si	$272,700
19	CC	5975918	FLOREZ CARRILLO GERMAN	X	X	X	230301	15	$875,453	$140,100	EPS037	15	$875,453	$35,100	CCF50	15	$911,930	$36,500	14-11	15	$875,453	6.960%	$61,000	15	$0	$0	Si	$272,700
20	CC	1110462175	MONTENEGRO GONZALEZ JOHAN MANUEL	X			230301	22	$1,283,997	$205,500	EPS002	22	$1,283,997	$51,400	CCF50	22	$1,283,997	$51,400	14-11	22	$1,283,997	6.960%	$89,400	22	$0	$0	Si	$397,700
21	CC	11308670	QUIMBAYO BERNAL JOSE OLIVERIO	X			25-14	22	$1,283,997	$205,500	EPS037	22	$1,283,997	$51,400	CCF50	22	$1,283,997	$51,400	14-11	22	$1,283,997	6.960%	$89,400	22	$0	$0	Si	$397,700
22	CC	1110482253	VIÑA VIÑA JUAN DIEGO	X	X	X	25-14	15	$875,453	$140,100	EPS002	15	$875,453	$35,100	CCF50	15	$911,930	$36,500	14-11	15	$875,453	6.960%	$61,000	15	$0	$0	Si	$272,700
Total	**Afiliados(22)**								$22,178,134	$3,549,600			$22,178,134	$888,500			$22,944,155	$918,800			$22,178,134		$1,544,600		$0	$0		$6,901,500

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				22	$3,549,600	$0	$0	$3,549,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	$1,214,400	$0	$0	$1,214,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	$2,045,600	$0	$0	$2,045,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$289,600	$0	$0	$289,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$1,544,600	$0	$0	$1,544,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	22	$1,544,600	$0	$0	$1,544,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$918,800	$0	$0	$918,800
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	22	$918,800	$0	$0	$918,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				22	$888,500	$0	$0	$888,500
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	1	$14,100	$0	$0	$14,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$9,400	$0	$0	$9,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$280,600	$0	$0	$280,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$133,200	$0	$0	$133,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	$378,700	$0	$0	$378,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$72,500	$0	$0	$72,500
TOTAL				22	$6,901,500	$0	$0	$6,901,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 902070443	0	DJG CONSTRUCCIONES SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	OBRAS SALADA	Conj brisas del cedro to 2 ap106	IBAGUE-TOLIMA	3102112605	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	505975389	9508415103	E	2026/07/10	2026/07/24	BANCOLOMBIA	14	$8,797,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO Identificación		Nombre	NOVEDADES ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	PENSION Codigo	Días	IBC	Aporte	SALUD Codigo	Días	IBC	Aporte	CCF Codigo	Dias	IBC	Aporte	RIESGOS Codigo	Dias	IBC	Aporte	PARAFISCALES Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1005780853	AMORTEGUI AGATON NELSON ENRIQUE	X																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
2	CC	72222328	BERDUGO TOVAR ALVARO RAFAEL	X																	230301	5	$291,818	$46,700	EPS037	5	$291,818	$11,700	CCF50	5	$291,818	$11,700	14-11	5	$291,818	$20,400	5	$0	$0	SI	$90,500
3	CC	14273068	BERNAL MORENO DAIRO	X																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
4	CC	1122403914	CORDOBA OSPINO FABIAN JOSE	X																	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPSIC1	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
5	PT	5200627	ESCALONA VALLADARES YSE ANTONIA	X																	230301	9	$525,272	$84,100	EPS002	9	$525,272	$21,100	CCF50	9	$525,272	$21,100	14-11	9	$525,272	$36,600	9	$0	$0	SI	$162,900
6	CC	93360083	FERNANDEZ PLAZAS RUSBEL	X																	230201	7	$408,545	$65,400	EPS002	7	$408,545	$16,400	CCF50	7	$408,545	$16,400	14-11	7	$408,545	$28,500	7	$0	$0	SI	$126,700
7	CC	14296420	FLOREZ MARTINEZ JUAN CARLOS	X																	230301	20	$1,167,270	$186,800	EPS002	20	$1,167,270	$46,700	CCF50	20	$1,167,270	$46,700	14-11	20	$1,167,270	$81,300	20	$0	$0	SI	$261,500
8	CC	14239504	GALEANO CARRILLO JDUVIN DARIO	X																	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
9	CC	1006125356	GARCIA ORTEGA JHON FABER	X																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
10	CC	93395334	GONZALEZ BAZURTO DIEGO JAVIER	X																	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
11	CC	1109070513	GRANADA PARRA JHON FREDY	X																	230301	7	$408,545	$65,400	EPS002	7	$408,545	$16,400	CCF50	7	$408,545	$16,400	14-11	7	$408,545	$28,500	7	$0	$0	SI	$126,700
12	CC	14240350	HERNANDEZ OSPINA SAUL	X																		0	$0	$0	EPS002	22	$1,283,997	$51,400	CCF50	22	$1,283,997	$51,400	14-11	22	$1,283,997	$89,400	22	$0	$0	SI	$192,200
13	CC	93391513	MORENO GIRALDO CARLOS JULIO	X																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
14	CC	6014565	NAICIPA JHON JAIRO	X																	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
15	CC	1005856213	OSORIO DAZA YOHAN CAMILO	X																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
16	CC	1110487863	PACHON CASTRO DIEGO FERNANDO	X	X															X	230301	3	$175,091	$28,100	EPS002	3	$175,091	$7,100	CCF50	3	$182,386	$7,300	14-11	3	$175,091	$12,200	3	$0	$0	SI	$54,700
17	CC	1105610411	PEÑA VILLALOBOS HECTOR JAVIER	X																	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
18	CC	1105611458	PEÑA VILLALOBOS LUIS MIGUEL	X																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
19	CC	1110473038	ROA CUBILLOS JULIO CESAR	X																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
20	CC	93358340	SALGUERO NARANJO FELIPE ANTONIO	X																	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
21	CC	7227763	TORRES ROJAS EDGAR HUMBERTO	X																	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
Total	Afiliados(21)																						$27,489,211	$4,399,300			$28,773,208	$1,152,200			$28,780,503	$1,152,400			$28,773,208	$2,003,500		$0	$0		$8,707,400

2026/07/23 07:51 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 902070443	0	DJG CONSTRUCCIONES SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	OBRAS SALADA	Conj brisas del cedro to 2 ap106	IBAGUE-TOLIMA	3102112605	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	505975389	9508415103	E	2026/07/10	2026/07/24	BANCOLOMBIA	14	$8,797,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				20	$4,399,300	$45,300	$0	$4,444,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$840,600	$8,700	$0	$849,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	$2,372,500	$24,400	$0	$2,396,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,186,200	$12,200	$0	$1,198,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$2,003,500	$20,600	$0	$2,024,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	21	$2,003,500	$20,600	$0	$2,024,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$1,152,400	$11,900	$0	$1,164,300
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	21	$1,152,400	$11,900	$0	$1,164,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				21	$1,152,200	$12,200	$0	$1,164,400
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	1	$70,100	$800	$0	$70,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$70,100	$800	$0	$70,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$151,900	$1,600	$0	$153,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$210,300	$2,200	$0	$212,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	11	$509,600	$5,300	$0	$514,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$140,200	$1,500	$0	$141,700
TOTAL				21	$8,707,400	$90,000	$0	$8,797,400

2026/07/23 07:51 PM

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que DIDIER FELIPE PORTELA GALINDO identificado(a) con CC 1110560167 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CONSORCIO OBRAS ESPECIALES HIDROSANITARIAS IBAGUE NI 902052376

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9507649056	459578038	E	2026-07-07	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-07	30																	
9507649056	459578038	E	2026-07-07	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-06	30																	
9507649056	459578038	E	2026-07-07	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-06	30																	
9507649056	459578038	E	2026-07-07	CCF	CCF50	COMFENALCO TOLIMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-06	30																	
9506021947	364547734	E	2026-06-04	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-06	30							X										
9506021947	364547734	E	2026-06-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30							X										
9506021947	364547734	E	2026-06-04	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30							X										
9506021947	364547734	E	2026-06-04	CCF	CCF50	COMFENALCO TOLIMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30							X										
9505156261	328797955	E	2026-05-22	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	2	X																
9505156261	328797955	E	2026-05-22	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	2	X																
9505156261	328797955	E	2026-05-22	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	2	X																
9505156261	328797955	E	2026-05-22	CCF	CCF50	COMFENALCO TOLIMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	2	X																

Este certificado se expide el día 2026-07-28 a las 12:07.

HOSPITAL SAN SEBASTIAN – ESE I NIVEL PIEDRAS TOLIMA NIT. 809.005.249-4		VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	190.252.096,60
	CONTRATO DE OBRA No. 102 Del 25 de febrero de 2026	VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:	0,00
		VALOR TOTAL:	190.252.096,60
	OBJETO: CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALÁ, MUNICIPIO DE PIEDRAS – TOLIMA	PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES
	CONTRATISTA: INCOBELCI S.A.S.		
	Nit: 900.088.145 – 2		
	REP. LEGAL: Ing. DIDIER PORTELA TORRES	FECHA DE INICIACION:	11/03/2026
	C.C. No. 14.244.520		
	SUPERVISOR: Dra. MARIA PAZ GAITAN OÑATE	FECHA DE TERMINACION:	10/06/2026
	Administradora HSS		
	INTERVENTOR: Ing. ALBERTO CASABIANCA MORENO		
ACTA PARCIAL No.01	C.C. No. 93.132.900	FECHA PRESENTE ACTA:	1/06/2026

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 1			PRESENTE ACTA PARCIAL No. 1		ACUMULADO	
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
1,00	PRELIMINARES								
1.1	RASPADO Y LIJADO DE PINTURA	M2	82,81	17.599,12	1.457.382,79	82,81	1.457.382,79	82,81	1.457.382,79
1.2	DEMOLICIONES (MUROS)	M2	44,95	8.088,61	363.583,19	44,95	363.583,19	44,95	363.583,19
1.3	DEMOLICIONES DE PISOS EN CERAMICA, PORCELANATO O ESMALTADOS	M2	55,12	19.886,88	1.096.164,93	55,12	1.096.164,93	55,12	1.096.164,93
1.4	DEMOLICIONES (GUARDA ESCOBAS)	ML	37,50	5.359,06	200.964,84	37,50	200.964,84	37,50	200.964,84
1.5	DEMOLICIONES (ENCHAPE - MUROS)	M2	12,80	8.861,78	113.430,78	12,80	113.430,78	12,80	113.430,78
1.6	DEMOLICION (MESON EN CONCRETO)	M2	3,60	34.695,65	124.904,33	3,60	124.904,33	3,60	124.904,33
1.7	DESMONTE (SANITARIOS Y LAVAMANOS)	UND	1,00	36.012,90	36.012,90	1,00	36.012,90	1,00	36.012,90
1.8	DESMONTE (CIELO RASO)	M2	40,50	15.005,38	607.717,69	40,50	607.717,69	40,50	607.717,69
1.9	DESMONTE CARPINTERIA METALICA PUERTAS, VENTANAS,VACIADO Y LIMPIEZA DE MARCOS)	UND	12,00	25.723,50	308.682,00	12,00	308.682,00	12,00	308.682,00
1.10	DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE	M2	57,66	15.205,16	876.729,53	57,66	876.729,53	57,66	876.729,53
1.11	RETIRO DE ESCOMBROS (BOTADERO AUTORIZADO LA	M3	13,37	59.000,00	788.830,00	13,37	788.830,00	13,37	788.830,00
1.12	TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE Y ESCOMBRO	M3	13,37	36.836,25	492.500,66	13,37	492.500,66	13,37	492.500,66
2,00	EXCAVACIONES -RELLENOS								
2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3	3,24	42.872,50	138.906,90	3,24	138.906,90	3,24	138.906,90
2.2	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE SITIO	M3	1,07	30.010,75	32.111,50	1,07	32.111,50	1,07	32.111,50
3,00	PLACA CONTRA PISO (AL INTERIOR DE LA EDIFICACION)								
3.1	PLACA DE CONTRA PISO DE 2500 PSI INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 15x15 5mm E:0.10cm	M2	10,50	68.404,64	718.248,71	10,50	718.248,71	10,50	718.248,71
4,00	OBRAS EN CUBIERTA								
4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA INCLUYE SOPORTES VERTICALES, PLATINAS, CHASOS EXPANSIVOS, PINTURA EMALTE, ANTICORROSIVO (TUBO RECTANGULAR 76 x 38 x 1.1mm x 6m) SECTOR ANTEJARDIN FACHADA PRINCIPAL	M2	33,49	154.271,12	5.166.539,94	33,49	5.166.539,94	33,49	5.166.539,94
4.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA TERMOACUSTICA UPVC CRESTA ALTA (INCLUYE TORNILLOS, CAPUCHON Y SIKA FLEX)	M2	69,27	108.170,06	7.492.939,99	69,27	7.492.939,99	69,27	7.492.939,99

HOSPITAL SAN SEBASTIAN – ESE I NIVEL PIEDRAS TOLIMA NIT. 809.005.249-4		VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	190.252.096,60
	CONTRATO DE OBRA No. 102 Del 25 de febrero de 2026	VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:	0,00
		VALOR TOTAL:	190.252.096,60
	OBJETO: CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALÁ, MUNICIPIO DE PIEDRAS – TOLIMA	PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES
	CONTRATISTA: INCOBELCI S.A.S.		
	Nit: 900.088.145 – 2		
	REP. LEGAL: Ing. DIDIER PORTELA TORRES	FECHA DE INICIACION:	11/03/2026
	C.C. No. 14.244.520		
	SUPERVISOR: Dra. MARIA PAZ GAITAN OÑATE	FECHA DE TERMINACION:	10/06/2026
	Administradora HSS		
	INTERVENTOR: Ing. ALBERTO CASABIANCA MORENO		
ACTA PARCIAL No.01	C.C. No. 93.132.900	FECHA PRESENTE ACTA:	1/06/2026

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 1			PRESENTE ACTA PARCIAL No. 1		ACUMULADO	
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE EN TEJA TERMOACUSTICA CRESTA BAJA SEGUN EL COLOR (INCLUYE TORNILLOS, CAPUCHON Y SIKA FLEX	ML	6,65	63.456,81	421.987,79	6,65	421.987,79	6,65	421.987,79
4.4	SUMINISTRO E INSTALCION CANAL GALABANIZADA CAL 22 DESARROLLO 61CM, INCLUYE WASH PRIMER Y SOPORTES EN ANGULO 3/4 X 1/8 (PREFABRICADA)	ML	13,30	222.929,90	2.964.967,67	13,30	2.964.967,67	13,30	2.964.967,67
4.5	BAJANTE PVC AMAZONAS	ML	7,00	48.978,43	342.849,01	7,00	342.849,01	7,00	342.849,01
4.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE METALICO (INCLUYE SIKAFLEX, CORTE CON DISCO DE TUNGSTENO)	ML	14,08	51.587,59	726.353,31	0,00	0,00	0,00	0,00
5,00	MAMPOSTERIA, ESTR. DE CONFINAMIENTO, PINTURA, PAÑETE Y ESTUCO								
5.1	MURO EN BLOQUE H4	M2	53,00	62.069,12	3.289.663,38	53,00	3.289.663,38	53,00	3.289.663,38
5.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 3000PSI VERTICAL, SECCION 15X20	ML	10,00	153.715,79	1.537.157,90	10,00	1.537.157,90	10,00	1.537.157,90
5.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 3000PSI HORIZONTAL SECCION 15X30	ML	12,20	158.582,42	1.934.705,51	12,20	1.934.705,51	12,20	1.934.705,51
5.4	PAÑETE MURO (INCL. FILOS, DILATACIONES Y CARTERAS)	M2	121,78	27.511,60	3.350.362,26	121,78	3.350.362,26	121,78	3.350.362,26
5.5	PAÑETE MURO IMPERMEABILIZADO (INCL FILOS, DILAT Y CARTERAS)	M2	53,03	31.164,40	1.652.648,39	53,03	1.652.648,39	53,03	1.652.648,39
5.6	ESTUCO PLASTICO DOS MANOS	M2	174,65	23.076,58	4.030.324,11	174,65	4.030.324,11	174,65	4.030.324,11
5.7	PINTURA INTERIOR DOS MANOS EN MUROS ANTIBACTERIAL-ANTIMOHO-LAVABLE (CORONA)	M2	64,82	17.485,10	1.133.383,97	64,82	1.133.383,97	64,82	1.133.383,97
5.8	GRANIPLAST HIDROFUGADO	M2	35,14	30.465,45	1.070.408,87	0,00	0,00	0,00	0,00
5,90	PINTURA KORAZA TRES MANOS	M2	30,00	26.389,99	791.699,68	30,00	791.699,68	30,00	791.699,68
6,00	PISOS Y CIELO RASO								
6.1	ALISTADO PISO 1:5 E:04M	M2	57,71	34.359,01	1.982.858,74	57,71	1.982.858,74	57,71	1.982.858,74
6.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBAS (FORMATO 60X60)	ML	48,35	27.974,66	1.352.574,66	48,35	1.352.574,66	48,35	1.352.574,66

HOSPITAL SAN SEBASTIAN – ESE I NIVEL PIEDRAS TOLIMA NIT. 809.005.249-4 ACTA PARCIAL No.01		VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	190.252.096,60
	CONTRATO DE OBRA No. 102 Del 25 de febrero de 2026	VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:	0,00
		VALOR TOTAL:	190.252.096,60
	OBJETO: CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALÁ, MUNICIPIO DE PIEDRAS – TOLIMA	PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES
	CONTRATISTA: INCOBELCI S.A.S.		
	Nit: 900.088.145 – 2		
	REP. LEGAL: Ing. DIDIER PORTELA TORRES	FECHA DE INICIACION:	11/03/2026
	C.C. No. 14.244.520		
	SUPERVISOR: Dra. MARIA PAZ GAITAN OÑATE	FECHA DE TERMINACION:	10/06/2026
	Administradora HSS		
	INTERVENTOR: Ing. ALBERTO CASABIANCA MORENO		
	C.C. No. 93.132.900	FECHA PRESENTE ACTA:	1/06/2026

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 1			PRESENTE ACTA PARCIAL No. 1		ACUMULADO	
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
6.3	CIELO RASO EN DRYWALL (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE, MASILLA Y PINTURA)	M2	20,00	75.880,61	1.517.612,25	20,00	1.517.612,25	20,00	1.517.612,25
7,00	ENCHAPE Y ACCESORIOS BAÑOS								
7.1	CERAMICA PARED DE 60x30- BAÑOS (INCLUYE BOQUILLA COLOR, WING Y LNEALES)	M2	94,25	91.427,68	8.617.058,58	94,25	8.617.058,58	94,25	8.617.058,58
7.2	CERAMICA PISO FORMATO 60x60 (INCLUYE BOQUILLA COLOR Y LINEALES) - (TRAFICO PESADO)	M2	68,26	112.088,28	7.651.145,81	68,26	7.651.145,81	68,26	7.651.145,81
7.3	POCETA LAVATRAPEROS INCLUYE(BLOQUE H4, PAÑETE IMPEMEABILIZADO, ENCHAPE, MOLDURA EN ALUMINIO, CARTERAS, FILOS, ALISTADO DE PISO Y ENCHAPE DE PISO)	UND	1,00	310.396,45	310.396,45	1,00	310.396,45	1,00	310.396,45
7.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO INSTITUCIONAL CORONA (INCLUYE ACOPLES)	UND	2,00	810.387,80	1.620.775,60	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS CON PEDESTAL CORONA (INCLUYE ACOPLES, GRIFERÍA LAVAMANOS MONOCONTROL ALUVIA, CONJUNTO DESAGUE LAVAMANOS)-(BAÑOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD)	UND	1,00	451.340,65	451.340,65	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS CON PEDESTAL CORONA (INCLUYE ACOPLES, CONJUNTO DESAGUE LAVAMANOS, KIT GRIFERIA INDUSTRIAL CON CONTROL DE PEDAL INSTITUCIONAL)-(CONSULTORIOS)	UND	2,00	495.240,65	990.481,30	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7	KIT BARRA DE SEGURIDAD PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (1 BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE ACERO 304 Y 1 BARRA DE SEGURIDAD AGARRADERA ACERO INOXIDABLE 60CM PREMIUM)	UND	2,00	355.199,50	710.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.8	TAPA REGISTRO PVC 15X15 (INCLUYE CAJA LLAVE REGISTRO)	UND	5,00	35.063,27	175.316,35	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA 3 " DE PISO ANTICUCARACHAS, CON SOSCO	UND	4,00	61.292,90	245.171,60	0,00	0,00	0,00	0,00
7,10	DISPENSADOR DE JABON	UND	3,00	154.910,75	464.732,25	0,00	0,00	0,00	0,00
7,11	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO	UND	2,00	187.910,75	375.821,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7,12	DISPENSADOR DE TOAYAS DE PAPEL	UND	2,00	225.912,90	451.825,80	0,00	0,00	0,00	0,00

HOSPITAL SAN SEBASTIAN – ESE I NIVEL
PIEDRAS TOLIMA
NIT. 809.005.249-4

ACTA PARCIAL No.01

CONTRATO DE OBRA No. 102 Del 25 de febrero de 2026

OBJETO: CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALÁ, MUNICIPIO DE PIEDRAS – TOLIMA

CONTRATISTA: INCOBELCI S.A.S.
Nit: 900.088.145 – 2
REP. LEGAL: Ing. DIDIER PORTELA TORRES
C.C. No. 14.244.520
SUPERVISOR: Dra. MARIA PAZ GAITAN OÑATE
Administradora HSS
INTERVENTOR: Ing. ALBERTO CASABIANCA MORENO
C.C. No. 93.132.900

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	190.252.096,60
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:	0,00
VALOR TOTAL:	190.252.096,60
PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES
FECHA DE INICIACION:	11/03/2026
FECHA DE TERMINACION:	10/06/2026
FECHA PRESENTE ACTA:	1/06/2026

ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 1			PRESENTE ACTA PARCIAL No. 1		ACUMULADO	
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
7,13	DISPENSADOR DE GEL ANTIBACTERIAL	UND	3,00	111.639,00	334.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPINTERIA -ESPEJOS-VIDRIOS-ALUMINIO								
8.1	MUEBLE EN AGLOMERADO RH EXP 15MM INCLUYE ((HERRAJES, BOTONES, CANTOS, TAPA TORNILLOS)	ML	3,40	635.661,22	2.161.248,14	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	PUERTA ENTAMBORADA EN AGLOMERADO, INCLUYE (MARCO EN MADERA, BISAGRAS Y CHAPA TIPO PALANCA) 0,90 X 2,00	UND	5,00	759.087,62	3.795.438,09	5,00	3.795.438,09	5,00	3.795.438,09
8.3	VENTANA SENCILLA EN ALUMINIO COLOR BLANCO CORREDIZA EN DOS CUERPOS PERFIL 744 INCLUYE ALFAJIA DE 8MM)	M2	5,98	489.236,83	2.927.103,97	5,98	2.925.636,26	5,98	2.925.636,26
8.4	ESPEJO 4MM	M2	1,20	160.798,00	192.957,60	0,00	0,00	0,00	0,00
9,00	SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRICA								
9.1	SALIDA PARA ILUMINACION INCLUYE (LED 12W, INTERRUPTOR, CABLE LIBRE DE ALOGENO, CAJA CUADRADA, CURVAS PVC 1/2, TUBO PVC 1/2 Y SUPLEMENTO)	UND	13,00	225.708,67	2.934.212,67	13,00	2.934.212,67	13,00	2.934.212,67
9.2	SALIDAS PARA TOMA CORRIENTE MONOFASICO DE 110V USO GENERA INCLUYE (TOMA CORRIENTE DOBLE, CABLE LIBRE DE ALOGENO, CAJA CUADRADA, CURVAS PVC 1/2, TUBO PVC 1/2 Y SUPLEMENTO)	UND	22,00	172.997,92	3.805.954,17	22,00	3.805.954,17	22,00	3.805.954,17
9.3	REGATAS	ML	37,62	13.308,70	500.673,30	37,62	500.673,30	37,62	500.673,30
10,00	SUMINISTRO E INSTALACION HIDROSANITARIAS Y AGUAS								
10.1	TUBERIA 1/2" PVC PRESION	ML	18,00	39.012,05	702.216,84	18,00	702.216,84	18,00	702.216,84
10.2	PUNTO HIDRAULICO 1/2"	UND	8,00	56.026,82	448.214,52	8,00	448.214,52	8,00	448.214,52
10.3	TUBERIA SANITARIA 3" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	18,00	73.102,67	1.315.848,11	18,00	1.315.848,11	18,00	1.315.848,11
10.4	TUBERIA SANITARIA 2" (INCLYE ACCEOSORIOS)	ML	9,00	60.352,40	543.171,64	9,00	543.171,64	9,00	543.171,64
10.5	REGISTRO PVC PRESION 1/2"	UND	5,00	45.538,45	227.692,25	5,00	227.692,25	5,00	227.692,25
10.6	SUMINITRO E INSTALACION DE TANQUE ELEVADO DE 600 LTS (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	1,00	808.804,90	808.804,90	1,00	808.804,90	1,00	808.804,90
10.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMINAL TIPO JARDIN	UND	2,00	73.053,60	146.107,20	2,00	146.107,20	2,00	146.107,20
10.8	PUNTO SANITARIO DE 2" O DE 1-1/2	UND	7,00	61.523,53	430.664,72	7,00	430.664,72	7,00	430.664,72

HOSPITAL SAN SEBASTIAN – ESE I NIVEL PIEDRAS TOLIMA NIT. 809.005.249-4 ACTA PARCIAL No.01			
	CONTRATO DE OBRA No. 102 Del 25 de febrero de 2026	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	190.252.096,60
		VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:	0,00
		VALOR TOTAL:	190.252.096,60
	OBJETO: CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALÁ, MUNICIPIO DE PIEDRAS – TOLIMA	PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES
	CONTRATISTA: INCOBELCI S.A.S.		
	Nit: 900.088.145 – 2		
	REP. LEGAL: Ing. DIDIER PORTELA TORRES	FECHA DE INICIACION:	11/03/2026
	C.C. No. 14.244.520		
	SUPERVISOR: Dra. MARIA PAZ GAITAN OÑATE	FECHA DE TERMINACION:	10/06/2026
	Administradora HSS		
	INTERVENTOR: Ing. ALBERTO CASABIANCA MORENO		
	C.C. No. 93.132.900	FECHA PRESENTE ACTA:	1/06/2026

ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 1			PRESENTE ACTA PARCIAL No. 1		ACUMULADO	
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
10.9	PUNTO SANITARIO DE 3"	UND	2,00	87.002,55	174.005,11	2,00	174.005,11	2,00	174.005,11
11,00	CARPINTERIA METALICA								
11.1	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA AGATA 6 DILATACIONES DE 0.80 X 2.10 ALA Y MARCO EN LAMINA CR CALIBRE 20. PINTURA ELECTROSTÁTICA BLANCA, CERRADURA DE INCRUSTAR TRES PASADORES K35MM, ESCUDO CUADRADO ACERO INOXIDABLE, BISAGRAS OMEGAS, PINTURA ELECTROSTÁTICA.	UND	2,00	752.555,94	1.505.111,89	2,00	1.505.111,89	2,00	1.505.111,89
11,20	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA AGATA 6 DILATACIONES DE 0.90 X 2.10 Y MARCO EN LAMINA CR CALIBRE 20. PINTURA ELECTROSTÁTICA BLANCA, CERRADURA DE INCRUSTAR TRES PASADORES K35MM, ESCUDO CUADRADO ACERO INOXIDABLE, BISAGRAS OMEGAS (REVISAR MANO DE OBRA,) (PREFABRICADA)	UND	2,00	772.555,94	1.545.111,89	2,00	1.545.111,89	2,00	1.545.111,89
11,30	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA PARA VENTANAS EN CARPINTERIA METALICA TUBO CUADRADO DE 3/4" CALIBRE 18 (INCLUYE ANTICORROSIVO, CHASOS EXPANSIVOS Y TRANSPORTE)	M2	32,81	189.331,24	6.211.957,89	22,70	4.297.819,08	22,70	4.297.819,08
11,40	SUMINISTRO E INTALACION DE ESTRUCTURA EN CARPINTERIA METALICA (Perfil C Gr50 150 x 50 x 1.5mm x 6m Galvanizado) PARA SOPORTE DE PANELES SOLARES	M2	30,00	243.968,32	7.319.049,60	30,00	7.319.049,60	30,00	7.319.049,60
12,00	ASEO GENERAL								
12.1	ASEO GENERAL ENTREGA	M2	57,71	5.877,22	339.174,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR COSTO DIRECTO - OBRA				108.549.308,92		96.322.779,09		96.322.779,09
	ADMINISTRACION	%	24,00		26.051.834,14		23.117.466,98		23.117.466,98
	IMPREVISTOS	%	1,00		1.085.493,09		963.227,79		963.227,79
	UTILIDAD	%	5,00		5.427.465,45		4.816.138,95		4.816.138,95
	VALOR COSTO INDIRECTO - OBRA				32.564.792,68		28.896.833,73		28.896.833,73
	VALOR COSTO TOTAL - OBRA				141.114.101,60		125.219.612,81		125.219.612,81

HOSPITAL SAN SEBASTIAN – ESE I NIVEL
PIEDRAS TOLIMA
NIT. 809.005.249-4

ACTA PARCIAL No.01

CONTRATO DE OBRA No. 102 Del 25 de febrero de 2026	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	190.252.096,60
	VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:	0,00
	VALOR TOTAL:	190.252.096,60
OBJETO: CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALÁ, MUNICIPIO DE PIEDRAS – TOLIMA	PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES
CONTRATISTA: INCOBELCI S.A.S.		
Nit: 900.088.145 – 2		
REP. LEGAL: Ing. DIDIER PORTELA TORRES	FECHA DE INICIACION:	11/03/2026
C.C. No. 14.244.520		
SUPERVISOR: Dra. MARIA PAZ GAITAN OÑATE	FECHA DE TERMINACION:	10/06/2026
Administradora HSS		
INTERVENTOR: Ing. ALBERTO CASABIANCA MORENO		
C.C. No. 93.132.900	FECHA PRESENTE ACTA:	1/06/2026

ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 1			PRESENTE ACTA PARCIAL No. 1		ACUMULADO	
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
13,00	MOBILIARIO USO PUESTO DE SALUD								
13,10	SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTO EN SERVICIO DE LETRERO ILUMINADO EN ACRILICO EN COLORES PRIMARIOS, EXPESOR DE LA LAMINA 3MM, INCLUYE TRANSPORTE Y LED (MEDIDAS 2,00 X 0,80) - (PREFABRICADO)	UND	1,00	2.630.862,18	2.630.862,18	0,00	0,00	0,00	0,00
13,20	SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO PLANTA SOLAR HIBRIDA 3,85 KWP 7,6 KW US FO	UND	1,00	32.792.661,34	32.792.661,34	1,00	32.792.661,34	1,00	32.792.661,34
13,30	SUMINSTRO E INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT INVERTER YORK DE 12.000 BTU/H, R410A, 220/1/60	UND	2,00	2.934.454,62	5.868.909,24	2,00	5.868.909,24	2,00	5.868.909,24
	SUB - TOTAL MOBILIARIO				41.292.432,77		38.661.570,59		38.661.570,59
	IVA	%	19,00		7.845.562,23		7.345.698,41		7.345.698,41
	TOTAL MOBILIARIO				49.137.995,00		46.007.269,00		46.007.269,00
	VALOR TOTAL OBRA + MOBILIARIO				190.252.096,60		171.226.881,81		171.226.881,81

BALANCE DEL CONTRATO

			% Ejecucion
VALOR TOTAL OBRA + MOBILIARIO	190.252.096,60		
VALOR ACTA PARCIAL No. 01		171.226.881,81	90,00
VALOR SIN EJECUTAR		19.025.214,79	10,00
SUMAS IGUALES	190.252.096,60	190.252.096,60	100,00

BALANCE DEL ANTICIPO

V/ANTICIPO CONCEDIDO	0,00	
V/AMORTIZACION ACTA PARCIAL No 01		0,00
V/SALDO POR AMORTIZAR		0,00
SUMAS IGUALES	0,00	0,00

VALOR NETO A CANCELAR

VALOR ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01	171.226.881,81
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO	0,00
VALOR NETO A CANCELAR	171.226.881,81

SON: CIENTO SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS

HOSPITAL SAN SEBASTIAN – ESE I NIVEL PIEDRAS TOLIMA NIT. 809.005.249-4		VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	190.252.096,60
	CONTRATO DE OBRA No. 102 Del 25 de febrero de 2026	VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:	0,00
		VALOR TOTAL:	190.252.096,60
	OBJETO: CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALÁ, MUNICIPIO DE PIEDRAS – TOLIMA	PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES
	CONTRATISTA: INCOBELCI S.A.S.		
	Nit: 900.088.145 – 2		
	REP. LEGAL: Ing. DIDIER PORTELA TORRES	FECHA DE INICIACION:	11/03/2026
	C.C. No. 14.244.520		
	SUPERVISOR: Dra. MARIA PAZ GAITAN OÑATE	FECHA DE TERMINACION:	10/06/2026
	Administradora HSS		
	INTERVENTOR: Ing. ALBERTO CASABIANCA MORENO		
ACTA PARCIAL No.01	C.C. No. 93.132.900	FECHA PRESENTE ACTA:	1/06/2026

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONDICIONES ACTUALIIZADAS No. 1			PRESENTE ACTA PARCIAL No. 1		ACUMULADO	
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL

Dra. MARIA PAZ GAITAN OÑATE
Administradora HSS
SUPERVISORA

Ing. JUAN DANIEL GARBOA GALEANO
APOYO A LA SUPERVISIÓN


Ing. ALBERTO CASABIANCA MORENO
INTERVENTOR

INCOBELCI S.A.S.
R.L. Ing. DIDIER PORTELA TORRES
CONTRATISTA DE OBRA

FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO		
FECHA	DD 1 MM 6 AA 2026	CORTE N° 1	ELABORÓ: Ing. Diego Fernando Portela Florez
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS, TOLIMA		INCOBELCI S.A.S.
CONTRATO	102 Del 25 de febrero de 2026		

CAPÍTULO	1,00	ITEM	1.1	RASPADO Y LIJADO DE PINTURA	UNIDAD	M2	UBICACIÓN	PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA



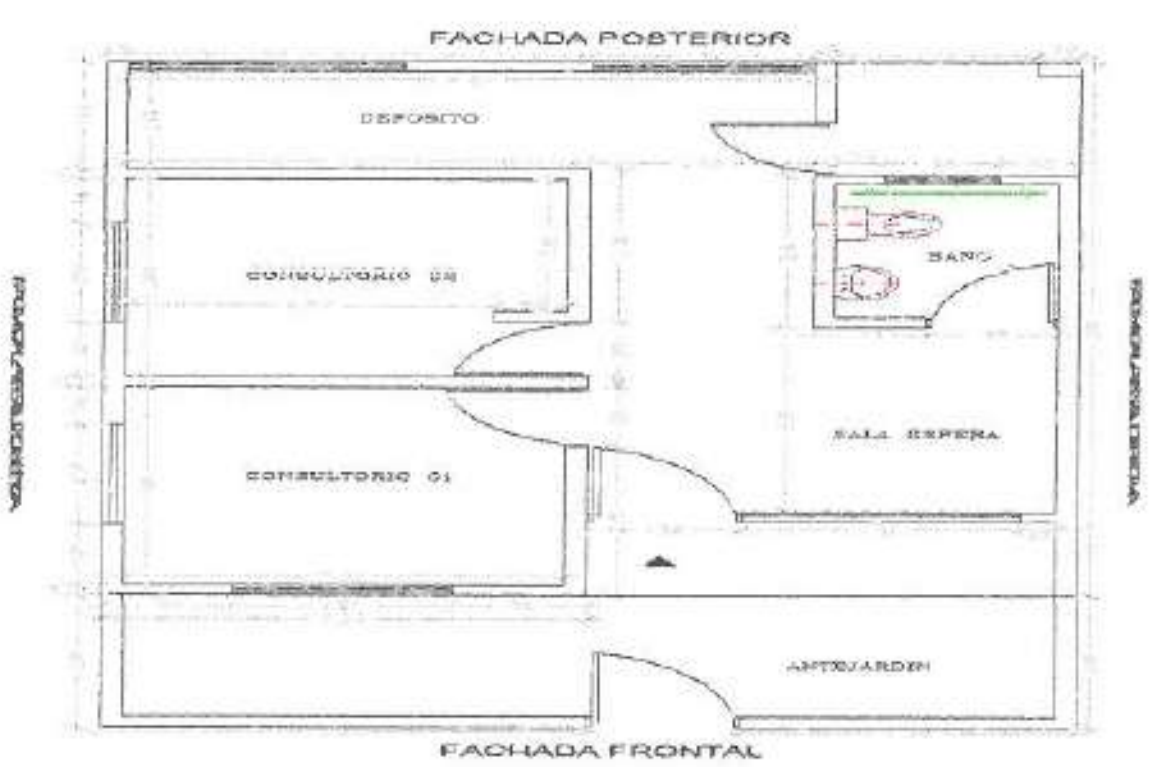

Localización	ELEMENTOS LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	Medida Total
FACHADA FRONTAL	3,30		3,00	1,00	9,90
FACH. LATE. IZQUIERDA	8,08		3,20	1,00	25,86
FACH. LATE. DERECHA	6,38		3,20	1,00	20,42
FACHADA POSTERIOR	4,96		3,00	1,00	14,88
CONSULTORIO 1	3,00		0,60	1,00	1,80
CONSULTORIO 2	3,00		0,60	1,00	1,80
DEPOSITO	4,66		0,60	1,00	2,80
SALA ESPERA	2,80		0,60	1,00	1,68
ANTEPECHO ANTEJARDI	9,60		0,85	2,00	16,32
DESCUENTOS VENTAN					
VENT. FACH. FRONTAL	1,50		1,60	-1,00	-2,40
VENT. FACH. IZQUIE.	1,50		1,60	-2,00	-4,80
VENT. FACH. POSTERIOR	1,50		1,60	-1,00	-2,40
	1,90		1,60	-1,00	-3,04
Subtotal					82,81
TOTAL					82,81

OBSERVACIONES:


FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO

FECHA	DD	1	MM	6	AA	2026	CORTE N°	1	ELABORO	Ing. Diego Fernando Portela Flore

INCOBELCI S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS, TOLIMA
CONTRATO	102 Del 25 de febrero de 2026

CAPÍTULO	1,00	ITEM	1.2	DEMOLICIONES (MUROS)	UNIDAD	M2	UBICACIÓN	PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA

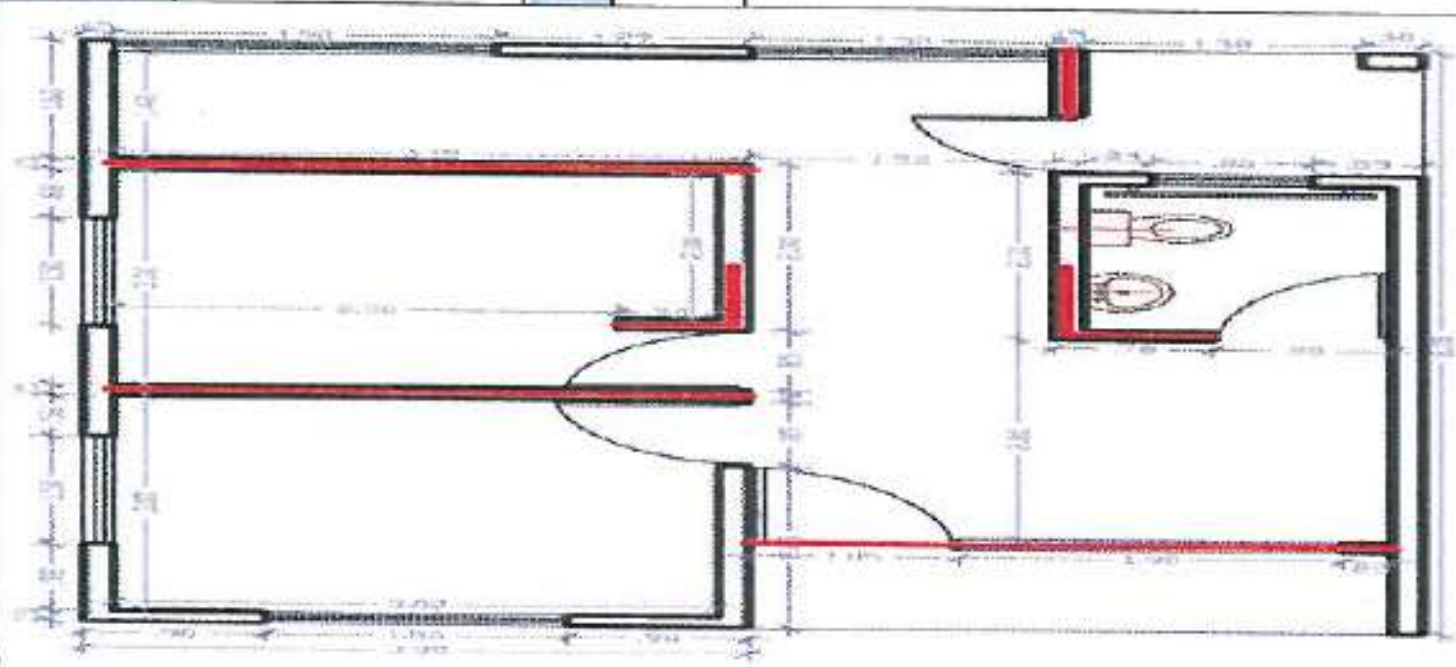




Localización	ELEMENTOS LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	Medida Total
CONSULTORIO 1	3,86		3,20	1,00	12,36
CONSULTORIO 2	3,91		3,20	1,00	12,51
	1,82		3,20	1,00	5,82
SALA DE ESPERA	4,17		3,20	1,00	13,34
DEPOSITO	0,98		3,20	1,00	3,14
BAÑO	2,19		2,40	1,00	5,26
DESCENTOS PUERT. Y VENT.					
VENT. SALA ESPERA	1,90		1,60	-1,00	-3,04
PUERT. SALA ESPERA	1,05		2,40	-1,00	-2,52
PUERT. DEPOSITO	0,80		2,40	-1,00	-1,92
Subtotal					44,95
TOTAL					44,95

OBSERVACIONES:

FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO																INCOBELCI S.A.S.
FECHA	DD	1	MM	6	AA	2026		CORTE Nº	1		ELABORÓ	Ing. Diego Fernando Portela Florez					
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS, TOLIMA																
CONTRATO	102 Del 25 de febrero de 2026																
CAPÍTULO	1,00		ITEM	1.3	DEMOLICIONES DE PISOS EN CERAMICA, PORCELANATO O ESMALTADOS			UNIDAD	M2		UBICACIÓN	PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA				

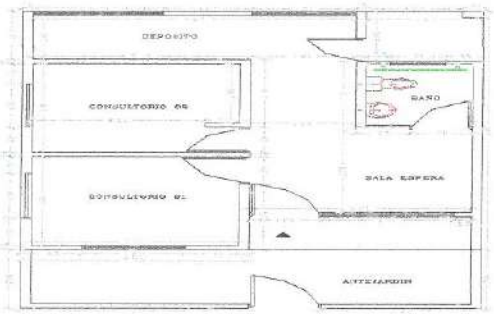



Localización	ELEMENTOS			CANT	Medida Total
	LARGO	ANCHO	ALTO		
CONSULTORIO 1	3,00	3,00		1,00	9,00
CONSULTORIO 2	3,00	3,00		1,00	9,00
SALA DE ESPERA	2,80	3,20		1,00	8,96
PASILLO	2,30	1,52		1,00	3,50
DEPOSITO	4,67	1,48		1,00	6,91
BAÑO	1,55	2,02		1,00	3,13
ANTE JARDIN	6,35	1,85		1,00	11,75
SALIDA POSTERIOR	1,70	1,69		1,00	2,87
				Subtotal	55,12
				TOTAL	55,12


OBSERVACIONES:


FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO									
FECHA	DD	1	MM	6	AA	2026	CORTE N°	1	ELABORÓ	Ing. Diego Fernando Portela Florez

INCOBELCI S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS, TOLIMA
CONTRATO	102 Del 25 de febrero de 2026

CAPÍTULO	1,00	ITEM	1.4	DEMOLICIONES (GUARDA ESCOBAS)	UNIDAD	ML	UBICACIÓN	PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA

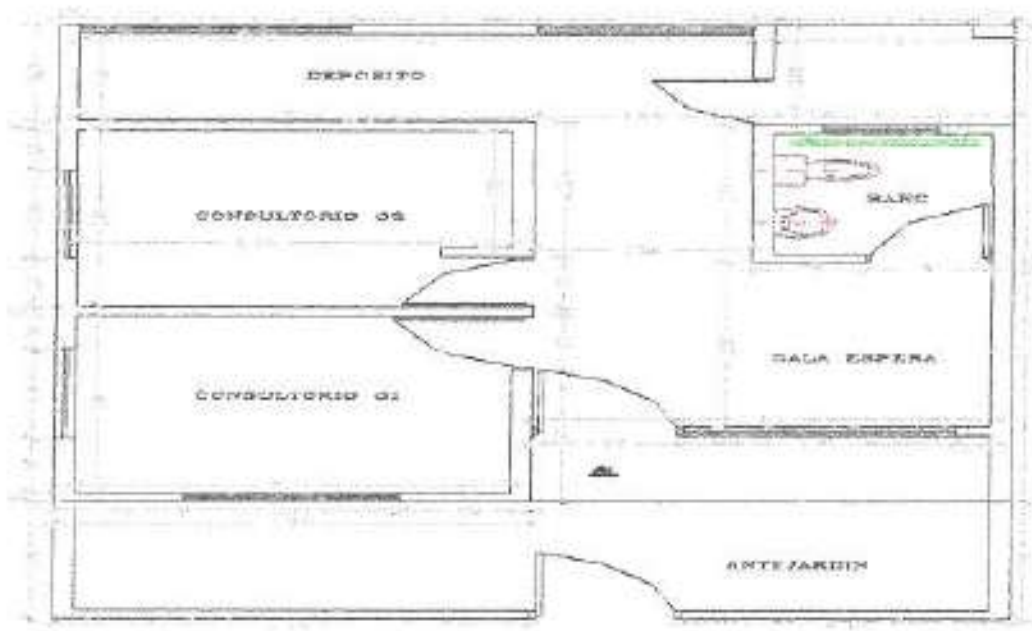

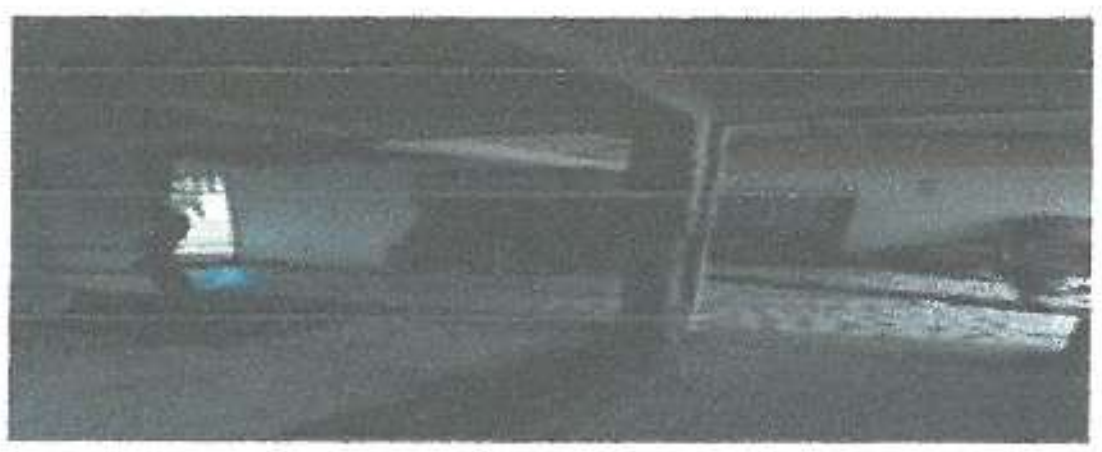


Localización	LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	Medida Total
CONSULTORIO 1	3,00			1,00	3,00
	3,00			1,00	3,00
	2,10			1,00	2,10
CONSULTORIO 2	3,00			1,00	3,00
	2,00			2,00	4,00
SALA DE ESPERA	2,80			1,00	2,80
	0,78			1,00	0,78
PASILLO	2,30			1,00	2,30
	2,31			1,00	2,31
DEPOSITO	4,67			1,00	4,67
	1,48			1,00	1,48
BAÑO	2,02			2,00	4,04
	1,53			1,00	1,53
	0,83			3,00	2,49
Subtotal					37,50
TOTAL					37,50

OBSERVACIONES:

FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO											
FECHA	DD	1	MM	6	AA	2026	CORTE N°	1	ELABORÓ	Ing. Diego Fernando Portela Florez		INCOBELCI S.A.S.
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS, TOLIMA											
CONTRATO	102 Del 25 de febrero de 2026											

CAPÍTULO	1,00	ITEM	1.6	DEMOLICIONES (ENCHAPE - MUROS)	UNIDAD	M2	UBICACIÓN	PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA

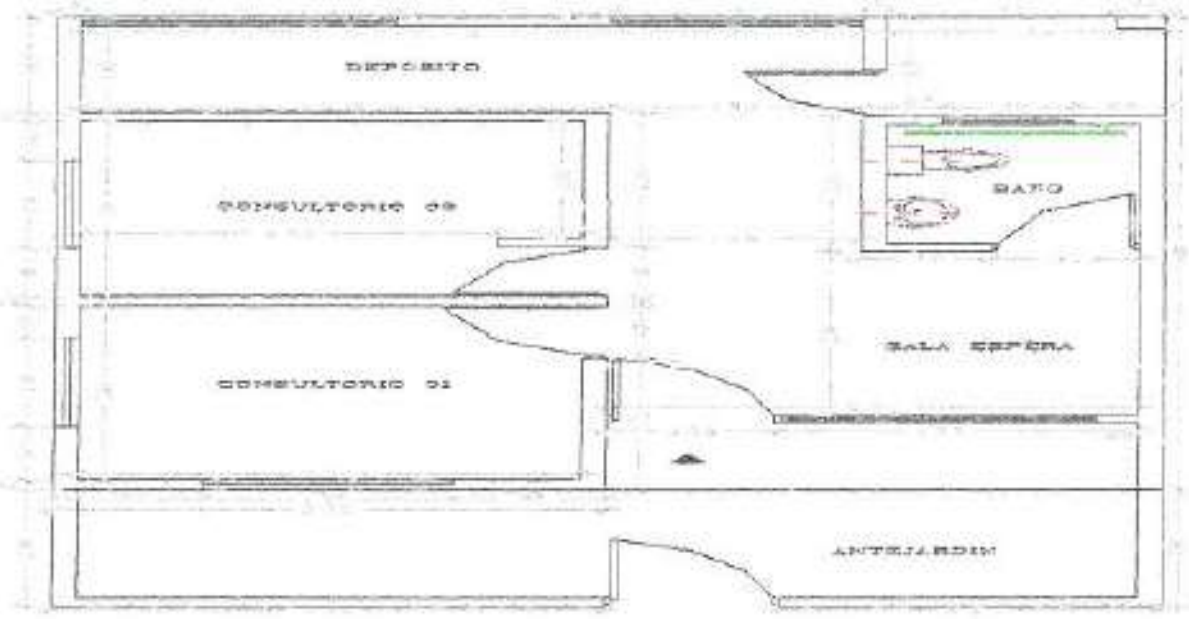




Localización	ELEMENTOS LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	Medida Total
BAÑO	2,02		2,00	2,00	8,08
	1,53		2,00	1,00	3,06
	0,83		2,00	1,00	1,66
Subtotal					12,80
TOTAL					12,80

OBSERVACIONES:

FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO															INCOBELCI S.A.S.
FECHA	DD	1	MM	6	AA	2026		CORTE N°	1		ELABORÓ	Ing. Diego Fernando Portela Florez				
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS, TOLIMA															
CONTRATO	102 Del 25 de febrero de 2026															

CAPÍTULO	1,00	ITEM	1.6	DEMOLICION (MESON EN CONCRETO)	UNIDAD	M2	UBICACIÓN	PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA

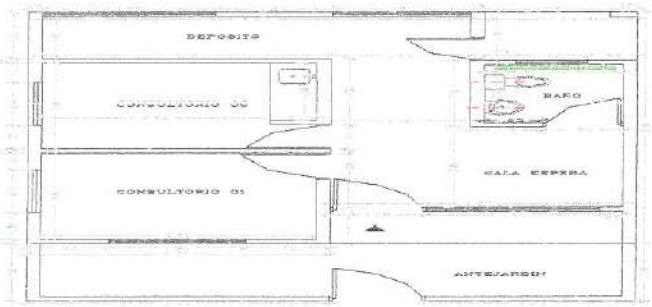




Localización	ELEMENTOS			CANT	Medida Total
	LARGO	ANCHO	ALTO		
CONSULTORIO 2					
MESON	2,00	0,60		1,00	1,20
ENTREPAÑO	2,00	0,60		1,00	1,20
POLLO PISO	2,00	0,60		1,00	1,20
Subtotal					3,60
TOTAL					3,60

OBSERVACIONES:

FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO												21.00
FECHA	DD	1	MM	6	AA	2026	CORTE N°	1	ELABORÓ	Ing. Diego Fernando Portela Flores			
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS, TOLIMA												INCOBELCI S.A.S.
CONTRATO	102 Del 25 de febrero de 2026												
CAPÍTULO	1,00		ITEM	1.7	DESMONTE (SANITARIOS Y LAVAMANOS)				UNIDAD	UND	UBICACIÓN	PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA	

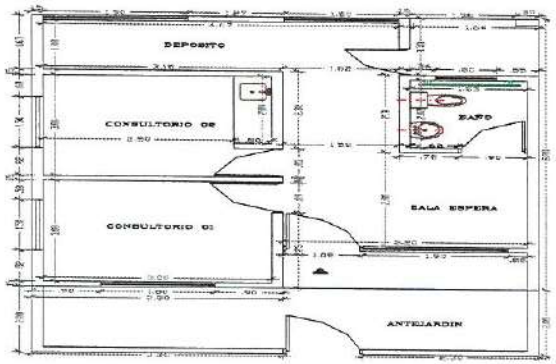




Localización	ELEMENTOS			CANT	Medida Total
	LARGO	ANCHO	ALTO		
BAÑO					
SANITARIO				1,00	1,00
LAVAMANOS				0,00	0,00
Subtotal					1,00
TOTAL					1,00

OBSERVACIONES:

FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO							
FECHA	DD 1	MM 6	AA 2026	CORTE N° 1	ELABORÓ	Ing. Diego Fernando Portela Florez		INCOBELCI S.A.S.
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS, TOLIMA							
CONTRATO	102 Del 25 de febrero de 2026							
CAPÍTULO	1,00	ITEM	1.8	DESMONTE (CIELO RASO)	UNIDAD	M2	UBICACIÓN	PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA

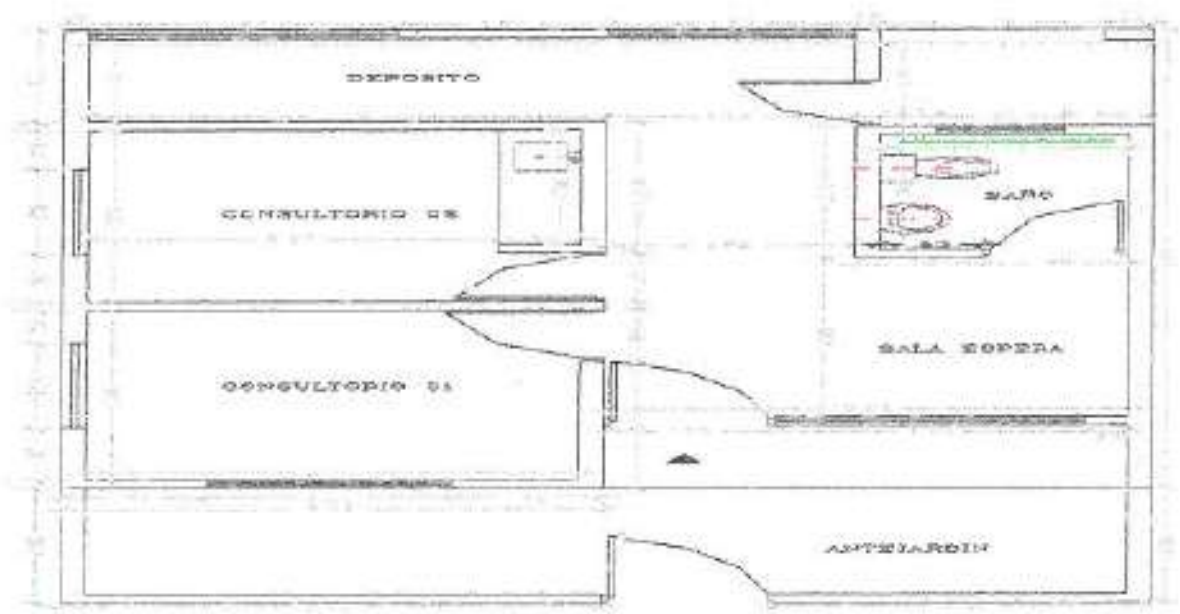




Localización	ELEMENTOS LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	Medida Total
CONSULTORIO 1	3,00	3,00		1,00	9,00
CONSULTORIO 2	3,00	3,00		1,00	9,00
SALA DE ESPERA	2,80	3,20		1,00	8,96
PASILLO	2,30	1,52		1,00	3,50
DEPOSITO	4,67	1,48		1,00	6,91
BAÑO	1,55	2,02		1,00	3,13
Subtotal					40,50
TOTAL					40,50

OBSERVACIONES:

21.00

FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO			
FECHA	DD 1 MM 6 AA 2026	CORTE N° 1	ELABORÓ	Ing. Diego Fernando Portela Florez
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS, TOLIMA			INCOBELCI S.A.S.
CONTRATO	102 Del 25 de febrero de 2026			

CAPÍTULO	1,00	ITEM	1.9	DESMONTE CARPINTERIA METALICA PUERTAS, VENTANAS,VACIADO Y LIMPIEZA DE MARCOS)	UNIDAD	UND	UBICACIÓN	PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA

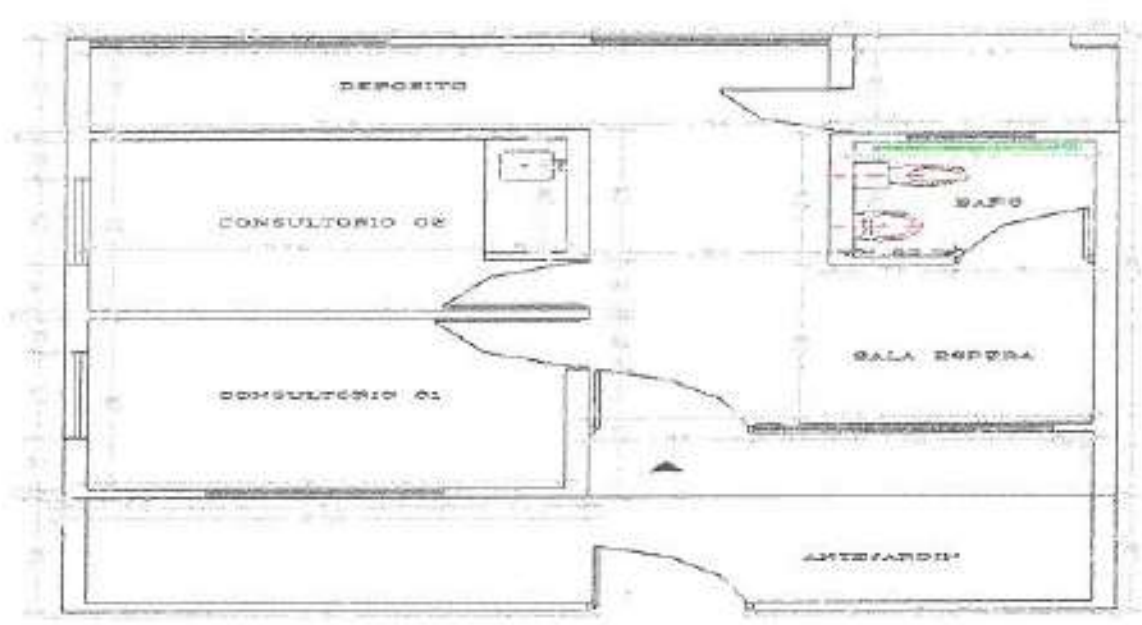




Localización	ELEMENTOS LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	Medida Total
CONSULTORIO 1				3,00	3,00
CONSULTORIO 2				2,00	2,00
SALA DE ESPERA				2,00	2,00
DEPOSITO				3,00	3,00
BAÑO				2,00	2,00
Subtotal					12,00
TOTAL					12,00

OBSERVACIONES:

FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO												INCOBELCI S.A.S.
FECHA	DD	1	MM	6	AA	2026		CORTE N°	1		ELABORÓ	Ing. Diego Fernando Portela Florez	
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS, TOLIMA												
CONTRATO	102 Del 25 de febrero de 2026												

CAPÍTULO	1,00	ITEM	1.10	DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE	UNIDAD	M2	UBICACIÓN	PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA



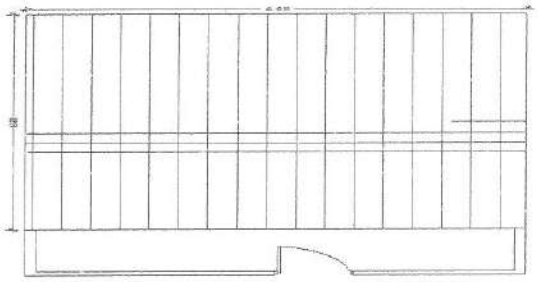


Localización	ELEMENTOS			CANT	Medida Total
	LARGO	ANCHO	ALTO		
	5,15	6,65		1,00	34,25
	3,52	6,65		1,00	23,41
Subtotal					57,66
TOTAL					57,66

OBSERVACIONES:

FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO															
FECHA	DD	1	MM	6	AA	2026		CORTE N°	1		ELABORÓ	Ing. Diego Fernando Portela Florez				
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS, TOLIMA															
CONTRATO	102 Del 25 de febrero de 2026															

INCOBELCI S.A.S.

CAPÍTULO	1,00	ITEM	1.11	RETIRO DE ESCOMBROS (BOTADERO AUTORIZADO LA MIEL)	UNIDAD	M3	UBICACIÓN	PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA

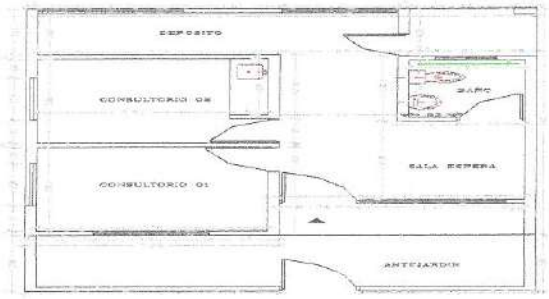




Localización	ELEMENTOS LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	Medida Total
DEMOLICION MUROS	32,75	0,15		1,00	4,91
DEMOLICION PISOS	55,12	0,05		1,00	2,76
DEM. GUARD. ESCOBAS	3,38	0,05		1,00	0,17
DEM, ENCHAPE PARED	12,80	0,02		1,00	0,26
DEM. MESON CONCRET,	3,60	0,07		1,00	0,25
DESMONTE CIELO RASO	40,50	0,02		1,00	0,81
EXCAVACIONES	35,08	0,30	0,40	1,00	4,21
EXPANSION EXCAV. 30%					
				Subtotal	13,37
				TOTAL	13,37

OBSERVACIONES:

ESPACIO RESERVADO PARA REGISTRO FOTOGRAFICO DE EJECUCION EN OBRA - ITEM 1.11

FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO																INCOBELCI S.A.S.
FECHA	DD	1	MM	6	AA	2026		CORTE N°	1		ELABORÓ	Ing. Diego Fernando Portela Florez					
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS, TOLIMA																
CONTRATO	102 Del 25 de febrero de 2026																

CAPÍTULO	1,00	ITEM	1,1	TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE Y ESCOMBRO EMPACADO EN FIBRAS HASTA UNA DISTANCIA DE 100 MTR	UNIDAD	M3	UBICACIÓN	PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA

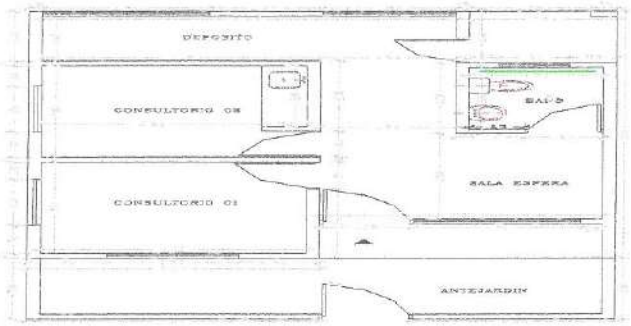




Localización	ELEMENTOS LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	Medida Total
DEMOLICION MUROS	32,75	0,15		1,00	4,91
DEMOLICION PISOS	55,12	0,05		1,00	2,76
DEM. GUARD. ESCOBAS	3,38	0,05		1,00	0,17
DEM, ENCHAPE PARED	12,80	0,02		1,00	0,26
DEM. MESON CONCRET,	3,60	0,07		1,00	0,25
DESMONTE CIELO RASO	40,50	0,02		1,00	0,81
EXCAVACIONES	35,09	0,30	0,40	1,00	4,21
EXPANSION EXCAV. 30%					
				Subtotal	13,37
				TOTAL	13,37

OBSERVACIONES:

FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO	
FECHA DD 1 MM 6 AA 2026	CORTE N° 1 ELABORÓ Ing. Diego Fernando Portela Florez	INCOBELCI S.A.S.
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS, TOLIMA	
CONTRATO	102 Del 25 de febrero de 2026	

CAPÍTULO	2,00	ITEM	2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	UNIDAD	M3	UBICACIÓN	PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA

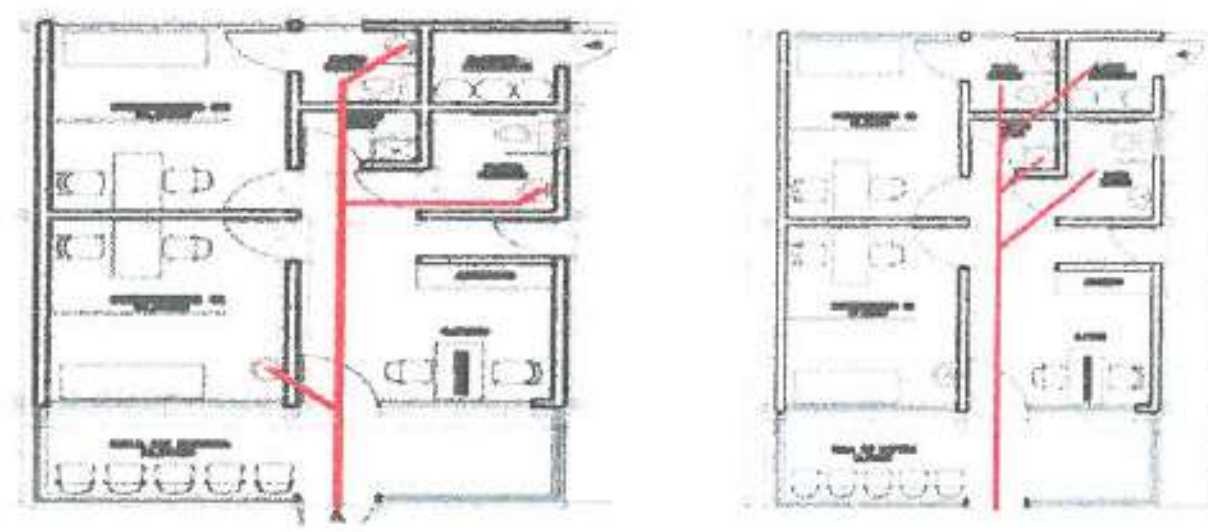





Localización	ELEMENTOS LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	Medida Total
TUBERIA SANT 2" X 2"	27,00	0,30	0,40	1,00	3,24
Subtotal					3,24
TOTAL					3,24

OBSERVACIONES:

FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO															INCOBELCI S.A.S.
FECHA	DD	1	MM	6	AA	2026		CORTE Nº	1		ELABORÓ	Ing. Diego Fernando Portela Florez				
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS, TOLIMA															
CONTRATO	102 Del 25 de febrero de 2026															

CAPÍTULO	2,00	ITEM	2.2	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE SITIO	UNIDAD	M3	UBICACIÓN	PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA








Localización	ELEMENTOS			CANT	Medida Total
	LARGO	ANCHO	ALTO		
TUBERIA SANT 2"	9,00	0,30	0,40	1,00	1,08
TUBERIA SANT 3"	18,00	0,30	0,40	1,00	2,16
DESCUENTO					
2"	9,00		0,06	-1,00	-0,57
3"	18,00		0,09	-1,00	-1,80
Subtotal					1,07
TOTAL					1,07

OBSERVACIONES:

ESPACIO RESERVADO PARA REGISTRO FOTOGRAFICO DE EJECUCION EN OBRA - ITEM 2.2

FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO															INCOBELCI S.A.S.
FECHA	DD	1	MM	6	AA	2026	CORTE N°	1		ELABORÓ	Ing. Diego Fernando Portela Florez					
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS, TOLIMA															
CONTRATO	102 Del 25 de febrero de 2026															

CAPÍTULO	3,00	ITEM	3.1	PLACA DE CONTRA PISO DE 2500 PSI INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 15x15 5mm E:0.10cm	UNIDAD	M2	UBICACIÓN	PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA

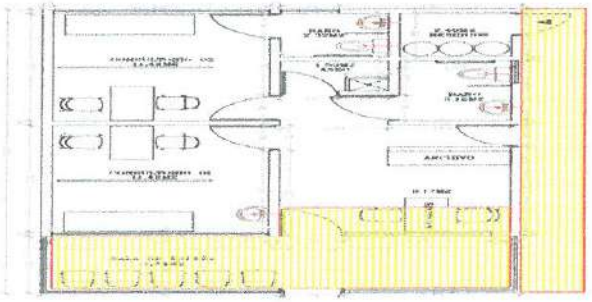





Localización	ELEMENTOS			CANT	Medida Total
	LARGO	ANCHO	ALTO		
ANTEJARDIN	6,65	0,78		1,00	5,19
	3,20	0,47		1,00	1,50
CIRCULACION LATERAL DERECHA	0,90	4,23		1,00	3,81
				Subtotal	10,50
				TOTAL	10,50

OBSERVACIONES:

FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO														INCOBELCI S.A.S.
FECHA	DD	1	MM	6	AA	2026		CORTE N°	1		ELABORÓ	Ing. Diego Fernando Portela Flores			
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS, TOLIMA														
CONTRATO	102 Del 25 de febrero de 2026														

CAPÍTULO	4,00	ITEM	4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA INCLUYE SOPORTES VERTICALES, PLATINAS, CHASOS EXPANSIVOS, PINTURA EMALTE, ANTICORROSIVO (TUBO RECTANGULAR 76 x 38 x 1.1mm x 6m) SECTOR ANTEJARDIN FACHADA PRINCIPAL	UNIDAD	M2	UBICACIÓN	PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA

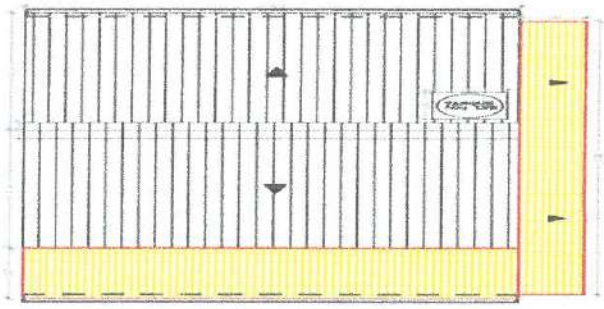



Localización	ELEMENTOS			CANT	Medida Total
	LARGO	ANCHO	ALTO		
ANTEJARDIIN	2,00	9,34		1,00	18,68
FACHADA LATERAL DERECHA	10,08	1,47		1,00	14,82
				Subtotal	33,50
				TOTAL	33,50

OBSERVACIONES:

21,00


FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO	

FECHA	DD	1	MM	6	AA	2026	CORTE N°	1	ELABORÓ	Ing. Diego Fernando Portela Florez

INCOBELCI S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS, TOLIMA
CONTRATO	102 Del 25 de febrero de 2026

CAPÍTULO	4,00	ITEM	4.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA TERMOACUSTICA UPVC CRESTA ALTA (INCLUYE TORNILLOS, CAPUCHON Y SIKA FLEX)	UNIDAD	M2	UBICACIÓN	PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA

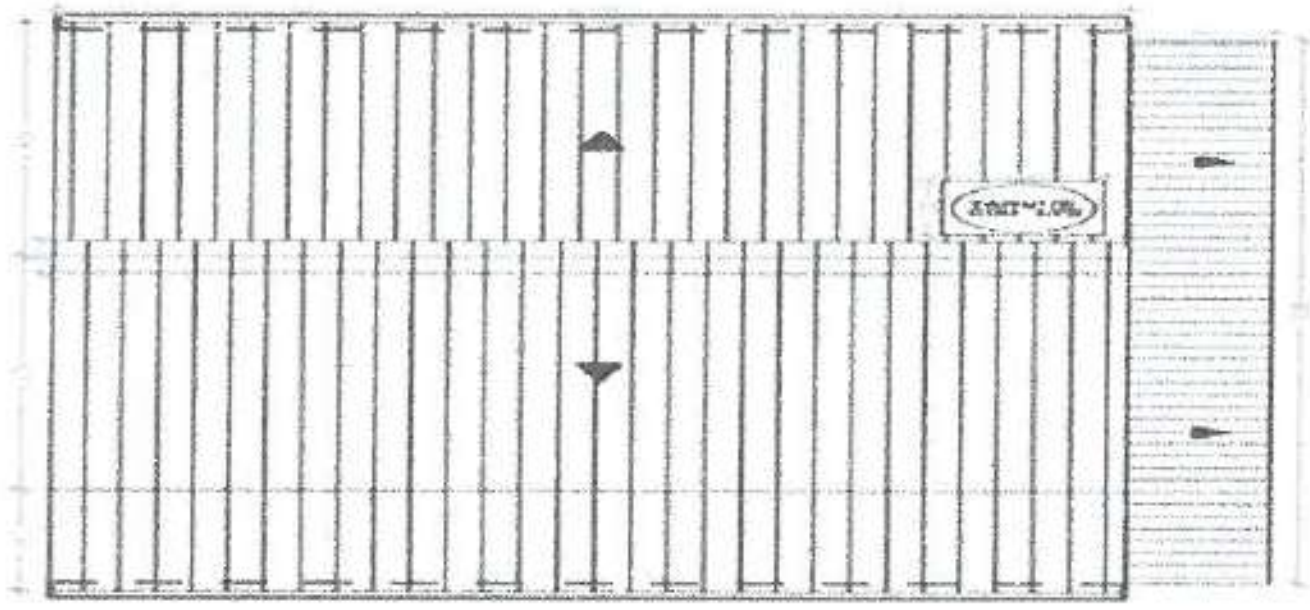




Localización	ELEMENTOS LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	Medida Total
	4,45	6,65		1,00	29,59
	4,45	6,65		1,00	29,59
	10,08	1,00		1,00	10,08
Subtotal					69,27
TOTAL					69,27

OBSERVACIONES:

FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO								INCOBELCI S.A.S.
FECHA	DD 1	MM 6	AA 2026	CORTE N° 1		ELABORÓ	Ing. Diego Fernando Portela Florez		
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS, TOLIMA								
CONTRATO	102 Del 25 de febrero de 2026								

CAPITULO	4,00	ITEM	4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE EN TEJA TERMOACUSTICA CRESTA BAJA SEGUN EL COLOR (INCLUYE TORNILLOS, CAPUCHON Y SIKA FLEX	UNIDAD	ML	UBICACIÓN	PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA

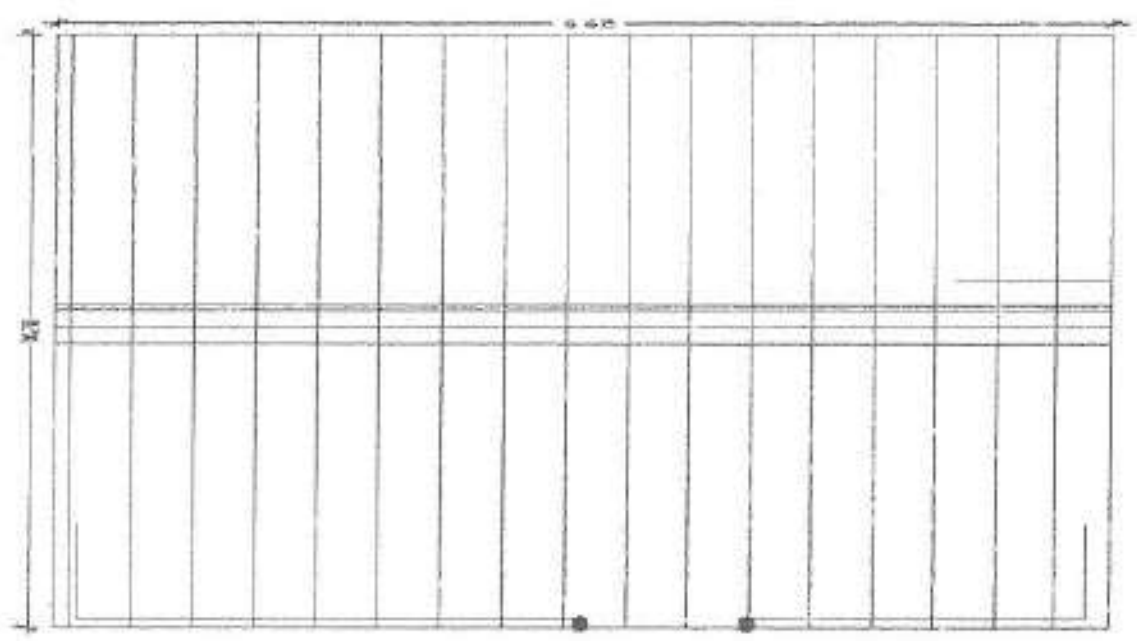




Localización	ELEMENTOS LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	Medida Total
	6,65			1,00	6,65
		Subtotal			6,65
		TOTAL			6,65


OBSERVACIONES:

FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO															
FECHA	DD	1	MM	6	AA	2026		CORTE N°	1		ELABORÓ	Ing. Diego Fernando Portela Flores				
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS, TOLIMA															
CONTRATO	102 Del 25 de febrero de 2026															

INCOBELCI S.A.S.

CAPÍTULO	4,00	ITEM	4.4	SUMINISTRO E INSTALCION CANAL GALABANIZADA CAL 22 DESARROLLO 61CM, INCLUYE WASH PRIMER Y SOPORTES EN ANGULO 3/4 X 1/8 (PREFABRICADA)	UNIDAD	ML	UBICACIÓN	PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA

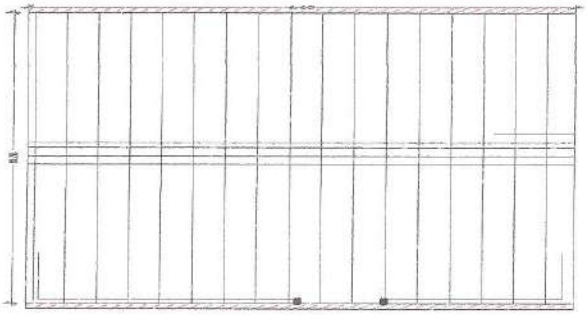



Localización	ELEMENTOS			CANT	Medida Total
	LARGO	ANCHO	ALTO		
FACHADA FRONTAL	6,65			1,00	6,65
FACHADA POSTERIOR	6,65			1,00	6,65
				Subtotal	13,30
				TOTAL	13,30


OBSERVACIONES:

FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO					
FECHA	DD 1	MM 6	AA 2026	CORTE N° 1	ELABORÓ	Ing. Diego Fernando Portela Flores

INCOBELCI S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS, TOLIMA
CONTRATO	102 Del 25 de febrero de 2026

CAPÍTULO	4,00	ITEM	4.5	BAJANTE PVC AMAZONAS	UNIDAD	ML	UBICACIÓN	PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA

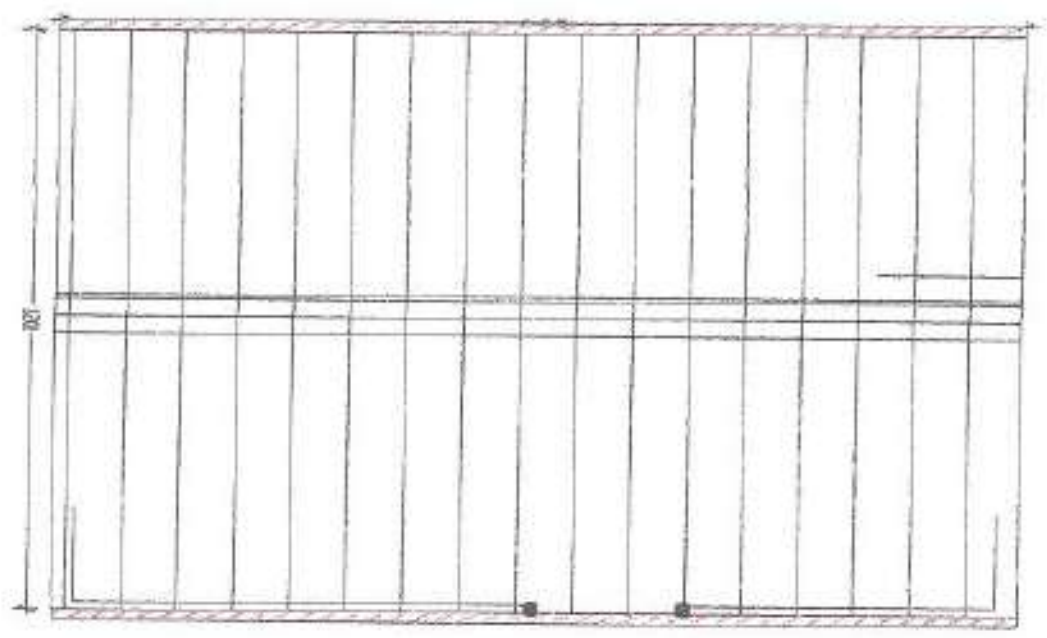



Localización	LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	Medida Total
FACHADA FRONTAL			3,50	1,00	3,50
FACHADA POSTERIOR			3,50	1,00	3,50
Subtotal					7,00
TOTAL					7,00


OBSERVACIONES:

ESPACIO RESERVADO PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO DE EJECUCIÓN EN OBRA - ITEM 4.5

FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO									
FECHA	DD	1	MM	6	AA	2026	CORTE N°	1	ELABORÓ	Ing. Diego Fernando Portela Florez

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS, TOLIMA	INCOBELCI S.A.S.
CONTRATO	102 Del 25 de febrero de 2026	

CAPÍTULO	4,00	ITEM	4.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE METALICO (INCLUYE SIKAFLEX, CORTE CON DISCO DE TUNGSTENO)	UNIDAD	ML	UBICACIÓN	PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA

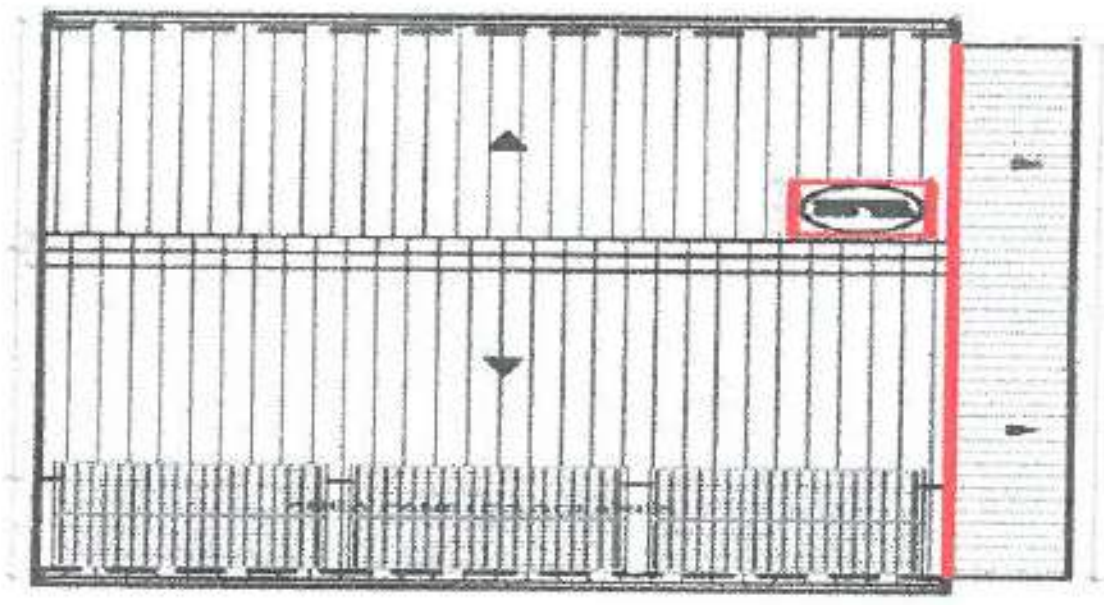


Localización	ELEMENTOS LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	Medida Total
TANQUE	0,00			0,00	0,00
CUBIERTA LATERAL DERCH	0,00			0,00	0,00
				Subtotal	0,00
				TOTAL	0,00


OBSERVACIONES:

21,00

FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO						
FECHA	DD 1	MM 6	AA 2026	CORTE N° 1	ELABORÓ	Ing. Diego Fernando Portela Florez	
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS, TOLIMA						INCOBELCI S.A.S.
CONTRATO	102 Del 25 de febrero de 2026						

CAPÍTULO	5,00	ITEM	5.1	MURO EN BLOQUE H4	UNIDAD	M2	UBICACIÓN	PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA

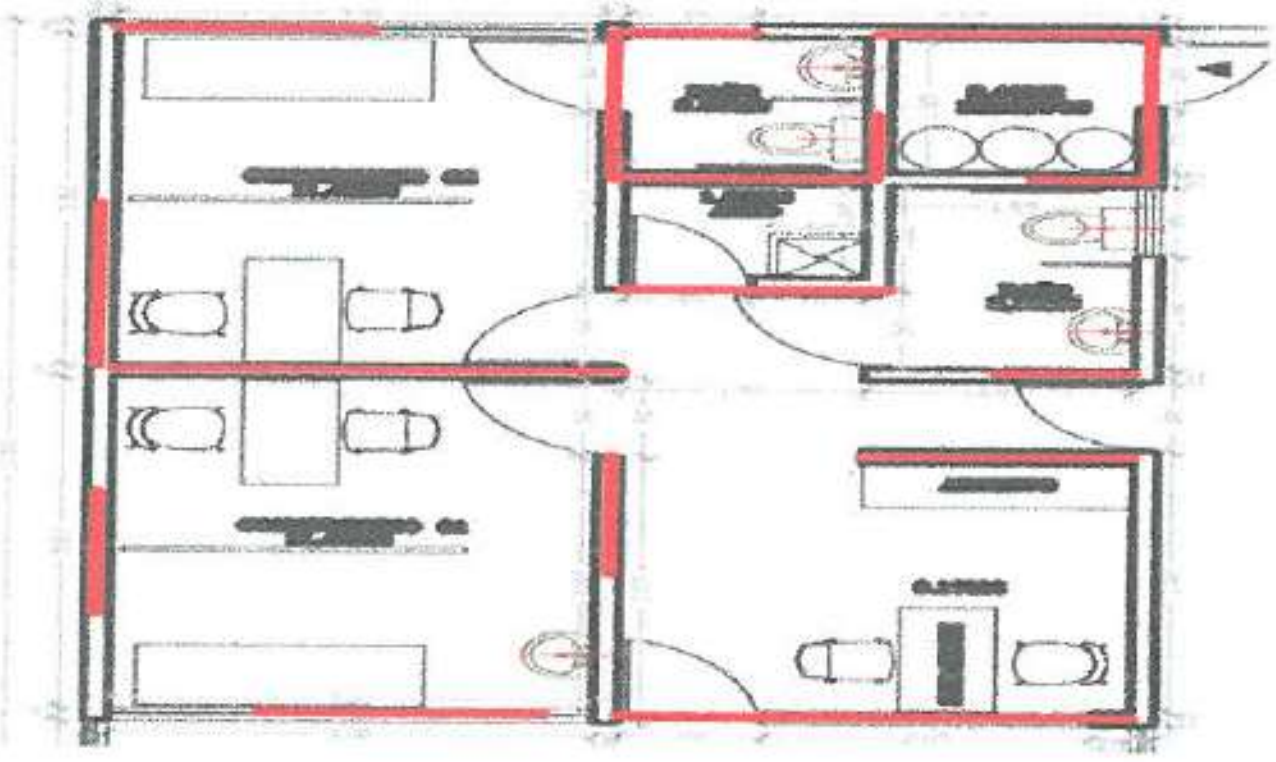

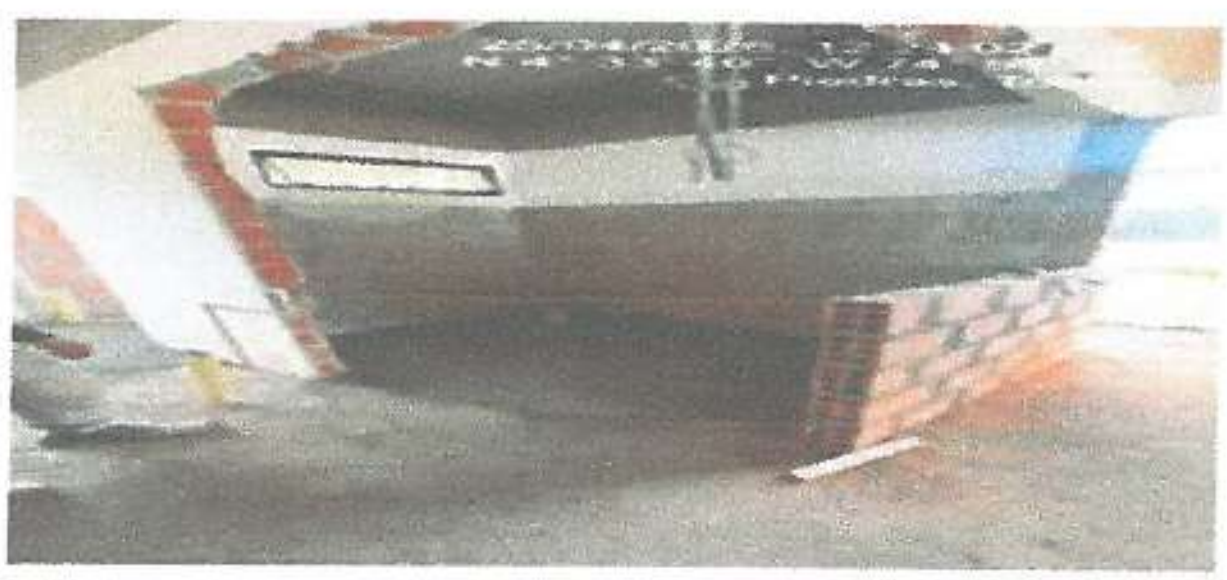


Localización	ELEMENTOS LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	Medida Total
CONSULTORIO 2					
VANO VENTANAS	1,39		1,60	1,00	2,22
VANO VENTANAS	1,50		1,22	1,00	1,83
ENTRADA CONSULTOR	0,81		2,79	1,00	2,26
MUROS ENTRE CONSULT	3,15		2,79	1,00	8,79
CONSULTORIO 1					
VANO VENTANAS	1,50		1,39	1,00	2,09
VANO VENTANAS	1,90		1,04	1,00	1,98
LAVADO					
MUIROS	1,65		2,79	2,00	9,21
RESIDUOS FINAL					
VANO PUERTA EXISTENT.	0,80		2,09	1,00	1,67
MURO F. LATERAL DERECH	1,55		2,61	1,00	4,05
MURO F. POSTER	1,55		2,09	1,00	3,24
DESCUENTO PUERTA	0,80		2,09	-1,00	-1,67
BAÑO					
VENTANA ALTA	0,80		0,52	1,00	0,42
VANO EXISTENTE	0,90		2,09	1,00	1,881
ANO CONSULTORIO	1,48		2,79	1,00	4,129
	0,80		1,04	1,00	0,832
RECEPCION	1,70		0,78	1,00	1,326
	3,20		2,74	1,00	8,768
Subtotal					53,01
TOTAL					53,01

OBSERVACIONES:

FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO			
FECHA	DD 1 MM 6 AA 2026	CORTE N° 1	ELABORÓ	Ing. Diego Fernando Portela Florez
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS, TOLIMA			INCOBELCI S.A.S.
CONTRATO	102 Del 25 de febrero de 2026			

CAPÍTULO	5,00	ITEM	5.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 3000PSI VERTICAL, SECCION 15X20	UNIDAD	ML	UBICACIÓN	PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA

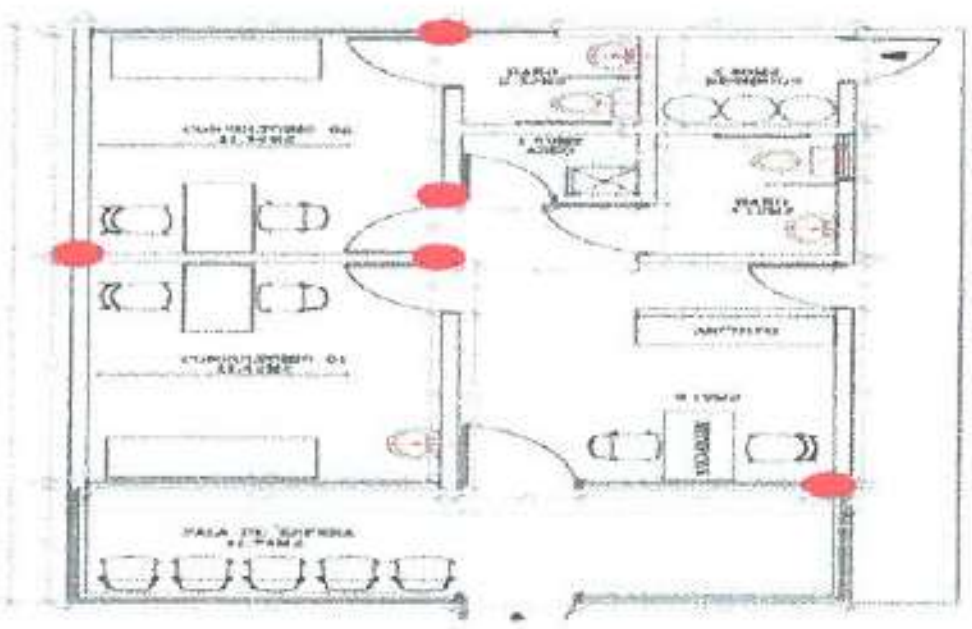



Localización	LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	Medida Total
MURO ENTRE CONSULT			2,00	2,00	4,00
RECEPCION			2,00	1,00	2,00
LAVADO			2,00	1,00	2,00
ARCHIVO			2,00	1,00	2,00
Subtotal					10,00
TOTAL					10,00

OBSERVACIONES:


21.00

FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO					
FECHA	DD 1	MM 6	AA 2026	CORTE N° 1	ELABORÓ	Ing. Diego Fernando Portela Florez

INCOBELCI S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS, TOLIMA
CONTRATO	102 Del 25 de febrero de 2026

CAPÍTULO	5,00	ITEM	5.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 3000PSI HORIZONTAL SECCION 15X30	UNIDAD	ML	UBICACIÓN	PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA

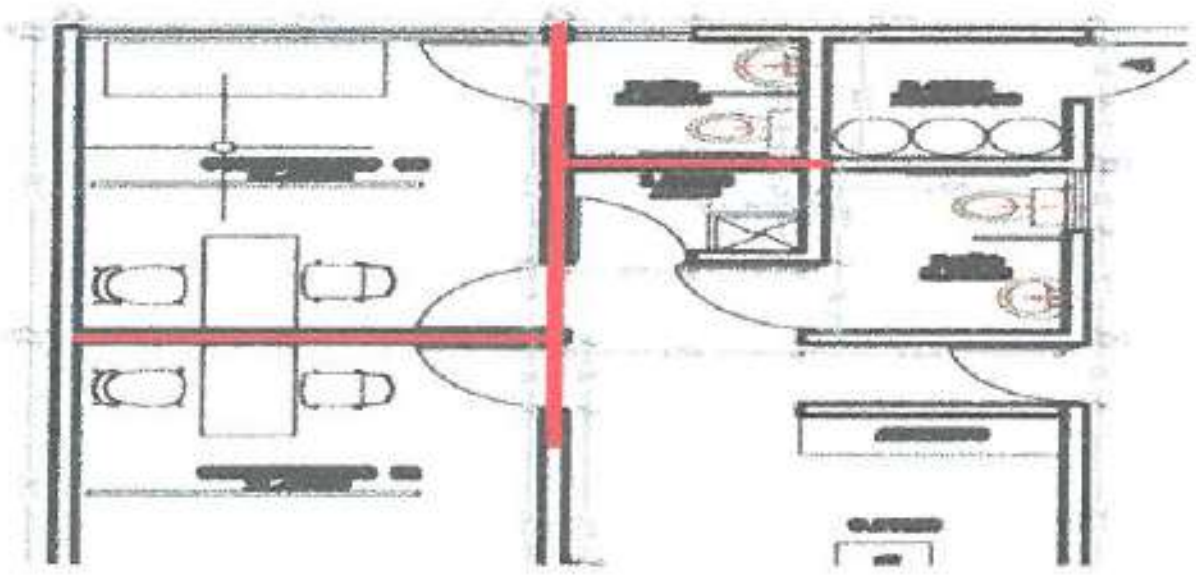





Localización	ELEMENTOS			CANT	Medida Total
	LARGO	ANCHO	ALTO		
CONSULTORIO 1 Y 2	3,57			1,00	3,57
	6,73			1,00	6,73
ARCHIVO	1,90			1,00	1,90
Subtotal					12,20
TOTAL					12,20

OBSERVACIONES:

FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO												INCOBELCI S.A.S.
FECHA	DD	1	MM	6	AA	2026	CORTE N°	1		ELABORÓ	Ing. Diego Fernando Portela Flores		
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS, TOLIMA												
CONTRATO	102 Del 25 de febrero de 2026												

CAPÍTULO	5,00	ITEM	5.4	PAÑETE MURO (INCL. FILOS, DILATACIONES Y CARTERAS)	UNIDAD	M2	UBICACIÓN	PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA

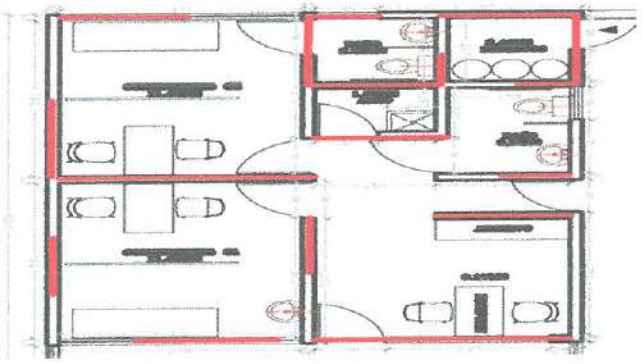



Localización	ELEMENTOS			CANT	Medida Total
	LARGO	ANCHO	ALTO		
CONSULTORIO 2					
VANO VENTANAS	1,50		1,60	2,00	4,80
VANO VENTANAS	1,50		1,40	2,00	4,20
ENTRADA CONSULTOR	0,81		3,20	2,00	5,18
MUROS ENTRE CONSULT	3,15		3,20	2,00	20,16
CONSULTORIO 1					
VANO VENTANAS	1,50		1,60	2,00	4,80
VANO VENTANAS	1,90		1,20	2,00	4,56
LAVADO					
MUROS	1,65		3,20	4,00	21,12
RESIDUOS FINAL					
VANO PUERTA EXISTENT.	0,80		2,40	2,00	3,84
MURO F. LATERAL DERECH.	1,55		3,00	2,00	9,30
MURO F. POSTER	1,55		2,40	2,00	7,44
DESCUENTO PUERTA	0,80		2,40	-2,00	-3,84
BAÑO					
VENTANA ALTA	0,80		0,60	2,00	0,96
VANO EXISTENTE	0,90		2,40	2,00	4,320
AÑO CONSULTORIO	1,48		3,20	2,00	9,472
	0,60		1,20	2,00	1,920
RECEPCION	1,70		0,90	2,00	3,060
	3,20		3,20	2,00	20,480
			Subtotal		121,78
			TOTAL		121,78


OBSERVACIONES:

ESPACIO RESERVADO PARA REGISTRO FOTOGRAFICO DE EJECUCIÓN EN OBRA - ITEM 5.4

FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO									21.00
FECHA	DD 1	MM 6	AA 2026	CORTE N° 1		ELABORÓ	Ing. Diego Fernando Portela Florez			

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS, TOLIMA	INCOBELCI S.A.S.
CONTRATO	102 Del 25 de febrero de 2026	

CAPÍTULO	5,00	ITEM	5.5	PAÑETE MURO IMPERMEABILIZADO (INCL FILOS, DILAT Y CARTERAS)	UNIDAD	M2	UBICACIÓN	PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA

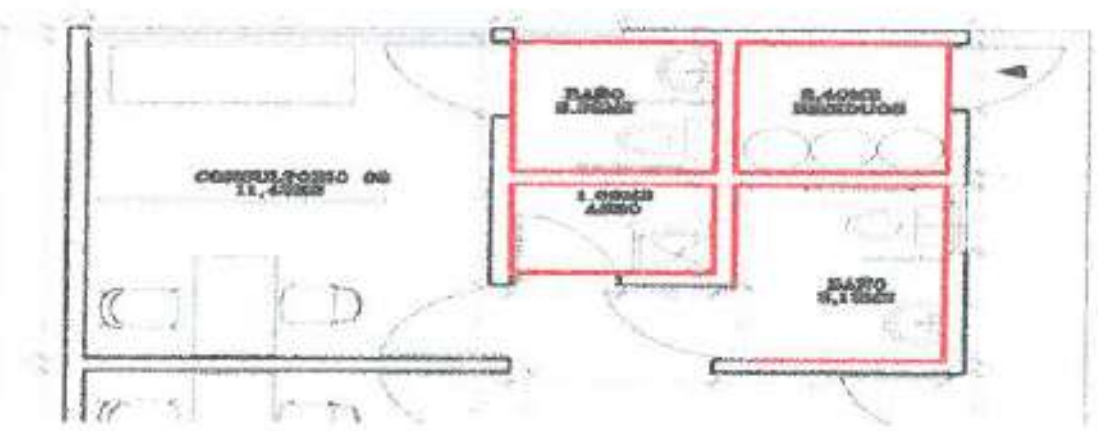





Localización	ELEMENTOS LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	Medida Total
RESIDUOS FINAL					
BAÑO CONSULTORIO	6,09		2,40	1,00	14,62
ASEO	5,12		3,00	1,00	15,36
RESIDUOS FINALES	6,20		2,40	1,00	14,88
BAÑO DISCAPACITADOS	6,24		2,40	1,00	14,98
DESCUENTO					
PUERTAS	0,80		2,00	-2,00	-3,20
PUERTAS	0,90		2,00	-2,00	-3,60
Subtotal					53,03
TOTAL					53,03

OBSERVACIONES:

ESPACIO RESERVADO PARA REGISTRO FOTOGRAFICO DE EJECUCION EN OBRA - ITEM 5.5

FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO								
FECHA	DD 1	MM 6	AA 2026	CORTE N° 1		ELABORÓ	Ing. Diego Fernando Portela Florez		INCOBELCI S.A.S.
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS, TOLIMA								
CONTRATO	102 Del 25 de febrero de 2026								
CAPÍTULO	5,00	ITEM	5.6	ESTUCO PLASTICO DOS MANOS	UNIDAD	M2	UBICACIÓN	PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA	

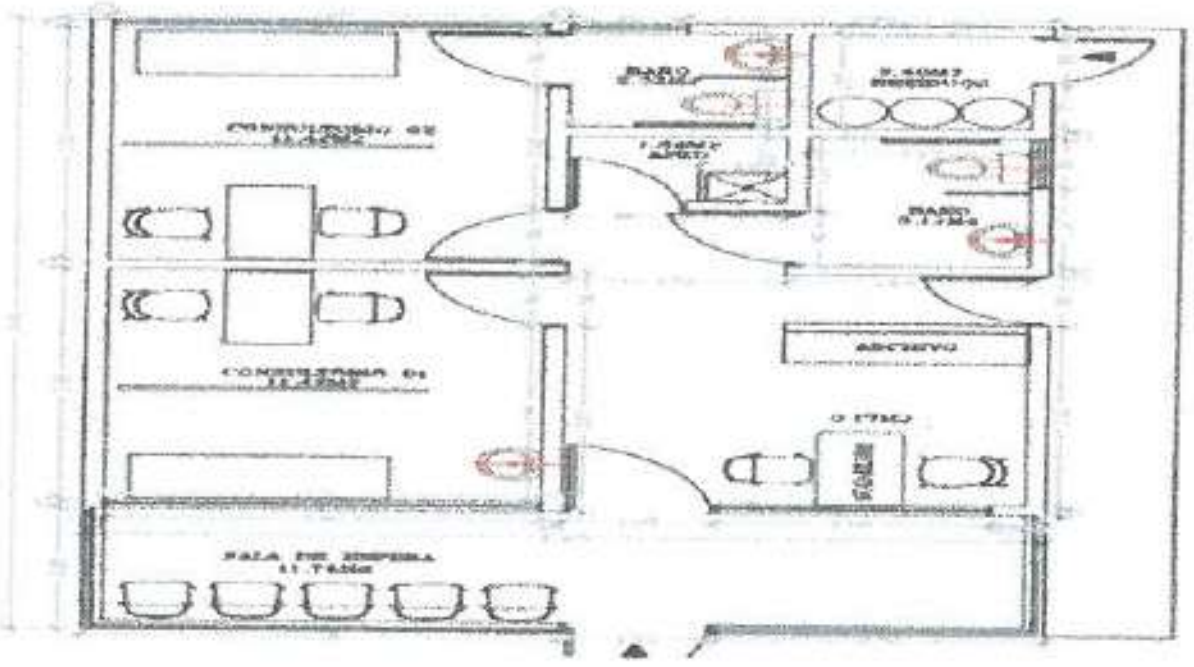

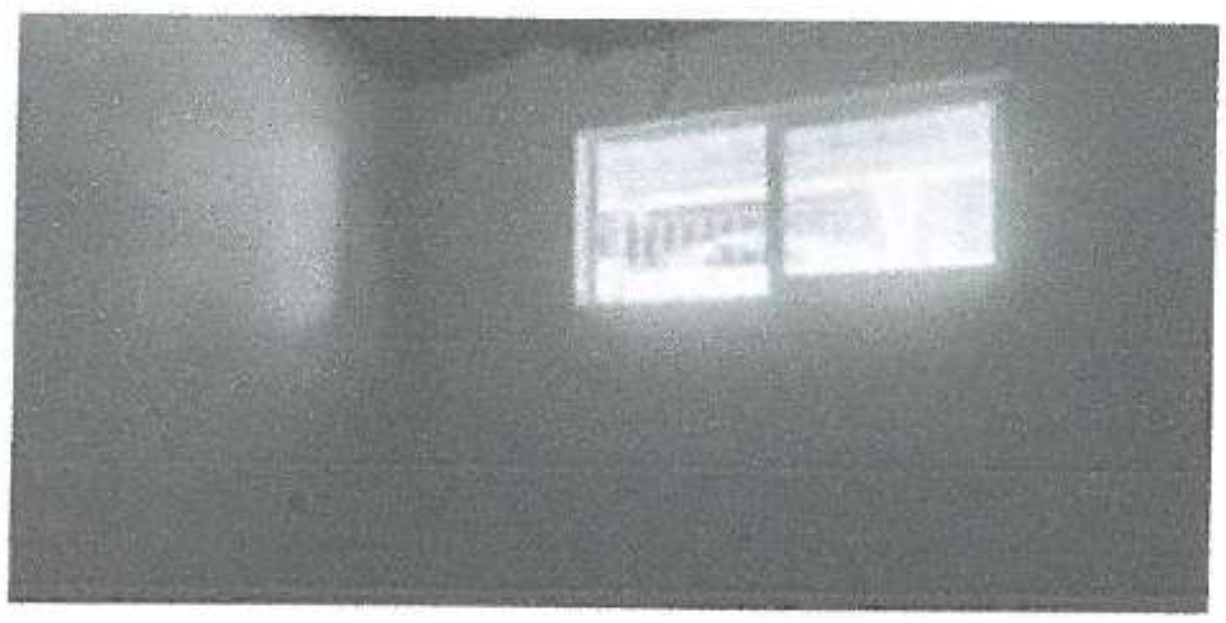


Localización	LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	Medida Total
CONSULTORI 01	13,64		3,10	1,00	42,28
BAÑO CONSULTORIO	6,09		3,10	1,00	18,88
CONSULTORIO 2	13,64		3,10	1,00	42,28
RECEPCION	12,13		3,10	1,00	37,60
ASEO	5,12		1,10	1,00	5,63
BAÑO	7,33		1,10	1,00	8,06
RESIDUOS FINAL	6,20		3,10	1,00	19,22
CIRUCLACIONES	11,99		3,10	1,00	37,17
DESCUENTOS					
PUERTAS	0,90		2,00	-7,00	-12,60
PUERTAS	0,90		1,10	-2,00	-1,98
PUERTAS	0,80		2,00	-2,00	-3,20
VENTANA	0,80		1,10	-1,00	-0,88
VENTA	8,05		0,62	-3,00	-14,97
VENTA	1,90		1,50	-1,00	-2,85
Subtotal					174,65
TOTAL					174,65

OBSERVACIONES:

FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO		21.00
FECHA DD 1 MM 6 AA 2026	CORTE N° 1	ELABORO: Ing. Diego Fernando Portela Flore	INCOBELCI S.A.S.
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS, TOLIMA		
CONTRATO	102 Del 25 de febrero de 2026		

CAPÍTULO	5,00	ITEM	5.7	PINTURA INTERIOR DOS MANOS EN MUROS ANTIBACTERIAL ANTIMOHO-LAVABLE (CORONA)	UNIDAD	M2	UBICACIÓN	PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA

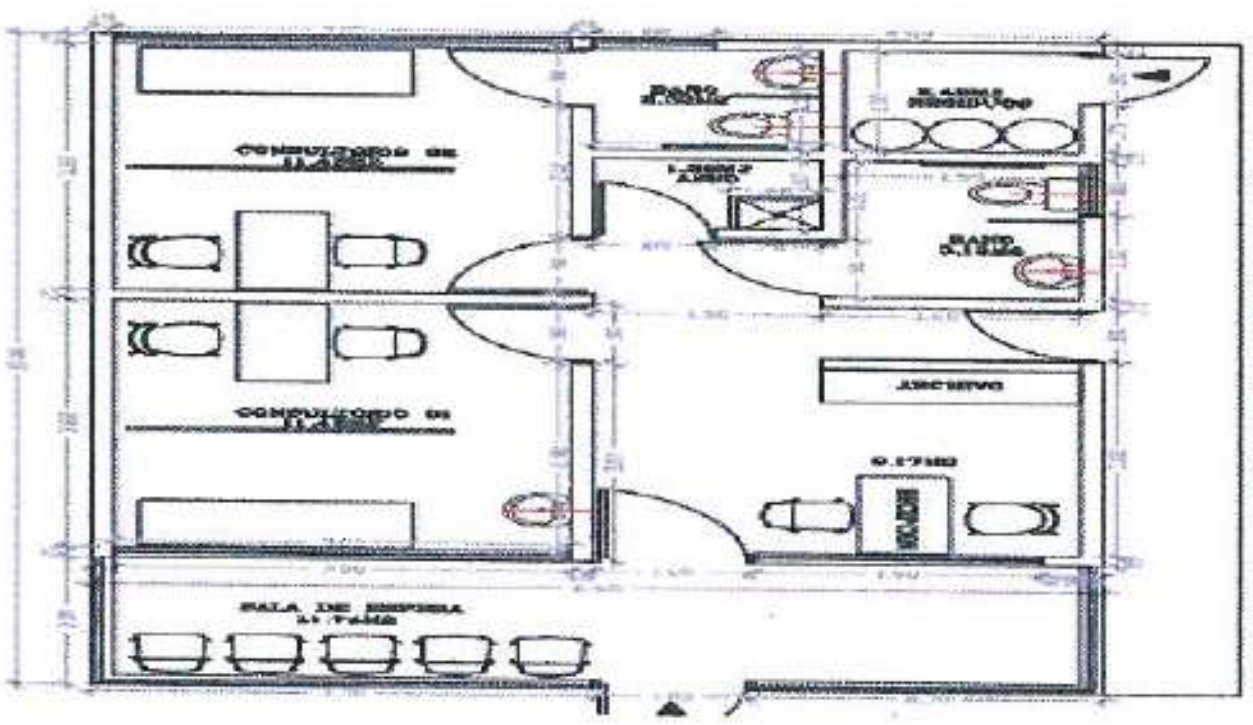




Localización	ELEMENTOS LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	Medida Total
CONSULTORI	6,55		3,10	1,00	20,31
BAÑO CONSULTORIO	2,92		3,10	1,00	9,05
CONSULTORIO 2	6,55		3,10	1,00	20,31
RECEPCION	5,82		3,10	1,00	18,04
ASEO	2,46		1,10	1,00	2,71
BAÑO	3,52		1,10	1,00	3,87
RESIDUOS FINAL	2,98		3,10	1,00	9,24
CIRUCLACIONES	5,75		3,10	1,00	17,83
DESCUENTOS					
PUERTAS	0,90		2,00	-7,00	-12,60
PUERTAS	0,90		1,10	-2,00	-1,98
PUERTAS	0,80		2,00	-2,00	-3,20
VENTANA	0,80		1,10	-1,00	-0,88
VENTA	8,05		0,62	-3,00	-14,97
VENTA	1,90		1,52	-1,00	-2,89
Subtotal					64,82
TOTAL					64,82

OBSERVACIONES:

ESPACIO RESERVADO PARA REGISTRO FOTOGRAFICO DE EJECUCION EN OBRA - ITEM 5.7

FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO	
FECHA	DD 1 MM 6 AA 2026 CORTE N° 1	ELABORÓ: Ing. Diego Fernando Portela Florez
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS, TOLIMA	INCOBELCI S.A.S.
CONTRATO	102 Del 25 de febrero de 2026	

CAPÍTULO	5,00	ITEM	5.8	GRANIPLAST HIDROFUGADO	UNIDAD	M2	UBICACIÓN	PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA

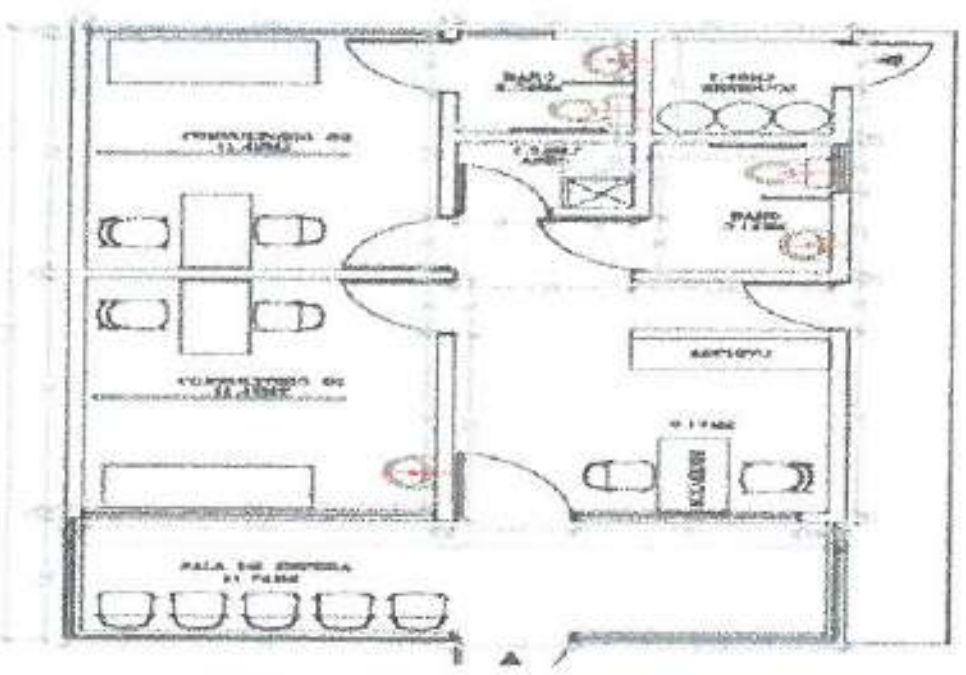


Localización	ELEMENTOS LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	Medida Total
FACHADA FRONTAL	3,30		3,00	1,00	9,90
FACH. LATE. IZQUIERDA	8,08		3,20	1,00	25,86
FACH. LATE. DERECHA	6,38		3,20	1,00	20,42
FACHADA POSTERIOR	4,96		3,00	1,00	14,88
DESCUENTO					
FACHADA FRONTAL					
VENTANA	3,00		0,62	-1,00	-1,86
VENTANA	2,05		0,62	-1,00	-1,27
PUERTA	0,90		2,60	-1,00	-2,34
FACHADA FRONTAL					
VENTANA	3,00		0,62	-1,00	-1,86
VENTANA	0,80		0,62	-1,00	-0,50
FACHADA LAT. DERCH.					
VENTANA	0,80		0,62	-1,00	-0,50
PUERTA	0,80		2,00	-2,00	-3,20
				Subtotal	0,00
				TOTAL	0,00

OBSERVACIONES:

FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO		
FECHA DD 1 MM 6 AA 2026	CORTE N° 1	ELABORO	ng. Diego Fernando Portela Flore
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS, TOLIMA	INCOBELCI S.A.S.	
CONTRATO	102 Del 25 de febrero de 2026		

21,00

CAPÍTULO	5,00	ITEM	5.9	PINTURA KORAZA TRES MANOS	UNIDAD	M2	UBICACIÓN	PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA

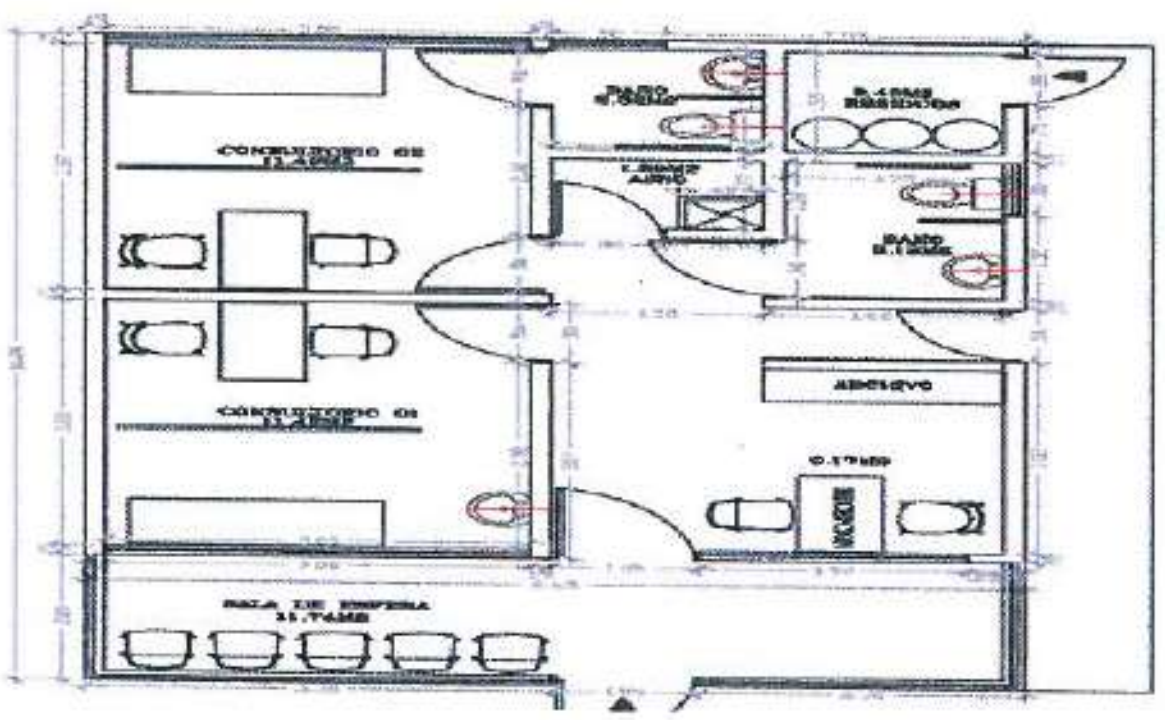



Localización	ELEMENTOS LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	Medida Total
FACHADA	3,30		1,51	1,00	4,98
FACH. LATE. IZQUIERDA	8,08		1,61	1,00	13,01
FACH. LATE. DERECHA	6,38		1,61	1,00	10,27
FACHADA POSTERIOR	4,96		1,51	1,00	7,49
DESCUENTO					
FACHADA FRONTAL					
VENTANA	3,00		0,31	-1,00	-0,93
VENTANA	2,05		0,31	-1,00	-0,64
PUERTA	0,90		1,31	-1,00	-1,18
FACHADA FRONTAL					
VENTANA	3,00		0,31	-1,00	-0,93
VENTANA	0,80		0,31	-1,00	-0,25
FACHADA LAT. DERCH.					
VENTANA	0,80		0,31	-1,00	-0,25
PUERTA	0,80		0,99	-2,00	-1,58
Subtotal					30,00
TOTAL					30,00


OBSERVACIONES:

FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO									
FECHA	DD	1	MM	6	AA	2026	CORTE N°	1	ELABORÓ	Ing. Diego Fernando Portela Florez
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS, TOLIMA									
CONTRATO	102 Del 25 de febrero de 2026									

INCOBELCI S.A.S.

21.00

CAPÍTULO	6,00	ITEM	6.1	ALISTADO PISO 1:5 E:04M	UNIDAD	M2	UBICACIÓN	PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA

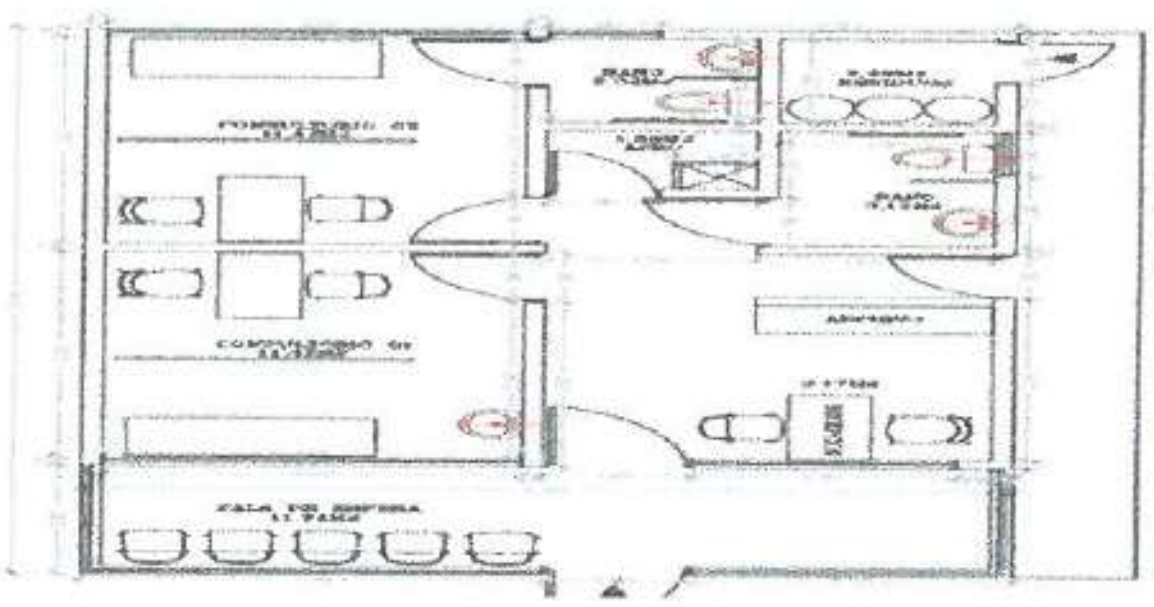




Localización	ELEMENTOS			CANT	Medida Total
	LARGO	ANCHO	ALTO		
CONSULTORI 01	11,44			1,00	11,44
BAÑO CONSULTORIO	2,32			1,00	2,32
CONSULTORIO 2	11,44			1,00	11,44
RECEPCION	9,16			1,00	9,16
ASEO	1,59			1,00	1,59
BAÑO	3,27			1,00	3,27
RESIDUOS FINAL	2,40			1,00	2,40
CIRUCLACIONES	4,35			1,00	4,35
ANTEJARDIN	11,74			1,00	11,74
Subtotal					57,71
TOTAL					57,71

OBSERVACIONES:

FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO		21,00
FECHA DD 1 MM 6 AA 2026	CORTE N° 1	ELABORÓ Ing. Diego Fernando Portela Florez	INCOBELCI S.A.S.
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS, TOLIMA		
CONTRATO	102 Del 25 de febrero de 2026		

CAPÍTULO	6,00	ITEM	6.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBAS (FORMATO 60X60)	UNIDAD	ML	UBICACIÓN	PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA

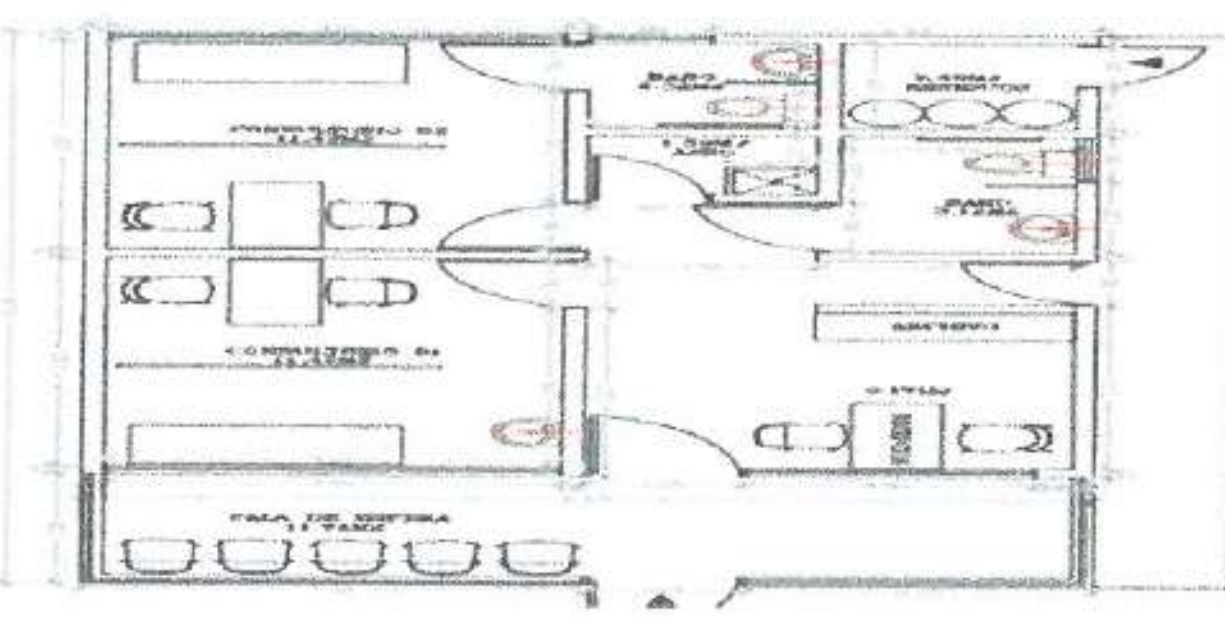




Localización	ELEMENTOS			CANT	Medida Total
	LARGO	ANCHO	ALTO		
CONSULTORIO 01	13,64			1,00	13,64
CONSULTORIO 2	13,64			1,00	13,64
RECEPCION	12,13			1,00	12,13
CIRUCLACIONES	11,99			1,00	11,99
ANTEJARDIN	6,65			1,00	6,65
DESCUENTO					
PUERTA	0,90			-9,00	-8,10
PUERTA	0,80			-2,00	-1,60
Subtotal					48,35
TOTAL					48,35

OBSERVACIONES:

FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO		
FECHA DD 1 MM 6 AA 2026	CORTE N° 1	ELABORO	Ing. Diego Fernando Portela Flores
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS, TOLIMA		INCOBELCI S.A.S.
CONTRATO	102 Del 25 de febrero de 2026		
CAPÍTULO 6,00	ITEM 6.3 CIELO RASO EN DRYWALL (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE, MASILLA Y PINTURA)	UNIDAD M2	UBICACIÓN: PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA

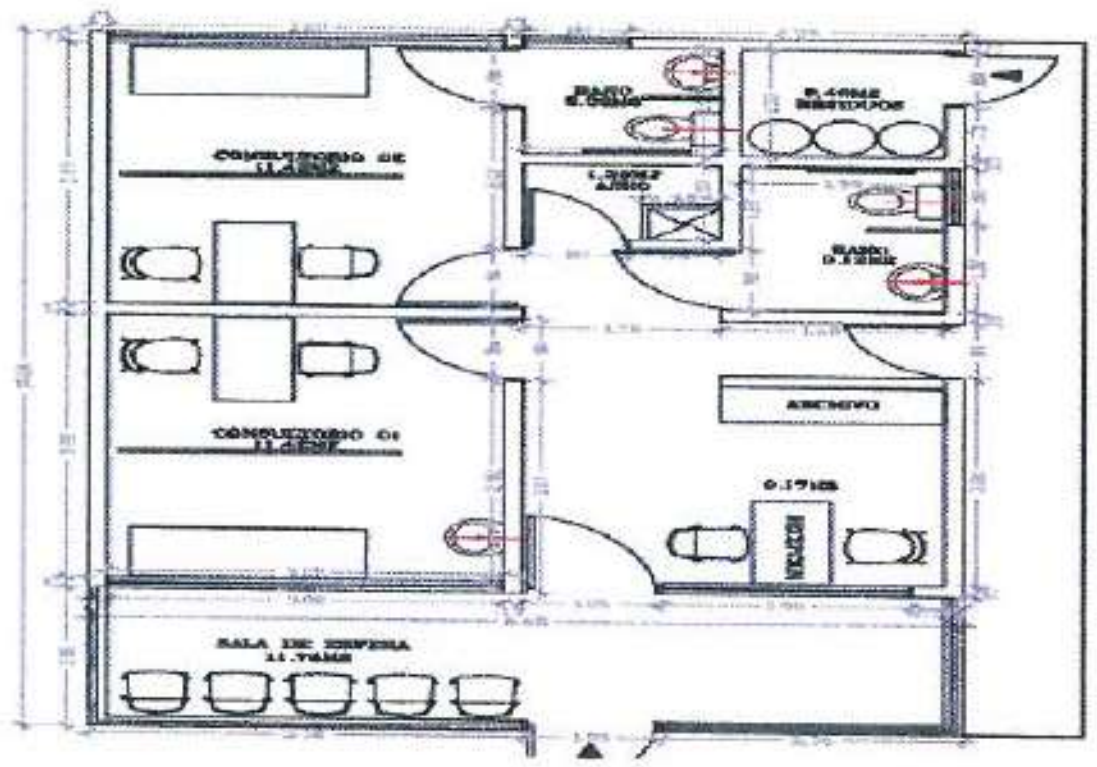

Localización	LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	Medida Total
CONSULTORI	3,96			1,00	3,96
BAÑO CONSULTORIO	0,80			1,00	0,80
CONSULTORIO 2	3,96			1,00	3,96
RECEPCION	3,17			1,00	3,17
ASEO	0,55			1,00	0,55
BAÑO	1,13			1,00	1,13
RESIDUOS FINAL	0,83			1,00	0,83
CIRUCLACIONES	1,53			1,00	1,53
ANTEJARDIN	4,07			1,00	4,07
Subtotal					20,00
TOTAL					20,00


OBSERVACIONES:


FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO		
FECHA: DD 1 MM 6 AA 2026	CORTE N° 1	ELABORO	Ing. Diego Fernando Portela Florez

INCOBELCI S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS, TOLIMA
CONTRATO	102 Del 25 de febrero de 2026

CAPÍTULO	7,00	ITEM	7.1	CERAMICA PARED DE 60x30- BAÑOS (INCLUYE BOQUILLA COLOR, WING Y LNEALES)	UNIDAD	M2	UBICACIÓN	PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA

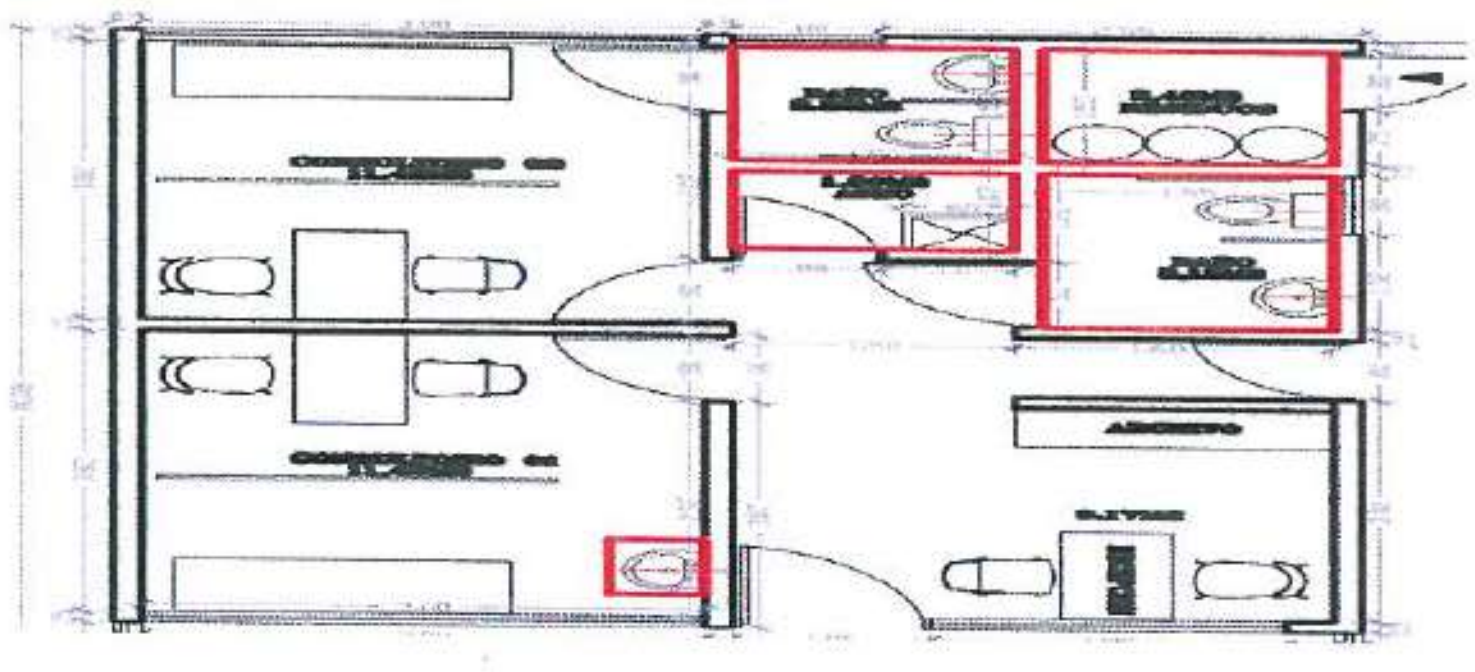

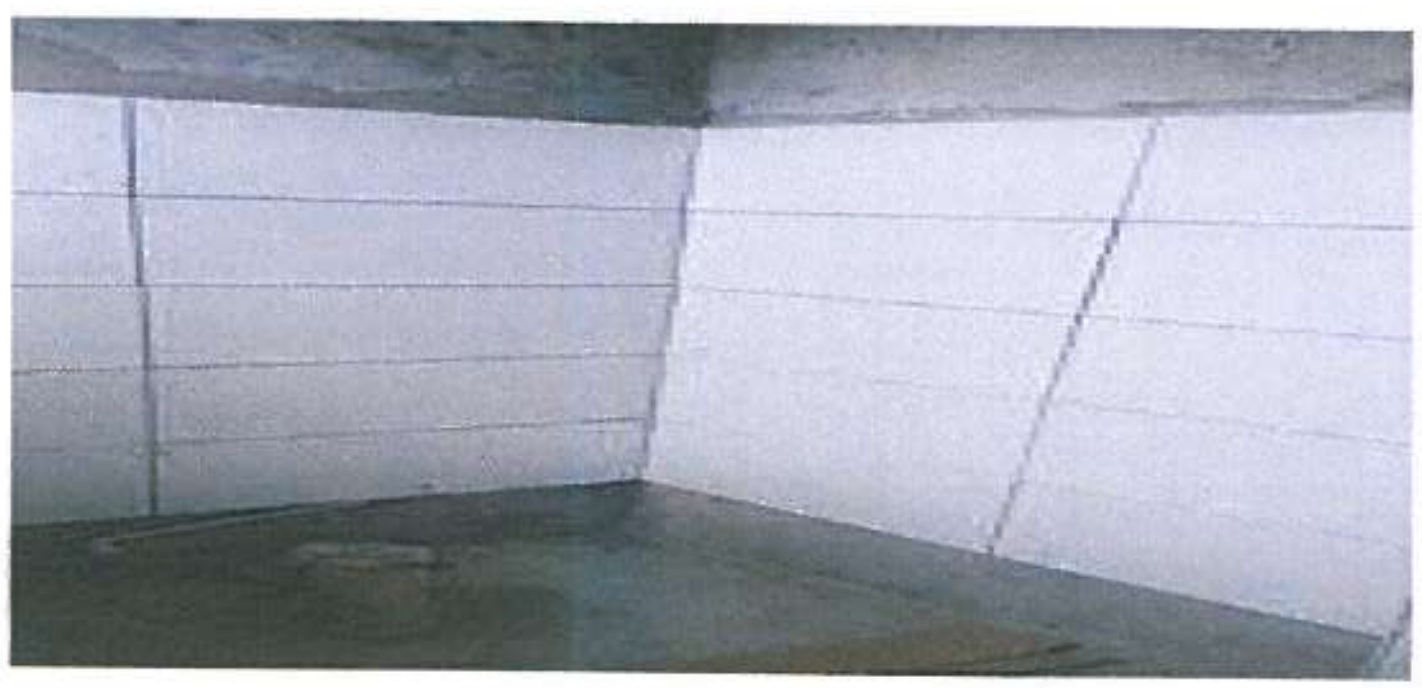


Localización	ELEMENTOS LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	Medida Total
BAÑO	13,34		2,00	1,00	26,68
CONSULTORIO 2	1,31		0,60	1,00	0,79
ASEO	11,21		2,00	1,00	22,42
BAÑO	16,05		2,00	1,00	32,10
RESIDUOS FINAL	13,58		2,00	1,00	27,16
DESCUENTOS					
PUERTAS	1,97		2,00	-2,00	-7,88
PUERTAS	1,75		2,00	-2,00	-7,02
Subtotal					94,25
TOTAL					94,25

OBSERVACIONES:

FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO	
FECHA DD 1 MM 6 AA 2026	CORTE N° 1	ELABORÓ: Ing. Diego Fernando Portela Florez
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS, TOLIMA	INCOBELCI S.A.S.
CONTRATO	102 Del 25 de febrero de 2026	

CAPÍTULO	7,00	ITEM	7.2	CERAMICA PISO FORMATO 60x60 (INCLUYE BOQUILLA COLOR Y LINEALES) - (TRAFICO PESADO)	UNIDAD	M2	UBICACIÓN	PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA

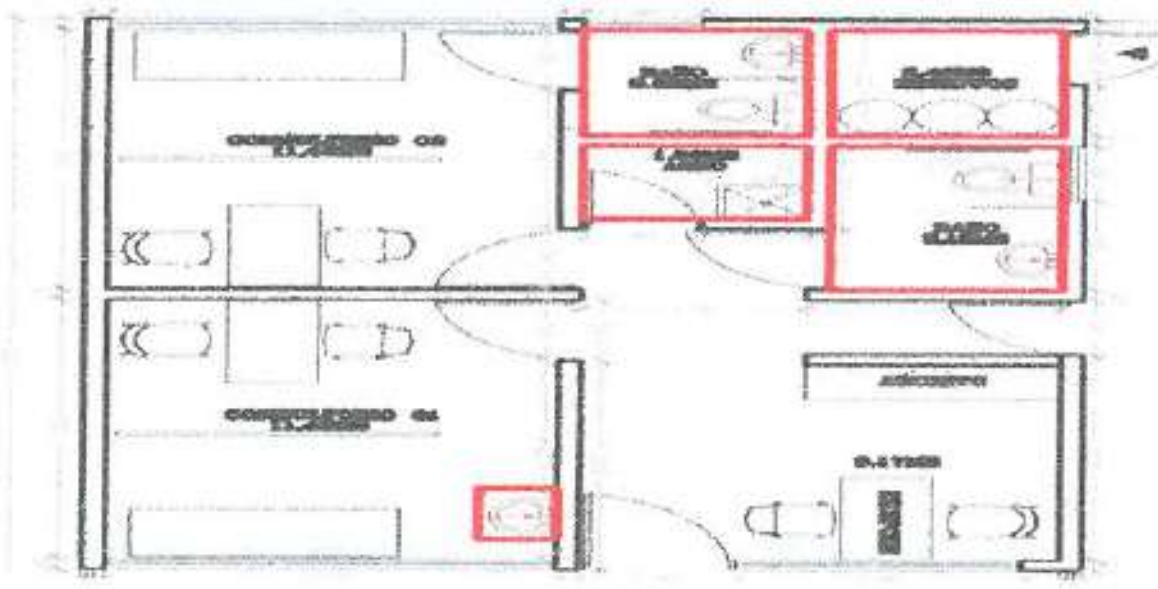




Localización	LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	Medida Total
CONSULTORI 04	13,53			1,00	13,53
BAÑO CONSULTORIO	2,74			1,00	2,74
CONSULTORIO 2	13,53			1,00	13,53
RECEPCION	10,84			1,00	10,84
ASEO	1,88			1,00	1,88
BAÑO	3,87			1,00	3,87
RESIDUOS FINAL	2,84			1,00	2,84
CIRUCLACIONES	5,14			1,00	5,14
ANTEJARDIN	13,89			1,00	13,89
Subtotal					68,26
TOTAL					68,26

OBSERVACIONES:

FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO		21,00
FECHA DD 1 MM 6 AA 2026	CORTE N° 1	ELABORO: Ing. Diego Fernando Portela Florez	INCOBELCI S.A.S.
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS, TOLIMA		
CONTRATO	102 Del 25 de febrero de 2026		

CAPÍTULO	7,00	ITEM	7.3	POCETA LAVATRAPEROS INCLUYE(BLOQUE H4, PAÑETE IMPEMEABILIZADO, ENCHAPE, MOLDURA EN ALUMINIO, CARTERAS, FILOS, ALISTADO DE PISO Y ENCHAPE DE PISO)	UNIDAD	UND	UBICACIÓN	PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA

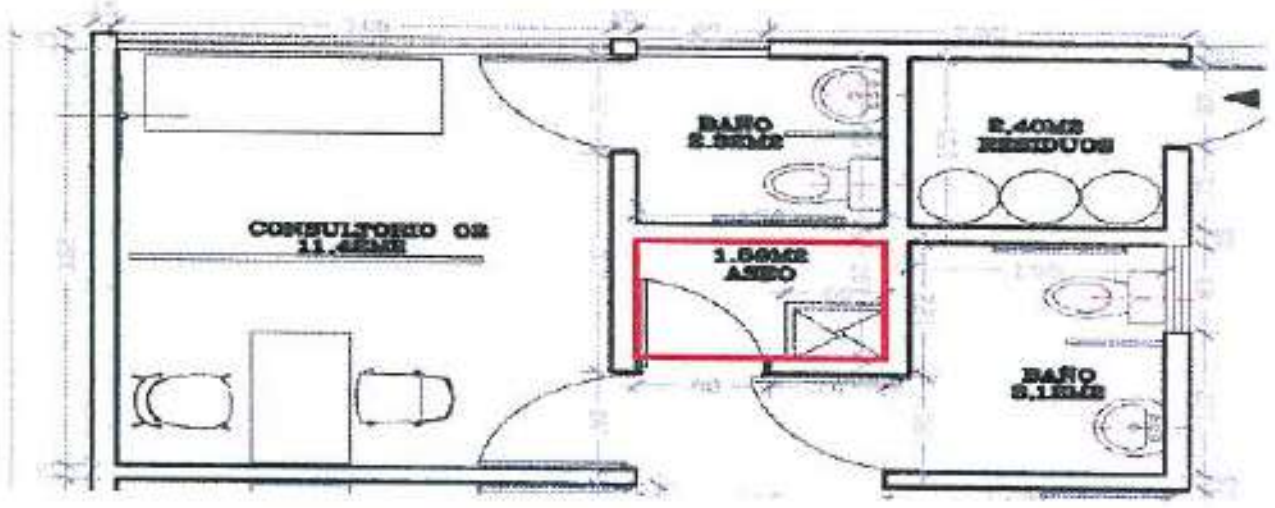




Localización	ELEMENTOS LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	Medida Total
ASEO				1,00	1,00
			Subtotal		1,00
			TOTAL		1,00

OBSERVACIONES:

FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO		21,00
FECHA: DD 1 MM 6 AA 2026	CORTE N° 1	ELABORÓ: Ing. Diego Fernando Portela Florez	INCOBELCI S.A.S.
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS, TOLIMA		
CONTRATO	102 Del 25 de febrero de 2026		


CAPÍTULO	7,00	ITEM	7.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO INSTITUCIONAL CORONA (INCLUYE ACOPLES)	UNIDAD	UND	UBICACIÓN	PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA

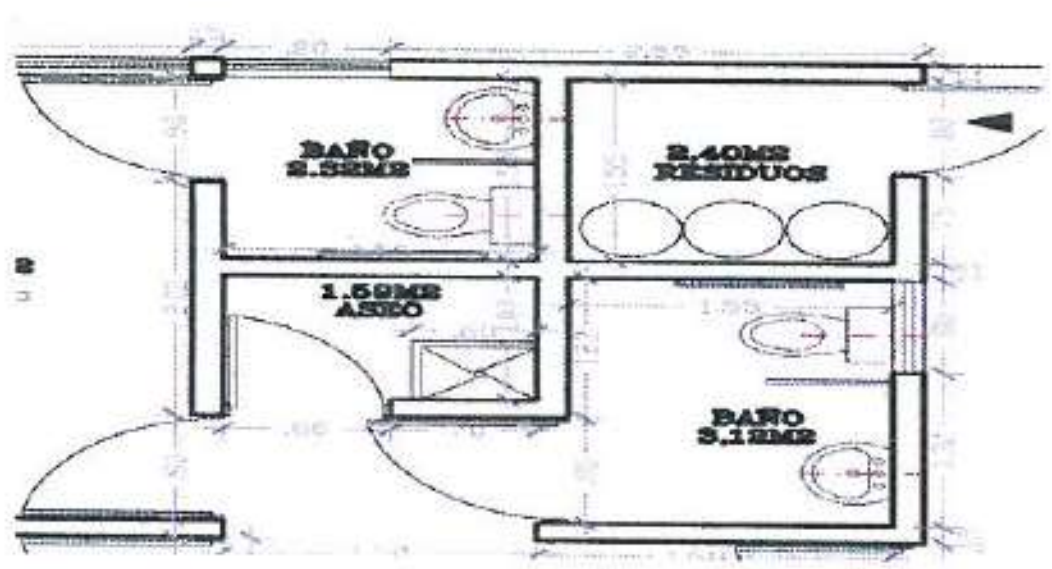

Localización	ELEMENTOS LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	Medida Total
BAÑO					0,00
BAÑO DISCAPACITADOS					0,00
				Subtotal	0,00
				TOTAL	0,00

OBSERVACIONES:


FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO									21.00
FECHA	DD 1	MM 6	AA 2026	CORTE N° 1		ELABORO	Ing. Diego Fernando Portela Flore		INCOBELCI S.A.S.	
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS, TOLIMA									
CONTRATO	102 Del 25 de febrero de 2026									
CAPÍTULO	7,00	ITEM	7.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS CON PEDESTAL CORONA (INCLUYE ACOPLES, GRIFERÍA LAVAMANOS MONOCONTROL ALUVIA, CONJUNTO DESAGUE LAVAMANOS)-(BAÑOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD)		UNIDAD	UND	UBICACIÓN	PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA	

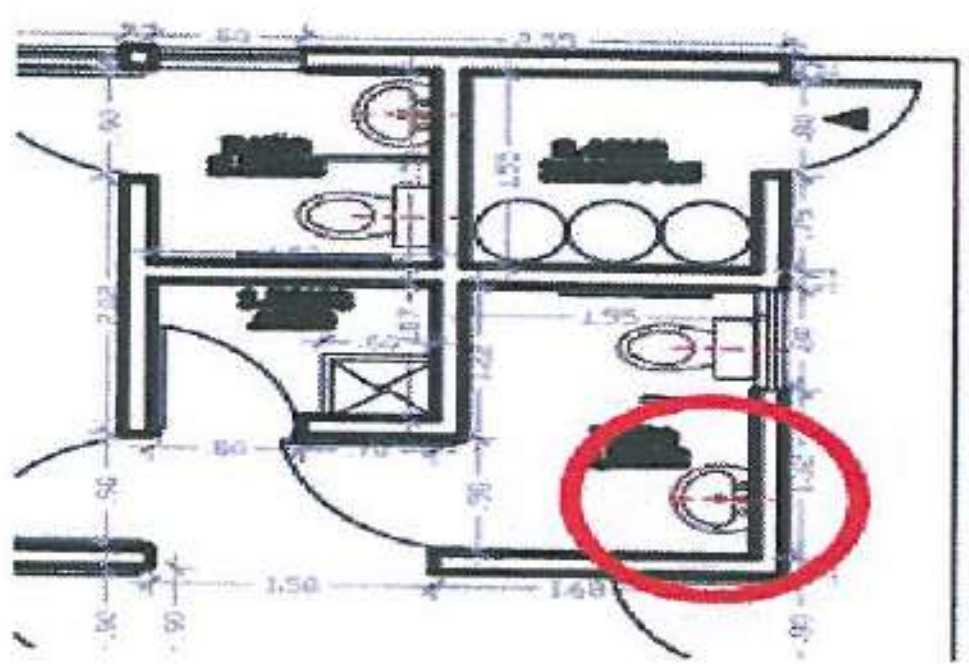

Localización	ELEMENTOS LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	Medida Total
BANO					0,00
		Subtotal			0,00
		TOTAL			0,00

OBSERVACIONES:

FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO								
FECHA	DD 1	MM 6	AA 2026	CORTE N° 1	ELABORO	Ing. Diego Fernando Portela Flore		INCOBELCI S.A.S.	
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS, TOLIMA								
CONTRATO	102 Del 25 de febrero de 2026								
CAPÍTULO	7,00	ITEM	7.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS CON PEDESTAL CORONA (INCLUYE ACOPLES, CONJUNTO DESAGUE LAVAMANOS, KIT GRIFERIA INDUSTRIAL CON CONTROL DE PEDAL INSTITUCIONAL)-(CONSULTORIOS)	UNIDAD	UND	UBICACIÓN	PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA	

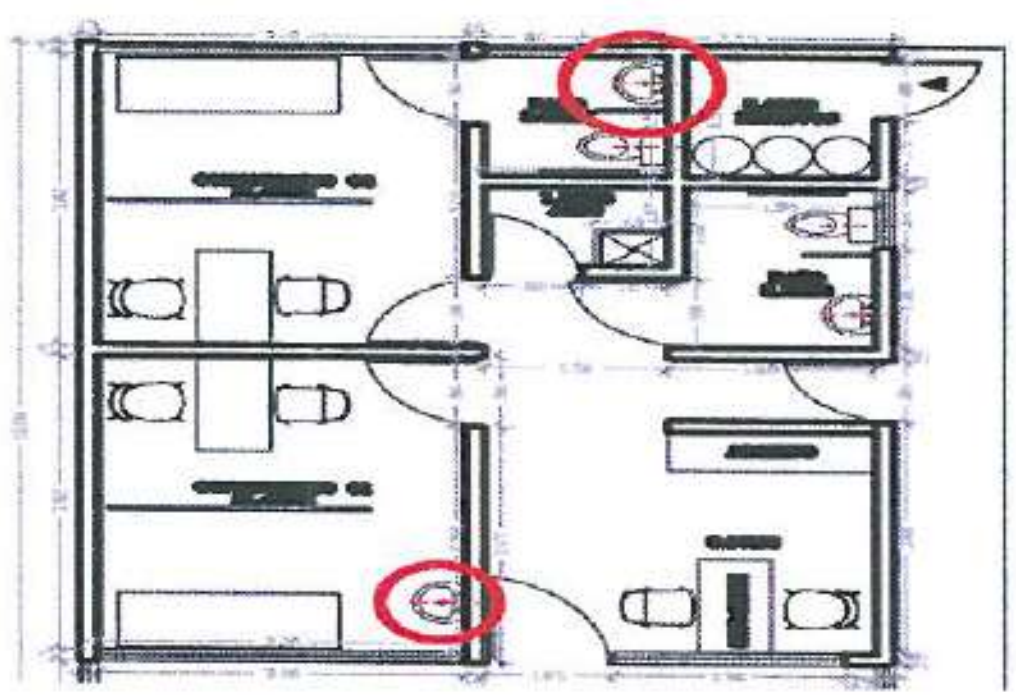


Localización	ELEMENTOS LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	Medida Total
CONSULTORIO					0,00
CONSULTORIO 2					0,00
Subtotal					0,00
TOTAL					0,00

OBSERVACIONES:

FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO		21,00
FECHA DD 1 MM 6 AA 2026	CORTE N° 1	ELABORO: Ing. Diego Fernando Portela Flore	INCOBELCI S.A.S.
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS, TOLIMA		
CONTRATO	102 Del 25 de febrero de 2026		


CAPÍTULO	7,00	ITEM	7.7	KIT BARRA DE SEGURIDAD PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (1 BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE ACERO 304 Y 1 BARRA DE SEGURIDAD AGARRADERA ACERO INOXIDABLE 60CM PREMIUM)	UNIDAD	UND	UBICACIÓN	PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA

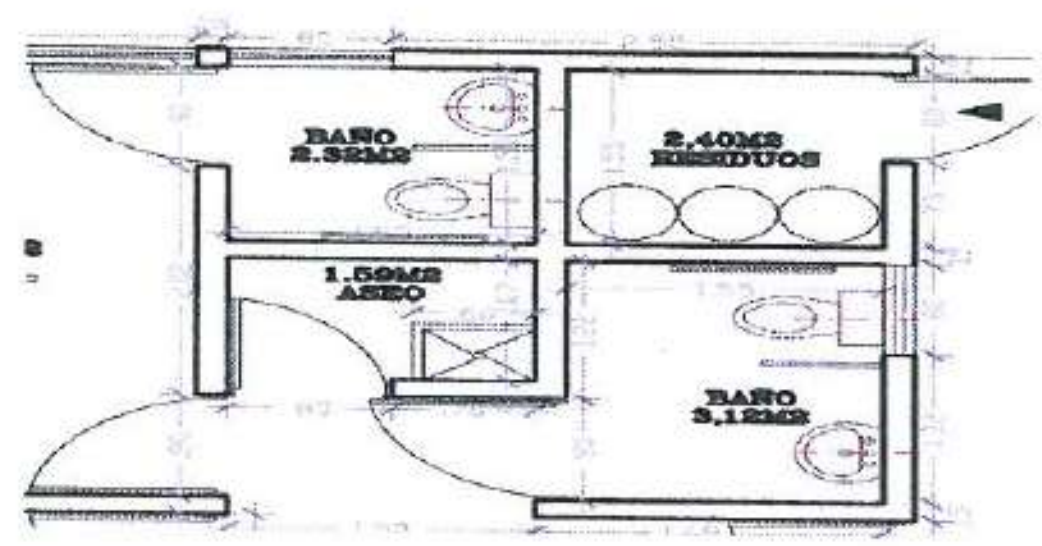

Localización	ELEMENTOS LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	Medida Total
BAÑO					0,00
BAÑO DISCAPACT					0,00
Subtotal					0,00
TOTAL					0,00

OBSERVACIONES:


FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO												
FECHA	DD	1	MM	6	AA	2026		CORTE N°	1		ELABORO	Ing. Diego Fernando Portela Flórez	INCOBELCI S.A.S.
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS, TOLIMA												
CONTRATO	102 Del 25 de febrero de 2026												
CAPÍTULO	7,00		ITEM	7.8	TAPA REGISTRO PVC 15X15 (INCLUYE CAJA LLAVE REGISTRO)			UNIDAD	UND	UBICACIÓN	PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA		

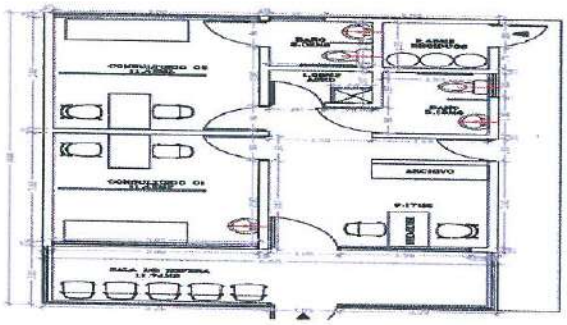

Localización	ELEMENTOS			CANT	Medida Total
	LARGO	ANCHO	ALTO		
BAÑO					0,00
CONSULTORIO 2					0,00
ASEO					0,00
BAÑO DISCAPA					0,00
RESIDUOS FINALES					0,00
Subtotal					0,00
TOTAL					0,00

OBSERVACIONES:

FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO								21.00
FECHA	DD 1	MM 6	AA 2026	CORTE N°	1	ELABORO	Ing. Diego Fernando Portela Flórez		INCOBELCI S.A.S.
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS, TOLIMA								
CONTRATO	102 Del 25 de febrero de 2026								
CAPÍTULO	7,00	ITEM	7.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA 3 " DE PISO ANTICUCARACHAS, CON SOSCO	UNIDAD	UND	UBICACIÓN	PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA	

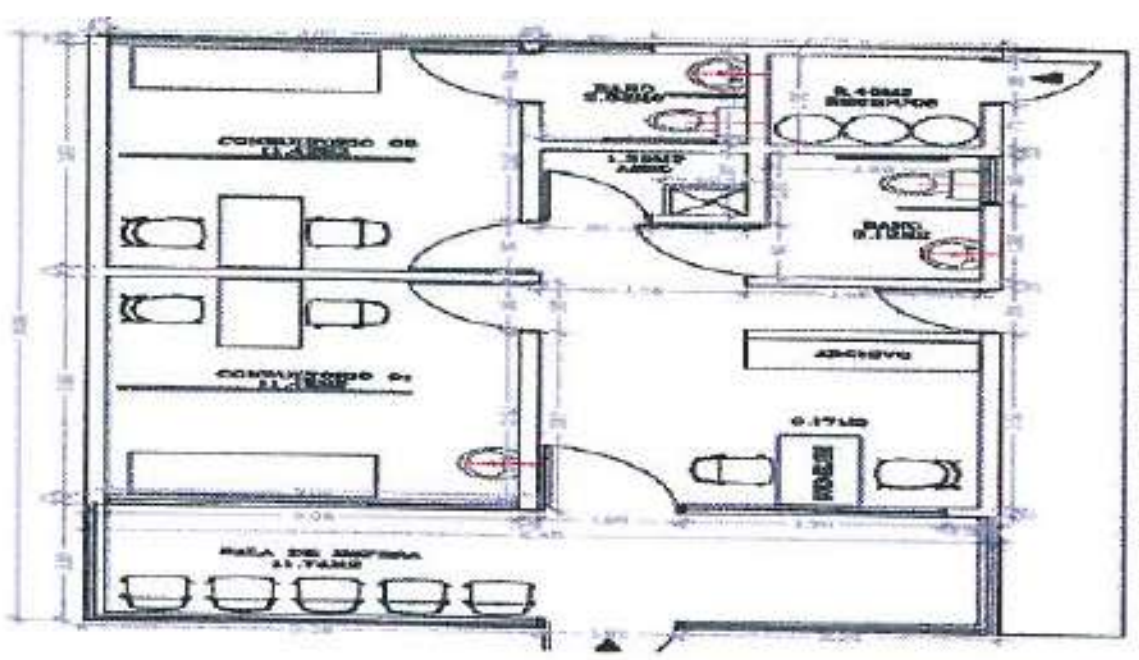


Localización	ELEMENTOS LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	Medida Total
ASEO					0,00
RESIDUOS FINALES					0,00
BAÑO DISCAPA					0,00
BAÑO CONSULTORIO					0,00
Subtotal					0,00
TOTAL					0,00

OBSERVACIONES:

FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO		21,00
FECHA DD 1 MM 6 AA 2026	CORTE N° 1	ELABORO	Ing. Diego Fernando Portela Florez
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS, TOLIMA		INCOBELCI S.A.S.
CONTRATO	102 Del 25 de febrero de 2026		

CAPÍTULO	7,00	ITEM	7,10	DISPENSADOR DE JABON

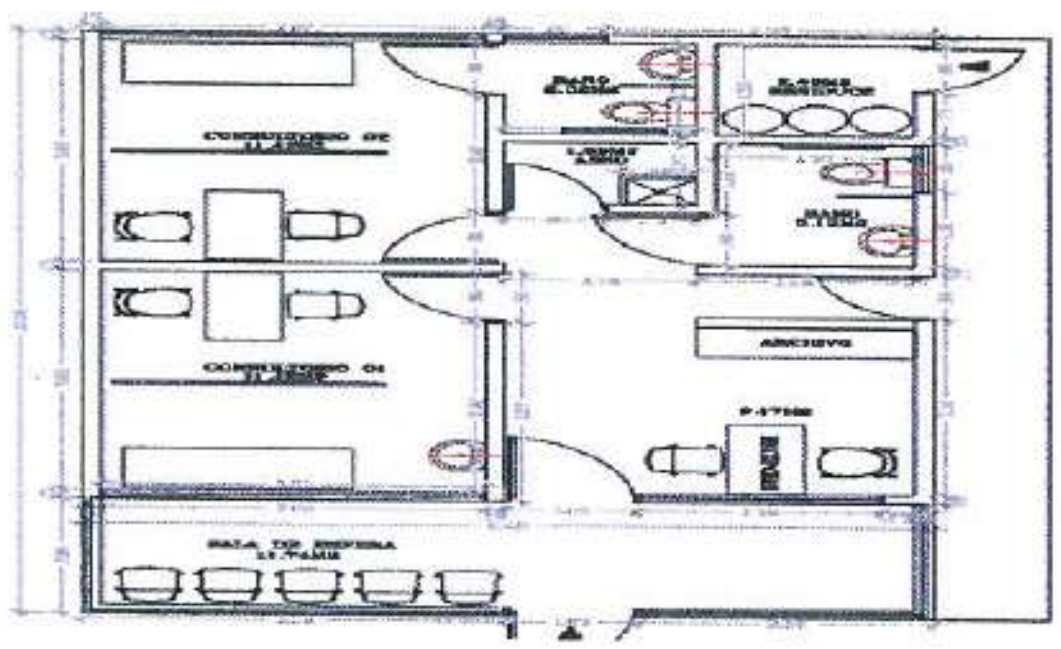


UNIDAD	UND	UBICACIÓN	PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA		
Localización	ELEMENTOS			CANT	Medida Total
	LARGO	ANCHO	ALTO		
BAÑO					0,00
CONSULTORIO 2					0,00
BAÑO PARA DISCAPA					0,00
Subtotal					0,00
TOTAL					0,00

OBSERVACIONES:

21,00

FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO	
FECHA: DD 1 MM 6 AA 2026 — CORTE N° 1	ELABORO: Ing. Diego Fernando Portela Flórez	INCOBELCI S.A.S.
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS, TOLIMA	
CONTRATO	102 Del 25 de febrero de 2026	

CAPÍTULO	7,00	ITEM	7,11	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO	UNIDAD	UND	UBICACIÓN	PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA

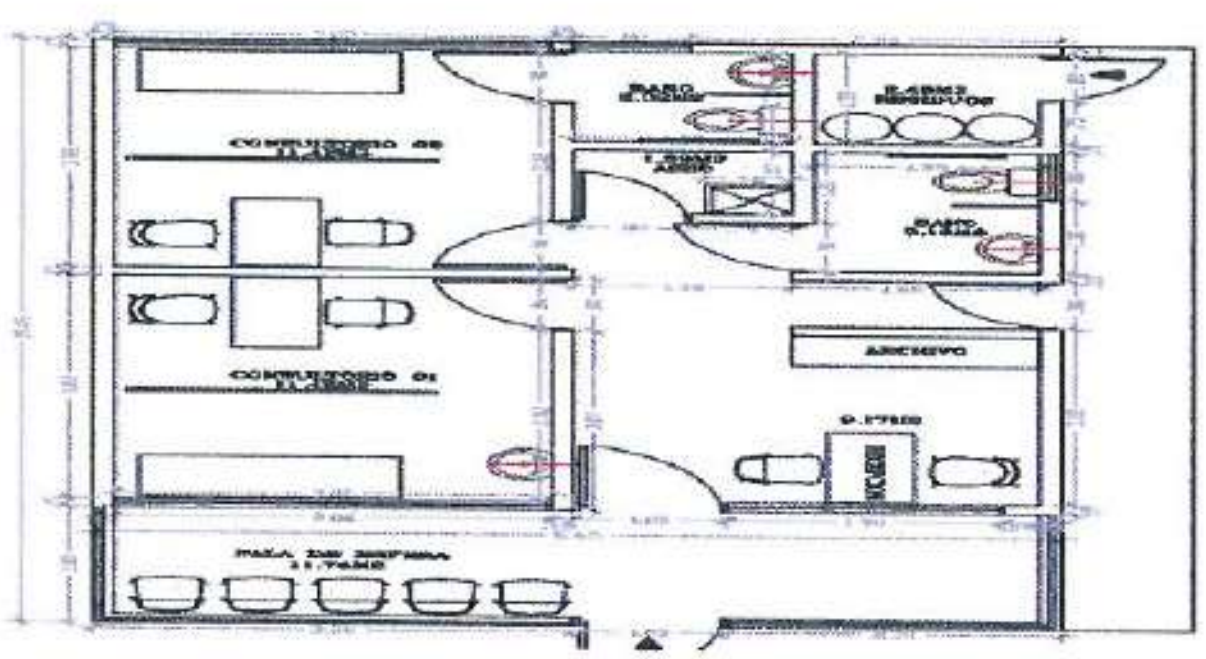


Localización	ELEMENTOS LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	Medida Total
BAÑOS					0,00
Subtotal					0,00
TOTAL					0,00

OBSERVACIONES:

FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO		
FECHA	DD 1 MM 6 AA 2026	CORTE N° 1	ELABORO: Ing. Diego Fernando Portela Flores
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS, TOLIMA		INCOBELCI S.A.S.
CONTRATO	102 Del 25 de febrero de 2026		

CAPÍTULO	7,00	ITEM	7,12	DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL	UNIDAD	UND	UBICACIÓN	PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA

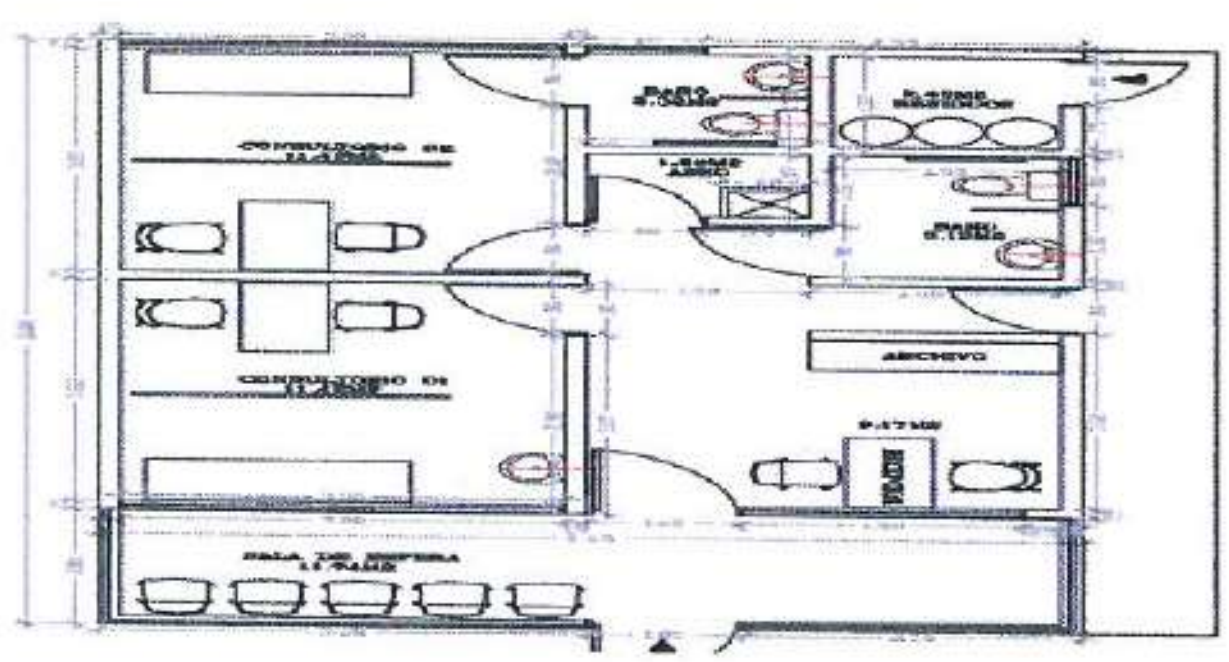


Localización	ELEMENTOS LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	Medida Total
CONSULTORIO					0,00
CONSULTORIO 2					0,00
Subtotal					0,00
TOTAL					0,00

OBSERVACIONES:

FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO		
FECHA	DD 1 MM 6 AA 2026 CORTE N° 1	ELABORO	Ing. Diego Fernando Portela Flore
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS, TOLIMA		INCOBELCI S.A.S.
CONTRATO	102 Del 25 de febrero de 2026		

21,00

CAPÍTULO	7,00	ITEM	7,13	DISPENSADOR DE GEL ANTIBACTERIAL	UNIDAD	UND	UBICACIÓN	PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA

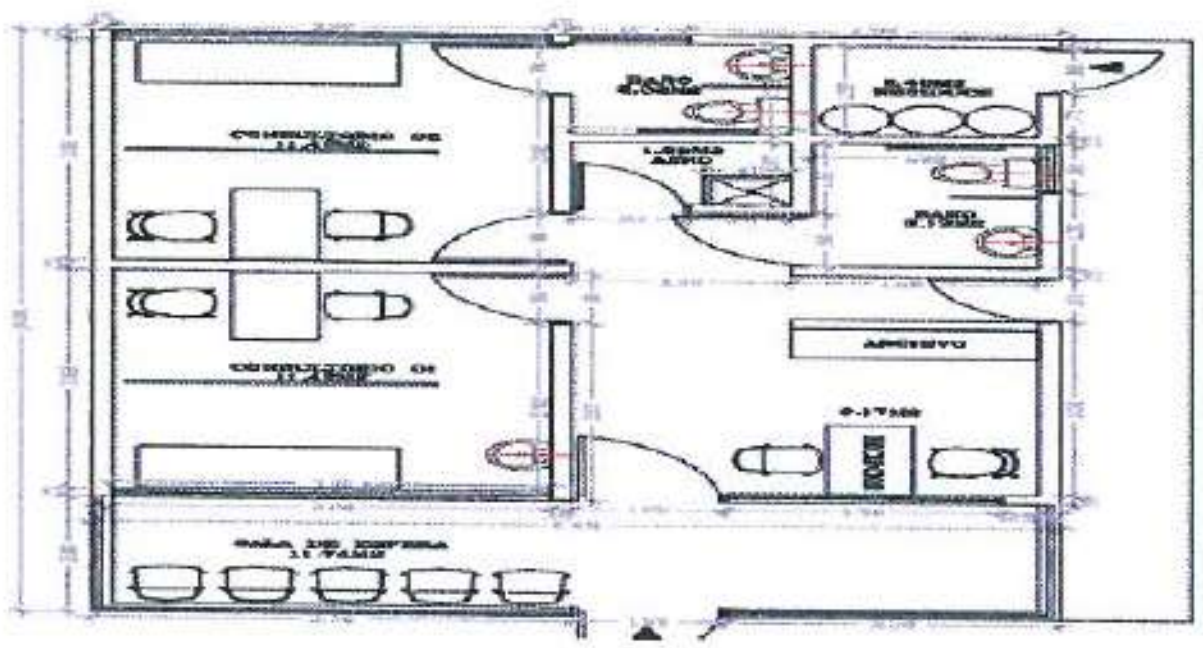


Localización	ELEMENTOS LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	Medida Total
CONSULTORIO					0,00
CONSULTORIO 2					0,00
SALA DE ESPERA					0,00
Subtotal					0,00
TOTAL					0,00

OBSERVACIONES:

FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO		21,00
FECHA DD 1 MM 6 AA 2026	CORTE N° 1	ELABORO: Ing. Diego Fernando Portela Flórez	INCOBELCI S.A.S.
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS, TOLIMA		
CONTRATO	102 Del 25 de febrero de 2026		

CAPÍTULO	8,00	ITEM	8.1	MUEBLE EN AGLOMERADO RH EXP 15MM INCLUYE ((HERRAJES, BOTONES, CANTOS, TAPA TORNILLOS)

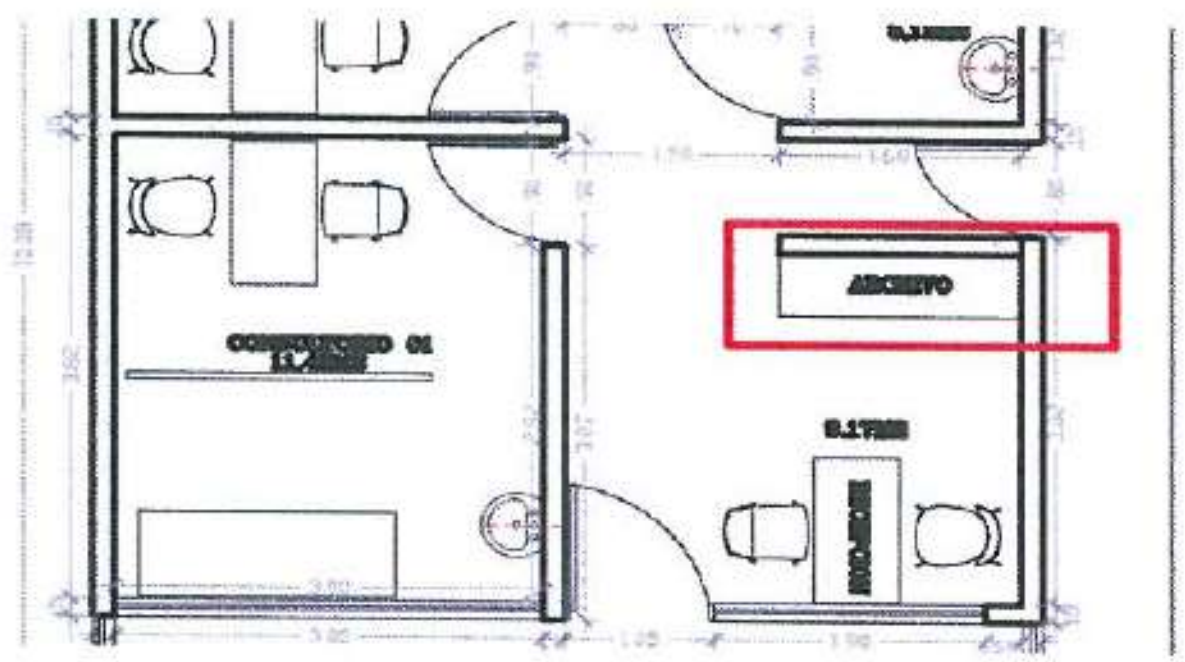



UNIDAD	ML	UBICACIÓN	PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA		
Localización	ELEMENTOS			CANT	Medida Total
	LARGO	ANCHO	ALTO		
ARCHIVO					
MUEBLE ALTO	1,70				0,00
MUEBLE BAJO	1,70				0,00
Subtotal					0,00
TOTAL					0,00

OBSERVACIONES:

FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO										INCOBELCI S.A.S.
FECHA	DD	1	MM	6	AA	2026	CORTE N°	1	ELABORÓ	Ing. Diego Fernando Portela Florez	
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS, TOLIMA										
CONTRATO	102 Del 25 de febrero de 2026										

CAPÍTULO	8,00	ITEM	8.2	PUERTA ENTAMBORADA EN AGLOMERADO, INCLUYE (MARCO EN MADERA, BISAGRAS Y CHAPA TIPO PALANCA) 0,90 X 2,00	UNIDAD	UND	UBICACIÓN	PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA

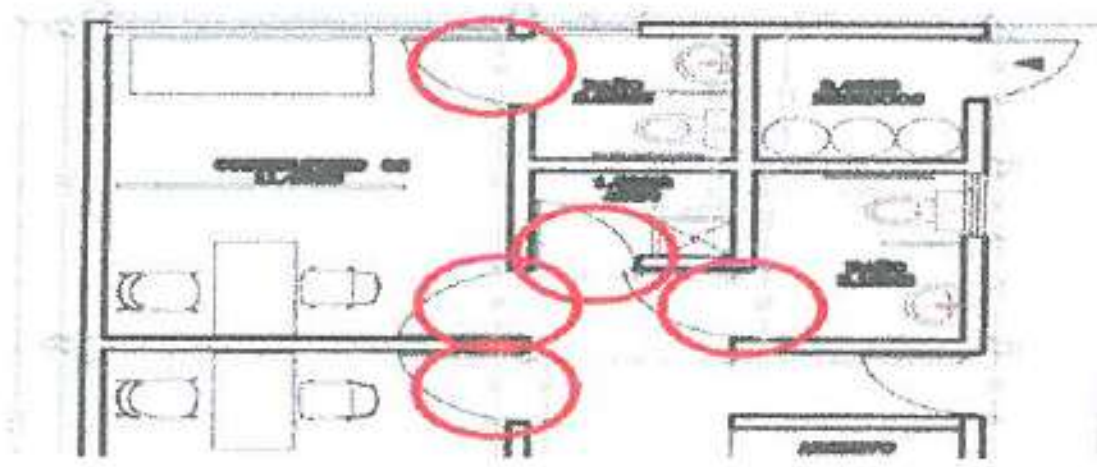

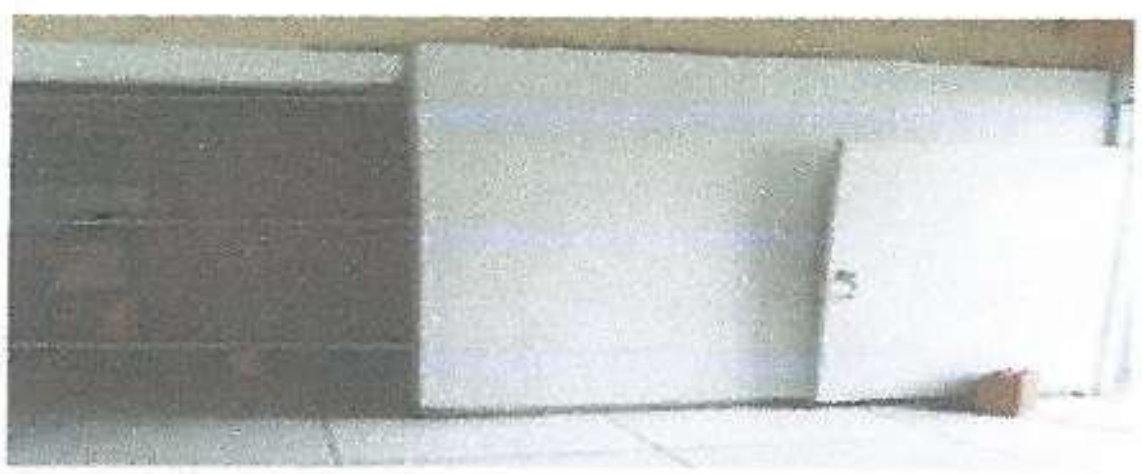


Localización	ELEMENTOS			CANT	Medida Total
	LARGO	ANCHO	ALTO		
CONSULTORIO 1				1,00	1,00
CONSULTORIO 2				1,00	1,00
BAÑOS				2,00	2,00
ASEO				1,00	1,00
Subtotal					5,00
TOTAL					5,00

OBSERVACIONES:

FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO												INCOBELCI S.A.S.
FECHA	DD	1	MM	6	AA	2026		CORTE N°	1		ELABORÓ	Ing. Diego Fernando Portela Florez	
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS, TOLIMA												
CONTRATO	102 Del 25 de febrero de 2026												

CAPÍTULO	8,00	ITEM	8.3	VENTANA SENCILLA EN ALUMINIO COLOR BLANCO CORREDIZA EN DOS CUERPOS PERFIL 744 INCLUYE ALFAJIA DE 8MM)	UNIDAD	M2	UBICACIÓN	PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA

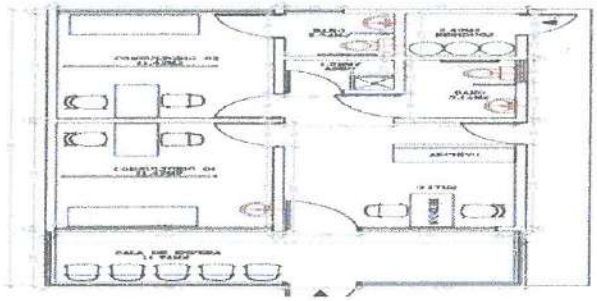




Localización	ELEMENTOS			CANT	Medida Total
	LARGO	ANCHO	ALTO		
CONSULTORIO 1 VENTANA	3,00		0,62	1,00	1,86
CONSULTORIO 2 VENTANA	3,00		0,62	1,00	1,86
RECEPCION -V, ALTA	2,05		0,62	1,00	1,27
BAÑO VENTANA ALTA	0,80		0,62	2,00	0,99
			Subtotal		5,98
			TOTAL		5,98

OBSERVACIONES:

FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO								
FECHA	DD 1	MM 6	AA 2026	CORTE N° 1	ELABORO	ng. Diego Fernando Portela Flore		INCOBELCI S.A.S.	21,00
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS, TOLIMA								
CONTRATO	102 Del 25 de febrero de 2026								
CAPÍTULO	8,00	ITEM	8.4	ESPEJO 4MM					

UNIDAD	M2	UBICACIÓN	PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA		
Localización	ELEMENTOS			CANT	Medida Total
	LARGO	ANCHO	ALTO		
BAÑOS	0,60		1,00	0,00	0,00
				Subtotal	0,00
				TOTAL	0,00

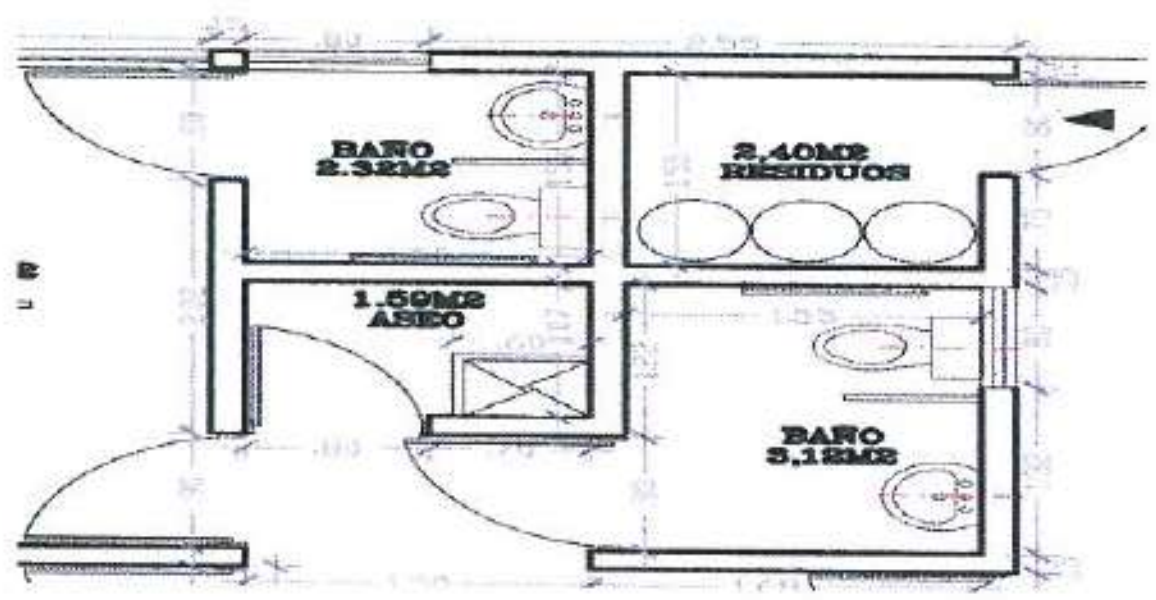


OBSERVACIONES:

FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO															
FECHA	DD	1	MM	6	AA	2026		CORTE N°	1		ELABORÓ	Ing. Diego Fernando Portela Flores				
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS, TOLIMA															
CONTRATO	102 Del 25 de febrero de 2026															

INCOBELCI S.A.S.

CAPÍTULO	9,00	ITEM	9.1	SALIDA PARA ILUMINACION INCLUYE (LED 12W, INTERRUPTOR, CABLE LIBRE DE ALOGENO, CAJA CUADRADA, CURVAS PVC 1/2, TUBO PVC 1/2 Y SUPLEMENTO)	UNIDAD	UND	UBICACIÓN	PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA

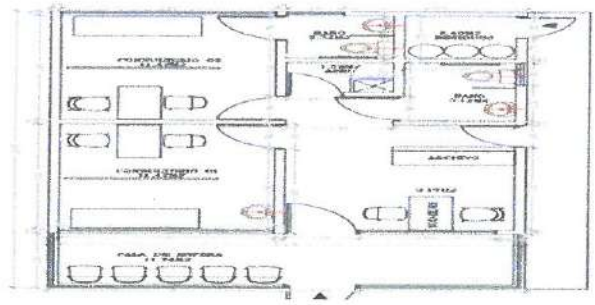





Localización	ELEMENTOS			CANT	Medida Total
	LARGO	ANCHO	ALTO		
CONSULTORIO 1				2,00	2,00
CONSULTORIO 2				3,00	3,00
RECEPCION				2,00	2,00
ASEO				1,00	1,00
BAÑOS				2,00	2,00
RESIDUOS FINAL				1,00	1,00
ANTEJARDIN				2,00	2,00
Subtotal					13,00
TOTAL					13,00

OBSERVACIONES:

FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO	
FECHA: DD 1 MM 6 AA 2026	CORTE N° 1	ELABORO: Ing. Diego Fernando Portela Florez
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS, TOLIMA	INCOBELCI S.A.S.
CONTRATO	102 Del 25 de febrero de 2026	

CAPÍTULO	9,00	ITEM	9.2	SALIDAS PARA TOMA CORRIENTE MONOFASICO DE 110V USO GENERA INCLUYE (TOMA CORRIENTE DOBLE, CABLE LIBRE DE ALOGENO, CAJA CUADRADA, CURVAS PVC 1/2, TUBO PVC 1/2 Y SUPLEMENTO)	UNIDAD	UND	UBICACIÓN	PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA

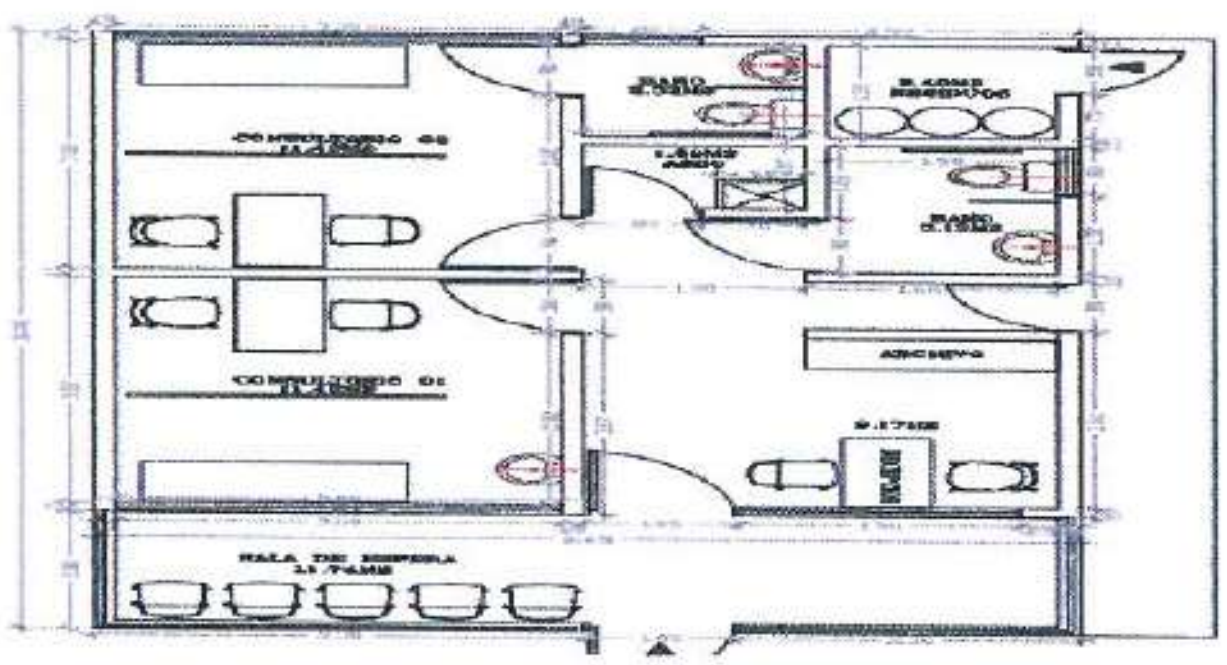

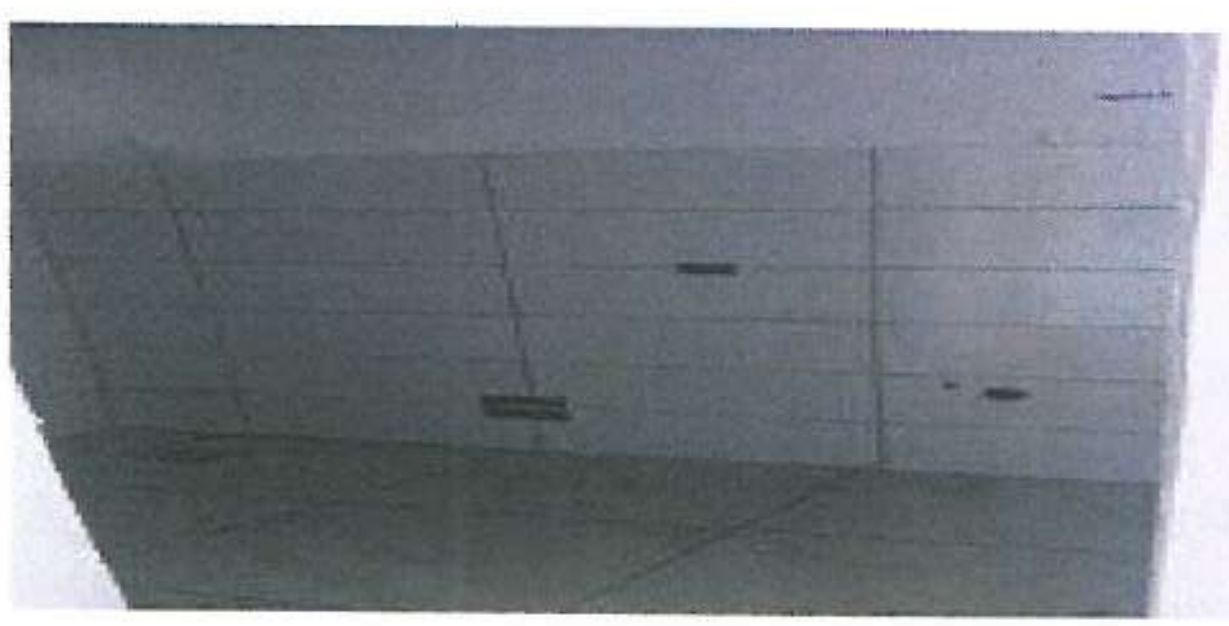

Localización	ELEMENTOS LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	Medida Total
CONSULTORIO				7,00	7,00
CONSULTORIO 2				7,00	7,00
RECEPCION				4,00	4,00
RESIDUOS FINALES				2,00	2,00
AIRES ACONDICIONAD				2,00	2,00
Subtotal					22,00
TOTAL					22,00


OBSERVACIONES:


21.00

FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO											
FECHA	DD	1	MM	6	AA	2026	CORTE N°	1	ELABORÓ	Ing. Diego Fernando Portela Florez		INCOBELCI S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS, TOLIMA
CONTRATO	102 Del 25 de febrero de 2026

CAPÍTULO	9,00	ITEM	9.3	REGATAS	UNIDAD	ML	UBICACIÓN	PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA

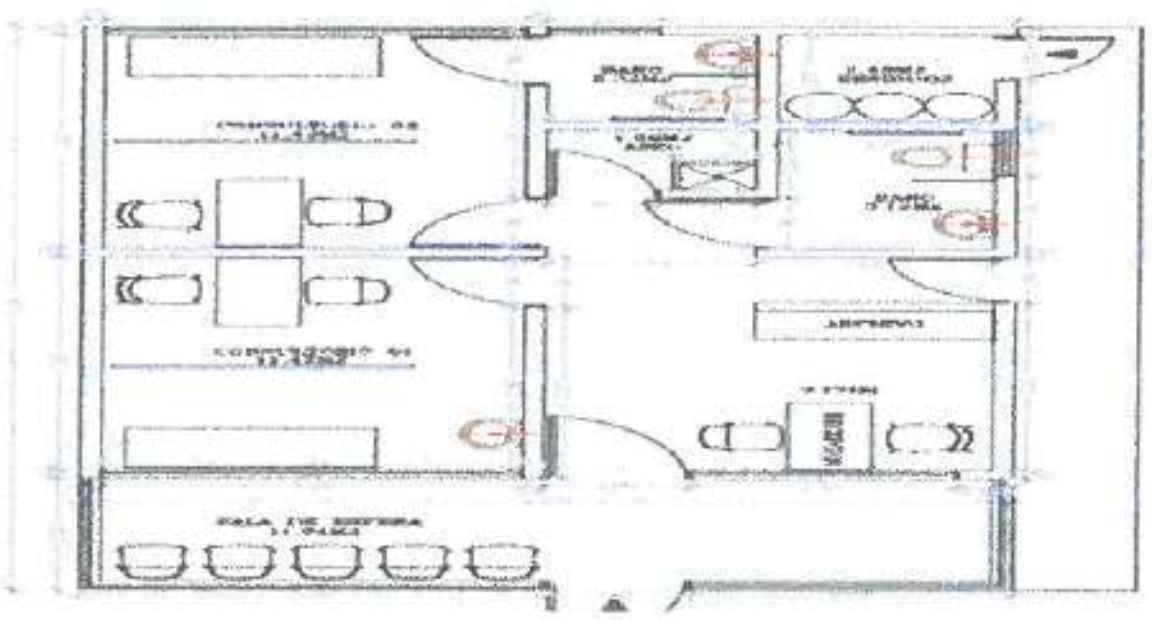

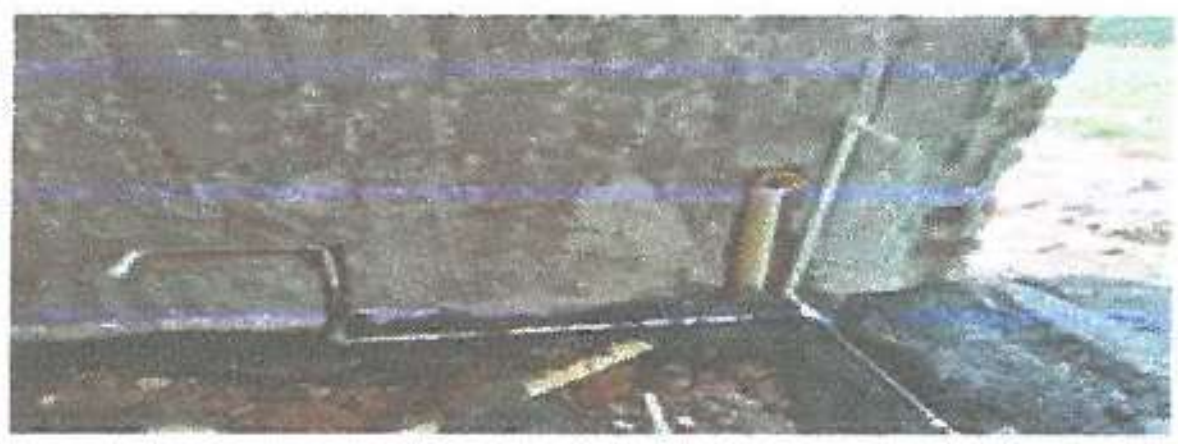

Localización	ELEMENTOS			CANT	Medida Total
	LARGO	ANCHO	ALTO		
REGATAS TB. ELECTR	37,62			1,00	37,62
		Subtotal			37,62
		TOTAL			37,62

OBSERVACIONES:


21.00

FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO									
FECHA	DD	1	MM	6	AA	2026	CORTE N°	1	ELABORÓ	Ing. Diego Fernando Portela Florez

INCOBELCI S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS, TOLIMA
CONTRATO	102 Del 25 de febrero de 2026

CAPÍTULO	10,00	ITEM	10.1	TUBERIA 1/2" PVC PRESION	UNIDAD	ML	UBICACIÓN	PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA

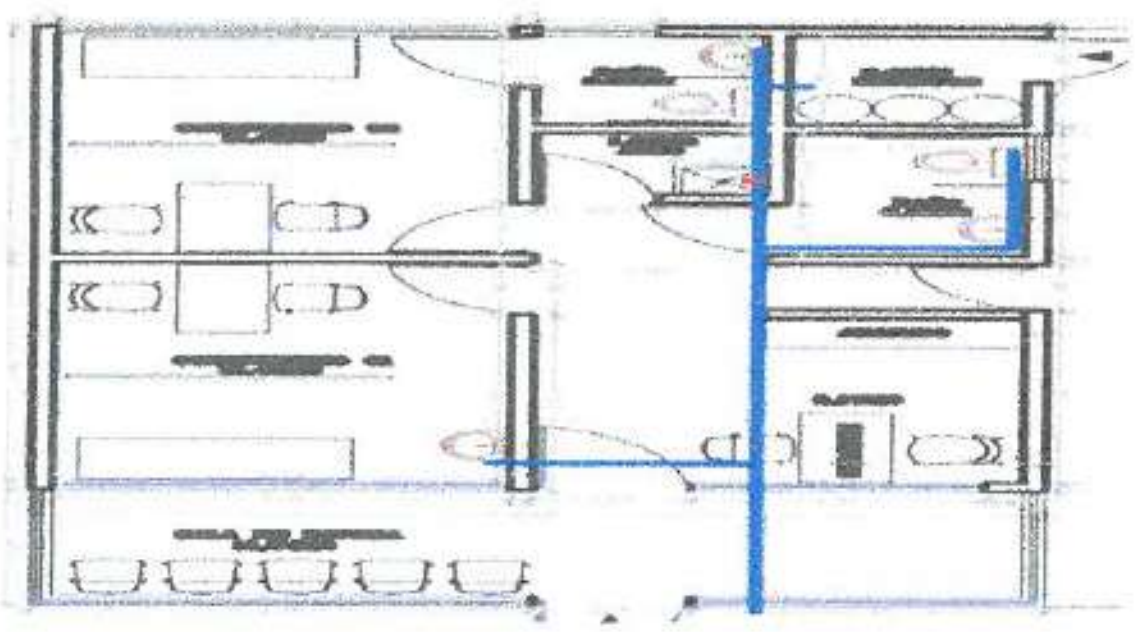




Localización	ELEMENTOS LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	Medida Total
	18,00			1,00	18,00
Subtotal					18,00
TOTAL					18,00

OBSERVACIONES:

FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO								
FECHA	DD 1	MM 6	AA 2026	CORTE N° 1		ELABORÓ	Ing. Diego Fernando Portela Florez	INCOBELCI S.A.S.	
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS, TOLIMA								
CONTRATO	102 Del 25 de febrero de 2026								
CAPÍTULO	10,00	ITEM	10.2	PUNTO HIDRAULICO 1/2"	UNIDAD	UND	UBICACIÓN	PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA	

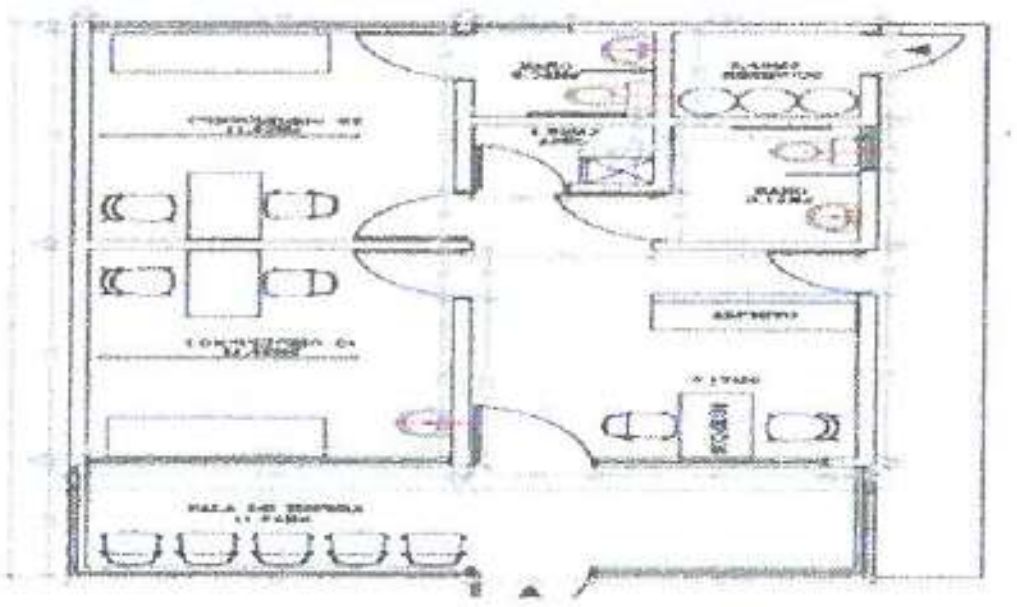




Localización	ELEMENTOS LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	Medida Total
BAÑS				2,00	2,00
CONSULTORIO 2				1,00	1,00
ASEO				1,00	1,00
RESIDUS FINAL				1,00	1,00
PUNTOS LLAVES PASO				3,00	3,00
Subtotal					8,00
TOTAL					8,00

OBSERVACIONES:

FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO														
FECHA	DD	1	MM	6	AA	2026		CORTE N°	1		ELABORÓ	Ing. Diego Fernando Portela Flórez		INCOBELCI S.A.S.	
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS, TOLIMA														
CONTRATO	102 Del 25 de febrero de 2025														

CAPÍTULO	10,00	ITEM	10.3	TUBERIA SANITARIA 3" (INCLUYE ACCESORIOS)	UNIDAD	ML	UBICACIÓN	PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA

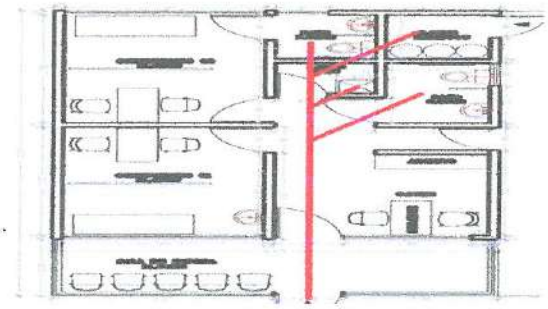




Localización	ELEMENTOS			CANT	Medida Total
	LARGO	ANCHO	ALTO		
LAVADO Y RESIDUOS	18,00			1,00	18,00
Subtotal					18,00
TOTAL					18,00

OBSERVACIONES:

FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO												INCOBELCI S.A.S.
FECHA	DD	1	MM	6	AA	2026	CORTE N°	1		ELABORÓ	Ing. Diego Fernando Portela Florez		
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS, TOLIMA												
CONTRATO	102 Del 25 de febrero de 2026												

CAPÍTULO	10,00	ITEM	10.4	TUBERIA SANITARIA 2" (INCLYE ACCEOSORIOS)	UNIDAD	ML	UBICACIÓN	PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA

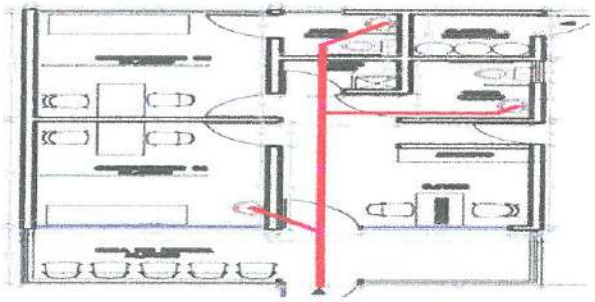



Localización	ELEMENTOS			CANT	Medida Total
	LARGO	ANCHO	ALTO		
CONSULTORIO 1 X 2	9,00			1,00	9,00
Subtotal					9,00
TOTAL					9,00

OBSERVACIONES:


21,00

FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO									
FECHA	DD	1	MM	6	AA	2026	CORTE N°	1	ELABORÓ	Ing. Diego Fernando Portela Flórez

INCOBELCI S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS, TOLIMA
CONTRATO	102 Del 25 de febrero de 2026

CAPÍTULO	10,00	ITEM	10.5	REGISTRO PVC PRESION 1/2"	UNIDAD	UND	UBICACIÓN	PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA

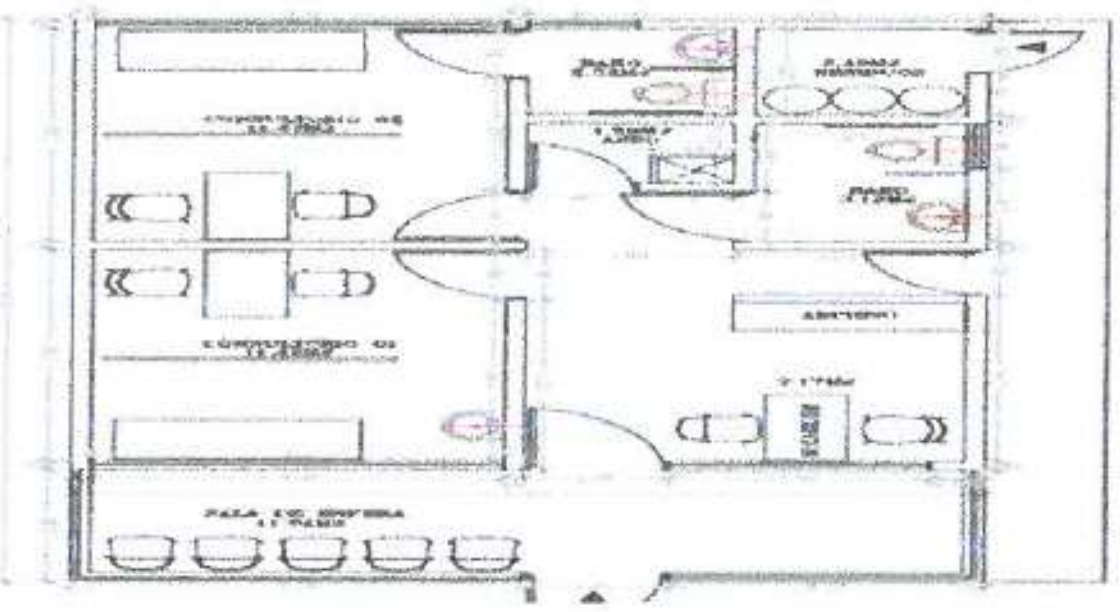




Localización	ELEMENTOS LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	Medida Total
BAÑOS				2,00	2,00
CONSULTORIO 2				1,00	1,00
ASEO				1,00	1,00
RESIDUOS FINAL				1,00	1,00
Subtotal					5,00
TOTAL					5,00

OBSERVACIONES:

FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO						
FECHA	DD 1	MM 6	AA 2026	CORTE N° 1	ELABORÓ	Ing. Diego Fernando Portela Florez	INCOBELCI S.A.S.
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS, TOLIMA						
CONTRATO	102 Del 25 de febrero de 2026						

CAPÍTULO	10,00	ITEM	10.6	SUMINITRO E INSTALACION DE TANQUE ELEVADO DE 500 LTS (INCLUYE ACCESORIOS)	UNIDAD	UND	UBICACIÓN	PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA

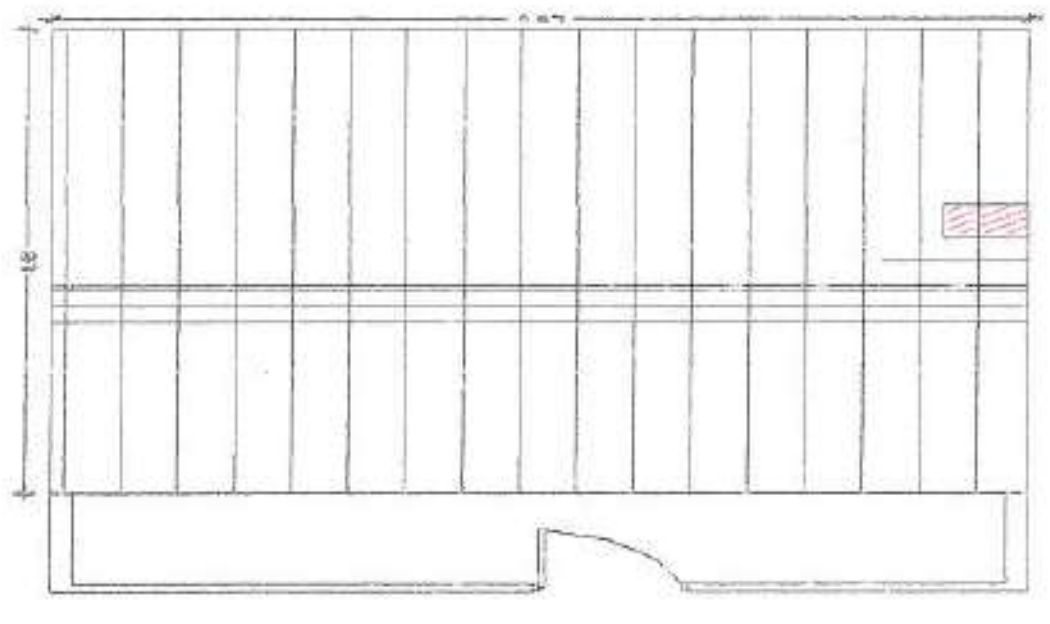




Localización	ELEMENTOS LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	Medida Total
CUBIERTA				1,00	1,00
		Subtotal			1,00
		TOTAL			1,00

OBSERVACIONES:

FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO														INCOBELCI S.A.S.
FECHA	DD	1	MM	6	AA	2026		CORTE N°	1		ELABORÓ	Ing. Diego Fernando Portela Florez			
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS, TOLIMA														
CONTRATO	102 Del 25 de febrero de 2026														

CAPÍTULO	10,00	ITEM	10.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMINAL TIPO JARDIN	UNIDAD	UND	UBICACIÓN	PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA

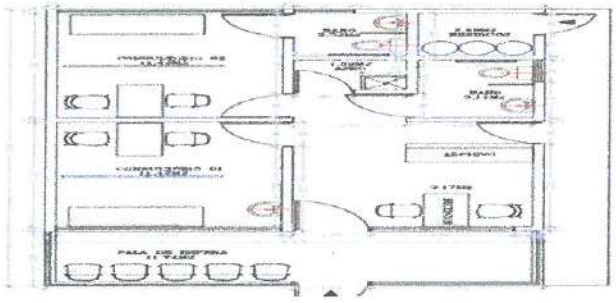



Localización	ELEMENTOS			CANT	Medida Total
	LARGO	ANCHO	ALTO		
ASEO				1,00	1,00
RESIDUOS FINAL				1,00	1,00
Subtotal					2,00
TOTAL					2,00


OBSERVACIONES:

21.00

FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO										
FECHA	DD	1	MM	6	AA	2026	CORTE N°	1	ELABORÓ	Ing. Diego Fernando Portela Florez	INCOBELCI S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS, TOLIMA
CONTRATO	102 Del 25 de febrero de 2026

CAPÍTULO	10,00	ITEM	10.8	PUNTO SANITARIO DE 2" O DE 1-1/2	UNIDAD	UND	UBICACIÓN	PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA

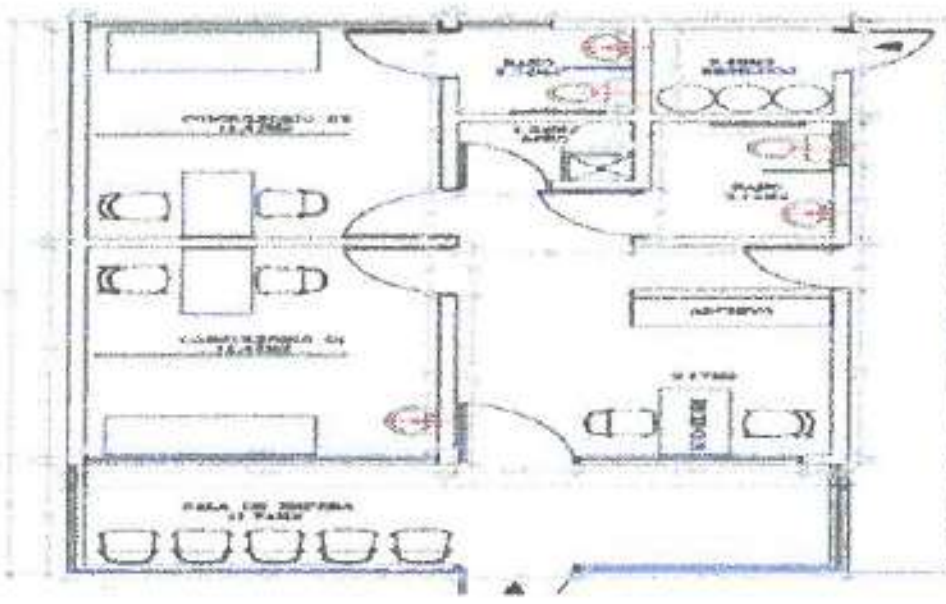





Localización	ELEMENTOS LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	Medida Total
LAVAMANOS					
BAÑOS (LAVAMANOS)				3,00	3,00
CONSULTORIO 2 (LAVAM)				2,00	2,00
PUNTORS AIRE ACONDICIONASO					
CONSULTORIO 1				1,00	1,00
CONSULTORIO 2				1,00	1,00
Subtotal					7,00
TOTAL					7,00

OBSERVACIONES:

FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO							
FECHA	DD 1	MM 6	AA 2026	CORTE N° 1		ELABORÓ	Ing. Diego Fernando Portela Florez	INCOBELCI S.A.S.
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS, TOLIMA							
CONTRATO	102 Del 25 de febrero de 2026							

CAPÍTULO	10,00	ITEM	10.9	PUNTO SANITARIO DE 3"	UNIDAD	UND	UBICACIÓN	PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA

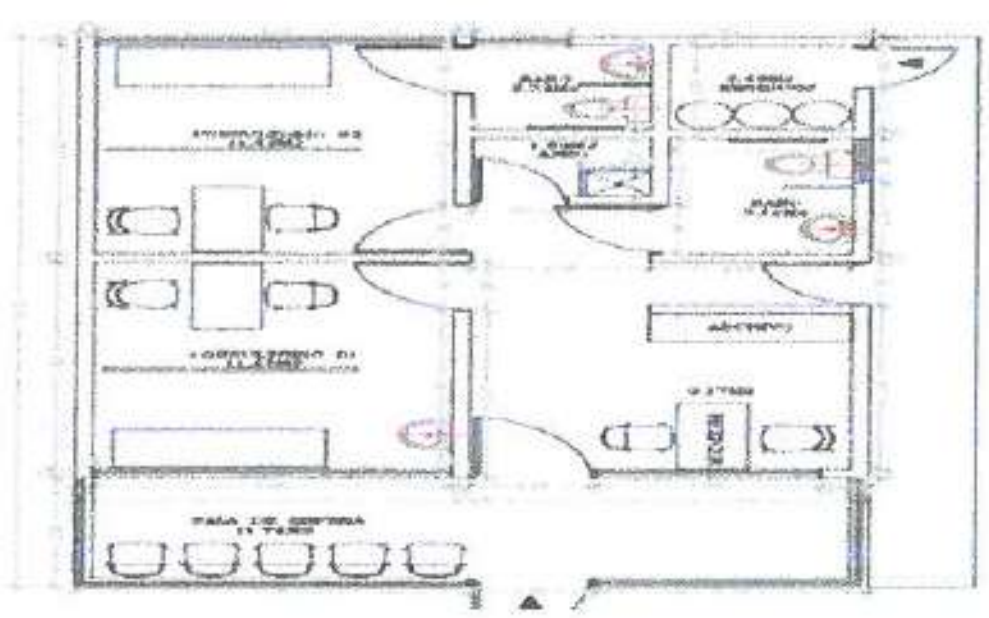

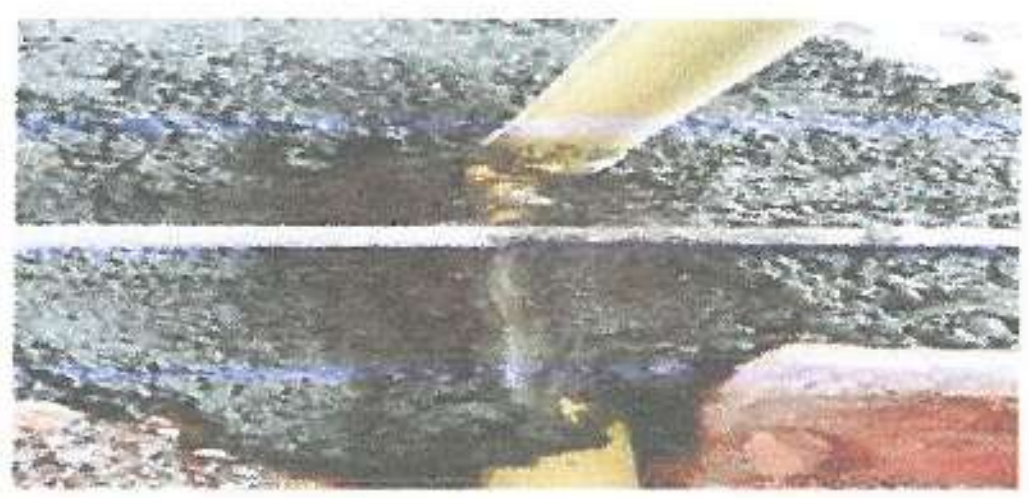


Localización	ELEMENTOS LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	Medida Total
BAÑOS				2,00	2,00
Subtotal					2,00
TOTAL					2,00

OBSERVACIONES.

21.00

FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO									INCOBELCI S.A.S.
FECHA	DD	1	MM	6	AA	2026	CORTE N°	1	ELABORÓ	Ing. Diego Fernando Portela Florez
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS, TOLIMA									
CONTRATO	102 Del 25 de febrero de 2026									

CAPÍTULO	11,00	ITEM	11.1	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA AGATA 6 DILATACIONES DE 0.80 X 2.10 ALA Y MARCO EN LAMINA CR CALIBRE 20, PINTURA ELECTROSTÁTICA BLANCA, CERRADURA DE INCRUSTAR TRES PASADORES K35MM, ESCUDO CUADRADO ACERO INOXIDABLE, BISAGRAS OMEGAS, PINTURA ELECTROSTÁTICA	UNIDAD	UND	UBICACIÓN	PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA

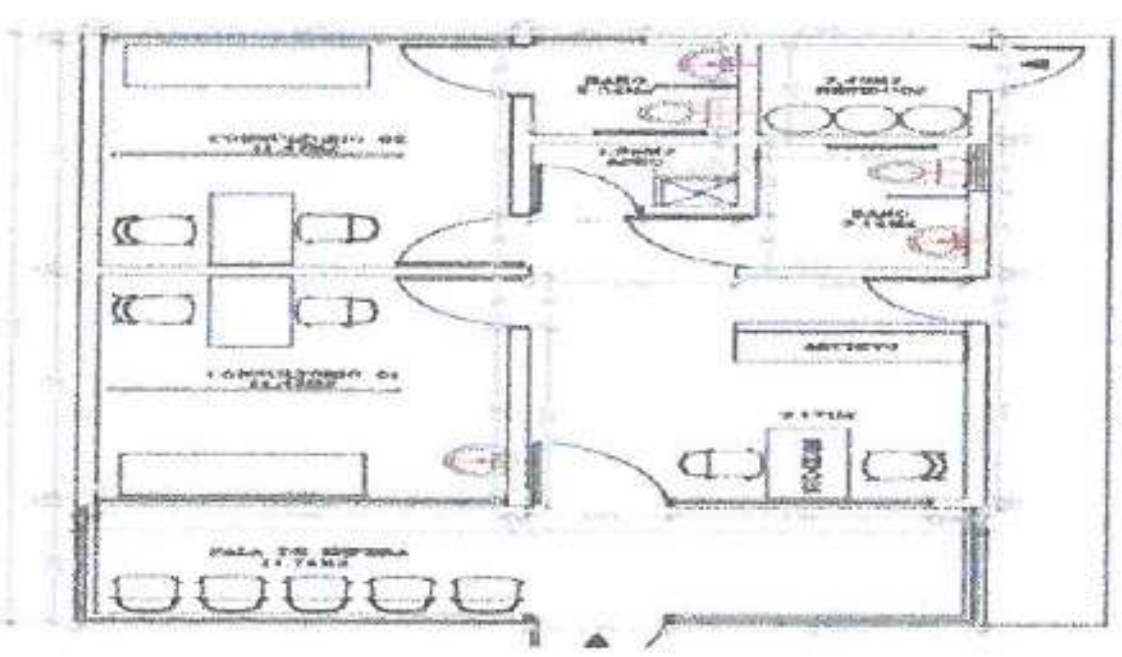




Localización	ELEMENTOS LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	Medida Total
DISPOSICION FINAL				1,00	1,00
SALIDA FACHADA LATERAL DERECHA				1,00	1,00
Subtotal					2,00
TOTAL					2,00

OBSERVACIONES.

FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO								21.00
FECHA	DD 1	MM 6	AA 2026	CORTE N° 1		ELABORÓ	Ing. Diego Fernando Portela Florez		
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS, TOLIMA							INCOBELCI S.A.S.	
CONTRATO	102 Del 25 de febrero de 2026								

CAPITULO	11,00	ITEM	11.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA AGATA 6 DILATACIONES DE 0.90 X 2.10 Y MARCO EN LAMINA CR CALIBRE 20. PINTURA ELECTROSTÁTICA BLANCA, CERRADURA DE INCRUSTAR TRES PASADORES K35MM, ESCUDO CUADRADO ACERO INOXIDABLE, BISAGRAS OMEGAS (REVISAR MANO DE OBRA,) (PREFABRICADA)	UNIDAD	UND	UBICACIÓN	PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA

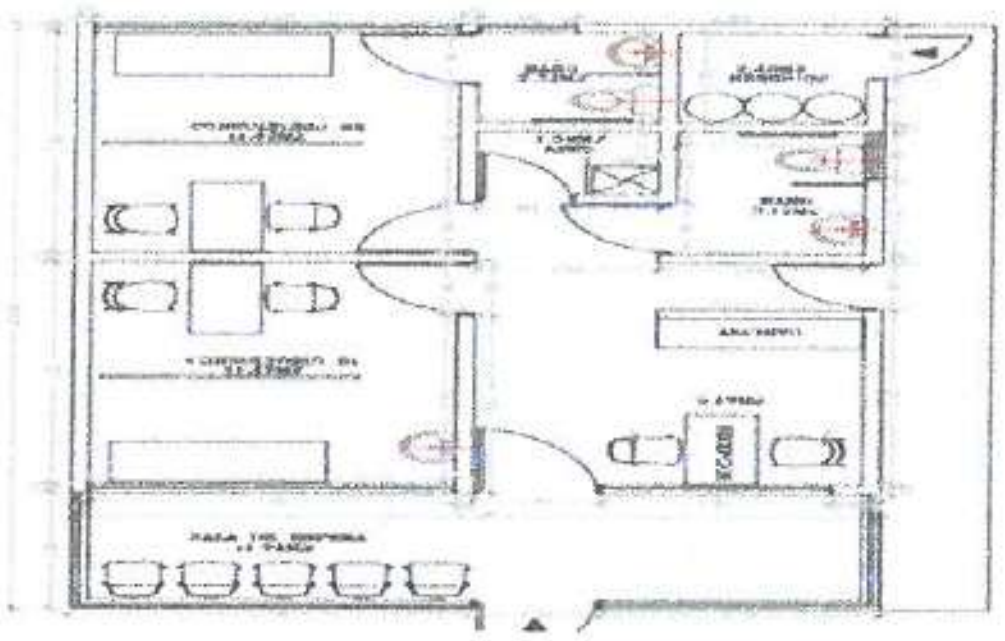




Localización	ELEMENTOS LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	Medida Total
ACCESO FACHADA				2,00	2,00
Subtotal					2,00
TOTAL					2,00

OBSERVACIONES:

FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO												21.00
FECHA	DD	1	MM	6	AA	2026		CORTE N°	1		ELABORO	Ing. Diego Fernando Portela Flore	INCOBELCI S.A.S.
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS, TOLIMA												
CONTRATO	102 Del 25 de febrero de 2026												
CAPÍTULO	11,00		ITEM	11,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA PARA VENTANAS EN CARPINTERIA METALICA TUBO CUADRADO DE 3/4" CALIBRE 18 (INCLUYE ANTICORROSIVO, CHASOS EXPANSIVOS Y TRANSPORTE)		UNIDAD	M2	UBICACIÓN	PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA		

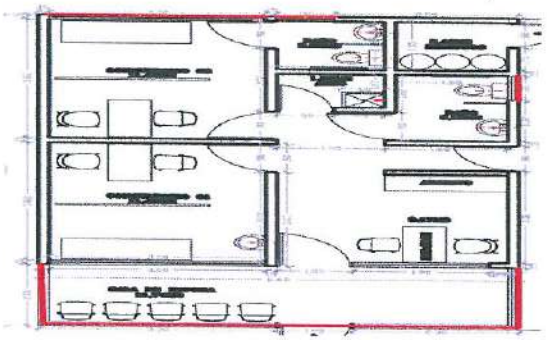



Localización	ELEMENTOS			CANT	Medida Total
	LARGO	ANCHO	ALTO		
ANTEJARDIN,	1,38		1,90	1,00	2,62
	4,60		1,90	1,00	8,74
	2,28		1,90	1,00	4,33
	1,70		1,90	1,00	3,23
	0,62		2,40	1,00	1,49
VENTANA F. POST	2,08		0,70	1,00	1,46
VENTEANA BAÑO	0,59		0,71	2,00	0,83
Subtotal					22,70
TOTAL					22,70

OBSERVACIONES:


21.00

FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO							
FECHA	DD 1	MM 6	AA 2026	CORTE N° 1		ELABORÓ	Ing. Diego Fernando Portela Florez	

INCOBELCI S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS, TOLIMA
CONTRATO	102 Del 26 de febrero de 2026

CAPÍTULO	11,00	ITEM	11,4	SUMINISTRO E INTALACION DE ESTRUCTURA EN CARPINTERIA METALICA (Perfil C Gr50 150 x 50 x 1.5mm x 6m Galvanizado) PARA SOPORTE DE PANELES SOLARES	UNIDAD	M2	UBICACIÓN	PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA

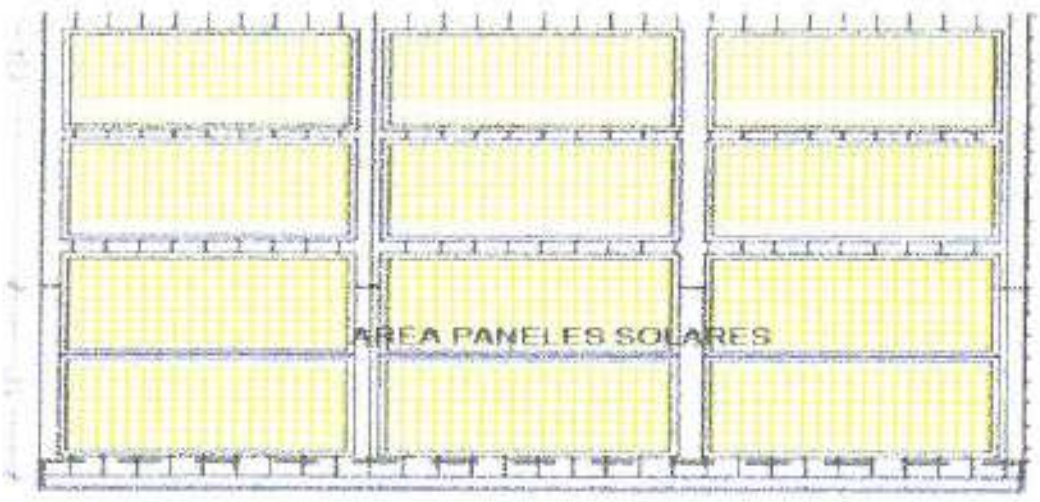




Localización	ELEMENTOS			CANT	Medida Total
	LARGO	ANCHO	ALTO		
	6,00	5,00		1,00	30,00
Subtotal					30,00
TOTAL					30,00

OBSERVACIONES:

FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO		
FECHA	DD 1 MM 6 AA 2026	CORTE N° 1	ELABORO: Ing. Diego Fernando Portela Flore
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS, TOLIMA		INCOBELCI S.A.S.
CONTRATO	102 Del 25 de febrero de 2026		

21,00

CAPÍTULO	12,00	ITEM	12.1	ASEO GENERAL ENTREGA	UNIDAD	M2	UBICACIÓN	PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA

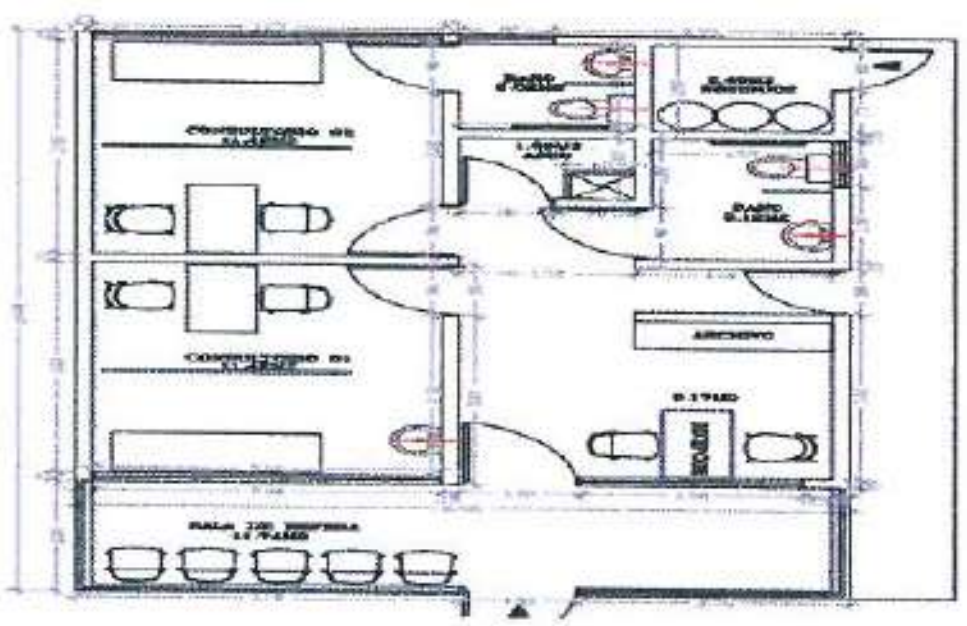

Localización	ELEMENTOS LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	Medida Total
CONSULTORI	11,44				0,00
BAÑO CONSULTORIO	2,32				0,00
CONSULTORIO 2	11,44				0,00
RECEPCION	9,16				0,00
ASEO	1,59				0,00
BAÑO	3,27				0,00
RESIDUOS FINAL	2,40				0,00
CIRUCLACIONES	4,35				0,00
ANTEJARDIN	11,74				0,00
Subtotal					0,00
TOTAL					0,00


OBSERVACIONES:

FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO			
				21,00

FECHA	DD	1	MM	6	AA	2026	CORTE N°	1	ELABORO	Ing. Diego Fernando Portela Flore

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS, TOLIMA	INCOBELCI S.A.S.
CONTRATO	102 Del 25 de febrero de 2026	

CAPÍTULO	13,00	ITEM	13,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTO EN SERVICIO DE LETRERO ILUMINADO EN ACRILICO EN COLORES PRIMARIOS, EXPESOR DE LA LAMINA 3MM, INCLUYE TRANSPORTE Y LED (MEDIDAS 2,00 X 0,80) - (PREFABRICADO)	UNIDAD	UND	UBICACIÓN	PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA

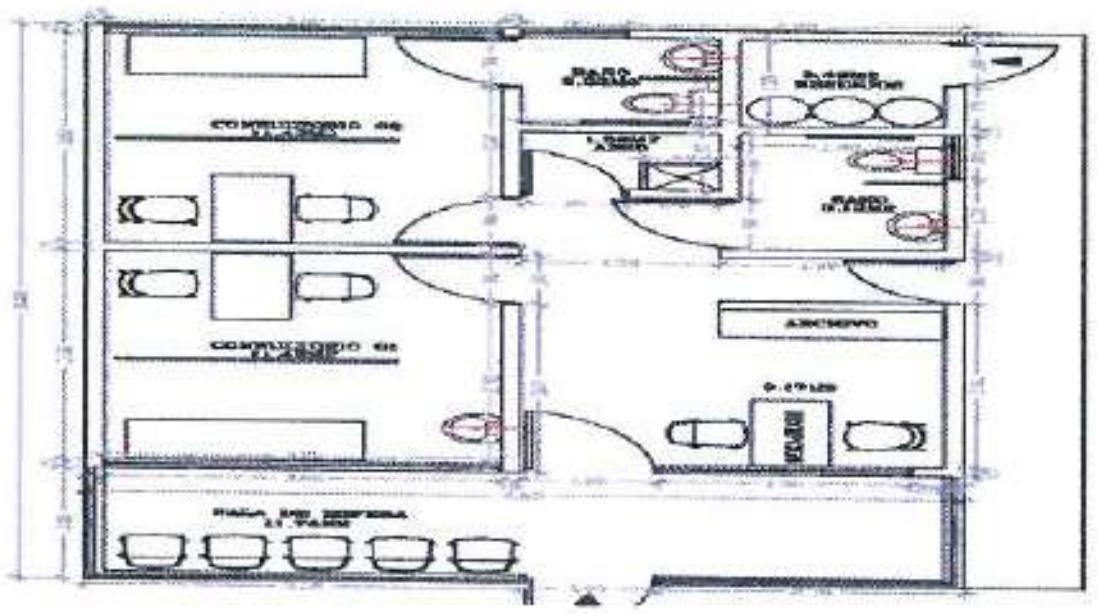


Localización	ELEMENTOS LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	Medida Total
ENTRADA				0,00	0,00
			Subtotal		0,00
			TOTAL		0,00

OBSERVACIONES:

FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO	
FECHA	DD 1 MM 6 AA 2026 CORTE N° 1 ELABORÓ Ing. Diego Fernando Portela Florez	INCOBELCI S.A.S.
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS, TOLIMA	
CONTRATO	102 Del 25 de febrero de 2026	

CAPITULO	13,00	ITEM	13,2	SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO PLANTA SOLAR HIBRIDA 3,85 KWP 7,6 KW US FO	UNIDAD	UND	UBICACIÓN	PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA

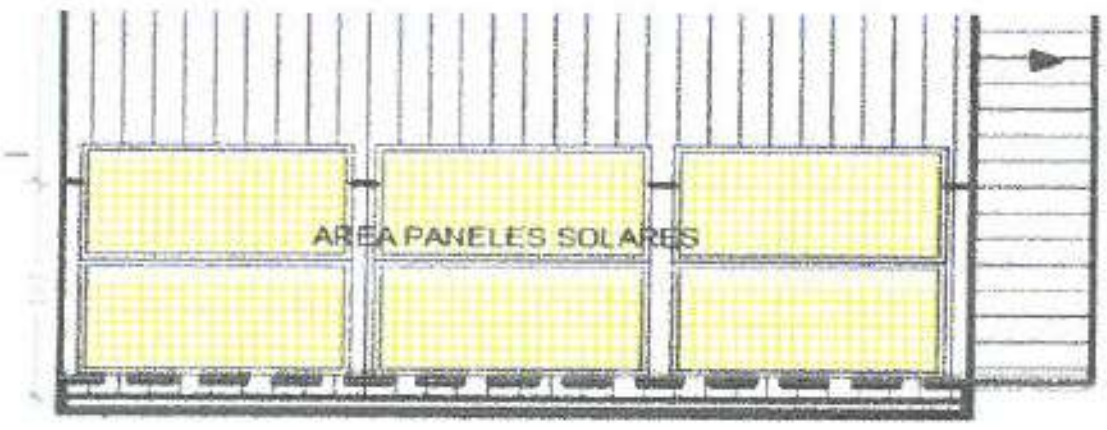




Localización	ELEMENTOS LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	Medida Total
CUBIERTA SECTOR:				1,00	1,00
		Subtotal			1,00
		TOTAL			1,00

OBSERVACIONES:

FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO								21,00
FECHA	DD 1	MM 6	AA 2026	CORTE N° 1		ELABORÓ	Ing. Diego Fernando Portela Florez		INCOBELCI S.A.S.
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS, TOLIMA								
CONTRATO	102 Del 25 de febrero de 2026								
CAPÍTULO	13,00	ITEM	13,3	SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT INVERTER YORK DE 12.000 BTU/H, R410A, 220/1/60	UNIDAD	UND	UBICACIÓN	PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA	

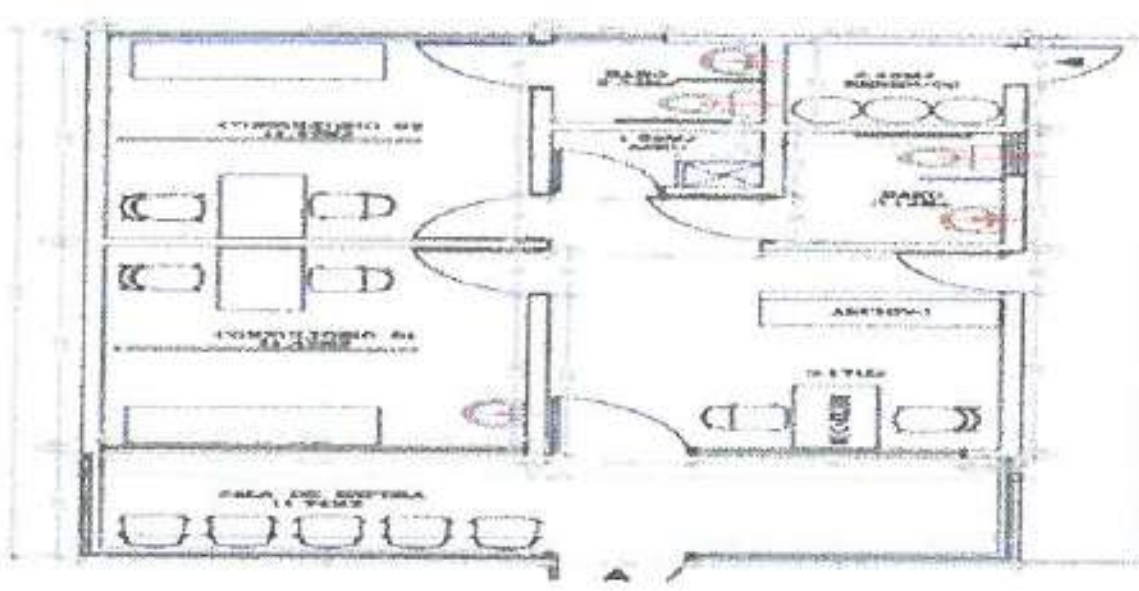



Localización	ELEMENTOS LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	Medida Total
CONSULTORIO 1				1,00	1,00
CONSULTORIO 2				1,00	1,00
			Subtotal		2,00
			TOTAL		2,00

OBSERVACIONES:

HOSPITAL SAN SEBASTIAN – ESE I NIVEL
PIEDRAS TOLIMA
NIT. 809.005.249-4

BALANCE DE OBRA No.01

CONTRATO DE OBRA No. 102 Del 25 de febrero de 2026	VALOR INICIAL DEL CONTRATO: 190.252.096,60
	VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO: 0,00
OBJETO: CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALÁ, MUNICIPIO DE PIEDRAS – TOLIMA	VALOR TOTAL: 190.252.096,60
	PLAZO INICIAL: TRES (3) MESES
CONTRATISTA: INCOBELCI S.A.S.	PLAZO ADICIONAL No. 1:
Nit: 900.088.145 – 2	
REP. LEGAL: Ing. DIDIER PORTELA TORRES	FECHA DE INICIACION: 11/03/2026
C.C. No. 14.244.520	
SUPERVISOR: Dra. MARIA PAZ GAITAN OÑATE	FECHA DE TERMINACION: 10/06/2026
Administradora HSS	
INTERVENTOR: Ing. ALBERTO CASABIANCA MORENO	
C.C. No. 93.132.900	FECHA PRESENTE ACTA: 29/05/2026

ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES - INICIALES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES			CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 1		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)	VALOR TOTAL	(+/-)	CANTIDAD	V/TOTAL	UND	CANTIDAD	V/ TOTAL
1,00	PRELIMINARES										
1.1	RASPADO Y LIJADO DE PINTURA	M2	82,81	17.599,12	1.457.347,59	=	0,00	35,20	M2	82,81	1.457.382,79
1.2	DEMOLICIONES (MUROS)	M2	32,75	8.088,61	264.918,28	+	12,20	98.664,91	M2	44,95	363.583,19
1.3	DEMOLICIONES DE PISOS EN CERAMICA, PORCELANATO O ESMALTADOS	M2	55,12	19.886,88	1.096.147,03	=	0,00	17,90	M2	55,12	1.096.164,93
1.4	DEMOLICIONES (GUARDA ESCOBAS)	ML	37,50	5.359,06	200.964,84	=	0,00	0,00	ML	37,50	200.964,84
1.5	DEMOLICIONES (ENCHAPE - MUROS)	M2	12,80	8.861,78	113.430,78	=	0,00	0,00	M2	12,80	113.430,78
1.6	DEMOLICION (MESON EN CONCRETO)	M2	3,60	34.695,65	124.904,33	=	0,00	0,00	M2	3,60	124.904,33
1.7	DESMONTE (SANITARIOS Y LAVAMANOS)	UND	2,00	36.012,90	72.025,80	-	-1,00	-36.012,90	UND	1,00	36.012,90
1.8	DESMONTE (CIELO RASO)	M2	40,50	15.005,38	607.696,68	=	0,00	21,01	M2	40,50	607.717,69
1.9	DESMONTE CARPINTERIA METALICA PUERTAS, VENTANAS,VACIADO Y LIMPIEZA DE MARCOS)	UND	12,00	25.723,50	308.682,00	=	0,00	0,00	UND	12,00	308.682,00
1.10	DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE	M2	57,66	15.205,16	876.661,10	=	0,00	68,42	M2	57,66	876.729,53
1.11	RETIRO DE ESCOMBROS (BOTADERO AUTORIZADO LA MIEL)	M3	13,37	59.000,00	788.681,14	=	0,00	148,86	M3	13,37	788.830,00
1,12	EMPACADO EN FIBRAS HASTA UNA DISTANCIA DE 100 MTR	M3	13,37	36.836,25	492.407,72	=	0,00	92,94	M3	13,37	492.500,66
2,00	EXCAVACIONES -RELLENOS										
2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3	3,24	42.872,50	138.906,90	=	0,00	0,00	M3	3,24	138.906,90
2.2	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE SITIO	M3	1,07	30.010,75	32.141,51	=	0,00	-30,01	M3	1,07	32.111,50
3,00	PLACA CONTRA PISO (AL INTERIOR DE LA EDIFICACION)										
3.1	PLACA DE CONTRA PISO DE 2500 PSI INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 15x15 5mm E:0.10cm	M2	24,96	68.404,64	1.707.277,18	-	-14,46	-989.028,47	M2	10,50	718.248,71
4,00	OBRAS EN CUBIERTA										

HOSPITAL SAN SEBASTIAN – ESE I NIVEL
PIEDRAS TOLIMA
NIT. 809.005.249-4

BALANCE DE OBRA No.01

CONTRATO DE OBRA No. 102 Del 25 de febrero de 2026	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** 190.252.096,60
	VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO: 0,00
	VALOR TOTAL: 190.252.096,60
OBJETO: CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALÁ, MUNICIPIO DE PIEDRAS – TOLIMA	**PLAZO INICIAL:** TRES (3) MESES
	PLAZO ADICIONAL No. 1:
CONTRATISTA: INCOBELCI S.A.S.	
Nit: 900.088.145 – 2	
REP. LEGAL: Ing. DIDIER PORTELA TORRES	**FECHA DE INICIACION:** 11/03/2026
C.C. No. 14.244.520	
SUPERVISOR: Dra. MARIA PAZ GAITAN OÑATE	**FECHA DE TERMINACION:** 10/06/2026
Administradora HSS	
INTERVENTOR: Ing. ALBERTO CASABIANCA MORENO	
C.C. No. 93.132.900	**FECHA PRESENTE ACTA:** 29/05/2026

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES - INICIALES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES			CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 1		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)	VALOR TOTAL	(+/-)	CANTIDAD	V/TOTAL	UND	CANTIDAD	V/ TOTAL
4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA INCLUYE SOPORTES VERTICALES, PLATINAS, CHASOS EXPANSIVOS, PINTURA EMALTE, ANTICORROSIVO (TUBO RECTANGULAR 76 x 38 x 1.1mm x 6m) SECTOR ANTEJARDIN FACHADA PRINCIPAL	M2	22,78	154.271,12	3.514.296,20	+	10,71	1.652.243,74	M2	33,49	5.166.539,94
4.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA TERMOACUSTICA UPVC CRESTA ALTA (INCLUYE TORNILLOS, CAPUCHON Y SIKA FLEX)	M2	69,27	108.170,06	7.492.399,14	=	0,00	540,85	M2	69,27	7.492.939,99
4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE EN TEJA TERMOACUSTICA CRESTA BAJA SEGUN EL COLOR (INCLUYE TORNILLOS, CAPUCHON Y SIKA FLEX	ML	6,65	63.456,81	421.987,79	=	0,00	0,00	ML	6,65	421.987,79
4.4	SUMINISTRO E INSTALCION CANAL GALABANIZADA CAL 22 DESARROLLO 61CM, INCLUYE WASH PRIMER Y SOPORTES EN ANGULO 3/4 X 1/8 (PREFABRICADA)	ML	13,30	222.929,90	2.964.967,67	=	0,00	0,00	ML	13,30	2.964.967,67
4.5	BAJANTE PVC AMAZONAS	ML	7,00	48.978,43	342.849,01	=	0,00	0,00	ML	7,00	342.849,01
4.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE METALICO (INCLUYE SIKAFLEX, CORTE CON DISCO DE TUNGSTENO)	ML	14,08	51.587,59	726.353,31	=	0,00	0,00	ML	14,08	726.353,31
5,00	MAMPOSTERIA, ESTR. DE CONFINAMIENTO, PINTURA, PAÑETE Y ESTUCO										
5.1	MURO EN BLOQUE H4	M2	60,89	62.069,12	3.779.264,60	-	-7,89	-489.601,22	M2	53,00	3.289.663,38
5.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 3000PSI VERTICAL, SECCION 15X20	ML	16,00	153.715,79	2.459.452,64	-	-6,00	-922.294,74	ML	10,00	1.537.157,90
5.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 3000PSI HORIZONTAL SECCION 15X30	ML	10,25	158.582,42	1.625.469,79	+	1,95	309.235,72	ML	12,20	1.934.705,51
5.4	PAÑETE MURO (INCL. FILOS, DILATACIONES Y CARTERAS)	M2	121,78	27.511,60	3.350.252,22	=	0,00	110,05	M2	121,78	3.350.362,26
5.5	PAÑETE MURO IMPERMEABILIZADO (INCL FILOS, DILAT Y CARTERAS)	M2	53,03	31.164,40	1.652.710,72	=	0,00	-62,33	M2	53,03	1.652.648,39
5.6	ESTUCO PLASTICO DOS MANOS	M2	174,65	23.076,58	4.030.347,19	=	0,00	-23,08	M2	174,65	4.030.324,11
5.7	ANTIBACTERIAL-ANTIMOHO-LAVABLE (CORONA)	M2	174,65	17.485,10	3.053.789,62	-	-109,83	-1.920.405,65	M2	64,82	1.133.383,97
5.8	GRANIPLAST HIDROFUGADO	M2	59,53	30.465,45	1.813.577,77	-	-24,39	-743.168,90	M2	35,14	1.070.408,87
5,90	PINTURA KORAZA TRES MANOS	M2	59,53	26.389,99	1.570.969,67	-	-29,53	-779.269,99	M2	30,00	791.699,68
6,00	PISOS Y CIELO RASO										

HOSPITAL SAN SEBASTIAN – ESE I NIVEL
PIEDRAS TOLIMA
NIT. 809.005.249-4

BALANCE DE OBRA No.01

CONTRATO DE OBRA No. 102 Del 25 de febrero de 2026

OBJETO: CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALÁ, MUNICIPIO DE PIEDRAS – TOLIMA

CONTRATISTA: INCOBELCI S.A.S.
Nit: 900.088.145 – 2
REP. LEGAL: Ing. DIDIER PORTELA TORRES
C.C. No. 14.244.520
SUPERVISOR: Dra. MARIA PAZ GAITAN OÑATE
Administradora HSS
INTERVENTOR: Ing. ALBERTO CASABIANCA MORENO
C.C. No. 93.132.900

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	190.252.096,60
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:	0,00
VALOR TOTAL:	190.252.096,60
PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 1:	
FECHA DE INICIACION:	11/03/2026
FECHA DE TERMINACION:	10/06/2026
FECHA PRESENTE ACTA:	29/05/2026

ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES - INICIALES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES			CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 1		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)	VALOR TOTAL	(+/-)	CANTIDAD	V/TOTAL	UND	CANTIDAD	V/ TOTAL
6.1	ALISTADO PISO 1:5 E:04M	M2	57,71	34.359,01	1.982.858,74	=	0,00	0,00	M2	57,71	1.982.858,74
6.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBAS (FORMATO 60X60)	ML	48,35	27.974,66	1.352.574,66	=	0,00	0,00	ML	48,35	1.352.574,66
6.3	CIELO RASO EN DRYWALL (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE, MASILLA Y PINTURA)	M2	57,71	75.880,61	4.379.070,16	-	-37,71	-2.861.457,90	M2	20,00	1.517.612,25
7,00	ENCHAPE Y ACCESORIOS BAÑOS										
7.1	CERAMICA PARED DE 60x30- BAÑOS (INCLUYE BOQUILLA COLOR, WING Y LNEALES)	M2	43,04	91.427,68	3.935.047,23	+	51,21	4.682.011,35	M2	94,25	8.617.058,58
7.2	CERAMICA PISO FORMATO 60x60 (INCLUYE BOQUILLA COLOR Y LINEALES) - (TRAFICO PESADO)	M2	57,71	112.088,28	6.468.614,48	+	10,55	1.182.531,33	M2	68,26	7.651.145,81
7.3	POCETA LAVATRAPEROS INCLUYE(BLOQUE H4, PAÑETE IMPEMEABILIZADO, ENCHAPE, MOLDURA EN ALUMINIO, CARTERAS, FILOS, ALISTADO DE PISO Y ENCHAPE DE PISO)	UND	1,00	310.396,45	310.396,45	=	0,00	0,00	UND	1,00	310.396,45
7.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO INSTITUCIONAL CORONA (INCLUYE ACOPLES)	UND	2,00	810.387,80	1.620.775,60	=	0,00	0,00	UND	2,00	1.620.775,60
7.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS CON PEDESTAL CORONA (INCLUYE ACOPLES, GRIFERÍA LAVAMANOS MONOCONTROL ALUVIA, CONJUNTO DESAGUE LAVAMANOS)-(BAÑOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD)	UND	1,00	451.340,65	451.340,65	=	0,00	0,00	UND	1,00	451.340,65
7.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS CON PEDESTAL CORONA (INCLUYE ACOPLES, CONJUNTO DESAGUE LAVAMANOS, KIT GRIFERIA INDUSTRIAL CON CONTROL DE PEDAL INSTITUCIONAL)-(CONSULTORIOS)	UND	2,00	495.240,65	990.481,30	=	0,00	0,00	UND	2,00	990.481,30
7.7	KIT BARRA DE SEGURIDAD PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (1 BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE ACERO 304 Y 1 BARRA DE SEGURIDAD AGARRADERA ACERO INOXIDABLE 60CM PREMIUM)	UND	2,00	355.199,50	710.399,00	=	0,00	0,00	UND	2,00	710.399,00
7.8	TAPA REGISTRO PVC 15X15 (INCLUYE CAJA LLAVE REGISTRO)	UND	5,00	35.063,27	175.316,35	=	0,00	0,00	UND	5,00	175.316,35
7.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA 3 " DE PISO ANTICUCARACHAS, CON SOSCO	UND	4,00	61.292,90	245.171,60	=	0,00	0,00	UND	4,00	245.171,60
7,10	DISPENSADOR DE JABON	UND	3,00	154.910,75	464.732,25	=	0,00	0,00	UND	3,00	464.732,25
7,11	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO	UND	2,00	187.910,75	375.821,50	=	0,00	0,00	UND	2,00	375.821,50

HOSPITAL SAN SEBASTIAN – ESE I NIVEL
PIEDRAS TOLIMA
NIT. 809.005.249-4

SAN SEBASTIÁN
PIEDRAS TOLIMA

BALANCE DE OBRA No.01

CONTRATO DE OBRA No. 102 Del 25 de febrero de 2026

OBJETO: CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALÁ, MUNICIPIO DE PIEDRAS – TOLIMA

CONTRATISTA: INCOBELCI S.A.S.
Nit: 900.088.145 – 2
REP. LEGAL: Ing. DIDIER PORTELA TORRES
C.C. No. 14.244.520
SUPERVISOR: Dra. MARIA PAZ GAITAN OÑATE
Administradora HSS
INTERVENTOR: Ing. ALBERTO CASABIANCA MORENO
C.C. No. 93.132.900

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	190.252.096,60
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:	0,00
VALOR TOTAL:	190.252.096,60
PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 1:	
FECHA DE INICIACION:	11/03/2026
FECHA DE TERMINACION:	10/06/2026
FECHA PRESENTE ACTA:	29/05/2026

ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES - INICIALES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES			CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 1		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)	VALOR TOTAL	(+/-)	CANTIDAD	V/TOTAL	UND	CANTIDAD	V/ TOTAL
7,12	DISPENSADOR DE TOAYAS DE PAPEL	UND	2,00	225.912,90	451.825,80	=	0,00	0,00	UND	2,00	451.825,80
7,13	DISPENSADOR DE GEL ANTIBACTERIAL	UND	3,00	111.639,00	334.917,00	=	0,00	0,00	UND	3,00	334.917,00
8,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPINTERIA -ESPEJOS-VIDRIOS-ALUMINIO										
8.1	MUEBLE EN AGLOMERADO RH EXP 15MM INCLUYE ((HERRAJES, BOTONES, CANTOS, TAPA TORNILLOS)	ML	3,40	635.661,22	2.161.248,14	=	0,00	0,00	ML	3,40	2.161.248,14
8.2	PUERTA ENTAMBORADA EN AGLOMERADO, INCLUYE (MARCO EN MADERA, BISAGRAS Y CHAPA TIPO PALANCA) 0,90 X 2,00	UND	5,00	759.087,62	3.795.438,09	=	0,00	0,00	UND	5,00	3.795.438,09
8.3	VENTANA SENCILLA EN ALUMINIO COLOR BLANCO CORREDIZA EN DOS CUERPOS PERFIL 744 INCLUYE ALFAJIA DE 8MM)	M2	5,98	489.236,83	2.927.103,97	=	0,00	0,00	M2	5,98	2.927.103,97
8.4	ESPEJO 4MM	M2	1,20	160.798,00	192.957,60	=	0,00	0,00	M2	1,20	192.957,60
9,00	SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRICA										
9.1	SALIDA PARA ILUMINACION INCLUYE (LED 12W, INTERRUPTOR, CABLE LIBRE DE ALOGENO, CAJA CUADRADA, CURVAS PVC 1/2, TUBO PVC 1/2 Y SUPLEMENTO)	UND	12,00	225.708,67	2.708.504,00	+	1,00	225.708,67	UND	13,00	2.934.212,67
9.2	SALIDAS PARA TOMA CORRIENTE MONOFASICO DE 110V USO GENERA INCLUYE (TOMA CORRIENTE DOBLE, CABLE LIBRE DE ALOGENO, CAJA CUADRADA, CURVAS PVC 1/2, TUBO PVC 1/2 Y SUPLEMENTO)	UND	17,00	172.997,92	2.940.964,58	+	5,00	864.989,58	UND	22,00	3.805.954,17
9.3	REGATAS	ML	37,62	13.308,70	500.673,30	=	0,00	0,00	ML	37,62	500.673,30
10,00	SUMINISTRO E INSTALACION HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS										
10.1	TUBERIA 1/2" PVC PRESION	ML	18,00	39.012,05	702.216,84	=	0,00	0,00	ML	18,00	702.216,84
10.2	PUNTO HIDRAULICO 1/2"	UND	12,00	56.026,82	672.321,79	-	-4,00	-224.107,26	UND	8,00	448.214,52
10.3	TUBERIA SANITARIA 3" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	18,00	73.102,67	1.315.848,11	=	0,00	0,00	ML	18,00	1.315.848,11
10.4	TUBERIA SANITARIA 2" (INCLYE ACCEOSORIOS)	ML	9,00	60.352,40	543.171,64	=	0,00	0,00	ML	9,00	543.171,64
10.5	REGISTRO PVC PRESION 1/2"	UND	5,00	45.538,45	227.692,25	=	0,00	0,00	UND	5,00	227.692,25
10.6	SUMINITRO E INSTALACION DE TANQUE ELEVADO DE 500 LTS (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	1,00	808.804,90	808.804,90	=	0,00	0,00	UND	1,00	808.804,90
10.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMINAL TIPO JARDIN	UND	2,00	73.053,60	146.107,20	=	0,00	0,00	UND	2,00	146.107,20

HOSPITAL SAN SEBASTIAN – ESE I NIVEL
PIEDRAS TOLIMA
NIT. 809.005.249-4

SAN SEBASTIÁN
PIEDRAS TOLIMA

BALANCE DE OBRA No.01

CONTRATO DE OBRA No. 102 Del 25 de febrero de 2026	
OBJETO: CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALÁ, MUNICIPIO DE PIEDRAS – TOLIMA	
CONTRATISTA: INCOBELCI S.A.S.	
Nit: 900.088.145 – 2	
REP. LEGAL: Ing. DIDIER PORTELA TORRES	
C.C. No. 14.244.520	
SUPERVISOR: Dra. MARIA PAZ GAITAN OÑATE	
Administradora HSS	
INTERVENTOR: Ing. ALBERTO CASABIANCA MORENO	
C.C. No. 93.132.900	

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	190.252.096,60
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:	0,00
VALOR TOTAL:	190.252.096,60
PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 1:	
FECHA DE INICIACION:	11/03/2026
FECHA DE TERMINACION:	10/06/2026
FECHA PRESENTE ACTA:	29/05/2026

ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES - INICIALES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES			CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 1		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)	VALOR TOTAL	(+/-)	CANTIDAD	V/TOTAL	UND	CANTIDAD	V/ TOTAL
10.8	PUNTO SANITARIO DE 2" O DE 1-1/2	UND	5,00	61.523,53	307.617,66	+	2,00	123.047,06	UND	7,00	430.664,72
10.9	PUNTO SANITARIO DE 3"	UND	4,00	87.002,55	348.010,21	-	-2,00	-174.005,11	UND	2,00	174.005,11
11,00	CARPINTERIA METALICA										
11.1	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA AGATA 6 DILATACIONES DE 0.80 X 2.10 ALA Y MARCO EN LAMINA CR CALIBRE 20. PINTURA ELECTROSTÁTICA BLANCA, CERRADURA DE INCRUSTAR TRES PASADORES K35MM, ESCUDO CUADRADO ACERO INOXIDABLE, BISAGRAS OMEGAS, PINTURA ELECTROSTÁTICA.	UND	2,00	752.555,94	1.505.111,89	=	0,00	0,00	UND	2,00	1.505.111,89
11,20	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA AGATA 6 DILATACIONES DE 0.90 X 2.10 Y MARCO EN LAMINA CR CALIBRE 20. PINTURA ELECTROSTÁTICA BLANCA, CERRADURA DE INCRUSTAR TRES PASADORES K35MM, ESCUDO CUADRADO ACERO INOXIDABLE, BISAGRAS OMEGAS (REVISAR MANO DE OBRA,) (PREFABRICADA)	UND	2,00	772.555,94	1.545.111,89	=	0,00	0,00	UND	2,00	1.545.111,89
11,30	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA PARA VENTANAS EN CARPINTERIA METALICA TUBO CUADRADO DE 3/4" CALIBRE 18 (INCLUYE ANTICORROSIVO, CHASOS EXPANSIVOS Y TRANSPORTE)	M2	32,81	189.331,24	6.211.957,89	=	0,00	0,00	M2	32,81	6.211.957,89
11,40	SUMINISTRO E INTALACION DE ESTRUCTURA EN CARPINTERIA METALICA (Perfil C Gr50 150 x 50 x 1.5mm x 6m Galvanizado) PARA SOPORTE DE PANELES SOLARES	M2	30,00	243.968,32	7.319.049,60	=	0,00	0,00	M2	30,00	7.319.049,60
12,00	ASEO GENERAL										
12.1	ASEO GENERAL ENTREGA	M2	57,71	5.877,22	339.174,34	=	0,00	0,00	M2	57,71	339.174,34
	VALOR COSTO DIRECTO - OBRA				108.549.308,92			0,00			108.549.308,92
	ADMINISTRACION	%	24,00		26.051.834,14			0,00			26.051.834,14
	IMPREVISTOS	%	1,00		1.085.493,09			0,00			1.085.493,09
	UTILIDAD	%	5,00		5.427.465,45			0,00			5.427.465,45
	VALOR COSTO INDIRECTO - OBRA				32.564.792,68			0,00			32.564.792,68

HOSPITAL SAN SEBASTIAN – ESE I NIVEL
PIEDRAS TOLIMA
NIT. 809.005.249-4

BALANCE DE OBRA No.01

CONTRATO DE OBRA No. 102 Del 25 de febrero de 2026	
OBJETO: CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALÁ, MUNICIPIO DE PIEDRAS – TOLIMA	
CONTRATISTA: INCOBELCI S.A.S.	
Nit: 900.088.145 – 2	
REP. LEGAL: Ing. DIDIER PORTELA TORRES	
C.C. No. 14.244.520	
SUPERVISOR: Dra. MARIA PAZ GAITAN OÑATE	
Administradora HSS	
INTERVENTOR: Ing. ALBERTO CASABIANCA MORENO	
C.C. No. 93.132.900	

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**190.252.096,60**
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:	**0,00**
VALOR TOTAL:	**190.252.096,60**
PLAZO INICIAL:	**TRES (3) MESES**
PLAZO ADICIONAL No. 1:	
FECHA DE INICIACION:	**11/03/2026**
FECHA DE TERMINACION:	**10/06/2026**
FECHA PRESENTE ACTA:	**29/05/2026**

ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES - INICIALES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES			CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 1		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)	VALOR TOTAL	(+/-)	CANTIDAD	V/TOTAL	UND	CANTIDAD	V/ TOTAL
	VALOR COSTO TOTAL - OBRA				**141.114.101,60**			**0,00**			**141.114.101,60**
13,00	**MOBILIARIO USO PUESTO DE SALUD**										
13,10	SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTO EN SERVICIO DE LETRERO ILUMINADO EN ACRILICO EN COLORES PRIMARIOS, EXPESOR DE LA LAMINA 3MM, INCLUYE TRANSPORTE Y LED (MEDIDAS 2,00 X 0,80) - (PREFABRICADO)	UND	1,00	2.630.862,18	2.630.862,18	=	0,00	0,00	UND	1,00	2.630.862,18
13,20	SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO PLANTA SOLAR HIBRIDA 3,85 KWP 7,6 KW US FO	UND	1,00	32.792.661,34	32.792.661,34	=	0,00	0,00	UND	1,00	32.792.661,34
13,30	SUMINSTRO E INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT INVERTER YORK DE 12.000 BTU/H, R410A, 220/1/60	UND	2,00	2.934.454,62	5.868.909,24	=	0,00	0,00	UND	2,00	5.868.909,24
	SUB - TOTAL MOBILIARIO				**41.292.432,77**			**0,00**			**41.292.432,77**
	IVA	%	19,00		7.845.562,23			0,00			7.845.562,23
	TOTAL MOBILIARIO				**49.137.995,00**			**0,00**			**49.137.995,00**
	VALOR TOTAL OBRA + MOBILIARIO				**190.252.096,60**			**0,00**			**190.252.096,60**
								ADICION			

Dra. MARIA PAZ GAITAN OÑATE
Administradora HSS
SUPERVISORA

Ing. JUAN DANIEL GAMBOA GALEANO
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Ing. ALBERTO CASABIANCA MORENO
INTERVENTOR

INCOBELCI S.A.S.
R.L. Ing. DIDIER PORTELA TORRES
CONTRATISTA DE OBRA

CHICALA

HOSPITAL SAN SEBASTIAN – E.S.E. I NIVEL
PIEDRAS - TOLIMA
NIT: 809.005.249-4

Piedras, Tolima, 04 de junio de 2026

Doctor:
HECTOR JAVIER CALDERÓN TORRES
Gerente
HOSPITAL SAN SEBASTIÁN E.S.E. DE PIEDRAS

Asunto: Solicitud de aprobación de Prórroga No. 01 al Contrato de Obra No. 102 de 2026

Respetado Doctor:

En mi calidad de Supervisora del Contrato de Obra No. 102 del 25 de febrero de 2026, suscrito con la sociedad INCOBELCI S.A.S., cuyo objeto corresponde a las adecuaciones menores de infraestructura física en el Puesto de Salud Rural de Chicala, me permito solicitar la aprobación de una prórroga por el término de un (1) mes.

La presente solicitud se fundamenta en:

1. La petición presentada por el contratista el día 1 de junio de 2026.
2. El concepto favorable emitido por la Interventoría Externa mediante Oficio del 1 de junio de 2026.
3. Las circunstancias técnicas verificadas durante la ejecución contractual, relacionadas con:
    - Demora en la entrega del inmueble.
    - Necesidad de ejecutar actividades no previstas inicialmente.
    - Ajustes requeridos en la acometida hidráulica y sanitaria.
    - Mayores cantidades de obra.
    - Condiciones logísticas y climáticas que afectaron los rendimientos de ejecución.

La Interventoría concluyó que las causas expuestas son reales, verificables y ajenas a la voluntad del contratista, recomendando la ampliación del plazo contractual para garantizar la correcta terminación del objeto contratado.

De igual manera, durante la ejecución del contrato se ha evidenciado cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista y avance de obra acorde con las condiciones reales de ejecución.

Por lo anterior, y considerando que la prórroga no modifica el valor del contrato y resulta necesaria para culminar satisfactoriamente las obras contratadas, solicito se autorice la Prórroga No. 01 por el término de un (1) mes y se adelante la suscripción del correspondiente Otrosí contractual.

Cordialmente,

MARÍA PAZ GAITÁN OÑATE
Supervisora del Contratista
Hospital San Sebastián E.S.E. de Piedras

Piedras, 04 de junio de 2026

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD PARA LA PRÓRROGA No. 01 DEL CONTRATO DE OBRA No. 102 DEL 25 DE FEBRERO DE 2026

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

Contrato No.: 102 de 2026

Contratista: INCOBELCI S.A.S.

NIT: 900.088.145-2

Objeto: CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALÁ EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS, TOLIMA.

Valor: $ 190.252.096,60) M/CTE

Plazo Inicial: Tres (03) meses.

2. ANTECEDENTES

Mediante Contrato de Obra No. 102 del 25 de febrero de 2026, el Hospital San Sebastián E.S.E. de Piedras contrató la ejecución de las obras de adecuaciones menores de infraestructura física en el Puesto de Salud Rural de Chicalá.
Durante la ejecución contractual se presentaron situaciones técnicas y operativas que incidieron directamente en el desarrollo normal del cronograma de obra, las cuales fueron puestas en conocimiento de la Entidad por parte del contratista mediante solicitud radicada el 1 de junio de 2026, requiriendo la ampliación del plazo contractual en un (01) mes..

3. ANÁLISIS DE LA NECESIDAD

De conformidad con la documentación presentada por el contratista y el concepto emitido por la Interventoría mediante Oficio de fecha 1 de junio de 2026, se evidenciaron las siguientes circunstancias:

- Demora en la entrega del inmueble objeto de intervención, generando afectaciones al cronograma inicialmente previsto.
- Necesidad de ejecutar actividades e ítems no contemplados inicialmente, indispensables para garantizar la funcionalidad de la infraestructura.
- Deficiencias e inexistencia de algunos componentes de la acometida hidráulica y sanitaria, requiriendo soluciones técnicas adicionales.
- Aparición de mayores cantidades de obra derivadas de las condiciones reales encontradas en sitio.

- Condiciones logísticas y climáticas propias de la zona rural que incidieron en los rendimientos programados.

Según el concepto de interventoría, dichas circunstancias son reales, verificables, ajenas a la voluntad del contratista y han tenido incidencia directa en la programación de la obra.

Igualmente, la interventoría certificó que el contratista ha mantenido presencia permanente en la obra, ha ejecutado las actividades contratadas conforme a las especificaciones técnicas y ha demostrado disposición para atender oportunamente las situaciones presentadas.

4. JUSTIFICACIÓN DE LA PRÓRROGA

La ampliación del plazo contractual resulta necesaria para garantizar la culminación integral de las actividades pendientes y el cumplimiento satisfactorio del objeto contractual, asegurando la calidad, funcionalidad y estabilidad de las obras ejecutadas.

La prórroga solicitada no implica modificación del valor contractual y tiene como finalidad exclusiva permitir la terminación adecuada del proyecto, evitando afectar la prestación de los servicios de salud que se desarrollarán en la infraestructura intervenida.

5. CONCLUSIÓN

Con fundamento en el análisis efectuado, la supervisión considera técnica, jurídica y administrativamente procedente la Prórroga No. 01 al Contrato de Obra No. 102 del 25 de febrero de 2026 por un término de un (1) meses, contados a partir del vencimiento del plazo inicialmente pactado.

En consecuencia, se recomienda al Representante Legal del Hospital San Sebastián E.S.E. de Piedras adelantar los trámites correspondientes para la suscripción del respectivo Otrosí de Prórroga.

Piedras, Tolima, 04 de junio de 2026.

MARÍA PAZ GAITÁN ONATE
Supervisora del Contrato
Hospital San Sebastián E.S.E. de Piedras

HOSPITAL SAN SEBASTIAN – E.S.E. I NIVEL
PIEDRAS - TOLIMA
NIT: 809.005.249-4

OTROSÍ No. UNO (01) – PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA No. 102 DEL 25 DE FEBRERO DE 2026	
CONTRATO	102-2026
CONTRATANTE	Hospital SAN SEBASTIAN DE PIEDRAS
CONTRATISTA	INCOBELCI S.A.S.
NIT/C.C.	900.088.145 – 2
DIRECCION	CARRERA 6 No. 53-29 TORRE EMPRESARIAL OFF 904
OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS TOLIMA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CIENTO NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($ 190.252.096,60) M/CTE. y demás impuestos y gastos
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIO	11 DE MARZO DE 2026
FECHA PREVISTA DE TERMINACION	10 DE JUNIO DE 2026
PRORROGA	UN (01) MESES
PLAZO TOTAL	CUATRO (04) MESES
FECHA DE TERMINACION INCLUYENDO PRORROGAS	10 DE JULIO DE 2026

Entre los suscritos a saber: HECTOR JAVIER CALDERON TORRES, mayor de edad, vecino y residenciado en la Ciudad de Ibagué, identificado con la cédula de ciudadanía No. 5.976.182 expedida en el Municipio de Piedras (Tolima) en su condición de Representante Legal y Gerente del Hospital SAN SEBASTIAN DE PIEDRAS reelegido y nombrado mediante Decreto No. 019 del 10 de febrero de 2024 y Acta de posesión de fecha 02 de abril del mismo año, Empresa Social del Estado identificada con Nit. 809.005.249-4 quien en adelante se denominará EL HOSPITAL, por una parte y por la otra, INCOBELCI S.A.S. identificado con NIT 900.088.145–2, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA; suscribimos el presente otrosí No. 001 al contrato de Obra No. 102 Del 25 de febrero de 2026, previo las siguientes consideraciones:

1. Que el objeto del contrato es: CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALA EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS TOLIMA.
2. Que el valor del contrato es de CIENTO NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($ 190.252.096,60) M/CTE. y demás impuestos y gastos.
3. Que el plazo inicial es de TRES (03) MESES, a partir del acta de inicio.
4. Que el contrato se encuentra vigente.
5. Que mediante comunicación radicada el 1 de junio de 2026, el contratista INCOBELCI S.A.S. solicitó la prórroga del plazo contractual por un (01) mes, manifestando que durante la ejecución se presentaron circunstancias ajenas a su voluntad relacionadas con la demora en la entrega del inmueble, la necesidad de ejecutar actividades no previstas inicialmente, mayores cantidades de obra, ajustes requeridos en las acometidas hidráulicas y sanitarias, así como condiciones logísticas y climáticas

propias de la zona de ejecución, situaciones que impactaron el cronograma inicialmente establecido.

6. Que, mediante Oficio del 1 de junio de 2026, la Interventoría del Contrato emitió concepto técnico favorable respecto de la solicitud de prórroga, concluyendo que las circunstancias expuestas son reales, verificables, ajenas a la voluntad del contratista y justifican técnicamente la ampliación del plazo contractual.
7. Que la supervisión del contrato, previo análisis de la solicitud presentada por el contratista y del concepto emitido por la interventoría, emitió concepto favorable y recomendó la ampliación del plazo contractual por un (01 meses).
8. Que el contratista se compromete a ampliar la vigencia de las garantías contractuales en los términos derivados de la presente modificación, cuando ello resulte procedente.
9. Que conforme al estudio por parte del supervisor del contrato se pudo evidenciar que la prórroga pretendida persigue el cumplimiento a cabalidad del objeto contractual, sin la cual se vería frustrado el fin perseguido por la Entidad Estatal, justificando a cabalidad la necesidad de prorrogar el plazo inicial del contrato
10. Que el contratista ha cumplido con sus obligaciones contractuales en debida forma.
11. Que la presente modificación contractual no genera incremento del valor inicialmente pactado, limitándose exclusivamente a la ampliación del plazo de ejecución.

Por lo dispuesto en las anteriores consideraciones las partes convienen suscribir la presente prorroga, la cual se regirá por las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERO: OBJETO El objeto del presente documento es prorrogar el plazo de ejecución acordado en la cláusula CUARTA denominada: *"PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecución del presente contrato es TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización."*

SEGUNDO: PRORROGAR el plazo de ejecución del Contrato de Obra No. 102 de 2026 por el término de un (01) mes, contados a partir del vencimiento del plazo inicialmente pactado, esto es, desde el 11 de junio de 2026 hasta el 10 de julio de 2026.

TERCERA: El contratista deberá ampliar la vigencia de las garantías constituidas, en caso de que resulte necesario, de conformidad con el nuevo plazo contractual aprobado mediante el presente Otrosí.

CUARTA: Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal, y sus ediciones anteriores no modificadas por el presente acuerdo, permanecen vigentes y su exigibilidad permanece.

QUINTA: PERFECCIONAMIENTO: La presente PRORROGA se perfecciona con las firmas de las partes.

SEXTA: FIRMA ELECTRONICA: El contratista acepta de manera inequívoca el contenido la presente modificación y sus anexos con la aceptación de este documento a través de la plataforma SECOP II.

PARÁGRAFO: Este documento hace parte integral del contrato electrónico del SECOP II, así como los demás documentos publicados en el SECOP II.

Proyectó	Ingrith Vargas Cardona - Asesora Juridica Y De Contratacion		05-06-2026

Bitacora de Obra.

Contrato de Obra No. 102 - 25 de Febrero de 2026

Objeto del Contrato: Adecuaciones menores de infraestructura física en el puesto de salud rural Chicala

Municipio: Prado - Tolima.

Diego Portela Florez

Ing. Alberto Castañeda Moreno.
Interventor.

Día 1 - Lunes, 30 de marzo de 2026

Con motivo del inicio formal del contrato de obra, se llevó a cabo la verificación de condiciones del sitio, se realizó recorrido de inspección al puesto de salud, constatando el estado general de la edificación existente. Se procedió a la instalación del campamento provisional y el acopio inicial de herramientas menores. En horas de la tarde se ejecutó el desmonte de puertas ubicadas en accesos principales y pasillo interior del puesto de salud, retirando marcos, hojas y herrajes de manera controlada.

Se identificó que el puesto de salud carece de conexión a servicios públicos, incluyendo red de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica activa. Se registró fotográficamente el estado general de la infraestructura antes del inicio de intervenciones

Día 2 - Martes, 31 de marzo de 2026.

Se ejecutó el desmonte de ventanas distribuidas en la fachada, incluyendo marcos metálicos y vidrios. Los vidrios fueron retirados en primer lugar para prevenir riesgo de fragmentación. Los marcos metálicos algunos presentaban corrosión y fueron cortados con pulidora y apilados en el área de acopio.

Se evidencia que varios de los marcos presentaban deterioro, comprometiendo el grado de abordaje y exposición prolongada a condiciones ambientales

Scanned with CamScanner

adecuado su mantenimiento preventivo.

Día 3 – Miércoles, 5 de abril de 2026

Jornada orientada al desarrollo de algunas áreas del cielorraso existente en el puesto de salud. Se retiraron placas de manera manual, haciendo uso de las herramientas adecuadas. Los residuos generados fueron recolectados y trasladados al punto de acopio. Se aseó el puesto de salud, así como también se iniciaron demoliciones.

En el orden del día se identificó manchas de humedad y sectores de percolación con probable origen biológico.

Día 4 – Lunes, 6 de Abril de 2026.

Se dio inicio a actividades de demolición, se ejecutó la demolición de tabiques y muros internos no estructurales identificados en planos de intervención, correspondientes a consultorios y a las divisiones de la sala de espera. Posteriormente se ejecutó la demolición de pisos en área de consultorios y corredor central, retirando la capa de baldosa y la contrapiso.

Los escombros generados fueron recolectados y transportados al punto de acopio. Durante la demolición de muros se constató que la mampostería existente presenta deficiencia en su proceso de construcción original.

Scanned with CamScanner

Dia 5 - Martes, 7 de abril de 2026

Se inicio con el adelanto de la demolicion de la veja existente en el cerramiento perimetral del puesto de salud. La veja estaba en estado de deterioro avanzado; simultaneamente se dio inicio a excavaciones manuales para redes hidrosanitarias

Dia 6 - Miercoles, 8 de abril de 2026.

La jornada se concentro en el avance de las excavaciones y rellenos para las redes de acometida hidraulicas y alcantarillado. Se verifico la correcta union de los tubos, se constato que el nivel freatico no representa inconveniente a las profundidades trabajadas. Se realizo registro fotografico para el respaldo documental del proceso constructivo

Dia 7 - Jueves 9 de abril de 2026

La jornada estuvo orientada al desmonte de cielorraso existente en las áreas interiores del puesto de salud. La intervencion se inicio retirando la teja por hileras de manera descendente. El material de cubierta fue clasificado; las tejas en buen estado se separaron para eventual reutilizacion en acopio

Scanned with CamScanner

identificado, y el resto se interpreta en [illegible]

En el sector de cubierta queda expuesta la estructura de losa de cubierta o viguetas existentes, evidenciando diversas longitudes en tramos de los elementos de concreto.

Se identificaron secciones de viga con segregación de concreto y exposición de acero de refuerzo con corrosión activa.

Las condiciones climáticas de la tarde fueron complejas, lo que obligó a suspender actividades por razones de seguridad. La jornada se extendió para compensar el tiempo perdido

Día 8. Viernes 10 de abril de 2026.

Se ejecutaron ajustes finales en redes hidráulicas y sanitaria del inmueble. Finalmente se completó el rellenó de zanja perdiente con material selecto.

Las pruebas arrojaron resultados satisfactorios; se procedió a retirar material sobrante de excavación hacia el punto de acopio.

Dia 9 - Lunes 13 de abril de 2026.

Se inicio jornada con aseo parcial interno y perimetral del puesto de salud. Se dio inicio al montaje de la nueva cubierta. Previo al montaje se realizaron reparaciones en los elementos de concreto deteriorados identificados durante el desmonte. Al final de la jornada se cuenta con el 60% de estructura metalica principal instalada y verificada en nivelacion y escuadra. La estructura metalica fue instalada siguiendo planos de taller aprobados, se verifico correcto aplomado de elementos verticales. Todos los perfiles fueron previamente pintados conforme a las especificaciones tecnicas del contrato.

Dia 10 - Martes 14 de abril de 2026.

Se siguio con la jornada de aseo del puesto de salud y demas acciones de organizacion. Se registro completamente la instalacion de estructura metalica de cubierta. Se avanzo en la instalacion de teja, cubriendo la totalidad del faldon principal. Durante horas de la tarde se realizo acopio y retiro parcial de escombros acumulados en el predio. Al cierre de la jornada se realizo un balance de avance de actividades ejecutadas.

Scanned with CamScanner

Se mantienen abiertas las observaciones tecnicas relacionadas con la conexion de acometidas publicas en el puesto de salud, la cual sigue sin resolverse y deberá ser gestionada por la entidad contratante para garantizar la funcionalidad de las obras a entregar.

Día 11 - Miercoles 15 de Abril de 2026

Se iniciaron labores de pañete en muros del area de consultorios aplicando la primera mano de nivelacion en proporcion 1:3 sobre las superficies previamente humedecidas. Se avanzó en la instalacion de tuberias de 3" para la red de aguas residuales en el baño principal. Se verificaron pendientes minimas para norma y se realizaron pruebas de alineacion

Día 12 - Jueves, 16 de Abril de 2026

La jornada se concentro en el avance de pañete de muros en baños y corredor central. Se aplico la segunda mano sobre las superficies que habian alcanzado el fraguado necesario, ejecutando filos y dilataciones. El equipo de carpinteria metalica adelanto el trazado y replanteo para instalacion de rejas en ventanas.

Revision tecnica de la red hidraulica verificando la correcta instalacion de tuberia PVC presion de 1/2" y puntos hidraulicos proyectados

Día 13 - Viernes 17 de Abril de 2026

Se avanza en la instalación de la red de tuberías sanitarias de 2" en los baños secundarios, ejecutando los cortes de losa necesarios para el paso de tuberías. Los escombros fueron recolectados y trasladados.

Se realizó aseo general y se aseguró la obra previo al inicio de semana santa

Día 14 - Sabado 18 de Abril

Jornada de medio día orientado al aseo y organización del sitio de obra previo a suspensión de actividades por semana santa.
Se organizaron materiales, se protegieron equipos y herramienta almacenada

Se realizó inventario de materiales disponibles en obra para planificar pedidos de la semana siguiente.

Día 15 - Lunes 20 de Abril de 2020

Se retomaron actividades con aseo general del área de trabajo tras el cierre de la semana anterior. Se continua con el proceso de mezcla impermeabilizado en zonas humedas (baños y cocina de interiores)

Scanned with CamScanner

Se avanza en las partes sanitarias de 3" en los baños de los consultorios

Día 16- Martes 21 de Abril de 2026

Se continua con el proceso de instalación de tuberías hidrosanitarias en los baños secundarios. Se verificaron las pendientes mínimas exigidas. Se adelantó el alistado de superficies para el inicio de pruebas de estanqueidad en el área de consultorios

Día 17 - Miércoles 22 de Abril de 2026.

Se continua con el proceso de instalación de tuberías hidrosanitarias. Se ejecutaron los puntos sanitarios de 2", verificando las pendientes mínimas exigidas. Se realizo enmallado de regata en jornadas de tarde

Se adelanto el alistado de superficies en el área de sala de espera para el inicio de pruebas de estanqueidad. Se aplico la primera mano de pintura sellante sobre muros

Día 18- Jueves 23 de Abril de 2026.

Se inicio la instalación de la red eléctrica, ejecutando regatas para el paso de tuberías. Se terminaron los puntos de iluminación y tomacorrientes según los planos eléctricos aprobados. Se hizo sellado de juntas

Scanned with CamScanner

Día 19 - Viernes 24 de Abril de 2026

La jornada se orienta al avance en instalaciones eléctricas y tendido cable libre de halógenos en los diestros de iluminación de los corredores 1 y 2. El personal electricista verifica continuidad y aislamiento en los tramos instalados.

En acabados, se aplica la primera mano de estuco plástico en los paños del corredor central y se garantiza el espesor uniforme de la capa mediante el uso de reglas y niveles.

Día 20 - Sábado 25 de Abril de 2025

Se continúa con el tendido del cableado eléctrico en los circuitos de iluminación de la sala de espera y pasillo principal. Se instalaron 6 de los 19 salidas de iluminación proyectadas verificando polaridad y puesta a tierra. Se realizó enmallado de las regletas ejecutadas durante la semana.

Al cierre de la jornada se realizó aseo general del puesto de trabajo

Día 21 - Lunes 27 de Abril de 2026

Se inicia el proceso de alistado de piso, comenzando por el área de circulación. Se verifica la alineación del área perimetral y de colocación previa de referencia para garantizar la

Scanned with CamScanner

plenitud de la propuesta. Se cubren aproximadamente el 40% del área proyectada.

En mampostería se ejecutaron los muros de bloque tipo pañetados en el área. Se verifica aplome y nivelación. Se inicia el proceso para columnas de confinamiento.

Día 22 - Martes 28 de Abril de 2026.

Se completa el alistado de piso en el área de consultorios y se extiende hasta la sala de espera, alcanzando el 75% del área total. Se verifican espesores mínimos. Las superficies terminadas fueron protegidas con polietileno para evitar daños.

Se avanzó con la red hidráulica, instalando registros y el funcionamiento correcto de los mismos. Se inicia el tendido de la tubería de 1/2" que abastecerá el tanque elevado de 1000 litros.

Día 23 - Miercoles 29 de Abril de 2026

Se completa el alistado de piso en el área total proyectada. Se deja el tiempo de curado inicial antes de proceder con las actividades de enchape. Se completa el tendido de cables en los circuitos proyectados para el área de luces y aparatos de aires

Dia 24 - Viernes 30 de Abril

Se instala el acero de espera para columnas y viga de confinamiento en el eje de mampostería nuevo. Se prepara la mezcla de concreto para el vaciado de elementos verticales

Se avanzó en la tegida manual de estibas plásticas en pared de los consultorios. Se realiza aseo general al cierre de la jornada.

Dia 25 - Sabado 2 de Mayo de 2026

Se ejecuta vaciado de concreto en las columnas de confinamiento. El proceso se realiza por capas para garantizar su consolidación correcta. Al cierre de la jornada se registra fotográficamente el avance de la semana. Se realiza inventario de materiales para planificar pedidos de la semana siguiente

Dia 26 - Lunes 4 de Mayo de 2026

Se retoma actividades con acero en sitio. Se inicia proceso de enchape de pisos. Se garantiza simetría y se prepara mezcla de pegante. Se realiza el vaciado de la viga de confinamiento horizontal sobre los muros de mampostería nueva. Se realiza la correcta colocación del acero de refuerzo.

Scanned with CamScanner

Dia 27 - Martes 5 de Mayo de 2026

Se continua con el enchape de pisos en baños. Se completo el enchape del baño pediatrial y se inicia el enchape de baños de consultorios. Se ejecuto el embeyrlado en las juntas del area ya enchapada.

Se continua con la segunda mano de esmalte plastico en muros interiores

Dia 28 - Miercoles 6 de Mayo de 2026.

Se continua con el enchape de pisos en el area de la sala de espera y comedor central. Se inicia el enchape de muros en los baños.

Se completo la segunda mano de esmalte plastico en interiores. Se realizo aseo general en las areas de trabajo retirando materiales sobrantes.

Dia 29 - Jueves 7 de Mayo de 2026

Se continua con el enchape de muros en baños, se verifica alineacion horizontal y vertical del enchape.

Scanned with CamScanner

Día 30 - Viernes 8 de Mayo de 2026

Se completo el enchape de muros en la totalidad de los locales proyectados. Se ejecuto el embaquillado de las juntas en las áreas ya enchapadas de muros, logrando un acabado limpio y uniforme.

Se inicio instalación del enchape de la pileta de lavatorios, incluyendo el perímetro de impermeabilización base.

Día 31 - Sabado 9 de Mayo de 2026

Se completo el enchape de pisos en la totalidad del área proyectada y se realizo el embaquillado final en todo el piso. Se iniciaron los trabajos de instalación de guardacable, comenzando por áreas ya liberadas de andamios y herramienta.

Al cierre de la jornada se hizo registro fotográfico

Día 32 - Lunes 11 de Mayo de 2026

Se completo instalación de tableros eléctricos y se realizo la conexión de circuitos al panel principal. Se verifico continuidad de circuito y correcto funcionamiento de interruptores, dejando las salidas preparadas para la posterior instalación de luminarias LED.

Scanned with CamScanner

Dia 33 - Martes 12 de Mayo de 2026

Se completo la instalacion de granitogres en el 40% del area total. Se hizo aseo general del puesto

Dia 34 - Miercoles 13 de Mayo de 2026

Se inicio la instalacion de las ventanas corredizas en aluminio en los vanos proyectados. Se verifico la alineacion de los marcos de aluminio y su correcta fijacion a los muros. Se instalaron las alfajias y se sello el permetro de cada ventana.

Dia 35 - Jueves 14 de Mayo de 2026.

Se completo la instalacion de las ventanas corredizas en los 5 vanos proyectados. Se verifico el correcto deslizamiento de los paneles y el funcionamiento de los seguros. Se completo totalmente la instalacion de granitogres

Dia 36 - Viernes 15 de Mayo de 2026

Se iniciaron los trabajos de carpinteria metalica, se instalaron algunas puertas metalicas, verificando aplome y nivel y correcto

Scanned with CamScanner

funcionamiento de cerraduras. Las puertas y rejas entregadas siguiendo especificaciones del contrato.

Día 37 - Sabado 16 de Mayo de 2026

Se completo la instalacion de puerta metalicas, se instalaron las rejas metalicas, se verifico la correcta fijacion de las mismas.


Día 38 - Martes 19 de Mayo de 2026

Se continuo con la verificacion de los items ya realizados en el puesto de salud constatando que todo este acorde a especificaciones.

Día 39 - Miercoles 20 de Mayo de 2026.

Se prosigue con la verificacion de los actividades ya realizadas. Se realizo prueba de funcionamiento del tablero electrico principal.

Scanned with CamScanner

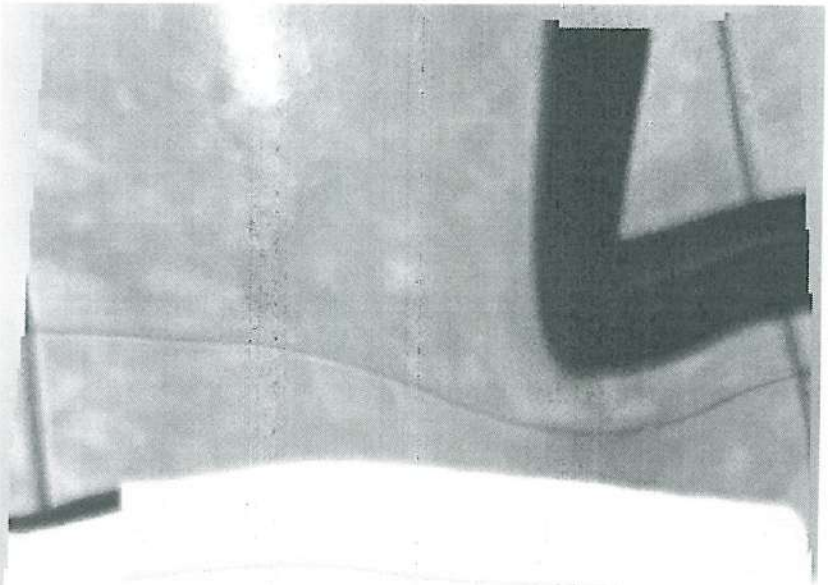

Día 40 - Jueves 21 de Mayo de 2026

Se a
ane Se verifica el correcto funcionamiento de circuitos de iluminación y tomacorrientes.

Día 41 - Viernes 22 de Mayo de 2026

Se in Se realiza el listado y retiro de materiales y herramientas. Se en u realiza balance de obra, además del registro fotográfico de a del puesto de salud.
las

Día 42 - Sabado 23 de Mayo de 2026

Se. Al cierre de la jornada se analizo el avance semanal. Se realiza balance de sistemas instalados y se identificaron JV actividades de acabados pendientes para la semana siguiente.
de
Tot Día 43 - Lunes 25 de Mayo de 2026

Día Se evidenciaron detalles por corregir en el parche de muros para ello mismo con un adecuado pasteado para continuar
Se con la pintura de los mismos. En paralelo se hara verificación
alg de circuitos instalados en el puesto, revisando continuidad

y puesta a tierra de cada punto como preparación para poder proceder a la energización general total del puesto.

Día 44 - Martes 26 de Mayo de 2026.

Se continua con el detallado del estuco plastico en muros interiores, consiguiendo nuevamente uniformidad y acabado liso de la superficie, corrigiendo pequeñas imperfecciones.

Se realizo aseo general en las áreas de trabajo, retirando materiales sobrantes y material herramienta

Día 45 - Miercoles 27 de Mayo de 2026.

Se finaliza con la correcta intervención menor de estuco plastico en muros interiores, se continua con la verificación de los circuitos electricos en areas de baños y cocina de obra.

Día 46 - Jueves 28 de Mayo de 2026.

Ya con el curado necesario de mano final de estuco plastico se dio inicio al proceso de pintura interior. Se observo la calidad del acabado en toda la superficie, sin observarse fisuras ni desprendimientos.

Scanned with CamScanner

Día 17 - Viernes 29 de Mayo de 2026.

Se finalizó con la totalidad de material en obra para el proceso de pintura interior, se continuó con la aplicación de la primera mano de pintura antimicelial, antibacterial y antiviral y la pasta en muros interiores de consultorios. La aplicación se realizó con rodillo y brocha en áreas de difícil acceso garantizando cobertura uniforme sobre la superficie.

Día 18 - Sábado 30 de Mayo de 2026.

Se continuó con la primera mano de pintura interior, anteriormente aplicada a la zona de espera y comedor central. Se verificó la uniformidad del color en toda la superficie, especialmente en esquinas y uniones con los enchapes.

Al finalizar de la jornada se registró fotográficamente el avance del personal. Se realizó balance de actividades ejecutadas, cantidades de avance del frente de pintura y suministro de electrica

Día 19 - Lunes 1 de Junio de 2026.

Se da por terminada la primera mano de pintura interior en la totalidad de muros del puesto de salud. Se dejó el tiempo de secado recomendado por el fabricante antes de

iniciar la segunda mano.

Se inicia el montaje de pre instalación como paso previo a la instalación del sistema fotovoltaico híbrido

Día 50 - Martes 2 de Junio de 2026.

Se dio inicio a la aplicación de la segunda mano de pintura antibacterial en los muros interiores de consultorios. Se verificó la uniformidad del acabado y se realizaron retoques necesarios en las áreas de mayor exposición al tránsito.

Se continua con la revisión de la instalación del sistema fotovoltaico híbrido conforme a los planos aprobados

Día 51 - Miércoles 3 de Junio de 2026.

Se completó la segunda mano de pintura interior en la totalidad de las áreas del puesto de salud, dando por terminado el proceso de pintura interior. Se realizó inspección visual del acabado, sin observarse defectos.

Se dio inicio a la instalación de panel solares, verificando la correcta orientación e inclinación de los paneles para maximizar la captación solar y se inicio el tendido del cableado hacia el inversor.

Scanned with CamScanner

Día 52 · Jueves 4 de Junio de 2026.

Con el anclaje y perno instalado y curado, se inicia la aplicación de la primera mano de pintura Koraza directamente sobre el panel anclado de la fachada exterior. Se realiza barrido previo de la superficie para garantizar la correcta adherencia del producto.

A continuación con la instalación del sistema fotovoltaico. Se instala el inversor híbrido y el banco de baterías en el cuarto técnico designado, avanzando en las conexiones eléctricas según el diagrama unifilar aprobado.

Día 53 - Viernes 5 de Junio de 2026.

Se continúa con la primera mano de pintura Koraza de fachada exterior, cubriendo la totalidad de muros perimetrales del puesto de salud. Se verifica la homogeneidad de la cobertura con condiciones climáticas favorables para el secado del producto.

Se avanza en las conexiones del sistema solar híbrido al Tablero eléctrico principal. El técnico especialista verifica la polaridad y los voltajes en cada punto de conexión antes de proceder con la energización.

Dia 54 - Sabado 6 de Junio de 2026

Se realiza inspección visual de la primera mano de pintura Korazo. Se deja el tiempo de secado recomendado antes de iniciar con la segunda mano. Se realiza aseo general del área perimetral del puesto de salud.

Al cierre de la jornada se registra fotograficamente el área general.

Dia 55 - Martes 9 de Junio de 2026

Se realiza la aplicación de la segunda y ultima mano de pintura Korazo en fachada exterior. Se verifica la uniformidad del acabado final y se realizan retoques en los encuentros entre muros y capiteles existentes.

Se realiza la puesta en servicio y prueba del sistema de energía solar hibrida. El tecnico especializado programa el inversor y verifica su funcionamiento del modulo solar, red y baterias.

Scanned with CamScanner

Día 56 - Miercoles 10 de Junio de 2026.

Se verificaron condiciones de humedad y detalles de superficie de muros intervenidos.

Día 57 - Jueves 11 de Junio de 2026

La jornada se concentro en la revisión de acabados efectuando también limpieza general y ajuste menor de imperfecciones puntuales previas a la ultima mano de pintura Koraza

Día 58 - Viernes 12 de Junio de 2026.

Se continuo con el inicio de la tercera y ultima mano de pintura Koraza, alcanzando el 25% del area perdiente.

Se realizo aseo general al frente de trabajo al cierre de la jornada

Día 59 - Sabado 13 de Junio de 2026.

Se verifico la aplicación y secado del primer tramo aplicado de la ultima mano de pintura Koraza. Se registro fotograficamente el avance

Día 60 - Martes 15 de Junio de 2026.

Se retomaron actividades de aplicación de tercera mano de pintura Koraza alcanzando el 40% de avance del área pendiente.

Se verifica uniformidad del color y correcta cubrición en esquinas y uniones

Día 61 - Miércoles 17 de Junio de 2026.

Se culmina con la aplicación de última mano de pintura Koraza alcanzando el 70% acumulado

Se realiza revisión de calidad sobre áreas ya finalizadas, sin identificar puntos de retoque.

Día 62 - Jueves 19 de Junio de 2026.

Se completa la última mano de pintura Koraza en la totalidad de la fachada exterior, alcanzando el 100% de ejecución

Día 63 - Viernes 19 de Junio de 2026.

Se realizo aseo general del frente de trabajo y se registro fotograficamente el avance acumulado de la semana

Día 64 - Sabado 20 de Junio de 2026.

Se realizo inspección visual general de cobertura de la ultima mano de pintura Koraza

Día 65 - Lunes 22 de Junio de 2026.

Se continua con la revisión general de acabados de pintura exterior finalizados, sin identificar puntos de retoque

Día 66 - Martes 23 de Junio de 2026.

Se inicio con la inspección de identificación de retoques en zonas de unions

Se registro fotograficamente el avance de la pachada

Día 67 - Miercoles 24 de Junio

Se realizo limpieza general de obra, intervención retirando protecciones plasticas de puertas y ventanas de fachada

Día 68 - Jueves 25 de Junio de 2026

Se realizo recorrido de verificación tecnica con todo el equipo de obra confirmando culminación al 100% de actividades de pintura interior y exterior

Día 69 - Viernes 26 de Junio de 2026

Se hizo limpieza general de todo el puesto de trabajo, ademas del retiro de equipo y material que ya no era necesario para la actividades restantes

Día 70 - Sabado 27 de Junio de 2026

Se hizo registro fotografico general del puesto de salud

Día 71 - Martes 30 de Junio de 2026

Se reinician las actividades que continuan pendiente de ejecución durante el periodo de prorroga: Cielo raso en Drywall, puertas interiores, instalación de sanitarios y lavamanos

Día 72 - Miercoles 1 de Julio de 2026

Se realiza acceso general del puesto de trabajo se inicia con la gestión de materiales para actividades restantes

Día 73 - Jueves 2 de Julio de 2026

Se verifica disponibilidad y gestión de aparatos sanitarios institucionales y lavamanos con pedestal requeridos para baño de usuarios y personas con discapacidad.

Día 74 - Viernes 3 de Julio de 2026.

Se realiza recorrido de verificación de detalles dejando constancia del estado de obra a la fecha.

Día 75 - Sabado 4 de Julio de 2026

Se realizo limpieza general de las areas donde se ejecutaron actividades la semana siguiente

Día 76 - Lunes 6 de Julio de 2026.

Se identifican tres constr entre contratista, interventoria y personal del hospital San Sebastian que actividades no serán ejecutadas, y cuales si tras realiza balance de obra

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DE PIEDRAS
E.S.E. HOSPITAL SAN SEBASTIÁN

OBJETO DEL CONTRATO:

"OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALÁ EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS, TOLIMA"

INFORME DEL CONTRATISTA

ACTA PARCIAL N.° 1

CONTRATO DE OBRA N.° 102 DE 2026

11 de marzo de 2026 al 1 de junio de 2026, con seguimiento de avance físico al 30 de junio de 2026

ENTIDAD	E.S.E. Hospital San Sebastián de Piedras – Tolima. NIT. 809.005.249-4
CONTRATISTA	INCOBELCI S.A.S. NIT. 900.088.145-2
CONTRATO	N.° 102 de 2026 (25 de febrero de 2026)
OBJETO DEL CONTRATO	Obras de adecuaciones menores de infraestructura física en el Puesto de Salud Rural de Chicalá, municipio de Piedras – Tolima
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 190.252.097
FECHA DE INICIO	11 de marzo de 2026
PLAZO INICIAL	Tres (3) meses (terminación inicial: 10 de junio de 2026)
PRÓRROGA	Un (1) mes, aprobada mediante otrosí/adición en plazo al contrato de obra N.° 102
% AVANCE (ACTA PARCIAL N.° 1)	90,00% de ejecución financiera (corte: 1 de junio de 2026)
MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO	Piedras – Tolima (vereda Chicalá)
COORDENADAS APROXIMADAS	N 4°33'40" W 74°51'28", según registro fotográfico geolocalizado de obra
SUPERVISOR	Dra. María Paz Gaitán Oñate – Administradora E.S.E. Hospital San Sebastián
INTERVENTOR	Ing. Alberto Casabianca Moreno
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	Ing. Didier Portela Torres
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	Ing. Diego Fernando Portela Florez – COPNIA N.° 091037-0588811 CND

CONTENIDO

Introducción

1. Justificación
2. Objetivo
3. Alcance
4. Descripción de la obra
5. Ubicación general
6. Ítems y cantidades de obra – Presupuesto ejecutado (Acta Parcial N.° 1)
7. Informe de obra por capítulo
8. Aspectos de seguridad, ambientales y de calidad
9. Estado actual de avance y observaciones técnicas
10. Firma

INTRODUCCIÓN

En el presente informe del contratista se detallan las actividades ejecutadas para el desarrollo del proyecto de adecuaciones menores de infraestructura física en el Puesto de Salud Rural de Chicalá, municipio de Piedras, departamento del Tolima, en cumplimiento del Contrato de Obra N.° 102 de 2026 suscrito con INCOBELCI S.A.S.

El presente documento constituye el soporte técnico y narrativo del Acta Parcial de Obra N.° 1, la cual certifica una ejecución financiera del 90,00% del valor del contrato con corte al 1 de junio de 2026. Se presenta el detalle de las actividades realizadas, las cantidades de obra correspondientes y su respaldo fotográfico y documental, consignado igualmente en el documento "Memorias de Cálculo – Acta Parcial de Obra N.° 1" que se anexa. Adicionalmente, se deja constancia del avance físico adelantado durante el período de prórroga de un (1) mes aprobado al contrato, con corte a la fecha del presente informe.

1. JUSTIFICACIÓN

El presente informe deja constancia, con su respectiva evidencia fotográfica y documental, del avance de ejecución física y financiera que respalda el Acta Parcial N.° 1, con el propósito de dar claridad y veracidad sobre las actividades realizadas y de verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y las cantidades contratadas frente a las efectivamente ejecutadas en obra.

2. OBJETIVO

Presentar el informe de obra del Contrato N.° 102 de 2026 que respalde las cantidades relacionadas en el Acta Parcial N.° 1, correspondiente al 90,00% de ejecución financiera del contrato, con corte al 1 de junio de 2026, cuyo objeto es la ejecución de las obras de adecuaciones menores de infraestructura física en el Puesto de Salud Rural de Chicalá, municipio de Piedras – Tolima.

3. ALCANCE

El alcance del presente informe comprende el detalle y la evidencia técnica de las actividades ejecutadas hasta la fecha de corte, como respaldo del Acta Parcial N.° 1, así como el estado de avance físico de las actividades adelantadas durante el período de prórroga. La veracidad, exactitud e integridad de la información aquí consignada es responsabilidad del Ingeniero Residente de obra, en su calidad de profesional a cargo de la dirección técnica del proyecto.


4. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

El proyecto consiste en la ejecución de obras de adecuaciones menores de infraestructura física en el Puesto de Salud Rural de Chicalá, comprendiendo trece (13) capítulos de obra: preliminares; excavaciones y rellenos; placa de contrapiso; obras en cubierta; mampostería, estructura de confinamiento, pañete, estuco y pintura; pisos y cielo raso; enchape y accesorios de baños; carpintería en madera, espejos, vidrios y aluminio; instalación eléctrica; instalaciones hidrosanitarias y aguas lluvias;

carpintería metálica; aseo general; y mobiliario de uso del puesto de salud, este último incluyendo el suministro e instalación de una planta solar híbrida y equipos de aire acondicionado. La intervención comprende actividades de demolición y adecuación de la edificación existente, con el fin de recuperar la funcionalidad operativa del puesto de salud y garantizar condiciones adecuadas de habitabilidad, salubridad y prestación del servicio.

5. UBICACIÓN GENERAL

PUESTO DE SALUD RURAL DE CHICALÁ – MUNICIPIO DE PIEDRAS, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

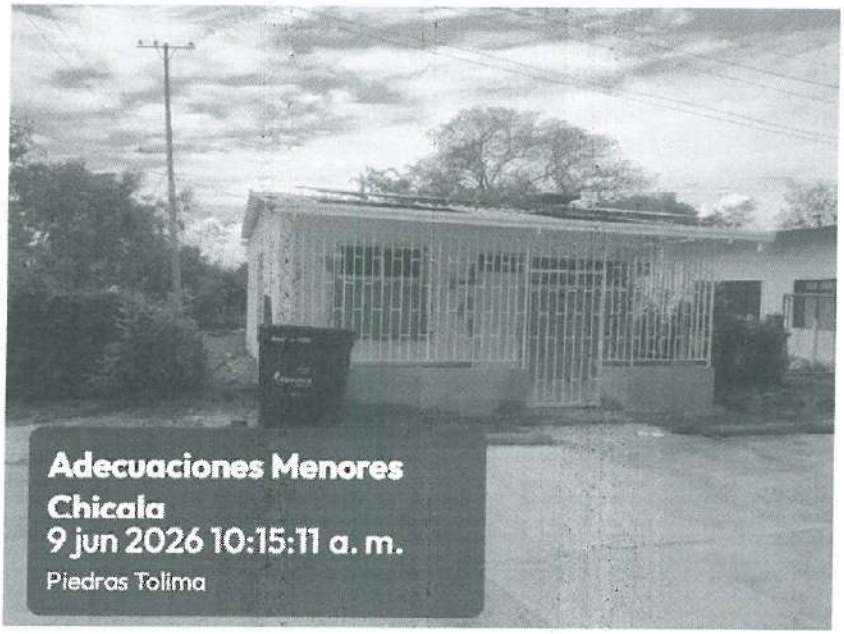

El proyecto se localiza en la vereda Chicalá, zona rural del municipio de Piedras, Tolima, en las coordenadas aproximadas N 4°33'40" W 74°51'28", conforme al registro fotográfico geolocalizado levantado durante la ejecución de la obra.

6. ÍTEMS Y CANTIDADES DE OBRA – PRESUPUESTO EJECUTADO (ACTA PARCIAL N.° 1)

A continuación, se presenta el presupuesto de obra correspondiente al Acta Parcial N.° 1, discriminado por capítulo e ítem, con las cantidades contractuales, las cantidades efectivamente ejecutadas y certificadas, el porcentaje de avance físico y los valores unitarios y parciales aplicados. Los ítems que a la fecha de corte registran cantidad ejecutada igual a cero se identifican en rojo y se analizan en el numeral 9 del presente informe.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT. CONTRACTUAL	CANT. EJECUTADA (ACTA 1)	% AVANCE	VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)	VALOR PARCIAL (ACTA 1)
1. PRELIMINARES							
1.1	RASPADO Y LIJADO DE PINTURA	M2	82,81	82,81	100,0%	$ 17.599	$ 1.457.383
1.2	DEMOLICIONES (MUROS)	M2	32,75	44,95	100,0%	$ 8.089	$ 363.583
1.3	DEMOLICIONES DE PISOS EN CERAMICA, PORCELANATO O ESMALTADOS	M2	55,12	55,12	100,0%	$ 19.887	$ 1.096.165
1.4	DEMOLICIONES (GUARDA ESCOBAS)	ML	37,50	37,50	100,0%	$ 5.359	$ 200.965
1.5	DEMOLICIONES (ENCHAPE - MUROS)	M2	12,80	12,80	100,0%	$ 8.862	$ 113.431
1.6	DEMOLICION (MESON EN CONCRETO)	M2	3,60	3,60	100,0%	$ 34.696	$ 124.904
1.7	DESMONTE (SANITARIOS Y LAVAMANOS)	UND	2,00	1,00	50,0%	$ 36.013	$ 36.013
1.8	DESMONTE (CIELO RASO)	M2	40,50	40,50	100,0%	$ 15.005	$ 607.718
1.9	DESMONTE CARPINTERIA METALICA PUERTAS, VENTANAS,VACIADO Y LIMPIEZA DE MARCOS)	UND	12,00	12,00	100,0%	$ 25.724	$ 308.682
1.10	DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE	M2	57,66	57,66	100,0%	$ 15.205	$ 876.730
1.11	RETIRO DE ESCOMBROS (BOTADERO AUTORIZADO LA MIEL)	M3	13,37	13,37	100,0%	$ 59.000	$ 788.830
1.12	TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE Y ESCOMBRO EMPACADO EN FIBRAS HASTA UNA DISTANCIA DE 100 MTR	M3	13,37	13,37	100,0%	$ 36.836	$ 492.501
2. EXCAVACIONES -RELLENOS							
2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3	3,24	3,24	100,0%	$ 42.873	$ 138.907
2.2	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE SITIO	M3	1,07	1,07	99,9%	$ 30.011	$ 32.112
3. PLACA CONTRA PISO (AL INTERIOR DE LA EDIFICACION)							
3.1	PLACA DE CONTRA PISO DE 2500 PSI INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 15x15 5mm E:0.10cm	M2	24,96	10,50	100%	$ 68.405	$ 718.249
4. OBRAS EN CUBIERTA							
4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA INCLUYE SOPORTES VERTICALES, PLATINAS, CHASOS EXPANSIVOS, PINTURA EMALTE, ANTICORROSIVO (TUBO RECTANGULAR 76 x 38 x 1.1mm x 6m) SECTOR ANTEJARDIN FACHADA PRINCIPAL	M2	22,78	33,49	100,0%	$ 154.271	$ 5.166.540

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT. CONTRACTUAL	CANT. EJECUTADA (ACTA 1)	% AVANCE	VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)	VALOR PARCIAL (ACTA 1)
4.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA TERMOACUSTICA UPVC CRESTA ALTA (INCLUYE TORNILLOS, CAPUCHON Y SIKA FLEX)	M2	69,27	69,27	100,0%	$ 108.170	$ 7.492.940
4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE EN TEJA TERMOACUSTICA CRESTA BAJA SEGUN EL COLOR (INCLUYE TORNILLOS, CAPUCHON Y SIKA FLEX	ML	6,65	6,65	100,0%	$ 63.457	$ 421.988
4.4	SUMINISTRO E INSTALCION CANAL GALABANIZADA CAL 22 DESARROLLO 61CM, INCLUYE WASH PRIMER Y SOPORTES EN ANGULO 3/4 X 1/8 (PREFABRICADA)	ML	13,30	13,30	100,0%	$ 222.930	$ 2.964.968
4.5	BAJANTE PVC AMAZONAS	ML	7,00	7,00	100,0%	$ 48.978	$ 342.849
4.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE METALICO (INCLUYE SIKAFLEX, CORTE CON DISCO DE TUNGSTENO)	ML	14,08	0,00	0,0%	$ 51.588	$ 0
5. MAMPOSTERIA, ESTR. DE CONFINAMIENTO, PINTURA, PAÑETE Y ESTUCO							
5.1	MURO EN BLOQUE H4	M2	60,89	53,00	100%	$ 62.069	$ 3.289.663
5.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 3000PSI VERTICAL, SECCION 15X20	ML	16,00	10,00	100%	$ 153.716	$ 1.537.158
5.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 3000PSI HORIZONTAL SECCION 15X30	ML	10,25	12,20	100,0%	$ 158.582	$ 1.934.706
5.4	PAÑETE MURO (INCL. FILOS, DILATACIONES Y CARTERAS)	M2	121,78	121,78	100,0%	$ 27.512	$ 3.350.362
5.5	PAÑETE MURO IMPERMEABILIZADO (INCL FILOS, DILAT Y CARTERAS)	M2	53,03	53,03	100,0%	$ 31.164	$ 1.652.648
5.6	ESTUCO PLASTICO DOS MANOS	M2	174,65	174,65	100,0%	$ 23.077	$ 4.030.324
5.7	PINTURA INTERIOR DOS MANOS EN MUROS ANTIBACTERIAL-ANTIMOHO-LAVABLE (CORONA)	M2	174,65	64,82	100%	$ 17.485	$ 1.133.384
5.8	GRANIPLAST HIDROFUGADO	M2	59,53	0,00	0,0%	$ 30.465	$ 0
5.9	PINTURA KORAZA TRES MANOS	M2	59,53	30,00	100%	$ 26.390	$ 791.700
6. PISOS Y CIELO RASO							
6.1	ALISTADO PISO 1:5 E:04M	M2	57,71	57,71	100,0%	$ 34.359	$ 1.982.859
6.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBAS (FORMATO 60X60)	ML	48,35	48,35	100,0%	$ 27.975	$ 1.352.575
6.3	CIELO RASO EN DRYWALL (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE, MASILLA Y PINTURA)	M2	57,71	0,00	0%	$ 75.881	$ 1.517.612
7. ENCHAPE Y ACCESORIOS BAÑOS							

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT. CONTRACTUAL	CANT. EJECUTADA (ACTA 1)	% AVANCE	VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)	VALOR PARCIAL (ACTA 1)
7.1	CERAMICA PARED DE 60x30-BAÑOS (INCLUYE BOQUILLA COLOR, WING Y LNEALES)	M2	43,04	94,25	100,0%	$ 91.428	$ 8.617.059
7.2	CERAMICA PISO FORMATO 60x60 (INCLUYE BOQUILLA COLOR Y LINEALES) - (TRAFICO PESADO)	M2	57,71	68,26	100,0%	$ 112.088	$ 7.651.146
7.3	POCETA LAVATRAPEROS INCLUYE(BLOQUE H4, PAÑETE IMPEMEABILIZADO, ENCHAPE, MOLDURA EN ALUMINIO, CARTERAS, FILOS, ALISTADO DE PISO Y ENCHAPE DE PISO)	UND	1,00	1,00	100,0%	$ 310.396	$ 310.396
7.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO INSTITUCIONAL CORONA (INCLUYE ACOPLES)	UND	2,00	0,00	0,0%	$ 810.388	$ 0
7.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS CON PEDESTAL CORONA (INCLUYE ACOPLES, GRIFERÍA LAVAMANOS MONOCONTROL ALUVIA, CONJUNTO DESAGUE LAVAMANOS)-(BAÑOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD)	UND	1,00	0,00	0,0%	$ 451.341	$ 0
7.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS CON PEDESTAL CORONA (INCLUYE ACOPLES, CONJUNTO DESAGUE LAVAMANOS, KIT GRIFERIA INDUSTRIAL CON CONTROL DE PEDAL INSTITUCIONAL)-(CONSULTORIOS)	UND	2,00	0,00	0,0%	$ 495.241	$ 0
7.7	KIT BARRA DE SEGURIDAD PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (1 BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE ACERO 304 Y 1 BARRA DE SEGURIDAD AGARRADERA ACERO INOXIDABLE 60CM PREMIUM)	UND	2,00	0,00	0,0%	$ 355.200	$ 0
7.8	TAPA REGISTRO PVC 15X15 (INCLUYE CAJA LLAVE REGISTRO)	UND	5,00	0,00	0,0%	$ 35.063	$ 0
7.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA 3 " DE PISO ANTICUCARACHAS, CON SOSCO	UND	4,00	0,00	0,0%	$ 61.293	$ 0
7.10	DISPENSADOR DE JABON	UND	3,00	0,00	0,0%	$ 154.911	$ 0
7.11	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO	UND	2,00	0,00	0,0%	$ 187.911	$ 0
7.12	DISPENSADOR DE TOAYAS DE PAPEL	UND	2,00	0,00	0,0%	$ 225.913	$ 0
7.13	DISPENSADOR DE GEL ANTIBACTERIAL	UND	3,00	0,00	0,0%	$ 111.639	$ 0
8. SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPINTERIA -ESPEJOS-VIDRIOS-ALUMINIO							
8.1	MUEBLE EN AGLOMERADO RH EXP 15MM INCLUYE ((HERRAJES,	ML	3,40	0,00	0,0%	$ 635.661	$ 0

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT. CONTRACTUAL	CANT. EJECUTADA (ACTA 1)	% AVANCE	VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)	VALOR PARCIAL (ACTA 1)
	BOTONES, CANTOS, TAPA TORNILLOS)						
8.2	PUERTA ENTAMBORADA EN AGLOMERADO, INCLUYE (MARCO EN MADERA, BISAGRAS Y CHAPA TIPO PALANCA) 0,90 X 2,00	UND	5,00	5,00	100,0%	$ 759.088	$ 3.795.438
8.3	VENTANA SENCILLA EN ALUMINIO COLOR BLANCO CORREDIZA EN DOS CUERPOS PERFIL 744 INCLUYE ALFAJIA DE 8MM)	M2	5,98	5,98	100%	$ 489.237	$ 2.925.636
8.4	ESPEJO 4MM	M2	1,20	0,00	0,0%	$ 160.798	$ 0
9. SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRICA							
9.1	SALIDA PARA ILUMINACION INCLUYE (LED 12W, INTERRUPTOR, CABLE LIBRE DE ALOGENO, CAJA CUADRADA, CURVAS PVC 1/2, TUBO PVC 1/2 Y SUPLEMENTO)	UND	12,00	13,00	100,0%	$ 225.709	$ 2.934.213
9.2	SALIDAS PARA TOMA CORRIENTE MONOFASICO DE 110V USO GENERA INCLUYE (TOMA CORRIENTE DOBLE, CABLE LIBRE DE ALOGENO, CAJA CUADRADA, CURVAS PVC 1/2, TUBO PVC 1/2 Y SUPLEMENTO)	UND	17,00	22,00	100,0%	$ 172.998	$ 3.805.954
9.3	REGATAS	ML	37,62	37,62	100,0%	$ 13.309	$ 500.673
10. SUMINISTRO E INSTALACION HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS							
10.1	TUBERIA 1/2" PVC PRESION	ML	18,00	18,00	100,0%	$ 39.012	$ 702.217
10.2	PUNTO HIDRAULICO 1/2"	UND	12,00	8,00	100%	$ 56.027	$ 448.215
10.3	TUBERIA SANITARIA 3" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	18,00	18,00	100,0%	$ 73.103	$ 1.315.848
10.4	TUBERIA SANITARIA 2" (INCLYE ACCEOSORIOS)	ML	9,00	9,00	100,0%	$ 60.352	$ 543.172
10.5	REGISTRO PVC PRESION 1/2"	UND	5,00	5,00	100,0%	$ 45.538	$ 227.692
10.6	SUMINITRO E INSTALACION DE TANQUE ELEVADO DE 500 LTS (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	1,00	1,00	100,0%	$ 808.805	$ 808.805
10.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMINAL TIPO JARDIN	UND	2,00	2,00	100,0%	$ 73.054	$ 146.107
10.8	PUNTO SANITARIO DE 2" O DE 1-1/2	UND	5,00	7,00	100,0%	$ 61.524	$ 430.665
10.9	PUNTO SANITARIO DE 3"	UND	4,00	2,00	100%	$ 87.003	$ 174.005
11. CARPINTERIA METALICA							
11.1	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA AGATA 6 DILATACIONES DE 0.80 X 2.10 ALA Y MARCO EN LAMINA CR CALIBRE 20. PINTURA ELECTROSTÁTICA BLANCA, CERRADURA DE INCRUSTAR TRES PASADORES K35MM,	UND	2,00	2,00	100,0%	$ 752.556	$ 1.505.112

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT. CONTRACTUAL	CANT. EJECUTADA (ACTA 1)	% AVANCE	VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)	VALOR PARCIAL (ACTA 1)
	ESCUDO CUADRADO ACERO INOXIDABLE, BISAGRAS OMEGAS, PINTURA ELECTROSTÁTICA.						
11.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA AGATA 6 DILATACIONES DE 0.90 X 2.10 Y MARCO EN LAMINA CR CALIBRE 20. PINTURA ELECTROSTÁTICA BLANCA, CERRADURA DE INCRUSTAR TRES PASADORES K35MM, ESCUDO CUADRADO ACERO INOXIDABLE, BISAGRAS OMEGAS (REVISAR MANO DE OBRA,) (PREFABRICADA)	UND	2,00	2,00	100,0%	$ 772.556	$ 1.545.112
11.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA PARA VENTANAS EN CARPINTERIA METALICA TUBO CUADRADO DE 3/4" CALIBRE 18 (INCLUYE ANTICORROSIVO, CHASOS EXPANSIVOS Y TRANSPORTE)	M2	32,81	22,70	100%	$ 189.331	$ 4.297.819
11.4	SUMINISTRO E INTALACION DE ESTRUCTURA EN CARPINTERIA METALICA (Perfil C Gr50 150 x 50 x 1.5mm x 6m Galvanizado) PARA SOPORTE DE PANELES SOLARES	M2	30,00	30,00	100,0%	$ 243.968	$ 7.319.050
12. ASEO GENERAL							
12.1	ASEO GENERAL ENTREGA	M2	57,71	0,00	0,0%	$ 5.877	$ 0
13. MOBILIARIO USO PUESTO DE SALUD							
13.1	SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTO EN SERVICIO DE LETRERO ILUMINADO EN ACRILICO EN COLORES PRIMARIOS, EXPESOR DE LA LAMINA 3MM, INCLUYE TRANSPORTE Y LED (MEDIDAS 2,00 X 0,80) - (PREFABRICADO)	UND	1,00	0,00	0,0%	$ 2.630.862	$ 0
13.2	SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO PLANTA SOLAR HIBRIDA 3,85 KWP 7,6 KW US FO	UND	1,00	1,00	100,0%	$ 32.792.661	$ 32.792.661
13.3	SUMINSTRO E INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT INVERTER YORK DE 12.000 BTU/H, R410A, 220/1/60	UND	2,00	2,00	100,0%	$ 2.934.455	$ 5.868.909
						VALOR COSTO DIRECTO – OBRA (Capítulos 1 a 12)	**$ 96.322.779**
						Administración (24%) + Imprevistos (1%) + Utilidad (5%)	**$ 28.896.834**
						VALOR COSTO TOTAL OBRA (Directo + AIU)	**$ 125.219.613**
						SUBTOTAL MOBILIARIO (Capítulo 13)	**$ 38.661.571**
						IVA Mobiliario (19%)	**$ 7.345.698**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT. CONTRACTUAL	CANT. EJECUTADA (ACTA 1)	% AVANCE	VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)	VALOR PARCIAL (ACTA 1)
						TOTAL MOBILIARIO (con IVA)	$ 46.007.269
						VALOR NETO ACTA PARCIAL N.° 1 (OBRA + MOBILIARIO)	$ 171.226.882

El registro fotográfico de soporte individual por cada ítem ejecutado se presenta en el documento anexo "Memorias de Cálculo – Acta Parcial de Obra N.° 1".

7. INFORME DE OBRA POR CAPÍTULO

7.1 Preliminares

Comprende las actividades de raspado y lijado de pintura, demoliciones de muros, pisos en cerámica, guardaescobas y enchapes existentes, desmonte de aparatos sanitarios, cielo raso y carpintería metálica, así como el retiro, cargue y trasiego de escombros hasta el botadero autorizado La Miel. Estas actividades fueron ejecutadas en su totalidad durante la fase inicial de la obra (30 de marzo al 14 de abril de 2026), alcanzando el 100% de las cantidades contratadas, según consta en el Acta Parcial N.° 1.



Fotografía 1. Evidencia representativa – Capítulo 1: Preliminares.

7.2 Excavaciones y rellenos

Las excavaciones manuales en material común y el relleno y compactación con material de sitio fueron ejecutados en su totalidad durante la misma fase inicial de la obra, alcanzando el 100% de las cantidades contratadas.



Fotografía 2. Evidencia representativa – Capítulo 2: Excavaciones y rellenos.

7.3 Placa de contrapiso

La placa de contrapiso de 2.500 PSI con malla electrosoldada fue ejecutada en su totalidad, alcanzando el 100% de los 24,96 m² contratados, según consta en el Acta Parcial N.° 1.%.



Fotografía 3. Evidencia representativa – Capítulo 3: Placa de contrapiso.

7.4 Obras en cubierta

La estructura metálica de cubierta, la teja termoacústica UPVC, el caballete, la canal galvanizada y el bajante PVC fueron ejecutados en su totalidad durante la fase inicial de la obra, alcanzando e incluso superando las cantidades contractuales en el caso de la estructura metálica (33,49 m² ejecutados de 22,78 m² contratados). El ítem de flanche metálico (4.6) no registra ejecución y, según lo indicado en el numeral 9 del presente informe, no será ejecutado.



Fotografía 4. Evidencia representativa – Capítulo 4: Obras en cubierta.

7.5 Manpostería, estructura de confinamiento, pañete, estuco y pintura

La construcción de muros en bloque H4, los elementos de concreto de confinamiento vertical y horizontal, el pañete (simple e impermeabilizado) y el estuco plástico fueron ejecutados en un porcentaje superior al 85% de las cantidades contratadas, con avance continuo entre el 15 de abril y el 8 de mayo de 2026.

Las actividades de pintura interior (antibacterial, antimoho y lavable) y pintura exterior tipo Koraza, que a la fecha de corte del Acta Parcial N.° 1 registraban un avance parcial de 64,82 m² y 30,00 m² respectivamente, fueron culminadas en su totalidad durante el período de prórroga, entre el 11 y el 24 de junio de 2026, alcanzando el 100% de los 174,65 m² y 59,53 m² contratados.

El ítem de Graniplast hidrofugado (5.8) no registra ejecución y no será ejecutado por restricción presupuestal del contratante, conforme se detalla en el numeral 9 del presente informe.



Fotografía 5. Evidencia representativa – Capítulo 5: Manpostería, pañete y pintura.

7.6 Pisos y cielo raso

El alistado de piso en mortero 1:5 y la instalación de guardaescobas fueron ejecutados en su totalidad entre el 27 de abril y el 9 de mayo de 2026.

El cielo raso en Drywall aun sigue por ejecutar, a la espera de la adicion de presupuesto, para poder cumplir dicha actividad a satisfacción conforme a contratados a la fecha de corte del Acta Parcial N.° 1. Con corte al 30 de junio de 2026, esta actividad continúa pendiente de ejecución, programada dentro del cronograma del período de prórroga.



Fotografía 6. Evidencia representativa – Capítulo 6: Pisos y cielo raso.

7.7 Enchape y accesorios de baños

La cerámica de pared y piso en los baños y consultorios, así como la poceta de lavatraperos, fueron ejecutadas en su totalidad entre el 4 y el 8 de mayo de 2026.

El sanitario institucional Corona (2 unidades) y los lavamanos con pedestal Corona de los baños de consultorios y de personas con discapacidad (3 unidades en total) no registran ejecución a la fecha de corte del Acta Parcial N.° 1. Con corte al 30 de junio de 2026, esta instalación continúa pendiente, programada dentro del cronograma del período de prórroga.

Los accesorios de baño (barras de seguridad para personas con movilidad reducida, tapas de registro, rejillas de piso anticucarachas y dispensadores de jabón, papel higiénico, toallas y gel antibacterial) no registran ejecución y no serán ejecutados por restricción presupuestal del contratante, conforme se detalla en el numeral 9 del presente informe.



Fotografía 7. Evidencia representativa – Capítulo 7: Enchape y accesorios de baños.

7.8 Carpintería en madera, espejos, vidrios y aluminio

Las puertas entamboradas en aglomerado (5 unidades) y las ventanas corredizas en aluminio (5,98 m²) fueron ejecutadas en su totalidad entre el 11 y el 14 de mayo de 2026. La verificación funcional de las puertas interiores, con ajuste de herrajes y cerraduras, continúa pendiente con corte al 30 de junio de 2026, programada dentro del cronograma del período de prórroga.

El mueble en aglomerado (8.1) y el espejo de 4 mm (8.4) no registran ejecución y no serán ejecutados por restricción presupuestal del contratante, conforme se detalla en el numeral 9 del presente informe.



Fotografía 8. Evidencia representativa – Capítulo 8: Carpintería en madera, espejos, vidrios y aluminio.

7.9 Instalación eléctrica

Las salidas de iluminación, salidas de tomacorriente y regatas fueron ejecutadas en su totalidad, incluso superando las cantidades contractuales en el caso de las salidas de iluminación (13 unidades ejecutadas

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CONTRATO N° 102-2026 - OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL CHICALÁ EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS TOLIMA

MARZO · ABRIL · MAYO · JUNIO · JULIO · AGOSTO

	ACTIVIDAD
1	PRELIMINARES
1.1	RASPADO Y LIJADO DE PINTURA
1.2	DEMOLICIONES (MUROS)
1.3	DEMOLICIONES DE PISOS EN CERAMICA, PORCELANATO O ENCHAPADOS
1.4	DEMOLICIONES (GUARDA ESCOBAS)
1.5	DEMOLICIONES (ENCHAPE - MUROS)
1.6	DEMOLICION (MESON EN CONCRETO)
1.7	DESMONTE (SANITARIOS Y LAVAMANOS)
1.8	DESMONTE (CIELO RASO)
1.9	DESMONTE CARPINTERIA METALICA PUERTAS, VENTANAS, MARCOS
1.10	DESMONTE DE CUBIERTA EXIST (AT)
1.11	RETIRO DE ESCOMBROS (BOTADERO AUTORIZADO LA MIEL)
1.12	TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE Y ESCOMBRO EMPACADO EN BESTIAS
2	EXCAVACIONES - RELLENOS
2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)
2.2	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE SITIO
3	PLACA CONTRAPISO (EL INTERIOR DE LA EDIFICACION)
3.1	PLACA DE CONTRA PISO DE 3000 PSI
4	OBRAS EN CUBIERTA
4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA
4.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA TERMOACUSTICA
4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE EN TEJA TERMOACUSTICA
4.4	SUMINISTRO E INSTALACION CANAL GALVANIZADA
4.5	BAJANTE PVC AMAZONAS
4.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE METALICO
5	MAMPOSTERIA, CONC. DE CONFINAMIENTO, PINTURA, PAÑETE Y ESTUCO
5.1	MURO EN BLOQUE N4
5.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 3000PSI VERTICAL
5.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 3000PSI HORIZONTAL
5.4	PAÑETE MURO (INCL. FILOS, DILATACIONES Y CARTERAS)
5.5	PAÑETE MURO IMPERMEABILIZADO (INCL. FILOS, DILAT Y CARTERAS)
5.6	ESTUCO PLASTICO DOS MANOS
5.7	PINTURA INTERIOR DOS MANOS EN MUROS
5.8	GRANIPLAST HIDROFUGADO
5.9	PINTURA KORAZA TRES MANOS
6	PISOS Y CIELO RASO
6.1	ALISTADO PISO 1:5 E=4cm
6.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBAS
6.3	CIELO RASO EN DRYWALL
7	ENCHAPES ACCESORIOS BAÑOS
7.1	CERAMICA PARED DE [illegible] BAÑOS
7.2	CERAMICA PISO FORMATO 60x60
7.3	POCETA LAVATRAPEROS
7.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO INSTITUCIONAL
7.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS CON PEDESTAL
7.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS CON PEDESTAL
7.7	KIT BARRA DE SEGURIDAD PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
7.8	TAPA REGISTRO PVC 35X35 (INCLUYE CAJA LLAVE REGISTRO)
7.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA 3" DE PISO ANTICUCARACHAS
7.10	DISPENSADOR DE JABON
7.11	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO
7.12	DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL
7.13	DISPENSADOR DE GEL ANTIBACTERIAL
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPINTERIA (ESPACIOS [illegible])
8.1	MUEBLE EN AGLOMERADO RH E=? 15MM
8.2	PUERTA ENTAMBORADA EN AGLOMERADO
8.3	VENTANA SENCILLA EN ALUMINIO COLOR BLANCO
8.4	ESPEJO 4MM
9	SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRICA
9.1	SALIDA PARA ILUMINACION
9.2	SALIDAS PARA TOMA CORRIENTE MONOFASICO DE 110V USO GENERAL
9.3	REGATAS
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE ZONAS VERDES Y ARBOLES

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CONTRATO Nº 102-2026 - OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL PUESTO DE SALUD RURAL CHICALÁ EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS TOLIMA



Ing. MIGUEL CORTES TORRES
C.C. No. 5[illegible]44.520
Rep. Legal Principal – INCOBELCE S.A.S.
NIT. No. 900.088.145 - 3

Vobo.

ENTERA JEFATURA

ALBERTO CASABIANCA MORENO
INGENIERO CIVIL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - UN

INFORME DE INTERVENTORIA No. 4 – ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 099 DEL 16 DE FEBRERO DE 2026
CONTRATO DE OBRA No. 102 DEL 25 DE FEBRERO DE 2026 – PUESTO SALUD CHICALA

PERIODO: 26 de mayo de 2026 al 25 de junio de 2026

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: No. 099 del 16 de febrero de 2026

CONTRATO DE OBRA: No. 102 DEL 25 DE FEBRERO DE 2026

ENTIDAD CONTRATANTE:
HOSPITAL SAN SEBASTIÁN E.S.E DE PIEDRAS – TOLIMA
NIT: 809.005.249-4

INTERVENTOR:
Ing. ALBERTO CASABIANCA MORENO
C.C. 93.132.900

CONTRATISTA DE OBRA:

INCOBELCI S.A.S.
Representante Legal: Ing. DIDIER PORTELA TORRES

OBJETO DE OBRA:

Adecuaciones menores de infraestructura física en el puesto de salud rural de Chicalá, municipio de Piedras – Tolima

VALOR DEL CONTRATO DE OBRA:
$190.252.096,60M/CTE

PLAZO INICIAL DE OBRA:
Tres (3) meses

PLAZO ADICIONAL DE OBRA:
Un (1) mes

FECHA DE INICIO:
11 de marzo de 2026

FECHA PREVISTA DE TERMINACION:
10 de Julio de 2026

ALBERTO CASABIANCA MORENO
INGENIERO CIVIL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - UN

2. *RESUMEN EJECUTIVO*

Durante el periodo comprendido entre el 26 de mayo de 2026 al 25 de junio de 2026, se desarrollaron actividades iniciales de coordinación, verificación técnica y seguimiento al contrato de obra.

Se evidenció una **afectación inicial al cronograma,** debido a la no entrega oportuna del inmueble por parte del Hospital, lo cual impidió el inicio de actividades hasta el día 25 de marzo de 2026.

Posteriormente, se dio inicio a actividades preliminares, identificándose **necesidades técnicas adicionales no previstas,** las cuales deberán ser objeto de balance contractual sin afectar el valor total del contrato.

3. *COMPONENTE TÉCNICO*

3.1 Supervisión de la ejecución del proyecto

Se realizó seguimiento permanente al contrato de obra, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales y especificaciones técnicas.

Se deja constancia que:

- No fue posible iniciar actividades el 11 de marzo de 2026.
- El inicio real de obra se dio el 25 de marzo de 2026.

3.2 Verificación de materiales

Durante el periodo no se evidenció uso significativo de materiales, dado que las actividades ejecutadas fueron preliminares. No obstante:

- Se exigió al contratista garantizar calidad certificada de materiales.
- Se solicitó presentación de fichas técnicas previas a su uso.

3.3 Pruebas y ensayos

No se realizaron ensayos técnicos durante el periodo, debido a la etapa inicial del proyecto.



3.4 Identificación de problemas técnicos

Se identificaron las siguientes situaciones relevantes:

- Inmueble no disponible al inicio del contrato
- Carencia de servicios públicos
- Deficiencias estructurales en muros
- Necesidad de actividades no previstas:
  - Excavaciones y rellenos
  - Demolición de pisos
  - Ajustes en redes hidráulicas y sanitarias

3.5 Seguridad social del personal

Se solicitó al contratista:

- Planillas de pago de seguridad social
- Relación del personal vinculado

Se encuentra en proceso de verificación documental.

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

4.1 Gestión documental

Se encuentra organizada y actualizada la siguiente documentación:

- Acta de inicio
- Actas de comité de obra No. 1 y 2
- Registro fotográfico
- Comunicaciones oficiales

4.2 Coordinación interinstitucional

Se realizaron comités de obra en las siguientes fechas:

- 11 de marzo de 2026
- 25 de marzo de 2026



Se coordinó con:

- Entidad contratante
- Contratista de obra

4.3 Seguimiento al cronograma

Se evidenció retraso inicial por causas no imputables al contratista.

Se recomienda:

- Evaluar ajuste de cronograma
- Analizar posible suspensión o ampliación contractual

4.4 Gestión de cambios

Se identificó la necesidad de:

- Balance de obra
- Incorporación de Ítems No Previstos (INP)
- Ajuste de cantidades

Se solicitó al contratista:


- Presentación de APU de nuevos ítems

5. COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE

5.1 Gestión de pagos

Durante el período objeto del presente informe, la Interventoría verificó y avaló la ejecución de las actividades desarrolladas por el Contratista de Obra, encontrando procedente la elaboración del **Acta Parcial de Obra No. 01,** cuyos principales datos son los siguientes:

Concepto	Valor
Valor Total Contrato de Obra + Mobiliario	**$190.252.096,60**
Valor Acta Parcial No. 01	**$171.226.881,81**



Concepto	Valor
Porcentaje Ejecutado	90,00 %
Valor pendiente por ejecutar	$19.025.214,79
Porcentaje pendiente	10,00 %

La Interventoría certifica que las cantidades ejecutadas corresponden a las actividades efectivamente construidas y verificadas en campo, cumpliendo con las especificaciones técnicas contractuales.

5.2 Verificación de facturación

Se revisó la documentación presentada por el Contratista de Obra correspondiente al cobro de la **Acta Parcial No. 01**, verificando:

- Acta Parcial de Obra No. 01.
- Memorias de cantidades ejecutadas.
- Balance de obra correspondiente.
- Registro fotográfico.
- Soportes administrativos y contractuales exigidos.

La documentación cumple con los requisitos establecidos para su trámite de pago.

5.3 Seguimiento presupuestal

El comportamiento presupuestal del contrato es el siguiente:

Concepto	Valor
Valor del Contrato	$190.252.096,60
Valor Ejecutado	$171.226.881,81
Saldo por Ejecutar	$19.025.214,79

La ejecución financiera guarda correspondencia con el avance físico verificado por la Interventoría.

5.4 Estado financiero del proyecto

A la fecha del presente informe, el proyecto presenta una ejecución financiera equivalente al **90,00 %** del valor contractual.

El saldo pendiente corresponde exclusivamente a las actividades restantes necesarias para la terminación total del objeto contractual.

5.5 Anticipo

El Contrato de Obra **no contempló la entrega de anticipo**, razón por la cual:

- No existe amortización de anticipo.
- El valor del Acta Parcial No. 01 corresponde íntegramente al valor de la obra efectivamente ejecutada y recibida por la Interventoría.

6. COMPONENTE JURÍDICO

- Contratos debidamente legalizados
- Acta de inicio suscrita
- Obligaciones contractuales exigidas al contratista

Se deja constancia:

- El retraso inicial no es atribuible al contratista
- Se configura posible causal para ajuste contractual

7. COMPONENTE AMBIENTAL

Durante el periodo:

- No se generaron impactos ambientales relevantes
- Se recomendó manejo adecuado de residuos

8. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)

Se solicitó al contratista:



- Afiliaciones al sistema de seguridad social

Se encuentra en revisión.

9. COMPONENTE SOCIAL

- No se presentaron conflictos sociales
- Se proyecta impacto positivo en la comunidad

10. AVANCE DEL PROYECTO

AVANCE FISICO (%)			
CONCEPTO	**ACUM. ANTERIOR**	**AVANCE MENSUAL**	**TOTAL ACUMULADO**
% Programado	60,00%	35,00%	95,00%
% Ejecutado	56,00%	34,00%	90,00%
Diferencia	**-4,00%**	**-1,00%**	**-5,00%**

AVANCE FINANCIERO (Porcentaje %) Incluye ejecutado de Interventoría			
CONCEPTO	**ACUM. ANTERIOR**	**AVANCE MENSUAL**	**TOTAL ACUMULADO**
% Programado	60,00%	35,00%	95,00%
% Ejecutado	56,00%	34,00%	90,00%
Diferencia	**-4,00%**	**-1,00%**	**-5,00%**

OBSERVACIÓN:
El desfase se debe a la entrega tardía del inmueble.

10. AVANCE DEL PROYECTO

AVANCE FÍSICO

Concepto	Valor
Avance Ejecutado	**90,00 %**
Pendiente por Ejecutar	**10,00 %**



AVANCE FINANCIERO

Concepto	Valor
Valor Total Contrato	**$190.252.096,60**
Valor Ejecutado (Acta Parcial No. 01)	**$171.226.881,81**
Saldo por Ejecutar	**$19.025.214,79**
Ejecución Financiera	**90,00 %**

OBSERVACIÓN

La ejecución financiera corresponde plenamente al avance físico certificado por la Interventoría mediante Acta Parcial de Obra No. 01.

El contrato no contempla anticipo, por lo cual no existe amortización.

11. CONCLUSIONES

- La Interventoría verificó técnicamente las actividades ejecutadas por el Contratista de Obra, encontrándolas conformes con las especificaciones contractuales.
- Se certificó una ejecución física y financiera del **90,00 %** del contrato.
- Se elaboró y avaló el **Acta Parcial de Obra No. 01**, por valor de **$171.226.881,81**.
- El saldo pendiente para la terminación del contrato asciende a **$19.025.214,79**, equivalente al **10 %** del valor contractual.
- Debido a que el contrato no contempló anticipo, no existe amortización por este concepto.
- El proyecto continúa su ejecución dentro de las condiciones técnicas establecidas por la Entidad.

12. RECOMENDACIONES

1. Tramitar el pago correspondiente al Acta Parcial de Obra No. 01.
2. Continuar con la ejecución de las actividades faltantes para alcanzar el 100 % del contrato.

3. Mantener el seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico hasta la terminación y liquidación del contrato.
4. Garantizar la entrega de las obras con el cumplimiento integral de las especificaciones técnicas y de calidad exigidas.

13. *ANEXOS*

- Acta Parcial de Obra No. 1
- Registro fotográfico
- Comunicaciones


Ing. ALBERTO CASABIANCA MORENO
C.C. No. 93.132.900 – M.P. No. 17.20.20.93.597 CLD
Interventor Externo


ALBERTO CASABIANCA MORENO
INGENIERO CIVIL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - UN

INFORME DE INTERVENTORIA No. 4 – ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 099 DEL 16 DE FEBRERO DE 2026
CONTRATO DE OBRA No. 102 DEL 25 DE FEBRERO DE 2026 – PUESTO SALUD CHICALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

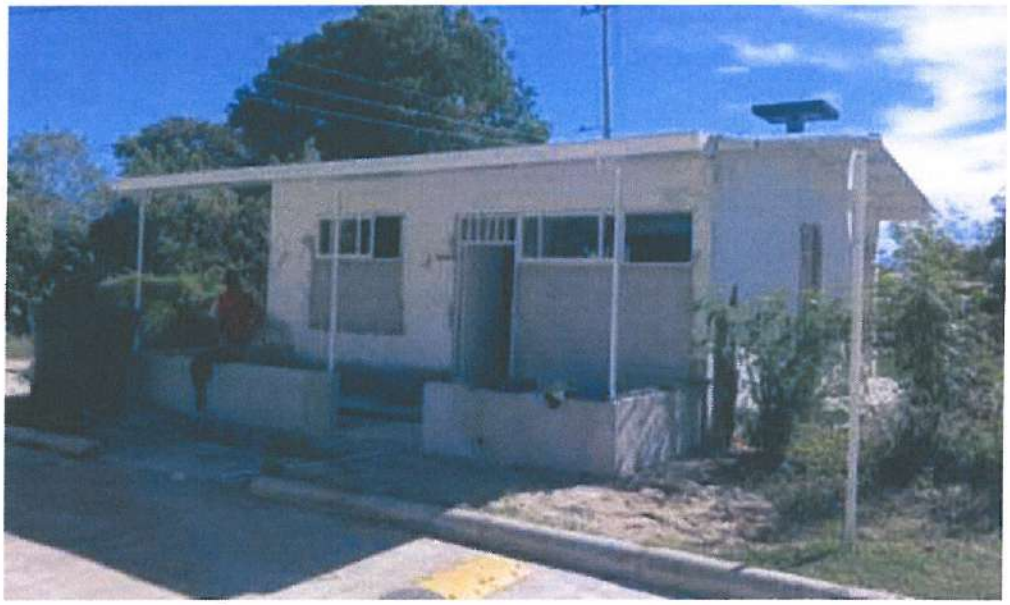

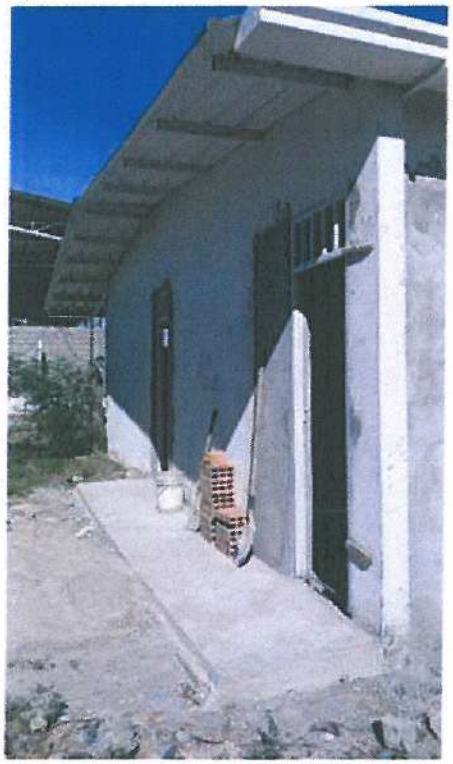

Carrera 2 No. 2 - 22 Centro Urbano de DOIMA– Piedras Tolima.
Celular 314.474.60.27 - Email: albertocasabianca61@gmail.com

ALBERTO CASABIANCA MORENO
INGENIERO CIVIL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - UN

INFORME DE INTERVENTORIA No. 4 – ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 099 DEL 16 DE FEBRERO DE 2026
CONTRATO DE OBRA No. 102 DEL 25 DE FEBRERO DE 2026 – PUESTO SALUD CHICALA



Carrera 2 No. 2 - 22 Centro Urbano de DOIMA– Piedras Tolima.
Celular 314.474.60.27 - Email: albertocasabianca61@gmail.com
