	CPROYECTOS S.A.S.	Código: Versión: Fecha:

INFORME DE INTERVENTORÍA

“INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE GAS NATURAL DOMICILIARIO PARA LOS ESTRATOS 1 Y 2 EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTODE BOLIVAR”

CONTRATO DE INTERVENTORIA : 3019-2026
INTERVENTOR: CPROYECTOS S.A.S.

CONTRATISTA: GASES DEL CARIBE

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOLIVAR



INFORME DE INTERVENTORIA
CORTE 01
PERIODO POR INTERVENTORIA: DEL 06 DE MARZO DE 2026 A 11 DE MAYO DE 2026

PERIODO POR GASES DEL CARIBE: DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2025 A 07 DE ABRIL DE 2026
(FECHA DE EJECUCION DE LAS 500 PRIMERAS CONEXIÓNES)

	CPROYECTOS S.A.S.	Código: Versión: Fecha:

INFORME DE INTERVENTORÍA

CODIGO BPIN: 202500000020318

ENTE TERRITORIAL:	DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
OBJETO DEL PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA AUMENTAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE GAS NATURAL DOMICILIARIO EN VIVIENDAS DE ESTRATOS 1 Y 2 DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.
EJECUTOR/CONTRATISTA	GASES DEL CARIBE S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS O GASCARIBE S.A. E.S.P.
CONTRATO	CONVENIO DE COOPERACION No. 137 de 2025 SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR Y GASES DEL CARIBE.
INTERVENTORIA:	CPROYECTOS S.A.S.
CONTRATO	3019-2026
OPERADOR DE SERVICIOS PUBLICOS:	GASES DEL CARIBE S.A E.S.P
NOMBRE DOCUMENTO	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 1

CONTROL DE DISTRIBUCION DEL DOCUMENTO				
Nombre	**Área o entidad**	**Copia No.**	**Tipo de copia Controlada C o no controlada NC**	**Fecha**
ENILSE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	GOBERNACION DE BOLÍVAR	1	C	ABRIL-2026

CONTROL DE MODIFICACIONES		
Versión	**Descripción de modificaciones**	**Fecha**

Elaboró:	Maria Nova, Directora de interventoría.	
Responsable:	Juan Jose Alzamora Perez, Representante	

	CPROYECTOS S.A.S.	Código: Versión: Fecha:

INFORME DE INTERVENTORÍA

	Legal	

CONTENIDO

1.-INTRODUCCIÓN....4

2.-DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO....4

2.1 ANTECEDENTES....4

2.2.- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO....6

2.2.1 UBICACIÓN DE MUNICIPIOS BENEFICIADOS....7

TABLA No 1.- LOCALIZACIONES POTENCIALES....8

3.-ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO....8

4.-ESTADO DE LOS CONTRATOS DERIVADOS....10

5.-CONTRATO DE COLABORACION....11

5.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO :....11

5.2.-Polizas del contrato de obra No 137 de 2025....12

5.3 MODIFICACIONES REALIZADAS AL CONTRATO DE OBRA....13

CLÁUSULA 4. PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA DEL CONVENIO....16

5.4 BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO....20

5.9 DIFICULTADES PRESENCIADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO....46

5.10 ASPECTOS SOCIALES....46

Componente Ambiental – Interventoría....*75*

INFORME DE INTERVENTORÍA

1.-INTRODUCCIÓN

En el presente informe se presentan los procedimientos y acciones realizadas por la Interventoría para asegurar, controlar y vigilar el desarrollo idóneo del contrato en el ámbito técnico, administrativo, financiero, presupuestal, legal, ambiental y social con el fin de garantizar la calidad de las conexiones en el marco del Contrato del convenio CONVENIO DE COOPERACION No. 137 DE 2025 SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR Y LA EMPRESA GASES DEL CARIBE S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS O GASCARIBE S.A. E.S. de las primeras 500 conexiones lo que corresponde al 50% de las conexiones a intervenir. De la misma manera, tiene el objeto de garantizar el cumplimiento de las normas técnicas, ambientales y de seguridad industrial de la entidad contratante y la legislación vigente. Igualmente, contiene todas las actividades desarrolladas por el Contratista durante el periodo comprendido en el mes de diciembre el 2025, enero, febrero, marzo y abril del 2026, las cuales se están ejecutando de acuerdo con los lineamientos propuestas en el alcance, en las condiciones y términos del concurso público y en forma integral con los enfoques, metodologías, organigramas, recursos humanos necesarios para el buen desarrollo del contrato.

2.-DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 ANTECEDENTES

El DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, a través de la Secretaria de Minas y Energía, justificó la necesidad de celebrar un Convenio de Cooperación cuyo objeto es Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para aumentar la cobertura del servicio de gas natural domiciliario en viviendas de estratos 1 y 2 de Municipios del Departamento de Bolívar.

En atención a lo anterior, la Secretaría Jurídica, en ejercicio de la delegación contractual otorgada mediante el Decreto No. 052 de 2024, adelantó el proceso de contratación, el cual culminó con la suscripción del Convenio de Cooperación No 137 de 2025 con la Empresa Gases del Caribe S.A. empresa de servicios públicos o Gascaribe S.A. E.S.P, por un valor de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS M/L ($1.698.561.930).

LA GOBERNACION DE BOLIVAR y ECOPETROL SAS suscribieron el CONVENIO ESPECÍFICO INTERADMINISTRATIVO No. 3055257 cuyo objeto es COLABORACIÓN ARMÓNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DESTINADA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO PARA LOS ESTRATOS 1 Y 2 EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, MEDIANTE EL APORTE DE RECURSOS y alcance es Ampliación de infraestructura destinada a la prestación del servicio de gas domiciliario para los estratos 1 y 2 de hasta MIL (1.000) viviendas en las cabeceras y corregimientos de los municipios: Arroyohondo, Calamar, Clemencia, San Cristóbal, San Estanislao de Kostka y Soplaviento del departamento de Bolívar.

INFORME DE INTERVENTORÍA

LA GOBERNACION DE BOLIVAR mediante el CONVENIO DE COOPERACION No. 137 de 2025 suscribio con la empresa GASES DEL CARIBE cuyo objeto es : AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA AUMENTAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE GAS NATURAL DOMICILIARIO EN VIVIENDAS DE ESTRATOS 1 Y 2 DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. Cuyo plazo según se establece en la CLÁUSULA 4. PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA DEL CONVENIO : EL plazo de ejecución es hasta 31 de diciembre a partir de la suscripción del acta de inicio, una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993. Este plazo podrá ser prorrogado por acuerdo entre LAS PARTES.

La ejecución de las conexiones debe realizarse conforme con la programación del cronograma del proyecto presentado y lo exigido por ECOPETROL S.A. GASCARIBE se obliga al 31 de diciembre de 2025 a cumplir con el primer avance establecido en el cronograma, esto es, el 10% de la totalidad de las conexiones. La ejecución de los posteriores avances señalados en el cronograma se encontrará sujeta al cronograma que se convenga entre GASCARIBE y la GOBERNACIÓN, o en su defecto, con el cronograma establecido en este convenio".

Mediante MODIFICATORIO No. 1 CONVENIO DE COOPERACION No. 137 DE 2025 SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR Y LA EMPRESA GASES DEL CARIBE S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS O GASCARIBE S.A. E.S.P se acordó mediante la CLÁUSULA PRIMERA- MODIFICAR LA CLAUSULA CUARTA DEL CONVENIO. No.137 de 2025, la cual quedara así:CLÁUSULA 4. PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA DEL CONVENIO: "EL plazo de ejecución es hasta 31 de diciembre de 2026 a partir de la suscripción del acta de inicio, una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993. Este plazo podrá ser prorrogado por acuerdo entre LAS PARTES.

La ejecución de las conexiones debe realizarse conforme con la programación del cronograma del proyecto presentado y lo exigido por ECOPETROL S.A. GASCARIBE se obliga al 31 de diciembre de 2025 a cumplir con el primer avance establecido en el cronograma, esto es, el 10% de la totalidad de las conexiones. La ejecución de los posteriores avances señalados en el cronograma se encontrará sujeta al cronograma que se convenga entre GASCARIBE y la GOBERNACIÓN, o en su defecto, con el cronograma establecido en este convenio".

Que mediante COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE PROPUESTA DEL CONTRATO 3019-2026 CELEBRADO CON CPROYECTOS SAS, CON NIT 901271270-2, EN EL MARCO DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA IMC-003-2026 Las partes hemos convenido integral al contrato electrónico 3019-2026, que se encuentra en el SECOP II, este documento el cual contiene las siguientes clausulas: Cuyo objeto se establece en la CLAUSULA PRIMERA -OBJETO: OBJETO: "INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE GAS NATURAL DOMICILIARIO PARA LOS ESTRATOS 1 Y 2 EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR". Y cuyo plazo se establece en LA CLÁUSULA SEXTA- PLAZO DEL CONTRATO: El plazo de ejecución será HASTA EL 31 DE DICIEMBRE de 2026. este plazo se contabilizará a partir de la suscripción del acta de inicio, cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, las partes suscriben el acta de inicio el día 06 de marzo de 2026, estableciéndose el plazo de ejecución hasta el día 31 de diciembre de 2026.

Que mediante OTROSI MODIFICATORIO NO 01, suscrito entre EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR Y Las

partes hemos convenido integrar esta modificación al contrato electrónico 3019-2026, que se encuentra publicado en la plataforma SECOP II, y a la comunicación de aceptación de la oferta las siguientes consideraciones y clausulas.


CLAUSULA PRIMERA – MODIFICACIÓN: Modifíquese la cláusula sexta del contrato 3019-2026 en el sentido de armonizar el plazo de ejecución al establecido en el convenio 137-2025 y respecto del cual se ejecuta el proyecto de inversión que da lugar a la razón de ser del contrato de interventoría celebrado entre el Departamento de Bolívar y CPROYECTOS SAS. En este sentido la cláusula SEXTA DEL CONTRATO 3019 quedara así:

CLAUSULA SEXTA - PLAZO DEL CONTRATO: El plazo de ejecución será HASTA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2026. término que se considera suficiente y ajustado a las necesidades actuales y al cronograma de ejecución.

CLAUSULA SEGUNDA- VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las demás cláusulas establecidas en la Aceptación de oferta del contrato 3019-2026, que no hayan sido objeto de adición, ampliación, modificación o aclaración en el presente documento, continuarán vigentes en los mismos términos y condiciones.

CLÁUSULA TERCERA- DOCUMENTOS INTEGRANTES: Hacen parte integral de esta modificación, las solicitudes, autorizaciones, oficios, certificaciones, especificaciones técnicas, contenidas en actas de modificación, y demás documentos técnicos, administrativos y presupuestales enunciados en la parte considerativa del presente.

2.2.- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

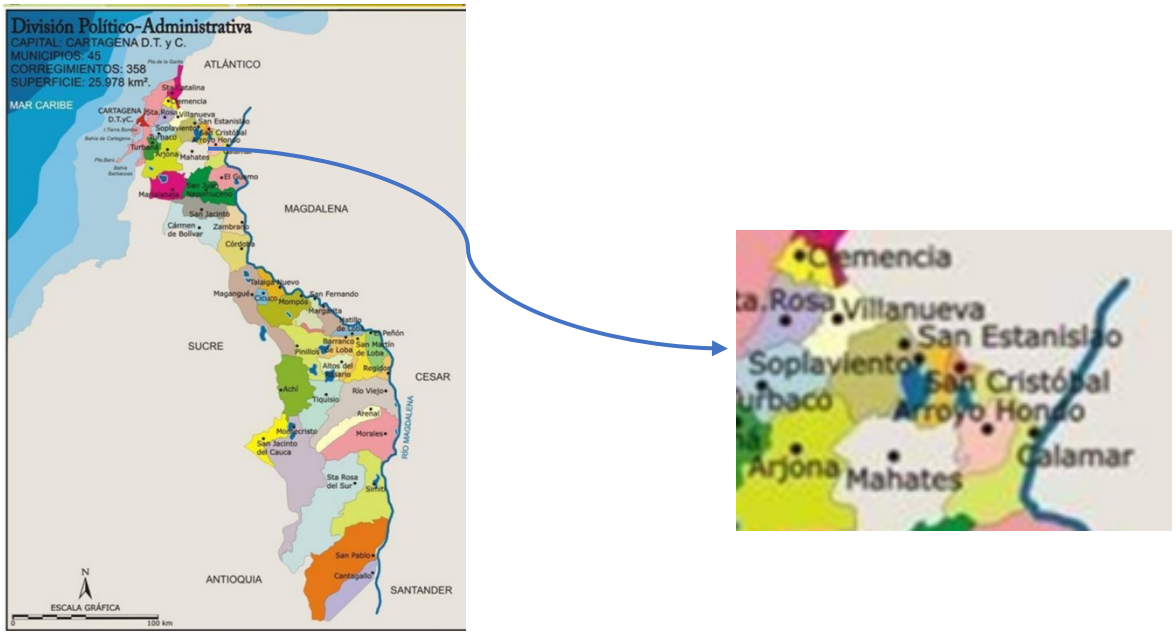

INFORME DE INTERVENTORÍA

2.2.1 UBICACIÓN DE MUNICIPIOS BENEFICIADOS

El Alcance objeto del presente Contrato esta ubicado en el Departamento de Bolívar en 1.000 viviendas de estratos 1 y 2 de los municipios :

- Clemencia, (Las caras)
- Calamar (Barranca Nueva, Barranca Vieja, Yucal, Hatoviejo),
- San Estanislao de Kostka (La Cabecera y Las piedras),
- Soplaviento, (Cabecera)
- Arroyo Hondo (Cabecera, Arroyo Hondo, Machado, Sato)
- San Cristóba (Higueretal, cabecera y Las Cruces)

A continuación se enumeran de manera general el listado Macro de las conexiones por municipio. En anexo adjunto se enumeran las conexiones con dirección, nombre, cc y teléfono de cada uno de los beneficiarios.

MUNICIPIO	ESTRATO 1	ESTRATO 2	TOTAL
Las Caras- Clemencia (*)	18	2	**20**
Calamar (M)	150	24	**174**
.-Barrancavieja (*)	59	-	**59**
.-Barrancanueva(*)	60		**60**
.-Yucal*	40	-	**40**
.-Hato Viejo(*)	29	1	**30**
San Estanislao de Kostka(M)	29	13	**42**
.-Las Piedras(*)	114	4	**118**
Soplaviento (M)	48	27	**75**
Arroyo Hondo (M)	18	12	**30**
.-Pilón(*)	15		**15**
.-Machado (*)	10	-	**10**
.-Sato(*)	30	-	**30**
San Cristobal (M)	272	-	**272**
.-Las Cruces(*)	10	-	**10**
.-Higueretal(*)	15	-	**15**
16	**917**	**83**	**1000**

INFORME DE INTERVENTORÍA

TABLA No 1.- LOCALIZACIONES POTENCIALES

3.-ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO

- Realizar las conexiones del servicio público domiciliario de gas combustible por redes al número de usuarios beneficiados con el subsidio, previa aceptación del mismo por parte del beneficiario final y cumplimiento de los requisitos técnicos y jurídicos contenidos en la regulación vigente en la materia y el contrato de condiciones uniformes de GASCARIBE S.A., salvo que no sea posible por causas no imputables a GASCARIBE S.A. E.S.P.

- Verificar, en el evento que la ejecución del objeto de este convenio de colaboración sea ejecutada a través de un contratista derivado, que éste cumpla con el pago de salarios y prestaciones del personal contratado para la ejecución de las conexiones, sin que estos sean inferiores al salario mínimo legal vigente (en la proporción laborada).

- Notificar al DEPARTAMENTO de cualquier evento que afecte la ejecución normal del objeto del convenio.

- Tener a disposición el personal necesario para la realización de comités, visitas e inspecciones al proyecto, durante el plazo de ejecución del proyecto, los cuales se realizarán con la periodicidad requerida por EL DEPARTAMENTO, previa citación con una antelación mínima de 3 días calendario, durante la vigencia del convenio.

- Informar a los potenciales beneficiarios sobre el saldo no subsidiado de la instalación interna y ofrecer los planes de financiación de acuerdo con las normas vigentes expedidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas CREC y las normas vigentes para servicios públicos domiciliarios si hubiere lugar a ello.

- Consultar con los potenciales usuarios de los estratos 1 y 2 su voluntad de acogerse o no al servicio público de gas domiciliario por redes y en consecuencia al beneficio del subsidio otorgado por EL DEPARTAMENTO, y sólo en caso afirmativo proceder a su instalación o conexión.

- Hacer suscribir al nuevo usuario un documento donde acepte expresamente ser beneficiario del subsidio otorgado por el Departamento de BOLIVAR y que el pago del valor correspondiente al subsidio sea girado directamente a GASCARIBE S.A. para cubrir el porcentaje del costo de la conexión subsidiado.

- Informar al Departamento los casos en que los potenciales usuarios de estratos 1 y/o 2 no acepten recibir el beneficio del aporte; no cumplan con la normatividad técnica establecida para este tipo de conexiones o presente alguna de las inconsistencias definidas en el presente documento o en el contrato de condiciones uniformes de GASCARIBE S.A. a fin de concertar con el Departamento la reasignación dentro de la lista de potenciales beneficiarios.

- Atender de manera oportuna los requerimientos de la comunidad y del departamento, de acuerdo con la normatividad vigente en la materia.

INFORME DE INTERVENTORÍA

- Realizar la socialización del proyecto con los beneficiarios, informándoles la participación de las entidades financiadoras.

- Suscribir de manera conjunta con el Departamento y municipios las actas que contengan el listado de beneficiarios con la identificación de los inmuebles vinculados, donde se acredite por parte del municipio la estratificación de estos.

- Dar respuesta a los derechos de petición formulados y que estén relacionados con el proyecto y remitir dentro del informe mensual un listado detallado de las peticiones presentadas con sus correspondientes respuestas, en formato Excel con los siguientes campos: Nombre — identificación — correo electrónico o dirección a la cual se envió la respuesta — asunto — municipio. Así mismo se debe entregar un archivo digital de las respuestas remitidas.

- Gestionar y entregar al supervisor para su correspondiente archivo toda la documentación relativa a la ejecución del proyecto, incluidos los documentos que comprueben el cumplimiento de los requisitos técnicos, legales y permitir el acceso de los mismos a al supervisor durante la vigencia del proyecto.

- Informar oportunamente al supervisor del presente convenio las situaciones especiales que se presenten e impidan la ejecución efectiva de la conexión del suministro de gas combustible domiciliario a potenciales beneficiarios incluidos en los listados entregados por los municipios y cruzados con la base de datos de GASCARIBE S.A. E.S.P., para que de manera expedita se inicie el procedimiento de reasignaciones de subsidios cuando se presente una de las causales previstas en el documento anexo que fije el procedimiento para realizar las reasignaciones.

- Dar Respuestas a autoridades frente a los requerimientos efectuados en el período del desarrollo del proyecto y llevar la relación de correspondencia entre operador y supervisor Departamento, o Ecopetrol.

- Disponer adecuadamente de los residuos sólidos en cumplimiento de las normas ambientales y las demás que rigen la materia.

Hacer entrega de la siguiente documentación en el desarrollo de los trabajos:

- Datos del usuario (No. del contrato, No. del medidor, nombre completo, tipo y No. de documento de identidad, barrio o corregimiento, dirección, estrato socioeconómico, No. de celular o teléfono fijo) soportado con la certificación expedida por parte del profesional competente o el área encargada del municipio donde se localice el usuario beneficiado que valide su nomenclatura y estratificación.
- Contrato de prestación del servicio público.
- Factura que evidencie que se está prestando el servicio al usuario.
- Certificación de conformidad de las instalaciones internas emitido por un organismo inspector acreditado por la ONAC.
- Imagen del medidor instalado donde se evidencie el No. del medidor.
- Imagen donde se evidencie el estado de la conexión y la estufa con la llama encendida.

INFORME DE INTERVENTORÍA

4.-ESTADO DE LOS CONTRATOS DERIVADOS

TIPO DE CONTRATO	CONTRATISTA	No CONTRATO	VALOR CONTRATO	ESTADO DEL CONTRATO
OBRA	GASES DEL CARIBE	CONVENIO DE COOPERACION No 137 de 2025 SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR Y GASES DEL CARIBE.	MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS M/L ($1.698.561.930) incluido IVA	VIGENTE
INTERVENTORIA	CPROYECTOS SAS	3019-2026	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVENCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS.($ 174.899.995) incluido IVA	VIGENTE

IMAGEN 2.- CONTRATOS DERIVADOS DEL CONVENIO

CRONOGRAMA DE ENTREGA GASES DEL CARIBE A INTERVENTORIA						
ENTREGA DE INFORMACION CONTRATISTA (CONEXIONES PERIODO)	abr-26				may-26	
	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6
	1 A 8 DE ABRIL	9 A 15 DE ABRIL	16 A 22 DE ABRIL	23 A 30 DE ABRIL	1 A 7 DE MAYO	8 A 14 DE MAYO
dic-25	130					
ene-26		178				
feb-26		45				
mar-26			244			
abr-26					403	
	130	**223**	**244**	**0**	**403**	**0**

CRONOGRAMA DE REVISION DOCUMENTAL INTERVENTORIA								
ENTREGA DE INFORMACION (CONEXIONES PERIODO)	abr-26				may-26			
	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8
	1 A 8 DE ABRIL	9 A 15 DE ABRIL	16 A 22 DE ABRIL	23 A 30 DE ABRIL	1 A 7 DE MAYO	8 A 14 DE MAYO	15 A 21 DE MAYO	22 A 29 DE MAYO
dic-25		130						
ene-26			178					
feb-26			22	23				
mar-26				244				
abr-26						200	103	100
		130	**200**	**267**		**200**	**103**	**100**

INFORME DE INTERVENTORÍA

CRONOGRAMA DE VISITA Y ENTREGA DE INFORMACION A GOBERNACION INTERVENTORIA 500 CONEXIONES					
VISITA Y ENTREGA DE INFORMACION (CONEXIONES)	**abr-26**				**may-26**
	SEMANA 1	**SEMANA 2**	**SEMANA 3**	**SEMANA 4**	**SEMANA 5**
	1 A 8 DE ABRIL	9 A 15 DE ABRIL	16 A 22 DE ABRIL	23 A 30 DE ABRIL	1 A 8 DE MAYO DEL
			152	178	170
			152	**178**	**170**

IMAGEN 3- LINEA DE TIEMPO CONTRATOS DERIVADOS

5.-CONTRATO DE COLABORACION

5.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO :

Entre el DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, representado legalmente por el Doctor YAMIL HERNANDO ARANA PADAUI, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.052.970.218 expedida en Magangué - Bolívar, en su calidad de Gobernador del DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, elegido por voto popular, posesionado mediante el Acta No. 2427 de 01 de enero de 2024, ante la Asamblea Departamental de Bolívar; quien en ejercicio de sus funciones y facultades constitucionales, legales y reglamentarias, delegó en el Secretario Jurídico, Código 020, Grado 04 de la Gobernación del DEPA RTAMENTO DE BOLÍVAR, mediante Decreto No. 052 de 25 de enero de 2024, las facultades para suscribir el presente convenio, el Doctor RAFAEL ENRIQUE MONTES COSTA, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 73.007.790 expedida en Cartagena – Bolívar, nombrado en este cargo mediante Decreto No. 001 de 02 de enero de 2024 y Acta de Posesión de 03 de enero de 2024, quien en adelante se denominará EL DEPARTAMENTO; por una parte, y por la otra ALBERTO ACOSTA MANZUR, mayor de edad, identificado(a) con cédula de ciudadanía 72.042.585de Malambo, Representante Legal con facultades legales para contratar, en representación de la empresa GASES DEL CARIBE S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS O GASCARIBE S.A. E.S.P. persona jurídica de derecho privado, identificada con el NIT No. 890.101.691-2, constituida mediante escritura pública No. 3.006 del 19 de Noviembre de 1966 y registrada bajo matricula No.4.418 ante la Cámara de Comercio de Barranquilla, según consta en Certificado de Existencia y Representación Legal, quien para todos los efectos legales del presente documento se denominará GASCARIBE S.A. E.S.P. , hemos acordado celebrar el presente CONVENIO cuyo objeto es : AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA AUMENTAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE GAS NATURAL DOMICILIARIO EN VIVIENDAS DE ESTRATOS 1 Y 2 DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

NÚMERO DEL CONTRATO DE OBRA	137 DE 2025
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
CONTRATISTA	GASCARIBE S.A EMPRESA DE SERVICION PUBLICOS O GASCARIBE S.A. E.S.P

INFORME DE INTERVENTORÍA

OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA AUMENTAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE GAS NATURAL DOMICILIARIO EN VIVIENDAS DE ESTRATOS 1 Y 2 DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.
ACTA DE INICIO CONTRATO	4 DE DICIEMBRE DEL 2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
MODIFICATORIO No 1 (MODIFICACION PLAZO)	HASTA 31 DE DICIEMBRE DEL 2026
MODIFICATORIO No 2 (MODIFICACION PLAZO)	HASTA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2026
VALOR DEL ONTRATO DE OBRA	MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS M/L ($1.698.651.930)
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP) DEL CONTRATO DE OBRA	449 de 2025
FORMA DE PAGO	

ENTREGABLE	Valor (COP)	%	MES
Primer desembolso: Corresponde al 10% del aporte de Ecopetrol y la Gobernación para las obras del proyecto, contra un avance acumulado de ejecución del contrato de obra igual o superior al 10% y el avance de interventoría del 17% , de los usuarios conectados contra entrega de informe del ejecutor del convenio y avalado con informe anexo de interventoria. Informes presentados por el contratista e interventor	$ 169.856.193	10%	4
Segundo desembolso: Corresponde al 20% del aporte de Ecopetrol y la Gobernación para las obras del proyecto, contra un avance acumulado de ejecución del contrato de obra igual o superior al 30% y el avance de interventoría del 33% , de los usuarios conectados contra entrega de informe del ejecutor del convenio y avalado con informe anexo de interventoria. Informes presentados por el contratista e interventor	$ 339.712.386	20%	5
Tercer desembolso: Corresponde al 20% del aporte de Ecopetrol y la Gobernación para las obras del proyecto, contra un avance acumulado de ejecución del contrato de obra igual o superior al 50% y el avance de interventoría del 50% , de los usuarios conectados contra entrega de informe del ejecutor del convenio y avalado con informe anexo de interventoria. Informes presentados por el contratista e interventor	$ 339.712.386	20%	6
Cuarto desembolso: Corresponde al 25% del aporte de Ecopetrol y la Gobernación para las obras del proyecto, contra un avance acumulado de ejecución del contrato de obra igual o superior al 75% y el avance de interventoría del 75% , de los usuarios conectados contra entrega de informe del ejecutor del convenio y avalado con informe anexo de interventoria. Informes presentados por el contratista e interventor	$ 424.640.483	25%	7
Quinto desembolso: Corresponde al 25% del aporte de Ecopetrol y la Gobernación para las obras del proyecto, contra un avance acumulado de ejecución del contrato de obra igual o superior al 100% y el avance de interventoría del 100% , de los usuarios conectados contra entrega de informe del ejecutor del convenio y avalado con informe anexo de interventoria. Informes presentados por el contratista e interventor	$ 424.640.483	25%	8
TOTAL	**$ 1.698.561.930**	**100%**	

TABLA 2.- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA NO 137 DE 2025

5.2.-POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA NO 137 DE 2025

El CONTRATISTA deberá constituir, a favor del DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR y de ECOPETROL, una garantía única, bajo cualquiera de las formas permitidas por el 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, con los siguientes amparos, cuantías y vigencias: Atendiendo al tipo contractual, se define como garantía del contrato destinada a amparar los perjuicios de naturaleza contractual o extracontractual derivados del incumplimiento del contrato así:

a) Cumplimiento, por un monto igual al 10% del valor del monto total de subsidios a otorgar, y una

vigencia igual al plazo del contrato. b) Pago de salarios y prestaciones sociales, por un monto igual al 5% del valor del monto total de subsidios a otorgar, y una vigencia igual al plazo del contrato y tres (3) años más. C) Seguro de Responsabilidad Civil extracontractual: por un monto de 400 SMMLV, y una vigencia igual al plazo del contrato.

					FIRMA CONTRATO		MODIFICATORIO No 1	
GARANTIAS	MONTO	ASEGURADORA	POLIZA No	VALOR	VIGENCIA		VIGENCIA	
					DESDE	HASTA	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES								
1.- Cumplimiento	10%	SEGUROS ALFA	CUM000556501000	$169.856.193	21/11/2025		31/12/2025	30/06/2027
2.-Prestaciones Sociales	5%			$ 84.928.097	21/11/2025		31/12/2025	30/06/2030

TABLA NO 3 POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NO137 DEL 2025

					FIRMA CONTRATO		MODIFICATORIO No 1	
GARANTIAS	MONTO	ASEGURADORA	POLIZA No	VALOR	VIGENCIA		VIGENCIA	
					DESDE	HASTA	DESDE	HASTA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL								
Predios Labores y Operaciones	400 SMMLV	SEGUROS ALFA	RES000289301	$ 569.400.000	21/11/2025	31/12/2025	31/12/2025	30/06/2027
Responsabilidad Civil Patronal				$ 569.400.000				
Contratistas y Subcontratistas				$ 569.400.000				
Vehiculos Propios				$ 569.400.000				
Vehiculos No Propios				$ 569.400.000				
Gastos Medicos				$ 569.400.000				
Responsabilidad Civil Cruzada				$ 569.400.000				

TABLA NO 4 POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NO137 DEL 2025

5.3 MODIFICACIONES REALIZADAS AL CONTRATO DE OBRA

MODIFICATORIO No. 1 CONVENIO DE COOPERACION No. 137 DE 2025 SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR Y LA EMPRESA GASES DEL CARIBE S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS O GASCARIBE S.A. E.S.P

Entre los suscritos RAFAEL ENRIQUE MONTES COSTA, identificado con cédula de ciudadanía No. 73.007.790, actuando en calidad de Secretario Jurídico de la Gobernación de Bolívar, nombrado mediante Decreto número 001 de fecha 02 de enero de 2024, delegado para ordenar el gasto y comprometer contractualmente al

INFORME DE INTERVENTORÍA

Departamento de Bolívar, en virtud del artículo primero del Decreto No. 052 de 25 de enero de 2024, quien en adelante y para efectos del presente Convenio Interadministrativo se denomina EL DEPARTAMENTO y por la otra la GASES DEL CARIBE S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS O GASCARIBE S.A. E.S.P. persona jurídica de derecho privado, identificada con el NIT No. 890.101.691-2, constituida mediante escritura pública No. 3.006 del 19 de Noviembre de 1966 y registrada bajo matricula No.4.418 ante la Cámara de Comercio de Barranquilla, según consta en Certificado de Existencia y Representación Legal, quien para todos los efectos legales del presente documento se denominará GASCARIBE S.A. E.S.P. representada legalmente ALBERTO ACOSTA MANZUR, mayor de edad, identificado(a) con cédula de ciudadanía72.042.585 de Malambo, Representante Legal con facultades legales para contratar, debidamente autorizado para suscribir y ejecutar este tipo de contratos, quien bajo la gravedad de juramento manifiesta no hallarse incursa en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad según el Estatuto de Contratos del Estado, hemos acordado celebrar el presente MODIFICATORIO No 1, al Convenio de Cooperación No 137 de 2025:

CONSIDERACIONES:

El Departamento de Bolívar celebró el *Convenio de Cooperación* No 137 de 2025 con la Empresa GASES DEL CARIBE S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS O GASCARIBE S.A. E.S.P , por un valor de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS M/L ($1.698.561.930) cuyo objeto es: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para aumentar la cobertura del servicio de gas natural domiciliario en viviendas de estratos 1 y 2 de Municipios del Departamento de Bolívar.

Que dentro del Programa de Transición Energética del Plan de Desarrollo Departamental 2024-2027 “Bolívar me Enamora”, se establece como meta del cuatrienio, alcanzar 1.890 viviendas conectadas a la red local de gas combustible y contribuir al indicador de aumentar la cobertura de gas natural en el Departamento de Bolívar.

Que la dificultad en la cobertura del servicio en los barrios y centros poblados de los municipios del departamento conlleva a que sus habitantes utilicen gas propano en cilindros y leña para las labores de cocina, afectando la salud de la población y propiciando la tala de bosques, contribuyendo de esta manera a un mayor deterioro del medio ambiente. Esta situación afecta el poder adquisitivo de las familias, sin contar que el uso de combustibles pocos seguros incrementan el índice de accidentalidad por quemaduras y un nivel bajo de calidad de vida; así como también, la incidencia de enfermedades pulmonares.

Que el proyecto **AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE GAS NATURAL DOMICILIARIO PARA LOS ESTRATOS 1 Y 2 EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR**, está articulado con la Estrategia Integral del Territorio de Ecopetrol S.A., dado que permite **GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR Y LA EMPRESA GASES DEL CARIBE S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS O GASCARIBE S.A. E.S.P** atender los servicios públicos en el marco de la línea de inversión Socioambiental “Servicios públicos”, teniendo en cuenta que existe una necesidad de suministro de gas, como una alternativa segura y ambientalmente sostenible para las familias. Adicionalmente, genera un impacto ambiental positivo por la disminución del uso de leña y otros combustibles más contaminantes, contribuyendo con los objetivos del Gobierno Nacional y dando soporte a la transición energética del país, convirtiendo el gas en servicio de primera necesidad. De igual manera, está acorde a los planes de desarrollo de la Nación, el Departamento de Bolívar y los municipios objeto de la intervención.

Que el proyecto **AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE GAS NATURAL DOMICILIARIO PARA LOS**

INFORME DE INTERVENTORÍA

ESTRATOS 1 Y 2 EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, fue priorizado ya que el Departamento de Bolívar es estratégico para los objetivos del grupo empresarial, teniendo en cuenta que en este departamento se encuentra la Refinería de Cartagena**,** que es un gran complejo industrial y de refinación, vital para la industria, la economía de la ciudad, de la región Caribe y del país, la seguridad energética de Colombia y la producción de combustibles limpios.

El Departamento de Bolívar presentó el proyecto **AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE GAS NATURAL DOMICILIARIO PARA LOS ESTRATOS 1 Y 2 EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR** a Ecopetrol S.A y fue viabilizado identificado en el banco de proyectos a través del código BPIN202500000020318 y pretende ser ejecutado mediante la suscripción del convenio interadministrativo mencionado en acápite anterior (Departamento de Bolívar y ECOPETROL).

El objetivo fundamental del proyecto se orienta a garantizar la ampliación de la infraestructura destinada a la prestación del servicios de gas domiciliario de los estratos 1 y 2 de hasta MIL (1.000) viviendas en las cabeceras y corregimientos de los municipios: Arroyohondo, Calamar, Clemencia, San Cristóbal, San Estanislao de Kostka y Soplaviento del departamento de Bolívar, así:

DPTO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	POTENCIALES BENEFICIARIOS
			TOTAL
BOLIVAR	Clemencia	Las Caras	20
	Calamar	Cabecera	363
		Barranca vieja	
		Barranca nueva	
		Yucal	
		Hato Viejo	
	San Estanislao de Kostka	Cabecera	160
		Las Piedras	
	Soplaviento	Cabecera	75
	Arroyo Hondo	Cabecera	85
		Pión	
		Machado	
		Sato	
	San Cristóbal	Cabecera	297
		Las Cruces	
		Higueretal	
TOTAL	6	16	1000

Para el desarrollo del mencionado proyecto 202500000020318, conforme a la información suministrada por la Secretaría de Minas, se celebró entre la Gobernación de Bolívar y ECOPETROL, el Convenio Específico Interadministrativo No.3055257, cuyo objeto es la Colaboración Armónica para Construcción de Infraestructura destinada a la prestación del servicio de gas domiciliario para los estratos 1 y 2 en los municipios del Departamento de Bolívar, mediante el aporte de recursos, por **GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR Y LA EMPRESA GASES DEL CARIBE S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS O GASCARIBE S.A. E.S.P** valor de $1.878.549.555,00, convenio marco general, amparado bajo los Certificados de Disponibilidad Presupuestas N° 449 y 1165-2025 y cuya vigencia quedo establecida en la Clausula Cuarta del mencionado convenio por un término de diecisiete (17) meses que comprende el plazo para la ejecución y el plazo para el cierre y balance final.

El plazo para la ejecución será de once (11) meses y empieza con la suscripción del acta de inicio y el plazo para el cierre y balance final será de seis (6) meses y empieza una vez finalice la ejecución.

Para materializar el cumplimento de las obligaciones derivadas del Convenio Específico y con cargo a los recursos de este, fue suscrito el Convenio de Cooperación No.137 de 2025, entre la Gobernación de Bolívar y la Sociedad Gases del Caribe S.A. E.S.P. cuyo objeto es : AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA AUMENTAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE GAS NATURAL DOMICILIARIO EN VIVIENDAS

INFORME DE INTERVENTORÍA

DE ESTRATOS 1 Y 2 DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, por valor de $ 1.698.561.930,00, amparado en los CDP 449 y 1165-2025 y en los RP 10066 y 10067-2025 y cuyo plazo y vigencia quedo establecido en la Clausula cuarta hasta el 31 de diciembre de 2025 a partir de la suscripción del acta de inicio, una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993.

La ejecución del Convenio de Cooperación No.137 de 2025 ha avanzado en bajo porcentaje, por lo que se hace necesario adicionar el plazo de ejecución del convenio para la vigencia 2026, ya que el objetivo es garantizar una obra de calidad.

Considerando que la ampliación del plazo de ejecución del Convenio de Cooperación No. 137 de 2025, sin aumentar el valor, genera afectación de presupuesto de la vigencia fiscal 2026, se solicitó ante la Honorable Asamblea Departamental la autorización para que el Gobernador amplie el plazo del convenio en ejecución sin aumentar su valor y sustituya parcialmente las apropiaciones presupuestales que respaldan dichos compromisos , en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 2.8.1.7.1.1. del Decreto 1068 de 2015.

Que mediante ordenanza No 409 de 2025 se autorizó al Gobernador del Departamento de Bolívar, para comprometer vigencias futuras de recepción de bienes y servicios en vigencias que superen el 31 de diciembre de 2025 para el desarrollo de los contratos y convenios.

Que, la Secretaría de Minas y Energía efectuó estudio de conveniencia, mediante el cual se justificó la procedencia de la modificación, indicando que "*Teniendo en cuenta, las apreciaciones realizadas con anterioridad, resulta viable y necesario efectuar la modificación mencionad* **MODIFICATORIO No. 1 CONVENIO DE COOPERACION No. 137 DE 2025 SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR Y LA EMPRESA GASES DEL CARIBE S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS O GASCARIBE S.A. E.S.P**

Que, por lo anteriormente expuesto, las partes en ejercicio de la autonomía de la voluntad, celebran el presente Modificatorio No. del Convenio de Cooperación No 137 de 2025 con el siguiente:

CLAUSULADO:

CLÁUSULA PRIMERA- MODIFICAR LA CLAUSULA CUARTA DEL CONVENIO. No.137 de 2025, la cual quedara así:

CLÁUSULA 4. PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA DEL CONVENIO

"EL plazo de ejecución es hasta 31 de diciembre de 2026 a partir de la suscripción del acta de inicio, una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993. Este plazo podrá ser prorrogado por acuerdo entre LAS PARTES.

PARÁGRAFO: La ejecución de las conexiones debe realizarse conforme con la programación del cronograma del proyecto presentado y lo exigido por ECOPETROL S.A. GASCARIBE se obliga al 31 de diciembre de 2025 a cumplir con el primer avance establecido en el cronograma, esto es, el 10% de la totalidad de las conexiones. La ejecución de los posteriores avances señalados en el cronograma se encontrará sujeta al cronograma que se convenga entre GASCARIBE y la GOBERNACIÓN, o en su defecto, con el cronograma establecido en este convenio".

INFORME DE INTERVENTORÍA

CLAUSULA SEGUNDA: **VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES**. En lo demás continúan vigentes, en sus partes, las cláusulas y estipulaciones del Convenio.

CLÁUSULA TERCERA. GARANTÍA ÚNICA. El Contratista deberá ampliar las vigencias de la garantía única constituida para avalar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio, de conformidad con la presente adición y modificación, de acuerdo con las coberturas y vigencias establecidas en la Cláusula décima del mismo.

CLÁUSULA CUARTA. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente documento se perfecciona con la firma de las partes y la aprobación de la garantía.

SE FIRMA POR LAS PARTES EN LA PLATAFORMA SECOP II.

MODIFICATORIO No 2. CONVENIO DE COOPERACION No. 137 DE 2025 SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR Y LA EMPRESA GASES DEL CARIBE S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS O GASCARIBE S.A. E.S.P

Entre los suscritos **RAFAEL ENRIQUE MONTES COSTA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 73.007.790, actuando en calidad de Secretario Jurídico de la Gobernación de Bolívar, nombrado mediante Decreto número 001 de fecha 02 de enero de 2024, delegado para ordenar el gasto y comprometer contractualmente al Departamento de Bolívar, en virtud del artículo primero del Decreto No. 052 de 25 de enero de 2024, quien en adelante y para efectos del presente Convenio Interadministrativo se denomina **EL DEPARTAMENTO** y por la otra la **GASES DEL CARIBE S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS O GASCARIBE S.A. E.S.P.** persona jurídica de derecho privado, identificada con el NIT No. 890.101.691-2, constituida mediante escritura pública No. 3.006 del 19 de Noviembre de 1966 y registrada bajo matricula No.4.418 ante la Cámara de Comercio de Barranquilla, según consta en Certificado de Existencia y Representación Legal, quien para todos los efectos legales del presente documento se denominará GASCARIBE S.A. E.S.P. representada legalmente **ALBERTO ACOSTA MANZUR,** mayor de edad, identificado(a) con cédula de ciudadanía **72.042.585** de Malambo, Representante Legal con facultades legales para contratar, debidamente autorizado para suscribir y ejecutar este tipo de contratos, quien bajo la gravedad de juramento manifiesta no hallarse incursa en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad según el Estatuto de Contratos del Estado, hemos acordado celebrar el presente MODIFICATORIO No 2. , al Convenio de Cooperación No 137 de 2025, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

El Departamento de Bolívar para el desarrollo del proyecto 2024002130103, celebro con ECOPETROL, el Convenio Específico Interadministrativo No.3055257, cuyo objeto es la Colaboración Armónica para Construcción de Infraestructura destinada a la prestación del servicio de gas domiciliario para los estratos 1 y 2 en los municipios del Departamento de Bolívar, mediante el aporte de recursos, por valor de $1.878.549.555,00, convenio marco general, amparado bajo los CDP 449 y 1165-2025 y cuya vigencia quedo establecida en la Clausula Cuarta del mencionado convenio por un término de diecisiete (17) meses que comprende el plazo para la ejecución y el plazo para el cierre y balance final.

Para materializar el cumplimento de las obligaciones derivadas del Convenio Específico y con cargo a los recursos de este, fue suscrito el Convenio de Cooperación No.137 de 2025, entre la Gobernación de Bolívar y

INFORME DE INTERVENTORÍA

la Sociedad Gases del Caribe S.A. E.S.P. cuyo objeto es : Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para aumentar la cobertura del servicio de gas natural domiciliario en viviendas de estratos 1 y 2 de municipios del Departamento de Bolívar, por valor de $ 1.698.561.930,00, amparado en los CDP 449 y 1165-2025 y en los RP 10066 y 10067-2025 y cuyo plazo y vigencia quedo establecido en la Clausula cuarta hasta el 31 de diciembre de 2025 a partir de la suscripción del acta de inicio, una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993.

Ahora bien, a través de Modificatorio No. 1 al Convenio de Cooperación No.137 de 2025, las partes consideraron necesario prorrogar el plazo de ejecución del convenio hasta 31 de diciembre 2026,

MODIFICATORIO No 2. CONVENIO DE COOPERACION No. 137 DE 2025 SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR Y LA EMPRESA GASES DEL CARIBE S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS O GASCARIBE S.A. E.S.P

contando con la respetiva autorización mediante ordenanza No 409 de 2025 para comprometer vigencias futuras de recepción de bienes y servicios en vigencias que superen el 31 de diciembre de 2025.

No obstante, en una revisión posterior se evidenció que el plazo de ejecución previsto superaría el término de duración del Convenio Específico Interadministrativo No. 3055257 suscrito con ECOPETROL, del cual se deriva el convenio de cooperación referenciado, lo que implica la necesidad de ajustar dicho plazo, en la medida en que la ejecución del convenio derivado debe enmarcarse en la vigencia del instrumento principal, del cual depende para su ejecución.

En consecuencia, se hace necesario modificar el plazo de ejecución del convenio de cooperación No.137 de 2025, con el fin de armonizarlo con la vigencia del convenio Específico Interadministrativo No. 3055257, garantizando coherencia jurídica y observancia de los principios que rigen la función administrativa y la contratación estatal.

Adicionalmente, se evidenció que en la cláusula sexta del Convenio de Cooperación No. 137 de 2025 existe un error involuntario en la identificación del número del convenio específico suscrito con ECOPETROL, el cual sirve de fundamento al presente instrumento. Esta imprecisión hace necesario su ajuste, con el fin de asegurar la correcta identificación del convenio de referencia y garantizar la adecuada trazabilidad y seguimiento del instrumento contractual.

Que, por lo anteriormente expuesto, las partes en ejercicio de la autonomía de la voluntad, celebran el presente Modificatorio No 2 del Convenio de Cooperación No 137 de 2025 con el siguiente:
CLAUSULADO:

CLÁUSULA PRIMERA- MODIFICAR LA CLAUSULA CUARTA DEL CONVENIO. No.137 de 2025, la cual quedara así:

CLÁUSULA 4. PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA DEL CONVENIO. EL plazo de ejecución es hasta 14 de septiembre de 2026 a partir de la suscripción del acta de inicio, una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993. Este plazo podrá ser prorrogado por acuerdo entre LAS PARTES.

PARÁGRAFO: La ejecución de las conexiones debe realizarse conforme con la programación del cronograma del proyecto presentado y lo exigido por ECOPETROL S.A. GASCARIBE se obliga al 31 de diciembre de 2025 a cumplir con el primer avance establecido en el cronograma, esto es, el 10% de la totalidad de las conexiones. La ejecución de los posteriores avances señalados en el cronograma se encontrará sujeta al cronograma que se convenga entre GASCARIBE y la GOBERNACIÓN, o en su defecto, con el cronograma establecido en este convenio.

CLAUSULA SEGUNDA: **MODIFICAR LA CLAUSULA SEXTA DEL CONVENIO. No.137 de 2025**, la cual quedara así:

CLÁUSULA 6. APROPIACION PRESUPUESTAL. Para respaldar las obligaciones contraídas en este Convenio, la Entidad Estatal cuenta con la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de disponibilidad presupuestal No 449 de 2025, expedido por la Dirección de Presupuesto del Departamento, para llevar a cabo el objeto de la presente contratación.

MODIFICATORIO No 2. CONVENIO DE COOPERACION No. 137 DE 2025 SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR Y LA EMPRESA GASES DEL CARIBE S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS O GASCARIBE S.A. E.S.P

Así mismo, el DEPARTAMENTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1165 de 2025 por valor de Novecientos treinta millones ciento cincuenta y cinco mil novecientos treinta mil pesos correspondiente a recursos aportados por ECOPETROL mediante Convenio Específico Interadministrativo número 3055257 suscrito el 10 de octubre de 2025.

CLAUSULA TERCERA: **VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES**. En lo demás continúan vigentes, en sus partes, las cláusulas y estipulaciones del Convenio.

CLÁUSULA CUARTA. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente documento se perfecciona con la firma de las partes y la aprobación de la garantía.

SE FIRMA POR LAS PARTES EN LA PLATAFORMA SECOP II.

ACTA DE INICIO CONTRATO	4 DE DICIEMBRE DEL 2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
MODIFICATORIO No 1 (MODIFICACION PLAZO)	HASTA 31 DE DICIEMBRE DEL 2026
MODIFICATORIO No 2 (MODIFICACION PLAZO)	HASTA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

TABLA N 5.- MODIFICACIONES REALIZADAS EN EL CONTRATO DE OBRA

INFORME DE INTERVENTORÍA

5.4 BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Para los efectos legales y fiscales, el valor total del convenio, corresponde a la suma de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS M/L ($1.698.561.930) incluido IVA y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación, correspondiente a la entrega de mil (1.000) subsidios de conformidad con el proyecto aprobado.

APORTES	
APORTANTE	**VALOR**
ECOPETROL	$ 930,155,930.00
GOBERNACION DE BOLIVAR	$ 768,406,000.00
	$ 1,698,561,930.00

Tabla No 6.- Balance de aportantes

Para respaldar las obligaciones contraídas en este Convenio, la Entidad Estatal cuenta con la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de disponibilidad presupuestal No 449 de 2025, expedido por la Dirección de Presupuesto del Departamento, para llevar a cabo el objeto de la presente contratación.

Así mismo, el DEPARTAMENTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1165 de 2025 por valor de Novecientos treinta millones ciento cincuenta y cinco mil novecientos treinta mil pesos correspondiente a recursos aportados por ECOPETROL mediante Convenio Específico Interadministrativo número 3055304 suscrito el 10 de octubre de 2025.

FORMA DE PAGO		
DESEMBOLSO	**PORCENTAJE**	**VALOR**
DESEMBOLSO No 1	10%	$ 169,856,193.00
DESEMBOLSO No 2	20%	$ 339,712,386.00
DESEMBOLSO No 3	20%	$ 339,712,386.00
DESEMBOLSO No 4	25%	$ 424,640,482.50
DESEMBOLSO No 5	25%	$ 424,640,482.50
		$ 1,698,561,930.00

Tabla No 8 .- Balance financiero contrato 137 de 2025

5.4.1 DESEMBOLSOS REALIZADOS AL CONTRATO 137 DE 2025

Los valores del contrato de obra serán desembolsados tal como se describe a continuación:

INFORME DE INTERVENTORÍA

ENTREGABLE	Valor (COP)	%	MES
Primer desembolso: Corresponde al 10% del aporte de Ecopetrol y la Gobernación para las obras del proyecto, contra un avance acumulado de ejecución del contrato de obra igual o superior al 10% y el avance de interventoría del 17% , de los usuarios conectados contra entrega de informe del ejecutor del convenio y avalado con informe anexo de interventoria. Informes presentados por el contratista e interventor	$ 169.856.193	10%	4
Segundo desembolso: Corresponde al 20% del aporte de Ecopetrol y la Gobernación para las obras del proyecto, contra un avance acumulado de ejecución del contrato de obra igual o superior al 30% y el avance de interventoría del 33% , de los usuarios conectados contra entrega de informe del ejecutor del convenio y avalado con informe anexo de interventoria. Informes presentados por el contratista e interventor	$ 339.712.386	20%	5
Tercer desembolso: Corresponde al 20% del aporte de Ecopetrol y la Gobernación para las obras del proyecto, contra un avance acumulado de ejecución del contrato de obra igual o superior al 50% y el avance de interventoría del 50% , de los usuarios conectados contra entrega de informe del ejecutor del convenio y avalado con informe anexo de interventoria. Informes presentados por el contratista e interventor	$ 339.712.386	20%	6
Cuarto desembolso: Corresponde al 25% del aporte de Ecopetrol y la Gobernación para las obras del proyecto, contra un avance acumulado de ejecución del contrato de obra igual o superior al 75% y el avance de interventoría del 75% , de los usuarios conectados contra entrega de informe del ejecutor del convenio y avalado con informe anexo de interventoria. Informes presentados por el contratista e interventor	$ 424.640.483	25%	7
Quinto desembolso: Corresponde al 25% del aporte de Ecopetrol y la Gobernación para las obras del proyecto, contra un avance acumulado de ejecución del contrato de obra igual o superior al 100% y el avance de interventoría del 100% , de los usuarios conectados contra entrega de informe del ejecutor del convenio y avalado con informe anexo de interventoria. Informes presentados por el contratista e interventor	$ 424.640.483	25%	8
TOTAL	**$ 1.698.561.930**	**100%**	

A la fecha no se ha presentado factura alguna y por lo tanto no se han generado desembolsos

5.5 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

En cumplimiento de las actividades y conexiones desarrolladas por el contratista

- La socialización del proyecto con un usuario potencial para el Convenio de Cooperación No. 137 de 2025
- La Planeación de la venta
- Venta
- Construcción e instalación del servicio de gas natural
- Revisión previa y certificación

OBLIGACION	ESTADO
10.2 Presentar un cronograma detallado mes a mes en el que se incluyan el número de conexiones y zonas a intervenir, así como el personal dispuesto para la ejecución de los trabajos en cada uno de los municipios.	Ok
10.3 Realizar las conexiones del servicio público domiciliario de gas combustible por redes al número de usuarios beneficiados con el subsidio, previa aceptación del mismo por parte del beneficiario final y cumplimiento de los requisitos técnicos y jurídicos contenidos en la regulación vigente en la materia y el contrato de condiciones uniformes de GASCARIBE S.A., salvo que no sea posible por causas no imputables a GASCARIBE S.A. E.S.P.	Ok
10.4 Gozar de autonomía técnica, administrativa y contractual, dentro del marco legal vigente aplicable a la empresa de servicios públicos, para la ejecución de las conexiones.	Ok
10.5 Cumplir con las especificaciones técnicas y de calidad de las Normas Técnicas y Legislación vigente aplicable.	Ok

	CPROYECTOS S.A.S.	Código: Versión: Fecha:

INFORME DE INTERVENTORÍA

OBLIGACION	ESTADO
10.6 Ejecutar las acciones asociadas al presente convenio con personal que se encuentre vinculado laboralmente a GASCARIBE S.A. o a los terceros contratados para el efecto, de acuerdo a las exigencias legales y asumir todas las obligaciones resultantes de tal vinculación laboral o comercial. Por tanto, será el único responsable de cubrir oportunamente las afiliaciones y aportes al sistema general de seguridad social (salud, pensión, ARL, ICBF, SENA, Caja de compensación, etc.), para el efecto, se obliga a dar cabal cumplimiento a lo estipulado en las Leyes 100 de 1993 y 789 de 2002. En todo caso Gases del Caribe deberá mantener indemne al DEPARTAMENTO frente a cualquier reclamación de este tipo.	Ok
10.7 Verificar, en el evento que la ejecución del objeto de este convenio de colaboración sea ejecutada a través de un contratista derivado, que éste cumpla con el pago de salarios y prestaciones del personal contratado para la ejecución de las conexiones, sin que estos sean inferiores al salario mínimo legal vigente (en la proporción laborada).	Ok
10.8 Notificar al DEPARTAMENTO de cualquier evento que afecte la ejecución normal del objeto del convenio.	Ok
10.9 Elaborar un informe mensual conjuntamente con el supervisor, donde se informe el avance de los aspectos técnico, administrativo, financiero, ambiental y jurídico, el cual deberán hacer llegar a la entidad dentro de los primeros diez días calendario de cada mes; presentado dentro de los diez (10) primeros días calendario de cada mes vencido, durante la duración del proyecto. El informe deberá acompañarse de los respectivos soportes que den evidencia de la ejecución de cada una de las actividades conforme al documento técnico aprobado en la formulación del proyecto.	OK
10.10 Tener a disposición el personal necesario para la realización de comités, visitas e inspecciones al proyecto, durante el plazo de ejecución del proyecto, los cuales se realizarán con la periodicidad requerida por EL DEPARTAMENTO, previa citación con una antelación mínima de 3 días calendario, durante la vigencia del convenio.	Ok
10.11 Realizar los comités técnicos en conjunto con el supervisor del proyecto (Departamento), el supervisor de Ecopetrol y el supervisor del proyecto.	Ok
10.12 Informar a los potenciales beneficiarios sobre el saldo no subsidiado de la instalación interna y ofrecer los planes de financiación de acuerdo con las normas vigentes expedidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas CREC y las normas vigentes para servicios públicos domiciliarios si hubiere lugar a ello.	Ok
10.13 Consultar con los potenciales usuarios de los estratos 1 y 2 su voluntad de acogerse o no al servicio público de gas domiciliario por redes y en consecuencia al beneficio del subsidio otorgado por EL DEPARTAMENTO, y sólo en caso afirmativo proceder a su instalación o conexión.	Ok
10.14 Hacer suscribir al nuevo usuario un documento donde acepte expresamente ser beneficiario del subsidio otorgado por el Departamento del Bolivar y que el pago del valor correspondiente al subsidio sea girado directamente a GASCARIBE S.A. para cubrir el porcentaje del costo de la conexión subsidiado.	OK
10.15 Informar al Departamento los casos en que los potenciales usuarios de estratos 1 y/o 2 no acepten recibir el beneficio del aporte; no cumplan con la normatividad técnica establecida para este tipo de conexiones o presente alguna de las inconsistencias definidas en el presente documento o en el contrato de condiciones uniformes de GASCARIBE S.A. a fin de concertar con el Departamento la reasignación dentro de la lista de potenciales beneficiarios.	Ok
10.16 Atender de manera oportuna los requerimientos de la comunidad y del Departamento, de acuerdo con la normatividad vigente en la materia.	Ok
10.17 Designar un gerente del proyecto; sin que esto impida la asignación del personal necesario para la ejecución; quien mantendrá contacto permanente con el personal que asigne EL DEPARTAMENTO. El gerente será el responsable general del desarrollo del proyecto verificando y controlando la ejecución de este en los tiempos previstos, así mismo debe realizar la coordinación del personal vinculado al proyecto y verificar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas.	Ok
10.18 Realizar la socialización del proyecto con los beneficiarios, informándoles la participación de las entidades financiadoras.	Ok
10.19 Suscribir de manera conjunta con el Departamento y municipios las actas que contengan el listado de beneficiarios con la identificación de los inmuebles vinculados, donde se acredite por parte del municipio la estratificación de estos.	Ok
10.20 Obtener las licencias o permisos para el manejo y disposición adecuada de los residuos o escombros generados con la ejecución de las conexiones, de la correcta consecución y/o extracción de los materiales en sitios debidamente licenciados por las autoridades competentes, manejo del tráfico y demás permisos que requieran para la correcta ejecución del proyecto descrito- Igualmente, será el responsable del cumplimiento de las normas técnicas aplicables al proyecto. La obtención de tales permisos será requisito indispensable para el desarrollo del proyecto.	OK

INFORME DE INTERVENTORÍA

OBLIGACION	ESTADO
10.21 Dar respuesta a los derechos de petición formulados y que estén relacionados con el proyecto y remitir dentro del informe mensual un listado detallado de las peticiones presentadas con sus correspondientes respuestas, en formato Excel con los siguientes campos: Nombre — identificación — correo electrónico o dirección a la cual se envió la respuesta — asunto — municipio. Así mismo se debe entregar un archivo digital de las respuestas remitidas.	Ok
10.22 Gestionar y entregar al supervisor para su correspondiente archivo toda la documentación relativa a la ejecución del proyecto, incluidos los documentos que comprueben el cumplimiento de los requisitos técnicos, legales y permitir el acceso de los mismos a al supervisor durante la vigencia del proyecto.	Ok
10.23 Informar oportunamente al supervisor del presente convenio las situaciones especiales que se presenten e impidan la ejecución efectiva de la conexión del suministro de gas combustible domiciliario a potenciales beneficiarios incluidos en los listados entregados por los municipios y cruzados con la base de datos de GASCARIBE S.A. E.S.P., para que de manera expedita se inicie el procedimiento de reasignaciones de subsidios cuando se presente una de las causales previstas en el documento anexo que fije el procedimiento para realizar las reasignaciones.	Ok
10.24 Dar Respuestas a autoridades frente a los requerimientos efectuados en el período del desarrollo del proyecto y llevar la relación de correspondencia entre operador y supervisor Departamento, o Ecopetrol.	ok
10.25 Disponer adecuadamente de los residuos sólidos en cumplimiento de las normas ambientales y las demás que rigen la materia.	ok
10.26 GASCARIBE se compromete a constituir un encargo fiduciario con una entidad autorizada por la Superintendencia Financiera, destinado exclusivamente al manejo de los recursos otorgados para ejecución del convenio; cuyo desembolso obedecerá a medida de la presentación y correcta recepción de los recursos tras mutuo acuerdo entre las partes.	ok

Tabla No 10. Cumplimiento de obligaciones contractuales

No 1	NOMBRE_LOCALIDAD	NOMBRE_SUBCATEGORIA	CONTRATO	DIRECCION
1	CALAMAR	ESTRATO 1	67783445	KR 2B CL 42A – 24
2	CALAMAR	ESTRATO 1	67783508	KR 2B CL 43 – 3
3	CALAMAR	ESTRATO 1	67783716	CL 43 KR 2B – 10
4	CALAMAR	ESTRATO 1	67783405	CL 43 KR 2B – 29
5	CALAMAR	ESTRATO 1	67783414	CL 43 KR 2B – 23
6	CALAMAR	ESTRATO 1	67783434	CL 43 KR 2B – 11
7	CALAMAR	ESTRATO 1	67783427	KR 2B CL 42A – 25
8	CALAMAR	ESTRATO 1	67783461	KR 2B CL 42A – 36
9	CALAMAR	ESTRATO 1	67783420	KR 2B CL 42A – 37
10	CALAMAR	ESTRATO 1	67783578	KR 2B CL 43 – 9
11	CALAMAR	ESTRATO 1	67783502	KR 2B CL 43 – 21
12	CALAMAR	ESTRATO 1	67783517	KR 2B CL 43 – 25
13	CALAMAR	ESTRATO 1	67784151	KR 2B CL 43 – 16
14	CALAMAR	ESTRATO 1	67783520	CL 43A KR 2B – 17
15	CALAMAR	ESTRATO 1	67783644	CL 43A KR 2B – 43
16	CALAMAR	ESTRATO 1	67783575	CL 43A KR 2B – 33
17	CALAMAR	ESTRATO 1	67783614	CL 43 KR 2B – 60
18	CALAMAR	ESTRATO 1	67783572	CL 43A KR 2B – 37
19	CALAMAR	ESTRATO 1	67783526	CL 43A KR 2B – 40
20	CALAMAR	ESTRATO 1	67783497	KR 2B CL 43 – 29
21	CALAMAR	ESTRATO 1	67783628	CL 43 KR 2B – 20
22	CALAMAR	ESTRATO 1	67783455	CL 43A KR 2B – 46
23	CALAMAR	ESTRATO 1	67783556	KR 2B CL 42A – 12
24	CALAMAR	ESTRATO 1	67783505	KR 2A CL 43 – 3
25	CALAMAR	ESTRATO 1	67783559	KR 2B CL 42A – 6
26	CALAMAR	ESTRATO 1	67783680	KR 2A CL 43 – 4
27	CALAMAR	ESTRATO 1	67784565	KR 2 CL 43 - 21 APTO 1
28	CALAMAR	ESTRATO 1	67784148	KR 2A CL 43 – 27
29	CALAMAR	ESTRATO 1	67784166	KR 2A CL 43 – 22

INFORME DE INTERVENTORÍA

No 1	NOMBRE_LOCALIDAD	NOMBRE_SUBCATEGORIA	CONTRATO	DIRECCION
30	CALAMAR	ESTRATO 1	67784154	KR 2A CL 43 – 16
31	CALAMAR	ESTRATO 1	67784187	KR 2A CL 43 – 10
32	CALAMAR	ESTRATO 1	67784202	KR 2A CL 43 – 15
33	CALAMAR	ESTRATO 1	67784184	KR 2 CL 43 – 21
34	CALAMAR	ESTRATO 1	67784328	KR 2 CL 43 – 22
35	CALAMAR	ESTRATO 1	67784169	KR 2 CL 43 – 16
36	CALAMAR	ESTRATO 1	67784172	KR 2 CL 43 – 10
37	CALAMAR	ESTRATO 1	67784562	KR 2 CL 43 - 9 APTO 1
38	CALAMAR	ESTRATO 1	67784193	KR 2 CL 43 – 15
39	CALAMAR	ESTRATO 1	67783700	KR 2 CL 42 – 53
40	CALAMAR	ESTRATO 1	67784178	KR 2A CL 43 – 9
41	CALAMAR	ESTRATO 1	67783399	KR 5 CL 31 – 76
42	CALAMAR	ESTRATO 1	67784313	CL 22 KR 4 - 33 APTO 1
43	CALAMAR	ESTRATO 1	67784310	KR 5 CL 33 – 54
44	CALAMAR	ESTRATO 1	67784163	CL 22A TV 3 – 166
45	CALAMAR	ESTRATO 1	67783514	CL 37 KR 2 – 23
46	CALAMAR	ESTRATO 1	67784331	CL 43 KR 2B – 17
47	CALAMAR	ESTRATO 1	67783451	CL 31 TV 3 – 26
48	CALAMAR	ESTRATO 2	67784181	KR 4 CL 33 – 27
49	CALAMAR	ESTRATO 2	67784553	KR 4 CL 33 - 27 APTO 2
50	CALAMAR	ESTRATO 1	67784340	CL 43A KR 2B – 22
51	CALAMAR	ESTRATO 2	67784559	KR 4 CL 33 – 15
52	CALAMAR	ESTRATO 1	67783664	CL 42A KR 1 – 15
53	CALAMAR	ESTRATO 1	67784316	KR 1 CL 43 – 22
54	CALAMAR	ESTRATO 2	67784175	KR 4 CL 34 – 99
55	CALAMAR	ESTRATO 2	67784920	KR 4 CL 34 - 71 APTO 3
56	BARRANCA VIEJA	ESTRATO 1	67784767	KR 5 CL 23 – 45
57	CALAMAR	ESTRATO 1	67784319	KR 1 CL 43 – 28
58	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67785876	CL 21 KR 15 – 17
59	CALAMAR	ESTRATO 1	67784325	CL 43 KR 2B – 5
60	CALAMAR	ESTRATO 1	67783417	KR 3 CL 43 – 25
61	CALAMAR	ESTRATO 1	67785767	KR 3 CL 43A – 7
62	CALAMAR	ESTRATO 1	67783568	CL 24 TV 3 – 47
63	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786995	KR 16 CL 17 – 4
64	CALAMAR	ESTRATO 1	67784484	CL 35 KR 4 – 20
65	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67785939	CL 20 KR 15 – 12
66	CALAMAR	ESTRATO 2	67784160	KR 3 CL 36 – 35
67	CALAMAR	ESTRATO 1	67786303	CL 43 KR 2B – 30
68	CALAMAR	ESTRATO 1	67784334	CL 43A KR 2B - 11 LT
69	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67785927	CL 20 KR 15 – 5
70	CALAMAR	ESTRATO 1	67783511	KR 7 CL 27 – 74
71	CALAMAR	ESTRATO 1	67784301	KR 6 CL 32 – 33
72	CALAMAR	ESTRATO 1	67784556	KR 6 CL 33 – 12
73	BARRANCA NUEVA	ESTRATO 1	67784490	CL 15 KR 2 – 101
74	BARRANCA NUEVA	ESTRATO 1	67784502	CL 15 KR 2 – 131
75	BARRANCA NUEVA	ESTRATO 1	67784463	CL 15 KR 2 – 208
76	BARRANCA NUEVA	ESTRATO 1	67784466	CL 15 KR 2 – 226
77	CALAMAR	ESTRATO 1	67784478	KR 4 CL 34 - 72 APTO INT
78	CALAMAR	ESTRATO 1	67784537	CL 32 KR 3 – 26
79	CALAMAR	ESTRATO 1	67783562	TV 3 CL 29 – 29
80	CALAMAR	ESTRATO 1	67783534	KR 4 CL 26 – 54
81	CALAMAR	ESTRATO 1	67783431	CL 31 KR 6 – 57
82	CALAMAR	ESTRATO 1	67784544	KR 7 CL 27 – 28
83	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786108	CL 20 KR 15 – 18
84	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67785900	CL 20 KR 15 – 11
85	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67785897	CL 21 KR 15 – 42

INFORME DE INTERVENTORÍA

No 1	NOMBRE_LOCALIDAD	NOMBRE_SUBCATEGORIA	CONTRATO	DIRECCION
86	BARRANCA VIEJA	ESTRATO 1	67784911	KR 8 CL 17 – 75
87	YUCAL	ESTRATO 1	67785403	KR 6 CL 7 - 27 APTO 2
88	YUCAL	ESTRATO 1	67785409	CL 7 KR 6 - 64 APTO 2
89	BARRANCA VIEJA	ESTRATO 1	67784603	KR 8 CL 17 – 81
90	BARRANCA VIEJA	ESTRATO 1	67784761	KR 8 CL 22 – 5
91	YUCAL	ESTRATO 1	67785365	CL 7 KR 6 – 64
92	BARRANCA NUEVA	ESTRATO 1	67784788	CL 13 KR 5A – 3
93	YUCAL	ESTRATO 1	67784898	CL 9 KR 2 – 4
94	CALAMAR	ESTRATO 1	67784481	CL 11 TV 2 – 3
95	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786917	KR 16 CL 16 - 82 CASA 1
96	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67785948	CL 20 KR 15 – 29
97	YUCAL	ESTRATO 1	67785374	KR 7 CL 8 – 106
98	BARRANCA NUEVA	ESTRATO 1	67784630	CL 15 KR 7 – 13
99	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67787019	KR 16 CL 17 – 40
100	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67787031	KR 16 CL 17 – 5
101	SOPLAVIENTO	ESTRATO 2	67791912	KR 12 CL 6 – 24
102	BARRANCA NUEVA	ESTRATO 1	67784487	KR 10 CL 14 – 116
103	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67792955	KR 16 CL 17 – 39
104	CALAMAR	ESTRATO 1	67784654	KR 6 CL 33 – 88
105	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802293	KR 13A CL 18 – 23
106	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802099	KR 13B CL 17C – 17
107	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802242	KR 13A CL 18 – 11
108	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802081	KR 13B CL 17C – 23
109	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802078	KR 13B CL 17C – 11
110	BARRANCA NUEVA	ESTRATO 1	67784472	CL 19 KR 11 – 18
111	BARRANCA NUEVA	ESTRATO 1	67784469	CL 19 KR 9 – 39
112	BARRANCA NUEVA	ESTRATO 1	67784349	KR 11 CL 22 – 34
113	CALAMAR	ESTRATO 2	67783565	KR 3 CL 36 – 111
114	BARRANCA NUEVA	ESTRATO 1	67784307	KR 9 CL 23 – 103
115	CALAMAR	ESTRATO 1	67784337	KR 5 CL 32 – 81
116	CALAMAR	ESTRATO 1	67784508	CL 22A TV 3 – 108
117	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786930	KR 16 CL 16 - 71 CASA 18
118	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786971	KR 16 CL 16 - 25 CASA 25
119	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786959	KR 16 CL 16 - 19 CASA 26
120	HATO VIEJO	ESTRATO 1	67784878	KR 9 CL 6 – 241
121	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786923	KR 16 CL 16 - 12 CASA 14
122	HATO VIEJO	ESTRATO 1	67784884	KR 10 CL 9 – 71
123	HATO VIEJO	ESTRATO 1	67784887	KR 9 CL 6 – 22
124	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786977	KR 16 CL 16 - 6 CASA 15
125	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67803392	CL 17B KR 16A – 12
126	HATO VIEJO	ESTRATO 1	67784890	KR 10 CL 9 – 68
127	HATO VIEJO	ESTRATO 1	67785439	KR 10 CL 9 - 83 LT _
128	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786939	KR 16 CL 16 - 18 CASA 13
129	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786991	KR 16 CL 16 - 26 CASA 12
130	HATO VIEJO	ESTRATO 1	67785448	KR 5 CL 5 – 94
131	HATO VIEJO	ESTRATO 1	67785451	KR 5 CL 6 - 40 LT _
132	HATO VIEJO	ESTRATO 1	67785760	KR 7 CL 9 – 87
133	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786936	KR 15 CL 16 - 49 CASA 22
134	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786965	KR 15 CL 16 - 69 CASA 17
135	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786974	KR 15 CL 16 - 65 CASA 18
136	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786983	KR 15 CL 16 - 45 CASA 23
137	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786968	KR 16 CL 16 - 32 CASA 11
138	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802260	KR 13B CL 18 – 17
139	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802297	KR 13B CL 18 – 6
140	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802236	KR 13B CL 18 – 5
141	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67800419	KR 16 CL 16 - 81 CASA 17

INFORME DE INTERVENTORÍA

No 1	NOMBRE_LOCALIDAD	NOMBRE_SUBCATEGORIA	CONTRATO	DIRECCION
142	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67800383	KR 16 CL 16 - 54 CASA 7
143	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67800386	KR 16 CL 16 - 60 CASA 6
144	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67800371	KR 16 CL 16 - 35 CASA 23
145	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802069	KR 14 CL 17C – 18
146	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802075	KR 14 CL 17C – 12
147	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802090	KR 14 CL 17C – 6
148	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67800368	KR 16 CL 16 - 43 CASA 22
149	BARRANCA VIEJA	ESTRATO 1	67784757	KR 8 CL 22 – 29
150	BARRANCA NUEVA	ESTRATO 1	67784651	KR 11 CL 22 - 34 APTO 2
151	BARRANCA NUEVA	ESTRATO 1	67784645	KR 11 CL 22 – 29
152	BARRANCA VIEJA	ESTRATO 1	67784606	KR 7 CL 19 – 39
153	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67785945	KR 16B CL 18 – 18
154	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67785936	KR 16B CL 18 – 23
155	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67785885	CL 21 KR 15 – 12
156	BARRANCA NUEVA	ESTRATO 1	67784627	KR 2 CL 13A – 84
157	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67785915	KR 16B CL 18 – 41
158	BARRANCA NUEVA	ESTRATO 1	67784636	CL 16 KR 2 – 49
159	YUCAL	ESTRATO 1	67785419	CL 12 KR 7 – 100
160	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67787034	KR 15 CL 17 – 39
161	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67787025	KR 15 CL 17 – 51
162	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786111	KR 15 CL 19 – 5
163	BARRANCA VIEJA	ESTRATO 1	67784764	KR 5 CL 24 – 10
164	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786756	KR 15 CL 16 - 78 CASA 3
165	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67791885	CL 20 KR 15 – 17
166	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67791882	CL 15A KR 11 – 9
167	SOPLAVIENTO	ESTRATO 1	67791946	CL 5 KR 23 - 7 APTO 1
168	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802266	KR 13A CL 18 – 17
169	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802408	KR 13A CL 18 – 5
170	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802405	KR 13A CL 18 – 24
171	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802378	KR 13A CL 18 – 12
172	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67803350	CL 17C KR 16B – 12
173	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802218	KR 13B CL 18 – 12
174	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802012	CL 16 KR 14A - 18 CASA 11
175	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802214	KR 16A CL 19 – 18
176	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802212	KR 16A CL 19 – 17
177	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67800392	KR 17 CL 16 - 5 CASA 22
178	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67800128	KR 17 CL 16 - 8 CASA 14
179	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67800416	KR 15 CL 16 - 70 CASA 4
180	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67800410	KR 15 CL 16 - 44 CASA 7
181	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67800398	KR 16 CL 16 - 50 CASA 8
182	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67800389	KR 15 CL 16 - 62 CASA 5
183	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67800365	KR 17 CL 16 - 7 CASA 21
184	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67800362	KR 16 CL 16 - 70 CASA 4
185	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67803343	KR 16A CL 18 – 18
186	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802023	CL 16 KR 14A - 10 CASA 12
187	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802009	CL 16 KR 14A - 9 CASA 15
188	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802096	KR 14 CL 18 – 18
189	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802060	KR 14 CL 18 – 12
190	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802036	KR 16 CL 16 - 7 CASA 28
191	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802048	KR 16 CL 17 – 20
192	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786427	CL 19 KR 15 – 18
193	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786433	CL 19 KR 15 – 11
194	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786597	KR 16A CL 20 – 6
195	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786926	KR 16 CL 16 - 76 CASA 3
196	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786750	KR 15 CL 16 - 86 CASA 2
197	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786956	KR 17 CL 16 - 6 CASA 15

INFORME DE INTERVENTORÍA

No 1	NOMBRE_LOCALIDAD	NOMBRE_SUBCATEGORIA	CONTRATO	DIRECCION
198	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786535	KR 16A CL 20 – 5
199	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786484	CL 19 KR 15 – 17
200	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802054	KR 16 CL 17 – 52
201	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786553	KR 16A CL 20 – 12
202	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786487	CL 19 KR 15 – 35
203	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786565	KR 16A CL 20 – 23
204	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786541	CL 19 KR 15 – 54
205	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786475	KR 16A CL 20 – 29
206	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786953	KR 16 CL 16 - 64 CASA 5
207	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786559	KR 16A CL 20 – 17
208	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786514	CL 19 KR 15 – 47
209	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786571	KR 16B CL 17D – 11
210	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786523	CL 19 KR 15 – 23
211	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786920	KR 16 CL 16 - 47 CASA 21
212	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786568	CL 20 KR 15 – 48
213	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786606	KR 16A CL 20 – 24
214	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786490	KR 16A CL 20 – 35
215	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786591	CL 17D KR 16B – 12
216	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786550	CL 19 KR 15 – 30
217	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786496	KR 16A CL 20 – 41
218	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786547	CL 19 KR 15 – 48
219	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786914	KR 16 CL 16 - 80 CASA 2
220	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786430	CL 19 KR 15 – 12
221	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786532	KR 16A CL 20 – 11
222	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786588	CL 20 KR 15 – 41
223	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786481	KR 16B CL 18 – 59
224	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786556	KR 16B CL 17C – 6
225	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786945	KR 16 CL 16 - 65 CASA 19
226	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786962	KR 15 CL 16 - 15 CASA 28
227	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786594	KR 16B CL 17C – 18
228	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786986	KR 15 CL 16 - 35 CASA 25
229	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786600	KR 16B CL 17C – 12
230	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786580	KR 16B CL 17D – 18
231	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67787037	KR 15 CL 16 - 41 CASA 24
232	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786493	KR 16B CL 18 – 77
233	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786436	KR 16B CL 18 – 65
234	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786980	KR 15 CL 16 - 94 CASA 1
235	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786505	KR 16B CL 18 – 83
236	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786933	KR 15 CL 16 - 61 CASA 19
237	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786989	KR 15 CL 16 - 5 CASA 29
238	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67800206	KR 17 CL 16 - 26 CASA 10
239	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802203	CL 19 KR 15 – 29
240	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67803274	CL 18 KR 16B – 17
241	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802284	KR 13A CL 17C – 23
242	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67800223	KR 17 CL 16 - 32 CASA 8
243	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67803262	KR 16B CL 20 – 18
244	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802511	KR 16B CL 20 – 24
245	BARRANCA VIEJA	ESTRATO 1	67784550	CL 17 KR 3 – 34
246	BARRANCA VIEJA	ESTRATO 1	67784547	CL 13 KR 8 – 42
247	BARRANCA NUEVA	ESTRATO 1	67784460	KR 2 CL 23 – 7
248	BARRANCA NUEVA	ESTRATO 1	67784499	KR 2 CL 13 – 115
249	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786508	CL 20 KR 15 – 42
250	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786544	CL 20 KR 15 – 30
251	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786499	CL 20 KR 15 – 36
252	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786577	CL 20 KR 15 – 54
253	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786609	KR 16A CL 21 – 6

INFORME DE INTERVENTORÍA

No 1	NOMBRE_LOCALIDAD	NOMBRE_SUBCATEGORIA	CONTRATO	DIRECCION
254	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786526	KR 16A CL 18 – 23
255	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786421	KR 16B CL 20 – 12
256	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786409	KR 16B CL 18 – 89
257	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786424	KR 16B CL 20 – 36
258	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786412	KR 16B CL 20 – 30
259	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786520	KR 16B CL 20 – 6
260	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786418	CL 21 KR 15 – 11
261	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786478	KR 16A CL 21 – 12
262	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67803271	KR 16B CL 18 – 5
263	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802227	CL 21 KR 15 – 5
264	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802281	KR 17 CL 17 – 4
265	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67800251	KR 17 CL 16 - 15 CASA 20
266	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67800413	KR 17 CL 16 - 41 CASA 15
267	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67800220	KR 17 CL 16 - 40 CASA 7
268	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786415	KR 12 CL 16 – 6
269	HATO VIEJO	ESTRATO 1	67785764	CL 5 KR 4 – 21
270	CALAMAR	ESTRATO 1	67784541	CL 28 TV 3 – 82
271	HATO VIEJO	ESTRATO 1	67785445	KR 6 CL 9 – 56
272	BARRANCA NUEVA	ESTRATO 1	67784496	CL 13A KR 10 – 74
273	HATO VIEJO	ESTRATO 1	67785442	KR 6 CL 8 – 8
274	HATO VIEJO	ESTRATO 1	67784779	CL 8 KR 4 – 73
275	HATO VIEJO	ESTRATO 1	67784881	KR 6 CL 6 - 20 LT _
276	CALAMAR	ESTRATO 1	67791891	CL 34 KR 3 – 35
277	CALAMAR	ESTRATO 1	67791368	KR 4 CL 34 - 70 APTO 1
278	CALAMAR	ESTRATO 2	67791359	KR 4 CL 34 - 99 APTO 1
279	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786562	CL 19 KR 15 – 36
280	CALAMAR	ESTRATO 1	67791356	TV 3 CL 29 - 103 APTO 1
281	CALAMAR	ESTRATO 1	67791362	KR 7 CL 26 - 41 APTO 2
282	CALAMAR	ESTRATO 1	67791365	CL 43 KR 1 – 15
283	BARRANCA NUEVA	ESTRATO 1	67791371	KR 6 CL 21 – 52
284	BARRANCA NUEVA	ESTRATO 1	67791852	KR 6 CL 21 – 46
285	BARRANCA NUEVA	ESTRATO 1	67792964	KR 4 CL 13 – 36
286	BARRANCA VIEJA	ESTRATO 1	67792967	KR 8 CL 19 – 67
287	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67800137	KR 17 CL 16 - 14 CASA 13
288	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802443	KR 7 CL 14 – 24
289	BARRANCA VIEJA	ESTRATO 1	67791909	KR 8 CL 9 – 15
290	CALAMAR	ESTRATO 1	67791352	KR 4 CL 34 - 30 APTO 1
291	CALAMAR	ESTRATO 1	67791888	KR 1 CL 29 - 66 APTO 2
292	HATO VIEJO	ESTRATO 1	67791859	KR 7 CL 9 – 85
293	HATO VIEJO	ESTRATO 1	67791864	KR 7 CL 6 – 173
294	HATO VIEJO	ESTRATO 2	67791875	CL 6 KR 5 – 17
295	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802507	KR 7 CL 11 – 31
296	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802072	KR 13B CL 17C – 5
297	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802200	CL 21 KR 15 – 29
298	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802208	CL 21 KR 15 – 53
299	YUCAL	ESTRATO 1	67792946	CL 12 KR 8 – 19
300	HATO VIEJO	ESTRATO 1	67791870	KR 8 CL 9 – 7
301	HATO VIEJO	ESTRATO 1	67792958	KR 8 CL 6 – 229
302	YUCAL	ESTRATO 1	67791858	CL 4 KR 3 – 52
303	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802224	CL 21 KR 15 – 24
304	SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	ESTRATO 1	67800122	CL 34 KR 28 - 66 APTO 2
305	SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	ESTRATO 2	67800431	CL 19 KR 12 - 178 APTO 1
306	SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	ESTRATO 1	67800434	KR 14 CL 34 – 248

INFORME DE INTERVENTORÍA

No 1	NOMBRE_LOCALIDAD	NOMBRE_SUBCATEGORIA	CONTRATO	DIRECCION
307	SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	ESTRATO 1	67800440	CL 34 KR 21 – 41
308	SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	ESTRATO 1	67800443	KR 14 CL 34 – 252
309	BARRANCA VIEJA	ESTRATO 1	67803745	KR 8 CL 12 – 48
310	CALAMAR	ESTRATO 1	67793113	TV 3 CL 11 – 117
311	BARRANCA NUEVA	ESTRATO 1	67803573	CL 10 KR 5A – 82
312	CALAMAR	ESTRATO 1	67795187	TV 3 CL 24 - 54 APTO 1
313	CALAMAR	ESTRATO 1	67791897	CL 17 TV 1A – 124
314	BARRANCA NUEVA	ESTRATO 1	67803543	CL 10 KR 5A – 92
315	HATO VIEJO	ESTRATO 1	67800809	CL 4 KR 6 – 8
316	HATO VIEJO	ESTRATO 1	67801901	CL 2 KR 6 – 4
317	HATO VIEJO	ESTRATO 1	67800184	CL 4 KR 4 - 35 LT _
318	HATO VIEJO	ESTRATO 1	67801908	CL 7A KR 5 – 28
319	HATO VIEJO	ESTRATO 1	67795193	CL 7A KR 5 – 18
320	HATO VIEJO	ESTRATO 1	67801905	KR 6 CL 7 – 58
321	SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	ESTRATO 1	67800125	KR 27 CL 15A – 17
322	SATO	ESTRATO 1	67791879	CL 2 KR 12 – 93
323	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802018	CL 15 KR 14A - 10 CASA 18
324	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802006	CL 15 KR 14A - 5 CASA 20
325	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67800233	KR 17 CL 16 - 54 CASA 5
326	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67800395	KR 17 CL 16 - 25 CASA 18
327	SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	ESTRATO 1	67800446	KR 14 CL 34 – 242
328	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67800374	KR 17 CL 16 - 92 CASA 1
329	BARRANCA VIEJA	ESTRATO 1	67803648	CL 10 KR 5 – 25
330	SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	ESTRATO 1	67803633	CL 32 KR 34 - 15 APTO 1
331	SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	ESTRATO 1	67803636	CL 34 KR 33 - 5 APTO 1
332	SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	ESTRATO 1	67803546	KR 33 CL 16 – 22
333	SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	ESTRATO 2	67800428	CL 29 KR 16 - 25 PISO 2
334	YUCAL	ESTRATO 1	67800957	CL 11 KR 1 – 13
335	BARRANCA VIEJA	ESTRATO 1	67803594	CL 9 KR 4 – 58
336	BARRANCA VIEJA	ESTRATO 1	67803615	CL 8 KR 4 – 77
337	HATO VIEJO	ESTRATO 1	67800257	KR 8 CL 6 – 215
338	YUCAL	ESTRATO 1	67800818	CL 12 KR 2 – 27
339	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802084	KR 16B CL 17B – 18
340	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67800404	KR 17 CL 16 - 39 CASA 16
341	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67801917	KR 14 CL 15A – 23
342	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802251	KR 17 CL 17 – 16
343	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67800245	KR 4 CL 15 – 32
344	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802066	KR 13B CL 17C – 18
345	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802399	KR 13A CL 18 – 6
346	BARRANCA VIEJA	ESTRATO 1	67803742	KR 5 CL 11A – 60
347	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802206	KR 15 CL 20 – 23
348	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802520	KR 15 CL 21 – 5
349	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67800230	KR 4 CL 15 – 25
350	SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	ESTRATO 1	67803618	CL 38 KR 25 – 36
351	SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	ESTRATO 1	67800119	CL 31 KR 28 – 30

INFORME DE INTERVENTORÍA

No 1	NOMBRE_LOCALIDAD	NOMBRE_SUBCATEGORIA	CONTRATO	DIRECCION
352	SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	ESTRATO 1	67803715	CL 23 KR 37 – 235
353	SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	ESTRATO 1	67803673	URBANIZACION VILLA VALENTINA MZ N CASA 10
354	SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	ESTRATO 2	67803400	KR 33 CL 21 - 20 APTO 1
355	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67800425	CL 16 KR 14A - 5 CASA 14
356	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67801994	KR 14 CL 16 – 93
357	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802014	CL 15 KR 14A - 16 CASA 17
358	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67801997	KR 7 CL 10 – 36
359	HATO VIEJO	ESTRATO 1	67784893	CL 1A SUR KR 4 – 116
360	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808708	KR 8 CL 21 – 108
361	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808560	CL 21 KR 5 - 33 APTO 2
362	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808501	CL 12 KR 4 – 29
363	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808460	CL 21 KR 5 – 43
364	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808448	CL 21 KR 5 – 33
365	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808442	CL 12 KR 4 – 42
366	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67809014	KR 8 CL 21 – 70
367	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808490	CL 10B KR 25 – 55
368	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808484	CL 10B KR 25 – 48
369	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808508	CL 10B KR 25 – 49
370	SOPLAVIENTO	ESTRATO 2	67808939	KR 21 CL 6 – 3
371	SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	ESTRATO 1	67809496	KR 27 CL 34 – 30
372	SOPLAVIENTO	ESTRATO 2	67808946	KR 21 CL 6 – 15
373	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808517	CL 15 KR 7 – 70
374	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808493	CL 11 KR 4 – 40
375	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808487	CL 12 KR 4 – 57
376	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808478	CL 15 KR 5 - 55 LT _
377	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808436	KR 5 CL 17 – 5
378	Ger	ESTRATO 1	67808829	CL 17 KR 5 – 64
379	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808554	CL 17 KR 5 – 162
380	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808551	KR 5 CL 15 – 47
381	HIGUERETAL	ESTRATO 1	67810868	CL 5 KR 12 – 22
382	HIGUERETAL	ESTRATO 1	67810912	CL 3 KR 6 – 18
383	HIGUERETAL	ESTRATO 1	67810202	CL 4 KR 1 – 24
384	HIGUERETAL	ESTRATO 1	67810871	CL 6 KR 13 – 54
385	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808904	KR 19 CL 14 – 35
386	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808716	KR 19 CL 15 – 78
387	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808711	KR 8 CL 18 – 35
388	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808451	KR 12 CL 17 – 147
389	SOPLAVIENTO	ESTRATO 1	67808820	KR 20 CL 12 – 32
390	LAS CRUCES	ESTRATO 1	67809992	KR 2 CL 3 – 52
391	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67811499	CL 19 KR 12 – 70
392	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67810931	KR 5 CL 23 – 68
393	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67810876	KR 9 CL 16 - 25 CASA 2
394	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67810147	KR 4 CL 24 – 6
395	LAS CRUCES	ESTRATO 1	67810138	CL 4 KR 2 – 26
396	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67811524	CL 19 KR 12 – 42
397	SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	ESTRATO 1	67808284	KR 25 CL 18 - 21 APTO 1
398	SOPLAVIENTO	ESTRATO 1	67809021	KR 14 CL 10 – 10
399	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67808454	KR 7 CL 10 – 45
400	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67811496	KR 11 CL 18 – 13
401	LAS CRUCES	ESTRATO 1	67809989	CL 3 KR 2 – 64
402	SOPLAVIENTO	ESTRATO 1	67808814	KR 19 CL 6 – 83

INFORME DE INTERVENTORÍA

No 1	NOMBRE_LOCALIDAD	NOMBRE_SUBCATEGORIA	CONTRATO	DIRECCION
403	SOPLAVIENTO	ESTRATO 1	67812217	KR 22A CL 6 – 17
404	SOPLAVIENTO	ESTRATO 1	67812214	KR 24 CL 12 – 30
405	LAS CRUCES	ESTRATO 1	67810184	CL 4 KR 2 – 36
406	LAS CRUCES	ESTRATO 1	67810115	CL 2 KR 4 – 90
407	SOPLAVIENTO	ESTRATO 2	67808733	KR 15 CL 10 - 34 APTO 1
408	SOPLAVIENTO	ESTRATO 2	67808730	KR 15 CL 10 - 6 APTO 1
409	SOPLAVIENTO	ESTRATO 1	67808720	CL 11 KR 14 – 29
410	SOPLAVIENTO	ESTRATO 2	67808817	CL 12 KR 15 - 46 APTO 1
411	SOPLAVIENTO	ESTRATO 1	67809018	TV 10 DG 14 – 186
412	SOPLAVIENTO	ESTRATO 1	67808949	TV 10 DG 14 – 200
413	CALAMAR	ESTRATO 1	67810112	CL 10 TV 2A – 32
414	SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	ESTRATO 1	67809486	KR 35 CL 19 – 98
415	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808496	KR 5 CL 18 – 34
416	CALAMAR	ESTRATO 1	67784660	CL 41B KR 7 - 43 APTO 1
417	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808466	CL 10B KR 25 – 7
418	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808481	CL 10A KR 25 – 7
419	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808457	CL 10A KR 25 – 18
420	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808520	CL 10A KR 25 – 37
421	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808713	CL 10A KR 25 – 48
422	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808811	CL 10A KR 25 – 36
423	SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	ESTRATO 2	67811518	CL 26 KR 38 - 114 APTO 1
424	SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	ESTRATO 1	67812194	URBANIZACION VILLA VALENTINA- 0 MZ C1 CASA 2
425	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808472	CL 12 KR 10 – 78
426	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808463	CL 11 KR 9 – 83
427	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808958	KR 16 CL 19 – 95
428	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808952	KR 16 CL 17 – 202
429	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808934	CL 17 KR 16 - 3 APTO 2
430	BARRANCA VIEJA	ESTRATO 1	67803597	CL 9 KR 4 – 38
431	CALAMAR	ESTRATO 1	67803406	KR 2 CL 43 – 4
432	BARRANCA NUEVA	ESTRATO 1	67801911	CL 22 KR 6 – 25
433	BARRANCA NUEVA	ESTRATO 1	67803549	CL 10 KR 6 – 210
434	BARRANCA NUEVA	ESTRATO 1	67803570	CL 10 KR 5A – 35
435	CALAMAR	ESTRATO 1	67803403	KR 7 CL 26 - 37 APTO 2
436	CALAMAR	ESTRATO 1	67803765	CL 19B TV 3 - 37 APTO 1
437	SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	ESTRATO 1	67810118	CL 34 KR 28 - 76 PISO 2 APTO 1
438	CALAMAR	ESTRATO 1	67808269	KR 4 CL 32 – 40
439	CALAMAR	ESTRATO 1	67808278	CL 27 TV 3 - 90 APTO 1
440	SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	ESTRATO 2	67809986	CL 23 KR 29 – 80
441	SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	ESTRATO 1	67809501	KR 35 CL 15B – 58
442	SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	ESTRATO 1	67809546	KR 36A CL 27 – 39
443	SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	ESTRATO 1	67810358	CL 32 KR 33A - 36 APTO 1
444	CALAMAR	ESTRATO 1	67810934	CL 12 TV 1A - 69 APTO 2
445	SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	ESTRATO 1	67810163	CL 32 KR 33A – 30
446	CALAMAR	ESTRATO 1	67810915	CL 11 TV 1A - 31 APTO 1
447	BARRANCA NUEVA	ESTRATO 1	67808937	CL 10 KR 6 - 170 LT _
448	HATO VIEJO	ESTRATO 1	67800815	CL 5 KR 12 – 215
449	BARRANCA VIEJA	ESTRATO 1	67809540	KR 4 CL 19 – 32

INFORME DE INTERVENTORÍA

No 1	NOMBRE_LOCALIDAD	NOMBRE_SUBCATEGORIA	CONTRATO	DIRECCION
450	CALAMAR	ESTRATO 1	67809520	TV 3 CL 26 – 82
451	HATO VIEJO	ESTRATO 1	67808275	CL 7A KR 4 – 26
452	CALAMAR	ESTRATO 1	67810191	TV 3 CL 22 - 104 APTO
453	CALAMAR	ESTRATO 1	67810927	CL 17 TV 1A – 39
454	CALAMAR	ESTRATO 2	67810858	CL 19 KR 7 - 127 APTO 2
455	CALAMAR	ESTRATO 1	67810865	CL 42 KR 7 - 19 APTO 2
456	CALAMAR	ESTRATO 1	67810874	KR 4 CL 26 – 44
457	ARROYO HONDO	ESTRATO 1	67812448	KR 5 CL 2 – 19
458	SATO	ESTRATO 1	67814713	CL 2 KR 8 - 5 APTO 2
459	ARROYO HONDO	ESTRATO 1	67812389	CL 2 KR 4A – 25
460	SATO	ESTRATO 1	67814725	CL 2 KR 8 – 46
461	ARROYO HONDO	ESTRATO 1	67812392	KR 4A CL 2 – 9
462	SATO	ESTRATO 1	67814710	CL 2 KR 9A – 71
463	ARROYO HONDO	ESTRATO 2	67812401	CL 3 KR 2 - 20 APTO 1
464	SATO	ESTRATO 1	67814719	CL 3 KR 9A – 46
465	SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	ESTRATO 2	67810361	KR 14 CL 32 – 63
466	YUCAL	ESTRATO 1	67812211	KR 7 CL 2 – 32
467	SATO	ESTRATO 1	67814812	CL 3 KR 9A – 130
468	BARRANCA NUEVA	ESTRATO 1	67812208	CL 10 KR 6 – 200
469	SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	ESTRATO 2	67809983	CL 22 KR 33 - 18 APTO 1
470	BARRANCA VIEJA	ESTRATO 1	67810457	KR 4 CL 17 – 4
471	CALAMAR	ESTRATO 1	67814748	TV 7 CL 11 – 15
472	SATO	ESTRATO 1	67814716	CL 3 KR 11 – 64
473	SATO	ESTRATO 1	67814729	CL 3 KR 11 – 49
474	SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	ESTRATO 1	67810187	KR 21 CL 34 - 132 APTO 1
475	CALAMAR	ESTRATO 1	67811665	CL 42 KR 7A – 18
476	CALAMAR	ESTRATO 1	67810861	CL 28 TV 3 - 76 APTO 1
477	SATO	ESTRATO 1	67815588	CL 2 KR 12 – 39
478	ARROYO HONDO	ESTRATO 2	67812232	KR 1C CL 1A – 60
479	ARROYO HONDO	ESTRATO 2	67812223	CL 4 KR 3 – 31
480	SATO	ESTRATO 1	67814707	CL 3 KR 9 – 149
481	SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	ESTRATO 1	67810501	KR 36 CL 15B – 61
482	CALAMAR	ESTRATO 1	67784917	CL 22 KR 4 - 119 APTO 1
483	BARRANCA NUEVA	ESTRATO 1	67784633	CL 22 KR 9 – 75
484	BARRANCA NUEVA	ESTRATO 1	67784618	CL 19 KR 4 – 22
485	CALAMAR	ESTRATO 2	67783523	KR 2 CL 36 – 122
486	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67785918	CL 21 KR 15 – 41
487	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67785908	CL 21 KR 15 – 18
488	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67785894	CL 21 KR 15 – 36
489	BARRANCA NUEVA	ESTRATO 1	67784624	KR 2 CL 13A – 52
490	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67785903	KR 16B CL 18 – 12
491	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67785775	CL 21 KR 15 – 6
492	BARRANCA NUEVA	ESTRATO 1	67784621	KR 2 CL 13 – 4
493	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67785773	KR 16A CL 18 – 5
494	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786406	KR 16B CL 18 – 35
495	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67803368	CL 17C KR 16B – 27
496	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802254	CL 17B KR 13B – 28
497	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802402	KR 13B CL 18 – 18
498	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67800380	KR 16 CL 16 - 29 CASA 24
499	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802063	KR 14 CL 17C – 24
500	SOPLAVIENTO	ESTRATO 1	67801914	CL 4 KR 1A – 52

Imagen No 4 Avance acumulado de ventas y servicios activos del 04 de diciembre del 2025 al 30 de abril del 2026

MUNICIPIO	ESTRATO No 1	ESTRATO No 2
ARROYO HONDO	3	3
BARRANCA NUEVA	32	
BARRANCA VIEJA	19	
CALAMAR	100	10
HATO VIEJO	27	1
HIGUERETAL	4	
LAS CARAS (CLEMENCIA)		
LAS CRUCES	5	
LAS PIEDRAS	34	
SAN CRISTOBAL	194	
SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	24	7
SATO	10	
SOPLAVIENTO	10	6
YUCAL	11	
	473	**27**

Tabla 11.-Relacion de servicios activos acumulados por municipios

5.6 AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO

En el presente informe solo se evidencia el 50 % de las conexiones, pese a que GASES DEL CARIBE ha realizado las 1000 conexiones contractuales, tal como se evidencia en tabla adjunta:

LOCALIDADES INTERVENIDAS PRESENTE INFORME			
MUNICIPIO	ESTRATO No 1	ESTRATO No 2	TOTAL
ARROYO HONDO	3	3	6
BARRANCA NUEVA	32		32
BARRANCA VIEJA	19		19
CALAMAR	100	10	110
HATO VIEJO	27	1	28

	CPROYECTOS S.A.S.	Código: Versión: Fecha:

INFORME DE INTERVENTORÍA

LOCALIDADES INTERVENIDAS PRESENTE INFORME			
HIGUERETAL	4		4
LAS CARAS (CLEMENCIA)			0
LAS CRUCES	5		5
LAS PIEDRAS	34		34
SAN CRISTOBAL	194		194
SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	24	7	31
SATO	10		10
SOPLAVIENTO	10	6	16
YUCAL	11		11
	473	**27**	**500**

	CPROYECTOS S.A.S.	Código:
		Versión:
		Fecha:

INFORME DE INTERVENTORÍA

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE		
PRIMER APELLIDO	**SEGUNDO APELLIDO**	**NOMBRE**
OSPINO	LUNA	DULCENOMBRE OSPINO LUNA
IDENTIFICACIÓN	**EXPEDIDA EN**	**CELULAR**
CC - 30897718	CALAMAR, BOLIVAR	3015219682
TELÉFONO FIJO	**EMPRESA DONDE TRABAJA**	**CARGO**
	Independiente	Independiente
CORREO ELECTRÓNICO	**NO. DE PERSONAS EN EL HOGAR**	**ENERGÉTICO ACTUAL COSTO MENSUAL**
bastodulce71@gmail.com	4	NO COCINA - $ 0,00

INFORMACIÓN DEL PREDIO		
DEPARTAMENTO	**LOCALIDAD**	**BARRIO**
Bolivar	Arroyo Hondo	Sector 1 De Arroyo Hondo
DIRECCIÓN		**TIPO DE PREDIO**
CL 3 KR 2 - 20 APTO 1		Vivienda
CATEGORÍA	**SUBCATEGORÍA**	**ORDEN DE VISITA**
1	2	1270045
INDEPENDIZACIÓN DE PREDIO	**CONTRATO**	**MEDIDOR**
No	-	-
USO DEL SERVICIO	**PREDIO EN CONSTRUCCIÓN**	**USO**
RESIDENCIAL	No	Propietario

	CPROYECTOS S.A.S.	Código: Versión: Fecha:

INFORME DE INTERVENTORÍA

DATOS DEL CONTRATISTA	
ASESOR CÓDIGO Y NOMBRE	**PUNTO DE ATENCIÓN CÓDIGO Y NOMBRE**
44422 - GRUPO GARCIA	4321 - VT-GRUPO GARCIA SAS
CELULAR DEL ASESOR	**CONTRATISTA / CÓDIGO Y NOMBRE**
3225217638	2310 - OFERTADO CONSORCIO GRUPO GARCIA
CÓDIGO TÉCNICO DE VENTAS	**NOMBRE TÉCNICO DE VENTAS**
62	CONS GRUPO GARCIA
UNIDAD DE TRABAJO CERTIFICADORA	**UNIDAD DE TRABAJO INSTALADORA**
3479 - CERTIFICACIÓN GASCARIBE	3478 - CONSTRUCCIÓN DE INTERNA GASCARIBE

CONDICIONES DE INSTALACIÓN	
CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DEL PLAN COMERCIAL	4 - CARGO X CONEXION-INT INTERNA CON REVISION PREVIA

EQUIPOS		
DESCRIPCIÓN	CANTITAD	**OBSERVACIONES**
Estufa Domestica	1	

VALOR DE LOS TRABAJOS COTIZADOS Y PLANES DE FINANCIACIÓN			
DESCRIPCIÓN	**VALOR $**	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR $**
CARGO POR CONEXIÓN	$ 849.590,00	FINANCIACIÓN [SI]	
REVISIÓN PREVIA	$ 102.347,00	CUOTA INICIAL	$ 0,00
IVA REVISIÓN PREVIA	$ 19.446,00	VALOR A FINANCIAR	$ 785.762,00

	CPROYECTOS S.A.S.	Código: Versión: Fecha:

INFORME DE INTERVENTORÍA

INSTALACIÓN INTERNA	$ 1.525.189,00	NÚMERO DE CUOTAS	24
IVA INSTALACIÓN INTERNA	$ 28.979,00	CUOTA MENSUAL APROX.	$ 40.266,00
OTROS		VALOR DE CONTADO	$ 785.762,00
TOTAL	$ 2.525.551,00	COTIZACIÓN VÁLIDA HASTA	31/12/2026

SUBSIDIOS / PROMOCIONES			
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**TOTAL $**
536	536-DESC TAR NUEV 2026 GOBB ECO REV	1	$ 12.825,00
535	535-DESC TAR NUEV 2026 GOBB ECO CXC	1	$ 41.227,00
538	538-DESC TAR NV GOBB ECO 2026 INTE2	1	$ 224.478,00
502	502-DESC GOB BOLV GDC ECP 2025 REV	1	$ 17.515,00
503	503-DESC GOB BOLV GDC ECP 2025 INT	1	$ 330.000,00
504	504-SUB GOB BOLV -ECOP 2025 IVA REV	1	$ 19.446,00
88	88-OBSEQUIO ESTUFA 2Q	1	$ 0,00
500	SUB GOB BOLV - ECOP 2025 REV	1	$ 102.347,00
501	SUB GOB BOLV - ECOP 2025 INT	1	$ 768.406,00
499	SUB GOB BOLV - ECOP 2025 CXC	1	$ 808.363,00
		VALOR TOTAL	$ 2.324.607,00

INFORME DE INTERVENTORÍA

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE	
COMENTARIOS	

* GASES DEL CARIBE S.A. E.S.P., en calidad de responsable del tratamiento de datos personales, informa que los datos suministrados por quienes diligencian este formato, serán tratados de acuerdo al Régimen de Protección de Datos Personales vigente en Colombia. Los datos serán recolectados con la finalidad de gestionar la posible contratación del servicio de gas natural, verificar las circunstancias que permitan ofertar una prestación eficiente del servicio, contactabilidad, mercadeo, publicidad, inteligencia de negocios y análisis para conocer las necesidades del mercado, respecto a nuestros potenciales usuarios del servicio de gas natural. Para el ejercicio del Habeas Data, el titular del dato personal o quien demuestre un legítimo interés conforme lo señalado en la normatividad vigente, podrá hacerlo a través del siguiente correo electrónico habeasdata@gascaribe.com, o dirigiendo una comunicación a la siguiente dirección física: CR 54 NO. 59 - 144 en la ciudad de Barranquilla. La política de protección de datos personales está disponible mediante este enlace: https://gascaribe.com/politica-de-proteccion-de-datos/

Firmado electrónicamente. Documento No. fbc48dbf-4abf-4306-bffe-b04527e

De acuerdo con lo anterior, expreso de forma previa e informada mi autorización para el tratamiento de datos personales"

FIRMA DEL COTIZADO O PROPIETARIO	25-03-2026		
NOMBRE COMPLETO	DULCENOMBRE OSPINO LUNA		
C.C. No.	30897718	**EXPEDIDA EN**	CALAMAR, BOLIVAR

INFORME DE INTERVENTORÍA

Localidad: Arroyo Hondo Fecha: 25 de marzo del año 2026

Señores:
GASES DEL CARIBE S.A.
Empresa de Servicios Pùblicos
Ciudad

ASUNTO: FORMULARIO DE ACEPTACIÓN DE SUBSIDIO PARA CONEXIÓN DE GAS NATURAL DOMICILIARIO Y CONSTANCIA DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO.

Yo, DULCENOMBRE OSPINO LUNA identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 30897718 expedida en CALAMAR, BOLIVAR el 1997-07-08 en mi calidad de Propietario del inmueble ubicado en la dirección CL 3 KR 2 - 20 APTO 1, del Municipio de Arroyo Hondo, perteneciente al estrato 2 acepto ser beneficiario del subsidio otorgado por la Gobernación de Bolívar y ECOPETROL que cubre los costos de cargo por conexión, revisión previa y parte de la instalación interna para el servicio de gas natural, el cual es financiado con aportes otorgados por la Gobernación de Bolívar y ECOPETROL como resultado de los convenios celebrados entre ECOPETROL, la Gobernación de Bolívar y GASES DEL CARIBE S.A. E.S.P.

Declaro que he escogido el plazo de 24 mes(es), para pagar la diferencia no cubierta por el subsidio del valor de la conexión suma que asciende a $ 785.762,00.

También declaro y autorizo a que el valor del subsidio, del cual soy beneficiario, sea girado directamente a GASCARIBE S.A. E.S.P por parte de la Gobernación de Bolívar y ECOPETROL, una vez se encuentre conectado el servicio.

Declaro que conozco el contrato de condiciones uniformes de GASCARIBE S.A. E.S.P y entiendo que el incumplimiento de cualquiera de los requisitos señalados para la conexión del servicio conllevará la pérdida del subsidio y por consiguiente deberé sufragar todos los costos de conexión, si deseo la consecución del servicio.

Declaro que me ha sido socializado el proyecto de subsidio para la conexión de gas natural domiciliario con los aportes de GASCARIBE.

Declaro que no estoy incurso en ninguna inhabilidad o incompatibilidad para ser beneficiario del subsidio y que no he sido beneficiario de subsidio para la conexión de gas de forma previa. Autorizo a que verifiquen la información suministrada y a ser excluido en el evento en que la información aportada no corresponda a la realidad.

Finalmente, acepto que en el evento de terminación del contrato, convenio y/o memorando de entendimiento entre GASCARIBE S.A., GASCARIBE o bien por cualquier razón que tenga como efecto el no pago de los subsidios por parte de la entidad administrativa, me sea cobrado en la facturación del servicio público cualquier costo que no haya sido subsidiado de forma oportuna.

Cordialmente,

25-03-2026

Imagen 5.-Creacion de la cotización de venta

INFORME DE INTERVENTORÍA

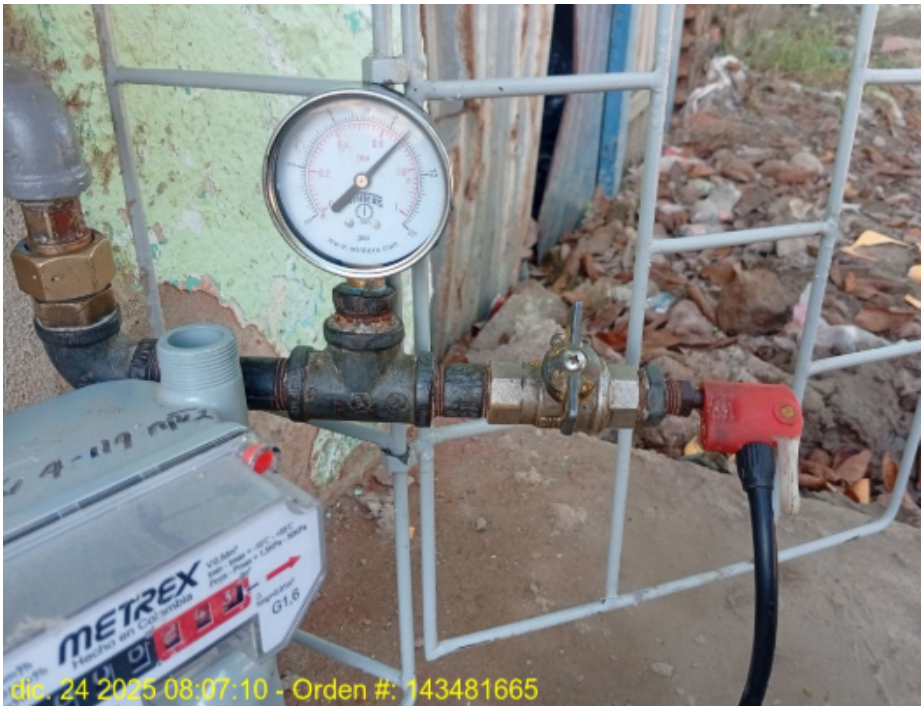


Imagen 6.-centro de medición interna y acometida



Imagen 7 – Imagen 9.- Válvula de instalación (interna y acometida)

INFORME DE INTERVENTORÍA



Imagen No 9 Prueba de hermeticidad de la instalación interna



Imagen 10.-Trazado de instalación, rotulado y resane en ubicación tuberia

INFORME DE INTERVENTORÍA



Imagen 11.-Prueba de Monóxido en el ambiente

Imagen 12.-Planeado vs ejecutado mensual

CRONOGRAMA GENERAL DE CONEXIONES.						
FECHA DE CONEXIONES	dic-1 a 31 - 2025	Ene- 1 a 31 2026	feb-1 a 28 2026	mar-1 a 31 2026	abr-1 a 30 2026	may-1 a 5 2026
CONEXIONES DEL CONVENIO	100	200	200	250	250	
CONEXIONES PROGRAMADAS (Plan de accion)	130	178	45	277	370	
CONEXIONES EJECUTADAS (V.O.B.O INTERVENTORIA)	130	178	45	244	382	21

5.7 PERSONAL DEL OPERADOR DE SERVICIO PUBLICO

INFORME DE INTERVENTORÍA

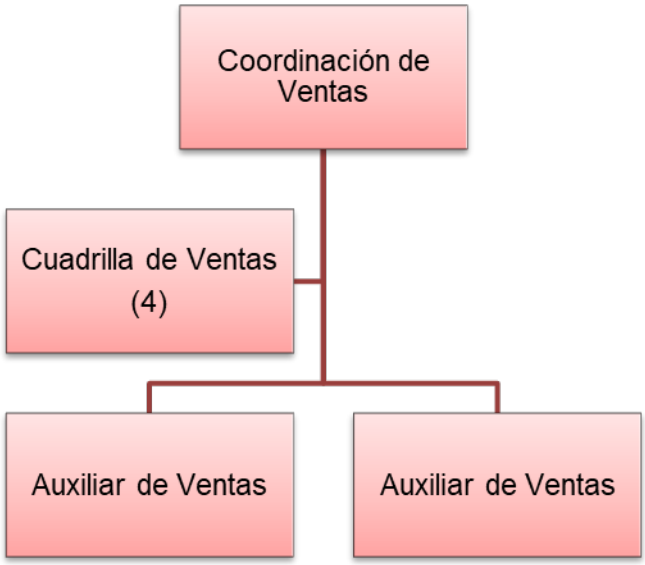


Imagen 13.- Estructura del departamento de ventas de Gases del Caribe

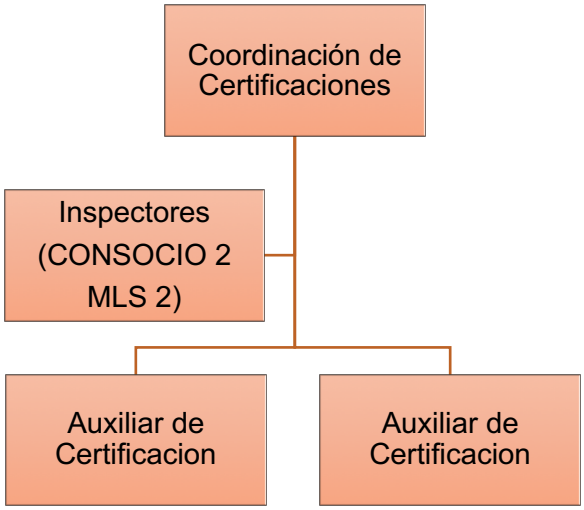


Imagen 14.- Estructura del departamento de certificaciones de Gases del Caribe

INFORME DE INTERVENTORÍA

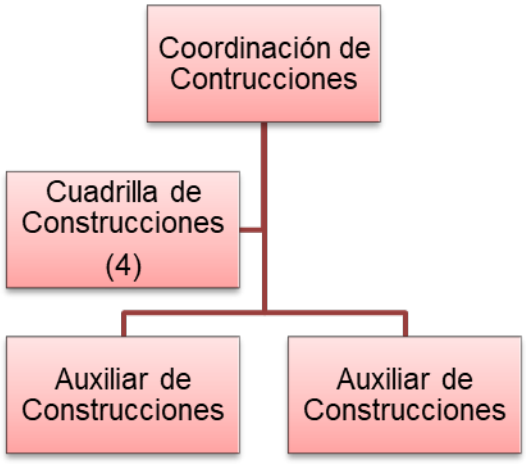


Imagen 15.- Estructura del departamento de construcciones de Gases del Caribe

5.8 EQUIPOS DEL OPERADOR DEL SERVICIO

1. Planta eléctrica o inversor (2 KW., 20 Amp., 110 v, monofásica).
2. Calentador 2 sw o 4 sw.
3. Juego de socket de 1/2” cts, 1/2” IPS, 3/4” IPS, 1” IPS.
4. Pinza cortadora de polietileno desde 1/2” cts. hasta 1"IPS.
5. Pinzas sujetadoras desde 1/2” cts. hasta 1” IPS.
6. Pinzas corta flujo desde 1/2” cts. hasta 1" IPS.
7. Biseladores desde 1/2” cts. hasta 1” IPS.
8. Calibradores de profundidad desde 1/2” cts. hasta 1" IPS.
9. Elemento de protección para el calentador.
10. Plancha de calentamiento con indicador de temperatura y caras planas.
11. Refrentador.
12. Carro alineador.
13. Guantes
14. Cronómetro.
15. Trapo de algodón.
16. Pico con azadón y cabo.
17. Pala punta redonda y cabo.
18. Mona de 14 lb., con cabo.
19. Barra de acero de punta y pala.

INFORME DE INTERVENTORÍA

20. Extensión eléctrica de 15 Mts con enchufe y toma.
21. Llave de expansión de 12".
22. Llave de expansión de 10".
23. Llave de boca fija de 3/4” x 7/8”.
24. Pisón de 15 Kg.
25. Solución liquida jabonosa o detector de gas combustible
26. Sellante anaeróbico fuerza media.
27. Herramientas de albañilería.
28. Perfiladora.
29. Dobla Tubo de 1/2” para Tubería de Cobre.
30. Juego Expander y Prensa.
31. Corta Tubo para Tubería de Cobre de 1/2".
32. Llave de Expansión de 12".
33. Llave de Expansión de 10".
34. Llave de Tubo de 12".
35. Llave Tubo de 10".
36. Llaves Boca Fija de 7/8" x 3/4”.
37. Palustre Mediano.
38. Martillo de Bola de 3 Lb.
39. Cincel de 1/2” x 6".
40. Cinta Métrica de 5 Mts.
41. Compresor de 3/4” Hp.
42. Manómetros Rango 0-100 Psi.
43. Destornillador de Pala de 4” x 3/16”.
44. Destornillador de Estría de 4” x 3/16”.
45. Extensión Eléctrica de 15 Mts. con Enchufe y Toma.
46. Escalera de Aluminio Tipo Tijera de 3 Mts.
47. Mesa Prensa y Juego Tarraja de 1/2” hasta 1".
48. Segueta.
49. Marco de Segueta.
50. Taladro Eléctrico con Brocas Ø 1/2” para Concreto.
51. Herramientas de Albañiles.
52. Solución Liquida Jabonosa.

53. Detector de Gas Combustible.
54. Sellante Anaeróbico Fuerza Baja.
55. Calculadora.
56. Doblatubo tipo resorte para PE(X)-AL-PE(X).
57. Biselador para tubería PE(X)-AL-PE(X).
58. Cortadora para polietileno.

5.9 DIFICULTADES PRESENCIADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

5.10 ASPECTOS SOCIALES



Imagen 16-socializacion con entidades

INFORME DE INTERVENTORÍA







Imagen 17.- Socialización en predio

Imagen 18.-Nomenclaturas entregadas a usuarios

6.-ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

	CPROYECTOS S.A.S.	Código: Versión: Fecha:

INFORME DE INTERVENTORÍA

NÚMERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	3019-2026
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
INTERVENTORÍA	CPROYECTOS S.A.S. NIT: 901271270-2 REP: JUAN JOSÉ ALZAMORA PÉREZ C.C. 1.047.509.559 de Cartagena de indias. Dirección de correo: BARRIO MANGA AVENIDA 3RA 22 154 Correo electrónico: cproyectos.sas@gmail.com
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE GAS NATURAL DOMICILIARIO PARA LOS ESTRATOS 1 Y 2 EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.
ACTA DE INICIO CONTRATO	6 DE MARZO DEL 2026
PLAZO DEL CONTRATO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DEL 2026
OTROSI MODIFICATORIO No1 (PLAZO)	HASTA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2026
VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/C $174.899.995
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP) DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	El pago de la suma esapulada en este contrato se sujetará al Ceraficado de Disponibilidad de la Gobernación de Bolívar No. 303 del tres (3) de Febrero de 2026 por un valor de CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE ($179.987.625.00)
REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) DE INTERVENTORIA	La asignación presupuestal está soportada por el RP de la Gobernación de Bolívar No. 3432 del 26 de febrero de 2026 por un valor de CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE ($174.899.995.00)

INFORME DE INTERVENTORÍA

FORMA DE PAGO	El DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR pagará al Contratista el contrato a celebrar, a través de actas mensuales de interventoría, de manera proporcional al avance físico de las obras contempladas en el Contrato de obras al que se le va a realizar la interventoría, que deberán ser debidamente aprobadas por el supervisor del contrato y cuya sumatoria corresponderá al noventa por ciento (90 %) del valor del mismo. El último pago del valor del contrato, corresponderá al diez por ciento (10 %) de su valor, y se hará efectivo con la Presentación de las actas de recibo y de liquidación final

TABLA 12.-INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

6.2 POLIZAS DE GARANTIA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

					FIRMA CONTRATO	
GARANTIAS	**MONTO**	**POLIZA No**	**ASEGURADORA**	**VALOR**	**VIGENCIA**	
					DESDE	**HASTA**
CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES						
1.-Cumplimiento	10%	400071611	NACIONAL DE SEGUROS	$ 17,489,999.50	25/02/2026	31/12/2026
2.-Calidad del Servicio	10%			$ 17,489,999.50	25/02/2026	31/12/2027
3.-Prestaciones Sociales	5%			$ 8,744,999.75	25/02/2026	31/12/2029

TABLA 13.-POLIZA DE SEGURO DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

					FIRMA CONTRATO	
GARANTIAS	**MONTO**	**POLIZA No**	**ASEGURADORA**	**VALOR**	**VIGENCIA**	
					DESDE	**HASTA**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL						
Predios Labores y Operaciones				$ 350,181,000.00		
Contratistas y Subcontratistas				$ 350,181,000.00		
	200 SMLMV	400071612	NACIONAL DE SEGUROS		25/02/2026	31/01/2027
Responsabilidad Civil Patronal				$ 350,181,000.00		
Responsabilidad Civil Cruzada				$ 350,181,000.00		
Vehiculos propios y No Propios				$ 350,181,000.00		

INFORME DE INTERVENTORÍA

TABLA No 13.- POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CONTRATO DE INTERVENTORIA

6.3 MODIFICACION REALIZADAS AL CONTRATO

OTROSI MODIFICATORIO NO 01- A LA COMUNICACIÓN DE ACEPTACION DE OFERTA DEL CONTRATO NO 3019-2026 CELEBRADO CON CPROYECTOS SAS, CON NIT 901271270-2.

OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE GAS NATURAL DOMICILIARIO PARA LOS ESTRATOS 1 Y 2 EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CONTRATISTA: CPROYECTOS SAS

NIT: 901271270-2.

Las partes hemos convenido integrar esta modificación al contrato electrónico 3019-2026, que se encuentra publicado en la plataforma SECOP II, y a la comunicación de aceptación de la oferta las siguientes consideraciones y clausulas.

Consideraciones: 1. Que, previa necesidad planteada en el Plan Anual de Adquisiciones 2026 y revisados los documentos de la planeación remitido desde el área correspondiente, el Departamento de Bolívar, realizó proceso de contratación IMC-003-2026, a través de la modalidad de MINÍMA CUANTÍA, resultando como adjudicatario: la sociedad por acciones simplificadas, CPROYECTOS SAS, identificada con Nit. 901271270-2. por haber acreditado las condiciones exigidas por la entidad en el marco del proceso de selección antes referenciado. 2. Que producto de la adjudicación el día 25 de febrero de 2026, se celebró con, CPROYECTOS SAS, el contrato No. 3019-2026, cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL

PROYECTO: AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE GAS NATURAL DOMICILIARIO PARA LOS ESTRATOS 1 Y 2 EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. 3.Que con cargo al Certificado de Disponibilidad No 303, expedido por el responsable de presupuesto el 03 de febrero de 2026, el valor del contrato se pactó en la suma de: CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVENCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS. ($ 174.899.995) incluido IVA e incluidos todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 4. Que el Departamento de Bolivar, atendiendo la naturaleza del contrato definió como forma de pago, la siguiente: El Departamento de Bolívar, pagará actas mensuales de interventoría, de manera proporcional al avance físico de las obras contempladas en el Contrato de obras al que se le va a realizar la interventoría, que deberán ser debidamente aprobadas por el supervisor del contrato y cuya sumatoria corresponderá al noventa por ciento (90 %) del valor del mismo. El último pago del valor del contrato, corresponderá al diez por ciento (10 %) de su valor, y se hará efectivo con la presentación de las actas de recibo y de liquidación final, 5. Que este contrato de interventoría comoquiera que va ligado a la ejecución del proyecto: AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE GAS NATURAL DOMICILIARIO PARA LOS ESTRATOS 1 Y 2 EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, el cual se materializa a través del convenio de Cooperación No. 137 de 2025, suscrito entre el Departamento y Gases del Caribe, tiene como plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2026, fecha que armonizaba con el termino inicial de ejecución del precitado convenio. Este término contractual se comenzó a contar a partir del

cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993. 6.Que una vez aprobadas las pólizas y expedido el registro de Disponibilidad Presupuestal, el día 06 de marzo de 2026, se suscribió entre el supervisor designado por el Departamento de Bolívar y el representante legal del contratista la respectiva acta de inicio. 7. Que el Contrato de Interventoría No. 3019-2026 es un negocio jurídico de carácter accesorio, cuya finalidad esencial es el seguimiento y control técnico, administrativo y jurídico de las obligaciones derivadas del Convenio No. 137 de 2025, por lo cual su vigencia y ejecución deben estar estrictamente armonizadas con los términos y plazos del instrumento principal que le dio origen. 8.Que mediante el Otrosí No. 1 al Convenio de Cooperación No. 137 de 2025, las partes acordaron modificar la Cláusula Cuarta relativa al plazo de ejecución, estableciendo como nueva fecha de terminación el 14 de septiembre de 2026, situación que obliga a la administración a ajustar el contrato de interventoría para evitar una desincronización contractual que afecte la supervisión del proyecto. 9. Que, con el propósito de asegurar el correcto desarrollo de la interventoría y en observancia al Otrosí No. 1 del Convenio 137-2025, el supervisor contractual del contrato 3019-2026, solicitó, a través del oficio GOBOL-26-024778 de fecha21 de abril de 2026, la modificación del plazo de ejecución a fin que se tome como fecha de terminación el 14 de septiembre de 2026, siendo la misma pactada para el convenio.10. Que dicha solicitud se sustenta en la obligación de mantener la sincronía entre el contrato principal y accesorio tal como se detalla en el informe técnico adjunto, emitido por la firma contratista que ejerce la interventora al convenio 137-2025, y que hace parte integral de este documento. 11. Que como resultado del análisis de la supervisión al informe de justificación técnica presentado por el contratista de interventoría, esta concluye que la reducción del plazo de ejecución no OTROSI MODIFICATORIO NO 01- A LA COMUNICACIÓN DE ACEPTACION DE OFERTA DEL CONTRATO NO 3019-2026 CELEBRADO CON CPROYECTOS SAS, CON NIT 901271270-2. conlleva una disminución de las metas ni del alcance, toda vez que se ha verificado un incremento en la disposición del personal técnico y operativo para garantizar el cumplimiento de las 1.000 conexiones de gas natural en el nuevo tiempo estipulado, sin que esto genere costos adicionales para la entidad. 12. Que, conforme al contenido de las solicitudes efectuadas por contratista y supervisor la modificación se realizaría respecto de la cláusula SEXTA, del contrato No 30192026, en el sentido expresado en sus escritos de justificación. 13. Que con la expedición de la ley 80 de 1993 la autonomía de la voluntad se constituyó en la fuente principal de los efectos que rigen la ejecución del contrato estatal. 14.Que el articulo 14 y 16 de la ley 80 de 1993, en concordancia con la ley 1150 de 2007, faculta a las entidades contratantes para modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral. 15. Que la presente modificación se fundamenta en el Principio de Mutabilidad del Contrato Estatal y la autonomía de la voluntad, permitiendo que la administración ajuste los elementos accidentales del contrato —como el plazo— para asegurar la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y el cumplimiento de los fines del Estado, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado y el artículo 3 de la Ley 80 de 1993. 16. Que la Honorable Corte Constitucional, mediante sentencia C-416 de 2012, expresó lo siguiente sobre la posibilidad de modificar los contratos estatales, afirmó: «Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para «[…] evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación" (…) 17. Que encontrándose el contrato en ejecución y no habiendo incumplimiento a la fecha por parte del contratista, se determina viable y procedente realizar otrosí 01 al contrato 3019 de 2026. 18. Que en merito de lo expuesto las partes acuerdan:

CLAUSULA PRIMERA – MODIFICACIÓN: Modifíquese la cláusula sexta del contrato 3019-2026 en el sentido de armonizar el plazo de ejecución al establecido en el convenio 137-2025 y respecto del cual se ejecuta el proyecto de inversión que da lugar a la razón de ser del contrato de interventoría celebrado entre el Departamento de Bolívar y CPROYECTOS SAS. En este sentido la cláusula SEXTA DEL CONTRATO 3019 quedara

así:

CLAUSULA SEXTA - PLAZO DEL CONTRATO: El plazo de ejecución será HASTA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2026. término que se considera suficiente y ajustado a las necesidades actuales y al cronograma de ejecución.

CLAUSULA SEGUNDA- VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las demás cláusulas establecidas en la Aceptación de oferta del contrato 3019-2026, que no hayan sido objeto de adición, ampliación, modificación o aclaración en el presente documento, continuarán vigentes en los mismos términos y condiciones.

CLÁUSULA TERCERA- DOCUMENTOS INTEGRANTES: Hacen parte integral de esta modificación, las solicitudes, autorizaciones, oficios, certificaciones, especificaciones técnicas, contenidas en actas de modificación, y demás documentos técnicos, administrativos y presupuestales enunciados en la parte considerativa del presente.

CLÁUSULA CUARTA -AJUSTE DE GARANTIAS: El CONTRATISTA deberá considerando el presente otrosí, realizar el ajuste a la garantía única, bajo la modalidad "A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES" la cual se constituyó para amparar el contrato inicial.

CLAUSULA QUINTA - EQUILIBRIO ECÓNÓMICO DEL CONTRATO: La presente modificación no afecta el equilibrio económico del contrato.

CLÁUSULA SEXTA - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente acto se perfecciona con su suscripción en la Plataforma SECOP II, y el ajuste a las pólizas correspondientes.

ACTA DE INICIO CONTRATO	6 DE MARZO DEL 2026
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DEL 2026
MODIFICATORIO No 1 (MODIFICACION PLAZO)	HASTA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

Tabla 14. Otros síes y Adicionales en tiempo y/o valor del contrato de interventoría

6.4 BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

El valor corresponderá a la suma de: **CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVENCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS.($ 174.899.995) incluido IVA** y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación de los contratos. **PARÁGRAFO:** el Contratista es responsable del **IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – I.V.A.,** de acuerdo a la información tributaria consignada en el Registro Único Tributario – RUT. El Contrato se encuentra amparado por el Certificado de Disponibilidad 303 , del 03 de febrero de 2026, por valor de $ 179,987,625, emitido por el (la) funcionario (a) responsable del presupuesto.

INFORME DE INTERVENTORÍA

6.4.1 VALOR Y FORMA DE PAGO AL CONTRATO DE LA INTERVENTORIA

El valor corresponderá a la suma de: **CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVENCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS.($ 174.899.995) incluido IVA** y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación de los contratos. **PARÁGRAFO:** el Contratista es responsable del **IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – I.V.A.,** de acuerdo a la información tributaria consignada en el Registro Único Tributario - RUT.

El DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR pagará al Contratista el contrato a celebrar, a través de actas mensuales de interventoría, de manera proporcional al avance físico de las obras contempladas en el Contrato de obras al que se le va a realizar la interventoría, que deberán ser debidamente aprobadas por el supervisor del contrato y cuya sumatoria corresponderá al noventa por ciento (90 %) del valor del mismo. El último pago del valor del contrato, corresponderá al diez por ciento (10 %) de su valor, y se hará efectivo con la presentación de las actas de recibo y de liquidación final. Cada acta mensual deberá ir acompañada de por lo menos doce (12) fotografías, donde se muestre el avance de cada una de las obras. Para los pagos a Contratistas se seguirán los procedimientos y formatos establecidos para tal fin. El contratista para cada factura deberá presentar el pago de los impuestos cancelados de acuerdo a la liquidación de la TESORERÍA DEPARTAMENTAL y las pólizas debidamente aprobadas y vigentes de acuerdo a lo señalado en el Contrato. La totalidad de la documentación requerida deberá ser presentada por el contratista al supervisor dentro de los cinco (05) días siguientes a la fecha de corte o según lo establecido contractualmente.

6.5 ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

Dentro de las actividades generales se realizo

- Seguimiento a información de conexiones
- Revisión de conexiones con soportes
- Verificacion de las conexiones
- Convocar y asistencia a Comités

6.5.1 OBLIGACIONES CONTRACTUALES INTERVENTORIA

OBLIGACIONES	ESTADO
a. suscribir el contrato.	OK
b. Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactados, de conformidad con las características técnicas requeridas por el Departamento de Bolívar, en los estudios previos, anexos técnicos, pliego de condiciones y la propuesta presentada por el contratista, documentos que forman parte integral del contrato, con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existirá ningún tipo de subordinación ni vínculo laboral alguno entre el contratista y el Departamento de Bolívar, ni entre ésta último y las personas que vincule el contratista para el desarrollo del contrato. En el evento en que llegue a presentarse contradicción entre los documentos precontractuales y la oferta prevalecerán los primeros.	OK
c.Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del Contrato bajo su propia responsabilidad, en los términos establecidos en el cuadro de asignación de riesgos contenido en los estudios previos y que forma parte integral Del Contrato.	OK
d. Realizar por su cuenta y costo todos los ensayos y pruebas de laboratorio que se requieran para el buen desarrollo del contrato.	OK

	CPROYECTOS S.A.S.	Código: Versión: Fecha:

INFORME DE INTERVENTORÍA

OBLIGACIONES	ESTADO
e. Acreditar de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003 el cumplimiento del pago mensual de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, mediante certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal según el caso.	OK
f. Suministrar toda la información requerida en el Pliego de Condiciones como obligaciones posteriores a la aceptación de la propuesta.	OK
g. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato de interventoria de acuerdo con las especificaciones propias, contenidos en la propuesta presentada y en la invitación publica. **h.** Ejecutar el objeto del contrato derivado de este proceso en el plazo establecido	OK
i. Contar con todos los equipos, herramientas, materiales y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato.	OK
j.Contar con el equipo humano necesario para ejecutar la labor contratada, de conformidad con su oferta y de manera general con el nivel de exigencia del objeto del convenio objeto de interventoria.	OK
k. Suministrar y mantener durante la ejecución del contrato y hasta la entrega de los productos elaborados, el personal profesional ofrecido. Si el Contratista requiere cambiar el profesional o profesionales propuestos, la aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación del DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, previo visto bueno del supervisor del contrato. Será por cuenta del Contratista el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución del contrato, igualmente la elaboración de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral de personal con el Departamento de Bolívar.	OK
l.Responder por el pago de los impuestos que cause la legalización y ejecución del contrato. **m.**Participar en la suscripccion del acta de inicio de ejecución del contrato, previo el cumplimiento de los requisitos necesarios para ello.	OK
n. Asistir a todas las reuniones que se celebren relacionadas con los trabajos objeto de la consultoría y elaborar y suscribir las actas correspondientes que se deriven de las diferentes etapas del convenio y del presente contrato, garantizando que las mismas sean suscritas por todas las personas que hayan intervenido.	OK
o.Las demás inherentes a la naturaleza del contrato.	OK

ESPECIFICAS:	
a. Verificar la ejecución del proyecto, de manera que cumpla con las condiciones, requisitos y demás especificaciones del proyecto.	OK
b. Conocer plenamente el objeto del proyecto y las especificaciones técnicas, para adelantar la coordinación y revisión de la ejecución de este.	OK
c.Verificar y aprobar la localización de los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar y desarrollar el objeto del proyecto.	OK
d. Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de la obra, equipos, materiales, bienes, insumos y producto. Para lo anterior, el interventor exigirá al operador efectuar los ensayos de laboratorio o pruebas que hayan sido pactadas en el proyecto. En caso de que estas pruebas o ensayos no cumplan con los resultados, el interventor deberá dejar registro de la implementación y verificación de las acciones correctivas pertinentes.	OK
e. Efectuar visitas al lugar de ejecución de los trabajos a efectos de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales; deberá cerciorarse del cumplimiento de los aspectos relativos a calidad, capacidad administrativa y técnica, normas de higiene y seguridad industrial, etc., e identificar las desviaciones que motiven la exigencia de planes de mejoramiento al operador, los cuales deberán constar en actas, establecer plazos de implementación y criterios y métodos para su seguimiento.	OK
f. Estudiar y decidir los requerimientos de orden técnico que no impliquen modificaciones al proyecto. En caso de requerir modificaciones estas deberán someterse al estudio del ordenador del gasto, previo concepto de la interventoría.	OK
g.Exigir y recibir del operador, para efectos de revisión y control la actualización de la programación de los trabajos entregada en la propuesta.	OK

	CPROYECTOS S.A.S.	Código: Versión: Fecha:

INFORME DE INTERVENTORÍA

OBLIGACIONES	ESTADO
h. Registrar con el operador y/o el residente de la obra o representante de aquel en el sitio de ejecución del proyecto, en la "Bitácora o Libro de Obras". Las acciones realizadas en ella; los inventarios periódicos de materiales, equipo y personal; así como las actas de los comités técnicos de obra o administrativos (debidamente suscritas por los asistentes) que periódicamente deben realizarse y las observaciones o novedades que se hayan sucedido. Este libro formará parte integral de los documentos del proyecto y de la interventoria.	OK
i. Verificar en la ejecución del proyecto la localización, ubicación de las viviendas beneficiarias del subsidio y su posible replanteo.	OK
j.Efectuar dentro del transcurso de la ejecución del proyecto, mediciones periódicas de los ítems ejecutados, las cuales deberá hacer constar en los informes periódicos, discriminando fechas, especificación del terreno medido, unidad y cantidad medida. Con base en estas medidas deberá efectuar cortes mensuales.	OK
K. Elaborar con base en los cortes mensuales, las actas de recibo parcial y todos los hechos que sucedan en su ejecución, las cuales suscribirá juntamente con el operador.	OK
l. Exigir la aplicación estricta de todas las normas técnicas y reglamentaciones exigidas por la entidad u organismo que regule la materia aplicable al objeto del proyecto.	OK
m. Ordenar la remoción y reemplazo de obras o trabajos mal ejecutados, fijando para el efecto un plazo determinado mediante comunicación escrita.	OK
n.Verificar que el operador realice los trabajos con los materiales que relacionó en el proyecto.	OK
o. Verificar que el operador cumpla con todas las normas de higiene y seguridad industrial aplicables, y en particular, las contempladas en la oferta, cuando sea del caso.	OK
p.Lo necesario para que la ejecución de los trabajos se lleve a cabo sin perjuicios para terceros.	OK
q. Exigir el total cumplimiento de la programación de la ejecución del proyecto, con facultades para recomendar al ordenador del gasto modificaciones contractuales, cuando por razón (es) técnica (s) o dada la naturaleza del proyecto resulten necesarias. **r.**Indicar al operador los faltantes y deficiencias de la labor con el fin de que sean subsanados en el período restante para el vencimiento del plazo contractual.	OK
S. Elaborar el acta de suspensión temporal del proyecto, por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, la cual debe justificarse, ser aprobada por el secretario de Despacho, jefe o director del área responsable del proyecto y avalado por ECOPETROL. Una vez aprobada, proceder a suscribir juntamente con el operador, el acta de suspensión. La suspensión del proyecto, más estrictamente de la ejecución del proyecto, procede, por regla general, de consumo entre las partes, cuando situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o de interés público impidan, temporalmente, cumplir el objeto de las obligaciones a cargo de las partes, de modo que el principal efecto que se desprende de la suspensión es que las obligaciones convenidas no pueden hacerse exigibles mientras perdure la medida y, por lo mismo, el término o plazo pactado del proyecto (de ejecución o instantáneo) no corre mientras permanezca suspendido. Por esa misma razón, la suspensión debe estar sujeta a un modo específico, plazo o condición, pactado con criterios de razonabilidad y proporcionalidad, acorde con la situación que se presente en cada caso, pero no puede permanecer indefinida en el tiempo.	NA
t. Revisar las solicitudes de modificación del proyecto, o la procedencia de las suspensiones, emitiendo un concepto técnico al respecto en el que se consigne su posición técnica sobre la solicitud, para el Ordenador del Gasto. Tanto la solicitud como el concepto de la interventoria deberán ser remitidos al Ordenador del Gasto con la suficiente antelación.	NA
u. Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en relación con el desarrollo del proyecto.	OK
v. Elaborar el proyecto acta de liquidación del proyecto objeto de la interventoría en un tiempo máximo de un (1) mes contado a partir de la fecha de terminación y remitir al ordenador del gasto para su revisión y aprobación final junto con la totalidad de los soportes. **w.** Verificar que el operador presente paz y salvos a los que haya lugar según la naturaleza del proyecto.	NA
x.Las demás actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la función de Interventoria.	OK
Control Administrativo:	
a. Mantener informado al funcionario responsable del proyecto, de los aspectos relevantes de ejecución del mismo.	OK

	CPROYECTOS S.A.S.	Código: Versión: Fecha:

INFORME DE INTERVENTORÍA

OBLIGACIONES	ESTADO
b. Revisar, orientar, programar y controlar al personal auxiliar que se le asigne para ejercer las funciones de interventoría del proyecto. Resolver las consultas que presente el operador y hacer las observaciones que estime conveniente; si durante la ejecución del proyecto se presentaren dudas o diferencias que no puedan ser resueltas junto con el operador, deberán ser aclaradas con el secretario o jefe de oficina solicitante responsable del proyecto, con la anticipación suficiente con el fin de no entorpecer el desarrollo del proyecto.	OK
c.Revisar y aprobar si es del caso, las hojas de vida del equipo de trabajo presentado por el operador. Para el efecto deberá revisar la formación académica y las certificaciones de experiencia general y especifica de conformidad con los criterios y metodología establecida en los pliegos de condiciones que dieron origen al proyecto objeto de interventoria. Solo podrá aceptarse los cambios cuando el personal presentado sea de iguales o superiores características que el que se pretende relevar.	OK
d.Participar en las mediciones y entregas parciales de las obras; certificar que la obra entregada corresponde proporcionalmente al valor de las cuentas presentadas por el operador y que se ejecutó dentro de los términos previstos en el proyecto.	OK
e. Velar por el cumplimiento de los procedimientos de instalación, y firma del proyecto de condiciones uniformes.	OK
f. Programar y coordinar con el operador, EL DEPARTAMENTO y ECOPETROL las reuniones de seguimiento a la ejecución del proyecto.	OK
g. Los informes podrán ser mensuales y finales según corresponda, de acuerdo con los requerimientos que para el efecto haga el supervisor designado por EL DEPARTAMENTO o como lo establezca el proyecto; en dichos informes se deberá presentar el estado de ejecución, avance y terminación del proyecto sobre el cual se ejerce la interventoria. El informe debe ser entregado al supervisor del proyecto, estos serán requisito para los pagos por los servicios prestados.	OK
h. Elaborar, revisar suscribir y radicar las actas y demás documentos necesarios para la ejecución del proyecto, enviando oportunamente los originales a la secretaría ordenadora del gasto para su correspondiente archivo en la carpeta original.	OK
i. Elaborar y firmar con el operador y el ordenador del gasto el acta de liquidación, de conformidad con los formatos establecidos para ello.	NA
j. Atender y/o responder las observaciones o aclaraciones que solicite el supervisor de la GOBERNACIÓN dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al requerimiento**.**	OK
k.Verificar y exigir que se otorguen las garantías exigidas, velar porque estas permanezcan vigentes de acuerdo con las condiciones estipuladas en el proyecto y formular al operador los requerimientos del caso, cuando sea necesario modificar las mismas en valor o en plazo. En caso de que el operador no realice las ampliaciones a que haya lugar, deberá informar al ordenador del gasto de esta situación, con el fin de que se tomen las medidas a que haya lugar. (cuando se requiera).	OK
l. Conformar una carpeta en donde se archiven de manera cronológica y sistemática toda la documentación (correspondencia, actas, requerimientos, permisos, pruebas, etc.) relacionada con la ejecución del proyecto sobre el cual se ejerce la interventoría. Esta carpeta deberá ser entregada y archivada en la secretaria ordenadora del gasto**.**	OK
m. Cualquier otra actividad administrativa requerida para la correcta administración del proyecto.	OK
Aspectos Ambientales:	
a.Velar porque los requerimientos de las autoridades ambientales sean contestados adecuadamente y en la oportunidad prevista.	OK
b.Exigir al operador que en el desarrollo del proyecto Implemente medidas que contribuyan a disminuir el efecto sobre el ambiente.	OK
Aspectos Legales:	
a. Cumplir y hacer cumplir al operador las obligaciones laborales que se generen con relación al proyecto suscrito.	OK
b. Cumplir y hacer cumplir al operador en que todo el personal a su cargo se encuentre afiliado al Sistema General de Seguridad Social (Salud, pensiones y ARL) de acuerdo con lo dispuesto en la ley, así como el pago de los aportes parafiscales.	OK
C.Verificar la aprobación de las pólizas exigidas (si las requiere), las modificaciones realizadas al inicio del proyecto, al igual que las variaciones que se presenten durante la marcha de este.	OK
d. Sustentar técnica y adecuadamente tanto los requerimientos al operador como las solicitudes de imposición de sanciones contractuales por el incumplimiento parcial o total de las obligaciones del proyecto.	NA

INFORME DE INTERVENTORÍA

OBLIGACIONES	ESTADO
e. Informar por escrito sobre la materialización de las causales que sustentan la aplicación de las cláusulas exorbitantes (caducidad, modificación, interpretación y terminación unilaterales).	NA
f. Participar en las audiencias de que trata el artículo 86 de la ley 1474 de 2011 y conceptuar sobre la imposición o no de las sanciones.	NA
g. Exigir periódicamente al operador, las planillas de afiliación y pago al sistema de seguridad social en salud y pensiones, recibos de pago de salarios y prestaciones sociales y demás conceptos para con sus trabajadores, durante la ejecución del proyecto y antes de su liquidación.	OK

TABLA 16.- SEGUIMIENTO OBLIGACIONES INTERVENTORIA

TABLA 17.-EJEMPLO DE CERTIFICACIÓN DE CONEXIONES POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE GAS NATURAL POR RED DE GASES DEL CARIBE **S.A. - E.S.P.**

Son partes del contrato de prestación de servicio de gas natural domiciliario las siguientes personas: GASES DEL CARIBE S.A., EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS, en adelante GASCARIBE S.A. E.S.P., sociedad anónima de acuerdo con las leyes colombianas, con domicilio principal en la ciudad de Barranquilla; y:

PERSONA JURÍDICA

_____, identificados (a) (s) como aparece al pie de mi (nuestra) firma, actuando como representante legal de _____ identificado (a) con el NIT No. _____.

PERSONA NATURAL

DULCENOMBRE OSPINO LUNA, identificado con el documento de identidad No. 30897718 Expedido en CALAMAR, BOLIVAR, obrando en mi nombre y representación, quien con la firma del presente documento acepta y se acoge a todas las disposiciones del contrato de condiciones uniformes establecido por GASCARIBE S.A. E.S.P. y quien se llamará en adelante EL SUSCRIPTOR.

El SUSCRIPTOR manifiesta que a través de la cotización No. 1270045 de fecha 25/03/2026, conoció y acepto las condiciones de financiación del bien y/o del servicio objeto del presente contrato y que fue adquirido con GASCARIBE S.A. E.S.P., de tal forma que tiene total y absoluta claridad sobre las condiciones de la financiación.

Objeto: El contrato de prestación del servicio público de Gas Natural domiciliario por red es un contrato uniforme y consensual en virtud del cual GASCARIBE S.A. E.S.P., se obliga a prestar a un SUSCRIPTOR a cambio de un precio en dinero pactado de acuerdo a la fórmula tarifaria definida por la autoridad competente, el suministro domiciliario de Gas Natural conforme a las condiciones uniformes definidas por GASCARIBE S.A. E.S.P., para suministrar dicho servicio a un número indeterminado de usuarios y/o suscriptores GASCARIBE S.A. E.S.P. podrá prestar sus servicios en todo el territorio nacional conforme a la regulación vigente.

Harán parte de este contrato no solo las estipulaciones escritas que en él se fijan por parte de GASCARIBE S.A. E.S.P., sino, además las definidas por la regulación de los servicios públicos domiciliarios y aquellas que GASCARIBE S.A. E.S.P. aplique de manera uniforme a sus usuarios o suscriptores en la prestación del servicio objeto del presente contrato.

PARÁGRAFO.- Las modificaciones al contrato de condiciones uniformes realizadas con posterioridad a la firma del presente documento se entienden aceptadas integralmente por el Usuario y Suscriptor, siempre y cuando dichas modificaciones se realicen de acuerdo con los principios de publicidad establecidos en el artículo 131 de la ley 142 de 1994 o aquella norma que la sustituya o modifique. El usuario podrá solicitar en cualquier momento y sin costo alguno copia completa del contrato de condiciones uniformes vigente.

Las partes convienen en someter el perfeccionamiento, ejecución y cumplimiento del presente contrato a las estipulaciones que se incorporen en el anexo de definiciones y condiciones del contrato, documento este que se entiende como parte integral del mismo.

Para todos los efectos previstos en el presente Contrato, cuando en alguna cláusula se utilicen los términos USUARIO, SUSCRIPTOR, PROPIETARIO Y/O POSEEDOR se entenderá que hace referencia a cualquiera de ellos.

En constancia de lo anterior, el SUSCRIPTOR Y/O USUARIO firma a los 25 de marzo del año 2026 en constancia de aceptación a los términos, condiciones, derechos y obligaciones contenidos en el Contrato de Prestación de Servicio Público de Gas Natural.

FIRMA: 25-03-2026

NOMBRES Y APELLIDOS: DULCENOMBRE OSPINO LUNA

C.C./NIT. No. 30897718 EXPEDIDA EN: CALAMAR, BOLIVAR

IMAGEN 19-CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO

INFORME DE INTERVENTORÍA

Localidad: Arroyo Hondo Fecha: 25 de marzo del año 2026

Señores:
GASES DEL CARIBE **S.A.**
Empresa de Servicios Públicos
Ciudad

ASUNTO: FORMULARIO DE ACEPTACIÓN DE SUBSIDIO PARA CONEXIÓN DE GAS NATURAL DOMICILIARIO Y CONSTANCIA DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO.

Yo, DULCENOMBRE OSPINO LUNA identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 30897718 expedida en CALAMAR, BOLIVAR el 1997-07-08 en mi calidad de Propietario del inmueble ubicado en la dirección CL 3 KR 2 - 20 APTO 1, del Municipio de Arroyo Hondo, perteneciente al estrato 2 acepto ser beneficiario del subsidio otorgado por la Gobernación de Bolívar y ECOPETROL que cubre los costos de cargo por conexión, revisión previa y parte de la instalación interna para el servicio de gas natural, el cual es financiado con aportes otorgados por la Gobernación de Bolívar y ECOPETROL como resultado de los convenios celebrados entre ECOPETROL, la Gobernación de Bolívar y GASES DEL CARIBE S.A. E.S.P.

Declaro que he escogido el plazo de 24 mes(es), para pagar la diferencia no cubierta por el subsidio del valor de la conexión suma que asciende a $ 785.762,00.

También declaro y autorizo a que el valor del subsidio, del cual soy beneficiario, sea girado directamente a GASCARIBE S.A. E.S.P por parte de la Gobernación de Bolívar y ECOPETROL, una vez se encuentre conectado el servicio.

Declaro que conozco el contrato de condiciones uniformes de GASCARIBE S.A. E.S.P y entiendo que el incumplimiento de cualquiera de los requisitos señalados para la conexión del servicio conllevará la pérdida del subsidio y por consiguiente deberé sufragar todos los costos de conexión, si deseo la consecución del servicio.

Declaro que me ha sido socializado el proyecto de subsidio para la conexión de gas natural domiciliario con los aportes de GASCARIBE.

Declaro que no estoy incurso en ninguna inhabilidad o incompatibilidad para ser beneficiario del subsidio y que no he sido beneficiario de subsidio para la conexión de gas de forma previa. Autorizo a que verifiquen la información suministrada y a ser excluido en el evento en que la información aportada no corresponda a la realidad.

Finalmente, acepto que en el evento de terminación del contrato, convenio y/o memorando de entendimiento entre GASCARIBE S.A., GASCARIBE o bien por cualquier razón que tenga como efecto el no pago de los subsidios por parte de la entidad administrativa, me sea cobrado en la facturación del servicio público cualquier costo que no haya sido subsidiado de forma oportuna.

Cordialmente,

25-03-2026

IMAGEN 20.-CONTINUACION CONTRATO DE PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO

INFORME DE INTERVENTORÍA

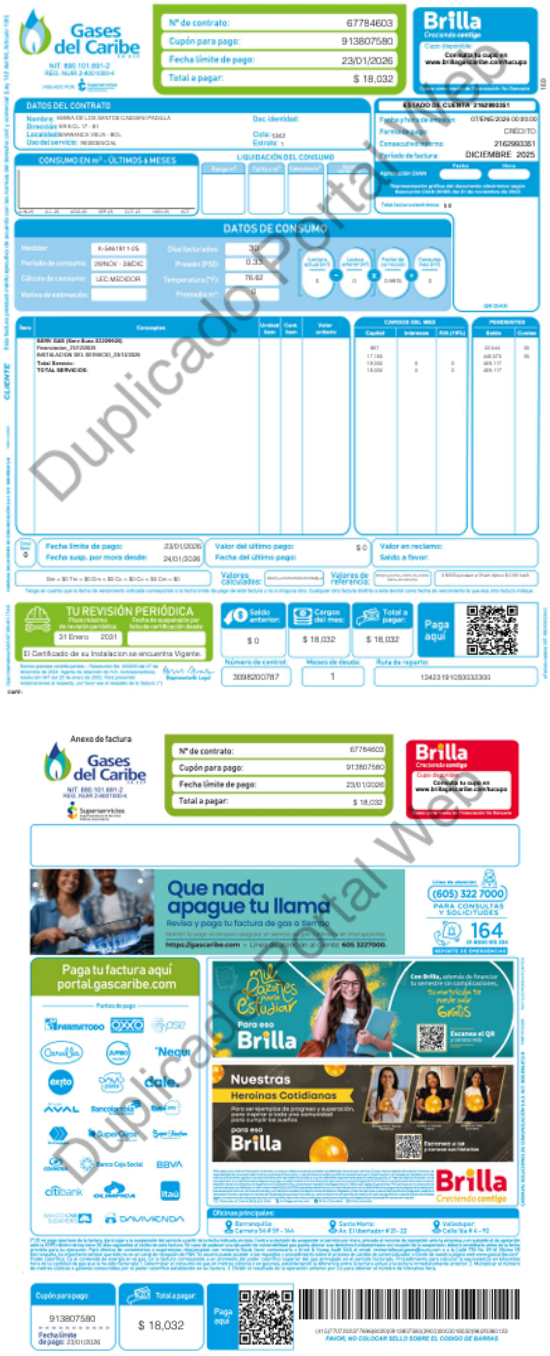


IMAGEN 21.-RECIBO DE SERVICIO PUBLICO

	CPROYECTOS S.A.S.	Código:
		Versión:
		Fecha:

INFORME DE INTERVENTORÍA

No 1	NOMBRE_LOCALIDAD	NOMBRE_SUBCATEGORIA	CONTRATO	DIRECCION	IDENTIFICACION	TELEFONO	FECHA_ELABORACION_VENTA	MEDIDOR	FECHA_LEGA_INST_CERTIFICADA	ESTUFA ENCENDIDA
1	CALAMAR	ESTRATO 1	67783445	KR 2B CL 42A - 24	1051815427	3225765950	11/12/2025	K-5543673-25	18/12/2025	OK
2	CALAMAR	ESTRATO 1	67783508	KR 2B CL 43 - 3	30897570	3235194630	11/12/2025	K-5543675-25	18/12/2025	OK
3	CALAMAR	ESTRATO 1	67783716	CL 43 KR 2B - 10	1007187666	3206313092	11/12/2025	K-5544189-25	18/12/2025	OK
4	CALAMAR	ESTRATO 1	67783405	CL 43 KR 2B - 29	73213310	3226615481	11/12/2025	K-5542865-25	18/12/2025	OK
5	CALAMAR	ESTRATO 1	67783414	CL 43 KR 2B - 23	30844781	3122971687	11/12/2025	K-5544165-25	18/12/2025	OK
6	CALAMAR	ESTRATO 1	67783434	CL 43 KR 2B - 11	1051357820	3148167250	11/12/2025	K-5544161-25	18/12/2025	OK
7	CALAMAR	ESTRATO 1	67783427	KR 2B CL 42A - 25	30843963	3125234518	11/12/2025	K-5544127-25	18/12/2025	OK
8	CALAMAR	ESTRATO 1	67783461	KR 2B CL 42A - 36	1051360507	3150851182	11/12/2025	K-5544129-25	18/12/2025	OK
9	CALAMAR	ESTRATO 1	67783420	KR 2B CL 42A - 37	30844066	3225828499	11/12/2025	K-5544135-25	18/12/2025	OK
10	CALAMAR	ESTRATO 1	67783578	KR 2B CL 43 - 9	1002388367	3125620734	11/12/2025	K-5544191-25	19/12/2025	OK
11	CALAMAR	ESTRATO 1	67783502	KR 2B CL 43 - 21	1051363568	3113192530	11/12/2025	K-5543676-25	19/12/2025	OK
12	CALAMAR	ESTRATO 1	67783517	KR 2B CL 43 - 25	30844189	3113192530	11/12/2025	K-5544131-25	19/12/2025	OK
13	CALAMAR	ESTRATO 1	67784151	KR 2B CL 43 - 16	72126450	3114089968	12/12/2025	K-5542847-25	20/12/2025	OK
14	CALAMAR	ESTRATO 1	67783520	CL 43A KR 2B - 17	30843900	3108401915	11/12/2025	K-5543771-25	20/12/2025	OK
15	CALAMAR	ESTRATO 1	67783644	CL 43A KR 2B - 43	1051356530	3106099280	11/12/2025	K-5543776-25	20/12/2025	OK
16	CALAMAR	ESTRATO 1	67783575	CL 43A KR 2B - 33	1007864632	3233929466	11/12/2025	K-5543774-25	20/12/2025	OK
17	CALAMAR	ESTRATO 1	67783614	CL 43 KR 2B - 60	1127942860	3188852569	11/12/2025	K-5544162-25	20/12/2025	OK
18	CALAMAR	ESTRATO 1	67783572	CL 43A KR 2B - 37	1007280380	3233929466	11/12/2025	K-5543773-25	20/12/2025	OK
19	CALAMAR	ESTRATO 1	67783526	CL 43A KR 2B - 40	1051360049	3148508872	11/12/2025	K-5543775-25	20/12/2025	OK
20	CALAMAR	ESTRATO 1	67783497	KR 2B CL 43 - 29	73266873	3113192530	11/12/2025	K-5544133-25	20/12/2025	OK
21	CALAMAR	ESTRATO 1	67783628	CL 43 KR 2B - 20	1051361001	3042498174	11/12/2025	K-5544779-25	20/12/2025	OK
22	CALAMAR	ESTRATO 1	67783455	CL 43A KR 2B - 46	1051819033	3106099280	11/12/2025	K-5544786-25	20/12/2025	OK
23	CALAMAR	ESTRATO 1	67783556	KR 2B CL 42A - 12	1051357224	3217836906	11/12/2025	K-5544132-25	20/12/2025	OK
24	CALAMAR	ESTRATO 1	67783505	KR 2A CL 43 - 3	9022429	3135115179	11/12/2025	K-5544781-25	21/12/2025	OK
25	CALAMAR	ESTRATO 1	67783559	KR 2B CL 42A - 6	1051357051	3217836906	11/12/2025	K-5544134-25	21/12/2025	OK
26	CALAMAR	ESTRATO 1	67783680	KR 2A CL 43 - 4	1051357185	3135115179	11/12/2025	K-5544187-25	21/12/2025	OK
27	CALAMAR	ESTRATO 1	67784565	KR 2 CL 43 - 21 APTO 1	1002293724	3205054321	15/12/2025	K-5544404-25	22/12/2025	OK
28	CALAMAR	ESTRATO 1	67784148	KR 2A CL 43 - 27	73270404	3235098691	12/12/2025	K-5544783-25	22/12/2025	OK
29	CALAMAR	ESTRATO 1	67784166	KR 2A CL 43 - 22	1051362016	3244293297	12/12/2025	K-5544190-25	22/12/2025	OK
30	CALAMAR	ESTRATO 1	67784154	KR 2A CL 43 - 16	30896264	3116603504	12/12/2025	K-5544782-25	22/12/2025	OK
31	CALAMAR	ESTRATO 1	67784187	KR 2A CL 43 - 10	1007187256	3234875402	12/12/2025	K-5544784-25	22/12/2025	OK
32	CALAMAR	ESTRATO 1	67784202	KR 2A CL 43 - 15	1002409196	3234875402	12/12/2025	K-5544785-25	22/12/2025	OK
33	CALAMAR	ESTRATO 1	67784184	KR 2 CL 43 - 21	1049264370	3205054321	12/12/2025	K-5544128-25	22/12/2025	OK
34	CALAMAR	ESTRATO 1	67784328	KR 2 CL 43 - 22	1051357024	3234866758	12/12/2025	K-5544400-25	22/12/2025	OK
35	CALAMAR	ESTRATO 1	67784169	KR 2 CL 43 - 16	1051358850	3206092755	12/12/2025	K-5544130-25	22/12/2025	OK
36	CALAMAR	ESTRATO 1	67784172	KR 2 CL 43 - 10	1051358212	3206092755	12/12/2025	K-5544402-25	22/12/2025	OK
37	CALAMAR	ESTRATO 1	67784562	KR 2 CL 43 - 9 APTO 1	1002293747	3108473919	15/12/2025	K-5544406-25	22/12/2025	OK
38	CALAMAR	ESTRATO 1	67784193	KR 2 CL 43 - 15	1002409199	3148303546	12/12/2025	K-5544398-25	22/12/2025	OK
39	CALAMAR	ESTRATO 1	67783700	KR 2 CL 42 - 53	1043604170	3127731569	11/12/2025	K-5544136-25	22/12/2025	OK
40	CALAMAR	ESTRATO 1	67784178	KR 2A CL 43 - 9	1051356100	3205396571	12/12/2025	K-5544777-25	22/12/2025	OK
41	CALAMAR	ESTRATO 1	67783399	KR 5 CL 31 - 76	73267208	3003670316	11/12/2025	K-5411448-25	24/12/2025	OK
42	CALAMAR	ESTRATO 1	67784313	CL 22 KR 4 - 33 APTO 1	22843144	3206289082	12/12/2025	K-5407365-25	24/12/2025	OK
43	CALAMAR	ESTRATO 1	67784310	KR 5 CL 33 - 54	22849252	3136823048	12/12/2025	K-5411443-25	24/12/2025	OK
44	CALAMAR	ESTRATO 1	67784163	CL 22A TV 3 - 166	22842731	3009054745	12/12/2025	K-5407363-25	24/12/2025	OK
45	CALAMAR	ESTRATO 1	67783514	CL 37 KR 2 - 23	1051357994	3225934132	11/12/2025	K-5407527-25	24/12/2025	OK
46	CALAMAR	ESTRATO 1	67784331	CL 43 KR 2B - 17	1051356921	3003634191	12/12/2025	K-5407525-25	24/12/2025	OK

	CPROYECTOS S.A.S.	Código:
		Versión:
		Fecha:

INFORME DE INTERVENTORÍA

No 1	NOMBRE_LOCALIDAD	NOMBRE_SUBCATEGORIA	CONTRATO	DIRECCION	IDENTIFICACION	TELEFONO	FECHA_ELABORACION_VENTA	MEDIDOR	FECHA_LEGA_INST_CERTIFICADA	ESTUFA ENCENDIDA
47	CALAMAR	ESTRATO 1	67783451	CL 31 TV 3 - 26	3826726	3244746291	11/12/2025	K-5543947-25	24/12/2025	OK
48	CALAMAR	ESTRATO 2	67784181	KR 4 CL 33 - 27	1049264988	3224920840	12/12/2025	K-5543985-25	24/12/2025	OK
49	CALAMAR	ESTRATO 2	67784553	KR 4 CL 33 - 27 APTO 2	30839378	3233774628	15/12/2025	K-5411449-25	24/12/2025	OK
50	CALAMAR	ESTRATO 1	67784340	CL 43A KR 2B - 22	1007187205	3108401915	12/12/2025	K-5544399-25	26/12/2025	OK
51	CALAMAR	ESTRATO 2	67784559	KR 4 CL 33 - 15	1002410975	3128144890	15/12/2025	K-5411444-25	26/12/2025	OK
52	CALAMAR	ESTRATO 1	67783664	CL 42A KR 1 - 15	1051357225	3117963859	11/12/2025	K-5544403-25	26/12/2025	OK
53	CALAMAR	ESTRATO 1	67784316	KR 1 CL 43 - 22	12390131	3023041991	12/12/2025	K-5407524-25	26/12/2025	OK
54	CALAMAR	ESTRATO 2	67784175	KR 4 CL 34 - 99	1051357927	3103966395	12/12/2025	K-5411441-25	26/12/2025	OK
55	CALAMAR	ESTRATO 2	67784920	KR 4 CL 34 - 71 APTO 3	1051356902	3044189226	16/12/2025	K-5411442-25	26/12/2025	OK
56	BARRANCA VIEJA	ESTRATO 1	67784767	KR 5 CL 23 - 45	22847228	3206044137	15/12/2025	K-5363337-25	26/12/2025	OK
57	CALAMAR	ESTRATO 1	67784319	KR 1 CL 43 - 28	1129514686	3023041991	12/12/2025	K-5407522-25	26/12/2025	OK
58	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67785876	CL 21 KR 15 - 17	1050004241	3023478202	17/12/2025	K-5362346-25	30/12/2025	OK
59	CALAMAR	ESTRATO 1	67784325	CL 43 KR 2B - 5	1051359636	3235194630	12/12/2025	K-5544397-25	26/12/2025	OK
60	CALAMAR	ESTRATO 1	67783417	KR 3 CL 43 - 25	30843824	3113400330	11/12/2025	K-5544401-25	26/12/2025	OK
61	CALAMAR	ESTRATO 1	67785767	KR 3 CL 43A - 7	1051362389	3023503814	17/12/2025	K-5407523-25	26/12/2025	OK
62	CALAMAR	ESTRATO 1	67783568	CL 24 TV 3 - 47	8744693	3114328958	11/12/2025	K-5407362-25	26/12/2025	OK
63	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786995	KR 16 CL 17 - 4	72229083	3012467813	19/12/2025	K-5361841-25	3/01/2026	OK
64	CALAMAR	ESTRATO 1	67784484	CL 35 KR 4 - 20	1051358100	3014413269	15/12/2025	K-5411446-25	26/12/2025	OK
65	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67785939	CL 20 KR 15 - 12	22803808	3046685410	17/12/2025	K-5450330-25	3/01/2026	OK
66	CALAMAR	ESTRATO 2	67784160	KR 3 CL 36 - 35	22843559	3226945536	12/12/2025	K-5407529-25	26/12/2025	OK
67	CALAMAR	ESTRATO 1	67786303	CL 43 KR 2B - 30	1051356061	3107203773	18/12/2025	K-5407521-25	26/12/2025	OK
68	CALAMAR	ESTRATO 1	67784334	CL 43A KR 2B - 11 LT	1044913731	3125620734	12/12/2025	K-5544405-25	26/12/2025	OK
69	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67785927	CL 20 KR 15 - 5	9106256	3006478718	17/12/2025	K-5450331-25	3/01/2026	OK
70	CALAMAR	ESTRATO 1	67783511	KR 7 CL 27 - 74	30843802	3043054934	11/12/2025	K-5411736-25	27/12/2025	OK
71	CALAMAR	ESTRATO 1	67784301	KR 6 CL 32 - 33	73266611	3126885489	12/12/2025	K-5411733-25	27/12/2025	OK
72	CALAMAR	ESTRATO 1	67784556	KR 6 CL 33 - 12	1051362553	3022293604	15/12/2025	K-5411735-25	27/12/2025	OK
73	BARRANCA NUEVA	ESTRATO 1	67784490	CL 15 KR 2 - 101	1051356372	3105000387	15/12/2025	K-5407369-25	27/12/2025	OK
74	BARRANCA NUEVA	ESTRATO 1	67784502	CL 15 KR 2 - 131	1007187307	3006738136	15/12/2025	K-5407657-25	27/12/2025	OK
75	BARRANCA NUEVA	ESTRATO 1	67784463	CL 15 KR 2 - 208	73271535	3106438561	15/12/2025	K-5407364-25	27/12/2025	OK
76	BARRANCA NUEVA	ESTRATO 1	67784466	CL 15 KR 2 - 226	73265781	3234547077	15/12/2025	K-5407653-25	27/12/2025	OK
77	CALAMAR	ESTRATO 1	67784478	KR 4 CL 34 - 72 APTO INT	30895470	3127628207	15/12/2025	K-5411737-25	27/12/2025	OK
78	CALAMAR	ESTRATO 1	67784537	CL 32 KR 3 - 26	1051357682	3015204953	15/12/2025	K-5543948-25	27/12/2025	OK
79	CALAMAR	ESTRATO 1	67783562	TV 3 CL 29 - 29	1051356130	3205425146	11/12/2025	K-5544778-25	27/12/2025	OK
80	CALAMAR	ESTRATO 1	67783534	KR 4 CL 26 - 54	1051357384	3216457765	11/12/2025	K-5411732-25	27/12/2025	OK
81	CALAMAR	ESTRATO 1	67783431	CL 31 KR 6 - 57	1051358399	3007816493	11/12/2025	K-5411731-25	29/12/2025	OK
82	CALAMAR	ESTRATO 1	67784544	KR 7 CL 27 - 28	30897559	3226004168	15/12/2025	K-5411734-25	29/12/2025	OK
83	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786108	CL 20 KR 15 - 18	45748689	3046685410	17/12/2025	K-5450327-25	3/01/2026	OK
84	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67785900	CL 20 KR 15 - 11	32873341	3046685410	17/12/2025	K-5450328-25	3/01/2026	OK
85	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67785897	CL 21 KR 15 - 42	1002325074	3018704465	17/12/2025	K-5355343-25	3/01/2026	OK
86	BARRANCA VIEJA	ESTRATO 1	67784911	KR 8 CL 17 - 75	1051356498	3132407257	16/12/2025	K-5461917-25	5/01/2026	OK
87	YUCAL	ESTRATO 1	67785403	KR 6 CL 7 - 27 APTO 2	1051361127	3242093003	16/12/2025	K-5449989-25	5/01/2026	OK
88	YUCAL	ESTRATO 1	67785409	CL 7 KR 6 - 64 APTO 2	1051361977	3137320165	16/12/2025	K-5363217-25	5/01/2026	OK
89	BARRANCA VIEJA	ESTRATO 1	67784603	KR 8 CL 17 - 81	30897567	3105444011	15/12/2025	K-5461911-25	5/01/2026	OK
90	BARRANCA VIEJA	ESTRATO 1	67784761	KR 8 CL 22 - 5	73270068	3205146325	15/12/2025	K-5462784-25	5/01/2026	OK
91	YUCAL	ESTRATO 1	67785365	CL 7 KR 6 - 64	85430036	3233278826	16/12/2025	K-5449991-25	5/01/2026	OK
92	BARRANCA NUEVA	ESTRATO 1	67784788	CL 13 KR 5A - 3	1051361012	3234367630	15/12/2025	K-5450307-25	5/01/2026	OK

	CPROYECTOS S.A.S.	Código:
		Versión:
		Fecha:

INFORME DE INTERVENTORÍA

No 1	NOMBRE_LOCALIDAD	NOMBRE_SUBCATEGORIA	CONTRATO	DIRECCION	IDENTIFICACION	TELEFONO	FECHA_ELABORACION_VENTA	MEDIDOR	FECHA_LEGA_INST_CERTIFICADA	ESTUFA ENCENDIDA
93	YUCAL	ESTRATO 1	67784898	CL 9 KR 2 - 4	1051359924	3022833149	16/12/2025	K-5449984-25	6/01/2026	OK
94	CALAMAR	ESTRATO 1	67784481	CL 11 TV 2 - 3	30843752	3145284564	15/12/2025	K-5407655-25	29/12/2025	OK
95	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786917	KR 16 CL 16 - 82 CASA 1	22435940	3006710732	19/12/2025	K-5419588-25	6/01/2026	OK
96	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67785948	CL 20 KR 15 - 29	23070430	3142076238	17/12/2025	K-5450326-25	8/01/2026	OK
97	YUCAL	ESTRATO 1	67785374	KR 7 CL 8 - 106	30897571	3136515095	16/12/2025	K-5450258-25	16/01/2026	OK
98	BARRANCA NUEVA	ESTRATO 1	67784630	CL 15 KR 7 - 13	22846503	3106438561	15/12/2025	K-5450345-25	16/01/2026	OK
99	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67787019	KR 16 CL 17 - 40	45749034	3013150790	19/12/2025	K-5361843-25	22/01/2026	OK
100	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67787031	KR 16 CL 17 - 5	22514636	3243179347	19/12/2025	K-5361839-25	22/01/2026	OK
101	SOPLAVIENTO	ESTRATO 2	67791912	KR 12 CL 6 - 24	19896160	3218994502	13/01/2026	K-5543689-25	30/01/2026	OK
102	BARRANCA NUEVA	ESTRATO 1	67784487	KR 10 CL 14 - 116	30843872	3234933180	15/12/2025	K-5407370-25	29/12/2025	OK
103	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67792955	KR 16 CL 17 - 39	30898226	3145897556	15/01/2026	K-5490539-25	10/02/2026	OK
104	CALAMAR	ESTRATO 1	67784654	KR 6 CL 33 - 88	1051359784	3115716466	15/12/2025	K-5411143-25	12/02/2026	OK
105	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802293	KR 13A CL 18 - 23	1042970960	3234978502	19/02/2026	K-5492513-25	28/02/2026	OK
106	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802099	KR 13B CL 17C - 17	45370997	3043733254	18/02/2026	K-5494910-25	28/02/2026	OK
107	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802242	KR 13A CL 18 - 11	72431908	3207465205	19/02/2026	K-5490583-25	28/02/2026	OK
108	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802081	KR 13B CL 17C - 23	1048210161	3018113624	18/02/2026	K-5493298-25	28/02/2026	OK
109	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802078	KR 13B CL 17C - 11	1046338312	3106172010	18/02/2026	K-5493301-25	28/02/2026	OK
110	BARRANCA NUEVA	ESTRATO 1	67784472	CL 19 KR 11 - 18	30895566	3208463999	15/12/2025	K-5419526-25	30/12/2025	OK
111	BARRANCA NUEVA	ESTRATO 1	67784469	CL 19 KR 9 - 39	30897034	3148031963	15/12/2025	K-5407367-25	30/12/2025	OK
112	BARRANCA NUEVA	ESTRATO 1	67784349	KR 11 CL 22 - 34	1051356737	3206287418	12/12/2025	K-5407366-25	30/12/2025	OK
113	CALAMAR	ESTRATO 2	67783565	KR 3 CL 36 - 111	50876092	3126299070	11/12/2025	K-5407530-25	31/12/2025	OK
114	BARRANCA NUEVA	ESTRATO 1	67784307	KR 9 CL 23 - 103	12711855	3128033294	12/12/2025	K-5419521-25	31/12/2025	OK
115	CALAMAR	ESTRATO 1	67784337	KR 5 CL 32 - 81	1007187309	3148499743	12/12/2025	K-5411445-25	31/12/2025	OK
116	CALAMAR	ESTRATO 1	67784508	CL 22A TV 3 - 108	30844642	3226665842	15/12/2025	K-5407361-25	31/12/2025	OK
117	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786930	KR 16 CL 16 - 71 CASA 18	30899025	3043882407	19/12/2025	K-5419536-25	31/12/2025	OK
118	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786971	KR 16 CL 16 - 25 CASA 25	30898171	3003793869	19/12/2025	K-5419531-25	31/12/2025	OK
119	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786959	KR 16 CL 16 - 19 CASA 26	8500386	3003793869	19/12/2025	K-5411247-25	31/12/2025	OK
120	HATO VIEJO	ESTRATO 1	67784878	KR 9 CL 6 - 241	73267659	3106658607	16/12/2025	K-5407526-25	31/12/2025	OK
121	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786923	KR 16 CL 16 - 12 CASA 14	52724313	3045471567	19/12/2025	K-5419530-25	31/12/2025	OK
122	HATO VIEJO	ESTRATO 1	67784884	KR 10 CL 9 - 71	3826418	3012795070	16/12/2025	K-5419550-25	31/12/2025	OK
123	HATO VIEJO	ESTRATO 1	67784887	KR 9 CL 6 - 22	30896133	3213621433	16/12/2025	K-5411738-25	31/12/2025	OK
124	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786977	KR 16 CL 16 - 6 CASA 15	73475665	3112403974	19/12/2025	K-5419498-25	31/12/2025	OK
125	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67803392	CL 17B KR 16A - 12	45749039	3011113838	19/02/2026	K-5544093-25	28/02/2026	OK
126	HATO VIEJO	ESTRATO 1	67784890	KR 10 CL 9 - 68	22848521	3012795070	16/12/2025	K-5419555-25	31/12/2025	OK
127	HATO VIEJO	ESTRATO 1	67785439	KR 10 CL 9 - 83 LT _	7912130	3136995524	16/12/2025	K-5419554-25	2/01/2026	OK
128	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786939	KR 16 CL 16 - 18 CASA 13	1050004239	3243580695	19/12/2025	K-5419499-25	2/01/2026	OK
129	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786991	KR 16 CL 16 - 26 CASA 12	45748772	3005244701	19/12/2025	K-5419537-25	2/01/2026	OK
130	HATO VIEJO	ESTRATO 1	67785448	KR 5 CL 5 - 94	1045307726	3223606473	16/12/2025	K-5419428-25	2/01/2026	OK
131	HATO VIEJO	ESTRATO 1	67785451	KR 5 CL 6 - 40 LT _	1002409727	3234723491	16/12/2025	K-5419429-25	2/01/2026	OK
132	HATO VIEJO	ESTRATO 1	67785760	KR 7 CL 9 - 87	1002409610	3106861674	17/12/2025	K-5419551-25	2/01/2026	OK
133	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786936	KR 15 CL 16 - 49 CASA 22	1049535858	3244558379	19/12/2025	K-5419426-25	2/01/2026	OK
134	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786965	KR 15 CL 16 - 69 CASA 17	1050005338	3003398958	19/12/2025	K-5419421-25	2/01/2026	OK
135	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786974	KR 15 CL 16 - 65 CASA 18	73476358	3245413774	19/12/2025	K-5419523-25	2/01/2026	OK
136	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786983	KR 15 CL 16 - 45 CASA 23	1050004820	3244558379	19/12/2025	K-5419424-25	2/01/2026	OK
137	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786968	KR 16 CL 16 - 32 CASA 11	45748691	3181519858	19/12/2025	K-5419533-25	2/01/2026	OK
138	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802260	KR 13B CL 18 - 17	1050007870	3003545980	19/02/2026	K-5492596-25	28/02/2026	OK

	CPROYECTOS S.A.S.	Código:
		Versión:
		Fecha:

INFORME DE INTERVENTORÍA

No 1	NOMBRE_LOCALIDAD	NOMBRE_SUBCATEGORIA	CONTRATO	DIRECCION	IDENTIFICACION	TELEFONO	FECHA_ELABORACION_VENTA	MEDIDOR	FECHA_LEGA_INST_CERTIFICADA	ESTUFA ENCENDIDA
139	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802297	KR 13B CL 18 - 6	1050005000	3008491097	19/02/2026	K-5544090-25	28/02/2026	OK
140	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802236	KR 13B CL 18 - 5	1002325187	3013098055	19/02/2026	K-5494923-25	28/02/2026	OK
141	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67800419	KR 16 CL 16 - 81 CASA 17	1050005501	3117095422	10/02/2026	K-5493202-25	1/03/2026	OK
142	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67800383	KR 16 CL 16 - 54 CASA 7	9600104	3046533299	10/02/2026	K-5493199-25	1/03/2026	OK
143	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67800386	KR 16 CL 16 - 60 CASA 6	49768331	3007118184	10/02/2026	K-5493197-25	1/03/2026	OK
144	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67800371	KR 16 CL 16 - 35 CASA 23	1050005055	3011726752	10/02/2026	K-5493201-25	1/03/2026	OK
145	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802069	KR 14 CL 17C - 18	1002325158	3001178470	18/02/2026	K-5493303-25	1/03/2026	OK
146	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802075	KR 14 CL 17C - 12	1050006639	3005010075	18/02/2026	K-5493304-25	1/03/2026	OK
147	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802090	KR 14 CL 17C - 6	1050004885	3217926214	18/02/2026	K-5493305-25	1/03/2026	OK
148	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67800368	KR 16 CL 16 - 43 CASA 22	45748883	3013053496	10/02/2026	K-5493205-25	1/03/2026	OK
149	BARRANCA VIEJA	ESTRATO 1	67784757	KR 8 CL 22 - 29	1002410349	3132671285	15/12/2025	K-5462782-25	26/12/2025	OK
150	BARRANCA NUEVA	ESTRATO 1	67784651	KR 11 CL 22 - 34 APTO 2	1001979049	3205535419	15/12/2025	K-5462610-25	26/12/2025	OK
151	BARRANCA NUEVA	ESTRATO 1	67784645	KR 11 CL 22 - 29	1007187457	3147904958	15/12/2025	K-5418276-25	26/12/2025	OK
152	BARRANCA VIEJA	ESTRATO 1	67784606	KR 7 CL 19 - 39	30843716	3146737401	15/12/2025	K-5462781-25	26/12/2025	OK
153	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67785945	KR 16B CL 18 - 18	1049538717	3046709172	17/12/2025	K-5362340-25	29/12/2025	OK
154	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67785936	KR 16B CL 18 - 23	73476018	3246510972	17/12/2025	K-5418265-25	29/12/2025	OK
155	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67785885	CL 21 KR 15 - 12	1050004308	3013264066	17/12/2025	K-5363247-25	29/12/2025	OK
156	BARRANCA NUEVA	ESTRATO 1	67784627	KR 2 CL 13A - 84	30843771	3015430544	15/12/2025	K-5462608-25	29/12/2025	OK
157	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67785915	KR 16B CL 18 - 41	1050006097	3016981363	17/12/2025	K-5363308-25	29/12/2025	OK
158	BARRANCA NUEVA	ESTRATO 1	67784636	CL 16 KR 2 - 49	1049264211	3243145491	15/12/2025	K-5462607-25	29/12/2025	OK
159	YUCAL	ESTRATO 1	67785419	CL 12 KR 7 - 100	1010150459	3235346363	16/12/2025	K-5363214-25	30/12/2025	OK
160	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67787034	KR 15 CL 17 - 39	73475562	3107684935	19/12/2025	K-5462709-25	3/01/2026	OK
161	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67787025	KR 15 CL 17 - 51	1050004339	3003793287	19/12/2025	K-5462708-25	3/01/2026	OK
162	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786111	KR 15 CL 19 - 5	32723100	3232891683	17/12/2025	K-5318812-25	3/01/2026	OK
163	BARRANCA VIEJA	ESTRATO 1	67784764	KR 5 CL 24 - 10	1002293923	3135291665	15/12/2025	K-5461991-25	5/01/2026	OK
164	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786756	KR 15 CL 16 - 78 CASA 3	1050005004	3243881110	19/12/2025	K-5419739-25	6/01/2026	OK
165	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67791885	CL 20 KR 15 - 17	1050004054	3116445790	13/01/2026	K-5543688-25	30/01/2026	OK
166	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67791882	CL 15A KR 11 - 9	1050006567	3216391020	13/01/2026	K-5543693-25	30/01/2026	OK
167	SOPLAVIENTO	ESTRATO 1	67791946	CL 5 KR 23 - 7 APTO 1	1051418712	3104054622	13/01/2026	K-5543687-25	30/01/2026	OK
168	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802266	KR 13A CL 18 - 17	1050007656	3003545980	19/02/2026	K-5494816-25	28/02/2026	OK
169	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802408	KR 13A CL 18 - 5	1051419677	3245842316	19/02/2026	K-5492599-25	28/02/2026	OK
170	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802405	KR 13A CL 18 - 24	1002324805	3006478548	19/02/2026	K-5494822-25	28/02/2026	OK
171	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802378	KR 13A CL 18 - 12	1050005003	3234978502	19/02/2026	K-5494823-25	28/02/2026	OK
172	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67803350	CL 17C KR 16B - 12	45748709	3042725004	19/02/2026	K-5544088-25	28/02/2026	OK
173	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802218	KR 13B CL 18 - 12	1050007029	3016230290	19/02/2026	K-5492604-25	28/02/2026	OK
174	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802012	CL 16 KR 14A - 18 CASA 11	1050004741	3001139703	18/02/2026	K-5493214-25	28/02/2026	OK
175	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802214	KR 16A CL 19 - 18	73507980	3106458615	19/02/2026	K-5494820-25	1/03/2026	OK
176	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802212	KR 16A CL 19 - 17	1050006478	3246006173	19/02/2026	K-5492605-25	1/03/2026	OK
177	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67800392	KR 17 CL 16 - 5 CASA 22	1050004458	3005955762	10/02/2026	K-5494936-25	1/03/2026	OK
178	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67800128	KR 17 CL 16 - 8 CASA 14	4008399	3006670348	10/02/2026	K-5494938-25	1/03/2026	OK
179	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67800416	KR 15 CL 16 - 70 CASA 4	22558108	3022105570	10/02/2026	K-5495092-25	1/03/2026	OK
180	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67800410	KR 15 CL 16 - 44 CASA 7	30896385	3212064733	10/02/2026	K-5495090-25	1/03/2026	OK
181	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67800398	KR 16 CL 16 - 50 CASA 8	73475942	3013053496	10/02/2026	K-5495095-25	1/03/2026	OK
182	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67800389	KR 15 CL 16 - 62 CASA 5	1002411117	3001309212	10/02/2026	K-5495093-25	1/03/2026	OK
183	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67800365	KR 17 CL 16 - 7 CASA 21	32865075	3017959466	10/02/2026	K-5493211-25	1/03/2026	OK
184	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67800362	KR 16 CL 16 - 70 CASA 4	1007208463	3136549234	10/02/2026	K-5495094-25	1/03/2026	OK

	CPROYECTOS S.A.S.	Código:
		Versión:
		Fecha:

INFORME DE INTERVENTORÍA

No 1	NOMBRE_LOCALIDAD	NOMBRE_SUBCATEGORIA	CONTRATO	DIRECCION	IDENTIFICACION	TELEFONO	FECHA_ELABORACION_VENTA	MEDIDOR	FECHA_LEGA_INST_CERTIFICADA	ESTUFA ENCENDIDA
185	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67803343	KR 16A CL 18 - 18	73475630	3128744864	19/02/2026	K-5494843-25	1/03/2026	OK
186	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802023	CL 16 KR 14A - 10 CASA 12	1002324845	3003363380	18/02/2026	K-5490411-25	1/03/2026	OK
187	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802009	CL 16 KR 14A - 9 CASA 15	73476032	3018704442	18/02/2026	K-5490453-25	1/03/2026	OK
188	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802096	KR 14 CL 18 - 18	23193879	3003545980	18/02/2026	K-5492886-25	1/03/2026	OK
189	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802060	KR 14 CL 18 - 12	73476277	3207322744	18/02/2026	K-5493004-25	1/03/2026	OK
190	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802036	KR 16 CL 16 - 7 CASA 28	4009410	3225968793	18/02/2026	K-5490454-25	1/03/2026	OK
191	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802048	KR 16 CL 17 - 20	1047386547	3216115241	18/02/2026	K-5490409-25	1/03/2026	OK
192	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786427	CL 19 KR 15 - 18	73476021	3013133510	18/12/2025	K-5419735-25	6/01/2026	OK
193	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786433	CL 19 KR 15 - 11	1050004179	3206120598	18/12/2025	K-5419732-25	6/01/2026	OK
194	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786597	KR 16A CL 20 - 6	1007028486	3002020567	18/12/2025	K-5411035-25	6/01/2026	OK
195	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786926	KR 16 CL 16 - 76 CASA 3	1050005253	3006506907	19/12/2025	K-5419585-25	6/01/2026	OK
196	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786750	KR 15 CL 16 - 86 CASA 2	45748964	3148115474	19/12/2025	K-5419736-25	6/01/2026	OK
197	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786956	KR 17 CL 16 - 6 CASA 15	1050007120	3003525202	19/12/2025	K-5419583-25	6/01/2026	OK
198	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786535	KR 16A CL 20 - 5	1050006821	3134848758	18/12/2025	K-5419602-25	6/01/2026	OK
199	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786484	CL 19 KR 15 - 17	22539567	3003331410	18/12/2025	K-5411796-25	6/01/2026	OK
200	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802054	KR 16 CL 17 - 52	22376820	3005762066	18/02/2026	K-5490413-25	1/03/2026	OK
201	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786553	KR 16A CL 20 - 12	1050005296	3043030206	18/12/2025	K-5419552-25	6/01/2026	OK
202	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786487	CL 19 KR 15 - 35	19896827	3205605410	18/12/2025	K-5411800-25	6/01/2026	OK
203	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786565	KR 16A CL 20 - 23	73475354	3002429189	18/12/2025	K-5419604-25	6/01/2026	OK
204	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786541	CL 19 KR 15 - 54	45748882	3018965547	18/12/2025	K-5419731-25	6/01/2026	OK
205	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786475	KR 16A CL 20 - 29	32835899	3243739323	18/12/2025	K-5419579-25	6/01/2026	OK
206	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786953	KR 16 CL 16 - 64 CASA 5	73475889	3144466207	19/12/2025	K-5419586-25	6/01/2026	OK
207	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786559	KR 16A CL 20 - 17	1050005401	3135905350	18/12/2025	K-5419600-25	6/01/2026	OK
208	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786514	CL 19 KR 15 - 47	45748499	3018965547	18/12/2025	K-5419730-25	6/01/2026	OK
209	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786571	KR 16B CL 17D - 11	73475491	3052796295	18/12/2025	K-5419577-25	6/01/2026	OK
210	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786523	CL 19 KR 15 - 23	45748723	3014916138	18/12/2025	K-5411794-25	6/01/2026	OK
211	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786920	KR 16 CL 16 - 47 CASA 21	30898257	3207608964	19/12/2025	K-5419582-25	6/01/2026	OK
212	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786568	CL 20 KR 15 - 48	1050004440	3116445790	18/12/2025	K-5411799-25	6/01/2026	OK
213	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786606	KR 16A CL 20 - 24	45749056	3113564293	18/12/2025	K-5419578-25	6/01/2026	OK
214	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786490	KR 16A CL 20 - 35	1002325229	3008689117	18/12/2025	K-5419482-25	6/01/2026	OK
215	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786591	CL 17D KR 16B - 12	73475736	3112632755	18/12/2025	K-5419573-25	6/01/2026	OK
216	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786550	CL 19 KR 15 - 30	73476023	3013136292	18/12/2025	K-5411798-25	6/01/2026	OK
217	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786496	KR 16A CL 20 - 41	1050006932	3233904304	18/12/2025	K-5419553-25	6/01/2026	OK
218	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786547	CL 19 KR 15 - 48	1050007578	3226496487	18/12/2025	K-5419733-25	6/01/2026	OK
219	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786914	KR 16 CL 16 - 80 CASA 2	1050005196	3006710732	19/12/2025	K-5419587-25	6/01/2026	OK
220	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786430	CL 19 KR 15 - 12	45563706	3026647120	18/12/2025	K-5411793-25	6/01/2026	OK
221	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786532	KR 16A CL 20 - 11	1143341134	3145043977	18/12/2025	K-5419603-25	6/01/2026	OK
222	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786588	CL 20 KR 15 - 41	1193110210	3016449912	18/12/2025	K-5411795-25	7/01/2026	OK
223	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786481	KR 16B CL 18 - 59	45748522	3015158011	18/12/2025	K-5419572-25	7/01/2026	OK
224	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786556	KR 16B CL 17C - 6	1050006030	3022293940	18/12/2025	K-5419576-25	7/01/2026	OK
225	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786945	KR 16 CL 16 - 65 CASA 19	1050004647	3207608964	19/12/2025	K-5419532-25	7/01/2026	OK
226	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786962	KR 15 CL 16 - 15 CASA 28	73475022	3235670824	19/12/2025	K-5411791-25	7/01/2026	OK
227	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786594	KR 16B CL 17C - 18	23192440	3243880863	18/12/2025	K-5419584-25	7/01/2026	OK
228	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786986	KR 15 CL 16 - 35 CASA 25	1047517449	3011161513	19/12/2025	K-5419734-25	7/01/2026	OK
229	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786600	KR 16B CL 17C - 12	1050005170	3013840664	18/12/2025	K-5419575-25	7/01/2026	OK
230	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786580	KR 16B CL 17D - 18	1050008790	3133600620	18/12/2025	K-5419574-25	7/01/2026	OK

	CPROYECTOS S.A.S.	Código:
		Versión:
		Fecha:

INFORME DE INTERVENTORÍA

No 1	NOMBRE_LOCALIDAD	NOMBRE_SUBCATEGORIA	CONTRATO	DIRECCION	IDENTIFICACION	TELEFONO	FECHA_ELABORACION_VENTA	MEDIDOR	FECHA_LEGA_INST_CERTIFICADA	ESTUFA ENCENDIDA
231	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67787037	KR 15 CL 16 - 41 CASA 24	73476255	3116445790	19/12/2025	K-5419737-25	7/01/2026	OK
232	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786493	KR 16B CL 18 - 77	73475865	3016916345	18/12/2025	K-5419570-25	7/01/2026	OK
233	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786436	KR 16B CL 18 - 65	1050004984	3016916345	18/12/2025	K-5419571-25	7/01/2026	OK
234	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786980	KR 15 CL 16 - 94 CASA 1	1048215697	3006911785	19/12/2025	K-5419738-25	7/01/2026	OK
235	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786505	KR 16B CL 18 - 83	73475947	3122533781	18/12/2025	K-5419580-25	7/01/2026	OK
236	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786933	KR 15 CL 16 - 61 CASA 19	73476105	3208262009	19/12/2025	K-5419425-25	7/01/2026	OK
237	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786989	KR 15 CL 16 - 5 CASA 29	30898050	3044295067	19/12/2025	K-5411792-25	7/01/2026	OK
238	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67800206	KR 17 CL 16 - 26 CASA 10	1007570284	3137801231	10/02/2026	K-5494941-25	1/03/2026	OK
239	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802203	CL 19 KR 15 - 29	1002324700	3146173976	19/02/2026	K-5544096-25	2/03/2026	OK
240	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67803274	CL 18 KR 16B - 17	1050006658	3116975410	19/02/2026	K-5495064-25	2/03/2026	OK
241	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802284	KR 13A CL 17C - 23	4009347	3225004196	19/02/2026	K-5495132-25	2/03/2026	OK
242	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67800223	KR 17 CL 16 - 32 CASA 8	1050004482	3013226642	10/02/2026	K-5494942-25	2/03/2026	OK
243	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67803262	KR 16B CL 20 - 18	19897042	3006675822	19/02/2026	K-5494916-25	2/03/2026	OK
244	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802511	KR 16B CL 20 - 24	1050006080	3008900751	19/02/2026	K-5495126-25	2/03/2026	OK
245	BARRANCA VIEJA	ESTRATO 1	67784550	CL 17 KR 3 - 34	30895241	3143519534	15/12/2025	K-5419520-25	8/01/2026	OK
246	BARRANCA VIEJA	ESTRATO 1	67784547	CL 13 KR 8 - 42	3826398	3126311731	15/12/2025	K-5419524-25	8/01/2026	OK
247	BARRANCA NUEVA	ESTRATO 1	67784460	KR 2 CL 23 - 7	8688379	3116902026	15/12/2025	K-5419522-25	8/01/2026	OK
248	BARRANCA NUEVA	ESTRATO 1	67784499	KR 2 CL 13 - 115	1051359668	3235167680	15/12/2025	K-5419527-25	8/01/2026	OK
249	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786508	CL 20 KR 15 - 42	45748896	3014842990	18/12/2025	K-5411105-25	8/01/2026	OK
250	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786544	CL 20 KR 15 - 30	22583864	3233371847	18/12/2025	K-5411102-25	8/01/2026	OK
251	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786499	CL 20 KR 15 - 36	1050004356	3225103463	18/12/2025	K-5411101-25	8/01/2026	OK
252	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786577	CL 20 KR 15 - 54	1050004046	3012161978	18/12/2025	K-5411103-25	8/01/2026	OK
253	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786609	KR 16A CL 21 - 6	45748625	3244606277	18/12/2025	K-5411876-25	9/01/2026	OK
254	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786526	KR 16A CL 18 - 23	1050004191	3233371853	18/12/2025	K-5411039-25	9/01/2026	OK
255	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786421	KR 16B CL 20 - 12	1050004697	3014565243	18/12/2025	K-5411878-25	9/01/2026	OK
256	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786409	KR 16B CL 18 - 89	73475460	3008616664	18/12/2025	K-5411873-25	9/01/2026	OK
257	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786424	KR 16B CL 20 - 36	73475673	3206296436	18/12/2025	K-5411874-25	9/01/2026	OK
258	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786412	KR 16B CL 20 - 30	73475805	3007970099	18/12/2025	K-5411879-25	9/01/2026	OK
259	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786520	KR 16B CL 20 - 6	1050004941	3016916345	18/12/2025	K-5411875-25	9/01/2026	OK
260	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786418	CL 21 KR 15 - 11	1050005132	3045211491	18/12/2025	K-5411104-25	9/01/2026	OK
261	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786478	KR 16A CL 21 - 12	39017424	3243739323	18/12/2025	K-5411877-25	9/01/2026	OK
262	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67803271	KR 16B CL 18 - 5	1083432946	3137884477	19/02/2026	K-5495134-25	2/03/2026	OK
263	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802227	CL 21 KR 15 - 5	23145020	3216857060	19/02/2026	K-5494839-25	2/03/2026	OK
264	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802281	KR 17 CL 17 - 4	45748757	3003892991	19/02/2026	K-5494922-25	2/03/2026	OK
265	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67800251	KR 17 CL 16 - 15 CASA 20	45748985	3013600832	10/02/2026	K-5494371-25	2/03/2026	OK
266	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67800413	KR 17 CL 16 - 41 CASA 15	1050004467	3043003581	10/02/2026	K-5494366-25	2/03/2026	OK
267	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67800220	KR 17 CL 16 - 40 CASA 7	45749081	3011941049	10/02/2026	K-5494370-25	2/03/2026	OK
268	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786415	KR 12 CL 16 - 6	73144929	3206947215	18/12/2025	K-5411107-25	19/01/2026	OK
269	HATO VIEJO	ESTRATO 1	67785764	CL 5 KR 4 - 21	1002294116	3233271197	17/12/2025	K-5419487-25	19/01/2026	OK
270	CALAMAR	ESTRATO 1	67784541	CL 28 TV 3 - 82	30897893	3108473970	15/12/2025	K-5411001-25	19/01/2026	OK
271	HATO VIEJO	ESTRATO 1	67785445	KR 6 CL 9 - 56	1051357472	3118759479	16/12/2025	K-5419483-25	19/01/2026	OK
272	BARRANCA NUEVA	ESTRATO 1	67784496	CL 13A KR 10 - 74	1051357143	3022274356	15/12/2025	K-5419528-25	19/01/2026	OK
273	HATO VIEJO	ESTRATO 1	67785442	KR 6 CL 8 - 8	73268381	3216481151	16/12/2025	K-5419486-25	19/01/2026	OK
274	HATO VIEJO	ESTRATO 1	67784779	CL 8 KR 4 - 73	1051357481	3216448362	15/12/2025	K-5419485-25	19/01/2026	OK
275	HATO VIEJO	ESTRATO 1	67784881	KR 6 CL 6 - 20 LT _	1049265048	3145157685	16/12/2025	K-5419481-25	19/01/2026	OK
276	CALAMAR	ESTRATO 1	67791891	CL 34 KR 3 - 35	30897349	3106395390	13/01/2026	K-5411144-25	19/01/2026	OK

	CPROYECTOS S.A.S.	Código: Versión: Fecha:

INFORME DE INTERVENTORÍA

No 1	NOMBRE_LOCALIDAD	NOMBRE_SUBCATEGORIA	CONTRATO	DIRECCION	IDENTIFICACION	TELEFONO	FECHA_ELABORACION_VENTA	MEDIDOR	FECHA_LEGA_INST_CERTIFICADA	ESTUFA ENCENDIDA
277	CALAMAR	ESTRATO 1	67791368	KR 4 CL 34 - 70 APTO 1	30844062	3234561715	8/01/2026	K-5411149-25	19/01/2026	OK
278	CALAMAR	ESTRATO 2	67791359	KR 4 CL 34 - 99 APTO 1	1051357879	3207842141	8/01/2026	K-5411147-25	19/01/2026	OK
279	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786562	CL 19 KR 15 - 36	45748474	3022009351	18/12/2025	K-5411797-25	19/01/2026	OK
280	CALAMAR	ESTRATO 1	67791356	TV 3 CL 29 - 103 APTO 1	1051359730	3117254652	8/01/2026	K-5543795-25	20/01/2026	OK
281	CALAMAR	ESTRATO 1	67791362	KR 7 CL 26 - 41 APTO 2	30896217	3116698693	8/01/2026	K-5450048-25	20/01/2026	OK
282	CALAMAR	ESTRATO 1	67791365	CL 43 KR 1 - 15	8803454	3135680936	8/01/2026	K-5411831-25	20/01/2026	OK
283	BARRANCA NUEVA	ESTRATO 1	67791371	KR 6 CL 21 - 52	1051358553	3147920739	8/01/2026	K-5411146-25	20/01/2026	OK
284	BARRANCA NUEVA	ESTRATO 1	67791852	KR 6 CL 21 - 46	1020750035	3122410086	13/01/2026	K-5490127-25	20/01/2026	OK
285	BARRANCA NUEVA	ESTRATO 1	67792964	KR 4 CL 13 - 36	30896766	3104293606	15/01/2026	K-5490129-25	20/01/2026	OK
286	BARRANCA VIEJA	ESTRATO 1	67792967	KR 8 CL 19 - 67	1051356422	3205053806	15/01/2026	K-5490135-25	21/01/2026	OK
287	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67800137	KR 17 CL 16 - 14 CASA 13	1002324743	3024340441	10/02/2026	K-5493207-25	2/03/2026	OK
288	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802443	KR 7 CL 14 - 24	23193439	3113985159	19/02/2026	K-5494825-25	2/03/2026	OK
289	BARRANCA VIEJA	ESTRATO 1	67791909	KR 8 CL 9 - 15	30897112	3137809239	13/01/2026	K-5490133-25	22/01/2026	OK
290	CALAMAR	ESTRATO 1	67791352	KR 4 CL 34 - 30 APTO 1	30843760	3116715477	8/01/2026	K-5411141-25	22/01/2026	OK
291	CALAMAR	ESTRATO 1	67791888	KR 1 CL 29 - 66 APTO 2	1051358297	3005029188	13/01/2026	K-5490131-25	23/01/2026	OK
292	HATO VIEJO	ESTRATO 1	67791859	KR 7 CL 9 - 85	1002409609	3106861674	13/01/2026	K-5488107-25	25/01/2026	OK
293	HATO VIEJO	ESTRATO 1	67791864	KR 7 CL 6 - 173	30896973	3147522097	13/01/2026	K-5488106-25	25/01/2026	OK
294	HATO VIEJO	ESTRATO 2	67791875	CL 6 KR 5 - 17	7912334	3132471796	13/01/2026	K-5488109-25	26/01/2026	OK
295	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802507	KR 7 CL 11 - 31	4009316	3148796125	19/02/2026	K-5494844-25	2/03/2026	OK
296	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802072	KR 13B CL 17C - 5	1002324924	3245444691	18/02/2026	K-5494908-25	2/03/2026	OK
297	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802200	CL 21 KR 15 - 29	1050004986	3216857060	19/02/2026	K-5544092-25	2/03/2026	OK
298	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802208	CL 21 KR 15 - 53	19896724	3006337887	19/02/2026	K-5495127-25	2/03/2026	OK
299	YUCAL	ESTRATO 1	67792946	CL 12 KR 8 - 19	73271460	3234529542	15/01/2026	K-5488110-25	31/01/2026	OK
300	HATO VIEJO	ESTRATO 1	67791870	KR 8 CL 9 - 7	73268006	3106503088	13/01/2026	K-5488113-25	31/01/2026	OK
301	HATO VIEJO	ESTRATO 1	67792958	KR 8 CL 6 - 229	7912272	3217797049	15/01/2026	K-5488114-25	31/01/2026	OK
302	YUCAL	ESTRATO 1	67791858	CL 4 KR 3 - 52	22738452	3116727672	13/01/2026	K-5490126-25	31/01/2026	OK
303	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802224	CL 21 KR 15 - 24	1050004336	3018680060	19/02/2026	K-5494824-25	2/03/2026	OK
304	SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	ESTRATO 1	67800122	CL 34 KR 28 - 66 APTO 2	1049537068	3137512673	10/02/2026	K-5494988-25	3/03/2026	OK
305	SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	ESTRATO 2	67800431	CL 19 KR 12 - 178 APTO 1	23071702	3135559759	10/02/2026	K-5494987-25	3/03/2026	OK
306	SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	ESTRATO 1	67800434	KR 14 CL 34 - 248	7958332	3222346458	10/02/2026	K-5418128-25	3/03/2026	OK
307	SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	ESTRATO 1	67800440	CL 34 KR 21 - 41	1049534245	3006542889	10/02/2026	K-5493817-25	3/03/2026	OK
308	SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	ESTRATO 1	67800443	KR 14 CL 34 - 252	1049532188	3104910095	10/02/2026	K-5418124-25	3/03/2026	OK
309	BARRANCA VIEJA	ESTRATO 1	67803745	KR 8 CL 12 - 48	1049264873	3137147502	20/02/2026	K-5492755-25	3/03/2026	OK
310	CALAMAR	ESTRATO 1	67793113	TV 3 CL 11 - 117	1003434571	3014466897	15/01/2026	K-5488350-25	11/02/2026	OK
311	BARRANCA NUEVA	ESTRATO 1	67803573	CL 10 KR 5A - 82	73268717	3018765962	20/02/2026	K-5492753-25	3/03/2026	OK
312	CALAMAR	ESTRATO 1	67795187	TV 3 CL 24 - 54 APTO 1	30897230	3016852731	26/01/2026	K-5488108-25	12/02/2026	OK
313	CALAMAR	ESTRATO 1	67791897	CL 17 TV 1A - 124	1051362498	3005745053	13/01/2026	K-5411142-25	12/02/2026	OK
314	BARRANCA NUEVA	ESTRATO 1	67803543	CL 10 KR 5A - 92	1051360361	3106348743	20/02/2026	K-5492752-25	3/03/2026	OK
315	HATO VIEJO	ESTRATO 1	67800809	CL 4 KR 6 - 8	30895756	3242393874	11/02/2026	K-5494807-25	26/02/2026	OK
316	HATO VIEJO	ESTRATO 1	67801901	CL 2 KR 6 - 4	8743683	3126529277	18/02/2026	K-5495476-25	26/02/2026	OK
317	HATO VIEJO	ESTRATO 1	67800184	CL 4 KR 4 - 35 LT _	1045307574	3242393874	10/02/2026	K-5495479-25	26/02/2026	OK
318	HATO VIEJO	ESTRATO 1	67801908	CL 7A KR 5 - 28	30896362	3003669843	18/02/2026	K-5495478-25	26/02/2026	OK

	CPROYECTOS S.A.S.	Código: Versión: Fecha:

INFORME DE INTERVENTORÍA

No 1	NOMBRE_LOCALIDAD	NOMBRE_SUBCATEGORIA	CONTRATO	DIRECCION	IDENTIFICACION	TELEFONO	FECHA_ELABORACION_VENTA	MEDIDOR	FECHA_LEGA_INST_CERTIFICADA	ESTUFA ENCENDIDA
319	HATO VIEJO	ESTRATO 1	67795193	CL 7A KR 5 - 18	77018809	3216482474	26/01/2026	K-5488112-25	26/02/2026	OK
320	HATO VIEJO	ESTRATO 1	67801905	KR 6 CL 7 - 58	1045309968	3127189077	18/02/2026	K-5495480-25	26/02/2026	OK
321	SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	ESTRATO 1	67800125	KR 27 CL 15A - 17	1049532859	3148939764	10/02/2026	K-5494991-25	4/03/2026	OK
322	SATO	ESTRATO 1	67791879	CL 2 KR 12 - 93	36725238	3104402567	13/01/2026	K-5488111-25	27/02/2026	OK
323	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802018	CL 15 KR 14A - 10 CASA 18	73475577	3145654953	18/02/2026	K-5493212-25	4/03/2026	OK
324	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802006	CL 15 KR 14A - 5 CASA 20	1047373005	3219309046	18/02/2026	K-5493213-25	4/03/2026	OK
325	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67800233	KR 17 CL 16 - 54 CASA 5	45749135	3022453718	10/02/2026	K-5493209-25	4/03/2026	OK
326	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67800395	KR 17 CL 16 - 25 CASA 18	33130534	3104574399	10/02/2026	K-5494367-25	4/03/2026	OK
327	SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	ESTRATO 1	67800446	KR 14 CL 34 - 242	7958494	3218182380	10/02/2026	K-5493818-25	4/03/2026	OK
328	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67800374	KR 17 CL 16 - 92 CASA 1	45748459	3045547024	10/02/2026	K-5490448-25	4/03/2026	OK
329	BARRANCA VIEJA	ESTRATO 1	67803648	CL 10 KR 5 - 25	22844385	3147527375	20/02/2026	K-5494643-25	4/03/2026	OK
330	SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	ESTRATO 1	67803633	CL 32 KR 34 - 15 APTO 1	1049536438	3125569401	20/02/2026	K-5490452-25	4/03/2026	OK
331	SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	ESTRATO 1	67803636	CL 34 KR 33 - 5 APTO 1	1049534788	3145034778	20/02/2026	K-5490451-25	4/03/2026	OK
332	SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	ESTRATO 1	67803546	KR 33 CL 16 - 22	7959751	3145626713	20/02/2026	K-5494992-25	4/03/2026	OK
333	SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	ESTRATO 2	67800428	CL 29 KR 16 - 25 PISO 2	23071007	3024190706	10/02/2026	K-5494989-25	4/03/2026	OK
334	YUCAL	ESTRATO 1	67800957	CL 11 KR 1 - 13	22852425	3215346960	11/02/2026	K-5494636-25	4/03/2026	OK
335	BARRANCA VIEJA	ESTRATO 1	67803594	CL 9 KR 4 - 58	22847294	3116091620	20/02/2026	K-5494641-25	4/03/2026	OK
336	BARRANCA VIEJA	ESTRATO 1	67803615	CL 8 KR 4 - 77	30897584	3233667876	20/02/2026	K-5494639-25	4/03/2026	OK
337	HATO VIEJO	ESTRATO 1	67800257	KR 8 CL 6 - 215	45481706	3136092270	10/02/2026	K-5494815-25	5/03/2026	OK
338	YUCAL	ESTRATO 1	67800818	CL 12 KR 2 - 27	1019081104	3215351571	11/02/2026	K-5494638-25	5/03/2026	OK
339	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802084	KR 16B CL 17B - 18	1050004970	3012047714	18/02/2026	K-5490414-25	6/03/2026	OK
340	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67800404	KR 17 CL 16 - 39 CASA 16	1051417635	3042781178	10/02/2026	K-5494939-25	7/03/2026	OK
341	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67801917	KR 14 CL 15A - 23	45748886	3232887345	18/02/2026	K-5492895-25	7/03/2026	OK
342	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802251	KR 17 CL 17 - 16	30567716	3105135732	19/02/2026	K-5494919-25	7/03/2026	OK
343	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67800245	KR 4 CL 15 - 32	45748611	3022690456	10/02/2026	K-5495089-25	9/03/2026	OK
344	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802066	KR 13B CL 17C - 18	1151471232	3244352590	18/02/2026	K-5493300-25	9/03/2026	OK
345	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802399	KR 13A CL 18 - 6	6115798	3207465205	19/02/2026	K-5494925-25	9/03/2026	OK
346	BARRANCA VIEJA	ESTRATO 1	67803742	KR 5 CL 11A - 60	1049265032	3233241176	20/02/2026	K-5494637-25	28/02/2026	OK
347	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802206	KR 15 CL 20 - 23	73475408	3024162763	19/02/2026	K-5494845-25	9/03/2026	OK
348	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802520	KR 15 CL 21 - 5	73475996	3135814552	19/02/2026	K-5494818-25	9/03/2026	OK
349	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67800230	KR 4 CL 15 - 25	45748359	3025666570	10/02/2026	K-5493196-25	9/03/2026	OK
350	SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	ESTRATO 1	67803618	CL 38 KR 25 - 36	7961600	3243096759	20/02/2026	K-5494994-25	9/03/2026	OK
351	SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	ESTRATO 1	67800119	CL 31 KR 28 - 30	12906636	3023301950	10/02/2026	K-5494990-25	9/03/2026	OK
352	SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	ESTRATO 1	67803715	CL 23 KR 37 - 235	1047488084	3152914848	20/02/2026	K-5490450-25	9/03/2026	OK
353	SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	ESTRATO 1	67803673	URBANIZACION VILLA VALENTINA MZ N CASA 10	1131106608	3216989972	20/02/2026	K-5492894-25	9/03/2026	OK
354	SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	ESTRATO 2	67803400	KR 33 CL 21 - 20 APTO 1	1049532710	3205052143	19/02/2026	K-5494995-25	9/03/2026	OK
355	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67800425	CL 16 KR 14A - 5 CASA 14	1050005695	3043596299	10/02/2026	K-5493208-25	10/03/2026	OK
356	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67801994	KR 14 CL 16 - 93	19896734	3012463753	18/02/2026	K-5492893-25	10/03/2026	OK

	CPROYECTOS S.A.S.	Código: Versión: Fecha:

INFORME DE INTERVENTORÍA

No 1	NOMBRE_LOCALIDAD	NOMBRE_SUBCATEGORIA	CONTRATO	DIRECCION	IDENTIFICACION	TELEFONO	FECHA_ELABORACION_VENTA	MEDIDOR	FECHA_LEGA_INST_CERTIFICADA	ESTUFA ENCENDIDA
357	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802014	CL 15 KR 14A - 16 CASA 17	1050007671	3239918745	18/02/2026	K-5493210-25	10/03/2026	OK
358	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67801997	KR 7 CL 10 - 36	1048660126	3246876093	18/02/2026	K-5494517-25	12/03/2026	OK
359	HATO VIEJO	ESTRATO 1	67784893	CL 1A SUR KR 4 - 116	1051817064	3135716003	16/12/2025	K-5419484-25	16/03/2026	OK
360	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808708	KR 8 CL 21 - 108	1002307057	3180283759	13/03/2026	K-5642108-26	24/03/2026	OK
361	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808560	CL 21 KR 5 - 33 APTO 2	1002307685	3215049854	12/03/2026	K-5642115-26	24/03/2026	OK
362	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808501	CL 12 KR 4 - 29	32941482	3135067604	12/03/2026	K-5642290-26	24/03/2026	OK
363	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808460	CL 21 KR 5 - 43	23073411	3177596317	12/03/2026	K-5642109-26	24/03/2026	OK
364	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808448	CL 21 KR 5 - 33	1049535089	3232017614	12/03/2026	K-5642110-26	24/03/2026	OK
365	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808442	CL 12 KR 4 - 42	1049534017	3158288120	12/03/2026	K-5642291-26	24/03/2026	OK
366	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67809014	KR 8 CL 21 - 70	1049535806	3104039100	13/03/2026	K-5623504-26	24/03/2026	OK
367	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808490	CL 10B KR 25 - 55	23073556	3235353271	12/03/2026	K-5642247-26	24/03/2026	OK
368	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808484	CL 10B KR 25 - 48	73132260	3175473433	12/03/2026	K-5642249-26	24/03/2026	OK
369	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808508	CL 10B KR 25 - 49	1193538857	3135274931	12/03/2026	K-5642248-26	24/03/2026	OK
370	SOPLAVIENTO	ESTRATO 2	67808939	KR 21 CL 6 - 3	19896480	3006579378	13/03/2026	K-5642268-26	26/03/2026	OK
371	SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	ESTRATO 1	67809496	KR 27 CL 34 - 30	1101685337	3014574565	17/03/2026	SH-21069627-25	26/03/2026	OK
372	SOPLAVIENTO	ESTRATO 2	67808946	KR 21 CL 6 - 15	19897271	3019576098	13/03/2026	K-5642266-26	26/03/2026	OK
373	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808517	CL 15 KR 7 - 70	1049533465	3126730540	12/03/2026	K-5623498-26	27/03/2026	OK
374	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808493	CL 11 KR 4 - 40	32941045	3215406267	12/03/2026	K-5642236-26	27/03/2026	OK
375	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808487	CL 12 KR 4 - 57	45749559	3105205140	12/03/2026	K-5642288-26	27/03/2026	OK
376	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808478	CL 15 KR 5 - 55 LT _	32940826	3107037183	12/03/2026	K-5642237-26	27/03/2026	OK
377	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808436	KR 5 CL 17 - 5	1049533498	3226595088	12/03/2026	K-5642107-26	27/03/2026	OK
378	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808829	CL 17 KR 5 - 64	3946277	3136139853	13/03/2026	K-5623503-26	27/03/2026	OK
379	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808554	CL 17 KR 5 - 162	3946328	3106718212	12/03/2026	K-5623502-26	27/03/2026	OK
380	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808551	KR 5 CL 15 - 47	1131379019	3136918173	12/03/2026	K-5623505-26	27/03/2026	OK
381	HIGUERETAL	ESTRATO 1	67810868	CL 5 KR 12 - 22	1002325111	3125784563	20/03/2026	K-5493721-25	28/03/2026	OK
382	HIGUERETAL	ESTRATO 1	67810912	CL 3 KR 6 - 18	23192488	3135945580	20/03/2026	K-5493720-25	28/03/2026	OK
383	HIGUERETAL	ESTRATO 1	67810202	CL 4 KR 1 - 24	19896680	3114145625	18/03/2026	K-5493719-25	28/03/2026	OK
384	HIGUERETAL	ESTRATO 1	67810871	CL 6 KR 13 - 54	1051417987	3106179089	20/03/2026	K-5642287-26	28/03/2026	OK
385	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808904	KR 19 CL 14 - 35	1049534252	3226990287	13/03/2026	K-5642101-26	28/03/2026	OK
386	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808716	KR 19 CL 15 - 78	32941453	3217096706	13/03/2026	K-5490386-25	28/03/2026	OK
387	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808711	KR 8 CL 18 - 35	1193280257	3147329132	13/03/2026	K-5642113-26	28/03/2026	OK
388	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808451	KR 12 CL 17 - 147	1044931562	3225784305	12/03/2026	K-5419568-25	28/03/2026	OK
389	SOPLAVIENTO	ESTRATO 1	67808820	KR 20 CL 12 - 32	45749017	3015767682	13/03/2026	K-5642208-26	30/03/2026	OK
390	LAS CRUCES	ESTRATO 1	67809992	KR 2 CL 3 - 52	1002325057	3125966941	18/03/2026	K-5623499-26	30/03/2026	OK
391	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67811499	CL 19 KR 12 - 70	45749134	3224975469	24/03/2026	SH-21070150-25	30/03/2026	OK
392	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67810931	KR 5 CL 23 - 68	45514647	3135489185	20/03/2026	SH-21069715-25	30/03/2026	OK
393	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67810876	KR 9 CL 16 - 25 CASA 2	1050006352	3014245451	20/03/2026	K-5642281-26	30/03/2026	OK
394	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67810147	KR 4 CL 24 - 6	1002325314	3246498863	18/03/2026	K-5642280-26	30/03/2026	OK
395	LAS CRUCES	ESTRATO 1	67810138	CL 4 KR 2 - 26	1002325018	3137036167	18/03/2026	K-5623500-26	30/03/2026	OK
396	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67811524	CL 19 KR 12 - 42	23059555	3207752325	24/03/2026	SH-21070142-25	30/03/2026	OK
397	SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	ESTRATO 1	67808284	KR 25 CL 18 - 21 APTO 1	23191721	3188419909	11/03/2026	K-5493722-25	30/03/2026	OK
398	SOPLAVIENTO	ESTRATO 1	67809021	KR 14 CL 10 - 10	19896093	3226100794	13/03/2026	K-5642211-26	30/03/2026	OK

	CPROYECTOS S.A.S.	Código: Versión: Fecha:

INFORME DE INTERVENTORÍA

No 1	NOMBRE_LOCALIDAD	NOMBRE_SUBCATEGORIA	CONTRATO	DIRECCION	IDENTIFICACION	TELEFONO	FECHA_ELABORACION_VENTA	MEDIDOR	FECHA_LEGA_INST_CERTIFICADA	ESTUFA ENCENDIDA
399	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67808454	KR 7 CL 10 - 45	45748860	3113832512	12/03/2026	K-5642279-26	30/03/2026	OK
400	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67811496	KR 11 CL 18 - 13	45748986	3223671750	24/03/2026	SH-21070146-25	30/03/2026	OK
401	LAS CRUCES	ESTRATO 1	67809989	CL 3 KR 2 - 64	1051418304	3225104746	18/03/2026	SH-21070184-25	30/03/2026	OK
402	SOPLAVIENTO	ESTRATO 1	67808814	KR 19 CL 6 - 83	23191472	3045951909	13/03/2026	K-5642212-26	NO REGISTRA	OK
403	SOPLAVIENTO	ESTRATO 1	67812217	KR 22A CL 6 - 17	23191634	3005786171	25/03/2026	K-5493718-25	30/03/2026	OK
404	SOPLAVIENTO	ESTRATO 1	67812214	KR 24 CL 12 - 30	1051417335	3013788828	25/03/2026	K-5493716-25	30/03/2026	OK
405	LAS CRUCES	ESTRATO 1	67810184	CL 4 KR 2 - 36	1050005382	3104186950	18/03/2026	K-5623497-26	30/03/2026	OK
406	LAS CRUCES	ESTRATO 1	67810115	CL 2 KR 4 - 90	1045307304	3127335244	18/03/2026	SH-21069545-25	30/03/2026	OK
407	SOPLAVIENTO	ESTRATO 2	67808733	KR 15 CL 10 - 34 APTO 1	23191674	3122383357	13/03/2026	K-5642269-26	30/03/2026	OK
408	SOPLAVIENTO	ESTRATO 2	67808730	KR 15 CL 10 - 6 APTO 1	19895111	3006258445	13/03/2026	K-5642272-26	30/03/2026	OK
409	SOPLAVIENTO	ESTRATO 1	67808720	CL 11 KR 14 - 29	19895124	3235073167	13/03/2026	K-5642207-26	30/03/2026	OK
410	SOPLAVIENTO	ESTRATO 2	67808817	CL 12 KR 15 - 46 APTO 1	30898890	3006605709	13/03/2026	K-5642213-26	30/03/2026	OK
411	SOPLAVIENTO	ESTRATO 1	67809018	TV 10 DG 14 - 186	23191980	3007547706	13/03/2026	K-5642215-26	30/03/2026	OK
412	SOPLAVIENTO	ESTRATO 1	67808949	TV 10 DG 14 - 200	32867731	3222693169	13/03/2026	K-5642214-26	30/03/2026	OK
413	CALAMAR	ESTRATO 1	67810112	CL 10 TV 2A - 32	22376196	3006555854	18/03/2026	SH-21070177-25	30/03/2026	OK
414	SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	ESTRATO 1	67809486	KR 35 CL 19 - 98	1049532862	3233622379	17/03/2026	SH-21070261-25	31/03/2026	OK
415	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808496	KR 5 CL 18 - 34	32941389	3137269071	12/03/2026	K-5642112-26	31/03/2026	OK
416	CALAMAR	ESTRATO 1	67784660	CL 41B KR 7 - 43 APTO 1	1051357332	3207250771	15/12/2025	K-5462643-25	1/04/2026	OK
417	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808466	CL 10B KR 25 - 7	23073462	3215101635	12/03/2026	SH-21070237-25	4/04/2026	OK
418	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808481	CL 10A KR 25 - 7	73557802	3117160108	12/03/2026	SH-21070288-25	4/04/2026	OK
419	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808457	CL 10A KR 25 - 18	1131379058	3225015613	12/03/2026	SH-21070233-25	4/04/2026	OK
420	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808520	CL 10A KR 25 - 37	32942229	3226202331	12/03/2026	SH-21070239-25	4/04/2026	OK
421	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808713	CL 10A KR 25 - 48	30765370	3207188246	13/03/2026	SH-21070234-25	4/04/2026	OK
422	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808811	CL 10A KR 25 - 36	23073653	3206560084	13/03/2026	SH-21070235-25	4/04/2026	OK
423	SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	ESTRATO 2	67811518	CL 26 KR 38 - 114 APTO 1	1049533139	3234445326	24/03/2026	K-5493717-25	4/04/2026	OK
424	SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	ESTRATO 1	67812194	URBANIZACION VILLA VALENTINA- 0 MZ C1 CASA 2	1049532095	3184599540	25/03/2026	K-5493723-25	4/04/2026	OK
425	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808472	CL 12 KR 10 - 78	23073550	3205049309	12/03/2026	K-5642240-26	7/04/2026	OK
426	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808463	CL 11 KR 9 - 83	23073423	3147359257	12/03/2026	K-5642243-26	7/04/2026	OK
427	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808958	KR 16 CL 19 - 95	73556299	3108908536	13/03/2026	K-5493808-25	7/04/2026	OK
428	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808952	KR 16 CL 17 - 202	32941951	3233961125	13/03/2026	K-5642097-26	7/04/2026	OK
429	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808934	CL 17 KR 16 - 3 APTO 2	1044917840	3225060390	13/03/2026	K-5642096-26	7/04/2026	OK
430	BARRANCA VIEJA	ESTRATO 1	67803597	CL 9 KR 4 - 38	30843686	3125145182	20/02/2026	K-5494640-25	4/03/2026	OK
431	CALAMAR	ESTRATO 1	67803406	KR 2 CL 43 - 4	1051356519	3218745518	19/02/2026	K-5494813-25	18/03/2026	OK
432	BARRANCA NUEVA	ESTRATO 1	67801911	CL 22 KR 6 - 25	1007187444	3127751914	18/02/2026	K-5492750-25	18/03/2026	OK
433	BARRANCA NUEVA	ESTRATO 1	67803549	CL 10 KR 6 - 210	30896675	3142178276	20/02/2026	K-5495686-25	18/03/2026	OK
434	BARRANCA NUEVA	ESTRATO 1	67803570	CL 10 KR 5A - 35	1051359071	3104285241	20/02/2026	K-5492754-25	18/03/2026	OK
435	CALAMAR	ESTRATO 1	67803403	KR 7 CL 26 - 37 APTO 2	1051358452	3002404809	19/02/2026	K-5492904-25	18/03/2026	OK

	CPROYECTOS S.A.S.	Código:
		Versión:
		Fecha:

INFORME DE INTERVENTORÍA

No 1	NOMBRE_LOCALIDAD	NOMBRE_SUBCATEGORIA	CONTRATO	DIRECCION	IDENTIFICACION	TELEFONO	FECHA_ELABORACION_VENTA	MEDIDOR	FECHA_LEGA_INST_CERTIFICADA	ESTUFA ENCENDIDA
436	CALAMAR	ESTRATO 1	67803765	CL 19B TV 3 - 37 APTO 1	30896887	3023040149	20/02/2026	K-5492903-25	18/03/2026	OK
437	SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	ESTRATO 1	67810118	CL 34 KR 28 - 76 PISO 2 APTO 1	32942261	3106243825	18/03/2026	SH-21069622-25	26/03/2026	OK
438	CALAMAR	ESTRATO 1	67808269	KR 4 CL 32 - 40	1002409139	3234904202	11/03/2026	K-5623098-26	26/03/2026	OK
439	CALAMAR	ESTRATO 1	67808278	CL 27 TV 3 - 90 APTO 1	1051357381	3007906838	11/03/2026	K-5641980-26	26/03/2026	OK
440	SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	ESTRATO 2	67809986	CL 23 KR 29 - 80	32941867	3208800949	18/03/2026	SH-21070268-25	26/03/2026	OK
441	SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	ESTRATO 1	67809501	KR 35 CL 15B - 58	1103123880	3151168077	17/03/2026	SH-21070269-25	26/03/2026	OK
442	SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	ESTRATO 1	67809546	KR 36A CL 27 - 39	1051419381	3003177628	17/03/2026	SH-21069625-25	26/03/2026	OK
443	SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	ESTRATO 1	67810358	CL 32 KR 33A - 36 APTO 1	7957243	3205749635	19/03/2026	SH-21069626-25	26/03/2026	OK
444	CALAMAR	ESTRATO 1	67810934	CL 12 TV 1A - 69 APTO 2	73267956	3019249516	20/03/2026	SH-21070296-25	26/03/2026	OK
445	SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	ESTRATO 1	67810163	CL 32 KR 33A - 30	32940509	3205749635	18/03/2026	SH-21069628-25	26/03/2026	OK
446	CALAMAR	ESTRATO 1	67810915	CL 11 TV 1A - 31 APTO 1	1051357883	3017350235	20/03/2026	SH-21070293-25	26/03/2026	OK
447	BARRANCA NUEVA	ESTRATO 1	67808937	CL 10 KR 6 - 170 LT _	1051357419	3206773052	13/03/2026	K-5642037-26	27/03/2026	OK
448	HATO VIEJO	ESTRATO 1	67800815	CL 5 KR 12 - 215	1050950480	3126797377	11/02/2026	K-5489734-25	27/03/2026	OK
449	BARRANCA VIEJA	ESTRATO 1	67809540	KR 4 CL 19 - 32	30844814	3116605372	17/03/2026	K-5642036-26	27/03/2026	OK
450	CALAMAR	ESTRATO 1	67809520	TV 3 CL 26 - 82	73270214	3024266357	17/03/2026	SH-21070179-25	30/03/2026	OK
451	HATO VIEJO	ESTRATO 1	67808275	CL 7A KR 4 - 26	1045309956	3105223904	11/03/2026	SH-21070297-25	30/03/2026	OK
452	CALAMAR	ESTRATO 1	67810191	TV 3 CL 22 - 104 APTO	30844674	3205310791	18/03/2026	SH-21070172-25	30/03/2026	OK
453	CALAMAR	ESTRATO 1	67810927	CL 17 TV 1A - 39	73271620	3014631138	20/03/2026	SH-21070175-25	30/03/2026	OK
454	CALAMAR	ESTRATO 2	67810858	CL 19 KR 7 - 127 APTO 2	28150311	3117647789	20/03/2026	SH-21070130-25	30/03/2026	OK
455	CALAMAR	ESTRATO 1	67810865	CL 42 KR 7 - 19 APTO 2	30844448	3105367931	20/03/2026	SH-21067966-25	30/03/2026	OK
456	CALAMAR	ESTRATO 1	67810874	KR 4 CL 26 - 44	73266267	3017346577	20/03/2026	SH-21067970-25	30/03/2026	OK
457	ARROYO HONDO	ESTRATO 1	67812448	KR 5 CL 2 - 19	9315605	3044240066	25/03/2026	SH-21070156-25	31/03/2026	OK
458	SATO	ESTRATO 1	67814713	CL 2 KR 8 - 5 APTO 2	1045307968	3135506574	26/03/2026	SH-21068691-25	31/03/2026	OK
459	ARROYO HONDO	ESTRATO 1	67812389	CL 2 KR 4A - 25	22845828	3247864095	25/03/2026	SH-21068276-25	31/03/2026	OK
460	SATO	ESTRATO 1	67814725	CL 2 KR 8 - 46	30895563	3205305936	26/03/2026	SH-21068694-25	31/03/2026	OK
461	ARROYO HONDO	ESTRATO 1	67812392	KR 4A CL 2 - 9	30895875	3104579444	25/03/2026	SH-21068693-25	31/03/2026	OK
462	SATO	ESTRATO 1	67814710	CL 2 KR 9A - 71	1045306789	3145577813	26/03/2026	SH-21068695-25	31/03/2026	OK
463	ARROYO HONDO	ESTRATO 2	67812401	CL 3 KR 2 - 20 APTO 1	30897718	3015219682	25/03/2026	SH-21070158-25	31/03/2026	OK
464	SATO	ESTRATO 1	67814719	CL 3 KR 9A - 46	1127953221	3106869484	26/03/2026	SH-21070159-25	31/03/2026	OK

	CPROYECTOS S.A.S.	Código: Versión: Fecha:

INFORME DE INTERVENTORÍA

No 1	NOMBRE_LOCALIDAD	NOMBRE_SUBCATEGORIA	CONTRATO	DIRECCION	IDENTIFICACION	TELEFONO	FECHA_ELABORACION_VENTA	MEDIDOR	FECHA_LEGA_INST_CERTIFICADA	ESTUFA ENCENDIDA
465	SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	ESTRATO 2	67810361	KR 14 CL 32 - 63	1049535895	3009503813	19/03/2026	K-5642028-26	31/03/2026	OK
466	YUCAL	ESTRATO 1	67812211	KR 7 CL 2 - 32	1051358934	3226930844	25/03/2026	SH-21067962-25	31/03/2026	OK
467	SATO	ESTRATO 1	67814812	CL 3 KR 9A - 130	73270228	3006899157	26/03/2026	SH-21070153-25	31/03/2026	OK
468	BARRANCA NUEVA	ESTRATO 1	67812208	CL 10 KR 6 - 200	1051357126	3229532383	25/03/2026	SH-21067969-25	31/03/2026	OK
469	SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	ESTRATO 2	67809983	CL 22 KR 33 - 18 APTO 1	72313005	3016903902	18/03/2026	SH-21068697-25	31/03/2026	OK
470	BARRANCA VIEJA	ESTRATO 1	67810457	KR 4 CL 17 - 4	32625601	3114223627	19/03/2026	SH-21067965-25	31/03/2026	OK
471	CALAMAR	ESTRATO 1	67814748	TV 7 CL 11 - 15	1047402939	3019846556	26/03/2026	SH-21068547-25	31/03/2026	OK
472	SATO	ESTRATO 1	67814716	CL 3 KR 11 - 64	1051356194	3122760613	26/03/2026	SH-21068294-25	31/03/2026	OK
473	SATO	ESTRATO 1	67814729	CL 3 KR 11 - 49	3830110	3235305168	26/03/2026	SH-21068295-25	31/03/2026	OK
474	SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	ESTRATO 1	67810187	KR 21 CL 34 - 132 APTO 1	22600380	3126952542	18/03/2026	K-5642031-26	1/04/2026	OK
475	CALAMAR	ESTRATO 1	67811665	CL 42 KR 7A - 18	1051361834	3126852878	24/03/2026	SH-21070171-25	1/04/2026	OK
476	CALAMAR	ESTRATO 1	67810861	CL 28 TV 3 - 76 APTO 1	1083434603	3224948088	20/03/2026	SH-21067968-25	1/04/2026	OK
477	SATO	ESTRATO 1	67815588	CL 2 KR 12 - 39	1051358227	3108361781	27/03/2026	K-5642027-26	1/04/2026	OK
478	ARROYO HONDO	ESTRATO 2	67812232	KR 1C CL 1A - 60	9315460	3242937170	25/03/2026	SH-21068696-25	1/04/2026	OK
479	ARROYO HONDO	ESTRATO 2	67812223	CL 4 KR 3 - 31	30895373	3243065825	25/03/2026	SH-21068698-25	1/04/2026	OK
480	SATO	ESTRATO 1	67814707	CL 3 KR 9 - 149	1007280061	3127120619	26/03/2026	SH-21070152-25	1/04/2026	OK
481	SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	ESTRATO 1	67810501	KR 36 CL 15B - 61	3945137	3016562656	19/03/2026	SH-21070300-25	1/04/2026	OK
482	CALAMAR	ESTRATO 1	67784917	CL 22 KR 4 - 119 APTO 1	1051357580	3014474049	16/12/2025	K-5407368-25	24/12/2025	OK
483	BARRANCA NUEVA	ESTRATO 1	67784633	CL 22 KR 9 - 75	1051822464	3209528218	15/12/2025	K-5462084-25	26/12/2025	OK
484	BARRANCA NUEVA	ESTRATO 1	67784618	CL 19 KR 4 - 22	73265713	3146900849	15/12/2025	K-5418278-25	26/12/2025	OK
485	CALAMAR	ESTRATO 2	67783523	KR 2 CL 36 - 122	22844235	3126270139	11/12/2025	K-5407528-25	26/12/2025	OK
486	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67785918	CL 21 KR 15 - 41	23190454	3011755995	17/12/2025	K-5363246-25	29/12/2025	OK
487	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67785908	CL 21 KR 15 - 18	1050005186	3043786661	17/12/2025	K-5363245-25	29/12/2025	OK
488	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67785894	CL 21 KR 15 - 36	1050005707	3206889493	17/12/2025	K-5363248-25	29/12/2025	OK
489	BARRANCA NUEVA	ESTRATO 1	67784624	KR 2 CL 13A - 52	30896105	3206085312	15/12/2025	K-5363591-25	29/12/2025	OK
490	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67785903	KR 16B CL 18 - 12	7912644	3246510972	17/12/2025	K-5362344-25	29/12/2025	OK
491	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67785775	CL 21 KR 15 - 6	1047515029	3011755995	17/12/2025	K-5418289-25	29/12/2025	OK
492	BARRANCA NUEVA	ESTRATO 1	67784621	KR 2 CL 13 - 4	3827759	3128159265	15/12/2025	K-5462151-25	29/12/2025	OK
493	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67785773	KR 16A CL 18 - 5	73475437	3017320419	17/12/2025	K-5406975-25	29/12/2025	OK
494	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786406	KR 16B CL 18 - 35	73008942	3016981363	18/12/2025	K-5407811-25	29/12/2025	OK
495	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67803368	CL 17C KR 16B - 27	22539573	3246006510	19/02/2026	K-5492668-25	25/02/2026	OK
496	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802254	CL 17B KR 13B - 28	45748659	3013766507	19/02/2026	K-5495056-25	28/02/2026	OK
497	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802402	KR 13B CL 18 - 18	1050004915	3042343564	19/02/2026	K-5495063-25	28/02/2026	OK
498	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67800380	KR 16 CL 16 - 29 CASA 24	22584013	3046199104	10/02/2026	K-5493198-25	1/03/2026	OK

INFORME DE INTERVENTORÍA

No 1	NOMBRE_LOCALIDAD	NOMBRE_SUBCATEGORIA	CONTRATO	DIRECCION	IDENTIFICACION	TELEFONO	FECHA_ELABORACION_VENTA	MEDIDOR	FECHA_LEGA_INST_CERTIFICADA	ESTUFA ENCENDIDA
499	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802063	KR 14 CL 17C - 24	45748994	3052078566	18/02/2026	K-5493302-25	1/03/2026	OK
500	SOPLAVIENTO	ESTRATO 1	67801914	CL 4 KR 1A - 52	1051418434	3006153733	18/02/2026	K-5490406-25	12/03/2026	OK

IMAGEN 22.-ESTADO DE INFORMACION DE LA CONEXIÓN Y NUMERO DE MEDIDOR

INFORME DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO GRUPO GARCIA S.A.S

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17020:2012
13-OIN-009

INFORME DE INSPECCIÓN DE INSTALACIÓN A GAS
Resolución 90902 de 24 de octubre de 2013 del Ministerio de Minas y Energía
Resolución 41385 de 07 de diciembre de 2017 del Ministerio de Minas y Energía

N°	1452978
Código	FT-T-01
Fecha	29/05/2025
Versión	21
CIO	146301476

INFORMACIÓN USUARIO

Nombre de usuario	YOHALIS DEL CARMEN VILLA HERNANDEZ	Dirección	KR 13B CL 17C - 18
Nombre de distribuidor de gas	gases del caribe	Medidor	K-5493300-25

FECHAS


Fecha de expedición	07/03/2026	Hora inicio	08:20	Hora fin	08:48
Revisión de instalación	Nueva	Tipo de instalación	Unifamiliar		
Fecha de instalación del servicio	02/03/2026	Fecha de la última certificación			

LÍNEA MATRIZ

La edificación cuenta con línea matriz	No	Nombre OIA	- -

CONSTRUCTOR DE LA INSTALACIÓN (NUEVA - REFORMADA)		INFORMACIÓN DE LA ORDEN			
Nombre del constructor	lebinto olibera	N° Orden de trabajo	394798233		
Código RUFI	9177672	N° Contrato	67802066		
Entidad certificadora	Sena	N° Medidor			
Fecha vencimiento certificado	31/03/2026	Celular	3244352590	Localidad	SAN CRISTOBAL

PLANTA - ISOMETRICO

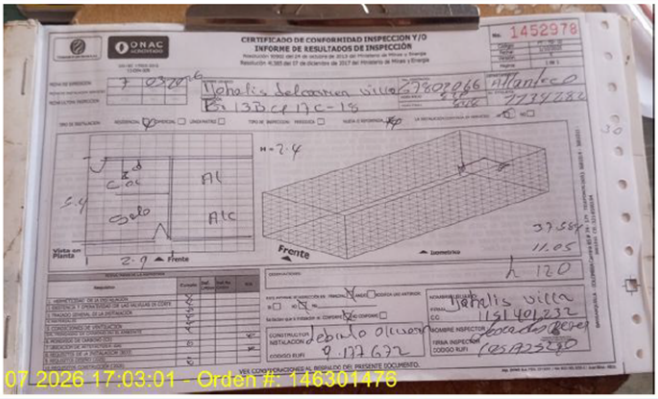

OBSERVACIÓN DE LA ORDEN

certificado

IMAGEN 23.-CERTIFICACION DEL ORGANISMO DE LA ONAC AVALANDO LOS TRABAJOS REALIZADOS

IMAGEN 24.-VERIFICACION DE NUMERO DE MEDIDOR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA







IMAGEN 25.-VERIFICACION DE LLAMA ENCENDIDA

6.5.2 INFORME AMBIENTAL Y SST

Informe Componente Recurso Humano Seguridad y Salud en el Trabajo Interventoría

Durante el período evaluado, la interventoría desarrolló actividades de seguimiento y control interno relacionadas con la gestión del recurso humano y la implementación de medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) del personal de interventoría vinculado al proyecto de instalación y suministro de gas domiciliario en comunidades que anteriormente no contaban con este servicio.

En cumplimiento de sus obligaciones, la interventoría verificó que el personal asignado al proyecto contara con afiliación vigente al Sistema General de Seguridad Social Integral, incluyendo EPS, ARL y Caja de Compensación Familiar, garantizando el cumplimiento de la normatividad laboral y de seguridad social aplicable.

De igual manera, la interventoría aseguró el suministro y uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP), conforme a las actividades ejecutadas y a los riesgos asociados a las labores desarrolladas en campo. Asimismo, realizó seguimiento permanente al cumplimiento de las normas de seguridad industrial,

condiciones seguras de trabajo y buenas prácticas operativas durante la ejecución de las actividades de supervisión y acompañamiento técnico.

Adicionalmente, la interventoría mantuvo control sobre el desarrollo de las actividades en campo, promoviendo el respeto hacia las comunidades beneficiarias y las poblaciones vecinas intervenidas, así como el adecuado manejo de las condiciones de convivencia y seguridad durante la ejecución del proyecto.

Como parte de las medidas de prevención y bienestar laboral, la interventoría garantizó el suministro de hidratación al personal en campo, con el propósito de prevenir afectaciones derivadas de la exposición prolongada a altas temperaturas y minimizar riesgos asociados a golpes de calor y fatiga térmica.

Componente Ambiental – Interventoría

Durante el período evaluado, la interventoría desarrolló actividades de seguimiento, control y acompañamiento ambiental en el marco del proyecto de instalación y suministro de gas domiciliario, con el propósito de garantizar la ejecución de las actividades bajo criterios de sostenibilidad y respeto por el entorno intervenido.

En cumplimiento de sus funciones, la interventoría verificó que las actividades ejecutadas en las áreas intervenidas se realizaran minimizando cualquier afectación a las condiciones ambientales, garantizando el adecuado manejo de las zonas de trabajo, el respeto por las condiciones físicas de cada vivienda y la conservación del entorno de las comunidades beneficiarias.

Asimismo, la interventoría efectuó acompañamiento permanente a las actividades desarrolladas en campo, realizando seguimiento al manejo adecuado de excavaciones, disposición temporal de materiales y control de los residuos generados durante la ejecución de las obras, verificando el cumplimiento de buenas prácticas ambientales y de orden y limpieza en las áreas intervenidas.

De igual manera, se supervisó que las actividades constructivas se desarrollaran bajo criterios de prevención y mitigación de impactos ambientales, promoviendo acciones orientadas a la protección del entorno y a la adecuada recuperación de las áreas intervenidas una vez finalizadas las actividades.

Como resultado de las medidas implementadas y del seguimiento realizado por la interventoría, no se evidenciaron impactos ambientales significativos ni afectaciones al entorno, permitiendo garantizar la sostenibilidad del proyecto y el cumplimiento de buenas prácticas ambientales durante la ejecución de las actividades.

6.5.3-COMITÉ ADMINISTRATIVO

	CPROYECTOS S.A.S.	Código: Versión: Fecha:

INFORME DE INTERVENTORÍA

GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR	**SECRETARÍA DE MINAS Y ENERGÍA**	**ACTA No.006**
	REUNIÓN DE SEGUIMIENTO GASES DEL CARIBE S.A.S Y CPROYECTOS S.A.S DENTRO DEL MARCO DEL CONVENIO No. 137 de 2025 y No.3019 de 2026.	**FECHA:13-03 -2026**

Acta No. SGE - 006-2026	**Forma de convocatoria:**	**Fecha (DD/MM/AA)**	**Hora inicia**	**Hora finaliza**
	Presencial	13-03-2026	**10:00 a.m.**	**12:00 m.**
Plataforma (reunión virtual)		**Lugar de la reunión (reunión presencial)**		
N/A		Secretaria de minas y energía (CAD)		
Responsable de la reunión		Federico Pinilla		
Redacción del acta		María Angelica Vasquez		
Revisión de compromisos		Enilse Rodríguez Rodríguez		

ecopetrol	**Formato Acta Comité de Seguimiento a la Ejecución del Convenio**		
	Gestión de Convenios **Vicepresidencia Corporativa Jurídica y Secretaría General**		
	CODIGO **GCO-F-039**	**Elaborado** **27/06/2025**	**Versión: 4**

Acta No:	08	**Fecha (dd/mm/aaaa)**	10/03/2026
Tema	Comité de Seguimiento y Control del Convenio del Convenio Específico Interadministrativo No. 3055257		
Responsable	María Fernanda Cortés Mosquera	**Área/Empresa**	Ecopetrol - Gerencia de Planeación y Seguimiento Territorial y HSE
Ubicación / Edificio / Piso	Vía teams	**Número de Convenio**	3055257
Hora Inicio:	10:00 a.m.	**Hora Fin:**	11:00 a.m.

INFORME DE INTERVENTORÍA

	Formato Acta Comité de Seguimiento a la Ejecución del Convenio		
ecopetrol	Gestión de Convenios Vicepresidencia Corporativa Jurídica y Secretaría General		
	CODIGO GCO-F-039	Elaborado 27/06/2025	Versión: 4

Acta No:	10	**Fecha (dd/mm/aaaa)**	14/04/2026
Tema	Comité de Seguimiento y Control del Convenio del Convenio Específico Interadministrativo No. 3055257		
Responsable	María Fernanda Cortés Mosquera	**Área/Empresa**	Ecopetrol - Gerencia de Planeación y Seguimiento Territorial y HSE
Ubicación / Edificio / Piso	Vía teams	**Número de Convenio**	3055257
Hora Inicio:	9:00 a.m.	**Hora Fin:**	10:00 a.m.

GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR	**SECRETARÍA DE MINAS Y ENERGÍA**	**ACTA No.007**
	REUNIÓN SEGUIMIENTO -CONVENIO No. 137 DE 2025 Y CONTRATO No. 3019 de 2026	**FECHA: 16-03-2026**

Acta No. SME-007	**Forma de convocatoria:**	**Fecha (DD/MM/AA)**	**Hora inicia**	**Hora finaliza**
	Presencial	16-03-2026	10:30	11:30
Plataforma (reunión virtual)		**Lugar de la reunión (reunión presencial)**		
N/A		Secretaria de minas y energía (CAD)		
Responsable de la reunión		Enilse Rodríguez Rodríguez		
Redacción del acta		María Luis Romero		
Revisión de compromisos		Enilse Rodríguez Rodríguez		

OBJETO DE LA REUNIÓN
Realizar seguimiento a las actividades establecidas en el **convenio No.137 de 2025** y el **contrato No.3019 de 2026,** en conjunto con la Secretaría General, así como verificar el estado del plazo del convenio y el contrato en mención, teniendo en cuenta que estos se encuentran por fuera del término del Convenio Marco firmado entre la Secretaría General y Ecopetrol. Lo anterior, en el marco de las funciones de supervisión ejercidas por la Secretaría de Minas y Energía.

INFORME DE INTERVENTORÍA

GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR	**SECRETARÍA DE MINAS Y ENERGÍA**	**ACTA No.002**
	Reunión de Seguimiento y Articulación-Convenio No. 3055257	**FECHA: 27-03-2026**

Acta No. SME-002	**Forma de convocatoria:**	**Fecha (DD/MM/AA)**	**Hora inicia**	**Hora finaliza**
	Presencial	26-03-2026	9:20 a.m.	12:00 m.
Plataforma (reunión virtual)		**Lugar de la reunión (reunión presencial)**		
N/A		Secretaria de minas y energía (CAD)		
Responsable de la reunión		**Enilse Rodríguez Rodríguez** - Secretaria de Minas y Energía		
Redacción del acta		**María Luis Romero** – Profesional universitario Grado 2		
Revisión de compromisos		**Enilse Rodríguez Rodríguez** - Secretaria de Minas y Energía		

IMAGEN 26.-COMITÉ ADMINISTRATIVO

6.5.3 RECORRIDO CON PERSONAL DE LA SUPERVISION DE GOBERNACION



IMAGEN 27. RECORRIDO CON PERSONAL DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR

ESTRATO 1	
LOCALIZACION	**CANTIDAD**
ARROYO HONDO	3
BARRANCA NUEVA	32
BARRANCA VIEJA	19

ESTRATO 2	
LOCALIZACION	**CANTIDAD**
ARROYO HONDO	3
BARRANCA NUEVA	
BARRANCA VIEJA	

INFORME DE INTERVENTORÍA

ESTRATO 1	
CALAMAR	100
HATO VIEJO	27
HIGUERETAL	4
LAS CARAS (CLEMENCIA)	
LAS CRUCES	5
LAS PIEDRAS	34
SAN CRISTOBAL	194
SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	24
SATO	10
SOPLAVIENTO	10
YUCAL	11
	473

ESTRATO 2	
CALAMAR	10
HATO VIEJO	1
HIGUERETAL	
LAS CARAS (CLEMENCIA)	
LAS CRUCES	
LAS PIEDRAS	
SAN CRISTOBAL	
SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	7
SATO	
SOPLAVIENTO	6
YUCAL	
	27

TABLA 18.-ESTRATOS DE USUARIOS EVIDENCIADOS Y REVISADOS EN ESTE INFORME


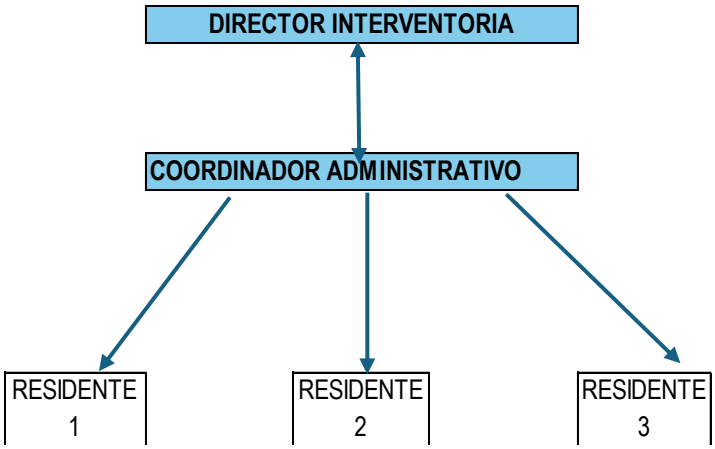


TABLA 19.-PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA INTERVENTORIA

7.-COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

INFORME DE INTERVENTORÍA

- Se evidencia que las conexiones fueron ejecutadas conforme a la normatividad vigente y a las especificaciones técnicas aplicables, contando con certificación acreditada por la ONAC, lo cual garantiza que cumplen con las condiciones de seguridad y funcionalidad requeridas.
- Se evidenció que Gases del Caribe utilizó materiales que cumplen con los estándares de calidad exigidos.
- No se observaron daños, defectos visibles ni irregularidades en los trabajos ejecutados, garantizando la adecuada funcionalidad de las conexiones.
- Las pruebas de hermeticidad realizadas arrojaron resultados satisfactorios, descartando la presencia de fugas o fallas en las conexiones.
- Así mismo, Gases del Caribe dejó constancia de la información suministrada a los beneficiarios, quienes cuentan con las instrucciones necesarias para la correcta operación del sistema.
- Se verificó que las conexiones fueron debidamente articuladas a la red principal de suministro, asegurando la continuidad del servicio a los usuarios.
- En consecuencia, las conexiones objeto del presente informe se encuentran aptas y en correcto funcionamiento.
- Finalmente, se recomienda realizar las revisiones periódicas conforme a la normatividad aplicable.
- Se solicitó al contratista actualizar las fechas de venta y certificaciones ONAC al momento de su ejecución, teniendo en cuenta que la información registrada presenta inconsistencias; específicamente, se evidencian diferencias entre la información en plataforma y las fechas consignadas en los formatos, lo cual genera falta de coincidencia en los registros. Lo anterior, con el fin de unificar la información y evitar confusiones. No obstante, dado que se trata de un aspecto asociado a la sistematización de GASES DEL CARIBE, el registro de la información en una fecha posterior no afecta ni modifica el resultado obtenido. SE ANEXA RESPUESTA DEL AREA CORRESPONDIENTE DE GASES DEL CARIBE SOBRE EL PRESENTE HALLAZGO:

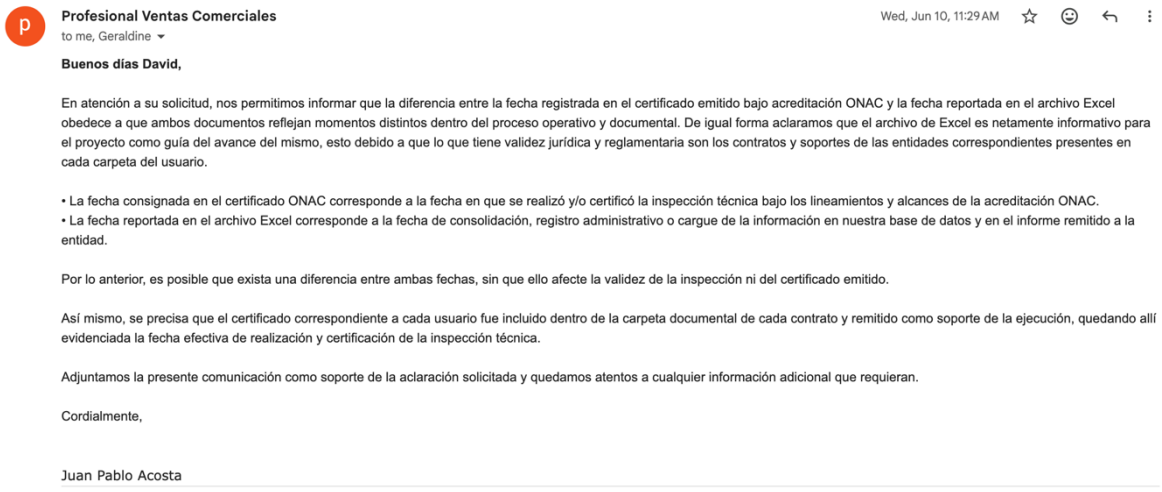

Profesional Ventas Comerciales
to me, Geraldine

Wed, Jun 10, 11:29 AM

Buenos días David,

En atención a su solicitud, nos permitimos informar que la diferencia entre la fecha registrada en el certificado emitido bajo acreditación ONAC y la fecha reportada en el archivo Excel obedece a que ambos documentos reflejan momentos distintos dentro del proceso operativo y documental. De igual forma aclaramos que el archivo de Excel es netamente informativo para el proyecto como guía del avance del mismo, esto debido a que lo que tiene validez jurídica y reglamentaria son los contratos y soportes de las entidades correspondientes presentes en cada carpeta del usuario.

• La fecha consignada en el certificado ONAC corresponde a la fecha en que se realizó y/o certificó la inspección técnica bajo los lineamientos y alcances de la acreditación ONAC.
• La fecha reportada en el archivo Excel corresponde a la fecha de consolidación, registro administrativo o cargue de la información en nuestra base de datos y en el informe remitido a la entidad.

Por lo anterior, es posible que exista una diferencia entre ambas fechas, sin que ello afecte la validez de la inspección ni del certificado emitido.

Así mismo, se precisa que el certificado correspondiente a cada usuario fue incluido dentro de la carpeta documental de cada contrato y remitido como soporte de la ejecución, quedando allí evidenciada la fecha efectiva de realización y certificación de la inspección técnica.

Adjuntamos la presente comunicación como soporte de la aclaración solicitada y quedamos atentos a cualquier información adicional que requieran.

Cordialmente,

Juan Pablo Acosta

- La presente interventoría deja constancia, mediante este informe, de que las 500 conexiones objeto del mismo se encuentran totalmente habilitadas y en uso; por lo tanto, se anexan los documentos que acreditan dicha circunstancia. Ver tabla adjunta de las conexiones

	CPROYECTOS S.A.S.	Código: Versión: Fecha:

INFORME DE INTERVENTORÍA

No 1	NOMBRE_LOCALIDAD	NOMBRE_SUBCATEGORIA	CONTRATO	DIRECCION	MEDIDOR	ACREDITACION BUEN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE LA CONEXIÓN
1	CALAMAR	ESTRATO 1	67783445	KR 2B CL 42A - 24	K-5543673-25	OK
2	CALAMAR	ESTRATO 1	67783508	KR 2B CL 43 - 3	K-5543675-25	OK
3	CALAMAR	ESTRATO 1	67783716	CL 43 KR 2B - 10	K-5544189-25	OK
4	CALAMAR	ESTRATO 1	67783405	CL 43 KR 2B - 29	K-5542865-25	OK
5	CALAMAR	ESTRATO 1	67783414	CL 43 KR 2B - 23	K-5544165-25	OK
6	CALAMAR	ESTRATO 1	67783434	CL 43 KR 2B - 11	K-5544161-25	OK
7	CALAMAR	ESTRATO 1	67783427	KR 2B CL 42A - 25	K-5544127-25	OK
8	CALAMAR	ESTRATO 1	67783461	KR 2B CL 42A - 36	K-5544129-25	OK
9	CALAMAR	ESTRATO 1	67783420	KR 2B CL 42A - 37	K-5544135-25	OK
10	CALAMAR	ESTRATO 1	67783578	KR 2B CL 43 - 9	K-5544191-25	OK
11	CALAMAR	ESTRATO 1	67783502	KR 2B CL 43 - 21	K-5543676-25	OK
12	CALAMAR	ESTRATO 1	67783517	KR 2B CL 43 - 25	K-5544131-25	OK
13	CALAMAR	ESTRATO 1	67784151	KR 2B CL 43 - 16	K-5542847-25	OK
14	CALAMAR	ESTRATO 1	67783520	CL 43A KR 2B - 17	K-5543771-25	OK
15	CALAMAR	ESTRATO 1	67783644	CL 43A KR 2B - 43	K-5543776-25	OK
16	CALAMAR	ESTRATO 1	67783575	CL 43A KR 2B - 33	K-5543774-25	OK
17	CALAMAR	ESTRATO 1	67783614	CL 43 KR 2B - 60	K-5544162-25	OK
18	CALAMAR	ESTRATO 1	67783572	CL 43A KR 2B - 37	K-5543773-25	OK
19	CALAMAR	ESTRATO 1	67783526	CL 43A KR 2B - 40	K-5543775-25	OK
20	CALAMAR	ESTRATO 1	67783497	KR 2B CL 43 - 29	K-5544133-25	OK
21	CALAMAR	ESTRATO 1	67783628	CL 43 KR 2B - 20	K-5544779-25	OK
22	CALAMAR	ESTRATO 1	67783455	CL 43A KR 2B - 46	K-5544786-25	OK
23	CALAMAR	ESTRATO 1	67783556	KR 2B CL 42A - 12	K-5544132-25	OK
24	CALAMAR	ESTRATO 1	67783505	KR 2A CL 43 - 3	K-5544781-25	OK
25	CALAMAR	ESTRATO 1	67783559	KR 2B CL 42A - 6	K-5544134-25	OK
26	CALAMAR	ESTRATO 1	67783680	KR 2A CL 43 - 4	K-5544187-25	OK
27	CALAMAR	ESTRATO 1	67784565	KR 2 CL 43 - 21 APTO 1	K-5544404-25	OK
28	CALAMAR	ESTRATO 1	67784148	KR 2A CL 43 - 27	K-5544783-25	OK
29	CALAMAR	ESTRATO 1	67784166	KR 2A CL 43 - 22	K-5544190-25	OK
30	CALAMAR	ESTRATO 1	67784154	KR 2A CL 43 - 16	K-5544782-25	OK
31	CALAMAR	ESTRATO 1	67784187	KR 2A CL 43 - 10	K-5544784-25	OK
32	CALAMAR	ESTRATO 1	67784202	KR 2A CL 43 - 15	K-5544785-25	OK
33	CALAMAR	ESTRATO 1	67784184	KR 2 CL 43 - 21	K-5544128-25	OK
34	CALAMAR	ESTRATO 1	67784328	KR 2 CL 43 - 22	K-5544400-25	OK
35	CALAMAR	ESTRATO 1	67784169	KR 2 CL 43 - 16	K-5544130-25	OK
36	CALAMAR	ESTRATO 1	67784172	KR 2 CL 43 - 10	K-5544402-25	OK
37	CALAMAR	ESTRATO 1	67784562	KR 2 CL 43 - 9 APTO 1	K-5544406-25	OK
38	CALAMAR	ESTRATO 1	67784193	KR 2 CL 43 - 15	K-5544398-25	OK
39	CALAMAR	ESTRATO 1	67783700	KR 2 CL 42 - 53	K-5544136-25	OK
40	CALAMAR	ESTRATO 1	67784178	KR 2A CL 43 - 9	K-5544777-25	OK
41	CALAMAR	ESTRATO 1	67783399	KR 5 CL 31 - 76	K-5411448-25	OK
42	CALAMAR	ESTRATO 1	67784313	CL 22 KR 4 - 33 APTO 1	K-5407365-25	OK
43	CALAMAR	ESTRATO 1	67784310	KR 5 CL 33 - 54	K-5411443-25	OK
44	CALAMAR	ESTRATO 1	67784163	CL 22A TV 3 - 166	K-5407363-25	OK
45	CALAMAR	ESTRATO 1	67783514	CL 37 KR 2 - 23	K-5407527-25	OK
46	CALAMAR	ESTRATO 1	67784331	CL 43 KR 2B - 17	K-5407525-25	OK
47	CALAMAR	ESTRATO 1	67783451	CL 31 TV 3 - 26	K-5543947-25	OK
48	CALAMAR	ESTRATO 2	67784181	KR 4 CL 33 - 27	K-5543985-25	OK
49	CALAMAR	ESTRATO 2	67784553	KR 4 CL 33 - 27 APTO 2	K-5411449-25	OK
50	CALAMAR	ESTRATO 1	67784340	CL 43A KR 2B - 22	K-5544399-25	OK
51	CALAMAR	ESTRATO 2	67784559	KR 4 CL 33 - 15	K-5411444-25	OK
52	CALAMAR	ESTRATO 1	67783664	CL 42A KR 1 - 15	K-5544403-25	OK
53	CALAMAR	ESTRATO 1	67784316	KR 1 CL 43 - 22	K-5407524-25	OK
54	CALAMAR	ESTRATO 2	67784175	KR 4 CL 34 - 99	K-5411441-25	OK
55	CALAMAR	ESTRATO 2	67784920	KR 4 CL 34 - 71 APTO 3	K-5411442-25	OK
56	BARRANCA VIEJA	ESTRATO 1	67784767	KR 5 CL 23 - 45	K-5363337-25	OK
57	CALAMAR	ESTRATO 1	67784319	KR 1 CL 43 - 28	K-5407522-25	OK
58	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67785876	CL 21 KR 15 - 17	K-5362346-25	OK
59	CALAMAR	ESTRATO 1	67784325	CL 43 KR 2B - 5	K-5544397-25	OK
60	CALAMAR	ESTRATO 1	67783417	KR 3 CL 43 - 25	K-5544401-25	OK
61	CALAMAR	ESTRATO 1	67785767	KR 3 CL 43A - 7	K-5407523-25	OK
62	CALAMAR	ESTRATO 1	67783568	CL 24 TV 3 - 47	K-5407362-25	OK
63	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786995	KR 16 CL 17 - 4	K-5361841-25	OK
64	CALAMAR	ESTRATO 1	67784484	CL 35 KR 4 - 20	K-5411446-25	OK
65	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67785939	CL 20 KR 15 - 12	K-5450330-25	OK
66	CALAMAR	ESTRATO 2	67784160	KR 3 CL 36 - 35	K-5407529-25	OK

	CPROYECTOS S.A.S.	Código: Versión: Fecha:

INFORME DE INTERVENTORÍA

No 1	NOMBRE_LOCALIDAD	NOMBRE_SUBCATEGORIA	CONTRATO	DIRECCION	MEDIDOR	ACREDITACION BUEN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE LA CONEXIÓN
67	CALAMAR	ESTRATO 1	67786303	CL 43 KR 2B - 30	K-5407521-25	OK
68	CALAMAR	ESTRATO 1	67784334	CL 43A KR 2B - 11 LT	K-5544405-25	OK
69	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67785927	CL 20 KR 15 - 5	K-5450331-25	OK
70	CALAMAR	ESTRATO 1	67783511	KR 7 CL 27 - 74	K-5411736-25	OK
71	CALAMAR	ESTRATO 1	67784301	KR 6 CL 32 - 33	K-5411733-25	OK
72	CALAMAR	ESTRATO 1	67784556	KR 6 CL 33 - 12	K-5411735-25	OK
73	BARRANCA NUEVA	ESTRATO 1	67784490	CL 15 KR 2 - 101	K-5407369-25	OK
74	BARRANCA NUEVA	ESTRATO 1	67784502	CL 15 KR 2 - 131	K-5407657-25	OK
75	BARRANCA NUEVA	ESTRATO 1	67784463	CL 15 KR 2 - 208	K-5407364-25	OK
76	BARRANCA NUEVA	ESTRATO 1	67784466	CL 15 KR 2 - 226	K-5407653-25	OK
77	CALAMAR	ESTRATO 1	67784478	KR 4 CL 34 - 72 APTO INT	K-5411737-25	OK
78	CALAMAR	ESTRATO 1	67784537	CL 32 KR 3 - 26	K-5543948-25	OK
79	CALAMAR	ESTRATO 1	67783562	TV 3 CL 29 - 29	K-5544778-25	OK
80	CALAMAR	ESTRATO 1	67783534	KR 4 CL 26 - 54	K-5411732-25	OK
81	CALAMAR	ESTRATO 1	67783431	CL 31 KR 6 - 57	K-5411731-25	OK
82	CALAMAR	ESTRATO 1	67784544	KR 7 CL 27 - 28	K-5411734-25	OK
83	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786108	CL 20 KR 15 - 18	K-5450327-25	OK
84	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67785900	CL 20 KR 15 - 11	K-5450328-25	OK
85	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67785897	CL 21 KR 15 - 42	K-5355343-25	OK
86	BARRANCA VIEJA	ESTRATO 1	67784911	KR 8 CL 17 - 75	K-5461917-25	OK
87	YUCAL	ESTRATO 1	67785403	KR 6 CL 7 - 27 APTO 2	K-5449989-25	OK
88	YUCAL	ESTRATO 1	67785409	CL 7 KR 6 - 64 APTO 2	K-5363217-25	OK
89	BARRANCA VIEJA	ESTRATO 1	67784603	KR 8 CL 17 - 81	K-5461911-25	OK
90	BARRANCA VIEJA	ESTRATO 1	67784761	KR 8 CL 22 - 5	K-5462784-25	OK
91	YUCAL	ESTRATO 1	67785365	CL 7 KR 6 - 64	K-5449991-25	OK
92	BARRANCA NUEVA	ESTRATO 1	67784788	CL 13 KR 5A - 3	K-5450307-25	OK
93	YUCAL	ESTRATO 1	67784898	CL 9 KR 2 - 4	K-5449984-25	OK
94	CALAMAR	ESTRATO 1	67784481	CL 11 TV 2 - 3	K-5407655-25	OK
95	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786917	KR 16 CL 16 - 82 CASA 1	K-5419588-25	OK
96	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67785948	CL 20 KR 15 - 29	K-5450326-25	OK
97	YUCAL	ESTRATO 1	67785374	KR 7 CL 8 - 106	K-5450258-25	OK
98	BARRANCA NUEVA	ESTRATO 1	67784630	CL 15 KR 7 - 13	K-5450345-25	OK
99	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67787019	KR 16 CL 17 - 40	K-5361843-25	OK
100	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67787031	KR 16 CL 17 - 5	K-5361839-25	OK
101	SOPLAVIENTO	ESTRATO 2	67791912	KR 12 CL 6 - 24	K-5543689-25	OK
102	BARRANCA NUEVA	ESTRATO 1	67784487	KR 10 CL 14 - 116	K-5407370-25	OK
103	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67792955	KR 16 CL 17 - 39	K-5490539-25	OK
104	CALAMAR	ESTRATO 1	67784654	KR 6 CL 33 - 88	K-5411143-25	OK
105	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802293	KR 13A CL 18 - 23	K-5492513-25	OK
106	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802099	KR 13B CL 17C - 17	K-5494910-25	OK
107	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802242	KR 13A CL 18 - 11	K-5490583-25	OK
108	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802081	KR 13B CL 17C - 23	K-5493298-25	OK
109	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802078	KR 13B CL 17C - 11	K-5493301-25	OK
110	BARRANCA NUEVA	ESTRATO 1	67784472	CL 19 KR 11 - 18	K-5419526-25	OK
111	BARRANCA NUEVA	ESTRATO 1	67784469	CL 19 KR 9 - 39	K-5407367-25	OK
112	BARRANCA NUEVA	ESTRATO 1	67784349	KR 11 CL 22 - 34	K-5407366-25	OK
113	CALAMAR	ESTRATO 2	67783565	KR 3 CL 36 - 111	K-5407530-25	OK
114	BARRANCA NUEVA	ESTRATO 1	67784307	KR 9 CL 23 - 103	K-5419521-25	OK
115	CALAMAR	ESTRATO 1	67784337	KR 5 CL 32 - 81	K-5411445-25	OK
116	CALAMAR	ESTRATO 1	67784508	CL 22A TV 3 - 108	K-5407361-25	OK
117	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786930	KR 16 CL 16 - 71 CASA 18	K-5419536-25	OK
118	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786971	KR 16 CL 16 - 25 CASA 25	K-5419531-25	OK
119	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786959	KR 16 CL 16 - 19 CASA 26	K-5411247-25	OK
120	HATO VIEJO	ESTRATO 1	67784878	KR 9 CL 6 - 241	K-5407526-25	OK
121	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786923	KR 16 CL 16 - 12 CASA 14	K-5419530-25	OK
122	HATO VIEJO	ESTRATO 1	67784884	KR 10 CL 9 - 71	K-5419550-25	OK
123	HATO VIEJO	ESTRATO 1	67784887	KR 9 CL 6 - 22	K-5411738-25	OK
124	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786977	KR 16 CL 16 - 6 CASA 15	K-5419498-25	OK
125	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67803392	CL 17B KR 16A - 12	K-5544093-25	OK
126	HATO VIEJO	ESTRATO 1	67784890	KR 10 CL 9 - 68	K-5419555-25	OK
127	HATO VIEJO	ESTRATO 1	67785439	KR 10 CL 9 - 83 LT _	K-5419554-25	OK
128	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786939	KR 16 CL 16 - 18 CASA 13	K-5419499-25	OK
129	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786991	KR 16 CL 16 - 26 CASA 12	K-5419537-25	OK
130	HATO VIEJO	ESTRATO 1	67785448	KR 5 CL 5 - 94	K-5419428-25	OK
131	HATO VIEJO	ESTRATO 1	67785451	KR 5 CL 6 - 40 LT _	K-5419429-25	OK
132	HATO VIEJO	ESTRATO 1	67785760	KR 7 CL 9 - 87	K-5419551-25	OK

	CPROYECTOS S.A.S.	Código: Versión: Fecha:

INFORME DE INTERVENTORÍA

No 1	NOMBRE_LOCALIDAD	NOMBRE_SUBCATEGORIA	CONTRATO	DIRECCION	MEDIDOR	ACREDITACION BUEN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE LA CONEXIÓN
133	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786936	KR 15 CL 16 - 49 CASA 22	K-5419426-25	OK
134	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786965	KR 15 CL 16 - 69 CASA 17	K-5419421-25	OK
135	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786974	KR 15 CL 16 - 65 CASA 18	K-5419523-25	OK
136	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786983	KR 15 CL 16 - 45 CASA 23	K-5419424-25	OK
137	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786968	KR 16 CL 16 - 32 CASA 11	K-5419533-25	OK
138	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802260	KR 13B CL 18 - 17	K-5492596-25	OK
139	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802297	KR 13B CL 18 - 6	K-5544090-25	OK
140	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802236	KR 13B CL 18 - 5	K-5494923-25	OK
141	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67800419	KR 16 CL 16 - 81 CASA 17	K-5493202-25	OK
142	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67800383	KR 16 CL 16 - 54 CASA 7	K-5493199-25	OK
143	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67800386	KR 16 CL 16 - 60 CASA 6	K-5493197-25	OK
144	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67800371	KR 16 CL 16 - 35 CASA 23	K-5493201-25	OK
145	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802069	KR 14 CL 17C - 18	K-5493303-25	OK
146	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802075	KR 14 CL 17C - 12	K-5493304-25	OK
147	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802090	KR 14 CL 17C - 6	K-5493305-25	OK
148	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67800368	KR 16 CL 16 - 43 CASA 22	K-5493205-25	OK
149	BARRANCA VIEJA	ESTRATO 1	67784757	KR 8 CL 22 - 29	K-5462782-25	OK
150	BARRANCA NUEVA	ESTRATO 1	67784651	KR 11 CL 22 - 34 APTO 2	K-5462610-25	OK
151	BARRANCA NUEVA	ESTRATO 1	67784645	KR 11 CL 22 - 29	K-5418276-25	OK
152	BARRANCA VIEJA	ESTRATO 1	67784606	KR 7 CL 19 - 39	K-5462781-25	OK
153	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67785945	KR 16B CL 18 - 18	K-5362340-25	OK
154	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67785936	KR 16B CL 18 - 23	K-5418265-25	OK
155	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67785885	CL 21 KR 15 - 12	K-5363247-25	OK
156	BARRANCA NUEVA	ESTRATO 1	67784627	KR 2 CL 13A - 84	K-5462608-25	OK
157	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67785915	KR 16B CL 18 - 41	K-5363308-25	OK
158	BARRANCA NUEVA	ESTRATO 1	67784636	CL 16 KR 2 - 49	K-5462607-25	OK
159	YUCAL	ESTRATO 1	67785419	CL 12 KR 7 - 100	K-5363214-25	OK
160	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67787034	KR 15 CL 17 - 39	K-5462709-25	OK
161	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67787025	KR 15 CL 17 - 51	K-5462708-25	OK
162	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786111	KR 15 CL 19 - 5	K-5318812-25	OK
163	BARRANCA VIEJA	ESTRATO 1	67784764	KR 5 CL 24 - 10	K-5461991-25	OK
164	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786756	KR 15 CL 16 - 78 CASA 3	K-5419739-25	OK
165	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67791885	CL 20 KR 15 - 17	K-5543688-25	OK
166	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67791882	CL 15A KR 11 - 9	K-5543693-25	OK
167	SOPLAVIENTO	ESTRATO 1	67791946	CL 5 KR 23 - 7 APTO 1	K-5543687-25	OK
168	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802266	KR 13A CL 18 - 17	K-5494816-25	OK
169	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802408	KR 13A CL 18 - 5	K-5492599-25	OK
170	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802405	KR 13A CL 18 - 24	K-5494822-25	OK
171	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802378	KR 13A CL 18 - 12	K-5494823-25	OK
172	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67803350	CL 17C KR 16B - 12	K-5544088-25	OK
173	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802218	KR 13B CL 18 - 12	K-5492604-25	OK
174	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802012	CL 16 KR 14A - 18 CASA 11	K-5493214-25	OK
175	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802214	KR 16A CL 19 - 18	K-5494820-25	OK
176	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802212	KR 16A CL 19 - 17	K-5492605-25	OK
177	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67800392	KR 17 CL 16 - 5 CASA 22	K-5494936-25	OK
178	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67800128	KR 17 CL 16 - 8 CASA 14	K-5494938-25	OK
179	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67800416	KR 15 CL 16 - 70 CASA 4	K-5495092-25	OK
180	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67800410	KR 15 CL 16 - 44 CASA 7	K-5495090-25	OK
181	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67800398	KR 16 CL 16 - 50 CASA 8	K-5495095-25	OK
182	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67800389	KR 15 CL 16 - 62 CASA 5	K-5495093-25	OK
183	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67800365	KR 17 CL 16 - 7 CASA 21	K-5493211-25	OK
184	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67800362	KR 16 CL 16 - 70 CASA 4	K-5495094-25	OK
185	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67803343	KR 16A CL 18 - 18	K-5494843-25	OK
186	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802023	CL 16 KR 14A - 10 CASA 12	K-5490411-25	OK
187	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802009	CL 16 KR 14A - 9 CASA 15	K-5490453-25	OK
188	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802096	KR 14 CL 18 - 18	K-5492886-25	OK
189	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802060	KR 14 CL 18 - 12	K-5493004-25	OK
190	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802036	KR 16 CL 16 - 7 CASA 28	K-5490454-25	OK
191	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802048	KR 16 CL 17 - 20	K-5490409-25	OK
192	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786427	CL 19 KR 15 - 18	K-5419735-25	OK
193	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786433	CL 19 KR 15 - 11	K-5419732-25	OK
194	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786597	KR 16A CL 20 - 6	K-5411035-25	OK
195	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786926	KR 16 CL 16 - 76 CASA 3	K-5419585-25	OK
196	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786750	KR 15 CL 16 - 86 CASA 2	K-5419736-25	OK
197	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786956	KR 17 CL 16 - 6 CASA 15	K-5419583-25	OK
198	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786535	KR 16A CL 20 - 5	K-5419602-25	OK

	CPROYECTOS S.A.S.	Código: Versión: Fecha:

INFORME DE INTERVENTORÍA

No 1	NOMBRE_LOCALIDAD	NOMBRE_SUBCATEGORIA	CONTRATO	DIRECCION	MEDIDOR	ACREDITACION BUEN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE LA CONEXIÓN
199	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786484	CL 19 KR 15 - 17	K-5411796-25	OK
200	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802054	KR 16 CL 17 - 52	K-5490413-25	OK
201	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786553	KR 16A CL 20 - 12	K-5419552-25	OK
202	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786487	CL 19 KR 15 - 35	K-5411800-25	OK
203	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786565	KR 16A CL 20 - 23	K-5419604-25	OK
204	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786541	CL 19 KR 15 - 54	K-5419731-25	OK
205	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786475	KR 16A CL 20 - 29	K-5419579-25	OK
206	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786953	KR 16 CL 16 - 64 CASA 5	K-5419586-25	OK
207	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786559	KR 16A CL 20 - 17	K-5419600-25	OK
208	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786514	CL 19 KR 15 - 47	K-5419730-25	OK
209	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786571	KR 16B CL 17D - 11	K-5419577-25	OK
210	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786523	CL 19 KR 15 - 23	K-5411794-25	OK
211	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786920	KR 16 CL 16 - 47 CASA 21	K-5419582-25	OK
212	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786568	CL 20 KR 15 - 48	K-5411799-25	OK
213	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786606	KR 16A CL 20 - 24	K-5419578-25	OK
214	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786490	KR 16A CL 20 - 35	K-5419482-25	OK
215	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786591	CL 17D KR 16B - 12	K-5419573-25	OK
216	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786550	CL 19 KR 15 - 30	K-5411798-25	OK
217	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786496	KR 16A CL 20 - 41	K-5419553-25	OK
218	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786547	CL 19 KR 15 - 48	K-5419733-25	OK
219	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786914	KR 16 CL 16 - 80 CASA 2	K-5419587-25	OK
220	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786430	CL 19 KR 15 - 12	K-5411793-25	OK
221	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786532	KR 16A CL 20 - 11	K-5419603-25	OK
222	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786588	CL 20 KR 15 - 41	K-5411795-25	OK
223	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786481	KR 16B CL 18 - 59	K-5419572-25	OK
224	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786556	KR 16B CL 17C - 6	K-5419576-25	OK
225	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786945	KR 16 CL 16 - 65 CASA 19	K-5419532-25	OK
226	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786962	KR 15 CL 16 - 15 CASA 28	K-5411791-25	OK
227	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786594	KR 16B CL 17C - 18	K-5419584-25	OK
228	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786986	KR 15 CL 16 - 35 CASA 25	K-5419734-25	OK
229	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786600	KR 16B CL 17C - 12	K-5419575-25	OK
230	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786580	KR 16B CL 17D - 18	K-5419574-25	OK
231	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67787037	KR 15 CL 16 - 41 CASA 24	K-5419737-25	OK
232	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786493	KR 16B CL 18 - 77	K-5419570-25	OK
233	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786436	KR 16B CL 18 - 65	K-5419571-25	OK
234	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786980	KR 15 CL 16 - 94 CASA 1	K-5419738-25	OK
235	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786505	KR 16B CL 18 - 83	K-5419580-25	OK
236	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786933	KR 15 CL 16 - 61 CASA 19	K-5419425-25	OK
237	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786989	KR 15 CL 16 - 5 CASA 29	K-5411792-25	OK
238	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67800206	KR 17 CL 16 - 26 CASA 10	K-5494941-25	OK
239	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802203	CL 19 KR 15 - 29	K-5544096-25	OK
240	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67803274	CL 18 KR 16B - 17	K-5495064-25	OK
241	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802284	KR 13A CL 17C - 23	K-5495132-25	OK
242	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67800223	KR 17 CL 16 - 32 CASA 8	K-5494942-25	OK
243	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67803262	KR 16B CL 20 - 18	K-5494916-25	OK
244	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802511	KR 16B CL 20 - 24	K-5495126-25	OK
245	BARRANCA VIEJA	ESTRATO 1	67784550	CL 17 KR 3 - 34	K-5419520-25	OK
246	BARRANCA VIEJA	ESTRATO 1	67784547	CL 13 KR 8 - 42	K-5419524-25	OK
247	BARRANCA NUEVA	ESTRATO 1	67784460	KR 2 CL 23 - 7	K-5419522-25	OK
248	BARRANCA NUEVA	ESTRATO 1	67784499	KR 2 CL 13 - 115	K-5419527-25	OK
249	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786508	CL 20 KR 15 - 42	K-5411105-25	OK
250	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786544	CL 20 KR 15 - 30	K-5411102-25	OK
251	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786499	CL 20 KR 15 - 36	K-5411101-25	OK
252	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786577	CL 20 KR 15 - 54	K-5411103-25	OK
253	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786609	KR 16A CL 21 - 6	K-5411876-25	OK
254	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786526	KR 16A CL 18 - 23	K-5411039-25	OK
255	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786421	KR 16B CL 20 - 12	K-5411878-25	OK
256	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786409	KR 16B CL 18 - 89	K-5411873-25	OK
257	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786424	KR 16B CL 20 - 36	K-5411874-25	OK
258	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786412	KR 16B CL 20 - 30	K-5411879-25	OK
259	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786520	KR 16B CL 20 - 6	K-5411875-25	OK
260	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786418	CL 21 KR 15 - 11	K-5411104-25	OK
261	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786478	KR 16A CL 21 - 12	K-5411877-25	OK
262	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67803271	KR 16B CL 18 - 5	K-5495134-25	OK
263	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802227	CL 21 KR 15 - 5	K-5494839-25	OK
264	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802281	KR 17 CL 17 - 4	K-5494922-25	OK

	CPROYECTOS S.A.S.	Código: Versión: Fecha:

INFORME DE INTERVENTORÍA

No 1	NOMBRE_LOCALIDAD	NOMBRE_SUBCATEGORIA	CONTRATO	DIRECCION	MEDIDOR	ACREDITACION BUEN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE LA CONEXIÓN
265	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67800251	KR 17 CL 16 - 15 CASA 20	K-5494371-25	OK
266	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67800413	KR 17 CL 16 - 41 CASA 15	K-5494366-25	OK
267	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67800220	KR 17 CL 16 - 40 CASA 7	K-5494370-25	OK
268	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786415	KR 12 CL 16 - 6	K-5411107-25	OK
269	HATO VIEJO	ESTRATO 1	67785764	CL 5 KR 4 - 21	K-5419487-25	OK
270	CALAMAR	ESTRATO 1	67784541	CL 28 TV 3 - 82	K-5411001-25	OK
271	HATO VIEJO	ESTRATO 1	67785445	KR 6 CL 9 - 56	K-5419483-25	OK
272	BARRANCA NUEVA	ESTRATO 1	67784496	CL 13A KR 10 - 74	K-5419528-25	OK
273	HATO VIEJO	ESTRATO 1	67785442	KR 6 CL 8 - 8	K-5419486-25	OK
274	HATO VIEJO	ESTRATO 1	67784779	CL 8 KR 4 - 73	K-5419485-25	OK
275	HATO VIEJO	ESTRATO 1	67784881	KR 6 CL 6 - 20 LT _	K-5419481-25	OK
276	CALAMAR	ESTRATO 1	67791891	CL 34 KR 3 - 35	K-5411144-25	OK
277	CALAMAR	ESTRATO 1	67791368	KR 4 CL 34 - 70 APTO 1	K-5411149-25	OK
278	CALAMAR	ESTRATO 2	67791359	KR 4 CL 34 - 99 APTO 1	K-5411147-25	OK
279	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786562	CL 19 KR 15 - 36	K-5411797-25	OK
280	CALAMAR	ESTRATO 1	67791356	TV 3 CL 29 - 103 APTO 1	K-5543795-25	OK
281	CALAMAR	ESTRATO 1	67791362	KR 7 CL 26 - 41 APTO 2	K-5450048-25	OK
282	CALAMAR	ESTRATO 1	67791365	CL 43 KR 1 - 15	K-5411831-25	OK
283	BARRANCA NUEVA	ESTRATO 1	67791371	KR 6 CL 21 - 52	K-5411146-25	OK
284	BARRANCA NUEVA	ESTRATO 1	67791852	KR 6 CL 21 - 46	K-5490127-25	OK
285	BARRANCA NUEVA	ESTRATO 1	67792964	KR 4 CL 13 - 36	K-5490129-25	OK
286	BARRANCA VIEJA	ESTRATO 1	67792967	KR 8 CL 19 - 67	K-5490135-25	OK
287	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67800137	KR 17 CL 16 - 14 CASA 13	K-5493207-25	OK
288	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802443	KR 7 CL 14 - 24	K-5494825-25	OK
289	BARRANCA VIEJA	ESTRATO 1	67791909	KR 8 CL 9 - 15	K-5490133-25	OK
290	CALAMAR	ESTRATO 1	67791352	KR 4 CL 34 - 30 APTO 1	K-5411141-25	OK
291	CALAMAR	ESTRATO 1	67791888	KR 1 CL 29 - 66 APTO 2	K-5490131-25	OK
292	HATO VIEJO	ESTRATO 1	67791859	KR 7 CL 9 - 85	K-5488107-25	OK
293	HATO VIEJO	ESTRATO 1	67791864	KR 7 CL 6 - 173	K-5488106-25	OK
294	HATO VIEJO	ESTRATO 2	67791875	CL 6 KR 5 - 17	K-5488109-25	OK
295	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802507	KR 7 CL 11 - 31	K-5494844-25	OK
296	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802072	KR 13B CL 17C - 5	K-5494908-25	OK
297	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802200	CL 21 KR 15 - 29	K-5544092-25	OK
298	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802208	CL 21 KR 15 - 53	K-5495127-25	OK
299	YUCAL	ESTRATO 1	67792946	CL 12 KR 8 - 19	K-5488110-25	OK
300	HATO VIEJO	ESTRATO 1	67791870	KR 8 CL 9 - 7	K-5488113-25	OK
301	HATO VIEJO	ESTRATO 1	67792958	KR 8 CL 6 - 229	K-5488114-25	OK
302	YUCAL	ESTRATO 1	67791858	CL 4 KR 3 - 52	K-5490126-25	OK
303	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802224	CL 21 KR 15 - 24	K-5494824-25	OK
304	SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	ESTRATO 1	67800122	CL 34 KR 28 - 66 APTO 2	K-5494988-25	OK
305	SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	ESTRATO 2	67800431	CL 19 KR 12 - 178 APTO 1	K-5494987-25	OK
306	SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	ESTRATO 1	67800434	KR 14 CL 34 - 248	K-5418128-25	OK
307	SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	ESTRATO 1	67800440	CL 34 KR 21 - 41	K-5493817-25	OK
308	SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	ESTRATO 1	67800443	KR 14 CL 34 - 252	K-5418124-25	OK
309	BARRANCA VIEJA	ESTRATO 1	67803745	KR 8 CL 12 - 48	K-5492755-25	OK
310	CALAMAR	ESTRATO 1	67793113	TV 3 CL 11 - 117	K-5488350-25	OK
311	BARRANCA NUEVA	ESTRATO 1	67803573	CL 10 KR 5A - 82	K-5492753-25	OK
312	CALAMAR	ESTRATO 1	67795187	TV 3 CL 24 - 54 APTO 1	K-5488108-25	OK
313	CALAMAR	ESTRATO 1	67791897	CL 17 TV 1A - 124	K-5411142-25	OK
314	BARRANCA NUEVA	ESTRATO 1	67803543	CL 10 KR 5A - 92	K-5492752-25	OK
315	HATO VIEJO	ESTRATO 1	67800809	CL 4 KR 6 - 8	K-5494807-25	OK
316	HATO VIEJO	ESTRATO 1	67801901	CL 2 KR 6 - 4	K-5495476-25	OK
317	HATO VIEJO	ESTRATO 1	67800184	CL 4 KR 4 - 35 LT _	K-5495479-25	OK
318	HATO VIEJO	ESTRATO 1	67801908	CL 7A KR 5 - 28	K-5495478-25	OK
319	HATO VIEJO	ESTRATO 1	67795193	CL 7A KR 5 - 18	K-5488112-25	OK
320	HATO VIEJO	ESTRATO 1	67801905	KR 6 CL 7 - 58	K-5495480-25	OK
321	SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	ESTRATO 1	67800125	KR 27 CL 15A - 17	K-5494991-25	OK
322	SATO	ESTRATO 1	67791879	CL 2 KR 12 - 93	K-5488111-25	OK
323	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802018	CL 15 KR 14A - 10 CASA 18	K-5493212-25	OK
324	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802006	CL 15 KR 14A - 5 CASA 20	K-5493213-25	OK
325	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67800233	KR 17 CL 16 - 54 CASA 5	K-5493209-25	OK

INFORME DE INTERVENTORÍA

No 1	NOMBRE_LOCALIDAD	NOMBRE_SUBCATEGORIA	CONTRATO	DIRECCION	MEDIDOR	ACREDITACION BUEN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE LA CONEXIÓN
326	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67800395	KR 17 CL 16 - 25 CASA 18	K-5494367-25	OK
327	SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	ESTRATO 1	67800446	KR 14 CL 34 - 242	K-5493818-25	OK
328	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67800374	KR 17 CL 16 - 92 CASA 1	K-5490448-25	OK
329	BARRANCA VIEJA	ESTRATO 1	67803648	CL 10 KR 5 - 25	K-5494643-25	OK
330	SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	ESTRATO 1	67803633	CL 32 KR 34 - 15 APTO 1	K-5490452-25	OK
331	SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	ESTRATO 1	67803636	CL 34 KR 33 - 5 APTO 1	K-5490451-25	OK
332	SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	ESTRATO 1	67803546	KR 33 CL 16 - 22	K-5494992-25	OK
333	SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	ESTRATO 2	67800428	CL 29 KR 16 - 25 PISO 2	K-5494989-25	OK
334	YUCAL	ESTRATO 1	67800957	CL 11 KR 1 - 13	K-5494636-25	OK
335	BARRANCA VIEJA	ESTRATO 1	67803594	CL 9 KR 4 - 58	K-5494641-25	OK
336	BARRANCA VIEJA	ESTRATO 1	67803615	CL 8 KR 4 - 77	K-5494639-25	OK
337	HATO VIEJO	ESTRATO 1	67800257	KR 8 CL 6 - 215	K-5494815-25	OK
338	YUCAL	ESTRATO 1	67800818	CL 12 KR 2 - 27	K-5494638-25	OK
339	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802084	KR 16B CL 17B - 18	K-5490414-25	OK
340	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67800404	KR 17 CL 16 - 39 CASA 16	K-5494939-25	OK
341	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67801917	KR 14 CL 15A - 23	K-5492895-25	OK
342	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802251	KR 17 CL 17 - 16	K-5494919-25	OK
343	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67800245	KR 4 CL 15 - 32	K-5495089-25	OK
344	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802066	KR 13B CL 17C - 18	K-5493300-25	OK
345	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802399	KR 13A CL 18 - 6	K-5494925-25	OK
346	BARRANCA VIEJA	ESTRATO 1	67803742	KR 5 CL 11A - 60	K-5494637-25	OK
347	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802206	KR 15 CL 20 - 23	K-5494845-25	OK
348	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802520	KR 15 CL 21 - 5	K-5494818-25	OK
349	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67800230	KR 4 CL 15 - 25	K-5493196-25	OK
350	SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	ESTRATO 1	67803618	CL 38 KR 25 - 36	K-5494994-25	OK
351	SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	ESTRATO 1	67800119	CL 31 KR 28 - 30	K-5494990-25	OK
352	SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	ESTRATO 1	67803715	CL 23 KR 37 - 235	K-5490450-25	OK
353	SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	ESTRATO 1	67803673	URBANIZACION VILLA VALENTINA MZ N CASA 10	K-5492894-25	OK
354	SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	ESTRATO 2	67803400	KR 33 CL 21 - 20 APTO 1	K-5494995-25	OK
355	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67800425	CL 16 KR 14A - 5 CASA 14	K-5493208-25	OK
356	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67801994	KR 14 CL 16 - 93	K-5492893-25	OK
357	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802014	CL 15 KR 14A - 16 CASA 17	K-5493210-25	OK
358	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67801997	KR 7 CL 10 - 36	K-5494517-25	OK
359	HATO VIEJO	ESTRATO 1	67784893	CL 1A SUR KR 4 - 116	K-5419484-25	OK
360	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808708	KR 8 CL 21 - 108	K-5642108-26	OK
361	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808560	CL 21 KR 5 - 33 APTO 2	K-5642115-26	OK
362	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808501	CL 12 KR 4 - 29	K-5642290-26	OK
363	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808460	CL 21 KR 5 - 43	K-5642109-26	OK
364	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808448	CL 21 KR 5 - 33	K-5642110-26	OK
365	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808442	CL 12 KR 4 - 42	K-5642291-26	OK
366	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67809014	KR 8 CL 21 - 70	K-5623504-26	OK
367	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808490	CL 10B KR 25 - 55	K-5642247-26	OK
368	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808484	CL 10B KR 25 - 48	K-5642249-26	OK
369	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808508	CL 10B KR 25 - 49	K-5642248-26	OK
370	SOPLAVIENTO	ESTRATO 2	67808939	KR 21 CL 6 - 3	K-5642268-26	OK
371	SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	ESTRATO 1	67809496	KR 27 CL 34 - 30	SH-21069627-25	OK
372	SOPLAVIENTO	ESTRATO 2	67808946	KR 21 CL 6 - 15	K-5642266-26	OK
373	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808517	CL 15 KR 7 - 70	K-5623498-26	OK
374	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808493	CL 11 KR 4 - 40	K-5642236-26	OK
375	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808487	CL 12 KR 4 - 57	K-5642288-26	OK
376	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808478	CL 15 KR 5 - 55 LT _	K-5642237-26	OK
377	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808436	KR 5 CL 17 - 5	K-5642107-26	OK
378	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808829	CL 17 KR 5 - 64	K-5623503-26	OK
379	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808554	CL 17 KR 5 - 162	K-5623502-26	OK
380	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808551	KR 5 CL 15 - 47	K-5623505-26	OK
381	HIGUERETAL	ESTRATO 1	67810868	CL 5 KR 12 - 22	K-5493721-25	OK
382	HIGUERETAL	ESTRATO 1	67810912	CL 3 KR 6 - 18	K-5493720-25	OK
383	HIGUERETAL	ESTRATO 1	67810202	CL 4 KR 1 - 24	K-5493719-25	OK

	CPROYECTOS S.A.S.	Código: Versión: Fecha:

INFORME DE INTERVENTORÍA

No 1	NOMBRE_LOCALIDAD	NOMBRE_SUBCATEGORIA	CONTRATO	DIRECCION	MEDIDOR	ACREDITACION BUEN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE LA CONEXIÓN
384	HIGUERETAL	ESTRATO 1	67810871	CL 6 KR 13 - 54	K-5642287-26	OK
385	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808904	KR 19 CL 14 - 35	K-5642101-26	OK
386	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808716	KR 19 CL 15 - 78	K-5490386-25	OK
387	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808711	KR 8 CL 18 - 35	K-5642113-26	OK
388	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808451	KR 12 CL 17 - 147	K-5419568-25	OK
389	SOPLAVIENTO	ESTRATO 1	67808820	KR 20 CL 12 - 32	K-5642208-26	OK
390	LAS CRUCES	ESTRATO 1	67809992	KR 2 CL 3 - 52	K-5623499-26	OK
391	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67811499	CL 19 KR 12 - 70	SH-21070150-25	OK
392	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67810931	KR 5 CL 23 - 68	SH-21069715-25	OK
393	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67810876	KR 9 CL 16 - 25 CASA 2	K-5642281-26	OK
394	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67810147	KR 4 CL 24 - 6	K-5642280-26	OK
395	LAS CRUCES	ESTRATO 1	67810138	CL 4 KR 2 - 26	K-5623500-26	OK
396	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67811524	CL 19 KR 12 - 42	SH-21070142-25	OK
397	SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	ESTRATO 1	67808284	KR 25 CL 18 - 21 APTO 1	K-5493722-25	OK
398	SOPLAVIENTO	ESTRATO 1	67809021	KR 14 CL 10 - 10	K-5642211-26	OK
399	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67808454	KR 7 CL 10 - 45	K-5642279-26	OK
400	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67811496	KR 11 CL 18 - 13	SH-21070146-25	OK
401	LAS CRUCES	ESTRATO 1	67809989	CL 3 KR 2 - 64	SH-21070184-25	OK
402	SOPLAVIENTO	ESTRATO 1	67808814	KR 19 CL 6 - 83	K-5642212-26	OK
403	SOPLAVIENTO	ESTRATO 1	67812217	KR 22A CL 6 - 17	K-5493718-25	OK
404	SOPLAVIENTO	ESTRATO 1	67812214	KR 24 CL 12 - 30	K-5493716-25	OK
405	LAS CRUCES	ESTRATO 1	67810184	CL 4 KR 2 - 36	K-5623497-26	OK
406	LAS CRUCES	ESTRATO 1	67810115	CL 2 KR 4 - 90	SH-21069545-25	OK
407	SOPLAVIENTO	ESTRATO 2	67808733	KR 15 CL 10 - 34 APTO 1	K-5642269-26	OK
408	SOPLAVIENTO	ESTRATO 2	67808730	KR 15 CL 10 - 6 APTO 1	K-5642272-26	OK
409	SOPLAVIENTO	ESTRATO 1	67808720	CL 11 KR 14 - 29	K-5642207-26	OK
410	SOPLAVIENTO	ESTRATO 2	67808817	CL 12 KR 15 - 46 APTO 1	K-5642213-26	OK
411	SOPLAVIENTO	ESTRATO 1	67809018	TV 10 DG 14 - 186	K-5642215-26	OK
412	SOPLAVIENTO	ESTRATO 1	67808949	TV 10 DG 14 - 200	K-5642214-26	OK
413	CALAMAR	ESTRATO 1	67810112	CL 10 TV 2A - 32	SH-21070177-25	OK
414	SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	ESTRATO 1	67809486	KR 35 CL 19 - 98	SH-21070261-25	OK
415	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808496	KR 5 CL 18 - 34	K-5642112-26	OK
416	CALAMAR	ESTRATO 1	67784660	CL 41B KR 7 - 43 APTO 1	K-5462643-25	OK
417	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808466	CL 10B KR 25 - 7	SH-21070237-25	OK
418	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808481	CL 10A KR 25 - 7	SH-21070288-25	OK
419	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808457	CL 10A KR 25 - 18	SH-21070233-25	OK
420	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808520	CL 10A KR 25 - 37	SH-21070239-25	OK
421	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808713	CL 10A KR 25 - 48	SH-21070234-25	OK
422	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808811	CL 10A KR 25 - 36	SH-21070235-25	OK
423	SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	ESTRATO 2	67811518	CL 26 KR 38 - 114 APTO 1	K-5493717-25	OK
424	SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	ESTRATO 1	67812194	URBANIZACION VILLA VALENTINA- 0 MZ C1 CASA 2	K-5493723-25	OK
425	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808472	CL 12 KR 10 - 78	K-5642240-26	OK
426	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808463	CL 11 KR 9 - 83	K-5642243-26	OK
427	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808958	KR 16 CL 19 - 95	K-5493808-25	OK
428	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808952	KR 16 CL 17 - 202	K-5642097-26	OK
429	LAS PIEDRA	ESTRATO 1	67808934	CL 17 KR 16 - 3 APTO 2	K-5642096-26	OK
430	BARRANCA VIEJA	ESTRATO 1	67803597	CL 9 KR 4 - 38	K-5494640-25	OK
431	CALAMAR	ESTRATO 1	67803406	KR 2 CL 43 - 4	K-5494813-25	OK
432	BARRANCA NUEVA	ESTRATO 1	67801911	CL 22 KR 6 - 25	K-5492750-25	OK
433	BARRANCA NUEVA	ESTRATO 1	67803549	CL 10 KR 6 - 210	K-5495686-25	OK
434	BARRANCA NUEVA	ESTRATO 1	67803570	CL 10 KR 5A - 35	K-5492754-25	OK
435	CALAMAR	ESTRATO 1	67803403	KR 7 CL 26 - 37 APTO 2	K-5492904-25	OK
436	CALAMAR	ESTRATO 1	67803765	CL 19B TV 3 - 37 APTO 1	K-5492903-25	OK


INFORME DE INTERVENTORÍA

No 1	NOMBRE_LOCALIDAD	NOMBRE_SUBCATEGORIA	CONTRATO	DIRECCION	MEDIDOR	ACREDITACION BUEN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE LA CONEXIÓN
437	SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	ESTRATO 1	67810118	CL 34 KR 28 - 76 PISO 2 APTO 1	SH-21069622-25	OK
438	CALAMAR	ESTRATO 1	67808269	KR 4 CL 32 - 40	K-5623098-26	OK
439	CALAMAR	ESTRATO 1	67808278	CL 27 TV 3 - 90 APTO 1	K-5641980-26	OK
440	SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	ESTRATO 2	67809986	CL 23 KR 29 - 80	SH-21070268-25	OK
441	SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	ESTRATO 1	67809501	KR 35 CL 15B - 58	SH-21070269-25	OK
442	SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	ESTRATO 1	67809546	KR 36A CL 27 - 39	SH-21069625-25	OK
443	SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	ESTRATO 1	67810358	CL 32 KR 33A - 36 APTO 1	SH-21069626-25	OK
444	CALAMAR	ESTRATO 1	67810934	CL 12 TV 1A - 69 APTO 2	SH-21070296-25	OK
445	SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	ESTRATO 1	67810163	CL 32 KR 33A - 30	SH-21069628-25	OK
446	CALAMAR	ESTRATO 1	67810915	CL 11 TV 1A - 31 APTO 1	SH-21070293-25	OK
447	BARRANCA NUEVA	ESTRATO 1	67808937	CL 10 KR 6 - 170 LT _	K-5642037-26	OK
448	HATO VIEJO	ESTRATO 1	67800815	CL 5 KR 12 - 215	K-5489734-25	OK
449	BARRANCA VIEJA	ESTRATO 1	67809540	KR 4 CL 19 - 32	K-5642036-26	OK
450	CALAMAR	ESTRATO 1	67809520	TV 3 CL 26 - 82	SH-21070179-25	OK
451	HATO VIEJO	ESTRATO 1	67808275	CL 7A KR 4 - 26	SH-21070297-25	OK
452	CALAMAR	ESTRATO 1	67810191	TV 3 CL 22 - 104 APTO	SH-21070172-25	OK
453	CALAMAR	ESTRATO 1	67810927	CL 17 TV 1A - 39	SH-21070175-25	OK
454	CALAMAR	ESTRATO 2	67810858	CL 19 KR 7 - 127 APTO 2	SH-21070130-25	OK
455	CALAMAR	ESTRATO 1	67810865	CL 42 KR 7 - 19 APTO 2	SH-21067966-25	OK
456	CALAMAR	ESTRATO 1	67810874	KR 4 CL 26 - 44	SH-21067970-25	OK
457	ARROYO HONDO	ESTRATO 1	67812448	KR 5 CL 2 - 19	SH-21070156-25	OK
458	SATO	ESTRATO 1	67814713	CL 2 KR 8 - 5 APTO 2	SH-21068691-25	OK
459	ARROYO HONDO	ESTRATO 1	67812389	CL 2 KR 4A - 25	SH-21068276-25	OK
460	SATO	ESTRATO 1	67814725	CL 2 KR 8 - 46	SH-21068694-25	OK
461	ARROYO HONDO	ESTRATO 1	67812392	KR 4A CL 2 - 9	SH-21068693-25	OK
462	SATO	ESTRATO 1	67814710	CL 2 KR 9A - 71	SH-21068695-25	OK
463	ARROYO HONDO	ESTRATO 2	67812401	CL 3 KR 2 - 20 APTO 1	SH-21070158-25	OK
464	SATO	ESTRATO 1	67814719	CL 3 KR 9A - 46	SH-21070159-25	OK
465	SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	ESTRATO 2	67810361	KR 14 CL 32 - 63	K-5642028-26	OK
466	YUCAL	ESTRATO 1	67812211	KR 7 CL 2 - 32	SH-21067962-25	OK
467	SATO	ESTRATO 1	67814812	CL 3 KR 9A - 130	SH-21070153-25	OK
468	BARRANCA NUEVA	ESTRATO 1	67812208	CL 10 KR 6 - 200	SH-21067969-25	OK
469	SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	ESTRATO 2	67809983	CL 22 KR 33 - 18 APTO 1	SH-21068697-25	OK
470	BARRANCA VIEJA	ESTRATO 1	67810457	KR 4 CL 17 - 4	SH-21067965-25	OK
471	CALAMAR	ESTRATO 1	67814748	TV 7 CL 11 - 15	SH-21068547-25	OK
472	SATO	ESTRATO 1	67814716	CL 3 KR 11 - 64	SH-21068294-25	OK
473	SATO	ESTRATO 1	67814729	CL 3 KR 11 - 49	SH-21068295-25	OK
474	SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	ESTRATO 1	67810187	KR 21 CL 34 - 132 APTO 1	K-5642031-26	OK
475	CALAMAR	ESTRATO 1	67811665	CL 42 KR 7A - 18	SH-21070171-25	OK
476	CALAMAR	ESTRATO 1	67810861	CL 28 TV 3 - 76 APTO 1	SH-21067968-25	OK

INFORME DE INTERVENTORÍA

No 1	NOMBRE_LOCALIDAD	NOMBRE_SUBCATEGORIA	CONTRATO	DIRECCION	MEDIDOR	ACREDITACION BUEN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE LA CONEXIÓN
477	SATO	ESTRATO 1	67815588	CL 2 KR 12 - 39	K-5642027-26	OK
478	ARROYO HONDO	ESTRATO 2	67812232	KR 1C CL 1A - 60	SH-21068696-25	OK
479	ARROYO HONDO	ESTRATO 2	67812223	CL 4 KR 3 - 31	SH-21068698-25	OK
480	SATO	ESTRATO 1	67814707	CL 3 KR 9 - 149	SH-21070152-25	OK
481	SAN ESTANISLAO DE KOSTKA	ESTRATO 1	67810501	KR 36 CL 15B - 61	SH-21070300-25	OK
482	CALAMAR	ESTRATO 1	67784917	CL 22 KR 4 - 119 APTO 1	K-5407368-25	OK
483	BARRANCA NUEVA	ESTRATO 1	67784633	CL 22 KR 9 - 75	K-5462084-25	OK
484	BARRANCA NUEVA	ESTRATO 1	67784618	CL 19 KR 4 - 22	K-5418278-25	OK
485	CALAMAR	ESTRATO 2	67783523	KR 2 CL 36 - 122	K-5407528-25	OK
486	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67785918	CL 21 KR 15 - 41	K-5363246-25	OK
487	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67785908	CL 21 KR 15 - 18	K-5363245-25	OK
488	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67785894	CL 21 KR 15 - 36	K-5363248-25	OK
489	BARRANCA NUEVA	ESTRATO 1	67784624	KR 2 CL 13A - 52	K-5363591-25	OK
490	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67785903	KR 16B CL 18 - 12	K-5362344-25	OK
491	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67785775	CL 21 KR 15 - 6	K-5418289-25	OK
492	BARRANCA NUEVA	ESTRATO 1	67784621	KR 2 CL 13 - 4	K-5462151-25	OK
493	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67785773	KR 16A CL 18 - 5	K-5406975-25	OK
494	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67786406	KR 16B CL 18 - 35	K-5407811-25	OK
495	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67803368	CL 17C KR 16B - 27	K-5492668-25	OK
496	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802254	CL 17B KR 13B - 28	K-5495056-25	OK
497	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802402	KR 13B CL 18 - 18	K-5495063-25	OK
498	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67800380	KR 16 CL 16 - 29 CASA 24	K-5493198-25	OK
499	SAN CRISTOBAL	ESTRATO 1	67802063	KR 14 CL 17C - 24	K-5493302-25	OK
500	SOPLAVIENTO	ESTRATO 1	67801914	CL 4 KR 1A - 52	K-5490406-25	OK

8. ANEXO: DE CERTIFICACION DE VISITAS.



María Bernarda Nova
Directora de Interventoría
CPROYECTO S.A.S.
