HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E


DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD UNION CHARTE DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	UBICACIÓN	Union Charte
		FECHA	30/04/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	MUROS Y ACABADOS	ÍTEM	6.2	Pañete liso (allanado) muros 1:4, incluye filos y dilataciones	UND	m²	CANT.	131,85

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA

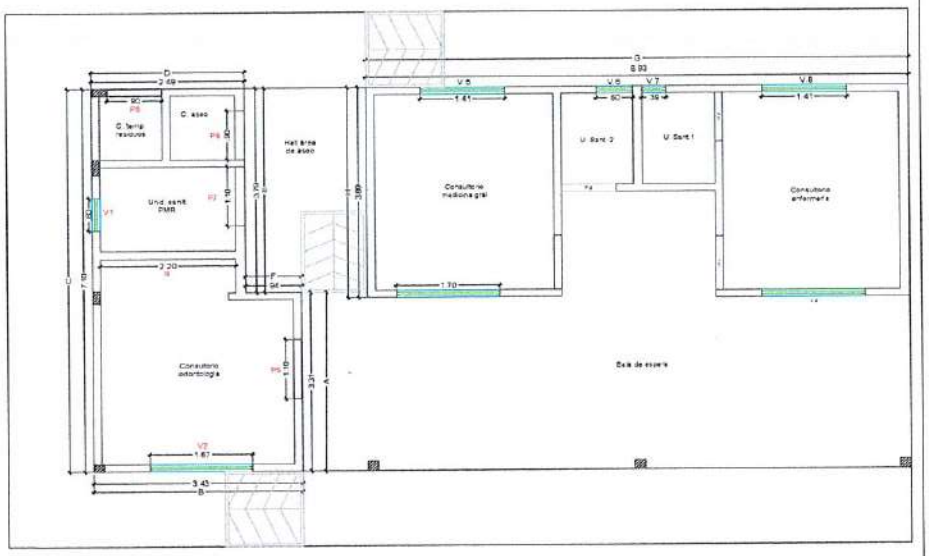







LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES Altura A (m)	Ancho B (m)	C=(A*B)/2	Longitud (m) L	CANT.	CANT. TOTAL C*L*CANT.
Lado A (h1=2.42;h2=3.26) Ht=(2.42*3.26)/2= 2.84		2,84	3,31			1,00	9,40
Puerta 6		1,95	1,10			-1,00	-2,15
Lado B		2,84	3,43			1,00	9,74
Ventana V2		1,19	1,67			-1,00	-1,99
Lado C1 (Área tringulo - cuchilla) (h1=3,40;h2=2,52) Ht=3.40 - 2.52= 0,88		0,88	3,24	1,43	3,24	1,00	4,62
Lado C1 (Área cuadrado) H= 3,40- 0,88= 2,52		2,52	3,24			1,00	8,16
Lado C2 (Área tringulo - cuchilla) Lado A (h1=3,40;h2=2,66) Ht=3,40 - 2,66= 0,74		0,74	3,86	3,93	3,87	1,00	15,21
Lado C2 (Área cuadrado)		2,66	3,86			1,00	10,27
Ventana V1		0,45	0,60			-1,00	-0,27
Lado D		2,66	2,49			1,00	6,62
Puerta P5		1,19	0,90			-1,00	-1,07
Lado E1 (Área tringulo - cuchilla) (h1=3,40;h2=2,52) Ht=3.40 - 2.52= 0,88		0,88	3,79			1,00	3,34
Lado E1(Área cuadrado)		1,78	3,79			1,00	6,75
Puerta P8		2,10	0,90			-1,00	-1,89
Puerta P7		1,95	1,10			-1,00	-2,15
Lado F		2,66	0,94			1,00	2,50
Lado G		2,66	8,93			1,00	23,75
Ventana V5		1,19	1,41			-1,00	-1,68
Ventana V6		0,45	0,60			-1,00	-0,27
Ventana V7		0,39	0,60			-1,00	-0,23
Ventana V8		1,20	1,41			-1,00	-1,69
Lado H1 (Área tringulo - cuchilla) (h1=3,40;h2=2,52) Ht=3.40 - 2.52= 0,88		0,88	3,89			1,00	3,42
Lado H1(Área cuadrado)		1,78	3,89			1,00	6,92
Item 6.1	U. Sanitaria 1	2,69			1,69	2,00	9,09
	U. Sanitaria 2	2,10			0,72	2,00	3,02
	C. aseo	1,02			0,61	2,00	1,24
	C. aseo	2,42			1,19	2,00	5,76
	Unid. Sanit. PMR	2,40			2,20	2,00	10,56
	Consultorio odontologico	2,40			0,81	2,00	3,89
		1,19			0,40	2,00	0,95
						Cantidad Proyectada	131,85
						Cantidad contractual	125,73
						Diferencia	6,12

ELABORÓ:

ROSELINO ACOSTA MENDOZA
RESIDENTE DE OBRA
J&M INGENIERIA

APROBÓ:

OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
REPRESENTANTE LEGAL
EPICO INGENIERIA SAS


HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E

DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD UNION CHARTE DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	UBICACIÓN	Union Charte
		FECHA	30/04/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	MUROS Y ACABADOS	ÍTEM	6.2	Pañete liso (allanado) muros 1:4, incluye filos y dilataciones	UND	m²	CANT.	0,00

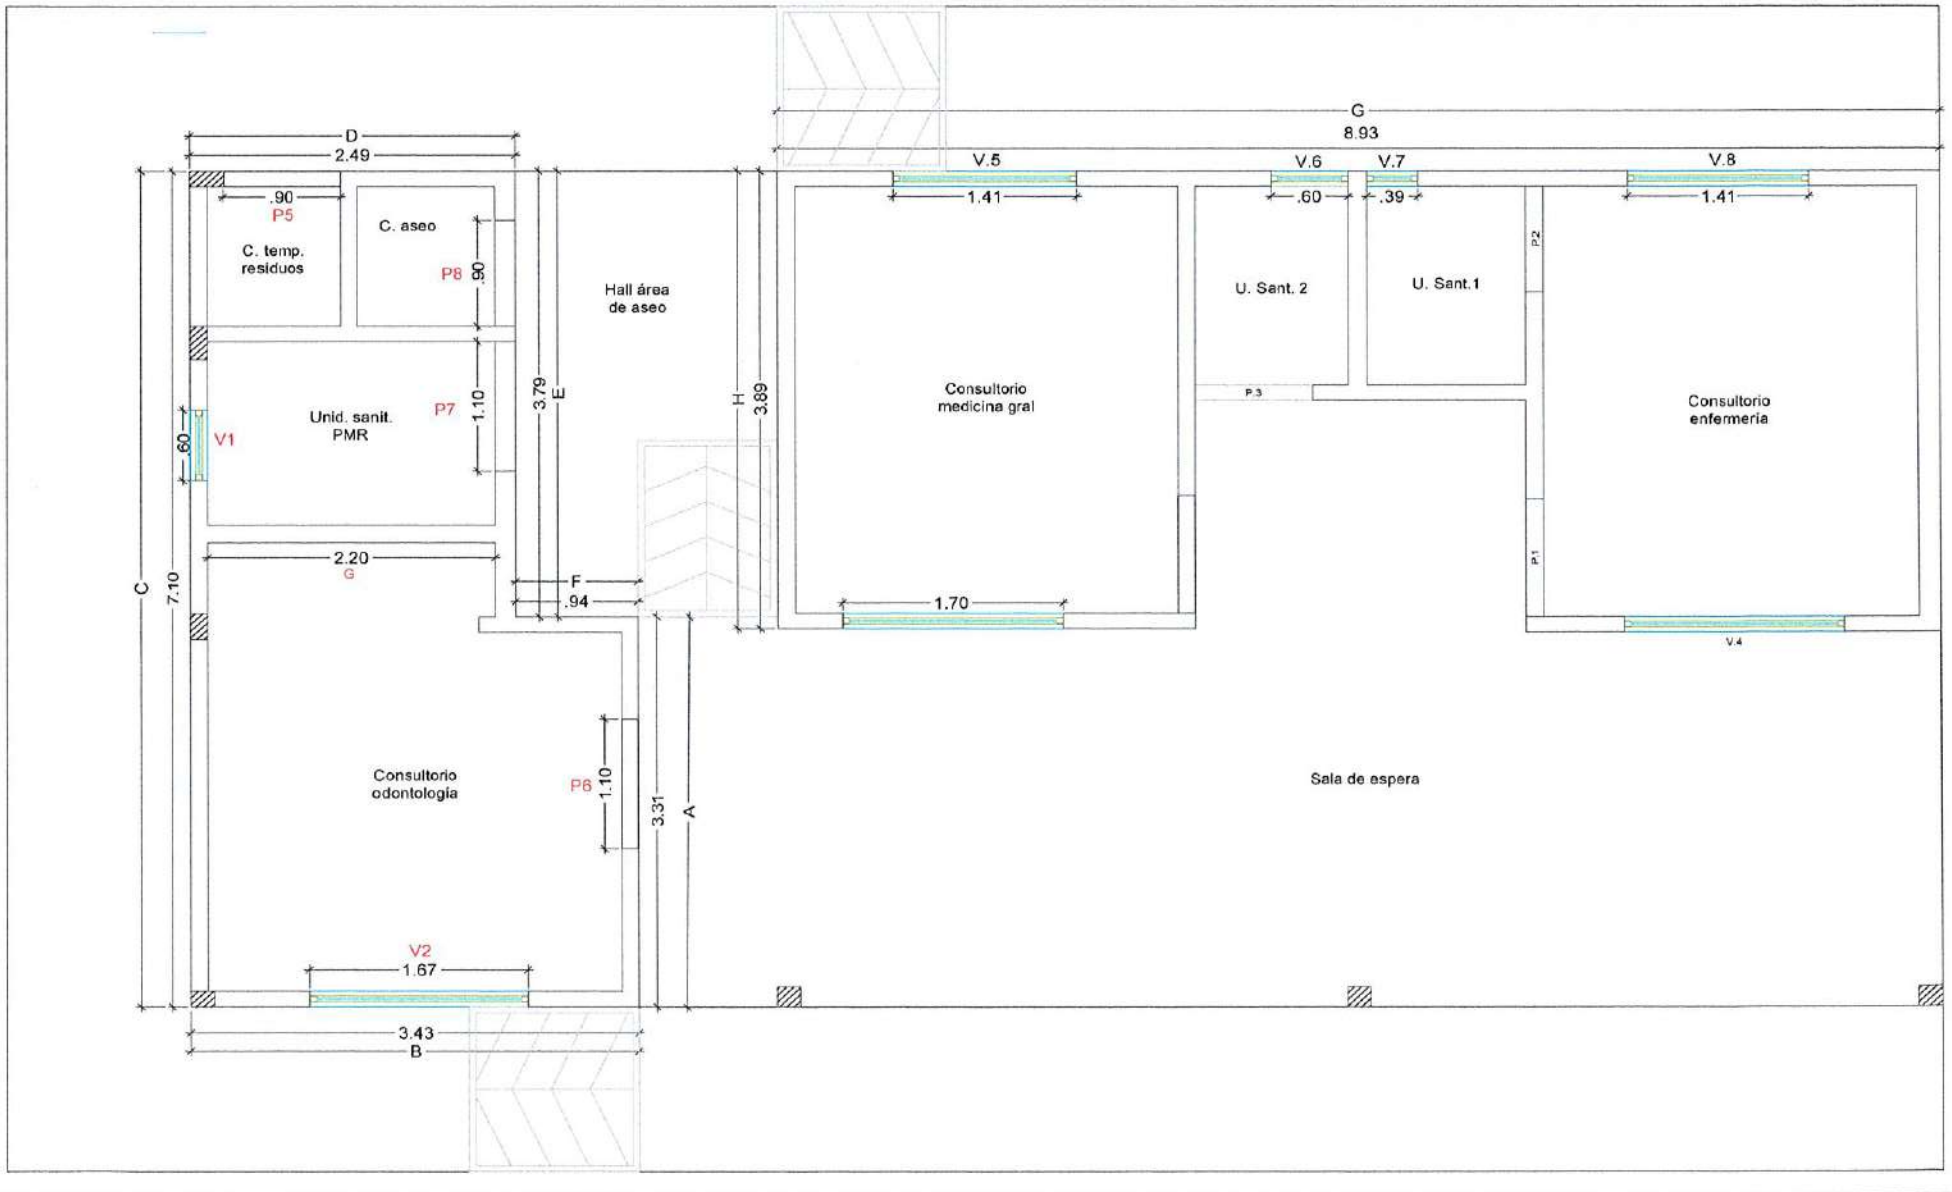

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E


DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD UNION CHARTE DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	UBICACIÓN	Union Charte
		FECHA	30/04/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	MUROS Y ACABADOS	ÍTEM	6.4	Pintura acrílica alta asepsia para interiores sobre muros 3 manos	UND	m²	CANT.	

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA

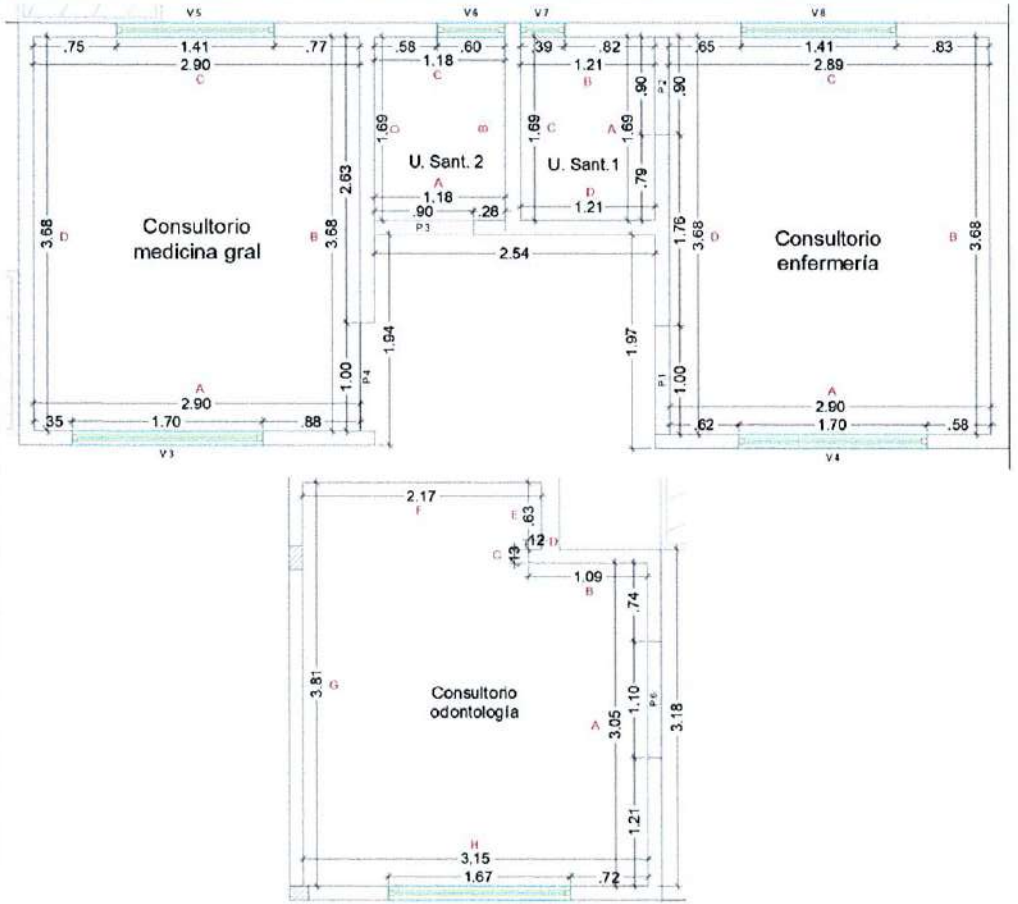

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	ÁREA (M2)	CANT.	CANT. TOTAL
Consultorio enfermería	Lado A		2,90	2,33		1,00	6,76
	Ventana v4		1,70	1,20		-1,00	-2,04
	Lado B	3,68		2,33		1,00	8,57
	Lado C		2,89	2,33		1,00	6,73
	Ventana V8		1,41	1,20		-1,00	-1,69
	Lado D	3,68		2,33		1,00	8,57
	Puerta P2		0,90	1,97		-1,00	-1,77
	Puerta P1		1,00	1,95		-1,00	-1,95
Unidad Sanitario 01	Lados A	1,69		0,40		1,00	0,68
	Lados B		1,21	0,40		1,00	0,48
	Ventana V7		0,39	0,32		-1,00	-0,12
	Lados C	1,69		0,40		1,00	0,68
	Puerta P2		0,90	1,97		-1,00	-1,77
Unidad Sanitario 02	Lados A		1,18	0,40		1,00	0,47
	Puerta P3		0,90	1,94		-1,00	-1,75
	Lados B	1,69		0,40		1,00	0,68
	Lados C		1,18	0,40		1,00	0,47
	Ventana V6		0,60	0,33		-1,00	-0,20
	Lado D	1,69		0,40		1,00	0,68
Consultorio medicina general	Lado A		2,90	2,27		1,00	6,58
	Ventana v3		1,70	1,20		-1,00	-2,04
	Lado B	3,68		2,33		1,00	8,57
	Lado C		2,90	2,33		1,00	6,76
	Ventana V5		1,37	1,19		-1,00	-1,63
	Lado D	3,68		2,35		1,00	8,65
	Puerta P4		1,00	1,96		-1,00	-1,96
Consultorio Odontología	Lado A	3,00		2,23		1,00	6,69
	Puerta P6		1,10	2,10		-1,00	-2,31
	Lado B		1,09	2,35		-1,00	-2,56
	Lado C	0,13		2,35		1,00	0,31
	Lado D		0,12	2,35		1,00	0,28
	Lado B	0,63		2,35		1,00	1,48
	Lado F		2,17	2,23		1,00	4,84
	Lado G	3,81		2,35		1,00	8,95
	Lado H		3,15	2,35		1,00	7,40
	Ventana v2		1,67	1,19		-1,00	-1,99
						Cantidad	71,51

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:	APROBÓ:
ROSELINO ACOSTA MENDOZA	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
RESIDENTE DE OBRA	REPRESENTANTE LEGAL
J&M INGENIERIA	EPICO INGENIERIA SAS

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E


DEPARTAMENTO DE CASANARE


MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD UNION CHARTE DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	**UBICACIÓN**	Union Charte
		FECHA	30/04/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	MUROS Y ACABADOS	ÍTEM	6.4	Pintura acrílica alta asepsia para interiores sobre muros 3 manos	UND	m²	CANT.	78,25

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA

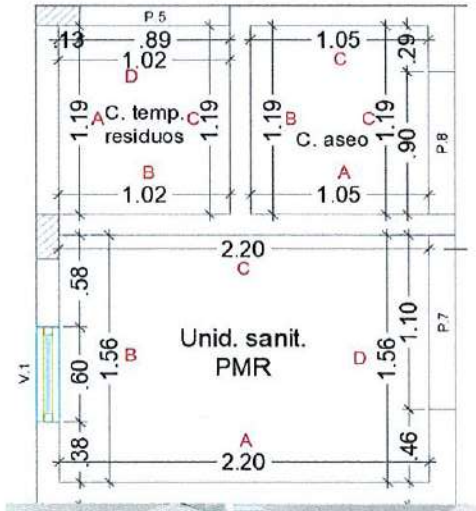

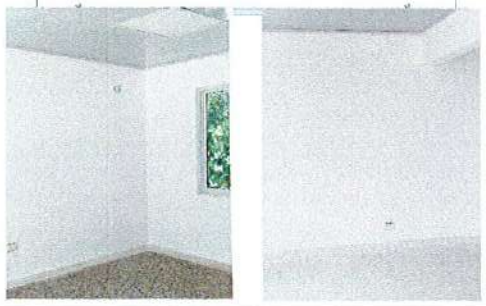

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES					CANT. TOTAL
		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	ÁREA (M2)	CANT.	
Cuarto de aseo	Lados A		1,20	0,40		1,00	0,48
	Lado B	1,19		0,40		1,00	0,48
	Lado C		1,05	0,40		1,00	0,42
	Lado D	0,29		0,40		1,00	0,12
	Puerta P8		0,9	0,18		1,00	0,16
Cuarto de residuos	Lado A	1,19		0,40		1,00	0,48
	Lado B		1,02	0,40		1,00	0,41
	Lado C	1,33		0,40		1,00	0,53
	Lado D		1,02	0,40		1,00	0,41
	Puerta P5		0,89	0,18		1,00	0,16
PMR	Lado A		2,20	0,40		1,00	0,88
	Lado B	1,56		0,40		1,00	0,62
	Ventana V1		0,60	0,20		-1,00	-0,12
	Lado C		2,20	0,40		1,00	0,88
	Lado D	1,56		0,40		1,00	0,62
	Puerta		1,10	0,18		1,00	0,20

Cantidad Proyectada	**6,74**
Viene	71,51
Valor total	78,25
Cantidad contractual	86,86
Diferencia	-8,61

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:	APROBÓ:
ROSELINO ACOSTA MENDOZA	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
RESIDENTE DE OBRA	REPRESENTANTE LEGAL
J&M INGENIERIA	EPICO INGENIERIA SAS


HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E

DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD UNION CHARTE DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	**UBICACIÓN**	Union Charte
		FECHA	30/04/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	**MUROS Y ACABADOS**	**ÍTEM**	**6.4**	Pintura acrílica alta asepsia para interiores sobre muros 3 manos	**UND**	m²	**CANT.**	**0,00**

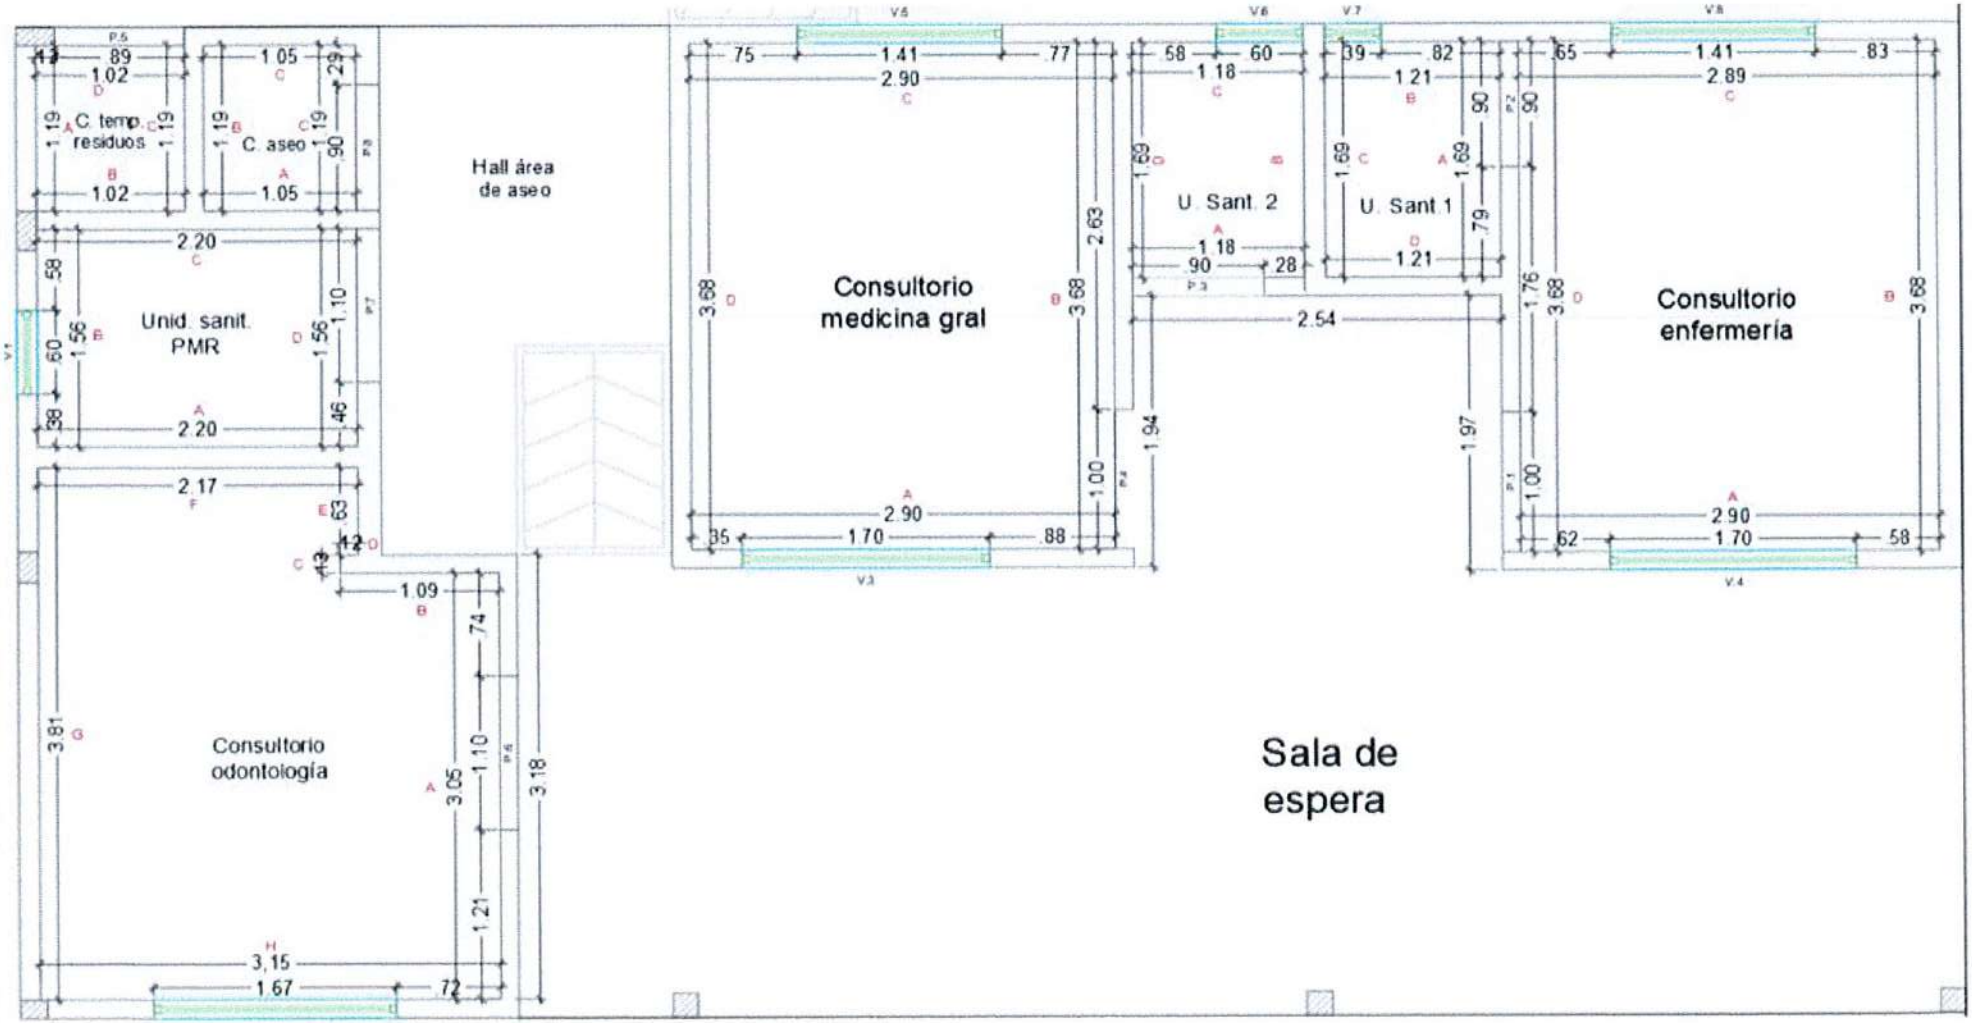

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E


DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD UNION CHARTE DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	UBICACIÓN	Union Charte
		FECHA	30/04/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	MUROS Y ACABADOS	ÍTEM	6.5	Pintura exterior acrilica tipo koraza o similar sobre muros 3 manos	UND	m²	CANT.	119,42

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA

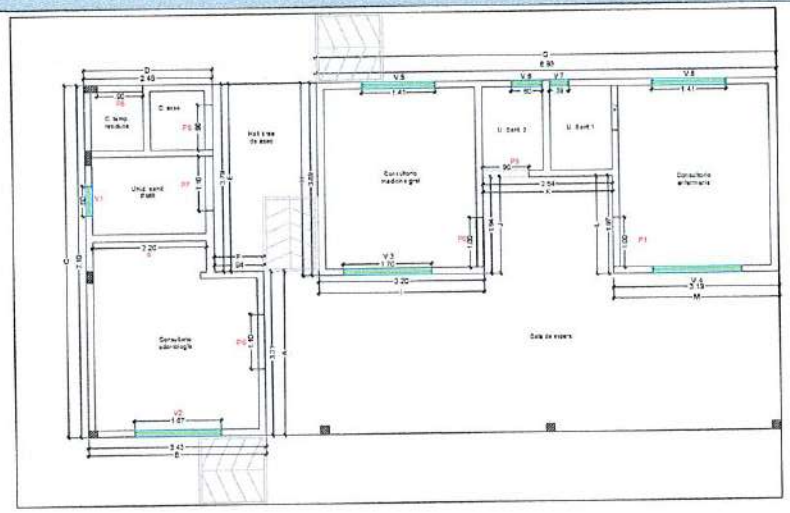





LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES Altura A (m)	Ancho B (m)	C=(A*B)/2	Longitud (m) L	CANT.	CANT. TOTAL C*L*CANT.
Lado A (h1=2.42;h2=3.26) Ht=(2.42*3.26)/2= 2.84		2,84	3,31			1,00	9,40
Puerta 6		1,95	1,10			-1,00	-2,15
Lado B		2,84	3,43			1,00	9,74
Ventana V2		1,19	1,67			-1,00	-1,99
Lado C1 (Área tringulo - cuchilla) (h1=3,40;h2=2,52) Ht=3.40 - 2.52= 0,88		0,88	3,24	1,43	3,24	1,00	4,62
Lado C1 (Área cuadrado) H= 3,40- 0,88= 2,52		2,52	3,24			1,00	8,16
Lado C2 (Área tringulo - cuchilla) Lado A (h1=3,40;h2=2,66) Ht=3,40 - 2,66= 0,74		0,74	3,86	3,93	3,87	1,00	15,21
Lado C2 (Área cuadrado)		2,66	3,86			1,00	10,27
Ventana V1		0,45	0,60			-1,00	-0,27
Lado D		2,66	2,49			1,00	6,62
Puerta P5		1,19	0,90			-1,00	-1,07
Lado E1 (Área tringulo - cuchilla) (h1=3,40;h2=2,52) Ht=3.40 - 2.52= 0,88		0,88	3,79			1,00	3,34
Lado E1(Área cuadrado)		1,78	3,79			1,00	6,75
Puerta P8		2,10	0,90			-1,00	-1,89
Puerta P7		1,95	1,10			-1,00	-2,15
Lado F		2,66	0,94			1,00	2,50
Lado G		2,66	8,93			1,00	23,75
Ventana V5		1,19	1,41			-1,00	-1,68
Ventana V6		0,45	0,60			-1,00	-0,27
Ventana V7		0,39	0,60			-1,00	-0,23
Ventana V8		1,20	1,41			-1,00	-1,69
Lado H1 (Área tringulo - cuchilla) (h1=3,40;h2=2,52) Ht=3.40 - 2.52= 0,88		0,88	3,89			1,00	3,42
Lado H1(Área cuadrado)		1,78	3,89			1,00	6,92
Sala de espera	Lado I	2,66	3,2			1,00	8,51
	Ventana 3	1,20	1,7			-1,00	-2,04
	Lado J	2,66	1,94			1,00	5,16
	Puerta P6	1,96	1,00			-1,00	-1,96
	Lado K	2,66	2,54			1,00	6,76
	Puerta P3	1,94	0,90			-1,00	-1,75
	Lado L	2,66	1,97			1,00	5,24
	Puerta 1	1,95	1,00			-1,00	-1,95
	Columnas	2,29	0,15			12,00	4,12
	Muro paisajismo						

Cantidad Proyectada	119,42
Cantidad contractual	139,16
Diferencia	-19,74

ELABORÓ:

ROSELINO ACOSTA MENDOZA
RESIDENTE DE OBRA
J&M INGENIERIA

APROBÓ:

OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
REPRESENTANTE LEGAL
EPICO INGENIERIA SAS


HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E

DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD UNION CHARTE DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	**UBICACIÓN**	Union Charte
		FECHA	30/04/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	MUROS Y ACABADOS	ÍTEM	6.5	Pintura exterior acrilica tipo koraza o similar sobre muros 3 manos	UND	m²	CANT.

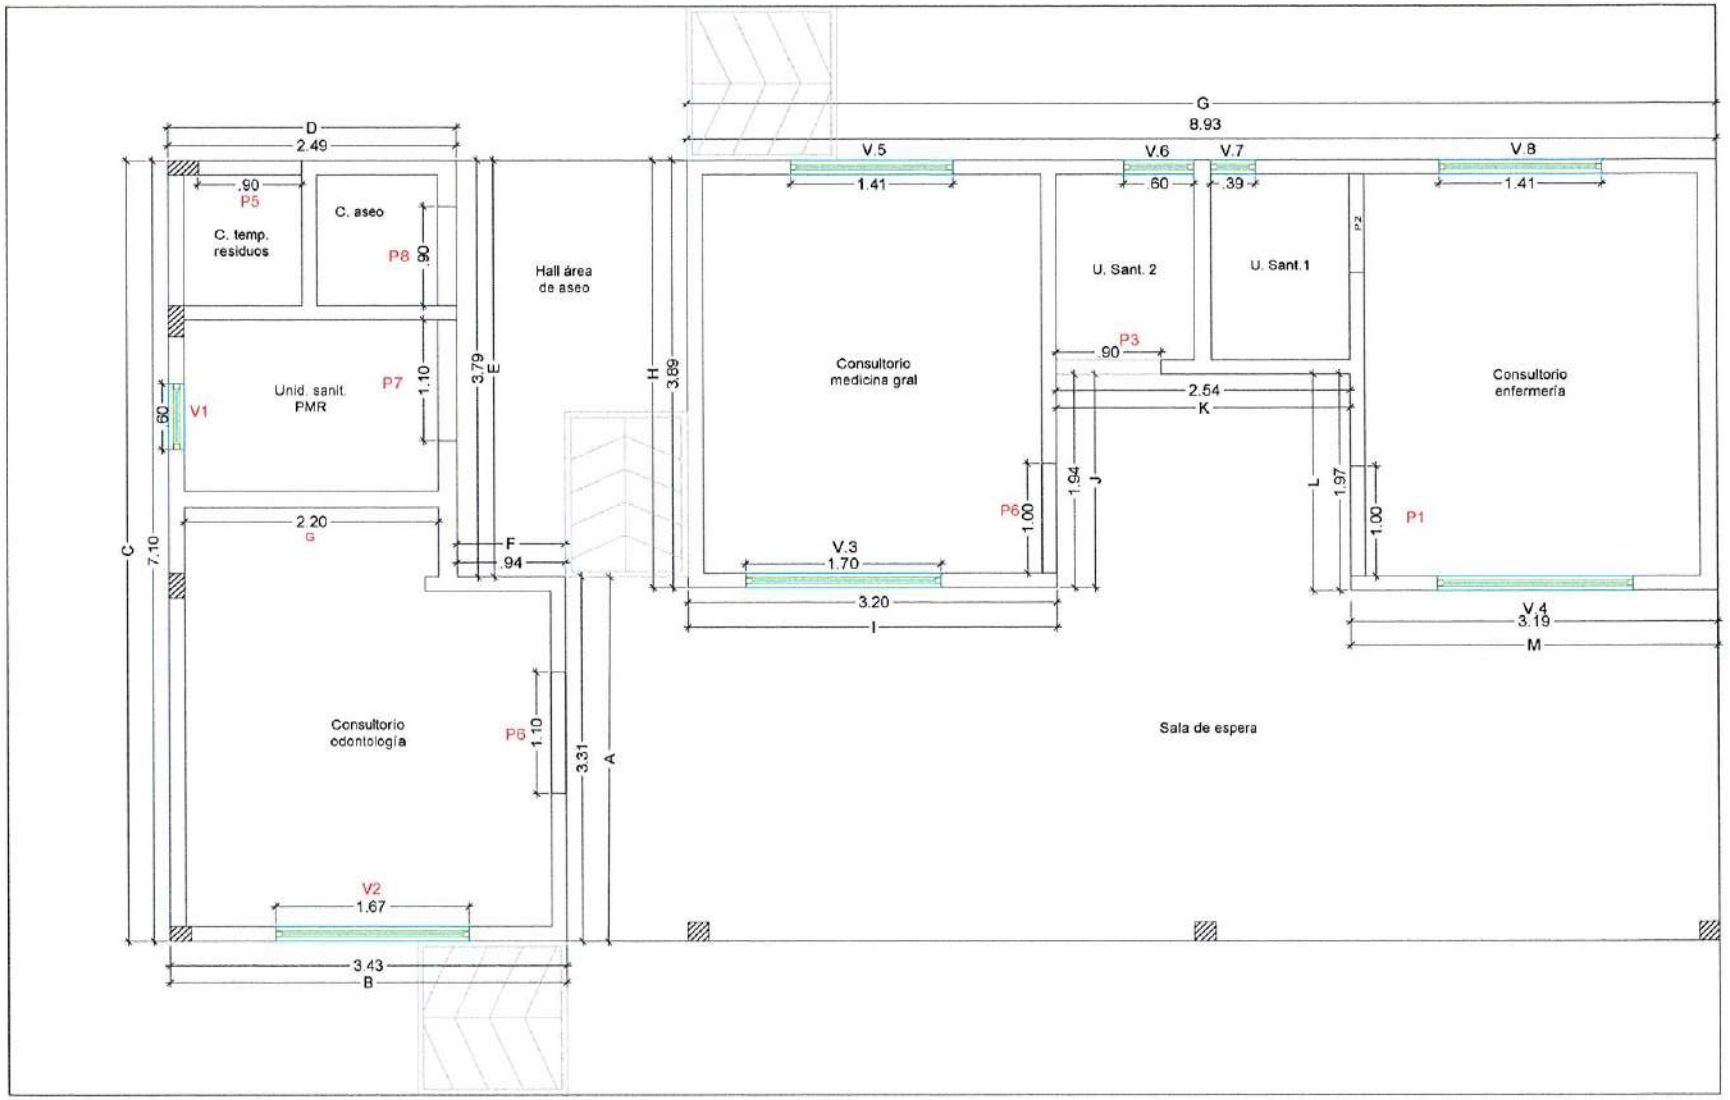

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E


DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD UNION CHARTE DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	UBICACIÓN	Union Charte
		FECHA	30/04/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	MUROS Y ACABADOS	ÍTEM	6.8	Estuco plástico muros. Suministro e instal.	UND	m2	CANT.	

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA

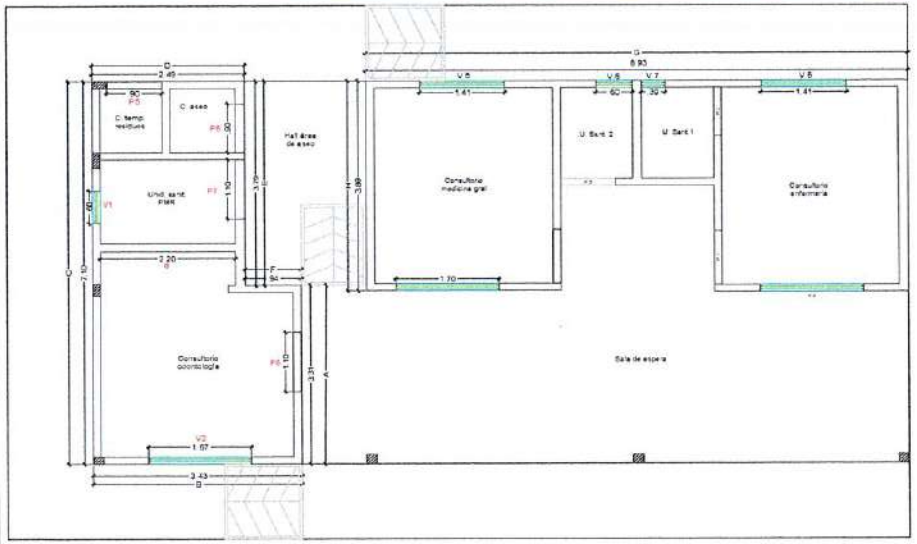

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					CANT. TOTAL C*L*CANT.
	Altura A (m)	Ancho B (m)	C=(A*B)/2	Longitud (m) L	CANT.	
Lado A (h1=2.42,h2=3.26) Ht=(2.42*3.26)/2= 2.84	2,84	3,31			1,00	9,40
Puerta 6	1,95	1,10			-1,00	-2,15
Lado B	2,84	3,43			1,00	9,74
Ventana V2	1,19	1,67			-1,00	-1,99
Lado C1 (Área tringulo - cuchilla) (h1=3,40;h2=2,52) Ht=3.40 - 2.52= 0,88	0,88	3,24	1,43	3,24	1,00	4,62
Lado C1 (Área cuadrado) H= 3,40- 0,88= 2,52	2,52	3,24			1,00	8,16
Lado C2 (Área tringulo - cuchilla) Lado A (h1=3,40;h2=2,66) Ht=3,40 - 2,66= 0,74	0,74	3,86	3,93	3,87	1,00	15,21
Lado C2 (Área cuadrado)	2,66	3,86			1,00	10,27
Ventana V1	0,45	0,60			-1,00	-0,27
Lado D	2,66	2,49			1,00	6,62
Puerta P5	1,19	0,90			-1,00	-1,07
Lado E1 (Área tringulo - cuchilla) (h1=3,40;h2=2,52) Ht=3.40 - 2.52= 0,88	0,88	3,79			1,00	3,34
Lado E1(Área cuadrado)	1,78	3,79			1,00	6,75
Puerta P8	2,10	0,90			-1,00	-1,89
Puerta P7	1,95	1,10			-1,00	-2,15
Lado F	22,66	0,94			1,00	21,30
Lado G	2,66	8,93			1,00	23,75
Ventana V5	1,19	1,41			-1,00	-1,68
Ventana V6	0,45	0,60			-1,00	-0,27
Ventana V7	0,39	0,60			-1,00	-0,23
Ventana V8	1,20	1,41			-1,00	-1,69
Lado H1 (Área tringulo - cuchilla) (h1=3,40;h2=2,52) Ht=3.40 - 2.52= 0,88	0,88	3,89			1,00	3,42
Lado H1(Área cuadrado)	1,78	3,89			1,00	6,92
U. Sanitaria 2	2,10			0,72	2,00	3,02
Consultorio odontologico	2,40			0,81	2,00	3,89
	1,19			0,40	2,00	0,95
					Cantidad Proyectada	123,99

ELABORÓ:

ROSELINO ACOSTA MENDOZA
RESIDENTE DE OBRA
J&M INGENIERIA

APROBÓ:

OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
REPRESENTANTE LEGAL
EPICO INGENIERIA SAS

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E


DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD UNION CHARTE DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	**UBICACIÓN**	Union Charte
		FECHA	30/04/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	MUROS Y ACABADOS	**ÍTEM**	6.8	Estuco plástico muros. Suministro e instal.	**UND**	m2	**CANT.**	

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA

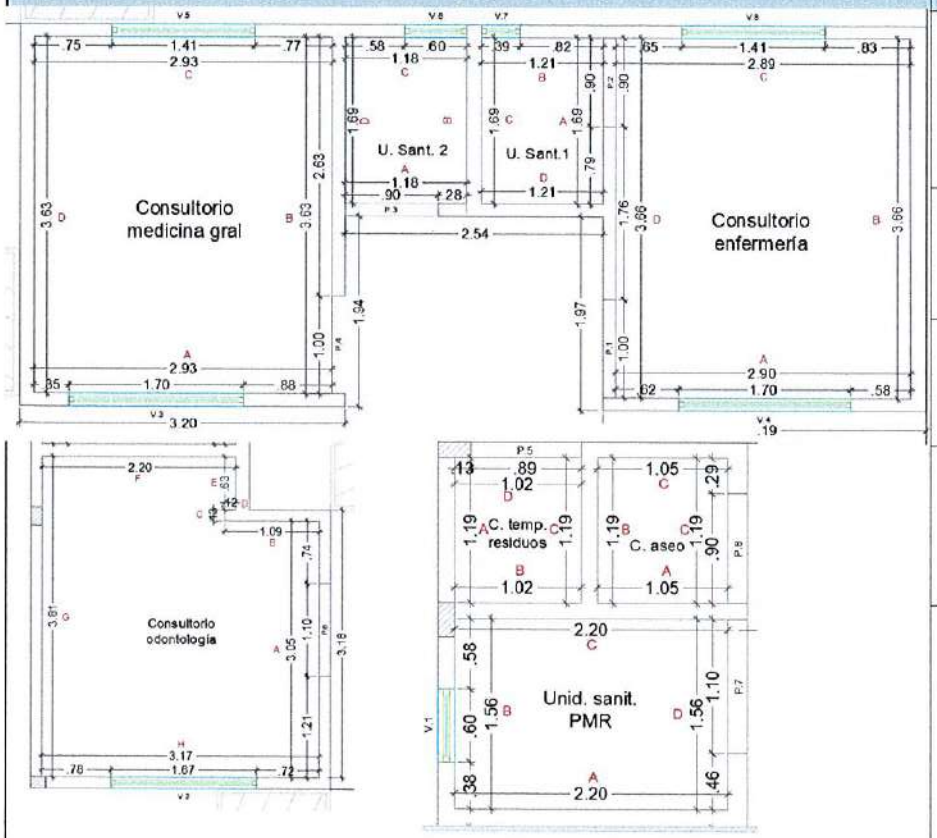

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	ÁREA (M2)	CANT.	CANT. TOTAL
Consultorio enfermería	Lado A		2,90	2,35		1,00	6,82
	Ventana v4		1,70	1,20		-1,00	-2,04
	Lado B	3,66		2,35		1,00	8,60
	Lado C		2,89	2,35		1,00	6,79
	Ventana V8		1,41	1,20		-1,00	-1,69
	Lado D	3,66		2,35		1,00	8,60
	Puerta P2		0,90	1,97		-1,00	-1,77
	Puerta P1		1,00	1,95		-1,00	-1,95
Unidad Sanitario 01	Lados A h:2,35 -1,80= 0,55	1,69		0,55		1,00	0,93
	Lados B h:2,35 -1,80= 0,55		1,21	0,55		1,00	0,67
	Ventana V7		0,39	0,32		-1,00	-0,12
	Lados C	1,69		0,55		1,00	0,93
	Puerta P2		0,90	1,94		-1,00	-1,75
Unidad Sanitario 02	Lados A		1,18	0,55		1,00	0,65
	Puerta P3		0,90	1,94		-1,00	-1,75
	Lados B	1,69		0,55		1,00	0,93
	Lados C		1,18	0,55		1,00	0,65
	Ventana V6		0,60	0,33		-1,00	-0,20
	Lado D	1,69		0,55		1,00	0,93
Cuarto de aseo	Lados A h:2,35 -1,80= 0,55		1,20	0,55		1,00	0,66
	Lado B	1,19		0,55		1,00	0,65
	Lado C		1,05	0,55		1,00	0,58
	Lado D	0,29		0,55		1,00	0,16
	Puerta P8 Puerta 2,10 (2.35-2,10=0.25)		0,9	0,25		1,00	0,23
Cuarto de residuos	Lado A	1,19		0,55		1,00	0,65
	Lado B		1,02	0,55		1,00	0,56
	Lado C	1,33		0,55		1,00	0,73
	Lado D		1,02	0,55		1,00	0,56
	Puerta P7 Puerta 2,09 (2.35-2,09=0.26)		0,89	0,26		1,00	0,23
U. Sant PMR	Lado A		2,20	0,55		1,00	1,21
	Lado B	1,56		0,55		1,00	0,86
	Ventana V1		0,60	0,20		-1,00	-0,12
	Lado C		2,20	0,55		1,00	1,21
	Lado D	1,56		0,55		1,00	0,86
	Puerta		1,10	0,25		1,00	0,28
						Cantidad Proyectada	34,63
						Viene	123,99
						Valor total	158,52
						Cantidad contractual	224,66
						Diferencia	-66,14

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:	APROBÓ:
ROSELINO ACOSTA MENDOZA	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
RESIDENTE DE OBRA	REPRESENTANTE LEGAL
J&M INGENIERIA	EPICO INGENIERIA SAS


HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E

DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD UNION CHARTE DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	**UBICACIÓN**	Union Charte
		FECHA	30/04/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	**MUROS Y ACABADOS**	**ÍTEM**	**6.8**	Estuco plástico muros. Suministro e instal.	**UND**	m2	**CANT.**	**0,00**

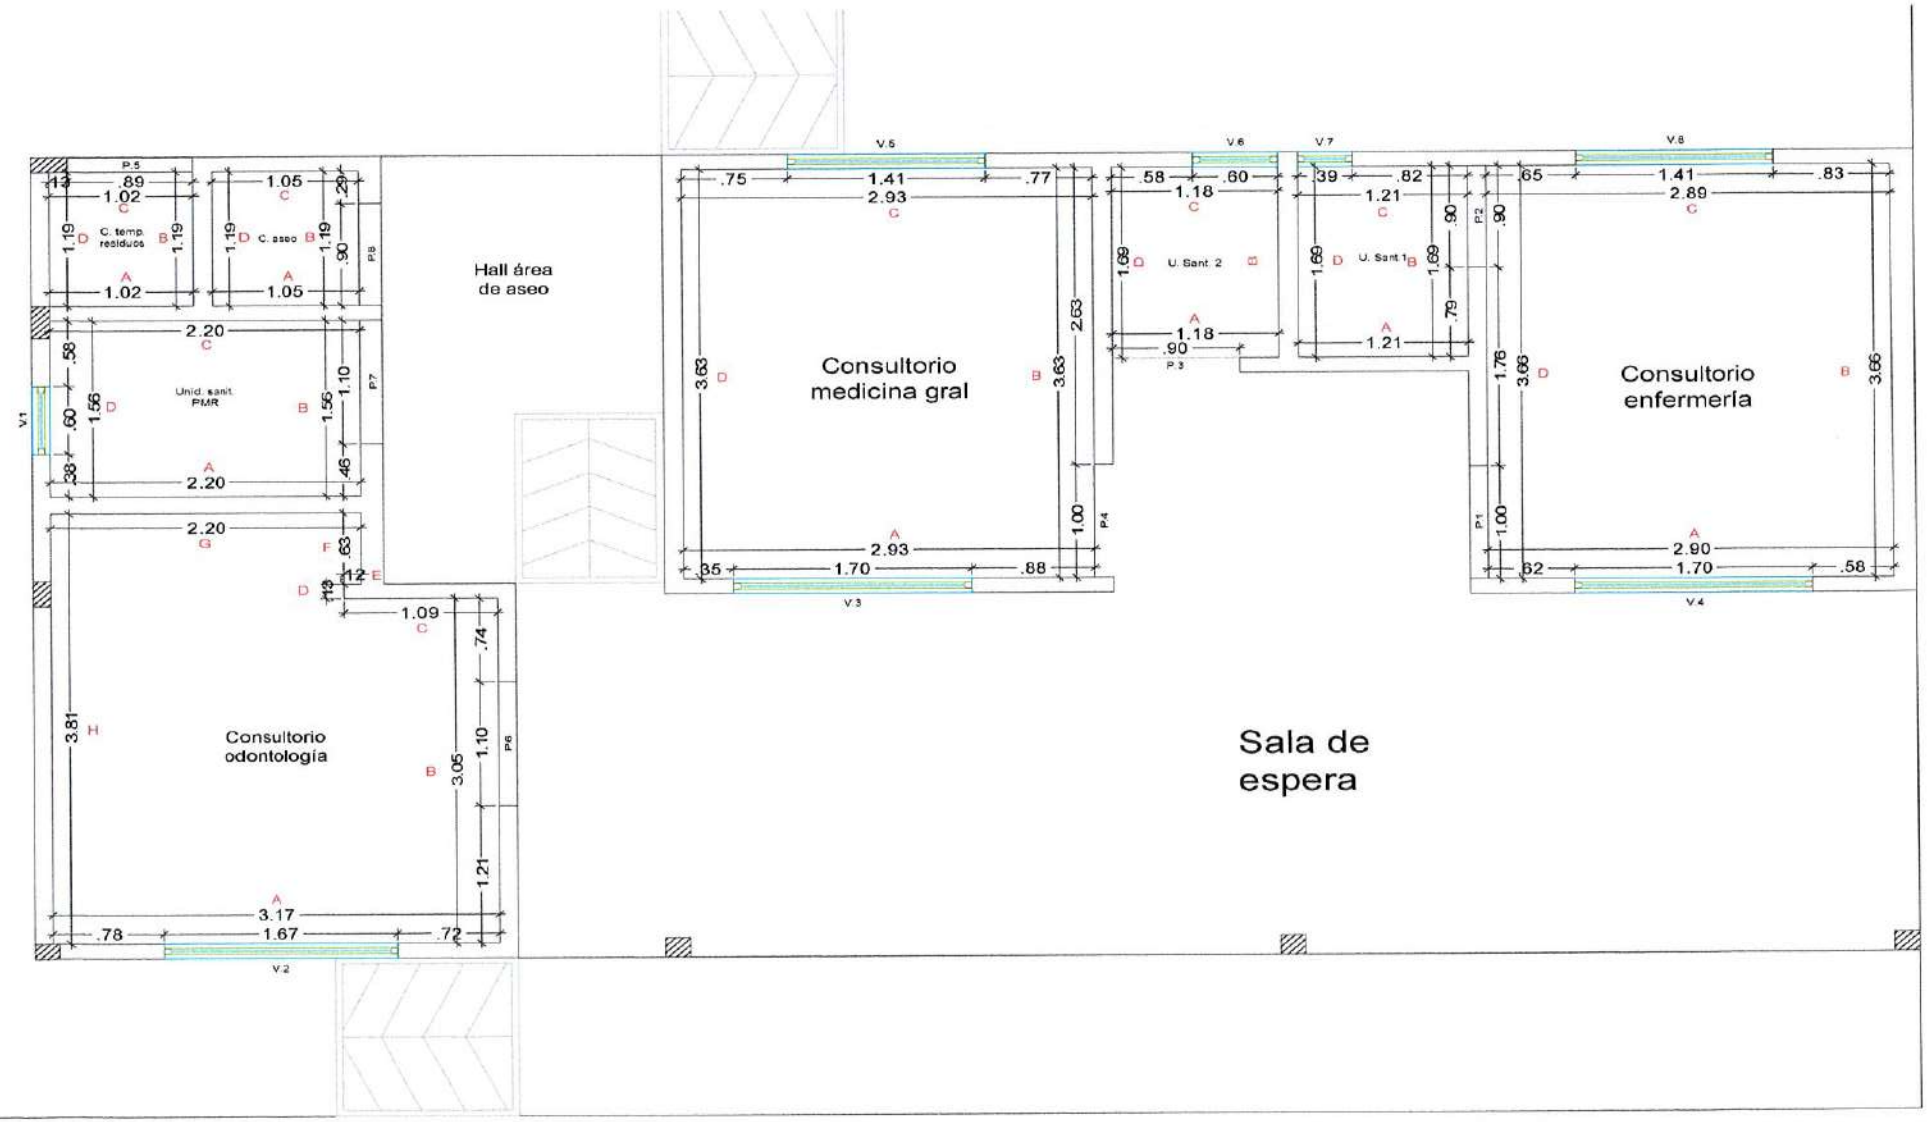

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E


DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD UNION CHARTE DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	UBICACIÓN	Union Charte
		FECHA	30/04/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	CUBIERTA	ÍTEM	7.1	Correa metálica en perfil estructural PHR-C 120 x 60 x 2 mm, con anticorrosivo, esmalte e instalación.	UND	m	CANT.	164,60

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA

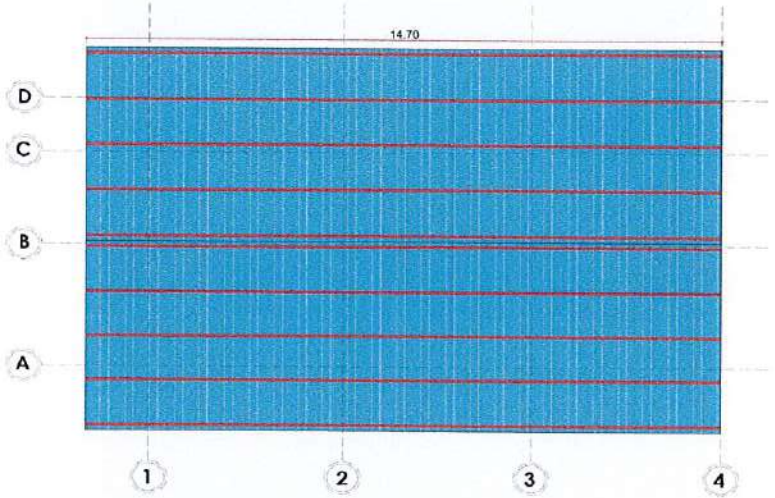





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					CANT. TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	ÁREA (M2)	CANT.	
Correa	14,70				10,00	147,00
Pie de amigo 01	1,40				8,00	11,20
Pie de amigo 02	0,80				8,00	6,40

Cantidad Proyectada	**164,60**
Cantidad contractual	164,60
Diferencia	0,00

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:	APROBÓ:
ROSELINO ACOSTA MENDOZA	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
RESIDENTE DE OBRA	REPRESENTANTE LEGAL
J&M INGENIERIA	EPICO INGENIERIA SAS

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E


DEPARTAMENTO DE CASANARE


MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD UNION CHARTE DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	UBICACIÓN	Union Charte
		FECHA	30/04/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	CUBIERTA	ÍTEM	7.2	Cubierta tipo sandwich Deck 333C - cal. 26 pintada a dos caras, poliuretano de e=38 mm. Suministro e instalación	UND	m²	CANT.	150,38

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA

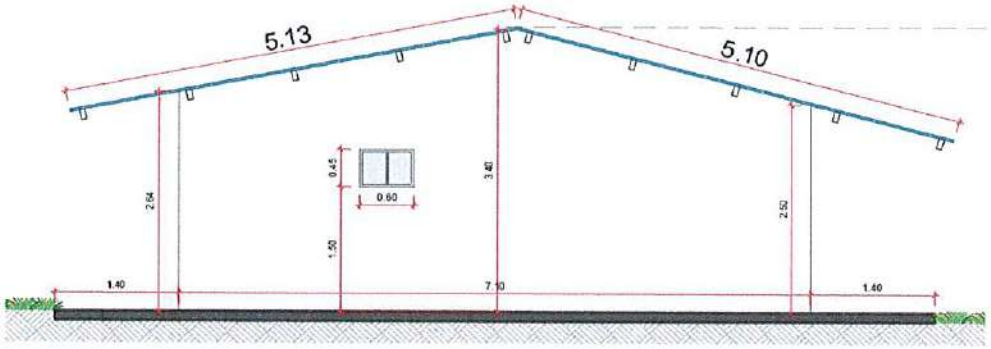

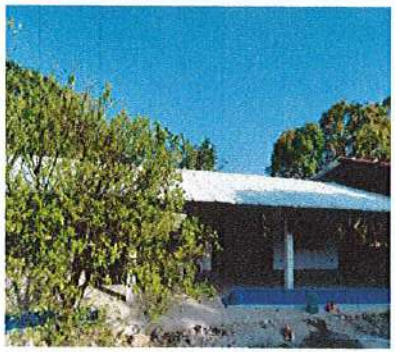




LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					CANT. TOTAL
	Altura A (m)	Ancho B (m)	Longitud (m) L		CANT.	
Cubierta tipo sandwich Deck 333C		5,10	14,70		1,00	74,97
Cubierta tipo sandwich Deck 333C		5,13	14,70		1,00	75,41


Cantidad Proyectada	150,38
Cantidad contractual	150,38
Diferencia	0,00

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:	APROBÓ:
ROSELINO ACOSTA MENDOZA	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
RESIDENTE DE OBRA	REPRESENTANTE LEGAL
J&M INGENIERIA	EPICO INGENIERIA SAS

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E								
DEPARTAMENTO DE CASANARE								
MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA								
OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD UNION CHARTE DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE			UBICACIÓN	Union Charte			
				FECHA	30/04/2026			
				ACTA No	Recibo y liquidación			
CAPÍTULO	CUBIERTA	ÍTEM	7.2	Cubierta tipo sandwich Deck 333C - cal. 26 pintada a dos caras, poliuretano de e=38 mm. Suministro e instalación	UND	m²	CANT.	0,00

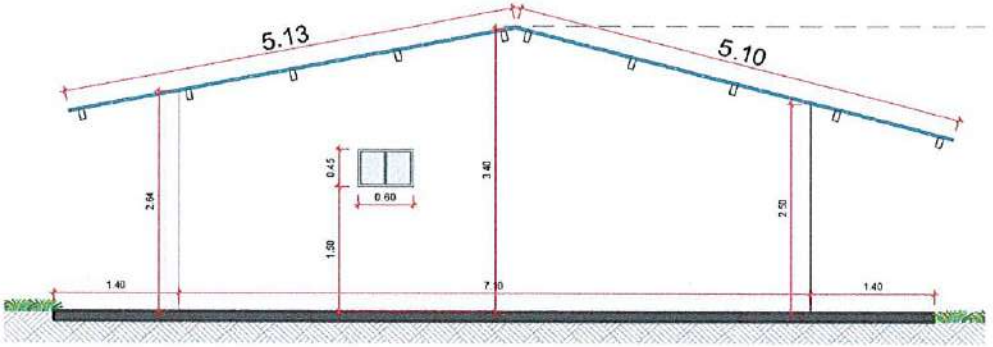

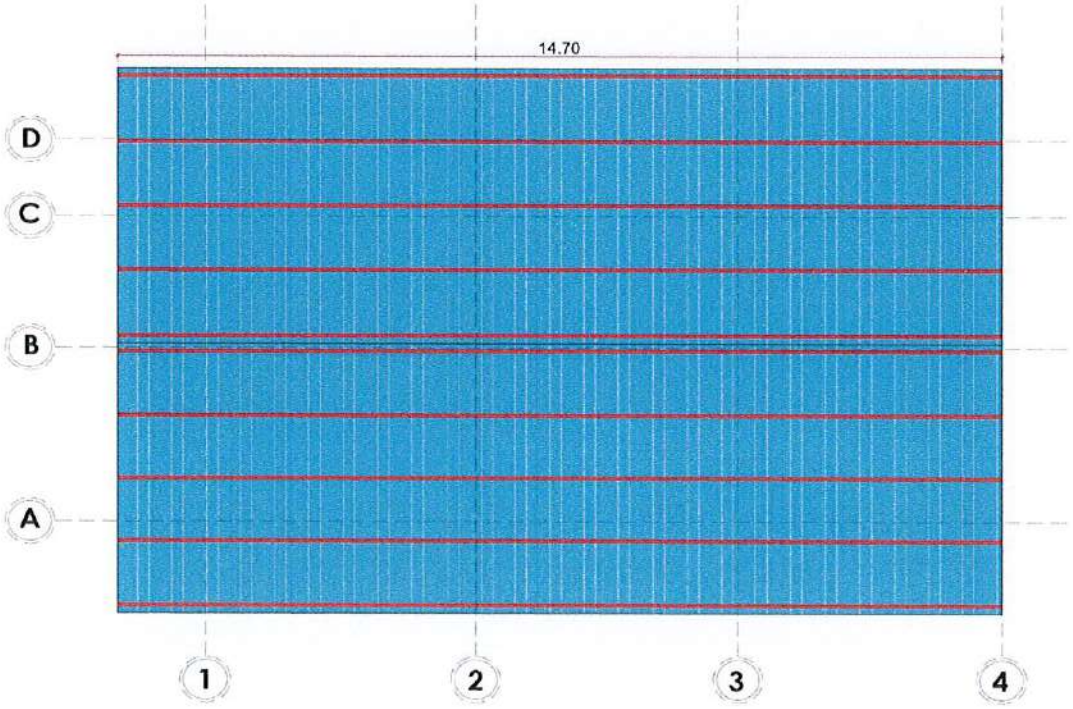


HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E

DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD UNION CHARTE DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	**UBICACIÓN**	Union Charte
		FECHA	30/04/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	CUBIERTA	ÍTEM	7.3	Caballete TZL metálico cal 26/28 prepintado a=0.60 m	UND	m	CANT.	14,70

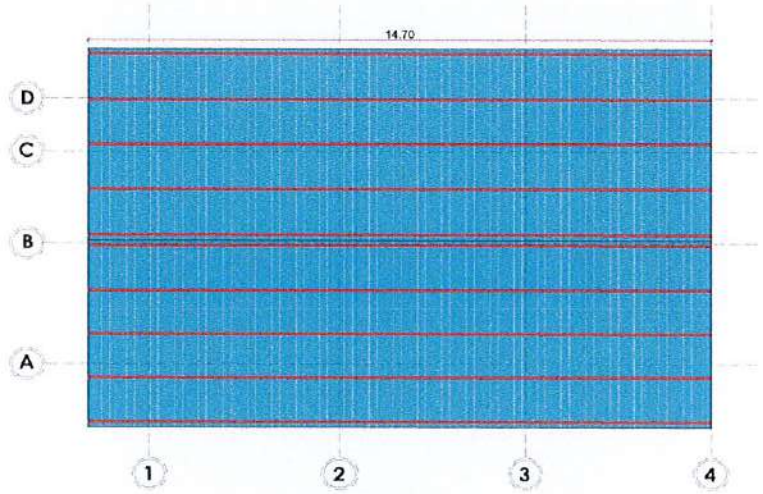ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					CANT. TOTAL
		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	ÁREA (M2)	CANT.	
	Caballete TZL metálico cal 26/28 prepintado a=0.60 m	14,70				1,00	14,70



Cantidad Proyectada	**14,70**
Cantidad contractual	14,70
Diferencia	0,00

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:	APROBÓ:
ROSELINO ACOSTA MENDOZA	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
RESIDENTE DE OBRA	REPRESENTANTE LEGAL
J&M INGENIERIA	EPICO INGENIERIA SAS

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E


DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD UNION CHARTE DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	**UBICACIÓN**	Union Charte
		FECHA	30/04/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	**CUBIERTA**	**ÍTEM**	**7.4**	**Cielo raso en lamina PVC 10 mm (incluye cornisa)**	**UND**	**m²**	**CANT.**	**42,22**

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA

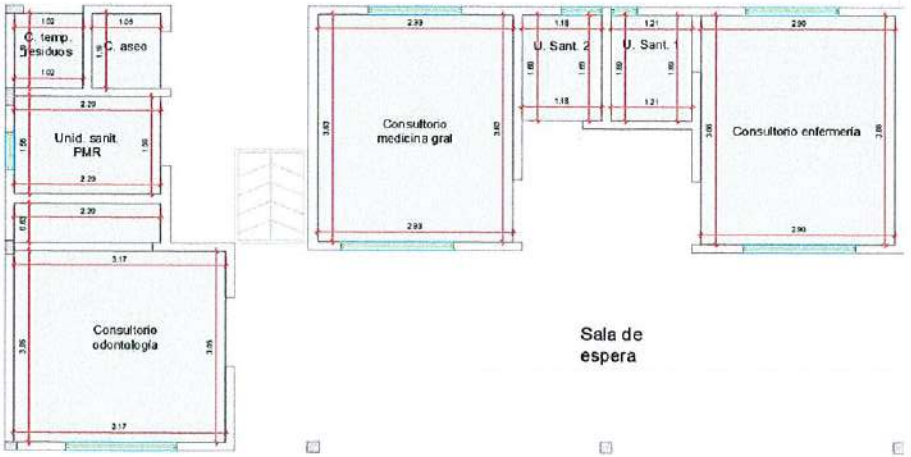

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					CANT. TOTAL
	Ancho B (m)	Altura A (m)	A (m2)	Longitud (m) L	CANT.	
Consultorio enfermeria	2,90			3,66	1,00	10,60
U. santi 1	1,21			1,69	1,00	2,04
U. santi 2	1,18			1,69	1,00	1,99
Consultorio medicina general	2,93			3,63	1,00	10,64
Consultorio Odontologia Colsultorio	3,17			3,05	1,00	9,67
Lavado	2,20			0,63	1,00	1,39
Umid. Sanit PMR	2,20			1,56	1,00	3,43
C aseo	1,05			1,19	1,00	1,25
C. temp residuos	1,02			1,19	1,00	1,21

Cantidad Proyectada	**42,22**
Cantidad contractual	42,70
Diferencia	-0,48

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:	APROBÓ:
ROSELINO ACOSTA MENDOZA	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
RESIDENTE DE OBRA	REPRESENTANTE LEGAL
J&M INGENIERIA	EPICO INGENIERIA SAS


HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E

DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD UNION CHARTE DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	UBICACIÓN	Union Charte
		FECHA	30/04/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	CUBIERTA	ÍTEM	7.4	Cielo raso en lamina PVC 10 mm (incluye cornisa)	UND	m²	CANT.	0,00

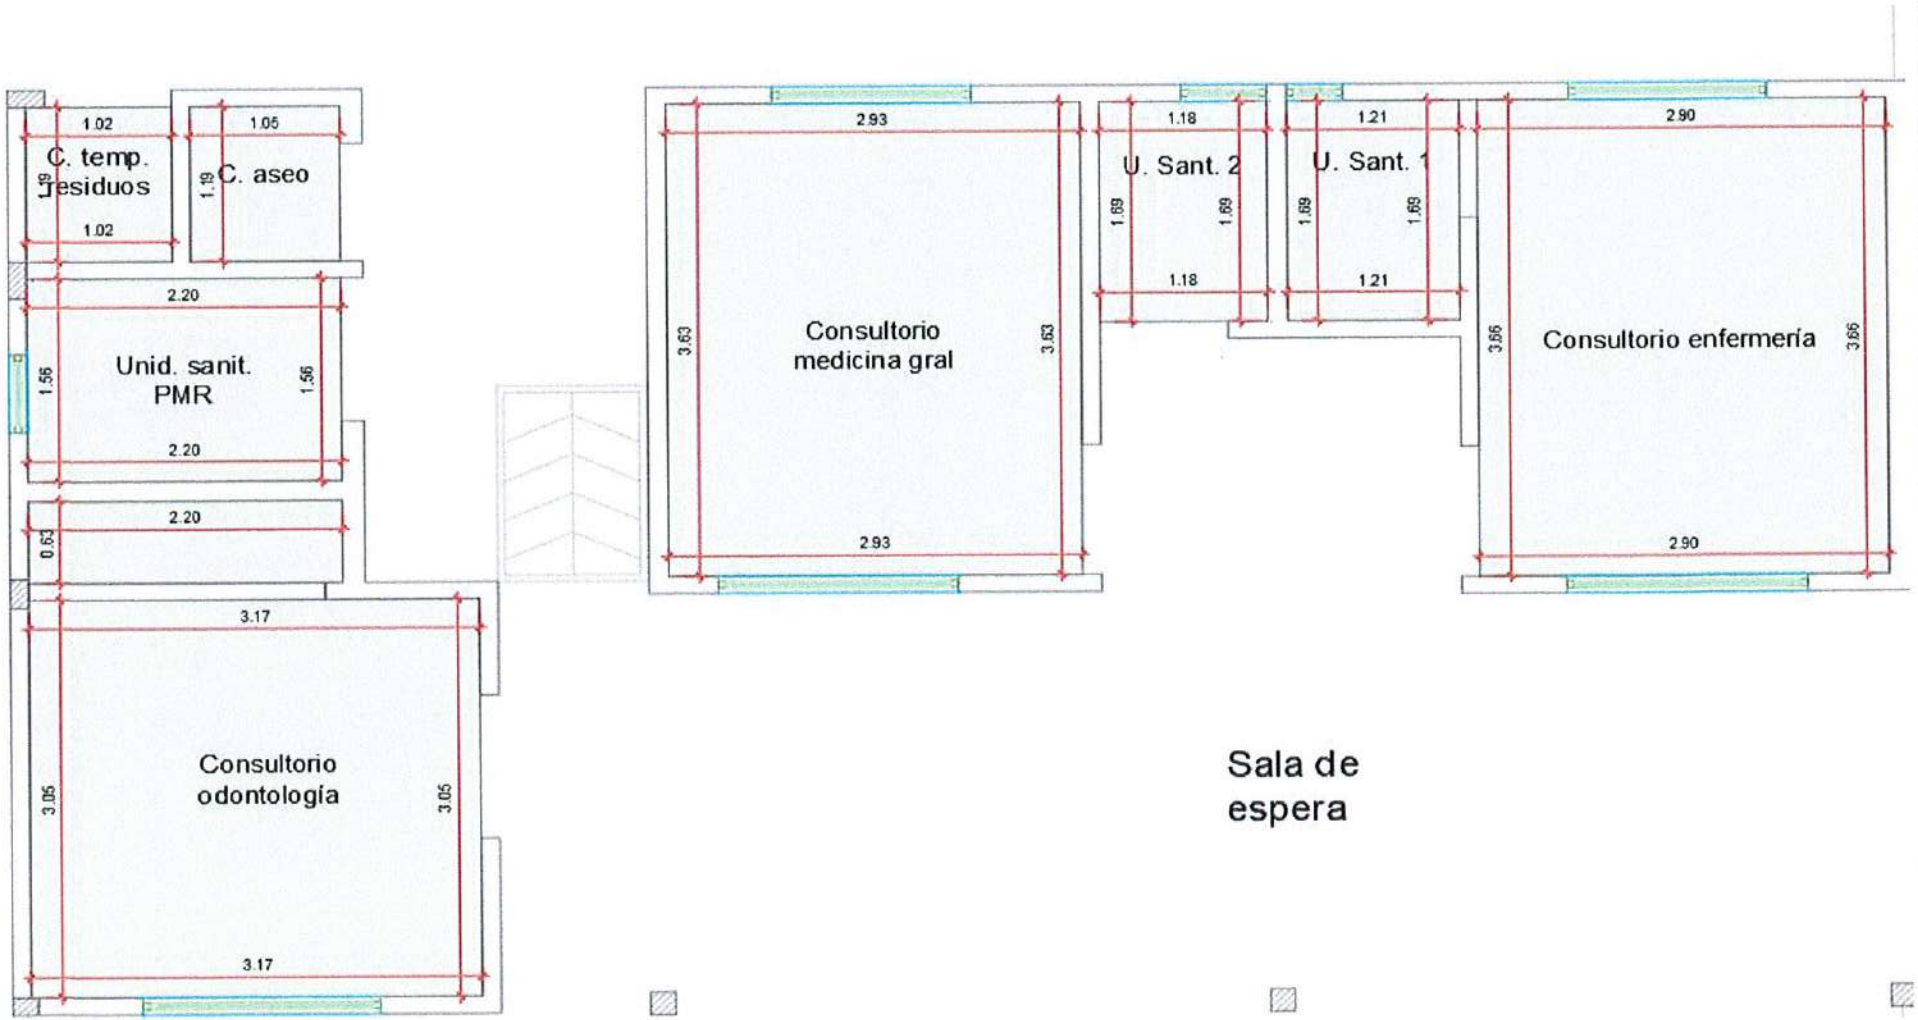

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E


DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD UNION CHARTE DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	**UBICACIÓN**	Union Charte
		FECHA	30/04/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	**CARPINTERÍA METALICA Y EN MADERA**	**ÍTEM**	**8.3**	**Pasamanos en acero inoxidable cal. 18 2" incluye soportes. Suministro e instal.**	**UND**	**m**	**CANT.**	**0,00**

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIONES**					**CANT. TOTAL**
		LONG (M)	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	**ÁREA (M2)**	**CANT.**	
	Rampa 01	1,50				1,00	1,50

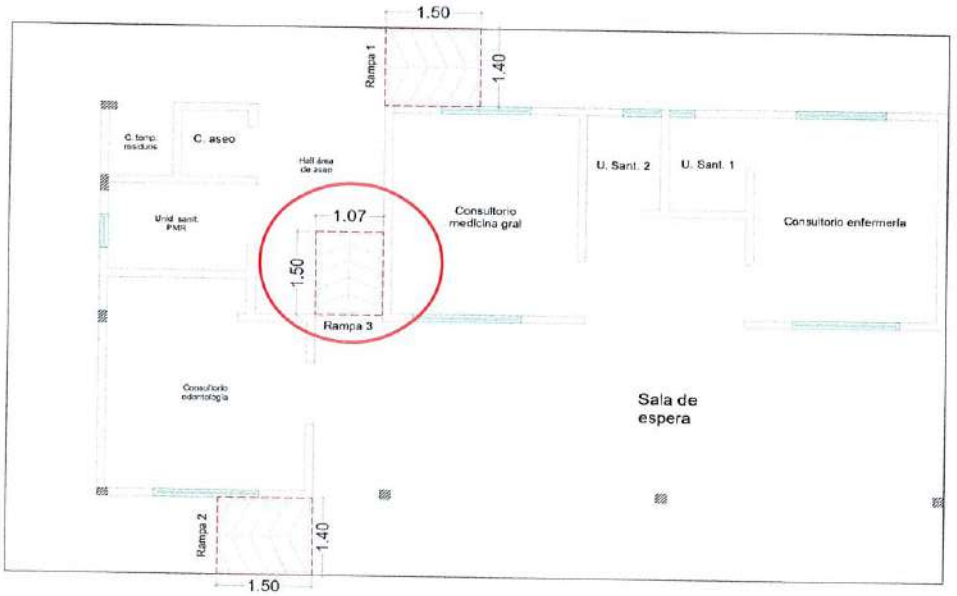

Cantidad Proyectada	**1,50**
Cantidad contractual	1,50
Diferencia	0,00

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:	APROBÓ:
ROSELINO ACOSTA MENDOZA	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
RESIDENTE DE OBRA	REPRESENTANTE LEGAL
J&M INGENIERIA	EPICO INGENIERIA SAS


HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E

DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD UNION CHARTE DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	UBICACIÓN	Union Charte
		FECHA	30/04/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	ADECUACION DE INSTALCIONES ELECTRICAS	ÍTEM	9.1	Acometida en baja tensión en conductor 2x8+8 AWG concéntrico 600 V 90°C XLPE-PVC. Suministro e instalación	UND	m	CANT.	25,00

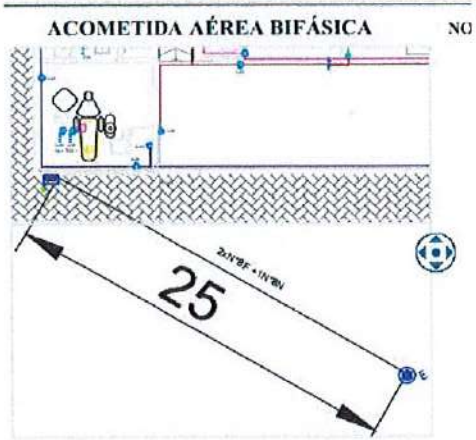ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					CANT. TOTAL
		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	ÁREA (M2)	CANT.	
	Acometida					25,00	25,00
							

Cantidad Proyectada	25,00
Cantidad contractual	25,00
Diferencia	0,00

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:	APROBÓ:
ROSELINO ACOSTA MENDOZA	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
RESIDENTE DE OBRA	REPRESENTANTE LEGAL
J&M INGENIERIA	EPICO INGENIERIA SAS



HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E

DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD UNION CHARTE DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	UBICACIÓN	Union Charte
		FECHA	30/04/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	ADECUACION DE INSTALCIONES ELECTRICAS	ÍTEM	9.2	Suministro e instalación de medidor de energia, incluye: caja para medidor, medidor trifásico tetrafilar, breaker totalizador, sistema de puesta a tierra	UND	und	CANT.	1,00

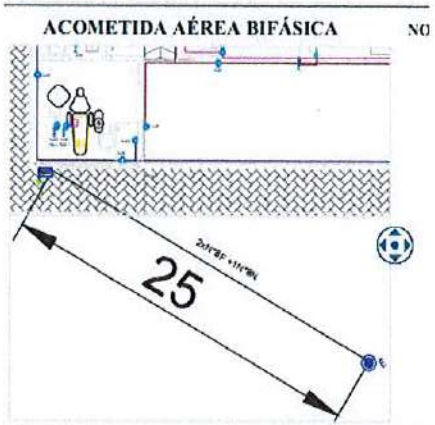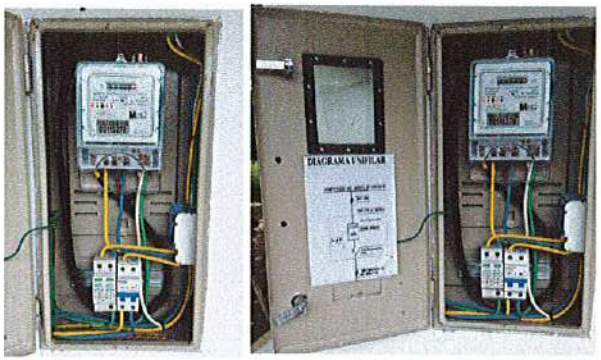ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					CANT. TOTAL
		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	ÁREA (M2)	CANT.	
	Medidor de energía					1,00	1,00
							

Cantidad Proyectada	**1,00**
Cantidad contractual	1,00
Diferencia	0,00

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:	APROBÓ:
ROSELINO ACOSTA MENDOZA	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
RESIDENTE DE OBRA	REPRESENTANTE LEGAL
J&M INGENIERIA	EPICO INGENIERIA SAS

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E


DEPARTAMENTO DE CASANARE


MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD UNION CHARTE DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	**UBICACIÓN**	Union Charte
		FECHA	30/04/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	ADECUACION DE INSTALCIONES ELECTRICAS	ÍTEM	9.3	Suministro e instalación tablero trifásico de 12 circuitos, 220 V, Imáx de 150A, Isc 10 kA, con espacio para totalizador, puerta, incluye accesorios de montaje.	UND	und	CANT.	1,00

DIAGRAMA UNIFILAR

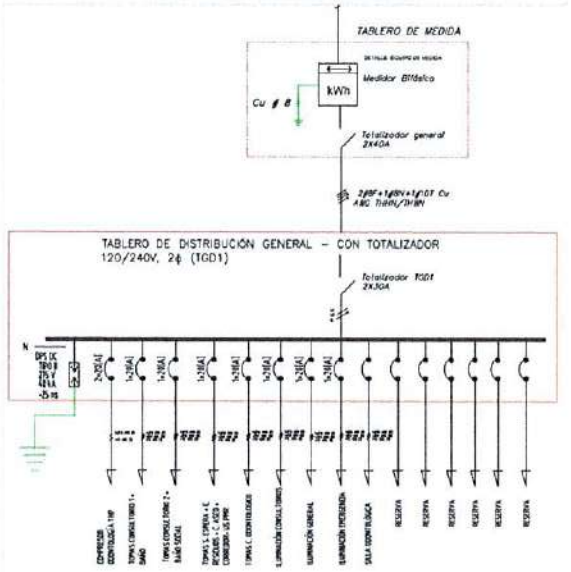

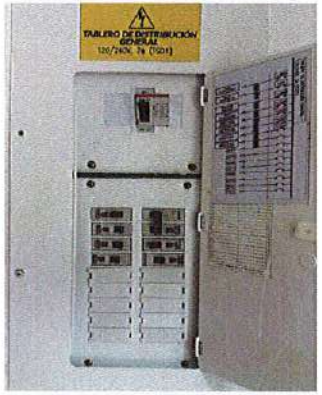

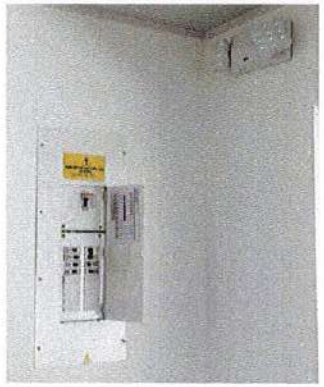


ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					CANT. TOTAL
		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	ÁREA (M2)	CANT.	
	Tablero trifásico					1,00	1,00

Cantidad Proyectada	**1,00**
Cantidad contractual	1,00
Diferencia	0,00

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:	APROBÓ:
ROSELINO ACOSTA MENDOZA	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
RESIDENTE DE OBRA	REPRESENTANTE LEGAL
J&M INGENIERIA	EPICO INGENIERIA SAS

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E

DEPARTAMENTO DE CASANARE


MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD UNION CHARTE DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	**UBICACIÓN**	Union Charte
		FECHA	30/04/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	ADECUACION DE INSTALCIONES ELECTRICAS	ÍTEM	9.4	Interruptor Termomagnético Regulable 35A a 50A, 25kA Totalizador. Suministro e instalación	UND	und	CANT.	1,00

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA

DIAGRAMA UNIFILAR

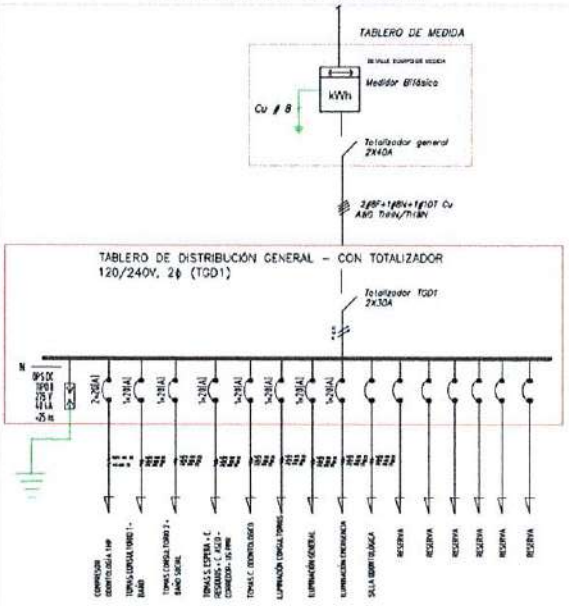





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					CANT. TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	ÁREA (M2)	CANT.	
Interruptor Termomagnético Regulable 35A a 50A, 25kA Totalizador.					1,00	1,00

Cantidad Proyectada	**1,00**
Cantidad contractual	1,00
Diferencia	0,00

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:	APROBÓ:
ROSELINO ACOSTA MENDOZA	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
RESIDENTE DE OBRA	REPRESENTANTE LEGAL
J&M INGENIERIA	EPICO INGENIERIA SAS

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E

DEPARTAMENTO DE CASANARE


MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD UNION CHARTE DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	**UBICACIÓN**	Union Charte
		FECHA	30/04/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	**ADECUACION DE INSTALCIONES ELECTRICAS**	**ÍTEM**	**9.5**	**Cortacircuito termomagnético de 1x(10A-60A), 120/240 V, 10kA, enchufable. Suministro e instalación**	**UND**	**und**	**CANT.**	**12,00**

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					CANT. TOTAL
		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	ÁREA (M2)	CANT.	
	Cortacircuuitos					12,00	12,00

DIAGRAMA UNIFILAR

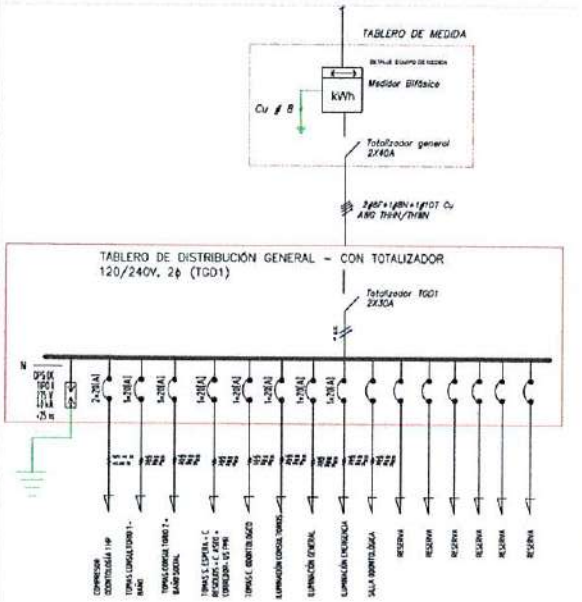



Cantidad Proyectada	**12,00**
Cantidad contractual	12,00
Diferencia	0,00

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:	APROBÓ:
ROSELINO ACOSTA MENDOZA	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
RESIDENTE DE OBRA	REPRESENTANTE LEGAL
J&M INGENIERIA	EPICO INGENIERIA SAS


HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E

DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD UNION CHARTE DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL ,CASANARE	UBICACIÓN	Union Charte
		FECHA	30/04/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	ADECUACION DE INSTALCIONES ELECTRICAS	ÍTEM	9.6	Salida para iluminación en techo, incluye tubería EMT 3/4", cable de cobre THWN N° 12, accesorios, cajas de paso	UND	und	CANT.	20,00

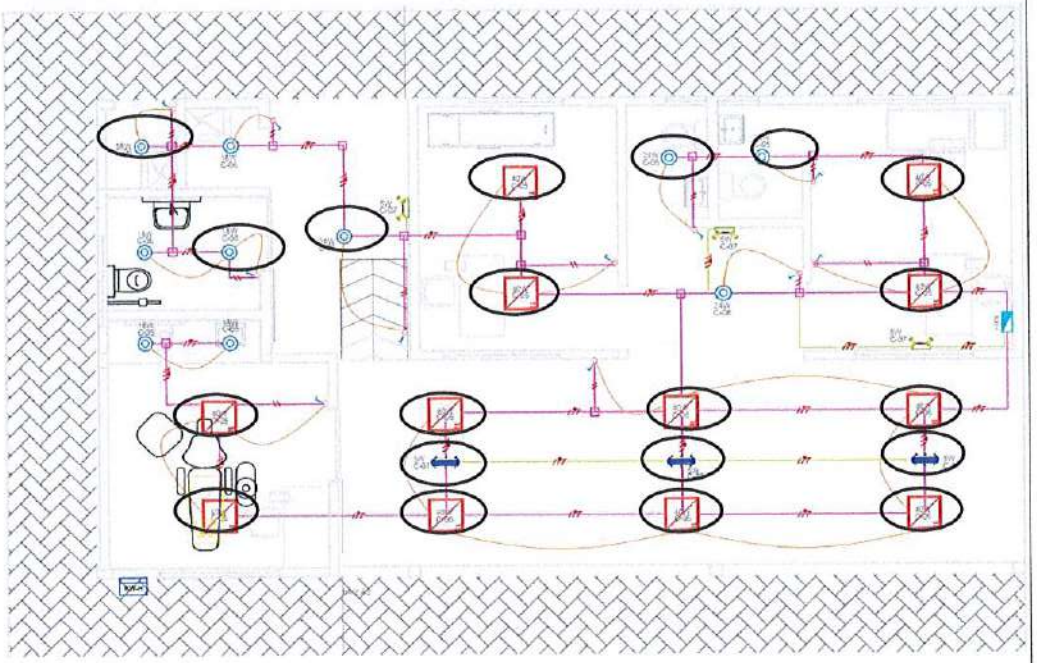ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					CANT. TOTAL
		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	ÁREA (M2)	CANT.	
	Luminarias					20,00	20,00

Cantidad Proyectada	**20,00**
Cantidad contractual	20,00
Diferencia	0,00

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:	APROBÓ:
ROSELINO ACOSTA MENDOZA	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
RESIDENTE DE OBRA	REPRESENTANTE LEGAL
J&M INGENIERIA	EPICO INGENIERIA SAS


HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E

DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD UNION CHARTE DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	**UBICACIÓN**	Union Charte
		FECHA	30/04/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	**ADECUACION DE INSTALCIONES ELECTRICAS**	**ÍTEM**	**9.7**	**Luminaria tipo panel led 60x60 cm, 110 V. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijación**	**UND**	**und**	**CANT.**	**12,00**

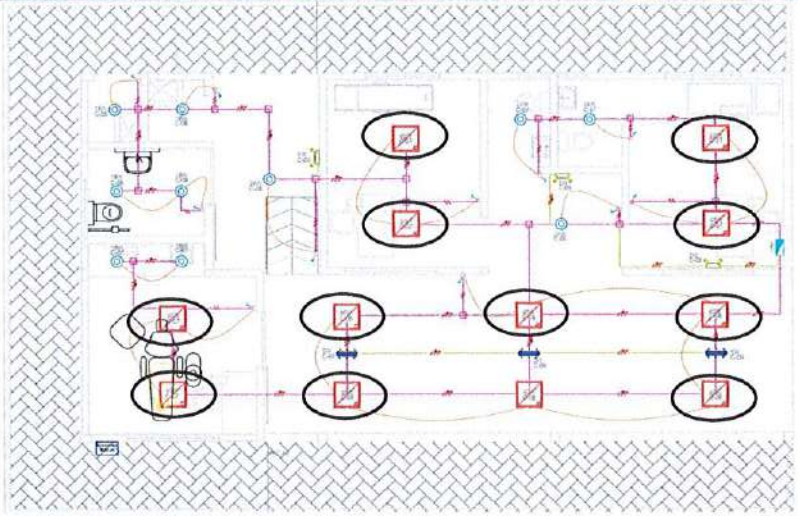ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					CANT. TOTAL
		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	ÁREA (M2)	CANT.	
	Luminarias panel led 60 x 60					12,00	12,00







Cantidad Proyectada	**12,00**
Cantidad contractual	12,00
Diferencia	0,00

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:	APROBÓ:
ROSELINO ACOSTA MENDOZA	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
RESIDENTE DE OBRA	REPRESENTANTE LEGAL
J&M INGENIERIA	EPICO INGENIERIA SAS

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E


DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD UNION CHARTE DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	**UBICACIÓN**	Union Charte
		FECHA	30/04/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	**ADECUACION DE INSTALCIONES ELECTRICAS**	**ÍTEM**	**9.8**	**Modulo LED redondo 24W, 110 V 1680-2400 lm de sobreponer. Suministro e instalación**	**UND**	**und**	**CANT.**	**4,00**

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA

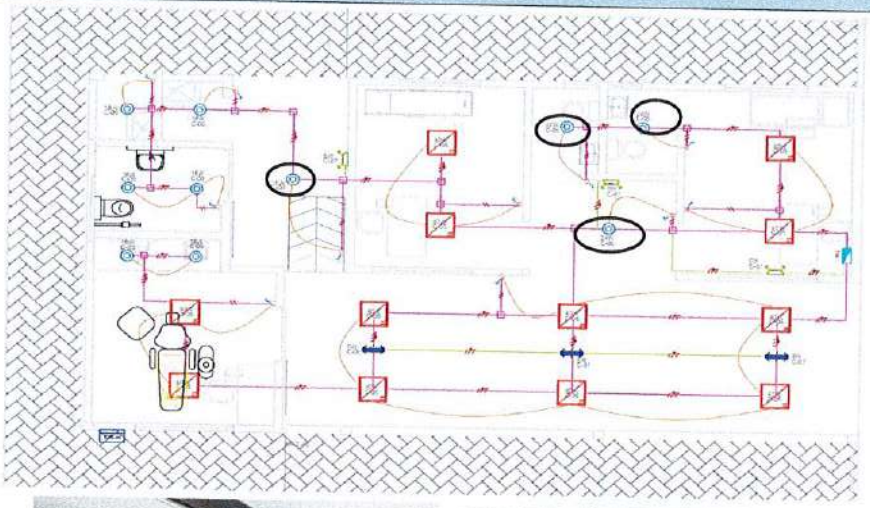





LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**					**CANT. TOTAL**
	LONG (M)	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	**ÁREA (M2)**	**CANT.**	
Modo LED redondo 24 W					4,00	4,00

Cantidad Proyectada	**4,00**
Cantidad contractual	4,00
Diferencia	**0,00**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:	APROBÓ:
ROSELINO ACOSTA MENDOZA	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
RESIDENTE DE OBRA	REPRESENTANTE LEGAL
J&M INGENIERIA	EPICO INGENIERIA SAS


HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E

DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD UNION CHARTE DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	UBICACIÓN	Union Charte
		FECHA	30/04/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	ADECUACION DE INSTALCIONES ELECTRICAS	ÍTEM	9.9	Salida para interruptor sencillo, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plástica 5800, terminales PVC y readecuación de muro.	UND	und	CANT.	11,00

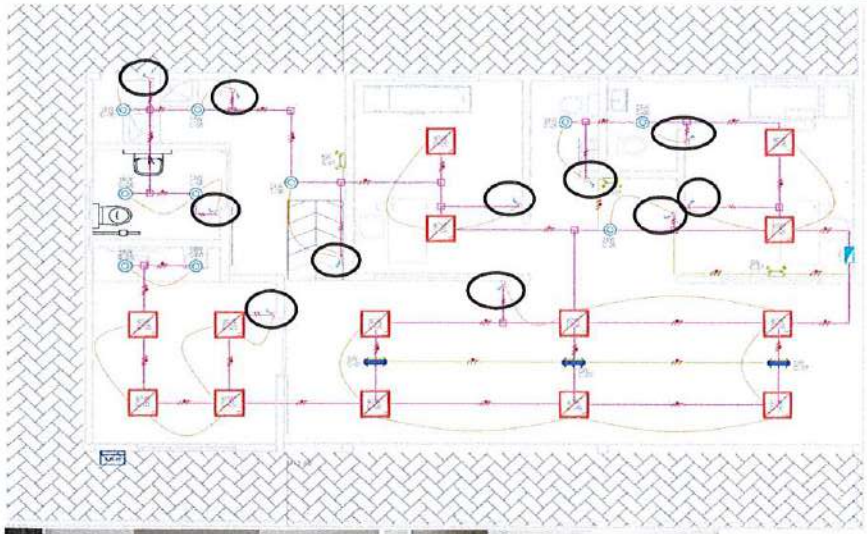ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					CANT. TOTAL
		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	ÁREA (M2)	CANT.	
  	Interruptor sencillo					11,00	11,00

Cantidad Proyectada	11,00
Cantidad contractual	11,00
Diferencia	0,00

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:	APROBÓ:
ROSELINO ACOSTA MENDOZA	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
RESIDENTE DE OBRA	REPRESENTANTE LEGAL
J&M INGENIERIA	EPICO INGENIERIA SAS

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E


DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD UNION CHARTE DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	**UBICACIÓN**	Union Charte
		FECHA	30/04/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	**ADECUACION DE INSTALCIONES ELECTRICAS**	**ÍTEM**	**9.10**	**Salida para tomacorriente doble con polo a tierra, 20A - 125V, salida dedicada. Incluye: tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre 12 AWG (10 m promedio), caja metálica 5800 o 2400 incluye aparato**	**UND**	**und**	**CANT.**	**15,00**

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA

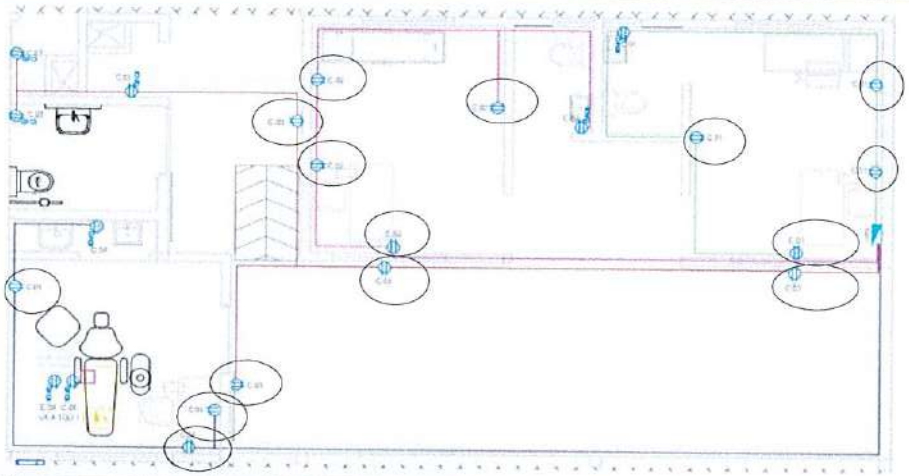





LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**					**CANT. TOTAL**
	LONG (M)	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	**ÁREA (M2)**	**CANT.**	
Tomacorriente doble					15,00	15,00

Cantidad Proyectada	**15,00**
Cantidad contractual	15,00
Diferencia	0,00

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:	APROBÓ:
ROSELINO ACOSTA MENDOZA	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
RESIDENTE DE OBRA	REPRESENTANTE LEGAL
J&M INGENIERIA	EPICO INGENIERIA SAS

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E


DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA


OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD UNION CHARTE DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	**UBICACIÓN**	Union Charte
		FECHA	30/04/2026 1
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	**ADECUACION DE INSTALCIONES ELECTRICAS**	**ÍTEM**	**9.11**	**Salida para tomacorriente doble con polo a tierra GFCI 15 A - 125 V, incluye: tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre**	**UND**	**und**	**CANT.**	**8,00**

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA

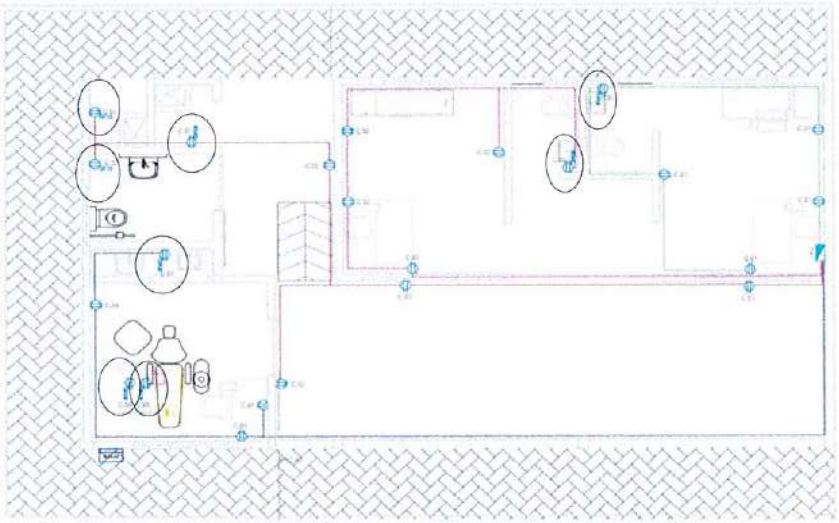



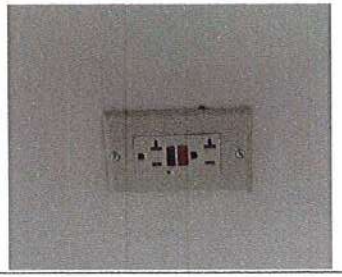

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					CANT. TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	ÁREA (M2)	CANT.	
C. temp residuos					1,00	1,00
Und Sant PMR					1,00	1,00
C. temp residuos					1,00	1,00
Consultorio odontología					3,00	3,00
U sant 2					1,00	1,00
U sant 1					1,00	1,00

Cantidad Proyectada	**8,00**
Cantidad contractual	8,00
Diferencia	0,00

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:	APROBÓ:
ROSELINO ACOSTA MENDOZA	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
RESIDENTE DE OBRA	REPRESENTANTE LEGAL
J&M INGENIERIA	EPICO INGENIERIA SAS

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E

DEPARTAMENTO DE CASANARE


MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD UNION CHARTE DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	UBICACIÓN	Union Charte
		FECHA	30/04/2026 1
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	ADECUACION DE INSTALCIONES ELECTRICAS	ÍTEM	9.12	Acometida en cable de cobre aislado {[3xN°8(F)]+ [1xN°8AWG(N)] + [1xN°10AWG(T)]} - THW 600 V 75°C. Suministro e instalación (TGD-1)	UND	m	CANT.	0,91

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					CANT. TOTAL
		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	ÁREA (M2)	CANT.	
	Acometid de cable de cobre					0,91	0,91

DIAGRAMA UNIFILAR

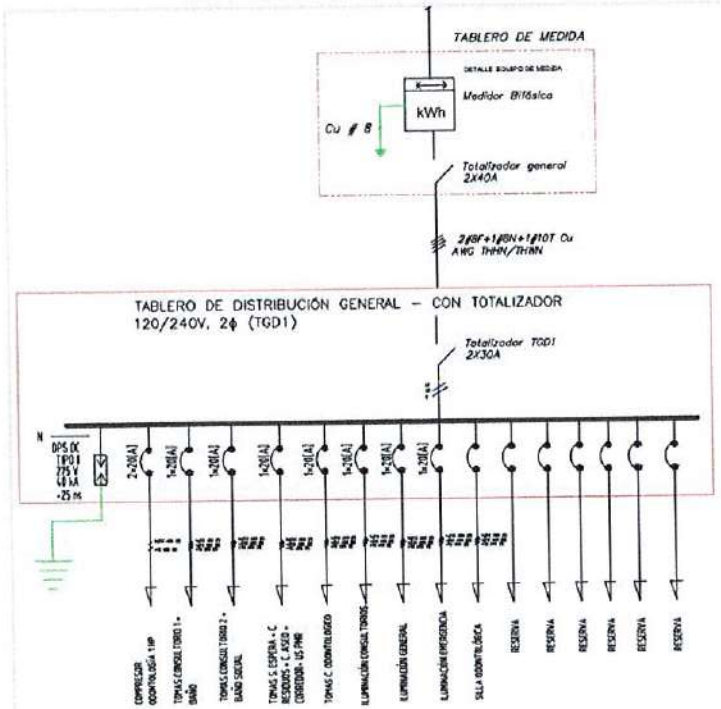

Cantidad Proyectada	**0,91**
Cantidad contractual	0,91
Diferencia	0,00

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:	APROBÓ:
ROSELINO ACOSTA MENDOZA	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
RESIDENTE DE OBRA	REPRESENTANTE LEGAL
J&M INGENIERIA	EPICO INGENIERIA SAS

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E


DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD UNION CHARTE DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	**UBICACIÓN**	Union Charte
		FECHA	30/04/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	**NO PREVISTOS**	**ÍTEM**	**NP 01**	**Guardaescoba mediacaña en granito pulido y brillado con junta de dilatación plástica m**	**UND**	**ML**	**CANT.**	**48,09**

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA

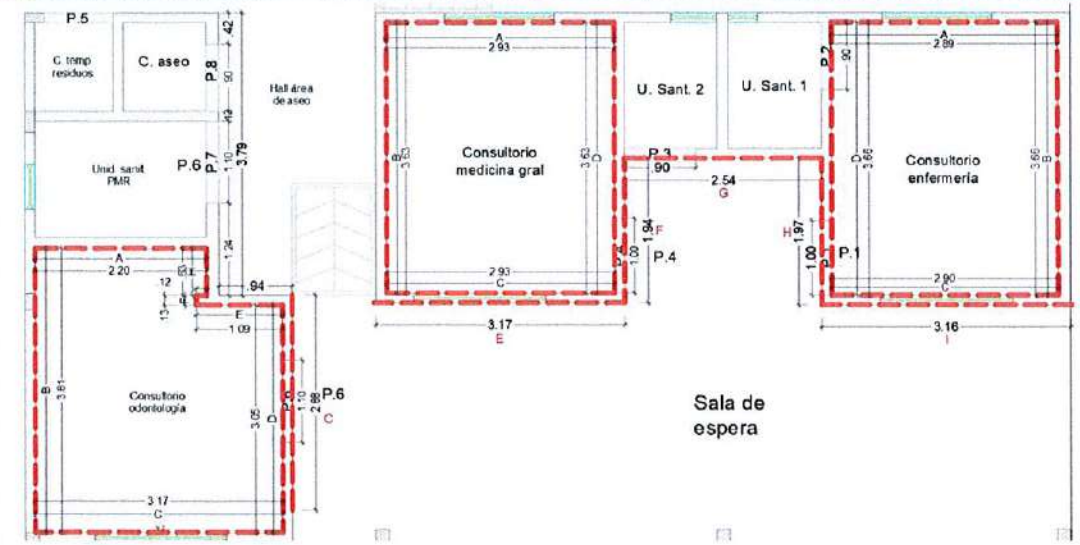








LOCALIZACIÓN		**DIMENSIONES**					**CANT. TOTAL**
		LONG (M)	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	**ÁREA (M2)**	**CANT.**	
Consultorio de enfermería	Lado A	2,89				1,00	2,89
	Lado B	3,66				1,00	3,66
	Lado C	2,90				1,00	2,90
	Lado D	3,66				1,00	3,66
	Puerta P1	1,00				-1,00	-1,00
	Puerta P2	0,90				-1,00	-0,90
Consultorio medicina general	Lado A	2,93				1,00	2,93
	Lado B	3,63				1,00	3,63
	Lado C	2,93				1,00	2,93
	Lado D	3,63				1,00	3,63
	Puerta P4	1,00				-1,00	-1,00
Consultorio Odontologia	Lado A	2,20				1,00	2,20
	Lado B	3,81				1,00	3,81
	Lado C	3,17				1,00	3,17
	Lado D	3,05				1,00	3,05
	Puerta 6	1,10				-1,00	-1,10
	Lado E	1,09				1,00	1,09
	Lado F	0,13				1,00	0,13
	Lado G	0,12				1,00	0,12
	Lado H	0,63				1,00	0,63
Guardaescoba exterior	Lado C	2,88				1,00	2,88
	Puerta P6	1,10				-1,00	-1,10
	Lado E	3,17				1,00	3,17
	Lado F	1,94				1,00	1,94
	Puerta P4	1,00				-1,00	-1,00
	Lado G	2,54				1,00	2,54
	Puerta P3	0,90				-1,00	-0,90
	Lado H	1,97				1,00	1,97
	Puerta P1	1,00				-1,00	-1,00
	Lado I	3,16				1,00	3,16
						Cantidad Proyectada	**48,09**
						Cantidad contractual	33,37
						Diferencia	14,72

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:	APROBÓ:
ROSELINO ACOSTA MENDOZA	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
RESIDENTE DE OBRA	REPRESENTANTE LEGAL
J&M INGENIERIA	EPICO INGENIERIA SAS

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E								
DEPARTAMENTO DE CASANARE								
MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA								
OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD UNION CHARTE DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE			UBICACIÓN	Union Charte			
				FECHA	30/04/2026			
				ACTA No	Recibo y liquidación			
CAPÍTULO	NO PREVISTOS	ÍTEM	NP 01	Guardaescoba medialcaña en granito pulido y brillado con junta de dilatación plástica m	UND	ML	CANT.	0,00

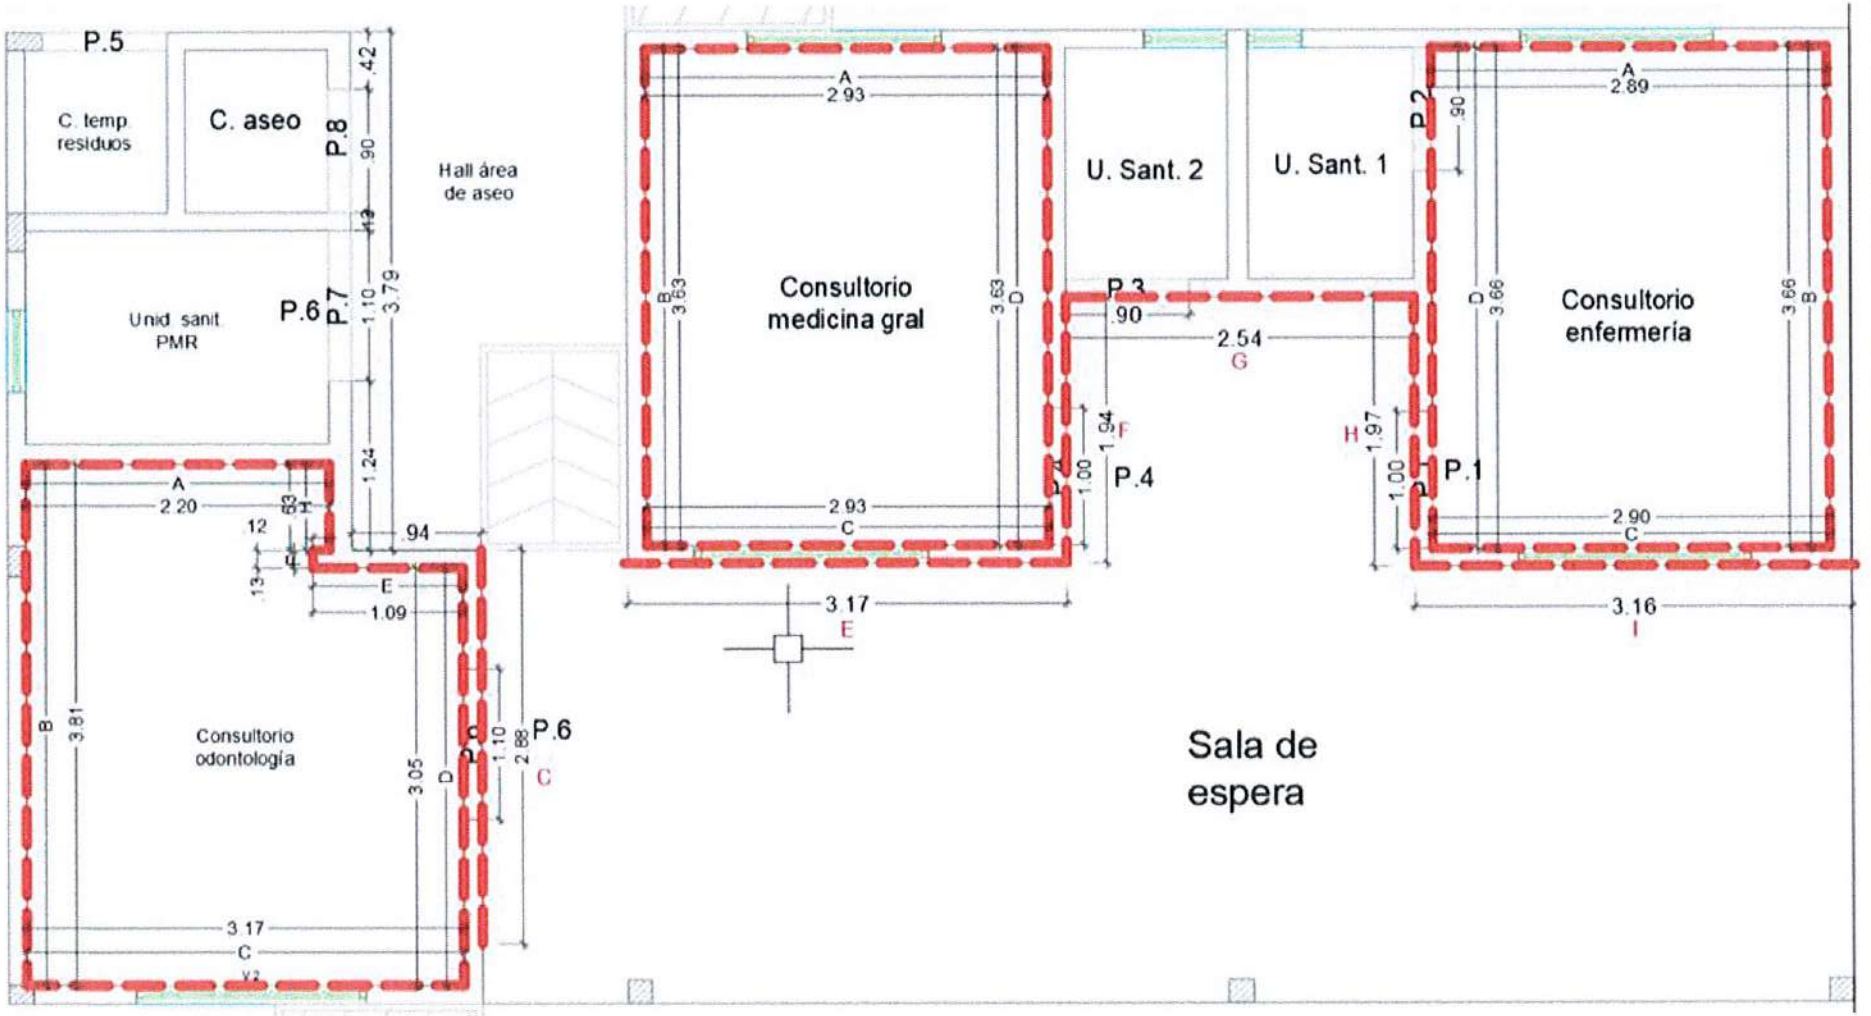

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E


DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD UNION CHARTE DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	UBICACIÓN	Union Charte
		FECHA	30/04/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	NO PREVISTOS	ÍTEM	NP 02	Pulida y brillada de piso granito (incuye material y maquinaria)	UND	M2	CANT.	56,52

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA

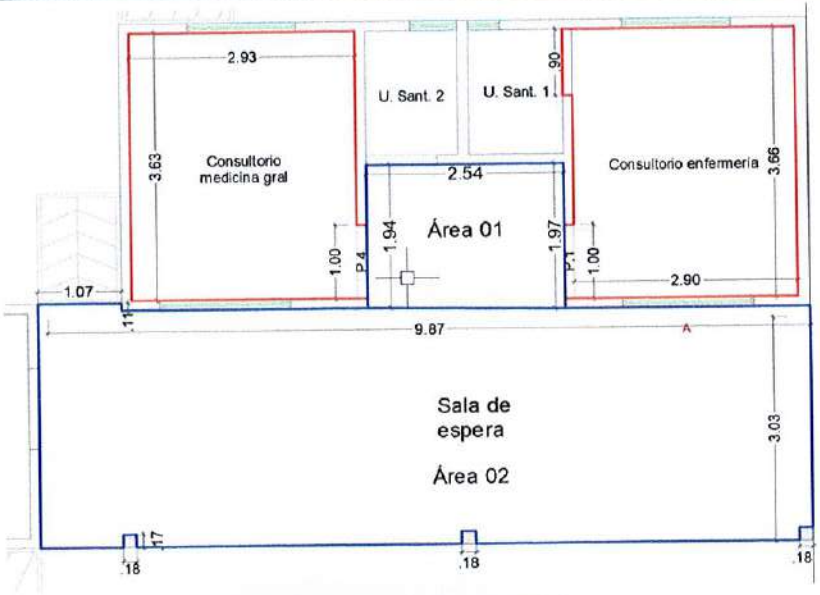



LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	ÁREA (M2)	CANT.	CANT. TOTAL
Consultorio enfermeria	Área general	3,66	2,90			1,00	10,61
	Bocapuerta P1	1,00	0,13			1,00	0,13
	Bocapuerta P2	0,90	0,13			1,00	0,12
Consultorio medicina gral	Área general	2,93	3,63			1,00	10,64
	Bocapuerta P4	1,00	0,13			1,00	0,13
Sala de espera - área 01 (a=1,94; a=1,97; apro=1,96)		2,54	1,96			1,00	4,97
Sala de espera - área 02		9,87	3,03			1,00	29,91
Sala de espera - área 02		1,07	0,11			1,00	0,12
Columna - sala área 02		0,18	0,17			-3,00	-0,09

Cantidad Proyectada	56,52
Cantidad contractual	56,52
Diferencia	0,00

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:	APROBÓ:
ROSELINO ACOSTA MENDOZA	OMAR AUGUSTO NEIRA SIERRA
RESIDENTE DE OBRA	REPRESENTANTE LEGAL
J&M INGENIERIA	EPICO INGENIERIA SAS


HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E

DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD UNION CHARTE DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	UBICACIÓN	Union Charte
		FECHA	30/04/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	NO PREVISTOS	ÍTEM	NP 03	Luminaria de emergencias tipo led 110 V, 2.4 W, autonomia minima 90 minutos. Incluye cable encauchetado 3 x 16 AWG, y elementos de fijación. Suministro e instalación.	UND	Und	CANT.	3,00

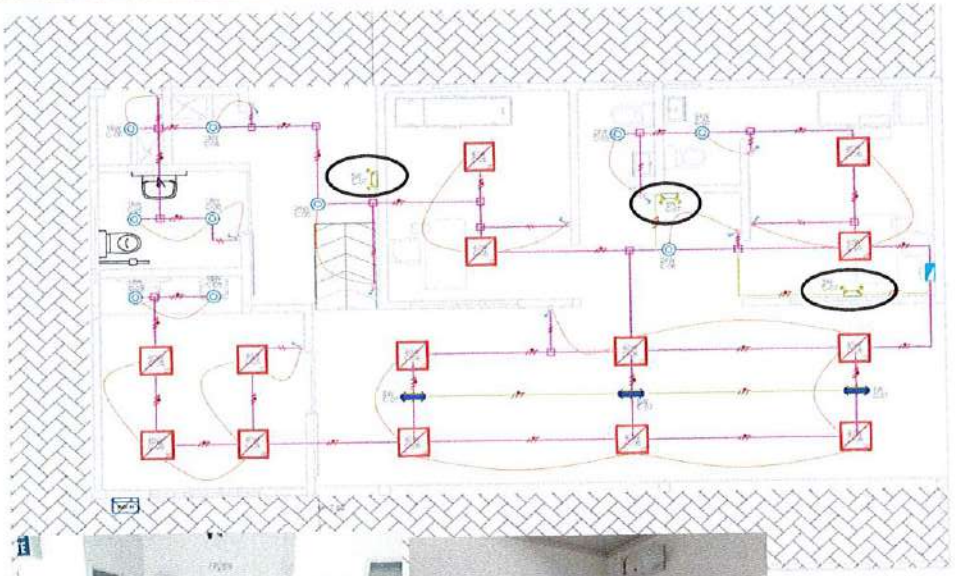ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					CANT. TOTAL
		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	ÁREA (M2)	CANT.	
	Hall área de aseo					1,00	1,00
	Consultorio de enfermería					1,00	1,00
	Sala de espera - muro baños					1,00	1,00
 							

Cantidad Proyectada	3,00
Cantidad contractual	3,00
Diferencia	0,00

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:	APROBÓ:
ROSELINO ACOSTA MENDOZA	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
RESIDENTE DE OBRA	REPRESENTANTE LEGAL
J&M INGENIERIA	EPICO INGENIERIA SAS




HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E

DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD UNION CHARTE DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	UBICACIÓN	Union Charte
		FECHA	30/04/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	NO PREVISTOS	ÍTEM	NP 04	Luminaria aplique LED emergencia 4. Inlcuye cable encuachetado 3 x 16 AWG, clavija de caucho y elementos de fiajación. Suministro e instalación.	UND	Und	CANT.	3,00

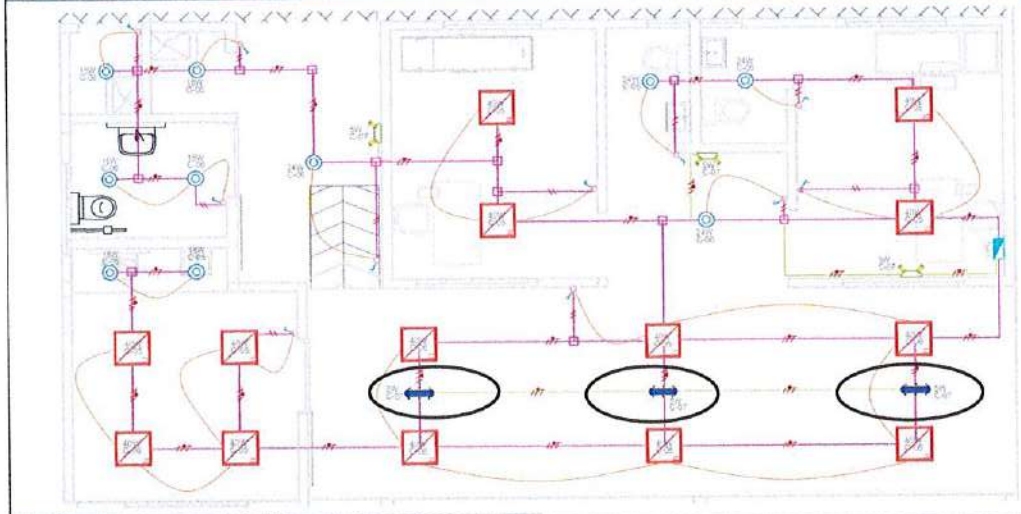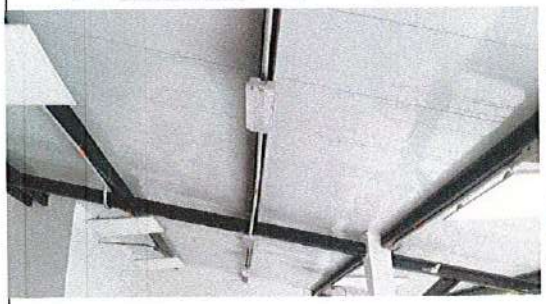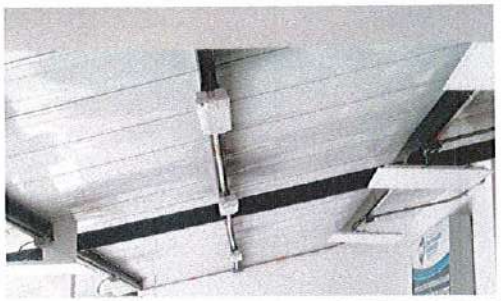ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					CANT. TOTAL
		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	ÁREA (M2)	CANT.	
	Sala de espera					3,00	3,00
							
							

Cantidad Proyectada	**3,00**
Cantidad contractual	3,00
Diferencia	0,00

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:	APROBÓ:
ROSELINO ACOSTA MENDOZA	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
RESIDENTE DE OBRA	REPRESENTANTE LEGAL
J&M INGENIERIA	EPICO INGENIERIA SAS

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E


DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD UNION CHARTE DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	**UBICACIÓN**	Union Charte
		FECHA	30/04/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	NO PREVISTOS	ÍTEM	NP 05	Modulo LED redondo 18W, 110V de incrustar. Incluye: Cable encuachetado 3x16AW y elementos de fijación. Suministro e instalación.	UND	Und	CANT.	6,00

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA

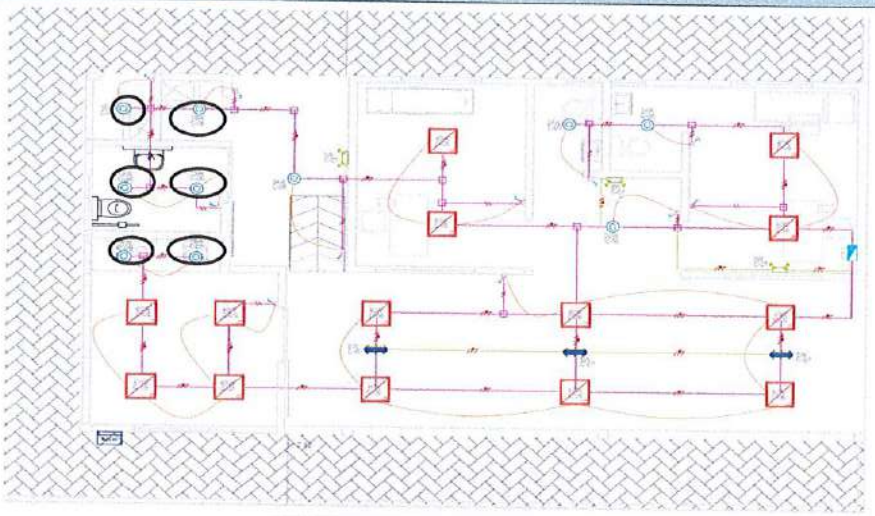



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					CANT. TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	ÁREA (M2)	CANT.	
C. temp residuos					1,00	1,00
C. aseo					1,00	1,00
Unid. Sant PMR					2,00	2,00
Odontologia - área lavado					2,00	2,00
						-

Cantidad Proyectada	**6,00**
Cantidad contractual	6,00
Diferencia	0,00

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:	APROBÓ:
ROSELINO ACOSTA MENDOZA	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
RESIDENTE DE OBRA	REPRESENTANTE LEGAL
J&M INGENIERIA	EPICO INGENIERIA SAS

ANEXO 3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

EPICO INGENIERIA S.A.S.
ESTUDIOS PROFESIONALES, INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES
NIT: 900.105.134-5


REGISTRO FOTOGRÁFICO
INFORME FINAL DE INTERVENTORIA – RECIBO CTO OBRA 753/2025 – PAPS VEREDA UNIÓN CHARTE

Contrato de Consultoría No. 759 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA "ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LAS **VEREDAS LA GRACIELA Y UNIÓN CHARTE** DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE"

Contrato de Obra No. 753 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD DE LA **VEREDA UNIÓN CHARTE**, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografía No. 01 – Vista acceso

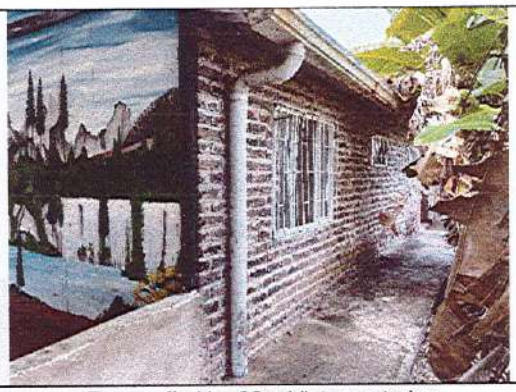

Fotografía No. 02 – Vista posterior




Fotografía No. 03 – Fachada principal



Fotografía No. 04 – Fachada lateral derecha



Fotografía No. 05 – Fachada posterior

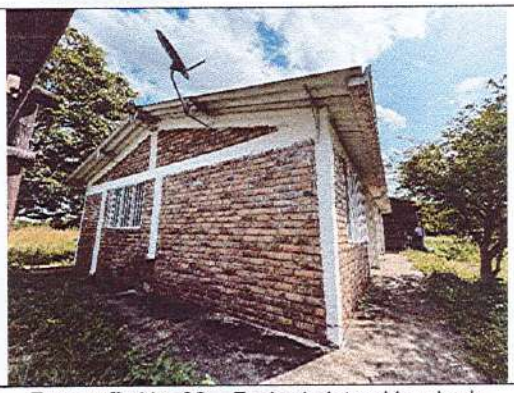

Fotografía No. 06 – Fachada lateral izquierda


EPICO INGENIERIA S.A.S.
ESTUDIOS PROFESIONALES, INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES
NIT: 900.105.134-5

REGISTRO FOTOGRÁFICO

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA – RECIBO CTO OBRA 753/2025 – PAPS VEREDA UNIÓN CHARTE

Contrato de Consultoría No. 759 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA "ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LAS **VEREDAS LA GRACIELA Y UNIÓN CHARTE** DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE"

Contrato de Obra No. 753 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD DE LA **VEREDA UNIÓN CHARTE**, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

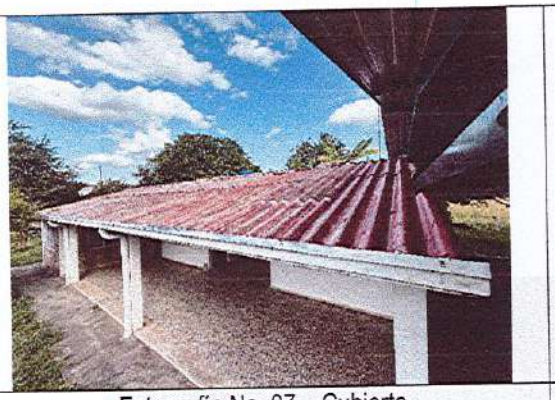


Fotografía No. 07 – Cubierta




Fotografía No. 08 – Exterior enfermería



Fotografía No. 09 – Exterior circulación

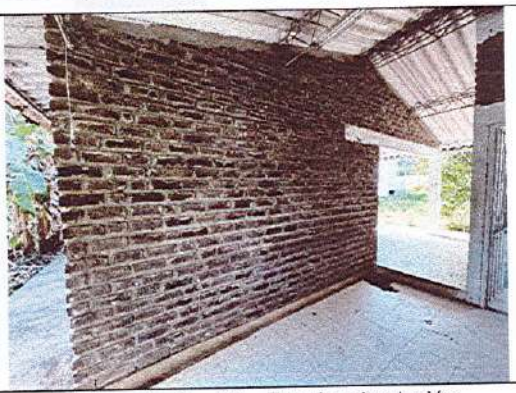

Fotografía No. 10 – Exterior circulación

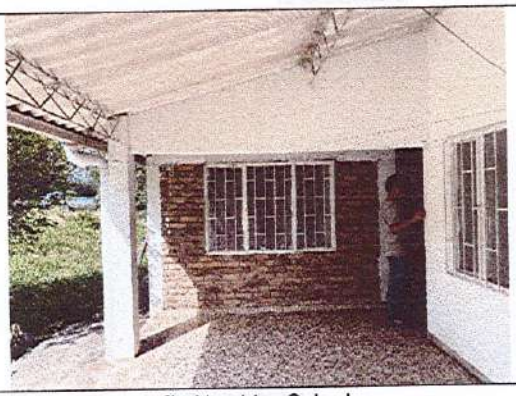

Fotografía No. 11 – Sala de espera




Fotografía No. 12 – Sala de espera

EPICO INGENIERIA S.A.S.
ESTUDIOS PROFESIONALES, INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES
NIT: 900.105.134-5

REGISTRO FOTOGRÁFICO
INFORME FINAL DE INTERVENTORIA – RECIBO CTO OBRA 753/2025 – PAPS VEREDA UNIÓN CHARTE

Contrato de Consultoría No. 759 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA "ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LAS **VEREDAS LA GRACIELA Y UNIÓN CHARTE** DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE"

Contrato de Obra No. 753 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD DE LA **VEREDA UNIÓN CHARTE**, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

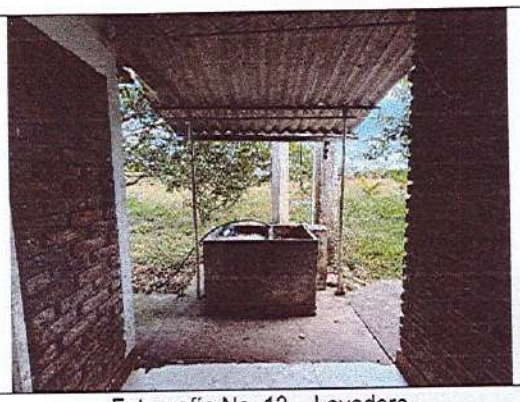

Fotografía No. 13 – Lavadero



Fotografía No. 14 – Tanques elevados



Fotografía No. 15 – Acceso consultorio 1



Fotografía No. 16 – Exterior consultorio 1



Fotografía No. 17 – Acceso consultorio 2



Fotografía No. 18 – Exterior consultorio 2

EPICO INGENIERIA S.A.S.
ESTUDIOS PROFESIONALES, INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES
NIT: 900.105.134-5

REGISTRO FOTOGRÁFICO
INFORME FINAL DE INTERVENTORIA – RECIBO CTO OBRA 753/2025 – PAPS VEREDA UNIÓN CHARTE

Contrato de Consultoría No. 759 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA "ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LAS **VEREDAS LA GRACIELA Y UNIÓN CHARTE** DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE"


Contrato de Obra No. 753 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD DE LA **VEREDA UNIÓN CHARTE**, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografía No. 19 – Interior cocina



Fotografía No. 20 – Interior consultorio 3

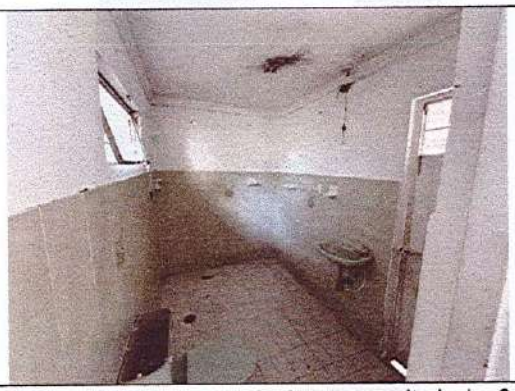

Fotografía No. 21 – Interior baño consultorio 1 y 2



Fotografía No. 22 – Interior consultorio 1



Fotografía No. 23 – Acceso baño consultorio



Fotografía No. 24 – Acceso exterior baño consultorio

EPICO INGENIERIA S.A.S.
ESTUDIOS PROFESIONALES, INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES
NIT: 900.105.134-5

REGISTRO FOTOGRÁFICO
INFORME FINAL DE INTERVENTORIA – RECIBO CTO OBRA 753/2025 – PAPS VEREDA UNIÓN CHARTE

Contrato de Consultoría No. 759 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA "ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LAS **VEREDAS LA GRACIELA Y UNIÓN CHARTE** DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE"

Contrato de Obra No. 753 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD DE LA **VEREDA UNIÓN CHARTE**, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografía No. 25 –




Fotografía No. 26 –



Fotografía No. 27 –



Fotografía No. 28 –

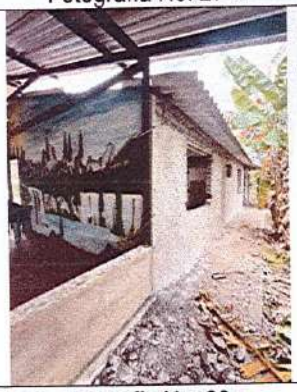

Fotografía No. 29 –



Fotografía No. 30 –

EPICO INGENIERIA S.A.S.
ESTUDIOS PROFESIONALES, INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES
NIT: 900.105.134-5

REGISTRO FOTOGRÁFICO
INFORME FINAL DE INTERVENTORIA – RECIBO CTO OBRA 753/2025 – PAPS VEREDA UNIÓN CHARTE

Contrato de Consultoría No. 759 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA "ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LAS **VEREDAS LA GRACIELA Y UNIÓN CHARTE** DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE"


Contrato de Obra No. 753 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD DE LA **VEREDA UNIÓN CHARTE,** DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE




Fotografía No. 31 –



Fotografía No. 32 –

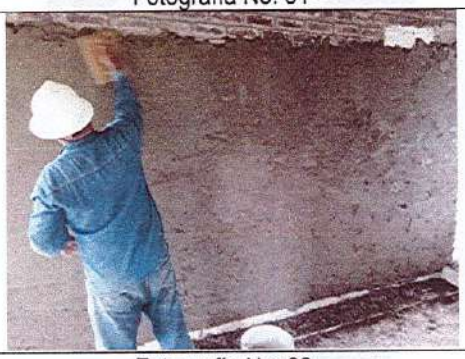

Fotografía No. 33 –

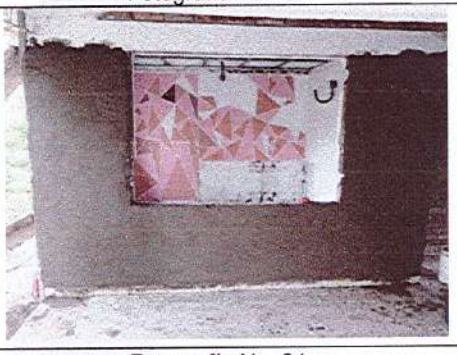

Fotografía No. 34 –



Fotografía No. 35 –



Fotografía No. 36 –

EPICO INGENIERIA S.A.S.
ESTUDIOS PROFESIONALES, INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES
NIT: 900.105.134-5

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA – RECIBO CTO OBRA 753/2025 – PAPS VEREDA UNIÓN CHARTE

Contrato de Consultoría No. 759 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA "ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LAS **VEREDAS LA GRACIELA Y UNIÓN CHARTE** DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE"


Contrato de Obra No. 753 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD DE LA **VEREDA UNIÓN CHARTE**, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE




Fotografía No. 37 – Vista acceso



Fotografía No. 38 – Vista Parte lateral izquierda

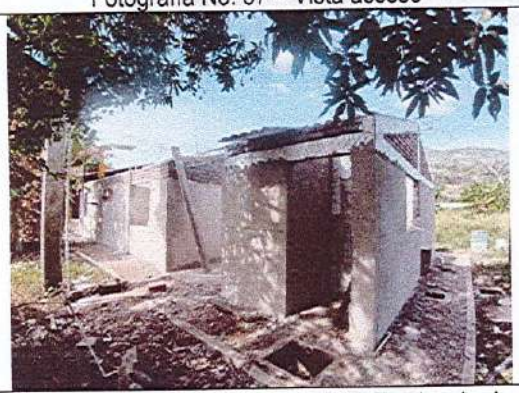

Fotografía No. 39 – Vista Parte Trasera Izquierda

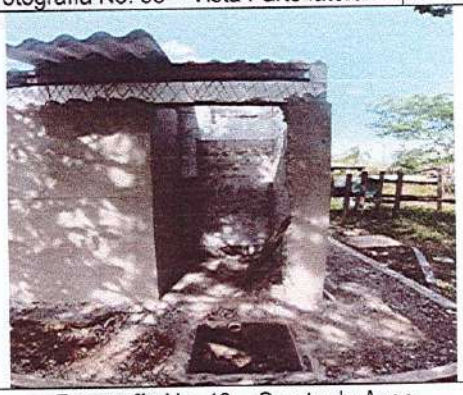

Fotografía No. 40 – Cuarto de Aseo



Fotografía No. 41 – Anden parte frontal



Fotografía No. 42 –Cuarto odontología

EPICO INGENIERIA S.A.S.
ESTUDIOS PROFESIONALES, INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES
NIT: 900.105.134-5

REGISTRO FOTOGRAFICO


INFORME FINAL DE INTERVENTORIA – RECIBO CTO OBRA 753/2025 – PAPS VEREDA UNIÓN CHARTE

Contrato de Consultoría No. 759 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA "ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LAS **VEREDAS LA GRACIELA Y UNIÓN CHARTE** DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE"

Contrato de Obra No. 753 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD DE LA **VEREDA UNIÓN CHARTE**, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografía No. 43 – Cuarto enfermería

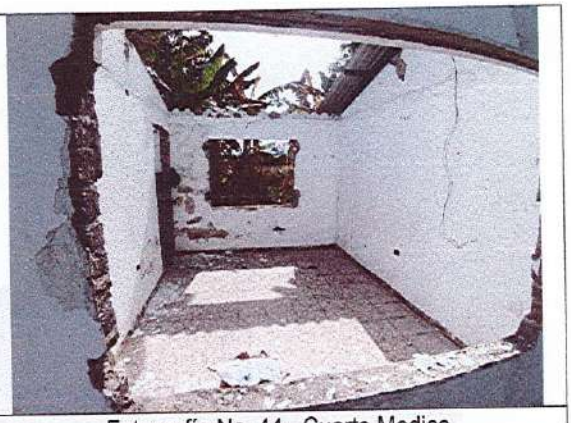

Fotografía No. 44– Cuarto Medico



Fotografía No. 45 – Cuarto Medico Interno



Fotografía No. 46 – Alistamiento correas cubierta



Fotografía No. 47 – Vista acceso



Fotografía No. 48 – Vista Parte lateral Derecha

EPICO INGENIERIA S.A.S.
ESTUDIOS PROFESIONALES, INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES
NIT: 900.105.134-5

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA – RECIBO CTO OBRA 753/2025 – PAPS VEREDA UNIÓN CHARTE

Contrato de Consultoría No. 759 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA "ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LAS **VEREDAS LA GRACIELA Y UNIÓN CHARTE** DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE"

Contrato de Obra No. 753 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD DE LA **VEREDA UNIÓN CHARTE**, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografía No. 49 – Sala de Espera



Fotografía No. 50 – Consultorio Médico 1



Fotografía No. 51 – consultorio 2



Fotografía No. 52 – Baño 3



Fotografía No. 53 – Parte Lateral Izquierda




Fotografía No. 54 – Anden Lateral Izquierdo

EPICO INGENIERIA S.A.S.
ESTUDIOS PROFESIONALES, INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES
NIT: 900.105.134-5

REGISTRO FOTOGRAFICO
INFORME FINAL DE INTERVENTORIA – RECIBO CTO OBRA 753/2025 – PAPS VEREDA UNIÓN CHARTE

Contrato de Consultoría No. 759 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA "ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LAS **VEREDAS LA GRACIELA Y UNIÓN CHARTE** DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE"

Contrato de Obra No. 753 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD DE LA **VEREDA UNIÓN CHARTE**, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

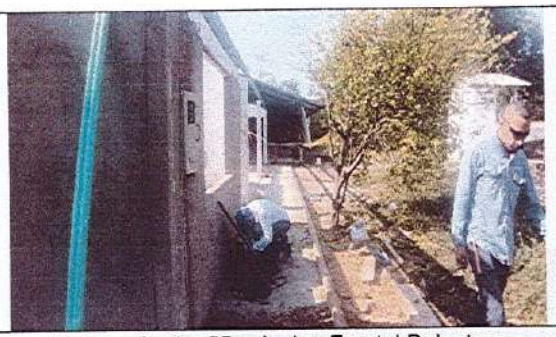

Fotografía No. 55 – Anden Frontal Delantero




Fotografía No. 56 – Parte Trasera Casa



Fotografía No . 57 – parte trasera derecho



Fotografía No. 58 - Anden

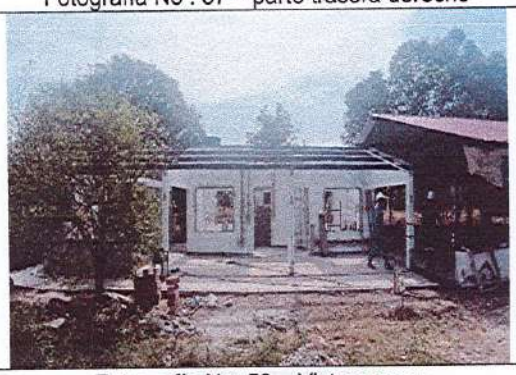

Fotografía No. 59 – Vista acceso



Fotografía No. 60 – Vista Parte lateral izquierda

EPICO INGENIERIA S.A.S.
ESTUDIOS PROFESIONALES, INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES
NIT: 900.105.134-5

REGISTRO FOTOGRAFICO
INFORME FINAL DE INTERVENTORIA – RECIBO CTO OBRA 753/2025 – PAPS VEREDA UNIÓN CHARTE

Contrato de Consultoría No. 759 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA "ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LAS **VEREDAS LA GRACIELA Y UNIÓN CHARTE** DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE"


Contrato de Obra No. 753 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD DE LA **VEREDA UNIÓN CHARTE**, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografía No. 61 – Vista Parte Lateral Izquierda



Fotografía No. 62 – Vista Trasera Parte Izquierda

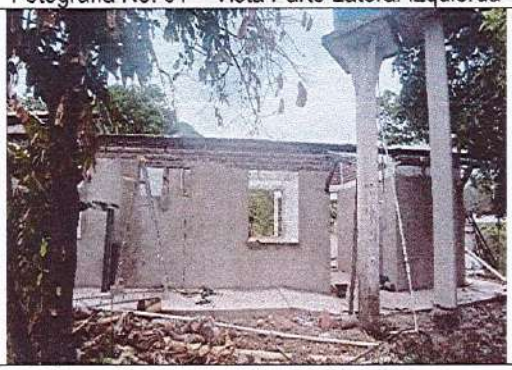

Fotografía No. 63 – Vista Posterior Trasera



Fotografía No. 64 –consultorio 2



Fotografía No. 65 – Baño



Fotografía No. 66 – Consultorio 3

EPICO INGENIERIA S.A.S.
ESTUDIOS PROFESIONALES, INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES
NIT: 900.105.134-5

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA – RECIBO CTO OBRA 753/2025 – PAPS VEREDA UNIÓN CHARTE

Contrato de Consultoría No. 759 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA "ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LAS **VEREDAS LA GRACIELA Y UNIÓN CHARTE** DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE"


Contrato de Obra No. 753 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD DE LA **VEREDA UNIÓN CHARTE**, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografía No. 67 – Vista acceso



Fotografía No. 68 – Vista Parte lateral Derecha

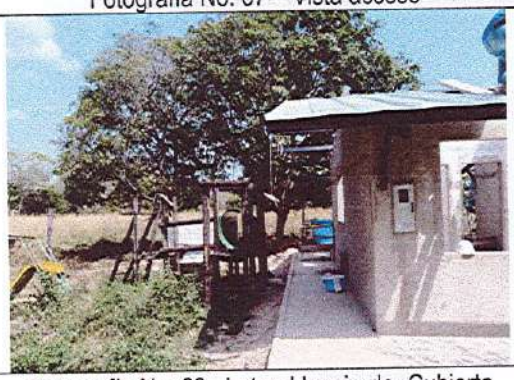

Fotografía No. 69 –Lateral Izquierda Cubierta



Fotografía No. 70 –Trasera Parte Izquierda Cubierta



Fotografía No. 71 – Cuarto Vacunación



Fotografía No. 72 –consultorio 1

EPICO INGENIERIA S.A.S.
ESTUDIOS PROFESIONALES, INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES
NIT: 900.105.134-5

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA – RECIBO CTO OBRA 753/2025 – PAPS VEREDA UNIÓN CHARTE

Contrato de Consultoría No. 759 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA "ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LAS **VEREDAS LA GRACIELA Y UNIÓN CHARTE** DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE"

Contrato de Obra No. 753 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD DE LA **VEREDA UNIÓN CHARTE**, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografía No. 73 – Cuarto De Limpieza Aseo



Fotografía No. 74 – Baño 1 – Consultorio 1




Fotografía No. 75 – Baño 2



Fotografía No. 76 – Pasillo



Fotografía No. 77 – Anden Parte Trasera

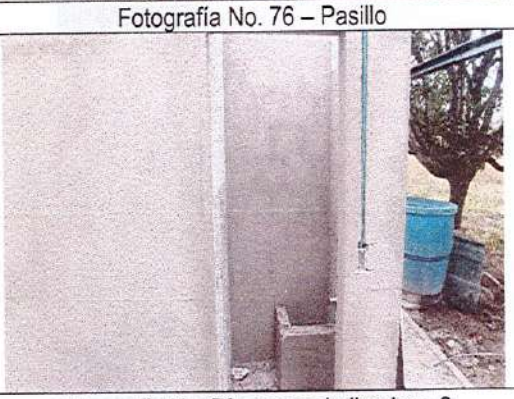

Fotografía No. 78 – zona de limpieza 2

EPICO INGENIERIA S.A.S.
ESTUDIOS PROFESIONALES, INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES
NIT: 900.105.134-5

REGISTRO FOTOGRAFICO
INFORME FINAL DE INTERVENTORIA – RECIBO CTO OBRA 753/2025 – PAPS VEREDA UNIÓN CHARTE

Contrato de Consultoría No. 759 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA "ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LAS **VEREDAS LA GRACIELA Y UNIÓN CHARTE** DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE"


Contrato de Obra No. 753 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD DE LA **VEREDA UNIÓN CHARTE**, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografía No. 79 – Vista acceso1




Fotografía No. 80 – Vista Acceso 2

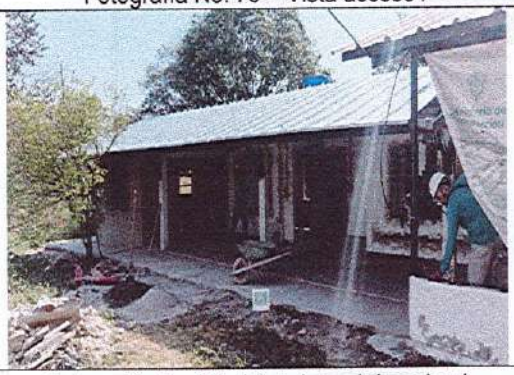

Fotografía No. 81 –Vista lateral derecha 1



Fotografía No. 82 –Vista lateral derecha 2

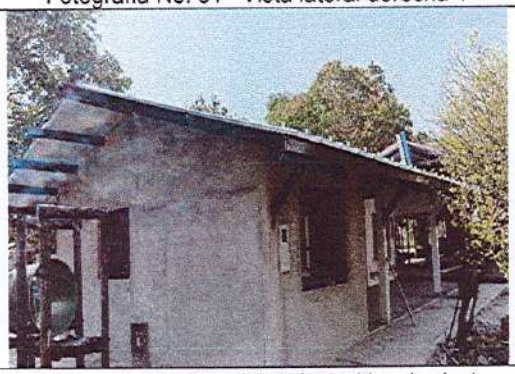

Fotografía No. 83 – Vista lateral izquierda 1



Fotografía No. 84 –Vista lateral izquierda 2


EPICO INGENIERIA S.A.S.
ESTUDIOS PROFESIONALES, INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES
NIT: 900.105.134-5

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA – RECIBO CTO OBRA 753/2025 – PAPS VEREDA UNIÓN CHARTE

Contrato de Consultoría No. 759 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA "ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LAS **VEREDAS LA GRACIELA Y UNIÓN CHARTE** DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE"


Contrato de Obra No. 753 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD DE LA **VEREDA UNIÓN CHARTE**, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

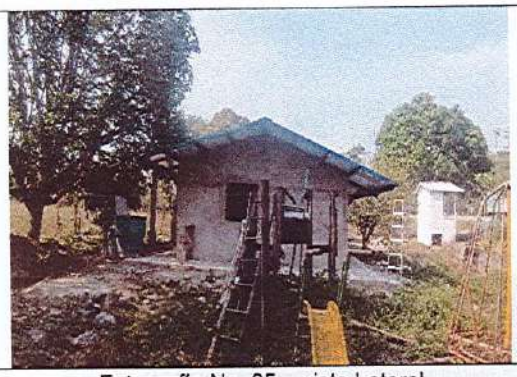


Fotografía No. 85 – vista Lateral



Fotografía No. 86 – Baño 1 – vista posterior derecho

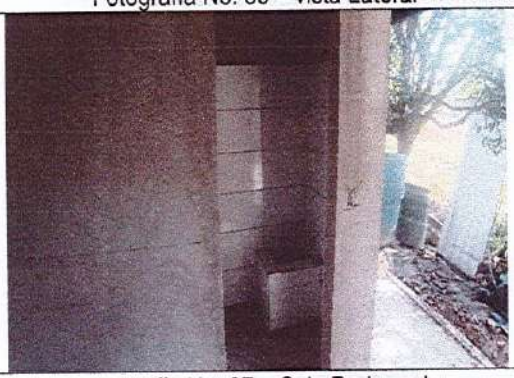

Fotografía No. 87 – Sala De Lavado

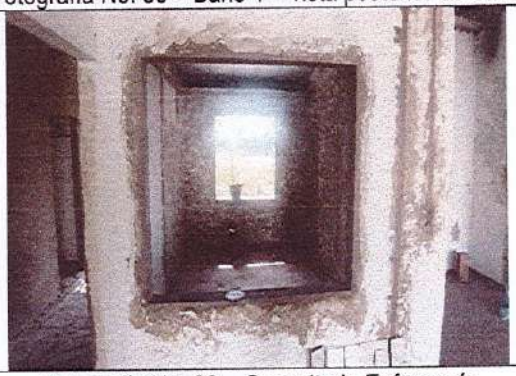

Fotografía No. 88 – Consultorio Enfermería



Fotografía No. 89 – Baño Consultorio 1



Fotografía No. 90 – Sala de Espera

EPICO INGENIERIA S.A.S.
ESTUDIOS PROFESIONALES, INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES
NIT: 900.105.134-5

REGISTRO FOTOGRAFICO
INFORME FINAL DE INTERVENTORIA – RECIBO CTO OBRA 753/2025 – PAPS VEREDA UNIÓN CHARTE

Contrato de Consultoría No. 759 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA "ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LAS **VEREDAS LA GRACIELA Y UNIÓN CHARTE** DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE"

Contrato de Obra No. 753 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD DE LA **VEREDA UNIÓN CHARTE**, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografía No. 91 – Vista acceso1



Fotografía No. 92 – Vista Lateral Derecha



Fotografía No. 93 –Vista lateral Izquierda



Fotografía No. 94 –Sala De Espera 1



Fotografía No. 95 – Sala De Espera 2



Fotografía No. 96 –Consultorio Odontologia


EPICO INGENIERIA S.A.S.
ESTUDIOS PROFESIONALES, INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES
NIT: 900.105.134-5

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA – RECIBO CTO OBRA 753/2025 – PAPS VEREDA UNIÓN CHARTE

Contrato de Consultoría No. 759 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA "ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LAS **VEREDAS LA GRACIELA Y UNIÓN CHARTE** DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE"

Contrato de Obra No. 753 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD DE LA **VEREDA UNIÓN CHARTE**, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

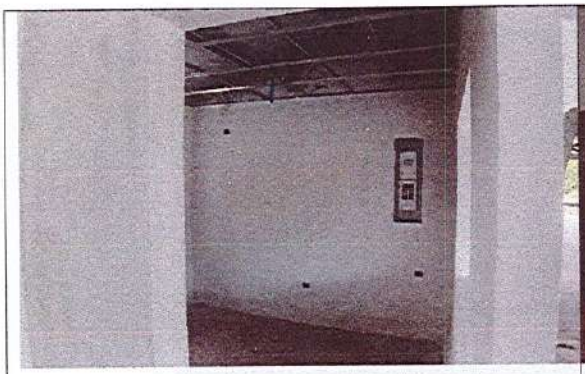

Fotografía No. 97 – Consultorio 1



Fotografía No. 98 – Consultorio 2- Estructura Cielo Raso



Fotografía No. 99 – Baño – Sala De Espera



Fotografía No. 100 – Baño PMR



Fotografía No. 101 – Cajas Aguas Negras- Pozo Séptico



Fotografía No. 102 – Pozo Séptico

EPICO INGENIERIA S.A.S.
ESTUDIOS PROFESIONALES, INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES
NIT: 900.105.134-5

REGISTRO FOTOGRÁFICO
INFORME FINAL DE INTERVENTORIA – RECIBO CTO OBRA 753/2025 – PAPS VEREDA UNIÓN CHARTE

Contrato de Consultoría No. 759 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA "ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LAS **VEREDAS LA GRACIELA Y UNIÓN CHARTE** DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE"

Contrato de Obra No. 753 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD DE LA **VEREDA UNIÓN CHARTE,** DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografía No. 103 – Vista acceso1



Fotografía No. 104 – Vista Lateral Derecha




Fotografía No. 105 –Vista lateral Izquierda



Fotografía No. 106 –Vista Posterior Derecha



Fotografía No. 107 – Vista Lateral

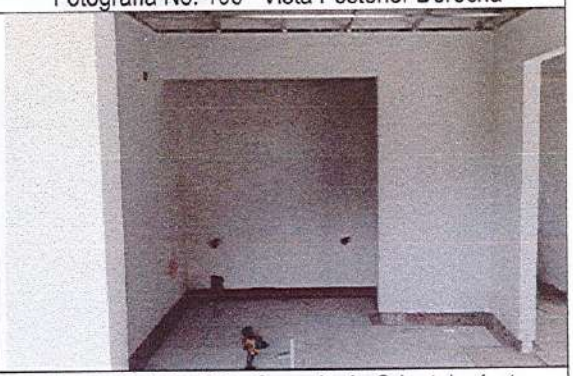

Fotografía No. 108 –Consultorio Odontología 1

EPICO INGENIERIA S.A.S.
ESTUDIOS PROFESIONALES, INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES
NIT: 900.105.134-5

REGISTRO FOTOGRAFICO
INFORME FINAL DE INTERVENTORIA – RECIBO CTO OBRA 753/2025 – PAPS VEREDA UNIÓN CHARTE

Contrato de Consultoría No. 759 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA "ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LAS **VEREDAS LA GRACIELA Y UNIÓN CHARTE** DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE"

Contrato de Obra No. 753 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD DE LA **VEREDA UNIÓN CHARTE**, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografía No. 109 – Consultorio Odontología 2



Fotografía No. 110 – Baño PRM – Cuarto Aseo




Fotografía No. 111 – Cuarto Residuos



Fotografía No. 112 – Sala de Espera



Fotografía No. 113 – Consultorio 2

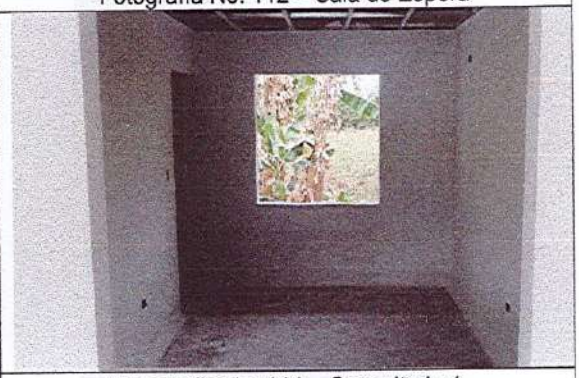

Fotografía No. 114 – Consultorio 1

EPICO INGENIERIA S.A.S.
ESTUDIOS PROFESIONALES, INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES
NIT: 900.105.134-5

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA – RECIBO CTO OBRA 753/2025 – PAPS VEREDA UNIÓN CHARTE

Contrato de Consultoría No. 759 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA "ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LAS **VEREDAS LA GRACIELA Y UNIÓN CHARTE** DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE"

Contrato de Obra No. 753 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD DE LA **VEREDA UNIÓN CHARTE**, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografía No. 115 – Vista acceso1



Fotografía No. 116 – Vista Lateral Derecha



Fotografía No. 117 –Vista lateral Izquierda 1



Fotografía No. 118 –Vista lateral izquierda 2



Fotografía No. 119 – Sala de espera 1



Fotografía No. 120 –Sala espera 2

EPICO INGENIERIA S.A.S.
ESTUDIOS PROFESIONALES, INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES
NIT: 900.105.134-5


REGISTRO FOTOGRAFICO
INFORME FINAL DE INTERVENTORIA – RECIBO CTO OBRA 753/2025 – PAPS VEREDA UNIÓN CHARTE

Contrato de Consultoría No. 759 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA "ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LAS **VEREDAS LA GRACIELA Y UNIÓN CHARTE** DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE"

Contrato de Obra No. 753 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD DE LA **VEREDA UNIÓN CHARTE**, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografía No. 121 – Consultorio Odontología 1

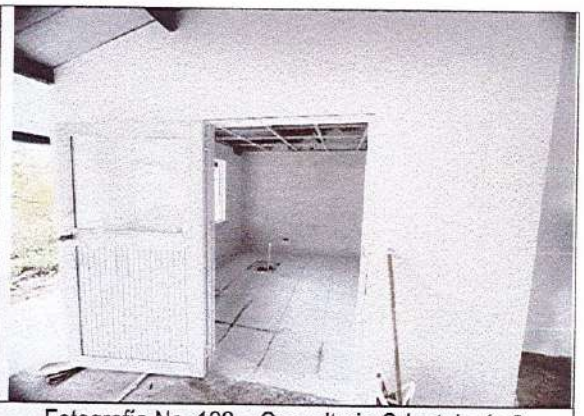

Fotografía No. 122 – Consultorio Odontología 2



Fotografía No. 123 – Consultorio 2



Fotografía No. 124 – Consultorio 1



Fotografía No. 125 – ventana consultorio 2



Fotografía No. 126 – Baño1

EPICO INGENIERIA S.A.S.
ESTUDIOS PROFESIONALES, INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES
NIT: 900.105.134-5

REGISTRO FOTOGRAFICO
INFORME FINAL DE INTERVENTORIA – RECIBO CTO OBRA 753/2025 – PAPS VEREDA UNIÓN CHARTE

Contrato de Consultoría No. 759 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA "ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LAS **VEREDAS LA GRACIELA Y UNIÓN CHARTE** DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE"

Contrato de Obra No. 753 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD DE LA **VEREDA UNIÓN CHARTE**, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografía No. 127 – Vista acceso1



Fotografía No. 128 – Vista Lateral Derecha



Fotografía No. 129 –Vista lateral Izquierda 1



Fotografía No. 130 –Vista lateral



Fotografía No. 131 – Vista Posterior Der



Fotografía No. 132 –Pasillo trasero

EPICO INGENIERIA S.A.S.
ESTUDIOS PROFESIONALES, INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES
NIT: 900.105.134-5

REGISTRO FOTOGRÁFICO
INFORME FINAL DE INTERVENTORIA – RECIBO CTO OBRA 753/2025 – PAPS VEREDA UNIÓN CHARTE

Contrato de Consultoría No. 759 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA "ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LAS **VEREDAS LA GRACIELA Y UNIÓN CHARTE** DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE"

Contrato de Obra No. 753 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD DE LA **VEREDA UNIÓN CHARTE**, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografía No. 133 – Baño PRM – Cuarto Aseo



Fotografía No. 134 – Consultorio 2 .1




Fotografía No. 135 – Consultorio 2 .2



Fotografía No. 136 – Baño Sala Espera



Fotografía No. 137 – Baño - consultorio 1

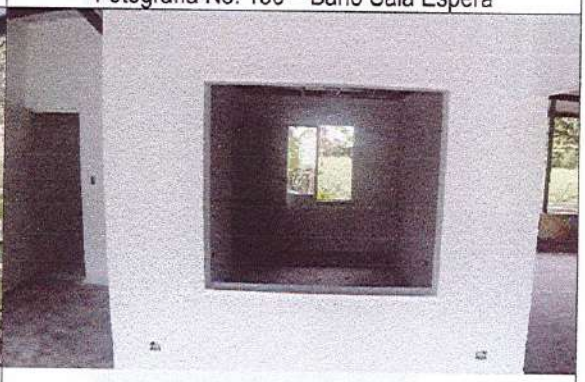


Fotografía No. 138 – Consultorio 1

EPICO INGENIERIA S.A.S.
ESTUDIOS PROFESIONALES, INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES
NIT: 900.105.134-5

REGISTRO FOTOGRAFICO
INFORME FINAL DE INTERVENTORIA – RECIBO CTO OBRA 753/2025 – PAPS VEREDA UNIÓN CHARTE

Contrato de Consultoría No. 759 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA "ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LAS **VEREDAS LA GRACIELA Y UNIÓN CHARTE** DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE"

Contrato de Obra No. 753 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD DE LA **VEREDA UNIÓN CHARTE**, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

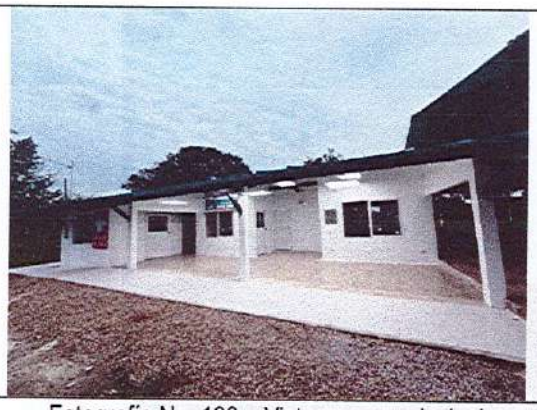

Fotografía No. 139 – Vista acceso principal



Fotografía No. 140 – Vista acceso principal



Fotografía No. 141 –Vista lateral



Fotografía No. 142 –Vista lateral




Fotografía No. 143 – Sala de espera



Fotografía No. 144 – Baño Mixto

ANEXO 4. CERTIFICACIÓN RETIE



EVALCON Evaluadores de la conformidad

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17020:2012
15-OIN-017

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
DICTAMEN DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE

Ciudad y fecha (dd-mm-aaaa)	Bogotá D.C., 16-6-2026	**Dictamen de Inspección No.**	E49957
Fecha de inicio etapa constructiva (dd-mm-aaaa)	22-12-2025		
Versión RETIE (No. Resolución)	RESOLUCIÓN 90708 DE AGOSTO 30 DE 2013		

A. IDENTIFICACION DEL ORGANISMO DE INSPECCION

Organismo de Inspección	EVALUADORES DE LA CONFORMIDAD S.A.S.	**Número de acreditación**	15-OIN-017
NIT	900.340.249-1	**Teléfono**	(57-1) 4888954
Dirección	Carrera 27 No. 84 - 40 Polo Club	**Ciudad**	Bogotá D.C.

B. IDENTIFICACION DE LA INSTALACION

Propietario de la Instalación	MUNICIPIO DE AGUAZUL				
NIT No. de documento de identificación	891855200-9				
Localización de la instalación	**Departamento**	CASANARE	**Dirección**	Puesto de Atención Primario en Salud Vereda Unión Charte.	
	Municipio	AGUAZUL	**Barrio**	VEREDA UNION CHARTE	

C. IDENTIFICACION DE LA INSTALACION DE USO FINAL OBJETO DEL DICTAMEN

Tipo de construcción	**Nueva**					**Ampliada**				**Remodelada**			X
Zona	**Urbana**		**Rural**	X	**ZNI**		**Servicio Comercial**	X	**Industrial**		**Residencial**		
Uso final	**Basicas**		**Provisionales**		**Especiales**	X	**Equipos especiales**		**Túneles y cavernas**		**Minas**		
Tipo de instalación	**Subtipo de instalación(es)***					ASISTENCIA MEDICA							
Capacidad (kVA o KW)	5,344	**Tensión [kV]**		0.120 / 0.240		**Fases**	1	②		3			

D. IDENTIFICACION DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES

Diseñador	DIEGO MAURICIO CASTAÑEDA ARIZA	**Profesión**	INGENIERO ELECTRICISTA	**Matrícula Prof.** CN205-116584
Constructor	DIVAGNER LOZANO AMEZQUITA	**Profesión**	TECNICO ELECTRICISTA	**Matrícula Prof.** 74753260-83523
Operador y Mantenedor (No aplica para	NO APLICA	**Profesión**	NO APLICA	**Matrícula Prof.** NO APLICA
Interventor (Si aplica)	NO APLICA	**Profesión**	NO APLICA	**Matrícula Prof.** NO APLICA

E. EVALUACION DE LA INSTALACION ELECTRICA

ÍTEM	REQUISITO ESENCIAL	ASPECTO A EVALUAR	APLICA SI	APLICA NO	PARAMETRO MEDIDO	PARAMETRO REFERENCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO
1	Diseño	Planos, diagramas y esquemas	X				X	
2		Análisis de riesgos de origen eléctrico	X				X	
3		Especificaciones técnicas	X				X	
4		Memoras de calculo	X				X	
5	Campos	Campo eléctrico		X				
6		Densidad de flujo magnético		X				
7	Distancias	Distancias de seguridad	X		0,75*0,9*1,9 m	0,75*0,9*1,9 m	X	
8	Protecciones	Accesibilidad a todos los dispositivos de control y protección	X				X	
9		Funcionamiento del corte automático de alimentación	X				X	
10		Selección de conductores	X				X	
11		Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes	X				X	
12		Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones	X				X	
13	Protección contra rayos	Evaluación del nivel de riesgo	X				X	
14		Verificación de la protección		X				
15	Sistema de puesta a tierra	Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales	X		0,23		X	
16		Resistencia de puesta a tierra	X		3,75 Ω	25 Ω	X	
17		Verificación de tensiones de paso		X				
18		Verificación de tensiones de contacto y transferidas		X				
19		Corrientes en el sistema de puesta a tierra		X				
20	Señalización	Identificación de canalizaciones	X				X	
21		Identificación de circuitos y conductores	X				X	
22		Diagramas, esquemas, avisos y señales de seguridad	X				X	
23	Documentación	Memoria del proyecto	X				X	
24		Plano(s), Diagrama(s) y Esquema(s) de lo Construido	X				X	
25		Certificaciones de productos	X				X	
26		Declaración de cumplimiento del diseñador		X				
27		Declaración de cumplimiento del constructor	X				X	
28		Declaración de cumplimiento de operación y mantenimiento		X				
29	Otros	Apoyos y estructuras		X				
30		Cámaras y canalizaciones		X				
31		Dispositivos de seccionamiento y mando		X				
32		Ejecución de las conexiones	X				X	
33		Herrajes		X				
34		Productos adecuados para las condiciones ambientales	X				X	
35		Protección contra corrosión	X				X	
36		Resistencia de aislamiento	X		215 MΩ	≥ 0,5 MΩ	X	
37		Sujeción mecánica de elementos de la instalación	X				X	
38		Ventilación de equipos	X				X	

F. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES

La inspección comprendió:	USO FINAL (INSTALACIONES MÉDICAS) EN BAJA TENSIÓN DESDE TABLERO DE MEDIDA, Y CIRCUITO ALIMENTADOR HASTA EL TABLERO DE DISTRIBUCIÓN SALIDA DE CIRCUITOS RAMALES TOMAS E ILUMINACIÓN PARA DOS CONSULTORIOS MEDICOS, UN CONSULTORIO ODONTOLOGICO, SALA DE ESPERA, DOS BAÑOS, ALUMBRADO DE EMERGENCIA, SISTEMA DE PUESTA A TIERRA CON UN ÁREA DE 80 M2				
Observaciones:	INSPECCIÓN REALIZADA BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LA RESOLUCIÓN 90708 DE AGOSTO 30 DE 2013				
Dictamenes asociados:	E49958				
Fecha de inspección:	22/4/2026	Orden de Inspección:	7175	Fecha de finalización de la construcción:	9/4/2026
Vigencia del dictamen:	5 Años	Fecha de Vencimiento:	16/06/2031	Tipo de instalación:	Nueva

G. ANEXOS

Declaración de constructor No.	02
Declaración de diseñador No.	NO APLICA
Declaración de de operación y mantenimiento No.	NO APLICA


H. RESULTADO DE LA INSPECCION

RESULTADO		**Aprobada**	X	**No aprobada**	
Director Técnico del organismo de inspección		**Inspector**			
Nombre	JESUS ANTONIO CEBALLOS BONIL	**Nombre**	FERNANDO SANCHEZ BERNAL		
No. de documento de identificación	14315946	**No. de documento de identificación**	93297548		
Profesión	INGENIERO ELECTRICISTA	**Profesión**	INGENIERO ELECTRICISTA		
Certificado de Competencias	1890	**Certificado de Competencias**	1877		
Matrícula Profesional	CN205-00869	**Matrícula Profesional**	CL205-52078		
Firma y sello		**Firma**			

NOTAS:
* El SubTipo de instalación(es) corresponde al tipo de instalación especial o equipo especial a inspeccionar

DICTAMEN DE INSPECCIÓN USO FINAL

Nota: La validez y vigencia del presente dictamen se puede corroborar llamando a los números que



EVALCOIN Evaluadores de la conformidad

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17020:2012
15-OIN-017

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
DICTAMEN DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE

Ciudad y fecha (dd-mm-aaaa)	Bogotá D.C., 16-6-2026	**Dictamen de inspección No.**	E49958
Fecha de inicio etapa constructiva (dd-mm-aaaa)	22-12-2025		
Versión RETIE (No. Resolución)	RESOLUCIÓN 90708 DE AGOSTO 30 DE 2013		

A. IDENTIFICACION DEL ORGANISMO DE INSPECCION

Organismo de inspección	EVALUADORES DE LA CONFORMIDAD S.A.S.	**Número de acreditación**	15-OIN-017
NIT	900.340.249-1	**Teléfono**	(57-1) 4688954
Dirección	Carrera 27 No. 84 - 40 Polo Club	**Ciudad**	Bogotá D.C.

B. IDENTIFICACION DE LA INSTALACION

Propietario de la Instalación	MUNICIPIO DE AGUAZUL				
NIT No. de documento de identificación	891855200-9				
Localización de la instalación	**Departamento**	CASANARE	**Dirección**	Puesto de Atención Primario en Salud Vereda Unión Charte	
	Municipio	AGUAZUL	**Barrio**	VEREDA UNION CHARTE	

C. IDENTIFICACION DE LA INSTALACION DE DISTRIBUCION OBJETO DEL DICTAMEN

Tipo de construcción	**Nueva**						**Ampliada**				**Remodelada**		X
Localización	AEREA						**Tensión [kV]**	0,120 / 0,240			**Capacidad [kVA]**	5,7	
Zona	**Urbana**		**Rural**	X	**ZNI**		**Servicio**	**Comercial**	X	**Industrial**		**Residencial**	
Uso	**General**				**Exclusivo**		X	**Alumbrado público**				**Uso final**	X
Tipo de configuración	**Monofásica**	X	**Trifásica**		**Longitud [km]**		0,025	**Tipo y calibre de conductores**			CABLE CONCENTRICO (2x8+1x8) AWG Cu		
Material estructuras	NO APLICA						**N° de estructuras de apoyo**	0					

D. IDENTIFICACION DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES

Diseñador	DIEGO MAURICIO CASTAÑEDA ARIZA	**Profesión**	INGENIERO ELECTRICISTA	**Matrícula Prof.**	CN205-116564
Constructor	DIVAGNER LOZANO AMEZQUITA	**Profesión**	TECNICO ELECTRICISTA	**Matrícula Prof.**	74753260-83523
Operador y Mantenedor (No aplica para	NO APLICA	**Profesión**	NO APLICA	**Matrícula Prof.**	NO APLICA
Interventor (Si aplica)	NO APLICA	**Profesión**	NO APLICA	**Matrícula Prof.**	NO APLICA

E. EVALUACION DE LA INSTALACION ELECTRICA

ITEM	REQUISITO ESENCIAL	ASPECTO A EVALUAR	APLICA SI	APLICA NO	PARAMETRO MEDIDO	PARAMETRO REFERENCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO
1	Diseño	Planos, diagramas y esquemas	X				X	
2		Análisis de riesgos de origen eléctrico	X				X	
3		Especificaciones técnicas	X				X	
4		Memorias de calculo	X				X	
5	Campos	Campo eléctrico		X				
6		Densidad de flujo magnético		X				
7	Distancias	Distancias de seguridad	X		26 m	1,7 m	X	
8	Protecciones	Accesibilidad a todos los dispositivos de control y protección	X				X	
9		Funcionamiento del corte automático de alimentación	X				X	
10		Selección de conductores	X				X	
11		Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes	X				X	
12		Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones		X				
13	Protección contra rayos	Evaluación del nivel de riesgo	X				X	
14		Verificación de la protección		X				
15	Sistema de puesta a tierra	Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales	X		0,06 Ω		X	
16		Resistencia de puesta a tierra	X		3,75 Ω	25 Ω	X	
17		Verificación de tensiones de paso		X				
18		Verificación de tensiones de contacto y transferidas		X				
19		Corrientes en el sistema de puesta a tierra		X				
20	Señalización	Identificación de canalizaciones	X				X	
21		Identificación de circuitos y conductores	X				X	
22		Diagramas, esquemas, avisos y señales de seguridad	X				X	
23	Documentación	Memoria del proyecto	X				X	
24		Plano(s), Diagrama(s) y Esquema(s) de lo Construido	X				X	
25		Certificaciones de productos	X				X	
26		Declaración de cumplimiento del diseñador		X				
27		Declaración de cumplimiento del constructor	X				X	
28		Declaración de cumplimiento de operación y mantenimiento		X				
29	Otros	Apoyos y estructuras	X				X	
30		Cámaras y canalizaciones		X				
31		Dispositivos de seccionamiento y mando		X				
32		Ejecución de las conexiones	X				X	
33		Herrajes		X				
34		Productos adecuados para las condiciones ambientales	X				X	
35		Protección contra corrosión	X				X	
36		Resistencia de aislamiento	X		215 MΩ	≥ 0,5 MΩ	X	
37		Sujeción mecánica de elementos de la instalación	X				X	
38		Ventilación de equipos	X				X	

F. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES

La inspección comprende:	DISTRIBUCION EN BAJA TENSIÓN DESDE PUNTO DE CONEXIÓN RED CONCENTRICA EN CABLE 2X8F+1X8N CU AWG CON UNA LONGITUD DE 25 METROS HASTA TABLERO DE MEDIDA CON PROTECCION DE 2X32 AMP				
Observaciones:	INSPECCIÓN REALIZADA BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LA RESOLUCIÓN 90708 DE AGOSTO 30 DE 2013				
Dictamenes asociados:					
Fecha de Inspección:	22/4/2026	Orden de Inspección:	7175	Fecha de finalización de la construcción:	9/4/2026
Vigencia del dictamen:	5 Años	Fecha de Vencimiento:	16/06/2031	Tipo de instalación:	Nueva

G. ANEXOS

Declaración de constructor No.	01
Declaración de diseñador No.	NO APLICA
Declaración de operación y mantenimiento No.	NO APLICA

H. RESULTADO DE LA INSPECCION

RESULTADO	**Aprobada**	X	**No aprobada**	

Director Técnico del organismo de inspección		**Inspector**	
Nombre	JESUS ANTONIO CEBALLOS BONIL	**Nombre**	FERNANDO SÁNCHEZ BERNAL
No. de documento de identificación	14315946	**No. de documento de identificación**	93297548
Profesión	INGENIERO ELECTRICISTA	**Profesión**	INGENIERO ELECTRICISTA
Certificado de Competencias	1890	**Certificado de Competencias**	1877
Matrícula Profesional	CN205-00869	**Matrícula Profesional**	CL205-52078
Firma y sello		**Firma**	

DICTAMEN DE INSPECCIÓN DISTRIBUCIÓN

Consulta nuestra acreditación ONAC

Nota: La validez y vigencia del presente dictamen se puede corroborar llamando a los números que aparecen en el presente documento o a través del código QR del encabezado

EPICO INGENIERIA S.A.S.
ESTUDIOS PROFESIONALES, INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES
NIT: 900.105.134-5

REGISTRO FOTOGRAFICO

Contrato de Consultoría No. 759 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA "ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LAS **VEREDAS LA GRACIELA Y UNIÓN CHARTE** DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE"

Contrato de Obra No. 753 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD DE LA **VEREDA UNIÓN CHARTE**, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografía No. 01 – Vista acceso



Fotografía No. 02 – Vista posterior



Fotografía No. 03 – Fachada principal



Fotografía No. 04 – Fachada lateral derecha



Fotografía No. 05 – Fachada posterior



Fotografía No. 06 – Fachada lateral izquierda

HOSPITAL DE AGUAZUL
JUAN HERNANDO URREGO E.S.E.
SALUD CON EXCELENCIA Y HUMANIZACION

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

EPICO INGENIERIA S.A.S.

HOJA	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.
1/1		martes, 20 de enero de 2026			759 DE 03 DE DICIEMBRE DE 2025

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DATOS DEL INFORME

Informe Número: 1 Del: 22/12/2025 Al: 18/01/2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 17 Dias

Nombre del Supervisor: JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD DE LA VEREDA UNIÓN CHARTE, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

CONTRATO DE CONSULTORIA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	J&M INGENIERIA S.A.S.	Interventor:	EPICO INGENIERIA S.A.S.
NIT:	900.103.645-8	NIT:	900.105.134-5
Contrato No.	753 DEL 28/NOV/2025	Contrato No.	759 DE 03/DIC/2025
Valor Inicial:	$ 195,333,425.93	Valor Inicial:	TOTAL-$28.799.414 - U. CHARTE-$15.644.503
Valor Actualizado:	$ 195,333,425.93	Valor Actualizado:	TOTAL-$28.799.414 - U. CHARTE-$15.644.503
Plazo Inicial:	UN (01) MES Y DIEZ (10) DIAS	Plazo Inicial:	DOS (2) MESES
Plazo Actualizado:	UN (01) MES Y DIEZ (10) DIAS	Plazo Actualizado:	DOS (2) MESES
Fecha de Iniciación:	22/12/2025	Fecha de Iniciación:	15/12/2025
Suspensión - Reinicio:	29/12/2025 a 08/01/2026	Suspensión - Reinicio:	29/12/2025 a 08/01/2026
Fecha de Términación:	10/02/2026	Fecha de Términación:	23/02/2026

Fase en ejecución: ☐ ESTUDIOS Y DISEÑOS ☑ CONSTRUCCION

VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS					0.0%
VALOR CONSTRUCCION			$	195,333,425.930	100.0%
PROGRAMADO	**SEMANAL**	**ACUMULADO**	**EJECUTADO**	**SEMANAL**	**ACUMULADO**
Avance programado (%)	2.49%	2.49%	Avance Ejecutado (%)	1.39%	1.39%
Valor programado:	$ 4,865,627	$ 4,865,627	Valor Ejecutado:	$ 2,710,206	$ 2,710,206

CONSTRUCCION	INTERVENTORIA	APOYO A LA SUPERVISION
J&M INGENIERIA S.A.S.	EPICO INGENIERIA S.A.S.	ARQ. JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON
MABEL SIERRA VARGAS	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA	Firma
Firma	Firma	SUPERVISION
		JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO
		Firma

ANEXO 5. INFORMES SEMANALES

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E. SALUD CON EXCELENCIA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

EPICO INGENIERIA S.A.S.

HOJA 1/1	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.
		miércoles, 4 de febrero de 2026			759 DE 03 DE DICIEMBRE DE 2025

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DATOS DEL INFORME

Informe Número: 3 Del: 26/01/2026 Al: 1/02/2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 31 Dias

Nombre del Supervisor: JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD DE LA VEREDA UNIÓN CHARTE, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

CONTRATO DE CONSULTORIA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	J&M INGENIERIA S.A.S.	Interventor:	EPICO INGENIERIA S.A.S.
NIT:	900.103.645-8	NIT:	900.105.134-5
Contrato No.	**753 DEL 28/NOV/2025**	Contrato No.	**759 DE 03/DIC/2025**
Valor Inicial:	$ 195,333,425.93	Valor Inicial:	TOTAL-$28.799.414 - U. CHARTE-$15.644.503
Valor Actualizado:	$ 195,333,425.93	Valor Actualizado:	TOTAL-$28.799.414 - U. CHARTE-$15.644.503
Plazo Inicial:	UN (01) MES Y DIEZ (10) DIAS	Plazo Inicial:	DOS (2) MESES
Prorroga 1	UN (01) MES	Prorroga 1:	UN (1) MES
Plazo Actualizado:	DOS (02) MESES Y DIEZ (10) DIAS	Plazo Actualizado:	TRES (3) MESES
Fecha de Iniciación:	22/12/2025	Fecha de Iniciación:	15/12/2025
Suspensión - Reinicio:	29/12/2025 a 08/01/2026	Suspensión - Reinicio:	29/12/2025 a 08/01/2026
Fecha de Términación:	10/03/2026	Fecha de Términación:	23/03/2026

Fase en ejecución: ☐ ESTUDIOS Y DISEÑOS ☑ CONSTRUCCION

VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS				*0.0%*
VALOR CONSTRUCCION	$ 195,333,425.930			*100.0%*
PROGRAMADO	**SEMANAL**	**ACUMULADO**	**EJECUTADO**	**SEMANAL**	**ACUMULADO**
Avance programado (%)	**4.51%**	**10.00%**	Avance Ejecutado (%)	**2.79%**	**8.34%**
Valor programado:	**$ 8,803,441**	**$ 19,541,288**	Valor Ejecutado:	**$ 5,445,523**	**$ 16,286,346**

CONSTRUCCION	INTERVENTORIA	APOYO A LA SUPERVISION
J&M INGENIERIA S.A.S.	EPICO INGENIERIA S.A.S.	ARQ. JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON
MABEL SIERRA VARGAS	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA	Firma
Firma	Firma	**SUPERVISION**
		JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO
		Firma

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E. SALUD CON EXCELENCIA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

EPICO INGENIERIA S.A.S.

HOJA 1/1	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.
		miércoles, 11 de febrero de 2026			759 DE 03 DE DICIEMBRE DE 2025

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DATOS DEL INFORME

Informe Número: **4** Del: 2/02/2026 Al: 8/02/2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 38 Dias

Nombre del Supervisor: JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCION PRIMARIO EN SALUD DE LA VEREDA UNIÓN CHARTE, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

CONTRATO DE CONSULTORIA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	J&M INGENIERIA S.A.S.	Interventor:	EPICO INGENIERIA S.A.S.
NIT:	900.103.645-8	NIT:	900.105.134-5
Contrato No.	**753 DEL 28/NOV/2025**	Contrato No.	**759 DE 03/DIC/2025**
Valor Inicial:	$ 195,333,425.93	Valor Inicial:	TOTAL-$28.799.414 - U. CHARTE-$15.644.503
Valor Actualizado:	$ 195,333,425.93	Valor Actualizado:	TOTAL-$28.799.414 - U. CHARTE-$15.644.503
Plazo Inicial:	UN (01) MES Y DIEZ (10) DIAS	Plazo Inicial:	DOS (2) MESES
Prorroga 1	UN (01) MES	Prorroga 1:	UN (1) MES
Plazo Actualizado:	DOS (02) MESES Y DIEZ (10) DIAS	Plazo Actualizado:	TRES (3) MESES
Fecha de Iniciación:	22/12/2025	Fecha de Iniciación:	15/12/2025
Suspensión - Reinicio:	29/12/2025 a 08/01/2026	Suspensión - Reinicio:	29/12/2025 a 08/01/2026
Fecha de Términación:	10/03/2026	Fecha de Términación:	23/03/2026

Fase en ejecución: ☐ ESTUDIOS Y DISEÑOS ☑ CONSTRUCCION

VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS		*0.0%*
VALOR CONSTRUCCION	$ 195,333,425.930	*100.0%*

PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO	EJECUTADO	SEMANAL	ACUMULADO
Avance programado (%)	**3.50%**	**13.50%**	Avance Ejecutado (%)	**3.97%**	**12.31%**
Valor programado:	**$ 6,832,030**	**$ 26,373,318**	Valor Ejecutado:	**$ 7,753,617**	**$ 24,039,963**

CONSTRUCCION	INTERVENTORIA	APOYO A LA SUPERVISION
J&M INGENIERIA S.A.S.	**EPICO INGENIERIA S.A.S**	ARQ. JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON
MABEL SIERRA VARGAS	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA	Firma
		SUPERVISION
		JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO
Firma	Firma	Firma

HOSPITAL DE AGUAZUL
JUAN HERNANDO URREGO E.S.E.
SALUD CON EXCELENCIA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

EPICO INGENIERIA S.A.S.

HOJA 1/1	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.
		miércoles, 18 de febrero de 2026			759 DE 03 DE DICIEMBRE DE 2025

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DATOS DEL INFORME

Informe Número: **5** Del: 9/02/2026 Al: 15/02/2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 45 Dias

Nombre del Supervisor: JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD DE LA VEREDA UNIÓN CHARTE, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

CONTRATO DE CONSULTORIA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	J&M INGENIERIA S.A.S.	Interventor:	EPICO INGENIERIA S.A.S.
NIT:	900.103.645-8	NIT:	900.105.134-5
Contrato No.	**753 DEL 28/NOV/2025**	Contrato No.	**759 DE 03/DIC/2025**
Valor Inicial:	$ 195,333,425.93	Valor Inicial:	TOTAL-$28.799.414 - U. CHARTE-$15.644.503
Valor Actualizado:	$ 195,333,425.93	Valor Actualizado:	TOTAL-$28.799.414 - U. CHARTE-$15.644.503
Plazo Inicial:	UN (01) MES Y DIEZ (10) DIAS	Plazo Inicial:	DOS (2) MESES
Prorroga 1	UN (01) MES	Prorroga 1:	UN (1) MES
Plazo Actualizado:	DOS (02) MESES Y DIEZ (10) DIAS	Plazo Actualizado:	TRES (3) MESES
Fecha de Iniciación:	22/12/2025	Fecha de Iniciación:	15/12/2025
Suspensión - Reinicio:	29/12/2025 a 08/01/2026	Suspensión - Reinicio:	29/12/2025 a 08/01/2026
Fecha de Términación:	10/03/2026	Fecha de Términación:	23/03/2026

Fase en ejecución: ☐ ESTUDIOS Y DISEÑOS ☑ CONSTRUCCION

VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS					*0.0%*
VALOR CONSTRUCCION	$	195,333,425.930			*100.0%*
PROGRAMADO	**SEMANAL**	**ACUMULADO**	**EJECUTADO**	**SEMANAL**	**ACUMULADO**
Avance programado (%)	**7.57%**	**21.07%**	Avance Ejecutado (%)	**8.83%**	**21.14%**
Valor programado:	**$ 14,791,861**	**$ 41,165,179**	Valor Ejecutado:	**$ 17,257,618**	**$ 41,297,581**

CONSTRUCCION	INTERVENTORIA	APOYO A LA SUPERVISION
J&M INGENIERIA S.A.S.	**EPICO INGENIERIA S.A.S.**	ARQ. JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON
MABEL SIERRA VARGAS	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA	Firma
		SUPERVISION
		JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO
Firma	Firma	Firma

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E. SALUD CON EXCELENCIA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

EPICO INGENIERIA S.A.S.

HOJA 1/1	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.
		miércoles, 25 de febrero de 2026			759 DE 03 DE DICIEMBRE DE 2025

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DATOS DEL INFORME

Informe Número: 6 Del: 16/02/2026 Al: 22/02/2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 52 Dias

Nombre del Supervisor: JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD DE LA VEREDA UNIÓN CHARTE, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

CONTRATO DE CONSULTORIA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	J&M INGENIERIA S.A.S.	Interventor:	EPICO INGENIERIA S.A.S.
NIT:	900.103.645-8	NIT:	900.105.134-5
Contrato No.	**753 DEL 28/NOV/2025**	Contrato No.	**759 DE 03/DIC/2025**
Valor Inicial:	$ 195,333,425.93	Valor Inicial:	TOTAL-$28.799.414 - U. CHARTE-$15.644.503
Valor Actualizado:	$ 195,333,425.93	Valor Actualizado:	TOTAL-$28.799.414 - U. CHARTE-$15.644.503
Plazo Inicial:	UN (01) MES Y DIEZ (10) DIAS	Plazo Inicial:	DOS (2) MESES
Prorroga 1	UN (01) MES	Prorroga 1:	UN (1) MES
Plazo Actualizado:	DOS (02) MESES Y DIEZ (10) DIAS	Plazo Actualizado:	TRES (3) MESES
Fecha de Iniciación:	22/12/2025	Fecha de Iniciación:	15/12/2025
Suspensión - Reinicio:	29/12/2025 a 08/01/2026	Suspensión - Reinicio:	29/12/2025 a 08/01/2026
Fecha de Términación:	10/03/2026	Fecha de Términación:	23/03/2026

Fase en ejecución: ☐ ESTUDIOS Y DISEÑOS ☑ CONSTRUCCION

VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS					*0.0%*
VALOR CONSTRUCCION			$ 195,333,425.930		*100.0%*
PROGRAMADO	**SEMANAL**	**ACUMULADO**	**EJECUTADO**	**SEMANAL**	**ACUMULADO**
Avance programado (%)	**19.55%**	**40.62%**	Avance Ejecutado (%)	**14.92%**	**36.06%**
Valor programado:	**$ 38,182,177**	**$ 79,347,355**	Valor Ejecutado:	**$ 29,140,256**	**$ 70,437,836**

CONSTRUCCION	INTERVENTORIA	APOYO A LA SUPERVISION
J&M INGENIERIA S.A.S.	**EPICO INGENIERIA S.A.S.**	ARQ. JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON
MABEL SIERRA VARGAS	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA	Firma
		SUPERVISION
		JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO
Firma	Firma	Firma

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E. SALUD CON EXCELENCIA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

EPICO INGENIERIA S.A.S.

HOJA 1/1	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.
		miércoles, 4 de marzo de 2026			759 DE 03 DE DICIEMBRE DE 2025

OFICINA DE GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DATOS DEL INFORME

Informe Número: 7 Del: 23/02/2026 Al: 1/03/2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 59 Dias

Nombre del Supervisor: JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD DE LA VEREDA UNIÓN CHARTE, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

CONTRATO DE CONSULTORIA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	J&M INGENIERIA S.A.S.	Interventor:	EPICO INGENIERIA S.A.S.
NIT:	900.103.645-8	NIT:	900.105.134-5
Contrato No.	**753 DEL 28/NOV/2025**	Contrato No.	**759 DE 03/DIC/2025**
Valor Inicial:	$ 195,333,425.93	Valor Inicial:	TOTAL-$28.799.414 - U. CHARTE-$15.644.503
Valor Actualizado:	$ 195,333,425.93	Valor Actualizado:	TOTAL-$28.799.414 - U. CHARTE-$15.644.503
Plazo Inicial:	UN (01) MES Y DIEZ (10) DIAS	Plazo Inicial:	DOS (2) MESES
Prorroga 1	UN (01) MES	Prorroga 1:	UN (1) MES
Plazo Actualizado:	DOS (02) MESES Y DIEZ (10) DIAS	Plazo Actualizado:	TRES (3) MESES
Fecha de Iniciación:	22/12/2025	Fecha de Iniciación:	15/12/2025
Suspensión - Reinicio:	29/12/2025 a 08/01/2026	Suspensión - Reinicio:	29/12/2025 a 08/01/2026
Fecha de Términación:	10/03/2026	Fecha de Términación:	23/03/2026

Fase en ejecución: ☐ ESTUDIOS Y DISEÑOS ☑ CONSTRUCCION

VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS				*0.0%*
VALOR CONSTRUCCION	$ 195,333,425.930			*100.0%*
PROGRAMADO	**SEMANAL**	**ACUMULADO**	**EJECUTADO**	**SEMANAL**	**ACUMULADO**
Avance programado (%)	**23.22%**	**63.84%**	Avance Ejecutado (%)	**23.78%**	**59.85%**
Valor programado:	**$ 45,350,623**	**$ 124,697,978**	Valor Ejecutado:	**$ 46,459,651**	**$ 116,897,487**

CONSTRUCCION	INTERVENTORIA	APOYO A LA SUPERVISION
J&M INGENIERIA S.A.S.	**EPICO INGENIERIA S.A.S.**	ARQ. JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON
MABEL SIERRA VARGAS	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA	Firma
		SUPERVISION
		JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO
Firma	Firma	Firma

HOSPITAL DE ACUAZUL
JUAN HERNANDO URREGO E.S.E.
SALUD CON EXCELENCIA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

EPICO INGENIERIA S.A.S.

HOJA 1/1	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.
		miércoles, 18 de marzo de 2026			759 DE 03 DE DICIEMBRE DE 2025

OFICINA DE GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DATOS DEL INFORME

Informe Número: **9** Del: 9/03/2026 Al: 15/03/2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 73 Dias

Nombre del Supervisor: JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD DE LA VEREDA UNIÓN CHARTE, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

CONTRATO DE CONSULTORIA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	J&M INGENIERIA S.A.S.	Interventor:	EPICO INGENIERIA S.A.S.
NIT:	900.103.645-8	NIT:	900.105.134-5
Contrato No.	**753 DEL 28/NOV/2025**	Contrato No.	**759 DE 03/DIC/2025**
Valor Inicial:	$ 195,333,425.93	Valor Inicial:	TOTAL-$28.799.414 - U. CHARTE-$15.644.503
Valor Actualizado:	$ 195,333,425.93	Valor Actualizado:	TOTAL-$28.799.414 - U. CHARTE-$15.644.503
Plazo Inicial:	UN (01) MES Y DIEZ (10) DIAS	Plazo Inicial:	DOS (2) MESES
Prorrogas 1 y 2	UN (01) MES + UN (01) MES	Prorroga 1:	UN (1) MES
Plazo Actualizado:	TRES (03) MESES Y DIEZ (10) DIAS	Plazo Actualizado:	TRES (3) MESES
Fecha de Iniciación:	22/12/2025	Fecha de Iniciación:	15/12/2025
Suspensión - Reinicio:	29/12/2025 a 08/01/2026	Suspensión - Reinicio:	29/12/2025 a 08/01/2026
Fecha de Términación:	10/04/2026	Fecha de Términación:	23/03/2026

Fase en ejecución: ☐ ESTUDIOS Y DISEÑOS ☑ CONSTRUCCION

VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS				*0.0%*
VALOR CONSTRUCCION			$ 195,333,425.930	*100.0%*
PROGRAMADO	**SEMANAL**	**ACUMULADO**	**EJECUTADO**	**SEMANAL**	**ACUMULADO**
Avance programado (%)	**3.76%**	**67.15%**	Avance Ejecutado (%)	**2.01%**	**77.78%**
Valor programado:	**$ 7,353,332**	**$ 131,170,573**	Valor Ejecutado:	**$ 3,925,819**	**$ 151,922,384**

CONSTRUCCION	INTERVENTORIA	APOYO A LA SUPERVISION
J&M INGENIERIA S.A.S.	**EPICO INGENIERIA S.A.S.**	ARQ. JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON
MABEL SIERRA VARGAS	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA	Firma
Firma	Firma	**SUPERVISION**
		JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO
		Firma

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E. SALUD CON EXCELENCIA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

EPICO INGENIERIA S.A.S.

HOJA 1/1	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.
		miércoles, 25 de marzo de 2026			759 DE 03 DE DICIEMBRE DE 2025

OFICINA DE GESTIÓN DEL AMBIENTE FISICO Y TECNOLÓGICO

DATOS DEL INFORME

Informe Número: **10** Del: 16/03/2026 Al: 22/03/2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 80 Dias

Nombre del Supervisor: JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD DE LA VEREDA UNIÓN CHARTE, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

CONTRATO DE CONSULTORIA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	J&M INGENIERIA S.A.S.	Interventor:	EPICO INGENIERIA S.A.S.
NIT:	900.103.645-8	NIT:	900.105.134-5
Contrato No.	**753 DEL 28/NOV/2025**	Contrato No.	**759 DE 03/DIC/2025**
Valor Inicial:	$ 195,333,425.93	Valor Inicial:	TOTAL-$28.799.414 - U. CHARTE-$15.644.503
Valor Actualizado:	$ 195,333,425.93	Valor Actualizado:	TOTAL-$28.799.414 - U. CHARTE-$15.644.503
Plazo Inicial:	UN (01) MES Y DIEZ (10) DIAS	Plazo Inicial:	DOS (2) MESES
Prorrogas 1 y 2	UN (01) MES + UN (01) MES	Prorroga 1 y 2:	UN (1) MES + UN (1) MES
Plazo Actualizado:	TRES (03) MESES Y DIEZ (10) DIAS	Plazo Actualizado:	CUATRO (4) MESES
Fecha de Iniciación:	22/12/2025	Fecha de Iniciación:	15/12/2025
Suspensión - Reinicio:	29/12/2025 a 08/01/2026	Suspensión - Reinicio:	29/12/2025 a 08/01/2026
Fecha de Términación:	10/04/2026	Fecha de Términación:	23/04/2026

Fase en ejecución: ☐ ESTUDIOS Y DISEÑOS ☑ CONSTRUCCION

VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS					*0.0%*
VALOR CONSTRUCCION			$ 195,333,425.930		*100.0%*
PROGRAMADO	**SEMANAL**	**ACUMULADO**	**EJECUTADO**	**SEMANAL**	**ACUMULADO**
Avance programado (%)	**8.03%**	**75.18%**	Avance Ejecutado (%)	**2.27%**	**80.05%**
Valor programado:	**$ 15,690,352**	**$ 146,860,925**	Valor Ejecutado:	**$ 4,433,170**	**$ 156,355,553**

CONSTRUCCION	INTERVENTORIA	APOYO A LA SUPERVISION
J&M INGENIERIA S.A.S.	**EPICO INGENIERIA S.A.S.**	ARQ. JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON
MABEL SIERRA VARGAS	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA	Firma
		SUPERVISION
		JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO
Firma	Firma	Firma

HOSPITAL DE AGUAZUL
JUAN HERNANDO URREGO E.S.E.
SALUD CON EXCELENCIA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

EPICO INGENIERIA S.A.S.

HOJA 1/1	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.
		miércoles, 1 de abril de 2026			759 DE 03 DE DICIEMBRE DE 2025

OFICINA DE GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DATOS DEL INFORME

Informe Número: **11** Del: 23/03/2026 Al: 29/03/2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 87 Dias

Nombre del Supervisor: JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD DE LA VEREDA UNIÒN CHARTE, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

CONTRATO DE CONSULTORIA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	J&M INGENIERIA S.A.S.	Interventor:	EPICO INGENIERIA S.A.S.
NIT:	900.103.645-8	NIT:	900.105.134-5
Contrato No.	**753 DEL 28/NOV/2025**	Contrato No.	**759 DE 03/DIC/2025**
Valor Inicial:	$ 195,333,425.93	Valor Inicial:	TOTAL-$28.799.414 - U. CHARTE-$15.644.503
Valor Actualizado:	$ 195,333,425.93	Valor Actualizado:	TOTAL-$28.799.414 - U. CHARTE-$15.644.503
Plazo Inicial:	UN (01) MES Y DIEZ (10) DIAS	Plazo Inicial:	DOS (2) MESES
Prorrogas 1 y 2	UN (01) MES + UN (01) MES	Prorroga 1 y 2:	UN (1) MES + UN (1) MES
Plazo Actualizado:	TRES (03) MESES Y DIEZ (10) DIAS	Plazo Actualizado:	CUATRO (4) MESES
Fecha de Iniciación:	22/12/2025	Fecha de Iniciación:	15/12/2025
Suspensión - Reinicio:	29/12/2025 a 08/01/2026	Suspensión - Reinicio:	29/12/2025 a 08/01/2026
Fecha de Términación:	10/04/2026	Fecha de Términación:	23/04/2026

Fase en ejecución: ☐ ESTUDIOS Y DISEÑOS ☑ CONSTRUCCION

VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS		*0.0%*
VALOR CONSTRUCCION	$ 195,333,425.930	*100.0%*

PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO	EJECUTADO	SEMANAL	ACUMULADO
Avance programado (%)	**6.00%**	**81.19%**	Avance Ejecutado (%)	**4.90%**	**84.95%**
Valor programado:	**$ 11,721,388**	**$ 158,582,313**	Valor Ejecutado:	**$ 9,574,572**	**$ 165,930,126**

CONSTRUCCION	INTERVENTORIA	APOYO A LA SUPERVISION
J&M INGENIERIA S.A.S.	**EPICO INGENIERIA S.A.S.**	ARQ. JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON
MABEL SIERRA VARGAS	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA	Firma
		SUPERVISION
		JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO
Firma	Firma	Firma

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E. SALUD CON EXCELENCIA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

EPICO INGENIERIA S.A.S.

HOJA 1/1	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.
		miércoles, 8 de abril de 2026			759 DE 03 DE DICIEMBRE DE 2025

OFICINA DE GESTIÓN DEL AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGICO

DATOS DEL INFORME

Informe Número: **12** Del: 30/03/2026 Al: 5/04/2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 94 Dias

Nombre del Supervisor: JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD DE LA VEREDA UNIÓN CHARTE, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

CONTRATO DE CONSULTORIA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	J&M INGENIERIA S.A.S.	Interventor:	EPICO INGENIERIA S.A.S.
NIT:	900.103.645-8	NIT:	900.105.134-5
Contrato No.	**753 DEL 28/NOV/2025**	Contrato No.	**759 DE 03/DIC/2025**
Valor Inicial:	$ 195,333,425.93	Valor Inicial:	TOTAL-$28.799.414 - U. CHARTE-$15.644.503
Valor Actualizado:	$ 195,333,425.93	Valor Actualizado:	TOTAL-$28.799.414 - U. CHARTE-$15.644.503
Plazo Inicial:	UN (01) MES Y DIEZ (10) DIAS	Plazo Inicial:	DOS (2) MESES
Prorrogas 1 y 2	UN (01) MES + UN (01) MES	Prorroga 1 y 2:	UN (1) MES + UN (1) MES
Plazo Actualizado:	TRES (03) MESES Y DIEZ (10) DIAS	Plazo Actualizado:	CUATRO (4) MESES
Fecha de Iniciación:	22/12/2025	Fecha de Iniciación:	15/12/2025
Suspensión - Reinicio:	29/12/2025 a 08/01/2026	Suspensión - Reinicio:	29/12/2025 a 08/01/2026
Fecha de Términación:	10/04/2026	Fecha de Términación:	23/04/2026

Fase en ejecución: ☐ ESTUDIOS Y DISEÑOS ☑ CONSTRUCCION

PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO
Avance programado (%)	**8.78%**	**89.97%**
Valor programado:	**$ 17,149,530**	**$ 175,731,843**

VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS		*0.0%*
VALOR CONSTRUCCION	$ 195,333,425.930	*100.0%*

EJECUTADO	SEMANAL	ACUMULADO
Avance Ejecutado (%)	**5.09%**	**90.03%**
Valor Ejecutado:	**$ 9,937,748**	**$ 175,867,874**

CONSTRUCCION	INTERVENTORIA	APOYO A LA SUPERVISION
J&M INGENIERIA S.A.S.	**EPICO INGENIERIA S.A.S.**	ARQ. JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON
MABEL SIERRA VARGAS	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA	Firma
		SUPERVISION
		JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO
Firma	Firma	Firma

ANEXO 6. CERTIFICACIÓN Y PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL, PARAFISCALES Y FIC DE OBRA

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E. SALUD CON EXCELENCIA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

EPICO INGENIERIA S.A.S.

HOJA 1/1	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.
		miércoles, 15 de abril de 2026			759 DE 03 DE DICIEMBRE DE 2025

OFICINA DE GESTION DEL AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGICO

DATOS DEL INFORME

Informe Número: **13** Del: 6/04/2026 Al: 12/04/2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 101 Dias

Nombre del Supervisor: JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE ATENCION PRIMARIO EN SALUD DE LA VEREDA UNION CHARTE, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

CONTRATO DE CONSULTORIA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	J&M INGENIERIA S.A.S.	Interventor:	EPICO INGENIERIA S.A.S.
NIT:	900.103.645-8	NIT:	900.105.134-5
Contrato No.	**753 DEL 28/NOV/2025**	Contrato No.	**759 DE 03/DIC/2025**
Valor Inicial:	$ 195,333,425.93	Valor Inicial:	TOTAL-$28.799.414 - U. CHARTE-$15.644.503
Valor Actualizado:	$ 195,333,425.93	Valor Actualizado:	TOTAL-$28.799.414 - U. CHARTE-$15.644.503
Plazo Inicial:	UN (01) MES Y DIEZ (10) DIAS	Plazo Inicial:	DOS (2) MESES
Prorrogas 1 y 2	UN (01) MES + UN (01) MES	Prorroga 1 y 2:	UN (1) MES + UN (1) MES
Plazo Actualizado:	TRES (03) MESES Y DIEZ (10) DIAS	Plazo Actualizado:	CUATRO (4) MESES
Fecha de Iniciación:	22/12/2025	Fecha de Iniciación:	15/12/2025
Suspensión - Reinicio:	29/12/2025 a 08/01/2026	Suspensión - Reinicio:	29/12/2025 a 08/01/2026
Fecha de Términación:	10/04/2026	Fecha de Términación:	23/04/2026

Fase en ejecución: ☐ ESTUDIOS Y DISEÑOS ☑ CONSTRUCCION

PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO
Avance programado (%)	**10.03%**	**100.00%**
Valor programado:	**$ 19,601,583**	**$195,333,425.93**
Acta de Terminación:	**10/04/2026**	

VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS		*0.0%*
VALOR CONSTRUCCION	$ 195,333,425.930	*100.0%*

EJECUTADO	SEMANAL	ACUMULADO
Avance Ejecutado (%)	**9.97%**	**100.00%**
Valor Ejecutado:	**$ 19,465,552**	**$195,333,425.93**

* La ejecución de actividades fue, terminada, se procederá a la revisión detallada de cantidades para establecer el Valor ejecutado definitivo a establecer en el Acta de Recibo Final.

CONSTRUCCION	INTERVENTORIA	APOYO A LA SUPERVISION
J&M INGENIERIA S.A.S.	**EPICO INGENIERIA S.A.S.**	ARQ. JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON
MABEL SIERRA VARGAS	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA	Firma
Firma	Firma	**SUPERVISION**
		JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO
		Firma

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900103645	8	J&M INGENIERIA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PAPS CHARTE	CR 16 14 55	AGUAZUL-CASANARE	3124489719	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	49626942	9499442652	E	2026/02/11	2026/02/09	NEQUI	0	$1,916,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	74752762	ACOSTA MENDOZA ROSELINO	230301	23	$1,342,361	$214,800	EPS037	23	$1,342,361	$53,700	CCF69	23	$1,342,361	$53,700	14-25	23	$1,342,361	$93,500	23	$0	$0
2	CC	1116553390	CARO PINTO JAIRO YESID	230301	16	$933,816	$149,500	EPS041	16	$933,816	$37,400	CCF69	16	$933,816	$37,400	14-25	16	$933,816	$65,000	16	$0	$0
3	CC	1096206917	FERREIRA RODRIGUEZ DIEGO ARMANDO	230301	10	$583,635	$93,400	EPSC25	10	$583,635	$23,400	CCF69	10	$583,635	$23,400	14-25	10	$583,635	$40,700	10	$0	$0
4	CC	1116548753	ROSAS BECERRA MAIRA ALEJANDRA	230301	23	$1,342,361	$214,800	EPS037	23	$1,342,361	$53,700	CCF69	23	$1,342,361	$53,700	14-25	23	$1,342,361	$93,500	23	$0	$0
5	CC	1055206087	SALCEDO CONDIA JHON DARIO	230301	17	$992,180	$158,800	EPS005	17	$992,180	$39,700	CCF69	17	$992,180	$39,700	14-25	17	$992,180	$69,100	17	$0	$0
6	CC	1029642586	TORRES ALFONSO WILLIAN ALEJANDRO	230301	17	$992,180	$158,800	EPS005	17	$992,180	$39,700	CCF69	17	$992,180	$39,700	14-25	17	$992,180	$69,100	17	$0	$0
Total			**Afiliados(6)**			**$6,186,533**	**$990,100**			$6,186,533	**$247,600**			**$6,186,533**	$247,600			$6,186,533	**$430,900**		**$0**	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$990,100	$0	$0	$990,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$990,100	$0	$0	$990,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$430,900	$0	$0	$430,900
COLMENA	14-25	800,226,175	3	6	$430,900	$0	$0	$430,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$247,600	$0	$0	$247,600
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	6	$247,600	$0	$0	$247,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				6	$247,600	$0	$0	$247,600
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$23,400	$0	$0	$23,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$107,400	$0	$0	$107,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$37,400	$0	$0	$37,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$79,400	$0	$0	$79,400
TOTAL				6	$1,916,200	$0	$0	$1,916,200

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900103645	8	J&M INGENIERIA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PAPS CHARTE	CR 16 14 55	AGUAZUL-CASANARE	3124489719	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	125971713	9501227833	E	2026/03/11	2026/03/09	NEQUI	0	$2,983,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	4214504	ABRIL CIRO ALFONSO	230201	4	$233,454	$37,400	EPSC25	4	$233,454	$9,400	CCF69	4	$233,454	$9,400	14-25	4	$233,454	$16,300	4	$0	$0
2	CC	74752762	ACOSTA MENDOZA ROSELINO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
3	CC	1118553390	CARO PINTO JAIRO YESID	230301	23	$1,342,361	$214,800	EPS041	23	$1,342,361	$53,700	CCF69	23	$1,342,361	$53,700	14-25	23	$1,342,361	$93,500	23	$0	$0
4	CC	1096206917	FERREIRA RODRIGUEZ DIEGO ARMANDO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPSC25	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
5	CC	1006442514	REYES VILLALOBOS CARLOS ESTIVEN	230301	4	$233,454	$37,400	EPSC25	4	$233,454	$9,400	CCF69	4	$233,454	$9,400	14-25	4	$233,454	$16,300	4	$0	$0
6	CC	1116548753	ROSAS BECERRA MAIRA ALEJANDRA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
7	CC	1055206087	SALCEDO CONDIA JHON DARIO	230301	14	$817,089	$130,800	EPS005	14	$817,089	$32,700	CCF69	14	$817,089	$32,700	14-25	14	$817,089	$56,900	14	$0	$0
8	CC	1029642586	TORRES ALFONSO WILLIAN ALEJANDRO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
Total			**Afiliados(8)**			**$9,629,978**	**$1,541,200**			**$9,629,978**	**$385,600**			**$9,629,978**	**$385,600**			**$9,629,978**	**$670,600**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				8	$1,541,200	$0	$0	$1,541,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,503,800	$0	$0	$1,503,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$37,400	$0	$0	$37,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$670,600	$0	$0	$670,600
COLMENA	14-25	800,226,175	3	8	$670,600	$0	$0	$670,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$385,600	$0	$0	$385,600
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	8	$385,600	$0	$0	$385,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				8	$385,600	$0	$0	$385,600
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	3	$88,900	$0	$0	$88,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$140,200	$0	$0	$140,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$53,700	$0	$0	$53,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$102,800	$0	$0	$102,800
TOTAL				8	$2,983,000	$0	$0	$2,983,000

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900103645	8	J&M INGENIERIA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PAPS CHARTE	CR 16 14 55	AGUAZUL-CASANARE	3124489719	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	202191711	9502774185	E	2026/04/14	2026/04/07	BANCOLOMBIA	0	$2,657,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	74752762	ACOSTA MENDOZA ROSELINO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
2	CC	1116506654	DUQUE BENAVIDES DANIEL ALEJANDRO	230301	29	$1,692,542	$270,900	EPS041	29	$1,692,542	$67,800	CCF69	29	$1,692,542	$67,800	14-25	29	$1,692,542	$117,900	29	$0	$0
3	CC	1096206917	FERREIRA RODRIGUEZ DIEGO ARMANDO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPSC25	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
4	CC	7177528	MOLINA MESA JOSE HERNANDO	231001	13	$758,726	$121,400	ESSC24	13	$758,726	$30,400	CCF69	13	$758,726	$30,400	14-25	13	$758,726	$52,900	13	$0	$0
5	CC	1116548753	ROSAS BECERRA MAIRA ALEJANDRA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
6	CC	1118577273	URBANO ORTIZ JONAIKER JESUS	230301	15	$875,453	$140,100	EPSC25	15	$875,453	$35,100	CCF69	15	$875,453	$35,100	14-25	15	$875,453	$61,000	15	$0	$0
Total	**Afiliados(6)**					$8,579,436	**$1,373,000**			**$8,579,436**	**$343,600**			$8,579,436	**$343,600**			**$8,579,436**	$597,500		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$1,373,000	$0	$0	$1,373,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$121,400	$0	$0	$121,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,251,600	$0	$0	$1,251,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$597,500	$0	$0	$597,500
COLMENA	14-25	800,226,175	3	6	$597,500	$0	$0	$597,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$343,600	$0	$0	$343,600
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	6	$343,600	$0	$0	$343,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				6	$343,600	$0	$0	$343,600
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	2	$105,200	$0	$0	$105,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$30,400	$0	$0	$30,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$140,200	$0	$0	$140,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$67,800	$0	$0	$67,800
TOTAL				6	$2,657,700	$0	$0	$2,657,700

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900103645	8	J&M INGENIERIA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PAPS CHARTE	CR 16 14 55	AGUAZUL-CASANARE	3124489719	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	289921704	9504480317	E	2026/05/13	2026/05/07	NEQUI	0	$687,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	74752762	ACOSTA MENDOZA ROSELINO	230301	10	$583,635	$93,400	EPS037	10	$583,635	$23,400	CCF69	10	$583,635	$23,400	14-25	10	$583,635	$40,700	10	$0	$0
2	CC	1116506654	DUQUE BENAVIDES DANIEL ALEJANDRO	230301	4	$233,454	$37,400	EPS041	4	$233,454	$9,400	CCF69	4	$233,454	$9,400	14-25	4	$233,454	$16,300	4	$0	$0
3	CC	1096206917	FERREIRA RODRIGUEZ DIEGO ARMANDO	230301	4	$233,454	$37,400	EPSC25	4	$233,454	$9,400	CCF69	4	$233,454	$9,400	14-25	4	$233,454	$16,300	4	$0	$0
4	CC	1116548753	ROSAS BECERRA MAIRA ALEJANDRA	230301	10	$583,635	$93,400	EPS037	10	$583,635	$23,400	CCF69	10	$583,635	$23,400	14-25	10	$583,635	$40,700	10	$0	$0
5	CC	1118577273	URBANO ORTIZ JONAIKER JESUS	230301	10	$583,635	$93,400	EPSC25	10	$583,635	$23,400	CCF69	10	$583,635	$23,400	14-25	10	$583,635	$40,700	10	$0	$0
Total	**Afiliados(5)**					**$2,217,813**	**$355,000**			**$2,217,813**	**$89,000**			**$2,217,813**	**$89,000**			**$2,217,813**	**$154,700**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$355,000	$0	$0	$355,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$355,000	$0	$0	$355,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$154,700	$0	$0	$154,700
COLMENA	14-25	800,226,175	3	5	$154,700	$0	$0	$154,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$89,000	$0	$0	$89,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	$89,000	$0	$0	$89,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$89,000	$0	$0	$89,000
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	2	$32,800	$0	$0	$32,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$46,800	$0	$0	$46,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$9,400	$0	$0	$9,400
TOTAL				5	$687,700	$0	$0	$687,700

CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURIDICAS)

ARMANDO DE JESUS CAMACHO BUSTAMANTE identificado con 85.448.370, y con tarjeta profesional No. 64753-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de J&M INGENIERIA SAS identificada con NIT 900.103.645-8, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Casanare, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección.

No. PLANILLA	PERIODO		IBC	SALUD	PENSION	ARL	CCF	VALOR TOTAL APORTE
9497749063	22025-12	2026-01	$1.656.000	$ 265.000	$66.300	$8.700	$66.300	$ 406.300
9499442652	2026-01	2026-02	$ 6.186.533	$ 247.600	$ 990.100	$ 430.900	$ 247.600	$ 1.916.200
9499627594	2026-01	2026-02	$1.750.905	$ 280.200	$70.100	$9.200	$70.100	$ 429.600
9501227833	2026-02	2026-03	$ 9.629.978	$ 385.600	$ 1.541.200	$ 670.600	$ 385.600	$ 2.983.000
9501423080	2026-02	2026-03	$1.750.905	$ 280.200	$70.100	$9.200	$70.100	$ 429.600
9502774185	2026-03	2026-04	$ 8.579.436	$ 343.600	$ 1.373.000	$ 597.500	$ 343.600	$ 2.657.700
9502866922	2026-03	2026-04	$1.750.905	$ 280.200	$70.100	$9.200	$70.100	$ 429.600
9504480317	2026-04	2026-05	$ 2.217.813	$ 89.000	$ 355.000	$ 154.700	$ 89.000	$ 687.700
9502866922	2026-04	2026-06	$1.750.905	$ 280.200	$70.100	$9.200	$70.100	$ 429.600

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Aguazul, a los (08) días del mes de Mayo de 2026.

MABEL SIERRA VARGAS
R/L C.C 1.116.542.304

ARMANDO DE JESUS CAMACHO BUSTAMANTE
C PUBLICO TP No. 64753-T REVISOR FISCAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E8B8E47A687BA16

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ARMANDO DE JESUS CAMACHO BUSTAMANTE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 85448370 de SANTA MARTA (MAGDALENA) Y Tarjeta Profesional No 64753-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS . . . . . .

Dado en BOGOTA a los 8 dias del mes de Abril de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado





aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900103645	8	J&M INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AGUAZUL	CARRERA 16 N 14 55	AGUAZUL-CASANARE	6384839	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2070712716	9497749063	E	2026/01/14	2026/01/09	BANCO DE BOGOTA	0	$10,143,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: AGUAZUL (22 Afiliados)																						$35,670,300	$5,708,000			$35,670,300	$1,427,800			$35,670,300	$1,427,800			$35,670,300		$1,579,600		$0	$0		$10,143,200
Centro de Trabajo: ADMIN (6 Afiliados)																						$13,760,900	$2,202,000			$13,760,900	$550,700			$13,760,900	$550,700			$13,760,900		$64,700		$0	$0		$3,368,100
Ciudad: AGUAZUL Depto: CASANARE (6 Afiliados)																						$13,760,900	$2,202,000			$13,760,900	$550,700			$13,760,900	$550,700			$13,760,900		$64,700		$0	$0		$3,368,100
1	CC	1116549589	CASTRO GALINDO ANGELA PAOLA											X						23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPSC25	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	0.000%	$0	30	$0	$0	SI	$341,800
2	CC	1098759214	DIAZ MATEUS LAURA XIMENA																	23030 1	30	$2,400,000	$384,000	EPS005	30	$2,400,000	$96,000	CCF69	30	$2,400,000	$96,000	14-25	30	$2,400,000	0.522%	$12,600	30	$0	$0	SI	$588,600
3	CC	1116549242	ROMERO MONROY DALIA AZUCENA							X										23020 1	30	$5,434,400	$869,600	EPS005	30	$5,434,400	$217,400	CCF69	30	$5,434,400	$217,400	14-25	30	$5,434,400	0.522%	$28,400	30	$0	$0	SI	$1,332,800
4	CC	1128385346	SALDARRIAGA BARRIENTOS GLORIA		X															23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
5	CC	1116542304	SIERRA VARGAS MABEL																	23030 1	30	$1,656,000	$265,000	EPS005	30	$1,656,000	$66,300	CCF69	30	$1,656,000	$66,300	14-25	30	$1,656,000	0.522%	$8,700	30	$0	$0	SI	$406,300
6	CC	33646953	SIERRA VARGAS PATRICIA																	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
Centro de Trabajo: OPER (16 Afiliados)																						$21,909,400	$3,506,000			$21,909,400	$877,100			$21,909,400	$877,100			$21,909,400		$1,514,900		$0	$0		$6,775,100
Ciudad: AGUAZUL Depto: CASANARE (16 Afiliados)																						$21,909,400	$3,506,000			$21,909,400	$877,100			$21,909,400	$877,100			$21,909,400		$1,514,900		$0	$0		$6,775,100
7	CC	17390121	BRAVO SUAREZ EDISON																	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
8	CC	17388820	BRAVO SUAREZ YESID ALONSO																	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
9	CC	1006442581	CALVO PARRA WILMER																	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
10	CC	9434838	CHALA GALINDO EDWIN ANDRES																	23030 1	27	$1,350,000	$216,000	EPS005	27	$1,350,000	$54,000	CCF69	27	$1,350,000	$54,000	14-25	27	$1,350,000	6.960%	$94,000	27	$0	$0	SI	$418,000
11	CC	9434838	CHALA GALINDO EDWIN ANDRES											X						23030 1	3	$150,000	$24,000	EPS005	3	$150,000	$6,000	CCF69	3	$150,000	$6,000	14-25	3	$150,000	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$36,000
12	CC	1115911035	CORREA LOPEZ ONEIRA VIVIANA																	23030 1	30	$1,656,000	$265,000	EPS037	30	$1,656,000	$66,300	CCF69	30	$1,656,000	$66,300	14-25	30	$1,656,000	6.960%	$115,300	30	$0	$0	SI	$512,900
13	CC	1116548700	GIRALDO BECERRA JAVIER ALEXANDER		X															23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
14	CC	1118531324	MONROY SILVA FREDY ALBERTO																	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
15	CC	74753111	PEREZ GARCIA ALVARO		X															23030 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF69	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	SI	$464,400
16	CC	1116542232	PLAZAS GUIO YAVID		X															25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF69	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	SI	$464,400
17	CC	91135249	RAMOS OREJARENA ORLANDO																	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPSC25	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
18	CC	1116551041	ROJAS PATIÑO DIANA ESTHEPHANIA																	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
19	CC	74753684	SILVA QUITIAN WILLIAM	X																23030 1	2	$94,900	$15,200	MIN002	2	$94,900	$3,800	CCF69	2	$94,900	$3,800	14-25	2	$94,900	6.960%	$6,700	2	$0	$0	SI	$29,500
20	CC	74753580	SUAREZ BRAVO JHON JAVIER		X															23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
21	CC	74755021	TORRES ALFONSO JOSE ALFREDO																	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPSC25	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
22	CC	1116542601	TORRES AGUDELO WILLIAM																	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
23	CC	79670243	VELASQUEZ JIMENEZ CARLOS RENE		X															23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
Total	**Afiliados(22)**																					$35,670,300	$5,708,000			$35,670,300	$1,427,800			$35,670,300	$1,427,800			$35,670,300		$1,579,600		$0	$0		$10,143,200

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				22	$5,708,000	$0	$0	$5,708,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$467,800	$0	$0	$467,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	18	$4,142,800	$0	$0	$4,142,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$1,097,400	$0	$0	$1,097,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$1,579,600	$0	$0	$1,579,600
COLMENA	14-25	800,226,175	3	22	$1,579,600	$0	$0	$1,579,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$1,427,800	$0	$0	$1,427,800
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	22	$1,427,800	$0	$0	$1,427,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				22	$1,427,800	$0	$0	$1,427,800
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	3	$171,000	$0	$0	$171,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$3,800	$0	$0	$3,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$408,300	$0	$0	$408,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	11	$844,700	$0	$0	$844,700
TOTAL				22	$10,143,200	$0	$0	$10,143,200

ANEXO 7. PÓLIZAS CONTRACTUALES VIGENTES Y APROBACIÓN

APROBACIÓN DE POLIZAS
PROCESO DE APOYO
GESTIÓN JURIDICA

Código:	FO0834015
Versión:	1
Fecha:	11-11-2022
Página:	1

LA OFICINA ASESORA JURIDICA DEL HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E.

HACE CONSTAR

QUE EN EJERCICIO DE LA FACULTAD OTORGADA POR EL ACUERDO Nº 014 DE 2024 Y EN ACATAMIENTO DE LO PRECEPTUADO POR EL ARTÍCULO 7 DE LA LEY 1150 DE 2007 Y EL DECRETO Nº. 1082 de 2015, SE EFECTUO LA REVISION DE LA POLIZA RESPECTO DEL CONTRATO QUE A CONTINUACION SE DESCRIBE:

CONTRATO DE OBRA PUBLICA	753-2025
CONTRATISTA	J&M INGENIERIA S.A.S. R/L MABEL SIERRA VARGAS
OBJETO	*PRÓRROGA No. 02 AL CONTRATO DE OBRA No. 753 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025, CUYO OBJETO ES "ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD DE LA VEREDA UNION CHARTE, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE".*

GARANTÍA

DESCRIPCION DE AMPAROS					
COMPAÑIA	POLIZA Y CERT. Nº	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA $
ADMINISTRADORA DE RIESGOS MUNDIAL	63-[illegible] ANEXO 0	CUMPLIMIENTO	10/03/2026	10/10/2028	$19.533.342,50
		PRESTACIONES SOCIALES	10/03/2026	10/04/2029	$9.766.671,25
		CALIDAD DEL SERVICIO	10/03/2026	10/10/2026	$19.533.342,50
		CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	10/03/2026	10/10/2028	$19.533.342,50
		ESTABILIDAD DE LA OBRA	10/04/2026	10/04/2031	$58.600.027,50
	[illegible] ANEXO 0	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	22/12/2025	10/04/2026	$264.700.000,00

CON BASE EN LO ANTERIOR, ESTE DESPACHO IMPARTE SU APROBACION EL ONCE (11) DEL MES DE MARZO DE DOS MIL VEINTISEIS (2026).

YISSET VANESA ECHEVERRIA LOPEZ
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Elaboró: Johan Ketzer Castañeda Contratista
Profesional Contratado Gestión Jurídica

seguros mundial®

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2026.03.11 16:32:36 -05:00

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 7051270 -

NIT 860 037 013 6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad 7cdVC2vaZLrh5XPMxhxtlg==

ANEXO DE MODIFICACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES SECTOR MIXTO

VERSIÓN CLAUSULADO

No. PÓLIZA	No. ANEXO	No. CERTIFICADO	No. GRUPO
PI-1002285285	5	15059861	

TIPO DE DOCUMENTO | FECHA DE EXPEDICIÓN 11/03/2026 | SUC. EXPEDIDORA MEDELLIN

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del 22/12/2025	24:00 Horas Del	18/04/2031	N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	J B M INGENIERIA S.A.S	No. DOC. IDENTIDAD	900.183.645-8
DIRECCIÓN	CARRERA 16 N 14 55	TELÉFONO	3134489719
ASEGURADO	HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E.	No. DOC. IDENTIDAD	844.001.355-6
DIRECCIÓN	CL 11 15 40	TELÉFONO	3168257983
BENEFICIARIO	HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E.	No. DOC. IDENTIDAD	844.001.355-6
DIRECCIÓN	CL 11 15 40	No. CELULAR	3168257983

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS CONFIRMA QUE CONOCE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO PRORROGA No. 02, AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 753 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025, SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E. Y JBM INGENIERIA S.A.S. R/L MABEL SIERRA VARGAS DE FECHA 18/03/2026, POR MEDIO DEL CUAL SE PROCEDE A PRORROGAR EL PLAZO DEL CONTRATO POR EL TERMINO DE UN (1) MES MAS, HASTA EL DIA 18/04/2026. LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAR VIGENTES.
OBJETO:
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIDIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. 753-2025 , CUYO OBJETO ES

ADECUACIÓN MENOR

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 18/03/2026	24:00 Horas Del 18/10/2026	39.533.342,50	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 18/03/2026	24:00 Horas Del 18/04/2029	9.766.671,25	25.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 18/03/2026	24:00 Horas Del 18/10/2026	39.533.342,50	0,00
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	00:00 Horas Del 18/03/2026	24:00 Horas Del 18/10/2026	39.533.342,50	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 18/04/2026	24:00 Horas Del 18/04/2031	58.800.027,50	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 326.666.726,25	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
ISLIAL SEGUROS LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COMISIONES				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIFICADO	% PARTICIPACIÓN

FORMA PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 11/03/2026	

PRIMA BRUTA	$	25.000,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	25.000,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	4.750,00
TOTAL A PAGAR	$	29.750,00

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON POSTERIORIDAD EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE ME FUERON A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, LAS CONDICIONES GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMAR LA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO

HOJA No.

462

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-86-PPSUS20000000959-D001

No. PÓLIZA	9-100285285	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	15459461	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	31/03/2026	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	22/12/2025	24:00 Horas Del	30/04/2032		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD DE LA VEREDA UNIÓN CHARTE, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE. PARAGRAFO:

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111955"

VIGILADO

Cumplimos las normas de nuestro planeta y celebramos responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

APLICADOS a la CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros **mundial**®

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2026.03.11 18:33:14 -05:00

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 BOGOTÁ
TELEFONO 2855600 FAX 7851720 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

NIT 860 037 013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: p1nG7oqkF3cZnvHCs39Fu==

APOYO DE MODIFICACIÓN DE PÓLIZA DE TIPO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSIÓN CLAUSULADO 13-03-2025-1317-0-00-PPSSRRRRRRRRRR-0000

No. PÓLIZA 0-1008742066	No. ANEXO 5	No. CERTIFICADO 15059662	No. RIESGO
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN 11/03/2026	SUC. EXPEDIDORA MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	23/12/2025	24:00 Horas Del	18/04/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	J & M INGENIERIA S.A.S	No. SOC. ASEGURADO	900.183.645-8
DIRECCIÓN	CARRERA 26 N 14 55	TELÉFONO	3124489719
ASEGURADO	J & M INGENIERIA S.A.S	No. SOC. BENEFICIARIO	900.183.645-8
DIRECCIÓN	CARRERA 26 N 14 55	TELÉFONO	3124489719
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. SOC. CORREDOR	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	1

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS CONFIRMA QUE CONOCE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO PRORROGA No. 02, AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 753 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025, SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E. Y J&M INGENIERIA S.A.S. R/L MABEL SIERRA VARGAS DE FECHA 10/03/2026, POR MEDIO DEL CUAL SE PROCEDE A PRORROGAR EL PLAZO DEL CONTRATO POR EL TERMINO DE UN (1) MES MAS, HASTA EL DIA 18/04/2026.
LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.
OBJETO:
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.753-2025 , CUYO OBJETO ES

ADECUACIÓN MENOR

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	25.000,00
PATRONAL	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
MENORES DE PROPIOS Y NO PROPIOS	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00

TOTAL ASEGURADO $ 284.700.000,00

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
ISSIAL SEGUROS LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIFICADO	% PARTICIPACIÓN

PRIMA EMITIDA	$	25.000,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	25.000,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	4.750,00
TOTAL A PAGAR	$	29.750,00

COMERCIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 11/03/2026

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

[redacted]

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MENCIONADA. ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE, ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

Tomador/Asegurado

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplamos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Proteja el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

APROBADO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - 009

seguros mundial

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 13-05-2025-1317-P-06-PPSUSB0000000827-0001

No. PÓLIZA	N-100074246	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	15059663	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	31/03/2026	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
08:00 Horas Del	22/12/2025	24:00 Horas Del	30/04/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD DE LA VEREDA UNIÓN CHARTE, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E. COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA J & M INGENIERIA S.A.S, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E. BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E. COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000121935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los niveles de nuestro sistema de gestión de responsabilidad social.
Protege el Medio Ambiente evitando imprimir innecesariamente este documento.

APLICADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y AMSA - APP

ANEXO 8. INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DE OBRA

J&M INGENIERIA SAS
NIT. 900103645-8

INFORME FINAL





CONTRATO DE OBRA 753-2025

"ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA UNIÓN CHARTE DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO CASANARE""

AGUAZUL – DEPARTAMENTO CASANERE

2026

CONTENIDO

Carrera 16 No. 14-55
Barrió Los Libertadores

Móvil: 3155674719
Móvil: 3162663148

administración@jymingenieria.com
contacto@jymingenieria.com
comercialjymingenieria.com

		Pág.
1.	INTRODUCCIÓN	3
2.	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 753-2025	4
3.	INFORMACIÓN CONTRACTUAL	5
1.1	Generalidades del contrato	5
1.2	Legalización del contrato	6
1.3	Justificación del proyecto	6
1.4	Actividades contractuales	7
1.5	Descripción de actividades ejecutadas	13
4.	REGISTRO FOTOGRAFICO	20
5.	Aspectos Administrativos	74
5.2.	Relación de personal.	75
5.3.	Pagos de Seguridad	75
5.4.	Correspondencia enviada y recibida.	78
5.5.	Seguridad y Salud en el Trabajo.	78
6.	CONCLUSIONES	79

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe de obra corresponde al contrato cuyo objeto es la "Adecuación menor del Puesto de Atención Primaria en Salud de la vereda Unión Charte del municipio de Aguazul, departamento de Casanare", cuyo propósito principal es mejorar las condiciones físicas, funcionales y de prestación del servicio del equipamiento de salud, garantizando espacios seguros, accesibles y adecuados para la atención a la comunidad.

Las actividades contempladas en el alcance del contrato comprenden intervenciones integrales sobre la infraestructura existente, incluyendo trabajos preliminares y demoliciones controladas, adecuación de pisos, muros y acabados, renovación de instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, instalación de aparatos sanitarios y mobiliario básico, mejoras en cubierta y cielo rasos, todo ello orientado a optimizar las condiciones de salubridad, accesibilidad, seguridad y confort del establecimiento.


El desarrollo de estas actividades busca dar cumplimiento a los estándares técnicos aplicables para edificaciones destinadas a la prestación de servicios de salud, fortaleciendo la capacidad operativa del puesto de atención y contribuyendo al bienestar de los habitantes de la vereda Unión Charte y su área de influencia.

Este informe presenta el avance y estado de ejecución de las actividades contractuales, así como las consideraciones técnicas relevantes asociadas a la ejecución de la obra.

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 753-2025

OBJETO: "ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA UNIÓN CHARTE DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO CASANARE""LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO DE PAJARITO

Grafica 2.1 Ubicación geográfica de Aguazul Casanare

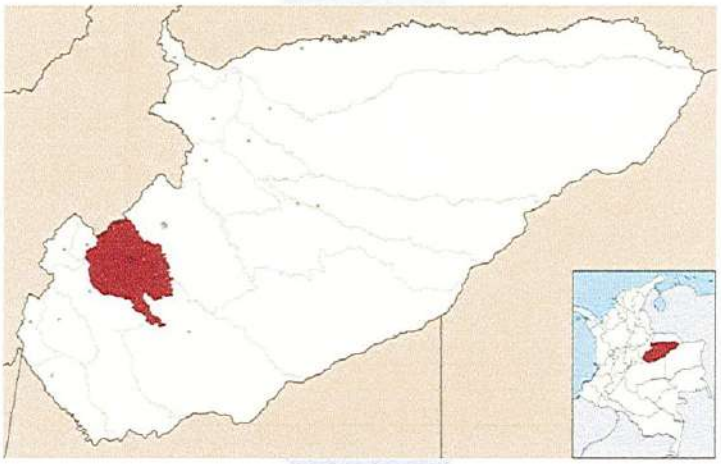

Grafica 2.2 Ubicación Especifica



Carrera 16 No. 14-55
Barrió Los Libertadores

Móvil: 3155674719
Móvil: 3162663148

administración@jymingenieria.com
contacto@jymingenieria.com
comercialjymingenieria.com

3. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

1.1 Generalidades del contrato

CONTRATO DE OBRA	753-2025
CONTRATISTA	J&M INGENIERIA S.A.S
NIT:	900.103.645-8
CONTRATANTE	E.S.E HOSPITAL LOCAL JUAN HERNANDO URREGO
NIT:	844.001.355-6
OBJETO	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA UNIÓN CHARTE DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO CASANARE""LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO DE PAJARITO
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE CINCO PESOS $195.333.425,93
INTERVENTORIA	EPICO INGENIERIA SAS
NIT:	900.105.134-5
FECHA DE INICIO	22 DIC 2025
PLAZO INCIAL DE EJECUCIÓN	(1) MES Y (10 DIAS)
PLAZO ACTUALIZADO	TRES (03) MESES Y DIEZ (10) DÍAS
FECHA TERMINACION ACTUAL	10/04/2026

1.2 Legalización del contrato

El presente contrato de obra fue suscrito entre el Hospital de Aguazul Juan Hernando Urrego y la empresa J&M SAS, por un valor inicial de ciento noventa y cinco millones trescientos treinta y tres mil cuatrocientos veinticinco pesos con noventa y tres centavos m/cte ($ 195.333.425,93).

El plazo contractual inicial es De un (01) meses y diez (10) días y se dio inicio el 22 de diciembre de 2025 con fecha de terminación inicial actual de 10 de marzo de 2025.

La empresa J&M, realizó el pago de las estampillas con número de liquidación 20250000005353 emitido por la secretaria de hacienda de la siguiente forma.

Contrato	753	**Fecha**	28/11/2025	**Valor**	$ 195.333.425,93
Contratista	J Y M INGENIERIA S.A.S				
Nit	900.103.645 -8				
Entidad	E.S.E HOSPITAL LOCAL JUAN HERNANDO URREGO				

TRIBUTO	**TARIFA**	**VALOR ESTAMPILLA**	**NUMERO DE REFERENCIA**
ADULTO MAYOR	4,30%	$ 8.399.337,00	10060520251211162731
CULTURA	1%	$ 1.953.334,00	10060520251211162730
PRO DEPORTE	2,50%	$ 4.883.336,00	10060520251211162732
TOTAL		**$ 15.236.007,00**	

1.3 Justificación del proyecto

La viabilidad se sustenta en la necesidad de corregir las condiciones inadecuadas de infraestructura que actualmente limitan la prestación de los servicios de salud, afectando la seguridad, la calidad y la oportunidad de la atención. El proyecto contempla acciones de mantenimiento correctivo y preventivo, orientadas a restablecer condiciones óptimas de funcionamiento y a cumplir con los criterios de habilitación vigentes para este tipo de establecimientos de salud.

La adecuación permitirá fortalecer la oferta de servicios básicos como consulta externa en enfermería, medicina general, vacunación. La ejecución del contrato "Adecuación menor

del Puesto de Atención Primaria en Salud de la vereda Unión Charte del municipio de Aguazul, departamento de Casanare" se desarrollará de manera secuencial garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente y las condiciones de seguridad, calidad y funcionalidad requeridas para la prestación de servicios de salud.

Las obras iniciarán con actividades preliminares de desmonte, demolición y preparación de áreas. Posteriormente, se ejecutarán las obras civiles de muros, acabados y cubierta, seguidas de la instalación de pisos y enchapes, garantizando superficies seguras, higiénicas y funcionales.

De manera paralela, se instalarán las redes hidráulicas y sanitarias, el sistema séptico y los aparatos sanitarios, asegurando el adecuado abastecimiento y disposición de aguas. Finalmente, se ejecutarán las actividades de carpintería y la adecuación de las instalaciones eléctricas conforme al RETIE, culminando con la certificación correspondiente.

1.4 Actividades contractuales

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR UNIT.
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES			
1,1	Desmonte cubiertas asbesto cemento con transporte	m²	136,61	$ 14.185,00
1,2	Demolición manual placa de piso 0.10 m prom, con retiro	m²	38,90	$ 33.335,00
1,3	Desmonte aparatos sanitarios	und	2,00	$ 14.739,00
1,4	Desmonte de ventanas, con transporte	m²	14,57	$ 10.365,00
1,5	Desmonte marcos y puertas con transporte	m²	10,57	$ 16.253,00
1,6	Demolición enchape muros con retiro	m²	30,34	$ 8.789,00
1,7	Excavación a mano en material común	m3	4,60	$ 44.782,00
1,8	Desmonte correas	m	71,50	$ 5.999,00
1,9	Regata en muro, mampostería tipo ladrillo o bloque para tuberías diámetros menores a 1". (Incluye corte y retiro)	m	14,50	$ 10.105,00

1,10	Resane en mortero 1:4 A = 0.10, E = 1.5 cm	m	14,50	$	3.758,00
1,11	Demolición a mano de tableta piso, espesor entre 0.06 y 0.08 m con retiro	m²	113,39	$	34.066,00
1,12	Desmonte instalaciones sanitarias pvc Ø 2",3",4"	m	9,00	$	5.607,00
1,13	Desmonte instalaciones hidráulicas pvc Ø 1/2",3/4",1", 1 1/2" con retiro	m	6,00	$	3.925,00
1,14	Desmonte tableros eléctricos	und	1,00	$	65.856,00
1,15	Demolición manual de mesón en concreto A=0.60 m	m	2,36	$	33.008,00
1,16	Demolición muro de ladrillo de espesor menor a 0.15 m. con retiro	m2	6,50	$	6.625,00
1,17	Desmonte de cielo raso con retiro	m²	43,38	$	14.550,00
1,18	Desmonte de canales y bajantes de aguas lluvias	m	48,30	$	3.170,00
1,19	Desmonte lavaderos prefabricados, con retiro	m2	1,00	$	86.773,00
2	PISOS Y ENCHAPES				
2,1	Alistado de pisos e= 0.04 m, en mortero 1:3	m²	37,86	$	27.599,00
2,2	Baldosa grano de mármol 30 x 30 / 33 x 33 Blanco	m²	38,84	$	124.179,00
2,3	Enchape piso en cerámica duropiso 33.8 x 33.8. Suministro e Instal.	m²	80,69	$	76.736,00
2,4	Enchape pared cerámica 30x60 cm blanco "Plana" de Corona o similar. Sumin e instal	m²	37,50	$	68.141,00
2,5	Placa base en concreto 3000 psi e=0.10 m reforzada con malla Q-5 de 6 mm	m²	37,86	$	76.934,00
2,6	Guardaescoba en cerámica duropiso 33 x 7 cm. Suministro e instalación	m	21,81	$	17.560,00
2,7	Mediacaña mortero imp 1:3 esmaltado 0.12*0.12m	m	39,35	$	36.770,00
2,8	Enchape de piso en cerámica antideslizante 45 x 45	m²	6,70	$	70.246,00

2,9	Concreto estriado rampas de 3000 psi reforzado 0.16 m	m²	6,03	$	186.618,00
3	INSTALACIONES HIDRAULICAS				
3,1	Tubería presión PVC RDE 9 1/2". Suministro e instal.	m	27,70	$	6.646,00
3,2	Tubería presión PVC RDE 21 3/4". Suministro e instal.	m	12,00	$	8.877,00
3,3	Punto agua fria PVC 1/2"	und	6,00	$	72.865,00
3,4	Barra de seguridad abatible en acero inoxidable 13 x 85 cm. Suministro e Instal.	und	3,00	$	486.705,00
3,5	Espejo baño en plata 5 mm. Suministro e instal.	m²	1,40	$	159.644,00
3,6	Tanque elevado 1.000 lts con conexión y distribución PVC de 1/2" y 1". Suministro e instal.	und	2,00	$	1.179.243,00
3,7	Conjunto ducho individual tipo Dalia pro de Corona o similar	und	1,00	$	109.168,00
3,8	Lavadero prefabricado de 60 x 80. Suministro e instal.	und	1,00	$	239.776,00
3,9	Llave jardín Ø= 1/2" tipo pesado. Suministro e Instal.	und	1,00	$	41.308,00
4	INSTALACIONES SANITARIAS				
4,1	Tubería sanitaria PVC 2". Suministro e instal.	m	7,10	$	23.732,00
4,2	Tubería sanitaria PVC 3". Suministro e instal.	m	6,64	$	32.344,00
4,3	Tubería sanitaria PVC 4". Suministro e instal.	m	18,11	$	44.049,00
4,4	Punto desagüe sanitario pvc 2" con sifón	und	5,00	$	71.127,00
4,5	Punto desagüe sanitario pvc 4"	und	3,00	$	144.759,00
4,6	Punto desagüe sanitario pvc 3" con sifón	und	7,00	$	126.883,00
4,7	Sistema séptico Ovoide 2000 Lt (incluye: Tanque séptico, Tanque anaeróbico y Trampa de grasas)	und	1,00	$	5.348.600,00
5	APARATOS SANITARIOS				

5,1	Lavamanos de incrustar San Lorenzo blanco de corona con grifería de mesa tipo push	und	3,00	$	586.253,00
5,2	Sanitario bajo consumo one piece doble descarga blanco. Suministro e Instal.	und	3,00	$	660.484,00
5,3	Lavaplatos sencillo en acero inoxidable acabado satinado de 62x48 cm de empotrar + grifería Aluvia o similar, con acoples y desagüe. Suministro e Instal.	und	1,00	$	387.982,00
5,4	Mesón en acero inoxidable básico con poceta 100 x 52 cm, grifería mono control, con desagüe. Suministro e Instal.	und	1,00	$	350.566,00
6	MUROS Y ACABADOS				
6,1	Muro en bloque No. 5 arcilla estándar de 0.12 m (30 x 12 x 20)	m²	3,52	$	91.046,00
6,2	Pañete liso (allanado) muros 1:4, incluye filos y dilataciones	m²	7,04	$	23.864,00
6,3	Raspado superficie de muro pintado en vinilo	m2	9,47	$	7.722,00
6,4	Pintura acrílica alta asepsia para interiores sobre muros 3 manos	m²	130,00	$	15.817,00
6,5	Pintura exterior acrílica tipo koraza o similar sobre muros 3 manos	m²	52,00	$	25.728,00
6,6	Barniz transparente ladrillo fachada dos manos	m²	55,00	$	27.231,00
6,7	Muro en superboard doble cara 10 mm pintado con viniltex o similar calidad.	m²	3,94	$	136.505,00
6,8	Estuco plástico muros. Suministro e instal.	m2	130,00	$	15.310,00
7	CUBIERTA				
7,1	Correa metalica en perfil estructural PHR-C 120 x 60 x 2 mm, con anticorrosivo, esmalte e instalacion.	m	148,70	$	53.938,00
7,2	Cubierta tipo sandwich Deck 333C - cal. 26 pintada a dos caras,	m²	141,76	$	323.505,00

J&M INGENIERIA SAS
NIT. 900103645-8

	poliuretano de e=38 mm. Suministro e instalación				
7,3	Caballete TZL metálico cal 26/28 prepintado a=0.60 m	m	14,86	$	42.402,00
7,4	Cielo raso en lámina PVC 10 mm (incluye cornisa)	m²	45,54	$	96.274,00
7,5	Canal en lámina galvanizada cal. 20 desarrollo 0.60 m. pintado con wash primer y esmalte. Suministro e Instal.	m	30,30	$	141.170,00
7,6	Bajante A.LL. PVC 4"	m	18,00	$	54.446,00
8	CARPINTERIA METALICA Y EN MADERA				
8,1	Ventana aluminio corrediza con vidrio templado 5 mm instalada a todo costo	m²	13,59	$	260.000,00
8,2	Puerta en aluminio con vidrio incoloro 4 mm. Suministro e instal.	m²	11,51	$	405.719,00
8,3	Pasamanos en acero inoxidable cal. 18 2" incluye soportes. Suministro e Instal.	m	1,00	$	168.333,00
9	ADECUACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS				
9,1	Acometida en baja tension en conductor 2x8+8 AWG concentrico 600 V 90°C XLPE-PVC. Suministro e instalacion	m	25,00	$	85.868,00
9,2	Suministro e instalación de medidor de energia, incluye: caja para medidor, medidor trifasico tetrafilar, breaker totalizador, sistema de puesta a tierra	und	1,00	$	2.213.427,00
9,3	Suministro e instalación tablero trifásico de 12 circuitos, 220 V, Imáx de 150A, Isc 10 kA, con espacio para totalizador, puerta, incluye accesorios de montaje.	und	1,00	$	860.467,00
9,4	Interruptor Termomagnético Regulable 35A a 50A, 25kA Totalizador. Suministro e instalación	und	1,00	$	343.575,00

Carrera 16 No. 14-55
Barrió Los Libertadores

Móvil: 3155674719
Móvil: 3162663148

administración@jymingenieria.com
contacto@jymingenieria.com
comercialjymingenieria.com

9,5	Cortacircuito termomagnetico de 1x(10A-60A), 120/240 V, 10kA, enchufable. Suministro e instalación	und	12,00	$	32.993,00
9,6	Salida para iluminación en techo, incluye tubería EMT 3/4", cable de cobre THWN N° 12, accesorios, cajas de paso	und	18,00	$	206.103,00
9,7	Luminaria tipo panel led 60x60 cm, 110 V. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijación	und	12,00	$	158.007,00
9,8	Modulo LED redondo 24W, 110 V 1680-2400 lm de sobreponer. Suministro e instalación	und	6,00	$	71.602,00
9,9	Salida para interruptor sencillo, línea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plástica 5800, terminales PVC y readecuación de muro.	und	10,00	$	151.111,00
9,10	Salida para tomacorriente doble con polo a tierra, 20A - 125V, salida dedicada. Incluye: tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre 12 AWG (10 m promedio), caja metálica 5800 o 2400 incluye aparato	und	11,00	$	250.151,00
9,11	Salida para tomacorriente doble con polo a tierra GFCI 15 A - 125 V, incluye: tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre	und	3,00	$	311.487,00
9,12	Acometida en cable de cobre aislado {[3xN°8(F)]+ [1xN°8AWG(N)] + [1xN°10AWG(T)]} - THW 600 V 75°C. Suministro e instalación (TGD-1)	m	0,91	$	250.151,00
	COSTO DIRECTO			**$**	**146.410.464,14**
	AIU		**30%**	**$**	**43.923.139,24**
	CERTIFICACIÓN RETIE			**$**	**5.000.000,00**
	VALOR CONTRACTUAL			**$**	**195.333.603,38**

Carrera 16 No. 14-55
Barrió Los Libertadores

Móvil: 3155674719
Móvil: 3162663148

administración@jymingenieria.com
contacto@jymingenieria.com
comercialjymingenieria.com

1.5 Descripción de actividades ejecutadas

I. Actividades Preliminares

Se ejecutaron labores de retiro y demolición necesarias para preparar las áreas de intervención. Incluyó el desmonte de cubiertas en asbesto cemento, ventanas, puertas, cielo raso, correas, canales y bajantes, garantizando un retiro controlado y seguro de los elementos existentes.

Se realizó la demolición manual de placas de piso y tabletas, así como la demolición de muros en ladrillo de bajo espesor y enchapes en muros. Estas actividades incluyeron cargue, retiro y disposición de escombros, dejando las áreas completamente limpias.

También se ejecutó el retiro de aparatos sanitarios, lavaderos, mesón en concreto y tableros eléctricos, mediante la desconexión previa de redes para evitar daños en instalaciones existentes.

Se llevaron a cabo excavaciones manuales en material común para adecuación de redes, junto con la apertura de regatas en muros para el paso de tuberías eléctricas e hidrosanitarias. Posteriormente, estas regatas fueron resanadas con mortero, dejando las superficies listas para acabados.

Adicionalmente, se desmontaron las redes hidráulicas y sanitarias existentes (PVC en varios diámetros), retirando completamente tuberías y accesorios.

II. Pisos y enchapes

Se realizó la instalación de enchape en piso en cerámica duro piso 33,8 x 33.8, iniciando con la verificación de la superficie de apoyo, la cual debía estar nivelada, limpia y libre de material suelto. Posteriormente, se aplicó mortero o adhesivo adecuado para la fijación de las piezas.

Se instaló cerámica 30 x 60 blanco,en los muros sobre una base previamente preparada.

Las piezas se colocaron de manera ordenada, alineadas y bien fijadas para evitar desprendimientos. Se sellaron las uniones entre piezas y se limpió la superficie, logrando un acabado uniforme y fácil de mantener.

Se construyó una base en concreto que sirve como soporte principal del piso. Primero se preparó el terreno y se dejó parejo, luego se vació el concreto y se distribuyó bien para que quedara uniforme. Esta base se dejó firme y nivelada, con el fin de que encima se puedan instalar el enchape de piso.

Para la construcción de las rampas se adecuó primero el área, realizando la preparación y nivelación de la superficie. Posteriormente se instaló el refuerzo necesario y se vació el concreto, dándole la forma y pendiente requerida para garantizar un acceso

III. Instalaciones Hidráulicas.

Se realizó el trazado de la red de agua y se abrieron los espacios necesarios para instalar la tubería ADE ½" Luego se colocaron los tubos, uniéndolos correctamente para evitar fugas, y se aseguraron en su posición.

Se instalaron salidas de agua en los lugares definidos, dejando los puntos listos para conectar los aparatos. Estas conexiones se dejaron bien fijadas y protegidas dentro del muro.

Se instaló la barra abatible, fijándola firmemente al muro para garantizar estabilidad. Se verificó su correcto funcionamiento y resistencia para brindar apoyo seguro al momento de usarla.

Se instaló el tanque de 1000 lt en una posición adecuada, asegurando su estabilidad. Luego se conectó a la red de agua mediante tuberías, permitiendo el almacenamiento y distribución del agua hacia los diferentes puntos.

IV. Instalaciones sanitarias.

Se realizó el suministro e instalación de tubería sanitaria PVC de 2" y PCV de 4" para la conducción de aguas residuales, ejecutando actividades de trazado, corte, ensamble y fijación de la tubería y accesorios necesarios. La instalación se efectuó garantizando las pendientes requeridas para un adecuado flujo.

Se realizó la instalación de puntos de desagüe sanitario en tubería PVC de 2" con sifón y PVC de 4", destinados a la evacuación de aguas residuales. Las actividades incluyeron trazado, corte, ensamble y conexión de tuberías y accesorios, garantizando las pendientes necesarias para un adecuado drenaje.

Se realizó el suministro e instalación de sistema séptico ovoide de 2000 litros, compuesto por tanque séptico, tanque anaeróbico y trampa de grasas, destinado al tratamiento primario de aguas residuales. Las actividades incluyeron la instalación y conexión de tuberías sanitarias en PVC de entrada y salida entre cada uno de los componentes del sistema, garantizando las pendientes y uniones necesarias para el adecuado flujo de las aguas residuales.

V. Aparatos sanitarios

Se realizó la instalación de lavamanos, verificando previamente las medidas y condiciones del área destinada para su ubicación. Se instalaron las conexiones hidráulicas y sanitarias correspondientes

Suministro del aparato sanitario, accesorios de instalación y elementos de fijación requeridos para su correcto montaje. Inicialmente se verificó el punto sanitario y las condiciones de nivelación del área, posteriormente se efectuó la instalación y fijación del sanitario asegurando estabilidad, alineación y hermeticidad en las conexiones.

Suministro e instalación de mesón en acero inoxidable de 100 x 52 cm con poceta integrada, grifería mono control y desagüe. Incluye instalación, fijación, conexión a redes hidráulicas y sanitarias, y verificación de su correcto funcionamiento.

VI. Muros y acabados.

Se realizó la construcción de muro en bloque de arcilla estándar No. 5 de 0.12 m de espesor (30 x 12 x 20 cm), mediante actividades de replanteo, nivelación, pega de bloques con mortero y alineación de hiladas. La ejecución se desarrolló garantizando la correcta plomada, nivel y estabilidad del muro, dejando la superficie lista para los acabados correspondientes.

Se realizó la ejecución de pañete liso allanado sobre muros en mortero relación 1:4, incluyendo la conformación de filos y dilataciones necesarias para un adecuado acabado. Las actividades comprendieron preparación de la superficie, aplicación y nivelación del mortero, garantizando uniformidad, adherencia y acabado liso en los muros intervenidos.

Se realizó la aplicación de pintura acrílica de alta asepsia para interiores sobre muros, mediante la ejecución de tres manos de pintura, garantizando uniformidad, cubrimiento y acabado final. Las actividades incluyeron limpieza y preparación básica de la superficie, así como la aplicación sucesiva de las capas de pintura, dejando los muros en adecuadas condiciones de protección.

Se realizó la aplicación de pintura acrílica para exteriores tipo Koraza o similar sobre muros, mediante la ejecución de tres manos de pintura, garantizando adecuado cubrimiento, uniformidad y protección de las superficies frente a las condiciones ambientales.

Se realizó la construcción de muro en Superboard doble cara de 10 mm, instalado sobre estructura de soporte y acabado con pintura tipo Viniltex o similar calidad. Las actividades incluyeron corte, fijación y ensamble de las láminas, tratamiento de juntas y aplicación de pintura.

Se realizó el suministro y aplicación de estuco plástico sobre muros, con el fin de mejorar la uniformidad y acabado de las superficies previo a la pintura final. Las actividades incluyeron preparación básica de la superficie, aplicación, extendido y lijado del material.

VII. Cubierta

Se realizó el suministro e instalación de correas metálicas en perfil estructural PHR-C de 120 x 60 x 2 mm, utilizadas como elemento de soporte para la cubierta, ejecutando actividades de corte, nivelación, alineación y fijación de la estructura metálica. Las correas fueron protegidas mediante la aplicación de pintura anticorrosiva y acabado en esmalte.

Posteriormente, se efectuó el suministro e instalación de cubierta tipo sándwich Deck 333C calibre 26, prepintada a dos caras y con núcleo en poliuretano de 38 mm de espesor, garantizando aislamiento térmico y adecuada protección de la edificación. La instalación incluyó posicionamiento, traslapo, fijación mecánica y sellado de las láminas, verificando correcta pendiente y alineación para el adecuado manejo de aguas lluvias.

Se instaló caballete metálico TZL prepintado calibre 26/28 de 0.60 m de ancho en la parte superior de la cubierta, realizando los respectivos empalmes y fijaciones para asegurar un cierre adecuado entre las superficies de cubierta,

Se realizó el suministro e instalación de cielo raso en lámina PVC de 10 mm, incluyendo cornisa perimetral para acabado y remate del sistema. Las actividades comprendieron replanteo, instalación de la estructura de soporte, corte, ajuste y fijación de las láminas, garantizando nivelación, alineación y adecuada estabilidad del cielo raso, dejando un acabado uniforme.

VIII. **Carpintería metálica.**

Se realizó el suministro e instalación de ventana corrediza en aluminio con vidrio templado de 5 mm y puerta en aluminio con vidrio incoloro de 4 mm. Los trabajos incluyeron armado, ubicación, instalación y ajuste de los elementos, así como la colocación de accesorios necesarios para garantizar su correcto funcionamiento, cierre adecuado y buena presentación final.

IX. Adecuaciones eléctricas.

Se realizó la instalación de la acometida eléctrica en baja tensión mediante cableado apto para distribución de energía, garantizando el suministro eléctrico seguro hacia la edificación.
Suministro e instalación del sistema de medición de energía, incluyendo caja para medidor, medidor trifásico, protección principal y sistema de puesta a tierra, permitiendo el adecuado control y seguridad de la instalación eléctrica.

Se instaló tablero eléctrico trifásico de 12 circuitos con capacidad para distribución y protección de las diferentes cargas eléctricas de la edificación, incluyendo interruptor totalizador y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

También se realizó la instalación de interruptor termomagnético regulable de 35A a 50A como protección principal del sistema eléctrico, garantizando seguridad ante sobrecargas o fallas.

Para el sistema de iluminación, se ejecutaron salidas eléctricas en techo con tubería, cableado y cajas necesarias para la conexión de luminarias. Posteriormente, se instalaron paneles LED de 60 x 60 cm a 110 V, Modulo LED redondo 24W, incluyendo cableado, clavija y elementos de fijación, garantizando adecuada iluminación de los espacios intervenidos.

Igualmente, se realizaron salidas para interruptores sencillos, incluyendo tubería, cableado, cajas y adecuaciones menores en muro para permitir el control independiente de la iluminación.

Se instalaron tomacorrientes dobles con polo a tierra de 20A y 125V para conexión de equipos eléctricos, incluyendo tubería, cableado, cajas y accesorios necesarios para su funcionamiento seguro.

De igual manera, se instalaron tomacorrientes dobles tipo GFCI de 15A y 125V, diseñados para brindar mayor protección eléctrica en áreas con presencia de humedad.

Finalmente, se ejecutó la acometida principal en cableado de cobre aislado para conexión del tablero general de distribución, incluyendo suministro, instalación y adecuación de los elementos requeridos para el correcto funcionamiento del sistema eléctrico.

X. No previstos.


Se realizó la instalación de guardaescoba tipo mediacaña en granito pulido y brillado, incluyendo juntas de dilatación plásticas para un mejor acabado y protección de las uniones. Las actividades comprendieron corte, ajuste, fijación y nivelación del material sobre la parte inferior de los muros, garantizando uniformidad, resistencia y una adecuada terminación entre piso y pared.

Se realizó la pulida y brillada de piso en granito utilizando maquinaria y materiales especializados, con el fin de mejorar la uniformidad, limpieza y apariencia de la superficie. Las actividades incluyeron desbaste, pulido y brillado del piso, logrando un acabado liso y uniforme.

Se realizó el suministro e instalación de luminarias LED de emergencia de 110 V y 2.4 W, con autonomía mínima de 90 minutos, incluyendo cableado y elementos de fijación necesarios para su correcto funcionamiento. Estas luminarias fueron ubicadas para garantizar iluminación en caso de interrupción del servicio eléctrico.

Asimismo, se efectuó la instalación de luminarias tipo aplique LED de emergencia, incluyendo cableado, clavija y accesorios de fijación, asegurando adecuada iluminación y funcionamiento en las áreas intervenidas.

De igual manera, se instalaron módulos LED redondos de incrustar de 18W y 110V, ejecutando actividades de conexión, fijación y ajuste de los elementos, garantizando una iluminación uniforme y adecuada presentación en los espacios interiores

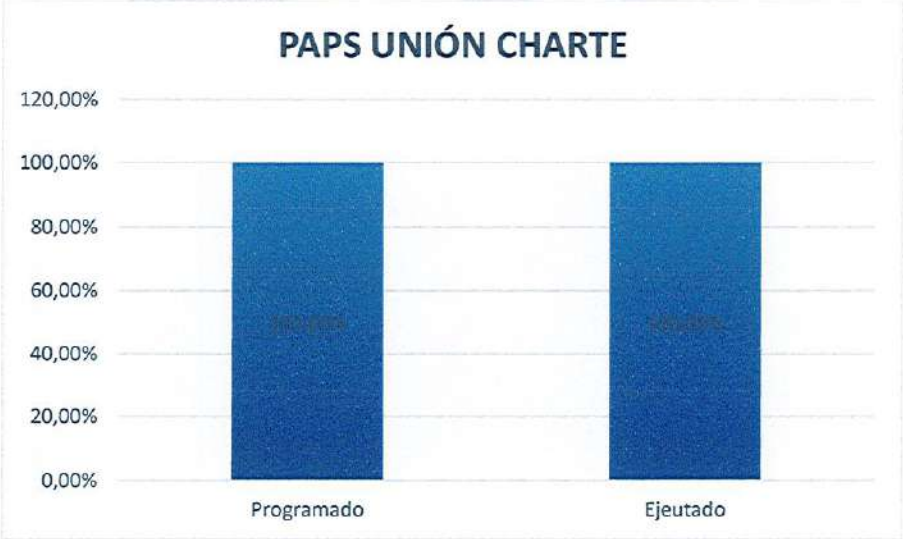

Las actividades del contrato de obra se ejecutaron conforme a las necesidades presentadas en campo, manteniendo coherencia con el presupuesto contractual. De igual manera, se dio cumplimiento a la programación establecida, desarrollando las actividades dentro de los tiempos previstos.

En consecuencia, se evidencia el cumplimiento del cronograma de obra

J&M INGENIERIA SAS
NIT. 900103645-8

4. REGISTRO FOTOGRAFICO





Visita y socialización del objeto del contrato





Instalación de valla informativa y retiro de canal de aguas lluvias.

Carrera 16 No. 14-55
Barrió Los Libertadores

Móvil: 3155674719
Móvil: 3162663148

administración@jymingenieria.com
contacto@jymingenieria.com
comercialjymingenieria.com

1.1. Desmonte Cubiertas cemento con transporte.





Desmonte de cubiertas de asbesto cemento.





Desmonte de cubiertas de asbesto cemento.

Carrera 16 No. 14-55
Barrió Los Libertadores

Móvil: 3155674719
Móvil: 3162663148

administración@jymingenieria.com
contacto@jymingenieria.com
comercialjymingenieria.com





Desmonte de cubiertas de asbesto cemento.





Desmonte de cubiertas de asbesto cemento.

Carrera 16 No. 14-55
Barrió Los Libertadores

Móvil: 3155674719
Móvil: 3162663148

administración@jymingenieria.com
contacto@jymingenieria.com
comercialjymingenieria.com


J&M INGENIERIA SAS
NIT. 900103645-8





Desmonte de cubiertas de asbesto cemento.



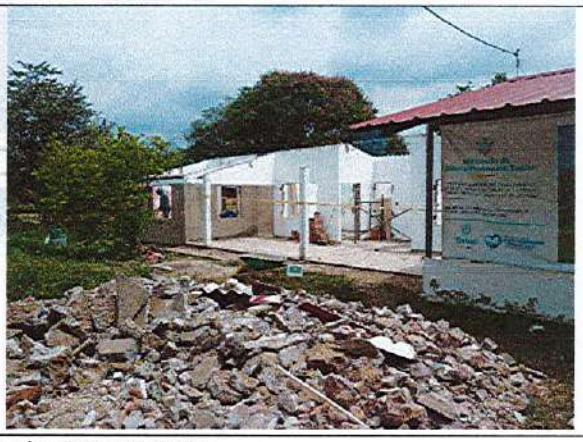

Desmonte de cubiertas de asbesto cemento

Carrera 16 No. 14-55
Barrió Los Libertadores

Móvil: 3155674719
Móvil: 3162663148

administración@jymingenieria.com
contacto@jymingenieria.com
comercialjymingenieria.com

J&M INGENIERIA SAS
NIT. 900103645-8





Desmonte de cubiertas de asbesto cemento, cargue y acopio.

1.2 Demolición manual placa de piso 0.10 m prom, con retiro.







Demolición manual de placa de piso

Carrera 16 No. 14-55
Barrió Los Libertadores

Móvil: 3155674719
Móvil: 3162663148

administración@jymingenieria.com
contacto@jymingenieria.com
comercialjymingenieria.com

J&M INGENIERIA SAS
NIT. 900103645-8






Demolición manual de placa de piso




Acopio de material de demolición.

Carrera 16 No. 14-55
Barrió Los Libertadores

Móvil: 3155674719
Móvil: 3162663148

administración@jymingenieria.com
contacto@jymingenieria.com
comercialjymingenieria.com

J&M INGENIERIA SAS
NIT. 900103645-8





Demolición manual de placa de piso

1.3 Desmonte aparatos sanitarios.
1.12 Desmonte instalaciones hidráulicas PVC ϴ 2", 3", 4"
1.13 Desmonte instalaciones hidráulicas PVC ϴ ½", ¾", 1", 1 ½" con retiro





Desmonte de sanitario

Carrera 16 No. 14-55
Barrió Los Libertadores

Móvil: 3155674719
Móvil: 3162663148


administración@jymingenieria.com
contacto@jymingenieria.com
comercialjymingenieria.com

1.4 Desmonte de ventanas, con transporte.
1.5 Desmonte marcos y puertas con transporte.





Desmonte de puertas y ventanas.

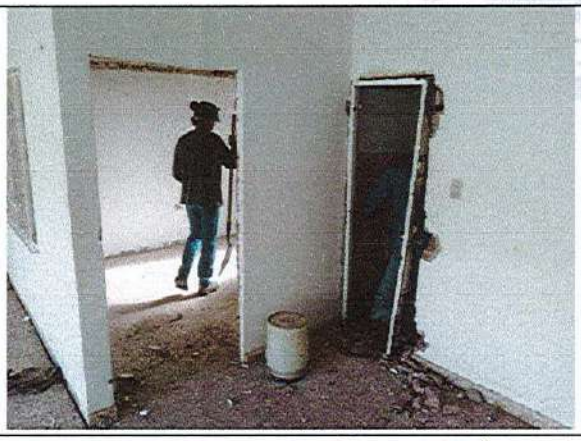



Desmonte de puertas y ventanas, incluye marco.

Carrera 16 No. 14-55
Barrió Los Libertadores

Móvil: 3155674719
Móvil: 3162663148

administración@jymingenieria.com
contacto@jymingenieria.com
comercialjymingenieria.com





Desmonte de marcos y puertas.





Desmonte de marcos y puerta.

1.6 Demolición enchape muros con retiro.

Carrera 16 No. 14-55
Barrió Los Libertadores

Móvil: 3155674719
Móvil: 3162663148

administración@jymingenieria.com
contacto@jymingenieria.com
comercialjymingenieria.com





Demolición manual de enchape de pisos y muros.








Demolición manual de enchape de pisos.

Carrera 16 No. 14-55
Barrió Los Libertadores

Móvil: 3155674719
Móvil: 3162663148

administración@jymingenieria.com
contacto@jymingenieria.com
comercialjymingenieria.com

J&M INGENIERIA SAS
NIT. 900103645-8

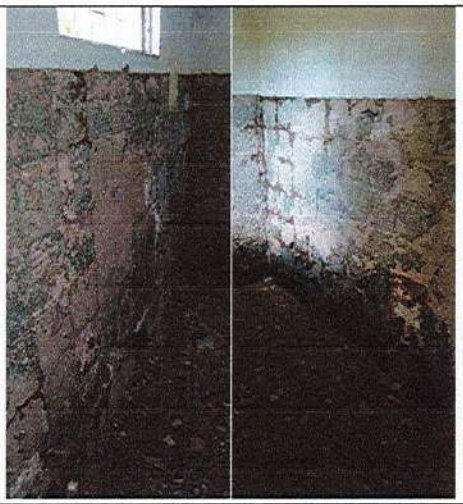



Demolición manual de enchape de pisos y muros.

Demolición enchape en piso.

1.7 Excavación a mano en material común





Excavación a mano.

Carrera 16 No. 14-55
Barrió Los Libertadores

Móvil: 3155674719
Móvil: 3162663148

administración@jymingenieria.com
contacto@jymingenieria.com
comercialjymingenieria.com

J&M INGENIERIA SAS
NIT. 900103645-8

1.8. Desmonte de correas.





Desmonte de correas.

1.9 Regata en muro, mampostería tipo ladrillo o bloque para tuberías diámetros menores a 1" (incluye corte y retiro).

1.10 Resane en mortero 1:4 A= 0.10, E= 1,5 cm





Regata y resane de muros.

Carrera 16 No. 14-55
Barrió Los Libertadores

Móvil: 3155674719
Móvil: 3162663148

administración@jymingenieria.com
contacto@jymingenieria.com
comercialjymingenieria.com





Regata y resane de muros.





Regata y resane en muro.

1.11 Demolición a mano de tableta piso, espesor entre 0,06 y 0,08 m con retiro.

Carrera 16 No. 14-55
Barrió Los Libertadores

Móvil: 3155674719
Móvil: 3162663148

administración@jymingenieria.com
contacto@jymingenieria.com
comercialjymingenieria.com





Demolición de tableta.









Demolición de tableta.

Carrera 16 No. 14-55
Barrió Los Libertadores

Móvil: 3155674719
Móvil: 3162663148

administración@jymingenieria.com
contacto@jymingenieria.com
comercialjymingenieria.com

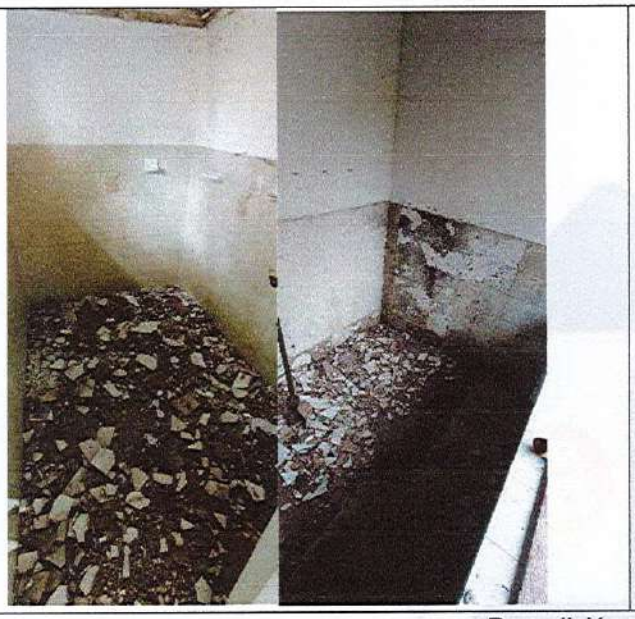

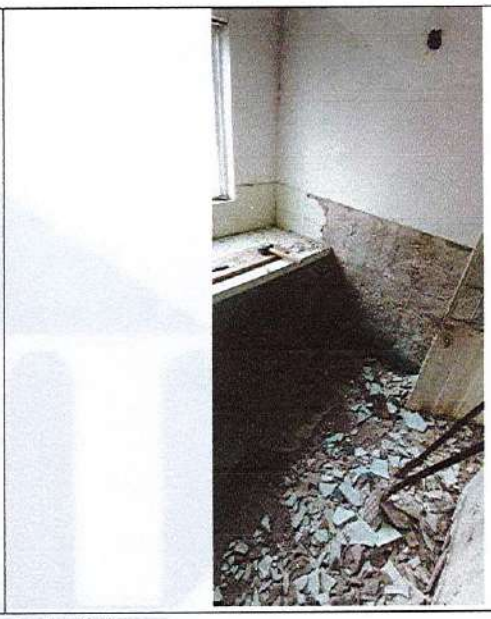

Demolición de tableta.





Demolición de tableta.

1.14 Desmonte de tablero eléctrico.


Carrera 16 No. 14-55
Barrió Los Libertadores

Móvil: 3155674719
Móvil: 3162663148

administración@jymingenieria.com
contacto@jymingenieria.com
comercialjymingenieria.com

J&M INGENIERIA SAS
NIT. 900103645-8



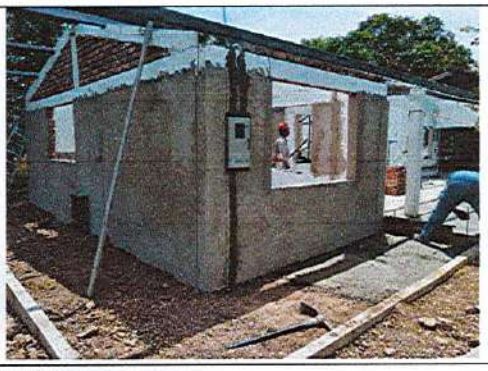

Desmonte de tablero eléctrico.

1.15 Demolición manual de mesón en concreto A= 0.60 m





Demolición manual de mesón.

Carrera 16 No. 14-55
Barrió Los Libertadores

Móvil: 3155674719
Móvil: 3162663148

administración@jymingenieria.com
contacto@jymingenieria.com
comercialjymingenieria.com






Demolición manual de mesón en concreto.

1.16 Demolición muro de ladrillo de espesor menor a 0.15m con retiro.



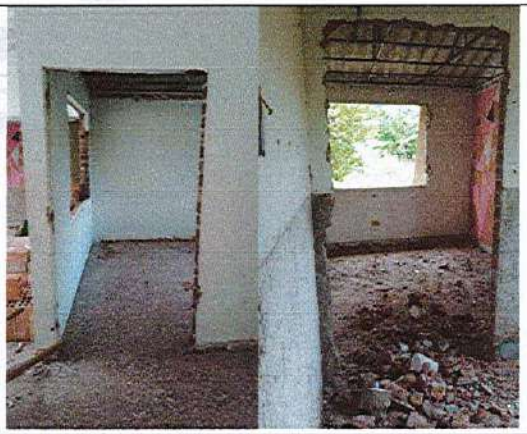

Corte y demolición manual de muros en ladrillo.

Carrera 16 No. 14-55
Barrió Los Libertadores

Móvil: 3155674719
Móvil: 3162663148

administración@jymingenieria.com
contacto@jymingenieria.com
comercialjymingenieria.com





Demolición muro de ladrillo.







Demolición muro de ladrillo.

1.17 Desmonte de cielo raso con retiro.

Carrera 16 No. 14-55
Barrió Los Libertadores

Móvil: 3155674719
Móvil: 3162663148

administración@jymingenieria.com
contacto@jymingenieria.com
comercialjymingenieria.com





Desmonte de cielo raso




Desmonte de cielo raso

1.18 Desmonte de canales y bajantes de agua lluvias.


Carrera 16 No. 14-55
Barrió Los Libertadores

Móvil: 3155674719
Móvil: 3162663148

administración@jymingenieria.com
contacto@jymingenieria.com
comercialjymingenieria.com

J&M INGENIERIA SAS
NIT. 900103645-8



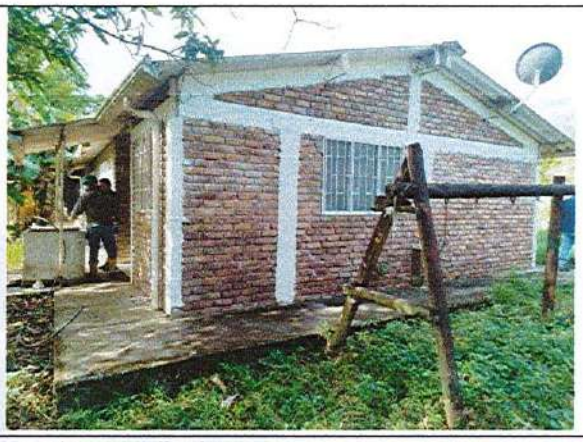

Desmonte de canales y bajantes de agua lluvias





Desmonte de canales y bajantes de agua lluvia.

Carrera 16 No. 14-55
Barrió Los Libertadores

Móvil: 3155674719
Móvil: 3162663148

administración@jymingenieria.com
contacto@jymingenieria.com
comercialjymingenieria.com

J&M INGENIERIA SAS
NIT. 900103645-8





Desmonte bajantes de agua lluvia.

1.19 Desmonte lavaderos prefabricados, con retiro





Desmonte lavaderos prefabricados

2.3 Enchape piso en cerámica duro piso 33.8 x 33.8. Suministro e instal.

Carrera 16 No. 14-55
Barrió Los Libertadores

Móvil: 3155674719
Móvil: 3162663148

administración@jymingenieria.com
contacto@jymingenieria.com
comercialjymingenieria.com





Enchape piso en cerámica.





Enchape piso en cerámica.

2.4. Enchape pared cerámica 30 x 60 cm blanco "Plana" de Corona o similar. Sum e insta.





Enchape pared cerámica 30 x 60 cm





Enchape pared cerámica 30 x 60 cm

2.5 Placa base en concreto 3000 psi e=0.10 m reforzada con malla Q-5 de 6 mm


Carrera 16 No. 14-55
Barrió Los Libertadores

Móvil: 3155674719
Móvil: 3162663148

administración@jymingenieria.com
contacto@jymingenieria.com
comercialjymingenieria.com

J&M INGENIERIA SAS
NIT. 900103645-8



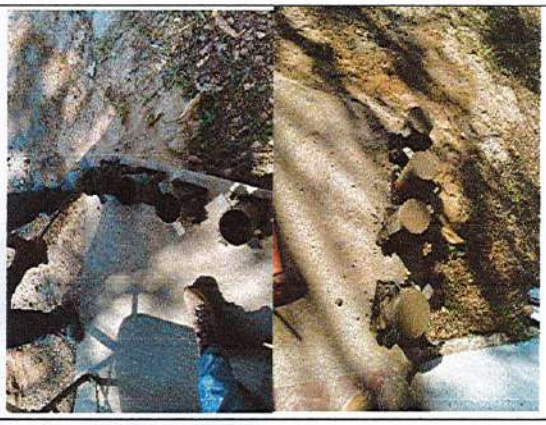

Construcción de anden perimetral.





Placa base de concreto de 3000 psi.

Carrera 16 No. 14-55
Barrió Los Libertadores

Móvil: 3155674719
Móvil: 3162663148

administración@jymingenieria.com
contacto@jymingenieria.com
comercialjymingenieria.com





Placa en concreto

2.6 Guardaescoba en cerámica duro piso 33 x 7 cm. Suministro e Instalación.




Guarda escoba en cerámica.

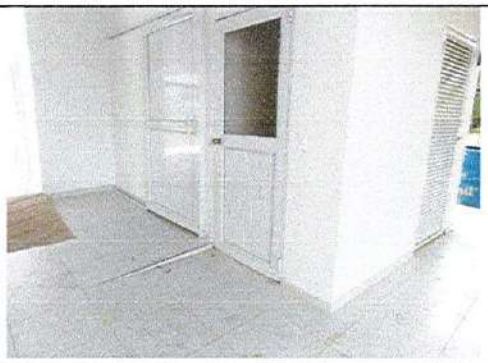Guarda escoba en cerámica.


Carrera 16 No. 14-55
Barrió Los Libertadores

Móvil: 3155674719
Móvil: 3162663148

administración@jymingenieria.com
contacto@jymingenieria.com
comercialjymingenieria.com


J&M INGENIERIA SAS
NIT. 900103645-8


2.9 Concreto estriado rampas de 3000 psi reforzado 0.16 m

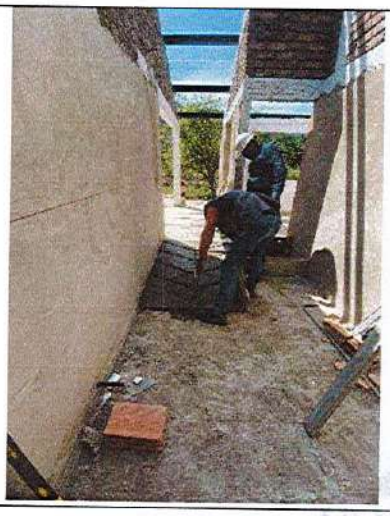



Construcción de rampas.

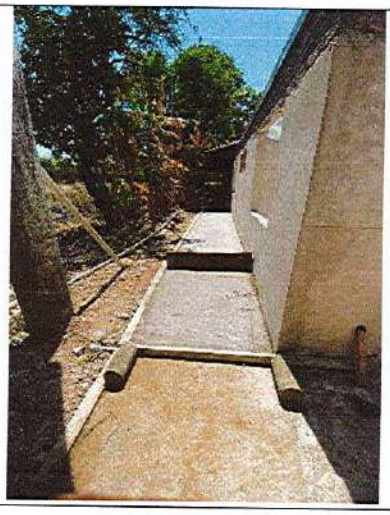

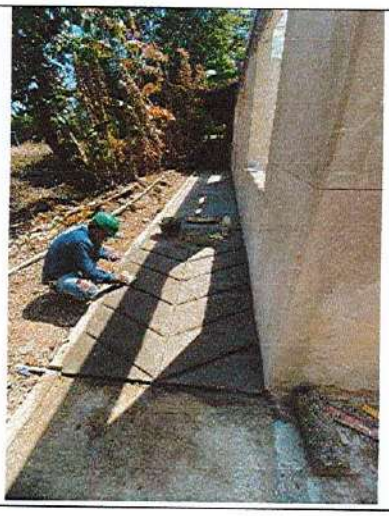

Construcción de rampas.

Carrera 16 No. 14-55
Barrió Los Libertadores

Móvil: 3155674719
Móvil: 3162663148

administración@jymingenieria.com
contacto@jymingenieria.com
comercialjymingenieria.com

3.1 Tubería presión PVC RDE 9 ½". Suministro e instal.
3.3 Punto de agua fría PVC ½"





Tubería presión PVC RDE 9 ½".

3.4 Barra de seguridad abatible en acero inoxidable 13 x 85 cm. Suministro e instal





Barra de seguridad.

3.6 Tanque elevado 1.000 lts con conexión y distribución PVC de ½" y 1". Suministro e instal.

J&M INGENIERIA SAS
NIT. 900103645-8






Tanque elevado 1.000 ltr.

4.1 Tubería sanitaria PVC 2". Suministro e instal.
4.3 Tubería sanitaria PVC 4". Suministro e instal.
4.4. Punto de desagüe sanitario.
4.5 Punto sanitario PVC 4"



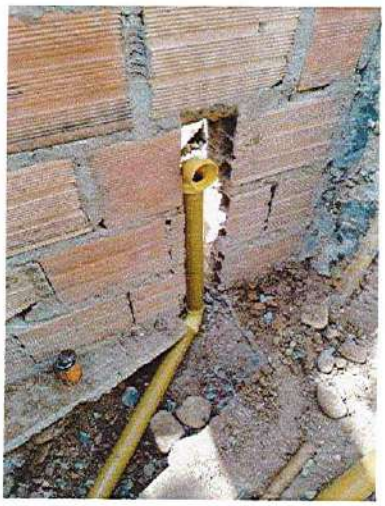


Tubería Sanitaria.

Carrera 16 No. 14-55
Barrió Los Libertadores

Móvil: 3155674719
Móvil: 3162663148

administración@jymingenieria.com
contacto@jymingenieria.com
comercialjymingenieria.com

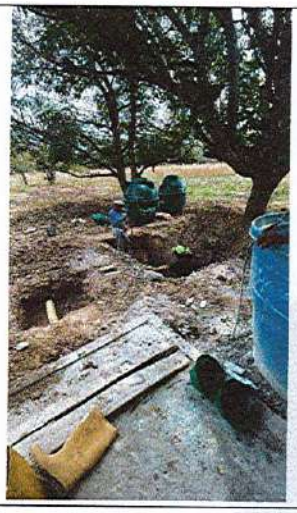
4.7 Sistema séptico Ovoide 2000 Lt (incluye: Tanque séptico, Tanque anaeróbico y Trampa de grasas)	
	
Sistema Séptico.	
5.1 Lavamanos de incrustar San Lorenzo blanco de corona con grifería de mesa tipo push. 5.2 Sanitario bajo consumo one piece doble descarga blanco. Suministro e Instal.	
	
Lavamanos y sanitario.	

Carrera 16 No. 14-55
Barrió Los Libertadores

Móvil: 3155674719
Móvil: 3162663148


administración@jymingenieria.com
contacto@jymingenieria.com
comercialjymingenieria.com



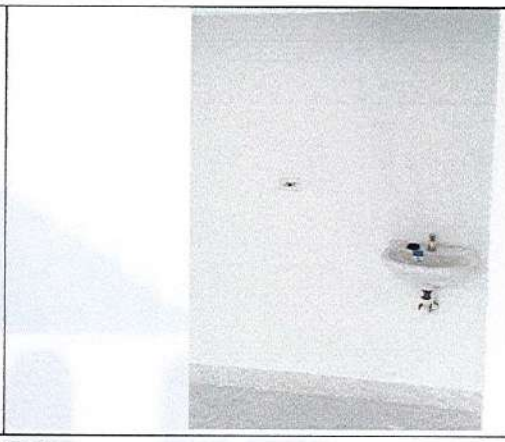

Lavamanos.

6.1 Muro en bloque no. 5 arcilla estándar de 0.12 m (30 x 12 x 20).

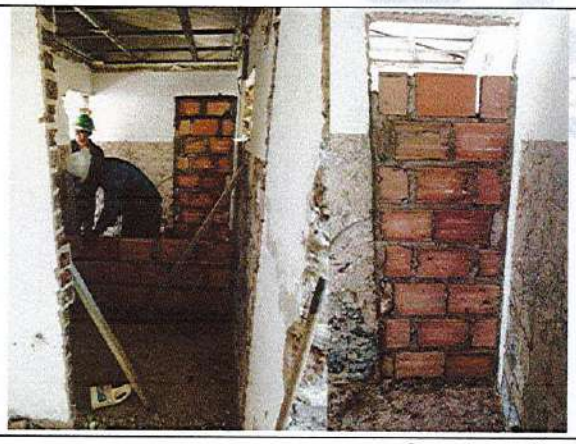



Construcción de muro en bloque No.5

Carrera 16 No. 14-55
Barrió Los Libertadores

Móvil: 3155674719
Móvil: 3162663148

administración@jymingenieria.com
contacto@jymingenieria.com
comercialjymingenieria.com


J&M INGENIERIA SAS
NIT. 900103645-8





Construcción de muro en bloque No.5



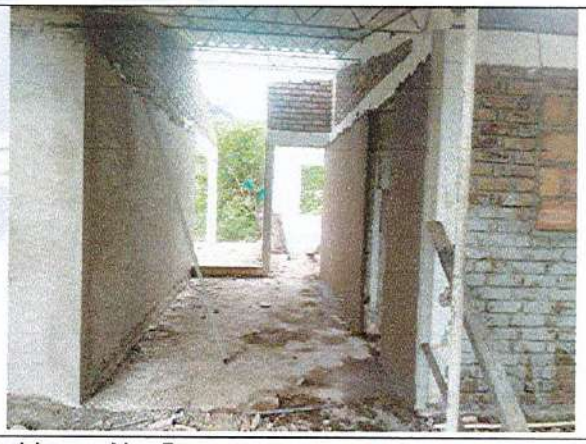

Construcción de muro en bloque No. 5

Carrera 16 No. 14-55
Barrió Los Libertadores

Móvil: 3155674719
Móvil: 3162663148

administración@jymingenieria.com
contacto@jymingenieria.com
comercialjymingenieria.com






Construcción de muro en bloque No. 5.

6.2 Pañete liso (allanado) muros 1:4, incluye filos y dilataciones.



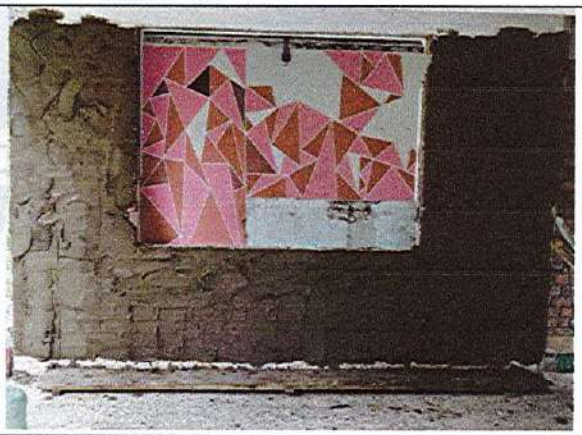

Limpieza de muros y aplicación de pañete liso 1:4 en muros

Carrera 16 No. 14-55
Barrió Los Libertadores

Móvil: 3155674719
Móvil: 3162663148

administración@jymingenieria.com
contacto@jymingenieria.com
comercialjymingenieria.com





Aplicación de pañete liso 1:4 en muros





Aplicación de pañete liso 1:4 en muros

Carrera 16 No. 14-55
Barrió Los Libertadores

Móvil: 3155674719
Móvil: 3162663148

administración@jymingenieria.com
contacto@jymingenieria.com
comercialjymingenieria.com





Aplicación de pañete liso 1:4 en muros





Aplicación de pañete liso 1:4 en muros

Carrera 16 No. 14-55
Barrió Los Libertadores

Móvil: 3155674719
Móvil: 3162663148

administración@jymingenieria.com
contacto@jymingenieria.com
comercialjymingenieria.com





Aplicación de pañete liso 1:4 en muros





Aplicación de pañete liso 1:4 en muros

Carrera 16 No. 14-55
Barrió Los Libertadores

Móvil: 3155674719
Móvil: 3162663148

administración@jymingenieria.com
contacto@jymingenieria.com
comercialjymingenieria.com





Aplicación de pañete liso 1:4 en muros





Aplicación de pañete liso 1:4 en muros

Carrera 16 No. 14-55
Barrió Los Libertadores

Móvil: 3155674719
Móvil: 3162663148

administración@jymingenieria.com
contacto@jymingenieria.com
comercialjymingenieria.com

J&M INGENIERIA SAS
NIT. 900103645-8








Aplicación de pañete liso 1:4 en muros.



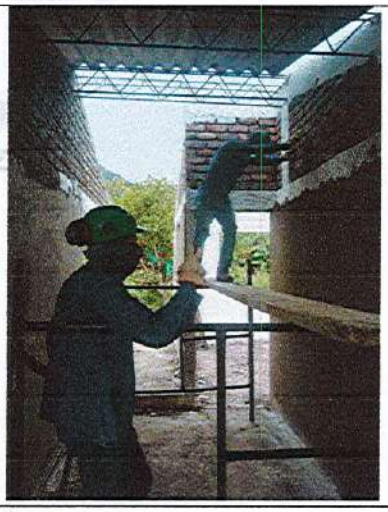

Aplicación de pañete liso 1:4

Carrera 16 No. 14-55
Barrió Los Libertadores

Móvil: 3155674719
Móvil: 3162663148

administración@jymingenieria.com
contacto@jymingenieria.com
comercialjymingenieria.com





Aplicación de pañete liso 1:4






Aplicación de pañete liso 1:4


6.4 Pintura acrílica alta asepsia para interiores sobre muros 3 manos

Carrera 16 No. 14-55
Barrió Los Libertadores

Móvil: 3155674719
Móvil: 3162663148

administración@jymingenieria.com
contacto@jymingenieria.com
comercialjymingenieria.com

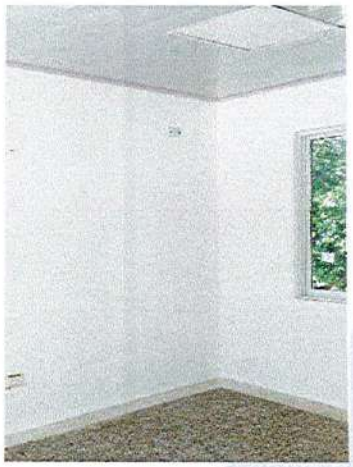



Pintura acrílica alta asepsia.

6.5 Pintura exterior acrílica tipo koraza o similar sobre muros 3 manos.





Pintura exterior acrílica tipo koraza.

Carrera 16 No. 14-55
Barrió Los Libertadores

Móvil: 3155674719
Móvil: 3162663148

administración@jymingenieria.com
contacto@jymingenieria.com
comercialjymingenieria.com





Pintura exterior acrílica tipo koraza.

6.8. Estuco plástico muros. Suministro e instal.





Aplicación de estuco.






Aplicación de estuco en los muros exteriores.

Carrera 16 No. 14-55
Barrió Los Libertadores

Móvil: 3155674719
Móvil: 3162663148

administración@jymingenieria.com
contacto@jymingenieria.com
comercialjymingenieria.com

J&M INGENIERIA SAS
NIT. 900103645-8

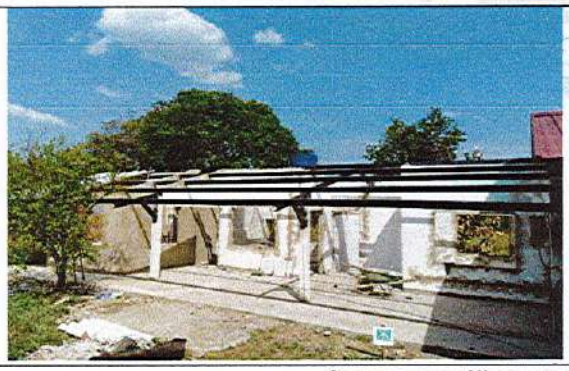7.1 Correa metálica en perfil PHR -C 120 x 60 x 2 mm, con anticorrosivo, esmalte e instalación.
 
Correa metálica en perfil PHR -C 120 x 60 x 2 mm
 
Correa metálica en perfil PHR -C 120 x 60 x 2 mm
7.2 cubierta tipo sándwich Deck 333C – cal. 26 pitada a dos caras, poliuretano de e=38mm. Suministro e instalación.

Carrera 16 No. 14-55
Barrió Los Libertadores

Móvil: 3155674719
Móvil: 3162663148


administración@jymingenieria.com
contacto@jymingenieria.com
comercialjymingenieria.com

J&M INGENIERIA SAS
NIT. 900103645-8





Suministro e Instalación de Cubierta tipo sandwich Deck 333C

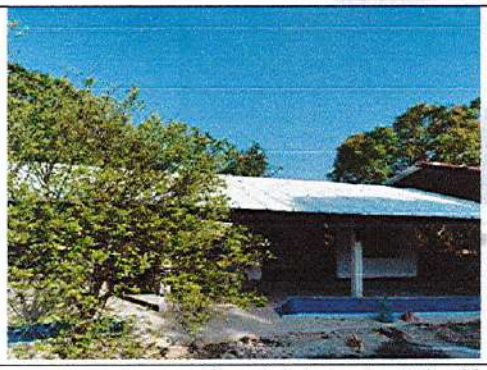



Suministro e Instalación de Cubierta tipo sandwich Deck 333C.

Carrera 16 No. 14-55
Barrió Los Libertadores

Móvil: 3155674719
Móvil: 3162663148

administración@jymingenieria.com
contacto@jymingenieria.com
comercialjymingenieria.com





Cubierta tipo sandwich Deck 333C.

7.3 Caballete TZL metálico cal 26/28 prepintado a=0.60 m



Caballete TZL metálico cal 26/28


7.4 Cielo raso en lamina PVC 10 mm (incluye cornisa)

Carrera 16 No. 14-55
Barrió Los Libertadores


Móvil: 3155674719
Móvil: 3162663148

administración@jymingenieria.com
contacto@jymingenieria.com
comercialjymingenieria.com

J&M INGENIERIA SAS
NIT. 900103645-8

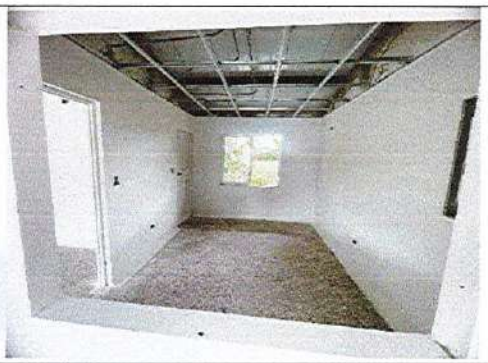



Cielo raso en lamina PVC 10 mm

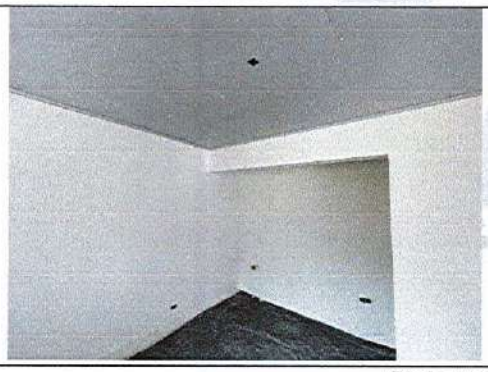


Cielo raso en lamina PVC 10 mm

8.1 Ventana aluminio corrediza con vidrio templado 5 mm instalada a todo costo.
8.2 Puerta en aluminio con vidrio incoloro 4 mm. Suministro e instal.

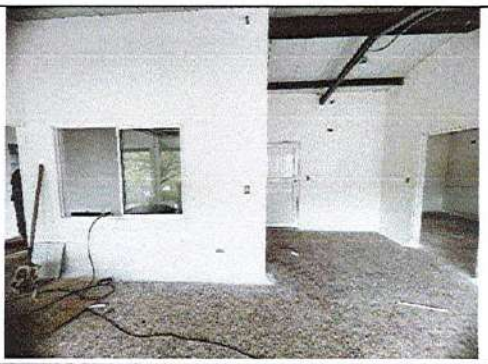Carrera 16 No. 14-55
Barrió Los Libertadores

Móvil: 3155674719
Móvil: 3162663148

administración@jymingenieria.com
contacto@jymingenieria.com
comercialjymingenieria.com

Instalación de puertas y ventanas en aluminio.
 
Instalación de puertas y ventanas en aluminio.
 
Instalación de ventanas.
9.1 Acometida en baja tensión en conductor 2x8+8 AWG concéntrico 600 V 90°C XLPE-PVC. Suministro e instalación.






Acometida de baja tensión.

9.2 Suministro e instalación de medidor de energía, incluye: caja para medidor, medidor trifásico tetrafilar, breaker totalizador, sistema de puesta a tierra.



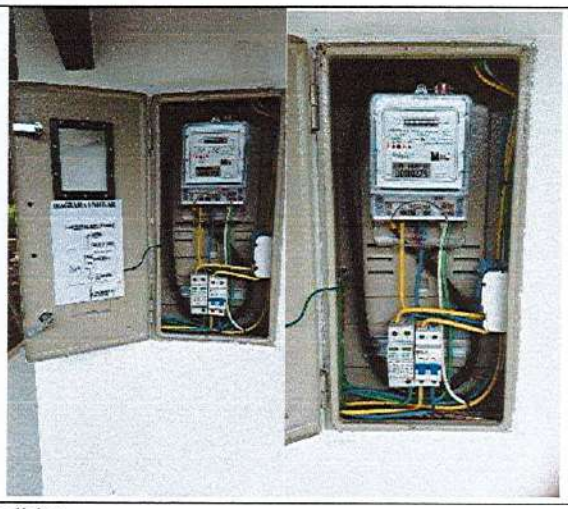


Instalación de medidor.

Carrera 16 No. 14-55
Barrió Los Libertadores

Móvil: 3155674719
Móvil: 3162663148

administración@jymingenieria.com
contacto@jymingenieria.com
comercialjymingenieria.com


J&M INGENIERIA SAS
NIT. 900103645-8

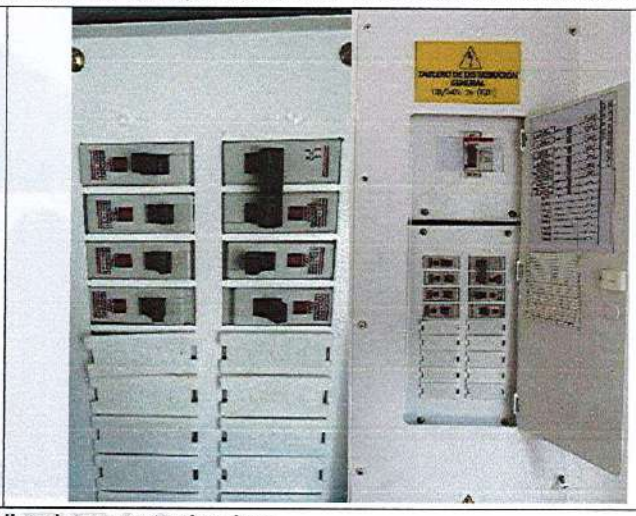
9.3 Suministro e instalación tablero trifásico de 12 circuitos, 220 V, Imáx de 150A, Isc 10 kA, con espacio para totalizador, puerta, incluye accesorios de montaje. 9.4 Interruptor Termomagnético Regulable 35A a 50A, 25kA Totalizador. Suministro e instalación. 9.5 Cortocircuito termomagnético de 1x(10A-60A), 120/240 V, 10kA, enchufable. Suministro e instalación
 
Instalación trifásica, totalizador y cortacircuitos.
9.6 Salida para iluminación en techo, incluye tubería EMT 3/4", cable de cobre THWN N° 12, accesorios, cajas de paso
 
Salida para iluminación de techo.

Carrera 16 No. 14-55
Barrió Los Libertadores

Móvil: 3155674719
Móvil: 3162663148

administración@jymingenieria.com
contacto@jymingenieria.com
comercialjymingenieria.com

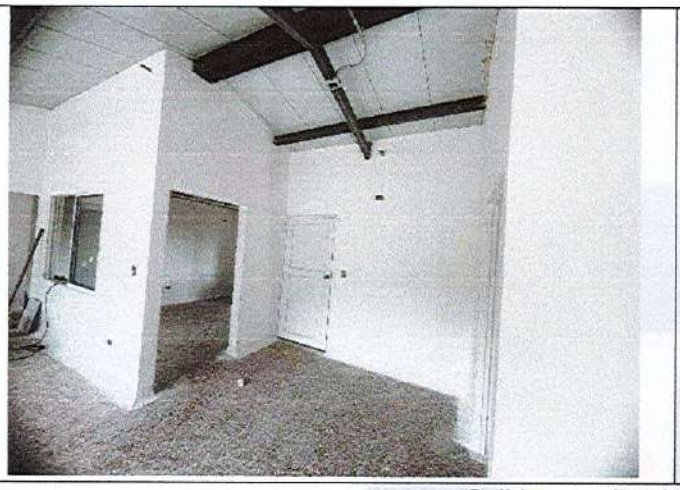

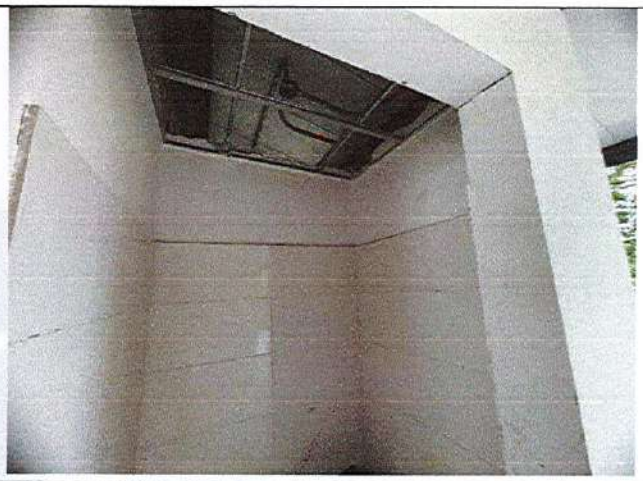

Salida para iluminación de techo.





Salida para iluminación de techo.

9.7 Luminaria tipo panel led 60x60 cm, 110 V. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijación

Carrera 16 No. 14-55
Barrió Los Libertadores

Móvil: 3155674719
Móvil: 3162663148

administración@jymingenieria.com
contacto@jymingenieria.com
comercialjymingenieria.com

J&M INGENIERIA SAS
NIT. 900103645-8





Luminaria tipo panel led 60x60 cm.





Luminaria tipo panel led 60x60 cm.

9.8 Modulo LED redondo 24W, 110 V 1680-2400 lm de sobreponer. Suministro e instalación

Carrera 16 No. 14-55
Barrió Los Libertadores

Móvil: 3155674719
Móvil: 3162663148

administración@jymingenieria.com
contacto@jymingenieria.com
comercialjymingenieria.com





Modulo LED redondo 24W

9.9 Salida para interruptor sencillo, línea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plástica 5800, terminales PVC y readecuación de muro.








Interruptor sencillo.

Carrera 16 No. 14-55
Barrió Los Libertadores

Móvil: 3155674719
Móvil: 3162663148

administración@jymingenieria.com
contacto@jymingenieria.com
comercialjymingenieria.com

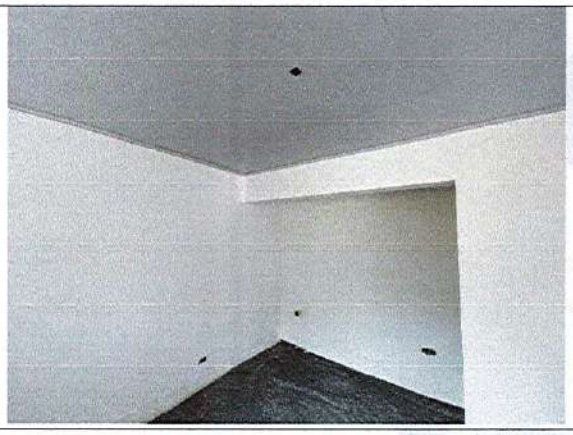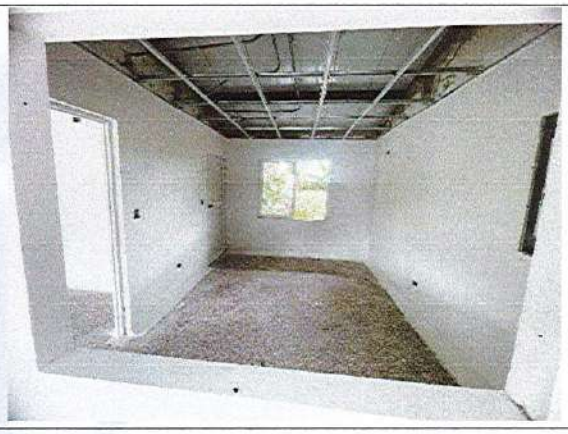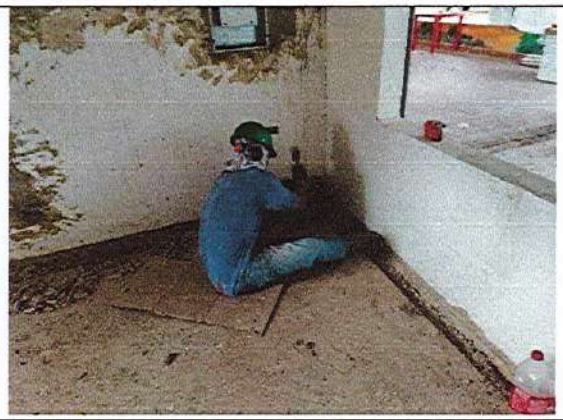9.10 Salida para tomacorriente doble con polo a tierra, 20A - 125V, salida dedicada. Incluye: tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre 12 AWG (10 m promedio), caja metálica 5800 o 2400 incluye aparato. 9.11 Salida para tomacorriente doble con polo a tierra GFCI 15 A - 125 V, incluye: tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre
 
Salida para tomacorriente.
NP 01 Guarda escoba mediacaña en granito pulido y brillado con junta de dilatación plástica m.
 
Guarda escoba media caña.

J&M INGENIERIA SAS
NIT. 900103645-8





Guarda escona media caña.





Guarda escoba media caña.





Guarda escoba media caña.

Carrera 16 No. 14-55
Barrió Los Libertadores

Móvil: 3155674719
Móvil: 3162663148

administración@jymingenieria.com
contacto@jymingenieria.com
comercialjymingenieria.com


J&M INGENIERIA SAS
NIT. 900103645-8

NP 02 Pulida y brillada de piso granito (incluye material y maquinaria).
 
Pulida y brillada de piso.
NP 03 Luminaria de emergencias tipo led 110 V, 2.4 W, autonomía mínima 90 minutos. Incluye cable encauchetado 3 x 16 AWG, y elementos de fijación. Suministro e instalación.
 
Luminaria de emergencia


Carrera 16 No. 14-55
Barrió Los Libertadores

Móvil: 3155674719
Móvil: 3162663148

administración@jymingenieria.com
contacto@jymingenieria.com
comercialjymingenieria.com

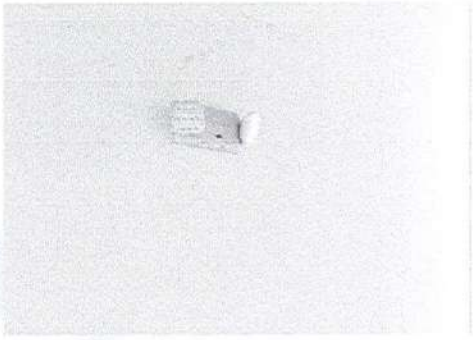	
Luminaria de emergencia.	
NP 04 Luminaria aplique LED emergencia 4. Incluye cable encuachetado 3 x 16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijación. Suministro e instalación.	
	
Luminaria aplique LED emergencia.	
NP 05 Modulo LED redondo 18W, 110V de incrustar. Incluye: Cable encuachetado 3x16AW y elementos de fijación. Suministro e instalación.	

Carrera 16 No. 14-55
Barrió Los Libertadores
Móvil: 3155674719
Móvil: 3162663148
administración@jymingenieria.com
contacto@jymingenieria.com
comercialjymingenieria.com

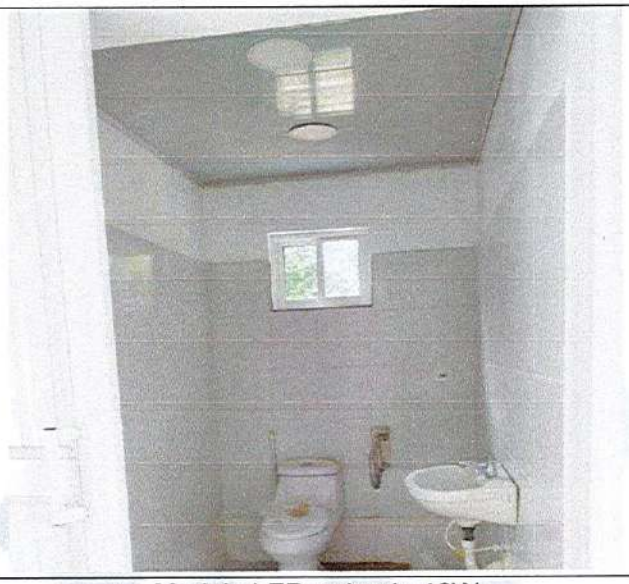

Modulo LED redondo 18W

5. Aspectos Administrativos

5.1. Resumen de actas

A continuación, se relaciona los actos administrativos del contrato No. 753 – 2025. Ver anexo 01

No.	ACTA	FECHA	PLAZO
-	Clausulado contrato No. 007 – 2025 Número interno 753 - 2025	28 de noviembre 2025	Un (01) mes y (10) diez días
01	Acta de Inicio	22 de diciembre 2025	
03	Acta de Suspensión 01	29 de diciembre 2025	10 días calendario
04	Acta de Reinicio	08 de enero 2026	

05	Prorroga No. 01	09 de febrero 2026	Un (01) mes
06	Prorroga No. 02	10 de marzo 2026	Un (01) mes
07	Acta modificatoria 01	31 de marzo 2026	

5.2. Relación de personal.

En el anexo 02, se relaciona el personal vinculado al proyecto.

5.3. Pagos de Seguridad

En el anexo 03 se evidencia el pago de aportes de seguridad del mes de diciembre de la Representante legal No. Planilla 9497749063 y del personal operativo enero 2026 No. 9499442652. Se adjunta en este anexo el pago de nómina.

No. PLANILLA	NOMBRES Y APELLIDOS	FECHA VINULACION	DÍAS	PENSIÓN	SALUD	CCF	RIESGOS	TOTAL, APORTES
9499442652	ACOSTA ROSELINO	8-ene-26	23,00	$ 214.800,00	$ 53.700,00	$ 53.700,00	$ 93.500,00	$ 415.700,00
	CARO JAIRO	15-ene-26	16,00	$ 149.500,00	$ 37.400,00	$ 37.400,00	$ 65.000,00	$ 289.300,00
	FERREIRA DIEGO	20-ene-26	10,00	$ 93.400,00	$ 23.400,00	$ 23.400,00	$ 40.700,00	$ 180.900,00
	ROSAS MAIRA	8-ene-26	23,00	$ 214.800,00	$ 53.700,00	$ 53.700,00	$ 93.500,00	$ 415.700,00
	SALCEDO JHON	14-ene-26	17,00	$ 158.800,00	$ 39.700,00	$ 39.700,00	$ 69.100,00	$ 307.300,00
	TORRES WILLIAM	14-ene-26	17,00	$ 158.800,00	$ 39.700,00	$ 39.700,00	$ 69.100,00	$ 307.300,00
							TOTAL	$ 1.916.200,00

En el anexo 03 se evidencia el pago de aportes de seguridad del mes de febrero 2026 No. Planilla 9501227833. Se adjunta en este anexo el pago de nómina.

No. PLANILLA	NOMBRES Y APELLIDOS	FECHA VINCULACIÓN	DÍAS	PENSIÓN	SALUD	CCF	RIESGOS	TOTAL, APORTES
95012227833	ACOSTA ROSELINO	1-feb-26	30,00	$ 280.200,00	$ 70.100,00	$ 70.100,00	$ 121.900,00	$ 542.300,00
	CARO JAIRO	1-feb-26	23,00	$ 214.800,00	$ 53.700,00	$ 53.700,00	$ 93.500,00	$ 415.700,00
	FERREIRA DIEGO	1-feb-26	30,00	$ 280.200,00	$ 70.100,00	$ 70.100,00	$ 121.900,00	$ 542.300,00
	ROSAS MAIRA	1-feb-26	30,00	$ 280.200,00	$ 70.100,00	$ 70.100,00	$ 121.900,00	$ 542.300,00
	SALCEDO JHON	1-feb-26	14,00	$ 130.800,00	$ 32.700,00	$ 32.700,00	$ 56.900,00	$ 253.100,00
	TORRES WILLIAM	1-feb-26	30,00	$ 280.200,00	$ 70.100,00	$ 70.100,00	$ 121.900,00	$ 542.300,00
	ABRIL CIRO	16-feb-26	4,00	$ 37.400,00	$ 9.400,00	$ 9.400,00	$ 16.300,00	$ 72.500,00
	CARLOS REYES	16-feb-26	4,00	$ 37.400,00	$ 9.400,00	$ 9.400,00	$ 16.300,00	$ 72.500,00
							TOTAL	$ 2.983.000,00

En el anexo 03 se evidencia el pago de aportes de seguridad del mes de marzo 2026 No. Planilla 9502774185. Se adjunta en este anexo el pago de nómina.

No. PLANILLA	NOMBRES Y APELLIDOS	FECHA VINCULACIÓN	DÍAS	PENSIÓN	SALUD	CCF	RIESGOS	TOTAL, APORTES
9502774185.	ACOSTA ROSELINO	1-mar-26	30,00	$ 280.200,00	$ 70.100,00	$ 70.100,00	$ 121.900,00	$ 542.300,00

	DUQUE BENAVIDES DANIEL ALEJANDRO	1-mar-26	29,00	$ 270.900,00	$ 67.800,00	$ 67.800,00	$ 117.900,00	$ 524.400,00
	FERREIRA DIEGO	1-mar-26	30,00	$ 280.200,00	$ 70.100,00	$ 70.100,00	$ 121.900,00	$ 542.300,00
	MOLINA MESA JOSE HERNANDO	2-mar-26	13,00	$ 121.400,00	$ 30.400,00	$ 30.400,00	$ 52.900,00	$ 235.100,00
	ROSAS MAIRA	1-mar-26	30,00	$ 280.200,00	$ 70.100,00	$ 70.100,00	$ 121.900,00	$ 542.300,00
	URBANO ORTIZ JONAIKER JESUS	15-mar-26	15,00	$ 140.100,00	$ 35.100,00	$ 35.100,00	$ 61.000,00	$ 271.300,00
							TOTAL	$ 2.657.700,00

En el anexo 03 se evidencia el pago de aportes de seguridad del mes de abril 2026 No. Planilla 9504480317. Se adjunta en este anexo el pago de nómina.

No. PLANILLA	NOMBRES Y APELLIDOS	FECHA VINCULACIÓN	DÍAS	PENSIÓN	SALUD	CCF	RIESGOS	TOTAL APORTES
9504480317	ACOSTA ROSELINO	1-abr-26	10,00	$ 93.400,00	$ 23.400,00	$ 23.400,00	$ 40.700,00	$ 180.900,00
	DUQUE BENAVIDES DANIEL ALEJANDRO	1-abr-26	4,00	$ 37.400,00	$ 9.400,00	$ 9.400,00	$ 16.300,00	$ 72.500,00
	FERREIRA DIEGO	1-abr-26	4,00	$ 37.400,00	$ 9.400,00	$ 9.400,00	$ 16.300,00	$ 72.500,00
	ROSAS MAIRA	1-abr-26	10,00	$ 93.400,00	$ 23.400,00	$ 23.400,00	$ 40.700,00	$ 180.900,00
	URBANO ORTIZ JONAIKER JESUS	1-abr-26	10,00	$ 93.400,00	$ 23.400,00	$ 23.400,00	$ 40.700,00	$ 180.900,00
							TOTAL	$ 687.700,00

5.4. Correspondencia enviada y recibida.

En el Anexo No. 04 se evidencia la correspondencia enviada y recibida por el contratista en el marco de la ejecución del contrato.

5.5. Seguridad y Salud en el Trabajo.

En lo referente a Seguridad y Salud en el Trabajo, el Anexo No. 05 contiene las evidencias de las acciones y actividades implementadas durante la ejecución del contrato.

5.6. Anexos Complentarios.

Carrera 16 No. 14-55
Barrió Los Libertadores
Móvil: 3155674719
Móvil: 3162663148
administración@jymingenieria.com
contacto@jymingenieria.com
comercialjymingenieria.com

6. CONCLUSIONES

Las actividades contempladas dentro del proyecto fueron ejecutadas en su totalidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas, condiciones de calidad y lineamientos establecidos contractualmente. Durante el desarrollo de la obra se realizaron de manera adecuada las labores de desmonte, demolición, construcción, instalación y adecuación de los diferentes espacios intervenidos, garantizando funcionalidad, seguridad y correcta terminación de cada una de las actividades ejecutadas.

De igual manera, las observaciones y recomendaciones efectuadas durante las visitas técnicas por parte de los profesionales especializados de los PAPS fueron atendidas e incorporadas en el desarrollo del proyecto, permitiendo realizar los ajustes necesarios para el adecuado cumplimiento de los requerimientos técnicos y operativos de la infraestructura.

La obra fue terminada satisfactoriamente, dejando las áreas intervenidas en óptimas condiciones de funcionamiento, seguridad y servicio, cumpliendo con los objetivos previstos y las obligaciones contractuales establecidas para el proyecto

MABEL SIERRA VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
J&M INGENIERÍA S.A.S.

J&M INGENIERIA SAS
NIT. 900103645-8

ANEXO 01
RESUMEN DE ACTAS DEL CONTRATO

Carrera 16 No. 14-55
Barrió Los Libertadores

Móvil: 3155674719
Móvil: 3162663148

administración@jymingenieria.com
contacto@jymingenieria.com
comercialjymingenieria.com

ANEXO 02
RELACION DE PERSONAL

Carrera 16 No. 14-55
Barrió Los Libertadores

Móvil: 3155674719
Móvil: 3162663148

administración@jymingenieria.com
contacto@jymingenieria.com
comercialjymingenieria.com

J&M INGENIERIA S.A.S.
NIT: 900.103.645-8
LISTADO DE PERSONAL

OBJETO: ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD DE LA VEREDA UNIÓN CHARTE, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.

NOVEDAD No. 01

ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	CÉDULA	CARGO	EPS	PENSION	DIRECCION	CELULAR	FECHA DE INGRESO		SALARIO	OBSERVACIONES
1	MABEL SIERRA VARGAS	1.116.542.304	REPRESENTANTE LEGAL	SANITAs	PORVENIR	CR 16 14 55 BRR LIBERTADORES	3162663148	22/12/2025	10/04/2025	$ 1.423.500,00	

NOVEDAD No. 02

ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	CÉDULA	CARGO	EPS	PENSION	DIRECCION	CELULAR	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	SALARIO	OBSERVACIONES
1	ROSELINO ACOSTA MENDOZA	74.752.762	RESIDENTE DE OBRA	NUEVA EPS	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR SA	CRA. 20 No. 8 -48 B. Sevilla Aguazul	3125871288	08/01/2026	10/04/2026	$ 1.750.905,00	
2	MAIRA ALEJANDRA ROSAS BECERRA	1.116.548.753	INSPECTOR HSE	NUEVA EPS	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR SA	CRA. 23B No. 18-29 San Pedro Aguazul	3204363262	08/01/2026	10/04/2026	$ 1.750.905,00	
3	JAIRO YESID CARO PINTO	1.116.553.390	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR SA	Vereda Unión Charte	3244631582	15/01/2026	23/02/2026	$ 1.750.905,00	
4	JHON DARIO SALCEDO CONDIA	1.055.206.087	AYUDANTE DE OBRA	SANITAS	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR SA	Vereda Unión Charte	3227100205	14/01/2026	14/02/2026	$ 1.750.905,00	
5	WILLIAN ALEJANDRO TORRES ALFONSO	1.029.642.586	AYUDANTE DE OBRA	SANITAS	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR SA	Vereda Unión Charte	3225198017	14/01/2026	28/02/2026	$ 1.750.905,00	
6	CIRO ALFONSO ABRIL	4.214.504	ELECTRICO	CAPRESOCA EPS	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A.	CRA 11 N 19 -20	3214917853	03/02/2026	06/02/2026	$ 1.750.905,00	
7	CARLOS ESTIVEN REYES VILLALOBOS	1.006.442.514	AYUDANTE ELECTRICO	CAPRESOCA EPS	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A.	CLL 11 N 19-20	3214917853	03/02/2026	06/02/2026	$ 1.750.905,00	
8	DIEGO ARMANDO FERREIRA RODRIGUEZ	1.096.206.917	OFICIAL DE OBRA	CAPRESOCA EPS	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR SA	CLL 18 N 6 - 45	3108017761	21/01/2026	04/04/2026	$ 1.750.905,00	
9	DANIEL ALEJANDRO DUQUE BENAVIDES	1.116.506.654	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS MOVILIDAD	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR SA	CLL 19 N 11 - 19	3503496756	02/03/2026	04/04/2026	$ 1.750.905,00	
10	JOSE HERNANDO MOLINA MESA	7.177.528	OFICIAL DE OBRA	COOSALUD MOVILIDAD	COMPAÑIA COLOMBIANA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS SA COLFONDOS	CLL 8 N 10-22	3118204481	02/03/2026	14/03/2026	$ 1.750.905,00	
11	JONAIKER JESUS URBANO ORTIZ	1.118.577.273	AYUDANTE	CAPRESOCA EPS	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR SA	CRA 10 N 16-41	3123426782	16/03/2026	10/04/2026	$ 1.750.905,00	

J&M INGENIERIA SAS
NIT. 900103645-8

ANEXO 3
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y NÓMINA
PAZ Y SALVO

Carrera 16 No. 14-55
Barrió Los Libertadores

Móvil: 3155674719
Móvil: 3162663148

administración@jymingenieria.com
contacto@jymingenieria.com
comercialjymingenieria.com

J&M INGENIERIA S.A.S.

NIT: 900.103.645-8

NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2026

OBJETO: ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD DE LA VEREDA UNIÓN CHARTE, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.

APORTES 4%

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	SALARIO BASICO	AUXILIO DE TRANSPORTE	FECHA DE INGRESO	FECHA DE CORTE	DIAS	SALUD	PENSION	TOTAL A PAGAR	FIRMA
1	MAIRA ALEJANDRA ROSAS BECERRA	1116548753	INSPECTOR HSE	$ 1.342.361	$ 190.973	08/01/2026	31/01/2026	23	$ 53.694	$ 53.694	$ 1.425.944	
2	ROSELINO ACOSTA MENDOZA	74752752	REDISENTE DE OBRA	$ 1.342.361	$ 190.973	08/01/2026	31/01/2026	23	$ 53.694	$ 53.694	$ 1.425.944	
1	JAIRO YESID CARO PINTO	1118553390	AYUDANTE DE OBRA	$ 933.816	$ 132.851	15/01/2026	31/01/2026	16	$ 37.353	$ 37.353	$ 991.961	
2	JHON DARIO SALCEDO CONDIA	1055206087	AYUDANTE DE OBRA	$ 875.453	$ 124.548	14/01/2026	31/01/2026	15	$ 35.018	$ 35.018	$ 929.964	
3	WILLIAN ALEJANDRO TORRES ALFONSO	1028542586	AYUDANTE DE OBRA	$ 933.816	$ 132.851	14/01/2026	31/01/2026	16	$ 37.353	$ 37.353	$ 958.628	
4	DIEGO ARMANDO FERREIRA RODRIGUEZ	1096206917	OFICIAL DE OBRA	$ 641.999	$ 91.335	21/01/2026	31/01/2026	11	$ 25.680	$ 25.680	$ 681.973	
			TOTAL									

Elaboro: _____
Area Contable

Vo.Bo. _____

J&M INGENIERIA S.A.S.

NIT: 900.103.645-8

NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

OBJETO: ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD DE LA VEREDA UNIÓN CHARTE, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.

									APORTES 4%			
No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	SALARIO BASICO	AUXILIO DE TRANSPORTE	FECHA DE INGRESO	FECHA DE CORTE	DIAS	SALUD	PENSION	TOTAL A PAGAR	FIRMA
1	MAIRA ALEJANDRA ROSAS BECERRA	1116548753	INSPECTOR HSE	$ 1.750.905	$ 249.095	01/02/2026	28/02/2026	30	$ 70.036	$ 70.036	$ 1.859.928	Alejandra Rosas
2	ROSELINO ACOSTA MENDOZA	74752762	REDISENTE DE OBRA	$ 1.750.905	$ 249.095	01/02/2026	28/02/2026	30	$ 70.036	$ 70.036	$ 1.859.928	R Acosta
3	CIRO ALFONSO ABRIL	4214504	ELECTRICO	$ 233.454	$ 33.213	03/02/2026	06/02/2026	4	$ 9.338	$ 9.338	$ 247.990	Ciro Alfonso Abril
4	CARLOS ESTIVEN REYES VILLABLOBOS	1006442514	AYUDANTE ELECTRICO	$ 1.634.178	$ 232.489	03/02/2026	06/02/2026	28	$ 65.367	$ 65.367	$ 1.735.932	Carlos Reyes

Elaboro: _____
Area Contable

Vo.Bo. _____

J&M INGENIERIA S.A.S.

NIT: 900.103.645-8
NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

OBJETO: ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD DE LA VEREDA UNIÓN CHARTE, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.

									APORTES 4%			
No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	SALARIO BASICO	AUXILIO DE TRANSPORTE	FECHA DE INGRESO	FECHA DE CORTE	DIAS	SALUD	PENSION	TOTAL A PAGAR	FIRMA
3	JAIRO YESID CARO PINTO	1118553390	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.225.634	$ 174.367	1/02/2026	23/02/2026	21	$ 49.025	$ 49.025	$ 1.301.949	
4	JHON DARIO SALCEDO CONDIA	1055206087	AYUDANTE DE OBRA	$ 817.089	$ 116.244	1/02/2026	14/02/2026	14	$ 32.684	$ 32.684	$ 867.966	Jhon S.
5	WILLIAN ALEJANDRO TORRES ALFONSO	1029642586	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	$ 249.095	1/02/2026	28/02/2026	30	$ 70.036	$ 70.036	$ 1.826.595	Alejandro T.
6	DIEGO ARMANDO FERREIRA RODRIGUEZ	1096206917	OFICIAL DE OBRA	$ 1.692.542	$ 240.792	1/02/2026	28/02/2026	29	$ 67.702	$ 67.702	$ 1.797.930	

Elaboro: _____
Area Contable

Vo.Bo. _____

J&M INGENIERIA S.A.S.

NIT: 900.103.645-8

NOMINA DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026

OBJETO: ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD DE LA VEREDA UNIÓN CHARTE, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.

									APORTES 4%			
No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	SALARIO BASICO	AUXILIO DE TRANSPORTE	FECHA DE INGRESO	FECHA DE CORTE	DIAS	SALUD	PENSION	TOTAL A PAGAR	FIRMA
1	MAIRA ALEJANDRA ROSAS BECERRA	1116548753	INSPECTOR HSE	$ 1.750.905	$ 249.095	01/03/2026	30/03/2026	30	$ 70.036	$ 70.036	$ 1.859.928	Alejandra Rosas
2	ROSELINO ACOSTA MENDOZA	74752752	REDISENTE DE OBRA	$ 1.750.905	$ 249.095	01/03/2026	30/03/2026	30	$ 70.036	$ 70.036	$ 1.859.928	
3	DIEGO ARMANDO FERREIRA RODRIGUEZ	1096206917	OFICIAL DE OBRA	$ 1.692.542	$ 240.792	01/03/2026	30/03/2026	29	$ 67.702	$ 67.702	$ 1.797.930	
4	DANIEL ALEJANDRO DUQUE BENAVIDES	1116506654	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.692.542	$ 240.792	02/03/2026	30/03/2026	29	$ 67.702	$ 67.702	$ 1.797.930	Daniel
5	JOSE HERNANDO MOLINA MESA	7177528	OFICIAL DE OBRA	$ 758.726	$ 107.941	02/03/2026	14/03/2026	13	$ 30.349	$ 30.349	$ 805.969	
6	JONAIKER JESUS URBANO ORTIZ	1118577273	AYUDANTE	$ 875.453	$ 124.548	16/03/2026	30/03/2026	15	$ 35.018	$ 35.018	$ 896.631	
							TOTAL				$ 9.018.314,65	

Elaboro: _____
Area Contable

Vo.Bo. _____

J&M INGENIERIA S.A.S.

NIT: 900.103.645-8

NOMINA DEL 01 AL 10 DE ABRIL DE 2026

OBJETO: ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD DE LA VEREDA UNIÓN CHARTE, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.

									APORTES 4%			
No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	SALARIO BASICO	AUXILIO DE TRANSPORTE	FECHA DE INGRESO	FECHA DE CORTE	DIAS	SALUD	PENSION	TOTAL A PAGAR	FIRMA
1	MAIRA ALEJANDRA ROSAS BECERRA	1116548753	INSPECTOR HSE	$ 583.635	$ 83.032	01/04/2026	10/04/2026	10	$ 23.345	$ 23.345	$ 619.976	
2	ROSELINO ACOSTA MENDOZA	74752762	REDISENTE DE OBRA	$ 583.635	$ 83.032	01/04/2026	10/04/2026	10	$ 23.345	$ 23.345	$ 619.976	
3	DIEGO ARMANDO FERREIRA RODRIGUEZ	1096206917	OFICIAL DE OBRA	$ 233.454	$ 33.213	01/04/2026	04/04/2026	4	$ 9.338	$ 9.338	$ 247.990	
4	DANIEL ALEJANDRO DUQUE BENAVIDES	1116506654	AYUDANTE DE OBRA	$ 233.454	$ 33.213	01/04/2026	04/04/2026	4	$ 9.338	$ 9.338	$ 247.990	
5	JONAIKER JESUS URBANO ORTIZ	1118577273	AYUDANTE	$ 583.635	$ 83.032	01/04/2026	10/04/2026	10	$ 23.345	$ 23.345	$ 586.643	
							TOTAL				$ 2.322.575,29	

Elaboro: _____
Area Contable

Vo.Bo. _____

J&M INGENÍERIA SAS
NIT: 900.103.645-8
LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

"Soluciones Integrales"

NOMBRE:	ROSELINO ACOSTA MENDOZA
C.C.:	74.752.762
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA
CAUSA DE LA LIQUIDACIÓN:	RENUNCIA

PERIODO DE LIQUIDACIÓN	
FECHA TERMINACIÓN DE CONTRATO	10-04-2026
FECHA DE INICIO CONTRATO	08-01-2026
TIEMPO TOTAL LABORADO	93
VALOR HORAS EXTRAS PENDIENTE DE PAGO	$ -
DÍAS SALARIO PENDIENTES POR CANCELAR	0

SALARIO BASE DE LIQUIDACIÓN:	
SUELDO BÁSICO:	$ 1.750.905
AUXILIO DE TRANSPORTE:	$ 249.095
PROMEDIO SALARIO VARIABLE	$ -
TOTAL BASE DE LIQUIDACIÓN:	**$ 2.000.000**
SANCIONES EN DÍAS	0,00

PRIMA	
FECHA DE LIQUIDACIÓN PRIMA	10-04-2026
FECHA DE CORTE PRIMA	08-01-2026
DÍAS PRIMA	**93**

CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACIÓN CESANTÍAS	10-04-2026
FECHA DE CORTE CESANTÍAS	08-01-2026
DÍAS CESANTÍAS	**93**

VACACIONES	
FECHA DE LIQUIDACIÓN VACACIONES	10-04-2026
FECHA DE CORTE VACACIONES	08-01-2026
DÍAS BASE DE LIQUIDACION	93
TOTAL DIAS DE VACACIONES	4
DÍAS PENDIENTES	**0**

INTERESES A LAS CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACIÓN INTERESES	10-04-2026
FECHA DE CORTE INTERESES	08-01-2026
DÍAS INTERESES	**93**

RESUMEN LIQUIDACIÓN PAGOS

CONCEPTO			CALCULO					TOTAL
DÍAS DE VACACIONES PENDIENTES:	$ 1.750.905	/	30	X	4		$	226.159
CESANTÍAS:	$ 2.000.000	/	360	X	93		$	516.667
INTERESES DE CESANTÍAS	$ 516.667	/	360	X	93	X 0,12	$	16.017
PRIMA SERVICIOS	$ 2.000.000	/	360	X	93		$	516.667
TOTAL DEVENGOS							**$**	**1.275.509**

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACIÓN :

CONCEPTO	PORCENTAJE		BASE	TOTAL
SALUD:	4%	$	-	$ -
PENSIÓN:	4%	$	-	$ -
PRESTAMOS O ANTICIPOS:				
TOTAL DEDUCCIONES				**$** -

VALOR LIQUIDACIÓN	**$ 1.275.509**
LA SUMA DE:	UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS M/C

SE HACE CONSTAR:

1. Hago constar que durante el tiempo trabajado con J&M INGENIERIA S.A.S, me fue pagada la totalidad de mis salarios devengados, horas extras, subsidios, vacaciones, primas y prestaciones a que tengo derecho de acuerdo a la ley y al tipo de contrato suscrito.
2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre J&M INGENÍERIA SAS y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

ROSELINO ACOSTA MENDOZA
C.C.: 74752762

MABEL SIERRA VARGAS
Representante Legal

Elaboró: Area contable
21-04-2026

J&M INGENÍERIA SAS
NIT: 900.103.645-8
LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

"Soluciones Integrales"

NOMBRE:	MAIRA ALEJANDRA ROSAS BECERRA
C.C.:	1.116.548.753
CARGO:	INSPECTOR HSE
CAUSA DE LA LIQUIDACIÓN:	RENUNCIA

PERIODO DE LIQUIDACIÓN	
FECHA TERMINACIÓN DE CONTRATO	10-04-2026
FECHA DE INICIO CONTRATO	08-01-2026
TIEMPO TOTAL LABORADO	93
VALOR HORAS EXTRAS PENDIENTE DE PAGO	$ -
DÍAS SALARIO PENDIENTES POR CANCELAR	0

SALARIO BASE DE LIQUIDACIÓN:	
SUELDO BÁSICO:	$ 1.750.905
AUXILIO DE TRANSPORTE:	$ 249.095
PROMEDIO SALARIO VARIABLE	$ -
TOTAL BASE DE LIQUIDACIÓN:	**$ 2.000.000**
SANCIONES EN DÍAS	0,00

PRIMA	
FECHA DE LIQUIDACIÓN PRIMA	10-04-2026
FECHA DE CORTE PRIMA	08-01-2026
DÍAS PRIMA	93

CESANTÍAS	
FECHA DE LIQUIDACIÓN CESANTÍAS	10-04-2026
FECHA DE CORTE CESANTÍAS	08-01-2026
DÍAS CESANTÍAS	93

VACACIONES	
FECHA DE LIQUIDACIÓN VACACIONES	10-04-2026
FECHA DE CORTE VACACIONES	08-01-2026
DÍAS BASE DE LIQUIDACION	93
TOTAL DIAS DE VACACIONES	4
DÍAS PENDIENTES	0

INTERESES A LAS CESANTÍAS	
FECHA DE LIQUIDACIÓN INTERESES	10-04-2026
FECHA DE CORTE INTERESES	08-01-2026
DÍAS INTERESES	93

RESUMEN LIQUIDACIÓN PAGOS

CONCEPTO			CALCULO					TOTAL
DÍAS DE VACACIONES PENDIENTES:	$ 1.750.905	/	30	X	4			$ 226.159
CESANTÍAS:	$ 2.000.000	/	360	X	93			$ 516.667
INTERESES DE CESANTÍAS	$ 516.667	/	360	X	93	X	0,12	$ 16.017
PRIMA SERVICIOS	$ 2.000.000	/	360	X	93			$ 516.667
TOTAL DEVENGOS								**$ 1.275.509**

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACIÓN :

CONCEPTO	PORCENTAJE		BASE	TOTAL
SALUD:	4%	$	-	$ -
PENSIÓN:	4%	$	-	$ -
PRESTAMOS O ANTICIPOS:				
TOTAL DEDUCCIONES				$ -

VALOR LIQUIDACIÓN	**$ 1.275.509**
LA SUMA DE:	UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS M/C

SE HACE CONSTAR:

1. Hago constar que durante el tiempo trabajado con J&M INGENIERIA S.A.S, me fue pagada la totalidad de mis salarios devengados, horas extras, subsidios, vacaciones, primas y prestaciones a que tengo derecho de acuerdo a la ley y al tipo de contrato suscrito.
2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre J&M INGENÍERIA SAS y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

Alejandra Rosas

MAIRA ALEJANDRA ROSAS BECERRA
C.C.: 1116548753

MABEL SIERRA VARGAS
Representante Legal

Elaboró: Area contable
21-04-2026

J&M INGENÍERIA SAS
NIT: 900.103.645-8
LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

"Soluciones Integrales"

NOMBRE:	JAIRO YESID CARO PINTO
C.C.:	1.118.553.390
CARGO:	AYUDANTE DE OBRA
CAUSA DE LA LIQUIDACIÓN:	RENUNCIA

PERIODO DE LIQUIDACIÓN	
FECHA TERMINACIÓN DE CONTRATO	23-02-2026
FECHA DE INICIO CONTRATO	15-01-2026
TIEMPO TOTAL LABORADO	39
VALOR HORAS EXTRAS PENDIENTE DE PAGO	$ -
DÍAS SALARIO PENDIENTES POR CANCELAR	0

SALARIO BASE DE LIQUIDACIÓN:	
SUELDO BÁSICO:	$ 1.750.905
AUXILIO DE TRANSPORTE:	$ 249.095
PROMEDIO SALARIO VARIABLE	$ -
TOTAL BASE DE LIQUIDACIÓN:	**$ 2.000.000**
SANCIONES EN DÍAS	0,00

PRIMA	
FECHA DE LIQUIDACIÓN PRIMA	23-02-2026
FECHA DE CORTE PRIMA	15-01-2026
DÍAS PRIMA	39

CESANTÍAS	
FECHA DE LIQUIDACIÓN CESANTÍAS	23-02-2026
FECHA DE CORTE CESANTÍAS	15-01-2026
DÍAS CESANTÍAS	39

VACACIONES	
FECHA DE LIQUIDACIÓN VACACIONES	23-02-2026
FECHA DE CORTE VACACIONES	15-01-2026
DÍAS BASE DE LIQUIDACION	39
TOTAL DIAS DE VACACIONES	2
DÍAS PENDIENTES	0

INTERESES A LAS CESANTÍAS	
FECHA DE LIQUIDACIÓN INTERESES	23-02-2026
FECHA DE CORTE INTERESES	15-01-2026
DÍAS INTERESES	39

RESUMEN LIQUIDACIÓN PAGOS

CONCEPTO			CALCULO					TOTAL
DÍAS DE VACACIONES PENDIENTES:	$ 1.750.905	/	30	X	2		$	94.841
CESANTÍAS:	$ 2.000.000	/	360	X	39		$	216.667
INTERESES DE CESANTÍAS	$ 216.667	/	360	X	39	X 0,12	$	2.817
PRIMA SERVICIOS	$ 2.000.000	/	360	X	39		$	216.667
TOTAL DEVENGOS							**$**	**530.991**

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACIÓN :

CONCEPTO	PORCENTAJE	BASE	TOTAL
SALUD:	4%	$ -	$ -
PENSIÓN:	4%	$ -	$ -
PRESTAMOS O ANTICIPOS:			
TOTAL DEDUCCIONES			$ -

VALOR LIQUIDACIÓN		**$ 530.991**
LA SUMA DE:	QUINIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/C	

SE HACE CONSTAR:

1. Hago constar que durante el tiempo trabajado con J&M INGENIERIA S.A.S, me fue pagada la totalidad de mis salarios devengados, horas extras, subsidios, vacaciones, primas y prestaciones a que tengo derecho de acuerdo a la ley y al tipo de contrato suscrito.
2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre J&M INGENÍERIA SAS y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

JAIRO YESID CARO PINTO
C.C.: 1118553390

MABEL SIERRA VARGAS
Representante Legal

Elaboró: Area contable
05-03-2026

J&M INGENÍERIA SAS
NIT: 900.103.645-8
LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

"Soluciones Integrales"

NOMBRE:	JHON DARIO SALCEDO CONDIA
C.C.:	1.055.206.087
CARGO:	AYUDANTE DE OBRA
CAUSA DE LA LIQUIDACIÓN:	RENUNCIA

PERIODO DE LIQUIDACIÓN	
FECHA TERMINACIÓN DE CONTRATO	14-02-2026
FECHA DE INICIO CONTRATO	14-01-2026
TIEMPO TOTAL LABORADO	31
VALOR HORAS EXTRAS PENDIENTE DE PAGO	$ -
DÍAS SALARIO PENDIENTES POR CANCELAR	0

SALARIO BASE DE LIQUIDACIÓN:	
SUELDO BÁSICO:	$ 1.750.905
AUXILIO DE TRANSPORTE:	$ 249.095
PROMEDIO SALARIO VARIABLE	$ -
TOTAL BASE DE LIQUIDACIÓN:	**$ 2.000.000**
SANCIONES EN DÍAS	0,00

PRIMA	
FECHA DE LIQUIDACIÓN PRIMA	14-02-2026
FECHA DE CORTE PRIMA	14-01-2026
DÍAS PRIMA	**31**

CESANTÍAS	
FECHA DE LIQUIDACIÓN CESANTÍAS	14-02-2026
FECHA DE CORTE CESANTÍAS	14-01-2026
DÍAS CESANTÍAS	**31**

VACACIONES	
FECHA DE LIQUIDACIÓN VACACIONES	14-02-2026
FECHA DE CORTE VACACIONES	14-01-2026
DÍAS BASE DE LIQUIDACION	31
TOTAL DIAS DE VACACIONES	1
DÍAS PENDIENTES	**0**

INTERESES A LAS CESANTÍAS	
FECHA DE LIQUIDACIÓN INTERESES	14-02-2026
FECHA DE CORTE INTERESES	14-01-2026
DÍAS INTERESES	**31**

RESUMEN LIQUIDACIÓN PAGOS

CONCEPTO	CALCULO							TOTAL
DÍAS DE VACACIONES PENDIENTES:	$ 1.750.905	/	30	X	1			$ 75.386
CESANTÍAS:	$ 2.000.000	/	360	X	31			$ 172.222
INTERESES DE CESANTÍAS	$ 172.222	/	360	X	31	X	0,12	$ 1.780
PRIMA SERVICIOS	$ 2.000.000	/	360	X	31			$ 172.222
TOTAL DEVENGOS								**$ 421.610**

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACIÓN :

CONCEPTO	PORCENTAJE	BASE	TOTAL
SALUD:	4%	$ -	$ -
PENSIÓN:	4%	$ -	$ -
PRESTAMOS O ANTICIPOS:			
TOTAL DEDUCCIONES			$ -

VALOR LIQUIDACIÓN	**$ 421.610**
LA SUMA DE:	CUATROCIENTOS VEINTI UN MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS M/C

SE HACE CONSTAR:

1. Hago constar que durante el tiempo trabajado con J&M INGENIERIA S.A.S, me fue pagada la totalidad de mis salarios devengados, horas extras, subsidios, vacaciones, primas y prestaciones a que tengo derecho de acuerdo a la ley y al tipo de contrato suscrito.
2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre J&M INGENÍERIA SAS y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

JHON DARIO SALCEDO CONDIA
C.C.: 1055206087

MABEL SIERRA VARGAS
Representante Legal

Elaboró: Area contable
05-03-2026

J&M INGENÍERIA SAS
NIT: 900.103.645-8
LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

"Soluciones Integrales"

NOMBRE:	WILLIAN ALEJANDRO TORRES ALFONSO
C.C.:	1.029.642.586
CARGO:	AYUDANTE DE OBRA
CAUSA DE LA LIQUIDACIÓN:	RENUNCIA

PERIODO DE LIQUIDACIÓN	
FECHA TERMINACIÓN DE CONTRATO	28-02-2026
FECHA DE INICIO CONTRATO	14-01-2026
TIEMPO TOTAL LABORADO	45
VALOR HORAS EXTRAS PENDIENTE DE PAGO	$ -
DÍAS SALARIO PENDIENTES POR CANCELAR	

SALARIO BASE DE LIQUIDACIÓN:	
SUELDO BÁSICO:	$ 1.750.905
AUXILIO DE TRANSPORTE:	$ 249.095
PROMEDIO SALARIO VARIABLE	$ -
TOTAL BASE DE LIQUIDACIÓN:	**$ 2.000.000**
SANCIONES EN DÍAS	0,00

PRIMA	
FECHA DE LIQUIDACIÓN PRIMA	28-02-2026
FECHA DE CORTE PRIMA	14-01-2026
DÍAS PRIMA	**45**

CESANTÍAS	
FECHA DE LIQUIDACIÓN CESANTÍAS	28-02-2026
FECHA DE CORTE CESANTÍAS	14-01-2026
DÍAS CESANTÍAS	**45**

VACACIONES	
FECHA DE LIQUIDACIÓN VACACIONES	28-02-2026
FECHA DE CORTE VACACIONES	14-01-2026
DÍAS BASE DE LIQUIDACION	45
TOTAL DIAS DE VACACIONES	2
DÍAS PENDIENTES	**0**

INTERESES A LAS CESANTÍAS	
FECHA DE LIQUIDACIÓN INTERESES	28-02-2026
FECHA DE CORTE INTERESES	14-01-2026
DÍAS INTERESES	**45**

RESUMEN LIQUIDACION PAGOS

CONCEPTO				CALCULO					TOTAL
DÍAS DE VACACIONES PENDIENTES:	$ 1.750.905	/	30	X	2			$	109.432
CESANTÍAS:	$ 2.000.000	/	360	X	45			$	250.000
INTERESES DE CESANTÍAS	$ 250.000	/	360	X	45	X	0,12	$	3.750
PRIMA SERVICIOS	$ 2.000.000	/	360	X	45			$	250.000
TOTAL DEVENGOS								**$**	**613.182**

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACIÓN :

CONCEPTO	PORCENTAJE	BASE	TOTAL
SALUD:	4%	$ -	$ -
PENSIÓN:	4%	$ -	$ -
PRESTAMOS O ANTICIPOS:			
TOTAL DEDUCCIONES			**$** -

VALOR LIQUIDACIÓN		**$ 613.182**
LA SUMA DE:	SEISCIENTOS TRECE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/C	

SE HACE CONSTAR:

1. Hago constar que durante el tiempo trabajado con J&M INGENIERIA S.A.S, me fue pagada la totalidad de mis salarios devengados, horas extras, subsidios, vacaciones, primas y prestaciones a que tengo derecho de acuerdo a la ley y al tipo de contrato suscrito.
2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre J&M INGENÍERIA SAS y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

Alejandro T.

WILLIAN ALEJANDRO TORRES ALFONSO
C.C.: 1029642586

MABEL SIERRA VARGAS
Representante Legal

Elaboró: Area contable
05-03-2026

J&M INGENÍERIA SAS
NIT: 900.103.645-8
LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

"Soluciones Integrales"

NOMBRE:	CIRO ALFONSO ABRIL
C.C.:	4.214.504
CARGO:	ELECTRICO
CAUSA DE LA LIQUIDACIÓN:	RENUNCIA

PERIODO DE LIQUIDACIÓN	
FECHA TERMINACIÓN DE CONTRATO	06-02-2026
FECHA DE INICIO CONTRATO	03-02-2026
TIEMPO TOTAL LABORADO	4
VALOR HORAS EXTRAS PENDIENTE DE PAGO	$ -
DÍAS SALARIO PENDIENTES POR CANCELAR	0

SALARIO BASE DE LIQUIDACIÓN:	
SUELDO BÁSICO:	$ 1.750.905
AUXILIO DE TRANSPORTE:	$ 249.095
PROMEDIO SALARIO VARIABLE	$ -
TOTAL BASE DE LIQUIDACIÓN:	**$ 2.000.000**
SANCIONES EN DÍAS	0,00

PRIMA	
FECHA DE LIQUIDACIÓN PRIMA	06-02-2026
FECHA DE CORTE PRIMA	03-02-2026
DÍAS PRIMA	4

CESANTÍAS	
FECHA DE LIQUIDACIÓN CESANTÍAS	06-02-2026
FECHA DE CORTE CESANTÍAS	03-02-2026
DÍAS CESANTÍAS	4

VACACIONES	
FECHA DE LIQUIDACIÓN VACACIONES	06-02-2026
FECHA DE CORTE VACACIONES	03-02-2026
DÍAS BASE DE LIQUIDACION	4
TOTAL DIAS DE VACACIONES	0
DÍAS PENDIENTES	0

INTERESES A LAS CESANTÍAS	
FECHA DE LIQUIDACIÓN INTERESES	06-02-2026
FECHA DE CORTE INTERESES	03-02-2026
DÍAS INTERESES	4

RESUMEN LIQUIDACIÓN PAGOS

CONCEPTO				CALCULO					TOTAL
DÍAS DE VACACIONES PENDIENTES:	$	1.750.905	/	30	X	0			$ 9.727
CESANTÍAS:	$	2.000.000	/	360	X	4			$ 22.222
INTERESES DE CESANTÍAS	$	22.222	/	360	X	4	X	0,12	$ 30
PRIMA SERVICIOS	$	2.000.000	/	360	X	4			$ 22.222
TOTAL DEVENGOS									**$ 54.201**

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACIÓN :

CONCEPTO	PORCENTAJE		BASE	TOTAL
SALUD:	4%	$	-	$ -
PENSIÓN:	4%	$	-	$ -
PRESTAMOS O ANTICIPOS:				
TOTAL DEDUCCIONES				**$ -**

VALOR LIQUIDACIÓN		**$ 54.201**
LA SUMA DE:	CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS UN PESOS M/C	

SE HACE CONSTAR:

1. Hago constar que durante el tiempo trabajado con J&M INGENIERIA S.A.S, me fue pagada la totalidad de mis salarios devengados, horas extras, subsidios, vacaciones, primas y prestaciones a que tengo derecho de acuerdo a la ley y al tipo de contrato suscrito.
2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre J&M INGENÍERIA SAS y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

CIRO ALFONSO ABRIL
C.C.: 4214504

MABEL SIERRA VARGAS
Representante Legal

Elaboró: Area contable
21-04-2026

J&M INGENÍERIA SAS
NIT: 900.103.645-8
LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO

"Soluciones Integrales"

NOMBRE:	CARLOS ESTIVEN REYES VILLALOBOS
C.C.:	1.006.442.514
CARGO:	AYUDANTE ELECTRICO
CAUSA DE LA LIQUIDACIÓN:	RENUNCIA

PERIODO DE LIQUIDACIÓN	
FECHA TERMINACIÓN DE CONTRATO	06-02-2026
FECHA DE INICIO CONTRATO	03-02-2026
TIEMPO TOTAL LABORADO	4
VALOR HORAS EXTRAS PENDIENTE DE PAGO	$ -
DÍAS SALARIO PENDIENTES POR CANCELAR	0

SALARIO BASE DE LIQUIDACIÓN:	
SUELDO BÁSICO:	$ 1.750.905
AUXILIO DE TRANSPORTE:	$ 249.095
PROMEDIO SALARIO VARIABLE	$ -
TOTAL BASE DE LIQUIDACIÓN:	**$ 2.000.000**
SANCIONES EN DÍAS	0,00

PRIMA	
FECHA DE LIQUIDACIÓN PRIMA	06-02-2026
FECHA DE CORTE PRIMA	03-02-2026
DÍAS PRIMA	4

CESANTÍAS	
FECHA DE LIQUIDACIÓN CESANTÍAS	06-02-2026
FECHA DE CORTE CESANTÍAS	03-02-2026
DÍAS CESANTÍAS	4

VACACIONES	
FECHA DE LIQUIDACIÓN VACACIONES	06-02-2026
FECHA DE CORTE VACACIONES	03-02-2026
DÍAS BASE DE LIQUIDACION	4
TOTAL DIAS DE VACACIONES	0
DÍAS PENDIENTES	**0**

INTERESES A LAS CESANTÍAS	
FECHA DE LIQUIDACIÓN INTERESES	06-02-2026
FECHA DE CORTE INTERESES	03-02-2026
DÍAS INTERESES	4

RESUMEN LIQUIDACIÓN PAGOS			CALCULO				TOTAL
CONCEPTO							
DÍAS DE VACACIONES PENDIENTES:	$ 1.750.905	/	30 X	0			$ 9.727
CESANTÍAS:	$ 2.000.000	/	360 X	4			$ 22.222
INTERESES DE CESANTÍAS	$ 22.222	/	360 X	4 X	0,12		$ 30
PRIMA SERVICIOS	$ 2.000.000	/	360 X	4			$ 22.222
TOTAL DEVENGOS							**$ 54.201**

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACIÓN :				
CONCEPTO	**PORCENTAJE**		**BASE**	**TOTAL**
SALUD:	4%	$	-	$ -
PENSIÓN:	4%	$	-	$ -
PRESTAMOS O ANTICIPOS:				
TOTAL DEDUCCIONES				$ -

VALOR LIQUIDACIÓN	**$ 54.201**
LA SUMA DE:	CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS UN PESOS M/C

SE HACE CONSTAR:

1. Hago constar que durante el tiempo trabajado con J&M INGENIERIA S.A.S, me fue pagada la totalidad de mis salarios devengados, horas extras, subsidios, vacaciones, primas y prestaciones a que tengo derecho de acuerdo a la ley y al tipo de contrato suscrito.
2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre J&M INGENÍERIA SAS y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

Carlos Reyes

CARLOS ESTIVEN REYES VILLALOBOS
C.C.: 1006442514

MABEL SIERRA VARGAS
Representante Legal

Elaboró: Area contable
21-04-2026

J&M INGENÍERIA SAS
NIT: 900.103.645-8
LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

"Soluciones Integrales"

NOMBRE:	DIEGO ARMANDO FERREIRA RODRIGUEZ
C.C.:	1.096.206.917
CARGO:	OFICIAL DE OBRA
CAUSA DE LA LIQUIDACIÓN:	RENUNCIA

PERIODO DE LIQUIDACIÓN	
FECHA TERMINACIÓN DE CONTRATO	04-04-2026
FECHA DE INICIO CONTRATO	21-01-2026
TIEMPO TOTAL LABORADO	74
VALOR HORAS EXTRAS PENDIENTE DE PAGO	$ -
DÍAS SALARIO PENDIENTES POR CANCELAR	0

SALARIO BASE DE LIQUIDACIÓN:	
SUELDO BÁSICO:	$ 1.750.905
AUXILIO DE TRANSPORTE:	$ 249.095
PROMEDIO SALARIO VARIABLE	$ -
TOTAL BASE DE LIQUIDACIÓN:	**$ 2.000.000**
SANCIONES EN DÍAS	0,00

PRIMA	
FECHA DE LIQUIDACIÓN PRIMA	04-04-2026
FECHA DE CORTE PRIMA	21-01-2026
DÍAS PRIMA	**74**

CESANTÍAS	
FECHA DE LIQUIDACIÓN CESANTÍAS	04-04-2026
FECHA DE CORTE CESANTÍAS	21-01-2026
DÍAS CESANTÍAS	**74**

VACACIONES	
FECHA DE LIQUIDACIÓN VACACIONES	04-04-2026
FECHA DE CORTE VACACIONES	21-01-2026
DÍAS BASE DE LIQUIDACION	74
TOTAL DIAS DE VACACIONES	3
DÍAS PENDIENTES	**0**

INTERESES A LAS CESANTÍAS	
FECHA DE LIQUIDACIÓN INTERESES	04-04-2026
FECHA DE CORTE INTERESES	21-01-2026
DÍAS INTERESES	**74**

RESUMEN LIQUIDACIÓN PAGOS

CONCEPTO									TOTAL
DÍAS DE VACACIONES PENDIENTES:	$	1.750.905	/	30	X	3			$ 179.954
CESANTÍAS:	$	2.000.000	/	360	X	74			$ 411.111
INTERESES DE CESANTÍAS	$	411.111	/	360	X	74	X	0,12	$ 10.141
PRIMA SERVICIOS	$	2.000.000	/	360	X	74			$ 411.111
TOTAL DEVENGOS									**$ 1.012.317**

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACIÓN :

CONCEPTO	PORCENTAJE	BASE	TOTAL
SALUD:	4%	$ -	$ -
PENSIÓN:	4%	$ -	$ -
PRESTAMOS O ANTICIPOS:			
TOTAL DEDUCCIONES			$ -

VALOR LIQUIDACIÓN	**$ 1.012.317**
LA SUMA DE:	UN MILLÓN DOCE MIL TRESCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS M/C

SE HACE CONSTAR:

1. Hago constar que durante el tiempo trabajado con J&M INGENIERIA S.A.S, me fue pagada la totalidad de mis salarios devengados, horas extras, subsidios, vacaciones, primas y prestaciones a que tengo derecho de acuerdo a la ley y al tipo de contrato suscrito.
2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre J&M INGENÍERIA SAS y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

DIEGO ARMANDO FERREIRA RODRIGUEZ
C.C.: 1096206917

MABEL SIERRA VARGAS
Representante Legal

Elaboró: Area contable
21-04-2026

J&M INGENÍERIA SAS
NIT: 900.103.645-8
LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

"Soluciones Integrales"

NOMBRE:	DANIEL ALEJANDRO DUQUE BENAVIDES
C.C.:	1.116.506.654
CARGO:	AYUDANTE DE OBRA
CAUSA DE LA LIQUIDACIÓN:	RENUNCIA

PERIODO DE LIQUIDACIÓN	
FECHA TERMINACIÓN DE CONTRATO	04-04-2026
FECHA DE INICIO CONTRATO	02-03-2026
TIEMPO TOTAL LABORADO	33
VALOR HORAS EXTRAS PENDIENTE DE PAGO	$ -
DÍAS SALARIO PENDIENTES POR CANCELAR	0

SALARIO BASE DE LIQUIDACIÓN:	
SUELDO BÁSICO:	$ 1.750.905
AUXILIO DE TRANSPORTE:	$ 249.095
PROMEDIO SALARIO VARIABLE	$ -
TOTAL BASE DE LIQUIDACIÓN:	**$ 2.000.000**
SANCIONES EN DÍAS	0,00

PRIMA	
FECHA DE LIQUIDACIÓN PRIMA	04-04-2026
FECHA DE CORTE PRIMA	02-03-2026
DÍAS PRIMA	33

CESANTÍAS	
FECHA DE LIQUIDACIÓN CESANTÍAS	04-04-2026
FECHA DE CORTE CESANTÍAS	02-03-2026
DÍAS CESANTÍAS	33

VACACIONES	
FECHA DE LIQUIDACIÓN VACACIONES	04-04-2026
FECHA DE CORTE VACACIONES	02-03-2026
DÍAS BASE DE LIQUIDACION	33
TOTAL DIAS DE VACACIONES	1
DÍAS PENDIENTES	0

INTERESES A LAS CESANTÍAS	
FECHA DE LIQUIDACIÓN INTERESES	04-04-2026
FECHA DE CORTE INTERESES	02-03-2026
DÍAS INTERESES	33

RESUMEN LIQUIDACIÓN PAGOS

CONCEPTO			CALCULO					TOTAL
DÍAS DE VACACIONES PENDIENTES:	$ 1.750.905	/	30	X	1			$ 80.250
CESANTÍAS:	$ 2.000.000	/	360	X	33			$ 183.333
INTERESES DE CESANTÍAS	$ 183.333	/	360	X	33	X	0,12	$ 2.017
PRIMA SERVICIOS	$ 2.000.000	/	360	X	33			$ 183.333
TOTAL DEVENGOS								**$ 448.933**

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACIÓN :

CONCEPTO	PORCENTAJE		BASE	TOTAL
SALUD:	4%	$	-	$ -
PENSIÓN:	4%	$	-	$ -
PRESTAMOS O ANTICIPOS:				
TOTAL DEDUCCIONES				$ -

VALOR LIQUIDACIÓN	**$ 448.933**
LA SUMA DE:	CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/C

SE HACE CONSTAR:

1. Hago constar que durante el tiempo trabajado con J&M INGENIERIA S.A.S, me fue pagada la totalidad de mis salarios devengados, horas extras, subsidios, vacaciones, primas y prestaciones a que tengo derecho de acuerdo a la ley y al tipo de contrato suscrito.
2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre J&M INGENÍERIA SAS y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

Daniel

DANIEL ALEJANDRO DUQUE BENAVIDES
C.C.: 1116506654

MABEL SIERRA VARGAS
Representante Legal

Elaboró: Area contable
21-04-2026

J&M INGENÍERIA SAS
NIT: 900.103.645-8
LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO

"Soluciones Integrales"

NOMBRE:	JOSE HERNANDO MOLINA MESA
C.C.:	7.177.528
CARGO:	OFICIAL DE OBRA
CAUSA DE LA LIQUIDACIÓN:	RENUNCIA

PERIODO DE LIQUIDACIÓN	
FECHA TERMINACIÓN DE CONTRATO	14-03-2026
FECHA DE INICIO CONTRATO	02-03-2026
TIEMPO TOTAL LABORADO	13
VALOR HORAS EXTRAS PENDIENTE DE PAGO	$ -
DÍAS SALARIO PENDIENTES POR CANCELAR	0

SALARIO BASE DE LIQUIDACIÓN:	
SUELDO BÁSICO:	$ 1.750.905
AUXILIO DE TRANSPORTE:	$ 249.095
PROMEDIO SALARIO VARIABLE	$ -
TOTAL BASE DE LIQUIDACIÓN:	**$ 2.000.000**
SANCIONES EN DÍAS	0,00

PRIMA	
FECHA DE LIQUIDACIÓN PRIMA	14-03-2026
FECHA DE CORTE PRIMA	02-03-2026
DÍAS PRIMA	13

CESANTÍAS	
FECHA DE LIQUIDACIÓN CESANTÍAS	14-03-2026
FECHA DE CORTE CESANTÍAS	02-03-2026
DÍAS CESANTÍAS	13

VACACIONES	
FECHA DE LIQUIDACIÓN VACACIONES	14-03-2026
FECHA DE CORTE VACACIONES	02-03-2026
DÍAS BASE DE LIQUIDACION	13
TOTAL DIAS DE VACACIONES	1
DÍAS PENDIENTES	0

INTERESES A LAS CESANTÍAS	
FECHA DE LIQUIDACIÓN INTERESES	14-03-2026
FECHA DE CORTE INTERESES	02-03-2026
DÍAS INTERESES	13

RESUMEN LIQUIDACIÓN PAGOS

CONCEPTO			CALCULO					TOTAL
DÍAS DE VACACIONES PENDIENTES:	$ 1.750.905	/	30	X	1			$ 31.614
CESANTÍAS:	$ 2.000.000	/	360	X	13			$ 72.222
INTERESES DE CESANTÍAS	$ 72.222	/	360	X	13	X	0,12	$ 313
PRIMA SERVICIOS	$ 2.000.000	/	360	X	13			$ 72.222
TOTAL DEVENGOS								**$ 176.371**

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACIÓN :

CONCEPTO	PORCENTAJE	BASE	TOTAL
SALUD:	4%	$ -	$ -
PENSIÓN:	4%	$ -	$ -
PRESTAMOS O ANTICIPOS:			
TOTAL DEDUCCIONES			$ -

VALOR LIQUIDACIÓN	**$ 176.371**
LA SUMA DE:	CIENTO SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/C

SE HACE CONSTAR:

1. Hago constar que durante el tiempo trabajado con J&M INGENIERIA S.A.S, me fue pagada la totalidad de mis salarios devengados, horas extras, subsidios, vacaciones, primas y prestaciones a que tengo derecho de acuerdo a la ley y al tipo de contrato suscrito.
2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre J&M INGENÍERIA SAS y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

JOSE HERNANDO MOLINA MESA
C.C.: 7177528

MABEL SIERRA VARGAS
Representante Legal

Elaboró: Area contable
21-04-2026

J&M INGENÍERIA SAS
NIT: 900.103.645-8
LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO

"Soluciones Integrales"

NOMBRE:	JONAIKER JESUS URBANO ORTIZ
C.C.:	1.118.577.273
CARGO:	AYUDANTE
CAUSA DE LA LIQUIDACIÓN:	RENUNCIA

PERIODO DE LIQUIDACIÓN	
FECHA TERMINACIÓN DE CONTRATO	10-04-2026
FECHA DE INICIO CONTRATO	16-03-2026
TIEMPO TOTAL LABORADO	25
VALOR HORAS EXTRAS PENDIENTE DE PAGO	$ -
DÍAS SALARIO PENDIENTES POR CANCELAR	0

SALARIO BASE DE LIQUIDACIÓN:	
SUELDO BÁSICO:	$ 1.750.905
AUXILIO DE TRANSPORTE:	$ 249.095
PROMEDIO SALARIO VARIABLE	$ -
TOTAL BASE DE LIQUIDACIÓN:	**$ 2.000.000**
SANCIONES EN DÍAS	0,00

PRIMA	
FECHA DE LIQUIDACIÓN PRIMA	10-04-2026
FECHA DE CORTE PRIMA	16-03-2026
DÍAS PRIMA	25

CESANTÍAS	
FECHA DE LIQUIDACIÓN CESANTÍAS	10-04-2026
FECHA DE CORTE CESANTÍAS	16-03-2026
DÍAS CESANTÍAS	25

VACACIONES	
FECHA DE LIQUIDACIÓN VACACIONES	10-04-2026
FECHA DE CORTE VACACIONES	16-03-2026
DÍAS BASE DE LIQUIDACION	25
TOTAL DIAS DE VACACIONES	1
DÍAS PENDIENTES	0

INTERESES A LAS CESANTÍAS	
FECHA DE LIQUIDACIÓN INTERESES	10-04-2026
FECHA DE CORTE INTERESES	16-03-2026
DÍAS INTERESES	25

RESUMEN LIQUIDACIÓN PAGOS

CONCEPTO	CALCULO						TOTAL
DÍAS DE VACACIONES PENDIENTES:	$ 1.750.905	/	30	X	1		$ 60.795
CESANTÍAS:	$ 2.000.000	/	360	X	25		$ 138.889
INTERESES DE CESANTÍAS	$ 138.889	/	360	X	25	X 0,12	$ 1.157
PRIMA SERVICIOS	$ 2.000.000	/	360	X	25		$ 138.889
TOTAL DEVENGOS							**$ 339.730**

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACIÓN :

CONCEPTO	PORCENTAJE	BASE	TOTAL
SALUD:	4%	$ -	$ -
PENSIÓN:	4%	$ -	$ -
PRESTAMOS O ANTICIPOS:			
TOTAL DEDUCCIONES			**$ -**

VALOR LIQUIDACIÓN		$ 339.730
LA SUMA DE:	TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS M/C	

SE HACE CONSTAR:

1. Hago constar que durante el tiempo trabajado con J&M INGENIERIA S.A.S, me fue pagada la totalidad de mis salarios devengados, horas extras, subsidios, vacaciones, primas y prestaciones a que tengo derecho de acuerdo a la ley y al tipo de contrato suscrito.
2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre J&M INGENÍERIA SAS y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

JONAIKER JESUS URBANO ORTIZ
C.C.: 1118577273

MABEL SIERRA VARGAS
Representante Legal

Elaboró: Area contable
21-04-2026

PAZ Y SALVO

NOMBRE:	ROSELINO ACOSTA MENDOZA
CEDULA:	74.752.762
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA
FECHA DE INICIO DEL SERVICIO:	08/01/2026
FECHA DE TERMINACION DEL SERVICIO:	10/04/2026

HAGO CONSTAR

QUE LA EMPRESA **J&M INGENIERIA SAS** IDENTIFICADA CON NIT 900.103.645-8 SE ENCUENTRA A **PAZ Y SALVO** CON EL SEÑOR **ROSELINO ACOSTA MENDOZA** IDENTIFICADO CON C.C No **74752762** DE AGUAZUL POR CONCEPTO DE PAGOS DE SALARIOS DEVENGADOS, SUBSIDIOS EXTRALEGALES, VACACIONES, PRIMAS Y DEMAS PRESTACIONES A QUE TUVO DERECHO DE ACUERDO A LA LEY Y AL TIPO DE CONTRATO SUSCRITO ENTRE LAS PARTES; ASI CERTIFICO QUE RECIBI LA DOTACION Y ELEMEMNTOS DE PROTECCION PERSONAL EPP ACORDES A LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR DURANTE EL TIEMPO LABORADO EN LA EMPRESA.

FIRMA DEL TRABAJADOR
ROSELINO ACOSTA MENDOZA
74.752.762

PAZ Y SALVO

NOMBRE:	MAIRA ALEJANDRA ROSAS BECERRA
CEDULA:	1.116.548.753
CARGO:	INSPECTOR HSE
FECHA DE INICIO DEL SERVICIO:	08/01/2026
FECHA DE TERMINACION DEL SERVICIO:	10/04/2026

HAGO CONSTAR

QUE LA EMPRESA **J&M INGENIERIA SAS** IDENTIFICADA CON NIT 900.103.645-8 SE ENCUENTRA A **PAZ Y SALVO** CON EL SEÑOR **MAIRA ALEJANDRA ROSAS BECERRA** IDENTIFICADA CON C.C No **1116548753** DE AGUAZUL POR CONCEPTO DE PAGOS DE SALARIOS DEVENGADOS, SUBSIDIOS EXTRALEGALES, VACACIONES, PRIMAS Y DEMAS PRESTACIONES A QUE TUVO DERECHO DE ACUERDO A LA LEY Y AL TIPO DE CONTRATO SUSCRITO ENTRE LAS PARTES; ASI CERTIFICO QUE RECIBI LA DOTACION Y ELEMEMNTOS DE PROTECCION PERSONAL EPP ACORDES A LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR DURANTE EL TIEMPO LABORADO EN LA EMPRESA.

Alejandra Rosas

FIRMA DEL TRABAJADOR
MAIRA ALEJANDRA ROSAS BECERRA
1.116.548.753

PAZ Y SALVO

NOMBRE:	JAIRO YESID CARO PINTO
CEDULA:	1.118.553.390
CARGO:	AYUDANTE DE OBRA
FECHA DE INICIO DEL SERVICIO:	15/01/2026
FECHA DE TERMINACION DEL SERVICIO:	23/02/2026

HAGO CONSTAR

QUE LA EMPRESA **J&M INGENIERIA SAS** IDENTIFICADA CON NIT 900.103.645-8 SE ENCUENTRA A **PAZ Y SALVO** CON EL SEÑOR **JAIRO YESID CARO PINTO** IDENTIFICADO CON C.C No **1.118.553.390** DE YOPAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE SALARIOS DEVENGADOS, SUBSIDIOS EXTRALEGALES, VACACIONES, PRIMAS Y DEMAS PRESTACIONES A QUE TUVO DERECHO DE ACUERDO A LA LEY Y AL TIPO DE CONTRATO SUSCRITO ENTRE LAS PARTES; ASI CERTIFICO QUE RECIBI LA DOTACION Y ELEMEMNTOS DE PROTECCION PERSONAL EPP ACORDES A LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR DURANTE EL TIEMPO LABORADO EN LA EMPRESA.

FIRMA DEL TRABAJADOR
JAIRO YESID CARO PINTO
1.118.553.390

PAZ Y SALVO

NOMBRE:	JHON DARIO SALCEDO CONDIA
CEDULA:	1.055.206.087
CARGO:	AYUDANTE DE OBRA
FECHA DE INICIO DEL SERVICIO:	14/01/2026
FECHA DE TERMINACION DEL SERVICIO:	14/02/2026

HAGO CONSTAR

QUE LA EMPRESA **J&M INGENIERIA SAS** IDENTIFICADA CON NIT 900.103.645-8 SE ENCUENTRA A **PAZ Y SALVO** CON EL SEÑOR **JHON DARIO SALCEDO CONDIA** IDENTIFICADO CON C.C No **1055206087** DE AGUAZUL POR CONCEPTO DE PAGOS DE SALARIOS DEVENGADOS, SUBSIDIOS EXTRALEGALES, VACACIONES, PRIMAS Y DEMAS PRESTACIONES A QUE TUVO DERECHO DE ACUERDO A LA LEY Y AL TIPO DE CONTRATO SUSCRITO ENTRE LAS PARTES; ASI CERTIFICO QUE RECIBI LA DOTACION Y ELEMEMNTOS DE PROTECCION PERSONAL EPP ACORDES A LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR DURANTE EL TIEMPO LABORADO EN LA EMPRESA.

FIRMA DEL TRABAJADOR
JHON DARIO SALCEDO CONDIA
1.055.206.087

PAZ Y SALVO

NOMBRE:	WILLIAN ALEJANDRO TORRES ALFONSO
CEDULA:	1.029.642.586
CARGO:	AYUDANTE DE OBRA
FECHA DE INICIO DEL SERVICIO:	14/01/2026
FECHA DE TERMINACION DEL SERVICIO:	28/02/2026

HAGO CONSTAR

QUE LA EMPRESA **J&M INGENIERIA SAS** IDENTIFICADA CON NIT 900.103.645-8 SE ENCUENTRA A **PAZ Y SALVO** CON EL SEÑOR **WILLIAN ALEJANDRO TORRES ALFONSO** IDENTIFICADO CON C.C No **1029642586** DE AGUAZUL POR CONCEPTO DE PAGOS DE SALARIOS DEVENGADOS, SUBSIDIOS EXTRALEGALES, VACACIONES, PRIMAS Y DEMAS PRESTACIONES A QUE TUVO DERECHO DE ACUERDO A LA LEY Y AL TIPO DE CONTRATO SUSCRITO ENTRE LAS PARTES; ASI CERTIFICO QUE RECIBI LA DOTACION Y ELEMEMNTOS DE PROTECCION PERSONAL EPP ACORDES A LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR DURANTE EL TIEMPO LABORADO EN LA EMPRESA.

Alejandro T.

FIRMA DEL TRABAJADOR
WILLIAN ALEJANDRO TORRES ALFONSO
1.029.642.586

PAZ Y SALVO

NOMBRE:	CIRO ALFONSO ABRIL
CEDULA:	4.214.504
CARGO:	ELECTRICO
FECHA DE INICIO DEL SERVICIO:	03/02/2026
FECHA DE TERMINACION DEL SERVICIO:	06/02/2026

HAGO CONSTAR

QUE LA EMPRESA **J&M INGENIERIA SAS** IDENTIFICADA CON NIT 900.103.645-8 SE ENCUENTRA A **PAZ Y SALVO** CON EL SEÑOR **CIRO ALFONSO ABRIL** IDENTIFICADO CON C.C No **4214504** DE AGUAZUL POR CONCEPTO DE PAGOS DE SALARIOS DEVENGADOS, SUBSIDIOS EXTRALEGALES, VACACIONES, PRIMAS Y DEMAS PRESTACIONES A QUE TUVO DERECHO DE ACUERDO A LA LEY Y AL TIPO DE CONTRATO SUSCRITO ENTRE LAS PARTES; ASI CERTIFICO QUE RECIBI LA DOTACION Y ELEMEMNTOS DE PROTECCION PERSONAL EPP ACORDES A LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR DURANTE EL TIEMPO LABORADO EN LA EMPRESA.

Ciro Alfonso Abril

FIRMA DEL TRABAJADOR
CIRO ALFONSO ABRIL
4.214.504

PAZ Y SALVO

NOMBRE:	CARLOS ESTIVEN REYES VILLALOBOS
CEDULA:	1.006.442.514
CARGO:	AYUDANTE ELECTRICO
FECHA DE INICIO DEL SERVICIO:	03/02/2026
FECHA DE TERMINACION DEL SERVICIO:	06/02/2026

HAGO CONSTAR

QUE LA EMPRESA **J&M INGENIERIA SAS** IDENTIFICADA CON NIT 900.103.645-8 SE ENCUENTRA A **PAZ Y SALVO** CON EL SEÑOR **CARLOS ESTIVEN REYES VILLALOBOS** IDENTIFICADO CON C.C No **1006442514** DE AGUAZUL POR CONCEPTO DE PAGOS DE SALARIOS DEVENGADOS, SUBSIDIOS EXTRALEGALES, VACACIONES, PRIMAS Y DEMAS PRESTACIONES A QUE TUVO DERECHO DE ACUERDO A LA LEY Y AL TIPO DE CONTRATO SUSCRITO ENTRE LAS PARTES; ASI CERTIFICO QUE RECIBI LA DOTACION Y ELEMEMNTOS DE PROTECCION PERSONAL EPP ACORDES A LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR DURANTE EL TIEMPO LABORADO EN LA EMPRESA.

Carlos Reyes

FIRMA DEL TRABAJADOR
CARLOS ESTIVEN REYES VILLALOBOS
1.006.442.514

PAZ Y SALVO

NOMBRE:	DIEGO ARMANDO FERREIRA RODRIGUEZ
CEDULA:	1.096.206.917
CARGO:	OFICIAL DE OBRA
FECHA DE INICIO DEL SERVICIO:	21/01/2026
FECHA DE TERMINACION DEL SERVICIO:	04/04/2026

HAGO CONSTAR

QUE LA EMPRESA **J&M INGENIERIA SAS** IDENTIFICADA CON NIT 900.103.645-8 SE ENCUENTRA A **PAZ Y SALVO** CON EL SEÑOR **DIEGO ARMANDO FERREIRA RODRIGUEZ** IDENTIFICADO CON C.C No **1096206917** DE AGUAZUL POR CONCEPTO DE PAGOS DE SALARIOS DEVENGADOS, SUBSIDIOS EXTRALEGALES, VACACIONES, PRIMAS Y DEMAS PRESTACIONES A QUE TUVO DERECHO DE ACUERDO A LA LEY Y AL TIPO DE CONTRATO SUSCRITO ENTRE LAS PARTES; ASI CERTIFICO QUE RECIBI LA DOTACION Y ELEMEMNTOS DE PROTECCION PERSONAL EPP ACORDES A LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR DURANTE EL TIEMPO LABORADO EN LA EMPRESA.

FIRMA DEL TRABAJADOR
DIEGO ARMANDO FERREIRA RODRIGUEZ
1.096.206.917

PAZ Y SALVO

NOMBRE:	DANIEL ALEJANDRO DUQUE BENAVIDES
CEDULA:	1.116.506.654
CARGO:	AYUDANTE DE OBRA
FECHA DE INICIO DEL SERVICIO:	02/03/2026
FECHA DE TERMINACION DEL SERVICIO:	04/04/2026

HAGO CONSTAR

QUE LA EMPRESA **J&M INGENIERIA SAS** IDENTIFICADA CON NIT 900.103.645-8 SE ENCUENTRA A **PAZ Y SALVO** CON EL SEÑOR **DANIEL ALEJANDRO DUQUE BENAVIDES** IDENTIFICADO CON C.C No **1116506654** DE AGUAZUL POR CONCEPTO DE PAGOS DE SALARIOS DEVENGADOS, SUBSIDIOS EXTRALEGALES, VACACIONES, PRIMAS Y DEMAS PRESTACIONES A QUE TUVO DERECHO DE ACUERDO A LA LEY Y AL TIPO DE CONTRATO SUSCRITO ENTRE LAS PARTES; ASI CERTIFICO QUE RECIBI LA DOTACION Y ELEMEMNTOS DE PROTECCION PERSONAL EPP ACORDES A LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR DURANTE EL TIEMPO LABORADO EN LA EMPRESA.

Daniel

FIRMA DEL TRABAJADOR
DANIEL ALEJANDRO DUQUE BENAVIDES
1.116.506.654

PAZ Y SALVO

NOMBRE:	JOSE HERNANDO MOLINA MESA
CEDULA:	7.177.528
CARGO:	OFICIAL DE OBRA
FECHA DE INICIO DEL SERVICIO:	02/03/2026
FECHA DE TERMINACION DEL SERVICIO:	14/03/2026

HAGO CONSTAR

QUE LA EMPRESA **J&M INGENIERIA SAS** IDENTIFICADA CON NIT 900.103.645-8 SE ENCUENTRA A **PAZ Y SALVO** CON EL SEÑOR **JOSE HERNANDO MOLINA MESA** IDENTIFICADO CON C.C No **7177528** DE AGUAZUL POR CONCEPTO DE PAGOS DE SALARIOS DEVENGADOS, SUBSIDIOS EXTRALEGALES, VACACIONES, PRIMAS Y DEMAS PRESTACIONES A QUE TUVO DERECHO DE ACUERDO A LA LEY Y AL TIPO DE CONTRATO SUSCRITO ENTRE LAS PARTES; ASI CERTIFICO QUE RECIBI LA DOTACION Y ELEMEMNTOS DE PROTECCION PERSONAL EPP ACORDES A LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR DURANTE EL TIEMPO LABORADO EN LA EMPRESA.

FIRMA DEL TRABAJADOR
JOSE HERNANDO MOLINA MESA
7.177.528

PAZ Y SALVO

NOMBRE:	JONAIKER JESUS URBANO ORTIZ
CEDULA:	1.118.577.273
CARGO:	AYUDANTE
FECHA DE INICIO DEL SERVICIO:	16/03/2026
FECHA DE TERMINACION DEL SERVICIO:	10/04/2026

HAGO CONSTAR

QUE LA EMPRESA **J&M INGENIERIA SAS** IDENTIFICADA CON NIT 900.103.645-8 SE ENCUENTRA A **PAZ Y SALVO** CON EL SEÑOR **JONAIKER JESUS URBANO ORTIZ** IDENTIFICADO CON C.C No **1118577273** DE AGUAZUL POR CONCEPTO DE PAGOS DE SALARIOS DEVENGADOS, SUBSIDIOS EXTRALEGALES, VACACIONES, PRIMAS Y DEMAS PRESTACIONES A QUE TUVO DERECHO DE ACUERDO A LA LEY Y AL TIPO DE CONTRATO SUSCRITO ENTRE LAS PARTES; ASI CERTIFICO QUE RECIBI LA DOTACION Y ELEMEMNTOS DE PROTECCION PERSONAL EPP ACORDES A LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR DURANTE EL TIEMPO LABORADO EN LA EMPRESA.

FIRMA DEL TRABAJADOR
JONAIKER JESUS URBANO ORTIZ
1.118.577.273

Personería
Municipal de Aguazul

Aguazul Casanare, mayo (08) de 2026
OFPMA-441-2026 **Cite este número al contestar**

Señora
MABEL SIERRA VARGAS
R/L J&M INGENIERIA S.A.S
Correo: consorciocadazul2024@gmail.com
Yopal

Asunto: Respuesta a solicitud de certificación no existencia de quejas o reclamaciones laborales.

En nombre de la Personeria Municipal de Aguazul, reciba un cordial y atento saludo deseando que sus labores diarias se realicen con éxito.

Dando respuesta a solicitud arriba señalada, con todo respeto me permito comunicarle que una vez revisados los archivos de este despacho no se encontró queja, petición o reclamo de tipo laboral en la ejecución del contrato de obra No. 753 de 2025, de igual manera se fijó en Cartelera y pagina institucional de la entidad por el termino de cinco (5) dias hábiles comunicando a la ciudadania en general para que de existir alguna reclamación en la ejecución del contrato se comunicara a este despacho, donde luego del término establecido no se presentó ningún interesado a reclamar en relación a la ejecución del contrato de obra No. 753 del 2025, cuyo objeto es **"ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA UNIÓN CHARTE, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".**

Se aclara que este documento no se considera paz y salvo por parte del municipio, ya que únicamente se da información en relación con los archivos que reposan en la Personeria Municipal de Aguazul, por lo que se desconoce si existen quejas o reclamos al respecto en otro ente de control, entidad administrativa y / o judicial.

Con sentido de cordialidad y respeto.

LUIS FRANCISCO CALA CASTRO
Personero Municipal

Proyectó: Milena Solér Sanabria
Profesional de Apoyo

CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURIDICAS)

ARMANDO DE JESUS CAMACHO BUSTAMANTE identificado con 85.448.370, y con tarjeta profesional No. 64753-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de J&M INGENIERIA SAS identificada con NIT 900.103.645-8, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Casanare, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección.

No. PLANILLA	PERIODO		IBC	SALUD	PENSION	ARL	CCF	VALOR TOTAL APORTE
9497749063	22025-12	2026-01	$1.656.000	$ 265.000	$66.300	$8.700	$66.300	$ 406.300
9499442652	2026-01	2026-02	$ 6.186.533	$ 247.600	$ 990.100	$ 430.900	$ 247.600	$ 1.916.200
9499627594	2026-01	2026-02	$1.750.905	$ 280.200	$70.100	$9.200	$70.100	$ 429.600
9501227833	2026-02	2026-03	$ 9.629.978	$ 385.600	$ 1.541.200	$ 670.600	$ 385.600	$ 2.983.000
9501423080	2026-02	2026-03	$1.750.905	$ 280.200	$70.100	$9.200	$70.100	$ 429.600
9502774185	2026-03	2026-04	$ 8.579.436	$ 343.600	$ 1.373.000	$ 597.500	$ 343.600	$ 2.657.700
9502866922	2026-03	2026-04	$1.750.905	$ 280.200	$70.100	$9.200	$70.100	$ 429.600
9504480317	2026-04	2026-05	$ 2.217.813	$ 89.000	$ 355.000	$ 154.700	$ 89.000	$ 687.700
9502866922	2026-04	2026-06	$1.750.905	$ 280.200	$70.100	$9.200	$70.100	$ 429.600

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Aguazul, a los (08) días del mes de Mayo de 2026.

MABEL SIERRA VARGAS
R/L C.C. 1.116.542.304

ARMANDO DE JESUS CAMACHO BUSTAMANTE
C PUBLICO TP No. 64753-T REVISOR FISCAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No

E8688E47A687BA16

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ARMANDO DE JESUS CAMACHO BUSTAMANTE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 85448370 de SANTA MARTA (MAGDALENA) Y Tarjeta Profesional No 64753-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS . . . . . .

Dado en BOGOTA a los 8 días del mes de Abril de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado





aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900103645	8	J&M INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AGUAZUL	CARRERA 16 N 14 55	AGUAZUL-CASANARE	6384839	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2070712716	9497749063	E	2026/01/14	2026/01/09	BANCO DE BOGOTA	0	$10,143,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	ima	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
																						$35,670,300	$5,708,000			$35,670,300	$1,427,800			$35,670,300	$1,427,800			$35,670,300		$1,579,600		$0	$0		$10,143,200
SUCURSAL: AGUAZUL (22 Afiliados)																						$13,760,900	$2,202,000			$13,760,900	$550,700			$13,760,900	$550,700			$13,760,900		$64,700		$0	$0		$3,368,100
Centro de Trabajo: ADMIN (6 Afiliados)																						$13,760,900	$2,202,000			$13,760,900	$550,700			$13,760,900	$550,700			$13,760,900		$64,700		$0	$0		$3,368,100
Ciudad: AGUAZUL Depto: CASANARE (6 Afiliados)																						$13,760,900	$2,202,000			$13,760,900	$550,700			$13,760,900	$550,700			$13,760,900		$64,700		$0	$0		$3,368,100
1	CC	1116549589	CASTRO GALINDO ANGELA PAOLA													X				23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPSC25	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	0.000%	$0	30	$0	$0	SI	$341,800
2	CC	1098759214	DIAZ MATEUS LAURA XIMENA																	23030 1	30	$2,400,000	$384,000	EPS005	30	$2,400,000	$96,000	CCF69	30	$2,400,000	$96,000	14-25	30	$2,400,000	0.522%	$12,600	30	$0	$0	SI	$588,600
3	CC	1116549242	ROMERO MONROY DALIA AZUCENA							X										23020 1	30	$5,434,400	$869,600	EPS005	30	$5,434,400	$217,400	CCF69	30	$5,434,400	$217,400	14-25	30	$5,434,400	0.522%	$28,400	30	$0	$0	SI	$1,332,800
4	CC	1128385346	SALDARRIAGA BARRIENTOS GLORIA		X															23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
5	CC	1116542304	SIERRA VARGAS MABEL																	23030 1	30	$1,656,000	$265,000	EPS005	30	$1,656,000	$66,300	CCF69	30	$1,656,000	$66,300	14-25	30	$1,656,000	0.522%	$8,700	30	$0	$0	SI	$406,300
6	CC	33646953	SIERRA VARGAS PATRICIA																	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
Centro de Trabajo: OPER (16 Afiliados)																						$21,909,400	$3,506,000			$21,909,400	$877,100			$21,909,400	$877,100			$21,909,400		$1,514,900		$0	$0		$6,775,100
Ciudad: AGUAZUL Depto: CASANARE (16 Afiliados)																						$21,909,400	$3,506,000			$21,909,400	$877,100			$21,909,400	$877,100			$21,909,400		$1,514,900		$0	$0		$6,775,100
7	CC	12390121	BRAVO SUAREZ EDISON																	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
8	CC	17388820	BRAVO SUAREZ YESID ALONSO																	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
9	CC	1006442581	CALVO PARRA WILMER																	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
10	CC	9434838	CHALA GALINDO EDWIN ANDRES																	23030 1	27	$1,350,000	$216,000	EPS005	27	$1,350,000	$54,000	CCF69	27	$1,350,000	$54,000	14-25	27	$1,350,000	6.960%	$94,000	27	$0	$0	SI	$418,000
11	CC	9434838	CHALA GALINDO EDWIN ANDRES													X				23030 1	3	$150,000	$24,000	EPS005	3	$150,000	$6,000	CCF69	3	$150,000	$6,000	14-25	3	$150,000	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$36,000
12	CC	1115911035	CORREA LOPEZ ONEIRA VIVIANA																	23030 1	30	$1,656,000	$265,000	EPS037	30	$1,656,000	$66,300	CCF69	30	$1,656,000	$66,300	14-25	30	$1,656,000	6.960%	$115,300	30	$0	$0	SI	$512,900
13	CC	1116548700	GIRALDO BECERRA JAVIER ALEXANDER		X															23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
14	CC	1118531324	MONROY SILVA FREDY ALBERTO																	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
15	CC	74753111	PEREZ GARCIA ALVARO		X															23030 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF69	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	SI	$464,400
16	CC	1116542232	PLAZAS GUIO YAVID		X															25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF69	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	SI	$464,400
17	CC	91135249	RAMOS OREJARENA ORLANDO																	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPSC25	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
18	CC	1116551041	ROJAS PATIÑO DIANA ESTHEPHANIA																	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
19	CC	74753684	SILVA QUITIAN WILLIAM	X																23030 1	2	$94,900	$15,200	AUX002	2	$94,900	$3,800	CCF69	2	$94,900	$3,800	14-25	2	$94,900	6.960%	$6,700	2	$0	$0	SI	$29,500
20	CC	74753580	SUAREZ BRAVO JHON JAVIER		X															23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
21	CC	74755021	TORRES ALFONSO JOSE ALFREDO																	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPSC25	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
22	CC	1116542601	TORRES AGUDELO WILLIAM																	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
23	CC	79620243	VELASQUEZ JIMENEZ CARLOS RENE		X															23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
Total Afiliados(22)																						$35,670,300	$5,708,000			$35,670,300	$1,427,800			$35,670,300	$1,427,800			$35,670,300		$1,579,600		$0	$0		$10,143,200

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				22	$5,708,000	$0	$0	$5,708,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$467,800	$0	$0	$467,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	18	$4,142,800	$0	$0	$4,142,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$1,097,400	$0	$0	$1,097,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$1,579,600	$0	$0	$1,579,600
COLMENA	14-25	800,226,175	3	22	$1,579,600	$0	$0	$1,579,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$1,427,800	$0	$0	$1,427,800
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	22	$1,427,800	$0	$0	$1,427,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				22	$1,427,800	$0	$0	$1,427,800
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	3	$171,000	$0	$0	$171,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$3,800	$0	$0	$3,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$408,300	$0	$0	$408,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	11	$844,700	$0	$0	$844,700
TOTAL				22	$10,143,200	$0	$0	$10,143,200

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900103645	8	J&M INGENIERIA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PAPS CHARTE	CR 16 14 55	AGUAZUL-CASANARE	3124489719	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	49626942	9499442652	E	2026/02/11	2026/02/09	NEQUI	0	$1,916,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	74752762	ACOSTA MENDOZA ROSELINO	230301	23	$1,342,361	$214,800	EPS037	23	$1,342,361	$53,700	CCF69	23	$1,342,361	$53,700	14-25	23	$1,342,361	$93,500	23	$0	$0
2	CC	1118553390	CARO PINTO JAIRO YESID	230301	16	$933,816	$149,500	EPS041	16	$933,816	$37,400	CCF69	16	$933,816	$37,400	14-25	16	$933,816	$65,000	16	$0	$0
3	CC	1096206917	FERREIRA RODRIGUEZ DIEGO ARMANDO	230301	10	$583,635	$93,400	EPSC25	10	$583,635	$23,400	CCF69	10	$583,635	$23,400	14-25	10	$583,635	$40,700	10	$0	$0
4	CC	1116548753	ROJAS BECERRA MAIRA ALEJANDRA	230301	23	$1,342,361	$214,800	EPS037	23	$1,342,361	$53,700	CCF69	23	$1,342,361	$53,700	14-25	23	$1,342,361	$93,500	23	$0	$0
5	CC	1055706087	SALCEDO CONDIA JHON DARIO	230301	17	$992,180	$158,800	EPS005	17	$992,180	$39,700	CCF69	17	$992,180	$39,700	14-25	17	$992,180	$69,100	17	$0	$0
6	CC	1029642586	TORRES ALFONSO WILLIAN ALEJANDRO	230301	17	$992,180	$158,800	EPS005	17	$992,180	$39,700	CCF69	17	$992,180	$39,700	14-25	17	$992,180	$69,100	17	$0	$0
Total	**Afiliados(6)**					**$6,186,533**	**$990,100**			**$6,186,533**	**$247,600**			**$6,186,533**	**$247,600**			**$6,186,533**	**$430,900**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$990,100	$0	$0	$990,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$990,100	$0	$0	$990,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$430,900	$0	$0	$430,900
COLMENA	14-25	800,226,175	3	6	$430,900	$0	$0	$430,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$247,600	$0	$0	$247,600
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	6	$247,600	$0	$0	$247,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				6	$247,600	$0	$0	$247,600
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$23,400	$0	$0	$23,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$107,400	$0	$0	$107,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$37,400	$0	$0	$37,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$79,400	$0	$0	$79,400
TOTAL				6	$1,916,200	$0	$0	$1,916,200

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900103645	8	J&M INGENIERIA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PAPS CHARTE	CR 16 14 55	AGUAZUL-CASANARE	3124189719	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	125971713	9501227833	E	2026/03/11	2026/03/09	NEQUI	0	$2,983,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	4214504	ABRIL CIRO ALFONSO	230201	4	$233,454	$37,400	EPSC25	4	$233,454	$9,400	CCF69	4	$233,454	$9,400	14-25	4	$233,454	$16,300	4	$0	$0
2	CC	74752762	ACOSTA MENDOZA ROSELINO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
3	CC	1118553390	CARO PINTO JAIRO YESID	230301	23	$1,342,361	$214,800	EPS041	23	$1,342,361	$53,700	CCF69	23	$1,342,361	$53,700	14-25	23	$1,342,361	$93,500	23	$0	$0
4	CC	1096206917	FERREIRA RODRIGUEZ DIEGO ARMANDO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPSC25	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
5	CC	1006442514	REYES VILLALOBOS CARLOS ESTIVEN	230301	4	$233,454	$37,400	EPSC25	4	$233,454	$9,400	CCF69	4	$233,454	$9,400	14-25	4	$233,454	$16,300	4	$0	$0
6	CC	1116548753	ROSAS BECERRA MAIRA ALEJANDRA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
7	CC	1055206087	SALCEDO CONDIA JHON DARIO	230301	14	$817,089	$130,800	EPS005	14	$817,089	$32,700	CCF69	14	$817,089	$32,700	14-25	14	$817,089	$56,900	14	$0	$0
8	CC	1029642566	TORRES ALFONSO WILLIAN ALEJANDRO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
Total	**Afiliados(8)**					$9,629,978	$1,541,200			$9,629,978	$385,600			$9,629,978	$385,600			$9,629,978	$670,600		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				8	$1,541,200	$0	$0	$1,541,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,503,800	$0	$0	$1,503,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$37,400	$0	$0	$37,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$670,600	$0	$0	$670,600
COLMENA	14-25	800,226,175	3	8	$670,600	$0	$0	$670,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$385,600	$0	$0	$385,600
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	8	$385,600	$0	$0	$385,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				8	$385,600	$0	$0	$385,600
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	3	$88,900	$0	$0	$88,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$140,200	$0	$0	$140,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$53,700	$0	$0	$53,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$102,800	$0	$0	$102,800
TOTAL				8	$2,983,000	$0	$0	$2,983,000

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900103645	8	J&M INGENIERIA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PAPS CHARTE	CR 16 14 55	AGUAZUL-CASANARE	3124489719	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	202191711	9502774185	E	2026/04/14	2026/04/07	BANCOLOMBIA	0	$2,657,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	74752762	ACOSTA MENDOZA ROSELIRO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
2	CC	1116506654	DUQUE BENAVIDES DANIEL ALEJANDRO	230301	29	$1,692,542	$270,900	EPS041	29	$1,692,542	$67,800	CCF69	29	$1,692,542	$67,800	14-25	29	$1,692,542	$117,900	29	$0	$0
3	CC	1096206917	FERREIRA RODRIGUEZ DIEGO ARMANDO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPSC25	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
4	CC	7177528	MOLINA MESA JOSE HERNANDO	231001	13	$758,726	$121,400	ESSC24	13	$758,726	$30,400	CCF69	13	$758,726	$30,400	14-25	13	$758,726	$52,900	13	$0	$0
5	CC	1116548753	ROSAS BECERRA MAIRA ALEJANDRA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
6	CC	1118577273	URBANO ORTIZ JONAIKER JESUS	230301	15	$875,453	$140,100	EPSC25	15	$875,453	$35,100	CCF69	15	$875,453	$35,100	14-25	15	$875,453	$61,000	15	$0	$0
Total			**Afiliados(6)**			**$8,579,436**	**$1,373,000**			**$8,579,436**	**$343,600**			**$8,579,436**	**$343,600**			**$8,579,436**	**$597,500**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$1,373,000	$0	$0	$1,373,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$121,400	$0	$0	$121,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,251,600	$0	$0	$1,251,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$597,500	$0	$0	$597,500
COLMENA	14-25	800,226,175	3	6	$597,500	$0	$0	$597,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$343,600	$0	$0	$343,600
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	6	$343,600	$0	$0	$343,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				6	$343,600	$0	$0	$343,600
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	2	$105,200	$0	$0	$105,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$30,400	$0	$0	$30,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$140,200	$0	$0	$140,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$67,800	$0	$0	$67,800
TOTAL				6	$2,657,700	$0	$0	$2,657,700

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900103645	8	JGM INGENIERIA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PAPS CHARTE	CR 16 14 55	AGUAZUL-CASANARE	3124489719	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	289921704	9504480317	E	2026/05/13	2026/05/07	NEQUI	0	$687,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	74752762	ACOSTA MENDOZA ROSELINO	230301	10	$583,635	$93,400	EPS037	10	$583,635	$23,400	CCF69	10	$583,635	$23,400	14-25	10	$583,635	$40,700	10	$0	$0
2	CC	1116506654	DUQUE BENAVIDES DANIEL ALEJANDRO	230301	4	$233,454	$37,400	EPS041	4	$233,454	$9,400	CCF69	4	$233,454	$9,400	14-25	4	$233,454	$16,300	4	$0	$0
3	CC	1096206917	FERREIRA RODRIGUEZ DIEGO ARMANDO	230301	4	$233,454	$37,400	EPSC25	4	$233,454	$9,400	CCF69	4	$233,454	$9,400	14-25	4	$233,454	$16,300	4	$0	$0
4	CC	1116548753	ROSAS BECERRA MAIRA ALEJANDRA	230301	10	$583,635	$93,400	EPS037	10	$583,635	$23,400	CCF69	10	$583,635	$23,400	14-25	10	$583,635	$40,700	10	$0	$0
5	CC	1118577273	URBANO ORTIZ JONAIKER JESUS	230301	10	$583,635	$93,400	EPSC25	10	$583,635	$23,400	CCF69	10	$583,635	$23,400	14-25	10	$583,635	$40,700	10	$0	$0
Total	**Afiliados(5)**					$2,217,813	$355,000			$2,217,813	$89,000			$2,217,813	$89,000			$2,217,813	$154,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

309

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)								
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$355,000	$0	$0	$355,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$355,000	$0	$0	$355,000
COLMENA	14-25	800,226,175	3	5	$154,700	$0	$0	$154,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$154,700	$0	$0	$154,700
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	$89,000	$0	$0	$89,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$89,000	$0	$0	$89,000
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	5	$89,000	$0	$0	$89,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$32,800	$0	$0	$32,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$46,800	$0	$0	$46,800
TOTAL				1	$9,400	$0	$0	$9,400
				5	$687,700	$0	$0	$687,700
