INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA

RECIBO CTO OBRA 751/2025 – PAPS SAN JOSE DEL BUBUY

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 758 DE 2025

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSÉ DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

EPICO INGENIERIA S.A.S.



CONTRATO DE OBRA No. 751 DE 2025

ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY

Periodo: **22 de diciembre de 2025 al 30 de abril de 2026**

CARRERA 16 No. 12-18 (AGUAZUL – CASANARE). CEL. 3115518363 - email: epicoing@gmail.com

EPICO INGENIERIA S.A.S.
ESTUDIOS PROFESIONALES, INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES
NIT: 900.105.134-5

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA **VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA** DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
Contrato de Obra No. 751 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD **SAN JOSE DEL BUBUY**, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

GENERALIDADES DEL CONTRATO

El presente **Informe Final de Interventoría para Recibo y Liquidación** consolida el seguimiento, control, verificación y cierre integral efectuado por **ESTUDIOS PROFESIONALES INTERVENTORÍAS Y CONSTRUCCIONES INGENIERÍA S.A.S. – EPICO INGENIERÍA S.A.S.**, en desarrollo del **Contrato de Consultoría No. SECOP II CP-008-2025**, identificado internamente con el **No. 758 de 2025**, suscrito el **03 de diciembre de 2025**, cuyo objeto corresponde a la **interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental, contable y jurídica de las obras de adecuación menor de los Puestos de Atención Primaria en Salud — PAPS de las veredas San José del Bubuy, San Miguel de Farallones y La Turua, en el municipio de Aguazul, Casanare**.

Para el caso particular del presente documento, se presenta el resultado final de las actividades de interventoría adelantadas sobre el **Contrato de Obra No. 751 de 2025**, cuyo objeto corresponde a la **"ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSÉ DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE"**.

El presente informe tiene como finalidad dejar constancia del desarrollo y cierre de la ejecución contractual, incluyendo la verificación de las actividades ejecutadas, el balance final de cantidades de obra, las modificaciones efectuadas durante la ejecución, el comportamiento técnico y financiero del proyecto, el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista y el concepto final de la interventoria frente a la terminación de las obras. En consecuencia, este documento se emite como soporte técnico, administrativo, financiero, ambiental, contable y jurídico para adelantar el trámite de **recibo final y liquidación del Contrato de Obra No. 751 de 2025**.

Información del Contrato de Obra No. 751 de 2025

- **Contratante:** Hospital de Aguazul Juan Hernando Urrego E.S.E.
- **Tipo de contrato:** Obra.
- **Proceso:** CP 005-2025.
- **Contratista:** CONSORCIO SAN JOSÉ DEL BUBUY.
- **Representante Legal:** Rossy Elena Niño Gómez.
- **Objeto contractual:** "ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSÉ DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE".
- **Localización:** Aguazul, Casanare.
- **Valor inicial del contrato:** CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE **($448.678.617,00)**.
- **Plazo inicial:** Dos (02) meses y veinte (20) días.
- **Fecha de inicio:** 22 de diciembre de 2025.
- **Fecha de terminación inicial:** 13 de marzo de 2026.
- **Fecha de terminación final:** 30 de abril de 2026.

CARRERA 16 No. 12-18 (AGUAZUL – CASANARE). CEL. 3115518363 - email: epicoing@gmail.com

Modificaciones al contrato

- **Suspensión No. 1:** 29 de diciembre de 2025.
- **Reinicio No. 1:** 08 de enero de 2026.
- **Prórroga No. 1:** Un (01) mes y diez (10) días.
- **Modificatorio No. 1:** Modificación de cantidades de obra.

Soporte presupuestal:

- Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP): No. 893 del 15 de agosto de 2025
- Registro Presupuestal (RP): No. 1344 del 1 de diciembre de 2025

Información del Contrato de Interventoría No. 758 de 2025

- Tipo contractual: Contrato de Consultoría
- Número SECOP II: CP 008-2025
- Número interno: 758-2025
- Fecha de suscripción: 03 de diciembre de 2025
- Contratante: Hospital de Aguazul Juan Hernando Urrego E.S.E.
- Contratista – Interventor: ESTUDIOS PROFESIONALES INTERVENTORÍAS Y CONSTRUCCIONES INGENIERÍA S.A.S. – EPICO INGENIERÍA S.A.S.
- NIT: 900.105.134-5
- Representante Legal: Omar Agusto Neira Sierra
- Cédula de Ciudadanía: 74.755.228 expedida en Aguazul
- Objeto contractual: "Interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental, contable y jurídica de la adecuación menor de los Puestos de Atención Primaria en Salud de la vereda San José del Bubuy, San Miguel de Farallones y La Turua del municipio de Aguazul, Casanare."
- Valor del contrato: SESENTA Y UN MILLONES TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($61.037.331)
- Plazo: Cuatro (04) meses
- Fecha de inicio: 15 de diciembre de 2025
- Fecha de terminación inicial: 14 de abril de 2026

Modificaciones al contrato:

- Suspensión No. 1: 29 de diciembre de 2025
- Plazo de suspensión: Diez (10) días calendario
- Reinicio No. 1: 08 de enero de 2026
- Prorroga No. 1: Del 22 de abril de 2026, por Quince (15) días
- **Acta de terminación: 8 de mayo de 2026**

Soporte presupuestal:

- CDP: No. 1120 del 07 de octubre de 2025
- RP: No. 1354 del 03 de diciembre de 2025

EPICO INGENIERIA S.A.S.
ESTUDIOS PROFESIONALES, INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES
NIT: 900.105.134-5

Supervisión

El Supervisor designado por la entidad contratante para el contrato de obra y el contrato de interventoría es:

JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO, Jefe de Oficina de Gestión del Ambiente Físico y Tecnológico del Hospital de Aguazul Juan Hernando Urrego E.S.E.

El presente informe consolida el resultado final de la gestión integral desarrollada por la interventoría durante la ejecución del **Contrato de Obra No. 751 de 2025**, correspondiente a la **adecuación menor del Puesto de Atención Primaria en Salud San José del Bubuy del municipio de Aguazul, Casanare**, desde el inicio de las actividades hasta la terminación de las obras. En este documento se recogen las actuaciones de seguimiento, control y verificación efectuadas en los componentes técnico, administrativo, financiero, ambiental, contable y jurídico, en cumplimiento de las obligaciones derivadas del **Contrato de Interventoria No. 758 de 2025**. Así mismo, se deja constancia del estado final de ejecución, del cumplimiento del objeto contractual, de las cantidades de obra efectivamente ejecutadas y verificadas, del balance final del contrato y de las condiciones de recibo de las obras, constituyéndose en soporte para el **recibo final** y el correspondiente trámite de **liquidación contractual**.

Alcance de la interventoría

Durante la ejecución del **Contrato de Obra No. 751 de 2025**, la interventoría realizó seguimiento permanente al desarrollo de las actividades constructivas correspondientes a la **adecuación menor del Puesto de Atención Primaria en Salud San José del Bubuy**, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, condiciones contractuales, cantidades ejecutadas, calidad de materiales, avances físicos, soportes administrativos, obligaciones de seguridad social, garantías contractuales y demás aspectos técnicos, financieros, ambientales, contables y jurídicos aplicables.

El ejercicio de interventoría desarrollado en el marco del **Contrato de Consultoría No. 758 de 2025** comprendió la verificación integral de las actividades ejecutadas, el acompañamiento técnico durante el desarrollo de la obra, la revisión de los soportes documentales y contractuales, así como la consolidación del balance final de cantidades y valores ejecutados, con el fin de establecer las condiciones de recibo final y servir de soporte para el trámite de liquidación contractual.

El seguimiento de interventoria comprendió principalmente:

- Verificación física de las actividades ejecutadas en obra.
- Revisión de cantidades de obra, memorias de cálculo y balance final.
- Seguimiento a la programación contractual y a las modificaciones formalizadas durante la ejecución.
- Control técnico de las actividades constructivas ejecutadas, incluyendo preliminares, pisos, enchapes, instalaciones hidráulicas, sanitarias, aparatos sanitarios, muros, acabados, cubierta, instalaciones eléctricas, carpintería metálica y demás actividades complementarias.

- Verificación de ítems no previstos incorporados durante la ejecución, necesarios para garantizar la funcionalidad y adecuada terminación de la infraestructura intervenida.
- Control técnico de los ajustes derivados del proceso de verificación y certificación RETIE.
- Revisión de soportes administrativos, pólizas, garantías contractuales, seguridad social y demás documentos exigidos para el cierre contractual.
- Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones ambientales básicas, manejo de residuos, orden y limpieza de obra.
- Registro fotográfico de los avances, actividades ejecutadas y estado final de las obras.
- Verificación del presupuesto ejecutado final y de las cantidades efectivamente realizadas.
- Emisión de concepto técnico para el recibo final de la obra y el trámite de liquidación contractual.

En consecuencia, la interventoría cumplió una función de control integral sobre la ejecución del contrato, orientada a garantizar que las obras recibidas correspondan a las cantidades realmente ejecutadas, a las condiciones técnicas aprobadas, a los soportes contractuales y al objeto establecido para el **PAPS San José del Bubuy**.

Ejecución Fisica ó Nivel de ejecución de la obra

Con fundamento en las verificaciones realizadas en campo, el registro fotográfico, las memorias de cantidades, las actas contractuales suscritas, el presupuesto ejecutado final y el seguimiento permanente efectuado por la interventoría, se evidencia que las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto contractual fueron ejecutadas y culminadas.

La obra presenta terminación física integral de las actividades requeridas para la **adecuación menor del Puesto de Atención Primaria en Salud San José del Bubuy**, encontrándose las áreas intervenidas en condiciones funcionales para el uso previsto, sin evidenciarse actividades pendientes que impidan su recibo final desde el punto de vista técnico y operativo.

Así mismo, se deja constancia de que fueron expedidos los dictámenes de inspección y verificación de cumplimiento del **RETIE** correspondientes al proyecto, así:

- **Dictamen de Inspección y Verificación de Cumplimiento del RETIE No. E49960**, correspondiente a la instalación de **distribución en baja tensión**, emitido el **16 de junio de 2026** por **EVALUADORES DE LA CONFORMIDAD S.A.S.**, con resultado **APROBADO** y vigencia hasta el **16 de junio de 2031**.
- **Dictamen de Inspección y Verificación de Cumplimiento del RETIE No. E49959**, correspondiente a la instalación eléctrica de **uso final**, emitido el **16 de junio de 2026** por **EVALUADORES DE LA CONFORMIDAD S.A.S.**, con resultado **APROBADO** y vigencia hasta el **16 de junio de 2031**.

En consecuencia, queda acreditado el cumplimiento del requisito RETIE respecto de las instalaciones eléctricas objeto de inspección, constituyéndose dichos dictámenes en soportes técnicos válidos para el recibo final de la obra y el trámite de liquidación contractual.

Las actividades ejecutadas comprendieron, entre otras:

- Actividades preliminares, desmontes y demoliciones.
- Adecuación de pisos, enchapes, muros y acabados.
- Instalaciones hidráulicas y sanitarias.
- Adecuación de aparatos sanitarios y elementos funcionales.
- Intervenciones en cubierta.
- Instalaciones eléctricas.
- Carpintería metálica y de madera.
- Ítems no previstos necesarios para la funcionalidad y adecuada terminación de la infraestructura.
- Actividades asociadas al cumplimiento RETIE.
- Obras complementarias, limpieza, terminación y disposición final para recibo.

La interventoria realizó la revisión y verificación de las cantidades de obra ejecutadas, con base en las mediciones efectuadas en campo, memorias de cálculo, registros fotográficos, informes de seguimiento, actas contractuales y demás soportes técnicos que integran el expediente contractual. Como resultado de dicha revisión, se consolidó el balance final de cantidades y valores ejecutados, el cual constituye soporte para el recibo final de la obra y el correspondiente trámite de liquidación contractual.

Conforme al presupuesto ejecutado final actualizado, el valor total ejecutado del **Contrato de Obra No. 751 de 2025** corresponde a la suma de **CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($448.675.868,00)**

Teniendo en cuenta que el valor contractual del **Contrato de Obra No. 751 de 2025** corresponde a **CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($448.678.617,00)**, el valor ejecutado representa aproximadamente el **100% del valor contractual**, quedando un saldo sin ejecutar de **DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($2.749,00)**, diferencia mínima que no afecta el cumplimiento sustancial del objeto contratado.

En consecuencia, la interventoria concluye que la obra se encuentra **fisicamente terminada, funcional, verificada y en condiciones de recibo final**, conforme a las cantidades efectivamente ejecutadas y certificadas. De igual manera, con la expedición de los dictámenes RETIE aprobados y la consolidación del presupuesto ejecutado final, el contrato cuenta con los soportes técnicos necesarios para avanzar al cierre financiero y al correspondiente trámite de **liquidación contractual**.

Modificaciones y ajustes técnicos durante la ejecución

Durante el desarrollo contractual se presentaron situaciones técnicas que hicieron necesario ajustar cantidades de obra y actividades inicialmente previstas, lo cual fue formalizado mediante la **Modificatoria No. 1** y la **Prórroga No. 1**, conforme a las necesidades verificadas durante la ejecución del proyecto.

Estos ajustes estuvieron asociados principalmente a la necesidad de optimizar la ejecución de las actividades técnicas del proyecto, atender condiciones reales identificadas en campo, incorporar ítems y cantidades requeridas para garantizar la funcionalidad de la infraestructura intervenida, y asegurar el cumplimiento de las condiciones técnicas aplicables al **Puesto de Atención Primaria en Salud San José del Bubuy**.

La interventoria revisó y conceptuó favorablemente las modificaciones tramitadas, teniendo en cuenta que estas resultaban necesarias para la adecuada culminación del objeto contractual, sin evidenciarse afectación a la finalidad del proyecto ni a la funcionalidad del Puesto de Atención Primaria en Salud.

De acuerdo con el presupuesto ejecutado final actualizado y los soportes del acta de recibo final, el contrato tuvo un valor inicial de **CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($448.678.617,00)** y un valor final ejecutado de **CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($448.675.868,00)**, quedando un saldo sin ejecutar de **DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($2.749,00)**, diferencia mínima que no afecta el cumplimiento sustancial del objeto contractual ni la funcionalidad de las obras ejecutadas.

Certificación RETIE

Uno de los componentes relevantes para el cierre técnico del proyecto corresponde a la verificación y aprobación de las instalaciones eléctricas conforme al **Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE**.

Para el caso del **Puesto de Atención Primaria en Salud – PAPS San José del Bubuy**, fueron expedidos dos dictámenes de inspección y verificación de cumplimiento RETIE, correspondientes a los componentes de **distribución en baja tensión** y **uso final** de las instalaciones eléctricas del proyecto.

El **Dictamen de Inspección y Verificación de Cumplimiento del RETIE No. E49960**, de fecha **16 de junio de 2026**, fue emitido por el organismo de inspección **EVALUADORES DE LA CONFORMIDAD S.A.S.**, acreditado bajo el No. **15-OIN-017**. Este dictamen corresponde a la instalación de **distribución en baja tensión**, desde el punto de conexión de red concéntrico en cable **3x1/0 F + 1x1/0 N**, con una longitud de **18 metros** hasta el tablero de medida con protección de **3x100 AMP**. El resultado de la inspección fue **APROBADO**, con vigencia de cinco años y fecha de vencimiento el **16 de junio de 2031**.

Así mismo, el **Dictamen de Inspección y Verificación de Cumplimiento del RETIE No. E49959**, de fecha **16 de junio de 2026**, fue emitido por **EVALUADORES DE LA CONFORMIDAD S.A.S.** y corresponde a la instalación eléctrica de **uso final** del PAPS San José del Bubuy. De acuerdo con su alcance, la inspección comprendió las instalaciones médicas en baja tensión desde el tablero de medida y circuito alimentador hasta los tableros de distribución en piso 1, piso 2 y auditorio, salidas de circuitos ramales, tomas e iluminación para consultorios médicos, consultorio odontológico, auditorio, sala de espera, baños, alumbrado de emergencia y sistema de puesta a tierra, en un área aproximada de **394 m²**. El resultado de la inspección fue **APROBADO**, con vigencia hasta el **16 de junio de 2031**.

En consecuencia, se acredita el cumplimiento del requisito RETIE correspondiente a las instalaciones eléctricas ejecutadas en el proyecto, constituyéndose dichos dictámenes en soportes técnicos válidos para el recibo final de la obra y el trámite de liquidación contractual.

Así mismo, dentro del presupuesto ejecutado final se incluyó el concepto de **Certificación RETIE** por valor de **CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($5.000.000,00)**, el cual hace parte del valor total ejecutado del contrato, que asciende a **CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($448.675.868,00)**.

En virtud de lo anterior, la interventoría deja constancia de que el requisito técnico relacionado con la **certificación RETIE** fue cumplido, verificado e incorporado como soporte del cierre técnico del proyecto, por lo cual no existen observaciones pendientes en este componente que impidan avanzar con el **recibo final** y el correspondiente proceso de **liquidación contractual del Contrato de Obra No. 751 de 2025**.

Estado financiero y balance de ejecución

De acuerdo con el balance final revisado y verificado por la interventoria, el **Contrato de Obra No. 751 de 2025** cuenta con un valor contractual de **CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($448.678.617,00)**, respaldado presupuestalmente mediante el **CDP No. 893** y el **RP No. 1344**.

Conforme al presupuesto ejecutado final actualizado, las cantidades de obra efectivamente ejecutadas, medidas, calculadas y verificadas por la interventoría ascienden a un valor total ejecutado de **CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($448.675.868,00)**, equivalente aproximadamente al **100% del valor contractual**. Dicho

valor incluye el subtotal de obras, los costos indirectos correspondientes al A.I.U. y el valor de la certificación RETIE, conforme al balance final de ejecución.

El valor ejecutado se encuentra discriminado así: subtotal de obras por **TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($341.289.129,00)**; administración del **23%** por valor de **SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($78.496.499,67)**; imprevistos del **2%** por valor de **SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($6.825.782,58)**; utilidad del **5%** por valor de **DIECISIETE MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($17.064.456,45)**, para un total de **A.I.U. del 30%** equivalente a **CIENTO DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($102.386.739,00)**. En consecuencia, el total de costos directos más A.I.U. corresponde a **CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($443.675.868,00)**, más el valor de la certificación RETIE por **CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($5.000.000,00)**, para un total ejecutado de **CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($448.675.868,00)**.

En consecuencia, frente al valor contractual de **CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($448.678.617,00)**, se establece un saldo no ejecutado de **DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($2.749,00)**, diferencia mínima que no afecta el cumplimiento sustancial del objeto contractual ni la funcionalidad de las obras ejecutadas.

El valor a reconocer y pagar al contratista corresponde al valor efectivamente ejecutado, verificado y aprobado por la interventoría, esto es, la suma de **CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($448.675.868,00)**, valor que deberá quedar incorporado en el **Acta de Recibo Final de Obra** y servir como soporte para el trámite de pago correspondiente y la posterior liquidación contractual, previa aplicación de las deducciones, retenciones o descuentos a que haya lugar.

La interventoria verificó que las cantidades reconocidas corresponden a actividades efectivamente ejecutadas y debidamente soportadas, sin evidenciar pagos por cantidades no ejecutadas, sobrecostos injustificados o situaciones que representen riesgo de detrimento patrimonial para la entidad contratante.

Estado administrativo, jurídico y de garantías

Durante la ejecución contractual, la interventoria verificó la legalización del **Contrato de Obra No. 751 de 2025**, la existencia de los soportes presupuestales correspondientes, la constitución de las garantías contractuales, el cumplimiento de las obligaciones administrativas del contratista y la formalización de las actuaciones contractuales requeridas para el adecuado desarrollo del proyecto.

Dentro de dichas actuaciones se incluyeron la **Suspensión No. 1**, el **Reinicio No. 1**, la **Prórroga No. 1** y la **Modificatoria No. 1**, documentos que permitieron ajustar la ejecución contractual a las condiciones reales verificadas en campo, mantener la trazabilidad administrativa y jurídica del contrato, y garantizar la adecuada culminación del objeto contratado.

Así mismo, se deja constancia de que el requisito técnico asociado al cumplimiento del **Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas — RETIE** fue atendido mediante la expedición de los siguientes dictámenes:

- **Dictamen de Inspección y Verificación de Cumplimiento del RETIE No. E49960**, correspondiente a la instalación de **distribución en baja tensión**, con resultado **APROBADO**, emitido el **16 de junio de 2026**, con vigencia hasta el **16 de junio de 2031**.
- **Dictamen de Inspección y Verificación de Cumplimiento del RETIE No. E49959**, correspondiente a la instalación eléctrica de **uso final**, con resultado **APROBADO**, emitido el **16 de junio de 2026**, con vigencia hasta el **16 de junio de 2031**.

No se evidenciaron incumplimientos contractuales que dieran lugar a la imposición de multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento o afectación de garantias. En tal sentido, desde el componente administrativo, juridico y contractual, la interventoría considera que existen soportes suficientes para adelantar el **recibo final** y continuar con el trámite de **liquidación del Contrato de Obra No. 751 de 2025**, previa verificación final de los documentos exigidos por la entidad contratante para dicho cierre.

ACTUALIZACIÓN POLIZAS SEGÚN PRÓRROGA N°1					
DESCRIPCIÓN DE AMPAROS					
COMPAÑIA	POLIZA Y CERT. N°	AMPARO	VIGENCIA		SUMA ASEGURADA
			DESDE	HASTA	
SEGUROS MUNDIAL	COQ-10007591 ANEXO: 2	CUMPLIMIENTO	22/12/2025	30/10/2026	$44.867.861,70
		PRESTACIONES SOCIALES	22/12/2025	30/04/2029	$22.433.930,85
		CALIDAD DEL SERVICIO	22/12/2025	30/10/2026	$44.867.861,70
		CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	22/12/2025	30/10/2026	$44.867.861,70
		ESTABILIDAD DE LA OBRA	30/04/2026	30/04/2031	$134.603.585,10
	COQ-100001941 ANEXO: 2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	22/12/2025	30/04/2026	$284.700.000,00

Para efectos del cierre contractual, recibo final y liquidación del Contrato de Obra No. 751 de 2025, deberá verificarse que las garantías contractuales se encuentren actualizadas conforme al valor contractual, las modificaciones aprobadas, el plazo final de ejecución y la fecha de suscripción del acta de recibo final.

Esta actualización es necesaria para garantizar que los amparos contractuales se mantengan vigentes conforme a los porcentajes y plazos exigidos en el contrato, especialmente aquellos que deben extenderse hasta la liquidación y los relacionados con la estabilidad y calidad de la obra, de acuerdo con lo establecido en la cláusula décima tercera, que señala lo siguiente:

No.	Amparo / Garantía	Valor asegurado exigido	Vigencia exigida según contrato	Observación para liquidación
1	**Cumplimiento**	10% del valor total del contrato	Por el término de ejecución del contrato y seis meses más, o hasta la liquidación del mismo	Debe verificarse que se encuentre vigente hasta la liquidación final del contrato.
2	**Calidad del servicio**	10% del valor del contrato	Igual al plazo de ejecución y seis meses más, contados a partir de la firma del contrato, manteniéndose vigente hasta la liquidación	Debe actualizarse si la vigencia no cubre la fecha de liquidación.
3	**Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales**	5% del valor total del contrato	Por el plazo del contrato y tres años más	Debe verificarse que cubra el término contractual y los tres años posteriores.
4	**Calidad de los bienes a suministrar**	10% del valor del contrato	Igual al plazo de ejecución y seis meses más, contados a partir de la firma del contrato	Debe revisarse su vigencia y correspondencia con los bienes efectivamente suministrados.
5	**Responsabilidad civil extracontractual**	No inferior a 200 SMLMV al momento de expedición de la póliza	Por el término de ejecución del contrato	Debe verificarse que haya estado vigente durante toda la ejecución contractual.
6	**Estabilidad y calidad de la obra**	30% del valor total del contrato	Cinco años contados a partir de la suscripción del acta de recibo final	Esta garantía debe constituirse o actualizarse con base en la fecha del acta de recibo final.

Para la liquidación final del contrato, el contratista deberá presentar la actualización y/o ampliación de las pólizas correspondientes, con base en el acta de recibo final que se suscriba como resultado del presente informe final de interventoría. Esta actualización es necesaria para garantizar que los amparos contractuales se mantengan vigentes conforme a los porcentajes y plazos exigidos en el contrato, especialmente aquellos que deben extenderse hasta la liquidación y los relacionados con la estabilidad y calidad de la obra.

CARRERA 16 No. 12-18 (AGUAZUL – CASANARE). CEL. 3115518363 - email: epicoing@gmail.com

Estado actual del proceso

A la fecha de elaboración del presente informe, el **Contrato de Obra No. 751 de 2025** se encuentra terminado en su ejecución física, con las actividades requeridas para el cumplimiento del objeto contractual ejecutadas, verificadas y recibidas por la interventoria desde el punto de vista técnico y operativo.

Así mismo, se deja constancia de que fueron expedidos los dictámenes RETIE correspondientes a los componentes de **distribución en baja tensión** y **uso final**, ambos con resultado **APROBADO**, lo cual acredita la conformidad reglamentaria de las instalaciones eléctricas ejecutadas en el **Puesto de Atención Primaria en Salud San José del Bubuy**.

De igual manera, la interventoria verificó y consolidó el presupuesto ejecutado final, estableciendo como valor total ejecutado la suma de **CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($448.675.868,00)**. Frente al valor contractual de **CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($448.678.617,00)**, se establece un saldo sin ejecutar de **DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($2.749,00)**, diferencia mínima que no afecta el cumplimiento sustancial del objeto contratado ni la funcionalidad de las obras ejecutadas.

En consecuencia, el contrato se encuentra en etapa de **recibo final y liquidación contractual**, contando con los soportes técnicos, administrativos, financieros, ambientales, contables y jurídicos necesarios para adelantar las actuaciones de cierre correspondientes.

Concepto final de interventoría

Con fundamento en las verificaciones técnicas, administrativas, financieras, ambientales, contables y jurídicas realizadas durante la ejecución del **Contrato de Obra No. 751 de 2025**, la interventoria conceptúa que:

- Las obras objeto del contrato fueron ejecutadas y culminadas conforme al alcance contractual aprobado y a las modificaciones formalizadas durante la ejecución.
- Las actividades desarrolladas permitieron cumplir el objeto contractual relacionado con la **adecuación menor del Puesto de Atención Primaria en Salud San José del Bubuy del municipio de Aguazul, Casanare**.
- Las cantidades de obra ejecutadas se encuentran soportadas en el presupuesto ejecutado final, memorias de cantidades, actas contractuales, registros fotográficos e informes de seguimiento elaborados durante la ejecución del contrato.
- Las modificaciones contractuales realizadas fueron tramitadas y formalizadas conforme a las necesidades técnicas verificadas durante la ejecución, sin alterar la naturaleza del objeto contractual ni la finalidad del proyecto.

- El valor final ejecutado del contrato corresponde a la suma de **CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($448.675.868,00),** de acuerdo con el balance final de cantidades revisado y verificado por la interventoría.
- Frente al valor contractual de CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($448.678.617,00), se establece un saldo sin ejecutar de **DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($2.749,00**), diferencia mínima que no afecta el cumplimiento sustancial del objeto contractual.
- El componente eléctrico cuenta con los dictámenes de inspección y verificación de cumplimiento RETIE **No. E49960** y **No. E49959**, ambos con resultado **APROBADO**, por lo cual se acredita la conformidad reglamentaria de las instalaciones eléctricas ejecutadas.
- No se evidencian situaciones técnicas, financieras, jurídicas, ambientales, administrativas o contractuales que impidan continuar con el proceso de recibo final y liquidación contractual.

En consecuencia, la interventoría emite **concepto favorable** respecto del estado final de ejecución del **Contrato de Obra No. 751 de 2025** y recomienda adelantar las actuaciones administrativas correspondientes para la suscripción del **acta de recibo final de obra**, el trámite de pago del valor efectivamente ejecutado y la posterior **liquidación contractual**, conforme a los documentos y soportes que integran el expediente del contrato.

Registro Fotográfico Final

El siguiente soporte fotográfico permite evidenciar el estado final de las áreas intervenidas y la culminación de los trabajos objeto del contrato.

FACHADA PRINCIPAL









FACHADA POSTERIOR









FACHADA LATERAL





TERRAZA









VACUNACION – SEGUNDO PISO









BAÑOS MIXTOS SEGUNDO PISO










ZONAS COMUNES – SEGUNDO PISO Y RAMPA DE ACCESO









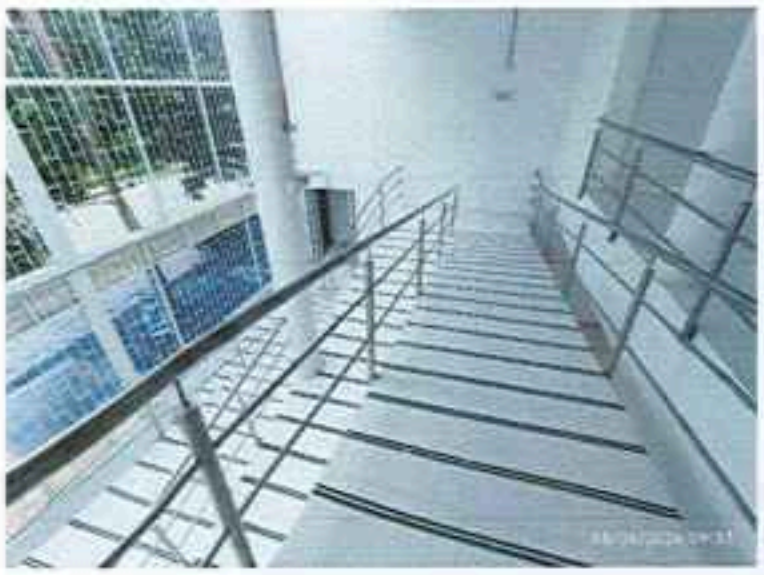







AUDITORIO





EPICO INGENIERIA S.A.S.
ESTUDIOS PROFESIONALES, INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES
NIT. 900.105.134-5

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA – RECIBO CTO OBRA 751/2025 – PAPS SAN JOSE DEL BUBUY

Contrato de Consultoria No. 758 de 2025 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA **VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA** DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
Contrato de Obra No. 751 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD **SAN JOSE DEL BUBUY**, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE





ZONAS COMUNES PRIMER PISO – SALA DE ESPERA









CARRERA 16 No. 12-18 (AGUAZUL – CASANARE). CEL. 3115518363 - email: epicoing@gmail.com









CUARTOS DE ASEO, ALMACENAMIENTO Y RESIDUOS





CARRERA 16 No. 12-18 (AGUAZUL – CASANARE). CEL. 3115518363 - email: epicoing@gmail.com





CONSULTORIOS Y ODONTOLOGIA










EPICO INGENIERIA S.A.S.
ESTUDIOS PROFESIONALES, INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES
NIT: 900.105.134-5

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA – RECIBO CTO OBRA 751/2025 – PAPS SAN JOSE DEL BUBUY

Contrato de Consultoria No. 758 de 2025 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA **VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA** DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
Contrato de Obra No. 751 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD **SAN JOSE DEL BUBUY**, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

TABLEROS DE ENERGIA

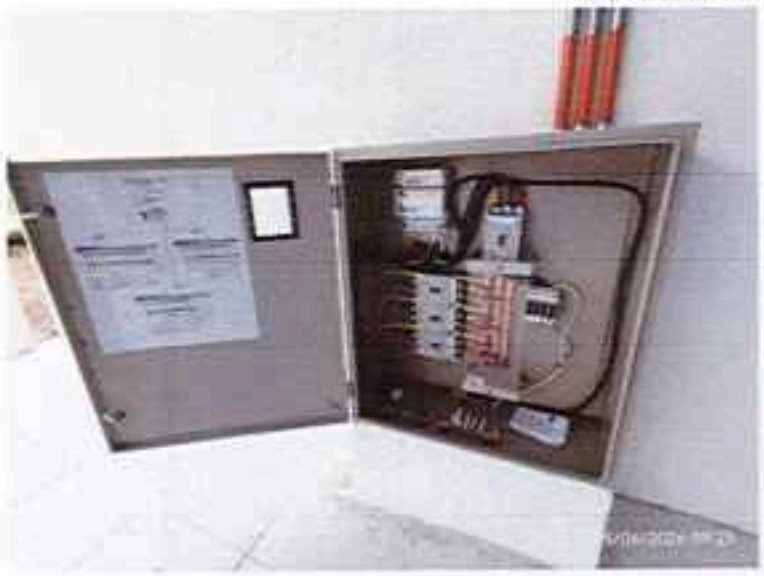



PUERTA DE INGRESO PRINCIPAL









CARRERA 16 No. 12-18 (AGUAZUL – CASANARE). CEL. 3115518363 - email: epicoing@gmail.com

El presente **Informe Final de Interventoría para Recibo y Liquidación** consolida el ejercicio integral de seguimiento, control y verificación técnica, administrativa, financiera, ambiental, contable y jurídica desarrollado por **ESTUDIOS PROFESIONALES INTERVENTORÍAS Y CONSTRUCCIONES INGENIERÍA S.A.S. – EPICO INGENIERIA S.A.S.**, en cumplimiento de las obligaciones derivadas del **Contrato de Consultoria No. 758 de 2025**, cuyo objeto corresponde a la **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSÉ DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL – CASANARE**.

Durante la ejecución contractual, la interventoría efectuó el seguimiento permanente al desarrollo de las actividades de obra, verificó el cumplimiento de las especificaciones técnicas, realizó el control de cantidades ejecutadas, revisó los soportes administrativos, financieros, ambientales, contables y jurídicos, y adelantó las actuaciones necesarias para garantizar que la ejecución del proyecto se ajustara al objeto contractual, a las condiciones pactadas, a las modificaciones formalizadas y a los documentos que integran el expediente del contrato.

Conforme al balance final de cantidades efectivamente ejecutadas, medidas, calculadas y verificadas por la interventoria, se establece que el valor final ejecutado del **Contrato de Obra No. 751 de 2025** corresponde a la suma de **CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($448.675.868,00)**, equivalente aproximadamente al **100% del valor contractual**, quedando un saldo sin ejecutar de **DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($2.749,00)** respecto del valor contractual, diferencia mínima que no afecta el cumplimiento sustancial del objeto contratado ni la funcionalidad de las obras ejecutadas.

Así mismo, se deja constancia de que el componente eléctrico cuenta con los **Dictámenes de Inspección y Verificación de Cumplimiento del RETIE No. E49960 y No. E49959**, ambos con resultado **APROBADO**, expedidos el **16 de junio de 2026** por **EVALUADORES DE LA CONFORMIDAD S.A.S.**, los cuales acreditan la conformidad reglamentaria de las instalaciones eléctricas de distribución en baja tensión y uso final ejecutadas en el **Puesto de Atención Primaria en Salud – PAPS San José del Bubuy**.

En consecuencia, la interventoría concluye que las actividades objeto del **Contrato de Obra No. 751 de 2025** fueron ejecutadas, verificadas y recibidas desde el punto de vista técnico, encontrándose la obra físicamente terminada, funcional y en condiciones de recibo final. Así mismo, se deja constancia de que el balance final de cantidades y valores ejecutados, junto con los soportes RETIE aprobados y los demás documentos contractuales, constituyen soporte suficiente para el cierre financiero y para adelantar el trámite de liquidación contractual correspondiente.

CARRERA 16 No. 12-18 (AGUAZUL – CASANARE). CEL. 3115518363 - email: epicoing@gmail.com

El presente documento se expide a solicitud de la supervisión, para los fines contractuales pertinentes, como soporte técnico, administrativo, financiero, ambiental, contable y jurídico en el marco del proceso de **recibo final y liquidación del Contrato de Obra No. 751 de 2025**.

En constancia de lo anterior, se firma en el municipio de Aguazul, Casanare, a los **treinta (30) días del mes de junio de 2026**.

OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
R. L. EPICO INGENIERÍA S.A.S.

LUIS ENRIQUE ACUÑA JIMENEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA CTO 758-2026

ANEXO 1. CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORÍA DEL CUMPLIMIENTO Y CANTIDADES DE OBRA

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No. 751 DE 2025

Aguazul, Casanare, treinta (30) de junio de 2026

La suscrita interventoria, **ESTUDIOS PROFESIONALES INTERVENTORÍAS Y CONSTRUCCIONES INGENIERÍA S.A.S. – EPICO INGENIERÍA S.A.S.**, identificada con NIT. **900.105.134-5**, en cumplimiento de las obligaciones derivadas del **Contrato de Consultoria No. 758 de 2025**, cuyo objeto corresponde a la **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA VEREDA SAN JOSÉ DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL – CASANARE**, se permite expedir la presente certificación respecto del **Contrato de Obra No. 751 de 2025**, para efectos de **recibo final y liquidación contractual**.

El suscrito **OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA**, identificado con cédula de ciudadania No. **74.755.228 de Aguazul**, en calidad de representante legal de **EPICO INGENIERÍA S.A.S.**, junto con el profesional de interventoria que suscribe, certifica que la interventoría realizó la revisión, seguimiento, verificación y aval de las actividades ejecutadas por el **CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY** en desarrollo del **Contrato de Obra No. 751 de 2025**, cuyo objeto corresponde a la **Adecuación menor del Puesto de Atención Primaria en Salud — PAPS San José del bubuy del municipio de Aguazul, Casanare**.

Que, en ejercicio de las funciones de interventoría, se efectuó el control técnico, administrativo, financiero, ambiental, contable y jurídico de la ejecución contractual, verificando que las actividades desarrolladas por el contratista corresponden al alcance del objeto contractual, a las especificaciones técnicas aplicables, al presupuesto aprobado, a las condiciones pactadas y a los documentos que hacen parte integral del expediente contractual.

Que las cantidades de obra ejecutadas fueron revisadas, medidas, cuantificadas y verificadas por la interventoría, con fundamento en las mediciones realizadas en campo, memorias de cantidades, registros fotográficos, informes de seguimiento, actas de obra y demás soportes técnicos correspondientes, razón por la cual se avala la relación de actividades y cantidades finales ejecutadas para efectos del recibo final y posterior liquidación del contrato.

Que, conforme al seguimiento realizado, la interventoría certifica que el contratista ejecutó las actividades objeto del contrato en condiciones técnicas aceptables, cumpliendo con las obligaciones contractuales, las especificaciones de obra, los requerimientos de calidad, las condiciones administrativas y los compromisos propios de la ejecución del proyecto.

Que durante el desarrollo del contrato, la interventoría realizó el seguimiento al cumplimiento del plazo contractual, controló la calidad de las actividades ejecutadas, verificó la correcta utilización de los recursos, efectuó la revisión de los soportes técnicos y administrativos, y adelantó las observaciones y recomendaciones necesarias para garantizar el cumplimiento del objeto contractual.

Que el contratista acreditó, conforme a los soportes allegados al expediente contractual, el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el personal vinculado al proyecto, aportes al sistema de seguridad social y demás documentos administrativos exigidos para el trámite de recibo final y liquidación, sin perjuicio de la revisión final que corresponda a la supervisión y a la entidad contratante.

Que las actividades ejecutadas fueron recibidas y verificadas por la interventoria, encontrándose la obra físicamente terminada, funcional y en condiciones de recibo final, conforme al balance de cantidades efectivamente ejecutadas y verificadas.

RELACIÓN DE CANTIDADES Y PRESUPUESTO EJECUTADO

A continuación, se deja el espacio correspondiente para incorporar el presupuesto final ejecutado, el cual hace parte integral de la presente certificación:

N°	Actividad	U.M	Cantidad	Vr. Unitario	Valor
1	**PRELIMINARES**				
1.1	Demolición manual placa de piso 0.10 m prom, con retiro	m2	4.00	33,335.00	133,340.00
1.2	Desmonte aparatos sanitarios	Und	18.00	14,739.00	265,302.00
1.3	Desmonte de ventanas, con transporte	m2	8.56	10,365.00	88,724.00
1.4	Desmonte marcos y puertas con transporte	m2	42.75	16,253.00	694,816.00
1.5	Desmonte de canales y bajantes de aguas lluvias	m	26.60	4,121.00	109,619.00
1.6	Desmonte de cielo raso con retiro	m2	486.93	14,550.00	7,084,832.00
1.7	Demolición a mano de tableta piso, espesor entre 0.06 y 0.08 m con retiro	m2	182.68	34,066.00	6,223,177.00
1.9	Desmonte de cerraduras de seguridad	Und	5.00	26,434.00	132,170.00
1.10	Demolición muro de ladrillo de espesor menor a 0.15 m, con retiro	m2	4.95	6,625.00	32,794.00
2	**PISOS Y ENCHAPES**				
2.3	Enchape piso en cerámica duropiso 33.8 x 33.8. suministro e instal.	m2	184.04	76,708.00	14,117,340.00
2.4	Cinta antideslizante fotoluminiscente a= 5cm instalada a todo costo sobre pasos de escalera o piso.	m	115.32	16,165.00	1,864,148.00
3	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**				
3.1	Tubería presión PVC RDE 9 1/2". Suministro e instal.	m	29.23	6,646.00	194,263.00

N°	Actividad	U.M	Cantidad	Vr. Unitario	Valor
3.2	Punto agua fria PVC 1/2"	und	8.00	72,865.00	582,920.00
3.3	Barra de seguridad abatible en acero inoxidable 13 x 85 cm	und	1.00	486,705.00	486,705.00
3.5	Tanque elevado 1.000 lts con conexión y distribución PVC de 1/2" y 1". Suministro e instal.	und	1.00	1,172,551.00	1,172,551.00
4	**INSTALACIONES SANITARIAS**				
4.1	Tuberia sanitaria PVC 2". Suministro e instal.	m	25.34	23,732.00	601,369.00
4.2	Punto desagüe sanitario pvc 2" con sifón	und	10.00	71,127.00	711,270.00
5	**APARATOS SANITARIOS**				
5.2	Sanitario bajo consumo one piece doble descarga blanco. Suministro e Instal.	und	8.00	660,484.00	5,283,872.00
5.3	Mesón en acero inoxidable básico con poceta 100 x 52 cm, griferia monocontrol, con desagüe. Suministro e Instal.	und	2.00	350,566.00	701,132.00
5.4	Sanitario para personas de movilidad reducida. Suministro e Instal.	und	1.00	719,258.00	719,258.00
6	**MUROS Y ACABADOS**				
6.1	Pañete liso (allanado) muros 1:4, incluye filos y dilataciones	m²	2.37	27,916.00	66,161.00
6.2	Estuco y vinilo interior 3 manos, filos y dilataciones	m²	157.10	41,288.00	6,486,345.00
6.3	Raspado superficie de muro pintado en vinilo	m²	104.62	5,072.00	530,633.00
6.4	Pintura acrilica alta asepsia para interiores sobre muros 3 manos	m²	674.16	15,817.00	10,663,189.00
6.5	Pintura exterior acrilica tipo koraza o similar sobre muros 3 manos	m²	349.39	25,728.00	8,989,106.00
6.6	Muro en superboard doble cara 10 mm pintado con viniltex o similar calidad.	m2	111.24	136,474.00	15,181,368.00
6.7	Sellador o recubrimiento acrilico blanco para superficies exteriores	m²	349.39	11,684.00	4,082,273.00
7	**CUBIERTA**				
7.3	Bajante A.LL. PVC 4"	m	44.60	54,446.00	2,428,292.00
7.4	Columna en tubo estructural cuadrado 100*100*3 mm, instalado y pintado.	m	19.20	138,820.00	2,665,344.00
8	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				
8.2	Suministro e instalación de medidor de energia, incluye: caja para medidor, medidor trifásico tetrafilar, breaker totalizador, sistema de puesta a tierra	und	1.00	2,213,427.00	2,213,427.00
8.4	Interruptor termomagnético regulable 50A a 63A, 35-40 kA . Totalizador Suministro e instalación	und	4.00	343,575.00	1,374,300.00
8.5	Cortacircuito termomagnético de 1x(10A-60A), 120/240 V, 10kA, enchufable. Suministro e instalación	und	40.00	32,993.00	1,319,720.00

N°	Actividad	U.M	Cantidad	Vr. Unitario	Valor
8.6	Salida para iluminación en techo, incluye tuberia EMT 3/4", cable de cobre THWN N° 12, accesorios, cajas de paso	und	169.00	206,103.00	34,831,407.00
8.7	Modulo LED redondo 24W, 110 V 1680-2400 lm de sobreponer. Suministro e instalación	und	22.00	71,602.00	1,575,244.00
8.8	Luminaria tipo panel led 30x120 cm, 40W, 110 V. Incluye: Elementos de fijación, suministro e instalación	und	13.00	180,415.00	2,345,395.00
8.9	Salida para interruptor sencillo, línea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plástica 5800, terminales PVC y readecuación de muro.	und	21.00	151,111.00	3,173,331.00
8.10	Salida para interruptor doble, línea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plástica 5800, terminales PVC y readecuación de muro.	und	5.00	165,238.00	826,190.00
8.13	Salida para tomacorriente a 220 V, 30 A, en tuberia PVC 3/4" y cable de cobre THWN 2x10+1x12T , incluye aparato. Suministro e instalación	und	13.00	311,487.00	4,049,331.00
9	**CARPINTERIA METALICA**				
9.1	Puerta en madera batiente de 1 hoja, con tablero entamborado e=4 cm con triplex 4.0 mm, con marco en madera, lacada, con cerradura de manija hacia adentro y hacia afuera en acero inoxidable y brazo neumático. Instalada	m²	46.32	427,641.00	19,808,331.00
9.2	Cerradura de doble seguridad de escudo pomo y cerrojo para entrada principal. Suministro e Instal.	und	4.00	188,048.00	752,192.00
NP	**ITEM NO PREVISTOS**				
NP1	Guardaescoba mediacaña en granito pulido y brillado con junta de dilatación plástica m	ml	133.62	61,796.00	8,257,182.00
NP2	Enchape pared cerámica 30x60 cm blanco "Plana" de Corona o similar. Sumin e instal	m2	27.38	67,730.00	1,854,447.00
NP3	Bocapuerta en granito pulido	ml	11.57	42,865.00	495,948.00
NP4	Guardaescoba en ceramica duro piso 33 x 7 cm. Suministro e instalación	ml	152.39	17,560.00	2,675,968.00
NP5	Estuco plástico muros. Suministro e instal.	m2	70.30	15,305.00	1,075,942.00
NP6	Regata en muro, mamosteria tipo ladrillo o bloque para tuberías diaetros menores a 1". (ncluye corte, retiro y resane)	ML	109.59	10,105.00	1,107,407.00
NP7	Demolición de muro drywall incluye retiro	m2	100.53	9,795.00	984,691.00
NP8	Cielo raso en lamina PVC 10 mm (incluye cornisa)	m2	486.93	96,072.00	46,780,339.00
NP9	Desmonte de aires acondicionado, incluye accesorios	Und	10.00	149,508.00	1,495,080.00

EPICO INGENIERIA S.A.S.
ESTUDIOS PROFESIONALES, INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES
NIT. 900.105.134-5

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA – RECIBO CTO OBRA 751/2025 – PAPS VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY

Contrato de Consultoria No. 758 de 2025 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA **VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA** DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Contrato de Obra No. 751 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD **SAN JOSE DEL BUBUY** DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

N°	Actividad	U.M	Cantidad	Vr. Unitario	Valor
NP10	Reparación puntual de cubierta mediante aplicación de cinta de aluminio bituminosa de 0.15 m de ancho, en dimensiones de 0.15 x 0.10 m, incluye limpieza, preparación e instalación.	Und	677.00	6,095.00	4,126,315.00
NP11	Esmalte sobre reja tipo bancaria	m2	164.30	29,930.00	4,917,499.00
NP12	Teja tipo master 1000 cal 28 pintada	M2	25.56	57,534.00	1,470,569.00
NP13	Estructura metálica en Acero ASTM - A500 C (Incluye: suministro- fabricación-pintura-montaje)	Kg	432.09	19,525.00	8,436,557.00
NP14	Canal blanco PVC para techo o C-30. Suministro e insta.	Ml	11.62	57,784.00	671,450.00
NP15	Limpieza, raspado y lavado de placas,muros, pisos en concreto existente.	m2	515.96	5,349.00	2,759,870.00
NP16	Limpieza y lavado de pisos en concreto, cermica, granito, arcilla, marmol, piedra, con acido muriatico	m2	366.31	7,528.00	2,757,582.00
NP17	Acometida en cable de cobre aislado 3x1/0+1x4T AWG THHN/THWN-2 600 V 90° C. Suministro e instalación	m	18.00	191,912.00	3,454,416.00
NP18	Salida para tomacorriente doble con polo a tierra, 20A - 125V, salida dedicada. Incluye tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre 12 AWG (10 m promedio), caja metalica 5800 o 2400 incluye aparato.	Und	60.00	250,151.00	15,009,060.00
NP19	Salida para tomacorriente doble con polo a tierra GFCI 15A - 125V, incluye: tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre	Und	16.00	311,486.00	4,983,776.00
NP20	Luminaria de emergencias tipo led 110 V, 2.4 W, autonomia minima 90 minutos. Incluye elementos de fijación. Suministro e instalación.	Und	10.00	128,328.00	1,283,280.00
NP21	Luminaria de emergencias tipo Aplique LED 4w. Incluye elementos de fijación. Suministro e instalación.	Und	27.00	141,344.00	3,816,288.00
NP22	Modulo LED redondo 18w, 110v de incrustar. Incluye: Elementos de fijación, suministro e instalación	Und	28.00	62,334.00	1,745,352.00
NP23	Luminaria tipo panel led 60x60 cm, 110 V. Incluye: Elementos de fijación. Suministro e instalación	Und	62.00	158,007.00	9,796,434.00
NP24	Luminaria tipo Led tortuga 12 W Incluye: Elementos de fijación. Suministro e instalación	Und	1.00	48,121.00	48,121.00
NP25	Luminaria tipo led Hermetica 36w . Incluye: Elementos de fijación. Suministro e instalación	Und	6.00	171,264.00	1,027,584.00
NP26	Salida para interruptor triple, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plastica 5800, terminales PVC y readcuación de muro	Und	1.00	138,683.00	138,683.00
NP27.	Interruptor termomagnetico regulable 32A a 40A, 35 - 40 KA. Suministro e instalación	Und	2.00	570,608.00	1,141,216.00

CARRERA 16 No. 12-18 (AGUAZUL – CASANARE). CEL. 3115518363 - email: epicoing@gmail.com

EPICO INGENIERIA S.A.S.
ESTUDIOS PROFESIONALES, INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES
NIT. 900.105.134-3

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA – RECIBO CTO OBRA 751/2025 – PAPS VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY

Contrato de Consultoria No. 758 de 2025 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA **VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA** DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Contrato de Obra No. 751 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD **SAN JOSE DEL BUBUY** DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

N°	Actividad	U.M	Cantidad	Vr. Unitario	Valor
NP28.	Tablero de protecciones trifasico de 24 circuitos con puerta y espacio para totalizador. Suministro e instalación.	Und	2.00	908,945.00	1,817,890.00
NP29	Tablero de protecciones trifasico de 18 circuitos con puerta y espacio para totalizador. Suministro e instalación.	Und	1.00	813,398.00	813,398.00
NP30	Puerta en persiana y marco en aluminio, incluye chapa, suministro e instal	m2	1.90	493,338.00	937,342.00
NP31.	Lavamano colgar blanco milano o similar con grifería para lavamanos institucional tipo push (incluye kit desagüe sifón regulación griflex) Suministro e instal	Und	14.00	350,241.00	4,903,374.00
NP32	Desmonte, suministro e instalación de vidrio azul lake/dark de 5mm.	m2	10.55	130,708.00	1,378,969.00
NP33	Mantenimiento general de barandas en acero inoxidable, que incluye limpieza, brillado , ejecución de uniones soldadas tipo TIG en tuberías, parales y accesorios con acabado pulido.	ml	112.37	273,841.00	30,771,513.00
NP34	Desmonte, mantenimiento y recorte de puerta en aluminio	ml	6.46	151,469.00	978,490.00
NP35	Marco metalico panel 60 x 60	Und	62.00	45,418.00	2,815,916.00
SUBTOTAL OBRAS					**$ 341,289,129.00**
				SUBTOTAL OBRAS (AJUSTADO AL PESO)	**$ 341,289,129.00**
				ADMINISTRACIÓN 23.0%	$ 78,496,499.67
				IMPREVISTOS 2.0%	$ 6,825,782.48
				UTILIDAD 5.0%	$ 17,064,456.45
				TOTAL A.I.U 30.0%	**$ 102,386,739.00**
				TOTAL COSTOS INDIRECTOS + (A.I.U)	**$ 443,675,868.00**
				CERTIFICACIÓN RETIE	$ 5,000,000.00
				TOTAL EJECUTADO	**$ 448,675,868.00**

Conforme al balance de cantidades efectivamente ejecutadas, calculadas y verificadas por la interventoria, se certifica que el valor final ejecutado del **Contrato de Obra No. 751 de 2025** corresponde a la suma de:

- ✓ **CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($448.675.868,00)**

Dicho valor corresponde a las actividades realmente ejecutadas y recibidas, de acuerdo con las mediciones, cantidades, precios unitarios, actas y soportes que integran el expediente contractual, constituyéndose en soporte para el cierre financiero, el recibo final y la liquidación del contrato.

En consecuencia, la interventoria **certifica y avala** que las actividades y cantidades de obra ejecutadas por el **CONSORCIO SAN MIGUEL DE FARALLONES** en desarrollo del **Contrato de Obra No. 751 de 2025** fueron

objeto de revisión, seguimiento y verificación, y que las mismas cumplen con las condiciones técnicas, administrativas, financieras, ambientales, contables y jurídicas requeridas para adelantar el trámite de **recibo final y liquidación contractual**.

Finalmente, se deja constancia de que la presente certificación se expide como soporte del informe final de interventoria, del acta de recibo final, del balance final de cantidades y del trámite de liquidación del **Contrato de Obra No. 751 de 2025**.

Para constancia, se firma en Aguazul, Casanare, a los treinta (30) dias del mes de junio de 2026.

OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
Representante Legal
EPICO INGENIERÍA S.A.S.
NIT. 900.105.134-5
Contrato de Consultoría No. 758 de 2025

LUIS ENRIQUE ACUÑA JIMÉNEZ
Residente de Interventoría
EPICO INGENIERÍA S.A.S.
Contrato de Consultoría No. 758 de 2025

ANEXO 2. BALANCE FINAL EJECUTADO Y MEMORIAS DE CANTIDADES

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CASANARE

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E.

CONSORCIO ITICO INGENIERIA S

ANEXO ACTA DE RECIBO FINAL - CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 751-2025

CONTRATO No.	751-2025
TIPO DE CONTRATO:	OBRA
PROCESO:	CP 005-2025
LOCALIZACION:	AGUAZUL
OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
SUPERVISION:	JEFE DE LA OFICINA DE GESTION DEL AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGICO.
SUPERVISOR	JONNATAN YAMIR AREVALO FRANCO

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY
NIT:	902.004.183-1
VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA:	$ 448,678,617.00
PLAZO DE EJECUCION:	DOS (02) MESES Y VEINTE (20) DIAS
FECHA DE INICIO:	22 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13 DE MARZO DE 2025
SUSPENSION 1:	SUSPENSION 29/12/2025 - REINICIO 08/01-2026
PRORROGA N°1:	UN (01) MES Y DIEZ (10) DIAS
FECHA DE TERMINACION:	30 DE ABRIL DE 2026
VALOR ANTICIPO (A):	$ 0.00
VALOR AMORTIZADO ACTA LIQUIDACION (B):	$ 0.00
SALDO POR AMORTIZAR (A-B):	$ 0.00

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL CTO	$ 448,678,617.00
VALOR EJECUTADO:	$ 448,675,868.00
VALOR SIN EJECUTAR	$ 2,749.00

ANEXO ACTA DE RECIBO FINAL - CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 751-2025

			CONTRACTUAL					MODIFICATORIA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS			PRESUPUESTO EJECUTADO	
N°	Código Resol. APU	Actividad	U.M	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total		Cantidad	Vr. Total	Cantidad (+/-)	Cantidad Actualizada	Valor	Cantidad	Valor
1		PRELIMINARES												
1.1		Demolición manual placa de piso 0.10 m prom, con retiro	m2	10.00	33,335.00	333,350.00		10.00	333,350.00	- 6.00	4.00	133,340.00	4.00	133,340.00
1.2		Desmonte aparatos sanitarios	Und	18.00	14,739.00	265,302.00		18.00	265,302.00	-	18.00	265,302.00	18.00	265,302.00
1.3		Desmonte de ventanas, con transporte	m2	8.56	10,365.00	88,724.40		8.56	88,724.40	-	8.56	88,724.40	8.56	88,724.00
1.4		Desmonte marcos y puertas con transporte	m2	39.46	15,253.00	641,343.38		42.75	694,815.75	-	42.75	694,815.75	42.75	694,816.00
1.5		Desmonte de canales y bajantes de aguas lluvias	m	19.00	4,121.00	78,299.00		26.60	109,618.60	-	26.60	109,618.60	26.60	109,619.00
1.6		Desmonte de cielo raso con retiro	m2	403.28	14,590.00	5,867,724.00		457.29	6,653,569.50	29.64	486.93	7,084,831.50	486.93	7,084,832.00
1.7		Demolición a mano de tableta piso, espesor entre 0.06 y 0.08 m con retiro	m2	427.88	34,666.00	14,570,160.08		177.44	6,044,671.04	5.24	182.68	6,223,175.89	182.68	6,223,177.00
1.8		Demolicion pañete muro, con retiro	m2	40.92	10,125.00	414,315.00		-	-	-	-	-	-	-
1.9		Desmonte de cerraduras de seguridad	Und	5.00	26,454.00	132,170.00		5.00	132,170.00	-	5.00	132,170.00	5.00	132,170.00
1.10		Demolición muro de ladrillo de espesor menor a 0.15 m, con retiro	m2	6.34	6,625.00	42,002.50		4.63	30,673.75	0.32	4.95	32,793.75	4.95	32,794.00
2		PISOS Y ENCHAPES												
2.1		Alistado de pisos e=0.04 m, en mortero 1:3	m2	427.88	28,334.00	12,033,697.12		-	-	-	-	-	-	-
2.2		Baldosa grano de mármol 30*30/33x33 con blanco incluye desronque, pulida y brillado a todo costo	m2	190.53	145,903.00	27,798,888.59		-	-	-	-	-	-	-
2.3		Enchape piso en cerámica duropiso 33.8 x 33.8. suministro e instal.	m2	237.35	79,308.00	18,206,643.80		182.62	14,008,414.96	1.42	184.04	14,117,340.32	184.04	14,117,340.00
2.4		Cinta antideslizante fotoluminiscente a= 5cm instalada a todo costo sobre pasos de escalera o piso	m	64.69	16,165.00	1,045,713.85		91.04	1,503,991.60	22.28	113.32	1,864,147.91	113.32	1,864,148.00
2.5		Guarda escoba mediacaña en granito pulido y brillado con junta de dilatación en bronce	m	116.94	64,019.00	7,486,381.86		-	-	-	-	-	-	-
2.6		Andenes en concreto de resistencia 2500 psi espesor 0.10 m	m2	10.00	75,814.00	758,140.00		-	-	-	-	-	-	-
3		INSTALACIONES HIDRAULICAS												
3.1		Tubería presión PVC RDE 9 1/2". Suministro e instal.	m	22.88	6,646.00	152,060.48		22.88	152,060.48	6.35	29.23	194,262.58	29.23	194,263.00
3.2		Punto agua fria PVC 1/2"	und	6.00	72,865.00	437,190.00		8.00	582,920.00	-	8.00	582,920.00	8.00	582,920.00
3.3		Barra de seguridad abatible en acero inoxidable 15 x 85 cm	und	2.00	486,705.00	973,410.00		1.00	486,705.00	-	1.00	486,705.00	1.00	486,705.00
3.4		Espejo baño en plata 5 mm. Suministro e instal.	m²	3.78	159,644.00	603,454.32		3.78	603,454.32	- 3.78	-	-	-	-
3.5		Tanque elevado 1.000 lts con conexión y distribución PVC de 1/2" y 1". Suministro e instal.	und	1.00	1,172,551.00	1,172,551.00		1.00	1,172,551.00	-	1.00	1,172,551.00	1.00	1,172,553.00
4		INSTALACIONES SANITARIAS												
4.1		Tubería sanitaria PVC 2". Suministro e instal.	m	58.40	23,732.00	1,385,948.80		58.40	1,385,948.80	- 33.06	25.34	601,368.88	25.34	601,369.00
4.2		Punto desagüe sanitario pvc 2" con sifón	und	6.00	71,127.00	426,762.00		8.00	569,016.00	2.00	10.00	711,270.00	10.00	711,270.00
5		APARATOS SANITARIOS												
5.1		Lavamanos de incrustar San Lorenzo blanco de corona con grifería de resca tipo push	und	9.00	586,253.00	5,276,277.00		-	-	-	-	-	-	-
5.2		Sanitario bajo consumo one piece doble descarga blanco. Suministro e instal.	und	7.00	660,484.00	4,623,388.00		8.00	5,283,872.00	-	8.00	5,283,872.00	8.00	5,283,872.00
5.3		Mesón en acero inoxidable báico con poceta 50G x 52 cm, grifería monocontrol, con desagüe. Suministro e instal.	und	5.00	350,566.00	1,752,830.00		3.00	1,053,698.00	- 1.00	2.00	701,132.00	2.00	701,132.00

CONTRACTUAL							MODIFICATORIA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS			PRESUPUESTO EJECUTADO	
N°	Código Resol. APU	Actividad	U.M	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad (+/-)	Cantidad Actualizada	Valor	Cantidad	Valor
5.4		Sanitario para personas de movilidad reducida. Suministro e instal.	und	2.00	719,258.00	1,438,516.00	1.00	719,258.00	-	1.00	719,258.00	1.00	719,258.00
6		MUROS Y ACABADOS											
6.1		Pañete liso (alisado) muros 1:4, incluye filos y dilataciones	m²	40.92	27,816.00	1,142,322.72	2.35	65,602.60	0.02	2.37	66,160.92	2.37	66,161.00
6.2		Estuco y vinilo interior 3 manos, filos y dilataciones	m²	72.97	41,288.00	3,012,785.36	72.97	3,012,785.36	84.13	157.10	6,486,344.80	157.10	6,486,345.00
6.3		Raspado superficie de muro pintado en vinilo	m²	43.87	5,072.00	222,508.64	43.87	222,508.64	60.75	104.62	530,632.64	104.62	530,633.00
6.4		Pintura acrílica alta asepsia para interiores sobre muros 3 manos	m²	726.34	15,817.00	11,488,519.78	726.34	11,488,519.78	52.18	674.16	10,663,188.72	674.16	10,663,189.00
6.5		Pintura exterior acrílica tipo koraza o similar sobre muros 3 manos	m²	387.75	25,728.00	9,976,032.00	387.75	9,976,032.00	38.36	349.39	8,989,105.92	349.39	8,989,106.00
6.6		Muro en superboard doble cara 10 mm pintado con viniltex o similar calidad	m2	69.26	136,474.00	9,452,189.24	81.62	11,138,302.68	29.42	111.24	15,181,367.76	111.24	15,181,368.00
6.7		Sellador o recubrimiento acrílico blanco para superficies exteriores	m²	387.75	11,684.00	4,530,471.00	387.75	4,530,471.00	38.36	349.39	4,082,272.76	349.39	4,082,273.00
7		CUBIERTA											
7.1		Cielo raso dry-wall plano con lámina gyplac RH antihumedad de 1/2" o 12.7mm o similar, pintado con 3 manos vinilo superlavable contra alto desgaste	m²	403.28	101,490.00	40,928,887.20	-	-	-	-	-	-	-
7.2		Canal en lamina galvanizada cal. 20 desarrollo 0.60 m pintado con wash primer y esmalte. Suministro e instal.	m	38.60	141,162.00	5,448,853.20	-	-	-	-	-	-	-
7.3		Bajante A.LL. PVC 4"	m	23.80	54,446.00	1,295,814.80	44.60	2,428,291.60	-	44.60	2,428,291.60	44.60	2,428,292.00
7.4		Columna en tubo estructural cuadrado 100*100*3 mm, instalado y pintado.	m	31.72	198,870.00	6,803,170.60	19.20	2,665,344.00	-	19.20	2,665,344.00	19.20	2,665,344.00
7.5		Cubierta en policarbonato traslucido color cristal 0.8 mm sin estructura de soporte	m2	139.00	72,387.00	10,061,793.00	-	-	-	-	-	-	-
7.6		Pérgola metálica, en tubo galvanizado 2 1/2" e = 2 mm cal. 14. Suministro e instal.	m	436.29	93,826.00	40,935,345.54	-	-	-	-	-	-	-
8		INSTALACIONES ELÉCTRICAS											
8.1		Acometida en baja tensión en conductor 2x8+8 AWG concéntrico 600 V 90°C XLPE-PVC. Suministro e instalación	m	20.00	85,868.00	1,717,360.00	-	-	-	-	-	-	-
8.2		Suministro e instalación de medidor de energía, incluye: caja para medidor, medidor trifásico tetrafilar, breaker totalizador, sistema de puesta a tierra	und	1.00	2,213,427.00	2,213,427.00	1.00	2,213,427.00	-	1.00	2,213,427.00	1.00	2,213,427.00
8.3		Suministro e instalación tablero trifásico de 12 circuitos, 220 V, Imáx de 150A, Ic 10 kA, con espacio para totalizador, puerta, incluye accesorios de montaje.	und	3.00	860,467.00	2,581,401.00	3.00	2,581,401.00	3.00	-	-	-	-
8.4		Interruptor termomagnético regulable 50A a 65A, 35-40 kA . Totalizador Suministro e instalación	und	3.00	343,575.00	1,030,725.00	4.00	1,374,300.00	-	4.00	1,374,300.00	4.00	1,374,300.00
8.5		Cortacircuito termomagnético de 1x(10A-60A), 120/240 V, 10kA, enchufable Suministro e instalación	und	36.00	32,993.00	1,187,748.00	40.00	1,319,720.00	-	40.00	1,319,720.00	40.00	1,319,720.00
8.6		Salida para iluminación en techo, incluye tubería EMT 3/4", cable de cobre THWN N° 12, accesorios, cajas de paso	und	92.00	206,103.00	18,961,476.00	169.00	34,831,407.00	-	169.00	34,831,407.00	169.00	34,831,407.00
8.7		Modulo LED redondo 24W, 110 V 1680-2400 lm de sobreponer. Suministro e instalación	und	60.00	71,602.00	4,296,120.00	22.00	1,575,244.00	-	22.00	1,575,244.00	22.00	1,575,244.00
8.8		Luminaria tipo panel led 30x120 cm, 40W, 110 V. Incluye: Elementos de fijación, suministro e instalación	und	32.00	180,615.00	5,773,280.00	13.00	2,345,395.00	-	13.00	2,345,395.00	13.00	2,345,395.00
8.9		Salida para interruptor sencillo, línea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plástica 5800, terminales PVC y readecuación de muro.	und	19.00	151,111.00	2,871,109.00	21.00	3,173,331.00	-	21.00	3,173,331.00	21.00	3,173,331.00
8.10		Salida para interruptor doble, línea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plástica 5800, terminales PVC y readecuación de muro.	und	2.00	165,238.00	330,476.00	5.00	826,190.00	-	5.00	826,190.00	5.00	826,190.00
8.11		Salida para tomacorriente doble con polo a tierra, 20A - 125V, salida dedicada. Incluye: tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre 12 AWG (10 m promedio), caja metálica 5800 o 2400 incluye aparato	und	62.00	165,283.00	10,247,546.00	-	-	-	-	-	-	-
8.12		Tomacorriente doble 15A 125V con polo a tierra grado residencial. Suministro e instalación	und	62.00	250,151.00	15,509,362.00	-	-	-	-	-	-	-
8.13		Salida para tomacorriente a 220 V, 30 A, en tubería PVC 3/4" y cable de cobre THWN 2x10+1x12T , incluye aparato. Suministro e instalación	und	12.00	311,487.00	3,737,844.00	13.00	4,049,331.00	-	13.00	4,049,331.00	13.00	4,049,331.00
9		CARPINTERIA METALICA											
9.1		Puerta en madera batiente de 1 hoja, con tablero entamborado e=4 cm con triplex 4.0 mm, con marco en madera, lacada, con cerradura de manija hacia adentro y hacia afuera en acero inoxidable y brazo neumático. Instalada	m²	46.32	427,641.00	19,982,983.99	47.35	20,248,801.35	1.03	46.32	19,808,331.12	46.32	19,808,331.00
9.2		Cerradura de doble seguridad de escudo pomo y cerrojo para entrada principal. Suministro e instal.	und	5.00	188,048.00	940,240.00	5.00	940,240.00	1.00	4.00	752,192.00	4.00	752,192.00
NP		ITEM NO PREVISTOS											
NP1		Guardaescoba mediacaña en granito pulido y brillado con junta de dilatación plástica m	ml	-	61,796.00	-	135.17	8,352,965.32	1.55	133.62	8,257,183.32	133.62	8,257,182.00
NP2		Enchape pared cerámica 30x60 cm blanco "Piana" de Corona o similar. Sumin e instal	m2	-	67,730.00	-	31.38	2,125,367.40	4.00	27.38	1,854,447.40	27.38	1,854,447.00
NP3		Bocaguarta en granito pulido	ml	-	42,865.00	-	6.20	265,763.00	5.37	11.57	495,948.05	11.57	495,948.00
NP4		Guardaescoba en cerámica dura piso 33 x 7 cm. Suministro e instalación	ml	-	37,560.00	-	93.93	3,649,410.80	58.46	152.39	2,675,968.40	152.39	2,675,968.00
NP5		Estuco plástico muros. Suministro e instal	m2	-	15,305.00	-	70.30	1,075,941.50	-	70.30	1,075,941.50	70.30	1,075,942.00

CONTRACTUAL							MODIFICATORIA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS			PRESUPUESTO EJECUTADO	
N°	Código Resol. APU	Actividad	U.M	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad (+/-)	Cantidad Actualizada	Valor	Cantidad	Valor
NP6		Regata en muro, mamposteria tipo ladrillo o bloque para tuberias diametros menores a 1". (incluye corte, retiro a escape)	ML	-	10,105.00	-	149.00	1,505,645.00	39.41	109.59	1,107,406.95	109.59	1,107,407.00
NP7		Demolición de muro drywall incluye retiro	m2	-	9,795.00	-	103.05	1,009,334.75	2.53	100.53	984,691.35	100.53	984,691.00
NP8		Cielo raso en lamina PVC 10 mm (incluye comual)	m2	-	96,072.00	-	457.23	43,932,764.88	29.64	486.93	46,780,338.96	486.93	46,780,339.00
NP9		Desmonte de aires acondicionado, incluye accesorios	Und	-	149,508.00	-	10.00	1,495,080.00	-	10.00	1,495,080.00	10.00	1,495,080.00
NP10		Reparación puntual de cubierta mediante aplicación de cinta de aluminio bituminosa de 0,15 m de ancho, en dimensiones de 0.15 x 0.30 m, incluye limpieza, preparación e instalación.	Und	-	6,095.00	-	677.00	4,126,315.00	-	677.00	4,126,315.00	677.00	4,126,315.00
NP11		Esmalte sobre reja tipo bancaria	m2	-	29,930.00	-	165.98	4,967,781.40	1.68	164.30	4,917,499.00	164.30	4,917,499.00
NP12		Teja tipo master 1000 cal 28 pintada	M2	-	57,534.00	-	25.56	1,470,569.04	-	25.56	1,470,569.04	25.56	1,470,569.00
NP13		Estructura metálica en Acero ASTM - A500 C (incluye: suministro fabricación-pintura-montaje)	Kg	-	19,525.00	-	432.09	8,436,557.25	-	432.09	8,436,557.25	432.09	8,436,557.00
NP14		Canal blanco PVC para techo o C-30. Suministro e inst	Ml	-	57,784.00	-	11.62	671,450.08	-	11.62	671,450.08	11.62	671,450.00
NP15		Limpieza, raspado y lavado de placas,muros, pisos en concreto existente	m2	-	5,349.00	-	556.00	2,974,097.49	40.05	515.96	2,759,870.04	515.96	2,759,870.00
NP16		Limpieza y lavado de pisos en concreto, cerámica, gravilla, arcilla, marmol, piedra, con acido muriatico	m2	-	7,578.00	-	352.08	2,667,233.64	13.93	366.31	2,757,181.68	366.31	2,757,582.00
NP17		Acometida en cable de cobre aislado 3x1/0+1x4T AWG THHN/THWN-2 600 V 90° C. Suministro e instalación	m	-	191,912.00	-	20.00	3,838,240.00	2.00	18.00	3,454,416.00	18.00	3,454,416.00
NP18		Salida para tomacorriente doble con polo a tierra, 20A - 125V, salida descicada. Incluye tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre 12 AWG (10 m promedio), caja metalica 5800 o 2400 incluye aparato	Und	-	250,151.00	-	60.00	15,009,060.00	-	60.00	15,009,060.00	60.00	15,009,060.00
NP19		Salida para tomacorriente doble con polo a tierra GFCI 15A - 125V, incluye: tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre	Und	-	311,486.00	-	16.00	4,983,776.00	-	16.00	4,983,776.00	16.00	4,983,776.00
NP20		luminaria de emergencias tipo led 110 V, 2 4 W, autonomia minima 90 minutos incluye elementos de fijación. Suministro e instalación.	Und	-	128,328.00	-	10.00	1,283,280.00	-	10.00	1,283,280.00	10.00	1,283,280.00
NP21		Luminaria de emergencias tipo Aplique LED 4w. Incluye elementos de fijación. Suministro e instalación.	Und	-	141,344.00	-	28.00	3,957,632.00	1.00	27.00	3,816,288.00	27.00	3,816,288.00
NP22		Modulo LED redondo 18w, 110v de incrustar. Incluye: Elementos de fijación, suministro e instalación	Und	-	62,334.00	-	24.00	1,496,016.00	6.00	28.00	1,745,352.00	28.00	1,745,352.00
NP23		Luminaria tipo panel led 60x60 cm, 110 V. Incluye: Elementos de fijación. Suministro e instalación	Und	-	158,007.00	-	62.00	9,796,434.00	-	62.00	9,796,434.00	62.00	9,796,434.00
NP24		Luminaria tipo Led sortuga 12 W Incluye: Elementos de fijación. Suministro e instalación	Und	-	48,121.00	-	4.00	192,484.00	3.00	1.00	48,121.00	1.00	48,121.00
NP25		Luminaria tipo led hermetica 36w. Incluye: Elementos de fijación. Suministro e instalación	Und	-	171,264.00	-	6.00	1,027,584.00	-	6.00	1,027,584.00	6.00	1,027,584.00
NP26		Salida para interruptor triple, linea decorativa incluye: Tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plastica 5800, terminales PVC y readecuación de muro	Und	-	138,683.00	-	1.00	138,683.00	-	1.00	138,683.00	1.00	138,683.00
NP27.		Interruptor termomagnetico regulable 32A a 40A, 35 - 40 KA. Suministro e instalación	Und	-	570,608.00	-	2.00	1,141,216.00	-	2.00	1,141,216.00	2.00	1,141,216.00
NP28.		Tablero de protecciones trifasico de 24 circuitos con puerta y espacio para totalizador. Suministro e instalación.	Und	-	908,945.00	-	2.00	1,817,890.00	-	2.00	1,817,890.00	2.00	1,817,890.00
NP29		Tablero de protecciones trifasico de 18 circuitos con puerta y espacio para totalizador. Suministro e instalación.	Und	-	813,398.00	-	1.00	813,398.00	-	1.00	813,398.00	1.00	813,398.00
NP30		Puerta en persiana y marco en aluminio, incluye chapa, suministro e instal	m2	-	493,536.00	-	1.94	957,075.72	0.04	1.90	937,342.20	1.90	937,342.00
NP31.		Lavamano colgar blanco nilano o similar con grifería para lavamanos institucional tipo push (incluye kit desagüe sifón regulación grifex) Suministro e instal	Und	-	950,241.00	-	14.00	4,903,374.00	-	14.00	4,903,374.00	14.00	4,903,374.00
NP32		Desmonte, suministro e instalación de vidrio azul folex/dark de 5mm.	m2	-	133,704.00	-	10.55	1,378,969.40	-	10.55	1,378,969.40	10.55	1,378,969.00
NP33		Mantenimiento general de barandas en acero inoxidable, que incluye fireplass, brillado , ejecución de uniones soldadas tipo TIG en tuberias, parales y accesorios con acabado pulido	ml	-	275,841.00	-	128.29	35,131,083.89	11.92	112.37	30,771,513.37	112.37	30,771,511.00
NP34		Desmonte, mantenimiento y recorte de puerta en aluminio	m2	-	151,669.00	-	6.47	980,804.43	0.01	6.46	978,489.74	6.46	978,490.00
NP35		Marco metalico panel 60 x 90	Und	-	45,418.00	-	62.00	2,815,916.00	-	62.00	2,815,916.00	62.00	2,815,916.00
SUBTOTAL OBRAS						$ 341,291,344.05		$ 341,285,841.00					$ 341,289,129.00
				SUBTOTAL OBRAS (AJUSTADO AL PESO)		$ 341,291,344.00		$ 341,285,841.00					$ 341,289,129.00
				ADMINISTRACIÓN	23.0%	$ 78,496,996.00		$ 78,495,743.43					$ 78,496,499.67
				IMPREVISTOS	2.0%	$ 6,825,825.00		$ 6,825,716.87					$ 6,825,782.58
				UTILIDAD	5.0%	$ 17,064,567.00		$ 17,064,293.05					$ 17,064,456.45
				TOTAL A.I.U	30.0%	$ 102,387,373.00		$ 102,385,752.00					$ 102,386,739.00
				TOTAL COSTOS INDIRECTOS + (A.I.U)		$ 443,678,617.00		$ 443,671,593.00					$ 443,675,868.00
				CERTIFICACIÓN RETIE		$ 5,000,000.00		$ 5,000,000.00					$ 5,000,000.00
				SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD		$ 0.00		$ 7,024.00					
				TOTAL PROYECTO		$ 448,678,617.00		$ 448,678,617.00					$ 448,675,868.00

CONTRACTUAL							MODIFICATORIA No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS			PRESUPUESTO EJECUTADO	
Nº	Código Rev/I APU	Actividad	U.M	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad (+/-)	Cantidad Actualizada	Valor	Cantidad	Valor
		AMORTIZACION DEL ANTICIPO				0%		$ -					
		VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA						$ 448,675,868.00					
		PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADA						100.00%					

CONCEPTO	VALOR CONTRATADO	VALOR EJECUTADO	VALOR AMORTIZADO ANTICIPO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 448,678,617.00			
ANTICIPO INICIAL (50%)				
VALOR ACTA DE LIQUIDACION		$ 448,675,868.00	$ -	$ 448,675,868.00
VALOR SIN EJECUTAR		$ 2,749.00	$ -	$ 2,749.00
TOTALES	$ 448,678,617.00	$ 448,678,617.00	$ -	$ 448,678,617.00

VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	$ 448,675,868.00
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 448,675,868.00
SON:	CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/C

El recibo por parte de la supervision de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que haga referencia el citado contrato de obra.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los treinta (30) dias del mes de junio de 2026.

Firma _____
ROSSY ELENA NIÑO GOMEZ
R/L CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY

Firma _____
OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
R/L EPICO INGENIERIA S.A.S.

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E


DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	UBICACIÓN	SAN JOSE DEL BUBUY
		FECHA	25/05/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	1	PRELIMINARES	ÍTEM	1.1	Demolición manual placa de piso 0.10 m prom, con retiro	UND	m2	CANT.	4,00

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA

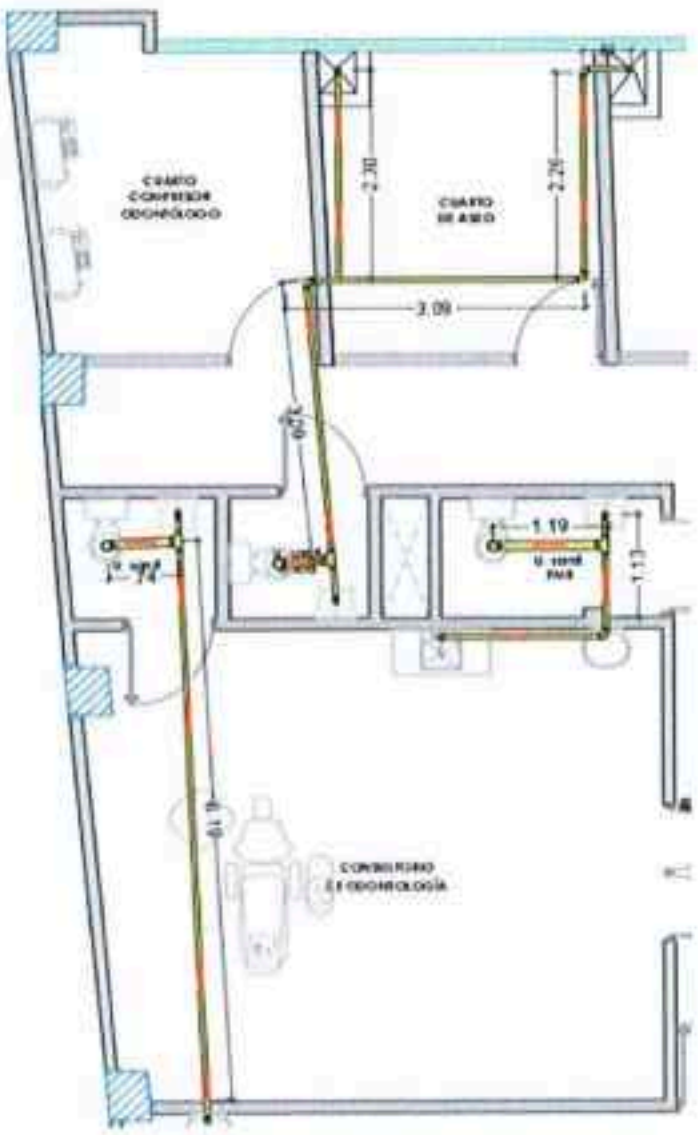







LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES					CANT. TOTAL
		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	ÁREA (M2)	CANT.	
U. sanitaria mixta - cuarto de residuos	L1	3,09	0,20			1,00	0,62
	L2	3,09	0,20			1,00	0,62
	L3	2,30	0,20			1,00	0,46
	L4	2,26	0,20			1,00	0,45
Baño PMR	L5	1,19	0,20			1,00	0,24
	L6	1,13	0,20			1,00	0,23
Odontologia	L7	6,19	0,20			1,00	1,24
	L8	0,74	0,20			1,00	0,15
							-
							-
							-

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E


DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	UBICACIÓN	SAN JOSE DEL BUBUY
		FECHA	25/05/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	1	PRELIMINARES	ÍTEM	1.2	Desmonte aparatos sanitarios	UND	Und	CANT.	18,00

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA

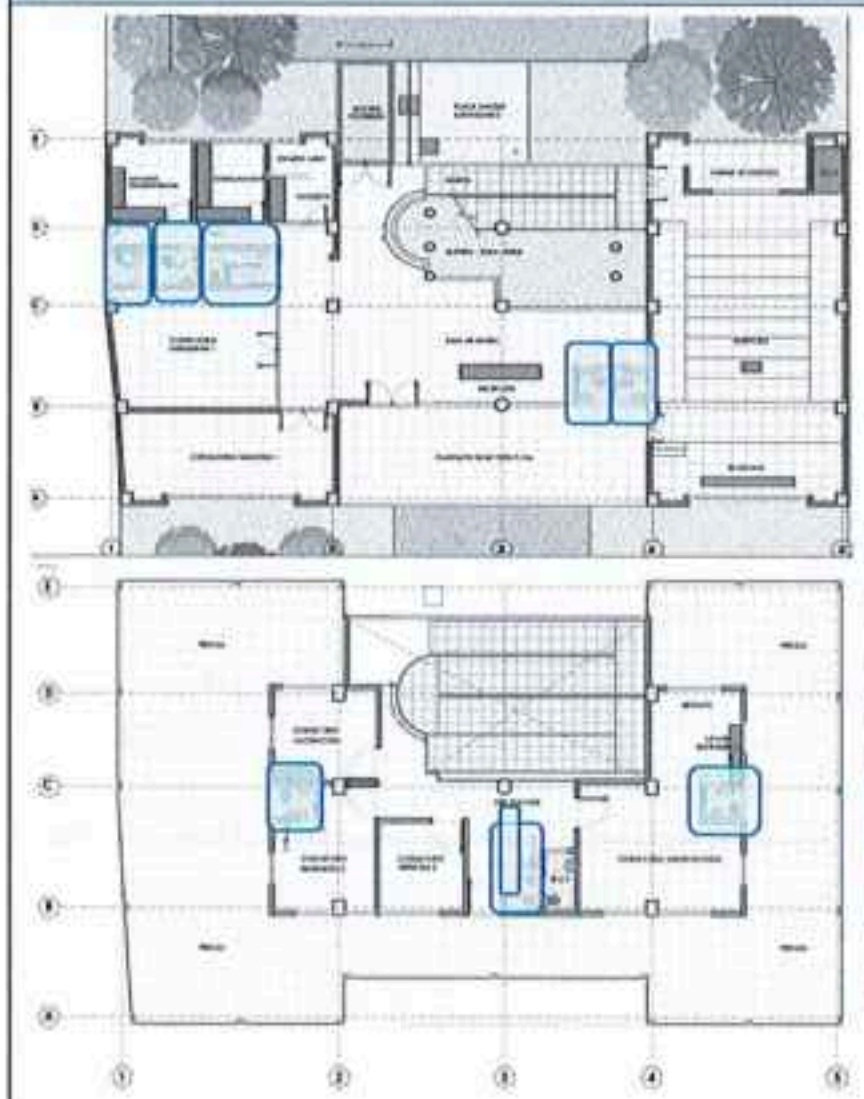





LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	ÁREA (M2)	CANT.	CANT. TOTAL
Primer Piso	Sanitarios					5,00	5,00
	Lavamanos					5,00	5,00
Segundo Piso	Sanitarios					4,00	4,00
	Lavamanos					4,00	4,00

CANTIDAD PROYECTADA	18,00
CANTIDAD CONTRACTUAL	18,00
DIFERENCIA	0,00

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:	ROSSY ELENA NIÑO GÓMEZ	APROBÓ:	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
	RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL
	CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPICO INGENIERIA S.A.S

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E


DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA


OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	UBICACIÓN	SAN JOSE DEL BUBUY
		FECHA	25/05/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	1	PRELIMINARES	ÍTEM	1.3	Desmonte de ventanas, con transporte	UND	m2	CANT.	8,56

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA

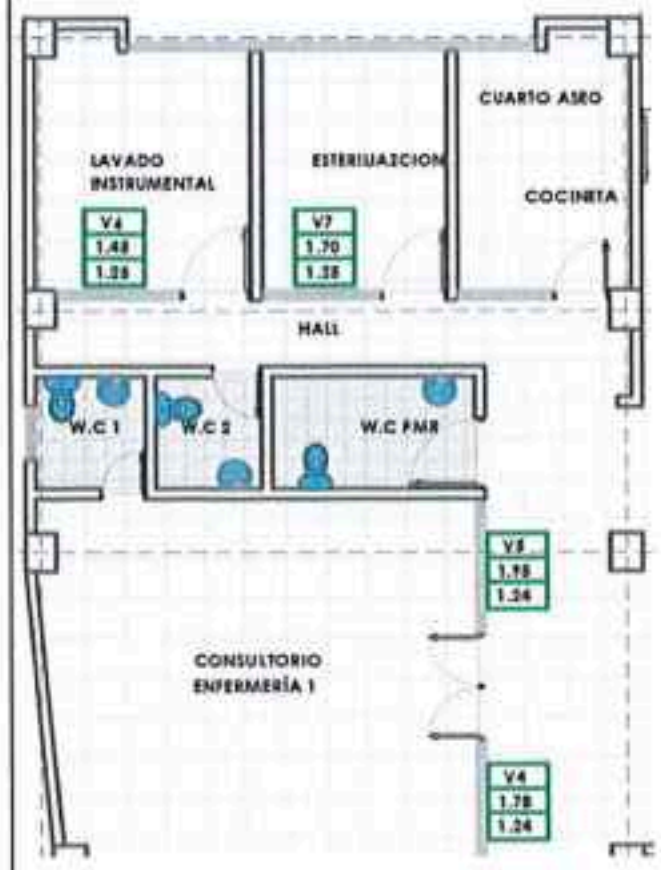





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					CANT. TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	ÁREA (M2)	CANT.	
Lavado instrumentación		1,45	1,25		1,00	1,81
Esterilización		1,70	1,25		1,00	2,13
consultorio enfermería 1		1,95	1,24		1,00	2,42
		1,78	1,24		1,00	2,21
						-
						-
						-

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E


DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	**UBICACIÓN**	SAN JOSE DEL BUBUY
		FECHA	25/05/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	1	PRELIMINARES	ÍTEM	1.4	Desmonte marcos y puertas con transporte	UND	m2	CANT.	42,75

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA

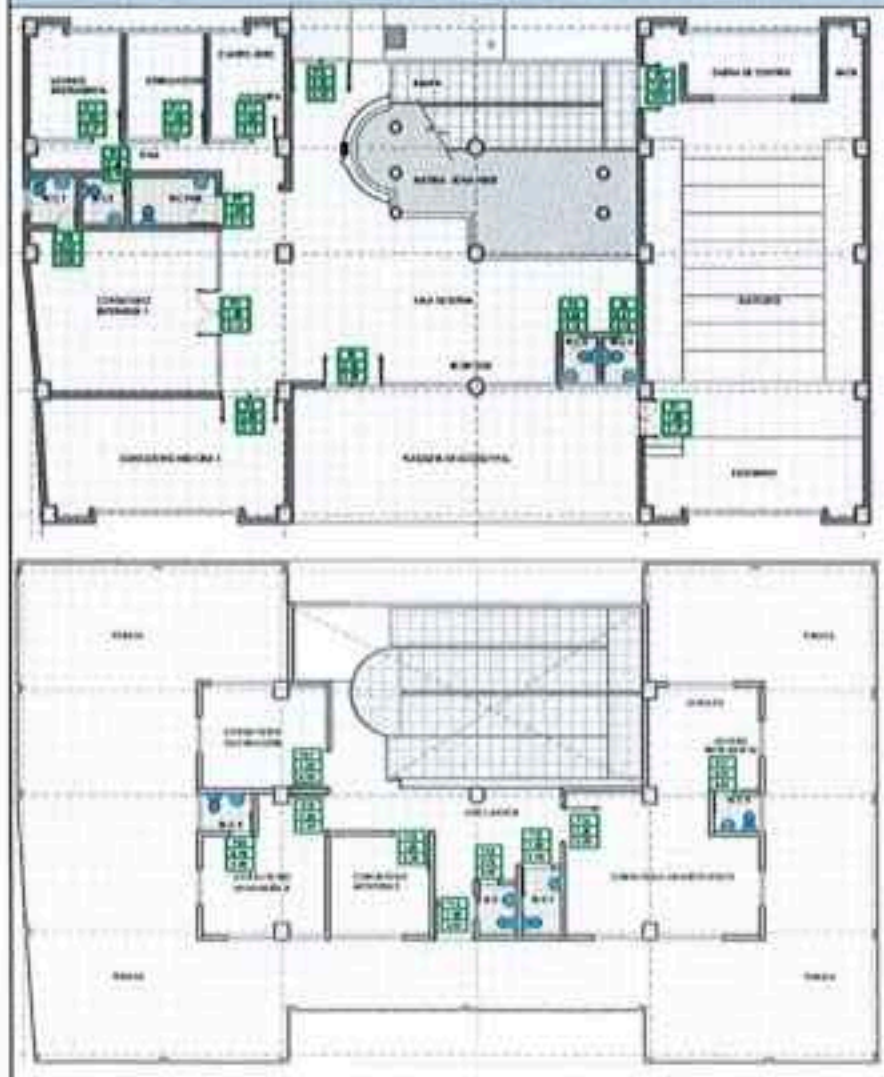





LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES					CANT. TOTAL
		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	ÁREA (M2)	CANT.	
PRIMER PISO	P2		1,47	2,24		1,00	3,29
	P3		0,67	2,18		1,00	1,46
	P4		0,68	2,18		1,00	1,48
	P6		2,00	2,15		1,00	4,30
	P7		1,50	2,16		1,00	3,24
	P8		0,65	2,20		1,00	1,43
	P9		1,00	2,16		1,00	2,16
	P10		0,65	2,17		1,00	1,41
	P11		1,00	2,17		1,00	2,17
	P11		1,00	2,17		1,00	2,17
	P11		1,00	2,17		1,00	2,17
SEGUNDO PISO	P14		0,70	2,20		1,00	1,54
	P15		1,00	2,20		1,00	2,20
	P16		1,20	2,20		1,00	2,64
	P17		0,70	2,20		1,00	1,54
	P18		1,20	2,20		1,00	2,64
	P19		1,24	2,20		1,00	2,73
	P20		0,70	2,20		1,00	1,54
	P21		1,20	2,20		1,00	2,64
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
					CANTIDAD PROYECTADA		**42,75**
					CANTIDAD CONTRACTUAL		**42,75**
					DIFERENCIA		**0,00**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	ROSSY ELENA NIÑO GÓMEZ	APROBÓ	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
	RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL
	CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPICO INGENIERIA S.A.S


HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E

DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE				UBICACIÓN	SAN JOSE DEL BUBUY			
					FECHA	25/05/2026			
					ACTA No	Recibo y liquidación			
CAPÍTULO	1	PRELIMINARES	ÍTEM	1.4	Desmonte marcos y puertas con transporte	UND	m2	CANT.	9,00

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA

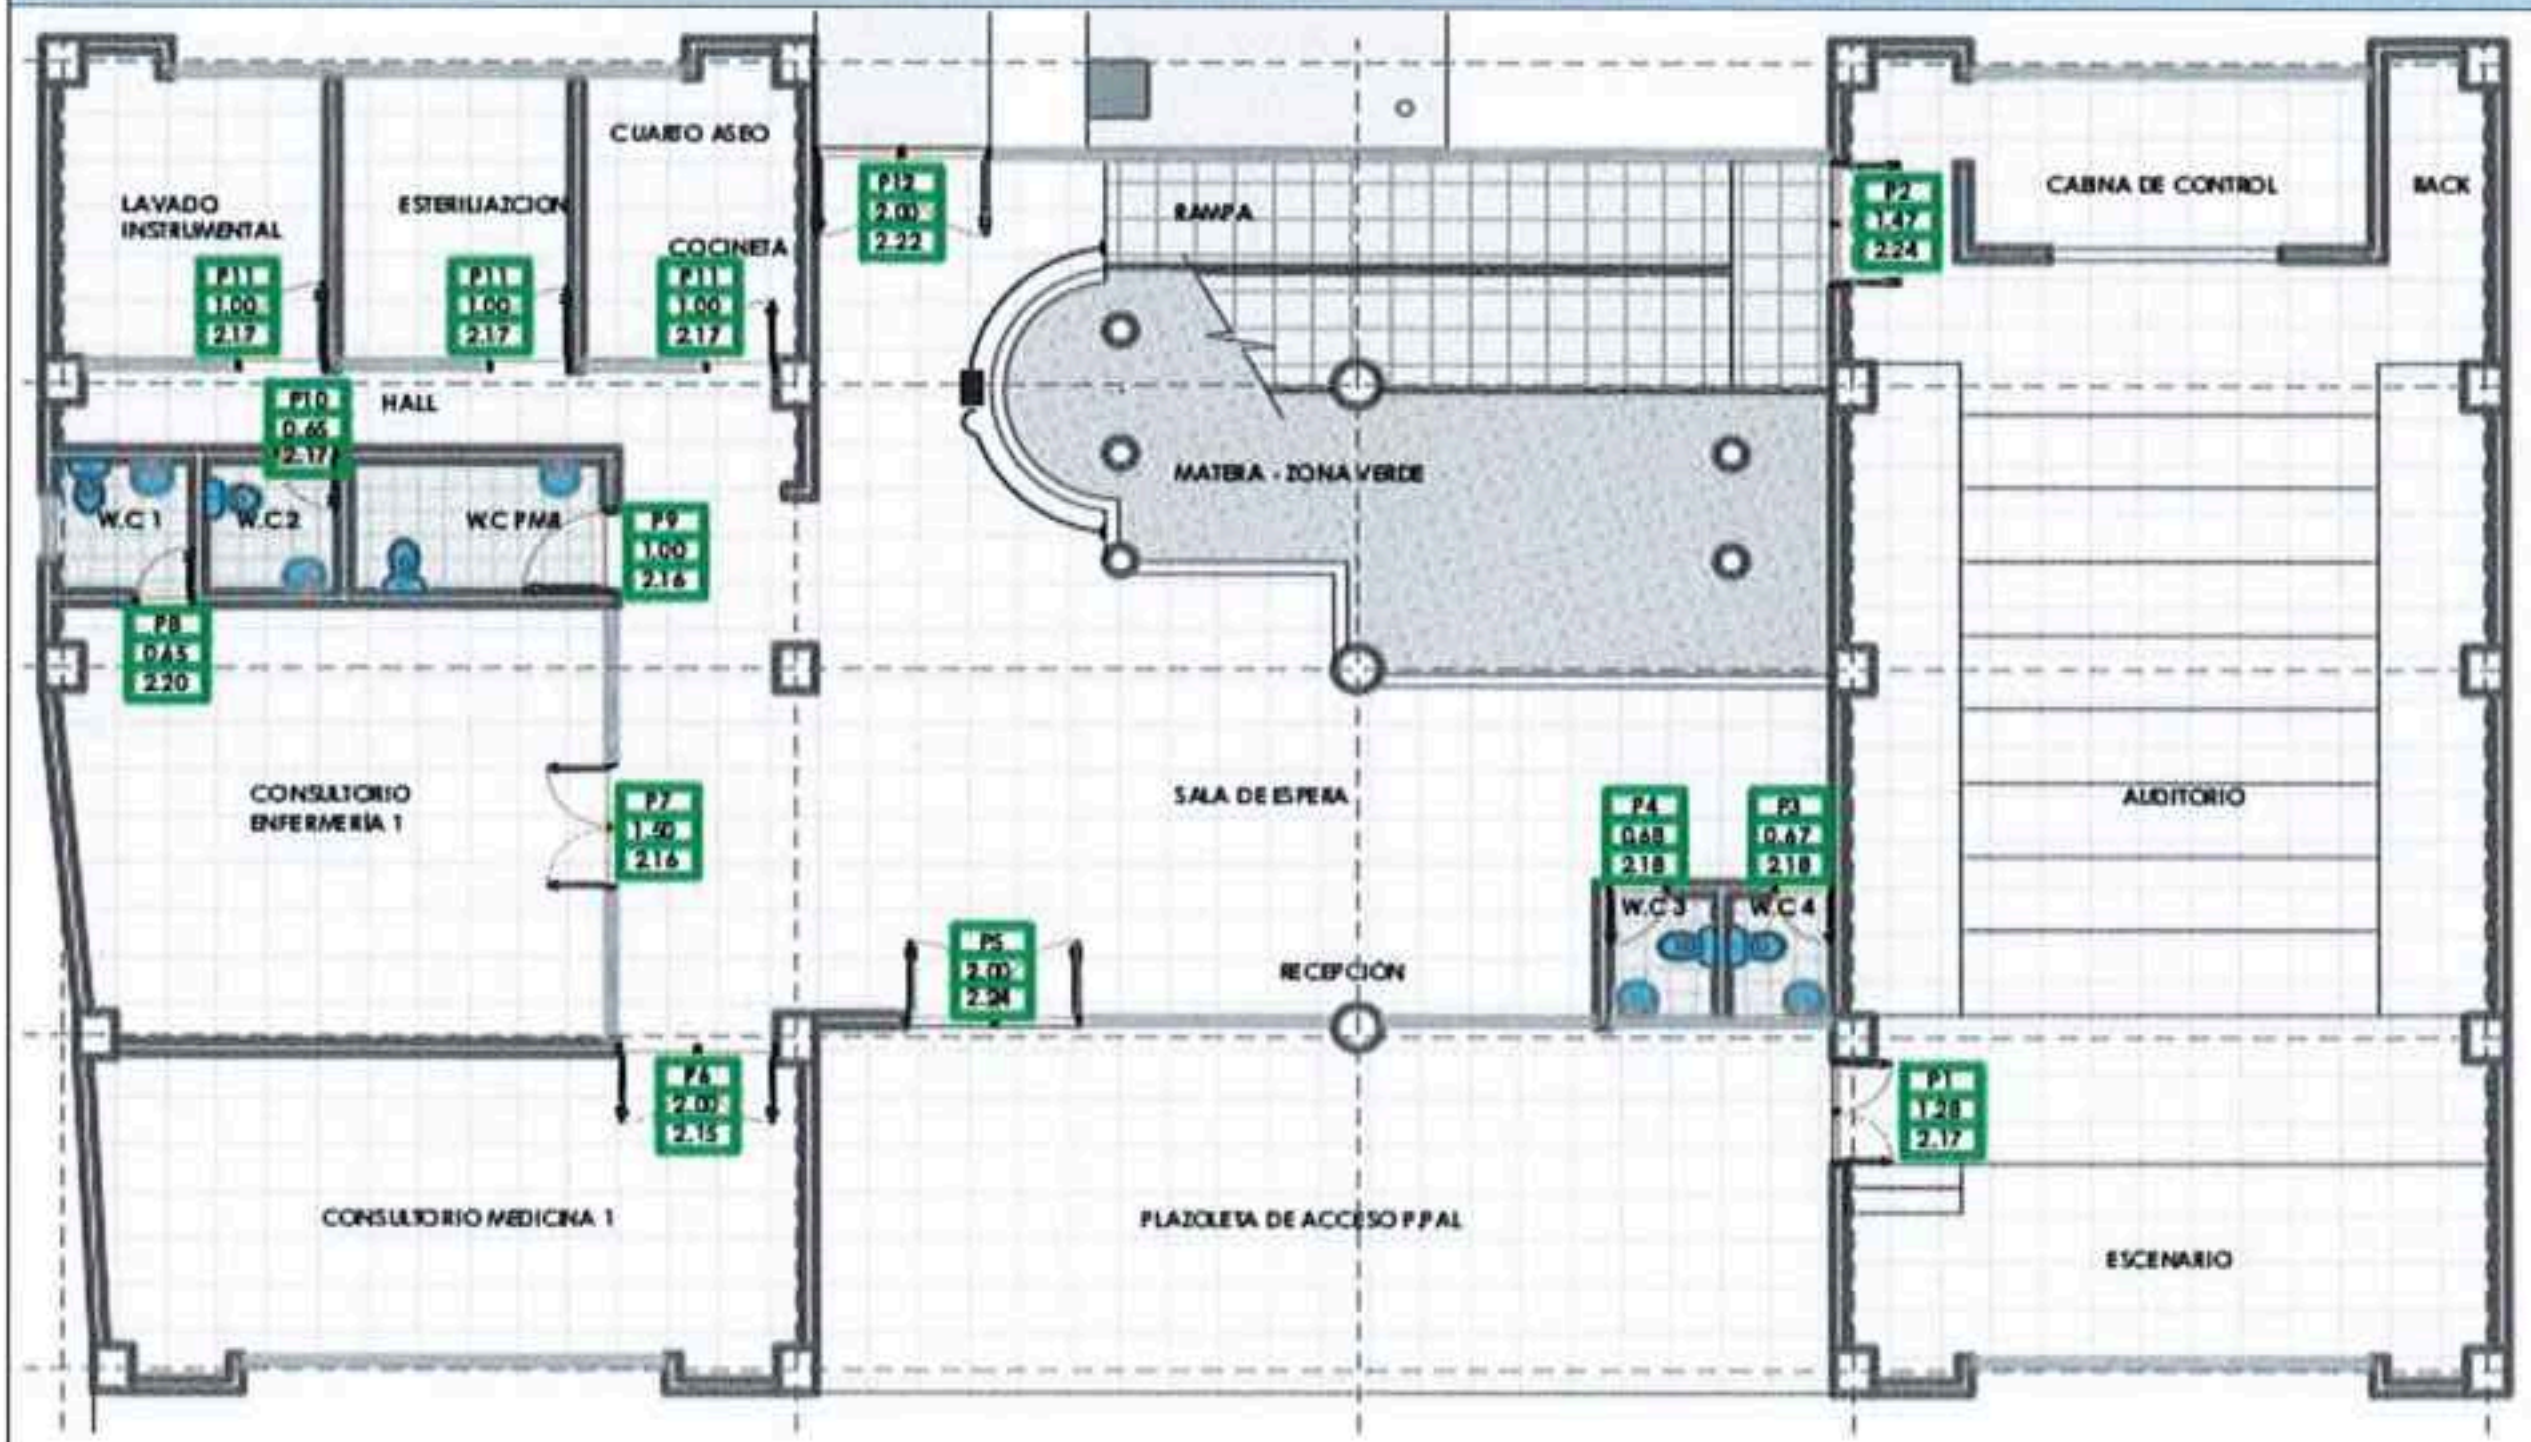


HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E

DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE				**UBICACIÓN**	SAN JOSE DEL BUBUY			
					FECHA	25/05/2026			
					ACTA No	Recibo y liquidación			
CAPÍTULO	1	**PRELIMINARES**	**ÍTEM**	1.4	**Desmonte marcos y puertas con transporte**	**UND**	m2	**CANT.**	0,00

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA

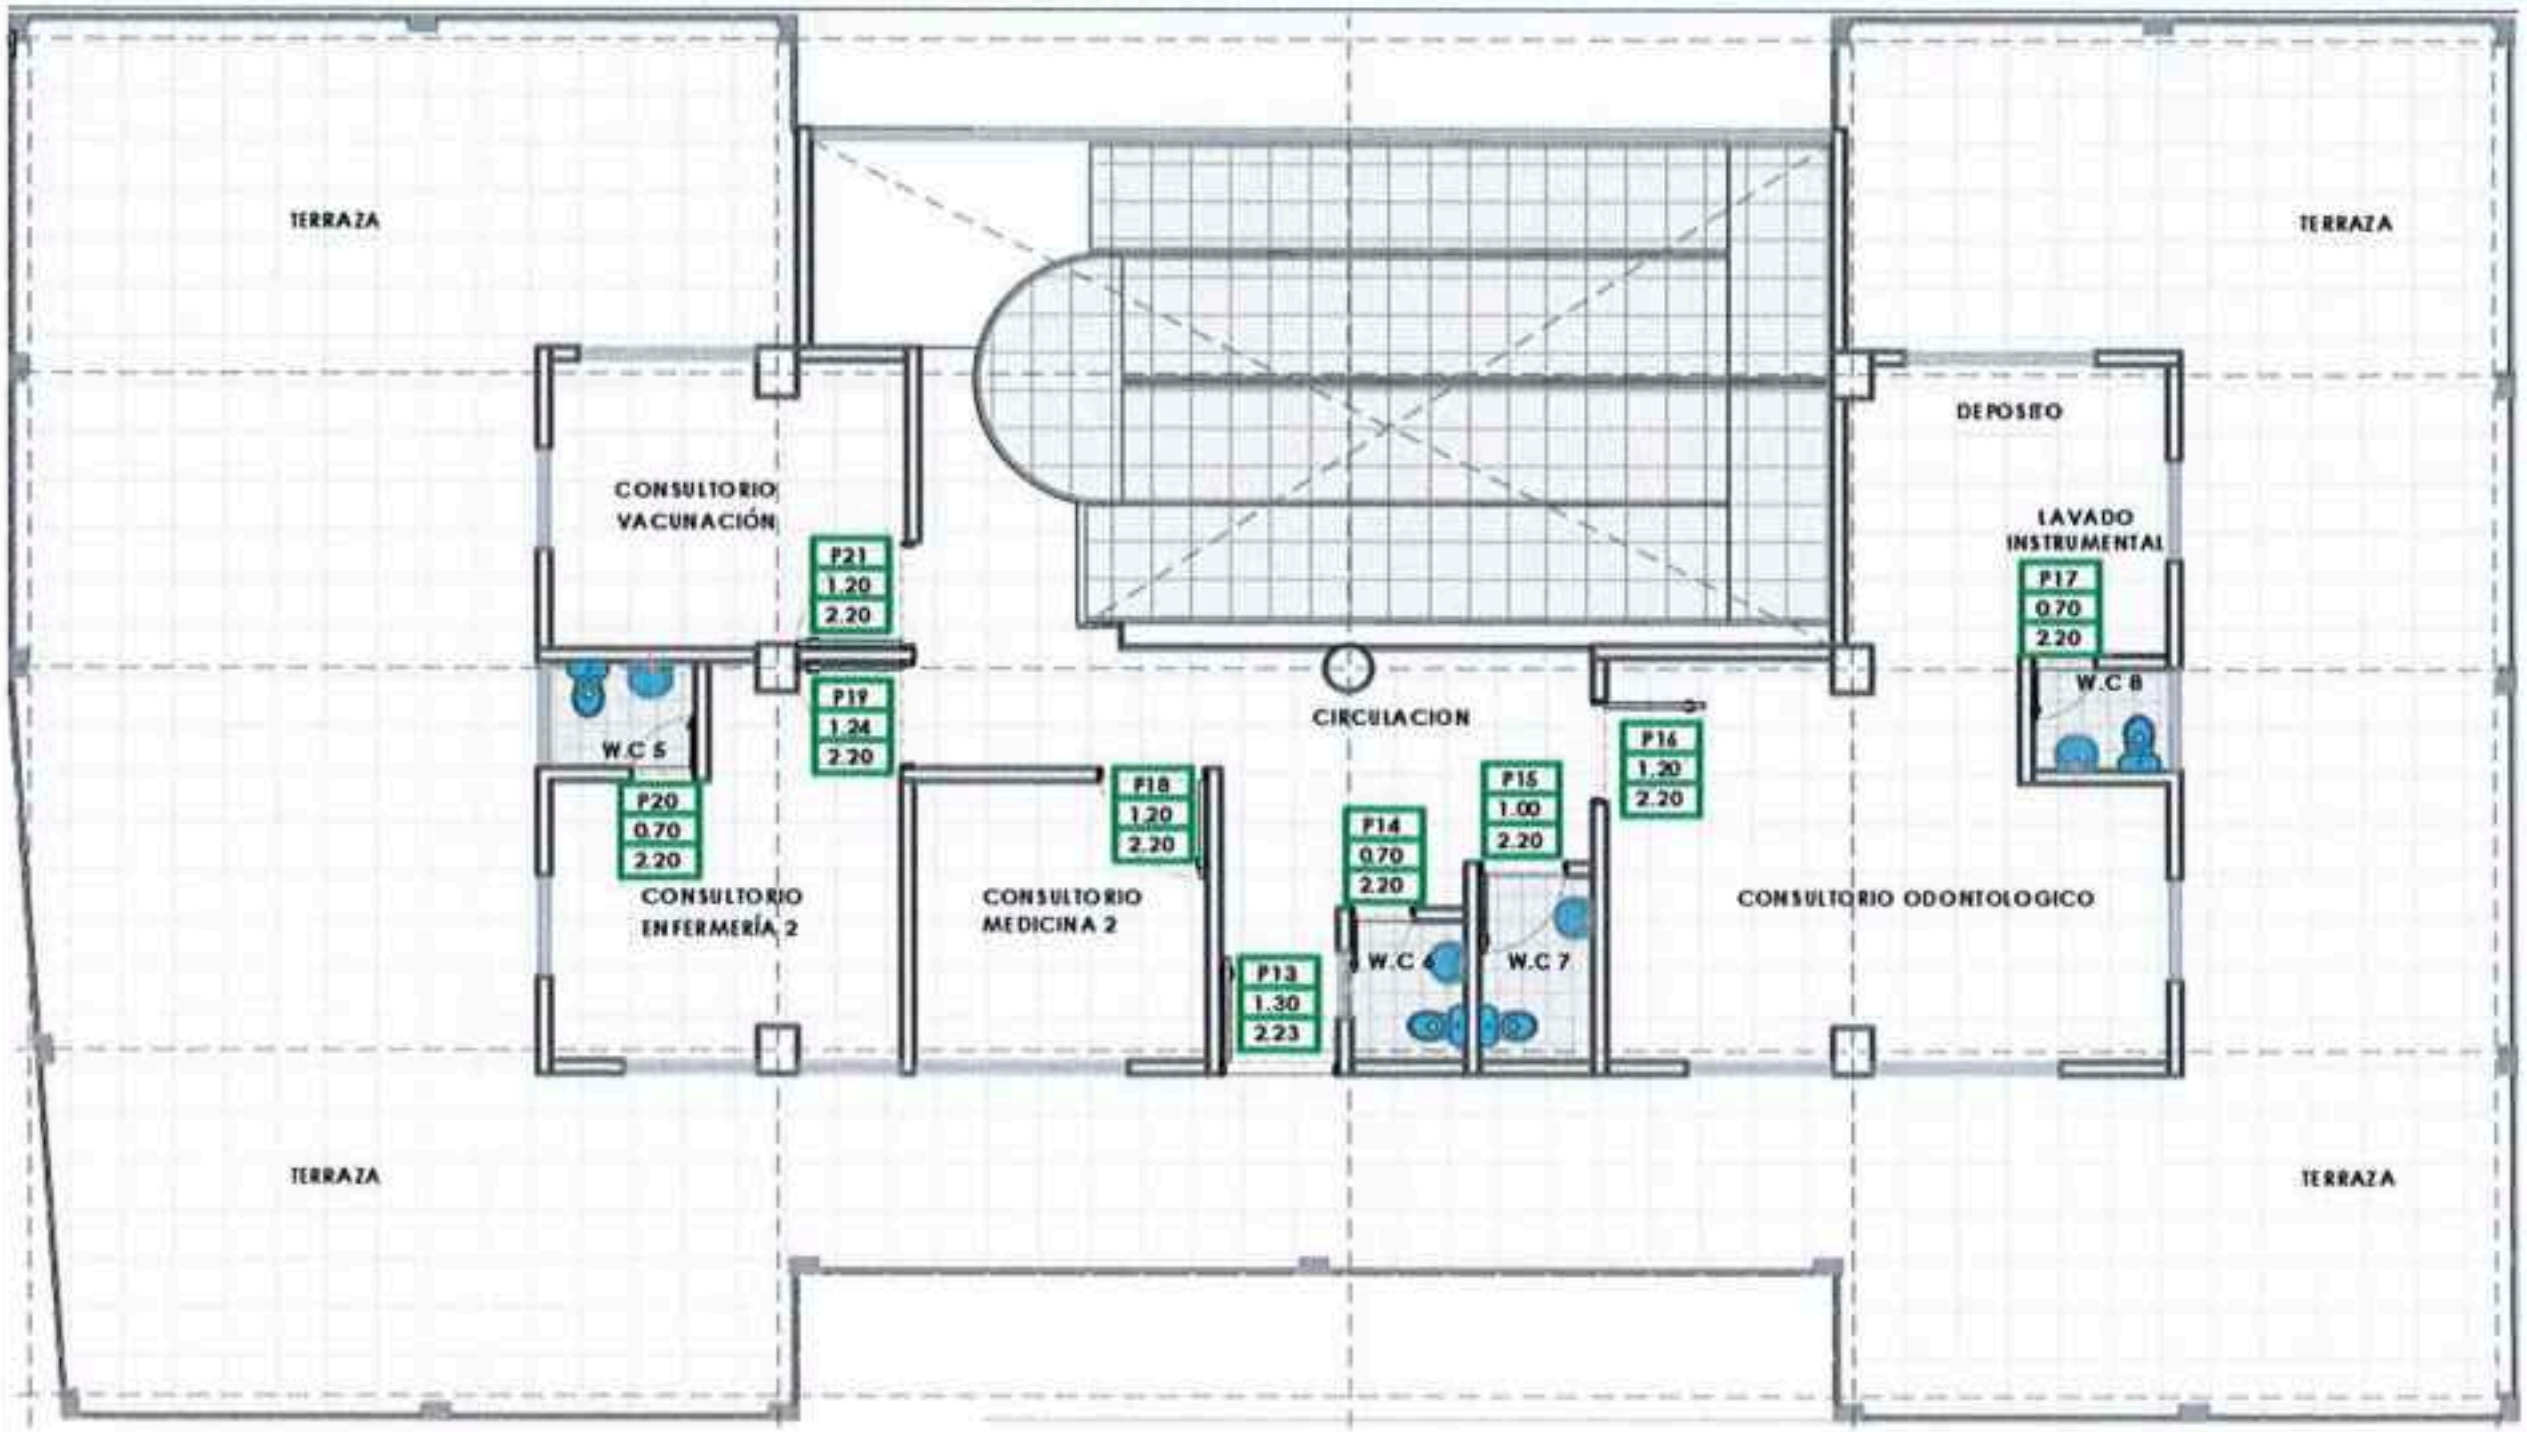

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E

DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	**UBICACIÓN**	SAN JOSE DEL BUBUY
		FECHA	25/05/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	1	PRELIMINARES	ÍTEM	1.5	Desmonte de canales y bajantes de aguas lluvias	UND	m	CANT.	26,60

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA











LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	ÁREA (M2)	CANT.	CANT. TOTAL
Segundo piso	B1 - Vertical			3,30		1,00	3,30
	B1 - Horizontal		4,00			1,00	4,00
	B2 - Vertical			3,40		1,00	3,40
	B2 - Horizontal		4,10			1,00	4,10
	B3 - Horizontal			3,20		1,00	3,20
	B3 - Vertical		4,50			1,00	4,50
Primer piso	B4 - Vertical			3,80		1,00	3,80
	B4 - Horizontal		0,30			1,00	0,30

CANTIDAD PROYECTADA	26,60
CANTIDAD CONTRACTUAL	26,60
DIFERENCIA	0,00

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:	ROSSY ELENA NIÑO GÓMEZ	APROBÓ:	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL	
CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPICO INGENIERIA S.A.S	

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E


DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	UBICACIÓN	SAN JOSE DEL BUBUY
		FECHA	25/05/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	1	PRELIMINARES	ÍTEM	1.6	Desmonte de cielo raso con retiro	UND	m2	CANT.	

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA

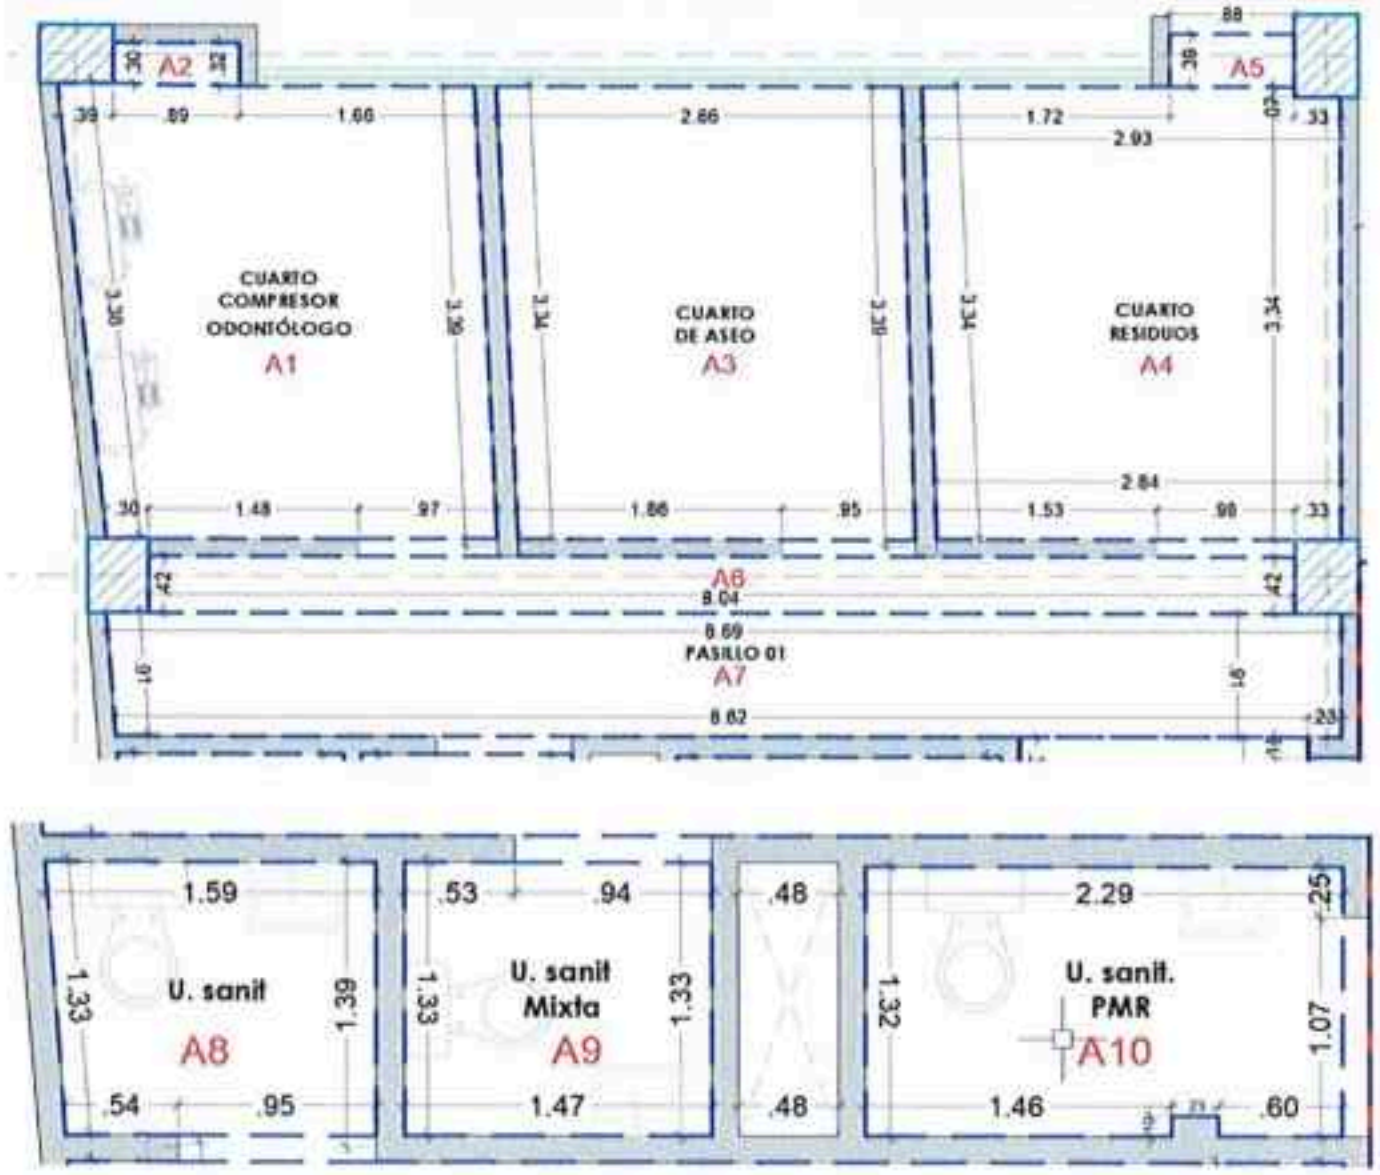

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES					CANT. TOTAL
		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	ÁREA (M2)	CANT.	
Cuarto compresor	A1 (L1=2.94;L2=2.75;Lp=2.85) (A1=3,38; A2=3,39; Ap=3,39)	2,85	3,39			1,00	9,66
	A2 (A1=0,30; A2=0,32; Ap=0,31	0,89	0,31			1,00	0,28
Cuarto Aseo	A3 (L1=2,86; L2=2,80;Lp=2,83) (A1=3,34; L2=3,39; Ap=3,37)	2,83	3,37			1,00	9,54
Cuarto de residuos	A4 (L1=2,93; L2=2,84;Lp=2,89)	2,89	3,34			1,00	9,65
	A4- Columna E2	0,33	0,07			- 1,00	- 0,02
	A5	0,88	0,39			1,00	0,34
Pasillo 01	A6	8,04	0,42			1,00	3,38
	A7 (L1=8,69;L2=8,62; Lp=	8,66	0,91			1,00	7,88
Baño consultorio odontologico	A8 (L1=1,59;L2=1,49; Lp=1,54) (A1=1,33; A2=1,39 Ap=1,36)	1,54	1,36			1,00	2,09
U. Sanit Mixta	A9	1,47	1,33			1,00	1,96
U. Sanit PMR	A10	2,29	1,32			1,00	3,02
	A10- Columna	0,23	0,10			- 1,00	- 0,02
Consultorio Odontología	A11 (L1=6,11; L2=5,69;Lp=5,90) ((A1=5,26; A2=5,20; Lp	5,90	5,23			1,00	30,86
	A11 - Columna C1	0,32	0,53			- 1,00	- 0,17
	A11 - Columna B1	0,30	0,34			- 1,00	- 0,10
Consultorio medicina 01	A12 (L1=8,03; L2=7,88;Lp=7,96) ((A1=3,56; A2=3,50; Lp	7,96	3,53			1,00	28,10
	A13 (A1=0,33;A2=0,29;Lp=0,31)	0,96	0,31			1,00	0,30
	A14 (A1=0,29;A2=0,40;Lp=0,35)	0,96	0,35			1,00	0,34
						CANTIDAD PROYECTADA	107,08

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:	ROSSY ELENA NIÑO GÓMEZ	APROBÓ:	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
	RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL
	CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPICO INGENIERIA S.A.S

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E


DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	UBICACIÓN	SAN JOSE DEL BUBUY
		FECHA	25/05/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	1	PRELIMINARES	ÍTEM	1.6	Desmonte de cielo raso con retiro	UND	m2	CANT.	

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA

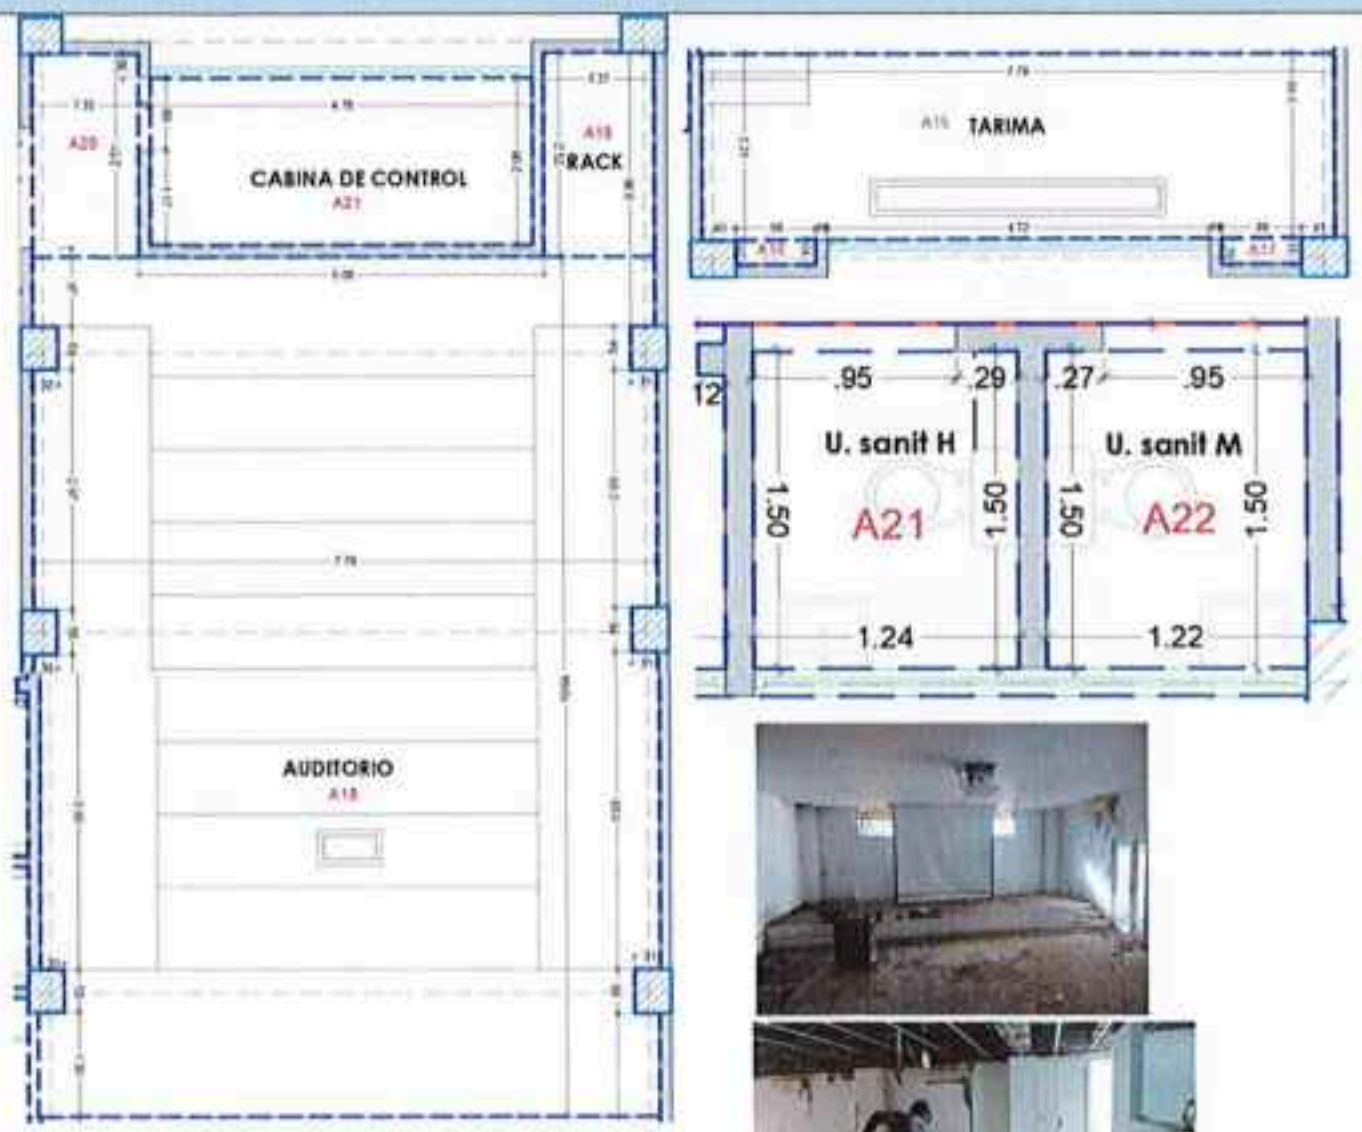



LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	ÁREA (M2)	CANT.	CANT. TOTAL
Tarima	A15	7,79	2,25			1,00	17,53
	A16 (L1= 0,29; L2= 0,30; Lp=0,30)	0,98	0,30			1,00	0,29
	A17 (L1= 0,30; L2= 0,32; Lp=0,31)	0,98	0,31			1,00	0,30
Auditorio	A18	7,78	10,64			1,00	82,78
	A18 - Columna B4	0,31	0,53		-	1,00 -	0,16
	A18 - Columna B5	0,31	0,55		-	1,00 -	0,17
	A18 - Columna C4	0,30	0,55		-	1,00 -	0,17
	A18 - Columna C5	0,31	0,55		-	1,00 -	0,17
	A18 - Columna D4	0,32	0,53		-	1,00 -	0,17
	A18 - Columna D5	0,31	0,54		-	1,00 -	0,17
Rack	A19	1,37	2,52			1,00	3,45
Entrada auditorio	A20	1,35	2,51			1,00	3,39
Cabina de control	A21	4,76	2,06			1,00	9,81
U. sanit H	A22	1,24	1,50			1,00	1,86
U. sanit M	A23	1,22	1,50			1,00	1,83
Sala de espera	A24	5,70	2,56			1,00	14,59
	A23	5,44	2,55			1,00	13,87
	A23 Columna	0,13	0,18		-	1,00 -	0,02
	A24	3,00	2,50			1,00	7,50
	A25	2,74	0,26			1,00	0,71
	A25 - columna redonda				0,02	1,00	0,02
	A26	2,74	1,15			1,00	3,15
	A26 - columna redonda				0,02	1,00	0,02
	A27	1,19	1,69			1,00	2,01
	A28 - Columna redoonda				0,45	1,00	0,45
	A29	2,00	3,28			1,00	6,56
	A30	0,36	1,84			1,00	0,66
	A31	2,03	1,99			1,00	4,04
	A32	5,57	3,03			1,00	16,88
	A32 - Columna C2	0,48	0,53		-	1,00 -	0,25
						CANTIDAD PROYECTADA	190,42
						Viene	107,08
						TOTAL	297,51

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:	ROSSY ELENA NIÑO GÓMEZ	APROBÓ:	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL	
CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPICO INGENIERIA S.A.S	

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E


DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	UBICACIÓN	SAN JOSE DEL BUBUY
		FECHA	25/05/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	1	PRELIMINARES	ÍTEM	1.6	Desmonte de cielo raso con retiro	UND	m2	CANT.	

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA

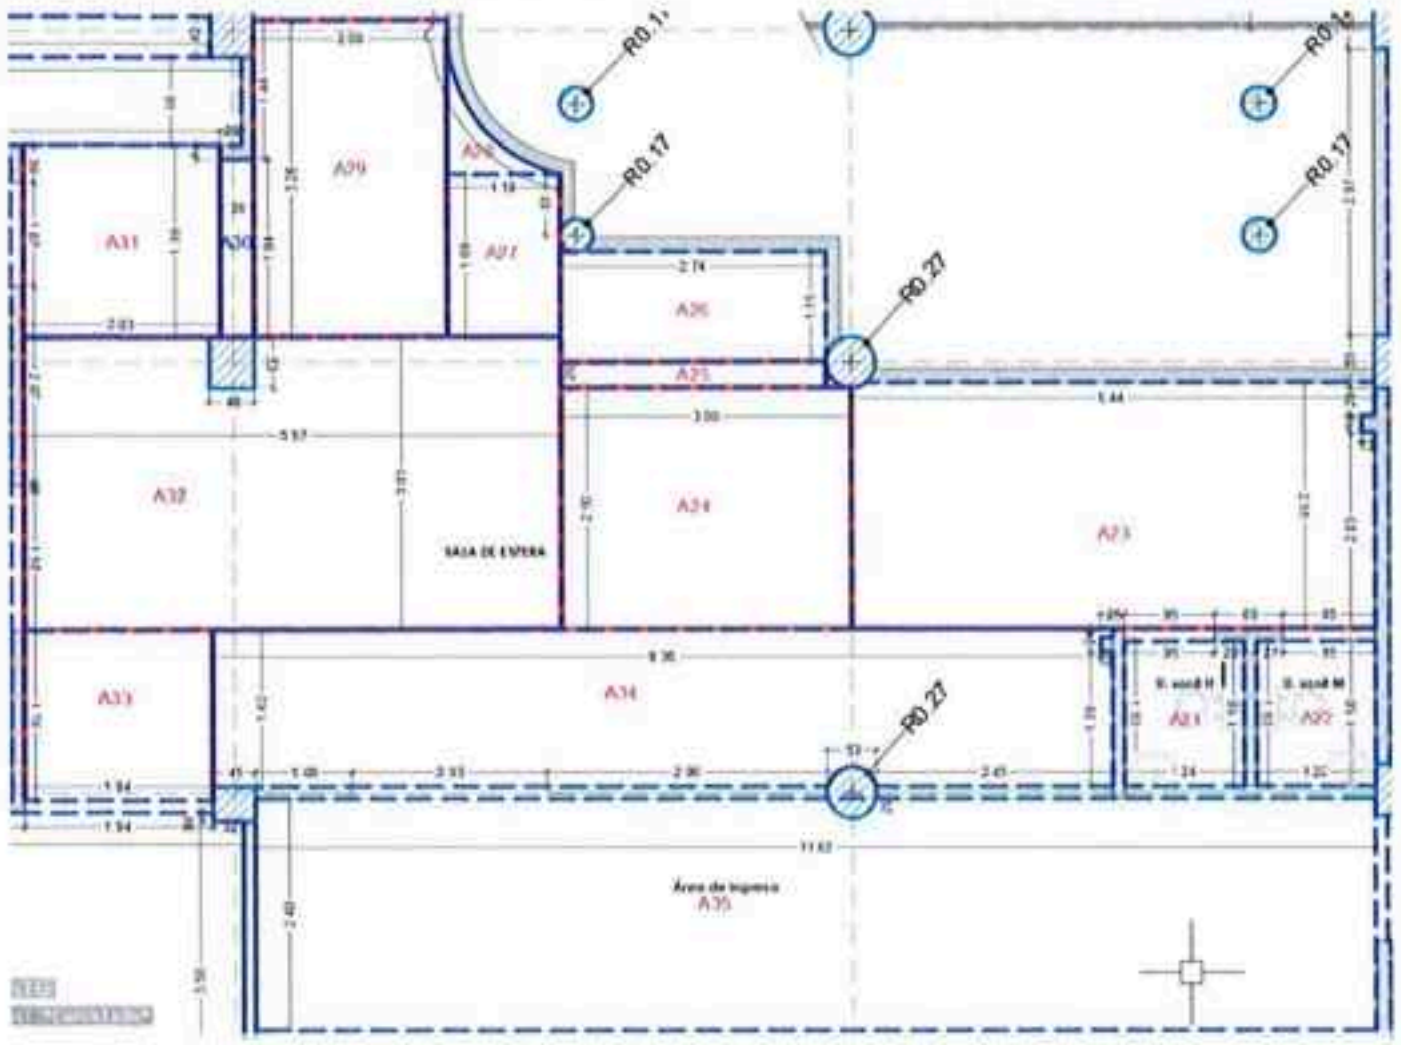

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	ÁREA (M2)	CANT.	CANT. TOTAL
Sala de espera	A33	1,94	1,76			1,00	3,41
	A34	9,36	1,62			1,00	15,16
	A34 - Columneta	0,12	0,24		-	1,00 -	0,03
	A34 Columna redonda r=0,20 $A = (\pi r^2)/2$				0,06 -	1,00 -	0,06
Área de ingreso	A35	11,62	2,40			1,00	27,89
	A35 - Columna redonda r=0,20 $A = (\pi r^2)/2$				0,06 -	1,00 -	0,06
SEGUNDO PISO							
Almacen alistam Termos	A1 (L1= 2,96; L2= 3,01; Lp=2,99)	2,99	0,19			1,00	0,57
	A2 (L1= 0,33; L2= 0,32; Lp=2,99)	0,33	2,99			1,00	0,99
	A3	3,02	0,11			1,00	0,33
	A4 (L1= 3,01; L2= 3,02; Lp=3,02)	3,02	3,20			1,00	9,66
Consultorio Vacunación	A5	2,29	1,20			1,00	2,75
	A6	0,62	1,09			1,00	0,68
	A7	1,35	1,50			1,00	2,03
	A8 (Total)	5,93	3,19			1,00	18,92
	A8 - Columna B4	0,43	0,33			- 1,00 -	0,14
	A8 Eje B esquina	0,06	0,19			- 1,00 -	0,01
W.C 9	A9	1,52	1,20			1,00	1,82
W.C 8	A10	1,29	2,33			1,00	3,01
W.C 7	A11	1,30	1,56			1,00	2,03
Oficina /Archivo	A12	3,29	3,29			1,00	10,82
						CANTIDAD PROYECTADA	99,76
						Viene	297,51
						TOTAL	397,26

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	ROSSY ELENA NIÑO GÓMEZ	APROBÓ	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL	
CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPICO INGENIERIA S.A.S	

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E


DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	UBICACIÓN	SAN JOSE DEL BUBUY
		FECHA	25/05/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	1	PRELIMINARES	ÍTEM	1.6	Desmonte de cielo raso con retiro	UND	m2	CANT.	486,93

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA

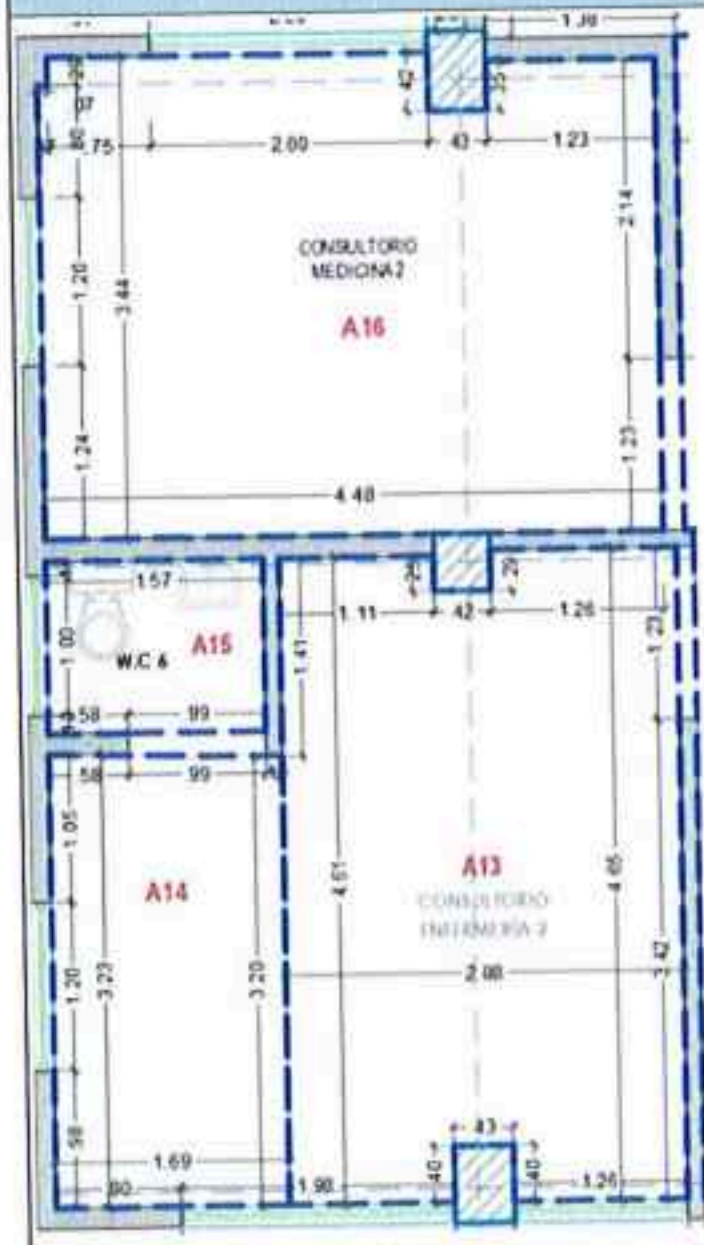



LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	ÁREA (M2)	CANT.	CANT. TOTAL
Consultorio enfermería 2	A13 (A1=4,61;A2=4,65;Ap=4,63))	2,88	4,63			1,00	13,33
	A13 - Columna B2	0,43	0,40		-	1,00 -	0,17
	A13 - Columna C2 A1=0,25;A2=0,29; Ap=0,27)	0,42	0,27		-	1,00 -	0,11
	A14 (A1=3,23;A2=3,20;Ap=4,63)	1,69	3,22			1,00	5,44
W.C 6	A15	1,57	1,00			1,00	1,57
Consultorio medicina 2	A16	4,48	3,44			1,00	15,41
	A16 - Columna D2 (A1=0,42;A2=0,35; Ap=0,39)	0,43	0,39		-	1,00 -	0,17
Circulación	A17	10,28	3,53			1,00	36,29
	A19 - Columna redonda D3 r=0,27 $A = \pi r^2$				0,23 -	1,00 -	0,23
	A18	3,42	1,35			1,00	4,62
	A19	4,17	1,35			1,00	5,63
	A19 - Columna redonda C3 r=0,27 $A = \pi r^2$				0,23 -	1,00 -	0,23
	A20	1,30	3,42			1,00	4,45
	A21	1,44	1,73			1,00	2,49
	A22	1,43	0,94			1,00	1,34

CANTIDAD PROYECTADA	89,66
Viene	397,26
TOTAL	486,93
CANTIDAD CONTRACTUAL	457,29
DIFERENCIA	29,64

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:	ROSSY ELENA NIÑO GÓMEZ	APROBÓ:	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
	RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL
	CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPICO INGENIERIA S.A.S


HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E

DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE				**UBICACIÓN**	SAN JOSE DEL BUBUY			
					FECHA	25/05/2026			
					ACTA No	Recibo y liquidación			
CAPÍTULO	1	**PRELIMINARES**	**ÍTEM**	1.6	**Desmonte de cielo raso con retiro**	**UND**	m2	**CANT.**	0,00

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA

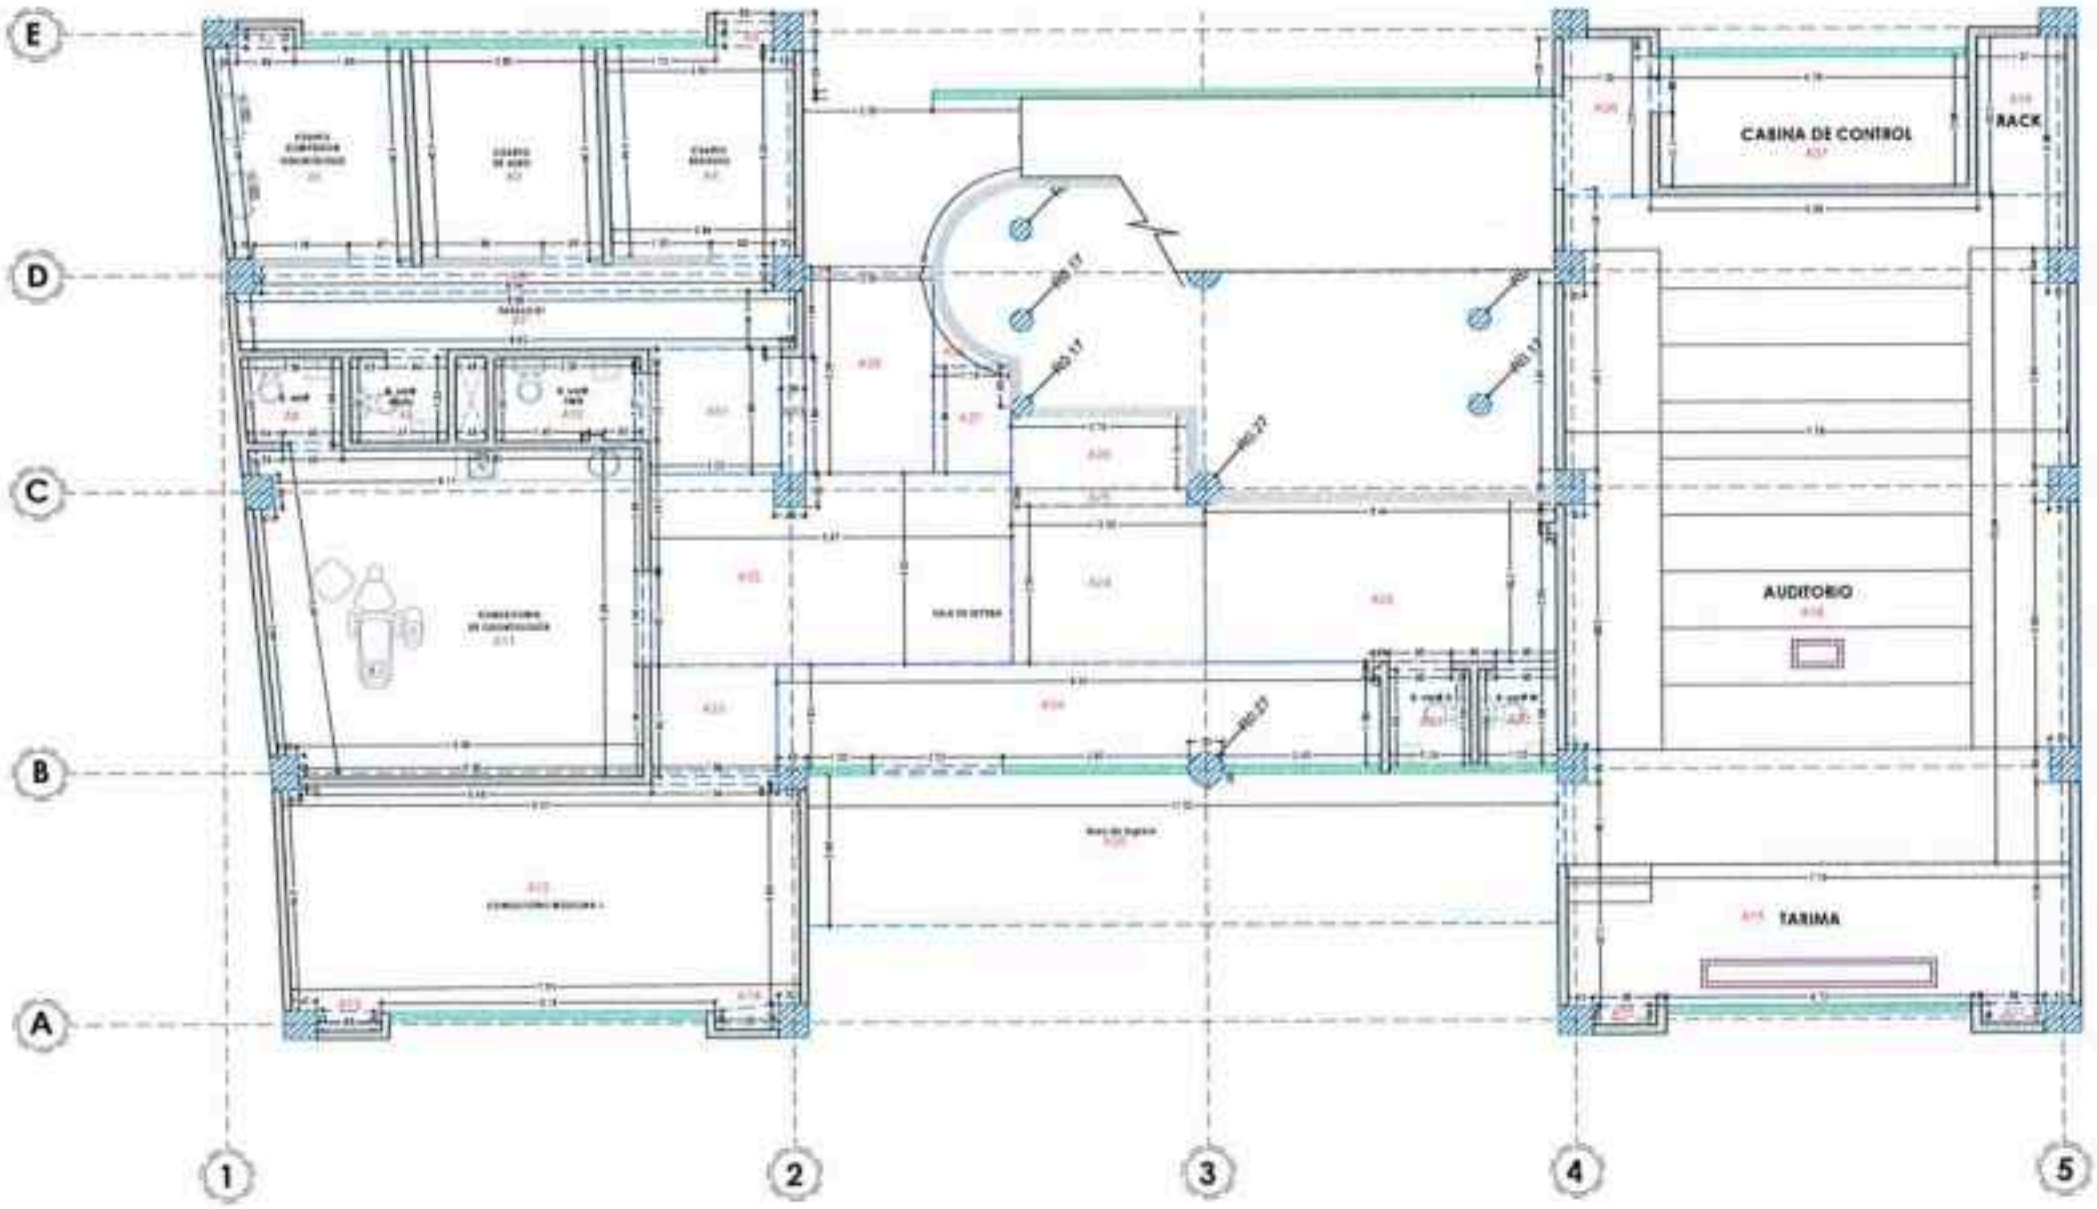

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E


DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	**UBICACIÓN**	SAN JOSE DEL BUBUY
		FECHA	25/05/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	**1**	**PRELIMINARES**	**ÍTEM**	**1.6**	**Desmonte de cielo raso con retiro**	**UND**	**m2**	**CANT.**	**0,00**

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA

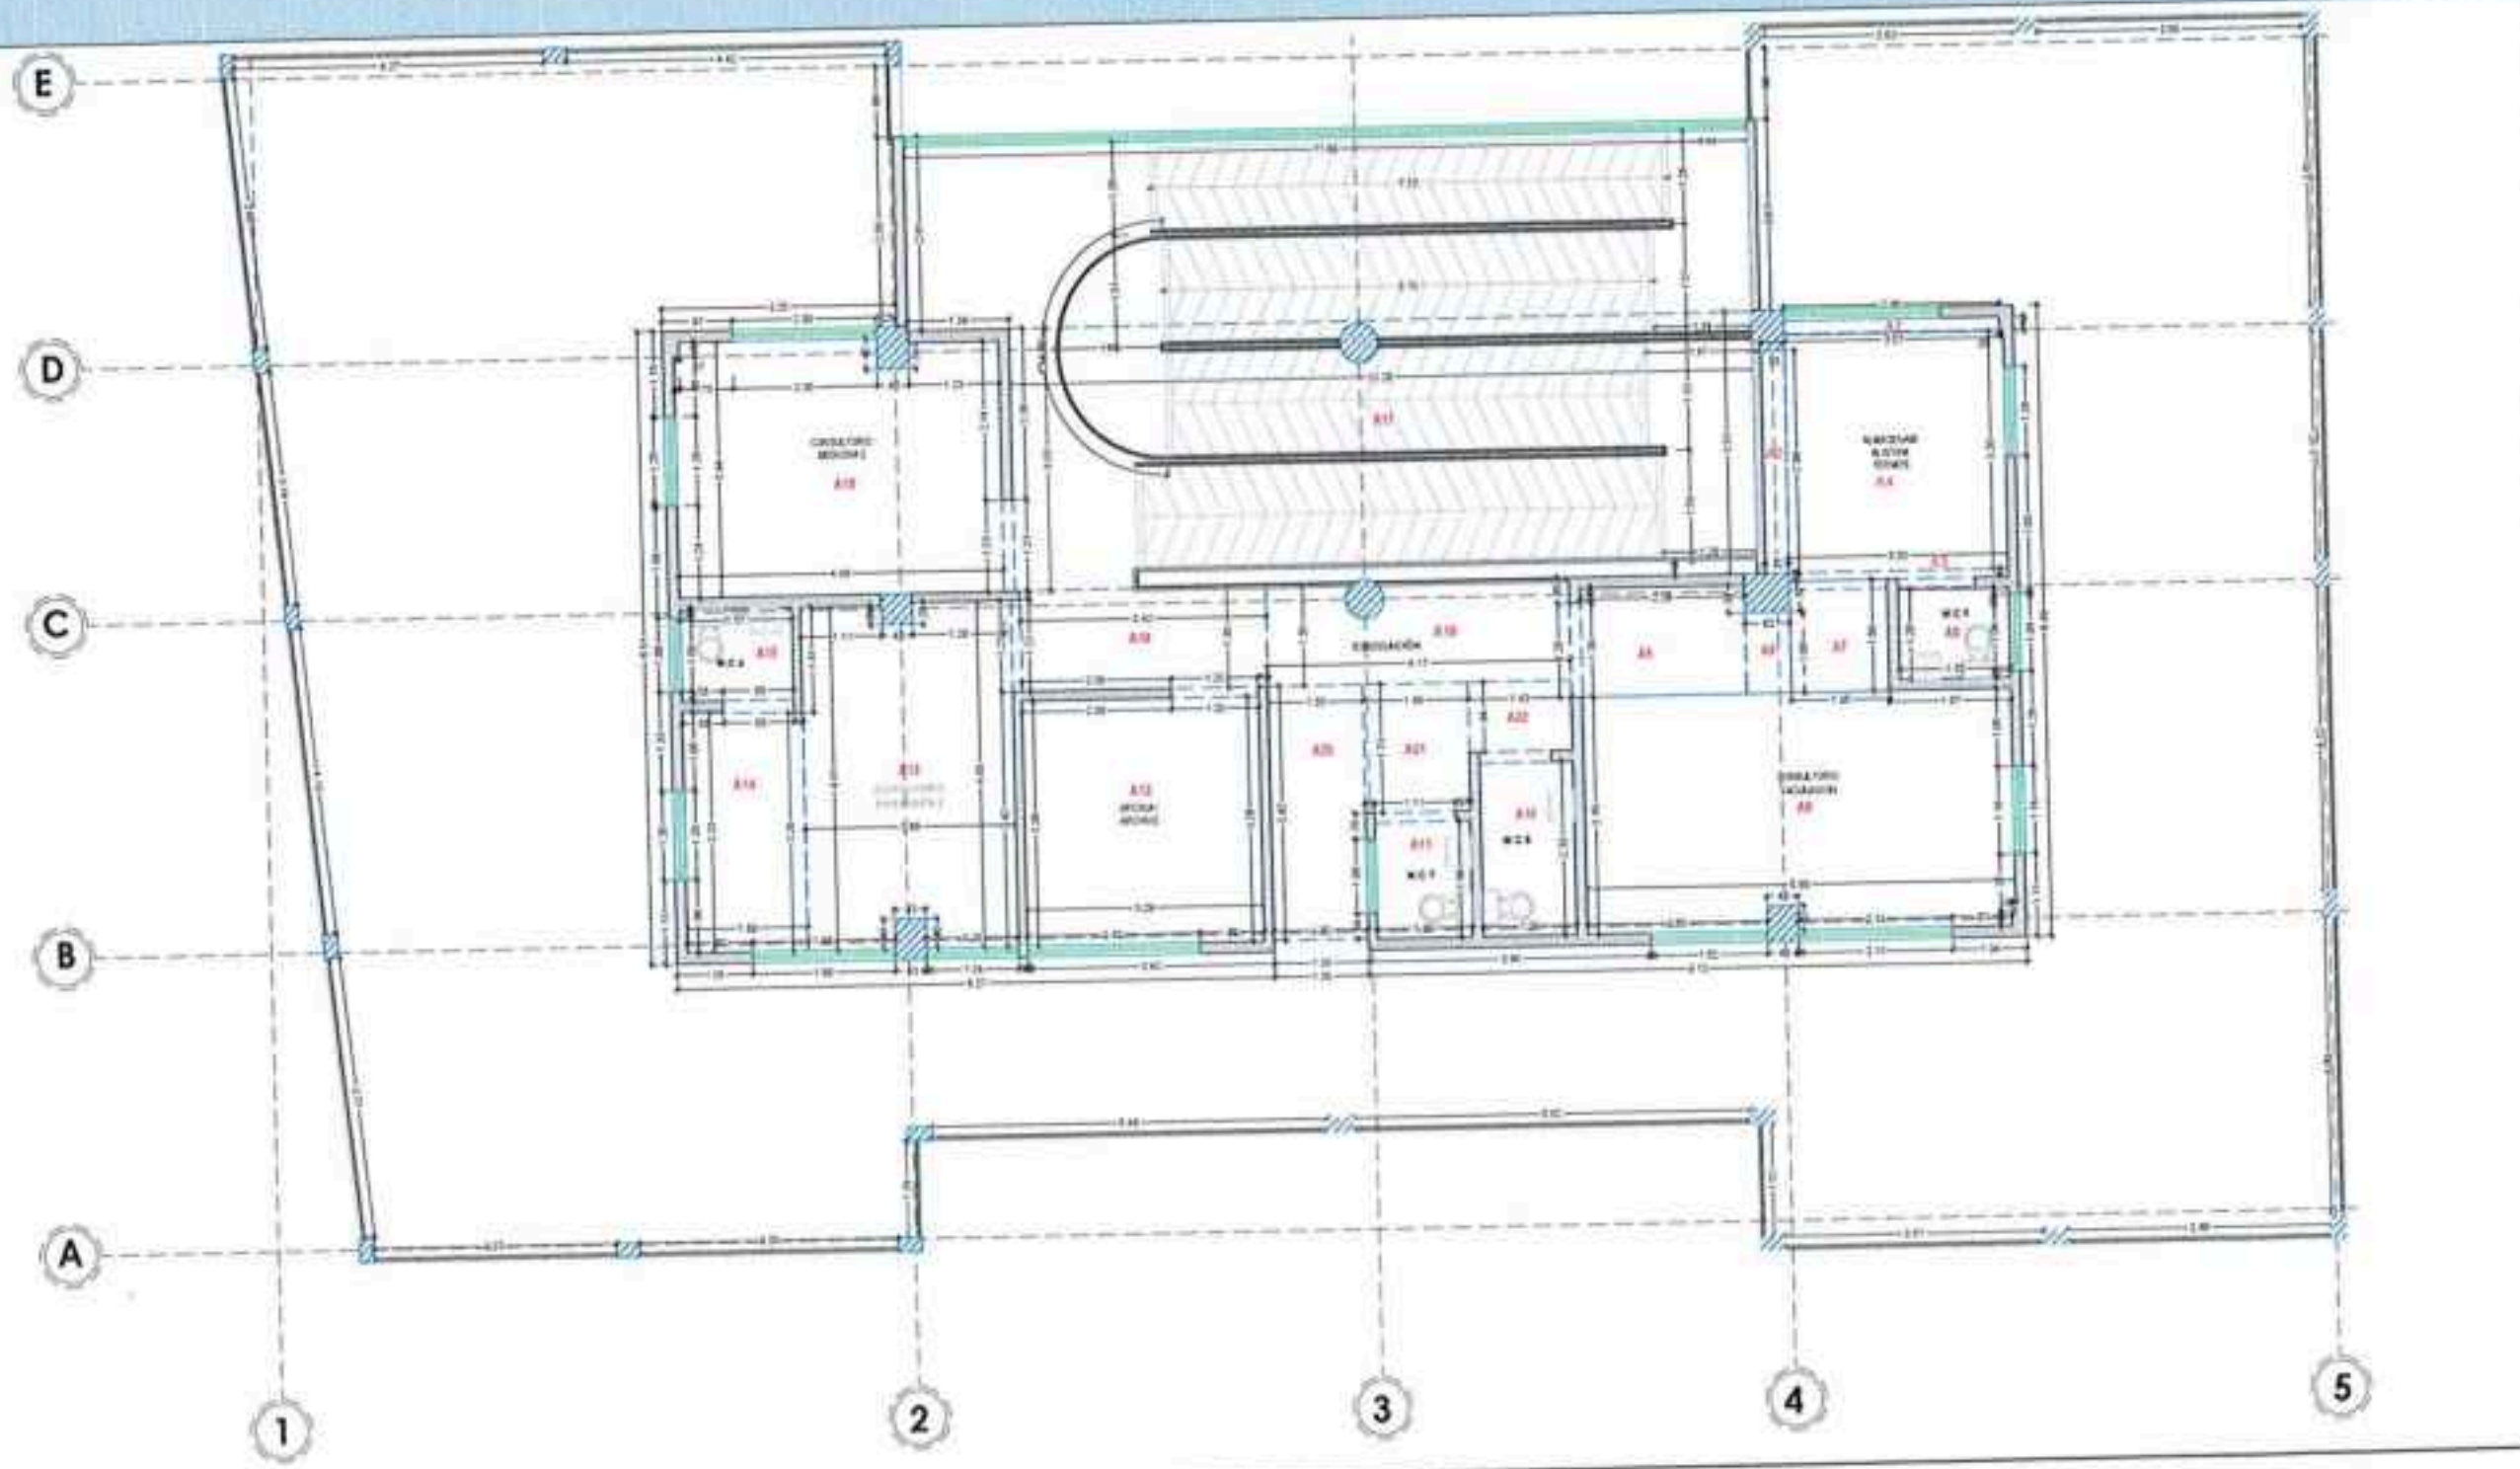

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E


DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	UBICACIÓN	SAN JOSE DEL BUBUY
		FECHA	25/05/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	1	PRELIMINARES	ÍTEM	1.7	Demolición a mano de tableta piso, espesor entre 0.06 y 0.08 m con retiro	UND	m2	CANT.	0,00

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA

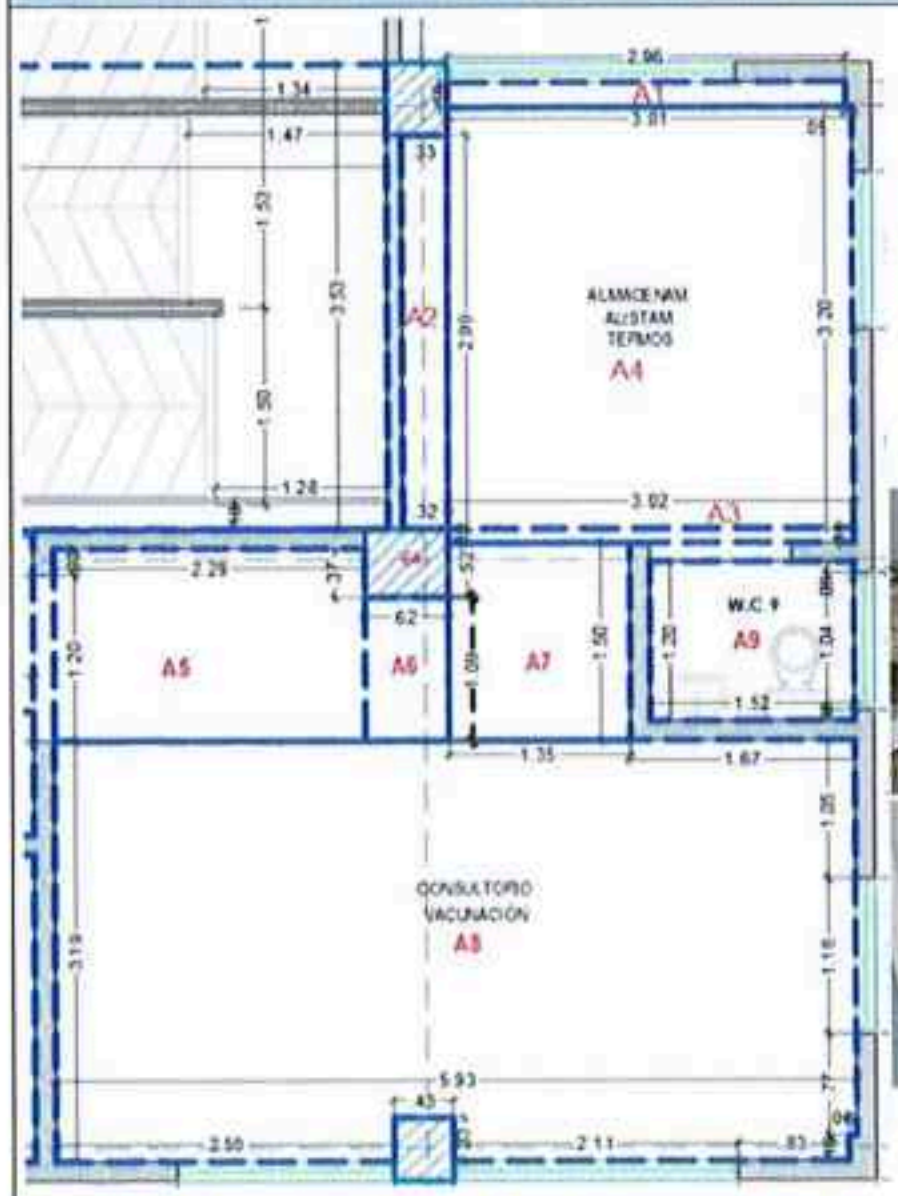





LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	ÁREA (M2)	CANT.	CANT. TOTAL
Almacen alistam Termos	A1 (L1= 2,96; L2= 3,01; Lp=2,99)	2,99	0,19			1,00	0,57
	A2 (L1= 0,33; L2= 0,32; Lp=2,99)	0,33	2,99			1,00	0,99
	A3	3,02	0,11			1,00	0,33
	A4 (L1= 3,01; L2= 3,02; Lp=3,02)	3,02	3,20			1,00	9,66
Consultorio Vacunación	A5	2,29	1,20			1,00	2,75
	A6	0,62	1,09			1,00	0,68
	A7	1,35	1,50			1,00	2,03
	A8 (Total)	5,93	3,19			1,00	18,92
	A8 - Columna B4	0,43	0,33			- 1,00	- 0,14
	A8 Eje B esquina	0,06	0,19			- 1,00	- 0,01
W.C 9	A9	1,52	1,20			1,00	1,82
W.C 7	A11	1,30	1,56			1,00	2,03
Baño consultorio odontologico	A8 (L1=1,59;L2=1,49; Lp=1,54) (A1=1,33; A2=1,39 Ap=1,36)	1,54	1,36			1,00	2,09
U. Sanit Mixta	A9	1,47	1,33			1,00	1,96
U. Sanit PMR	A10	2,29	1,32			1,00	3,02
	A10- Columna	0,23	0,10			- 1,00	- 0,02
Cuarto compresor	A1 (L1=2,94;L2=2,75;Lp=2,85) (A1=3,38; A2=3,39; Ap=3,39)	2,85	3,39			1,00	9,66
	A2 (A1=0,30; A2=0,32; Ap=0,31	0,89	0,31			1,00	0,28
Cuarto Aseo	A3 (L1=2,86; L2=2,80;Lp=2,83) (A1=3,34; L2=3,39; Ap=3,37)	2,83	3,37			1,00	9,54

CANTIDAD PROYECTADA: 66,14

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:	ROSSY ELENA NIÑO GÓMEZ	APROBÓ:	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
	RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL
	CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPICO INGENIERIA S.A.S

54

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E


DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	UBICACIÓN	SAN JOSE DEL BUBUY
		FECHA	25/05/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	1	PRELIMINARES	ÍTEM	1.7	Demolición a mano de tableta piso, espesor entre 0.06 y 0.08 m con retiro	UND	m2	CANT.	182,68

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA

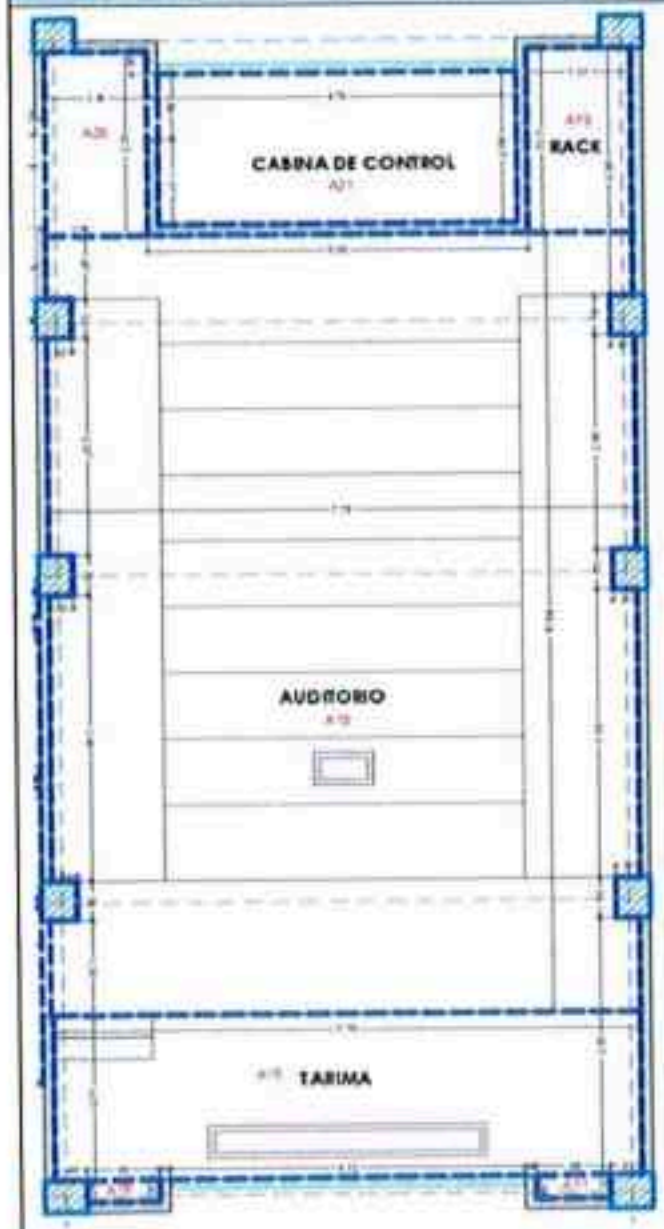







LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	ÁREA (M2)	CANT.	CANT. TOTAL
Tarima	A15	7,79	2,25			1,00	17,53
	A16 (L1= 0,29; L2= 0,30; Lp=0,30)	0,98	0,30			1,00	0,29
	A17 (L1= 0,30; L2= 0,32; Lp=0,31)	0,96	0,31			1,00	0,30
Auditorio	A18	7,78	10,64			1,00	82,78
	A18 - Columna B4	0,31	0,53		-	1,00 -	0,16
	A18 - Columna B5	0,31	0,55		-	1,00 -	0,17
	A18 - Columna C4	0,30	0,55		-	1,00 -	0,17
	A18 - Columna C5	0,31	0,55		-	1,00 -	0,17
	A18 - Columna D4	0,32	0,53		-	1,00 -	0,17
	A18 - Columna D5	0,31	0,54		-	1,00 -	0,17
Rack	A19	1,37	2,52			1,00	3,45
Entrada auditorio	A20	1,35	2,51			1,00	3,39
Cabina de control	A21	4,76	2,06			1,00	9,81

CANTIDAD PROYECTADA	116,54
Viene	65,14
TOTAL	182,68
CANTIDAD CONTRACTUAL	177,44
DIFERENCIA	5,24

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	ROSSY ELENA NIÑO GÓMEZ	APROBÓ	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
	RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL
	CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPICO INGENIERIA S.A.S

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E


DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	UBICACIÓN	SAN JOSE DEL BUBUY
		FECHA	25/05/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	1	PRELIMINARES	ÍTEM	1.9	Desmonte de cerraduras de seguridad	UND	Und	CANT.	5,00

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA

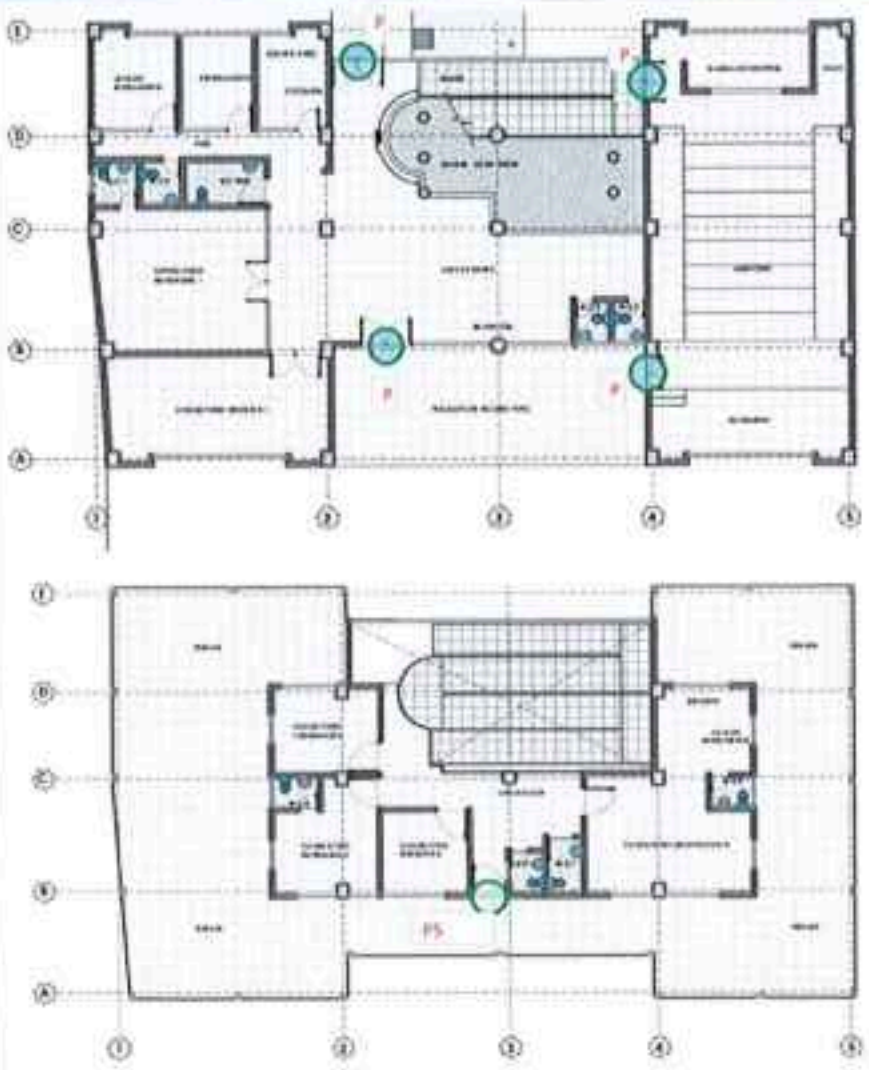

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES					CANT. TOTAL
		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	Cant	Repetición	
Primer piso	P1,P2,P3,P4				1,00	4,00	4,00
Segundo Piso	P5				1,00	1,00	1,00
						CANTIDAD PROYECTADA	5,00

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:	ROSSY ELENA NIÑO GÓMEZ	APROBÓ:	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
	RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL
	CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPICO INGENIERIA S.A.S
	RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL
	CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPICO INGENIERIA S.A.S

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E


DEPARTAMENTO DE CASANARE


MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	UBICACIÓN	SAN JOSE DEL BUBUY
		FECHA	25/05/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	1	PRELIMINARES	ÍTEM	1.10	Demolición muro de ladrillo de espesor menor a 0.15 m, con retiro	UND	m2	CANT.	4,95

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA

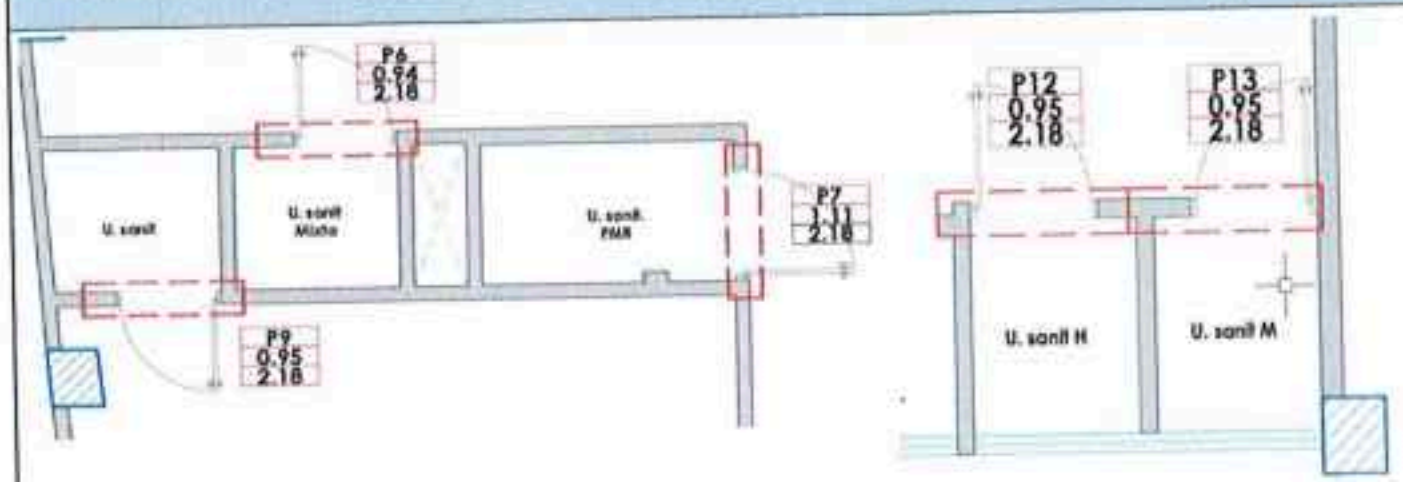

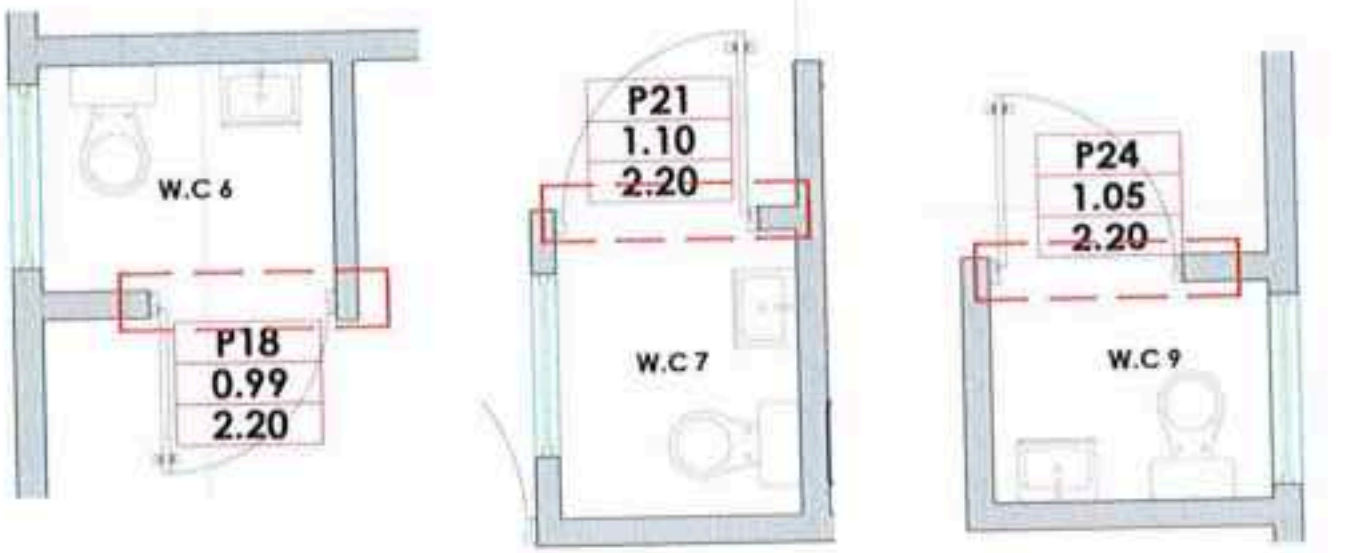

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES					CANT. TOTAL (AN.T * A * C)
		Ancho Original (m)	Ancho nuevo (m)	Ancho total (m) AN. T	Altura (m) A	CANT. C	
Primer Piso							
U. sanit 01	Puerta P9	0,65	0,94	0,29	2,18	1,00	0,63
U. sanit mixta 02	Puerta P6	0,65	0,94	0,29	2,18	1,00	0,63
U. sanit PMR 03	Puerta P7	1,00	1,11	0,11	2,18	1,00	0,24
U. sanit H.	Puerta P12	0,68	0,94	0,26	2,18	1,00	0,57
U. sanit M.	Puerta P13	0,67	0,94	0,27	2,18	1,00	0,59
Segundo Piso							-
U. sant 06	Puerta 18	0,70	0,99	0,29	2,20	1,00	0,64
U. santi 07	Puerta 21	0,70	1,10	0,40	2,20	1,00	0,88
U. santi 09	Puerta 24	0,70	1,05	0,35	2,20	1,00	0,77



CANTIDAD PROYECTADA	4,95
CANTIDAD CONTRACTUAL	4,63
DIFERENCIA	0,32

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:	ROSSY ELENA NIÑO GÓMEZ	APROBÓ:	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
	RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL
	CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPICO INGENIERIA S.A.S


HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E

DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE				UBICACIÓN	SAN JOSE DEL BUBUY			
					FECHA	25/05/2026			
					ACTA No	Recibo y liquidación			
CAPÍTULO	1	PRELIMINARES	ÍTEM	1.10	Demolición muro de ladrillo de espesor menor a 0.15 m, con retiro	UND	m2	CANT.	0,00

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA

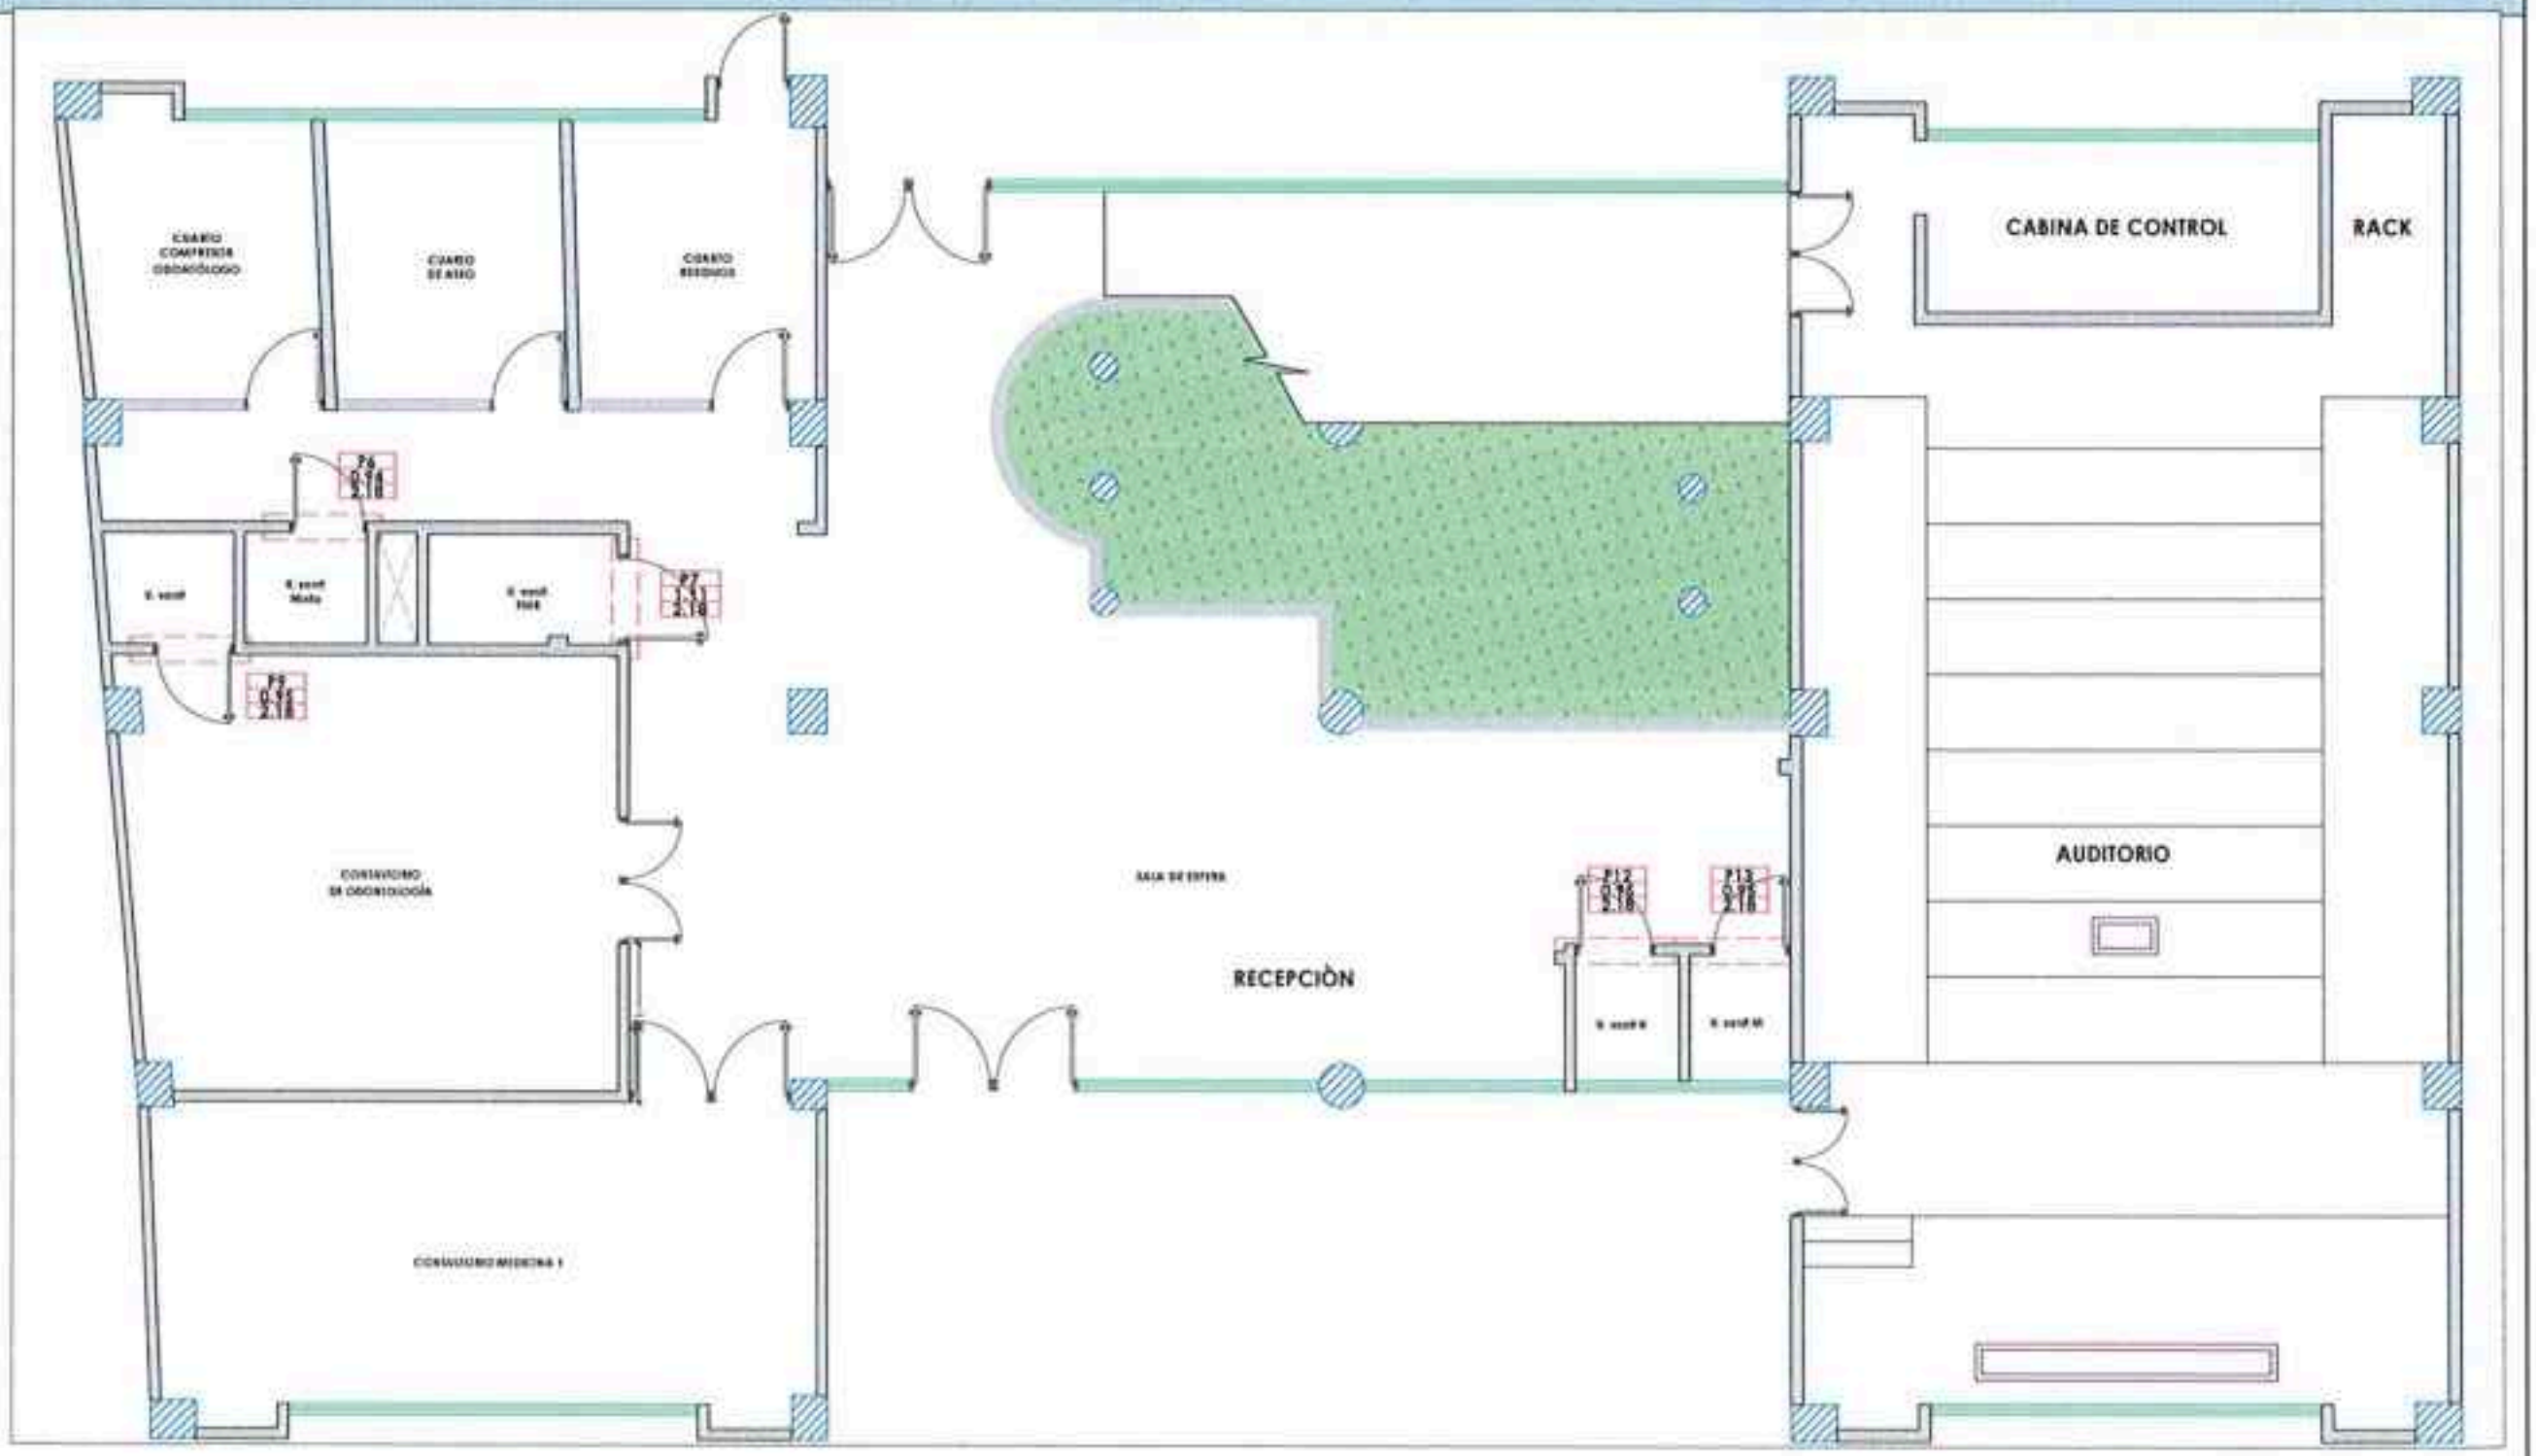


HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E

DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE				**UBICACIÓN**	SAN JOSE DEL BUBUY			
					FECHA	25/05/2026			
					ACTA No	Recibo y liquidación			
CAPÍTULO	1	**PRELIMINARES**	**ÍTEM**	1.10	Demolición muro de ladrillo de espesor menor a 0.15 m, con retiro	**UND**	m2	**CANT.**	0,00

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA

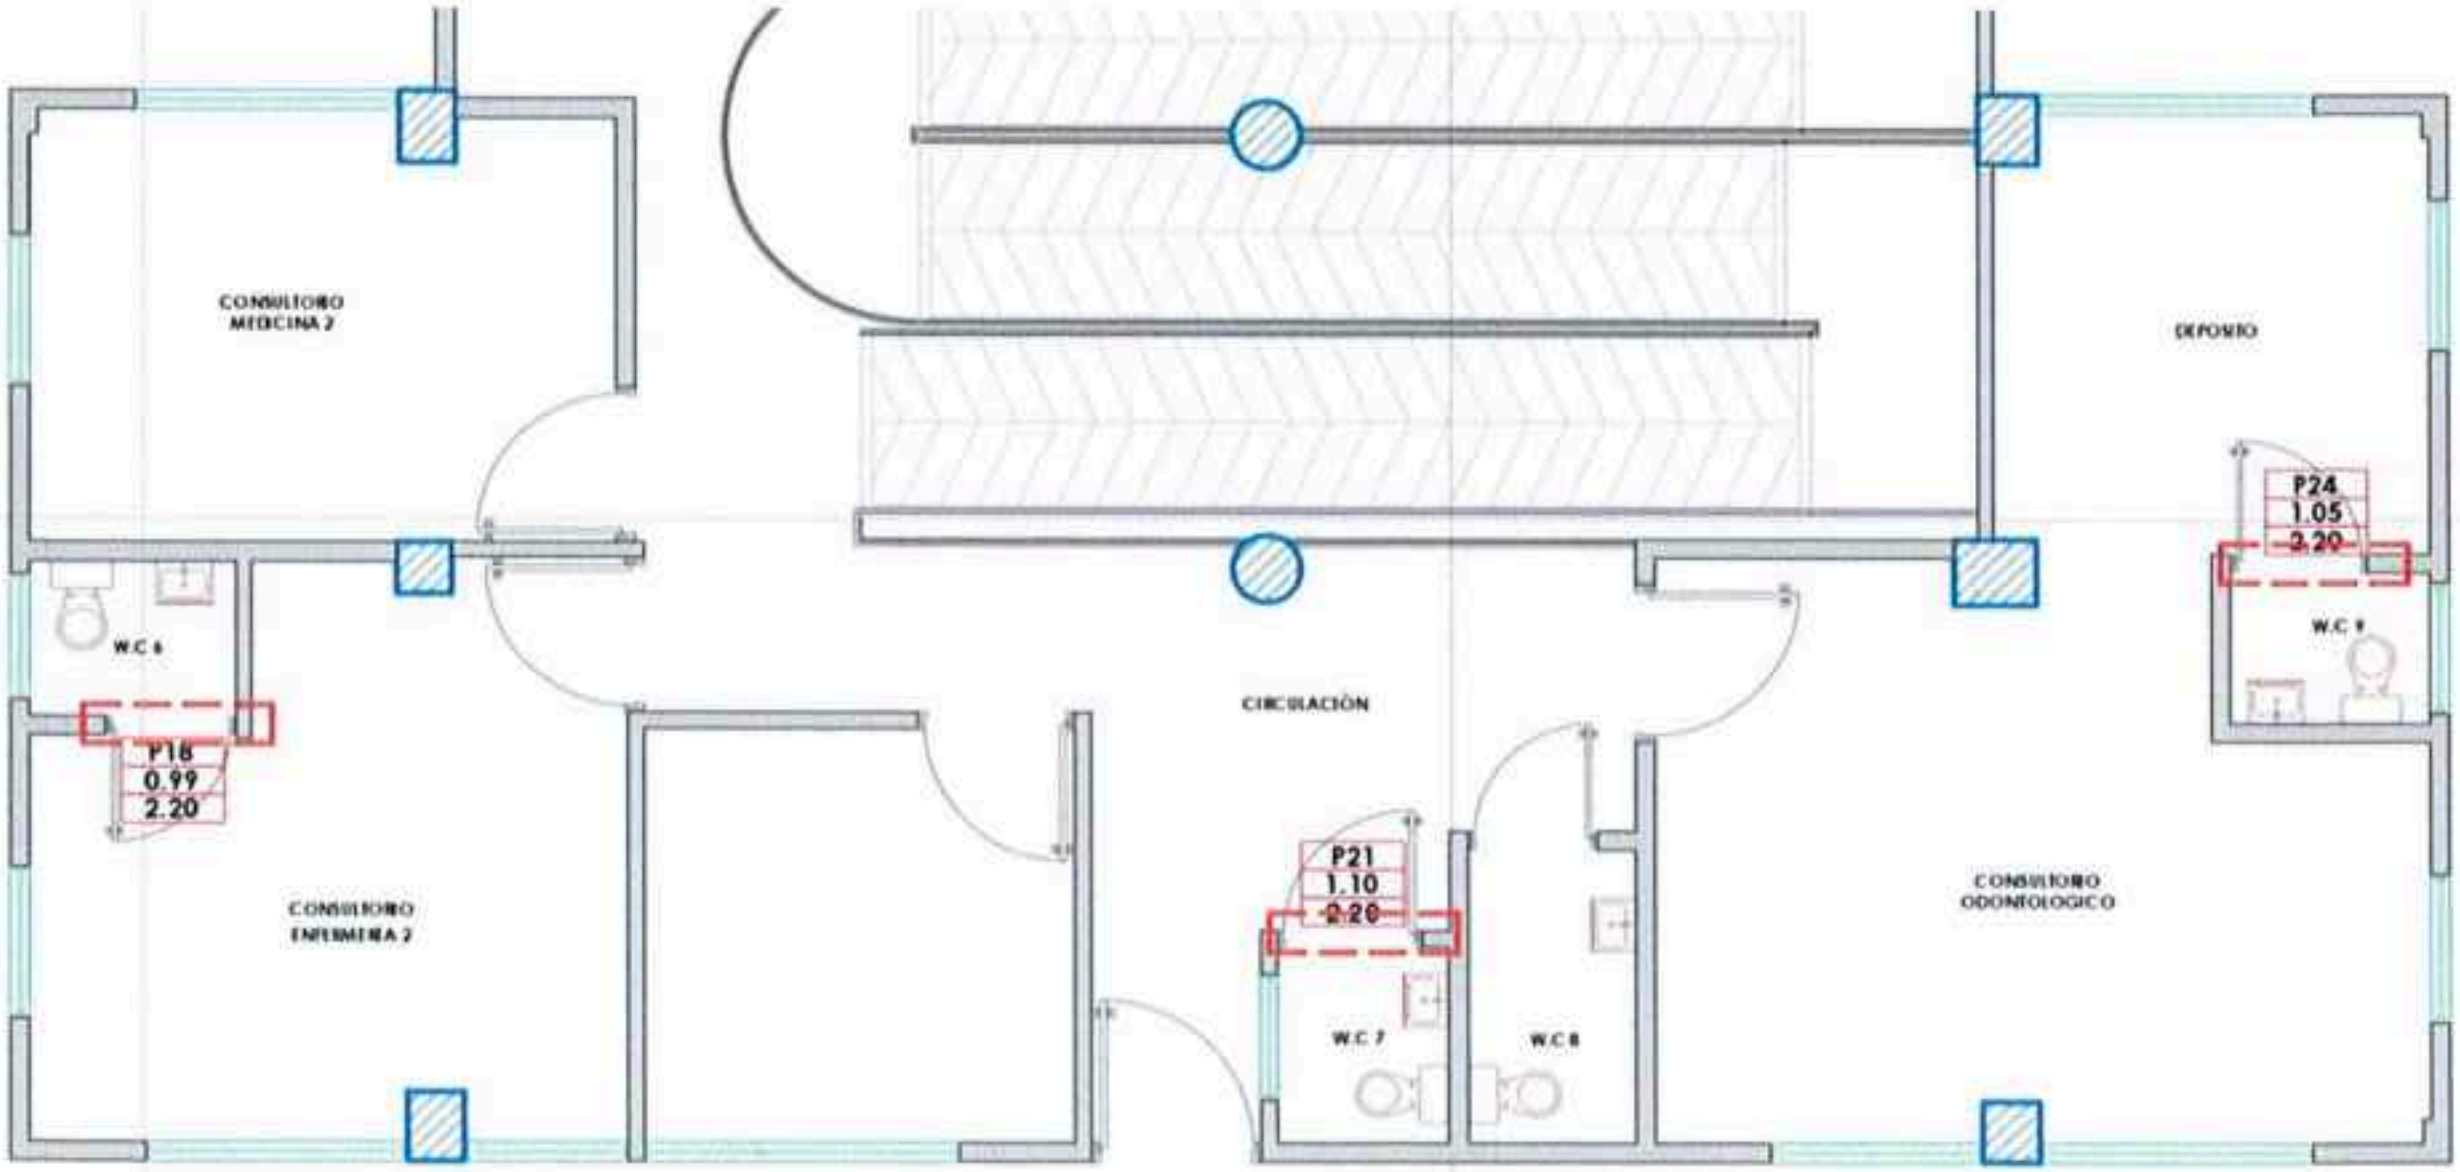

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E


DEPARTAMENTO DE CASANARE


MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	UBICACIÓN	SAN JOSE DEL BUBUY
		FECHA	25/05/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	2	PISOS Y ENCHAPES	ÍTEM	2.3	Enchape piso en cerámica duropiso 33.8 x 33.8. suministro e instal.	UND	m2	CANT.	

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA

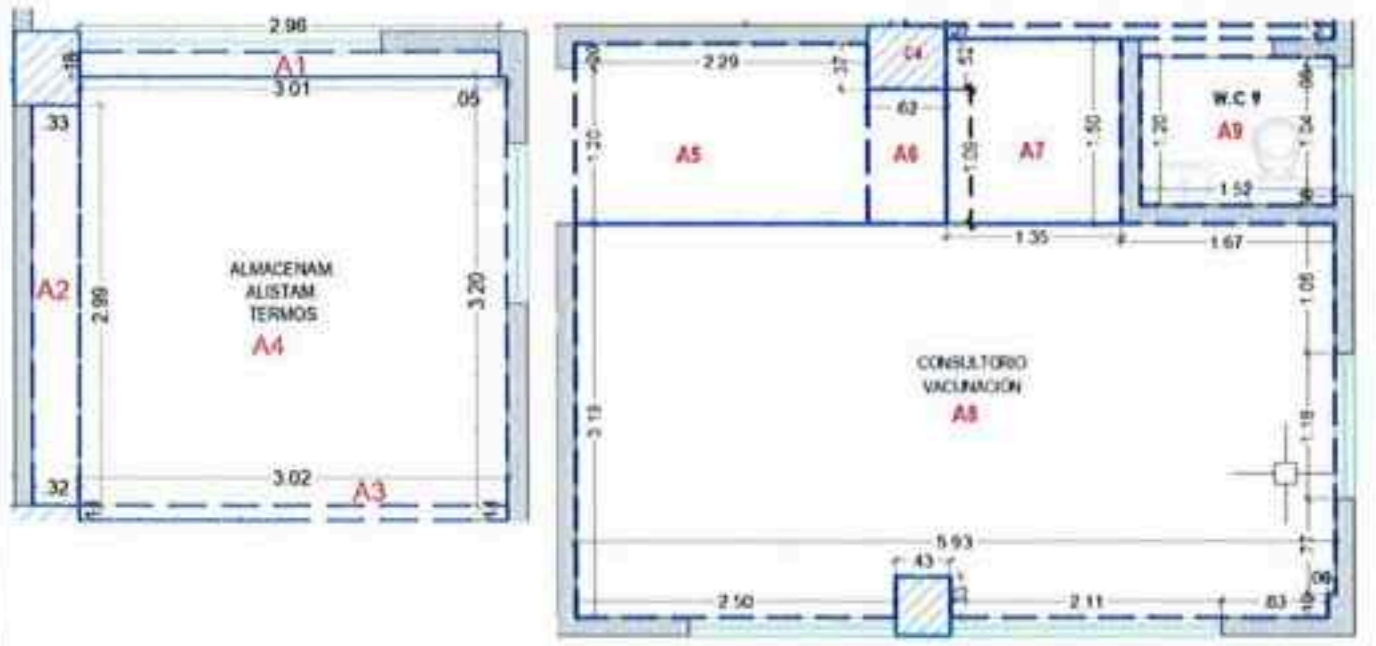

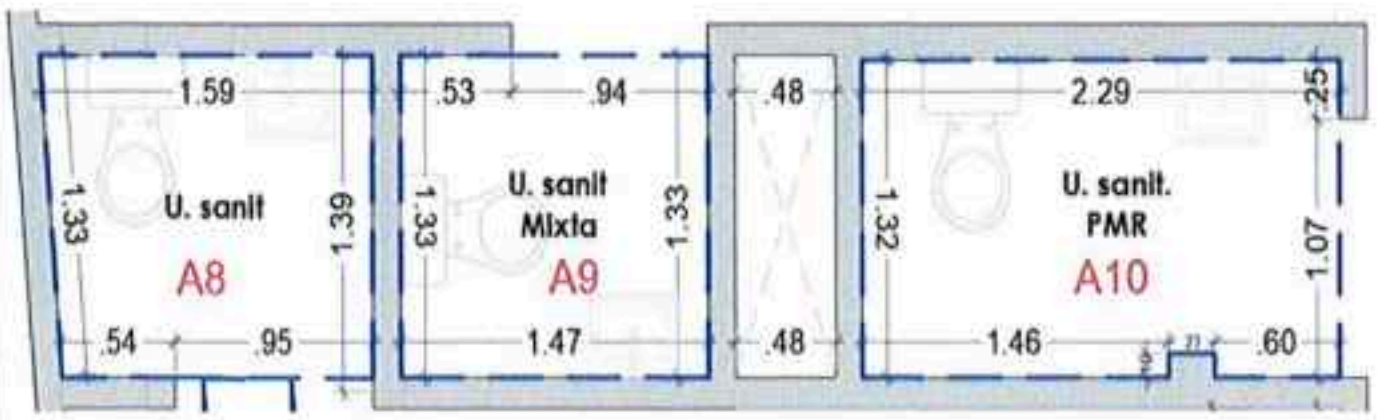

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES					CANT. TOTAL
		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	ÁREA (M2)	CANT.	
Almacen alistam Termos	A1 (L1= 2,96; L2= 3,01; Lp=2,99)	2,99	0,19			1,00	0,57
	A2 (L1= 0,33; L2= 0,32; Lp=2,99)	0,33	2,99			1,00	0,99
	A3	3,02	0,11			1,00	0,33
	A4 (L1= 3,01; L2= 3,02; Lp=3,02)	3,02	3,20			1,00	9,66
Consltorio Vacunación	A5	2,29	1,20			1,00	2,75
	A6	0,62	1,09			1,00	0,68
	A7	1,35	1,50			1,00	2,03
	A8 (Total)	5,93	3,19			1,00	18,92
	A8 - Columna B4	0,43	0,33			- 1,00	- 0,14
	A8 Eje B esquina	0,06	0,19			- 1,00	- 0,01
W.C 9	A9	1,52	1,20			1,00	1,82
Tarima	A15	7,79	2,25			1,00	17,53
	A16 (L1= 0,29; L2= 0,30; Lp=0,30)	0,98	0,30			1,00	0,29
	A17 (L1= 0,30; L2= 0,32; Lp=0,31)	0,98	0,31			1,00	0,30
Auditorio	A18	7,76	10,64			1,00	82,78
	A18 - Columna B4	0,31	0,53			- 1,00	- 0,16
	A18 - Columna B5	0,31	0,55			- 1,00	- 0,17
	A18 - Columna C4	0,30	0,55			- 1,00	- 0,17
	A18 - Columna C5	0,31	0,55			- 1,00	- 0,17
	A18 - Columna D4	0,32	0,53			- 1,00	- 0,17
	A18 - Columna D5	0,31	0,54			- 1,00	- 0,17
Rack	A19	1,37	2,52			1,00	3,45
Entrada auditorio	A20	1,35	2,51			1,00	3,39
Cabina de control	A21	4,76	2,06			1,00	9,81
Baño consultorio odontologico	A8 (L1=1,59;L2=1,49; Lp=1,54) (A1=1,33; A2=1,39 Ap=1,36)	1,54	1,36			1,00	2,09
U. Sanit Mixta	A9	1,47	1,33			1,00	1,96
U. Sanit PMR	A10	2,29	1,32			1,00	3,02
	A10 - Columna	0,23	0,10			- 1,00	- 0,02
						CANTIDAD PROYECTADA	161,18

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:	ROSSY ELENA NIÑO GÓMEZ	APROBÓ:	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL	
CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPICO INGENIERIA S.A.S	

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E


DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	UBICACIÓN	SAN JOSE DEL BUBUY
		FECHA	25/05/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	2	PISOS Y ENCHAPES	ÍTEM	2.3	Enchape piso en cerámica duropiso 33.8 x 33.8, suministro e instal.	UND	m2	CANT.	184,04

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA

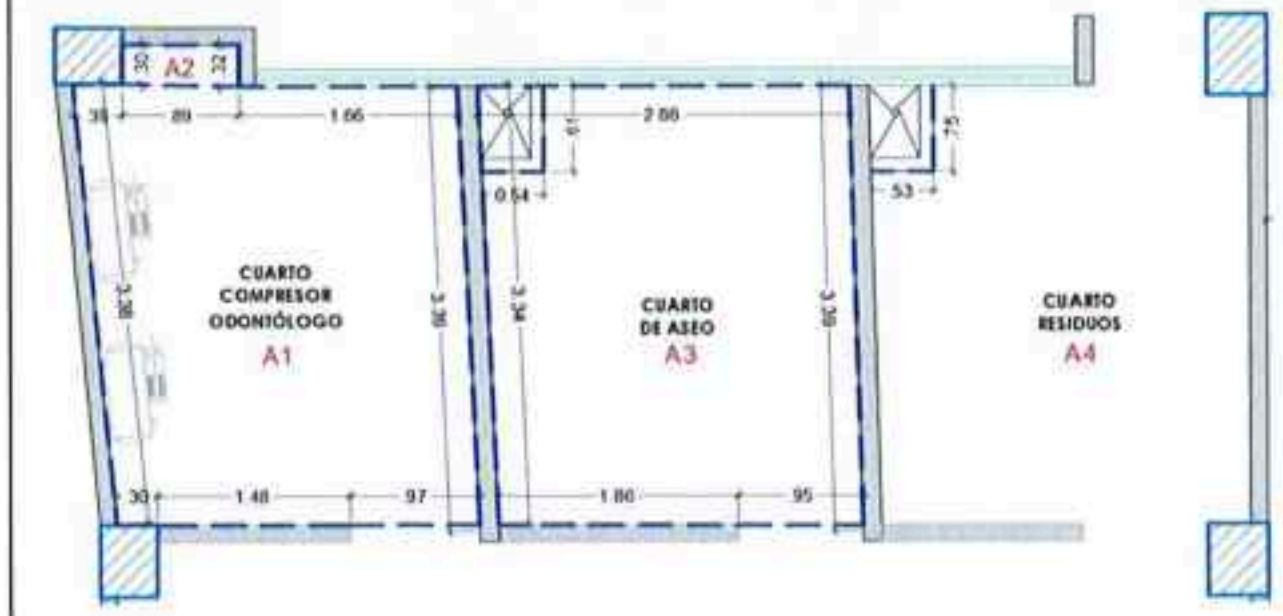



LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	ÁREA (M2)	CANT.	CANT. TOTAL
Cuarto compresor	A1 (L1=2.94;L2=2,75;Lp=2,85) (A1=3,38; A2=3,39; Ap=3,39)	2,85	3,39			1,00	9,66
	A2 (A1=0,30; A2=0,32; Ap=0,31	0,89	0,31			1,00	0,28
Cuarto Aseo	A3 (L1=2,86; L2=2,80;Lp=2,83) (A1=3,34; L2=3,39; Ap=3,37)	2,83	3,37			1,00	9,54
	Poceta (Piso)	0,54	0,61			- 1,00	- 0,33
Poceta cuarto aseo A3	Lado A	0,54		0,44		1,00	0,24
		0,54	0,15			1,00	0,08
	Lao B	0,61		0,44		1,00	0,27
		0,46	0,15			1,00	0,07
	Pis0	0,39	0,46			1,00	0,18
Poceta cuarto compresores A4	Lado A	0,53		0,44		1,00	0,23
		0,53	0,15			1,00	0,08
	Lao B	0,75		0,44		1,00	0,33
		0,60	0,15			1,00	0,09
Piso odontologia	A11	5,00	0,43			1,00	2,15

CANTIDAD PROYECTADA	22,86
VIENE	161,18
TOTAL	184,04
CANTIDAD CONTRACTUAL	182,62
DIFERENCIA	1,42

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:	ROSSY ELENA NIÑO GÓMEZ	APROBÓ:	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
	RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL
	CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPICO INGENIERIA S.A.S


HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E

DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE				**UBICACIÓN**	SAN JOSE DEL BUBUY			
					FECHA	25/05/2026			
					ACTA No	Recibo y liquidación			
CAPÍTULO	**2**	**PISOS Y ENCHAPES**	**ÍTEM**	**2.3**	**Enchape piso en cerámica duropiso 33.8 x 33.8. suministro e instal.**	**UND**	**m2**	**CANT.**	**0,00**

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA

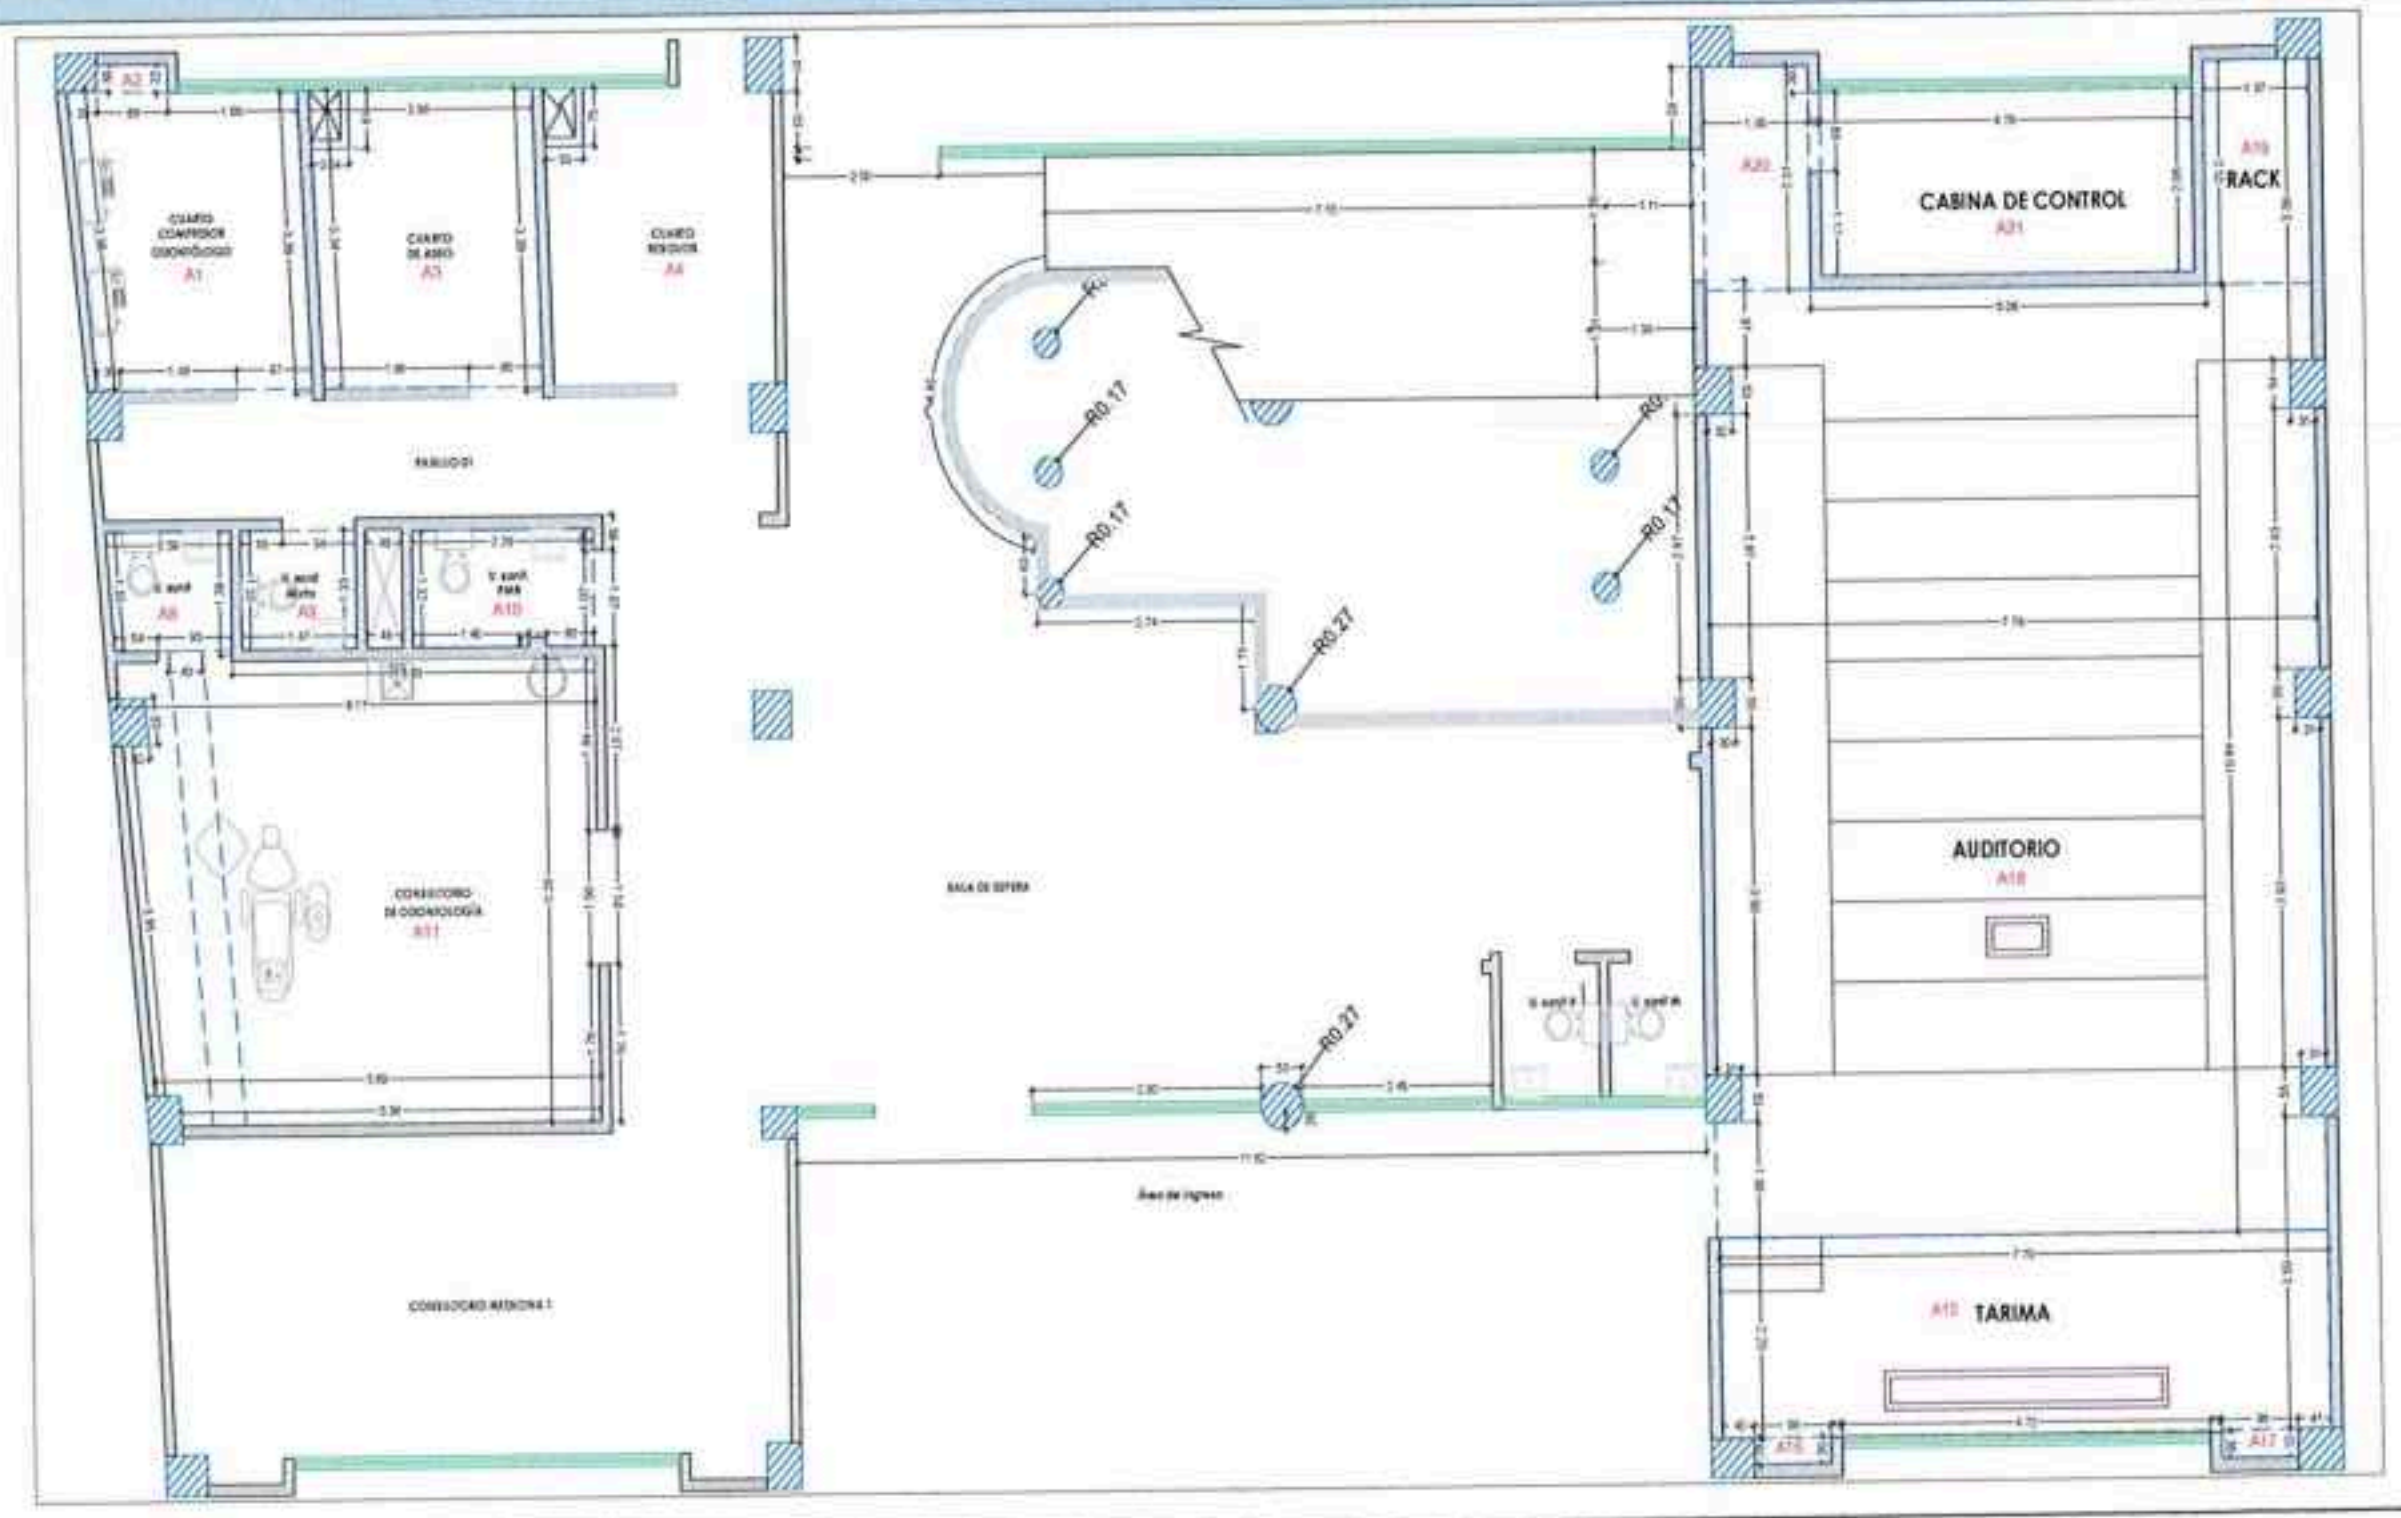

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E


DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	**UBICACIÓN**	SAN JOSE DEL BUBUY
		FECHA	25/05/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	**2**	**PISOS Y ENCHAPES**	**ÍTEM**	**2.3**	**Enchape piso en cerámica duropiso 33.8 x 33.8, suministro e instal.**	**UND**	**m2**	**CANT.**	**0,00**

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA

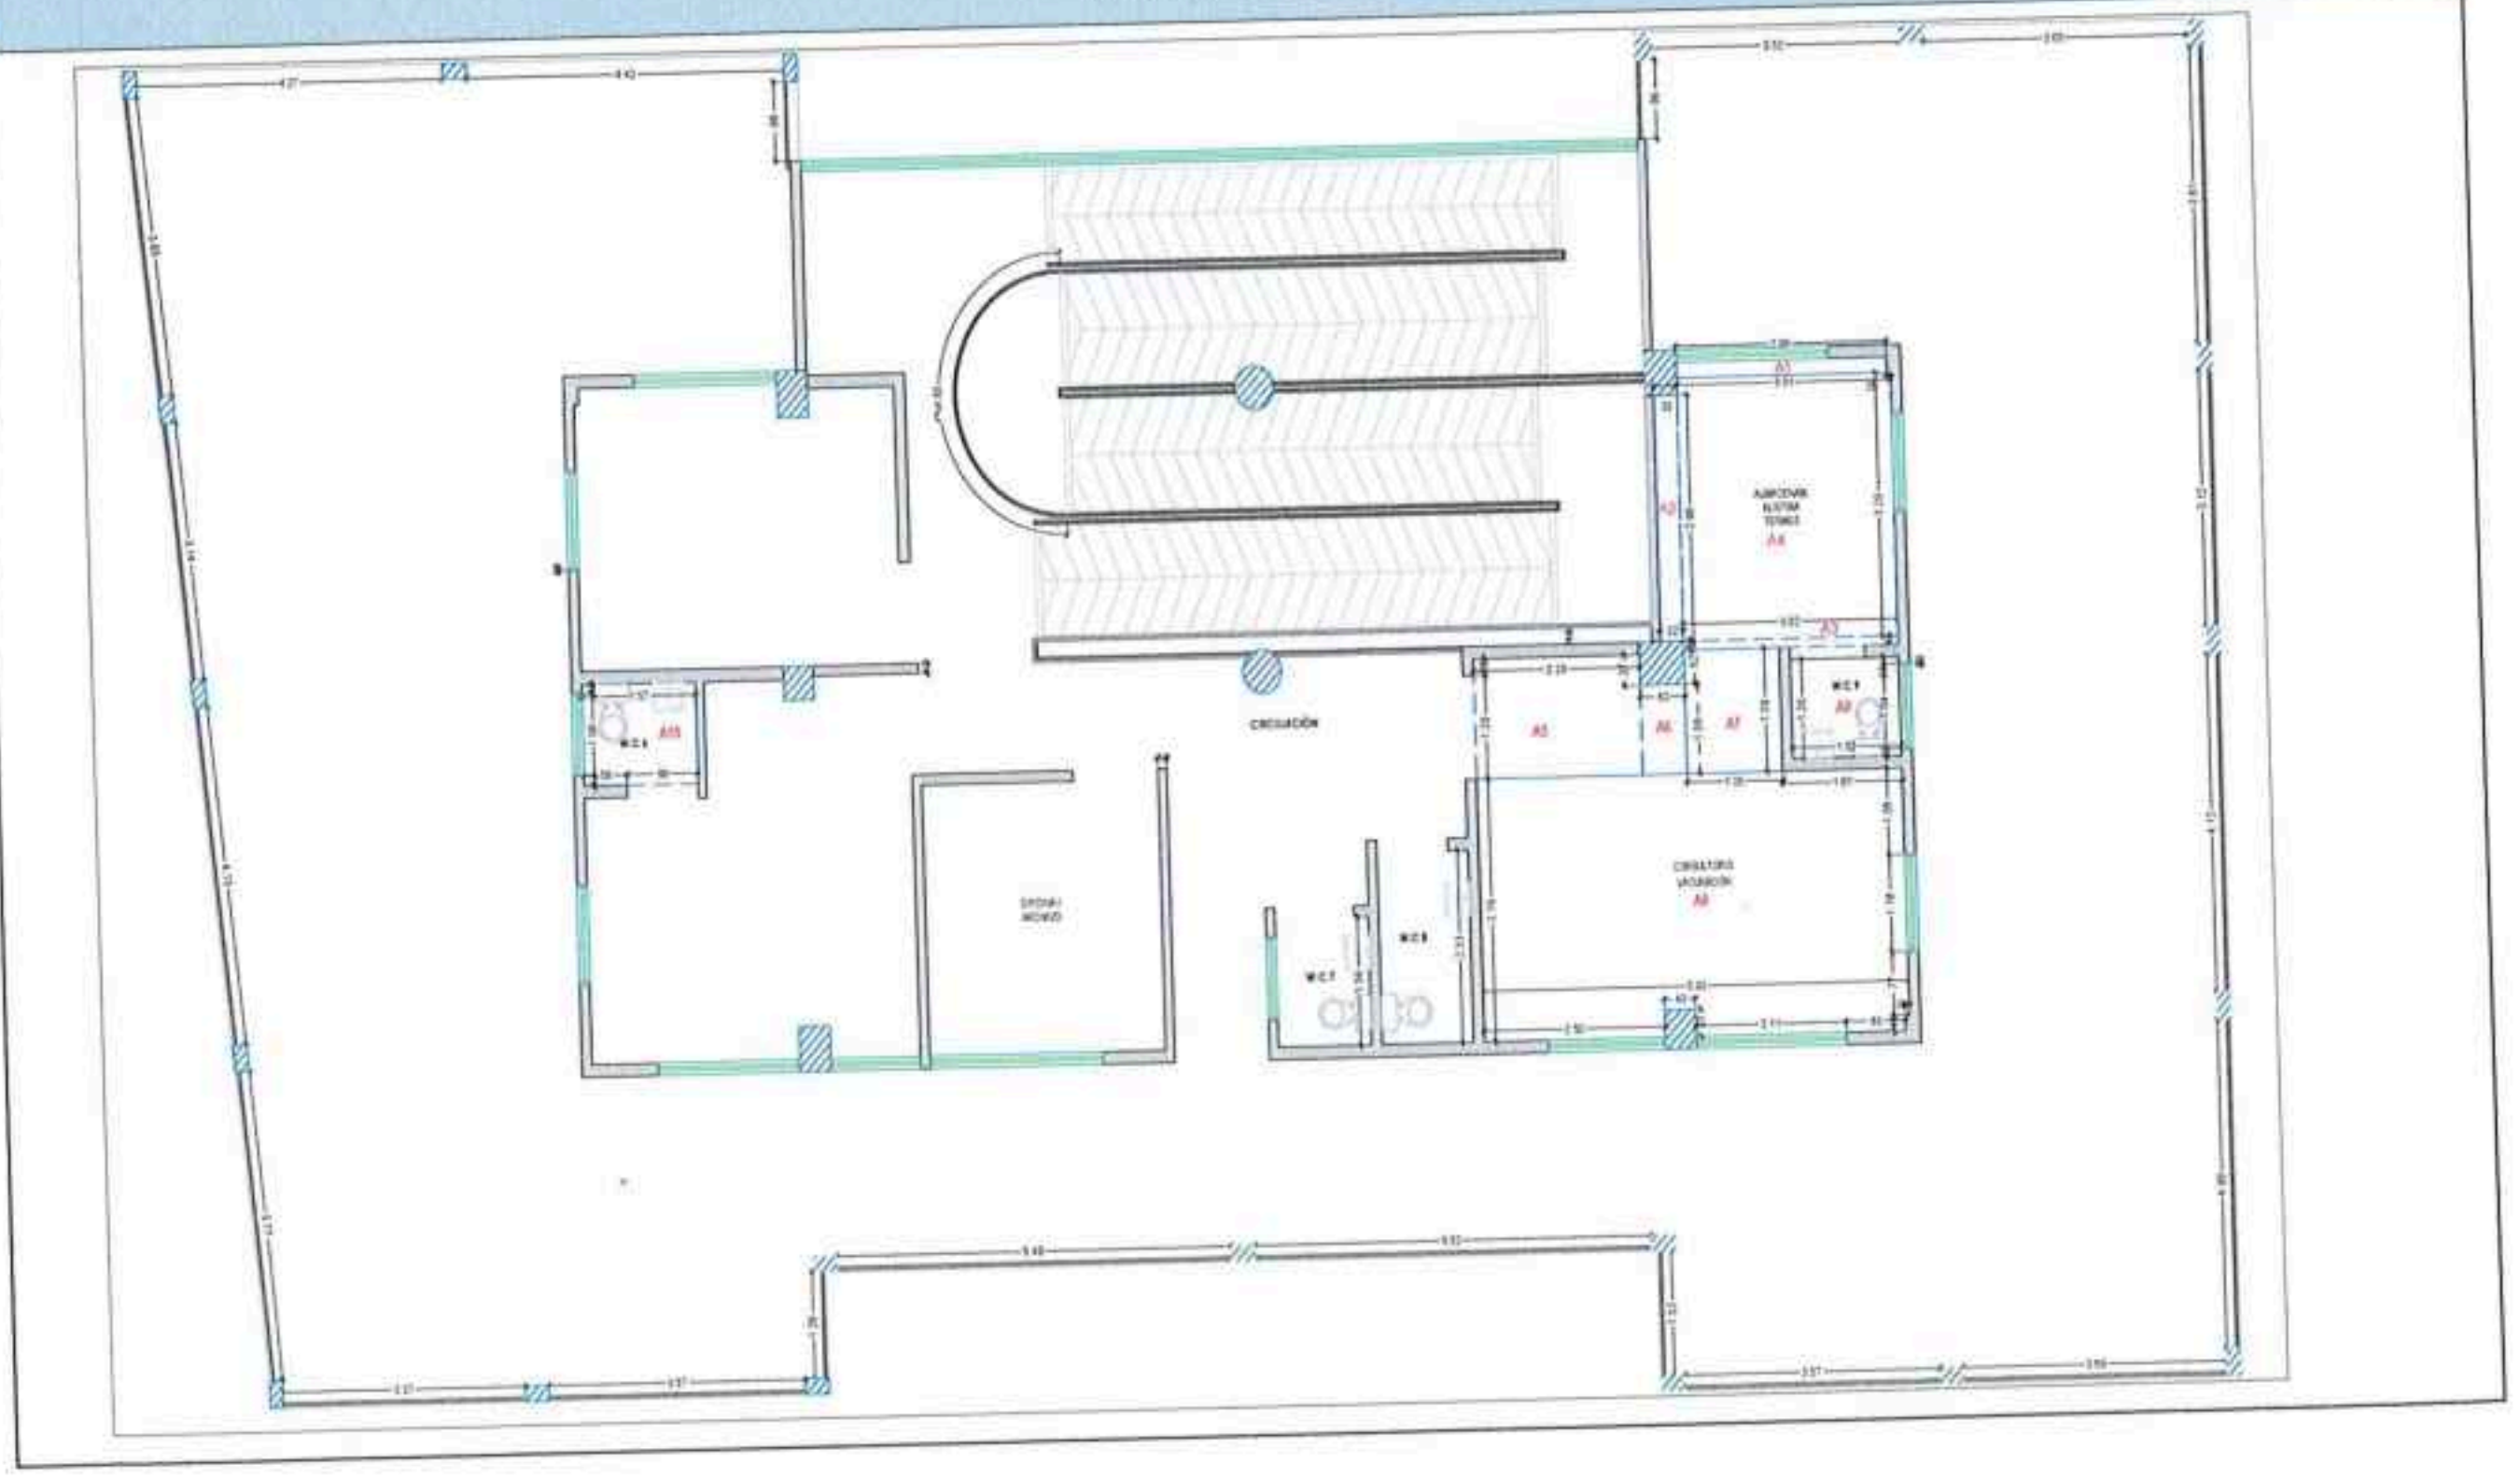

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E


DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÒN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÒN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	UBICACIÓN	SAN JOSE DEL BUBUY
		FECHA	25/05/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	2	PISOS Y ENCHAPES	ÍTEM	2.4	Cinta antideslizante fotoluminiscente a= 5cm instalada a todo costo sobre pasos de escalera o piso.	UND	m	CANT.	0,00

ILUSTRACIÒN / FOTOGRAFÍA

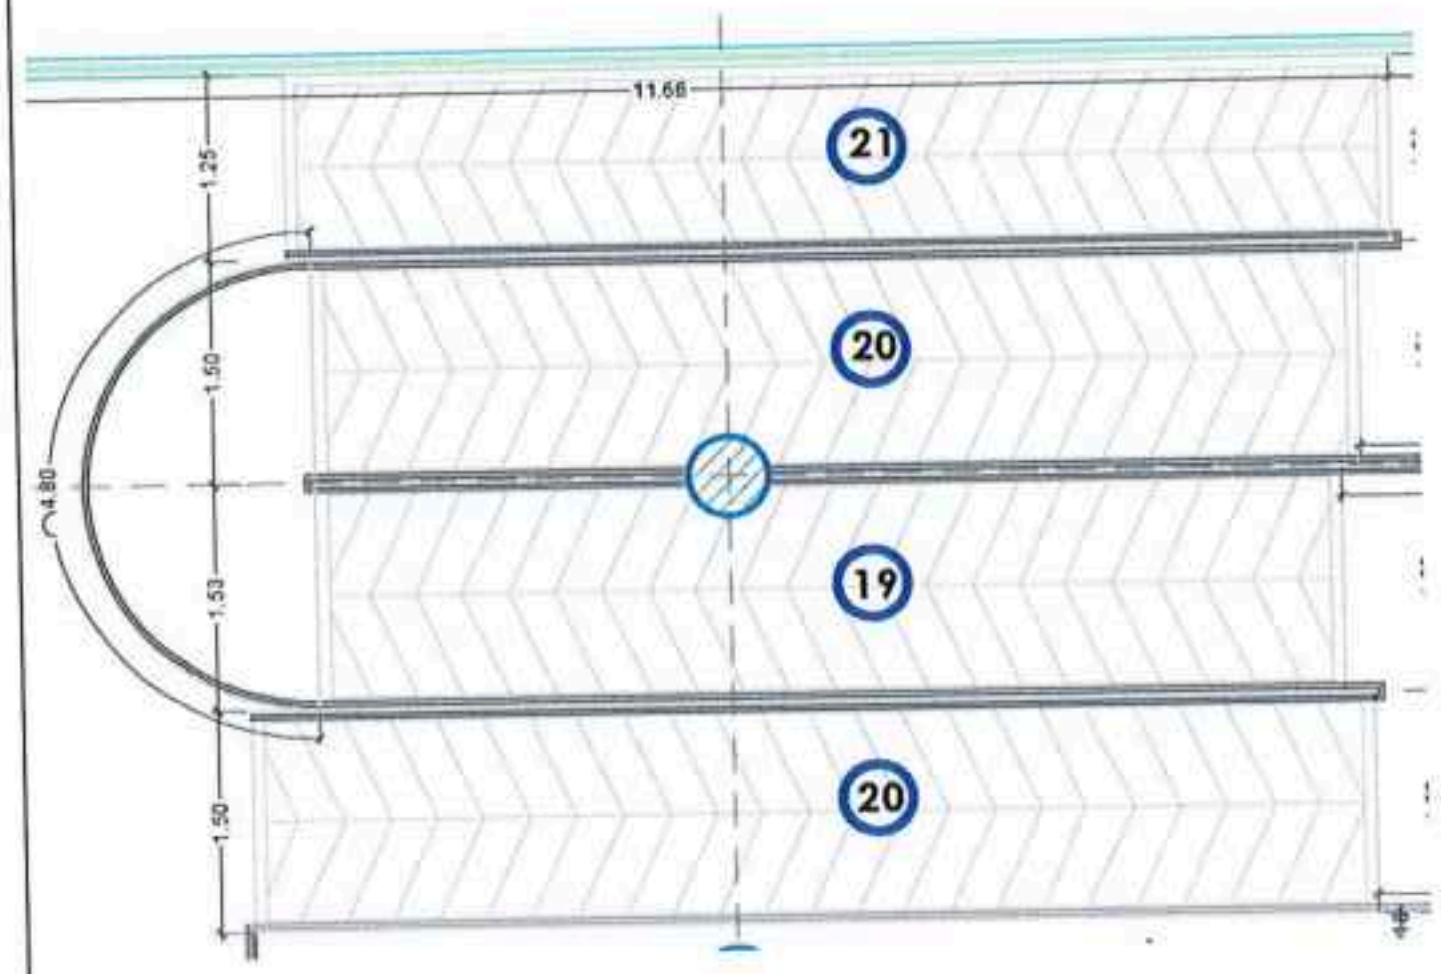

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES					CANT. TOTAL
		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	Cantidad	CANT.	
Auditorio	Rampa1 - primer piso		1,25		21,00	1,00	26,25
	Rampa 2		1,50		20,00	1,00	30,00
	Rampa 3		1,53		19,00	1,00	29,07
	Rampa 4 - segundo piso		1,50		20,00	1,00	30,00



CANTIDAD PROYECTADA	115,32
CANTIDAD CONTRACTUAL	93,04
DIFERENCIA	22,28

OBSERVACIONES:

ELABORÒ:	ROSSY ELENA NIÑO GÒMEZ	APROBÒ:	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
	RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL
	CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPICO INGENIERIA S.A.S

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E


DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	UBICACIÓN	SAN JOSE DEL BUBUY
		FECHA	25/05/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	3	INSTALACIONES HIDRAULICAS	ÍTEM	3.1	Tuberia presión PVC RDE 9 1/2". Suministro e instal.	UND	22,88	CANT.	29,23

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA

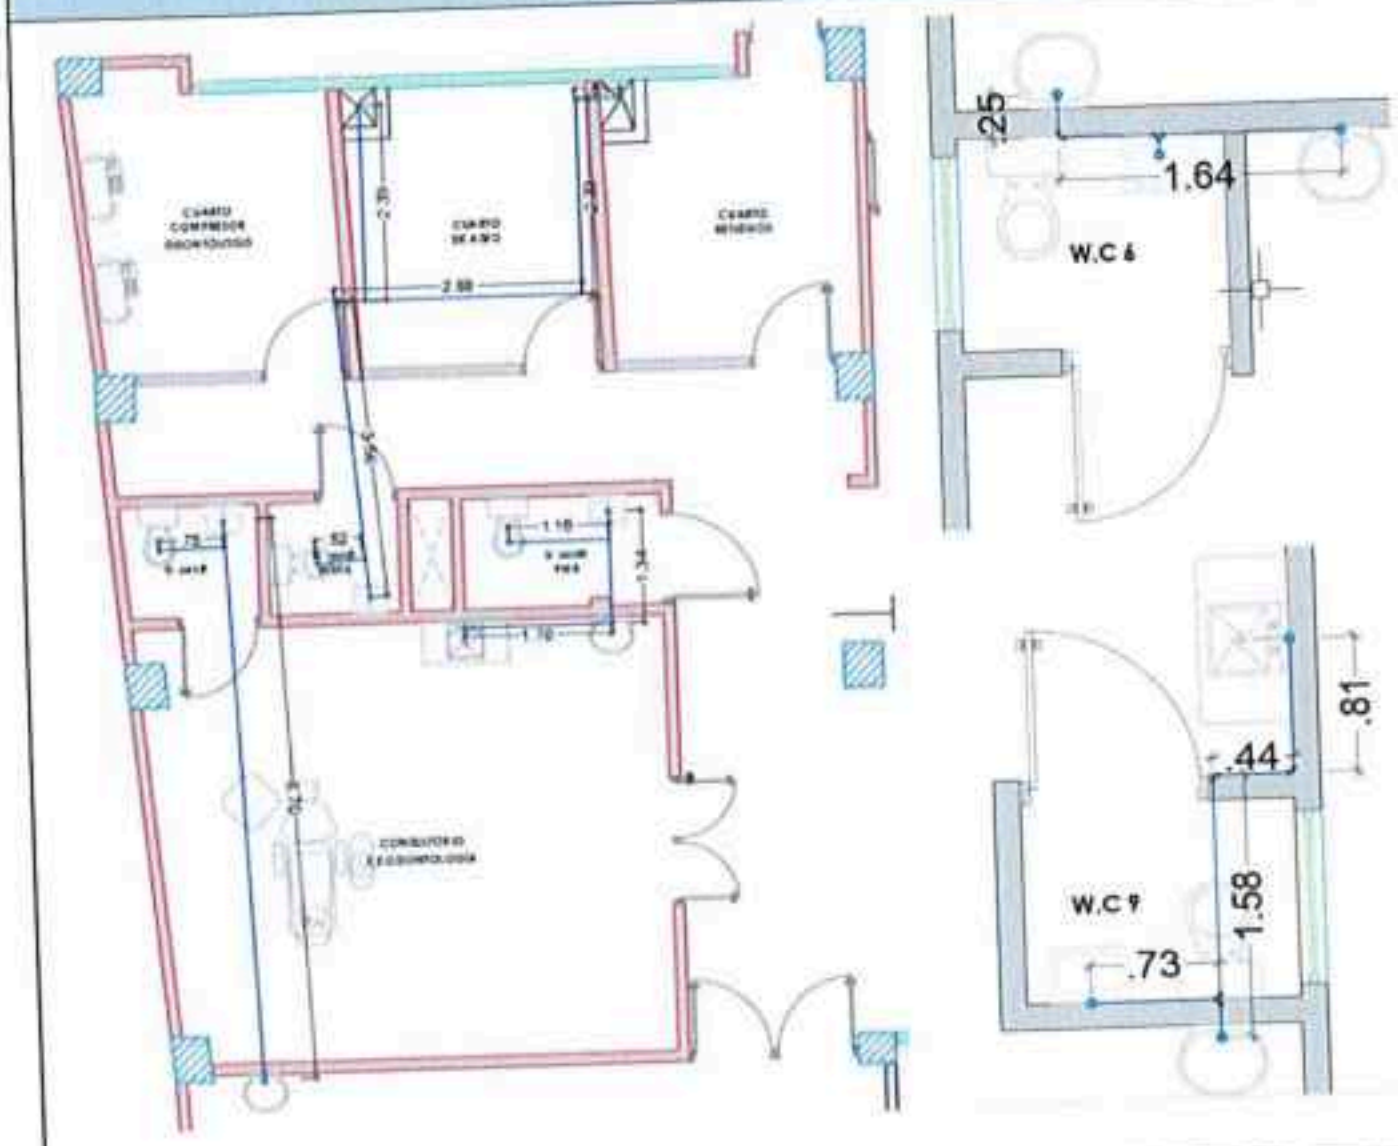

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES					CANT. TOTAL
		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	Cantidad	CANT.	
Cuarto residuos	L1	0,51				1,00	0,51
Cuarto de aseo	L2	2,88				1,00	2,88
	L3	2,33				2,00	4,66
U. Sanit a cuarto de aseo	L4	3,56				1,00	3,56
U sanit Mixta	L5	0,52				1,00	0,52
Odontologia	L6	0,75				1,00	0,75
	L7	6,70				1,00	6,70
U. Sanit PMR	L8	1,16				1,00	1,16
	L9	1,34				1,00	1,34
	L10	1,70				1,00	1,70
W.C 6	L11	1,64				1,00	1,64
	L12	0,25				1,00	0,25
W.C 9	L13	0,73				1,00	0,73
	L14	1,58				1,00	1,58
	L15	0,44				1,00	0,44
	L16	0,81				1,00	0,81



CANTIDAD PROYECTADA	29,23
CANTIDAD CONTRACTUAL	22,88
DIFERENCIA	6,35

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:	ROSSY ELENA NIÑO GÓMEZ	APROBÓ:	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
	RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL
	CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPICO INGENIERIA S.A.S

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E


DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	UBICACIÓN	SAN JOSE DEL BUBUY
		FECHA	25/05/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	3	INSTALACIONES HIDRAULICAS	ÍTEM	3.2	Punto agua fria PVC 1/2"	UND	8,00	CANT.	8,00

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA

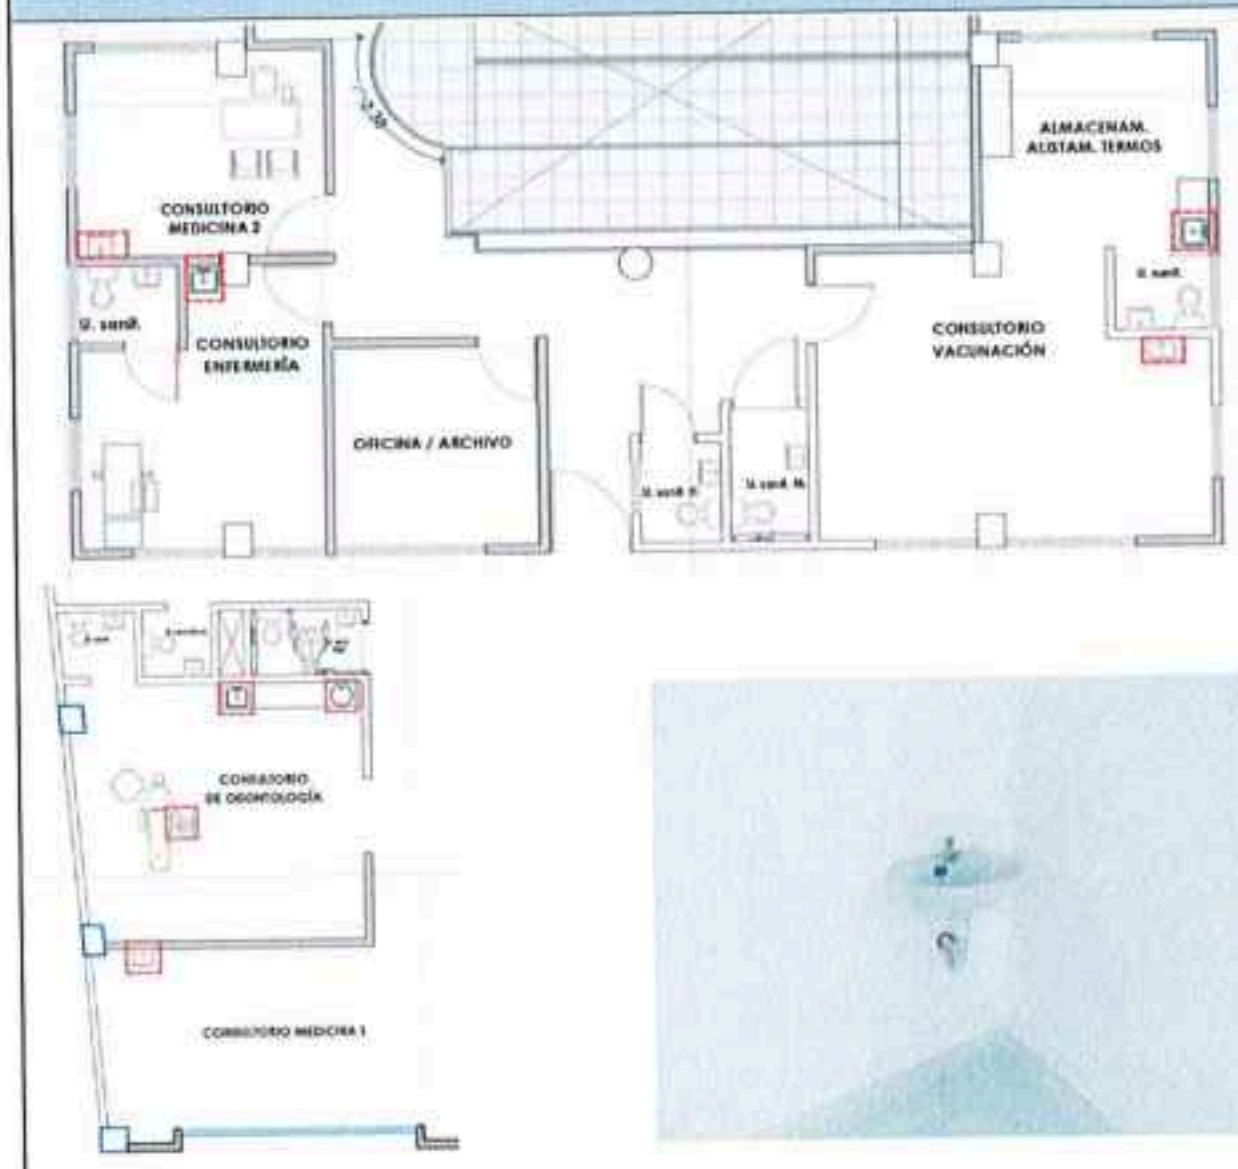

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES					CANT. TOTAL
		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	Cantidad	CANT.	
Segundo Piso	Consultorio medicina 2					1,00	1,00
	Consultorio enfermería					1,00	1,00
	Almacenamiento termos					1,00	1,00
	Consultorio vacunación					1,00	1,00
Primar Piso	Consultorio odontología					3,00	3,00
	Conultorio medicina 1					1,00	1,00

CANTIDAD PROYECTADA	8,00
CANTIDAD CONTRACTUAL	8,00
DIFERENCIA	0,00

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:	ROSSY ELENA NIÑO GÓMEZ	APROBÓ:	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
	RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL
	CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPICO INGENIERIA S.A.S

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E

DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	UBICACIÓN	SAN JOSE DEL BUBUY
		FECHA	25/05/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	3	INSTALACIONES HIDRAULICAS	ÍTEM	3.3	Barra de seguridad abatible en acero inoxidable 13 x 85 cm	UND	1,00	CANT.	1,00

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					CANT. TOTAL
		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	Cantidad	CANT.	
	U. Sanit PMR				1,00		1,00





CANTIDAD PROYECTADA	1,00
CANTIDAD CONTRACTUAL	1,00
DIFERENCIA	0,00

OBSERVACIONES:


ELABORÓ	ROSSY ELENA NIÑO GÓMEZ	APROBÓ	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
	RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL
	CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPICO INGENIERIA S.A.S

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E

DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE				**UBICACIÓN**	SAN JOSE DEL BUBUY			
					FECHA	25/05/2026			
					ACTA No	Recibo y liquidación			
CAPÍTULO	**3**	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**	**ÍTEM**	**3.5**	**Tanque elevado 1.000 lts con conexión y distribución PVC de 1/2" y 1". Suministro e instal.**	**UND**	**1,00**	**CANT.**	**1,00**

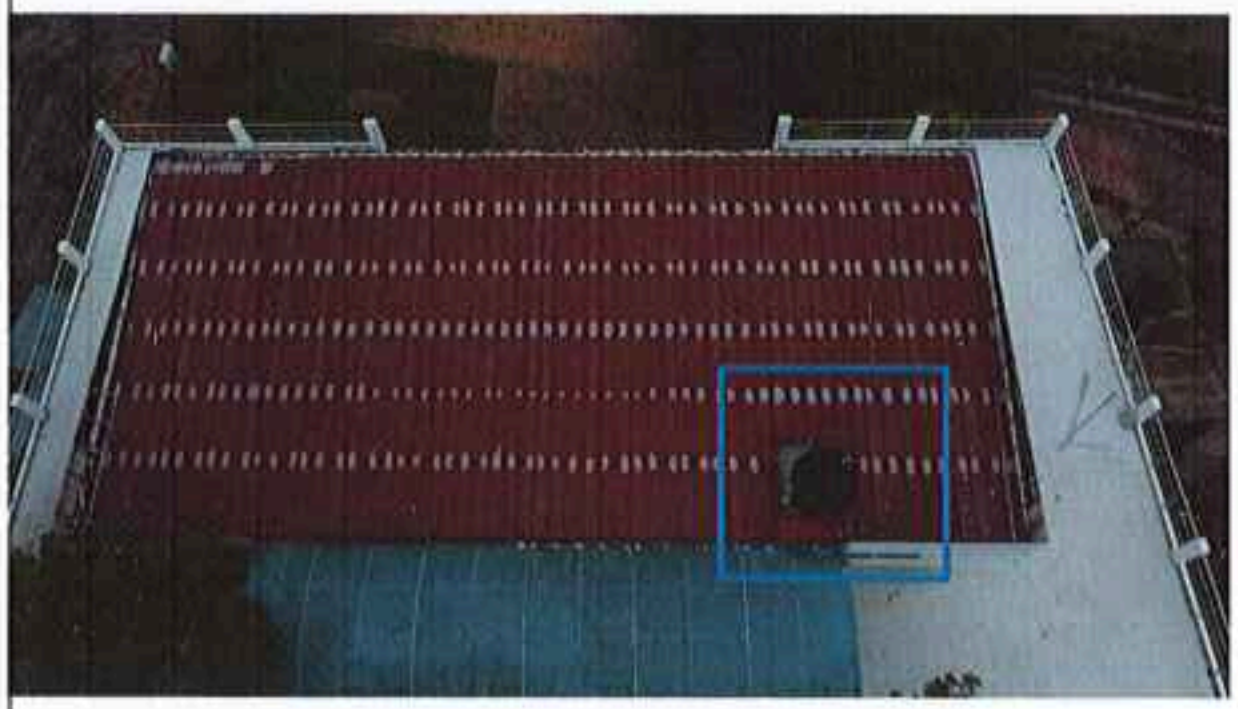ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIONES**					**CANT. TOTAL**
		LONG (M)	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	**Cantidad**	**CANT.**	
	Tanque elevado 1000 ltr					1,00	1,00

CANTIDAD PROYECTADA	**1,00**
CANTIDAD CONTRACTUAL	**1,00**
DIFERENCIA	**0,00**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	ROSSY ELENA NIÑO GÓMEZ	APROBÓ	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL	
CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPICO INGENIERIA S.A.S	

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E


DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	UBICACIÓN	SAN JOSE DEL BUBUY
		FECHA	25/05/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	4	INSTALACIONES SANITARIAS	ÍTEM	4.1	Tubería sanitaria PVC 2". Suministro e instal.	UND	m	CANT.	25,34

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA

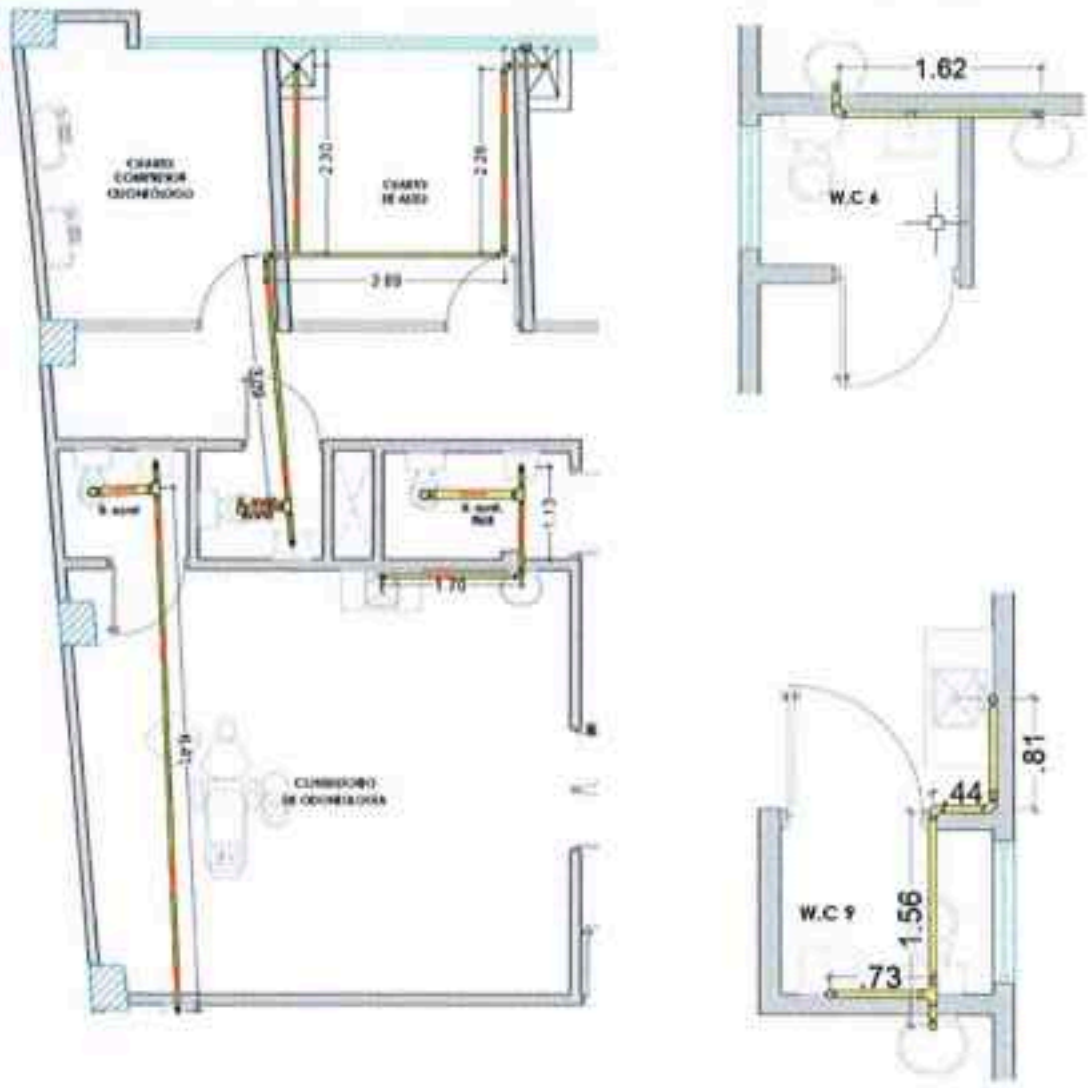

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	Cantidad	CANT.	CANT. TOTAL
Cuarto residuos	L1	0,50				1,00	0,50
Cuarto de aseo	L2	2,26				1,00	2,26
	L3	2,89				1,00	2,89
	L4	2,30				1,00	2,30
U. Sanit a cuarto de aseo	L5	3,09				1,00	3,09
	L8	6,41				1,00	6,41
U. Sanit PMR	L9	1,13				1,00	1,13
	L11	1,70				1,00	1,70
W.C.6	L12	1,62				1,00	1,62
W.C.9	L13	0,73				1,00	0,73
	L14	1,46				1,00	1,46
	L15	0,44				1,00	0,44
	L16	0,81				1,00	0,81





CANTIDAD PROYECTADA	25,34
CANTIDAD CONTRACTUAL	58,40
DIFERENCIA	-33,06

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	APROBÓ
ROSSY ELENA NIÑO GÓMEZ	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
RESIDENTE DE OBRA	REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY	EPICO INGENIERIA S.A.S

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E


DEPARTAMENTO DE CASANARE


MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	UBICACIÓN	SAN JOSE DEL BUBUY
		FECHA	25/05/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	4	INSTALACIONES SANITARIAS	ÍTEM	4.2	Punto desagüe sanitario pvc 2" con sifón	UND	und	CANT.	10,00

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA

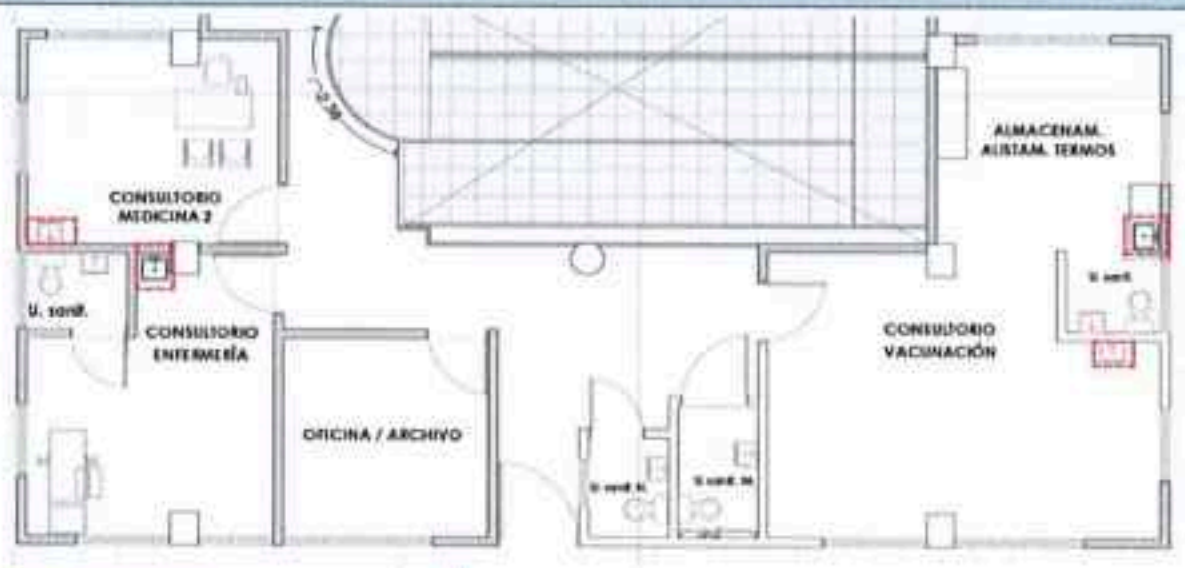

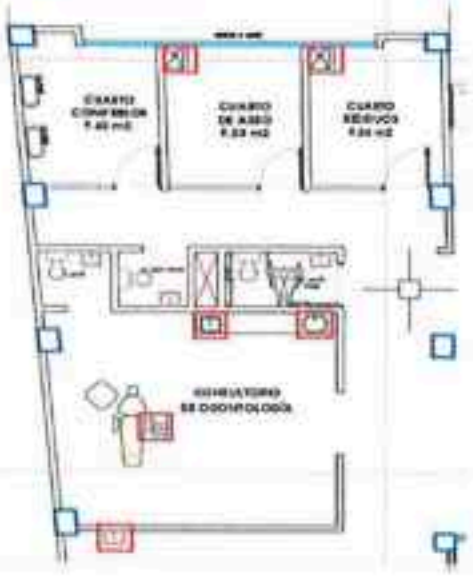





LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)		CANT.	CANT. TOTAL
Segundo Piso	Consultorio medicina 2					1,00	1,00
	Consultorio enfermeria					1,00	1,00
	Almacenamiento termos					1,00	1,00
	Consultorio vacunación					1,00	1,00
Primer Piso	Consultorio odontología					3,00	3,00
	Consultorio medicina 1					1,00	1,00
	Cuarto de aseo					1,00	1,00
	Cuarto de residuos					1,00	1,00

CANTIDAD PROYECTADA	10,00
CANTIDAD CONTRACTUAL	8,00
DIFERENCIA	2,00

OBSERVACIONES:



ELABORÓ:	ROSSY ELENA NIÑO GÓMEZ	APROBÓ:	OMAR AUGUSTO NEIRA SIERRA
	RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL
	CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPICO INGENIERIA S.A.S

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E

DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE				**UBICACIÓN**	SAN JOSE DEL BUBUY					
					FECHA	25/05/2026					
					ACTA No	Recibo y liquidación					
CAPÍTULO	**5**	**APARATOS SANITARIOS**	**ÍTEM**	**5.2**	**Sanitario bajo consumo one piece doble descarga blanco. Suministro e instal.**	**UND**	**und**	**CANT.**	**8,00**		

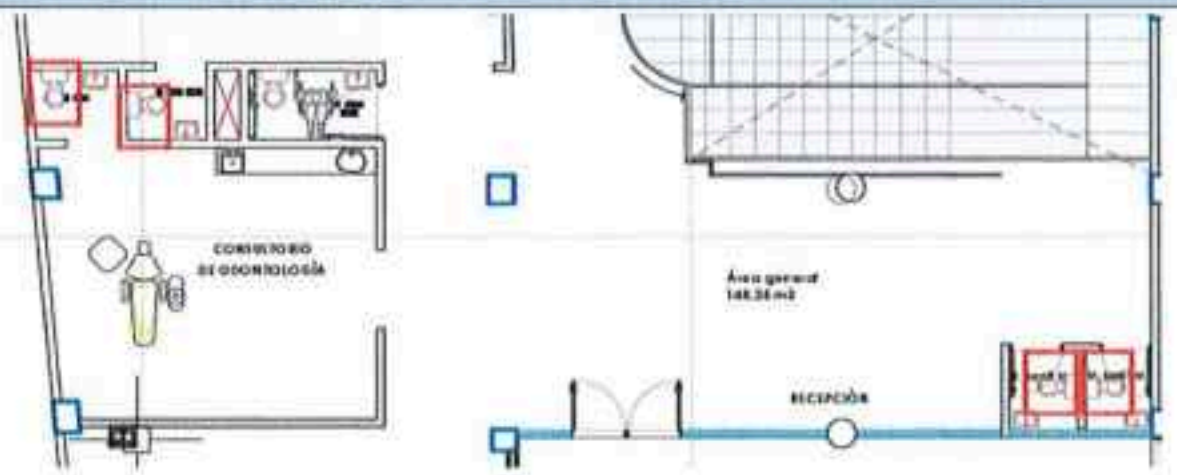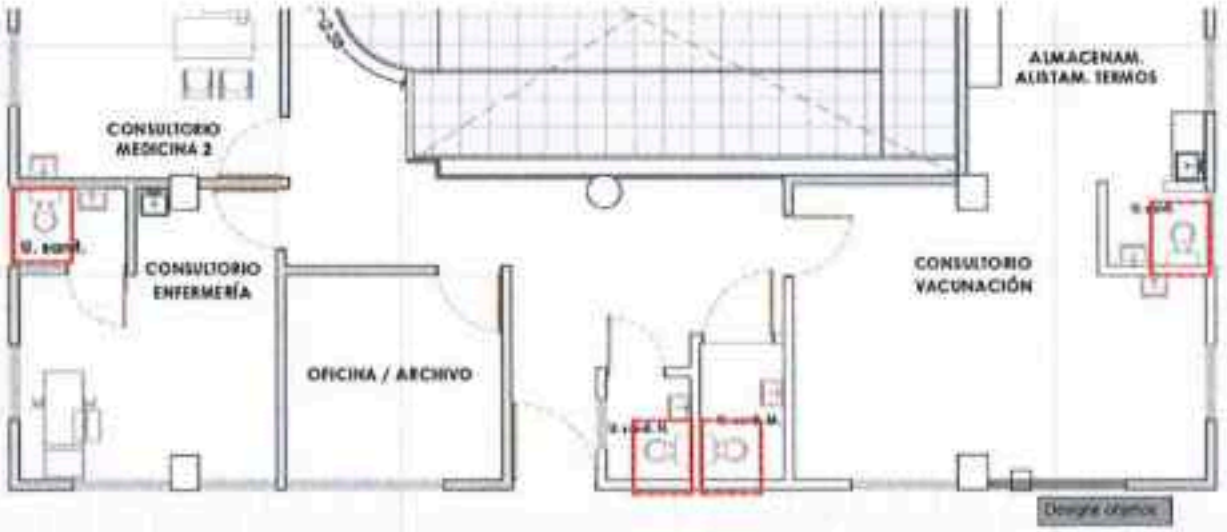ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA	LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES					CANT. TOTAL
			LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	Cantidad	CANT.	
	Primer piso	U. sant 01					1,00	1,00
		U. sant mixta 02					1,00	1,00
		U. sant 04					1,00	1,00
		U. sant 05					1,00	1,00
	Segundo piso	U. sant 06					1,00	1,00
		U. sant 07					1,00	1,00
		U. sant 08					1,00	1,00
		U. sant 09					1,00	1,00
								
								

CANTIDAD PROYECTADA	**8,00**
CANTIDAD CONTRACTUAL	**8,00**
DIFERENCIA	**0,00**

OBSERVACIONES:


ELABORÓ:	ROSSY ELENA NIÑO GÓMEZ	APROBÓ:	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL	
CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPICO INGENIERIA S.A.S	

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E

DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE				**UBICACIÓN**	SAN JOSE DEL BUBUY			
					FECHA	25/05/2026			
					ACTA No	Recibo y liquidación			
CAPÍTULO	**5**	**APARATOS SANITARIOS**	**ÍTEM**	**5.2**	**Sanitario bajo consumo one piece doble descarga blanco. Suministro e instal.**	**UND**	**und**	**CANT.**	**0,00**

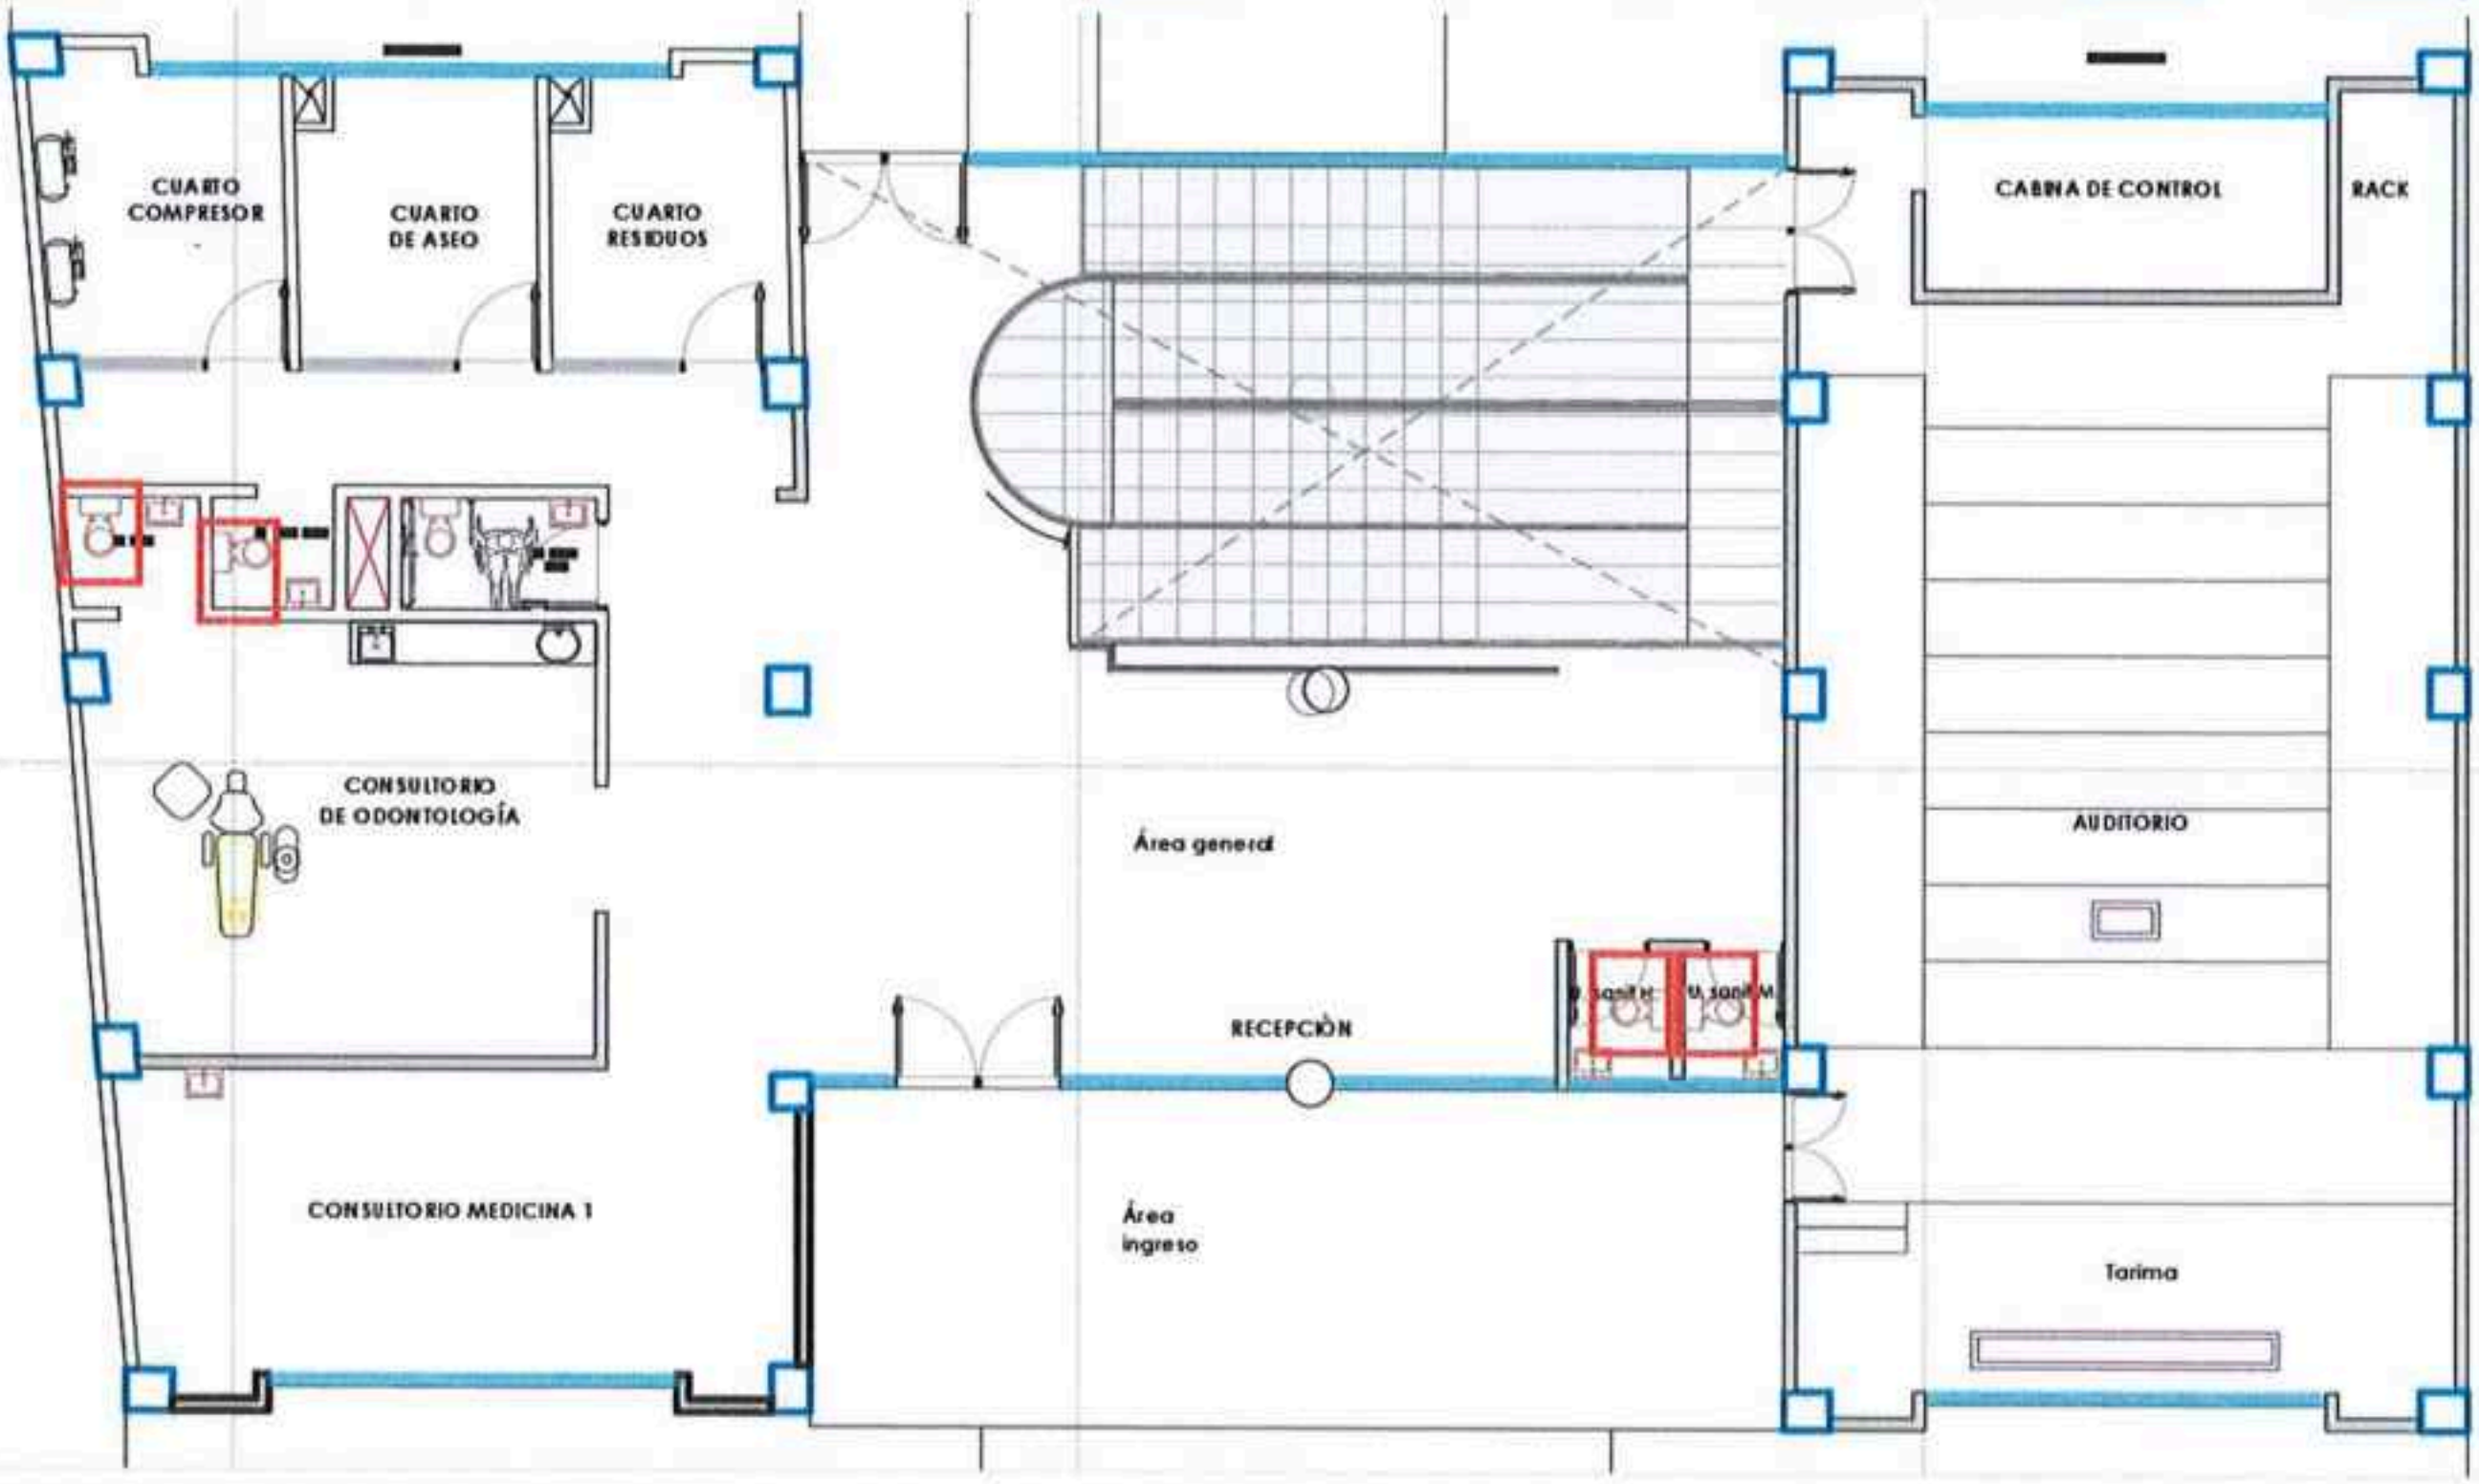


HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E

DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE				**UBICACIÓN**	SAN JOSE DEL BUBUY			
					FECHA	25/05/2026			
					ACTA No	Recibo y liquidación			
CAPÍTULO	**5**	**APARATOS SANITARIOS**	**ÍTEM**	**5.2**	**Sanitario bajo consumo one piece doble descarga blanco. Suministro e Instal.**	**UND**	**und**	**CANT.**	**0,00**

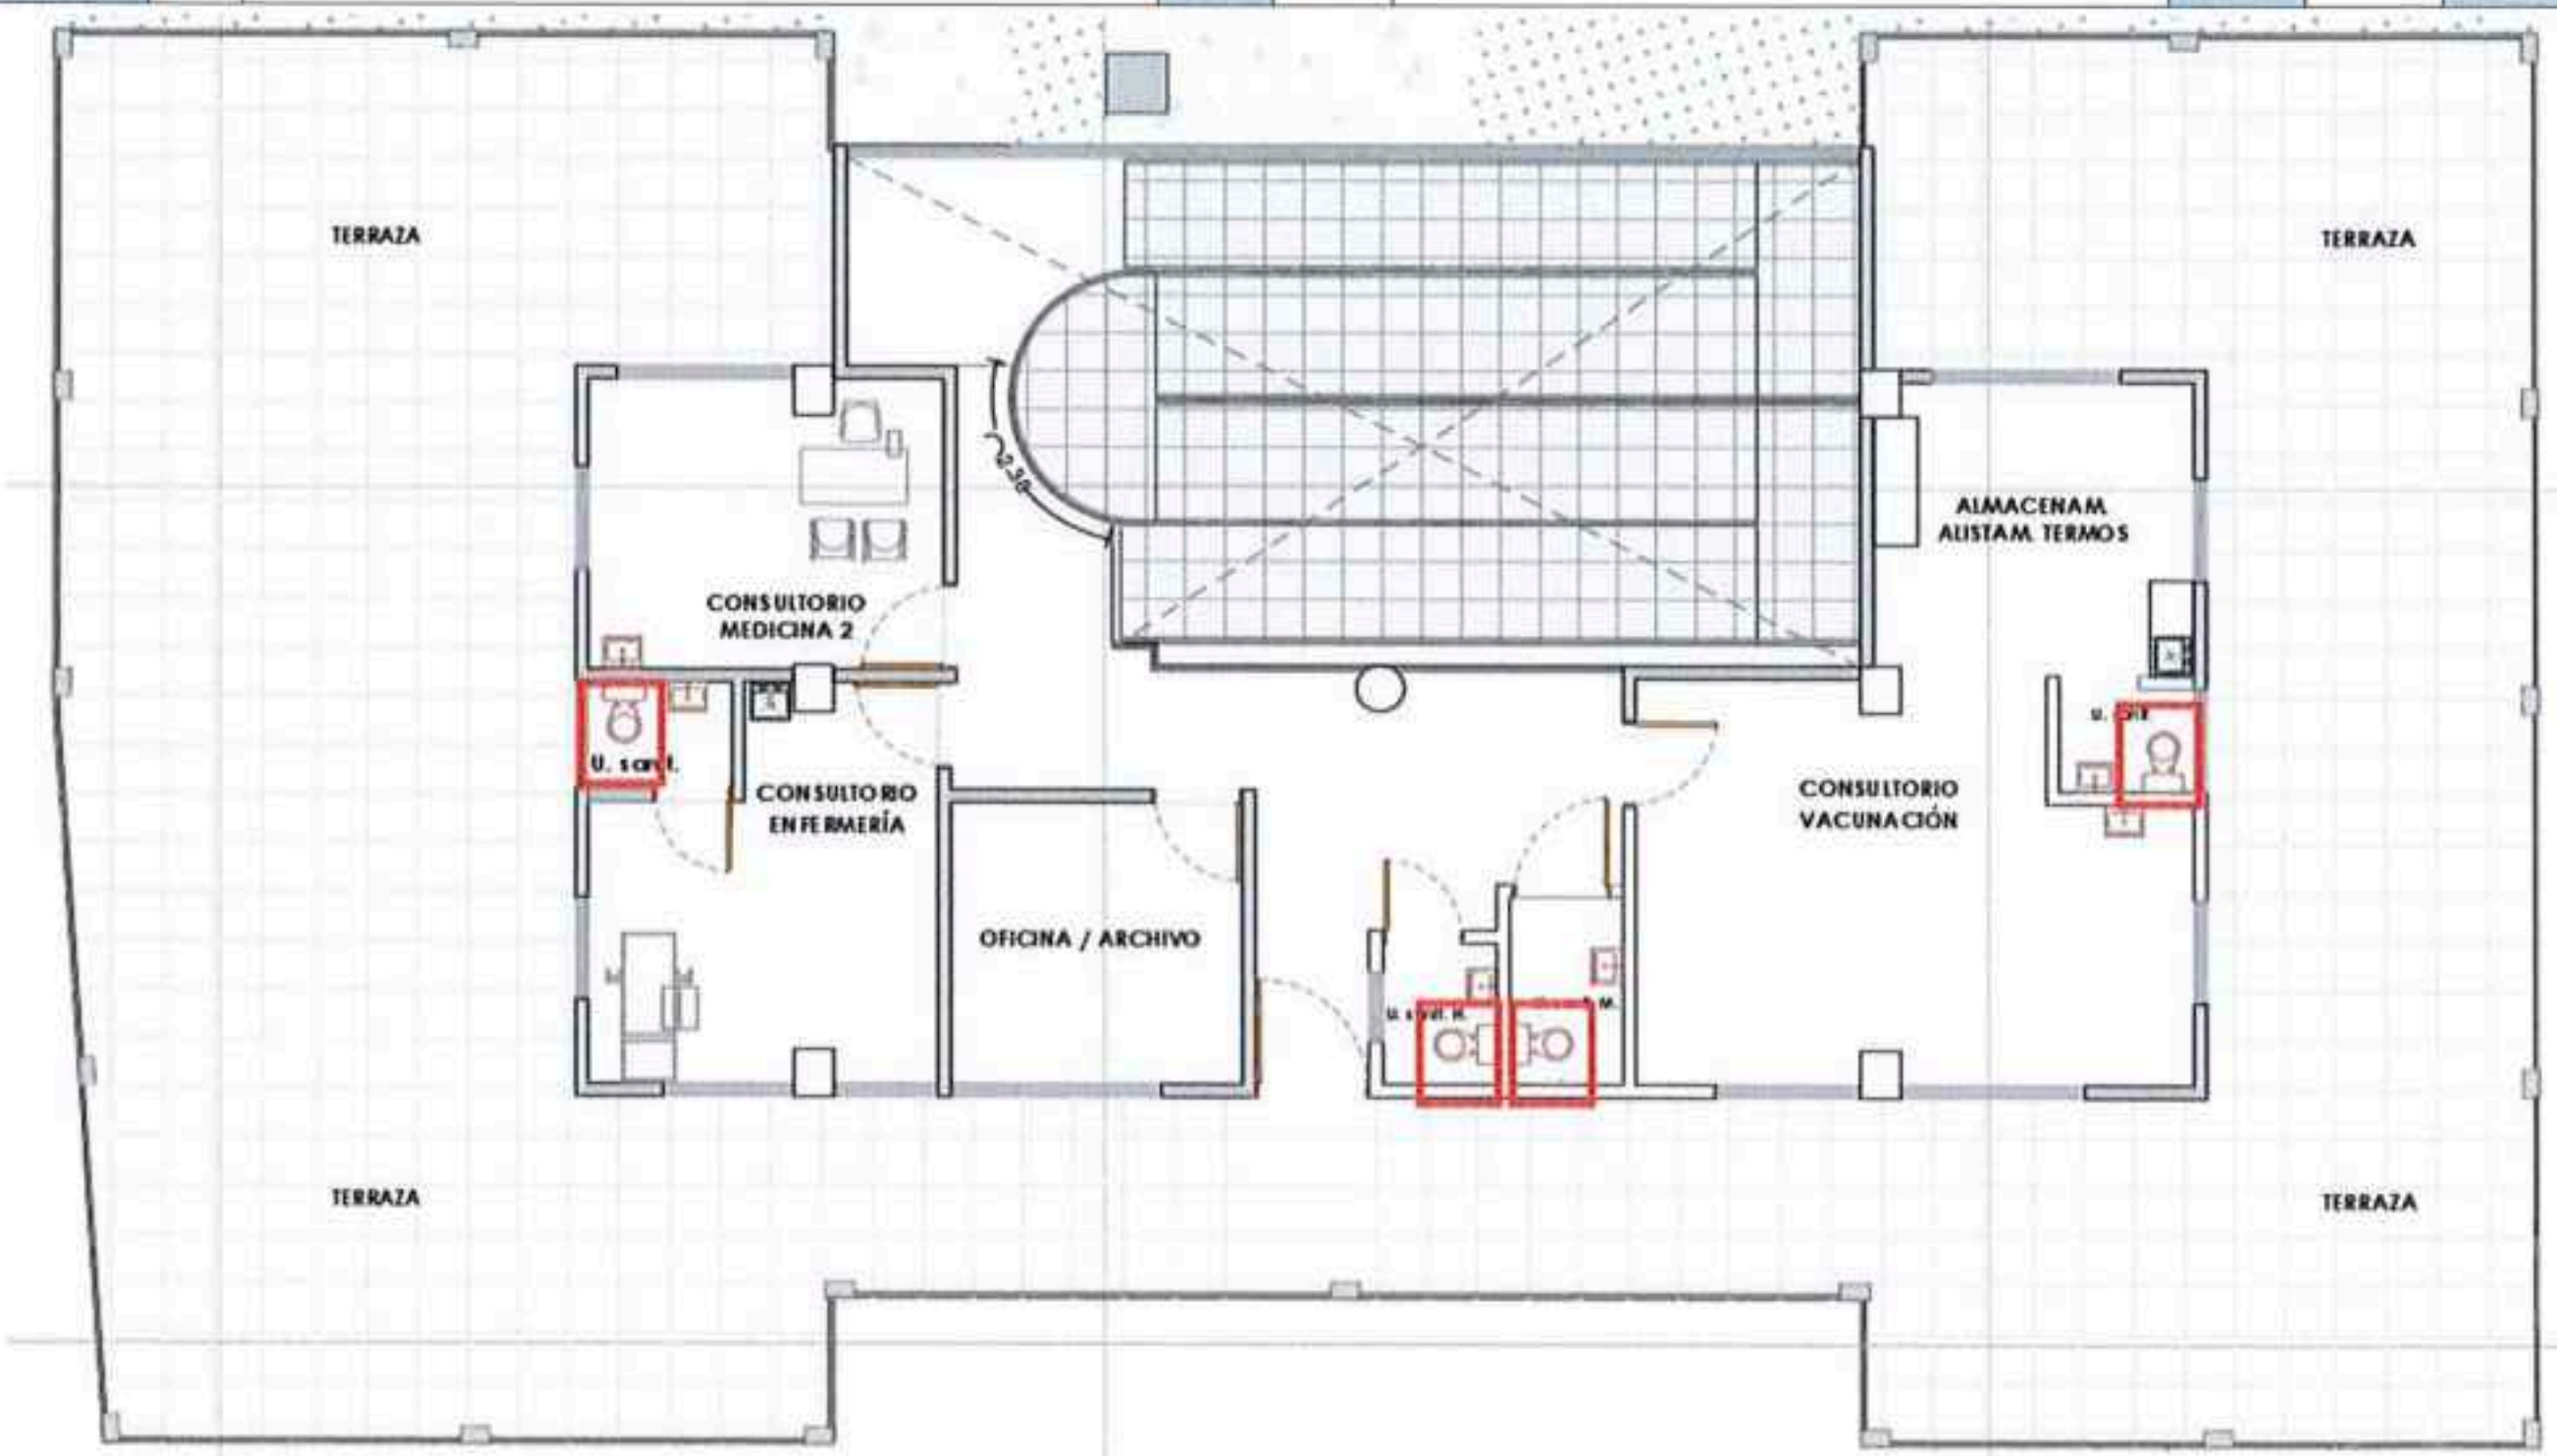

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E

DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	UBICACIÓN	SAN JOSE DEL BUBUY
		FECHA	25/05/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	5	APARATOS SANITARIOS	ÍTEM	5.3	Mesón en acero inoxidable básico con poceta 100 x 52 cm, grifería monocontrol, con desagüe. Suministro e instal.	UND	und	CANT.	2,00

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	Cantidad	CANT.	CANT. TOTAL
Primer piso	Cons. Odontolofía					1,00	1,00
Segundo piso	Almacenamiento					1,00	1,00

CANTIDAD PROYECTADA	2,00
CANTIDAD CONTRACTUAL	3,00
DIFERENCIA	-1,00

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	ROSSY ELENA NIÑO GÓMEZ	APROBÓ	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
	RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL
	CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPICO INGENIERIA S A S

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E

DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	UBICACIÓN	SAN JOSE DEL BUBUY
		FECHA	25/05/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	5	APARATOS SANITARIOS	ÍTEM	5.4	Sanitario para personas de movilidad reducida. Suministro e Instal.	UND	und	CANT.	1,00





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					CANT. TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	Cantidad	CANT.	
Primer piso					1,00	1,00

CANTIDAD PROYECTADA	1,00
CANTIDAD CONTRACTUAL	1,00
DIFERENCIA	0,00

OBSERVACIONES:


ELABORÓ:	ROSSY ELENA NIÑO GÓMEZ	APROBÓ:	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
	RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL
	CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPICO INGENIERIA S.A.S

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E

DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE			UBICACIÓN	SAN JOSE DEL BUBUY		
				FECHA	25/05/2026		
				ACTA No	Recibo y liquidación		
CAPÍTULO 6	MUROS Y ACABADOS	ÍTEM	6.1	Pañete liso (allanado) muros 1:4, incluye filos y dilataciones	UND m²	CANT. 0,00	

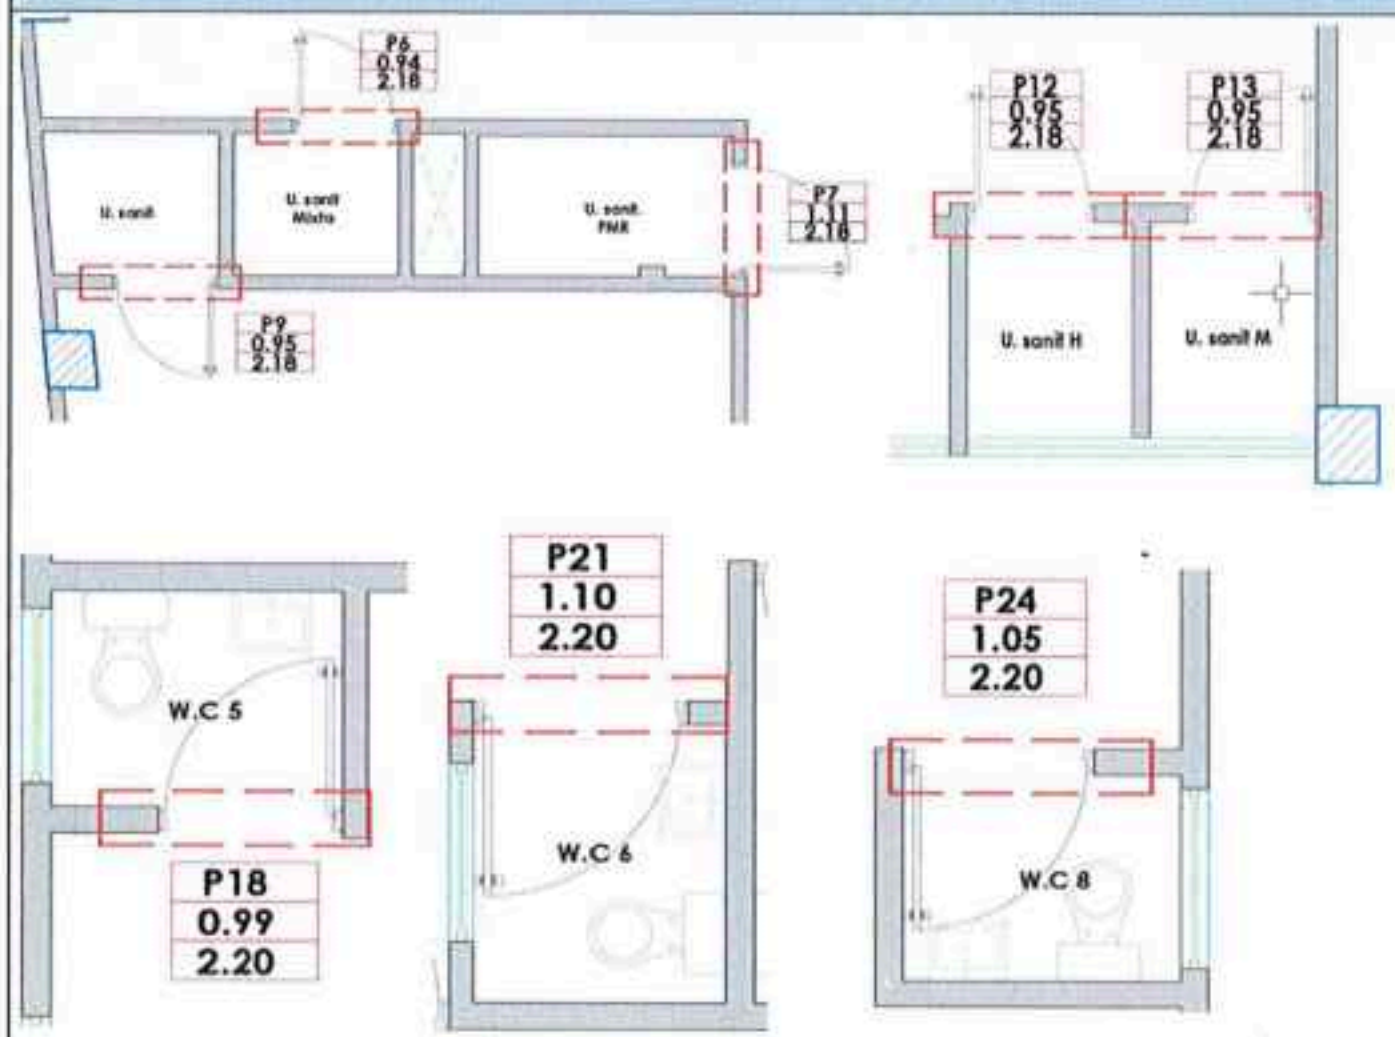

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES					CANT. TOTAL (AN.T *A*C)
		Ancho Original (m)	Ancho nuevo (m)	Ancho total (m) AN. T	Altura (m) A	Espesor (m)	
Primer Piso							
U. sanit 01	Puerta P9	0,65	0,95	0,30		0,12	0,04
					2,18	0,12	0,26
U. sanit mixta 02	Puerta P6	0,65	0,94	0,29		0,12	0,03
					2,18	0,12	0,26
U. sanit PMR 03	Puerta P7	1,00	1,11	0,11		0,12	0,01
					2,18	0,12	0,26
U. sanit H.	Puerta P12	0,68	0,95	0,27		0,12	0,03
					2,18	0,12	0,26
U. sanit M.	Puerta P13	0,67	0,95	0,28		0,12	0,03
					2,18	0,12	0,26
Segundo Piso							
U. sant 05	Puerta 18	0,70	0,99	0,29		0,12	0,03
					2,20	0,12	0,26
U. santi 06	Puerta 21	0,70	1,10	0,40		0,12	0,05
					2,20	0,12	0,26
U. santi 07	Puerta 24	0,70	1,05	0,35		0,12	0,04
					2,20	0,12	0,26



CANTIDAD PROYECTADA	2,37
CANTIDAD CONTRACTUAL	2,35
DIFERENCIA	0,02

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:	ROSSY ELENA NIÑO GÓMEZ	APROBÓ	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
	RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL
	CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPICO INGENIERIA S.A.S

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E


DEPARTAMENTO DE CASANARE


MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	UBICACIÓN	SAN JOSE DEL BUBUY
		FECHA	25/05/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	6	MUROS Y ACABADOS	ÍTEM	6.2	Estuco y vinilo interior 3 manos, filos y dilataciones	UND	m²	CANT.	

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA

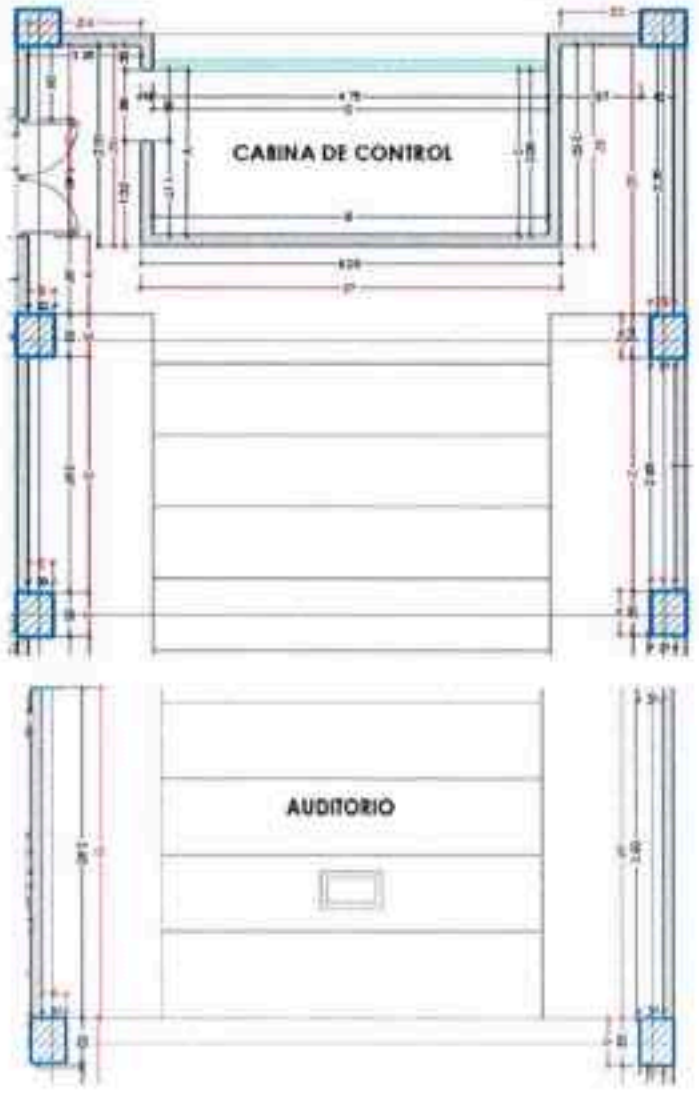

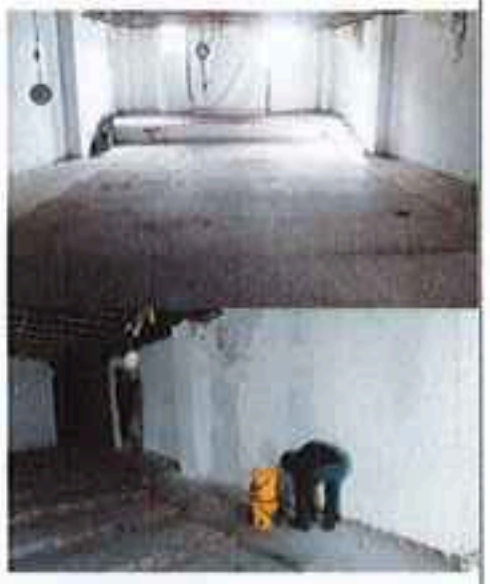



LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	Área (m2)	CANT.	CANT. TOTAL
Cabina control	Lado A		1,17	2,30		1,00	2,69
	Lado B		5,06	2,30		1,00	11,64
	Vano		2,68	1,17	-	1,00	-3,14
	Lado C		2,06	2,30		1,00	4,74
	Lado D		4,76	2,30		1,00	10,95
	Ventana		4,76	0,90	-	1,00	-4,28
	Lado A		0,97	2,40		1,00	2,33
	Lado B		0,32	2,40		2,00	1,54
	Lado C		0,53	2,40		1,00	1,27
	Lado D (A1= 2,30; A2=2,40; Ap=2,35)		2,97	2,35		1,00	6,98
	Lado E		0,30	2,60		1,00	0,78
	Lado F		0,55	2,64		1,00	1,45
	Lado G (A1= 2,64; A2=3,64; Ap=3,14)		3,90	3,14		1,00	12,25
	Lado H		0,31	3,60		1,00	1,12
	Lado I		1,30	3,10		1,00	4,03
	Puerta		1,30	2,19	-	1,00	-2,85
	Muro Tarima		7,79	0,50		1,00	3,90
	Lado J		2,25	2,64		1,00	5,94
	Lado K		0,40	2,64		1,00	1,06
	Lado L		0,29	2,64		1,00	0,77
Auditorio	Lado M		0,98	2,64		1,00	2,59
	Lado N		0,30	2,64		1,00	0,79
	Lado O		5,02	2,64		1,00	13,25
	Ventana		4,72	0,95	-	1,00	-4,48
	Lado P		0,30	2,64		1,00	0,79
	Lado Q		0,98	2,64		1,00	2,59
	Lado R		0,32	2,64		1,00	0,84
	Lado S		0,41	2,64		1,00	1,08
	Lado T		1,27	3,10		1,00	3,94
	Lado T		2,23	2,64		1,00	5,89
	Lado U		0,31	3,64		2,00	2,26
	Lado V		0,55	3,64		1,00	2,00
	Lado W (A1= 2,64; A2=3,64; Ap=3,14)		3,93	3,14		1,00	12,34
	Lado X		0,55	2,74		1,00	1,51
	Lado Y		0,31	2,70		2,00	1,67
						CANTIDAD PROYECTADA	110,23

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:	ROSSY ELENA NIÑO GÓMEZ	APROBÓ:	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL	
CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPICO INGENIERIA S.A.S	

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E


DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	UBICACIÓN	SAN JOSE DEL BUBUY
		FECHA	25/05/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	6	MUROS Y ACABADOS	ÍTEM	6.2	Estuco y vinilo interior 3 manos, filos y dilataciones	UND	m²	CANT.	157,10

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA

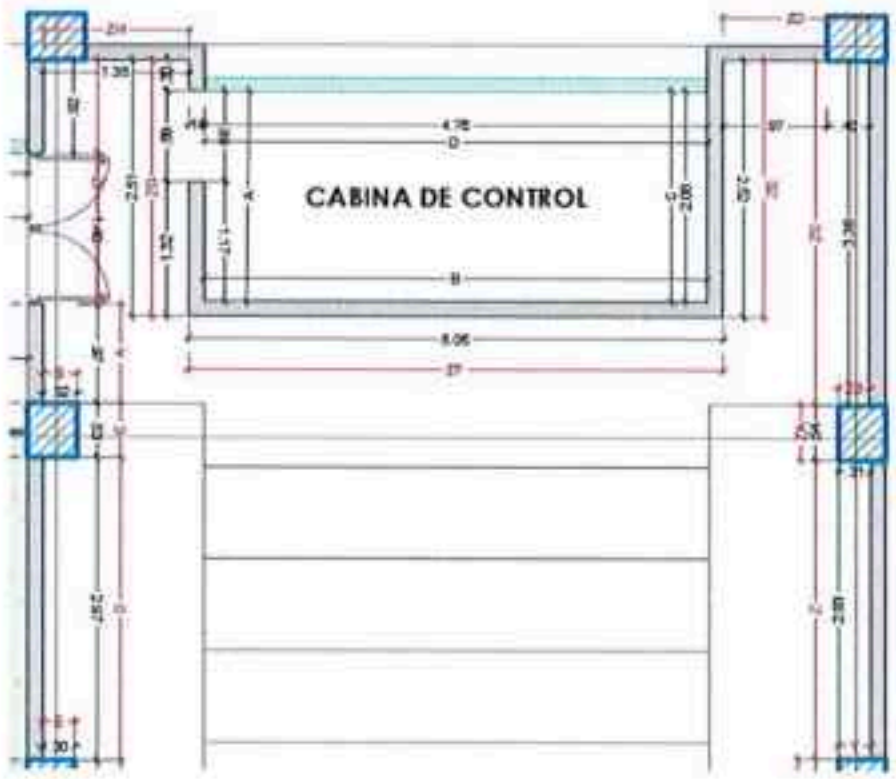



LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	Área (m2)	CANT.	CANT. TOTAL
Auditorio	Lado Z (A1= 2,30, A2=2,40; Ap=2,35)		2,93	2,35		1,00	6,89
	Lado ZA		0,54	2,30		1,00	1,24
	Lado ZB		0,31	2,30		2,00	1,43
	Lado ZC		3,38	2,30		1,00	7,77
	Lado ZD		1,37	2,30		1,00	3,15
	Lado ZE		2,52	2,30		1,00	5,80
	Lado ZF		5,06	2,30		1,00	11,64
	Lado ZG		2,51	2,30		1,00	5,77
	Ingreso Cabina		0,69	2,30	-	1,00 -	2,05
	Lado ZH		1,35	2,30		1,00	3,11
	Lado ZI		2,40	2,30		1,00	5,52
	Puerta ingreso		1,48	2,30	-	1,00 -	3,40

CANTIDAD PROYECTADA	46,87
Viene	110,23
Total	157,10
CANTIDAD CONTRACTUAL	72,97
Diferencia	84,13

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:	ROSSY ELENA TRIÑO GOMEZ	APROBÓ:	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
	RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL
	CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPICO INGENIERIA S.A.S

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E


DEPARTAMENTO DE CASANARE


MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	UBICACIÓN	SAN JOSE DEL BUBUY
		FECHA	25/05/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	6	MUROS Y ACABADOS	ÍTEM	6.3	Raspado superficie de muro pintado en vinilo	UND	m²	CANT.	

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA

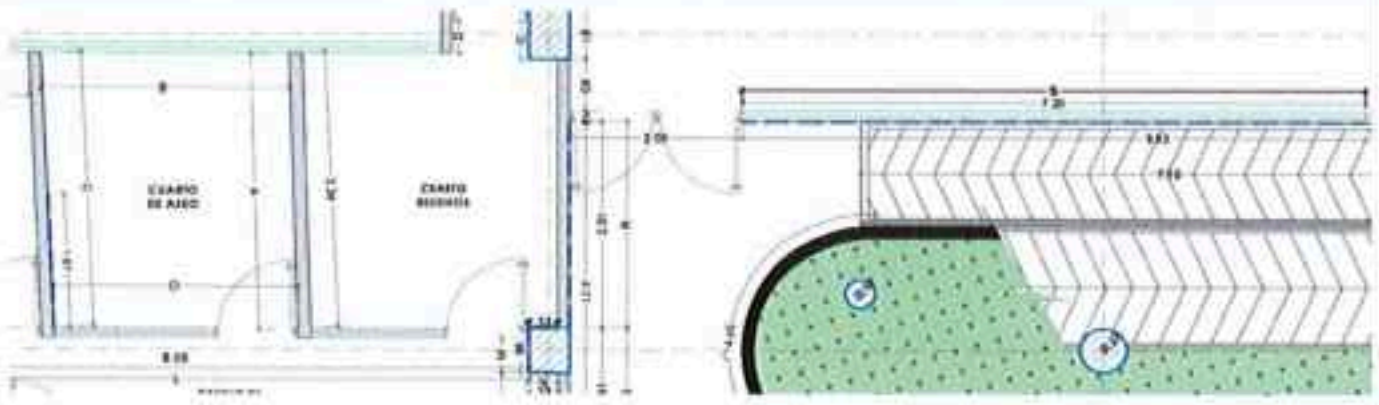

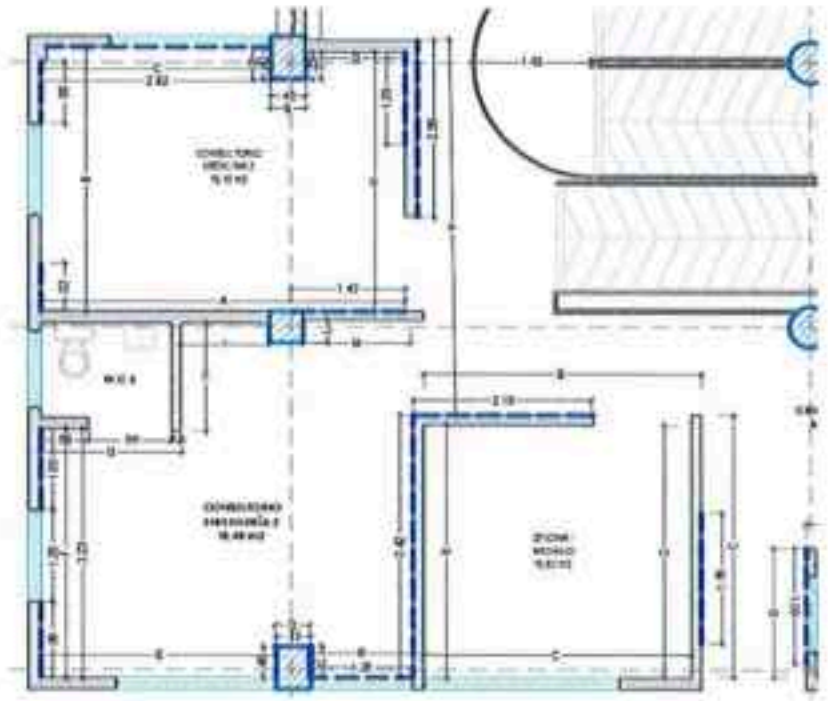

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	Área (m2)	CANT.	CANT. TOTAL
Pasillo y sala de espera primer piso	Lado R		2,51	3,00		1,00	7,53
	Lado S Área 1 (0,71*1,43=1,02)				1,02	1,00	1,02
	Lado S Área 2 (5,73*0,71)/2=2,03				2,03	1,00	2,03
	Lado T		2,77	3,00		1,00	8,31
	Lado F		2,46	0,17		1,00	0,42
	Lado G		2,90	0,17		1,00	0,49
	Lado F		1,00	0,17		1,00	0,17
Cuarto de aseo	Lado C		1,61	1,40		1,00	2,25
Pasillo 1 columna D2	Lado M		0,55	0,50		1,00	0,28
	Lado N		0,33	0,50		2,00	0,33
Circulación segundo piso	Lado A		2,30	2,90		1,00	6,67
	Lado B		2,09	2,90		1,00	6,06
	Lado C		1,70	1,85		1,00	3,14
	Lado D		1,50	1,73		1,00	2,60
Consultorio medicina 2	Lado A		1,40	1,30		1,00	1,82
	Lado B		0,62	2,14		1,00	1,33
	Lado B		0,80	2,87		1,00	2,30
	Lado C		2,82	0,60		1,00	1,69
	Lado H		1,20	2,87		1,00	3,44
	Lado E		0,43	2,87		1,00	1,23
Consultoria enfermeria	Lado A		3,42	2,19		1,00	7,49
	Lado B		1,26	0,50		1,00	0,63
	Columna C		0,40	2,87		2,00	2,30
	Columna D		0,43	2,87		1,00	1,23
	Lado F		0,80	2,87		1,00	2,30
	Lado F		1,05	2,87		1,00	3,01
Almacenamiento de termos	Lado I		1,07	0,60		1,00	0,64
	Columna lado K		0,33	0,60		1,00	0,20

CANTIDAD PROYECTADA	70,91
CONTIDAD CONTRACTUAL	70,30
Total	0,61

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:	ROSSY ELENA NIÑO GÓMEZ	APROBÓ:	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL	
CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPICO INGENIERIA S.A.S	

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E


DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	**UBICACIÓN**	SAN JOSE DEL BUBUY
		FECHA	25/05/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	6	MUROS Y ACABADOS	ÍTEM	6.3	Raspado superficie de muro pintado en vinilo	UND	m²	CANT.	104,62

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA

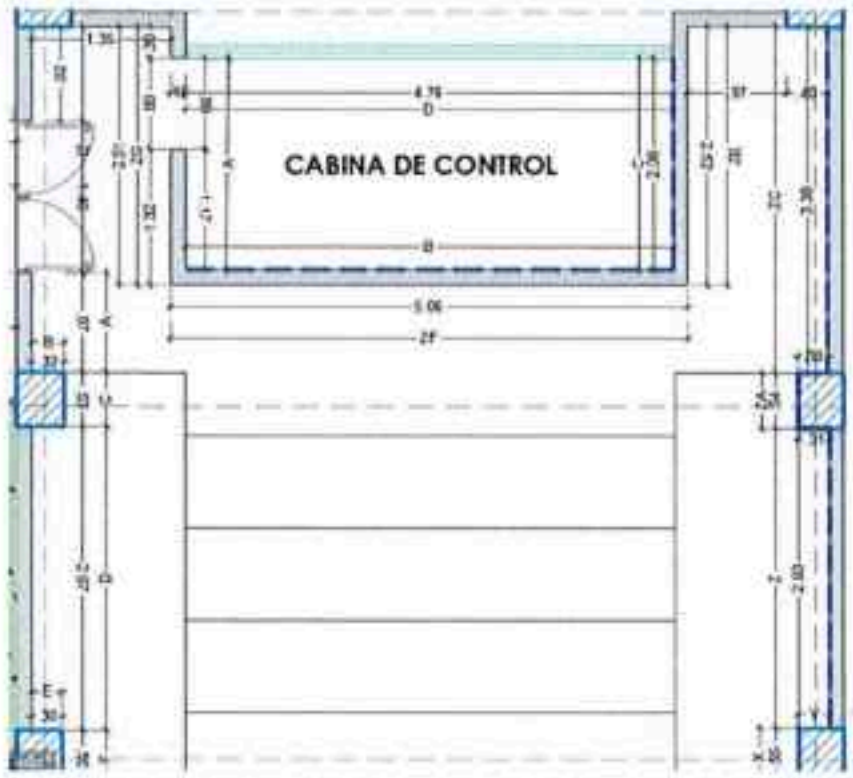



LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES					CANT. TOTAL
		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	Área (m2)	CANT.	
Cabina control	Lado B		5,06	2,30		1,00	11,64
	Lado C		2,06	2,30		1,00	4,74
Auditorio	Lado Z (A1= 2,30; A2=2,40; Ap=2,335)		2,93	2,35		1,00	6,89
	Lado ZA		0,54	2,30		1,00	1,24
	Lado ZB		0,31	2,30		2,00	1,43
	Lado ZC		3,38	2,30		1,00	7,77

CANTIDAD PROYECTADA	**33,71**
Viene	**70,91**
Total	**104,62**
Cantidad contractual	**43,87**
Diferencia	**60,75**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:	ROSSY ELENA NIÑO GÓMEZ	APROBÓ:	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL	
CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPICO INGENIERIA S.A.S	


HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E

DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	**UBICACIÓN**	SAN JOSE DEL BUBUY
		FECHA	25/05/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	**6**	**MUROS Y ACABADOS**	**ÍTEM**	**6.3**	**Raspado superficie de muro pintado en vinilo**	**UND**	**m²**	**CANT.**	

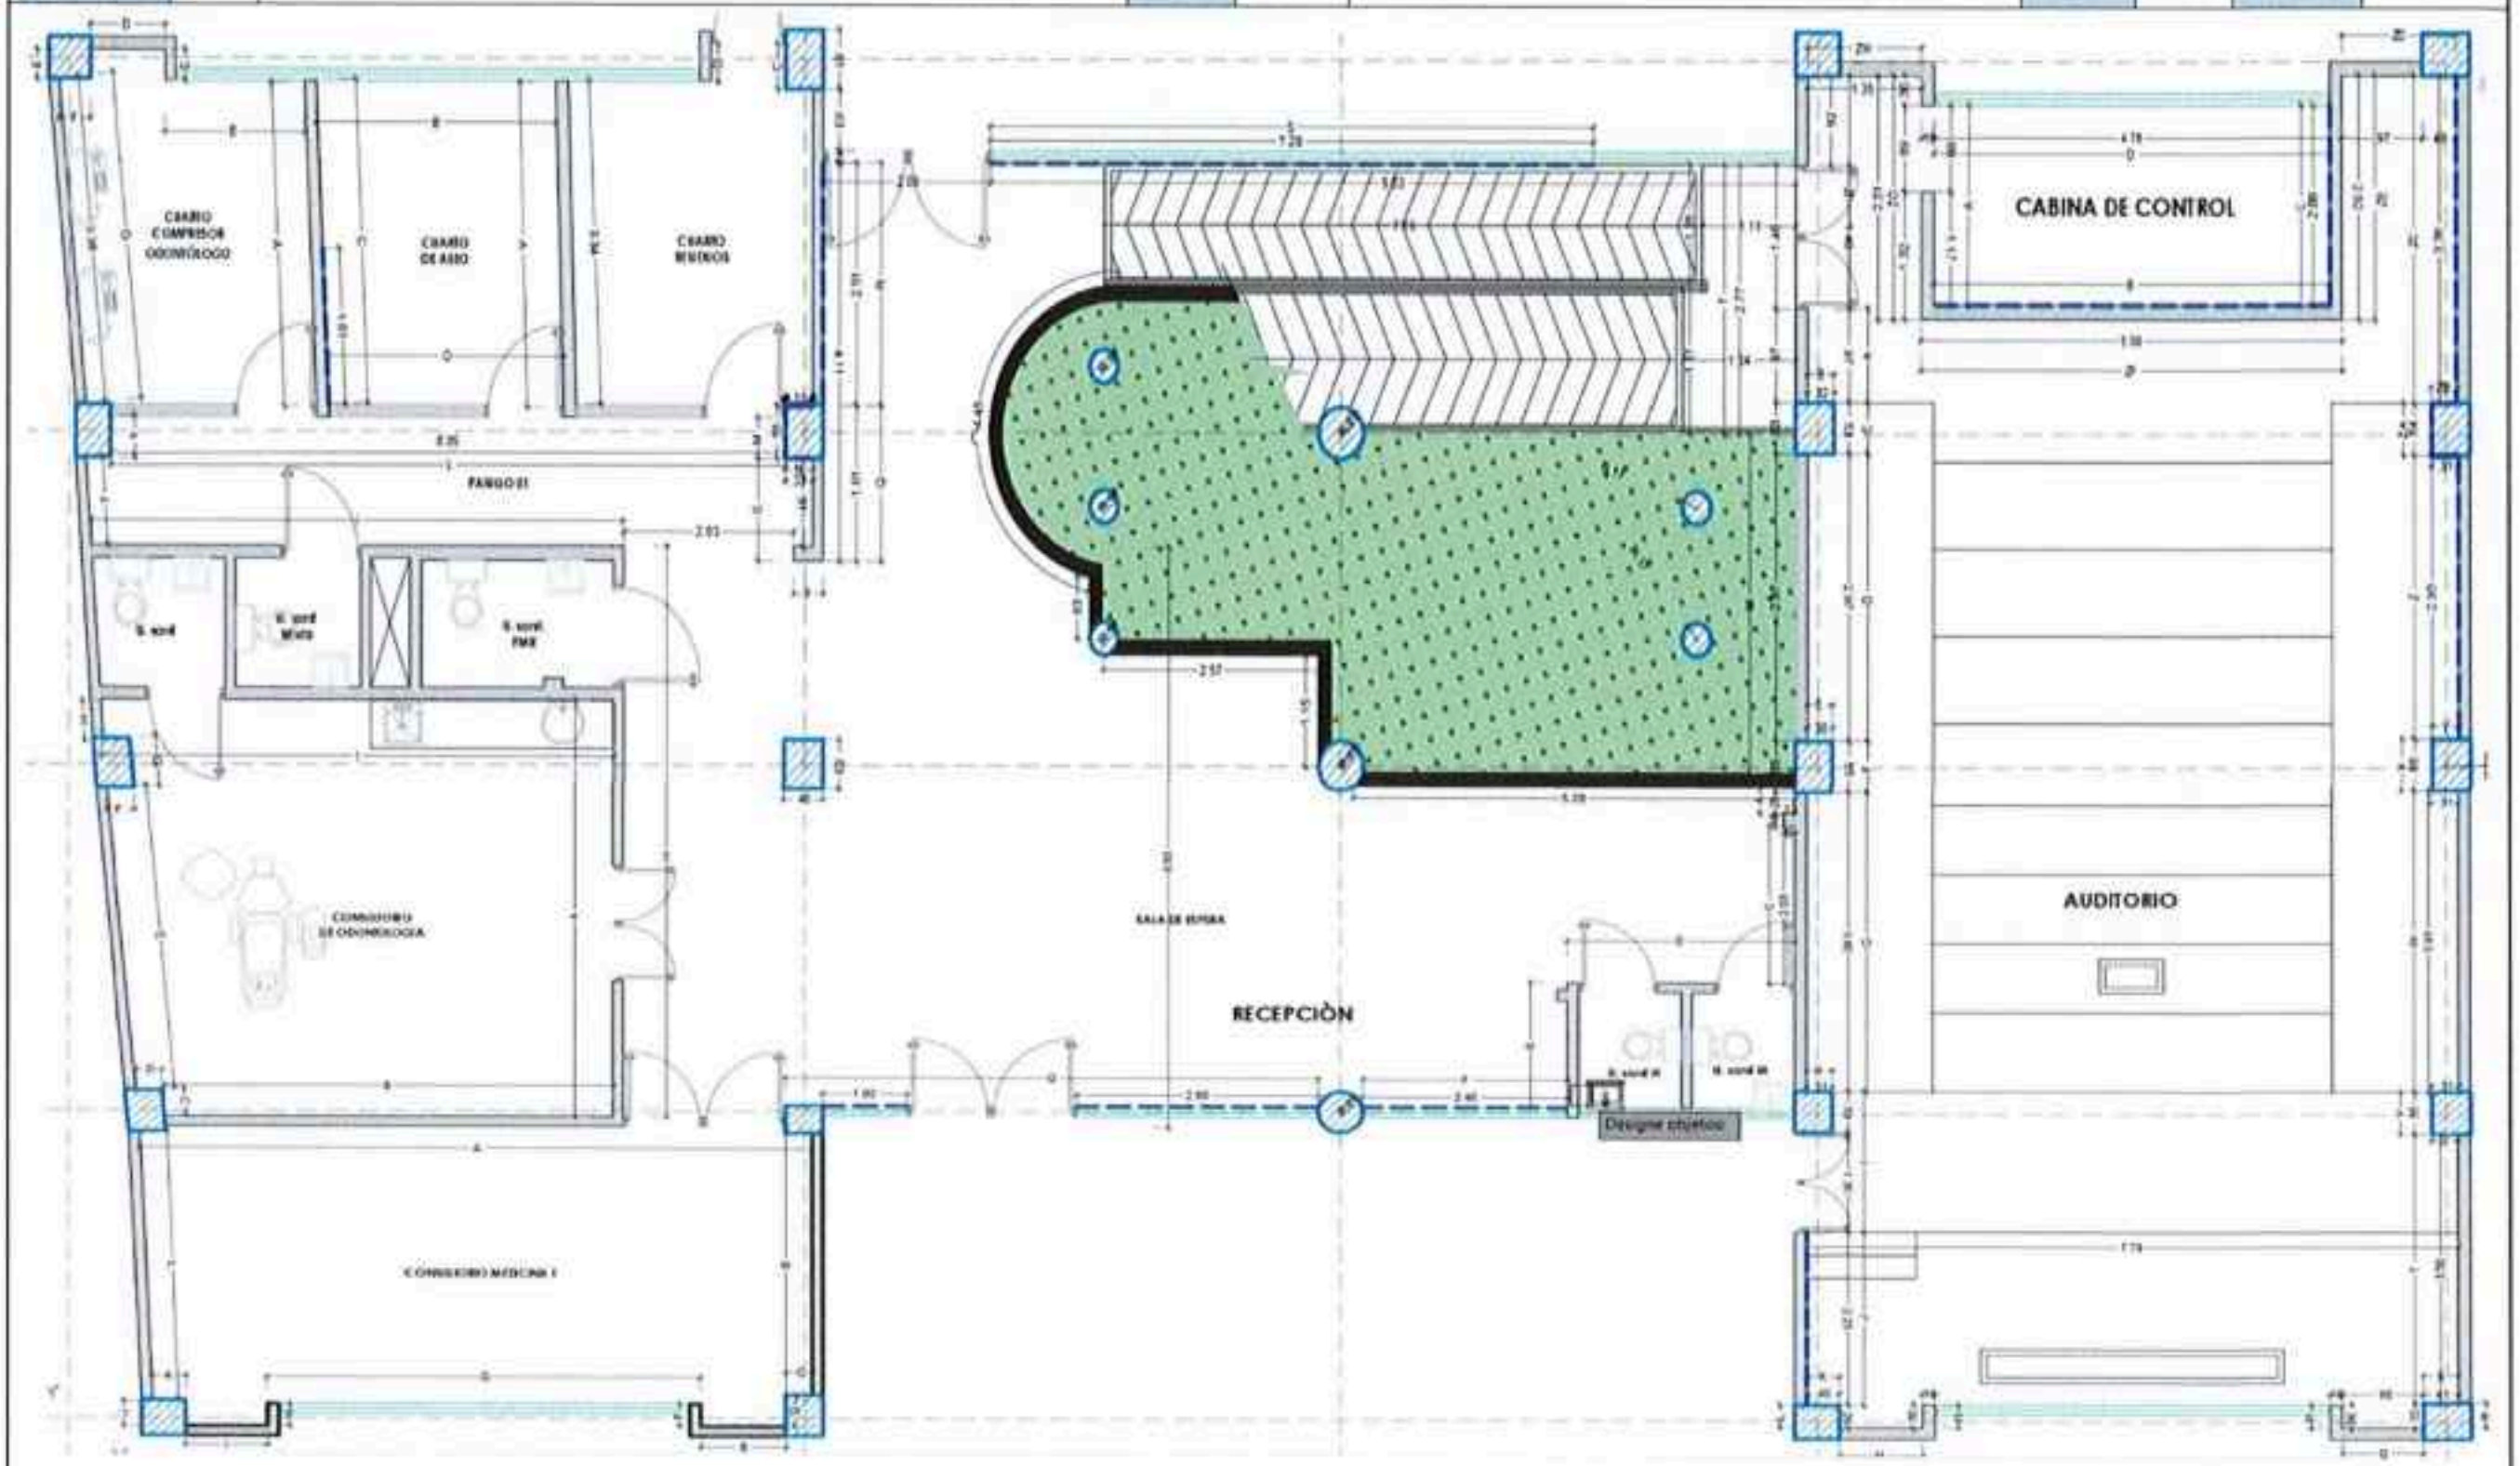


HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E

DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE				**UBICACIÓN**	SAN JOSE DEL BUBUY		
					FECHA	25/05/2026		
					ACTA No	Recibo y liquidación		
CAPÍTULO	**6**	**MUROS Y ACABADOS**	**ÍTEM**	**6.3**	**Raspado superficie de muro pintado en vinilo**	**UND**	**m²**	**CANT.**	

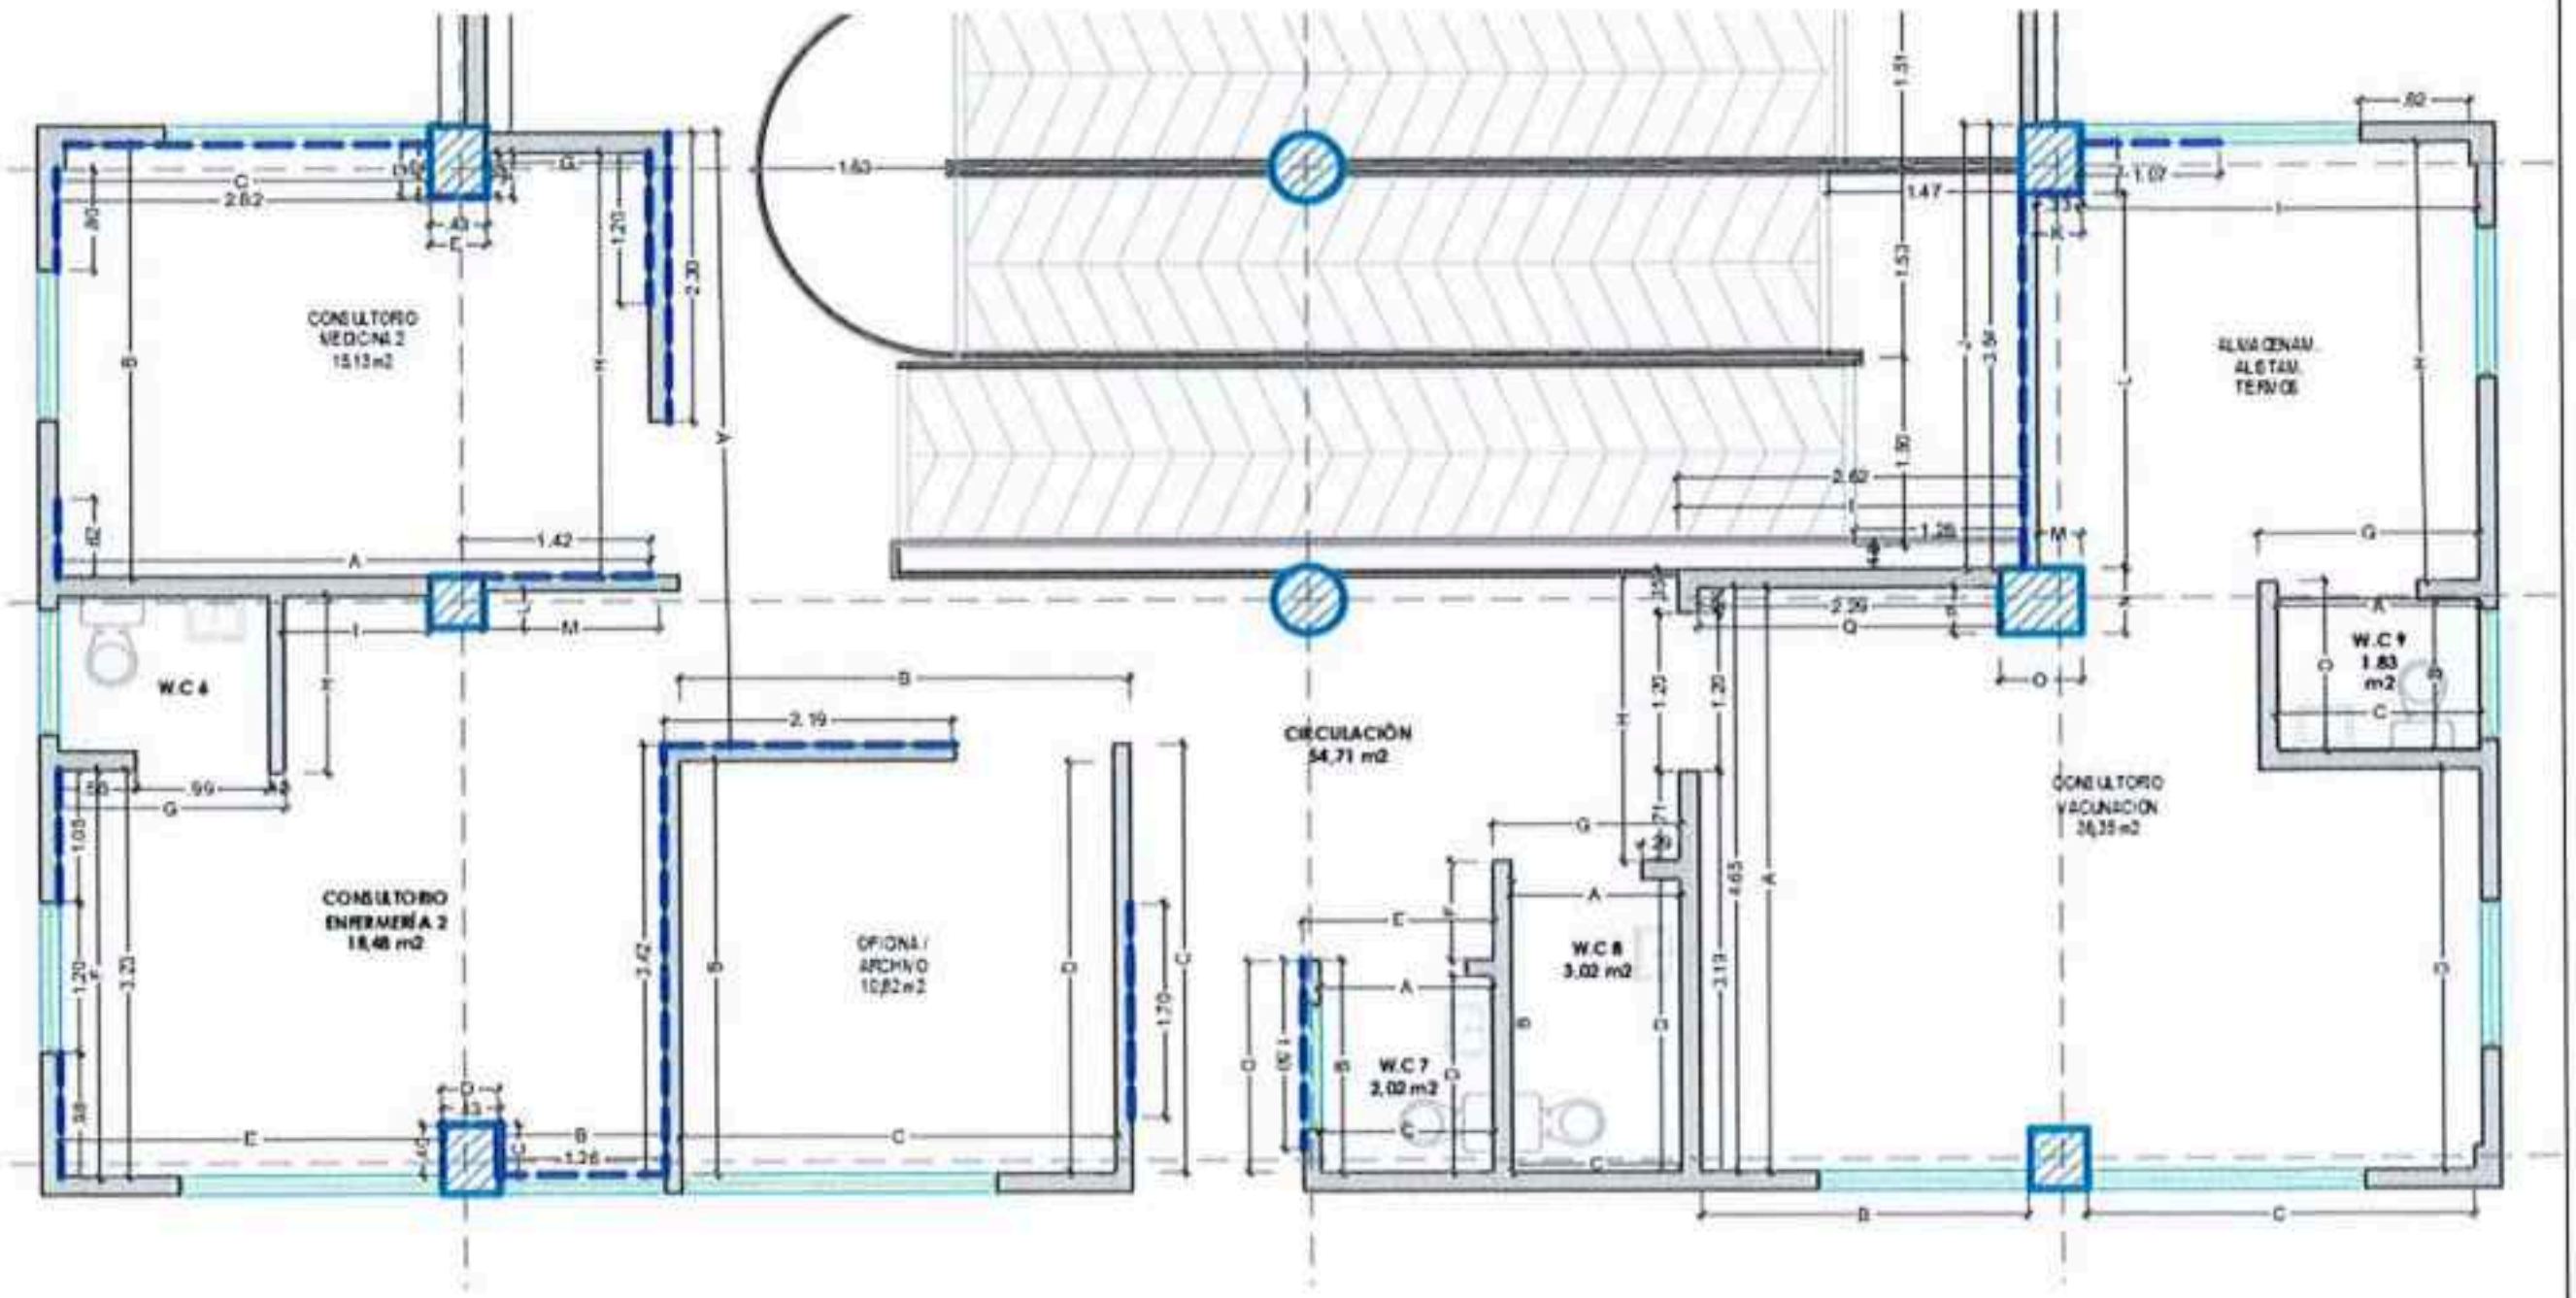

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E


DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	UBICACIÓN	SAN JOSE DEL BUBUY
		FECHA	25/05/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	6	MUROS Y ACABADOS	ÍTEM	6.4	Pintura acrilica alta asepsia para interiores sobre muros 3 manos	UND	m²	CANT.	

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA

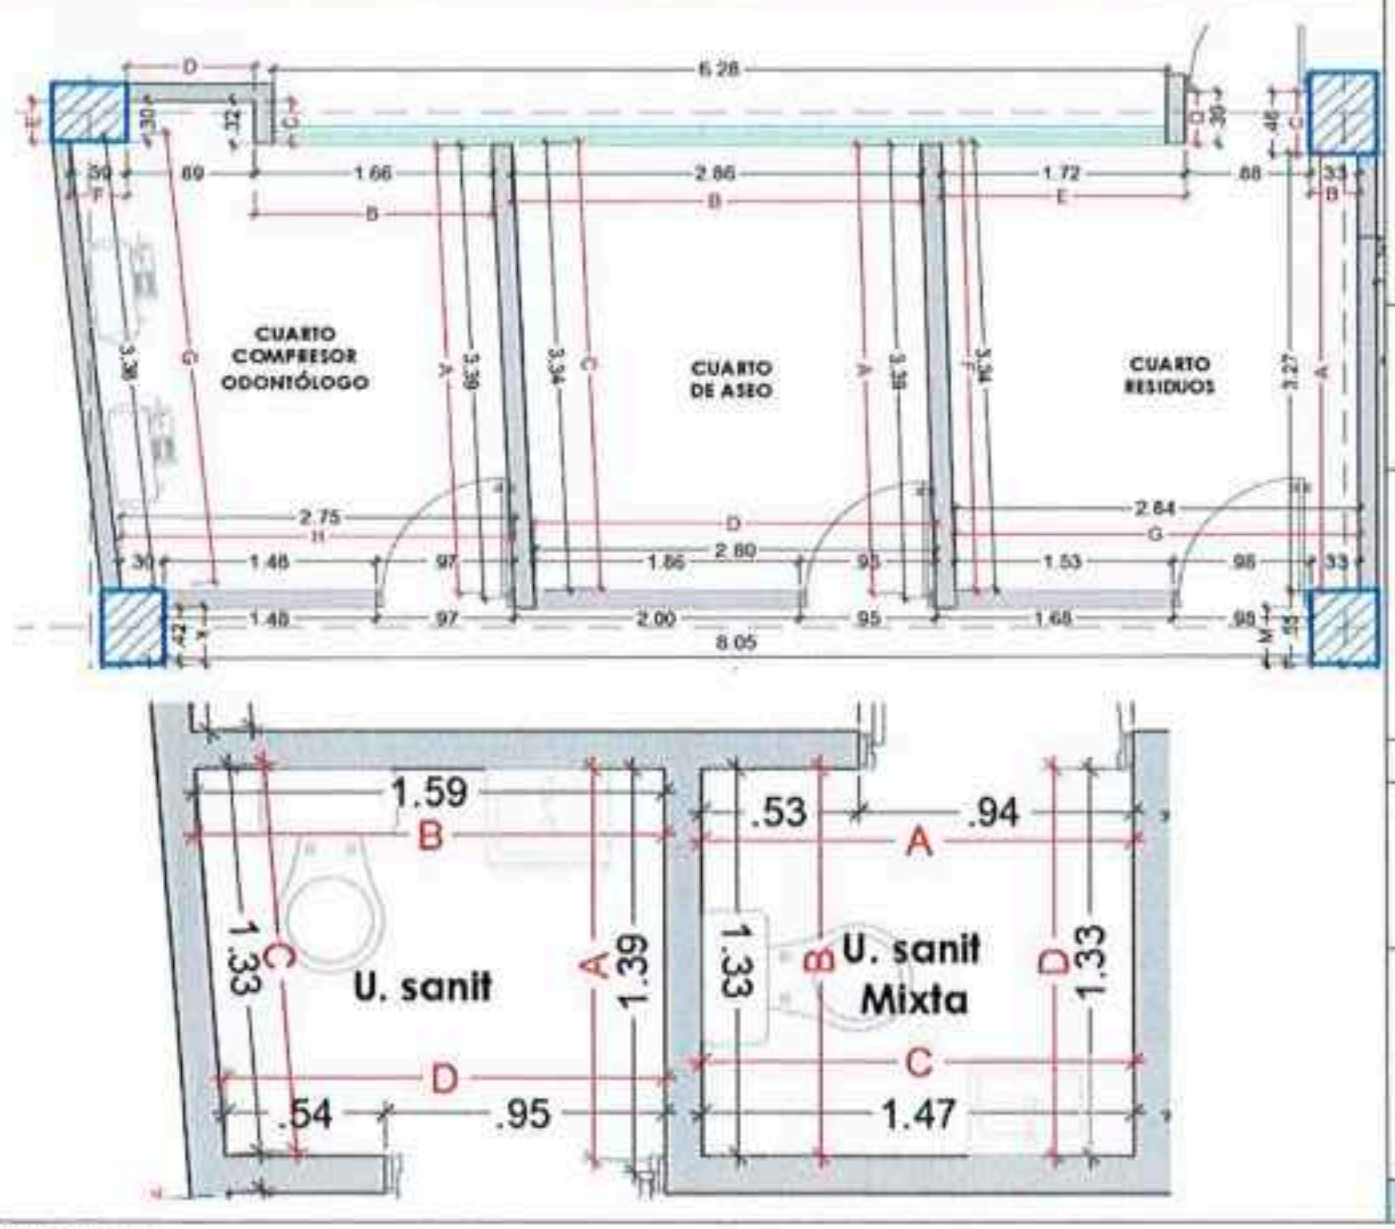

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	Cantidad	CANT.	CANT. TOTAL
Cuarto compresor odontologico	Lado A		3,39	3,00		1,00	10,17
	Lado B		1,66	3,00		1,00	4,98
	Lado C		0,32	3,00		1,00	0,96
	Lado D		0,89	3,00		1,00	2,67
	Lado E		0,30	3,00		1,00	0,90
	Lado F		0,39	3,00		1,00	1,17
	Lado G		3,38	3,00		1,00	10,14
	Lado H		2,75	3,00		1,00	8,25
	Puerta		0,97	2,18		- 1,00	- 2,11
Cuarto de aseo	Lado A		3,39	3,00		1,00	10,17
	Lado B		2,86	3,00		1,00	8,58
	Lado C		3,34	3,00		1,00	10,02
	Lado D		2,80	3,00		1,00	8,40
	Puerta		0,95	2,18		- 1,00	- 2,05
Cuarto Residuos	Lado A		3,27	3,00		1,00	9,81
	Lado B		0,33	3,00		1,00	0,99
	Lado C		0,46	3,00		1,00	1,38
	Lado D		0,39	3,00		1,00	1,17
	Lado E		1,72	3,00		1,00	5,16
	Lado F		3,34	3,00		1,00	10,02
	Lado G		2,84	3,00		1,00	8,52
	Puerta		0,96	2,17		- 1,00	- 2,13
Ventana de cuarto de compresor a cuarto de residuos			6,28	2,65		- 1,00	- 16,64
U. Sani 01	Lado A		1,39	1,06		1,00	1,47
	Lado B		1,59	1,06		1,00	1,69
	Lado C		1,33	1,06		1,00	1,41
	Lado D		1,49	1,06		1,00	1,58
	Puerta		0,95	0,20		- 1,00	- 0,19
U. Sani PMR	Lado A		2,29	1,06		1,00	2,43
	Lado B		1,32	1,06		1,00	1,40
	Lado C		1,46	1,06		1,00	1,55
	Columna		0,10	1,06		2,00	0,21
	Columna		0,23	1,06		1,00	0,24
	Lado D		1,32	1,06		1,00	1,40
	Puerta		1,11	0,17		- 1,00	- 0,19
						CANTIDAD PROYECTADA	103,63

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:	ROSSY ELENA NIÑO GOMEZ	APROBÓ:	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
	RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL
	CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPICO INGENIERIA S.A.S

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E


DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	UBICACIÓN	SAN JOSE DEL BUBUY		
		FECHA	46167		
		ACTA No	Recibo y liquidación		

CAPÍTULO	6	MUROS Y ACABADOS	ÍTEM	6.4	Pintura acrilica alta asepsia para interiores sobre muros 3 manos	UND	m²	CANT.	

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA

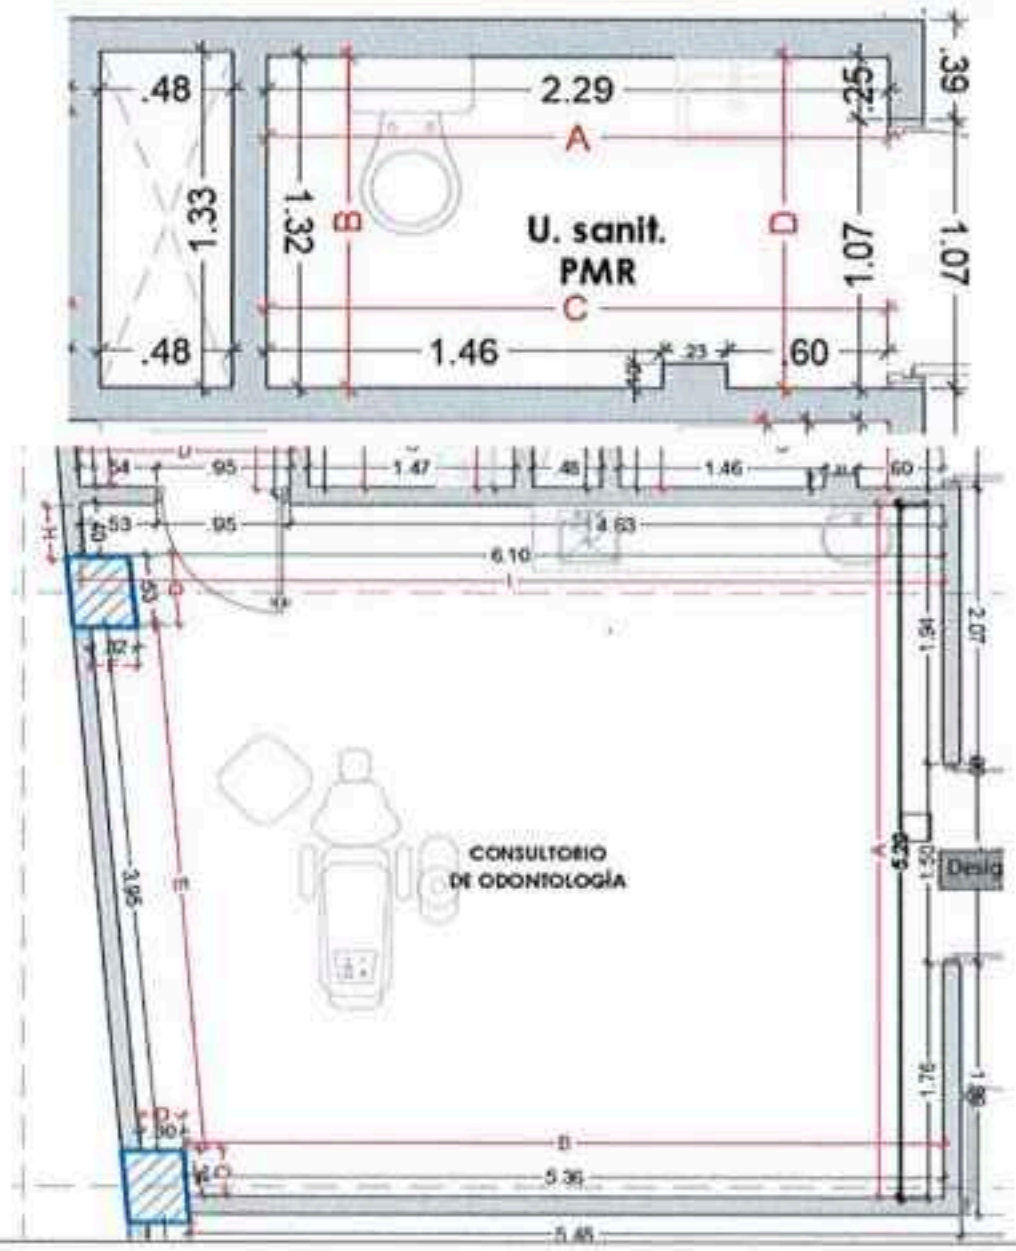

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	Cantidad	CANT.	CANT. TOTAL
U. Sanit. Mixta	Lado A	1,47		1,08		1	1,59
	Puerta	0,94		0,20		-1 -	0,19
	Lado B	1,33		1,08		1	1,44
	Lado C	1,47		1,08		1	1,59
	Lado D	1,33		1,08		1	1,44
Consultorio Odontologia	Lado A	5,20		3,00		1	15,60
	Puerta	1,49		2,18		-1 -	3,25
	Lado B	5,36		3,00		1	16,08
	Lado C	0,34		3,00		1	1,02
	Lado D	0,3		3,00		1	0,90
	Lado E	3,95		3,00		1	11,85
	Lado F	0,32		3,00		2	1,92
	Lado G	0,53		3,00		1	1,59
	Lado H	0,4		3,00		1	1,20
	Lado I	6,1		3,00		1	18,30
Consultorio medicina 1	Lado A	8,03		3,00		1	24,09
	Puerta	1,94		2,16		-1 -	4,19
	Lado B	3,41		3,00		1	10,23
	Lado C	0,32		3,00		1	0,96
	Lado D	0,4		3,00		1	1,20
	Lado E	1		3,00		1	3,00
	Lado F	0,29		3,00		1	0,87
	Lado G	5,19		3,00		1	15,57
	Ventana	4,82		2,70			-
	Lado H	0,29		3,00		1	0,87
	Lado I	0,98		3,00		1	2,94
	Lado J	0,33		3,00		1	0,99
	Lado K	0,4		3,00		1	1,20
	Lado L	3,5		3,00		1	10,50
U. Sant H	Lado A	0,95		1,06		1	1,01
	Puerta	0,95		0,20		-1 -	0,19
	Lado B	1,50		1,06		1	1,59
	Lado C	1,24		1,06		1	1,31
	Lado D	1,5		1,06		1	1,59
					CANTIDAD PROYECTADA		144,62
					Viene		103,53
					Total		248,15

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:	ROSSY ELENA NIÑO GÓMEZ	APROBÓ:	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL	
CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPICO INGENIERIA S.A.S	

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E


DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	UBICACIÓN	SAN JOSE DEL BUBUY
		FECHA	25/05/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	6	MUROS Y ACABADOS	ÍTEM	6.4	Pintura acrilica alta asepsia para interiores sobre muros 3 manos	UND	m²	CANT.	

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA

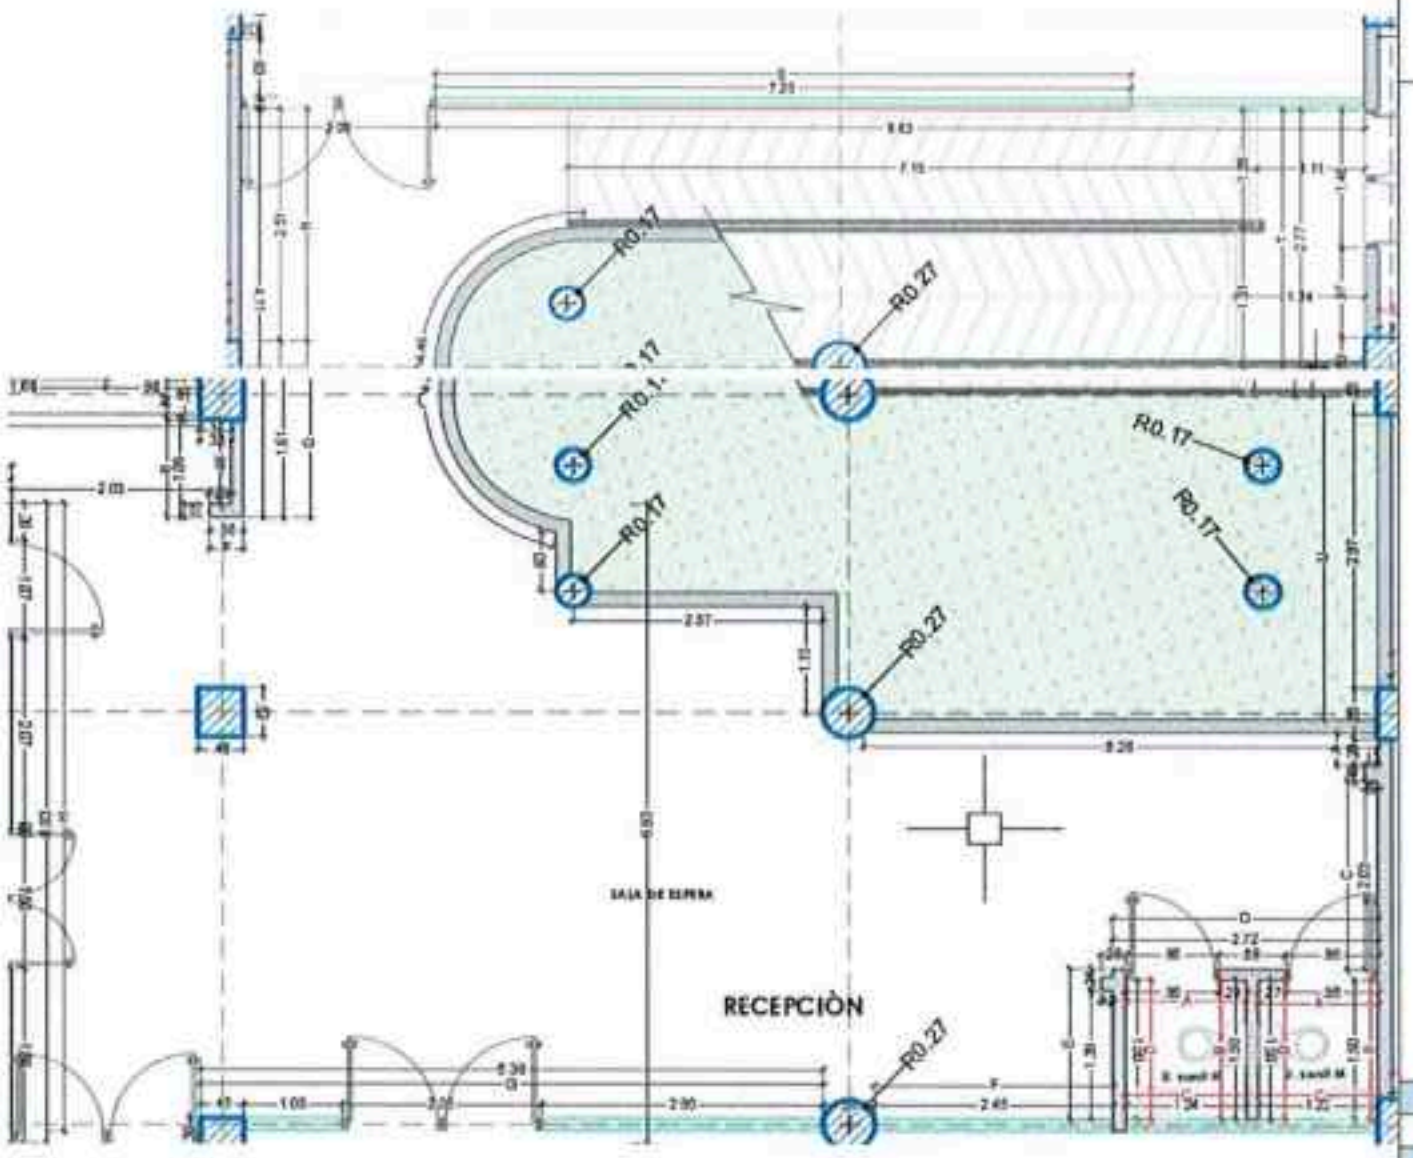

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	Cantidad	CANT.	CANT. TOTAL
U. Sant H	Lado A		1,22	1,06		1,00	1,29
	Puerta		0,95	0,20	-	1,00	-0,19
	Lado B		1,50	1,06		1,00	1,59
	Lado C		1,22	1,06		1,00	1,29
	Lado B		1,50	1,06		1,00	1,59
Pasillo y sala de espera	Lado A		0,28	3,00		1,00	0,84
	Columna		0,18	3,00		1,00	0,54
	Lado B		0,13	3,00		2,00	0,78
	Lado C		2,03	3,00		1,00	6,09
	Lado D		2,72	3,00		1,00	8,16
	Puerta U. Sanit M		0,94	2,18	-	1,00	-2,05
	Puerta U. Sanit H		0,94	2,18	-	1,00	-2,05
	Lado E		1,39	3,00		1,00	4,17
	Columna		0,12	3,00		2,00	0,72
	Lado F		2,45	0,17		1,00	0,42
	Lado G		6,36	0,17		1,00	1,08
	Puerta principal		1,97	2,18	-	1,00	-4,29
	Lado H		6,93	3,00		1,00	20,79
	Puerta Odontologia		1,50	2,18	-	1,00	-3,27
	Puerta PMR		1,12	2,18	-	1,00	-2,44
	Columna C2		0,53	3,00		2,00	3,18
	Columna C2		0,46	3,00		2,00	2,88
	Lado I		6,36	3,00		1,00	19,08
	Puerta Sant Mixto		0,94	2,18	-	1,00	-2,05
	Lado J		0,91	3,00		1,00	2,73
	Columna		0,41	3,00		1,00	1,23
	Lado K		0,42	3,00		1,00	1,26
	Lado L		8,05	3,00		1,00	24,15
	Puerta compresor		0,97	2,18	-	1,00	-2,11
	Puerta Aseo		0,95	2,18	-	1,00	-2,07
	Puerta Residuos		0,98	2,17	-	1,00	-2,13
	Lado M		0,55	3,00		1,00	1,65
	Lado N		0,33	3,00		1,00	0,99
	Muro		0,23	3,00		1,00	0,70
	Lado O		1,06	3,00		1,00	3,18
						CANTIDAD PROYECTADA	87,73
						Viene	248,15
						Total	335,88

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:	ROSSY ELENA NIÑO GÓMEZ	APROBÓ:	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
	RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL
	CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPICO INGENIERIA S.A.S

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E

DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	UBICACIÓN	SAN JOSE DEL BUBUY		
		FECHA	25/05/2026		
		ACTA No	Recibo y liquidación		

CAPÍTULO	6	MUROS Y ACABADOS	ÍTEM	6,4	Pintura acrílica alta asepsia para interiores sobre muros 3 manos	UND	m²	CANT.	

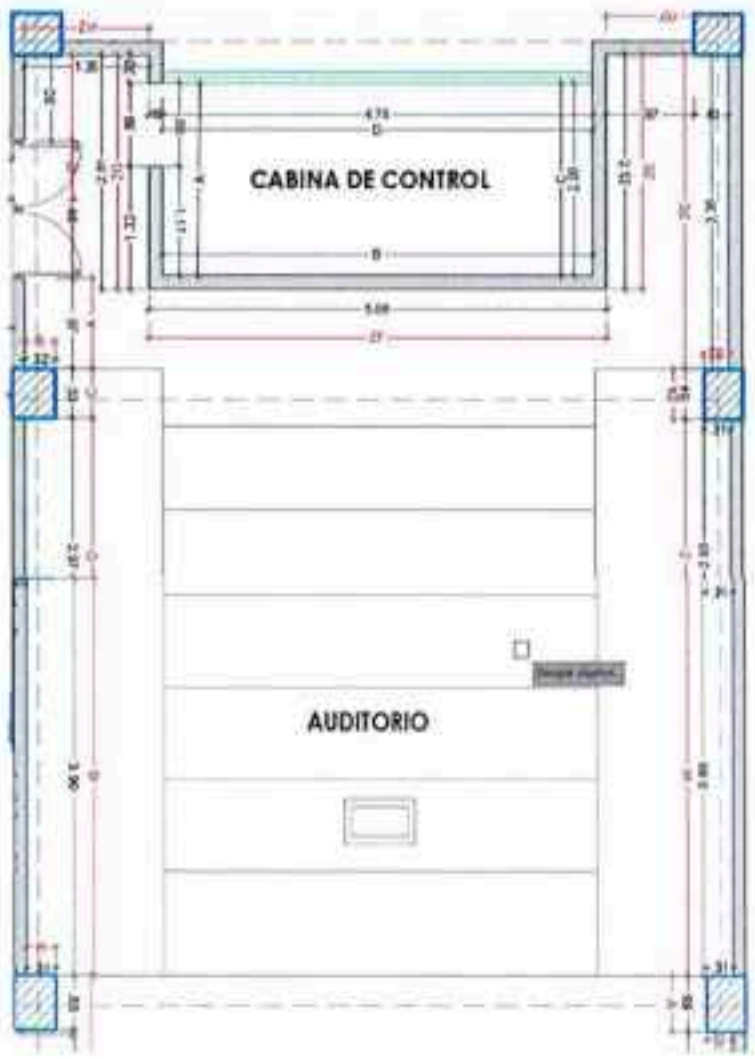




ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA	LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES					CANT. TOTAL
			LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	Área (m2)	CANT.	
	Pasillo 01 y sala de espera	Lado P		0,36	3,00		1,00	1,08
		Lado Q		1,61	3,00		1,00	4,83
		Lado R		2,51	6,00		1,00	15,06
		Lado S Área 1 (0,71*1,43=1,02)				1,02	1,00	1,02
		Lado S Área 2 (5,73*0,71)/2=2,03				2,03	1,00	2,03
		Lado T		2,77	6,95		1,00	19,25
		Puerta auditorio		1,48	2,18		- 1,00	-3,23
		Lado U		2,97	2,50		1,00	7,43
		Columna redonda r=0,17 (Soporte escalera D4) $P= 2\pi r$	1,07		2,25		2,00	4,81
		Columna redonda r=0,17 (Soporte escalera D2) $P= 2\pi r$	1,07		1,30		3,00	4,17
		Columna redonda r=0,27 D3 $P= 2\pi r$	1,70		3,00		2,00	10,18
	Consultorio medicina 2	Lado A		4,48	2,90		1,00	12,99
		Lado B		3,44	2,90		1,00	9,98
		Ventana		1,20	2,40		- 1,00	-2,88
		Lado C		2,82	2,90		1,00	8,18
		Lado D		0,42	2,90		1,00	1,22
		Lado E		0,43	2,90		1,00	1,25
		Lado F		0,35	2,90		1,00	1,02
		Lado G		1,38	2,90		1,00	4,00
		Lado H		3,37	2,90		1,00	9,77
		Puerta Medicina 2		1,20	2,10		- 1,00	-2,52

CANTIDAD PROYECTADA	109,64
Viene	335,88
Total	445,52

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:	ROSSY ELENA NIÑO GOMEZ	APROBÓ:	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL	
CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPICO INGENIERIA S.A.S	

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E


DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	UBICACIÓN	SAN JOSE DEL BUBUY
		FECHA	25/05/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	6	MUROS Y ACABADOS	ÍTEM	6.4	Pintura acrilica alta asepsia para interiores sobre muros 3 manos	UND	m²	CANT.	

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA

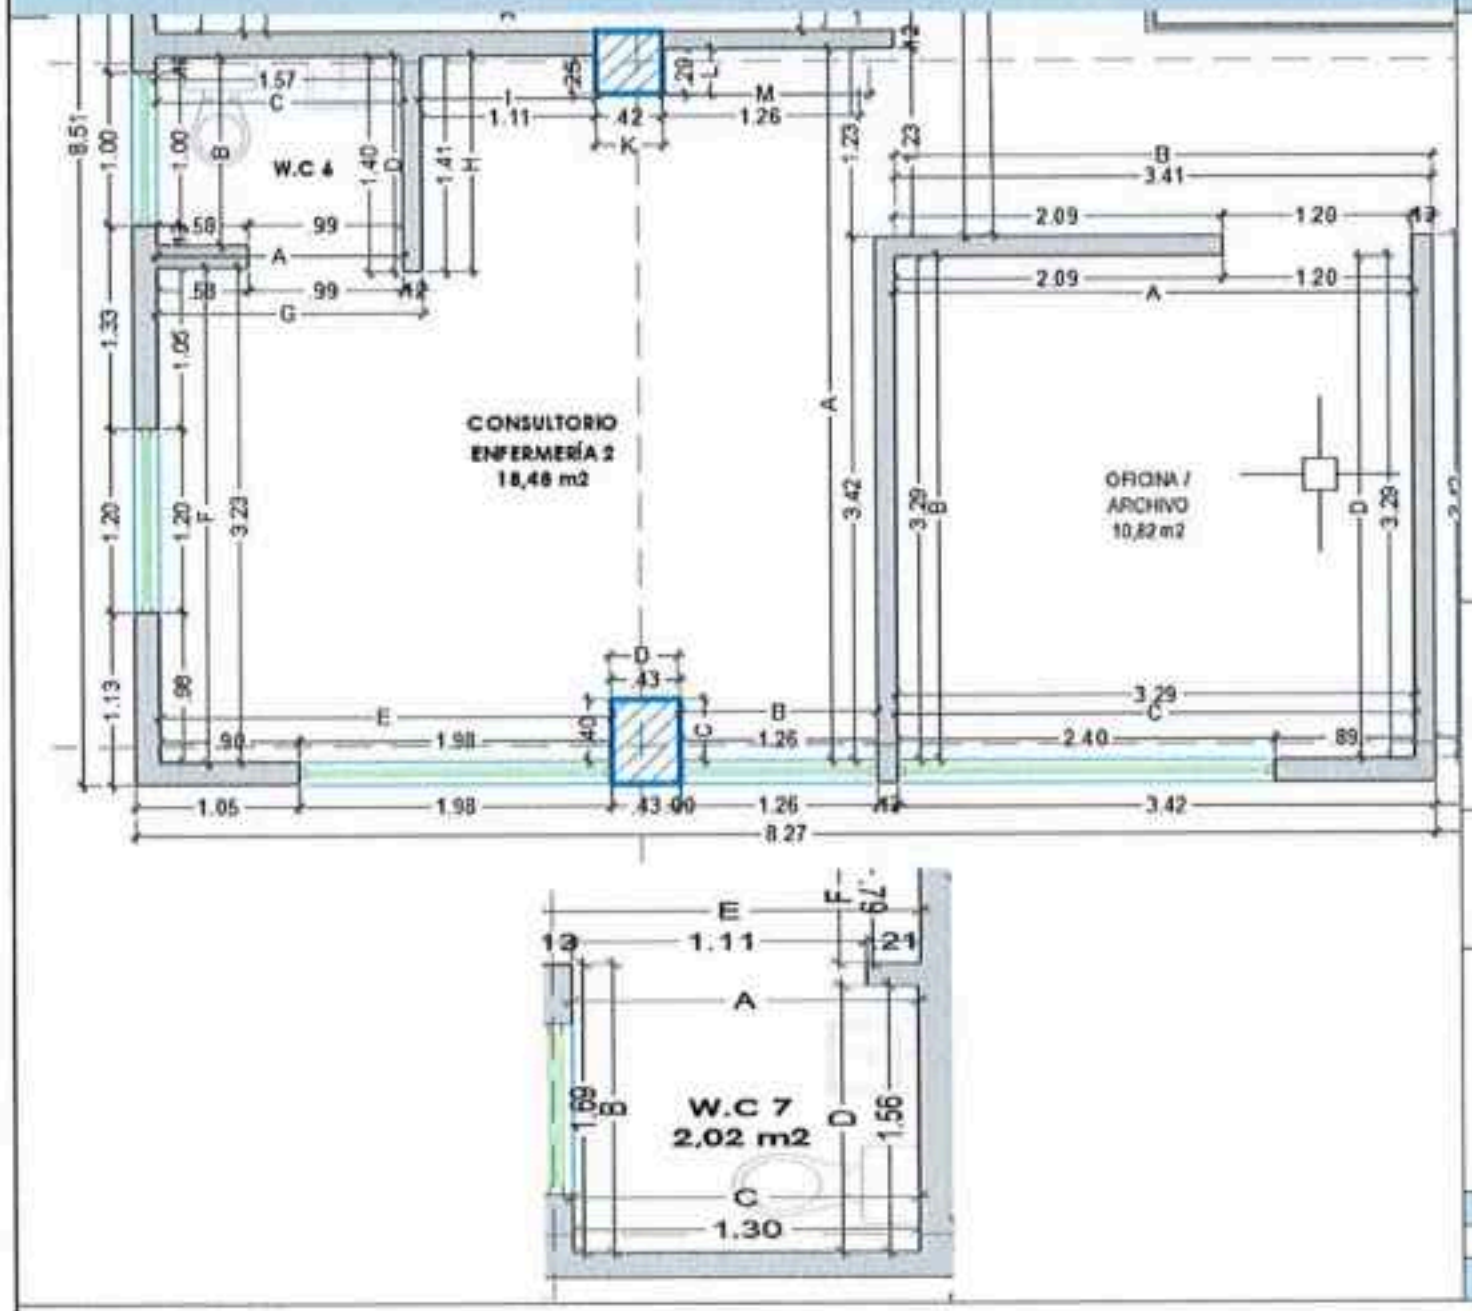

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	Área (m2)	CANT.	CANT. TOTAL
Consultorio enfermeria 2	Lado A		4,65	2,90		1,00	13,49
	Puerta enfermeria		1,23	2,21	-	1,00 -	2,72
	Lado B		1,26	2,90		1,00	3,65
	Lado C		0,40	2,90		2,00	2,32
	Lado D		0,43	2,90		1,00	1,25
	Lado E		2,88	2,90		1,00	8,35
	Ventana		1,98	2,40	-	1,00 -	4,75
	Lado F		3,23	2,90		1,00	9,37
	Ventana		1,20	2,40	-	1,00 -	2,88
	Lado G		1,57	2,90		1,00	4,55
	Puerta Baño		0,99	2,20	-	1,00 -	2,18
	Lado H		1,41	2,90		1,00	4,09
	Lado I		1,11	2,90		1,00	3,22
	Lado J		0,25	2,90		1,00	0,73
	Lado K		0,42	2,90		1,00	1,22
	Lado L		0,29	2,90		1,00	0,84
	Lado M		1,26	2,90		1,00	3,65
W.C 6	Lado A		1,57	0,97		1,00	1,52
	Puerta		0,99	0,20	-	1,00 -	0,20
	Lado B		1,23	0,97		1,00	1,19
	Ventana		1,00	0,74	-	1,00 -	0,74
	Lado C		1,57	0,97		1,00	1,52
	Lado D		1,40	0,97		1,00	1,36
Archivo/ Oficina	Lado A		3,29	2,90		1,00	9,54
	Puerta		1,20	2,20	-	1,00 -	2,64
	Lado B		3,29	2,90		1,00	9,54
	Lado C		3,29	2,90		1,00	9,54
W.C.7	Lado A		1,32	1,10		1,00	1,45
	Puerta		1,11	0,38	-	1,00 -	0,42
	Lado B		1,69	1,10		1,00	1,86
	Vano		1,00	0,48	-	1,00 -	0,48
	Lado C		1,30	1,10		1,00	1,43
	Lado D		1,56	1,10		1,00	1,72
	Vano		0,70	0,48	-	1,00 -	0,34
						CANTIDAD PROYECTADA	80,05
						Viene	445,52
						Total	525,57

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	ROSSY ELENA NIÑO GÓMEZ	APROBÓ	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL	
CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPICO INGENIERIA S.A.S	

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E


DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	UBICACIÓN	SAN JOSE DEL BUBUY
		FECHA	25/05/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	6	MUROS Y ACABADOS	ÍTEM	6.4	Pintura acrilica alta asepsia para interiores sobre muros 3 manos	UND	m²	CANT.	

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA

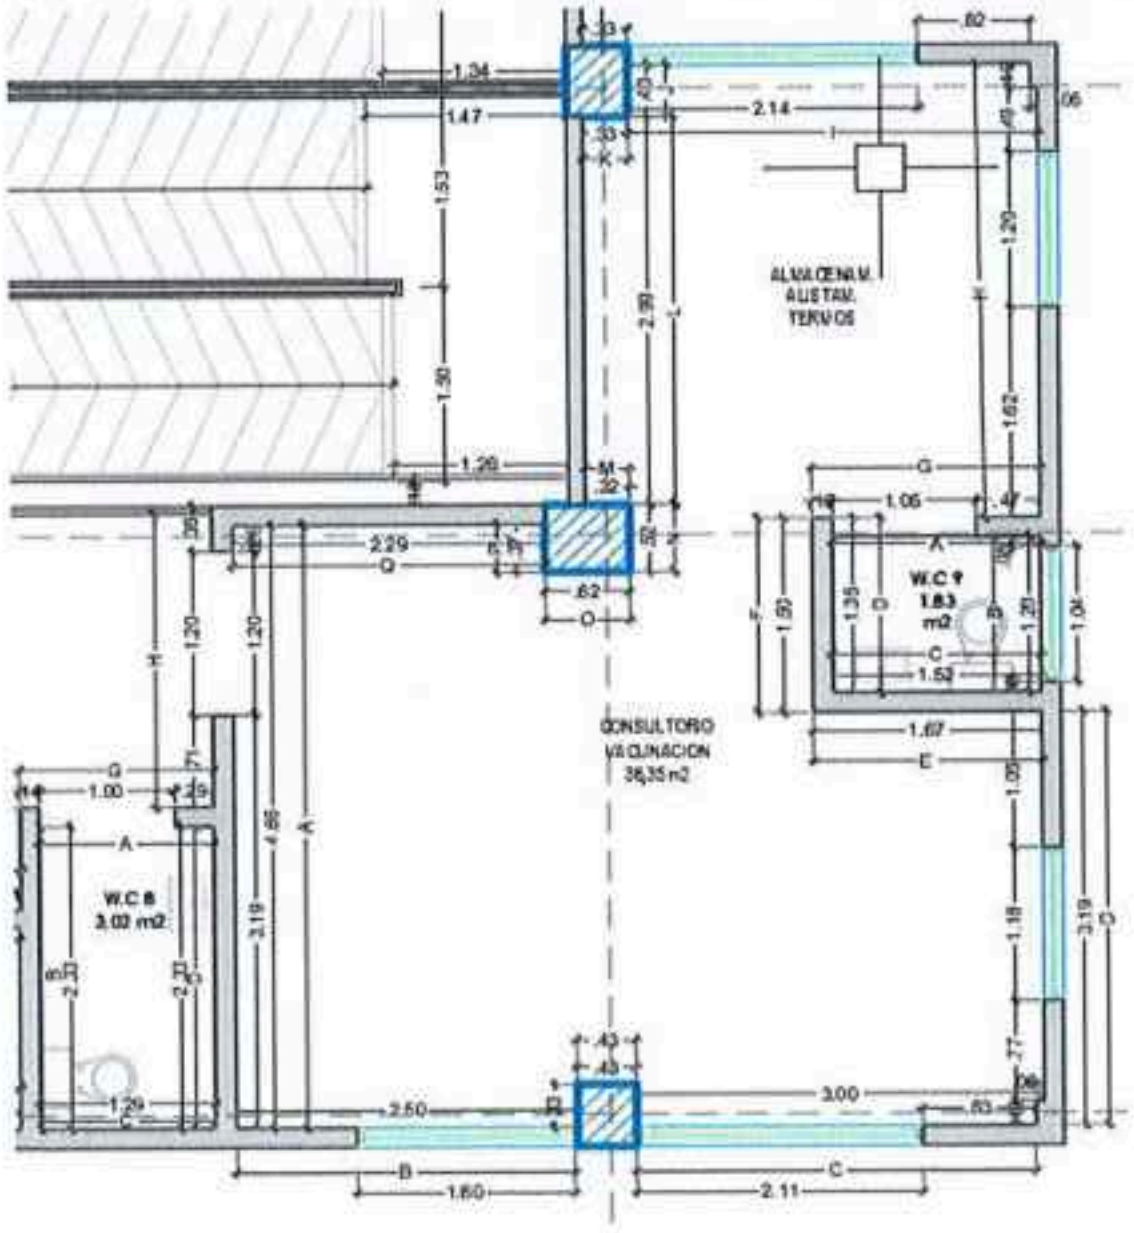

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	Área (m2)	CANT.	CANT. TOTAL
W.C 8	Lado A	1,29		1,10		1,00	1,42
	Puerta Baño	1,00		0,38	-	1,00 -	0,38
	Lado B	2,33		1,10		1,00	2,56
	Vano	0,70		0,48	-	1,00 -	0,34
	Lado C	1,29		1,00		1,00	1,29
	Ventana	2,40		1,00	-	1,00 -	2,40
	Lado D	2,33		1,00		1,00	2,33
Consultorio Vacunación	Lado A	4,65		2,90		1,00	13,49
	Puerta	1,20		2,20	-	1,00 -	2,64
	Lado B	2,50		2,90		1,00	7,25
	Ventana	1,60		2,37	-	1,00 -	3,79
	Columna B4	0,33		2,90		2,00	1,91
	Columna B4	0,43		2,90		1,00	1,25
	Lado C	3,00		2,90		1,00	8,70
	Ventana	2,11		2,36	-	1,00 -	4,98
	Lado D	3,19		2,90		1,00	9,25
	Ventana	1,18		2,40	-	1,00 -	2,83
	Lado E	1,67		2,90		1,00	4,84
	Lado F	1,50		2,90		1,00	4,35
	Lado G	1,67		2,90		1,00	4,84
	Lado H	3,50		2,90		1,00	10,15
	Ventana	1,20		2,40	-	1,00 -	2,88
	Lado I	2,96		2,90		1,00	8,58
	Ventana	2,14		2,40	-	1,00 -	5,14
	Lado J	0,40		2,90		1,00	1,16
	Lado K	0,33		2,90		1,00	0,96
	Lado L	2,99		2,90		1,00	8,67
	Lado M	0,32		2,90		1,00	0,93
	Lado N	0,52		2,90		1,00	1,51
	Lado O	0,62		2,90		1,00	1,80
	Lado P	0,37		2,90		1,00	1,07
	Lado Q	2,29		2,90		1,00	6,64
Pintura en muros exteriores	Lado A	4,88		2,90		1,00	14,15
	Puerta Medicina	1,23		2,20	-	1,00 -	2,71
	Puerta enfermeria	1,23		2,21		1,00	2,72
	Lado B	3,41		2,90		1,00	9,89
	Puerta Archivo	1,20		2,20	-	1,00 -	2,64
						CANTIDAD PROYECTADA	100,99
						Viene	525,67
						Total	626,66

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	ROSSY ELENA NIÑO GÓMEZ	APROBÓ	OMAR AGOSTO NEIRA SIERRA
	RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL
	CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPICO INGENIERIA S.A.S

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E


DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	UBICACIÓN	SAN JOSE DEL BUBUY
		FECHA	25/05/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	6	MUROS Y ACABADOS	ÍTEM	6.4	Pintura acrílica alta asepsia para interiores sobre muros 3 manos	UND	m²	CANT.	674,16

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA

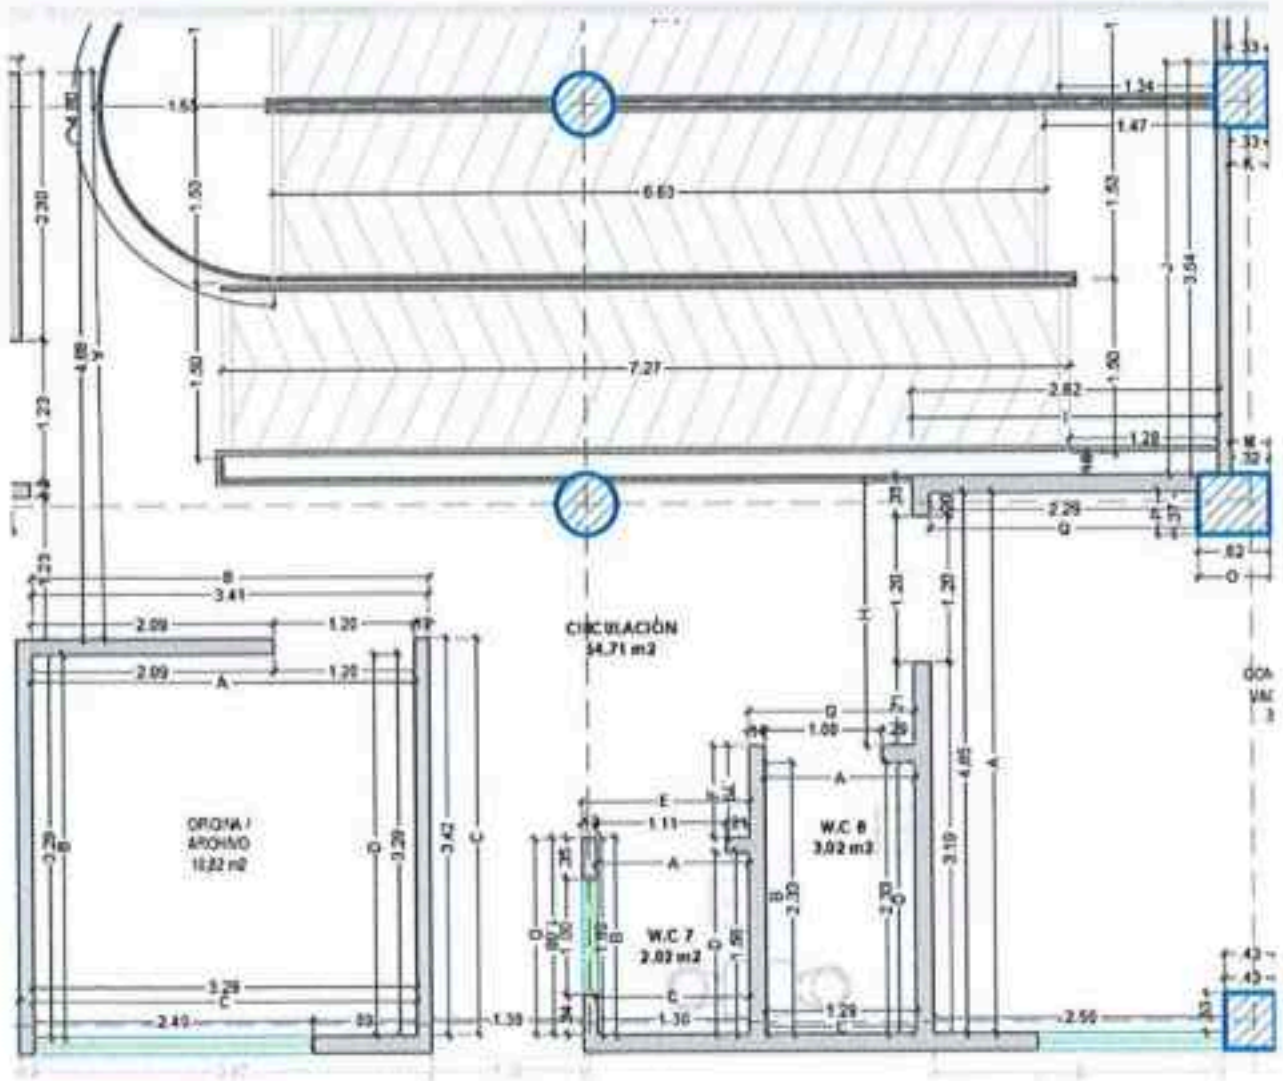

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES					CANT. TOTAL
		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	Área (m2)	CANT.	
Pintura en muros exteriores	Lado C		3,41	2,90		1,00	9,89
	Puerta Oficina		1,20	2,20	-	1,00 -	2,64
	Lado D		1,68	2,90		1,00	4,87
	Ventana		1,00	2,90	-	1,00 -	2,90
	Lado E		1,45	2,90		1,00	4,21
	Puerta W.C 7		1,11	2,90	-	1,00 -	3,22
	Lado F		0,79	2,90		1,00	2,29
	Lado G		1,43	2,90		1,00	4,15
	Puerta W.C. 8		1,00	2,20	-	1,00 -	2,20
	Lado H		2,26	2,90		1,00	6,55
	Puerta consultorio vacunación		1,20	2,20	-	1,00 -	2,64
	Columna redonda C3 r=0,27 P= 2πr			2,90	1,70	1,00	4,92
	Lado I P= 2πr		2,62	3,30		1,00	8,65
	Lado J		3,54	3,90		1,00	13,81
	Puerta ingreso auditorio		1,48	2,18	-	1,00 -	3,23
W.C 9 Consultorio de vacunación	Lado A		1,52	1,00		1,00	1,52
	Puerta W.C 9		1,05	0,38		1,00	0,40
	Lado B		1,20	1,00		1,00	1,20
	Ventana		1,04	0,86	-	1,00 -	0,89
	Lado C		1,52	1,00		1,00	1,52
	Lado D		1,35	1,00		1,00	1,35

CANTIDAD PROYECTADA	47,60
Viene	626,56
Total	674,16
Cantidad contractual	726,34
Diferencia	-52,18

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:	ROSSY ELENA NIÑO GÓMEZ	APROBÓ:	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
	RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL
	CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPICO INGENIERIA S A S

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E

DEPARTAMENTO DE CASANARE


MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA


OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	UBICACIÓN	SAN JOSE DEL BUBUY
		FECHA	25/05/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	6	MUROS Y ACABADOS	ÍTEM	6.5	Pintura exterior acrilica tipo koraza o similar sobre muros 3 manos	UND	m²	CANT.	

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA



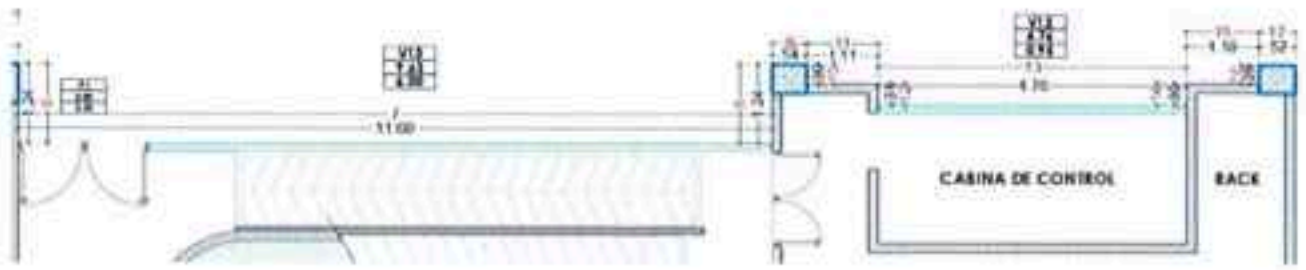

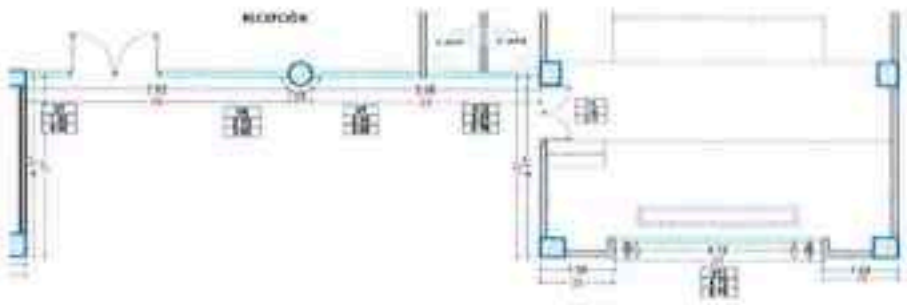

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	Cantidad	CANT.	CANT. TOTAL
MUROS PRIMER PISO						
L1	1,54		3,30		1,00	5,08
L2	0,32		3,30		1,00	1,06
L3	6,22		3,30		1,00	20,53
DESCUENTO VENTANA V1	6,22		2,65		-1,00	-16,48
L4	0,34		3,30		1,00	1,12
L5	1,47		3,30		1,00	4,85
DESCUENTO PUERTA P2	0,88		2,18		-1,00	-1,92
L6	1,24		3,30		1,00	4,09
L7	11,6		3,30		1,00	38,28
DESCUENTO PUERTA P1	2,00		3,91		-1,00	-7,82
DESCUENTO VENTANA V13	9,63		3,11		-1,00	-29,95
L8	1,24		3,30		1,00	4,09
L9	0,54		3,30		1,00	1,78
L10	0,3		3,30		1,00	0,99
L11	1,11		3,30		1,00	3,66
L12	0,31		3,30		1,00	1,02
L13	4,76		3,30		1,00	15,71
DESCUENTO VENTANA V12	4,76		0,95		-1,00	-4,52
L14	0,30		3,30		1,00	0,99
L15	1,10		3,30		1,00	3,63
L16	0,29		3,30		1,00	0,96
L17	0,52		3,30		1,00	1,72
L18	1,64		3,30		1,00	5,41
L19	0,29		3,30		1,00	0,96
L20	4,72		3,30		1,00	15,58
DESCUENTO VENTANA V11	4,72		0,95		1,00	4,48
L21	0,30		3,30		1,00	0,99
L22	1,66		3,30		1,00	5,48
L23	4,17		3,30		1,00	13,76
DESCUENTO PUERTA P15	1,30		2,19		-1,00	-2,85
L24	5,08		3,30		1,00	16,76
					Cantidad Proyectada	109,44

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	ROSSY ELENA NIÑO GÓMEZ	APROBÓ	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
	RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL
	CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPCO INGENIERIA S.A.S

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E


DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA


OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	UBICACIÓN	SAN JOSE DEL BUBUY
		FECHA	25/05/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	6	MUROS Y ACABADOS	ÍTEM	6.5	Pintura exterior acrilica tipo koraza o similar sobre muros 3 manos	UND	m²	CANT.	

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA

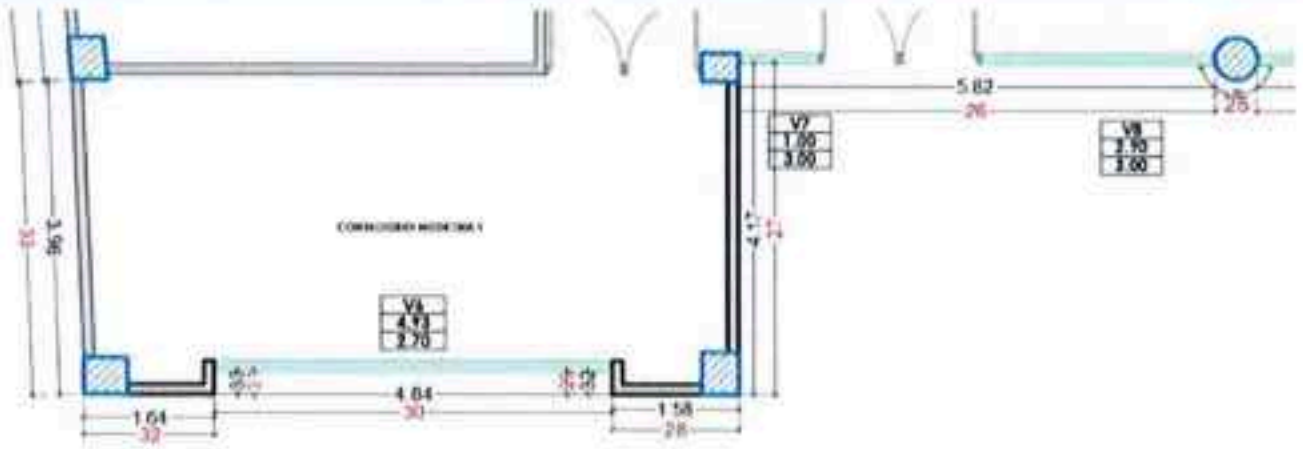

Entre piso

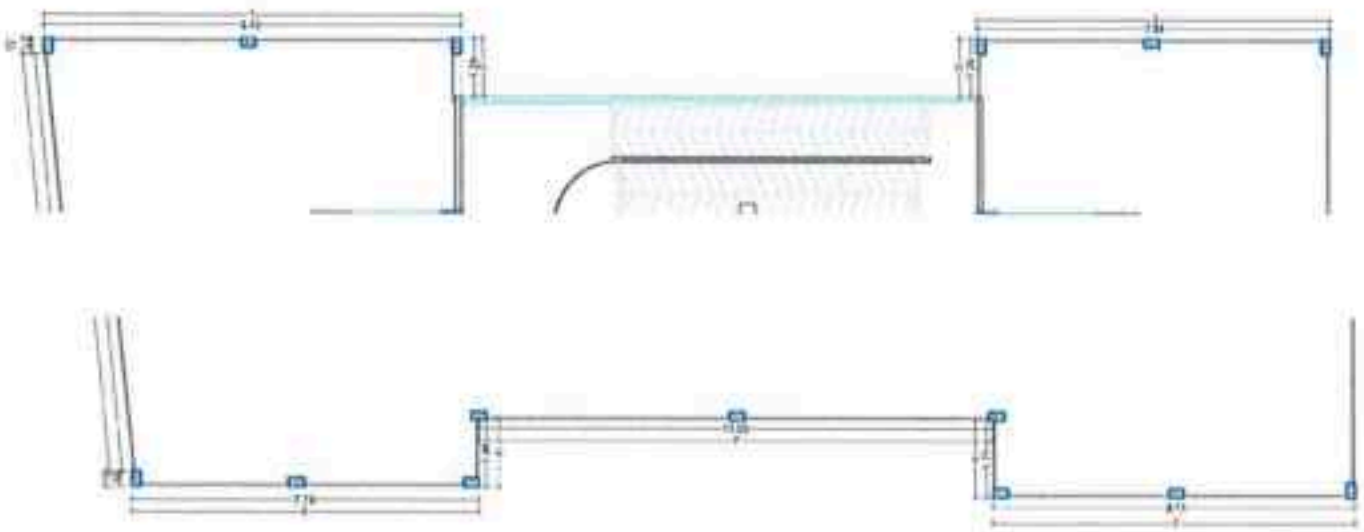

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					CANT. TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	Cantidad	CANT.	
DESCUENTO VENTANA V10	2,59		0,98		-1,00	-2,54
DESCUENTO VENTANA V9	2,49		3,00		-1,00	-7,47
L25	0,7		3,30		1,00	2,31
L26	5,82		3,30		1,00	19,21
DESCUENTO VENTANA V8	2,90		3,00		-1,00	-8,70
DESCUENTO VENTANA V7	1,00		3,00		-1,00	-3,00
DESCUENTO PUERTA P15	2,00		3,30		-1,00	-6,60
L27	4,17		3,30		1,00	13,76
L28	1,58		3,30		1,00	5,21
L29	0,32		3,30		1,00	1,06
L30	4,84		3,30		1,00	15,97
DESCUENTO VENTANA V6	4,93		2,70		-1,00	-13,31
L31	0,33		3,30		1,00	1,09
L32	1,64		3,30		1,00	5,41
L33	3,96		3,30		1,00	13,07
L34	7,94		3,30		1,00	26,20
DESCUENTO SUBESTACION ELECTRICA 1	6,50		2,53		-1,00	-16,45
DESCUENTO SUBESTACION ELECTRICA 2	1,20		1,50		-1,00	-1,80
L35	0,55		3,30		1,00	1,82
L36	3,38		3,30		1,00	11,15
L37	0,43		3,30		1,00	1,42
	ENTRE PISO					
L1	9,40		0,75		1,00	7,05
L2	1,29		0,75		1,00	0,97
L3	1,29		0,75		1,00	0,97
L4	7,94		0,75		1,00	5,96
L5	8,11		0,75		1,00	6,08
L6	1,71		0,75		1,00	1,28
L7	11,59		0,75		1,00	8,69
L8	1,48		0,75		1,00	1,11
L9	7,79		0,75		1,00	5,84
L10	0,33		0,75		1,00	0,25
L11	15,68		0,75		1,00	11,76
L12	0,33		0,75		1,00	0,25
					Cantidad Proyectada	**108,02**
					Cantidad contractual	109,44
					Diferencia	217,46

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:	ROSSY ELENA NIÑO GÓMEZ	APROBÓ:	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
	RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL
	CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPICO INGENIERIA S.A.S


HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E

DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE				UBICACIÓN	SAN JOSE DEL BUBUY			
					FECHA	25/05/2026			
					ACTA No	Recibo y liquidación			
CAPÍTULO	6	MUROS Y ACABADOS	ÍTEM	6.5	Pintura exterior acrilica tipo koraza o similar sobre muros 3 manos	UND	m²	CANT.	349,39

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA

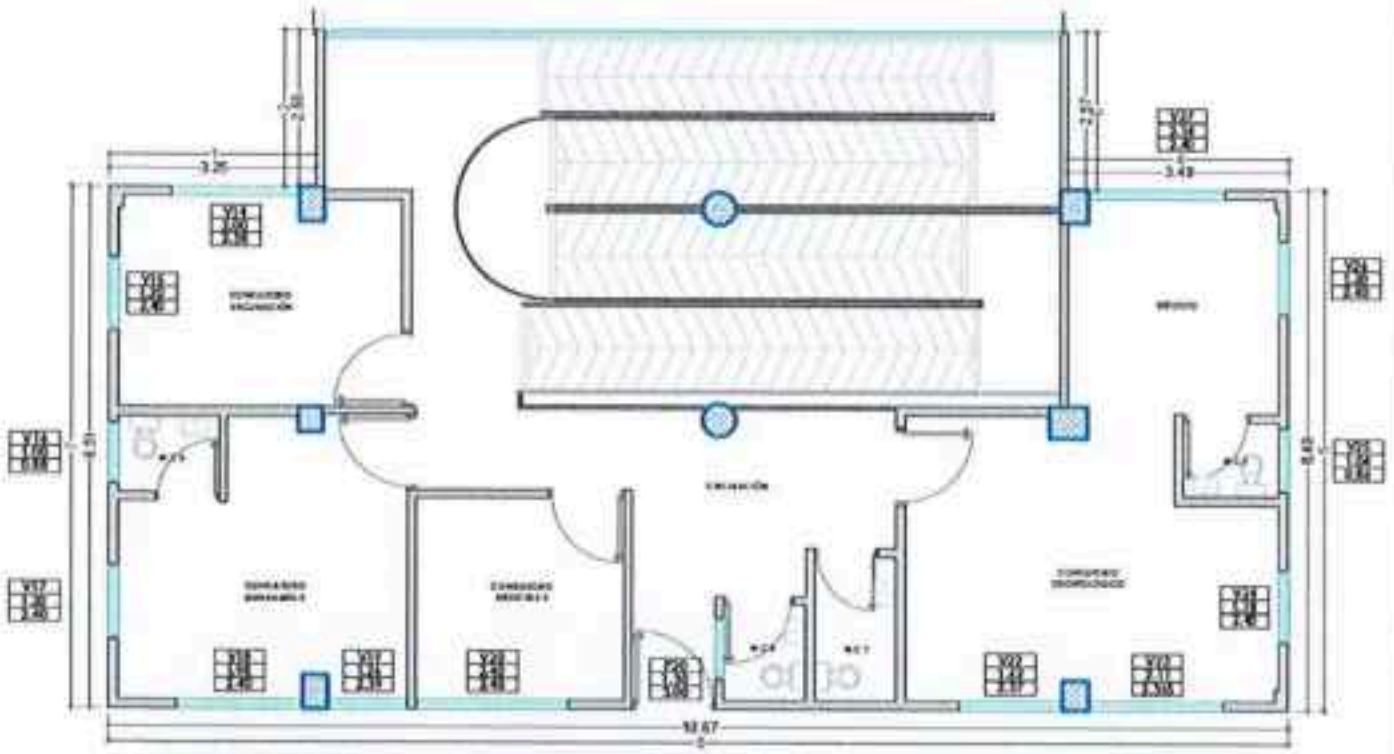





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					CANT. TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	Cantidad	CANT.	
COLUMNAS BALCON						
COLUMNAS BALCON CARA 1	0,33		1,06		21,00	7,35
COLUMNAS BALCON CARA 2	0,19		1,06		21,00	4,23
COLUMNAS BALCON CARA 3	0,33		1,06		21,00	7,35
COLUMNAS BALCON CARA 4	0,19		1,06		21,00	4,23
COLUMNAS BALCON CARA 5	0,33		0,19		21,00	1,32
MUROS SEGUNDO PISO						
L1	3,25		3,30		1,00	10,73
DESCUENTO VENTANA V14	2,00		2,38		-1,00	-4,76
L2	2,55		3,30		1,00	8,42
L3	2,57		3,30		1,00	8,48
L4	3,49		3,30		1,00	11,52
DESCUENTO VENTANA V27	2,14		2,40		-1,00	-5,14
L5	8,49		3,30		1,00	28,02
DESCUENTO VENTANA V26	1,20		2,40		-1,00	-2,88
DESCUENTO VENTANA V25	1,04		0,86		-1,00	-0,89
DESCUENTO VENTANA V24	1,18		2,40		-1,00	-2,83
L6	18,67		3,30		1,00	61,61
DESCUENTO VENTANA V23	2,11		2,36		-1,00	-4,98
DESCUENTO VENTANA V22	1,62		2,37		-1,00	-3,84
DESCUENTO PUERTA P20	1,30		3,00		-1,00	-3,90
DESCUENTO VENTANA V20	2,40		2,40		-1,00	-5,76
DESCUENTO VENTANA V19	1,26		2,39		-1,00	-3,01
DESCUENTO VENTANA V18	1,98		2,40		-1,00	-4,75
L7	8,51		3,30		1,00	28,08
DESCUENTO VENTANA V17	1,20		2,40		-1,00	-2,88
DESCUENTO VENTANA V16	1,00		0,88		-1,00	-0,88
DESCUENTO VENTANA V15	1,20		2,40		-1,00	-2,88

CANTIDAD PROYECTA	131,93
VIENE	217,46
TOTAL	349,39
CANTIDAD CONTRACTUAL	387,75
DIFERENCIA	-38,36

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:	ROSSY ELENA NIÑO GOMEZ	APROBÓ:	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
	RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL
	CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPICO INGENIERIA S.A.S


HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E

DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE			UBICACIÓN	SAN JOSE DEL BUBUY		
				FECHA	25/05/2026		
				ACTA No	Recibo y liquidación		
CAPÍTULO 6	MUROS Y ACABADOS	ÍTEM	6.6	Muro en superboard doble cara 10 mm pintado con vinilitex o similar calidad.	UND m2	CANT.	111,24

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA

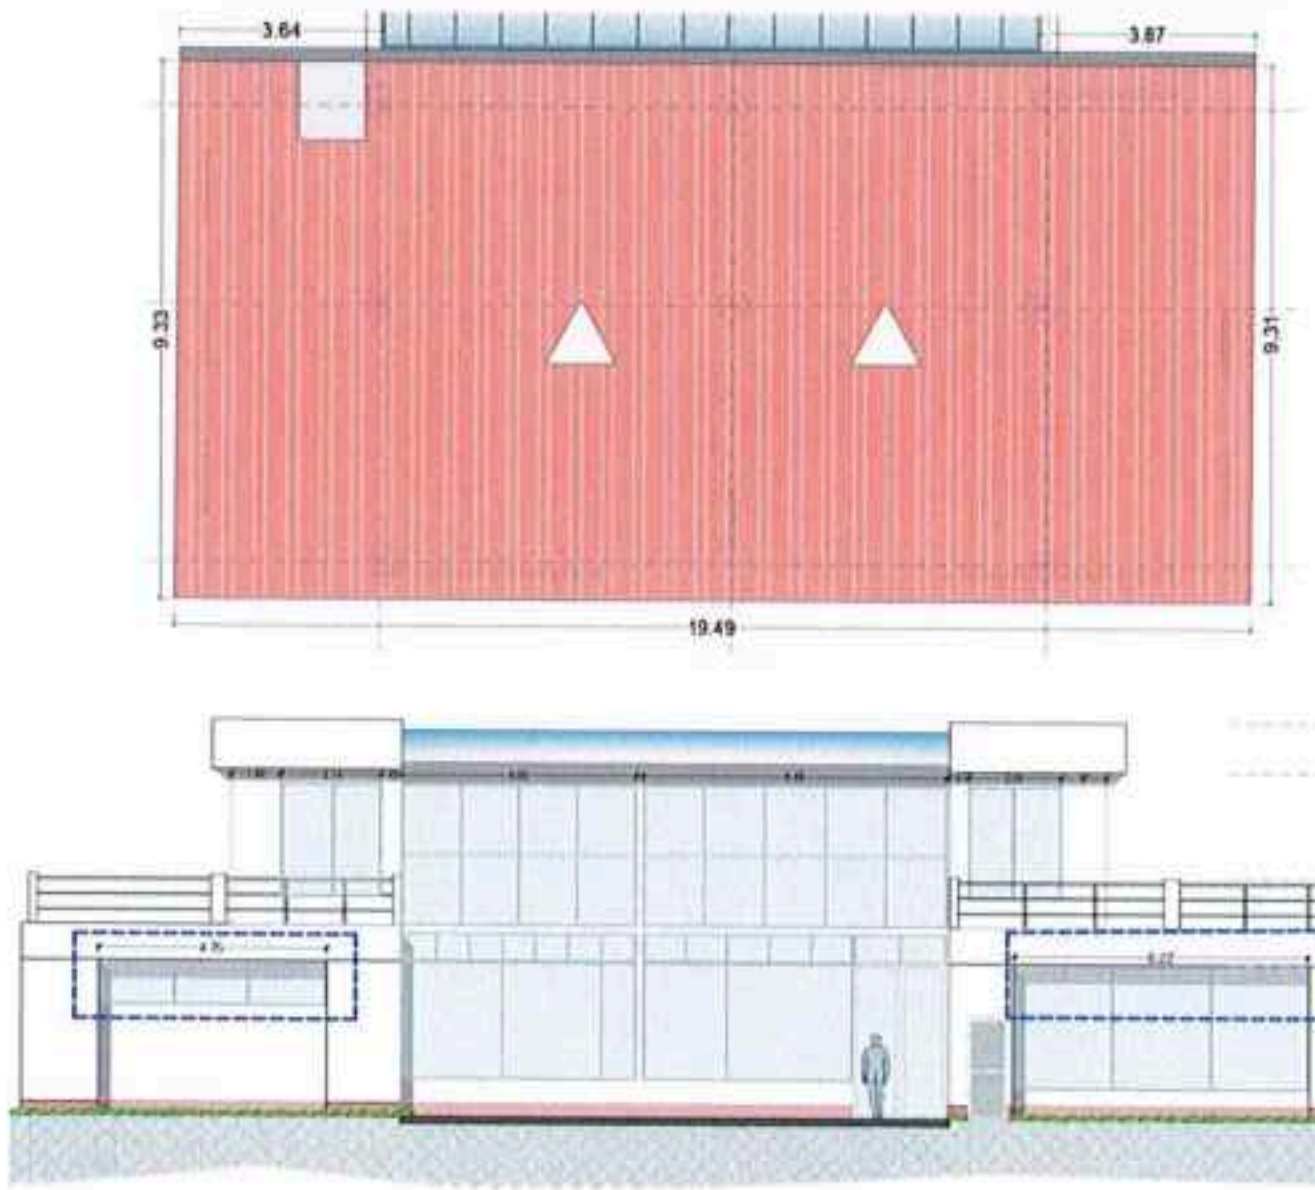

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	ÁREA (M2)	CANT.	CANT. TOTAL
Culata - Cubierta	Culata - vertical	3,64		1,05		1,00	4,69
		9,33		1,05		1,00	10,36
		19,49		1,05		1,00	20,54
		9,31		1,05		1,00	10,36
		3,87		1,05		1,00	4,92
	Culata - horizontal	3,64		0,41		1,00	4,05
		8,51		0,41		1,00	8,92
		19,49		0,41		1,00	19,90
		8,49		0,41		1,00	8,90
		3,87		0,41		1,00	4,28
Ventana exterior (cuarto de aseo y cuarto de residuos)		6,22	0,34			1,00	2,11
Ventana exterior (auditorio)		4,76	0,31			1,00	1,48
Cuarto compresores - Ventana		1,48		1,25		1,00	1,85
Cuarto de aseo - Ventana		1,86		1,25		1,00	2,33
Cuarto residuos - Ventana		1,53		1,25		1,00	1,91
Consultorio de Odontología	V1	1,76		1,25		1,00	2,20
	V2	1,94		1,25		1,00	2,43
							-
							-
							-
							-
							-
							-

CANTIDAD PROYECTADA	111,24
CANTIDAD CONTRACTUAL	81,82
DIFERENCIA	29,42

OBSERVACIONES:


ELABORÓ:	ROSSY ELENA NIÑO GÓMEZ	APROBÓ:	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
	RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL
	CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPICO INGENIERIA S.A.S


HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E


DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE				**UBICACIÓN**	SAN JOSE DEL BUBUY			
					FECHA	25/05/2026			
					ACTA No	Recibo y liquidación			
CAPÍTULO	**6**	**MUROS Y ACABADOS**	**ÍTEM**	**6.6**	**Muro en superboard doble cara 10 mm pintado con viniltex o similar calidad.**	**UND**	**m2**	**CANT.**	**0,00**

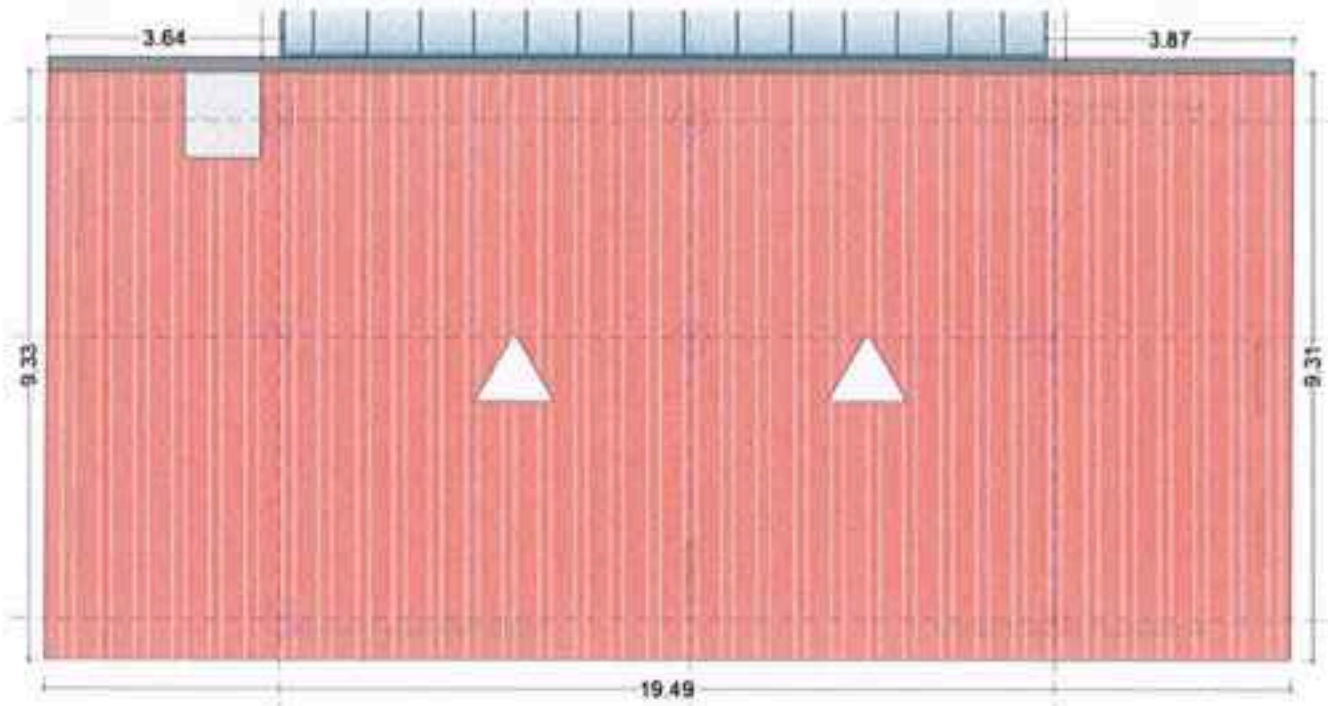

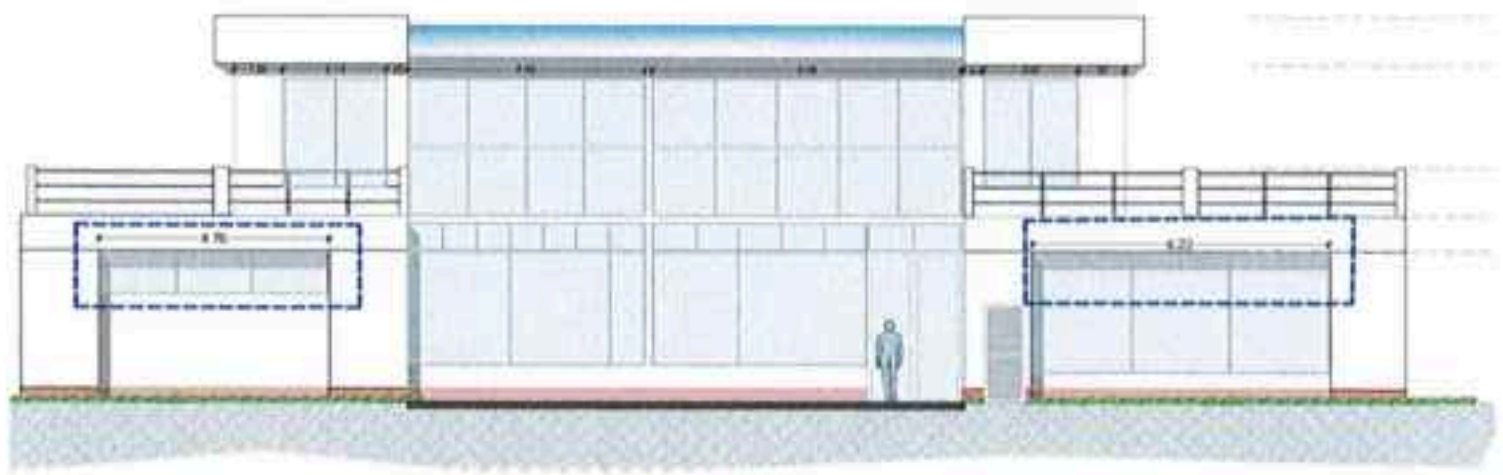

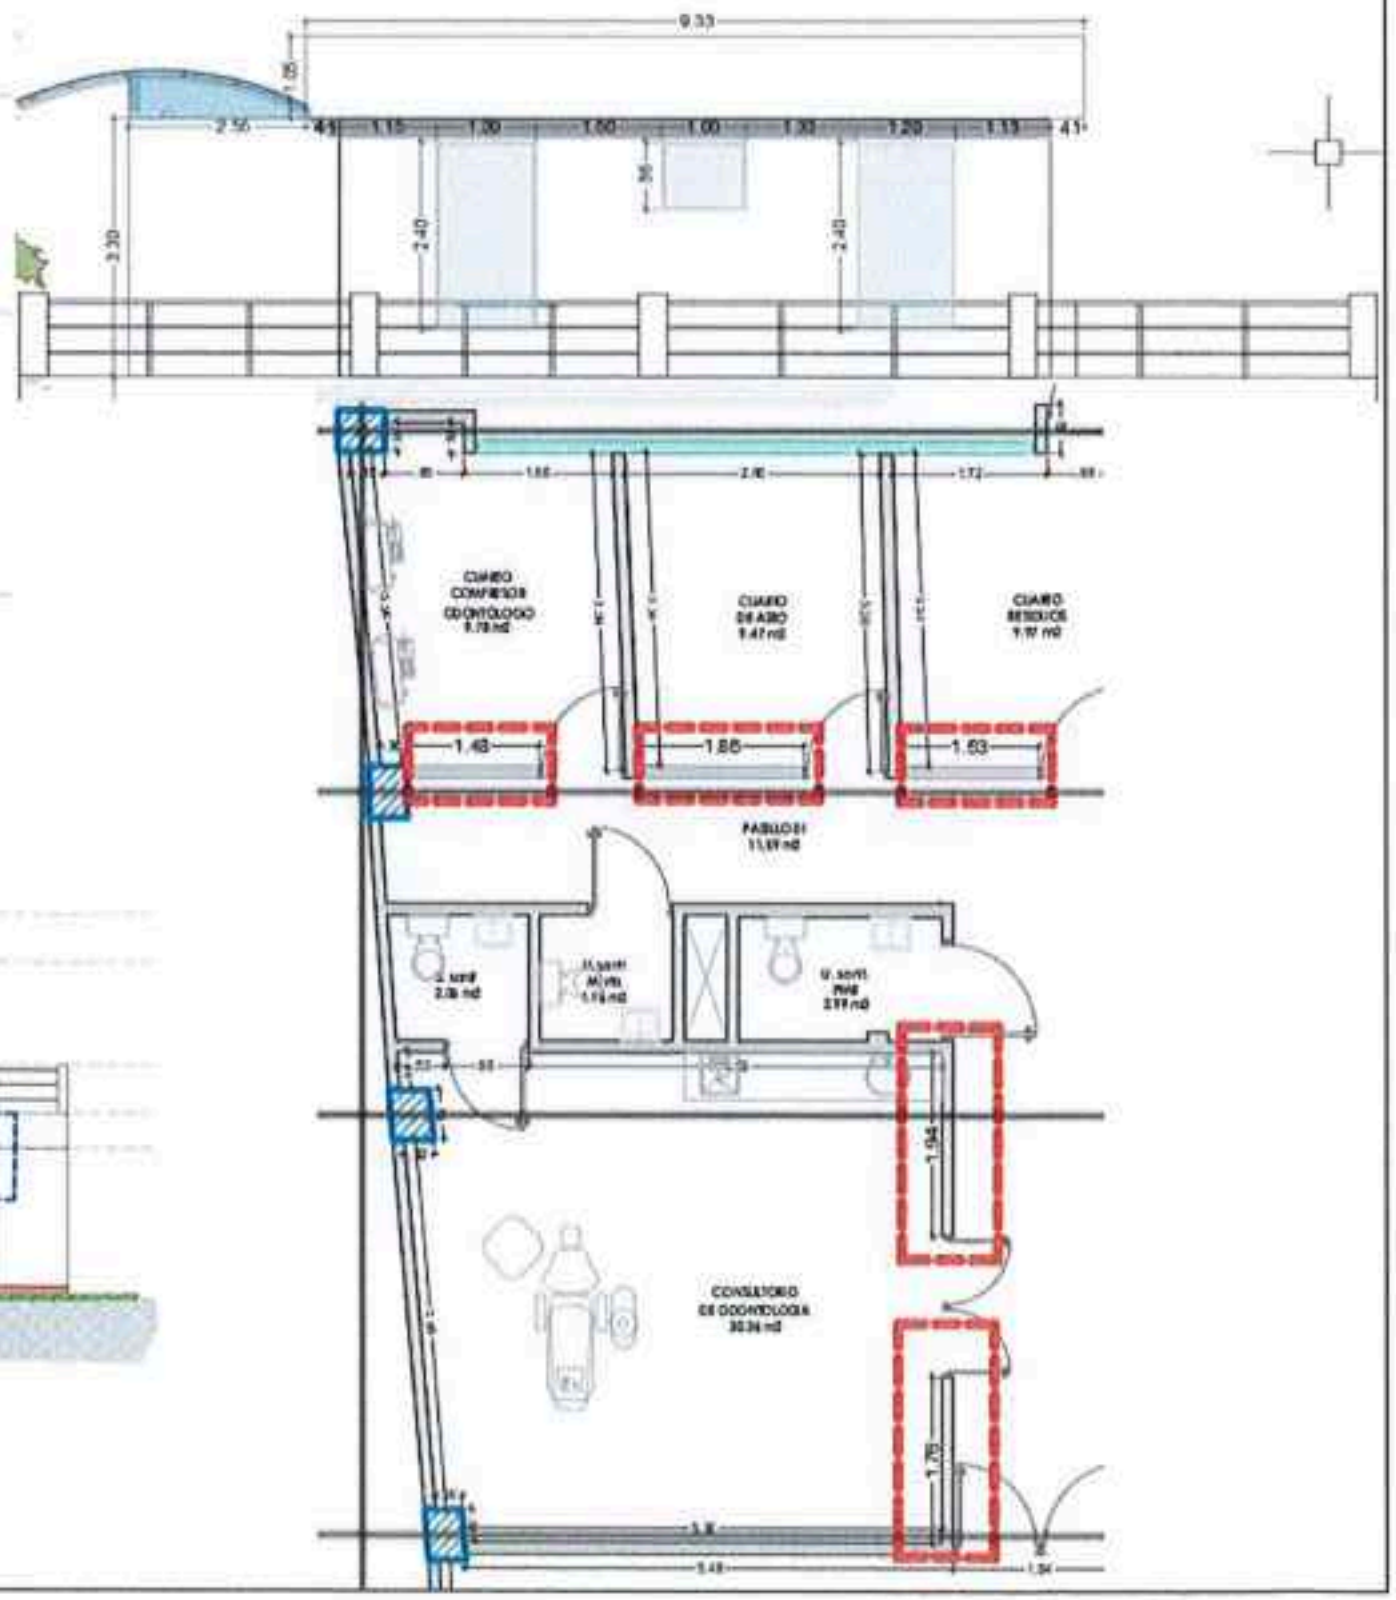

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E

DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	UBICACIÓN	SAN JOSE DEL BUBUY
		FECHA	25/05/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	6	MUROS Y ACABADOS	ÍTEM	6.7	Sellador o recubrimiento acrilico blanco para superficies exteriores	UND	m²	CANT.	

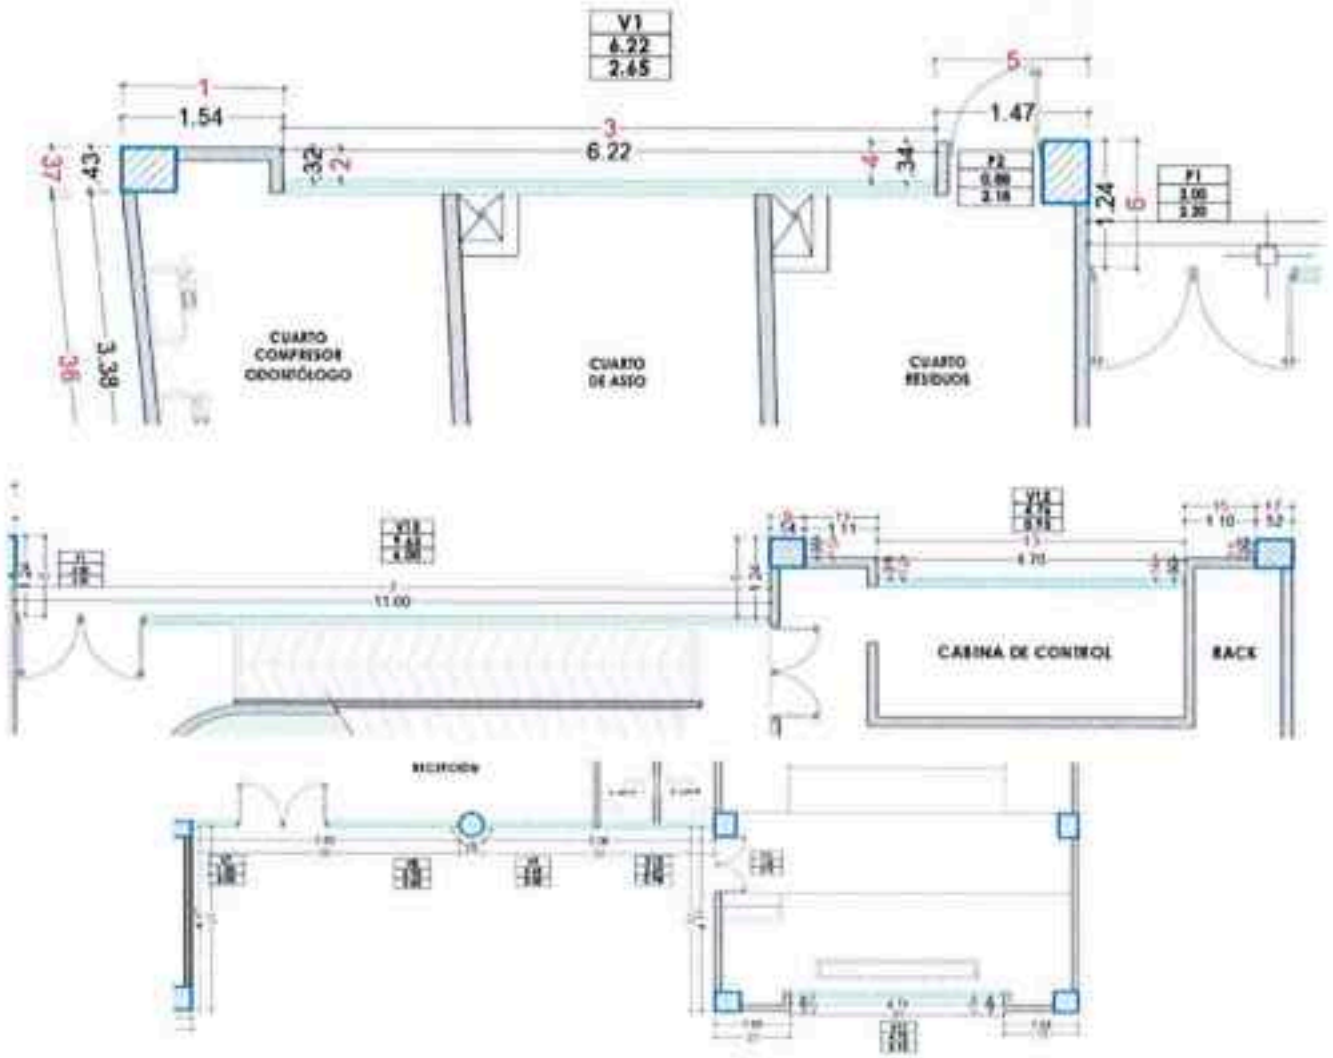


ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					CANT. TOTAL
		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	Cantidad	CANT.	
	MUROS PRIMER PISO						
	L1	1,54		3,30		1,00	5,08
	L2	0,32		3,30		1,00	1,06
	L3	6,22		3,30		1,00	20,53
	DESCUENTO VENTANA V1	6,22		2,65		-1,00	-16,48
	L4	0,34		3,30		1,00	1,12
	L5	1,47		3,30		1,00	4,85
	DESCUENTO PUERTA P2	0,66		2,18		-1,00	-1,92
	L6	1,24		3,30		1,00	4,09
	L7	11,60		3,30		1,00	38,28
	DESCUENTO PUERTA P1	2,00		3,91		-1,00	-7,82
	DESCUENTO VENTANA V13	9,63		3,11		-1,00	-29,95
	L8	1,24		3,30		1,00	4,09
	L9	0,54		3,30		1,00	1,78
	L10	0,3		3,30		1,00	0,99
	L11	1,11		3,30		1,00	3,66
	L12	0,31		3,30		1,00	1,02
	L13	4,76		3,30		1,00	15,71
	DESCUENTO VENTANA V12	4,76		0,95		-1,00	-4,52
	L14	0,30		3,30		1,00	0,99
	L15	1,10		3,30		1,00	3,63
	L16	0,29		3,30		1,00	0,96
	L17	0,52		3,30		1,00	1,72
	L18	1,64		3,30		1,00	5,41
	L19	0,29		3,30		1,00	0,96
	L20	4,72		3,30		1,00	15,58
	DESCUENTO VENTANA V11	4,72		0,95		1,00	4,48
	L21	0,30		3,30		1,00	0,99
	L22	1,66		3,30		1,00	5,48
	L23	4,17		3,30		1,00	13,76
	DESCUENTO PUERTA P15	1,30		2,19		-1,00	-2,85
	L24	5,08		3,30		1,00	16,76
						Cantidad Proyectada	109,44

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:	ROSSY ELENA NIÑO GÓMEZ	APROBÓ:	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
	RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL
	CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPICO INGENIERIA S.A.S

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E


DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	UBICACIÓN	SAN JOSE DEL BUBUY
		FECHA	25/05/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	6	MUROS Y ACABADOS	ÍTEM	6.7	Sellador o recubrimiento acrilico blanco para superficies exteriores	UND	m²	CANT.	

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA

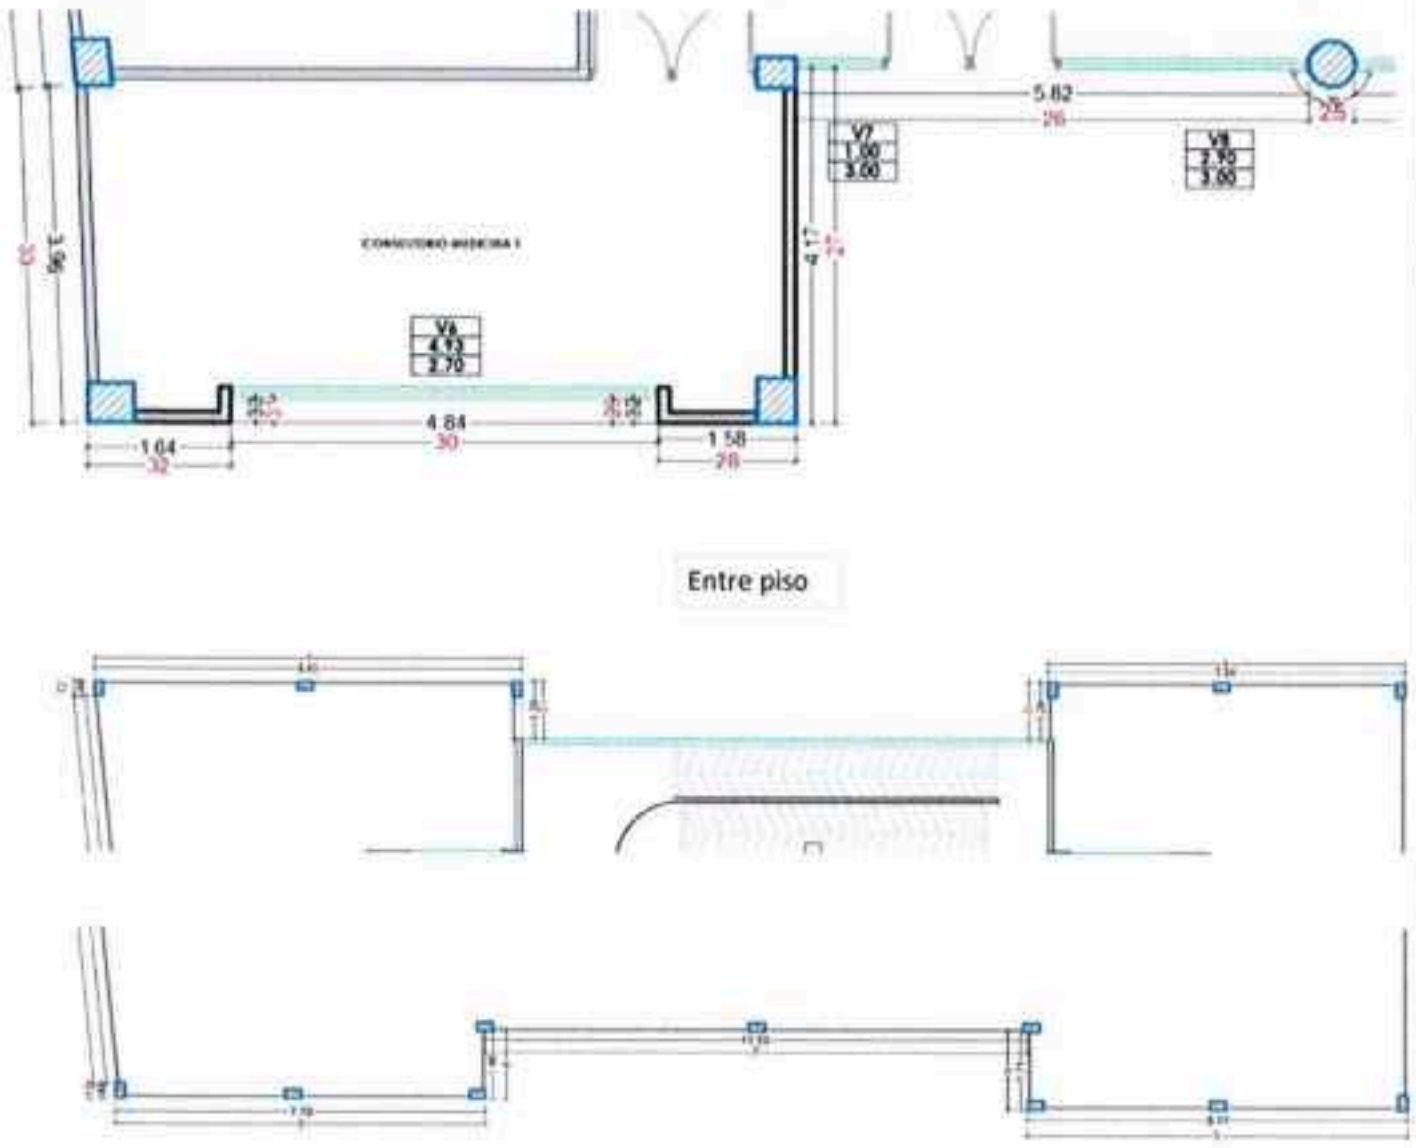

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					CANT. TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	Cantidad	CANT.	
DESCUENTO VENTANA V10	2,59		0,98		-1,00	-2,54
DESCUENTO VENTANA V9	2,49		3,00		-1,00	-7,47
L25	0,7		3,30		1,00	2,31
L26	5,82		3,30		1,00	19,21
DESCUENTO VENTANA V8	2,90		3,00		-1,00	-8,70
DESCUENTO VENTANA V7	1,00		3,00		-1,00	-3,00
DESCUENTO PUERTA P15	2,00		3,30		-1,00	-6,60
L27	4,17		3,30		1,00	13,76
L28	1,58		3,30		1,00	5,21
L29	0,32		3,30		1,00	1,06
L30	4,84		3,30		1,00	15,97
DESCUENTO VENTANA V6	4,93		2,70		-1,00	-13,31
L31	0,33		3,30		1,00	1,09
L32	1,64		3,30		1,00	5,41
L33	3,96		3,30		1,00	13,07
L34	7,94		3,30		1,00	26,20
DESCUENTO SUBESTACION ELECTRICA 1	6,50		2,53		-1,00	-16,45
DESCUENTO SUBESTACION ELECTRICA 2	1,20		1,50		-1,00	-1,80
L35	0,55		3,30		1,00	1,82
L36	3,38		3,30		1,00	11,15
L37	0,43		3,30		1,00	1,42
		ENTRE PISO				
L1	9,40	0,75			1,00	7,05
L2	1,29	0,75			1,00	0,97
L3	1,29	0,75			1,00	0,97
L4	7,94	0,75			1,00	5,96
L5	8,11	0,75			1,00	6,08
L6	1,71	0,75			1,00	1,28
L7	11,59	0,75			1,00	8,69
L8	1,48	0,75			1,00	1,11
L9	7,79	0,75			1,00	5,84
L10	0,33	0,75			1,00	0,25
L11	15,68	0,75			1,00	11,76
L12	0,33	0,75			1,00	0,25
					Cantidad Proyectada	108,02
					Viene	109,44
					Diferencia	217,46

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	ROSSY ELENA NIÑO GÓMEZ	APROBÓ	OMAR AUGUSTO NEIRA SIERRA
	RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL
	CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPICO INGENIERIA S.A.S

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E


DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	UBICACIÓN	SAN JOSE DEL BUBUY
		FECHA	25/05/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	6	MUROS Y ACABADOS	ÍTEM	6.7	Sellador o recubrimiento acrílico blanco para superficies exteriores	UND	m²	CANT.	349,39

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA

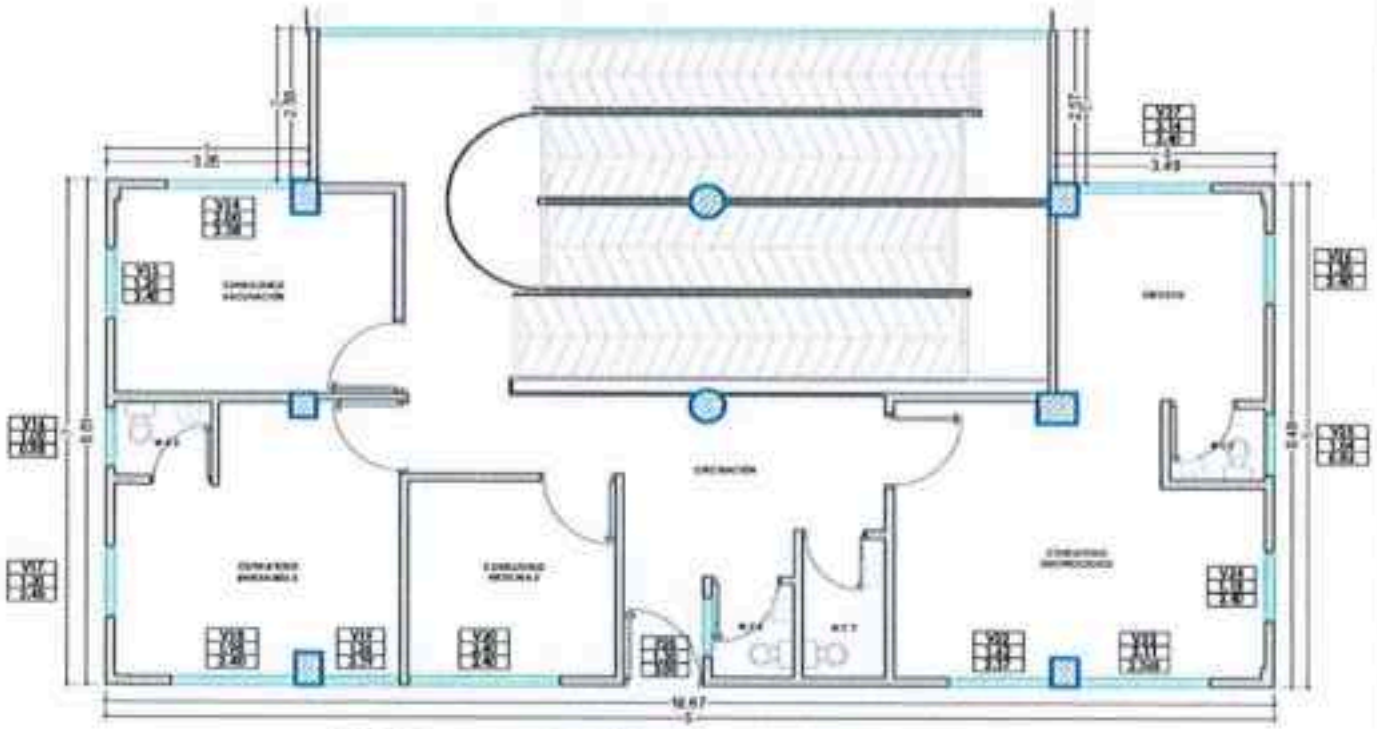





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					CANT. TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	Cantidad	CANT.	
COLUMNAS BALCON						
COLUMNAS BALCON CARA 1	0,33		1,06		21,00	7,35
COLUMNAS BALCON CARA 2	0,19		1,06		21,00	4,23
COLUMNAS BALCON CARA 3	0,33		1,06		21,00	7,35
COLUMNAS BALCON CARA 4	0,19		1,06		21,00	4,23
COLUMNAS BALCON CARA 5	0,33		0,19		21,00	1,32
MUROS SEGUNDO PISO						
L1	3,25		3,30		1,00	10,73
DESCUENTO VENTANA V14	2,00		2,38		-1,00	-4,76
L2	2,55		3,30		1,00	8,42
L3	2,57		3,30		1,00	8,48
L4	3,49		3,30		1,00	11,52
DESCUENTO VENTANA V27	2,14		2,40		-1,00	-5,14
L5	8,49		3,30		1,00	28,02
DESCUENTO VENTANA V26	1,20		2,40		-1,00	-2,88
DESCUENTO VENTANA V25	1,04		0,86		-1,00	-0,89
DESCUENTO VENTANA V24	1,18		2,40		-1,00	-2,83
L6	18,67		3,30		1,00	61,61
DESCUENTO VENTANA V23	2,11		2,36		-1,00	-4,98
DESCUENTO VENTANA V22	1,62		2,37		-1,00	-3,84
DESCUENTO PUERTA P20	1,30		3,00		-1,00	-3,90
DESCUENTO VENTANA V20	2,40		2,40		-1,00	-5,76
DESCUENTO VENTANA V19	1,26		2,39		-1,00	-3,01
DESCUENTO VENTANA V18	1,98		2,40		-1,00	-4,75
L7	8,51		3,30		1,00	28,08
DESCUENTO VENTANA V17	1,20		2,40		-1,00	-2,88
DESCUENTO VENTANA V16	1,00		0,88		-1,00	-0,88
DESCUENTO VENTANA V15	1,20		2,40		-1,00	-2,88

CANTIDAD PROYECTA	131,93
VIENE	217,46
TOTAL	349,39
CANTIDAD CONTRACTUAL	387,75
DIFERENCIA	-38,36

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	ROSSY ELENA NIÑO GÓMEZ	APROBÓ	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
	RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL
	CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPICO INGENIERIA S.A.S

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E

DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE			UBICACIÓN	SAN JOSE DEL BUBUY		
				FECHA	25/05/2026		
				ACTA No	Recibo y liquidación		
CAPÍTULO 7	CUBIERTA	ÍTEM	7.3	Bajante A.LL. PVC 4"	UND	m	CANT. 44,60

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA











LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	ÁREA (M2)	CANT.	CANT. TOTAL
Segundo piso	B1 - Vertical			3,30		1,00	3,30
	B1 - Horizontal		4,00			1,00	4,00
	B2 - Vertical			3,40		1,00	3,40
	B2 - Horizontal		4,10			1,00	4,10
	B3 - Horizontal			3,20		1,00	3,20
	B3 - Vertical		4,50			1,00	4,50
Primer piso	B4 - Vertical			3,80		1,00	3,80
	B4 - Horizontal		0,30			1,00	0,30
Cubierta primer piso	Bajante vertical			3,30		5,00	16,50
	Bajante horizonatal		0,30			5,00	1,50

CANTIDAD PROYECTADA	44,60
CANTIDAD CONTRACTUAL	44,60
DIFERENCIA	0,00

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:	ROSSY ELENA NIÑO GÓMEZ	APROBÓ:	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL	
CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPICO INGENIERIA S.A.S	

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E


DEPARTAMENTO DE CASANARE


MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	**UBICACIÓN**	SAN JOSE DEL BUBUY
		FECHA	25/05/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	7	CUBIERTA	ÍTEM	7.4	Columna en tubo estructural cuadrado 100*100*3 mm, instalado y pintado.	UND	m	CANT.	19,20

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA

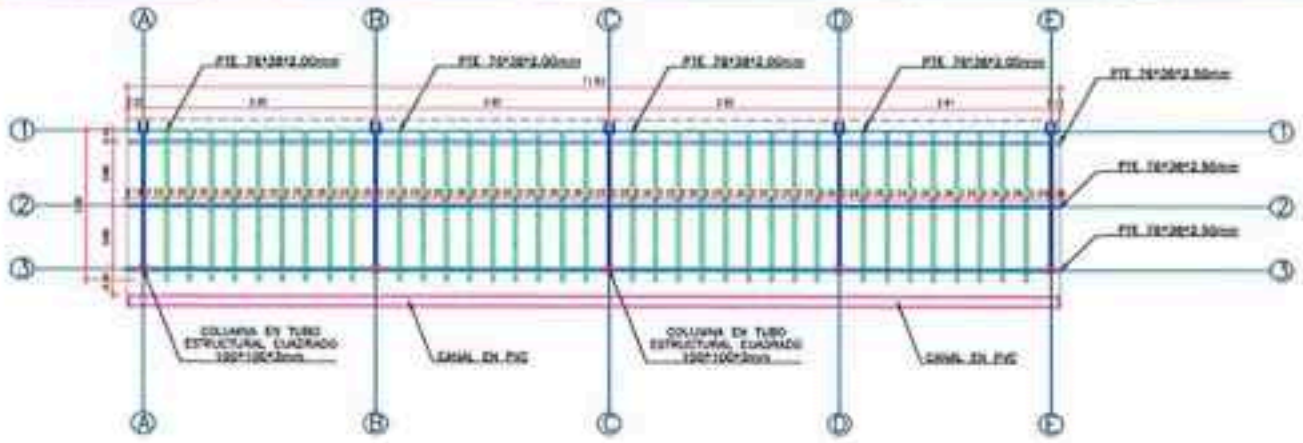

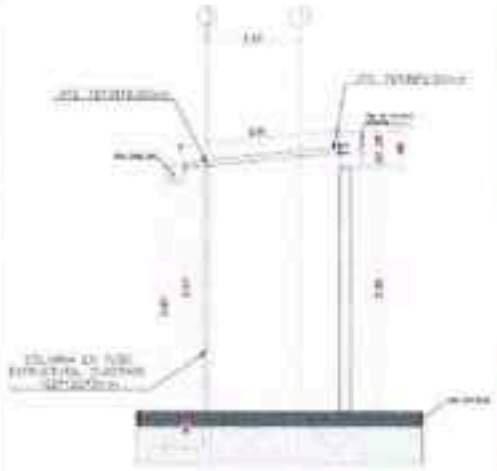





LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES					CANT. TOTAL
		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	ÁREA (M2)	CANT.	
Primer piso	Columna A			3,8		1,00	4,80
	Columna B			3,8		1,00	4,80
	Columna C			3,8		1,00	4,80
	Columna D			3,8		1,00	4,80

CANTIDAD PROYECTADA	19,20
CANTIDAD CONTRACTUAL	19,20
DIFERENCIA	0,00

OBSERVACIONES:


ELABORÓ:	ROSSY ELENA NIÑO GÓMEZ	APROBÓ:	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL	
CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPICO INGENIERIA S.A.S	

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E

DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE				UBICACIÓN	SAN JOSE DEL BUBUY			
					FECHA	25/05/2026			
					ACTA No	Recibo y liquidación			
CAPÍTULO	8	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	ÍTEM	8.2	Suministro e instalación de medidor de energia, incluye: caja para medidor, medidor trifásico tetrafilar, breaker totalizador, sistema de puesta a tierra	UND	und	CANT.	1,00

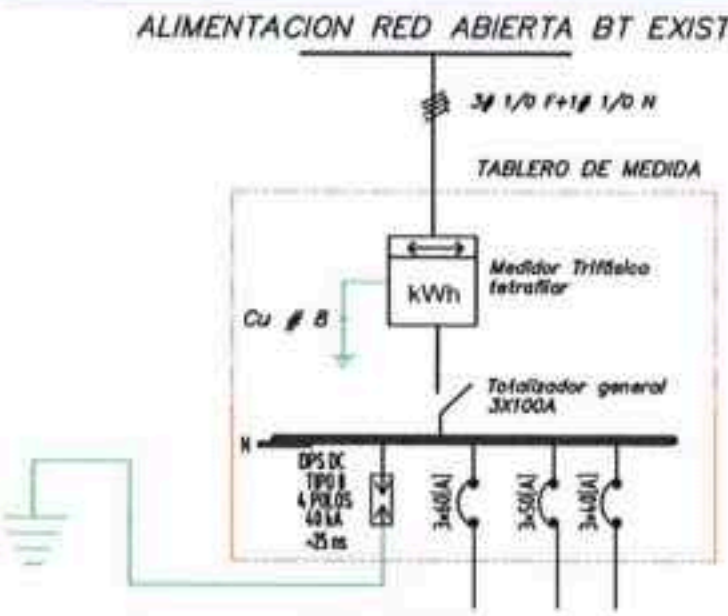ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					CANT. TOTAL
		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	ÁREA (M2)	CANT.	
	Medidor de energia					1,00	1,00
							
							

CANTIDAD PROYECTADA	1,00
CANTIDAD CONTRACTUAL	1,00
DIFERENCIA	0,00

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	ROSSY ELENA NIÑO GÓMEZ	APROBÓ	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL	
CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPICO INGENIERIA S.A.S	

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E


DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE			UBICACIÓN	SAN JOSE DEL BUBUY		
				FECHA	25/05/2026		
				ACTA No	Recibo y liquidación		

CAPÍTULO	8	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	ÍTEM	8.4	Interruptor termomagnético regulable 50A a 63A, 35-40 kA . Totalizador Suministro e Instalación	UND	3,00	CANT.	4,00

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					CANT. TOTAL
		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	ÁREA (M2)	CANT.	
	Tablero de media - Tablero 3x60 (A)					2,00	2,00
	Tablero de media - Tablero 3x50 (A)					2,00	2,00

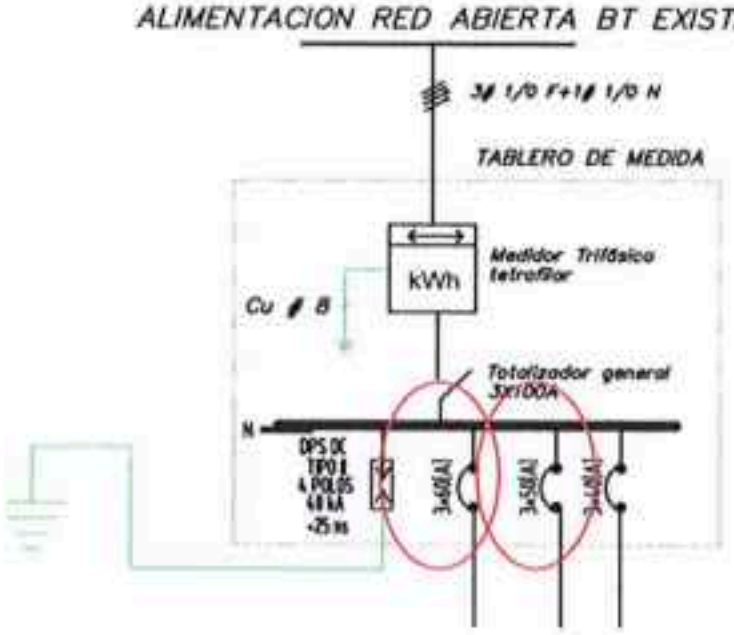



CANTIDAD PROYECTADA	4,00
CANTIDAD CONTRACTUAL	4,00
DIFERENCIA	0,00

OBSERVACIONES:


ELABORÓ	ROSSY ELENA NIÑO GÓMEZ	APROBÓ	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL	
CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPICO INGENIERIA S.A.S	

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E

DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE					**UBICACIÓN**	SAN JOSE DEL BUBUY		
						FECHA	25/05/2026		
						ACTA No	Recibo y liquidación		
CAPÍTULO	8	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**	**ÍTEM**	8.4	**Interruptor termomagnético regulable 50A a 63A, 35-40 kA . Totalizador Suministro e instalación**	**UND**	und	**CANT.**	0,00

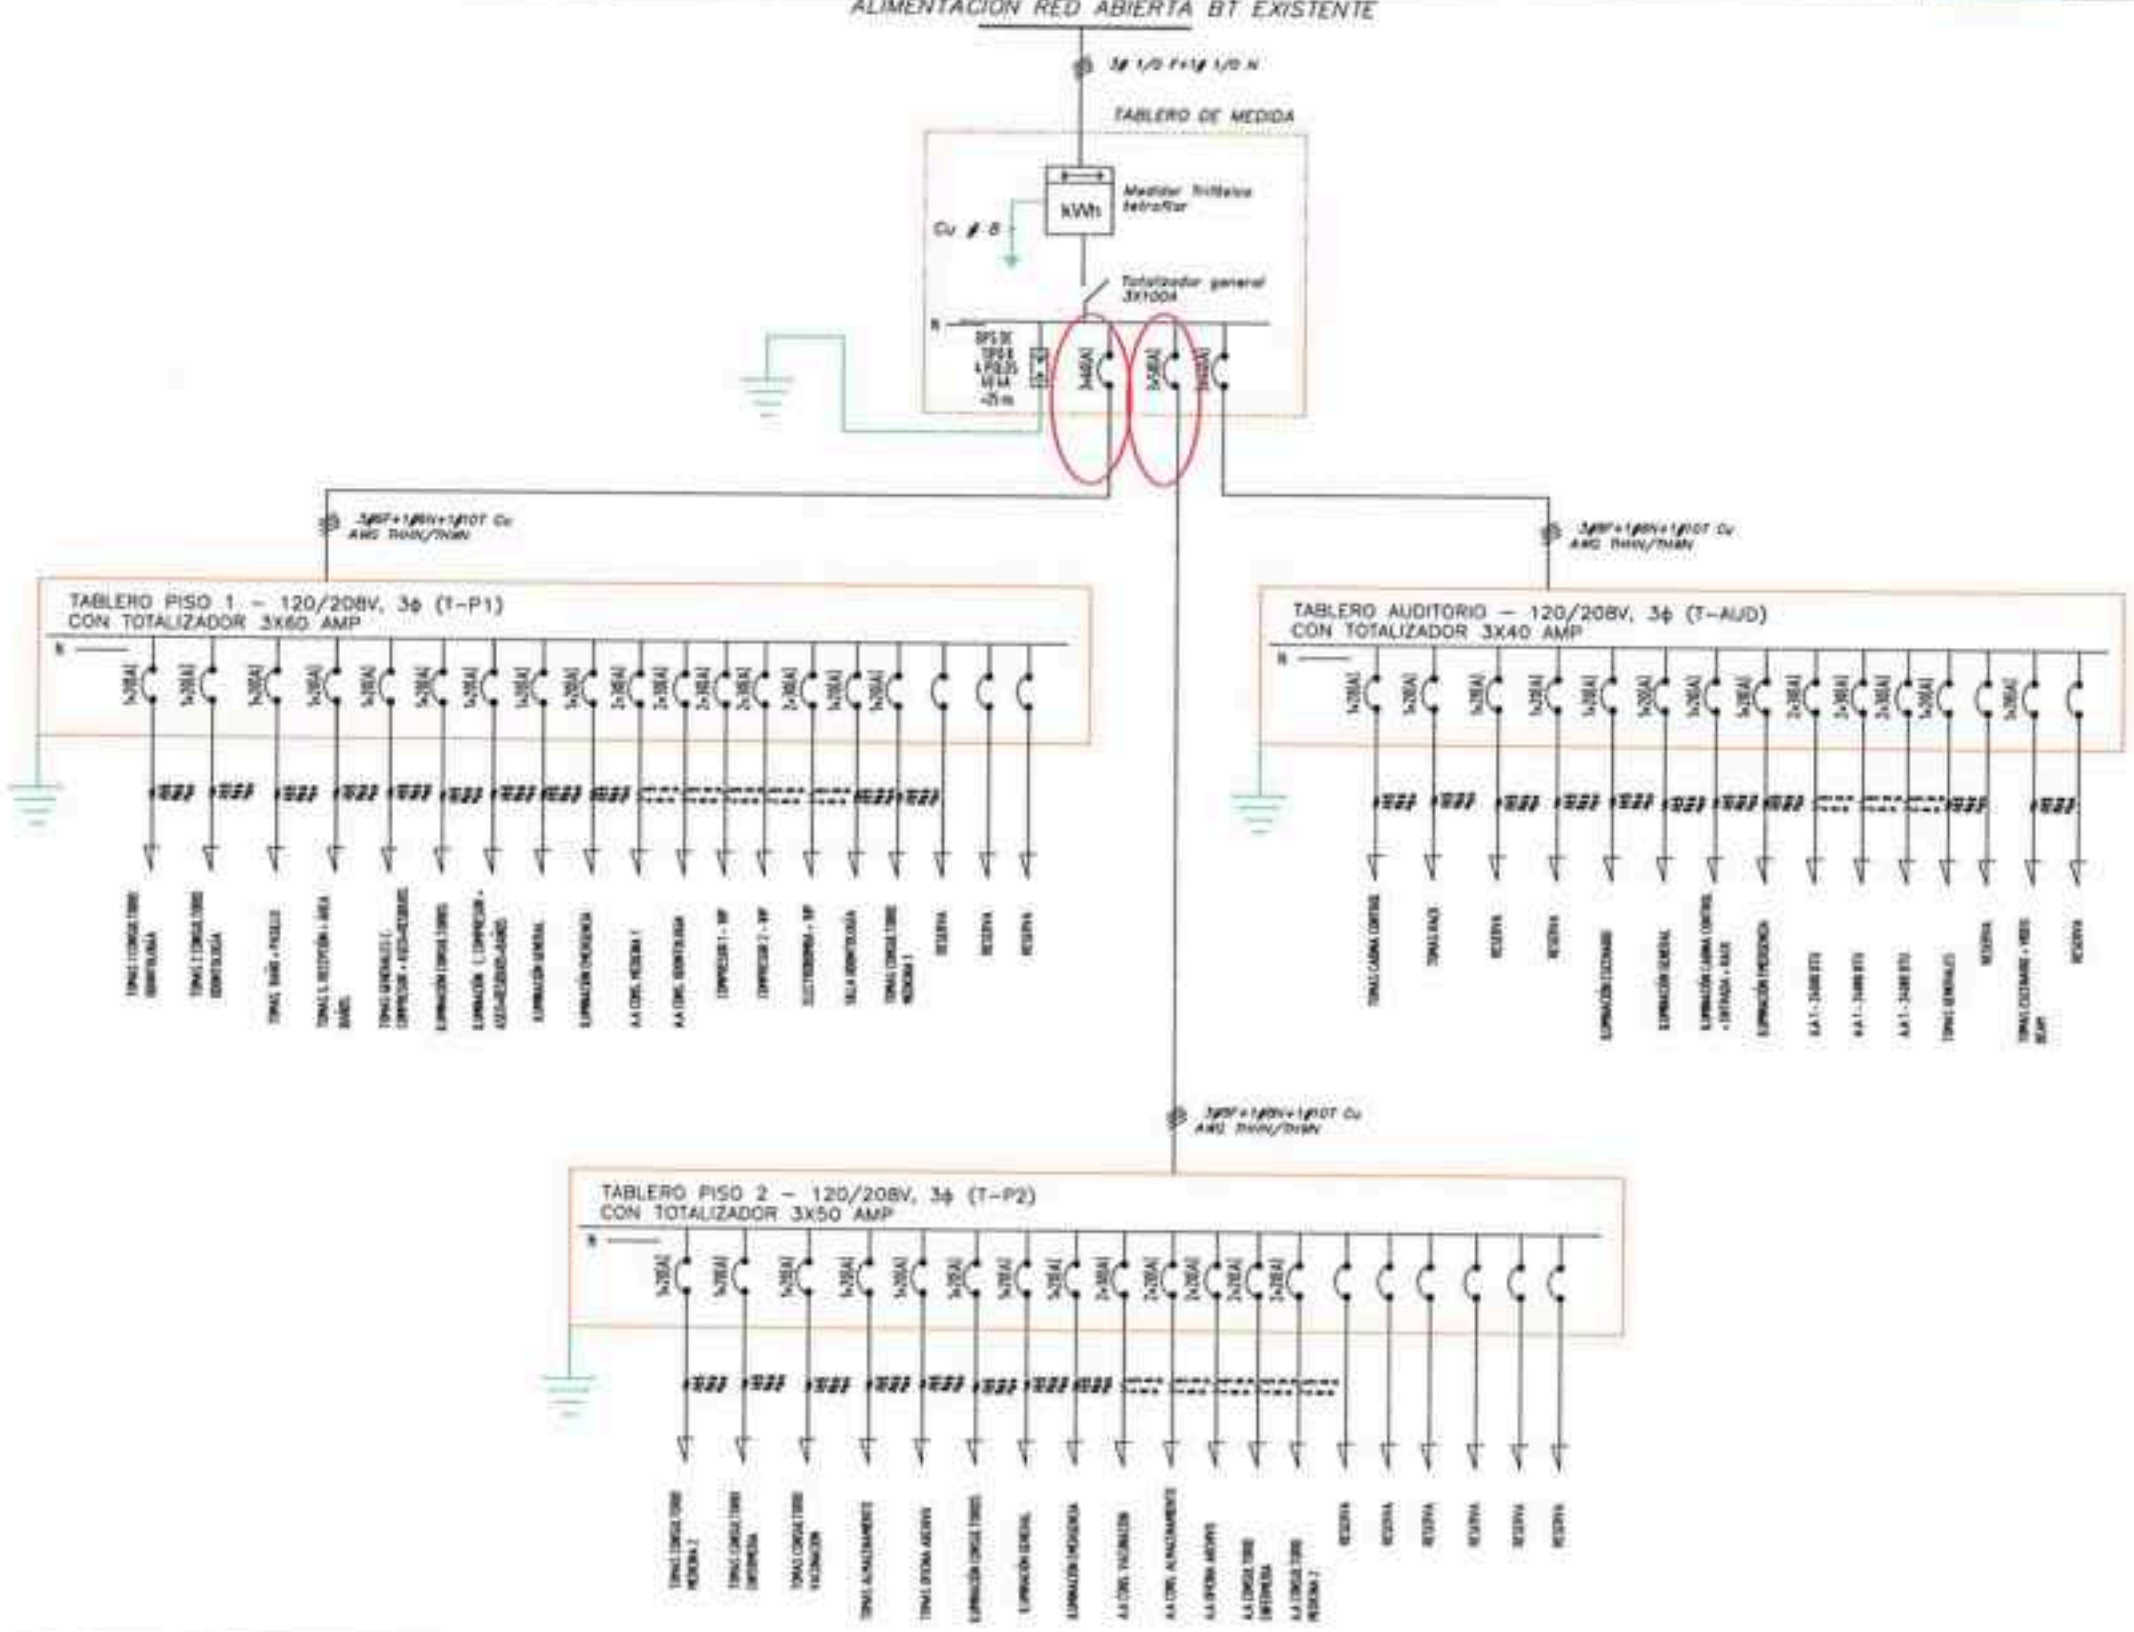


HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E

DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE				**UBICACIÓN**	SAN JOSE DEL BUBUY			
					FECHA	25/05/2026			
					ACTA No	Recibo y liquidación			
CAPÍTULO	**8**	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**	**ÍTEM**	**8.5**	**Cortacircuito termomagnético de 1x(10A-60A), 120/240 V, 10kA, enchufable. Suministro e instalación**	**UND**	und	**CANT.**	**40,00**

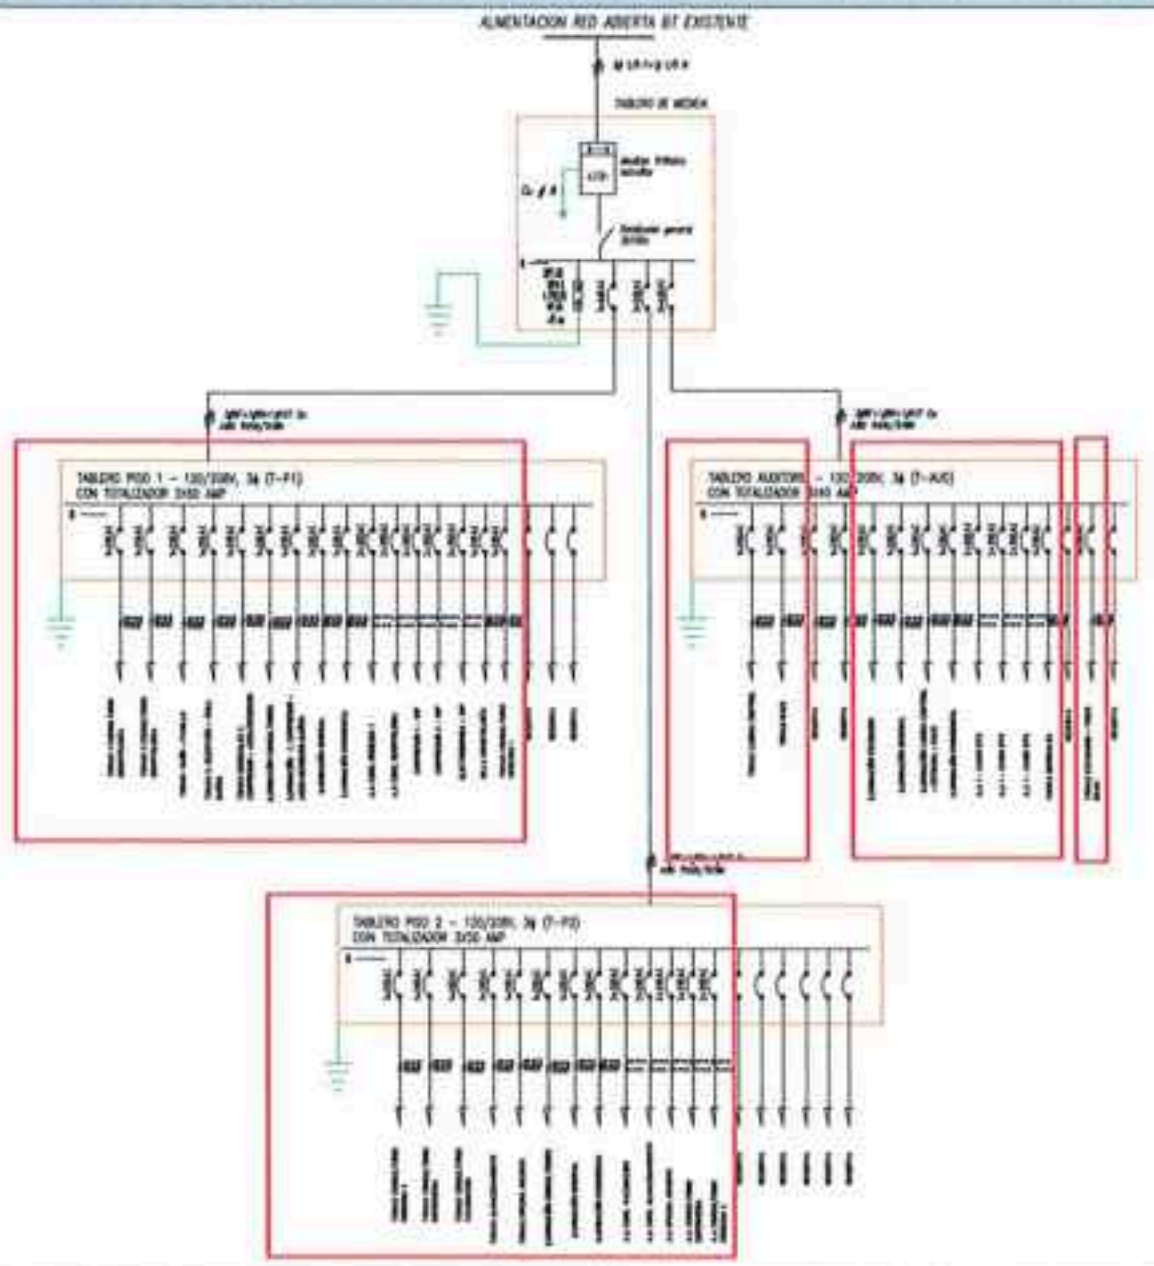ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA	LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES					CANT. TOTAL
			LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	ÁREA (M2)	CANT.	
	Tablero piso 1	3x60 (A)					16,00	16,00
	Tablero piso 2	3x50 (A)					13,00	13,00
	Tablero Auditorio	3x40 (A)					11,00	11,00
								

CANTIDAD PROYECTADA	**40,00**
CANTIDAD CONTRACTUAL	**40,00**
DIFERENCIA	**0,00**

OBSERVACIONES:


ELABORÓ	ROSSY ELENA NIÑO GÓMEZ	APROBÓ	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL	
CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPICO INGENIERIA S.A.S	

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E

DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE				**UBICACIÓN**	SAN JOSE DEL BUBUY		
					FECHA	25/05/2026		
					ACTA No	Recibo y liquidación		
CAPÍTULO	**8**	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**	**ÍTEM**	**8.5**	**Cortacircuito termomagnético de 1x(10A-60A), 120/240 V, 10kA, enchufable. Suministro e instalación**	**UND**	**und**	**CANT.**	**0,00**


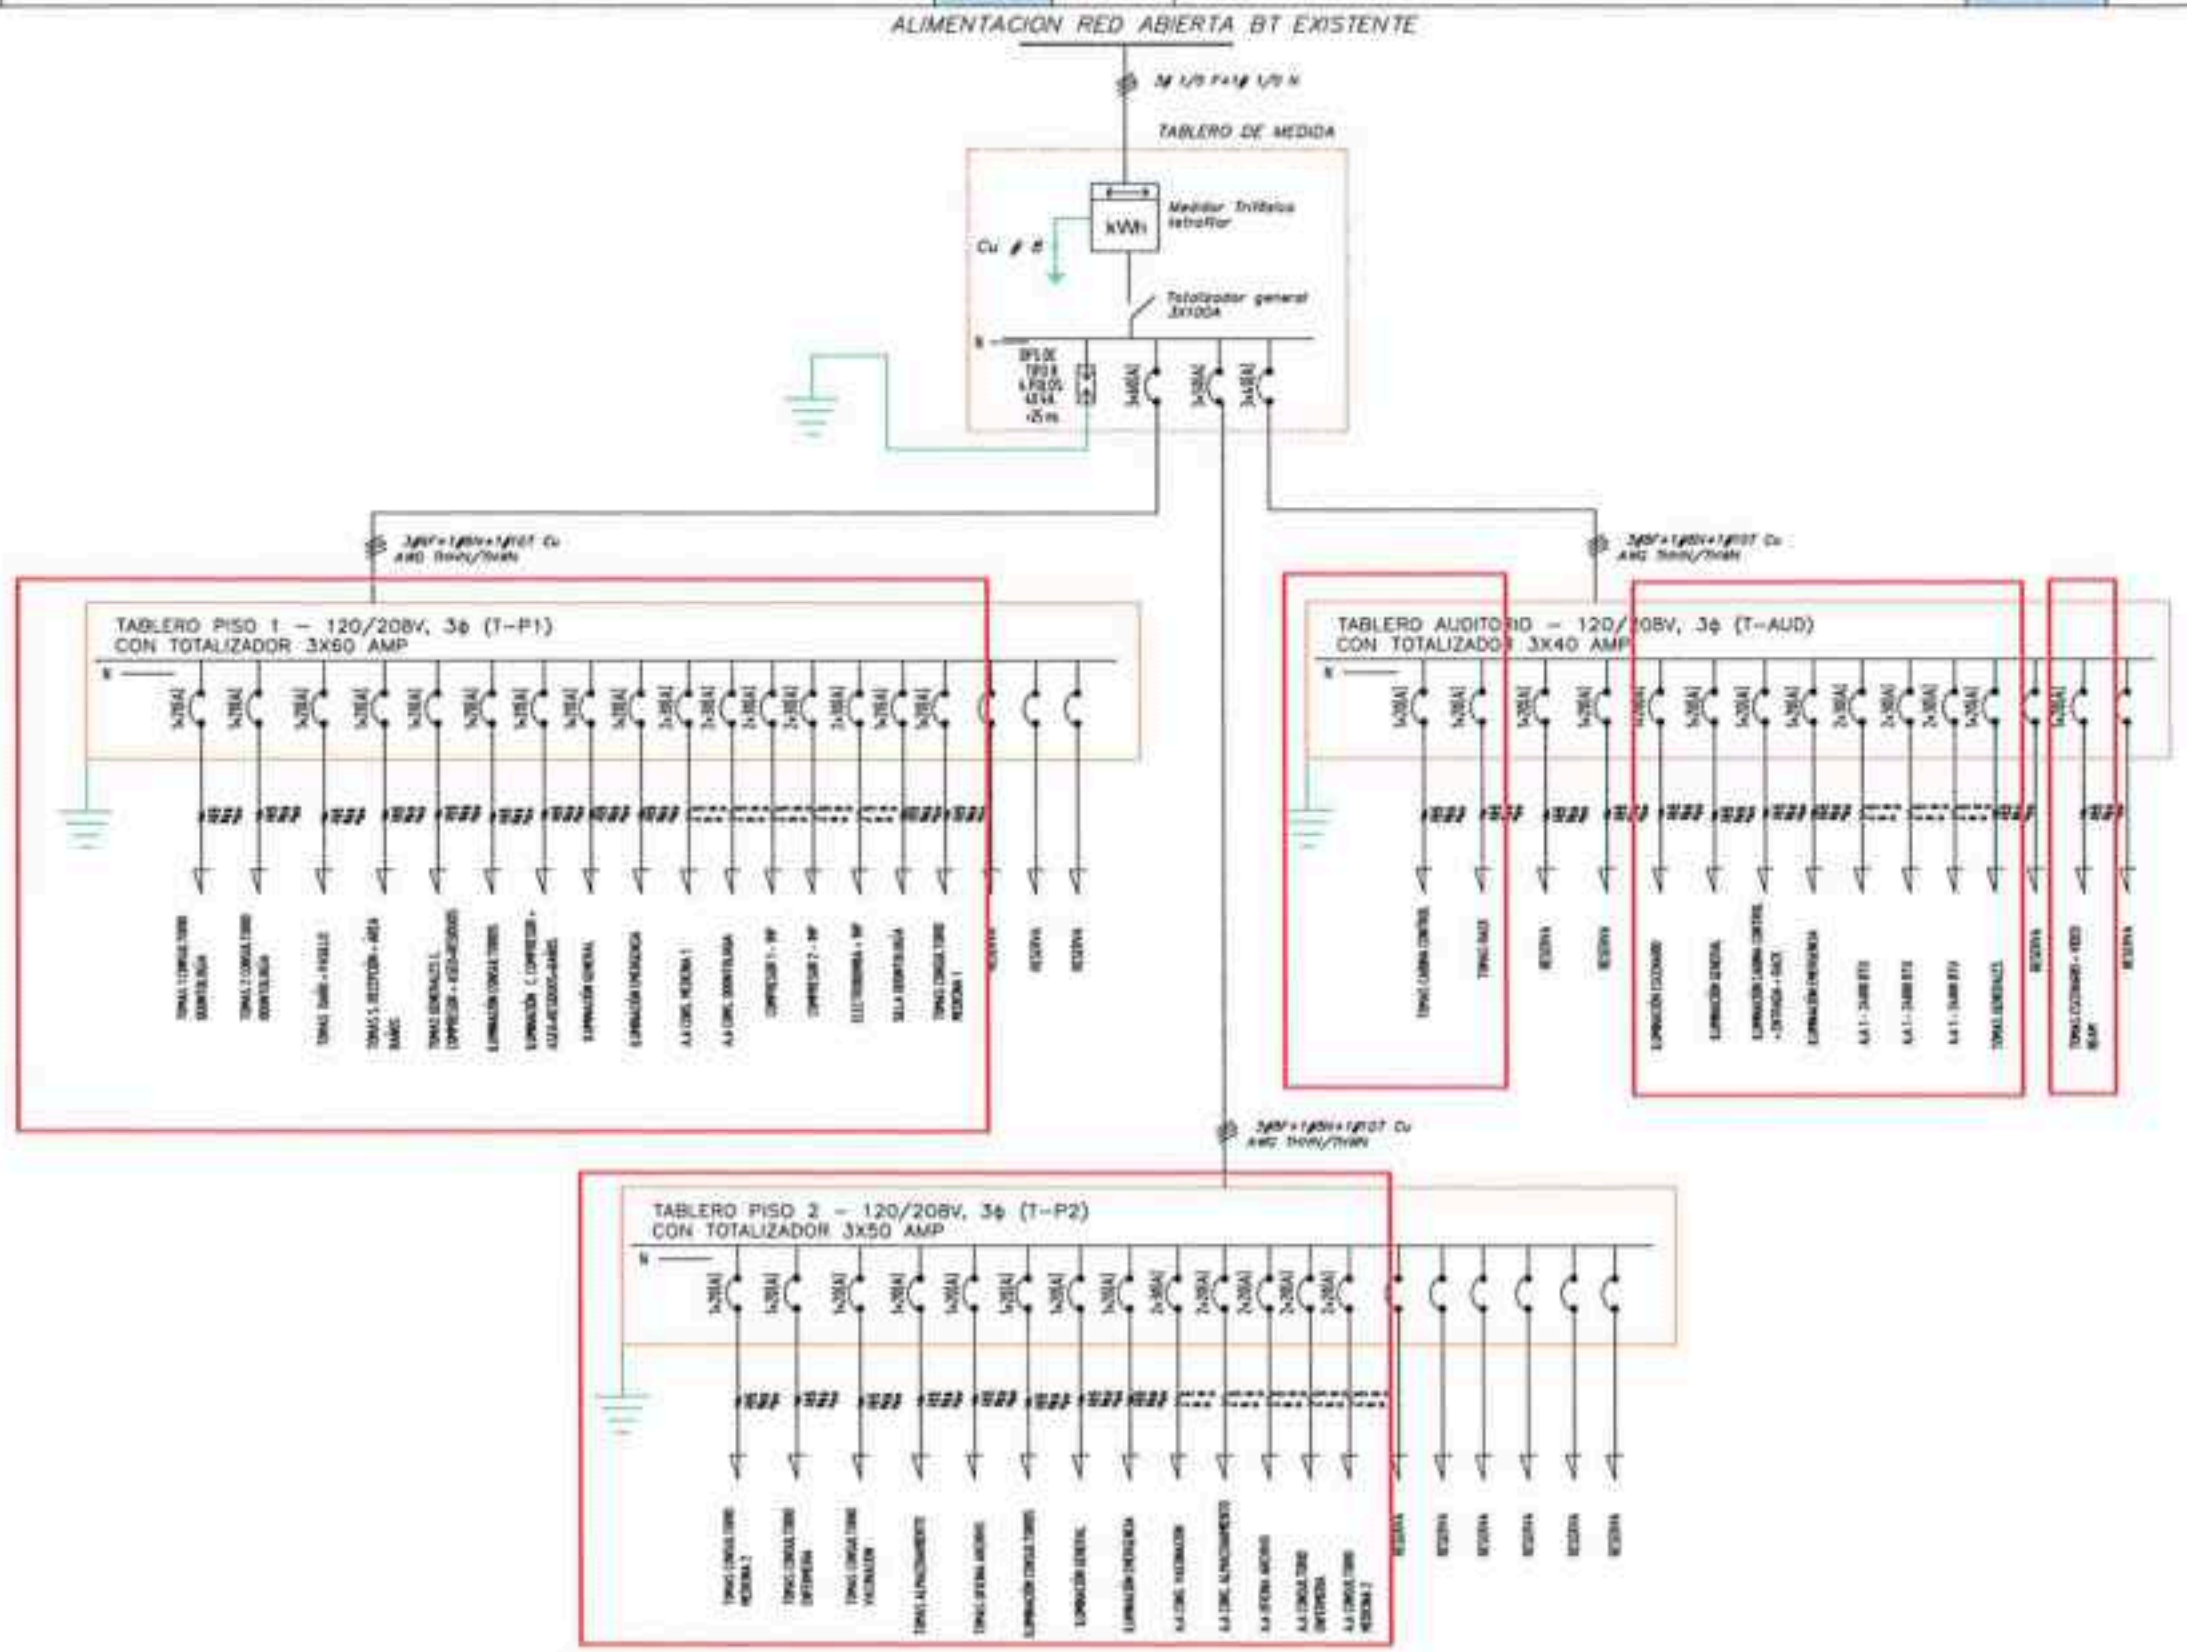


HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E

DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE				UBICACIÓN	SAN JOSE DEL BUBUY			
					FECHA	25/05/2026			
					ACTA No	Recibo y liquidación			
CAPÍTULO	8	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	ÍTEM	8.6	Salida para iluminación en techo, incluye tubería EMT 3/4", cable de cobre THWN N° 12, accesorios, cajas de paso	UND	und	CANT.	169,00

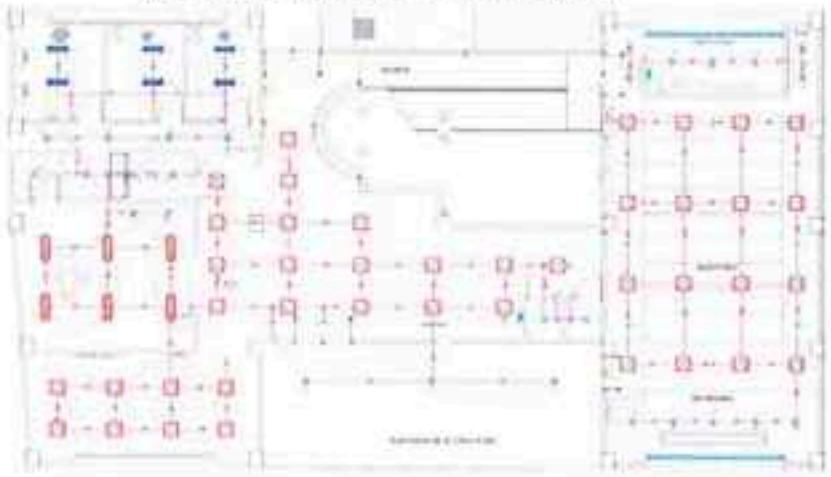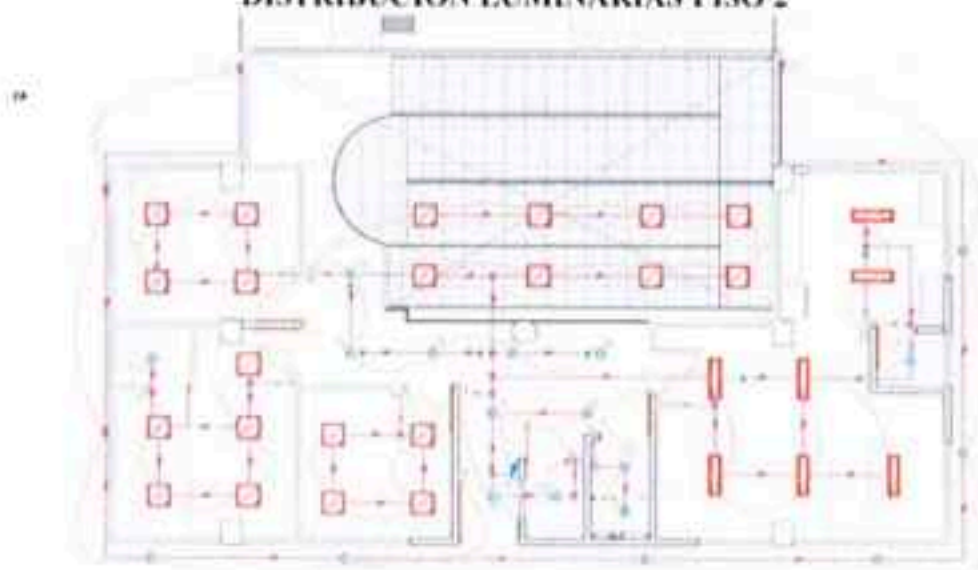ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					CANT. TOTAL
		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	ÁREA (M2)	CANT.	
DISTRIBUCIÓN LUMINARIAS PISO 1	Modulo led redondo 24 W					22,00	22,00
	Panel led 30 x 120 cm					13,00	13,00
	Luminaria de emergencia tipo led 110 v					10,00	10,00
	Luminaria tipo Aplique LED 5w					27,00	27,00
	Modulo led redondo 18 W					28,00	28,00
	Luminaria tipo pinal 60 x 60 cm					62,00	62,00
	Luminaria Tortuga 12 W					1,00	1,00
	Luminaria Hermética 36 W					6,00	6,00
DISTRIBUCIÓN LUMINARIAS PISO 2							
							

CANTIDAD PROYECTADA	169,00
CANTIDAD CONTRACTUAL	169,00
DIFERENCIA	0,00

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:	ROSSY ELENA NIÑO GÓMEZ	APROBÓ:	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL	
CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPICO INGENIERIA S.A.S	


HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E

DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE				UBICACIÓN	SAN JOSE DEL BUBUY			
					FECHA	25/05/2026			
					ACTA No	Recibo y liquidación			
CAPÍTULO	8	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	ÍTEM	8.8	Salida para iluminación en techo, incluye tubería EMT 3/4", cable de cobre THWN N° 12, accesorios, cajas de paso	UND	und	CANT.	0,00

DISTRIBUCIÓN LUMINARIAS PISO 1

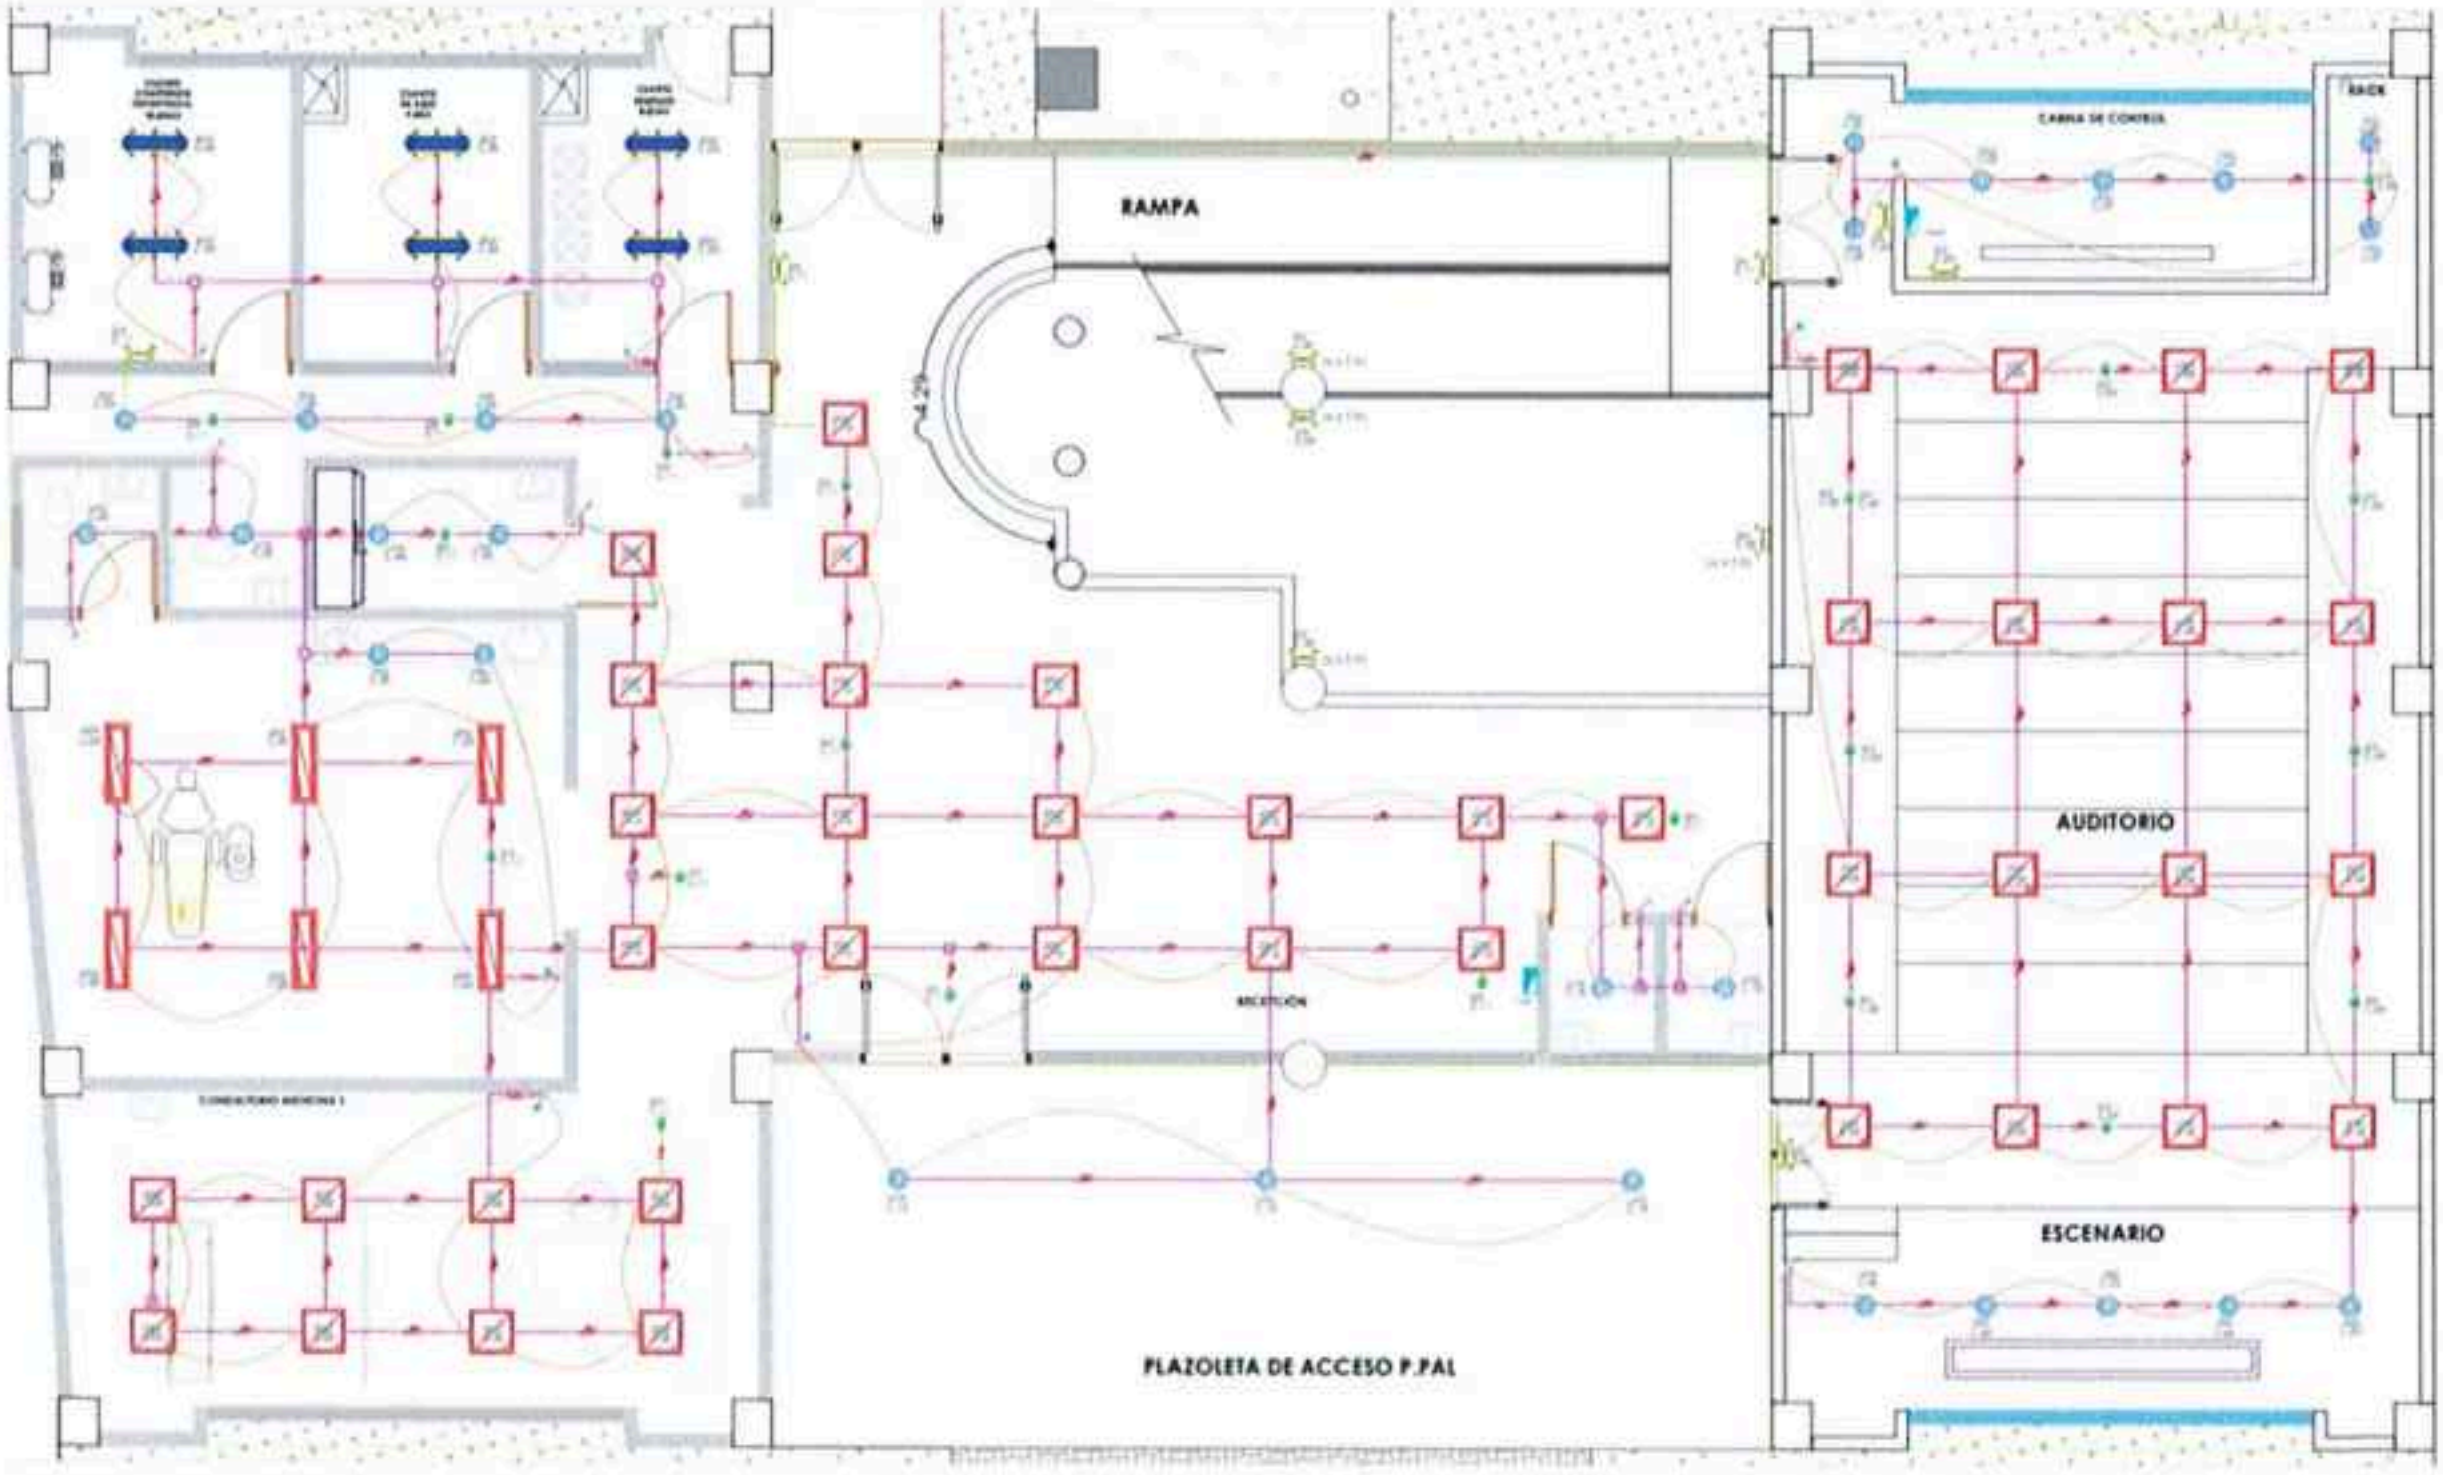


HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E

DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE				**UBICACIÓN**	SAN JOSE DEL BUBUY		
					FECHA	25/05/2026		
					ACTA No	Recibo y liquidación		
CAPÍTULO 8	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**	**ÍTEM**	8.6	**Salida para iluminación en techo, incluye tubería EMT 3/4", cable de cobre THWN N° 12, accesorios, cajas de paso**	**UND**	und	**CANT.**	0,00

DISTRIBUCIÓN LUMINARIAS PISO 2

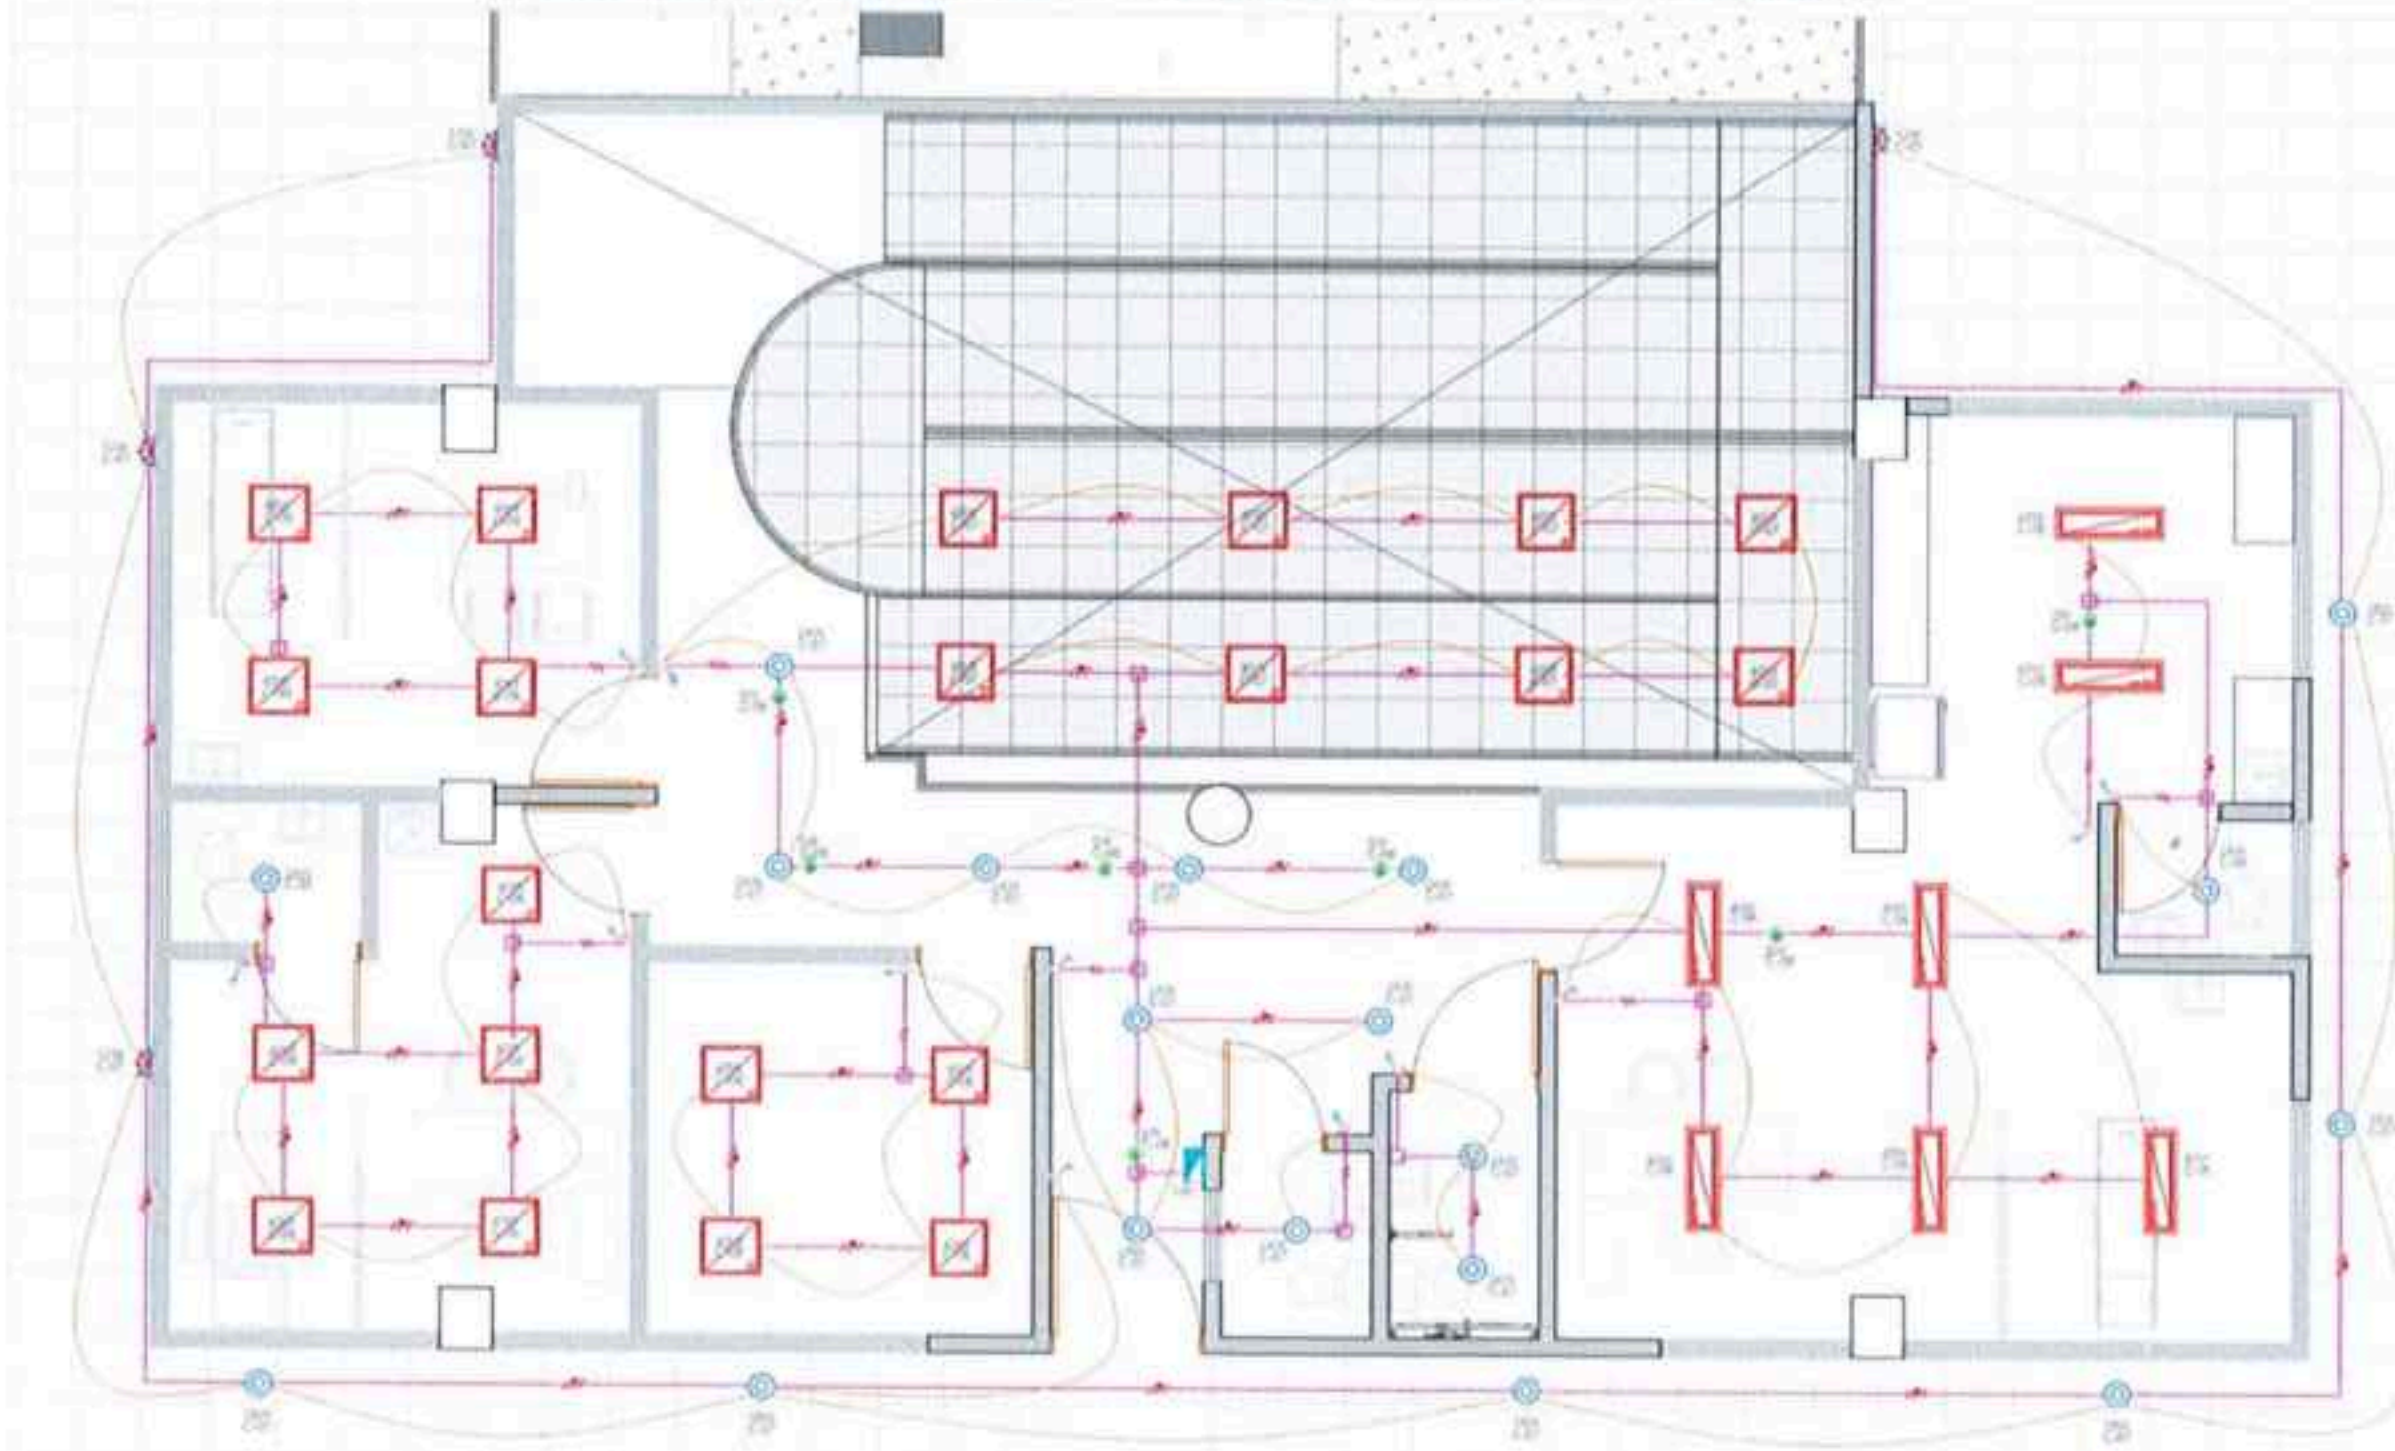


HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E

DEPARTAMENTO DE CASANARE


MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE				UBICACIÓN	SAN JOSE DEL BUBUY			
					FECHA	25/05/2026			
					ACTA No	Recibo y liquidación			
CAPÍTULO	8	ITEM S O PREVISTOS	ÍTEM	8.7	Modulo LED redondo 24W, 110 V 1680-2400 lm de sobreponar. Suministro e instalación	UND	und	CANT.	22,00

DISTRIBUCIÓN LUMINARIAS PISO 1

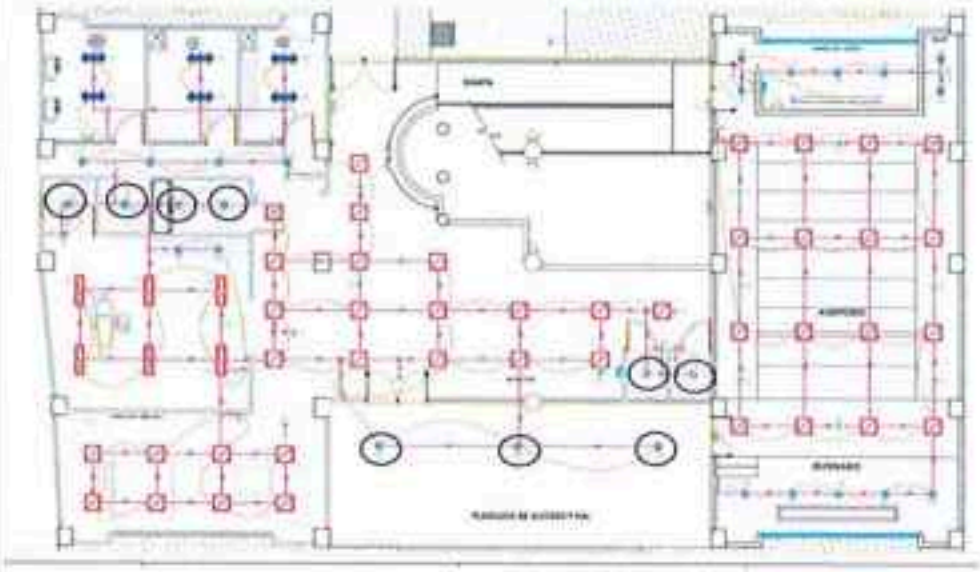

DISTRIBUCIÓN LUMINARIAS PISO 2

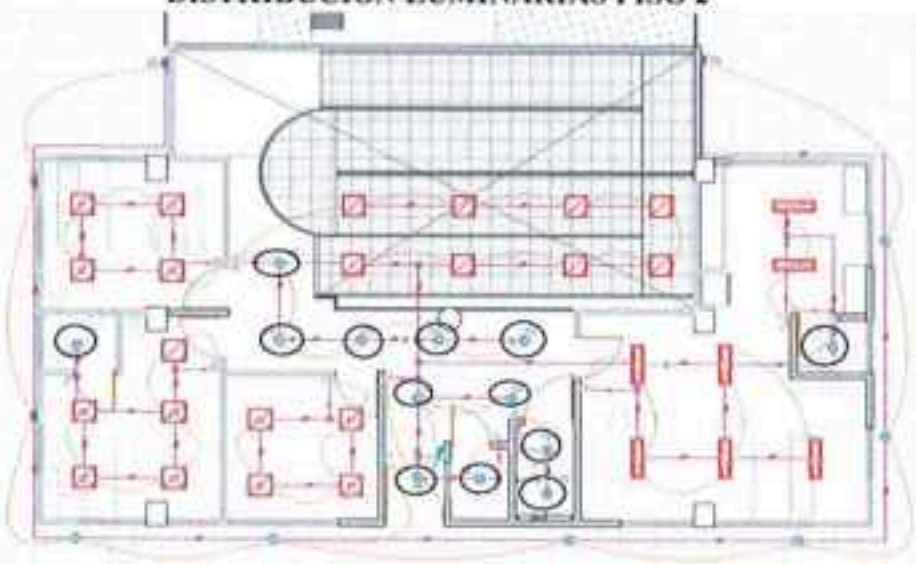

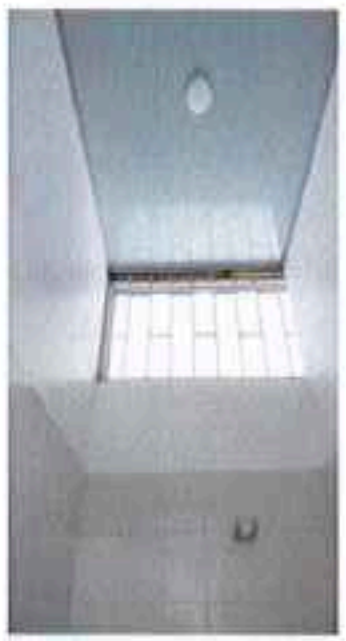




ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA	LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES					CANT. TOTAL
			LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	ÁREA (M2)	CANT.	
	Modulo LED redondo 24 W	Segundo piso					13,00	13,00
		Primer piso					9,00	9,00

CANTIDAD PROYECTADA	22,00
CANTIDAD CONTRACTUAL	22,00
DIFERENCIA	0,00

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:	ROSSY ELENA NIÑO GÓMEZ	APROBÓ	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL	
CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPICO INGENIERIA S.A.S	


HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E

DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE				**UBICACIÓN**	SAN JOSE DEL BUBUY		
					FECHA	25/05/2026		
					ACTA No	Recibo y liquidación		
CAPÍTULO	**8**	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**	**ÍTEM**	**8.7**	**Modulo LED redondo 24W, 110 V 1680-2400 lm de sobreponer. Suministro e instalación**	**UND**	**und**	**CANT.**	**0,00**

DISTRIBUCIÓN LUMINARIAS PISO 1

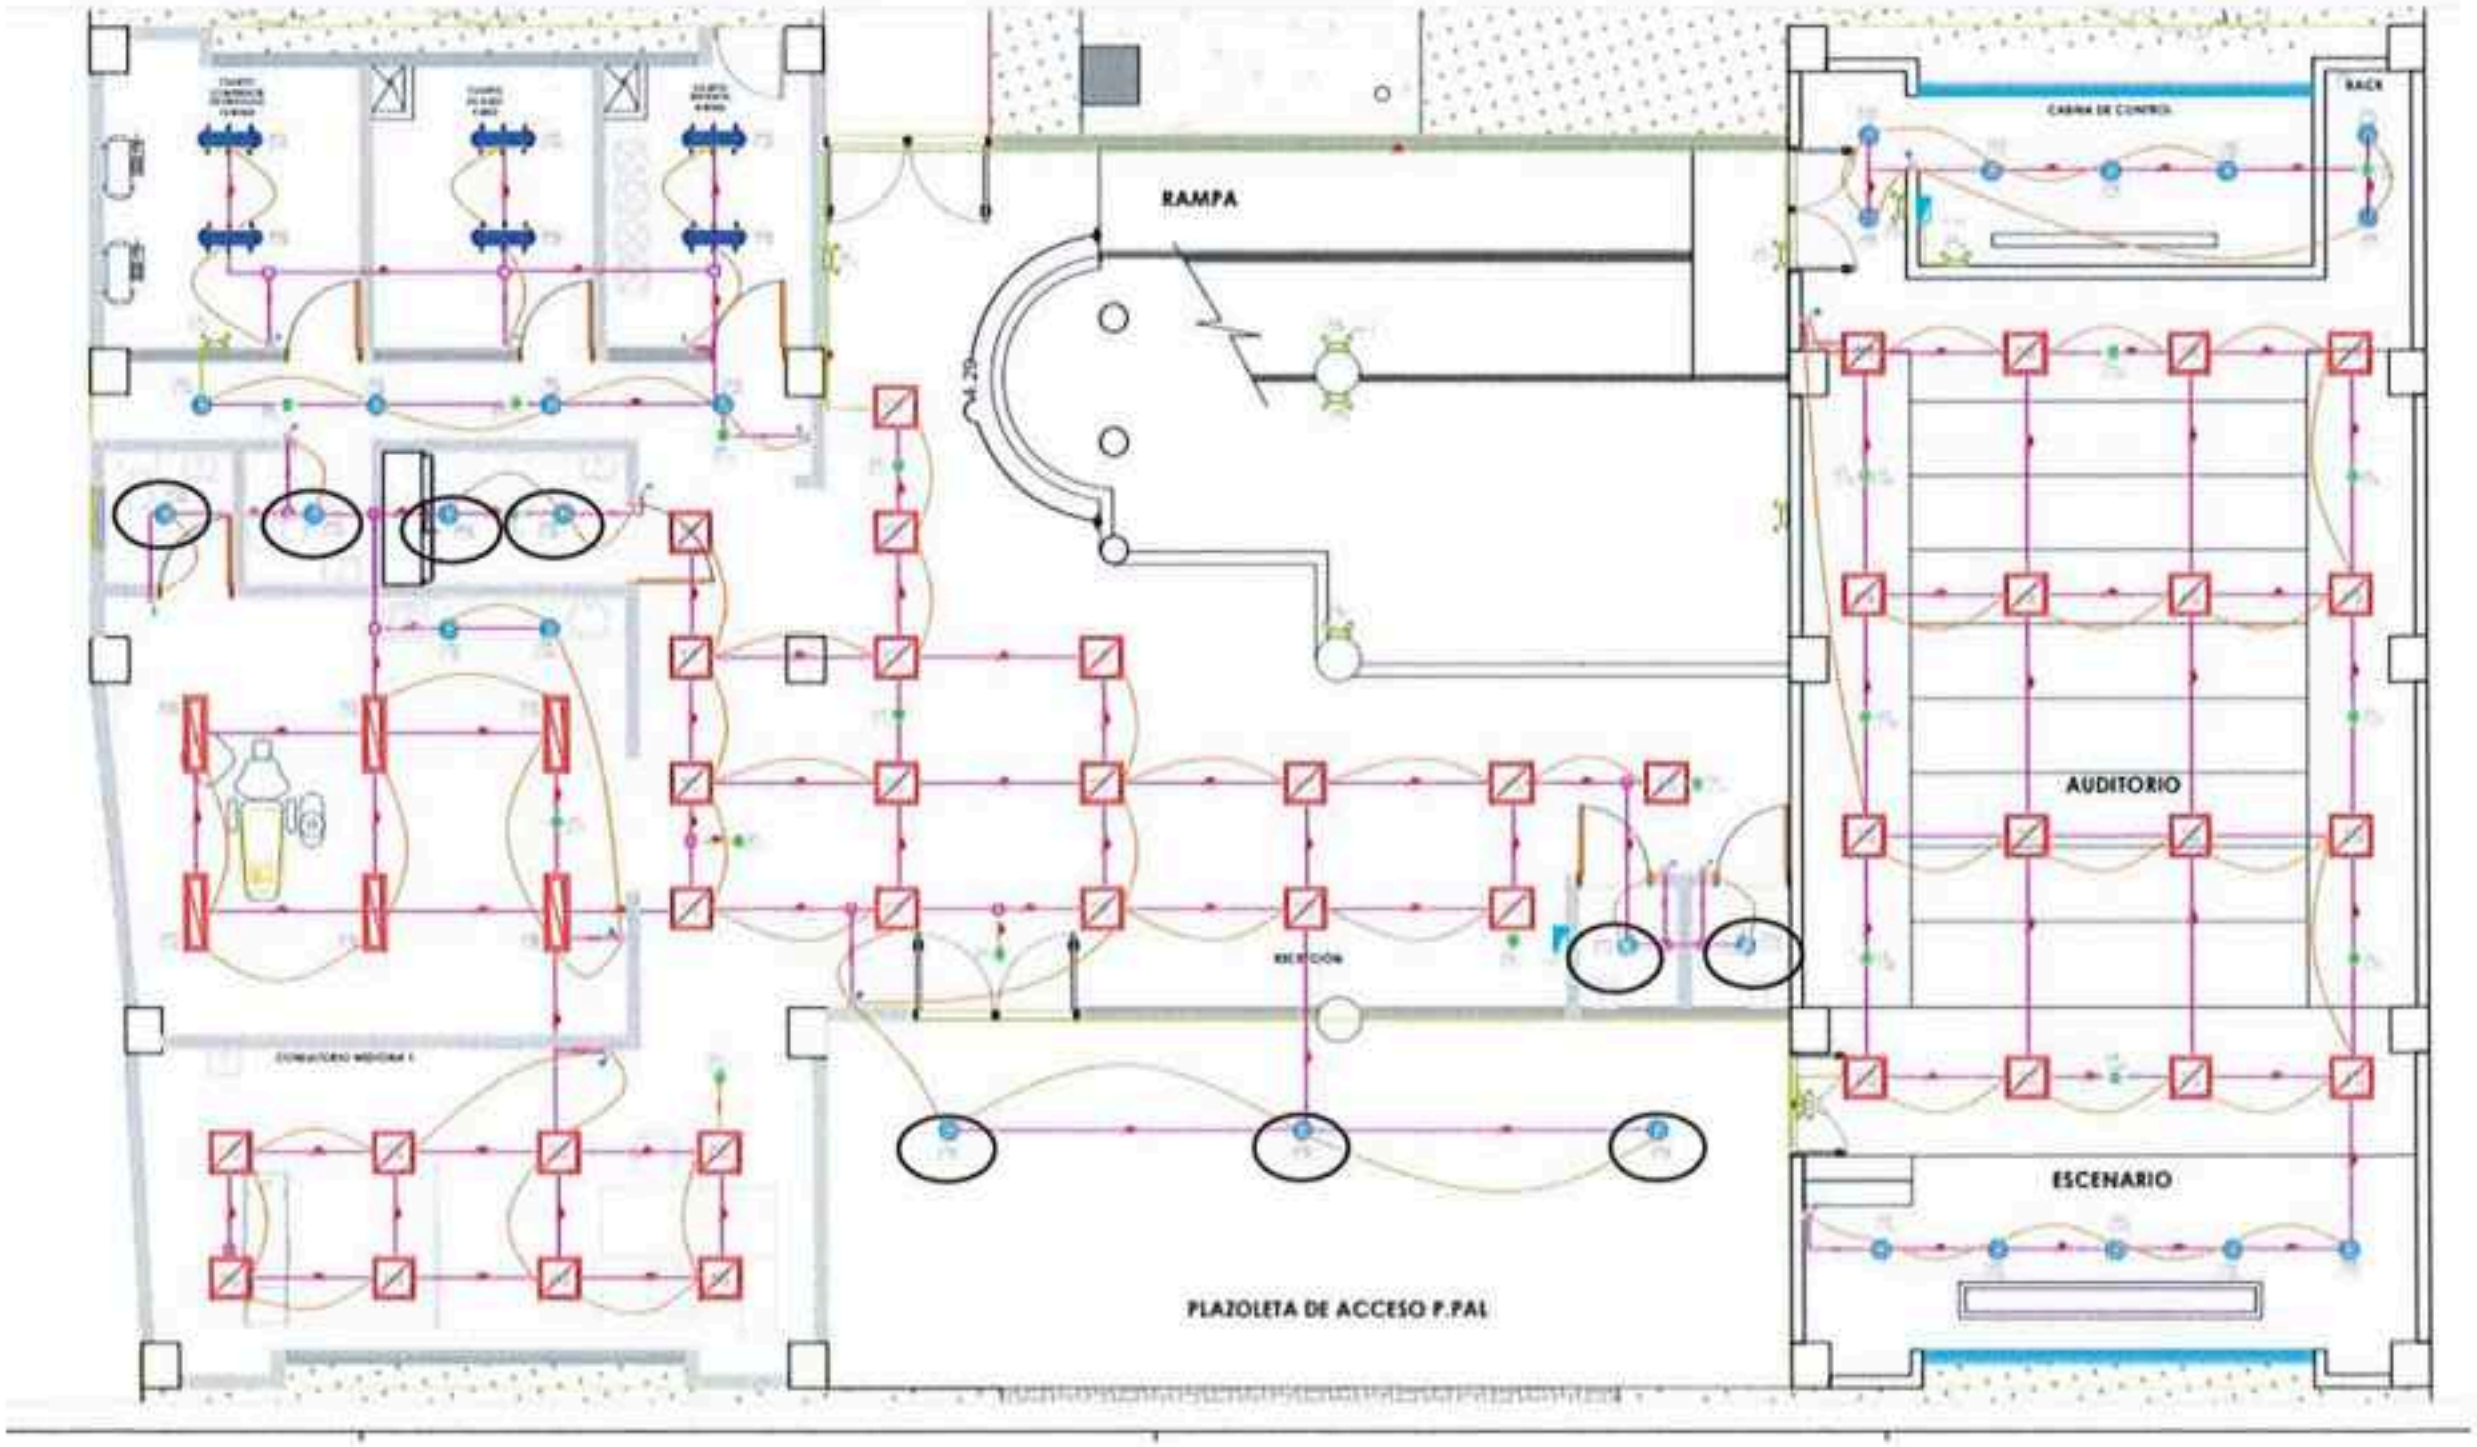


DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE				**UBICACIÓN**	SAN JOSE DEL BUBUY			
					FECHA	25/05/2026			
					ACTA No	Recibo y liquidación			
CAPÍTULO	**8**	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**	**ÍTEM**	**8.7**	**Modulo LED redondo 24W, 110 V 1680-2400 lm de sobreponer. Suministro e instalación**	**UND**	**und**	**CANT.**	**0,00**

DISTRIBUCIÓN LUMINARIAS PISO 2

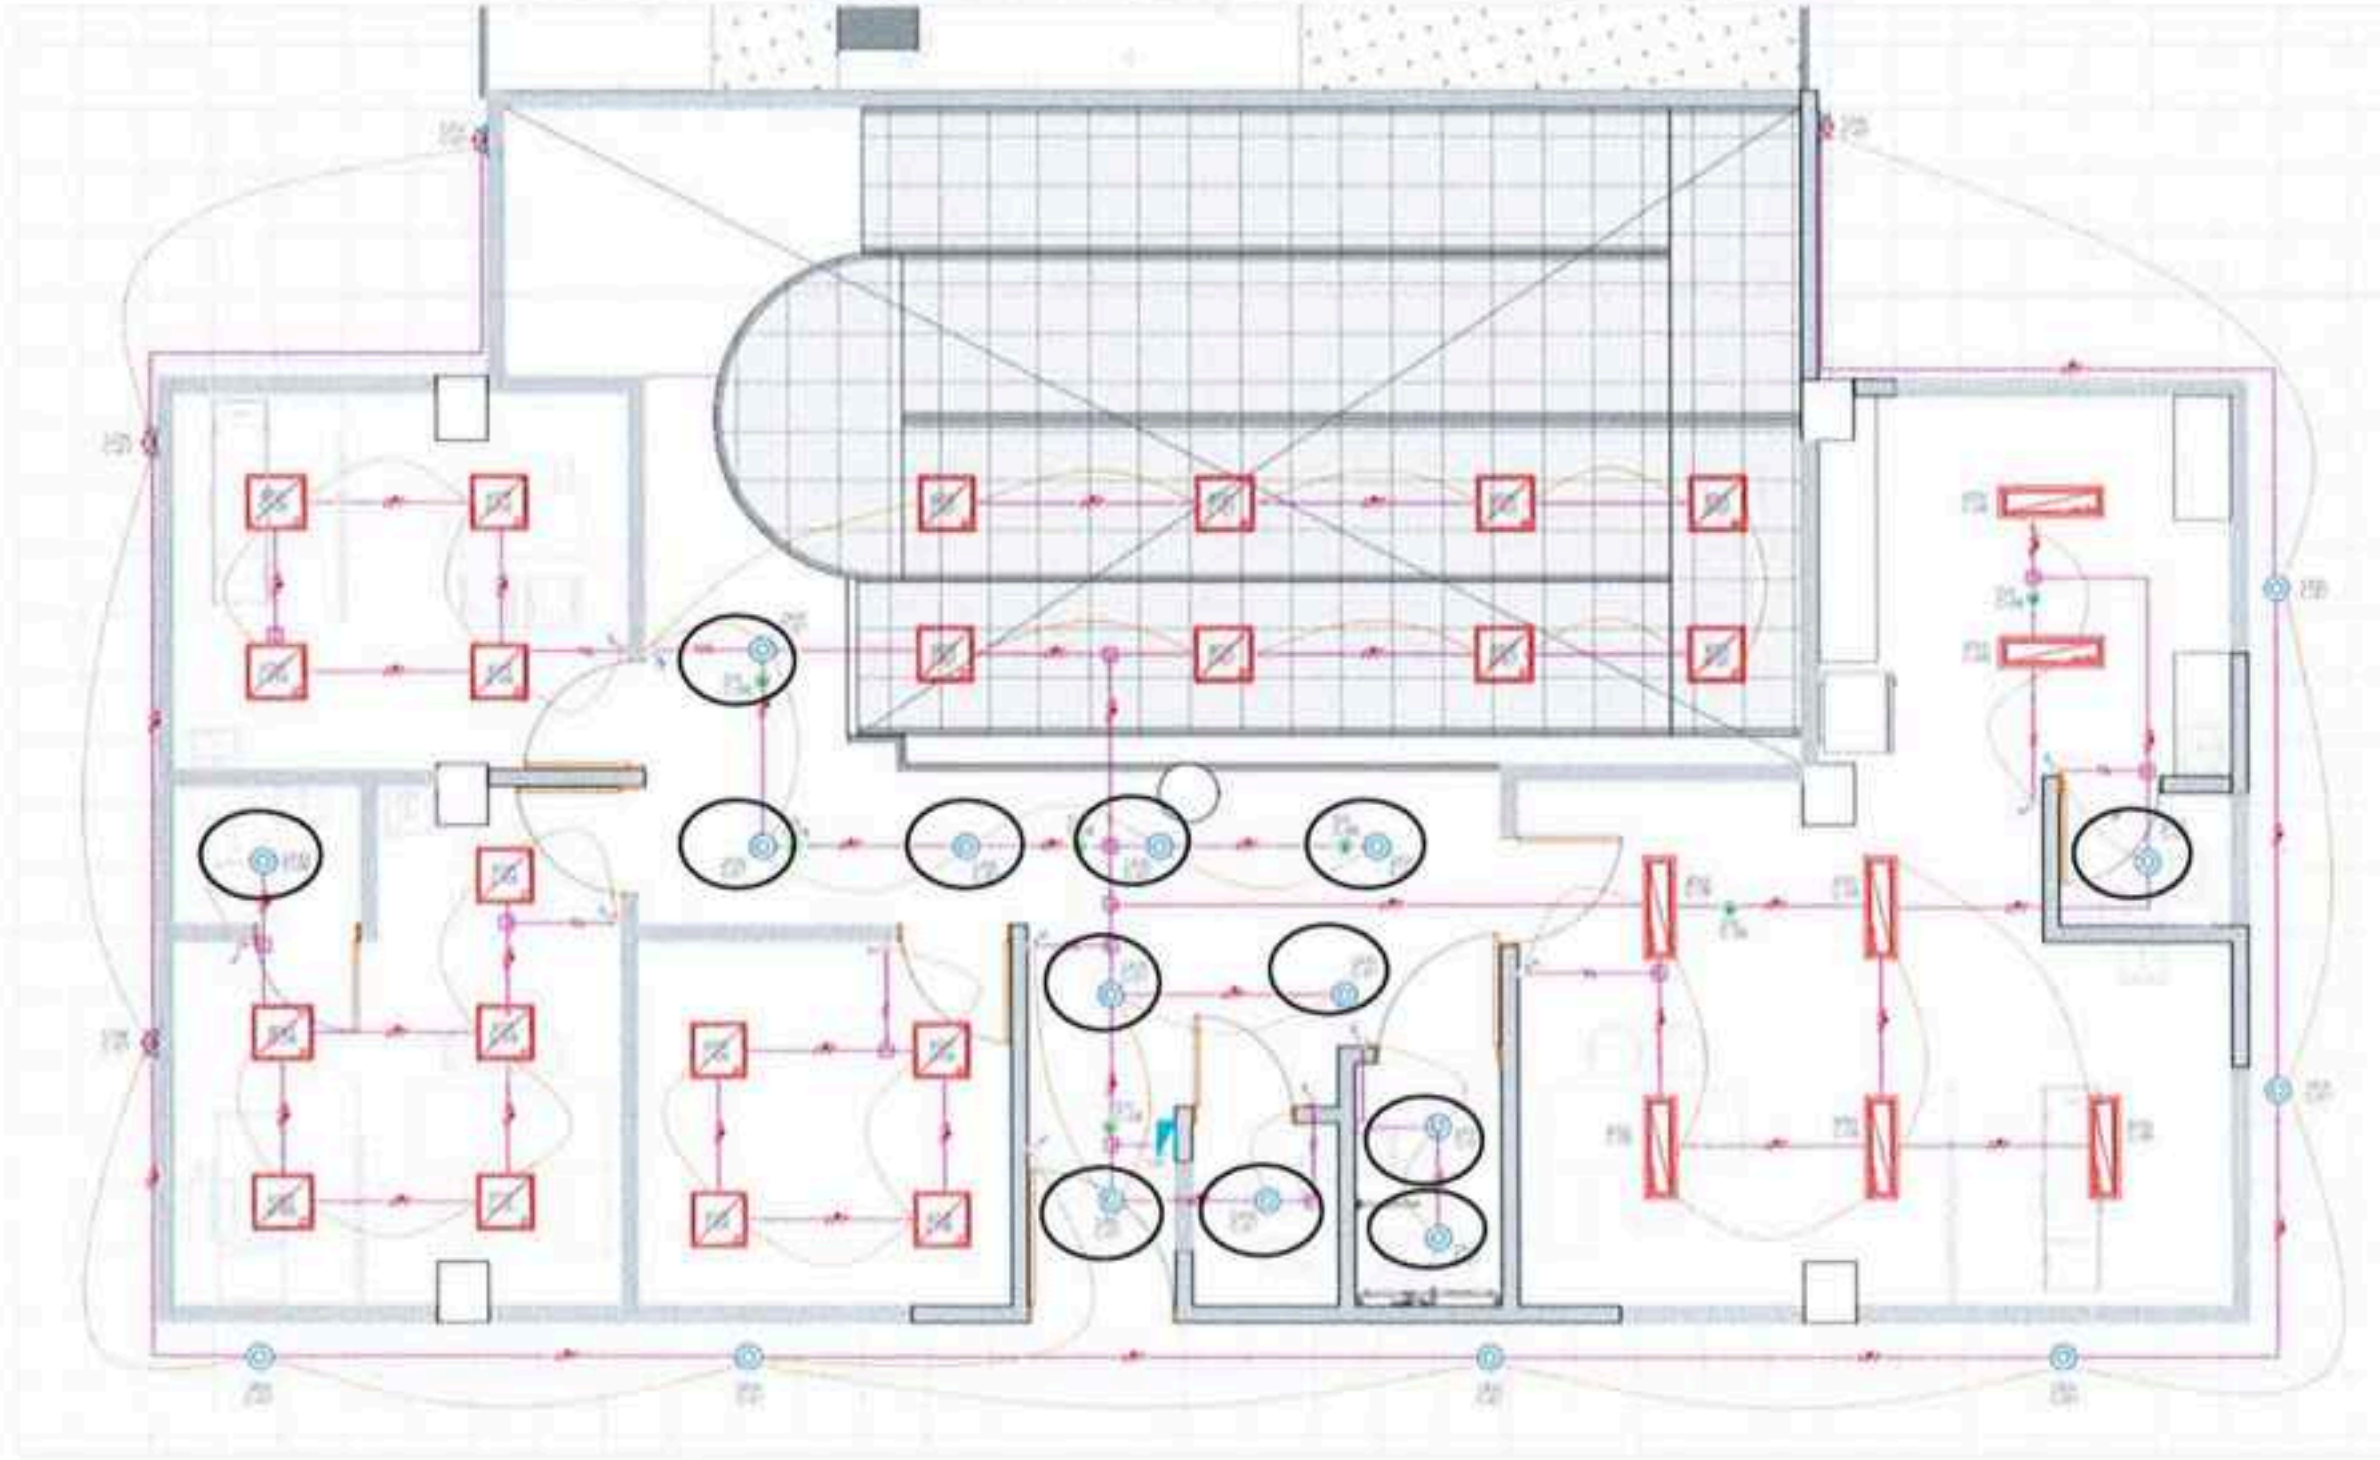

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E


DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	**UBICACIÓN**	SAN JOSE DEL BUBUY
		FECHA	25/05/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	8	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	ÍTEM	8.8	Luminaria tipo panel led 30x120 cm, 40W, 110 V. Incluye: Elementos de fijación, suministro e instalación	UND	und	CANT.	13,00

DISTRIBUCIÓN LUMINARIAS PISO 1

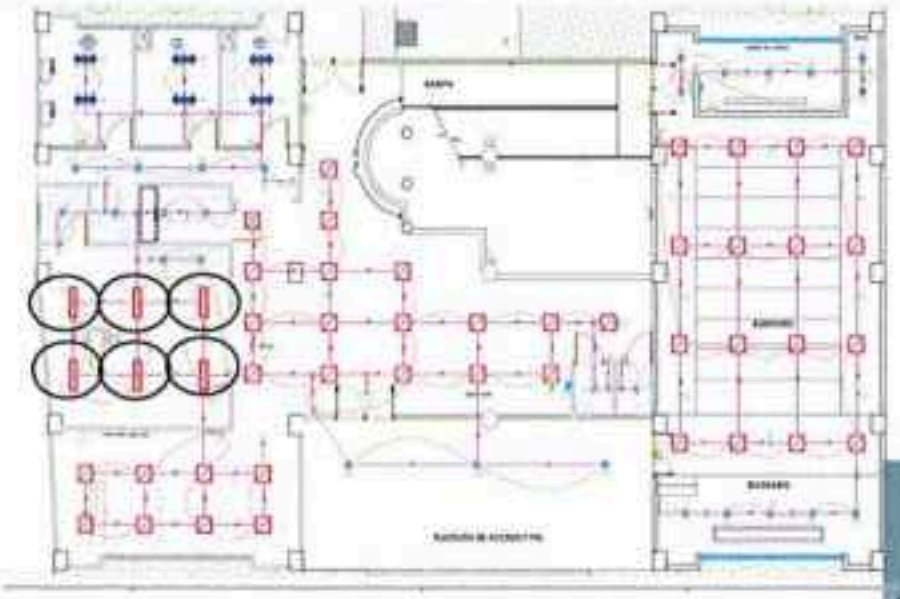



DISTRIBUCIÓN LUMINARIAS PISO 2

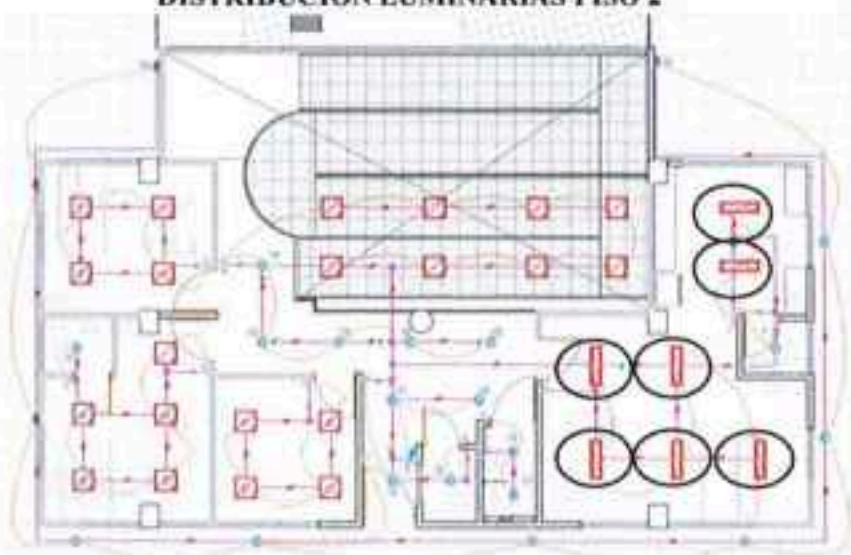




ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA	LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES					CANT. TOTAL
			LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	ÁREA (M2)	CANT.	
	Luminaria tipo panel led 30 x 120 cm	Piso 1						6,00
		Piso 2						7,00

CANTIDAD PROYECTADA	**13,00**
CANTIDAD CONTRACTUAL	**13,00**
DIFERENCIA	**0,00**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	ROSSY ELENA NIÑO GÓMEZ	APROBÓ	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL	
CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPICO INGENIERIA S A S	

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E


DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	UBICACIÓN	SAN JOSE DEL BUBUY
		FECHA	25/05/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	8	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	ÍTEM	8.9	Salida para interruptor sencillo, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plástica 5800, terminales PVC y readecuación de muro.	UND	und	CANT.	21,00

DISTRIBUCIÓN LUMINARIAS PISO 1

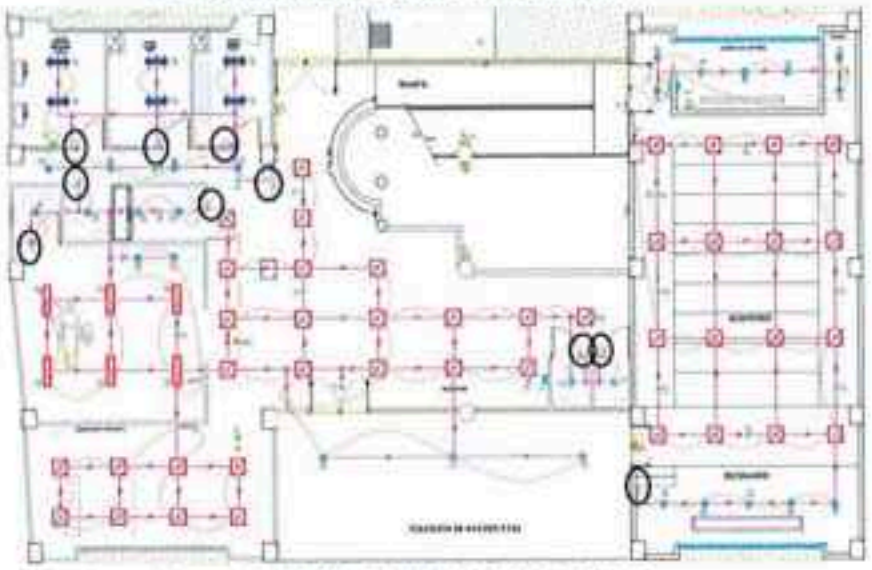



DISTRIBUCIÓN LUMINARIAS PISO 2

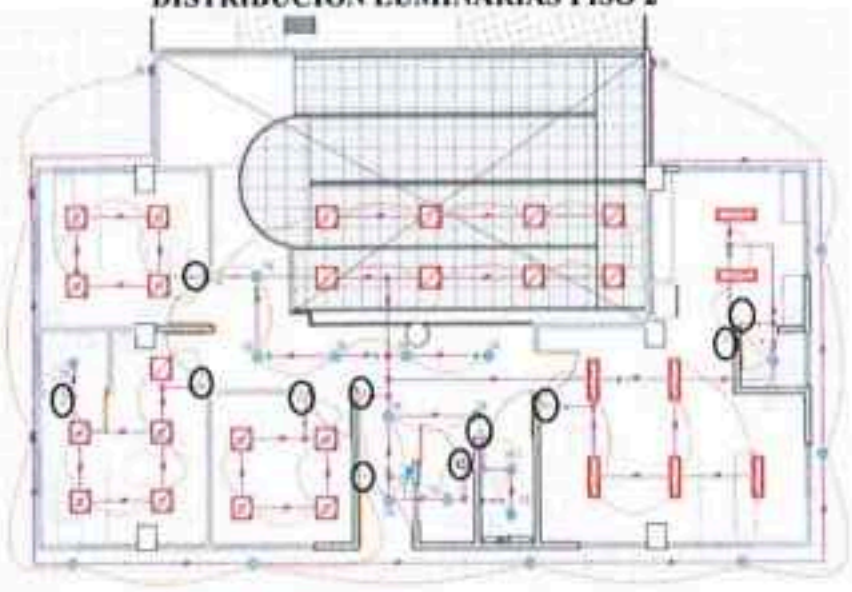




ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA	LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES					CANT. TOTAL
			LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	ÁREA (M2)	CANT.	
	Salida para interruptor	Primer Piso					10,00	10,00
		Segundo Piso					11,00	11,00

CANTIDAD PROYECTADA	21,00
CANTIDAD CONTRACTUAL	21,00
DIFERENCIA	0,00

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:	ROSSY ELENA NIÑO GÓMEZ	APROBÓ:	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL	
CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPICO INGENIERIA S.A.S	


HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E

DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE				**UBICACIÓN**	SAN JOSE DEL BUBUY			
					FECHA	25/05/2026			
					ACTA No	Recibo y liquidación			
CAPÍTULO	**8**	**ITEM S O PREVISTOS**	**ÍTEM**	**8.10**	**Salida para interruptor doble, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plástica 5800, terminales PVC y readecuación de muro.**	**UND**	**und**	**CANT.**	**5,00**

DISTRIBUCION LUMINARIAS PISO 1

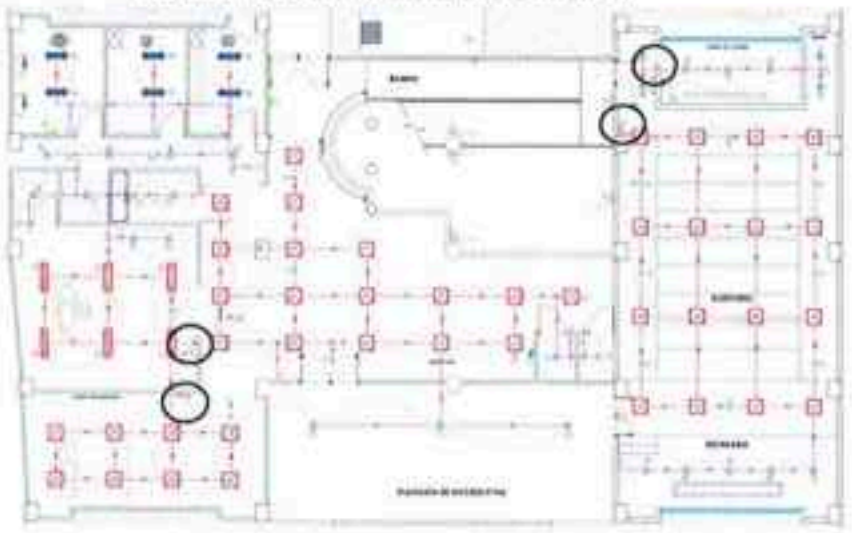



DISTRIBUCIÓN LUMINARIAS PISO 2





ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA	**LOCALIZACIÓN**		**DIMENSIONES**					**CANT. TOTAL**
			LONG (M)	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	**ÁREA (M2)**	**CANT.**	
	Interruptor doble	Primer piso					4,00	4,00
		Segundo Piso					1,00	1,00

CANTIDAD PROYECTADA	**5,00**
CANTIDAD CONTRACTUAL	**5,00**
DIFERENCIA	**0,00**

OBSERVACIONES:



ELABORÓ:	ROSSY ELENA NIÑO GÓMEZ	APROBÓ:	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL	
CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPICO INGENIERIA S.A.S	

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E

DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE				**UBICACIÓN**	SAN JOSE DEL BUBUY			
					FECHA	25/05/2026			
					ACTA No	Recibo y liquidación			
CAPÍTULO	**8**	**ITEM S O PREVISTOS**	**ÍTEM**	**8.13**	**Salida para tomacorriente a 220 V, 30 A, en tubería PVC 3/4" y cable de cobre THWN 2x10+1x12T , incluye aparato. Suministro e instalación**	**UND**	**und**	**CANT.**	**13,00**

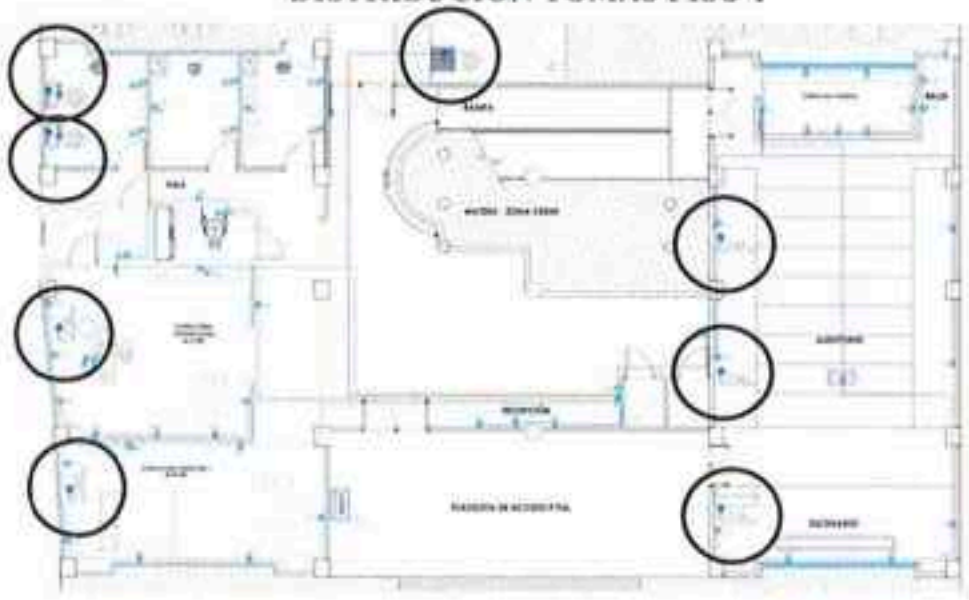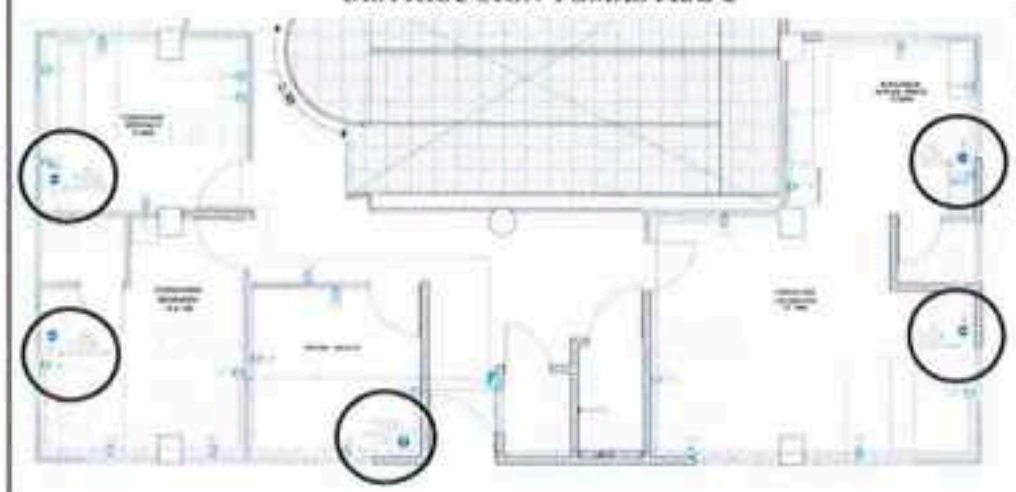ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA	LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES					CANT. TOTAL
			LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	ÁREA (M2)	CANT.	
DISTRIBUCIÓN TOMAS PISO 1 	Salida tomacorriente a 220 v	Primer piso					8,00	8,00
		Segundo Piso					5,00	5,00
DISTRIBUCIÓN TOMAS PISO 2  								

CANTIDAD PROYECTADA	**13,00**
CANTIDAD CONTRACTUAL	**13,00**
DIFERENCIA	**0,00**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	ROSSY ELENA NIÑO GÓMEZ	APROBÓ	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL	
CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPICO INGENIERIA S.A.S	

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E


DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	UBICACIÓN	SAN JOSE DEL BUBUY
		FECHA	25/05/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	9	CARPINTERIA METALICA	ÍTEM	9.1	Puerta en madera batiente de 1 hoja, con tablero entamborado e=4 cm con triplex 4.0 mm, con marco en madera, lacada, con cerradura de manija hacia adentro y hacia afuera en acero inoxidable y brazo neumático. instalada	UND	m²	CANT.	46,32

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA

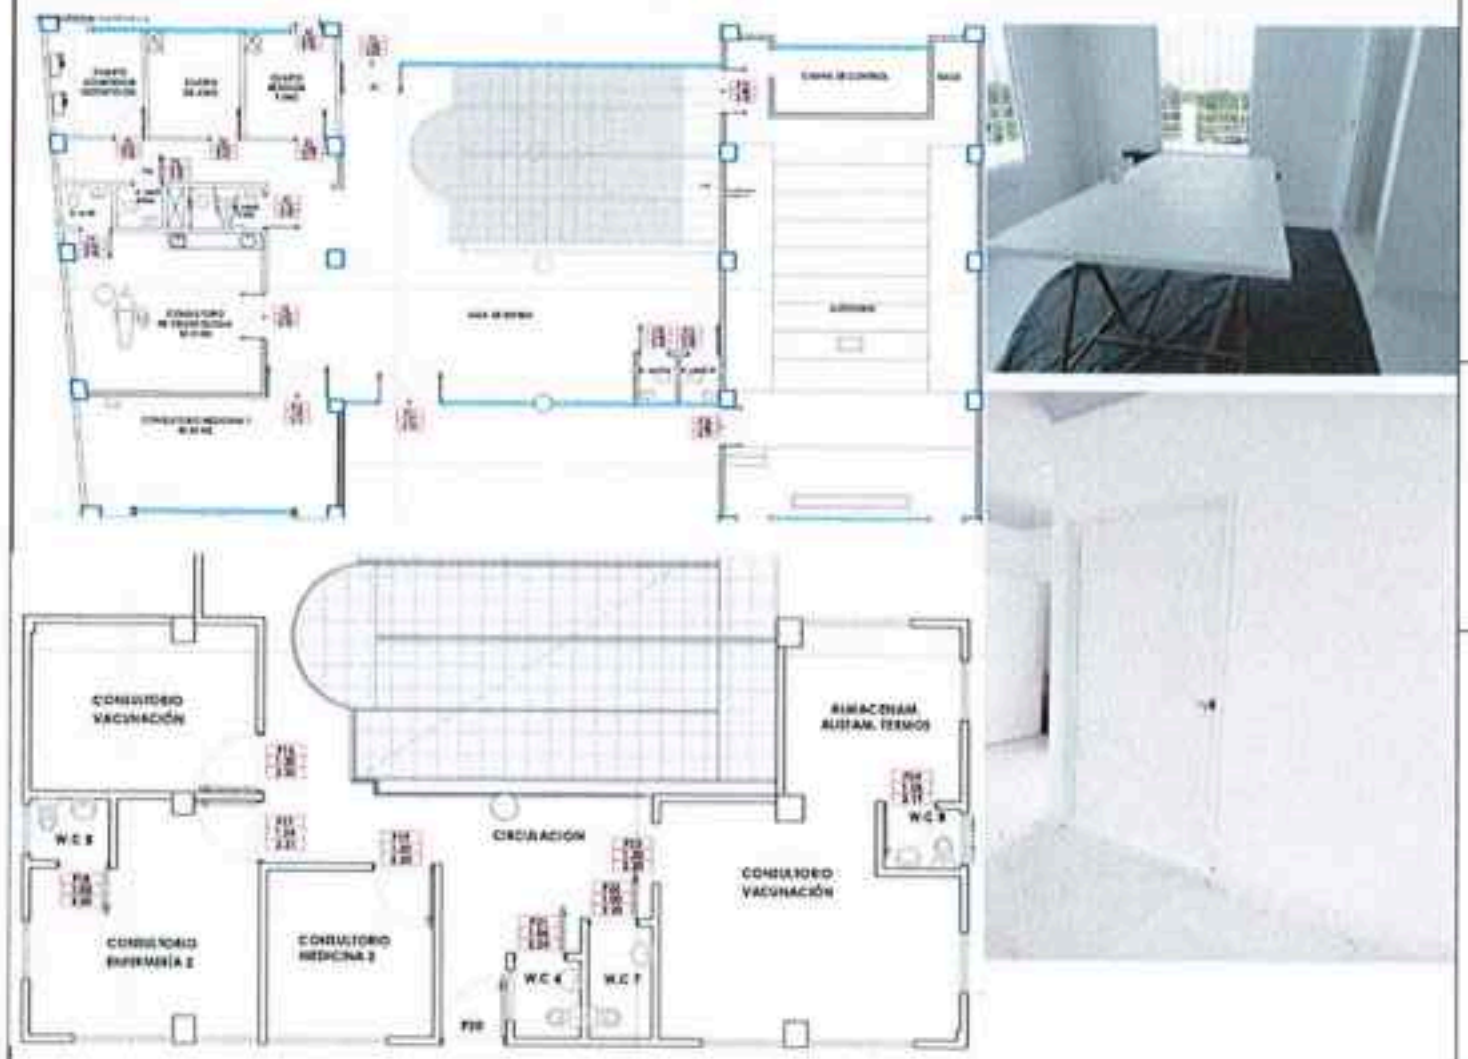

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES					CANT. TOTAL
		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	ÁREA (M2)	CANT.	
Primer piso	Cuarto residuos - P3		0,98	2,17		1,00	2,13
	Cuarto de aseo - P4		0,95	2,16		1,00	2,05
	Cuarto compresores - P5		0,97	2,18		1,00	2,11
	U. Sant mixta - P6		0,94	2,18		1,00	2,05
	U. sant PMR - P7		1,12	2,18		1,00	2,44
	Un Sant - P9		0,94	2,18		1,00	2,05
	Odontologia - P8		1,50	2,18		1,00	3,27
	Consultoria medicina 1 - P10		1,94	2,16		1,00	4,19
	U. sant H - P12		0,94	2,18		1,00	2,05
	U. Sant M - P13		0,94	2,18		1,00	2,05
	Auditorio - P14		1,48	2,18	-	1,00	3,23
Segundo Piso	Consutorio med 2 - P16		1,20	2,20		1,00	2,64
	Consultorio enfermeria 2 - P17		1,24	2,21		1,00	2,74
	Un. Sant - P18		1,00	2,20		1,00	2,20
	Oficina Archivo -P19		1,20	2,20		1,00	2,64
	Und saniaria H - P21		1,10	2,20		1,00	2,42
	Und saniaria M - P22		1,00	2,20		1,00	2,20
	Consultorio Vacunación- P23		1,20	2,20		1,00	2,64
	Unt Sant - P24		1,03	1,19		1,00	1,23

CANTIDAD PROYECTADA	46,32
CANTIDAD CONTRACTUAL	47,35
DIFERENCIA	-1,03

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:	ROSSY ELENA NIÑO GOMEZ	APROBÓ:	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
	RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL
	CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPICO INGENIERIA S.A.S

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E


DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	UBICACIÓN	SAN JOSE DEL BUBUY
		FECHA	25/05/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	9	CARPINTERIA METALICA	ÍTEM	9.1	Puerta en madera batiente de 1 hoja, con tablero entamborado e=4 cm con triplex 4.0 mm, con marco en madera, lacada, con cerradura de manija hacia adentro y hacia afuera en acero inoxidable y brazo neumático. Instalada	UND	m²	CANT.	0,00

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA

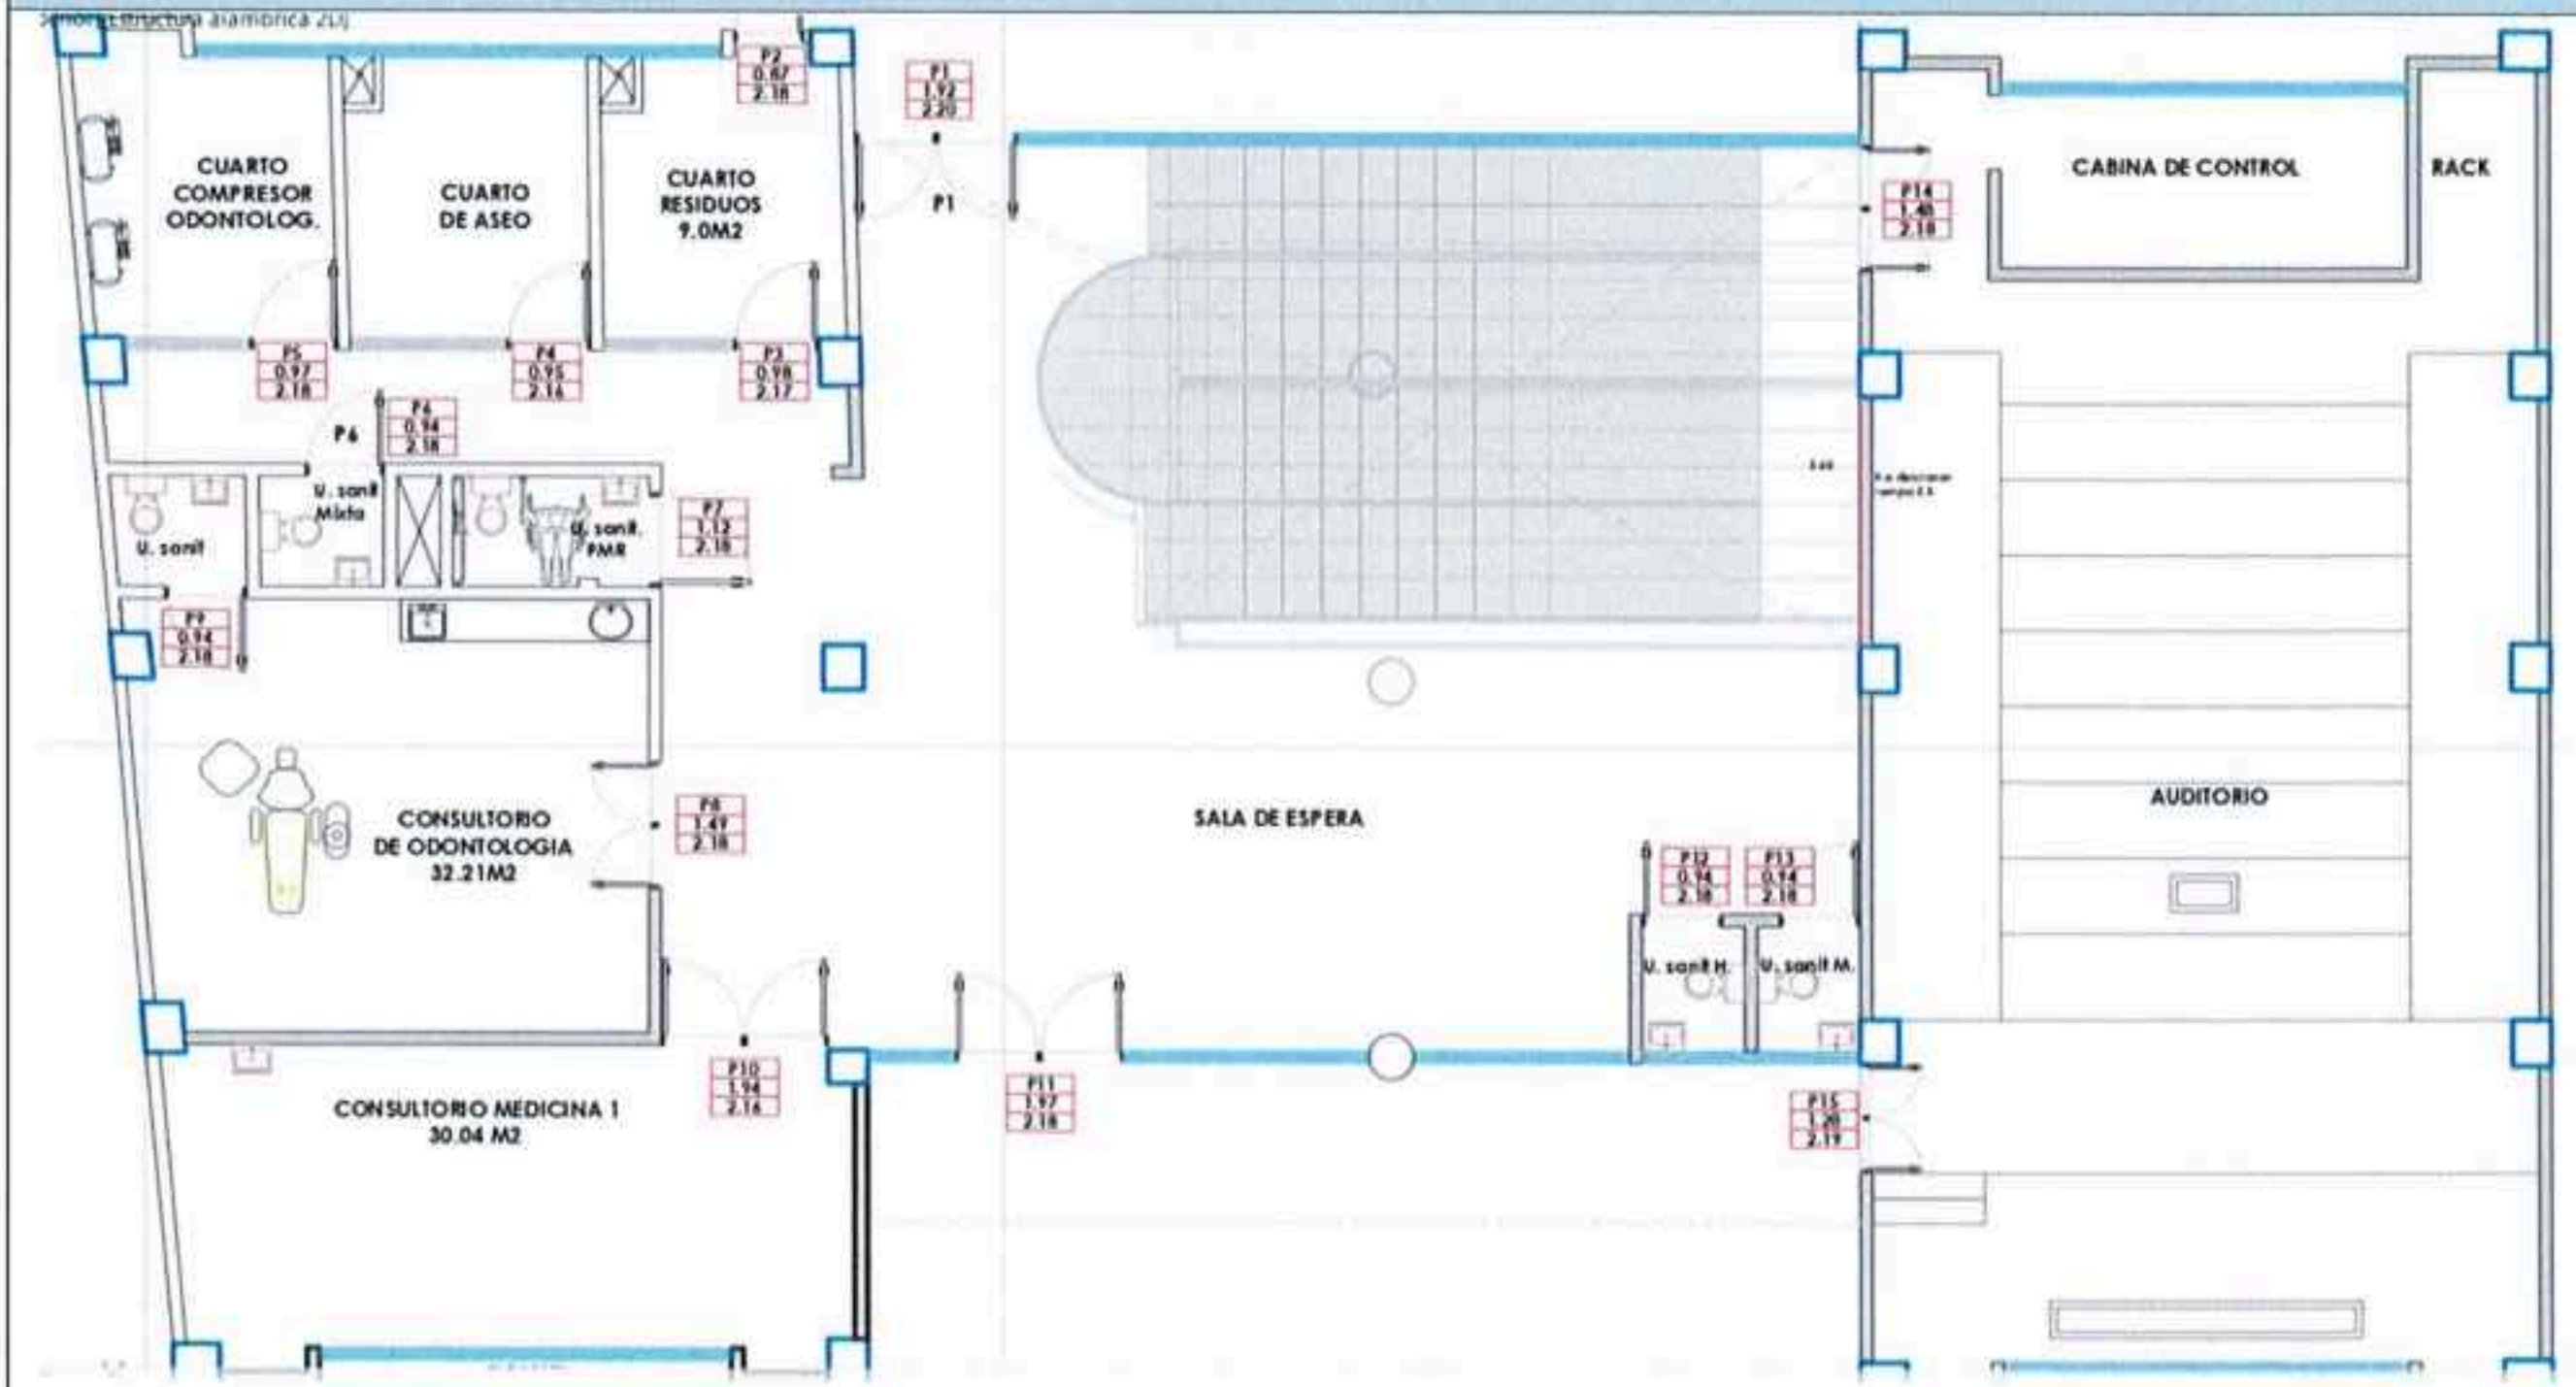


HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E

DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE				**UBICACIÓN**	SAN JOSE DEL BUBUY			
					FECHA	25/05/2026			
					ACTA No	Recibo y liquidación			
CAPÍTULO	**9**	**CARPINTERIA METALICA**	**ÍTEM**	**9.1**	**Puerta en madera batiente de 1 hoja, con tablero entamborado e=4 cm con triplex 4.0 mm, con marco en madera, lacada, con cerradura de manija hacia adentro y hacia afuera en acero inoxidable y brazo neumático. Instalada**	**UND**	**m²**	**CANT.**	**0,00**

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA

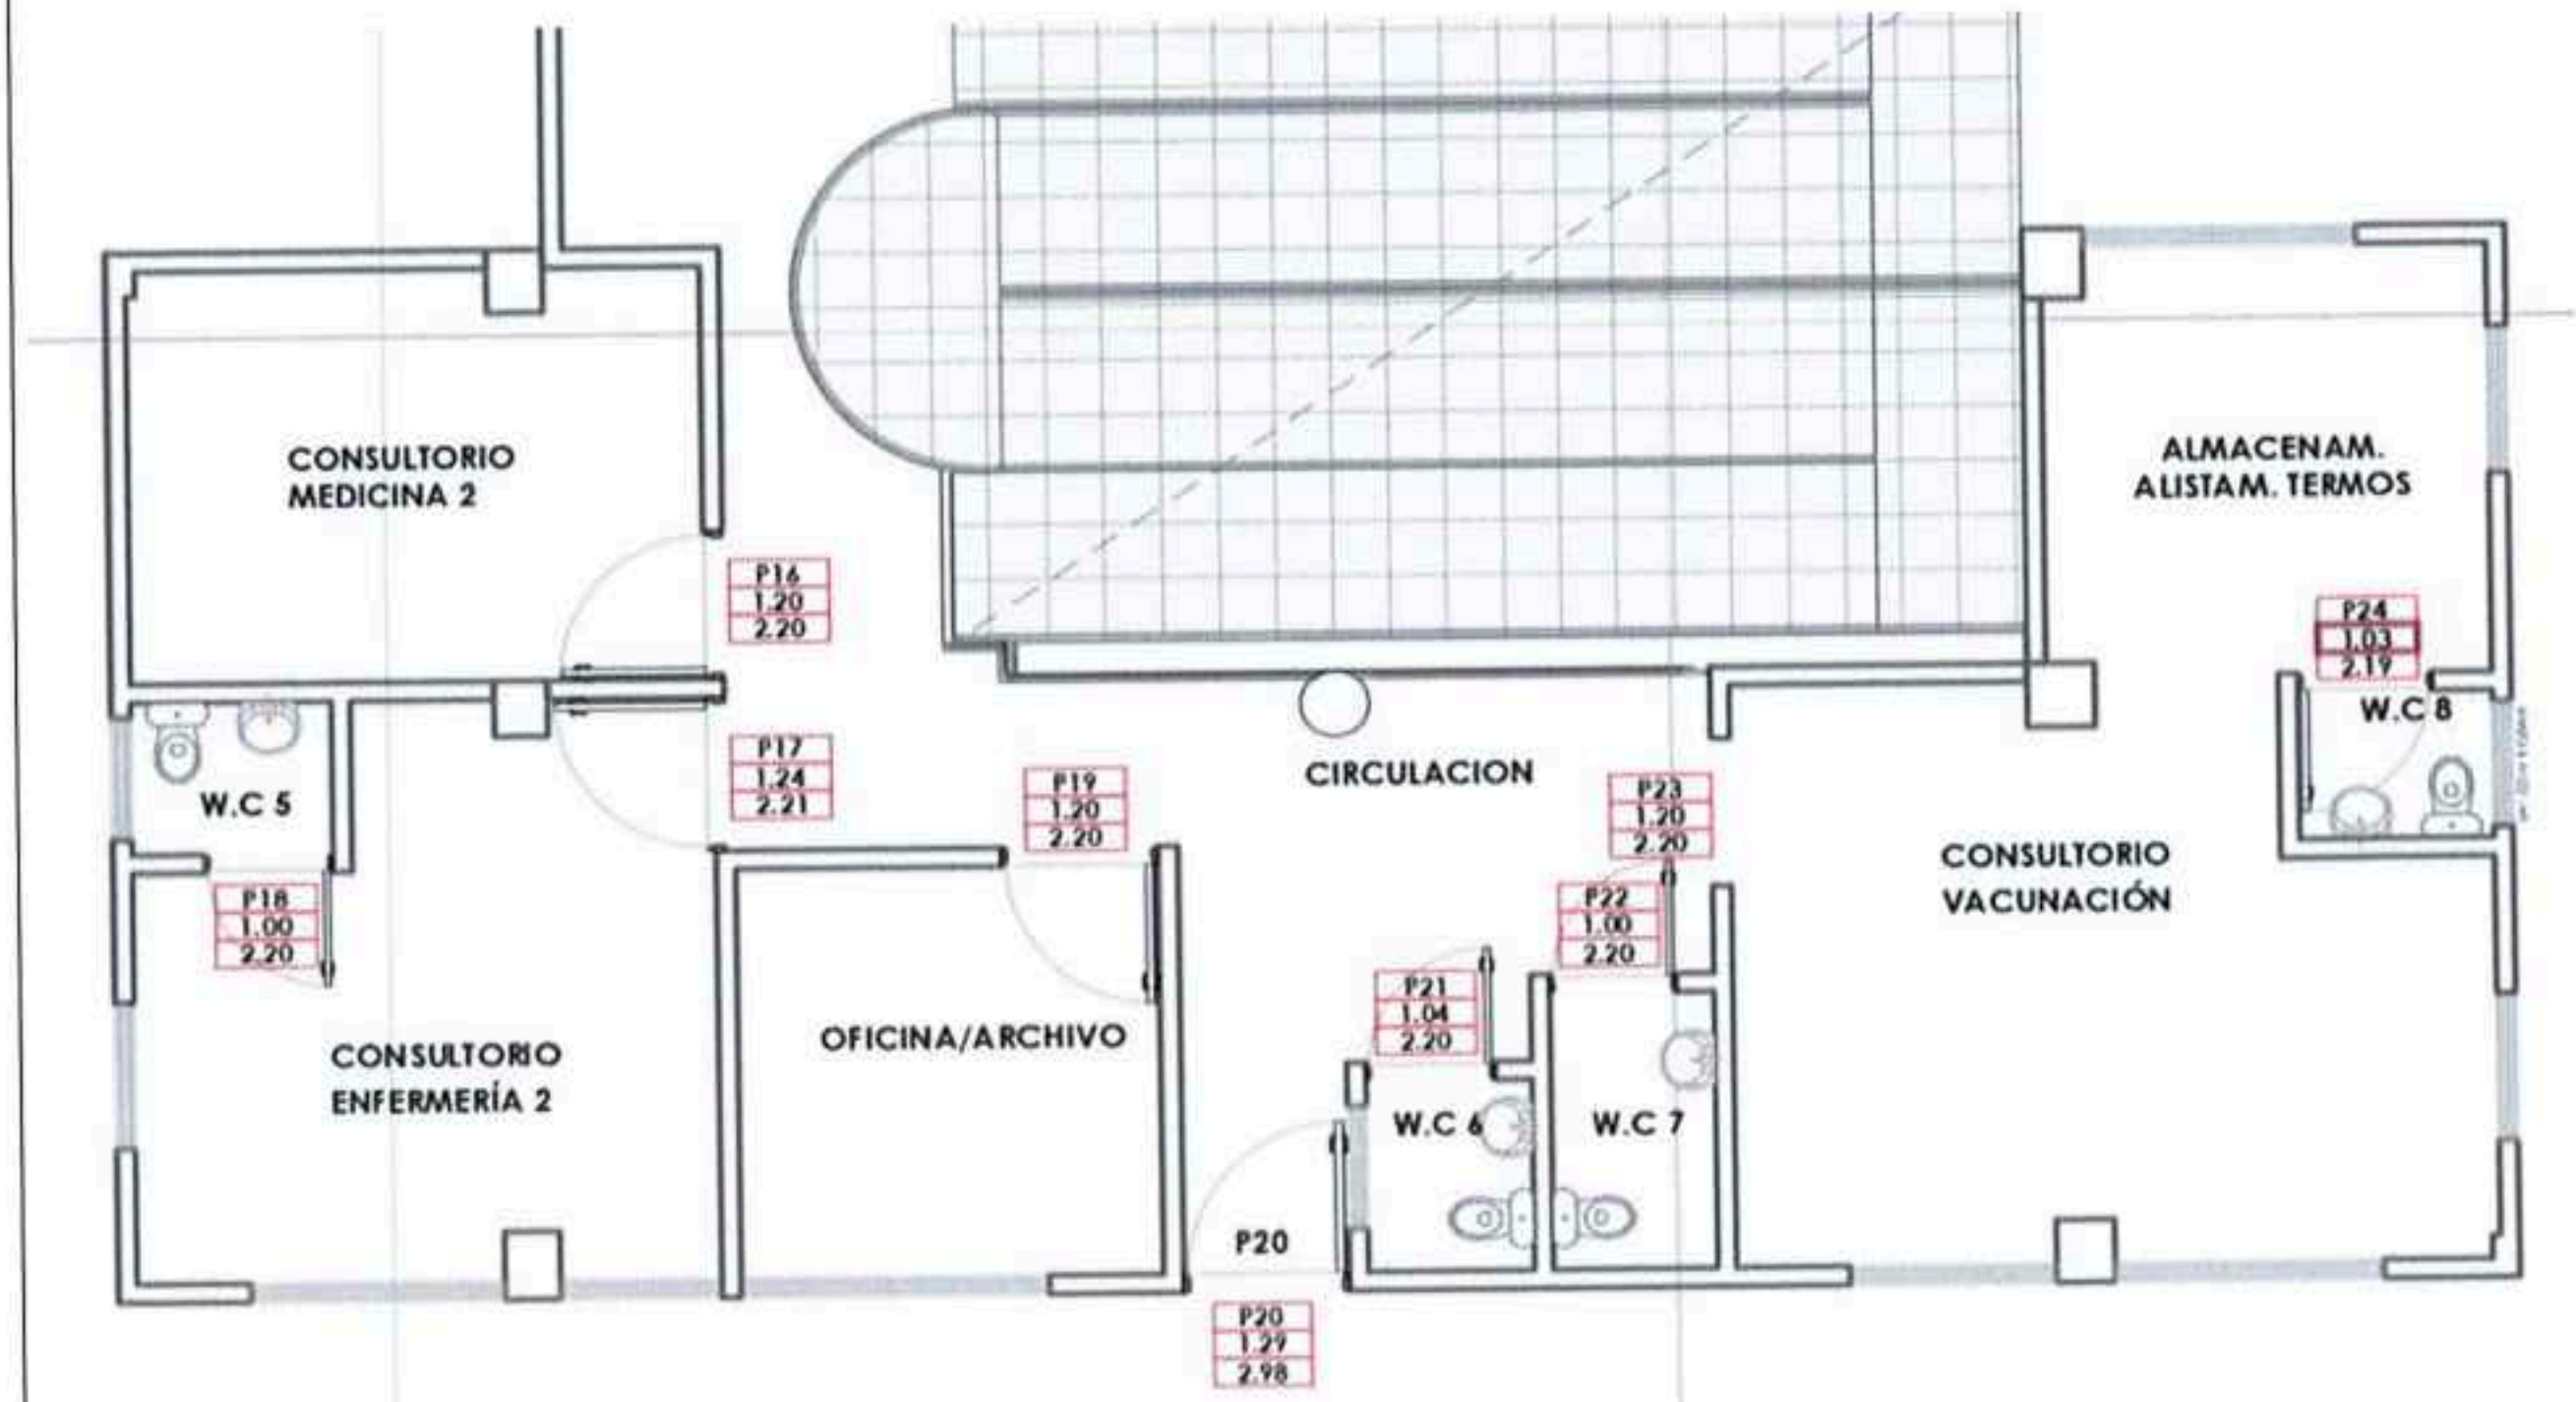


HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E

DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	UBICACIÓN	SAN JOSE DEL BUBUY
		FECHA	25/05/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	9	CARPINTERIA METALICA	ÍTEM	9.2	Cerradura de doble seguridad de escudo pomo y cerrojo para entrada principal. Suministro e instal.	UND	und	CANT.	4,00

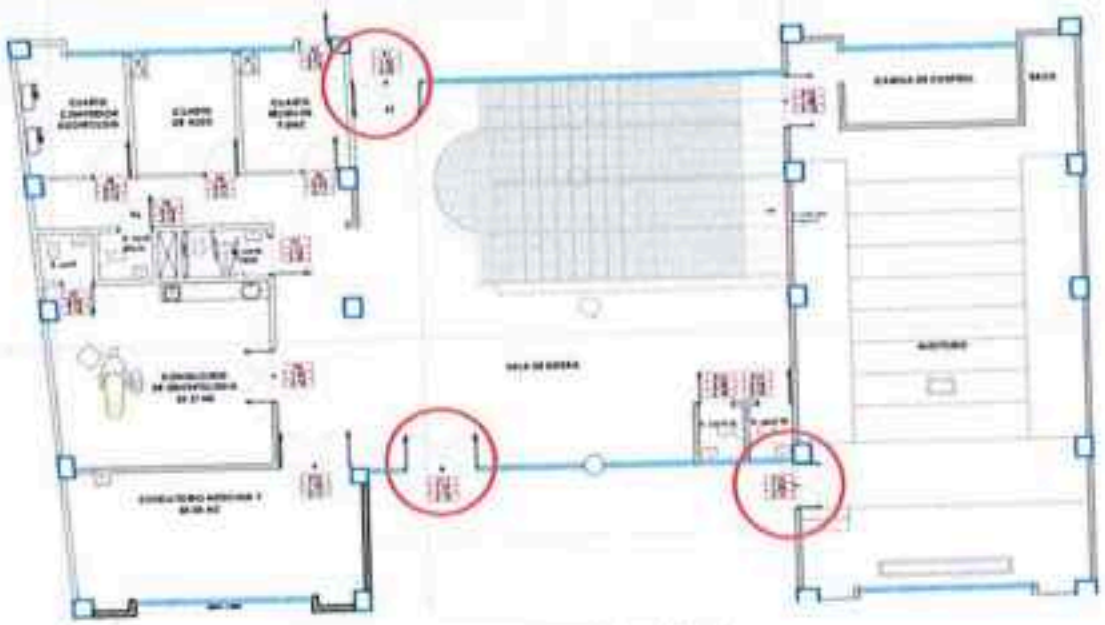ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA	LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES					CANT. TOTAL
			LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	ÁREA (M2)	CANT.	
		Entrada principal					1,00	1,00
	Primer piso	Entrada posterior					1,00	1,00
		Entrada Auditorio					1,00	1,00
	Segundo piso	Terraza					1,00	1,00
								

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E


DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	UBICACIÓN	SAN JOSE DEL BUBUY
		FECHA	25/05/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	NP	ITEM 5 O PREVISTOS	ÍTEM	NP1	Guardaescoba mediacaña en granito pulido y brillado con junta de dilatación plástica m	UND	ml	CANT.	61,55

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA

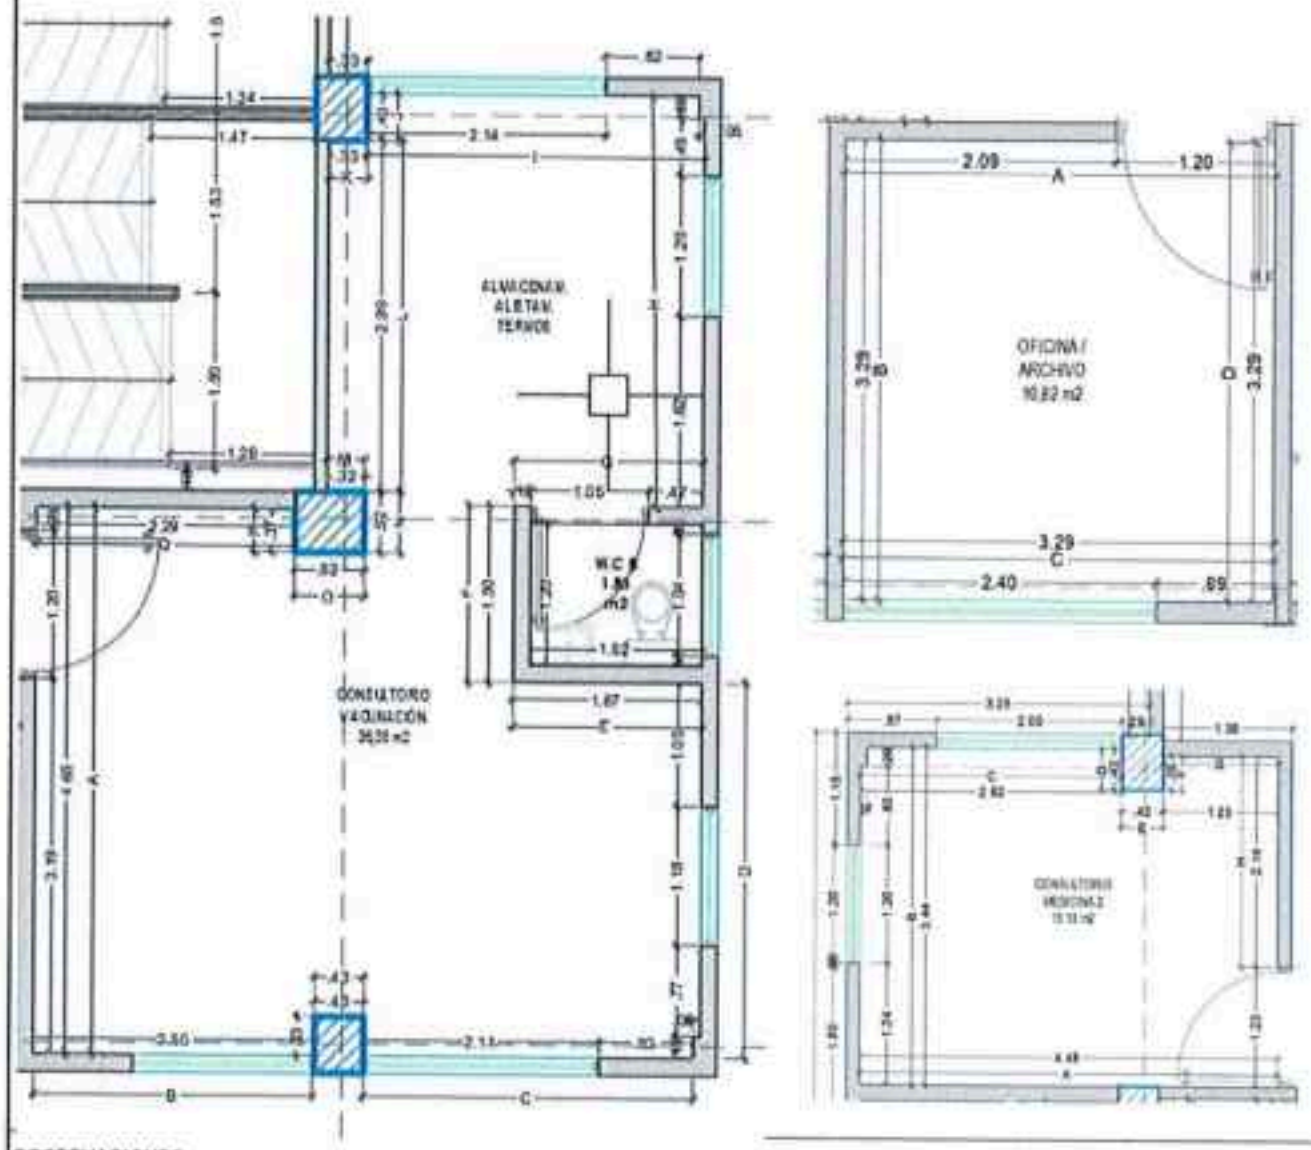

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	ÁREA (M2)	CANT.	CANT. TOTAL
Colsultorio de vacucación y almacenamiento alistado de termos	Lado A	4,65				1,00	4,65
	Puerta	1,20				- 1,00	- 1,20
	Lado B	2,50				2,00	5,00
	Columna lateral	0,33				2,00	0,66
	Columna frente	0,43				1,00	0,43
	Lado C	3,00				1,00	3,00
	Lado D	3,00				1,00	3,00
	Lado D - Columna	0,19				1,00	0,19
	Lado E	1,67				1,00	1,67
	Lado F	1,50				1,00	1,50
	Lado G	1,67				1,00	1,67
	Puerta baño	1,05				- 1,00	- 1,05
	Lado G	3,50				1,00	3,50
	Lado I	2,96				1,00	2,96
	Lado J columna	0,40				1,00	0,40
	Lado K columna	0,33				1,00	0,33
	Lado L	2,99				1,00	2,99
	Lado M - columna	0,32				1,00	0,32
	Lado N - columna	0,52				1,00	0,52
	Lado O - columna	0,62				1,00	0,62
	Lado P - columna	0,37				1,00	0,37
	Lado Q	2,29				1,00	2,29
Oficina Archivo	Lado A	2,09				1,00	2,09
	Lado B	3,29				1,00	3,29
	Lado C	3,29				1,00	3,29
	Lado D	3,29				1,00	3,29
Consultorio enfermeria	Lado A	3,42				1,00	3,42
	Lado B	1,26				1,00	1,26
	Lado C - columna	0,40				2,00	0,80
	Lado D	0,43				1,00	0,43
	Lado E	2,88				1,00	2,88
	Lado F	3,23				1,00	3,23
	Puerta baño	0,99				- 1,00	- 0,99
	Lado H	1,41				1,00	1,41
	Lado I	1,11				1,00	1,11
	Lado K columna	0,25				1,00	0,25
	Lado J columna	0,42				1,00	0,42
	Lado K columna	0,29				1,00	0,29
	Lado L	1,26				1,00	1,26
						CANTIDAD PROYECTADA	61,55

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:	ROSSY ELENA NIÑO GÓMEZ	APROBÓ:	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
	RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL
	CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPICO INGENIERIA S.A.S

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E


DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	UBICACIÓN	SAN JOSE DEL BUBUY
		FECHA	25/05/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPITULO	NP	ITEM S O PREVISTOS	ÍTEM	NP1	Guardaescoba mediacaña en granito pulido y brillado con junta de dilatación plástica m	UND	ml	CANT.	133,62

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA

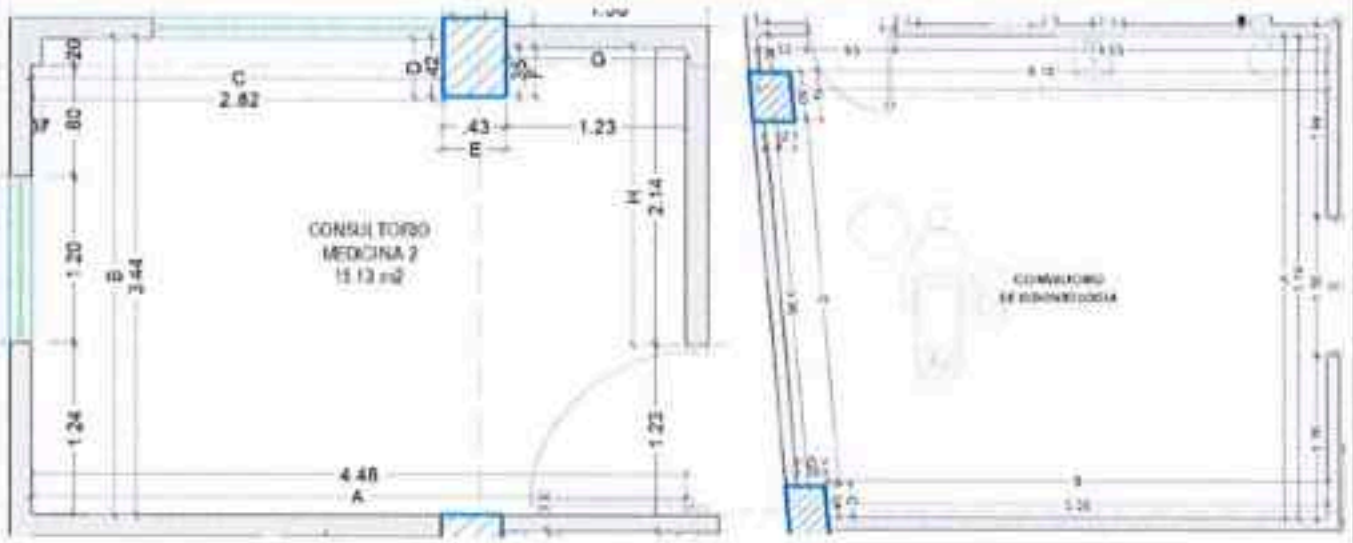





LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES					CANT. TOTAL
		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	ÁREA (M2)	CANT.	
Consultorio medicina	Lado A	4.48				1,00	4,48
	Lado B	3.44				1,00	3,44
	Lado C	2.82				1,00	2,82
	Lado D columna	0.42				1,00	0,42
	Lado E columna	0.43				1,00	0,43
	Lado F columna	0.35				1,00	0,35
	Lado G	1.23				1,00	1,23
	Lado H	2.14				1,00	2,14
Exterior segundo piso	Lado A	4.88				1,00	4,88
	Puerta medicina 2	1.23			-	1,00	1,23
	Puerta Enfermeria 2	1.23			-	1,00	1,23
	Lado B	3.41				1,00	3,41
	Puerta Archivo	1.20			-	1,20	1,73
	Lado C	3.42				1,00	3,42
	Lado D	1.68				1,00	1,68
	Lado E	1.45				1,00	1,45
	Puerta baño	1.11			-	1,00	1,11
	Lado F	0.79				1,00	0,79
	Lado G	1.43				1,00	1,43
	Puerta Baño	1.00			-	1,00	1,00
	Lado H	2.26				1,00	2,26
	Puerta Vacunación	1.20			-	1,00	1,20
Consultorio odontologia	Lado A	5.19				1,00	5,19
	Puerta	1.50			-	1,00	1,50
	Lado B	5.36				1,00	5,36
	Lado C Columna	0.34				1,00	0,34
	Lado D Columna	0.30				1,00	0,30
	Lado E	3.95				1,00	3,95
	Lado F columna	0.32				1,00	0,32
	Lado G columna	0.53				1,00	0,53
	Lado I	6.10				1,00	6,10
	Puerta Baño	0.95			-	1,00	0,95
Consultorio medicina I	Lado A	5.40				1,00	5,40
						CANTIDAD PROYECTADA	72,07
						Viene	61,55
						Total	133,62
						CANTIDAD CONTRACTUAL	135,17
						DIFERENCIA	-1,55

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:	ROSSY ELENA NIÑO GÓMEZ	APROBÓ:	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL	
CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPICO INGENIERIA S.A.S	


HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E


DEPARTAMENTO DE CASANARE


MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE				UBICACIÓN	SAN JOSE DEL BUBUY					
					FECHA	25/05/2026					
					ACTA No	Recibo y liquidación					
CAPÍTULO	NP	ITEM S O PREVISTOS	ÍTEM	NP2	Enchape pared cerámica 30x60 cm blanco "Plana" de Corona o similar. Sumin e instal	UND	m2	CANT.	27,38		

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA

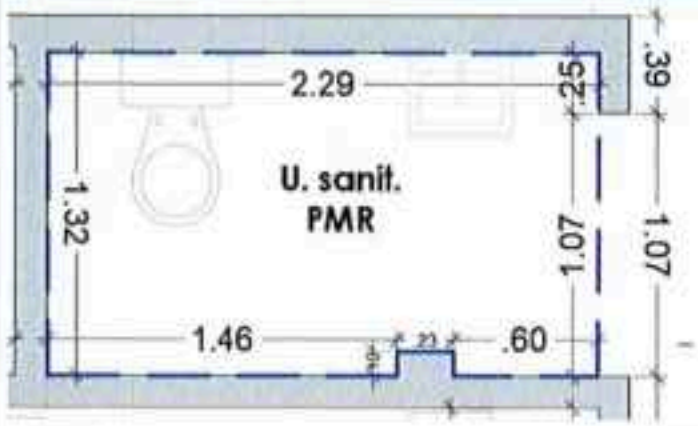

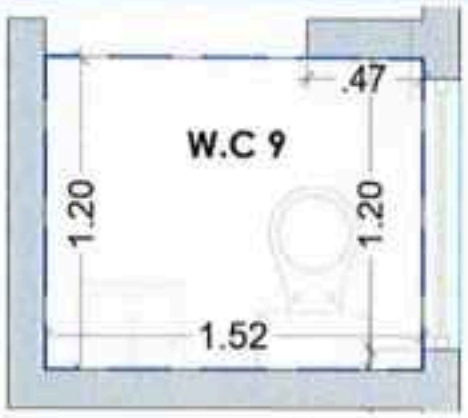

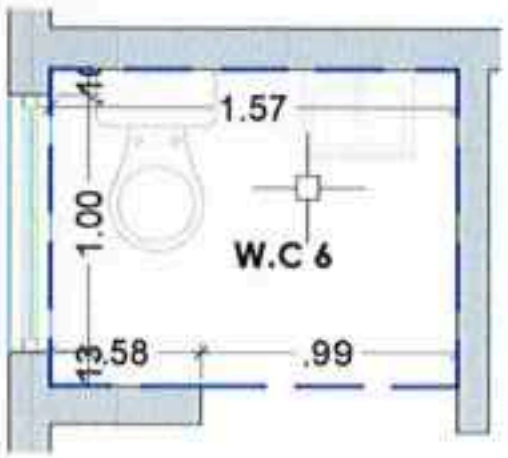





LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	ÁREA (M2)	CANT.	CANT. TOTAL
U. sanit PMR	Lado A	0,25		2,00		1,00	0,50
	Lado B	2,29		2,00		1,00	4,58
	Lado C	1,32		2,00		1,00	2,64
	Lado D	1,46		2,00		1,00	2,92
		0,10		2,00		2,00	0,40
		0,23		2,00		1,00	0,46
		0,60		2,00		1,00	1,20
W.C 6 (Consultorio de enfermería)	Lado A	1,57		2,00		1,00	3,14
	Lado B	1,00		2,00		1,00	2,00
	Lado C	0,58		2,00		1,00	1,16
	Lado D	1,00		2,00		1,00	2,00
W.C 9	Lado A	0,47		2,00		1,00	0,94
	Lado B	1,20		2,00		1,00	2,40
	Lado C	1,52		2,00		1,00	3,04
	Lado D	1,20		2,00		1,00	2,40

CANTIDAD PROYECTADA	27,38
CANTIDAD CONTRACTUAL	31,38
DIFERENCIA	-4,00

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:	ROSSY ELENA NIÑO GÓMEZ	APROBÓ:	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL	
CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPICO INGENIERIA S.A.S	

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E


DEPARTAMENTO DE CASANARE


MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	**UBICACIÓN**	SAN JOSE DEL BUBUY
		FECHA	25/05/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	NP	ITEM S O PREVISTOS	ÍTEM	NP3	Bocapuerta en granito pulido	UND	ml	CANT.	11,57

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA

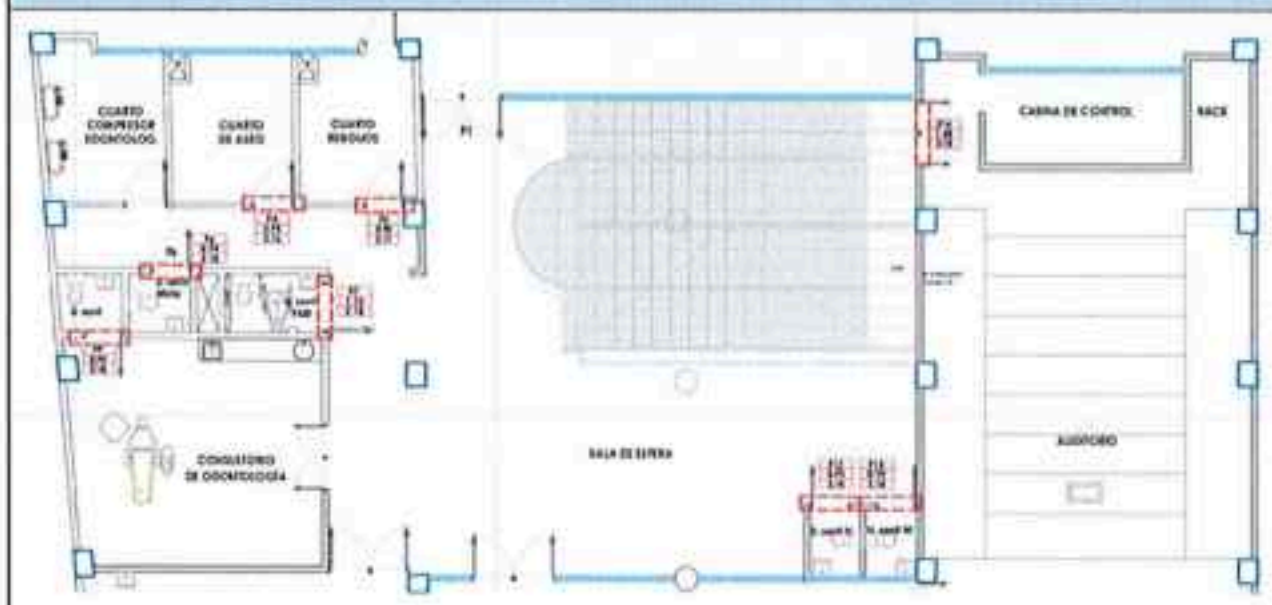

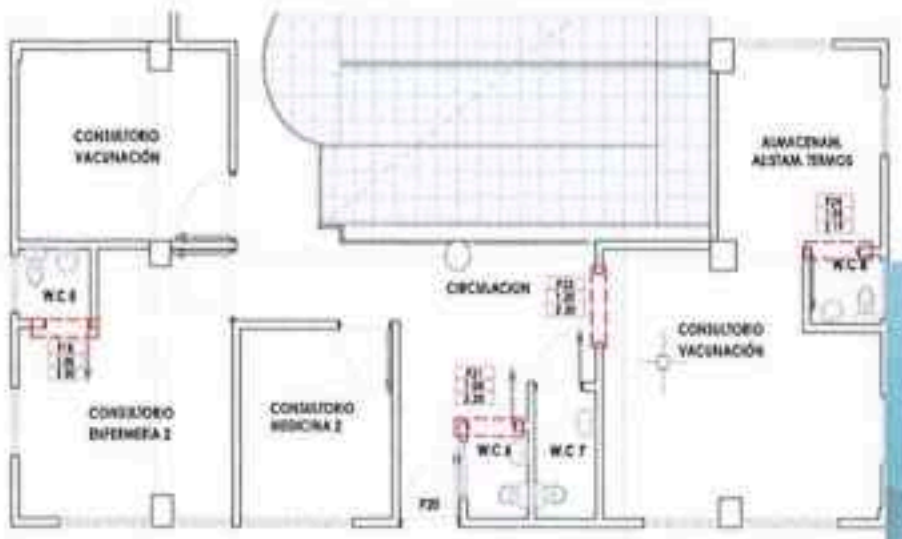





LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (N)	ÁREA (M2)	CANT.	CANT. TOTAL
Primer piso	Puerta P12		0,94			1,00	0,94
	Puerta P13		0,94			1,00	0,94
	Puerta P14		1,48			1,00	1,48
	Canina de control		0,89			1,00	0,89
	Puerta P9		0,94			1,00	0,94
	Puerta P7		1,12			1,00	1,12
	Puerta P6		0,94			1,00	0,94
	Puerta P3		0,98			1,00	0,98
	Puerta P4		0,95			1,00	0,95
Seguno Piso	Puerta P24		1,03			1,00	1,03
	Puerta P23		1,20			1,00	1,20
	Puerta P21		1,04			1,00	1,04
	Puerta P18		1,00			1,00	1,00

CANTIDAD PROYECTADA	**11,57**
CANTIDAD CONTRACTUAL	**6,20**
DIFERENCIA	**5,37**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:	ROSSY ELENA NIÑO GÓMEZ	APROBÓ:	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
	RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL
	CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPICO INGENIERIA S.A.S


HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E

DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE					**UBICACIÓN**	SAN JOSE DEL BUBUY		
						FECHA	25/05/2026		
						ACTA No	Recibo y liquidación		
CAPÍTULO	**NP**	**ITEM S O PREVISTOS**	**ÍTEM**	**NP3**	**Bocapuerta en granito pulido**	**UND**	**ml**	**CANT.**	**0,00**

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA

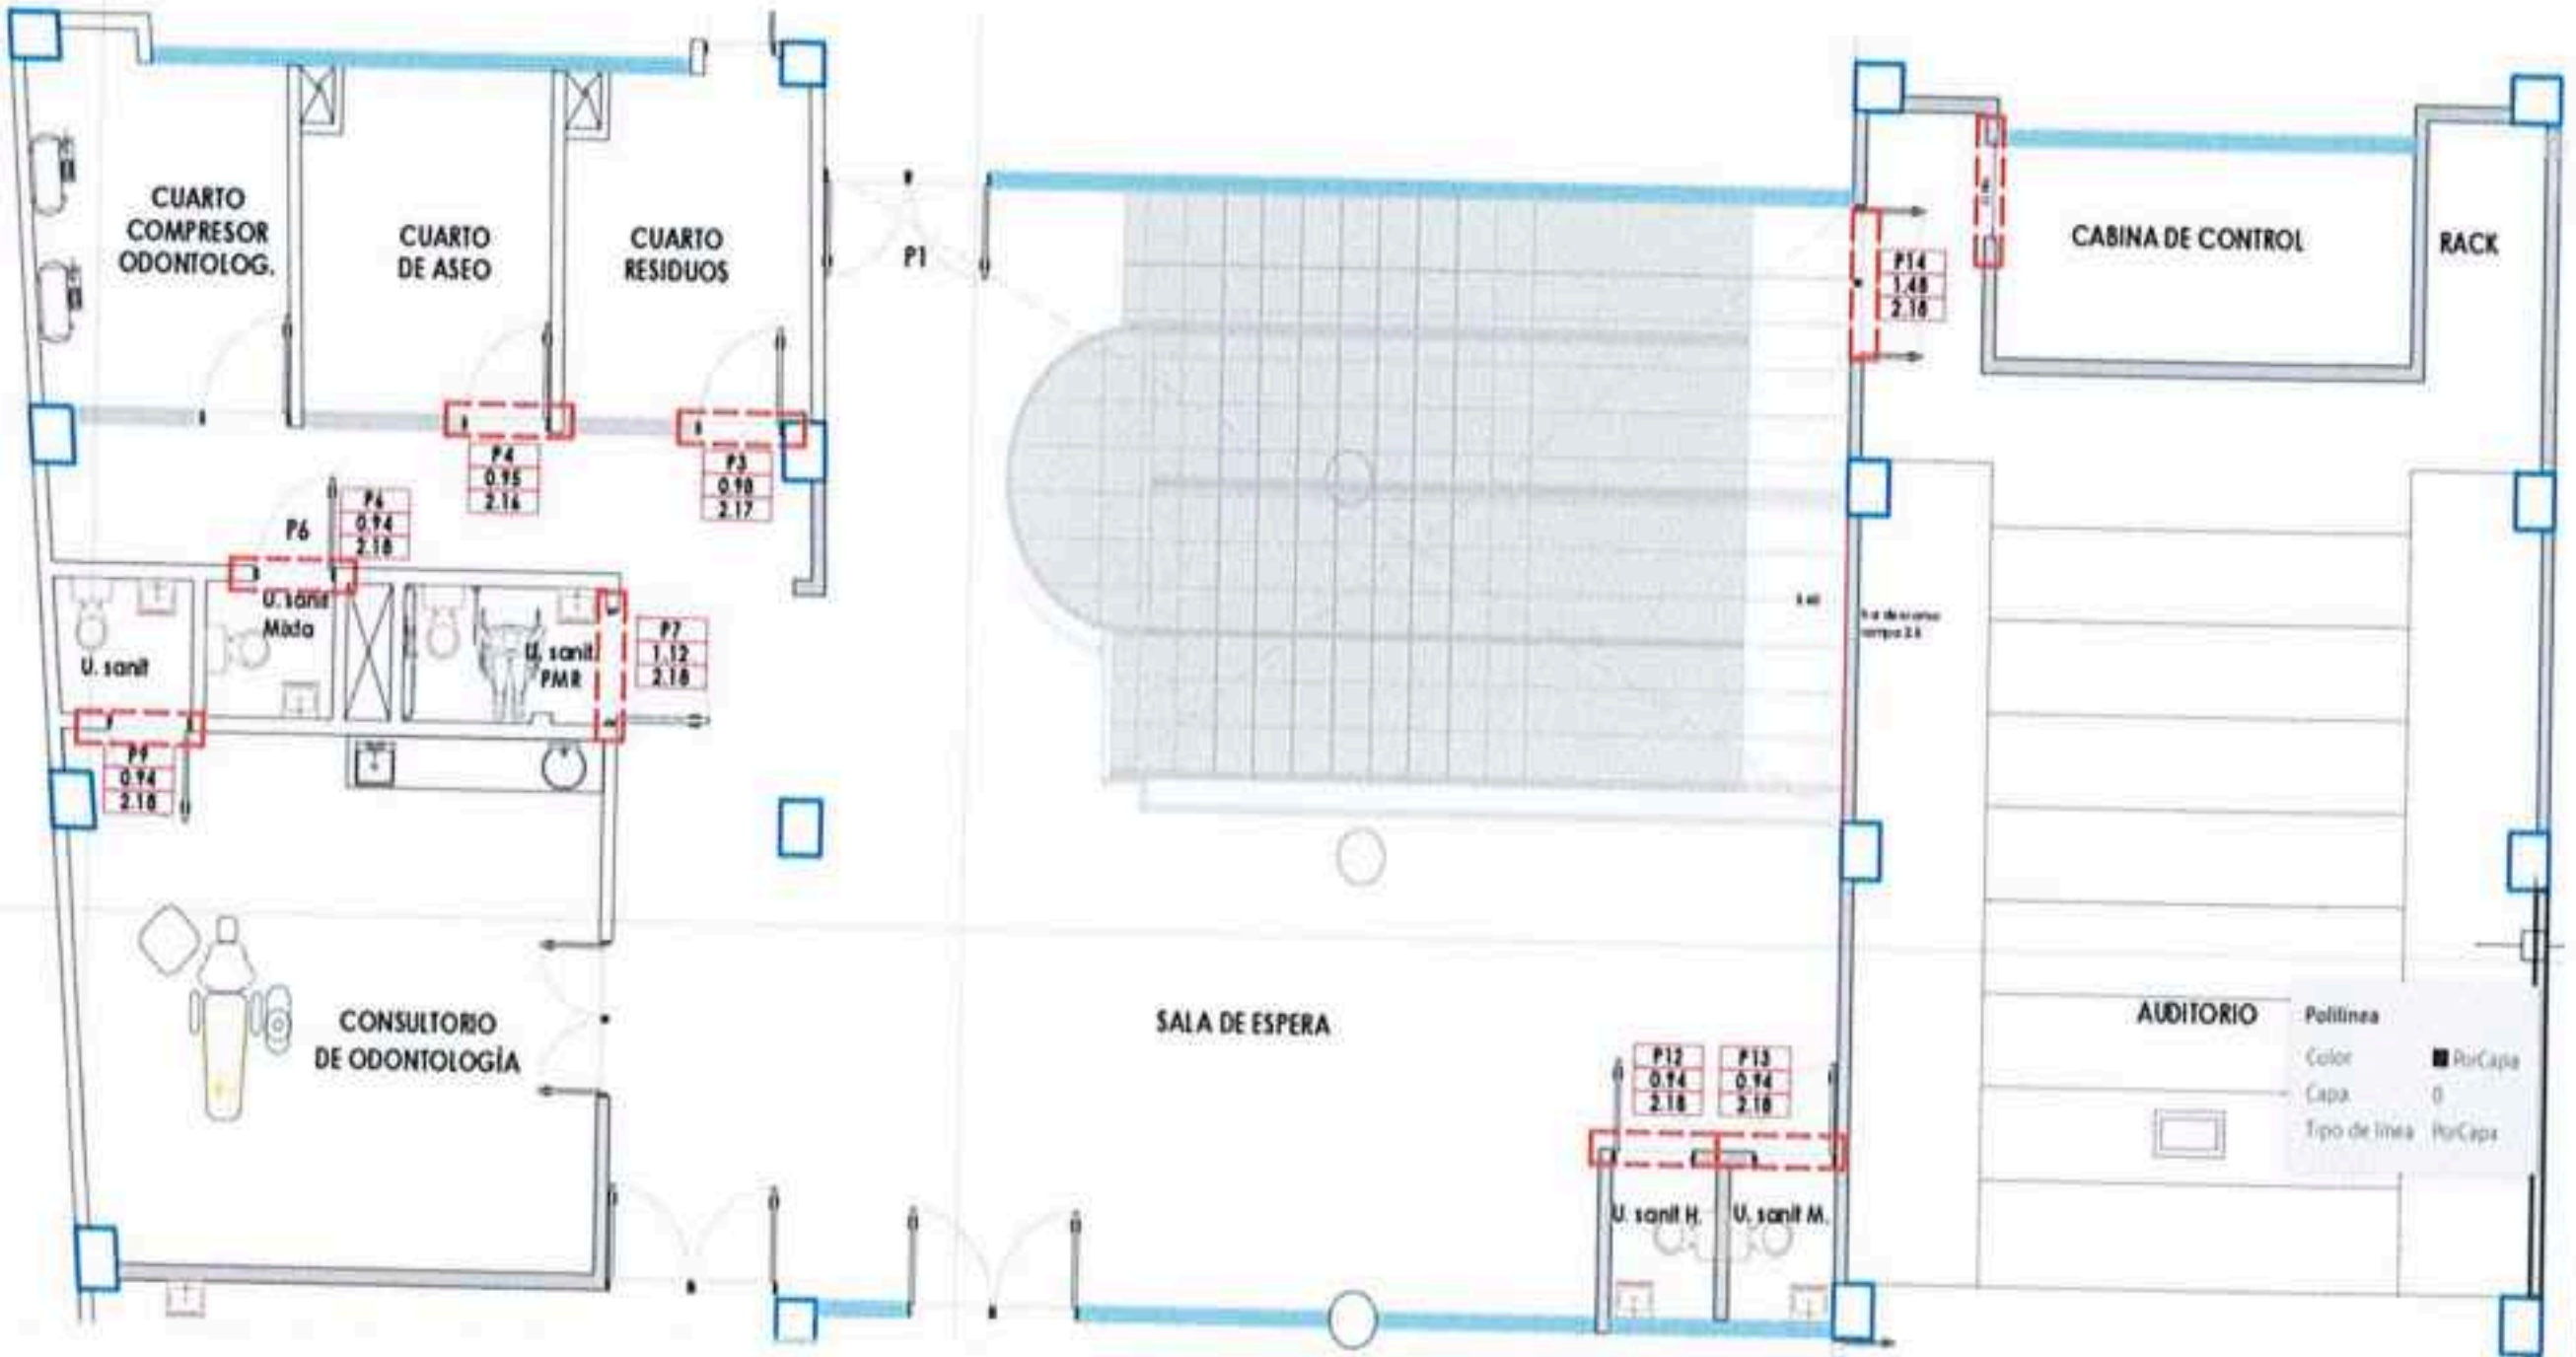


HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E

DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE					**UBICACIÓN**	SAN JOSE DEL BUBUY			
						FECHA	25/05/2026			
						ACTA No	Recibo y liquidación			
CAPÍTULO	**NP**	**ITEM S O PREVISTOS**	**ÍTEM**	**NP3**	**Bocapuerta en granito pulido**	**UND**	**ml**	**CANT.**	**0,00**	

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA

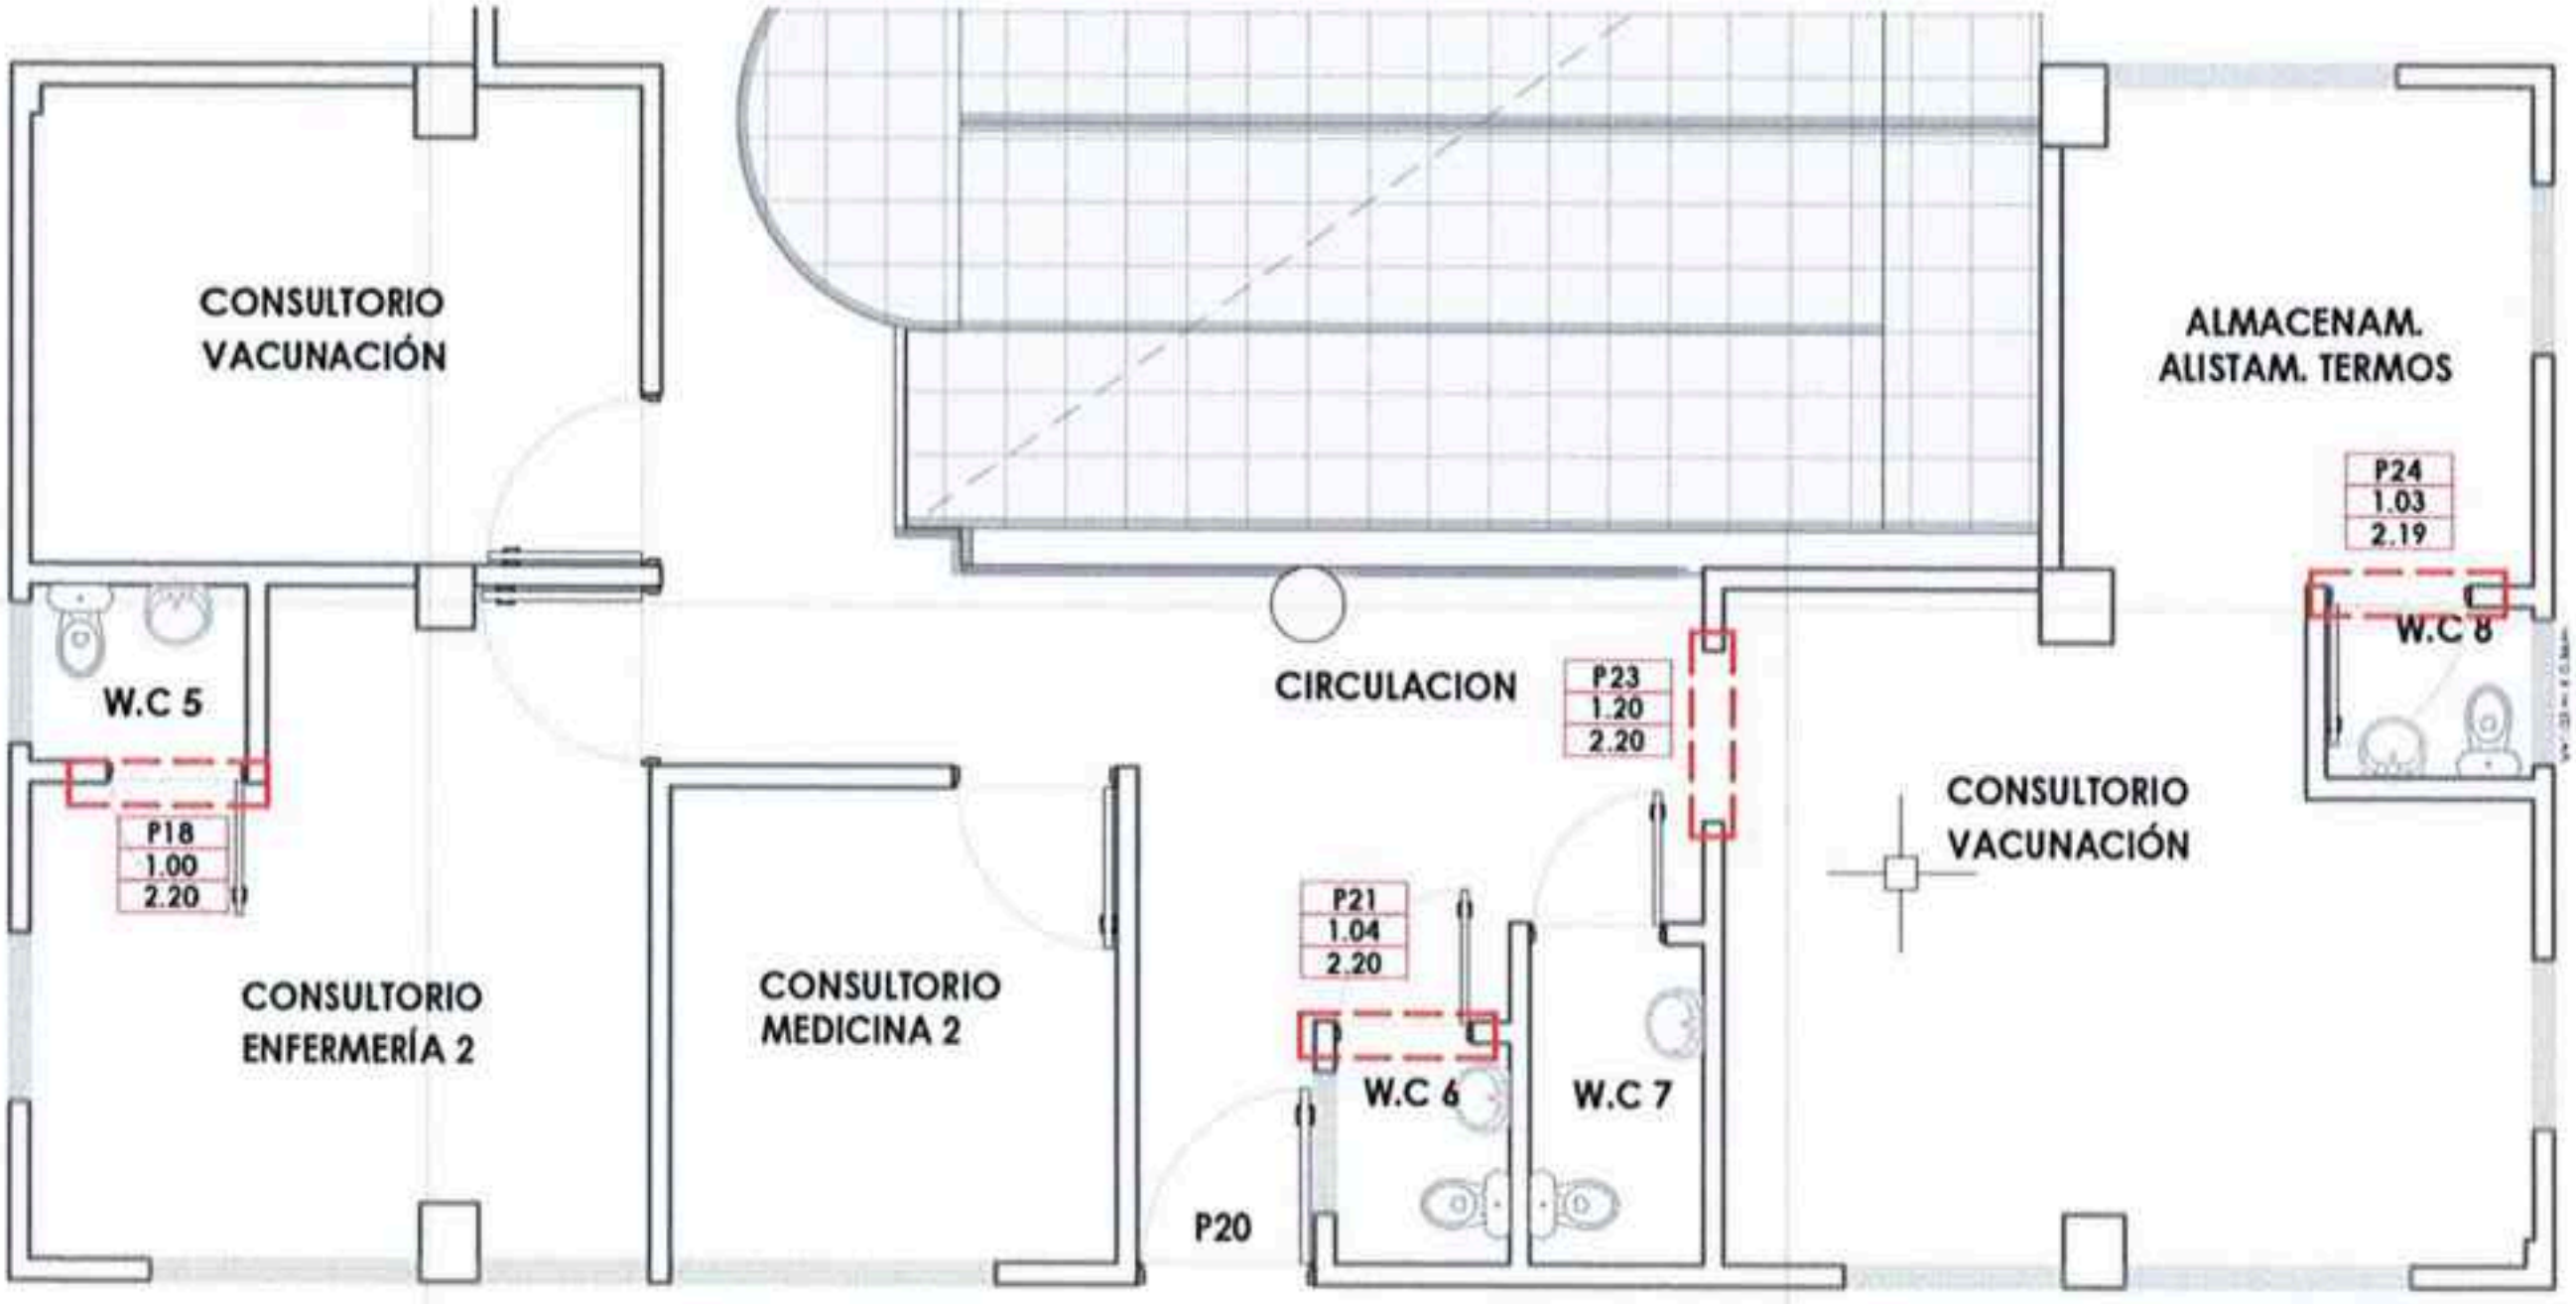

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E


DEPARTAMENTO DE CASANARE


MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	**UBICACIÓN**	SAN JOSE DEL BUBUY
		FECHA	25/05/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	NP	ITEM S O PREVISTOS	ÍTEM	NP4	Guardaescoba en ceramica duro piso 33 x 7 cm. Suministro e instalación	UND	ml	CANT.	

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA

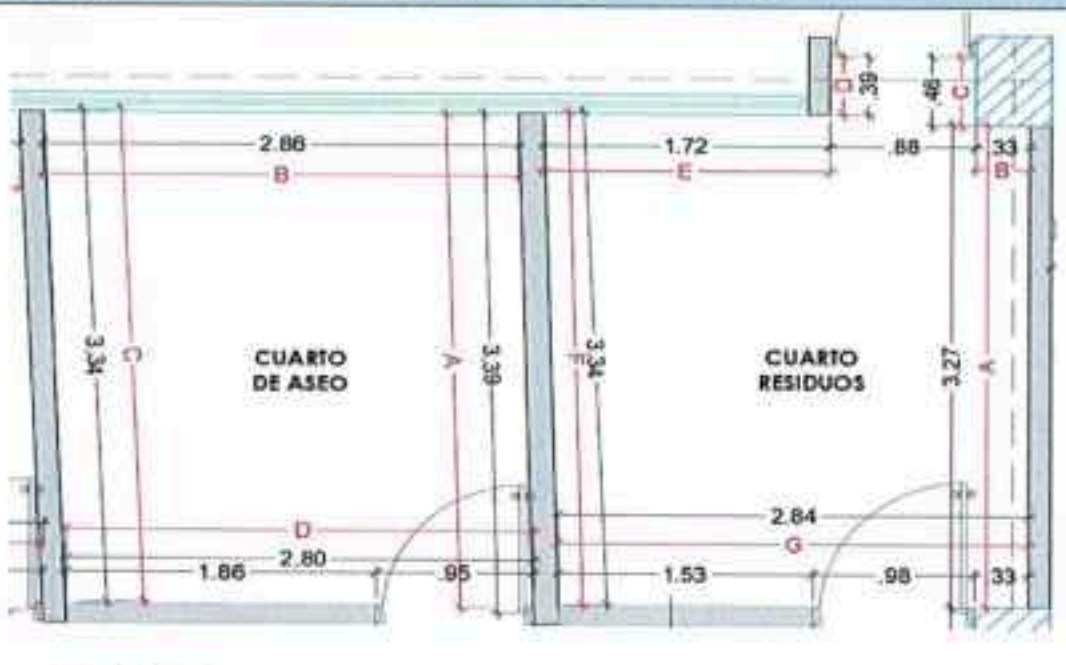

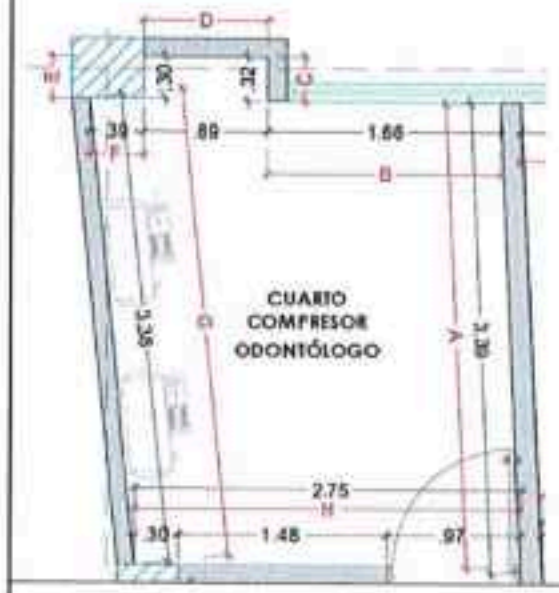



LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	ÁREA (M2)	CANT.	CANT. TOTAL
Cuarto Residuos	Lado A	3,27				1,00	3,27
	Lado B	0,33				1,00	0,33
	Lado C	0,46				1,00	0,46
	Lado D	0,39				1,00	0,39
	Lado E	1,72				1,00	1,72
	Poceta	0,53				- 1,00	- 0,53
	Lado F	3,34				1,00	3,34
	Poceta	0,75				- 1,00	- 0,75
	Lado G	2,84				1,00	2,84
	Puerta	0,98				- 1,00	- 0,98
Cuarto de aseo	Lado A	3,39				1,00	3,39
	Lado B	2,86				1,00	2,86
	Poceta	0,54				- 1,00	- 0,54
	Lado C	3,34				1,00	3,34
	Poceta	0,61				- 1,00	- 0,61
	Lado D	2,80				1,00	2,80
	Puerta	0,95				- 1,00	- 0,95
Cuarto compresor odontologico	Lado A	3,39				1,00	3,39
	Lado B	1,66				1,00	1,66
	Lado C	0,32				1,00	0,32
	Lado D	0,89				1,00	0,89
	Lado E	0,30				1,00	0,30
	Lado F	0,39				1,00	0,39
	Lado G	3,38				1,00	3,38
	Lado H	2,75				1,00	2,75
	Puerta	0,97				- 1,00	- 0,97
Cabina de control	Lado A	1,17				1,00	1,17
	Puerta	0,89				- 1,00	- 0,89
	Lado B	4,76				1,00	4,76
	Lado C	2,06				1,00	2,06
	Lado D	4,76				1,00	4,76
Auditorio	Lado A	0,97				1,00	0,97
	Lado C	0,53				1,00	0,53
						CANTIDAD PROYECTADA	**45,85**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	ROSSY ELENA NIÑO GÓMEZ	APROBÓ	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
	RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL
	CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPICO INGENIERIA S.A.S

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E


DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	UBICACIÓN	SAN JOSE DEL BUBUY
		FECHA	25/05/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	NP	ITEM S O PREVISTOS	ÍTEM	NP4	Guardaescoba en ceramica duro piso 33 x 7 cm. Suministro e instalación	UND	ml	CANT.	152,39

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA

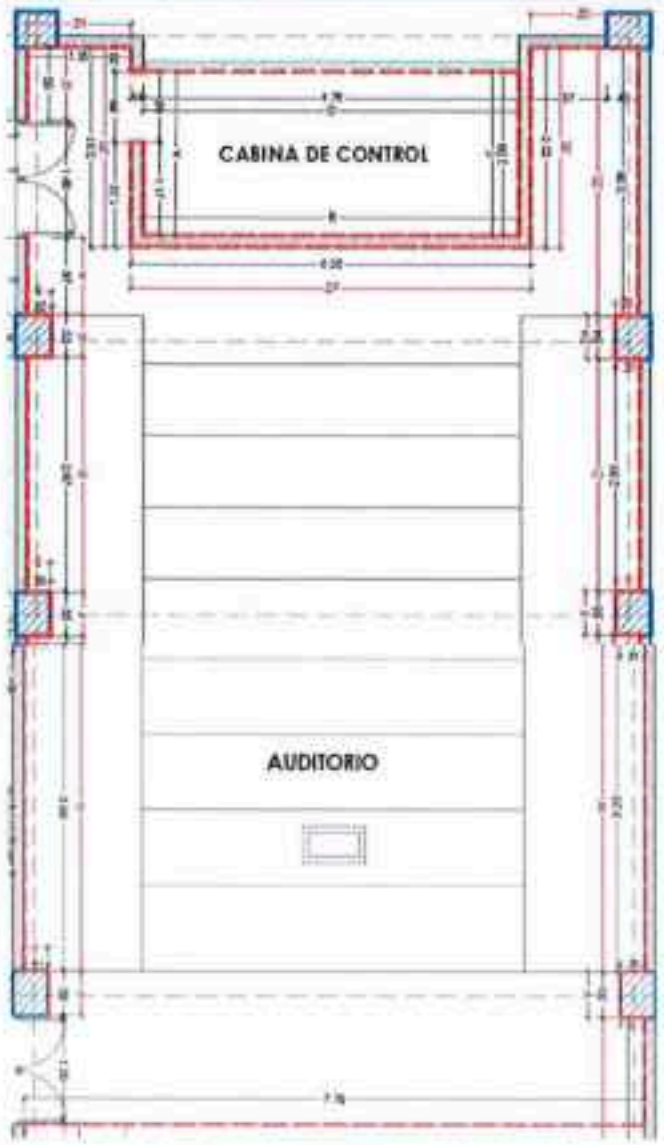





LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	ÁREA (M2)	CANT.	CANT. TOTAL
Auditorio	Lado D	2,97				1,00	2,97
	Lado E	0,30				2,00	0,60
	Lado F	0,55				1,00	0,55
	Lado G	3,90				1,00	3,90
	Lado H	0,31				2,00	0,62
	Lado I	0,53				1,00	0,53
	Lado J	2,25				1,00	2,25
	Tarima, parte inferior	7,79				1,00	7,79
	Lado K	0,40				1,00	0,40
	Lado L	0,29				1,00	0,29
	Lado M	0,98				1,00	0,98
	Lado N	0,30				1,00	0,30
	Lado O	55,02				1,00	55,02
	Lado P	0,30				1,00	0,30
	Lado Q	0,98				1,00	0,98
	Lado R	0,32				1,00	0,32
	Lado S	0,41				1,00	0,41
	Lado T	3,50				1,00	3,50
	Lado U	0,31				2,00	0,62
	Lado V	0,55				1,00	0,55
	Lado W	3,93				1,00	3,93
	Lado X	0,55				1,00	0,55
	Lado Y	0,31				2,00	0,62
	Lado Z	2,93				1,00	2,93
	Lado ZA	0,54				1,00	0,54
	Lado ZB	0,31				2,00	0,62
	Lado ZC	3,38				1,00	3,38
	Lado ZD	0,97				1,00	0,97
	Lado ZE	2,52				1,00	2,52
	Lado ZF	5,06				1,00	5,06
	Lado ZG	2,51				1,00	2,51
	Puerta	0,89		-		1,00 -	0,89
	Lado ZI	0,92				1,00	0,92
						CANTIDAD PROYECTADA	106,54
						VIENE	45,85
						TOTAL	152,39
						CANTIDAD CONTRACTUAL	93,93
						DIFERENCIA	58,46

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	ROSSY ELENA NIÑO GÓMEZ	APROBÓ	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL	
CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPICO INGENIERIA S.A.S	

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E


DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	UBICACIÓN	SAN JOSE DEL BUBUY		
		FECHA	25/05/2026		
		ACTA No	Recibo y liquidación		

CAPÍTULO	NP	ITEM S O PREVISTOS	ÍTEM	NP5	Estuco plástico muros. Suministro e instal.	UND	m2	CANT.	70,30

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA

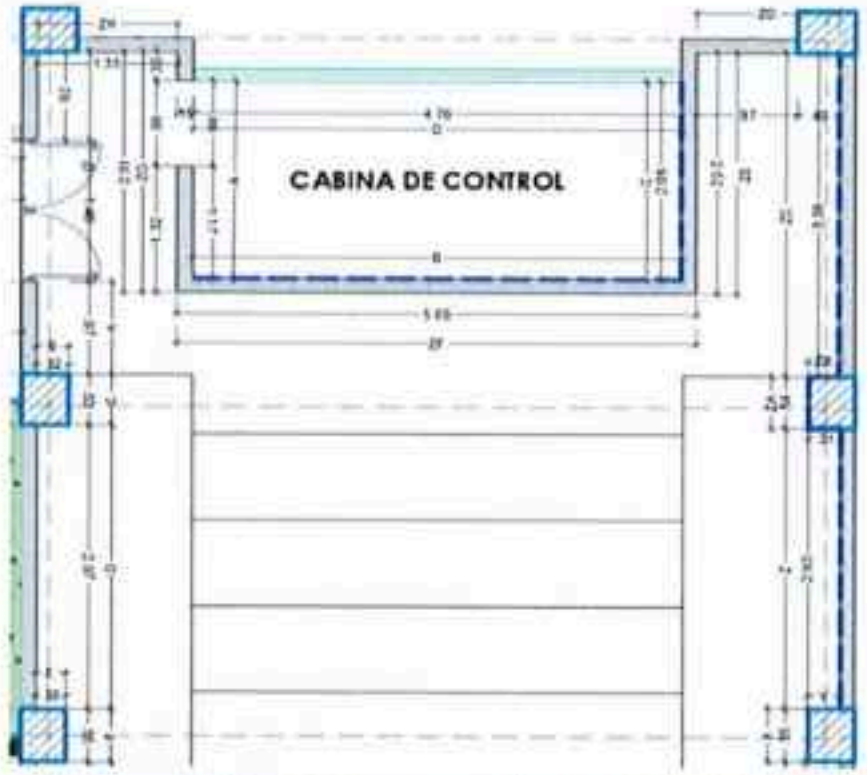



LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	Área (m2)	CANT.	CANT. TOTAL
	Lado R		2,51	3,00		1,00	7,53
	Lado S Área 1 (0,71*1,43=1,02)				1,02	1,00	1,02
Pasillo y sala de espera primer piso	Lado S Área 2 (5,73*0,71)/2=2,03				2,03	1,00	2,03
	Lado T		2,77	3,00		1,00	8,31
	Lado F		2,46	0,17		1,00	0,42
	Lado G		2,90	0,17		1,00	0,49
	Lado F		1,00	0,17		1,00	0,17
Cuarto de aseo	Lado C		1,61	1,40		1,00	2,25
Pasillo 1 columna D2	Lado M		0,55	0,50		1,00	0,28
	Lado N		0,33	0,50		2,00	0,33
Circulación segundo piso	Lado A		2,30	2,87		1,00	6,60
	Lado B		2,09	2,87		1,00	6,00
	Lado C		1,70	1,85		1,00	3,14
	Lado D		1,50	1,70		1,00	2,55
Consultorio medicina 2	Lado A		1,40	1,30		1,00	1,82
	Lado B		0,62	2,14		1,00	1,33
	Lado B		0,80	2,87		1,00	2,30
	Lado C		2,82	0,50		1,00	1,41
	Lado H		1,20	2,87		1,00	3,44
	Lado E		0,43	2,70		1,00	1,16
Consultoria enfermeria	Lado A		3,42	2,19		1,00	7,49
	Lado B		1,26	0,50		1,00	0,63
	Columna C		0,40	2,87		2,00	2,30
	Columna D		0,43	2,87		1,00	1,23
	Lado F		0,80	2,87		1,00	2,30
	Lado F		1,05	2,87		1,00	3,01
Almacenamiento de termos	Lado I		1,07	0,55		1,00	0,59
	Columna lado K		0,33	0,50		1,00	0,17

CANTIDAD PROYECTADA	70,30
CONTIDAD CONTRACTUAL	70,30
DIFERENCIA	0,00

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:	ROSSY ELENA NIÑO GÓMEZ	APROBÓ:	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL	
CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPICO INGENIERIA S.A.S	


HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E

DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	**UBICACIÓN**	SAN JOSE DEL BUBUY		
		FECHA	25/05/2026		
		ACTA No	Recibo y liquidación		

CAPÍTULO	**NP**	**ITEM S O PREVISTOS**	**ÍTEM**	**NPS**	**Estuco plástico muros. Suministro e instal.**	**UND**	**m2**	**CANT.**	**0,00**

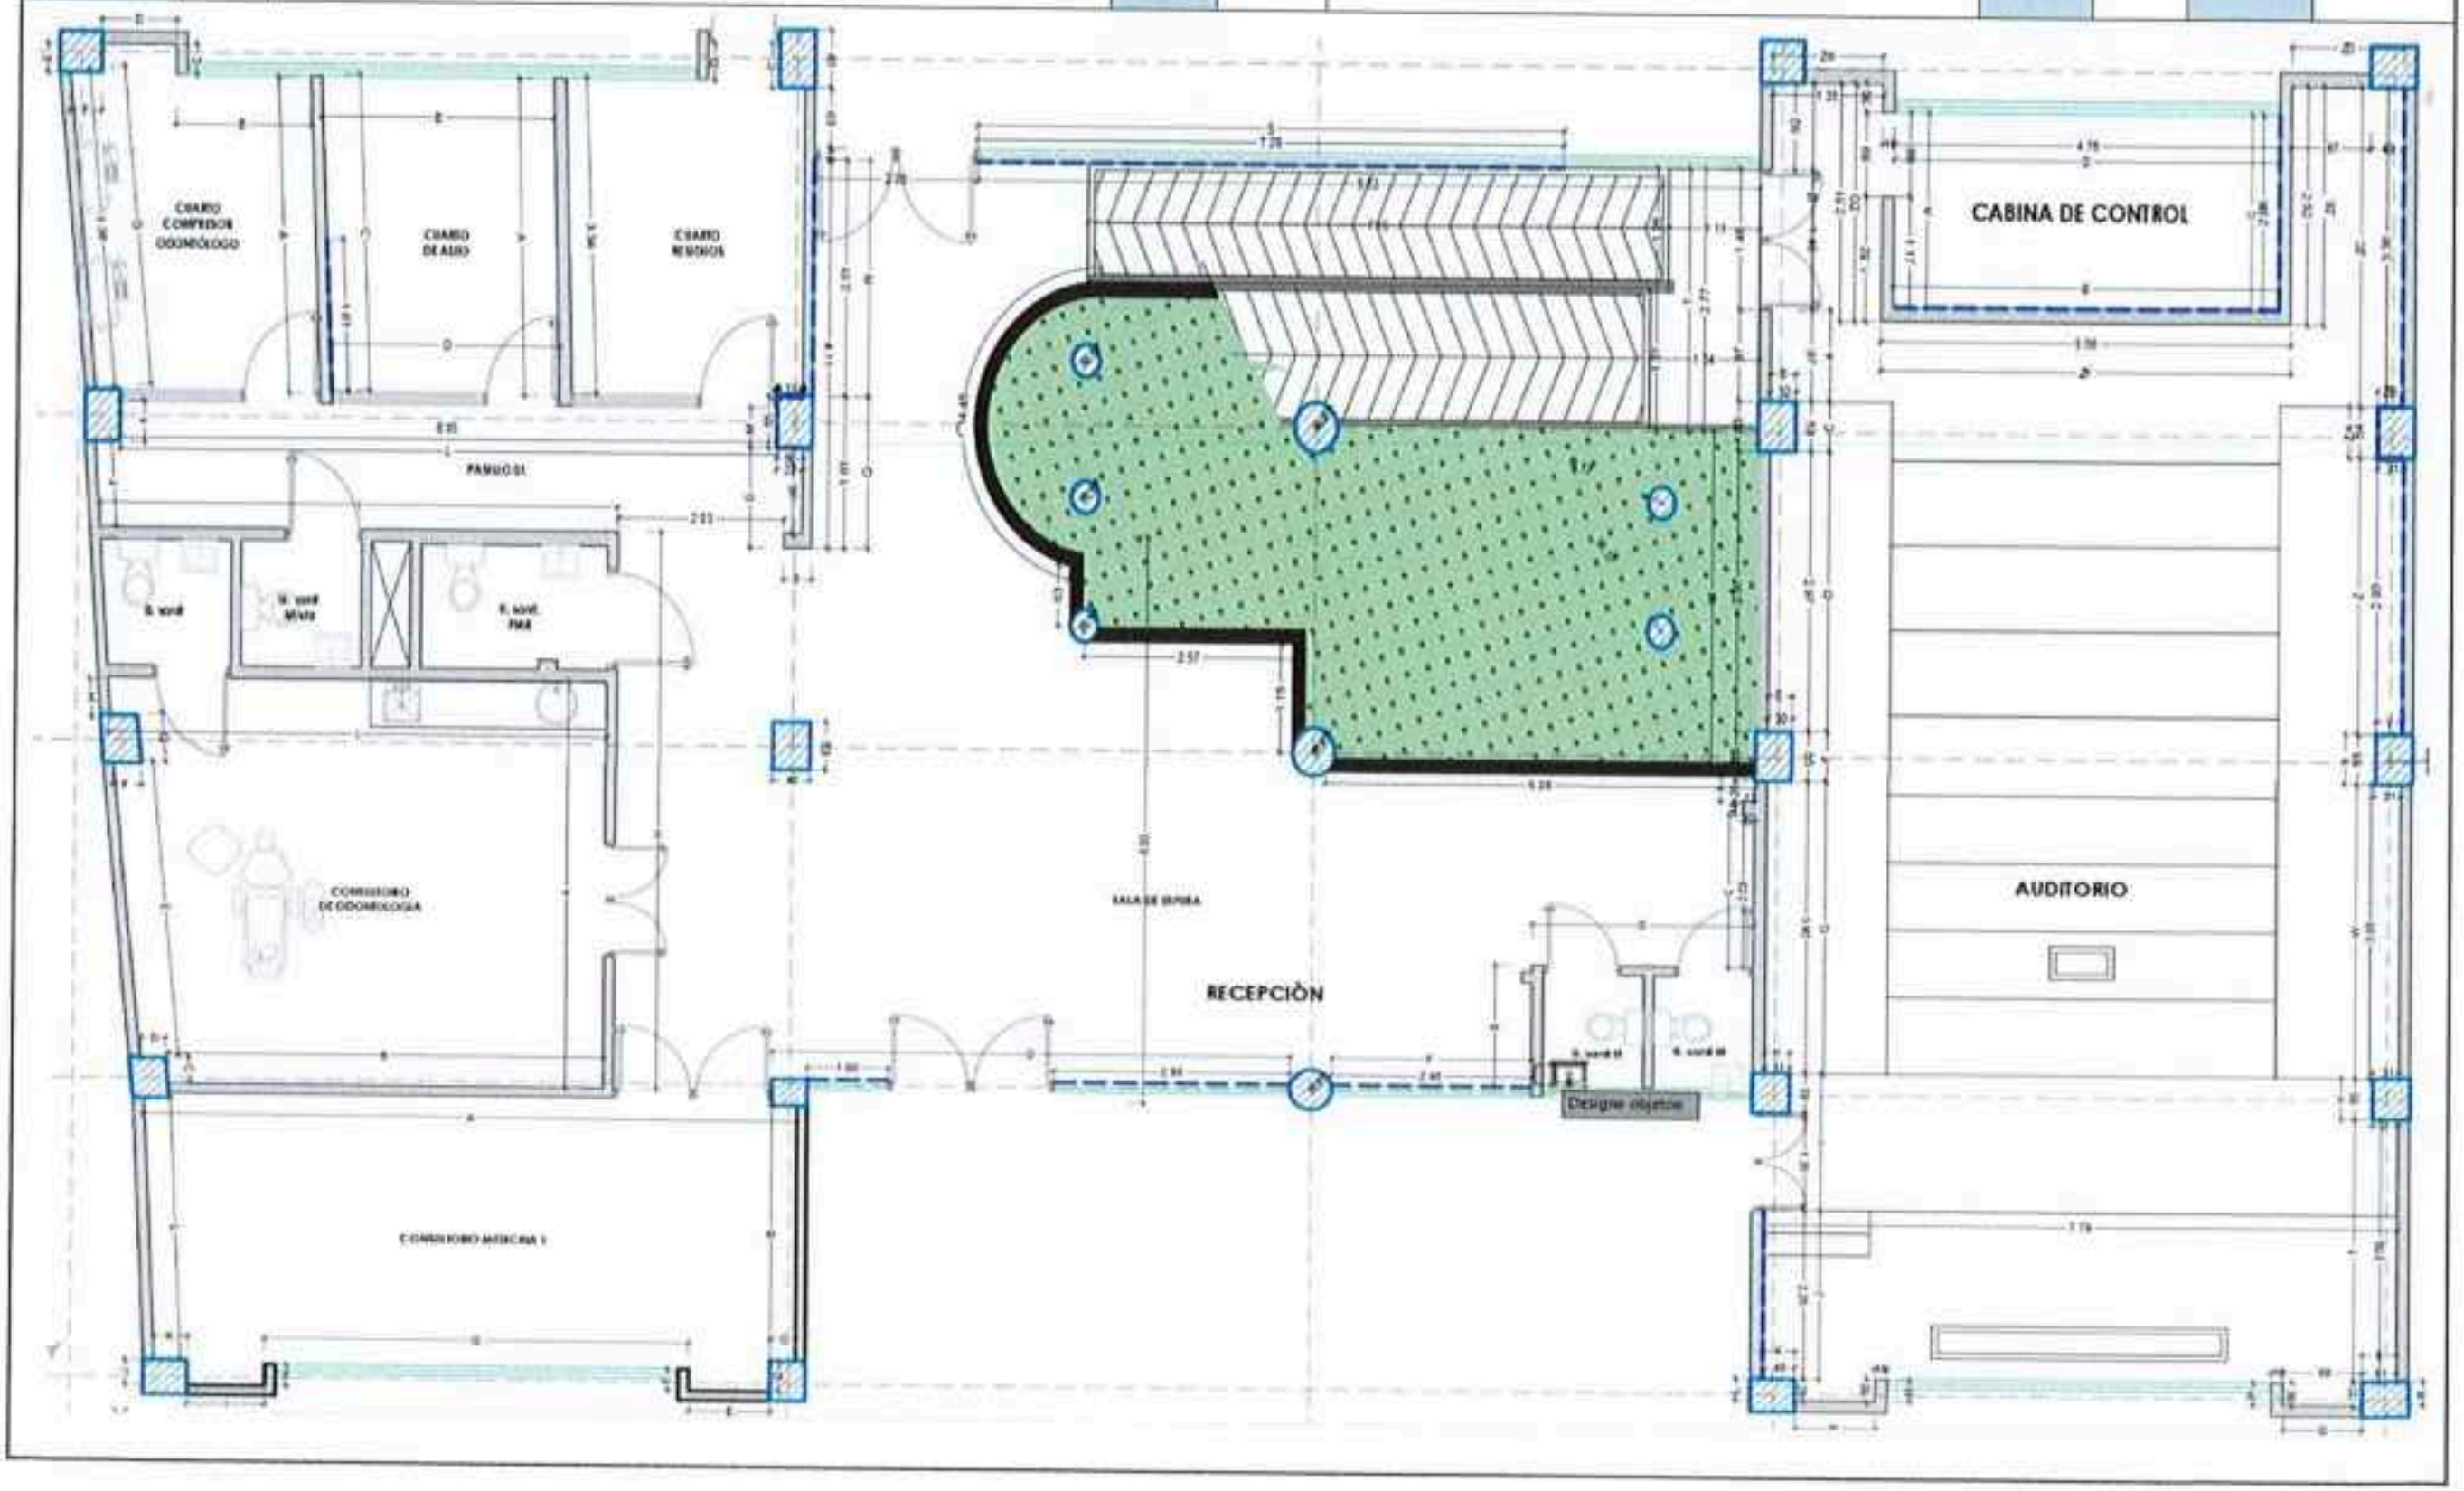

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E


DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	**UBICACIÓN**	SAN JOSE DEL BUBUY
		FECHA	25/05/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	NP	ITEM S O PREVISTOS	ÍTEM	NPs		UND	ml	CANT.	
					Regata en muro, mamosteria tipo ladrillo o bloque para tuberias diaetros menores a 1". (ncluye corte, retiro y resana)				

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA

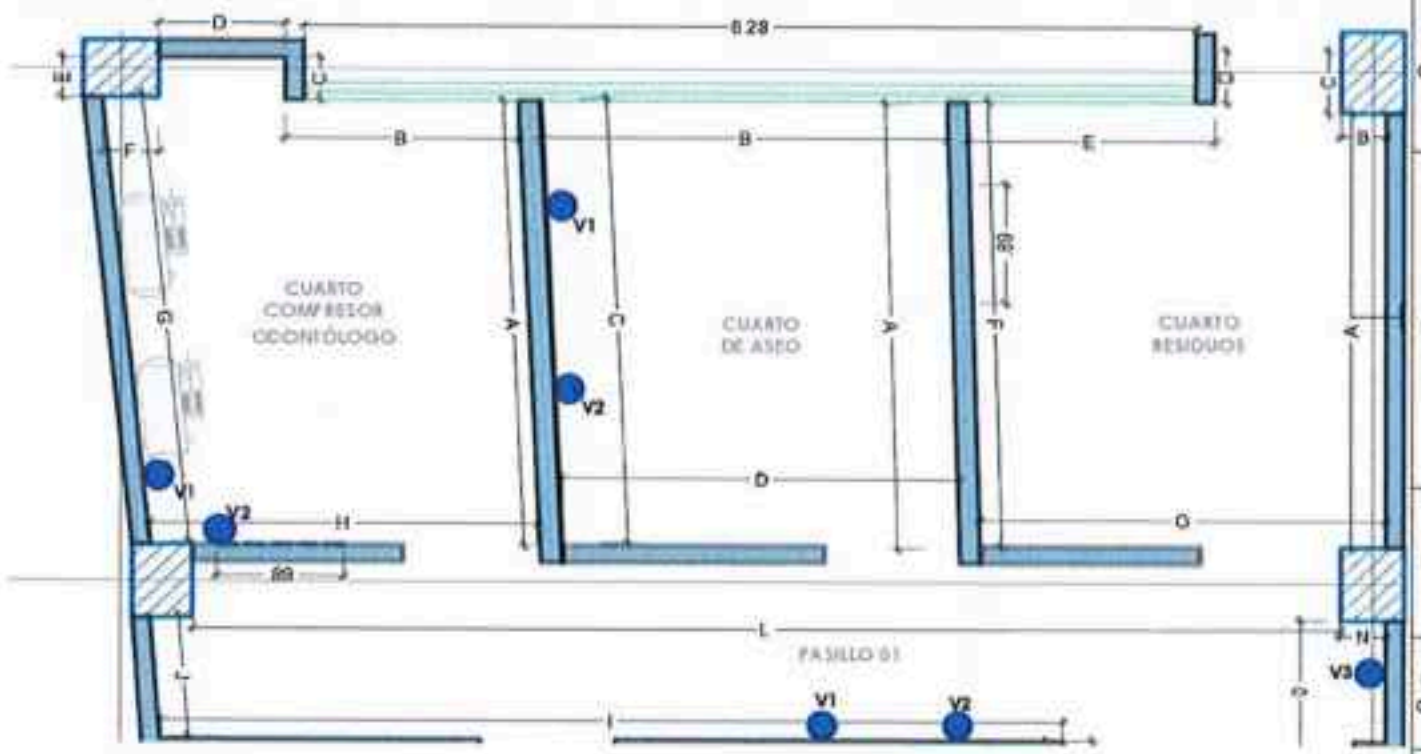





LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES					CANT. TOTAL
		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	Area (m2)	CANT.	
Cabina control	Lado A Tablero vertical			1,00		1,00	1,00
	Lado B horizontal		4,76			1,00	4,76
	Lado C horizontal		2,06			1,00	2,06
	Lado D horizontal		2,38			1,00	2,38
	Lado ZG vertical V9			1,10		1,00	1,10
Auditorio	Lado A vertical V1			2,00		1,00	2,00
	Lado D vertical V2			2,00		1,00	2,00
	Lado G vertical V3			2,79		1,00	2,79
	Lado J vertical V4			2,29		1,00	2,29
	Lado O horizontal		4,15			1,00	4,15
	Lado O vertical V5			2,23		1,00	2,23
	Lado T vertical V6			2,23		1,00	2,23
	Lado W vertical V7			2,40		1,00	2,40
	Lado Z vertical V8			2,03		1,00	2,03
Pasillo 1	Lado I - vertical V1			2,65		1,00	2,65
	Lado I - horizontal		0,50			1,00	0,50
	Lado I - vertical V2			0,80		1,00	0,80
	Lado O - vertical V3			1,35		1,00	1,35
Cuarto compresores	Lado G vertical V1			1,40		1,00	1,40
	Lado H vertical V2			2,00		2,00	4,00
	Lado H horizontal		0,89			1,00	0,89
Cuarto de aseo	Lado C vertical V1			2,65		1,00	2,65
	Lado C vertical V2			2,65		1,00	2,65
Pasillo muro baño PMR	Lado H vertical V4			1,40		1,00	1,40
	Lado H vertical V5			2,65		1,00	2,65
	Lado H horizontal		1,53			1,00	1,53
Consutorio de Odontología	Lado E vertical V1			3,00		1,00	3,00
	Lado E vertical V2			2,65		1,00	2,65
	Lado B Vertical V3			2,65		1,00	2,65
	Lado B horizontal		2,84			1,00	2,84
	Lado A horizontal		0,68			1,00	0,68
	Lado B Vertical V4			2,65		1,00	2,65
	Lado A horizontal		1,63			1,00	1,63
	Lado I horizontal		2,45			1,00	2,45
						CANTIDAD PROYECTADA	74,64

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	ROSSY ELENA NIÑO GÓMEZ	APROBÓ	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL	
CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPICO INGENIERIA S.A.S	

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E


DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	UBICACIÓN	SAN JOSE DEL BUBUY
		FECHA	25/05/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	NP	ITEM S O PREVISTOS	ÍTEM	NP6	Regata en muro, mamosteria tipo ladrillo o bloque para tuberias diaetros menores a 1". (ncluye corte, retiro y resane)	UND	ml	CANT.	109,59

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA

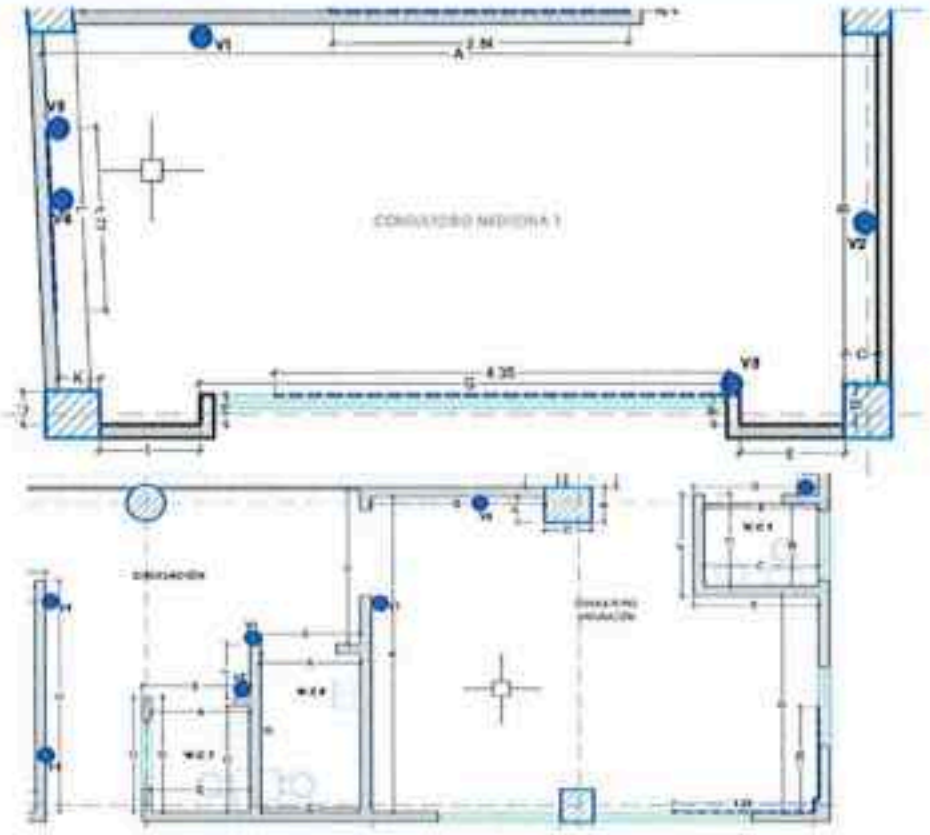







LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	Área (m2)	CANT.	CANT. TOTAL
Consultoria medicina 1	Lado A vertical V1			2,65		1,00	2,65
	Lado B vertical V2			2,65		1,00	2,65
	Lado G vertical V3			2,65		1,00	2,65
	Lado G horizontal V3		4,35			1,00	4,35
	Lado L vertical V4			0,60		1,00	0,60
	Lado L vertical V5			2,65		1,00	2,65
	Lado L horizontal V5		1,77			1,00	1,77
Cuarto residuos	Lado F horizontal		0,89			1,00	0,89
	Segundo Piso						
Baño muro exterior	Lado G vertical V1			1,30		1,00	1,30
Pasillo hacia terraza	Lado E vertical V2			1,30		1,00	1,30
	Lado C vertical V3			1,30		1,00	1,30
	Lado C vertical V4			1,30		1,00	1,30
Consultorio Vacunación	Lado A vertical V1			1,25		1,00	1,25
	Lado C horizontal		1,89			1,00	1,89
	Lado D horizontal		1,55			1,00	1,55
	Lao Q vertical V2			1,25		1,00	1,25
	Lado H vertical V3			1,25		1,00	1,25
	Lado H horizontal			2,50		1,00	2,50
	Lado G vertical V4			1,25			
Consultorio medicina 2	Lado B vertical V1			0,80		1,00	0,60
	Lado H vertical V2			1,25		1,00	1,25

CANTIDAD PROYECTADA	34,95
VIENE	74,64
TOTAL	109,59
CANTIDAD CONTRACTUAL	149,00
DIFERENCIA	-39,41

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	ROSSY ELENA NIÑO GOMEZ	APROBÓ	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL	
CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPICO INGENIERIA S.A.S	


HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E

DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE				UBICACIÓN	SAN JOSE DEL BUBUY			
					FECHA	25/05/2026			
					ACTA No	Recibo y liquidación			
CAPÍTULO	NP	ITEM S O PREVISTOS	ÍTEM	NP6	Regata en muro, mamosteria tipo ladrillo o bloque para tuberias diastros menores a 1". (ncluye corte, retiro y resane)	UND	ml	CANT.	0,00

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA

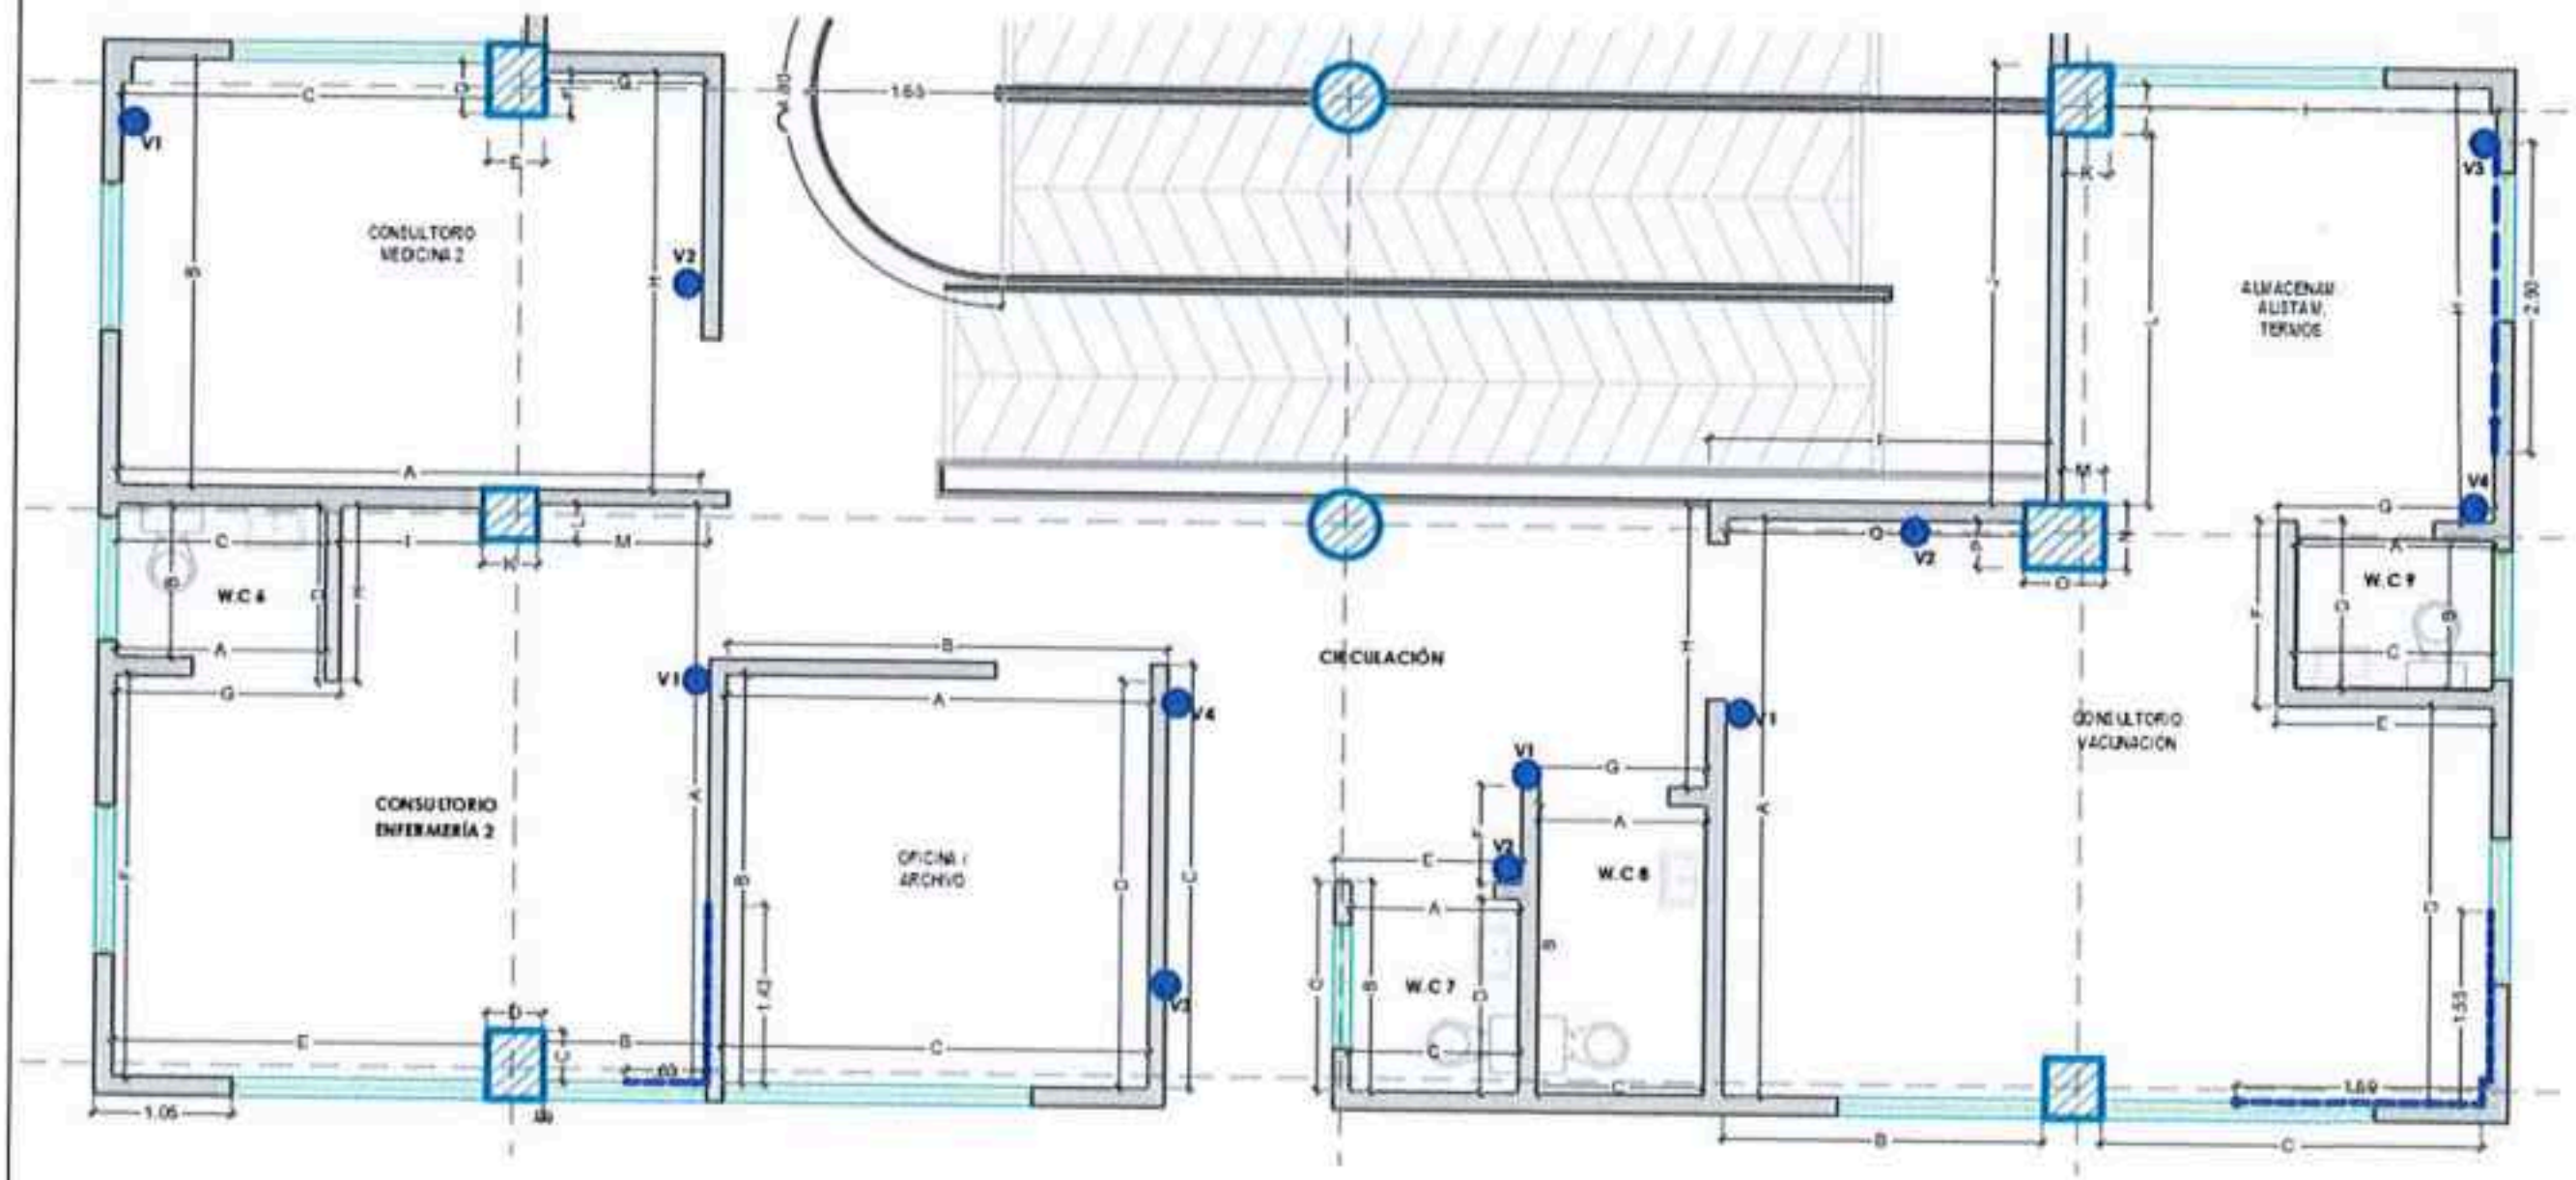


HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E

DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE					**UBICACIÓN**	SAN JOSE DEL BUBUY			
						FECHA	25/05/2026			
						ACTA No	Recibo y liquidación			
CAPÍTULO	**NP**	**ITEM S O PREVISTOS**	**ÍTEM**	**NP6**	**Regata en muro, mamosteria tipo ladrillo o bloque para tuberias diaetros menores a 1". (ncluye corte, retiro y resane)**	**UND**	**ml**	**CANT.**	**0,00**	

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA

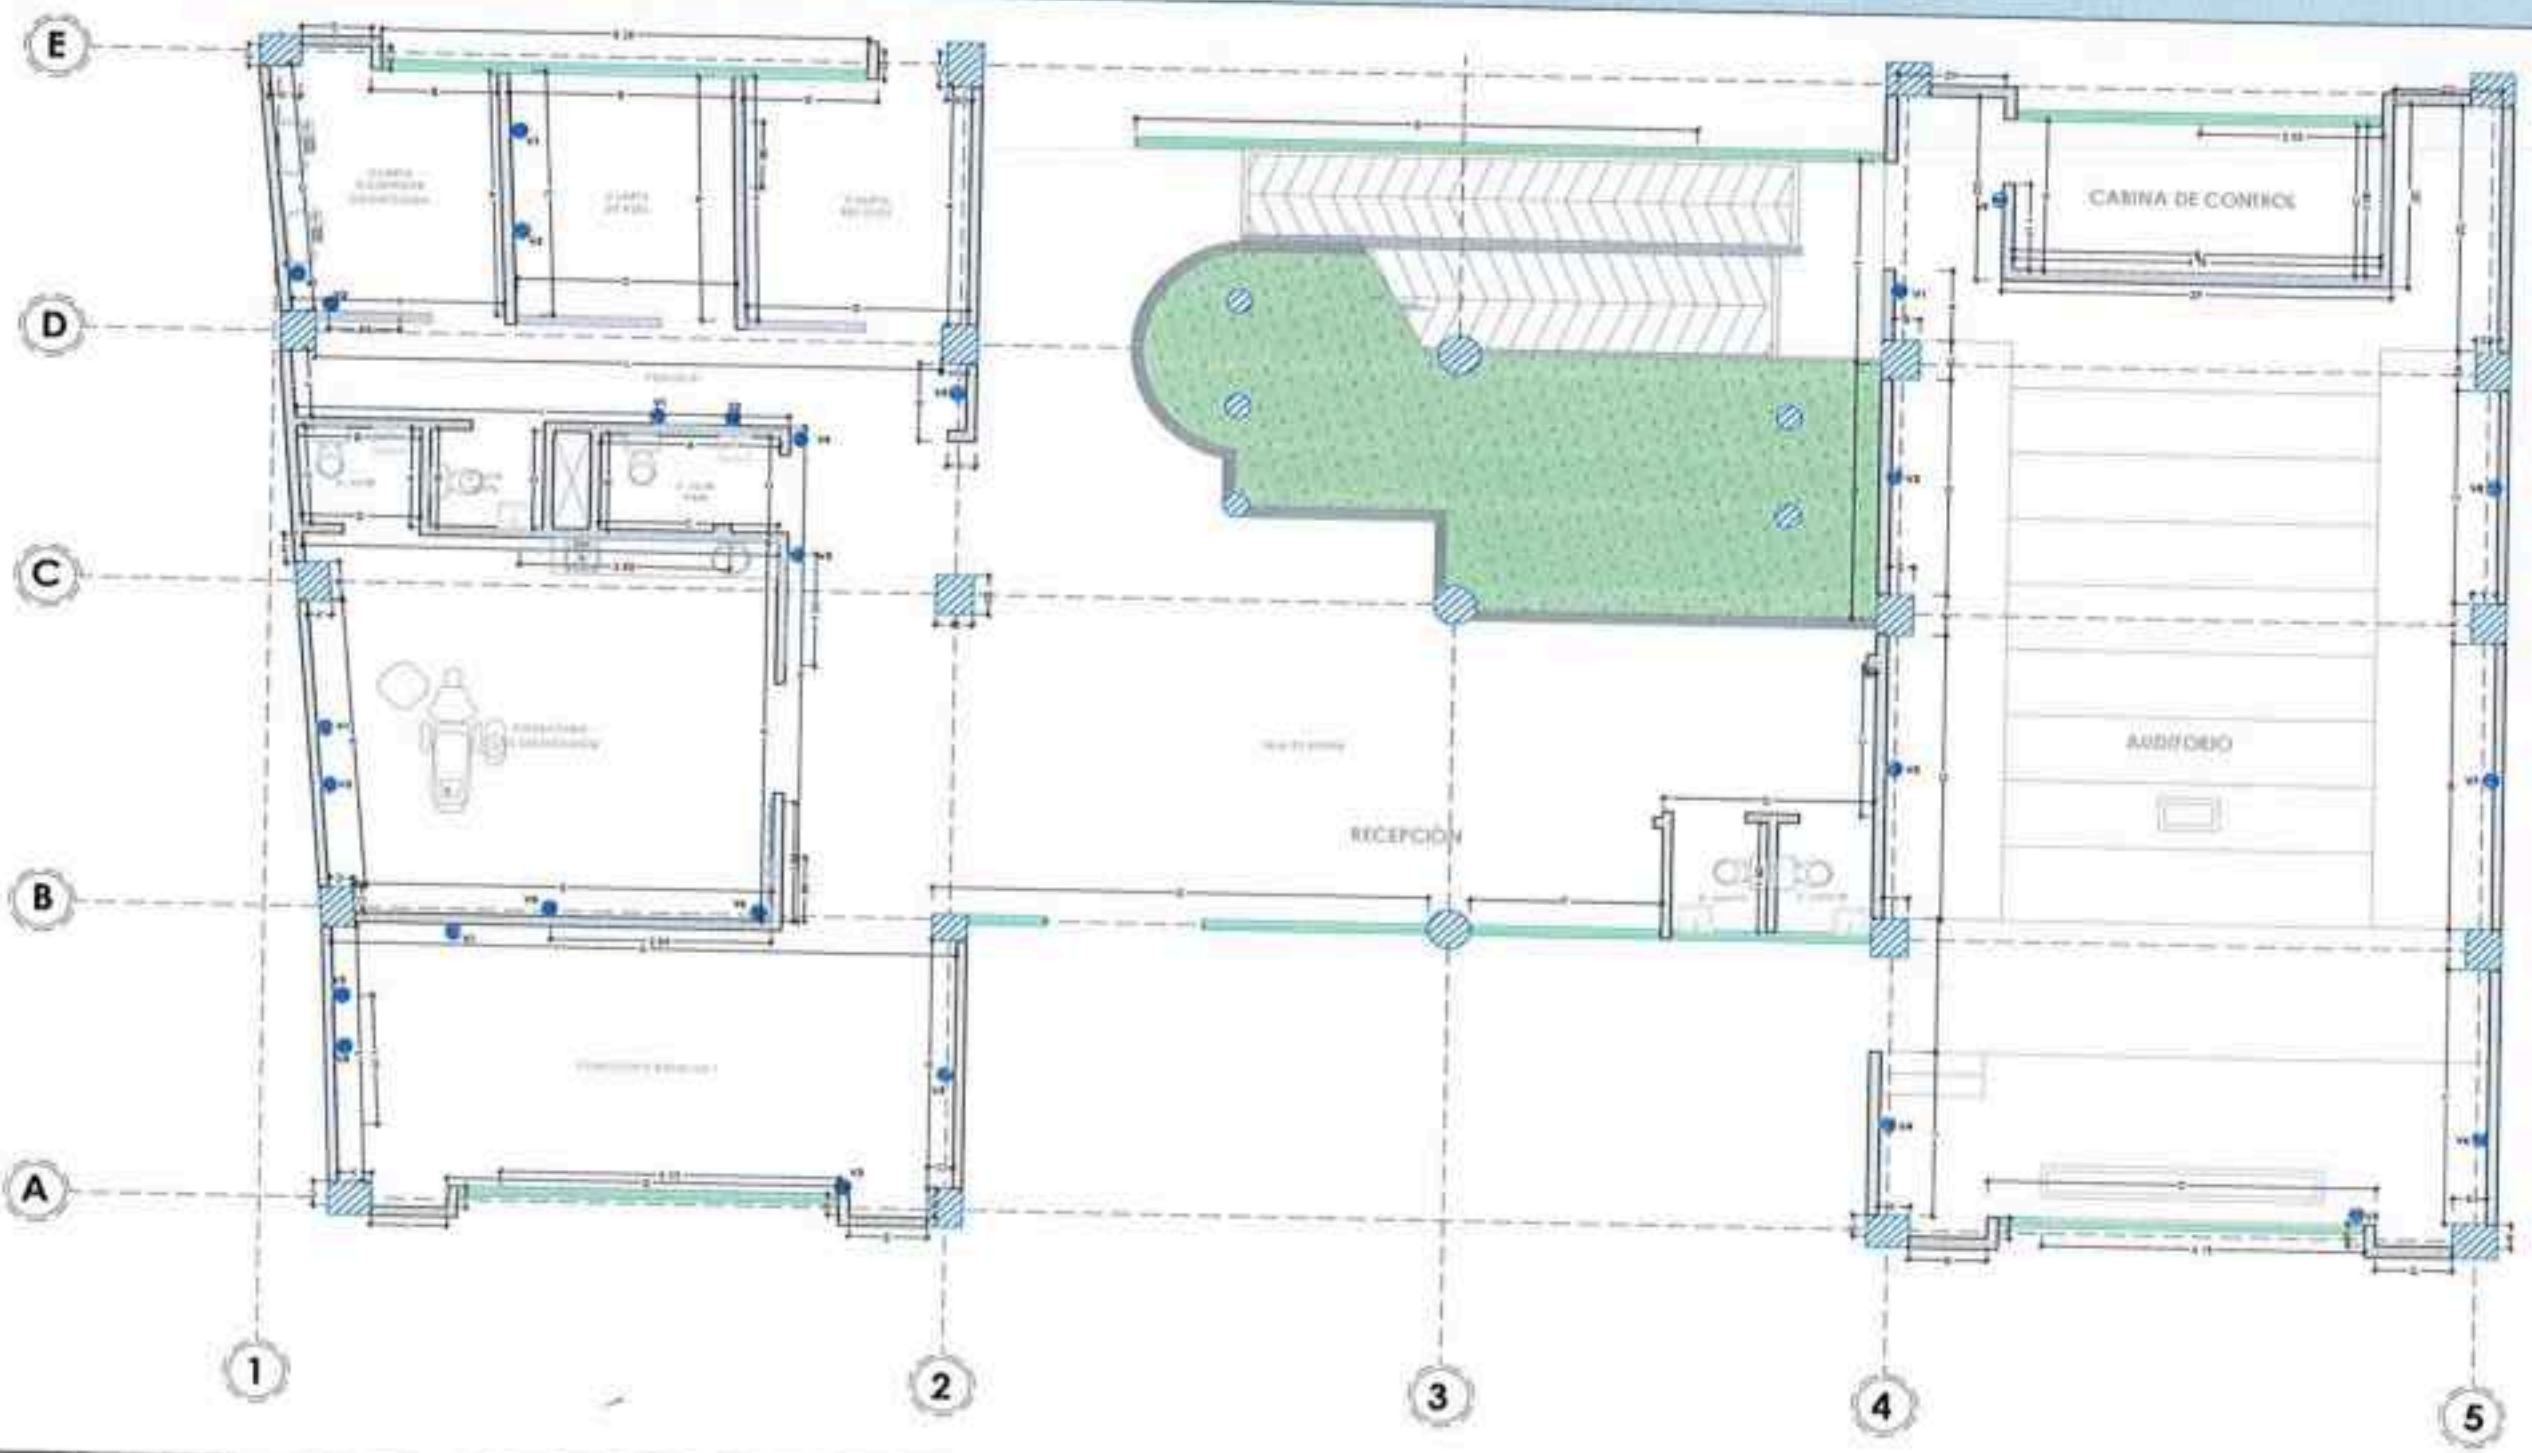

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E


DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE		UBICACIÓN	SAN JOSE DEL BUBUY	
			FECHA	25/05/2026	
			ACTA No	Recibo y liquidación	

CAPÍTULO	NP	ITEM NO PREVISTOS	ÍTEM	NP7	Demolición de muro drywall incluye retiro	UND	m2	CANT.	100,53

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA

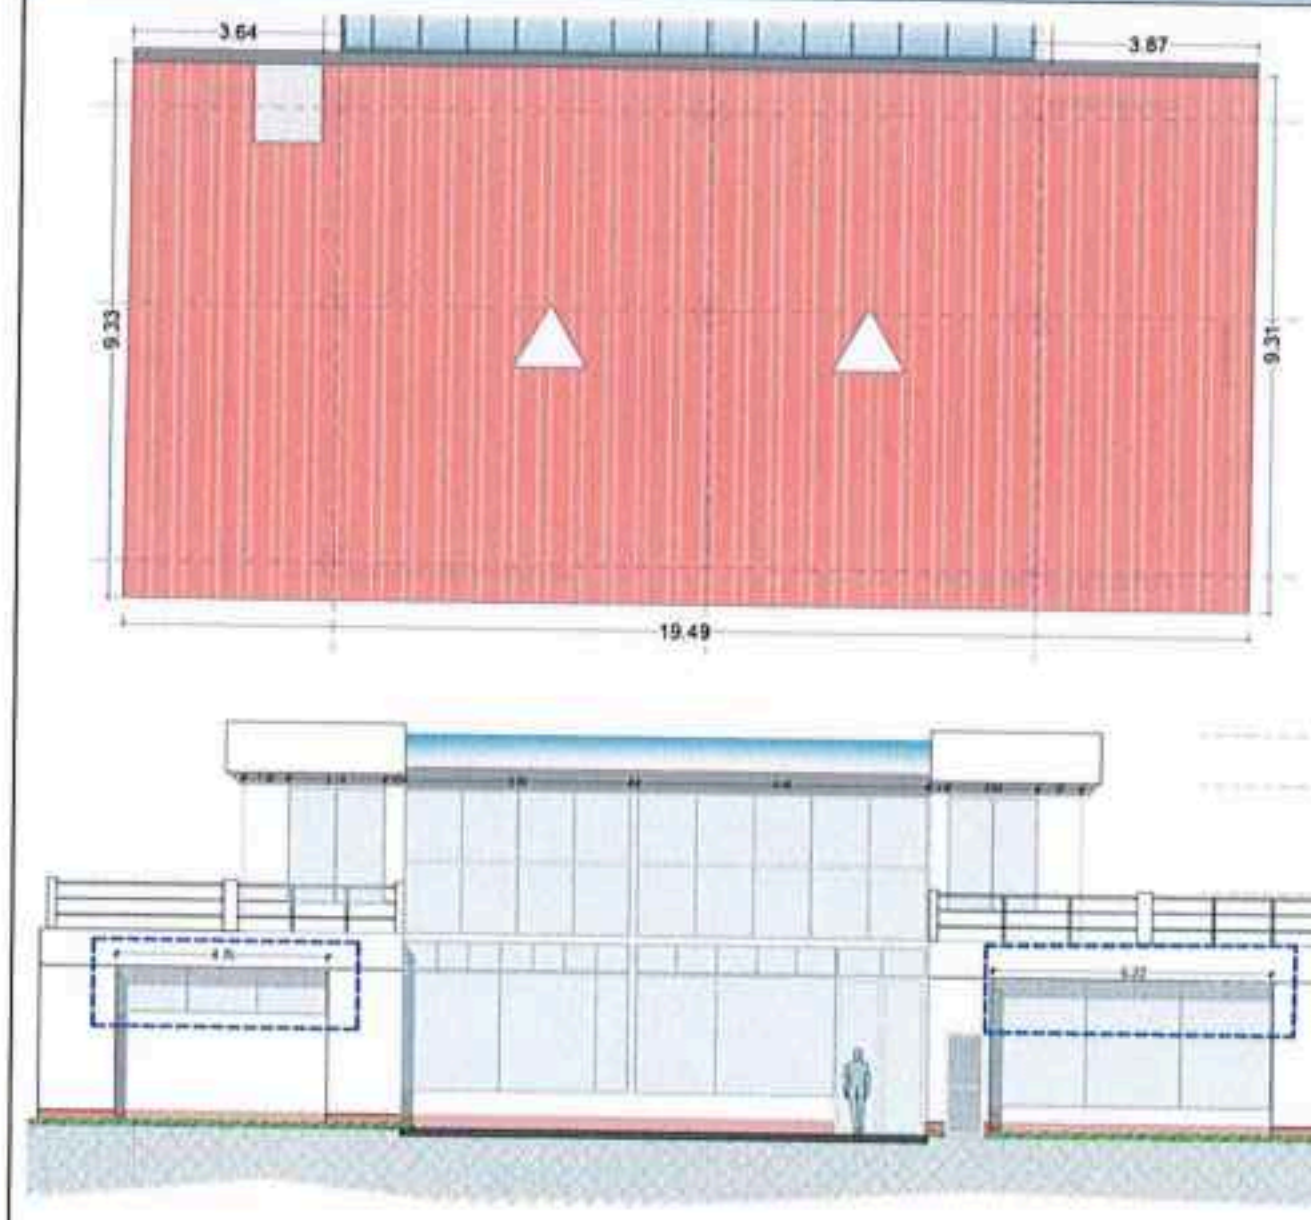

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					CANT. TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	ÁREA (M2)	CANT.	
	3,64		1,05		1,00	4,69
	9,33		1,05		1,00	10,38
Culata - vertical	19,49		1,05		1,00	20,54
	9,31		1,05		1,00	10,36
Culata - Cubierta	3,87		1,05		1,00	4,92
	3,64		0,41		1,00	4,05
	8,51		0,41		1,00	8,92
Culata - horizontal	19,49		0,41		1,00	19,90
	8,49		0,41		1,00	8,90
	3,87		0,41		1,00	4,28
Ventana exterior (cuarto de aseo y cuarto de residuos)	6,22	0,34			1,00	2,11
Ventana exterior (auditorio)	4,76	0,31			1,00	1,48







CANTIDAD PROYECTADA	100,53
CANTIDAD CONTRACTUAL	103,05
DIFERENCIA	-2,52

OBSERVACIONES:


ELABORÓ:	ROSSY ELENA NIÑO GÓMEZ	APROBÓ:	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
	RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL
	CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPICO INGENIERIA S.A.S


HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E


DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE				**UBICACIÓN**	SAN JOSE DEL BUBUY		
					FECHA	25/05/2026		
					ACTA No	Recibo y liquidación		
CAPÍTULO	**NP**	**ITEM NO PREVISTOS**	**ÍTEM**	**NP7**	**Demolición de muro drywall incluye retiro**	**UND**	**m2**	**CANT.**	**0,00**

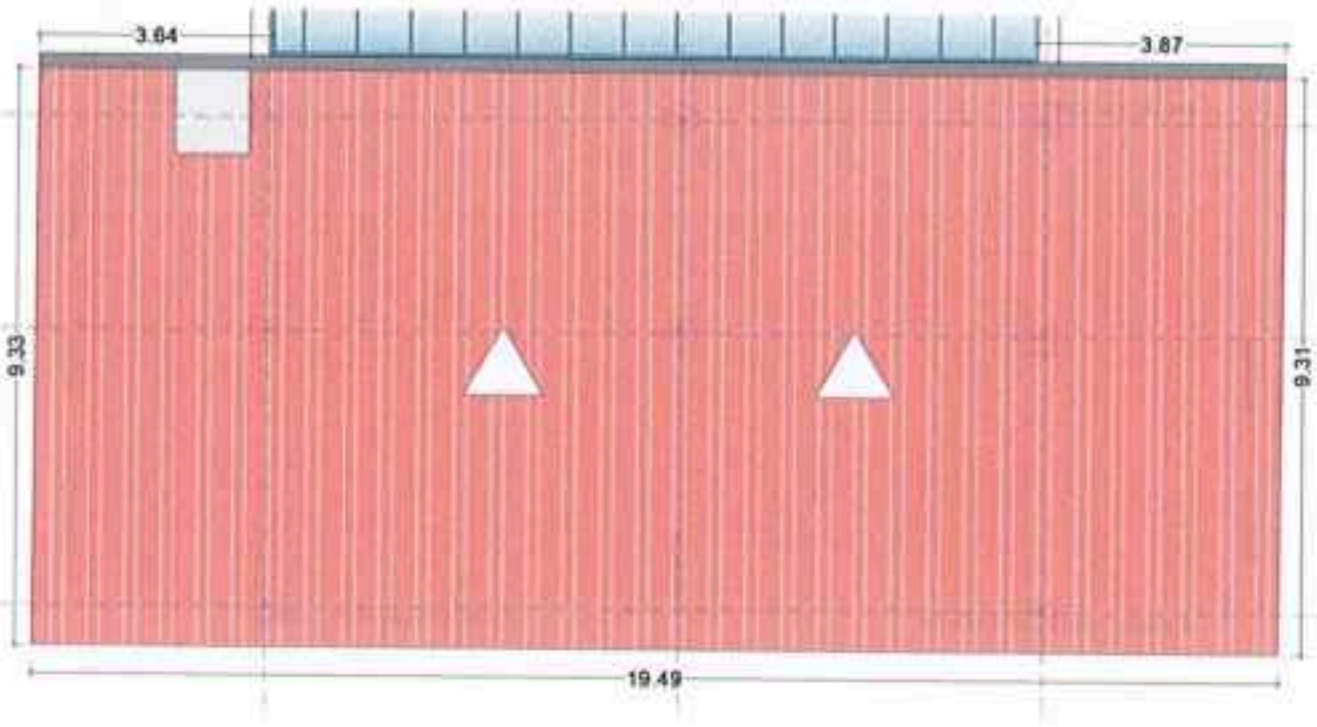

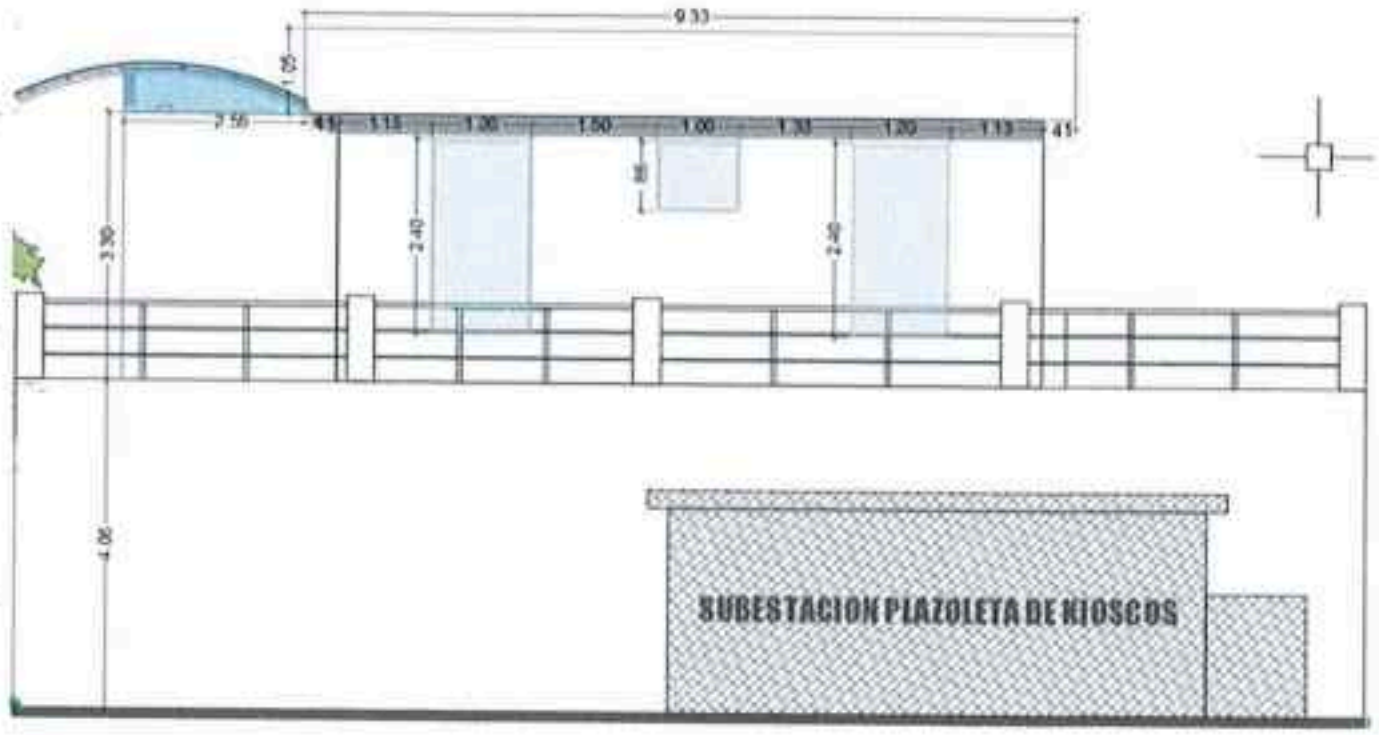

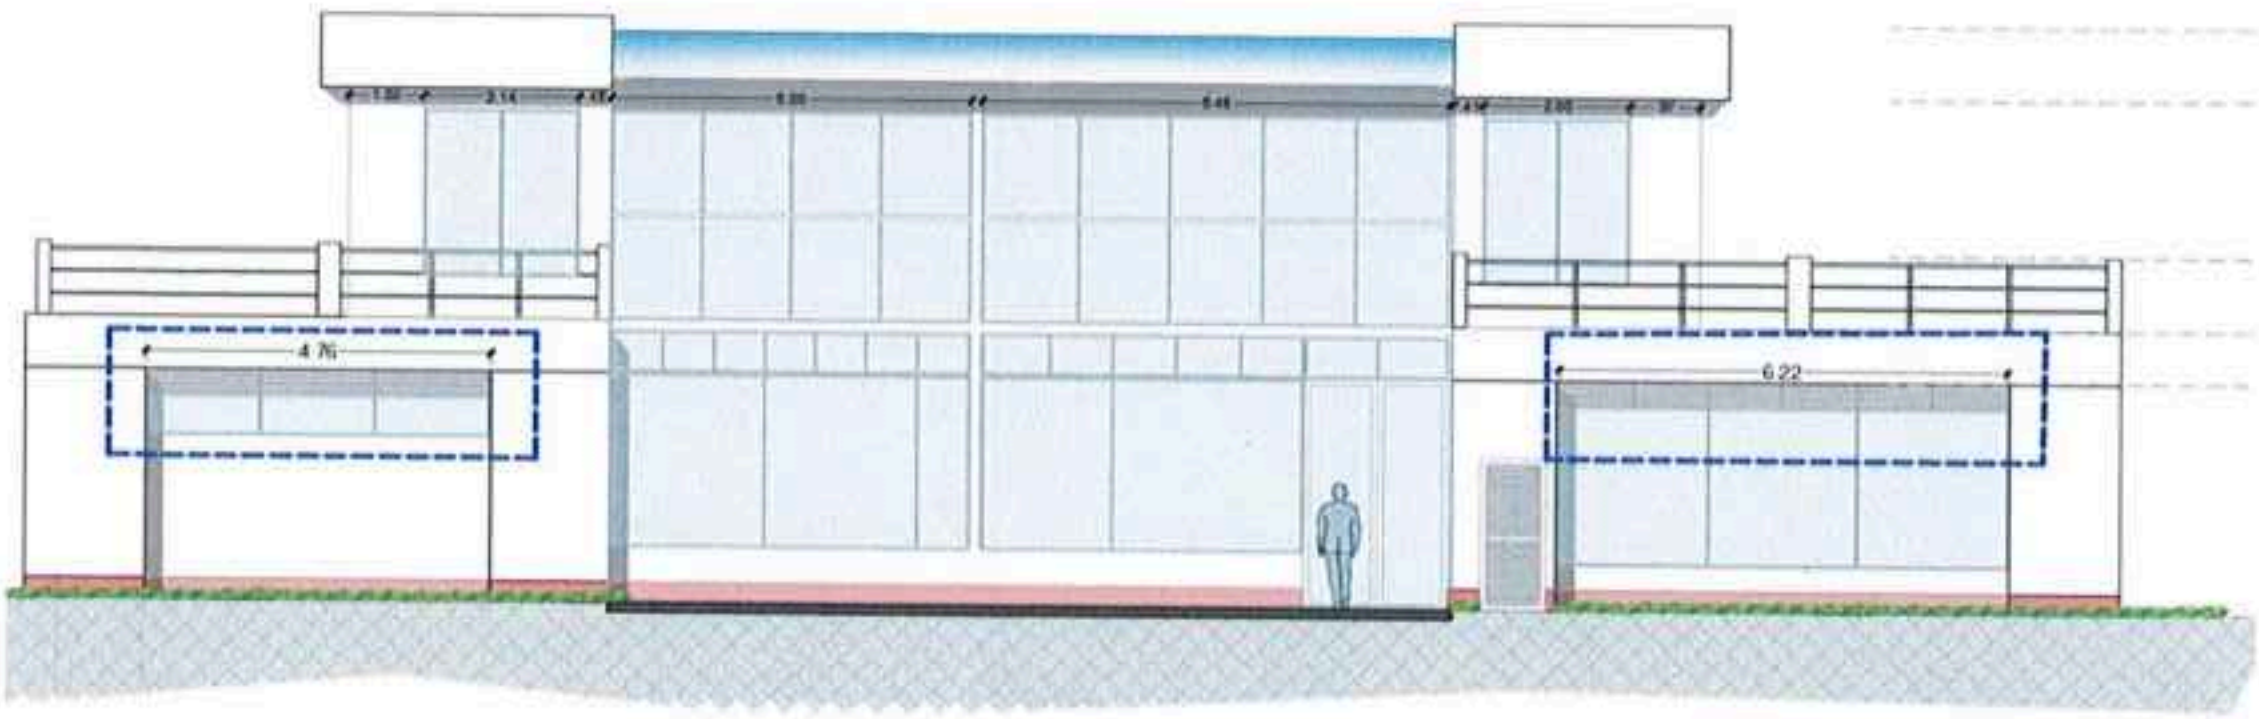

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E


DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	UBICACIÓN	SAN JOSE DEL BUBUY
		FECHA	25/05/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	NP	ITEM NO PREVISTOS	ÍTEM	NP8	Cielo raso en lamina PVC 10 mm (incluye cornisa)	UND	m2	CANT.	0,00

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA

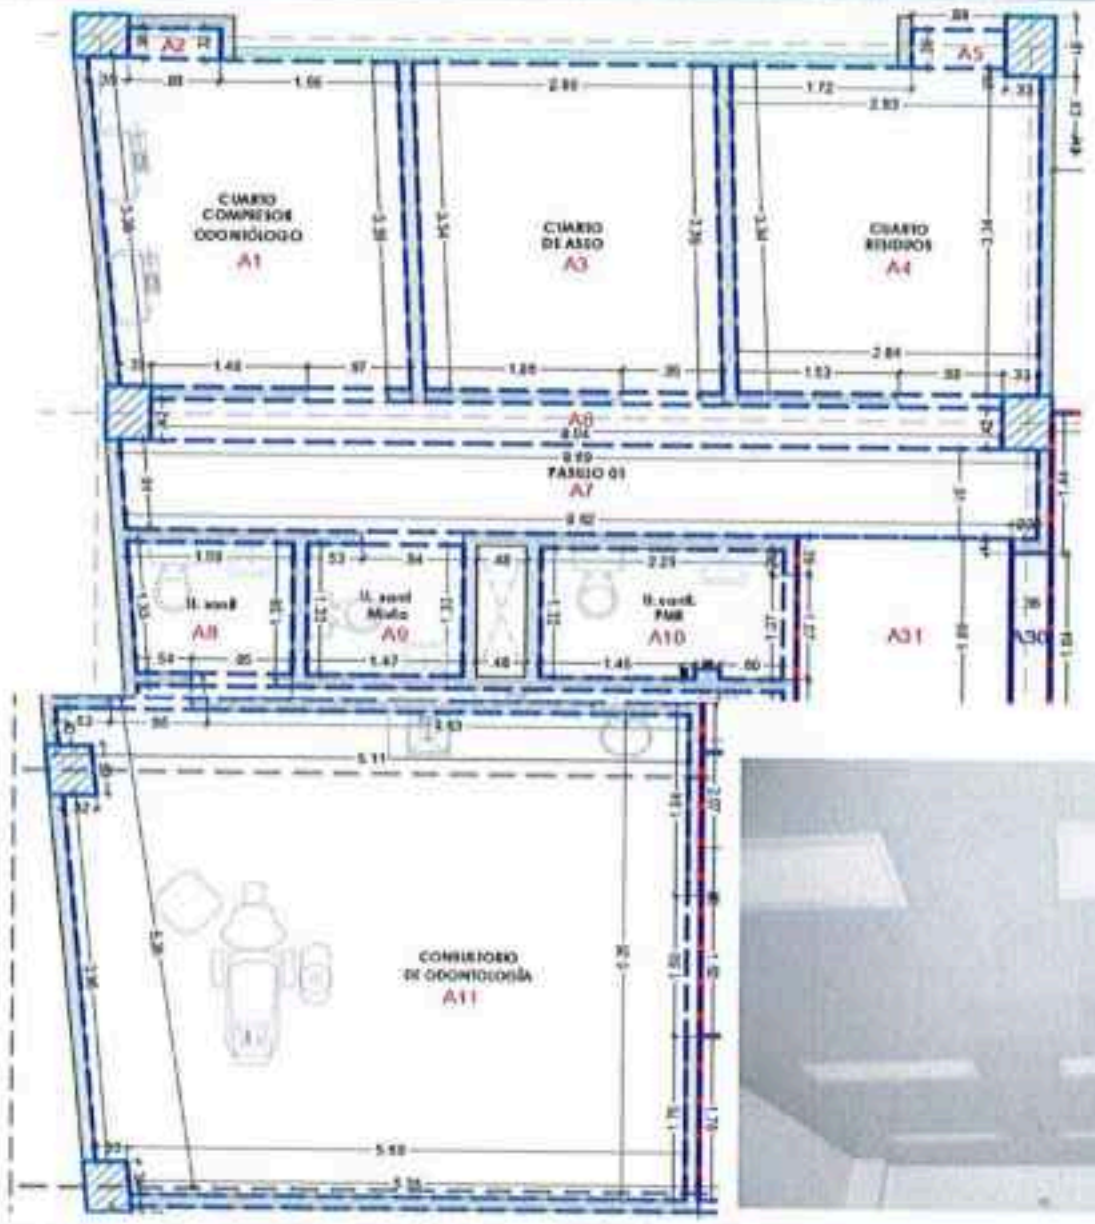

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES					CANT. TOTAL
		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	ÁREA (M2)	CANT.	
Cuarto compresor	A1 (L1=2.94;L2=2,75;Lp=2,85) (A1=3,38; A2=3,39; Ap=3,39)	2,85	3,39			1,00	9,66
	A2 (A1=0,30; A2=0,32; Ap=0,31	0,89	0,31			1,00	0,28
Cuarto Aseo	A3 (L1=2,86; L2=2,80;Lp=2,83) (A1=3,34; L2=3,39; Ap=3,37)	2,83	3,37			1,00	9,54
Cuarto de residuos	A4 (L1=2,93; L2=2,84;Lp=2,89)	2,89	3,34			1,00	9,65
	A4- Columna E2	0,33	0,07			- 1,00	- 0,02
	A5	0,86	0,39			1,00	0,34
Pasillo 01	A6	8,04	0,42			1,00	3,38
	A7 (L1=8,69;L2=8,62; Lp=	8,66	0,91			1,00	7,88
Baño consultorio odontologico	A8 (L1=1,59;L2=1,49; Lp=1,54) (A1=1,33; A2=1,39 Ap=1,36)	1,54	1,36			1,00	2,09
U. Sanit Mixta	A9	1,47	1,33			1,00	1,96
U. Sanit PMR	A10	2,29	1,32			1,00	3,02
	A10- Columna	0,23	0,10			- 1,00	- 0,02
Consultorio Odontologia	A11 (L1=6,11; L2=5,69;Lp=5,90) ((A1=5,26; A2=5,20; Lp	5,90	5,23			1,00	30,86
	A11 - Columna C1	0,32	0,53			- 1,00	- 0,17
	A11 - Columna B1	0,30	0,34			- 1,00	- 0,10
Consultorio medicina 01	A12 (L1=8,03; L2=7,88;Lp=7,96) ((A1=3,56; A2=3,50; Lp	7,96	3,53			1,00	28,10
	A13 (A1=0,33;A2=0,29;Lp=0,31)	0,98	0,31			1,00	0,30
	A14 (A1=0,29;A2=0,40;Lp=0,35)	0,98	0,35			1,00	0,34
						CANTIDAD PROYECTADA	107,08

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	ROSSY ELENA NIÑO GÓMEZ	APROBÓ	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
	RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL
	CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPICO INGENIERIA S.A.S

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E


DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	UBICACIÓN	SAN JOSE DEL BUBUY		
		FECHA	25/05/2026		
		ACTA No	Recibo y liquidación		

CAPÍTULO	NP	ITEM NO PREVISTOS	ÍTEM	NP8	Cielo raso en lamina PVC 10 mm (incluye cornisa)	UND	m2	CANT.	0,00

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA

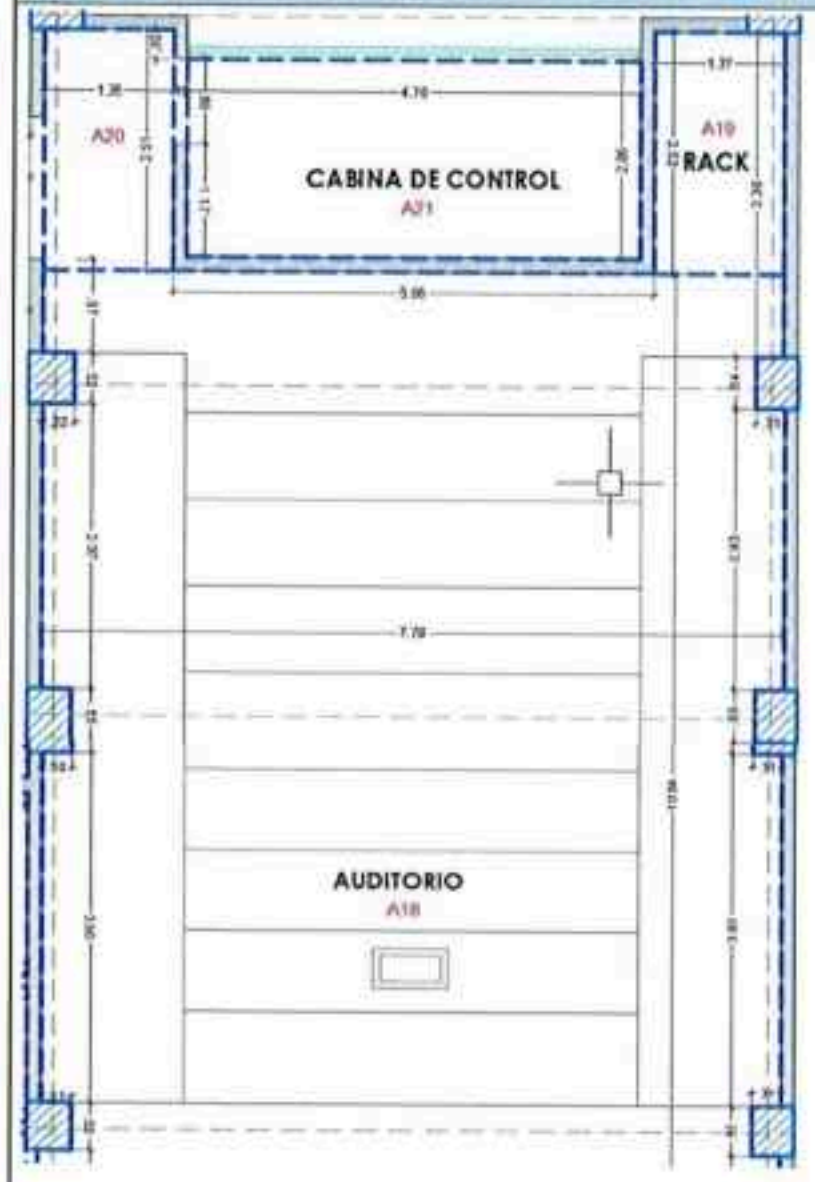





LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	ÁREA (M2)	CANT.	CANT. TOTAL
Tarima	A15	7,79	2,25			1,00	17,53
	A16 (L1= 0,29; L2= 0,30; Lp=0,30)	0,98	0,30			1,00	0,29
	A17 (L1= 0,30; L2= 0,32; Lp=0,31)	0,98	0,31			1,00	0,30
Auditorio	A18	7,76	10,64			1,00	82,78
	A18 - Columna B4	0,31	0,53		-	1,00 -	0,16
	A18 - Columna B5	0,31	0,55		-	1,00 -	0,17
	A18 - Columna C4	0,30	0,55		-	1,00 -	0,17
	A18 - Columna C5	0,31	0,55		-	1,00 -	0,17
	A18 - Columna D4	0,32	0,53		-	1,00 -	0,17
	A18 - Columna D5	0,31	0,54		-	1,00 -	0,17
Rack	A19	1,37	2,52			1,00	3,45
Entrada auditorio	A20	1,35	2,51			1,00	3,39
Cabina de control	A21	4,76	2,06			1,00	9,81
U. sanit H	A22	1,24	1,50			1,00	1,86
U. sanit M	A23	1,22	1,50			1,00	1,83
Sala de espera	A24	5,70	2,56			1,00	14,59
Sala de espera	A23	5,44	2,55			1,00	13,87
	A23 Columna	0,13	0,18		-	1,00 -	0,02
	A24	3,00	2,50			1,00	7,50
	A25	2,74	0,26			1,00	0,71
	A25 - columna redonda				0,02	1,00	0,02
	A26	2,74	1,15			1,00	3,15
	A26 - columna redonda				0,02	1,00	0,02
	A27	1,19	1,69			1,00	2,01
	A28 - Columna redoonda				0,45	1,00	0,45
	A29	2,00	3,28			1,00	6,56
	A30	0,36	1,84			1,00	0,66
	A31	2,03	1,99			1,00	4,04
	A32	5,57	3,03			1,00	16,88
	A32 - Columna C2	0,48	0,53		-	1,00 -	0,25
						CANTIDAD PROYECTADA	190,42
						Viene	107,08
						TOTAL	297,51

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	ROSSY ELENA NIÑO GÓMEZ	APROBÓ	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL	
CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPICO INGENIERIA S.A.S	

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E


DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	**UBICACIÓN**	SAN JOSE DEL BUBUY
		FECHA	25/05/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	NP	ITEM NO PREVISTOS	ÍTEM	NP8	Cielo raso en lamina PVC 10 mm (incluye cornisa)	UND	m2	CANT.	0,00

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA

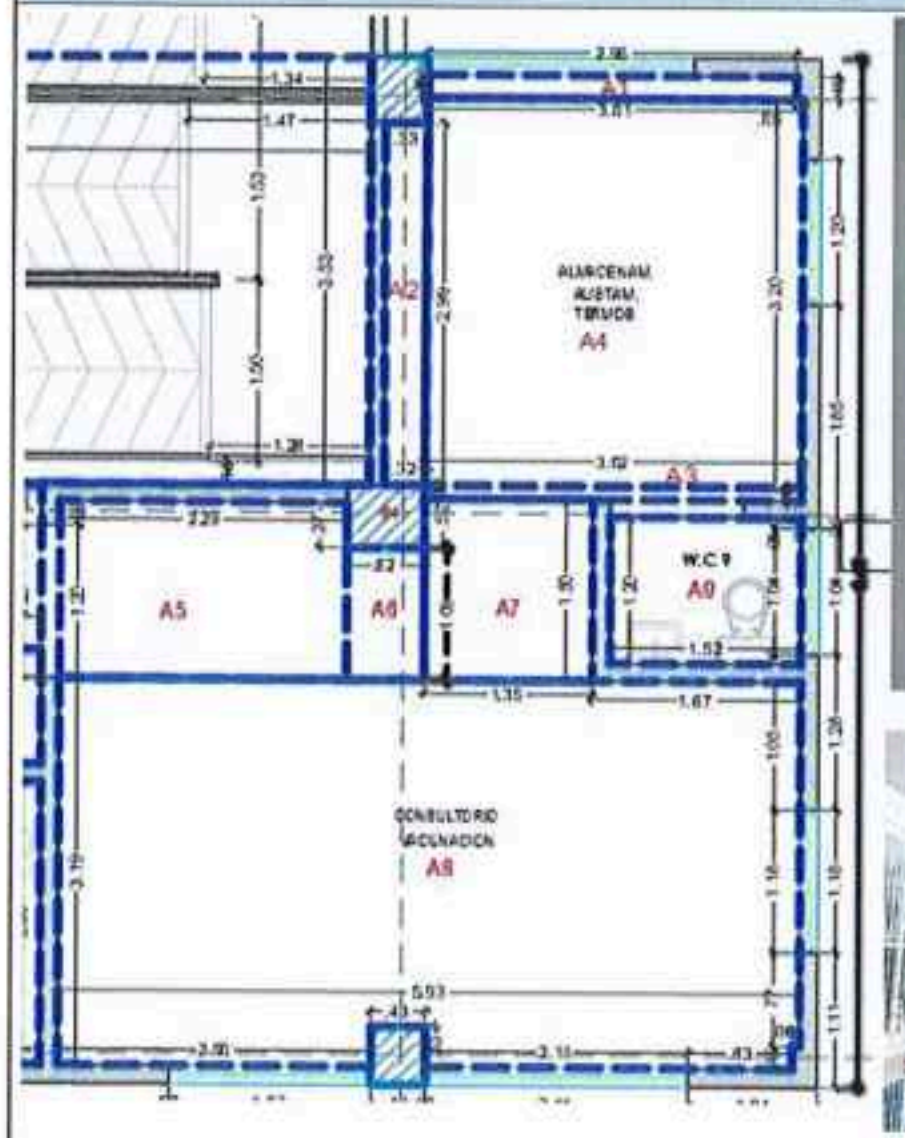





LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	ÁREA (M2)	CANT.	CANT. TOTAL
Sala de espera	A33	1,94	1,78			1,00	3,41
	A34	9,36	1,62			1,00	15,16
	A34 - Columneta	0,12	0,24		-	1,00 -	0,03
	A34 Columna redonda r=0,20 $A = (\pi r^2)/2$				0,06 -	1,00 -	0,06
Área de ingreso	A35	11,62	2,40			1,00	27,89
	A35 - Columna redonda r=0,20 $A = (\pi r^2)/2$				0,06 -	1,00 -	0,06
SEGUNDO PISO							
Almacen alistam Termos	A1 (L1= 2,96; L2= 3,01; Lp=2,99)	2,99	0,19			1,00	0,57
	A2 (L1= 0,33; L2= 0,32; Lp=2,99)	0,33	2,99			1,00	0,99
	A3	3,02	0,11			1,00	0,33
	A4 (L1= 3,01; L2= 3,02; Lp=3,02)	3,02	3,20			1,00	9,66
Consltorio Vacunación	A5	2,29	1,20			1,00	2,75
	A6	0,62	1,09			1,00	0,68
	A7	1,35	1,50			1,00	2,03
	A8 (Total)	5,93	3,19			1,00	18,92
	A8 - Columna B4	0,43	0,33			- 1,00 +	0,14
	A8 Eje B esquina	0,06	0,19			- 1,00 -	0,01
W.C 9	A9	1,52	1,20			1,00	1,82
W.C 6	A10	1,29	2,33			1,00	3,01
W.C 7	A11	1,30	1,56			1,00	2,03
Oficina /Archivo	A12	3,29	3,29			1,00	10,82
						CANTIDAD PROYECTADA	99,76
						Viene	297,51
						TOTAL	397,26

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:	ROSSY ELENA NIÑO GÓMEZ	APROBÓ:	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
	RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL
	CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPICO INGENIERIA S.A.S

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E


DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	UBICACIÓN	SAN JOSE DEL BUBUY
		FECHA	25/05/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	NP	ITEM NO PREVISTOS	ÍTEM	NP6	Cielo raso en lamina PVC 10 mm (incluye cornisa)	UND	m2	CANT.	486,93

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA

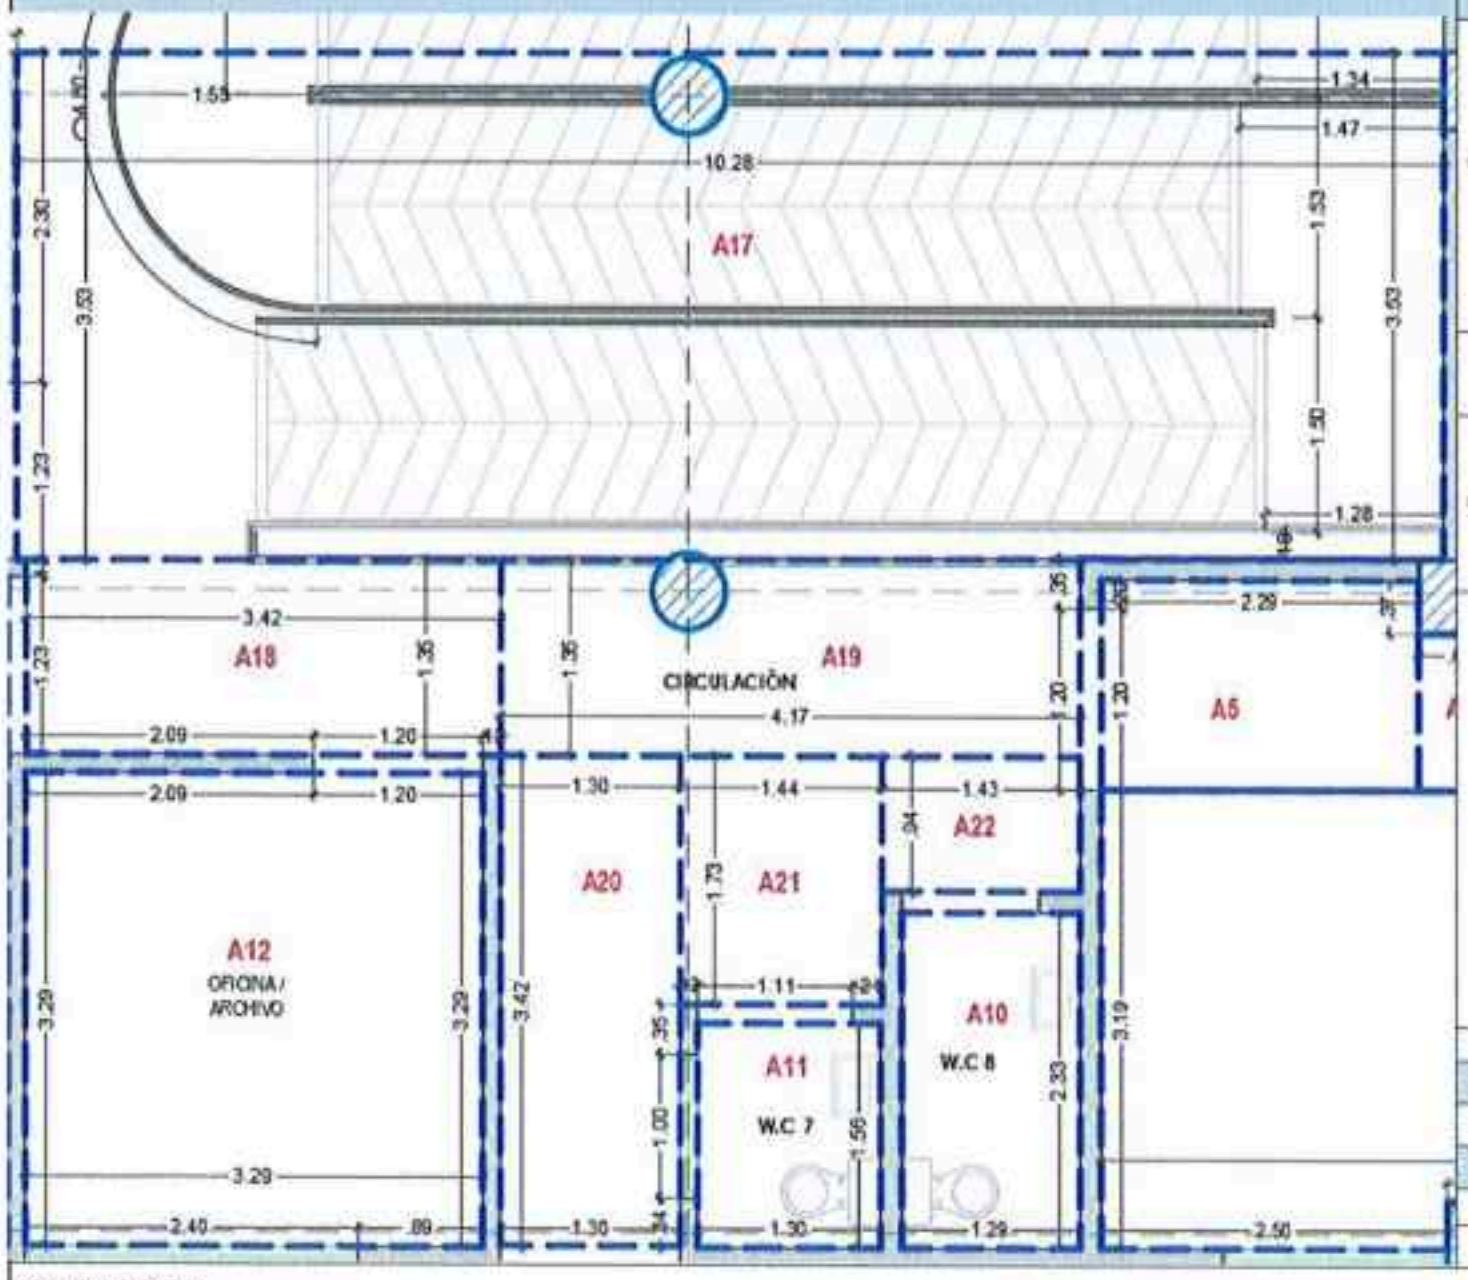

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	ÁREA (M2)	CANT.	CANT. TOTAL
Consultorio enfermería 2	A13 (A1=4,61;A2=4,65;Ap=4,63	2,88	4,63			1,00	13,33
	A13 - Columna B2	0,43	0,40		-	1,00 -	0,17
	A13 - Columna C2 A1=0,25;A2=0,29; Ap=	0,42	0,27		-	1,00 -	0,11
	A14 (A1=3,23;A2=3,20;Ap=4,63	1,69	3,22			1,00	5,44
W.C 6	A15	1,57	1,00			1,00	1,57
Consultorio medicina 2	A16	4,48	3,44			1,00	15,41
	A16 - Columna D2 (A1=0,42;A2=0,35; Ap=	0,43	0,39		-	1,00 -	0,17
Circulación	A17	10,28	3,53			1,00	36,29
	A19 - Columna redonda D3 r=0,27				0,23 -	1,00 -	0,23
	$A_{18}\ \pi r^2$	3,42	1,35			1,00	4,62
	A19	4,17	1,35			1,00	5,63
	A19 - Columna redonda C3 r=0,27				0,23 -	1,00 -	0,23
	$A_{20}\ \pi r^2$	1,30	3,42			1,00	4,45
	A21	1,44	1,73			1,00	2,49
	A22	1,43	0,94			1,00	1,34

CANTIDAD PROYECTADA	89,66
Viene	397,26
TOTAL	486,93
CANTIDAD CONTRACTUAL	457,29
DIFERENCIA	29,64

OBSERVACIONES:



ELABORÓ	ROSSY ELENA NIÑO GOMEZ	APROBÓ	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
	RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL
	CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPICO INGENIERIA S.A.S

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E

DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÒN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÒN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE				**UBICACIÒN**	SAN JOSE DEL BUBUY					
					FECHA	25/05/2026					
					ACTA No	Recibo y liquidación					
CAPÍTULO	**NP**	**ITEM NO PREVISTOS**	**ÍTEM**	**NP9**	**Desmonte de aires acondicionado, incluye accesorios**	**UND**	**Und**	**CANT.**	**10,00**		

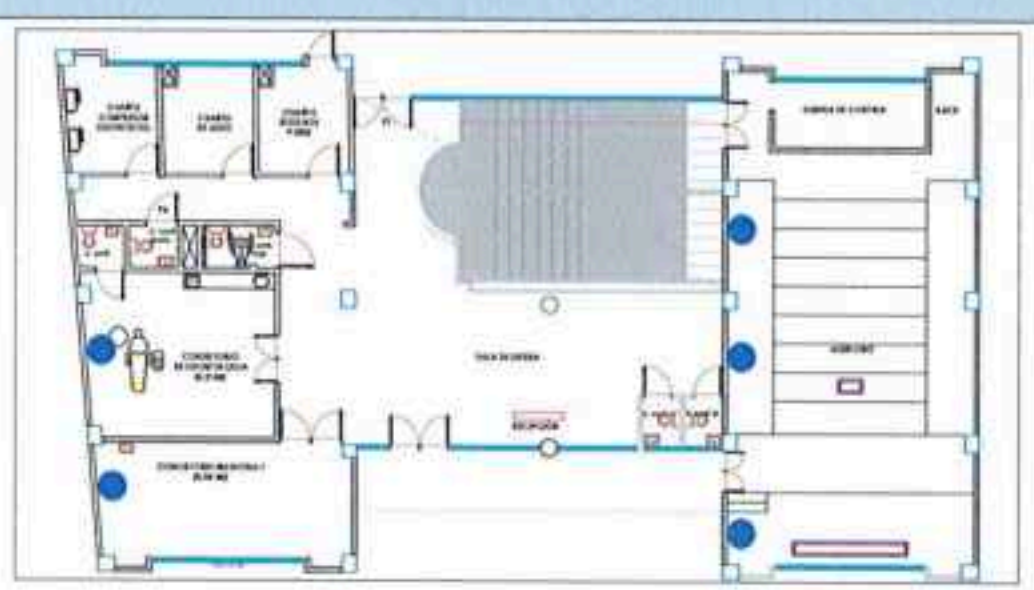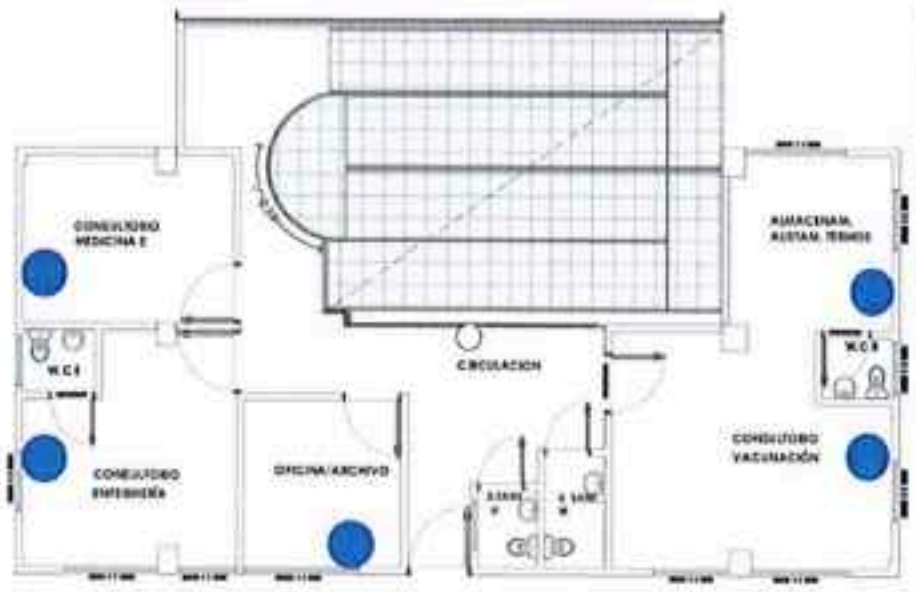ILUSTRACIÒN / FOTOGRAFÍA	LOCALIZACIÒN		DIMENSIONES					CANT. TOTAL
			LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	ÁREA (M2)	CANT.	
		Auditorio					3,00	3,00
	Primer piso	Odontología					1,00	1,00
		Consultorio medicina 1					1,00	1,00
		Consultorio medicina 2					1,00	1,00
		Consultorio enfermería					1,00	1,00
	Segundo Piso	Oficina /archivo					1,00	1,00
		Consultorio vacunación					1,00	1,00
		Almacenamiento termos					1,00	1,00
								
								
								

CANTIDAD PROYECTADA	**10,00**
CANTIDAD CONTRACTUAL	**10,00**
DIFERENCIA	**0,00**

OBSERVACIONES:

ELABORÒ:	ROSSY ELENA NIÑO GÓMEZ	APROBÒ	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
	RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL
	CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPICO INGENIERIA S.A.S


HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E


DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE				UBICACIÓN	SAN JOSE DEL BUBUY		
					FECHA	25/05/2026		
					ACTA No	Recibo y liquidación		
CAPÍTULO	NP	ITEM NO PREVISTOS	ÍTEM	NP10	Reparación puntual de cubierta mediante aplicación de cinta de aluminio bituminosa de 0.15 m de ancho, en dimensiones de 0.15 x 0.10 m, incluye limpieza, preparación e instalación.	UND	Und	CANT.

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA

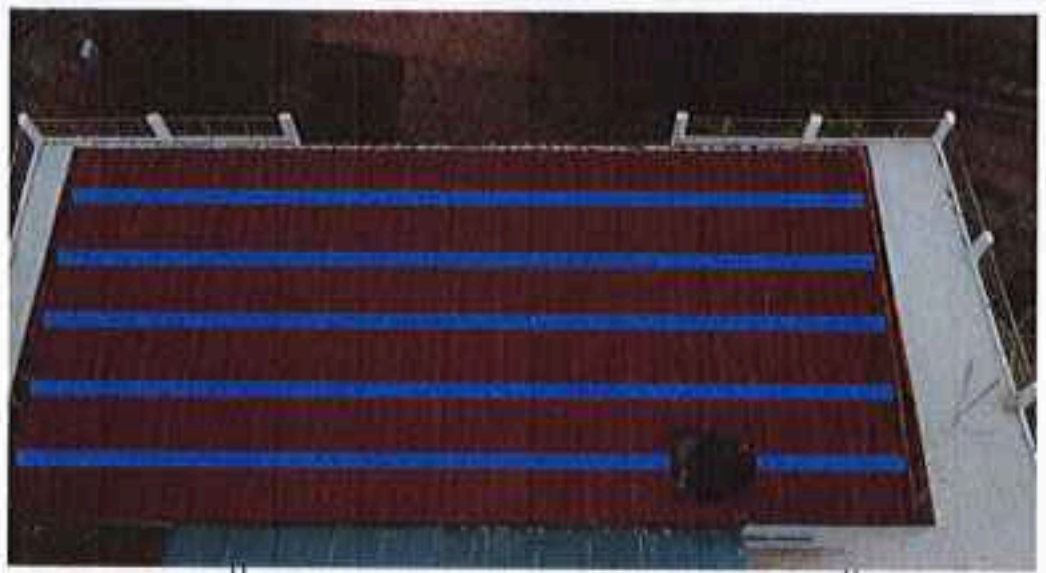


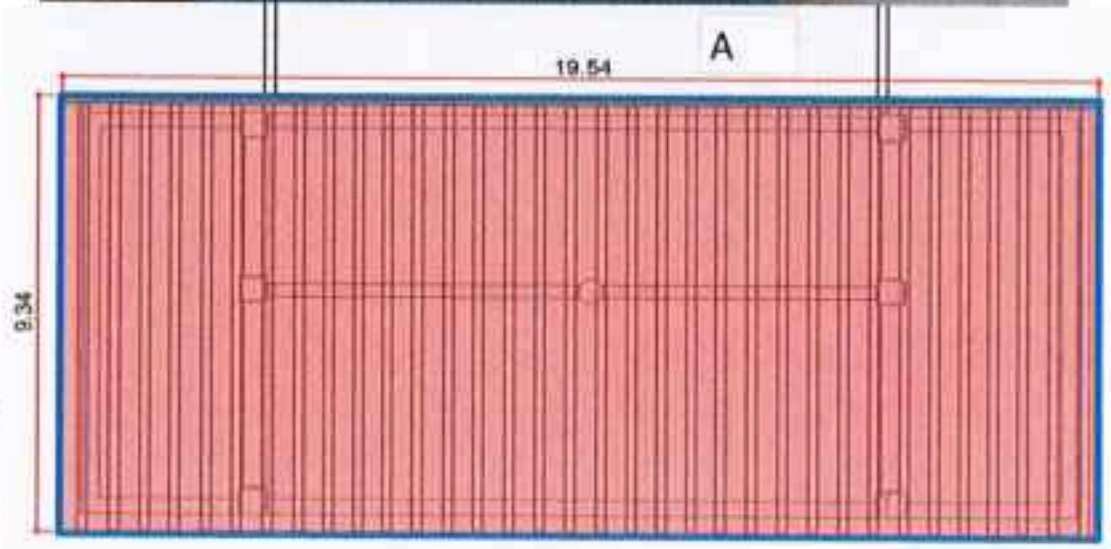

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M) L	DIMENSIONES PARCHES (0,15 X 0,10) (M)	CANTIDAD (UND) L/M	CANT	REPETICION	CANT. TOTAL
Cubierta				58,00	4,00	232,00
				53,00	1,00	53,00
				8,00	1,00	8,00

LOCALIZACIÓN	LONG (M) L	DIMENSIONES PARCHES (0,15 X 0,10) (M)	CANTIDAD (UND) L/M	CANT	REPETICION	TOTAL
Lateral A y C	19,54	0,15	130,00		2,00	260,00
Lateral B y D	9,34	0,15	62,00		2,00	124,00



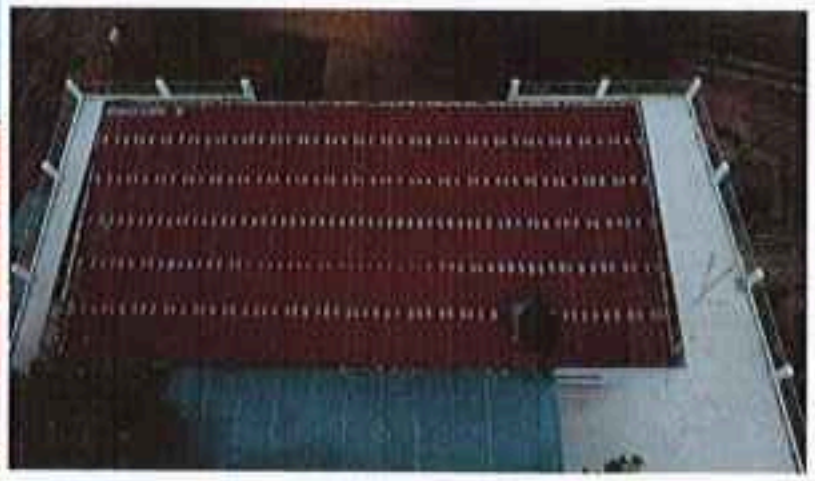

CANTIDAD PROYECTADA	677,00
CANTIDAD CONTRACTUAL	677,00
DIFERENCIA	0,00

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:	ROSSY ELENA NIÑO GÓMEZ	APROBÓ:	OMAR AUGUSTO NEIRA SIERRA
RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL	
CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPICO INGENIERIA S.A.S	

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E


DEPARTAMENTO DE CASANARE


MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	UBICACIÓN	SAN JOSE DEL BUBUY		
		FECHA	25/05/2026		
		ACTA No	Recibo y liquidación		

CAPÍTULO	NP	ITEM S O PREVISTOS	ÍTEM	NP11	Esmalte sobre reja tipo bancaria	UND	m2	CANT.	164,30

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA

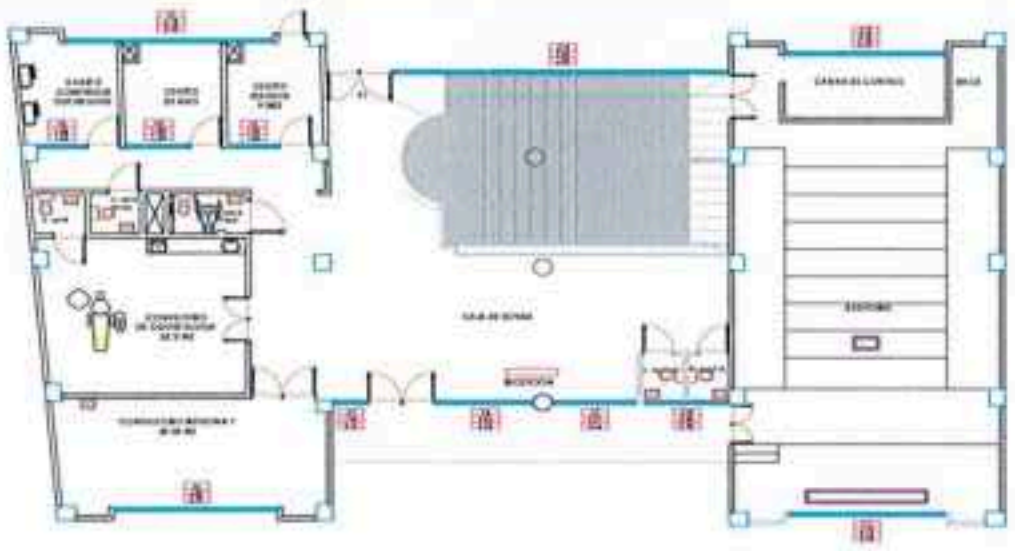

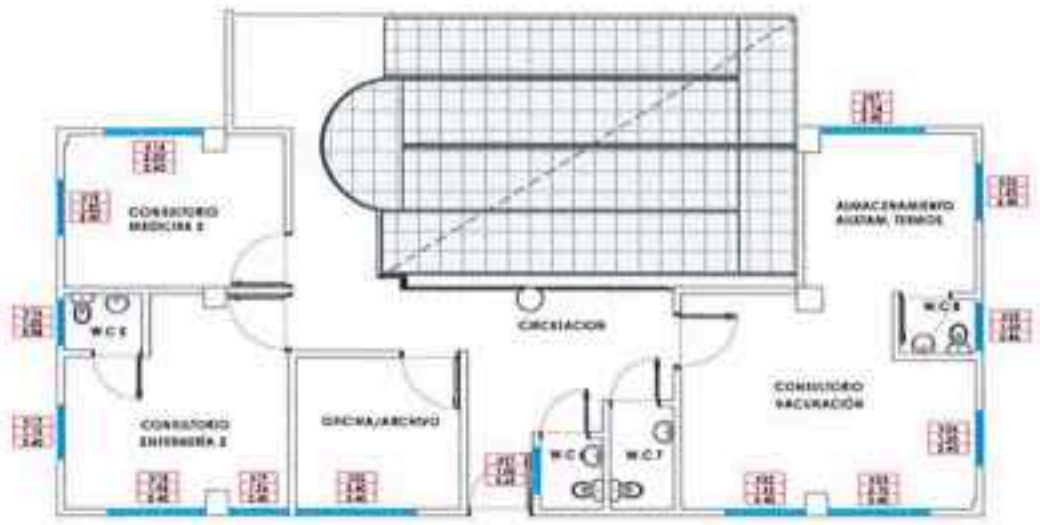

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	ÁREA (M2)	CANT.	CANT. TOTAL
Primer Piso	Cuarto compresor, aseo, residuos - V1		6,26	2,65		1,00	16,64
	Ventana principal - V13		9,63	6,00		1,00	57,78
	Cabina control - V12		4,76	0,95		1,00	4,52
	Tarima - V11		4,72	0,95		1,00	4,48
	Baños Hy M - V10		2,59	0,98		1,00	2,54
	Recepción - V9		2,45	3,00		1,00	7,35
	Recepción - V8		2,90	3,00		1,00	8,70
	Entrada - V7		1,00	3,00		1,00	3,00
	Medicina 1 - V6		4,93	2,70		1,00	13,31
	Consultorio medicina 2 -V14		2,00	2,38		1,00	4,76
	Consultorio medicina 2 -V15		1,20	2,40		1,00	2,88
	Un sanitaria - V16		1,00	0,88		1,00	0,88
	Consultorio enfermería 2 - V17		1,20	2,40		1,00	2,88
	Consultorio enfermería 2 - V18		1,98	2,40		1,00	4,75
	Consultorio enfermería 2 - V19		1,26	2,39		1,00	3,01
Segundo Piso	Consultorio medicina 2 -V20		2,40	2,40		1,00	5,76
	Und. Sant - V21		1,00	0,49		1,00	0,49
	Consultorio - V22		1,62	2,37		1,00	3,84
	Consultorio - V23		2,11	2,36		1,00	4,98
	Consultorio - V24		1,18	2,40		1,00	2,83
	Und. Sant - V25		1,04	0,86		1,00	0,89
	Almacenamiento termos - V26		1,20	2,40		1,00	2,88
	Almacenamiento termos - V27		2,14	2,40		1,00	5,14

CANTIDAD PROYECTADA	164,30
CANTIDAD CONTRACTUAL	165,98
DIFERENCIA	-1,68

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:	ROSSY ELENA NIÑO GOMEZ	APROBÓ:	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
	RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL
	CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPICO INGENIERIA S.A.S


HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E

DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:		ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE				UBICACIÓN	SAN JOSE DEL BUBUY			
						FECHA	25/05/2026			
						ACTA No	Recibo y liquidación			
CAPÍTULO	NP	ITEM S O PREVISTOS	ÍTEM	NP11	Esmalte sobre reja tipo bancaria	UND	m2	CANT.	0,00	

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA

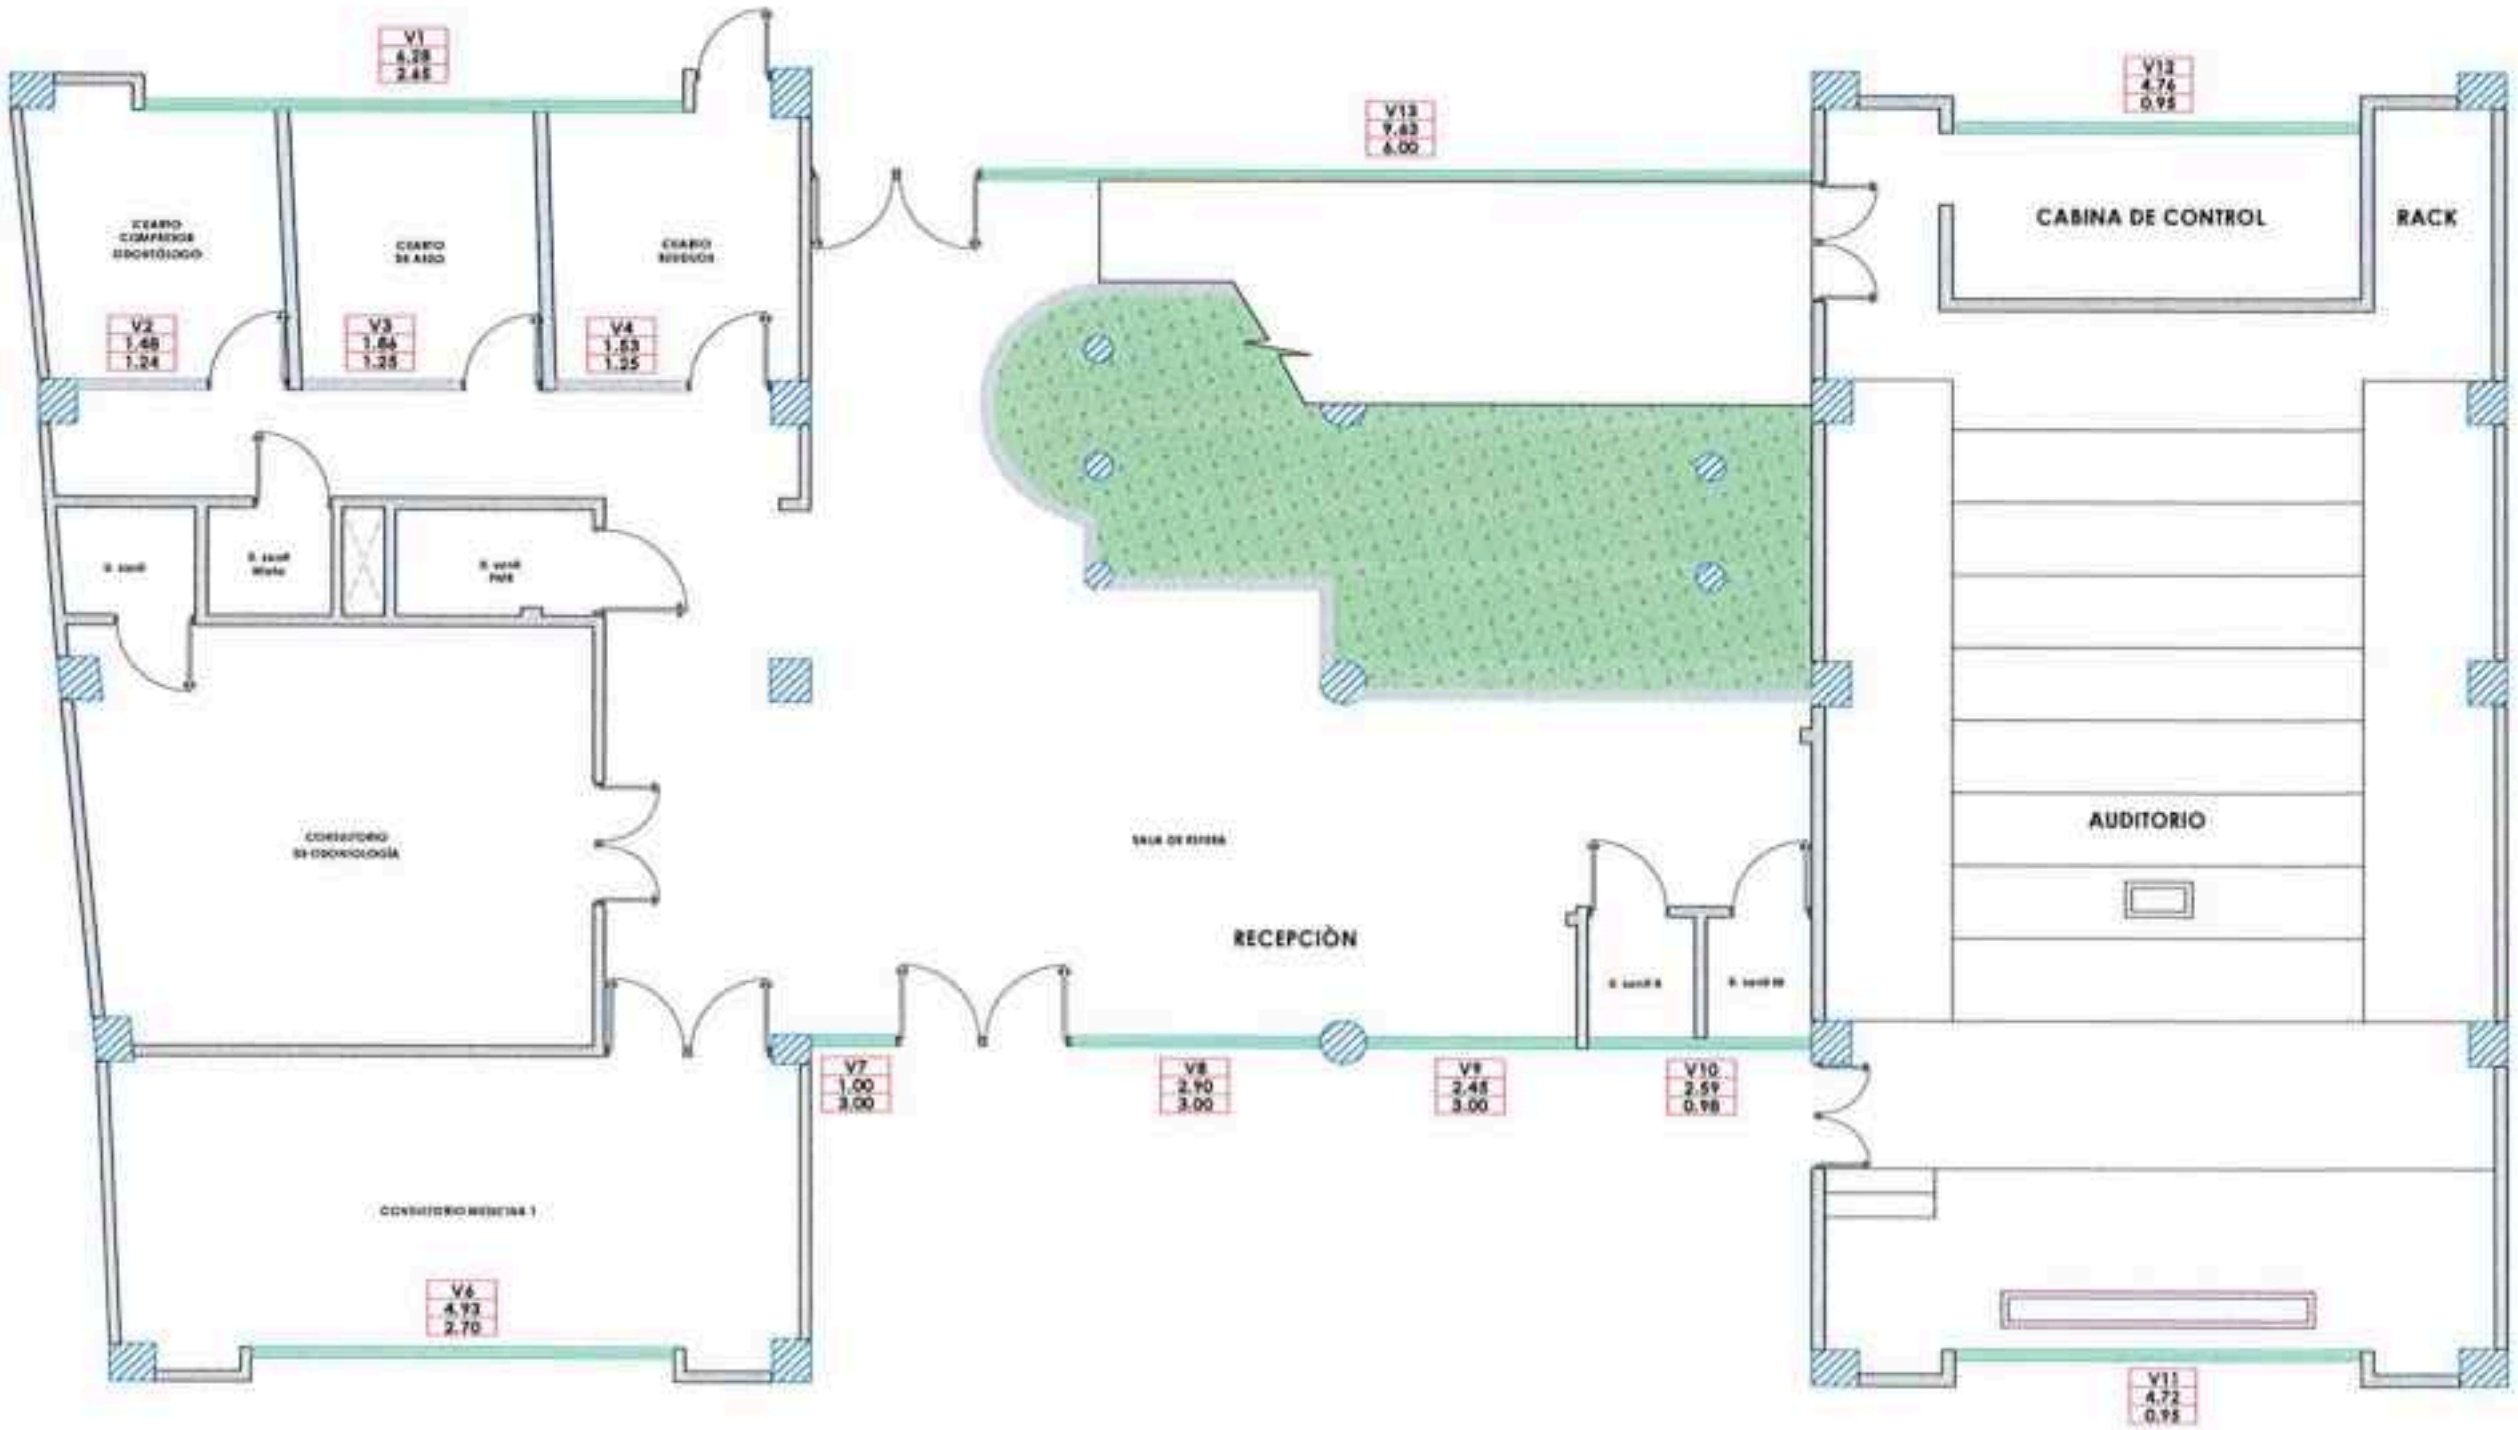


HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E

DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE					UBICACIÓN	SAN JOSE DEL BUBUY		
						FECHA	25/05/2026		
						ACTA No	Recibo y liquidación		
CAPÍTULO	NP	ITEM S O PREVISTOS	ÍTEM	NP11	Esmalte sobre reja tipo bancaria	UND	m2	CANT.	0,00

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA

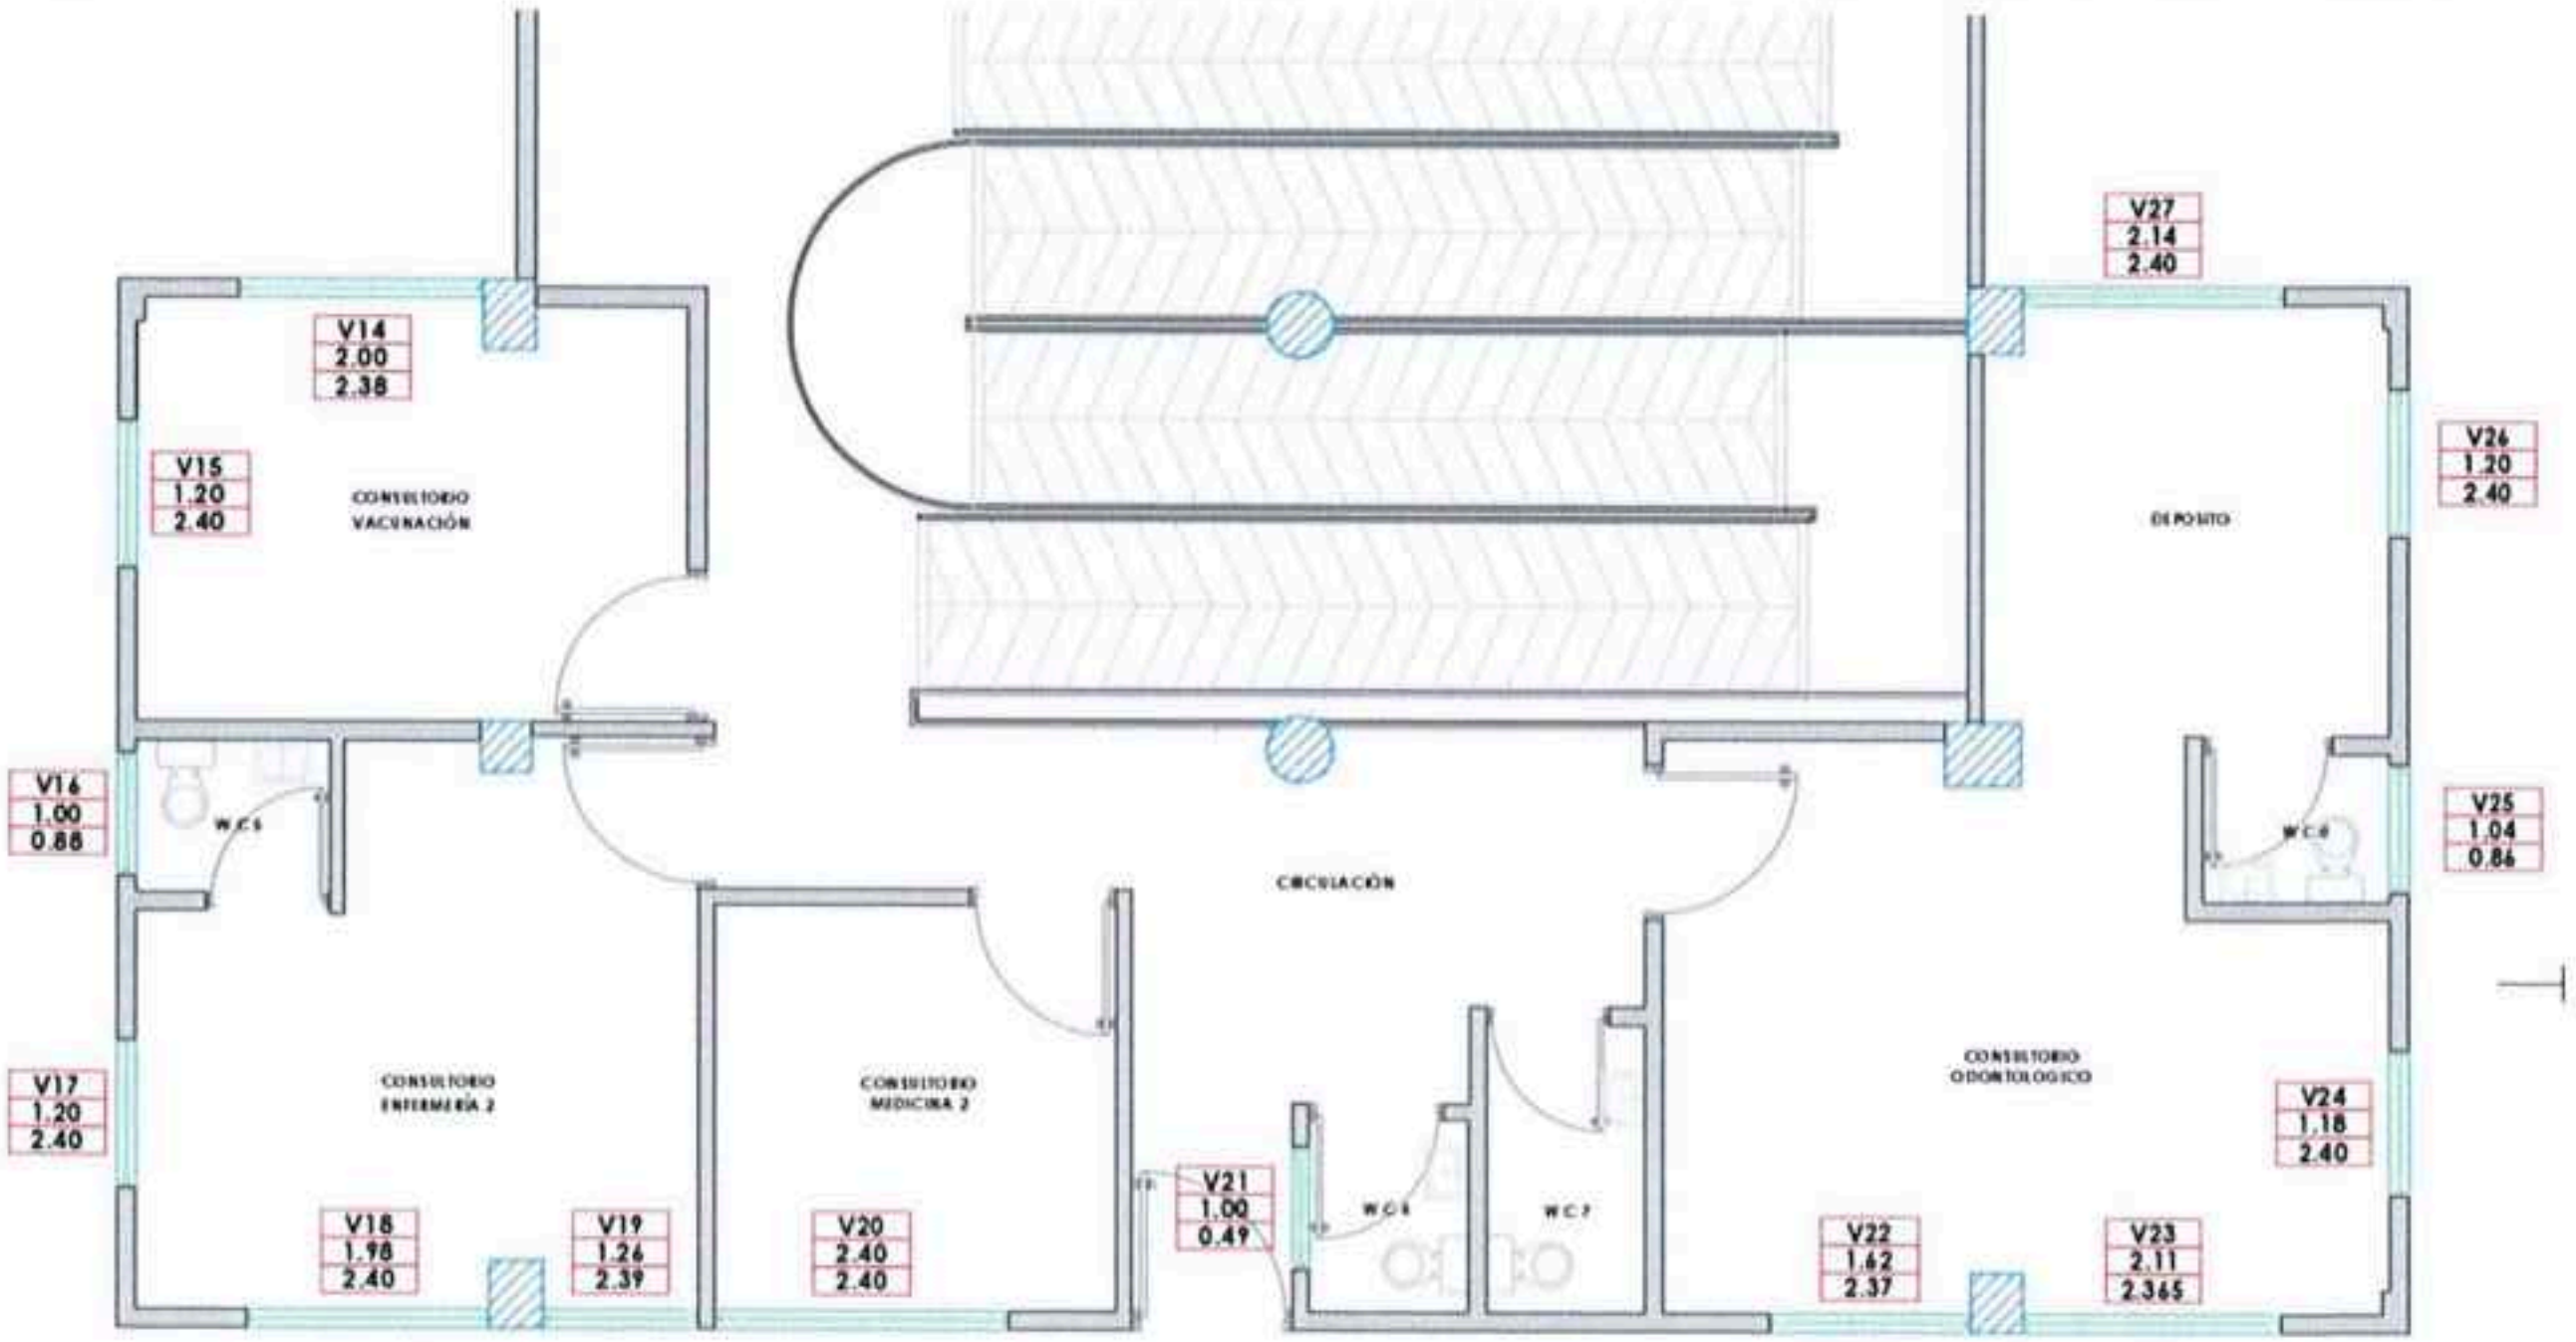


HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E

DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE				UBICACIÓN	SAN JOSE DEL BUBUY			
					FECHA	25/05/2026			
					ACTA No	Recibo y liquidación			
CAPÍTULO	Nº	ITEM 5 O PREVISTOS	ÍTEM	NP12	Teja tipo master 1000 cal 28 pintada	UND	M2	CANT.	25,56

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA	LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES					CANT. TOTAL
			LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	ÁREA (M2)	CANT.	
	Primer piso	Teja	11,62	2,20			1,00	25,56

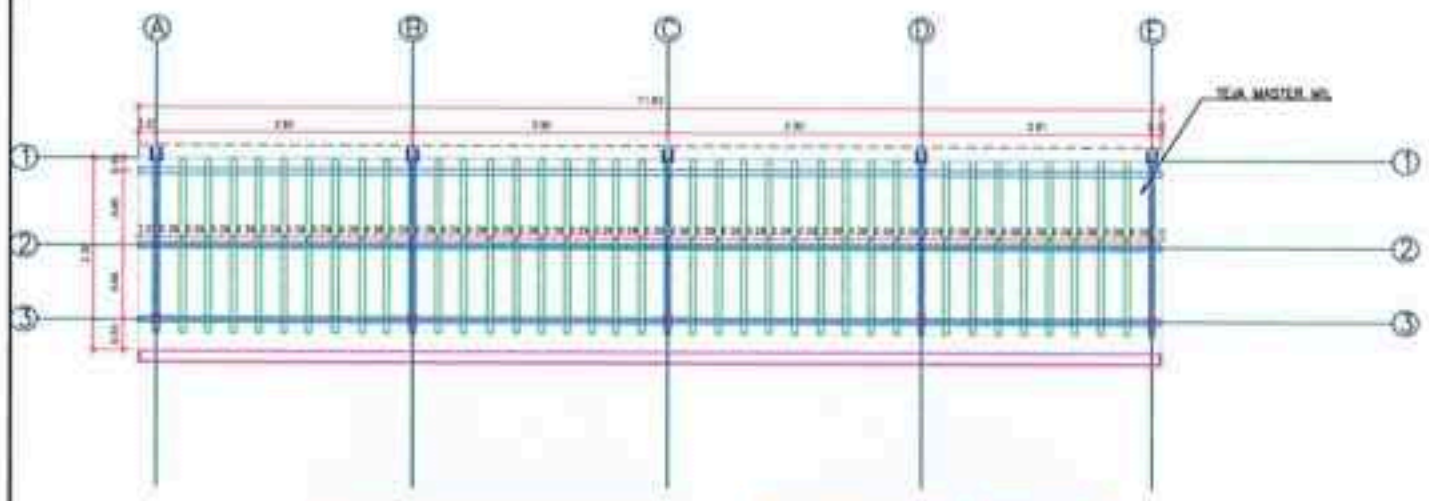





CANTIDAD PROYECTADA	25,56
CANTIDAD CONTRACTUAL	25,56
DIFERENCIA	0,00

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	ROSSY ELENA NIÑO GÓMEZ	APROBÓ	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL	
CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPICO INGENIERIA S.A.S	

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E


DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	UBICACIÓN	SAN JOSE DEL BUBUY
		FECHA	25/05/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	NP	ITEM S O PREVISTOS	ÍTEM	NP13	Estructura metálica en Acero ASTM - A500 C (incluye: suministro- fabricación-pintura-montaje)	UND	Kg	CANT.	432,09

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					CANT. TOTAL
		CANTIDAD (ML)	PESO (KG/M)	ALTO (M)	ÁREA (M2)	CANT.	
	Tubería 76 x 38 2.5 mm	11,62	4,34			3,00	151,29
	Tubería 76 x 38 2 mm	2,00	3,51			40,00	280,80

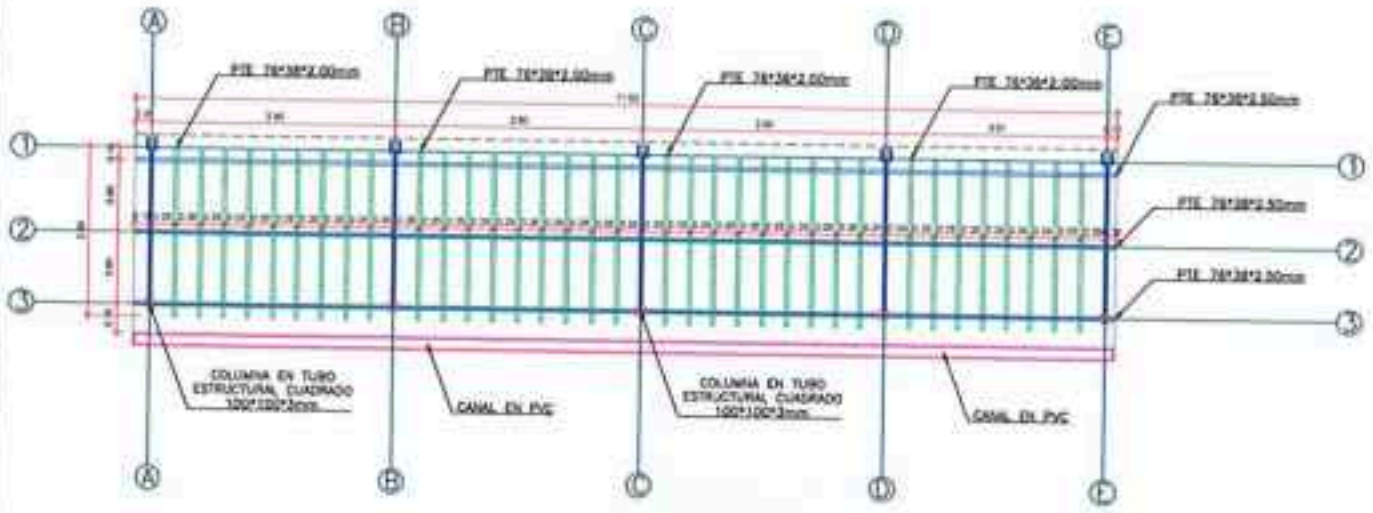



CANTIDAD PROYECTADA	432,09
CANTIDAD CONTRACTUAAL	432,09
DIFERENCIA	0,00

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	ROSSY ELENA NIÑO GÓMEZ	APROBÓ	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
	RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL
	CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPICO INGENIERIA S.A.S

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E


DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	**UBICACIÓN**	SAN JOSE DEL BUBUY	
		FECHA	25/05/2026	
		ACTA No	Recibo y liquidación	

CAPÍTULO	**NP**	**ITEM S O PREVISTOS**	**ÍTEM**	**NP13**	**Estructura metálica en Acero ASTM - A500 C (incluye: suministro-fabricación-pintura-montaje)**	**UND**	**Kg**	**CANT.**	**0,00**

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA

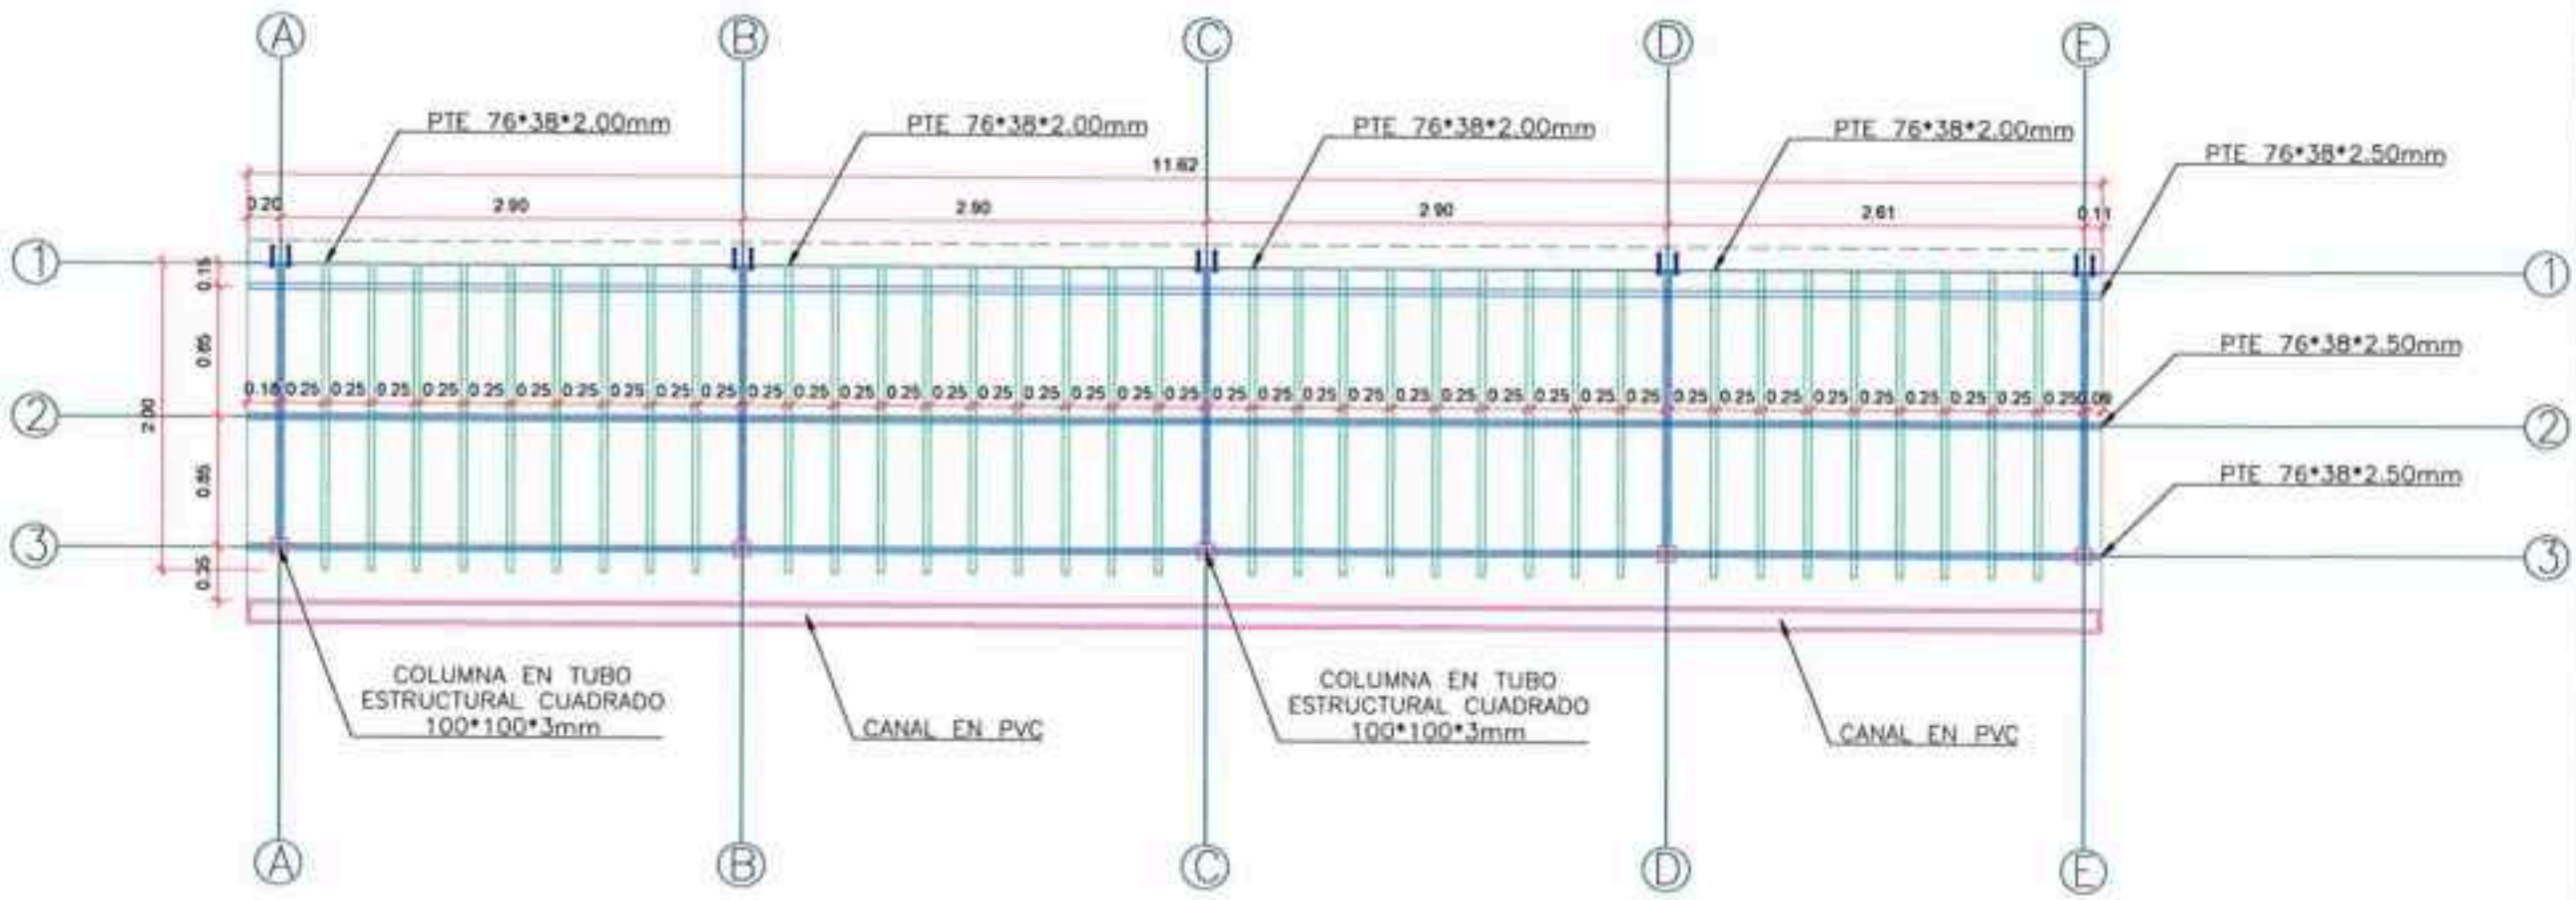
A
B
C
D
E
1
2
3
PTE 76*38*2.00mm
PTE 76*38*2.00mm
PTE 76*38*2.00mm
PTE 76*38*2.00mm
PTE 76*38*2.50mm
PTE 76*38*2.50mm
PTE 76*38*2.50mm
11.62
0.20
2.90
2.90
2.90
2.61
0.11
0.15
0.65
2.00
0.85
0.25
0.15 0.25 0.25 0.25

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E


DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	UBICACIÓN	SAN JOSE DEL BUBUY
		FECHA	25/05/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	NP	ITEM S O PREVISTOS	ÍTEM	NP14	Canal blanco PVC para techo o C-30. Suministro e insta.	UND	MI	CANT.	11,62

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA

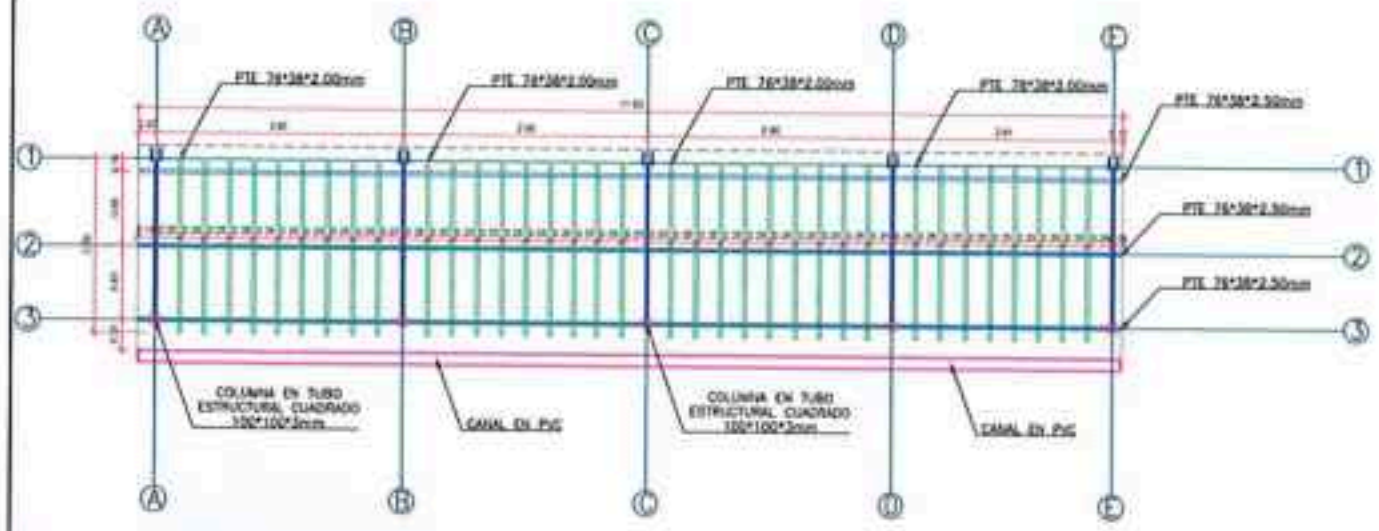





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					CANT. TOTAL
	CANTIDAD (ML)	PESO (KG/M)	ALTO (M)	ÁREA (M2)	CANT.	
Canal blanco PVC	11,62				1,00	11,62

CANTIDAD PROYECTADA	11,62
CANTIDAD CONTRACTUAL	11,62
DIFERENCIA	0,00

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:	ROSSY ELENA NIÑO GÓMEZ	APROBÓ:	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
	RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL
	CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPICO INGENIERIA S.A.S


HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E

DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE					**UBICACIÓN**	SAN JOSE DEL BUBUY				
						FECHA	25/05/2026				
						ACTA No	Recibo y liquidación				
CAPÍTULO	**NP**	**ITEM NO PREVISTOS**	**ÍTEM**	**NP15**	**Limpieza, raspado y lavado de placas,muros, pisos en concreto existente.**		**UND**	**m2**	**CANT.**	**0,00**	

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA

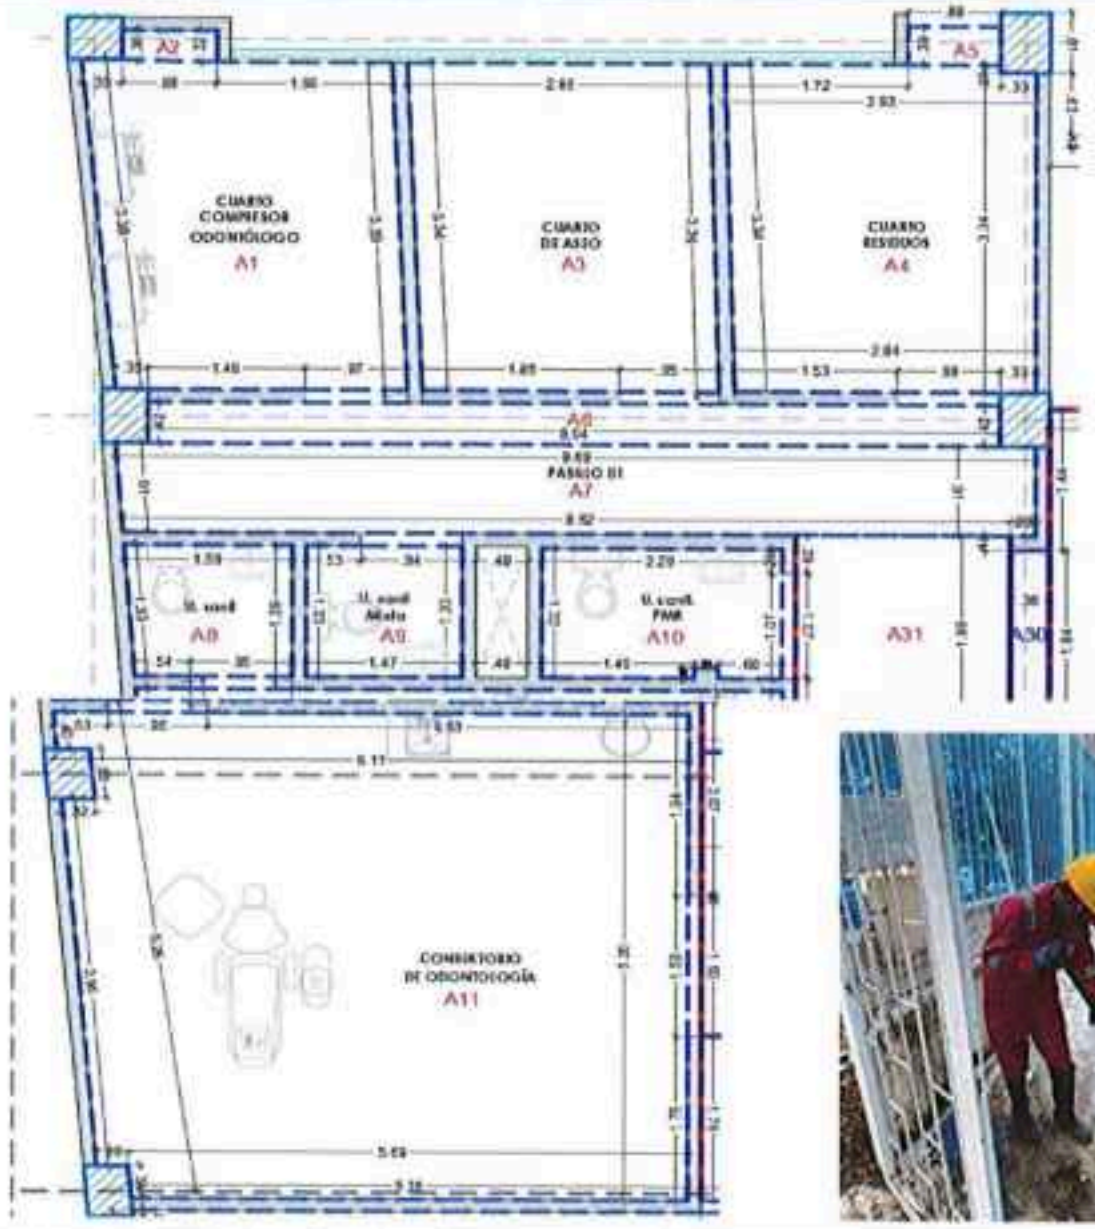

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	ÁREA (M2)	CANT.	CANT. TOTAL
Cuarto compresor	A1 (L1=2,94;L2=2,75;Lp=2,85) (A1=3,38; A2=3,39; Ap=3,39)	2,85	3,39			1,00	9,66
	A2 (A1=0,30; A2=0,32; Ap=0,31	0,89	0,31			1,00	0,28
Cuarto Aseo	A3 (L1=2,86; L2=2,80;Lp=2,83) (A1=3,34; L2=3,39; Ap=3,37)	2,83	3,37			1,00	9,54
Cuarto de residuos	A4 (L1=2,93; L2=2,84;Lp=2,89)	2,89	3,34			1,00	9,65
	A4- Columna E2	0,33	0,07			- 1,00	- 0,02
	A5	0,88	0,39			1,00	0,34
Pasillo 01	A6	8,04	0,42			1,00	3,38
	A7 (L1=8,69;L2=8,82; Lp=	8,66	0,91			1,00	7,88
Baño consultorio odontologico	A8 (L1=1,59;L2=1,49; Lp=1,54) (A1=1,33; A2=1,39 Ap=1,36)	1,54	1,36			1,00	2,09
U. Sanit Mixta	A9	1,47	1,33			1,00	1,96
U. Sanit PMR	A10	2,29	1,32			1,00	3,02
	A10- Columna	0,23	0,10			- 1,00	- 0,02
Consultorio Odontologia	A11 (L1=6,11; L2=5,69;Lp=5,90) ((A1=5,26; A2=5,20; Lp	5,90	5,23			1,00	30,86
	A11 - Columna C1	0,32	0,53			- 1,00	- 0,17
	A11 - Columna B1	0,30	0,34			- 1,00	- 0,10
Consultorio medicina 01	A12 (L1=8,03; L2=7,88;Lp=7,96) ((A1=3,56; A2=3,50; Lp	7,96	3,53			1,00	28,10
	A13 (A1=0,33;A2=0,29;Lp=0,31)	0,98	0,31			1,00	0,30
	A14 (A1=0,29;A2=0,40;Lp=0,35)	0,98	0,35			1,00	0,34
						CANTIDAD PROYECTADA	**107,08**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:	ROSSY ELENA NIÑO GÓMEZ	APROBÓ:	OMAR AGOSTO NEIRA SIERRA
	RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL
	CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPICO INGENIERIA S.A.S

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E


DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	UBICACIÓN	SAN JOSE DEL BUBUY
		FECHA	25/05/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	NP	ITEM NO PREVISTOS	ÍTEM	NP15	Limpieza, raspado y lavado de placas,muros, pisos en concreto existente.	UND	m2	CANT.	0,00

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA

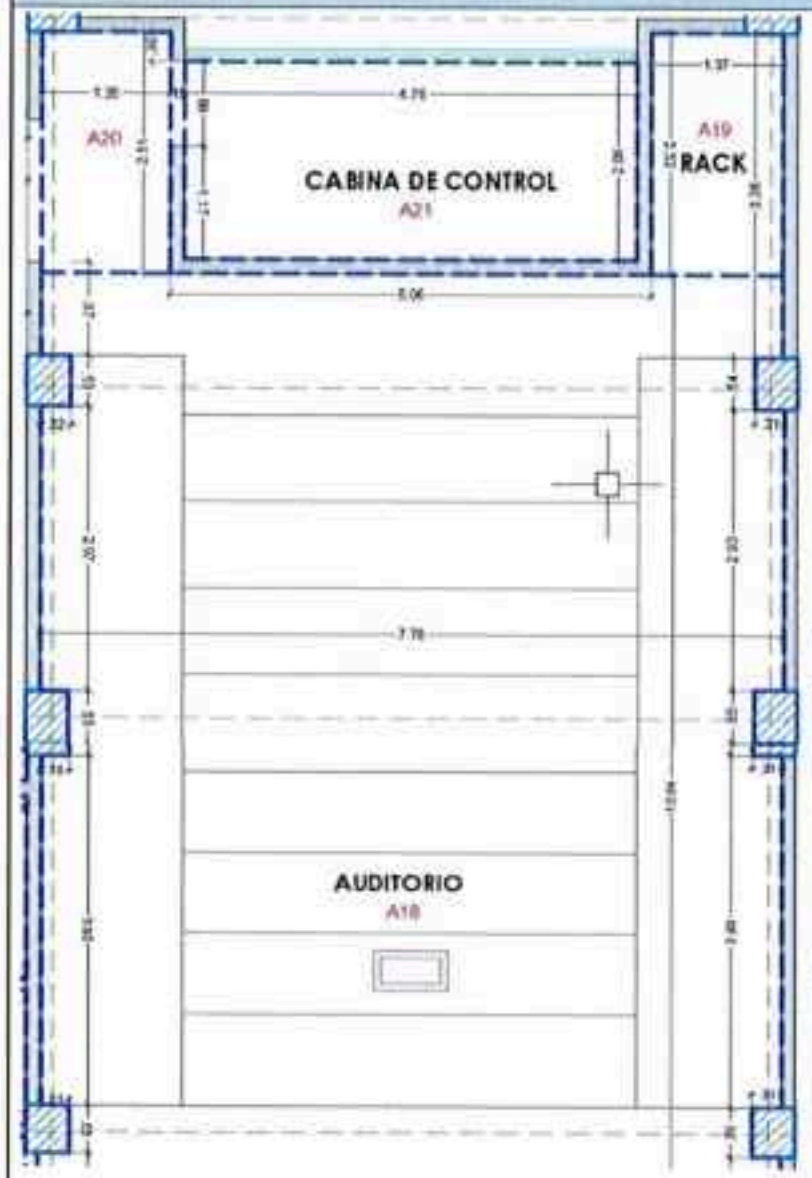









LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	ÁREA (M2)	CANT.	CANT. TOTAL
Tarima	A15	7,79	2,25			1,00	17,53
	A16 (L1= 0,29; L2= 0,30; Lp=0,30)	0,98	0,30			1,00	0,29
	A17 (L1= 0,30; L2= 0,32; Lp=0,31)	0,98	0,31			1,00	0,30
Auditorio	A18	7,78	10,64			1,00	82,78
	A18 - Columna B4	0,31	0,53			1,00 -	0,16
	A18 - Columna B5	0,31	0,55			1,00 -	0,17
	A18 - Columna C4	0,30	0,55			1,00 -	0,17
	A18 - Columna C5	0,31	0,55			1,00 -	0,17
	A18 - Columna D4	0,32	0,53			1,00 -	0,17
	A18 - Columna D5	0,31	0,54			1,00 -	0,17
Rack	A19	1,37	2,52			1,00	3,45
Entrada auditorio	A20	1,35	2,51			1,00	3,39
Cabina de control	A21	4,76	2,06			1,00	9,81
U. sanit H	A22	1,24	1,50			1,00	1,86
U. sanit M	A23	1,22	1,50			1,00	1,83
Sala de espera	A24	5,70	2,56			1,00	14,59
Sala de espera	A23	5,44	2,55			1,00	13,87
	A23 Columna	0,13	0,18		-	1,00 -	0,02
	A24	3,00	2,50			1,00	7,50
	A25	2,74	0,26			1,00	0,71
	A25 - columna redonda				0,02	1,00	0,02
	A26	2,74	1,15			1,00	3,15
	A26 - columna redonda				0,02	1,00	0,02
	A27	1,19	1,69			1,00	2,01
	A28 - Columna redoonda				0,45	1,00	0,45
	A29	2,00	3,28			1,00	6,56
	A30	0,36	1,84			1,00	0,66
	A31	2,03	1,99			1,00	4,04
	A32	5,57	3,03			1,00	16,88
	A32 - Columna C2	0,48	0,53		-	1,00 -	0,25
						CANTIDAD PROYECTADA	190,42
						Viene	107,08
						TOTAL	297,51

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	ROSSY ELENA NIÑO GÓMEZ	APROBÓ	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL	
CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPICO INGENIERIA S.A.S	

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E


DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	UBICACIÓN	SAN JOSE DEL BUBUY
		FECHA	25/05/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	NP	ITEM NO PREVISTOS	ÍTEM	NP15	Limpieza, raspado y lavado de placas,muros, pisos en concreto existente.	UND	m2	CANT.	0,00

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA

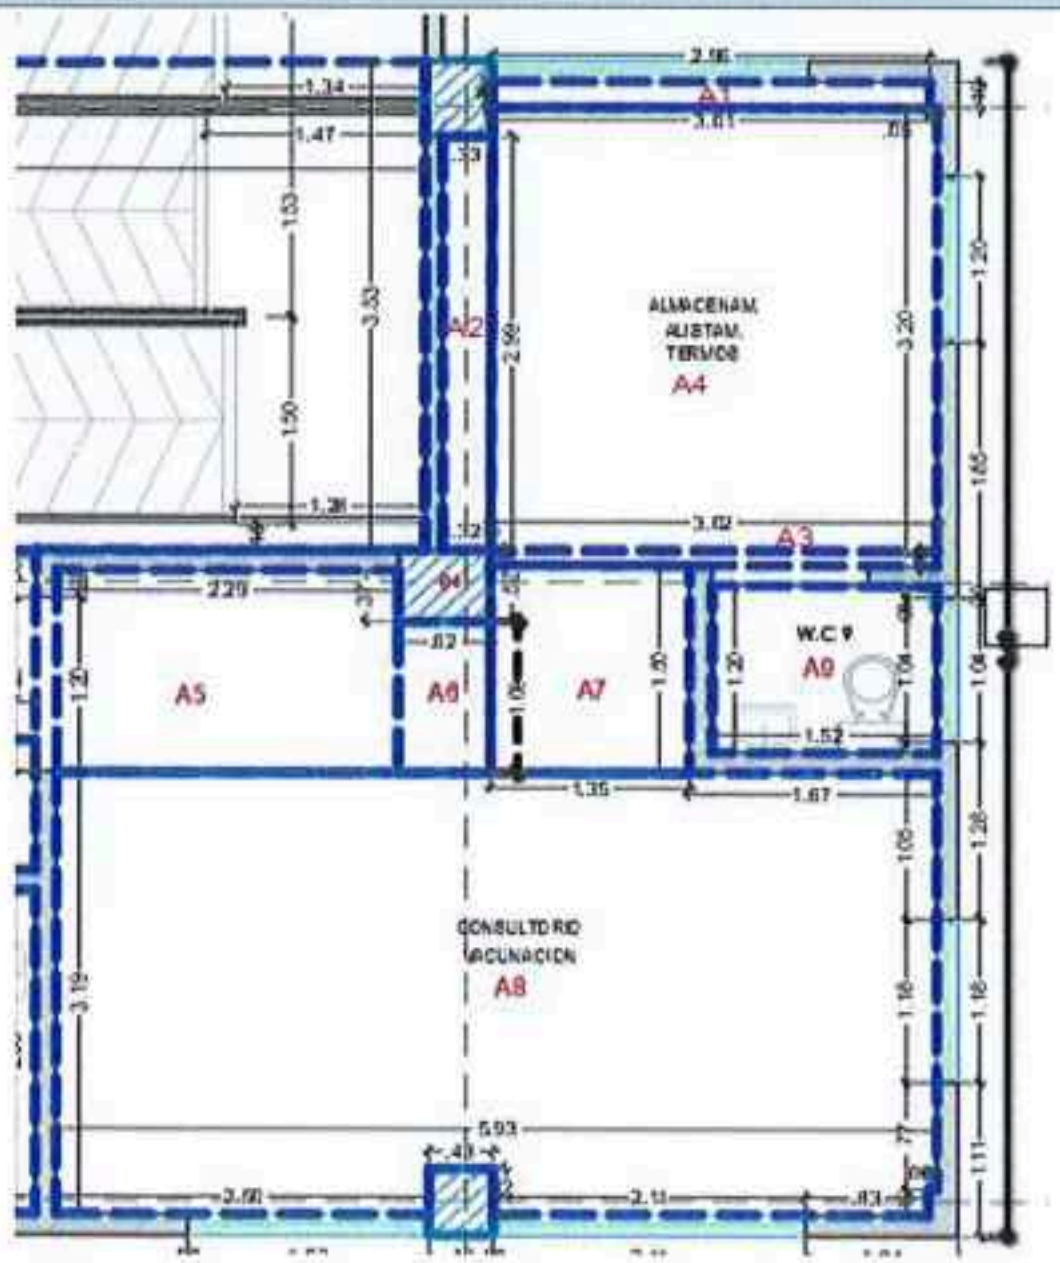

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	ÁREA (M2)	CANT.	CANT. TOTAL
Sala de espera	A33	1,94	1,76			1,00	3,41
	A34	9,36	1,62			1,00	15,16
	A34 - Columneta	0,12	0,24		-	1,00 -	0,03
	A34 Columna redonda r=0,20 $A = (\pi r^2)/2$				0,06 -	1,00 -	0,06
Área de ingreso	A35	11,62	2,40			1,00	27,89
	A35 - Columna redonda r=0,20 $A = (\pi r^2)/2$				0,06 -	1,00 -	0,06
SEGUNDO PISO							
Almacen alistam Termos	A1 (L1= 2,96; L2= 3,01; Lp=2,99)	2,99	0,19			1,00	0,57
	A2 (L1= 0,33; L2= 0,32; Lp=2,99)	0,33	2,99			1,00	0,99
	A3	3,02	0,11			1,00	0,33
	A4 (L1= 3,01; L2= 3,02; Lp=3,02)	3,02	3,20			1,00	9,66
Consltorio Vacunación	A5	2,29	1,20			1,00	2,75
	A6	0,62	1,09			1,00	0,68
	A7	1,35	1,50			1,00	2,03
	A8 (Total)	5,93	3,19			1,00	18,92
	A8 - Columna B4	0,43	0,33			- 1,00 -	0,14
	A8 Eje B esquina	0,06	0,19			- 1,00 -	0,01
W.C 9	A9	1,52	1,20			1,00	1,82
W.C 8	A10	1,29	2,33			1,00	3,01
W.C 7	A11	1,30	1,56			1,00	2,03
Oficina /Archivo	A12	3,29	3,29			1,00	10,82
						CANTIDAD PROYECTADA	99,76
						Viene	297,51
						TOTAL	397,26

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:	ROSSY ELENA NIÑO GÓMEZ	APROBÓ	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL	
CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPICO INGENIERIA S.A.S	

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E


DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	**UBICACIÓN**	SAN JOSE DEL BUBUY
		FECHA	25/05/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	NP	ITEM NO PREVISTOS	ÍTEM	NP15	Limpieza, raspado y lavado de placas,muros, pisos en concreto existente.	UND	m2	CANT.	515,96

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA

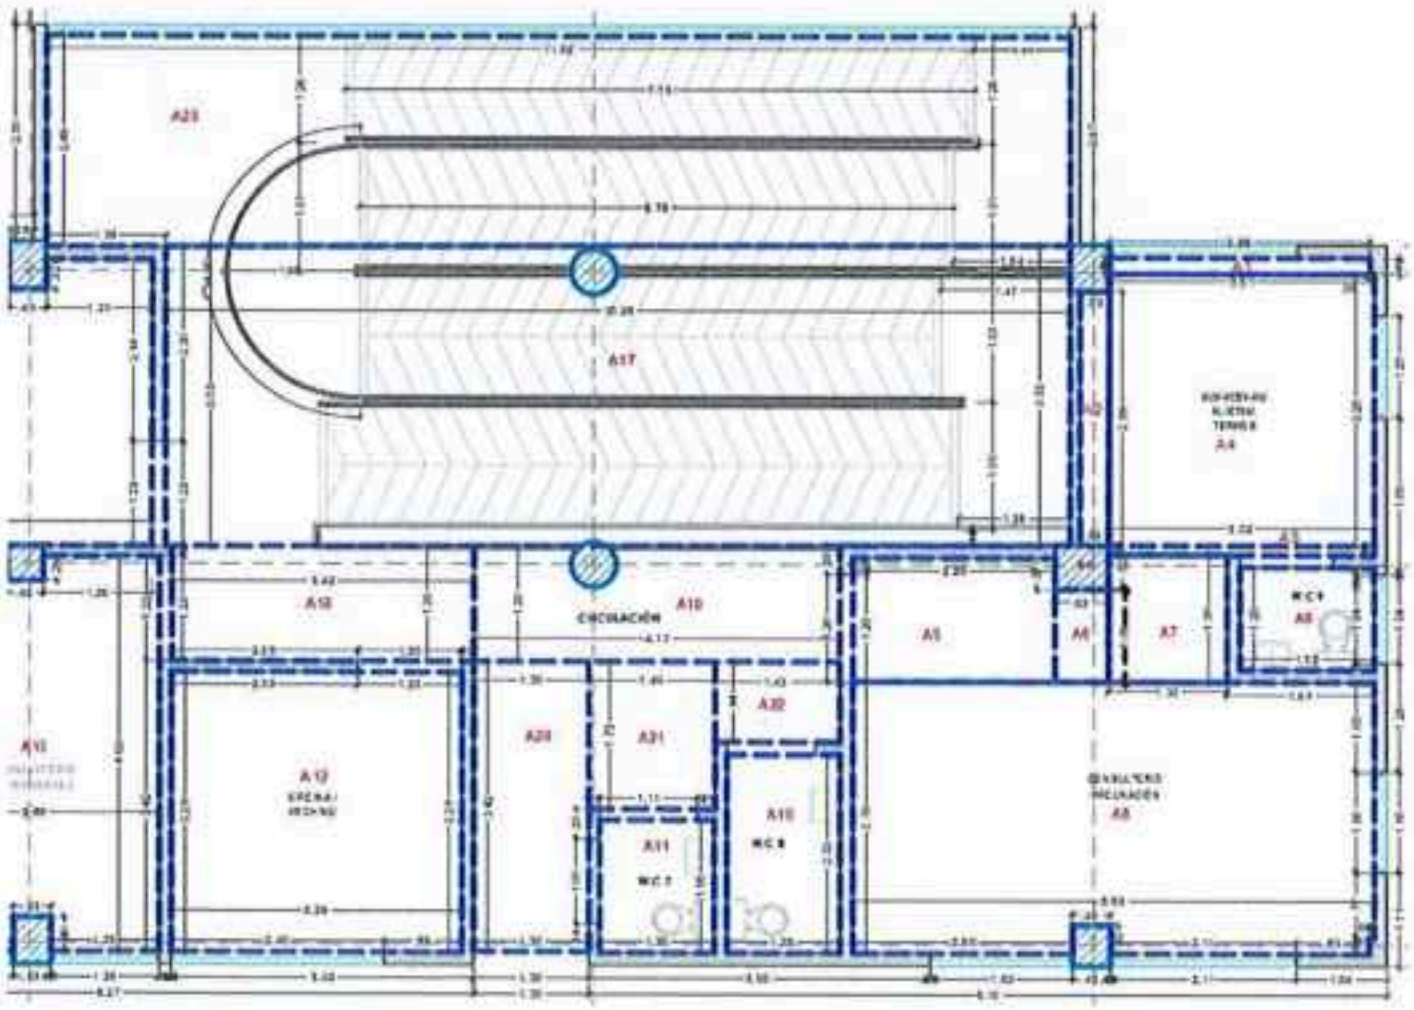

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	ÁREA (M2)	CANT.	CANT. TOTAL
Consultorio enfermeria 2	A13 (A1=4,61;A2=4,65;Ap=4,63	2,88	4,63			1,00	13,33
	A13 - Columna B2	0,43	0,40		-	1,00 -	0,17
	A13 - Columna C2 A1=0,25;A2=0,29; Ap=	0,42	0,27		-	1,00 -	0,11
	A14 (A1=3,23;A2=3,20;Ap=4,63	1,69	3,22			1,00	5,44
W.C 6	A15	1,57	1,00			1,00	1,57
Consultorio medicina 2	A16	4,48	3,44			1,00	15,41
	A16 - Columna D2 (A1=0,42;A2=0,35; Ap=	0,43	0,39		-	1,00 -	0,17
Circulación	A17	10,28	3,53			1,00	36,29
	A19 - Columna redonda D3 r=0,27 $A = \pi r^2$				0,23 -	1,00 -	0,23
	A18	3,42	1,35			1,00	4,62
	A19	4,17	1,35			1,00	5,63
	A19 - Columna redonda C3 r=0,27 $A = \pi r^2$				0,23 -	1,00 -	0,23
	A20	1,30	3,42			1,00	4,45
	A21	1,44	1,73			1,00	2,49
	A22	1,43	0,94			1,00	1,34
	A23 (limpieza del primer piso)	11,66	2,49			1,00	29,03
						CANTIDAD PROYECTADA	**118,70**
						Viene	**397,26**
						TOTAL	**515,96**
						CANTIDAD CONTRACTUAL	**556,01**
						DIFERENCIA	**-40,05**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	ROSSY ELENA NIÑO GÓMEZ	APROBÓ	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
	RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL
	CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPICO INGENIERIA S.A.S


HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E

DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE					**UBICACIÓN**	SAN JOSE DEL BUBUY			
						FECHA	25/05/2026			
						ACTA No	Recibo y liquidación			
CAPÍTULO	**NP**	**ITEM NO PREVISTOS**	**ÍTEM**	**NP15**	**Limpieza, raspado y lavado de placas,muros, pisos en concreto existente.**	**UND**	**m2**	**CANT.**	**0,00**	

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA

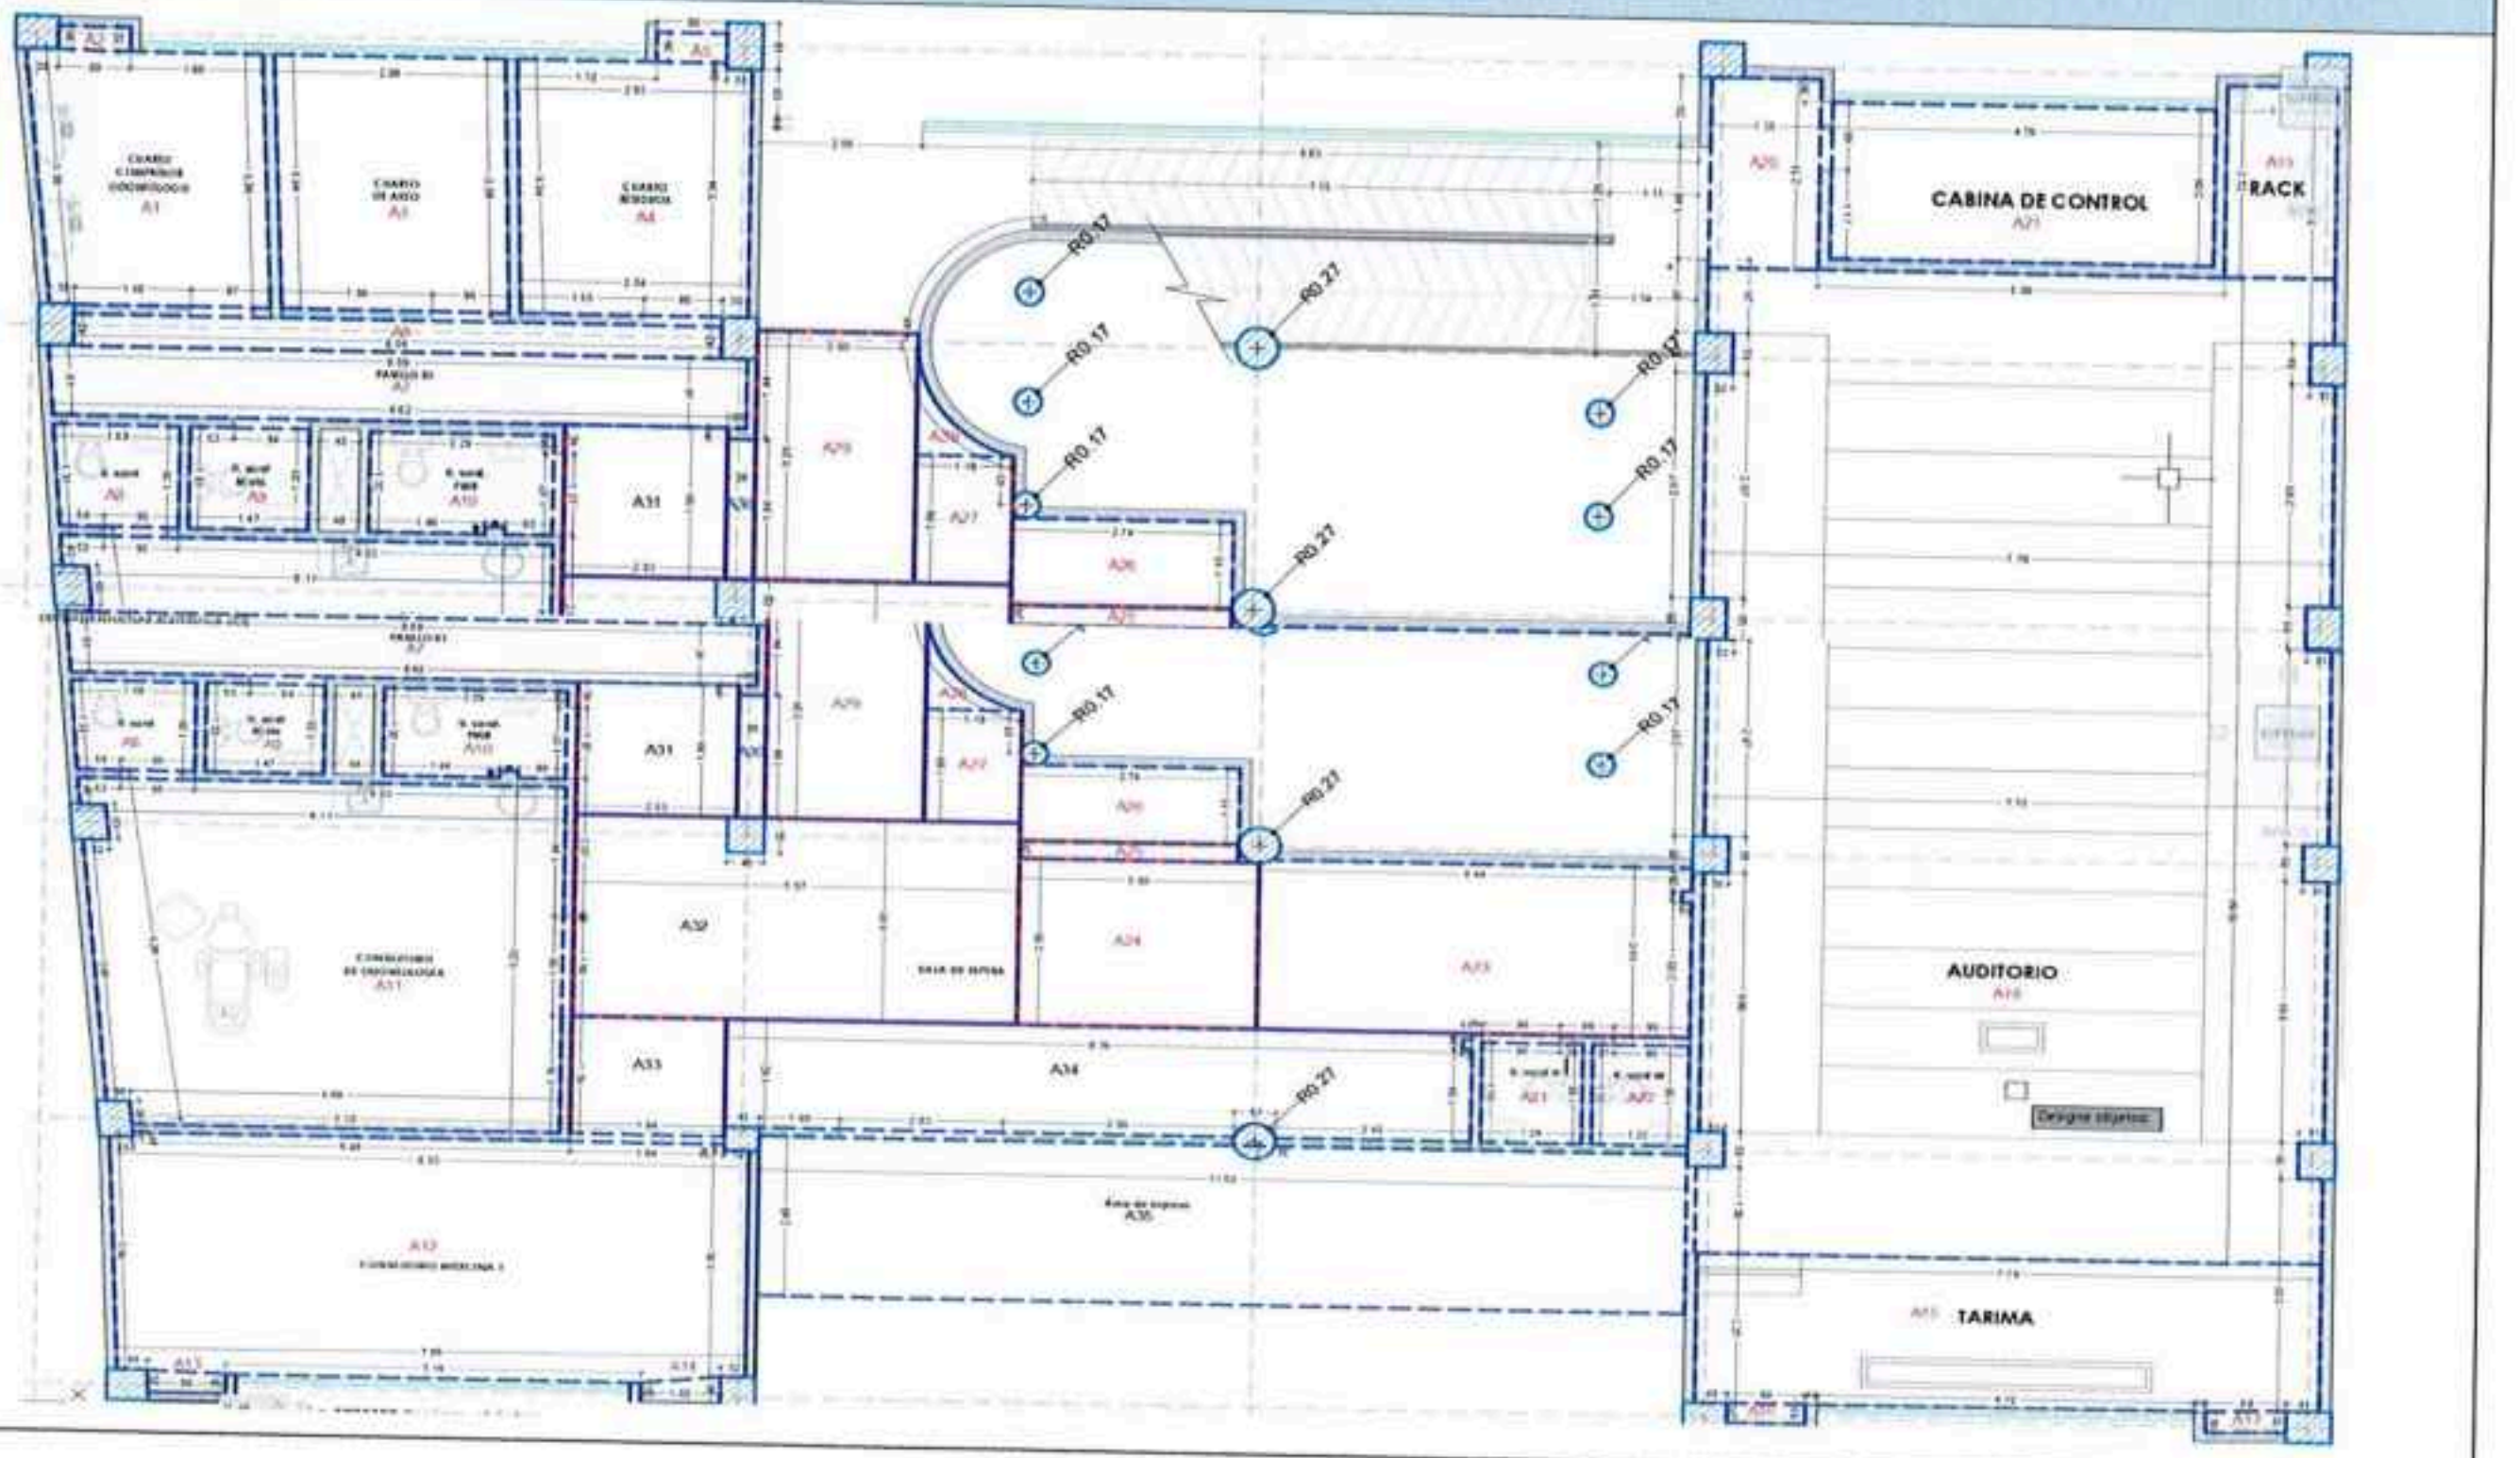


HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E

DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE					**UBICACIÓN**	SAN JOSE DEL BUBUY			
						FECHA	25/05/2026			
						ACTA No	Recibo y liquidación			
CAPÍTULO	**NP**	**ITEM NO PREVISTOS**	**ÍTEM**	**NP15**	**Limpieza, raspado y lavado de placas,muros, pisos en concreto existente.**	**UND**	**m2**	**CANT.**	**0,00**	

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA

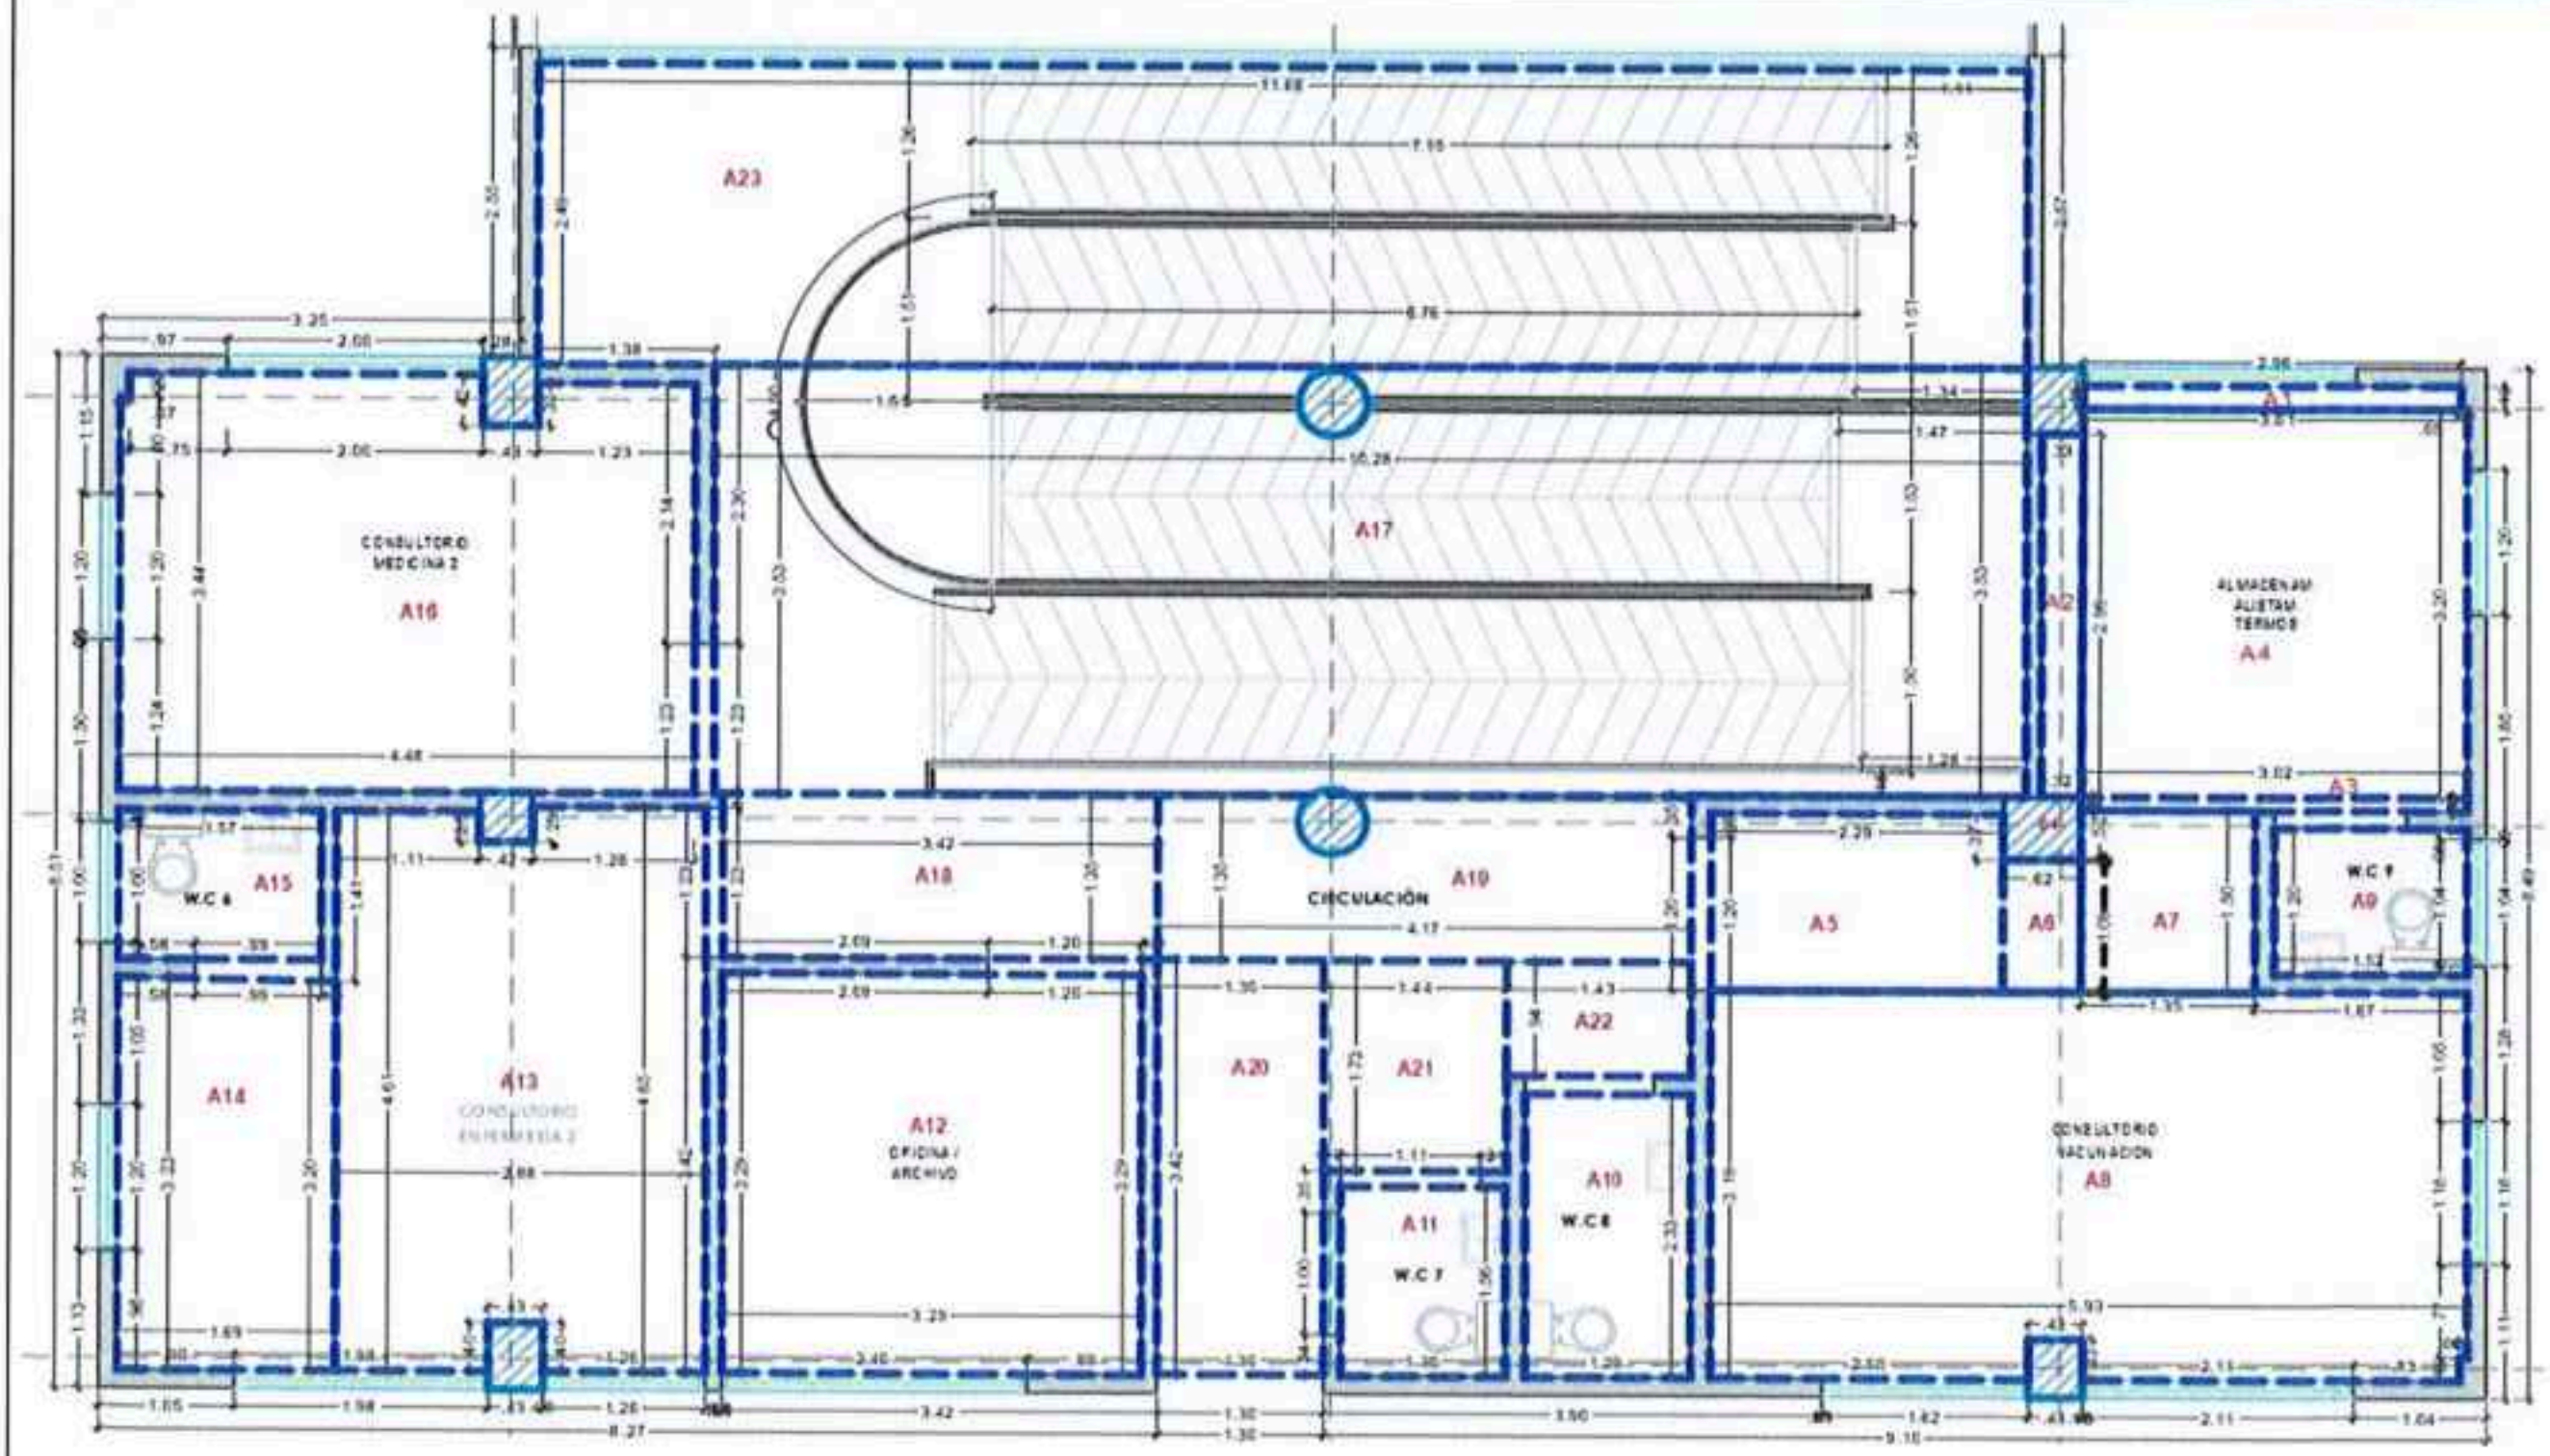


HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E

DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE				UBICACIÓN	SAN JOSE DEL BUBUY					
					FECHA	25/05/2026					
					ACTA No	Recibo y liquidación					
CAPÍTULO	NP	ITEM NO PREVISTOS	ÍTEM	NP16	Limpieza y lavado de pisos en concreto, cermica, granito, arcilla, marmol, piedra, con acido muriatico	UND	m2	CANT.	366,31		

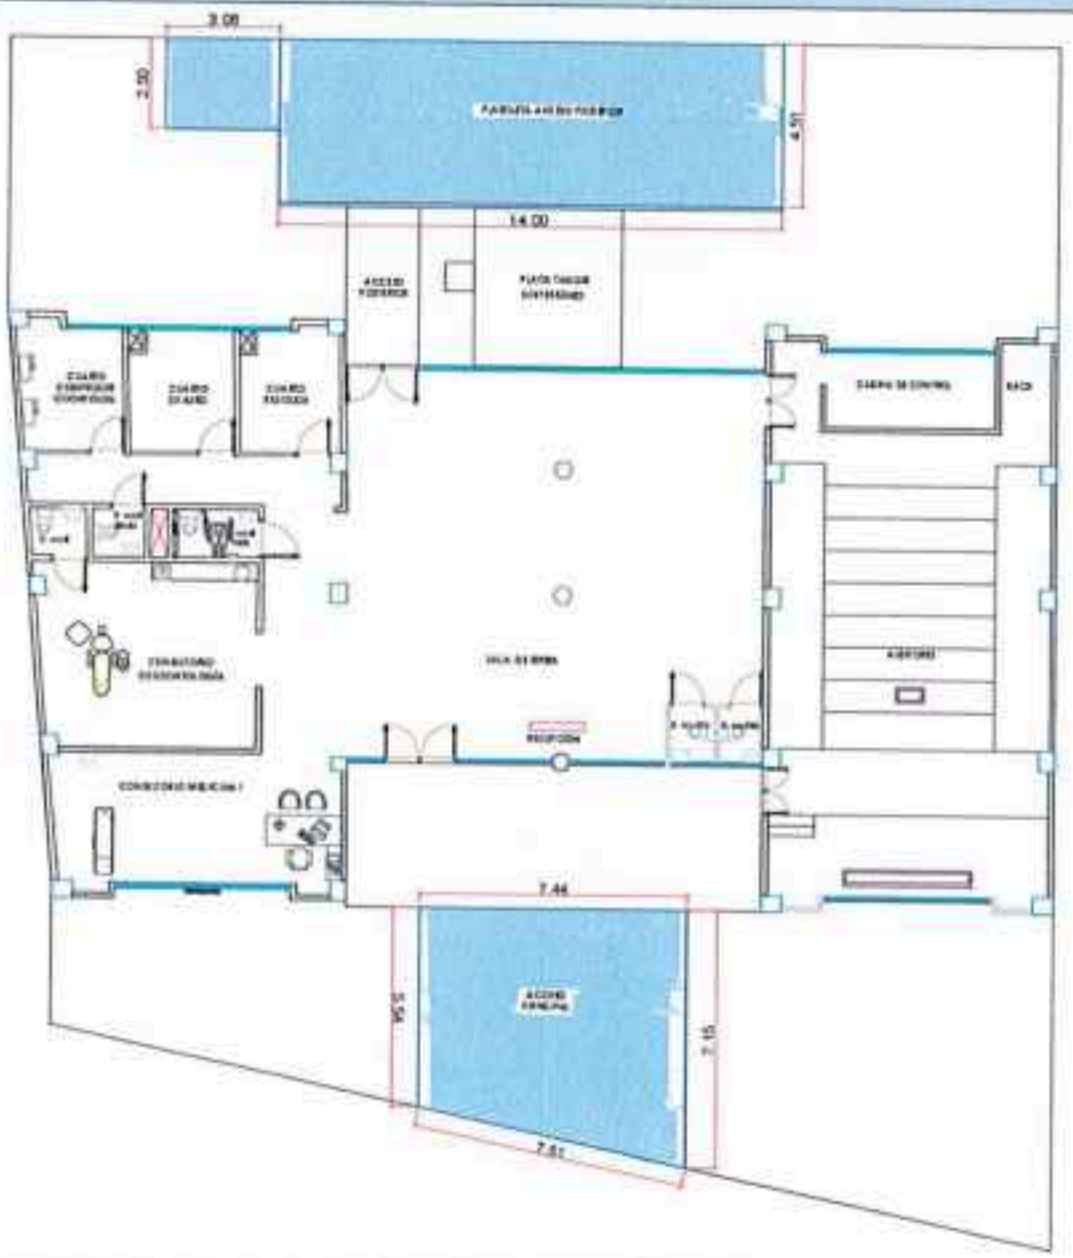ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA	LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES					CANT. TOTAL
			LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	ÁREA (M2)	CANT.	
	Terraza	Área total L1= 29,02;L2=27,46; Lp=28,25 A1= 16,34;A2=16,50; Ap=16,42	28,25	16,42			1	463,87
		Área Cubierta	12,02	3,19			-1	-38,34
		Área De Oficinas	18,67	8,49			-1	-158,51
		Vano Balcon A1=1,48; A2=1,71;Ap=	11,62	1,60			-1	-18,53
		Columneta esquineros	0,27	0,13			-6	-0,21
		Columneta centrales	0,33	0,13			-13	-0,56
	Acceso principal	Área (L1=7,44;L2=7,61;Lp=7,53) (A1=5,54;A2=7,15;Ap=6,35	7,53	6,35			1	47,75
	Plazoleta acceso posterior	Área 01	3,08	2,50			1,00	7,7
		Área 02	14,00	4,51			1,00	63,14





CANTIDAD PROYECTADA	366,31
CANTIDAD CONTRACTUAL	352,98
DIFERENCIA	13,33

OBSERVACIONES:


ELABORÓ	ROSSY ELENA NIÑO GÓMEZ	APROBÓ	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
	RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL
	CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPICO INGENIERIA S.A.S

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E

DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE					**UBICACIÓN**	SAN JOSE DEL BUBUY			
						FECHA	25/05/2026			
						ACTA No	Recibo y liquidación			
CAPÍTULO	**NP**	**ITEM NO PREVISTOS**	**ÍTEM**	**NP16**	**Limpieza y lavado de pisos en concreto, cemica, granito, arcilla, marmol, piedra, con acido muriatico**	**UND**	**m2**	**CANT.**	**0,00**	

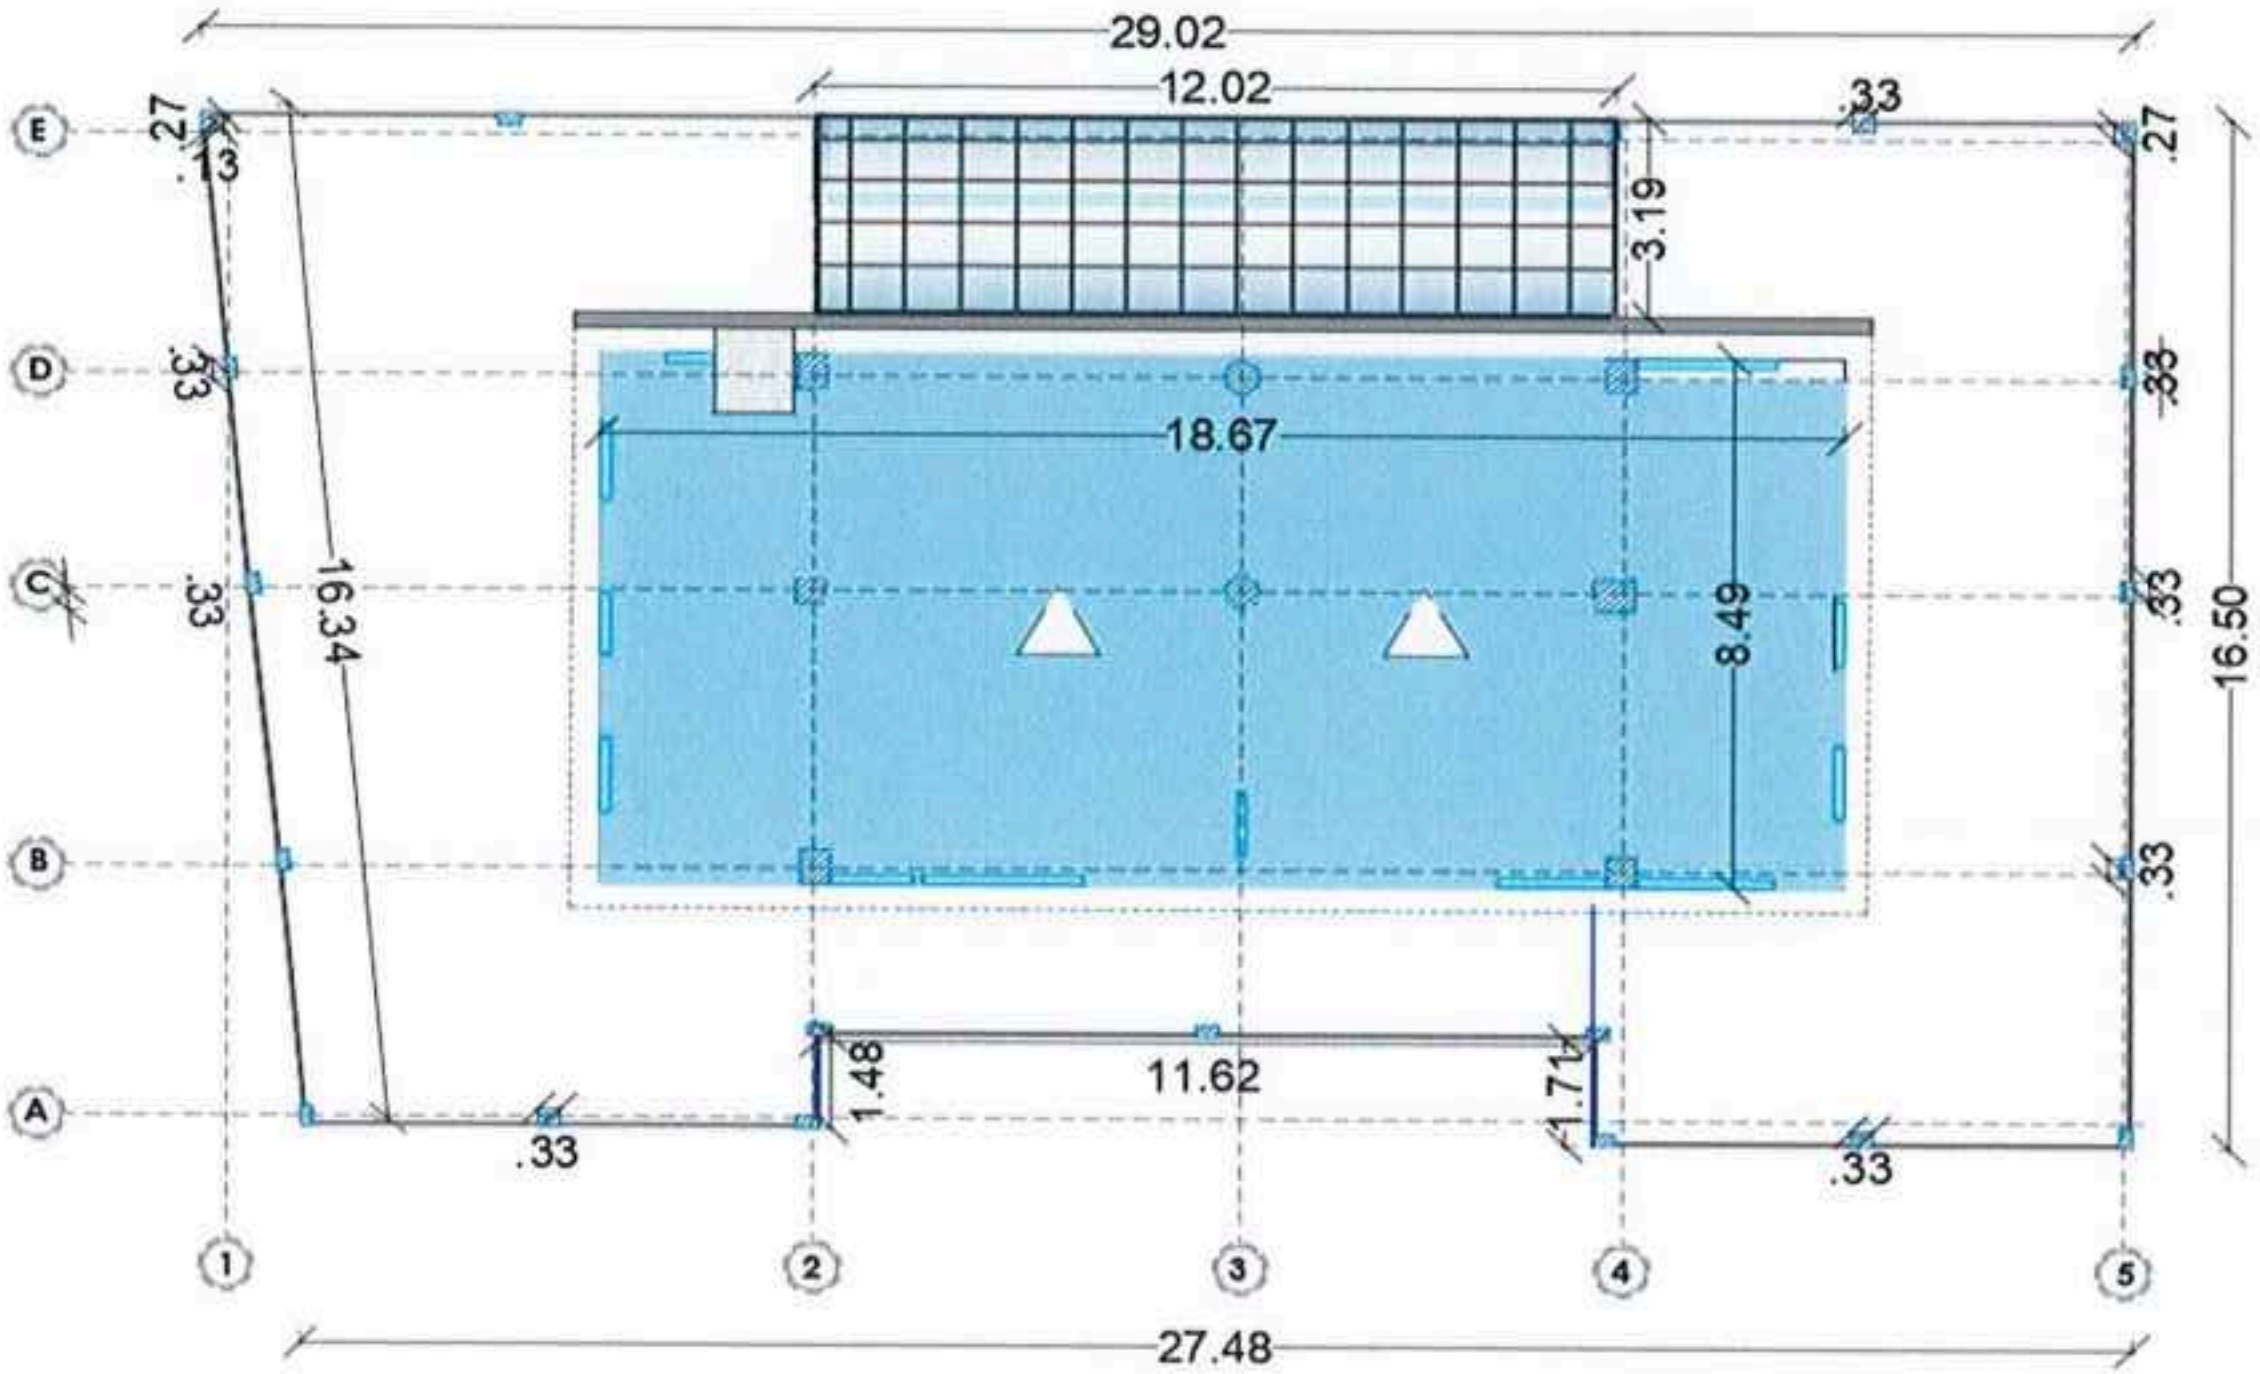

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E

DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE					**UBICACIÓN**	SAN JOSÉ DEL BUBUY				
						FECHA	25/05/2026				
						ACTA No	Recibo y liquidación				
CAPÍTULO	**NP**	**ITEM NO PREVISTOS**	**ÍTEM**	**NP17**	**Acometida en cable de cobre aislado 3x1/0+1x4T AWG THHN/THWN-2 600 V 90° C. Suministro e instalación**			**UND**	**m**	**CANT.**	**18,00**

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIONES**					**CANT. TOTAL**
		LONG (M)	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	**ÁREA (M2)**	**CANT.**	
	Acometida en cable					18,00	18,00

kWh





CANTIDAD PROYECTADA	**18,00**
CANTIDAD CONTRACTUAL	**20,00**
DIFERENCIA	**-2,00**

OBSERVACIONES:



ELABORÓ:	ROSSY ELENA NIÑO GÓMEZ	APROBÓ:	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL	
CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPICO INGENIERIA S.A.S	

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E

DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE				UBICACIÓN	SAN JOSE DEL BUBUY			
					FECHA	25/05/2026			
					ACTA No	Recibo y liquidación			
CAPÍTULO	NP	ITEM S O PREVISTOS	ÍTEM	NP18	Salida para tomacorriente doble con polo a tierra, 20A - 125V, salida dedicada. incluye tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre 12 AWG (10 m promedio), caja metalica 5800 o 2400 incluye aparato.	UND	Und	CANT.	60,00

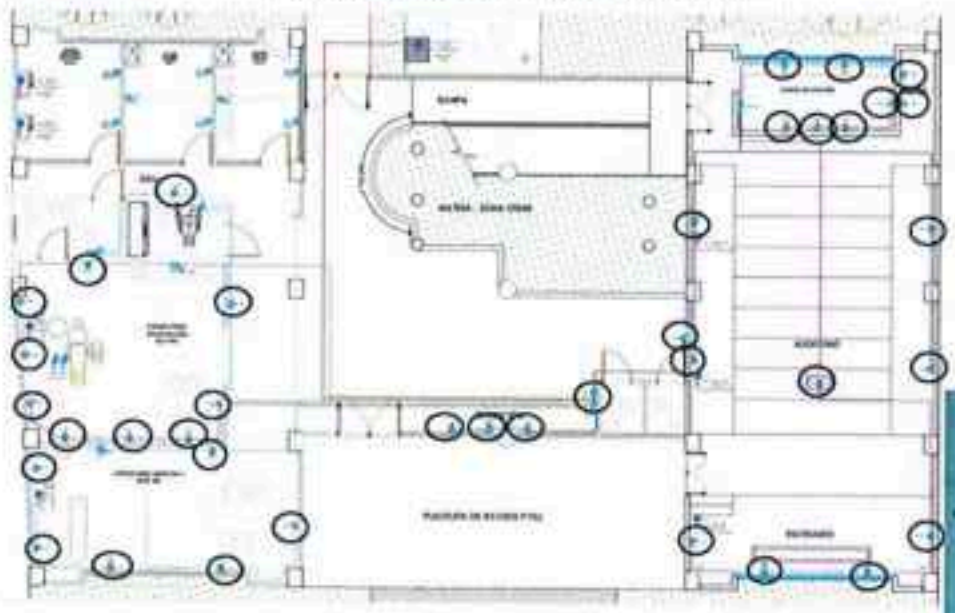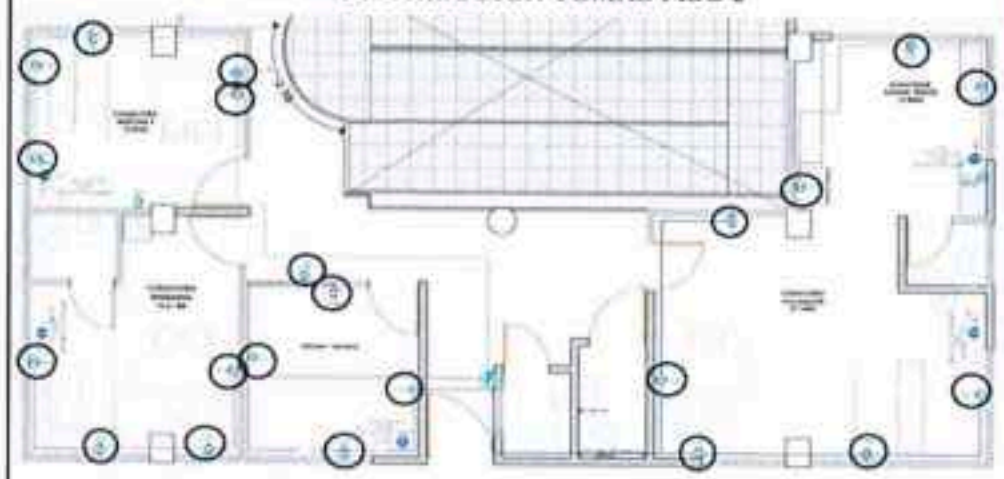ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					CANT. TOTAL
		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	ÁREA (M2)	CANT.	
DISTRIBUCIÓN TOMAS PISO 1	Primer piso					38,00	38,00
	Segundo Piso					22,00	22,00
DISTRIBUCIÓN TOMAS PISO 2							
							
							


CANTIDAD PROYECTADA	60,00
CANTIDAD CONTRACTUAL	60,00
DIFERENCIA	0,00

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:	ROSSY ELENA NIÑO GÓMEZ	APROBÓ:	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
	RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL
	CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPICO INGENIERIA S.A.S

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E										
DEPARTAMENTO DE CASANARE										
MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA										
OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE				UBICACIÓN	SAN JOSE DEL BUBUY				
					FECHA	25/05/2026				
					ACTA No	Recibo y liquidación				
CAPÍTULO	NP	ITEM NO PREVISTOS	ÍTEM	NP18	Salida para tomacorriente doble con polo a tierra, 20A - 125V, salida dedicada. Incluye tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre 12 AWG (10 m promedio), caja metalica 5800 o 2400 incluye aparato.	UND	Und	CANT.	0,00	

DISTRIBUCIÓN TOMAS PISO 1

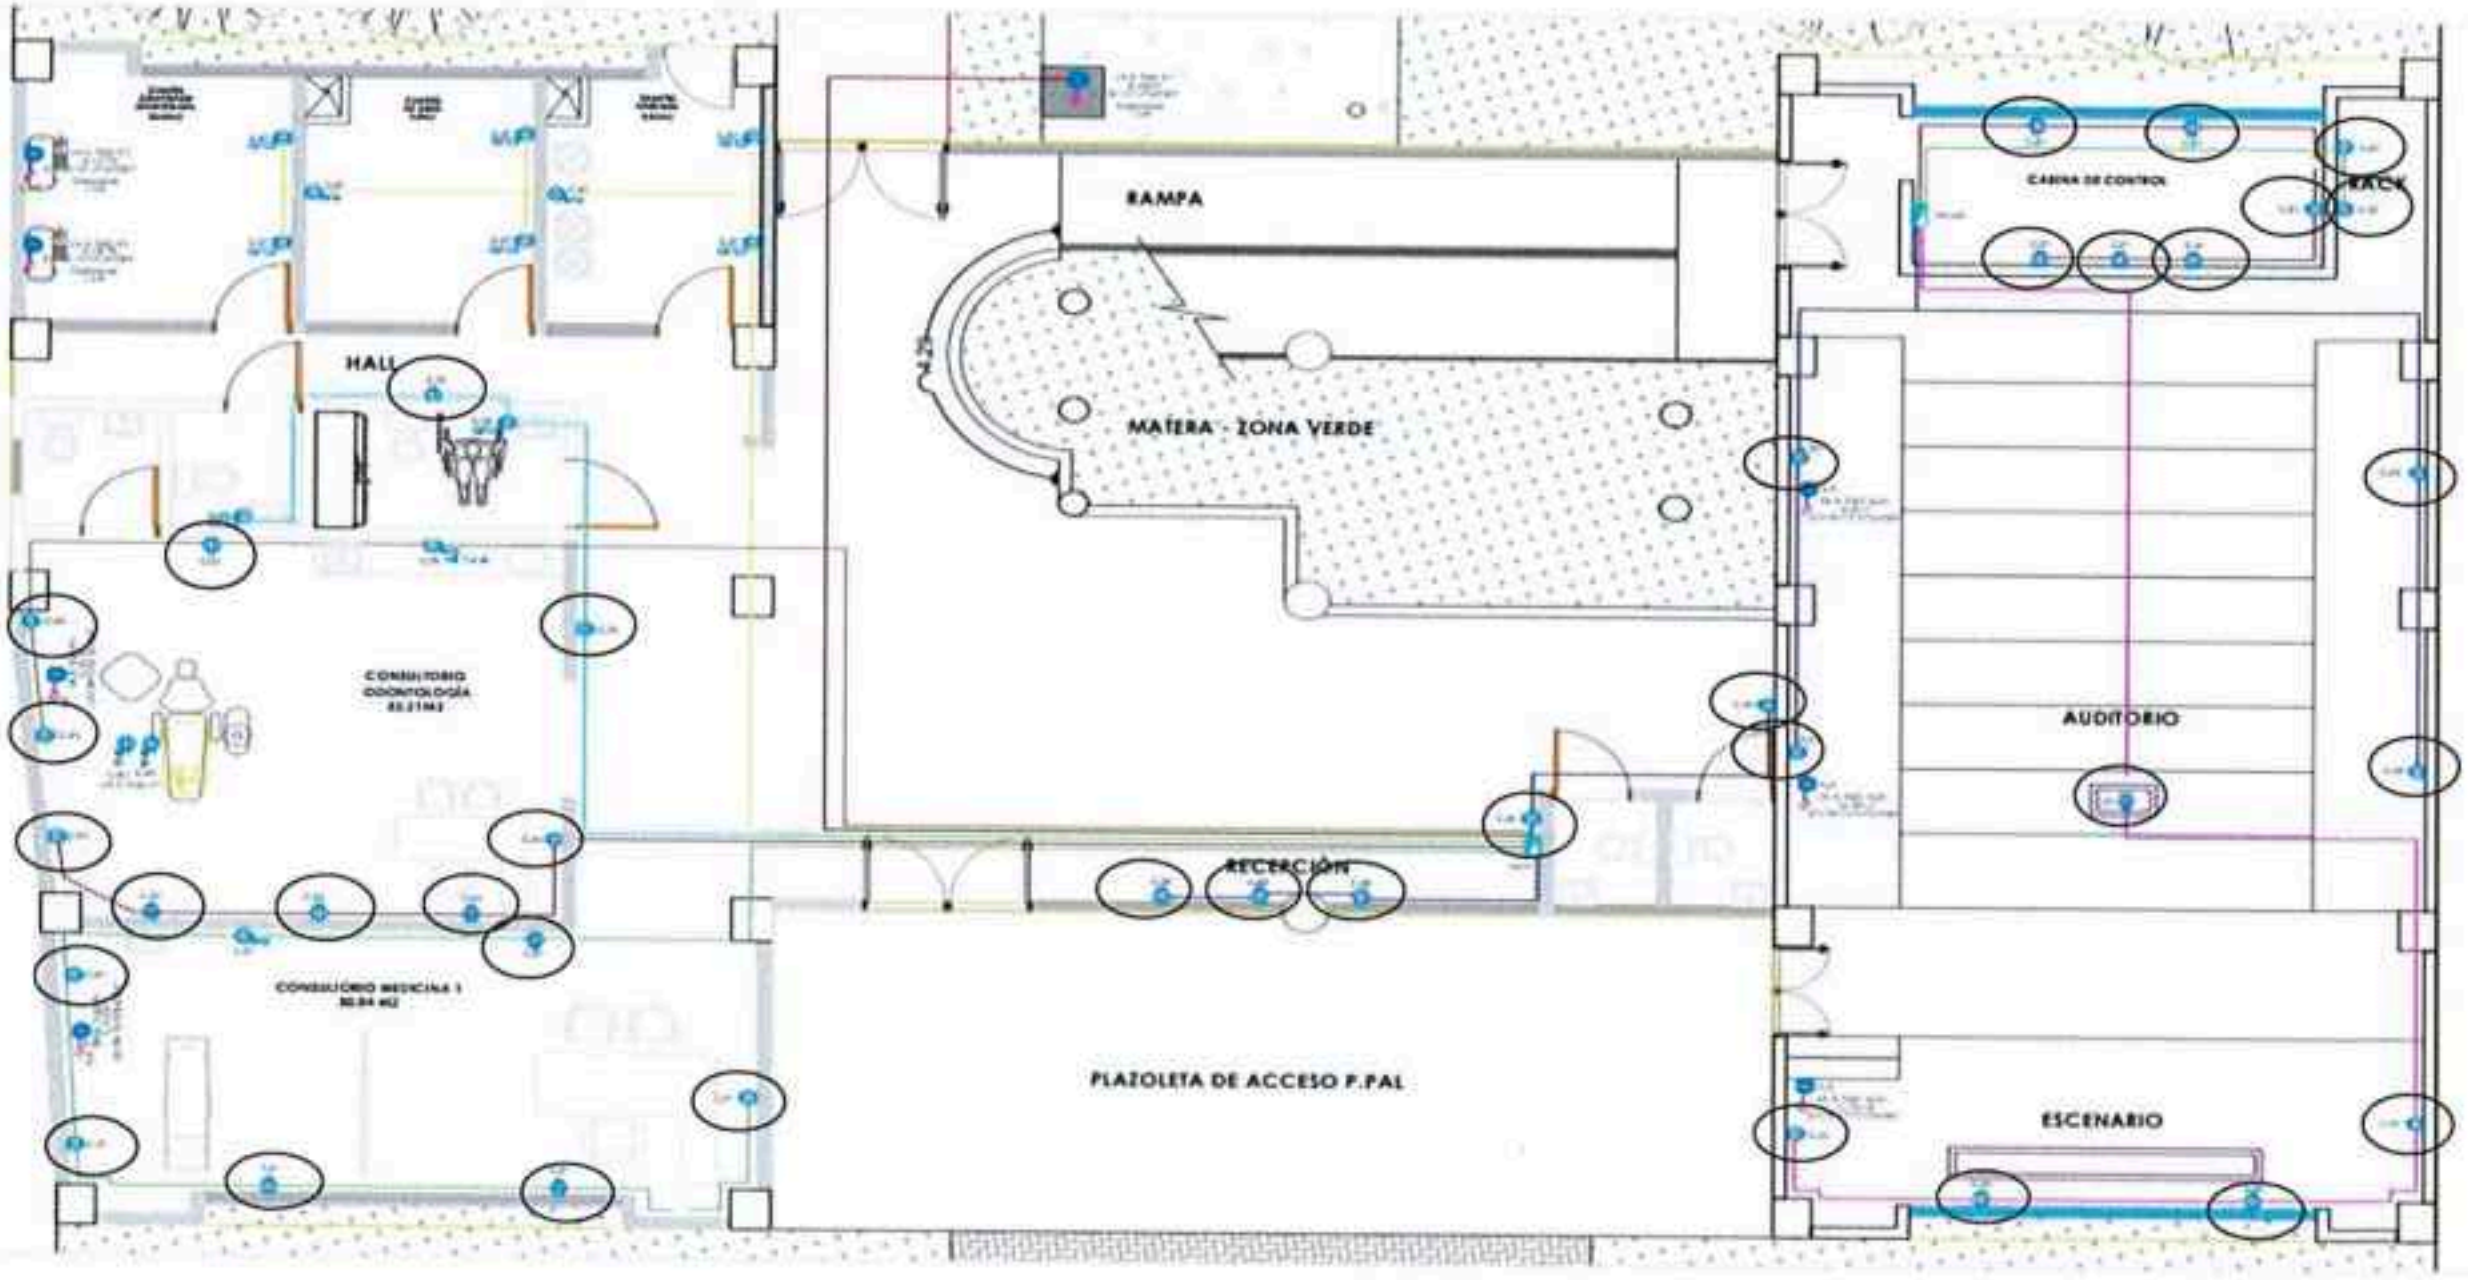


HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E

DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE					**UBICACIÓN**	SAN JOSE DEL BUBUY		
						FECHA	25/05/2026		
						ACTA No	Recibo y liquidación		
CAPÍTULO	**NP**	**ITEM NO PREVISTOS**	**ÍTEM**	**NP18**	**Salida para tomacorriente doble con polo a tierra, 20A - 125V, salida dedicada. Incluye tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre 12 AWG (10 m promedio), caja metalica 5800 o 2400 incluye aparato.**	**UND**	**Und**	**CANT.**	**0,00**

DISTRIBUCIÓN TOMAS PISO 2

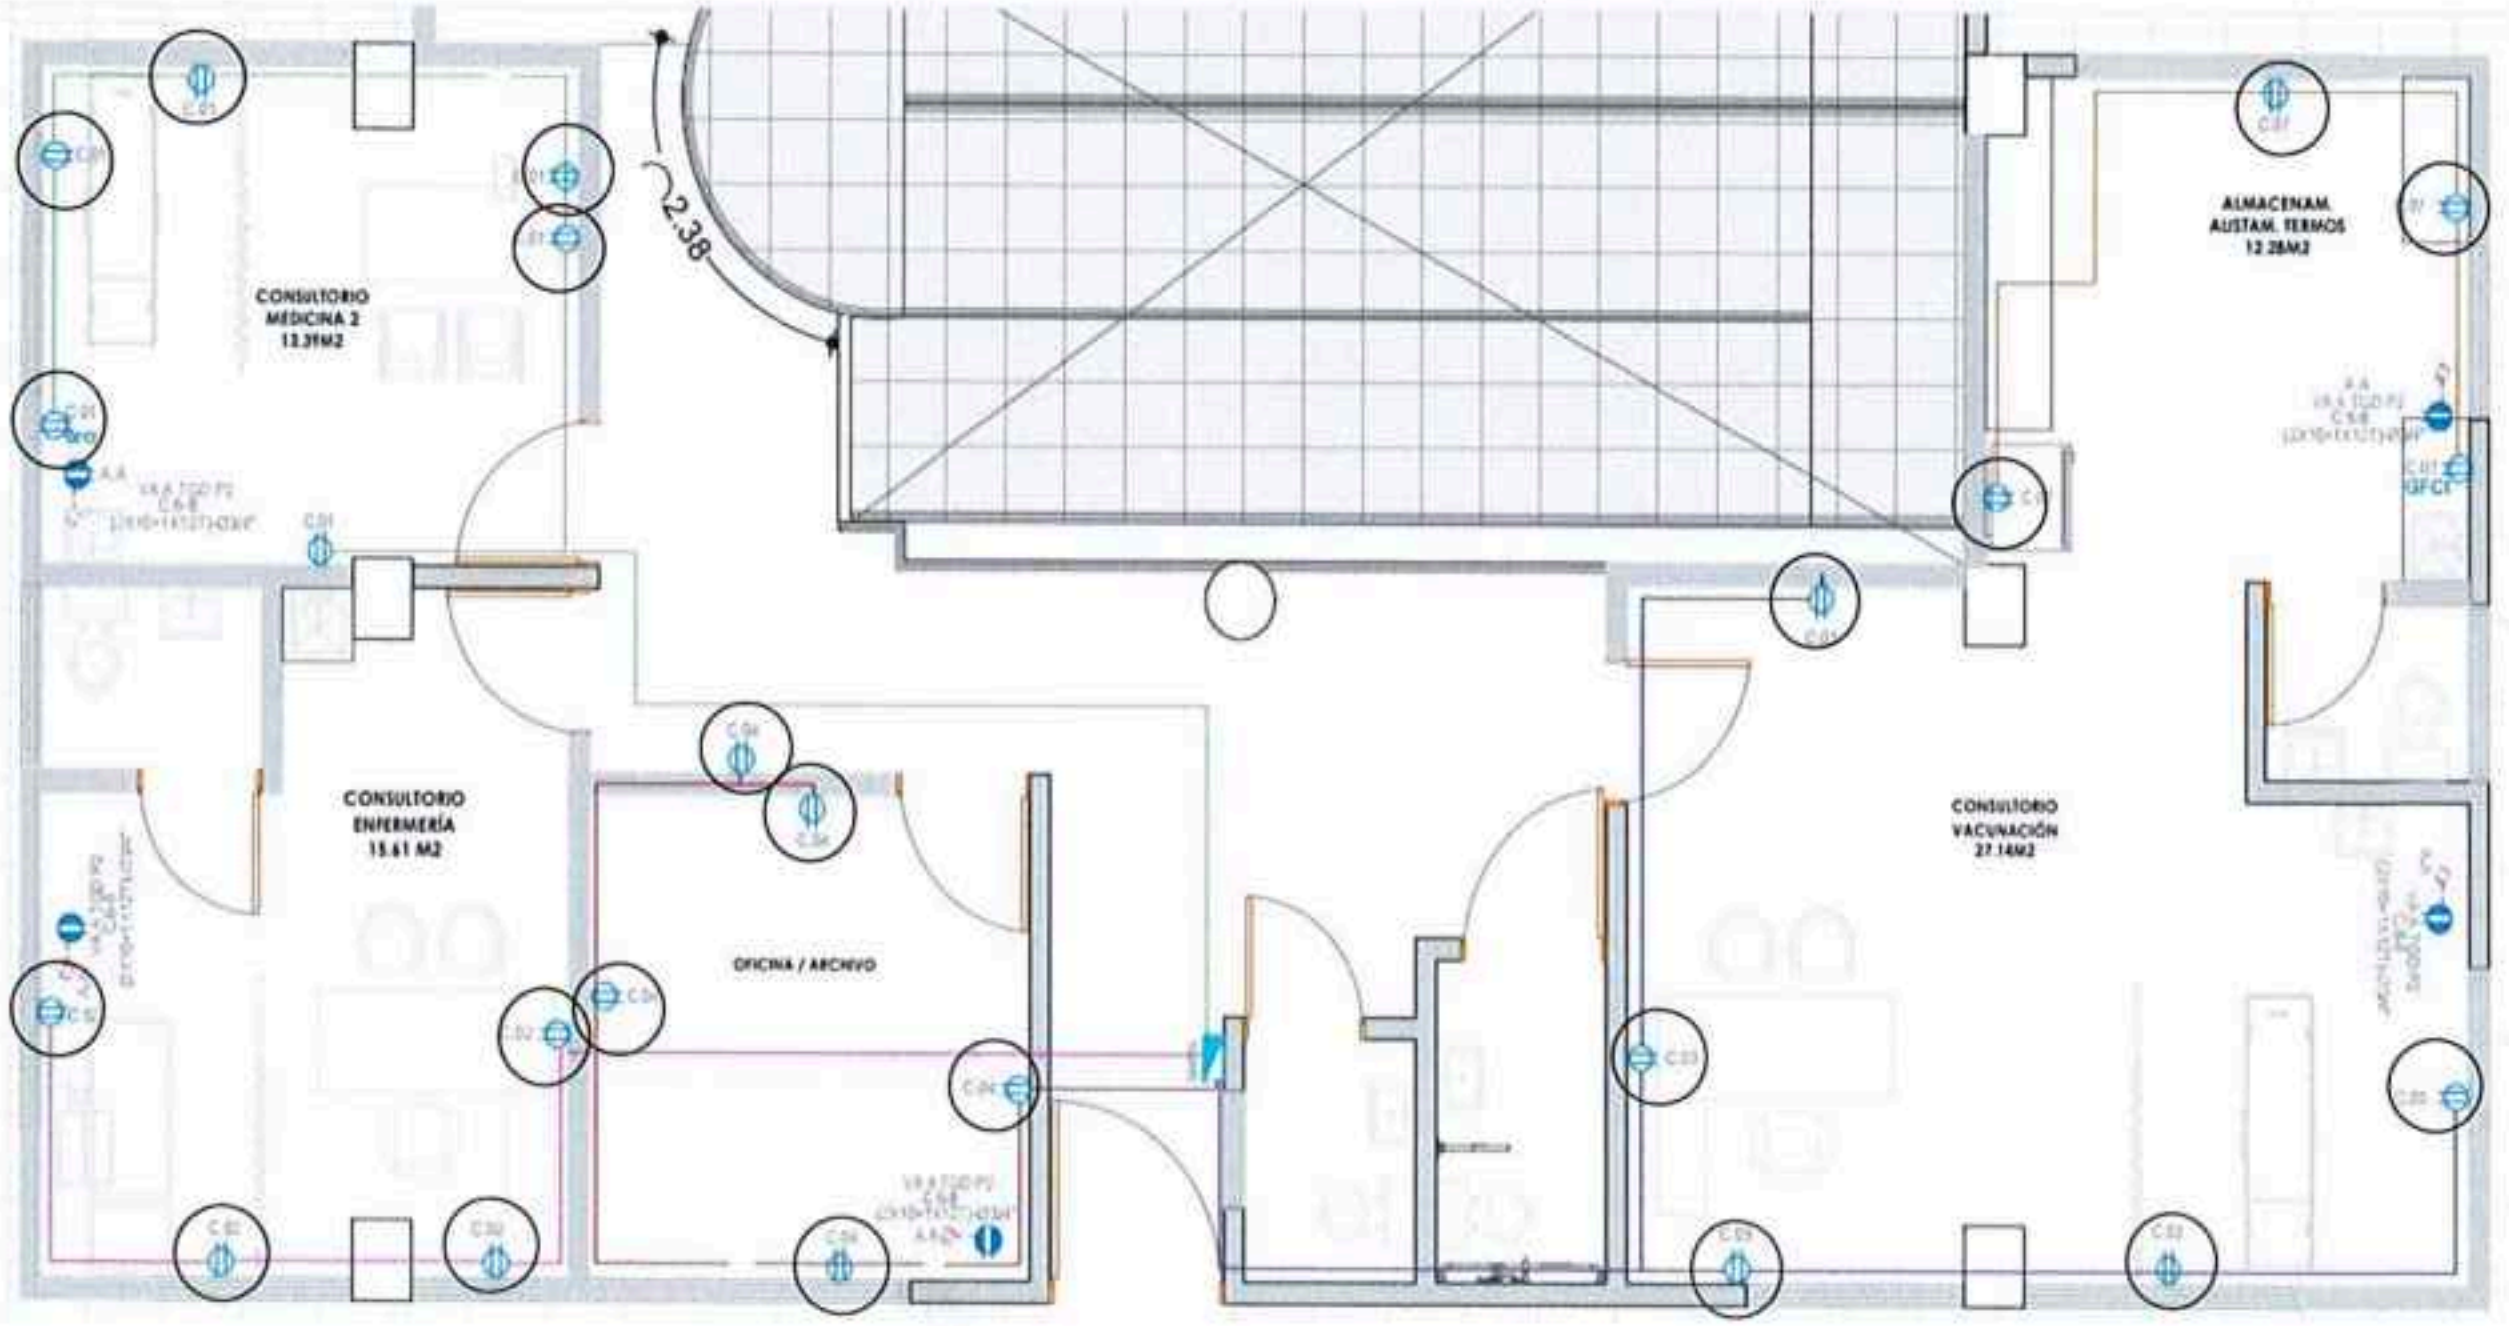


HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E

DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE				UBICACIÓN	SAN JOSE DEL BUBUY			
					FECHA	25/05/2026			
					ACTA No	Recibo y liquidación			
CAPÍTULO	NP	ITEM S O PREVISTOS	ÍTEM	NP19	Salida para tomacorriente doble con polo a tierra GFCI 15A - 125V, incluye: tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre	UND	Und	CANT.	16,00

DISTRIBUCIÓN TOMAS PISO 1

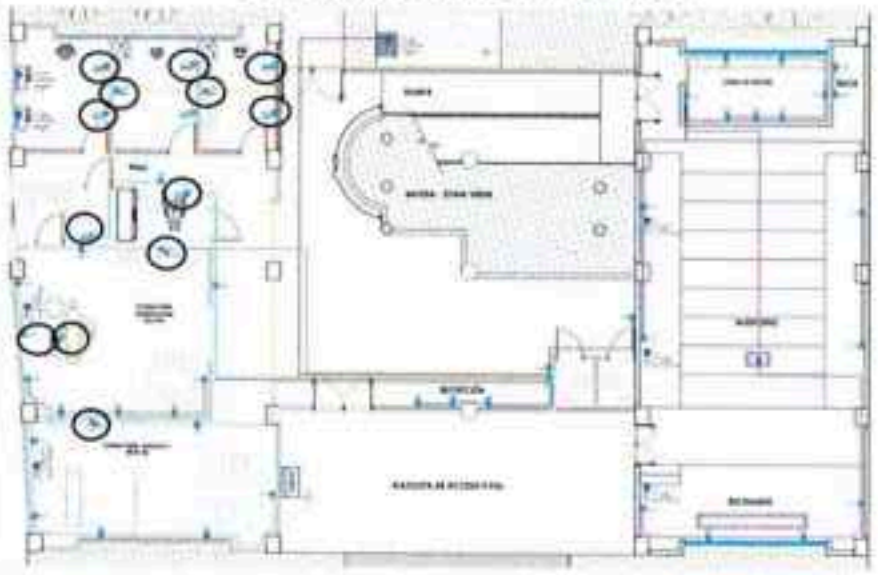



DISTRIBUCIÓN TOMAS PISO 2

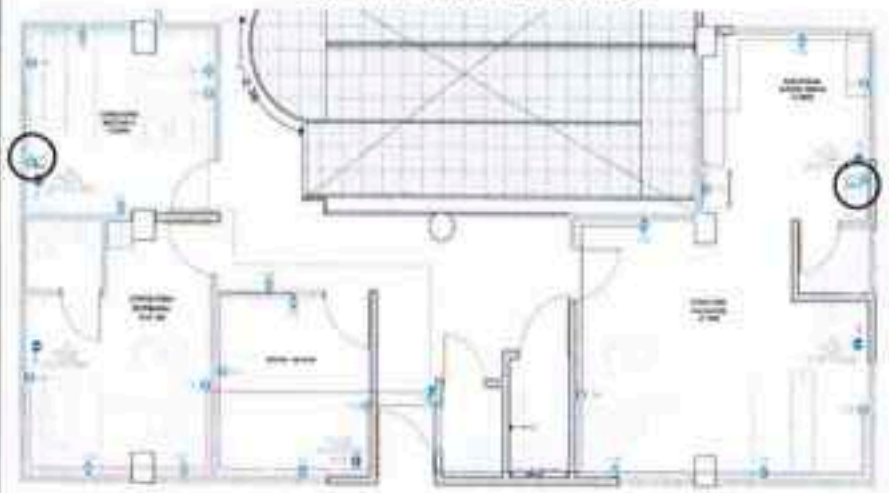




ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA	LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES					CANT. TOTAL
			LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	ÁREA (M2)	CANT.	
	Salida tomacorriente doble	Primer piso					14,00	14,00
		Segundo Piso					2,00	2,00

CANTIDAD PROYECTADA	16,00
CANTIDAD CONTRACTUAL	16,00
DIFERENCIA	0,00

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:	ROSSY ELENA NIÑO GÓMEZ	APROBÓ:	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
	RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL
	CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPICO INGENIERIA S.A.S

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E

DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE				**UBICACIÓN**	SAN JOSE DEL BUBUY			
					FECHA	25/05/2026			
					ACTA No	Recibo y liquidación			
CAPÍTULO	**NP**	**ITEM 5 O PREVISTOS**	**ÍTEM**	**NP20**	**Luminaria de emergencias tipo led 110 V, 2.4 W, autonomia minima 90 minutos. Incluye elementos de fijación. Suministro e instalación.**	**UND**	**Und**	**CANT.**	**10,00**

DISTRIBUCIÓN LUMINARIAS PISO 1

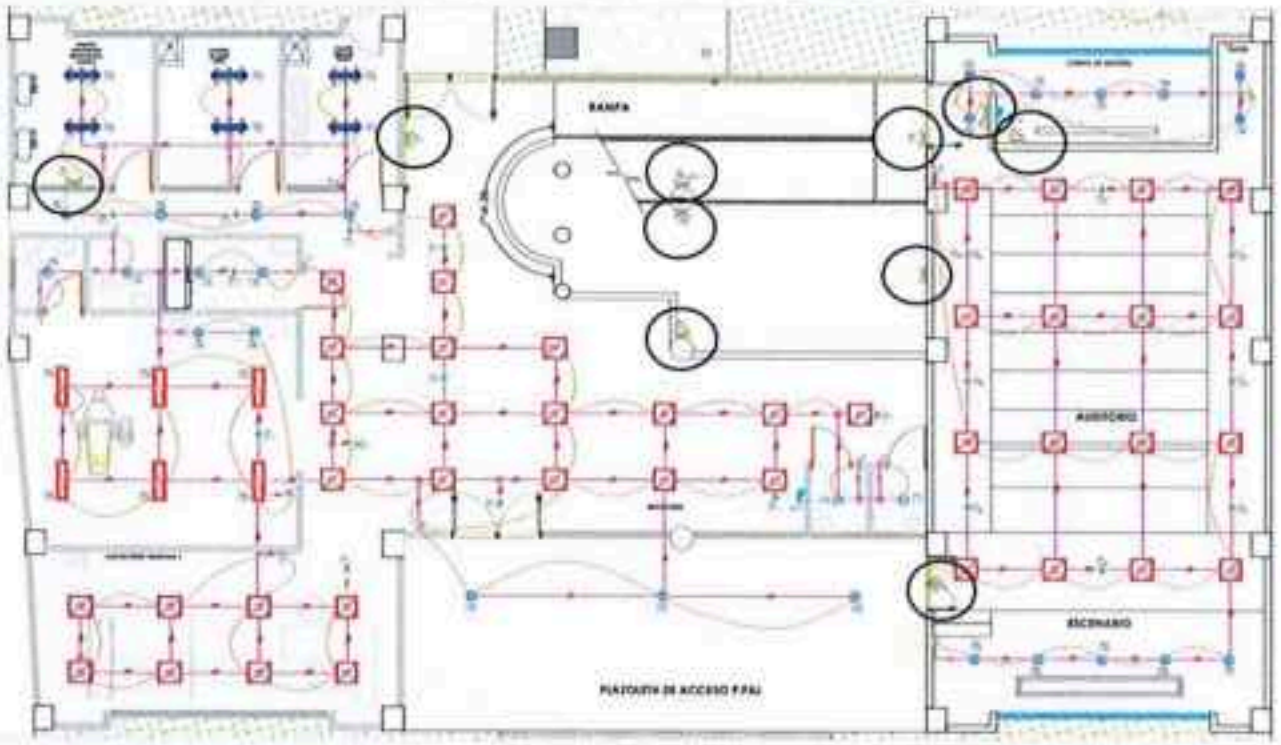




ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					CANT. TOTAL
		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	ÁREA (M2)	CANT.	
	Primer piso					10,00	10,00

CANTIDAD PROYECTADA	**10,00**
CANTIDAD CONTRACTUAL	**10,00**
DIFERENCIA	**0,00**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:	ROSSY ELENA NIÑO GÓMEZ	APROBÓ:	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL	
CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPICO INGENIERIA S.A.S	

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E

DEPARTAMENTO DE CASANARE


MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	UBICACIÓN	SAN JOSE DEL BUBUY
		FECHA	25/05/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	NP	ITEM S O PREVISTOS	ÍTEM	NP21	Luminaria de emergencias tipo Aplique LED 4w. Incluye elementos de fijación. Suministro e instalación.	UND	Und	CANT.	27,00

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					CANT. TOTAL
		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	ÁREA (M2)	CANT.	
	Primer piso					20,00	20,00
	Segundo piso					7,00	7,00

DISTRIBUCIÓN LUMINARIAS PISO 1

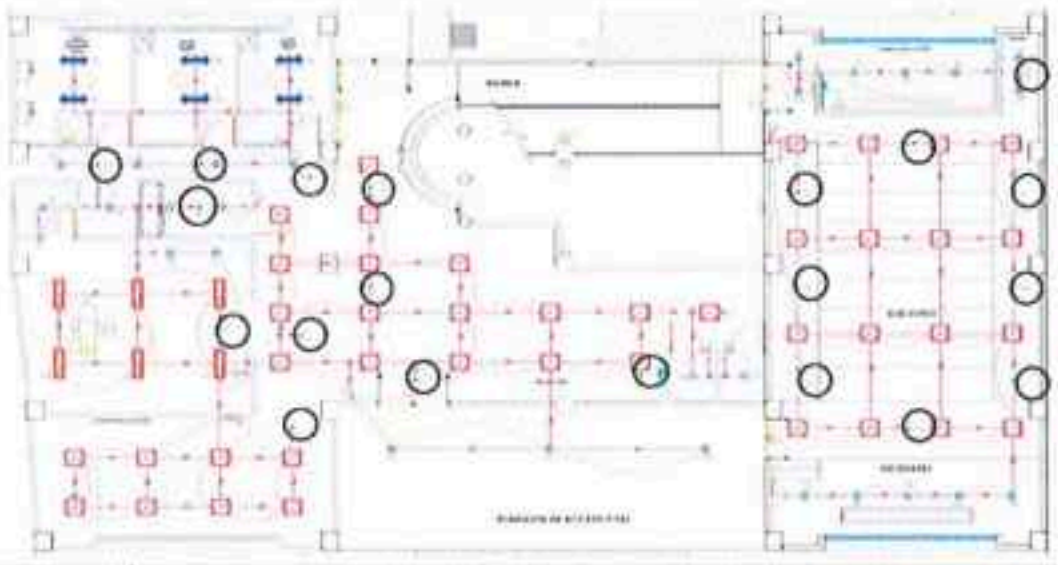

DISTRIBUCIÓN LUMINARIAS PISO 2







CANTIDAD PROYECTADA	27,00
CANTIDAD CONTRACTUAL	28,00
DIFERENCIA	-1,00

OBSERVACIONES:



ELABORÓ:	ROSSY ELENA NIÑO GÓMEZ	APROBÓ:	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
	RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL
	CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPICO INGENIERIA S.A.S

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E

DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE				UBICACIÓN	SAN JOSE DEL BUBUY			
					FECHA	25/05/2026			
					ACTA No	Recibo y liquidación			
CAPÍTULO	NP	ITEM S O PREVISTOS	ÍTEM	NP22	Modulo LED redondo 18w, 110v de incrustar. Incluye: Elementos de fijación, suministro e instalación	UND	Und	CANT.	28,00

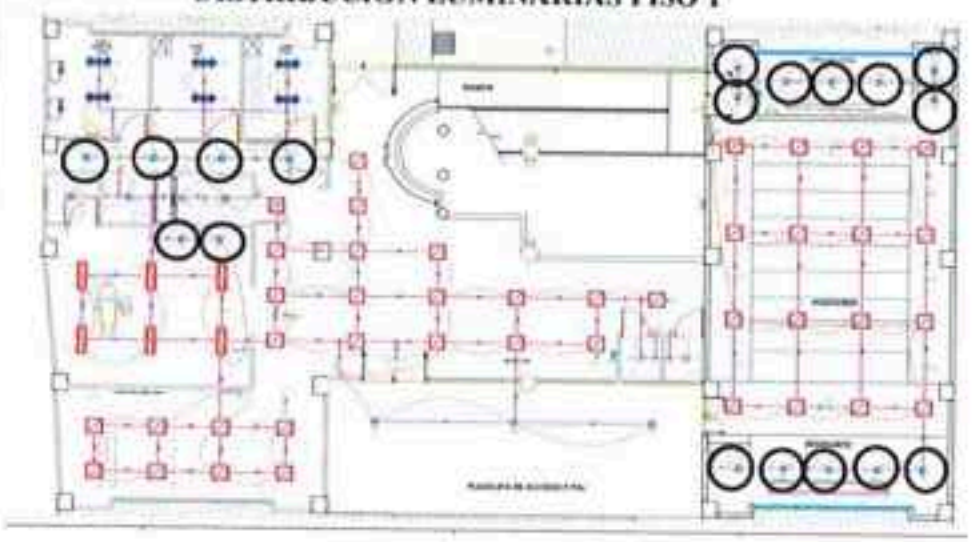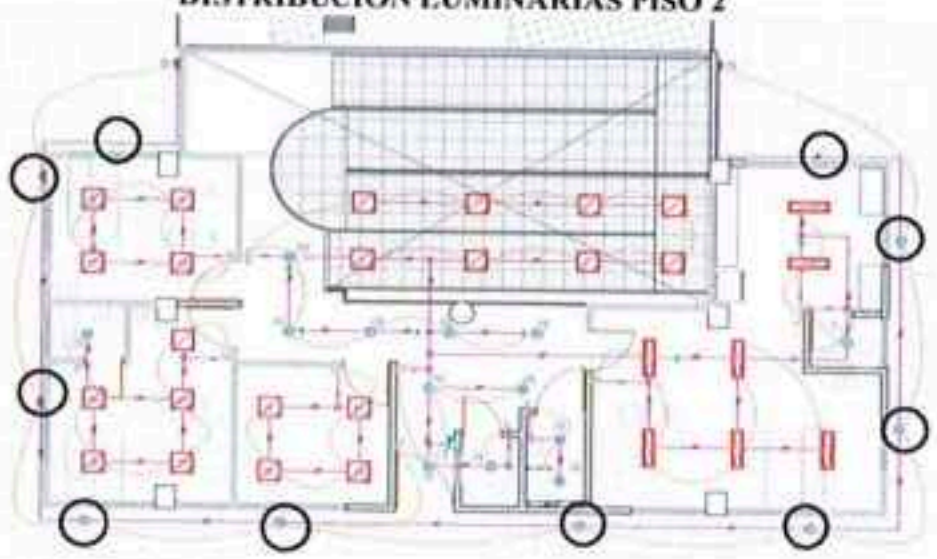ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA	LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES					CANT. TOTAL
			LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	ÁREA (M2)	CANT.	
DISTRIBUCIÓN LUMINARIAS PISO 1 	Modulo Led redondo 18W	Primer piso					18,00	18,00
		Segundo piso					10,00	10,00
DISTRIBUCIÓN LUMINARIAS PISO 2 								





CANTIDAD PROYECTADA	28,00
CANTIDAD CONTRACTUAL	24,00
DIFERENCIA	4,00

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	ROSSY ELENA NIÑO GÓMEZ	APROBÓ	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
	RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL
	CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPICO INGENIERIA S.A.S

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E


DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	UBICACIÓN	SAN JOSE DEL BUBUY
		FECHA	25/05/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	NP	ITEM S O PREVISTOS	ÍTEM	NP23	Luminaria tipo panel led 60x60 cm, 110 V. Incluye: Elementos de fijación. Suministro e Instalación	UND	Und	CANT.	62,00

DISTRIBUCIÓN LUMINARIAS PISO 1

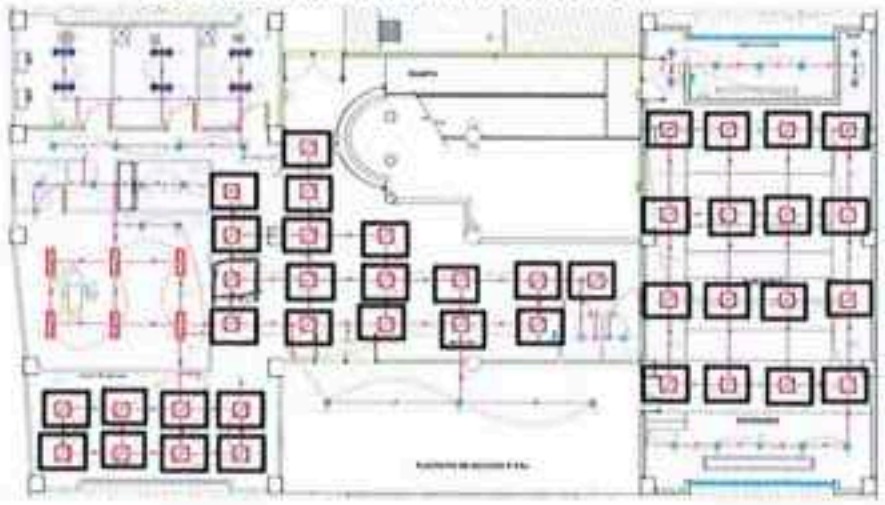





DISTRIBUCIÓN LUMINARIAS PISO 2

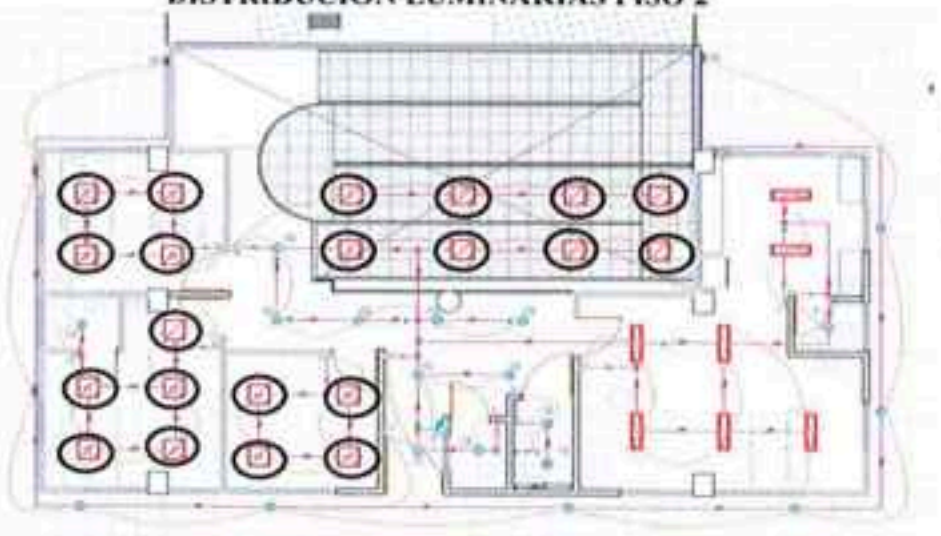


ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA	LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES					CANT. TOTAL
			LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	ÁREA (M2)	CANT.	
	Primer Piso	Auditorio					16,00	16,00
		Pasillo					17,00	17,00
		Medicina					8,00	8,00
		Escaleras					8,00	8,00
	Segundo Piso	Consultorio medicina					4,00	4,00
		Consultorio enfermería					5,00	5,00
		Oficina/archivo					4,00	4,00

CANTIDAD PROYECTADA	62,00
CANTIDAD CONTRACTUAL	62,00
DIFERENCIA	0,00

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:	ROSSY ELENA NIÑO GÓMEZ	APROBÓ:	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
	RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL
	CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPICO INGENIERIA S.A.S


HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E

DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE				**UBICACIÓN**	SAN JOSE DEL BUBUY			
					FECHA	25/05/2026			
					ACTA No	Recibo y liquidación			
CAPÍTULO	**NP**	**ITEM S O PREVISTOS**	**ÍTEM**	**NP24**	**Luminaria tipo Led tortuga 12 W Incluye: Elementos de fijación. Suministro e instalación**	**UND**	Und	**CANT.**	1,00

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIONES**					**CANT. TOTAL**
		LONG (M)	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	**ÁREA (M2)**	**CANT.**	
DISTRIBUCIÓN LUMINARIAS PISO 2	Segundo piso					1,00	1,00

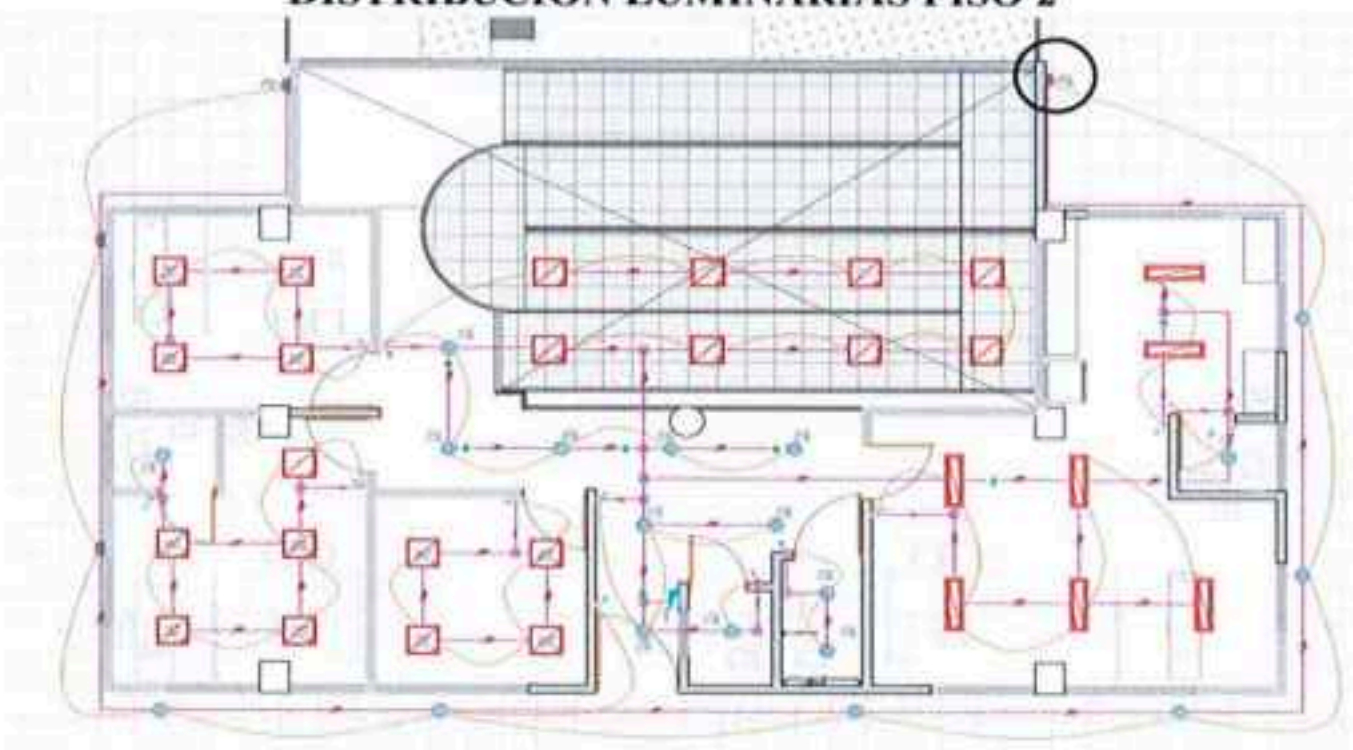



CANTIDAD PROYECTADA	**1,00**
CANTIDAD CONTRACTUAL	**4,00**
DIFERENCIA	**-3,00**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:	ROSSY ELENA NIÑO GÓMEZ	APROBÓ:	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL	
CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPICO INGENIERIA S.A.S	


HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E

DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE				**UBICACIÓN**	SAN JOSE DEL BUBUY		
					FECHA	25/05/2026		
					ACTA No	Recibo y liquidación		
CAPÍTULO	**NP**	**ITEM S O PREVISTOS**	**ÍTEM**	**NP25**	Luminaria tipo led Hermetica 36w . Incluye: Elementos de fijación. Suministro e instalación	**UND**	Und	**CANT.**	6,00

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					CANT. TOTAL
		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	ÁREA (M2)	CANT.	
DISTRIBUCIÓN LUMINARIAS PISO 1	Primer piso					6,00	6,00

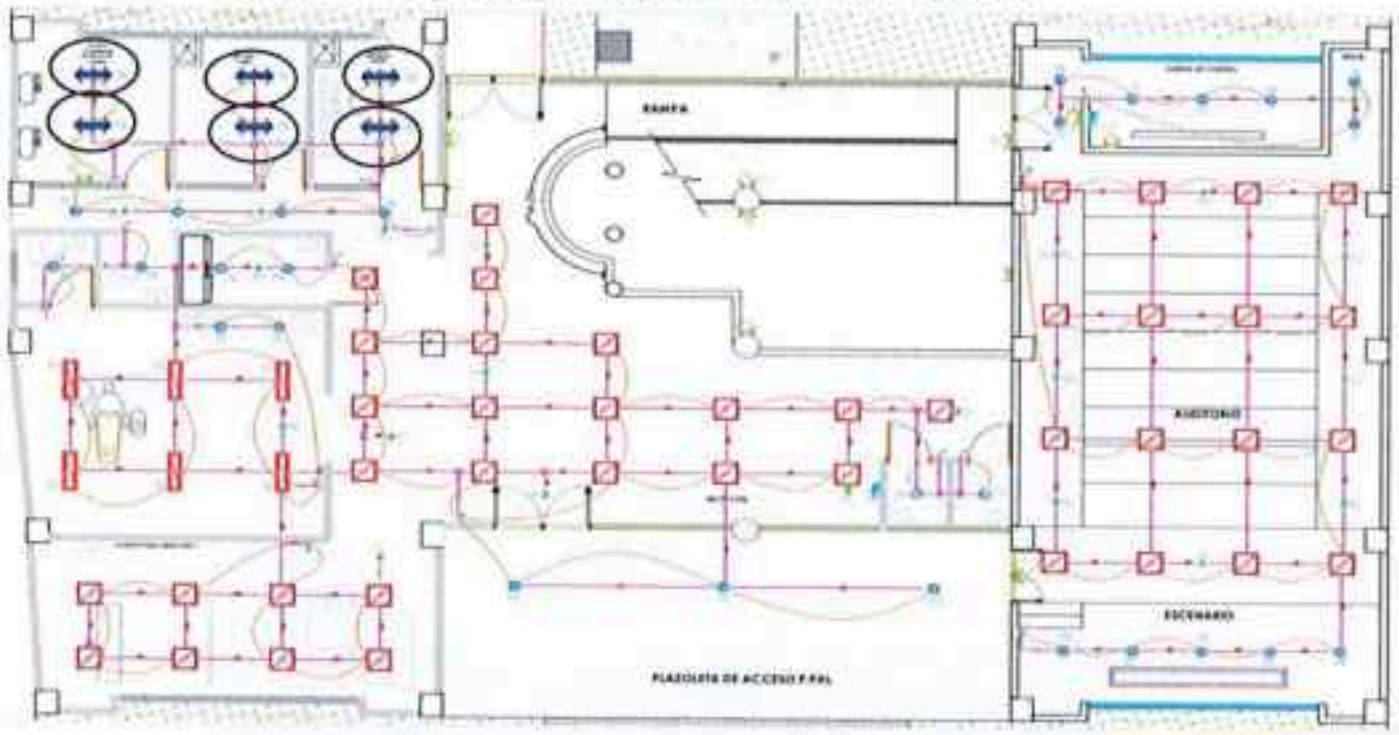





CANTIDAD PROYECTADA	6,00
CANTIDAD CONTRACTUAL	6,00
DIFERENCIA	0,00

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	ROSSY ELENA NIÑO GÓMEZ	APROBÓ	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL	
CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPICO INGENIERIA S.A.S	


HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E

DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE					UBICACIÓN	SAN JOSE DEL BUBUY				
						FECHA	25/05/2026				
						ACTA No	Recibo y liquidación				
CAPÍTULO	NP	ITEM S O PREVISTOS	ÍTEM	NP26	Salida para interruptor triple, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plastica 5500, terminales PVC y readcuación de muro	UND	Und	CANT.	1,00		

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					CANT. TOTAL
		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	ÁREA (M2)	CANT.	
DISTRIBUCIÓN LUMINARIAS PISO 1	Primer piso					1,00	1,00

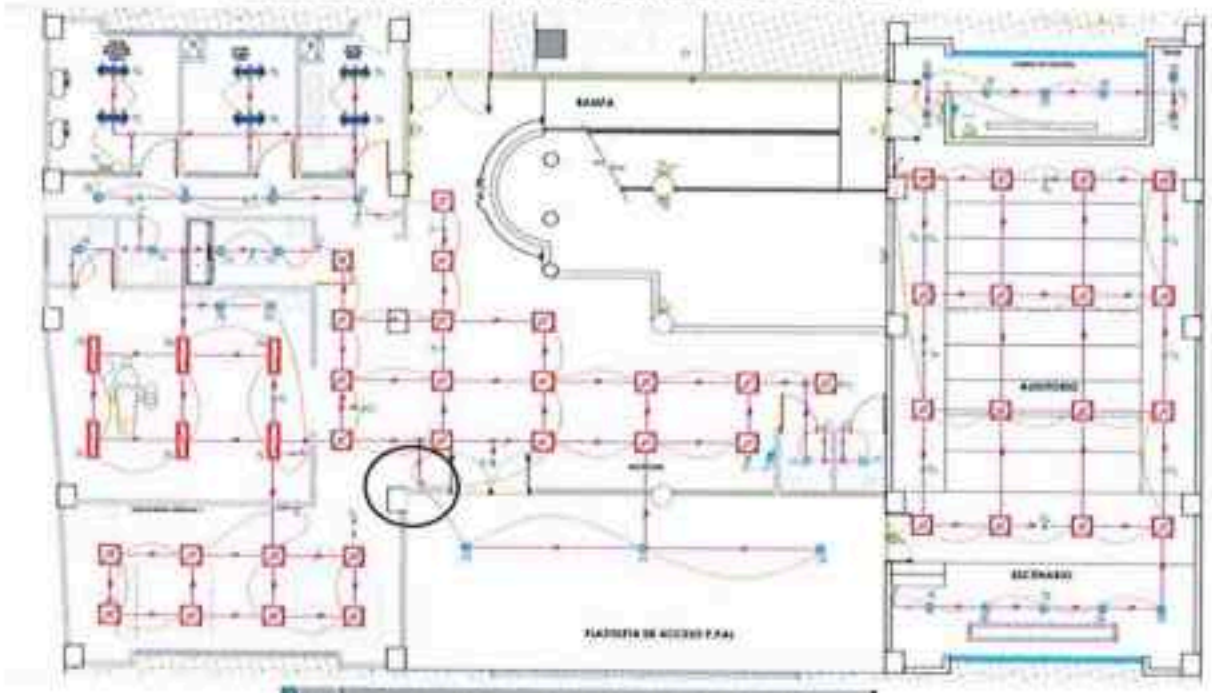



CANTIDAD PROYECTADA	1,00
CANTIDAD CONTRACTUAL	1,00
DIFERENCIA	0,00

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:	ROSSY ELENA NIÑO GÓMEZ	APROBÓ:	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
	RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL
	CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPICO INGENIERIA S.A.S


HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E

DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE				UBICACIÓN	SAN JOSE DEL BUBUY			
					FECHA	25/05/2026			
					ACTA No	Recibo y liquidación			
CAPÍTULO	NP	ITEM S O PREVISTOS	ÍTEM	NP27.	Interruptor termomagnetico regulable 32A a 40A, 35 - 40 KA. Suministro e instalación	UND	Und	CANT.	2,00

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					CANT. TOTAL
		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	ÁREA (M2)	CANT.	
	Tablero de media - Tablero 3x40 (A)					2,00	2,00

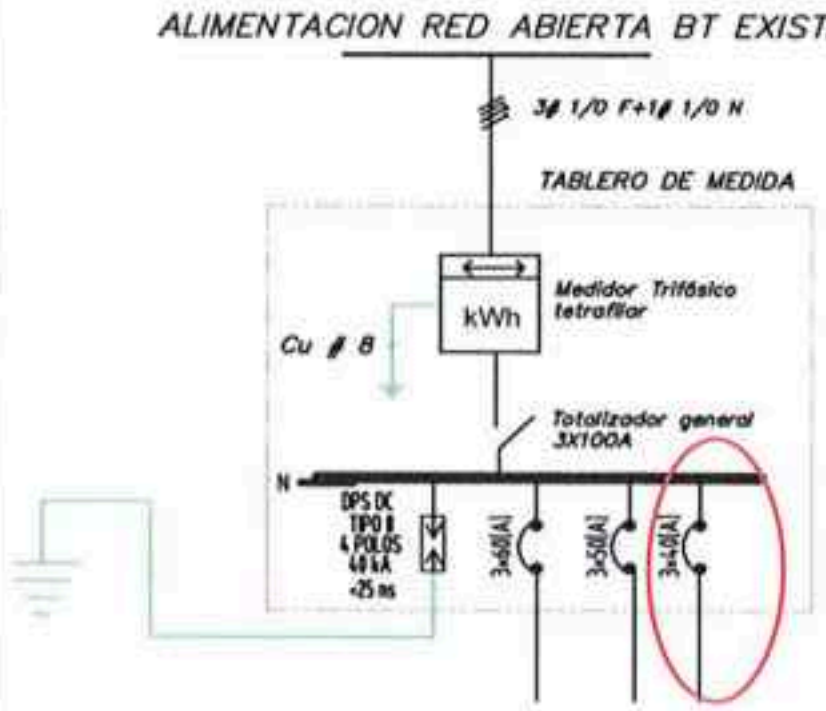



CANTIDAD PROYECTADA	2,00
CANTIDAD CONTRACTUAL	2,00
DIFERENCIA	0,00

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	ROSSY ELENA NIÑO GÓMEZ	APROBÓ	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL	
CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPICO INGENIERIA S.A.S	


HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E

DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE				**UBICACIÓN**	SAN JOSE DEL BUBUY			
					FECHA	25/05/2026			
					ACTA No	Recibo y liquidación			
CAPÍTULO	**NP**	**ITEM S O PREVISTOS**	**ÍTEM**	**NP28.**	**Tablero de protecciones trifasico de 24 circuitos con puerta y espacio para totalizador. Suministro e instalación.**	**UND**	**Und**	**CANT.**	**2,00**

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					CANT. TOTAL
		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	ÁREA (M2)	CANT.	
	Tablero Piso 1					1,00	1,00
	Tablero Piso 2					1,00	1,00
							-

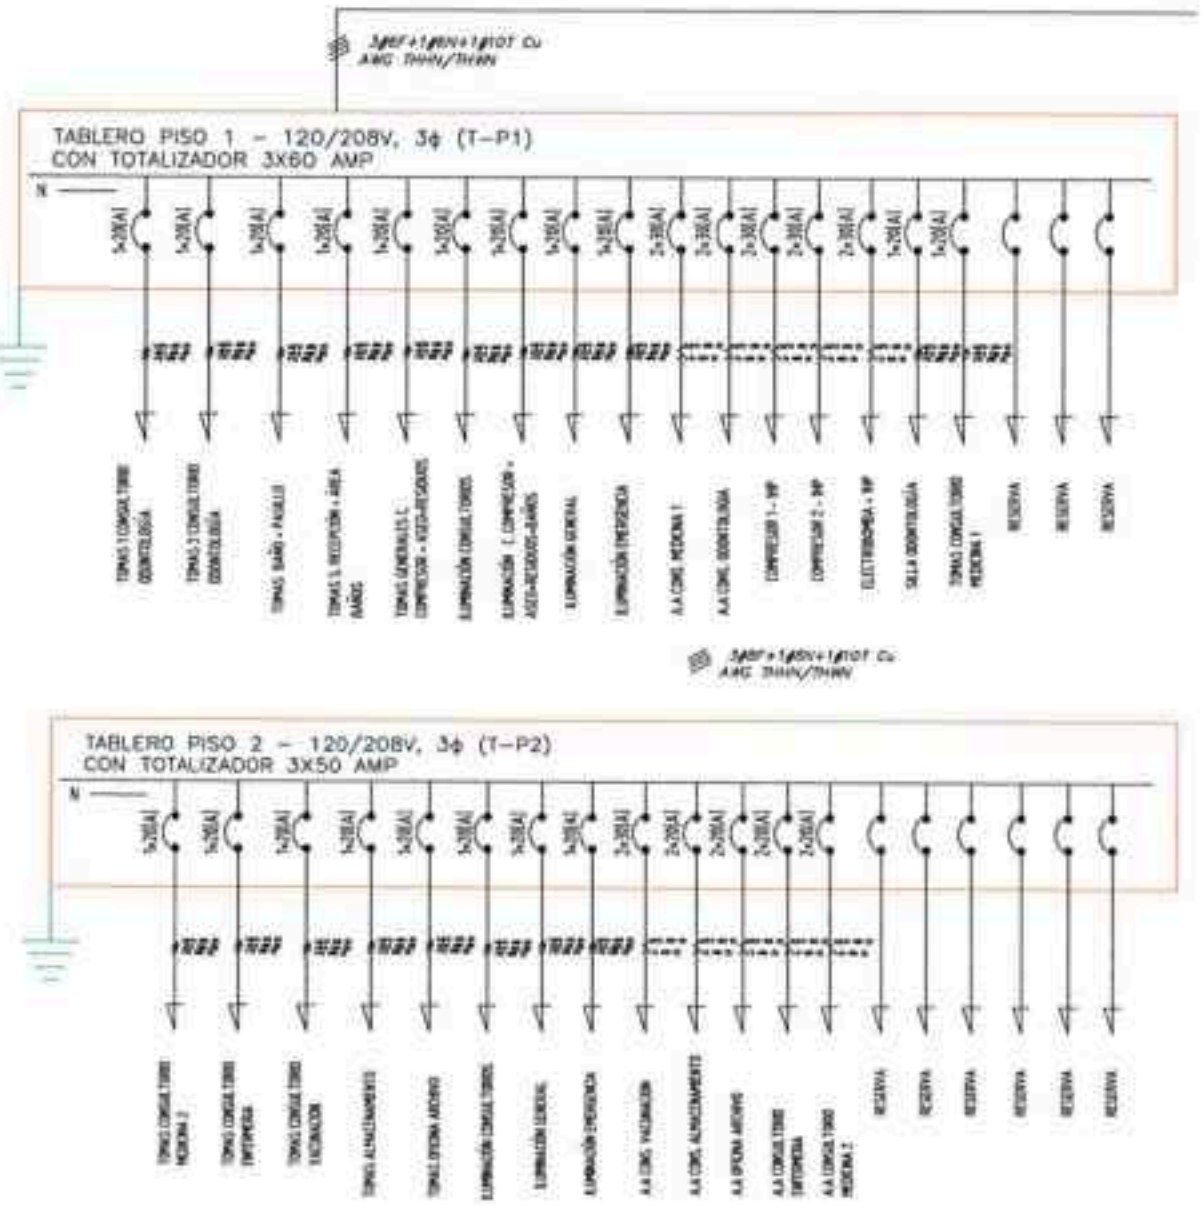



CANTIDAD PROYECTADA	**2,00**
CANTIDAD CONTRACTUAL	**2,00**
DIFERENCIA	**0,00**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	ROSSY ELENA NIÑO GÓMEZ	APROBÓ	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL	
CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPICO INGENIERIA S.A.S	


HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E

DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE			UBICACIÓN	SAN JOSE DEL BUBUY		
				FECHA	25/05/2026		
				ACTA No	Recibo y liquidación		

CAPÍTULO	NP	ITEM 5 O PREVISTOS	ÍTEM	NP29	Tablero de protecciones trifasico de 18 circuitos con puerta y espacio para totalizador. Suministro e instalación.	UND	Und	CANT.	1,00

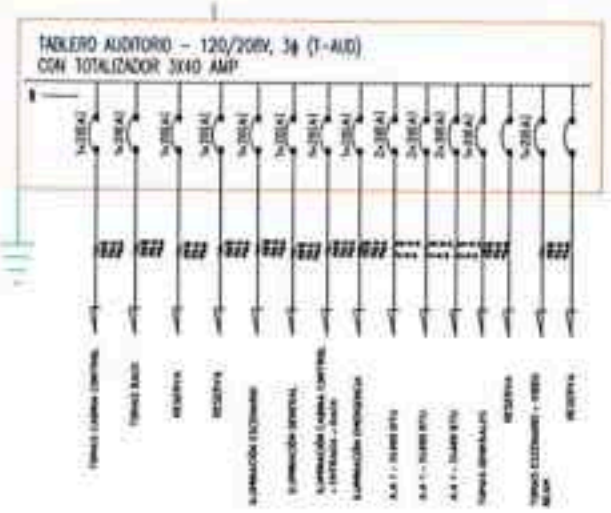ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA	LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES					CANT. TOTAL
			LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	ÁREA (M2)	CANT.	
 	Auditorio	3x40 (A)					1,00	1,00



CANTIDAD PROYECTADA	1,00
CANTIDAD CONTRACTUAL	1,00
DIFERENCIA	0,00

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:	ROSSY ELENA NIÑO GÓMEZ	APROBÓ	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
	RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL
	CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPICO INGENIERIA S.A.S

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E


DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	**UBICACIÓN**	SAN JOSE DEL BUBUY
		FECHA	25/05/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	NP	ITEM S O PREVISTOS	ÍTEM	NP30	Puerta en persiana y marco en aluminio, incluye chapa, suministro e instal	UND	m2	CANT.	1,90

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA

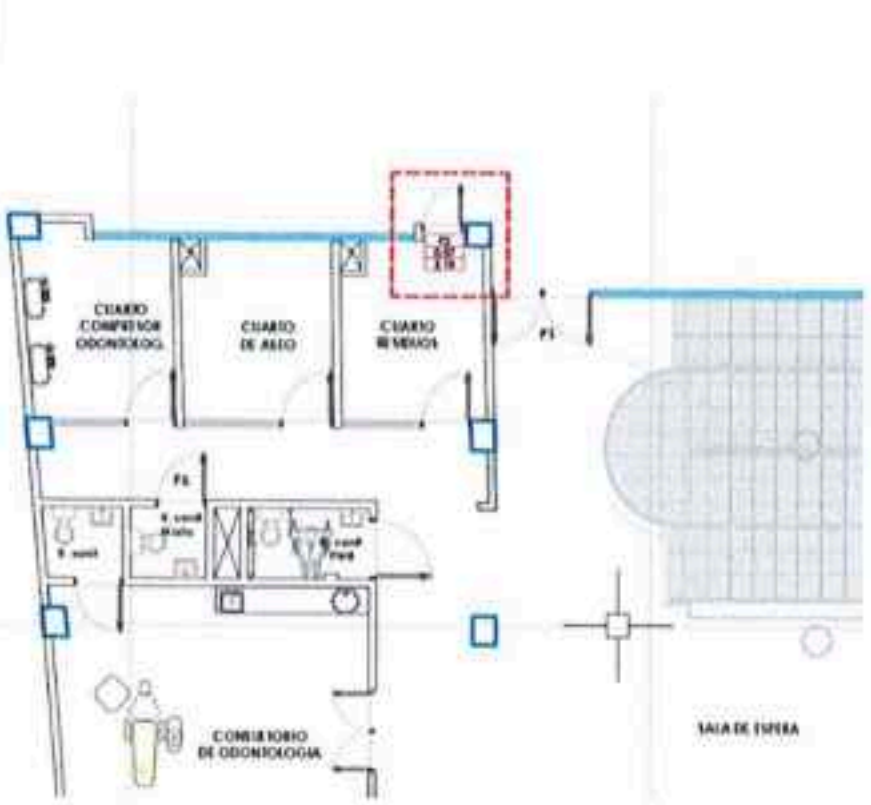



LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES					CANT. TOTAL
		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	ÁREA (M2)	CANT.	
Primer piso	Cuarto residuos - P2		0,87	2,18		1,00	1,90

CANTIDAD PROYECTADA	**1,90**
CANTIDAD CONTRACTUAL	**1,94**
DIFERENCIA	**-0,04**

OBSERVACIONES:



ELABORÓ:	ROSSY ELENA NIÑO GÓMEZ	APROBÓ:	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
	RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL
	CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPICO INGENIERIA S.A.S

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E

DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE				**UBICACIÓN**	SAN JOSE DEL BUBUY			
					FECHA	25/05/2026			
					ACTA No	Recibo y liquidación			
CAPÍTULO	**NP**	**ITEM S O PREVISTOS**	**ÍTEM**	**NP31.**	**Lavamano colgar blanco milano o similar con griferia para lavamanos institucional tipo push (incluye kit desagüe sifón regulación griflex) Suministro e instal**	**UND**	**Und**	**CANT.**	**14,00**

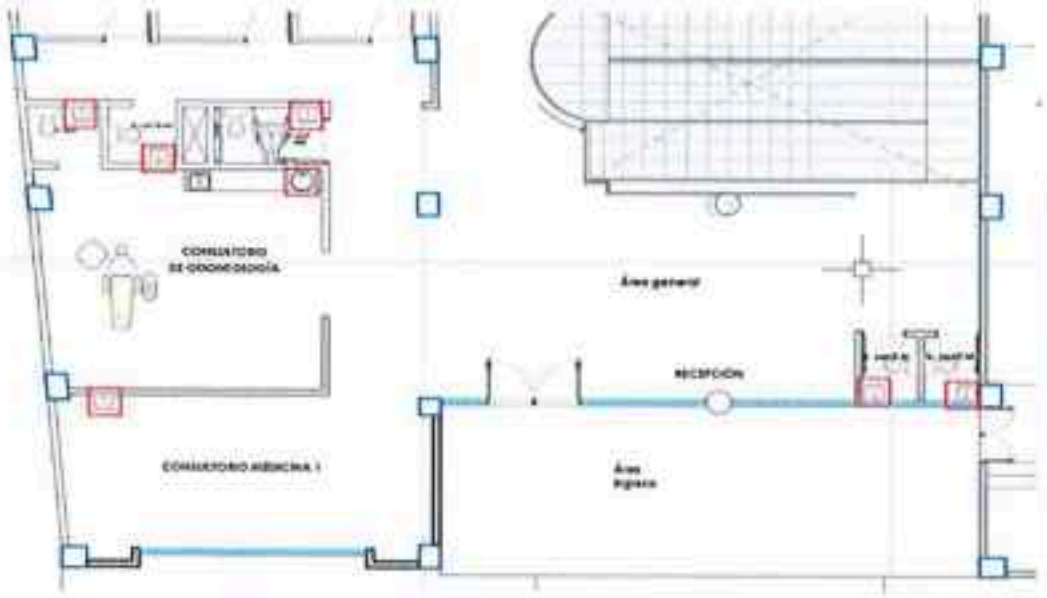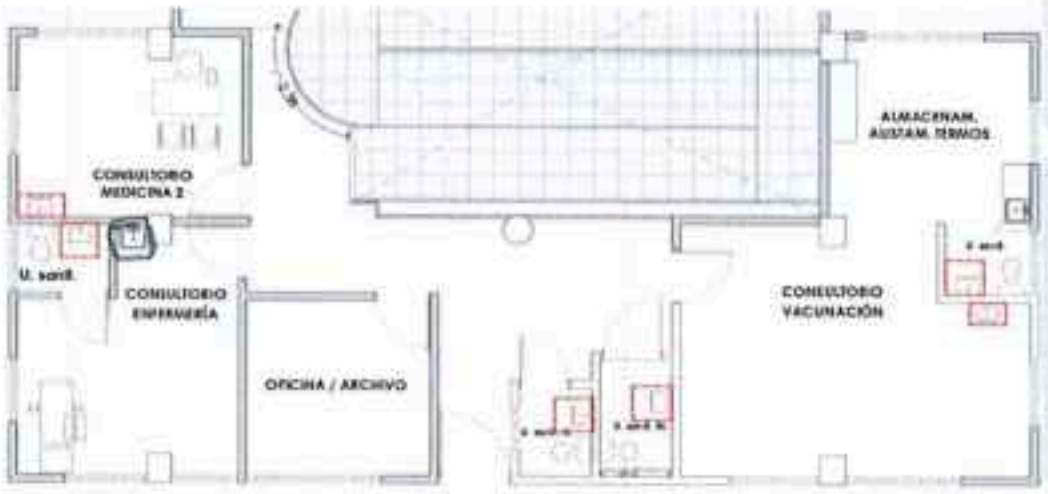ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA	**LOCALIZACIÓN**		**DIMENSIONES**					**CANT. TOTAL**
			LONG (M)	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	**Cantidad**	**CANT.**	
	Primer piso	U. sant 01					1,00	1,00
		U. sant mixta 02					1,00	1,00
		U. sant PMR 03					1,00	1,00
		Cons. Odontologia					1,00	1,00
		U. sant 04					1,00	1,00
		U. sant 05					1,00	1,00
		Cons. Medicina 01					1,00	1,00
	Segundo piso	Cons. Medicina 02					2,00	2,00
		U. sant 06					1,00	1,00
		U. sant 07					1,00	1,00
		U. sant 08					1,00	1,00
		Cons. Vacunación					1,00	1,00
		U. sant 09					1,00	1,00
								
								
								
							CANTIDAD PROYECTADA	**14,00**
							CANTIDAD CONTRACTUAL	**14,00**
							DIFERENCIA	**0,00**

OBSERVACIONES:


ELABORÓ:	ROSSY ELENA NIÑO GOMEZ	APROBÓ:	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL	
CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPICO INGENIERIA S.A.S	

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E

DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE				UBICACIÓN	SAN JOSE DEL BUBUY			
					FECHA	25/05/2026			
					ACTA No	Recibo y liquidación			
CAPÍTULO	NP	ITEM S O PREVISTOS	ÍTEM	NP32	Desmonte, suministro e instalación de vidrio azul lake/dark de 6mm.	UND	m2	CANT.	10,55

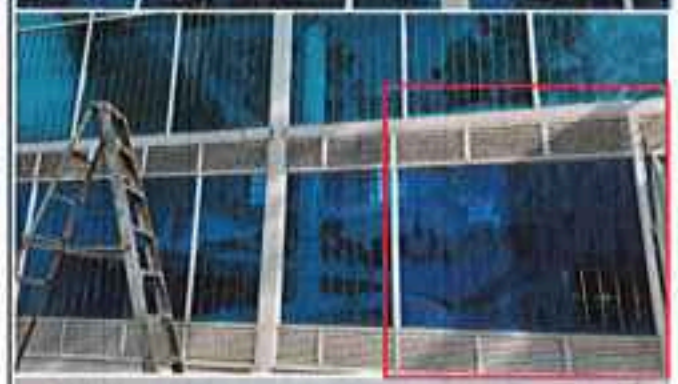ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA	LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES					CANT. TOTAL
			LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	Cantidad	CANT.	
     	Vidrio azul	Primer Piso		2,10	1,79		1,00	3,76
				2,38	1,78		1,00	4,24
				1,40	1,82		1,00	2,55

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E

DEPARTAMENTO DE CASANARE


MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	UBICACIÓN	SAN JOSE DEL BUBUY
		FECHA	25/05/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	NP	ITEM S O PREVISTOS	ÍTEM	NP33	Mantenimiento general de barandas en acero inoxidable, que incluye limpieza, brillado , ejecución de uniones soldadas tipo TIG en tuberias, parales y accesorios con acabado pulido.	UND	ml	CANT.	112,37

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA



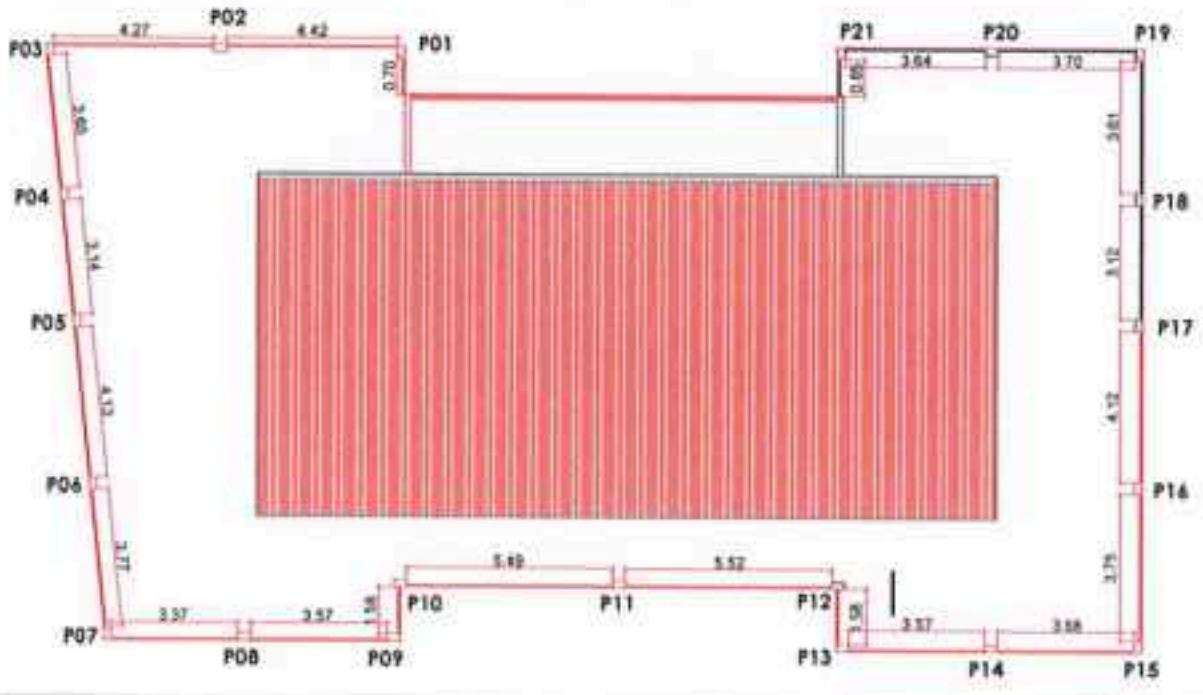

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES					CANT. TOTAL
		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	ÁREA (M2)	CANT.	
Primer a segundo Piso	Tramo 1	5,36				1,00	5,36
	Tramo 2	0,45				1,00	0,45
	Tramo 3	7,94				1,00	7,94
	Tramo 4	8,90				1,00	8,90
	Tramo 5	0,65				1,00	0,65
	Tramo 6	5,00				1,00	5,00
	Tramo 7	4,70				1,00	4,70
	Tramo 8	7,04				1,00	7,04
	Tramo 9	5,23				1,00	5,23
	Tramo 10	2,56				1,00	2,56
	Tramo 11	5,23				1,00	5,23
	Muro - P1	0,70				1,00	0,70
	P1 - P2	4,42				1,00	4,42
	P2 - P3	4,27				1,00	4,27
	P3 - P4	3,65				1,00	3,65
	P4 - P5	3,14				1,00	3,14
	P5 - P6	4,13				1,00	4,13
	P6 - P7	3,77				1,00	3,77
	P7 - P8	3,37				1,00	3,37
Terraza	P8 - P9	3,57				1,00	3,57
	P9 - P10	1,58				1,00	1,58
	P10 - P11	5,49				1,00	5,49
	P11 - P12	5,52				1,00	5,52
	P12 - P13	1,58				1,00	1,58
	P13 - P14	3,57				1,00	3,57
	P14 - P15	3,68				1,00	3,68
	P15 - P16	3,75				1,00	3,75
	P17 - P18	3,12				1,00	3,12

CANTIDAD PROYECTADA	112,37
CANTIDAD CONTRACTUAL	128,29
DIFERENCIA	-15,92

OBSERVACIONES:


ELABORÓ:	ROSSY ELENA NIÑO GÓMEZ	APROBÓ:	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
	RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL
	CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPICO INGENIERIA S.A.S

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E

DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:		ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE				**UBICACIÓN**	SAN JOSE DEL BUBUY		
						FECHA	25/05/2026		
						ACTA No	Recibo y liquidación		
CAPÍTULO	**NP**	**ITEM 5 O PREVISTOS**	**ÍTEM**	**NP33**	**Mantenimiento general de barandas en acero inoxidable, que incluye limpieza, brillado , ejecución de uniones soldadas tipo TIG en tuberías, parales y accesorios con acabado pulido.**	**UND**	**ml**	**CANT.**	**0,00**

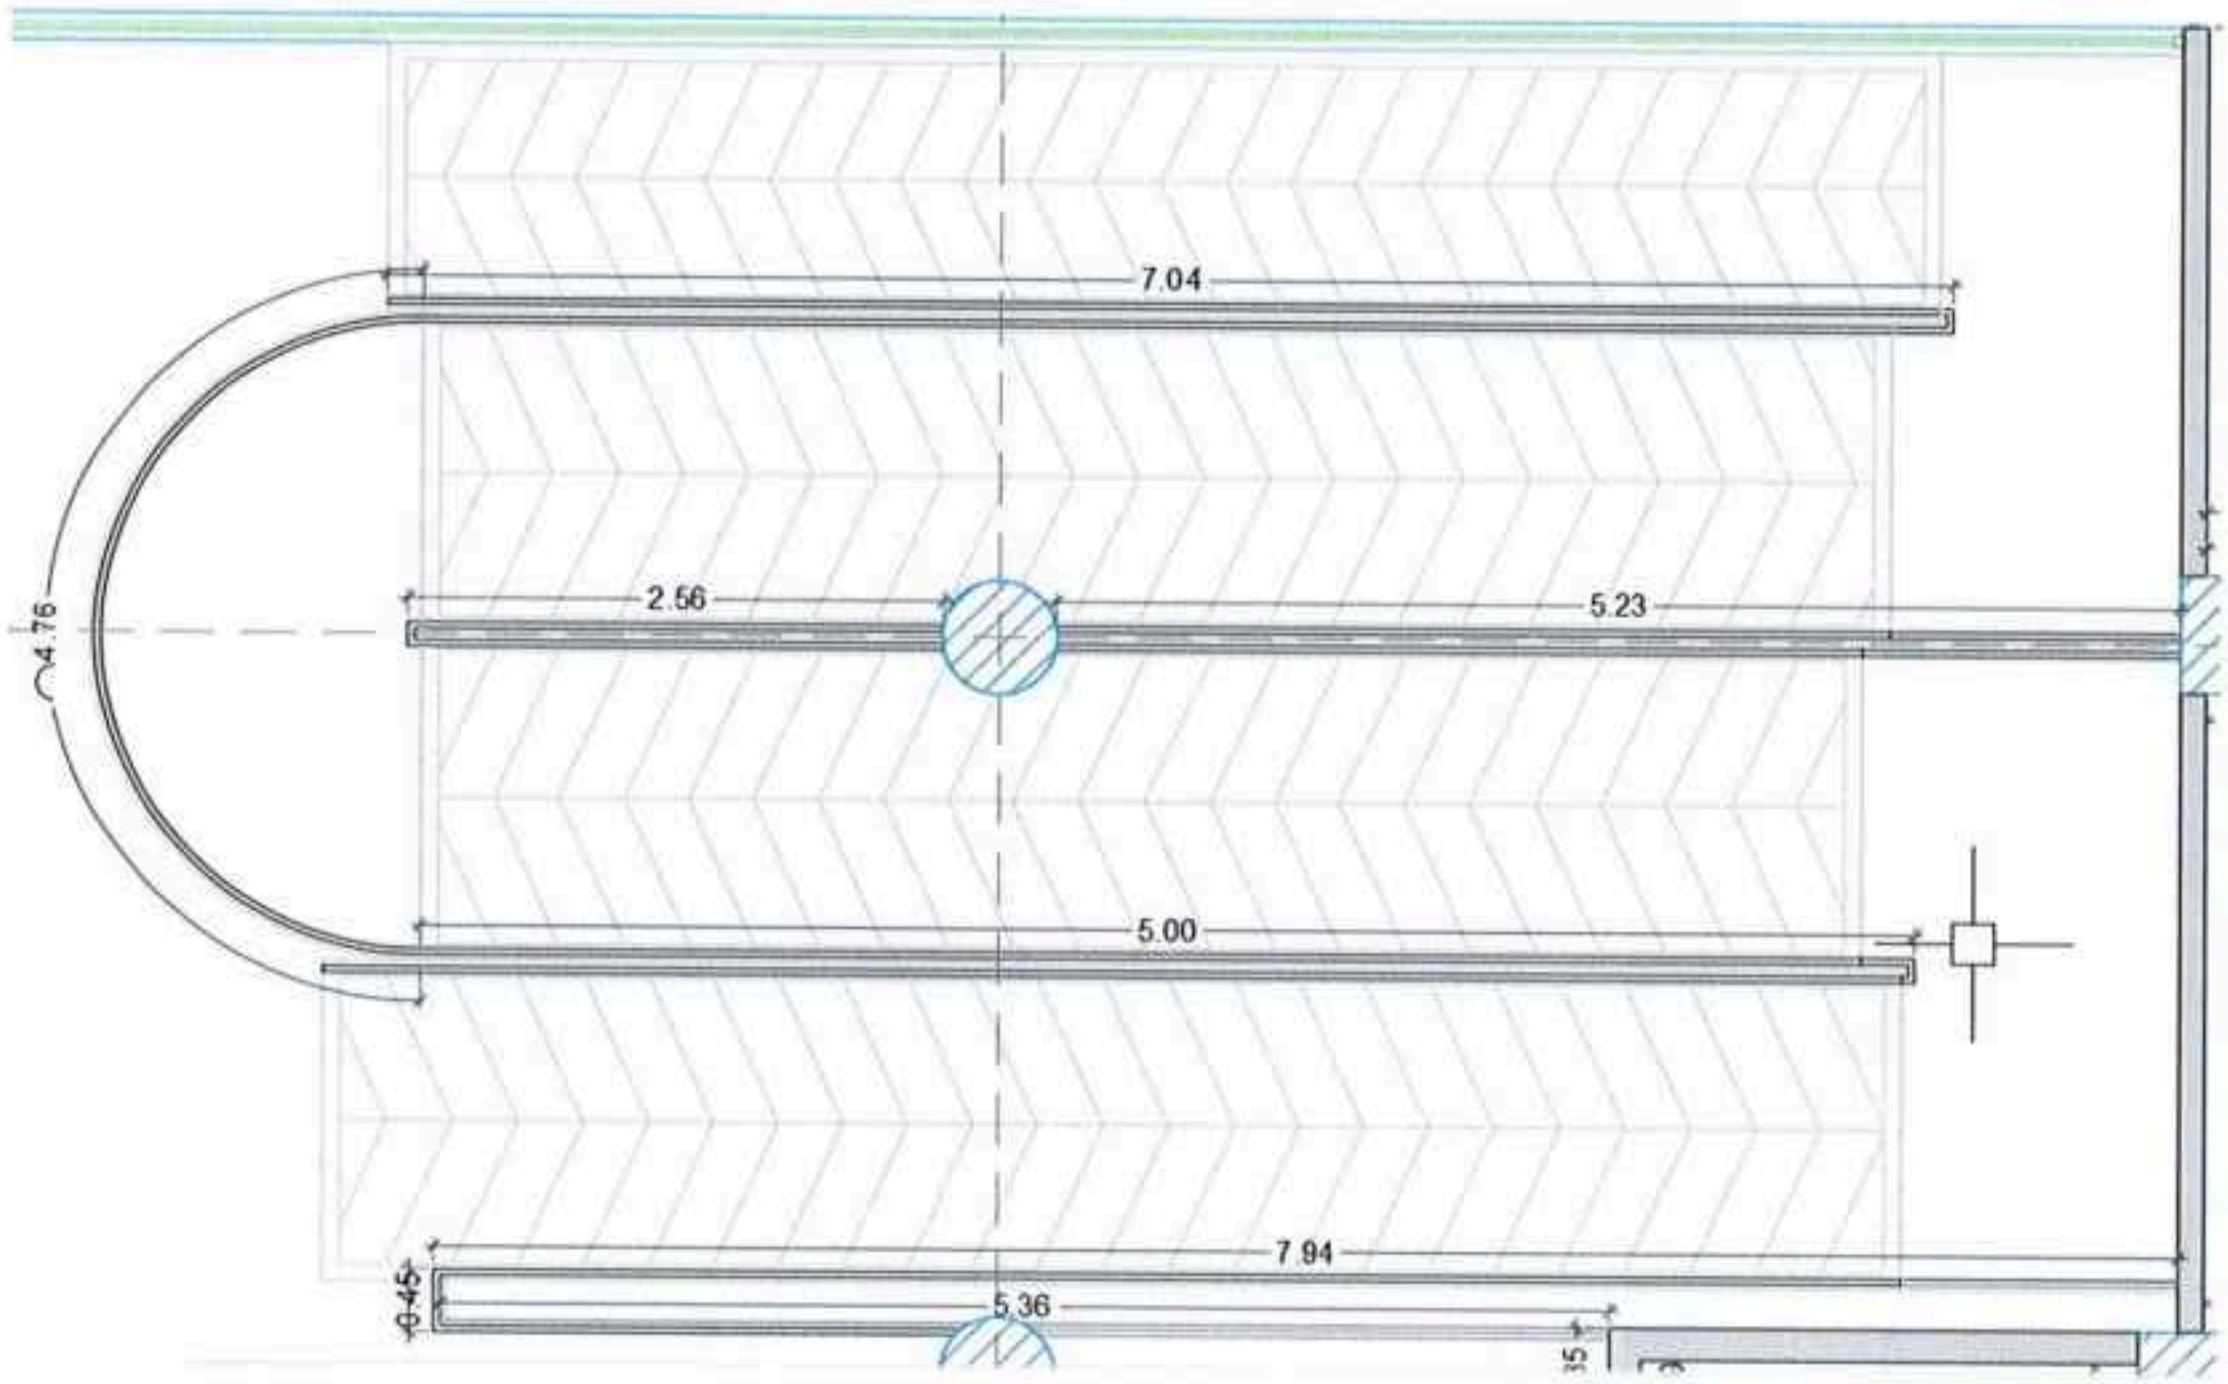

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E


DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA


OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	UBICACIÓN	SAN JOSE DEL BUBUY
		FECHA	25/05/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	NP	ITEM 5 O PREVISTOS	ÍTEM	NP34	Desmonte, mantenimiento y recorte de puerta en aluminio	UND	ml	CANT.	6,46

ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA

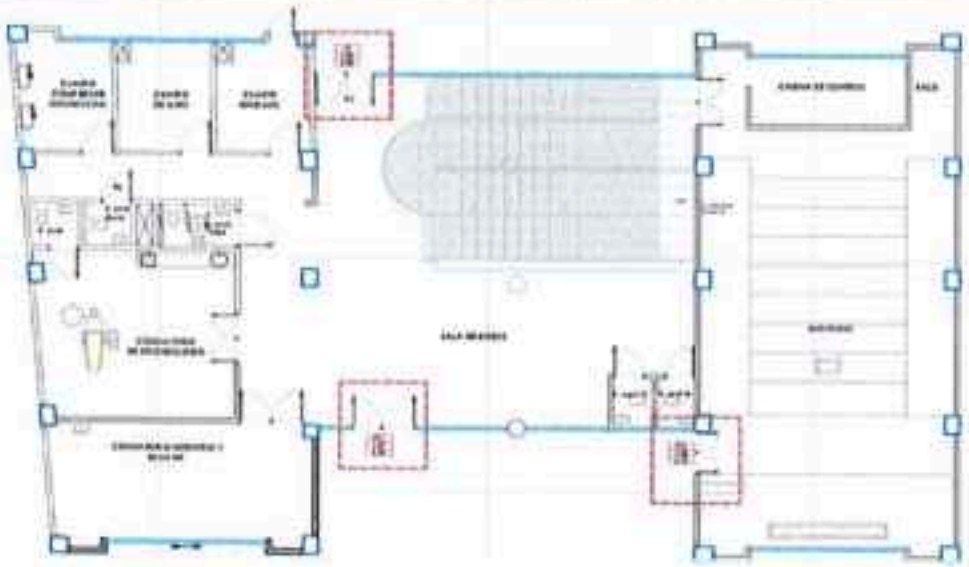



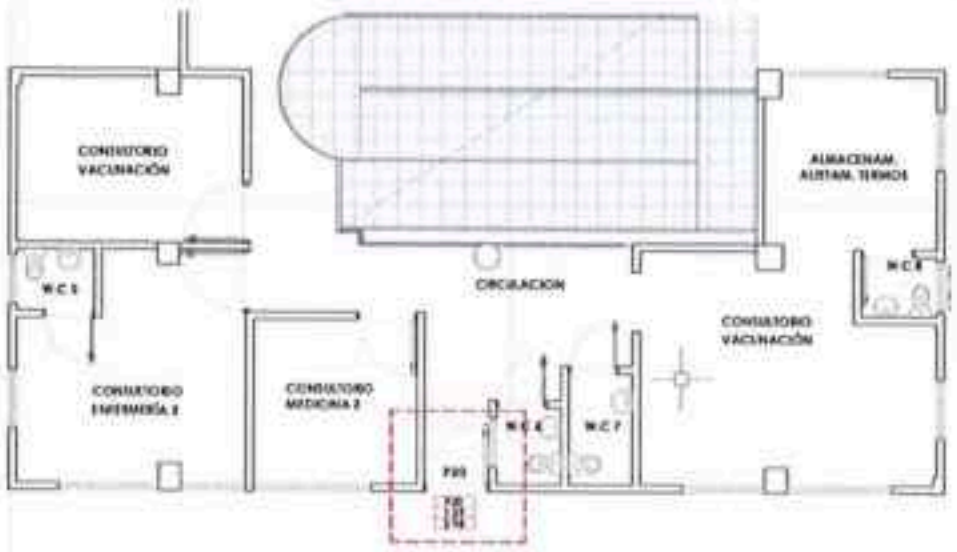



LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES					CANT. TOTAL
		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	ÁREA (M2)	CANT.	
Primer piso	Puerta P1		1,92			1,00	1,92
	Puerta P11		1,97			1,00	1,97
	Puerta P15		1,26			1,00	1,26
Segundo Piso	Puerta P20		1,29			1,00	1,29

CANTIDAD PROYECTADA	6,46
CANTIDAD CONTRACTUAL	6,47
DIFERENCIA	-0,01

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:	ROSSY ELENA NIÑO GÓMEZ	APROBÓ	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
	RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL
	CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPICO INGENIERIA S.A.S

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E


DEPARTAMENTO DE CASANARE

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	UBICACIÓN	SAN JOSE DEL BUBUY
		FECHA	25/05/2026
		ACTA No	Recibo y liquidación

CAPÍTULO	NP	ITEM S O PREVISTOS	ÍTEM	NP35	Marco metalico panel 60 x 60	UND	Und	CANT.	62,00

DISTRIBUCIÓN LUMINARIAS PISO 1

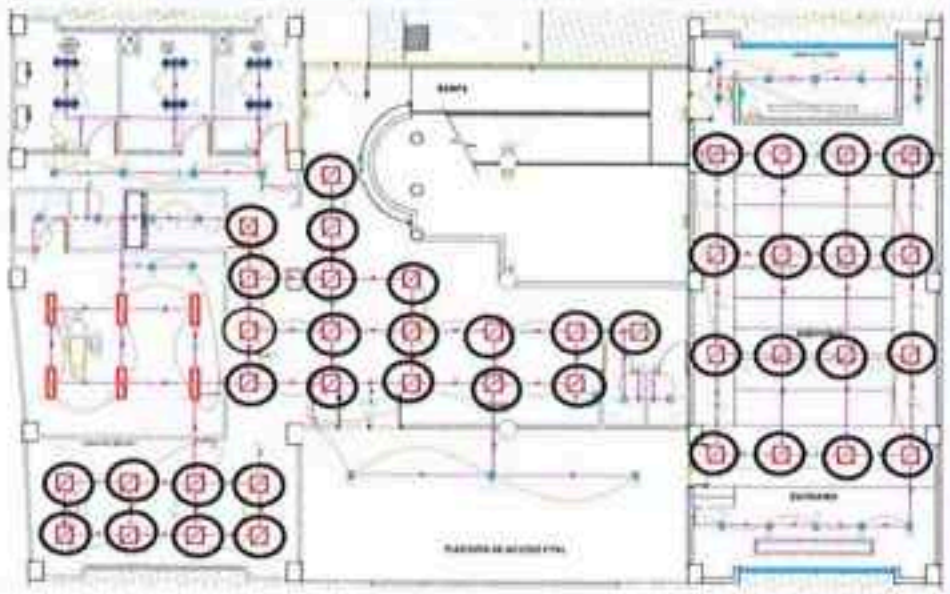



DISTRIBUCIÓN LUMINARIAS PISO 2







ILUSTRACIÓN / FOTOGRAFÍA	LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES					CANT. TOTAL
			LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	ÁREA (M2)	CANT.	
	Primer Piso	Auditorio					16,00	16,00
		Pasillo					17,00	17,00
		Medicina					8,00	8,00
		Escaleras					8,00	8,00
	Segundo Piso	Consultorio medicina					4,00	4,00
		Consultorio enfermeria					5,00	5,00
		Oficina/archivo					4,00	4,00

CANTIDAD PROYECTADA	62,00
CANTIDAD CONTRACTUAL	62,00
DIFERENCIA	0,00

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:	ROSSY ELENA NIÑO GÓMEZ	APROBÓ	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA
RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL	
CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY		EPICO INGENIERIA S.A.S	

ANEXO 3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

EPICO INGENIERIA S.A.S.
ESTUDIOS PROFESIONALES, INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES
NIT. 900.185.134-5

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA – RECIBO CTO OBRA 751/2025 – PAPS VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY

Contrato de Consultoria No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA **VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA** DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
Contrato de Obra No. 751 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD **SAN JOSE DEL BUBUY**, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografía No. 01 – Fachada principal



Fotografía No. 02 – Fachada posterior



Fotografía No. 03 – Fachada lateral derecha



Fotografía No. 04 – Fachada lateral derecha



Fotografía No. 05 – Balcón - Terraza



Fotografía No. 06 – Balcón - Terraza

EPICO INGENIERIA S.A.S.
ESTUDIOS PROFESIONALES, INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES
NIT. 900.105.134-5

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA – RECIBO CTO OBRA 751/2025 – PAPS VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA **VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA** DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Contrato de Obra No. 751 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD **SAN JOSE DEL BUBUY**, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografia No. 07 – Sala de espera



Fotografia No. 08 – Puerta de acceso posterior



Fotografía No. 09 – Rampa segundo nivel



Fotografía No. 10 – Rampa primer nivel



Fotografia No. 11 – Cielo raso primer piso




Fotografia No. 12 – Sala de espera

EPICO INGENIERIA S.A.S.
ESTUDIOS PROFESIONALES, INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES
NIT: 900.185.134-5

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA – RECIBO CTO OBRA 751/2025 – PAPS VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY

Contrato de Consultoria No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA **VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA** DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
Contrato de Obra No. 751 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD **SAN JOSE DEL BUBUY**, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

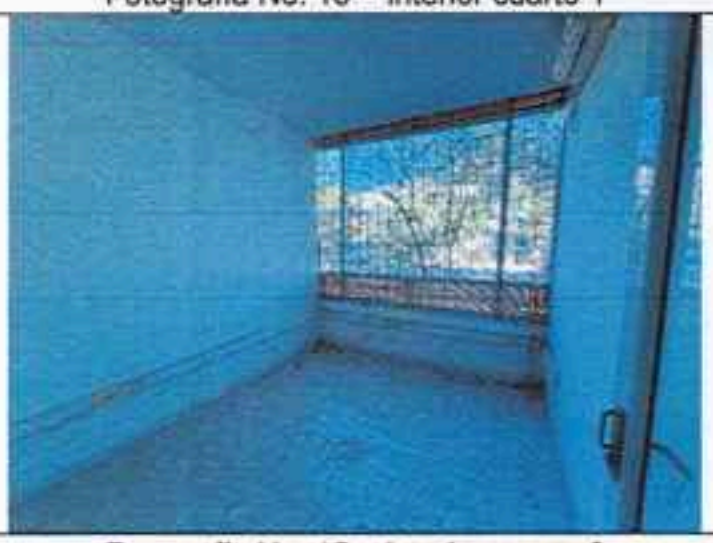	
Fotografía No. 13 – Interior cuarto 1	Fotografía No. 14 – Circulación
	
Fotografía No. 15 – Interior cuarto 2	Fotografía No. 16 – Interior cuarto 3
	
Fotografía No. 17 – Baño 1	Fotografía No. 18 – Baño 2

EPICO INGENIERIA S.A.S.
ESTUDIOS PROFESIONALES, INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES
NIT. 900.105.134-5

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA – RECIBO CTO OBRA 751/2025 – PAPS VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA **VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA** DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
Contrato de Obra No. 751 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD **SAN JOSE DEL BUBUY**, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografía No. 19 – Interior consultorio enfermería



Fotografía No. 20 – Interior consultorio enfermería



Fotografía No. 21 – Consultorio medicina 1



Fotografía No. 22 – Consultorio medicina 2



Fotografía No. 23 – Baño 3



Fotografía No. 24 – Acceso exterior baño 3

EPICO INGENIERIA S.A.S.
ESTUDIOS PROFESIONALES, INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES
NIT. 900.105.134-5

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA – RECIBO CTO OBRA 751/2025 – PAPS VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY

Contrato de Consultoria No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA **VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA** DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
Contrato de Obra No. 751 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD **SAN JOSE DEL BUBUY**, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE




Fotografía No. 25 – Circulación sala de espera



Fotografía No. 26 – Cuarto 3



Fotografía No. 27 – Cuarto 4

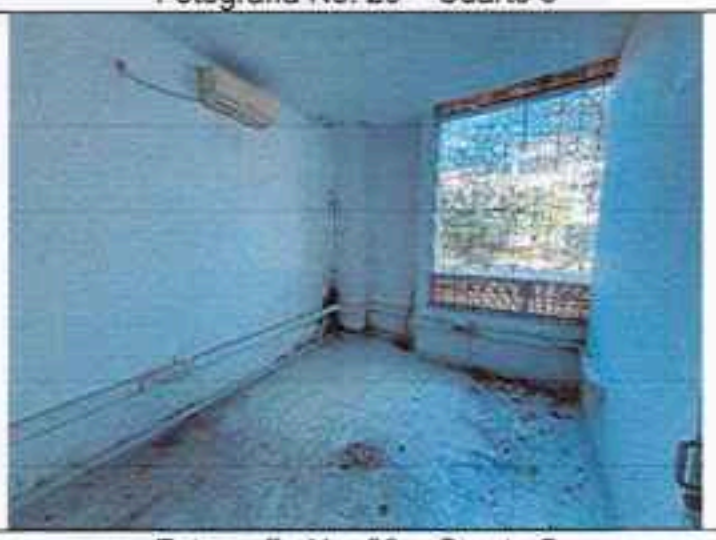

Fotografía No. 28 – Cuarto 5



Fotografía No. 29 – Auditorio



Fotografía No. 30 – Auditorio

EPICO INGENIERIA S.A.S.
ESTUDIOS PROFESIONALES, INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES
NIT. 900.105.134-5

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA – RECIBO CTO OBRA 751/2025 – PAPS VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY

Contrato de Consultoria No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA **VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA** DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
Contrato de Obra No. 751 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD **SAN JOSE DEL BUBUY**, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE




Fotografia No. 31 – Circulación segundo nivel



Fotografia No. 32 – Consultorio segundo nivel



Fotografia No. 33 – Consultorio segundo nivel

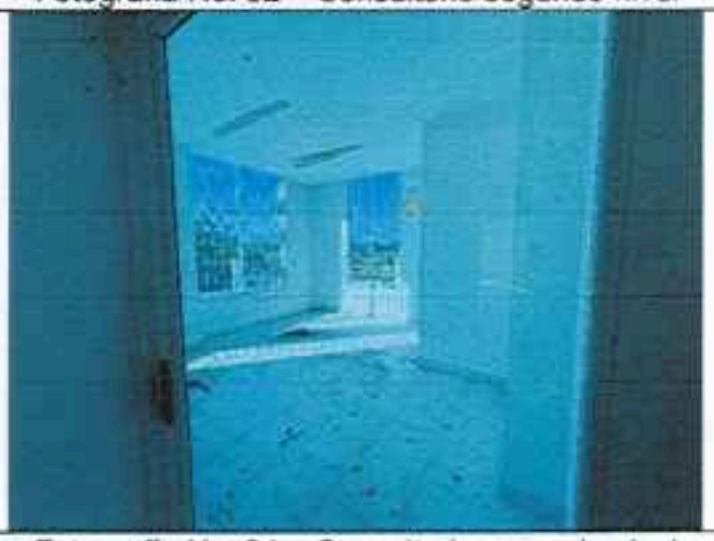

Fotografia No. 34 – Consultorio segundo nivel



Fotografía No. 35 – Baño segundo nivel



Fotografia No. 36 – Baño segundo nivel

EPICO INGENIERIA S.A.S.
ESTUDIOS PROFESIONALES, INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES
NIT. 900.105.134-5

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA – RECIBO CTO OBRA 751/2025 – PAPS VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA **VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA** DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
Contrato de Obra No. 751 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD **SAN JOSE DEL BUBUY**, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografia No. 37 – Valla informativa de obra



Fotografia No. 38 – Lavado de áreas



Fotografia No. 39 – Lavado de fachadas



Fotografia No. 40 – Desmonte de cielo raso auditorio



Fotografia No. 41 – Desmonte cielo raso segundo piso



Fotografia No. 42 – Desmonte de cielo raso primer piso

EPICO INGENIERIA S.A.S.
ESTUDIOS PROFESIONALES, INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES
NIT. 900.105.134-5

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA – RECIBO CTO OBRA 751/2025 – PAPS VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA **VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA** DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
Contrato de Obra No. 751 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD **SAN JOSE DEL BUBUY**, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografía No. 43 – Desmonte de cielo raso segundo piso consultorio



Fotografía No. 44 – Visita a obra Interventoría y supervisión de obra Hospital



Fotografía No. 45 – Desmonte de aparatos sanitarios



Fotografía No. 46 – Demolición parcial baldosa – media caña



Fotografía No. 47 – Desmonte baldosa auditorio



Fotografía No. 48 – Retiro de material estuco

EPICO INGENIERIA S.A.S.
ESTUDIOS PROFESIONALES, INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES
NIT. 900.105.134-5

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA – RECIBO CTO OBRA 751/2025 – PAPS VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA **VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA** DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
Contrato de Obra No. 751 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD **SAN JOSE DEL BUBUY**, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografía No. 49 – Demolición parcial de baldosa para media caña



Fotografía No. 50 - Demolición parcial de baldosa para media caña



Fotografía No. 51 – Desmonte de puertas de acceso a consultorios



Fotografía No. 52 – Retiro de material estuco en rampa de acceso a segundo piso



Fotografía No. 53 – Retiro de material estuco en consultorio segundo piso



Fotografía No. 54 – Aplicación de estuco para interior

EPICO INGENIERIA S.A.S.
ESTUDIOS PROFESIONALES, INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES
NIT: 900.185.134-5

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA – RECIBO CTO OBRA 751/2025 – PAPS VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY

Contrato de Consultoria No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA **VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA** DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
Contrato de Obra No. 751 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD **SAN JOSE DEL BUBUY**, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografia No. 55 – Retiro de canaletas



Fotografia No. 56 – cortado de bloque para puerta de 1.10m (baño movilidad reducida)



Fotografia No. 57 – Fachada principal



Fotografia No. 58 – Fachada trasera derecha



Fotografia No. 59 – Fachada trasera izquierda



Fotografia No. 60 – balcón

EPICO INGENIERIA S.A.S.
ESTUDIOS PROFESIONALES, INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES
NIT: 900.105.134-5

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA – RECIBO CTO OBRA 751/2025 – PAPS VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY

Contrato de Consultoria No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA **VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA** DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
Contrato de Obra No. 751 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD **SAN JOSE DEL BUBUY**, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografia No. 61 – Balcón – Terraza parte trasera



Fotografia No. 62 – Balcón – Terraza- derecha



Fotografia No. 63 – Sala de espera



Fotografia No. 64 – Parte abajo escalera



Fotografia No. 65 – baños segundo piso



Fotografia No. 66 – consultorio 1 segundo piso

EPICO INGENIERIA S.A.S.
ESTUDIOS PROFESIONALES, INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES
NIT. 900.165.134-5

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA – RECIBO CTO OBRA 751/2025 – PAPS VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA **VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA** DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
Contrato de Obra No. 751 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD **SAN JOSE DEL BUBUY**, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografía No. 67 – Consultorio 2 segundo piso



Fotografía No. 68 – cuarto 1 piso



Fotografía No. 69 – consultorio odontología



Fotografía No. 70 – cuarto primer piso



Fotografía No. 71 – Auditorio



Fotografía No. 72 – Balcón – Terraza- derecha

EPICO INGENIERIA S.A.S.
ESTUDIOS PROFESIONALES, INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES
NIT: 900.185.134-5

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA – RECIBO CTO OBRA 751/2025 – PAPS VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA **VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA** DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
Contrato de Obra No. 751 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD **SAN JOSE DEL BUBUY**, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografía No. 73 – Vista Fachada principal



Fotografía No. 74 – vista Fachada principal derecha



Fotografía No. 75 – Fachada Trasera Frente



Fotografía No. 76 – Fachada Trasera Derecha



Fotografía No. 77 –Fachada Trasera izquierda



Fotografía No. 78 – Balcón – Terraza- derecha

EPICO INGENIERIA S.A.S.
ESTUDIOS PROFESIONALES, INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES
NIT: 900.165.134-5

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA – RECIBO CTO OBRA 751/2025 – PAPS VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA **VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA** DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Contrato de Obra No. 751 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD **SAN JOSE DEL BUBUY**, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografía No. 79 – balcón – terraza trasera



Fotografía No. 80 – Cuarto Lavado Instrumental 1



Fotografía No. 81 – Cuarto Lavado Instrumental 2



Fotografía No. 82 – consultorio 1 primer piso



Fotografía No. 83 – Fachada principal



Fotografía No. 84 – Fachada trasera derecha

EPICO INGENIERIA S.A.S.
ESTUDIOS PROFESIONALES, INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES
NIT: 900.105.134-5

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA – RECIBO CTO OBRA 751/2025 – PAPS VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA **VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA** DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
Contrato de Obra No. 751 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD **SAN JOSE DEL BUBUY**, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografía No. 85 – Fachada trasera izquierda



Fotografía No. 86 – balcón, pasillo



Fotografía No. 87 – Balcón – Terraza parte trasera



Fotografía No. 88 – Balcón – Terraza- derecha



Fotografía No. 89 – Electricidad Y Guarda Escobas



Fotografía No. 90 – Electricidad

EPICO INGENIERIA S.A.S.
ESTUDIOS PROFESIONALES, INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES
NIT. 900.195.134-5

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA – RECIBO CTO OBRA 751/2025 – PAPS VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY

Contrato de Consultoria No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA **VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA** DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
Contrato de Obra No. 751 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD **SAN JOSE DEL BUBUY**, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

	
Fotografía No. 91 – Fachada principal	Fotografía No. 92 – Fachada trasera derecha
	
Fotografía No. 93 – Fachada trasera izquierda	Fotografía No. 94 – balcón, pasillo
	
Fotografía No. 95 – baño Consultorio 4 Segundo Piso	Fotografía No. 96 – Consultorio 4 Segundo Piso

EPICO INGENIERIA S.A.S.
ESTUDIOS PROFESIONALES, INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES
NIT. 900.105.134-5

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA – RECIBO CTO OBRA 751/2025 – PAPS VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY

Contrato de Consultoria No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA **VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA** DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
Contrato de Obra No. 751 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD **SAN JOSE DEL BUBUY**, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografía No. 97 – Auditorio 1



Fotografía No. 98 – Auditorio 2



Fotografía No. 99 – – Cuarto Control Auditorio



Fotografía No. 100 – Baño 1 Primer Piso



Fotografía No. 101 – Baño – Consultorio 2 Segundo Piso



Fotografía No. 102 – Pasillo Primer Piso

EPICO INGENIERIA S.A.S.
ESTUDIOS PROFESIONALES, INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES
NIT. 900.105.134-5

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA – RECIBO CTO OBRA 751/2025 – PAPS VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA **VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA** DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Contrato de Obra No. 751 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD **SAN JOSE DEL BUBUY**, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografia No. 103 – Vista Delantera



Fotografia No. 104 – Vista Posterior



Fotografia No. 105 – Fachada trasera izquierda



Fotografia No. 106 – Balcón, Pasillo



Fotografia No. 107 – Vista trasera Pasillo, Balcón



Fotografia No. 108 – Vista Latera Derecha Balcón, Pasillo

EPICO INGENIERIA S.A.S.
ESTUDIOS PROFESIONALES, INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES
NIT: 900.105.134-5

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA – RECIBO CTO OBRA 751/2025 – PAPS VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY

Contrato de Consultoria No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA **VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA** DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Contrato de Obra No. 751 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD **SAN JOSE DEL BUBUY**, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografía No. 109 – Auditorio 1



Fotografía No. 110 – Auditorio 2



Fotografía No. 111 – Consultorio Odontologia



Fotografía No. 112 – Cuarto Esterilización



Fotografía No. 113 – Consultorio Enfermería Segundo Piso



Fotografía No. 114 – Consultorio Médico Primer Piso

EPICO INGENIERIA S.A.S.
ESTUDIOS PROFESIONALES, INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES
NIT: 900.105.134-5

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA – RECIBO CTO OBRA 751/2025 – PAPS VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY

Contrato de Consultoria No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA **VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA** DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
Contrato de Obra No. 751 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD **SAN JOSE DEL BUBUY**, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

	
Fotografia No. 115 – Vista Delantera	Fotografia No. 116 – Vista Posterior
	
Fotografia No. 117 – Balcón, Pasillo, Lado Derecho	Fotografia No. 118 – Balcón, Pasillo, lado izquierdo
	
Fotografia No. 119 – Vista trasera Pasillo, Balcón	Fotografia No. 120 – Auditorio 1

EPICO INGENIERIA S.A.S.
ESTUDIOS PROFESIONALES, INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES
NIT. 900.105.134-5

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA – RECIBO CTO OBRA 751/2025 – PAPS VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA **VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA** DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Contrato de Obra No. 751 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD **SAN JOSE DEL BUBUY**, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografía No. 121 – Auditorio 2



Fotografía No. 122 – Esterilización



Fotografía No. 123 – Baño 1



Fotografía No. 124 – Consultorio Enfermería



Fotografía No. 125 – Consultorio Odontología Piso 1



Fotografía No. 126 – Baños 2 – Piso 2

EPICO INGENIERIA S.A.S.
ESTUDIOS PROFESIONALES, INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES
NIT. 900.105.134-5

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA – RECIBO CTO OBRA 751/2025 – PAPS VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA **VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA** DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
Contrato de Obra No. 751 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD **SAN JOSE DEL BUBUY**, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografía No. 127 – Vista Delantera



Fotografía No. 128 – Vista Posterior



Fotografía No. 129 – Auditorio



Fotografía No. 130 – Consultorio Enfermeria –Piso 2



Fotografía No. 131 – Baño Consultorio 3 –Piso 2




Fotografía No. 132 – Consultorio 3 –piso 2

EPICO INGENIERIA S.A.S.
ESTUDIOS PROFESIONALES, INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES
NIT: 900.105.134-5

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA – RECIBO CTO OBRA 751/2025 – PAPS VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA **VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA** DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
Contrato de Obra No. 751 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD **SAN JOSE DEL BUBUY**, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

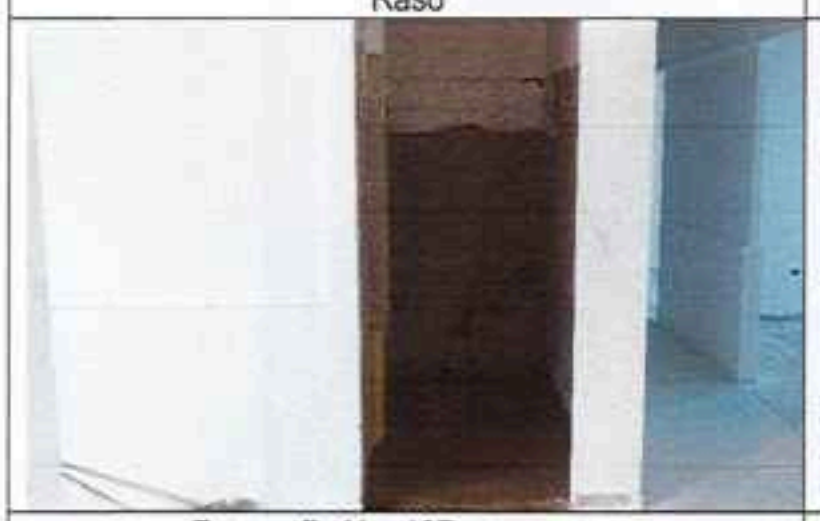	
Fotografía No. 133 –Cónsul Enfermería –Baño-Piso2	Fotografia No. 134 – Instalación Tubería Cónsul. Odontológico
	
Fotografia No. 135 – Instalación Estructura Cielo Raso	Fotografia No. 136 – Instalación Estructura Cielo Raso 2
	
Fotografia No. 137 – Baño PMR	Fotografia No. 138 – Escaleras- Estructura Cielo Raso

EPICO INGENIERIA S.A.S.
ESTUDIOS PROFESIONALES, INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES
NIT. 900.105.134-5

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA – RECIBO CTO OBRA 751/2025 – PAPS VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY

Contrato de Consultoria No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA **VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA** DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Contrato de Obra No. 751 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD **SAN JOSE DEL BUBUY**, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografía No. 139 – Vista Delantera



Fotografía No. 140 – Vista Posterior



Fotografía No. 141 – Auditorio 1



Fotografía No. 142 – Auditorio 2



Fotografía No. 143 – Baño Consultorio 3 –Piso 2



Fotografía No. 144 – Baños -Piso 2

EPICO INGENIERIA S.A.S.
ESTUDIOS PROFESIONALES, INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES
NIT. 900.185.134-5

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA – RECIBO CTO OBRA 751/2025 – PAPS VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY

Contrato de Consultoria No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA **VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA** DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
Contrato de Obra No. 751 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD **SAN JOSE DEL BUBUY**, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografia No. 145 –Cónsul Enfermeria –Piso2



Fotografia No. 146 – Consultorio 1 – piso 2



Fotografia No. 147 – Consultorio Odontologia



Fotografia No. 148 –Sala De Espera



Fotografia No. 149 – Consultorio 1 Piso 1



Fotografia No. 150 – Baño PRM

EPICO INGENIERIA S.A.S.
ESTUDIOS PROFESIONALES, INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES
Nit. 900.105.134-5

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA – RECIBO CTO OBRA 751/2025 – PAPS VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA **VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA** DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
Contrato de Obra No. 751 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD **SAN JOSE DEL BUBUY**, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografia No. 151 – Vista Delantera



Fotografia No. 152 – Vista Posterior



Fotografia No. 153 – Pasillo – terraza 1



Fotografia No. 154 – Pasillo – terraza 2



Fotografia No. 155 – Consultorio Odontologia



Fotografia No. 156 – Sala Espera - Piso 1

EPICO INGENIERIA S.A.S.
ESTUDIOS PROFESIONALES, INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES
NIT. 900.105.134-5

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA – RECIBO CTO OBRA 751/2025 – PAPS VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA **VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA** DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
Contrato de Obra No. 751 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD **SAN JOSE DEL BUBUY**, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografía No. 157 – Baño PRM



Fotografía No. 158 – Cuarto Esterilización



Fotografía No. 159 – auditorio



Fotografía No. 160 – Consultorio 1 piso 2



Fotografía No. 161 – Consultorio enfermería piso 2



Fotografía No. 162 – Baño –Consultorio 3

EPICO INGENIERIA S.A.S.
ESTUDIOS PROFESIONALES, INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES
NIT. 900.185.134-5

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA – RECIBO CTO OBRA 751/2025 – PAPS VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY

Contrato de Consultoria No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA **VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA** DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
Contrato de Obra No. 751 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD **SAN JOSE DEL BUBUY**, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografia No. 163 – Vista Delantera



Fotografia No. 164 – Vista Posterior



Fotografia No. 165 – Pasillo – terraza 1



Fotografia No. 166 – Entrada



Fotografia No. 167 – Pasillo – terraza 3



Fotografia No. 168 – Vista Ventana Posterior

EPICO INGENIERIA S.A.S.
ESTUDIOS PROFESIONALES, INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES
NIT. 900.105.134-5

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA – RECIBO CTO OBRA 751/2025 – PAPS VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY

Contrato de Consultoria No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA **VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA** DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Contrato de Obra No. 751 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD **SAN JOSE DEL BUBUY**, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografia No. 169 – Instalación De Cielo Raso



Fotografia No. 170 – Ventanales Internos



Fotografia No. 171 – Estructura Cielo Raso- Pasillo- Piso 2



Fotografia No. 172 –Consultorio Enfermeria piso 2



Fotografia No. 173 – Consultorio 2 piso 2



Fotografia No. 174 – Estructura Cielo Raso- Tubería Eléctrica – piso 2

EPICO INGENIERIA S.A.S.
ESTUDIOS PROFESIONALES, INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES
NIT: 900.105.134-5

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA – RECIBO CTO OBRA 751/2025 – PAPS VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA **VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA** DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
Contrato de Obra No. 751 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD **SAN JOSE DEL BUBUY**, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

	
Fotografia No. 175 – Vista Delantera	Fotografia No. 176 – Vista Posterior
	
Fotografia No. 177 – Vista Lateral Der.	Fotografia No. 178 – Vista Lateral Izq.
	
Fotografia No. 179 – Vista Posterior Derecha	Fotografia No. 180 – Cuarto control auditorio

EPICO INGENIERIA S.A.S.
ESTUDIOS PROFESIONALES, INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES
NIT: 900.105.134-5

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA – RECIBO CTO OBRA 751/2025 – PAPS VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA **VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA** DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
Contrato de Obra No. 751 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD **SAN JOSE DEL BUBUY**, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

	
Fotografía No. 181 – Escalera Segundo Piso	Fotografía No. 182 – Cielo Raso Pasillo Piso 2
	
Fotografía No. 183 – Consultorio 2 piso 2	Fotografía No. 184 –Consultorio Enfermeria piso 2
	
Fotografía No. 185 – Consultorio 3 piso 2	Fotografía No. 186 – Consultorio 1 piso 2

EPICO INGENIERIA S.A.S.
ESTUDIOS PROFESIONALES, INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES
NIT. 900.105.134-5

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA – RECIBO CTO OBRA 751/2025 – PAPS VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA **VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA** DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
Contrato de Obra No. 751 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD **SAN JOSE DEL BUBUY**, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografía No. 187 – Vista Delantera



Fotografía No. 188 – Vista Posterior



Fotografía No. 189 – Pasillo- Balcón Lado Derecho



Fotografía No. 190 – Balcón Lado Izquierda



Fotografía No. 191 – Barandas Escaleras



Fotografía No. 192 – Consultorio 2 - Piso 2

EPICO INGENIERIA S.A.S.
ESTUDIOS PROFESIONALES, INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES
NIT: 900.105.134-3

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA – RECIBO CTO OBRA 751/2025 – PAPS VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY

Contrato de Consultoria No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA **VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA** DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
Contrato de Obra No. 751 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD **SAN JOSE DEL BUBUY**, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE




Fotografia No. 193 –Instalación De Puerta Baño PRM



Fotografia No. 194 – Cuarto Start - Piso 1



Fotografia No. 195 – Auditorio

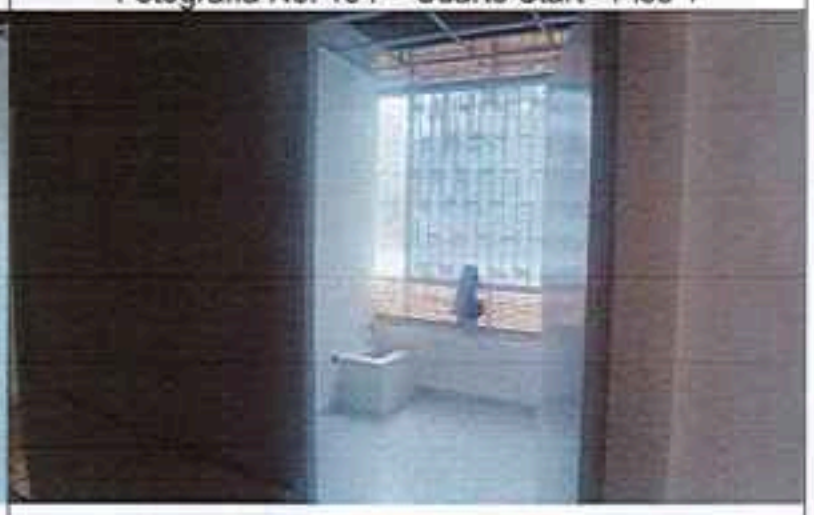

Fotografia No. 196 –Cuarto de aseo



Fotografia No. 197 – Consultorio Enfermería – Piso 2



Fotografia No. 198 – Consultorio 1 piso 2

EPICO INGENIERIA S.A.S.
ESTUDIOS PROFESIONALES, INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES
NIT. 900.105.134-5

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA – RECIBO CTO OBRA 751/2025 – PAPS VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA **VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA** DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Contrato de Obra No. 751 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD **SAN JOSE DEL BUBUY**, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografía No. 199 – Vista Delantera



Fotografía No. 200 – Vista Posterior



Fotografía No. 201 – Barandas De Pasillo- Vista Posterior 1



Fotografía No. 202 – Barandas De Pasillo- Vista Posterior 2



Fotografía No. 203 – Barandas Escaleras



Fotografía No. 204 – Ventanas –Vista Posterior

EPICO INGENIERIA S.A.S.
ESTUDIOS PROFESIONALES, INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES
NIT. 900.105.134-5

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA – RECIBO CTO OBRA 751/2025 – PAPS VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY

Contrato de Consultoria No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA **VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA** DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
Contrato de Obra No. 751 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD **SAN JOSE DEL BUBUY**, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

	
Fotografia No. 205 –Puertas – Consultorio Odontologia	Fotografia No. 206 – Instalación Puerta Consultorio 1 Piso 2
	
Fotografia No. 207 –Consultorio Enfermeria- Piso 2	Fotografia No.208 Consultorio 2 – Piso 2
	
Fotografia No. 209 – regate eléctrico Consultorio 3 – Piso 2	Fotografia No. 210 – Cuarto Interno- Consultorio 3

EPICO INGENIERIA S.A.S.
ESTUDIOS PROFESIONALES, INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES
NIT. 900.105.134-5

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA – RECIBO CTO OBRA 751/2025 – PAPS VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY

Contrato de Consultoría No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA **VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA** DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
Contrato de Obra No. 751 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD **SAN JOSE DEL BUBUY**, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografía No. 211 – Fachada Principal



Fotografía No. 212 - Fachada Principal



Fotografía No. 213– Fachada Principal



Fotografía No. 214– Fachada Posterior



Fotografía No. 215 - Señalización



Fotografía No. 216 – Misión Médica

EPICO INGENIERIA S.A.S.
ESTUDIOS PROFESIONALES, INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES
NIT: 900.165.134-5

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA – RECIBO CTO OBRA 751/2025 – PAPS VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY

Contrato de Consultoria No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA **VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA** DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
Contrato de Obra No. 751 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD **SAN JOSE DEL BUBUY**, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografia No. 217 – Zona rampa y barandas



Fotografia No. 218 – Sala espera 1er piso



Fotografia No. 219 – Fachada Posterior



Fotografia No. 220 - Consultorio



Fotografia No. 221 – Terraza y cubierta 1er piso



Fotografia No. 222 – Rampa de acceso 2do piso

EPICO INGENIERIA S.A.S.
ESTUDIOS PROFESIONALES, INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES
NIT. 900.105.134-5

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA – RECIBO CTO OBRA 751/2025 – PAPS VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY

Contrato de Consultoria No. 758 de 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA **VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, SAN MIGUEL DE FARALLONES Y LA TURUA** DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE


Contrato de Obra No. 751 de 2025 - ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD **SAN JOSE DEL BUBUY**, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE



Fotografia No. 223 - Terraza



Fotografia No. 224 - Terraza

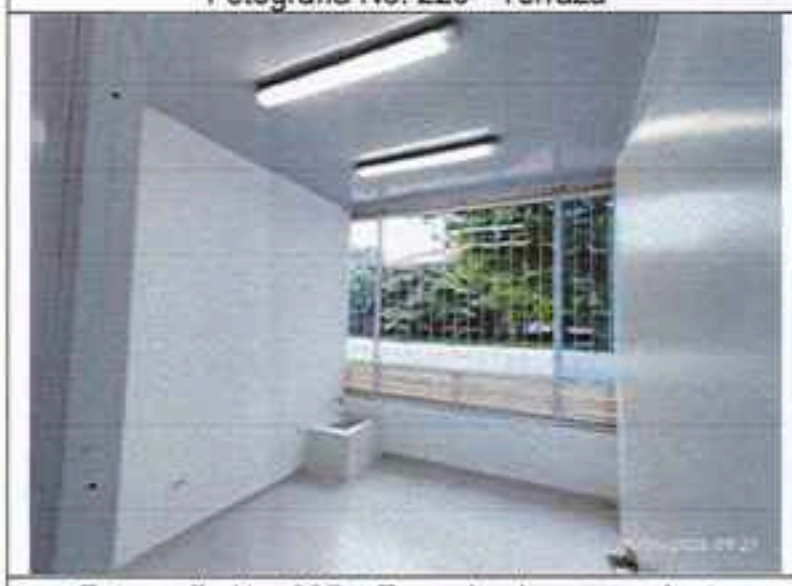

Fotografia No. 225 – Zona de almacenamiento



Fotografia No. 226 – Unidades Sanitarias



Fotografia No. 227 – Sala Espera 1er Piso



Fotografia No. 228 – Impermeabilización cubierta

ANEXO 4. CERTIFICACIÓN RETIE



EVALCON Evaluadores de la conformidad

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17020:2012
15-OIN-017

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
DICTAMEN DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE

Ciudad y fecha (dd-mm-aaaa)	Bogota D.C., 16-6-2026	Dictamen de inspección No.	E49960
Fecha de inicio etapa constructiva (dd-mm-aaaa)	22-12-2025		
Versión RETIE (No. Resolución)	RESOLUCIÓN 90708 DE AGOSTO 30 DE 2013		

A. IDENTIFICACION DEL ORGANISMO DE INSPECCION

Organismo de inspección	EVALUADORES DE LA CONFORMIDAD S.A.S.	Número de acreditación	15-OIN-017
NIT	900.340.249-1	Teléfono	(57-1) 4688954
Dirección	Carrera 27 No. 84 - 40 Polo Club	Ciudad	Bogotá D.C.

B. IDENTIFICACION DE LA INSTALACION

Propietario de la instalación	MUNICIPIO DE AGUAZUL				
NIT No. de documento de identificación	891855200-9				
Localización de la instalación	Departamento	CASANARE	Dirección	Puesto de Atención Primario en Salud San Jose del Bubuy	
	Municipio	AGUAZUL	Barrio	VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY	

C. IDENTIFICACION DE LA INSTALACION DE DISTRIBUCION OBJETO DEL DICTAMEN

Tipo de construcción	Nueva		X	Ampliada			Remodelada										
Localización	AEREA						Tensión [kV]		0,208 / 0,120		Capacidad [kVA]	42,294					
Zona	Urbana		Rural	X	ZNI		Servicio	Comercial	X	Industrial			Residencial				
Uso	General			Exclusivo		X	Alumbrado público						Uso final	X			
Tipo de configuración	Monofásica		Trifásica		X	Longitud [km]	0,018	Tipo y calibre de conductores				CABLE CONCENTRICO 3X1/0 F+1X1/0 AWG Cu					
Material estructuras	NO APLICA						N° de estructuras de apoyo	8									

D. IDENTIFICACION DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES

Diseñador	DIEGO MAURICIO CASTAÑEDA ARIZA	Profesión	INGENIERO ELECTRICISTA	Matrícula Prof.	CN205-116344
Constructor	DIVAGNER LOZANO AMEZQUITA	Profesión	TECNICO ELECTRICISTA	Matrícula Prof.	74753260-83523
Operador y Mantenedor (No aplica para	NO APLICA	Profesión	NO APLICA	Matrícula Prof.	NO APLICA
Interventor (Si aplica)	NO APLICA	Profesión	NO APLICA	Matrícula Prof.	NO APLICA

E. EVALUACION DE LA INSTALACION ELECTRICA

ITEM	REQUISITO ESENCIAL	ASPECTO A EVALUAR	APLICA SI	APLICA NO	PARAMETRO MEDIDO	PARAMETRO REFERENCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO
1	Diseño	Planos, diagramas y esquemas	X				X	
2		Análisis de riesgos de origen eléctrico	X				X	
3		Especificaciones técnicas	X				X	
4		Memorias de cálculo	X				X	
5	Campos	Campo eléctrico		X				
6		Densidad de flujo magnético		X				
7	Distancias	Distancias de seguridad	X				X	
8	Protecciones	Accesibilidad a todos los dispositivos de control y protección	X				X	
9		Funcionamiento del corte automático de alimentación	X				X	
10		Selección de conductores	X				X	
11		Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes	X				X	
12		Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones		X				
13	Protección contra rayos	Evaluación del nivel de riesgo	X				X	
14		Verificación de la protección		X				
15	Sistema de puesta a tierra	Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales	X		0,2 Ω		X	
16		Resistencia de puesta a tierra	X		4,08 Ω	25 Ω	X	
17		Verificación de tensiones de paso		X				
18		Verificación de tensiones de contacto y transferidas		X				
19		Corrientes en el sistema de puesta a tierra		X				
20	Señalización	Identificación de canalizaciones	X				X	
21		Identificación de circuitos y conductores	X				X	
22		Diagramas, esquemas, avisos y señales de seguridad	X				X	
23	Documentación	Memoria del proyecto	X				X	
24		Plano(s), Diagrama(s) y Esquema(s) de lo Construido	X				X	
25		Certificaciones de productos	X				X	
26		Declaración de cumplimiento del diseñador		X				
27		Declaración de cumplimiento del constructor	X				X	
28		Declaración de cumplimiento de operación y mantenimiento		X				
29	Otros	Apoyos y estructuras	X				X	
30		Cámaras y canalizaciones		X				
31		Dispositivos de seccionamiento y mando		X				
32		Ejecución de las conexiones	X				X	
33		Herrajes		X				
34		Productos adecuados para las condiciones ambientales	X				X	
35		Protección contra corrosión	X				X	
36		Resistencia de aislamiento	X				X	
37		Sujeción mecánica de elementos de la instalación	X				X	
38		Ventilación de equipos	X				X	

F. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES

La inspección comprende:	DISTRIBUCION EN BAJA TENSIÓN DESDE PUNTO DE CONEXIÓN RED CONCENTRICO EN CABLE 3X1/0 F+1X1/0 N CON UNA LONGITUD DE 18 METROS HASTA TABLERO DE MEDIDA CON PROTECCION DE 3X100 AMP					
Observaciones:	INSPECCIÓN REALIZADA BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LA RESOLUCIÓN 90708 DE AGOSTO 30 DE 2013					
Dictamenes asociados:						
Fecha de inspección:	2/6/2026	Orden de Inspección:	7176	Fecha de finalización de la construcción:	30/5/2026	
Vigencia del dictamen:	5 Años	Fecha de Vencimiento:	16/06/2531	Tipo de instalación:	Nueva	

G. ANEXOS

Declaración de constructor No.	03
Declaracion de diseñador No.	NO APLICA
Declaración de operación y mantenimiento No.	NO APLICA

H. RESULTADO DE LA INSPECCION

RESULTADO	Aprobada	X	No aprobada		

Director Tecnico del organismo de Inspección		Inspector	
Nombre	JESUS ANTONIO CEBALLOS BONIL	Nombre	FERNANDO SÁNCHEZ BERNAL
No. de documento de identificación	14315048	No. de documento de identificación	93097548
Profesión	INGENIERO ELECTRICISTA	Profesión	INGENIERO ELECTRICISTA
Certificado de Competencias	1690	Certificado de Competencias	1877
Matrícula Profesional	CN205-00869	Matrícula Profesional	CL205-52078
Firma y sello		Firma	

DICTAMEN DE INSPECCIÓN DISTRIBUCIÓN

Consulta nuestra acreditación ONAC

Nota: La validez y vigencia del presente dictamen se puede corroborar llamando a los números que aparecen en el presente documento o a través del código QR del encabezado

(57-1) 4688954 3152660390 3156781057 3017058989 Cra. 27 # 84-40 Polo Club - Bogotá info@evalcon.com.co www.evalcon.com.co



ISO/IEC 17020:2012
15-OIN-017

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
DICTAMEN DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE

Ciudad y fecha (dd-mm-aaaa)	Bogotá D.C., 19-6-2026	Dictamen de inspección No.	E49959
Fecha de inicio etapa constructiva (dd-mm-aaaa)	22-12-2025		
Versión RETIE (No. Resolución)	RESOLUCIÓN 90708 DE AGOSTO 30 DE 2013		

A. IDENTIFICACION DEL ORGANISMO DE INSPECCION

Organismo de inspección	EVALUADORES DE LA CONFORMIDAD S.A.S.	Numero de acreditación	15-OIN-017
NIT	900.340.249-1	Teléfono	(57-1) 4688954
Dirección	Carrera 27 No. 84 - 40 Polo Club	Ciudad	Bogotá D.C.

B. IDENTIFICACION DE LA INSTALACION

Propietario de la instalación	MUNICIPIO DE AGUAZUL				
NIT No. de documento de identificación	891855200-9				
Localización de la instalación	Departamento	CASANARE	Dirección	Puesto de Atención Primario en Salud San Jose del Bubuy	
	Municipio	AGUAZUL	Barrio	VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY	

C. IDENTIFICACION DE LA INSTALACION DE USO FINAL OBJETO DEL DICTAMEN

Tipo de construcción	Nueva					Ampliada					Remodelada		X		
Zona	Urbana		Rural	X	ZNI		Servicio	Comercial	X	Industrial		Residencial			
Uso final	Basicas		Provisionales		Especiales	X	Equipos especiales			Túneles y cavernas		Minas			
Tipo de instalación	Subtipo de instalación(es)*		ASISTENCIA MEDICA												
Capacidad (kVA o KW)	42,294	Tensión (kV)		0,208 / 0,120		Fases	1		2		③				

D. IDENTIFICACION DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES

Diseñador	DIEGO MAURICIO CASTAÑEDA ARIZA	Profesión	INGENIERO ELECTRICISTA	Matrícula Prof.	CN205-116994
Constructor	DIVAGNER LOZANO AMEZQUITA	Profesión	TECNICO ELECTRICISTA	Matrícula Prof.	74753265-83525
Operador y Mantenedor (No aplica para	NO APLICA	Profesión	NO APLICA	Matrícula Prof.	NO APLICA
Interventor (Si aplica)	NO APLICA	Profesión	NO APLICA	Matrícula Prof.	NO APLICA

E. EVALUACION DE LA INSTALACION ELECTRICA

ITEM	REQUISITO ESENCIAL	ASPECTO A EVALUAR	APLICA SI	APLICA NO	PARAMETRO MEDIDO	PARAMETRO REFERENCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO
1	Diseño	Planos, diagramas y esquemas	X				X	
2		Análisis de riesgos de origen eléctrico	X				X	
3		Especificaciones técnicas	X				X	
4		Memoria de calculo	X				X	
5	Campos	Campo eléctrico		X				
6		Densidad de flujo magnético		X				
7	Distancias	Distancias de seguridad	X		0,75*0,9*1,8 m	0,75*0,9*1,8 m	X	
8	Protecciones	Accesibilidad a todos los dispositivos de control y protección	X				X	
9		Funcionamiento del corte automático de alimentación	X				X	
10		Selección de conductores	X				X	
11		Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes	X				X	
12		Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones	X				X	
13	Protección contra rayos	Evaluación del nivel de riesgo	X				X	
14		Verificación de la protección		X				
15	Sistema de puesta a tierra	Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales	X		0,45 Ω		X	
16		Resistencia de puesta a tierra	X		4,09 Ω	25 Ω	X	
17		Verificación de tensiones de paso		X				
18		Verificación de tensiones de contacto y transferidas		X				
19		Corrientes en el sistema de puesta a tierra		X				
20	Señalización	Identificación de canalizaciones	X				X	
21		Identificación de circuitos y conductores	X				X	
22		Diagramas, esquemas, avisos y señales de seguridad	X				X	
23	Documentación	Memoria del proyecto	X				X	
24		Plano(s), Diagrama(s) y Esquema(s) de lo Construido	X				X	
25		Certificaciones de productos	X				X	
26		Declaración de cumplimiento del diseñador		X				
27		Declaración de cumplimiento del constructor	X				X	
28		Declaración de cumplimiento de operación y mantenimiento		X				
29	Otros	Apoyos y estructuras		X				
30		Cámaras y canalizaciones		X				
31		Dispositivos de seccionamiento y mando		X				
32		Ejecución de las conexiones	X				X	
33		Herrajes		X				
34		Productos adecuados para las condiciones ambientales	X				X	
35		Protección contra corrosión	X				X	
36		Resistencia de aislamiento	X		117,9 MΩ	≥ 0,5 MΩ	X	
37		Sujeción mecánica de elementos de la instalación	X				X	
38		Ventilación de equipos	X				X	

F. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES

La inspección comprendió:	USO FINAL (INSTALACIONES MÉDICAS) EN BAJA TENSIÓN DESDE TABLERO DE MEDIDA, Y CIRCUITO ALIMENTADOR HASTA LOS TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN EN PISO 1, PISO 2 Y AUDITORIO, SALIDA DE CIRCUITOS RAMALES TOMAS E ILUMINACIÓN PARA CONSULTORIOS MEDICOS, CONSULTORIO ODONTOLOGICO, AUDITORIO, SALA DE ESPERA, BAÑOS, ALUMBRADO DE EMERGENCIA, SISTEMA DE PUESTA A TIERRA CON UN ÁREA DE 294 M2					
Observaciones:	INSPECCIÓN REALIZADA BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LA RESOLUCIÓN 90708 DE AGOSTO 30 DE 2013					
Dictamenes asociados:	E-49960					
Fecha de inspección:	2/6/2026	Orden de Inspección:	7176	Fecha de finalización de la construcción:	30/5/2026	
Vigencia del dictamen:	5 Años	Fecha de Vencimiento:	19/06/2031	Tipo de instalación:	Nueva	

G. ANEXOS

Declaración de constructor No.	04
Declaración de diseñador No.	NO APLICA
Declaración de de operación y mantenimiento No.	NO APLICA

H. RESULTADO DE LA INSPECCION

RESULTADO		Aprobada	X	No aprobada			
Director Técnico del organismo de inspección		**Inspector**	
Nombre	JESUS ANTONIO CEBALLOS BONIL	Nombre	FERNANDO SANCHEZ BERNAL
No. de documento de identificación	14315946	No. de documento de identificación	93257548
Profesión	INGENIERO ELECTRICISTA	Profesión	INGENIERO ELECTRICISTA
Certificado de Competencias	1690	Certificado de Competencias	1877
Matrícula Profesional	CN205-60669	Matrícula Profesional	CL205-52078
Firma y sello		Firma	

NOTAS:
* El Sub/Tipo de instalación(es) corresponde al tipo de instalación especial o equipo especial a inspeccionar

DICTAMEN DE INSPECCIÓN USO FINAL

Consulta nuestra acreditación OINAC

Nota: La validez y vigencia del presente dictamen se puede corroborar llamando a los números que aparecen en el presente documento o a través del código QR del encabezado

(57-1) 4688954 3152660390 3156781057 3017058989 Cra. 27 # 84-40 Polo Club - Bogota info@evalcon.com.co www.evalcon.com.co

ANEXO 5. INFORMES SEMANALES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E. SALUD CON EXCELENCIA

EPICO INGENIERIA S.A.S.

HOJA 1/1	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.
		martes, 27 de enero de 2026			758 DE 03 DE DICIEMBRE DE 2025

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DATOS DEL INFORME

Informe Número: 1 Del: 8/01/2026 Al: 25/01/2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 24 Dias

Nombre del Supervisor: JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

CONTRATO DE CONSULTORIA:		**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	
Contratista:	CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY	Interventor:	EPICO INGENIERIA S.A.S.
NIT:	902.004.183-1	NIT:	900.105.134-5
Contrato No.	751 DEL 28/NOV/2025	Contrato No.	758 DE 03/DIC/2025
Valor Inicial:	$ 448,678,617.00	Valor Inicial:	$ 61,037,331.00
Valor Actualizado:	$ 448,678,617.00	Valor Actualizado:	$ 61,037,331.00
Plazo Inicial:	DOS (2) MESES VEINTE DIAS	Plazo Inicial:	CUATRO (4) MESES
Plazo Actualizado:	DOS (2) MESES VEINTE DIAS	Plazo Actualizado:	CUATRO (4) MESES
Fecha de Iniciación:	22/12/2025	Fecha de Iniciación:	15/12/2025
Suspensión - Reinicio:	29/12/2025 a 08/01/2026	Suspensión - Reinicio:	29/12/2025 a 08/01/2026
Fecha de Términación:	20/03/2026	Fecha de Términación:	23/04/2026

Fase en ejecución: ☐ ESTUDIOS Y DISEÑOS ☑ CONSTRUCCION

VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS					0.0%
VALOR CONSTRUCCION			$ 448,678,617.000		100.0%
PROGRAMADO	**SEMANAL**	**ACUMULADO**	**EJECUTADO**	**SEMANAL**	**ACUMULADO**
Avance programado (%)	**0.94%**	**2.35%**	Avance Ejecutado (%)	**2.31%**	**3.08%**
Valor programado:	**$ 4,207,481**	**$ 10,542,841**	Valor Ejecutado:	**$ 10,377,041**	**$ 13,836,054**

CONSTRUCCION	INTERVENTORIA	APOYO A LA SUPERVISION
CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY	EPICO INGENIERIA S.A.S.	ARQ. JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON
ROSSY ELENA NIÑO GOMEZ	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA	Firma
		SUPERVISION
		JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO
Firma	Firma	Firma

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E. — SALUD CON EXCELENCIA

EPICO INGENIERIA S.A.S.

HOJA 1/1	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.
		martes, 27 de enero de 2026			758 DE 03 DE DICIEMBRE DE 2025

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DATOS DEL INFORME

Informe Número: **2** Del: 19/01/2026 Al: 25/01/2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 24 Dias

Nombre del Supervisor: JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

CONTRATO DE CONSULTORIA:		**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	
Contratista:	CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY	Interventor:	EPICO INGENIERIA S.A.S.
NIT:	902.004.183-1	NIT:	900.105.134-5
Contrato No.	**751 DEL 28/NOV/2025**	Contrato No.	**758 DE 03/DIC/2025**
Valor Inicial:	$ 448,678,617.00	Valor Inicial:	TOTAL - $61.037.331 - SAN JOSE - $31.057.503
Valor Actualizado:	$ 448,678,617.00	Valor Actualizado:	TOTAL - $61.037.331 - SAN JOSE - $31.057.503
Plazo Inicial:	DOS (2) MESES VEINTE DIAS	Plazo Inicial:	CUATRO (4) MESES
Plazo Actualizado:	DOS (2) MESES VEINTE DIAS	Plazo Actualizado:	CUATRO (4) MESES
Fecha de Iniciación:	22/12/2025	Fecha de Iniciación:	15/12/2025
Suspensión - Reinicio:	29/12/2025 a 08/01/2026	Suspensión - Reinicio:	29/12/2025 a 08/01/2026
Fecha de Términación:	20/03/2026	Fecha de Términación:	23/04/2026

Fase en ejecución: ☐ ESTUDIOS Y DISEÑOS ☑ CONSTRUCCION

PROGRAMADO	**SEMANAL**	**ACUMULADO**
Avance programado (%)	**0.94%**	**2.35%**
Valor programado:	**$ 4,207,481**	**$ 10,542,841**

VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS		*0.0%*
VALOR CONSTRUCCION	$ 448,678,617.000	*100.0%*

EJECUTADO	**SEMANAL**	**ACUMULADO**
Avance Ejecutado (%)	**2.31%**	**3.08%**
Valor Ejecutado:	**$ 10,377,041**	**$ 13,836,054**

CONSTRUCCION	**INTERVENTORIA**	**APOYO A LA SUPERVISION**
CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY	**EPICO INGENIERIA S.A.S.**	ARQ. JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON
ROSSY ELENA NIÑO GOMEZ	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA	Firma
		SUPERVISION
		JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO
Firma	Firma	Firma

HOSPITAL DE AGUAZUL
JUAN HERNANDO URREGO E.S.E.
SALUD CON EXCELENCIA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

EPICO INGENIERIA S.A.S.

HOJA 1/1	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.
		miércoles, 4 de febrero de 2026			758 DE 03 DE DICIEMBRE DE 2025

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DATOS DEL INFORME

Informe Número: 3 Del: 26/01/2026 Al: 1/02/2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 31 Dias

Nombre del Supervisor: JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

CONTRATO DE CONSULTORIA:		**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	
Contratista:	CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY	Interventor:	EPICO INGENIERIA S.A.S.
NIT:	902.004.183-1	NIT:	900.105.134-5
Contrato No.	**751 DEL 28/NOV/2025**	Contrato No.	**758 DE 03/DIC/2025**
Valor Inicial:	$ 448,678,617.00	Valor Inicial:	TOTAL - $61.037.331 - SAN JOSE - $31.057.503
Valor Actualizado:	$ 448,678,617.00	Valor Actualizado:	TOTAL - $61.037.331 - SAN JOSE - $31.057.503
Plazo Inicial:	DOS (2) MESES VEINTE DIAS	Plazo Inicial:	CUATRO (4) MESES
Plazo Actualizado:	DOS (2) MESES VEINTE DIAS	Plazo Actualizado:	CUATRO (4) MESES
Fecha de Iniciación:	22/12/2025	Fecha de Iniciación:	15/12/2025
Suspensión - Reinicio:	29/12/2025 a 08/01/2026	Suspensión - Reinicio:	29/12/2025 a 08/01/2026
Fecha de Términación:	20/03/2026	Fecha de Términación:	23/04/2026

Fase en ejecución: ☐ ESTUDIOS Y DISEÑOS ☑ CONSTRUCCION

VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS				*0.0%*
VALOR CONSTRUCCION	$		448,678,617.000	*100.0%*

PROGRAMADO	**SEMANAL**	**ACUMULADO**	**EJECUTADO**	**SEMANAL**	**ACUMULADO**
Avance programado (%)	**6.92%**	**9.27%**	Avance Ejecutado (%)	**3.27%**	**6.36%**
Valor programado:	**$ 31,067,702**	**$ 41,610,543**	Valor Ejecutado:	**$ 14,686,583**	**$ 28,522,637**

CONSTRUCCION	**INTERVENTORIA**	**APOYO A LA SUPERVISION**
CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY	**EPICO INGENIERIA S.A.S.**	ARQ. JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON
ROSSY ELENA NIÑO GOMEZ	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA	Firma
		SUPERVISION
		JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO
Firma	Firma	Firma

HOSPITAL DE AGUAZUL
JUAN HERNANDO URREGO E.S.E.
SALUD CON EXCELENCIA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

EPICO INGENIERIA S.A.S.

HOJA 1/1	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.
		miércoles, 11 de febrero de 2026			758 DE 03 DE DICIEMBRE DE 2025

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DATOS DEL INFORME

Informe Número: **4** Del: 2/02/2026 Al: 8/02/2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 38 Dias

Nombre del Supervisor: JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

CONTRATO DE CONSULTORIA:		**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	
Contratista:	CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY	Interventor:	EPICO INGENIERIA S.A.S.
NIT:	902.004.183-1	NIT:	900.105.134-5
Contrato No.	**751 DEL 28/NOV/2025**	Contrato No.	**758 DE 03/DIC/2025**
Valor Inicial:	$ 448,678,617.00	Valor Inicial:	TOTAL - $61.037.331 - SAN JOSE - $31.057.503
Valor Actualizado:	$ 448,678,617.00	Valor Actualizado:	TOTAL - $61.037.331 - SAN JOSE - $31.057.503
Plazo Inicial:	DOS (2) MESES VEINTE DIAS	Plazo Inicial:	CUATRO (4) MESES
Plazo Actualizado:	DOS (2) MESES VEINTE DIAS	Plazo Actualizado:	CUATRO (4) MESES
Fecha de Iniciación:	22/12/2025	Fecha de Iniciación:	15/12/2025
Suspensión - Reinicio:	29/12/2025 a 08/01/2026	Suspensión - Reinicio:	29/12/2025 a 08/01/2026
Fecha de Términación:	20/03/2026	Fecha de Términación:	23/04/2026

Fase en ejecución: ☐ ESTUDIOS Y DISEÑOS ☑ CONSTRUCCION

PROGRAMADO	**SEMANAL**	**ACUMULADO**
Avance programado (%)	**4.02%**	**13.29%**
Valor programado:	**$ 18,017,516**	**$ 59,628,059**

VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS		*0.0%*
VALOR CONSTRUCCION	$ 448,678,617.000	*100.0%*

EJECUTADO	**SEMANAL**	**ACUMULADO**
Avance Ejecutado (%)	**3.96%**	**10.31%**
Valor Ejecutado:	**$ 17,757,254**	**$ 46,279,891**

CONSTRUCCION	**INTERVENTORIA**	**APOYO A LA SUPERVISION**
CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY	**EPICO INGENIERIA S.A.S.**	ARQ. JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON
ROSSY ELENA NIÑO GOMEZ	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA	Firma
		SUPERVISION
		JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO
Firma	Firma	Firma

HOSPITAL DE AGUAZUL
JUAN HERNANDO URREGO E.S.E.
SALUD CON EXCELENCIA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

EPICO INGENIERIA S.A.S.

HOJA 1/1	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.
		miércoles, 18 de febrero de 2026			758 DE 03 DE DICIEMBRE DE 2025

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DATOS DEL INFORME

Informe Número: **5** Del: 9/02/2026 Al: 15/02/2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 45 Dias

Nombre del Supervisor: JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

CONTRATO DE CONSULTORIA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY	Interventor:	EPICO INGENIERIA S.A.S.
NIT:	902.004.183-1	NIT:	900.105.134-5
Contrato No.	**751 DEL 28/NOV/2025**	Contrato No.	**758 DE 03/DIC/2025**
Valor Inicial:	$ 448,678,617.00	Valor Inicial:	TOTAL - $61.037.331 - SAN JOSE - $31.057.503
Valor Actualizado:	$ 448,678,617.00	Valor Actualizado:	TOTAL - $61.037.331 - SAN JOSE - $31.057.503
Plazo Inicial:	DOS (2) MESES VEINTE DIAS	Plazo Inicial:	CUATRO (4) MESES
Plazo Actualizado:	DOS (2) MESES VEINTE DIAS	Plazo Actualizado:	CUATRO (4) MESES
Fecha de Iniciación:	22/12/2025	Fecha de Iniciación:	15/12/2025
Suspensión - Reinicio:	29/12/2025 a 08/01/2026	Suspensión - Reinicio:	29/12/2025 a 08/01/2026
Fecha de Términación:	20/03/2026	Fecha de Términación:	23/04/2026

Fase en ejecución: ☐ ESTUDIOS Y DISEÑOS ☑ CONSTRUCCION

PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO
Avance programado (%)	**8.88%**	**22.17%**
Valor programado:	**$ 39,856,747**	**$ 99,484,806**

VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS		*0.0%*
VALOR CONSTRUCCION	$ 448,678,617.000	*100.0%*

EJECUTADO	SEMANAL	ACUMULADO
Avance Ejecutado (%)	**6.93%**	**17.24%**
Valor Ejecutado:	**$ 31,086,849**	**$ 77,366,740**

CONSTRUCCION	INTERVENTORIA	APOYO A LA SUPERVISION
CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY	**EPICO INGENIERIA S.A.S.**	ARQ. JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON
ROSSY ELENA NIÑO GOMEZ	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA	Firma
		SUPERVISION
		JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO
Firma	Firma	Firma

HOSPITAL DE AGUAZUL
JUAN HERNANDO URREGO E.S.E.
SALUD CON EXCELENCIA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

EPICO INGENIERIA S.A.S.

HOJA 1/1	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.
		miércoles, 25 de febrero de 2026			758 DE 03 DE DICIEMBRE DE 2025

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DATOS DEL INFORME

Informe Número: 6 Del: 16/02/2026 Al: 22/02/2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 52 Dias

Nombre del Supervisor: JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

CONTRATO DE CONSULTORIA:		**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	
Contratista:	CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY	Interventor:	EPICO INGENIERIA S.A.S.
NIT:	902.004.183-1	NIT:	900.105.134-5
Contrato No.	**751 DEL 28/NOV/2025**	Contrato No.	**758 DE 03/DIC/2025**
Valor Inicial:	$ 448,678,617.00	Valor Inicial:	TOTAL - $61.037.331 - SAN JOSE - $31.057.503
Valor Actualizado:	$ 448,678,617.00	Valor Actualizado:	TOTAL - $61.037.331 - SAN JOSE - $31.057.503
Plazo Inicial:	DOS (2) MESES VEINTE DIAS	Plazo Inicial:	CUATRO (4) MESES
Plazo Actualizado:	DOS (2) MESES VEINTE DIAS	Plazo Actualizado:	CUATRO (4) MESES
Fecha de Iniciación:	22/12/2025	Fecha de Iniciación:	15/12/2025
Suspensión - Reinicio:	29/12/2025 a 08/01/2026	Suspensión - Reinicio:	29/12/2025 a 08/01/2026
Fecha de Términación:	20/03/2026	Fecha de Términación:	23/04/2026

Fase en ejecución: ☐ ESTUDIOS Y DISEÑOS ☑ CONSTRUCCION

PROGRAMADO	**SEMANAL**	**ACUMULADO**
Avance programado (%)	**3.40%**	**25.57%**
Valor programado:	**$ 15,258,352**	**$ 114,743,158**

VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS		*0.0%*
VALOR CONSTRUCCION	$ 448,678,617.000	*100.0%*

EJECUTADO	**SEMANAL**	**ACUMULADO**
Avance Ejecutado (%)	**3.54%**	**20.78%**
Valor Ejecutado:	**$ 15,878,475**	**$ 93,245,215**

CONSTRUCCION	**INTERVENTORIA**	**APOYO A LA SUPERVISION**
CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY	**EPICO INGENIERIA S.A.S.**	ARQ. JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON
ROSSY ELENA NIÑO GOMEZ	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA	Firma
		SUPERVISION
		JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO
Firma	Firma	Firma

HOSPITAL DE AGUAZUL
JUAN HERNANDO URREGO E.S.E.
SALUD CON EXCELENCIA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

EPICO INGENIERIA S.A.S.

HOJA 1/1	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.
		miércoles, 4 de marzo de 2026			758 DE 03 DE DICIEMBRE DE 2025

OFICINA DE GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DATOS DEL INFORME

Informe Número: 7 Del: 23/02/2026 Al: 1/03/2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 59 Dias

Nombre del Supervisor: JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

CONTRATO DE CONSULTORIA:		**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	
Contratista:	CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY	Interventor:	EPICO INGENIERIA S.A.S.
NIT:	902.004.183-1	NIT:	900.105.134-5
Contrato No.	**751 DEL 28/NOV/2025**	Contrato No.	**758 DE 03/DIC/2025**
Valor Inicial:	$ 448,678,617.00	Valor Inicial:	TOTAL - $61.037.331 - SAN JOSE - $31.057.503
Valor Actualizado:	$ 448,678,617.00	Valor Actualizado:	TOTAL - $61.037.331 - SAN JOSE - $31.057.503
Plazo Inicial:	DOS (2) MESES VEINTE DIAS	Plazo Inicial:	CUATRO (4) MESES
Plazo Actualizado:	DOS (2) MESES VEINTE DIAS	Plazo Actualizado:	CUATRO (4) MESES
Fecha de Iniciación:	22/12/2025	Fecha de Iniciación:	15/12/2025
Suspensión - Reinicio:	29/12/2025 a 08/01/2026	Suspensión - Reinicio:	29/12/2025 a 08/01/2026
Fecha de Términación:	20/03/2026	Fecha de Términación:	23/04/2026

Fase en ejecución: ☐ ESTUDIOS Y DISEÑOS ☑ CONSTRUCCION

VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS					*0.0%*
VALOR CONSTRUCCION			$	448,678,617.000	*100.0%*
PROGRAMADO	**SEMANAL**	**ACUMULADO**	**EJECUTADO**	**SEMANAL**	**ACUMULADO**
Avance programado (%)	**11.77%**	**37.34%**	Avance Ejecutado (%)	**11.61%**	**32.39%**
Valor programado:	**$ 52,810,103**	**$ 167,553,261**	Valor Ejecutado:	**$ 52,094,323**	**$ 145,339,538**

CONSTRUCCION	**INTERVENTORIA**	**APOYO A LA SUPERVISION**
CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY	**EPICO INGENIERIA S.A.S.**	ARQ. JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON
ROSSY ELENA NIÑO GOMEZ	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA	Firma
		SUPERVISION
		JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO
Firma	Firma	Firma

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

HOJA 1/1	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.
		miércoles, 11 de marzo de 2026			758 DE 03 DE DICIEMBRE DE 2025

OFICINA DE GESTIÓN DEL AMBIENTE FISICO Y TECNOLÒGICO

DATOS DEL INFORME

Informe Número: 8 Del: 2/03/2026 Al: 8/03/2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 66 Dias

Nombre del Supervisor: JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

CONTRATO DE CONSULTORIA:		**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	
Contratista:	CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY	Interventor:	EPICO INGENIERIA S.A.S.
NIT:	902.004.183-1	NIT:	900.105.134-5
Contrato No.	**751 DEL 28/NOV/2025**	Contrato No.	**758 DE 03/DIC/2025**
Valor Inicial:	$ 448,678,617.00	Valor Inicial:	TOTAL - $61.037.331 - SAN JOSE - $31.057.503
Valor Actualizado:	$ 448,678,617.00	Valor Actualizado:	TOTAL - $61.037.331 - SAN JOSE - $31.057.503
Plazo Inicial:	DOS (2) MESES Y VEINTE DIAS	Plazo Inicial:	CUATRO (4) MESES
Prorroga 1	UN (01) MES		
Plazo Actualizado:	TRES (3) MESES Y VEINTE DIAS	Plazo Actualizado:	CUATRO (4) MESES
Fecha de Iniciación:	22/12/2025	Fecha de Iniciación:	15/12/2025
Suspensión - Reinicio:	29/12/2025 a 08/01/2026	Suspensión - Reinicio:	29/12/2025 a 08/01/2026
Fecha de Términación:	20/04/2026	Fecha de Términación:	23/04/2026

Fase en ejecución: ☐ ESTUDIOS Y DISEÑOS ☑ CONSTRUCCION

PROGRAMADO	**SEMANAL**	**ACUMULADO**	**EJECUTADO**	**SEMANAL**	**ACUMULADO**
Avance programado (%)	**1.52%**	**38.86%**	Avance Ejecutado (%)	**6.59%**	**38.98%**
Valor programado:	**$ 6,802,957**	**$ 174,356,218**	Valor Ejecutado:	**$ 29,563,448**	**$ 174,902,987**

VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS		*0.0%*
VALOR CONSTRUCCION	$ 448,678,617.000	*100.0%*

CONSTRUCCION	**INTERVENTORIA**	**APOYO A LA SUPERVISION**
CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY	**EPICO INGENIERIA S.A.S.**	ARQ. JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON
ROSSY ELENA NIÑO GOMEZ	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA	Firma
		SUPERVISION
		JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO
Firma	Firma	Firma

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E. SALUD CON EXCELENCIA

EPICO INGENIERIA S.A.S.

HOJA 1/1	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.
		miércoles, 18 de marzo de 2026			758 DE 03 DE DICIEMBRE DE 2025

OFICINA DE GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DATOS DEL INFORME

Informe Número: 9 Del: 9/03/2026 Al: 15/03/2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 73 Dias

Nombre del Supervisor: JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

CONTRATO DE CONSULTORIA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY	Interventor:	EPICO INGENIERIA S.A.S.
NIT:	902.004.183-1	NIT:	900.105.134-5
Contrato No.	**751 DEL 28/NOV/2025**	Contrato No.	**758 DE 03/DIC/2025**
Valor Inicial:	$ 448,678,617.00	Valor Inicial:	TOTAL - $61.037.331 - SAN JOSE - $31.057.503
Valor Actualizado:	$ 448,678,617.00	Valor Actualizado:	TOTAL - $61.037.331 - SAN JOSE - $31.057.503
Plazo Inicial:	DOS (2) MESES Y VEINTE (20) DIAS	Plazo Inicial:	CUATRO (4) MESES
Prorroga 1	UN (01) MES Y DIEZ (10) DIAS		
Plazo Actualizado:	CUATRO (4) MESES	Plazo Actualizado:	CUATRO (4) MESES
Fecha de Iniciación:	22/12/2025	Fecha de Iniciación:	15/12/2025
Suspensión - Reinicio:	29/12/2025 a 08/01/2026	Suspensión - Reinicio:	29/12/2025 a 08/01/2026
Fecha de Términación:	30/04/2026	Fecha de Términación:	23/04/2026

Fase en ejecución: ☐ ESTUDIOS Y DISEÑOS ☑ CONSTRUCCION

VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS					*0.0%*
VALOR CONSTRUCCION			$	448,678,617.000	*100.0%*
PROGRAMADO	**SEMANAL**	**ACUMULADO**	**EJECUTADO**	**SEMANAL**	**ACUMULADO**
Avance programado (%)	**2.49%**	**41.35%**	Avance Ejecutado (%)	**2.37%**	**41.35%**
Valor programado:	**$ 11,167,291**	**$ 185,523,509**	Valor Ejecutado:	**$ 10,620,522**	**$ 185,523,509**

CONSTRUCCION	INTERVENTORIA	APOYO A LA SUPERVISION
CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY	**EPICO INGENIERIA S.A.S.**	ARQ. JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON
ROSSY ELENA NIÑO GOMEZ	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA	Firma
		SUPERVISION
		JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO
Firma	Firma	Firma

HOSPITAL DE AGUAZUL
JUAN HERNANDO URREGO E.S.E.
SALUD CON EXCELENCIA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

EPICO INGENIERIA S.A.S.

HOJA 1/1	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.
		miércoles, 25 de marzo de 2026			758 DE 03 DE DICIEMBRE DE 2025

OFICINA DE GESTIÓN DEL AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGICO

DATOS DEL INFORME

Informe Número: **10** Del: 16/03/2026 Al: 22/03/2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 80 Dias

Nombre del Supervisor: JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

CONTRATO DE CONSULTORIA:		**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	
Contratista:	CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY	Interventor:	EPICO INGENIERIA S.A.S.
NIT:	902.004.183-1	NIT:	900.105.134-5
Contrato No.	**751 DEL 28/NOV/2025**	Contrato No.	**758 DE 03/DIC/2025**
Valor Inicial:	$ 448,678,617.00	Valor Inicial:	TOTAL - $61.037.331 - SAN JOSE - $31.057.503
Valor Actualizado:	$ 448,678,617.00	Valor Actualizado:	TOTAL - $61.037.331 - SAN JOSE - $31.057.503
Plazo Inicial:	DOS (2) MESES Y VEINTE (20) DIAS	Plazo Inicial:	CUATRO (4) MESES
Prorroga 1	UN (01) MES Y DIEZ (10) DIAS		
Plazo Actualizado:	CUATRO (4) MESES	Plazo Actualizado:	CUATRO (4) MESES
Fecha de Iniciación:	22/12/2025	Fecha de Iniciación:	15/12/2025
Suspensión - Reinicio:	29/12/2025 a 08/01/2026	Suspensión - Reinicio:	29/12/2025 a 08/01/2026
Fecha de Términación:	30/04/2026	Fecha de Términación:	23/04/2026

Fase en ejecución: ☐ ESTUDIOS Y DISEÑOS ☑ CONSTRUCCION

PROGRAMADO	**SEMANAL**	**ACUMULADO**
Avance programado (%)	**0.74%**	**42.09%**
Valor programado:	**$ 3,325,472**	**$ 188,848,981**

VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS		*0.0%*
VALOR CONSTRUCCION	$ 448,678,617.000	*100.0%*

EJECUTADO	**SEMANAL**	**ACUMULADO**
Avance Ejecutado (%)	**2.29%**	**43.64%**
Valor Ejecutado:	**$ 10,296,168**	**$ 195,819,677**

CONSTRUCCION	**INTERVENTORIA**	**APOYO A LA SUPERVISION**
CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY	**EPICO INGENIERIA S.A.S.**	ARQ. JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON
ROSSY ELENA NIÑO GOMEZ	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA	Firma
		SUPERVISION
		JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO
Firma	Firma	Firma

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

HOJA 1/1	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.
		miércoles, 1 de abril de 2026			758 DE 03 DE DICIEMBRE DE 2025

OFICINA DE GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DATOS DEL INFORME

Informe Número: 11 Del: 23/03/2026 Al: 29/03/2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 87 Dias

Nombre del Supervisor: JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

CONTRATO DE CONSULTORIA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY	Interventor:	EPICO INGENIERIA S.A.S.
NIT:	902.004.183-1	NIT:	900.105.134-5
Contrato No.	**751 DEL 28/NOV/2025**	Contrato No.	**758 DE 03/DIC/2025**
Valor Inicial:	$ 448,678,617.00	Valor Inicial:	TOTAL - $61.037.331 - SAN JOSE - $31.057.503
Valor Actualizado:	$ 448,678,617.00	Valor Actualizado:	TOTAL - $61.037.331 - SAN JOSE - $31.057.503
Plazo Inicial:	DOS (2) MESES Y VEINTE (20) DIAS	Plazo Inicial:	CUATRO (4) MESES
Prorroga 1	UN (01) MES Y DIEZ (10) DIAS		
Plazo Actualizado:	CUATRO (4) MESES	Plazo Actualizado:	CUATRO (4) MESES
Fecha de Iniciación:	22/12/2025	Fecha de Iniciación:	15/12/2025
Suspensión - Reinicio:	29/12/2025 a 08/01/2026	Suspensión - Reinicio:	29/12/2025 a 08/01/2026
Fecha de Términación:	30/04/2026	Fecha de Términación:	23/04/2026

Fase en ejecución: ☐ ESTUDIOS Y DISEÑOS ☑ CONSTRUCCION

VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS				*0.0%*
VALOR CONSTRUCCION	$	448,678,617.000		*100.0%*

PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO	EJECUTADO	SEMANAL	ACUMULADO
Avance programado (%)	**8.23%**	**50.32%**	Avance Ejecutado (%)	**5.03%**	**48.67%**
Valor programado:	**$ 36,925,491**	**$ 225,774,472**	Valor Ejecutado:	**$ 22,559,498**	**$ 218,379,175**

CONSTRUCCION	INTERVENTORIA	APOYO A LA SUPERVISION
CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY	**EPICO INGENIERIA S.A.S.**	ARQ. JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON
ROSSY ELENA NIÑO GOMEZ	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA	Firma
Firma	Firma	**SUPERVISION**
		JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO
		Firma

HOSPITAL DE AGUAZUL
JUAN HERNANDO URREGO E.S.E.
SALUD CON EXCELENCIA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

EPICO INGENIERIA S.A.S.

HOJA 1/1	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.
		miércoles, 8 de abril de 2026			758 DE 03 DE DICIEMBRE DE 2025

OFICINA DE GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DATOS DEL INFORME

Informe Número: **12** Del: 30/03/2026 Al: 5/04/2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 94 Dias

Nombre del Supervisor: JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

CONTRATO DE CONSULTORIA:		**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	
Contratista:	CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY	Interventor:	EPICO INGENIERIA S.A.S.
NIT:	902.004.183-1	NIT:	900.105.134-5
Contrato No.	**751 DEL 28/NOV/2025**	Contrato No.	**758 DE 03/DIC/2025**
Valor Inicial:	$ 448,678,617.00	Valor Inicial:	TOTAL - $61.037.331 - SAN JOSE - $31.057.503
Valor Actualizado:	$ 448,678,617.00	Valor Actualizado:	TOTAL - $61.037.331 - SAN JOSE - $31.057.503
Plazo Inicial:	DOS (2) MESES Y VEINTE (20) DIAS	Plazo Inicial:	CUATRO (4) MESES
Prorroga 1	UN (01) MES Y DIEZ (10) DIAS		
Plazo Actualizado:	CUATRO (4) MESES	Plazo Actualizado:	CUATRO (4) MESES
Fecha de Iniciación:	22/12/2025	Fecha de Iniciación:	15/12/2025
Suspensión - Reinicio:	29/12/2025 a 08/01/2026	Suspensión - Reinicio:	29/12/2025 a 08/01/2026
Fecha de Términación:	30/04/2026	Fecha de Términación:	23/04/2026

Fase en ejecución: ☐ ESTUDIOS Y DISEÑOS ☑ CONSTRUCCION

PROGRAMADO	**SEMANAL**	**ACUMULADO**	**EJECUTADO**	**SEMANAL**	**ACUMULADO**	
Avance programado (%)	**8.38%**	**58.70%**	Avance Ejecutado (%)	**5.90%**	**54.57%**	
Valor programado:	**$ 37,590,585**	**$ 263,365,057**	Valor Ejecutado:	**$ 26,482,889**	**$ 244,862,064**	
			VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS			*0.0%*
			VALOR CONSTRUCCION	$ 448,678,617.000		*100.0%*

CONSTRUCCION	**INTERVENTORIA**	**APOYO A LA SUPERVISION**
CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY	**EPICO INGENIERIA S.A.S.**	ARQ. JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON
ROSSY ELENA NIÑO GOMEZ	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA	Firma
		SUPERVISION
		JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO
Firma	Firma	Firma

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

HOJA 1/1	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.
		miércoles, 15 de abril de 2026			758 DE 03 DE DICIEMBRE DE 2025

OFICINA DE GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DATOS DEL INFORME

Informe Número: **13** Del: 6/04/2026 Al: 12/04/2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 101 Dias

Nombre del Supervisor: JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

CONTRATO DE CONSULTORIA:		**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	
Contratista:	CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY	Interventor:	EPICO INGENIERIA S.A.S.
NIT:	902.004.183-1	NIT:	900.105.134-5
Contrato No.	**751 DEL 28/NOV/2025**	Contrato No.	**758 DE 03/DIC/2025**
Valor Inicial:	$ 448,678,617.00	Valor Inicial:	TOTAL - $61.037.331 - SAN JOSE - $31.057.503
Valor Actualizado:	$ 448,678,617.00	Valor Actualizado:	TOTAL - $61.037.331 - SAN JOSE - $31.057.503
Plazo Inicial:	DOS (2) MESES Y VEINTE (20) DIAS	Plazo Inicial:	CUATRO (4) MESES
Prorroga 1	UN (01) MES Y DIEZ (10) DIAS		
Plazo Actualizado:	CUATRO (4) MESES	Plazo Actualizado:	CUATRO (4) MESES
Fecha de Iniciación:	22/12/2025	Fecha de Iniciación:	15/12/2025
Suspensión - Reinicio:	29/12/2025 a 08/01/2026	Suspensión - Reinicio:	29/12/2025 a 08/01/2026
Fecha de Términación:	30/04/2026	Fecha de Términación:	23/04/2026

Fase en ejecución: ☐ ESTUDIOS Y DISEÑOS ☑ CONSTRUCCION

PROGRAMADO	**SEMANAL**	**ACUMULADO**	**EJECUTADO**	**SEMANAL**	**ACUMULADO**
Avance programado (%)	**9.64%**	**68.34%**	Avance Ejecutado (%)	**8.50%**	**63.07%**
Valor programado:	**$ 43,259,494**	**$ 306,624,552**	Valor Ejecutado:	**$ 38,140,248**	**$ 283,002,312**

VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS		*0.0%*
VALOR CONSTRUCCION	$ 448,678,617.000	*100.0%*

CONSTRUCCION	**INTERVENTORIA**	**APOYO A LA SUPERVISION**
CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY	**EPICO INGENIERIA S.A.S.**	ARQ. JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON
ROSSY ELENA NIÑO GOMEZ	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA	Firma
		SUPERVISION
		JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO
Firma	Firma	Firma

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E. SALUD CON EXCELENCIA

EPICO INGENIERIA S.A.S.

HOJA 1/1	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.
		miércoles, 22 de abril de 2026			758 DE 03 DE DICIEMBRE DE 2025

OFICINA DE GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DATOS DEL INFORME

Informe Número: **14** Del: 13/04/2026 Al: 19/04/2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 108 Dias

Nombre del Supervisor: JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

CONTRATO DE CONSULTORIA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY	Interventor:	EPICO INGENIERIA S.A.S.
NIT:	902.004.183-1	NIT:	900.105.134-5
Contrato No.	**751 DEL 28/NOV/2025**	Contrato No.	**758 DE 03/DIC/2025**
Valor Inicial:	$ 448,678,617.00	Valor Inicial:	TOTAL - $61.037.331 - SAN JOSE - $31.057.503
Valor Actualizado:	$ 448,678,617.00	Valor Actualizado:	TOTAL - $61.037.331 - SAN JOSE - $31.057.503
Plazo Inicial:	DOS (2) MESES Y VEINTE (20) DIAS	Plazo Inicial:	CUATRO (4) MESES
Prorroga 1	UN (01) MES Y DIEZ (10) DIAS	Prorroga No. 1	QUINCE (15) DIAS
Plazo Actualizado:	CUATRO (4) MESES	Plazo Actualizado:	CUATRO (4) MESES+QUINCE (15) DIAS
Fecha de Iniciación:	22/12/2025	Fecha de Iniciación:	15/12/2025
Suspensión - Reinicio:	29/12/2025 a 08/01/2026	Suspensión - Reinicio:	29/12/2025 a 08/01/2026
Fecha de Términación:	30/04/2026	Fecha de Términación:	8/05/2026

Fase en ejecución: ☐ ESTUDIOS Y DISEÑOS ☑ CONSTRUCCION

VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS					*0.0%*
VALOR CONSTRUCCION			$	448,678,617.000	*100.0%*
PROGRAMADO	**SEMANAL**	**ACUMULADO**	**EJECUTADO**	**SEMANAL**	**ACUMULADO**
Avance programado (%)	**10.60%**	**78.94%**	Avance Ejecutado (%)	**12.45%**	**75.52%**
Valor programado:	**$ 47,554,660**	**$ 354,179,213**	Valor Ejecutado:	**$ 55,848,510**	**$ 338,850,822**

CONSTRUCCION	INTERVENTORIA	APOYO A LA SUPERVISION
CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY	**EPICO INGENIERIA S.A.S.**	ARQ. JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON
ROSSY ELENA NIÑO GOMEZ	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA	Firma
Firma	Firma	**SUPERVISION**
		JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO
		Firma

HOSPITAL DE AGUAZUL
JUAN HERNANDO URREGO E.S.E.
SALUD CON EXCELENCIA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

EPICO INGENIERIA S.A.S.

HOJA 1/1	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.
		miércoles, 29 de abril de 2026			758 DE 03 DE DICIEMBRE DE 2025

OFICINA DE GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DATOS DEL INFORME

Informe Número: **15** Del: 20/04/2026 Al: 26/04/2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 115 Dias

Nombre del Supervisor: JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

CONTRATO DE CONSULTORIA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY	Interventor:	EPICO INGENIERIA S.A.S.
NIT:	902.004.183-1	NIT:	900.105.134-5
Contrato No.	**751 DEL 28/NOV/2025**	Contrato No.	**758 DE 03/DIC/2025**
Valor Inicial:	$ 448,678,617.00	Valor Inicial:	TOTAL - $61.037.331 - SAN JOSE - $31.057.503
Valor Actualizado:	$ 448,678,617.00	Valor Actualizado:	TOTAL - $61.037.331 - SAN JOSE - $31.057.503
Plazo Inicial:	DOS (2) MESES Y VEINTE (20) DIAS	Plazo Inicial:	CUATRO (4) MESES
Prorroga 1	UN (01) MES Y DIEZ (10) DIAS	Prorroga No. 1	QUINCE (15) DIAS
Plazo Actualizado:	CUATRO (4) MESES	Plazo Actualizado:	CUATRO (4) MESES+QUINCE (15) DIAS
Fecha de Iniciación:	22/12/2025	Fecha de Iniciación:	15/12/2025
Suspensión - Reinicio:	29/12/2025 a 08/01/2026	Suspensión - Reinicio:	29/12/2025 a 08/01/2026
Fecha de Términación:	30/04/2026	Fecha de Términación:	8/05/2026

Fase en ejecución: ☐ ESTUDIOS Y DISEÑOS ☑ CONSTRUCCION

VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS					*0.0%*
VALOR CONSTRUCCION			$ 448,678,617.000		*100.0%*
PROGRAMADO	**SEMANAL**	**ACUMULADO**	**EJECUTADO**	**SEMANAL**	**ACUMULADO**
Avance programado (%)	**11.73%**	**90.67%**	Avance Ejecutado (%)	**12.49%**	**88.01%**
Valor programado:	**$ 52,631,881**	**$ 406,811,093**	Valor Ejecutado:	**$ 56,038,580**	**$ 394,889,402**

CONSTRUCCION	INTERVENTORIA	APOYO A LA SUPERVISION
CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY	**EPICO INGENIERIA S.A.S.**	ARQ. JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON
ROSSY ELENA NIÑO GOMEZ	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA	Firma
		SUPERVISION
		JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO
Firma	Firma	Firma

HOSPITAL DE AGUAZUL
JUAN HERNANDO URREGO E.S.E.
SALUD CON EXCELENCIA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

EPICO INGENIERIA S.A.S.

HOJA 1/1	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.
		miércoles, 6 de mayo de 2026			758 DE 03 DE DICIEMBRE DE 2025

OFICINA DE GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DATOS DEL INFORME

Informe Número: **16** Del: 27/04/2026 Al: 30/04/2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 120 Dias

Nombre del Supervisor: JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

CONTRATO DE CONSULTORIA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY	Interventor:	EPICO INGENIERIA S.A.S.
NIT:	902.004.183-1	NIT:	900.105.134-5
Contrato No.	**751 DEL 28/NOV/2025**	Contrato No.	**758 DE 03/DIC/2025**
Valor Inicial:	$ 448,678,617.00	Valor Inicial:	TOTAL - $61.037.331 - SAN JOSE - $31.057.503
Valor Actualizado:	$ 448,678,617.00	Valor Actualizado:	TOTAL - $61.037.331 - SAN JOSE - $31.057.503
Plazo Inicial:	DOS (2) MESES Y VEINTE (20) DIAS	Plazo Inicial:	CUATRO (4) MESES
Prorroga 1	UN (01) MES Y DIEZ (10) DIAS	Prorroga No. 1	QUINCE (15) DIAS
Plazo Actualizado:	CUATRO (4) MESES	Plazo Actualizado:	CUATRO (4) MESES+QUINCE (15) DIAS
Fecha de Iniciación:	22/12/2025	Fecha de Iniciación:	15/12/2025
Suspensión - Reinicio:	29/12/2025 a 08/01/2026	Suspensión - Reinicio:	29/12/2025 a 08/01/2026
Fecha de Términación:	30/04/2026	Fecha de Términación:	8/05/2026

Fase en ejecución: ☐ ESTUDIOS Y DISEÑOS ☑ CONSTRUCCION

PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO
Avance programado (%)	**9.33%**	**100.00%**
Valor programado:	**$ 41,867,525**	**$ 448,678,617**

VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS		*0.0%*
VALOR CONSTRUCCION	$ 448,678,617.000	*100.0%*

EJECUTADO	SEMANAL	ACUMULADO
Avance Ejecutado (%)	**11.99%**	**100.00%**
Valor Ejecutado:	**$ 53,789,215**	**$ 448,678,617**

CONSTRUCCION	INTERVENTORIA	APOYO A LA SUPERVISION
CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY	**EPICO INGENIERIA S.A.S.**	ARQ. JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON
ROSSY ELENA NIÑO GOMEZ	OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA	Firma
		SUPERVISION
		JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO
Firma	Firma	Firma

ANEXO 6. CERTIFICACIÓN Y PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL, PARAFISCALES Y FIC DE OBRA

CONSORCIO
SAN JÓSE DEL BUBUY
NIT: 902.004.183-1

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO INSCRITO ANTE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA

REFERENCIA. Contrato de Obra Pública No. 751 de 2025. Cuyo objeto es **"ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE."**

Que el **CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY** identificado con **NIT. No. 902.004.183- 1** luego de examinar la contabilidad y demás documentación, de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, basado en pruebas selectivas de las evidencias que soportan hechos y revelaciones, se ha realizado el pago de los siguientes aportes, según se indica en la planilla soporte, los cuales corresponden a los montos contabilizados y pagados por la misma durante el periodo del mes de Diciembre de 2025 a Abril de 2026, de acuerdo en lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

N° PLANILLA	PERÍODO	IBC	SALUD	PENSION	ARL	CAJA DE COMPEN.	VALOR TOTAL APORTES
9498305873	Diciembre	$ 432.934	$ 17.400	$ 69.300	$ 30.200	$ 17.400	$ 134.300
9499443296	Enero	$ 641.999	$ 25.700	$ 102.800	$ 44.700	$ 25.700	$ 198.900
9499443296	Enero	$ 233.454	$ 9.400	$ 37.400	$ 16.300	$ 9.400	$ 72.500
9499443296	Enero	$ 992.180	$ 39.700	$ 158.800	$ 69.100	$ 39.700	$ 307.300
9499443296	Enero	$ 641.999	$ 25.700	$ 102.800	$ 44.700	$ 25.700	$ 198.900
9499443296	Enero	$ 641.999	$ 25.700	$ 102.800	$ 44.700	$ 25.700	$ 198.900
9499443296	Enero	$ 992.180	$ 39.700	$ 158.800	$ 69.100	$ 39.700	$ 307.300
9499443296	Enero	$ 1.342.361	$ 53.700	$ 214.800	$ 93.500	$ 53.700	$ 415.700
9499443296	Enero	$ 1.342.361	$ 53.700	$ 214.800	$ 93.500	$ 53.700	$ 415.700
9499443296	Enero	$ 992.180	$ 39.700	$ 158.800	$ 69.100	$ 39.700	$ 307.300
9501228159	Febrero	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 280.200	$ 121.900	$ 70.100	$ 542.300
9501228159	Febrero	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 280.200	$ 121.900	$ 70.100	$ 542.300
9501228159	Febrero	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 280.200	$ 121.900	$ 70.100	$ 542.300
9501228159	Febrero	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 280.200	$ 121.900	$ 70.100	$ 542.300
9501228159	Febrero	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 280.200	$ 121.900	$ 70.100	$ 542.300

CONSORCIO
SAN JÓSE DEL BUBUY
NIT. 902 004 183 -1

9501228159	Febrero	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 280.200	$ 121.900	$ 70.100	$ 542.300
9501228159	Febrero	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 280.200	$ 121.900	$ 70.100	$ 542.300
9501228159	Febrero	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 280.200	$ 121.900	$ 70.100	$ 542.300
9501228159	Febrero	$ 291.818	$ 11.700	$ 46.700	$ 20.400	$ 11.700	$ 90.500
9502774544	Marzo	$ 408.545	$ 16.400	$ 65.400	$ 28.500	$ 16.400	$ 126.700
9502774544	Marzo	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 280.200	$ 121.900	$ 70.100	$ 542.300
9502774544	Marzo	$ 1.634.178	$ 65.400	$ 261.500	$ 113.800	$ 65.400	$ 506.100
9502774544	Marzo	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 280.200	$ 121.900	$ 70.100	$ 542.300
9502774544	Marzo	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 280.200	$ 121.900	$ 70.100	$ 542.300
9502774544	Marzo	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 280.200	$ 121.900	$ 70.100	$ 542.300
9502774544	Marzo	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 280.200	$ 121.900	$ 70.100	$ 542.300
9502774544	Marzo	$ 1.634.178	$ 65.400	$ 261.500	$ 113.800	$ 65.400	$ 506.100
9502774544	Marzo	$ 700.362	$ 28.100	$ 112.100	$ 48.800	$ 28.100	$ 217.100
9504970635	Abril	$ 58.364	$ 2.400	$ 9.400	$ 4.100	$ 2.400	$ 18.300
9504970635	Abril	$ 525.272	$ 21.100	$ 84.100	$ 36.600	$ 21.100	$ 162.900
9504970635	Abril	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 280.200	$ 121.900	$ 70.100	$ 542.300
9504970635	Abril	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 280.200	$ 121.900	$ 70.100	$ 542.300
9504970635	Abril	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 280.200	$ 121.900	$ 70.100	$ 542.300
9504970635	Abril	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 280.200	$ 121.900	$ 70.100	$ 542.300
9504970635	Abril	$ 58.364	$ 2.400	$ 9.400	$ 4.100	$ 2.400	$ 18.300
9504970635	Abril	$ 525.272	$ 21.100	$ 84.100	$ 36.600	$ 21.100	$ 162.900
		$ 43.855.385	**$ 1.756.100**	**$ 7.018.700**	**$ 3.053.900**	**$ 1.756.100**	**$ 13.584.800**

1) Se ha cumplido con las siguientes obligaciones:

- ✓ Sistema de salud
- ✓ Riesgos profesionales
- ✓ Pensiones
- ✓ Caja de compensación

2) **"CERTIFICO"** el cumplimiento legal y oportuno a todas las obligaciones con el sistema integral de seguridad social.

3) **CERTIFICO** que se encuentra a **PAZ Y SALVO** en cuanto a Salud, Pensión, Riesgos profesionales y caja de compensación y que se encuentran exonerados del pago de los parafiscales, en ejecución del Contrato de Obra Pública No. 751 de 2025.

CONSORCIO
SAN JÓSE DEL BUBUY
NIT: 902.004.183 -1

Cuyo objeto es **"ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.**

En constancia de lo anterior se expide en Aguazul, Casanare a los Veinticinco (25) días del mes de mayo de 2026, a solicitud del interesado con destino a "FINES PERTINENTES" y es válida únicamente con la fotocopia de la tarjeta profesional y el Certificado de Antecedentes expedido por la Junta Central de Contadores, de lo contrario carece de toda validez.

ROSSY ELENA NIÑO GOMEZ
R/L C. SAN JOSE DEL BUBUY

LILIANA PAOLA ROJAS PIRAGAUTA
C PUBLICO TP No. 260819-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E D E 4 1 C D 6 8 E 3 F 2 H B B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LILIANA PAOLA ROJAS PIRAGAUTA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1116550012 de AGUAZUL (CASANARE) Y Tarjeta Profesional No 260819-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS . . . . . .


Dado en BOGOTA a los 19 días del mes de Mayo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



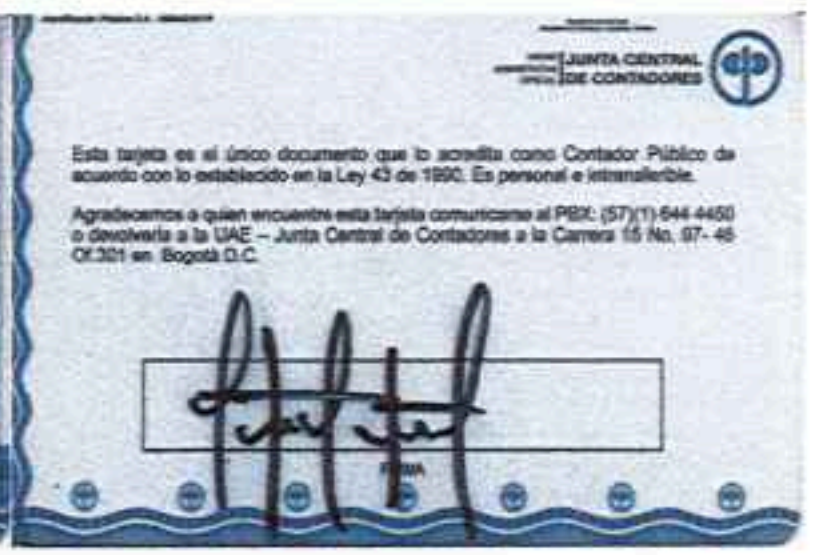

aportes en linea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 902004183	1	CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY	CR 12 10 13	AGUAZUL-CASANARE	3203218976	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	322976370	9504970635	E	2026/05/22	2026/05/20	BANCOLOMBIA	0	$2,531,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	4214504	ABRIL CIRO ALFONSO	230201	1	$58,364	$9,400	EPSC25	1	$58,364	$2,400	CCF69	1	$58,364	$2,400	14-23	1	$58,364	$4,100	1	$0	$0
2	CC	4214504	ABRIL CIRO ALFONSO	230201	9	$525,272	$84,100	EPSC37	9	$525,272	$21,100	CCF69	9	$525,272	$21,100	14-23	9	$525,272	$36,600	9	$0	$0
3	CC	1116555138	FORERO ALFONSO DEYSON JULIAN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
4	CC	1006064309	MIRANDA PEREZ DEIFER	05-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
5	CC	1057370525	NIÑO GOMEZ ROSSY ELENA	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS009	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
6	CC	5847193	PERALTA PINTO EYDI YORLEY	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
7	CC	1116542356	VASQUEZ RAMIREZ ANDRES FABIAN	230301	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF69	1	$58,364	$2,400	14-23	1	$58,364	$4,100	1	$0	$0
8	CC	1116542356	VASQUEZ RAMIREZ ANDRES FABIAN	230301	9	$525,272	$84,100	EPS037	9	$525,272	$21,100	CCF69	9	$525,272	$21,100	14-23	9	$525,272	$36,600	9	$0	$0
Total			**Afiliados(6)**			**$8,170,892**	**$1,307,800**			**$8,170,892**	**$327,400**			**$8,170,892**	**$327,400**			**$8,170,892**	**$569,000**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				6	$1,307,800	$0	$0	$1,307,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$653,900	$0	$0	$653,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$93,500	$0	$0	$93,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$569,000	$0	$0	$569,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	$569,000	$0	$0	$569,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$327,400	$0	$0	$327,400
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	6	$327,400	$0	$0	$327,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				6	$327,400	$0	$0	$327,400
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$23,500	$0	$0	$23,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$23,500	$0	$0	$23,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$70,100	$0	$0	$70,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$210,300	$0	$0	$210,300
TOTAL				6	$2,531,600	$0	$0	$2,531,600

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900004183	1	CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY	CR 12 10 13	AGUAZUL-CASANARE	3203218976	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	203203724	95022774544	E	2026/04/22	2026/04/07	BANCOLOMBIA	0	$4.067.500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificacion		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	4214504	ADRIS CRIO ALFONSO	230201	7	$408,545	$65,400	EPSC25	7	$408,545	$16,400	CCF69	7	$408,545	$16,400	14-23	7	$408,545	$28,500	7	$0	$0
2	CC	1116555138	FORERO ALFONSO DEYSON JAISAN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
3	CC	13689833	GARCIA DIAZ NAPOLEON	230301	28	$1,634,178	$261,500	EPS005	28	$1,634,178	$65,400	CCF69	28	$1,634,178	$65,400	14-23	28	$1,634,178	$113,800	28	$0	$0
4	CC	1006442275	GALICIA SANDOVAL ANDRES FELIPE	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
5	CC	1050064109	MIRANDA PEREZ DEIFER	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
6	CC	1057570515	NIÑO GOMEZ ROSSY ELENA	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
7	CC	33647192	PERALTA PINTO EYDI YORLEY	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
8	CC	9658843	PUENTO JORGE	230301	28	$1,634,178	$261,500	EPSC25	28	$1,634,178	$65,400	CCF69	28	$1,634,178	$65,400	14-23	28	$1,634,178	$113,800	28	$0	$0
9	CC	1116542256	VASQUEZ RAMIREZ ANDRES FABIAN	230301	13	$700,362	$112,100	EPS037	12	$700,362	$28,100	CCF69	12	$700,362	$28,100	14-23	12	$700,362	$48,800	12	$0	$0
Total			**Afiliados(9)**			$13,131,788	$2,101,500			$13,131,788	$525,600			$13,131,788	$525,600			$13,131,788	$914,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$2,101,500	$0	$0	$2,101,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,475,700	$0	$0	$1,475,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$65,400	$0	$0	$65,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$914,400	$0	$0	$914,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	9	$914,400	$0	$0	$914,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$525,800	$0	$0	$525,800
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	9	$525,800	$0	$0	$525,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$525,800	$0	$0	$525,800
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	2	$81,800	$0	$0	$81,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$98,200	$0	$0	$98,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$70,100	$0	$0	$70,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$275,700	$0	$0	$275,700
TOTAL				9	$4,067,500	$0	$0	$4,067,500

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901004183	1	CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY	CR 12 10 13	AGUAZUL CASANARE	3203218976	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	126218447	95012281S9	E	2026/03/19	2026/03/09	BANCOLOMBIA	0	$4,428,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
Nu.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	1116555138	FORERO ALFARO DEYSON JULIAN	130301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14 23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
2	CC	13689871	GARCIA DIAZ NAPOLEON	130301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14 23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
3	CC	1006442375	GALICHIA SANDOVAL JAVIER FELIPE	130301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14 23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
4	CC	1116954460	MENDOZA SALAMANCA NICOLAS	130301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14 23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
5	CC	1050064309	MIRANDA PEREZ DOFER	25 14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14 23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
6	CC	1057570525	NIÑO GOMEZ ROSIV ELENA	131001	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14 23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
7	CC	33647193	PERALTA PINTO EYDI YORLEY	130301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14 23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
8	CC	7653847	PUERTO JORGE	130101	30	$1,750,905	$280,200	EPSC25	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14 23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
9	CC	79758934	RINCON RODRIGO ALIRIO	130101	5	$291,818	$46,700	EPS005	5	$291,818	$11,700	CCF69	5	$291,818	$11,700	14 23	5	$291,818	$20,400	5	$0	$0
Total	**Afiliados(9)**					**$14,299,058**	**$2,288,300**			**$14,299,058**	**$572,500**			**$14,299,058**	**$572,500**			**$14,299,058**	**$995,600**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$2,288,300	$0	$0	$2,288,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,727,900	$0	$0	$1,727,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$995,600	$0	$0	$995,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	9	$995,600	$0	$0	$995,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$572,500	$0	$0	$572,500
CONFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	9	$572,500	$0	$0	$572,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$572,500	$0	$0	$572,500
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$70,100	$0	$0	$70,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$140,200	$0	$0	$140,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$70,100	$0	$0	$70,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$292,100	$0	$0	$292,100
TOTAL				**9**	**$4,428,900**	**$0**	**$0**	**$4,428,900**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 902004183	1	CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY	CR 12 10 13	AGUAZUL-CASANARE	3203218976	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	494147852	9499443296	E	2026/02/19	2026/02/09	NEQUI	0	$2,427,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1116555138	FORERO DEYSON	130301	11	$641,999	$102,800	EPS041	11	$641,999	$35,200	CCF69	11	$641,999	$25,700	14-13	11	$641,999	$44,940	11	$0	$0
2	CC	1118560942	FORERO JENNY	130301	4	$233,454	$37,400	EPS037	4	$233,454	$9,400	CCF69	4	$233,454	$9,400	14-13	4	$233,454	$16,340	4	$0	$0
3	CC	9348573	GARCIA NAPOLEON	130301	17	$992,180	$158,800	EPS002	17	$992,180	$39,700	CCF69	17	$992,180	$39,700	14-13	17	$992,180	$69,470	17	$0	$0
4	CC	1006462275	GARCIA ANDRES	130301	11	$641,999	$102,800	EPS037	11	$641,999	$35,200	CCF69	11	$641,999	$25,700	14-13	11	$641,999	$44,940	11	$0	$0
5	CC	1116554460	MENDOZA NICOLAS	130301	11	$641,999	$102,800	EPS037	11	$641,999	$35,200	CCF69	11	$641,999	$25,700	14-13	11	$641,999	$44,940	11	$0	$0
6	CC	1030064309	MIRANDA JEFFER	23-14	17	$992,180	$158,800	EPS005	17	$992,180	$39,700	CCF69	17	$992,180	$39,700	14-13	17	$992,180	$69,470	17	$0	$0
7	CC	1075270525	NIÑO BIBIAN	231001	21	$1,342,361	$214,800	EPS087	21	$1,342,361	$53,700	CCF69	21	$1,342,361	$53,700	14-13	21	$1,342,361	$93,940	21	$0	$0
8	CC	33647893	PERALTA EYDI	130301	23	$1,342,361	$214,800	EPS089	23	$1,342,361	$53,700	CCF69	23	$1,342,361	$53,700	14-13	23	$1,342,361	$93,940	23	$0	$0
9	CC	9659847	PUERTO JORGE	230301	17	$992,180	$158,800	EPS025	17	$992,180	$39,700	CCF69	17	$992,180	$39,700	14-13	17	$992,180	$69,470	17	$0	$0
Total	**Afiliados(9)**					$7,820,713	$1,251,800			$7,820,713	$313,000			$7,820,713	$313,000			$7,820,713	$544,760		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

TIPO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$1,251,800	$0	$0	$1,251,800
COLFONDOS	23100I	800,227,940	6	1	$214,800	$0	$0	$214,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$158,800	$0	$0	$158,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$878,200	$0	$0	$878,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$544,700	$0	$0	$544,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	9	$544,700	$0	$0	$544,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$313,000	$0	$0	$313,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	9	$313,000	$0	$0	$313,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$313,000	$0	$0	$313,000
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$39,700	$0	$0	$39,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$60,800	$0	$0	$60,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$25,700	$0	$0	$25,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$186,800	$0	$0	$186,800
TOTAL				9	$2,422,500	$0	$0	$2,422,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900904183	1	CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY	CR 12 10 11	AGUAZUL-CASANARE	3203218976	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	94980010[illegible]	94981C5873	E	2026/01/22	2026/01/26	BANCO DE BOGOTA	4	$134,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	Ret	Tde	Tae	Tdp	Tap	Vsp	Cor	Vst	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	Irl	Vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1057570525	[illegible] BOYA	X	X																	21001	8	$432,934	$69,300	EPS005	8	$432,934	$57,400	CCF07	8	$432,934	$57,400	14-25	8	$432,934	$30,240	8	$0	$0	SI	$134,300
Total Afiliados(1)																								$432,934	$69,300			$432,934	$57,400			$432,934	$57,400			$432,934	$30,240		$0	$0		$134,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900004583	1	CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY	CR 12 12 13	AGUAZUL-CASANARE	3103218976	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	9498305873	9498305873	E	2026/01/23	2026/01/26	BANCO DE BOGOTA	4	$134,400

RESUMEN DE PAGO

AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	$69,300	$200	$0	$69,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6		1	$69,300	$200	$0	$69,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	$30,200	$100	$0	$30,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6		1	$30,200	$100	$0	$30,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					1	$17,400	$100	$0	$17,500
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8		1	$17,400	$100	$0	$17,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	$17,400	$100	$0	$17,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6		1	$17,400	$100	$0	$17,500

ANEXO 7. PÓLIZAS CONTRACTUALES VIGENTES Y APROBACIÓN

	APROBACIÓN DE POLIZAS	Código: FO034015
		Versión: 1
	PROCESO DE APOYO	Fecha: 11-11-2022
	GESTIÓN JURIDICA	Página: 1
		DOCUMENTO CONTROLADO

LA OFICINA ASESORA JURIDICA DEL HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E.

HACE CONSTAR

QUE EN EJERCICIO DE LA FACULTAD OTORGADA POR EL ACUERDO Nº 014 DE 2024 Y EN ACATAMIENTO DE LO PRECEPTUADO POR EL ARTÍCULO 7 DE LA LEY 1150 DE 2007 Y EL DECRETO Nº. 1082 de 2015, SE EFECTUO LA REVISION DE LA POLIZA RESPECTO DEL CONTRATO QUE A CONTINUACION SE DESCRIBE:

CONTRATO DE OBRA PUBLICA	**751-2025**
CONTRATISTA	**CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY R/L ROSSY ELENA NIÑO GOMEZ**
OBJETO	***PRORROGA No. 01*** *al CONTRATO DE OBRA No. 751 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025. cuyo objeto es: "ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE."*
GARANTÍA	

DESCRIPCION DE AMPAROS					
COMPAÑIA	**POLIZA Y CERT. Nº**	**AMPARO**	**VIGENCIA**		**SUMA ASEGURADA $**
			DESDE	**HASTA**	
ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL	COQ-100007591 ANEXO: 2	CUMPLIMIENTO	20/03/2026	30/10/2026	$44.867.861,70
		PRESTACIONES SOCIALES	20/03/2026	30/04/2029	$22.433.930,85
		CALIDAD DEL SERVICIO	20/03/2026	30/10/2026	$44.867.861,70
		CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	20/03/2026	30/10/2026	$44.867.861,70
		ESTABILIDAD DE LA OBRA	30/04/2026	30/04/2031	$134.603.585,10
	COQ-100001941 ANEXO: 2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	11/12/2025	30/04/2026	$284.700.000,00

CON BASE EN LO ANTERIOR, ESTE DESPACHO IMPARTE SU APROBACION EL OCHO (08) DEL MES DE ABRIL DE DOS MIL VEINTISEIS (2026).

YISSET VANESA [illegible] VERRIA LOPEZ
Jefe Oficina Asesora jurídica

Katerine Cristancho
Elaboro. - Jhann Katerine Cristancho Castblanco
Profesional Contratada- Of. Jurídica

seguros mundial®

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2026.03.24 15:31:54 -05:00

Codigo de Seguridad: EwRIDWsMUd9S55wtX48dDw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 30-05-2025 -1117-P-05-PMSIS20000000059-0002

No. PÓLIZA	CDQ-100007591	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	680016210	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	24/03/2026	SUC. EXPEDIDORA	CEN ORINOQUIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	11/12/2025	24:00 Horas Del	30/04/2031		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY	No. DOC. IDENTIDAD	902.004.183-1
DIRECCIÓN	CR 16 14 55	TELÉFONO	3138568266
ASEGURADO	HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E.	No. DOC. IDENTIDAD	844.001.355-6
DIRECCIÓN	CL 11 15 40	TELÉFONO	3160257983
BENEFICIARIO	HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E.	No. DOC. IDENTIDAD	844.001.355-6
DIRECCIÓN	CL 11 15 40	TELÉFONO	3160257983

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS UN (1) MES Y VEINTE (20) DÍAS, SEGUN PRORROGA 01 DE FECHA 20/03/2026.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINUAN VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SECOP II CP 005-2025 Y NÚMERO INTERNO 751-2025 CUYO OBJETO ES ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

ASEGURADO/BENEFICIARIO: HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT. 844.001.355-6

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 20/03/2026	24:00 Horas Del 30/10/2026	44.867.861,70	9.834,05
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 20/03/2026	24:00 Horas Del 30/04/2029	22.433.930,85	5.039,95
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 20/03/2026	24:00 Horas Del 30/10/2026	44.867.861,70	9.834,05
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	00:00 Horas Del 20/03/2026	24:00 Horas Del 30/10/2026	44.867.861,70	9.834,05
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 30/04/2026	24:00 Horas Del 30/04/2031	134.603.585,10	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 291.641.101,05	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
ISLIAL SEGUROS LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	34.542,10
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	34.542,10
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	6.563,00
TOTAL A PAGAR	$	41.105,10

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 24/03/2026

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACION VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACION DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGUN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CODIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA. MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atencion al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	COQ-100007591	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	680016210	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	24/03/2026	SUC. EXPEDIDORA	CEN ORINOQUIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
08:00 Horas Del	11/12/2025	24:00 Horas Del	30/04/2031		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO
Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

APLICACIÓN A LA CLÁUSULA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAGA ABF

seguros mundial®

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2026.03.24 15:30:01 -05:00

Codigo de Seguridad: ceZIAwOOrH/go86tzlQ3Xwww

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 12-05-2025-1317-P-96-PPSUSB00000027-0002

No. POLIZA	CDQ-100001941	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	680016287	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	24/03/2026	SUC. EXPEDIDORA	CEN ORINOQUIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	13/12/2025	24:00 Horas Del	30/04/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY	No. DOC. IDENTIDAD	902.004.183-1
DIRECCIÓN	CR 16 14 55	TELÉFONO	3138568266
ASEGURADO	CONSORCIO SAN JOSE DEL BUBUY	No. DOC. IDENTIDAD	902.004.183-1
DIRECCIÓN	CR 16 14 55	TELÉFONO	3138568266
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	900187229737
DIRECCIÓN	...	TELÉFONO	.....

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS UN (1) MES Y VEINTE (20) DÍAS, SEGUN PRORROGA 01 DE FECHA 20/03/2026.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINUAN VIGENTES.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SECOP II CP 005-2025 Y NÚMERO INTERNO 751-2025 CUYO OBJETO ES ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.

ASEGURADO/BENEFICIARID: HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT. 844.001.355-6

.

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES PATRONAL	0,00	284.700.000,00	284.700.000,00	53.960,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	0,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	0,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
	0,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 284.700.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
ISLIAL SEGUROS LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	53.960,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	53.960,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	12.352,40
TOTAL A PAGAR	$	76.112,40

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 24/03/2026

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 02% DE 2008 SUPERFINANCIERA)

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGUN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CODIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTICULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMAS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACION, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUI INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTIAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA POLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO

Firma Autorizada - Compañia Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atencion al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento

VIGILADO

HOJA No.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 12-05-2025-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	COQ-100001941	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	680016207	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	24/03/2026	SUC. EXPEDIDORA	CEN ORINOQUIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	11/12/2025	24:00 Horas Del	30/04/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

- ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ AL HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT. 844.001.355-6 COMO O ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DEL HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT. 844.001.355-6 BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ AL HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT. 844.001.355-6 COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

APLICACIÓN A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Ley 1 PAGA: ARP
