
CRONOGRAMA AEROPUERTO CUCUTA LINEA BASE 6


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
1		**REALIZAR LA NIVELACIÓN DE LA PISTA 16-34 DEL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CÚCUTA.**	**282 días**	**vie 11/07/25**	**lun 19/10/26**	**$ 13.223.236.041,00**
2		Suscripcion del Acta de inicio	0 días	vie 11/07/25	vie 11/07/2	$ 0,00
3		**1. DOCUMENTACION PRELIMINAR**	**30 días**	**vie 11/07/25**	**jue 21/08/2**	**$ 0,00**
29		**2. ACTIVIDADES PRELIMINARES PARA INICIO DE OBRA**	**30 días**	**vie 11/07/25**	**jue 21/08/2**	**$ 0,00**
47		**3. ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION**	**266 días**	**jue 24/07/25**	**jue 8/10/26**	**$ 12.276.805.409,00**
48		1.1 Localización, Replanteo, Verificación Topográfica y seguimiento de obra, incluye topografía y entrega de planos seguimiento y record (Comisión Topografía, estación total, logística y demás elementos necesarios)	20 días	jue 24/07/25	mié 20/08/25	$ 230.070.648,76
49		**Componente técnico HITO 1 (Tramo 1: K0+000 a K0+150)**	**174 días**	**jue 11/09/25**	**mar 21/07/**	**$ 1.796.819.858,41**
56		**Componente técnico HITO 2 (Tramo 2: K0+150 a K0+300)**	**140 días**	**mié 29/10/2**	**mar 21/07/**	**$ 1.165.552.472,57**
64		**Componente técnico HITO 3 (Tramo 3: K0+300 a K0+355)**	**115 días**	**jue 27/11/25**	**vie 22/05/**	**$ 837.409.700,40**
71		**Componente técnico HITO 4 (Tramo 4: K0+355 a K0+452.5**	**95 días**	**vie 16/01/26**	**mar 21/07/**	**$ 971.666.748,07**
78		**Componente técnico HITO 5 (Tramo 5: K0+452.5 a K0+591.5)**	**78 días**	**vie 6/02/26**	**vie 17/07/**	**$ 1.938.398.803,45**
85		**Componente técnico HITO 6 (Tramo 6 (K0+591.5 a K0+730)**	**52 días**	**lun 16/03/26**	**vie 17/07/**	**$ 2.197.719.022,13**
92		**Componente técnico HITO 7 (Tramo 7 (K0+730 a K0+900)**	**25 días**	**mié 22/04/2**	**vie 17/07/**	**$ 2.308.528.683,80**
99		**Componente técnico HITO 8 Franjas de seguridad**	**59 días**	**lun 20/07/26**	**jue 8/10/2**	**$ 830.639.471,42**
100		1.1 Localización, Replanteo, Verificación Topográfica y seguimiento de obra	59 días	lun 20/07/26	jue 8/10/26	$ 237.386.860,64
101		2.5 Suministro de imprimación con emulsión asfáltica, según normal FAA P-602, incluye barrido y transporte	59 días	lun 20/07/26	jue 8/10/26	$ 60.353.764,18
102		NP-01 Suministro y aplicación de pintura imprimante acrílica para borrado de señalización existente en la pista. La actividad incluye la dilución controlada del imprimante mediante disolvente tipo XILOL, según especificaciones del fabricante.	59 días	lun 20/07/26	jue 8/10/26	$ 118.161.419,40
103		NP-02 CONFORMACIÓN Y ESTABILIZACIÓN MECÁNICA DE MÁRGENES Y FRANJAS DE SEGURIDAD MEDIANTE REUTILIZACIÓN DE MATERIAL FRESADO RAP, INCLUYENDO DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO, EXTENDIDO, HOMOGENIZACIÓN, CONTROL DE HUMEDAD, CONFORMACIÓN GEOMÉTRICA, NIVELACI	59 días	lun 20/07/26	jue 8/10/26	$ 414.737.427,20
104		**BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA INTERVENCIÓN DE AYUDAS VISUALES**	**282 días**	**vie 11/07/25**	**lun 19/10/26**	**$ 946.430.632,00**
105		**NTERVENCIÓN DE AYUDAS VISUALES hito 1, 2 y 3**	**4 días**	**mié 10/12/25**	**lun 15/12/2**	**$ 380.781.892,00**
120		**INTERVENCIÓN DE AYUDAS VISUALES HITO 4 , 5 Y 6**	**7 días**	**mié 20/05/26**	**mar 21/07/**	**$ 302.397.159,90**
128		**NTERVENCIÓN DE AYUDAS VISUALES HITO 8**	**67 días**	**vie 17/07/26**	**lun 19/10/2**	**$ 263.251.538,78**
129		3.1.1 – Desinstalación de bases de 8” en trabajo nocturno. No incluye sellado de orificio ni disposición. Incluye desconexión de lámpara y entrega en almacén del Aeropuerto de Cúcuta	10 días	vie 17/07/26	jue 30/07/26	$ 610.099,00
130		3.1.3 – Desinstalación de bases de 12” en trabajo nocturno. No incluye sellado de orificio ni disposición. Incluye desconexión de lámpara y entrega en almacén del Aeropuerto de Cúcuta	10 días	vie 17/07/26	jue 30/07/26	$ 797.210,00

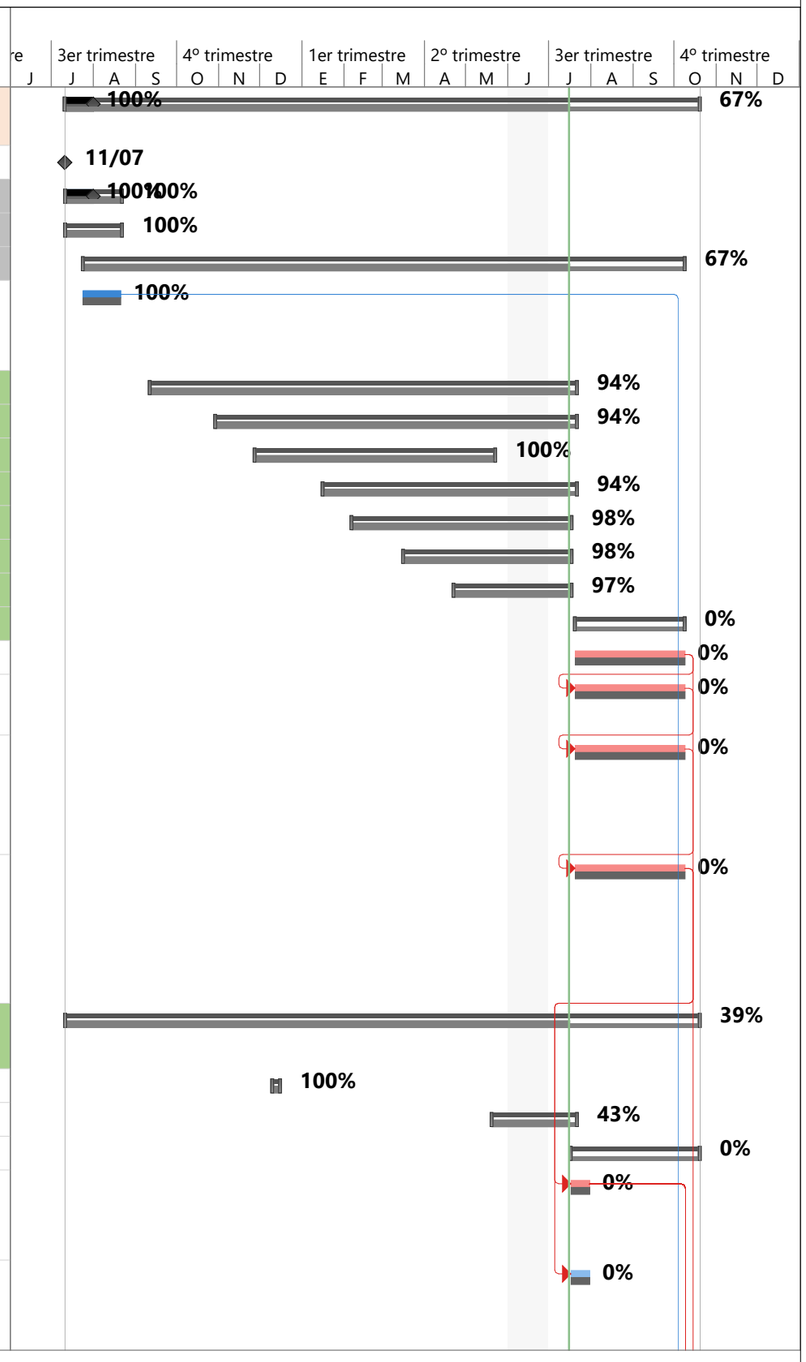

Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
solo el comienzo
solo fin
solo duración
Tareas críticas
División crítica
Línea base
División de la línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite
Resumen de línea base

CRONOGRAMA AEROPUERTO CUCUTA LINEA BASE 6

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
131		3.1.4 – Suministro e instalación de asfalto en frío para recuperación de carpeta asfáltica por retiro de balizas y bases de 8”. Incluye limpieza de superficie, cargue, transporte, preparación de la superficie, riego de liga y colocación/compactación en ca	6 días	vie 9/10/26	vie 16/10/26	$ 115.612,00
132		3.2.1 – Suministro en obra, transporte, perforación del pavimento, colocación, nivelación y sellado de bases poco profundas tipo FAA L-868 de 8” para el sistema de ayudas visuales en pista. Incluye replanteo, perforación del núcleo, limpieza de la cavidad	6 días	vie 9/10/26	vie 16/10/26	$ 2.123.366,00
133		3.2.2 – Suministro en obra, transporte, perforación del pavimento, colocación, nivelación y sellado de bases poco profundas tipo FAA L-868 de 12” para el sistema de ayudas visuales en pista. Incluye replanteo, perforación del núcleo, limpieza de la cavida	6 días	vie 9/10/26	vie 16/10/26	$ 3.054.182,00
134		3.3 – Suministro e instalación de juego de conectores secundarios FAA L-823, incluyendo mano de obra, equipos, insumos y pruebas de continuidad y aislamiento	6 días	vie 9/10/26	vie 16/10/26	$ 7.650.476,00
135		3.4 – Suministro e instalación de cable secundario 2×10 AWG THHN-TWH para redes eléctricas de baja tensión, incluyendo medición, corte, tendido, conexión, fijación y pruebas según RETIE y NTC	6 días	vie 9/10/26	vie 16/10/26	$ 8.205.778,00
136		3.5 – Instalación de luces de pista sobre bases FAA L-868 previamente suministradas (no incluye suministro ni conectores), incluyendo nivelación, alineación, conectorización, sellado y pruebas de funcionamiento	6 días	vie 9/10/26	vie 16/10/26	$ 4.817.225,00
137		3.6 – Ranurado en asfalto y sellado para instalaciones de acometidas a luces empotradas. Incluye apertura de ranuras, corte mecánico con disco diamantado, limpieza y disposición de residuos. No incluye ductos, tendido de cables ni sellado final	3 días	vie 9/10/26	mar 13/10/26	$ 10.847.232,00
138		3.7 - SUMINISTRO DE LUZ LED DE TOMA DE CONTACTO EMPOTRADA DE 8 PULGADAS (8")	6 días	vie 9/10/26	vie 16/10/26	$ 95.185.125,00
139		3.9 - suministro de luz led de eje de pista empotrada de 8 pulgadas (8")	6 días	vie 9/10/26	vie 16/10/2(	$ 30.836.800,00
140		3.10 - suministro de luz led elevada de borde de pista	6 días	vie 9/10/26	vie 16/10/2(	$ 16.160.200,00
141		3.11 - suministro de luz led de umbral de pista	6 días	vie 9/10/26	vie 16/10/2(	$ 35.090.125,00
142		3.12 - suministro e instalación de base de concreto cónica con los accesorios necesarios para la instalación de luces elevadas de borde de pista. incluye reinstalación de luz de borde de pista previamente retirada.	6 días	vie 9/10/26	vie 16/10/26	$ 31.691.592,78
143		3.13 - desconexión de transformador y retiro de luces de borde de pista. luces elevadas de borde de pista ww-8, luces elevadas de borde de pista ww-19 y luces elevadas de borde de eje de pista ww-14. incluye demolición de bases de concreto, desmonte, reco	7 días	vie 9/10/26	lun 19/10/26	$ 16.066.516,00
144		**5. MANUAL DE MANTENIMIENTO (MM)**	**199 días**	**vie 11/07/25**	**lun 4/05/2(**	**$ 41,32**
149		Acta de terminacion de contrato	0 días	jue 8/10/26	jue 8/10/26	$ 0,00

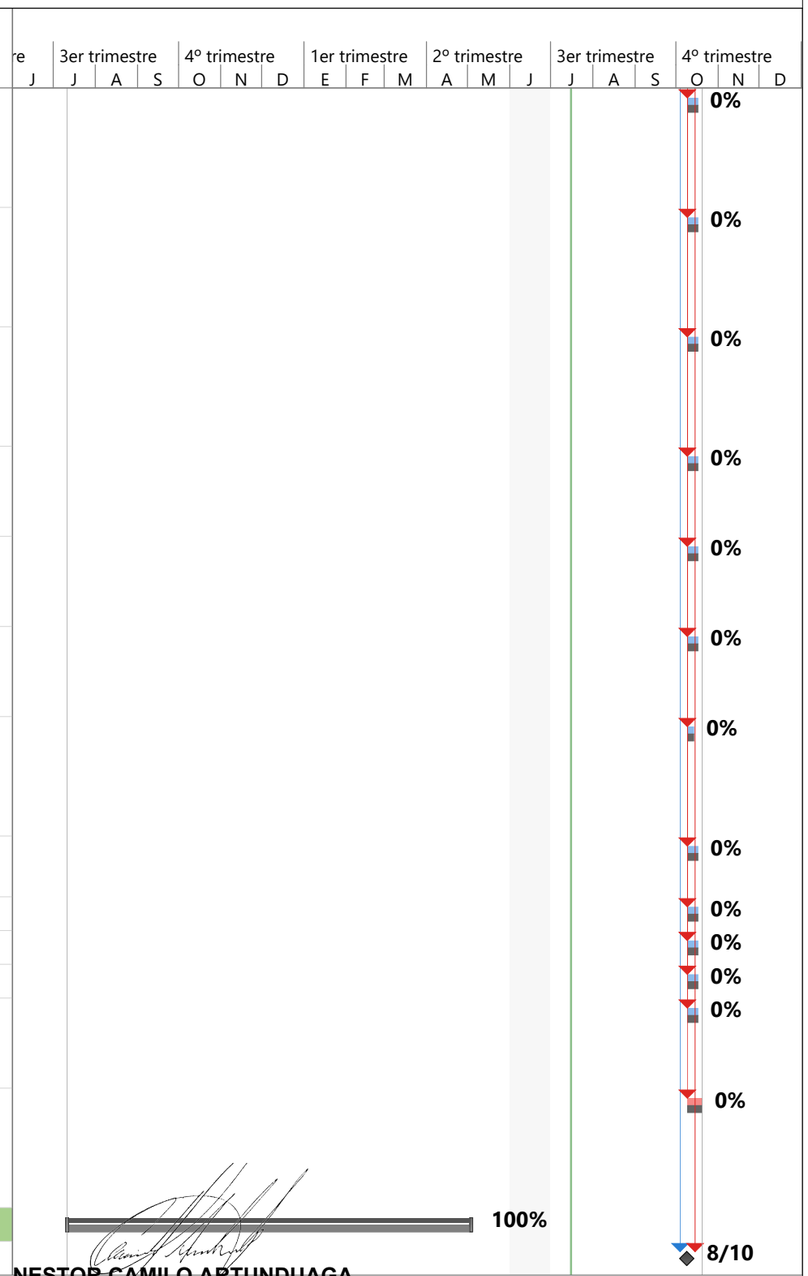

GERARDO SEGURA PEREZ
Representante Legal
CONSORCIO PISTA 16-34
CONTRATISTA

NESTOR CAMILO ARTUNDUAGA
Representante Legal
CONSORCIO INTERPISTAS 25
INTERVENTORIA

Progreso de tarea crítica	solo el comienzo	Línea base	Resumen	Tarea inactiva	
Tarea	solo fin	División de la línea base	Resumen manual	Hito inactivo	
División	solo duración	Hito de línea base	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	
Progreso de tarea	Tareas críticas	Hito	Tareas externas	Fecha límite	
Tarea manual	División crítica	Progreso del resumen	Hito externo	Resumen de línea base	
