15. INCONVENIENTES, OBSERVACIONES Y SOLUCIONES

Durante el periodo 1, que comprende desde el **13 de mayo y el 17 de julio de 2026**, se presentaron los siguientes inconvenientes y sus respectivas soluciones:

Observación 1: durante el proceso constructivo de las actividades de desmonte y demolición se evidencio que para las redes hidrosanitarias propuestas se hace necesario evaluar un nuevo trazado de redes pues las redes sanitarias existentes desembocaban en pozos sépticos improvisados bajo placa que no era fácilmente identificables dentro de la fase de planeación del proyecto

Solución 1.: se realiza el armado de tuberías hasta el punto de recolección y se deja pendiente por definir la nueva ruta de desagües de aguas sanitarias para la etapa 1 y 2 del proyecto

se estableció en conjunto con la interventoría y supervisión un nuevo trazado para las instalaciones hidrosanitarias ya que todas las existentes terminaban en pozos improvisados bajo placa

Observación 2: durante el proceso de demolición y desmonte se hace necesario el desmonte de tabletas en paredes y pisos de las áreas de cocinas y baños existentes para las etapas 1 y 2 del proyecto dado que las tabletas de muros se ve comprometida y deteriorada en las juntas con el suelo y en juntas donde se realizan demoliciones de muros ; teniendo en cuenta que la tableta instalada existente es cerámica blanca del formato 20 x 20 y que la misma se encuentra fuera del mercado lo que imposibilitaría una correcto empalme estético de reparación para dichas áreas , teniendo en cuenta que estas áreas solicita la evaluación del retiro total de dicha tableta la corrección de niveles de bajo rampas.

Solución 2: se incluye el cambio total de tableta dentro del proceso de balance de mayores y menores cantidades

Observación 3: durante el proceso de desmonte y de cubierta y desmonte de cielorrasos se ve la necesidad de evaluar un cambio de tipo de cubierta teniendo en cuenta que la infraestructura actual no cuanta con un sistema estructural adecuado que permita realizar una fijación con anclajes o tornillería teniendo en cuenta que la estructura existente son celosías en forma de triángulo invertido formadas con varillas de acero soldadas entre si.

Solución 3 se realiza el desmonte de cubierta y cielo Razo y se incluye dentro del proceso de modificatoria la evaluación del cambio de material de cubierta y a su vez al evidenciarse la necesidad de volver a distribuir puntos eléctricos de toma corrientes e interruptores de luz también se incluye la evaluación de la inclusión de dichos ítems eléctricos.

Observación 4: durante el periodo de seguimiento presentado en este documento hubo unas constantes lluvias lo que impidió la normal ejecución e las actividades de desmonte y demoliciones

Solución 4:se solicita al contratista de obra evaluar un plan de acción para conservar el cronograma de actividades según lo establecido inicialmente,

Observación 5: Durante el período comprendido entre el 01 y el 30 de junio, la Interventoría evidenció la ocurrencia de precipitaciones de alta intensidad durante la jornada laboral, situación que afectó el desarrollo normal de las actividades de obra. Adicionalmente, las fuertes lluvias ocasionaron interrupciones en el suministro de energía eléctrica (apagones), generando suspensión parcial de las labores en diferentes oportunidades.

Solución 5: En coordinación con el contratista de obra, la Interventoría verificó la implementación de un plan de trabajo orientado a priorizar la ejecución de actividades bajo cubierta, con el propósito de mitigar el impacto de las condiciones climáticas sobre el cumplimiento del cronograma. No obstante, se constató que, en diversas ocasiones, las precipitaciones intensas ocasionaron interrupciones prolongadas del servicio de energía eléctrica, impidiendo el desarrollo normal de las actividades programadas. Como soporte de estas eventualidades, la Interventoría llevó el registro detallado en la bitácora de obra de las horas no laboradas y de las circunstancias que dieron lugar a dichas suspensiones.

16. CONCLUSIONES

- Interventoría ha realizado seguimiento a cada una de las obligaciones contractuales del contratista, para garantizar su cumplimiento a satisfacción del contratante, incluyendo lo relacionado al personal vinculado y seguridad social
- Se realiza comités de obra semanales, entre el contratista y la supervisión con el fin de analizar y observar el desarrollo de las actividades iniciales del proyecto.
- Se acudieron las reuniones pactadas como comités, reuniones técnicas, visitas técnicas y las demás reuniones adicionales requeridas en el ejercicio de interventoría.
- Se realizaron actividades de control y vigilancia de las actividades realizadas por el contratista de obra objeto de esta interventoría.
- El contratista de obra avanza con actividades en aras de subsanar y realiza las reparaciones necesarias exigidas por la interventoría
- Se evidencia mejora continua en los procesos constructivos y mayor atención a detalles técnicos en los cuales se habían tenido falencia anteriormente como sobre tamaños, riego, mejores procesos constructivo durante vaciado, entre otros.

- Durante los primeros días del mes de junio se llevó a cabo la revisión y posterior aprobación por parte de la interventoría y supervisión a la solicitud de modificación de balance de mayores y menores cantidades al contrato
- Para la ejecución del periodo comprendido entre el **13 de mayo y el 17 de julio de 2026**, se logró evidenciar un avance físico del 31,76 % equivalente a la suma en pesos de **$ 117.456.030,01**

Cordialmente.

R/L DE INTERVENTORIA
ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
Arquitectura Ingeniería Consultoría Y Construcciones S.A.S.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA.
AARON ALFREDO STEFAN PORTELA
Arquitectura Ingeniería Consultoría Y Construcciones S.A.S.

ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE PERIODO


ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD MOD 01	ACUMUADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO	FALTANTE POR EJECUTAR	
							CANT	%
1	**DEMOLICIONES Y DESMONTES**							
1,1	Desmonte de cielo raso en drywall. Incluye traslado hasta sitio de cargue o de almacenamiento	M2	309,37	0,00	201,45	201,45	107,92	34,88%
DESCRIPCIÓN:								






ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD MOD 01	ACUMUADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO	FALTANTE POR EJECUTAR	
							CANT	%
1	**DEMOLICIONES Y DESMONTES**							
1,2	Demolición Concreto Simple. Incluye Trasiego Y Cargue Manual	M3	8,59	0,00	6,47	6,47	2,12	24,68%
DESCRIPCIÓN: Se realiza demolición manual de concreto y la disposición del mismo								



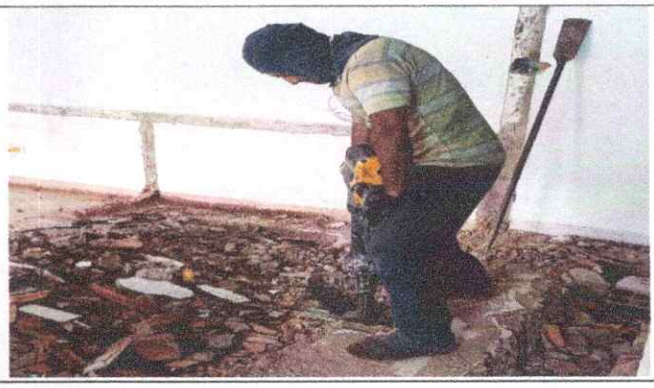

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD MOD 01	ACUMUADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO	FALTANTE POR EJECUTAR	
							CANT	%
1	**DEMOLICIONES Y DESMONTES**							
1,3	Desmonte De Piso Baldosa Cerámica O Gress. Incluye Traslado Hasta Sitio De Cargue O De Almacenamiento	M2	288,57	0,00	193,87	193,87	94,70	32,82%

DESCRIPCIÓN:

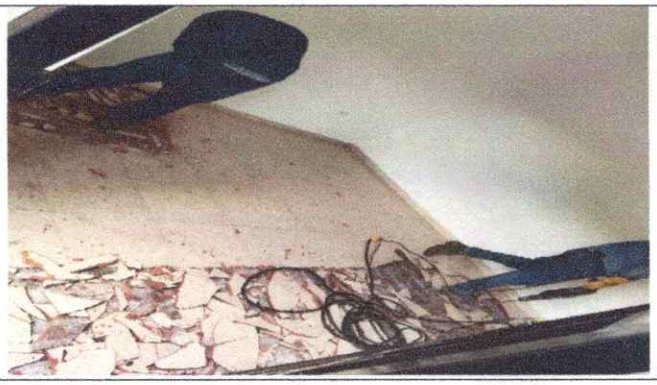



ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	ACUMUADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO	FALTANTE POR EJECUTAR	
							CANT	%
1	**DEMOLICIONES Y DESMONTES**							
1,4	Desmonte De Canal Metálica Existente.	ML	25,91	0,00	25,91	25,91	0,00	0,00%

DESCRIPCIÓN:






ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	ACUMUADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO	FALTANTE POR EJECUTAR	
							CANT	%
1	DEMOLICIONES Y DESMONTES							
1,5	Desmonte De Teja Asbesto Cemento. Incluye Traslado Hasta Sitio De Cargue O De Almacenamiento	M2	452,34	0,00	288,34	288,34	164,00	36,26%


DESCRIPCIÓN:



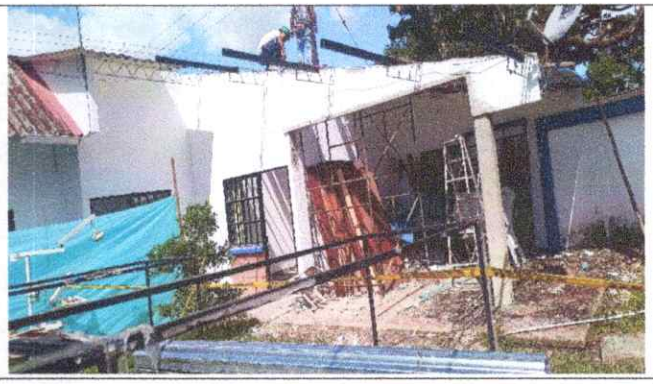

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	ACUMUADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO	FALTANTE POR EJECUTAR	
							CANT	%
1	DEMOLICIONES Y DESMONTES							
1,6	Desmonte De Luminaria Led	UND	95,00	0,00	57,00	57,00	38,00	40,00%

DESCRIPCIÓN:

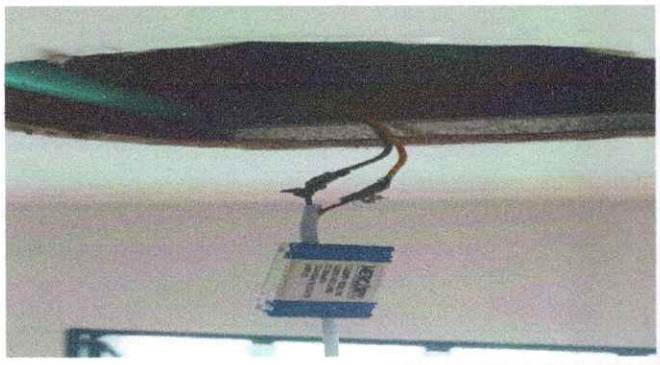




ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD MOD 01	ACUMUADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO	FALTANTE POR EJECUTAR	
							CANT	%
1	**DEMOLICIONES Y DESMONTES**							
1,7	Desmonte De Duchas Y Griferías. Incluye Traslado Hasta Sitio De Cargue O De Almacenamiento	UN	19,00	0,00	13,00	13,00	6,00	31,58%

DESCRIPCIÓN:



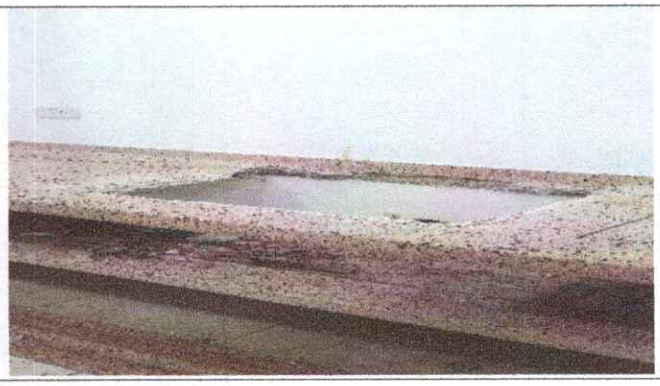

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD MOD 01	ACUMUADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO	FALTANTE POR EJECUTAR	
							CANT	%
1	**DEMOLICIONES Y DESMONTES**							
1,8	Demolicion Manual Enchape Cerámico Muros. Incluye Trasiego Y Cargue Manual	M2	114,86	0,00	83,46	83,46	31,40	27,34%

DESCRIPCIÓN:





ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD MOD 01	ACUMUADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO	FALTANTE POR EJECUTAR	
							CANT	%
1	**DEMOLICIONES Y DESMONTES**							
1,9	Desmonte De Rejas Y Ventanas Metalicas. Incluye Traslado Hasta Sitio De Cargue O De Almacenamiento	M2	25,93	0,00	18,27	18,27	7,66	29,54%


DESCRIPCIÓN:





ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD MOD 01	ACUMUADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO	FALTANTE POR EJECUTAR	
							CANT	%
1	**DEMOLICIONES Y DESMONTES**							
1.10	Demolicion Manual Muro Ladrillo Tolete Macizo/Común. Incluye Trasiego Y Cargue Manual	M2	63,14	0,00	35,61	35,61	27,54	43,61%


DESCRIPCIÓN:

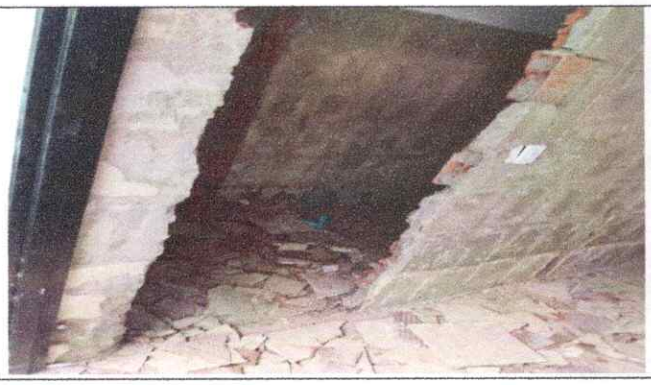



ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	ACUMUADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO	FALTANTE POR EJECUTAR	
							CANT	%
1	DEMOLICIONES Y DESMONTES							
1,11	Desmonte De Marco Y Puerta. Incluye Traslado Hasta Sitio De Cargue O De Almacenamiento	UN	27,00	0,00	16,00	16,00	11,00	40,74%

DESCRIPCIÓN:

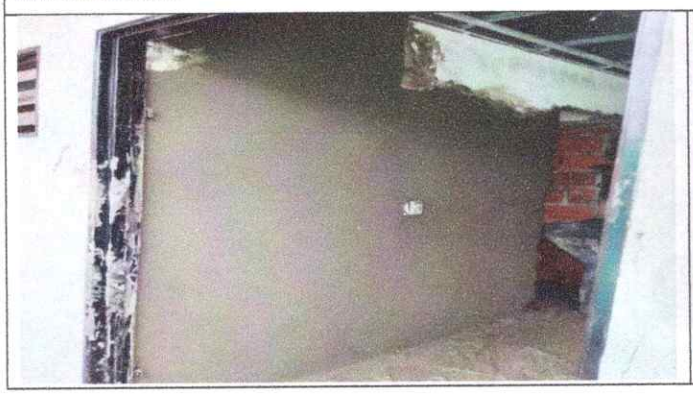



ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD MOD 01	ACUMUADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO	FALTANTE POR EJECUTAR	
							CANT	%
1	DEMOLICIONES Y DESMONTES							
1,12	Desmonte De Lavamanos. Incluye Traslado Hasta Sitio De Cargue O De Almacenamiento.	UN	15,00	0,00	10,00	10,00	5,00	33,33%

DESCRIPCIÓN:





ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD MOD 01	ACUMUADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO	FALTANTE POR EJECUTAR	
							CANT	%
1	**DEMOLICIONES Y DESMONTES**							
1,13	Desmonte De Sanitario. Incluye Traslado Hasta Sitio De Cargue O De Almacenamiento	UN	12,00	0,00	8,00	8,00	4,00	33,33%

DESCRIPCIÓN:.





ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD MOD 01	ACUMUADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO	FALTANTE POR EJECUTAR	
							CANT	%
1	**DEMOLICIONES Y DESMONTES**							
NP-1,14	Transporte Disposición Final De Escombros Y Sobrantes	M3/KM	8421,71	0,00	5180,43	5180,43	3241,28	38,49%

DESCRIPCIÓN:.






ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD MOD 01	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO	FALTANTE POR EJECUTAR	
							CANT	%
2	**EXCAVACIONES**							
2,1	Excavación Manual En Conglomerado H= 0 - 2.00 M Incluye Cargue	M3	12,94	0,00	8,32	8,32	4,62	35,70%

DESCRIPCIÓN:



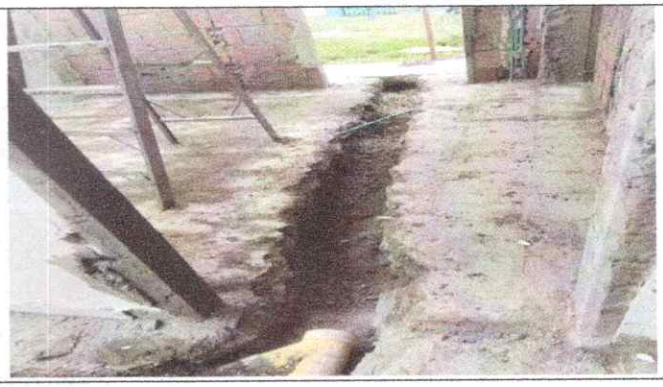

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD MOD 01	ACUMUADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO	FALTANTE POR EJECUTAR	
							CANT	%
2	**EXCAVACIONES**							
NP-2,2	Transporte Disposición Final De Escombros Y Sobrantes	M3/KM	520,26	0,00	334,25	334,25	186,01	35,75%

DESCRIPCIÓN:.





ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD MOD 01	ACUMUADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO	FALTANTE POR EJECUTAR	
							CANT	%
3	RELLENOS							
NP-3,2	Camada En Arena Para Cimentación De Tuberías	M3	5,17	0,00	2,87	2,87	2,30	44,49%

DESCRIPCIÓN:





ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD MOD 01	ACUMUADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO	FALTANTE POR EJECUTAR	
							CANT	%
3	RELLENOS							
NP-3,3	Relleno En Material Seleccionando Proveniente de Excavación Compactación Manual	M3	5,98	0,00	3,67	3,67	2,31	38,63%


DESCRIPCIÓN:





ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD MOD	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO	FALTANTE POR EJECUTAR	
							CANT	%
4	**MUROS Y PINTURA**							
4,2	Muro En Bloque Flexa No. 5, 0.12x0.20x0.30 M (Mortero Tipo S 1:4)	M2	83,23	0,00	74,55	74,55	8,68	10,43%

DESCRIPCIÓN: .

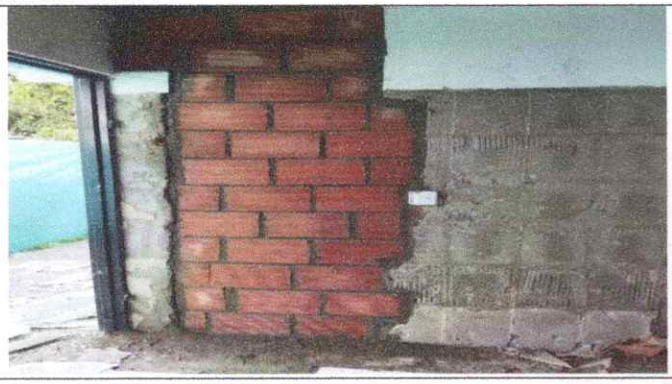




ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD MOD 01	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO	FALTANTE POR EJECUTAR	
							CANT	%
4	**MUROS Y PINTURA**							
4,4	Pañete Muros Interiores Mortero 1:4 Incluye Filos Y Dilataciones. Suministro Y Aplicación	M2	161,05	0,00	140,04	140,04	21,00	13,04%

DESCRIPCIÓN:.



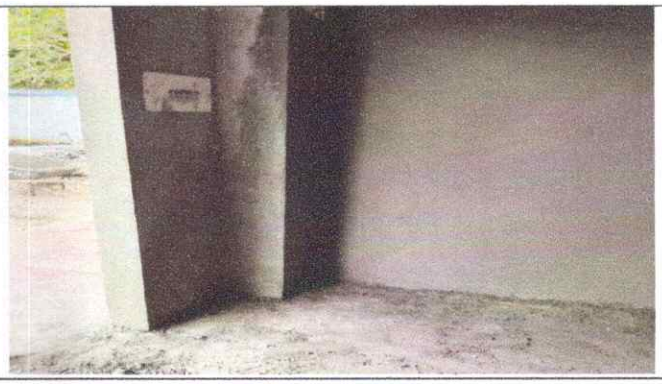

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD MOD 01	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO	FALTANTE POR EJECUTAR	
							CANT	%
4	MUROS Y PINTURA							
4,5	Pañete Muro Exterior Y Culatas Mortero 1:4 Impermeabilizado. Suministro Y Aplicación	M2	11,11	0,00	11,11	11,11	0,00	0,00%


DESCRIPCIÓN:.






ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD MOD 01	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO	FALTANTE POR EJECUTAR	
							CANT	%
4	MUROS Y PINTURA							
4,7	Estuco Plastico	M2	993,54	0,00	447,55	447,55	545,99	45,05%

DESCRIPCIÓN:.

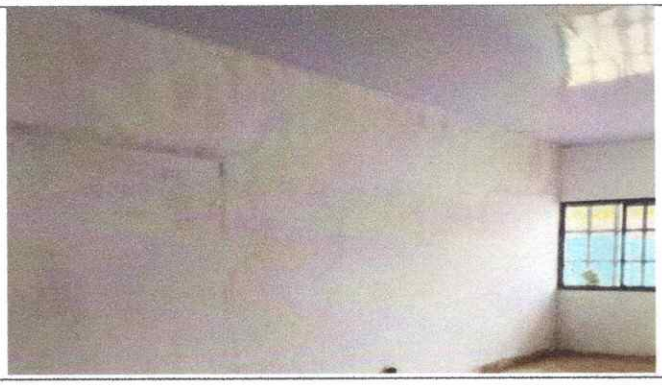

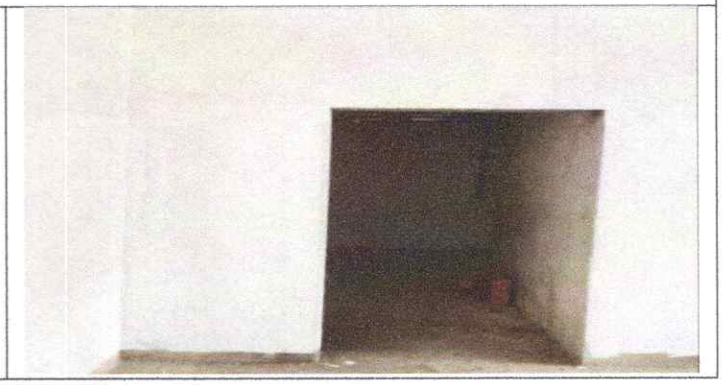

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	ACUMUADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO	FALTANTE POR EJECUTAR	
							CANT	%
5	**CIELO RASOS**							
NP-5,3	Suministro E Instalacion De Cielo Raso En Pvc Incluye Estructura Metalica	M2	277,77	0,00	169,85	169,85	107,92	38,85%

DESCRIPCIÓN:





ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD MOD 01	ACUMUADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO	FALTANTE POR EJECUTAR	
							CANT	%
6	**PISOS Y ENCHAPES**							
6,4	Placa De Contrapiso En Concreto Impermeabilizado 24.1 Mpa (3500 Psi) Mezcla En Obra. Suministro Y Construcción	M3	3,50	0,00	1,72	1,72	1,78	50,86%

DESCRIPCIÓN:





ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD MOD 01	ACUMUADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO	FALTANTE POR EJECUTAR	
							CANT	%
6	**PISOS Y ENCHAPES**							
NP-6,5	Afinado Pisos Mortero 1:4, E= 50 Mm	M2	288,57	0,00	180,65	180,65	107,92	37,40%


DESCRIPCIÓN:





ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD MOD 01	ACUMUADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO	FALTANTE POR EJECUTAR	
							CANT	%
7	**CUBIERTA**							
7,4	Suministro E Instalación Flanche Lámina Galvanizada Cal. 22 A 0.20 M	ML	54,56	0,00	41,95	41,95	12,61	23,11%

DESCRIPCIÓN:

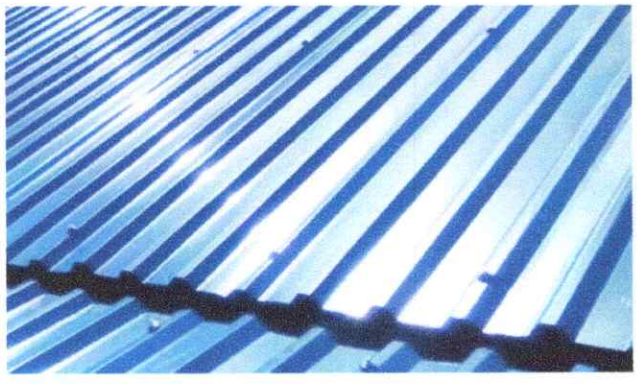



ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD MOD 01	ACUMUADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO	FALTANTE POR EJECUTAR	
							CANT	%
7	**CUBIERTA**							
NP-7,5	Suministro E Instalación Cubierta Arquitectónica Metálica Perfil Trapezoidal Tipo Acesco. No Incluye Estructura	M2	452,34	0,00	250,45	250,45	201,89	44,63%

DESCRIPCIÓN:





ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	ACUMUADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO	FALTANTE POR EJECUTAR	
							CANT	%
10	**RED SANITARIA**							
10,1	Tuberia Pvcs 2" Suministro E Instalación	ML	42,24	0,00	1,32	38,02	4,22	9,99%

DESCRIPCIÓN:





ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	ACUMUADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO	FALTANTE POR EJECUTAR	
							CANT	%
10	RED SAITARIA							
10,2	Tuberia Pvcs 4" Suministro E Instalación	ML	66,39	0,00	46,47	46,47	19,92	30,00%

DESCRIPCIÓN:





ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	ACUMUADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO	FALTANTE POR EJECUTAR	
							CANT	%
10	RED SAITARIA							
10,3	Accesorio Pvcs 2" Suministro E Instalación	UN	23,00	0,00	17,00	17,00	6,00	26,09%


DESCRIPCIÓN:





ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	ACUMUADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO	FALTANTE POR EJECUTAR	
							CANT	%
10	RED SAITARIA							
10,4	Accesorio Pvcs 4" Suministro E Instalación	UN	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	0,00%

DESCRIPCIÓN:

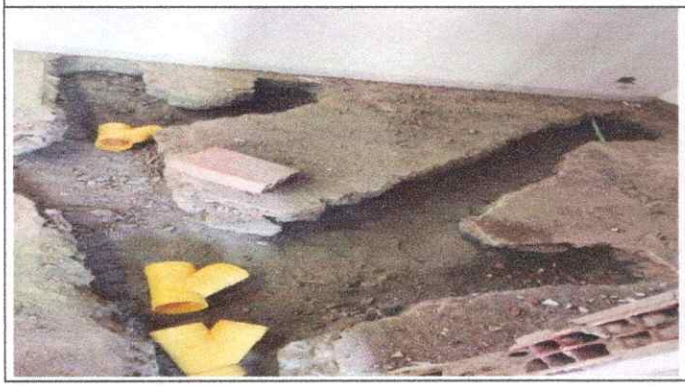



ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	ACUMUADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO	FALTANTE POR EJECUTAR	
							CANT	%
10	RED SAITARIA							
10,5	Sifón 180° Pvcs 2" Suministro E Instalación	UN	28,00	0,00	9,00	9,00	19,00	67,86%

DESCRIPCIÓN:





ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	ACUMUADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO	FALTANTE POR EJECUTAR	
							CANT	%
10	RED SAITARIA							
10,6	Salida Sanitaria Sifon De Piso 2"	UN	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00%

DESCRIPCIÓN:





ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	ACUMUADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO	FALTANTE POR EJECUTAR	
							CANT	%
11	RED HIDRAULICA							
11,1	Tubería Pvcp Rde 09 1/2" Suministro E Instalación	ML	86,41	0,00	80,49	80,49	5,92	6,85%

DESCRIPCIÓN:






ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	ACUMUADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO	FALTANTE POR EJECUTAR	
							CANT	%
11	**RED HIDRAULICA**							
11,3	Accesorio Pvcp 1/2" Suministro E Instalación	UN	54,00	0,00	20,00	20,00	34,00	62,96%

DESCRIPCIÓN:



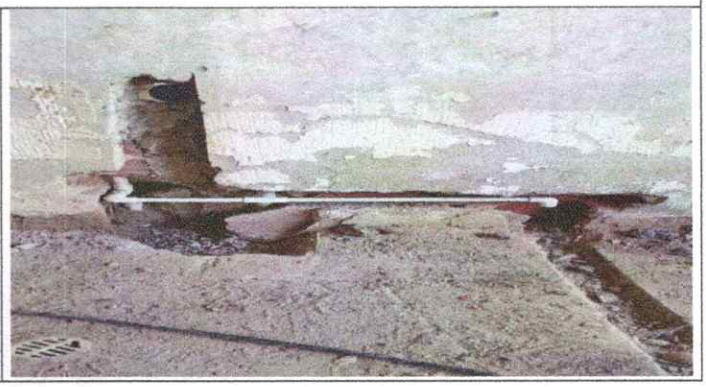

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD MOD 01	ACUMUADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO	FALTANTE POR EJECUTAR	
							CANT	%
11	**RED HIDRAULICA**							
11,5	Punto Hidráulico Pvcp Paral Desde Piso Promedio 1/2" Suministro E Instalación	UN	28,00	0,00	19,00	19,00	9,00	32,14%

DESCRIPCIÓN: o





ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD MOD 01	ACUMUADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO	FALTANTE POR EJECUTAR	
							CANT	%
11	**RED HIDRAULICA**							
NP-11,6	Tubería Pvcp Rde 13.5 1" Suministro E Instalación	UN	75,55	0,00	52,89	52,89	22,66	29,99%

DESCRIPCIÓN: o





ANEXO 2 INFORME MENSUAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

EL SUSCRITO CONTADOR DEL

MARIN DIAS Y ROMERO NEGOCIOS GLOBALES S.A.S

El **MARIN DIAZ Y ROMERO NEGOCIOS GLOBALES S.A.S**, identificado con **NIT 901.825.374-9** certifica que durante El período comprendidos entre el **13 de MAYO y el 17 de JULIO de 2026**, ha dado cumplimiento al pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y se encuentra a paz y salvo con las **Entidades Promotoras de Salud (EPS), Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales (ARL)** y **Cajas de Compensación Familiar**, en relación con las obligaciones derivadas del personal vinculado para la ejecución del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el **artículo 50 de la Ley 789 de 2002.**

Así mismo, de conformidad con la normatividad vigente, se certifica que **MARÍN DÍAZ Y ROMERO NEGOCIOS GLOBALES S.A.S.**, identificada con **NIT 901.825.374-9**, ha cumplido oportunamente con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y de los aportes parafiscales a cargo del empleador, correspondientes al **SENA**, al **ICBF** y a la Caja de Compensación Familiar, durante el período comprendido entre el 13 de mayo y el 17 de julio de 2026

MARYSOL TORRES RONCANCIO
C.C. No. 1.123.512.370
Contador Público

(+57) 310 3312528
Carrera 7 # 7 - 39 BRR CENTRO
gerencia.mdrng@gmail.com
Castilla la Nueva, Meta

Hospital E.S.E. CASTILLA LA NUEVA — MDR S.A.S NEGOCIOS GLOBALES — Ramdco S.A.S.

ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA

CONTRATO N°	**2026-109-CP-001**	**PROYECTO N°**	**2026-109-CP-001**
OBJETO DEL PROYECTO:	"ADECUACIONES DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE SAN LORENZO EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA - META"		
CONTRATISTA:	MARIN, DIAZ Y ROMERO NEGOCIOS GLOBALES S.A.S.		
NIT:	NIT. 901825374-9		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	ARQUITECTURA INGENIERIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.		
INTERVENTORÍA:	NIT. 900134299-5		

NUMERO DE PLANILLA:	37653596 TIPO E						**PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:**			13 de mayo de 2026		a	31 de mayo de 2026
Nombre personal	**Cargo y/o oficio**	**cedula**	**sueldo**	**Dias Cotizados**	**SALUD**		**PENSIÓN**		**Valor**	**I.C.B.F.**	**SENA**	**caja de compensación**	**Total a pagar**
					EPS	**VALOR**	**PENSION**	**VALOR**	**Riesgos profesionales**				
ARIAS GARCIA CARLOS ALBERTO	OBRERO	1,005,134,287	1,750,905	6	EPS-S CAPITALE PSC34	$ 43.800,00	PORVENIR-230301	$ 56.100,00	$ 24.400,00	$ 10.600,00	$ 7.100,00	$ 14.100,00	$ 156.100,00
JIMENEZ GARCIA SANTIAGO	OBRERO	1,116,863,367	1,750,905	10	EPS-S CAPITALE PSC34	$ 73.000,00	PORVENIR-230301	$ 93.400,00	$ 40.700,00	$ 17.600,00	$ 11.700,00	$ 23.400,00	$ 259.800,00
												Total	$ 415.900,00

NUMERO DE PLANILLA:	37653598 TIPO Y						**PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:**			13 de mayo de 2026		a	31 de mayo de 2026
CHAVARRO BUSTOS RAUL	PROFESIONAL SST	97,613,030	$ 1.750.905,00	18	SALUD TOTALEPS 002	$ 131.400,00	PORVENIR-230301	$ 168.100,00	$ 73.200,00			SIN CCFSINCCF	$ 372.700,00
GORDILLO LINARES YESICA	ALMACENISTA	1,123,511,951	$ 1.750.905,00	10	EPS-S CAPITALE PSC34	$ 73.000,00	PORVENIR-230301	$ 93.400,00	$ 40.700,00			SIN CCFSINCCF	$ 207.100,00
BAENA PEÑA JORGE LUIS	INGENIERO RESIDENTE	1,123,513,740	$ 1.750.905,00	18	SALUD TOTALEPS 002	$ 131.400,00	PORVENIR-230301	$ 168.100,00	$ 73.200,00			SIN CCFSINCCF	$ 372.700,00
												Total	$ 952.500,00

Nota: los pagos parafiscales serán verificados por la interventoria o supervisión y se anexan a la presente acta.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día 17/07/2026

Firma: MARIA CAMILA ANDRADE
Nombre; MARIA CAMILA ANDRADE MORENO
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre: JORGE LUIS BAENA PEÑA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matricula Profesional: 091037-0644647 CND

Firma:
Nombre: MARYSOL TORRES RONCANCIO
CONTADOR DE CONTRATISTA OBRA
N° Matricula Profesional:352065-T

Firma:
Nombre:ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: AARON ALFREDO STEFAN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
N° Matricula Profesional: 091037-0629604 CND

Firma: Arlex Mojica
Nombre: ARLEX ERASMO MOJICA GARAVITO
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 289241-T

OBSERVACIONES:

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Hospital E.S.E. CASTILLA LA NUEVA — MDR S.A.S. NEGOCIOS GLOBALES — Ramdco S.A.S.

ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA

CONTRATO N°	**2026-109-CP-001**	**PROYECTO N°**	**2026-109-CP-001**
OBJETO DEL PROYECTO:	"ADECUACIONES DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE SAN LORENZO EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA - META"		
CONTRATISTA:	MARIN, DIAZ Y ROMERO NEGOCIOS GLOBALES S.A.S.		
NIT:	NIT. 901825374-9		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	ARQUITECTURA INGENIERIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.		
INTERVENTORÍA:	NIT. 900134299-5		

NUMERO DE PLANILLA:	37653596 TIPO E											**PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:**	1 de junio de 2026	a	30 de junio de 2026
Nombre personal	**Cargo y/o oficio**	**cedula**	**sueldo**	**Dias Cotizados**	**SALUD**		**PENSIÓN**		**Valor**	**I.C.B.F.**	**SENA**	**caja de compensación**	**Total a pagar**		
					EPS	**VALOR**	**PENSION**	**VALOR**	**Riesgos profesionales**						
ARIAS GARCIA CARLOS ALBERTO	OBRERO	1,005,134,287	1,750,905	26	EPS-S CAPITALE PSC34	$ 189.700,00	PORVENIR-230301	$ 242.800,00	$ 105.700,00	$ 45.600,00	$ 30.400,00	$ 60.700,00	$ 674.900,00		
JIMENEZ GARCIA SANTIAGO	OBRERO	1,116,863,367	1,750,905	5	EPS-S CAPITALE PSC34	$ 36.500,00	PORVENIR-230301	$ 46.700,00	$ 20.400,00	$ 8.800,00	$ 5.900,00	$ 11.700,00	$ 130.000,00		
													Total	$	804.900,00
NUMERO DE PLANILLA:	37653598 TIPO Y											**PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:**	1 de junio de 2026	a	30 de junio de 2026
CHAVARRO BUSTOS RAUL	PROFESIONAL SST	97,613,030	$ 1.750.905,00	30	SALUD TOTALEPS 002	$ 218.900,00	PORVENIR-230301	$ 280.200,00	$ 121.900,00			SIN CCFSINCCF	$ 621.000,00		
GORDILLO LINARES YESICA	ALMACENISTA	1,123,511,951	$ 1.750.905,00	5	EPS-S CAPITALE PSC34	$ 36.500,00	PORVENIR-230301	$ 46.700,00	$ 20.400,00			SIN CCFSINCCF	$ 103.600,00		
BAENA PEÑA JORGE LUIS	INGENIERO RESIDENTE	1,123,513,740	$ 1.750.905,00	30	SALUD TOTALEPS 002	$ 218.900,00	PORVENIR-230301	$ 280.200,00	$ 121.900,00			SIN CCFSINCCF	$ 621.000,00		
													Total	$	1.345.600,00

Nota: los pagos parafiscales serán verificados por la interventoria o supervisión y se anexan a la presente acta.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día 17/07/2026

Firma:
Nombre; MARIA CAMILA ANDRADE MORENO
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre: JORGE LUIS BAENA PEÑA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 091037-0644647 CND

Firma:
Nombre: MARYSOL TORRES RONCANCIO
CONTADOR DE CONTRATISTA OBRA
N° Matrícula Profesional:352065-T

Firma:
Nombre:ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: AARON ALFREDO STEFAN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
N° Matrícula Profesional: 091037-0629604 CND

Firma:
Nombre: ARLEX ERASMO MOJICA GARAVITO
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 289241-T

OBSERVACIONES:

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901825374	9	MARIN DIAZ Y ROMERO NEGOCIOS GLOBALES SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	2511	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
50-150	CL 8 13 31		3134637940			GERENCIA.MDRNG@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-05	2026-05	37653598	Y	2026-06-09	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	952.500	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	37653598	2026-06-18	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	APPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 97613030	CHAVARRO BUSTOS RAUL	1.750.905		X															0			18	18	0	18	PORVENIR-230301	1.050.543	168.100	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.050.543	131.400	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.050.543	73.200	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	372.700	N	5411201
2	CC 1123511951	GORDILLO LINARES YESICA	1.750.905		X															0			10	10	0	10	PORVENIR-230301	583.635	93.400	0	0	EPS-S CAPITAL-EPSC34	583.635	73.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	583.635	40.700	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	207.100	N	5411201
3	CC 1123513740	BAENA PEÑA JORGE LUIS	1.750.905		X															0			18	18	0	18	PORVENIR-230301	1.050.543	168.100	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.050.543	131.400	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.050.543	73.200	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	372.700	N	5411201

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901825374	9	MARIN DIAZ Y ROMERO NEGOCIOS GLOBALES SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	2511	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
50-150	CL 8 13 31		3134637940			GERENCIA.MDRNG@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-05	2026-05	37653598	Y	2026-06-09	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	952.500	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	37653598	2026-06-18	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.684.721	2.684.721	2.684.721	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				3	429.600	0	0	0	429.600
PORVENIR	230301	800224808	8	3	429.600	0	0	0	429.600
EPS(Administradoras: 2)				3	335.800	0	0	0	335.800
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	2	262.800	0	0	0	262.800
EPS-S CAPITAL	EPSC34	900298372	9	1	73.000	0	0	0	73.000
ARP(Administradoras: 1)				3	187.100	0	0	0	187.100
POSITIVA	14-23	860011153	6	3	187.100	0	0	0	187.100

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901825374	9	MARIN DIAZ Y ROMERO NEGOCIOS GLOBALES SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	2511	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
50-150	CL 8 13 31		3134637940			GERENCIA.MDRNG@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-05	2026-06	37653596	E	2026-06-23	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	417.800	1.900	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	37653596	2026-06-18	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 1005134287	ARIAS GARCIA CARLOS ALBERTO	1.750.905	F	X															0			6	6	6	6	PORVENIR-230301	350.181	56.100	0	0	EPS-S CAPITAL-EPSC34	350.181	43.800	COFREM-CCF34	350.181	14.100	350.181	24.400	0,06960	350.181	7.100	10.600	0	0	01	0	156.100	N	1711001
2	CC 1116863367	JIMENEZ GARCIA SANTIAGO	1.750.905	F	X															0			10	10	10	10	PORVENIR-230301	583.635	93.400	0	0	EPS-S CAPITAL-EPSC34	583.635	73.000	COFREM-CCF34	583.635	23.400	583.635	40.700	0,06960	583.635	11.700	17.600	0	0	01	0	259.800	N	1711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901825374	9	MARIN DIAZ Y ROMERO NEGOCIOS GLOBALES SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	2511	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
50-150	CL 8 13 31		3134637940			GERENCIA.MDRNG@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-05	2026-06	37653596	E	2026-06-23	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	417.800	1.900	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	37653596	2026-06-18	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
933.816	933.816	933.816	933.816	933.816

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				2	149.500	0	600	0	150.100
PORVENIR	230301	800224808	8	2	149.500	0	600	0	150.100
EPS(Administradoras: 1)				2	116.800	0	500	0	117.300
EPS-S CAPITAL	EPSC34	900298372	9	2	116.800	0	500	0	117.300
ARP(Administradoras: 1)				2	65.100	0	300	0	65.400
POSITIVA	14-23	860011153	6	2	65.100	0	300	0	65.400
CCF(Administradoras: 1)				2	37.500	0	200	0	37.700
COFREM	CCF34	892000146	3	2	37.500	0	200	0	37.700
SENA(Administradoras: 1)				2	18.800	0	100	0	18.900

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
SENA	PASENA	899999034	1	2	18.800	0	100	0	18.900
ICBF(Administradoras: 1)				2	28.200	0	200	0	28.400
ICBF	PAICBF	899999239	2	2	28.200	0	200	0	28.400
Gran Total					415.900	0	1.900	0	417.800

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901825374	9	MARIN DIAZ Y ROMERO NEGOCIOS GLOBALES SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	2511	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
50-150	CL 8 13 31		3134637940			GERENCIA.MDRNG@GMAIL.COM		N

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-06	2026-06	38022503	Y	2026-07-14	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.345.600	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	38022503	2026-07-17	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	PRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 97613030	CHAVARRO BUSTOS RAUL	1.750.905																	0			30	30	0	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.750.905	218.900	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	621.000	N	5411201
2	CC 1123511951	GORDILLO LINARES YESICA	1.750.905			T														0			5	5	0	5	PORVENIR-230301	291.818	46.700	0	0	EPS-S CAPITAL-EPSC34	291.818	36.500	SIN CCF-SINCCF	0	0	291.818	20.400	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	103.600	N	5411201
3	CC 1123513740	BAENA PEÑA JORGE LUIS	1.750.905																	0			30	30	0	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.750.905	218.900	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	621.000	N	5411201

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901825374	9	MARIN DIAZ Y ROMERO NEGOCIOS GLOBALES SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	2511	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
50-150	CL 8 13 31		3134637940			GERENCIA.MDRNG@GMAIL.COM		N

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-06	2026-06	38022503	Y	2026-07-14	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.345.600	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	38022503	2026-07-17	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
3.793.628	3.793.628	3.793.628	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				3	607.100	0	0	0	607.100
PORVENIR	230301	800224808	8	3	607.100	0	0	0	607.100
EPS(Administradoras: 2)				3	474.300	0	0	0	474.300
EPS-S CAPITAL	EPSC34	900298372	9	1	36.500	0	0	0	36.500
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	2	437.800	0	0	0	437.800
ARP(Administradoras: 1)				3	264.200	0	0	0	264.200
POSITIVA	14-23	860011153	6	3	264.200	0	0	0	264.200

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901825374	9	MARIN DIAZ Y ROMERO NEGOCIOS GLOBALES SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	2511	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
50-150	CL 8 13 31		3134637940			GERENCIA.MDRNG@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-06	2026-07	38024190	E	2026-07-14	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	804.900	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	38024190	2026-07-17	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES													DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 1005134287	ARIAS GARCIA CARLOS ALBERTO	1.750.905	F	X														0				26	26	26	26	PORVENIR-230301	1.517.451	242.800	0	0	EPS-S CAPITAL-EPSC34	1.517.451	189.700	COFREM-CCF34	1.517.451	60.700	1.517.451	105.700	0,06960	1.517.451	30.400	45.600	0	0	01	0	674.900	N	1711001
2	CC 1116863367	JIMENEZ GARCIA SANTIAGO	1.750.905	F	X														0				5	5	5	5	PORVENIR-230301	291.818	46.700	0	0	EPS-S CAPITAL-EPSC34	291.818	36.500	COFREM-CCF34	291.818	11.700	291.818	20.400	0,06960	291.818	5.900	8.800	0	0	01	0	130.000	N	1711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901825374	9	MARIN DIAZ Y ROMERO NEGOCIOS GLOBALES SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	2511	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
50-150	CL 8 13 31		3134637940			GERENCIA.MDRNG@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-06	2026-07	38024190	E	2026-07-14	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	804.900	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	38024190	2026-07-17	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.809.269	1.809.269	1.809.269	1.809.269	1.809.269

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				2	289.500	0	0	0	289.500
PORVENIR	230301	800224808	8	2	289.500	0	0	0	289.500
EPS(Administradoras: 1)				2	226.200	0	0	0	226.200
EPS-S CAPITAL	EPSC34	900298372	9	2	226.200	0	0	0	226.200
ARP(Administradoras: 1)				2	126.100	0	0	0	126.100
POSITIVA	14-23	860011153	6	2	126.100	0	0	0	126.100
CCF(Administradoras: 1)				2	72.400	0	0	0	72.400
COFREM	CCF34	892000146	3	2	72.400	0	0	0	72.400
SENA(Administradoras: 1)				2	36.300	0	0	0	36.300

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
SENA	PASENA	899999034	1	2	36.300	0	0	0	36.300
ICBF(Administradoras: 1)				2	54.400	0	0	0	54.400
ICBF	PAICBF	899999239	2	2	54.400	0	0	0	54.400
Gran Total					804.900	0	0	0	804.900
