INFORME DE INTERVENTORÍA N. º002

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 334 DE 2026

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORIA INTEGRAL, (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA) AL CONTRATO DE OBRA DE ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD MONTELIBANO DE ACACÍAS, META

CONTRATISTA DE OBRA

INTERCONS DE COLOMBIA S.A.S

INTERVENTORÍA

EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S

ENTIDAD CONTRATANTE

HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACÍAS E.S.E.

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:

01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 3

3.GENERALIDADES DEL PROYECTO 6

4. PRESUPUESTO INICIALMENTE CONTRATADO. 7

5. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA 11

6. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 11

7. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 12

Personal Operativo. *12*

8. PERSONAL DE INTERVENTORIA. 12

9. PÓLIZAS Y GARANTIAS 12

Perfeccionamiento del contrato. *12*

Póliza según acta de inicio *13*

1. PRESUPUESTO INICIALMENTE CONTRATADO. 14

10. AVANCE MENSUAL 16

2. TOTAL, EJECUTADO PROGRAMADO VS EJECUTADO 19

3. ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS 20

11. CONCLUSIONES 26

1. INTRODUCCIÓN

La **EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S.**, identificada con **NIT No. 901629216-3** y representada legalmente por Lina Lorena Salgado García, se encuentra ejecutando el Contrato de Interventoría No. 334 de 2026, suscrito con el Hospital Municipal de Acacías E.S.E., cuyo objeto es la **"INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA) AL CONTRATO DE OBRA DE ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD MONTELÍBANO DE ACACÍAS, META", el cual cuenta con un valor de DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($16.665.289)**, incluido IVA, y un plazo de ejecución de cuatro (04) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

El presente informe corresponde al periodo evaluado y contiene la descripción de las actividades desarrolladas por la interventoría, el seguimiento realizado a la ejecución del contrato de obra, el control del avance físico y financiero del proyecto, la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas y obligaciones contractuales, el estado de las pólizas, las observaciones efectuadas durante el periodo, las conclusiones y el respectivo registro fotográfico.

El Hospital Municipal de Acacías E.S.E., mediante el proceso de selección correspondiente, adjudicó el Contrato de Interventoría No. 334 de 2026 a la EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S., con el propósito de ejercer el control, seguimiento y vigilancia integral sobre la ejecución de las obras de adecuación menor del Centro de Salud Montelíbano, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, administrativas, financieras y jurídicas establecidas en el contrato, así como la correcta ejecución de los recursos destinados para el proyecto.

2. OBJETIVO GENERAL

Realizar el seguimiento y control a la ejecución de las obras de adecuación menor del Centro de Salud Montelíbano de Acacías, Meta, verificando el cumplimiento de las actividades programadas, las especificaciones técnicas, los plazos establecidos y el adecuado avance físico y financiero del proyecto, con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto contractual y la correcta ejecución de los recursos asignados.

2.1 ALCANCE DEL PROYECTO

De acuerdo con el Contrato de Interventoría No. 334 de 2026, cuyo objeto es la "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA) AL CONTRATO DE OBRA DE ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD MONTELÍBANO DE ACACÍAS, META", el contrato cuenta con un valor de DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($16.665.289), incluido IVA, y un plazo de cuatro (04) meses contados a partir del acta de inicio.

El alcance de la interventoría corresponde al seguimiento y control de la ejecución de las obras de adecuación menor del Centro de Salud Montelíbano, verificando el cumplimiento de las actividades y condiciones establecidas contractualmente.

2.2 LOCALIZACIÓN

El municipio de Acacías se encuentra localizado en el departamento del Meta, en la región centro-suroriental del mismo. En una zona de transición entre piedemonte llanero y llanura aluvial. Geográficamente, se ubica en las coordenadas 3°59'20" de latitud norte y 73°45'53" de longitud oeste, con una altitud promedio de 498 metros sobre el nivel del mar. Limita al norte con Villavicencio, al sur con San Martín, al oriente con Castilla La Nueva y al

occidente con El Calvario. Su acceso principal se realiza por la vía nacional que conecta Villavicencio con los municipios del sur del Meta.

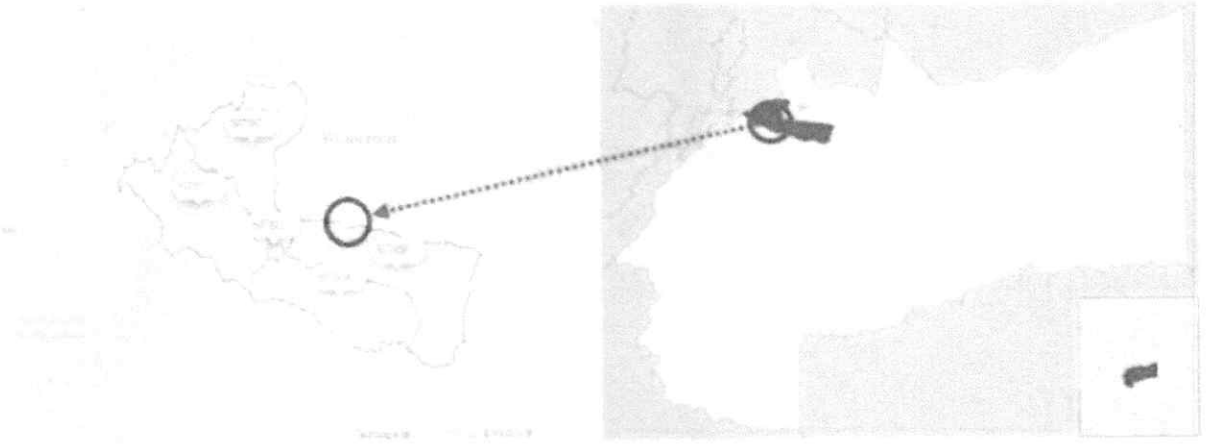


Ilustración 1. Localización Geográfica del Departamento del Meta y Municipio de Acacías.

Límites del municipio
Norte: Villavicencio
Oriente: Castilla La Nueva
Occidente: El Calvario
Sur: San Martin

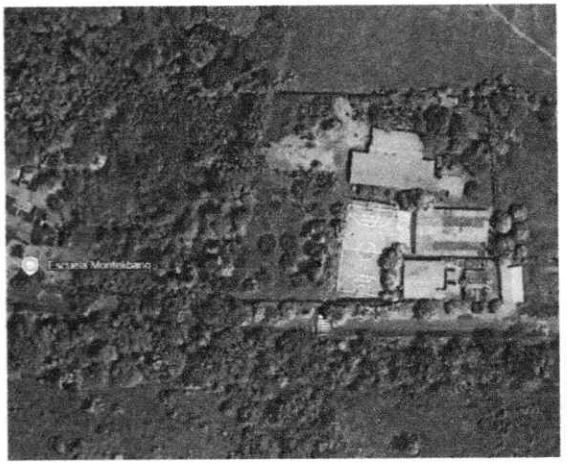


Ilustración 2 Ubicación Proyecto, Puesto de Montelíbano.

3.GENERALIDADES DEL PROYECTO

El presente informe corresponde a la interventoría del proyecto denominado "Obra de Adecuaciones Menores para el Puesto de Salud de Montelíbano en el Municipio de Acacías, Meta", cuyo objeto fue realizar el seguimiento y control a la ejecución del contrato de obra, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, los diseños, las cantidades de obra, el presupuesto, los plazos contractuales y las demás obligaciones establecidas en los documentos del contrato.

La interventoría se desarrolló como un mecanismo de control para garantizar que las actividades ejecutadas por el contratista se realizaran conforme a la normatividad vigente, las buenas prácticas constructivas y las condiciones técnicas definidas para el proyecto, asegurando la calidad de las obras y el adecuado desarrollo de cada una de las etapas de ejecución.

Durante el desarrollo del contrato, la interventoría efectuó la supervisión permanente de las actividades correspondientes a las adecuaciones menores del Puesto de Salud de Montelíbano, incluyendo la verificación de los procesos constructivos, la calidad de los materiales utilizados, el avance físico de la obra, la medición de cantidades ejecutadas y la revisión de las actas e informes presentados por el contratista, con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto contractual.

Como resultado de esta labor de seguimiento y control, se verificó que las obras ejecutadas contribuyeran al mejoramiento de las condiciones físicas y funcionales de la infraestructura del puesto de salud, permitiendo su adecuada operación y el cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos para este tipo de edificaciones.

4. PRESUPUESTO INICIALMENTE CONTRATADO.

OBRA DE ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD MONTELIBANO DE ACACIAS, META					
CONDICIONES CONTRACTUALES					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1.00	**DESMONTE Y DEMOLICIONES**				
1.01	CORTE VERTICAL EN MAMPOSTERIA CON CORTADORA E = 1 CM	ML	11,56	$ 1.729,00	$ 19.987,00
1.02	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	6,00	$ 32.517,00	$ 195.102,00
1.03	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	162,43	$ 8.549,00	$ 1.388.614,00
1.04	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	222,95	$ 14.662,00	$ 3.268.893,00
1.05	DEMOLICION MANUAL PAÑETE MUROS E=0.03 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	537,84	$ 13.007,00	$ 6.995.685,00
1.06	DEMOLICION MECÁNICA PLACA ALIGERADA CONCRETO REFORZADO E= 0.45 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	23,39	$ 198.000,00	$ 4.630.824,00
1.07	DESMONTE DE PUNTO DE ILUMINACIÓN	UN	42,00	$ 21.678,00	$ 910.476,00
1.08	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	222,95	$ 18.922,00	$ 4.218.660,00
2.00	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**				
2.01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	12,65	$ 73.164,00	$ 925.429,00
2.02	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO. COMPACTACIÓN MANUAL	M3	7,39	$ 73.636,00	$ 543.949,00
2.03	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3/KM	464,40	$ 1.723,00	$ 800.161,00
3.00	**CIMENTACIÓN**				
3,01	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,76	$ 869.600,00	$ 663.809,00

3,02	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO E=0.15 M B=0.20 H=0.55 M CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	5,13	$ 142.441,00	$ 730.722,00
3,03	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	0,43	$ 682.607,00	$ 290.688,00
3,04	PLASTICO POLIETILENO CALIBRE 6	M2	2,84	$ 1.591,00	$ 4.517,00
3,05	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,70	$ 988.895,00	$ 690.249,00
3,06	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,44	$ 1.059.849,00	$ 462.359,00
3,07	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,22	$ 1.434.240,00	$ 313.740,00
3,08	MURO LADRI. PRENS. MACIZO VISTA T. STA FE (MORTERO TIPO 1:3)	M2	4,89	$ 143.896,00	$ 703.076,00
3,09	ALFAJÍAS EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,09	$ 1.924.017,00	$ 181.300,00
4.00	**ESTRUCTURAS METALICAS**				
4,01	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO,FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	283,85	$ 8.362,00	$ 2.373.514,00
4,02	CERRAMIENTO PARA ESCENARIO DEPORTIVO EN MALLA ESLABONADA TIPO CICLON. MALLA GALVANIZADA RECUBRIMIENTO EN PVC HUECO 2" X 2" CAL. 10 POSTES DE LÍNEA TUBERÍA GALVANIZADA 2" Y PIÉ DE AMIGO EN ANGULO GALVANIZADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	10,47	$ 137.281,00	$ 1.437.332,00
4,03	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A500 (FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA)	KG	1.194,32	$ 31.896,00	$ 38.093.910,00
5.00	**PAÑETE**				
5,01	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	178,40	$ 38.830,00	$ 6.927.272,00
5,02	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	359,44	$ 27.728,00	$ 9.966.552,00
6.00	**PINTURA**				
6,01	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	178,40	$ 14.860,00	$ 2.651.024,00

6,02	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	359,44	$ 12.387,00	$ 4.452.383,00
6,03	IMPERMEABILIZACION FACHADAS, MUROS MASTERSEAL 485	M2	178,40	$ 34.765,00	$ 6.202.076,00
6,04	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2	178,40	$ 36.532,00	$ 6.517.309,00
6,05	ESMALTE SINTETICO PARA VENTANAS	M2	25,31	$ 24.267,00	$ 614.076,00
7	**CIELO RASO**				
7,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC 10 MM, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y ACCESORIOS DE INSTALACION	M2	162,43	$ 238.965,00	$ 38.815.085,00
8	**OBRAS EN CUBIERTA**				
8,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TIPO SANDWICH 250C CAL. 26 PREPINTADA. INCLUYE ICOPOR O MATERIAL SIMILAR. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	222,95	$ 232.292,00	$ 51.789.501,00
9	**RED ELECTRICA INTERNA**				
9,01	ACCESORIO PVCP 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	14,00	$ 5.463,00	$ 76.482,00
9,02	TUBERÍA PVCP RDE 13.5 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	9,00	$ 17.590,00	$ 158.310,00
9,03	VALVULA DE CORTE 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 128.271,00	$ 256.542,00
9,04	TANQUE SÉPTICO TIPO IMHOFF OVOIDE VERDE 2000 LT SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 2.488.240,00	$ 2.488.240,00
10	**RED SANITARIA**				
10,01	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	7,45	$ 29.434,00	$ 219.283,00
10,02	TUBERÍA PVCS 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	11,48	$ 112.166,83	$ 1.287.675,00
10,03	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 118.904,00	$ 118.904,00
10,04	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2"	UN	1,00	$ 69.035,00	$ 69.035,00
10,05	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8,00	$ 11.066,00	$ 88.528,00
10,06	ACCESORIO PVCS 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 161.645,30	$ 323.291,00
11	**RED ELECTRICA INTERNA**				
11,01	ACOMETIDA PARCIAL 4 No4 +1 No 6 DUCTO 1-1/2" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	165,37	$ 116.462,00	$ 19.259.321,00

11,02	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	24,00	$ 122.078,00	$ 2.929.872,00
11,03	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	5,00	$ 178.596,00	$ 892.980,00
11,04	SALIDA DE LAMPARA LED SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	7,00	$ 243.154,00	$ 1.702.078,00
11,05	PANEL LED 60X60 W	UN	9,00	$ 143.184,00	$ 1.288.656,00
11,06	PANEL LED REDONDO 18 W	UN	29,00	$ 49.840,00	$ 1.445.360,00
11,07	SUMINISTRO E INSTALACION ELECTROBOMBA BARNES M.HE 375-3 (2020HCE)	UN	1,00	$ 4.589.414,00	$ 4.589.414,00
12	**APARATOS SANITARIOS**				
12,01	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UN	5,00	$ 544.399,00	$ 2.721.995,00
12,02	JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO	JGO	1,00	$ 121.453,00	$ 121.453,00
12,03	REJILLA SOSCO 3" X 2", ALUMINIO ANTICUCARACHAS	UN	1,00	$ 21.545,00	$ 21.545,00
12,04	ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	4,90	$ 160.512,00	$ 786.509,00
13	**ASEO Y LIMPIEZA**				
13,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	117,95	$ 6.836,00	$ 806.306,00
COSTOS DIRECTOS					**$ 239.430.053,00**
ADMINISTRACION (A) %					$ 67.040.414,84
IMPREVISTOS (I) %					$ 4.788.601,06
UTILIDAD (U) %					$ 11.971.502,65
COSTOS INDIRECTOS					$ 83.800.518,55
VALOR TOTAL					**$ 323.230.572,00**

5. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA.

ENTIDAD CONTRATANTE:	HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E NIT. 800.037.021.7
OBJETO DEL CONTRATO:	"OBRA DE ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD MONTELIBANO DE ACACIAS, META".
CONTRATO NO:	324 DE 2026
FECHA	16 DE ABRIL DE 2026
CONTRATISTA DE LA OBRA:	INTERCONS DE COLOMBIA SAS NIT: 900.849.552-3
REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN CAMILO POSADA VARELA CC. N° 1.094.921.302 de Armenia
VALOR DEL CONTRATO:	TRESCIENTOS VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($ 323.330.566,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA
VALOR DEL ANTICIPO:	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	CUATRO (4) MESES
FECHA DE INICIO:	04 DE MAYO DE 2026
FECHA DE FINALIZACION	03 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Tabla 1 Información del contratista.

6. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

CONTRATO:	334 DEL 29 DE ABRIL DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	**INTERVENTORIA INTEGRAL, (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANC\ERA Y JURIDICA) AL CONTRATO DE OBRA DE ADECUACIN MENOR DEL CENTRO MONTELIBANO DE ACACIAS, META.**
CONTRATISTA	**EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA DE COLOMBIA SAS** NIT: 901.629.216-3
REPRESENTANTE LEGAL	**LINA LORENA SALGADO GARCIA** CC. 1.122.647.270 de Restrepo.
SUPERVISOR	**HUGO FERNANDO ROJAS OSPINA**
VALOR DEL CONTRATO	DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ($16.665.289,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA
PLAZO	CUATRO (4) MESES
FECHA DE INICIO	04 DE MAYO DE 2026
FECHA DE FINALIZACION	03 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Tabla 2 Información del contrato Interventoría

7. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO

N°.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	% DEDICACION
1	JUAN CAMILO POSADA VARELA	1.094.921.302	RESIDENTE DE OBRA	100%
2	WILLIAM ANDRÉS OVIEDO ARIAS	4.617.487	RESIDENTE DE OBRA	100%

Tabla 3.Personal Administrativo

Nota: Durante el periodo evaluado se efectuó el cambio del Residente de Obra. El ingeniero **Juan Camilo Posada Varela** presentó su renuncia y fue reemplazado por el arquitecto **William Andrés Oviedo Arias**, previa aprobación de la Interventoría.

Personal Operativo.

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO
1	JOSE ALEJANDRO MOSQUERA POSADA	1.113.791.483	AYUDANTE
2	DIEGO FERNANDO VERGARA BARBOSA	16550585	OFICIAL DE OBRA
3	JAISSON PAEZ MARQUEZ	86071378	AYUDANTE

Tabla 4 Personal Operativo.

8. PERSONAL DE INTERVENTORIA.

N°.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	% DEDICACION
1	JOSE LUIS CERON CERON	1.121.833.673	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	100%

9. PÓLIZAS Y GARANTIAS

En cumplimiento de lo establecido en la minuta contractual No 324 se establecieron las respectivas pólizas de cumplimiento con la Compañía de ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA como se detalla a continuación:

Perfeccionamiento del contrato.

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	**320-47-994000037497**
ANEXO N°	**1**
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**320-74-994000016255**
ANEXO N°	**1**
COMPAÑÍA DE SEGUROS	**ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/04/2026	16/12/2026	$64.666.113,20
PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	16/04/2026	16/08/2029	$16.166.528.30
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMAPARA 5 AÑOS		$32.333.056,60
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	16/04/2026	16/08/2026	$350,181,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	16/04/2026	16/08/2026	$350,181,000.00
RESPOSABILIDAD CIVIL PATRONAL	16/04/2026	16/08/2026	$350,181,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	16/04/2026	16/08/2026	$350,181,000.00

Tabla 5 Pólizas según minuta.

Tabla 6 Amparos según minuta.

Póliza según acta de inicio

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	**320-47-994000037497**
ANEXO N°	**2**
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**320-74-994000016255**
ANEXO N°	**2**
COMPAÑÍA DE SEGUROS	**ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**

Tabla 7 Pólizas según acta de inicio.

AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/05/2026	04/01/2027	$64.666.113,20
PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	04/05/2026	04/09/2029	$16.166.528.30
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMAPARA 5 AÑOS		$41.992.100,50
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	16/08/2026	03/09/2026	$350,181,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	16/08/2026	03/09/2026	$350,181,000.00
RESPOSABILIDAD CIVIL PATRONAL	16/08/2026	03/09/2026	$350,181,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	16/08/2026	03/09/2026	$350,181,000.00

Tabla 8 Garantías según acta de inicio.

1. PRESUPUESTO INICIALMENTE CONTRATADO.

OBRA DE ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD MONTELIBANO DE ACACIAS, META

CONDICIONES CONTRACTUALES

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	**DESMONTE Y DEMOLICIONES**				
1.01	CORTE VERTICAL EN MAMPOSTERIA CON CORTADORA E = 1 CM	ML	11,56	$ 1.729,00	$ 19.987,00
1.02	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	6,00	$ 32.517,00	$ 195.102,00
1.03	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	162,43	$ 8.549,00	$ 1.388.614,00
1.04	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	222,95	$ 14.662,00	$ 3.268.893,00
1.05	DEMOLICION MANUAL PAÑETE MUROS E=0.03 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	537,84	$ 13.007,00	$ 6.995.685,00
1.06	DEMOLICION MECÁNICA PLACA ALIGERADA CONCRETO REFORZADO E= 0.45 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	23,39	$ 198.000,00	$ 4.630.824,00
1.07	DESMONTE DE PUNTO DE ILUMINACIÓN	UN	42,00	$ 21.678,00	$ 910.476,00
1.08	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	222,95	$ 18.922,00	$ 4.218.660,00
2.00	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**				
2.01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	12,65	$ 73.164,00	$ 925.429,00
2.02	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO. COMPACTACIÓN MANUAL	M3	7,39	$ 73.636,00	$ 543.949,00
2.03	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3/KM	464,40	$ 1.723,00	$ 800.161,00
3.00	**CIMENTACIÓN**				
3,01	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,76	$ 869.600,00	$ 663.809,00
3,02	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO E=0.15 M B=0.20 H=0.55 M CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	5,13	$ 142.441,00	$ 730.722,00
3,03	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	0,43	$ 682.607,00	$ 290.688,00
3,04	PLASTICO POLIETILENO CALIBRE 6	M2	2,84	$ 1.591,00	$ 4.517,00
3,05	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,70	$ 988.895,00	$ 690.249,00
3,06	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,44	$ 1.059.849,00	$ 462.359,00
3,07	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,22	$ 1.434.240,00	$ 313.740,00
3,08	MURO LADRI. PRENS. MACIZO VISTA T. STA FE (MORTERO TIPO 1:3)	M2	4,89	$ 143.896,00	$ 703.076,00
3,09	ALFAJÍAS EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,09	$ 1.924.017,00	$ 181.300,00
4.00	**ESTRUCTURAS METALICAS**				
4,01	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO,FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	283,85	$ 8.362,00	$ 2.373.514,00
4,02	CERRAMIENTO PARA ESCENARIO DEPORTIVO EN MALLA ESLABONADA TIPO CICLON.	M2	10,47	$ 137.281,00	$ 1.437.332,00

	MALLA GALVANIZADA RECUBRIMIENTO EN PVC HUECO 2" X 2" CAL. 10 POSTES DE LÍNEA TUBERÍA GALVANIZADA 2" Y PIÉ DE AMIGO EN ANGULO GALVANIZADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN				
4,03	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A500 (FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA)	KG	1.194,32	$ 31.896,00	$ 38.093.910,00
5.00	**PAÑETE**				
5,01	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	178,40	$ 38.830,00	$ 6.927.272,00
5,02	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	359,44	$ 27.728,00	$ 9.966.552,00
6.00	**PINTURA**				
6,01	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	178,40	$ 14.860,00	$ 2.651.024,00
6,02	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	359,44	$ 12.387,00	$ 4.452.383,00
6,03	IMPERMEABILIZACION FACHADAS, MUROS MASTERSEAL 485	M2	178,40	$ 34.765,00	$ 6.202.076,00
6,04	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2	178,40	$ 36.532,00	$ 6.517.309,00
6,05	ESMALTE SINTETICO PARA VENTANAS	M2	25,31	$ 24.267,00	$ 614.076,00
7	**CIELO RASO**				
7,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC 10 MM, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y ACCESORIOS DE INSTALACION	M2	162,43	$ 238.965,00	$ 38.815.085,00
8	**OBRAS EN CUBIERTA**				
8,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TIPO SANDWICH 250C CAL. 26 PREPINTADA. INCLUYE ICOPOR O MATERIAL SIMILAR. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	222,95	$ 232.292,00	$ 51.789.501,00
9	**RED ELECTRICA INTERNA**				
9,01	ACCESORIO PVCP 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	14,00	$ 5.463,00	$ 76.482,00
9,02	TUBERIA PVCP RDE 13.5 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	9,00	$ 17.590,00	$ 158.310,00
9,03	VALVULA DE CORTE 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 128.271,00	$ 256.542,00
9,04	TANQUE SÉPTICO TIPO IMHOFF OVOIDE VERDE 2000 LT SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 2.488.240,00	$ 2.488.240,00
10	**RED SANITARIA**				
10,01	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	7,45	$ 29.434,00	$ 219.283,00
10,02	TUBERÍA PVCS 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	11,48	$ 112.166,83	$ 1.287.675,00
10,03	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 118.904,00	$ 118.904,00
10,04	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2"	UN	1,00	$ 69.035,00	$ 69.035,00
10,05	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8,00	$ 11.066,00	$ 88.528,00
10,06	ACCESORIO PVCS 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 161.645,30	$ 323.291,00
11	**RED ELECTRICA INTERNA**				
11,01	ACOMETIDA PARCIAL 4 No4 +1 No 6 DUCTO 1-1/2" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	165,37	$ 116.462,00	$ 19.259.321,00
11,02	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	24,00	$ 122.078,00	$ 2.929.872,00
11,03	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	5,00	$ 178.596,00	$ 892.980,00
11,04	SALIDA DE LAMPARA LED SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	7,00	$ 243.154,00	$ 1.702.078,00
11,05	PANEL LED 60X60 W	UN	9,00	$ 143.184,00	$ 1.288.656,00
11,06	PANEL LED REDONDO 18 W	UN	29,00	$ 49.840,00	$ 1.445.360,00
11,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELECTROBOMBA BARNES M.HE 375-3 (2020HCE)	UN	1,00	$ 4.589.414,00	$ 4.589.414,00
12	**APARATOS SANITARIOS**				
12,01	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UN	5,00	$ 544.399,00	$ 2.721.995,00
12,02	JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO	JGO	1,00	$ 121.453,00	$ 121.453,00
12,03	REJILLA SOSCO 3" X 2", ALUMINIO ANTICUCARACHAS	UN	1,00	$ 21.545,00	$ 21.545,00
12,04	ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	4,90	$ 160.512,00	$ 786.509,00
13	**ASEO Y LIMPIEZA**				
13,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	117,95	$ 6.836,00	$ 806.306,00
COSTOS DIRECTOS					**$ 239.430.053,00**
ADMINISTRACION (A) %					$ 67.040.414,84
IMPREVISTOS (I) %					$ 4.788.601,06
UTILIDAD (U) %					$ 11.971.502,65
COSTOS INDIRECTOS					$ 83.800.518,55
VALOR TOTAL					**$ 323.230.572,00**

10. AVANCE MENSUAL

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de junio de 2026, la Interventoría realizó el seguimiento, control y verificación a las actividades de obra correspondientes al proyecto "Obra de Adecuación Menor del Centro de Salud Montelibano", ubicado en el municipio de Acacías, departamento del Meta, abarcando la totalidad de los capítulos previstos en el presupuesto contractual: desmonte y demoliciones, excavaciones y rellenos, cimentación, estructuras metálicas y refuerzo, pañetes, pintura e impermeabilización, obras en cubierta y carpintería metálica e hidrosanitaria.

En primer lugar, la Interventoría realizó el seguimiento a los trabajos preliminares de desmonte y demolición, verificando que estos habilitaran los frentes de trabajo para el resto de actividades. Estas labores incluyeron el corte vertical en mampostería con cortadora para delimitar las zonas de intervención, el desmonte de dos lavamanos con su traslado al sitio de acopio, el retiro del cielo raso en drywall en un área de 162,43 m², el desmonte de la cubierta existente en teja de fibrocemento sobre 222,95 m², la demolición manual del pañete de muros en 537,84 m² con su respectivo trasiego y cargue, y el desmonte de 39 puntos de iluminación previo a la intervención de redes eléctricas. De igual manera, la Interventoría verificó que los escombros y sobrantes generados por estas actividades fueran transportados y dispuestos en escombrera autorizada, gestionando un volumen de 464,40 m³/km.

En cuanto a la cimentación, la Interventoría verificó la fundición del solado de limpieza en concreto de 2000 PSI y la instalación del plástico polietileno calibre 6 como barrera de vapor, sobre los cuales se construyó la placa de contrapiso en concreto de 3000 PSI mezclado en obra, con un volumen de 0,76 m³, reforzada con 120 kg de acero Fy=4200 MPa suministrado, figurado, armado y colocado en obra. Adicionalmente, realizó seguimiento a la instalación de un cerramiento en malla eslabonada galvanizada tipo ciclón, con postes de línea en tubería galvanizada de 2" y pie de amigo en ángulo galvanizado.

OBRA DE ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD MONTELIBANO DE ACACIAS, META					
CONDICIONES CONTRACTUALES					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1.00	**DESMONTE Y DEMOLICIONES**				
1.01	CORTE VERTICAL EN MAMPOSTERIA CON CORTADORA E = 1 CM	ML	11,56	$ 1.729,00	$ 19.987,00
1.02	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	2,00	$ 32.517,00	$ 65.034,00
1.03	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	162,43	$ 8.549,00	$ 1.388.614,00
1.04	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	222,95	$ 14.662,00	$ 3.268.893,00
1.05	DEMOLICION MANUAL PAÑETE MUROS E=0.03 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	537,84	$ 13.007,00	$ 6.995.685,00
1.07	DESMONTE DE PUNTO DE ILUMINACIÓN	UN	39,00	$ 21.678,00	$ 845.442,00
2.00	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**				
2.03	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3/KM	464,40	$ 1.723,00	$ 800.161,00
3.00	**CIMENTACIÓN**				
3,01	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,76	$ 869.600,00	$ 663.809,00
3,03	SOLADO,LIMPIEZA EN CONCRETO 13,8 Mpa (2000PSI)	M3	0,27	$ 682.607,00	$ 184.304,00
3,04	PLASTICO POLIETILENO CALIBRE 6	M2	2,84	$ 1.591,00	$ 4.517,00
4.00	**ESTRUCTURAS METALICAS**				


4,01	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	120,00	$ 8.362,00	$ 1.003.440,00
4,02	CERRAMIENTO PARA ESCENARIO DEPORTIVO EN MALLA ESLABONADA TIPO CICLON. MALLA GALVANIZADA RECUBRIMIENTO EN PVC HUECO 2" X 2" CAL. 10 POSTES DE LÍNEA TUBERÍA GALVANIZADA 2" Y PIÉ DE AMIGO EN ANGULO GALVANIZADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	10,47	$ 137.281,00	$ 1.437.332,00
5.00	**PAÑETE**				
5,01	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	57.00	$ 38.830,00	$ 2.213.310,00
5,02	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	7.00	$ 27.728,00	$ 194.096,00
6.00	**PINTURA**				
6,01	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	178,40	$ 14.860,00	$ 2.651.024,00
6,02	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	359,44	$ 12.387,00	$ 4.452.383,00
6,03	IMPERMEABILIZACION FACHADAS, MUROS MASTERSEAL 485	M2	178,40	$ 34.765,00	$ 6.202.076,00
6,04	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2	178,40	$ 36.532,00	$ 6.517.309,00
8	**OBRAS EN CUBIERTA**				
8,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TIPO SANDWICH 250C CAL. 26 PREPINTADA.INCLUYE ICOPOR O MATERIAL SIMILAR. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	100,00	$ 232.292,00	$ 23.229.200,00
9	**CARPINTERIA METALICA**				
9,03	VALVULA DE CORTE 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 128.271,00	$ 256.542,00
				COSTOS DIRECTOS	**$ 62.393.158,00**

ADMINISTRACION (A) %	$	17.470.084,24
IMPREVISTOS (I) %	$	1.247.863,16
UTILIDAD (U) %	$	3.119.657,90
COSTOS INDIRECTOS	$	21.837.605,30
VALOR TOTAL	**$**	**84.230.763,00**

Tabla 9 Presupuesto contractual.

- Se ha verificado un avance acumulado **financiero del 26.06%** en diversas actividades acumuladas, contempladas en el proyecto, correspondiente a la fase de obra civil, la cual forma parte integral de los ítems contratados.


2. TOTAL, EJECUTADO PROGRAMADO VS EJECUTADO.

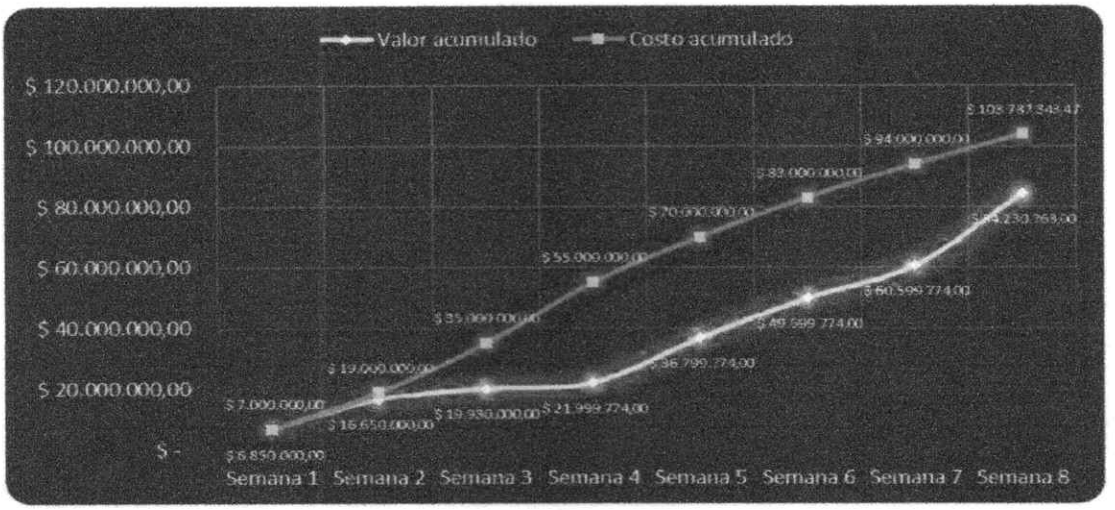


Semana	Costo	Costo acumulado	% Programado	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor ejecutado	Valor acumulado	% Ejecutado
Semana 1	$ 7.000.000,00	$ 7.000.000,00	2,17%	04/05/2026	10/05/2026	$ 6.850.000,00	$ 6.850.000,00	2,12%
Semana 2	$ 12.000.000,00	$ 19.000.000,00	5,88%	11/05/2026	17/05/2026	$ 9.800.000,00	$ 16.650.000,00	5,15%
Semana 3	$ 16.000.000,00	$ 35.000.000,00	10,83%	18/05/2026	24/05/2026	$ 3.280.000,00	$ 19.930.000,00	6,17%
Semana 4	$ 20.000.000,00	$ 55.000.000,00	17,02%	25/05/2026	31/05/2026	$ 2.069.774,00	$ 21.999.774,00	6,81%
Semana 5	$ 15.000.000,00	$ 70.000.000,00	21,66%	01/06/2026	07/06/2026	$ 14.800.000,00	$ 36.799.774,00	11,38%
Semana 6	$ 13.000.000,00	$ 83.000.000,00	25,68%	08/06/2026	14/06/2026	$ 12.900.000,00	$ 49.699.774,00	15,38%
Semana 7	$ 11.000.000,00	$ 94.000.000,00	29,08%	15/06/2026	21/06/2026	$ 10.900.000,00	$ 60.599.774,00	18,75%
Semana 8	$ 9.787.343,47	$ 103.787.343,47	32,11%	22/06/2026	30/06/2026	$ 23.630.989,00	$ 84.230.763,00	26,06%

3. ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA	% DE AVANCE EN EL PERIODO	% DE AVANCE ACUMULADO
1.01	CORTE VERTICAL EN MAMPOSTERIA CON CORTADORA E = 1 CM	ML	11,56	11,56	11,56	100%	100%

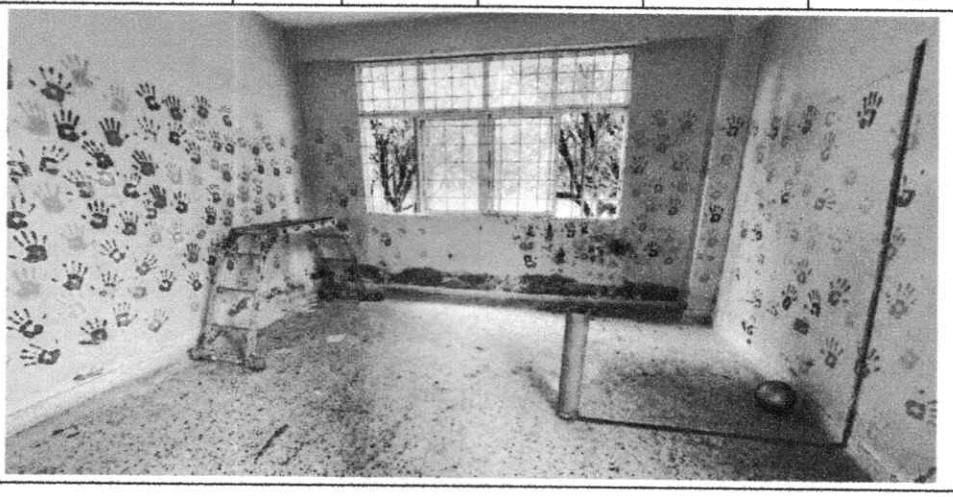



ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA	% DE AVANCE EN EL PERIODO	% DE AVANCE ACUMULADO
1.02	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	2.00	2.00	2.00	100%	100%

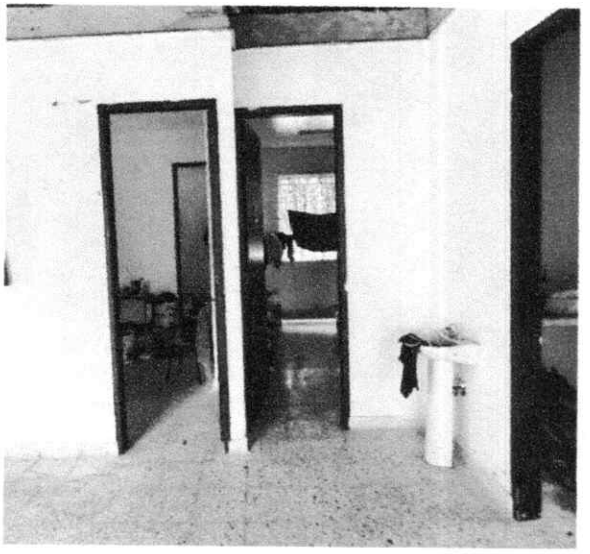



ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA	% DE AVANCE EN EL PERIODO	% DE AVANCE ACUMULADO
1.04	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	222.95	222.95	222.95	100%	100%

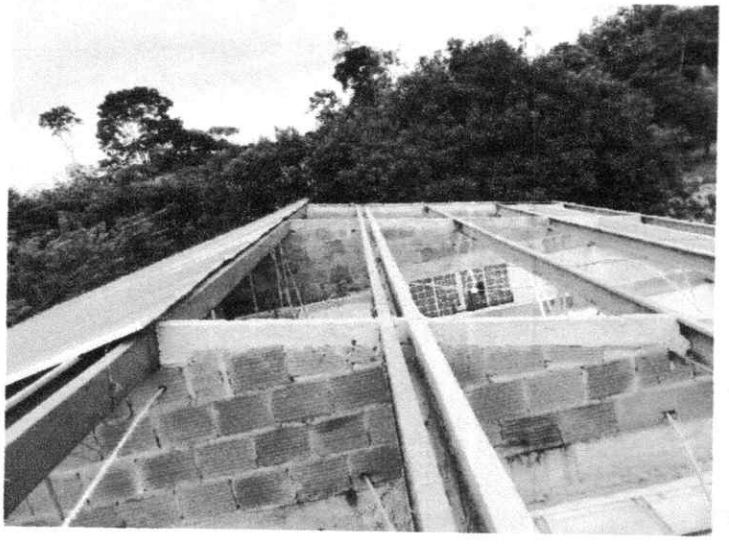


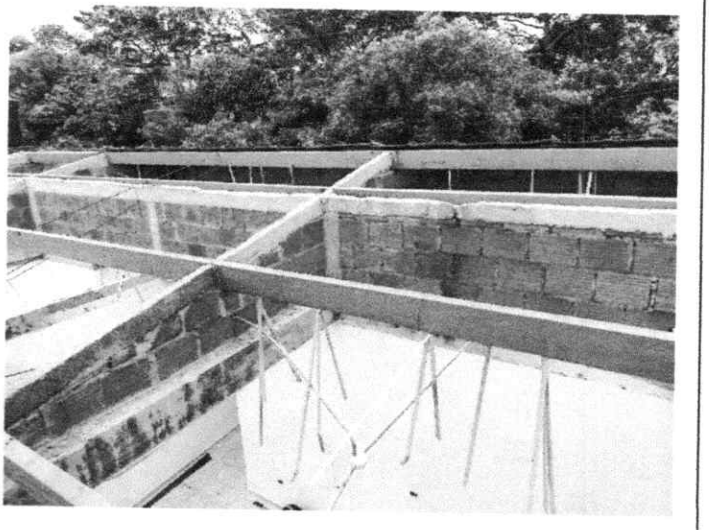


ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA	% DE AVANCE EN EL PERIODO	% DE AVANCE ACUMULADO
2.03	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3/KM	464.40	464.40	464.40	100%	100%




ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA	% DE AVANCE EN EL PERIODO	% DE AVANCE ACUMULADO
3.04	PLASTICO POLIETILENO CALIBRE 6	M2	2.84	2.84	2.84	100%	100%

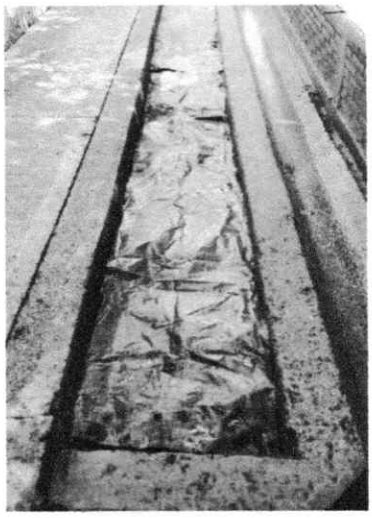


ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA	% DE AVANCE EN EL PERIODO	% DE AVANCE ACUMULADO
4.02	CERRAMIENTO PARA ESCENARIO DEPORTIVO EN MALLA ESLABONADA TIPO CICLON. MALLA GALVANIZADA RECUBRIMIENTO EN PVC HUECO 2" X 2" CAL. 10 POSTES DE LÍNEA TUBERÍA GALVANIZADA 2" Y PIÉ DE AMIGO EN ANGULO GALVANIZADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	10.47	10.47	10.47	100%	100%

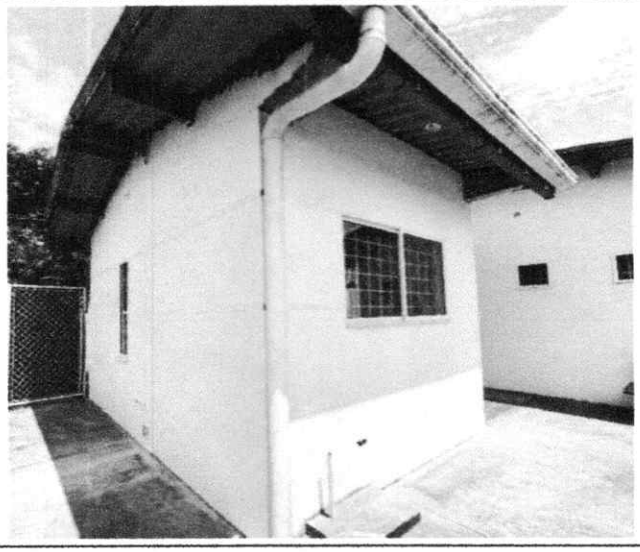

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA	% DE AVANCE EN EL PERIODO	% DE AVANCE ACUMULADO
5.02	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	359.44	7.00	7.00	1.95%	1.95%

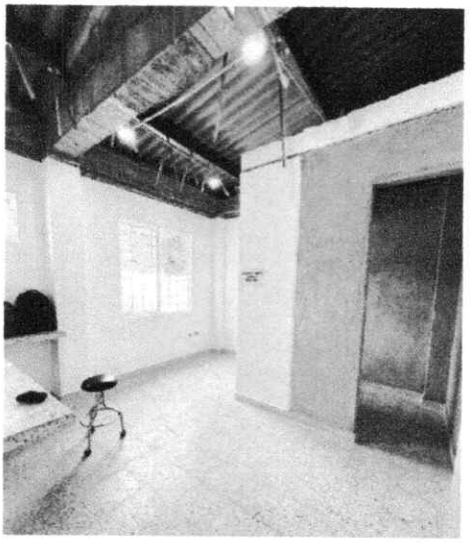


ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA	% DE AVANCE EN EL PERIODO	% DE AVANCE ACUMULADO
6.01	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	178.40	178.40	178.40	100%	100%

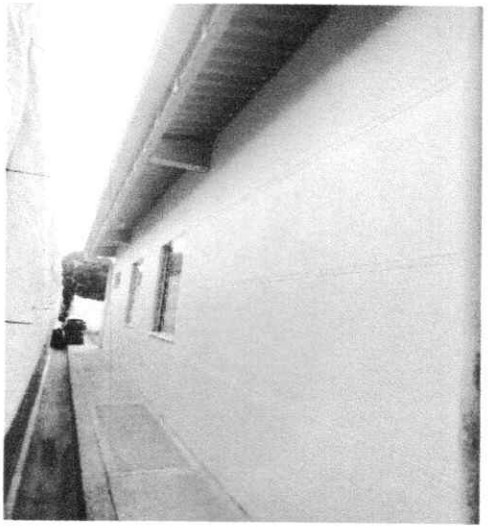

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA	% DE AVANCE EN EL PERIODO	% DE AVANCE ACUMULADO
6.02	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	359.44	359.44	359.44	100%	100%



ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA	% DE AVANCE EN EL PERIODO	% DE AVANCE ACUMULADO
8.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TIPO SANDWICH 250C CAL. 26 PREPINTADA.INCLUYE ICOPOR O MATERIAL SIMILAR. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	100.00	100.00	100.00	100%	100%

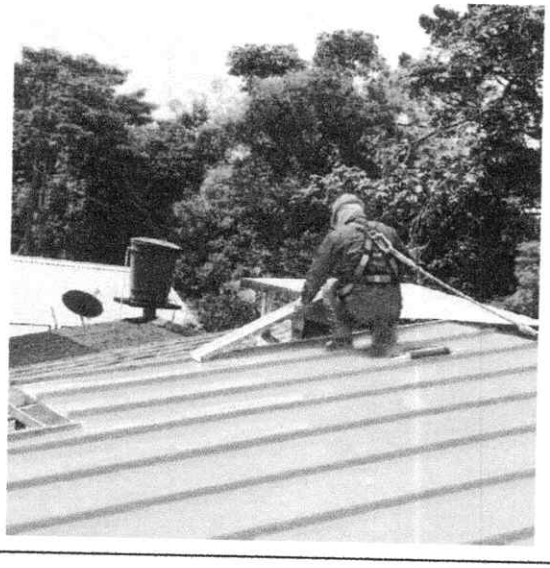



ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA	% DE AVANCE EN EL PERIODO	% DE AVANCE ACUMULADO
9.03	VALVULA DE CORTE 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2.00	2.00	2.00	100%	100%



11. CONCLUSIONES

Con base en el seguimiento realizado durante el periodo del 01 al 30 de junio de 2026 a la obra de adecuación menor del Centro de Salud Montelíbano, en el municipio de Acacías, Meta, se pueden establecer las siguientes conclusiones generales:

El proyecto avanzó de manera integral y ordenada, cumpliendo con la secuencia lógica constructiva, iniciando con las labores preliminares de desmonte y demolición y continuando con las actividades de cimentación, estructuras metálicas, acabados en pañete y pintura, cubierta y elementos hidrosanitarios, sin evidenciarse traslapos ni reprocesos que afectaran el desarrollo normal de la obra.

Se verificó que las actividades de desmonte y demolición resultaron determinantes para el avance general del proyecto, ya que de su correcta y oportuna ejecución dependió el inicio de los demás frentes de trabajo, en particular la intervención de cubierta y de acabados.

Asimismo, se evidenció que los capítulos de mayor incidencia económica en el periodo fueron las obras en cubierta y los sistemas de pintura e impermeabilización de fachada, en concordancia con el alcance de la adecuación menor.

En términos generales, la obra se desarrolló conforme a las condiciones contractuales pactadas, ejecutando la totalidad de las cantidades y actividades previstas en el presupuesto para el periodo reportado, por un valor total de $84.230.763,00, sin observarse desviaciones significativas respecto a lo programado.

En el presente informe de avance de interventoría se relaciona el siguiente cuadro de condiciones generales a corte del 30 de junio de 2026.

CONDICIONES ACTUALIZADAS	
VALOR CONDICIONES CONTRATADAS	$ 323.230.572.00
VALOR AVANCE A 30 DE JUNIO	$ 84.230.763,00
PORCENTAJE PRESENTE	26.06%
VALOR POR EJECUTAR	$ 238.999.809,00
PORCENTAJE POR EJECUTAR	73.94%

JOSE LUIS CERON CERON
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

INFORME MENSUAL SST DE INTERVENTORÍA N.º002



INFORME MENSUAL SST DE INTERVENTORÍA N.º 002

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 334 DE 2026

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORIA INTEGRAL, (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA) AL CONTRATO DE OBRA DE ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD MONTELIBANO DE ACACÍAS, META

CONTRATISTA DE OBRA
INTERCONS DE COLOMBIA S.A.S

INTERVENTORÍA
EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S

ENTIDAD CONTRATANTE
HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACÍAS E.S.E.

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:
01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 4

2. GENERALIDADES 4

2.1. FINALIDAD DEL PROYECTO 4

2.2. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA. 5

2.3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 6

2.4. ALCANCE del proyecto 7

2.5. OBJETIVO DEL SG-SST 7

2.6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 7

2.7. LOCALIZACIÓN 8

2.8. CONTROL DEL PERSONAL Y PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 9

2.9. INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS 10

3. CONTROL DE SEGUIMIENTO TECNICO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DE INTERVENTORÍA. 10

4. ASPECTOS LEGALES, TECNICOS, HSEQ Y AMBIENTAL 10

4.1. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 10

4.2. ACCIDENTES LABORALES Y AUSENTISMO 11

4.3. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES 11

4.4. INGRESO DE NUEVO PERSONAL 11

4.5. RETIRO DEL PERSONAL 12

4.6. CONCLUSIONES 12

1. INTRODUCCIÓN

EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S. y como representante legal **LINA LORENA SALGADO GARCIA**, se encuentra ejecutando el CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 334 DE 2026 que tiene como objeto: **"INTERVENTORIA INTEGRAL, (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA) AL CONTRATO DE OBRA DE ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD MONTELIBANO DE ACACÍAS, META"**

El presente informe está comprendido en el periodo del 01 de junio al 30 de junio del 2026, sujeto exclusivamente al desarrollo de las actividades de **SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** donde su objetivo principal es el de ejercer el control, seguimiento y vigilancia sobre el desarrollo del proyecto mencionado para asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y obligaciones especiales a lo establecido en la ley 1562 de 2012, 1072 de julio de 2015, resolución 0312 de 2019 y la normatividad vigente en todo lo que se comprometen.

2. GENERALIDADES

2.1. FINALIDAD DEL PROYECTO

La finalidad del **CONTRATO INTERVENTORIA INTEGRAL, (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA) AL CONTRATO DE OBRA DE ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD MONTELIBANO DE ACACÍAS, META** es cumplir con las obligaciones pactadas en el Contrato. Además, de acuerdo con el proceso del contrato o parcial de las obligaciones nacidas de su cumplimiento defectuoso por parte del contratista, es poder conminarlo cuando éste suministre un bien o servicio de mala calidad no atendiendo las condiciones pactadas en el contrato.

2.2. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA.

ENTIDAD CONTRATANTE:	HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E NIT. 800.037.021.7
OBJETO DEL CONTRATO:	"OBRA DE ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD MONTELIBANO DE ACACIAS, META".
CONTRATO NO:	324 DE 2026
FECHA	16 DE ABRIL DE 2026
CONTRATISTA DE LA OBRA:	INTERCONS DE COLOMBIA SAS NIT: 900.849.552-3
REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN CAMILO POSADA VARELA CC. Nº 1.094.921.302 de Armenia
VALOR DEL CONTRATO:	TRESCIENTOS VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($ 323.330.566,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA
VALOR DEL ANTICIPO:	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	CUATRO (4) MESES
FECHA DE INICIO:	04 DE MAYO DE 2026
FECHA DE FINALIZACION	03 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Tabla 1 Información del contratista.

2.3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

CONTRATO:	334 DEL 29 DE ABRIL DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	**INTERVENTORIA INTEGRAL, (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA) AL CONTRATO DE OBRA DE ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO MONTELIBANO DE ACACIAS, META.**
CONTRATISTA	**EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA DE COLOMBIA SAS** NIT: 901.629.216-3
REPRESENTANTE LEGAL	**LINA LORENA SALGADO GARCIA** CC. 1.122.647.270 de Restrepo.
SUPERVISOR	**HUGO FERNANDO ROJAS OSPINA**
VALOR DEL CONTRATO	DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ($16.665.289,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA
PLAZO	CUATRO (4) MESES
FECHA DE INICIO	04 DE MAYO DE 2026
FECHA DE FINALIZACION	03 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Tabla 2 Información del contrato Interventoría

2.4. ALCANCE DEL PROYECTO

De acuerdo al presupuesto oficial del Contrato N°334 de 2026 se prevé desarrollar la **"INTERVENTORIA INTEGRAL, (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA) AL CONTRATO DE OBRA DE ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD MONTELIBANO DE ACACÍAS, META"** por un valor del contrato de **DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ($16.665.289) MONEDA CORRIENTE. INCLUIDO IVA**, con el fin de realizar el seguimiento y control integral a la ejecución del Contrato de Obra No. 324 de 2026, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, administrativas, financieras, jurídicas y de Seguridad y Salud en el Trabajo establecidas por la en tidad contratante.

2.5. OBJETIVO DEL SG-SST

Evidenciar la gestión del Contratista INTERCONS DE COLOMBIA con referencia al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo – SG-SST y de los protocolos de Higiene industrial.

2.6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Hacer seguimiento periódico a las áreas de trabajo verificando la ejecución de las diferentes medidas de control, realizadas por el contratista.
- Inspeccionar la ejecución del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y supervisarlo, con el fin de coordinar el seguimiento de las actividades ejecutadas por el contratista de Obra.
- Verificar el cumplimiento de la legislación en materia de seguridad y salud en el trabajo (SST). La calidad de vida, salud física y mental del trabajador y el desarrollo de sus capacidades y desempeño.

2.7. LOCALIZACIÓN

El municipio de Acacías se encuentra localizado en el departamento del Meta, en la región centro-suroriental del mismo. En una zona de transición entre piedemonte llanero y llanura aluvial. Geográficamente, se ubica en las coordenadas 3°59′20″ de latitud norte y 73°45′53″ de longitud oeste, con una altitud promedio de 498 metros sobre el nivel del mar. Limita al norte con Villavicencio, al sur con San Martín, al oriente con Castilla La Nueva y al occidente con El Calvario. Su acceso principal se realiza por la vía nacional que conecta Villavicencio con los municipios del sur del Meta.

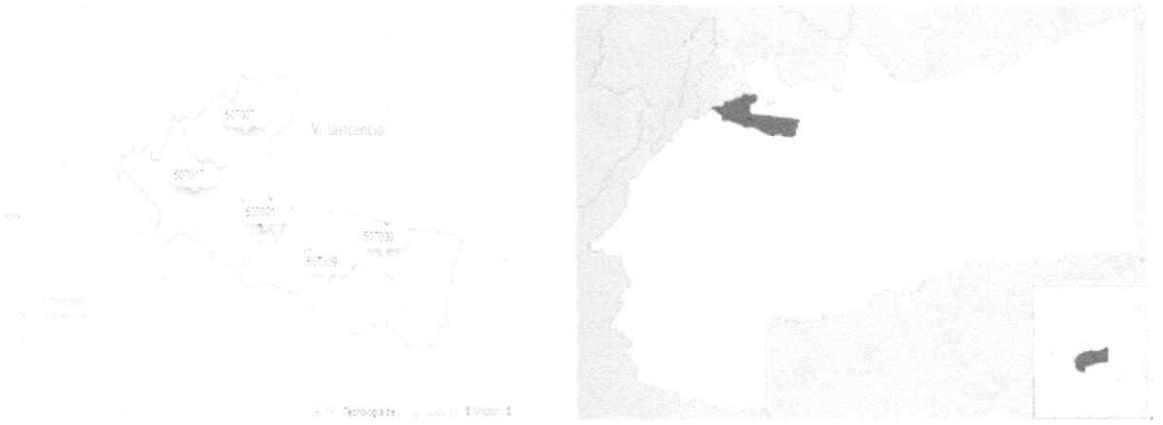


Ilustración 1. Localización Geográfica del Departamento del Meta y Municipio de Acacías

Límites del municipio

Norte: Villavicencio

Oriente: Castilla La Nueva

Occidente: El Calvario

Sur: San Martin



Ilustración 2 Ubicación Proyecto, Puesto de Montelíbano.

2.8. CONTROL DEL PERSONAL Y PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

La Interventoría verificó las afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral del personal vinculado al proyecto, conforme a los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones, la Ley 100 de 1993 y demás normatividad aplicable, para el Contrato de Obra No. 324 de 2026.

Durante el periodo evaluado, se realizó el cambio del profesional Residente de Obra, debido a la renuncia presentada por el ingeniero Juan Camilo Posada Varela, quien se desempeñaba en dicho cargo. En su reemplazo fue designado el arquitecto William Andrés Oviedo Arias, previa revisión y aprobación por parte de la Interventoría, verificando el cumplimiento de los requisitos técnicos, académicos y de experiencia exigidos en los términos de referencia del contrato. Con este cambio se garantizó la continuidad técnica, administrativa y de Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución del proyecto.

PERSONAL DEL CONTRATISTA OBRA

N°.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	N° PLANILLA
1	JUAN CAMILO POSADA VARELA	1.094.921.302	DIRECTOR DE OBRA	
2	WILLIAM ANDRÉS OVIEDO ARIAS	4.617.487	RESIDENTE DE OBRA	

Tabla Personal Administrativo

PERSONAL OPERATIVO.

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	N° PLANILLA
1	JOSE ALEJANDRO MOSQUERA POSADA	1.113.791.483	AYUDANTE	
2	DIEGO FERNANDO VERGARA BARBOSA	16550585	OFICIAL DE OBRA	
3	JAISSON PAEZ MARQUEZ	86071378	AYUDANTE	

Tabla Personal Operativo

De igual manera, durante el periodo comprendido entre el 01 de junio y el 30 de junio de 2026, el contratista **INTERCONS DE COLOMBIA S.A.S.**, en el marco del Contrato de Obra No. 324 de 2026, dio cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y Seguridad Industrial, garantizando la afiliación del personal al Sistema General de Seguridad Social Integral y manteniendo el personal requerido para la adecuada ejecución del contrato. Asimismo, el cambio del Residente de Obra se realizó de conformidad con el procedimiento establecido y con la aprobación de la Interventoría, sin afectar la continuidad de las actividades del proyecto.

2.9. INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS

El contratista cuenta con domicilio de oficina como espacio independiente en la urbanización prados de mavicure manzana h9 bifamiliar 5c Villavicencio-meta, para darle recepción de documentos laborales y trámites pertinentes al contrato.

La Interventoría cuenta con oficina en la Calle 7b # 46 - 43 etapa 4, B/ La Esperanza, lugares en el que se permiten la recepción de documentos y trámites pertinentes al contrato.

3. CONTROL DE SEGUIMIENTO TECNICO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DE INTERVENTORÍA.

se evidencia las actividades que se entregaron ante la supervisión en el periodo comprendido del 01 de junio 2026 al 30 junio 2026, la documentación al día del personal y verificación de certificados de afiliaciones.

4. ASPECTOS LEGALES, TECNICOS, HSEQ Y AMBIENTAL

4.1. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Para el período comprendido en el presente informe, se realizó el pago de las obligaciones correspondientes al Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales del personal que se encuentra laborando para la Contratista INTERCONS DE COLOMBIA S.A.S., en ejecución del Contrato de Obra No. 324 de 2026, dando cumplimiento a las obligaciones contractuales y a lo establecido en la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demás normas aplicables.

De igual manera, la Interventoría dio cumplimiento al pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social correspondientes al personal vinculado al Contrato de Interventoría No. 334 de 2026.

N°.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	N° PLANILLA
1	JOSE LUIS CERON CERON	1.121.833.673	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	9507598048

Tabla Personal Interventoría.

4.2. ACCIDENTES LABORALES Y AUSENTISMO

N°	CARGO Y EVENTO	FECHA	TRABAJADOR	INVESTIGADO	MEDIDAS DE INTERVENCION	INCAPACIDAD
0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

NOTA: Durante el período del mes de junio del presente año, no se presentaron eventos de accidentalidad, contratista demuestra estadística de accidentes en obra, permitiendo demostrar un índice de frecuencia

4.3. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES

El contratista de obra, manifiesta y hace entrega de evidencia de charlas y capacitaciones SST, al personal, preoperacionales a las herramientas eléctricas; como compromiso diario permitiendo dar un cumplimiento de intensidad al desarrollo, dentro del informe SST del contratista **INTERCONS COLOMBIA S.A.S**., se evidencia listados de asistencia de los trabajadores.

El contratista realiza entrega de los EPP, permitiéndose dar cumplimiento a las exigencias y obligaciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Se da cumplimiento al desarrollo de impartir el formato de Análisis de Trabajo Seguro (ATS) a los trabajadores que realizan actividades, documentos que se encuentran anexos en el informe SST del contratista.

4.4. INGRESO DE NUEVO PERSONAL

En este periodo no hubo ingreso de personal nuevo.

4.5. RETIRO DEL PERSONAL

En este periodo si se presentó retiro de personal. El contratista presenta reporte de Cero Accidentes en el período del 01 de junio al 30 de junio 2026, emitido por la ARL.

4.6. CONCLUSIONES


Durante el período comprendido entre el 01 de junio y el 30 de junio de 2026, correspondiente al inicio de ejecución del Contrato de Obra No. 324 de 2026 y del Contrato de Interventoría No. 334 de 2026, se realizó el seguimiento y verificación de los aspectos relacionados con Seguridad y Salud en el Trabajo, evidenciando el cumplimiento de los requisitos exigidos para el desarrollo de las actividades contractuales.



La Interventoría verificó la documentación del personal vinculado al proyecto, incluyendo afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social, exámenes de ingreso, inducciones, capacitaciones y entrega de elementos de protección personal (EPP), constatando el cumplimiento de los lineamientos establecidos por la normatividad vigente en materia de SST.

Durante el período evaluado no se presentaron accidentes de trabajo, incapacidades ni retiros de personal. Asimismo, se evidenció la implementación de actividades de inspección, seguimiento y control por parte del contratista, orientadas a garantizar condiciones seguras para la ejecución de las labores.

En conclusión, se observa cumplimiento de las obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte del contratista, permitiendo el adecuado inicio del proyecto y contribuyendo al desarrollo seguro de las actividades ejecutadas durante el período reportado.

5. EVIDENCIA FOTOGRAFICA JUNIO:

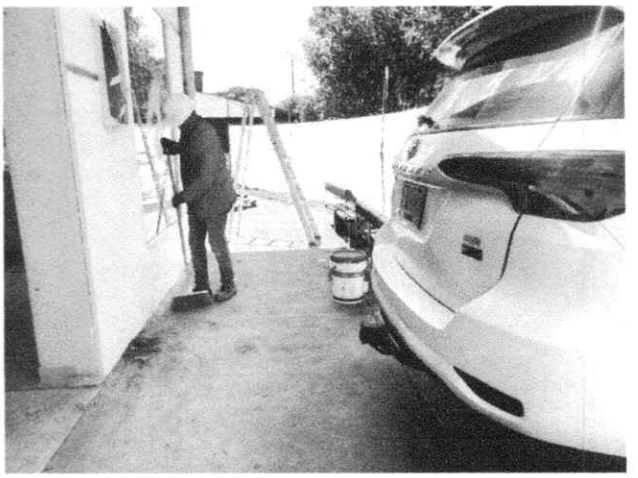EVIDENCIA FOTOGRAFICA	
	
FOTOGRAFIA 1. INSPECCION HERRAMIENTAS DE OBRA	FOTOGRAFIA 2. ORDEN Y ASEO
	

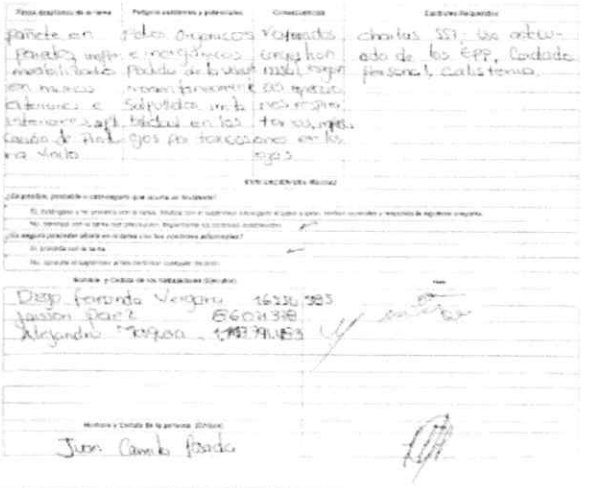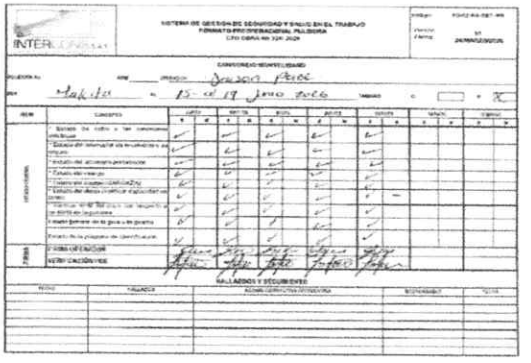FOTOGRAFIA 3. SEÑALIZACION	FOTOGRAFIA 4. ACOMPAÑAMIENTO DE CHARLAS
	
FOTOGRAFIA 5. FORMATO ATS	FOTOGRAFIA 6. FORMATO ATS
	
FOTOGRAFIA 7. ASISTENCIA CHARLAS	FOTOGRAFIA 8. PREOPERACIONAL

FIRMA: _____

JOSE LUIS CERON CERON
PROFESIONAL EN SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901629216	3	EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LINA LORENA SALGADOGARCIA	CALLE 7 B N 46 43	VILLAVICENCIO-META	3015559657	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-06	2026-07	505399750	9507598048	E	2026/07/06	2026/07/23	BANCOLOMBIA	17	$657,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: MONTE LIBANO (1 Afiliados)						$2,096,714	$335,500			$2,096,714	$83,900			$2,096,714	$83,900			$2,096,714	$146,000		$0	$0
Centro de Trabajo: MONTELIBANO HOSPITAL (1 Afiliados)						$2,096,714	$335,500			$2,096,714	$83,900			$2,096,714	$83,900			$2,096,714	$146,000		$0	$0
Ciudad: ACACIAS Depto: META (1 Afiliados)						$2,096,714	$335,500			$2,096,714	$83,900			$2,096,714	$83,900			$2,096,714	$146,000		$0	$0
1	CC	1121833673	CERON JOSE	230301	30	$2,096,714	$335,500	EPS002	30	$2,096,714	$83,900	CCF34	30	$2,096,714	$83,900	14-23	30	$2,096,714	$146,000	30	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			$2,096,714	$335,500			$2,096,714	$83,900			$2,096,714	$83,900			$2,096,714	$146,000		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$335,500	$4,200	$0	$339,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$335,500	$4,200	$0	$339,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$146,000	$1,900	$0	$147,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$146,000	$1,900	$0	$147,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$83,900	$1,100	$0	$85,000
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$83,900	$1,100	$0	$85,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$83,900	$1,100	$0	$85,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$83,900	$1,100	$0	$85,000
TOTAL				1	$649,300	$8,300	$0	$657,600
